

**EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 202400001030 DEL 20 DE
NOVIEMBRE DE 2024**

CERTIFICA QUE:

La firma contratista MULTICONSTRUCCIONES E INGENIERIA ZOMAC S.A.S., identificada con NIT 901.359.219-6 y representada por ESTHER ALEJANDRA ORTEGA CARDENAS, portador de la cédula de ciudadanía No. 1.030.706.894 de Bogotá D.C., ha cumplido satisfactoriamente con todas las obligaciones contractuales derivadas del contrato No. 202400001030, fechado el 20 de noviembre de 2024. El objeto de dicho contrato es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBEJTO CONSTRUCCIÓN DE REDES MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON SUBESTACIONES EN POSTE EN ZONA RURAL VEREDA ROSARIO, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ".

El contratista ha presentado la documentación correspondiente para el pago, evidenciando una ejecución por parte del contratista de obra del 89.78% y cumpliendo cabalmente con cada uno de los ítems establecidos en el contrato. Por lo tanto, se aprueba el pago por un porcentaje del 78,22%, conforme a lo estipulado en la cláusula OCTAVA: **FORMA DE PAGO** del contrato.

Se ha verificado y por tanto se certifica que el contratista ha cumplido con todas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato de interventoría No. 202400001030. En virtud de lo anterior, se autoriza el pago a la interventoría por un valor de SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS (\$75.122.956,00), que corresponde al 78,22%, de acuerdo con el informe parcial de supervisión para pago.

Además, se deja constancia y verificado que la interventoría ha cumplido con el pago de la seguridad social y que todas las actividades acordadas en el contrato fueron ejecutadas en su totalidad, satisfaciendo así el contrato de interventoría No. 202400001030.

La interventoría presentó el acta de recibo parcial de actividades en formatos físico y magnético, que incluye registros fotográficos e informes, los cuales están debidamente archivados en el expediente físico bajo custodia de la Secretaría de Infraestructura Departamental. Por lo anterior, se avala el pago de acuerdo con lo establecido en el contrato de interventoría No. 202400001030, fechado el 20 de noviembre de 2024.

Dado en Florencia, Caquetá, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre del año 2024.


HERLEY SUAREZ CUELLAR
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA – PDA
C.C. N° 17.656.668 de Florencia
Supervisor del contrato No. 202400001030

Proyectó y Elaboró: Luis Antonio Vesga Rueda
Profesional Contratista



		Manual de Contratación de la Gobernación del Caquetá - Versión 2023	
Proceso: Gestión Contractual		Código: FCT-071	
Informe Parcial No. 1 de Supervisión para Pago		Versión: 2	
		Vigente Desde: 15/09/2024	

Florencia, 18 diciembre de 2024

No. del Proceso en el SECOP	DC-IN-CMA-003-2024			Fecha	De	20 de Noviembre de 2024
Contrato No.	202400001030			Suscripción		
Tipo de Persona	PERSONA JURIDICA					
Clase de Contrato:	CONSULTORIA (INTERVENTORIA)					
Contratista:	MULTICONSTRUCCIONES INGENIERIA ZOMAC S.A.S	E	Identificación	901.359.219.6		
Objeto:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON SUBESTACIONES EN POSTE EN ZONA RURAL VEREDA ROSARIO, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ					
CONDICIONES INICIALES						
Valor Inicial Contrato:	CIENTO DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS (\$ 116.675.849).					
Adición 1 del Contrato	N/A					
Valor Total	CIENTO DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS (\$ 116.675.849).					
No. de CDP.	2024081559	Fecha de Expedición	14 de Agosto de 2024	Valor	\$ 116.675.849	
No. de RP	2024114750	Fecha de Expedición	20 de Agosto de 2024	Valor	\$ 116.675.849	
Plazo de Ejecución:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024					
Prorroga 1	N/A					
Suspension	N/A					
Nombre del Supervisor o Interventor	HERLEY SUÁREZ CUÉLLAR Secretario de Infraestructura-PDA					
Fecha de Inicio:	29 DE NOVIEMBRE 2024					
Fecha de Terminación Inicial:	31 DE DICIEMBRE DE 2024					

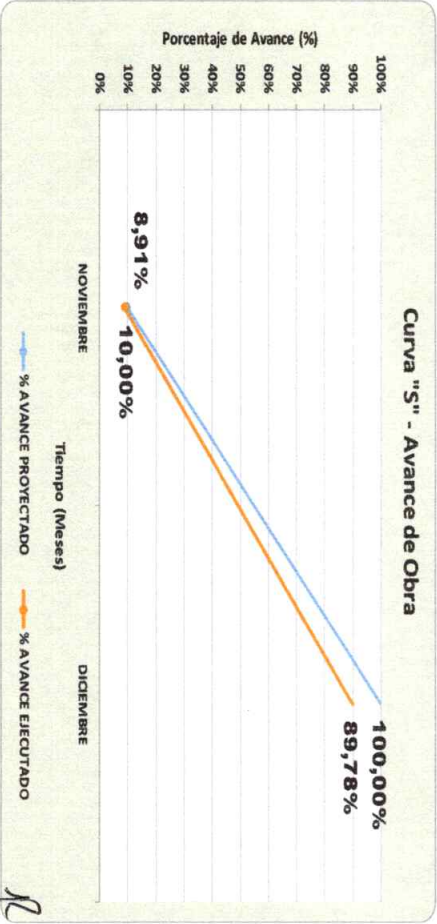



	
Manual de Contratación de la Gobernación del Caquetá - Versión 2023	
Proceso: Gestión Contractual	Código: FCT-071
INFORME PARCIAL No. 1 DE SUPERVISION PARA PAGO	Versión: 2
VIGENTE DESDE: 15/09/2024	

GARANTÍA			
FECHA DE APROBACIÓN	29/11/2024		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	CHU-100034689	FECHA DE EXPEDICIÓN	20/11/2024
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
Cumplimiento del Contrato	\$23.3353169,60	20/11/2024 hasta 30/06/2025	
Pagos de salarios, prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales	\$5.833.792,45	20/11/2024 hasta 31/12/2027	
Calidad del Servicio	\$11.667.584,90	31/12/2024 hasta 31/12/2029	

1. **DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO:** en mi calidad de SUPERVISOR me permito realizar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al informe del periodo del 29/11/2024 al 16/12/2024 de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación.

La siguiente es la representación del avance de obra proyectado Vs el avance real ejecutado, que corresponden a un porcentaje del 89.78%, tal como se observa en la siguiente curva S:



Manual de Contratación de la Gobernación del Caquetá - Versión 2023			
 GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ	Proceso: Gestión Contractual		Código: FCT-071
	INFORME PARCIAL No. 1 DE SUPERVISION PARA PAGO		Versión: 2
	VIGENTE DESDE: 15/09/2024		

En cumplimiento del objeto del contrato me permito certificar que el contratista cumplió con las siguientes obligaciones pactadas:
Durante el periodo de ejecución se realizaron las siguientes actividades contractuales, que se resumen a continuación:

- Se realizó un recorrido en compañía del contratista interventor, donde se verificó la construcción de las líneas de media y baja tensión, así como el montaje de los transformadores de cada núcleo. Se evidenció que la red de media y baja tensión no presenta acercamiento a tierra, el aplomado de la portería de media y baja tensión es correcto, las retenidas de media y baja tensión se encuentran bien ubicadas, los sistemas de puesta a tierra en baja tensión de las estructuras terminales se encuentran ejecutados, e igualmente los sistemas de puesta a tierra de las diferentes subestaciones de distribución tipo poste. Estos equipos se encuentran instalados con todas sus protecciones. Con lo cual se pudo establecer que la obra está construida según el avance reportado y la interventoría cumplió con las actividades propias de su rol.
- Se realizaron los tramites pertinentes para que las garantías se mantuvieran vigentes dentro de los plazos contemplados de acuerdo al acta de inicio.
- Se aprobó Acta de menores y mayores cantidades y de ítems nuevos no previstos,

Entre las actividades generales realizadas por el Contratista de interventoría, se relacionan a continuación:

- Cumplió con el objeto del Contrato en los términos pactados y las obras que se entregan se encuentran asociada al avance de obra, cumplen con las características técnicas, de calidad y demás condiciones establecidas, de acuerdo al acta parcial e informe asociado con el periodo del 29/11/2024 al 16/12/2024.
- Se aprobó el acta de menores y mayores cantidades
- Realizó las gestiones pertinentes para que las garantías exigidas se mantuvieran vigentes dentro de los plazos exigidos por el contrato.
- Cumplió con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), para lo cual presenta las respectivas planillas pagadas de seguridad social.
- Realizó entrega de los informes realizados por el contratista de obra, anexando fotografías que se generaron en el transcurso de la ejecución del contrato.
- Presentó un informe ejecutivo de las actividades propias de la interventoría.

[Handwritten signature]

Manual de Contratación de la Gobernación del Caquetá - Versión 2023			
 GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ	Proceso: Gestión Contractual		Código: FCT-071
	INFORME PARCIAL No. 1 DE SUPERVISION PARA PAGO		Versión: 2
			VIGENTE DESDE: 15/09/2024

Entre las actividades específicas realizadas por el Contratista de interventoría, se relacionan a continuación:

- Estableció mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría a su cargo, y sus decisiones estuvieron encaminadas a hacer que la obra avanzara adecuadamente y sin dilaciones.
- Verificó los permisos de paso y servidumbre, los cuales hacen parte del expediente.
- Organizó la información y documentos que se generaron durante la ejecución del contrato.
- Mantuvo el equilibrio financiero del contrato.
- Presentó informes sobre el estado de ejecución y avance del contrato No. 202400001014, sobre el cual se ejerció la interventoría.
- Exigió el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental al contratista de obra.
- Llevó un registro fotográfico que evidencia el paso a paso de los trabajos, su antes y después, el cual se encuentra en el expediente del contrato de obra junto a los anexos de los informes de ejecución, los cuales se encuentran en la Secretaría de Infraestructura.
- Verificó que el contratista de obra estaba al día en los pagos de pensiones, ARP, parafiscales y salud, de conformidad con lo establecido en las normas pertinentes.
- Verificó y aprobó la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el contrato, constatando la existencia de planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones y demás consideraciones técnicas que estimó necesarias.
- Certificó que el contratista de obra suministró y mantuvo el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente.
- Se realizó el replanteo de obra final en línea de Media y Baja Tensión
- Verificación de la Instalación del sistema de puesta a tierra
- Verificación Tendido de red en Media y Baja Tensión y comprobación de las distancias mínimas de seguridad

Las actividades descritas en la siguiente tabla, corresponden a la ejecución de obra, la cual fue verificada y avaladas para el respectivo pago de obra No. 1:

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS						AVANCE DE OBRA DEL 28NOV HASTA 18DIC 2024		
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON SUBESTACIONES EN POSTE ZONA RURAL VEREDA ROSARIO, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ								
ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	TOTAL	AVANCE ACUMULADO		
						AVANCE CANT,	VALOR	%
RED DE MEDIA TENSIÓN A 13 200 VOLTIOS								
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MT							
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO LINEA DE MEDIA TENSION	km	10,416	\$ 710.016,00	\$ 7.395.527,00	10,416	\$ 7.395.527,00	100,00%
2	APOYOS MT							
2.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POSTE EN CONCRETO DE 10 METROS (INCLUYE EXCAVACIÓN EN TERRENO COMÚN Y PLACA PARA MARCACION)	Un	4	\$ 2.102.973,00	\$ 8.411.892,00	4	\$ 8.411.892,00	100,00%
2.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POSTE METALICO DE 10 METROS (INCLUYE EXCAVACIÓN EN TERRENO COMÚN, ATERRIZAJE A TIERRA Y PLACA PARA MARCACION)	Un	0	\$ 2.698.652,00	\$ -	0	\$ -	0,00%
2.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POSTE POLIMERICO DE 10 METROS (INCLUYE EXCAVACIÓN EN TERRENO COMÚN Y PLACA PARA MARCACION)	Un	51	\$ 2.597.851,00	\$ 132.490.401,00	51	\$ 132.490.401,00	100,00%
3	VESTIDA / ARMADA POSTES MT							
3.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (710)	Un	16	\$ 2.481.863,00	\$ 39.709.808,00	16	\$ 39.709.808,00	100,00%

72

Manual de Contratación de la Gobernación del Caquetá - Versión 2023

Proceso: Gestión Contractual

Código: FCT-071

INFORME PARCIAL No. 1 DE SUPERVISION PARA PAGO

Versión: 2

VIGENTE DESDE: 15/09/2024

3.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (731)	Un	3	\$ 1.391.537,00	\$ 4.174.611,00	3	\$ 4.174.611,00	100,00%
3.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (501)	Un	4	\$ 130.095,00	\$ 520.380,00	4	\$ 520.380,00	100,00%
3.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (505)	Un	6	\$ 315.593,00	\$ 1.893.558,00	6	\$ 1.893.558,00	100,00%
3.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (506)	Un	6	\$ 467.200,00	\$ 2.803.200,00	6	\$ 2.803.200,00	100,00%
3.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (510)	Un	22	\$ 573.177,00	\$ 12.609.894,00	22	\$ 12.609.894,00	100,00%
3.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (512)	Un	6	\$ 1.003.377,00	\$ 6.020.262,00	6	\$ 6.020.262,00	100,00%
3.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (514)	Un	17	\$ 993.262,00	\$ 16.885.454,00	17	\$ 16.885.454,00	100,00%
3.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (515)	Un	5	\$ 1.431.842,00	\$ 7.159.210,00	5	\$ 7.159.210,00	100,00%
4	TENDIDO RED MT							
4.1	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTORES MEDIA TENSION 1/0 ACSR	km	10,416	\$ 20.435.010,00	\$ 212.851.064,00	10,416	\$ 212.851.064,00	100,00%
4.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AMORTIGUADORES TIPO STOCKBRIDGE PARA 13,2 kv	Un	96	\$ 86.591,00	\$ 8.312.736,00	96	\$ 8.312.736,00	100,00%
5	TEMPLETES MT							
5.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEMPLETES SENCILLOS (INCLUYE EXCAVACION PARA VIGUETAS EN TERRENO COMÚN)	Un	53	\$ 412.294,00	\$ 21.851.582,00	53	\$ 21.851.582,00	100,00%

Manual de Contratación de la Gobernación del Caquetá - Versión 2023

Proceso: Gestión Contractual

INFORME PARCIAL No. 1 DE SUPERVISIÓN PARA PAGO

Código: FCT-071

Versión: 2

VIGENTE DESDE: 15/09/2024

RED DE BAJA TENSIÓN A 220/120 VOLTIOS									
6	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO BT								
6.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO LINEA DE BAJA TENSION	km	7,222	\$ 818.278,00	\$ 5.909.604,00	7,222	\$ 5.909.604,00	100,00%	
7	APOYOS BT								
7.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POSTE EN CONCRETO DE 8 METROS (INCLUYE EXCAVACION EN TERRENO COMÚN)	Un	0	\$ 1.436.303,00	\$ -	0	\$ -	0,00%	
7.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POSTE METALICO DE 8 METROS (INCLUYE EXCAVACIÓN EN TERRENO COMÚN)	Un	0	\$ 1.790.473,00	\$ -	0	\$ -	0,00%	
7.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POSTE POLIMERICO DE 8 METROS (INCLUYE EXCAVACION EN TERRENO COMÚN)	Un	50	\$ 1.768.761,00	\$ 88.438.050,00	50	\$ 88.438.050,00	100,00%	
8	VESTIDA / ARMADA POSTES BT								
8.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (617)	Un	19	\$ 187.155,00	\$ 3.555.945,00	19	\$ 3.555.945,00	100,00%	
8.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (619)	Un	73	\$ 187.155,00	\$ 13.662.315,00	73	\$ 13.662.315,00	100,00%	
9	TENDIDO RED BT								
9.1	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTORES BAJA TENSION 3 x 2 ACSR	km	7,222	\$ 22.172.352,00	\$ 160.128.726,00	7,222	\$ 160.128.726,00	100,00%	
10	TEMPLETES BT								

R



Manual de Contratación de la Gobernación del Caquetá - Versión 2023

Proceso: Gestión Contractual

Código: FCT-071

Informe Parcial No. 1 de Supervisión para Pago

Versión: 2

Vigente desde: 15/09/2024

10.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEMPLETES SENCILLOS BAJA TENSION (INCLUYE EXCAVACIÓN PARA VIGUETAS EN TERRENO COMÚN)	Un	81	\$ 387.440,00	\$ 31.382.640,00	81	\$ 31.382.640,00	100,00%
11	PUESTA A TIERRA BT							
11.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ATERRIZAJE DE ESTRUCTURA TERMINAL DE BAJA TENSION CON BAJANTE DE ACERO GALVANIZADO EXTRARESISTENTE 9,5 MM Y VARILLA DE PUESTA A TIERRA ACERO GALVANIZADO 70 MICRAS 5/8 X 2,4 MTS, CON CONECTOR NORMA RETIE (INCLUYE ACCESORIOS)	Un	36	\$ 334.990,00	\$ 12.059.640,00	36	\$ 12.059.640,00	100,00%
	SUBTOTALES				\$ 315.136.920,00		\$ 315.136.920,00	100,00%
	TOTAL RED DE BAJA TENSION A 220/120 VOLTIOS				\$ 315.136.920,00		\$ 315.136.920,00	100,00%
TRANSFORMACIÓN 13200/220/120 VOLTIOS								
12	TRANSFORMADORES							
12.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 5 KVA	Un	16	\$ 5.875.355,00	\$ 94.005.680,00	2	\$ 11.750.710,00	12,50%
	SUBTOTALES				\$ 94.005.680,00		\$ 11.750.710,00	12,50%
	TOTAL TRANSFORMACIÓN 13200/220/120 VOLTIOS				\$ 94.005.680,00		\$ 11.750.710,00	12,50%
	COSTOS DIRECTOS				\$ 897.471.826,00		\$ 815.216.856,00	90,83%
	ADMINISTRACIÓN		23%	\$ 206.418.520,00			\$ 187.499.877,00	
	IMPREVISTOS		1%	\$ 8.974.718,00			\$ 8.152.169,00	
	UTILIDAD		6%	\$ 53.848.310,00			\$ 48.913.011,00	
	COSTOS INDIRECTOS				\$ 269.241.548,00		\$ 244.565.057,00	90,83%
	SUBTOTAL 1 COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS				\$ 1.166.713.374,00		\$ 1.059.781.913,00	90,83%

Manual de Contratación de la Gobernación del Caquetá - Versión 2023			
 GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	Proceso: Gestión Contractual		Código: FCT-071
	Informe Parcial No. 1 DE SUPERVISIÓN PARA PAGO		Versión: 2
	VIGENTE DESDE: 15/09/2024		


INTERVENTORÍA TÉCNICA		\$	\$	
SUBTOTAL 2 (INDIRECTOS + DIRECTOS + INTERVENTORÍA TÉCNICA)		\$ 1.166.713.374,00	\$ 1.059.781.913,00	90,83%
CERTIFICACIÓN RETIE		\$ 13.712.482,00		
SUBTOTAL 3 (SUBTOTAL 2 + RETIE)		\$ 1.180.425.856,00	\$ 1.059.781.913,00	89,78%
VALOR TOTAL SOLICITADO		\$ 1.180.425.856,00	\$ 1.059.781.913,00	89,78%
TOTAL PROYECTO		\$ 1.180.425.856,00	\$ 1.059.781.913,00	89,78%

Por lo tanto, el resumen se puede observar en la siguiente tabla:

TEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
1	TENDIDO RED DE MEDIA TENSIÓN- INSTALADO	km	10.416
2	TENDIDO RED DE BAJA TENSIÓN- INSTALADO	km	7.222
3	TRANSFORMADORES DE 5KVA-INSTALADOR	Un	3
4	APOYOS EN MEDIA TENSIÓN-INSTALADO (10m POLIMERICOS)	Un	51
5	APOYOS EN MEDIA TENSIÓN-INSTALADO (10m CONCRETO)	Un	4
6	APOYOS EN BAJA TENSIÓN-INSTALADO (8m POLIMERICOS)	Un	50

A continuación, se relaciona el registro fotográfico que sustenta el avance financiero del 89.78% 

 Manual de Contratación de la Gobernación del Caquetá - Versión 2023		Código: FCT-071	
Proceso: Gestión Contractual		Versión: 2	
INFORME PARCIAL No. 1 DE SUPERVISION PARA PAGO		VIGENTE DESDE: 15/09/2024	

Handwritten signature

Handwritten signature



Manual de Contratación de la Gobernación del Caquetá - Versión 2023



Proceso: Gestión Contractual

INFORME PARCIAL No. 1 DE SUPERVISION PARA PAGO

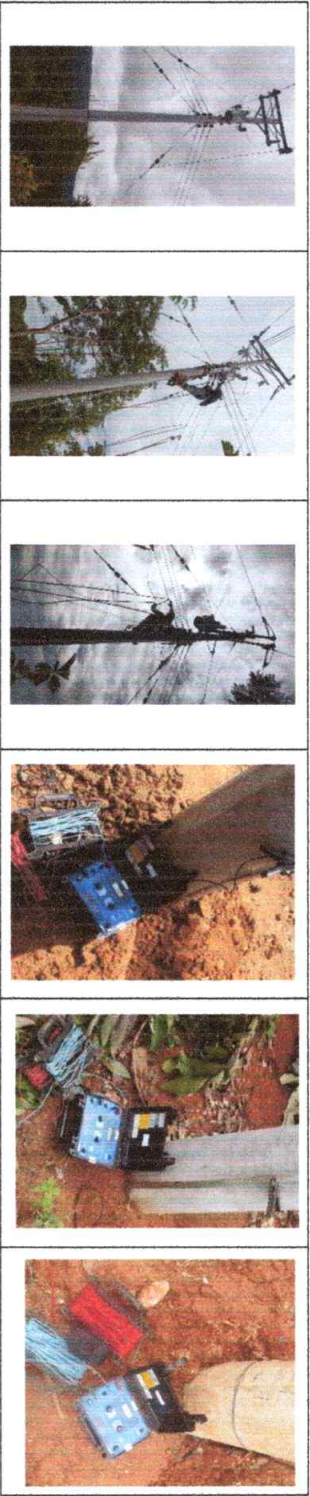
Código: FCT-071

Versión: 2

VIGENTE DESDE: 15/09/2024

		Manual de Contratación de la Gobernación del Caquetá - Versión 2023	
Proceso: Gestión Contractual INFORME PARCIAL No. 1 DE SUPERVISION PARA PAGO		Código: FCT-071	
		Versión: 2	
		VIGENTE DESDE: 15/09/2024	



2. OBSERVACIONES: n/a

3. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA DE OBRA: Sobre dicho aspecto se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al periodo de ejecución antes mencionado:

- Planilla de seguridad social mes de noviembre 9478519599 con fecha de pago el 03-12-2024

Personal relacionado para la ejecución del contrato, correspondiente al periodo del 29/11/2024 al 16/12/2024: 



Manual de Contratación de la Gobernación del Caquetá - Versión 2023

Proceso: Gestión Contractual

Código: FCT-071

INFORME PARCIAL No. 1 DE SUPERVISION PARA PAGO

Versión: 2

VIGENTE DESDE: 15/09/2024

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO				CONTRATO DE OBRA No. 20240001014	
ITEM	CANTIDAD	PERFIL	PROFESIONAL	No. DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE INGRESO
1	1	DIRECTOR DE OBRA	INGENIERO ELECTRICISTA YIBER ALEXIZ GASCA GUTIERREZ	17.688.626	26/11/2024
2	1	RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO ELECTRICISTA LEONARDO FABIO LOZANO VALENCIA	9.860.709	26/11/2024
4	1	PROFESIONAL AMBIENTAL	INGENIERO AGROECÓLOGO EDWIN ANDRES GASCA VARGAS	6.805.577	26/11/2024
5	1	TECNICO ELECTRICISTA	TECNICO TE-5 RODIN AUGUSTO GASCA NARANJO	17.689.007	26/11/2024

PERSONAL OBRA				CONTRATO DE OBRA No. 20240001014	
ITEM	CANTIDAD	PERFIL	PROFESIONAL	No. DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE INGRESO
1	1	TECNICO ELECTRICISTA	TÉCNICO ARIEL JESUS VALENCIA CEDENO	17.647.992	26/11/2024

12

 GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ			Manual de Contratación de la Gobernación del Caquetá - Versión 2023	
Proceso: Gestión Contractual INFORME PARCIAL No. 1 DE SUPERVISION PARA PAGO			Código: FCT-071	VIGENTE DESDE: 15/09/2024
			Versión: 2	

PERSONAL OBRA CONTRATO DE OBRA No. 202400001014					
ITEM	CANTIDAD	PERFIL	PROFESIONAL	No. DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE INGRESO
2	1	AYUDANTE OBRA	AYUDANTE SEBASTIAN CEPEDA PUENTES	1.118.363.086	26/11/2024
3	1	AYUDANTE OBRA	AYUDANTE JHON ANDERSON CABEZAS CORDOBA	1.117.541.984	26/11/2024
4	1	AYUDANTE OBRA	AYUDANTE JHOHAN ALREZ VALENCIA TOLOSA	1.118.365.299	26/11/2024
5	1	AYUDANTE OBRA	AYUDANTE ADIN CORREA CAMACHO	1.117.232.201	26/11/2024
6	1	AYUDANTE OBRA	AYUDANTE YON JAIRO YATE CARRANZA	12.236.999	26/11/2024

Manual de Contratación de la Gobernación del Caquetá - Versión 2023			
 GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ	Proceso: Gestión Contractual		Código: FCT-071
	INFORME PARCIAL No. 1 DE SUPERVISION PARA PAGO		Versión: 2
			VIGENTE DESDE: 15/09/2024

PERSONAL OBRA CONTRATO DE OBRA No. 202400001014						
ITEM	CANTIDAD	PERFIL	PROFESIONAL	No. DE IDENTIFICACIÓ N	FECHA DE INGRESO	
7	1	AYUDANTE OBRA	AYUDANTE EDITH ALBERTO GIL CALEÑO	1.115.953.309	26/11/2024	
8	1	TECNICO ELECTRICISTA	TÉCNICO JAROL ANDRÉS LLANOS LOZADA	1.117.534.469	26/11/2024	
9	1	AYUDANTE OBRA	AYUDANTE EDINSON DANIEL BUENDÍA CASTRO	1.020.827.185	26/11/2024	
10	1	AYUDANTE OBRA	AYUDANTE JEFFERSON GARCIA BAHAMON	1.006.417.421	26/11/2024	
11	1	AYUDANTE OBRA	AYUDANTE ARNOLD LAZO VALENCIA	1.117.545.685	26/11/2024	

Manual de Contratación de la Gobernación del Caquetá - Versión 2023			
 GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ	Proceso: Gestión Contractual		Código: FCT-071
	INFORME PARCIAL No. 1 DE SUPERVISION PARA PAGO		Versión: 2
			VIGENTE DESDE: 15/09/2024

PERSONAL OBRA CONTRATO DE OBRA No. 202400001014				
ITEM	CANTIDAD	PERFIL	PROFESIONAL	No. DE IDENTIFICACIÓ N
12	1	AYUDANTE OBRA	AYUDANTE OSCAR JULIAN MENDEZ GARCIA	1.115.944.362
				26/11/2024

4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

MES DE NOVIEMBRE

PLANILLA RESUMEN NOVIEMBRE-MULTICONSTRUCCIONES E INGENIERIA ZOMAC SAS				
No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	
1	JAIRO BARRIOS	14.237.276	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
2	YOYLAN TORRES BELTRAN	74.242.089	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
3	CARLOS ALBERTO LOPEZ	10.176.310	ING. RESIDENTE INTERVENTORIA	
4	HASBLEIDY BOBADILLA LOPEZ	40.078.714	PROFESIONAL SST	
5	SANDRA M. GARCIA CARDOSO	39.798.694	PROFESIONAL SST	
6	ERIKA DEL PILAR MURCIA CHAVARRO	1.082.157.052	INGENIERA AMBIENTAL	
7	GUSTAVO ADOLFO ARIAS PAREDES	1.117.490.460	TECNICO ELECTRICISTA	
8	GUSTAVO ARIAS MEDINA	17.634.493	TECNICO ELECTRICISTA	
9	JHON ALEXANDER ARIAS PAREDES	1.117.498.350	TECNICO ELECTRICISTA	
10	DARIO CALDERON SUAREZ	17.645.248	TECNICO ELECTRICISTA	
11	KEVIN E. TORRES CAMACHO	1.002.600.154	TECNOLOGO SUPERVISOR EN REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA	

		Manual de Contratación de la Gobernación del Caquetá - Versión 2023	
Proceso: Gestión Contractual		Código: FCT-071	
Informe Parcial No. 1 de Supervisión para Pago		Versión: 2	
		Vigente Desde: 15/09/2024	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO
12	KATHERINE GARZON LOPEZ	1.117.504.386	CONTADOR
13	MARIA CAMILA TORRES G.	1.000.596.775	SECRETARIA

Se registra las afiliaciones a seguridad social del personal mínimo y adicional del contrato de la interventoría verificado por la supervisión, según planilla No. 31721814 con fecha de pago el 29/11/2024 y la planilla No.31991451 con fecha de pago el 23/12/2024

5. **BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA.** El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	FECHA DE PAGO
PAGO ANTICIPADO.	N.A	N.A
ADICIÓN	N.A	N.A
VALOR AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	\$ 75.122.956,00	
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 41.552.893,00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 116.675.849,00	

6. **Observaciones:** N/A

ANEXOS:

- Reporte SIA-Certificado de cumplimiento a satisfacción expedido por el supervisor
- Factura Electrónica de Venta-Documento de cámara de comercio
- Cedula de representante legal- RUT
- Certificado de aportes de Seguridad Social documentos del contador-Certificación Bancaria

Manual de Contratación de la Gobernación del Caquetá - Versión 2023			
 GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ	Proceso: Gestión Contractual		Código: FCT-071
	INFORME PARCIAL No. 1 DE SUPERVISIÓN PARA PAGO		Versión: 2
	VIGENTE DESDE: 15/09/2024		

- Planillas de aportes de seguridad social pagadas-Acta de recibo parcial de obra (Contratista de obra)
- Informe del Contratista
- Planilla de interventoría

Con base en todo lo anterior y en concordancia con lo estipulado en la Clausula “NOVENA: FORMA DE PAGO. – La Entidad pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: Pagos parciales conforme al avance del contrato objeto de interventoría hasta el 80% de ejecución”, se informa que el avance de obra del contrato 202400001014, sobre el cual se desarrolla la interventoría, es del 89.78%, según el informe de avance de obra ejecutado en el periodo del 29/11/2024 al 16/12/2024 presentado por el contratista, verificado en campo y validado por medio de las actas de recibo parcial de obra, que se anexa a la presente. En virtud de la cláusula anteriormente citada, se establece, el monto a recibir de ejecución de interventoría en el presente informe parcial No-1 de supervisión para pago, por valor de SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VENTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$75.122.956,00), tal como se detalla en la siguiente tabla:

relacionan las cantidades entregadas en mi calidad de SUPERVISOR,

7. DESCRIPCIÓN DE COBRO

INFORME PARCIAL No.1 DE SUPERVISIÓN PARA PAGO			
DESCRIPCIÓN	VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES	PORCENTAJE DE AVANCE (%)	VALOR TOTAL EN LA PRESENTE ACTA Nº 1
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON SUBESTACIONES EN POSTE EN ZONA RURAL VEREDA ROSARIO, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN EL	\$ 116.675.849,00	64,39%	\$ 75.122.956,00

[Handwritten signature]

Manual de Contratación de la Gobernación del Caquetá - Versión 2023	
 GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ	Proceso: Gestión Contractual Informe Parcial No. 1 DE SUPERVISIÓN PARA PAGO
	Código: FCT-071 Versión: 2
VIGENTE DESDE: 15/09/2024	

DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
VALOR PROYECTO		\$ 116.675.849,00	
TOTAL A PAGAR			\$ 111.747.643,20

8. **CONCLUSION:** Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito SUPERVISOR certifica que el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social, con las obligaciones contractuales según lo dicho en este documento y en consecuencia autoriza el pago correspondiente por valor de SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VENTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$75.122.956,00)

Por la supervisión	Por la secretaría	Por el contratista
 HERLEY SUÁREZ CUELLAR Secretario de Infraestructura-PDA CC 17.656.668 de Florencia	 HERLEY SUÁREZ CUELLAR Secretario de Infraestructura-PDA CC 17.656.668 de Florencia	 ESTER ALEJANDRA ORTEGA CARDENAS Rep. Legal MULTICONSTRUCCIONES E INGENIERÍA ZOMAC S.A.S CC 1030.706.894 de Bogotá

CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO		
VERSION	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA DEL CAMBIO
1	Documento inicial, versión 1	15/12/23
2	Documento modificado, versión 2	15/09/24

VoBo. Luis Antonio Vesga Rueda
Apoyo a la Supervisión
Profesional Contratista

