



MONTANSafe SAS
NIT 901.809.069-1
TV 2 A 1 29 CA 75
Tel: (318) 6054283
Santa María - Colombia
montansafesas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. MM 7

Señores	MUNICIPIO DE SANTA MARIA		
NIT	800.029.386-6	Teléfono	(000) 3102710601 - Ext. 000
Dirección	CRA 3 No 3 53	Ciudad	Santa María - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/12/2024, 10:09
Expedición	16/12/2024, 10:15
Vencimiento	16/12/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Imppto. Cargo	Vr. Total
1	CONTRATO DE OBRA No MC-SP-031-2024 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y TENDIDO DE REDES PARA LA REUBICACIÓN A SITIO SEGURO DE VIVIENDA PREFABRICADA POR RIESGO MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, BOYACÁ, COMO PARTE DE GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL.		1.00	7,994,424.48	0 %	7,994,424.48

Total items: 1

Valor en Letras:

Siete millones novecientos noventa y cuatro mil cuatrocientos veinticuatro pesos m/cte con cuarenta y ocho cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación \$ 7,994,424.48

Observaciones:

Total Bruto	7,994,424.48
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	7,994,424.48

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764074823353 aprobado en 20240709 prefijo MM desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 10
CUFE: 54860959de3f15e6ffae038d6f70e6f0d5fa1241e9bdb8fd13da382c7c2d39533309bedba729bdf7403b6e984006771d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

Santa María Boyacá, 16 de diciembre de 2024.

Señores:


Municipio de Santa María Boyacá.

Asunto:

Autorización para el realizar el pago de factura MM7 del contrato de Obra No MC-SP-031-2024 cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y TENDIDO DEREDES PARA LA REUBICACIÓN A SITIO SEGURO DE VIVIENDA PREFABRICADA POR RIESGO MUNICIPIO DE SANTAMARÍA, BOYACÁ, COMO PARTE DE GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL.

Yo Juan Manuel Mancipe Lesmes identificado con cedula de ciudadanía No 1.020.740.023 de Bogotá, D.C actuando como representante legal de la empresa MONTANSAFE S.A.S. Nit 901.809.069-1, autorizo al MUNICIPIO DE SANTA MARIA con Nit 800.029.386-6 a realizar el pago de la factura MM7 del contrato de Obra No MC-SP-031-2024 por concepto de CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y TENDIDO DE REDES PARA LA REUBICACIÓN A SITIO SEGURO DE VIVIENDA PREFABRICADA POR RIESGO MUNICIPIO DE SANTAMARÍA, BOYACÁ, COMO PARTE DE GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL. Por un valor de (\$ 7.994.424,48) M/CTE, los cuales deben ser consignados a la cuenta a la cuenta de ahorros No 353109432 de Banco de Bogotá a nombre de Juan Manuel Mancipe Lesmes con cedula de ciudadanía No 1.020.740.023.

Agradezco su valiosa Colaboración



Juan Manuel Mancipe L CC
No 1020740023 de
Bogotá
Representante Legal.
MONTANSAFE SAS Nit
901809069-1



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO

Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015



COD 1047

En la ciudad de Macanal, Departamento de Boyacá, República de Colombia, el dieciseis (16) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), en la Notaría única del Círculo de Macanal, compareció: JUAN MANUEL MANCIPE LESMES, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 1020740023 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.



02cd424eb6

16/12/2024 11:19:40

----- Firma autógrafa -----

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Esta Acta se asocia al documento que contiene la siguiente información: DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO, AUTORIZACION de AUTENTICACION DOCUMENTO.



MERY MARGARET MENDOZA CARRILLO

Notaria Única del Círculo de Macanal , Departamento de Boyacá
Consulte este documento en <https://notariid.notariasegura.com.co>


Número Único de Transacción: 02cd424eb6, 16/12/2024 11:19:52

ESPACIO EN BLANCO
Notaria U. Macanal (Boy)

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que JUAN MANUEL MANCIPE LESMES, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.020.740.023 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 353109432, abierta/o desde el 28/11/2017.

Se expide en Bogotá el día 14 del mes de Diciembre del año 2024 con destino a: Municipio Santa María, Boyacá



Firma Autorizada

Santa María Boyacá, 13 de diciembre de 2024.
INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE OBRA

Señores:

Municipio de Santa María Boyacá.

Ingeniero DAIRO MAURICIO RODRIGUEZ RUSINQUE.

Supervisor de Contrato.

INFORME FINAL DE EJECUCION DE OBRA del contrato MC-SP-031-2024

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
N° DE CONTRATO	MC-SP-031-2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA BOYACA NIT: 800.029.386-6 R/LEGAL: RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA C.C. N° 74.280.418 DE GUATEQUE (BOY)
CONTRATISTA CC/ NIT	MONTANSAFE S.A.S. NIT. 901.809.069-1 R/L: JUAN MANUEL MANCIPE C:C: No. 1.020.740.023 EXPEDIDA EN BOGOTÁ.
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y TENDIDO DE REDES PARA LA REUBICACIÓN A SITIO SEGURO DE VIVIENDA PREFABRICADA POR RIESGO MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, BOYACÁ, COMO PARTE DE GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL.
PLAZO DE EJECUCIÓN (INCLUIDO AMPLIACIONES)	QUINCE (15) DÍAS
VALOR	VALOR INICIAL CONTRATO: SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROSCIENTO QUINCE PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 6.654.515,58) M/CTE. VALOR ADICION 01: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETESCIENTOS SETENTA Y UN PEOSOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 1.344.771,59) M/CTE. VALOR INICIAL MAS ADICIÓN 01: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y OCHO (\$ 7.999.187,17) M/CTE VALOR FINAL: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 7.994.424,48) M/CTE
SUPERVISOR CC / NIT	ING. DAIRO MAURICIO RODRÍGUEZ C.C No 1072339068 del Peñón Cundinamarca.
FECHA DE CONTRATO	03 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA INICIO	05 DE DICIEMBRE DE 2024
ADICIÓN N° 1	10 DE DICIEMBRE DE 2024
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 05-DICIEMBRE-2024 AL 13-DICIEMBRE-2024
FECHA DE TERMINACIÓN	13 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA PRESENTE INFORME	13 DE DICIEMBRE DE 2024

Respetado ingeniero.

UBICACIÓN:

El proyecto de construcción de losa se localiza en el kilómetro 0+200 de la vía que conduce desde Santa María, Boyacá hacia el corregimiento de Mambita, sector Cruce de la Libertad, costado derecho.

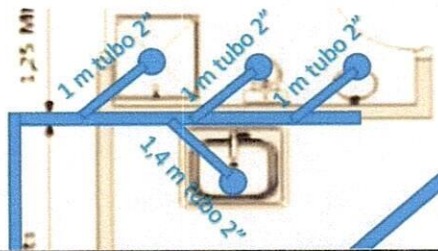


Ubicación general del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

A continuación, se relacionan el listado detallado de actividades con registro fotográfico, actividades fueron ejecutadas en el periodo comprendido entre el 5 de diciembre el 13 de diciembre de 2024.

CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y TENDIDO DE REDES PARA LA REUBICACIÓN A SITIO SEGURO DE VIVIENDA PREFABRICADA POR RIESGO MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, BOYACÁ COMO PARTE DE GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL.				
numero		UND	CANT.	REGISTRO
1,00	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	m2	36,00	
2,00	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	m3	3,60	


3,00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=2"	ml	4,20	
4,00	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	CANT	12,00	
5,00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=4" aguas residenciales	ml	13,50	
6,00	CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO	und	1,00	

7,00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = ½" RDE 13.5	ml	7,50	
8,00	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	kg	51,77	
9,00	LOSA MACIZA CIMENTO CONCRETO 21 MPa - 3000 PSI H=15 CM	CANT	26,00	
11,00	MURO CONTENCION CONCRETO CICLOPEO H<1.5 MTS 40%		1,20	


12,00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6	ml	6,80	
-------	---	----	------	--

El día 13 de diciembre se finalizaron las actividades del proyecto con la jornada de orden y aseo con lo que se cumple con la entrega de los ítems planteados en el contrato MC-SP-031-2024 celebrado con el municipio de Santa María, Boyacá.

Sin otro asunto en particular.


Juan Manuel Mancipe L
CC No 1020740023
Rep. Legal.
MONTANSafe SAS
Nit 901809069-1

BITACORA DE OBRA MS-SP-031-2024				
FECHA	HORA	ACTIVIDAD	FIRMA ING Civil Residente	
5/12/2024	7:00 a. m.	Inicio de jornada 7am Se inician trabajos de socializacion del proyecto con los vecinos del sector.		
	8:00 a. m.	Limpieza y descapote del lote.		
	10:00 a. m.	Se extraen aproximadamente 3m3 de capa vegetal		
	4:00 p. m.	Se retira capa vegetal en volqueta sencilla		
	5:00 p. m.	Fin de la jornada.		
6/12/2024	7:00 a. m.	Inicio la jornada a las 7:00 am		
	8:00 a. m.	Continua excavacion de material para la localizacion y replanteo completando un area de 36 m 2		
	10:00 a. m.	Se completan un total de 3,6 m3 de material excavado del lote para nivelacion del terreno .		
	4:00 p. m.	Se encuentran rocas de gran tamaño que requiere mayor tiempo de excavación		
	5:00 p. m.	Se finaliza la excavacion del replanteo a las 5pm		
7/12/2024	7:00 a. m.	Incicia jornada a las 7am		
	8:00 a. m.	Se realiza la excavacion para la tubería sanitaria de 2" y 4" interna		
	11:00 a. m.	Se completa 4,2 m3 de lineales de excavacion para la tubería sanitaria.		
	2:00 p. m.	Se realiza el corte y presentacion de la tubería PVC sanitaria de 2 y 4" para la red sanitaria interna de la casa.		
	3:00 p. m.	Se deja presentada la tubería para pruebas de escorrentía.		
	4:00 p. m.	Prueba de escorrentía exitosa, el agua no se estanca.		
	4:30 p. m.	Se realizar el pegado de la tubería con soldadura PVC.		
	5:00 p. m.	Fin de la jornada 5 pm		

BITACORA DE OBRA MS-SP-031-2024				
FECHA	HORA	ACTIVIDAD	FIRMA ING Civil Residente	
8/12/2024		dominical obra inactiva		
	7:00 a. m.	Inicio jornada a las 7am		
	11:00 a. m.	Se realiza el llenado de la tubería pvc con cama de arena		
	2:00 p. m.	Se realiza compactado sobre la línea de la tubería sanitaria pvc interna.		
	3:00 p. m.	Llegada de material seleccionado para relleno.		
	4:00 p. m.	Se realizar el extendido y compactado de material de relleno		
	4:30 p. m.	Se realiza la compactación con saltarín.		
9/12/2024	5:00 p. m.	Finaliza la jornada a las 5pm.		
	7:00 a. m.	Inicio jornada a las 7am		
	8:00 a. m.	Se realiza la excavacion e instalacion de red sanitaria de 4"		
	11:00 a. m.	Corte y presentacion de la tubería externa de 4" que traslada las aguas negras a la casa.		
	2:00 p. m.	Prueba de escorrentia exitosa, el agua no se estanca.		
	3:00 p. m.	Pegado de tubería con soldadura pvc.		
	4:00 p. m.	Cama de arena		
10/12/2024	4:30 p. m.	llenado de zanja de excavacion de tubería. Y compactado		
		Se identifica la necesidad de conducir aguas lluvias en un mayor diametro y de realizar un muro de contencion para confinar la losa y mejorar la estabilizacion del terreno. Se sugiere obra adicional a ala adminstración.		
	4:50 p. m.	Finaliza la jornada a las 5pm.		
	5:00 p. m.	Inicio jornada a las 7am		
	7:00 a. m.	Se informa de parte de la administracion el aval para la contruccion de muro e intalar la tubería de 6"		
	11:00 a. m.			

BITACORA DE OBRA MS-SP-031-2024				
FECHA	HORA	ACTIVIDAD	FIRMA ING Civil Residente	
11/12/2024		Se inicia la excavacion, instalacion de tubería 4" y 6" en paralelo y llenado con material de relleno. Se compacta con canguro.		
	2:00 p. m.			
	3:00 p. m.	Se sacan escuadras a 90°.		
	3:30 p. m.	Se instala al tubería de acueducto de 1/2" se deja protegido con tapones.		
	4:00 p. m.	Se compacta la tubería de 1/2"		
	4:30 p. m.	Se realiza la construcción de caja de inspección de 60x60		
12/12/2024	5:00 p. m.	Finaliza la jornada a las 5pm.		
	7:00 a. m.	Inicio jornada a las 7am		
	11:00 a. m.	Se instala la malla electrosoldada de 5mm, se separa del suelo con mogollas y rocas de tamaño de 7,5cm, se alinea en los bordes e inicia el vaciado de la losa.		
	2:00 p. m.	Finaliza vaciado de losa de concreto con un total de 26m2		
	3:00 p. m.	Se realiza la excavación para el muro de contención a 1,2 m de profundidad en el punto mas bajo		
	3:30 p. m.	Se realiza la nivelación y replanteo del muro		
13/12/2024	4:00 p. m.	Se realiza el mezclado y encofrado de concreto para muro		
	4:30 p. m.	se finaliza la fundición y finaliza la jornada.		
	5:00 p. m.	Finaliza la jornada a las 5pm.		
	7:00 a. m.	Inicio jornada a las 7am		
	11:00 a. m.	Inicio vaciado de la losa de concreto		
	2:00 p. m.	Se funde 26m2 de losa con espesor de 15cm.		
13/12/2024	3:00 p. m.	Se realiza el mezclado y encofrado de concreto para losa		
	3:30 p. m.	se finaliza la fundición y finaliza la jornada.		
	4:00 p. m.	Orden y aseo del área		
	5:00 a. m.	Finaliza la jornada a las 5pm.		

Fin de Obra
13-12-2024

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA		FORMATO: ACTA MODIFICATORIA DE CANTIDADES DE OBRA Y/O ACTA PAGOS Y/O BALANCE	
	GESTIÓN CONTRACTUAL			
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		VERSIÓN: 02	FECHA: 25/07/2023

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y TENDIDO DE REDES PARA LA REUBICACIÓN A SITIO SEGURO DE VIVIENDA PREFABRICADA POR RIESGO MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, BOYACÁ COMO PARTE DE GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL.

CONTRATISTA: MONTANSFÉ S.A.S.

SUPERVISOR: ING. DAIRÓ MAURICIO RODRIGUEZ

FECHA: 16 DE DICIEMBRE 2024



CONTRATO No. MC-SP-031-2024


Mediante la presente Acta, RUBEN DARIO GONZÁLEZ, en calidad de alcalde municipal de Santa María, JUAN MANUEL MANCIPE LESMES representante legal de MONTANSFÉ S.A.S., en calidad de contratista de obra, y ING. DAIRÓ MAURICIO RODRIGUEZ, Secretario de Planeación Municipal y supervisor del contrato de la referencia, dejan constancia de las modificaciones a las cantidades de obra, el día trece (13) de del mes de diciembre del año 2024, en las condiciones que se detallan a continuación:



ITEM	CODIGO GOB	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES ACTUAUZADAS		CANTIDADES		VALORES	
				CANT	VALOR/UNIT	VALOR/TOTAL	CANT	VALOR	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)
1	1.01.68	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	m2	36,00	\$ 2.969,00	\$ 106.884,00	36,00	\$ 106.884,00			\$ 0,00	\$ 0,00
2	1.02.17	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	m3	3,60	\$ 34.090,00	\$ 122.724,00	3,60	\$ 122.724,00			\$ 0,00	\$ 0,00
3	1.02.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=2"	ml	10,90	\$ 25.727,00	\$ 280.424,30	4,20	\$ 108.053,40		6,70	\$ 0,00	\$ 172.370,90
4	2.01.09	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	m3	12,00	\$ 21.028,00	\$ 252.336,00	12,00	\$ 252.336,00			\$ 0,00	\$ 0,00
5	2.05.58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=4" aguas residenciales	ml	13,50	\$ 29.509,00	\$ 398.371,50	13,50	\$ 398.371,50			\$ 0,00	\$ 0,00
6	1.02.04	CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x80 cm LADRILLO	und	1,00	\$ 280.122,00	\$ 280.122,00	1,00	\$ 280.122,00			\$ 0,00	\$ 0,00
7	2.01.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1/2" RDE 13.5	ml	18,00	\$ 5.729,00	\$ 103.122,00	7,50	\$ 42.967,50		10,50	\$ 0,00	\$ 60.154,50
8	3.13.25	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	kg	51,77	\$ 7.705,00	\$ 398.887,85	51,77	\$ 398.887,85			\$ 0,00	\$ 0,00
9	1.02.21	LOSA MACIZA CEMENTO CONCRETO 21 MPa - 3000 PSI H=15 CM	m2	26,00	\$ 122.149,00	\$ 3.175.874,00	26,00	\$ 3.175.874,00			\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO						\$ 5.118.745,65	\$ 4.886.220,25			\$ 0,00	\$ 232.525,40	
ITEM NO PREVISTOS												
1	1.02.01	MURO CONTENCIÓN CONCRETO CICLOPEO H<1.5 MTS 40%	m3	0,00	\$ 712.933,02	\$ 0,00	1,20	\$ 855.519,62	1,20		\$ 855.519,62	\$ 0,00
2	2.05.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6	ml	0,00	\$ 59.973,15	\$ 0,00	6,80	\$ 407.817,42	6,80		\$ 407.817,42	\$ 0,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO						\$ 0,00	\$ 1.263.337,04			\$ 1.263.337,04	\$ 0,00	
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO						\$ 5.118.745,65	\$ 6.149.557,29			\$ 1.263.337,04	\$ 232.525,40	
ADMINISTRACION						22%	\$ 1.126.124,00	\$ 1.352.902,60		\$ 277.934,15	\$ 51.155,59	
IMPREVISTOS						3%	\$ 153.562,00	\$ 184.486,72		\$ 37.900,11	\$ 6.975,76	
UTILIDAD						3%	\$ 255.937,00	\$ 307.477,86		\$ 63.166,85	\$ 11.626,27	
COSTO TOTAL DEL PROYECTO						\$ 6.654.368,65	\$ 7.994.424,48			\$ 1.642.338,00	\$ 302.283,00	
VALOR TOTAL		SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON VENTIOCHO CENTAVOS (\$ 7.994.424,48) M/CTE										
ADICIONAL N°1		UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (\$ 1.642.338,00) M/CTE										
CONTRATISTA:			Firma: 			MONTANSFÉ SAS			ING. JUAN MANUEL MANCIPE LESMES			
MUNICIPIO:			Firma: 			RUBEN DARIO GONZÁLEZ			ALCALDE MUNICIPAL			
SUPERVISOR:			Firma: 			ING. DAIRÓ MAURICIO RODRIGUEZ			SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA			



Carrera 3 No. 3 – 56 - Código Postal 152820 - Página web www.santamaria-boyaca.gov.co
Secretaría General y de Gobierno Tel. 3217516462 - Email: gobierno@santamaria-boyaca.gov.co


MEMORIAS DE CANTIDADES CONTRATO DE OBRA MC-SP-031.2024

MUNICIPIO DE SANTA MARIA										
MEMORIA DE CANTIDADES										
CONTRATISTA:	MONTASAFE SAS									
SUPERVISOR:	ING. DAIRO MAURICIO RODRIGUEZ					Sec. De Planeación E Infraestructura				
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y TENDIDO DE REDES PARA LA REUBICACIÓN A SITIO SEGURO DE VIVIENDA PREFABRICADA POR RIESGO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, BOYACÁ COMO PARTE DE GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL.									
CAPÍTULO	1.01.68					FECHA:				
						13	12 2024			
ÍTEM	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA					UNIDAD	m ²			
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO				REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones				
						ANCHO	ALTO			
						LONGITUD	CANT			
							MEDIDA TOTAL			
 				Lote casa	Area construccion losa	6.00	6.00		36.00	
										0.00
							Subtotal	36.00		
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA				36.00		
ELABORÓ:	 ING. JUAN MANUEL MANCIPE LESMES RESIDENTE DE OBRA					OBSERVACIONES				
REVISÓ Y APROBÓ:	 ING. DAIRO MAURICIO RODRIGUEZ Sec. De Planeación E Infraestructura									

MUNICIPIO DE SANTA MARIA										
MEMORIA DE CANTIDADES										
CONTRATISTA:	MONTASAFE SAS									
SUPERVISOR:	ING. DAIRO MAURICIO RODRIGUEZ					Sec. De Planeación E Infraestructura				
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y TENDIDO DE REDES PARA LA REUBICACIÓN A SITIO SEGURO DE VIVIENDA PREFABRICADA POR RIESGO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, BOYACÁ COMO PARTE DE GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL.									
CAPÍTULO	1.02.17					FECHA:				
						13	12 2024			
ÍTEM	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)					UNIDAD	m ³			
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO				REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones				
						ANCHO	ALTO			
						LONGITUD	CANT			
							MEDIDA TOTAL			
				Area de vivienda	Area losa	5.20	0.13	5.20	1.00	3.5963
							Subtotal	3.60		
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA				3.60		
ELABORÓ:	 ING. JUAN MANUEL MANCIPE LESMES RESIDENTE DE OBRA					OBSERVACIONES				
REVISÓ Y APROBÓ:	 ING. DAIRO MAURICIO RODRIGUEZ Sec. De Planeación E Infraestructura									

MUNICIPIO DE SANTA MARIA									
MEMORIA DE CANTIDADES									
CONTRATISTA:	MONTASAFE SAS								
SUPERVISOR:	ING. DAIRO MAURICIO RODRIGUEZ			Sec. De Planeación E Infraestructura					
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y TENDIDO DE REDES PARA LA REUBICACIÓN A SITIO SEGURO DE VIVIENDA PREFABRICADA POR RIESGO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, BOYACÁ COMO PARTE DE GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL.									
CAPÍTULO:	1.02.39			FECHA:					
				13	12				
				2024					
ÍTEM:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=2"			UNIDAD:	ml				
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO				REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN				
				Dimensiones					
				ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANT	MEDIDA TOTAL	
				Sanitaria Losa nueva		Lavamanos	1,00	1,00	1,00
						Ducha	1,00	1,00	1,00
						Lavaplatos	1,40	1,00	1,40
						Conduccion a Caja	0,80	1,00	0,80
				Subtotal		4,20			
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		4,20			
ELABORÓ:				OBSERVACIONES					
 ING. JUAN MANUEL MANCIPE LESMES RESIDENTE DE OBRA									
REVISÓ Y APROBÓ:									
 ING. DAIRO MAURICIO RODRIGUEZ Sec. De Planeación E Infraestructura									


MUNICIPIO DE SANTA MARIA											
MEMORIA DE CANTIDADES											
CONTRATISTA:	MONTASAFE SAS										
SUPERVISOR:	ING. DAIRO MAURICIO RODRIGUEZ			Sec. De Planeación E Infraestructura							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y TENDIDO DE REDES PARA LA REUBICACIÓN A SITIO SEGURO DE VIVIENDA PREFABRICADA POR RIESGO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, BOYACÁ COMO PARTE DE GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL.											
CAPÍTULO:	2.01.09			FECHA:							
				13	12						
				2024							
ÍTEM:	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA			UNIDAD:	m3						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO				REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN						
				Dimensiones							
				ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANT	MEDIDA TOTAL			
				Area de Vivienda		Losa de vivienda	5,30	0,30	5,30	1,00	8,43
						Area muro	0,80	0,74	6,00	1,00	3,57
				Subtotal		12,00					
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		12,00					
ELABORÓ:				OBSERVACIONES							
 ING. JUAN MANUEL MANCIPE LESMES RESIDENTE DE OBRA											
REVISÓ Y APROBÓ:											
 ING. DAIRO MAURICIO RODRIGUEZ Sec. De Planeación E Infraestructura											

MUNICIPIO DE SANTA MARIA									
MEMORIA DE CANTIDADES									
CONTRATISTA:	MONTASAFE SAS								
SUPERVISOR:	ING. DAIRO MAURICIO RODRIGUEZ								
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y TENDIDO DE REDES PARA LA REUBICACIÓN A SITIO SEGURO DE VIVIENDA PREFABRICADA POR RIESGO MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, BOYACÁ COMO PARTE DE GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL.								
CAPÍTULO	2.05.58						FECHA:		
							13	12	2024
ÍTEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=4" aguas residenciales						UNIDAD	ml	
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO		REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			CANT	MEDIDA TOTAL	
				ANCHO	ALTO	LONGITUD			
		Red Sanitaria Aguas Negras	Conduccion 4" hacia afuera del lote	0,00	0,00	8,50	1,00	8,50	
		Res Sanitaria Losa	Aguas Negras Losa			5,00	1,00	5,00	
Subtotal								13,50	
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA								13,50	
ELABORÓ:		OBSERVACIONES							
ING. JUAN MANUEL MANCIPE LESMES RESIDENTE DE OBRA									
REVISÓ Y APROBÓ:									
ING. DAIRO MAURICIO RODRIGUEZ Sec. De Planeación E Infraestructura									

MUNICIPIO DE SANTA MARIA									
MEMORIA DE CANTIDADES									
CONTRATISTA:	MONTASAFE SAS								
SUPERVISOR:	ING. DAIRO MAURICIO RODRIGUEZ								
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y TENDIDO DE REDES PARA LA REUBICACIÓN A SITIO SEGURO DE VIVIENDA PREFABRICADA POR RIESGO MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, BOYACÁ COMO PARTE DE GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL.								
CAPÍTULO	1.02.04						FECHA:		
							13	12	2024
ÍTEM	CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO						UNIDAD	und	
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO		REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			CANT	MEDIDA TOTAL	
				ANCHO	ALTO	LONGITUD			
		Caja recolectora aguas negras	Parte posterior de la casa	0,60	0,60	0,10	1	1,00	
Subtotal								1,00	
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA								1,00	
ELABORÓ:		OBSERVACIONES							
ING. JUAN MANUEL MANCIPE LESMES RESIDENTE DE OBRA									
REVISÓ Y APROBÓ:									
ING. DAIRO MAURICIO RODRIGUEZ Sec. De Planeación E Infraestructura									

MUNICIPIO DE SANTA MARIA								
MEMORIA DE CANTIDADES								
CONTRATISTA:	MONTASAFE SAS							
SUPERVISOR:	ING. DAIRO MAURICIO RODRIGUEZ							
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y TENDIDO DE REDES PARA LA REUBICACIÓN A SITIO SEGURO DE VIVIENDA PREFABRICADA POR RIESGO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, BOYACÁ COMO PARTE DE GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL.							
CAPÍTULO:	2.01.16					FECHA:		
					13	12	2024	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1/2" RDE 13.5					UNIDAD	ml		
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO		REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones		CANT	MEDIDA TOTAL	
		RED INTERNA 1/2" Presion	Lavamanos	0,00	0,00	30,00	1,50	
			Ducha				1,50	
			Sanitorio				1,50	
			Lavaplatos				1,00	
			Conducción hacia medidor				2,00	
Subtotal						7,50		
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA						7,50		
LABORÓ:		OBSERVACIONES						
ING. JUAN MANUEL MANCIPE LESMES RESIDENTE DE OBRA								
REVISÓ Y APROBÓ:								
ING. DAIRO MAURICIO RODRIGUEZ Sec. De Planeación E Infraestructura								

MUNICIPIO DE SANTA MARIA								
MEMORIA DE CANTIDADES								
CONTRATISTA:	MONTASAFE SAS							
SUPERVISOR:	ING. DAIRO MAURICIO RODRIGUEZ							
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y TENDIDO DE REDES PARA LA REUBICACIÓN A SITIO SEGURO DE VIVIENDA PREFABRICADA POR RIESGO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, BOYACÁ COMO PARTE DE GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL.							
CAPÍTULO:	3.13.25					FECHA:		
					13	12	2024	
ÍTEM	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)					UNIDAD	KG	
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO		REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones		CANT	MEDIDA TOTAL	
			MALLA DE LOSA	Densidad	Area	peso KG		
				1,99038831	26,01	51,77	1	51,77
Subtotal						51,77		
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA						51,77		
LABORÓ:		OBSERVACIONES						
ING. JUAN MANUEL MANCIPE LESMES RESIDENTE DE OBRA								
REVISÓ Y APROBÓ:								
ING. DAIRO MAURICIO RODRIGUEZ Sec. De Planeación E Infraestructura								

MUNICIPIO DE SANTA MARIA									
MEMORIA DE CANTIDADES									
CONTRATISTA:		MONTASAFE SAS							
SUPERVISOR:		ING. DAIRO MAURICIO RODRIGUEZ							
OBJETO:		CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y TENDIDO DE REDES PARA LA REUBICACIÓN A SITIO SEGURO DE VIVIENDA PREFABRICADA POR RIESGO MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, BOYACÁ COMO PARTE DE GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL.							
CAPÍTULO		2.05.52					FECHA:		
							13122024		
ÍTEM		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6					UNIDADML		
		REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			CANT	MEDIDA TOTAL	
		ANCHO	ALTO	LONGITUD					
		Manejo de Aguas Iluvias	tubo 6"	1,00	1,00	6,80	1,00	6,80	
						Subtotal		6,80	
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		6,80	
ELABORÓ:		OBSERVACIONES							
ING. JUAN MANUEL MANCIPE LESMES RESIDENTE DE OBRA									
DISEÑO Y APROBO:									
ING. DAIRO MAURICIO RODRIGUEZ Secretaría de Planeación e Infraestructura									

Santa María Boyacá, 17 de Diciembre de 2024

Señores:

MUNICIPIO DE SANTA MARIA


La ciudad

JUAN MANUEL MANCIPE LESMES identificado con CC. No **1.020.740.023** de Bogotá, representante legal de la **empresa MONTANSafe SAS** con NIT **901809069-1**, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la ley 828 de 2003, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes a Seguridad Social, a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Artículo 65 Ley 1819 de 2019).

Bajo la gravedad de Juramento manifiesto que dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de firma del contrato no tuve personal a cargo y por ende no estoy obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social.

Se expide la presente certificación en el municipio de Santa María a los Diez y Siete (17) días del mes de Diciembre de 2024

Atentamente,


JUAN MANUEL MANCIPE LESMES
CC. No **1.020.740.023** de Bogotá
Representante Legal
MONTANSafe
NIT **901809069-1**

Correo electrónico: MONTANSafeSAS@GMAIL.COM Dirección: TV 2 A 1 29 CA 75
Municipio de Santa María-Boyacá- Celular: 3 1 8 6 0 5 4 2 8 3

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1020740023		MANCIBE LESMES JUAN MANUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 169a # 55a - 49 apt 703	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6515113	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Pago	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1131606532	9478970464	1	2025/01/09	2024/12/16	BANCOLOMBIA		0	\$113,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$62,400	\$0	\$0	\$62,400
POVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$62,400	\$0	\$0	\$62,400
AR (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$2,100	\$0	\$0	\$2,100
SÉGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	\$2,100	\$0	\$0	\$2,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$48,800	\$0	\$0	\$48,800
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$48,800	\$0	\$0	\$48,800
TOTAL				1	\$113,300	\$0	\$0	\$113,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																											
Identificación		dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono	Exonerado SENA e ICBF													
CC 1020740023			MANCIBE LESMES JUAN MANUEL		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		Calle 169a # 55a - 49 apt 703		BOGOTA-BOGOTA D.E.		6515113	NO													
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																											
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor													
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	1	Límite	2025/01/09	Pago	2024/12/16	BANCOLOMBIA		0		\$113,300													
2024-12	2024-12	1131600532	9478970d64																								
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																											
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$390,000	\$62,400			\$390,000	\$48,800			\$0	\$0			\$390,000	\$2,100			\$0	\$0			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$390,000	\$62,400			\$390,000	\$48,800			\$0	\$0			\$390,000	\$2,100			\$0	\$0			\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$390,000	\$62,400			\$390,000	\$48,800			\$0	\$0			\$390,000	\$2,100			\$0	\$0			\$0	\$0	
1	CC	1020740023	MANCIBE JUAN	230301	9		EP5005	9		\$390,000	\$48,800	0	\$0	\$0	14-7	9		\$390,000	\$2,100	0		\$0	\$0			\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$390,000	\$62,400			\$390,000	\$48,800			\$0	\$0			\$390,000	\$2,100			\$0	\$0			\$0	\$0	

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			
2024-12	2024-12	1	17/12/2024	82706515
CANTIDAD				
		EMPLEADOS		
		UPC		
		1		
		0		
		TOTAL A PAGAR		
		\$461,000		

INFORMACION COTIZANTE

[illegible]

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPE
					1 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-12	2024-12	I	17/12/2024	82708515	\$461,000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

NIT

899999034

Medio de Pago

NEQUI

No. Transacción

122164625

No. Autorización/CUS Fecha y Hora

1133854564

17/12/2024

Número de Identificación

901809069

Primer Apellido (si es Persona natural)**Dígito de Verificación (Si es persona**

1

Departamento

BOYACA

Dirección de Domicilio

TRVSAL 2 A No 1-29

Localización

Nacional

Correo electrónico

montansafesas@gmail.com

Regional

Boyaca

Número Licencia de Obra

MC-SP-031-2024

Nombre Obra

LOSA REUBICACION CASA

Fecha Terminación Obra

13/12/2024

Tipo FIC

Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Mes Periodo a Pagar

12

Costo Total Mano de Obra

1500000.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

MONTANSafe S.A.S.

Tipo de documento

01

Naturaleza Juridica

01

Ciudad Capital

TUNJA (BOYACA)

Ciudad de Domicilio

Santa María

Teléfono de Contacto

+57,318 6054283

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-015-000000

Número Contrato de Obra

MC-SP-031-2024

Fecha Inicio Obra

05/12/2024

Ciudad de Ejecución de la Obra

Santa Maria Boyaca

Año Periodo a Pagar

2024

Costo Total de Obra a Todo Costo

7994424.48

Número de Trabajadores en el Periodo

2

Aporte FIC

19986.00

Valor del Pago

19986.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	NEQUI	122164625	1133854564	17/12/2024

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901809069**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **165.225.218.209**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **\$ 19,986.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 19,986.00	COP\$ 19,986.00



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN			SUCURSAL			COD. SUC		NO. PÓLIZA		ANEXO	
TUNJA			TUNJA			39		39-44-101167398		4	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO			DÍA	MES	AÑO	
17	12	2024	05	12	2024	00:00		24	12	2027	23:59
TIPO MOVIMIENTO											ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	MONTANSAFE S.A.S.	IDENTIFICACIÓN	NIT: 901.809.069-1
DIRECCIÓN: TV 2 A NRO. 129 - 75 CA75	CIUDAD: SANTA MARIA, BOYACA	TELÉFONO:	3186054283

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	IDENTIFICACIÓN	NIT: 800.029.386-6
DIRECCIÓN: CARRERA 3 NO. 3-56	CIUDAD: SANTA MARIA, BOYACA	TELÉFONO:	3103275407
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. MC-SP-031-2024, DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2024, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y TENDIDO DE REDES PARA LA REUBICACIÓN A SITIO SEGURO DE VIVIENDA PREFABRICADA POR RIESGO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, BOYACA, COMO PARTE DE GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/12/2024	24/06/2025	\$799,918.72	\$799,918.72
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	05/12/2024	24/12/2027	\$799,918.72	\$799,918.72
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	13/12/2024	13/12/2026	\$1,599,837.43	

ACLARACIONES

SEGUN ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2024, SE AJUSTA EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, QUEDANDO A PARTIR DE LA MISMA Y POR DOS (02) AÑOS MAS.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****3,199,674.87	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NTNY JOHANNA DIAZ AGUDELO	174053	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 10 NO. 21-33 OFC. 108 -202- TELÉFONO: 7409487 - TUNJA

39-44-101167398

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Queda - Vicepresidente de Finanzas



FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELÉFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF174053A

1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION TUNJA			SUCURSAL TUNJA			COD.SUC 39		NO.POLIZA 39-44-101167398		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICION DIA MES AÑO 17 12 2024			VIGENCIA DESDE DIA MES AÑO 05 12 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DIA MES AÑO 24 12 2027		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL MONTANSAFE S.A.S.		IDENTIFICACION NIT: 901.809.069-1	
DIRECCION: TV 2 A NRO. 129 - 75 CA75		CIUDAD: SANTA MARIA, BOYACA	
		TELÉFONO: 3186054283	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA		IDENTIFICACION NIT: 800.029.386-6	
DIRECCION: CARRERA 3 NO. 3-56		CIUDAD: SANTA MARIA, BOYACA	
		TELÉFONO: 3103275407	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 10 NO. 21-33 OFC. 108 -202 - TELEFONO: 7409487 - TUNJA

39-44-101167398

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF174053A

2
