



Sepi Ltda.
Servicios Especializados
Profesionales Integrales

- Gestión Empresarial
- Construcción de Obras Civiles e Interventoría
- Diseños Arquitectónicos y Estructurales
- Elaboración de Proyectos

INFORME FINAL

29 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

**CONTRATO:
CO1.PCCNTR.5769147
CONTRATANTE: IMPULSA + SAS**



OBJETIVO: “MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUSBANZÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.

**CONTRATISTA: SEPI LTDA
REPRESENTANTE LEGAL: YESID ALONSO FAGUA HERRERA**

**BUSBANZÁ
2024**





1 Tabla de contenido

2.1 LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA.....	6
2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	6
1.1 El personal incluido en la anterior relación se encuentra afiliado al sistema de Seguridad Social como se evidencia la planilla del mes de septiembre. (ver anexo).	8
2.1 RELACIÓN DE EQUIPOS PRESENTES EN EL CONTRATO.	8
7.1 BUEN MANEJO DE MATERIALES.....	24
7.2 CERTIFICADOS DE MATERIALES Y/O FICHAS TÉCNICAS.....	24
7.3 ENSAYOS DE LABORATORIO	24
7.4 ESTADO DEL TIEMPO.....	25
8.1 RELACIÓN DE PAGOS Y BALASE FINANCIERO	25
9. GESTIÓN AMBIENTAL.	26
9.1 Durante el periodo del presente informe se identifican los cuerpos de agua cercanos para identificar los posibles impactos relacionados con la ejecución de la obra, de esta manera se determinó inicialmente los puntos de acopio temporal del material granular, para evitar, posibles afectaciones.	26
9.2 Se realiza humectación a lo largo del tramo para evitar la propagación de material particulado en los predios aledaños. 26 Los materiales utilizados cuentan con los permisos legales de regulación (ver anexo).....	26
10. GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO.	26
10.1 Al personal involucrado se afilio al sistema de seguridad. (ver anexo)	26
10.2 Se realizó charla de inducción al personal que se encontró involucrado durante el periodo.	26
10.3 Se hace entrega de EPP,s (Casco, guantes, gafas, tapabocas), a cada integrante del grupo operativo	26
11. CONCLUSIONES	27
ING YESID ALONSO FAGUA.....	27
12. ANEXOS	29





Sepi Ltda.
Servicios Especializados
Profesionales Integrales

- Gestión Empresarial
- Construcción de Obras Civiles e Interventoría
- Diseños Arquitectónicos y Estructurales
- Elaboración de Proyectos

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Ubicación del Proyecto.	6
Ilustración 2: Cuadro de equipo en obra.	8
Ilustración 3: Cuadro de documentos legales del contrato.	12





LISTADO DE TABLAS

Tabla 1: Información del contrato.....	7
Tabla 2: Cronología del contrato.	7
Tabla 3: Cuadro de relación de personal en obra.....	8
Tabla 4: Cuadro de relación de pólizas.	9
Tabla 5: Cuadro Control de Correspondencia.....	9
Tabla 6: Cuadro de documentos legales del contrato.	10
Tabla 7: Presupuesto oficial.....	11
Tabla 8: Cuadro de avances programados y ejecutados.	12
Tabla 9: Cantidades ejecutadas.....	23
Tabla 10: Resultados de ensayos de rotura de cilindros.	25
Tabla 11: Control financiero.....	25





1. INTRODUCCIÓN

El proyecto busca realizar la pavimentación de la vía de la entrada a la vereda Tobo en el municipio de Busbanzá, de acuerdo con las especificaciones técnicas del invias, en la Guía de diseño de Pavimentos con Placa Huella, esto dentro del contrato "MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUSBANZÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

CONTRATO	CO1.PCCNTR.5769147
TIPO DE ADJUDICACIÓN	LICITACIÓN PUBLICA
CONTRATISTA	SEPI LTDA R/L ING. YESID ALONSO FAGUA HERRERA
CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPIO DE BUSBANZÁ
INTERVENTORÍA	ING. JUAN MANUEL ROJAS MORENO
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUSBANZÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".
VALOR DEL CONTRATO	\$ 419.765.128
FECHA DE INICIO	29 DE ENERO DE 2024
FECHAS SUSPENSIÓN 01	16 DE FEBRERO DE 2024
FECHA AMPLIACIÓN 1 A LA SUS 01	11 DE MARZO DE 2024
FECHA AMPLIACIÓN 2 A LA SUS 01	11 DE ABRIL DE 2024
FECHA AMPLIACIÓN 3 A LA SUS 01	11 DE MAYO DE 2024
FECHA AMPLIACIÓN 4 A LA SUS 01	11 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE REINICIO 01	11 DE JUNIO DE 2024
FECHA REINICIO 03	27 DE JUNIO DE 2023
PRORROGA 1	17 DE OCTUBRE DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES 60 DIAS CALENDARIO





2.1 LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA.

Busbanzá es un municipio que se encuentra en la provincia de Tundama, perteneciente al departamento de Boyacá en Colombia. Está situado en la cordillera oriental de los Andes, a una altitud media de 2,472 metros sobre el nivel del mar, lo que le confiere un clima templado y una geografía montañosa característica. Con coordenadas geográficas aproximadas de 5°49'49" Norte y 72°53'03" Oeste, Busbanzá limita al norte con los municipios de Santa Rosa de Viterbo y Nuevo Colón, al sur con Corrales, al este con Coper y al oeste con Paipa. La vereda Tonemí pertenece al territorio de este municipio, en el cual se va desarrollar el contrato



Ilustración 1: Ubicación del Proyecto.

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

La placa huella es una solución constructiva para el mejoramiento de acceso a las vías terciarias, especialmente en zonas rurales, que para este caso ayuda al acceso de unas de los sectores de la vereda Tonemi. Consiste en la elaboración y colocación de concreto hidráulico reforzado, dispuesto en módulos separados por piedra pegada, siguiendo especificaciones técnicas precisas para garantizar su durabilidad y funcionalidad en un tramo aproximado de 220 metros lineales. Este proyecto tiene la capacidad para adaptarse al terreno y contribuye significativamente al desarrollo y accesibilidad de comunidades del sector.

Adicionalmente se construirá una alcantarilla como obra adicional para poder dar manejo y adecuada conducción de las aguas de escorrentía cuando se presenten altas precipitaciones.





2.2 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.

A continuación, se presenta información general del contrato de obra MT-CO1.PCCNTR.5769147. cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUSBANZÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No	CO1.PCCNTR.5769147
CONTRATISTA	SEPI LTDA, R/L YESID ALONSO FAGUA HERRERA
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUSBANZÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Tabla 1: Información del contrato.

2.3 CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	FECHA		
	Dd	mm	aaaa
Firma del contrato	19	01	2024
Acta de inicio	29	01	2024
Suspensión 01	16	02	2024
Ampliación 01 a la suspensión 01	11	03	2024
Ampliación 02 a la suspensión 01	11	04	2024
Ampliación 03 a la suspensión 01	11	05	2024
Ampliación 04 a la suspensión 01	11	06	2024
Reinicio 01	11	06	2024
PRORROGA 1	17	10	2024
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	17	12	2024

Tabla 2: Cronología del contrato.

2.4 CONTROL ADMINISTRATIVO Y LEGAL.

2.4.1 OBLIGACIONES GENERALES:

Las actividades ejecutas para este periodo se han ceñido de acuerdo con los estudios, diseños y en general a las especificaciones técnicas entregados por administración municipal y avaladas por la interventoría

2.4.1.1 El objeto del contrato se ha ejecutado de manera estricta, cumpliendo todos los parámetros que obliga el mismo, teniendo en cuenta





2.4.2.1 todos los requerimientos de control que ha realizado la interventoría en el quehacer diario de las actividades.

2.4.2.2 Se han atendido todos los requerimientos técnicos realizados por la supervisión del contrato y la interventoría,

2.5 RELACIÓN DEL PERSONAL VINCULADO EN EL CONTRATO.

No	NOMBRE	C.C	CARGO
1	Pablo Gonzales	71184656	Maestro General
2	Daniel Alexander Rativa Rache	1049619759	Oficial de obra
3	José de Jesús Cárdenas Martínez	4083791	Oficial de obra
4	José Dilmo Cristancho	4068181	Ayudante de obra
5	Jhon Alexander Acevedo	7184828	Ayudante de obra
6	Harley Rodríguez	4068201	Ayudante de obra
7	Yesid Jerónimo Gallego Adame	1002437118	Ayudante de obra
8	Misael Ducón Araque	4068122	Ayudante de obra
9	Luis Eduardo Gonzáles	40068202	Ayudante de obra
10	-José Daniel Gonzales Torres	1049619182	Oficial de obra

Tabla 3: Cuadro de relación de personal en obra.

1.1 El personal incluido en la anterior relación se encuentra afiliado al sistema de Seguridad Social como se evidencia la planilla del mes de septiembre. (ver anexo).

2.1 RELACIÓN DE EQUIPOS PRESENTES EN EL CONTRATO.

A continuaciones relacionan los equipos utilizados durante el periodo de enero del 2024,

BUZBANSÁ-BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL		FORMATO																														
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUZBANSÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".	FORMATO																														
FORMATO	CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA	EQUIPO DE OBRA																														
CONTRATISTA		SEPI LTDA	CONTRATO DE OBRA No. COL.PCCNTR.5769147																													
PERIODO INFORME		DEL 30	NOVIEMBRE																													
CONTRATISTA		SEPI LTDA	R/L YESID ALONSO FAGUA HERRERA																													
MAQUINA	DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Herramienta menor		1A	1A	-	-	1A	-	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A
RETRO EXCAVADORA CATERPILLAR 4216A		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VOLQUETA INTERNACIONAL PLACAS (2X3 251)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VOLQUETA MAC PLACAS (WLB 838)		1A	-	-	1A	-	-	1A	-	1A	1A	-	-	-	1A	-	-	-	1A	-	-	-	1A	-	-	1A	-	-	-	-	-	-
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 130g		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIBROCOMPACTADOR INGERSOLL RAND 5070		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MESCLADORA DIESEL TRES BULTOS		1A	1A	-	-	1A	-	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A
CONVENIONES																																
ACTIVO = A																																
REPARACIÓN = B																																
INACTIVO = I																																
SUSPENSOS Y FECTIVOS																																
 JUAN CARLOS TORRES HERNANDEZ RESIDENTE DE OBRA																 YESID ALONSO FAGUA HERRERA DIRECTOR DE OBRA																

Ilustración 2: Cuadro de equipo en obra





3. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO.

3.1 RELACIÓN DE PÓLIZAS

No.	No. Póliza	Fecha Expedida.	Vigencia desde.	Vigencia Hasta.	Tipo de Movimiento	Anexo
1	BY-100039900	24/01/2024	19/01/2024	19/01/2027	EMISIÓN ORIGINAL PÓLIZA DE GARANTÍA	0
2	BY-100005423	23/01/2024	19/01/2024	19/05/2024	PÓLIZA RCE	0
3	BY-100039900	24/01/2024	19/01/2024	30/09/2027	EMISIÓN ORIGINAL PÓLIZA DE GARANTÍA ANEXO 4	
4	BY-100005423	23/01/2024	19/01/2024	12/10/2024	PÓLIZA RCE ANEXO 3	

Tabla 4: Cuadro de relación de pólizas.

Dentro del anexo "CONTROL LEGAL DE OBRA" Se relacionan las pólizas suscritas al presente contrato, los contratos adicionales al plazo inicial, valor adición, listado de las actas tramitadas. (Ver anexo).

3.2 CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y ENVIADA

CONTROL DE CORRESPONDENCIA						
No	ENVIADA	RECIBIDA	REFERENCIA	ASUNTO	DESTINATARIO	FECHA EMISIÓN
	FÍSICO		CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5769147 CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUSBANZÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"	Respuesta a oficio del 26 de septiembre y radicación de información.	INTERVENTORÍA A C/C DIRECTOR IMPULSA MAS SAS	30/09/2024
	FÍSICO		CONTRATO No. MI-CO-2022-081 CUYO OBJETO ES: "RECUPERACIÓN Y AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE TOCA - BOYACÁ"	Respuesta a oficio del 26 de septiembre y radicación de información.	INTERVENTORÍA A C/C DIRECTOR IMPULSA MAS SAS	30/09/2024
	FÍSICO		CONTRATO No. MI-CO-2022-081 CUYO OBJETO ES: "RECUPERACIÓN Y AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE TOCA - BOYACÁ"	Plan de contingencia para la ejecución del contrato.	INTERVENTORÍA A C/C DIRECTOR IMPULSA MAS SAS	30/09/2024
	FÍSICO		CONTRATO No. MI-CO-2022-081 CUYO OBJETO ES: "RECUPERACIÓN Y AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE TOCA - BOYACÁ"	Solicitud prórroga 01	INTERVENTORÍA A C/C DIRECTOR IMPULSA MAS SAS	20/09/2024
	FÍSICO		CONTRATO No. MI-CO-2022-081 CUYO OBJETO ES: "RECUPERACIÓN Y AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE TOCA - BOYACÁ"	Solicitud aprobación de ítems no previstos.	INTERVENTORÍA A C/C DIRECTOR IMPULSA MAS SAS	09/10/2024

Tabla 5: Cuadro Control de Correspondencia.





4. CONTROL TÉCNICO.

4.1 CONDICIONES DEL CONTRATO


DESCRIPCIÓN	FECHA		
	Dd	mm	aaaa
Firma del contrato	19	01	2024
Acta de inicio	29	01	2024
Suspensión 01	16	02	2024
Ampliación 01 a la suspensión 01	11	03	2024
Ampliación 02 a la suspensión 01	11	04	2024
Ampliación 03 a la suspensión 01	11	05	2024
Ampliación 04 a la suspensión 01	11	06	2024
Reinicio 01	11	06	2024
PRORROGA 1	17	10	2024

Tabla 6: Cuadro de documentos legales del contrato.

4.2 CONDICIONES CONTRACTUALES.

CONDICIONES CONTRACTUALES								
N	ÍTEM DE PAGO	GENERAL	PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL
1				IMPLEMENTAR EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS PARA LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO				
1.01	1.01	3.04.03		CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACIÓN)	Kilómetro	0.23	\$ 1,624,611.00	\$ 73,661.00
1.02	1.02	1.02.15		EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	Metro Cúbico	341.00	\$ 33,084.00	\$ 11,281,644.00
1.03	1.03	1.02.43		RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR	Metro Cúbico	147.00	\$ 32,586.00	\$ 4,790,142.00
1.04	1.04	3.04.07		SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM)	Metro Cúbico	171.39	\$ 133,219.00	\$ 22,832,404.00
1.05	1.05	1.02.09		CONCRETO CICLÓPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P	Metro Cúbico	41.47	\$ 689,620.00	\$ 28,598,541.00
1.06	1.06	3.03.26		SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	Metro Cúbico	112.50	\$ 1,065,813.00	\$ 119,903,963.00
1.07	1.07	1.02.42		SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	Kilogramo	7875.00	\$ 9,375.00	\$ 73,828,125.00
1.08	1.08	3.03.05		CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	Metro Cúbico	33.75	\$ 932,732.00	\$ 31,479,705.00
1.09	1.09	3.08.09		BORDILLO FUNDIDO EN SITIO 20 X 35 CM	Metro lineal	450.00	\$ 93,232.00	\$ 41,954,400.00
1.10	1.10	1.18.04		CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17,5MPa - (2500 PSI)	Metro Cuadrado	50.00	\$ 174,143.00	\$ 8,707,150.00
1.11	1.11	1.02.13		CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	Metro Cúbico	26.45	\$ 1,110,809.00	\$ 29,380,898.00
1.12	1.12	3.12.03		TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-Km	3438.24	\$ 3,006.00	\$ 10,335,349.00





1.13	1.13	3.09.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 60 x 60 cm.	Unidad	7.00	\$	528,220.00	\$	2,075,550.00
1.14	1.14	3.09.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DELINEADORES DE CURVA HORIZONTAL DE TAMAÑO 40*50 cm. SEGÚN NORMA INVÍAS	Unidad	21.00	\$	124,138.00	\$	2,606,898.00
SUBTOTAL									\$ 389,770,476.00
2 CONSTRUIR OBRAS DE DRENAJE									
2.01	2.01	3.02.07	EXCAVACIONES MECÁNICAS VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO	Metro Cúbico	29.87	\$	21,358.00	\$	637,963.00
2.02	2.02	3.03.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLÓPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% RAJÓN PARA BASES	Metro Cúbico	0.77	\$	732,770.00	\$	564,233.00
2.03	2.03	3.03.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLÓPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	Metro Cúbico	4.06	\$	1,124,626.00	\$	4,565,982.00
2.04	2.04	3.03.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36", INCLUYE EMBOQUILLADA	Metro lineal	6.00	\$	937,639.00	\$	5,625,834.00
2.05	2.05	1.11.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	Metro Cúbico	9.57	\$	95,871.00	\$	917,485.00
2.06	2.06	3.03.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	Metro Cúbico	4.51	\$	691,402.00	\$	3,118,223.00
2.07	2.07	1.02.42	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	Kilogramo		\$	9,375.00	\$	-
2.08	2.08	3.03.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	Metro Cúbico		\$	1,065,813.00	\$	-
2.09	NP-05	3.03.14	PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍAS Y CANALES (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	Metro Cuadrado		\$	379,588.00		
SUBTOTAL									\$ 15,429,720.00
3 ITEMS NO PREVISTOS									
3.01	NP-01	1.01.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	Kilometro	0.21	\$	4,965,917.00	\$	1,042,843.00
3.02	NP-02	1.01.07	CORTE ÁRBOL (INCL. RAÍCES) H>3.0	Unidad	6.00	\$	130,387.00	\$	782,322.00
3.03	NP-03	3.10.06	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE).	Metro lineal	1465.29	\$	21,036.00	\$	30,823,840.00
3.04	NP-04	3.03.10	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	Metro Cúbico	7.10	\$	83,911.00	\$	595,768.00
SUBTOTAL									\$ 33,244,773.00

AJUSTE POR ACTA DE MODIFICACIÓN				
TOTAL, COSTOS DIRECTOS				\$ 405,200,196.00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				1.0 \$ 7,950,000.00 \$ 7,950,000.00
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO				1.0 \$ 6,614,932.00 \$ 6,614,932.00
VALOR TOTAL OBRA				\$ 419,765,932.00

Tabla 7: Presupuesto oficial





4.3 CONTROL AVANCE FINANCIERO.

4.4

PROGRAMADO			EJECUTADO		
	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO		PRESENTE PERIODO	ACUMULADO
Obra programada (%)	57.32%	100%	Obra física ejecutada (%)	42.76%	99.99%
Valor de la Obra programada:	\$ 240,609.371,37	\$ 419,765.128.00	Valor de la obra Ejecutada	\$ 179,527,415.00	\$ 419,729,917.00

4.5

4.6 CONTROL AVANCE FÍSICO.

4.7

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	42.68%	57.32%	0,01%
Durante el periodo	57.32%	42.76%	
Acumulado actual	100%	100%	

Tabla 8: Cuadro de avances programados y ejecutados.

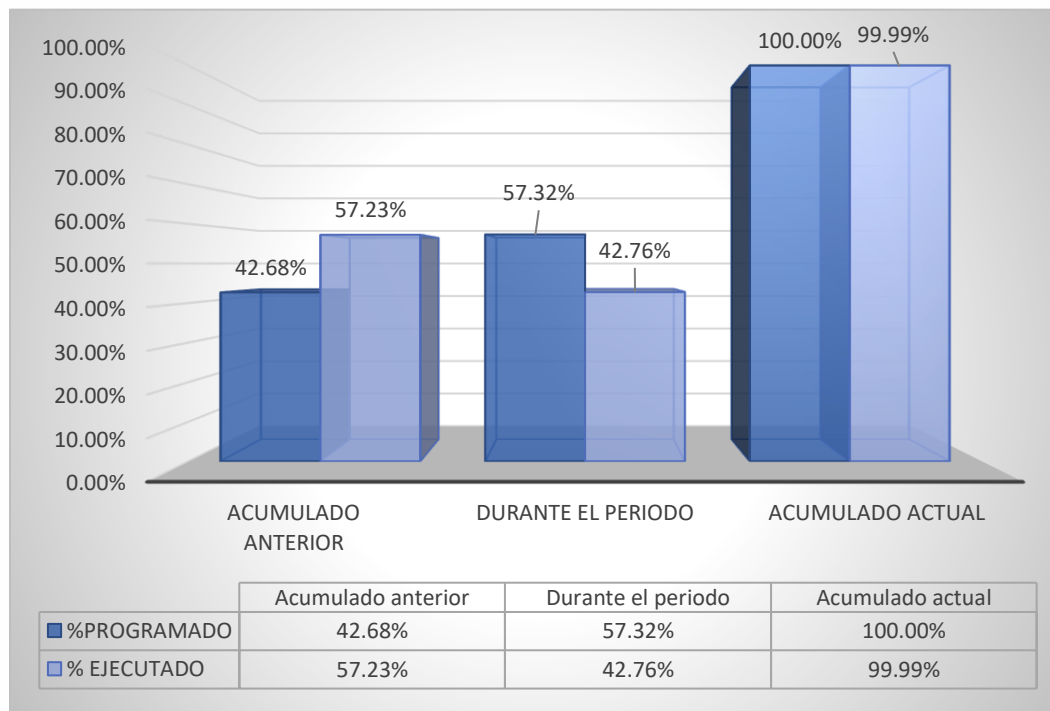


Ilustración 3: Cuadro de documentos legales del contrato.

Las actividades desarrolladas durante el periodo se presentan a continuación:





5 ACTIVIDADES EJECUTADAS PRESENTE INFORME

5.1 CONCRETO CICLÓPEO 21 Mpa (3000PSI) RELACIÓN 60C/40P

Para este periodo se realiza la conformación de las placas laterales y centrales en cada uno de los módulos y de acuerdo a los diseños. Se ejecuta para este periodo los módulos de acuerdo con los diseños, entre las abscisas k0+078 hasta la k0+007, como se evidencia en las memorías de cantidades del “**ACTA DE RECIBO FINAL**”, en donde se reporta un total de 5.85 m³ de Concreto Ciclópeo.



Imagen 01: Conformación de módulos laterales e internos de concreto ciclópeo a la altura de la abscisa k0+099



Imagen 02: Conformación de módulos laterales e internos de concreto ciclópeo a la altura de la abscisa k0+075



Imagen 03: Conformación de módulos laterales e internos de concreto ciclópeo a la altura de la abscisa k0+069.



Imagen 04: Conformación de módulos lateral derecho de concreto ciclópeo a la altura de la abscisa k0+018.

5.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa (3000 PSI) PARA BASES.

Paralelo a conformación de los módulos de ciclópeo, se realiza la conformación de las placa huellas, teniendo en cuenta igualmente con los diseños, en cuanto a la modulación de las mismas y sus dimensiones, y de acuerdo a las especificaciones técnicas. Para esta actividad se realizaron módulos pares y módulos en línea de tres, esta información se encuentra de igual forma en la memoria de cantidades del “**ACTA DE RECIBO FINAL**”. En





resumen, se conforman placa huellas entre las abscisas k0+093 hasta la k0+007, para un total de 31.0 m³ de concreto fundido en placa huellas.



5.3 SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420Mpa.

Para la conformación de los módulos de placa huella, cunetas y bordillos, como se evidencia en las especificaciones técnicas, son concretos reforzados, para esto se incluye esta actividad, en donde se describen y enumeran los elementos que componen cada una de las estructuras, así como en los anteriores numerales, se puede evidenciar al detalle los elementos constituidos en las memorias de cantidades del "**ACTA DE RECIBO FINAL**", se realiza, suministro, figurado y amarre del acero para los módulos de placa huella entre las abscisas k0+093 hasta la k0+007, para las cunetas y el bordillo entre la k0+108 hasta la k0+007 y finalmente las vigas riostras entre k0+096 hasta la k0+0007, para un total instalado de 3,026.58 kg, en el presente reporte.





Imagen 09: Instalación de acero de módulos de Placa Huella a la altura de la abscisa k0+078



Imagen 10: Instalación de acero de módulos de Placa Huella a la altura de la abscisa k0+069



Imagen 11: Instalación de acero de módulos de Cuneta a la altura de la abscisa k0+084



Imagen 12: Instalación de acero de módulos de Cuneta a la altura de la abscisa k0+045



Imagen 13: Instalación de acero de para bordillo a la altura de la abscisa k0+096



Imagen 14: Instalación de acero de para bordillo a la altura de la abscisa k0+054



Imagen 15: Instalación de acero de viga riostra la altura de la abscisa k0+024



Imagen 16: Instalación de acero de viga riostra la altura de la abscisa k0+007





5.4 CUNETA REVESTIDA EN CONCRETO DE 21 Mpa (3000 PSI SIN REFUERZO INCLUYE SELLO DE JUNTAS).

Esta actividad se realiza con la fundida de las cunetas laterales dentro del tramo ejecutado entre las abscisas k0+108 hasta la k0+007, tanto por el costado derecho, como por el izquierdo de la vía, para un total de cuneta fundida de 26.03 M3.



5.5 BORDILLO FUNDIDO EN SITIO 20 X 35 CM

Esta actividad se realiza con la fundida de los bordillos laterales dentro del tramo ejecutado entre las abscisas k0+108 hasta la k0+07, tanto por el costado derecho, como por el izquierdo de la vía, para un total de bordillo fundido de 173.66 metros.





5.6 CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17,5MPA-(2500 PSI)

Esta actividad se encuentra contemplando dentro del contrato, se refiere a las rampas de entrada y salida de la placa huella, a la altura de las abscisas k0+007 y la k0+219 respectivamente con un área total de 24.36 m².



Imagen 23: Conformación de rampa de acceso k+007.



Imagen 24: Conformación de rampa de acceso k+219.

5.7 CONCRETO VIGA DE AMARRE 21.1 Mpa, SECCIÓN RECTANGULAR

A medida que se avanza en conformación de los módulos de concreto ciclópeo y los módulos de placa huella se va avanzando con la conformación de las vigas de confinamiento o vigas riostra. Durante el presente periodo se fundieron 30 unidades, iniciando con la que se ubica en la abscisa k0+213 hasta la k0+096, para un total de 7.68m³.



Imagen 23: Conformación de viga riostra a la altura de la abscisa k0+096



Imagen 24: Conformación de bordillo a la altura de la abscisa k0+015

5.8 Suministro e instalación de señal DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA 60X60CM).

Se hace la instalación de la señalización reglamentaria de acuerdo con los diseños de señalización y las cantidades contratadas una vez finalizada la ejecución del proyecto, para un total de 7 unidades.







	
<i>Imagen 25: Señal de tránsito ubicada en k0+007 costado derecho.</i>	<i>Imagen 26: Señal de tránsito ubicada en k0+010 costado derecho.</i>
	
<i>Imagen 27: Señal de tránsito ubicada en k0+060 costado izquierdo.</i>	<i>Imagen 28: Señal de tránsito ubicada en k0+124 costado izquierdo.</i>
	
<i>Imagen 29: Señal de tránsito ubicada en k0+180 costado izquierdo.</i>	<i>Imagen 30: Señal de tránsito ubicada en k0+180 costado derecho.</i>
	
<i>Imagen 31: Señal de tránsito ubicada en k0+250 costado izquierdo.</i>	

5.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DELINEADORES DE CURVA HORIZONTAL DE TAMAÑO 40*50 cm. SEGÚN NORMA INVIAS

Así como en el ítem anterior se hace la instalación de los delineadores de acuerdo con las cantidades contratadas y la ubicación que describe el diseño de señalización para un total de **21 unidades**.

	
<i>Imagen 32: Señal de tránsito ubicada en k0+180 costado izquierdo.</i>	<i>Imagen 33: Señal de tránsito ubicada en k0+180 costado izquierdo.</i>






Imagen 34: Señal de tránsito ubicada en k0+180 costado izquierdo.	Imagen 35: Señal de tránsito ubicada en k0+180 costado izquierdo.
---	---

5.10 2.01 EXCAVACIONES MECÁNICAS VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO

Esta actividad fue se realizó para la construcción de la alcantarilla, se excavo transversalmente la vía sobre la k0+040, de igual manera se excavo sobre los predios aledaños con autorización previa, por los propietarios, para la construcción de la caja de encole y las obras de descole de la misma.

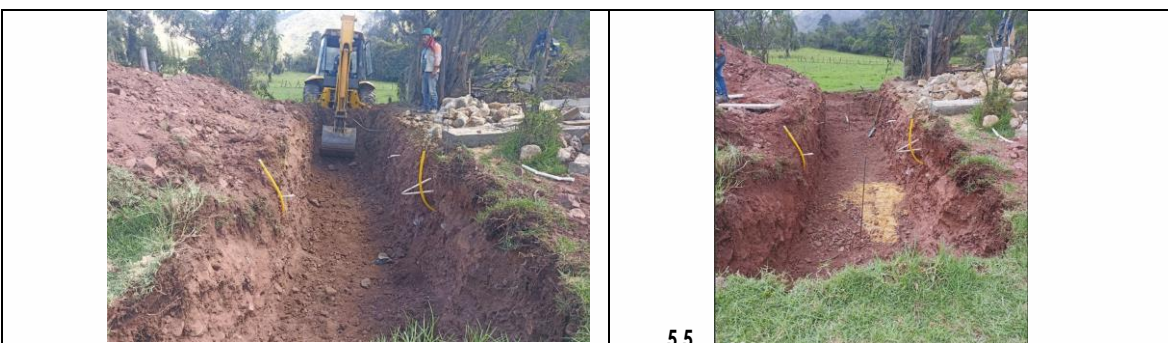


Imagen 36: Excavación para construcción de alcantarilla.

5.11 2.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLÓPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% RAJÓN PARA BASES

El desarrollo de esta actividad se da para crear una base estable para la instalación de la tubería de concreto reforzado, como para las bases de las obras de encole y descole de la alcantarilla.



Imagen 37: Bases en ciclópeo.





5.12 2.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLÓPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES

Este tipo de concreto se utilizó para la conformación de los muros, cabezales, perimetrales y aletas de las obras de encole y descole de la alcantarilla



Imagen 38: Bases en ciclópeo para elevaciones

5.13 2.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36", INCLUYE EMBOQUILLADA

Se hace la instalación de cinco tubos de concreto reforzado de 36", transversalmente a la vía para la construcción de la alcantarilla de acuerdo a los ítems contratados y los diseños del mismo.



Imagen 39: Instalación y emboquillado de tubería en concreto.





5.14 2.05 BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO

Una vez instalada la tubería con sus respectivos atraques se hizo el relleno con material afirmado, para cumplir con los espesores y realizar el debido relleno, tanto de la tubería, como para el contorno de las obras de encole y descole.



Imagen 40: Relleno con material de afirmado.

5.15 2.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES.

Se realiza esta actividad para generar una capa de aislamiento o limpieza antes de iniciar con la conformación de las bases de la tubería y las obras de encole y descole de la alcantarilla.



Imagen 41: Instalación de solado.

5.16 NP-03 SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)

El sello de juntas se realizo en las dilataciones que se generan entre elementos estructurales como las placa huellas, vigas riostras y ciclópeos y de drenaje Como cunetas y bordillos, para evitar que estos presenten fisuración a futuro y para evitar que se filtre el agua de escorrentía a las capas inferiores de la vía.





Sepi

- Gestión Empresarial
- Civiles e Interventoría
- Mécnicos y Estructurales
- Elaboración de Proyectos



Imagen 42: Corte de dilataciones.



Imagen 43: Instalación cordón "JUMBOLOM"



Imagen 44: Producto para juntas



Imagen 45: Aplicación de epóxico para juntas

5.17 NP-04 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN

Para la correcta instalación de las vigas de apoyo o riostras, se realizó la excavación transversal del terreno para instalación de refuerzo y concreto



Imagen 46: Excavaciones para vigas riostras.





6 RESUMEN DE ACTIVIDADES Y AVANCE EJECUTADO.

N	DESCRIPCIÓN	CANT	V. TOTAL
1	IMPLEMENTAR EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS PARA LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO		
1.05	CONCRETO CICLÓPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P	5.85	\$ 4,034,277.00
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	31.00	\$ 33,040,203.00
1.07	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	3026.58	\$ 28,374,188.00
1.08	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	26.03	\$ 24,279,014.00
1.09	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO 20 X 35 CM	173.66	\$ 16,190,669.00
1.10	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17,5MPa - (2500 PSI)	24.36	\$ 4,242,123.00
1.11	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCIÓN RECTANGULAR	7.68	\$ 8,531,013.00
1.12	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).		\$ -
1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 60 x 60 CM	7.00	\$ 3,697,596.00
1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DELINEADORES DE CURVA HORIZONTAL DE TAMAÑO 40*50 cm. SEGÚN NORMA INVIAS	21.00	\$ 2,606,898.00
	SUBTOTAL		\$ 124,995,981.00
2	CONSTRUIR OBRAS DE DRENAJE		
2.01	EXCAVACIONES MECÁNICAS VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO	34.25	\$ 731,512.00
2.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLÓPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% RAJÓN PARA BASES	4.72	\$ 3,458,674.00
2.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLÓPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	3.65	\$ 4,104,885.00
2.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36", INCLUYE EMBOQUILLADA	6.00	\$ 5,625,834.00
2.05	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	12.23	\$ 1,172,502.00
2.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	2.97	\$ 2,053,464.00
2.07	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	188.70	\$ 1,769,063.00
2.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	2.97	\$ 3,165,465.00
	SUBTOTAL		\$ 22,081,399.00
3	ITEMS NO PREVISTOS		
3.03	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	1465.29	\$ 30,823,840.00
3.04	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	19.38	\$ 1,626,195.00
	SUBTOTAL		\$ 32,450,035.00
TOTAL, COSTOS DIRECTOS			\$ 179,527,415.00

Tabla 9: Cantidades ejecutadas.





7. CONTROL DE CALIDAD

7.1 BUEN MANEJO DE MATERIALES.

Contemplando las actividades ejecutadas en el presente periodo, los materiales utilizados son adquiridos a proveedores reconocidos, quienes en el momento de la facturación, anexan verificaciones de calidad y/o fichas técnicas, una vez los materiales en obra, como cemento, arena y acero, se acopian y almacenan de forma que son protegidos de la intemperie, (sol y agua), así como de agentes químicos o biológicos, en el momento de su utilización se tienen en cuenta los criterios técnicos y las recomendaciones de los proveedores. En cuanto a control y seguimiento de los estándares de calidad, para las actividades de preparación y colocación de concretos, se han tomado cilindros y testigos para que de acuerdo a la norma NSR, se lleven a laboratorio para someterlos al fallo, soportando las resistencias exigidas por los diseños (ver anexo)

7.2 CERTIFICADOS DE MATERIALES Y/O FICHAS TÉCNICAS.

Dando cumplimiento con los requerimientos contractuales, se realiza solicitud del certificado de calidad y/o fichas técnicas de los materiales e insumos comprados en el presente periodo (ver anexo)

De igual manera se toman cilindros de los diferentes concretos preparados para la fundida de los diferentes elementos que componen la placa huella



Imagen 47: Toma cilindros concretos ciclópeos



Imagen 48: Toma cilindros concretos de 3000PSI para Placa Huellas .

7.3 ENSAYOS DE LABORATORIO

De acuerdo con los resultados que entrega el laboratorio, se puede evidenciar el cumplimiento en las resistencias de los concretos de acuerdo con los diseños (Ver anexo).





Item	Muestra tomada	Ubicación	Edad de rotura	Resultado
1	PLACA HUELLA 03/10/24	K0+210		
2	PLACA HUELLA 03/10/24	K0+160		
3	CICLÓPEO 10/10/24	K0+120		
4	CICLÓPEO 10/10/24	K0+190		

Tabla 10: Resultados de ensayos de rotura de cilindros.

7.4 ESTADO DEL TIEMPO.

Cabe anotar que el clima predominante durante el periodo del presente periodo fue con presencia de medianas y altas precipitaciones, la época de invierno freno en gran parte la ejecución de las actividades. (veranexo).

8. CONTROL PRESUPUESTAL Y FINANCIERO.

8.1 RELACIÓN DE PAGOS Y BALASE FINANCIERO

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA Y ESTADO FINANCIERO		
CONDICIONES INICIALES		
	%	V. TOTAL
TOTAL, COSTOS DIRECTOS		\$ 293,835,589.60
Administración	24%	\$ 100,743,630.72
Imprevistos	1.00%	\$ 4,197,651.28
Utilidad	5.00%	\$ 20,988,256.40
VALOR TOTAL OBRA		\$ 419,765,128.00
VALOR ANTICIPO	50%	\$ 209,882,564.00
VALOR ACTA ANTERIOR	57.22%	\$ 240,202,502.00
VALOR EJECUTADO PRESENTE INFORME	42.76%	\$ 179,527.415.00
SALDO POR EJECUTAR	0.01%	\$ 35,211

Tabla 11: Control financiero.





9. GESTIÓN AMBIENTAL.

9.1 Durante el periodo del presente informe se identifican los cuerpos de agua cercanos para identificar los posibles impactos relacionados con la ejecución de la obra, de esta manera se determinó inicialmente los puntos de acopio temporal del material granular, para evitar, posibles afectaciones.

9.2 Se realiza humectación a lo largo del tramo para evitar la propagación de material particulado en los predios aledaños.

Los materiales utilizados cuentan con los permisos legales de regulación (ver anexo).

10. GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO.

10.1 Al personal involucrado se afilio al sistema de seguridad. (ver anexo).

10.2 Se realizó charla de inducción al personal que se encontró involucrado durante el periodo.

10.3 Se hace entrega de EPP,s (Casco, guantes, gafas, tapabocas), a cada integrante del grupo operativo.





11. CONCLUSIONES

En pro del cumplimiento al contrato **CO1.PCCNTR.5769147**, con cada uno de los ítems contractuales y de acuerdo con las recomendaciones y observaciones realizadas tanto por la supervisión como de la interventoría, en el presente informe se realizó la descripción detallada de cada uno de los componentes (Técnicos, administrativos, financieros y legales) que como contratistas se desarrollaron para dar cumplimiento estricto a la programación presentada como en estándares de calidad.

De igual manera se hace el reporte de las actividades ejecutadas, descritas y cuantificadas de acuerdo con el informe de avance, allí se plasman las actividades ejecutadas, con sus respectivas cantidades, el porcentaje programado, versus el ejecutado.

De acuerdo con la descripción del este informe, se manifiesta que se cumplió con el objeto del contrato, de acuerdo a especificaciones, actividades y cuantías estipuladas.

Cordialmente,



ING YESID ALONSO FAGUA
Representante Legal
SEPI LTDA





Sepi Ltda.
Servicios Especializados
Profesionales Integrales

- Gestión Empresarial
- Construcción de Obras Civiles e Interventoría
- Diseños Arquitectónicos y Estructurales
- Elaboración de Proyectos



Carrera 12 No. 20-34 • Of. 302
Edificio Miguel Andrés • Tunja - Boyacá
Telefax: (098) 740 2063
e-mail: sepiltda@gmail.com



Sepi Ltda.
Servicios Especializados
Profesionales Integrales

- Gestión Empresarial
- Construcción de Obras Civiles e Interventoría
- Diseños Arquitectónicos y Estructurales
- Elaboración de Proyectos

12. ANEXOS





Sepi Ltda.
Servicios Especializados
Profesionales Integrales

- Gestión Empresarial
- Construcción de Obras Civiles e Interventoría
- Diseños Arquitectónicos y Estructurales
- Elaboración de Proyectos

INFORME DE SUBSANACIÓN A LAS OBSERVACIONES DEL ACTA DE RECIBIDO FINAL

05 DICIEMBRE 2024

CONTRATO:
CO1.PCCNTR.5769147
CONTRATANTE: IMPULSA + SAS



OBJETIVO: “MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUSBANZÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.

CONTRATISTA: SEPI LTDA
REPRESENTANTE LEGAL: YESID ALONSO FAGUA HERRERA

BUSBANZÁ
DICIEMBRE
2024





1. INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta las observaciones realizadas por la Ing. Sandra Rodríguez Márquez, supervisora delegada por parte de la empresa IMPULSA MAS SAS en el "ACTA DE RECIBO FINAL", a continuación, se referencian las actividades desarrolladas,

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

2.1 TERMINAR INSTALACIÓN DE SELLO EN LAS JUNTAS DE LA PLACA HUELLA.

De acuerdo con los pendientes, en esta actividad se completó con el sello de las juntas longitudinales que estaban pendientes entre la abscisa k0+132 a la k0+219, para un total aproximado de 3000 metros lineales de sello de juntas.





Imagen 5: Sello de juntas k0+210



Imagen 6: Sello de juntas k0+219

2.2 REALIZAR LAS DILATACIONES DE LOS BORDILLOS.

De igual manera se realizan las dilataciones de los bordillos en cada sección confrontada con la viga riostra a lo largo de todo el tramo.

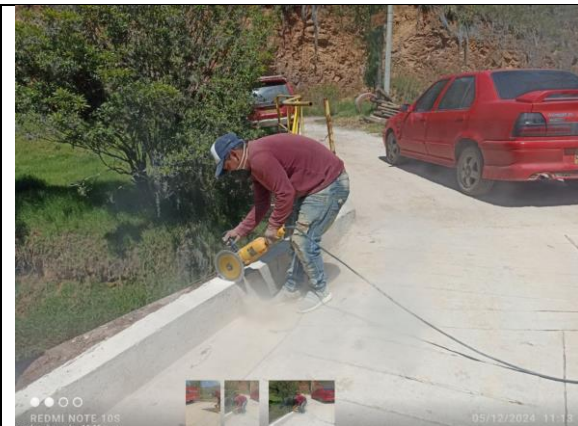


Imagen 7: Corte de dilatación de bordillo k0+010.



Imagen 8: Corte de dilatación de bordillo k0+040.



Imagen 9: Corte de dilatación de bordillo k0+070.



Imagen 10: Corte de dilatación de bordillo k0+090.

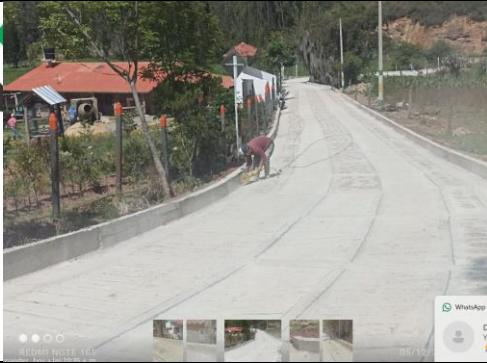


Imagen 11: Corte de dilatación de bordillo k0+120.



Imagen 12: Corte de dilatación de bordillo k0+150.



Imagen 13: Corte de dilatación de bordillo k0+165.



Imagen 14: Corte de dilatación de bordillo k0+185.

2.3 TERMINAR LA INSTALACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN.

- Suministro e instalación de señal de tránsito (preventiva, reglamentaria e informativa) 60x60 cm. Para un total de siete unidades contratadas.



Imagen 15: Instalación de señales k0+020



Imagen 16: Instalación de señales k0+130.



Sepi

- Gestión Empresarial
- Interventoría
- Estructurales
- de Proyectos



Imagen 17: Instalación de señales k0+0



Imagen 18: Instalación de señales k0+190.



Imagen 19: Instalación de señales k0+015.

- Suministro e instalación de delineadores de curva horizontal de tamaño 40x50 cm Según Invias. Para un total de veiti




Imagen 19: Instalación de delineadores de curva entre k0+015/080.



Imagen 20: Instalación de delineadores de curva entre k0+015/080.





SEPI

- Gestión Empresarial
- Obras Civiles e Interventoría
- Estructurales y Estructurales
- Elaboración de Proyectos



Imagen 21: Instalación de delineadores de curva entre k0+130/170.



Imagen 22: Instalación de delineadores de curva entre k0+195/219.

3. CONCLUSIONES

En pro del cumplimiento al contrato **CO1.PCCNTR.5769147**, con cada uno de los ítems contractuales y de acuerdo con las recomendaciones y observaciones realizadas tanto por la supervisión como de la interventoría, en el presente informe se realizó la descripción detallada de cada de las actividades ejecutadas de acuerdo a las recomendadas de la supervisión, haciendo entrega del presente documento como evidencia, para poder cerrar los compromisos del "ACTA DE RECIBO FINAL" dando estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas y a los estándares de calidad.

Cordialmente,

ING YESID ALONSO FAGUA
Representante Legal
SEPI LTDA





Sepi Ltda.
Servicios Especializados
Profesionales Integrales

Gestión Empresarial •
Construcción de Obras Civiles e Interventoría •
Diseños Arquitectónicos y Estructurales •
Elaboración de Proyectos •

PAZ Y SALVO

Yo, JOSÉ DILMO CRISTANCHO, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.068.181 de Busbanzá. Certifico que la empresa **SEPI LTDA**, con Nit: 900.053.752-2. Se encuentra a paz y salvo por concepto de Pago de salarios y prestaciones sociales del contrato de obra N° CO1.PCCNTR.5769147 CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUSBANZÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

El presente certificado, se expide en el municipio de Busbanzá, a los 03 días del mes de Diciembre de 2024.

Atentamente:

FIRMA: 

CEDULA: 4'068'181 de Busbanzá

CELULAR: 3775802182





Sepi Ltda.
Servicios Especializados
Profesionales Integrales

- Gestión Empresarial
- Construcción de Obras Civiles e Interventoría
- Diseños Arquitectónicos y Estructurales
- Elaboración de Proyectos

PAZ Y SALVO

Yo, Jhon Alexander Acevedo, identificado con cedula de ciudadanía No. 7184828 de Tunja. Certifico que la empresa SEPI LTDA, con Nit: 900.053.752-2. Se encuentra a paz y salvo por concepto de Pago de salarios y prestaciones sociales del contrato de obra N° CO1.PCCNTR.5769147 CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUSBANZÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

El presente certificado, se expide en el municipio de Busbanzá, a los 03 días del mes de Diciembre de 2024.

Atentamente:

FIRMA: *Jhon Alexander Acevedo*

CEDULA: 7184828 de Tunja

CELULAR: 327 855 4602.





Sepi Ltda.
Servicios Especializados
Profesionales Integrales

- Gestión Empresarial
- Construcción de Obras Civiles e Interventoria
- Diseños Arquitectónicos y Estructurales
- Elaboración de Proyectos

PAZ Y SALVO

Yo, Edilberto Salamanca Martínez, identificado con cedula de ciudadanía No. 406821 de Busbanzá. Certifico que la empresa **SEPI LTDA**, con Nit: 900.053.752-2. Se encuentra a paz y salvo por concepto de Pago de salarios y prestaciones sociales del contrato de obra N° **CO1.PCCNTR.5769147** CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUSBANZÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

El presente certificado, se expide en el municipio de Busbanzá, a los 03 días del mes de Diciembre de 2024.

Atentamente:

FIRMA: Edilberto Salamanca

CEDULA: 4068218 de Busbanzá

CELULAR: 3232186491





Sepi Ltda.
Servicios Especializados
Profesionales Integrales

Gestión Empresarial •
Construcción de Obras Civiles e Interventoría •
Diseños Arquitectónicos y Estructurales •
Elaboración de Proyectos •

PAZ Y SALVO

Yo, HERLEY RODRÍGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 4068201 de Busbanzá. Certifico que la empresa **SEPI LTDA**, con Nit: 900.053.752-2. Se encuentra a paz y salvo por concepto de Pago de salarios y prestaciones sociales del contrato de obra N° CO1.PCCNTR.5769147 CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUSBANZÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

El presente certificado, se expide en el municipio de Busbanzá, a los 03 días del mes de Diciembre de 2024.

Atentamente:

FIRMA: Rodríguez

CEDULA: 4.068201 de BUSBANZA

CELULAR: 3209204702





Sepi Ltda.
Servicios Especializados
Profesionales Integrales

Gestión Empresarial •
Construcción de Obras Civiles e Interventoría •
Diseños Arquitectónicos y Estructurales •
Elaboración de Proyectos •

PAZ Y SALVO

Yo, VÍCTOR HUGO RONCÓN MARTÍNEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 4068151 de Busbanzá. Certifico que la empresa **SEPI LTDA**, con Nit: 900.053.752-2. Se encuentra a paz y salvo por concepto de Pago de salarios y prestaciones sociales del contrato de obra N° CO1.PCCNTR.5769147 CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUSBANZÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

El presente certificado, se expide en el municipio de Busbanzá, a los 03 días del mes de Diciembre de 2024.

Atentamente:

FIRMA: VICTOR RONCON M

CEDULA: 4068151 de Busbanzá

CELULAR: 3279624857





Sepi Ltda.
Servicios Especializados
Profesionales Integrales

Gestión Empresarial •
Construcción de Obras Civiles e Interventoria •
Diseños Arquitectónicos y Estructurales •
Elaboración de Proyectos •

PAZ Y SALVO

Yo, MISAEL DUCÓN ARAQUE identificado con cedula de ciudadanía No. 4068122 de Busbanzá Certifico que la empresa **SEPI LTDA**, con Nit: 900.053.752-2. Se encuentra a paz y salvo por concepto de Pago de salarios y prestaciones sociales del contrato de obra N° MT-CO-2022-068, cuyo objeto es N° MT-CO-2022-081, cuyo objeto es N° MT-CO-2022-081, cuyo objeto es N° CO1.PCCNTR.5769147 CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUSBANZÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

El presente certificado, se expide en el municipio de Busbanzá, a los 03 días del mes de Diciembre de 2024.

Atentamente:

FIRMA: Misael

CEDULA: 4.068127 de Busbanzá

CELULAR: 320.4653876





Sepi Ltda.
Servicios Especializados
Profesionales Integrales

Gestión Empresarial •
Construcción de Obras Civiles e Interventoría •
Diseños Arquitectónicos y Estructurales •
Elaboración de Proyectos •

PAZ Y SALVO

Yo, JOSÉ DE JESÚS CÁRDENAS MARTÍNEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 4083791 de Busbanzá. Certifico que la empresa SEPI LTDA, con Nit: 900.053.752-2. Se encuentra a paz y salvo por concepto de Pago de salarios y prestaciones sociales del contrato de obra N° CO1.PCCNTR.5769147 CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUSBANZÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

El presente certificado, se expide en el municipio de Busbanzá, a los 03 días del mes de Diciembre de 2024.

Atentamente:

FIRMA: Jesús Cardenas

CEDULA: 4083791 de Cardenas

CELULAR: 321 326 6502





Sepi Ltda.
Servicios Especializados
Profesionales Integrales

- Gestión Empresarial
- Construcción de Obras Civiles e Interventoria
- Diseños Arquitectónicos y Estructurales
- Elaboración de Proyectos

PAZ Y SALVO

Yo, LUIS EDUARDO GONZÁLES, identificado con cedula de ciudadanía No. 4068202 de Busbanzá. Certifico que la empresa **SEPI LTDA**, con Nit: 900.053.752-2. Se encuentra a paz y salvo por concepto de Pago de salarios y prestaciones sociales del contrato de obra N° CO1.PCCNTR.5769147 CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUSBANZÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

El presente certificado, se expide en el municipio de Busbanzá, a los 03 días del mes de Diciembre de 2024.

Atentamente:

FIRMA: Luis Gonzales

CEDULA: 4068202 de Busbanzá

CELULAR: 310 506 9044





Sepi Ltda.
Servicios Especializados
Profesionales Integrales

Gestión Empresarial •
Construcción de Obras Civiles e Interventoría •
Diseños Arquitectónicos y Estructurales •
Elaboración de Proyectos •

PAZ Y SALVO

Yo, YESID JERÓNIMO GALLEGO ADAME, identificado con cedula de ciudadanía No. 10.02.437.118 de Tunja. Certifico que la empresa **SEPI LTDA**, con Nit: 900.053.752-2. Se encuentra a paz y salvo por concepto de Pago de salarios y prestaciones sociales del contrato de obra N° CO1.PCCNTR.5769147 CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUSBANZÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

El presente certificado, se expide en el municipio de Busbanzá, a los 03 días del mes de Diciembre de 2024.

Atentamente:

FIRMA: Jerónimo Adams

CEDULA: 1002437118 de Busbanza

CELULAR: B202694357



Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social SEPI LTDA identificado con el NIT 900053752, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
SGR-SC-012-2024	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES	Busbanza	779,163	2024-12	12-DIC-2024	121903291
		Total	779,163			

Expedido por el SENA, a los doce (12) días del mes de Diciembre de 2024

“LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC.”

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

SENA, MÁS TRABAJO

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2024-12-12

Generado por : Certificados En Linea

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 2535374637 - 350385

SENA, MÁS TRABAJO


EL SUSCRITO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO DE LA
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY
NIT 891800213 - 8
C E R T I F I C A

1. Que los aportes recibidos por la Caja de Compensación Familiar de Boyacá - COMFABOY, se originaron de una relación laboral, por tanto, todo pago de aportes parafiscales que aquí se certifican, se tomaron únicamente de la autoliquidación que efectuó la empresa aportante a través de Planilla PILA.
2. Que los aportes recibidos correspondieron a la autoliquidación de la empresa aportante, quien es la que relaciona trabajadores en la planilla PILA de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 la entidad contratante es quien tiene la obligación de validar y certificar que todos los trabajadores vinculados en la ejecución de la obra debieron estar afiliados a la seguridad social y pago de parafiscales.
3. Que la Caja de compensación al no poder establecer que todos los trabajadores que ejecutaron el contrato están relacionados en esta autoliquidación, se reserva el derecho a realizar las auditorias que correspondan, tanto a la entidad contratante como al contratista sobre los pagos que se debieron cancelar a la seguridad social y parafiscales.
4. Que esta certificación expedida por COMFABOY no tiene efectos de paz y salvo sobre los valores que debería cancelar el contratista respecto de la ejecución del contrato, ni tiene efectos para la afiliación a otra Caja de Compensación Familiar.
5. Que los pagos de aportes mensuales efectuados por la empresa SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROFESIONALES INTEGRALES LIMÍ con nit 900053752 en la vigencia solicitada, se relacionan a continuación:

Fecha	Planilla	# Trab	Val Tot	Consig	Mes Pago	Valor 4%	Pagado	Valor Nomina	Valor Nomina Con Subs. Transp. paplceap
28/02/2024	849463617863	2	67,700	202401	67,700	\$1,690,001	\$1,690,001	\$1,690,001	
21/03/2024	849464344845	1	52,000	202401	52,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	
15/03/2024	849464349785	6	103,400	202402	103,400	\$2,580,002	\$2,580,002	\$2,580,002	
26/04/2024	849464883029	2	98,400	202403	98,400	\$2,460,000	\$2,460,000	\$2,460,000	
14/06/2024	849466256414	2	98,400	202404	98,400	\$2,460,000	\$2,460,000	\$2,460,000	
14/06/2024	849467754450	2	98,400	202405	98,400	\$2,460,000	\$2,460,000	\$2,460,000	
12/07/2024	849469895991	12	335,100	202406	335,100	\$8,363,339	\$8,363,339	\$8,363,339	
16/08/2024	849471367425	9	320,900	202407	320,900	\$8,016,669	\$8,016,669	\$8,016,669	
04/09/2024	849472676804	1	1,800	202407	1,800	\$43,334	\$43,334	\$43,334	
17/09/2024	849473366392	1	52,000	202407	52,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	
17/09/2024	849473427768	3	83,300	202408	83,300	\$2,080,001	\$2,080,001	\$2,080,001	
28/10/2024	849476266827	3	89,100	202409	89,100	\$2,226,667	\$2,226,667	\$2,226,667	
14/11/2024	849477287564	12	504,400	202410	504,400	\$12,595,208	\$12,595,208	\$12,595,208	
TOTALES:			\$1,904,900		\$1,904,900	\$47,575,221	\$47,575,221		

FECHA DE EXPEDICION: 13/12/2024

Cordialmente;



LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VALIDO: LUIS ARIEL RODRIGUEZ - subapo15
DPTO. APORTES Y SUBSIDIO

F - 12 - 276 | Version 2 | 13/09/2018
certificación de aportes 2024 Afil.:701997 NIT: 900053752



Se certifica que FABIAN ALFONSO TORRALBA identificado(a) con CC 74185134 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ASOCIACION DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES NI 900237408																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2024-08	2024-08	825353414	9471063093	Y	2024-08-05																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC				Cotización													
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$1,300,000				\$208,000													
ARL		SEGUROS BOLIVAR		30	6.96%	\$1,300,000				\$90,500													
EPS		SANITAS		30	12.5%	\$1,300,000				\$162,500													

Este certificado se expide el día 2024-08-05 a las 04:50.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900053752	2	SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROFESIONALES SEPI LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPERATIVA	cra 12 n 20 34 ofcna 302	TUNJA-BOYACA	7478807	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1049096782	9477287564	E	2024/11/15	2024/11/14	BANCOLOMBIA	0	\$4,081,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte								
Sucursal: OPERATIVA (11 Afiliados)					\$11,960,006	\$1,914,200			\$11,960,006	\$479,000			\$11,295,208	\$452,400			\$11,960,006	\$833,000			\$0	\$0							
Centro de Trabajo: OPERATIVA (11 Afiliados)					\$11,960,006	\$1,914,200			\$11,960,006	\$479,000			\$11,295,208	\$452,400			\$11,960,006	\$833,000			\$0	\$0							
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (11 Afiliados)					\$11,960,006	\$1,914,200			\$11,960,006	\$479,000			\$11,295,208	\$452,400			\$11,960,006	\$833,000			\$0	\$0							
1	CC	7184828	ACEVEDO JOHN	230301	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS037	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF10	28	\$1,213,334	\$48,600	14-11	28	\$1,213,334	\$84,500	28	\$0	\$0							
2	CC	4083791	CARDENAS JOSE	230301	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS037	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF10	28	\$1,213,334	\$48,600	14-11	28	\$1,213,334	\$84,500	28	\$0	\$0							
3	CC	4068181	CRISTANCHO JOSE	230301	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS037	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF10	28	\$1,213,334	\$48,600	14-11	28	\$1,213,334	\$84,500	28	\$0	\$0							
4	CC	4068127	DUCON MISAEL	230201	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS041	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF10	28	\$1,213,334	\$48,600	14-11	28	\$1,213,334	\$84,500	28	\$0	\$0							
5	CC	1002437118	GALLEGRO YESID	230301	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS037	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF10	28	\$1,213,334	\$48,600	14-11	28	\$1,213,334	\$84,500	28	\$0	\$0							
6	CC	4068202	GONZALEZ LUIS	230301	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS037	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF10	28	\$1,213,334	\$48,600	14-11	28	\$1,213,334	\$84,500	28	\$0	\$0							
7	CC	7184656	GONZALEZ PABLO	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0							
8	CC	1049619759	RATIVA DANIEL	230301	19	\$823,334	\$131,800	EPS041	19	\$823,334	\$33,000	CCF10	19	\$823,334	\$33,000	14-11	19	\$823,334	\$57,400	19	\$0	\$0							
9	CC	4068151	RINCON VICTOR	230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS037	1	\$43,334	\$1,800	CCF10	1	\$43,334	\$1,800	14-11	1	\$43,334	\$3,100	1	\$0	\$0							
10	CC	4068201	RODRIGUEZ HERLEY	25-14	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS037	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF10	28	\$688,536	\$27,600	14-11	28	\$1,213,334	\$84,500	28	\$0	\$0							
11	CC	7179916	TORRES JUAN	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0							
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte								
Sucursal: SOGAMOSO (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$90,500			\$0	\$0							
Centro de Trabajo: SOGAMOSO (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$90,500			\$0	\$0							
Ciudad: SOGAMOSO Depto: BOYACA (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$90,500			\$0	\$0							
12	CC	7172119	FAGUA YESID	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0							
Total	Afiliados(12)				\$13,260,006	\$2,122,200			\$13,260,006	\$531,000			\$12,595,208	\$504,400			\$13,260,006	\$923,500			\$0	\$0							

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900053752	2	SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROFESIONALES SEPI LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPERATIVA	cra 12 n 20 34 oficna 302	TUNJA-BOYACA	7478807	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1049096782	9477287564	E	2024/11/15	2024/11/14	BANCOLOMBIA	0	\$4,081,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	\$2,122,200	\$0	\$0	\$2,122,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$194,200	\$0	\$0	\$194,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	\$1,525,800	\$0	\$0	\$1,525,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$402,200	\$0	\$0	\$402,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$923,500	\$0	\$0	\$923,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	\$923,500	\$0	\$0	\$923,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$504,400	\$0	\$0	\$504,400	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	12	\$504,400	\$0	\$0	\$504,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				12	\$531,000	\$0	\$0	\$531,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	\$397,400	\$0	\$0	\$397,400	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$81,600	\$0	\$0	\$81,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
TOTAL				12	\$4,081,100	\$0	\$0	\$4,081,100	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900053752	2	SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROFESIONALES SEPI LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPERATIVA	cra 12 n 20 34 oficina 302	TUNJA-BOYACA	7478807	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-09	2024-10	1006518283	9476266827	E	2024/10/11	2024/10/28	BANCOLOMBIA	\$717,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte							
Sucursal: OPERATIVA (2 Afiliados)						\$996,667	\$159,500			\$996,667	\$39,900			\$926,667	\$37,100			\$996,667	\$69,500			\$0	\$0						
Centro de Trabajo: OPERATIVA (2 Afiliados)						\$996,667	\$159,500			\$996,667	\$39,900			\$926,667	\$37,100			\$996,667	\$69,500			\$0	\$0						
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (2 Afiliados)						\$996,667	\$159,500			\$996,667	\$39,900			\$926,667	\$37,100			\$996,667	\$69,500			\$0	\$0						
1	CC	7184656	GONZALEZ TORRES PABLO ISIDORO	230301	8	\$346,667	\$55,500	EPS037	8	\$346,667	\$13,900	CCF10	8	\$346,667	\$13,900	14-11	8	\$346,667	\$24,200	8	\$0	\$0							
2	CC	7179916	TORRES HERNANDEZ JUAN CARLOS	230301	15	\$650,000	\$104,000	EPS037	15	\$650,000	\$26,000	CCF10	15	\$580,000	\$23,200	14-11	15	\$650,000	\$45,300	15	\$0	\$0							
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte							
Sucursal: SOGAMOSO (1 Afiliados)						\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$90,500			\$0	\$0						
Centro de Trabajo: SOGAMOSO (1 Afiliados)						\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$90,500			\$0	\$0						
Ciudad: SOGAMOSO Depto: BOYACA (1 Afiliados)						\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$90,500			\$0	\$0						
3	CC	7172119	FAGUA HERRERA YESID ALONSO	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0							
Total	Afiliados(3)					\$2,296,667	\$367,500			\$2,296,667	\$91,900			\$2,226,667	\$89,100			\$2,296,667	\$160,000			\$0	\$0						

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900053752	2	SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROFESIONALES SEPI LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPERATIVA	cra 12 n 20 34 oficna 302	TUNJA-BOYACA	7478807	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	1006518283	9476266827	E	2024/10/11	2024/10/28	BANCOLOMBIA		\$717,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$367,500	\$0	\$372,100		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$159,500	\$0	\$161,500		
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$208,000	\$0	\$210,600		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$160,000	\$0	\$162,000		
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	\$160,000	\$0	\$162,000		
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$89,100	\$0	\$90,200		
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	\$89,100	\$0	\$90,200		
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$91,900	\$0	\$93,100		
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$39,900	\$0	\$40,400		
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$52,000	\$0	\$52,700		
TOTAL				3	\$708,500	\$0	\$717,400		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900053752	2	SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROFESIONALES SEPI LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPERATIVA	cra 12 n 20 34 oficna 302	TUNJA-BOYACA	7478807	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	515112798	9464349785	E	2024/03/13	2024/03/15	BANCOLOMBIA	2	\$877,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: OPERATIVA (5 Afiliados)																																										
Centro de Trabajo: OPERATIVA (5 Afiliados)																																										
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (5 Afiliados)																																										
1	CC	1052000090	DAZA JAIVER EDINSON																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$396,900
2	CC	4047088	DAZA VACA LUIS ALIRIO	X	X																230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS041	2	\$86,667	\$3,500	CCF10	2	\$86,667	\$3,500	14-11	2	\$86,667	6.960%	\$6,100	2	\$0	\$0	Si	\$27,000
3	CC	4047120	DAZA GAMEZ LUIS ERIBERTO	X	X																230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS037	2	\$86,667	\$3,500	CCF10	2	\$86,667	\$3,500	14-11	2	\$86,667	6.960%	\$6,100	2	\$0	\$0	Si	\$27,000
4	CC	7172119	FAGUA HERRERA YESID ALONSO																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$396,900
5	CC	1052000130	LINARES CARDENAS JOHN JAIRO		X																230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS037	1	\$43,334	\$1,800	CCF10	1	\$43,334	\$1,800	14-11	1	\$43,334	6.960%	\$3,100	1	\$0	\$0	Si	\$13,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: TUNJA (1 Afiliados)																																										
Centro de Trabajo: TUNJA ALCALDIA (1 Afiliados)																																										
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																																										
6	CC	74243717	ARIAS TORRES JOSE ANTONIO	X																	230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS008	1	\$43,334	\$1,800	CCF10	1	\$43,334	\$1,800	14-11	1	\$43,334	6.960%	\$3,100	1	\$0	\$0	Si	\$13,700
Total Afiliados(6)																					\$2,860,002	\$457,800	\$2,860,002	\$114,600	\$2,580,002	\$103,400	\$2,860,002	\$199,400	\$0	\$0	\$875,200											

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900053752	2	SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROFESIONALES SEPI LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPERATIVA	cra 12 n 20 34 oficina 302	TUNJA-BOYACA	7478807	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	515112798	9464349785	E	2024/03/13	2024/03/15	BANCOLOMBIA	2	\$877,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	\$457,800	\$900	\$0	\$458,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$249,800	\$500	\$0	\$250,300	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$208,000	\$400	\$0	\$208,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$199,400	\$400	\$0	\$199,800	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	\$199,400	\$400	\$0	\$199,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$103,400	\$200	\$0	\$103,600	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	6	\$103,400	\$200	\$0	\$103,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	\$114,600	\$400	\$0	\$115,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$1,800	\$100	\$0	\$1,900	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$5,300	\$100	\$0	\$5,400	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$55,500	\$100	\$0	\$55,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$52,000	\$100	\$0	\$52,100	
TOTAL				6	\$875,200	\$1,900	\$0	\$877,100	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900053752	2	SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROFESIONALES SEPI LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPERATIVA	cra 12 n 20 34 ofcina 302	TUNJA-BOYACA	7478807	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2024-07	2024-08	9471367425	9471367425	E	2024/08/14	2024/08/16	BANCO DE BOGOTA	\$2,487,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte							
Sucursal: SOGAMOSO (9 Afiliados)						\$8,016,669	\$1,282,900			\$8,016,669	\$320,900			\$8,016,669	\$320,900			\$8,016,669	\$558,600		\$0	\$0							
Centro de Trabajo: SOGAMOSO (9 Afiliados)						\$8,016,669	\$1,282,900			\$8,016,669	\$320,900			\$8,016,669	\$320,900			\$8,016,669	\$558,600		\$0	\$0							
Ciudad: SOGAMOSO Depto: BOYACA (9 Afiliados)						\$8,016,669	\$1,282,900			\$8,016,669	\$320,900			\$8,016,669	\$320,900			\$8,016,669	\$558,600		\$0	\$0							
1	CC	1085102209	CHACON BELENO YESION	230201	20	\$866,667	\$138,700	EPS002	20	\$866,667	\$34,700	CCF10	20	\$866,667	\$34,700	14-11	20	\$866,667	\$60,400	20	\$0	\$0							
2	CC	7172119	FAGUA HERRERA YESID ALONSO	230201	15	\$650,000	\$104,000	EPS005	15	\$650,000	\$26,000	CCF10	15	\$650,000	\$26,000	14-11	15	\$650,000	\$45,300	15	\$0	\$0							
3	CC	1049432395	GARCIA MENDIVELSO LUIS JOSE	230301	20	\$866,667	\$138,700	EPS037	20	\$866,667	\$34,700	CCF10	20	\$866,667	\$34,700	14-11	20	\$866,667	\$60,400	20	\$0	\$0							
4	CC	7162370	GONZALEZ BARAHONA FABRICIANO	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0							
5	CC	1057586436	LOPEZ DIAZ JOSE MANUEL	230301	20	\$866,667	\$138,700	EPS037	20	\$866,667	\$34,700	CCF10	20	\$866,667	\$34,700	14-11	20	\$866,667	\$60,400	20	\$0	\$0							
6	PT	1143427	MENDOZA LUGO OSCAR JESUS	230301	20	\$866,667	\$138,700	EPS037	20	\$866,667	\$34,700	CCF10	20	\$866,667	\$34,700	14-11	20	\$866,667	\$60,400	20	\$0	\$0							
7	CC	1057586350	PEREZ FONSECA JHONATAN ALFONSO	230301	20	\$866,667	\$138,700	EPS017	20	\$866,667	\$34,700	CCF10	20	\$866,667	\$34,700	14-11	20	\$866,667	\$60,400	20	\$0	\$0							
8	PT	1410560	ROJAS SALAZAR MANUEL SALVADOR	230301	20	\$866,667	\$138,700	EPS037	20	\$866,667	\$34,700	CCF10	20	\$866,667	\$34,700	14-11	20	\$866,667	\$60,400	20	\$0	\$0							
9	CC	86075652	SALGADO MARIN MESIAS ALEXANDER	230301	20	\$866,667	\$138,700	EPS037	20	\$866,667	\$34,700	CCF10	20	\$866,667	\$34,700	14-11	20	\$866,667	\$60,400	20	\$0	\$0							
Total	Afiliados(9)					\$8,016,669	\$1,282,900			\$8,016,669	\$320,900			\$8,016,669	\$320,900			\$8,016,669	\$558,600		\$0	\$0							

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900053752	2	SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROFESIONALES SEPI LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPERATIVA	cra 12 n 20 34 oficna 302	TUNJA-BOYACA	7478807	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	9471367425	9471367425	E	2024/08/14	2024/08/16	BANCO DE BOGOTA		\$2,487,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	\$1,282,900	\$0	\$1,285,000		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$208,000	\$0	\$208,400		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	\$832,200	\$0	\$833,500		
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$242,700	\$0	\$243,100		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$558,600	\$0	\$559,500		
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	\$558,600	\$0	\$559,500		
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$320,900	\$0	\$321,400		
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	9	\$320,900	\$0	\$321,400		
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				9	\$320,900	\$0	\$321,600		
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$34,700	\$0	\$34,800		
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$173,500	\$0	\$173,800		
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$52,000	\$0	\$52,100		
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$34,700	\$0	\$34,800		
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$26,000	\$0	\$26,100		
TOTAL				9	\$2,483,300	\$0	\$2,487,500		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900053752	2	SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROFESIONALES SEPI LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPERATIVA	cra 12 n 20 34 oficina 302	TUNJA-BOYACA	7478807	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	920199286	9473427768	E	2024/09/12	2024/09/17	BANCO DAVIVIENDA		\$577,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte							
Sucursal: OPERATIVA (1 Afiliados)					\$1,083,334	\$173,400			\$1,083,334	\$43,400			\$1,083,334	\$43,400			\$1,083,334	\$5,700			\$0	\$0							
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVA (1 Afiliados)					\$1,083,334	\$173,400			\$1,083,334	\$43,400			\$1,083,334	\$43,400			\$1,083,334	\$5,700			\$0	\$0							
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					\$1,083,334	\$173,400			\$1,083,334	\$43,400			\$1,083,334	\$43,400			\$1,083,334	\$5,700			\$0	\$0							
1	CC	33376333	VERGARA ALVARADO SINDY HASBLEVDY	25-14	25	\$1,083,334	\$173,400	EPS005	25	\$1,083,334	\$43,400	CCF10	25	\$1,083,334	\$43,400	14-11	25	\$1,083,334	\$5,700	25	\$0	\$0							
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte							
Sucursal: SOGAMOSO (2 Afiliados)					\$996,667	\$159,500			\$996,667	\$39,900			\$996,667	\$39,900			\$996,667	\$69,500			\$0	\$0							
Centro de Trabajo: SOGAMOSO (2 Afiliados)					\$996,667	\$159,500			\$996,667	\$39,900			\$996,667	\$39,900			\$996,667	\$69,500			\$0	\$0							
Ciudad: SOGAMOSO Depto: BOYACA (2 Afiliados)					\$996,667	\$159,500			\$996,667	\$39,900			\$996,667	\$39,900			\$996,667	\$69,500			\$0	\$0							
2	CC	7172119	FAGUA HERRERA YESID ALONSO	230201	9	\$390,000	\$62,400	EPS005	9	\$390,000	\$15,600	CCF10	9	\$390,000	\$15,600	14-11	9	\$390,000	\$27,200	9	\$0	\$0							
3	CC	7162370	GONZALEZ BARAHONA FABRICIANO	25-14	14	\$606,667	\$97,100	EPS041	14	\$606,667	\$24,300	CCF10	14	\$606,667	\$24,300	14-11	14	\$606,667	\$42,300	14	\$0	\$0							
Total	Afiliados (3)				\$2,080,001	\$332,900			\$2,080,001	\$83,300			\$2,080,001	\$83,300			\$2,080,001	\$75,200			\$0	\$0							

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900053752	2	SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROFESIONALES SEPI LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPERATIVA	cra 12 n 20 34 oficna 302	TUNJA-BOYACA	7478807	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-08	2024-09	920199286	9473427768	E	2024/09/12	2024/09/17	BANCO DAVIVIENDA			\$577,100

RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR			
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$332,900	\$0	\$334,200			
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$270,500	\$0	\$271,500			
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$62,400	\$0	\$62,700			
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$75,200	\$0	\$75,500			
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	\$75,200	\$0	\$75,500			
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$83,300	\$0	\$83,700			
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	\$83,300	\$0	\$83,700			
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$83,300	\$0	\$83,700			
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$24,300	\$0	\$24,400			
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$59,000	\$0	\$59,300			
TOTAL				3	\$574,700	\$0	\$577,100			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900053752	2	SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROFESIONALES SEPI LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPERATIVA	cra 12 n 20 34 oficina 302	TUNJA-BOYACA	7478807	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-09	2024-10	1006518283	9476266827	E	2024/10/11	2024/10/28	BANCOLOMBIA	\$717,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: OPERATIVA (2 Afiliados)						\$996,667	\$159,500			\$996,667	\$39,900			\$926,667	\$37,100			\$996,667	\$69,500		\$0	\$0
Centro de Trabajo: OPERATIVA (2 Afiliados)						\$996,667	\$159,500			\$996,667	\$39,900			\$926,667	\$37,100			\$996,667	\$69,500		\$0	\$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (2 Afiliados)						\$996,667	\$159,500			\$996,667	\$39,900			\$926,667	\$37,100			\$996,667	\$69,500		\$0	\$0
1	CC	7184656	GONZALEZ TORRES PABLO ISIDORO	230301	8	\$346,667	\$55,500	EPS037	8	\$346,667	\$13,900	CCF10	8	\$346,667	\$13,900	14-11	8	\$346,667	\$24,200	8	\$0	\$0
2	CC	7179916	TORRES HERNANDEZ JUAN CARLOS	230301	15	\$650,000	\$104,000	EPS037	15	\$650,000	\$26,000	CCF10	15	\$580,000	\$23,200	14-11	15	\$650,000	\$45,300	15	\$0	\$0
EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: SOGAMOSO (1 Afiliados)						\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$90,500		\$0	\$0
Centro de Trabajo: SOGAMOSO (1 Afiliados)						\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$90,500		\$0	\$0
Ciudad: SOGAMOSO Depto: BOYACA (1 Afiliados)						\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$90,500		\$0	\$0
3	CC	7172119	FAGUA HERRERA YESID ALONSO	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0
Total	Afiliados(3)					\$2,296,667	\$367,500			\$2,296,667	\$91,900			\$2,226,667	\$89,100			\$2,296,667	\$160,000		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900053752	2	SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROFESIONALES SEPI LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPERATIVA	cra 12 n 20 34 oficna 302	TUNJA-BOYACA	7478807	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	1006518283	9476266827	E	2024/10/11	2024/10/28	BANCOLOMBIA		\$717,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$367,500	\$0	\$372,100		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$159,500	\$0	\$161,500		
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$208,000	\$0	\$210,600		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$160,000	\$0	\$162,000		
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	\$160,000	\$0	\$162,000		
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$89,100	\$0	\$90,200		
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	\$89,100	\$0	\$90,200		
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$91,900	\$0	\$93,100		
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$39,900	\$0	\$40,400		
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$52,000	\$0	\$52,700		
TOTAL				3	\$708,500	\$0	\$717,400		

No. PÓLIZA	BY-100039900	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	36184461	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	10/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del 29/01/2024		24:00 Horas Del 31/12/2027			N/A		N/A
TOMADOR	SEPI LIMITADA					No. DOC. IDENTIDAD	900.053.752-2
DIRECCIÓN	CRA 12 N 20 - 34 OFC. 302					TELÉFONO	3183580321
ASEGURADO	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL IMPULSA MAS S.A.S					No. DOC. IDENTIDAD	901.700.548-6
DIRECCIÓN	CR 9 29 63					TELÉFONO	3104248374
BENEFICIARIO	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL IMPULSA MAS S.A.S					No. DOC. IDENTIDAD	901.700.548-6
DIRECCIÓN	CR 9 29 63					TELÉFONO	3104248374

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA POLIZA SEGUN ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 28/10/2024. GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.5769147, CUYO OBJETO ES

MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUSBANZÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 17/10/2024	24:00 Horas Del 11/03/2025	41.977.360,50	0,00
PAGO ANTICIPADO	00:00 Horas Del 17/10/2024	24:00 Horas Del 13/05/2025	209.886.802,50	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 17/10/2024	24:00 Horas Del 17/12/2027	20.988.680,25	0,00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	00:00 Horas Del 17/10/2024	24:00 Horas Del 13/07/2025	41.977.360,50	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 28/12/2024	24:00 Horas Del 28/10/2026	41.977.360,50	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 356.807.564,25	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN	PRIMA BRUTA	\$	0,00
ASESORAMOS WJL L.T.D.A	AGENCIAS	100,00	DESCUENTOS	\$	

DISTRIBUCIÓN COASEGURO					EXTRA PRIMA	
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN	PRIMA NETA	\$ 0,00
					GASTOS EXP.	\$ 0,00
					IVA	\$ 0,00
					TOTAL A PAGAR	\$ 0,00

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 10/12/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTECIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUOSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	BY-100039900	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	36184461	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	10/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del	29/01/2024	24:00 Horas Del	31/12/2027		N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.seguosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@seguosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"



Busbanzá, 10 de diciembre de 2024

Doctor:

JHON STEVEN AGUDELO LÓPEZ

Representante legal

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL IMPULSA MAS S.A.S,

NIT. 901.700.548-6

ING. CIVIL

SANDRA RODRÍGUEZ MÁRQUEZ

Supervisora

Quimbaya - Quindío

supervision@impulsamas.com.co

supervisionimpulsa@gmail.com

REF: **INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA Y AVAL PARA PAGO FINAL** contrato de obra cuyo objeto es: **“MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUSBANZÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**

Por medio de la presente allego documentos, avales, revisión de documentos, **INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA** y **AVAL PARA PAGO FINAL** para el contrato de obra cuyo objeto es: **“MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUSBANZÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.**

Se anexa:

- 1- Acta Final de Obra
- 2- Informe Final De Interventoría Y Aval Para Pago Final (seguimiento Pólizas, aportes al sistema de seguridad social, equipos utilizados, ensayos de laboratorio de obra y de interventoría con sus correspondientes anexos)
- 3- Informe Final contratista
- 4- Memoria de cantidades de obra
- 5- Bitácora de obra
- 6- Planos Récord de Obra
- 7- Comités de obra
- 8- Documentos para fijación de Ítems No previstos

Cordialmente,



ARQ. JUAN MANUEL ROJAS MORENO

C.C No.: 1.052.020.253 de Floresta -Boyacá

INTERVENTOR al contrato de obra N° SGR-SC-012-2024

Contrato de Interventoría No. SGR-SD-015-2024

**INFORME FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. CO1.PCCNTR.5783773
PROCESO DE SELECCIÓN No. SGR-SD-015-2024**

INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA Y AVAL PARA PAGO FINAL

**CONTRATO DE OBRA N° SGR-SC-012-2024
CO1.PCCNTR.5769147**

**“MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUSBANZÁ, DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ**



**CONTRATO DE INTERVENTORÍA N.. CO1.PCCNTR.5783773
PROCESO DE SELECCIÓN No. SGR-SD-015-2024
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO QUE TIENE
POR OBJETO “MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUSBANZÁ,
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**

CONTRATISTA: JUAN MANUEL ROJAS MORENO

**BUSBANZA
DICIEMBRE 10 DE 2024**

**INFORME FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. CO1.PCCNTR.5783773
PROCESO DE SELECCIÓN No. SGR-SD-015-2024**

**INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA Y AVAL PARA PAGO FINAL
CONTRATO DE OBRA N° SGR-SC-012-2024
CO1.PCCNTR.5769147**

**“MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUSBANZÁ, DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ**

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE INVERSION – SGR


1.1. INTRODUCCIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto contempla el mejoramiento de vías rurales en concreto rígido sistema placa huella en una longitud de 225 ml, mediante el cuneteo perfilado y compactación de la banca existente, construcción de estructura mediante la aplicación de subbase granular, construcción de huellas en concreto rígido (De acuerdo con determinaciones del diseño geométrico) construcción de cunetas y bordillos laterales. Se plantean técnicas de mejoramiento para la estructura de pavimento en tipo placa huella para atender necesidades tanto funcionales como estructurales de la red vial terciaria en el siguiente Tramo:

- 1- construcción de placa huella desde la vía principal Pavimentada que comunica Busbanza con Corrales en la vereda de Tobo Parte Baja, cruce del ramal vial terciario de acceso en la vereda de Tobo Parte Baja en el km 0 + 000 hasta el km 0 + 225, sección longitudinal de 0,225 Km, sección transversal Variable según diseño geométrico; incluyendo cunetas y bordillos laterales, con un espesor de 15 cm de placa huella y 20 cm de espesor en viga riostra; También contempla la construcción de una alcantarilla de 36” de 6 ml de longitud.

1.2. LOCALIZACION DE LA ALTERNATIVA.

El Proyecto Se Encuentra Localizado En La zona rural del municipio de Busbanzá

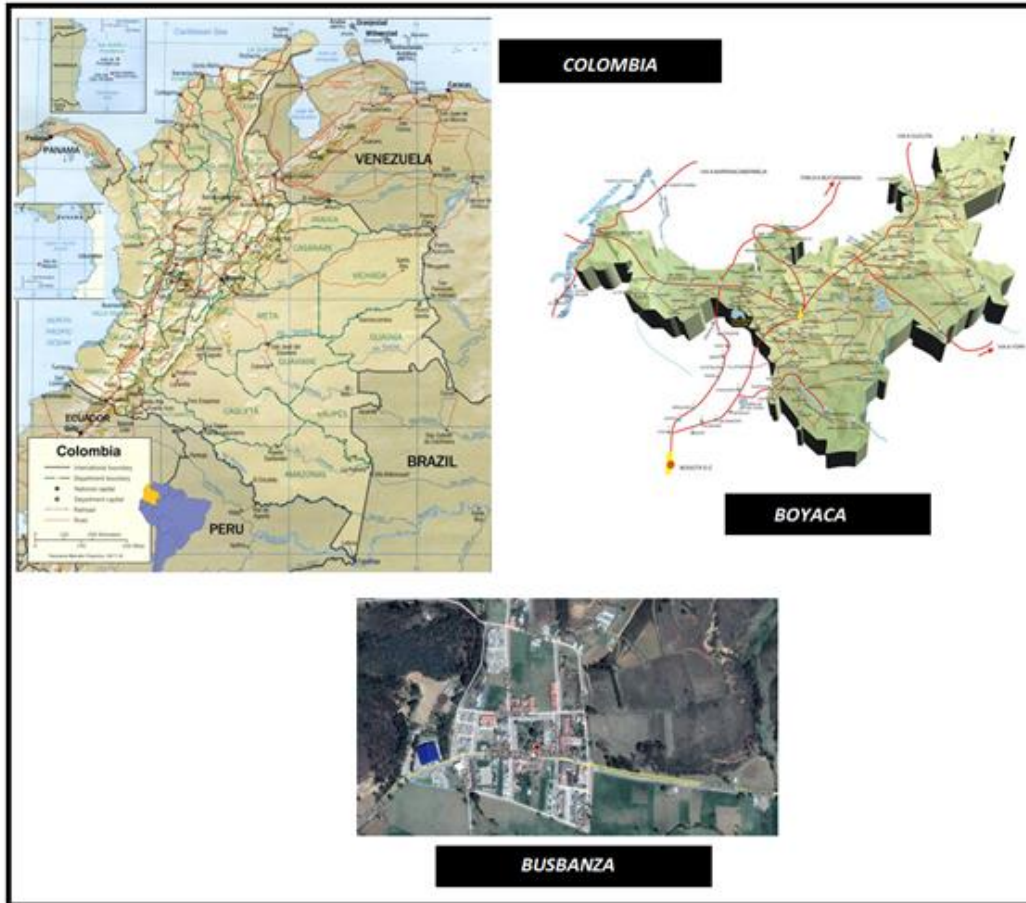

1.3. LOCALIZACION ESPECIFICA

Corredor vial vereda de Tobo Parte Baja del Municipio de Busbanzá Departamento de Boyacá y específicamente en el tramo:

1- construcción de placa huella desde la vía principal Pavimentada que comunica Busbanza con Corrales en la vereda de Tobo Parte Baja, cruce del ramal vial terciario de acceso en la vereda de Tobo Parte Baja en el km 0 + 000 hasta el km 0 + 225, sección longitudinal de 0,225 Km,

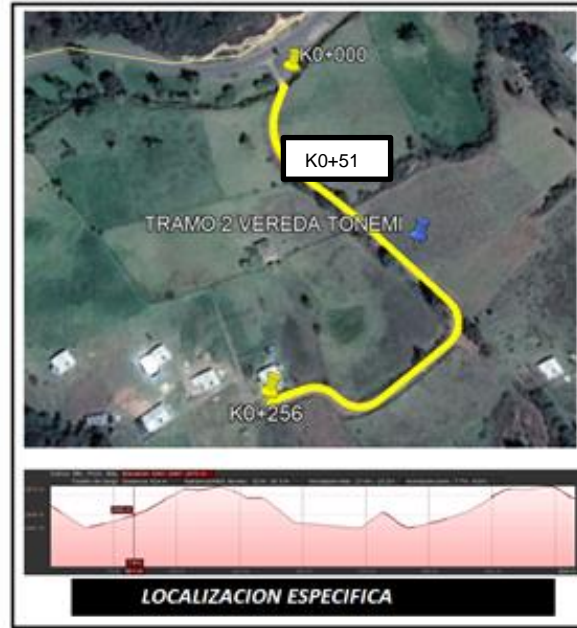


Figura 2. Localización Específica tramo del Proyecto
 Fuente. Google Earth

TRAMO 1. TOBO PARTE BAJA	
NICIO K0+000 N:1136500.677 E:1133199.056	FIN: K0+2225 N:1136350.499 E:1133187.162

1.4. ANEXO FOTOGRÁFICO



1.5. CADENA DE VALOR DEL PROYECTO DE INVERSION

Nombre de proyecto		MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUSBANZÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ			
Objetivo general del proyecto		Mejorar la intercomunicación terrestre de una parte de la población rural del Municipio de Busbanzá			
Cauda directa	Objetivo específico	Producto	Unidad de medida	de actividad	Costo total (incluye AIU)
Deterioro de las vías rurales	Mejorar vías rurales del municipio	COSTO DE INVERSION			
		Via terciaria mejorada	Kilomeros de vías terciarias	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	\$ 389.778.932,62
				CONTRUIR OBRAS DE DRENAJE	\$ 15.429.740,64
				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL -PMA	\$7.950.000
				PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT	\$ 6.614.932
				INTERVENTORIA	\$ 30.403.697,61
TOTAL COSTO DEL PROYECTO					\$ 450.177.302,88

2. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

INFORMACIÓN GENERAL DE INTERVENTORIA	
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5783773
PROCESO DE SELECCIÓN No.	SGR-SD-015-2024
NOMBRE DE CONTRATANTE	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL IMPULSA MAS S.A.S, NIT. 901.700.548-6
NOMBRE CONTRATISTA OBRA	JUAN MANUEL ROJAS MORENO
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DELCONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE VÍASRURALES EN EL MUNICIPIO DE BUSBANZÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".
DATOS DE CONTACTO CONTRATISTA OBRA (TELEFONO Y E-MAIL)	juanmaro8803@gmail.com 310 698 74 77
FECHA INICIO	29 DE ENERO DE 2024
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	29 DE MAYO DE 2024

SUSPENSION	AMPLIACIÓN 1 A LA SUS 01 11 DE MARZO DE 2024 AMPLIACIÓN 2 A LA SUS 01 11 DE ABRIL DE 2024 AMPLIACIÓN 3 A LA SUS 01 11 DE MAYO DE 2024 AMPLIACIÓN 4 A LA SUS 01 11 DE JUNIO DE 2024
REINICIO 01	27 DE JUNIO DE 2023
PRORROGA 01	17 DE OCTUBRE DE 2024 (60 DIAS)
PLAZO FINAL	SEIS (6) MESES
FECHA TERMINACIÓN FINAL	17 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL	TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS M/CTE(\$30.403.697,61)
ADICIONES	N/A
VALOR FINAL	TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS M/CTE(\$30.403.697,61)

2.1. ACTAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

DESCRIPCIÓN	FECHA		
	Dd	mm	aaaa
Firma del contrato	19	01	2024
Acta de inicio	29	01	2024
Suspensión 01	16	02	2024
Ampliación 01 a la suspensión 01	11	03	2024
Ampliación 02 a la suspensión 01	11	04	2024
Ampliación 03 a la suspensión 01	11	05	2024
Ampliación 04 a la suspensión 01	11	06	2024
Reinicio 01	11	06	2024
PRORROGA 1	17	10	2024

2.2. INFORMACIÓN LEGAL DE CONTARTO INTERVENTORIA: GARANTIAS Y POLIZAS

No.	No. Póliza	Fecha Expedida.	Vigencia desde.	Vigencia Hasta.	Tipo de Movimiento
1	39-44-1011590 41	24/01/2024	23/01/2024	23/01/2029	POLIZA DE SEGURO CUMPLIMIENTO ANEXO 0
2	39-44-1011590 41	02/10/2024	29/01/2024	13/06/2029	POLIZA DE SEGURO CUMPLIMIENTO ANEXO 3

3	39-44-1011590 41	03/10/2024	29/01/2024	13/06/2029	POLIZA DE SEGURO CUMPLIMIENTO ANEXO 4
4	39-44-1011590 41	29/10/2024	29/01/2024	17/08/2029	POLIZA DE SEGURO CUMPLIMIENTO ANEXO 5 ACTUALIZADA

Nota: Una vez revisadas las pólizas se avalan que están acorde con las exigencias del contrato de Interventoría se anexan pólizas.

2.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA.

Operador	No. Planilla Pila	Razón social del aportante	Periodo salud	Periodo pensión	Valor aportado
SOI	452972 8828	JUAN MANUEL ROJAS MORENO	2023-12	2023-12	\$ 487.600
SOI	458087 3328	JUAN MANUEL ROJAS MORENO	2024-07	2024-07	\$ 406.600
SOI	458087 4081	JUAN MANUEL ROJAS MORENO	2024-08	2024-08	\$ 398.500
SOI	458087 4383	JUAN MANUEL ROJAS MORENO	2024-09	2024-09	\$ 390.600
SOI	458087 4928	JUAN MANUEL ROJAS MORENO	2024-10	2024-10	\$ 377.300
SOI	458087 4731	JUAN MANUEL ROJAS MORENO	2024-11	2024-11	\$ 381.200

Nota: Una vez revisadas y verificadas las Planillas de aporte al sistema de seguridad se avalan que están acorde con las exigencias del contrato de interventoría se anexan planillas al presente informe.

2.4. ENSAYOS DE LABORATORIO

Item	Muestra tomada	Descripción
1	DENSIDAD DEL TERRENO, METODO	Ensayo de suelo realizado

	CONO Y ARENA	para suelo de Base y/o SubBase
--	--------------	--------------------------------

Nota: Una vez analizados y revisados De los resultados que entrega el laboratorio, se puede evidenciar el cumplimiento en las resistencias de la sub base de acuerdo con los diseños, se anexan ensayos realizados por el contratista

3. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA

3.1. ANTECEDENTES CONTRATO DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DE OBRA	
No. CONTRATO	CO1.PCCNTR.5769147 SGR-SC-012-2024
NOMBRE DE CONTRATANTE	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL IMPULSA MAS S.A.S, NIT. 901.700.548-6
NOMBRE CONTRATISTA	SEPI LTDA, R/L YESID ALONSO FAGUA HERRERA
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUSBANZÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
DATOS DE CONTACTO CONTRATISTA (TELEFONO Y E-MAIL)	sepiltda@gmail.com 318 358 03 21
FECHA INICIO	ENERO 29 DE 2024
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	29 DE MAYO DE 2024
SUSPENSION	AMPLIACIÓN 1 A LA SUS 01 11 DE MARZO DE 2024 AMPLIACIÓN 2 A LA SUS 01 11 DE ABRIL DE 2024 AMPLIACIÓN 3 A LA SUS 01 11 DE MAYO DE 2024 AMPLIACIÓN 4 A LA SUS 01 11 DE JUNIO DE 2024
REINICIO 01	27 DE JUNIO DE 2023
PRORROGA 01	17 DE OCTUBRE DE 2024 (60 DIAS)
PLAZO FINAL	SEIS (6) MESES
FECHA TERMINACIÓN FINAL	17 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL	\$419.765.128
ADICIONES	N/A
VALOR FINAL	\$419.765.128

3.2. ACTAS DEL CONTRATO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN	FECHA		
	Dd	mm	aaaa
Firma del contrato	19	01	2024
Acta de inicio	29	01	2024
Suspensión 01	16	02	2024
Ampliación 01 a la suspensión 01	11	03	2024

Ampliación 02 a la suspensión 01	11	04	2024
Ampliación 03 a la suspensión 01	11	05	2024
Ampliación 04 a la suspensión 01	11	06	2024
Reinicio 01	11	06	2024
PRORROGA 1	17	10	2024

3.3. INFORMACIÓN LEGAL DE CONTARTO: GARANTIAS Y POLIZAS

No.	No. Póliza	Fecha Expedida.	Vigencia desde.	Vigencia Hasta.	Tipo de Movimiento
1	BY-100039900	24/01/2024	19/01/2024	19/01/2027	EMISIÓN ORIGINAL PÓLIZA DE GARANTÍA
2	BY-100005423	23/01/2024	19/01/2024	19/05/2024	PÓLIZA RCE
3	BY-100039900	24/01/2024	19/01/2024	30/09/2027	EMISIÓN ORIGINAL PÓLIZA DE GARANTÍA ANEXO 4
4	BY-100005423	23/01/2024	19/01/2024	12/10/2024	PÓLIZA RCE ANEXO 3
5	BY-100039900	18/10/2024	29/01/2024	30/12/2024	EMISIÓN ORIGINAL PÓLIZA DE GARANTÍA ANEXO 5
6	BY-100039900	10/12/2024	29/01/2024	31/12/2027	EMISIÓN ORIGINAL PÓLIZA DE GARANTÍA ANEXO 5 – ACTUALIZACION ESTABILIDAD DE OBRA

Nota: Una vez revisadas las pólizas se avalan que están acorde con las exigencias del contrato de obra se anexan pólizas.

3.4. RELACIÓN DEL PERSONAL VINCULADO A LA EJECUION DEL CONTRATO DE OBRA.

No	NOMBRE	C.C	CARGO
1	Pablo Gonzales	71184656	Maestro General
2	Daniel Alexander Rativa Rache	1049619759	Oficial de obra
3	José de Jesús Cárdenas Martínez	4083791	Oficial de obra
4	José Dilmo Cristancho	4068181	Ayudante de obra

5	Jhon Alexander Acevedo	7184828	Ayudante de obra
6	Harley Rodríguez	4068201	Ayudante de obra
7	Yesid Jerónimo Gallego Adame	1002437118	Ayudante de obra
8	Misael Ducón Araque	4068122	Ayudante de obra
9	Luis Eduardo Gonzáles	40068202	Ayudante de obra
10	-José Daniel Gonzales Torres	1049619182	Oficial de obra

Nota: El personal incluido en la anterior relación se encuentra afiliado al sistema de Seguridad Social se anexan planillas de seguridad social.

3.5. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA.

Operador	No. Planilla Pila	Razón social del aportante	Periodo salud	Periodo pensión	Valor aportado
Aportes En Línea	946434 9785	SERVICIOS ESPECIALIZADOSP ROFESIONALES SEPI LTDA	2024-02	2024-03	\$ 875.200
Aportes En Línea	947136 7425	SERVICIOS ESPECIALIZADOSP ROFESIONALES SEPI LTDA	2024-07	2024-08	\$ 2.487.500
Aportes En Línea	947342 7768	SERVICIOS ESPECIALIZADOSP ROFESIONALES SEPI LTDA	2024-08	2024-09	\$ 577.100
Aportes En Línea	476266 827	SERVICIOS ESPECIALIZADOSP ROFESIONALES SEPI LTDA	2024-09	2024-10	\$ 717.400
Aportes En Línea	947728 7564	SERVICIOS ESPECIALIZADOSP ROFESIONALES SEPI LTDA	2024-10	2024-11	\$ 4.081.100

Nota: Una vez revisadas y verificadas las Planillas de aporte al sistema de seguridad social y la vinculación de los trabajadores se avalan que están acorde con las exigencias del contrato de obra se anexan planillas al presente informe.

3.6. ENSAYOS DE LABORATORIO

Item	Muestra tomada	Ubicación
1	PLACA HUELLA 03/10/24	K0+210

2	PLACA HUELLA 03/10/24	K0+160
3	CICLÓPEO 10/10/24	K0+120
4	CICLÓPEO 10/10/24	K0+190

Nota: Una vez analizados y revisados De los resultados que entrega el laboratorio, se puede evidenciar el cumplimiento en las resistencias de los concretos de acuerdo con los diseños, se anexan ensayos realizados por el contratista.

3.7. EQUIPOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA:

Herramienta menor
RETRO EXCAVADORA CATERPILLAR 4216A
VOLQUETA ITERNATIONAL PLACAS (ZKG 251)
VOLQUETA MAC PLACAS (WLB 838)
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 130g
VIBROCOMPATADOR INGERSOLL RAND SD70
MESCLADORA DIESEL TRES BULTOS

Nota: el suscrito interventor certifica que el equipo relacionado fue utilizado durante la ejecución del contrato de obra.

3.8. COCONDICIONES CONTRACTUALES DEFINITIVAS INCLUYE FIJACION DE ÍTEMES NO PREVISTOS

N	ÍTEM DE PAGO	GENERAL	PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL
1				IMPLEMENTAR EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS PARA LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO				
1.01	1.01	3.04.03		CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACIÓN)	Kilómetro	0.23	\$ 1,624,611.00	\$ 73,661.00
1.02	1.02	1.02.15		EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	Metro Cúbico	341.00	\$ 33,084.00	\$ 11,281,644.00
1.03	1.03	1.02.43		RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR	Metro Cúbico	147.00	\$ 32,586.00	\$ 4,790,142.00
1.04	1.04	3.04.07		SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM)	Metro Cúbico	171.39	\$ 133,219.00	\$ 22,832,404.00
1.05	1.05	1.02.09		CONCRETO CICLÓPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P	Metro Cúbico	41.47	\$ 689,620.00	\$ 28,598,541.00
1.06	1.06	3.03.26		SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	Metro Cúbico	112.50	\$ 1,065,813.00	\$ 119,903,963.00
1.07	1.07	1.02.42		SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	Kilogramo	7875.00	\$ 9,375.00	\$ 73,828,125.00
1.08	1.08	3.03.05		CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	Metro Cúbico	33.75	\$ 932,732.00	\$ 31,479,705.00
1.09	1.09	3.08.09		BORDILLO FUNDIDO EN SITIO 20 X 35 CM	Metro lineal	450.00	\$ 93,232.00	\$ 41,954,400.00
1.10	1.10	1.18.04		CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17,5MPa - (2500 PSI)	Metro Cuadrado	50.00	\$ 174,143.00	\$ 8,707,150.00
1.11	1.11	1.02.13		CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	Metro Cúbico	26.45	\$ 1,110,809.00	\$ 29,380,898.00
1.12	1.12	3.12.03		TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-Km	3438.24	\$ 3,006.00	\$ 10,335,349.00
1.13	1.13	3.09.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 60 x 60 CM	Unidad	7.00	\$ 528,228.00	\$ 3,697,596.00
1.14	1.14	3.09.08		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DELINEADORES DE CURVA HORIZONTAL DE TAMAÑO 40*50 cm. SEGÚN NORMA INVIAS	Unidad	21.00	\$ 124,138.00	\$ 2,606,898.00
				SUBTOTAL				\$ 389,770,476.00
2				CONSTRUIR OBRAS DE DRENAJE				
2.01	2.01	3.02.07		EXCAVACIONES MECÁNICAS VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO	Metro Cúbico	29.87	\$ 21,358.00	\$ 637,963.00



2.02	2.02	3.03.19		SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLÓPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% RAJÓN PARA BASES	Metro Cúbico	0.77	\$ 732,770.00	\$ 564,233.00
2.03	2.03	3.03.20		SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLÓPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	Metro Cúbico	4.06	\$ 1,124,626.00	\$ 4,565,982.00
2.04	2.04	3.03.27		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36", INCLUYE EMBOQUILLADA	Metro lineal	6.00	\$ 937,639.00	\$ 5,625,834.00
2.05	2.05	1.11.06		BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	Metro Cúbico	9.57	\$ 95,871.00	\$ 917,485.00
2.06	2.06	3.03.22		SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	Metro Cúbico	4.51	\$ 691,402.00	\$ 3,118,223.00
2.07	2.07	1.02.42		SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	Kilogramo		\$ 9,375.00	\$ -
2.08	2.08	3.03.26		SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	Metro Cúbico		\$ 1,065,813.00	\$ -
2.09	NP-05	3.03.14		PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍAS Y CANALES (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	Metro Cuadrado		\$ 379,588.00	
				SUBTOTAL				\$ 15,429,720.00
3				ITEMS NO PREVISTOS				
3.01	NP-01	1.01.01		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	Kilometro	0.21	\$ 4,965,917.00	\$ 1,042,843.00
3.02	NP-02	1.01.07		CORTE ÁRBOL (INCL. RAÍCES) H>3.0	Unidad	6.00	\$ 130,387.00	\$ 782,322.00
3.03	NP-03	3.10.06		SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE).	Metro lineal	1465.29	\$ 21,036.00	\$ 30,823,840.00
3.04	NP-04	3.03.10		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	Metro Cúbico	7.10	\$ 83,911.00	\$ 595,768.00
				SUBTOTAL				\$ 33,244,773.00

				AJUSTE POR ACTA DE MODIFICACIÓN				
TOTAL, COSTOS DIRECTOS								\$ 405,200,196.00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL						1.0	\$ 7,950,000.00	\$ 7,950,000.00
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO						1.0	\$ 6,614,932.00	\$ 6,614,932.00
VALOR TOTAL OBRA								\$ 419,765,932.00



**3.9. RESUMEN DE ACTIVIDADES Y AVANCE EJECUTADO PRESENTE
 PERIODO – ACTA FINAL DE PAGO PRESENTE ACTA**

N	DESCRIPCIÓN	CANT	V. TOTAL
1	IMPLEMENTAR EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias PARA LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO		
1.05	CONCRETO CICLÓPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P	5.85	\$ 4,034,277.00
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	31.00	\$ 33,040,203.00
1.07	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	3026.58	\$ 28,374,188.00
1.08	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	26.03	\$ 24,279,014.00
1.09	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO 20 X 35 CM	173.66	\$ 16,190,669.00
1.10	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17,5MPa - (2500 PSI)	24.36	\$ 4,242,123.00
1.11	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCIÓN RECTANGULAR	7.68	\$ 8,531,013.00
1.12	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).		\$ -
1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 60 x 60 CM	7.00	\$ 3,697,596.00
1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DELINEADORES DE CURVA HORIZONTAL DE TAMAÑO 40*50 cm. SEGÚN NORMA INVIAS	21.00	\$ 2,606,898.00
	SUBTOTAL		\$ 124,995,981.00
2	CONSTRUIR OBRAS DE DRENAJE		
2.01	EXCAVACIONES MECÁNICAS VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO	34.25	\$ 731,512.00
2.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLÓPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% RAJÓN PARA BASES	4.72	\$ 3,458,674.00
2.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLÓPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	3.65	\$ 4,104,885.00
2.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36", INCLUYE EMBOQUILLADA	6.00	\$ 5,625,834.00
2.05	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	12.23	\$ 1,172,502.00
2.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	2.97	\$ 2,053,464.00

2.07	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	188.70	\$ 1,769,063.00
2.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	2.97	\$ 3,165,465.00
	SUBTOTAL		\$ 22,081,399.00
3	ITEMS NO PREVISTOS		
3.03	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	1465.29	\$ 30,823,840.00
3.04	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	19.38	\$ 1,626,195.00
	SUBTOTAL		\$ 32,450,035.00
TOTAL, COSTOS DIRECTOS			\$ 179,527,415.00


3.10. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCION	VALOR	VALOR ANTICIPO	VALOR EJECUTADO	VALOR AMORTIZAR	% EJECUTADO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 419.765.128				
VALOR ANCTIPIO 50%		\$ 209.882.564			
VALOR ACTA PARCIAL 01			\$ 240.202.502	\$ 120.101.251	57,22 %
VALOR ACTA FINAL (PRESENTE ACTA)			\$ 179.527.415	\$ 89.746.102	42.77%
ACUMULADO	\$ 419.765.128	\$ 209.882.564	\$ 419.729.917	\$ 209.847.353	99.99%
SALDO POR EJECUTAR A FAVOR DE IMPULSA MAS SAS	\$ 0	\$ 0	\$ 35.211	\$ 35.211	
SUMAS IGUALES	\$ 419.765.128	\$ 209.882.564	\$ 419.765.128	\$ 209.882.564	

- De acuerdo con el anterior balance financiero se concluye que una vez Amortizado el Pago Final a girar en la presente acta corresponde a la suma de **OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO DOS PESOS (\$ 89.746.102) M.C.**
- De acuerdo con el anterior balance financiero se concluye que queda un saldo a favor de **IMPULSA MAS SAS** la correspondiente suma de treinta y cinco mil doscientos once pesos (**\$ 35.211) M.C.**

3.11. AVANCE FISICO DE LA OBRA

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior Acta parcial 01	42.68%	57.32%	0.01%
Durante el Presente Periodo - Acta final	57.32%	42.67 %	
Acumulado actual	100%	99,99 %	

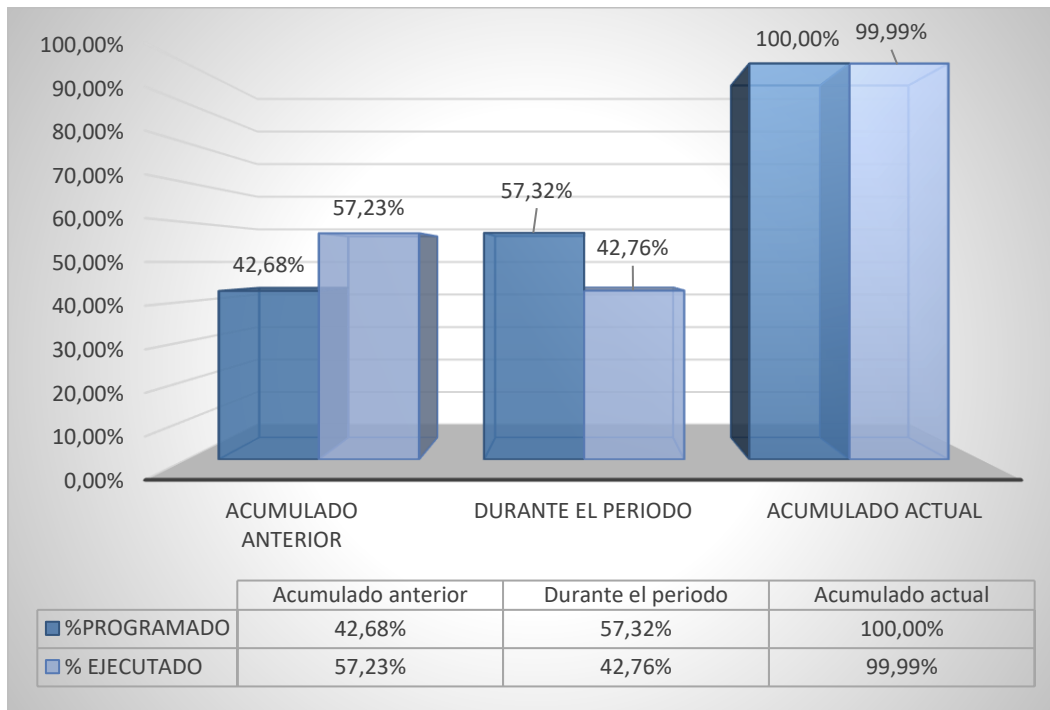

3.12. ACTIVIDADES A LAS QUE SE LE HIZO SEGUIMIENTO

- LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO
- CORTE ÁRBOL (INCL. RAÍCES) H>3.0
- EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN
- CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION)
- EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR
- INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM
- RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR

- SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM)
- CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P
- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES
- SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa
- CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)
- BORDILLO FUNDIDO EN SITIO 20 X 35 CM
- CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17,5MPa-(2500 PSI)
- CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA 60X60CM).
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DELINEADORES DE CURVA HORIZONTAL DE TAMAÑO 40*50 cm. SEGÚN NORMA INVIAS
- EXCAVACIONES MECÁNICAS VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO
- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLÓPEO DE17.5 MPA (2500) , 40% RAJÓN PARA BASES
- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLÓPEO DE17.5 MPA (2500) , 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES
- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36", INCLUYE EMBOQUILLADA
- BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO
- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES.
- NP-03 SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)
- NP-04 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN
- TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).

3.13. REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO



CORTE ÁRBOL (INCL. RAÍCES) H>3.0



EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN



**CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE.
(TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION)**



**EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR
INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM**



RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO CON VIBROCOMPACADOR



SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM)





CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P



SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES



SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa



**CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO
(INCLUYE SELLO DE JUNTAS)**



BORDILLO FUNDIDO EN SITIO 20 X 35 CM





- CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17,5MPA-(2500 PSI)






- CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR



- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA 60X60CM).



- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DELINEADORES DE CURVA HORIZONTAL DE TAMAÑO 40*50 cm. SEGÚN NORMA INVIAS

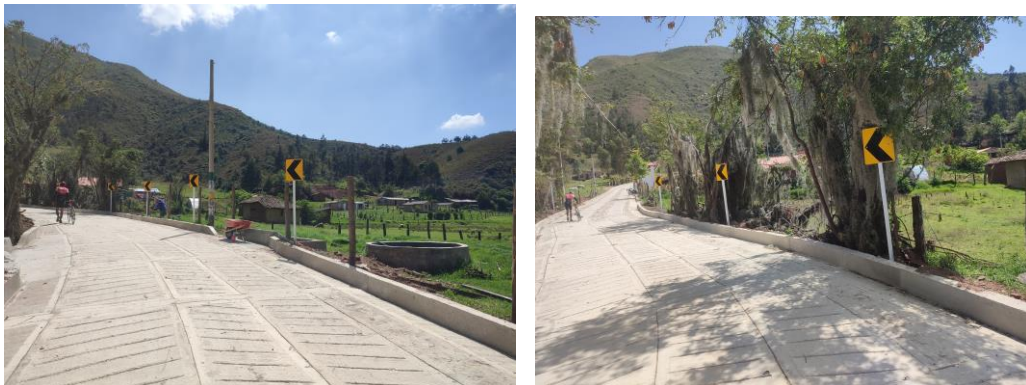



- EXCAVACIONES MECÁNICAS VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO



- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLÓPEO DE 17.5 MPA (2500)
, 40% RAJÓN PARA BASES



- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLÓPEO DE 17.5 MPA (2500), 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES



- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36", INCLUYE EMBOQUILLADA



- BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO



- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES.



- NP-03 SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)





- NP-04 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN



TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).



4. CONCLUSIONES, APROBACION Y AVAL PARA PAGO PARCIAL 01

Una vez revisado y analizado el Informe y anexos para acta Final se evidencia con un avance del 99.99% de ejecución de obra, y un financiero porcentual del 99.99% con respecto al presupuesto aprobado.

De igual forma hacen parte integral del presente informe de interventoría la siguiente información la cual fue revisada y conciliada en conjunto con el contratista de obra y posterior revisión por parte de la Supervisión delegada por IMPULSA MAS SAS:

- 1- Acta Final de obra
- 2- Informes Parciales, Finales y subsanación de pendientes.
- 3- Memoria de cantidades de obra
- 4- Bitácora de obra
- 5- Control de seguimiento Pólizas
- 6- Control de equipos utilizados
- 7- Control aportes al sistema de seguridad social
- 8- Control de ensayos de laboratorio
- 9- Comités de obra
- 10- Planos récord
- 11- Documentos para fijación de ítems no previstos
- 12- Informes de Interventoría Parciles y final

Por lo anterior yo **JUAN MANUEL ROJAS MORENO** identificado con cedula de ciudadanía No. **1.052.020.253** de Floresta, de profesión **ARQUITECTO** y con Matricula profesional vigente No. **A-121-2018-1052020253 CPNAAA** concejo profesional de arquitectura y sus

profesiones auxiliares en calidad de **INTERVENTOR** y en calidad de Contratista del **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SGR-SD-015-2024** cuyo objeto es: **INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO “MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUSBANZÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**, una vez revisados y estudiados los documentos presentados por el Contratista de obra y de acuerdo a nuestra revisión diaria y periódica de la ejecución de la obra Certifico la información presentada como veraz y se da un **CONCEPTO FAVORABLE** para dar viabilidad al pago Parcial del Acta de Pago Final al contrato de obra No. **CO1.PCCNTR.5769147 - SGR-SC-012-2024** cuyo objeto es: **MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUSBANZÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ** a nombre del contratista **SEPI LTDA, R/L YESID ALONSO FAGUA HERRERA**, para lo cual se le informa a la entidad contratante y ejecutora del proyecto **EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL IMPULSA MAS S.A.S**, con **NIT. 901.700.548-6** proceder con el **PAGO FINAL** del contrato de obra y de interventoría.

5. ANEXOS

En constancia de lo anterior se firma en Busbanza departamento de Boyacá el día 10 de diciembre de 2024.

Cordialmente,



ARQ. JUAN MANUEL ROJAS MORENO
C.C No.: 1.052.020.253 de Floresta -Boyacá
M.P. vigente No. A-121-2018-1052020253 CPNAAA
INTERVENTOR al contrato de obra N° SGR-SC-012-2024
Contrato de Interventoría No. SGR-SD-015-2024

5 ANEXOS

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1052020253	NÚMERO PLANILLA:	4580874081	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	FLORESTA	DEPARTAMENTO:	JUAN MANUEL ROJAS MORENO	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES agosto AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2024
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARRERA 2 NO 5-110	TELÉFONO:	BOYACA	DÍAS DE MORA:	78	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9990857953
DIRECCIÓN:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/29		
TIPO APORTANTE:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act				
TIPO EMPRESA:	ÚNICO						
FORMA DE PRESENTACIÓN:							
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.700	\$ 0	\$ 208.000	\$ 11.700	\$ 0	\$ 219.700
SUBTOTALES:										\$ 208.000	\$ 11.700	\$ 0	\$ 219.700

TOTAL APORTES A SALUD															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500	\$ 0	\$ 9.100	\$ 0	\$ 162.500	\$ 9.100	\$ 0	\$ 171.600
SUBTOTALES:										\$ 162.500	\$ 9.100	\$ 0	\$ 0	\$ 171.600	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.800	\$ 6.800	\$ 400	\$ 0	\$ 0	\$ 7.200	
SUBTOTALES:										\$ 6.800	\$ 400	\$ 0	\$ 7.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																				
DATOS DEL COTIZANTE				NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN					SALUD					ARP					PARAFISCALES											
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE		
1	CC 1052020253	ROJAS MORENO JUAN MANUEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 1.300.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	1.300.000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	1.300.000	\$ 162.500	\$ 0	\$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.300.000	\$ 6.800	\$ 400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL \$ 398.500

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1052020253	NÚMERO PLANILLA:	4580874383	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	FLORESTA	DEPARTAMENTO:	JUAN MANUEL ROJAS MORENO	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES septiembre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2024
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARRERA 2 NO 5-110	TELÉFONO:	BOYACA	DÍAS DE MORA:	49	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9990857602
DIRECCIÓN:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/29		
TIPO APORTANTE:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act				
TIPO EMPRESA:	ÚNICO						
FORMA DE PRESENTACIÓN:							
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.300	\$ 0	\$ 208.000	\$ 7.300	\$ 0	\$ 215.300
SUBTOTALES:										\$ 208.000	\$ 7.300	\$ 0	\$ 215.300

TOTAL APORTES A SALUD															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500	\$ 0	\$ 5.700	\$ 0	\$ 162.500	\$ 5.700	\$ 0	\$ 168.200
SUBTOTALES:										\$ 162.500	\$ 5.700	\$ 0	\$ 168.200		

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.800	\$ 6.800	\$ 300	\$ 0	\$ 0	\$ 7.100	
SUBTOTALES:										\$ 6.800	\$ 300	\$ 0	\$ 7.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																							
DATOS DEL COTIZANTE														NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SALUD				ARP				PARAFISCALES																	
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE			
1	CC 1052020253	ROJAS MORENO JUAN MANUEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 1.300.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	1.300.000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	1.300.000	\$ 162.500	\$ 0	\$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.300.000	\$ 6.800	\$ 0	\$ 6.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			

TOTAL \$ 390.600

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1052020253	NÚMERO PLANILLA:	4580874731	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	FLORESTA	DEPARTAMENTO:	JUAN MANUEL ROJAS MORENO	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES octubre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2024
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARRERA 2 NO 5-110	TELÉFONO:	BOYACA	DÍAS DE MORA:	14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9990857557
DIRECCIÓN:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/29		
TIPO APORTANTE:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act				
TIPO EMPRESA:	ÚNICO						
FORMA DE PRESENTACIÓN:							
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.100	\$ 0	\$ 208.000	\$ 2.100	\$ 0	\$ 210.100
SUBTOTALES:										\$ 208.000	\$ 2.100	\$ 0	\$ 210.100

TOTAL APORTES A SALUD															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500	\$ 0	\$ 1.700	\$ 0	\$ 162.500	\$ 1.700	\$ 0	\$ 164.200
SUBTOTALES:										\$ 162.500	\$ 1.700	\$ 0	\$ 164.200		

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.800	\$ 6.800	\$ 100	\$ 0	\$ 0	\$ 6.900	
SUBTOTALES:										\$ 6.800	\$ 100	\$ 0	\$ 6.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																				
DATOS DEL COTIZANTE				NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SALUD				ARP		PARAFISCALES																
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP
1	CC 1052020253	ROJAS MORENO JUAN MANUEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 1.300.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	1.300.000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	1.300.000	\$ 162.500	\$ 0	\$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.300.000	\$ 6.800	\$ 0	\$ 6.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL \$ 381.200

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1052020253	NÚMERO PLANILLA:	4580873328	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	FLORESTA	DEPARTAMENTO:	JUAN MANUEL ROJAS MORENO	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOYACA	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE	DÍAS DE MORA:	107	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9990856589
DIRECCIÓN:	CARRERA 2 NO 5-110	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/29		
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE						
TIPO EMPRESA:	PRIVADA						
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.100	\$ 0	\$ 208.000	\$ 16.100	\$ 0	\$ 224.100
SUBTOTALES:										\$ 208.000	\$ 16.100	\$ 0	\$ 224.100

TOTAL APORTES A SALUD															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500	\$ 0	\$ 12.600	\$ 0	\$ 162.500	\$ 12.600	\$ 0	\$ 175.100
SUBTOTALES:										\$ 162.500	\$ 12.600	\$ 0	\$ 175.100		

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.800	\$ 6.800	\$ 600	\$ 0	\$ 0	\$ 7.400	
SUBTOTALES:										\$ 6.800	\$ 600	\$ 0	\$ 7.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																	
DATOS DEL COTIZANTE				NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN					SALUD					ARP					PARAFISCALES								
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP
1	CC 1052020253	ROJAS MORENO JUAN MANUEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 1.300.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	1.300.000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	1.300.000	\$ 162.500	\$ 0	\$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.300.000	\$ 6.800	\$ 600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL \$ 406.600

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	CEDULA DE CIUDADANIA FLORESTA CARRERA 2 NO 5-110 02-INDEPENDIENTE PRIVADA ÚNICO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: JUAN MANUEL ROJAS MORENO DEPARTAMENTO: BOYACA TELÉFONO: 7777777 CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y facilitadoras de la act	1052020253	NÚMERO PLANILLA: 4529728828	PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES diciembre AÑO 2023	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES diciembre AÑO 2023
				FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2023/12/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9997121287		

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 268.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 268.800	\$ 0	\$ 0	\$ 268.800
SUBTOTALES:										\$ 268.800	\$ 0	\$ 0	\$ 268.800

TOTAL APORTES A SALUD															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 210.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 210.000	\$ 0	\$ 0	\$ 210.000
SUBTOTALES:										\$ 210.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 210.000	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.800	\$ 0	\$ 8.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.800	
SUBTOTALES:										\$ 8.800	\$ 0	\$ 0	\$ 8.800	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																							
DATOS DEL COTIZANTE														NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SALUD				ARP				CCF					SENA	ICBF	ESAP	MINEDU									
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN					DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1052020253	ROJAS MORENO JUAN MANUEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 1.680.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	1.680.000	\$ 268.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 268.800	EPS037-NUEVA EPS	30	1.680.000	\$ 210.000	\$ 0	\$ 210.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.680.000	\$ 8.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0				

TOTAL \$ 487.600

