

E.S.E ARSENIO REPIZO VANEGAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DELHULA PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA ALTO QUINCHANA		CONTRATO No:		122		ACTA PARCIAL No 02 DE 2024 FINAL 					
--	--	--------------	--	-----	--	--	--	--	--	--	--

E.S.E ARSENIO REPIZO VANEGAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DELHULA PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA ALTO QUINCHANA	CONTRATO No:	122	ACTA PARCIAL No 02 DE 2024 FINAL
	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS PUESTOS DE SALUD PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	
	VALOR:	\$ 679.505.761	
	CONTRATISTA:	WILSON UNI COLLAZOS	04 DE DICIEMBRE DE 2024
	INTERVENTORA:	YUDI TATIANA HERNANDEZ	
	INICIACION:	18 DE MARZO DE 2024	
	PLAZO INICIAL:	DOS MESES HASTA EL 18 DE MAYO DE 2024	
	PRORROGA 1	1 MES HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2024	
	SUSPENSIÓN No 1	14 DE JUNIO DE 2024	
	FECHA DE REINICIO No 1	29 DE JULIO DE 2024	
	PRORROGA No 2	UN MES HASTA EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
	TERMINACION DE LA OBRA	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	

ACTA PARCIAL No 02 - FINAL DEL 2024											
ITEM	ACTIVIDADES	CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No 2 - DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024				ACTA PARCIAL 001 DEL 2024		PRESENTE ACTA FINAL		ACUMULADO FINAL	
		UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
5,4	CIELO RASO EN DRY WALL(INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	m2	66,09	\$ 83.000,00	\$ 5.485.429	66,09	\$ 5.485.429	-	\$ 0	66,09	5.485.429
6	ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS										
6,1	CERAMICA PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LINEALES)	m2	13,88	\$ 84.900,00	\$ 1.178.667	13,88	\$ 1.178.667	-	\$ 0	13,88	1.178.667
6,2	CERAMICA PISO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES)	m2	2,42	\$ 84.900,00	\$ 205.034	2,42	\$ 205.034	-	\$ 0	2,42	205.034
6,3	POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJILLA 3" X 2", LLAVE TERMINAL JARDIN)	und	1,00	\$ 345.000,00	\$ 345.000	1,00	\$ 345.000	-	\$ 0	1,00	345.000
6,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	1,00	\$ 450.000,00	\$ 450.000	1,00	\$ 450.000	-	\$ 0	1,00	450.000
6,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	1,00	\$ 280.000,00	\$ 280.000	1,00	\$ 280.000	-	\$ 0	1,00	280.000
6,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	1,00	\$ 35.000,00	\$ 35.000	0,00	0,00	1,00	\$ 35.000	1,00	35.000

<div>E.S.E ARSENIO REPIZO VANEGAS</div> <div>MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN</div> <div>DEPARTAMENTO DELHULA</div> <div>PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA ALTO QUINCHANA</div>		CONTRATO No:				122		ACTA PARCIAL No 02 DE 2024 FINAL			
		OBJETO:				CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS PUESTOS DE SALUD PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA					
		VALOR:				\$ 679.505.761					
		CONTRATISTA:				WILSON UNI COLLAZOS		04 DE DICIEMBRE DE 2024			
		INTERVENTORA:				YUDI TATIANA HERNANDEZ					
		INICIACION:				18 DE MARZO DE 2024					
		PLAZO INICIAL:				DOS MESES HASTA EL 18 DE MAYO DE 2024					
		PRORROGA 1				1 MES HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2024					
		SUSPENSIÓN No 1				14 DE JUNIO DE 2024					
		FECHA DE REINICIO No 1				29 DE JULIO DE 2024					
		PRORROGA No 2				UN MES HASTA EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024					
		TERMINACION DE LA OBRA				02 DE SEPTIEMBRE DE 2024					
ACTA PARCIAL No 02 - FINAL DEL 2024											
ITEM	ACTIVIDADES	CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No 2 - DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024				ACTA PARCIAL 001 DEL 2024		PRESENTE ACTA FINAL		ACUMULADO FINAL	
		UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
6,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	1,00	\$ 35.000,00	\$ 35.000	0,00	0,00	1,00	\$ 35.000	1,00	35.000
6,8	LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	1,00	\$ 250.000,00	\$ 250.000	1,00	\$ 250.000	-	\$ 0	1,00	250.000
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA										
7,1	VENTANA SENCILLA EN ALUMINIO INC VIDRIO	M2	0,75	\$ 345.000,00	\$ 260.130	0,00	0,00	0,75	\$ 260.130	0,75	260.130
7,2	ESPEJO 4 MM	m2	0,50	\$ 85.000,00	\$ 42.500	0,00	0,00	0,50	\$ 42.500	0,50	42.500
7,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO ESMERILADO DE 4 MM PARA VENTANERIA EXISTENTE	m2	5,20	\$ 62.000,00	\$ 322.617	0,00	0,00	5,20	\$ 322.617	5,20	322.617
7,4	BARRA DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD L= 1M	Und	1,00	\$ 345.000,00	\$ 345.000	0,00	0,00	1,00	\$ 345.000	1,00	345.000
8	SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS										
8,1	CAJA METALICA PARA CONTADOR INC TOTALIZADOR	und	1,00	\$ 450.000,00	\$ 450.000	0,00	0,00	1,00	\$ 450.000	1,00	450.000
8,2	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	und	1,00	\$ 55.000,00	\$ 55.000	0,00	0,00	1,00	\$ 55.000	1,00	55.000

E.S.E ARSENIO REPIZO VANEGAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DELHULA PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA ALTO QUINCHANA	CONTRATO No:	122		ACTA PARCIAL No 02 DE 2024 FINAL							
	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS PUESTOS DE SALUD PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA									
	VALOR:	\$ 679.505.761									
	CONTRATISTA:	WILSON UNI COLLAZOS									
	INTERVENTORA:	YUDI TATIANA HERNANDEZ				04 DE DICIEMBRE DE 2024					
	INICIACION:	18 DE MARZO DE 2024									
	PLAZO INICIAL:	DOS MESES HASTA EL 18 DE MAYO DE 2024									
	PRORROGA 1	1 MES HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2024									
	SUSPENSIÓN No 1	14 DE JUNIO DE 2024									
	FECHA DE REINICIO No 1	29 DE JULIO DE 2024									
PRORROGA No 2	UN MES HASTA EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024										
TERMINACION DE LA OBRA	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024										
ACTA PARCIAL No 02 - FINAL DEL 2024											
ITEM	ACTIVIDADES	CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No 2 - DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024				ACTA PARCIAL 001 DEL 2024		PRESENTE ACTA FINAL		ACUMULADO FINAL	
		UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
8,3	SALIDAS PARA ILUMINACIÓN 120V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 Y/O 3/4", CABLEADO EN #12 AWG + TIERRA E INTERRUPTOR. NO INCLUYE LUMINARIA)	und	12,00	\$ 145.000,00	\$ 1.740.000	12,00	\$ 1.740.000	-	\$ 0	12,00	1.740.000
8,4	SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DE 110V USO GENERAL (INCLUYE TUBERÍA, CAJAS Y CABLEADO. NO INCLUYE APARATO)	und	10,00	\$ 105.000,00	\$ 1.050.000	10,00	\$ 1.050.000	-	\$ 0	10,00	1.050.000
8,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 25W (INCLUYE LUMINARIA, AÉREO, DERIVACIÓN EN SALIDA CON CONECTORES DE RESORTE. CABLE ENCAUCHETADA 3*14, INTERRUPTOR TOMA Y ENCHUFE)	und	12,00	\$ 105.000,00	\$ 1.260.000	12,00	\$ 1.260.000	-	\$ 0	12,00	1.260.000
9	SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS										
9,1	CANAL EN PVC AMAZONAS BLANCO INC UNION, TAPAS LATERALES, SOPORTE UNION BAJANTE Y DEMAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	16,00	\$ 92.500,00	\$ 1.480.000	16,00	\$ 1.480.000	-	\$ 0	16,00	1.480.000
9,2	TUBERIA 1/2" PVC PRESIÓN	ml	42,30	\$ 8.500,00	\$ 359.550	42,30	\$ 359.550	-	\$ 0	42,30	359.550
9,3	ACCESORIOS 1/2" PVC PRESIÓN	und	18,00	\$ 1.250,00	\$ 22.500	18,00	\$ 22.500	-	\$ 0	18,00	22.500
9,4	PUNTO HIDRÁULICO INODORO TANQUE	und	1,00	\$ 52.600,00	\$ 52.600	1,00	\$ 52.600	-	\$ 0	1,00	52.600
9,5	PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS	und	1,00	\$ 52.600,00	\$ 52.600	1,00	\$ 52.600	-	\$ 0	1,00	52.600
9,6	PUNTO HIDRÁULICO POCETA	und	1,00	\$ 52.600,00	\$ 52.600	1,00	\$ 52.600	-	\$ 0	1,00	52.600
9,7	PUNTO SANITARIO INODORO TANQUE	und	1,00	\$ 62.400,00	\$ 62.400	1,00	\$ 62.400	-	\$ 0	1,00	62.400


<div>E.S.E ARSENIO REPIZO VANEGAS</div> <div>MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN</div> <div>DEPARTAMENTO DELHULA</div> <div>PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA ALTO</div> <div>QUINCHANA</div>		CONTRATO No:		122		ACTA PARCIAL No 02 DE 2024 FINAL					
		OBJETO:		CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS PUESTOS DE SALUD PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA							
		VALOR:		\$ 679.505.761		04 DE DICIEMBRE DE 2024					
		CONTRATISTA:		WILSON UNI COLLAZOS							
		INTERVENTORA:		YUDI TATIANA HERNANDEZ							
		INICIACION:		18 DE MARZO DE 2024							
		PLAZO INICIAL:		DOS MESES HASTA EL 18 DE MAYO DE 2024							
		PRORROGA 1		1 MES HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2024							
		SUSPENSIÓN No 1		14 DE JUNIO DE 2024							
		FECHA DE REINICIO No 1		29 DE JULIO DE 2024							
PRORROGA No 2		UN MES HASTA EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024									
TERMINACION DE LA OBRA		02 DE SEPTIEMBRE DE 2024									
ACTA PARCIAL No 02 - FINAL DEL 2024											
ITEM	ACTIVIDADES	CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No 2 - DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024				ACTA PARCIAL 001 DEL 2024		PRESENTE ACTA FINAL		ACUMULADO FINAL	
		UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VALOR A PAGAR MEDIANTE PRESENTE ACTA						5.164.239					
VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO						90.974.939					


En San Agustín Huila, a los 04 días del mes de diciembre de 2024, se reunieron la Ing. YUDI TATIANA HERNANDEZ, Interventora del proyecto, el Sr OLMEDO BRAVO NAVIA, supervisor del contrato, el Arq. WILSON UNI COLLAZOS, Contratista de obra, el Ing. EDWIN JIMENEZ HURTADO, como apoyo a la supervision del contrato y el Ing ROBERTO ÑAÑEZ, como apoyo a la supervision del contrato, con el fin de suscribir la presente acta de entrega final de obra

El valor de la presente acta es de CINCO MILLONES CIENTOSESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$ 5,164,239,00).


Dada en el municipio de San Agustín Huila a los 04 días del mes de diciembre de 2024


Ing YUDI TATIANA HERNANDEZ
 Interventora


WILSON UNI COLLAZOS
 Contratista

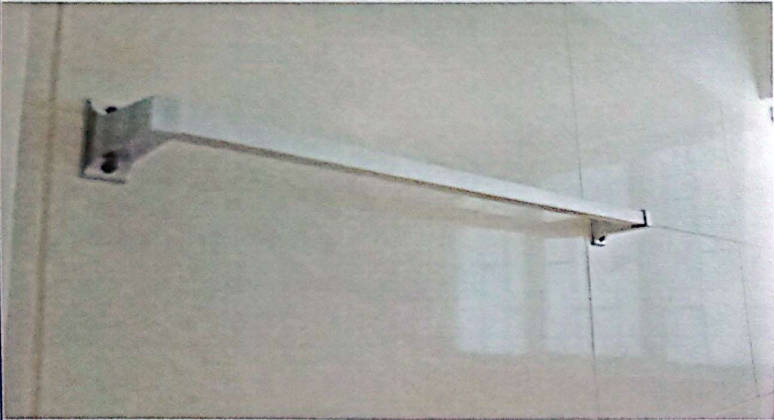

OLMEDO BRAVO NAVIA
 Supervisor


Ing EDWIN JIMENEZ HURTADO
 Apoyo a la supervision


Ing. ROBERTO ÑAÑEZ
 Apoyo a la supervision

[illegible]

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA						MEMORIA DE CANTIDADES						
<div> <div>  </div> <div> E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA </div> </div>						<div> <div> PAGINA 1 DE 1 </div> <div> ELABORO </div> </div>						
FECHA		DIA	4	MES	12	AÑO	2024	CORTE No		1	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS	
OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN										
INTERVENTORIA		YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI				NIT O CC		1.084.258.308		CONTRATO No		124 DEL 18 /03 /2024
CONTRATISTA		WILSON UNI COLLAZOS				NIT O CC		12.169.279		CONTRATO No		122 DEL 18 /03 /2024
CAPITULO		6, ENCHAPES Y ACCESORIOS DE BAÑO		ITEM	6.6	DESCRIPCION		SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS)	UNIDAD	UND	LUGAR	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA ALTO QUINCHANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA
		LOCALIZACION		DIMENSIONES			No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION			
				ANCHO	LARGO	ALTO						
		ENTRE EJES 4 Y 5 Y EJES D Y E					1	1,00				
		OBSERVACIONES:								SUB-TOTAL		1,00
								VIENEN				
								TOTAL		1,00		
Vbo. Contratista		Wilson Uni Collazos						Vbo. Interventoria		Yudy Tatiana H.S.		

 E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA						MEMORIA DE CANTIDADES						
						PAGINA 1 DE		1				
FECHA	DIA	4	MES	12	AÑO	2024	CORTE No	1	ELABORO	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS		
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN											
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					NIT O CC	1.084.258.308	CONTRATO No	124 DEL 18 /03 /2024			
CONTRATISTA	WILSON UNI COLLAZOS					NIT O CC	12.169.279	CONTRATO No	122 DEL 18 /03 /2024			
CAPITULO	6, ENCHAPES Y ACCESORIOS DE BAÑO	ITEM	6,7	DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOALLERO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO		UNIDAD	UND	LUGAR	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA ALTO QUINCHANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA		
						LOCALIZACION	DIMENSIONES			No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
							ANCHO	LARGO	ALTO			
						ENTRE EJES 4 Y 5 Y EJES D Y E				1	1,00	
						OBSERVACIONES:						SUB-TOTAL
						VIENEN						
						TOTAL			1,00			
Vbo. Contratista						Vbo. Interventoria						

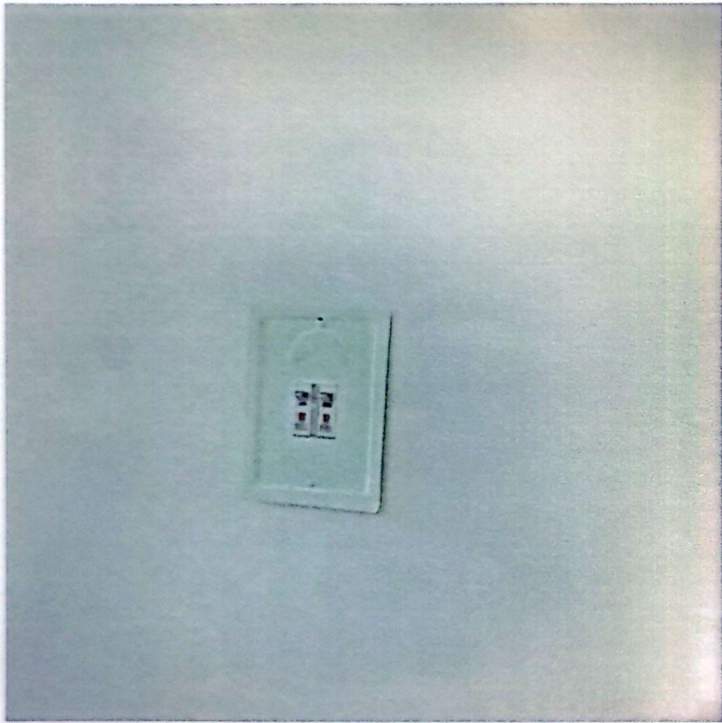
Wilson Uni Collazos

Yudy Tatiana H.S.

 E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA					MEMORIA DE CANTIDADES					
					PAGINA 1 DE		1			
FECHA	DIA	4	MES	12	AÑO	2024	CORTE No	1	ELABORO	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN									
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					NIT O CC	1.084.258.308	CONTRATO No	124 DEL 18 /03 /2024	
CONTRATISTA	WILSON UNI COLLAZOS					NIT O CC	12.169.279	CONTRATO No	122 DEL 18 /03 /2024	
CAPITULO	7, SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA	ITEM	7,1	DESCRIPCION	VENTANA SENCILLA EN ALUMINIO INC VIDRIO		UNIDAD	M2	LUGAR	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA ALTO QUINCHANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA
		LOCALIZACION			DIMENSIONES			No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
					ANCHO	LARGO	ALTO			
		EJE 6 ENTRE EJES A Y C			1,16		0,65		0,75	
					SUB-TOTAL				0,75	0,75
					VIENEN					
			TOTAL			0,75				
OBSERVACIONES:										
Vbo. Contratista					Vbo. Interventoria					

Wilson Uni Collazos

Yudy Tatiana H.S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA				MEMORIA DE CANTIDADES								
				PAGINA 1 DE		1						
FECHA	DIA	4	MES	12	AÑO	2024	CORTE No	1	ELABORO	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS		
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN											
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI				NIT O CC	1.084.258.308	CONTRATO No	124 DEL 18 /03 /2024				
CONTRATISTA					NIT O CC	12.169.279	CONTRATO No	122 DEL 18 /03 /2024				
CAPITULO	8, SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS	ITEM	8,2	DESCRIPCION	BREAKER 2P DESDE 15 HASTA 60 AMP	UNIDAD	UND	LUGAR	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA ALTO QUINCHANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA			
						LOCALIZACION	DIMENSIONES			No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
							ANCHO	LARGO	ALTO			
						EJE 1 ENTRE EJES G Y H				1	1,00	
						OBSERVACIONES:						SUB-TOTAL
						VIENEN						
						TOTAL		1,00				
Vbo. Contratista						Wilson Uni Collazos						
Vbo. Interventoria						Yudy Tatiana H. S.						

