

	ESE HOSPITAL “ARSENIO REPIZO VANEGAS” SAN AGUSTIN - HUILA	CÓDIGO: A-CO-FO-11
		VERSIÓN: 02
	SUPERVISION	FECHA: 21/12/2023
		TRD: 100 40 01

ACTA DE SUPERVISION			
NUMERO DE ACTA	008	FECHA DE ELABORACION	30 de diciembre de 2024
SUPERVISORA	ANGIE LORENA GASCA OME	CARGO	GERENTE
CONTRATANTE	ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS		
NIT.	891.180113-8		
REPRESENTANTE LEGAL	ANGIE LORENA GASCA OME		
CEDULA	1.070.015.003		
DCTO DE NOMBRAMIENTO	051 DEL 22 DE MARZO DE 2024		
ACTA POSESION	166 DEL 01 DE ABRIL DE 2024		
CONTRATISTA	EDWIN ESTEBAN JIMENEZ HURTADO		
CEDULA	1082773171		
NUMERO DE CONTRATO:	147		
FECHA DE CONTRATO:	27 DE MARZO DE 2024		
OBJETO DEL CONTRATO	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APOYO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO A LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE INTERVENTORÍA N° 121 Y N° 124, CELEBRADOS PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES PARA LA FASE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS		
VALOR	VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$24.471.000).		
DURACIÓN	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2024.		
CUMPLIMIENTO Y ALACANCE DEL CONTRATO	Una vez supervisada las actividades y/o obligaciones a desempeñar establecidas en el contrato para desarrollar por parte del contratista, se puede evidenciar que se han llevado a cabalidad, información que coincide al revisar el informe suministrado por parte contratista, por lo que garantiza la ejecución durante el mes de noviembre de 2024. Como se muestra a continuación: 1. Realizar, verificación, seguimiento y control técnico, administrativo y financiero de la etapa precontractual del contrato de interventoría de obra número 121 y 124 ejecutados por la ESE Arsenio Repizo Vanegas. 2. Ejecutar el seguimiento y garantizar el cumplimiento de los requisitos de ley como seguridad social del personal contratado de interventoría. 3. Verificación del seguimiento del cronograma de obra de los contratos 121 y 124, con reporte semanal para alertar avance o retraso; de acuerdo a los informes		

“Salud Comunitaria Humanizada con Calidad”

Calle 3 No. 2-51 Esquina. Conmutador: 8373314
Gerencia: 3133769596 Urgencias: 8373565 - 3133770857
E-mail: gerencia@eseharv-sanagustin-huila.gov.co
<http://www.eseharv-sanagustin-huila.gov.co>
San Agustín - Huila – Colombia
Código Postal: 418060



	ESE HOSPITAL “ARSENIO REPIZO VANEGAS” SAN AGUSTIN - HUILA	CÓDIGO: A-CO-FO-11
		VERSIÓN: 02
	SUPERVISION	FECHA: 21/12/2023
		TRD: 100 40 01

CUMPLIMIENTO Y ALACANCE DEL CONTRATO	- Verificación del seguimiento del cronograma de obra de los contratos 121 y 124, con reporte semanal para alertar avance o retraso; de acuerdo a los informes reparados por interventoría. - Realizar las recomendaciones de obra según lo programado. - Realizar las actividades que garanticen las obligaciones contractuales de la interventoría. - Apoyar en el informe técnico de la supervisión. - Las demás que encomiende de manera especial la gerencia de la entidad, relacionados con el objeto del presente contrato. El contratista desarrollo el objeto contractual en debida forma y acorde a las exigencias del mismo, por lo tanto, no se presentó ningún incumplimiento al que haya tenido conocimiento la parte supervisora y el contratista atendió cada una de las indicaciones y sugerencias de la supervisión. El contrato a la fecha por parte de la entidad contratante ha cumplido con las obligaciones correspondientes, y de igual forma por parte del contratista, concluyendo entonces, por la parte supervisora un avance como porcentaje ejecutado del ochenta y ocho (88%) para las actividades ejecutadas durante el mes de noviembre de 2024
DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA	- Cuenta de cobro (08) del cont. 147, del mes de noviembre de 2024 - Planilla de seguridad social del mes de noviembre de 2024 - Informe de actividades que hubo lugar durante el mes de noviembre de 2024 en 111 folios. - Certificado de seguridad social emitido por Asesor de SST.
EJECUCION ADMINISTRATIVA	Las actividades asignadas al contratista se encuentran desarrolladas en debida forma, atendiendo cada una de las necesidades requeridas por la E.S.E, en relación al objeto contractual, se anexan evidencias y pantallazos del

“Salud Comunitaria Humanizada con Calidad”

Calle 3 No. 2-51 Esquina. Conmutador: 8373314
Gerencia: 3133769596 Urgencias: 8373565 - 3133770857
E-mail: gerencia@eseharv-sanagustin-huila.gov.co
<http://www.eseharv-sanagustin-huila.gov.co>
San Agustín - Huila – Colombia
Código Postal: 418060

VIGILADO Supersalud 



ESE HOSPITAL "ARSENIO REPIZO VANEGAS"
SAN AGUSTIN - HUILA
SUPERVISION

CÓDIGO: A-CO-FO-11

VERSIÓN: 02

FECHA: 21/12/2023

TRD: 100 40 01

contenido del mismo:

	EDWIN ESTEBAN JIMENEZ HURTADO Ingeniero Ambiental TP: 19238-249369 CAU	Código: CONS-ADM04 Fecha aprobación: Enero 2018
	INFORMES	Versión: 01 Página 1 de 23

San Agustín Huila, 30 de noviembre de 2024.

Doctora
ANGIE LORENA GASCA OME
Supervisora Contrato 147 de 2024.
La ciudad

Referencia: Contrato OPS 147

Asunto: Informe entre el 01 de octubre al 30 de octubre de 2024.

Cordial saludo.

Edwin Esteban Jimenez Hurtado identificado con cédula N° 1082773171 expedida en San Agustín, en calidad de contratista de la OPS N°147 "DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APOYO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO A LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA N° 121 Y N° 124, CELEBRADOS PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES PARA LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS" presento a continuación el informe N°7 entre el 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2024.

La presente con el fin de consolidar la información reportada del avance de los contratos de interventorias N°121 de 2024 y N°124 de 2024.

Cordialmente.

EDWIN ESTEBAN JIMENEZ HURTADO
Ingeniero Ambiental TP: 19238-249369 CAU
Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca
Esp HSEQ Universidad Autónoma de Occidente

	EDWIN ESTEBAN JIMENEZ HURTADO Ingeniero Ambiental TP: 19238-249369 CAU	Código: CONS-ADM04 Fecha aprobación: Enero 2018
	INFORMES	Versión: 01 Página 2 de 23

CONDICIONES INICIALES CONTRATO OPS N° 147 DE 2024

Objeto Contractual: DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APOYO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO A LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA N° 121 Y N° 124, CELEBRADOS PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES PARA LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS

Inicio: 27 de marzo de 2024

Final: 27 de diciembre de 2024

Valor mensual: Dos Millones seiscientos diecinueve mil pesos (\$ 2.719.000)

Actividades Específicas:

	ESE HOSPITAL "ARSENIO REPIZO VANEGAS" SAN AGUSTIN - HUILA CONTRATO	CÓDIGO: GTC-FO-01 VERSIÓN: 01 FECHA: 01/06/2018 TRD:
7 DURACION	sus honorarios, seguridad social y demás prestaciones económicas de ley. Desde la firma de acta de inicio hasta el 27 de diciembre de 2024.	
8 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	1. Realizar la verificación, seguimiento y control técnico, administrativo y financiero de la etapa precontractual de contrato de interventoría de obra número 121 y 124 ejecutados por la ESE Arsenio Repizo Vanegas. 2. Realizar el seguimiento y garantizar el cumplimiento de los requisitos de ley como Seguridad social de personal contratado de interventoría. 3. Verificación del seguimiento del programa de obra de los contratos 121 y 124 con reporte semanal para alertar avance o retraso de acuerdo a los informes reportados por interventoría. 4. Realizar recomendaciones para los comités de obra según lo programado. 5. Realizar actividades que garanticen el cumplimiento de las obligaciones contractuales de interventoría. 6. Apoyar en la elaboración del informe técnico de supervisión. 7. Las demás que encomiende de manera especial la Gerencia de la Entidad, relacionadas con el objeto del presente contrato.	

**EJECUCION
ADMINISTRATIVA**

"Salud Comunitaria Humanizada con Calidad"

Calle 3 No. 2-51 Esquina. Conmutador: 8373314
Gerencia: 3133769596 Urgencias: 8373565 - 3133770857
E-mail: gerencia@eseharv-sanagustin-huila.gov.co/
<http://www.eseharv-sanagustin-huila.gov.co>
San Agustín - Huila - Colombia
Código Postal: 418060

VIGILADO Supersalud



ESE HOSPITAL "ARSENIO REPIZO VANEGAS"
SAN AGUSTIN - HUILA
SUPERVISION

CÓDIGO: A-CO-FO-11

VERSIÓN: 02

FECHA: 21/12/2023

TRD: 100 40 01

**EJECUCION
ADMINISTRATIVA**

	EDWIN ESTEBAN JIMENEZ HURTADO Ingeniero Ambiental TP: 19238-249369 CAU	Código: CONS-ADM04
		Fecha aprobación: Enero 2018
	INFORMES	Versión: 01 Página: 3 de 23

INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE DEL CONTRATO OPS 147 DE 2024

I. Seguimiento Contrato 124 de 2024:

ACTIVIDADES ESPECIFICAS	SEGUIMIENTO CONTRATO DE INTERVENTORIA 124 DE 2024
1. Realizar verificación, seguimiento y control técnico, administrativo y financiero de la etapa precontractual del contrato de interventoría de obra número 121 y 124 ejecutados por la ESE Arsenio Repizo Vanegas.	La información reportada corresponde a la información que se salvaguarda en contratación en medio físico. Con la información existente se reporta requerimiento de la superintendencia de salud de cada uno de los proyectos asignados mediante la resolución 2363 de 2023 y la resolución 2289 de 2023. Se anexa formatos diligenciados de referencia de los 5 reportes: • Formato de seguimiento técnico • Formato de seguimiento administrativo • Formato de seguimiento financiero • Formato de seguimiento de cumplimiento • Formato de seguimiento de calidad Se anexa formato de seguimiento de cumplimiento de los 5 reportes. Se anexa formato de seguimiento de cumplimiento de los 5 reportes.
2. Ejecutar el seguimiento y garantizar el cumplimiento de los requisitos de	Se comunica a la interventoría la necesidad de adelantar el proceso de liquidación y anexar los soportes correspondientes al tema de

	EDWIN ESTEBAN JIMENEZ HURTADO Ingeniero Ambiental TP: 19238-249369 CAU	Código: CONS-ADM04
		Fecha aprobación: Enero 2018
	INFORMES	Versión: 01 Página: 4 de 23

ley como seguridad social del personal contratado de interventoría.	seguridad social. Se anexa formato de seguimiento de cumplimiento de los 5 reportes. Se anexa formato de seguimiento de cumplimiento de los 5 reportes.
3. Verificación del seguimiento del cronograma de obra de los contratos 121 y 124, con reporte semanal para alertar avance o retraso, de acuerdo a los informes reportados por interventoría.	De acuerdo al requerimiento del MSPS se hace necesario se reporte un informe ejecutivo y registro de cada uno de los puestos de salud. Se hace observaciones al informe inicial presentado para que se use fotografías actuales del estado en el que se encuentra cada puesto de salud, requerimiento que fue acogido por la interventoría y envía consolidado el 13 de noviembre de 2024.
4. Realizar las recomendaciones de obra según lo programado	se recomienda que el balance financiero y técnico se ratifique con el apoyo de supervisión técnica de ingeniería de la entidad HARV el ingeniero Roberto Nafiez, quien es la persona encargada de dar el visto bueno de ejecución.
5. Realizar las actividades que garanticen las obligaciones	Se solicita los requerimientos para el proceso de liquidación con el objetivo de realizarlo dentro de los 2 meses siguientes al acta de recibido del 02 de septiembre.

"Salud Comunitaria Humanizada con Calidad"

Calle 3 No. 2-51 Esquina. Conmutador: 8373314
Gerencia: 3133769596 Urgencias: 8373565 - 3133770857
E-mail: gerencia@eseharv-sanagustin-huila.gov.co
<http://www.eseharv-sanagustin-huila.gov.co>
San Agustín - Huila - Colombia
Código Postal: 418060

VIGILADO Supersalud



ESE HOSPITAL "ARSENIO REPIZO VANEGAS"
SAN AGUSTIN - HUILA
SUPERVISION

CÓDIGO: A-CO-FO-11

VERSIÓN: 02

FECHA: 21/12/2023

TRD: 100 40 01

**EJECUCION
ADMINISTRATIVA**

	EDWIN ESTEBAN JIMENEZ HURTADO Ingeniero Ambiental TP: 19238-249369 CAU	Código: CONS-ADM04 Fecha aprobación: Enero 2018
	INFORMES	Versión: 01 Página 8 de 23

7. Las demás que encomiende de manera especial la gerencia de la entidad, relacionados con el objeto del presente contrato.	Para este periodo no se reporta a la plataforma PISIS debido a que no se ha hecho la liquidación y se ha tenido que reprogramar reunión virtual con el asesor Diego Cepeda del MSPS ya que a comienzo de noviembre se presentó un accidente al ingeniero de sistemas encargado del cargo por parte de la entidad HARV. Para este periodo no se ha realizado comité técnico, pero se requirió adelantar el tema de liquidación a la interventoría por lo que se vuelve a requerir el 26 de noviembre. Ingeniera YUDI TATIANA HERNANDEZ SAMBONI RL contrato interventoría 124 de 2024 Arquitecto WILSON UNI COLLAZOS RL Contrato obra 122 de 2022 Asunto: Envío soportes para el proceso de liquidación de los contratos 122 de 2024 y 124 de 2024. Teniendo en cuenta la obligación contractual y de poder finalizar el proceso de liquidación se solicita hacer llegar en medio físico y digital los soportes del proceso de liquidación de los contratos de referencia, debido que se tiene la obligación con el Ministerio de Salud y Protección Social de finalizar con el proceso de cierre de los recursos asignados mediante las Resoluciones N°2363 de 2023 y N°2285 de 2023 para los 5 proyectos de adecuación de los puestos de salud de Alto Quinchana, Obando, Rosario, Villafatima y Sevilla respectivamente. El periodo de corte es el 25 de cada mes.
---	---

Elaboró:

EDWIN ESTEBAN JIMENEZ HURTADO
Ingeniero Ambiental TP: 19238-249369 CAU
Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca
Esp HSEQ Universidad Autónoma de Occidente

	EDWIN ESTEBAN JIMENEZ HURTADO Ingeniero Ambiental TP: 19238-249369 CAU	Código: CONS-ADM04 Fecha aprobación: Enero 2018
	INFORMES	Versión: 01 Página 7 de 23

II. Seguimiento Contrato 121 de 2024:

ACTIVIDADES ESPECIFICAS	SEGUIMIENTO CONTRATO DE INTERVENTORIA 121 DE 2024																																																
1. Realizar la verificación, seguimiento y control técnico, administrativo y financiero de la etapa precontractual del contrato de interventoría de obra número 121 y 124 ejecutados por la ESE Arsenio Repizo Vanegas.	Se realiza verificación de la información salvaguardada en contratación para verificar que toda la documentación este firmada para que los cargues a plataforma PISIS del MSPS se subsanen. Para el mes de noviembre el plan de obra radicado por el contratista se empieza a implementar con el fin de lograr reducir el atraso de obra planteando el trabajo en la distribución de 5 fases que agrupan los módulos. Tabla 2.2.1.1. Avance de ejecución de obra por fases y módulos. <table border="1"><thead><tr><th>FASE</th><th>MÓDULO</th><th>AVANCE O AVANCE POR MÓDULO</th><th>AVANCE POR FASE</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>1</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>5</td><td>5</td><td>100%</td><td>100%</td></tr></tbody></table> UT HOSPITAL CA E INFORME DE INTERVENTORIA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS SAN AGUSTIN - HUILA <table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>ACTIVIDAD</th><th>RESPONSABLE</th><th>AVANCE</th></tr></thead><tbody><tr><td>2023-12-21</td><td>Verificación de la documentación de contratación</td><td>Yudi Tatiana Hernandez Samboni</td><td>100%</td></tr><tr><td>2023-12-21</td><td>Verificación de la documentación de contratación</td><td>Wilson Uni Collazos</td><td>100%</td></tr><tr><td>2023-12-21</td><td>Verificación de la documentación de contratación</td><td>Wilson Uni Collazos</td><td>100%</td></tr><tr><td>2023-12-21</td><td>Verificación de la documentación de contratación</td><td>Wilson Uni Collazos</td><td>100%</td></tr><tr><td>2023-12-21</td><td>Verificación de la documentación de contratación</td><td>Wilson Uni Collazos</td><td>100%</td></tr></tbody></table>	FASE	MÓDULO	AVANCE O AVANCE POR MÓDULO	AVANCE POR FASE	1	1	100%	100%	2	2	100%	100%	3	3	100%	100%	4	4	100%	100%	5	5	100%	100%	FECHA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	AVANCE	2023-12-21	Verificación de la documentación de contratación	Yudi Tatiana Hernandez Samboni	100%	2023-12-21	Verificación de la documentación de contratación	Wilson Uni Collazos	100%	2023-12-21	Verificación de la documentación de contratación	Wilson Uni Collazos	100%	2023-12-21	Verificación de la documentación de contratación	Wilson Uni Collazos	100%	2023-12-21	Verificación de la documentación de contratación	Wilson Uni Collazos	100%
FASE	MÓDULO	AVANCE O AVANCE POR MÓDULO	AVANCE POR FASE																																														
1	1	100%	100%																																														
2	2	100%	100%																																														
3	3	100%	100%																																														
4	4	100%	100%																																														
5	5	100%	100%																																														
FECHA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	AVANCE																																														
2023-12-21	Verificación de la documentación de contratación	Yudi Tatiana Hernandez Samboni	100%																																														
2023-12-21	Verificación de la documentación de contratación	Wilson Uni Collazos	100%																																														
2023-12-21	Verificación de la documentación de contratación	Wilson Uni Collazos	100%																																														
2023-12-21	Verificación de la documentación de contratación	Wilson Uni Collazos	100%																																														
2023-12-21	Verificación de la documentación de contratación	Wilson Uni Collazos	100%																																														

EJECUCION

"Salud Comunitaria Humanizada con Calidad"

Calle 3 No. 2-51 Esquina. Conmutador: 8373314
Gerencia: 3133769596 Urgencias: 8373565 - 3133770857
E-mail: gerencia@eseharv-sanagustin-huila.gov.co
<http://www.eseharv-sanagustin-huila.gov.co>
San Agustín - Huila - Colombia
Código Postal: 418060

VIGILADO Supersalud



ESE HOSPITAL "ARSENIO REPIZO VANEGAS"
SAN AGUSTIN - HUILA
SUPERVISION

CÓDIGO: A-CO-FO-11

VERSIÓN: 02

FECHA: 21/12/2023

TRD: 100 40 01

ADMINISTRATIVA

	EDWIN ESTEBAN JIMENEZ HURTADO Ingeniero Ambiental TP: 15238-10589 CAU	Código: CONS-ADM04 Fecha aprobación: Enero 2018
	INFORMES	Versión: 01 Página 8 de 23

2- Ejecutar el seguimiento y garantizar el cumplimiento de los requisitos de ley como seguridad social del personal contratado de interventoría.

Mediante comunicado UTH-C&E-110-2024. Respuesta comunicación escrita 100.35.01.1107, con asunto "Solicitud de Información." Remisión de Hojas de Vida personal ofertado y bitácora de obra. Envían soporte de pago de planillas de seguridad social y hojas de vida del personal ofertado que esta realizando el apoyo en los componentes contractuales.


Se tiene línea de comunicación directa con el representante legal de interventoría el Ingeniero Mario Gutiérrez, para los requerimientos y concertaciones técnicas requeridas a interventoría.

El cronograma planteado para implementar desde el 01 de noviembre

7 plan de obra establece un cronograma de actividades, en el cual se evidencian los hitos y las fechas de inicio y término de las actividades programadas.




Seguimiento mes de noviembre:



	EDWIN ESTEBAN JIMENEZ HURTADO Ingeniero Ambiental TP: 15238-10589 CAU	Código: CONS-ADM04 Fecha aprobación: Enero 2018
	INFORMES	Versión: 01 Página 9 de 23

UT. HOSPITAL C & E
INFORME DE INTERVENTORIA

El presente informe, describe el estado de los componentes programados y ejecutados de la ejecución de la obra, en el periodo comprendido entre el 26 de octubre al 25 de noviembre de 2023, presentando un atraso acumulado de 7.7%.



presenta una ejecución acumulada del 8.73% para el periodo entre el 26 de octubre al 25 de noviembre vs un programado de 10.52% con un atraso de 1.79 %.

Seguimiento obra: las siguientes actividades se desarrollaron para el periodo

Fase 0

Bloque 8: Levantamiento de muros en mampostería, Fundición de Columnetas y viguetas para confinamiento de mampostería, Excavación para cajero para pavimento de acceso a servicios complementarios.

Bloque 7: Levantamiento de muros en Mampostería, Armado de acero de refuerzo vigas aéreas, Fundición de vigas aéreas, Levantamiento de muros en mampostería, Fundición de Columnetas y viguetas para confinamiento de mampostería.

Bloque 6: Levantamiento de muros en mampostería, Fundición de Columnetas y viguetas para confinamiento de mampostería.

EJECUCION
ADMINISTRATIVA

"Salud Comunitaria Humanizada con Calidad"

Calle 3 No. 2-51 Esquina. Conmutador: 8373314
Gerencia: 3133769596 Urgencias: 8373565 - 3133770857
E-mail: gerencia@eseharv-sanagustin-huila.gov.co
<http://www.eseharv-sanagustin-huila.gov.co>
San Agustín - Huila - Colombia
Codigo Postal: 418060

VIGILADO Supersalud



ESE HOSPITAL "ARSENIO REPIZO VANEGAS"
SAN AGUSTIN - HUILA
SUPERVISION

CÓDIGO: A-CO-FO-11

VERSIÓN: 02

FECHA: 21/12/2023

TRD: 100 40 01

**EJECUCION
ADMINISTRATIVA**

	EDWIN ESTEBAN JIMENEZ HURTADO Ingeniero Ambiental TP: 15038-149369 CAJ	Código: CONS-ADM04 Fecha aprobación: Enero 2018
INFORMES	Versión: 01	Página: 10 de 23

	Fase 1 Demolición: Desmonte cubierta Zona archivo y auditorio, Demolición de muro en zona de archivo y auditorio, Demolición de cemento zona de gerencia y sala de juntas. Bloque 4: Localización y replanteo, Excavación para cimentación, Fundición de ciclópeo, Armado de acero de refuerzo para zapatas y vigas de cimentación, Fundición de zapatas y vigas de cimentación, Armado de acero de refuerzo de columnas. Bloque 5: Localización y replanteo, Excavación para cimentación, Fundición de ciclópeo, Armado de acero de refuerzo para zapatas y vigas de cimentación, Fundición de zapatas y vigas de cimentación, Armado de acero de refuerzo de columnas, Instalación de malla electrosoldada y fundición de piso, Fundición de columnas. Fase 2 Demolición: Desmonte cubierta bloque antiguo, Demolición de muro bloque antiguo, Demolición de cimentación bloque antiguo. Bloque 2 Plan de contingencia: Se cumplió el 31 de octubre con el plan de contingencia fase 1 liberando más frentes de trabajo para el contratista de obra. Intimamente en la ESE HARV se está coordinando con el contratista de obra e interventoría las actividades de traslado para la fase 2 de acuerdo al cronograma, disponibilidad presupuestal, traslado de redes eléctricas, hidráulicas y sanitarias a cargo del contratista de obra debido a que están conectados de un mismo sistema de distribución los edificios existentes con los nuevos módulos condicionando el avance del mismo, además de que la entrega de los módulos de la fase 0 permitiría despejar el resto de áreas sujeto a la terminación de los módulos 6, 7 y 8 de servicios complementarios. Durante el periodo desde el 01 de noviembre se tuvo dos jornadas de 6am-12am, -2pm -10 pm presentándose 321.5 horas seco, 20 horas de lluvias moderadas, 5 horas de lluvias intensas.
4 Realizar las recomendaciones de obra según lo programado	Se sugirió a la interventoría un control y seguimiento semanal en tiempo real considerando que el mes de diciembre la meta es mayor y se entra en temporada de fiestas. También se solicitó que realizaran control de tema de consumo de alcohol y ausentismos debido a que son factores que pueden influir en el rendimiento de obra y escaneros de riesgo.

	EDWIN ESTEBAN JIMENEZ HURTADO Ingeniero Ambiental TP: 15038-149369 CAJ	Código: CONS-ADM04 Fecha aprobación: Enero 2018
INFORMES	Versión: 01	Página: 11 de 23

	Se solicitó el tema de cerramiento entre la obra y el parqueadero interno de ambulancia de acuerdo a requerimiento de control interno por el tema de que en época de festividades se pone en riesgo la integridad del personal de la salud por eventos anteriores de amenazas al intentar ingresar al área de urgencias. 
5. Realizar las actividades que garanticen las obligaciones contractuales de la interventoría	Comunicaciones recibidas de interventoría. UTH-CAE-114-2024 del 05 de noviembre de 2024. Información solicitada mediante comunicación 2024ER0246531 de 28/10/2024. Se verifica que la información reportada corresponde a lo previamente reportado por la interventoría. UTH-CAE-117-2024 del 07 de noviembre de 2024. Remisión de Informe Ejecutivo. Se verifica que la información reportada corresponde a lo previamente reportado por la interventoría. Se anexa informe técnico. UTH-CAE-122-2024 del 29 de noviembre de 2024. Respuesta comunicación contraloría con asunto: ACCIÓN PREVENTIVA IUS E-2024-684395. Se verifica que la información reportada corresponde a lo previamente reportado por la interventoría.
6. Apoyar en el informe técnico de la supervisión	Mediante comunicado UTH-CAE-116-2024 del 06 de noviembre. Remisión de Informe mensual No 7 correspondiente al periodo 26 de septiembre - 25 de octubre de 2024, donde se evidencia un ejecutado del 1.45% con un acumulado de 4.03% vs un proyectado de 6.29% con un atraso de 2.26%

"Salud Comunitaria Humanizada con Calidad"

Calle 3 No. 2-51 Esquina. Conmutador: 8373314
Gerencia: 3133769596 Urgencias: 8373565 - 3133770857
E-mail: gerencia@eseharv-sanagustin-huila.gov.co /
http://www.eseharv-sanagustin-huila.gov.co
San Agustín - Huila - Colombia
Código Postal: 418060

VIGILADO Supersalud



ESE HOSPITAL "ARSENIO REPIZO VANEGAS"
SAN AGUSTIN - HUILA
SUPERVISION

CÓDIGO: A-CO-FO-11

VERSIÓN: 02

FECHA: 21/12/2023

TRD: 100 40 01

**EJECUCION
ADMINISTRATIVA**



EDWIN ESTEBAN JIMENEZ HURTADO
Ingeniero Ambiental
TP: 15038-40389 CAU

INFORMES

Código: CONS-ADM04

Fecha aprobación:
Enero 2018

Version: 01

Página 12 de 23

A continuación, se relacionan las cantidades ejecutadas para el periodo de reporte.

A continuación, se relacionan las cantidades ejecutadas para el periodo de reporte.

ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	VALOR	ESTADO
1	ORDEN DE COMPRA	2023-11-18	1.200.000,00	COMPLETADO
2	ORDEN DE COMPRA	2023-11-18	1.200.000,00	COMPLETADO
3	ORDEN DE COMPRA	2023-11-18	1.200.000,00	COMPLETADO
4	ORDEN DE COMPRA	2023-11-18	1.200.000,00	COMPLETADO
5	ORDEN DE COMPRA	2023-11-18	1.200.000,00	COMPLETADO

Se tiene un acumulado de 46 órdenes de compra de acuerdo con el informe N7 de interventoría.

DESCRIPCION	FECHA	APROBADO	SALDO
ORDEN DE COMPRA	2023-11-18	1.200.000,00	1.200.000,00
ORDEN DE COMPRA	2023-11-18	1.200.000,00	1.200.000,00
ORDEN DE COMPRA	2023-11-18	1.200.000,00	1.200.000,00
ORDEN DE COMPRA	2023-11-18	1.200.000,00	1.200.000,00
ORDEN DE COMPRA	2023-11-18	1.200.000,00	1.200.000,00

UT HOSPITAL C & E
INFORME DE INTERVENTORIA

ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	VALOR	ESTADO
1	ORDEN DE COMPRA	2023-11-18	1.200.000,00	COMPLETADO
2	ORDEN DE COMPRA	2023-11-18	1.200.000,00	COMPLETADO
3	ORDEN DE COMPRA	2023-11-18	1.200.000,00	COMPLETADO
4	ORDEN DE COMPRA	2023-11-18	1.200.000,00	COMPLETADO
5	ORDEN DE COMPRA	2023-11-18	1.200.000,00	COMPLETADO

Con la información consolidada del informe, se diligenció el formato D06 para reporte a PISIS.

Se participo en la reunión programada para el 18 de noviembre para verificar el estado de cargue del proyecto en la plataforma PISIS con la participación de contratación, secretaría de gerencia con la asesoría del Ingeniero Diego Cepeda del MSPS.



EDWIN ESTEBAN JIMENEZ HURTADO
Ingeniero Ambiental
TP: 15038-40389 CAU


INFORMES

Código: CONS-ADM04

Fecha aprobación:
Enero 2018

Version: 01

Página 12 de 23




7. Las demás que encomiende de manera especial la gerencia de la entidad, relacionados con el objeto del presente contrato.

Comité técnico mes de noviembre

Se participo en la mesa técnica solicitada por interventoría mediante comunicado UTH-C&E-118-2024 radicado el 08 de noviembre.

Reunión reprogramada el 13 de noviembre



"Salud Comunitaria Humanizada con Calidad"

Calle 3 No. 2-51 Esquina. Conmutador: 8373314
Gerencia: 3133769596 Urgencias: 8373565 - 3133770857
E-mail: gerencia@eseharv-sanagustin-huila.gov.co
<http://www.eseharv-sanagustin-huila.gov.co>
San Agustín - Huila - Colombia
Código Postal: 418060

VIGILADO Supersalud



ESE HOSPITAL "ARSENIO REPIZO VANEGAS"
SAN AGUSTIN - HUILA
SUPERVISION

CÓDIGO: A-CO-FO-11

VERSIÓN: 02

FECHA: 21/12/2023

TRD: 100 40 01

	EDWIN ESTEBAN JIMENEZ HURTADO Ingeniero Ambiental TP: 15038-249369 CAU		Código: CONS-ADM04 Fecha aprobación: Enero 2018	
	INFORMES		Versión: 01	Página 16 de 23

Plan de contingencia
traslados internos zona fase 2

Adecuación sala de espera laboratorio y adecuación frente al laboratorio



Requerimiento ruta de acceso a urgencias



	EDWIN ESTEBAN JIMENEZ HURTADO Ingeniero Ambiental TP: 15038-249369 CAU		Código: CONS-ADM04 Fecha aprobación: Enero 2018	
	INFORMES		Versión: 01	Página 17 de 23



Solución planteada



EJECUCION
ADMINISTRATIVA

"Salud Comunitaria Humanizada con Calidad"

Calle 3 No. 2-51 Esquina. Conmutador: 8373314
Gerencia: 3133769596 Urgencias: 8373565 - 3133770857
E-mail: gerencia@eseharv-sanagustin-huila.gov.co
<http://www.eseharv-sanagustin-huila.gov.co>
San Agustín - Huila - Colombia
Código Postal: 418060

VIGILADO Supersalud 



ESE HOSPITAL "ARSENIO REPIZO VANEGAS"
SAN AGUSTIN - HUILA
SUPERVISION

CÓDIGO: A-CO-FO-11

VERSIÓN: 02

FECHA: 21/12/2023

TRD: 100 40 01



EDWIN ESTEBAN JIMENEZ HURTADO
Ingeniero Ambiental
TP: 19238-49369 CAU

INFORMES

Código: CONS-ADM04

Fecha aprobación:
Enero 2018

Versión: 01

Página 19 de 23

SEGUIMIENTO PGIO

Doble jornada



EDWIN ESTEBAN JIMENEZ HURTADO
Ingeniero Ambiental
TP: 19238-49369 CAU

INFORMES

Código: CONS-ADM04

Fecha aprobación:
Enero 2018

Versión: 01

Página 21 de 23

Seguimiento a las reparaciones por daños ocasionados no previsto en las áreas aledañas



Seguimiento a la gestión ambiental en la construcción



**EJECUCION
ADMINISTRATIVA**

"Salud Comunitaria Humanizada con Calidad"

Calle 3 No. 2-51 Esquina. Conmutador: 8373314
Gerencia: 3133769596 Urgencias: 8373565 - 3133770857
E-mail: gerencia@eseharv-sanagustin-huila.gov.co
<http://www.eseharv-sanagustin-huila.gov.co>
San Agustín - Huila - Colombia
Código Postal: 418060

VIGILADO Supersalud



	ESE HOSPITAL "ARSENIO REPIZO VANEGAS" SAN AGUSTIN - HUILA	CÓDIGO: A-CO-FO-11
		VERSIÓN: 02
	SUPERVISION	FECHA: 21/12/2023
		TRD: 100 40 01

EJECUCION ADMINISTRATIVA	ANEXOS SEGUIMIENTO CONTRATO 124 DE 2024 "INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN- HUILA." 28/11/24, 12:29 p.m. Gmail - Fwd: IMPORTANTE ALCANCE - Seguimiento recursos asignados Empresas Sociales del Estado - Resoluciones vigenc...  Gmail EDWIN ESTEBAN JIMENEZ HURTADO <e2dwinj@gmail.com> Fwd: IMPORTANTE ALCANCE - Seguimiento recursos asignados Empresas Sociales del Estado - Resoluciones vigencias 2023 y 2024 EDWIN ESTEBAN JIMENEZ HURTADO <e2dwinj@gmail.com> 28 de noviembre de 2024, 12:29 Para: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS <eseharv@gmail.com> Cc: angie105@gmail.com nota: Hasta hoy 28/11/2024 esta el enlace autorizado el cargue de todas las resoluciones del MSPS Buena tarde Sandra Ordoñez Auxiliar Administrativo Secretaria de Gerencia Respuesta solicitud requerimiento supersalud para que sea remitido desde el correo oficial del HARV a la dependencia que envió el correo según lo manifiestan. En calidad de apoyo de supervisión de los contratos de infraestructura (cto147 de 2024), se diligenció para los 6 proyectos de recursos asignados del MSPS del 2023 a 2024 que se relacionan a continuación: *Resolución 1832 del 08/11/2023 proyecto CONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, FARMACIA, SALA DE PARTOS, VACUNACION Y AREA ADMINISTRATIVA, Y SERVICIOS DE APOYO COMPLEMENTARIO DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN HUILA. *Resolución 2363 del 29/12/2023 proyecto ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA DE ALTO QUINCHANA, DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA *Resolución 2289 del 28/12/2023 proyecto ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA OBANDO, DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA proyecto ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA ROSARIO, DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA proyecto ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA SEVILLA, DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA proyecto ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLAFATIMA, DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA se verifica el cargue en el enlace • SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA https://forms.office.com/r/wMQArp73r7?origin=lprLink anexo pantallazo de cargue y respuesta [El texto oculto está oculto] 7 adjuntos
--	---

"Salud Comunitaria Humanizada con Calidad"

Calle 3 No. 2-51 Esquina. Conmutador: 8373314
Gerencia: 3133769596 Urgencias: 8373565 - 3133770857
E-mail: gerencia@eseharv-sanagustin-huila.gov.co
<http://www.eseharv-sanagustin-huila.gov.co>
San Agustín - Huila - Colombia
Código Postal: 418060

VIGILADO Supersalud 



ESE HOSPITAL "ARSENIO REPIZO VANEGAS"
SAN AGUSTIN - HUILA
SUPERVISION

CÓDIGO: A-CO-FO-11
VERSIÓN: 02
FECHA: 21/12/2023
TRD: 100 40 01

EJECUCION
ADMINISTRATIVA



EDWIN ESTEBAN JIMENEZ MURTADO <edwin@gmail.com>

Solicitud de informacion /

2 mensajes

gerencia.gerencia@eseharv-sanagustin-huila.gov.co

Para: edwinesteban@gmail.com, Contraloría ESE "ARSENIO REPIZO VANEGAS" <arv@eseharv-sanagustin-huila.gov.co>

Cc: ing.endermendez@eseharv-sanagustin-huila.gov.co, EDWIN ESTEBAN JIMENEZ MURTADO <edwin@gmail.com>, aldoquintero@eseharv-sanagustin-huila.gov.co

7 de noviembre de 2024, 10:54

Caro Saludo,

Teniendo en cuenta el acuerdo a esta docuemento por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, con el contenido: CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN - HUILA, me permito hacer lo siguiente:

1. Informe ejecutivo del estado del contrato o los contratos existentes celebrados, para efectos de ejecutar dichos recursos; Interventoría
2. Expediente del contrato o los contratos existentes celebrados por las ESE y/o las entidades territoriales, para efectos de ejecutar dichos recursos; Contratación ESE
3. Estado de ejecución de la inversión de los recursos; Interventoría
4. Registro integral con existencia del estado en el que se encuentra el proyecto; Interventoría

De acuerdo a lo anterior, se le solicita un plazo máximo de 1 día hábil, para enviar respuesta, teniendo en cuenta que vence el 13 de noviembre

Sin otro particular

Saludo Cordial,
Asesor Administrativo

3 adjuntos

28343201744171 Res 2089 de 2023.pdf

13 KB

28343201744141 Res 2089 de 2023.pdf

13 KB

28343201744181 Res 2089 de 2023.pdf

13 KB

28343201744181 Res 2089 de 2023.pdf

13 KB

28343201744131 Res 2089 de 2023.pdf

13 KB

YUDY TATIANA HERNANDEZ SAMBON <yudithernandez@gmail.com>

Para: gerencia.gerencia@eseharv-sanagustin-huila.gov.co, EDWIN ESTEBAN JIMENEZ MURTADO <edwin@gmail.com>, aldoquintero@eseharv-sanagustin-huila.gov.co

13 de noviembre de 2024, 8:32

Estimado Saludo,

A través de este correo electrónico se le informa de la información solicitada por la presentación adjunta en calidad de interventoría del contrato de obra No 122 de 2024 y controlada del contrato de consultoría No 124 de 2024.

Muchas gracias por la atención prestada.

Atentamente,

YUDY TATIANA HERNANDEZ SAMBON

5 ANEXO FOTOGRAFICO VILLA PATRIA.pdf



EDWIN ESTEBAN JIMENEZ MURTADO <edwin@gmail.com>

Solicitud requerimiento documentación para proceso de liquidación cto 122 y cto 124

EDWIN ESTEBAN JIMENEZ MURTADO <edwin@gmail.com>

Para: yudithernandez@gmail.com

Cc: aldoquintero@eseharv-sanagustin-huila.gov.co, ing.endermendez@eseharv-sanagustin-huila.gov.co, aldoquintero@eseharv-sanagustin-huila.gov.co, TISSOTERIA ESE-HARV <eseharv@eseharv-sanagustin-huila.gov.co>, argeria@eseharv-sanagustin-huila.gov.co

8 de noviembre de 2024, 8:48

Señor Saludo,

Ing. YUDY TATIANA HERNANDEZ SAMBON
PL Contrato Interventoría 124 de 2024

Asunto:
HUILA UNI COLLADO
R. Contrato obra 122 de 2022

Asunto: Envío de expedientes para el proceso de liquidación de los contratos 122 de 2024 y 124 de 2024.

En calidad de asesor a la supervisión del contrato 124 de 2024 cuyo objeto es "INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN - HUILA".

Se solicita se haga llegar a la entidad el informe final de interventoría y controlada de obra con los todos los soportes de seguridad social del personal contratado que labore, paz y salvo del personal contratado, momento de cálculo de las cantidades y soporte de las mismas de acuerdo al balance final, soporte de pago de impuestos y obligaciones tributarias.

Lo anterior como soporte para el proceso de liquidación de los contratos 124 de 2024 y 122 de 2024.

Si por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, se hace algún requerimiento adicional para el cargo a PREIS se estará informando.

Sin otro particular.

Edwin Esteban Jimenez Murtado
Apoyo a la supervisión Cto 147 de 2024.

ANEXOS SEGUIMIENTO CONTRATO 121 DE 2024

INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y
URÍDICA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO
CLÍNICO, FARMACIA, SALA DE PARTOS, VACUNACIÓN Y ÁREA
ADMINISTRATIVA; Y SERVICIOS DE APOYO COMPLEMENTARIO DE ESE
HOSPITAL ARSENIO VANEGAS DE SAN AGUSTÍN HUILA"

"Salud Comunitaria Humanizada con Calidad"

Calle 3 No. 2-51 Esquina. Conmutador: 8373314
Gerencia: 3133769596 Urgencias: 8373565 - 3133770857
E-mail: gerencia@eseharv-sanagustin-huila.gov.co /
http://www.eseharv-sanagustin-huila.gov.co
San Agustín - Huila - Colombia
Codigo Postal: 418060

VIGILADO Supersalud



ESE HOSPITAL "ARSENIO REPIZO VANEGAS"
SAN AGUSTIN - HUILA
SUPERVISION

CÓDIGO: A-CO-FO-11

VERSIÓN: 02

FECHA: 21/12/2023

TRD: 100 40 01

**EJECUCION
ADMINISTRATIVA**



EDWIN ESTEBAN JIMENEZ MURTAO <edwinj@gmail.com>

Remision oficio UTH-C&E-122-2024 - Respuesta comunicacion contraloria con asunto: ACCION PREVENTIVA IUS E-2024-684395.

mensaje

UT HOSPITAL C&E <uthospital@gmail.com>
Para: gerencia gerencia <gerencia@sanagustin-huila.gov.co>
Cc: edwinj@gmail.com

29 de noviembre de 2024, 14:

29 de noviembre de 2024

UTH-C&E-122-2024

Destinatario:
ANDRÉS LORIANA GARCÍA OMB.
Gerente E. S. E Hospital Arsenio Repizo Vanegas.
Superintendente

Ingente:
EDWIN ESTEBAN JIMENEZ
Asesor a la gerencia.
E. S. E Hospital Arsenio Repizo Vanegas.

Asunto: Respuesta comunicacion contraloria con asunto: ACCION PREVENTIVA IUS E-2024-684395.

Referencia: Contrato de obra 123 del 2024 "CONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO, FARMACIA, SALA DE PARTOS, VACUNACIÓN Y AREA ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS DE APOYO COMPLEMENTARIO DE ESE HOSPITAL ARSENIO VANEGAS DE SAN AGUSTIN HUILA".

Contenido adjunto.

MARIO ALBERTO GUTIERREZ GOMEZ

R.L. UNIÓN TEMPORAL C&E
Contratista Interventor

UTH-C&E-122-2024 Respuesta contraloria.pdf
122 KB



EDWIN ESTEBAN JIMENEZ MURTAO <edwinj@gmail.com>

Fwd: Remision oficio UTH-C&E-118-2024 - Solicitud de mesa técnica.

mensaje

gerencia gerencia <gerencia@sanagustin-huila.gov.co>

Para: EDWIN ESTEBAN JIMENEZ MURTAO <edwinj@gmail.com>, aldoquieninforma@h@gmail.com, anexo@h@gmail.com, ing. roberto@h@gmail.com, ing. roberto@h@gmail.com

8 de noviembre de 2024, 11:02

----- Forwarded message -----
De: UT HOSPITAL C&E <uthospital@gmail.com>
Envío: mié, 6 nov 2024 a las 10:37
Subjeto: Remision oficio UTH-C&E-118-2024 - Solicitud de mesa técnica.
Re: gerencia gerencia <gerencia@sanagustin-huila.gov.co>

08 de noviembre de 2024

UTH-C&E-118-2024

Destinatario:
ANDRÉS LORIANA GARCÍA OMB.
Gerente E. S. E Hospital Arsenio Repizo Vanegas.
Superintendente

Ingente:
EDWIN ESTEBAN JIMENEZ
Asesor a la gerencia.
E. S. E Hospital Arsenio Repizo Vanegas.

Asunto: Solicitud de mesa técnica.

Contenido adjunto.
Adjunto oficio del asunto.

MARIO ALBERTO GUTIERREZ GOMEZ

R.L. UNIÓN TEMPORAL C&E
Contratista Interventor

UTH-C&E-118-2024 Mesa tecnica.pdf.pdf
12 KB



UT. HOSPITAL C & E
INFORME DE INTERVENTORIA.



ESE HOSPITAL
"ARSENIO REPZO VANEGAS"
SAN AGUSTIN - HUILA
30 de 10 de 2024

Gerente E.S.E Hospital Arsenio Repizo Vanegas.

Ingente: EDWIN ESTEBAN JIMENEZ.

Asesor a la supervisión.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO No. 121 DE 2024

Contrato de Obra para la construcción de la intervención

CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE HOSPITAL ARSENIO REPZO VANEGAS"
IDENTIFICACIÓN	NIT. 891.180.115-8
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL HOSPITAL C&E
NIT	207.873.351-1
REPRESENTANTE LEGAL	MARIO ALBERTO GUTIERREZ GÓMEZ
IDENTIFICACIÓN	C.C. 1.102.371.474 de Pinedococha
DIRECCIÓN	C&E 38 "C" 44-05 Bucaramanga
CORREO ELECTRÓNICO	Marioalberto.gutierrez@gmail.com uthospital@gmail.com
TÉLEFONO	3154590069
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO, FARMACIA, SALA DE PARTOS, VACUNACIÓN Y AREA ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS DE APOYO COMPLEMENTARIO DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO VANEGAS DE SAN AGUSTIN"
VALOR DEL CONTRATO	NOVECIENTOS VEINTISIETE MILONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 46 CENTAVOS (\$27.999.991,46)

"Salud Comunitaria Humanizada con Calidad"

Calle 3 No. 2-51 Esquina. Conmutador: 8373314
Gerencia: 3133769596 Urgencias: 8373565 - 3133770857
E-mail: gerencia@eseharv-sanagustin-huila.gov.co
<http://www.eseharv-sanagustin-huila.gov.co>
San Agustín - Huila - Colombia
Código Postal: 418060

VIGILADO Supersalud



ESE HOSPITAL "ARSENIO REPIZO VANEGAS"
SAN AGUSTIN - HUILA
SUPERVISION

CÓDIGO: A-CO-FO-11

VERSIÓN: 02

FECHA: 21/12/2023

TRD: 100 40 01

**EJECUCION
ADMINISTRATIVA**



UT. HOSPITAL C & E
INFORME DE INTERVENTORÍA.



ESE HOSPITAL
"ARSENIO REPIZO VANEGAS"
SAN AGUSTIN - HUILA
NIT 901.188.153.8

PLAZO DE EJECUCIÓN	DIECIOCHO (18) MESES
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	(CDP) N.º 140 de fecha 13 de febrero de 2024 por el valor de NOVECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS MCTE (\$928.000.000).
SUPERVISOR	Doctora: ANGIE LORENA GASCA OME. Gerente E.S.E Hospital Arsenio Repizo Vanegas. Ingeniero: EDWIN ESTEBAN JIMÉNEZ. Apoya a la supervisión.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Los diseños identifican la intervención por bloque, los cuales se relacionan a continuación:

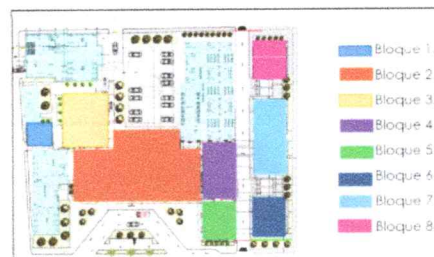


Figura No. 1. Distribución por bloques.

La distribución del bloque es la siguiente:

- Bloque 1 – Depósito de cadáveres
- Bloque 2 – área administrativa.
- Bloque 3 – Sala de Partos.

- Bloque 4 – Farmacia.
- Bloque 5 – Auditorio.
- Bloque 6 – Servicio Complementario.
- Bloque 7 – Servicio Complementario.
- Bloque 8 – Servicio Complementario.
- Urbanismo.

3. ALCANCE DEL CONTRATO DE OBRA.

El alcance contempla la construcción de los servicios de laboratorio clínico, farmacia, sala de partos, vacunación y área administrativa; y servicios de apoyo complementario de la ese Hospital Arsenio Vanegas de San Agustín Huila"



Figura No. 2. Alcance del proyecto.

"Salud Comunitaria Humanizada con Calidad"

Calle 3 No. 2-51 Esquina. Conmutador: 8373314
Gerencia: 3133769596 Urgencias: 8373565 - 3133770857
E-mail: gerencia@eseharv-sanagustin-huila.gov.co
<http://www.eseharv-sanagustin-huila.gov.co>
San Agustín - Huila - Colombia
Código Postal: 418060

VIGILADO Supersalud



ESE HOSPITAL "ARSENIO REPIZO VANEGAS"
SAN AGUSTIN - HUILA
SUPERVISION

CÓDIGO: A-CO-FO-11

VERSIÓN: 02

FECHA: 21/12/2023

TRD: 100 40 01

**EJECUCION
ADMINISTRATIVA**



Resumen 3. Alcance administrativo



Resumen 4. Alcance de servicios complementarios

4. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO.

UT. HOSPITAL C & E
INFORME DE INTERVENTORIA

ESE HOSPITAL
"ARSENIO REPIZO VANEGAS"
SAN AGUSTIN - HUILA
NIT 907 108 1318

Se construye la denominada fase 0, correspondiente a la construcción del bloque 6, 7 y 8. De igual forma si inicia actividades en la fase 1, correspondiente a los bloques 4 y 5.

Bloque 6.

Cimentación: 100%
Columnas: 100%
Vigas aéreas: 100%
Contrapiso: 100%
Redes Hidrosanitaria: 100%
Mampostería: 20%
Cubierta: 0%
Aparatos Sanitarios: 0%
Otra Blanca: 0%



Bloque 7.

Cimentación: 100%
Columnas: 95%
Vigas aéreas: 75%
Contrapiso: 100%
Redes Hidrosanitaria: 100%
Mampostería: 45%



"Salud Comunitaria Humanizada con Calidad"

Calle 3 No. 2-51 Esquina. Conmutador: 8373314
Gerencia: 3133769598 Urgencias: 8373565 - 3133770857
E-mail: gerencia@eseharv-sanagustin-huila.gov.co /
http://www.eseharv-sanagustin-huila.gov.co
San Agustín - Huila - Colombia
Código Postal: 418060

VIGILADO Supersalud



ESE HOSPITAL "ARSENIO REPIZO VANEGAS"
SAN AGUSTIN - HUILA
SUPERVISION

CÓDIGO: A-CO-FO-11

VERSIÓN: 02

FECHA: 21/12/2023

TRD: 100 40 01

**EJECUCION
ADMINISTRATIVA**



UT. HOSPITAL C & E
INFORME DE INTERVENTORIA



ESE HOSPITAL
"ARSENIO REPIZO VANEGAS"
SAN AGUSTIN - HUILA
NIT 901 160 1154

Cubierta: 0%

Aparatos Sanitarios: 0%

Obra Blanca: 0%

Bloque 8:

Cimentación: 100%

Columnas: 100%

Vigas aéreas: 100%

Contrapiso: 100%

Redes Hidrosanitarias: 100%

Mampostería: 75%

Cubierta: 0%

Aparatos Sanitarios: 0%

Obra Blanca: 0%



Bloque 5:

Cimentación: 10%



UT. HOSPITAL C & E
INFORME DE INTERVENTORIA



ESE HOSPITAL
"ARSENIO REPIZO VANEGAS"
SAN AGUSTIN - HUILA
NIT 901 160 1154

4.1 PORCENTAJE DE AVANCE

El porcentaje de avance a la fecha es del **4,67%**



4.2 Pago de Actas Parciales

A la fecha no se ha presentado acta de obra.

5. ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN DE OBRA

Las actividades de planeación y/o alistamiento de obra corresponde a actividades necesarias para el inicio de actividades físicas de obra, todas las actividades ejecutadas en la etapa de planeación se realizaron bajo el seguimiento y acompañamiento de parte de la interventoría. A continuación, se detallan las actividades llevadas a cabo durante la planificación de la obra:

- Instalación de valla informativa.

"Salud Comunitaria Humanizada con Calidad"

Calle 3 No. 2-51 Esquina. Conmutador: 8373314
Gerencia: 3133769596 Urgencias: 8373565 - 3133770857
E-mail: gerencia@eseharv-sanagustin-huila.gov.co
<http://www.eseharv-sanagustin-huila.gov.co>
San Agustín - Huila - Colombia
Código Postal: 418060

VIGILADO Supersalud



ESE HOSPITAL "ARSENIO REPIZO VANEGAS"
SAN AGUSTIN - HUILA
SUPERVISION

CÓDIGO: A-CO-FO-11

VERSIÓN: 02

FECHA: 21/12/2023

TRD: 100 40 01

**EJECUCION
ADMINISTRATIVA**



UT. HOSPITAL C & E
INFORME DE INTERVENTORÍA.



ESE HOSPITAL
"ARSENIO REPIZO VANEGAS"
SAN AGUSTIN - HUILA
NIT 891 108 113 8

Excavación Redes.



7.4 Base concreto pobre 5 cm.

La base se concreto se realiza para las vigas de cimentación de los B6, B7, B8



UT. HOSPITAL C & E
INFORME DE INTERVENTORÍA.



ESE HOSPITAL
"ARSENIO REPIZO VANEGAS"
SAN AGUSTIN - HUILA
NIT 891 108 113 8

Vigas de Cimentación



Columnas.



"Salud Comunitaria Humanizada con Calidad"


Calle 3 No. 2-51 Esquina. Conmutador: 8373314
Gerencia: 3133769596 Urgencias: 8373565 - 3133770857
E-mail: gerencia@eseharv-sanagustin-huila.gov.co
<http://www.eseharv-sanagustin-huila.gov.co>
San Agustín - Huila - Colombia
Código Postal: 418060

VIGILADO Supersalud

	ESE HOSPITAL “ARSENIO REPIZO VANEGAS” SAN AGUSTIN - HUILA	CÓDIGO: A-CO-FO-11
		VERSIÓN: 02
	SUPERVISION	FECHA: 21/12/2023 TRD: 100 40 01

	 Zapatos.  Vigas de cimentación.  Columnas. 
EJECUCION FINANCIERA	Por concepto de pago, la ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS, adeuda al contratista el valor de DOS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS M/CTE (\$2.719.000,00) conforme a forma de pago establecido en el contrato principal, cumpliendo con los requisitos y previa verificación por parte del supervisor.
OBSERVACIONES	A la fecha el contratista ha dado cumplimiento a lo estipulado en el contrato, presentando documentos de manera física, con informe anexo en 111 folios, evidencias las cuales reposan en la carpeta contractual, Por lo anterior, se manifiesta que ha cumplido con las actividades establecidas en el contrato durante el mes de noviembre de 2024, razón por la cual, se recomienda cancelar el valor adeudado.

Atentamente,



ANGIE LORENA GASCA OME

Supervisora de Contrato 147

Proyecto: Carolina Ordoñez

“Salud Comunitaria Humanizada con Calidad”

Calle 3 No. 2-51 Esquina. Conmutador: 8373314
Gerencia: 3133769596 Urgencias: 8373565 - 3133770857
E-mail: gerencia@eseharv-sanagustin-huila.gov.co
<http://www.eseharv-sanagustin-huila.gov.co>
San Agustín - Huila - Colombia
Código Postal: 418060

VIGILADO Supersalud 
