

 Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	INFORME DE DESPLAZAMIENTO CONTRATISTAS	CÓDIGO:	F-GG-40
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-24
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

FECHA:	AÑO	MES	DIA	N° Solicitud aplicativo de tiquetes:	268077
	2024	12	11		

GRUPO DE TRABAJO:	GRUPO DESARROLLO DE PROYECTOS 1					
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JEHIMY ALEJANDRA ERAZO MOLINA					
N° CONTRATO:	2024834					
LUGAR DEL DESPLAZAMIENTO:	BOGOTA – CÚCUTA - COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO COCUC CUCUTÁ					
NOMBRE DEL PROYECTO VISITADO:	“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO COCUC CUCUTÁ - NORTE DE SANTANDER, A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 216144“					
FECHA DEL DESPLAZAMIENTO:	Desde			Hasta		
	AAAA	MM	DD	AAAA	MM	DD
	2024	12	06	2024	12	06
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	ARQ. JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA			Rol o cargo	GERENTE DE UNIDAD GRUPO DESARROLLO DE PROYECTOS 1	
OBJETO DE LA VISITA:	Realizar visita técnica de seguimiento al contrato de obra 2240066 y contrato de interventoría 2240069 en ejecución, revisión de avance de obra en el Establecimiento Penitenciario COCUC CÚCUTA.					

INFORME
A. ITINERARIO DEL VIAJE Número de solicitud: 268077 Convenio/Centro de costo: 216144 USPEC Nombre de Viajero: Jehimy Alejandra Erazo Molina Itinerario: SALIDA BOGOTA (BOG) – CÚCUTA (CUC) 5:00 AM – 06 de diciembre de 2024 CÚCUTA (CUC) – BOGOTÁ (BOG) 8:00 PM – 06 de diciembre de 2024 Desplazamiento: BOGOTA- CÚCUTA- BOGOTÁ B. CRONOLOGÍA DEL DESPLAZAMIENTO DIA 1 – 06 DE DICIEMBRE DE 2024 Ingreso al Establecimiento: 9:00am – Salida del Establecimiento: 4:00pm (COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO COCUC CUCUTÁ)

 Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	INFORME DE DESPLAZAMIENTO CONTRATISTAS	CÓDIGO:	F-GG-40
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-24
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

INFORME

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO:

Tipo de Contrato y Número:	OBRA No. 2240066
Objeto:	“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO COCUC CUCUTÁ - NORTE DE SANTANDER, A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 216144.”.
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL COMPLEJOS CARCELARIOS CUCUTA
Valor Inicial:	\$3.900.534.991,2
Valor final:	NO APLICA
Fecha de suscripción:	23 DE ABRIL DE 2024
Fecha de inicio:	17 DE JUNIO DE 2024
Fecha de Liquidación:	NO APLICA
Fecha de Terminación:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
Contrato de Interventoría:	2240069
Contratista:	CONSORCIO INTER COCUC
Valor Inicial	\$ 323.826.866,62
Valor final:	NO APLICA
Fecha de inicio:	17 DE JUNIO DE 2024
Fecha de Terminación:	17 DE DICIEMBRE DE 2024

Siendo las 9:00pm del día 06 de diciembre de 2024, se hace presencia en el proyecto del establecimiento COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO COCUC CUCUTÁ ubicado en el Departamento de NORTE DE SANTANDER, en el Kilómetro 3 Carretera Panamericana Vía al Salado, con el fin de dar seguimiento a la ejecución del contrato 2240066 dentro del contrato interadministrativo No. 216144 de 2016, cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO COCUC CUCUTÁ - NORTE DE SANTANDER, A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 216144.”

ASISTENTES VISITA

INPEC

- Dragoneante Jesús Peñaloza – Responsable de infraestructura y mantenimiento COCUC INPEC

ENTERRITORIO S.A.

- Jehimy Alejandra Erazo Molina - Supervisor del C.I. 216144

CONTRATISTA DE OBRA

- Danilo de Jesús España Calvo – Residente de obra UT COMPLEJOS CARCELARIOS
- Nishmet Bajrhaim Sayegh Montes – Inspectora de obra UT COMPLEJOS CARCELARIOS

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

 Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	INFORME DE DESPLAZAMIENTO CONTRATISTAS	CÓDIGO:	F-GG-40
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-24
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

INFORME
• Ing. Juan David Brito – Residente de interventoría • Camila Baquero – Inspectora de interventoría CONSORCIO INTER COCUC
INFORME DE VISITA Durante el recorrido, se inspeccionaron las áreas intervenidas y por intervenir, conforme a los alcances contemplados en el contrato de obra y los compromisos adquiridos el pasado 22 de noviembre de 2024, en visita técnica por los delegados de ENTerritorio S.A., la Ing. Mildred Carvajal– Gerente C.I. 216144 y la Arq. Alejandra Erazo – Supervisora técnica. A continuación, se detallan los aspectos relevantes observados y los compromisos acordados. COMPONENTE2 ▪ Reforzamiento del Muro Perimetral (Zona Norte) Se evidencia la fundición en concreto de 4000PSI de 18 contrapesas y pedestales, finalizó la actividad de anclajes en columnas y se fundieron 03 columnas completas, 04 columnas a la altura de 2.5 metros, está pendiente fundir la altura de 2.5m a 5m de las columnas. Para esta longitud del muro (100 metros lineales) se han instalado 38 metros lineales de concertina. <u>Compromiso:</u> Fecha de terminación de esta actividad 14 de diciembre de 2024
 
Ilustración 1: 06/12/2024 Lugar de Reforzamiento muro perimetral zona norte Fundición de columnas Ilustración 2: 06/12/2024 Lugar de Reforzamiento muro perimetral zona norte Fundición de columnas

 Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	INFORME DE DESPLAZAMIENTO CONTRATISTAS	CÓDIGO:	F-GG-40
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-24
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

INFORME



Ilustración 3: 06/12/2024
Lugar de Reforzamiento muro perimetral zona norte
Fundición de columnas



Ilustración 4: 06/12/2024
Lugar de Reforzamiento muro perimetral zona
norte Fundición de columnas

■ **Instalación de Concertina**

Se reporta por parte del INPEC, que a la fecha se han instalado 303 metros lineales de 750 metros contractuales. Por parte del INPEC, se reporta que la actividad no ha continuado, debido a que el mismo frente que estaba instalando concertina, ahora inicio actividades en la malla eslabonada. Se recomienda abrir frente nuevo para instalar concertina y finalizar la actividad en el plazo contractual del Componente 2, es decir, 17 de diciembre de 2024.

Compromiso: Fecha de terminación de esta actividad 20 de diciembre de 2024



Ilustración 5: 06/12/2024
Instalación de concertina áreas externas e
internas



Ilustración 6: 06/12/2024
Instalación de concertina áreas muro perimetral zona
norte

■ **Instalación de Malla Eslabonada**

Inicia actividad de instalación de malla eslabonada, se evidencia la instalación de nueve (09) paraleles, y el suministro de módulos con marco y malla eslabonada.

 Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	INFORME DE DESPLAZAMIENTO CONTRATISTAS	CÓDIGO:	F-GG-40
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-24
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

INFORME

Compromiso: Realizar seguimiento a los rendimientos de esta actividad para que se reporte fecha de terminación y entrega de este alcance contractual.

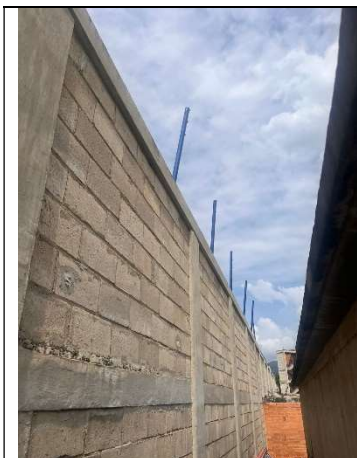


Ilustración 7: 06/12/2024
Instalación de parales



Ilustración 8: 06/12/2024
Suministro de marco con malla eslabonada.

COMPONENTE1

▪ **Garita 9 y 3**

Se reporta por parte del contratista de obra e interventoría, que aún no se han entregado los estudios de suelos, se prevé que para el día 09 de diciembre de 2024 se entreguen los resultados y ajustes a diseños de garita.

▪ **Iluminación Perimetral**

Se instalaron 298 luminarias perimetrales, pero se requiere verificar su correcto funcionamiento de 15 internas y 8 externas. En la presente visita se reporta por parte de la interventoría y contratista de obra, que se realizaron los ajustes correspondientes para el correcto funcionamiento de 15 luminarias que presentaban falla. Para las 8 luminarias pendientes de instalación en el área externa del ERON, aun no ha iniciado esta actividad, se solicita se inicien actividades en la semana del 9 al 13 de diciembre.

Compromiso: Entregar informe de instalación de acometida de 8 luminarias (tubería, cableado y excavación), para identificar posibles ítems no previstos. Fecha de terminación de esta actividad 12 de diciembre de 2024

▪ **Transformador de 630 KVA y mantenimiento acometidas eléctricas**

Compromiso: Determinar el alcance requerido para el transformador y coordinar las actividades necesarias. Programar reunión con USPEC e INPEC para determinar la prioridad del alcance.

▪ **Rampa en el Pabellón 24 (actualmente Pabellón 21)**

Se evidencia la fundición de 14 zapatas de 38 y 20 metros lineales de vigas de cimentación en la ejecución de la rampa de acceso. Se presentan dificultades en la excavación de la cimentación de la rampa, ya que emanan aguas negras y no permiten el rendimiento de la actividad. Se establece el compromiso de fundir 30 zapatas para el 21 de diciembre de 2024. Para este día, ingresa la maquinaria para el retiro del material que está invadiendo las vías de acceso al INPEC.

Compromiso: Se programa fundición de 30 zapatas para 21 de diciembre de 2024. Se solicita un informe de las actividades realizadas a la fecha en esta actividad con la reprogramación realizada conforme a la prórroga en proceso, para dar al Tribunal de Norte de Santander en el marco de la sentencia que solicita la construcción de la presente rampa de acceso.

 Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	INFORME DE DESPLAZAMIENTO CONTRATISTAS	CÓDIGO:	F-GG-40
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-24
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

INFORME



Ilustración 9: 06/12/2024

Área de rampa de acceso al Pabellón 21

Ilustración 10: 06/12/2024

Excavaciones de 8 zapatas

2. Conclusión y compromisos:

Además de los compromisos ya descritos, se solicita que se realice una evaluación inmediata y detallada de los puntos mencionados, estableciendo un plan de acción para garantizar el cumplimiento de los plazos y la calidad en la ejecución del contrato, teniendo en cuenta las fechas de fin de año que se aproximan y que pueden afectar el rendimiento en la ejecución de las obras, en especial en la construcción de las garitas que representan actualmente la ruta crítica del contrato. A continuación, se relacionan los compromisos a cumplir:



1. Entregar informe de resultados de estudios de suelos y rediseños de cimentación de garita 3 y 9.
2. Cumplimiento con la terminación de la actividad de reforzamiento de muro perimetral zona norte para el 14 de diciembre de 2024
3. Apertura de frente de trabajo para continuar con la actividad de instalación de concertina.
4. Realizar seguimiento a los rendimientos de esta actividad para que se reporte fecha de terminación y entrega de este alcance contractual
5. Seguimiento a la construcción de rampa de acceso, cumplimiento con la fundición de 30 zapatas y vigas de cimentación para el 21 de diciembre de 2024.
6. Iniciar actividad de instalación de ocho (08) luminarias exteriores.
7. Entregar informe técnico con el cronograma de ejecución del alcance de rampa de acceso.
8. Así mismo, se requiere la entrega de los informes mensuales técnico y PGIO de interventoría, correspondientes al mes 2, 3, 4 y 5, de acuerdo con las obligaciones contractuales de la interventoría CONSORCIO INTER COCUC

En conclusión, se evidencia la necesidad de toma de decisiones a partir de los resultados de Estudios de suelos de garitas, para definir ajustes a diseños, rebalanceo del contrato y proceder con las novedades contractuales de obra e interventoría.

Aprobó: Ing. Mildred Jhomara Carvajal Montañez- Gerente del Convenio No. 216144



 Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	INFORME DE DESPLAZAMIENTO CONTRATISTAS	CÓDIGO:	F-GG-40
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-24
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

INFORME			
ANEXOS			
a) F-GG-09- ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO 06-12-2024 b) Se anexan pasabordos de vuelo/comisión (2 folios)			
Firma del contratista:	 Arq. Jehimy Alejandra Erazo Molina	Firma del supervisor:	 Arq. Juan Eduardo Quintero Luna

ver instrucciones de diligenciamiento al respaldo

 Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	INFORME DE DESPLAZAMIENTO CONTRATISTAS	CÓDIGO:	F-GG-40
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-24
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Fecha: fecha de presentación del *F-GG-40 Informe de Desplazamiento Contratistas*.

No. Solicitud aplicativo de tiquetes: diligencie el número de solicitud del aplicativo de tiquetes.

Grupo de Trabajo: *Grupo al cual pertenece el contratista que realizó el desplazamiento*

N° Contrato: *Número del contrato del contratista*

Nombre del contratista: nombre y apellidos del contratista.

Lugar de desplazamiento: se registran los diferentes lugares visitados según el objeto del desplazamiento. Es preciso que se registren todos los sitios, especificando vereda, barrio, sector corregimiento, municipio y departamento.

Fecha del desplazamiento: se registra la fecha de inicial y la fecha final del desplazamiento.

Nombre del supervisor: se registra los nombres y apellidos del supervisor del contratista que reporta el viaje y su rol o cargo, ejemplo: Gerente de Convenio No. ##### / Gerente de Grupo XXXX / Subgerente (Desarrollo de Proyectos, Administrativo, Contratación o Financiero).

Objeto de la visita: descripción clara del objeto de la visita.

Informe:

1. El informe de desplazamiento recogerá los aspectos más relevantes y conclusiones que queden plasmadas en las actas que se suscriban producto de la(s) visita(s).
2. El informe debe relacionar de forma cronológica todas las actividades o visitas realizadas.
3. Transcribir las siglas que se relacionen en el contenido del informe.
4. El informe de desplazamiento debe relacionar los cargos y los nombres de los acompañantes en las actividades de la comisión o desplazamiento.
5. Los registros fotográficos se deben reportar a la par con el contenido del informe y deberán llevar nota al pie con la fecha, lugar y asunto relacionado de la fotografía.
6. Las fotografías no pueden sobrepasar en ninguna de sus dimensiones los 6 cm.
7. El informe de desplazamiento debe radicarse al supervisor del contrato, con máximo tres días hábiles luego de la finalización de la visita, con el fin de reaccionar a tiempo frente a recomendaciones o hallazgos críticos en la(s) visita(s).
8. El informe de desplazamiento se debe transferir al expediente documental del contrato derivado, contrato o convenio interadministrativo objeto de la visita.
9. Cuando se trate de una visita de seguimiento a la ejecución de una obra, los supervisores deben incluir como anexo obligatorio al F-GG-40 Informe de Desplazamiento Contratistas, el formato F-GG-09 Acta de Seguimiento de Contrato. Estos formatos harán parte del informe de pago de los supervisores.

 Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CÓDIGO:	F-GG-09
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

ACTA No:	019		
FECHA:	06 de diciembre del 2024		
CONTRATO N°:	2240066	CONTRATO N°:	216144 ENTerritorio - USPEC
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO COCUC CUCUTÁ - NORTE DE SANTANDER, A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 216144.		

1. SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DEL CONTRATO

TEMAS PRESENTE ACTA

Se realiza visita al COMPLEJO METROPOLITANO DE CÚCUTA (COCUC), para realizar mesa de trabajo técnica con el fin de revisar el avance de la ejecución del contrato de obra No. 2240066, que actualmente presenta un retraso del 40.78%.

En la visita se contó con la participación de los siguientes asistentes:

Por parte de ENTerritorio:

Arq. Jehimy Alejandra Erazo Molina – Contratista Supervisora Técnica C.I. 216144

Por parte del INPEC:

Dragoneante Jesús Peñaloza – INPEC -Apoyo al proyecto

Por parte de la Interventoría CONSORCIO INTER COCUC:

Ing. Juan David Brito – Residente de interventoría

Ing. Camila Andrea Baquero Ibarra – Inspectora de interventoría

Por parte del contratista de obra UNION TEMPORAL COMPLEJOS CARCELARIOS CUCUTA:

Ing. Danilo de Jesús España Calvo – Residente de obra

Nishmet Bajrhaim Sayegh Montes – Inspectora de obra

1. Recorrido por las Áreas a Intervenir e intervenidas

Durante el recorrido, se inspeccionaron las áreas intervenidas y por intervenir, conforme a los alcances contemplados en el contrato de obra y los compromisos adquiridos el pasado 22 de noviembre de 2024, en visita técnica por los delegados de ENTerritorio S.A., la Ing. Mildred Carvajal– Gerente C.I. 216144 y la Arq. Alejandra Erazo – Supervisora técnica. A continuación, se detallan los aspectos relevantes observados y los compromisos acordados.

COMPONENTE2

- **Reforzamiento del Muro Perimetral (Zona Norte)**

Se evidencia la fundición en concreto de 4000PSI de 18 contrapesas y pedestales, finalizó la actividad de anclajes en columnas y se fundieron 03 columnas completas, 04 columnas a la altura de 2.5 metros, está pendiente fundir la altura de 2.5m a 5m de las columnas.

Para esta longitud del muro (100 metros lineales) se han instalado 38 metros lineales de concertina.

Compromiso: Fecha de terminación de esta actividad 14 de diciembre de 2024

	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CÓDIGO:	F-GG-09
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP



Ilustración 1: 06/12/2024
Lugar de Reforzamiento muro perimetral zona norte
Fundición de columnas



Ilustración 2: 06/12/2024
Lugar de Reforzamiento muro perimetral zona norte
Fundición de columnas



Ilustración 3: 06/12/2024
Lugar de Reforzamiento muro perimetral zona norte
Fundición de columnas



Ilustración 4: 06/12/2024
Lugar de Reforzamiento muro perimetral zona norte
Fundición de columnas

▪ **Instalación de Concertina**

Se reporta por parte del INPEC, que a la fecha se han instalado 303 metros lineales de 750 metros contractuales. Por parte del INPEC, se reporta que la actividad no ha continuado, debido a que el mismo frente que estaba instalando concertina, ahora inicio actividades en la malla eslabonada. Se recomienda abrir frente nuevo para instalar concertina y finalizar la actividad en el plazo contractual del Componente 2, es decir, 17 de diciembre de 2024.

Compromiso: Fecha de terminación de esta actividad 20 de diciembre de 2024

 Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CÓDIGO:	F-GG-09
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP



Ilustración 5: 06/12/2024
Instalación de concertina áreas externas e internas



Ilustración 6: 06/12/2024
Instalación de concertina áreas muro perimetral zona norte

▪ **Instalación de Malla Eslabonada**

Inicia actividad de instalación de malla eslabonada, se evidencia la instalación de nueve (09) parales, y el suministro de módulos con marco y malla eslabonada.

Compromiso: Realizar seguimiento a los rendimientos de esta actividad para que se reporte fecha de terminación y entrega de este alcance contractual.



Ilustración 7: 06/12/2024
Instalación de parales



Ilustración 8: 06/12/2024
Suministro de marco con malla eslabonada.

COMPONENTE1

▪ **Garita 9 y 3**

Se reporta por parte del contratista de obra e interventoría, que aún no se han entregado los estudios de suelos, se prevé que para el día 09 de diciembre de 2024 se entreguen los resultados y ajustes a diseños de garita.

 Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CÓDIGO:	F-GG-09
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

▪ **Iluminación Perimetral**

Se instalaron 298 luminarias perimetrales, pero se requiere verificar su correcto funcionamiento de 15 internas y 8 externas. En la presente visita se reporta por parte de la interventoría y contratista de obra, que se realizaron los ajustes correspondientes para el correcto funcionamiento de 15 luminarias que presentaban falla. Para las 8 luminarias pendientes de instalación en el área externa del ERON, aun no ha iniciado esta actividad, se solicita se inicien actividades en la semana del 9 al 13 de diciembre.

Compromiso: Entregar informe de instalación de acometida de 8 luminarias (tubería, cableado y excavación), para identificar posibles ítems no previstos. Fecha de terminación de esta actividad 12 de diciembre de 2024

▪ **Transformador de 630 KVA y mantenimiento acometidas eléctricas**

Compromiso: Determinar el alcance requerido para el transformador y coordinar las actividades necesarias. Programar reunión con USPEC e INPEC para determinar la prioridad del alcance.

▪ **Rampa en el Pabellón 24 (actualmente Pabellón 21)**

Se evidencia la fundición de 14 zapatas de 38 y 20 metros lineales de vigas de cimentación en la ejecución de la rampa de acceso. Se presentan dificultades en la excavación de la cimentación de la rampa, ya que emanan aguas negras y no permiten el rendimiento de la actividad. Se establece el compromiso de fundir 30 zapatas para el 21 de diciembre de 2024.

Para este día, ingresa la maquinaria para el retiro del material que está invadiendo las vías de acceso al INPEC.

Compromiso: Se programa fundición de 30 zapatas para 21 de diciembre de 2024. Se solicita un informe de las actividades realizadas a la fecha en esta actividad con la reprogramación realizada conforme a la prórroga en proceso, para dar al Tribunal de Norte de Santander en el marco de la sentencia que solicita la construcción de la presente rampa de acceso.

	
Ilustración 9: 06/12/2024 Área de rampa de acceso al Pabellón 21	Ilustración 10: 06/12/2024 Excavaciones de 8 zapatas

2. Conclusión y compromisos:

Además de los compromisos ya descritos, se solicita que se realice una evaluación inmediata y detallada de los puntos mencionados, estableciendo un plan de acción para garantizar el cumplimiento de los plazos y la calidad en la ejecución

	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CÓDIGO:	F-GG-09
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

del contrato, teniendo en cuenta las fechas de fin de año que se aproximan y que pueden afectar el rendimiento en la ejecución de las obras, en especial en la construcción de las garitas que representan actualmente la ruta crítica del contrato. A continuación, se relacionan los compromisos a cumplir:

1. Entregar informe de resultados de estudios de suelos y rediseños de cimentación de garita 3 y 9.
2. Cumplimiento con la terminación de la actividad de reforzamiento de muro perimetral zona norte para el 14 de diciembre de 2024
3. Apertura de frente de trabajo para continuar con la actividad de instalación de concertina.
4. Realizar seguimiento a los rendimientos de esta actividad para que se reporte fecha de terminación y entrega de este alcance contractual
5. Seguimiento a la construcción de rampa de acceso, cumplimiento con la fundición de 30 zapatas y vigas de cimentación para el 21 de diciembre de 2024.
6. Iniciar actividad de instalación de ocho (08) luminarias exteriores.
7. Entregar informe técnico con el cronograma de ejecución del alcance de rampa de acceso.
8. Así mismo, se requiere la entrega de los informes mensuales técnico y PGIO de interventoría, correspondientes al mes 2, 3, 4 y 5, de acuerdo con las obligaciones contractuales de la interventoría CONSORCIO INTER COCUC

En conclusión, se evidencia la necesidad de toma de decisiones a partir de los resultados de Estudios de suelos de garitas, para definir ajustes a diseños, rebalanceo del contrato y proceder con las novedades contractuales de obra e interventoría.

2. COMPROMISOS

Nombre del Proyecto:	
Responsable por Contratista	
Responsable por Interventoría	
Fecha programada cumplimiento	
- Los descritos anteriormente.	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

PARTICIPANTES		
NOMBRE	Arq. Jehimy Alejandra Erazo Molina	Firma 
En Representación de	ENTerritorio S.A. – Supervisión Técnica	
Correo electrónico	jerazo@enterritorio.gov.co	
Teléfono		

 Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CÓDIGO:	F-GG-09
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

NOMBRE	Dragoneante Jesús Peñaloza	Firma
En Representación de	Infraestructura y mantenimiento COCUT INPEC	
Correo electrónico	obrasciviles.cocucuta@inpec.gov.co	
Teléfono		
NOMBRE	Ing. Camila Andrea Baquero Ibarra	Firma
En Representación de	Inspectora de interventoría – Consorcio Inter Cocuc	<i>Camila Baquero I.</i>
Correo electrónico	consorciointercocuc@gmail.com	
Teléfono		
NOMBRE	Ing. Juan David Brito	Firma
En Representación de	Residente de interventoría – Consorcio Inter Cocuc	<i>Juan David Brito</i>
Correo electrónico	utcomplejoscarcelarioscucuta@gmail.com	
Teléfono		
NOMBRE	Ing. Danilo de Jesús España Calvo	Firma
En Representación de	Residente de obra -UT Complejos Carcelarios Cúcuta	<i>Danilo España</i>
Correo electrónico	utcomplejoscarcelarioscucuta@gmail.com	
Teléfono		
NOMBRE	Ing. Nishmet Bajrhaim Sayegh Montes	Firma
En Representación de	Inspectora de obra -UT Complejos Carcelarios Cúcuta	<i>Nishmet Sayegh</i>
Correo electrónico	utcomplejoscarcelarioscucuta@gmail.com	
Teléfono		Escaneado con CamScanner

Para uso exclusivo del supervisor de ENTerritorio S.A: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR ENTerritorio S.A.

Original: ENTerritorio S.A.
Copia: interventoría
Copia: contratista

	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CÓDIGO:	F-GG-09
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.- ENTerritorio S.A., con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web <https://www.enterritorio.gov.co>

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio S.A. sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

Mrs. Erazo Molina Jehimy Al **AV 9328**

HORA EN SALA

05:40

GRUPO

C

ASIENTO

9E

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

BOG BOGOTA

Vie, 06 Dec | 06:40

BOGOTA EL DORAD, Terminal 1

CUC CUCUTA

Vie, 06 Dec | 08:00

CUCUTA CAMILO



SEC 104

TU TARIFA ES Flex



Equipaje de mano
SI/YES



Equipaje de bodega
1X23kg

Reserva: **4EJIWU**

E-ticket: **134209118008001**

Viajero frecuente: **AV-10262782681**

Operado por: **AVIANCA**

Vendido por:

Status: **RED PLUS
AV*S**



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:

- ✓ Reserva tu vuelo
- ✓ Gestiona tu viaje
- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo

¡Y mucho más! Descárgala en:



Disponible en
App Store



Disponible en
Google Play

Mrs. Erazo Molina Jehimy Al **AV 9341**

HORA EN SALA

18:45

GRUPO

C

ASIENTO


8C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

CUC CUCUTA

Vie, 06 Dec |18:49

CUCUTA CAMILO D



BOG BOGOTA

Vie, 06 Dec |20:00

BOGOTA EL DOR, Terminal 1

SEC 128

TU TARIFA ES Flex



Equipaje de mano
SI/YES



Equipaje de bodega
1X23kg

Reserva: **4EJIWU**

E-ticket: **134209118008002**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA**

Vendido por:

Status:



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:

- ✓ Reserva tu vuelo
- ✓ Gestiona tu viaje
- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo

¡Y mucho más! Descárgala en:



Disponible en
App Store



Disponible en
Google Play

CAUSACIÓN DE VARIABLES

FECHA DE CORTE:	miércoles, 11 de diciembre de 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JEHIMY ALEJANDRA ERAZO MOLINA
PROYECTO:	COCUC CÚCUTA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL - NORTE DE SANTANDER, A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 216144.
FECHA DE VISITA:	06 de diciembre 2024

	HONORARIO MES FIJO BÁSICO	VALOR DIA
	\$6.850.000	\$397.496
Cantidad de días duración del viaje	Cantidad de viajes	Valor Parcial
0,5	2	\$397.496
1,5	1	\$596.244
2,5	0	\$0
3,5	0	\$0
4,5	0	\$0
Valor Estimado para visitas a proyectos		\$993.740

RÉGIMEN	SIMPLIFICADO
No. Contrato	2024834
Total, Valor Asignado de Variables	\$ 3.577.461,00
Total, Valor de comisiones realizadas	\$993.740
Total, Saldo Gastos Variables	\$ 2.583.721,00
