

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 1 de 66
---	---	---

**INFORME DE SUPERVISION 07
18 DE MAYO 2023 – 17 DE JUNIO 2023**

NOMBRE DEL PROYECTO	“CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION VULNERABLE DEL CENTRO POBLADO LOS CALABAZOS, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR”.
--------------------------------	---

SUPERVISOR DELEGADO (a): ARQ. YINA KARINA DURÁN BENAVIDEZ

VALLEDUPAR
JUNIO 2023

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 2 de 66
---	---	---

Elaborado por: Yina Karina Durán Benavidez Profesional Especializado Firma: Fecha: Enero 2023	Revisado por: Firma: Fecha:	Aprobado por: Firma: Fecha:
---	--	--

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 3 de 66
---	---	---

RELACION DE TABLAS

- Tabla 1: Actividades constructivas del proyecto
- Tabla 2: Generalidades del proyecto
- Tabla 3: Relación manejo desembolso 1
- Tabla 4: Ejecución periodo
- Tabla 5: Relación ejecución – programación periodo
- Tabla 6: Relación ejecución acumulada
- Tabla 7: Seguimiento historial ejecución
- Tabla 8: Cronología del término contractual
- Tabla 9: Ejecución actividades del periodo
- Tabla 10: Ejecución física por beneficiario
- Tabla 11: Nivel de Ejecución física por rangos
- Tabla 12: Actividades constructivas

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 4 de 66
---	---	---

RELACION DE GRAFICOS

Gráfico 1: Historial ejecución del proyecto

Gráfico 2: Relación ejecución – programación periodo

Gráfico 3: Relación ejecución – programación acumulada

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 5 de 66
---	---	---

RELACION DE CONTENIDO

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
 - 1.1 Fuentes De financiación
 - 1.2 Ubicación
 - 1.3 Descripción De Las Obras Del Proyecto
 - 1.4 Población Objetivo
 - 2 DATOS GENERALES CONTRATO/CONVENIO No. 2022-03-0069
 - 2.1 DATOS FINANCIEROS.
 - 2.2 PAGO DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA.
 - 2.3 CONTROL DE POLIZAS
 - 2.4 RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME.
 - 2.5 RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO/CONVENIO SUSCRITOS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME.
 - 2.6 RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA DE OBRA.
 - 2.7 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO.
 - 3 AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO.
 - 3.1 Avance Físico
 - 3.2 Actividades Realizadas En El Periodo.
 - 3.2.1 Actividades Técnicas
 - 3.2 Avance Financiero
 - 4 CUMPLIMIENTO CON EL PERSONAL EN CAMPO Y DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
 - 5 CONCLUSIONES, SUGERENCIAS, OBSERVACIONES Y/O INFORMACION A REPORTAR A LA ENTIDAD
- ANEXOS

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 6 de 66
---	---	---

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	"CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION VULNERABLE DEL CENTRO POBLADO LOS CALABAZOS, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR".		
CODIGO BPIN	2022002200100		
VALOR INICIAL DEL PROYECTO			
	OBRAS	INTERVENTORIA	TOTAL
VALOR OCAD	\$	\$	\$
VALOR CONTRACTUAL	767.311.890,00	\$	767.311.890,00

1.1 Fuentes De Financiación:

PROPIOS- DEPARTAMENTO	\$ 486.051.441,00
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO	\$ 24.302.572,00
COMUNIDAD - ESPECIES	\$ 256.957.877,00
Total	\$ 767.311.890,00

1.2 Ubicación:

Centro Poblado Los calabazos , Valledupar cesar

1.3 Descripción De Las Obras Del Proyecto

El proyecto contempla la ejecución de 33 mejoramientos de vivienda, cuyo alcance se define por la realización de las siguientes actividades:

1 MEJORAMIENTO VIVIENDA	
	MATERIALES
	TRANSPORTE
	MAQUINARIA Y EQUIPOS
2 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL Y	

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 7 de 66
---	---	---

	FAMILIAR	
		Profesional social
		Viaticos profesional social

3	ACOMPANIAMIENTO OPERATIVO	
		Acompañamiento regente
		Acompañamiento profesional operativo
		Acompañamiento tecnico asistencial
		Viáticos apoyo regente

4	COSTOS ADMINISTRATIVOS DE GERENCIA	
----------	---	--

El componente de Mejoramiento de Vivienda contempla las siguientes actividades:

-	COMPONENTE
1	PRELIMINARES
2	RELLENOS
3	CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS
4	PISOS
5	MAMPOSTERIA
6	ESTRUCTURA EN CONCRETO
7	PAÑETES Y ACABADOS
8	ENCHAPES
9	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
10	APARATOS SANITARIOS E INCRUSTACIONES
11	INSTALACIONES ELECTRICAS
12	CUBIERTA
13	CARPINTERIA METALICA
14	SISTEMA SÉPTICO

Tabla 1: Actividades constructivas del proyecto

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 8 de 66
---	---	---

1.4 Población Objetivo

POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA		
Habitantes Afectados (Proyección 2022 Censo DANE 2018). (Hogares con déficit 2022)		552.048
POBLACIÓN OBJETIVO / POR EDAD		
POBLACIÓN OBJETIVO		150
RANGO (GRUPOS ETARIOS)	HOMBRES	MUJERES
GENERO	69	
GENERO		81
0-6 AÑOS	11	9
7-14 AÑOS	10	15
15-17 AÑOS	13	17
18-26 AÑOS	17	23
27-59 AÑOS	14	12
60 EN ADELANTE	4	5

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población vulnerable en el centro poblado los Calabazos, municipio de Valledupar, departamento del Cesar.

1.5 Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Unidad de medida	Meta	Fuente de verificación
Viviendas rurales mejoradas	Número	33	Informe de Supervisión
DESCRIPCION			
Soluciones de vivienda para deficiencias en las condiciones sanitarias satisfactorias de espacio, servicios públicos y calidad de estructura de las viviendas de los hogares beneficiarios del subsidio. Intervenciones locativas asociadas, prioritariamente, a la habilitación o instalación de baños; lavaderos; cocinas; redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas; cubiertas; pisos; reforzamiento estructural y otras condiciones relacionadas con el saneamiento y mejoramiento de la solución habitacional.			

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 8 de 66
---	---	---

2. DATOS GENERALES CONTRATO/CONVENIO No. 2022-03-0069

DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO	
Modalidad	CONTRATACIÓN DIRECTA
Tipo	CONVENIO
Número	2022-03-0069
Fecha de Suscripción	20 DE OCTUBRE DE 2022
Contratista Ejecutor	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CESAR "COMFACESAR"
NIT	892.399.989-8
Representante legal del contratista Ejecutor	FRANK DAVID MONTERO VILLEGAS
Identificación del Representante Legal	79.521.215
Objeto	"CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION VULNERABLE DEL CENTRO POBLADO LOS CALABAZOS, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR".
Valor Total del Convenio	SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL OCHOSCIENTOS NOVENTA PESOS (\$767.311.890) MCTE.
Valor Total del Departamento	\$486.051.441
Valor Total del Cooperante	\$24.302.572
Valor Aporte comunidad Beneficiaria	\$256.957.877
Plazo	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Supervisor	Arq. YINA KARINA DURAN BENAVIDEZ
Fecha de Inicio	18 DE NOVIEMBRE DE 2022
Fecha de Terminación Inicial	31 DE DICIEMBRE 2022
Prorroga 1	Tres (3) meses
Fecha de terminación según Prorroga 01	31 de marzo de 2023
Prorroga 2	Dos (2) meses
Fecha de terminación según Prorroga 02	30 de Mayo de 2023
Prorroga 3	Dos (2) meses

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 8 de 66
--	--	---

Fecha de terminación según Prorroga 03	30 De julio 2023
---	------------------

Tabla 2: Generalidades del proyecto

2.1 DATOS FINANCIEROS.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP					
Nº	002	VALOR	\$ 486.051.441	FECHA	6 De Septiembre 2022
REGISTRO PRESUPUESTAL – RP					
Nº	002	VALOR	\$ 486.051.441	FECHA	3 de Noviembre de 2022
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)			3-3-1		

2.2 PAGO DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA.

TIPO DE IMPUESTO	VALOR BASE DE CÁLCULO	VALOR	Nº DE LIQUIDACIÓN	Nº RECIBO DE PAGO	FECHA DE PAGO
PRO UNIVERSIDAD	\$	\$			
PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL	\$	\$			
PRO DESARROLLO FRONTERIZO	\$	\$			
PRO CULTURA	\$	\$			
PRO ADULTO MAYOR	\$	\$			

2.3 CONTROL DE POLIZAS

GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA DE OBRAS

ASEGURADORA	Nº DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
SURAMERICANA	3472001-3	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	\$ 194.420.576	18-11-2022 A 01-5-2023
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 48.605.144	18-11-2022 A 1-7-2023
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	\$ 48.605.144	18-11-2022 A 31-12-2025

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 8 de 66
---	---	---

ASEGURADORA	Nº DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
	0876829-8	BASICO- RESPONSABILIDAD CIVIL	\$200.000.000	5-10-2022 al 31-12- 2022
FECHA DE APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS			11 DE NOVIEMBRE 2022	
			13 DE DICIEMBRE 2022	
Nº DE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN (SI APLICA)			N.A	

Pólizas actualizadas según Prorroga 01

ASEGURADORA	Nº DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
SURAMERICAN A	3472001-3	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	\$ 194.420.576	18-11-2022 A 01-10- 2023
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 48.605.144	18-11-2022 A 1-10- 2023
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	\$ 48.605.144	18-11-2022 A 31-03- 2026
	0876829-8	BASICO- RESPONSABILIDAD CIVIL	\$200.000.000	5-10-2022 al 31-03- 2023
Fecha de aprobación de las garantías: CO1.WRT.10936423			2 De febrero 2023	
Nº DE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN (SI APLICA)			N.A	

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 8 de 66
---	---	---

Pólizas actualizadas según Prorroga 02

ASEGURADORA	Nº DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
SURAMERICANA	3472001-3	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	\$ 194.420.576	18-11-2022 A 01-10-2023
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 48.605.144	18-11-2022 A 1-12-2023
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	\$ 48.605.144	18-11-2022 A 31-05-2026
	0876829-8	BASICO-RESPONSABILIDAD CIVIL	\$200.000.000	5-10-2022 al 31-05-2023
Fecha de aprobación de las garantías:			21 de abril 2023	
Nº DE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN (SI APLICA)			N.A	

2.4 RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME.

NOMBRE O TIPO DE ACTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA	MOTIVO DEL ACTA	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

2.5 RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO/CONVENIO SUSCRITOS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME.

NÚMERO DE LA MODIFICACIÓN	OBJETO DE LA MODIFICACIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN
PRORROGA 3	AMPLIACION DEL TERMINO CONTRACTUAL	30-5-2023	Ampliación del termino contractual actualizado en dos (2) meses; debido a recurrentes

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 8 de 66
---	---	---

NÚMERO DE LA MODIFICACIÓN	OBJETO DE LA MODIFICACIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN
			limitaciones presupuestales en múltiples beneficiarios.

Mediante comunicación CR-00084-202305511-GobCesar IdControl: 215340 de fecha 8 de mayo de 2023, solicita ampliación del termino contractual 03 en dos (2) meses para finalizar la ejecución de las actividades del convenio, exponiéndose la siguiente justificación:

“.. como es de su conocimiento la Gobernación del Cesar y la caja de Compensación Familiar – COMFACESAR, suscribieron el convenio electrónico 2022030069, el cual se inició el 18 de noviembre de 2022, se realizó una prórroga 1 de por tres (3) meses más, quedando como fecha de terminación el próximo 31 de mayo de 2023; teniendo en cuenta que no se culminaron las actividades, hubo la necesidad de realizar una nueva prórroga por dos (2) meses más para la terminación de las actividades e cada uno de los 33 beneficiarios, y a la fecha de corte mensual 17 de abril de 2023 se lleva un avance del convenio del 73.16%; esta gerencia integral, prevé que no se logrará la culminación de los mejoramientos de vivienda en la fecha de terminación pactada el día 31 de mayo de 2023; debido a que la mano de obra de los mejoramientos de vivienda está a cargo del beneficiario y sumándole las lluvias constantes que han azotado la zona en el mes de Marzo y Abril, generaron atraso significativo en el avance del convenio de asociación 2022030069).”

Posteriormente COMFACESAR mediante informe de actividades enviado vía correo electrónico el día 29-5-2023; expone de forma actualizada (18 de abril a 17 de mayo de 2023) el nivel avance, tal como se relaciona

Durante el periodo correspondiente se logró la intervención exitosa de 33 beneficiarios, lo que representa un avance de ejecución acumulada del 93,34%, esto quiere decir, que para este periodo la ejecución física mensual fue del 40,71%. A pesar de haberse presentado algunos inconvenientes a lo

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 8 de 66
---	---	---

largo del mes, se ha evidenciado un progreso significativo en el desarrollo del proyecto. Aunque persisten dificultades mencionadas en periodos anteriores donde beneficiarios manifiestan tener bajos recursos para garantizar el desarrollo efectivo de las intervenciones. Asimismo, algunos beneficiarios han tenido problemas para conseguir personal adecuado o han enfrentado dificultades con el personal en obra, lo que ha llevado a retrasos en la ejecución de las actividades. Finalmente, algunos beneficiarios deben suspender las ejecuciones según la programación establecida debido a inconvenientes personales, lo que ha afectado el porcentaje de avance del proyecto en relación a lo programado. De los 33 proyectos en ejecución actualmente 14 se encuentran al 100% de ejecución, 13 superan el 91,19% de avance, mientras que 6 se encuentran por debajo del 80,46%.

(Ver Anexo)

Aunado a ello la Supervisión sectorial puntualiza las siguientes apreciaciones¹:

- El nivel de avance a la fecha 17 de mayo de 2023 corresponde a 93.34%, a esa fecha el avance programado corresponde a 98%, presentando así un atraso aproximado de 5,0%; la ejecución faltante corresponde a 6.66%, y de acuerdo a los rendimientos de las múltiples actividades, al comportamiento de los beneficiarios en el aporte de la contrapartida que les corresponde; resulta pertinente la ampliación del término del convenio, en aras de garantizar el alcance del mismo.
- COMFACESAR relaciona registro de lluvias que han afectado y dificultado el transporte de los materiales de obra a cada frente beneficiario. (anexo Registro fotográfico)
- Este despacho infiere los avances significativos que se han obtenido respecto de la materialización del convenio referencia, y muestra de ello es, el positivo porcentaje que se ha logrado, a pesar de las circunstancias que

¹ ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA LA PRORROGA No. 3 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2022-03-0069

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 8 de 66
---	--	---

han traumatizado su ejecución. Por ende, compartimos la necesidad perentoria de extender su plazo actual, como instrumento administrativo adecuado para satisfacer el objeto contractual convenido y llevar a feliz término la insuficiencia que le sirve de fundamento. No obstante, aunque tenemos en común sacar adelante las actividades integrales del convenio y nuestra meta conjunta apunta al 100% de estas; resulta conveniente señalar que, dicha disposición solo estaría enmarcada en la concesión de la modificación del referido plazo, pero sin la directa adición de recursos requerida.

En virtud de lo anterior se amplía mediante la suscripción de la prorroga 3 de fecha 30 de mayo de 2023, el termino contractual vigente, por lo cual la nueva fecha de terminación corresponde a 30 de julio de 2023.

- COMFACESAR tiene en proceso de validación acta modificatoria 01, frente a lo cual ha avanzado en estructuración y presentación de Nuevos ítems no previstos, y la justificación de los mismos.

2.6 RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA DE OBRA.

CONCEPTO	VALOR BRUTO	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	VALOR NETO	ORDEN DE PAGO N°	COMPROBANTE DE EGRESO	
					N°	FECHA
TOTALES	\$	\$0	\$			
VALOR INICIAL	\$	\$	\$			
SALDOS	\$	\$	\$			

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 8 de 66
---	--	---

2.7 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

	DESCRIPCION	VALOR	PORCENTAJE
1.1	APOYO TECNICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES HABITACIONALES		
1,1,1	Mejoramiento Vivienda	172.913.981	40,20%
1,2	ACOMPANIAMIENTO FAMILIAR Y SOCIAL		
1,2,1	Profesional Social	3.595.178	33,33%
1,2,2	Viáticos apoyo social	900.000	33,33%
1,3	ACOMPANIAMIENTO OPERATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES HABITACIONALES		
1,3,1	Acompañamiento regente	1.938.181	33,33%
1,3,2	Acompañamiento profesional operativo	4.063.792	33,33%
1,3,3	Acompañamiento técnico asistencial	3.129.752	33,33%
1,3,4	viáticos apoyo regente	600.000	33,33%
2,0	COSTOS ADMINISTRATIVOS GERENCIA		
2,1	Consumibles de Oficina	372.783	33,33%
2,2	Gestión Administrativa (Pólizas)	4.301.343	100,00%
2,3	Gestión Financiera y Jurídica	745.566	33,33%
2,4	Costos de Transporte	1.860.000	33,33%
Total costos Primer Desembolso		194.420.576	

Tabla 3: Relación manejo desembolso 1

CONTROL DEL MANEJO DEL ANTICIPO DE OBRA						
CONTRATO DE OBRA No.			CONSORCIO			
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:		\$				
ANTICIPO %		\$				
NUMERO ORDEN	FECHA	CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN	VALOR	LEGALIZADO	SALDO
1					\$	

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 8 de 66
--	--	---

					\$	
					\$	

3 AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO.

3.1 Avance Físico

Hasta la fecha se han ejecutado actividades correspondientes a acompañamiento social, y avance físico de actividades constructivas en 33 hogares; de los cuales en este periodo reportan ejecución física 9 viviendas; 13 viviendas se hayan terminadas 100%, y el resto se encuentran parcialmente suspendidas en ejecución; logrando de esta manera una ejecución acumulada en el periodo de 95% aproximadamente del componente de Mejoramiento de Viviendas, y los demás componentes relacionan un avance aproximado tal como se relaciona en la siguiente tabla:

- Ejecución periodo

COMPONENTE	CONVENIO	EJECUCION PERIODO	(%)	AVANCE CONVENIO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	\$ 430.134.342,00	\$ 7.140.230,08	1,66%	0,93%
ACOMPANAMIENTO FAMILIAR Y SOCIAL	\$ 13.485.534,00	\$ 65.000,00	0,48%	0,01%
ACOMPANAMIENTO OPERATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES HABITACIONALES	\$ 29.195.174,00	\$ 38.000,00	0,13%	0,00%
COSTOS ADMINISTRATIVOS GERENCIA	\$ 13.236.391,00	\$ 180.000,00	1,36%	0,02%
COMUNIDAD BENEFICIARIA - MANO DE OBRA (APOORTE EN ESPECIE)	\$ 256.957.877,00	\$ 4.284.138,05	1,67%	0,56%
APOYO LOGISTICO, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO EN ESPECIE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO 5%	\$ 24.302.572,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
				1,53%

Tabla 4: Ejecución periodo

En el componente físico relacionado con la ejecución del ítem MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, se logró avanzar en este periodo un 1.53% del costo total de este componente, consolidando un avance acumulado aproximado de 95% de las actividades físicas que delimitan el alcance de este aparte del convenio; a pesar del avance que se relaciona, el análisis histórico del desempeño de las actividades permite concluir que en este periodo se redujo el rendimiento ostensiblemente en la ejecución de las mismas.

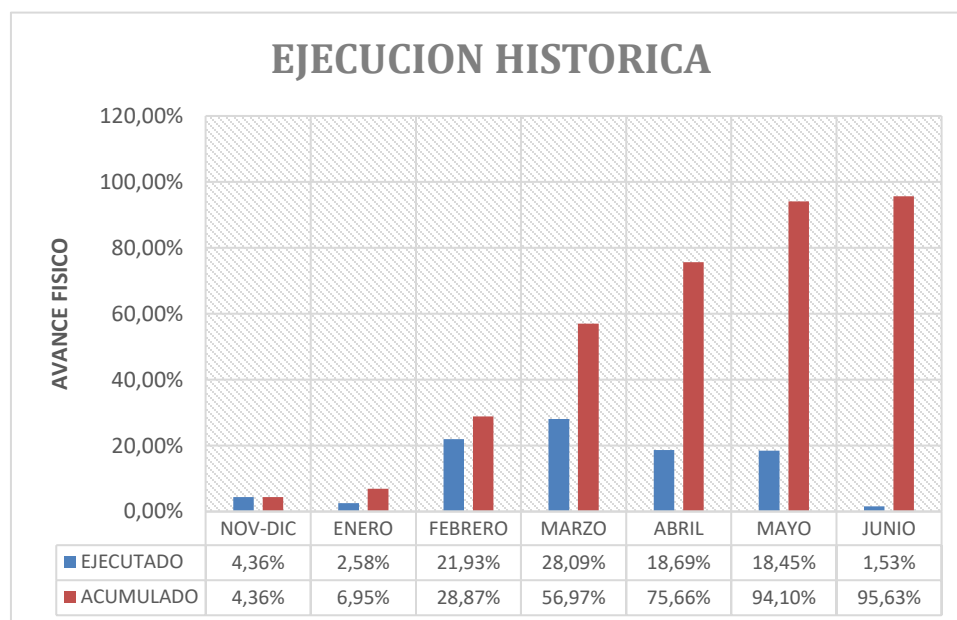


Gráfico 1: Historial ejecución del proyecto

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 19 de 66
--	--	--

	CONTRACTUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO JUNIO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	430.134.342	15.742.917	7.140.230
ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y SOCIAL	13.485.534	75.000	65.000
ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES HABITACIONALES	29.195.174	50.000	38.000
COSTOS ADMINISTRATIVOS GERENCIA	13.236.391	248.196	180.000
COMUNIDAD BENEFICIARIA - MANO DE OBRA (APOORTE EN ESPECIE)	256.957.877	9.404.658	4.284.138
APOYO LOGISTICO, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO EN ESPECIE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO 5%	24.302.572	810.086	-
	26.330.857		11.707.368
		3,43%	1,53%

Tabla 5: Relación ejecución – programación periodo

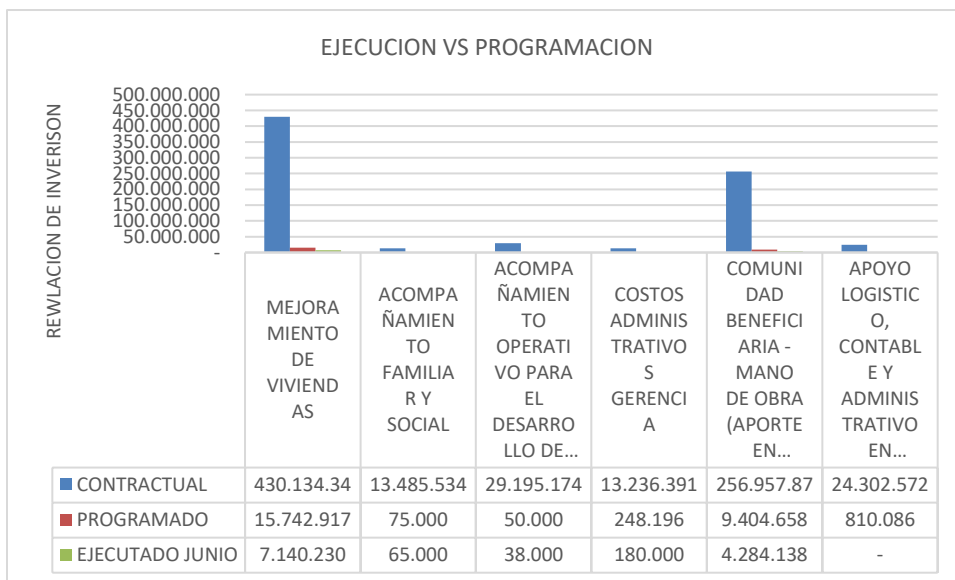


Gráfico 2: Relación ejecución – programación periodo

En el Periodo comprendido entre 18 de mayo Y el 17 de junio 2023 se evidencia una

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 20 de 66
---	---	--

desviación aproximada de -1.91%, de acuerdo a la programación actualizada según prorroga 2; según programación el avance en este periodo es de 3.43%, y la ejecución es de 1.53%; a pesar que la desviación porcentual es mínima respecto a la programación de actividades presentada por COMFACESAR, se evidencia con preocupación el escaso avance en las actividades de múltiples hogares en este periodo; en virtud de ello COMFACESAR manifiesta en este sentido, que, pese a que se han presentado múltiples dificultades en el transcurso del periodo, se ha evidenciado un avance significativo en el desarrollo del proyecto, sin embargo, aún persisten las dificultades, por una parte de la población beneficiaria, que manifiesta tener limitaciones de recursos para garantizar fluidez física de las obras.

- Ejecución Acumulada

	CONTRACTUAL	PROGRAMADO ACUMULADO JUNIO	EJECUCION ACUMULADA		
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	430.134.342	417.230.312	414.563.479	73,16%	54%
ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y SOCIAL	13.485.534	13.410.534	13.475.534	98,89%	2%
ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES HABITACIONALES	29.195.174	29.145.174	29.183.174	99,66%	4%
COSTOS ADMINISTRATIVOS GERENCIA	13.236.391	12.988.195	13.168.195	96,25%	2%
COMUNIDAD BENEFICIARIA - MANO DE OBRA (APORTE EN ESPECIE)	256.957.877	249.249.141	245.027.973	73,16%	32%
APOYO LOGISTICO, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO EN ESPECIE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO 5%	24.302.572	23.492.486	24.302.572	93,33%	3%
	767.311.890	745.515.841	739.720.927		96,40%
		97,16%	96,40%		

Tabla 6: Relación ejecución acumulada

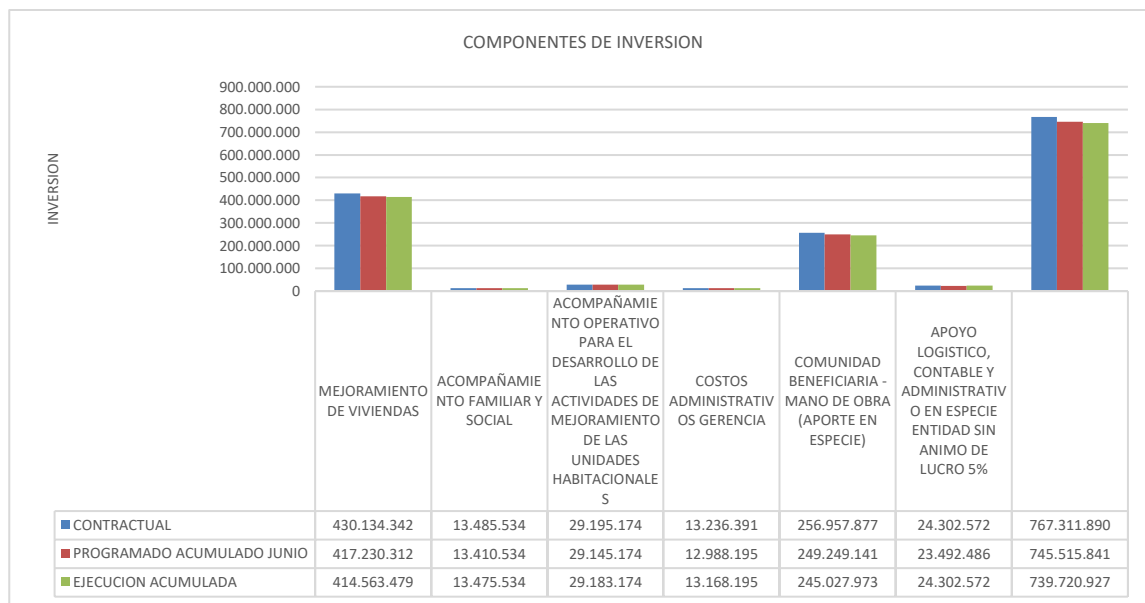


Gráfico 3: Relación ejecución – programación acumulada

Seguimiento de Ejecución

PERIODO	EJECUTADO	ACUMULADO
NOV-DIC	4,36%	4,36%
ENERO	2,58%	6,95%
FEBRERO	21,93%	28,87%
MARZO	28,09%	56,97%
ABRIL	18,69%	75,66%
MAYO	18,45%	94,10%
JUNIO	1,53%	95,63%

Tabla 7: Seguimiento historial ejecución

El avance acumulado aproximado hasta la fecha es de 95,63% respecto al monto total del convenio.

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 22 de 66
---	---	--

Observaciones: cronológicamente el término actualizado del convenio (prorroga 3) ha avanzado aproximadamente el 83%; tal como se relaciona en la siguiente tabla:

CRONOLOGIA TERMINO CONTRACTUAL		días		ACUMULADO
18-nov-22	17-dic-22	30	12%	12%
18-dic-22	17-ene-23	30	12%	24%
18-ene-23	17-feb-23	30	12%	36%
18-feb-23	17-mar-23	30	12%	48%
18-mar-23	17-abr-23	30	12%	60%
18-abr-23	17/05/2023	30	12%	71%
18-may-23	17/06/2023	30	12%	83%
18-jun-23	17/07/2023	30	12%	95%
18/07/2023	30/07/2023	12	5%	100%
		252	100%	

Tabla 8: Cronología del término contractual

Y según programación actualizada y la relación de ejecución acumulada, existe una desviación aproximada de -1.91%.

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 1 de 66
---	---	---

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR TOTAL CONVENIO	jun-23
1						
1.1	APOYO TECNICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES HABITACIONALES	Und	1	\$ 430.134.342	\$ 430.134.342,00	\$ 7.140.230,08
1.2	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y SOCIAL	Und	1	\$ 13.485.534	\$ 13.485.534,00	\$ 65.000,00
1.3	ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES HABITACIONALES	Und	1	\$ 29.195.174	\$ 29.195.174,00	\$ 38.000,00
1.4	COSTOS ADMINISTRATIVOS GERENCIA	Und	1	\$ 13.236.391	\$ 13.236.391,00	\$ 180.000,00
TOTAL COSTOS APOORTE GOBERNACIÓN					\$ 486.051.441,00	\$ 7.423.230,08
1.5	COMUNIDAD BENEFICIARIA - MANO DE OBRA (APOORTE EN ESPECIE)	Und	1	\$ 256.957.877	\$ 256.957.877,00	\$ 4.284.138,05
1.6	APOYO LOGISTICO, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO EN ESPECIE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO 5%	Und	1	\$ 24.302.572	\$ 24.302.572,00	\$ 0,00
TOTAL APORTES EN ESPECIE					\$ 281.260.449,00	\$ 4.284.138,05
VALOR TOTAL CONVENIO					\$ 767.311.890,00	\$ 11.707.368,12

Tabla 9: Ejecución actividades del periodo

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 2 de 66
---	---	---

COMFACESAR presentó vía correo electrónico programación actualizada de obra general y de forma detallada por beneficiario en la cual se relaciona una programación acumulada a corte Junio es de 97,16%%

COMFACESAR ha manifestado en múltiples ocasiones que el desempeño o avance físico de las obras se han visto afectados en gran medida al aporte de la contrapartida que corresponde a los beneficiarios, lo cual ha dificultado el cumplimiento de la programación establecida previamente por el operador; aunado a ello los múltiples cambios que los beneficiarios han solicitado en aras de actualizar las condiciones de habitabilidad de los mismos.

En este periodo no se evidencia avance físico de las actividades de obra, el cooperante ha realizado las actividades que se relacionan:

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 1 de 66
---	---	---

BENEFICIARIO		RAFAEL ARZUAGA	
Actividades ejecutadas		Preliminares: -Se realizó la limpieza y/o descapote del terreno para el inicio de la construcción. - Se realizó el trazado y replanteo del terreno para la construcción de dos alcobas. Cimientos y sobrecimientos: -Se realizó la excavación para la cimentación de dos alcobas.Se realiza el corte, figurado y amarre de la estructura en acero de 3/8" para las longitudinales y los flejes en acero de 1/4" para la viga de cimentación y columnetas de las alcobas, se hacela presentación de la estructura en las excavaciones y se funden las vigas de cimentación. Mampostería: -Se retoma levante de muro en ladrillos tipo bocadillo hasta nivel de vigas aéreas yse culmina en cuchillas para cubierta. Estructura en concreto: -Se figura la estructura en acero para las columnetas y vigas aéreas perimetrales y se realiza el vaciado de columnetas y de vigas aéreas perimetral sobre muro en su totalidad. Pañetes y acabados: -Se aplica el pañete interior y exterior, allanado en muros para alcobas según especificaciones técnicas. Aparatos Sanitarios e Incrustaciones: - NO APLICA Instalaciones eléctricas: -Se realiza la instalación de las tuberías y puntos eléctricos en alcobas. Cubierta: -Se realiza la instalación de las correas metálicas y de la cubierta en laminas onduladas de fibrocemento en alcobas. Carpintería metálica: -Se realiza la instalación de puerta metálica y ventanas en aluminio en alcobas. Pisos: continua ejecución de actividad enchape de pisos.	
		Avance Periodo	0%
		Avance acumulada	91.19%
NO REPORTA AVANCE FISICO EN EL PERIODO			

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 1 de 66
---	---	---

BENEFICIARIO	MIGUEL ANGEL ARMENTA PEDROZA				
Actividades ejecutadas	Preliminares:				
	- Se realizó la limpieza y/o descapote del terreno para el inicio de la construcción. - Se realizó el trazado y replanteo del terreno para la construcción de sala y cocina.				
	Cimientos y sobrecimientos: - Se realizó la excavación para la cimentación de sala y cocina. - Se realiza el corte, figurado y amarre de la estructura en acero de 3/8" para las longitudinales y los flejes en acero de 1/4" para la viga de cimentación y columnetas de las alcobas, se hace la presentación de la estructura en las excavaciones y se funden las vigas de cimentación. - Se hace el levante de sobrecimiento en ladrillos tipo bocadillo. Mampostería: -Se hace el levante de sobrecimiento en ladrillos tipo bocadillo. Estructura en concreto: -Se figura la estructura en acero para las columnetas y vigas aéreas perimetrales, se realiza vaciado de columnetas y se continua con vaciado de vigas aéreas. Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias: --Se realiza la instalación de tuberías y puntos tanto sanitarios como hidráulicos en el baño y cocina. Instalaciones eléctricas: -Se realiza la instalación de las tuberías y puntos eléctricos en cocina y baño. Cubierta: -Se realiza la instalación de las correas metálicas y de la cubierta en laminas onduladas de fibrocemento. Carpintería metálica: -Se realiza la instalación de puerta metálica y ventanas en aluminio. Acabados: Se realiza estuco de muros				
	<table border="1"> <tr> <td>Avance periodo</td><td>2.68%</td></tr> <tr> <td>Avance acumulado</td><td>100%</td></tr> </table>	Avance periodo	2.68%	Avance acumulado	100%
Avance periodo	2.68%				
Avance acumulado	100%				
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TERMINADO					

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 1 de 66
---	---	---

BENEFICIARIO	ASMET MEJIA				
Actividades ejecutadas	Preliminares: - Se realizó la limpieza y/o descapote del terreno para el inicio de la construcción. - Se realizó el trazado y replanteo del terreno para la construcción de dos alcobas. Cimientos y sobrecimientos: - Se realizó la excavación para la cimentación de dos alcobas. - Se realiza el corte, figurado y amarre de la estructura en acero de 3/8" para las longitudinales y los flejes en acero de 1/4" para la viga de cimentación y columnetas de las alcobas, se hace la presentación de la estructura en las excavaciones y se funden las vigas de cimentación. - Se hace el levante de sobrecimiento en ladrillos tipo bocadillo. Estructura en concreto: Se figura la estructura en acero para las columnetas. Pañetes y acabados: -Se aplica el pañete exterior allanado en muros de alcobas según especificaciones técnicas. Instalaciones eléctricas: -Se realiza la instalación de las tuberías y puntos eléctricos en alcobas. Cubierta: -Se realiza la instalación de las correas metálicas y de la cubierta en laminas onduladas de fibrocemento en alcobas. Carpintería metálica: -Se realiza la instalación de puerta metálica y ventanas en aluminio en alcobas Pisos Acabados				
	<table> <tr> <td data-bbox="721 1698 1040 1730">Avance periodo</td><td data-bbox="1040 1698 1466 1730">3.23%</td></tr> <tr> <td data-bbox="721 1730 1040 1761">Avance acumulado</td><td data-bbox="1040 1730 1466 1761">95%</td></tr> </table>	Avance periodo	3.23%	Avance acumulado	95%
Avance periodo	3.23%				
Avance acumulado	95%				

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 1 de 66
---	---	---

BENEFICIARIO	YEISON JOSE HERRERA DIAZ	
Actividades ejecutadas	Preliminares: - Se realizó la limpieza y/o descapote del terreno para el inicio de la construcción. - Se realizó el trazado y replanteo del terreno para la construcción de cocina y alcoba. Cimientos y sobrecimientos: - Se realizó la excavación para la cimentación de cocina y alcoba. - Se realiza el corte, figurado y amarre de la estructura en acero de 3/8" para las longitudinales y los flejes en acero de 1/4" para la viga de cimentación y columnetas de las alcobas, se hace la presentación de la estructura en las excavaciones y se funden las vigas de cimentación. - Se hace el levante de sobrecimiento en ladrillos tipo bocadillo. Estructura en concreto: Se figura la estructura en acero para las columnetas Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias: -NO APLICA Instalaciones eléctricas: -Se realiza la instalación de las tuberías y puntos eléctricos en alcobas. Cubierta: -Se realiza la instalación de las correas metálicas y de la cubierta en laminas onduladas de fibrocemento. Carpintería metálica: -Se realiza la instalación de puerta metálica y ventanas en aluminio. Pisos Acabados	
	Avance periodo	0%
	Avance acumulado	91,79%
NO REPORTA AVANCE FISICO EN EL PERIODO		

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 1 de 66
---	---	---

BENEFICIARIO	YULIANA RODRIGUEZ MEJIA				
Actividades ejecutadas	Preliminares: - Se realizó la limpieza y/o descapote del terreno para el inicio de la construcción. - Se realizó el trazado y replanteo del terreno para la construcción de cocina y alcoba. Cimientos y sobrecimientos: - Se realizó la excavación para la cimentación de cocina y alcoba. - Se realiza el corte, figurado y amarre de la estructura en acero de 3/8" para las longitudinales y los flejes en acero de 1/4" para la viga de cimentación y columnetas de las alcobas, se hace la presentación de la estructura en las excavaciones y se funden las vigas de cimentación. - Se hace el levante de sobrecimiento en ladrillos tipo bocadillo. Estructura en concreto: - Se figura la estructura en acero para las columnetas Pañetes y acabados: -Se aplica el pañete allanado en muros de la sala y cocina según especificaciones técnicas. Instalaciones eléctricas: -Se realiza la instalación de las tuberías y puntos eléctricos en sala y cocina. Cubierta: -Se realiza la instalación de las correas metálicas y de la cubierta en laminas onduladas de fibrocemento en sala y cocina. Carpintería metálica: -Se realiza la instalación de puertas metálicas en sala y cocina. Acabados				
	<table> <tr> <td>Avance periodo</td><td>0.23%</td></tr> <tr> <td>Avance acumulado</td><td>99%</td></tr> </table>	Avance periodo	0.23%	Avance acumulado	99%
Avance periodo	0.23%				
Avance acumulado	99%				

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 1 de 66
---	---	---

BENEFICIARIO	EPIFANIA BEATRIZ YEPEZ
Actividades ejecutadas	Preliminares:
	- Se realizó la limpieza y/o descapote del terreno para el inicio de la construcción. - Se realizó el trazado y replanteo del terreno para la construcción de sala/cocina y alcoba. Cimientos y sobrecimientos: - Se realizó la excavación para la cimentación de cocina y alcoba. - Se realiza el corte, figurado y amarre de la estructura en acero de 3/8" para las longitudinales y los flejes en acero de 1/4" para la viga de cimentación y columnetas de las alcobas, se hace la presentación de la estructura en las excavaciones y se funden las vigas de cimentación. - Se hace el levante de sobrecimiento en ladrillos tipo bocadillo. Estructura en concreto: Se figura la estructura en acero para las columnetas y vigas aéreas perimetrales y se realiza la fundida de columnetas y de vigas aéreas perimetral sobre muro en su totalidad. Pisos: -Se realizó la plantilla en concreto de 3000psi con malla electro soldada. Pañetes y acabados: -Se aplica el pañete allanado en muros internos de la alcoba y sala/cocina según especificaciones técnicas. Enchapes: - Se realiza la instalación de cerámica duro piso de primera calidad en alcoba. Aparatos Sanitarios e Incrustaciones: - NO APLICA Instalaciones eléctricas: -Se realiza la instalación de las tuberías y puntos eléctricos en alcoba y sala/cocina. Cubierta: -Se realiza la instalación de las correas metálicas y de la cubierta en laminas onduladas de fibrocemento en alcoba y sala/cocina.

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 1 de 66
---	---	---

	Carpintería metálica: -Se realiza la instalación de puerta metálica y ventanas en aluminio en alcoba y sala/cocina.				
	<table> <tr> <td>Avance periodo</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Avance acumulado</td><td>100%</td></tr> </table>	Avance periodo	0	Avance acumulado	100%
Avance periodo	0				
Avance acumulado	100%				
VIVIENDA TERMINADA					

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 1 de 66
---	---	---

BENEFICIARIO	DIRLIANIS ANDREA RIVERO MORALES	
Actividades ejecutadas	Preliminares:	
	- Se realizó la limpieza y/o descapote del terreno para el inicio de la construcción. - Se realizó el trazado y replanteo del terreno para la construcción de sala/comedor y cocina	
	Cimientos y sobrecimientos: - Se realizó la excavación para la cimentación de cocina y alcoba. - Se realiza el corte, figurado y amarre de la estructura en acero de 3/8" para las longitudinales y los flejes en acero de 1/4" para la viga de cimentación y columnetas de las alcobas, se hace la presentación de la estructura en las excavaciones y se funden las vigas de cimentación. - Se hace el levante de sobrecimiento en ladrillos tipo bocadillo. Estructura en concreto: - Se figura la estructura en acero para las columnetas y vigas aéreas perimetrales y se realiza la fundida de columnetas y de vigas aéreas perimetral sobremuro en su totalidad. Mampostería Acabados Pisos	
	Avance periodo	0.0
	Avance acumulado	94.49%
NO REPORTA AVANCE FISICO EN EL PERIODO		

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 1 de 66
---	---	---

BENEFICIARIO	MIRIAM JUDITH BARRIOS YEPEZ	
Actividades ejecutadas	Preliminares: - Se realizó la limpieza y/o descapote del terreno para el inicio de la construcción. - Se realizó el trazado y replanteo del terreno para la construcción de sala y cocina Cimientos y sobrecimientos: - Se realizó la excavación para la cimentación de cocina y alcoba. - Se realiza el corte, figurado y amarre de la estructura en acero de 3/8" para las longitudinales y los flejes en acero de 1/4" para la viga de cimentación y columnetas de las alcobas, se hace la presentación de la estructura en las excavaciones y se funden las vigas de cimentación. - Se hace el levante de sobrecimiento en ladrillos tipo bocadillo. Estructura en concreto: Se figura la estructura en acero para las columnetas y vigas aéreas perimetrales y se realiza la fundida de columnetas y de vigas aéreas perimetral sobre muro en su totalidad. Pañetes y acabados: -Se aplica el pañete allanado en muros de la sala y cocina según especificaciones técnicas. Instalaciones eléctricas: -Se realiza la instalación de las tuberías y puntos eléctricos en sala y cocina. Cubierta: -Se realiza la instalación de las correas metálicas y de la cubierta en laminas onduladas de fibrocemento en sala y cocina. Pisos: -Se realizó la plantilla en concreto de 3000 psi con malla electro soldada. Enchapes: - Se realiza la instalación de cerámica duro piso de primera calidad en la sala/cocina. Aparatos Sanitarios e Incrustaciones: - Se realiza instalación de tubería hídrica para cocina. Carpintería metálica: -Se realiza la instalación de puerta metálica y ventanas en aluminio en sala y cocina. Acabados	
	Avance periodo	0%
	Avance acumulado	97,17%
NO REPORTA AVANCE FISICO EN EL PERIODO		

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 1 de 66
---	---	---

BENEFICIARIO	VICTORIA LAUDITH RODRIGUEZ PINTO	
Actividades ejecutadas	Preliminares:	
	- Se realizó la limpieza y/o descapote del terreno para el inicio de la construcción. - Se realizó el trazado y replanteo del terreno para la construcción de sitio de trabajo y baño	
	Cimientos y sobrecimientos:	
	- Se realizó la excavación para la cimentación de cocina y alcoba. - Se realiza el corte, figurado y amarre de la estructura en acero de 3/8" para las longitudinales y los flejes en acero de 1/4" para la viga de cimentación y columnetas de las alcobas, se hace la presentación de la estructura en las excavaciones y se funden las vigas de cimentación.	
	Estructura en concreto:	
Se figura la estructura en acero para las columnetas y vigas aéreas perimetrales y se realiza la fundida de columnetas y de vigas aéreas perimetral sobre muro en su totalidad		
Pañetes y acabados: -Se aplica el pañete allanado en muros internos de sitio de trabajo según especificaciones técnicas.		
Enchapes: - Se realiza la instalación de cerámica duro piso de primera calidad en sitio de trabajo.		
Instalaciones eléctricas: -Se realiza la instalación de las tuberías y puntos eléctricos en sitio de trabajo.		
Cubierta: -Se realiza la instalación de las correas metálicas para cubierta en sitio de trabajo.		
Avance periodo		3.55%
Avance acumulado		95%



INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069

Código: GC-FPM-377
Versión: 2
Fecha: 25/07/2019
Página 1 de 66

BENEFICIARIO	MARIA VICTORIA PADILLA SALGADO				
Actividades ejecutadas	Preliminares:				
	- Se realizó la limpieza y/o descapote del terreno para el inicio de la construcción. - Se realizó el trazado y replanteo del terreno para la construcción de lavadero, sitio de trabajo y cocina Cimientos y sobrecimientos: - Se realizó la excavación para la cimentación de cocina y alcoba. - Se realiza el corte, figurado y amarre de la estructura en acero de 3/8" para las longitudinales y los flejes en acero de 1/4" para la viga de cimentación y columnetas de las alcobas, se hace la presentación de la estructura en las excavaciones y se funden las vigas de cimentación. - Se hace el levante de sobrecimiento en ladrillos tipo bocadillo.				
	Estructura en concreto: Se figura la estructura en acero para las columnetas y se realiza el vaciado de columnetas. Pisos: -Se realizó la plantilla en concreto de 3000 psi con malla electro soldada. Pañetes y acabados: -Se aplica el pañete allanado en muros de sitio de trabajo, lavadero y muro limitante según especificaciones técnicas. Se realiza aplicación de estuco interior en sitio de trabajo. Enchapes: - Se realiza la instalación de cerámica duro piso de primera calidad en sitio de trabajo. Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias: se instalan puntos hidráulicos y sanitarios, así como las redes de tubería para las mismas. Cubierta: -Se realiza la instalación de las correas metálicas en lavadero.				
	<table border="1"> <tr> <td>Avance periodo</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>Avance acumulado</td><td>100%</td></tr> </table>	Avance periodo	0%	Avance acumulado	100%
Avance periodo	0%				
Avance acumulado	100%				
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TERMINADO					

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 1 de 66
---	---	---

BENEFICIARIO	NINI JOHANA RAMIREZ ZAPATA				
Actividades ejecutadas	Preliminares:				
	- Se realizó la limpieza y/o descapote del terreno para el inicio de la construcción. - Se realizó el trazado y replanteo del terreno para sala y cocina				
	Cimientos y sobrecimientos: - Se realizó la excavación para la cimentación de cocina y sala. - Se realiza el corte, figurado y amarre de la estructura en acero de 3/8" para las longitudinales y los flejes en acero de 1/4" para la viga de cimentación y columnetas. - Se hace el levante de sobrecimiento en ladrillos tipo bocadillo.				
	Estructura en concreto: Se figura la estructura en acero para las columnetas y vigas aéreas perimetrales y se realiza la fundida de columnetas y de vigas aéreas perimetral sobre muro en su totalidad.				
	Estructura en concreto: -Se figura la estructura en acero para las columnetas y vigas aéreas perimetrales y se realiza la fundida de columnetas y de vigas aéreas perimetral sobre muro en su totalidad.				
	Instalaciones eléctricas: -Se realiza la instalación de las tuberías y puntos eléctricos en sala y cocina.				
	Cubierta: -Se realiza la instalación de las correas metálicas y de la cubierta en laminas onduladas de fibrocemento en sala y cocina				
	Pisos: -Se realizó la plantilla en concreto de 3000 psi con malla electro soldada.				
	Pañetes y acabados: -Se aplica el pañete allanado en muros según especificaciones técnicas.				
	-Se realiza aplicación de estuco interior.				
	Enchapes: - Se realiza la instalación de cerámica duro piso de primera calidad.				
	Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias: se instalan puntos hidráulicos y sanitarios, así como las redes de tubería para las mismas.				
	Enchapes y acabados				
	<table border="1"> <tr> <td>Avance periodo</td><td>0.72%</td></tr> <tr> <td>Avance acumulado</td><td>98,22%</td></tr> </table>	Avance periodo	0.72%	Avance acumulado	98,22%
Avance periodo	0.72%				
Avance acumulado	98,22%				



INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069

Código: GC-FPM-377
Versión: 2
Fecha: 25/07/2019
Página 1 de 66

BENEFICIARIO		MARYORIS YULIETH MARCHEDA BRAVO	
Actividades ejecutadas		Preliminares: - Se realizó la limpieza y/o descapote del terreno para el inicio de la construcción. - Se realizó el trazado y replanteo del terreno para sala y cocina Cimientos y sobrecimientos: - Se realizó la excavación para la cimentación de la sala y cocina. - Se realiza el corte, figurado y amarre de la estructura en acero de 3/8" para las longitudinales y los flejes en acero de 1/4" para la viga de cimentación y columnetas de las alcobas, se hace la presentación de la estructura en las excavaciones y se funden las vigas de cimentación. - Se hace el levante de sobrecimiento en ladrillos tipo bocadillo. Estructura en concreto: - Se figura la estructura en acero para las columnetas y vigas aéreas perimetrales y se realiza la fundida de columnetas y de vigas aéreas perimetral sobre muro, continua en desarrollo Pisos: -Se realizó la plantilla en concreto de 3000 psi con malla electro soldada.	
		Pañetes y acabados: -Se aplica el pañete allanado en muros interiores de sala y cocina según especificaciones técnicas.	
		Instalaciones eléctricas: -Se realiza la instalación de las tuberías y puntos eléctricos en sala y cocina.	
		Cubierta: -Se realiza la instalación de las correas metálicas y de la cubierta en laminas onduladas de fibrocemento en sala y cocina	
		Enchapes y acabados	
		Avance periodo	0%
		Avance acumulado	97,18%
NO REPORTA AVANCE FISICO EN EL PERIODO			



**INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL
CONVENIO 2022-03-0069**

Código: GC-FPM-377
Versión: 2
Fecha: 25/07/2019
Página 1 de 66

BENEFICIARIO	LEONILDE ZAPATA GUERRA	
Actividades ejecutadas	Preliminares: -Se realizó la limpieza y/o descapote del terreno para el inicio de la construcción. -Se realizó el trazado y replanteo del terreno para la intervención de sala / cocina y baño. Cimientos y sobrecimientos: -Se realizó la excavación para la cimentación de la cocina. -Se realiza el corte, figurado y amarre de la estructura en acero de 3/8" para las longitudinales y los flejes en acero de 1/4" para la viga de cimentación y columnetas de la cocina, se hace la presentación de la estructura en las excavaciones y se funden las vigas de cimentación. -Se hace el levante de sobrecimiento en ladrillos tipo bocadillo. Mampostería: -Se inicia levante de muro en ladrillos tipo bocadillo. Estructura en concreto: -Se figura la estructura en acero para las columnetas y vigas aéreas perimetrales y se realiza la fundida de columnetas y de vigas aéreas perimetral sobre muro, continua en desarrollo.	
	Avance periodo	0%
	Avance acumulado	80,51%
<u>NO REPORTA AVANCE FISICO EN EL PERIODO</u>		

Gobernación del Cesar

Sede principal: Edificio "Alfonso López Michelsen" Calle 16 #12-120. Sede Secretaría De Salud Transv. 18 #19-25- Sede: Secretaría de Deportes: Calle 11 #19C-5 Coliseo Cubierto "Julio Monsalvo Castilla"- Sede: Oficina de la Mujer: Calle 28 No. 8A-15 – Sede: Archivo Departamental: Edificio Archivo General del Departamento "Anibal Martínez Zuleta" Calle 14 No. 13-45 - Valledupar – Cesar
Líneas de atención a la ciudadanía: 01-8000-954-099 / (575)- 5748230
Correo: contactenos@cesar.gov.co Código Postal: 200001

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 1 de 66
---	---	---

BENEFICIARIO	CLARA ESTHER CARMONA PALMERA
Actividades ejecutadas	Preliminares:
	Se realizó la limpieza y/o descapote del terreno para el inicio de la construcción.
	Se realizó el trazado y replanteo del terreno para sala y alcoba.
	Cimientos y sobrecimientos:
	- Se realizó la excavación para la cimentación de alcoba y sala. - Se realiza el corte, figurado y amarre de la estructura en acero de 3/8" para las longitudinales y los flejes en acero de 1/4" para la viga de cimentación y columnetas, se funde viga de cimentación. - Se hace el levante de sobrecimiento en ladrillos tipo bocadillo.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TERMINADO	

Estructura en concreto:

Se figura la estructura en acero para las columnetas y vigas aéreas perimetrales y se realiza vaciado de columnetas y de vigas aéreas perimetral sobre muro en su totalidad, se continua con levante de cuchillas.

Pisos: -Se realizó la plantilla en concreto de 3000 psi con malla electro soldada.

Pañetes y acabados: -Se aplica el pañete allanado en muros de la alcoba y sala según especificaciones técnicas.

- Se realiza aplicación de estuco interior y exterior en alcoba y sala

-Se realiza la aplicación de pintura en interiores y exteriores de alcoba y sala.

Enchapes: - Se realiza la instalación de cerámica duro piso de primera calidad en alcoba y sala.

Instalaciones eléctricas: -Se realiza la instalación de las tuberías y puntos eléctricos en alcoba y sala.

Cubierta: -Se realiza la instalación de las correas metálicas y de la cubierta en laminas onduladas de fibrocemento en alcoba y sala.

Carpintería metálica: -Se realiza la instalación de puertas metálicas y ventanas en aluminio en alcoba y sala.

Avance periodo

Avance acumulado

100%

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 1 de 66
---	---	---

BENEFICIARIO	MARINA DIONICIA PADILLA ARAUJO	
Actividades ejecutadas	Preliminares:	
	- Se realizó la limpieza y/o descapote del terreno para el inicio de la construcción. - Se realizó el trazado y replanteo del terreno para alcoba y baño.	
	Cimientos y sobrecimientos: - Se realizó la excavación para la cimentación de alcoba y baño. - Se realiza el corte, figurado y amarre de la estructura en acero de 3/8" para las longitudinales y los flejes en acero de 1/4" para la viga de cimentación y columnetas. - Se hace el levante de sobrecimiento en ladrillos tipo bocadillo. Estructura en concreto: - Se figura la estructura en acero para las columnetas y vigas aéreas perimetrales y se realiza vaciado de columnetas y de vigas aéreas perimetral sobre muro en su totalidad, se continua con levante de cuchillas. Pisos: -Se realizó la plantilla en concreto de 3000 psi con malla electro soldada. Pañetes y acabados: -Se aplica el pañete allanado en muros de la alcoba y baño según especificaciones técnicas. -Se realiza aplicación de estuco interior y exterior en alcoba. Enchapes: - Se realiza la instalación de cerámica duro piso de primera calidad en alcoba y sala. Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias: se instalan puntos hidráulicos y sanitarios, así como las redes de tubería para las mismas. Instalaciones eléctricas: -Se realiza la instalación de las tuberías y puntos eléctricos en alcoba y baño. Cubierta: -Se realiza la instalación de las correas metálicas y de la cubierta en laminas onduladas de fibrocemento en alcoba y baño. Carpintería metálica: -Se realiza la instalación de puertas metálicas y ventanas en aluminio en alcoba y baño.	
	Avance periodo	0%
	Avance acumulado	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TERMINADO		

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 1 de 66
---	---	---

BENEFICIARIO	JACINTO GARCIA			
Actividades ejecutadas	Preliminares: -Se realizó la limpieza y/o descapote del terreno para el inicio de la construcción. -Se realizó el trazado y replanteo del terreno para la construcción de alcoba y baño. Cimientos y sobrecimientos: -Se realizó la excavación para la cimentación de la alcoba y baño. -Se realiza el corte, figurado y amarre de la estructura en acero de 3/8" para las longitudinales y los flejes en acero de 1/4" para la viga de cimentación y columnetas de las alcobas, se hace la presentación de la estructura en las excavaciones y se funden las vigas de cimentación. -Se hace el levante de sobrecimiento en ladrillos tipo bocadillo. Mampostería: -Se inicia levante de muro en ladrillos tipo bocadillo. Estructura en concreto: -Se figura la estructura en acero para las columnetas y vigas aéreas perimetrales y se realiza vaciado de columnetas y de vigas aéreas perimetral sobre muro en su totalidad, se continua con levante de cuchillas. Pisos: -Se realizó la plantilla en concreto de 3000 psi con malla electro soldada. Pañetes y acabados: -Se aplica el pañete allanado en muros de la alcoba y baño según especificaciones técnicas -Se realiza aplicación de estuco interior en alcoba y baño. Enchapes: - Se realiza la instalación de cerámica duro piso de primera calidad en alcoba, y cerámica estipulada para baño. Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias: se instalan puntos hidráulicos y sanitarios, así como las redes de tubería para las mismas. Instalaciones eléctricas: -Se realiza la instalación de las tuberías y puntos eléctricos en alcoba y baño. Cubierta: -Se realiza la instalación de las correas metálicas y de la cubierta en laminas onduladas de fibrocemento en alcoba y baño. Carpintería metálica: -Se realiza la instalación de puertas metálicas y ventanas en aluminio en alcoba y baño.			
				
	<table> <tr> <td>Avance periodo</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>Avance acumulado</td><td>100%</td></tr> </table>	Avance periodo	0%	Avance acumulado
Avance periodo	0%			
Avance acumulado	100%			
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TERMINADO				

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 1 de 66
---	---	---

BENEFICIARIO	LISETH PERALTA	
Actividades ejecutadas	Preliminares: -Se realizó la limpieza y/o descapote del terreno para el inicio de la construcción. -Se realizó el trazado y replanteo del terreno para la construcción de dos alcobas. Cimientos y sobrecimientos: -Se realizó la excavación para la cimentación de dos alcobas. -Se realiza el corte, figurado y amarre de la estructura en acero de 3/8" para las longitudinales y los flejes en acero de 1/4" para la viga de cimentación y columnetas de las alcobas, se hace la presentación de la estructura en las excavaciones y se funden las vigas de cimentación. -Se hace el levante de sobrecimiento en ladrillos tipo bocadillo. Mampostería: -Se inicia levante de muro en ladrillos tipo bocadillo. Estructura en concreto: -Se figura la estructura en acero para las columnetas y vigas aéreas perimetrales y se realiza vaciado de columnetas y de vigas aéreas perimetral sobre muro en su totalidad. Instalaciones eléctricas: -Se realiza la instalación de las tuberías y puntos eléctricos en alcobas. Cubierta: -Se realiza la instalación de las correas metálicas y de la cubierta en laminas onduladas de fibrocemento. Carpintería metálica: -Se realiza la instalación de puerta metálica y ventanas en aluminio. Pisos Enchapes Acabados	
	Avance periodo	0%
	Avance acumulado	96,46%
NO REPORTA AVANCE FISICO EN EL PERIODO		



INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069

Código: GC-FPM-377
Versión: 2
Fecha: 25/07/2019
Página 1 de 66

BENEFICIARIO	YULIS OROZCO CARMONA	
Actividades ejecutadas	Preliminares: -Se realizó la limpieza y/o descapote del terreno para el inicio de la construcción. Se realizó el trazado y replanteo del terreno para la construcción de dos alcobas. Cimientos y sobrecimientos: -Se realizó la excavación para la cimentación de dos alcobas. Se realiza el corte, figurado y amarre de la estructura en acero de 3/8" para las longitudinales y los flejes en acero de 1/4" para la viga de cimentación y columnetas de las alcobas, se hace la presentación de la estructura en las excavaciones y se funden las vigas de cimentación. Se hace el levante de sobrecimiento en ladrillos tipo bocadillo. Mampostería: -Se inicia levante de muro en ladrillos tipo bocadillo. Estructura en concreto: -Se figura la estructura en acero para las columnetas y vigas aéreas perimetrales y se realiza vaciado de columnetas y de vigas aéreas perimetral sobre muro en su totalidad, se continua con levante de cuchillas. Pisos: -Se realizó la plantilla en concreto de 3000 psi con malla electro soldada. Pañetes y acabados: -Se aplica el pañete allanado en muros de las alcobas según especificaciones técnicas. Instalaciones eléctricas: -Se realiza la instalación de las tuberías y puntos eléctricos en alcobas Cubierta: -Se realiza la instalación de las correas metálicas y de la cubierta en laminas onduladas de fibrocemento en alcobas.	
	Avance periodo	0%
	Avance Acumulado	100%
<u>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TERMINADO</u>		

BENEFICIARIO	YULEIDIS OROZCO				
Actividades ejecutadas	Preliminares: -Se realizó la limpieza y/o descapote del terreno para el inicio de la construcción. -Se realizó el trazado y replanteo del terreno para la construcción de dos alcobas. Cimientos y sobrecimientos: -Se realizó la excavación para la cimentación de dos alcobas. -Se realiza el corte, figurado y amarre de la estructura en acero de 3/8" para las longitudinales y los flejes en acero de 1/4" para la viga de cimentación y columnetas de las alcobas, se hace la presentación de la estructura en las excavaciones y se funden las vigas de cimentación. -Se hace el levante de sobrecimiento en ladrillos tipo bocadillo. Mampostería: -Se inicia levante de muro en ladrillos tipo bocadillo. Estructura en concreto: -Se figura la estructura en acero para las columnetas y vigas aéreas perimetrales y se realiza vaciado de columnetas y de vigas aéreas perimetral sobre muro en su totalidad. Pisos Enchapes Acabados				
					
	<table> <tr> <td>Avance periodo</td><td>25,95%</td></tr> <tr> <td>Avance acumulado</td><td>100%</td></tr> </table>	Avance periodo	25,95%	Avance acumulado	100%
Avance periodo	25,95%				
Avance acumulado	100%				



**INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL
CONVENIO 2022-03-0069**

Código: GC-FPM-377
Versión: 2
Fecha: 25/07/2019
Página 1 de 66

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TERMINADO

BENEFICIARIO	ROSALBA PADILLA	
Actividades ejecutadas	Pañetes y acabados: -Se aplica el pañete allanado en muros de las alcobas, sala y cocina según especificaciones técnicas. Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias: -Se realizan instalaciones de puntos y redes hidráulicas para cocina. Instalaciones eléctricas: -Se realiza la instalación de las tuberías y puntos eléctricos en alcobas, sala y cocina. Cubierta: -Se realiza la instalación de las correas metálicas y de la cubierta en laminas onduladas de fibrocemento en alcoba y sala. Carpintería metálica: -Se realiza la instalación de puertas metálicas y ventanas en aluminio en alcoba y sala.	
Avance periodo		0%
Avance acumulado		98%
<u>NO REPORTA AVANCE FISICO EN EL PERIODO</u>		

Gobernación del Cesar


Sede principal: Edificio "Alfonso López Michelsen" Calle 16 #12-120. Sede: Secretaría De Salud Transv. 18 #19-25- Sede: Secretaría de Deportes: Calle 11 #19C-5 Coliseo Cubierto "Julio Monsalvo Castilla"- Sede: Oficina de la Mujer: Calle 28 No. 8A-15 – Sede: Archivo Departamental: Edificio Archivo General del Departamento "Anibal Martínez Zuleta" Calle 14 No. 13-45 - Valledupar – Cesar
Líneas de atención a la ciudadanía: 01-8000-954-099 / (575)- 5748230
Correo: contactenos@cesar.gov.co Código Postal: 200001

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 1 de 66
---	---	---

BENEFICIARIO	AIDA FUENTES	
Actividades ejecutadas	Preliminares: -Se realizó la limpieza y/o descapote del terreno para el inicio de la construcción. -Se realizó el trazado y replanteo del terreno para la construcción de dos alcobas. Cimientos y sobrecimientos: -Se realizó la excavación para la cimentación de dos alcobas. -Se realiza el corte, figurado y amarre de la estructura en acero de 3/8" para las longitudinales y los flejes en acero de 1/4" para la viga de cimentación y columnetas de las alcobas,se hace la presentación de la estructura en las excavaciones yse funden las vigas de cimentación. - Se hace el levante de sobrecimiento en ladrillos tipo bocadillo. Mampostería: -Se inicia levante de muro en ladrillos tipo bocadillo. Estructura en concreto: -Se figura la estructura en acero para las columnetas y vigas aéreas perimetrales y se realiza vaciado de columnetas y de vigas aéreas perimetral sobre muro en su totalidad, se continua con levante de cuchillas. Pañetes y acabados: -Se aplica el pañete allanado en muros de dos alcobas según especificaciones técnicas. Cubierta: -Se realiza la instalación de las correas metálicas y de la cubierta en laminas onduladas de fibrocemento en dos alcobas. Carpintería metálica: -Se realiza la instalación de puertas metálicas y ventanas en aluminio en alcobas. Enchapes Acabados	
	Avance periodo	0%
	Avance acumulado	93,91%
NO REPORTA AVANCE FISICO EN EL PERIODO		

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 1 de 66
---	---	---

BENEFICIARIO	DERLYS KATHERINE GOMEZ ACUÑA	
Actividades ejecutadas	 Preliminares: - Se realizó la limpieza y/o descapote del terreno para el inicio de la construcción. - Se realizó el trazado y replanteo del terreno para cocina y alcoba. Cimientos y sobrecimientos: - Se realizó la excavación para la cimentación de alcoba y cocina. - Se realiza el corte, figurado y amarre de la estructura en acero de 3/8" para las longitudinales y los flejes en acero de 1/4" para la viga de cimentación y columnetas de los espacios, se hace la presentación de la estructura en las excavaciones y se funden las vigas de cimentación - Se hace el levante de sobrecimiento en ladrillos tipo bocadillo. Estructura en concreto: - Se figura la estructura en acero para las columnetas y vigas aéreas perimetrales y se realiza vaciado de columnetas y de vigas aéreas perimetral sobre muro en su totalidad, se continua con levante de cuchillas. Pisos: -Se realizó la plantilla en concreto de 3000 psi con malla electro soldada. Pañetes y acabados: -Se aplica el pañete allanado en muros internos de la alcoba y cocina según especificaciones técnicas. Enchapes: - Se realiza la instalación de cerámica duro piso de primera calidad en alcoba y cocina. Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias: -Se instalan puntos y redes hídricas para lava plato en cocina. Instalaciones eléctricas: -Se realiza la instalación de las tuberías y puntos eléctricos en alcoba y cocina. Cubierta: -Se realiza la instalación de las correas metálicas y de la cubierta en laminas onduladas de fibrocemento en alcoba y cocina. Carpintería metálica: -Se realiza la instalación de puertas metálicas y ventanas en aluminio en alcoba y cocina.	
	Avance periodo	0%
	Avance acumulado	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TERMINADO		



 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 1 de 66
---	---	---

BENEFICIARIO	MARIA ANGELICA VILLALBA	
Actividades ejecutadas	Preliminares:	
	-Se realizó la limpieza y/o descapote del terreno para el inicio de la construcción. -Se realizó el trazado y replanteo del terreno para la construcción de sala y cocina.	
	Cimientos y sobrecimientos:	
	-Se realizó la excavación para la cimentación de la sala y cocina.	
	-Se realiza el corte, figurado y amarre de la estructura en acero de 3/8" para las longitudinales y los flejes en acero de 1/4" para la viga de cimentación y columnetas de las alcobas, se hace la presentación de la estructura en las excavaciones y se funden las vigas de cimentación.	
	-Se hace el levante de sobrecimiento en ladrillos tipo bocadoillo.	
	Mampostería:	
	-Se inicia levante de muro en ladrillos tipo bocadoillo.	
	Estructura en concreto: -Se figura la estructura en acero para las columnetas.	
	Pisos: -Se realizó la plantilla en concreto de 3000 psi con malla electro soldada.	
	Pañetes y acabados: -Se aplica el pañete allanado en muros interiores de sala y cocina según especificaciones técnicas.	
	Instalaciones eléctricas: -Se realiza la instalación de las tuberías y puntos eléctricos en sala y cocina.	
	Cubierta: -Se realiza la instalación de las correas metálicas y de la cubierta en laminas onduladas de fibrocemento en sala y cocina.	
	Avance periodo	12.67%
	Avance acumulado	89%

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 1 de 66
---	---	---

BENEFICIARIO	RUBY CERVANTES JINETE	
Actividades ejecutadas	Pañetes y acabados: -Se aplica el pañete allanado en muros internos de la sala y alcoba según especificaciones técnicas.	
	Instalaciones eléctricas: -Se realiza la instalación de las tuberías y puntos eléctrico. Enchapes Carpintería Metálica	

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 1 de 66
---	---	---

BENEFICIARIO	DORELIS OROZCO ECHEVERRIA	
Actividades ejecutadas	Pisos: -Se realizó la plantilla en concreto de 3000 psi con malla electro soldada.	
	Pañetes y acabados: -Se aplica el pañete allanado en muros internos de la sala/cocina según especificaciones técnicas.	
	Instalaciones eléctricas: -Se realiza la instalación de las tuberías y puntos eléctricos en alcoba y baño.	
	Acabados	
	Instalaciones Electricas	
	Avance periodo	0%
	Avance acumulado	79,56%
NO REPORTA AVANCE FISICO EN EL PERIODO		

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 1 de 66
---	---	---

BENEFICIARIO	LINA MARCELA ARAUJO MEJIA				
Actividades ejecutadas	Preliminares: - Se realizó la limpieza y/o descapote del terreno para el inicio de la construcción. - Se realizó el trazado y replanteo del terreno para alcoba y baño. Cimientos y sobrecimientos: - Se realizó la excavación para la cimentación de alcoba y baño. - Se realiza el corte, figurado y amarre de la estructura en acero de 3/8" para las longitudinales y los flejes en acero de 1/4" para la viga de cimentación y columnetas. - Se hace el levante de sobrecimiento en ladrillos tipo bocadillo. Estructura en concreto: Se figura la estructura en acero para las columnetas y vigas aéreas perimetrales y se realiza vaciado de columnetas y de vigas aéreas perimetral sobre muro en su totalidad, se continua con levante de cuchillas. Pisos: -Se realizó la plantilla en concreto de 3000 psi con malla electro soldada. Pañetes y acabados: -Se aplica el pañete allanado en muros de las alcobas según especificaciones técnicas. Instalaciones eléctricas: -Se realiza la instalación de las tuberías y puntos eléctricos en alcobas. Cubierta: -Se realiza la instalación de las correas metálicas y de la cubierta en laminas onduladas de fibrocemento en alcobas. Carpintería metálica: -Se realiza la instalación de puertas metálicas y ventanas en aluminio en alcobas. <table data-bbox="704 1570 1406 1642"> <tr> <td>Avance periodo</td><td>24,68%</td></tr> <tr> <td>Avance acumulado</td><td>100%</td></tr> </table>	Avance periodo	24,68%	Avance acumulado	100%
Avance periodo	24,68%				
Avance acumulado	100%				
<u>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TERMINADO</u>					



INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069

Código: GC-FPM-377
Versión: 2
Fecha: 25/07/2019
Página 1 de 66

BENEFICIARIO	ROSAURA ROCIO MEJIA	
Actividades ejecutadas	Preliminares: - Se realizó la limpieza y/o descapote del terreno para el inicio de la construcción. - Se realizó el trazado y replanteo del terreno para la construcción de dos alcobas. Cimientos y sobrecimientos: - Se realiza el corte, figurado y amarre de la estructura en acero de 3/8" para las longitudinales y los flejes en acero de 1/4" para la viga de cimentación y columnetas de las alcobas, se hace la presentación de la estructura en las excavaciones y se funden las vigas de cimentación - Se hace el levante de sobrecimiento en ladrillos tipo bocadillo. Estructura en concreto: - Se figura la estructura en acero para las columnetas y vigas aéreas perimetrales y se realiza vaciado de columnetas y de vigas aéreas perimetral sobre muro en su totalidad, se continua con levante de cuchillas Pisos: -Se realizó la plantilla en concreto de 3000 psi con malla electro soldada. Pañetes y acabados: -Se aplica el pañete allanado en muros de las alcobas según especificaciones técnicas. Instalaciones eléctricas: -Se realiza la instalación de las tuberías y puntos eléctricos en alcobas. Cubierta: -Se realiza la instalación de las correas metálicas y de la cubierta en laminas onduladas de fibrocemento en alcobas. Carpintería metálica: -Se realiza la instalación de puertas metálicas y ventanas en aluminio en alcobas.	
		
		
	Avance periodo	7,91%
	Avance acumulado	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TERMINADO		

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 1 de 66
---	---	---

BENEFICIARIO	ROBERT PADILLA RODRIGUEZ	
Actividades ejecutadas	Preliminares:	
	-Se realizó la limpieza y/o descapote del terreno para el inicio de la construcción. - Se realizó el trazado y replanteo del terreno para la construcción de cocina y alcoba.	
	Cimientos y sobrecimientos:	
	-Se realizó la excavación para la cimentación de la cocina y alcoba. -Se realiza el corte, figurado y amarre de la estructura en acero de 3/8" para las longitudinales y los flejes en acero de 1/4" para la viga de cimentación y columnetas de las alcobas, se hace la presentación de la estructura en las excavaciones y se funden las vigas de cimentación. -Se hace el levante de sobrecimiento en ladrillos tipo bocadillo.	
	Mampostería: -Se inicia levante de muro en ladrillos tipo bocadillo. Estructura en concreto: -Se figura la estructura en acero para las columnetas.	
	Avance periodo	13,63%
	Avance acumulado	86.48%

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 1 de 66
---	---	---

BENEFICIARIO	FLORENTINO LERMA MURGAS	
Actividades ejecutadas	Preliminares:	
	Se realizó la limpieza y/o descapote del terreno para el inicio de la construcción.	
	Se realizó el trazado y replanteo del terreno para espacios a intervenir.	
	Cimientos y sobrecimientos:	
	Se realiza el corte, figurado y amarre de la estructura en acero de 3/8" para las longitudinales y los flejes en acero de 1/4" para la viga de cimentación y columnetas de las alcobas, se hace la presentación de la estructura en las excavaciones y se funden las vigas de cimentación	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TERMINADO	Se hace el levante de sobrecimiento en ladrillos tipo bocadillo.	
	Pañetes y acabados: -Se aplica el pañete allanado en muros de la sala y cocina según especificaciones técnicas.	
	Instalaciones eléctricas: -Se realiza la instalación de las tuberías y puntos eléctricos en sala y cocina.	
	Cubierta: -Se realiza la instalación de las correas metálicas y de la cubierta en laminas onduladas de fibrocemento en cocina.	
	Carpintería metálica: -Se realiza la instalación de puertas metálicas en cocina.	
	Enchapes	
	Acabados	
	Avance periodo	2.02%
	Avance acumulado	100%

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 1 de 66
---	---	---

BENEFICIARIO	OSCAR PADILLA RODRIGUEZ																																													
Actividades ejecutadas	Preliminares: -Se realizó la limpieza y/o descapote del terreno para el inicio de la construcción. -Se realizó el trazado y replanteo del terreno para la construcción de sala y alcoba. Cimientos y sobrecimientos: -Se realizó la excavación para la cimentación de la sala y alcoba. -Se realiza el corte, figurado y amarre de la estructura en acero de 3/8" para las longitudinales y los flejes en acero de 1/4" para la viga de cimentación y columnetas de las alcobas, se hace la presentación de la estructura en las excavaciones y se funden las vigas de cimentación. -Se hace el levante de sobrecimiento en ladrillos tipo bocadillo. Mampostería: -Se inicia levante de muro en ladrillos tipo bocadillo. Estructura en concreto: -Se figura la estructura en acero para las columnetas y vigas aéreas perimetrales y se realiza vaciado de columnetas y de vigas aéreas perimetrales sobre muro en su totalidad, se continua con levante de cuchillas. Estructura en concreto: -Se figura la estructura en acero para las columnetas y vigas aéreas perimetrales y se realiza vaciado de columnetas y de vigas aéreas perimetrales sobre muro en su totalidad, se continua con levante de cuchillas. Pisos: -Se realizó la plantilla en concreto de 3000 psi con malla electro soldada. Pañetes y acabados: -Se aplica el pañete allanado en muros internos de la alcoba y sala según especificaciones técnicas. Enchapes: - Se realiza la instalación de cerámica duro piso de primera calidad en alcoba. Instalaciones eléctricas: -Se realiza la instalación de las tuberías y puntos eléctricos en alcoba y sala Cubierta: -Se realiza la instalación de las correas																																													
 <table><caption>% DE EJECUCIÓN</caption><thead><tr><th>Etapa</th><th>% PROGRAMADO</th><th>% EJECUTADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>S0</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>S1</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>S2</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>S3</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>S4</td><td>19.62%</td><td>13.67%</td></tr><tr><td>S5</td><td>46.65%</td><td>34.83%</td></tr><tr><td>S6</td><td>53.90%</td><td>43.57%</td></tr><tr><td>S7</td><td>64.67%</td><td>54.37%</td></tr><tr><td>S8</td><td>76.74%</td><td>61.41%</td></tr><tr><td>S9</td><td>94.01%</td><td>76.23%</td></tr><tr><td>S10</td><td>100.00%</td><td>76.23%</td></tr><tr><td>S11</td><td>100.00%</td><td>76.23%</td></tr><tr><td>S12</td><td>100.00%</td><td>76.23%</td></tr><tr><td>S13</td><td>100.00%</td><td>100.00%</td></tr></tbody></table>	Etapa	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	S0	0.00%	0.00%	S1	0.00%	0.00%	S2	0.00%	0.00%	S3	0.00%	0.00%	S4	19.62%	13.67%	S5	46.65%	34.83%	S6	53.90%	43.57%	S7	64.67%	54.37%	S8	76.74%	61.41%	S9	94.01%	76.23%	S10	100.00%	76.23%	S11	100.00%	76.23%	S12	100.00%	76.23%	S13	100.00%	100.00%	
Etapa	% PROGRAMADO	% EJECUTADO																																												
S0	0.00%	0.00%																																												
S1	0.00%	0.00%																																												
S2	0.00%	0.00%																																												
S3	0.00%	0.00%																																												
S4	19.62%	13.67%																																												
S5	46.65%	34.83%																																												
S6	53.90%	43.57%																																												
S7	64.67%	54.37%																																												
S8	76.74%	61.41%																																												
S9	94.01%	76.23%																																												
S10	100.00%	76.23%																																												
S11	100.00%	76.23%																																												
S12	100.00%	76.23%																																												
S13	100.00%	100.00%																																												

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 1 de 66
---	---	---

	metálicas y de la cubierta en laminas onduladas de fibrocemento en alcoba y sala/cocina. Carpintería metálica: -Se realiza la instalación de puerta metálica y ventanas en aluminio.				
	<table> <tr> <td>Avance periodo</td><td>38,84%</td></tr> <tr> <td>Avance acumulado</td><td>100%</td></tr> </table>	Avance periodo	38,84%	Avance acumulado	100%
Avance periodo	38,84%				
Avance acumulado	100%				
<u>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TERMINADO</u>					



**INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL
CONVENIO 2022-03-0069**

Código: GC-FPM-377
Versión: 2
Fecha: 25/07/2019
Página 1 de 66

BENEFICIARIO	ANDRES RIVERO	
Actividades ejecutadas	Preliminares: -Se realizó la limpieza y/o descapote del terreno para el inicio de la construcción. -Se realizó el trazado y replanteo del terreno para la construcción de cocina y alcoba. Cimientos y sobrecimientos: -Se realizó la excavación para la cimentación de la cocina y alcoba. -Se realiza el corte, figurado y amarre de la estructura en acero de 3/8" para las longitudinales y los flejes en acero de 1/4" para la viga de cimentación y columnetas de las alcobas, se hace la presentación de la estructura en las excavaciones y se funden las vigas de cimentación. -Se hace el levante de sobrecimiento en ladrillos tipo bocadillo. Estructura y concretos Pisos: -Se realizó la plantilla en concreto de 3000 psi con malla electro soldada. Pañetes Cubierta Carpintería metálica	
	Avance periodo	0%
	Avance acumulado	78,63%
NO REPORTA AVANCE FISICO EN EL PERIODO		

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 1 de 66
---	---	---

BENEFICIARIO	JUAN MAXIMO ARAUJO	
Actividades ejecutadas	Preliminares: -Se realizó la limpieza y/o descapote del terreno para el inicio de la construcción. -Se realizó el trazado y replanteo del terreno para la construcción de Alcoba y sala. Mampostería: -Se inicia levante de muro en ladrillos tipo bocadillo. Cimientos y sobrecimientos: -Se realizó la excavación para la cimentación de alcoba y sala. -Se realiza el corte, figurado y amarre de la estructura en acero de 3/8" para las longitudinales y los flejes en acero de 1/4" para la viga de cimentación y columnetas de las alcobas, se hace la presentación dela estructura en las excavaciones y se funden las vigas de cimentación.	
	Avance periodo	11.18%
	Avance acumulado	75%

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 1 de 66
--	--	---

N°	NOMBRE	ACTIVIDAD EJECUTADA	% EJECUTADO	% INCIDENCIA CONVENIO
1	RAFAEL ARZUAGA (ESPECIAL)	ACABADOS	91,19%	2,76%
2	MIGUEL ARMENTA (ESPECIAL)	ACABADOS	100,00%	3,03%
3	ASMET MEJIA (ESPECIAL)	ACABADOS	95,00%	2,88%
4	YEISON HERRERA (ESPECIAL)	ACABADOS	91,79%	2,78%
5	YULIANA RODRIGUEZ (ESPECIAL)	ACABADOS	99,00%	3,00%
6	EPIFANIA YEPEZ (ESPECIAL)	EJECUCION TOTAL	100,00%	3,03%
7	DIRLIANY RIVERO (ESPECIAL)	ACABADOS	94,49%	2,86%
8	MIRIAM BARRIOS (ESPECIAL)	ACABADOS	99,00%	3,00%
9	VICTORIA RODRIGUEZ (ESPECIAL)	ACABADOS	95,00%	2,88%
10	MARIA VICTORIA PADILLA (ESPECIAL)	EJECUCION TOTAL	100,00%	3,03%
11	NINI RAMIREZ (ESPECIAL)	ACABADOS	99,00%	3,00%
12	MARIORIS MARCHEDA (ESPECIAL)	ACABADOS	99,00%	3,00%
13	LEONILDE ZAPATA (ESPECIAL)	ACABADOS	80,51%	2,44%
14	CLARA CARMONA (ESPECIAL)	EJECUCION TOTAL	100,00%	3,03%
15	MARINA PADILLA (ESPECIAL)	EJECUCION TOTAL	100,00%	3,03%
16	JACINTO GARCIA (ESPECIAL)	EJECUCION TOTAL	100,00%	3,03%
17	LICETH PERALTA (ESPECIAL)	ACABADOS	96,46%	2,92%
18	YULIS OROZCO (ESPECIAL)	EJECUCION TOTAL	100,00%	3,03%
19	YULEIDIS OROZCO (ESPECIAL)	EJECUCION TOTAL	100,00%	3,03%
20	ROSALBA PADILLA (ESPECIAL)	EJECUCION TOTAL	98,00%	2,97%
21	AIDA FUENTES (ESPECIAL)	ACABADOS	93,91%	2,85%
22	DERLYS K. GOMEZ (ESPECIAL)	EJECUCION TOTAL	100,00%	3,03%
23	JUAN PERALTA GUERRA (ESPECIAL)	EJECUCION TOTAL	99,00%	3,00%
24	MARI ANGELICA VILLALBA (ESPECIAL)	PAÑETE Y ACABADOS	89,00%	2,70%
25	RUBY CERVANTES JINETE (ESPECIAL)	ACABADOS	94,98%	2,88%
26	DORELIS OROZCO ECHEVERRIA (ESPECIAL)	PAÑETE Y ACABADOS	79,56%	2,41%
27	LINA MARCELA ARAUJO (ESPECIAL)	EJECUCION TOTAL	100,00%	3,03%
28	ROSAURA MEJIA (ESPECIAL)	EJECUCION TOTAL	100,00%	3,03%
29	ROBERT PADILLA RODRIGUEZ (ESPECIAL)	PAÑETE Y ACABADOS	86,48%	2,62%
30	FLORENTINO LERMA MURGAS (ESPECIAL)	EJECUCION TOTAL	100,00%	3,03%
31	ANDRES RIVERO MORALES (ESPECIAL)	PAÑETE Y ACABADOS	78,63%	2,38%
32	OSCAR PADILLA RODRIGUEZ (ESPECIAL)	EJECUCION TOTAL	100,00%	3,03%
33	JUAN MAXIMO ARAUJO (ESPECIAL)	CUBIERTA Y PAÑETE	75,00%	2,27%
		% DE AVANCE FÍSICO TOTAL		95,00%

Tabla 10: Ejecución física por beneficiario

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 1 de 66
--	--	---

BENEFICIARIOS INTERVENIDOS	33	100%
BENEFICIARIOS POR INTERVENIR	0	0%
BENEFICIARIOS CONVENIO	33	100,00%

RANGO	CANTIDAD	(%)
ENTRE 0% Y 10%	0	0,00%
ENTRE 11% Y 20%	0	0,00%
ENTRE 21% Y 30%	0	0,00%
ENTRE 31% Y 40%	0	0,00%
ENTRE 41% Y 50%	0	0,00%
ENTRE 51% Y 60%	0	0,00%
ENTRE 61% Y 70%	0	0,00%
ENTRE 71% Y 80%	3	9,09%
ENTRE 81% Y 90%	3	9,09%
ENTRE 91% Y 100%	27	81,82%
BENEFICIARIOS CONVENIO	33	100,00%

Tabla 11: Nivel de Ejecución física por rangos

3.2 Actividades Realizadas En El Periodo.

3.2.1 Actividades Técnicas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
1				
1.1	APOYO TECNICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES HABITACIONALES	Und	1	PAÑETES Y ACABADOS INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS CARPINTERÍA METALICA CUBIERTA INSTALACIONES ELECTRICAS ACABADOS

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 38 de 66
---	---	--

Tabla 12: Actividades constructivas

Hasta la fecha se han ejecutado actividades correspondientes a acompañamiento social, y avance físico de actividades constructivas en 33 hogares; de los cuales en este periodo reportan ejecución física 9 viviendas; 13 viviendas se hayan terminadas 100%, y el resto se encuentran parcialmente suspendidas en ejecución; logrando de esta manera una ejecución acumulada en el periodo de 95%.

Actividades Componente Social

Durante este periodo en el componente social se realizaron capacitaciones y visitas individuales, en aras de concientizar a los beneficiarios de la importancia en adelantar la ejecución de la obra e incentivar a los que aun no cuentan con el aporte de la mano de obra que deben suministrar para cumplir con el objetivo del proyecto y/o alcance del convenio referencia.

- Visitas técnico-social
- Visitas domiciliarias
- Seguimiento a la línea de atención a usuarios

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 39 de 66
---	---	--

3.3 Avance Financiero

- De acuerdo a los desembolsos realizados, el avance financiero acumulado corresponde al 40%, en este periodo no realizó pago a COMFACESAR por parte de la entidad territorial.

4. CUMPLIMIENTO CON EL PERSONAL EN CAMPO Y DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

A la fecha del presente informe el operador COMFACESAR no aporta informe referente al periodo comprendido entre 18 de MAYO - 18 de JUNIO 2023.

5. CONCLUSIONES, SUGERENCIAS, OBSERVACIONES Y/O INFORMACION A REPORTAR A LA ENTIDAD

La supervisión en ejercicio de sus funciones ha realizado en este periodo solicitudes a COMFACESAR en aras de garantizar el seguimiento efectivo de las múltiples actividades que definen el alcance contractual.

REFERENCIA	FECHA	OBJETO
CE-00120-202302286-GobCesar Id: 217437 Folios: 2	Fecha: 2023-06-06 11:54:21	SOLICITUD PRESENTACION DE INFORMES DE EJECUCION
CE-00120-202302279-GobCesar Id: 217424	Fecha: 2023-06-06 11:18:07	SOLICITUD DE INFORMACION

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 40 de 66
---	---	--

a) Observaciones Generales:

- La información relacionada en el presente informe corresponde a compilación de medios de verificación en campo, realizados por la supervisión en visitas y recorridos técnicos, y parte de información suministrada por el operador COMFACESAR, a la fecha no aportan informe de actividades 07, teniendo en cuenta requerimiento realizado por la supervisión delegada mediante CE-00120-202301899-GobCesar Id: 215488y CE-00120-202302286-GobCesar Id: 217437.
- Frente al atraso relacionado en el presente informe, la supervisión delegada sugiere la implementación de medidas técnicas, administrativas y sociales, que permitan subsanar las limitaciones que están afectando la ejecución de las actividades del proyecto, específicamente respecto al aporte de la contrapartida correspondiente a la población beneficiaria.


YINA KARINA DURAN BENAVIDEZ

Supervisor Designado

Nota: "Estos formatos contienen la información básica y mínima para el desarrollo de las relaciones contractuales que bajo supervisión de la Secretaría de Infraestructura se encuentran y sólo podrán ser modificados de acuerdo a lo establecido en el procedimiento GC-PPE-008 – Control de Documentos."

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 41 de 66
---	---	--

ANEXOS REGISTRO FOTOGRAFICO.




Carpintería metálica: ROBERT
PADILLA



Carpintería metálica: NINI
RAMIREZ



Enchape cocina: MARIA
ANGELICA VILLALBA

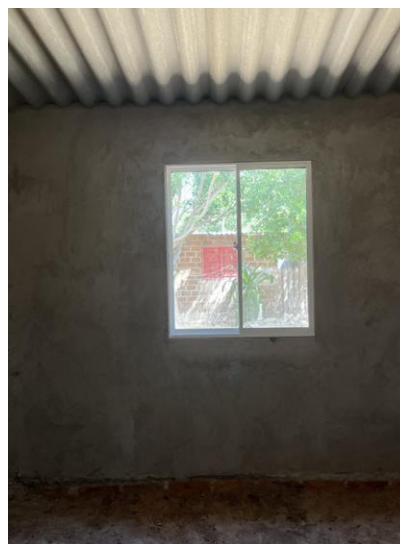

Carpintería metálica: JUAN
ARAUJO

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	INFORME No. 07 DE SUPERVISION DEL CONVENIO 2022-03-0069	Código: GC-FPM-377 Versión: 2 Fecha: 25/07/2019 Página 42 de 66
--	---	--

**ANEXOS
CORRESPONDENCIA
ACTAS**

PROCESO	GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO: GC-FPA-106 VERSIÓN: 1
FORMATO	COMUNICACIÓN OFICIAL ENVIADA	FECHA: 3/08/2017 Página: 1 de 2

Al contestar cite Radicado CE-00120-202302286-GobCesar Id: 217437
Folios: 2 Fecha: 2023-06-06 11:54:21
Anexos: 0
Remitente: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: COMFACESAR - JOSE MARIO SOLORZANO y Otros...

Valledupar, 6 de junio 2023

Señores

CAJA DE COMPENSACION DEL CESAR – COMFACESAR

Cl. 14 #14 - 66, Valledupar,
E. S. M.

REFERENCIA: CONVENIO-2022-03-0069- “CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION VULNERABLE DEL CENTRO POBLADO LOS CALABAZOS, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR”.

ASUNTO: SOLICITUD PRESENTACION DE INFORMES DE EJECUCION

Respetado(s) Señor(es).

La presente tiene por objeto en calidad de supervisor (a) Delegado (a), de conformidad con Clausula 7- Supervisión; CLAUSULA 6 Actividades y/o acciones a cargo de las entidades – 6.1 Actividades a cargo de la entidad sin ánimo de lucro – inciso 11 y El artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, comunicación CE-00120-202301899-GobCesar Id: 215488 Folios: 2 Fecha: 2023-05-09 16:08:24 ; solicitar la

Gobernación del Cesar

Sede principal: Edificio "Alfonso López Michelsen" Calle 18 #12-120. Sede Secretaría De Salud Transv. 18 #19-25- Sede: Secretaría de Deportes: Calle 11 #19C-5 Coliseo Cubierto "Julio Monsalvo Castilla"- Sede: Oficina de la Mujer: Calle 28 No. 8A-15 – Sede: Archivo Departamental: Edificio Archivo General del Departamento "Anibal Martínez Zuleta"

Calle 14 No. 13-45 - Valledupar – Cesar
Líneas de atención a la ciudadanía: 01-8000-954-099 / (575)- 5748230
Correo: contactenos@cesar.gov.co Código Postal: 200001

Al contestar cite Radicado CE-00120-202302286-GobCesar Id: 217437
Folios: 2 Fecha: 2023-06-06 11:54:21
Anexos: 0
Remitente: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: COMFACESAR - JOSE MARIO SOLORIZANO y Otros...

presentación de informe(s) vencido(s) de ejecución técnica, administrativa y financiera conforme a los fines y propósitos del proyecto.

La presente solicitud se realiza en cumplimiento de la Clausula 6 - Actividades y/o acciones a cargo de las Entidades.

La entidad territorial enfatiza en la potestad de adelantar acciones administrativas de conformidad con la CLAUSULA 13- Multas Por Incumplimiento: **EI FONDO podrá imponer a El Cooperante multas sucesivas por cada día de mora en el incumplimiento de sus obligaciones del 0.05% del valor del aporte del fondo. Las Multas deberán imponerse de acuerdo a la tasación indicada anteriormente, pero sin superar el diez por ciento (10%) del valor del aporte del FONDO.**

Agradezco su amable atención al respecto,

Atentamente,

Yina Karina Duran Benavidez

Supervisora Delegada

 Outlook

Buscar

Reunirse ahora













Inicio

Vista

Ayuda

Correo nuevo

Eliminar

Archivar

Informar

Limpiar

Mover a

Responder

Leído / No leído

Outlook recomienda Microsoft Edge para ver el correo. Pruébalo ahora

Favoritos

Bandeja de e... 29

Borradores 6

Elementos envi...

Agregar favorito

Carpetas

Bandeja de e... 29

Correo no des... 2

Borradores 6

Elementos envia...

Elementos elimi...

Archivo

Notas

Historial de con...

Crear carpeta nu...

Grupos

Elementos enviados

Filtrar

JOSE MARIO SOLORZANO BLANCO; coordinad...
SOLICITUD PRESENTACION DE INFORMES DE... 12:11
Valledupar, 6 de junio 2023 Señores CAJA DE COMPE...
coordinadorconvenioscomfacesar@gmail.com; ...
SOLICITUD DE INFORMACION 11:31
Valledupar, 6 de junio de 2023 Señores CAJA DE CO...
Este mes
yeikanu@hotmail.com
Revision Balances Jue 01/06
No hay vista previa disponible.
BALANCE OBRA...
Mayo
Sec. Infraestructura - Gobernación del Departam...
RESPUESTA GS-2023-053811 Mié 31/05
No hay vista previa disponible.
respuesta AREA...
dalmagranadosn@gmail.com
PRORROGA 3 CONVENIO 2022 03 0069 Lun 29/05
Buenas tardes, Adjunto estudio de co0nveniencia y C...
ESTUDIO CONV OTROSI 3 CIAU

SOLICITUD PRESENTACION DE INFORMES DE EJECUCION

1 archivo adjunto

Yina Karina Du

Para: Jy 2 más Mar 06/06/2023 12:11

(6-6-2023) e6608267311947... 156 KB

Valledupar, 6 de junio 2023

Señores
CAJA DE COMPENSACION DEL CESAR – COMFACESAR
Cl. 14 #14 - 66, Valledupar,
E. S. M.

REFERENCIA: CONVENIO-2022-03-0069- “CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION VULNERABLE DEL CENTRO POBLADO LOS CALABAZOS, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

Al contestar cite Radicado CE-00120-202302279-GobCesar Id: 217424
Folios: 3 Fecha: 2023-06-06 11:18:07
Anexos: 0
Remitente: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: COMFACESAR - JOSE MARIO SOLORZANO y Otros...

Valledupar, 6 de junio de 2023

Señores

CAJA DE COMPENSACION DEL CESAR – COMFACESAR

Cl. 14 #14 - 66, Valledupar, Cesar

E. S. M.

REFERENCIA: CONVENIO-2022-03-0069- “CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION VULNERABLE DEL CENTRO POBLADO LOS CALABAZOS, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR”.

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACION

Respetado(s) Señor(es).

La presente tiene por objeto en calidad de supervisor (a) Delegado (a), de conformidad con Clausula 7- Supervisión y El artículo 83 de la Ley 1474 de 2011; y comunicación; solicitar la información que se relaciona:

1. **Actualización de programación de obra**, teniendo en cuenta término de **prórroga 03** de fecha 29 de mayo de 2023. Dicha programación debe aportarse de forma desglosada por frente de obra u hogar beneficiario, teniendo en cuenta los componentes que configuran el alcance del convenio.

Al contestar cite Radicado CE-00120-202302279-GobCesar Id: 217424
Folios: 3 Fecha: 2023-06-06 11:18:07
Anexos: 0
Remitente: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: COMFACESAR - JOSE MARIO SOLORZANO y Otros...

Adicional a lo anterior se enfatiza en la fecha de terminación del convenio referencia (30 de julio 2023), en aras de solicitar que se implementen las medidas pertinentes que garanticen el cumplimiento del avance de actividades en el término contractual vigente.

2. **Póliza actualizada** de conformidad con CLAUSULA TERCERA (Prorroga 3): **COMFACESAR se obliga a modificar la Garantía Única de Cumplimiento, de acuerdo al nuevo plazo pactado.**

La presente solicitud se realiza en cumplimiento de la Clausula 6 - Actividades y/o acciones a cargo de las Entidades.

La entidad territorial reitera la potestad de adelantar acciones administrativas de conformidad con la CLAUSULA 13- Multas Por Incumplimiento: **EI FONDO podrá imponer a El Cooperante multas sucesivas por cada día de mora en el incumplimiento de sus obligaciones del 0.05% del valor del aporte del fondo. Las Multas deberán imponerse de acuerdo a la tasación indicada anteriormente, pero sin superar el diez por ciento (10%) del valor del aporte del FONDO.**

Agradezco su amable atención al respecto,

Atentamente,



PROCESO	GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO: GC-FPA-106 VERSIÓN: 1
FORMATO	COMUNICACIÓN OFICIAL ENVIADA	FECHA: 3/08/2017 Página: 3 de 3

Al contestar cite Radicado CE-00120-202302279-GobCesar Id:
217424
Folios: 3 Fecha: 2023-06-06 11:18:07
Anexos: 0
Remitente: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: COMFACESAR - JOSE MARIO SOLORZANO y
Otros...

Yina Karina Duran Benavidez

Supervisora Delegada

Gobernación del Cesar

Sede principal: Edificio "Alfonso López Michelsen" Calle 18 #12-120. Sede Secretaría De Salud Transv. 18 #19-25- Sede: Secretaría de Deportes: Calle 11 #19C-5 Coliseo Cubierto "Julio Monsalvo Castilla"- Sede: Oficina de la Mujer: Calle 28 No. 8A-15 – Sede: Archivo Departamental: Edificio Archivo General del Departamento "Anibal Martínez Zuleta"

Calle 14 No. 13-45 - Valledupar – Cesar
Líneas de atención a la ciudadanía: 01-8000-954-099 / (575)- 5748230
Correo: contactenos@cesar.gov.co Código Postal: 200001

 Outlook

Buscar

Reunirse ahora













Inicio

Vista

Ayuda

Correo nuevo

Eliminar

Archivar

Informar

Limpiar

Mover a

Responder

Leído / No leído

Outlook recomienda Microsoft Edge para ver el correo. Pruébalo ahora

Favoritos

Bandeja de e... 29

Borradores 6

Elementos envi...

Agregar favorito

Carpetas

Bandeja de e... 29

Correo no des... 2

Borradores 6

Elementos envia...

Elementos elimi...

Archivo

Notas

Historial de con...

Crear carpeta nu...

Grupos

Elementos enviados

Filtrar

Hoy

coordinadorconvenioscomfacesar@gmail.com; ...
SOLICITUD DE INFORMACION 11:31
Valledupar, 6 de junio de 2023 Señores CAJA DE CO...

Este mes

yeikanu@hotmail.com
Revision Balances
No hay vista previa disponible.
BALANCE OBRA...

Mayo

Sec. Infraestructura - Gobernación del Departam...
RESPUESTA GS-2023-053811 Mié 31/05
No hay vista previa disponible.
respuesta AREA...

dalmagranadosn@gmail.com
PRORROGA 3 CONVENIO 2022 03 0069 Lun 29/05
Buenas tardes, Adjunto estudio de co0nveniencia y C...
ESTUDIO CONV... OTROSI 3 CLAU...

Karel Aguilar: hugues jose moron de la hoz

SOLICITUD DE INFORMACION

1 archivo adjunto

Yina Karina Du

Para: cy 2 más Mar 06/06/2023 11:31

(6-6-2023) f3f6cd65417d237... 181 KB

Valledupar, 6 de junio de 2023

Señores

CAJA DE COMPENSACION DEL CESAR – COMFACESAR

Cl. 14 #14 - 66, Valledupar, Cesar

E. S. M.

REFERENCIA: CONVENIO-2022-03-0069- “CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION VULNERABLE DEL CENTRO POBLADO LOS CALABAZOS, MUNICIPIO DE VAI I FDI IPAR



Valledupar, 25 de mayo de 2023.

Doctora.
CLAUDIA NUÑEZ PADILLA.
Gerencia Proyectos Vivienda – Comfacesar.

Ref. 1. Convenio de Asociación No. 2022 03 0013, cuyo objeto es: “CONTRIBUCIÓN AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL CORREGIMIENTO DE SALOA, MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, DEPARTAMENTO DEL CESAR.”

Ref. 2. Convenio de Asociación No. 2022 03 0069, cuyo objeto es: “CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL CENTRO POBLADO LOS CALABAZOS, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.”

Asunto: Respuesta a comunicaciones de fecha 8 de mayo de 2023, emitidas en virtud de la ejecución y necesidad de cada convenio.

Cordial saludo.

Acudo ante ustedes con acostumbrado respeto, en calidad de secretaria de Infraestructura, con la finalidad de dar contestación a las solicitudes que nos ocupan, a través de las cuales se pone de presente la necesidad de ampliar el plazo de los convenios y su consecuente adición de recursos para suplir tal novedad.


Advertido lo anterior, es preciso indicar que, en la medida que los requerimientos que ahora se atienden comportan identidad en su objeto y motivación y, además de ello, recibirán idéntico tratamiento y resolución institucional; nos permitimos en atención de los principios de eficacia y economía¹, compilarlos para efectos de contestarlos en esta única ocasión.

Dicho lo anterior, es claro para este despacho los avances significativos que hemos podido obtener respecto de la materialización de ambos convenios, y muestra de ello es, el positivo porcentaje que se ha logrado, a pesar de las circunstancias que han traumatizado su ejecución.

Por ende, compartimos la necesidad perentoria de extender su plazo actual, como instrumento administrativo adecuado para satisfacer el objeto contractual convenido y llevar a feliz término la insuficiencia que le sirve de fundamento. No obstante, aunque tenemos en común sacar avante las actividades integrales del convenio y nuestra meta conjunta apunta al 100% de estas; resulta conveniente señalar que, dicha disposición solo estaría enmarcada en la concesión de la modificación del referido plazo, pero sin la directa adición de recursos requerida.

Tal decisión obedece, a que, dentro de la planeación del gasto público, infortunadamente no goza de prioridad la necesidad que ahora se plantea; pues los recursos disponibles, se encuentran preliminarmente determinados para suplir otros compromisos del plan de desarrollo. De allí, la inviabilidad de aumentar los costos de operación en esta oportunidad.

Agradecemos la atención y esperamos haber satisfecho su solicitud.

Atentamente,

ESTHER MENDOZA PEINADO.
Secretaria de Infraestructura.

Proyectaron: Arq. Gina Durán – Arq. Andreina Builes (Supervisoras)	Firma:
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las disposiciones legales o técnicas vigentes, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para su firma.	

¹ Ley 1437 de 2011, **ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS.** [...]

11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa.

12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas.

Todas las carpetas ▾

← s De: Sec. Infraestructura - Gobe... X



Reunirse ahora



Inicio Vista Ayuda

Correo nuevo ▾ Eliminar ▾ Archivar Informar ▾ Limpiar Mover a ▾ Responder ▾ Leído / No leído ▾ Marcado ▾ Importar ▾

Favoritos

- Bandeja de ... 160
- Borradores 11
- Elementos envia...

Agregar favorito

Carpetas

- Bandeja de ... 160
- Correo no des... 8
- Borradores 11
- Elementos envia...
- Elementos eli... 1
- Archivo
- Notas
- Historial de con...

Crear carpeta nu...

Grupos

Nuevo grupo

Resulta...

Tiene datos adjuntos

No leído

Para mí

Me menciona

Marcado

Importar ▾

S Sec. Infraestructura - Goberna... 31/05/2023
> RESPUESTA A COM...
Forwarded messa... Bandeja de ent...

respuesta AREA...

S Sec. Infraestructura - Goberna... 31/05/2023
> Solicitud – Procedimi...
Forwarded messa... Bandeja de ent...

Solicitud – Proc...

S Sec. Infraestructura - Goberna... 29/05/2023
> ACTAS BALANCES D...
Forwarded messa... Bandeja de ent...

BALANCE OBRA...

S Sec. Infraestructura - Goberna... 29/05/2023
> INFORME EJECUTIVO...
Forwarded messa... Bandeja de ent...

INFORME EJEC...

○ Sec. Infraestructura - Goberna... 26/05/2023
> Asunto: Respuesta a ...
Forwarded messa... Bandeja de ent...

Respuesta a soli...

S Sec. Infraestructura - Goberna... 24/05/2023
> ORDENES DE PAGO E...

Asunto: Respuesta a comunicaciones de fecha 8 de mayo de 2023, emitidas en virtud de la ejecución y necesidad de cada convenio.

1 archivo adjunto ▾

----- Forwarded message -----

De: **Sec. Infraestructura - Gobernación del Departamento del Cesar**
<infraestructura@cesar.gov.co>

Date: vie, 26 may 2023 a las 14:59

Subject: Asunto: Respuesta a comunicaciones de fecha 8 de mayo de 2023, emitidas en virtud de la ejecución y necesidad de cada convenio.

To: <vivienda@comfacesar.com>

Cc: ANDREINA BUILES TORRES <andreinabuiles@hotmail.com>, <solorzanovivienda@hotmail.com>, <coordinadorconvenioscomfacesar@gmail.com>

Doctora.

CLAUDIA NUÑEZ PADILLA.

Gerencia Proyectos Vivienda – Comfacesar.

Ref. 1. Convenio de Asociación No. 2022 03 0013, cuyo objeto es: “CONTRIBUCIÓN AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL CORREGIMIENTO DE SALOA, MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, DEPARTAMENTO DEL CESAR.”

Ref. 2. Convenio de Asociación No. 2022 03 0069, cuyo objeto es: “CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL CENTRO POBLADO LOS CALABAZOS, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.”

Asunto: Respuesta a comunicaciones de fecha 8 de mayo de 2023, emitidas en virtud de la ejecución y necesidad de cada convenio.

Cordial saludo.

En archivo adjunto enviamos respuesta a solicitud.
