

	INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR	Código: R GJP01-8
		Versión: 3
		Vigencia: 11/04/2016
		Página 1 de 27

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 070 DE 2024
INFORME FINAL**

NÚMERO DE CONTRATO: 0070 DE 2024		VALOR CONTRATO INICIAL: \$ 114.492.422,00 M/L	
		VALOR ADICIONAL: NINGUNO	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYESTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL, PRIDA S.A.S		PERSONA NATURAL:	☐
		PERSONA JURÍDICA:	☒
IDENTIFICACIÓN:	NIT: 900.026.388 -1	CEDULA DE CIUDADANÍA:	
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA". BPIN 20233218000010.			
FECHA DE INICIO: CUATRO (04) DE JULIO DE 2024		FECHA DE VENCIMIENTO: TRES (03) DE NOVIEMBRE DE 2024	
PRÓRROGA: UN MES		NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: TRES (03) DE DICIEMBRE DE 2024	
PÓLIZA – DE CUMPLIMIENTO No.: 47-44-101027654		FECHA DE CONSTITUCIÓN: Anexo 04 10/07/2024	FECHA DE TERMINACIÓN: 03/11/2029
PÓLIZA – DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: 47-40-101008525		Anexo 6 10/07/2024	03/11/2024
ADICIONES O PRÓRROGAS:		HASTA EL 50 % DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	EN EL TIEMPO:



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 2 de 27

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

1.1 DESARROLLO DEL INFORME:

1.1.1. CRONOLOGIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	N° 070 DE 2024
CONTRATISTA	PROYESTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL, PRIDA S.A.S – JUAN CARLOS AMAYA BAUTISTA (REP L).
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA". BPIN 20233218000010.
CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11 DE JUNIO DE 2024
SUPERVISOR ASIGNADO	JEFERSON JOSÉ BRACHO CARVAJAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 114.492.422,00 M/L
VALOR ADICIONAL	NINGUNO
VALOR TOTAL	\$ 114.492.422,00 M/L
PLAZO EJECUCIÓN INICIAL	CUATRO (04) MESES
PLAZO DE PRÓRROGA	UN (1) MES
FECHA DE INICIACIÓN	CUATRO (04) DE JULIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	TRES (03) DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	TRES (03) DE DICIEMBRE DE 2024
PERIODO PRESENTE INFORME	04 de julio al 03 de diciembre de 2024; fecha del informe: 12/02/2025

1.2 DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El proyecto aprobado para ser financiado con recursos SIFF NACIÓN No. 8523 del 27 de octubre de 2023, y 311 del 18 de octubre de 2023 denominado: "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA". BPIN 20233218000010", el cual fue tramitado por la oficina asesora de planeación y debidamente viabilizado y aprobado para su ejecución. Que de conformidad con los Estudios Previos elaborados y lo dispuesto en el artículo 2, numeral 3 de la Ley 1150 de 2007, reglamentada por el Decreto 1082 de 2015 y Artículo 219 del Decreto 19/2012, se estableció como modalidad de selección para la presente contratación el concurso de méritos No. 004 de 2024, y que el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 que preceptúa sobre la obligación de las entidades públicas de vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda; establece, respecto de la definición de interventoría, que esta "consistirá en el seguimiento técnico administrativo y financiero que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. (...)".

El proyecto referido, dado la descripción de su alcance, requiere de un seguimiento técnico especializado en la materia, de tal manera, que se ejecute de conformidad con el cumplimiento de sus fines; por tal motivo, a CORPOGUAJIRA, le asiste el deber de contratar una INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA". BPIN 20233218000010".



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 3 de 27

La necesidad la constituye, el deber legal que le asiste a Corpoguajira, en atender oportuna y eficazmente los diferentes requerimientos que el desarrollo de la función pública requiere y en lo referente a su competencia. Ley 80 de 1993: ARTÍCULO 32; Numeral 2°. Contrato de Consultoría. Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidas a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico pre-factibilidad o factibilidad para programas o proyectos, específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. La interventoría debe ser integral por cuanto se requiere de profesionales, y logística que conlleven a un buen control y seguimiento del proyecto logrando obtener los productos convenidos.

De conformidad con los Estudios Previos elaborados y lo dispuesto en el artículo 2, numeral 3 de la Ley 1150 de 2007, reglamentada por el Decreto 1082 de 2015 y Artículo 219 del Decreto 19/2012, se estableció como modalidad de selección para la presente contratación el Concurso de Méritos. Mediante la Resolución No. 00884 del 02 de mayo de 2024, se ordenó la apertura de este proceso de Contratación Concurso de Méritos N°. 0004 de 2024 y Mediante Resolución N°. 1256 del 06 de junio de 2024, la Entidad adjudicó el Concurso de Méritos N°. 0004 de 2024 al Contratista. Con base en lo anterior, CORPOGUAJIRA y EL CONTRATISTA, acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, Código Civil, Código de Comercio y las demás normas legales aplicables a la materia.

Corpoguajira ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del proyecto mencionado, por medio del Interventor "PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL, PRIDA S.A.S", quien aplicó al Concurso de Méritos N°. 0004 de 2024 y celebró el contrato de interventoría N° CI 0070 de 2024, cuya función es verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista. El interventor ejercerá, en nombre del Contratante, un control integral sobre el contrato, para lo cual puede, en cualquier momento, exigir al contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de las medidas para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, administrativas y financieras existentes desde el momento de su celebración. Además de las actividades generales antes mencionadas, el interventor apoya, asiste y asesora a la Corporación Contratante en todos los asuntos de orden técnico, administrativos y financiero, que se susciten durante la ejecución del contrato, hasta su recibo definitivo y posterior liquidación.

1.3 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 050 DE 2024 SOBRE EL CUAL SE EJERSE INTERVENTORÍA

El objeto del contrato es "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA". BPIN 20233218000010" y consiste en la construcción de 300 Estufas ecoeficientes para igual número de familias rurales que consumen leña para cocinar sus alimentos lo cual implica una demanda de 1.555,08 toneladas de leña anuales que son responsables de la emisión de 1.648,38 toneladas equivalentes de CO2. La finalidad del proyecto es mejorar la eficiencia en los procesos de cocción de alimentos empleados por las familias en zona rural de los municipios de El Molino y San Juan del Cesar, La Guajira, los cuales seguirán las siguientes estrategias:

1. Mejorar las prácticas en el uso de leña para cocción de alimentos: Se realizaron diversas actividades que contribuyen al cumplimiento y ejecución de este propósito, entre ellas se tienen las siguientes: Actividades preliminares; que implicó visitas para selección del sitio con la aprobación del beneficiario y adecuación del espacio donde fue ubicada la estufa el cual cuenta con un piso completamente nivelado, Construcción de estufas ecoeficientes; Las Estufas fueron construidas con ladrillo normal, ladrillo refractario, mortero y partes metálicas formadas por un módulo de 105 cm de largo, 83 cm de altura y 73 cm de fondo bajo las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos además, se realizó la georreferenciación de los punto donde se instalaron las estufa en formato shapefile.

2. Desarrollar procesos de educación informal ambiental en la comunidad: Durante esta estrategia se ejecutaron las siguientes acciones: Realizar taller de socialización del proyecto y auditoria visible, Realizar taller de capacitación para la operación y mantenimiento de la Estufa Ecoeficiente y Realizar divulgación del proyecto.



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

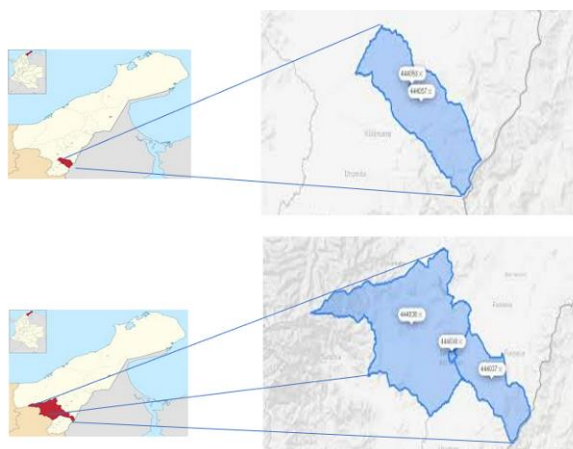
Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 4 de 27

Todas estas actividades fueron supervisadas por la interventoría que es la encargada de realizar *el seguimiento y evaluación del proyecto técnica administrativa y financiera*.

1.4 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



Este proyecto planteó desarrollar actividades en comunidades rurales campesinas de los municipios de El Molino y San Juan del Cesar.

La localización del proyecto se encuentra en sujeta a las coordenadas de ubicación de los beneficiarios del proyecto donde se logra apreciar una distribución del 91% para familias rurales del municipio de El Molino y un 9% para las familias ubicadas en área rural del municipio de San Juan del Cesar en el departamento de la Guajira. Sin embargo, dado las complicaciones presentadas donde existían predios que no cumplían con las condiciones mínimas para la instalación de las estufas y otros que desistieron de este propósito se tomó la decisión de incluir nuevos beneficiarios, por lo cual el porcentaje de distribución pasó de 91% a 68% para el Molino y de 9% a 32% para San Juan del Cesar.

2. COMPONENTES BÁSICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 COMPONENTE CONTRACTUAL, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE INTERVENTORÍA:

Durante el periodo se realizó el seguimiento técnico de la ejecución del contrato de interventoría N° 070 de 2024, donde se desarrollaron las actividades que se especifican a continuación:

La firma interventora PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL, PRIDA S.A.S, presentó el informe final, el día quince (15) de diciembre correspondiente al período que se evalúa, comprendido entre el 01 de noviembre al 03 de diciembre de 2024, el cual fue enviado a través de correo electrónico para ser evaluado por la supervisión; este informe fue programado su entrega con la firma del acta de terminación. (se anexa evidencias).

Se deja plasmado que se evaluó la información presentada en el informe final. Esto con el fin de dar cumplimiento con las cláusulas Segunda, Tercera, Novena y obligaciones técnicas de la minuta del contrato donde se evidencia lo siguiente: requerido en la cláusula Novena OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA inciso 1 Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo sus Anexos y su Pliego de Condiciones, Inciso 2. Entregar el Cronograma estimado de la ejecución de las actividades. Inciso 3. Colaborar con La Corporación en cualquier requerimiento que ella haga. Inciso 4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con los Anexos Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a LA CORPORACIÓN. Inciso 11 Dar estricto cumplimiento de acuerdo a la labor encomendada de conformidad con lo establecido en el estatuto de contratación y al contrato que suscriba con la entidad contratante, así como las recomendaciones y sugerencias impartidas por el (os) supervisor del contrato Inciso 15 "Rendir y elaborar los informes, conceptos y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato, teniendo en cuenta que deben remitir dichos informes de avance técnico y presupuestal el primer día hábil de cada mes independientemente de la fecha del acta de inicio.) Inciso 16. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la Corporación, Inciso 22 Informar oportunamente a LA CORPORACIÓN sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato, inciso 33 Presentar la información de la ejecución mensual física y financiera al área supervisora el primer día hábil de cada mes de cada una de las actividades y subactividades con cantidades, utilizando las unidades de medida correspondientes que han sido establecidas por el Departamento Nacional de Planeación.



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 5 de 27

De acuerdo con las obligaciones del contratista contempladas en la minuta del Contrato de Interventoría N°. 070 de 2024 a continuación se presentan las observaciones resultantes de la ejecución del contrato en relación a la presentación del informe final del contrato de interventoría, correspondientes al período comprendido entre el 01 de noviembre al 03 de diciembre de 2024.

CLAUSULA	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
NOVENA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	9.1 Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo sus Anexos y su Pliego de Condiciones.	X		El contratista conoce sus obligaciones, así como los anexos y pliego de condiciones. Para este reporte el contratista presentó informe final el día 15 de diciembre, el cual fue acordado su entrega para el día 18 de diciembre de 2024.
	9.2. Entregar el Cronograma estimado de la ejecución de las actividades.	X		El contratista presentó plan de trabajo en el ítem 4.2 del informe final, incluye cronograma de ejecución de actividades, Se cumplió con los plazos señalados en la en el acta de terminación para la entrega del informe final.
	9.3. Colaborar con La Corporación en cualquier requerimiento que ella haga.	X		La firma consultora atendió requerimientos señalados por la supervisión.
	9.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con los Anexos Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a LA CORPORACIÓN.	X		Se realizó prórroga de un mes al contrato de interventoría N° 070 de 2024, para atender las necesidades y requerimientos suscitados con la ejecución del contrato de obra oportunamente.
	9.5. Dar a conocer a LA CORPORACIÓN cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.			Dado la apertura de diferentes frentes de trabajo en la obra y a falta del personal de interventoría se estudió y aprobó la solicitud de prórroga realizada por la interventoría; el proceso finalizó con un otrosí, al contrato de interventoría.
	9.6. Comunicarle a LA CORPORACIÓN cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.	X		Se presentó el cambio de beneficiario, dado circunstancias en la cual no era posible la instalación de las estufas en muchos de los predios aprobados inicialmente. Además, se aprobó prórroga al contrato de interventoría para realizar los recorridos a las estufas que no fueron verificadas durante su construcción.
	9.7 Elaborar, suscribir y presentar a LA CORPORACIÓN las respectivas Actas parciales de ejecución. Estas Actas parciales de ejecución deben estar aprobadas por el interventor y/o supervisor del Contrato, según corresponda.			No aplica en este periodo
	9.8. Realizar las demás actividades inherentes al objeto del contrato, garantizando así la culminación de la misma y buena prestación del servicio.	X		Se presentó Informe Final correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de noviembre al 03 de diciembre de manera oportuna.
	9.9. Mantener los precios ofrecidos fijos e informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que advierta en el desarrollo del contrato.	X		El contratista para este periodo cumple con los precios ofrecidos. Sin embargo, al no proceder de acuerdo los gastos de algunos componentes del F.M. se procedió a reinvertir los recursos en la adición de un mes al contrato de interventoría.
	9.10. Presentar los documentos necesarios para la legalización del contrato.	X		El contratista presentó los documentos y pólizas requeridas para legalización del contrato, con la verificación se formalizó el inicio del contrato.
	9.11. Dar estricto cumplimiento de acuerdo a la labor encomendada de conformidad con lo establecido en el estatuto de contratación y al contrato que suscriba con la entidad contratante, así como las recomendaciones y sugerencias impartidas por el (os) supervisor del contrato.	X		El contratista presentó en su informe la metodología y plan de trabajo.



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 6 de 27

CLAUSULA	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
NOVENA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA	9.12. Colaborar con la Corporación en lo que sea necesario para que el objeto del contrato se cumpla y que este sea de la mejor calidad.	X		El contratista presentó los contratos de personal calificado para la ejecución del contrato de interventoría y para la prórroga aprobada.
	9.13. Presentar en el plazo establecido en los términos de la invitación los documentos y cumplir con los requisitos de orden técnico, exigidos como condición previa e indispensable para suscribir el Acta de Iniciación del Contrato.	X		Se suscribió acta de inicio el 04 de julio de 2024.
	9.14. Ejecutar las actividades de acuerdo con el programa general aprobado por la supervisión, realizar las entregas en las cantidades y sitios especificados.	X		El contratista entregó en su informe la metodología y plan de trabajo, el cual se cumplió de acuerdo a lo programado.
	9.15. Rendir y elaborar los informes, conceptos y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato, teniendo en cuenta que deben remitir dichos informes de avance técnico y presupuestal el primer día hábil de cada mes independientemente de la fecha del acta de inicio	X		A corte del presente informe, la firma interventora presentó el informe final de interventoría, el día 15 de diciembre de 2024 con corte de 01 de noviembre al 03 de diciembre de 2024.
	9.16. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la Corporación.	X		La firma consultora, presentó las recomendaciones realizadas a los informes de avances e informe final
	9.17. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, con el fin de hacer u omitir algún hecho.			No aplica en este periodo
	9.18. Radicar las facturas de cobro por las actividades ejecutadas y ajustes dentro de los plazos convenidos.	X		A corte del presente informe la firma consultora entregó para el mes de julio, la documentación para adelantar los tramites del anticipo, No se entregó acta parcial durante la ejecución del contrato.
	9.19. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo, si estuviere obligado a ello.	X		El contratista, Actualizó pólizas de cumplimiento el día 10/07/2024, a través de la póliza N°: 47-44-101027654 y 47-40-101008525 a partir del acta de inicio del contrato del 04/07/2024 y con la Prórroga del contrato del 03/11/2024 puesta para aprobación a la entidad.
	9.20. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato.			El contratista presentó los contratos de personal calificado para la ejecución del contrato y para la prórroga de la interventoría. Presentó las planillas de aportes a SS con un profesional en nómina y los demás como independiente, No se ejecutaron los gastos relacionados con algunos componentes del F.M; por lo que se procedió a redistribuir los recursos y ampliar el plazo de ejecución dado la necesidad presentada por la interventoría.
	9.21. Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley y demás normas concordantes, requisito que deberá tenerse en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato.	X		
	9.22. Informar oportunamente a LA CORPORACIÓN sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato.	X		Se presentó cambio en 68 beneficiarios y se amplió el plazo de ejecución del contrato de interventoría por un plazo de un mes.
	9.23. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.	X		
	9.24. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con La Corporación autónoma regional de La Guajira.	X		El contratista presentó los contratos de personal calificado para la ejecución del contrato de interventoría y la prórroga, entregó planilla de aportes a nómina de un miembro del equipo y planillas de SS independiente de 3 miembros que evidencian al personal presentado en licitación, algunos costos relacionados con F.M al final se redistribuyeron en el presupuesto de la ampliación.
	9.25. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas.			No aplica en este periodo



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 7 de 27

CLAUSULA	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
NOVENA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA	9.26. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entramamientos.	X		
	9.27. Suscribir la correspondiente acta de liquidación del contrato.			No aplica en este periodo
	9.28. Las demás que por ley o contrato le correspondan.	X		
	9.29. El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la corporación o a terceros.			No aplica en este periodo
	9.30. De ser necesario, vigilar en el contrato de obra el establecimiento de una valla informativa con las dimensiones y tamaño que estarán ajustadas a los lineamientos expuestos en la circular No. 006 del 5 de marzo de 2014, expedida por la Dirección de Regalías, o reglamento que la reemplace, y contener medidas de 3 metros de largo x 2 metros de ancho, estructura en cerchas de 4 mts por 30 cm, paneles en lámina galvanizada, banner adhesivo de 13" impreso a full color en HD y tintas ecosolventes, además de los siguientes datos como: La entidad pública beneficiaria de los recursos del SGR o la instancia que se designó como ejecutora de estos recursos; Nombre del proyecto de inversión, tal como fue aprobado en el OCAD; Fuentes de financiación del SGR	X		La interventoría, reportó la instalación de la valla publicitaria en el mes de agosto por parte del contratista de obra entre las coordenadas N 10°39'39" y W 72°56'6"; teniendo en cuenta que previamente presentó diseño a la oficina asesora de comunicaciones de Corpoguajira quien aprobó los diseños correspondientes.
	9.31. Reportar a la Secretaría Técnica de la Oficina Asesora de Planeación antes del inicio de la ejecución, la plantilla con la información de la programación inicial del proyecto. (Primer ingreso de información a la plataforma GESPROY relacionado con la programación de las actividades del proyecto).	X		Se reportó por la secretaría técnica de la oficina asesora de planeación el primer ingreso a gesproy en el mes de julio con la programación sin previa actualización con respecto al acta de inicio.
	9.32. Cumplir con el cronograma establecido y en caso de cualquier modificación en las metas de las actividades contempladas en el proyecto, se debe cumplir con los lineamientos establecido en el acuerdo 020 de 20214 de la CRSGR o el que lo actualice o modifique.	X		Hasta la fecha del reporte la interventoría cumple con el cronograma establecido de acuerdo a la planilla de gesproy
	9.33. Presentar la información de la ejecución mensual física y financiera al área supervisora el primer día hábil de cada mes de cada una de las actividades y sub-actividades con cantidades, porcentajes y demás unidades de medida aplicables, que sean establecidas por la Oficina Asesora de Planeación.	X		A corte del presente informe la firma interventora presentó el informe de interventoría final el día 15 de diciembre de 2024 con corte de 01 de noviembre al 03 de diciembre de 2024, a este informe se realizaron observaciones supervisión del contrato
	9.34. Toda decisión de ajuste del proyecto debe conciliarse con el área supervisora y la Oficina Asesora de Planeación.	X		Se realizó ajuste al presupuesto con pleno conocimiento de la oficina jurídica y el director general quienes aprobaron la solicitud del contratista, además se comunicó al encargado del gesproy en planeación.
	9.35. Elaborar una memoria de cálculo actualizada semanalmente durante todo el tiempo de ejecución del proyecto, cabe precisar que esta memoria debe ser clara, verificable y estar disponible de manera continua en el proyecto en ejecución.	X		En el informe Final se relaciona la memoria de cálculo actualizada al 03 de diciembre de 2024.
	9.36. La obligación del contratista abarca el cumplimiento de las acciones de mejora que halle el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación del Departamento Nacional de Planeación en sus visitas planificadas.			No aplica en este periodo
	9.37. Vigilar la realización antes del inicio de los trabajos o actividades propios del contrato, la socialización, sensibilización y reconocimiento a los gremios, comunidades y grupos de interés que se encuentren en la jurisdicción o área de influencia del municipio donde se vaya a desarrollar el proyecto, bajo el esquema que para el efecto tenga adoptado Corpoguajira.	X		La interventoría reportó para la ejecución del proyecto 5 talleres de sensibilización, 3 en el molino (Veredas: el Corral y los Tamacos y el predio Mi hijo y yo) y dos en San Juan del Cesar (Corregimiento: Cañaverales y Corralejas), con participación de 110 beneficiarios,



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 8 de 27

CLAUSULA	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
NOVENA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA	9.38. Vigilar la realización de las acciones de divulgación previstas en el marco de este contrato, de manera coordinada con la Oficina Asesora de comunicaciones de la Corporación, quien deberá otorgar el respectivo visto bueno a toda publicidad en medios de comunicación regionales, pieza audiovisual (folletos, afiches, cartillas, vallas, pendones, etc.), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Plan de Comunicaciones Institucional y en manual de imagen corporativo.	X		La interventoría verificó que el contratista de obra presentó a la oficina asesora de comunicaciones de la Corporación los diseños correspondientes a la valla informativa. Además, verificó su ubicación y montaje en el municipio de El Molino
	9.39. Tanto la información de avance parcial como el informe final y sus anexos, evidencias y/o documentos afines deben ser remitidos en formato físico y magnético, según consideraciones de la supervisión.	X		A corte del presente informe la firma interventora presentó el informe Final de interventoría, el día 15 de diciembre de 2024 con corte de 01 de noviembre al 03 de diciembre de 2024, a través de medio electrónico.
	9.40. Incluir en un porcentaje del 8% de los bienes o servicios a contratar a población de extrema pobreza, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional de los señalados en el parágrafo 1 del artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021.			No aplica en este periodo

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO DE OBRA Y MEDIDAS DE PAGO INTERVENTORÍA

Actividades Contrato de Obra	Medida Y pago (Interventoría)	Estado de avance
Actividades preliminares donde se verificará el sitio donde se va a construir la estufa, se deberá colocar 4 estacas para formar una escuadra, dejando 10 centímetros en cada lado para colocar las hiladas de ladrillos y con ello, formar un perímetro interior de 95 cm de ancho por 63 cm de largo.	Este ítem se medirá en metros cuadrados (m ²) tomando en cuenta únicamente la superficie neta ejecutada (Localización y replanteo). El pago por el trabajo efectuado tal como lo describe este ítem y medido en la forma indicada por metros cuadrado (m ²), de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada, de acuerdo a lo señalado revisado y aprobado por el Interventoría, Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.	225
Construir estufas ecoeficientes con ladrillo normal, ladrillo refractario, mortero y partes metálicas que comprende un módulo de 105 cm de largo, 83 cm de altura y 73 cm de fondo, que cumplimiento a la Norma Técnica - Estufas de biomasa para cocción de alimentos (NTC 6358)	Este ítem se medirá en Unidad (UND) tomando en cuenta únicamente la superficie neta ejecutada. El pago por el trabajo efectuado tal como lo describe este ítem y medido en la forma indicada por Unidad (UND) de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada, de acuerdo a lo señalado revisado y aprobado por la Interventoría, Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos	300
Realizar 3 talleres de socialización del proyecto y auditoria visible.	Este ítem se medirá en Números (Num) tomando en cuenta únicamente la superficie neta ejecutada. El pago por el trabajo efectuado tal como lo describe este ítem y medido en la forma indicada por Números (Num) de acuerdo con lo contratado y las presentes especificaciones técnicas será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada, de acuerdo a lo señalado revisado y aprobado por el Interventoría, Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos	3



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 9 de 27

Realizar 5 talleres de capacitación para la operación y mantenimiento de la estufa ecoeficiente.	Este ítem se medirá en Números (Num) tomando en cuenta únicamente la superficie neta ejecutada. El pago por el trabajo efectuado tal como lo describe este ítem y medido en la forma indicada por Números (Num) de acuerdo con lo contratado y las presentes especificaciones técnicas será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada, de acuerdo a lo señalado revisado y aprobado por el Interventoría, Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos	5
Realizar la divulgación del proyecto	Este ítem se medirá en Unidad (UND) tomando en cuenta únicamente la superficie neta ejecutada. El pago por el trabajo efectuado tal como lo describe este ítem y medido en la forma indicada por Unidad (UND) de acuerdo con lo contratado y las presentes especificaciones técnicas será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada, de acuerdo a lo señalado revisado y aprobado por la interventoría, Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.	1

3.1 ACTIVIDADES DE CONTROL EJERCIDO POR LA INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA N° 050/24

Para este periodo se desarrollaron las siguientes actividades en esencia de la supervisión del Contrato de Interventoría No. 0070 de 2024, cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA". BPIN 20233218000010". Durante el periodo comprendido entre el 01 de noviembre al 03 de diciembre de 2024, a la fecha de elaboración del presente informe, el contratista PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL, PRIDA S.A.S, presentó el informe Final correspondiente al mes de noviembre, el día quince (15) del mes de diciembre dicho informe fue acordado entrega para el 18 de diciembre, a través del acta de terminación firmada el día 03 de diciembre de 2024.

Durante el presente período la interventoría relacionó las acciones desarrolladas para el control de la ejecución del contrato N° 070/24, las cuales se especifican a continuación:

3.2 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- Correspondencia enviada y recibida: La interventoría reporta a través del anexo N°5 toda la correspondencia enviada y recibida durante el periodo de ejecución del contrato, comprendido entre el 04 de julio al 03 de diciembre del año 2024.
- Actas generadas en el periodo del informe: La interventoría informa la generación de 102 acta de visita.
- Actas generadas en el desarrollo del contrato: A lo largo de la ejecución del contrato, la interventoría informa la generación de 416 acta de visita técnicas, reportadas en el anexo 1 del informe fina de interventoría.
- Actas de comité técnico: Durante la ejecución del contrato se generaron 4 actas de comité técnico.
- Sistema Integral de seguridad social: El personal de interventoría se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social, se presentó como evidenciar planillas de pago de tres profesionales afiliados como independiente al sistema de seguridad social y una planilla en nómina, por lo cual no se demuestra el uso del factor multiplicador para 3 miembros del equipo de trabajo, por lo cual se realizó prórroga, con la redistribución de los recursos que no fueron empleados por el contratista.
- Revisión de Vigencia de las Garantías: Las garantías fueron aprobadas por la oficina jurídica de la corporación.



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 10 de 27

3.3 ACTIVIDADES TÉCNICAS

- Seguimiento de la interventoría a la actividad de localización y replanteo: Hasta la fecha del presente informe la interventoría reportó 416 visitas de campo realizadas en puntos estratégicos, para verificar los predios de los beneficiarios de estufas ecoeficientes; distribuidas de la siguiente manera: visitas georreferenciadas, visita entrega de materia a los beneficiarios y verificación estufas construidas en las veredas Farías de Tamaco, las Ilusiones, el corral orejero, san Benito, la morada, el manantial, los barriales, Montaña de Catatumbo. Zona rural del Molino y El tablazo, los pozos, cañaverales y corraleja zona rural de Sanjuán del cesar Guajira.
- Seguimiento de la interventoría a la actividad de construcción de estufas ecoeficientes: A la fecha del mes de diciembre 03 el contratista de obra reporta 300 estufas ecoeficientes instaladas; sin embargo, la interventoría lleva un acumulado de 300 estufas verificadas.
- Seguimiento de la interventoría a las actividades de talleres de socialización del proyecto y auditoria visible: la interventoría reportó para el mes de octubre, con respecto al área social de la Interventoría, en compañía con la contratista Fundación Agua Luna, recorridos en campo en las veredas Guabinas, Los Papeles, Faria Los Tamacos, Las Ilusiones, El Manantial y Bejuco Voladorcito, logrando establecer 102 visitas de acercamiento con los beneficiarios, donde se recogieron manifestaciones de satisfacción.
- Seguimiento de la interventoría a la actividad de taller de capacitación para la operación y mantenimiento de la estufa ecoeficiente (Manual, Carta de beneficio y otros: A lo largo de la ejecución el contratista Fundación Agua Luna realizó cinco (5) talleres de capacitación 2 en el municipio de San Juan y 3 en el municipio de El Molino sobre el uso, manejo y mantenimiento de las estufas, el cual contó con la participación de 110 beneficiarios del proyecto.
- Seguimiento de la interventoría a las actividades de divulgación del proyecto: La Interventoría notificó evidencia de traslado al área de comunicación de CORPOGUAJIRA del diseño y georreferenciación de la valla publicitaria en el sitio estratégico en el municipio de El Molino, por parte de contratista de obra, para el mes de agosto, la cual fue verificada por la interventoría de acuerdo al informe presentado.

3.3.1 Avance físico de actividades: A la fecha se reporta un avance de 100,00% de ejecución física de actividades, en socialización y auditoria visible, construcción de estufas, localización y replanteo, divulgación del proyecto.

3.3.2 Actividades programadas y ejecutadas en el periodo: Hasta la fecha se reportó por parte del contratista a la celebración de cinco (5) reuniones de capacitación, divulgación del proyecto. Verificación y replanteo, construcción de 10 estufas ecoeficientes, para un total de 300 construidas hasta la fecha.

3.3.3 Actividades ejecutadas y aprobadas: Se han adelantado los avances en campo y la aprobación por parte de la interventoría de 5 talleres de capacitación y 300 estufas verificadas.

3.3.4 Estado General del tiempo: De acuerdo a la interventoría, el contrato se ejecuta de acuerdo al cronograma.

4. CONTROL A LOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 070 DE 2024

Para este ítem se realizó las siguientes actividades en cumplimiento al seguimiento administrativo, financiero y contable.

4.1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

- Se verificó por parte de la supervisión los contratos del personal de interventoría, los cuales fueron anexado al informe.
- Se verificó el estado actual de las vigencias de las pólizas que amparan el contrato de interventoría N° 070 de 2024 y



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 11 de 27

las mismas se encuentran vigentes, a la fecha, de tal forma que la Corporación está amparada por la póliza única de cumplimiento del contrato.

- PRIDA S.A.S, para el presente informe se entregaron las planillas de 4 profesionales, donde 3 de ellos se muestran como independiente con los pagos a los aportes por concepto de seguridad social, riesgos profesionales para el desarrollo de las actividades propias del contrato para los meses de julio a octubre y 3 planillas de profesionales para el mes de noviembre.
- Se amplió el plazo del contrato atendiendo el requerimiento del contratista que solicitó ampliación por un mes para cumplir con las revisiones pendientes del contrato, dado el incremento en el número de estufas construidas en el último mes y que por carecer de personal no fue posible atender todos los frentes de trabajo colocados por el contratista de la obra. Para solventar económicamente esta necesidad se calculó y redistribuyó los recursos que el contratista no utilizó relacionado con algunos ítem del factor multiplicador. Se anexó evidencias que comprueben los requerimientos y modificaciones realizadas al contrato.

4.1.1 Personal administrativo y técnico de la Interventoría

A continuación, se detalla el personal que ejerció la Interventoría en el contrato N° 070 de 2024

Nombre	Cédula	Cargo	% de Dedicación (Mes)
Juan Carlos Amaya Bautista	79.555.163	Director de Interventoría	50%
Caroline Celedón Matute	1.122.410.841	Residente de Interventoría	100%
Yislen Cristina Fragozo Fuentes	1.119.836.743	Profesional Social	50%
Yenireth Gutiérrez Jerez	1.122.406.871	Auxiliar de Oficina	50%

Revisado las hojas de vida del personal que aplicó en el proceso de selección de la propuesta de la firma Interventora PRIDA S.A.S, se tomaron como referencia los profesionales presentados en dicho proceso de selección los cuales cumplen con las condiciones exigidas; sin embargo, se aclara que se recibió solicitud para el cambio de personal (Auxiliar de oficina) para finales del mes de julio, donde se presentó la renuncia por razones personales de la señora Doris Edilma Roza Santana y en su remplazo se propuso la profesional Yenireth Gutiérrez Jerez, quien cuenta con mejor perfil profesional que la señora Roza, por lo cual se aprobó la viabilidad de la modificación manteniendo los perfiles profesionales y el personal anteriormente mencionado, para la ejecución del contrato de interventoría solo se presentó una sola modificación del personal.

4.1.2 Relación de aportes al sistema de seguridad social por parte de Prida S.A.S

El contratista a la fecha anexó cuatro planillas de pago de seguridad social, correspondiente a igual número de personal del periodo evaluado para los meses de Julio a octubre y planillas para el mes de noviembre que se ajustan al personal contratado (Ver anexo seguimiento aportes seguridad social contrato 070 de 2024), No se tuvo en cuenta algunos ítems relacionados con el Factor Multiplicador en el concepto de salarios y prestaciones sociales del personal facturable, dado que el tipo de contratos evidenciados al personal, son contratos por prestación de servicios.

4.1.3 Relación de actas y/o modificaciones

Descripción	Fecha	Valor	Tiempo adicionado	Justificaciones
Acta de inicio contrato de interventoría N° 070 de 2024	04/07/2024	0	0	Se suscribe acta de inicio con la firma Prida S.A.S, para vigilancia y control al contrato de obra N° 050/24

4.2 COMPONENTE TÉCNICO

4.2.1 Actividades de control técnico realizado por la supervisión al contrato de interventoría N° 070 de 2024

- Se realizó acompañamiento a la interventoría en visitas de seguimiento a la construcción de estufas ecoeficiente en las veredas las Ilusiones y el manantial, se contó con la presencia de personal de la interventoría y personal del contratista de obra quien tuvieron atentos a las sugerencias realizadas. En conclusión, las estufas visitadas contaron con el visto bueno y aprobación por parte de la interventoría; También se aprovechó la oportunidad para resolver inquietudes y sugerir las posibles acciones tendientes a garantizar el buen desarrollo del proyecto durante la ejecución de las actividades especificadas en contratos. Anexo acta de inicio, registro fotográfico



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 12 de 27

- Durante la ejecución del contrato de interventoría se realizaron 4 comité técnico de obra 2 de ellos de forme virtual y 2 de manera presencial, donde se atendieron y resolvieron inquietudes y sugerencias, las acciones encaminadas a superar los inconvenientes presentados durante esta etapa de desarrollo del proyecto.

4.2.2 Avance físico

PRESUPUESTO AJUSTADO DEL CONTRATO No 070 DE 2024 CON LA SOLICITTUD DE PRORROGA													
CONTRATO									AVANCE FISICO				
ITEM	ACTIVIDAD	A SUELDO MES BASICO	B CANT.	C DEDIC %	D F.M	E Valor Mes (A*B*C*D)	F N° DE MESES	TOTAL PARCIAL (E*F)	AVANCE EN NOV - DIC	AVANCE ACUMULADO	POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN	% POR EJECUTAR
1.	COSTO DE PERSONAL												
1,1	Personal de Supervisión												
1.1.1	Director de Interventoria	\$ 4.500.000	1	50%	1,98	\$ 4.455.000	4,00	\$ 17.820.000		4,00	0,0	100%	0,00%
1.1.2	Profesional Area Social	\$ 2.850.000	1	50%	1,43	\$ 2.035.898	4,00	\$ 8.143.590		4,00	0,0	100%	0,00%
1.1.3	Auxiliar de oficina	\$ 2.500.000	1	50%	1,43	\$ 1.785.875	4,00	\$ 7.143.500		4,00	0,0	100%	0,00%
1.1.4	Ingeniero Ambiental o Civil	\$ 3.500.000	1	100%	1,43	\$ 5.000.450	4,00	\$ 20.001.800		4,00	0,0	100%	0,00%
1,2	Personal de Supervisión prorroga					A*B*C							
1,2,1	Director de Interventoria	\$ 4.500.000	1	30%		\$ 1.350.000	1,00	\$ 1.350.000	1	1	0,0	100,00%	0%
1,2,2	Profesional Area Social	\$ 2.850.000	1	50%		\$ 1.425.000	1,00	\$ 1.425.000	1	1	0,0	100,00%	0%
1,2,3	Ingeniero Ambiental o Civil	\$ 3.500.000	1	100%		\$ 3.500.000	1,00	\$ 3.500.000	1	1	0,0	100,00%	0%
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL								\$ 59.383.890					
OTROS COSTOS DIRECTOS													
2	OTROS COSTOS DIRECTOS	UNIDAD	CANT.	DED		Vr Unitario		Vr Total					
2.1	Papeleria	Und	1	100%		\$ 286.120		\$ 286.120		1,00	0,00	100%	0,00%
2.2	Transporte (4X4 Con conductor)	Mes	5	100%		\$ 7.300.000		\$ 36.500.000	1	5,00	0,00	100,00%	0,00%
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS								\$ 36.786.120					
COSTO TOTAL (1+2)								\$ 96.170.010					
							19%	\$ 18.272.302					
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA								\$ 114.442.312				100,00%	0,00%

Nota: SE PRESENTA EL PRESUPUESTO AJUSTADO CON LA REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS GENERADOS A PARTIR DE LOS COMPONENTES DEL F.M QUE NO SE UTILIZÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA Y SE EMPLEO EN LA PRORROGA DE UN MES SOLICITADO POR EL CONTRATISTA.

De acuerdo a los datos presentado por el contratista se pudo determinar el avance físico del contrato en ejecución en un 100%, teniendo en cuenta la redistribución de recursos tras la prórroga de un mes solicitada por el contratista y autorizada por el ordenador del gasto.

4.2.2 Avance en tiempo

PLAZO TOTAL + PRORROGA	PLAZO TRANSCURRIDO (días)	% DE AVANCE
Cinco (05) meses	152 días	100,00 %

4.2.4 Avance comparativo total

AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)		% DE AVANCE EN TIEMPO
	Ejecutado	Cancelado	
100%	99,96%	0,00	100,00%

El avance físico y financiero del contrato, van acorde con el tiempo de avance o ejecución del contrato con una leve diferencia, dado el valor total del contrato por la suma de \$114.492.422 y a causa de la prórroga otorgada se redujo en un 0,04%; es decir el contrato se ajustó a la suma de \$114.442.312, dicho valor se ejecutó en un 100%, con una diferencia del presupuesto inicial aprobado. Teniendo en cuenta que avanzó en el quinto mes de ejecución en 152 días.

4.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE

4.3.1 Pago contrato de interventoría N° 070 de 2024

La cláusula SEXTA del contrato de consultoría No. 070 de 2024, determinó la entrega al contratista PRIDA S.A.S, un anticipo del cincuenta (50%) del valor del contrato, es decir, la suma de **CINCUENTA Y SIETEMILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS (\$57.246.211) M/L** previo el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, además de los siguientes: a) Que se haya perfeccionado el contrato con la firma de las partes. b) Que se haya realizado por CORPOGUAJIRA correspondiente Registro presupuestal. c) Que se haya constituido por parte de EL CONTRATISTA, Garantía Única exigida, y esta se haya aprobado por parte de CORPOGUAJIRA.



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 13 de 27

d) Que se presente por parte de EL CONTRATISTA un plan de inversión del anticipo, aprobado por el supervisor, respecto del cual se puede solicitar modificaciones por requerimientos de CORPOGUAJIRA, una vez suscrita el acta de inicio. Durante el mes de julio se realizó por parte del contratista la solicitud para el trámite del anticipo, solicitud que fue atendida de forma inmediata dando traslado al área de financiera correspondiente al desembolso por el 50% del valor del anticipo desembolsado en agosto a favor del contratista con los documentos correspondiente.

Las formas de pagos quedaron establecidas en la cláusula octava del contrato de interventoría N° 070 de 2024 de la siguiente manera:

- **Pagos parciales:** Pagos parciales: Mediante actas de recibo parcial, por porcentaje de avance del contrato vigilado o intervenido aplicando al contrato de interventoría el porcentaje de las actas de avance del constructor, amortizando el anticipo recibido, el cual debe estar acorde con el cronograma del mismo; en ellas debe constar que las actividades correspondientes se ejecutaron dando cumplimiento al cronograma presentado y aprobado por el Supervisor. Durante la ejecución del contrato no se presentó cobro de acta parcial por parte del contratista.
- **Pago final:** Lo efectuará CORPOGUAJIRA por el valor del saldo restante del valor total del contrato, previa amortización del anticipo y los pagos parciales realizados, una vez se reciba la ejecución total del contrato a entera satisfacción y según recibo de acta final firmada por el CONTRATISTA y el supervisor del contrato. No obstante, la forma de pago pactada, las partes acuerdan que un 5% del valor total del contrato será retenido por Corpoguajira, sin lugar a rendimientos, actualización, indexación, ni intereses por mora, para ser girados al CONTRATISTA una vez suscrita el acta de liquidación del contrato. Para el presente informe aplica un único pago final por valor de \$ 114.442.312.

4.3.2 Control de órdenes de pago

PRIDA S.A.S. No tramitó órdenes de pago parciales durante la ejecución del contrato.

Tramite	Fecha	Valor	Supervisor	Estado

4.3.3 Tramite de anticipo

N° Cto	Objeto	Clase y N° de Cuenta	Banco	Valor anticipo	Estado
0070/24	Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera al proyecto de inversión denominado "Construcción de Estufas Ecoeficientes como medida de mitigación al cambio climático en comunidades de la zona rural de los municipios de El Molino y San Juan del Cesar - La Guajira"	Cuenta de Ahorro N° 21924723821	Bancolombia - ofic Bogotá	\$ 57.246.211,00	Tramitado, y pagado en el mes de agosto

4.3.4 Avance financiero

La interventoría a la fecha de corte del presente informe entregó documentos para adelantar acciones correspondientes al anticipo, los cuales, según información obtenida del área de tesorería, el pago se efectuó en el mes de agosto.

Es importante que se acate lo establecido en el Manual de Contratación de la Corporación Autónoma Regional de la Guajira en la resolución 1527 del 14 de junio de 2023 que modifica la resolución 1157 de 2022 en el que se manifiesta el deber por parte del contratista entregar toda la información relacionada con la inversión y buen manejo del anticipo.

El contratista reportó para el informe correspondiente al mes 03 de diciembre un avance del contrato de interventoría que corresponde al periodo comprendido entre el 01 de noviembre al 03 de diciembre de 2024, donde reportó gastos para el último mes de ejecución por un valor de \$16.154.250, y un acumulado por valor de \$ 114.442.312, donde se relacionan a los ítems del presupuesto que pertenece, de acuerdo a esta información representa un 99,96% con respecto al valor total inicial del contrato.



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 14 de 27

Contrato de Interventoría N° 070 de 2024 a fecha de corte 03 de diciembre de 2024

FLUJO DE FONDOS DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 070 DE 2024 CELEBRADO ENTRE CORPOGUAJIRA Y PRIDA S.A.S PROYECTADO CON LA PRORROGA DE UN MES

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL LOS MUNICIPIOS DEL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES								3. PROGRAMCIÓN DE ACTIVIDADES										
	DESCRIPCIÓN	CANT	DEDIC	SALARIO/ VALOR	F.M	MESES	V. UNIT	V. TOTAL	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5 PRÓRROGA		
									04 AL 31 DE JUL	%	01 AL 31 DE AGO	%	01 AL 30 DE SEP	%	01 AL 31 DE OCT	%	01 DE NOV AL 03 DIC	%	
1.	Subtotal Director de interventoría																		
	Director de Interventoría	1	50%	4.500.000	1,98	4	4.455.000	17.820.000	4.455.000	25%	4.455.000	25%	4.455.000	25%	\$ 4.455.000	25%		100%	
2.	Subtotal Residente de Interventoría																		
	Ing. Ambiental o Civil	1	100%	3.500.000	1,43	4	5.000.450	20.001.800	5.000.450	25%	5.000.450	25%	5.000.450	25%	\$ 5.000.450	25%		100%	
3.	Subtotal Profesional área social																		
	Profesional área social	1	50%	2.850.000	1,43	4	2.035.898	8.143.590	2.035.898	25%	2.035.898	25%	2.035.898	25%	\$ 2.035.898	25%		100%	
4.	Auxiliar de oficina																		
	Auxiliar de oficina	1	50%	2.500.000	1,43	4	1.785.875	7.143.500	1.785.875	25%	1.785.875	25%	1.785.875	25%	\$ 1.785.875	25%		100%	
5.	Personal de supervisión Prórroga																		
5.1	Director de Interventoría	1	30%	4.500.000		1	1.350.000	1.350.000	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		1.350.000	100%	
5.2	Profesional Área Social	1	50%	2.850.000		1	1.425.000	1.425.000	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		1.425.000	100%	
5.3	Ingeniero Ambiental o Civil	1	100%	3.500.000		1	3.500.000	3.500.000	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		3.500.000	100%	
5.	Subtotal Transporte																		
	Transporte (4x4 incluido conductor)	1	100%	7.300.000	1	5	7.300.000	36.500.000	7.300.000	20%	7.300.000	20%	7.300.000	20%	\$ 7.300.000	20%	\$ 7.300.000	100%	
5.	Subtotal Realizar Informes																		
	Papelería y edición de informes	1	100%	286.120	1	1	286.120.000	286.120	286.120	100%	-	0%	-	0%	\$ -	0%		100%	
	TOTAL COSTOS DIRECTOS								96.170.010	20.863.343		20.577.223		20.577.223		\$ 20.577.223		13.575.000	
	IVA									18.272.302	3.964.035		3.909.672		3.909.672		\$ 2.579.250		
	TOTAL CONTRATO								114.442.312	24.827.378	21,7%	24.486.895	21,4%	24.486.895	21,4%	\$ 24.486.895	21,4%	\$ 16.154.250	
						TOTAL ACUMULADO			24.827.378	21,7%	49.314.272	43,1%	73.801.167	64,5%	\$ 98.288.062	85,9%	\$ 114.442.312	99,96%	

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE CUADRO RESULTA DE LA PROYECCIÓN AJUSTADA EN RELACIÓN AL FACTOR MULTIPLICADOR, REPORTADA POR EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LOS CUALES VAN ACORDE AL PLAN DEL ANTICIPO DONDE NO SE INCLUYÓ EL IVA

De la información presentada por el contratista se percibe la redistribución de recursos del presupuesto de aquellos componentes del FM que no fueron empleados por el contratista, pero que fue reinvertido para ampliar por un mes más la ejecución del contrato de interventoría.

4.3.4.1 Seguimiento y control del anticipo al contrato de interventoría N° 070 de 2024

De acuerdo al cuadro anterior se pudo verificar que los gastos correspondientes hasta el mes de agosto se encuentran dentro de lo estimado en el plan de inversión del anticipo presentado previamente por el contratista sin incluir el IVA, sin sobrepasar dichos valores. (Ver Plan de inversión del anticipo)

La información reportada en este cuadro se obtuvo de la propuesta económica presentada por el contratista durante el proceso de contratación del contrato No 0070 de 2024 para el periodo correspondiente al 03 de diciembre de 2024.

CONTROL FINANCIERO			
CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR TOTAL PAGADO
Inversión Contratada	\$ 114.492.422,00		
Anticipo del 50%	\$ 57.246.211,00		\$ 57.246.211
Acta Parcial 1			\$ 0.00
Total, Pagado			\$ 0.00

Lo anterior indica que solo se hizo efectivo una cuenta por concepto de anticipo al contratista, dado que cumplió con los trámites correspondientes con todos los documentos entregado por el contratista y para el mes a 03 de diciembre no se reportó el cobro de acta parcial por parte del contratista.

4.3.4.2 Balance del Contrato de Interventoría N°. 070 de 2024

Dentro del seguimiento financiero se tiene en cuenta el presupuesto inicial y como avanzan los gastos presupuestales con relación al anticipo y las respectivas actas parciales de entrega. El resumen del Balance hasta la fecha, es el siguiente:



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 15 de 27

Balance del Contrato de Interventoría N°. 070 DE 2023

VALOR CONTRATO	\$ 114.492.422,00	
VALOR ANTICIPO		\$ 57.246.211,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$ -
VALOR PRESENTE PAGO		\$ 114.442.312,00
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO		\$ 57.246.211,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$ 57.196.101,00
SALDO DEL CONTRATO, POR EJECUTAR		\$ 50.110,00
SUMAS IGUALES	\$ 114.492.422,00	\$ 114.492.422,00

A la fecha de corte del presente informe PRIDA S.A.S, reporta movimiento financiero por valor de \$ 114.442.312; el cual corresponde a los gastos ajustados al valor de la prórroga presentada por el contratista a corte 03 de diciembre de 2024; sin embargo, como se evidencia en el cuadro anterior se autorizó el anticipo para el mes de agosto, dado el cumplimiento de los documentos que permitió adelantar dichos trámites.

4.4 COMPONENTE JURÍDICO:

El designado supervisor realizó las siguientes actividades en el seguimiento jurídico:

- Revisión del cumplimiento de las pólizas tanto en la cuantía como en la vigencia.

4.4.1 Pólizas de garantías

Las pólizas de garantías fueron expedidas el día 14 de junio de 2024 y fueron aprobadas, así:

Las pólizas de garantías se encuentran actualizadas después de la firma del contrato, aprobadas por parte de la CORPORACIÓN, sin embargo, se hace la claridad que estas fueron actualizada además de acuerdo a la fecha de inicio del contrato.

CONTROL PÓLIZAS DE ACUERDO AL CONTRATO

PÓLIZA	No.	COMPAÑÍA	FECHA EXPEDICIÓN	VALOR ASEGURADO TOTAL	
	47-44-101027654	SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT.: 860.009.578-6	14/06/2024	\$ 108.767.800,90	
AMPAROS	CUMPLIMIENTO	ANTICIPO	SALARIOS	CALIDAD	RESPONSABILIDAD CIVIL N° 47-40- 101008525
VALOR ASEGURADO	\$ 22.898.484,40	\$ 57.246.211,00	\$ 5.724.621,10	\$ 22.898.484,40	\$ 260.000.000,0
VIGENCIA DESDE	7/06/2024	7/06/2024	7/06/2024	7/10/2024	7/06/2024
VIGENCIA HASTA	7/10/2025	7/10/2025	7/10/2027	7/10/2029	7/10/2024

CONTROL PÓLIZAS DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO

PÓLIZA	No.	COMPAÑÍA	FECHA EXPEDICIÓN	VALOR ASEGURADO TOTAL	
	47-44-101027654	SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT.: 860.009.578-6	10/07/2024	\$ 108.767.800,90	
AMPAROS	CUMPLIMIENTO	ANTICIPO	SALARIOS	CALIDAD	RESPONSABILIDAD CIVIL N° 47-40- 101008525
VALOR ASEGURADO	\$ 22.898.484,40	\$ 57.246.211,00	\$ 5.724.621,10	\$ 22.898.484,40	\$ 260.000.000,0
VIGENCIA DESDE	4/07/2024	4/07/2024	4/07/2024	3/11/2024	4/07/2024
VIGENCIA HASTA	3/11/2025	3/11/2025	3/11/2027	3/11/2029	3/11/2024

CONTROL PÓLIZAS DE ACUERDO A LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (PRÓRROGA N° 01)

PÓLIZA	No.	COMPAÑÍA	FECHA EXPEDICIÓN	VALOR ASEGURADO TOTAL	
	47-44-101027654	SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT.: 860.009.578-6	4/12/2024	\$ 108.720.196,4	
AMPAROS	CUMPLIMIENTO	ANTICIPO	SALARIOS	CALIDAD	RESPONSABILIDAD CIVIL N° 47-40- 101008525
VALOR ASEGURADO	\$ 22.888.462,40	\$ 57.221.156,00	\$ 5.722.115,60	\$ 22.888.462,40	\$ 260.000.000,0
VIGENCIA DESDE	4/07/2024	4/07/2024	4/07/2024	3/11/2024	4/07/2024
VIGENCIA HASTA	3/12/2025	3/12/2025	3/12/2027	3/11/2029	3/12/2024



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 16 de 27

5. ACTIVIDADES REPORTADAS POR LA INTERVENTORÍA QUE FUERON EJECUTADAS EN EL CONTRATO DE OBRA N° 050 DE 2024, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 04 DE JULIO AL 03 DE DICIEMBRE DE 2024

5.1 COMPONENTES BÁSICO DEL PROYECTO

De acuerdo a las condiciones pactadas en el contrato de referencia, los alcances del contrato a cargo de Fundación Agua Luna, se realiza la intervención y vigilancia del siguiente contrato:

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	N°. 0050 DE 2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010.
CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	
VALOR INICIAL CONTRATO	\$1.144.763.400
VALOR ADICIONAL	NINGUNO
VALOR TOTAL	MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L (\$ 1.144.763.400,00)
PLAZO EJECUCIÓN INICIAL	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	CUATRO (04) DE JULIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	TRES (03) DE NOVIEMBRE DE 2024
ESTADO	INICIADO Y EN EJECUCIÓN
CONTRATISTA	FUNDACIÓN AGUA LUNA (GERALD BRISSON MENDOZA) R.L
SUPERVISOR ASIGNADO	LUIS HOYOS CASTROS
INTERVENTOR	PROYESTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL, PRIDA S.A.S – JUAN CARLOS AMAYA BAUTISTA (REP L)
FECHA PRESENTE INFORME	01 al 03 de noviembre de 2024; fecha del informe: 05/12/2024

El Proyecto “CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010” tiene como objetivos específicos Mejorar las prácticas en el uso de leña para cocción de alimentos, con la construcción de 300 estufas ecoeficientes y Desarrollar procesos de educación informal ambiental en la comunidad.

El proyecto está dirigido a la construcción de 300 estufas ecoeficientes en los municipios de El Molino y San Juan del Cesar, en el cual se ejecutarán las siguientes actividades:

5.1.1 AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO N° 0050 DE 2024

OBJETIVO ESPECÍFICO	Indicador de producto	Actividades del contrato	Unidad medida	Meta proyectada	Avance Meta
Objetivo específico 1: Mejorar las prácticas en el uso de leña para cocción de alimentos.	320601500 Estufas ecoeficientes construidas	Actividades preliminares donde se verificará el sitio donde se va a construir la estufa Localización y replanteo.	m2	225	225
		Construir estufas ecoeficientes con ladrillo normal, ladrillo refractario, mortero y partes metálicas y georreferenciadas.	Und	300	300
Objetivo Especifico 2: Desarrollar procesos de educación informal ambiental en la comunidad.	320600400 Personas capacitadas en GCC	Realizar 3 talleres de socialización del proyecto y auditoria visible.	Num	3	3
		Realizar 5 talleres de capacitación para la operación y mantenimiento de la estufa ecoeficiente.	Num	5	5
		Realizar la divulgación del proyecto	Und	1	1



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 17 de 27

5.3 ASPECTOS TÉCNICOS CONTRATO N° 050/2024

5.3.1 Programación y Avance Físico del Contrato de Obra Pública No. 050/2024

A continuación, se hace una breve descripción sobre los sucesos que actuaron en el plazo de ejecución del Contrato de Obra a la presente fecha:

- ✓ Se suscribe Acta de inicio el día 04 de julio de 2024, se da inicio a la ejecución de las actividades, con actividades preliminares de verificación de los beneficiarios y los sitios, para reconocimiento del estado actual y la disposición del espacio para el depósito de materiales y ubicación de las estufas ecoeficientes.
- ✓ En el siguiente cuadro se observa la programación vs la ejecución vs lo que falta por ejecutar del contrato N° 050 de 2024.

Programación vs ejecución vs por ejecutar en el contrato de obra N° 050 de 2024

ACTIVIDAD	UND	CANT	Prog/Eje/Por ejecución	Cronograma de ejecución				
				Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
1. Mejorar las prácticas en el uso de leña para cocción de alimentos.			Programado (P)					
			Ejecutado(E)					
			Por ejecutar (PE)					
Actividades preliminares donde se verificará el sitio donde se va a construir la estufa Localización y replanteo.	Und	300	P	125	100			
			E	130	50	33,75	11,25	
			PE	-5	45	11,25	0,0	
Construir estufas ecoeficientes con ladrillo normal, ladrillo refractario, mortero y partes metálicas y georreferenciadas.	Und	300	P		80	100	100	20
			E		102	56	132	10
			PE		-22	22	-10	0
2. Desarrollar procesos de educación informal ambiental en la comunidad.			Programado (P)					
			Ejecutado(E)					
			Por ejecutar (PE)					
Realizar 3 talleres de socialización del proyecto y auditoria visible.	NUM	3	P		1		1	1
			E	1	2		0	0
			PE	-1	-2		-1	0
Realizar 5 talleres de capacitación para la operación y mantenimiento de la estufa ecoeficiente.	NUM	5	P				5	
			E			1	3	1
			PE			-1	1	0
Realizar la divulgación del proyecto.	UND	1	P		1			
			E		1		0	
			PE		0		0,00	

5.3.2 Actividades desarrolladas en el contrato N° 050/24

En el periodo comprendido del presente informe el contrato de obra hasta la fecha se continua con el proceso de verificación de beneficiarios y se logró realizar avance acumulado en la construcción de 300 estufas ecoeficientes, de igual manera, se avanza en la entrega de los materiales a los diferentes predios con el fin de adelantar los procesos constructivo gradualmente con el avance de las cuadrillas destinadas a realizar el montaje de las estufas ecoeficientes, así mismo, el contratista avanzó para los meses de julio y agosto en los talleres de socialización del proyecto a la comunidad, evento desarrollado en el municipio de El Molino, de igual manera para octubre y noviembre se realizaron 5 talleres de capacitación 2 en San Juan del Cesar y 3 en el municipio de El Molino. Ver anexo. Acta de entrega de estufas ecoeficientes.



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 18 de 27

5.4 ASPECTOS FINANCIERO CONTRATO N° 050/2024

5.4.1 Anticipo y pagos realizados Contrato de Obra Pública No. 0050 de 2.024

De conformidad a la Cláusula sexta del contrato:- Se debe entregar al contratista un anticipo correspondiente al 50% del valor total del contrato equivalente a la suma de QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 572,381,699,85). El Manejo del anticipo, se viene realizando de acuerdo con lo estipulado en el contrato. EL CONTRATISTA, presentó la Garantía Única de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual, el Plan de Inversión del Anticipo y La certificación de apertura de una Cuenta Especial, identificada con el Número del Contrato y el Objeto contractual. Para el mes de julio el contratista de obra realizó la gestión del anticipo los cuales será amortizado en las actas de pago en la misma proporción del valor entregado en calidad de anticipo. A la fecha del presente informe se hizo afectivo el desembolso.

En el informe de interventoría NO se muestra el contrato de Fiducia, por medio del cual se realiza el manejo del anticipo; sin embargo, para este periodo se realizó el trámite del anticipo surtiendo su trámite de pago durante el mes de julio.

5.4.2 Avance en el período

DATOS DEL CONTRATO: CONTRATO N° 050 DE 2024:	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR LA GUAJIRA".									
	ACTIVIDAD	UND	CANT	Valor Unitario	Valor	Ejecución del Mes		Ejecución Acumulada		% de Ejecución
						Cant	Valor	Cant	Valor	
1. Mejorar las prácticas en el uso de leña para cocción de alimentos.										
Actividades preliminares donde se verificará el sitio donde se va a construir la estufa Localización y replanteo.	Und	225	\$ 5.420	\$ 1.219.500	0,00	\$ -	225,00	\$ 1.219.500	100,00	
Construir estufas ecoeficientes con ladrillo normal, ladrillo refractario, mortero y partes metálicas y georreferenciadas.	Und	300	\$ 2.836.810	\$ 851.042.994	10,00	\$ 28.368.100	300,00	\$ 851.042.994	100,00	
SUBTOTAL COSTOS DIRECTO 1				\$ 852.262.494		\$ 28.368.100		\$ 852.262.494		
2. Desarrollar procesos de educación informal ambiental en la comunidad.										
Realizar talleres de socialización.	NUM	3	\$ 1.263.685	\$ 3.791.055		\$ -	3,00	\$ 3.791.055	100,00	
Realizar talleres de sensibilización ambiental	NUM	5	\$ 1.521.061	\$ 7.605.305	1,00	\$ 1.521.061	5,00	\$ 7.605.305	100,00	
Realizar la divulgación del proyecto.	Und	1	\$ 10.540.000	\$ 10.540.000		\$ -	1,00	\$ 10.540.000	100,00	
SUBTOTAL COSTOS DIRECTO 2				\$ 21.936.360		\$ 1.521.061		\$ 21.936.360		
SUBTOTAL				\$ 874.198.854		\$ 29.889.161		\$ 874.198.854		
Administración			24%	209.807.725		\$ 7.173.399		\$ 209.807.725		
Imprevistos			1%	8.741.989		\$ 298.892		\$ 8.741.988,54		
Utilidad			5%	43.709.943		\$ 1.494.458		\$ 43.709.943		
IVA Sobre Utilidad			19%	8.304.889		\$ 283.947		\$ 8.304.889		
TOTAL 1				1.144.763.400		\$ 39.139.856		\$ 1.144.763.400	100,00%	

Fuente: La interventoría en su informe de avance reportó movimientos financieros del contrato de obra por valor de \$874.198.854, los cuales no incluyen los gastos correspondientes a IVA y AIU

5.4.3 Estado Financiero N°. 0050/24

ESTADO FINANCIERO A FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2024				AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES		CONDICIONES ACTUALIZADA			
VALOR CONTRATO	1.144.763.400	\$ 1.144.763.400	100,00%	Inversión contratada:	1.144.763.400
PLAZO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	CUATRO (04) MESES	CUATRO (04) MESES	100%	Inversión total ejecutada:	\$ 1.144.763.400
				Porcentaje total ejecutado:	100,00%

Fuente: Interventoría



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 19 de 27

5.4.4 Resumen financiero contrato de obra N°. 050/24

A la fecha de corte del 03 de noviembre de 2024 el avance financiero de acuerdo a lo reportado por la interventoría es del 100,00% de las obras Contratadas y Programadas.

INVERSIÓN INICIAL CONTRATADA	\$ 1.144.763.400
ANTICIPO ENTREGADO (50%)	\$ 572.381.699,85
INVERSIÓN EJECUTADA EN EL PERIODO	\$ 39.139.856,08
PORCENTAJE EJECUTADO EN EL PERIODO	3,42%
INVERSIÓN TOTAL EJECUTADA	\$ 1.144.763.399,71
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	100,00%
PORCENTAJE TOTAL FACTURADO	37,64%
INVERSIÓN TOTAL FACTURADA	\$ 430.936.593,06
INVERSIÓN TOTAL POR FACTURAR	\$ 713.826.807
PORCENTAJE TOTAL POR FACTURAR	62,36%

Fuente: Interventoría

De acuerdo al informe presentado por la interventoría en el cuadro de avance financiero se muestran un progreso de 100,000% del total de la inversión contratada, es decir, los gastos ascienden a \$ 1.144.763.400,00 frente a un total contratado de \$ 1.144.763.400,00.

5.4.5 Seguimiento financiero a la ejecución del contrato de obra N°. 0050/24

A la fecha de corte del 03 de noviembre de 2024 el siguiente cuadro muestra los valores invertidos en la ejecución de las obras Contratadas y Programadas

DESCRIPCIÓN	VALOR DEL CONTRATO					ANTICIPO		
	VR INICIAL	VR EJECUTADO	VR X EJECUTAR	% X EJECUTAR	% EJECUTADO	VR AMORTIZADO	VR X AMORTIZAR	% AMORTIZADO
CONTRATO INICIAL N° 050 DE 2024								
VR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 1.144.763.400							
VR TOTAL CONTRATO	\$ 1.144.763.400							
ANTICIPO	\$ 572.381.700							
VR ANTICIPO CONTRATO INICIAL 0050 DE 2024	\$ 572.381.700							
VR TOTAL ANTICIPO	\$ 572.381.700							
VR RECIBO PARCIALES SEGÚN ACTAS		\$ 430.936.593	0			\$ 215.468.297	\$ 356.913.403	37,64%
CORTE OBRA A 03 DE NOVIEMBRE DE 2024		\$ 1.144.763.400	\$ 0,00	0,00%	100,00%			
VALORES TOTALES RECIBIDOS								
VALORES TOTALES POR RECIBIR		\$ 1.575.699.993	\$ 0,00	0,00%	100,00%	\$ 215.468.296,53	\$ 356.913.403,32	37,64%

5.4.6 Avance tiempo

Avance en tiempo

PLAZO TOTAL (meses)	PLAZO TRANSCURRIDO (días)	% AVANCE
CUATRO (04)	120	100 %

Fuente: Interventoría

Hasta la fecha de entrega del presente informe el proyecto ha tenido un avance en el tiempo del 100,00 % en un total de Ciento veinte (120) días transcurridos desde el inicio del proyecto.



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 20 de 27

6. OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA

En el informe de Final presentado por la interventoría se presentan las observaciones, recomendaciones y conclusiones presentadas por la interventoría al contrato de obra N° 050 de 2024. (Ver Informe Final de interventoría).

EVALUACIÓN O REEVALUACIÓN AL PROVEEDOR:

CERTIFICACIÓN.

Como supervisor del Contrato N° 070 de 2024 Certifico que, evaluado el desempeño del contratista o proveedor para el periodo comprendido desde el 01 de noviembre al 03 de diciembre de 2024, obtuvo los puntajes que se detallan a continuación:

Nombre del Proveedor: PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL, PRIDA S.A.S			
Contrato de interventoría: 070 DE 2024			
Fecha de Seguimiento: Febrero de 2025			
CRITERIOS NECESARIOS	PORCENTAJE		CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL PERIODO
Cumplimiento del objeto del contrato	30%		30%
Calidad del producto/servicio (especificaciones/obligaciones)	30%		30%
Cumplimiento en tiempo de entrega del bien, obra o para la prestación del servicio	25%		18%
Personal idóneo	10%		10%
Valor Agregado	3%		
Atención a reclamaciones o sugerencias y/o sugerencias	2%		2%
Proveedor cumple con criterios:	SI X	NO	
SUMATORIA CALIFICACIÓN:			90%

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo, a la información contenida en el informe final de la interventoría, el cual fue analizada sobre el desarrollo de las actividades del contrato y el papel de la interventoría a nombre de PRIDA S.A.S, se tiene las siguientes conclusiones:

- Se mantuvo registros de visita durante el desarrollo de las actividades el cual presentaron las eventualidades y circunstancia exhibidas con las acciones dirigidas a su pronta solución, las cuales fueron refrendadas por las partes intervinientes (LIBRO DE BITÁCORA).
- La interventoría verificó según informe presentado, la instalación de la valla de publicitaria la cual cumple con las especificaciones técnicas y aprobación por parte del área de comunicaciones de la Corporación, donde se refleje la información del proyecto en ejecución, instalado en un sitio visible del municipio de El Molino.
- Teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y según la interventoría, el contratista de la obra realizó su intervención en los sitios señalados con las actividades contratadas: georreferenciación para la localización puntual del sitio, constatando a los beneficiarios y realizando la construcción de las estufas ecoeficientes en los sitios señalados.
- No existe evidencia o acta de creación del comité de veeduría ciudadana, establecido por la comunidad para vigilancia del contrato N° 050 de 2024.
- El contratista presentó, el plan de trabajo y metodología de ejecución de las actividades de la interventoría, con el respectivo cronograma de actividades ajustados al cronograma del contrato de obra.



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 21 de 27

- A la fecha de presentación del presente informe, se corroboró que el contratista mantuviera vinculado al personal que intervino en la ejecución de las actividades contratadas (Director de interventoría, Residente de interventoría, personal social, auxiliar de oficina etc.). De igual manera, el contratista de obra mantuvo el personal correspondiente, de acuerdo a sus perfiles y dedicación.
- Los informes de interventoría fueron ajustados de acuerdo a las recomendaciones impartidas, los cuales están soportados por sus respectivas evidencias, como son anexos fotográficos, registros de asistencias a los talleres realizados por el contratista de obra, planillas de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, intercambio de correspondencias, registros de visitas y todas aquellas que correspondan de acuerdo al periodo evaluado.

La firma consultora PRIDA S.A.S presentó el informe final, a través del correo electrónico el día 15 de diciembre de 2024, el cual de acuerdo a la información reportada se corroboró el desarrollo de las actividades realizadas por la interventoría en este periodo, donde se realizó revisión y se presentaron sugerencias por parte de la supervisión que fueron tenidas en cuenta por parte del contratista, y a la fecha del 31 de enero de 2025 presentaron informe final con los ajustes.

La interventoría presentó evidencias con el informe final, como fueron los siguientes anexos: Registro fotográfico, Acta de visita para la entrega de materiales, actas de visitas de estufas construidas, Actas de visitas de estufas georreferenciadas, Planillas de aportes a la seguridad social del PRIDA S.A.S, Intercambio de correspondencia, seguimiento al gasto semanal realizado por el contrato de obra y las evidencias que permitieron evaluar el cumplimiento del alcance del contrato para el mes de noviembre y los 3 días del mes de diciembre.

En relación con la documentación proporcionada por la firma Consultora PRIDA S.A.S. para el período comprendido entre el 4 de julio y el 3 de diciembre de 2024, se verificó el cumplimiento de los pagos correspondientes a seguridad social, riesgos profesionales y pensión. Sin embargo, se evidenció que, en el caso de tres integrantes del equipo de trabajo, no se registraron aportes parafiscales. Asimismo, no se presentó el desglose detallado de algunos componentes del factor multiplicador. Adicionalmente, a raíz de la solicitud de prórroga de la interventoría, se aprobó una modificación del contrato de interventoría.

En este contexto, también se requirió el ajuste de las planillas de aporte al sistema de seguridad social del profesional ambiental, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones asociadas al desarrollo de las actividades del contrato.

Hasta la fecha de ejecución del informe final, se reporta un acumulado en avance físico de 100% en avance financiero del 99,96% del presupuesto inicial, el 100% del presupuesto final y en avance en tiempo del **100** %. Este avance financiero se debe a la redistribución realizada al presupuesto teniendo en cuenta que el contratista no empleó algunos componentes relacionados con el uso del F.M y así mismos, se realizó prórroga por un mes para realizar las actividades de supervisión a las estufas construidas, al cual se le asignaron recursos del FM, lo que afectó los movimientos financieros que se mostraban en los primeros meses de ejecución dado que no se logró demostrar con evidencias el uso del factor multiplicador de 3 miembros de su equipo de trabajo por parte del contratista y como resultado de los ajustes realizados al contrato se reflejó una diferencia de 0,04% entre el presupuesto inicial y el presupuesto final ajustado del contrato, es decir unos \$50.110 pesos.

CERTIFICACIÓN:

Dado el análisis a la ejecución del contrato N° 070 de 2024 a través del informe final en el período evaluado, comprendido entre el 01 de noviembre al 03 de diciembre de 2024, en mi condición de supervisor del contrato de interventoría, certifico que a la fecha el contratista cumple con las actividades propias del contrato y que éstas avanzaron de acuerdo al tiempo transcurrido; Sin embargo, se presentó demoras en la entrega del informe final que fue solucionado y la firma consultora proporcionó la documentación completa que dan cuenta de estar al día en los pagos por concepto de seguridad social, riesgos profesionales y pensión; sin contar con los componentes del FM que se redistribuyeron al contrato para el desarrollo de las actividades propias del contrato.

JEFERSON JOSÉ BRACHO CARVAJAL

Supervisor del contrato de interventoría 070 del 2024

Se anexan: Registro fotográfico, acta de inicio contrato, Plan de Inversión Contrato 070 de 2024, Informe técnico de verificación de usuarios que no cumplen, actas de comités de obra N°01, N°02, N°03 y N° 04, documento modificadorio del contrato N° 070 de 2024, Intercambio de Correspondencia enviadas y recibidas, acta de terminación contrato N° 070 de 2024, Seguimiento aportes de seguridad social contrato N° 070 de 2024, Acta de entrega de estufas.

	INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR	Código: R GJP01-8
		Versión: 3
		Vigencia: 11/04/2016
		Página 22 de 27

Anexos

- Registros Fotográficos
- Acta de inicio contrato N° 070 de 2024
- Plan de inversión del anticipo contrato N° 070 de 2024
- Informe técnico de verificación de usuarios que no cumplen
- Actas de comités de obra N° 01, N°02, N°03 y N°04
- Documento modificadorio contrato N° 070 de 2024.
- Intercambio de Correspondencia.
- Acta de terminación del contrato de interventoría N° 070 de 2024.
- Seguimiento aportes de seguridad social contrato N° 070 de 2024
- Actas de entrega de estufas ecoeficientes



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 23 de 27

Registro fotográfico

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 01. Reunión de comité de obra N° 01 de 2024, Contrato de obra e interventoría N° 050 y 070 de 2024, mes de agosto



Foto 02. En esta reunión participaron Personal de la interventoría, contratista de obra y los supervisores de ambos contratos, mes de agosto.



Foto 03. En la reunión programada se trataron temas de interés e inconvenientes presentados durante la ejecución del contrato de obra de 2024, mes de agosto.



Foto 04. En esta reunión Personal de la interventoría, contratista de obra y los supervisores de ambos contratos, mes de agosto.



Foto 05. Seguimiento a los materiales de construcción (baldosas tablones) de las estufas ecoeficientes en bodegas del contratista Agua Luna.



Foto 06. Seguimiento a los materiales de construcción (Ladrillo) de las estufas ecoeficientes en bodegas del contratista Agua Luna.



Foto 07. Seguimiento a los materiales de construcción (Parrilla interna) de las estufas ecoeficientes en bodegas del contratista Agua Luna.



Foto 08. Seguimiento a los materiales de construcción (Hornos) de las estufas ecoeficientes en bodegas del contratista Agua Luna.



Foto 09. Seguimiento a los materiales de construcción (Marcos externos y tubos chimenea) de las estufas ecoeficientes en bodegas del contratista Agua Luna.



Foto 10. Seguimiento a los materiales de construcción (planchas) de las estufas ecoeficientes en bodegas del contratista Agua Luna.



Foto 11. Seguimiento a la construcción de estufas ecoeficientes terminadas en el sector de El Molino.



Foto 12. Seguimiento a la construcción de estufas ecoeficientes terminadas en el sector de El Molino.



Foto 13 Seguimiento a la construcción de estufas ecoeficientes terminadas en el sector de San Juan del Cesar.



Foto 14. Seguimiento a la construcción de estufas ecoeficientes terminadas en el sector de El Molino.



Foto 15. Seguimiento a la construcción de estufas ecoeficientes terminadas en el sector de San Juan del Cesar.



Foto 16. Seguimiento a la construcción de estufas ecoeficientes terminadas en el sector de El Molino.



Foto 17. Seguimiento a la construcción de estufas ecoeficientes terminadas en el sector de El Molino.



Foto 18. Seguimiento a la construcción de estufas ecoeficientes terminadas en el sector de El Molino.



Foto 19. Seguimiento a la construcción de estufas ecoeficientes terminadas en el sector de El Molino.



Foto 20. Seguimiento a la construcción de estufas ecoeficiente terminadas en el sector de El Molino.



Foto 21. Seguimiento a la construcción de estufas ecoeficientes terminadas en el sector de El Molino.



Foto 22. Seguimiento a la construcción de estufas ecoeficiente terminadas en el sector de El Molino.



Foto 23. Seguimiento a la construcción de estufas ecoeficientes terminadas en el sector de San Juan del Cesar de propiedad de Alberto Calderón.



Foto 24. Seguimiento a la construcción de estufas ecoeficientes en el sector de San Juan del Cesar de propiedad de Alonso Mendoza.



Foto 25. Seguimiento a la construcción de estufas ecoeficientes terminadas en el sector de San Juan del Cesar de propiedad de Álvaro Petit.



Foto 26. Seguimiento a la construcción de estufas ecoeficiente terminadas en el sector de El Molino de propiedad de Carlos Eduardo Fernández.



Foto 27. Seguimiento a la construcción de estufas ecoeficientes terminadas en el sector de El Molino de propiedad de Carlos Mario Guerra.



Foto 28. Seguimiento a la construcción de estufas ecoeficiente terminadas en el sector de El Molino de propiedad de Delio Blanchar.



Foto 29. Seguimiento a la construcción de estufas ecoeficientes terminadas en el sector de El Molino de propiedad de Clara Joiro.



Foto 30. Seguimiento a la construcción de estufas ecoeficientes terminadas en el sector de El Molino de propiedad de Fredy Petit.



Foto 31. Seguimiento a la construcción de estufas ecoeficientes terminadas en el sector de El Molino de propiedad de Erica Pérez.



Foto 32. Seguimiento a la construcción de estufas ecoeficientes terminadas en el sector de El Molino de propiedad de Yaneth Celedón.



Foto 33. Seguimiento a la construcción de estufas ecoeficientes terminadas en el sector de El Molino de propiedad de Dilson Merino.



Foto 34. Seguimiento a la construcción de estufas ecoeficientes terminadas en el sector de El Molino de propiedad de José Julián Bula.



Foto 35. Seguimiento a la construcción de estufas ecoeficientes terminadas en el sector de San Juan Del Cesar de propiedad de Elirio Baracaldo.



Foto 36. Seguimiento a la construcción de estufas ecoeficientes terminadas en el sector de El Molino de propiedad de Annes López.



Foto 37. Seguimiento a la construcción de estufas ecoeficientes terminadas en el sector de El Molino de propiedad de Amira Garzón.



Foto 38. Seguimiento a la construcción de estufas ecoeficientes terminadas en el sector de San Juan Del Cesar de propiedad de Felipe Amaya.



Foto 39. Seguimiento a la construcción de estufas ecoeficientes terminadas en Vereda el Bejuco de propiedad de Iván Darío Olivero.



Foto 40. Seguimiento a la construcción de estufas ecoeficiente terminadas en el sector de El Molino de propiedad de Jesualdo Marín Puche.

	INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR	Código: R GJP01-8
		Versión: 3
		Vigencia: 11/04/2016
		Página 1 de 15

Acta de inicio contrato N°070 de 2024

	ACTA DE INICIO DE CONTRATO	Código: R GJP01- 3
		Versión: 5
		Vigencia: 21/07/2023
		Página 1 de 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA: NÚMERO 070 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA". BPIN 20233218000010

CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA – CORPOGAJIRA

CONTRATISTA: PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL SAS
NIT: 900026388-1

SUPERVISOR: JEFERSON JOSÉ BRACHO CARVAJAL

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VENTIDOS PESOS M/CTE (\$114.492.422.00)

PLAZO DE EJECUCIÓN: CUATRO (04) MESES

FECHA DE INICIACIÓN: 04 DE JULIO DE 2024

FECHA DE TERMINACIÓN 03 DE NOVIEMBRE DE 2024

En Riohacha La Guajira, el día cuatro (04) del mes de julio de 2024, se reunieron el Señor **JUAN CARLOS AMAYA BAUTISTA**, en su calidad de Contratista y **JEFERSON JOSÉ BRACHO CARVAJAL**, en su calidad de funcionario de CORPOGUAJIRA y Supervisor(a) designado(a) por el Director general de la entidad, mediante designación de fecha 03 del mes junio de 2024, para suscribir la presente Acta de Inicio y dejar constancia de los siguientes hechos:

1. Que, el día once (11) de octubre de 2023, se suscribió Contrato de Interventoría No. 0070 de 2024, entre la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA – CORPOGAJIRA** y **PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL SAS**, en calidad de Contratista.
2. Que, de conformidad con la cláusula novena del Contrato, denominada GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO, la entidad, consideró necesaria la exigencia de una Póliza de cumplimiento en aras de asegurar el buen ejercicio de las actividades a cargo del Contratista, y en virtud de ello el Contratista aportó la Póliza de Cumplimiento a favor de Entidades Estatales expedida por SEGUROS DEL ESTADO, que se detalla a continuación:

	ACTA DE INICIO DE CONTRATO	Código: R GJP01- 3
		Versión: 5
		Vigencia: 21/07/2023
		Página 2 de 3

No. de Póliza	Amparo	Fecha de expedición	Valor Asegurado	Vigencia
47-44-101027654	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/06/2024	\$22.898.484,40	11/06/2024 - 11/10/2025
47-44-101027654	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	18/06/2024	\$57.246.211,00	11/06/2024 - 11/10/2025
47-44-101027654	SALARIOS Y PRESTACIONES	18/06/2024	\$5.724.621,10	11/06/2024 - 11/10/2027
47-44-101027654	CALIDAD DEL SERVICIO	18/06/2024	\$22.898.484,40	11/10/2024 - 11/10/2029
47-40-101008525	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	18/06/2024	\$260.000.000,00	11/06/2024 - 11/10/2024

NOTA: Conforme al tipo de contrato, relacionar todos los amparos exigidos en el mismo.

La correspondiente póliza fue aprobada en la plataforma SECOP II el día 20 de junio de 2024.

3. Que, el Soporte Financiero para la ejecución del Contrato se encuentra amparado bajo la siguiente información:

Entidad	Concepto	Fecha	Valor
CORPOGUAJIRA	Número de CDP 524	2024/06/18	114.492.422,00
	Número de RP 1284	2024/06/13	114.492.422,00

4. Que el Contratista acreditó afiliación al Sistema Integral de Seguridad Social HABILITADO, así:

Descripción	Nombre de la entidad	Acreditación
E.P.S.	N/A	Certificaciones
PENSIÓN	N/A	
ARL	N/A	

5. Que de conformidad con la designación de Supervisor del Contrato No. 0070 de 2024, la Vigilancia en el Cumplimiento y Ejecución del Objeto del Presente Contrato, se ejercerá a través del (la) Área de Gestión Ambiental, grupo de Ecosistema y Biodiversidad.


Por lo anteriormente expuesto las partes

	ACTA DE INICIO DE CONTRATO	Código: R GJP01- 3
		Versión: 5
		Vigencia: 21/07/2023
		Página 3 de 3

ACUERDAN

- I. Fijar como fecha de inicio de la ejecución del Contrato de Interventoría No. 0070 de 2024, el día cuatro (04) de julio de 2024.
- II. Fijar como fecha de terminación del Contrato de Interventoría No. 0070 de 2023, hasta el día tres (03) de noviembre de 2024.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Riohacha, el día primero el día cuatro (04) de julio de 2024, por las personas que en ella intervinieron:


JEFERSON JOSÉ BRACHO CARVAJAL
 Supervisor(a)


JUAN CARLOS AMAYA BAUTISTA
 Rep. Legal PRIDA Contratista


	INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR	Código: R GJP01-8
		Versión: 3
		Vigencia: 11/04/2016
		Página 2 de 15


Plan de inversión del anticipo contrato N° 070 de 2024



**PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO
CONTRATO 070 DE 2024**

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	TOTAL
ITEM					
SALARIOS	\$ 8.425.000	\$ 8.425.000	\$ 8.425.000		
OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL	\$ 4.644.702	\$ 4.644.702	\$ 858.211		
TRANSPORTE	\$ 7.300.000	\$ 7.300.000			
GASTOS DE OFICINA Y VARIOS	\$ 3.611.798	\$ 3.611.798			
Total Mensual	\$ 23.981.500	\$ 23.981.500	\$ 9.283.211	\$ 0	\$ 57.246.211


 Juan Carlos Amaya Bautista
 C.C 79,555,163
 Representante Legal Prida Sas.


 Jeferson J. Bracho C.
 Supervisor contrato 070 del 2024



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 1 de 15

Informe técnico de verificación de usuarios que no cumplen

INFORME TÉCNICO DE VERIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL PROYECTO

ASUNTO: Informe técnico de verificación de beneficiarios que no cumplen con los requerimientos mínimos del proyecto

CONTRATO DE OBRA: No. 050 DE 2024

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL LOS MUNICIPIOS DEL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA".

ENTIDAD CONTRATANTE: CORPOGUAJIRA

CONTRATISTA: FUNDACION AGUA LUNA

INTERVENTORIA: PRIDA SAS

FECHA DE ENTREGA: 11/10/2024

ANTECEDENTES

El día 25 de septiembre del año en curso, La Fundación Agua Luna emite oficio remitario *MS-014 BENEFICIARIOS QUE NO CUMPLEN* donde relacionan 68 beneficiarios que presuntamente no cumplen con los requisitos mínimos del contrato sobre el cual solicita de manera textual lo siguiente: *"se solicita el cambio de beneficiarios de manera urgente por temas de tiempo contractual, por lo tanto, se enviara posibles nuevos beneficiarios que se han acercado a la FUNDACION AGUA LUNA con el fin de ser parte de este proyecto"*.

De los 68 beneficiarios relacionados, el contratista presenta 6 beneficiarios que firmaron actas de desistimientos, tal es el caso de:

NO.	NOMBRE	MUNICIPIO	VEREDA
1	Hugo José Rincones González	El Molino	Los Barriales
2	Dolores María Petit Balcázar	El Molino	Los Barriales
3	Franklin Rafael Urbina Bolaño	El Molino	Bejuco Voladorcito
4	Nora Luz Arias Abuabara	El Molino	El Manantial
5	Manuel Quiroz Laguna	El Molino	Bejuco Voladorcito

6	Noel Guayacundo Rosas	El Molino	Farias Los Tamacos
---	-----------------------	-----------	--------------------

Ahora bien, analizando el documento técnico en el cual en el ítem **METODOLOGÍA PARA ESCOGER LAS FAMILIAS BENEFICIADAS**, para la selección de los usuarios, se consideraron los siguientes criterios:

“Acceso a otro energético: Priorizar aquellas poblaciones que no tengan acceso a electricidad ni a otro combustible que pueda ser empleado para la cocción y/o calefacción, o que, por altos costos, mala calidad de la red eléctrica y/o aspectos culturales prefieran utilizar leña para cocción y/o calefacción.

Circunstancias geográficas/ambientales: Las familias ubicadas en zonas rurales donde exista evidencia de la disminución de los depósitos de carbono asociada a procesos de deforestación o degradación forestal independientemente del factor causal (altas tasas de consumo de leña, ampliación de la frontera agrícola, cultivos ilícitos, etc.).

Población en riesgo de exposición a contaminantes provenientes de la combustión de leña en sus hogares: Población en alto grado de vulnerabilidad, como las madres cabeza de familia o las familias con menores de edad expuestos a la contaminación intramuros. Si se ha encontrado evidencia de afecciones en la salud, asociadas con la presencia de humos producidos por la combustión de leña, referenciar los estudios en el proyecto”.

Así mismo, en el documento técnico se detalla de manera textual que:

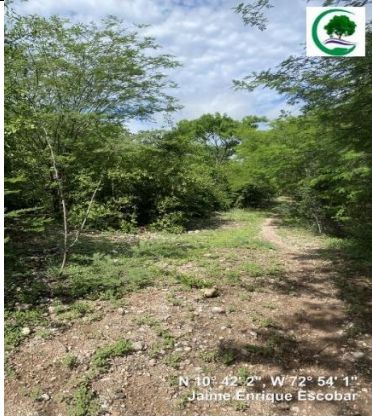
... *“verificando los criterios de selección se escogieron instalar 300 estufas, estarán distribuidas en comunidades rurales de los municipios de El Molino y San Juan del Cesar”.*

Por su parte, en el en las especificaciones técnicas, precisa lo siguiente:

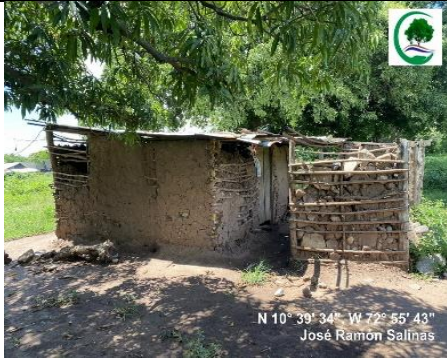
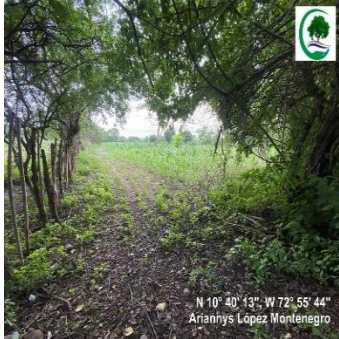
- a. en el ítem **Adecuaciones Preexistentes** en el inciso 3 señala que *“Donde se ubicará la Estufa Ecoeficiente deberá tener un muro en mampostería posterior a la Estufa y deberá tener una cubierta de protección cuando se proyecte por fuera de la vivienda”.*
- b. En las **Especificaciones constructivas Estufa Ecoeficiente** inciso 1 señala que *“La Estufa Ecoeficiente para leña debe ser construida dentro de la vivienda, ubicada en un rincón y donde lo especifique el propietario de la vivienda, cumpliendo con las adecuaciones preexistentes anteriormente expuesto”.*

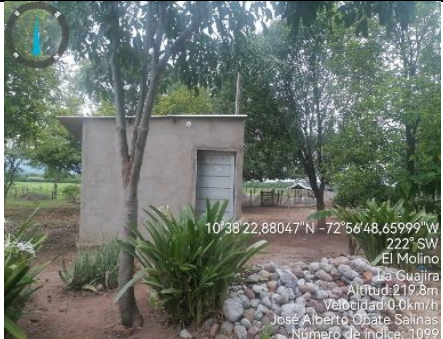
Una vez aclarado los criterios y las especificaciones técnicas del contrato esta interventoría procede a presentar las observaciones de los resultados obtenidos en las

visitas técnicas de verificación realizadas a los beneficiarios relacionados por el contratista de obra, de la siguiente manera:

BENEFICIARIOS QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DEL PROYECTO				
Nº	MUNICIPIO	COMUNIDAD	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES
1	EL MOLINO	EL CORRAL EL OREJERO	JAIME ENRIQUE ESCOBAR	 <p>NO HAY VIVIENDA</p>
2	EL MOLINO	EL CORRAL EL OREJERO	FABIO GONZALES PETIT	 <p>VIVIENDA ABANDONADA</p>

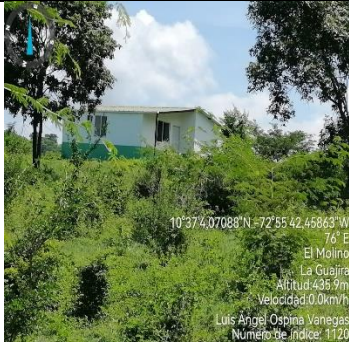
3	EL MOLINO	EL CORRAL EL OREJERO	JOSE DOMINGO GONZALES SUAREZ	 <p>NO HAY VIVIENDA</p>
4		EL CORRAL EL OREJERO	HERALDO RAFAEL ACOSTA MONTERO	 <p>NO HAY VIVIENDA</p>
5		EL CORRAL EL OREJERO	NATALIA DE GONZALEZ GUERRA	 <p>ESTUFA EXISTENTE EN BUEN ESTADO</p>
6	EL MOLINO	MONTAÑAS DEL CATATUMBO	DELIA LEONOR LOPEZ	 <p>LA CASA SE ENCUENTRA HABITADA Y LA ESTUFA CONSTRUIDA</p>

7	EL MOLINO	MONTAÑAS DEL CATATUMBO	JOSE RAMON SALINAS	 <p>N 10° 39' 34" W 72° 55' 43" José Ramon Salinas</p> <p>CASA ABANDONADA</p>
8	EL MOLINO	MONTAÑAS DEL CATATUMBO	ARIANIS LOPEZ MONTENEGRO	 <p>N 10° 40' 43" W 72° 55' 44" Arianys Lopez Montenegro</p> <p>NO HAY VIVIENDA</p>
9	EL MOLINO	MONTAÑAS DEL CATATUMBO	RAFAEL BALDIMIRO GONZALES LOPEZ	 <p>N 10° 40' 22" W 72° 55' 52" El Molino Rafael Vladimiro Gonzales Lopez</p> <p>CASA ABANDONADA</p>
10	EL MOLINO	MONTAÑAS DEL CATATUMBO	JORGE ARMANDO SALINAS	 <p>10°39'49.35276"N - 72°55'43.2608"W 89° E El Molino La Guajira Altitud:233.1m Velocidad:0.0km/h Jorge Armando Salinas Número de índice: 1098</p> <p>CASA ABANDONADA</p>

11	EL MOLINO	EL MANANTIAL	JOSE EDUARDO ACOSTA JIMENEZ	 <p>N 10° 39' 9" W 72° 55' 4" José Eduardo Acosta Jiménez</p> <p>NO HAY VIVIENDA</p>
12	EL MOLINO	LAS ILUSIONES	JOSE ALBERTO OÑATE SALINAS	 <p>10°38'22.88047" N - 72°56'48.65999" W 222' SW El Molino La Guajira Altitud: 219.8m Velocidad: 0.0km/h José Alberto Oñate Salinas Número de índice: 1099</p> <p>NO HAY VIVIENDA</p>
13	EL MOLINO	LAS ILUSIONES	NUMAS POMPILIO ARIAS	 <p>N 10° 37' 42" W 72° 56' 46" Numas Pompilio Arias</p> <p>NO HAY VIVIENDA</p>
14	EL MOLINO	LAS ILUSIONES	ARLEDIS LOPEZ IBARRA	 <p>10°38'37.28395" N - 72°56'18.86667" W 246' SW El Molino La Guajira Altitud: 230.9m Velocidad: 0.3km/h Arledis Lopez Número de índice: 1079</p> <p>VIVIENDA ABANDONADA Y DESTRUIDA</p>

15	EL MOLINO	LAS ILUSIONES	MARTHA ZABALETA JIMENEZ	 <p>N 10° 37' 52", W 72° 56' 39" Martha Zabaleta Jimenez</p> <p>NO SE PUDO VERIFICAR DEBIDO A QUE NO SE PUDO INGRESAR</p>
16	EL MOLINO	LAS ILUSIONES	YAMILETH OLIVELLA ACOSTA	 <p>N 10° 38' 42", W 72° 56' 43" El Molino La Guajira Colombia Yamileth Olivella</p> <p>PROCESO DE HERENCIA POR TANTO NO TIENE VIVIENDA</p>
17	EL MOLINO	LAS ILUSIONES	JULIA MALIA ESCOBAR ACOSTA	 <p>N 10° 38' 57", W 72° 56' 21" El Molino Julia Amalia Escobar</p> <p>NO HAY VIVIENDA</p>
18	EL MOLINO	LAS ILUSIONES	ROSA ANGELICA USTARIS	 <p>10°39'10,92952"N -72°56'45,41292"W 172°S El Molino La Guajira Altitud:223.1m Velocidad:0.3km/h Rosa Ustaris Número de índice: 1103</p> <p>VIVIENDA EN CONSTRUCCION</p>


19	EL MOLINO	LAS ILUSIONES	ARAMIS ANTONIO ACOSTA	 <p>10°39'14.79545"N - 72°56'55.73128"W 96° E El Molino La Guajira Altitud: 218.3m Velocidad: 0.0km/h Aramis Acosta Número de índice: 1105</p> <p>NO HAY VIVIENDA</p>
20	SANJUAN DEL CESAR	LOP PONDORES	JOAQUIN OLIVELLA JIMENEZ	 <p>N 10° 39' 47" W 72° 56' 0" Joaquín Olivella Jiménez</p> <p>NO HAY VIVIENDA</p>
21	SANJUAN DEL CESAR	LAS GUABINAS	ANA PATRICIA MENDOZA MAESTRE	 <p>10°39'27.32925"N - 73°2'30.92062"W 135° SE Altitud: 174.9m Velocidad: 0.0km/h Ana Patricia Mendoza Maestre Número de índice: 1109</p> <p>CASA ABANDONADA Y DESTRUIDA</p>
22	SANJUAN DEL CESAR	LAS GUABINAS	JORGE VEGA GONZALES	 <p>N 10° 39' 26" W 73° 2' 34" José Jorge Vega Gonzales</p> <p>CASA ABANDONADA</p>

23	EL MOLINO	LOS PAPELES	LUIS ANGELOSPINO VANEGAS	 <p>10°37'40.7088"N - 72°55'42.45863"W 76° E El Molino La Guajira Altitud: 435.9m Velocidad: 0.0km/h Luis Angel Ospina Vanegas Numero de indice: 1120</p> <p>CASA ABANDONADA</p>
24	EL MOLINO	LOS PAPELES	ENA DEL ROSARIO GRANADILLO	 <p>N 10° 37' 0", W 72° 55' 21" El Molino Ena del Rosario Granadillo Casa abandonada</p> <p>CASA ABANDONADA</p>
25	EL MOLINO	LOS PAPELES	LUIS MANUEL REDONDO GARCIA	 <p>N 10° 36' 35" W 72° 53' 35" Luis Manuel Redondo Garcia</p> <p>VENDIO LA PROPIEDAD A LILIANA ALARZA</p>
26	EL MOLINO	LOS PAPELES	LILIANA ANDREA ALARZA CUELLO	 <p>N 10° 36' 35" W 72° 55' 38" Liliana Andrea Alarza Cuello</p> <p>CASA ABANDONADA, SIN PUERTAS Y SIN VENTANAS</p>

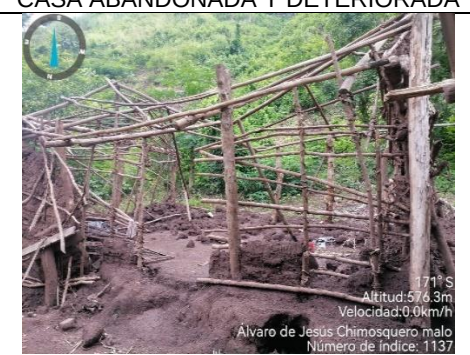
27	EL MOLINO	LOS PAPELES	INDIRA PATRICIA OSPINA JOIRO	 <p>N 10° 37' 11" W 72° 57' 37" Villanueva Indira Ospina Jairo</p> <p>NO HAY VIVIENDA</p>
28	EL MOLINO	EL MANANTIAL	TEOFILA PAULINA FUENTES DIAZ	 <p>10°38'35,05794" N -72°55'26,45549" W 254° W El Molino La Guajira Altitud: 252.7m Velocidad: 0.5km/h Teofila Fuentes Número de Índice: 1122</p> <p>NO HAY VIVIENDA</p>
29		EL MANANTIAL	ALEXIS ISABEL LOPEZ ROMERO	 <p>14/09/2024 8:16:40 a. m. 10°37'40,068" N -72°54'33,278" W en 50m 170° S #AlexisLopez #ElManantial</p> <p>NO HAY VIVIENDA</p>
30	EL MOLINO	EL BEJUCO VOLADORCITO	CARMEN LUCILA NIEVES DAZA	 <p>166° S Altitud: 773.7m Velocidad: 0.0km/h Carmen Lucila Nieves Daza Número de índice: 1133</p> <p>NO HAY VIVIENDA</p>

31	EL MOLINO	LOS BARRIALES	HIMELDA CRISTINA DUARTES MARTINEZ	 <p>12 sept 2024 8:55:44 a.m. 10°37'21.8061772°S 72°35'29.602°W 45.30m</p> <p>CASA ABANDONADA</p>
32	EL MOLINO	LOS BARRIALES	MARCOS SERGIO DIAZ DUARTE	 <p>25 sept 2024 5:58:14 a.m. 10°37'21.204°N 72°35'29.602°W 45.30m</p> <p>CASA ABANDONADA</p>
33		LOS BARRIALES	OLGA LUCIA MONTENEGRO	 <p>10 sept 2024 11:22:55 a.m. 10°37'21.8061772°S 72°35'29.602°W 45.30m</p> <p>NO HAY VIVIENDA</p>
34		LOS BARRIALES	VICTOR ALFONSO DIAZ SALAS	 <p>10 sept 2024 11:22:55 a.m. 10°37'21.8061772°S 72°35'29.602°W 45.30m</p> <p>NO HAY VIVIENDA</p>
35		LOS BARRIALES	RAFAEL NICOLAS DIAZ ROSADO	

				 <p>NO HAY VIVIENDA</p>
36		LOS BARRIALES	FABIOLA ORTEGON ACOSTA	 <p>CASA ABANDONADA</p>
37		LOS BARRIALES	TOMAS FRANCISCO MORALES BALCAZAR	 <p>NO HAY VIVIENDA</p>
38		LOS BARRIALES	GABRIEL EDUARDO CHAMORRO MORALES	 <p>NO HAY VIVIENDA</p>
39		LOS BARRIALES	ROSSY ARIAS AGUIRRE	 <p>CASA ABANDONADA</p>
40		LOS BARRIALES	NAYERITH ESCOBAR ARIAS	

				NO HAY VIVIENDA
41		LOS BARRIALES	OSMAR NICOLAS ARIAS DIAZ	 <p>CASA ABANDONADA</p>
42		LOS BARRIALES	ISABEL CRISTINA OÑATE MARTINEZ	 <p>VIVIENDA ABANDONADA Y DETERIORADA</p>
43		LOS BARRIALES	JAIME ENRIQUE DAZA IBARRA	 <p>NO HAY VIVIENDA</p>
44		EL MANANTIAL	RAMON EDUARDO LOPEZ	 <p>NO HAY VIVIENDA</p>
45		BEJUCO VOLADORCITO	JOSE MANUEL MALO CHIMUNQUERA	 <p>NO HAY VIVIENDA</p>
46		BEJUCO VOLADORCITO	JOSE DE JESUS ALONSO BOLAÑO	

				CASA ABANDONADA
47		BEJUCO VOLADORCITO	CARLOS AVIGUI CONCHACALA	 <p>NO HAY VIVIENDA</p>
48		BEJUCO VOLADORCITO	MARIA CAYETANA NIEVES GUERRA	 <p>NO HAY VIVIENDA</p>
49		BEJUCO VOLADORCITO	ALVARO ENRIQUE DIAZ VANEGAS	  <p>LOS PRPIETARIOS ARREGLARON LA VIVIENDA Y SE ENCUENTRA HABITADA</p>
50		BEJUCO VOLADORCITO	JOSE JORGE PULGAR NIEVES	

				 <p>NO HAY VIVIENDA</p>
51		BEJUCO VOLADORCITO	CESAR ANTONIO NIEVES GUERRA	 <p>NO HAY VIVIENDA</p>
52		BEJUCO VOLADORCITO	MARGARITA DE MUEGUE ACOSTA	 <p>CASA ABANDONADA Y DETERIORADA</p>
53		FARIAS LOS TAMACOS	ALVARO DE JESUS CHUMOSQUERA MALO	 <p>NO HAY VIVIENDA</p>
54		FARIAS LOS TAMACOS	YANIRIS YANETH TORRES CHIMUNQUERO	 <p>NO HAY VIVIENDA</p>

55		FARIAS LOS TAMACOS	YEISA CAROLINA CHIMOSQUERO MALO	 <p>10°40'2.56604" N - 72°50'56.3361" W 69° E 6S-23 Carrera 4 San Juan del Cesar La Guajira Altitud: 530.5m Velocidad: 0.0km/h Yeisa carolina Chimosquero Malo Número de índice: 1138</p> <p>NO HAY VIVIENDA</p>
56		FARIAS LOS TAMACOS	ERICSON DAVID TORRES GUERRA	 <p>10°40'2.62605" N - 72°50'57.45227" W 124° SE San Juan del Cesar La Guajira Altitud: 527.5m Velocidad: 0.1km/h Ericson David torres guerra Número de índice: 1139</p> <p>NO HAY VIVIENDA</p>
57		FARIAS LOS TAMACOS	ABRAHAM ENRIQUE VEGA MEJIA	 <p>29 Jun 2024 12:54:43 p. 10°40'25.0218" N - 72°50'53.4159" W 225° Ericson David guerra</p> <p>NO HAY VIVIENDA</p>
58		FARIAS LOS TAMACOS	ADRIANA CRISTINA BARBUDO SAVEDRA	 <p>13 Jun 2024 12:45:50 p. 10°40'29.48024" N - 72°50'53.0024" W 124° SE San Juan del Cesar La Guajira Altitud: 527.5m Velocidad: 0.1km/h Adriana cristina Savedra</p> <p>NO HAY VIVIENDA</p>
59		FARIAS LOS TAMACOS	ROSMIRA DEL CARMEN BRITO	 <p>13 Jun 2024 12:45:50 p. 10°40'29.48024" N - 72°50'53.0024" W 124° SE San Juan del Cesar La Guajira Altitud: 527.5m Velocidad: 0.1km/h Rosmira del Carmen Brito</p> <p>NO HAY VIVIENDA</p>

60		FARIAS LOS TAMACOS	MARIA CATALINA ARIZA DIAZ	 CASA ABANDONADA
61		FARIAS LOS TAMACOS	MARIA ANGELA GUEVARA VENCE	 CASA ABANDONADA
62		FARIAS LOS TAMACOS	TEODORO ENRIQUE MEJIA BOLAÑOS	 CASA ABANDONADA
63		FARIAS LOS TAMACOS	CELIA CATALINA ARMENTA	 NO HAY VIVIENDA
64		FARIAS LOS TAMACOS	MARIA ANGELICA GUEVARA VENCE	 CASA ABANDONADA

En virtud a lo anterior se determina lo siguiente:

1. Durante las visitas se evidencia que el beneficiario Álvaro Enrique Diaz Vanegas, el predio se encuentra habitado.
2. Con respecto a Rosa Angelica Ustaris, durante la visita se evidencio que la vivienda se encontraba en construcción y la beneficiaria manifestó que se mudara lo más pronto posible.

3. En el predio de la señora Natalia De González Guerra, existe una estufa ecoeficiente en buen estado y funcional.

Así las cosas, se determina que los beneficiarios anteriormente mencionados al no poseer viviendas o en su defecto se encuentren abandonadas no cumplen con los requisitos mínimos del contrato y/o garanticen la sostenibilidad del proyecto.

Como soporte a este informe se anexa oficio remitatorio *MS-014 BENEFICIARIOS QUE NO CUMPLEN*, y las actas de desistimientos emitidos por la *FUNDACION AGUA LUNA*.

Cordialmente,



Juan Carlos Amaya Bautista
Director De interventoría
Al Contrato 050 de 2024



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 2 de 15

Actas de comités de obra N° 01, N° 02, N° 03 y
N° 04,

	ACTA DE REUNION Nº.001	Código: R PCP04-2
		Versión: 5
		Fecha: 05/11/2015
		Página 1 de 3

Nombre del Evento:		Comité de seguimiento técnico, contrato de obra pública N° 050 de 2024.	
Tema/Proyecto/Asunto: Comité de seguimiento técnico, contrato de obra pública N°050 de 2024		Fecha: 13/08/2024	
		Lugar: CORPOGUAJIRA territorial sur- Fonseca- La Guajira	
		Hora de Inicio: 9.30 a.m.	
		Hora de Final: 10:30 a.m.	
Agenda: <ol style="list-style-type: none"> 1. Apertura de la reunión. 2. Presentación de los asistentes. 3. Socialización de los avances de obra 4. Compromisos. 			
PARTICIPANTES			
NOMBRE		CARGO	ENTIDAD
Luis Hoyos		Supervisor de Obra	Corpoguajira
Jefferson Bracho		Supervisor de interventoría	Corpoguajira
Gerald Brisson		Representante Legal	Fundación Agua Luna
Juan Carlos Amaya		Director interventoría	Prida S.A.S
Caroline Celedon		Residente	Prida S.A.S
Valentina Brisson		Apoyo técnico	Fundación Agua Luna
Andrés Brisson		Apoyo técnico	Fundación Agua Luna
SEGUIMIENTO COMPROMISOS REUNION ANTERIOR			
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
DESARROLLO			
<p>Siendo las 9:30 am del día 13 de agosto de la anualidad en curso, se da apertura al comité de seguimiento del contrato de obra No. 050 del 2024, donde se contó con la asistencia de los participantes anteriormente mencionados.</p> <p>Inicialmente el supervisor de interventoría Jefferson Bracho sugiere ajustar el cronograma actualizado a la corporación con el objetivo de hacer seguimiento y este quede cargado en el GESPROY, así mismo con el de la interventoría.</p> <p>El director de interventoría Juan Carlos Amaya le solicita al contratista acta de entrega con registros fotográficos del antes y después de la construcción de las estufas por beneficiario. También manifiesta que estas deben contener toda la información de los beneficiarios.</p> <p>El contratista presenta ante el comité un folder con el avance de obra, donde manifiesta haber construido 37 estufas y 143 predios con material entregados. Así mismo manifestaron que el compromiso adquirido con los beneficiarios es que estos deben tener instala un techo en condiciones optimas en el lugar donde será construida la estufa. Por otro lado, manifiesta que</p>			

	ACTA DE REUNION Nº.001	Código: R PCP04-2
		Versión: 5
		Fecha: 05/11/2015
		Página 2 de 3

la construcción de la estufa no será en U, sino en cuadro tal y como se establece en la oferta económica.

El supervisor de obra Luis Hoyos manifiesta que la programación suministrada por el contratista de obra carece de objetividad, solicita que esta contenga por cada actividad los polígonos y punto para facilitar las visitas en campo. Sugiere realizar estas visitas de maneras conjuntas y visitas ocasionales. Dentro de su intervención también solicito al contratista de obra informe semanal sobre el avance de obra.

Con respecto a la valla publicitaria el contratista se compromete a enviar a la supervisión y a la interventoría la georreferenciación donde será ubicada y el correo donde fue aprobado el diseño por parte del área de comunicación de la corporación.

Por otro lado, el contratista de obra manifiesta que durante las visitas previas se han encontrado predios que no cumplen con las especificaciones técnicas para adquirir el beneficio. Se ha presentado dificultades con la ubicación de los puntos dado que estos no coinciden con el predio del beneficiario. Por tanto, se ha venido realizando el levantamiento de punto reales durante las visitas.

Finalmente se acuerdan los siguientes compromisos:

COMPROMISO		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Entregar cuadro comparativo de coordenadas de los predios contenidos en los pliegos con los verificados en campo, a la supervisión y a la interventoría de las 37 estufas construidas	Fundación agua luna	
Entrega de los beneficiarios que no cumplen con las especificaciones del contrato	Fundación agua luna	
Entregar del listado de posibles candidatos para ser verificados.	Fundación agua luna	
Entregar Programación semanal que contenga por cada actividad los polígonos y puntos verificados	Fundación agua luna	

Se cierra el acta con 2 folios y 1 folio de planilla de asistencia

	ACTA DE REUNION Nº.001	Código: R PCP04-2
		Versión: 5
		Fecha: 05/11/2015
		Página 3 de 3



Luis Hoyos
Supervisor de Obra



Jefferson Bracho
Supervisor de Interventoría




Gerald Brisson
Contratista Obra



Juan Carlos Amaya
Contratista Interventor



Caroline Celedón
Residente de Interventoría



Valentina Brisson
Apoyo técnico de contratista de obra



Andrés Brisson
Apoyo técnico de contratista de obra

	ACTA DE REUNION Nº.002	Código: R PCP04-2
		Versión: 5
		Fecha: 05/11/2015
		Página 1 de 3

Nombre del Evento:	Comité virtual de seguimiento técnico, contrato de obra pública N° 050 de 2024.
Tema/Proyecto/Asunto: Comité virtual de seguimiento técnico, contrato de obra pública N°050 de 2024	Fecha: 13/09/2024
	Lugar:
	Hora de Inicio: 9.30 a.m.
	Hora de Final: 10:30 a.m.

Agenda:

1. Apertura de la reunión.
2. Presentación de los asistentes.
3. Socialización de los avances de obra
4. Compromisos.

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Luis Hoyos	Supervisor de Obra	Corpoguajira
Jefferson Bracho	Supervisor de interventoría	Corpoguajira
Gerald Brisson	Representante Legal	Fundación Agua Luna
Juan Carlos Amaya	Director interventoría	Prida S.A.S
Carolaine Celedon	Residente	Prida S.A.S
Valentina Brisson	Apoyo técnico administrativo	Fundación Agua Luna
Andrés Brisson	Apoyo técnico administrativo	Fundación Agua Luna

SEGUIMIENTO COMPROMISOS REUNION ANTERIOR

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Entregar cuadro comparativo de coordenadas de los predios contenidos en los pliegos con los verificados en campo, a la supervisión y a la interventoría de las 37 estufas construidas	Fundación Agua Luna	50%	Entregaron las coordenadas sin el cuadro comparativo
Entrega de los beneficiarios que no cumplen con las especificaciones del contrato		100%	Enviaron la información
Entregar del listado de posibles candidatos para ser verificados.		0%	No enviaron el listado de los posibles candidatos
Entregar Programación semanal que contenga por cada actividad los polígonos y puntos verificados		50%	Enviaron programación semanal sin polígonos y puntos verificados

DESARROLLO

	ACTA DE REUNION Nº.002	Código: R PCP04-2
		Versión: 5
		Fecha: 05/11/2015
		Página 2 de 3

Siendo las 9:30 am del día 13 de septiembre de la anualidad en curso, se da apertura al comité virtual de seguimiento No. 2 del contrato de obra No. 050 del 2024, donde se contó con la asistencia de los participantes anteriormente mencionados.

Inicialmente el contratista obra presenta ante el comité el avance de obra, donde manifiesta haber construido 160 estufas y 215 predios con material entregados, de 244 predios visitados. Dentro de su intervención reporta que en las visitas realizadas han detectado hasta la fecha que 29 predios no cumplen con las especificaciones técnicas, y reportaron ante la supervisión y la interventoría el listado de 24 a la fecha de corte del 4 septiembre.

El supervisor de interventoría Jefferson Bracho manifiesta que el protocolo de cambio de beneficiarios, parte del listado inicial propuesto por el contratista de obra, el cual será trasladado a la interventoría para la verificación en campo dicha situación, posteriormente es la interventoría es quien realiza el traslado a la corporación la solicitud realizada por el contratista, para que la corporación realiza el trámite respectivo ante los municipios.

En el comité también se trato las dificultades de acceso para ingresar a algunos predios, lo que ha representado una situación compleja para la entrega de materiales, sumándole el estado del tiempo, que empeora las vías con las lluvias. Ante esta situación de manera unánime se decide convocar una reunión con los presidentes de JAC y los beneficiarios para la próxima con el objetivo de buscar alguna solución para el traslado de material a estos predios.

Finalmente se acuerdan los siguientes compromisos:

COMPROMISO		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Entregar coordenadas a la supervisión y a la interventoría de las 160 estufas construidas	Fundación Agua Luna	13 al 20 de septiembre de 2024
Entregar el listado de los beneficiarios que no cumplen con las especificaciones del contrato a la interventoría para su verificación.	Fundación Agua Luna	
Entregar del listado de posibles nuevos beneficiarios.	Fundación Agua Luna	
Dar traslado a la corporación de la verificación de los predios que no cumplen.	Interventoría	
Solicitar a la alcaldía el cambio de usuarios	Corpoguajira	
Convocar reunión con los presidentes de JAC y beneficiarios para resolver la entrega de material a predios de difícil acceso.	Fundación Agua Luna	

Se cierra el acta con 2 folios y 1 folio de planilla de asistencia


	ACTA DE REUNION Nº.002	Código: R PCP04-2
		Versión: 5
		Fecha: 05/11/2015
		Página 3 de 3



 Luis Hoyos
 Supervisor de Obra



 Jefferson Bracho
 Supervisor de Interventoría




 Gerald Brisson
 Contratista Obra




 Juan Carlos Amaya
 Contratista Interventor



 Caroline Celedón
 Residente de Interventoría



 Valentina Brisson
 Apoyo técnico de contratista de obra



 Andrés Brisson
 Apoyo técnico de contratista de obra

	ACTA DE REUNION Nº.003	Código: R PCP04-2
		Versión: 5
		Fecha: 05/11/2015
		Página 1 de 3

Nombre del Evento:	Comité virtual de seguimiento técnico, contrato de obra pública N° 050 de 2024.
Tema/Proyecto/Asunto: Comité virtual de seguimiento técnico, contrato de obra pública N°050 de 2024	Fecha: 10/10/2024
	Lugar:
	Hora de Inicio: 9:00 a.m.
	Hora de Final: 10:00 a.m.

Agenda:

1. Apertura de la reunión.
2. Presentación de los asistentes.
3. Socialización de los avances de obra
4. Compromisos.

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Luis Hoyos	Supervisor de Obra	Corpoguajira
Gerald Brisson	Representante Legal	Fundación Agua Luna
Juan Carlos Amaya	Director interventoría	Prida S.A.S
Carolaine Celedón	Residente	Prida S.A.S
Valentina Brisson	Apoyo técnico administrativo	Fundación Agua Luna
Andrés Brisson	Apoyo técnico administrativo	Fundación Agua Luna

SEGUIMIENTO COMPROMISOS REUNION ANTERIOR

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Entregar coordenadas a la supervisión y a la interventoría de las 160 estufas construidas	Fundación Agua Luna	100%	Se cumplieron con los compromisos
Entregar el listado de los beneficiarios que no cumplen con las especificaciones del contrato a la interventoría para su verificación.		100%	Se cumplieron con los compromisos
Entregar del listado de posibles nuevos beneficiarios.		100%	Se cumplieron con los compromisos
Dar traslado a la corporación de la verificación de los predios que no cumplen.	Interventoría	100%	Se cumplieron con los compromisos
Solicitar a la alcaldía el cambio de usuarios	Corpoguajira	100%	Se cumplieron con los compromisos
Convocar reunión con los presidentes de JAC y	Fundación agua luna	100%	Se cumplieron con los compromisos

	ACTA DE REUNION Nº.003	Código: R PCP04-2
		Versión: 5
		Fecha: 05/11/2015
		Página 2 de 3

beneficiarios para resolver la entrega de material a predios de difícil acceso.			
<p style="text-align: center;">DESARROLLO</p> <p>Siendo las 9:00 am se da inicio al Comité virtual de seguimiento técnico, contrato de obra pública N°050 de 2024, donde se contó con la asistencia de los participantes anteriormente mencionados.</p> <p>Inicialmente en la reunión se aborda la identificación de beneficiarios que no cumplen con los criterios del proyecto del contrato. Luis Manuel Hoyos Castro destaca la importancia de recibir apoyo de la Secretaría de Planeación Municipal y la interventoría para facilitar el cambio de beneficiarios, mientras que la Secretaría solicita un informe detallado sobre las razones de rechazo de los beneficiarios actuales.</p> <p>La Fundación Agua Luna expuso que se han recopilado datos sobre beneficiarios y nuevos candidatos, organizando la información en carpetas para facilitar su revisión. Luis Manuel Hoyos Castro enfatizó que el secretario podrá acceder rápidamente a la lista de beneficiarios y candidatos. Sin embargo, la Secretaría de Planeación Municipal expresó preocupaciones sobre la equidad en la distribución de beneficiarios entre el Molino y San Juan.</p> <p>La administración ha decepcionado Solicitud de inclusión de nuevos beneficiarios por parte de los habitantes del Molino.</p> <p>La Fundación Agua Luna presenta avances en la Entrega de Materiales y Coordinación de Beneficiarios, así mismo solicitó agilidad en el proceso de entrega de materiales, enfatizando la importancia de cumplir con los plazos contractuales.</p> <p>Luis Manuel Hoyos Castro indicó que se espera un documento revisado que permitirá avanzar en la aprobación de nuevos beneficiarios. El ingeniero Juan Amaya advirtió que la revisión por parte de la subdirección podría tomar algunos días, mientras que la Secretaría de Planeación Municipal se comprometió a facilitar la verificación de la información necesaria.</p> <p>Finalmente Luis Manuel Hoyos Castro y la Fundación Agua Luna abordaron la situación de beneficiarios que no cumplen con los requisitos del proyecto, destacando la necesidad de colaboración con la Secretaría de Planeación Municipal y la interventoría para facilitar el cambio de beneficiarios. La Fundación presentó un listado organizado de beneficiarios y candidatos, y se enfatizó la urgencia de coordinar la entrega de materiales, dado que el tiempo es un factor crítico. Todos los participantes coincidieron en la importancia de trabajar juntos para asegurar la aprobación de nuevos beneficiarios y cumplir con los plazos establecidos.</p>			
COMPROMISO			
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA	


	ACTA DE REUNION Nº.003	Código: R PCP04-2
		Versión: 5
		Fecha: 05/11/2015
		Página 3 de 3

Entregar informe de beneficiarios rechazados y la documentación de nuevos beneficiarios al secretario de Planeación	Fundación Agua Luna	
Entregar informe de verificación de la solicitud de los contratistas a la supervisión.	Interventoría	
Revisar el informe de beneficiarios rechazados y la documentación enviada por la FUNDACION AGUA LUNA	Secretaria de planeación	
Coordinar la verificación de la información sobre beneficiarios que cumplan con las condiciones mínimas.	Interventoría y secretaria de planeación del molino	


Se cierra el acta con 3 folios



Luis Hoyos
Supervisor de Obra



Gerald Brisson
Contratista Obra




Andrés Brisson
Apoyo técnico de contratista de obra



Juan Carlos Amaya
Contratista Interventor



Caroline Celedón
Residente de Interventoría



Valentina Brisson
Apoyo técnico de contratista de obra

	ACTA DE REUNION Nº.004	Código: R PCP04-2
		Versión: 5
		Fecha: 05/11/2015
		Página 1 de 3

Nombre del Evento:	Comité virtual de seguimiento técnico, contrato de obra pública N° 050 de 2024.
Tema/Proyecto/Asunto: Comité virtual de seguimiento técnico, contrato de obra pública N°050 de 2024	Fecha: 25/10/2024
	Lugar:
	Hora de Inicio: 9:30 a.m.
	Hora de Final: 10:00 a.m.

Agenda:

1. Apertura de la reunión.
2. Presentación de los asistentes.
3. Socialización de los avances de obra
4. Compromisos.

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Luis Hoyos	Supervisor de Obra	Corpoguajira
Jefferson Bracho	Supervisor de interventoría	Corpoguajira
Gerald Brisson	Representante Legal	Fundación Agua Luna
Juan Carlos Amaya	Director interventoría	Prida S.A.S
Caroline Celedon	Residente	Prida S.A.S
Valentina Brisson	Apoyo técnico administrativo	Fundación Agua Luna
Andrés Brisson	Apoyo técnico administrativo	Fundación Agua Luna
María Piedad Echeverría	Jefe De Jurídica	Corpoguajira

SEGUIMIENTO COMPROMISOS REUNION ANTERIOR

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Entregar informe de beneficiarios rechazados y la documentación de nuevos beneficiarios al secretario de Planeación	Fundación Agua Luna	100%	Se cumplieron con los compromisos
Entregar informe de verificación de la solicitud de los contratistas a la supervisión.	Interventoría	100%	Se cumplieron con los compromisos
Revisar el informe de beneficiarios rechazados y la documentación enviada por la FUNDACION AGUA LUNA	Secretaria de planeación	100%	Se cumplieron con los compromisos
Coordinar la verificación de la información sobre beneficiarios que cumplan con las condiciones mínimas.	Interventoría y secretaria de planeación del molino	100%	Se cumplieron con los compromisos



ACTA DE REUNION Nº.004

Código: R PCP04-2

Versión: 5

Fecha: 05/11/2015

Página 2 de 3

DESARROLLO

En el Comité virtual de seguimiento técnico, contrato de obra pública N°050 de 2024, se continuo con la temática del comité No. 003 del 10 de octubre de 2024, donde se contó con la participación de la Dra María Piedad Echeverría jefe de jurídica Corpoguajira, quienes en compañía de los participantes anteriormente mencionados dan inicio al comité de seguimiento virtual No. 004.

Durante la reunión la fundación agua luna presentaron los documentos de remisión de nuevos beneficiarios, el aval por parte del secretario de planeación de El Molino y de San Juan del cesar para nuevos beneficiarios. Los cuales fueron analizados por todos los presentes determinando que estos cumplen con las especificaciones mínimas para ser nuevos beneficiarios del contrato.

Por su parte, se le exhorta a la fundación agua luna a aumentar esfuerzos para la construcción de estas estufas dado la limitación de tiempo restante del contrato. Sin embargo, el contratista manifiesta que aumentaron las cuadrillas y teniendo en cuenta que los nuevos beneficiarios no se encuentran tan disperso la entrega de material seria mas efectiva, dado que esa era una de las dificultades durante la ejecución, a esto sumarle las buenas condiciones climatológicas que permiten una mejor movilidad, bajo estos rendimientos se espera cumplir con los tiempos y los compromisos pactados.

Finalmente, la interventoría manifiesta que está realizando verificación permanente en campo, verificando las estufas construidas y velando que el contratista cumpla con los rendimientos proyectados.

COMPROMISO

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Presentar programación semanal de las actividades.	Fundación Agua Luna	

Se cierra el acta con 2 folios

Luis Hoyos
Supervisor de Obra

Jefferson Bracho
Supervisor de Interventoría

Gerald Brisson
Contratista Obra

Juan Carlos Amaya
Contratista Interventor



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 9 de 15

Documento modificadorio contrato N° 070 de 2024



MODIFICATORIO N° 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CI 0070-2024

OBJETO:	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA". BPIN 20233218000010
CONTRATANTE:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA – CORPOGUAJIRA
CONTRATISTA:	PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL S.A.S.
NIT No.	900.026.388-1
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS AMAYA BAUTISTA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	79.555.163
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS (\$ 114.492.422) M/L
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO:	CUATRO (04) DE JULIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	TRES (3) DE NOVIEMBRE DE 2024
PLAZO PRÓRROGA:	UN (1) MÉS
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUES DE PRÓRROGA:	TRES (3) DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO TOTAL	CINCO (5) MESES

Entre los suscritos, **ALVARO EVARISTO GNECCO RODRÍGUEZ**, mayor de edad, con domicilio en esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.805.865 expedida en Riohacha, en su condición de Secretario General y actuando en virtud de la delegación conferida por el Director General, mediante Resolución No. 1007 del 14 de mayo de 2024, en ejercicio del artículo 11 y 12 de la ley 80 de 1993, obra en nombre y representación legal de la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, CORPOGUAJIRA**, ente corporativo de carácter público, domiciliado en la ciudad de Riohacha, identificado con el NIT. No. 892.11.314-9, y creado mediante Decreto 3453 de 1983, modificado por la ley 99 de 1993, y en adelante se denominará **CORPOGUAJIRA o LA CORPORACIÓN**, de una parte y por la otra **PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL S.A.S.** con NIT 900.026.388-1, representado legalmente por **JUAN CARLOS AMAYA BAUTISTA** identificado con cedula de ciudadanía No. 79.555.163 y que en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente **MODIFICATORIO** al **contrato de interventoría No. CI 0070-2024**, previas las siguientes consideraciones: **A)** Que entre CORPOGUAJIRA y EL CONTRATISTA, se celebró el contrato de interventoría No. CI 0070-2024, que tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES



MODIFICATORIO N° 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CI 0070-2024

COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA". BPIN 20233218000010. **B)** Que EL CONTRATISTA, por medio de oficio 202410313440099201 de fecha 31/10/2024, solicitó al supervisor la modificación del contrato, indicando la necesidad de prorrogar el contrato por un término de 30 días, sustentado en que se surtió el proceso de cambio de beneficiarios y debido a que la interventoría solo cuenta con un residente, al cual le es imposible hacer la correcta verificación de las estufas que se están construyendo y ante la inminencia de terminación del contrato, requiere la prórroga solicitada. **C)** Que la supervisión, mediante oficio No. 202410313500036773 de misma fecha, dirigido al Director General, indicó que conforme a la solicitud de prórroga al contrato N° 0070 de 2024, realizada por el contratista interventor, por un periodo de tiempo de 30 días, que tendría los costos descritos a continuación:

ITEM	DEDICACION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Transporte 4x4	1	\$ 7.300.000	\$ 7.300.000
Director de Interventoría	0.3	\$ 4.500.000	\$ 1.350.000
Trabajadora Social	0.5	\$ 2.850.000	\$ 1.425.000
Ingeniero Ambiental o civil	1	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000
TOTAL			\$ 13.575.000

Indicó que avala la solicitud realizada por el contratista, dado que las razones expuestas son completamente válidas y viables desde el punto de vista técnico y económico, lo cual implica que el tiempo restante no es suficiente para garantiza la adecuada verificación de las estufas ecoeficientes, toda vez que la interventoría no cuenta con el personal suficiente para cubrir los diferentes frentes de trabajo. **D)** Que en virtud de lo anteriormente expuesto, la Dirección General de la Corporación impartió aprobación a la solicitud de modificación del contrato y por ende considera pertinente acceder a la misma, en virtud del **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CI 0070-2024**. Por tal motivo, las partes acuerdan: **CLAUSULA PRIMERA:** Modifíquese la **CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO**, el cual se prorroga de la siguiente manera: **CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO:** Prorróguese el plazo de ejecución del contrato principal por el término de UN (1) MES, contados a partir del vencimiento del término del plazo inicial, quedando como plazo de ejecución final del mismo, el término de CINCO (5) MESES. **PARÁGRAFO.** La presente prórroga no generará erogación presupuestal alguna a cargo de LA CORPORACIÓN. **CLÁUSULA SEGUNDA:** Modifíquese el presupuesto del contrato, el cual quedará así:

ITEM	ACTIVIDAD	A	B	C	D	E	F	TOTAL PARCIAL (E*F)
		SUELDO MES BASICO	CANT.	DEDIC %	F.M	Valor Mes (A*B*C*D)	N° DE MESES	
1.	COSTO DE PERSONAL							
1,1	Personal de Supervisión							
1.1.1	Director de Interventoría	\$ 4.500.000	1	50%	1,98	\$ 4.455.000	4,00	\$ 17.820.000
1.1.2	Profesional Área Social	\$ 2.850.000	1	50%	1,43	\$ 2.035.898	4,00	\$ 8.143.590
1.1.3	Auxiliar de oficina	\$ 2.500.000	1	50%	1,43	\$ 1.785.875	4,00	\$ 7.143.500
1.1.4	Ingeniero Ambiental o Civil	\$ 3.500.000	1	100%	1,43	\$ 5.000.450	4,00	\$ 20.001.800
1,2	Personal de Supervisión prorroga					A*B*C		
1,2,1	Director de Interventoría	\$ 4.500.000	1	30%		\$ 1.350.000	1,00	\$ 1.350.000
1,2,2	Profesional Área Social	\$ 2.850.000	1	50%		\$ 1.425.000	1,00	\$ 1.425.000
1,2,3	Ingeniero Ambiental o Civil	\$ 3.500.000	1	100%		\$ 3.500.000	1,00	\$ 3.500.000



MODIFICATORIO N° 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CI 0070-2024

SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL								\$
								59.383.890
	OTROS COSTOS DIRECTOS							
2	OTROS COSTOS DIRECTOS	UNIDAD	CANT.	DED		Vr Unitario		Vr Total
2.1	Papeleria	Und	1	100%		\$ 286.120		\$ 286.120
2.2	Transporte (4X4 Con conductor)	Mes	5	100%		\$ 7.300.000		\$ 36.500.000
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS								\$ 36.786.120
COSTO TOTAL (1+2)								\$ 96.170.010
							19%	\$ 18.272.302
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA								\$ 114.442.312

PARÁGRAFO. Teniendo que el valor del presupuesto inicial es superior al modificado, se dejará constancia en el acta de liquidación, sobre la liberación de recursos por concepto de reintegros de recursos no ejecutados. **CLÁUSULA TERCERA. GARANTIAS: EL CONTRATISTA** se compromete para los términos de la presente modificación a actualizar o ampliar las garantías del **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CI 0070-2024** por el término Y valor indicado en el presente modificadorio. **CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA DE CLÁUSULAS PACTADAS EN EL CONTRATO PRINCIPAL.** Las partes se ratifican en la interpretación y contenido de las demás cláusulas establecidas en el **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CI 0070-2024**, las cuales no fueron objeto de modificación alguna por el presente acto. **CLAUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION:** El presente modificadorio se entiende perfeccionado con la firma de las partes en la plataforma SECOP II y para su ejecución se requiere la aprobación de la ampliación de las garantías, por parte de CORPOGUAJIRA.

Dado en Riohacha Departamento de La Guajira.

POR CORPOGUAJIRA,

POR EL CONTRATISTA,

ALVARO EVARISTO GNECCO RODRIGUEZ
Secretario General

JUAN CARLOS AMAYA BAUTISTA
Rep. Legal PRIDA



352

Riohacha DTC,

CORPOGUAJIRA

FECHA:31/10/2024 17:07:42



202410313500036773

PARA: **SAMUEL LANA ROBLER**
Director Corpoguajira

COPIA: **MARIA P. ECHEVERRIA RODRIGUEZ**
Jefe Oficina Asesora Jurídica

DE: **JEFERSON J BRACHO CARVAJAL**
Supervisor Contrato de interventoría No. 070 de 2024

REFERENCIA: Contrato N° 070 de 2024 cuyo objeto es la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA". BPIN 20233218000010.

ASUNTO: En Respuesta a oficios con radicados N° 202410313440099201 de fecha 31 de octubre de 2024, solicitud de prórroga al contrato de interventoría N° 070 de 2024.

Cordial saludo:

El contrato N° 070 de 2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA". BPIN 20233218000010, ejecutado por la empresa Proyectos Integrales de Desarrollo Ambiental, PRIDA S.A.S con sede en San Juan Del Cesar, el cual ejerce seguimiento técnico, administrativo y financiero al contrato de obra N° 050 de 2024 con el objeto de "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010; ha tenido a bien solicitar una prórroga en tiempo por 30 días y en recursos económicos para la continuidad del contrato de interventoría N° 070 de 2024, a fin de poder recibir los productos (Estufas Ecoeficiente) establecidas en el contrato objeto de seguimiento, sustentada en las razones expresadas a continuación:

- 1) El contrato de interventoría N° 070 de 2024 dio inicio como consta en acta el día 04 de julio de 2024, el cual ha venido informando a través de informe de avance que en algunos predios no se cumplen con las condiciones requeridas para la instalación de las estufas ecoeficientes, por las siguientes razones: Predios en completo abandono, predios sin construcciones de vivienda, predios con viviendas, pero sin un espacio adecuado con techo para instalación de las estufas. Toda esta



SC-CER894723



SA-CER731710



Cra. 7 # 12-15, Riohacha - Colombia

Tel: (5) 727 3905 Telefax: (5) 727 3904

Laboratorio: (5) 727 5052 - Fonseca (5) 775 6123

www.corpoguajira.gov.co



situación condujo a que el contratista de obra solicitará a la interventoría un concepto técnico para realizar un cambio de beneficiarios, proceso que fue solucionado invirtiendo tiempo y recursos por parte de la interventoría, el cual corroboró la información enviada por el contratista de obra con visitas en campo como se informó en los reportes mensuales.

- 2) Ambos contratos, tanto el de obra como el de interventoría tienen fecha de terminación del día tres (3) de noviembre de 2024 como consta en actas, con la salvedad que el contratista de obra asegura que cuenta con el personal suficiente para avanzar con el 100% de la ejecución de la obra en el tiempo programado sin la necesidad de requerir tiempo adicional.
- 3) El contrato de obra N° 050 de 2024, de acuerdo a información de la interventoría presenta hasta el día 24 de octubre un avance físico del 77% con pendiente de realizar las siguientes actividades: - Construcción de estufas ecoeficientes con ladrillo normal ladrillos refractario, morteros y partes metálicas y georreferenciadas con avance del 76%, cuentan con el material disponible, personal y los insumos que requieren para el desarrollo de esta actividad - Realizar 2 talleres de capacitación para la operación y mantenimiento de la estufa ecoeficiente, con un avance del 60%.
- 4) Además de las razones descritas anteriormente, el contratista de interventoría afirma que solo cuenta con un ingeniero residente, el cual se le hace imposible realizar la correcta verificación del total de las estufas faltantes en el tiempo programado y que además del tiempo invertido en la verificación de los anteriores beneficiarios condujo a que no se cumpliera en el tiempo de ejecución proyectado.
- 5) La Interventoría realizó a través de oficio con el radicado N° 202410313440099201 la solicitud de prórroga al contrato N° 0070 de 2024 a esta supervisión por un periodo de tiempo de 30 días, lo cual tendría unos costos descritos a continuación:

ITEM	DEDICACION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Transporte 4x4	1	\$ 7.300.000	\$ 7.300.000
Director de Interventoría	0.3	\$ 4.500.000	\$ 1.350.000
Trabajadora Social	0.5	\$ 2.850.000	\$ 1.425.000
Ingeniero Ambiental o civil	1	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000
TOTAL			\$ 13.575.000

- 6) Ser verificado y confirmó por esta supervisión que el contratista de interventoría no ha presentado en ninguno de los informes de avance las evidencias que indique el uso del Factor Multiplicador (F.M) aplicados en tres (3) de los miembros del equipo de trabajo (Trabajadora social, Auxiliar de oficina e Ingeniero ambiental o civil), por concepto de salarios y prestaciones sociales de personal facturable. Sin embargo, se confirma a través de los contratos de prestación de servicios de los tres (3) miembros del equipo de trabajo adjuntado por la interventoría en sus informes, que estos no guardan ninguna relación laboral con el empleador reafirmando que el contratista no ejerce derecho sobre el F.M.
- 7) Se estima que los gastos del Factor Multiplicador (F.M) por concepto de salarios y prestaciones sociales de personal facturable sobre los cuales no ejerce derecho el contratista están en el orden del 0,55% y en este orden de ideas, se aprecia un saldo sin ejecutar por valor de \$13.617.110, de acuerdo al siguiente balance:



SC-CER894723

SA-CER731710

Cra. 7 # 12-15, Riohacha - Colombia
 Tel: (5) 727 3905 Telefax: (5) 727 3904
 Laboratorio: (5) 727 5052 - Fonseca (5) 775 6123
www.corpoguajira.gov.co

CONTRATO								
ITEM	ACTIVIDAD	A SUELDO MES BASICO	B CANT.	C DEDIC %	D F.M	E Valor Mes (A*B*C*D)	F N° DE MESES	TOTAL PARCIAL (E*F)
1.	COSTO DE PERSONAL							
1.1	Personal de Supervisión							
1.1.1	Director de Interventoría	\$ 4.500.000	1	50%	1,98	\$ 4.455.000	4,00	\$ 17.820.000
1.1.2	Profesional Área Social	\$ 2.850.000	1	50%	1,43	\$ 2.035.898	4,00	\$ 8.143.590
1.1.3	Auxiliar de oficina	\$ 2.500.000	1	50%	1,43	\$ 1.785.875	4,00	\$ 7.143.500
1.1.4	Ingeniero Ambiental o Civil	\$ 3.500.000	1	100%	1,43	\$ 5.000.450	4,00	\$ 20.001.800
	SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL							\$ 53.108.890
2	OTROS COSTOS DIRECTOS							
2.1	Papelería	Und	1	100%		\$ 286.120		\$ 286.120
2.2	Transporte (4X4 Conductor)	Mes	4	100%		\$ 7.300.000		\$ 29.200.000
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS							\$ 29.486.120
	COSTO TOTAL (1+2)							\$ 82.595.010
							19%	\$ 18.280.302
	VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA							\$ 100.875.312

Como se puede observar en el cuadro anterior el FM para el profesional del área social, Auxiliar de oficina e ingeniero ambiental aplica en 1,43% y en esta forma el contrato alcanza un total ejecutado de \$ 100.875.312

Por lo cual se establece el siguiente balance:

VALOR CONTRATO	\$ 114.492.422,00	
VALOR ANTICIPO		\$ 57.246.211,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$ -
VALOR PRESENTE PAGO		\$ 100.875.312,00
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO		\$ 57.246.211,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$ 43.629.101,00
SALDO DEL CONTRATO, POR EJECUTAR		\$ 13.617.110,00
SUMAS IGUALES	\$ 114.492.422,00	\$ 114.492.422,00

Teniendo en cuenta la situación que generó la solicitud de tiempo y recursos para el contrato de interventoría N° 070 de 2024, esta supervisión avala la solicitud realizada por el contratista, dado que las razones expuestas son completamente validas y viables desde el punto de vista técnico y económico, lo cual implica que el tiempo restante no es suficiente para garantizar la adecuada verificación de las estufas ecoeficientes, toda vez que la interventoría no cuenta con el personal suficiente para cubrir los diferentes frentes de trabajo.

En ese orden de ideas, esta supervisión solicita a través de este medio se considere realizar la adicción en tiempo y reinversión de los recursos del saldo por ejecutar al contrato de interventoría N° 070 de 2024 y pongo en consideración para su aprobación como director y generador de gasto de la entidad.

Atentamente,

JEFERSON J. BRACHO CARVAJAL

Supervisor contrato de interventoría No. 070 de 2024

Anexo: Solicitud Prorroga contrato de interventoría con radicado N°202410313440099201, Propuesta económica y factor multiplicador aprobado para el contrato de interventoría.



Cra. 7 # 12-15, Riohacha - Colombia
Tel: (5) 727 3905 Telefax: (5) 727 3904
Laboratorio: (5) 727 5052 - Fonseca (5) 775 6123
www.corpoguajira.gov.co



202410313440099201



San Juan Del Cesar La Guajira octubre 31 de 2024

Oficio N° 13

Ingeniero.

Jefferson José Bracho Carvajal

Supervisor de interventoría contrato 070 de 2024

REF: Solicitud De Prórroga

Cordial saludo,

En desarrollo de las actividades correspondientes al Contrato de interventoria No. 0070 de 2024, cuyo Objeto es “ **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL LOS MUNICIPIOS DEL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA**”, me dirijo a usted con el finde solicitar una prórroga por un término de 30 días esto sustentado en que se surtió el proceso de cambio de beneficiarios y debido a que la interventoria solo cuenta con un residente le es imposible hacer la correcta verificación de las estufas que se están construyendo y ante la inminencia de terminación del contrato, requerimos la prórroga, esta prórroga acarrea unos costos los cuales describo a continuación .

ITEM	DEDICACION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Transporte 4x4	1	\$ 7.300.000	\$ 7.300.000
Director de Interventoría	0.3	\$ 4.500.000	\$ 1.350.000
Trabajadora Social	0.5	\$ 2.850.000	\$ 1.425.000
Ingeniero Ambiental o civil	1	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000
TOTAL			\$ 13.575.000


Como soporte a este oficio se anexa:

1. Oficio de solicitud de Cambio de usuarios por el contratista de obra

Cordialmente,


Juan Carlos Amaya Bautista
Representante Legal
Contrato 070 de 2024

PROPUESTA ECONOMICA								
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA". BPIN 20233218000010								
		A	B	C	D	E	F	
ITEM	ACTIVIDAD	SUELDO MES BÁSICO	CANT	% DEDICACIÓN	F.M.	Valor Mes (A * B * C * D)	Nº MESES	TOTAL PARCIAL (E * F)
1	COSTOS DEL PERSONAL							
1.1	Personal de Supervisión							
1.1.1	Director de Interventoría	\$ 4.500.000	1	50%	1,98	\$ 4.455.000	4	\$ 17.820.000
1.1.2	Trabajadora Social	\$ 2.850.000	1	50%	1,98	\$ 2.821.500	4	\$ 11.286.000
1.1.3	Auxiliar de oficina	\$ 2.500.000	1	50%	1,98	\$ 2.475.000	4	\$ 9.900.000
1.1.4	Ingeniero Ambiental o civil	\$ 3.500.000	1	100%	1,98	\$ 6.930.000	4	\$ 27.720.000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL								\$ 66.726.000
OTROS COSTOS DIRECTOS								
2	OTROS COSTOS DIRECTOS	Unidad	Cant.	Dedicacion		Vr Unitario		Valor Total
2.1	Papelería	Un	1	100%		\$ 286.120		\$ 286.120
2.2	Transporte 4x4 con conductor	mes	4	100%		\$ 7.300.000		\$ 29.200.000
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS								\$ 29.486.120
RESUMEN GENERAL								
COSTO TOTAL (1 + 2)								\$ 96.212.120
IVA 19%								\$ 18.280.302,0
VALOR TOTAL INTERVENTORIA								\$ 114.492.422


 JUAN CARLOS AMAYA BAUTISTA
 REPRESENTANTE LEGAL PRIDA SAS

CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA.

<u>FACTOR MULTIPLICADOR</u>		
	<u>CONCEPTO</u>	<u>PORCENTAJE</u>
1,	<u>Salarios y Prestaciones Sociales de Personal Facturable</u>	
1,1	Salarios	100,00%
1,2	Prima anual (legal) $100,00\% \div 12 =$	8,33%
1,3	Cesantía $100,00\% \div 12 =$	8,33%
1,4	Intereses de cesantía $1,00\% \times 1.3. =$	1,30%
1,5	Vacaciones	4,17%
1,6	Seguridad Social (salud + pensión)	20,50%
1,7	Caja de Compensación Familiar	4,00%
1,8	ARP	2,50%
1,9	Sena	2,00%
1,10	ICBF	3,00%
1,11	Otros (Auxilios varios, prestaciones extralegales, Incapacidades no cubertas)	1,00%
	Sub-total	155,13%
2,	<u>Gastos Directos</u>	
2,1	Arriendo oficina	1,50%
2,2	Administración edificio	0,40%
2,3	Servicios públicos	0,50%
	Sub-total	2,40%
3,	<u>Gastos Generales</u>	
3,2	Asesoría contable, tributaria y Juridica	1,50%
3,5	Documentación Técnica	2,50%
3,6	Personal Administrativo no facturado	3,80%
3,8	Depreciación de muebles y equipos	0,70%
3,9	Licenciamiento de software	0,50%
3,10	Gastos de Representación y otros	2,80%
	Sub-total	11,80%
4,	<u>Costos Directos no Reembolsables</u>	
4,1	Poliza de Calidad	0,51%
4,2	Póliza Cumplimiento	0,66%
4,3	Póliza Salarios y prestaciones Sociales	0,80%
4,4	Estampilla Pro cultura	2,20%
4,5	Estampilla Pro departamental	2,90%
4,6	Estampilla Pro desarrollo fronterizo	0,70%
4,7	Prouniversidad	2,90%
	Sub-total	10,67%
5,	<u>Honorarios (Utilidad del consultor y costos no previstos)</u>	18,00%
T O T A L		198,00%


 JUAN CARLOS AMAYA BAUTISTA
 REPRESENTANTE LEGAL PRIDA SAS



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 25 de 15

**Intercambio de correspondencia
Mes de Julio**



202407183500038842

Riohacha,

Ingeniero:

JUAN CARLOS AMAYA BAUTISTA

Representante legal PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL SAS (PRIDA)

Contrato de interventoría N° 070 de 2024 (CMA 0004 DE 2024)

Email: pridasas702024@gmail.com

Celular: 3102127607

Asunto: Requerimiento para la presentación de informe de avance.

Cordial saludo:

En mi calidad de supervisor designado del contrato N° 070 de 2024, debo ser insistente y recordarle al contratista que la entrega de los informes de avance mensual debe ser entregado los primeros días de cada mes de manera puntual. Sumado a lo anterior recordamos al contratista sobre las obligaciones contraídas con la firma del contrato, las cuales están especificadas en la minuta contractual en este caso especialmente en la *cláusula novena OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA en los siguientes incisos:*

Inciso 1. Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo sus Anexos y su Pliego de Condiciones.

Inciso 2. Entregar el Cronograma estimado de la ejecución de las actividades.

Inciso 3. Colaborar con La Corporación en cualquier requerimiento que ella haga.

Inciso 11. Dar estricto cumplimiento de acuerdo a la labor encomendada de conformidad con lo establecido en el estatuto de contratación y al contrato que suscriba con la entidad contratante, así como las recomendaciones y sugerencias impartidas por el (os) supervisor del contrato.

Inciso 15. Rendir y elaborar los informes, conceptos y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato, teniendo en cuenta que deben remitir dichos informes de avance técnico y presupuestal el primer día hábil de cada mes independientemente de la fecha del acta de inicio.

Inciso 16. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la Corporación.

Inciso 20. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato.

Inciso 21. Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley y demás normas concordantes, requisito que deberá tenerse en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato.

Inciso 23. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.

Inciso 24. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, igualmente la elaboración de



SC-CER894723

SA-CER731710

Cra. 7 # 12-15, Riohacha - Colombia
Tel: (5) 727 3905 Telefax: (5) 727 3904
Laboratorio: (5) 727 5052 - Fonseca (5) 775 6123
www.corpoguajira.gov.co



los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con La Corporación autónoma regional de La Guajira.

Inciso 33. Presentar la información de la ejecución mensual física y financiera al área supervisora el primer día hábil de cada mes de cada una de las actividades y sub-actividades con cantidades, porcentajes, y demás unidades de medida aplicables que sean establecidas por la oficina asesora de planeación.

Inciso 35. Elaborar una memoria de cálculo actualizada semanalmente durante todo el tiempo de ejecución del proyecto, cabe precisar que esta memoria debe ser clara, verificable y estar disponible de manera continua en el proyecto en ejecución.

Inciso 39. Tanto la información de avance parcial como el informe final y sus anexos, evidencias y/o documentos afines deben ser remitidos en formato físico y magnético, según consideraciones de la supervisión.

Aprovecho la oportunidad para solicitar de manera oficial al contratista, presentar metodología y plan de trabajo de la interventoría para el seguimiento técnico administrativo y financiero al contrato N° 070 de 2024, de igual manera informales que de acuerdo a directrices impartidas desde el área de jurídica cada contratista tiene la responsabilidad de realizar el cargue de los informes de avance, así como el de las cuentas que se adelanten a la plataforma de secopII con su respectivo usuario. Los informes deben ser enviados a los supervisores el primer día de cada mes, es así como respetuosamente recomiendo enviar informes de avances y final antes del cargue a la plataforma secopII para su revisión y luego de subsanados los requerimientos y validados por el supervisor proceder con su cargue en plataforma, para lo cual propongo que estos informes puedan ser enviado a más tardar los días 30 de cada mes, si se puede antes es mucho mejor.

En aras de dar cumplimiento con los requerimientos hechos a través de la circular interna con radicado N° 202211083440024613 del 08 de noviembre de 2022 en cuyo asunto establece articulación entre supervisores de contratos principales y de interventoría así como el documento de dirección y oficina de control interno con radicado N° 20221109344002477 de asunto seguimiento, vigilancia y control en el ejercicio de supervisión de contrato y teniendo en cuenta la necesidad de realizar el debido seguimiento, control y recibo a satisfacción al contrato N° 070 de 2024 el cual inició el día 04 de julio de 2024. Envío información para la estructura de los informes de avance presentado por el contratista.

Así, el informe de interventoría deberá ser estructurado siguiendo las necesidades técnicas, administrativas y financieras que facilite el seguimiento de la supervisión y del contrato de interventoría donde se incluyen los ítems anteriormente expuestos y donde se tenga en cuenta las funciones generales del contratista, las funciones administrativas generales, las funciones técnicas generales de los interventores, funciones financieras generales de los interventores y las funciones generales de carácter operativo de los interventores especificadas en el contrato N° 070 de 2024, para lo cual se sugiero tener en cuenta el siguiente contenido para realizar la estructuración de los informes:

❖ Índice general

1. Introducción: Se debe presentar de forma clara y muy resumidamente, una visión general de lo que se trata el informe de interventoría en el tiempo relacionado.

2. Descripción del proyecto

2.1. Localización: Realizar gráficas o mapas y textualmente la localización de ejecución del proyecto.



Cra. 7 # 12-15, Riohacha - Colombia
Tel: (5) 727 3905 Telefax: (5) 727 3904
Laboratorio: (5) 727 5052 - Fonseca (5) 775 6123
www.corpoguajira.gov.co



2.2. Característica del proyecto: Describir los ítems más representativos del proyecto

3. Contrato de Obra

3.1. Información General del contrato: Realizar un resumen que incluya el No, fecha de Suscripción, objeto, contratista, valor, plazo, inicio, terminación, fechas de las actas de Suspensión, Reinicio, Prorrogas si las hay, Tiempo Transcurrido, Porcentaje de Obra Programada, Porcentaje de Obra Ejecutada, Porcentaje de Atraso, Actas Parciales.

3.2. Obras programadas y características técnicas del contrato: Dar cuenta del estado inicial del contrato con las cantidades y precios del mismo, así como expresar claramente las características técnicas contratadas del proyecto, Ítem, Descripción, unidad, Cantidad Valor Unitario, Valor Total

3.3. Obras ejecutadas en el período respectivo: Describir actividades desarrolladas por ítems, incluyendo reseña fotográfica de cada actividad relacionada en los diferentes frentes de trabajo y grafico de barras de control de cantidades (programadas en el periodo VS ejecutadas en el periodo) describiendo su porcentaje de avance o atraso con su justificación. Es decir, rinde cuenta de las actividades realizadas en el periodo que se está rindiendo dando balance del estado del contrato al momento de corte del informe.

3.4. Obras ejecutadas acumuladas a partir de la iniciación del contrato: Rendir cuenta de las actividades acumuladas desde el inicio del contrato. Realizando un gráfico (tipo Curva "S") que muestre el estado de las inversiones ejecutadas respecto a las programadas determinando el porcentaje de avance o atraso con su respectiva justificación técnica.

3.5. Control de programación de obra de acuerdo a la programación entregada por el contratista de obra: Se debe realizar una gráfica que muestre el estado de adelanto o atraso en días del contrato.

3.6. Informe de inversión del anticipo: Informar sobre el desarrollo del programa de las actividades de inversión y buen manejo de anticipo.

3.7. Recursos del contratista

3.7.1. Personal: Se debe informar y mostrar los formatos de control de personal y pagos parafiscales, control de elementos de seguridad industrial y control de seguridad industrial en obra.

3.7.2. Equipo: Se debe informar y mostrar los formatos de control de maquinaria y equipo

3.8. Control de calidad: Realizar una descripción de la calidad y estado de entrega de los ensayos de laboratorio ejecutados a los materiales y elementos de la obra, con su análisis y conclusiones y recibo de los productos describiendo las fechas en las cuales se efectuaron los ensayos, y los resultados obtenidos; asimismo, se incluirán los análisis y conclusiones correspondientes, detallando el seguimiento al plan de calidad del contratista e interventoría.

3.9. Estado general del tiempo: Informa el avance del tiempo basados en los controles del estado del tiempo realizados.

3.10. Dificultades presentadas durante el desarrollo del contrato: Este ítem es donde se pueden manifestar todos los contratiempos que se han presentado en la ejecución del contrato, las cuales deberán estar debidamente justificadas y anexas al informe.

4. Contrato de interventoría

4.1. Información general del contrato: Mostrar la información pertinente del contrato de interventoría, como Numero, año, Entidad Contratante, Contratista, Objeto del Contrato, Valor, Fecha de Suscripción, Fecha del Acta de Inicio, Suspensión, Reinicio, Prorrogas si las hay.

4.2. Actividades desarrolladas por la interventoría: Realizar un resumen de las actividades que ha realizado la interventoría a través del personal contratado en los aspectos técnica, administrativa financiera y contable.

4.2.1. Actas generadas en el periodo del informe: Relación de las actas, Informes semanales generadas en el periodo del informe.

4.2.2. Actas generadas en el desarrollo del contrato: Relación de las actas, Informes semanales generadas en el periodo del informe.



SC-CER894723



SA-CER731710



Cra. 7 # 12-15, Riohacha - Colombia
Tel: (5) 727 3905 Telefax: (5) 727 3904
Laboratorio: (5) 727 5052 - Fonseca (5) 775 6123
www.corpoguajira.gov.co



5. Cuadros control de personal y equipo: Elaborar un cuadro en los cuales se permita evidenciar el número de personas que laboran en la ejecución del contrato, y los equipos con que cuenta el contratista. Se debe informar y mostrar los formatos de control de maquinaria y equipo. Aportar hojas de vida del personal contratado y hacer una descripción general de las actividades desarrolladas por cada miembro del personal vinculado en relación a sus actividades (puede ser el informe que presenta el personal contratado de forma mensual).

6. Actas de Comité Técnico: Relacionar los comités realizados durante la ejecución del contrato.

7. Registro fotográfico: Este será un documento anexo con su respectivo pie de foto y evidencia la participación activa de la interventoría en la ejecución del contrato.

8. Correspondencia: Se deberá relacionar la correspondencia enviada y recibida por la interventoría en las tareas de ejecución del contrato.

9. Bitácora: Se anexará copia de este vital documento, donde el interventor (ingenieros residentes), lleva el diario, transcurrido día a día de la ejecución del contrato.

10. Observaciones, Recomendación y Conclusiones: Describir y justificar porcentualmente la ejecución y avance del proyecto o contrato en pesos y tiempos. Realizar las apreciaciones y recomendaciones técnicas, administrativas y contables relevantes en la ejecución del proyecto o contrato en el periodo respectivo. Identificar y describir si aplica, las posibles acciones que demanden cambios contractuales en la ejecución del proyecto.

10.1. Observaciones: Se debe realizar las observaciones que a bien considere pertinentes.

10.2. Recomendación: Se debe realizar las recomendaciones que a bien considere pertinentes.

10.3. Conclusiones: Se debe realizar las conclusiones que a bien considere pertinentes

Teniendo en cuenta lo anterior, es sumamente importante para Corpoguajira que la firma consultora haga la entrega de los soportes o evidencias mensuales a las obligaciones del contratista, es decir, la presentación de cada informe de avance debe estar soportada con las evidencias correspondientes, el cual reposaran en el expediente de dicho contrato que serán cargadas en el Secop II.

Por otro lado, es importante además tener en cuenta, los documentos adicionales complementarios a fin de mantener actualizado el expediente con toda la información del proceso. Para ello anexo documento con la información adicional complementaria.

Por último, recomiendo tener en cuenta en la información financiera, demostrar con evidencias documentales los conceptos especificados en el FACTOR MULTIPLICADOR, si estos NO pueden ser demostrados por parte del contratista, NO serán tenidos en cuenta al momento de liquidar cualquier factura presentada como pago de los servicios prestados.

Agradezco de antemano la atención prestada.

Atentamente,

JEFERSON J. BRACHO C
Supervisor contrato 070 del 2024

Anexo: Información requerida y complementaria para los contratos de obras e interventoría - proyectos estufas eco



Cra. 7 # 12-15, Riohacha - Colombia
Tel: (5) 727 3905 Telefax: (5) 727 3904
Laboratorio: (5) 727 5052 - Fonseca (5) 775 6123
www.corpoguajira.gov.co

INFORMACIÓN REQUERIDA Y COMPLEMENTARIA PARA LOS CONTRATOS DE OBRAS E INTERVENTORÍA - PROYECTOS ESTUFAS ECO

Teniendo en cuenta la necesidad de mantener actualizado los expedientes de los contratos no solo en la plataforma secop ii, si no además en la Corporación en los archivos de las supervisiones, en el cual se lleva el control de la revisión de los contratos de obras e interventoría y trazan un derrotero el cual es preciso corregir en los contratos que se están llevando a cabo en estos momentos por la Corporación y donde el Subdirector del área de gestión ambiental, el señor Manuel Manjarrez Altahona solicitó que se tenga en cuenta para documentar los expedientes de cada proyecto esto aplica para aquellos que estén en ejecución y los que se encuentran en la fase de entrega final y recibo a satisfacción de los contratos mencionados, los cuales deben incluir todos sin excepción esta información.

A. INFORMACIÓN LEGAL:

- 1) Contratos de obra, interventoría y suministro, ejecutados durante el desarrollo del proyecto.
- 2) Certificados de existencia y representación legal de los contratistas.
- 3) Registro único tributario – RUT de los contratistas.
- 4) Actas de inicio, actas de suspensión, actas de reinicio; actas de recibo a satisfacción, actas de terminación y actas de liquidación (si hay lugar), de los contratos celebrados.
- 5) Pólizas constituidas y los respectivos recibos de pago, incluyendo las modificaciones y certificaciones de aprobación.
- 6) Justificaciones técnicas y jurídicas de las adiciones y/o prórrogas, plazos efectuados y de las suspensiones y reinicio, en caso de aplicar.
- 7) Oficios de correspondencia completa del contrato entre contratistas, contratante e interventor.
- 8) Informes de supervisión e interventoría donde se evidencie los aspectos técnicos, financieros y administrativos de la ejecución del proyecto y contratos.
- 9) Certificados de tradición y libertad de los predios en donde se realiza la inversión de los recursos del SGR.
- 10). Plan de sostenibilidad del proyecto.

B INFORMACIÓN FINANCIERA

- 1) Certificados de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal del Contrato de obra, consultoría y/o interventoría.

- 2) Órdenes de pago, comprobantes de egreso, facturas y/o cuentas de cobro, soporte equivalente presentadas por el contratista con las correspondientes actas de consultoría, informes o recibo a satisfacción anexando soportes documentales de los pagos realizados legalizados. (pagos a los contratistas por parte de la entidad).
3. Contratos, soportes de pago de parafiscales, nomina, prestaciones sociales y liquidación del personal vinculado para desarrollar las actividades propias de los contratos de obra, consultoría y/o interventoría.
4. Contratos de prestación de servicios, con sus respectivos soportes de pago del personal vinculado para desarrollar las actividades propias de los contratos de obra, consultoría y/o interventoría.
5. Soportes Contables Legales (Facturas, Comprobantes de egreso, recibos de pago, etc.) para la Legalización de los gastos realizados por los contratistas de obra e interventoría para la ejecución de los contratos.
6. Plan de inversión del anticipo, extractos bancarios del manejo de la cuenta donde se consignó el anticipo, certificado de los rendimientos financieros generados en la cuenta y soporte de la devolución de estos al Tesoro Nacional.
7. Contratos de fiducias celebrados para el manejo de los anticipos entregados con ocasión de los contratos de obra, en los que se estableció el anticipo como forma de pago.
8. Contabilidad del proyecto debidamente legalizada con soportes contables legales en los contratos de obra, consultoría e interventoría.
9. Justificación y desglose del AI (administración e Imprevistos) del contratista de obra, detallando cada concepto.
10. Soportes Contables Legales (Facturas, Comprobantes de egreso, recibos de pago, etc.) para la Legalización de los gastos del AI (administración e Imprevistos) realizados en los contratos de obra.
11. Soportes Contables Legales (Facturas, Comprobantes de egreso, recibos de pago, etc.) para la Legalización de los gastos del factor multiplicador.
12. Copia legible de los actos administrativos de incorporación, adiciones y modificaciones presupuestales correspondientes al proyecto del SGR expedidos tanto por la entidad.
13. Soportes de la amortización de los anticipos entregados a los contratistas, en cada acta parcial. Para los Contratos de Obra, consultoría, Interventoría y de suministros.
14. Certificado de las deducciones y porcentaje de impuestos aplicadas por la Corporación a los pagos realizados a los contratos de obra, consultorías interventoría y suministro.
15. Soporte del pago de Impuestos Municipales (estampillas y renta). Para los contratos de obra, consultoría, interventoría y suministro.
20. Propuestas económicas de los contratos de obra, consultoría interventoría y suministro según aplique.

C. INFORMACIÓN TÉCNICA

1. Propuesta técnica de los contratos de obra, consultoría, interventoría y suministro adjudicados para el desarrollo del proyecto, según corresponda.
2. Cronograma de actividades para la ejecución de los contratos aprobados por la supervisión o la interventoría.
3. Información georreferenciada de la localización espacial del proyecto delimitada (polígono). (incluir fotografías aéreas, satelitales, coordenadas, mapas) la georreferenciación de los punto donde se instale las estufa, entregarlo en formato shapefile.
4. Localización con georreferenciación, nombre de la vereda y sana posecion del predio donde se establecerá la estufa ecoeficiente.
5. Especificaciones, características técnicas y diseños implementados para la Construcción de las estufas ecoeficientes.
6. Registro del proyecto en el Registro nacional de reducción de emisiones GEI establecido mediante el artículo 175 de la Ley 1753 de 2015, de acuerdo con la reglamentación que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expida para este fin.
7. Justificación y legalización con soportes contables legales, (facturas, cuentas de cobro, recibos, etc.) de los gastos realizados por el contratista para la construcción de las estufas ecoeficientes.
8. Justificación y legalización de los gastos realizados por el contratista para el desarrollo de las actividades de:
 - a. Actividades Preliminares.
 - b. Cosntrucción de estufas Eco
 - c. Talleres de socialización del proyecto y auditoria visible.
 - d. Taller de capacitación para la operación y mantenimiento de la Estufa Ecoeficiente (Manual, Carta de beneficio y otros).
 - e. Divulgación del proyecto
9. Informe técnico en donde se indique la metodología de las actividades desplegadas por el Contratista.
10. Actas parciales de pago, actas de entrega y recibo a satisfacción, actas de liquidación para los contratos de obra, interventoría y suministro adjudicados.
11. Análisis de precios unitarios APU de los contratos de Obra, justificación y legalización de los gastos de administración e imprevistos en contratos de obras, justificación y legalización de los gastos de los contratos de consultorías, Interventoría y suministro.
12. Listado de beneficiarios de los talleres y/o capacitaciones con la información de contacto de los asistentes (teléfono, correo electrónico, cedula).
13. Certificados de asistencia a los talleres y/o capacitaciones.

14. Material impreso entregado a los asistentes.

15. justificación y legalización con soportes contables legales de los gastos en los que incurrió el contratista para el desarrollo de las actividades.

16. Numero de talleres y/o capacitaciones realizadas, fecha, contenido y material que se compartió durante el desarrollo de los mismos.

12

Mail

Chat

Meet

Redactar

Recibidos12

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores67

Más

Etiquetas+

_Archive

_Draft

_Sent

Bulk

Gestion Ambiental

JEFERSON BRAC...97

pridasas702024@gmail.com

Activo

38 de 40

Pólizas y certificación Bancaria Externo Recibidos x

PRIDA SAS <pridasas702024@gmail.com> para mí

Respetado ingeniero, le informo que las pólizas ya fueron cargadas en el secop II tal y como fue solicitado, de igual manera anexo remito certificación bancaria actualizada.

Cordialmente

Juan Carlos Amaya Bautista
Representante Legal Prida Sas

1 archivo adjunto • Analizado por Gmail



12

Mail

Chat

Meet

Redactar

Recibidos12

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores67

Más

Etiquetas+

_Archive

_Draft

_Sent

Bulk

Gestion Ambiental

JEFERSON BRAC...97

pridasas702024@gmail.com

Activo

37 de 40

Plan de Inversión Del Anticipo Ajustado Externo Recibidos x

PRIDA SAS <pridasas702024@gmail.com> para mí

Respetado Ingeniero anexo remito plan de inversión del anticipo ajustado correspondiente al contrato 070 de 2024 .

Cordialmente

Juan Carlos Amaya Bautista
Representante Legal Prida Sas

1 archivo adjunto • Analizado por Gmail



12

Mail

Chat

Meet

Redactar

Recibidos12

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores67

Más

Etiquetas+

_Archive

_Draft

_Sent

Bulk

Gestion Ambiental

JEFERSON BRAC...97

pridasas702024@gmail.com

Activo

36 de 40

Cronograma Contrato de obra 050 de 2024 Aprobado Externo Recibidos x

PRIDA SAS <pridasas702024@gmail.com> para stocad, j.salas, mí

Anexo remito para los fines pertinentes, Cronograma de obra aprobado correspondiente al contrato de obra 050 de 2024 el cual tiene por objeto CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DEL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA

Cordialmente

Juan Carlos AmayaBautista
Director de Interventoría
Contrato 070 de 2024

1 archivo adjunto • Analizado por Gmail





San Juan Del Cesar La Guajira Julio 10 de 2024

Oficio N° 01


Señor.
GERALD BRISSON MENDOZA
Representante legal Fundación Agua Luna
Barrancas

REF: Observaciones iniciales

Cordial saludo, por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de precisar algunas generalidades correspondientes al desarrollo, del contrato 084 de 2024 el cual tiene por objeto **"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DEL MILINO Y SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA"**.

1. El correo oficial de la interventoria para recibir y enviar correspondencia es pridasas702024@gmail.com
2. Los dias viernes de cada semana el contratista remitirá tanto a interventoria como a la supervisión la programación de actividades a ejecutar la semana siguiente.
3. El día lunes de cada semana el contratista remitirá tanto a interventoria como a la supervisión el avance de obra de la semana anterior.

Cordialmente,



Juan Carlos Amaya Bautista
Representante Legal
Prida Sas

San Juan Del Cesar, La Guajira, 16 de julio de 2024

Oficio N° 03


Señor.
GERALD BRISSON MENDOZA
Representante legal Fundación Agua Luna
Barrancas

REF: Solicitud de programación de actividades semanal.

Cordial saludo,

En desarrollo de las actividades del contrato de obra No 050 de 2023 el cual tiene por objeto **“CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010”** solicito a usted la programación de actividades correspondiente a la semana del 15 al 19 de julio de 2024, la cual hasta la fecha no ha sido recibida por esta interventoría, dicha programación había sido solicitada en el oficio con consecutivo N. 01 del día 10 de julio del presente año, por tal razón solicitamos enviar dicha programación a la mayor brevedad posible

Cordialmente



Juan Carlos Amaya Bautista
Director De Interventoría
Contrato 070 de 2023



CORPOGUAJIRA

FECHA: 09/08/2024 15:14:23

202408093500044502

Riohacha,

Ingeniero:

JUAN CARLOS AMAYA BAUTISTA

Representante legal PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL SAS (PRIDA)

Contrato de interventoría N° 070 de 2024 (CMA 0004 DE 2024)

Email: pridasas702024@gmail.com

Celular: 3102127607

Asunto: Reitero requerimiento al oficio con radicado N° 202407183500038842

Ref: Requerimiento para la presentación de informe de avance.

Cordial saludo:

En mi calidad de supervisor designado del contrato N° 070 de 2024, debo ser insistente y recordarle al contratista que la entrega de los informes de avance mensual debe ser entregado los primeros días de cada mes de manera puntual. Sumado a lo anterior recordamos al contratista sobre las obligaciones contraídas con la firma del contrato, las cuales están especificadas en la minuta contractual en este caso especialmente en la *cláusula novena OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA en los siguientes incisos:*

Inciso 1. Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo sus Anexos y su Pliego de Condiciones.

Inciso 2. Entregar el Cronograma estimado de la ejecución de las actividades.

Inciso 3. Colaborar con La Corporación en cualquier requerimiento que ella haga.

Inciso 11. Dar estricto cumplimiento de acuerdo a la labor encomendada de conformidad con lo establecido en el estatuto de contratación y al contrato que suscriba con la entidad contratante, así como las recomendaciones y sugerencias impartidas por el (os) supervisor del contrato.

Inciso 15. Rendir y elaborar los informes, conceptos y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato, teniendo en cuenta que deben remitir dichos informes de avance técnico y presupuestal el primer día hábil de cada mes independientemente de la fecha del acta de inicio.

Inciso 16. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la Corporación.

Inciso 20. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato.

Inciso 21. Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley y demás normas concordantes, requisito que deberá tenerse en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato.

Inciso 23. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.



SC-CER894723



SA-CER731710



Cra. 7 # 12-15, Riohacha - Colombia
Tel: (5) 727 3905 Telefax: (5) 727 3904
Laboratorio: (5) 727 5052 - Fonseca (5) 775 6123
www.corpoguajira.gov.co



Inciso 24. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con La Corporación autónoma regional de La Guajira.

Inciso 33. Presentar la información de la ejecución mensual física y financiera al área supervisora el primer día hábil de cada mes de cada una de las actividades y sub-actividades con cantidades, porcentajes, y demás unidades de medida aplicables que sean establecidas por la oficina asesora de planeación.

Inciso 35. Elaborar una memoria de cálculo actualizada semanalmente durante todo el tiempo de ejecución del proyecto, cabe precisar que esta memoria debe ser clara, verificable y estar disponible de manera continua en el proyecto en ejecución.

Inciso 39. Tanto la información de avance parcial como el informe final y sus anexos, evidencias y/o documentos afines deben ser remitidos en formato físico y magnético, según consideraciones de la supervisión.

Aprovecho la oportunidad para informales que de acuerdo a directrices impartidas desde el área de jurídica cada contratista tiene la responsabilidad de realizar el cargue de los informes de avance, así como el de las cuentas que se adelanten a la plataforma de secopII con su respectivo usuario. Los informes deben ser enviados a los supervisores el primer día de cada mes, es así como respetuosamente recomiendo enviar informes de avances y final antes del cargue a la plataforma secopII para su revisión y luego de subsanados los requerimientos y validados por el supervisor proceder con su cargue en plataforma, para lo cual propongo que estos informes puedan ser enviado a más tardar los días 30 de cada mes, si se puede antes es mucho mejor.

En aras de dar cumplimiento con los requerimientos hechos a través de la circular interna con radicado N° 202211083440024613 del 08 de noviembre de 2022 en cuyo asunto establece articulación entre supervisores de contratos principales y de interventoría así como el documento de dirección y oficina de control interno con radicado N° 20221109344002477 de asunto seguimiento, vigilancia y control en el ejercicio de supervisión de contrato y teniendo en cuenta la necesidad de realizar el debido seguimiento, control y recibo a satisfacción al contrato N° 070 de 2024 el cual inició el día 04 de julio de 2024 y a la fecha del día de hoy no se cuenta con el informe de avance de interventoría N° 01 correspondiente al mes de julio, con la estructura de los informes de avance presentado al contratista de interventoría, por lo cual se hace un llamado al contratista para que haga llegar en un plazo perentorio de 3 días el informe de avance del mes de julio.

Teniendo en cuenta lo anterior, es sumamente importante para Corpoguajira que la firma consultora haga la entrega de los soportes o evidencias mensuales a las obligaciones del contratista, es decir, la presentación de cada informe de avance debe estar soportada con las evidencias correspondientes, el cual reposaran en el expediente de dicho contrato que serán cargadas en el Secop II.

Por último, recomiendo tener en cuenta en la información financiera, demostrar con evidencias documentales los conceptos especificados en el FACTOR MULTIPLICADOR, si estos NO pueden ser demostrados por parte del contratista, NO serán tenidos en cuenta al momento de liquidar cualquier factura presentada como pago de los servicios prestados.



Cra. 7 # 12-15, Riohacha - Colombia
Tel: (5) 727 3905 Telefax: (5) 727 3904
Laboratorio: (5) 727 5052 - Fonseca (5) 775 6123
www.corpoguajira.gov.co



Agradezco de antemano la atención prestada.

Atentamente,

JEFERSON J. BRACHO C
Supervisor contrato 070 del 2024



Cra. 7 # 12-15, Riohacha - Colombia
Tel: (5) 727 3905 Telefax: (5) 727 3904
Laboratorio: (5) 727 5052 - Fonseca (5) 775 6123
www.corpoguajira.gov.co



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 28 de 15

Intercambio de correspondencia
Mes de Agosto



202408093500044502

Riohacha,

Ingeniero:

JUAN CARLOS AMAYA BAUTISTA

Representante legal PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL SAS (PRIDA)

Contrato de interventoría N° 070 de 2024 (CMA 0004 DE 2024)

Email: pridasas702024@gmail.com

Celular: 3102127607

Asunto: Reitero requerimiento al oficio con radicado N° 202407183500038842

Ref: Requerimiento para la presentación de informe de avance.

Cordial saludo:

En mi calidad de supervisor designado del contrato N° 070 de 2024, debo ser insistente y recordarle al contratista que la entrega de los informes de avance mensual debe ser entregado los primeros días de cada mes de manera puntual. Sumado a lo anterior recordamos al contratista sobre las obligaciones contraídas con la firma del contrato, las cuales están especificadas en la minuta contractual en este caso especialmente en la *cláusula novena OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA en los siguientes incisos:*

Inciso 1. Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo sus Anexos y su Pliego de Condiciones.

Inciso 2. Entregar el Cronograma estimado de la ejecución de las actividades.

Inciso 3. Colaborar con La Corporación en cualquier requerimiento que ella haga.

Inciso 11. Dar estricto cumplimiento de acuerdo a la labor encomendada de conformidad con lo establecido en el estatuto de contratación y al contrato que suscriba con la entidad contratante, así como las recomendaciones y sugerencias impartidas por el (os) supervisor del contrato.

Inciso 15. Rendir y elaborar los informes, conceptos y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato, teniendo en cuenta que deben remitir dichos informes de avance técnico y presupuestal el primer día hábil de cada mes independientemente de la fecha del acta de inicio.

Inciso 16. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la Corporación.

Inciso 20. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato.

Inciso 21. Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley y demás normas concordantes, requisito que deberá tenerse en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato.

Inciso 23. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.



Cra. 7 # 12-15, Riohacha - Colombia
Tel: (5) 727 3905 Telefax: (5) 727 3904
Laboratorio: (5) 727 5052 - Fonseca (5) 775 6123
www.corpoguajira.gov.co



Inciso 24. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con La Corporación autónoma regional de La Guajira.

Inciso 33. Presentar la información de la ejecución mensual física y financiera al área supervisora el primer día hábil de cada mes de cada una de las actividades y sub-actividades con cantidades, porcentajes, y demás unidades de medida aplicables que sean establecidas por la oficina asesora de planeación.

Inciso 35. Elaborar una memoria de cálculo actualizada semanalmente durante todo el tiempo de ejecución del proyecto, cabe precisar que esta memoria debe ser clara, verificable y estar disponible de manera continua en el proyecto en ejecución.

Inciso 39. Tanto la información de avance parcial como el informe final y sus anexos, evidencias y/o documentos afines deben ser remitidos en formato físico y magnético, según consideraciones de la supervisión.

Aprovecho la oportunidad para informales que de acuerdo a directrices impartidas desde el área de jurídica cada contratista tiene la responsabilidad de realizar el cargue de los informes de avance, así como el de las cuentas que se adelanten a la plataforma de secopII con su respectivo usuario. Los informes deben ser enviados a los supervisores el primer día de cada mes, es así como respetuosamente recomiendo enviar informes de avances y final antes del cargue a la plataforma secopII para su revisión y luego de subsanados los requerimientos y validados por el supervisor proceder con su cargue en plataforma, para lo cual propongo que estos informes puedan ser enviado a más tardar los días 30 de cada mes, si se puede antes es mucho mejor.

En aras de dar cumplimiento con los requerimientos hechos a través de la circular interna con radicado N° 202211083440024613 del 08 de noviembre de 2022 en cuyo asunto establece articulación entre supervisores de contratos principales y de interventoría así como el documento de dirección y oficina de control interno con radicado N° 20221109344002477 de asunto seguimiento, vigilancia y control en el ejercicio de supervisión de contrato y teniendo en cuenta la necesidad de realizar el debido seguimiento, control y recibo a satisfacción al contrato N° 070 de 2024 el cual inició el día 04 de julio de 2024 y a la fecha del día de hoy no se cuenta con el informe de avance de interventoría N° 01 correspondiente al mes de julio, con la estructura de los informes de avance presentado al contratista de interventoría, por lo cual se hace un llamado al contratista para que haga llegar en un plazo perentorio de 3 días el informe de avance del mes de julio.

Teniendo en cuenta lo anterior, es sumamente importante para Corpoguajira que la firma consultora haga la entrega de los soportes o evidencias mensuales a las obligaciones del contratista, es decir, la presentación de cada informe de avance debe estar soportada con las evidencias correspondientes, el cual reposaran en el expediente de dicho contrato que serán cargadas en el Secop II.

Por último, recomiendo tener en cuenta en la información financiera, demostrar con evidencias documentales los conceptos especificados en el FACTOR MULTIPLICADOR, si estos NO pueden ser demostrados por parte del contratista, NO serán tenidos en cuenta al momento de liquidar cualquier factura presentada como pago de los servicios prestados.



Cra. 7 # 12-15, Riohacha - Colombia
Tel: (5) 727 3905 Telefax: (5) 727 3904
Laboratorio: (5) 727 5052 - Fonseca (5) 775 6123
www.corpoguajira.gov.co



Agradezco de antemano la atención prestada.

Atentamente,

JEFERSON J. BRACHO C
Supervisor contrato 070 del 2024



Cra. 7 # 12-15, Riohacha - Colombia
Tel: (5) 727 3905 Telefax: (5) 727 3904
Laboratorio: (5) 727 5052 - Fonseca (5) 775 6123
www.corpoguajira.gov.co



202408213440073451

San Juan Del Cesar La Guajira, 12 de agosto de 2024

Oficio No. 6

Ingeniero
JEFFERSON BRACHO
Supervisor Contrato 070 DE 2024
Riohacha

Ref: Cambio de personal

Cordial Saludo:

En desarrollo de las actividades correspondientes al contrato de interventoría No 070 de 2024 el cual tiene por objeto "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA, PARA EL PROYECTO DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA.CÓDIGO BPIN 20233218000010" Me permito solicitar aprobación para realizar cambio de personal para el cargo de técnico operativo de:

Profesional actual	Profesional nuevo	Cargo
DORIS EDILMA ROZO	YENIRETH GUTIERREZ JEREZ	Auxiliar De Oficina

Se adjunta hoja de vida de la ingeniera ambiental YENIRETH GUTIERREZ JEREZ, para que sea revisada y verificada por usted, lo cual representa una mejora en el perfil, tal y como lo dictamina la norma

Cordialmente

Juan Carlos Amaya Bautista
Director De Interventoría
Al Contrato 050 de 2024



CORPOGUAJIRA

FECHA: 26/08/2024 16:59:56

202408263500047262

Ingeniero:

JUAN CARLOS AMAYA BUTISTA

Representante legal PRIDA SAS

Contrato de Interventoría N° 070 de 2024 (CMA 0004 DE 2024)

Email: pridasas702024@gmail.com

Celular: 3102127607

Asunto: Revisión del informe de avance N° 01 al contrato de interventoría N° 070 de 2024 correspondiente al mes de julio de 2023

Cordial saludo:

Revisando la información contenida en el informe de avance N° 01 correspondiente al período comprendido entre el 04 al 31 de julio del presente año, el cual fue presentado el pasado 12 de agosto a través de correo electrónico, se pudo concluir lo siguiente:

1) Se requiere presentar los Contratos del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato de interventoría, los cuales son aquellos presentados en la propuesta dentro del proceso N° CMA 0004 DE 2024.

- Director de Interventoría (Dedicación 50%) – Juan Carlos Amaya Bautista
- Profesional del área social (Dedicación 50%) – Yisrlen Cristina Fragoso Fuentes
- Ingeniero Ambiental (Dedicación 100%) – Carolaine Celedón Matute
- Auxiliar de Oficina (Dedicación 50%) – Doris Edilma Roza Santana, solicitada en remplazo por: Yenireth Gutiérrez Jerez

En el ítem 5.3 Cuadro control de personal y equipo, No se relaciona el auxiliar de oficina, toda vez que en el ítem 5.4.2 Ejecución financiera del periodo Contrato de interventoría, si relacionan pago efectuado además se aclara que se recibió solicitud para el cambio de personal (Auxiliar de oficina) para finales del mes de julio.

Aprovecho para recordarles que cualquier actuación relacionada con la modificación de personal que conforma el equipo de trabajo presentado para cumplir con el objeto contractual, debe solicitarse a la entidad contratante a través del supervisor del contrato quien realizará su evaluación y aprobación si cumple con los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones del proceso de contratación CMA 0004 DE 2024, dado que el profesional propuesto para remplazar cualquier miembro del equipo de trabajo debe mejorar o igualar las condiciones con las que participó en el proceso de contratación. Para el caso en particular este cumple con los requerimientos.

2) Se requiere presentar los Soportes, planillas de pago mensual a aportes al sistema de seguridad social y parafiscales del personal que labora en la Interventoría y que hace parte del equipo conformado por Prida SAS. Además, no se presentan evidencia de los pagos realizados o cuentas por pagar al personal de interventoría contratado por concepto de salarios. Se solicita al contratista aclarar lo relacionado con este tema, dado que solo se anexaron tres planillas de pago de seguridad social, correspondiente a igual número de personal, cuando se informa la presencia de 4 profesionales.



Cra. 7 # 12-15, Riohacha - Colombia

Tel: (5) 727 3905 Telefax: (5) 727 3904

Laboratorio: (5) 727 5052 - Fonseca (5) 775 6123

www.corpoguajira.gov.co



3) Es preciso tener en cuenta lo relacionado con el Factor multiplicador (FM), si bien es cierto el contratista no está obligado a mantener en nómina al personal presentado, se le recuerdan que existen unos compromisos establecidos con el FM donde se especifican los siguientes conceptos:

CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA.

FACTOR MULTIPLICADOR		
CONCEPTO		PORCENTAJE
1.	Salarios y Prestaciones Sociales de Personal Facturable	
1.1	Salarios	100,00%
1.2	Prima anual (legal) 100,00% + 12 =	8,33%
1.3	Cesantía 100,00% + 12 =	8,33%
1.4	Intereses de cesantía 1,00% x 1.3. =	1,30%
1.5	Vacaciones	4,17%
1.6	Seguridad Social (salud + pensión)	20,50%
1.7	Caja de Compensación Familiar	4,00%
1.8	ARP	2,50%
1.9	Sena	2,00%
1.10	ICBF	3,00%
1.11	Otros (Auxilios varios, prestaciones extralegales, Incapacidades no cubiertas)	1,00%
	Sub-total	155,13%

En base a lo anterior se solicita las evidencias que demuestren los anteriores conceptos incluidos en los salarios y prestaciones sociales del personal facturable.

Así mismo, siguiendo con los conceptos incluidos en el FM, relacionados con los ítems 2 y 3 se deben presentar las evidencias relacionadas con estos gastos relacionados, como se muestran a continuación:

2.	Gastos Directos	
2.1	Arriendo oficina	1,50%
2.2	Administración edificio	0,40%
2.3	Servicios públicos	0,50%
	Sub-total	2,40%
3.	Gastos Generales	
3.2	Asesoría contable, tributaria y Jurídica	1,50%
3.5	Documentación Técnica	2,50%
3.6	Personal Administrativo no facturado	3,80%
3.8	Depreciación de muebles y equipos	0,70%
3.9	Licenciamiento de software	0,50%
3.10	Gastos de Representación y otros	2,80%
	Sub-total	11,80%

4) En el informe de avance se presentan gastos relacionados con transporte 4x4 con conductor; sin embargo, no se anexan las evidencias relacionadas con: características, documentación del vehículo y el pago efectuados al beneficiario. De igual manera, se debe presentar facturas y o soportes de los gastos efectuados con ocasión de la papelería.

5) Se requiere recordar al contratista de obra sobre la instalación de la valla informativa en los términos establecido en el contrato. A la fecha de presentación del informe de avance del mes de julio no existen evidencias del montaje de la valla; de igual manera recordarles que toda información relacionada con la divulgación del proyecto debe ser coordinada o contar con la aprobación de la Corporación a través de la oficina asesora de Comunicaciones. Clausula 9, inciso 33, contrato de interventoría.

6) Se sugiere que se solicite al contratista de obra evidencia o copia del acta de creación del comité de veeduría ciudadana, establecido por la comunidad para vigilancia del contrato N° 050 de 2024.



SC-CER894723 SA-CER731710

Cra. 7 # 12-15, Riohacha - Colombia
Tel: (5) 727 3905 Telefax: (5) 727 3904
Laboratorio: (5) 727 5052 - Fonseca (5) 775 6123
www.corpoguajira.gov.co



7) teniendo en cuenta que el contratista cuenta con personal con dedicación al 100% como ingeniero residente se recomienda llevar registros de bitácora de las actividades que corresponden a la ejecución del contrato N° 050 de 2024, relacionarlas y anexarlas en los informes de avance.

8) En el informe de avance del mes de julio no se relacionan anexos correspondientes a la actividad de socialización como es el registro de asistencia, solo se relacionan registro fotográfico. Se recomienda al contratista adjuntar esta información.

9) Elaborar una memoria de cálculo actualizada semanalmente durante todo el tiempo de ejecución del proyecto, cabe precisar que esta memoria debe ser clara, verificable y estar disponible de manera continua en el proyecto en ejecución. Clausula Novena (9), inciso 35.

10) Se solicita al contratista presentar metodología y plan de trabajo de la interventoría incluido cronograma de ejecución de actividades actualizada a partir del acta de inicio para el seguimiento técnico administrativo y financiero al contrato N° 070 de 2024.

11) Se recomienda que los anexos se relacionen en el texto del documento y estos se ordenen como anexo con sus hojas divisorias, por ejemplo: anexo fotográfico, acta de visita, Bitácora de campo, anexo contables y financieros, intercambio de correspondencia, etc.

12) En el texto del informe se enumera el intercambio de correspondencia en el ítem 4.2.1.1. Correspondencia Enviada y Recibida; sin embargo, no se anexan las evidencias: se solicita al contratista anexar la correspondencia enviada y recibida y relacionarlo en el texto.

13) En el texto del informe no se relaciona el seguimiento ambiental de las obras y el cumplimiento de las normas en la materia. Se recomienda especificar en el texto del informe lo correspondiente al seguimiento en materia ambiental realizado por la interventoría a las obras y su cumplimiento con la normatividad ambiental.

14) En las observaciones de la interventoría en el ítem 6.1 Observaciones; se debe tener en cuenta que, si no existe la pared o muro en el predio del contratista para el apoyo de la estufa ecoeficiente, es deber del contratista de obra realizar su construcción tal como fue aclarado el tema, por lo cual no se debe realizar estas recomendaciones a los propietarios, pues su deber es tener un sitio adecuado con su respectiva cubierta o techo para protección de la estufa. Por tanto, se debe corregir las observaciones de la viñeta 1 y 3 de la interventoría.

Por último, se le recuerda al contratista que para la validación y aprobación de los informes de avance se debe entregar con todas las evidencias anexas correspondientes.

Agradezco revisar las recomendaciones y atender con prontitud las solicitudes al respecto.

Atentamente,


JEFERSON J. BRACHO C
 Supervisor contrato 070 del 2024



Cra. 7 # 12-15, Riohacha - Colombia
 Tel: (5) 727 3905 Telefax: (5) 727 3904
 Laboratorio: (5) 727 5052 - Fonseca (5) 775 6123
www.corpoguajira.gov.co



Riohacha,



CORPOGUAJIRA

FECHA: 09/09/2024 09:55:33

202409093500050232

Ingeniero:

JUAN CARLOS AMAYA BAUTISTA

Representante legal PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL SAS (PRIDA)

Contrato de interventoría N° 070 de 2024 (CMA 0004 DE 2024)

Email: pridasas702024@gmail.com

Celular: 3102127607

Asunto: Requerimiento de informe de avance N° 02 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2024 y los ajustes sugeridos al informe de avance N° 01.

Cordial saludo:

En mi calidad de supervisor designado del contrato N° 070 de 2024, debo ser insistente y recordarle al contratista que la entrega de los informes de avance mensual debe ser entregado el primer día de cada mes de manera puntual. Sumado a lo anterior recordamos al contratista sobre las obligaciones contraídas con la firma del contrato, las cuales están especificadas en la minuta contractual en este caso especialmente en la *cláusula novena OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA en los siguientes incisos:*

Inciso 1. Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo sus Anexos y su Pliego de Condiciones.

Inciso 2. Entregar el Cronograma estimado de la ejecución de las actividades.

Inciso 3. Colaborar con La Corporación en cualquier requerimiento que ella haga.

Inciso 11. Dar estricto cumplimiento de acuerdo a la labor encomendada de conformidad con lo establecido en el estatuto de contratación y al contrato que suscriba con la entidad contratante, así como las recomendaciones y sugerencias impartidas por el (os) supervisor del contrato.

Inciso 15. Rendir y elaborar los informes, conceptos y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato, teniendo en cuenta que deben remitir dichos informes de avance técnico y presupuestal el primer día hábil de cada mes independientemente de la fecha del acta de inicio.

Inciso 16. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la Corporación.

Inciso 20. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato.

Inciso 21. Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley y demás normas concordantes, requisito que deberá tenerse en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato.



SC-CER894723



SA-CER731710



Cra. 7 # 12-15, Riohacha - Colombia
Tel: (5) 727 3905 Telefax: (5) 727 3904
Laboratorio: (5) 727 5052 - Fonseca (5) 775 6123
www.corpoguajira.gov.co



Inciso 23. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.

Inciso 24. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con La Corporación autónoma regional de La Guajira.

Inciso 33. Presentar la información de la ejecución mensual física y financiera al área supervisora el primer día hábil de cada mes de cada una de las actividades y sub-actividades con cantidades, porcentajes, y demás unidades de medida aplicables que sean establecidas por la oficina asesora de planeación.

Inciso 35. Elaborar una memoria de cálculo actualizada semanalmente durante todo el tiempo de ejecución del proyecto, cabe precisar que esta memoria debe ser clara, verificable y estar disponible de manera continua en el proyecto en ejecución.

Inciso 39. Tanto la información de avance parcial como el informe final y sus anexos, evidencias y/o documentos afines deben ser remitidos en formato físico y magnético, según consideraciones de la supervisión.

Aprovecho la oportunidad para informales que de acuerdo a directrices impartidas desde el área de jurídica cada contratista tiene la responsabilidad de realizar el cargue de los informes de avance, así como el de las cuentas que se adelanten a la plataforma de secopII con su respectivo usuario. Los informes deben ser cargados el primer día de cada mes, es así como respetuosamente solicito realizar la entrega del informe de avance de interventoría N° 02 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2024 del contrato, dado que a la fecha no he recibido el respetivo reporte, al igual que subsanaciones requeridas al informe de avance N° 01 para realizar los trámites correspondientes. Recomendaciones enviar informes antes del cargue a la plataforma secopII para su revisión y luego de subsanados los requerimientos proceder con su cargue en plataforma, para lo cual estos informes deben ser enviado a más tardar los días 30 de cada mes. El informe de interventoría deberá ser estructurado siguiendo las necesidades técnicas, administrativas y financieras.

Teniendo en cuenta lo anterior, es sumamente importante para Corpoguajira que la firma consultora haga la entrega de los soportes o evidencias mensuales a las obligaciones del contratista, es decir, la presentación de cada informe de avance debe estar soportada con las evidencias correspondientes, el cual reposaran en el expediente de dicho contrato que serán cargadas en el Secop II.

Por último, recomiendo tener en cuenta en la información financiera, demostrar con evidencias documentales los conceptos especificados en el FACTOR MULTIPLICADOR, si estos NO pueden ser demostrados por parte del contratista, NO serán tenidos en cuenta al momento de liquidar cualquier factura presentada como pago de los servicios prestados.

Agradezco de antemano la atención prestada.

Atentamente,


JEFERSON J. BRACHO C
 Supervisor contrato 070 del 2024



Cra. 7 # 12-15, Riohacha - Colombia
 Tel: (5) 727 3905 Telefax: (5) 727 3904
 Laboratorio: (5) 727 5052 - Fonseca (5) 775 6123
www.corpoguajira.gov.co



San Juan Del Cesar La Guajira 9 octubre del 2024

oficio N° 5

Señores
GERALD BRISSON MENDOZA
Representante Legal De La Fundación Agua Luna

JEFFERSON JOSÉ BRACHO
Supervisor de interventoría 070 de 2024

LUIS HOYOS
Supervisor de obra 050 de 2024

Ref.: Citación a Comité técnico

Cordial saludo

Una vez concertada la programación para la celebración del comité técnico No. 1, esta interventoría les recuerda a las partes, supervisión y contratista de obra su asistencia para el día 13 de agosto del 2024 a las 9:00 am en las instalaciones de Corpoguajira territorial sur en Fonseca La Guajira; para dar seguimiento técnico a las actividades correspondientes al contrato No 50 de 2024 el cual tiene por objeto "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA".

Cordialmente,

Juan Carlos Amaya Bautista
Director De interventoría
Contrato 050 de 2024

San Juan Del Cesar La Guajira, 12 de agosto de 2024

Oficio No. 6

Ingeniero
JEFFERSON BRACHO
Supervisor Contrato 070 DE 2024
Riohacha

Ref: Cambio de personal


Cordial Saludo:

En desarrollo de las actividades correspondientes al contrato de interventoría No 070 de 2024 el cual tiene por objeto "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA, PARA EL PROYECTO DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA.CÓDIGO BPIN 20233218000010" Me permito solicitar aprobación para realizar cambio de personal para el cargo de técnico operativo de:

Profesional actual	Profesional nuevo	Cargo
DORIS EDILMA ROZO	YENIRETH GUTIERREZ JEREZ	Auxiliar De Oficina

Se adjunta hoja de vida de la ingeniera ambiental YENIRETH GUTIERREZ JEREZ, para que sea revisada y verificada por usted, lo cual representa una mejora en el perfil, tal y como lo dictamina la norma

Cordialmente



Juan Carlos Amaya Bautista
Director De Interventoría
Al Contrato 050 de 2024



Barrancas, 30 de agosto de 2024

MS-002

LUIS MANUEL HOYOS CASTRO

Supervisor.

JUAN CARLOS AMAYA BAUTISTA

PRIDA S.A.S

Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental

Interventoría.

Ref: Contrato de Obra No. 050 de 2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010"

Asunto: Capacitación a beneficiarios del proyecto en mención.

Cordial saludo,

En la presente extendemos la invitación a ustedes a la capacitación sobre el uso, manejo y mantenimiento de las estufas programada para el día de mañana 31 de agosto de 2024 a las 9:00 am en el municipio de El molino, Vereda manantial, predio del beneficiario Carlos Llanos.

Gracias por la atención prestada, quedamos atentos a sus comentarios.

Agradezco su atención

GERALD BRISSON MENDOZA

CC. 19.486.805 de Bogotá D.C

R/L de FUNDACION AGUA LUNA.



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 28 de 15

Intercambio de correspondencia
Mes de Septiembre



Riohacha,



CORPOGUAJIRA

FECHA: 09/09/2024 09:55:33

202409093500050232

Ingeniero:

JUAN CARLOS AMAYA BAUTISTA

Representante legal PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL SAS (PRIDA)

Contrato de interventoría N° 070 de 2024 (CMA 0004 DE 2024)

Email: pridasas702024@gmail.com

Celular: 3102127607

Asunto: Requerimiento de informe de avance N° 02 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2024 y los ajustes sugeridos al informe de avance N° 01.

Cordial saludo:

En mi calidad de supervisor designado del contrato N° 070 de 2024, debo ser insistente y recordarle al contratista que la entrega de los informes de avance mensual debe ser entregado el primer día de cada mes de manera puntual. Sumado a lo anterior recordamos al contratista sobre las obligaciones contraídas con la firma del contrato, las cuales están especificadas en la minuta contractual en este caso especialmente en la *cláusula novena OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA en los siguientes incisos:*

Inciso 1. Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo sus Anexos y su Pliego de Condiciones.

Inciso 2. Entregar el Cronograma estimado de la ejecución de las actividades.

Inciso 3. Colaborar con La Corporación en cualquier requerimiento que ella haga.

Inciso 11. Dar estricto cumplimiento de acuerdo a la labor encomendada de conformidad con lo establecido en el estatuto de contratación y al contrato que suscriba con la entidad contratante, así como las recomendaciones y sugerencias impartidas por el (os) supervisor del contrato.

Inciso 15. Rendir y elaborar los informes, conceptos y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato, teniendo en cuenta que deben remitir dichos informes de avance técnico y presupuestal el primer día hábil de cada mes independientemente de la fecha del acta de inicio.

Inciso 16. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la Corporación.

Inciso 20. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato.

Inciso 21. Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley y demás normas concordantes, requisito que deberá tenerse en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato.



SC-CER894723



SA-CER731710



Cra. 7 # 12-15, Riohacha - Colombia
Tel: (5) 727 3905 Telefax: (5) 727 3904
Laboratorio: (5) 727 5052 - Fonseca (5) 775 6123
www.corpoguajira.gov.co



Inciso 23. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.

Inciso 24. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con La Corporación autónoma regional de La Guajira.

Inciso 33. Presentar la información de la ejecución mensual física y financiera al área supervisora el primer día hábil de cada mes de cada una de las actividades y sub-actividades con cantidades, porcentajes, y demás unidades de medida aplicables que sean establecidas por la oficina asesora de planeación.

Inciso 35. Elaborar una memoria de cálculo actualizada semanalmente durante todo el tiempo de ejecución del proyecto, cabe precisar que esta memoria debe ser clara, verificable y estar disponible de manera continua en el proyecto en ejecución.

Inciso 39. Tanto la información de avance parcial como el informe final y sus anexos, evidencias y/o documentos afines deben ser remitidos en formato físico y magnético, según consideraciones de la supervisión.

Aprovecho la oportunidad para informales que de acuerdo a directrices impartidas desde el área de jurídica cada contratista tiene la responsabilidad de realizar el cargue de los informes de avance, así como el de las cuentas que se adelanten a la plataforma de secopII con su respectivo usuario. Los informes deben ser cargados el primer día de cada mes, es así como respetuosamente solicito realizar la entrega del informe de avance de interventoría N° 02 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2024 del contrato, dado que a la fecha no he recibido el respetivo reporte, al igual que subsanaciones requeridas al informe de avance N° 01 para realizar los trámites correspondientes. Recomendaciones enviar informes antes del cargue a la plataforma secopII para su revisión y luego de subsanados los requerimientos proceder con su cargue en plataforma, para lo cual estos informes deben ser enviado a más tardar los días 30 de cada mes. El informe de interventoría deberá ser estructurado siguiendo las necesidades técnicas, administrativas y financieras.

Teniendo en cuenta lo anterior, es sumamente importante para Corpoguajira que la firma consultora haga la entrega de los soportes o evidencias mensuales a las obligaciones del contratista, es decir, la presentación de cada informe de avance debe estar soportada con las evidencias correspondientes, el cual reposaran en el expediente de dicho contrato que serán cargadas en el Secop II.

Por último, recomiendo tener en cuenta en la información financiera, demostrar con evidencias documentales los conceptos especificados en el FACTOR MULTIPLICADOR, si estos NO pueden ser demostrados por parte del contratista, NO serán tenidos en cuenta al momento de liquidar cualquier factura presentada como pago de los servicios prestados.

Agradezco de antemano la atención prestada.

Atentamente,


JEFERSON J. BRACHO C
 Supervisor contrato 070 del 2024



Cra. 7 # 12-15, Riohacha - Colombia
 Tel: (5) 727 3905 Telefax: (5) 727 3904
 Laboratorio: (5) 727 5052 - Fonseca (5) 775 6123
www.corpoguajira.gov.co



CORPOGUAJIRA

FECHA: 11/09/2024 11:41:44

202409113500051072

Ingeniero:

JUAN CARLOS AMAYA BUTISTA

Representante legal PRIDA SAS

Contrato de Interventoría N° 070 de 2024 (CMA 0004 DE 2024)

Email: pridasas702024@gmail.com

Celular: 3102127607

Asunto: Revisión del informe de avance N° 02 al contrato de interventoría N° 070 de 2024 correspondiente al mes de agosto de 2024

Cordial saludo:

Revisando la información contenida en el informe de avance N° 02 correspondiente al período comprendido entre el 01 al 31 de agosto del presente año, el cual fue presentado el pasado 09 de septiembre a través de correo electrónico, se pudo concluir lo siguiente:

1) Se requiere presentar los Contratos del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato de interventoría, los cuales son aquellos presentados en la propuesta dentro del proceso N° CMA 0004 DE 2024.

- Director de Interventoría (Dedicación 50%) – Juan Carlos Amaya Bautista
- Profesional del área social (Dedicación 50%) – Yisrlen Cristina Fragozo Fuentes
- Ingeniero Ambiental (Dedicación 100%) – Caroline Celedón Matute
- Auxiliar de Oficina (Dedicación 50%) – Doris Edilma Roza Santana, solicitada en remplazo por: Yenireth Gutiérrez Jerez

En el Item 5.3 Cuadro control de personal y equipo, se relaciona a Yenireth Gutiérrez como técnico y no como auxiliar de oficina, corregir esta información dado que en todo el proceso se habla de auxiliar de oficina.

Aprovecho para recordarles que cualquier actuación relacionada con la modificación de personal que conforma el equipo de trabajo presentado para cumplir con el objeto contractual, debe solicitarse a la entidad contratante a través del supervisor del contrato quien realizará su evaluación y aprobación si cumple con los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones del proceso de contratación CMA 0004 DE 2024, dado que el profesional propuesto para remplazar cualquier miembro del equipo de trabajo debe mejorar o igualar las condiciones con las que participó en el proceso de contratación. Para el caso en particular este cumple con los requerimientos.

2) Revisados los Soportes, planillas de pago mensual a aportes al sistema de seguridad social y parafiscales del personal que labora en la Interventoría y que hace parte del equipo conformado por Prida SAS, no es posible identificar en el archivo de Caroline Celedón el pago relacionado con la ARL. Existen tres planillas como trabajadores independientes y una planilla como trabajador dependiente. No se presentan evidencia de los pagos realizados por concepto de salarios, cuentas por pagar, comprobantes de egresos, entre otros del personal de interventoría contratado. Se solicita al contratista aclarar lo relacionado con este tema.



SC-CER894723

SA-CER731710

Cra. 7 # 12-15, Riohacha - Colombia

Tel: (5) 727 3905 Telefax: (5) 727 3904

Laboratorio: (5) 727 5052 - Fonseca (5) 775 6123

www.corpoguajira.gov.co



3) Es preciso aclarar para tener en cuenta lo relacionado con el Factor multiplicador (FM), si bien es cierto el contratista no está obligado a mantener en nómina al personal presentado, se le recuerdan que existen unos compromisos establecidos con el FM donde se especifican los siguientes conceptos:

CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA.

FACTOR MULTIPLICADOR		
	CONCEPTO	PORCENTAJE
1.	Salarios y Prestaciones Sociales de Personal Facturable	
1.1	Salarios	100,00%
1.2	Prima anual (legal) 100,00% + 12 =	8,33%
1.3	Cesantía 100,00% + 12 =	8,33%
1.4	Intereses de cesantía 1,00% x 1.3. =	1,30%
1.5	Vacaciones	4,17%
1.6	Seguridad Social (salud + pensión)	20,50%
1.7	Caja de Compensación Familiar	4,00%
1.8	ARP	2,50%
1.9	Sena	2,00%
1.10	ICBF	3,00%
1.11	Otros (Auxilios varios, prestaciones extralegales, Incapacidades no cubiertas)	1,00%
	Sub-total	155,13%

En base a lo anterior se solicita las evidencias que demuestren los anteriores conceptos incluidos en los salarios y prestaciones sociales del personal facturable.

Así mismo, siguiendo con los conceptos incluidos en el FM, relacionados con los ítems 2 y 3 se deben presentar las evidencias relacionadas con estos gastos relacionados, como se muestran a continuación:

2.	Gastos Directos	
2.1	Arriendo oficina	1,50%
2.2	Administración edificio	0,40%
2.3	Servicios públicos	0,50%
	Sub-total	2,40%
3.	Gastos Generales	
3.2	Asesoría contable, tributaria y Jurídica	1,50%
3.5	Documentación Técnica	2,50%
3.6	Personal Administrativo no facturado	3,80%
3.8	Depreciación de muebles y equipos	0,70%
3.9	Licenciamiento de software	0,50%
3.10	Gastos de Representación y otros	2,80%
	Sub-total	11,80%

4) En el informe de avance se presentan gastos relacionados con transporte 4x4 con conductor; sin embargo, no se anexan las evidencias relacionadas con: características, documentación del vehículo y el pago efectuados al beneficiario. De igual manera, se debe presentar facturas y o soportes de los gastos efectuados con ocasión de la papelería.

5) Se sugiere que se solicite al contratista de obra evidencia o copia del acta de creación del comité de veeduría ciudadana, establecido por la comunidad para vigilancia del contrato N° 050 de 2024.

6) teniendo en cuenta que el contratista cuenta con personal con dedicación al 100% como ingeniero residente se recomienda llevar registros de bitácora de las actividades que corresponden a la ejecución del contrato N° 050 de 2024, relacionarlas y anexarlas en los informes de avance.



SC-CER894723 SA-CER731710

Cra. 7 # 12-15, Riohacha - Colombia
Tel: (5) 727 3905 Telefax: (5) 727 3904
Laboratorio: (5) 727 5052 - Fonseca (5) 775 6123
www.corpoguajira.gov.co



7) Elaborar una memoria de cálculo actualizada semanalmente durante todo el tiempo de ejecución del proyecto, cabe precisar que esta memoria debe ser clara, verificable y estar disponible de manera continua en el proyecto en ejecución. Clausula Novena (9), inciso 35.

8) Se solicita al contratista presentar metodología y plan de trabajo de la interventoría incluido cronograma de ejecución de actividades actualizada a partir del acta de inicio para el seguimiento técnico administrativo y financiero al contrato N° 070 de 2024.

9) Se recomienda que los anexos se relacionen en el texto del documento y estos se ordenen como anexo con sus hojas divisorias, por ejemplo: anexo fotográfico, acta de visita, Bitácora de campo, anexo contables y financieros, intercambio de correspondencia, etc. También se puede ordenar por archivos, pero referenciados en el texto.

10) En el texto del informe se enumera el intercambio de correspondencia en el ítem 4.2.1.1. Correspondencia Enviada y Recibida; sin embargo, no se anexan las evidencias: se solicita al contratista anexar la correspondencia enviada y recibida y relacionarlo en el texto.

11) En el texto del informe no se relaciona el seguimiento ambiental de las obras y el cumplimiento de las normas en la materia. Se recomienda especificar en el texto del informe lo correspondiente al seguimiento en materia ambiental realizado por la interventoría a las obras y su cumplimiento con la normatividad ambiental.

12) En las observaciones de la interventoría en el ítem 6.2 Recomendaciones; se debe tener en cuenta que, si no existe la pared o muro en el predio del contratista para el apoyo de la estufa ecoeficiente, es deber del contratista de obra realizar su construcción tal como fue aclarado el tema, por lo cual no se debe realizar estas recomendaciones a los propietarios, pues su deber es tener un sitio adecuado con su respectiva cubierta o techo para protección de la estufa. Por tanto, se debe corregir las recomendaciones.

Por último, se le recuerda al contratista que para la validación y aprobación de los informes de avance se debe entregar con todas las evidencias anexas correspondientes. Además de tener en cuenta las recomendaciones realizadas para los informes de avance, dado que se están presentando las mismas recomendaciones que informes anteriores.

Agradezco revisar las recomendaciones y atender con prontitud las solicitudes al respecto. Esto aplica para los informes de avance N° 01 y N° 02, los cuales presentan en general las mismas recomendaciones.

Atentamente,


JEFERSON J. BRACHO C
 Supervisor contrato 070 del 2024



Cra. 7 # 12-15, Riohacha - Colombia
 Tel: (5) 727 3905 Telefax: (5) 727 3904
 Laboratorio: (5) 727 5052 - Fonseca (5) 775 6123
www.corpoguajira.gov.co



202409253500054112

Ingeniero:

JUAN CARLOS AMAYA BUTISTA

Representante legal PRIDA SAS

Contrato de Interventoría N° 070 de 2024 (CMA 0004 DE 2024)

Email: pridasas702024@gmail.com

Celular: 3102127607

Asunto: Requerimiento a los ajustes realizados a los informes de avances N° 01 y N° 02 del contrato de interventoría N° 070 de 2024 y solicitud de informe de avance N°03

Cordial saludo:

En esta oportunidad paso a solicitarles los ajustes requerido a través de los oficios con radicados N° 202408263500047262 y 202409113500051072 del 26 de agosto y 11 de septiembre de 2022, donde se solicitan realizar ajustes a los informes de julio y agosto respectivamente, el cual a la fecha del día de hoy no se ha tenido respuesta por parte del contratista, esta información es importante presentarla para revisión y aprobación de dicho informe por parte de la supervisión con el fin de realizar el cargue oportuno de reportes con información calidad en la plataforma de secopii.

De igual manera, le informo que revisado la plataforma de secopii aún no se encuentran cargados los informes de avance del contrato de interventoría, el cual se configura en un hallazgo frente a cualquier auditoría y en especial al de los entes de control, por tanto, es preferible tomar acciones prontas que nos permita subsanar los inconvenientes y así evitar futuras sanciones y/o dificultades del tipo jurídico y administrativas.

Por último, se le recuerda al contratista que para la validación y aprobación de los informes de avance se debe entregar con todas las evidencias anexas correspondientes. Además de tener en cuenta las recomendaciones realizadas para los informes de avance, dado que han sido reiterativas para cada informe.

Agradezco tomar las medidas pertinentes para atender con prontitud los requerimientos al respecto. Esto aplica para los informes de avance N° 01 y N° 02, los cuales presentan en general las mismas recomendaciones y aprovecho la oportunidad para solicitar el informe de avance N° 03 del periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre de 2024.

Atentamente,



JEFERSON J. BRACHO C
Supervisor contrato 070 del 2024



Cra. 7 # 12-15, Riohacha - Colombia
Tel: (5) 727 3905 Telefax: (5) 727 3904
Laboratorio: (5) 727 5052 - Fonseca (5) 775 6123
www.corpoguajira.gov.co



San Juan Del Cesar La Guajira 10 de septiembre del 2024

oficio No. 8

Señores
GERALD BRISSON MENDOZA
Representante Legal De La Fundación Agua Luna

JEFFERSON JOSÉ BRACHO
Supervisor de interventoría 070 de 2024

LUIS HOYOS
Supervisor de obra 050 de 2024

Ref.: Citación a Comité técnico

Cordial saludo

Con el fin de dar seguimiento a las actividades correspondientes al contrato de obra No 50 de 2024 el cual tiene por objeto “CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA”, esta interventoría solicita la asistencia de La Fundación Agua Luna y los supervisores de obra e interventoría, a la celebración del segundo comité de seguimiento técnico el cual se desarrollará en las instalaciones de la sede principal de CORPOGUAJIRA, en la ciudad de Riohacha el día viernes 13 de septiembre del 2024 a las 9:00 a.m.

Cordialmente,

Juan Carlos Amaya Bautista
Director De interventoría
Contrato 050 de 2024



San Juan Del Cesar La Guajira 13 de septiembre del 2024

oficio No. 9

Señores
GERALD BRISSON MENDOZA
Representante Legal De La Fundación Agua Luna

Ref.: solicitud de cuadro comparativo y otros

Cordial saludo

En desarrollo de las actividades del contrato de obra No 050 de 2023 el cual tiene por objeto **“CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR – LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010”** solicito cuadro comparativo de coordenadas de los predios contenidos en los pliegos con los verificados en campo hasta la fecha.

Por su parte, se reitera la entrega de la programación de actividades que contenga por cada actividad los polígonos y puntos verificados tal y como lo solicitó supervisor de obra, el ingeniero Luis Hoyos en el comité de seguimiento No. 1 celebrado el 13 de agosto de 2024.

Así mismo, se reitera la solicitud de entrega del avance de obra de la semana anterior los días lunes de cada semana tal y como se solicitó en el oficio No. 1 enviado el día 10 de julio del presenta año, el cual deberá ser remitido tanto a interventoría como a la supervisión.

Cordialmente,

Juan Carlos Amaya Bautista
Director De interventoría
Contrato 050 de 2024

San Juan Del Cesar La Guajira 24 de septiembre del 2024

Oficio No. 10

Señores
GERALD BRISSON MENDOZA
Representante Legal De La Fundación Agua Luna
Contrato de obra 050 de 2024

Ref.: Requerimiento Entrega De Avance De
Obra

Cordial saludo

Teniendo en cuenta que en el oficio con consecutivo No 01 emitido por esta interventoría el 10 de julio de 2024 se le solicitó al contratista enviar avance de obra de la semana anterior todos los días lunes de cada semana, el cual no fue enviado; ante esta situación se le reitera en el oficio 09 del 13 de septiembre del 2024 la misma solicitud.

Sin embargo, hasta la fecha no hay respuesta por LA FUNDACION AGUA LUNA sobre la información solicitada, por tanto, se le requiere en el término perentorio de máximo 24 horas sea remitido a esta interventoría.

Cordialmente,



Juan Carlos Amaya Bautista
Director De interventoría
Contrato 050 de 2024

28

Mail

Chat

Meet

Gmail

Redactar

Recibidos

28

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores

73

Más

Etiquetas

+

_Archive

_Draft

_Sent

Bulk

Gestion Ambiental

JEFERSON BRA...

108

JULIO VEGA SUBDIREC...

KATERINE PAZ SE...

1

pridasas702024@gmail.com

Activo

Invitación actualizada: COMITE 2 CONTRATO 050 DE 2024 vie 13 de sept de 2024 4am - 5am (COT) (j.bracho@corpoguajira.gov.co)

Externo Recibidos x Gestion Ambiental/JEFERSON BRACHO x

PRIDA SAS <pridasas702024@gmail.com>

para mí, l.hoyos, fundagualuna, carolainecel30

sept

13

vie

COMITE 2 CONTRATO 050 DE 2024

Míralo en Google Calendar

Cuándo vie 13 de sept de 2024 4am - 5am (COT)

Participantes Luis Manuel Hoyos Castro, fundagualuna@gmail.com, carolainecel30@gmail.com, PRIDA SAS*

Agenda

vie 13 de sept de 2024

No hay eventos anteriores.

4am COMITE 2 CONTRATO 050 DE 2024

No hay eventos posteriores.

Este evento se ha actualizado



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 7 de 15

Intercambio de Correspondencia Mes de Octubre

19

Redactar

Mail

Chat

Meet

Recibidos19

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores71

Más

Etiquetas

+

_Archive

_Draft

_Sent

Bulk

Gestion Ambiental

JEFERSON BRAC...128

pridasas702024@gmail.com

Activo

28 de muchas

Es

INFORME 1

Externo

Recibidos x

Gestion Ambiental/JEFERSON BRACHO x

PRIDA SAS <pridasas702024@gmail.com>

para mí

lun, 12 ago, 13:53

Respetado Ingeniero, Anexo remito Informe 1 de inventoria con sus anexos, correspondiente al contrato 070 de 2024 el cual tiene por objeto INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA, PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA.CÓDIGO BPIN 20233218000010.

Quedo atento a sus comentarios

Cordialmente

Juan Carlos Amaya Bautista
Representante Legal
Prida Sas

1 archivo adjunto

Analizado por Gmail

19

Redactar

Mail

Chat

Meet

Recibidos19

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores71

Más

Etiquetas

+

_Archive

_Draft

_Sent

Bulk

Gestion Ambiental

JEFERSON BRAC...128

pridasas702024@gmail.com

Activo

29 de muchas

Es

INFORME 2

Externo

Recibidos x

Gestion Ambiental/JEFERSON BRACHO x

PRIDA SAS <pridasas702024@gmail.com>

para mí

lun, 9 sept, 16:00

Respetado Ingeniero anexo remito informe 2 de inventoria correspondiente al contrato 070 de 2024 , para revisión y aprobación, quedo atento a sus comentarios

Cordialmente

Juan Carlos Amaya Bautista
Representante Legal
Prida Sas

anexo 1 actas de visita.zip

ANEXO 2 PARAFISCALES (3).zip

4 archivos adjuntos

Analizado por Gmail

19

Mail

Chat

Meet

Redactar

Recibidos19

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores71

Más

Etiquetas+

_Archive

_Draft

_Sent

Bulk

Gestion Ambiental

pridasas702024@gmail.com

Activo

31 de muchas

Es

Invitación actualizada: (Sin asunto) jue 10 de oct de 2024 9am - 11am (COT)

(j.bracho@corpoguajira.gov.co) Externo Recibidos x

FUNDACION AGUA LUNA <fundagualuna@gmail.com>

para mí, l.hoyos, planeacion, pridasas702024, secretariadeplaneacion

oct

10

jue

(Sin asunto)

Míralo en Google Calendar

Cuándo jue 10 de oct de 2024 9am - 11am (COT)

Participantes Luis Manuel Hoyos Castro, planeacion@sanjuandelcesar-laguajira.gov.co, pridasas702024@gmail.com...

Agenda

jue 10 de oct de 2024

No hay eventos anteriores.

9am (Sin asunto)

No hay eventos posteriores.

Este evento se ha actualizado

Se ha cambiado: hora



San Juan Del Cesar La Guajira Octubre 10 de 2024

Oficio N° 11

Ingeniero.

Jefferson José Bracho Carvajal

Supervisor de interventoría contrato 070 de 2024

Ingeniero.

LUIS HOYOS

Supervisor de obra 050 de 2024

REF: Informe técnico de verificación de beneficiarios que no cumplen con los requerimientos mínimos del proyecto

Cordial saludo, por medio de la presente remito a ustedes Informe técnico de verificación de beneficiarios que no cumplen con los requerimientos mínimos del proyecto, correspondientes al contrato de obra N° 050 de 2024 el cual tiene por objeto " **CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL LOS MUNICIPIOS DEL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA**". El presente informe obedece a la solicitud presentada por el contratista fundación Agua Luna

Cordialmente,

Juan Carlos Amaya Bautista
Representante Legal
Contrato 070 de 2024



CORPOGUAJIRA

FECHA: 24/10/2024 08:48:32

202410243500059962

Riohacha,

Ingeniero:

JUAN CARLOS AMAYA BUTISTA

Representante legal PRIDA SAS

Contrato de Interventoría N° 070 de 2024 (CMA 0004 DE 2024)

Email: pridasas702024@gmail.com

Celular: 3102127607

Asunto: Revisión del informe de avance N° 03 al contrato de interventoría N° 070 de 2024 correspondiente al mes de septiembre de 2024

Cordial saludo:

Revisando la información contenida en el informe de avance N° 03 correspondiente al período comprendido entre el 01 al 30 de septiembre del presente año, el cual fue presentado el pasado 09 de octubre a través de correo electrónico, se pudo concluir lo siguiente:

1) Se recibieron los contratos de prestación de servicios profesionales del profesional social, Ingeniero ambiental y auxiliar de oficina, los cuales representan el personal mínimo requerido para la ejecución del contrato de interventoría dentro del proceso N° CMA 0004 DE 2024.

- Director de Interventoría (Dedicación 50%) – Juan Carlos Amaya Bautista
- Profesional del área social (Dedicación 50%) – Yisrlen Cristina Fragozo Fuentes
- Ingeniero Ambiental (Dedicación 100%) – Carolaine Celedón Matute
- Auxiliar de Oficina (Dedicación 50%) – Doris Edilma Rozo Santana, solicitada en remplazo por: Yenireth Gutiérrez Jerez.

Para el caso de los contratos se pudo observar que en ninguno de ellos se guarda relación laboral entre el empleador con el empleado, razón por la cual no existen indicios para proceder con el cobro del factor multiplicador en el Item 1 Salarios y Prestaciones Sociales de personal facturable, dada estas condiciones en caso de presentar actas parciales la entidad procederá a realizar los respectivos descuentos según se presente el caso.

2) Dada la alternativa optada por el contratista en la forma de contratación del personal, se requiere ajustar los valores a las planillas de pago mensual a los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales del profesional ambiental dado que de acuerdo al contrato de prestación de servicios o el presupuesto presentado por el contratista estos valores no se ajustan el IBC cotizado. Además, no se presentan evidencia de los pagos realizados o cuentas por pagar al personal de interventoría contratado por concepto de salarios. Se solicita al contratista adjuntar esta información, relacionada con los pagos realizados.



Cra. 7 # 12-15, Riohacha - Colombia
Tel: (5) 727 3905 Telefax: (5) 727 3904
Laboratorio: (5) 727 5052 - Fonseca (5) 775 6123
www.corpoguajira.gov.co

3) Es preciso tener en cuenta lo relacionado con el Factor multiplicador (FM), si bien es cierto el contratista no está obligado a mantener en nómina al personal presentado, se le recuerdan que existen unos compromisos establecidos con el FM donde se especifican los siguientes conceptos:

CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA.

FACTOR MULTIPLICADOR		
CONCEPTO		PORCENTAJE
1.	Salarios y Prestaciones Sociales de Personal Facturable	
1.1	Salarios	100,00%
1.2	Prima anual (legal) 100,00% + 12 =	8,33%
1.3	Cesantía 100,00% + 12 =	8,33%
1.4	Intereses de cesantía 1,00% x 1.3. =	1,30%
1.5	Vacaciones	4,17%
1.6	Seguridad Social (salud + pensión)	20,50%
1.7	Caja de Compensación Familiar	4,00%
1.8	ARP	2,50%
1.9	Sena	2,00%
1.10	ICBF	3,00%
1.11	Otros (Auxilios varios, prestaciones extralegales, Incapacidades no cubiertas)	1,00%
	Sub-total	155,13%

En base a lo anterior se solicita las evidencias que demuestren los anteriores conceptos incluidos en los salarios y prestaciones sociales del personal facturable.

Así mismo, siguiendo con los conceptos incluidos en el FM, relacionados con los ítems 2 y 3 se deben presentar las evidencias relacionadas con estos gastos relacionados, como se muestran a continuación:

2.	Gastos Directos	
2.1	Arriendo oficina	1,50%
2.2	Administración edificio	0,40%
2.3	Servicios públicos	0,50%
	Sub-total	2,40%
3.	Gastos Generales	
3.2	Asesoría contable, tributaria y Jurídica	1,50%
3.5	Documentación Técnica	2,50%
3.6	Personal Administrativo no facturado	3,80%
3.8	Depreciación de muebles y equipos	0,70%
3.9	Licenciamiento de software	0,50%
3.10	Gastos de Representación y otros	2,80%
	Sub-total	11,80%

4) El contratista aún no ha entregado las facturas y o soportes de los gastos efectuados con ocasión de la papelería.

5) Se recomienda solicitar al contratista de obra evidencia o copia del acta de creación del comité de veeduría ciudadana, establecido por la comunidad para vigilancia del contrato N° 050 de 2024.

6) Elaborar una memoria de cálculo actualizada semanalmente durante todo el tiempo de ejecución del proyecto, cabe precisar que esta memoria debe ser clara, verificable y estar disponible de manera continua en el proyecto en ejecución. Clausula Novena (9), inciso 35.

7) Se solicita al contratista presentar metodología y plan de trabajo de la interventoría incluido cronograma de ejecución de actividades actualizada a partir del acta de inicio para el seguimiento técnico administrativo y financiero al contrato N° 070 de 2024.



8) En el texto del informe se enumera el intercambio de correspondencia en el ítem 4.2.1.1. Correspondencia Enviada y Recibida; sin embargo, solo se anexan los correos enviados: se solicita al contratista anexar la correspondencia enviada y recibida, dado que no solo se trata de los correos enviados sino de toda la correspondencia incluida las de supervisión, tal como lo enumera el ítem mencionado.


10) En el texto del informe no se relaciona el seguimiento ambiental de las obras y el cumplimiento de las normas en la materia. Se recomienda especificar en el texto del informe lo correspondiente al seguimiento en materia ambiental realizado por la interventoría a las obras y su cumplimiento con la normatividad ambiental.

11) Se solicita realizar y presentar los ajustes solicitado por la supervisión de los informes N° 01 y N° 02 con la mayor brevedad posible, dado que estos deben colgarse en la plataforma de secop ii por parte del contratista y a la fecha esta información está en mora con los riesgos y consecuencias que esto implica.

Por último, se le recuerda al contratista que para la validación y aprobación de los informes de avance se debe entregar con todas las evidencias anexas correspondientes.

Agradezco revisar las recomendaciones y atender con mayor celeridad las solicitudes realizadas al respecto.

Atentamente,



JEFERSON J. BRACHO C
Supervisor contrato 070 del 2024



Cra. 7 # 12-15, Riohacha - Colombia
Tel: (5) 727 3905 Telefax: (5) 727 3904
Laboratorio: (5) 727 5052 - Fonseca (5) 775 6123
www.corpoguajira.gov.co



330,

Riohacha

Ingeniero

LUIS MANUEL HOYOS CASTRO

Supervisor contrato de obra No. 050 de 2024

CORPOGUAJIRA

FECHA:28/10/2024 11:02:45



202410283300035953

Asunto: Recomendación - Refrendación del trámite del listado de nuevos beneficiarios**Referencia:** Contrato de obra No. 050 de 2024 cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010

De acuerdo con la reunión virtual sostenida el viernes 25 de octubre del 2024 en la cual se debatió la actuación del contratista frente al municipio de El Molino en el trámite de los nuevos beneficiarios del proyecto de la referencia y la necesidad de volver a hacer el trámite directamente por la supervisión ante el municipio, comedidamente me permito reiterar, lo expuesto en reunión así: i. Se tiene que el día 10 de octubre de la presente anualidad se adelantó reunión con su participación como representante de la Corporación para este contrato, el representante legal del contrato y el secretario de Planeación de El Molino como delgado del alcalde y en la cual se expuso la necesidad de levantar un nuevo listado de beneficiarios teniendo en cuenta que del listado allegado previamente, algunos no cumplían con los requisitos para ser beneficiarios; ii. El municipio de El Molino a través del Secretario de Planeación el día 18 de octubre hogaño, emite Aval para 21 beneficiarios del listado de 45 beneficiarios sugeridos por el contratista (quien en su deber de diligencia, adelantó el trámite para presentarlo y poner en consideración ante el municipio).

De acuerdo con lo expuesto, es evidente la participación de la entidad en el deber de seguimiento que le asiste del contrato de obra 050 del 2024 en el trámite ante el municipio de los nuevos beneficiarios del proyecto.

Respecto a la responsabilidad del supervisor en el seguimiento de los contratos vigilados, el Departamento Administrativo de la Función Pública mediante Concepto 103151 de 2022 señaló:

...(...).

La Procuraduría General de la Nación en fallo dentro del proceso disciplinario número 162-97771 de 2004, sobre la función del supervisor, indica:

"Es así como en virtud de tales poderes la Entidad, ejerce la dirección, control y vigilancia del contrato. Por ello, cuando (sic) el interventor o supervisor del contrato, según sea el caso, tiene el deber legal de asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación de los servicios, que pretende satisfacer con el objeto contratado.



SC-CER894723



SA-CER731710



Cra. 7 # 12-15, Riohacha - Colombia

Tel: (5) 727 3905 Telefax: (5) 727 3904

Laboratorio: (5) 727 5052 - Fonseca (5) 775 6123

www.corpoguajira.gov.co



En este sentido es claro que la vigilancia del supervisor y/o Director de (...) se dirige a que debe examinar permanentemente el estado de ejecución del objeto contratado, así el cumplimiento de las funciones propende y garantizan el aseguramiento jurídico de las actividades

involucradas por la naturaleza del objeto contractual en ejecución, su normal desarrollo y el cabal cumplimiento de lo contratado.

La supervisión formal consiste en la verificación del cumplimiento de los requisitos que sean necesarios e indispensables para la ejecución y desarrollo del objeto contratado. La supervisión material consiste en la comprobación y certificación de la efectiva y real ejecución y cumplimiento del objeto contratado y el informe anexo al certificado de cumplimiento, es el sustento del debido pago de las obligaciones contraídas.

[...]

Sobre este último aparte es necesario destacar la importancia de la actividad que debe desplegar el supervisor del contrato, en cumplimiento de las funciones señaladas, concretamente referidas a la responsabilidad que adquiere de ejercer un seguimiento permanente y continuo que le permita verificar la ejecución normal del contrato para prevenir, situaciones de dilación, demoras o, incumplimientos parciales que a la postre conlleven a un incumplimiento total que motive dar por terminada la relación contractual en forma anticipada y por ende, a declarar la caducidad del contrato.

En este sentido le corresponde al supervisor del contrato verificar el cumplimiento del objeto contractual a efectos de evitar incumplimientos por cualesquiera de las partes.

...(....).

ARTICULO 51. DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. *El servidor público responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la Constitución y de la ley."*

Conforme a lo anterior, es importante que la Entidad mantenga un contacto permanente con el contrato que se supervisa a fin de que se verifique el cumplimiento formal y los requisitos necesarios e indispensables para la ejecución y desarrollo del contrato, así como, para comprobar y certificar la efectiva y real ejecución del objeto contratado, tareas que servirán de sustento para expedir el certificado de cumplimiento como soporte para el pago de las obligaciones contraídas

...(....).

6. Por otro lado, las Entidades Estatales para el cumplimiento de los fines de la contratación, al celebrar un contrato cuentan con la potestad de: tener la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 del Artículo 14, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado

Ley 80 de 1993. Numeral 2 del Artículo 268 Ley 678 de 2001 Artículo 2 En los términos de la Ley 80 de 1993 y el Estatuto Anticorrupción, las Entidades Estatales, los servidores públicos, contratistas e interventores que intervienen en la



Cra. 7 # 12-15, Riohacha - Colombia
Tel: (5) 727 3905 Telefax: (5) 727 3904
Laboratorio: (5) 727 5052 - Fonseca (5) 775 6123
www.corpoguajira.gov.co



celebración, ejecución y liquidación del contrato estatal son responsables por sus actuaciones y omisiones y en consecuencia responden civil, fiscal, penal y disciplinariamente por las faltas que cometan en el ejercicio de sus funciones.

Continúa el DAFP en cuanto a la responsabilidad del supervisor

Responsabilidad fiscal

La responsabilidad fiscal es aquella imputable a los servidores públicos y/o a los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado⁹. La responsabilidad fiscal tiene como finalidad o propósito específico la protección y garantía del patrimonio del Estado, buscando la reparación de los daños que éste haya podido sufrir como consecuencia de la gestión irregular de quienes tienen a su cargo el manejo de dineros o bienes públicos¹⁰.

Para efectos de la responsabilidad fiscal la gestión fiscal debe entenderse como el conjunto de actividades económico-jurídicas relacionadas con la adquisición, conservación, explotación, enajenación, consumo, disposición de los bienes del Estado, así como la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines de éste, y realizadas por los órganos o entidades de naturaleza jurídica pública o por personas naturales o jurídicas de carácter privado¹¹.

Esta clase de responsabilidad tiene las siguientes características: i) es meramente resarcitoria, ii) es de carácter patrimonial pues el gestor fiscal responde con su patrimonio y iii) es personal porque quien responde es la persona que maneja o administra los recursos públicos que en este caso es el supervisor o interventor.

Como consecuencia de lo anterior, son responsables fiscales los supervisores o interventores cuando por el incumplimiento de sus funciones de control y vigilancia sobre determinado contrato estatal se ocasiona un detrimento patrimonial para la Entidad Estatal que, entre otros, puede ser consecuencia de deficiencias en la ejecución del objeto contractual o en el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad establecidas en el contrato vigilado.

Además, en su calidad de gestores fiscales se presume que los supervisores o interventores de los contratos incurren en responsabilidad fiscal: i) a título de dolo fiscal cuando por los mismos hechos haya sido condenados penalmente o sancionados disciplinariamente por la comisión de un delito o una falta disciplinaria imputados a título y ii) a título de culpa grave cuando se omite el cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos de interventoría o de las funciones de supervisión, tales como el adelantamiento de revisiones periódicas de obras, bienes o servicios, de manera que no se establezca la correcta ejecución del objeto contractual o el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad ofrecidas por los contratistas y cuando se incumpla la obligación de asegurar los bienes de la entidad o la de hacer exigibles las pólizas o garantías frente al acaecimiento de los siniestros o el incumplimiento de los contratos.

C. Responsabilidad penal

La responsabilidad penal es aquella derivada de actuaciones que transgreden, sin justificación legítima, los bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento penal. En el caso particular de los supervisores e interventores que para este tipo de responsabilidad también son considerados particulares que ejercen funciones públicas, la responsabilidad penal se configura cuando cualquiera de ellos incurre en alguna de las conductas tipificadas como delitos contra la administración pública, es decir, peculado, concusión, cohecho, celebración indebida de contratos, tráfico de influencias,



SC-CER894723



SA-CER731710



Cra. 7 # 12-15, Riohacha - Colombia
Tel: (5) 727 3905 Telefax: (5) 727 3904
Laboratorio: (5) 727 5052 - Fonseca (5) 775 6123
www.corpoguajira.gov.co



enriquecimiento ilícito y prevaricato. Es importante precisar que dentro del proceso que se adelante por responsabilidad penal en las condiciones descritas, también puede hacerse exigible la responsabilidad civil o patrimonial.

Responsabilidad disciplinaria

La responsabilidad disciplinaria se configura cuando un servidor público o particular que ejerce funciones públicas incurre en alguna de las faltas estipuladas en el Código Disciplinario Único que implique el incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el Artículo 28 del presente ordenamiento.

Para el caso específico de los supervisores e interventores, la responsabilidad disciplinaria se configura cuando: i) no se exigen la calidad de los bienes y servicios contratados acordada en el contrato vigilado o exigida por las normas técnicas obligatorias, ii) se certifica como recibida a satisfacción una obra que no ha sido ejecutada a cabalidad y iii) se omite el deber de informar a la Entidad Estatal contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.

En todo caso y de manera general, los supervisores e interventores son responsables disciplinariamente por el incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de las funciones, o la violación al régimen de prohibiciones, impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses consagrados en la Constitución o en la ley."

Desde la oficina asesora jurídica, se evidencia el cumplimiento de la entidad en el trámite de los nuevos beneficiarios con el municipio de El Molino, razón por la cual, en aras de cumplir satisfactoriamente el objeto del contrato, por lo que se considera viable la refrendación del mismo de parte de la entidad (supervisor) en aras de garantizar el principio de economía y celeridad en el cumplimiento del objeto contratado máxime si tomamos en cuenta la proximidad de la terminación del plazo el 4 de noviembre hog año.

Sin otro particular,

MARIA PIEDAD ECHEVERRÍA RODRIGUEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica



Cra. 7 # 12-15, Riohacha - Colombia
Tel: (5) 727 3905 Telefax: (5) 727 3904
Laboratorio: (5) 727 5052 - Fonseca (5) 775 6123
www.corpoguajira.gov.co

San Juan Del Cesar La Guajira 28 de Octubre del 2024

Oficio No. 12

Señores
GERALD BRISSON MENDOZA
Representante Legal De La Fundación Agua Luna
Contrato de obra 050 de 2024

Ref.: Solicitud de programación de capacitación para la operación y mantenimiento de la estufa ecoeficiente.

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento el contrato 050 de 2024 se encuentra a portas de finalizar con respecto al cronograma inicial, por esta razón la interventoría comunica a La Fundación Agua Luna que debe avanzar en el ítem *Realizar Taller De Capacitación Para La Operación Y Mantenimiento De La Estufa Ecoeficiente*, dado que solo se ha realizado una jornada de capacitación. Por tanto, se le solicita al contratista enviar programación con fecha, días y hora donde se desarrollaran dichas actividades.

Cordialmente,



Juan Carlos Amaya Bautista
Director De interventoría
Al Contrato 050 de 2024



CORPOGUAJIRA

FECHA: 31/10/2024 18:02:42

202410313500061812

Riohacha,

Ingeniero:

JUAN CARLOS AMAYA BAUTISTA**Representante legal** PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL SAS (PRIDA)

Contrato de interventoría N° 070 de 2024 (CMA 0004 DE 2024)

Email: pridasas702024@gmail.com

Celular: 3102127607

Asunto: Requerimiento de informe de avance N° 04 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2024 y los ajustes sugeridos a los informes de avances del N° 01 al N° 03.

Cordial saludo:

En mi calidad de supervisor designado del contrato N° 070 de 2024, debo ser insistente y recordarle al contratista que la entrega de los informes de avance mensual debe ser entregado el primer día de cada mes de manera puntual. Sumado a lo anterior recordamos al contratista sobre las obligaciones contraídas con la firma del contrato, las cuales están especificadas en la minuta contractual en este caso especialmente en la *cláusula novena OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA en los siguientes incisos: 1, 2, 3, 11, 15, 16, 20, 21, 23, 24, 33, 35, 39.*

Aprovecho la oportunidad para informales que de acuerdo a directrices impartidas desde el área de jurídica cada contratista tiene la responsabilidad de realizar el cargue de los informes de avance, así como el de las cuentas que se adelanten a la plataforma de secopII con su respectivo usuario. Los informes deben ser cargados el primer día de cada mes, es así como respetuosamente solicito realizar la entrega del informe de avance de interventoría N° 04 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2024 del contrato, dado que a la fecha no he recibido el respectivo reporte, al igual que subsanaciones requeridas a los informes de avance N° 01 al N° 03, los cuales deben estar cargados en la plataforma de secop ii, en un plazo de 5 días, de lo contrario se corre el riesgo de suspensión de los recursos por parte del DNP.

Se recomienda enviar informes antes del cargue a la plataforma secopII para su revisión y luego de subsanados los requerimientos proceder con su cargue en plataforma, para lo cual estos informes deben ser enviado a más tardar los días 30 de cada mes. El informe de interventoría deberá ser estructurado siguiendo las necesidades técnicas, administrativas y financieras.

Teniendo en cuenta lo anterior, es sumamente importante para Corpoguajira que la firma consultora haga la entrega de los soportes o evidencias mensuales a las obligaciones del contratista, es decir, la presentación de cada informe de avance debe estar soportada con las evidencias correspondientes, el cual reposaran en el expediente de dicho contrato que serán cargadas en el Secop II.

Atentamente,



JEFERSON J. BRACHO C
Supervisor contrato 070 del 2024



SC-CER894723



SA-CER731710



Cra. 7 # 12-15, Riohacha - Colombia
Tel: (5) 727 3905 Telefax: (5) 727 3904
Laboratorio: (5) 727 5052 - Fonseca (5) 775 6123
www.corpoguajira.gov.co



202410313440099201



San Juan Del Cesar La Guajira octubre 31 de 2024

Oficio N° 13

Ingeniero.

Jefferson José Bracho Carvajal

Supervisor de interventoría contrato 070 de 2024

REF: Solicitud De Prórroga

Cordial saludo,

En desarrollo de las actividades correspondientes al Contrato de interventoria No. 0070 de 2024, cuyo Objeto es “ **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL LOS MUNICIPIOS DEL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA**”, me dirijo a usted con el finde solicitar una prórroga por un término de 30 días esto sustentado en que se surtió el proceso de cambio de beneficiarios y debido a que la interventoria solo cuenta con un residente le es imposible hacer la correcta verificación de las estufas que se están construyendo y ante la inminencia de terminación del contrato, requerimos la prórroga, esta prórroga acarrea unos costos los cuales describo a continuación .

ITEM	DEDICACION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Transporte 4x4	1	\$ 7.300.000	\$ 7.300.000
Director de Interventoría	0.3	\$ 4.500.000	\$ 1.350.000
Trabajadora Social	0.5	\$ 2.850.000	\$ 1.425.000
Ingeniero Ambiental o civil	1	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000
TOTAL			\$ 13.575.000

Como soporte a este oficio se anexa:

1. Oficio de solicitud de Cambio de usuarios por el contratista de obra

Cordialmente,

Juan Carlos Amaya Bautista
Representante Legal
Contrato 070 de 2024



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 7 de 15

Intercambio de Correspondencia Mes de Noviembre



202411143500064102

Riohacha,

Ingeniero:

JUAN CARLOS AMAYA BAUTISTA**Representante legal** PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL SAS (PRIDA)

Contrato de interventoría N° 070 de 2024 (CMA 0004 DE 2024)

Email: pridasas702024@gmail.com

Celular: 3102127607

Asunto: Reitero requerimiento de informe de avance N° 04 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2024 y los ajustes sugeridos a los informes de avances del N° 01 al N° 03.

Cordial saludo:

En mi calidad de supervisor designado del contrato N° 070 de 2024, debo ser insistente y recordarle al contratista que la entrega de los informes de avance mensual debe ser entregado el primer día de cada mes de manera puntual. Sumado a lo anterior recordamos al contratista sobre las obligaciones contraídas con la firma del contrato, las cuales están especificadas en la minuta contractual en este caso especialmente en la *cláusula novena OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA en los siguientes incisos: 1, 2, 3, 11, 15, 16, 20, 21, 23, 24, 33, 35, 39.*

Aprovecho la oportunidad para informales que de acuerdo a directrices impartidas desde el área de jurídica cada contratista tiene la responsabilidad de realizar el cargue de los informes de avance, así como el de las cuentas que se adelanten a la plataforma de secopII con su respectivo usuario. Los informes deben ser cargados el primer día de cada mes, es así como respetuosamente solicito realizar la entrega del informe de avance de interventoría N° 04 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2024 del contrato, dado que ha sido requerido y a la fecha no he recibido el respetivo reporte, al igual que subsanaciones requeridas a los informes de avance N° 01 al N° 03, los cuales deben estar cargados en la plataforma de secop ii, en un plazo de 5 días. Nuevamente le recuerdo que el no cargue oportuno de los informes de avance genera un posible incumplimiento, además de otras implicaciones como colocar en riegos de suspensión, los recursos del proyecto por parte del DNP.

El informe de interventoría deberá ser estructurado siguiendo las necesidades técnicas, administrativas y financieras. Teniendo en cuenta lo anterior, es sumamente importante para Corpoguajira que la firma consultora haga la entrega de los soportes o evidencias mensuales a las obligaciones del contratista, es decir, la presentación de cada informe de avance debe estar soportada con las evidencias correspondientes, el cual reposaran en el expediente de dicho contrato que serán cargadas en el Secop II.

Atentamente,


JEFERSON J. BRACHO C
Supervisor contrato 070 del 2024



Cra. 7 # 12-15, Riohacha - Colombia
Tel: (5) 727 3905 Telefax: (5) 727 3904
Laboratorio: (5) 727 5052 - Fonseca (5) 775 6123
www.corpoguajira.gov.co

San Juan Del Cesar La Guajira 15 de Noviembre del 2024

Oficio No. 14

Señores
GERALD BRISSON MENDOZA
Representante Legal De La Fundación Agua Luna
Contrato de obra 050 de 2024

Ref.: solicitud de informe de obra No. 4 e
informe Final

Cordial saludo

En desarrollo de las actividades del contrato de obra No 050 de 2023 el cual tiene por objeto "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR – LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010" solicito a usted el informe de obra No.04 correspondiente a las actividades del mes de octubre del 2024; así mismo, se solicita la entrega del informe final, los cuales hasta la fecha no ha sido recibida por esta interventoría, por tal razón solicitamos enviar dichos informes a la mayor brevedad posible.

Cordialmente,



Juan Carlos Amaya Bautista
Director De interventoría
Contrato 050 de 2024

San Juan Del Cesar La Guajira 18 de noviembre del 2024

Oficio No. 15

Señores
GERALD BRISSON MENDOZA
Representante Legal De La Fundación Agua Luna
Contrato de obra 050 de 2024

Ref.: observaciones al informe No. 4 e
informe final de obra

Cordial saludo

Una vez revisado el informe No. 4 e informe final de las actividades ejecutadas en el contrato 050 de 2024, se observa que este no presenta información detallada de todas las actividades desarrolladas, por ende, se solicita realizar los ajustes pertinentes a las siguientes observaciones:

1. En el inciso 7.1 **Talleres De Socialización**, el contratista debe describir las temáticas tratadas, la metodología y programación de los espacios realizados. Así mismo, suministrar en los anexos actas de SOCIALIZACION y listas de asistencias.
2. En el inciso 7.2 **Visita De Verificación De Predios**, en esta actividad el contratista debe mencionar a los 70 beneficiarios que no cumplen con las especificaciones del contrato y las razones que motivaron a la no construcción de las estufas ecoeficientes. Además, debe anexar actas de desistimientos y registros fotográficos por beneficiario como soporte de dicha actuación.
3. En el inciso 7.5 **Construcción De Estufas**, el contratista manifiesta haber construido 300 estufas ecoeficientes, pero no relaciona a los beneficiarios, cabe mencionar que los actores principales de este contrato son los beneficiarios, por ende, es fundamental relacionarlos con su respectivo registro fotográfico como producto final.
4. En el inciso 7.6 **Taller De Capacitación**, el contratista debe describir las temáticas tratadas, la metodología y programación de los espacios realizados. Así mismo, suministrar en los anexos actas de las capacitaciones y listas de asistencias.

5. Con respecto a la actividad Realizar **Divulgación Del Proyecto**, el contratista no lo relaciona en el informe, por consiguiente, el contratista debe presentar registro fotográfico de la instalación de la valla publicitaria, georreferenciación y correo de aprobación por parte del área de comunicaciones de CORPOGUAJIRA.
6. El contratista debe presentar una memoria de cálculo actualizada semanalmente durante todo el tiempo de ejecución del proyecto, cabe precisar que esta memoria debe ser clara, verificable y estar disponible de manera continua en el proyecto en ejecución. Clausula Novena (9), inciso 35.

Adicionalmente, a este a estos informes se debe anexar la siguiente información:

7. Información cartográfica
8. Paz y salvo del personal contratado
9. Planillas de pago de seguridad social durante la ejecución del contrato
10. Soportes de talleres ambientales
11. Soportes de capacitaciones
12. Soportes de la inversión del anticipo
13. Memoria de calculo semanal
14. Actas de desistimientos
15. Documentos prediales de nuevos beneficiarios
16. Ficha de entrega de estufas ecoeficientes por beneficiarios

En virtud a lo anterior, se solicita a LA FUNDACION AGUA LUNA que proceda a corregir dichos informes y anexar todos los soportes a la mayor brevedad posible.

Cordialmente,



Juan Carlos Amaya Bautista
Director De interventoría
Contrato 050 de 2024

San Juan Del Cesar La Guajira 25 de noviembre del 2024

Oficio No. 16

Señores
GERALD BRISSON MENDOZA
Representante Legal De La Fundación Agua Luna
Contrato de obra 050 de 2024

Ref.: solicitud reiterativa sobre
observaciones al informe No. 4 e informe
final de obra

Cordial saludo

Teniendo en cuenta la solicitud en el oficio No. 15 emitido por esta interventoría 18 de noviembre de 2024 sobre observaciones a el informe No. 4 e informe final de las actividades ejecutadas en el contrato 050 de 2024 y que hasta la fecha no han sido subsanadas; se le reitera a LA FUNDACION AGUA LUNA realizar los ajustes pertinentes a las siguientes observaciones:

1. En el inciso 7.1 **Talleres De Socialización**, el contratista debe describir las temáticas tratadas, la metodología y programación de los espacios realizados. Así mismo, suministrar en los anexos actas de SOCIALIZACION y listas de asistencias.
2. En el inciso 7.2 **Visita De Verificación De Predios**, en esta actividad el contratista debe mencionar a los 70 beneficiarios que no cumplen con las especificaciones del contrato y las razones que motivaron a la no construcción de las estufas ecoeficientes. Además, debe anexar actas de desistimientos y registros fotográficos por beneficiario como soporte de dicha actuación.
3. En el inciso 7.5 **Construcción De Estufas**, el contratista manifiesta haber construido 300 estufas ecoeficientes, pero no relaciona a los beneficiarios, cabe mencionar que los actores principales de este contrato son los beneficiarios, por ende, es fundamental relacionarlos con su respectivo registro fotográfico como producto final.
4. En el inciso 7.6 **Taller De Capacitación**, el contratista debe describir las temáticas tratadas, la metodología y programación de los espacios

realizados. Así mismo, suministrar en los anexos actas de las capacitaciones y listas de asistencias.

5. Con respecto a la actividad Realizar **Divulgación Del Proyecto**, el contratista no lo relaciona en el informe, por consiguiente, el contratista debe presentar registro fotográfico de la instalación de la valla publicitaria, georreferenciación y correo de aprobación por parte del área de comunicaciones de CORPOGUAJIRA.
6. El contratista debe presentar una memoria de cálculo actualizada semanalmente durante todo el tiempo de ejecución del proyecto, cabe precisar que esta memoria debe ser clara, verificable y estar disponible de manera continua en el proyecto en ejecución. Clausula Novena (9), inciso 35.

Adicionalmente, a este a estos informes se debe anexar la siguiente información:

7. Información cartográfica
8. Paz y salvo del personal contratado
9. Planillas de pago de seguridad social durante la ejecución del contrato
10. Soportes de talleres ambientales
11. Soportes de capacitaciones
12. Soportes de la inversión del anticipo
13. Memoria de calculo semanal
14. Actas de desistimientos
15. Documentos prediales de nuevos beneficiarios
16. Ficha de entrega de estufas ecoeficientes por beneficiarios

En virtud a lo anterior, se solicita que proceda a corregir dichos informes y anexar todos los soportes a la mayor brevedad posible.

Cordialmente,



Juan Carlos Amaya Bautista
Director De interventoría
Contrato 050 de 2024

8

Mail

Chat

Meet

Redactar

Recibidos

8

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores

79

Más

Etiquetas

+

_Archive

_Draft

_Sent

Bulk

Gestion Ambiental

JEFERSON BRAC...

127

in:sent pridasas702024@gmail.com

Activo

3 de 29

Revisión informe de interventoría N° 04 mes de octubre

Gestion Ambiental/JEFERSON BRACHO x

J

Jeferson José Bracho Carvajal <j.bracho@corpoguajira.gov.co>

para PRIDA

17 dic 2024, 21:44

Revisado el informe de avance 4 se encontraron las siguientes sugerencias:

1) en el ítem 4.2.1.1 Correspondencia enviada y recibida ➤ Aclaración sobre el Factor Multiplicador, recibido el 16 de octubre de 2024; pertenece al contrato del CORUAL, De igual manera para este ítem se debe incluir la solicitud de prórroga realizada por la interventoría con el radicado N° 202410313440099201 solicitud de prórroga y con ella anexar todos los documentos que pertenecen a este proceso y de igual manera relacionarlo en el texto del informe.

2) De acuerdo a lo establecido en el contrato de prestación de servicio N° 01 de 2024, firmado entre Prida SAS y la Ing Caroline Celedón Matute y en concordancia con el sistema de seguridad social, el IBC debe ser de 1.600.000, por lo tanto se debe realizar ajustes a las planillas de este profesional desde el mes de julio hasta el mes de noviembre.

3) Para el mes de octubre no se adjuntó la planilla de pagos de aportes al sistema de seguridad social del señor Juan Carlos Amaya.

4) En el numeral 5 Avance físico de actividades del informe N° 04 la interventoría reporta un 100% de avance físico; en este punto se debe mencionar la necesidad de tiempo para ejecutar la totalidad del contrato, por lo cual supone un avance físico del 85,85% teniendo en cuenta lo

8

Mail

Chat

Meet

Redactar

Recibidos

8

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores

79

Más

Etiquetas

+

_Archive

_Draft

_Sent

Bulk

Gestion Ambiental

JEFERSON BRAC...

127

in:sent pridasas702024@gmail.com

Activo

3 de 29

que se dejó de consumir a causa del Factor multiplicador.

5) En el numeral 5.1 actividades programadas y ejecutadas; se debe ser concluyente, es decir cuantas estufas a la fecha han sido verificadas por la interventoría, cuantos talleres a la fecha se han desarrollado,

6) Ajustar los valores de ejecución financiera del contrato de interventoría de acuerdo a la redistribución de recursos empleado en la prórroga dado que en la fecha del 31 de octubre ya se contaba con el VoBo del ordenador del gasto.

7) En el numeral 5.4.4 Ejecución financiera Acumulada Contrato de interventoría, el cuadro de la inversión acumulada no representa el valor acumulado a la fecha dado que no se ha actualizado los valores a los 4 meses y al ajuste del FM. ajustar valores.

De igual manera el numeral 5.5 Información financiera contrato de interventoría enuncian el total de los recursos empleados al 100%, lo que significa que no existen recursos para la prórroga, por lo cual se debe ajustar teniendo en cuenta el ajuste al FM. Aunque en la fecha no existía la prórroga ya era un hecho dado que existía aprobación por parte del director.

Adjunto avance físico ajustado con el FM, de allí pueden ajustar los valores de la ejecución financiera.

--



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 8 de 15

Acta de terminación del contrato de interventoría N°
070 de 2024

	ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CI 0070 DE 2024	Código: R GJP01-5
		Versión: 3
		Vigencia: 11/04/2016
		Página 3 de 3

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORIA:	NÚMERO CI 0070 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA". BPIN 20233218000010
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA – CORPOGUAJIRA
CONTRATISTA:	PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL SAS - NIT: 900026388-1
SUPERVISOR:	JEFERSON JOSE BRACHO CARVAJAL
FECHA ACTA DE INICIO:	04 DE JULIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	03 DE NOVIEMBRE DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CUATRO (04) MESES
PRORROGA	1 MES
FECHA DE TERMINACIÓN 2:	03 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	CINCO (05) MESES
CUANTÍA DEL CONTRATO:	CIENTO CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VENTIDOS PESOS M/CTE (\$114.492.422.00)

En las Oficinas de Corpoguajira en Riohacha, a los tres días (03) días del mes de diciembre de 2024, se reunieron el Señor **JUAN CARLOS AMAYA BAUTISTA**, en su calidad de Contratista como interventoría externa por parte de CORPOGUAJIRA y **JEFERSON JOSÉ BRACHO CARVAJAL**, en su calidad de funcionario de CORPOGUAJIRA y Supervisor(a) designado(a) por el Director general de la entidad, mediante designación con radicado 202407033300016633 de fecha 03 del mes julio de 2024; con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta que se terminan las actividades del contrato de interventoría N° CI 0070 de 2024.

	ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CI 0070 DE 2024	Código: R GJP01-5
		Versión: 3
		Vigencia: 11/04/2016
		Página 3 de 3

El supervisor de interventoría, y el interventor pusieron en conocimiento lo siguiente:

QUE:

- El contrato de interventoría N°. CI 0070 del 2024 cumple con el plazo de ejecución el día 03 de diciembre de 2024.
- La interventoría se encuentra en la fase revisión documental (Informe final de ejecución) del contrato sobre el cual ejerció vigilancia.
- Se realizó el seguimiento y control técnico, administrativa y financiera para el proyecto de inversión denominado "Construcción de Estufas Ecoeficientes como Medida de Mitigación al Cambio Climático en Comunidades de la Zona Rural de los Municipios de El Molino y San Juan Del Cesar - La Guajira". BPIN 20233218000010, por parte del contratista de interventoría; el cual, se encuentra en preparación de los documentos de interventoría incluido el Informe final para recibo a satisfacción del contrato N° CI 0070 de 2024.

En consecuencia, las partes acuerdan:

ACUERDAN

1. Un Plazo de 15 días calendarios para la entrega del informe final y aquellos que hagan falta por subsanar del contrato N°. CI 0070 del 2024.
2. Cumplida la condición establecida en el numeral anterior se procederá a firmar el acta de recibo final a satisfacción.

Verificado lo anterior se establece como fecha máxima de entrega de los informes del contrato de interventoría N° CI 0070 de 2024, el día dieciocho (18) del mes de diciembre de 2024.

Por lo expresado anteriormente se firma por las personas que intervinieron en esta reunión:


JUAN CARLOS AMAYA BAUTISTA
 PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO
 AMBIENTAL SAS (PRIDA)
 Representante Legal


JEFERSON BRACHO CARVAJAL
 Supervisor Corpoguajira



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 6 de 15

Seguimiento a la seguridad social

SEGUIMIENTO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO N° 070 DE 2024

PLANILLA DE APORTES PERSONAL PRIDA SAS CONTRATO 070 DE 2024 PERIODO JULIO

Nombre Profesional	Cédula	N° de Planilla	Días Cot	lbc	Clase Aportante	Pensión	Salud	CCF	ARP	ICBF	SENA	INT/ MORA	Total Aporte
Juan Carlos Amaya Bautista	79.555.163	1065298474	30	2.300.000	Dependiente	368.000	92.000	92.000	56.100	0	0		608.100
Caroline Celedón Matute	1.122.410.841	9474637530	27	1.170.000	Independiente	187.200	146.300	-	28.600	0	0	14.000	456.400
		9481473932	30	230.000		36.800	28.700		5.600			9.200	
Yenireth Gutiérrez Jerez	1.122.406.871	9471175063	27	1.300.000	Independiente	187.200	146.300	-	81.500	0	0		415.000
Yisrlen Cristina Frago Fuent	1.119.836.743	9470580342	30	1.300.000	Independiente	208.000	162.500	-	6.800	0	0	-	377.300
TOTALES						763.200	400.800	92.000	91.500				1.856.800

PLANILLA DE APORTES PERSONAL PRIDA SAS CONTRATO 070 DE 2024 PERIODO AGOSTO

Nombre Profesional	Cédula	N° de Planilla	Días Cot	Básico	Clase Aportante	Pensión	Salud	CFC	ARP	ICBF	SENA	INT/ MORA	Total Aporte
Juan Carlos Amaya Bautista	79.555.163	1065818116	30	2.300.000	Dependiente	368.000	92.000	92.000	56.100	0	0		608.100
Caroline Celedón Matute	1.122.410.841	9472695701	30	1.600.000	Independiente	256.000	200.000	-	39.000	0	0		495.000
Yenireth Gutiérrez Jerez	1.122.406.871	9472199639	30	1.300.000	Independiente	208.000	162.500	-	90.500	0	0		461.000
Yisrlen Cristina Frago Fuent	1.119.836.743	9471833891	30	1.300.000	Independiente	208.000	162.500	-	6.800	0	0	0	377.300
TOTALES						832.000	454.500	92.000	185.600				1.941.400

PLANILLA DE APORTES PERSONAL PRIDA SAS CONTRATO 070 DE 2024 PERIODO SEPTIEMBRE

Nombre Profesional	Cédula	N° de Planilla	Días Cot	Básico	Clase Aportante	Pensión	Salud	CFC	ARP	ICBF	SENA	INT/ MORA	Total Aporte
Juan Carlos Amaya Bautista	79.555.163	1067102839	30	2.300.000	Dependiente	368.000	92.000	92.000	56.100	0	0		608.100
Caroline Celedón Matute	1.122.410.841	9474637588	30	1.300.000	Independiente	208.000	162.500	-	31.700	0	0	-	435.700
		9481133263	30	100.000		16.000	12.500		2.500			2.500	
Yenireth Gutiérrez Jerez	1.122.406.871	9474648792	30	1.300.000	Independiente	208.000	162.500	-	90.500	0	0		461.000
Yisrlen Cristina Frago Fuent	1.119.836.743	947425122	30	1.300.000	Independiente	208.000	162.500	-	6.800	0	0	0	377.300
TOTALES						784.000	417.000	92.000	178.300				1.504.800

PLANILLA DE APORTES PERSONAL PRIDA SAS CONTRATO 070 DE 2024 PERIODO OCTUBRE

Nombre Profesional	Cédula	N° de Planilla	Días Cot	Básico	Clase Aportante	Pensión	Salud	CFC	ARP	ICBF	SENA	INT/ MORA	Total Aporte
Juan Carlos Amaya Bautista	79.555.163	1068313622	30	2.300.000	Dependiente	368.000	92.000	92.000	56.100	0	0		608.100
Caroline Celedón Matute	1.122.410.841	9476270510	30	1.300.000	Independiente	208.000	162.500	-	31.700	0	0	-	435.000
		9481133313	30	100.000		16.000	12.500		2.500			1.800	
Yenireth Gutiérrez Jerez	1.122.406.871	9476941509	30	1.300.000	Independiente	208.000	162.500	-	90.500	0	0		461.000
Yisrlen Cristina Frago Fuent	1.119.836.743	9476295537	30	1.300.000	Independiente	208.000	162.500	-	6.800	0	0	0	377.300
TOTALES						784.000	417.000	92.000	178.300				1.504.100

PLANILLA DE APORTES PERSONAL PRIDA SAS CONTRATO 070 DE 2024 PERIODO NOVIEMBRE

Nombre Profesional	Cédula	N° de Planilla	Días Cot	Básico	Clase Aportante	Pensión	Salud	CFC	ARP	ICBF	SENA	INT/ MORA	Total Aporte
Juan Carlos Amaya Bautista	79.555.163	1068313623	30	2.300.000	Dependiente	368.000	92.000	92.000	56.100	0	0		608.100
Caroline Celedón Matute	1.122.410.841	9477751214	30	1.300.000	Independiente	208.000	162.500	-	31.700	0	0	700	435.100
		9481133355	30	100.000		16.000	12.500		2.500			1.200	
Yenireth Gutiérrez Jerez	1.122.406.871	9478077008	30	1.300.000	Independiente	208.000	162.500	-	90.500	0	0		461.000
Yisrlen Cristina Frago Fuent	1.119.836.743	9477808725	30	1.300.000	Independiente	208.000	162.500	-	6.800	0	0	2400	379.700
TOTALES						784.000	417.000	92.000	178.300				1.504.200

OBSERVACIONES: Del seguimiento realizado a los aportes de seguridad social del contrato N° 070 de 2024 hasta el mes de noviembre, se observa, que el señor Juan Carlos Amaya es el único del equipo que se encuentra vinculado a través de la empresa Prida S.A.S, y cancela a portes de pensión, salud, riesgos y caja de compensación. Los demás miembros del equipo presentaron planillas como independiente evidenciando claramente aportes de pensión, salud, riesgosy en ellas No se refleja el uso del FM.



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 11 de 15

Planillas SS Julio

PAGADA 2024-08-12 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PRIDA SAS						
Documento	NI 900026388			Dirección	CR 101 #73 - 02		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR			Teléfono	4454396		
Tipo Persona	JURÍDICA			Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	BOGOTA D.C.			Departamento	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	AMAYA BAUTISTA JUAN CARLOS			Identificación	CC 79555163		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 79555163		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					AMAYA BAUTISTA JUAN CARLOS	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades															Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud					Riesgos					Caja				Parafiscales												
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF							
														0	30	30	30	30																																
															</																																			

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 368.000	\$ 0	\$ 0	\$ 92.000	\$ 56.100	\$ 92.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1119836743		FRAGOZO FUENTES YISREN CRISTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	ELANDRO DIAZ ETPA 1	VALLEDUPAR-CESAR	7778374	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	803340587	9470580342	I	2024/08/13	2024/07/29	NEQUI	0	\$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$ 1,300,000	\$208,000			\$ 1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$ 1,300,000	\$6,800		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$ 1,300,000	\$208,000			\$ 1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$ 1,300,000	\$6,800		\$0	\$0	
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)					\$ 1,300,000	\$208,000			\$ 1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$ 1,300,000	\$6,800		\$0	\$0	
1	CC	1119836743	FRAGOZO YISREN	231001	30	\$ 1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$ 1,300,000	\$162,500	0		\$0	\$0	14-23	30	\$ 1,300,000	\$6,800	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$ 1,300,000	\$208,000			\$ 1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$ 1,300,000	\$6,800		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1119836743		FRAGOZO FUENTES YISLEN CRISTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	ELANDRO DIAZ ETPA 1	VALLEDUPAR-CESAR	7778374	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-07	2024-07	803340587		9470580342	I	2024/08/13	2024/07/29	NEQUI	\$377,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,800	\$0	\$0	\$6,800	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$6,800	\$0	\$0	\$6,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
TOTAL				1	\$377,300	\$0	\$0	\$377,300	

Cesantías Empleador (datosEmpleadorDomestico.aspx?marempsid=jwukocqbezft5ufxpyhj44cm) Empleados (empleados.aspx)
Liquidaciones (Autoliquidaciones.aspx?marempsid=jwukocqbezft5ufxpyhj44cm) Novedades (Novedades.aspx?Inc=mnu) Add-ins Excel (Marketplace/Apps.aspx)
Informes Personalizados Pensiones Voluntarias (PensionesVoluntarias/PensionesVoluntarias.aspx) Nómina Electrónica Salir (Terminar.aspx)

☒ Ver Intereses Mora

1

of 1

Select a format

Export



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1122406871		GUTIERREZ JEREZ YENIRETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 2#19- 54	SAN JUAN DEL CESAR-LA GUAJIRA	7741260	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	834392989	9471175063	I	2024/08/20	2024/08/09	BANCO DAVIVIENDA	0	\$415.000
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$187,200	\$0	\$0	\$187,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$187,200	\$0	\$0	\$187,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$81,500	\$0	\$0	\$81,500	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$81,500	\$0	\$0	\$81,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$146,300	\$0	\$0	\$146,300	
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$146,300	\$0	\$0	\$146,300	
TOTAL				1	\$415,000	\$0	\$0	\$415,000	

¿Quiénes somos?
(../Home/QuienesSomos.aspx)

¿Cómo liquido mis aportes?
(../Home/ComoLiquidado.aspx)

Preguntas frecuentes
(Contacto.aspx?MItem=Cntct)

Documentos y normas
(NormasRelevantes.aspx)

Servicios que ofrecemos
(../Home/ServiciosQueOfrecemos.aspx)

¿Por qué elegirnos?
(../Home/porqueAporteEnLinea.aspx)

Contáctenos
(../Home/Contacto.aspx)

Línea Ética
(../Home/LineaEtica.aspx)



(https://www.aportesenlinea.com/Home/Contacto.aspx?MItem=Cntct)



(http://www.facebook.com/aportesenlinea)



(http://www.twitter.com/APORTESENLINEA)



(http://www.youtube.com/user/aportes)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1122410841		CELEDON MATUTE CAROLAINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 3 sur 1A 53	SAN JUAN DEL CESAR-LA GUAJIRA	3024617273	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-07	2024-07	957199516	9474637530	I	2024/08/12	2024/10/03	NEQUI	52	\$376,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,170,000	\$187,200			\$1,170,000	\$146,300			\$0	\$0			\$1,170,000	\$28,600		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,170,000	\$187,200			\$1,170,000	\$146,300			\$0	\$0			\$1,170,000	\$28,600		\$0	\$0
Ciudad: SAN JUAN DEL CESAR Depto: LA GUAJIRA (1 Afiliados)					\$1,170,000	\$187,200			\$1,170,000	\$146,300			\$0	\$0			\$1,170,000	\$28,600		\$0	\$0
1	CC 1122410841	CELEDON CAROLAINE	230301	27	\$1,170,000	\$187,200	EPS041	27	\$1,170,000	\$146,300		0	\$0	\$0	14-23	27	\$1,170,000	\$28,600	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,170,000	\$187,200			\$1,170,000	\$146,300			\$0	\$0			\$1,170,000	\$28,600		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1122410841		CELEDON MATUTE CAROLAINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 3 sur 1A 53	SAN JUAN DEL CESAR-LA GUAJIRA	3024617273	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-07	2024-07	957199516		9474637530	I	2024/08/12	2024/10/03	NEQUI	\$376,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$187,200	\$7,200	\$0	\$194,400
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$187,200	\$7,200	\$0	\$194,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$28,600	\$1,100	\$0	\$29,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$28,600	\$1,100	\$0	\$29,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$146,300	\$5,700	\$0	\$152,000
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	1	\$146,300	\$5,700	\$0	\$152,000
TOTAL					1	\$362,100	\$14,000	\$0	\$376,100

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	1256676363	9481473932	N	2024/08/12	2025/02/10	NEQUI	182	\$80,30

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1122410841		CELEDON MATUTE CAROLAINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 3 sur #1A 53	SAN JUAN DEL CESAR-LA GUAJIRA	3024617273	No

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$36,800	\$4,700	\$0	\$41,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$36,800	\$4,700	\$0	\$41,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$5,600	\$800	\$0	\$6,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$5,600	\$800	\$0	\$6,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$28,700	\$3,700	\$0	\$32,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$28,700	\$3,700	\$0	\$32,400
TOTAL				1	\$71,100	\$9,200	\$0	\$80,300



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 12 de 15

Planillas SS Agosto

PAGADA 2024-09-09 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PRIDA SAS						
Documento	NI 900026388			Dirección	CR 101 #73 - 02		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR			Teléfono	4454396		
Tipo Persona	JURÍDICA			Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	BOGOTA D.C.			Departamento	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	AMAYA BAUTISTA JUAN CARLOS			Identificación	CC 79555163		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 79555163		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					AMAYA BAUTISTA JUAN CARLOS	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades															Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud					Riesgos					Caja				Parafiscales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
														0	30	30	30	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 368.000	\$ 0	\$ 0	\$ 92.000	\$ 56.100	\$ 92.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC 1122410841		CELEDON MATUTE CAROLAINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 3 sur 1A 53	SAN JUAN DEL CESAR- LA GUAJIRA	302461727 3

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Pensión	2024-08	Periodo Salud	2024-08
Fecha límite de pago	2024/09/10	Fecha de pago	2024/09/04
Días de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES

Valor a pagar	\$495,000
Intereses de mora	\$0
Saldos e incapacidades	\$0
Valor total	\$495,000

DATOS DE LA TRANSACCIÓN

Clave planilla	9472695701
Clave de pago	891487384
Banco	NEQUI

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1122410841		CELEDON MATUTE CAROLAINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 3 sur #1A 53	SAN JUAN DEL CESAR-LA GUAJIRA	3024617273	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-08	2024-08	891487384		9472695701	I	2024/09/10	2024/09/04	NEQUI	\$495,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							\$1,600,000	\$256,000			\$1,600,000	\$200,000			\$0	\$0			\$1,600,000		\$39,000		\$0	\$0	\$495,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							\$1,600,000	\$256,000			\$1,600,000	\$200,000			\$0	\$0			\$1,600,000		\$39,000		\$0	\$0	\$495,000
Ciudad: SAN JUAN DEL CESAR Depto: LA GUAJIRA (1 Afiliados)																							\$1,600,000	\$256,000			\$1,600,000	\$200,000			\$0	\$0			\$1,600,000		\$39,000		\$0	\$0	\$495,000
1	CC	1122410841	CELEDON																	230301	30	\$1,600,000	\$256,000	EPS041	30	\$1,600,000	\$200,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,600,000	2.436%	\$39,000	0	\$0	\$0	No	\$495,000
Total Afiliados(1)																							\$1,600,000	\$256,000			\$1,600,000	\$200,000			\$0	\$0			\$1,600,000		\$39,000		\$0	\$0	\$495,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1122410841		CELEDON MATUTE CAROLAINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 3 sur #1A 53	SAN JUAN DEL CESAR-LA GUAJIRA	3024617273	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-08	2024-08	891487384		9472695701	I	2024/09/10	2024/09/04	NEQUI	\$495,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$256,000	\$0	\$0	\$256,000
PORVENIR	230301		800,224,808	8	1	\$256,000	\$0	\$0	\$256,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$39,000	\$0	\$0	\$39,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23		860,011,153	6	1	\$39,000	\$0	\$0	\$39,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041		900,156,264	2	1	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000
TOTAL					1	\$495,000	\$0	\$0	\$495,000

Cesantías Empleador (datosEmpleadorDomestico.aspx?maremplsid=nutbxtixfdol33hzkavudsqh) Empleados (empleados.aspx)
Liquidaciones (Autoliquidaciones.aspx?maremplsid=nutbxtixfdol33hzkavudsqh) Novedades (Novedades.aspx?Inc=mnu) Add-ins Excel (Marketplace/Apps.aspx)
Informes Personalizados Pensiones Voluntarias (PensionesVoluntarias/PensionesVoluntarias.aspx) Nómina Electrónica Salir (Terminar.aspx)

☒ Ver Intereses Mora

1 of 1

Select a format ▼

Export



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1122406871		GUTIERREZ JEREZ YENIRETH	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	Calle 2#19- 54	SAN JUAN DEL CESAR-LA GUAJIRA	7741260	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	887739362	9472199639	I	2024/09/17	2024/09/03	BANCO DAVIVIENDA	0	\$461.000
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$90,500	\$0	\$0	\$90,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$90,500	\$0	\$0	\$90,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
TOTAL					1	\$461,000	\$0	\$0	\$461,000

¿Quiénes somos?
(../Home/QuienesSomos.aspx)

¿Cómo liquido mis aportes?
(../Home/ComoLiquidado.aspx)

Preguntas frecuentes
(Contacto.aspx?MItem=Cntct)

Documentos y normas
(NormasRelevantes.aspx)

Servicios que ofrecemos
(../Home/ServiciosQueOfrecemos.aspx)

¿Por qué elegirnos?
(../Home/porqueAporteEnLinea.aspx)

Contáctenos
(../Home/Contacto.aspx)

Línea Ética
(../Home/LineaEtica.aspx)



(https://www.aportesenlinea.com/Home/Contacto.aspx?MItem=Cntct)



(http://www.facebook.com/aportesenlinea)



(http://www.twitter.com/APORTESENLINEA)



(http://www.youtube.com/user/aportes)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1119836743		FRAGOZO FUENTES YISLEN CRISTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	ELANDRO DIAZ ETPA 1	VALLEDUPAR-CESAR	7778374	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	887821410	9471833891	I	2024/09/11	2024/09/03	NEQUI	0	\$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0
1	CC 1119836743	FRAGOZO YISLEN	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1119836743		FRAGOZO FUENTES YISLEN CRISTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	ELANDRO DIAZ ETPA 1	VALLEDUPAR-CESAR	7778374	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	887821410	9471833891	I	2024/09/11	2024/09/03	NEQUI	0	\$377,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,800	\$0	\$0	\$6,800	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$6,800	\$0	\$0	\$6,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
TOTAL				1	\$377,300	\$0	\$0	\$377,300	



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 13 de 15

Planillas SS Septiembre

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PRIDA SAS						
Documento	NI 900026388			Dirección	CR 101 #73 - 02		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR			Teléfono	4454396		
Tipo Persona	JURÍDICA			Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	BOGOTA D.C.			Departamento	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	AMAYA BAUTISTA JUAN CARLOS			Identificación	CC 79555163		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 79555163		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					AMAYA BAUTISTA JUAN CARLOS	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades															Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud					Riesgos					Caja				Parafiscales					
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSFS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
														0	30	30	30	230301		16 %	\$ 2.300.000	\$ 368.000	\$ 0	\$ 0	EPS017		4 %	\$ 2.300.000	\$ 92.000	\$ 0	14-11	3	2,436 %	\$ 2.300.000	\$ 56.100	CCF24	4 %	\$ 2.300.000	\$ 92.000	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSFS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 368.000	\$ 0	\$ 0	\$ 92.000	\$ 56.100	\$ 92.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1122410841		CELEDON MATUTE CAROLAINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 3 sur 1A 53	SAN JUAN DEL CESAR-LA GUAJIRA	3024617273	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	957579961	9474637588	I	2024/10/09	2024/10/03	NEQUI	0	\$402,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																											
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte		Codigo	Días	IBC	Aporte		Codigo	Días	IBC	Aporte		Días	IBC	Aporte					
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							\$1,300,000	\$208,000				\$1,300,000	\$162,500				\$0	\$0				\$1,300,000	\$31,700			\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							\$1,300,000	\$208,000				\$1,300,000	\$162,500				\$0	\$0				\$1,300,000	\$31,700			\$0	\$0
Ciudad: SAN JUAN DEL CESAR Depto: LA GUAJIRA (1 Afiliados)							\$1,300,000	\$208,000				\$1,300,000	\$162,500				\$0	\$0				\$1,300,000	\$31,700			\$0	\$0
1	CC	1122410841	CELEDON CAROLAINE		230301	30	\$1,300,000	\$208,000		EPS041	30	\$1,300,000	\$162,500			0	\$0	\$0		14-23	30	\$1,300,000	\$31,700	0		\$0	\$0
Total Afiliados(1)							\$1,300,000	\$208,000				\$1,300,000	\$162,500				\$0	\$0				\$1,300,000	\$31,700			\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1122410841		CELEDON MATUTE CAROLAINÉ	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 3 sur 1A 53	SAN JUAN DEL CESAR-LA GUAJIRA	3024617273	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-09	2024-09	957579961		9474637588	I	2024/10/09	2024/10/03	NEQUI	\$402,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$31,700	\$0	\$0	\$31,700	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$31,700	\$0	\$0	\$31,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
TOTAL				1	\$402,200	\$0	\$0	\$402,200	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1122410841		CELEDON MATUTE CAROLAINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 3 sur #1A 53	SAN JUAN DEL CESAR-LA GUAJIRA	3024617273	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	1232892710	9481133263	N	2024/10/09	2025/01/31	NEQUI	114	\$33,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$100,000	\$16,000			\$100,000	\$12,500			\$0	\$0			\$100,000	\$2,500		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$100,000	\$16,000			\$100,000	\$12,500			\$0	\$0			\$100,000	\$2,500		\$0	\$0	
Ciudad: SAN JUAN DEL CESAR Depto: LA GUAJIRA (1 Afiliados)						\$100,000	\$16,000			\$100,000	\$12,500			\$0	\$0			\$100,000	\$2,500		\$0	\$0	
1	CC	1122410841	CELEDON CAROLAINE	230301	30	(\$1,300,000)	(\$208,000)	EPS041	30	(\$1,300,000)	(\$162,500)		0	\$0	\$0	14-23	30	(\$1,300,000)	(\$31,700)	0	\$0	\$0	
2	CC	1122410841	CELEDON CAROLAINE	230301	30	\$1,400,000	\$224,000	EPS041	30	\$1,400,000	\$175,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,400,000	\$34,200	0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)						\$100,000	\$16,000			\$100,000	\$12,500			\$0	\$0			\$100,000	\$2,500		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1122410841		CELEDON MATUTE CAROLAINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 3 sur #1A 53	SAN JUAN DEL CESAR-LA GUAJIRA	3024617273	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	1232892710	9481133263	N	2024/10/09	2025/01/31	NEQUI	114	\$33,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$16,000	\$1,300	\$0	\$17,300	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$16,000	\$1,300	\$0	\$17,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$2,500	\$200	\$0	\$2,700	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$2,500	\$200	\$0	\$2,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$12,500	\$1,000	\$0	\$13,500	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$12,500	\$1,000	\$0	\$13,500	
TOTAL				1	\$31,000	\$2,500	\$0	\$33,500	

Cesantías [Empleador \(datosEmpleadorDomestico.aspx?maremplsid=2osdem41mofp4bk5nhqxqjak\)](#) Empleados ([empleados.aspx](#))

Liquidaciones ([Autoliquidaciones.aspx?maremplsid=2osdem41mofp4bk5nhqxqjak](#)) Novedades ([Novedades.aspx?Inc=mnu](#)) Add-ins Excel ([Marketplace/Apps.aspx](#))

Informes Personalizados Pensiones Voluntarias ([PensionesVoluntarias/PensionesVoluntarias.aspx](#)) Nómina Electrónica Salir ([Terminar.aspx](#))

Planilla Resumen

Filtros

Ver nombres completos: ☒

Ver Intereses Mora: ☒

Ver sin IBC y sin Aporte: ☐

Consultar

1 of 2 Select a format Export

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1122406871		GUTIERREZ JEREZ YENIRETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 2#19- 54	SAN JUAN DEL CESAR-LA GUAJIRA	7741260	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-09	2024-09	957319396	94746-48792	I	2024/10/17	2024/10/03	BANCO DAVIVIENDA	\$461,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide	ide

Página 1 de 2

2024/10/03 02:57 PM

¿Quiénes somos?
(../Home/QuienesSomos.aspx)

¿Cómo liquido mis aportes?
(../Home/ComoLiquido.aspx)

Preguntas frecuentes
(Contacto.aspx?MItem=Cntct)

Documentos y normas
(NormasRelevantes.aspx)

Servicios que ofrecemos
(../Home/ServiciosQueOfrecemos.aspx)

¿Por qué elegirnos?
(../Home/porqueAporteEnLinea.aspx)

Contáctenos
(Home/Contacto.aspx)

Línea Ética
(../Home/LineaEtica.aspx)



(https://www.aportesenlinea.com/Home/Contacto.aspx?MItem=Cntct)



(http://www.facebook.com/aportesenlinea.notici)



(http://www.twitter.com/APORTESENLINEA)



(http://www.youtube.com/user/aportesenlin)

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1119836743		FRAGOZO FUENTES YISRELI CRISTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	ELANDRO DIAZ ETPA 1	VALLEDUPAR-CEsar	7778374	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Hora	Valor
2024-09	2004-09	956016022	9474285122	I	2024/10/10	2024/10/03	NEQUI	0	\$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0	
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0	
1	CC 1119836743	FRAGOZO YISRELI	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$162,500	0		\$0	\$0	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0	

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1119836743		FRAGOZO FUENTES YISREIN CRISTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	ELANDRO DIAZ ETRA 1	VALLEDUPAR-CESAR	7778334	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-09	2024-09	954016022	9474285122	I	2024/10/10	2024/10/03	REQUI	0	\$377,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,800	\$0	\$0	\$6,800	
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$6,800	\$0	\$0	\$6,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
TOTAL				1	\$377,300	\$0	\$0	\$377,300	



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 14 de 15

Planillas SS Octubre

PAGADA 2025-01-31 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PRIDA SAS				
Documento	NI 900026388		Dirección	CR 101 #73 - 02	
Tipo de Empresa	EMPLEADOR		Teléfono	4454396	
Tipo Persona	JURÍDICA		Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados 1
Ciudad	BOGOTA D.C.		Departamento	BOGOTA D.C.	
Representante Legal	AMAYA BAUTISTA JUAN CARLOS		Identificación	CC 79555163	

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 79555163		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					AMAYA BAUTISTA JUAN CARLOS	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades															Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud					Riesgos					Caja				Parafiscales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSFS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSFS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 368.000	\$ 0	\$ 0	\$ 92.000	\$ 56.100	\$ 92.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1122410841		CELEDON MATUTE CAROLAINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 3 sur 1A 53	SAN JUAN DEL CESAR-LA GUAJIRA	3024617273	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1037317751	9476270510	I	2024/11/13	2024/11/08	NEQUI	0	\$402,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$31,700		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$31,700		\$0	\$0
Ciudad: SAN JUAN DEL CESAR Depto: LA GUAJIRA (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$31,700		\$0	\$0
1	CC 1122410841	CELEDON CAROLAINE	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,300,000	\$31,700	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$31,700		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1122410841		CELEDON MATUTE CAROLAINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 3 sur 1A 53	SAN JUAN DEL CESAR-LA GUAJIRA	3024617273	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-10	2024-10	1037317751		9476270510	I	2024/11/13	2024/11/08	NEQUI	\$402,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$31,700	\$0	\$0	\$31,700	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$31,700	\$0	\$0	\$31,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
TOTAL				1	\$402,200	\$0	\$0	\$402,200	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1122410841		CELEDON MATUTE CAROLAINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 3 sur #1A 53	SAN JUAN DEL CESAR-LA GUAJIRA	3024617273	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-10	2024-10	1232924696		9481133313	N	2024/11/13	2025/01/31	NEQUI	\$32,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$100,000	\$16,000			\$100,000	\$12,500			\$0	\$0			\$100,000	\$2,500		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$100,000	\$16,000			\$100,000	\$12,500			\$0	\$0			\$100,000	\$2,500		\$0	\$0	
Ciudad: SAN JUAN DEL CESAR Depto: LA GUAJIRA (1 Afiliados)						\$100,000	\$16,000			\$100,000	\$12,500			\$0	\$0			\$100,000	\$2,500		\$0	\$0	
1	CC	1122410841	CELEDON CAROLAINE	230301	30	(\$1,300,000)	(\$208,000)	EPS041	30	(\$1,300,000)	(\$162,500)		0	\$0	\$0	14-23	30	(\$1,300,000)	(\$31,700)	0	\$0	\$0	
2	CC	1122410841	CELEDON CAROLAINE	230301	30	\$1,400,000	\$224,000	EPS041	30	\$1,400,000	\$175,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,400,000	\$34,200	0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)						\$100,000	\$16,000			\$100,000	\$12,500			\$0	\$0			\$100,000	\$2,500		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1122410841		CELEDON MATUTE CAROLAINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 3 sur #1A 53	SAN JUAN DEL CESAR-LA GUAJIRA	3024617273	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-10	2024-10	1232924696		9481133313	N	2024/11/13	2025/01/31	NEQUI	\$32,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$16,000	\$900	\$0	\$16,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$16,000	\$900	\$0	\$16,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$2,500	\$200	\$0	\$2,700	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$2,500	\$200	\$0	\$2,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$12,500	\$700	\$0	\$13,200	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$12,500	\$700	\$0	\$13,200	
TOTAL				1	\$31,000	\$1,800	\$0	\$32,800	

Cesantías Empleador (datosEmpleadorDomestico.aspx?maremplsid=w25k4fyirvhstrbfk5r5qoak) Empleados (empleados.aspx)
Liquidaciones (Autoliquidaciones.aspx?maremplsid=w25k4fyirvhstrbfk5r5qoak) Novedades (Novedades.aspx?Inc=mnu) Add-ins Excel (Marketplace/Apps.aspx)
Informes Personalizados Pensiones Voluntarias (PensionesVoluntarias/PensionesVoluntarias.aspx) Nómina Electrónica Salir (Terminar.aspx)

☒ Ver Intereses Mora

1 of 1

Select a format ▼

Export

aportes
en línea

ADMINISTRADORA DE APORTES EN LÍNEA

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF				
CC 1122406871		GUTIERREZ JEREZ YENIRETH		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		Calle 2#19- 54		SAN JUAN DEL CESAR-LA GUAJIRA	7741260	No				
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																
Periodo		Clave		Tipo	Fecha			Pago								
Pensión	Salud	Pago		Planilla		Planilla		Limite	Pago		Banco		Dias Mora	Valor		
2024-10	2024-10	1032036025		9476791509		I		2024/11/20	2024/11/06		BANCO DAVIVIENDA		0	\$461,000		
RESUMEN DE PAGO																
RIESGO		CODIGO		NIT		DV	AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)							1		\$208,000		\$0		\$0		\$208,000	
PORVENIR		230301		800,224,808		8	1		\$208,000		\$0		\$0		\$208,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)							1		\$90,500		\$0		\$0		\$90,500	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23		860,011,153		6	1		\$90,500		\$0		\$0		\$90,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)							1		\$162,500		\$0		\$0		\$162,500	
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041		900,156,264		2	1		\$162,500		\$0		\$0		\$162,500	
TOTAL							1		\$461,000		\$0		\$0		\$461,000	

Página 1 de 1

2024/11/06 10:45 AM

¿Quiénes somos?
(../Home/QuienesSomos.aspx)

¿Cómo liquido mis aportes?
(../Home/ComoLiquido.aspx)

Preguntas frecuentes
(Contacto.aspx?MItem=Cntct)

Documentos y normas
(NormasRelevantes.aspx)

Servicios que ofrecemos
(../Home/ServiciosQueOfrecemos.aspx)

¿Por qué elegirnos?
(../Home/porqueAporteEnLinea.aspx)

Contáctenos
(Home/Contacto.aspx)

Línea Ética
(../Home/LineaEtica.aspx)



(https://www.aportesenlinea.com/Home/Contacto.aspx?MItem=Cntct)



(http://www.facebook.com/aportesenlinea.notici



(http://www.twitter.com/APORTESENLINEA)



(http://www.youtube.com/user/aportesenlin

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1119836743		FRAGOZO FUENTES YSRIEN CRISTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	ELANDRO DIAZ ETRA 1	VALLEDUPAR-CEsar	7778334	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2024-10	2024-10	1026732031		9476295537	I	2024/11/14	2024/11/05	NEQUI	\$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0
1	CC 1119836743	FRAGOZO YSRIEN	131001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$162,500	0		50	\$0	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11 19836743		FRAGOZO FUENTES YISRIEN CRISTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	ELANDRO DIAZ ETPA 1	VALLEDUPAR- CESAR	7778374	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	102672031	947629537	I	2024/11/14	2024/11/05	NEQUI	0	\$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,800	\$0	\$0	\$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$6,800	\$0	\$0	\$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
TOTAL				1	\$377,300	\$0	\$0	\$377,300



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 15 de 15

Planillas SS Noviembre

PAGADA 2025-01-31 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PRIDA SAS				
Documento	NI 900026388		Dirección	CR 101 #73 - 02	
Tipo de Empresa	EMPLEADOR		Teléfono	4454396	
Tipo Persona	JURÍDICA		Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados 1
Ciudad	BOGOTA D.C.		Departamento	BOGOTA D.C.	
Representante Legal	AMAYA BAUTISTA JUAN CARLOS		Identificación	CC 79555163	

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 79555163		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					AMAYA BAUTISTA JUAN CARLOS	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades															Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud					Riesgos					Caja				Parafiscales								
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT				IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días CCF	Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSFS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA
															0	30	30	30	30	30			16 %	\$ 2.300.000	\$ 368.000	\$ 0	\$ 0	EPS017		4 %	\$ 2.300.000	\$ 92.000	\$ 0	14-11	3	2,436 %	\$ 2.300.000	\$ 56.100	CCF24	4 %	\$ 2.300.000	\$ 92.000	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSFS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 368.000	\$ 0	\$ 0	\$ 92.000	\$ 56.100	\$ 92.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1122410841		CELEDON MATUTE CAROLAINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 3 sur 1A 53	SAN JUAN DEL CESAR-LA GUAJIRA	3024617273	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-11	2024-11	1120916755	9477751214	I	2024/12/10	2024/12/12	NEQUI	2	\$402,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$31,700		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$31,700		\$0	\$0	
Ciudad: SAN JUAN DEL CESAR Depto: LA GUAJIRA (1 Afiliados)						\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$31,700		\$0	\$0	
1	CC	1122410841	CELEDON CAROLAINE	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,300,000	\$31,700	0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)						\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$31,700		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1122410841		CELEDON MATUTE CAROLAINÉ	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 3 sur 1A 53	SAN JUAN DEL CESAR-LA GUAJIRA	3024617273	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-11	2024-11	1120916755		9477751214	I	2024/12/10	2024/12/12	NEQUI	\$402,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$300	\$0	\$208,300	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$208,000	\$300	\$0	\$208,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$31,700	\$100	\$0	\$31,800	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$31,700	\$100	\$0	\$31,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$300	\$0	\$162,800	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$162,500	\$300	\$0	\$162,800	
TOTAL				1	\$402,200	\$700	\$0	\$402,900	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1122410841		CELEDON MATUTE CAROLAINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 3 sur #1A 53	SAN JUAN DEL CESAR-LA GUAJIRA	3024617273	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-11	2024-11	1232945763		9481133355	N	2024/12/10	2025/01/31	NEQUI	\$32,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							\$100,000	\$16,000			\$100,000	\$12,500			\$0	\$0			\$100,000	\$2,500		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							\$100,000	\$16,000			\$100,000	\$12,500			\$0	\$0			\$100,000	\$2,500		\$0	\$0	
Ciudad: SAN JUAN DEL CESAR Depto: LA GUAJIRA (1 Afiliados)							\$100,000	\$16,000			\$100,000	\$12,500			\$0	\$0			\$100,000	\$2,500		\$0	\$0	
1	CC	1122410841	CELEDON CAROLAINE	230301	30	(\$1,300,000)	(\$208,000)	EPS041	30	(\$1,300,000)	(\$162,500)		0		\$0	\$0	14-23	30	(\$1,300,000)	(\$31,700)	0		\$0	\$0
2	CC	1122410841	CELEDON CAROLAINE	230301	30	\$1,400,000	\$224,000	EPS041	30	\$1,400,000	\$175,000		0		\$0	\$0	14-23	30	\$1,400,000	\$34,200	0		\$0	\$0
Total Afiliados(1)							\$100,000	\$16,000			\$100,000	\$12,500			\$0	\$0			\$100,000	\$2,500		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1122410841		CELEDON MATUTE CAROLAINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 3 sur #1A 53	SAN JUAN DEL CESAR-LA GUAJIRA	3024617273	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-11	2024-11	1232945763		9481133355	N	2024/12/10	2025/01/31	NEQUI	\$32,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$16,000	\$600	\$0	\$16,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$16,000	\$600	\$0	\$16,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$2,500	\$100	\$0	\$2,600	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$2,500	\$100	\$0	\$2,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$12,500	\$500	\$0	\$13,000	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$12,500	\$500	\$0	\$13,000	
TOTAL				1	\$31,000	\$1,200	\$0	\$32,200	

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1119836743		FRAGOZO FUENTES YISLEN CRISTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	ELANDRO DIAZ ETPA 1	VALLEDUPAR-CESAR	7778374	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1140410327	9477808725	I	2024/12/11	2024/12/20	NEQUI	9	\$379,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0	
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0	
1	CC 1119836743	FRAGOZO YISLEN	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5041	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0	

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1119836743		FRAGOZO FUENTES YISREIN CRISTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	ELANDRO DIAZ ETPA 1	VALLEDUPAR-CESAR	7778374	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1140410327	9477808725	I	2024/12/11	2024/12/20	NEQUI	9	\$379,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$1,300	\$0	\$209,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$208,000	\$1,300	\$0	\$209,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,800	\$100	\$0	\$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$6,800	\$100	\$0	\$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$1,000	\$0	\$163,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$162,500	\$1,000	\$0	\$163,500
TOTAL				1	\$377,300	\$2,400	\$0	\$379,700



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 10 de 15

Actas de entrega de estufas ecoeficientes

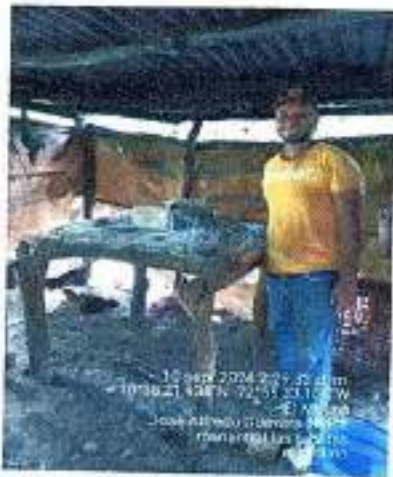
INSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN
IDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN
20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	10-9-24
		Hora de entrega:	
Municipio	El Molino		
Vereda			
Nombre del predio	La montaña	Coordenadas:	10° 38' 21.138" -72° 55' 33.168"
Propietario	Jose Alfredo Guerra Vence	Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas				
trabajador/beneficiario del proyecto	Fernando Augusto Vence Zabaleta	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadania	5172007	76	7

3. Estufa Ecológica			
Fecha de construcción (dd-mm-aa)	10-9	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	10-10
		OFICIAL:	

3.1 Registro fotográfico	
<p>ANTES</p> 	<p>DESPUES</p> 

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


5172007
Beneficiario
C.C.


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010.

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
Municipio	EL MOLINO	Fecha:	09-09/24
Vereda	LA MONTAÑA - CATATUMBO	Hora de entrega:	2:30 PM
Nombre del predio	Finca el Parnaso	Cordenadas:	N 10° 40' 8,3" W 72° 51' 9,9"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	FERNANDO AUGUSTO VENCE ZABALETA	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadanía	5.172.007	26 AÑOS	3	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	09-09/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	09-10/24	OFICIAL:	José A. Rodríguez
----------------------------------	----------	---	----------	----------	-------------------


3.1 Registro fotográfico


ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald B. Sosa Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
c.c. 5.172.007


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	28-9-24
		Hora de entrega:	
Municipio	Molino		
Vereda	Los papeler		
Nombre del predio		Coordenadas:	10°36'37.578" -72°55'23.804"
Propietario	Dainer Enrique Diaz	Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas				
trabajador/beneficiario del proyecto		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISEEN
	Cedula ciudadanía	17921788	65	3

3. Estufa Ecológica				
Fecha de construcción (dd-mm-aa)	28-9	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	28-10	OFICIAL:

3.1 Registro fotográfico	
<p>ANTES</p> 	<p>DESPUES</p> 

4. Compromiso y acuerdo de voluntades
 El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogualjira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

 Gerald Brisson Mendoza FUNDACION AGUA LUNA Contratista	 Beneficiario C.C. 17921788	 PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental Interventoria
--	--	---

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	2-10-24
Municipio	EL MOLINO		Hora de entrega:
Vereda	LOS PALELES		
Nombre del predio		Coordenadas:	N 10° 36' 55.0" W 72° 55' 43.31"
Propietario		Administrador:	Richard Paves Sandoval

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	CARLOS EDUARDO FERNANDEZ DIAZ	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	1123731174	33	1

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	02-10-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	02-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	----------	---	----------	----------

3.1 Registro fotográfico

<p>ANTES</p> 	<p>DESPUES</p> 
--	---

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brieson Mendoca
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Richard Paves

Beneficiario
C.C.1123731174

Caroline C.

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	5-9-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	3 pm
Vereda	LOS PALELES		
Nombre del predio	Los olivos	Coordenadas:	N 10° 37' 15,1" W 72° 55' 9,1"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	NELLYS MARIA RIOS	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía: <u>Diego Romero</u> 1123733907		Hijo	X

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	5-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	5-10-24	OFICIAL:	Yenny
----------------------------------	--------	---	---------	----------	-------


3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Blasón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C. 1123733907
Hijo


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General

			No.	
			Fecha:	27-9-24
			Hora de entrega:	
Municipio	El Molino			
Vereda	Los papeles			
Nombre del predio	La Esperanza		Coordenadas:	10° 36' 58.614"
Propietario			Administrador:	-72° 55' 30.48"

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Yadira Stella Perez Acosta	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadania	39515703	49	4	A4

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	27-9	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	27-10	OFICIAL:
----------------------------------	------	---	-------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES



DESPUES



4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

[Signature]
Gerardo Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

[Signature]
Beneficiario
c.c. 39515703

[Signature]
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	28-10-24
Municipio		Hora de entrega:	
Vereda	comodin		
Nombre del predio	mi vendición	Coordenadas:	70,7177N 72,8380W
Propietario	Johan E. DIAZ	Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadania	1766331	46	3

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	28-10-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	28-11-24	OFICIAL:
				Jessy A. Rodríguez

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brissón Mesa
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Johan E. DIAZ
Beneficiario
C.C. 176633

Carolaire C.
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoria

***CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233213000010*.**

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	27-10-24
Municipio:		Hora de entrega:	
Vereda:	Camodin		
Nombre del predio:	Los milceles	Coordenadas:	10.7160 N 72.8353 W
Propietario:	Jesualdo-marin	Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadanía: 17910-022	60	2	

3. Estufa Ecológica


Fecha de construcción (dd-mm-aa)	27-10-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	27-11-24	Oficial:	Jose Rodriguez
----------------------------------	----------	---	----------	----------	----------------


3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C. 17910022


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría



"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	9-8-24
		entrega:	1-Pm
Municipio	San Juan del Cesar		
Vereda	Potrerito		
Nombre del predio	Jesús Lamas	Coordenadas:	16° 41' 36.384"
Propietario		Administrador:	Alexis Orante

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Jesús Lamas	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadanía		44	3	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	9-8-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	9-9-24	OFICIAL: Daurin
----------------------------------	--------	---	--------	-----------------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerardo Brison Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Beneficiario
C.C. 56076950

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoria



"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	20-10-24
Municipio	San Juan del Cesar	entrega:	
Vereda			
Nombre del predio	Villa Marrana	Coordenadas:	10° 45' 33.324" -72° 51' 17.022"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Marrana Benjumea	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cédula ciudadanía	56078731	40	3	1

3. Estufa Ecológica


Fecha de construcción (dd-mm-aa)	20-10	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	20-11	OFICIAL:
----------------------------------	-------	---	-------	----------

3.1 Registro fotográfico


ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar los labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Brison Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
cc. 56078731


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA"
BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	14/10/24
Municipio		Hora de entrega:	
Vereda			
Nombre del predio	Los Brinquitos.	Coordenadas:	10° 38' 50.35" N -72° 55' 13.45" W
Propietario	Victoria Venec Suarez	Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Victor Venec Suarez	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadania				

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	14/10/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	14/11/24	OFICIAL:
----------------------------------	----------	---	----------	----------


3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Besson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Victoria Venec Suarez Caroline C.
Beneficiario
C.C. 27065329

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	24-8-24
		Hora de entrega:	
Municipio			
Vereda			
Nombre del predio	Luz Delicias	Coordenadas:	10°36'8.9" -72°53'41.9"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	JAVIER MONTERO	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadania 17971653			

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	24-8-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	24-9-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	---------	----------


3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Javier Montero
Beneficiario
C.C.

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	22-9-24
Municipio	El Molino	Hora de entrega:	
Vereda			
Nombre del predio		Coordenadas:	10°39.152' -72°55.041
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Jorge L. Escobar L.	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cédula ciudadania 5772159	68	3	A+1

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	22-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	22-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	----------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES



DESPUES



4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoaguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brinson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Jorge L. Escobar Camblare C.
Beneficiario
C.C. 5.172.159.

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	25-10-24
Municipio		Hora de entrega:	
Vereda			
Nombre del predio		Coordenadas:	10° 41' 8.518" N -72° 56' 31.518" W
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Nitheth Zulay Blanchar Diaz		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía				

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	25-10-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	25-11-24	OFICIAL: Darwin
----------------------------------	----------	---	----------	-----------------

3.1 Registro fotográfico

ANTES



DESPUES




4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpeguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C.


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	26-10-24
		Hora de entrega:	
Municipio		Coordenadas:	10,7357.8N 72,8485 W
Vereda		Administrador:	
Nombre del predio	POTRERITO		
Propietario	Anuar. Eladio Tirado		

2. Condiciones socioeconómicas				
trabajador/beneficiario del proyecto	Anuar Eladio Tirado		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)
	Cedula ciudadania	5165182	44	7
				Nivel SISBEN

3. Estufa Ecológica	
Fecha de construcción (dd-mm-aa)	26-10-24
Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	26-10-24
OFICIAL:	JOSÉ A. RODRIGUEZ

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
 <p>10.7357N 72.8485W ANUAR ELADIO TIRADO ACOSTA vereda el potrero Chagüta Número de teléfon: 354</p>	 <p>10.7357N 72.8485W ANUAR ELADIO TIRADO ACOSTA vereda el potrero Chagüta Número de teléfon: 354</p>

4. Compromiso y acuerdo de voluntades
El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoaguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

ANUAR E. Tirado Carabaine C.
Beneficiario
C.C. 5165182
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	27-9-24
Municipio		Hora de entrega:	
Vereda			
Nombre del predio	Buena vista	Coordenadas:	10°39'35.907"N 72°55'10.748"W
Propietario	Delis Leonor Lopez Armenta	Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadania 40799436	52	2	B3

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	27-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	27-10-24	OFICIAL:
---	---------	--	----------	-----------------

3.1 Registro fotográfico

ANTES




DESPUES



4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C. 40799436

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	22-10-24
Municipio		Hora de entrega:	
Vereda			
Nombre del predio	Sabason	Coordenadas:	10,7554 N 72,8443 W
Propietario	Digna Cuello	Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Alvaro Teran	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadania	77159005	42	4	A2

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	22-10-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	22-10-24	OFICIAL:
				JOSE ALVAREZ

3.1 Registro fotográfico

ANTES





DESPUES



4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Brison Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Alvaro Teran

Beneficiario
C.C. 77159005

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	2-11-24
		Hora de entrega:	
Municipio	El Molino		
Vereda			
Nombre del predio	El salon #2	Coordenadas:	10°39'2.55" -72°56'21.658"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Hasser Escobar		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	5172132			

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	2-11-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	2-12-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	---------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Beneficiario
C.C. 5172132


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría
Carolina C.

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	18-4-24
Municipio	SAN JUAN		Hora de entrega:
Vereda:	LA GUABINA		
Nombre del predio		Coordenadas:	N 10°39'25,48" W 73°02'34,61"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	HENRY JAVIER SOCARRAS CASADO		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	12646904	43	4	1

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	18-4-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	18-10-24	OFICIAL:	Jose Angel
----------------------------------	---------	---	----------	----------	------------


3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	


4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Blasquez Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Henry Socarras Casado

Beneficiario
C.C. 12646904


Caroline C.

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	17-9-24
Municipio	SAN JUAN		Hora de entrega:
Vereda	LA GUABINA		
Nombre del predio	VIA REBE	Coordenadas:	N 10°39'20,83" W 73°02'50,01"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	GUSTAVO ENRIQUE RUMBO FUENTES	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadanía	5162831	70	4	1

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	17-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	17-10-24	OFICIAL: JOSE ANGE
----------------------------------	---------	---	----------	--------------------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brissón Mardoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Gustavo Rumbos Caroline C.
Beneficiario
C.C. 5162831
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	25-9-24
Municipio	SAN JUAN	Hora de entrega:	11:30 AM
Vereda	LA GUABINA		
Nombre del predio		Coordenadas:	N 10° 36' 04.91" W 73° 03' 01.72"
Propietario		Administrador:	Henry Coroboa

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	DILIA ESTHER SUAREZ NEGRETE		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	17 974 521			

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	25-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	25-9-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	---------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES




DESPUES



4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


HENRY COROBA CARABINE C.

Beneficiario
C.C. 17. 974 521

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	27-9-24
Municipio	SAN JUAN		Hora de entrega:
Vereda	LA GUABINA		
Nombre del predio	Villa Esperanza	Coordenadas:	N 10° 39' 24,53" W 73° 02' 50,28"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	JUANA DEL SOCORRO RUMBO PERALTA	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	84 038 973	72	3

3. Estufa Ecológica


Fecha de construcción (dd-mm-aa)	27-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	27-10-24	OFICIAL:	JOSE ANGE
----------------------------------	---------	---	----------	----------	-----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Bissen Mendoza
FUNDACIÓN AGUA LUNA
Contratista



Beneficiario
C.C. 84.038.973

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	20/9/24
Municipio	SAN JUAN		Hora de entrega:
Vereda	LA GUABINA		
Nombre del predio	La Casuna	Coordenadas:	N 10°39'26,98" W 73°02'34,45"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	WILDER ENRIQUE MAESTRE BERMUDEZ		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	5165.052	48	5	1

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	20/9/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	20/10/24	OFICIAL:	DAURIN
----------------------------------	---------	---	----------	----------	--------


3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brison Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C. 5165052


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	19/9/24
Municipio	SAN JUAN	Hora de entrega:	
Vereda	LA GUABINA		
Nombre del predio	Guabino 3	Coordenadas:	N 10°39'37,46" W 73°02'54,13"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	YANMARIS DE LA CRUZ MENDOZA SANCHEZ	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadania	1043841869	42	3

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	19/9/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	19/10/24	OFICIAL:	Dawson
----------------------------------	---------	---	----------	----------	--------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
 <p>19 sept 2024 12:17 pm 10°39'37.022"N 73°02'54.13"W Yanmaris de la Cruz Mendoza San Juan del Cesar</p>	 <p>19 sept 2024 3:55 pm 10°39'37.022"N 73°02'54.13"W Yanmaris de la Cruz Mendoza San Juan del Cesar</p>

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerardo Brissón Mendoza
FUNDACIÓN AGUA LUNA
Contratista

Beneficiario
C.C.

1043 849 869

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	18-9-24
		Hora de entrega:	
Municipio	El Molino	Coordenadas:	10°36'15.95694"-N 72°54'21.58452"-W
Vereda	Los Barriales	Administrador:	
Nombre del predio	Rincon Saino		
Propietario			

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Hecleodoro Antonio Pareja Mireles		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadania	17972108	62	2	x

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	18-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	18-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	----------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES



DESPUES



4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Hecleodoro Pareja Carolina C.

Beneficiario
C.C. 17972108

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIM 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	17-9-24
		Hora de entrega:	
Municipio	EL MOLINO	Coordenadas:	10°37'21.465"
Vereda	Los Barrales		-72°52'35.846"
Nombre del predio	EL REFUGIO	Administrador:	
Propietario			

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Helber Jesus Jorro Lopez		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadania	5172745	43	4	X

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	17-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	17-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	----------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES



DESPUES



4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

[Signature]
Gerard Brinson Mendoza
FUNDACIÓN AGUA LUNA
Contratista

HELBERT JOIRO L.
Beneficiario
C.C. 5172745

[Signature]
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	17-4-24
Municipio	El Molino	Hora de entrega:	
Vereda	Los Barriales		
Nombre del predio	Finca La Ponderosa	Coordenadas:	
Propietario	GUSTAVO MONTAÑO	Administrador:	Suger E.Petit. RU

2. Condiciones socioeconómicas				
trabajador/beneficiario del proyecto	GUSTAVO MONTAÑO	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadanía				

3. Estufa Ecológica			
Fecha de construcción (dd-mm-aa)	17-4-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	17-10-24
		OFICIAL:	

3.1 Registro fotográfico

<p>ANTES</p> 	<p>DESPUES</p> 
--	---

4. Compromiso y acuerdo de voluntades
El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Briscoy Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Beneficiario
C.C. 56.045.047/notis

Caroline C.
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	12
		Fecha:	24.9.24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	1.30. PM
Vereda	LOS BARRIALES - NUEVAS IDEAS		
Nombre del predio	el progreso	Coordenadas:	N 10° 37' 36.6" W 72° 53' 51.6"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	ELIZABETH MONTERO ZABALETA	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadania		68	3	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	24.9.24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	24.10.24	OFICIAL:
				Jose A Rodriguez

3.1 Registro fotográfico

<p>ANTES</p> 	<p>DESPUES</p> 
--	---

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brison Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Elizabeth Montero

Beneficiario
C.C.

Carolina C.

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	12-10-24
		Hora de entrega:	
Municipio	El molino	Coordenadas:	10°37'19.76514"N 72°53'4.28262"W
Vereda	Las barrales		
Nombre del predio	Briga de Rio	Administrador:	
Propietario			

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Edilma Isidorena Duarte Morales	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadania 27013488	75	3	B2

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	12-10-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	12-11-24	OFICIAL:
----------------------------------	----------	---	----------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES




DESPUES



4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoquejira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Brison Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Edilma Duarte Morales C.

Beneficiario
C.C. 27013488

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	20-8/24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	1:30 P.M
Vereda	LOS BARRIALES - NUEVAS IDEAS		
Nombre del predio	las Mercedez	Coordenadas:	N 10° 38' 12.9" W 72° 54' 17.8"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	JOSE DE JESUS JOIRO IBARRA	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadanía	1785391	84	4	B.4

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	20-8/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	20-9/24	OFICIAL:
				Jose A. Rodriguez

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brieson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Jose de Jesus Jairo

Beneficiario
C.C. 1785391

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental

Interventoria
Carolina C.

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	24/124
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	12.50 PM
Vereda	LOS BARRIALES - NUEVAS IDEAS		
Nombre del predio	EL OASIS	Coordenadas:	N 10° 37' 33,4" W 72° 53' 47"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	ALEIDA ESCOBAR DE VEGA	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadanía	27016860	65	3	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	24-12	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	24-12	OFICIAL:
				José A. Rodríguez

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brisson Menéndez
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Beneficiario

C.C. 27016860

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	28-9-24
		Fecha:	
		Hora de entrega:	
Municipio			
Vereda	Los Barrales		
Nombre del predio	Finc. Casiquillo	Coordenadas:	10°37'43.9" -72°53'50.3"
Propietario	Manuel Montero Lopez	Administrador:	Denes Lopez

2. Condiciones socioeconómicas				
trabajador/beneficiario del proyecto	Leonel Lopez	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadania		72	4	B.3

3. Estufa Ecológica			
Fecha de construcción (dd-mm-aa)	28-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	28-10-24
		OFICIAL:	

3.1 Registro fotográfico

ANTES



DESPUES



4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Bresh Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Beneficiario

c.c.27016997

 
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA BPN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General

		No.	
		Fecha:	3-9-24
		Hora de entrega:	
Municipio	El Molino		
Vereda	Los Barriales		
Nombre del predio	Neiro bigi	Coordenadas:	10°37'29.832" N 72°53'37.404" W
Propietario		Administrador:	Gabriel Molinar

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Neiro Alberto DIAZ SANCHEZ		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía		47 años	4	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	3-9	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	3-10	OPICIAL: Lauren Redrigo
----------------------------------	-----	---	------	-------------------------

3.1 Registro fotográfico

ANTES

DESPUES



4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA

Gabriel Molinar
2.768.394
Beneficiario

Lauren Redrigo C.
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental

***CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010*.**

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	20-9-24
		Hora de entrega:	
Municipio	El Molino	Coordenadas:	10° 36' 18.69792° -72° 53' 28.41138°
Vereda	Barriles		
Nombre del predio	El Pitao	Administrador:	
Propietario	Juan Rm		


2. Condiciones socioeconómicas				
trabajador/beneficiario del proyecto	Jaidel Rosado Morales	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadania	517269	46	1	B5

3. Estufa Ecológica				
Fecha de construcción (dd-mm-aa)	20-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	20-10-24	OFICIAL:

3.1 Registro fotográfico	
<p>ANTES</p> 	<p>DESPUES</p> 

4. Compromiso y acuerdo de voluntades
El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


 Gerald Brsson Mendoza
 FUNDACION AGUA LUNA
 Contratista


 Beneficiario
 C.C. 5172269


 PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
 Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	22-9-24
		Hora de entrega:	
Municipio	El Molino		
Vereda	Los Barriales		
Nombre del predio	2a union	Coordenadas:	10° 37.313 -72° 51.719
Propietario	Jesus Carrillo	Administrador:	Doris Pultrivel

2. Condiciones socioeconómicas			
trabajador/beneficiario del proyecto	Jesus carrillo orate	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)
Cedula ciudadania			Nivel SISBEN

3. Estufa Ecológica			
Fecha de construcción (dd-mm-aa)	22-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	22-10-24
		OFICIAL:	

3.1 Registro fotográfico	
<p>ANTES</p> 	<p>DESPUES</p> 

4. Compromiso y acuerdo de voluntades
El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corporación, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contralista

Beneficiario J. 158.771
C.C.

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

***CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA BPIN 20233218000010*.**

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	21-9-24
		Hora de entrega:	
Municipio	El molino	Coordenadas:	70°36'39"-50'192"N 72°53'58.6497"-W
Vereda	Los barriles	Administrador:	
Nombre del predio	El descanso		
Propietario			


2. Condiciones socioeconómicas				
trabajador/beneficiario del proyecto	Jefferson Luna Morale	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadania	17972820	58	1	X

3. Estufa Ecológica				
Fecha de construcción (dd-mm-aa)	21-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	21-10-24	OFICIAL:

3.1 Registro fotográfico	
<p>ANTES</p> 	<p>DESPUES</p> 

4. Compromiso y acuerdo de voluntades
El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar los labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Brison Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C. 17972820


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	8
		Fecha:	28-8/24
		Hora de entrega:	12:10 P.M.
Municipio	EL MOLINO		
Vereda	LOS BARRIALES - NUEVAS IDEAS		
Nombre del predio	Santa rita 2	Coordenadas:	N 10° 36' 55,6" W 72° 54' 38,4"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	JAVIER ENRIQUE MONTENEGRO	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadanía	77972979	58	3	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	28-8/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	28-9/24	OFICIAL:	Jose A. Rodriguez
----------------------------------	---------	---	---------	----------	-------------------


3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brissón Mendoza
FUNDACIÓN AGUA LUNA
Contratista


Javier Montenegro
Beneficiario
C.C.

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	14
		Fecha:	06.09.24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	2.50 PM
Vereda	LOS BARRIALES - NUEVAS IDEAS		
Nombre del predio		Coordenadas:	N 10° 39' 18,36" W 72° 56' 54,84"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	JOSE LUIS MORALES BALCAZAR	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadania			

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	06.09/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	06.10.24	OFICIAL:	Jose A Rodriguez
----------------------------------	----------	---	----------	----------	------------------


3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brison Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


17971980
Beneficiario
C.C.


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	7
		Fecha:	27-8/24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	2:05 P.M.
Vereda	LOS BARRIALES - NUEVAS IDEAS		
Nombre del predio	Santa Rita 1	Coordenadas:	N 10° 37' 7,05" W 72° 54' 37,3"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	JUAN JOSE MONTENEGRO ORATE	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	70	3	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	27/8/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	27-9/24	OFICIAL:	jose A. Rodriguez
----------------------------------	---------	---	---------	----------	-------------------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brissón Méndez
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Juan José Montenegro Carabali C.

Beneficiario
C.C.

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	8-10-24
		Hora de entrega:	
Municipio	EL MOLINO		
Vereda	LOS BARRIALES		
Nombre del predio	NAZARETH	Coordenadas:	10°37'26.60478"N 72°52'25.78926"W
Propietario	MAICHEL J. MINDIOLA-J	Administrador:	


2. Condiciones socioeconómicas				
trabajador/beneficiario del proyecto		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadania	1123733512	28	1

3. Estufa Ecológica				
Fecha de construcción (dd-mm-aa)	3-10-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	3-10-24	OFICIAL:

3.1 Registro fotográfico	
<p>ANTES</p> 	<p>DESPUES</p> 

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

 Gerald Ensson Mendoza FUNDACION AGUA LUNA Contratista	 Beneficiario C.C. 1123733512	 PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental Interventoria
---	---	---

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	7
Municipio	EL MOLINO	Fecha:	22.8.24
Vereda	LOS BARRIALES - NUEVAS IDEAS	Hora de entrega:	1.30 P.M
Nombre del predio	el paraiso	Coordenadas:	N 10° 37' 29" W 72° 53' 35"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	LUDY CONSUELO ACERO QUINTERO	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	1192806882	27	S

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	22.8./24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	22.9./24	OFICIAL:	José Rodríguez
----------------------------------	----------	---	----------	----------	----------------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brison Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Jaider Vergel Cambare C

Beneficiario
C.C.1192806882

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoria

REPRESENTANTE

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233210000010"

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	Fecha: 14/8/24
Municipio	El Molino	Hora de entrega:	
Vereda	La Unión Barrales		
Nombre del predio	la unión	Coordenadas	10° 31' 2.3925" - 72° 52' 18.66"
Propietario		Administrador	

2. Condiciones socioeconómicas				
trabajador/beneficiario del proyecto	Pedro Nicolás Carrillo	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISEN
Cédula ciudadana	17974189	56	5	B7

3. Estufa Ecológica				
Fecha de construcción (dd-mm-aa)	14/8/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	19/9/24	OFICIAL
3.1 Registro fotográfico				



4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los acuerdos previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el controlista.

[Signature]
 Gerardo Brison Mendoza
 COMISIÓN AGUA LLUNA
 Controlista

Pedro Carrillo Carrillo c.
 Beneficiario
 C.C. **17974189**

PRISA S.A.S Proyectos Integrativos De Desarrollo Ambiental
 Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	27/8/24
Municipio	El Molino	Hora de entrega:	6:00
Vereda	8 los Barriales		
Nombre del predio	la esperanza	Coordenadas:	10° 36' 52.34" N -72° 54' 21.95" W
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Roberto Martínez Moscate		Edad (años)	54	Personas a cargo (esposa e hijos)	6	Nivel SISBEN	B7
	Cedula ciudadania	56 095 755						

3. Estufa Ecológica


Fecha de construcción (dd-mm-aa)	27/8/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	27/9/24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	---------	----------


3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brison Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista



Beneficiario
C.C. 56 095 755



PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	7-8-24
		Hora de entrega:	
Municipio	El Molino		
Vereda	Los Barriales		
Nombre del predio		Coordenadas:	10°44'25.0206" -72°59'33.8758"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Rodrigo Gutierrez	Edad (años)		Personas a cargo (esposa e hijos)		Nivel SISBEN
	Cedula ciudadania 1.7770549			4		B5

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	7-8	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	7-9	OFICIAL:
----------------------------------	-----	---	-----	----------

3.1 Registro fotográfico

<p>ANTES</p> 	<p>DESPUES</p> 
---	--

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


 Gerald Brisco Mendoza
 FUNDACION AGUA LUNA
 Contratista


 Beneficiario
 C.C. 1.7770549

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
 Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
Municipio	EL MOLINO	Fecha:	21-8-24
Vereda	LOS BARRIALES - NUEVAS IDEAS	Hora de entrega:	3:11 pm
Nombre del predio	Nueva frontera	Coordenadas:	N 10° 38' 54,7" W 72° 54' 33,5"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	VANESSA LIDNEY ARGUELLES MONTERO		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	27016059	60	6	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	21-8	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	21-8	OFICIAL:	yony
----------------------------------	------	---	------	----------	------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brison Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Vanessa Lidney Arguelles Montero
Beneficiario
C.C. 27016059
Representante.

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	13
		Fecha:	05.07.24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	2.40-PM
Vereda	LOS BARRIALES - NUEVAS IDEAS		
Nombre del predio	La fortuna	Coordenadas:	N 10° 38' 07.0" W 72° 51' 58.8"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	YESMINA MARIA JIMENEZ GAMEZ		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	27015019	62	4	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	05.07.24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	05.07.24	OFICIAL:	José A. Rodríguez
----------------------------------	----------	---	----------	----------	-------------------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Enisson Mendoza
FUNDACIÓN AGUA LUNA
Contratista

Yesmina Jimenez Gamez
Beneficiario
C.C. 27015019

Caroline C.
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	27/8/24
Municipio	El Molino	Hora de entrega:	
Vereda	Los Barriales		
Nombre del predio	La Sociedad	Coordenadas:	10°35'52.92066" -72°51'49.3073"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas				
trabajador/beneficiario del proyecto	Maria Lopez Escobar	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadania 27016286	88	2	A 9


3. Estufa Ecológica				
Fecha de construcción (dd-mm-aa)	27/8/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	27/9/24	OFICIAL:

3.1 Registro fotográfico

<p>ANTES</p> 	<p>DESPUES</p> 
---	--

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brison Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Maria Lopez
Beneficiario 27016286.
C.C.

carolaine c.
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIM 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	7/8/24
		Hora de entrega:	
Municipio	El Molino		
Vereda	Los Barriales		
Nombre del predio	Fc. La Batulla	Coordenadas:	10°36'19.164" -72°52'6.468"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas				
trabajador/beneficiario del proyecto	Pedro	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISEEN
	AGUSTIN merino			
Cedula ciudadania	1785636	80	4	A2

3. Estufa Ecológica				
Fecha de construcción (dd-mm-aa)	7/8/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	7/8/24	OFICIAL:



4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.



Gerald Brsson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista



Beneficiario
C.C. 1785636

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	8/8/24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	LOS BARRIALES - NUEVAS IDEAS		
Nombre del predio	El coyral	Coordenadas:	N 10° 39' 03,0" W 72° 56' 47,2"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas					
trabajador/beneficiario del proyecto	NORKA JOSEFINA MOLINA ACOSTA		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	27014708	64	4	

3. Estufa Ecológica			
Fecha de construcción (dd-mm-aa)	6/8/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	8/9/24
		OFICIAL:	

3.1 Registro fotográfico	
ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades
El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 060 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Briceño Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C. 27.014708


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA, BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	10
		Fecha:	30.08/24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	2.00. PM
Vereda	LOS BARRIALES - NUEVAS IDEAS		
Nombre del predio	Los REYES	Coordenadas:	N 10° 39' 44" W 72° 56' 27"
Propietario		Administrador:	DELLIS

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	REYES CAMILO ZABALETA ROMERO	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadanía	15.163985	47	5	6

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	30.08/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	30.09/24	OFICIAL:	JOSE A RODRIGUEZ
----------------------------------	----------	---	----------	----------	------------------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C. 15.165.985


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	4/8/24
		Hora de entrega:	
Municipio	el Molino	Coordenadas:	10°36'19.05"
Vereda	dos Borriales		-72°52'6.68"
Nombre del predio	panplona	Administrador:	
Propietario	Romberto diaz		

2. Condiciones socioeconómicas				
trabajador/beneficiario del proyecto	Romberto Diaz S.	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadanía		49	6	A. 5

3. Estufa Ecológica			
Fecha de construcción (dd-mm-aa)	4/8/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	4/9/24
		OFICIAL:	

3.1 Registro fotográfico

ANTES



DESPUES



4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corporación, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerardo Brisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Beneficiario
C.C. 5172396.

Corolaine C.
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	5/8/24
Municipio	El Molino		entrega:
Vereda	Los Barriales		
Nombre del predio		Coordenadas:	10.8240 -72.8467
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Rafael Alberto Menjarrez	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	45	3	1

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	5-8	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	5-9	OFICIAL:
----------------------------------	-----	---	-----	----------


3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Brison Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C.


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	16/8/24
		Hora de entrega:	
Municipio	El molino	Coordenadas:	70°36'51.70878" W
Vereda	Los barriales		72°54'5.84208" W
Nombre del predio	Reguano so	Administrador:	
Propietario			

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBIEN
Cedula ciudadanía: 1.23730.89	39	2	X

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	16/8/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	16/9/24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	---------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES



DESPUES



4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corporación Agua Luna, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brisco Merloza
FUNDACIÓN AGUA LUNA
Contratista

Rafael M. Carrizalez Camolaine C.

Beneficiario
C.C. 1.2373089

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	27-8-24
		Hora de entrega:	
Municipio	San Juan del Cesar - Guajira		
Vereda	Orrialejas		
Nombre del predio	* Dios Verd *	Coordenadas:	10°41'57.03" -72°49'39.14"
Propietario	William Acosta	Administrador	* Luis David J

2. Condiciones socioeconómicas					
trabajador/beneficiario del proyecto		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN	
	Cedula ciudadanía	1010052354	30	2	A1

3. Estufa Ecológica				
Fecha de construcción (dd-mm-aa)	27-8-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	27-9-24	OFICIAL: <i>Carolina C.</i>

3.1 Registro fotográfico **ANTES** **DESPUES**



4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

[Signature]
Gerald Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA

[Signature]
101005234
Beneficiario

[Signature]
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA, BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	14/10/24
Municipio		Hora de entrega:	
Vereda	Corraleja		
Nombre del predio	Los Delirio.	Coordenadas:	10,7557 N 73,8443 W
Propietario	Raúl A Rosado	Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadania 84039334	63	3	

3. Estufa Ecológica


Fecha de construcción (dd-mm-aa)	14/10	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	14/10	OFICIAL:
				José A Rodríguez

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Brison Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

 
Beneficiario
C.C. 84039334
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	15/10/24
Municipio		Hora de entrega:	
Vereda	Pajonal		
Nombre del predio	Paramo 2	Coordenadas:	10°39'52.42044" -72°50'48.6648"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Segundo Marten Torres Nino		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	12568982	42	8	A1

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	15/10/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	15/11/24	OFICIAL:
----------------------------------	----------	---	----------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C.
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	2-11-24
		Hora de entrega:	
Municipio			
Vereda	Pantano		
Nombre del predio	Agua Luna	Coordenadas:	10,7327N 72,8382W
Propietario	Hector Granadillo	Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadanía: 84036293	62	3	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	2-11-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	2-12-24	OFICIAL:	José A. Rodríguez
----------------------------------	---------	---	---------	----------	-------------------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, considerando en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contralista

Hector Granadillo comulgare c.

Beneficiario
C.C. 84036293

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha: <u>28-10-24</u>	
Municipio		Hora de entrega:	
Vereda	<u>El Pantano</u>		
Nombre del predio	<u>La Victoria</u>	Coordenadas:	<u>10,7332 N</u> <u>72,8399 W</u>
Propietario	<u>Carlos Mario Guerra</u>	Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	<u>Carlos Mario Guerra</u>	Edad (años)	<u>43</u>	Personas a cargo (esposa e hijos)	<u>3</u>	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía <u>5164810</u>					

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	<u>28-10-24</u>	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	<u>28-10-24</u>	OFICIAL:	<u>Jose A Rodriguez</u>
----------------------------------	-----------------	---	-----------------	----------	-------------------------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
 <p><small>10,7332 N 72,8399 W CARLOS MARIO GUERRA vereda EL pantano 1 Número de índice 244</small></p>	 <p><small>10,7332 N 72,8399 W CARLOS MARIO GUERRA vereda EL pantano 1 Número de índice 244</small></p>

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corporación Agua Luna, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Carlos Mario Guerra Carla Ivette C.
Beneficiario
C.C. 5164810

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA, BPIN 20233218000010".

FÓRMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	29/10/24
		Hora de entrega:	
Municipio			
Vereda	El Pantano		
Nombre del predio	Finca Las Mercedes	Coordenadas:	10,7355 -72,8430
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadanía: 84036943	62	2	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	29/10/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	29/11/24	OFICIAL:	José A. Rodríguez
----------------------------------	----------	---	----------	----------	-------------------


3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra D50 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


 Gerardo Briceño Méndez
 FUNDACION AGUA LUNA
 Contratista


 Nicolás Aníes M. Carabali
 Beneficiario
 C.C. 84036943

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
 Ambiental
 Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	26-10-24
Municipio	San Juan del Cesar		
Vereda	EL PANTANO		
Nombre del predio	LAS MARIAS	Coordenadas:	10,7307 N 72 8380 W
Propietario	JORGE LUIS EGURROLA	Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	5164831	43	6

3. Estufa Ecológica


Fecha de construcción (dd-mm-aa)	26-10-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	26-11-24	OFICIAL:
				JOSE A RODRIGUEZ


3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


 Gerardo Brissón Mendoza
 FUNDACION AGUA LUNA
 Contratista

 
 Beneficiario
 C.C 5164831
 PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
 Ambiental
 Interventoria

***CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010*.**

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General

		No.	
		Fecha:	30-10-24
		Hora de entrega:	
Municipio			
Vereda	El Pantano		
Nombre del predio	Coordenadas:	10.7092-N	
Propietario	Administrador:	#28379-001	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	56056837	47

3. Estufa Ecológica


Fecha de construcción (dd-mm-aa)	30-10-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	30-10-24	OFICIAL:	José A. Rodríguez
----------------------------------	----------	---	----------	----------	-------------------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brison Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Naribel Mejía Carolaire C.
Beneficiario
C.C. 56056837

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	2-11-24
		Hora de entrega:	
Municipio			
Vereda	El Pantano		
Nombre del predio	Alejandra	Coordenadas:	10.7303. N 72.6395. W
Propietario	Maria Angelica Vega.V	Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas				
trabajador/beneficiario del proyecto		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadania	56075507	54	3

3. Estufa Ecológica				
Fecha de construcción (dd-mm-aa)	2-7-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	2-12-24	OFICIAL: José A. Rodríguez

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
 <p>16.7307W 72.6395W MARIA ANGELICA VEGA V vereda el pantano 1 Municipio de San Juan del Cesar</p>	 <p>16.7307W 72.6395W MARIA ANGELICA VEGA V vereda el pantano 1 Municipio de San Juan del Cesar</p>

4. Compromiso y acuerdo de voluntades
El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Besson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Maria Vega.V
Beneficiario
C.C. 56075507

Carolina C.
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	31-10/24
Municipio		Hora de entrega:	
Vereda	El pantano		
Nombre del predio	La clarida	Coordenadas:	10,7319 N 72,8379 W
Propietario	Wilberto Tirado G	Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadania 17953127	58	6	

3. Estufa Ecológica


Fecha de construcción (dd-mm-aa)	31/10/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	30/11/24	OFICIAL:
				José A Rodríguez


3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brison Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C.17953127


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoria

***CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010*.**

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	18/10/24
		Hora de entrega:	
Municipio	San Juan	Coordenadas:	10,7368N
Vereda	El Pantano	Administrador:	72,8443W
Nombre del predio	La beva		
Propietario	Victor Rosado		

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Victor Rosado	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadania: 84104549	48	6	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	18/10/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	18/11/24	OFICIAL:
			JOSÉ RODRÍGUEZ	

3.1 Registro fotográfico


ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brisson Mendoza
FUNDACIÓN AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
c.c. 84104549


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA, BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
Municipio	SAN JUAN	Fecha:	28/08/24
Vereda	TABLAZO	Hora de entrega:	12:43 Pm
Nombre del predio	Guayacon.	Coordenadas:	N 10° 44' 11,52" W 72° 53' 40,75"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	MERLE ZUÑIGA NUÑEZ		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	17970540.	68	6.	A1.

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	28-8	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	28-9	OFICIAL:	Rosario Rodríguez
----------------------------------	------	---	------	----------	-------------------

3.1 Registro fotográfico



4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


 Gerald Brissón Mendoza
 FUNDACION AGUA LUNA
 Contratista


 Beneficiario
 C.C. 17970540.


 PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
 Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
Municipio	SAN JUAN	Fecha:	13/08/24
Vereda	EL TABLAZO	Hora de entrega:	1:59 pm
Nombre del predio		Coordenadas:	N 10°43'52,32" W 72°56'07,04"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	ROSA MARIA MENDOZA GUTIERREZ	Edad (años)		Personas a cargo (esposa e hijos)		Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía					

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	13-8	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	13-09	OFICIAL:	Diana Rodriguez
----------------------------------	------	---	-------	----------	-----------------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
 <p>13 ago 2024 10:22 a.m. 10°43'42.02" N - 72°56'5.82" W San Juan del Cesar Rosa Maria Mendoza al servicio San Juan del Cesar Guajira</p>	 <p>13 ago 2024 10:22 a.m. 10°43'42.02" N - 72°56'5.82" W San Juan del Cesar Rosa Maria Mendoza al servicio San Juan del Cesar Guajira</p>

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Rosa Maria Mendoza Caroline C.

Beneficiario
C.C.

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010"

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
Municipio	SAN JUAN	Fecha:	31-08-24
Vereda	TABLAZO	Hora de entrega:	12:28 pm
Nombre del predio	Posquito a Poco.	Coordenadas:	N 10° 44' 43,86" W 72° 53' 19,19"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	MANUEL ANTONIO ORTEGA GAMEZ	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadania	12.470.028	80	3	B1.

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	31-8	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	30-9	OFICIAL:
				Dania Rodriguez

3.1 Registro fotográfico



4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoaguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C. 12.470.028


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoria

***CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010*.**

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
Municipio	SAN JUAN	Fecha:	29-08-24
Vereda	TABLAZO	Hora de entrega:	5:19 P.m.
Nombre del predio	San Marcos.	Coordenadas:	N 10° 44' 10,98"
Propietario			W 72° 53' 27,45"
	Administrador:		

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	FELICITA LOPEZ	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadania	49685420.	69	3	B7.

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	29-8	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	29-9	OFICIAL:
				Carolina Rodriguez

3.1 Registro fotográfico

<p>ANTES</p>  <p>29 ago 2024 5:20:05 p.m. 10°44'10.998"N - 72°53'27.34"W San Juan del Cesar Felicita Lopez Tablazo San Juan</p>	<p>DESPUES</p>  <p>29 ago 2024 5:29:15 p.m. 10°44'10.998"N - 72°53'27.34"W San Juan del Cesar Felicita Lopez Tablazo San Juan</p>
---	--

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Beneficiario

C.C. 49685420.

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	23-10-24
		Hora de entrega:	
Municipio	San Juan		
Vereda	Tablazo		
Nombre del predio	LAS MARIA	Coordenadas:	10°44'6.444"N -72°54'46.848"W
Propietario	ELKIN DIAZ	Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas					
trabajador/beneficiario del proyecto		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN	
	Cedula ciudadanía	27	3	A2	

3. Estufa Ecológica				
Fecha de construcción (dd-mm-aa)	23-10-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	23-11-24	Oficial: <i>Daivin Rodriguez</i>

3.1 Registro fotográfico



4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

[Signature]
Gerald Brisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

[Signature]
Beneficiario
C.C.
841021503

[Signature]
CAROLINE C.
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010"

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General

Municipio	SAN JUAN		
Vereda	EL TABLAZO		
Nombre del predio	CAYUZO	Coordenadas:	N 11°43'14,16" W 72°56'44,93"
Propietario	Administrador:		

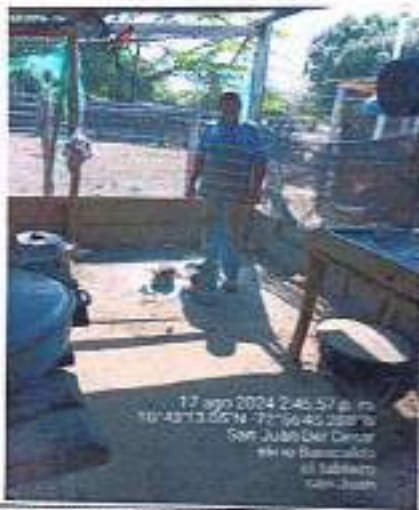
2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	ELIRIO JOSE BARACALDO MENDOZA	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadanía	5172620	46	8	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	17-8-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	17-9-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	---------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
 <p>17 ago 2024 2:45:57 p.m. 10°43'13.05"N - 72°56'45.00"W San Juan del Cesar Elirio Baracaldo El Tablazo San Juan</p>	 <p>17 ago 2024 2:45:57 p.m. 10°43'13.05"N - 72°56'45.00"W San Juan del Cesar Elirio Baracaldo El Tablazo San Juan</p>

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brison Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Beneficiario
C.C. 5172620
ALMIS-180001

PRIDA S.A.S. Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010"

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	29/08/24
		Hora de entrega:	11:32 Am.
Municipio	SAN JUAN		
Vereda	EL TABLAZO		
Nombre del predio	La tormenta.	Coordenadas:	N 10° 44' 15,28" W 72° 53' 53,93
Propietario		Administrador:	Deiner Cornejo.

2. Condiciones socioeconómicas				
trabajador/beneficiario del proyecto	BERNARDO ANTONIO CASTRO TONCEL	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadanía	1120242503	40.	3	A1.

3. Estufa Ecológica				
Fecha de construcción (dd-mm-aa)	29-8	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	29-9	OFICIAL: Deyan Rodriguez



4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brissom Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

BERNARDO CASTRO
Beneficiario
C.C. 1120242503

Camelaine C.
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	15/08/24
Municipio	SAN JUAN	Hora de entrega:	5:42 Pm
Vereda	EL TABLAZO		
Nombre del predio		Coordenadas:	N 10°43'48,57" W 72°54'48,73"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	ALONSO MENDOZA GUTIERREZ	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadanía				

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	15-8	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	15-8	OFICIAL:
				Darwin Rodriguez

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Alonso Mendoza
Beneficiario
C.C.

Caroline C.
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	1-10-24
		Hora de entrega:	
Municipio	San Juan	Coordenadas:	10°46'22.086"N 72°31'8.85"W
Vereda	Carraverales		
Nombre del predio	MOREAL 1	Administrador:	
Propietario	Henry Frías		

2. Condiciones socioeconómicas		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
trabajador/beneficiario del proyecto	Henry Frías	52	3	A1
Cedula ciudadanía				

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	1-10-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	1-11-24	OFICIAL: Dorina Rodriguez
---	---------	--	---------	-------------------------------------


3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C. 84103618


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoria

CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA.
BPIN 20233218000010"

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	31-10-24
		Hora de entrega:	
Municipio	San Juan del Cesar		
Vereda	Cañaverales		
Nombre del predio	Finca la lucha	Coordenadas:	10°45'52.504"N 77°50'44.622"W
Propietario	Felipe Agustin Amaya m	Administrador:	Blas Charris

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadania: 17952287	52	5	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	31-10	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	30-11	OFICIAL: David Rodriguez
----------------------------------	-------	---	-------	--------------------------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
 <p>31/10/2024 2:29 p.m. 17952287 San Juan del Cesar Felipe Agustin Amaya m San Juan del Cesar - La Guajira</p>	 <p>31/10/2024 4:28 p.m. 17952287 San Juan del Cesar Felipe Agustin Amaya m San Juan del Cesar - La Guajira</p>

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Felipe Amaya

Beneficiario
C.C. 17.952.287

Carolina C.

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	23-10-24
		Hora de entrega:	
Municipio	San Juan del Cesar		
Vereda	Cañaverales		
Nombre del predio	La Montaña	Coordenadas:	10°45'37.596"N -72°51'10.902"W
Propietario	Elkin Guerra	Administrador:	Eniyeveeth

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadania	43	4	A1

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	23-10-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	23-11-24	OFICIAL:
				Daurin Rodriguez

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista


Gerald Brisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista



Beneficiario

C.C. 1.067.717.304

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR"
 BPIN 20233218000010"

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO


1. Información General		No.	
		Fecha:	28-10-24
Municipio	San Juan del Cesar	Hora de entrega:	
Vereda	Cañaverales		
Nombre del predio	La Rosa	Coordenadas:	10°45'34.744"N -76°51'23.962"W
Propietario	Cesar Daza	Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas				
trabajador/beneficiario del proyecto	Cesar Daza	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cédula ciudadanía	2.767.919.	60	4	A3

3. Estufa Ecológica			
Fecha de construcción (dd-mm-aa)	28-10-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	28-10-24
3.1 Registro fotográfico		OFICIAL: <u>Darwin Rodryg</u>	

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades
El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


 Gerald Brissón Mendoza
 FUNDACION AGUA LUNA
 Contratista

Cesar Daza
 Beneficiario
 C.C.
 2.767.919

Caroline C.
 PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
 Ambiental
 Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA"
BPIN 20233219000010"

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General

		No.	
		Fecha:	7/11/24
Municipio	San Juan	Hora de entrega:	12:34 P.M.
Vereda	Concepcionales		
Nombre del predio	Los Martillos	Coordenadas	10°45'43.626"N 72°50'40.908"W
Propietario		Administrador	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Jorge Francisco Fierro	74	2	B3
Cedula ciudadania	2767872		

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	4-11-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	7-12-24	OFICIAL:	Rivera Rodriguez
----------------------------------	---------	---	---------	----------	------------------

3.1 Registro fotográfico

ANTES



DESPUES




4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Briceon Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Beneficiario

C.C. 2767872


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA, BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	22-10-24
Municipio	San Juan	Hora de entrega:	
Vereda	Cañaverales		
Nombre del predio	Nuevo Horizonte	Coordenadas:	10°45'50.232"N -72°51'54.336"W
Propietario	Alonso Mendoza Gomez	Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadania	69	3	A1

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	22-10-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	22-10-24	Oficial:
				Carolina Padilla

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


 Gerald Brisson Mendoza
 FUNDACION AGUA LUNA
 Contratista


 Beneficiario
 C.C. 17953405


 PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
 Ambiental
 Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	3-11-24
		Hora de entrega:	
Municipio	San Juan		
Vereda	Carrizales		
Nombre del predio	La Ceiba	Coordenadas:	10°46'22.44"N 72°50'23.00"W
Propietario	Alvaro Wega Giobanetti	Administrador:	Viviana Florez

2. Condiciones socioeconómicas				
trabajador/beneficiario del proyecto		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	42	4	

3. Estufa Ecológica			
Fecha de construcción (dd-mm-aa)	3-11-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	3-12-24
		OFICIAL:	Darwin Restrepo

3.1 Registro fotográfico ANTES DESPUES



4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguaajira, contemplados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

[Signature]
Gerald Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA

[Signature]
Viviana Florez
1118820993
Beneficiario

[Signature]
Caroline C.
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	24-10-24
Municipio	San Juan	Hora de entrega:	
Vereda	Cañaverales		
Nombre del predio	Casa blanca	Coordenadas:	10°45'42.864"
Propietario	Hiramel Molina	Administrador:	72°51'15.282"

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Miriamel Molina Martinez	68	3	B3
Cedula ciudadanía	2767904		

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	24-10	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	24-11	OFICIAL:
				Arvin Rodriguez

3.1 Registro fotográfico


ANTES


DESPUES



4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA

 Miriamel Molina Carabina C.

Beneficiario
2767904

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	29-10-24
		Hora de entrega:	
Municipio	San Juan	Coordenadas:	10°44'36.09"N
Vereda	Cañaverales		72°51'44.332"W
Nombre del predio	Nunca esampa	Administrador:	Belisario Bessio
Propietario	Alberto Celestino Calderon		

2. Condiciones socioeconómicas				
trabajador/beneficiario del proyecto	Alberto Celestino Calderon	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadania		43	4	A2

3. Estufa Ecológica


Fecha de construcción (dd-mm-aa)	29-10-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	29-10-24	OFICIAL:
				David Rodriguez

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


 Gerardo Brissón Mendoza
 FUNDACION AGUA LUNA
 Contratista


 Beneficiario
 C.C. V


 PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
 Ambiental
 Interventoria

1.081.909.073

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	27-10-24
		Hora de entrega:	
		Municipio: <u>San Juan</u> Vereda: <u>Cañacurpes</u> Nombre del predio: <u>Las delicias 1</u> Propietario: <u>Jaime Rafael Contreras</u>	

2. Condiciones socioeconómicas				
trabajador/beneficiario del proyecto	<u>Jaime Contreras</u>	Edad (años)		Personas a cargo (esposa e hijos)
Cedula ciudadania	<u>5.162.739</u>	<u>68</u>		<u>3</u>
				Nivel SISBEN <u>A1</u>

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	<u>27-10-24</u>	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	<u>27-10-24</u>	OFICIAL:
				<u>Devin Restrepo</u>

3.1 Registro fotográfico

ANTES




DESPUES




4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Pinson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C. 5162739


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	25-10-24
Municipio	San Juan del Cesar - Guajira	Hora de entrega:	
Vereda	Cañoverales		
Nombre del predio	Bogotá	Coordenadas:	10° 45' 20.33" N -72° 51' 2.868" W
Propietario	JOSE ALFONSO BRITO	Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Cedula ciudadanía	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	2.767.880	72	4	A1

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	25-10-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	25-11-24	OFICIAL: <i>Daniel Rodríguez</i>
----------------------------------	----------	---	----------	----------------------------------

3.1 Registro fotográfico

ANTES



DESPUES



4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

[Signature]
Gerald Brison Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

[Signature]
José A Brito
Beneficiario
C.C. 2.767.880

[Signature]
Caroline C.
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	28-10-24
Municipio	San Juan	Hora de entrega:	
Vereda	Cañaverales		
Nombre del predio	Los Hornales	Coordenadas:	10°46'24.636"N -72°50'43.11"W
Propietario	Josefina Tancel	Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Josefina Tancel	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadania 27005216	84	4	A3

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	25-10-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	28-11-24	OFICIAL: <i>Darwin Rodriguez</i>
----------------------------------	----------	---	----------	----------------------------------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

[Signature]
Gerald Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

[Signature]
Josefina Tancel
Beneficiario
C.C. 27005216

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	18/10/24
Municipio	SAN JUAN DEL CESAR		Hora de entrega:
Vereda	CANOBERALES.		
Nombre del predio	MANCO	Coordenadas:	10°45'24.474"N -72°51'10.482"W
Propietario	pedro lucas Daza	Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadania: 5163332	65	2	A A

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	18/10/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	18/11/24	OFICIAL:
				Dacirín Pedraza

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corporación Agua Luna, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

PEDRO LUCAS DAZA CARABALLO C.
Beneficiario
C.C. 5163332

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoria



"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	2-11-24
Municipio	San Juan del Cesar	entrega:	
Vereda	Canauverale		
Nombre del predio	Norreal	Coordenadas:	10° 46' 11.72" -72° 50' 59.42"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Vony G. Gamez	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadania	84.036.586	42	2	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	2-11	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	2-12	OFICIAL:
----------------------------------	------	---	------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corporación Agua Luna, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

YERTIN S. VILLERO Camelina C.
Beneficiario
C.C. 5.165.083

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	2-11-24
		Hora de entrega:	
Municipio	San Juan	Coordenadas:	10°44'56.598"N -72°51'4.932"W
Vereda	Cañaverales		
Nombre del predio	Bonayre	Administrador:	Lis Edel de Harquez
Propietario	Maria Luisa Mendoza		

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadania	45	4	A1

3. Estufa Ecológica


Fecha de construcción (dd-mm-aa)	2-11-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	2-12-24	OFICIAL:
				Laurin Rodas


3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Lis Edel de Harquez
Beneficiario
C.C. 7618656

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
Municipio	San Juan	Fecha:	31-10-24
Vereda	Cañaverales	Hora de entrega:	
Nombre del predio	El Molino	Coordenadas:	10°45'47.602"N -72°50'44.214"W
Propietario	Oscar Vasquez	Administrador:	


2. Condiciones socioeconómicas				
trabajador/beneficiario del proyecto	Oscar Vasquez	Edad (años)	69	Personas a cargo (esposa e hijos)
Cedula ciudadanía	1795014			Nivel SISBEN

3. Estufa Ecológica			
Fecha de construcción (dd-mm-aa)	31-10	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	30-11
		OFICIAL:	David Rodriguez

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades
El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


 Gerald Brissón Mendoza
 FUNDACION AGUA LUNA
 Contratista


 Beneficiario
 C.C. 1795014


 PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
 Ambiental
 Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	24-10-24
Municipio		Hora de entrega:	
Vereda	poloquemao		
Nombre del predio		Coordenadas:	10,7268N 73,2428W
Propietario	Elsa B. Fuente U.	Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas				
trabajador/beneficiario del proyecto		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadanía	27003375	62	2	


3. Estufa Ecológica			
Fecha de construcción (dd-mm-aa)	24-10-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	24-11-24
		OFICIAL:	JOSÉ A. RODRIGUES


3.1 Registro fotográfico


ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Bisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
CC27003375


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010"

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	20-10-24
Municipio		Hora de entrega:	
Vereda	Comodin Palo Quemado		
Nombre del predio	Villa Esperanza	Coordenadas:	10,7247 N 72,8389 W
Propietario *	Rafael Ospino	Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadania 14226041	66	3	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	20-10-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	20-11-24	OFICIAL: Jose A Rodriguez
----------------------------------	----------	---	----------	---------------------------

3.1 Registro fotográfico

ANTES




DESPUES



4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Brison Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C. 14226041


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	2-11-24
Municipio		Hora de entrega:	
Vereda	Ataquemas		
Nombre del predio	La Trinidad	Coordenadas:	10.7133.N 72.8439.W
Propietario	Yoban Garcia	Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Edad (años)	Personas a cargo (esposa o hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadania: 17958063	43	3	

3. Estufa Ecológica


Fecha de construcción (dd-mm-aa)	2-11-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	2-12-24	OFICIAL:
				José A Rodríguez

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Brison Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Yoban Garcia
Beneficiario
C.C. 17958063

Caroline C.
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	29-10-24
		Hora de entrega:	
Municipio			
Vereda	Los Tres Caños		
Nombre del predio	Tres Caños	Coordenadas:	10,7383 N 72,8462 W
Propietario	Jorge Orozco Montem	Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadania: 84036166	62	2	

3. Estufa Ecológica


Fecha de construcción (dd-mm-aa)	29-10-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	24-11-24	OFICIAL: José A Rodríguez
----------------------------------	----------	---	----------	---------------------------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


 Gerardo Brison Mendoza
 FUNDACION AGUA LUNA
 Contratista


 Beneficiario
 C.C. 84036166


 PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
 Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	3 Nov
		Hora de entrega:	12:30
Municipio	San Juan del Cesar		
Vereda	Tres caño		
Nombre del predio	San Jose	Coordenadas:	70, 7398 72 8445
Propietario	José Gregorio Orozco	Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadanía	84039143	53	3

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	3.11.24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	3.12.24	OFICIAL:	José A. Rodríguez
----------------------------------	---------	---	---------	----------	-------------------


3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


 Gerald Brissón Mendoza
 FUNDACION AGUA LUNA
 Contratista


 Beneficiario
 C.C. 84039143

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
 Ambiental
 Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	2-11-24
		Hora de entrega:	
Municipio			
Vereda	los tres caño		
Nombre del predio	El Porvenir	Coordenadas:	10,7402 N 72,8458 W
Propietario	Yeyla Rosado	Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadania	56077435	44	1

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	2-11-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	2-11-24	OFICIAL:	José A. Rodríguez
----------------------------------	---------	---	---------	----------	-------------------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Bresson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Yeyla Rosado
Beneficiario
C.C. 56077435

Carolina C.
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	3-11-24
Municipio		Hora de entrega:	
Vereda	Los 3 caño		
Nombre del predio	La Lucha	Coordenadas:	70,7386 N 72,8448 W
Propietario	Maricelina Ace	Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto		Edad (años)	Personas a cargo (esposos e hijos)	Nivel SSBEN
Cedula ciudadanía	27004697	58	2	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	3-11-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	3-12-24	OFICIAL:
				José A. Rodríguez


3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoquajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


 Gerald Bresson Merloza
 FUNDACION AGUA LUNA
 Contratista


 Beneficiario
 C.C. 27004697


 PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
 Ambiental
 Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010"

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	2-8-24
Municipio	EL MOLINO		Hora de entrega:
Vereda	MANANTIAL - TABLITAS		
Nombre del predio		Coordenadas:	N 10° 38' 8,6" W 72° 55' 00,4"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	FABIOLA ORTEGON ACOSTA		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	28717041	66	5	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	2-8-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	2-9-24	OFICIAL:
----------------------------------	--------	---	--------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Fabiola Ortega Caroline C.

Beneficiario
C.C. 28717041

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	19-8-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	MANANTIAL - TABLITAS		
Nombre del predio	El Manantial	Coordenadas:	N 10° 38' 34,9" W 72° 55' 47,8"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	EMILIANO DUARTE LOPEZ		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	5 172 528	47	5	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	19-8-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	19-9-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	---------	----------


3.1 Registro fotográfico



4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


5.172.528
Beneficiario
C.C.

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	25-9-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	1:45 PM
Vereda	Los Papeles	MANANTIAL - TABLITAS	
Nombre del predio	Bella Sida	Coordenadas:	N 10° 36' 51,2" W 72° 55' 59,2"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	ELIX ANGARITA MARQUEZ	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadanía	6795605	56	5	

3. Estufa Ecológica


Fecha de construcción (dd-mm-aa)	25-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	25-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	----------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Brison Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

ELIX Angarita
Beneficiario
C.C. 6795605

Consuelo C.
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	2-9-24
Municipio	EL MOLINO		Hora de entrega:
Vereda	MANANTIAL - TABLITAS		
Nombre del predio	El espinito	Coordenadas:	N 10° 37' 32,9" W 72° 55' 04,7"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	EFRAIN BIENVENIDO VENCE	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadanía	517070051	79		

3. Estufa Ecológica


Fecha de construcción (dd-mm-aa)	2-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	2-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	--------	---	---------	----------


3.1 Registro fotográfico

<p>ANTES</p> 	<p>DESPUES</p> 
--	---

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C. 517070051

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	
		Hora de entrega:	
Municipio	EL MOLINO		
Vereda	MANANTIAL - TABLITAS		
Nombre del predio	Los visperos 3	Coordenadas:	N 10° 39' 18.33" W 72° 54' 53.76"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	DIDSON ALFREDO MERINO MONTERO		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	17972110	63	4	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	11-4-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	11-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	----------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Didson merino Caroline C.
Beneficiario
C.C.17972110P
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	26-10-24
		Hora de entrega:	
Municipio	El molino		
Vereda	El manantial		
Nombre del predio	El Prutal	Coordenadas:	70°39'20.24682"N 72°54'49.77264"W
Propietario	Jose Alfredo Zabaleta	Administrador:	Murcio Novas Píez

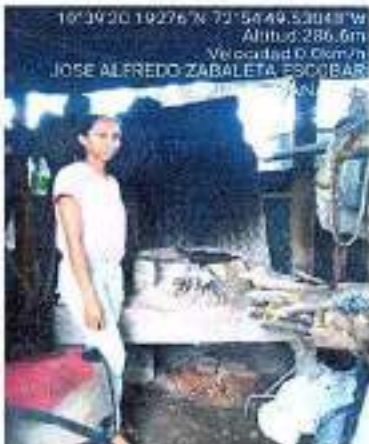
2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Cedula ciudadanía	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
		5120560	42	3

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	26-10-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	26-11-24	OFICIAL:
----------------------------------	----------	---	----------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
 <p>Altitud: 19276 m Altitud: 286.6m Velocidad: 0.0cm/h JOSE ALFREDO ZABALETA ESCOBAR</p>	 <p>Altitud: 19276 m Velocidad: 0.2cm/h JOSE ALFREDO ZABALETA ESCOBAR</p>

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brison Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Murcio Novas Píez Caroline C.

Beneficiario
C.C. 5110560

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA" BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	10-9-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	2:30 pm
Vereda	MANANTIAL DE LAS ESTUFAS		
Nombre del predio		Coordenadas	N 10° 22' 56,50" W 72° 57' 09,92"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	JOSE ALFREDO GUEVARA RENCE	Educación	Personas a cargo: Nueve (9) BENEFICIARIOS
	Cedula ciudadania: 5112 278	52	

3. Estufa Ecologica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	10-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	10-10-24	OFICIAL:	OBG
----------------------------------	---------	---	----------	----------	-----

3.1 Registro fotografico



4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

[Signature]
Gerard Brinson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

[Signature]
Beneficiario
C.C.

[Signature]
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	16-8-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	2:51 pm
Vereda	MANANTIAL - TABLITAS		
Nombre del predio	Los Nisperos 2	Coordenadas:	N 10° 39' 30,4" W 72° 54' 8,7"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	DALIS MARIA MERINO MONTERO	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadania 27016497	67	5	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	16-8	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	16-9	OFICIAL: Yenny
----------------------------------	------	---	------	----------------


3.1 Registro fotográfico


ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C. 27.016.797.


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	29-10-24
		Hora de entrega:	
Municipio	El molino	Coordenadas:	10°38'22.49136"N 72°55'34.9182"W
Vereda	El manantial	Administrador:	
Nombre del predio	el descanso		
Propietario			

2. Condiciones socioeconómicas				
trabajador/beneficiario del proyecto	Dainer Armenta		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)
	Cédula ciudadania	15225690	39	4
				Nivel SISBEN
				C2

3. Estufa Ecológica				
Fecha de construcción (dd-mm-aa)	29-10-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	29-10-24	OFICIAL:

3.1 Registro fotográfico	
<p>ANTES</p> 	<p>DESPUES</p> 

4. Compromiso y acuerdo de voluntades
El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


 Gerardo Brissón Mendoza
 FUNDACION AGUA LUNA
 Contratista

Dainer J. Armenta Carabine C.

Beneficiario
 C.C. 15225690

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
 Ambiental
 Interventoria

***CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010*.**

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	9
		Fecha:	29.8. /24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	Hora 0.11.15. AM
Vereda	MANANTIAL - TABLITAS		
Nombre del predio	Los Clabeles	Coordenadas:	N 10° 38' 2,7" W 72° 54' 46,1"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	CESAR ELIAS GONZALEZ JIMENEZ		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	5771852	67	2	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	29.8/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	29.9 /24	OFICIAL:	Jose A Rodriguez
----------------------------------	----------------	---	-----------------	----------	-------------------------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoaguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Cesar E. Gonzalez Carbolinec.

Beneficiario
C.C. **5777852**

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	7-9-24
Municipio	EL MOLINO		Hora de entrega:
Vereda	MANANTIAL - TABLITAS		
Nombre del predio	W 5 W 355 9 90	Coordenadas:	N 10° 38' 6,5" W 72° 55' 8,1"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	CARLOS ALBERTO LLANOS DIAZ		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	5172544	49	8	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	7-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	7-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	--------	---	---------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brissón Mendoza
FUNDACIÓN AGUA LUNA
Contratista

Beneficiario
C.C. 5172544

Caroline C.
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010"

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	28-8-24
Municipio:	EL MOLINO	Hora de entrega:	3:44 pm
Vereda:	MANANTIAL - TABLITAS		
Nombre del predio:	El Peregrino	Coordenadas:	N 10°38'57,7" W 72°55'11,1"
Propietario:		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	CARLOS ANDRES DIAZ IBARRA	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadania	1123731002	36	5	A4

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	28-8	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	28-7	OFICIAL:	yony
----------------------------------	------	---	------	----------	------

3.1 Registro fotográfico

<p>ANTES</p> 	<p>DESPUES</p> 
---	--

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brissón Mendoza
FUNDACIÓN AGUA LUNA
Contratista

Laura Morales Carolina C.
39515865
Beneficiario Esposo.
C.C.

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.:	
		Fecha:	5-9-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	MANANTIAL - TABLITAS		
Nombre del predio	Coordenadas:	N 10° 39'13,0 W 72°54'49,5'	
Propietario	Administrador:		

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	ANTONIO VALDIMIR VANEGAS MERINO	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía 517050	75	8	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	5-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	5-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	--------	---	---------	----------

3.1 Registro fotográfico

<p>ANTES</p>  <p>10°39'15.66114"N - 72°54'48.9478"W Altitud: 269.0m Velocidad: 0.7km/h JUANA QUINTERO VEREDA EL MANANTIAL Número de identificación</p>	<p>DESPUES</p>  <p>10°39'16.65442"N - 72°54'48.9478"W Altitud: 269.0m Velocidad: 0.7km/h JUANA QUINTERO VEREDA EL MANANTIAL Número de identificación</p>
---	--

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brison Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Beneficiario

C.C.

Antonio Vanegas Merino

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	8-9-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	Las Papayas MANANTIAL - TABLITAS		
Nombre del predio	La Juna	Coordenadas:	N 10° 37' 23,2" W 72° 55' 7,5"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas				
trabajador/beneficiario del proyecto	ANA YIVE CARDENAS TELLEZ	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadania	1061441163	25	2.	X


3. Estufa Ecológica	
Fecha de construcción (dd-mm-aa)	8-9-24
Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	8-10-24
OFICIAL:	

3.1 Registro fotográfico	
<p>ANTES</p>  <p>8 sept 2024 13:55 p. m. 10°37'33.342"N - 72°55'7.506"W Altitud: 454.1 m Velocidad: 0.0 km/h Anexo: Cardenal vereda los papayas</p>	<p>DESPUES</p>  <p>8 sept 2024 13:55 p. m. 10°37'33.342"N - 72°55'7.506"W Altitud: 454.1 m Velocidad: 0.0 km/h Anexo: Cardenal vereda los papayas</p>

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brissan Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario Hija
C.C. 1061441163


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General

		No.	14-8-24
		Fecha:	
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	1:30 pm
Vereda	MANANTIAL - TABLITAS		
Nombre del predio	LA CORDILLERA	Coordenadas:	N 10° 38' 8.5" W 72° 55' 49"
Propietario	LADYMIRO ACOSTA D.	Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	LADYMIRO ACOSTA DUARTE	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadanía	5.171.708	69 años	2	C3

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	14-8	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	14-9	OFICIAL: Yony
----------------------------------	------	---	------	---------------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brisco Nandoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Beneficiario
C.C. 5.171.708

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	17/8/24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	MANANTIAL - TABLITAS		
Nombre del predio	El Manantial	Coordenadas:	N 10° 39' 00,1" W 72° 55' 06,8"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	NERIO ENRIQUE LOPEZ BOLAÑO		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	17992439	60		

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	17/8/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	17/9/24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	---------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 060 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C. 17992439


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	12-8-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	1 PM
Vereda	MANANTIAL - TABLITAS		
Nombre del predio	pentagono	Coordenadas:	N 10° 38' 14,6" W 72° 56' 36,3"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	HIDALGO DE JESUS ACOSTA ARMENTA	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía 17971061			

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	12-8-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	12-9-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	---------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brison Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C. 17971061

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

1

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
Municipio	EL MOLINO	Fecha:	18-8-24
Vereda	MANANTIAL - TABLITAS	Hora de entrega:	3: PM
Nombre del predio		Coordenadas:	N 10° 36' 21,2" W 72°54'56,7"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	JORGE ELIAS VALDEZ OÑATE	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadanía	27015655	69		

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	18-8-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	18-09-24	OFICIAL:	Jose Angel
----------------------------------	---------	---	----------	----------	------------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Bascón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C.
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoria

CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010.

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	22-10-24
Municipio	EL MOLINO		Hora de entrega:
Vereda	MANANTIAL - TABLITAS		
Nombre del predio	mirador del olímpo	Coordenadas:	N 10° 36' 51,8" W 72° 55' 8,1"
Propietario		Administrador:	Claudia Perez

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	JEYSON DAVIER DIAZ PEREZ		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía		50	3	X

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	22-10-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	22-11-24	OFICIAL:
----------------------------------	----------	---	----------	----------

3.1 Registro fotográfico

<p>ANTES</p> 	<p>DESPUES</p> 
--	---

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de implementación, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Brisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C.56095759


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	18-8-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	5:45 pm
Vereda	MANANTIAL - TABLITAS		
Nombre del predio	LA DEMOCRACIA	Coordenadas:	N 10° 39' 59" W 72° 55' 52"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	JOSE ALFREDO DIAZ MARZAL	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadania	Elvina Maria Zubrin 1.123.731.673	65	Sobrina	A5

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	18-8	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	18-9	OFICIAL: yony
----------------------------------	------	---	------	---------------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Bresson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Elvina Zubrin

Beneficiario
C.C. 1.123.731.673
Sobrina

Caroline C.

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010"

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	7-10-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	MANANTIAL - TABLITAS		
Nombre del predio	La Franca.	Coordenadas:	N 10° 37' 03,6" W 72° 55' 41,2"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	LUIS GUILLERMO ZABALETA VEGA		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía				

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	7-10-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	7-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	---------	----------



3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

 
Beneficiario
C.C. 109 650 824
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	29-8-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	MANANTIAL - TABLITAS		
Nombre del predio		Coordenadas:	N 10° 38' 08.0" W 72° 54' 12.9"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	LUIS JOSE ARGOTE MORALES		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía				

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	24-8-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	24-9-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	---------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
 <p>29 ago 2024 5:41:42 p.m. 10°38'10.3"N 72°54'12.9"W El Molino La Guajira Colombia Altitud: 466.0m Velocidad: 0.0km/h Luz: fuerte Viento: El mínimo</p>	 <p>29 ago 2024 5:41:42 p.m. 10°38'10.3"N 72°54'12.9"W El Molino La Guajira Colombia Altitud: 466.7m Velocidad: 0.0km/h Luz: fuerte Viento: El mínimo</p>

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Luis Jose Argote Morales

Beneficiario
C.C. 5.172.023

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010"

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
Municipio	EL MOLINO	Fecha:	30-9-24
Vereda	MANANTIAL - TABLITAS	Hora de entrega:	
Nombre del predio		Coordenadas:	N 10° 37' 36,6" W 72° 54' 40,3"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	LUIS GREGORIO ROMERO JIMENEZ		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	5172 409	57	5	A-5

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	30-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	30-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	----------	----------



3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Brissón Menéndez
FUNDACIÓN AGUA LUNA
Contratista

 
Beneficiario
C.C.
5172 409

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	15-8-24
		Fecha:	
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	2:15 PM
Vereda	MANANTIAL - TABLITAS		
Nombre del predio	Los Nispero 1	Coordenadas:	N 10° 39' 35,4" W 72° 54' 8,8"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	LUIS BENJAMIN MERINO MONTERO		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	39515686	43	5	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	15-8	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	15-9	OFICIAL:	Yoney
----------------------------------	------	---	------	----------	-------


3.1 Registro fotográfico


ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Enisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Karen Vance
Beneficiario
C.C. 39515686


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	18-8-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	5:33 pm
Vereda	MANANTIAL - TABLITAS		
Nombre del predio	Los NISPEROS	Coordenadas:	N 10°37'20,51" W 72° 55'13,54"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	LUIS ALFREDO APONTE ESCOBAR		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	LUIS APONTE 5172504	47	LUIS APONTE	2

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	18-8	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	18-9	OFICIAL: YONY
----------------------------------	------	---	------	---------------

3.1 Registro fotográfico

<p>ANTES</p> 	<p>DESPUES</p> 
--	---

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brissan Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Luis Aponte
Beneficiario
C.C. 5172504

Caroline C.
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	4-9-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	5 pm
Vereda	MANANTIAL - TABLITAS		
Nombre del predio	EL RECUERDO	Coordenadas:	N 10° 38' 36,9" W 72° 55' 46,7"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	VICTOR ELIECER ARIAS MEJIA		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	5171407	69	2 hijos	X

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	4-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	4-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	--------	---	---------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES



DESPUES



4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

[Signature]
Gerald Briston Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

[Signature]
Beneficiario
C.C. 5171407 v/ausus

[Signature]
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	17/9/24
		Hora de entrega:	
Municipio	EL MOLINO		
Vereda	MANANTIAL - TABLITAS		
Nombre del predio	El Frotal	Coordenadas:	N 10°39'08,52 W 72°55'02,15"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	YARLY YURLEY MENDOZA LOPEZ		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	39515774	43 años	3	A3

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	17/9/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	17/10/24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	----------	----------


3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


 Gerald Briceón Mendoza
 FUNDACION AGUA LUNA
 Contratista

 
 Beneficiario
 C.C. 39515774

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
 Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	16-8-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	3:57 PM
Vereda	MANANTIAL - TABLITAS		
Nombre del predio	Sevilla	Coordenadas:	N 10° 39' 07,2" W 72° 54' 22,6
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	WILSON OSPINA JOIRO		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	40.498.817	55	3	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	16-8	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	16-8	OFICIAL:	yony
----------------------------------	------	---	------	----------	------


3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

 
Milenis Vanegas
Beneficiario
C.C.U 0498817
Representante

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	21-8/24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	12:45 PM.
Vereda	MANANTIAL - TABLITAS		
Nombre del predio		Coordenadas:	N 10° 38' 11.6" W 72° 54' 24.5"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	WILLIAN JOSE LOPEZ MERINO	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadania	40.797215	62	5	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	21-8/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	21-9/24	OFICIAL:	JOSE A. RODRIGUEZ
----------------------------------	---------	---	---------	----------	-------------------

3.1 Registro fotográfico

ANTES



DESPUES



4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Britson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Gloria Perez

Beneficiario
C.C. 40.797215
representante

Carolina C.

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	6-4-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	4 PM
Vereda	MANANTIAL - TABLITAS		
Nombre del predio	mi ^o Fortuna	Coordenadas:	N 10° 36' 59,6" W 72° 55' 51,5"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	YORLEDIS TRILLOS ORTEGA		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	36496556	44	2	A1

3. Estufa Ecológica


Fecha de construcción (dd-mm-aa)	6-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	6-10-24	OFICIAL:	fonny S.
----------------------------------	--------	---	---------	----------	----------


3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Brissón Méndez
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Yorleidis Trillos Carolina C.
Beneficiario
C.C. 36.496556

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	30/8/24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	MANANTIAL - TABLITAS		
Nombre del predio	Las Capinitos	Coordenadas:	N 10° 37' 28,8" W 72° 55' 01,30
Propietario		Administrador:	Victor Jose Lopez

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	MARIA DE LOS REYES RODRIGUEZ	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía 17 975149	50	5	A3

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	30/8/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	30/9/24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	---------	----------


3.1 Registro fotográfico


ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


 Gerald Brison Mendoza
 FUNDACION AGUA LUNA
 Contratista


 Beneficiario
 C.C. 17 975 149


 PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
 Ambiental
 Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO


1. Información General		No.	
		Fecha:	2-11-24
		Hora de entrega:	
Municipio	El Molino	Coordenadas:	10°38'51-107°04"W 72°54'21.96312"W
Vereda	El Manantial		
Nombre del predio	Mi Finquita	Administrador:	
Propietario	Maria A-onáte		


2. Condiciones socioeconómicas				
trabajador/beneficiario del proyecto	Maria Angelica Orate Vence	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadania	1123733654	26	3	B6

3. Estufa Ecológica				
Fecha de construcción (dd-mm-aa)	2-11-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	2-12-24	OFICIAL:

3.1 Registro fotográfico	
ANTES 	DESPUES 

4. Compromiso y acuerdo de voluntades
El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corporación, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


 Gerald Ensson Mendoza
 FUNDACION AGUA LUNA
 Contratista


 Beneficiario
 c.c. 1123733654


 PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
 Interventoria

CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	19.8/24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	4:20 P.M
Vereda	MANANTIAL - TABLITAS		
Nombre del predio	Los Horia	Coordenadas:	N 10° 38' 6,3" W 72° 54' 37"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	OSWALDO ALFREDO ACOSTA JIMENEZ		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadania	72071979	62.	2.	B4.

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	19-8/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	19-9/24	OFICIAL:	José A Rodríguez
----------------------------------	---------	---	---------	----------	------------------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
 <p>19-08-2024 Oswaldo Acosta El Molino de Tablitas - 140</p>	 <p>19-09-2024 Oswaldo Acosta El Molino de Tablitas - 140</p>

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Oswaldo A.
Beneficiario
C.C. 72 071 979

Candela C.
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA 20233216000010"

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha	9-9-24
		Hora de entrega	5:45pm
Municipio	EL MOLINO		
Vereda	MANANTIAL - TABLAS		
Nombre del predio	MA...	Coordenadas	N 10° 37' 18.7"
Propietario	NIXON ANTONIO HERRERA MARTINEZ	Administrador	W 72° 55' 78"

2. Condiciones socioeconómicas			
trabajador/beneficiario del proyecto	NIXON ANTONIO HERRERA MARTINEZ	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)
	Cedula ciudadania 3185201	32	3

3. Estufa Ecológica			
Fecha de construcción (dd-mm-aa)	9-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	9-10-24
		OFICIAL:	

3.1 Registro fotográfico	
<p>ANTES</p>  <p>9 sept 2024 6:44:30 p. m. 10° 37' 11.46" N - 72° 55' 45.672" W Altitud 432.3m Velocidad 0.0km/h Nixon Antonio Herrera Martinez Vereda los papales</p>	<p>DESPUES</p>  <p>9 sept 2024 5:44:30 p. m. 10° 37' 11.46" N - 72° 55' 45.672" W Altitud 432.3m Velocidad 0.0km/h Nixon Antonio Herrera Martinez Vereda los papales</p>

4. Compromiso y acuerdo de voluntades
El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corporación, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar los labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Nixon Antonio Herrera Martinez
Beneficiario
C.C. 3185201

Carolaire C.
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	31-8-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	MANANTIAL - TABLITAS		
Nombre del predio	La Fertilidad	Coordenadas:	N 10° 38' 50,0" W 72° 55' 17,5"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	MATILDE CATALINA RODRIGUEZ ZABALETA	Edad (años)		Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadania	39.515.606	43		

3. Estufa Ecológica


Fecha de construcción (dd-mm-aa)	31/8/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	30/9/24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	---------	----------


3.1 Registro fotográfico


ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C. 39.515.606


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010"

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
Municipio	EL MOLINO	Fecha:	19-8-24
Vereda	LA MONTAÑA - CATATUMBO	Hora de entrega:	4:22 PM
Nombre del predio	EL ENCANTO	Coordenadas:	N 10° 39' 8,6" W 72° 55' 59,3"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	PEDRO MANUEL IBARRA	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadanía	17993567	55	3	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	19-8	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	19-9	OFICIAL:	Yony
----------------------------------	------	---	------	----------	------

3.1 Registro fotográfico

ANTES



DESPUES



4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerardo Balseán Mendoza
FUNDACIÓN AGUA LUNA
Contratista

NEWEL IBARRA Contralor C.

Beneficiario
C.C. 17993567 V/N
Representante

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010"

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	13/8/24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	LA MONTAÑA - CATATUMBO		
Nombre del predio	EL Aceituno	Coordenadas:	N 10° 39' 50.4" W 72° 55' 46.7"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	WILLIAN ALFREDO VALDES OÑATE		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	179 719 33	87	4	A-2

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	13/8/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	13/9/24	OFICIAL:	<i>[Signature]</i>
----------------------------------	---------	---	---------	----------	--------------------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

[Signature]
Gerald Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

[Signature]
77971933
Beneficiario
C.C.

[Signature]
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	13-8-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	4:31 pm
Vereda	LA MONTAÑA - CATATUMBO		
Nombre del predio	MI HUERTO	Coordenadas:	N 10° 39' 57,7" W 72° 55' 14,3"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	WIDER ENRIQUE BALCAZAR BULA		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadania	19993569	55	5	

3. Estufa Ecológica


Fecha de construcción (dd-mm-aa)	13-8	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	13-9	OFICIAL:	YONY
----------------------------------	------	---	------	----------	------


3.1 Registro fotográfico


ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C. 19993569 U/mu


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	6/8/24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	LA MONTAÑA - CATATUMBO		
Nombre del predio		Coordenadas:	N 10° 39' 47,4 W 72° 55' 59,3
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	YAJAIRA SERAFINA DAZA IBARRA		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	27016939	49	8	

3. Estufa Ecológica


Fecha de construcción (dd-mm-aa)	6/8/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	6/9/24	OFICIAL:
----------------------------------	--------	---	--------	----------

3.1 Registro fotográfico


ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brison Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C. 27016939


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	10/8/24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	LA MONTAÑA - CATATUMBO		
Nombre del predio		Coordenadas:	N 10° 39' 43,7" W 72° 55' 53,9"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	WILMAN JOSE OÑATE DIAZ		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	17970541	65	6	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	10/8/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	10/9/24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	---------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


 Gerald Brissón Mendoza
 FUNDACIÓN AGUA LUNA
 Contratista


 Beneficiario
 C.C. 17970541


 PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
 Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	9-8-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	11 Am
Vereda	LA MONTAÑA - CATATUMBO		
Nombre del predio	Sara lila	Coordenadas:	N 10° 39' 39,4" W 72° 55' 33,1"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	OMAIRO ANTONIO LOPEZ ARGOTE	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía			

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	9-8-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	9-9-24	OFICIAL: Daurin
----------------------------------	--------	---	--------	-----------------

3.1 Registro fotográfico

<p>ANTES</p> 	<p>DESPUES</p> 
---	--

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguaque, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brissón Mendoza
FUNDACIÓN AGUA LUNA
Contratista

O. ZUBI CAROLINE C.
Beneficiario 17879230
C.C. PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	12/8/24
		Hora de entrega:	
Municipio	EL MOLINO		
Vereda	LA MONTAÑA - CATATUMBO		
Nombre del predio	EL CUANCA	Coordenadas:	N 10° 39' 8,7" W 72° 55' 31"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	MARTHA CECILIA MORALES BALCAZAR	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía: 27004219	59	6	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	12/8/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	12/9/24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	---------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Bresson Mendoza
FUNDACIÓN AGUA LUNA
Contratista

Martha C. Morales

Beneficiario
C.C. 27004219

Caroline C.

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	15-8-24
		Hora de entrega:	
Municipio	EL MOLINO		
Vereda	LA MONTAÑA - CATATUMBO		
Nombre del predio	El Puerto	Coordenadas:	N 10° 39' 8,03" W 72° 55' 9,4"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	EMILIO FEDERICO DAZA FUENTES		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	1764705	91	8	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	15-8-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	15-9-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	---------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brissón Mendoza
FUNDACIÓN AGUA LUNA
Contratista

Emilio Federico Daza Carolaine C.

Beneficiario
C.C. 1764705

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
Municipio	EL MOLINO	Fecha:	12-8-24
Vereda	LA MONTAÑA - CATATUMBO	Hora de entrega:	
Nombre del predio	LA COMODITA	Coordenadas:	N 10° 39' 34,6" W 72° 55' 35,1"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	ELVINA DEL ROSARIO IBARRA IGUARAN	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadania	5172704	46	5	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	12-8-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	12-9-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	---------	----------

3.1 Registro fotográfico

<p>ANTES</p> 	<p>DESPUES</p>  <p>12/08/2024 4:02:27 p. m. a la montaña finca Comodita - elvina ibarra</p>
--	---

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoquejira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Geraldo Brissón Mendoza
FUNDACIÓN AGUA LUNA
Contratista

Yvick Ibarra
Beneficiario
cc. 5172704
Representante

Caroline C.
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA, BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	13-9-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	LA MONTAÑA - CATATUMBO		
Nombre del predio	El puente 2	Coordenadas:	N 10° 30' 49,3" W 72° 56' 03,7"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	EDITH MONTENEGRO DE LOPEZ	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadania	27016899	60	7

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	13-09-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	13-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	----------	---	----------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES



DESPUES



4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 060 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Beneficiario

c.c. 27016899

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	14-8-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	LA MONTAÑA - CATATUMBO		
Nombre del predio		Coordenadas:	N 10°41'07,7" W 72°56'39,3"
Propietario		Administrador:	GUSEIC 1900000

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	DELIO JOSE BLANCHAR		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	1192540814	30	5	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	14-8-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	14-04-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	----------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES




DESPUES




4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brison Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C.


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.:	
		Fecha:	9-9-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	LA MONTAÑA - CATATUMBO		
Nombre del predio	aguas blancas	Coordenadas:	N 10°42'16,0" W 72°57'19,0"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	CESAR ENRIQUE OÑATE BROCHERO	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	5170973	74	S B

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	9-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	9-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	--------	---	---------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Beneficiario

cc. 5170973


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General

		No.	
		Fecha:	10-09/24
		Hora de entrega:	1:15 PM
Municipio	EL MOLINO		
Vereda	LA MONTAÑA - CATATUMBO		
Nombre del predio	Nuevo eden	Coordenadas:	N 10° 40' 23' W 72° 55' 32'
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	CARLOS DARIO OÑATE MONTERO	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	5170642	.75	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	10-09/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	10-10/24	OFICIAL:
				Jose A. Rodriguez


3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Carlos Dario Oñate Montero
Beneficiario
C.C.

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	LA MONTAÑA - CATATUMBO		
Nombre del predio	El Puente	Coordenadas:	N 10° 40'08,18" W 72°56'09,07"
Propietario		Administrador:	Edith Montenegro

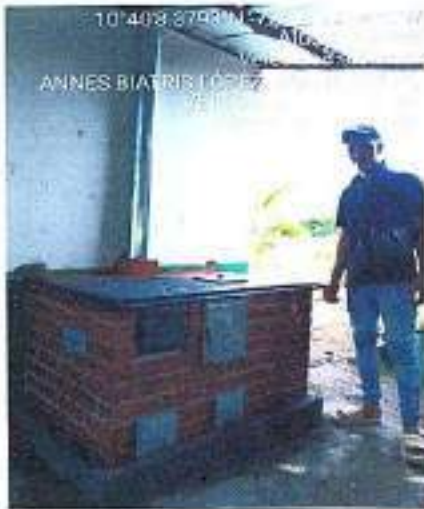
2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	ANNES BEATRIZ LOPEZ MONTENEGRO		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	27016538	82	5	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	5-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	5-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	--------	---	---------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Beneficiario

C.C.

27016538

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	8-8-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	4:52 pm
Vereda	LA MONTANA - CATATUMBO		
Nombre del predio	Casa Azul	Coordenadas:	N 10° 40'22,1" W 72°54'54,4"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	NEREIDA APONTE GUEVARA		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	27016722	73		

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	8-8-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	8-9-24	OFICIAL:	Dawson
----------------------------------	--------	---	--------	----------	--------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brissón Mendoza
FUNDACIÓN AGUA LUNA
Contratista

Beneficiario
C.C. 27016722

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	1-9-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	LA MONTAÑA - CATATUMBO		
Nombre del predio	Rincon del Paraíso	Coordenadas:	N 10°40'34,10" W 72°56'25,00"
Propietario ☒		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	ALDEMAR ANTONIO ZULUAGA ARANGO		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	70384943	48	3	A

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	1-9-24 ANTES	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	1-9-24 DESPUES
----------------------------------	-----------------	---	-------------------

3.1 Registro fotográfico



4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brison Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Beneficiario
C.C. 70384943

Caroline C.
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	17-8-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	3:30 pm
Vereda	LA MONTAÑA - CATATUMBO		
Nombre del predio	La pista	Coordenadas:	N 10° 39' 51,0" W 72° 55' 46,9
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	JAVIER ENRIQUE GIL GUERRA		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cédula ciudadanía	192472495	22	6	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	17-8	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	17-8	OFICIAL:	Yony
----------------------------------	------	---	------	----------	------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
 <p>17/08/2024 3:28:56 p. m. 10° 39' 51" N - 72° 55' 49" W Vereda Catatumbo Javier Enrique Gil</p>	 <p>17/08/2024 3:30:49 p. m. 10° 39' 51" N - 72° 55' 49" W Vereda El Catatumbo Javier Gil guerra</p>

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Branson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C. 129272495


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

***CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010*.**

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	30-10-24
Municipio	EL Molino-La Guajira	Hora de entrega:	
Vereda	Cotatumba		10°40'20.22426"N
Nombre del predio	Villa Isabel	Coordenadas:	72°55'11.8032"W
Propietario	Juan Raul Daza	Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBIEN
Cedula ciudadania 1.065.574.623	38	3	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	30-10-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	30-11-24	OFICIAL:
----------------------------------	----------	---	----------	----------


3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
 <p>10°40'20.17632"N 72°55'11.26542"W Altitud: 263.9m Velocidad: 0.3km/h JUAN RAUL DAZA APONTE VEREDA EL OREGERO</p>	 <p>Altitud: 247.4m Velocidad: 0.3km/h JUAN RAUL DAZA APONTE VEREDA EL OREGERO</p>

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corporación Agua Luna, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brison Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C. 1.065.574.623

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010"

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	4-9-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	LA MONTAÑA - CATATUMBO		
Nombre del predio	Los Maengos	Coordenadas:	N 10° 40' 28,6" W 72° 55' 6,7"
Propietario	Gustavo Gonzalez	Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	GUSTAVO ELIAS GONZALEZ		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	1.785.520	84	6	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	4-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	4-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	--------	---	---------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra C50 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


 Gerald Orisson Mendoza
 FUNDACION AGUA LUNA
 Contratista


 Gustavo Gonzalez
 1.785520
 Beneficiario
 C.C.


 Carolina C.
 PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
 Ambiental
 Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	24-8-24
Municipio	EL MOLINO		Hora de entrega:
Vereda	LA MONTAÑA - CATATUMBO		
Nombre del predio		Coordenadas:	N 10° 39' 36,21" W 72° 55' 52,94"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	GLADYS ESTHER VALDES OÑATE		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía				

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	24-8-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	24-9-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	---------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoaguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brison Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

 
Beneficiario
C.C. 26,939.869
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA, BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	30-8-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	3:25 PM
Vereda	LA MONTAÑA - CATATUMBO		
Nombre del predio		Coordenadas:	N 10° 39' 21,8" W 72° 55' 33,2"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	FIDELINA SAUNA MALO	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadanía	56.075.711			

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	30-8-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	30-9-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	---------	----------


3.1 Registro fotográfico

<p>ANTES</p> 	<p>DESPUES</p> 
--	---

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Brinson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
CC-56075711

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	15-8-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	8: Am
Vereda	LA MONTAÑA - CATATUMBO		
Nombre del predio	Villo duarte	Coordenadas:	N 10° 40' 6,4" W 72° 55' 28,9"
Propietario		Administrador:	Edith Balazar

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	MANUEL ALBERTO DUARTE ZABALETA	Edad (años)		Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía				

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	15-8	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	15-7	OFICIAL:	Xony
----------------------------------	------	---	------	----------	------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
 <p>15 Sept 2024 5:59 10° 40' 6.4" N 72° 55' 28.9" W El Molino, La Guajira, C.A. Vereda 23 Catatumbo</p>	 <p>15 Jan 2024 8:00 C.A.S. m 10° 40' 6.4" N 72° 55' 28.9" W El Molino La Guajira manuel duarte zabaleta vereda 23 catatumbo</p>

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Edith Balazar Caroline C.
27016673
Beneficiario
C.C.

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	16-9-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	LAS ILUSIONES		
Nombre del predio	Donde Gloria	Coordenadas:	N 10° 39' 32.4" W 72° 56' 11.31"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	GLORIA STELLA MONTERO IBARRA	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadanía				

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	16-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	16-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	----------	----------

3.1 Registro fotográfico


<p>ANTES</p> 	<p>DESPUES</p> 
--	---

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Besson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C. 31248313


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	10-9-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	12 M
Vereda	LAS ILUSIONES		
Nombre del predio	LA MANO DE DIOS	Coordenadas:	N 10° 38'24,85" W 72°56'37,34"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	FREDY HERNANDO PETIT ZABALETA	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	19 103 904		

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	10-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	10-10-24	OFICIAL:	Yenny
----------------------------------	---------	---	----------	----------	-------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Ensson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C. 19.103.904


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010"

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	8-10-24
Municipio	EL MOLINO		Hora de entrega:
Vereda	LAS ILUSIONES		
Nombre del predio	Los manguito	Coordenadas:	N 10° 39' 11,5"
Propietario	Enrique Luis Morales	Administrador:	W 72° 56' 38,9"



2. Condiciones socioeconómicas				
trabajador/beneficiario del proyecto	ENRIQUE LUIS MORALES VILLAFANE		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)
	Cedula ciudadanía	5172058	72	6
				Nivel SISBEN
				B4

3. Estufa Ecológica				
Fecha de construcción (dd-mm-aa)	8-10-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	8-10-24	OFICIAL:

3.1 Registro fotográfico	
<p>ANTES</p> 	<p>DESPUES</p> 

4. Compromiso y acuerdo de voluntades
El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


 Gerardo Brisson Mendoza
 FUNDACION AGUA LUNA
 Contratista

 
 Beneficiario
 C.C. 5172058

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
 Ambiental
 Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA, BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	2-8-24
Municipio	EL MOLINO		Hora de entrega:
Vereda	LAS ILUSIONES		
Nombre del predio	VILLA EYICA	Coordenadas:	N 10° 40' 33,7° W 72° 56' 30"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	ERICA ISABEL JOIRO PEREZ		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	36095975	47	5	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	2-8-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	2-9-24	OFICIAL:
----------------------------------	--------	---	--------	----------

3.1 Registro fotografico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Erica Joiro
Beneficiario
CC 36095975

Caroline C.
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	13-4-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	LAS ILUSIONES		
Nombre del predio	El Paraíso	Coordenadas:	N 10° 39' 18" W 72° 56' 9"
Propietario ☒		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	EDILSA AURORA MORALES VILLANUEVA		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	39515989	40.	3	7

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	13-4-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	13-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	----------	----------

3.1 Registro fotográfico

<p>ANTES</p> 	<p>DESPUES</p> 
--	---

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brissen Mendoza
FUNDACIÓN AGUA LUNA
Contratista

Beneficiario
C.C. 39515989

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	13-8-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	LAS ILUSIONES		
Nombre del predio	Los Quintos	Coordenadas:	N 10° 39' 09,7" W 72° 55' 42,8"
Propietario		Administrador:	ALVARO MOLINA

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	AMINA GARZON MAESTRE	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía			

3. Estufa Ecológica


Fecha de construcción (dd-mm-aa)	13-8-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	13-09-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	----------	----------


3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Bresson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Alvaro Molina
Beneficiario
C.C. 1119.84011

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA, BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	21-8-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	8:21 Am
Vereda	LAS ILUSIONES		
Nombre del predio	LA RASA	Coordenadas:	N 10° 37' 54" W 72° 56' 0,9"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	AMELIA MARIA BORJA PACHECO	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadanía	26826277	72	3	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	21-8	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	21-8	OFICIAL:	Yenny
----------------------------------	------	---	------	----------	-------

3.1 Registro fotográfico

<p>ANTES</p> 	<p>DESPUES</p> 
--	---

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brissan Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Amelia BORJA
Beneficiario
C.C. 26826277

Caroline C.
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	3-5-24
Municipio	EL MOLINO		Hora de entrega:
Vereda	LAS ILUSIONES		
Nombre del predio	B+ETHZL	Coordenadas:	N 10° 39' 11,8" W 72° 56' 7,5"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	ALVARO JOSE VEGA HERRERA		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	5142068	74	5	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	3-8-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	3-9-24	OFICIAL:
----------------------------------	--------	---	--------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Bisson Mendoza
FUNDACIÓN AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C. 5142068


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	LAS ILUSIONES		
Nombre del predio	los marcos	Coordenadas:	N 10° 39' 04,5" W 72° 56' 54,8"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	ALVARO ENRIQUE MONTERO ZABALETA	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadania	17971264	63	5

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	2-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	2-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	--------	---	---------	----------


3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

 
Beneficiario
C.C. 17971264
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	11-9-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	LAS ILUSIONES		
Nombre del predio	La Quevedo Viejo	Coordenadas:	N 10° 40' 28,9" W 72° 56' 24,1"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	DIANA ISABEL JOIRO PEREZ	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadania	40799231	52	3	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	11-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	11-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	----------	----------

3.1 Registro fotográfico

<p>ANTES</p> 	<p>DESPUES</p> 
--	---

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Diana Jairo
Beneficiario
CC 40799231

Caroline C.
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	7-9-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	2:46 PM
Vereda	LAS ILUSIONES		
Nombre del predio	SARA SAFIA	Coordenadas:	N 10° 36' 50,9" W 72° 55' 38,6"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	DANOBIS DE JESUS REDONDO GARCIA		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	5172617	52	2	A1

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	7-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	7-10-24	OFICIAL:	XOMMJS
----------------------------------	--------	---	---------	----------	--------


3.1 Registro fotográfico


ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Amistador
Beneficiario
C.C. 5172617


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	23-8-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	LAS ILUSIONES		
Nombre del predio	LOS TUXPIALLOS 4	Coordenadas:	N 10° 39' 17,8" W 72° 57' 10,3"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	DANITH DEL SOCORRO VENCE LOPEZ	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadania	27014734	64	6	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	23-8-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	23-09-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	----------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brissón Mendoza
FUNDACIÓN AGUA LUNA
Contratista

Beneficiario
C.C. 27014734

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	9-9-24
Municipio	EL MOLINO		Hora de entrega:
Vereda	LAS ILUSIONES		
Nombre del predio	LA EVANGELIA	Coordenadas:	N 10° 39' 52,5" W 72° 56' 24,1"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	CRISTIAN ALBERTO LOPEZ ROSADO		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	27016885	62	4	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	9-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	9-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	--------	---	---------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Chris Daza *carolaine c.*
Beneficiario
cc.27016885
representante

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	18-8-24
Municipio <u>El Molino</u>	EL MOLINO	Hora de entrega:	11 am
Vereda	LAS ILUSIONES		
Nombre del predio	Clara Neyeth Joiro Perez	Coordenadas:	N 10° 40' 32,4" W 72° 56' 26,9"
Propietario	Vereda las Ilusiones	Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	CLARA NEYETH JOIRO PEREZ	Edad (años)	62	Personas a cargo (esposa e hijos)	2	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	56095 703				

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	18-8-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	18-9-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	---------	----------

3.1 Registro fotográfico

<p>ANTES</p> 	<p>DESPUES</p> 
--	---

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Clara joiro p
Beneficiario
C.C. 56095 703

Caroline C.
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	2-8-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	LAS ILUSIONES		
Nombre del predio	mi Bendición	Coordenadas:	N 10° 40' 32.2" W 72° 56' 35"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	CELENA JOIRO PEREZ		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	27016936	53	3	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	2-8-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	2-09-24	OFICIAL:
----------------------------------	--------	---	---------	----------


3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Blisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C. 27016936


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	24/10/24
		Hora de entrega:	
Municipio	El Molino		
Vereda	Las Alusiones		
Nombre del predio	ECA	Coordenadas:	10°39'17.99454"N 72°56'14.07618"W
Propietario	Asociación	Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Asociación	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía: 1123730608	34	12	x

3. Estufa Ecológica


Fecha de construcción (dd-mm-aa)	24/10/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	24/11/24	OFICIAL:
----------------------------------	----------	---	----------	----------

3.1 Registro fotográfico


ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C. 1123730608


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

***CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010*.**

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	6-9-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	LAS ILUSIONES		
Nombre del predio	Luna Isabel	Coordenadas:	N 10° 39' 00,1" W 72° 55' 59,5"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	ATILIO JOSE VEGA SUAREZ	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadania	5.172200	63	4	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	6-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	6-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	--------	---	---------	----------

3.1 Registro fotográfico

<p>ANTES</p> 	<p>DESPUES</p> 
---	--

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Briceño Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Atilio Jose Vega. Caroline C.

Beneficiario
C.C. 5 172200

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	21-10-24
		Hora de entrega:	
Municipio	El Molino		
Vereda	Carretera Nacional Las Ilusiones		
Nombre del predio	el Portento	Coordenadas:	10°37'51.39954"N 72°57'3.66612"W
Propietario	Aleida Escobar	Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	27.016.860	64	2

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	21-10-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	21-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	----------	---	----------	----------

3.1 Registro fotográfico

<p>ANTES</p>  <p>10°37'51.31296"N 72°57'3.31111"W Altitud: 830.7m Velocidad: 0.5km/h ALEIDA ESCOBAR VEREDA LAS ILUSIONES</p>	<p>DESPUES</p>  <p>Altitud: 225.2m Velocidad: 0.4km/h ALEIDA ESCOBAR VEREDA LAS ILUSIONES</p>
---	---

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corporación, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Aleida Escobar
Beneficiario
C.C. 27016.860

Caroline C.
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	25/7/24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	LAS ILUSIONES		
Nombre del predio	El Corral	Coordenadas:	N 10° 38' 8,7" W 72° 56' 29,1"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	NEIL DEAN ACOSTA ESCOBAR		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	5171148	72	5	A

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	22/9/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	22/8/24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	---------	----------


3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 060 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C.
5171.148

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría



"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIH 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	8-8-24
		entrega:	4 PM
Municipio	El Molino		
Vereda	Las Ilusiones		
Nombre del predio		Coordenadas:	10° 38' 33" N -72° 55' 52" W
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Ibeth Mercedes	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Payales Gonzalez			
Cedula ciudadania		50	3	2

3. Estufa Ecológica


Fecha de construcción (dd-mm-aa)	8-8	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	8-9	OFICIAL:
----------------------------------	-----	---	-----	----------


3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Ensson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C.


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	19-9-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	LAS ILUSIONES		
Nombre del predio	El Porvenir	Coordenadas:	N 10° 38' 20,81" W 72° 55' 33,26"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	IRIS BETSABE ZABALETA ARISTIZABAL	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadania 40397793	56	6	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	19-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	19-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	----------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Briceño Mendoza
FUNDACIÓN AGUA LUNA
Contratista

Iris Betsabe Aristizabal
Beneficiario
C.C. 40397793

Caroline C.
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	20-8-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	LAS ILUSIONES		
Nombre del predio	La arcadia	Coordenadas:	N 10° 38' 68" W 72° 55' 38.5"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	IDALDIS ISABEL ARIAS VECE	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía 27016712	74	6	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	20-8	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	20-9	OFICIAL: Yenny
----------------------------------	------	---	------	----------------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Edaldis Arias

Beneficiario
C.C. 27016712

Caroline C.

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	29-10-24
Municipio	El Molino	Hora de entrega:	
Vereda	Las Ilusiones		
Nombre del predio		Coordenadas:	10° 57' 34.85" -72° 58' 53.96"
Propietario	Jose Fernando Mota	Administrador:	Familio giralt

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Jorge Fernando Mendoza Diaz	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadania: 17974784	60	2	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	29-10-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	29-11-24	OFICIAL:
----------------------------------	----------	---	----------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C. 17974784


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General

Municipio	EL MOLINO		No. Fecha	11-9-24
Vereda	LAS ILUSIONES		Hora de entrega:	
Nombre del predio	Laramada	Coordenadas:	N 10° 40' 14,67"	
Propietario		Administrador:	W 72° 58' 55,91"	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	JAVIER MARTINEZ DAZA	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadania	1063592360	30	3	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	11-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	11-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	----------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUE
 <p>11 sept 2024 11:05:49 a.m. 10° 40' 10,0224 72° 58' 1,546" W Via sin nombre, El Molino, La Guajira, Colombia Altitud: 89,2m Velocidad: 0,0km/h Javier Martinez Vereda Las Ilusiones</p>	 <p>11 sept 2024 10:40:11.203 Via sin nombre, El Molino, La</p>

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consiguientes en los estudios previos del contrato de obra 060 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Albeiro D. Araya
Beneficiario Trabajador
C.C. 1063592360

Caroline C.
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	24-9-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	LAS ILUSIONES		
Nombre del predio	cabo pongo	Coordenadas:	N 10° 40' 0,30" W 72° 57' 19,7"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	JOSE JULIAN BULA SAMPER	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadanía	17972957	57	6	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	24-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	24-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	----------	----------

3.1 Registro fotográfico

<p>ANTES</p> 	<p>DESPUES</p> 
--	---

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Beneficiario
C.C. 17972957

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	15/8/24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	LAS ILUSIONES		
Nombre del predio	La Positiva	Coordenadas:	N 10° 39' 02,80" W 72° 55' 42,06"
Propietario		Administrador:	Luz Díaz

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	MARLENE ISABEL ZABALETA ARIAS	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía 36054975	58	5	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	15/8/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	15/9/24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	---------	----------


3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Brison Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Luz Hineya Diaz
Beneficiario
C.C.36054975


Carolina C.
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	16-8-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	12 m
Vereda	LAS ILUSIONES		
Nombre del predio	potrerito	Coordenadas:	N 10° 42' 09,4" W 72° 56' 10,4"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	MARLON FABIAN OÑATE PERPIÑAN		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	1123732972	29 años	Subrina	Adolescente

3. Estufa Ecológica


Fecha de construcción (dd-mm-aa)	16-8-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	16-9-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	---------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

1123732972
Nany Oñate
Beneficiario Subrina
C.C.

carolaine.c.
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	20-10-24
Municipio		Hora de entrega:	
Vereda	Las Ilusiones		
Nombre del predio		Coordenadas:	10°38'33.95" -72°57'7.251"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas				
trabajador/beneficiario del proyecto	Jose Francisco Cruz Zabaleta	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISEEN
	Cedula ciudadanía: 5.172264	56 años	6 -	

3. Estufa Ecológica	
Fecha de construcción (dd-mm-aa)	20-10
Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	20-11
OFICIAL:	

3.1 Registro fotográfico	
ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

[Signature]
Gerardo Brissen Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

[Signature]
Jose P. Cruz Zabaleta Carolaine C.
Beneficiario
C.C. 5172264 El Molino
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	19-8-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	9:38 Am
Vereda	LAS ILUSIONES		
Nombre del predio	Villa Johana	Coordenadas:	N 10° 38' 15" W 72° 56' 54,6"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	JUAN MIGUEL ROMERO PINTO	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadania				

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	19-8	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	19-9	OFICIAL:	yomy
----------------------------------	------	---	------	----------	------

3.1 Registro fotográfico

<p>ANTES</p> 	<p>DESPUES</p> 
---	--

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brissen Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Beneficiario

C.C. 1920424

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	19-8-24
		Fecha:	3:25 PM
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	LAS ILUSIONES		
Nombre del predio	El lino	Coordenadas:	N 10° 36' 46,6" W 72° 56' 32,1"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	LUIS MAURICIO LOPEZ IBARRA	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía			

3. Estufa Ecológica


Fecha de construcción (dd-mm-aa)	19-8	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	19-9	OFICIAL: yony
----------------------------------	------	---	------	---------------


3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Buisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

 
Beneficiario
C.C. 1728363
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	30-10-24
Municipio	El Molino Las Huerfanas	Hora de entrega:	
Vereda			
Nombre del predio	Villa Juli	Coordenadas:	10°33'34" -72°57'0"
Propietario		Administrador:	Luis E. Montero

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Luis Emilio Montero Rodríguez	Edad (años)		Personas a cargo (esposa e hijos)		Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	1121335011	30	S		

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	30-10-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	30-11-24	OFICIAL:
---	----------	--	----------	-----------------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerardo Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Luis Emilio Montero Caroline C.

Beneficiario
C.C. 1121335011

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA, BPIN 20233218000010"

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	30-9-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	LAS ILUSIONES		
Nombre del predio	Los Pedregalitos	Coordenadas:	N 10° 39' 9,3" W 72° 57' 14,7"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	LUIS ABELARDO GOMEZ BERMUDEZ		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	3602623	61	5	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	30-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	30-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	----------	----------


3.1 Registro fotográfico



4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Brison Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C. 3102623


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	24-8-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	7:16 Am
Vereda	Yulla Lucila	LAS ILUSIONES	
Nombre del predio		Coordenadas:	N 10° 36' 38,3" W 72° 56' 8,08"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	LIBIA SALINAS DE OÑATE		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	4797077	73	5	A-1

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	24-8	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	24-9	OFICIAL:	Yom y
----------------------------------	------	---	------	----------	-------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
 <p>10/09/2024 9:53:19 a.m. 10°38'58.5552"N 72°56'8.5932"W El Molino La Guajira Altitud: 239.6m Velocidad: 0.7km/h Libia, trabel Atlio Vena</p>	 <p>24 ago 2024 7:16 03 a. m. 10°38'23.028" N 72°56'48.582" W Villanueva - San Juan Del Cesar El Molino La Guajira Libia salinas de oñate trabaja</p>

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Libia de Oñate. Caroline C.

Beneficiario
cc.4797077

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	19-8-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	4:18 pm
Vereda	LAS ILUSIONES		
Nombre del predio	El Recuerdo 2	Coordenadas:	N 10° 41' 19,4" W 72° 56' 40,2"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	SOLEDAD DUARTE LOPEZ		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	5172528	47	5	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	19-8	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	19-9	OFICIAL:	Yomay
----------------------------------	------	---	------	----------	-------


3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brisson Méndez
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


S-172-528
Beneficiario AMINISTRADOR
C.C.


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	12/8/24
Municipio	Molino	Hora de entrega:	
Vereda	Las Ilusiones		
Nombre del predio	Villa Daniela	Coordenadas:	N 10° 39' 01.5" W 72° 55' 54.2"
Propietario	Suanny Elvira Jimenez	Administrador:	Sonia Margarita

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Suanny Elvira J.	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadania 16918894	48	6	1

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	12/8/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	12/9/24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	---------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES




DESPUES




4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C. 16918894


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	77
		Fecha:	03.9.24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	2:10 PM
Vereda	LOS BARRIALES - NUEVAS IDEAS		
Nombre del predio		Coordenadas:	N 10° 37' 39,7" W 72° 53' 45,1
Propietario		Administrador:	MARCO ANTONIO DIAZ

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	TEOFILA PAULINA FUENTES DE DIAZ		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía				

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	03.9.24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	03.10.24	OFICIAL:	JOSÉ A. RODRÍGUEZ
----------------------------------	---------	---	----------	----------	-------------------

3.1 Registro fotográfico



4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brissón Mendoza
FUNDACIÓN AGUA LUNA
Contratista

Beneficiario
005172620

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	10/10/24
Municipio	EL MOLINO		Hora de entrega:
Vereda	LAS ILUSIONES		
Nombre del predio	La SORJUNA	Coordenadas:	N 10° 39' 01,4" W 72° 55' 52,1"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	SIDIS GENOVEVA ZABALETA ROMERO	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadania 27016700	71	5	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	10/10/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	10/11/24	OFICIAL:
----------------------------------	----------	---	----------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brissón Mendoza
FUNDACIÓN AGUA LUNA
Contratista

Sidis Zabaleta R
Beneficiario
CC 27016700

Caroline C.
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. SPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO


1. Información General		No.	
		Fecha:	20/8/20
Municipio	El Molino	Hora de entrega:	
Vereda	Las Placeres		
Nombre del predio	Villa Alexandra	Coordenadas:	10°39'10.9665"N 72°56'45.61044"W
Propietario	Rosa Angelina Ortiz	Administrador:	


2. Condiciones socioeconómicas				
trabajador/beneficiario del proyecto		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadanía	56.095.769	58a.	4	D1

3. Estufa Ecológica			
Fecha de construcción (dd-mm-aa)	20/8/20	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	20/9/20
		OFICIAL:	

3.1 Registro fotográfico	
<p>ANTES</p> 	<p>DESPUES</p> 

4. Compromiso y acuerdo de voluntades
El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corporación, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Rosa Angelina Ortiz
Beneficiario
C.C. 56.095.769

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA, BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	25/10/24
Municipio	El Molino	Hora de entrega:	
Vereda	Las Ilusiones		
Nombre del predio	La Lluvia	Coordenadas:	
Propietario		Administrador:	Aldemar Lago

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Rodrigo Antonio Lago Duarte	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	56	1	X

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	25/10/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	25/11/24	OFICIAL:
----------------------------------	----------	---	----------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguaajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brison Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Aldemar Lago Carabore C.

Beneficiario
C.C. 17.953779

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	27/8/24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	LAS ILUSIONES		
Nombre del predio	LA FORTUNA	Coordenadas:	N 10° 39' 01,8" W 72° 55' 45,1"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	VIRGINIA ELVIRA ZABALETA ROMERO		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	40794724	60		

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	27/8/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	27/9/24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	---------	----------

3.1 Registro fotográfico


ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Bisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C. 40794724


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA, BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	25/8/24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	LAS ILUSIONES		
Nombre del predio	El Tiupialito 2	Coordenadas:	N 10° 39' 55" W 72° 57' 00"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	OSMAN ENRIQUE VENCE LOPEZ		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadania	19206337	73	4	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	25/8/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	25/9/24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	---------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Osman Enrique Vence Lopez
Beneficiario
C.C. 19206337.

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	20-8-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	LAS ILUSIONES		
Nombre del predio	Las delicias	Coordenadas:	N 10° 38' 51,5' W 72° 55' 00,8"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	ORLANDO JOSE OÑATE FRAGOZO	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadania	-19215039		

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	20-8	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	20-9	OFICIAL: yony
----------------------------------	------	---	------	---------------

3.1 Registro fotográfico

<p>ANTES</p> 	<p>DESPUES</p> 
--	---

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguaajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Beneficiario
C.C.

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	3/8/24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	LAS ILUSIONES		
Nombre del predio	Villa Valery	Coordenadas:	N 10° 37' 45.62" W 72° 56' 47.97"
Propietario:		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	RAMIRO ENRIQUE OLIVELLA BOLAÑO		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadania	51 fo 852	45	4	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	3/8/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	3/9/24	OFICIAL:
----------------------------------	--------	---	--------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguaijira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Beneficiario
C.C. 51 fo 852

Caroline C.
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoria

***CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN
COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN
28233218000010*.**

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	3-11-24
		Hora de entrega:	
Municipio	el molino		
Vereda	Las Ilusiones		
Nombre del predio	Villa Yuly	Coordenadas:	10°38' 996" -72°55' 839"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Martha Lucra Zabaleta Romero		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadania	40 779 003	55	4	B1

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	3-11-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	3-12-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	---------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES




DESPUES



4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brison Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Martha Zabaleta. 
Beneficiario
c.c. 40 779 003
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	31/8/24
		Hora de entrega:	
Municipio	El Molino	Coordenadas:	10°38.76'
Vereda	Las Ilusiones	Administrador:	73°40'45"
Nombre del predio	Finca el Poto		
Propietario			

2. Condiciones socioeconómicas				
trabajador/beneficiario del proyecto	Martha mora	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadania 40798269	55	2	B ³


3. Estufa Ecológica				
Fecha de construcción (dd-mm-aa)	31/8/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	30/9/24	OFICIAL:

3.1 Registro fotográfico	
ANTES 	DESPUES 

4. Compromiso y acuerdo de voluntades
El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


 Gerald Brissón Mendoza
 FUNDACION AGUA LUNA
 Contratista

Martha Mora
 Beneficiario
 C.C.40798269


 PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
 Ambiental
 Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	18/10/24
		Hora de entrega:	
Municipio	El molino	Coordenadas:	10°39'51.57108"N 72°56'23.68644"W
Vereda	Las Ilusiones		
Nombre del predio	Villa del Socorro	Administrador:	
Propietario			

2. Condiciones socioeconómicas				
trabajador/beneficiario del proyecto	Rafael Eduardo Zabaleta Martinez		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)
	Cedula ciudadania	1785627	80	1
				Nivel SISBEN
				4.5

3. Estufa Ecológica				
Fecha de construcción (dd-mm-aa)	18/10/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	18/11/24	OFICIAL:

3.1 Registro fotográfico	
<p>ANTES</p> 	<p>DESPUES</p> 

4. Compromiso y acuerdo de voluntades
El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Rafael E Zabaleta: carabara c.

Beneficiario
C.C. 1785627

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	1-11-24
		Hora de entrega:	
Municipio	San Juan		
Vereda	El Jotico		
Nombre del predio	El Jotico 1	Coordenadas:	
Propietario		Administrador:	José A. H. H. H.

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Maria Margarita Ariza		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadania	1079887327	24	1	1

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	1-11-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	1-12-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	---------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES





DESPUES



4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


1079887327
Beneficiario
C.C.


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010"

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	30-9-24
Municipio	SAN JUAN		Hora de entrega:
Vereda	FARIAS - LOS TAMACOS		
Nombre del predio	Buenos Aires	Coordenadas:	N 10° 41' 08,8" W 72° 51' 06,0"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	ELBA ELISA VEGA LOPEZ		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	27076501	85	3	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	30-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	30-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	----------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Brisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C. 27076501

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	22-01-24
Municipio	EL MOLINO		Hora de entrega:
Vereda	FARIAS - LOS TAMACOS		
Nombre del predio	Paraiso 2	Coordenadas:	N 10° 39' 42,41" W 72° 51' 45,47"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	EGLEBIA MARGARITA GONZALEZ LOPEZ		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	40799126	54	4	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	22-10-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	22-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	----------	---	----------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


 Gerald Brison Mendoza
 FUNDACION AGUA LUNA
 Contratista

Eglebia Gonzalez Caroline C.
 Beneficiario
 C.C. 40799126

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
 Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPI# 20233218003010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	25-9-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	3:40 PM
Vereda	FARIAS - LOS TAMACOS		
Nombre del predio	La Falsa	Coordenadas:	N 10° 39' 55,6" W 72° 50' 51,7"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	JOSE FRANCISCO CHIMUNQUERO DAZA	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadanía		34	2	A

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	25-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	25-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	----------	----------

3.1 Registro fotográfico


ANTES	DESPUES
 <p>25/09/2024 6:20N 2:40W 10°44'14.42616"N 73°03'10248"W San Juan del Cesar La Guajira Fajonal Jose Francisco chimunquero</p>	 <p>25/09/2024 6:40 52.6"N 10°44'14.42616"N 73°03'10248"W San Juan del Cesar La Guajira Fajonal Jose Francisco chimunquero</p>

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


General Brison Mepitza
FUNDACION AGUA LINA
Contratista


Beneficiario
C.C. 1662805212


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	22-10-24
Municipio:	El Molino	Hora de entrega:	
Vereda:	Farías - Los tamacos		
Nombre del predio:	nueva fortuna	Coordenadas:	N 10° 38' 58,3° W 72° 51' 04,7
Propietario:		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Deyanira Liz Gonzales	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadanía	27014298	68	4	

3. Estufa Ecológica


Fecha de construcción (dd-mm-aa)	22-10-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	22-11-24	OFICIAL:
----------------------------------	----------	---	----------	----------


3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
cc.27014298

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	10-9-24
Municipio	EL MOLINO		Hora de entrega:
Vereda	FARIAS - LOS TAMACOS		
Nombre del predio	La Oveleria	Coordenadas:	N 10° 40' 15,4" W 72° 51' 17,1"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	DALSY VICTORIA MANJARREZ VEGA	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadanía	40797013	69	7	51

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	10-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	10-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	----------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerardo Binsón Menaño
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Dalcy Manjarrez Carabine c.
Beneficiario
C.C. 40797013

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General

Municipio	El Molino	No.	
Vereda	Farias los Tamaco	Fecha:	28-10-24
Nombre del predio	Región de Santa Maria	Hora de entrega:	
Propietario	Comunidad Indígena Cariachi	Coordenadas:	10°40'47"-159°16'W 72°51'57"-903°W
		Administrador:	Aleides Juze Lbarra

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadanía	17974570	53	3	B2

3. Estufa Ecológica

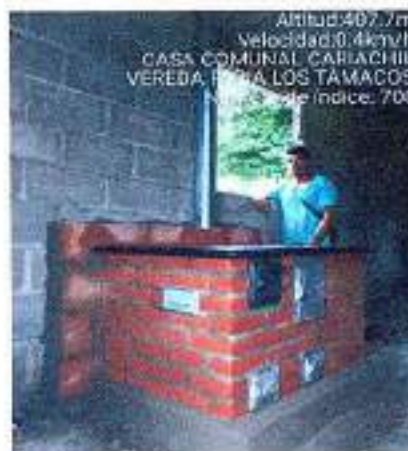
Fecha de construcción (dd-mm-aa)	28-10-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	28-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	----------	---	----------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES



DESPUES



4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brison Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Aleides Juze Lbarra Caroline C.

Beneficiario
C.C. 17974570

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	26-8-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	2:14 PM
Vereda	FARIAS - LOS TAMACOS		
Nombre del predio		Coordenadas:	N 10°40'50,56" W 72°51'52,58"
Propietario		Administrador:	Rafael Bultr

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	CARLOS ANDRES RINCONES MUÑOZ (Casa comunal)	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadanía				

3. Estufa Ecológica


Fecha de construcción (dd-mm-aa)	26-8-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	26-9-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	---------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	


4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Ensson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista



Beneficiario
C.C. 77.954 140



PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De
Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	21-4-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	FARIAS - LOS TAMACOS		
Nombre del predio	Sta Barbara	Coordenadas:	N 10° 39' 57,37" W 72° 50' 53,06'
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	ANA VICTORIA CHUMOSQUERA DAZA		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	27008345	63	4	A

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	24-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	24-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	----------	----------


3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Ana Victoria Chumosquera Daza
Beneficiario
cc. 27008345


Caroline C.
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	25-9-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	4:45 pm
Vereda	FARIAS - LOS TAMACOS		
Nombre del predio	Brisa loca	Coordenadas:	N 10° 40' 01,42" W 72° 50' 55,82"
Propietario		Administrador:	

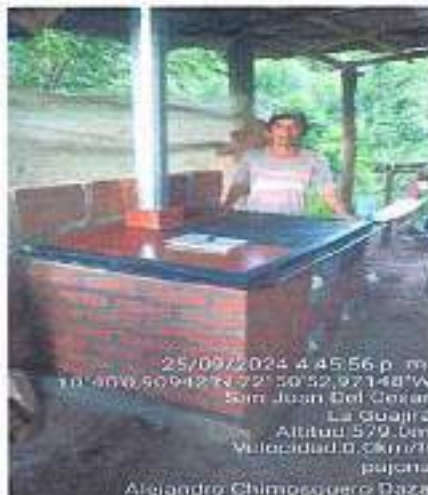
2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	ALEJANDRO CHUMUNQUERA DAZA	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	47	7	A

3. Estufa Ecológica


Fecha de construcción (dd-mm-aa)	25-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	25-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	----------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
 <p>25/09/2024 4:45:24 p. m. 10°44'31" 164°51'N 72°50'40"2964W San Juan Del Cesar La Guajira Altitud: 579.3m Velocidad: 0.0km/h pajona Alejandro Chumunquera Daza</p>	 <p>25/09/2024 4:45:56 p. m. 10°40'50'94213722" 50°52'521481W San Juan Del Cesar La Guajira Altitud: 579.3m Velocidad: 0.0km/h pajona Alejandro Chumunquera Daza</p>

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Besson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C. 12567956


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	FARIAS - LOS TAMACOS		
Nombre del predio	Nuevo Intento	Coordenadas:	N 10° 39' 7,5" W 72° 51' 7,7"
Propietario	Alquimides Jose Bula Marquez	Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	ALQUIMIDES JOSE BULA MARQUEZ	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadania	5.172373	52	2	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	1/20	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	1-11	OFICIAL:
----------------------------------	------	---	------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 060 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

 Alquimides Bula Caroline C.

Beneficiario
C.C. 5.172.373 401-110

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010"

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	23-8-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	2:58 PM
Vereda	FARIAS - LOS TAMACOS		
Nombre del predio		Coordenadas:	N 10° 40' 9,7" W 72° 51' 38,8"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	LEINER LOPEZ DIAZ	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía: 17.974.326	52	6	A I

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	23-8-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	23-9-24	OFICIAL:	Yonnys
----------------------------------	---------	---	---------	----------	--------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brison Mendoza
FUNDACIÓN AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C. 17924326


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPI# 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	22-10-24
Municipio	El Molino	Hora de entrega:	
Vereda	Farías Los Tamacos		
Nombre del predio		Coordenadas:	10° 39' 59.01258" - 72° 51' 47.67774"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas				
trabajador/beneficiario del proyecto	Minervina Diaz Mejia	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISEEN
Cedula ciudadanía	27015642	66	3	A1

3. Estufa Ecológica			
Fecha de construcción (dd-mm-aa)	22-10	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	22-11
		OFICIAL:	

3.1 Registro fotográfico

ANTES




DESPUES




4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Blisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
c.c. 27 015 642


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General

Municipio <u>Molino</u>	No.	
Vereda <u>Paniaslo Tardos</u>	Fecha:	<u>21-8-24</u>
Nombre del predio <u>los corozos</u>	Hora de entrega:	
Propietario	Coordenadas:	<u>10° 41' 23.31"</u> <u>-72° 52' 05.3"</u>
	Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	<u>Jaime Gregorio Parodi Aragón</u>	Edad (años)	<u>61</u>	Personas a cargo (esposa e hijos)	<u>4</u>	Nivel SISBEN
	Cedula Ciudadania <u>77972139</u>					

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	<u>21-8-24</u>	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	<u>21-8-24</u>	OFICIAL:
----------------------------------	----------------	---	----------------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES



DESPUES



4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corporación, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Jaimé Parodi
Beneficiario
c.c. 77972139

Caroline C.
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	20-9-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	FARIAS - LOS TAMACOS		
Nombre del predio	EL MANTANIAL	Coordenadas:	N 10° 39' 24,7" W 72° 55' 54,2"
Propietario:		Administrador:	LAZARO DAZA

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	JAIME ELIECER AMAYA DAZA	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	84 104 522	47	1

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	20-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	20-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	----------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Brisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

LAZARO DAZA Caroline C.
Beneficiario
C.C. 84 104 522

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	23-10-24
Municipio	EL MOLINO		Hora de entrega:
Vereda	FARIAS - LOS TAMACOS		
Nombre del predio	El Pajonal	Coordenadas:	N 10°40'07,7" W 72°51'02,4"
Propietario		Administrador:	Catalis Chimosquera

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	INGRIS PATRICIA CHIMOSQUERA MALO	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía: 1003040428	28	2	A1

3. Estufa Ecológica


Fecha de construcción (dd-mm-aa)	23-10-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	23-11-24	OFICIAL:
----------------------------------	----------	---	----------	----------


3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
 <p>23 oct 2024 a 24:32 p.m. 10°40'10.314"N 72°51'9.438"W 1961.5M Ingris Patricia Chimosquera Malo Vereda de Farias Los Tamaeos Municipio de El Molino</p>	 <p>23 oct 2024 a 24:51 p.m. 10°40'10.314"N 72°51'9.438"W 1961.5M Ingris Patricia Chimosquera Malo Vereda de Farias Los Tamaeos Municipio de El Molino</p>

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brissón Méndez
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

 Catalis Chimosquera
Beneficiario
C.C. 1003040428

Caroline C.
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	23-9-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	FARIAS - LOS TAMACOS		
Nombre del predio	Brisas locas	Coordenadas:	N 10°39'42,52" W 72°51'46,35"
Propietario		Administrador:	Jose A Daza

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	JOSE ALBERTO DAZA MARTINEZ	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía: 1-766-423	43	1	X

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	23-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	23-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	----------	----------


3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

 
Beneficiario
C.C. 1-766-423
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	14-10-24
Municipio	EL MOLINO		Hora de entrega:
Vereda	FARIAS - LOS TAMACOS		
Nombre del predio	los Tamaguito	Coordenadas:	N 10°39'58,8" W 72°50'48,7"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	JOSE MANUEL CHIMOSQUERA DAZA		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	84104208	54	7	A 1

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	14-10-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	14-11-24	OFICIAL:
----------------------------------	----------	---	----------	----------


3.1 Registro fotográfico


ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


José Manuel Chimosquera Daza
Beneficiario
C.C. 84104208


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	25-9-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	FARIAS - LOS TAMACOS		
Nombre del predio	Paromo 1	Coordenadas:	N 10°39'56,57" W 72°50'51,31"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	JOSE LUIS CHIMOSQUERO DAZA	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	12.568.228	2	A 1

3. Estufa Ecológica


Fecha de construcción (dd-mm-aa)	25-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	25-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	----------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
 <p>Antes de la construcción de la estufa ecológica. Se ven a tres personas (dos mujeres y un hombre) de pie al lado de un molde de concreto para la estufa. El molde tiene tres círculos que indican la posición de los quemadores.</p>	 <p>Después de la construcción de la estufa ecológica. Se ve a una persona de pie al lado de la estufa ecológica ya construida. La estufa es de ladrillo rojo y tiene tres quemadores. Hay un texto superpuesto en la foto que dice: '30-40-02-02-10-4-N 72°07'37.152"-W, Cámara 2, Los Pájaros, San Juan del Cesar, La Guajira, Dpto. 25, José Luis Chimosquero'.</p>

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


 Gerald Brissón Mendoza
 FUNDACION AGUA LUNA
 Contratista


 Beneficiario
 C.C. 12.568.228


 PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
 Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	30-8-24
Municipio	EL MOLINO		Hora de entrega:
Vereda	FARIAS - LOS TAMACOS		21:07 Am
Nombre del predio	Villa Elvira	Coordenadas:	N 10°41'04,97"
Propietario		Administrador:	W 72°55'39,50"

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	JOSE JAVIER DIAZ SOCARRAS	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadanía	1.252.9676			

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	30-8	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	30-9	OFICIAL: Yomy
----------------------------------	------	---	------	---------------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
 <p>30 ago 2024 4:56 PM 10°41'04.97"N 72°55'39.50"W El Molino La Guajira Colombia Altitud 222 m Velocidad 0 Km/h Jose Javier Diaz vereda farias montañas</p>	 <p>30 ago 2024 4:50 PM 10°41'04.98"N 72°55'39.50"W El Molino La Guajira Colombia Altitud 222 m Velocidad 0 Km/h Jose Javier Diaz vereda farias montañas</p>

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Beneficiario

C.C. 12529676
J. J. Diaz

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	27-8-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	2:33 PM
Vereda	FARIAS - LOS TAMACOS		
Nombre del predio	los sandes	Coordenadas:	N 10° 41' 57,14" W 72° 49'39,17"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	JOSE ALFREDO CALDERON GOVANETTY	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadanía	Ruben Daraba 1002420290	26	Segundo Arminio	X

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	27-8	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	27-9	OFICIAL: Yony
----------------------------------	------	---	------	---------------


3.1 Registro fotográfico


ANTES	DESPUES
 <p>27 ago 2024 2:33:53 p.m. 10°41'36.832"N 72°51'39.426"W Jose Alfredo Calderon Govanetty Vereda Farias Los Tamaños</p>	 <p>27 ago 2024 2:33:27 p.m. 10°41'37.25"N 72°51'39.54"W Jose Alfredo Calderon Govanetty Vereda Farias Los Tamaños</p>

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C.1002420290
segundo Arminio


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA, BPIN 20233218000010


FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	27-9-2024
Municipio	EL MOLINO		Hora de entrega:
Vereda	FARIAS - LOS TAMACOS		
Nombre del predio		Coordenadas:	N 10° 40' 09,63"
			W 72° 51'09,14'
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	JUANA MALO GIL		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	42401242	45	12	A 1

3. Estufa Ecológica


Fecha de construcción (dd-mm-aa)	27/9	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	27/10	OFICIAL:	
----------------------------------	------	---	-------	----------	---

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
 <p>27/09/2024 09:03:16 a.m. palmal Juana Malo Gil</p>	 <p>27/09/2024 09:40:51 a.m. 104°10'04.48"E N 72°51'09.14"W CORPORACIÓN AGUA LUNA</p>

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brison Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Juana Gil
42401242
Beneficiario
C.C.

Caroline C.
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	21-9-24
		Hora de entrega:	
Municipio	EL MOLINO		
Vereda	FARIAS - LOS TAMACOS		
Nombre del predio	Snt. Lx+haru	Coordenadas:	N 10° 40' 10,15" W 72° 51' 09,09"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	LUZ MARINA CHIMUNQUERA GUERRA		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	42401246	42	5	A1

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	21-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	21-10-24	OFICIAL:	<i>[Signature]</i>
----------------------------------	---------	---	----------	----------	--------------------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 060 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

[Signature]
Gerald Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

[Signature] Caroline C.
Beneficiario
C.C. 42401246

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010"

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	09-10-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	FARIAS - LOS TAMACOS		
Nombre del predio	los Mejia	Coordenadas:	N 10° 40' 4,5" W 72° 51' 47,7"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	LUZ MELIA DIAZ MEJIA		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadania	27015378	64	3	A2

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	9-10-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	9-11-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	---------	----------


3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


 Gerald Brison Mendoza
 FUNDACION AGUA LUNA
 Contratista


 Beneficiario
 C.C. 27015378

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
 Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	1-11-24
		Hora de entrega:	
Municipio	El Molino	Coordenadas:	10°41'11.9856"N 72°52'13.0084"W
Vereda	Feria Los Tannacos		
Nombre del predio	Villa Ceiva	Administrador:	
Propietario			

2. Condiciones socioeconómicas		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
trabajador/beneficiario del proyecto	Luz Jarden Molina Sanchez			
Cedula ciudadania	1010053936	35	5	x

3. Estufa Ecológica		Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	1-12-24	OFICIAL:
Fecha de construcción (dd-mm-aa)	1-11-24			

3.1 Registro fotográfico
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>ANTES</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>DESPUES</p>  </div> </div>

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

[Signature]
 Gerardo Brissón Mendoza
 FUNDACION AGUA LUNA
 Contratista

Luz Jarden Molina Sanchez *[Signature]*
 Beneficiario
 C.C. 1010053936

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
 Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010"

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	3/10/24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	FARIAS - LOS TAMACOS		
Nombre del predio	La bendición	Coordenadas:	N 10°40'53.88" W 72°52'12.40"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	MAGALIS BEATRIZ CHINCHILLA GONZALEZ	Edad (años)	57	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	27016930		2 m/m/m 2 nicta	B 3

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	3/10	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	3/11	OFICIAL:
----------------------------------	------	---	------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Brisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C. 27016930

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	2-10-24
Municipio	EL MOLINO		Hora de entrega:
Vereda	FARIAS - LOS TAMACOS		
Nombre del predio		Coordenadas:	N 10° 39' 10,4" W 72° 51' 39,2"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	LUIS RAFAEL VANEGAS PEÑALOZA		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía		43	5	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	2-10-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	2-11-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	---------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brissón Mendoza
FUNDACIÓN AGUA LUNA
Contratista

Luis R Vanegas Peñaloza C.

Beneficiario
C.C. 5172867

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	23-8-24
		Hora de entrega:	
Municipio	El Molino	Coordenadas:	10°40'50"
Vereda	Ferrias Los Tamaños		-72°51'45"
Nombre del predio	El Carmen	Administrador:	
Propietario			

2. Condiciones socioeconómicas				
trabajador/beneficiario del proyecto	Luis Carlos Acuña Vega	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadanía	17951739	61	5	A1

3. Estufa Ecológica				
Fecha de construcción (dd-mm-aa)	23-8	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	23-9	OFICIAL:

3.1 Registro fotográfico	
<p>ANTES</p>  <p>23/08/2024 7:21:22 a. m. 10°40'50"N -72°51'45"W Los tamaños Luis Carlos Acuña Vega</p>	<p>DESPUES</p>  <p>23/08/2024 7:21:22 a. m. 10°40'50"N -72°51'45"W Los tamaños Luis Carlos Acuña Vega</p>

4. Compromiso y acuerdo de voluntades
El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Beneficiario
c.c. 17951739

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	28/9/24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	FARIAS - LOS TAMACOS		
Nombre del predio		Coordenadas:	N 10°39'48,81" W 72°51'44,38"
Propietario		Administrador:	Leonel Guerrero Solor

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	PEDRO PABLO BOLAÑO IBARRA		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	77161520	46	7	A1

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	28/9/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	28/10/24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	----------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Besson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Leonel Guerrero Solor Coneslaine C.

Beneficiario
C.C. 77161520

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	14/9/24
		Hora de entrega:	
Municipio	EL MOLINO		
Vereda	FARIAS - LOS TAMACOS		
Nombre del predio	El Higueron	Coordenadas:	N 10° 39' 55,8" W 72° 52' 32,1"
Propietario		Administrador:	Jose diaz

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	ROSA ELENA DUARTE DE DIAZ		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	27016342	95	3	X

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	14/9/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	14/10/24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	----------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Brison Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C. 2529276


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	31/10/24
Municipio		Hora de entrega:	
Vereda	Feria los tamacos		
Nombre del predio	La tamorra	Coordenadas:	10°40'16.37232"N -72°51'53.05668"W
Propietario	Walter Enriquez Onate	Administrador:	Robinson Rivera

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cédula ciudadania 5164275	69	2	X

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	31/10/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	30/11/24	OFICIAL:
----------------------------------	----------	---	----------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES



DESPUES



4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Robinson Rivera carolaire C.

Beneficiario
C.C. 5.164.275

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	26/8/24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	FARIAS - LOS TAMACOS		
Nombre del predio		Coordenadas:	N 10° 41' 10.9" W 72° 52' 00.5"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	YAMILETH PIEDAD PEREZ BALCAZAR	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía			

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	26/8/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	26/9/24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	---------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Eufemia Marquez consolaire c

Beneficiario
C.C.66 944583

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	23-8-24
Municipio	El Molino	Hora de entrega:	
Vereda	Farias los tamacos		
Nombre del predio	Santa Maria	Coordenadas:	10°40'56.064" -72°51'56.652"
Propietario		Administrador:	


2. Condiciones socioeconómicas				
trabajador/beneficiario del proyecto	Yerson Enrique Mejia Ariza	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadania	5166671	39	7	A1


3. Estufa Ecológica				
Fecha de construcción (dd-mm-aa)	23-8	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	23-8	OFICIAL:

3.1 Registro fotográfico	
<p>ANTES</p>  <p>23 ago 2024 5:17:38 p.m. 10°40'56.064N - 72°51'56.652W Altitud 375.6m Velocidad 0.0km/h Yerson Enrique Mejia Ariza</p>	<p>DESPUES</p>  <p>23 ago 2024 5:17:38 p.m. 10°40'56.064N - 72°51'56.652W Altitud 375.6m Velocidad 0.0km/h Yerson Enrique Mejia Ariza</p>

4. Compromiso y acuerdo de voluntades
El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C.5166671


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010"

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	1-10/24
Municipio	EL MOLINO		Hora de entrega:
Vereda	FARIAS - LOS TAMACOS		
Nombre del predio	Villa Cardina	Coordenadas:	N 10° 40' 5,88" W 72° 51' 8,47"
Propietario		Administrador:	Josmin Vega Jimenez

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	YELMA IDANIDIS NUÑEZ VEGA		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	1192813832	32	1	A1

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	1/10/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	1/11/24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	---------	----------


3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Brissón Mendoza
 FUNDACION AGUA LUNA
 Contratista


Josmin Vega
 Beneficiario
 C.C. 1192813832


Camila C.
 PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
 Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	26-9-24
Municipio:	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda:	FARIAS - LOS TAMACOS		
Nombre del predio:		Coordenadas:	N 10° 40' 10,07"
			W 72° 51' 10,07"
Propietario:		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	MARIA TRINIDAD CHIMUNQUERO MALO	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cédula ciudadanía	1193145256	24	4

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	26/9	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	26/10	OFICIAL:
----------------------------------	------	---	-------	----------


3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
 <p>26/09/2024 3:51:52 p.m. pajóna Maria Trinidad Chimunquero Malo</p>	 <p>26/09/2024 3:52:25 p.m.</p>

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C. 1193145256


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO


1. Información General		No.	
		Fecha:	22-8-24
Municipio	El Molino	Hora de entrega:	
Vereda	Las Llanuras		
Nombre del predio	Santa Fe	Coordenadas:	10°40'53.165" N -72°51'56.346" W
Propietario		Administrador:	


2. Condiciones socioeconómicas				
trabajador/beneficiario del proyecto	Orlando José Mejía B.	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos):	Nivel SISEN
Cédula ciudadanía	12470054	72	4	A1

3. Estufa Ecológica				
Fecha de construcción (dd-mm-aa)	22-8	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	22-9	OFICIAL:

3.1 Registro fotográfico	
<p>ANTES</p>  <p>22 ago 2024 5:42:21 p.m. 10°40'53.165" N 72°51'56.346" W Altitud: 378.3 m Velocidad: 0 km/h Orlando José Mejía Vereda Las Llanuras</p>	<p>DESPUES</p>  <p>22 ago 2024 5:42:21 p.m. 10°40'53.165" N 72°51'56.346" W Altitud: 378.3 m Velocidad: 0 km/h Orlando José Mejía Vereda Las Llanuras</p>

4. Compromiso y acuerdo de voluntades
El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Brisseri Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
cc. 12470054


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	27-8-24
		Hora de entrega:	
Municipio	Molino		
Vereda	Farras		
Nombre del predio	Villa Male.	Coordenadas:	10°41'15.13" -72°52'20.99"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Oswaldo Enrique Parodyls Aragon	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadania 17.972.422.	60 años	6.	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	27-8	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	27-9	OFICIAL:
----------------------------------	------	---	------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES



DESPUES



4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogualjira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brisson Mendóza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Oswaldo parodyls. carolaire c.

Beneficiario
C.C. 17.972.422.

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	24/8/24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	FARIAS - LOS TAMACOS		
Nombre del predio		Coordenadas:	N 10° 40' 02,87" W 72° 50' 58,44"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	OSCAR FRANCISCO CHIMOSQUERA MALO	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadanía	4003039814	27	1	A 1

3. Estufa Ecológica


Fecha de construcción (dd-mm-aa)	24/8/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	24/9/24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	---------	----------


3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Brissón Menéndez
FUNDACIÓN AGUA LUNA
Contratista


Oscar Francisco Chimosquera
Beneficiario
C.C.


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	22-8-24
		Hora de entrega:	8 AM
Municipio	El Molino	Coordenadas:	10° 41' 18.368" -72° 52' 8.19"
Vereda	Ferrias Las Llanas		
Nombre del predio	Beras Arriba	Administrador:	
Propietario	Orlando Nicolás Duarte		


2. Condiciones socioeconómicas				
trabajador/beneficiario del proyecto	Orlando N. Diaz Duarte	Edad (años)	64	Personas a cargo (esposa e hijos)
Cedula ciudadania	17970850			Nivel SISBEN
				5 C 2

3. Estufa Ecológica			
Fecha de construcción (dd-mm-aa)	22-8	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	22-9
		OFICIAL:	

3.1 Registro fotográfico	
<p>ANTES</p> 	<p>DESPUES</p> 

4. Compromiso y acuerdo de voluntades
El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corporación Agua Luna, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C. 17970850


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	27/10/24
Municipio	EL MOLINO		Hora de entrega:
Vereda	FARIAS - LOS TAMACOS		
Nombre del predio		Coordenadas:	N 10°40'15,7" W 72°52'10,3"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	ROBERTO JOSE MEJIA MELGAREJO		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía				

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	23/10/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	27/11/24	OFICIAL:
----------------------------------	----------	---	----------	----------


3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brissón Mendoza
FUNDACIÓN AGUA LUNA
Contratista


Susmelia Díaz
Beneficiario
C.C. 27015378


Carolina C.
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	
Municipio	EL MOLINO		Hora de entrega:
Vereda	FARIAS - LOS TAMACOS		
Nombre del predio	RANCHO EL MEDIO	Coordenadas:	N 10° 38' 58,1" W 72° 51' 03,7"
Propietario		Administrador:	Cesar López

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	RAFAEL EDUARDO GONZALEZ MORALES		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadania	1123730316	38	1	1

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	20/10	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	20/11	OFICIAL:	Yonny
----------------------------------	-------	---	-------	----------	-------

3.1 Registro fotográfico

ANTES



DESPUES




4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Briceño Mendez
FUNDACIÓN AGUA LUNA
Contratista

Cesar López
Beneficiario
C.C. 1123730316


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	25-10-24
Municipio	San Juan del Cesar	Hora de entrega:	
Vereda	Los pozos		
Nombre del predio		Coordenadas:	10°44'53.034"N 72°53'17.958"W
Propietario	Frank Gomez	Administrador:	Karla Gomez

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Frank Gomez Brito	Edad (años)	32 años	Personas a cargo (esposa e hijos)	3	Nivel SISBEN
Cedula ciudadania						

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	25-10	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	25-11	Oficial:	Darwin Zobiigay
----------------------------------	-------	---	-------	----------	-----------------


3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brisson Mendoza
FUNDACIÓN AGUA LUNA
Contratista

 carolaine c.
Beneficiario
C.C. 1.122.406595
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	24-10-24
		Hora de entrega:	
Municipio	San Juan		
Vereda	Cerro Los pozos		
Nombre del predio	MIRAY	Coordenadas:	10°44'36.036"N -72°52'43.842"W
Propietario	Fernando Alvarez	Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas				
trabajador/beneficiario del proyecto	Fernando Alvarez G		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)
	Cedula ciudadanía	2768107	44	3
				Nivel SISBEN
				C 15


3. Estufa Ecológica				
Fecha de construcción (dd-mm-aa)	24-10-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	24-11-24	OFICIAL: David Rodriguez


3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades
El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Bisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C. 2768107


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoria

***CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010*.**

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	25-10-20
		Hora de entrega:	
Municipio	San Juan		
Vereda	Los popes		
Nombre del predio	Las Mercedes	Coordenadas:	10°44'46.57"N 72°52'42.636"W
Propietario	Danellis Benjumea Rendo	Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Danellis Benjumea	Edad (años)	42	Personas a cargo (esposa e hijos)	3	Nivel SISBEN	
	Cedula ciudadania	56.078.119					

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	25-10	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	25-11	OFICIAL:	José Antonio Rodríguez
----------------------------------	-------	---	-------	----------	------------------------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

DANELLIS Benjumea

Beneficiario
C.C. 56.078.119

Carrobrine C.

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	26-10-24
Municipio	San Juan	Hora de entrega:	
Vereda	Los pozos		
Nombre del predio	Rancho de mama	Coordenadas:	10° 43' 37.33" -72° 0' 17.71"
Propietario	Yaneth Celedón	Administrador:	Juan Guerra

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Yaneth Celedón Celedón	48	4	
Cedula ciudadania	27003193		

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	26-10	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	26-11	OFICIAL:
				Davila Padilla

3.1 Registro fotográfico

ANTES


DESPUES



4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA


2766471
Beneficiario


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	26-10-24
		Hora de entrega:	
Municipio	San Juan		
Vereda	Los popes		
Nombre del predio	Las Mercedes 1	Coordenadas:	10°44'46.428"N 72°52'45.192"W
Propietario	Juana Mercedes Carrillo	Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Juana Carrillo	73	3	
Cedula ciudadanía	27.001.350		

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	26-10	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	26-11	OFICIAL:
3.1 Registro fotográfico	ANTES	DESPUES		



4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

[Signature]
Gerald Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA

[Signature]
27.001.350
Beneficiario

[Signature]
CAROLINA C.
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
Municipio	SAN JUAN	Fecha:	30-08-24
Vereda	LOS POZOS	Hora de entrega:	2:38pm.
Nombre del predio	trinidad 2.	Coordenadas:	N 10° 43' 55,50"
Propietario		Administrador:	W 72° 52' 39,83

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	RUBBY ZUÑIGA NUÑEZ	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadanía	27001536.	74	4	A2

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	30-8	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	30-9	OFICIAL:
				Carolina Rodriguez

3.1 Registro fotográfico



4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brissón Merloza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Ruby Zuñiga
Beneficiario
C.C. 27001536.

Caroline C.
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
Municipio	SAN JUAN	Fecha:	23/08/24
Vereda	LOS POZOS	Hora de entrega:	12:40 Pm
Nombre del predio	Los Pozos.	Coordenadas:	N 10°43'25,71" W 72°52'44,44"
Propietario		Administrador:	Juan Peralta

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	VICTORIA DOLORES PERALTA MENDOZA	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadanía		83.	4.	A1.

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	23-8	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	23-9	OFICIAL:
				Dawn Rodriguez

3.1 Registro fotográfico



4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Victoria Peralta
Beneficiario
C.C. 1.765.789.

Camelina C.
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	18-10-24
Municipio	San Juan	Hora de entrega:	
Vereda	Los posos		
Nombre del predio	Lote de Terreno	Coordenadas:	10°44'19.120"N -72°52'20.962"W
Propietario	Oswaldo Brito	Administrador:	Carlos Carmona

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Oswaldo Enrique Brito Jancel	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	34	5	A2

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	18/10/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	18/12/24	OFICIAL:
				Davuin Rodriguez

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoquajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brison Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

* Carlos Carmona Camblanc C.

Beneficiario
C.C.

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

*1122 405380

***CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010*.**

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	26/10/24
Municipio	San Juan	Hora de entrega:	
Vereda	Los pesos		
Nombre del predio	Las Mercedes	Coordenadas:	10°44'28.04" N -72°52'31.77" W
Propietario	Ricardo Araya	Administrador:	Rogelio Medina

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadania	33	4	A1

3. Estufa Ecológica


Fecha de construcción (dd-mm-aa)	20/10/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	20/11/24	OFICIAL:
				Marin Rodriguez

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades


El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoquejira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Rogelio Medina

Beneficiario
C.C.

1051358589


Carolina C.

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoria



"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	23-10-24
Municipio	San Juan del Cesar		
Vereda	Los Pozos		
Nombre del predio		Coordenadas:	10°44'47.5E" -72°53'27.492"
Propietario		Administrador:	Alidis Orate

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Martha Ines Orbe Pasado		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadania		44	3		

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	22-10	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	22-11	OFICIAL:
----------------------------------	-------	---	-------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoaguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Alidis Orate
Beneficiario
C.C. 40 935542


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	25-10-24
		Hora de entrega:	
Municipio			
Vereda	EL orejero		
Nombre del predio		Coordenadas:	10° 40.231 -72° 54.864
Propietario		Administrador:	



2. Condiciones socioeconómicas				
trabajador/beneficiario del proyecto	Emiliano cruz		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)
	Cedula ciudadanía	13016514	55	2
				Nivel SISBEN

3. Estufa Ecológica	
Fecha de construcción (dd-mm-aa)	25-10-24
Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	25-10-24
OFICIAL:	

3.1 Registro fotográfico	
ANTES	DESPUES
 <p>17:37:58 N10° 40.444, W72° 54.866 La Guajira emiliano cruz vereda el orejero</p>	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades
El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corporación Agua Luna, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Ensson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

 
Beneficiario 13016514
C.C. PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	3-7-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	4:20 pm
Vereda	EL CORRAL - OREJERO - SAN BENITO		
Nombre del predio	TAROA	Coordenadas:	N 10° 40' 35" W 72° 54' 52"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	ALVARO MODESTO PETIT JIMENEZ	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadanía	Alvaro Petit Jimenez	58 años	Hna	X

3. Estufa Ecológica


Fecha de construcción (dd-mm-aa)	3-7	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	3-10	OFICIAL:	Yony
----------------------------------	-----	---	------	----------	------


3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


 Gerardo Balleza Mendoza
 FUNDACION AGUA LUNA
 Contratista


 Hna.
 Beneficiario
 C.C. 40797462


 PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
 Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010"

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	4-9-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	4:04 PM
Vereda	EL CORRAL - OREJERO - SAN BENITO		
Nombre del predio	Aguaacero	Coordenadas:	N 10°40'42,4" W 72°53'44,5"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	ADRIAN GONZALEZ VEGA	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadanía	5172395	49	1	X

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	4-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	4-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	--------	---	---------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	 <p>4 sep 2024 4:04:51 p. m. 10°42'42.234"N 72°53'44.026"W Los Hornos, San Juan Del Cesar, La Guajira, Colombia Altitud: 300.3m Velocidad: 0.04 m/h Adrian Gonzalez vereda San Benito</p>

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brissón Menéndez
FUNDACIÓN AGUA LUNA
Contratista


Adrian Gonzalez
Beneficiario
cc. 5172395

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	2-9-24
Municipio	SAN JUAN	Hora de entrega:	
Vereda	EL CORRAL - OREJERO - SAN BENITO		
Nombre del predio	San Benito	Coordenadas:	N 10° 41' 46,4" W 72° 53' 03,8"
Propietario		Administrador:	JOSE MENDOZA

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	JOSE DOMINGO GONZALEZ JIMENEZ	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadanía	12590730	68	1	A1

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	2-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	2-10-24	OFICIAL:	Shonni
----------------------------------	--------	---	---------	----------	--------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
 <p>2 sept 2024 09:38 pm 10°41'46.4"N 72°53'03.8"W Jose Domingo Gonzalez Vereda San Benito Número de Indico: 105</p>	 <p>2 sept 2024 09:11 pm 10°41'46.4"N 72°53'03.8"W Jose Domingo Gonzalez Vereda San Benito Número de Indico: 105</p>

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brison Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Beneficiario
C.C. 12590730

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.		
		Fecha:	21-8-24	
Municipio	EL MOLINO		Hora de entrega:	2:25 PM
Vereda	EL CORRAL - OREJERO - SAN BENITO			
Nombre del predio	corral 4	Coordenadas:	N 10° 39' 51,8" W 72° 54' 34"	
Propietario		Administrador:		

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	BELQUIS LUZ LOPEZ MARZAL		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	40798562			

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	21-8	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	21-9	OFICIAL:	Yanny
----------------------------------	------	---	------	----------	-------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Brissen Mendoza
FUNDACIÓN AGUA LUNA
Contratista

Belquis Lopez Carola D.
Beneficiario
C.C. 40798562

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	10-8-24
		Hora de entrega:	
Municipio	EL MOLINO		
Vereda	EL CORRAL - OREJERO - SAN BENITO		
Nombre del predio	El Corral	Coordenadas:	N 10° 39' 46" W 72° 54' 30,9"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	ARMANDO ALFREDO VEGA GOMEZ		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadania	13970491	66	5	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	10-8-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	10-09-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	----------	----------


3.1 Registro fotográfico

<p>ANTES</p> 	<p>DESPUES</p>  <p>10/08/2024 4:17:02 p. m. finco el corral armando Vega</p>
---	---

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Brison Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Armando Vega G. Carabaine C.
Beneficiario
C.C. 13970491

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	21-8-24
Municipio	EL MOLINO		Hora de entrega:
Vereda	EL CORRAL - OREJERO - SAN BENITO		
Nombre del predio	corral 4	Coordenadas:	N 10° 39' 50,7" W 72° 54' 40,0"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	NELSON ENRIQUE LOPEZ MARZAL		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadania	84036081			

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	21-8	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	21-9	OFICIAL:	yony
----------------------------------	------	---	------	----------	------


3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brsson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C. 84036081


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	24-8-24
Municipio	SAN JUAN	Hora de entrega:	3:00 PM
Vereda	EL CORRAL - OREJERO - SAN BENITO		
Nombre del predio	Sanbenito	Coordenadas:	N 10° 41' 54.0" W 72° 53' 02.9"
Propietario		Administrador:	José Mendoza

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	NANCIO GONZALEZ JIMENEZ	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadania	12590730	68	1	A5

3. Estufa Ecológica


Fecha de construcción (dd-mm-aa)	24-8-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	24-9-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	---------	----------


3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C. 12590730


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	14-8-24
Municipio	EL MOLINO		Hora de entrega:
Vereda	EL CORRAL - OREJERO - SAN BENITO		
Nombre del predio	Mate gusto	Cordenadas:	N 10° 40' 01,71" W 72° 54' 49,34"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	ANTONIO MARIA LOPEZ VENCE		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	5.131191			

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	14-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	14-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	----------	----------

3.1 Registro fotografico

<p>ANTES</p> 	<p>DESPUES</p> 
--	---

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Antonio Lopez Caroline C.
Beneficiario
C.C.5171191
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	21-9-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	EL CORRAL - OREJERO - SAN BENITO		
Nombre del predio	el kiosco	Coordenadas:	N 10° 39' 15,7" W 72° 55' 13,4"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	JANETH MORALES LOPEZ		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	40.197626	63	5	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	21-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	21-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	----------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Briceño Mendoza
FUNDACIÓN AGUA LUNA
Contratista

Janeth Moral P. Cambarec.

Beneficiario
C.C. 40797626

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	15-8-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	12m
Vereda	EL CORRAL - OREJERO - SAN BENITO		
Nombre del predio	LA ESPERANZA	Coordenadas:	N 10° 41' 14,0" W 72° 53' 28,0"
Propietario		Administrador:	Fabio Gonzalez

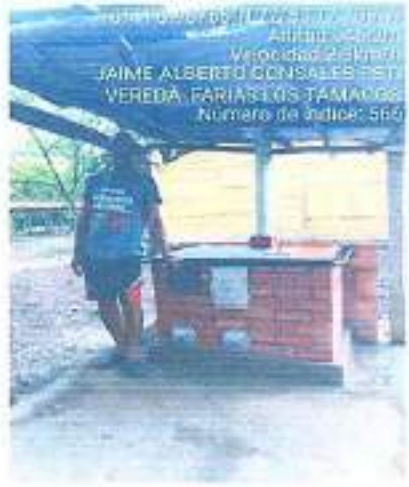
2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	JAIME ALBERTO GONZALEZ PETIT		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	17972493	58	3	X

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	15-8-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	15-9-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	---------	----------

3.1 Registro fotográfico

<p>ANTES</p> 	<p>DESPUES</p> 
---	--

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brison Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Beneficiario

C.C. 17972493

FABIO GONZALEZ

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	23-09-24
		Hora de entrega:	
Municipio	EL MOLINO		
Vereda	EL CORRAL - OREJERO - SAN BENITO		
Nombre del predio	El Corral #1	Coordenadas:	N 10° 39' 58,2" W 72° 54' 24,7"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	JOSE ALBERTO MORALES ZULETA	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadania			

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	23-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	23-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	----------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Erisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


José Alberto Morales
Beneficiario
C.C. 5.091.746

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	9/8/24
		Hora de entrega:	
Municipio	EL MOLINO		
Vereda	EL CORRAL - OREJERO - SAN BENITO		
Nombre del predio	Casa Brava	Coordenadas:	N 10° 39' 26,1" W 72° 54' 59,7"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	MARIA DEL SOCORRO ZABALETA Socorro Zabaleta		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	27.016.614	83		

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	9/8/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	9/8/24	OFICIAL:
----------------------------------	--------	---	--------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Brisson Mandoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Socorro Zabaleta Canabire C.

Beneficiario
c.c. 27.016.614

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	2-10-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	EL CORRAL - OREJERO - SAN BENITO		
Nombre del predio	Turpialitos	Coordenadas:	N 10° 40' 47,4" W 72° 54' 53,5"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	MARCOS ALFREDO CELEDON RAMIREZ	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía			

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	2-10-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	2-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	---------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brinson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C. 1067712502


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	25-9-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	2:55 PM
Vereda	EL CORRAL - OREJERO - SAN BENITO		
Nombre del predio	Villa Natalia	Coordenadas:	N 10° 40' 38" W 72° 55' 45.6"
Propietario		Administrador:	Julio Mendoza

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	MARCIANO GUERRA GONZALEZ		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadania	12590696	70	5	X

3. Estufa Ecológica


Fecha de construcción (dd-mm-aa)	25-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	26-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	----------	----------


3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
 <p>25 sept 2024 2:55 PM 10°41'18.384"N 72°55'15.685"W 30° 140 marciano guerra vereda corral orejero Nivel SISBEN 126</p>	 <p>26 oct 2024 2:55 PM 10°41'18.40"N 72°55'15.685"W 30° 140 marciano guerra vereda corral orejero Nivel SISBEN 126</p>

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar los labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C. 12590696

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	15/8/24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	EL CORRAL - OREJERO - SAN BENITO		
Nombre del predio	Nueva Frontera	Coordenadas:	N 10° 40' 29,1" W 72° 54' 02,0"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	OLGA LUCIA MONTERO MARZAL	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadania			

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	15/6/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	15/8/24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	---------	----------


3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	 <p>15/08/2024 3:26:36 p.m. 10°40'7"N - 72°54'12"W el corral Olga montero</p>

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brason Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

 
Beneficiario
C.C. 27016995
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	7/8/24
		Hora de entrega:	
Municipio	SAN JUAN		
Vereda	EL CORRAL - OREJERO - SAN BENITO		
Nombre del predio	Villa aurora	Coordenadas:	N 10° 41' 37,5" W 72° 53' 07,1"
Propietario	Roberto Gonzalez	Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	ROBERTO ENRIQUE GONZALEZ JIMENEZ	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadanía	18935587	65	1	B4

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	7/8/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	7/9/24	OFICIAL:
----------------------------------	--------	---	--------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES



DESPUES



4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerardo Brisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Roberto Gonzalez Jimenez
Beneficiario
C.C. 18935587

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	8-8-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	11 am
Vereda	EL CORRAL - OREJERO - SAN BENITO		
Nombre del predio	mi Resugio	Coordenadas:	N 10° 40' 48.6" W 72° 54' 48"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	ROBERTO CALDERON GIOVANNETY		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadania	Ruben Daraba 1002420290	26	Segunda Admin. Ruben	X

3. Estufa Ecológica


Fecha de construcción (dd-mm-aa)	8-8-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	8-9-24	OFICIAL:	Damen
----------------------------------	--------	---	--------	----------	-------


3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Briceño Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C.1002420290

Segundo Administrador


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	20/8/24
Municipio	EL MOLINO		Hora de entrega:
Vereda	BEJUCO - VOLADORCITO		
Nombre del predio	Coordenadas:	N 10° 38' 10,5" W 72° 48' 08,82"	
Propietario	Administrador:		

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	RAFAEL ANTONIO MALO CHUMUNQUERO	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadania	1062810349	32	7

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	20/8/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	20/9/24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	---------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Rafael A Malo Ch.
Beneficiario
C.C. 7062 810 349

Caroline C.
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	27/8/24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	BEJUCO - VOLADORCITO		
Nombre del predio		Coordenadas:	N 10° 38' 17,7" W 72° 48' 59,3"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	MERCEDES MALO BOLAÑO	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadanía	7722415816	31	5	A-1

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	27/8/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	27/9/24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	---------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoquajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Mercedes

Beneficiario
C.C. 7722415816

Carabira

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	23/8/24
		Hora de entrega:	
		Municipio	
Vereda		BEJUCO - VOLADORCITO	
Nombre del predio		Coordenadas:	N 10° 38' 26,31" W 72° 49' 08,66"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	RUPERTO ANTONIO NIEVES DAZA		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	12567958	54	3	A1

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	23/8/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	23/9/24	OFICIAL:
---	---------	--	---------	-----------------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

[Signature]
Gerald Brison Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

No firma
[Signature]
12567958
Beneficiario
C.C.

[Signature]
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	21/8/24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	BEJUCO - VOLADORCITO		
Nombre del predio	El Bejucó	Coordenadas:	N 10°38'28,6" W 72°52'43,4"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	ROSA DOMINGA LOPEZ ACOSTA		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	27016664	44	2	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	21/8/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	21/9/24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	---------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Bessen Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C. 27016664


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

***CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010*.**

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	10/8/24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	BEJUCO - VOLADORCITO		
Nombre del predio	Elvira	Coordenadas:	N 10°37'19.33" W 72°53'04.25"
Propietario		Administrador:	Deulis

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	REYES CAMILO ZABALETA ROMERO		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	15.163985	47	5	X

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	10/8/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	10/4/24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	---------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES 	DESPUES 
---	--

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

Gerald Erisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Deulis
Beneficiario
c.c. 15163985

Caroline C.
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	04-04
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	2:30
Vereda	BEJUCO - VOLADORCITO		
Nombre del predio	San Sipeude	Coordenadas:	N 10°38'00,4" W 72°53'36,3"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	RAFAEL ENRIQUE MENDOZA PEREZ	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadanía	17973568	57	4	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	4-4-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	4-10-24	OFICIAL:	<i>[Signature]</i>
----------------------------------	--------	---	---------	----------	--------------------

3.1 Registro fotográfico

<p>ANTES</p> 	<p>DESPUES</p> 
--	---

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

[Signature]
Gerald Brisan Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

[Signature] 17973568 *[Signature]*
Beneficiario
C.C. 17973568

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	7-10-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	BEJUCO - VOLADORCITO		
Nombre del predio	Parcela La Gloria	Coordenadas:	N 10° 38' 31,3" W 72° 51' 41,6"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	GLORIA CECILIA MONTERO DE QUINTERO	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	40797645	60	4

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	7-10-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	7-11-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	---------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES



DESPUES




4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Anselon Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C. 40797645


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
Municipio	EL MOLINO	Fecha:	7-9-24
Vereda	BEJUCO - VOLADORCITO	Hora de entrega:	5:45pm
Nombre del predio	El Placer	Coordenadas:	N 10° 37' 01,45" W 72° 52' 31,30"
Propietario	Franklin Urbina Bolaño	Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	FRANKLIN RAFAEL URBINA BOLAÑO		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	17972884	63	1	B.

3. Estufa Ecológica


Fecha de construcción (dd-mm-aa)	7-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	7-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	--------	---	---------	----------


3.1 Registro fotográfico

<p>ANTES</p> 	<p>DESPUES</p> 
--	---

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Ensson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C. 17972884


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA, BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	12-9-24
Municipio	EL MOLINO		Hora de entrega:
Vereda	BEJUCO - VOLADORCITO		
Nombre del predio		Coordenadas:	N 10° 38' 26,11" W 72° 49'09,12"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	DISLEYNI MARIA TORRES MALO		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	1062814281	28	6	A1

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	12-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	12-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	----------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.

[Signature]
Gerald Briceño Mendoza
FUNDACIÓN AGUA LUNA
Contratista

[Signature]
Beneficiario
C.C. 1062814281

[Signature]
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	23-9-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	BEJUCO - VOLADORCITO		
Nombre del predio	Nueva Esperanza	Coordenadas:	N 10° 38' 37,3" W 72° 51' 39,9"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	JOSE ANIBAL DIAZ DUARTE	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	63	5	

3. Estufa Ecológica


Fecha de construcción (dd-mm-aa)	23-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	23-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	----------	----------



3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades.

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brissón Méndez
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

 
Beneficiario
C.C. 12.951.831.
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	4-9-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	1:36 Pm
Vereda	BEJUCO - VOLADORCITO		
Nombre del predio		Coordenadas:	N 10° 38' 18,74" W 72° 49' 00,43"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	ANA ELVIA NIEVES DAZA	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadanía	49 748 754	46	8	A=1

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	4-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	4-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	--------	---	---------	----------


3.1 Registro fotográfico

<p>ANTES</p> 	<p>DESPUES</p> 
--	---

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C. 49748754


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES" COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	4-9-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	BEJUCO - VOLADORCITO		
Nombre del predio	EL HAJAGUA	Coordenadas:	N 10° 38'44,8" W 72°52'35,8"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	ALVARO DE JESUS RODRIGUEZ SERRANO	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadanía	5172.100	72	7	

3. Estufa Ecológica


Fecha de construcción (dd-mm-aa)	7-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	7-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	--------	---	---------	----------



3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


 Gerardo Enríquez Méndez
 FUNDACIÓN AGUA LUNA
 Contratista

 
 Beneficiario
 cc.5172.100
 PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
 Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA, BPIN 20233210000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	4/8/24
		Hora de entrega:	
Municipio	EL MOLINO		
Vereda	BEJUCO - VOLADORCITO		
Nombre del predio	DIOS VERA	Coordenadas:	N 10° 39' 09,9" W 72° 55' 21,6"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	NEIRO ENRIQUE MINDIOLA DELUQUE	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadania	17975708	47	3	X

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	4/8/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	4/9/24	OFICIAL:
----------------------------------	--------	---	--------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 060 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Brissón Menéndez
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C. 17975708


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	24-10-24
Municipio	El Molino	Hora de entrega:	
Vereda	Betisco		
Nombre del predio	Nueva idea	Coordenadas:	10°38'44.86"N -72°51'41.45"W
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Ivan olivero garcia	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	47	4	A1

3. Estufa Ecológica


Fecha de construcción (dd-mm-aa)	24-10-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	24-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	----------	---	----------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoaguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

IVAN Olivero

Beneficiario
C.C. 7647087

Caroline C.

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	19-9-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	BEJUCO - VOLADORCITO		
Nombre del predio	El paraíso	Coordenadas:	N 10° 38' 23,01" W 72° 49'03,69"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	IMELDA MERCEDES NIEVES DAZA	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía: 49748682	56	1	B2

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	14-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	19-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	----------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

IMELDA NIEVES
Beneficiario
C.C. 49748682

Camelaine C.
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	3/10
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	BEJUCO - VOLADORCITO		
Nombre del predio		Coordenadas:	N 10° 38' 19,52" W 72° 50' 49,30"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	HILDA MONTERO DE ZABALETA	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadanía	1062806245	40	4	A1

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	3/10	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	3/11	OFICIAL:
----------------------------------	------	---	------	----------


3.1 Registro fotográfico


<p>ANTES</p>  <p>3/10/2024 11:28:23 a.m. 10°43' 16.03"N 72°51' 46.11"W bejucovoladorcito Hilda Montero de Zabaleta Número de índice: 10</p>	<p>DESPUES</p>  <p>3/11/2024 9:55:07 a.m. bejucovoladorcito Hilda Montero de Zabaleta Número de índice: 8</p>
--	---

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brison Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C. 1062806245


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	24-9-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	BEJUCO - VOLADORCITO		
Nombre del predio	Los sielo	Coordenadas:	N 10° 36' 08,7" W 72° 50' 21,3"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	JOSE LUIS HERRERA MORALES	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadania	5172255	57	1

3. Estufa Ecológica


Fecha de construcción (dd-mm-aa)	24-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	24-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	----------	----------


3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
 <p>10°37'27.042"N 72°49'35.000"W 20° W Jose Luis Herrera Morales Vereda el Bejucó Municipio de El Molino</p>	 <p>10°37'26.941"N 72°49'29.698"W 30° NE Jose Luis Herrera Morales Vereda el Bejucó</p>

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Brieson Mendoza
FUNDACIÓN AGUA LUNA
Contratista


Jose Luis Herrera Morales
Beneficiario
C.C. 5172255


Caroline C.
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA, BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	26-9-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	BEJUCO - VOLADORCITO		
Nombre del predio	La Sombra	Coordenadas:	N 10°38'27,8" W 72°48'55,9"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	JUAN ANTONIO VILLA PAEZ	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadania 19581765	71	3	A+1

3. Estufa Ecológica


Fecha de construcción (dd-mm-aa)	26-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	26-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	----------	----------


3.1 Registro fotográfico


ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Brason Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Juan Antonio Villa Paez
Beneficiario
C.C. 19581765


Carolina C.
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	6-10-24
Municipio	EL MOLINO		Hora de entrega:
Vereda	BEJUCO - VOLADORCITO		
Nombre del predio		Coordenadas:	N 10° 38' 17,51" W 72° 48' 58,15"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	JOSE MARIA MALO BOLAÑO		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	1123731077	35	11	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	6-10-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	6-11-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	---------	----------


3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoaguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


 Gerald Brissón Mendoza
 FUNDACION AGUA LUNA
 Contratista


 Beneficiario
 C.C. 1123731077


 PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
 Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	26-9-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	BEJUCO - VOLADORCITO		
Nombre del predio		Coordenadas:	N 10° 38' 18,8" W 72° 48' 59,3"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	JOSE ROSARIO SIMONGAMA GIL	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía: 9149446640	43	8	

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	26-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	26-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	----------	----------

3.1 Registro fotográfico


ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C.


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	25-09-24
Municipio	EL MOLINO		Hora de entrega:
Vereda	BEJUCO - VOLADORCITO		
Nombre del predio		Coordenadas:	N 10° 38' 10,36" W 72° 48' 53,07"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	JOSE MANUEL MALO CHIMUNQUERO	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadania	7123734703	29	5	A#7

3. Estufa Ecológica


Fecha de construcción (dd-mm-aa)	25-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	25-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	----------	----------


3.1 Registro fotográfico


ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguaajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Brison Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Jose Manuel Malo
Beneficiario
C.C. 7123734703


CARLOS C.
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	29-9-24
		Hora de entrega:	
Municipio	EL MOLINO		
Vereda	BEJUCO - VOLADORCITO		
Nombre del predio	Bello Horizonte	Coordenadas:	N 10° 38' 30,8" W 72° 51' 17,4"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	LUCINDA ISABEL ACOSTA HERRERA		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadania	27015399	68	2	V C

3. Estufa Ecológica


Fecha de construcción (dd-mm-aa)	29-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	29-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	----------	----------

3.1 Registro fotográfico


ANTES	DESPUES
 <p>10°38'30.88"N 72°51'17.10078"W Altitud: 713.6m Velocidad: 0.8km/h LUSINDA ACOSTA VEREDA EL BEJUCO VOLADORCITO Número de índice: 627</p>	 <p>Altitud: 725.4m Velocidad: 0.4km/h LUSINDA ACOSTA VEREDA EL BEJUCO VOLADORCITO Número de índice: 633</p>

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguaijira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
CC. 27015399


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010"

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	29-9-24
Municipio	EL MOLINO		Hora de entrega:
Vereda	BEJUCO - VOLADORCITO		
Nombre del predio		Coordenadas:	N 10° 38' 20,67" W 72° 43' 00,08"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	LORENA FRANCISCA GIL CHUMUSQUERA	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía: 7.062.807.913	28	5	A#1

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	29-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	29-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	----------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brissón Mendoza
FUNDACIÓN AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
c.c. 7.062.807.913


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010"

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	28-9-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	BEJUCO - VOLADORCITO		
Nombre del predio	El paraíso	Coordenadas:	N 10° 38' 23,25" W 72° 49' 03,68"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	LILIANA PATRICIA ARIAS MALO	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía: 36373199	45	1	B2

3. Estufa Ecológica


Fecha de construcción (dd-mm-aa)	28-9-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	28-10-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	----------	----------


3.1 Registro fotográfico


ANTES	DESPUES
 <p>15/25/21 tombado 462 N 44 38 W 51.5 Liliana Arias malo vereda el bejucó municipio de el molino</p>	 <p>15/25/21 tombado 462 N 44 38 W 51.5 Liliana Arias malo vereda el bejucó municipio de el molino</p>

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Buisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C. 36373199


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoria



**"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN
COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN
20233218000010".**

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	5-8-24
		entrega:	
Municipio	El Molino		
Vereda	Uchacorcito		
Nombre del predio		Coordenadas:	10°37'23.03036° -72°53'47.45214°
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	Rafael Alberto Mojonero Perez		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadania		55	2	1

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	5-8	Fecha de encendido/operación (dd- mm-aa)	5-9	OFICIAL:
-------------------------------------	-----	---	-----	----------

3.1 Registro fotográfico


ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoaguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, conservación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brison Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C.


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo
Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	15/8/24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	El viejo BEJUCO - VOLADORCITO		
Nombre del predio	El Escudo	Coordenadas:	N 10° 38' 26.25" W 72° 48' 08.82"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	PEDRO RAFAEL MALO CHIMUNQUERO	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadania 1003034332	22	5	A=1

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	15/8/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	15/9/24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	---------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

 
Beneficiario
C.C. 1003 034 332
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	4/9/24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	BEJUCO - VOLADORCITO		
Nombre del predio		Coordenadas:	N 10°38'21,47" W 72°49'00,16"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	VICTOR JESUS ZABALETA JIMENEZ		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	1785386	28	5	x

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	4/9/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	4/10/24	OFICIAL:
----------------------------------	--------	---	---------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES





DESPUES



4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brison Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C. 1785386


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA, BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	15/1/24
		Hora de entrega:	
Municipio	EL MOLINO		
Vereda	BEJUCO - VOLADORCITO		
Nombre del predio	Coordenadas:	N 10° 36' 56,6" W 72° 56' 21,5"	
Propietario	Administrador:		

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	TULIO ENRIQUE ROSADO MEJIA		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadania	1485500	89 años	5	B.5

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	18/1/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	18/1/24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	---------	----------


3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
 <p>08:14 10°36'56.6"N 72°56'21.5"W Tulio Enrique Rosado Mejia Vereda el Bejucito Municipio El Molino</p>	 <p>15:05 10°36'56.6"N 72°56'21.5"W Tulio Enrique Rosado Mejia Vereda el Bejucito Municipio El Molino</p>

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpogujira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Basso Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C. 1485500

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	7-10-24
Municipio	EL MOLINO	Hora de entrega:	
Vereda	BEJUCO - VOLADORITO		
Nombre del predio	El paraíso	Coordenadas:	N 10° 38' 23,14" W 72° 49' 03,73"
Propietario		Administrador:	José mendoza

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	MARIA NATALY ARIAS MALO	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadanía	77101164	51	1	B2

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	2-10-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	2-11-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	---------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
 <p>15-10-24 07:22:06 72° 49' 45" W 24° 07' 54" N Maria Nataly Arias Malo Vereda El Sajon Número de identificación</p>	 <p>15-10-24 07:38:53 72° 49' 45" W 24° 07' 54" N Maria Nataly Arias Malo Vereda El Sajon Número de identificación</p>

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Brinson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

MARIA ARIA
Beneficiario
C.C. 77101164


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA, BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	3-10-24
Municipio	EL MOLINO		Hora de entrega:
Vereda	BEJUCO - VOLADORCITO		
Nombre del predio		Coordenadas:	N 10° 38' 26,21"
			W 72° 49' 08,85"
Propietario		Administrador:	

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	MARIA MILENA MALO MALO		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
	Cedula ciudadanía	1062808838	35	3	A1

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	3-10-24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	3-11-24	OFICIAL:
----------------------------------	---------	---	---------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
	

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


 Gerald Brison Mendoza
 FUNDACION AGUA LUNA
 Contratista


 Beneficiario
 c.c. 1062808838


 PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
 Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1. Información General		No.	
		Fecha:	1/10/2024
		Hora de entrega:	
Municipio	EL MOLINO		
Vereda	BEJUCO - VOLADORCITO		
Nombre del predio		Coordenadas:	N 10° 37'48,55" W 72°49'59,91"
Propietario		Administrador:	Jairo Pulgar

2. Condiciones socioeconómicas

trabajador/beneficiario del proyecto	ROBERTO CARLOS ZABALETA MONTERO	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadanía	1062809135	33	12	A1

3. Estufa Ecológica

Fecha de construcción (dd-mm-aa)	1/10	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	1/11	OFICIAL:
----------------------------------	------	---	------	----------

3.1 Registro fotográfico

ANTES	DESPUES
 <p>2/10/2024 7:36:13 a.m. Bejucos Voladorcito Roberto Carlos Zabaleta Montero Número de Predio: 6</p>	 <p>1/10/2024 4:44:05 p.m. 10°38'27.87618"N 72°50'56.87496"W Altitud: 849.0m Velocidad: 1.4km/h</p>

4. Compromiso y acuerdo de voluntades

El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Ceropogajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerald Brisson Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista

Jairo Pulgar
Beneficiario
C.C. 1062809135

Caroline C.
PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO


1. Información General		No.	
		Fecha:	31/10/24
		Hora de entrega:	
Municipio	San Juan del Cesar		
Vereda	La Peña		
Nombre del predio	Villa Clara	Coordenadas:	10° 46' 968" -73° 4' 534"
Propietario	Moises Enrique Manjarez	Administrador:	


2. Condiciones socioeconómicas				
trabajador/beneficiario del proyecto	Moises E. Manjarez	Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)	Nivel SISBEN
Cedula ciudadania	5169144	66	3	1

3. Estufa Ecológica				
Fecha de construcción (dd-mm-aa)	31/10/24	Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	30/11/24	OFICIAL:

3.1 Registro fotográfico	
ANTES  <p>17:22:10 N10° 46' 968", W73° 4' 534" La Guajira Moisés manjarez vereda lapeña</p>	DESPUES 

4. Compromiso y acuerdo de voluntades
El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corpoguajira, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


 Gerald Brisson Mendoza
 FUNDACION AGUA LUNA
 Contratista


 Beneficiario
 C.C. 5165701

PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
 Interventoria

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN 20233218000010".

FORMATO ENTREGA DE PRODUCTOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO


1. Información General		No.	
		Fecha:	28-10-24
		Hora de entrega:	
Municipio			
Vereda	Los pondores		
Nombre del predio	Villa Elsa	Coordenadas:	10° 43' 14.2198" -73° 0' 30.5258"
Propietario	Julia E. Doza	Administrador:	


2. Condiciones socioeconómicas				
trabajador/beneficiario del proyecto	Julia Esthela Doza Granadillo		Edad (años)	Personas a cargo (esposa e hijos)
	Cédula ciudadana	27003548	61	5
				Nivel SISBEN
				1


3. Estufa Ecológica	
Fecha de construcción (dd-mm-aa)	28-10-24
Fecha de encendido/operación (dd-mm-aa)	28-11-24
OFICIAL:	

3.1 Registro fotográfico	
<p>ANTES</p> 	<p>DESPUES</p> 

4. Compromiso y acuerdo de voluntades
El beneficiario del Proyecto recibe a satisfacción y conformidad una estufa ecoeficiente, bajo los criterios técnicos establecidos por la Corporación Agua Luna, consignados en los estudios previos del contrato de obra 050 de 2024. El beneficiario se compromete a realizar las labores de limpieza, operación y mantenimiento de la estufa conforme a las instrucciones dadas por el contratista.


Gerardo Brissón Mendoza
FUNDACION AGUA LUNA
Contratista


Beneficiario
C.C. 27003548


PRIDA S.A.S Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental
Interventoría
