

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
GOBIERNO
Alcalde Local de Los Martires

CONTRATO DE OBRA CO-137-2019


INFORME TECNICO N° 12

CONTRATISTA

CONSULTORÍA Y CONSTRUCCION SAS - CON & CON SAS

INTERVENTORÍA

MIRS LATINOAMERICA S.A.S

REVISO:	APROBO:
ARQ. JUAN PABLO RICCI	ING. SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS
FIRMA:	FIRMA:
	
CARGO:	CARGO:
REPRESENTANTE LEGAL	DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

1221

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

TABLA DE CONTENIDO

1	INFORME ADMINISTRATIVO	6
1.1	INTRODUCCIÓN.....	6
1.2	OBJETIVOS	7
1.3	MARCO TEÓRICO.....	8
1.4	METODOLOGÍA.....	9
1.5	ASPECTOS GENERALES	10
2	INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	12
2.1	PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA, INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN 13	
2.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CONTRATISTA.....	13
2.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERVENTORÍA.....	13
2.1.3	PERSONAL ADMINISTRATIVO FDLM.....	14
2.2	CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.....	14
3	INFORME LEGAL CONTRATO DE OBRA	19
3.1	ACTA DE INICIO DE OBRA	19
4	ADICIONES, SUSPENSIONES Y PRORROGAS	20
4.1	SUSPENSIONES	20
4.2	REINICIOS	27
4.3	ADICIONES Y PRORROGAS	32
5	CONTRATOS SUSCRITOS.....	45
5.1	CONTRATO DE OBRA No. CO-137-2019	45
5.2	GARANTIAS Y VIGENCIAS	45
6	INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA.....	47
6.1	ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	47
6.1.1	GESTIÓN FINANCIERA.....	47
6.1.2	PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO	48
7	PRESUPUESTO CONTRATO DE OBRA	49
8	ITEMS NO PREVISTOS.....	55
9	INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	58
9.1	FACTURACIÓN MENSUAL	58
10	INFORME TÉCNICO.....	59
10.1	EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICOS EN CADA CIV	59
11	BALANCE DE OBRA.....	64
12	PROCESO SANCIONATORIO CONTRATO DE OBRA	67
12.1	RESPECTO A LOS INCUMPLIMIENTOS DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS:.....	67

122

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

12.1.1	RESPUESTA AL INCUMPLIENDO DEL ASPECTO TÉCNICO	68
12.1.2	PROPUESTA PARA CULMINACION DE LOS FRENTES DEL CONTRATO DE OBRA No. 137-2019	71
13	RESUMEN DE VERIFICACIÓN POR CIV	75
13.1	INDICADORES DE INTERVENCIÓN.....	75
13.2	PROGRAMACIÓN DE OBRA.....	76
14	ACTAS DE SEGUIMIENTO DESARROLLADAS EN EL PERIODO	107
14.1	REUNIONES EXTRAORDINARIAS	107
14.2	ACTAS DE COMITÉ.....	107
15	INFORME DE TRANSITO.....	107
15.1	PLANES DE MANEJO DE TRANSITO.....	107
15.1.1	PROBLEMAS PRESNETADOS PARA LA APROBACIÓN DE LOS PMT's.....	108
15.1.2	COMITES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (COI)	109
16	CALIDAD.....	111
16.1	RESULTADOS DE LABORATORIO E INSPECCIONES CONTRATO DE OBRA	111
16.2	CERTIFICADOS DE CALIDAD	111
17	CONCLUSIONES.....	112
18	ANEXOS	113
18.1	ANEXO 1 CORRESPONDENCIA ENVIADA.....	114
18.2	ANEXO 1 CORRESPONDENCIA RECIBIDA.....	115
18.3	ANEXO 3 COI APROBADOS	116
Tabla 1 INFORMACIÓN CONTRATO CO-137-2019		12
Tabla 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CONTRATISTA.....		13
Tabla 3 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA INTERVENTORÍA.....		13
Tabla 4 CORRESPONDENCIA ENVIADA		14
Tabla 5 CORRESPONDENCIA RECIBIDA		17
Tabla 6 RELACION DE POLIZAS.....		45
Tabla 7 GESTIÓN FINANCIERA		47
Tabla 8 PLAN DETALLADO INVERSIÓN DEL ANTICIPO		48
Tabla 9 PREUPUESTO OFICIAL – OFERTA ECONOMICA.....		49
Tabla 10 PRESUPUESTO INICIAL DEL CONTRATO CO-137-2019.....		52
Tabla 11 ACTIVIDADES NO PREVISTAS		55
Tabla 12 DETALLE DEL ACTA DE OBRA No.06		58
Tabla 13 CLASIFICACIÓN Y TIPO DE INTERVENCIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE.....		59
Tabla 14 CLASIFICACIÓN Y TIPO DE INTERVENCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO		59
Tabla 15 BALANCE ACTUALIZADO		64
Tabla 16 CUADRO DE CORRESPONDENCIA.....		67

1223

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>(GOBIERNO)</small> <small>Alcalde: Carlos Gustavo Lemos</small>
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

Tabla 17 ACTIVIDADES A EJECUTAR PK-ID CALZADA	68
Tabla 18 ACTIVIDADES A EJECUTAR PK-ID ANDENES	69
Tabla 19 ASIGNACION DE SEGMENTOS A INTERVENIR.....	69
Tabla 20 SEGMENTOS EXCLUIDOS POR EJECUCIÓN DE TERCEROS.....	70
Tabla 21 REQUERIMIENTOS DE SECRETARIA DE MOVILIDAD	71
Tabla 22 FRENTES A EJECUTAR-GRUPO 1	72
Tabla 23 FRENTES A EJECUTAR-GRUPO 2	73
Tabla 24 FRENTES A EJECUTAR-GRUPO 3	74
Tabla 25 FRENTES A EJECUTAR-GRUPO 4	74
Tabla 26 FRENTES A EJECUTAR-GRUPO 5	75
Tabla 27 PROGRAMACION DE OBRA " REACTIVACION No4".....	76
Tabla 28 GESTIÓN DE PMT	107
Ilustración 1 LOCALIDAD 14 LOS MARTIRES.....	11
Ilustración 2 LOCALIDAD 14 LOS MARTIRES.....	11
Ilustración 3 Diseño de Pavimento alternativa 1 y 2. CIV 14000178-14000206.....	60
Ilustración 4 Diseño de Pavimento alternativa 1 y 2. CIV 14000233	60
Ilustración 5 Diseño de Pavimento alternativa 1 y 2. CIV 14000266	60
Ilustración 6 Diseño de Pavimento alternativa 1 y 2. CIV 14001154-14001098.....	61
Ilustración 7 Diseño de Pavimento alternativa 1 y 2. CIV 14000565-14000573-14000615	61
Ilustración 8 Diseño para andenes TIPO	61
Ilustración 9 Diseño de Pavimento alternativa 1 y 2. CIV 14001156	62
Ilustración 10 Diseño de Pavimento alternativa 1 y 2. CIV 14001678-14000718-14000741-14000772.....	62
Ilustración 11 Diseño de Pavimento alternativa 1 y 2. CIV 14001517-14001545	62
Ilustración 12 Diseño de Pavimento alternativa 1 y 2. CIV 14001367	63
Ilustración 13 Diseño de Pavimento alternativa 1 y 2. CIV 1400126	63
Ilustración 14 Ilustración 13 Diseño de Pavimento alternativa 1 y 2. CIV 14001506.....	63
Ilustración 15 Ilustración 13 Diseño de Pavimento alternativa 1 y 2. CIV 14001619-14001616.....	64

122A

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	 <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CONTRATO Alcaldía Local de Los Martires</small>
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

CONTROL DE CAMBIOS			
Revisión	Fecha	Descripción	Elaboró
0	16-JUN-2022	Versión inicial	Eusebio Rodríguez Ramírez
1			
2			

114
1225

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

1 INFORME ADMINISTRATIVO

1.1 INTRODUCCIÓN

Con el objeto de "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES", la Alcaldía Local de Los Mártires a través de licitación pública FDLM-LP-134-2019 adjudicó a Consultoría y Construcción S.A.S, el contrato de obra CO-137-2019.

El valor inicial del contrato corresponde a CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/C (\$5.437.884.572,00) MONEDA LEGAL, el cual fue adicionado en un valor de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$2.845.236.531) para un valor final de OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL CIENTO TRES PESOS M/C (\$ 8.283.121.103,00) con un plazo de ejecución inicial de SIETE (7) MESES prorrogado dos (04) MESES y con fecha de inicio del 25 de febrero del 2020.

Teniendo en cuenta los motivos técnicos, jurídicos y financieros expuestos por la firma CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S y avalada por la interventoría MIRS LATINOAMERICA S.A.S bajo los radicados C&C-CO137-2019-132 de fecha 6 de abril de 2022, y de entrada al CDI mediante Radicado No. 20226410019592 del 6 de abril de 2022 y el día 26 de abril de 2022 mediante el oficio bajo radicación 20226410022742 y memorando radicado con número 20226420001933, se dio lugar a prorrogar el plazo de ejecución del contrato de obra pública FDLM-137-2019, desde el diecisiete (17) de mayo de 2022 hasta el quince (15) de septiembre del 2022.

En el presente informe se incluyen las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 17 de mayo al 16 de junio del 2022.

1135
1226

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>COOPROM</small> <small>Municipio Local de Los Martires</small>
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

1.2 OBJETIVOS

GENERAL:

Presentar un informe integral de manera mensual sobre el avance del contrato de obra CO-137-2019, en el cual se muestren todos los antecedentes, trazabilidad y aspectos relevantes de la etapa de ejecución.

ESPECÍFICOS:

- Presentar un informe administrativo de manera general, en el cual se muestren los detalles que se tuvieron en cuenta para la elaboración del contrato de obra.
- Presentar un informe legal acerca del avance del contrato de obra, para de esta forma dejar evidencia de las adiciones, suspensiones o prorrogas que se puedan llegar a generar durante la etapa de ejecución.
- Presentar un informe financiero sobre el plan de inversión del anticipo, variaciones en el presupuesto de obra y la gestión financiera del contrato de obra.
- Presentar un informe técnico acerca del avance y ejecución del contrato de obra, junto con los detalles propios de las actividades constructivas.
- Presentar un informe de tránsito sobre la gestión de pmts y aprobaciones publicadas por la SDM.
- Presentar un informe sobre la gestión de calidad, acerca de los resultados de ensayos de laboratorio realizados a los materiales utilizados en la ejecución de la obra.

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

1.3 MARCO TEÓRICO

A continuación, se presentan los conceptos más relevantes dentro de la ejecución del contrato de la referencia:

- **DEMOLICIONES Y PRELIMINARES:** Se refiere al desmonte de mobiliarios y demoliciones necesarias para iniciar los trabajos de excavaciones, rellenos y construcción de zonas duras o elementos de concreto o adoquín.
- **EXCAVACIONES Y RELLENOS:** Se refiere al retiro de material necesario para conformar las bases y rellenos de contra elementos de concreto o adoquín.
- **ESTRUCTURA:** Se refiere a la construcción de concretos o morteros, muros de concreto, bases para andenes en adoquín o concreto que se requieran en la consecución del proyecto.
- **REDES HIDRÁULICAS:** Incluye el suministro e instalación de tuberías de drenaje de aguas lluvias, acometidas, cajas de inspección y cunetas.
- **CICLORUTA:** Calzada destinada de manera permanente a la circulación de bicicletas, ubicada en el andén, el separador o segregada de la calzada vehicular o en otros lugares autorizados, debidamente señalizada y delimitada.
- **ESPACIO PÚBLICO:** El conjunto de espacios urbanos conformados por plazas, las vías peatonales y andenes, los controles ambientales de las vías arterias, las alamedas y ciclo rutas delimitadas.
- **ESPECIFICACIONES:** Procesos y procedimientos técnicos generales o particulares, según el caso a los que se debe ceñir el Contratista durante la ejecución de las obras, para obtener los resultados objeto del contrato.
- **ADITIVO:** Es un material distinto del agua, agregados y cemento hidráulico usado como ingrediente en concretos y morteros añadido a la mezcla inmediatamente antes o durante su mezclado. Hoy en día, los aditivos se consideran un ingrediente más del concreto y se emplean para modificar las propiedades de modo que lo hagan más adecuado para condiciones de trabajo.
- **CURADO:** Es el proceso con el cual se mantienen una temperatura y un contenido de humedad adecuados, durante los primeros días después del vaciado, para que se puedan desarrollar en él las propiedades de resistencia y durabilidad.
- **SELLO DE JUNTAS:** Sellos de juntas de dilatación en pavimentos es un programa de mantenimiento que reduce el deterioro y ayuda a conservar el estado de este. La vida útil de un pavimento puede prolongarse al menos en 2 años realizando el sellado en el momento adecuado, permitiendo mantener la utilidad del pavimento.
- **PAVIMENTO.** Conjunto de capas superpuestas, relativamente horizontales, que se diseñan y construyen técnicamente con materiales apropiados y adecuadamente compactados. Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la subrasante de una vía y deben resistir adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del tránsito le transmiten durante el período para el cual fue diseñado la estructura y el efecto degradante de los agentes climáticos.
- **PAVIMENTO FLEXIBLE.** Tipo de pavimento constituido por una capa de rodadura bituminosa apoyada generalmente sobre capas de material no ligado.
- **PAVIMENTO RÍGIDO.** Es aquel que fundamentalmente está constituido por una losa de concreto hidráulico, apoyada sobre la subrasante o sobre una capa de material seleccionado, la cual se denomina sub base del pavimento rígido

1228

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

- **RASANTE.** Es la proyección vertical del desarrollo del eje de la superficie de rodadura de la vía.
- **REPLANTEO.** Actividades topográficas encaminadas a localizar un proyecto vial en el terreno para su posterior construcción. Se apoya en los planos de diseño y en las bases de topografía empleadas previamente en el levantamiento del corredor vial.
- **CIV:** Código de Identificación Vial.
- **SDM:** Secretaria Distrital de Movilidad.
- **PMT:** Plan de Manejo de Trafico.

1.4 METODOLOGÍA

A continuación se muestra la metodología que será empleada para la ejecución del contrato de obra CO-137-2019:

INICIACION DEL CONTRATO	<u>Proceso de Iniciación</u> <ul style="list-style-type: none"> • Acta de Inicio del contrato <u>Gestión de los Interesados</u> <ul style="list-style-type: none"> • Identificar los interesados.
PLANIFICACION DEL CONTRATO (ACTIVIDADES PREVIAS)	<u>Proceso de elaboración documentos</u> <ul style="list-style-type: none"> • Acta de suspensión del contrato. • Acta de reinicio del plazo del contrato. <u>Proceso de elaboración de diagnósticos</u> <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de los diagnósticos de los segmentos viales proyectados. • Revisión diagnósticos entregados por el FDLM. <u>Proceso de elaboración de los diseños</u> <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de los diseños de los segmentos viales proyectados • Revisión de diseños entregados por el FDLM. <u>Gestión de la Integración</u> <ul style="list-style-type: none"> • Programa de Gerencia del Proyecto. <u>Gestión del Alcance</u> <ul style="list-style-type: none"> • Planificar la gestión del alcance del proyecto. <u>Gestión del Cronograma</u> <ul style="list-style-type: none"> • Planificar el cronograma de obra. • Definir actividades • Establecer secuencia de las actividades • Desarrollar el cronograma <u>Gestión de Costos</u> <ul style="list-style-type: none"> • Determinar el Presupuesto del proyecto <u>Gestión de los Recursos</u> <ul style="list-style-type: none"> • Gestionar los recursos <u>Gestión de la Calidad</u> <ul style="list-style-type: none"> • Planificar la gestión de la calidad. <u>Gestión de las comunicaciones</u> <ul style="list-style-type: none"> • Planificar la gestión de las comunicaciones. <u>Gestión de Riesgos</u> <ul style="list-style-type: none"> • Identificación de riesgos. <u>Gestión de las adquisiciones</u> <ul style="list-style-type: none"> • Plan de Gestión de las adquisiciones.

1229

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

EJECUCION DEL CONTRATO (ACTIVIDADES DE OBRA)	<u>Gestión de la Integración</u> <ul style="list-style-type: none"> Ejecución de las actividades de obra del proyecto. <u>Gestión de la Calidad</u> <ul style="list-style-type: none"> Gestionar la calidad <u>Gestión de los Recursos</u> <ul style="list-style-type: none"> Adquirir los recursos para la ejecución. Desarrollar el equipo de trabajo. <u>Gestión de las Comunicaciones</u> <ul style="list-style-type: none"> Desarrollar las comunicaciones enviadas y recibidas. <u>Gestión de Riesgos</u> <ul style="list-style-type: none"> Respuesta a los riesgos. <u>Gestión de las Adquisiciones</u> <ul style="list-style-type: none"> Gestionar las adquisiciones para ejecución. <u>Gestión de los Interesados</u> <ul style="list-style-type: none"> Participación de los Interesados.
CONTROL DEL CONTRATO	<u>Gestión de la Integración</u> <ul style="list-style-type: none"> Supervisar y contralar la ejecución de las obras. Controlar las modificaciones del proyecto. <u>Gestión del Alcance</u> <ul style="list-style-type: none"> Controlar el alcance del contrato. <u>Gestión del Cronograma</u> <ul style="list-style-type: none"> Controlar el cronograma de obra. <u>Gestión de Costos</u> <ul style="list-style-type: none"> Controlar el Presupuesto del proyecto <u>Gestión de los Recursos</u> <ul style="list-style-type: none"> Controlar los recursos <u>Gestión de la Calidad</u> <ul style="list-style-type: none"> Controlar la calidad del contrato. <u>Gestión de las comunicaciones</u> <ul style="list-style-type: none"> Monitorear las comunicaciones de envío y recibido. <u>Gestión de Riesgos</u> <ul style="list-style-type: none"> Monitorear los riesgos. <u>Gestión de las adquisiciones</u> <ul style="list-style-type: none"> Controlar las adquisiciones. <u>Gestión de los Interesados</u> <ul style="list-style-type: none"> Revisar la participación de los interesados.
CIERRE DEL CONTRATO	<u>Gestión de la Integración</u> <ul style="list-style-type: none"> Informe final de obra Acta de liquidación del contrato

1.5 ASPECTOS GENERALES


Los Mártires es la localidad número 14 del Distrito Capital de Bogotá. Se encuentra ubicada en la parte centro-sur de la ciudad. Entre sus residentes predomina la clase media baja, el estrato socioeconómico 3. El nombre se debe a que en el parque de su zona oriental fueron fusiladas varias figuras notables de la independencia de Colombia. La localidad se encuentra completamente urbanizada, salvo por parques y rondas de los ríos. Junto a las localidades de La Candelaria, Santa Fe y Teusaquillo conforma El Centro de la ciudad. Pese a albergar varios monumentos arquitectónicos e históricos, desde mediados del siglo XX sus zonas oriental y norte han sufrido un

142
1230

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Oficina de Planeación</small> <small>Alcaldía Local de Los Martires</small>
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

proceso de deterioro presentando algunos de sus barrios graves problemas de delincuencia y criminalidad.


Ilustración 1 LOCALIDAD 14 LOS MARTIRES

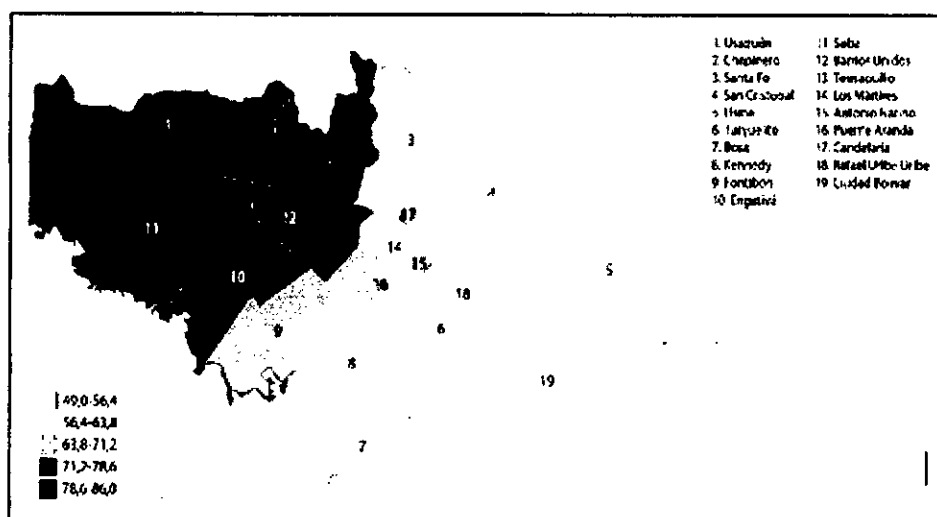

FUENTE: GOOGLE MAPS

PUNTO CARDINAL	LOCALIDAD	LIMITE
NORTE	TEUSAQUILLO	DIAGONAL 22 Y AVENIDA EL DORADO
SUR	ANTONIO NARIÑO	CALLE OCTAVA SUR Y AVENIDA PRIMERA
ORIENTE	SANTA FE	AVENIDA CARACAS
OCCIDENTE	PUENTE ARANDA	AVENIDA NORTE-QUITO-SUR

Ilustración 2 LOCALIDAD 14 LOS MARTIRES

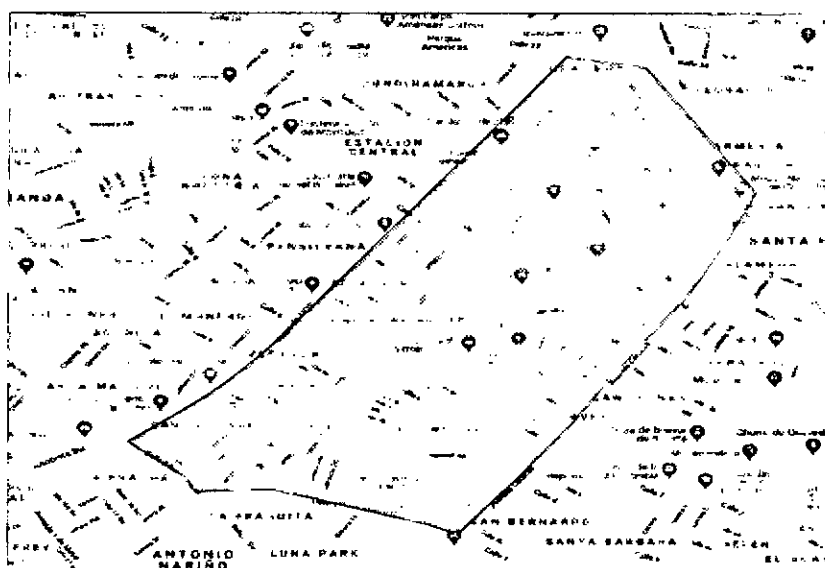

FUENTE: GOOGLE MAPS

149
1233

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

2.1 PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA, INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN

2.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CONTRATISTA

Tabla 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CONTRATISTA

CARGO	NOMBRE	DED.
DIRECTOR DE OBRA	VICTOR MANUEL ARIZA (<i>Proceso de Aprobación</i>)	50%
RESIDENTE DE OBRA	EUSEBIO RODRIGUEZ RAMIREZ	100%
RESIDENTE AMBIENTAL	NESTOR GIOVANI RUIZ RAMOS (<i>Proceso de Aprobación</i>)	60%
RESIDENTE SST	SANDRA MILENA GIL	100%
RESIDENTE SOCIAL	MONICA PATRICIA MURCIA ANDRADE (<i>Proceso de Aprobación</i>)	60%
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	JUAN DANIEL MOYA	10%
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	OSCAR JAVIER ALFONSO (<i>Proceso de Aprobación</i>)	10%
ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS	GERMAN GABRIEL RODRIGUEZ	30%
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN	HERNAN RICCI RUIZ	20%
ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE	MARTHA ROCIO CASTILLO	30%
TOPÓGRAFO	JUAN CARLOS PARRA	50%

FUENTE: CON & CON SAS / CO-137-2019

2.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERVENTORÍA

Tabla 3 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA INTERVENTORÍA

CARGO	NOMBRE	DED.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA	SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS	50%
ESPECIALISTA EN VIAS, GEOTÉCNIA O PAVIMENTOS	MELQUIEDEDEC CANTOR BELLO	35%
RESIDENTE DE INTERVENTORIA I	SANTIAGO CARRILLO VARGAS	100%
RESIDENTE DE INTERVENTORIA II	FREDY RAMIREZ PINZÓN	100%
APOYO TECNICO	DIEGO FORERO	100%

1234

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Alcaldía Local No. 1 de Martires</small>
CONTRATO CO-137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

CARGO	NOMBRE	DED.
RESIDENTE AMBIENTAL	CLAUDIA EUGENIA PALOMARES QUINTERO	30%
RESIDENTE SST	CLAUDIA EUGENIA PALOMARES QUINTERO	30%
RESIDENTE SOCIAL	MARIA ADRIANA GUTIERREZ	30%
ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE	JORGE ALBERTO GARCIA SÁNCHEZ	7%
TOPOGRAFO	PEDRO ALEXANDER SOSA MARTINEZ	50%
CADENERO	ALBERTO SALAZAR	50%
INSPECTOR 1	MAIDA COMBITA	100%
INSPECTOR 2	DIEGO ALEXANDER RODRIGUEZ	100%
LABORATORISTA INSPECTOR	GABRIEL RODRIGUEZ MUÑOZ	5%
MENSAJERO	ALAN CASTELLÓN	100%
CONDUCTOR	EDWIN BARAJAS	20%
SECRETARIA	OLGA VARÓN ESPITIA	10%

FUENTE: CON & CON SAS / CO-137-2019

2.1.3 PERSONAL ADMINISTRATIVO FDLM

TABLA 4: PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL FDLM

CARGO	NOMBRE
ARQ. INFRAESTRUCTURA FDLM	JAIME HERNAN VILLALBA VARGAS

2.2 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Tabla 4 CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONTRATO DE OBRA CO-137-2019					
CORRESPONDENCIA ENVIADA - INFORME TÉCNICO N.º 12					
FECHA DE ELABORACIÓN	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	ASUNTO	ELABORADO POR	FECHA DE RECIBIDO
25/11/2021	C&C-CO137-2019-119	ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES	RESPUESTA COMUNICADO MIRS-MAR-132-2021; CITACION AUDIENCIA	Juan Pablo Ricci Ruiz	26-nov.-21

1235

 CONTRATO CO-137-2019	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

CONTRATO DE OBRA CO-137-2019					
CORRESPONDENCIA ENVIADA - INFORME TÉCNICO N.º 12					
FECHA DE ELABORACIÓN	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	ASUNTO	ELABORADO POR	FECHA DE RECIBIDO
			SANCIUNATORIO CONTRATO DE OBRA Nº137-2019		
17-sep.-21	C&C-CO137-2019-122	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	RADICACION INFORME TECNICO 10	Juan Pablo Ricci Ruiz	17-sep.-21
17-sep.-21	C&C-CO137-2019-123	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	RADICACION DEL ACTA Nº6	Juan Pablo Ricci Ruiz	17-sep.-21
6-oct.-21	C&C-CO137-2019-124	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - Subdirección de planes de manejo de transito	RESPUESTA RADICADO Nº20213126489371- INCUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	Juan Pablo Ricci Ruiz	7-oct.-21
22-oct.-21	C&C-CO137-2019-125	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	SOLICITUD DE AMPLIACION Nº1 A LA SUSPENSION Nº4	Juan Pablo Ricci Ruiz	25-oct.-21
30-nov.-21	C&C-CO137-2019-126	ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES	PROPUESTA CULMINACION DE LOS FRENTE DEL CONTRATO DE OBRA Nº137-2019	Juan Pablo Ricci Ruiz	30-nov.-21
2-dic.-21	C&C-CO137-2019-127	ANA MORENO	DERECHO DE PETICION DE FECHA DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2021	Juan Pablo Ricci Ruiz	2-dic.-21
10-dic.-21	C&C-CO137-2019-128	ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES	NOTIFICACION DE CONTROVERSA CONTRACTUAL Y CONVOCATORIA A LA ETAPA DE AREGLO DIRECTO	Juan Pablo Ricci Ruiz	10-dic.-21
13-ene.-22	C&C-CO137-2019-129	ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES	SOLICITUD DE MESA DE TRABAJO PARA LA REVISION DE PROPUESTA DE CULMINACION DE FRENTE	Juan Pablo Ricci Ruiz	13-ene.-22
7-feb.-22	C&C-CO137-2019-130	ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES	RESPUESTA DERECHO DE PETICION RNº2021- 641-006888-2	Juan Pablo Ricci Ruiz	7-feb.-22
14-mar.-22	C&C-CO137-2019-131	ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES	RESPUESTA OFICIO MIRS-MAR-152-2019	Juan Pablo Ricci Ruiz	15-mar.-22
4-abr.-22	C&C-CO137-2019-132	ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES	RESPUESTA OFICIO MIRS-MAR-154-2020	Juan Pablo Ricci Ruiz	5-abr.-22
25-abr.-22	C&C-CO137-2019-133	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	SOLICITUD DE REINICIO DE OBRA FDLN-137-2019	Juan Pablo Ricci Ruiz	25-abr.-22
25-abr.-22	C&C-CO137-2019-134	ETB S.A. E.S.P	RESPUESTA DAÑOS INFRAESTRUCTURA RED ETB-VALORACION 7792	Juan Pablo Ricci Ruiz	28-abr.-22



1044
1236

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

CONTRATO DE OBRA CO-137-2019					
CORRESPONDENCIA ENVIADA - INFORME TÉCNICO N.º 12					
FECHA DE ELABORACIÓN	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	ASUNTO	ELABORADO POR	FECHA DE RECIBIDO
10-may.-22	C&C-CO137-2019-135	ACUEDUCTO DE BOGOTA	RESPUESTA TRASLADO E-2022-10021678	Juan Pablo Ricci Ruíz	10-may.-22
17-may.-22	C&C-CO137-2019-136	ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES	ALCANCE OFICIO C&C-CO137-2019-133; Solicitud de Reinicio del contrato.	Juan Pablo Ricci Ruíz	17-may.-22
18-may.-22	C&C-CO137-2019-137	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	INFORME DE SALDO DE ANTICIPO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA 137-2019	Juan Pablo Ricci Ruíz	18-may.-22
24-may.-22	C&C-CO137-2019-138	ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES	OFICIO INFORMATIVO- ACTUALIZACION DE POLIZAS	Juan Pablo Ricci Ruíz	24-may.-22
26-may.-22	C&C-CO137-2019-139	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	ACTUALIZACION HOJAS DE VIDA-CTO137-2019	Juan Pablo Ricci Ruíz	26-may.-22
27-may.-22	C&C-CO137-2019-140	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	INFORME DE OBRA DE MANO NO CALIFICADA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 137-2019	Juan Pablo Ricci Ruíz	27-may.-22
6-jun.-22	C&C-CO137-2019-141	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	INFORME DEL ESTADO DE LOS FRENTES- ACCIONES DE MOVILIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 137-2019	Juan Pablo Ricci Ruíz	8-jun.-22
6-jun.-22	C&C-CO137-2019-142	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	RESPUESTA RADICADA SDA N°2021ER78651	Juan Pablo Ricci Ruíz	7-jun.-22
14-jun.-22	C&C-CO137-2019-143	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	RESPUESTA OFICIO MIRS-MAR-165-2019	Juan Pablo Ricci Ruíz	14-jun.-22
15-jun.-21	C&C-CO137-2019-145	ACUEDUCTO DE BOGOTA	RESPUESTA TRASLADO RADICADO E-2022-036245	Juan Pablo Ricci Ruíz	15-jun.-22

FUENTE: CON & CON SAS / CO-137-2019

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

Tabla 5 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CONTRATO DE OBRA CO-137-2019					
CORRESPONDENCIA RECIBIDA - INFORME TÉCNICO N° 12					
FECHA DE ELABORACIÓN	CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
24-ene.-22	MIRS-MAR-151-2020	24-ene.-22	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON	RESPUESTA OFICIO N°20216420854581
9-feb.-22	MIRS-MAR-152-2020	9-feb.-22	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON	COPIA- RESPUESTA A OFICIO No 20216420854581 - SOLICITUD CONCEPTO JURIDICO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO, FRENTE A PROPUESTA PARA CULMINACION DE LOS FRENTES DEL CONTRATO DE OBRA No. 137-2019.
25-feb.-22	MIRS-MAR-153-2020	1-mar.-22	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON	SOLICITUD MEDIDAS CORRECTIVAS A IMPLEMENTACION PMT Y ESTADO DE OBRAS, PARA EL CONTRATO DE OBRA CO-137-2019
24-mar.-22	MIRS-MAR-154-2020	28-mar.-22	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON	RESPUESTA OFICIO N°20216420854581- SOLICITUD CONCEPTO JURIDICO ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO
22-abr.-22	22A8R22	22-abr.-22	ETB	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON	DAÑOS INFRAESTRUCTURA RED ETB-VALORACION 7792
27-abr.-22	CORREO ELECTRONICO	27-abr.-22	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON	TRASLADO DE COMPETENCIA- COMUNICADO EAAB RADICADO E-2022-10021678
4-may.-22	CORREO ELECTRONICO	4-may.-22	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON	TRASLADO DE COMPETENCIA -INFORME DE SALDO DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 137 DE 2019
31-may.-22	202264220363921	31-may.-22	ALCALDÍA LOCAL DE LOS MARTIRES	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON	RESPUESTA A SOLICITUD ENVIADA POR CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS- PERIODO TOTAL DE SUSPENSION N°4
1-jun.-22	CORREO ELECTRONICO	1-jun.-22	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON	RADICADO SDA N°2021ER78651 DEL 29/04/2022



1746
1238

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

31-may.-22	MIRS-MAR-165-2020	31-may.-22	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON	Respuesta a oficio C&C- CO137-2019-139- ACTUALIOZACIO HOJAS DE VIDA CTO137-2019
6-jun.-21	MIRS-MAR-166-2020	7-jun.-21	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON	LLAMADO DE ATENCION POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES
13-jun.-21	MIRS-MAR-168-2020	14-jun.-22	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON	LLAMADO DE ATENCION POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN NO ACTUALIZACION DE POLIZAS DE REINICIO N°4 PRORROGA 3
21-may.-21	CORREO ELECTRONICO	15-jun.-22	ACUEDUCTO DE BOGOTA	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON	TRASLADO RADICADO E- 2022-036245, SUMIDEROS
16-jun.-22	MIRS-MAR-169-2020	14-jun.-22	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON	INFORME DE INCUMPLIENTODE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, ATRASO EN REINICIO 4, PRORROGA 3

FUENTE: CON & CON SAS / CO-137-2019



	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO-137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

3 INFORME LEGAL CONTRATO DE OBRA

3.1 ACTA DE INICIO DE OBRA



SECRETARÍA DE
GOBIERNO



ALCALDÍA LOCAL DE LOS MÁRTIRES


ACTA DE INICIO
CONTRATO No. 137 DE 2019
Tipo de Contrato: OBRA
Objeto del contrato: OBJETO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 137-2019 CUYO OBJETO ES CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. CON&CON
Nombre del Contratista: NIT 830 041 411-0
Identificación del Contratista:
Fecha de inicio: 25 de febrero de 2020
Pizzo de ejecución: SIETE (7) MESES
Fecha prevista de terminación: 24 de septiembre de 2020
Valor: \$5.437.284.572,00
No. Certificado de Registro
Presupuesto: 355 del 18 de Octubre de 2019
Póliza: Equidad Seguros No. AA007885 - Cumplimiento del contrato
Equidad Seguros No. AA007887 - responsabilidad Civil Extracontractual.

En las instalaciones de la Alcaldía Local de los Mártires, se reunieron Raúl Hernando Esteban García, Alcalde Local de los Mártires en representación legal del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES y JUAN PABLO RICCI RUIZ, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.417.377, en calidad de representante legal de CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. CON&CON, dan inicio a la ejecución del contrato relacionado anteriormente.

La presente se firma por quienes en esta intervinieron, a los veinticinco (25) días del mes de febrero de dos mil veinte (2020).

Por la Alcaldía Local de los Mártires,

Contratista,


RAÚL HERNANDO ESTEBAN GARCÍA
ALCALDE LOCAL DE LOS MÁRTIRES


JUAN PABLO RICCI RUIZ
C.C.: 80.417.377
REPRESENTANTE LEGAL


NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA
R.L. MRS LATINOAMERICA S.A.S.
Interventor

Elaboró: DAFC-SAJBA- MRS LATINOAMERICA SAS.

Calle 19 No. 28 - 80 - Centro Comercial Calma - Correo: 3759531 - 3511577 - Información Línea 195
 Bogotá D.C. - Colombia Página Web: www.alcaldia.local.gov.co



1190
1240

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CONTRATO CO-137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

4 ADICIONES, SUSPENSIONES Y PRORROGAS

4.1 SUSPENSIONES

De acuerdo al Secop II se presenta el pantallazo de la suspensión temporal No.01 del contrato:

Información general

Identificador Único de la
Modificación CO1 CTRMOD.2601856

ID del contrato en SECOP CO1 PCCNTR.1245314

Estado Publicados

Tipo Suspender el contrato

¿Requiere reconocimiento del
proveedor?

Fecha del estado 24/03/2020 5:04:52 PM UTC-05:00 Bogotá Lima, Quito

SE REALIZA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 137 DE 2019 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES. QUIENES ACUERDAN SUSPENDER LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR UN (1) MES A PARTIR DEL 24 DE MARZO DE 2020 INCLUSIVE. ES DECIR, SE REINICIA A PARTIR DEL 24 DE ABRIL DE 2020. Y PODER CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL MISMO. EN ESTE PLAZO SE PODRÁ REINICIAR O PRORROGAR. ESTO DEPENDE LA DURACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA DERIVADA DE LA PANDEMIA COVID-19. EN RAZÓN A LA EXPEDICIÓN DEL

Justificación de la modificación DECRETO 081 DE 2020 POR EL CUAL "SE ADOPTAN MEDIDAS SANITARIAS Y ACCIONES TRANSITORIAS DE POLICÍA PARA LA PRESERVACIÓN DE LA VIDA Y MITIGACIÓN DEL RIESGO CON OCASIÓN DE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA CAUSADA POR EL CORONAVIRUS (COVID-19) EN BOGOTÁ, D.C. Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" ADOPTANDO LAS MEDIDAS CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA VIDA Y LA SALUD DE LOS HABITANTES DE BOGOTÁ D.C. Y EN CONCORDANCIA EL DECRETO 457 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2020 EMITIDO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para Suspendido.

Reconocido por el proveedor Andres Felipe Montaña Dávalos 24-03-2020 15:55 UTC-05:00 Bogotá Lima, Quito

Cambios del proveedor

Sin cambios

Reconocido por la Entidad Estatal RAUL HERNANDO ESTEBAN GARCIA 24-03-2020 13:53 UTC-05:00 Bogotá Lima, Quito



1449
1241

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO-137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

De la misma forma se presenta la suspensión No.02 del contrato de obra:



SUSPENSIÓN No. 2 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 137 - 2019 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES Y CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CON & CON SAS

No. Contrato	CO-137-2019
Objeto	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES
Contratista	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S - CON & CON S.A.S. NIT: 830.041.411-0
Valor incluido adiciones	\$8.283.121.103
Plazo de Ejecución incluidas suspensión No. 1 y Prórroga No.1	Nueve (9) meses
Fecha de Inicio	25 de febrero de 2020
Fecha de Terminación Inicial	24 de septiembre de 2020
Adiciones	Adición No. 1: \$2.845.236.531
Prórrogas	Prórroga No. Dos (02) meses
Suspensiones	Suspensión No. 1 de fecha 24 de marzo de 2020
Reinicios	Reinicio No. 1 de 21 de julio de 2020
Fecha de Terminación Incluida Suspensiones y prórroga	12 de abril de 2021

Entre los suscritos a saber, **TATIANA PIÑEROS LAVERDE**, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía No 1.018.503.593 de Bogotá, quien actúa en su condición de Alcaldesa Local (E) de Los Mártires, y como tal ordenadora del Gasto del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES, cargo para el cual fue nombrada mediante Decreto No. 118 del 16 de abril de 2020 y Acta de posesión No. 112 del 20 de abril de 2020, con capacidad jurídica para suscribir la presente Suspensión No. 2 en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Distrital No. 374 de 2019 y demás disposiciones legales vigentes, quien en adelante y para los efectos del presente documento se denominará **EL FONDO** y **JUAN PABLO RICCI RUIZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.417.377, quien obra en nombre y representación legal de la sociedad **CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. - CON & CON S.A.S.**, identificada con NIT 830.041.411-0, quien para los efectos de este contrato se ha denominado como **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la Suspensión No. 2 al contrato de obra pública No 137 de 2019, la cual se registrará por las cláusulas descritas a continuación, previas las siguientes consideraciones: 1). Que entre el FONDO y EL CONTRATISTA, se suscribió el contrato de obra pública No 137 de 2019 cuyo objeto es: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES". 2). Que el valor del contrato se pactó por la suma de CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$ 5.437.884.572) MCTE., incluido el IVA e impuestos a que haya lugar. 3). Que el plazo de ejecución del contrato se pactó por el término de SIETE (7) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución. 4). Que el día 24 de marzo de 2020, se suscribió otro modificatorio al contrato de

Alcaldía Local de Los Mártires.
Calle 19 No. 28-80
Calima Centro Comercial
Piso 7 Torre Administrativa
Tel. 3750531 - 3511577

BOGOTÁ

SECRETARÍA DE
GOBIERNO



1050
1242

 CONTRATO CO-137-2019	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES INFORME TÉCNICO No.12	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022 Versión 00	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>GOBIERNO</small> <small>Municipio Local de Los Martires</small>
--	--	--	--

De la misma forma se presenta la suspensión No.03 del contrato de obra:



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SUSPENSIÓN No. 3 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 137 - 2019 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES Y CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CON & CON SAS

No. Contrato	CO-137-2019
Objeto	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES
Contratista	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S - CON & CON S.A.S. NIT: 830.041.411-0
Valor incluido adiciones	\$8.283.121.103
Plazo de Ejecución incluidas suspensión No. 1 y Prórroga No.1	Nueve (9) meses
Fecha de Inicio	25 de febrero de 2020
Fecha de Terminación Inicial	24 de septiembre de 2020
Adiciones	Adición No. 1: \$2.845.236.531
Prórrogas	Prórroga No. Dos (02) meses
Suspensiones	Suspensión No. 1 de fecha 24 de marzo de 2020 Suspensión No. 2 de fecha 28 de noviembre de 2020
Reinicios	Reinicio No. 1 de 21 de julio de 2020 Reinicio No. 1 de 28 de diciembre de 2020
Fecha de Terminación Incluida Suspensiones y prórroga	12 de abril de 2021

Entre los suscritos a saber, **TATIANA PIÑEROS LAVERDE**, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía No 1.018.503.593 de Bogotá, quien actúa en su condición de Alcaldesa Local (E) de Los Martires, y como tal ordenadora del Gasto del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES, cargo para el cual fue nombrada mediante Decreto No. 118 del 16 de abril de 2020 y Acta de posesión No. 112 del 20 de abril de 2020, con capacidad jurídica para suscribir la presente Suspensión No. 3 en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Distrital No. 374 de 2019 y demás disposiciones legales vigentes, quien en adelante y para los efectos del presente documento se denominará **EL FONDO** y **JUAN PABLO RICCI RUIZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.417.377, quien obra en nombre y representación legal de la sociedad **CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. - CON & CON S.A.S.**, identificada con NIT 830.041.411-0, quien para los efectos de este contrato se ha denominado como **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la Suspensión No. 3 al contrato de obra pública No 137 de 2019, la cual se regirá por las cláusulas descritas a continuación, previas las siguientes consideraciones: 1). Que entre el **FONDO** y **EL CONTRATISTA**, se suscribió el contrato de obra pública No 137 de 2019 cuyo objeto es: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES". 2). Que el valor del contrato se pactó por la suma de CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$ 5.437.884.572) MCTE., incluido el IVA e impuestos a que haya lugar. 3). Que el plazo de ejecución del contrato se pactó por el término de SIETE (7)

Alcaldía Local de Los Martires.
Calle 19 No. 28-80
Callema Centro Comercial
Piso 7 Torre Administrativa
Tel. 3759531 - 3511577

BOGOTÁ
SECRETARÍA DE GOBIERNO



1243

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Alcaldía Local de Los Martires</small>
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	



SUSPENSIÓN No. 3 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 137 - 2019 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES Y CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CON & CON SAS

MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución. 4). Que el día 24 de marzo de 2020, se suscribió otro(s) modificatorio al contrato de obra pública N° 137 de 2019, en el sentido de modificar en los documentos técnicos y de ejecución del proceso el personal profesional requerido. 5). Que por cuenta de las restricciones de la pandemia del COVID-19 se suspendió la ejecución del contrato desde el 19 de marzo y a su vez el día 24 de marzo de 2020 a través de la plataforma SECOP II. 6). Que el 21 de julio de 2020 se reinició la ejecución del contrato a través de la plataforma SECOP II. 7). Que el 18 de noviembre de 2020, a través de la plataforma se suscribió la Prórroga y Adición No. 1 del Contrato de Obra Pública 137 de 2019, por la cual se amplió el plazo de ejecución del contrato en dos (02) meses y adición al valor del mismo la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$2.845.236.531). 8). Que por razones de fuerza mayor relacionadas con la temporada o periodo de lluvias, el 28 de noviembre se suspendió la ejecución del contrato. 9). Que el 28 de diciembre de 2020 se reinició la ejecución del contrato a través de la plataforma SECOP II. 10). Que el apoyo a la supervisión del contrato de obra No. 137 de 2019, mediante forma de modificación contractual solicitó la Suspensión del Contrato en consideración a lo siguiente: *"Es claro que en virtud a la posible afectación de la calidad en la ejecución de los trabajos y procesos constructivos, que por la alta precipitación en estos dos últimos meses, donde se generan saturación de las capas granulares, ocasionando cambios en materiales, cabe indicar que cuando hay sustitución, reparación o reposición de redes Sanitarias o lluvias, hay una carga hidráulica que no permite su debida instalación, todo esto inciden en mayores tiempos de ejecución y que han retrasado la programación y cronograma normal de obra, se hace indispensable aprobar la suspensión de la obra, para garantizar que el desarrollo normal de actividades, con una estabilidad óptima para cada tramo vial y que constituyan un perjuicio para la comunidad, el FDLM y las partes involucradas en el proyecto."* 11). Que el interventor del Contrato de Obra No. 137 de 2019, MIRS LATINOAMERICA S.A.S, mediante oficio escrito avaló la solicitud de suspensión en los siguientes términos: *"Esta interventoría se permite otorgar el aval para la suspensión por un periodo de treinta (30) días calendario, y/o hasta que las circunstancias se superen (...)"*. Que el documento anteriormente relacionado que justifica la Suspensión No. 3 del Contrato de Obra No. 137 de 2019, forma parte integral de la presente modificación contractual. Que con fundamento en lo anteriormente expuesto las partes acuerdan: **CLAUSULA PRIMERA:** SUSPENDER la ejecución del el Contrato de Obra No. 137 de 2019 por el término de TREINTA (30) días calendario, esto es desde el 31 de marzo 2021 hasta el 30 de abril de 2021. **CLAUSULA SEGUNDA:** La presente acta forma parte del contrato, por lo cual se anexará al expediente del mismo y se publicará en la plataforma SECOP II. **CLAUSULA TERCERA:** Las demás condiciones y obligaciones del Contrato de Obra No. 137 de 2019, se mantienen sin modificación alguna.

Elaboró: Ricardo Casas Inguai, Abogado FDLM
 Revisó: Elfrán Barros, Abogado de Despacho
 Aprobó: Tatiana Piñeros, Alcaldesa Local (E) de Los Martires.

Alcaldía Local de Los Martires.
 Calle 19 No. 28-80
 Calima Centro Comercial
 Piso 7 Torre Administrativa
 Tel. 3750531 - 3511577

BOGOTÁ  SECRETARÍA DE
GOBIERNO



1244

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO-137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

De la misma forma se presenta la suspensión No.04 del contrato de obra:



SUSPENSIÓN No. 4 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 137 - 2019 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES Y CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. - CON & CON S.A.S.

No. Contrato	CO-137-2019
Objeto	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES
Contratista	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S - CON & CON S.A.S. NIT: 830.041.411-0
Valor inicial	\$ 5.437.884.572
Plazo de ejecución inicial	Sieta (7) meses
Fecha de Inicio	25 de febrero de 2020
Fecha de Terminación Inicial	24 de septiembre de 2020
Adiciones	Adición No. 1: \$ 2.845.236.531
Prórrogas	Prórroga No. 1: Dos (02) meses Prórroga No. 2: Dos (02) meses
Suspensiones	Suspensión No. 1 de fecha 24 de marzo de 2020 Suspensión No. 2 de fecha 28 de noviembre de 2020 Suspensión No. 3 de fecha 31 de marzo de 2020
Reinicios	Reinicio No. 1 de fecha 21 de julio de 2020 Reinicio No. 2 de 28 de diciembre de 2020 Reinicio No. 3 de 29 de Junio de 2021
Plazo de ejecución final incluidas prórrogas	Once (11) meses
Valor total incluido adiciones	\$ 8.283.121.103
Fecha de Terminación Incluida Suspensiones y prórrogas	Diecisiete (17) de septiembre de 2021.

Entre los suscritos a saber, **TATIANA PIÑEROS LAVERDE**, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía No 1.018.503.593 de Bogotá, quien actúa en su condición de Alcaldesa Local (E) de Los Mártires, y como tal ordenadora del Gasto del **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES**, cargo para el cual fue nombrada mediante Decreto No. 118 del 16 de abril de 2020 y Acta de posesión No. 112 del 20 de abril de 2020, con capacidad jurídica para suscribir el presente documento en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Distrital No. 374 de 2019 y demás disposiciones legales vigentes, quien en adelante y para los efectos del presente documento se denominará **EL FONDO** y **JUAN PABLO RICCI RUIZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.417.377, quien obra en nombre y representación legal de la sociedad **CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. - CON & CON S.A.S.**, identificada con NIT 830.041.411-0, quien para los efectos de este contrato se ha denominado

Alcaldía Local de Los Mártires.
Calle 19 No. 28-80
Calima Centro Comercial
Piso 7 Torre Administrativa
Tel 376 531 3511877

 **BOGOTÁ**
SECRETARÍA DE
GOBIERNO



1053
1245

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CORPORACIÓN Alcalde Local de Los Martires
CONTRATO CO-137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	



SUSPENSIÓN No. 4 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 137 - 2019 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES Y CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. - CON & CON S.A.S.

como EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la prórroga No. 2 al contrato de obra pública No 137 de 2019, la cual se registrará por las cláusulas descritas a continuación, previas las siguientes consideraciones: 1). Que entre el FONDO y EL CONTRATISTA, se suscribió el contrato de obra pública No 137 de 2019 cuyo objeto es: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES". 2). Que el valor del contrato se pactó por la suma de CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$ 5.437.884.572) MCTE., incluido el IVA e impuestos a que haya lugar. 3). Que el plazo de ejecución del contrato se pactó por el término de SIETE (7) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución. 4). Que el día 24 de marzo de 2020, se suscribió otro modificatorio al contrato de obra pública N° 137 de 2019, en el sentido de modificar en los documentos técnicos y de ejecución del proceso el personal profesional requerido. 5). Que por cuenta de las restricciones de la pandemia del COVID-19 se suspendió la ejecución del contrato desde el 19 de marzo y a su vez el día 24 de marzo de 2020 a través de la plataforma SECOP II. 6). Que el 21 de julio de 2020 se reinició el contrato de obra pública 137 de 2019 través de la plataforma SECOP II. 7) Que el 18 de noviembre de 2020, se suscribió la Prórroga y Adición No. 1 del Contrato de Obra Pública 137 de 2019, por la cual se amplió el plazo de ejecución del contrato en dos (02) meses y se adicionó el valor del mismo en la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$2.845.236.531), de igual manera se modificó el contrato agregando una nueva cláusula (cláusula 29) al mismo. 8). Que el 28 de noviembre de 2020 se suspendió el 28 de noviembre de 2020 por el término de VEINTITRÉS (23) días, hasta el 20 de diciembre de 2020. 9). Que el 28 de diciembre de 2020 se reinició la ejecución del contrato a través de la plataforma SECOP II. 10). Que el apoyo a la supervisión del contrato de obra No. 137 de 2019, mediante formato de modificación contractual solicitó la Suspensión del Contrato la cual fue suscrita a través de la plataforma transaccional SECOP II el 3 de marzo de 2020. 11) Que cumplido el plazo de suspensión del contrato el Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires procedió a realizar el evento de reactivación, no obstante, EL CONTRATISTA solicitó la ampliación de la suspensión dos (02) oportunidades, argumentando situaciones que impedían la ejecución del contrato relacionadas con problemas de orden público. 12). Que el día 29 de junio de 2021 las partes suscribieron a través de la plataforma SECOP II reactivación del contrato. 13). Que el 17 de julio de 2021 prorrogaron el plazo de ejecución del contrato por DOS (02) meses, siendo la fecha de terminación final del contrato el 17 de septiembre de 2021; la modificación contractual fue tramitada y suscrita en la Plataforma SECOP II. 14). Que mediante oficio del 16 de septiembre de 2021, de radicado interno No. 20216410050482, el contratista CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS elevó la siguiente solicitud a la entidad: "1. En garantía del derecho constitucional al debido proceso, se sugiere adelantar los trámites sancionatorios de terminación previo a la finalización del plazo contractual, teniendo en cuenta que el resultado del debate puede ocasionar la necesidad de eventuales prórrogas del contrato. Consultoría y Construcción SAS CON&CON SAS advierte la necesidad de otorgar y tramitar ante el Fondo de Desarrollo Local de mártires una Suspensión del contrato de obra a partir del día 16 de septiembre del presente año, con el fin de dar terminación de forma satisfactoria a las actividades previstas en el contrato. 2. Una vez sea superado el objeto que da lugar a la suspensión, se dará el reinicio para así poder dar finalización al objeto

Alcaldía Local de Los Mártires
Calle 19 No. 28-80
Calera Centro Comercial
Piso 7 Torre Administrativa
Tel. 3790431 - 3811577

 SECRETARÍA DE GOBIERNO

4

1240

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

**SUSPENSIÓN No. 4 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 137 - 2019 SUSCRITO ENTRE
EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES Y CONSULTORIA Y
CONSTRUCCION S.A.S. - CON & CON S.A.S.**

contractual". 15). Que el 16 de septiembre de 2021, la interventoría del contrato, MIRS LATINOAMERICA S.A.S., radicó oficio el cual tiene radicado interno No. 20216410050522, se manifestó respecto a la solicitud de suspensión hecha al contratista en los siguientes términos. "Con el fin de garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa y contradicción y así brindar garantías, sugerimos respetuosamente a la administración analice los argumentos aquí esbozados, y apruebe la suspensión solicitada mediante el oficio No. C&C-CO-137-2019-114, por el contratista de obra. Por ende la presente interventoría se permite otorgar el aval para la suspensión por un periodo de treinta (30) días calendario, y/o hasta que las circunstancias que dan lugar a esta suspensión se superen, o en tal caso se sugiere prorrogar dicha suspensión." 16). Que el apoyo a la supervisión en atención a la solicitud del contratista y teniendo en cuenta el aval de la interventoría, radicó la solicitud de modificación del contrato para suspender el contrato de obra 137 de 2019 por un plazo de TREINTA (30) DIAS calendario. De conformidad con lo anterior las partes acuerdan: **CLAUSULA PRIMERA:** SUSPENDER el plazo de ejecución del Contrato de obra pública No. 137 de 2019, por el término de TREINTA (30) DIAS calendario, y/o hasta que las circunstancias que dan lugar a esta suspensión se superen. **CLAUSULA SEGUNDA:** La presente modificación se entiende perfeccionada con la aceptación que corresponde a la firma electrónica de las partes a través de la plataforma del SECOP II. **CLAUSULA TERCERO:** Las demás condiciones y obligaciones del contrato de obra pública No. 137 de 2019, se mantienen sin modificación alguna.

Elaboró: Ricardo Casas, Abogado de Despacho.

Alcaldía Local de Los Martires.
Calle 19 No. 28-80
Calena Centro Comercial
Piso 7 Torre Administrativa
Tel. 3759631 3311377

BOGOTÁ  SECRETARÍA DE
GOBIERNO



1247

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO-137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

4.2 REINICIOS

A continuación se presenta el Acta de reinicio No.01:



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE GOBIERNO

DOCUMENTO ANEXO A LA REACTIVACION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 137 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES Y CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

No. Contrato	137 DE 2019
Objeto	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE. LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES
Contratista	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S NIT: 830041411
Valor	\$ 5.437.884.572
Plazo de Ejecución	Siete (7) meses
Fecha de Inicio	25 de febrero de 2020
Fecha de Terminación Inicial	24 de septiembre de 2020
Adiciones	N/A
Prorrogas	N/A
Suspensiones	Suspensión No. 1 de fecha 24 de marzo de 2020
Fecha de Terminación Final Incluida Suspensión	20 de enero de 2021

Entre los suscritos a saber, **TATIANA PIÑEROS LAVERDE**, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía No 1.018.503.593 de Bogotá, quien actúa en su condición de Alcaldesa Local de Los Mártires (E), y como tal ordenador del Gasto del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES, cargo para el cual fue nombrada mediante Decreto No. 118 del 16 de abril de 2020 y Acta de posesión No. 112 del 20 de abril de 2020, con capacidad jurídica para suscribir la presente reactivación en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Distrital No. 374 de 2019 y demás disposiciones legales vigentes, quien en adelante y para los efectos del presente documento se denominará **EL FONDO** y **CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.**, sociedad identificada con NIT 900351236, representada legalmente por **JUAN PABLO RICCI RUIZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.417.377 quien para los efectos de este documento se ha denominado como **EL CONTRATISTA**, se ha convenido suscribir reactivación No. 1 al contrato de obra pública No. 137 DE 2019, previas las siguientes consideraciones: 1). Que entre el **FONDO** y **CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.**, se suscribió el contrato de obra pública No. 137 de 2019 cuyo objeto es: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES." 2). Que el valor del contrato se pactó por la suma de CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$ 5.437.884.572) MCTE., incluido el IVA e impuestos a que haya lugar. 3). Que el plazo de ejecución del contrato se pactó por el término de SIETE (7) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución. 4). Que, como acción de prevención y cuidado de la vida de las personas, el Gobierno Nacional el 22 de marzo de 2020 expidió el Decreto 457 de 2020, mediante el cual se imparten instrucciones para el cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio de 19 días en todo el territorio colombiano, que rigió a partir de las cero horas del 25 de marzo, hasta las cero horas del 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del coronavirus COVID-19. 5). Que el día 24 de marzo de 2020, se suscribió otrosí

Alcaldía Local de Los Mártires.
Calle 19 No. 28-80
Calima Centro Comercial
Piso 7 Torre Administrativa
Tel. 3759531 - 3511577

BOGOTÁ  SECRETARIA DE GOBIERNO

48
1248

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CONSEJO LOCAL DE LOS MARTIRES
CONTRATO CO-137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

Y de la misma forma se presenta el Acta de reinicio No.02:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

REINCIO No. 2 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 137 - 2019 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES Y CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CON & CON SAS

No. Contrato	CO-137-2019
Objeto	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES
Contratista	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S - CON & CON S.A.S. NIT: 830.041.411-0
Valor incluido adiciones	\$8.283.121.103
Plazo de Ejecución incluidas suspensión No. 1 y Prórroga No. 1	Nueve (9) meses
Fecha de Inicio	25 de febrero de 2020
Fecha de Terminación Inicial	24 de septiembre de 2020
Adiciones	Adición No. 1: \$2.845.236.531
Prórrogas	Prórroga No. 1: Dos (02) meses
Suspensiones	Suspensión No. 1 de fecha 24 de marzo de 2020 Suspensión No. 2 de fecha 28 de noviembre de 2020
Reinicios	Reinicio No. 1 de fecha 21 de julio de 2020
Fecha de Terminación Incluida Suspensiones y prórroga	12 de abril de 2021

Entre los suscritos a saber, **TATIANA PINEROS LAVERDE**, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía No 1.018.503.593 de Bogotá, quien actúa en su condición de Alcaldesa Local (E) de Los Mártires, y como tal ordenadora del Gasto del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES, cargo para el cual fue nombrada mediante Decreto No. 118 del 16 de abril de 2020 y Acta de posesión No. 112 del 20 de abril de 2020, con capacidad jurídica para suscribir la presente Reinicio No. 2 en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Distrital No. 374 de 2019 y demás disposiciones legales vigentes, quien en adelante y para los efectos del presente documento se denominará **EL FONDO** y **JUAN PABLO RICCI RUIZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.417.377, quien obra en nombre y representación legal de la sociedad **CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. - CON & CON S.A.S.**, identificada con NIT 830.041.411-0, quien para los efectos de este contrato se ha denominado como **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la Reinicio No. 2 al contrato de obra pública No 137 de 2019, la cual se registrará por las cláusulas descritas a continuación, previas las siguientes consideraciones: 1). Que entre el FONDO y EL CONTRATISTA, se suscribió el contrato de obra pública No 137 de 2019 cuyo objeto es: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES". 2). Que el valor del contrato se pactó por la suma de CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$ 5.437.884.572) MCTE., incluido el IVA e impuestos a que haya lugar. 3). Que el plazo de ejecución del contrato se pactó por el término de SIETE (7) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos

Alcaldía Local de Los Mártires.
Calle 10 No. 28-80
Calima Centro Comercial
Piso 7 Torre Administrativa
Tel. 3758331 - 3511577



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

1200
1250

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Alcaldía Local de Los Martires</small>
CONTRATO CO-137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

la firma CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S tiene para el reinicio y culminación de los frentes:

PROPUESTA

Una vez evaluada y analizada la programación "costos-tiempo" que se requiere para la culminación de los frentes que actualmente se encuentra abiertos y los que se requieren iniciar (*Frentes de Adición y Acciones de Movilidad*), se propone la culminación de los frentes en cinco grupos, de acuerdo a las necesidades de la comunidad y de la programación de obra.

GRUPO No.1

A continuación, se presentan los CIV que actualmente se encuentran en ejecución y tienen requerimientos por parte de la comunidad y se priorizan para iniciar en el Grupo No.1, ver anexo No.21.

Tabla 22 FRENTES A EJECUTAR-GRUPO 1

No	Cod.	BARRIO	PK-ID	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA	% EJECUCION	ACTIVIDADES POR EJECUTAR
18	14001619	COLEGIOS	182788	CALZADA	CL 1C	KR 19A	KR 19BBIS	95%	1.SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB
			70476-70477	CINTA DE AJUSTE - ANDEN				20%	1.CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA ANDEN, CINTA DE AJUSTE Y FINALIZACION DE LAS CAJAS DE INSPECCION
19	14001616	COLEGIOS	182789	CALZADA	CL 1C	KR 19BBIS	KR 19C	94%	1.SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB
			70478-70479	CINTA DE AJUSTE - ANDEN				5%	1.CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA ANDEN, CINTA DE AJUSTE Y FINALIZACION DE LAS CAJAS DE INSPECCION
15	14001506	TAPICERIAS	182491	CALZADA	KR 18	CL 2	CL 3	41%	1. CONFORMACION DE LA CALZADA COSTADO OCCIDENTAL 2. SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB 3. DEMARCACION Y MOBILIARIO (TACHAS, ESTOPEROLES. ETC
			69902-69903	ANDEN				0%	1.CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA ANDEN
10	14001367	SANTA ISABEL-1B	182827	CALZADA	CL 1B	KR 27A	KR 28	99%	1.SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB
			70542-70543	ANDEN				0%	1.CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA ANDEN

FUENTE: CON&CON SAS / CO-137-2019

1158
1251

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO-137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

Y de la misma forma se presenta el Acta de reinicio No.03:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

REACTIVACIÓN No. 3 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 137 - 2019 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES Y CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. - CON & CON S.A.S.

No. Contrato	CO-137-2019
Objeto	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES
Contratista	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S - CON & CON S.A.S. NIT: 830.041.411-0
Valor incluido adiciones	\$8.283.121.103
Plazo de Ejecución incluidas suspensión No. 1 y Prórroga No.1	Nueve (9) meses
Fecha de Inicio	25 de febrero de 2020
Fecha de Terminación Inicial	24 de septiembre de 2020
Adiciones	Adición No. 1: \$2.845.236.531
Prórrogas	Prórroga No. 1: Dos (02) meses
Suspensiones	Suspensión No. 1 de fecha 24 de marzo de 2020 Suspensión No. 2 de fecha 28 de noviembre de 2020 Suspensión No. 3 de fecha 31 de marzo de 2020
Reinicios	Reinicio No. 1 de fecha 21 de julio de 2020 Reinicio No. 2 de 28 de diciembre de 2020
Fecha de Terminación Incluida Suspensiones y prórroga	19 días después de aceptado y publicado el reinicio del contrato en SECOP II

Entre los suscritos a saber, **TATIANA PIÑEROS LAVERDE**, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía No 1.018.503.593 de Bogotá, quien actúa en su condición de Alcaldesa Local (E) de Los Mártires, y como tal ordenadora del Gasto del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES, cargo para el cual fue nombrada mediante Decreto No. 118 del 16 de abril de 2020 y Acta de posesión No. 112 del 20 de abril de 2020, con capacidad jurídica para suscribir la presente Reinicio No. 3 en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Distrital No. 374 de 2019 y demás disposiciones legales vigentes, quien en adelante y para los efectos del presente documento se denominará EL FONDO y **JUAN PABLO RICCI RUIZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.417.377, quien obra en nombre y representación legal de la sociedad **CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. - CON & CON S.A.S.**, identificada con NIT 830.041.411-0, quien para los efectos de este contrato se ha denominado como EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la Reinicio No. 3 al contrato de obra pública No 137 de 2019, la cual se regirá por las cláusulas descritas a continuación, previas las siguientes consideraciones: 1). Que entre el FONDO y EL CONTRATISTA, se suscribió el contrato de obra pública No 137 de 2019 cuyo objeto es: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA

Alcaldía Local de Los Mártires
Calle 19 No. 28-80
Galena Centro Comercial
Piso 7 Torre Administrativa
Tel. 3759531 - 3511577

 **BOGOTÁ**
SECRETARÍA DE
GOBIERNO

159
1252

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	 <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. C-001000 Alcaldía Local de Los Mártires</small>
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

REACTIVACIÓN No. 3 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 137 - 2019 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES Y CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. - CON & CON S.A.S.

CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES. 2). Que el valor del contrato se pactó por la suma de CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$ 5.437.884.572) MCTE., incluido el IVA e impuestos a que haya lugar. 3). Que el plazo de ejecución del contrato se pactó por el término de SIETE (7) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución. 4). Que el día 24 de marzo de 2020, se suscribió otro si modificatorio al contrato de obra pública N° 137 de 2019, en el sentido de modificar en los documentos técnicos y de ejecución del proceso el personal profesional requerido. 5). Que por cuenta de las restricciones de la pandemia del COVID-19 se suspendió la ejecución del contrato desde el 19 de marzo y a su vez el día 24 de marzo de 2020 a través de la plataforma SECOP II. 6). Que el 21 de julio de 2020 se reinició el contrato de obra pública 137 de 2019 a través de la plataforma SECOP II. 7) Que el 18 de noviembre de 2020, se suscribió la Prórroga y Adición No. 1 del Contrato de Obra Pública 137 de 2019, por la cual se amplió el plazo de ejecución del contrato en dos (02) meses y adición al valor del mismo la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$2.845.236.531). 8). Que el 28 de noviembre de 2020 se suspendió el 28 de noviembre de 2020 por el término de VEINTITRÉS (23) días, hasta el 20 de diciembre de 2020. 9). Que el 28 de diciembre de 2020 se reinició la ejecución del contrato a través de la plataforma SECOP II. 10). Que el apoyo a la supervisión del contrato de obra No. 137 de 2019, mediante forma de modificación contractual solicitó la Suspensión del Contrato la cual fue suscrita a través de la plataforma transaccional SECOP II el 3 de marzo de 2020. 11) Que cumplido el plazo de suspensión del contrato el Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires procedió a realizar el evento de reactivación, no obstante, EL CONTRATISTA solicitó la ampliación de la suspensión dos (02) oportunidades, argumentando situaciones que impedían la ejecución del contrato relacionadas con problemas de orden público. 12). Que en atención a que fueron superadas las condiciones que motivaron la suspensión del Contrato de Obra 137, las partes acordaron tramitar la reactivación del contrato. **CLAUSULA PRIMERA: REACTIVAR** la ejecución del Contrato de obra pública No. 137 de 2019. **CLAUSULA SEGUNDA:** Que dado lo anterior la nueva fecha de terminación de la ejecución contractual será de diecinueve (19) días después de aceptado y publicado el reinicio del contrato en SECOP II. **CLAUSULA TERCERA:** El contratista se obliga a ampliar la vigencia de las garantías del contrato en los términos del presente documento. **CLAUSULA CUARTA:** La presente modificación se entiende perfeccionada con la aceptación que corresponde a la firma electrónica de las partes a través de la plataforma del SECOP II. **CLAUSULA QUINTA:** Las demás condiciones y obligaciones del contrato de obra pública No. 137 de 2019, se mantienen sin modificación alguna.

Elaboró: Renne Romero Hernández. Abogado Contratación FDLM.
Revisó: Ricardo Casas. Abogado de Despacho.
Aprobó: Tabara Prieros. Alcaldesa Local (E) de Los Mártires.

Alcaldía Local de Los Mártires.
Calle 19 No. 28-80
Callema Centro Comercial
Piso 7 Torre Administrativa
Tel. 3750531 - 3511577

BOGOTÁ  SECRETARÍA DE
GOBIERNO

+160
1253

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO-137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

4.3 ADICIONES Y PRORROGAS

El día 18 de noviembre del año 2020 se firmó la adición por un valor de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$2.845.236.531) y una prórroga de dos (02) meses, lo cual se soporta con la siguiente acta:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

PRORROGA Y ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 137 - 2019 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES Y CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CON & CON SAS

No. Contrato	CO-137-2019
Objeto	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES
Contratista	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S - CON & CON S.A.S. NIT: 830.041.411-0
Valor	\$5.437.884.572
Plazo de Ejecución	Siete (7) meses
Fecha de Inicio	25 de febrero de 2020
Fecha de Terminación Inicial	24 de septiembre de 2020
Adiciones	N/A
Prorrogas	N/A
Suspensiones	Suspensión No. 1 de fecha 24 de marzo de 2020
Reinicios	Reinicio No. 1 de 21 de julio de 2020
Fecha de Terminación Incluida	20 de marzo de 2021
Suspensión y/o prórroga	

Entre los suscritos a saber, **TATIANA PIÑEROS LAVERDE**, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía No 1.018.503.593 de Bogotá, quien actúa en su condición de Alcaldesa Local (E) de Los Mártires, y como tal ordenadora del Gasto del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES, cargo para el cual fue nombrado mediante Decreto No. 118 del 16 de abril de 2020 y Acta de posesión No. 112 del 20 de abril de 2020, con capacidad jurídica para suscribir la presente Adición y Prórroga en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Distrital No. 374 de 2019 y demás disposiciones legales vigentes, quien en adelante y para los efectos del presente documento se denominará EL FONDO y **JUAN PABLO RICCI RUIZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.417.377, quien obra en nombre y representación legal de la sociedad CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. - CON & CON S.A.S., identificada con NIT 830.041.411-0, quien para los efectos de este contrato se ha denominado como EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir prórroga y adición No. 1 al contrato de obra pública No 137 de 2019, la cual se regirá por las cláusulas descritas a continuación, previas las siguientes consideraciones: 1). Que entre el FONDO y EL CONTRATISTA, se suscribió el contrato de obra pública No 137 de 2019 cuyo objeto es: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES". 2). Que el valor del contrato se pactó por la suma de CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$ 5.437.884.572) MCTE., incluido el IVA e impuestos a que haya lugar. 3). Que el plazo de ejecución del contrato se pactó por el término de SIETE (7) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución. 4). Que el día 24 de marzo de 2020, se suscribió otro(s) modificatorio al contrato de obra pública N° 137 de 2019, en el sentido de modificar en los documentos técnicos

Alcaldía Local de Los Mártires.
Calle 19 No. 28-80
Calima Centro Comercial
Piso 7 Torre Administrativa
Tel. 3759531 - 3511577

BOGOTÁ
SECRETARÍA DE GOBIERNO

1254

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO-137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

PRORROGA Y ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 137 - 2019 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES Y CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CON & CON SAS

y de ejecución del proceso el personal profesional requerido. 5). Que a través del Decreto 090 de 2020 se limitó totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio del Distrito desde el día 19 de marzo del presente año, lo que motivó la suspensión de actividades del contrato desde ese mismo 19 de marzo y que a su vez, el día 24 de marzo de 2020, a través de la plataforma SECOP II, se suspendiera el contrato de obra pública 137 de 2019 "por un (1) mes a partir del 24 de marzo de 2020 inclusive, es decir, se reinicia a partir del 24 de abril de 2020, y poder continuar con la ejecución del mismo, en este plazo se podrá reiniciar o prorrogar, esto depende la duración del estado de emergencia económica, social y ecológica derivada de la pandemia covid-19, en razón a la expedición del decreto 081 de 2020 por el cual "se adoptan medidas sanitarias y acciones transitorias de policía para la preservación de la vida y mitigación del riesgo con ocasión de la situación epidemiológica causada por el coronavirus (covid-19) en Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones" adoptando las medidas con el objeto de garantizar la vida y la salud de los habitantes de Bogotá D.C. y en concordancia el decreto 457 de fecha 22 de marzo de 2020, emitido por el ministerio del interior". 6). Que mediante oficio del 25 de septiembre de 2020, EL CONTRATISTA solicitó a la sociedad MIRS LATINOAMERICA S.A.S., prórroga y adición del contrato de obra pública 137 de 2019 con sustento en lo siguiente:

"Una vez evaluado y analizado el presupuesto de obra general, con base en los diseños debidamente aprobados por MIRS LATINOAMERICA S.A.S como Interventor de este contrato, se determina que los recursos presupuestados para la ejecución del contrato de obra 137 de 2019 con el Fondo de Desarrollo de Los Mártires – FDLM no son suficientes para lograr la meta física prevista para la terminación de los CIVs priorizados y seleccionados por parte del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires de acuerdo al correo enviado por parte del Arquitecto Jaime Villalba como Apoyo a la Supervisión el 14 de agosto de 2020 y ajustados en reunión del día 3 de septiembre de 2020 en las oficinas del FDLM.

A pesar de ser un contrato a monto agotable, se ha realizado un análisis de cada uno de los CIVs previstos con el objeto de que la intervención garantice la terminación de estos segmentos viales cumpliendo con las especificaciones y condiciones técnicas requeridas.

SEGMENTOS ESTABLECIDOS PARA INTERVENCIÓN

Nº	CIV	KM	DIRECC	VASTA	ILUMINADO	UPZ	BANDEO	TIPO DE INTERVENCIÓN	TIPOLOGÍA	TIPO DE PAVIMENTO
1	14001469	CL 1F	KR 24A	KR 24B	CALZADA	SANTA ISABEL	EL VERDEZ	REHABILITACIÓN	INTERMEDIA	FLEXIBLE
2	14001481	CL 1F	KR 24	KR 24A	CALZADA	SANTA ISABEL	EL VERDEZ	REHABILITACIÓN	INTERMEDIA	FLEXIBLE
3	14000772	KR 25A	AC 6	CL 6BIS	CALZADA	LA SABANA	RECALARTE	REHABILITACIÓN	LOCAL	RIEGO
4	14000741	KR 25A	CL 6BIS	CL 6A	CALZADA	LA SABANA	RECALARTE	REHABILITACIÓN	LOCAL	RIEGO
5	14000718	KR 25A	CL 6A	CL 7	CALZADA	LA SABANA	RECALARTE	REHABILITACIÓN	LOCAL	RIEGO
6	14001678	KR 25A	CL 7	CL 7BIS	CALZADA	LA SABANA	RECALARTE	REHABILITACIÓN	LOCAL	RIEGO
7	14001545	CL 1A2B	AC 1	KR 26	CALZADA	SANTA ISABEL	SANTA ISABEL SUR	REHABILITACIÓN	INTERMEDIA	FLEXIBLE
8	14001517	KR 26	CL 1ABIS	CL 1B	CALZADA	SANTA ISABEL	SANTA ISABEL SUR	REHABILITACIÓN	INTERMEDIA	FLEXIBLE
9	14001156	CL 2B	KR 25A	KR 26	CALZADA	SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	REHABILITACIÓN	LOCAL	FLEXIBLE
10	14001387	CL 1B	KR 27A	KR 28	CALZADA	LA SABANA	SANTA ISABEL	REHABILITACIÓN	INTERMEDIA	FLEXIBLE
11	14000126	KR 24	CL 22A	CG 22B BIS	CALZADA	LA SABANA	SAMPER MENDOZA	REHABILITACIÓN	LOCAL	FLEXIBLE
12	14001306	KR 1B	CL 2A	CL 1	CALZADA	SANTA ISABEL	EDUARDO SANTOS	REHABILITACIÓN	LOCAL	FLEXIBLE
13	14001619	CL 1C	KR 19A	KR 19BIS	CALZADA	SANTA ISABEL	EDUARDO SANTOS	REHABILITACIÓN	LOCAL	FLEXIBLE
14	14000666	CL 1C	KR 19BIS	KR 19C	CALZADA	SANTA ISABEL	EDUARDO SANTOS	REHABILITACIÓN	LOCAL	FLEXIBLE
15	14001058	KR 26	CL 2C	CL 3	CALZADA	SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	REHABILITACIÓN	INTERMEDIA	FLEXIBLE

Alcaldía Local de Los Mártires.
Calle 19 No. 28-80
Calima Centro Comercial
Piso 7 Torre Administrativa
Tel. 3759531 - 3511577

BOGOTÁ
SECRETARÍA DE GOBIERNO

1255

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO-137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

PRORROGA Y ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 137 - 2019 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES Y CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CON & CON SAS

De igual manera, es importante realizar una intervención integral a las calzadas de estos CIVs, ya que, de acuerdo con los diagnósticos elaborados y aprobados por la Interventoría, se ha determinado el cambio de tipo de intervención al requerirse rehabilitación en lugar de lo previsto en los estudios previos que correspondía a mantenimiento.

Esta situación se presenta debido a las malas condiciones actuales de las estructuras de los CIVs priorizados, que sumado a la presencia de rutas de SITP y al incremento de los flujos vehiculares han causado mayor deterioro y obligan a construir estructuras acordes a los nuevos requerimientos, con mayores y mejores especificaciones que garanticen la estabilidad de los mismos y permita ofrecer a los usuarios vías en perfectas condiciones.

Adicionalmente y de acuerdo con las exigencias de la Empresa de Acueducto de Bogotá – EAB, se deben también intervenir las redes húmedas, ya que las actuales datan de muchos años, se encuentran en materiales que no se ajustan a las normas técnicas vigentes y tampoco permiten garantizar la estabilidad de cualquier tipo de intervención que se requiera efectuar (con base en la ley 1682 de 2013), que se traduce en la necesidad de una mayor inversión para la terminación total de cada CIV.

Debido a que se tienen diseños de CIVs de contratos anteriores suministrados por parte del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires – FOLM, sumado al requerimiento de las comunidades afectadas, se contemplan para la intervención estos segmentos viales, por el estado actual de los mismos, y se hace necesario una inversión adicional que permita entregar obras de calidad y con la estabilidad requerida. Lo anterior, previniendo la inclusión de uno o varios segmentos dentro del Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales, como lo ordena la Ley N° 2020 del 17 de julio de 2020.

CIVs ADICIONALES CONTRATO CO-137-2019

Nº	CIV	PK	EIE	DESDE	HASTA	ELEMENTO	LONGITUD (KM)	INTERVENCIÓN REAL
1	14000131	72474	CL 22C	KR 20	KR 22	ANDEN	0,08	REHABILITACIÓN
2	14000178	183819	CL 22A	KR 19A	KR 19B	CALZADA	0,05	REHABILITACIÓN
3	14000206	72426	CL 22A	KR 18B	AK 19	ANDEN	0,11	REHABILITACIÓN
4	14000233	183801	CL 22	KR 18B	AK 19	CALZADA	0,10	REHABILITACIÓN
5	14000266	183679	KR 18	CL 22A	CL 22C BIS	CALZADA	0,02	REHABILITACIÓN
6	14001098	182856	CL 1D BIS	KR 29B	KR 30	CALZADA	0,10	REHABILITACIÓN
7	14000425	72013	KR 21	CL 14	CL 15	ANDEN	0,10	REHABILITACIÓN
8	14000440	72011	KR 21	CL 13A	CL 14	ANDEN	0,04	REHABILITACIÓN
9	14000463	72009	KR 21	AC 13	CL 13A	ANDEN	0,04	REHABILITACIÓN
10	14000615	183438	CL 12	KR 19	KR 19A	CALZADA	0,08	REHABILITACIÓN

Una vez elaborado el presupuesto de obra contractual con respecto a las cantidades reales de ejecución en cada uno de los CIV's, se ha determinado que los recursos apropiados por el Fondo de Desarrollo de Los Mártires no son suficientes para el cumplimiento del alcance real y total del proyecto lo cual se plasmó en las memorias de cálculo presentadas como soporte del presupuesto de obra final ajustado, con cada uno de los ítems contractuales e ítems no previstos.

Alcaldía Local de Los Mártires.
Calle 10 No. 28-80
Calima Centro Comercial
Piso 7 Torre Administrativa
Tel. 3759531 - 3511577

BOGOTÁ SECRETARÍA DE GOBIERNO

1256

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

**PRORROGA Y ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 137 - 2019 SUSCRITO
ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES Y CONSULTORIA Y
CONSTRUCCION CON & CON SAS**

Se ha previsto también en este adicional los valores requeridos para la implementación de los protocolos de bioseguridad debidamente aprobados por la interventoría y la ARL AXXA Colpatría.

Se deja constancia que de los segmentos viales contractuales contemplados en los estudios previos (Anexo Técnico), se excluyeron por la Intervención de terceros los siguientes CIVs:

SEGMENTOS VIALES EXCLUIDOS POR INTERVENCIÓN DE TERCEROS

Nº	CIV	DE	DESDE	HASTA	ELEMENTO	UPZ	BARRIO	TIPO DE INTERVENCIÓN	TIPOLOGÍA
1	1-4001265	KM 25	CL 2	CL 2A	CALZADA	SANTA ISABEL	EL VERGEL	MANTENIMIENTO	INTERMEDIA
2	1-4001565	CL 12	KR 20A	KR 21	CALZADA	LA SABANA	LA SABANA	REHABILITACIÓN	INTERMEDIA
3	1-4002573	CL 12	KR 20	KR 20A	CALZADA	LA SABANA	LA SABANA	REHABILITACIÓN	INTERMEDIA
4	1-4002590	CL 12A	KR 20	KR 21	CALZADA	LA SABANA	LA SABANA	MANTENIMIENTO	LOCAL

Como complemento a la solicitud de adición de los recursos que se necesitan para darle cumplimiento al alcance total del proyecto se debe tener en cuenta el plazo necesario para cumplir con estas actividades adicionales. Se debe prever un Plazo adicional que garantice la ejecución de las obras previstas y sus complementarias, por lo que solicitamos se prorrogue el contrato en un término de DOS (2) MESES con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las Obras contractuales como adicionales.

Teniendo en cuenta todas las condiciones y especificaciones técnicas requeridas se elaboró el presupuesto de obra con el soporte de las memorias de Cálculo para cada ítem, en cada uno de los segmentos a intervenir como soporte de esta solicitud, teniendo como objetivo llegar al alcance final de los mismos con base en los diseños aprobados. De igual manera se prevé que en este periodo de ejecución se apoye de manera efectiva la reactivación económica tanto de la localidad como de la ciudad.

El balance de los CIV's a intervenir es el siguiente:

1164
1257

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO-137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	



PRORROGA Y ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 137 - 2019 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES Y CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CON & CON SAS

INVERSION TOTAL POR SEGMENTOS INTERVENIDOS

DESCRIPCION		VALOR
COSTO DIRECTO SEGMENTOS INICIALES DEL CONTRATO		\$ 3.878.772.615
COSTO DIRECTO SEGMENTOS ADICIONALES		\$ 1.450.681.682
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 5.329.454.297
A.I.U.	30,89%	\$ 1.646.268.432
TOTAL COSTOS OBRAS		\$ 6.975.722.729
COMPONENTE AMBIENTAL-SST	2,96%	\$ 206.237.965
COMPONENTE SOCIAL	2,72%	\$ 189.706.577
MANEJO DE TRAFICO	1,23%	\$ 85.607.500
TOTAL OBRAS		\$ 7.457.274.869
COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO	0,41%	\$ 30.501.751
COSTO ESTIMADO DE AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (F) (INCLUYE IVA)		\$ 337.110.102
VALOR TOTAL SIN AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES =		\$ 7.824.976.722
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS	2,60%	\$ 208.144.381
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		\$ 8.033.121.103
PROTOCOLO BIOSEGURIDAD - TRANSPORTE SEGURO (CONSIDERANDO 5 FRENTES DE OBRA)		\$ 250.000.000
COSTO TOTAL DEL PROYECTO + PROTOCOLOS		\$ 8.283.121.103

De acuerdo con esta información, para lograr el alcance total del contrato CO-137-2019 cuyo objeto es CONTRATAR PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, se requiere un valor de OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL CIENTO TRES PESOS (\$8.283.121.103) MONEDA LEGAL.

De igual manera y de acuerdo con los protocolos de bioseguridad aprobados se incluye en el valor de la adición la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$250.000.000) MONEDA LEGAL para la implementación y cumplimiento del protocolo de bioseguridad (según anexo), aprobado tanto por la interventoría como ARL AXXA COLPA TRIA."

Alcaldía Local de Los Mártires.
Calle 19 No. 28-80
Callema Centro Comercial
Piso 7 Torre Administrativa
Tel. 3750531 - 3511577

BOGOTÁ
SECRETARÍA DE
GOBIERNO

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. (SECRETARÍA DE GOBIERNO) Alcalde Local de Los Mártires
CONTRATO CO-137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

PRORROGA Y ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 137 - 2019 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES Y CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CON & CON SAS

7). Que mediante Oficio No. 20206410039432, la sociedad MIRS LATINOAMERICA S.A.S. (interventora), avaló la prórroga y adición del contrato de obra pública No. 137 de 2019 solicitada por EL CONTRATISTA. 8). Que mediante formato de modificación contractual y anexos, el apoyo a la supervisión solicitó prorrogar y adicionar el Contrato de Obra No. 137 de 2019 en los siguientes términos: "(...) solicito la aprobación de la ADICION PRESUPUESTAL No.1 del CONTRATO No 137 de 2019, por un valor de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$2.845.236.531) y la PRORROGA No.1, por un periodo de DOS (2) MESES para culminar con las actividades de ejecución de contrato en mención y modificación del mismo para agregar la cláusula Clausula 29 - Vinculación de personal que reside en la Localidad, teniendo como fecha final de ejecución el día 20 de marzo del 2021.". 5). Que el documento anteriormente relacionado que justifica la prórroga y adición No. 1 del Contrato de Obra No. 137 de 2019, forma parte integral de la presente modificación contractual. Que con fundamento en lo anteriormente expuesto las partes acuerdan: **CLAUSULA PRIMERA:** PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de Obra No. 137 de 2019, por el término de DOS (02) MESES, con nueva fecha de terminación incluido suspensión y prórroga el día VEINTE (20) de marzo de 2021. **CLAUSULA SEGUNDA:** ADICIONAR al valor del Contrato de Obra No. 137 de 2019 la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$2.845.236.531), los cuales se pagarán en la forma dispuesta en la cláusula séptima del contrato. **CLAUSULA TERCERA:** MODIFICAR el contrato de obra 137 de 2019 para agregar la siguiente cláusula: "**CLAUSULA 29 - VINCULACIÓN DE PERSONAL QUE RESIDA EN LA LOCALIDAD:** El Contratista se compromete a dar prioridad a mujeres y hombre que residan en la localidad de Los Mártires, dentro de la contratación de su personal de trabajo relacionado con mano de obra no calificada.". **CLAUSULA CUARTA:** EL CONTRATISTA se obliga a ampliar la vigencia de las garantías del contrato en los términos del presente documento. **CLAUSULA QUINTA:** La presente modificación se entiende perfeccionada con la aceptación que corresponde a la firma electrónica de las partes a través de la plataforma del SECOP II. **CLAUSULA SEXTA:** Las demás condiciones y obligaciones del Contrato de Obra No. 137 de 2019, se mantienen sin modificación alguna.

Elaboró: Ricardo Casas Iregui, Abogado FDL.
Revisó: Efraín Barros, Abogado de Despacho.
Aprobó: Tatiana Piñeros, Alcaldesa Local (E) de Los Mártires.

Alcaldía Local de Los Mártires,
Calle 19 No. 28-80
Calima Centro Comercial
Piso 7 Torre Administrativa
Tel. 3758531 - 3511577

BOGOTÁ
SECRETARÍA DE GOBIERNO

1105
1259

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO Alcaldía Local de Los Mártires
CONTRATO CO-137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

A continuación se presenta la prorroga No.02:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

PRORROGA No. 2 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 137 - 2019 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES Y CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. - CON & CON S.A.S.

No. Contrato	CO-137-2019
Objeto	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES
Contratista	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S - CON & CON S.A.S. NIT: 830.041.411-0
Valor inicial	\$ 5.437.884.572
Plazo de ejecución inicial	Siete (7) meses
Fecha de Inicio	25 de febrero de 2020
Fecha de Terminación Inicial	24 de septiembre de 2020
Adiciones	Adición No. 1: \$ 2.845.236.531
Promogas	Prórroga No. 1: Dos (02) meses
Suspensiones	Suspensión No. 1 de fecha 24 de marzo de 2020 Suspensión No. 2 de fecha 28 de noviembre de 2020 Suspensión No. 3 de fecha 31 de marzo de 2020
Reinicios	Reinicio No. 1 de fecha 21 de julio de 2020 Reinicio No. 2 de 28 de diciembre de 2020 Reinicio No. 3 de 29 de Junio de 2021
Plazo de ejecución final incluidas promogas	Once (11) meses
Valor total incluido adiciones	\$ 8.283.121.103
Fecha de Terminación Incluida Suspensiones y prórogas	Diecisiete (17) de septiembre de 2021.

Entre los suscritos a saber, TATIANA PIÑEROS LAVERDE, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía No 1.018.503.593 de Bogotá, quien actúa en su condición de Alcaldesa Local (E) de Los Mártires, y como tal ordenadora del Gasto del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES, cargo para el cual fue nombrada mediante Decreto No. 118 del 16 de abril de 2020 y Acta de posesión No. 112 del 20 de abril de 2020, con capacidad jurídica para suscribir el presente documento en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Distrital No. 374 de 2019 y demás disposiciones legales vigentes, quien en adelante y para los efectos del presente documento se denominará EL FONDO y JUAN PABLO RICCI RUIZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.417.377, quien obra en nombre y representación legal de la sociedad CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. - CON & CON S.A.S., identificada con NIT 830.041.411-0, quien para los efectos de este contrato se ha denominado como EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la prorroga No. 2 al contrato de obra pública

Alcaldía Local de Los Mártires.
Calle 19 No. 28-80
Callema Centro Comercial
Piso 7 Torre Administrativa
Tel. 3759531 - 3511577

BOGOTÁ  SECRETARÍA DE
GOBIERNO

1260

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO-137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

PRORROGA No. 2 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 137 - 2019 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES Y CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. - CON & CON S.A.S.

No 137 de 2019, la cual se registró por las cláusulas descritas a continuación, previas las siguientes consideraciones: 1). Que entre el FONDO y EL CONTRATISTA, se suscribió el contrato de obra pública No 137 de 2019 cuyo objeto es: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES". 2). Que el valor del contrato se pactó por la suma de CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$ 5.437.884.572) MCTE., incluido el IVA e impuestos a que haya lugar. 3). Que el plazo de ejecución del contrato se pactó por el término de SIETE (7) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución. 4). Que el día 24 de marzo de 2020, se suscribió otro si modificatorio al contrato de obra pública N° 137 de 2019, en el sentido de modificar en los documentos técnicos y de ejecución del proceso el personal profesional requerido. 5). Que por cuenta de las restricciones de la pandemia del COVID-19 se suspendió la ejecución del contrato desde el 19 de marzo y a su vez el día 24 de marzo de 2020 a través de la plataforma SECOP II. 6). Que el 21 de julio de 2020 se reinició el contrato de obra pública 137 de 2019 través de la plataforma SECOP II. 7) Que el 18 de noviembre de 2020, se suscribió la Prórroga y Adición No. 1 del Contrato de Obra Pública 137 de 2019, por la cual se amplió el plazo de ejecución del contrato en dos (02) meses y se adicionó el valor del mismo en la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$2.845.236.531), de igual manera se modificó el contrato agregando una nueva cláusula (cláusula 29) al mismo. 8). Que el 28 de noviembre de 2020 se suspendió el 28 de noviembre de 2020 por el término de VEINTITRÉS (23) días, hasta el 20 de diciembre de 2020. 9). Que el 28 de diciembre de 2020 se reinició la ejecución del contrato a través de la plataforma SECOP II. 10). Que el apoyo a la supervisión del contrato de obra No. 137 de 2019, mediante formato de modificación contractual solicitó la Suspensión del Contrato la cual fue suscrita a través de la plataforma transaccional SECOP II el 3 de fecha 31 de marzo de 2020. 11) Que cumplido el plazo de suspensión del contrato el Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires procedió a realizar el evento de reactivación, no obstante, EL CONTRATISTA solicitó la ampliación de la suspensión dos (02) oportunidades, argumentando situaciones que impedían la ejecución del contrato relacionadas con problemas de orden público. 12). Que el día 29 de junio de 2021 las partes suscribieron a través de la plataforma SECOP II reactivación del contrato. 13). Que el contratista mediante oficio C&C-CO-137-2019-078, expuso las siguientes justificaciones para la solicitud de prórroga al contrato de obra 137 de 2019:

"Una vez evaluada y analizada la ejecución de la obra en general, se determina que esta se ha visto afectada por situaciones que no son inherentes ni atribuibles a las actividades en Obra.

En gran parte de los dos (2) meses prorrogados al contrato no ha sido posible realizar las actividades acorde a lo programado. En el CIV 14000126 (KR 24 entre CL y DG 228 BIS), aun cuando el PMT contemplaba el cierre total del tramo y se programaron las obras en la totalidad de la calzada, los residentes y los comerciantes del sector no permitían iniciar obras con el cierre total del tramo por lo que en reunión del 3 de diciembre de 2020, con la participación de la Alcaldesa Local de la localidad Dra Tatiana Piñeros Laverde, interventoria y contratista, se acordó realizar las obras en este tramo con cierre parcial de la calzada, lo que conllevó a unos menores rendimientos.

Alcaldía Local de Los Mártires
Calle 19 No. 28-80
Calles Centro Comercial
Piso 7 Torre Administrativa
Tel 3750531 - 3511577

 **BOGOTÁ**
SECRETARÍA DE
GOBIERNO

T163
126

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	



PRORROGA No. 2 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 137 - 2019 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES Y CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. - CON & CON S.A.S.

En ese mismo sentido, en los dos (2) meses prorrogados al contrato se han presentado periodos atípicos en los que no se pudieron realizar los cálculos de los aforos y modelaciones requeridas por la SDM, lo que conllevó a que se tuvieran que realizar aforos y modelaciones no contempladas inicialmente en la primera prórroga y que se reflejan en mayores plazos en la aprobación de los PMTs para los CIVs 14001546 (CL IABIS entre AC y KR 26) y 14001517 (KR 26 entre CL IABIS y CL IB) por lo que no se pudieron iniciar obras en estos segmentos viales en las fechas iniciales previstas, los cuales a la fecha ya tienen aprobados los PMT. De igual forma para el CIV 14001098 (CL IDBIS entre KR 29BB y A V NQS) se aprobó por parte de la SDM el día 4 de marzo de 2021 con COI No. 09

(...)
No obstante, el contrato estableció la exigencia al ejecutor de TRES (3) FRENTES DE OBRA, con los cuales se realizó la propuesta y suscripción del contrato por lo que se previeron los profesionales técnicos, ambiental, SST, personal para implementar los respectivos PMT, vehículos y equipos necesarios para tener 3 frentes de obra activos al tiempo por lo que, si se abrieran nuevos frentes de obra, se superaría la capacidad técnica y logística.

Así las cosas, considerando las situaciones o circunstancias que se han dado en la ejecución de las obras en estos últimos dos meses y teniendo en cuenta que el plazo del contrato pendiente, se aprecia no es suficiente para ejecutar la totalidad de los tramos que se tienen previstos, ya que iniciar la ejecución de nuevos frentes de obra sin tener la plena seguridad de que sean finalizados en el plazo restante, sería perjudicial tanto para los residentes y los comerciantes de estos sectores como para la Administración, interventoría y contratista, especialmente porque en el Informe de Predicción Climática a Corto Mediano y Largo Plazo 1 publicado el 19 de febrero de 2021 por el IDEAM indican que las precipitaciones en el mes de marzo de 2021 pueden superar entre el 40% y el 70% los valores normales y para los meses de abril y mayo de 2021 pueden superar entre el 45% y el 70%.

(...)

Todas estas situaciones o circunstancias han incidido y están incidiendo en la ejecución del contrato por lo que consideramos que para terminar la totalidad de las cantidades contratadas se requiere de un plazo adicional de noventa (90) días por lo cual solicitamos se haga una prórroga del contrato en el tiempo indicado."

14). Que la interventoría del contrato mediante oficio del 30 de junio de 2021 con radicado de la Alcaldía Local de Los Mártires No. 2021-641-003385-2, con asunto "ALCANCE AL AVAL A SOLICITUD DE PRORROGA N°. 2, SOLICITA por el contratista dentro de la EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CO-137-2019. (R No 2021-641-001347-2)", dio alcance al aval dado para el trámite de la modificación en el siguiente sentido: "Dada la revisión y aprobación de esta interventoría, se estima en una prórroga de DOS (2) meses al plazo contractual previsto, contados a partir de la fecha de terminación del mismo. Espacio de tiempo en cual se realizarán las obras priorizadas restantes. Las demás cláusulas no requieren modificación". Que la prórroga del contrato de Obra 137 de 2019 se fundamenta en hechos o circunstancias sobrevenientes

Alcaldía Local de Los Mártires
Calle 19 No. 28-80
Calima Centro Comercial
Piso 7 Torre Administrativa
Tel. 3759531 - 3511577

BOGOTÁ  **SECRETARÍA DE GOBIERNO**

1189
1262

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

PRORROGA No. 2 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 137 - 2019 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES Y CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. - CON & CON S.A.S.

relacionadas con las obligaciones adquiridas por el contratista, lo cual determina la necesidad apremiante de prorrogar el contrato para efectos de garantizar la terminación de los tramos viales. De conformidad con lo anterior las partes acuerdan: **CLAUSULA PRIMERA:** PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de obra pública No. 137 de 2019, por el término de DOS (2) MESES, con nueva fecha de terminación el día diecisiete (17) de septiembre de 2021. **CLÁUSULA SEGUNDA:** El contratista se obliga a ampliar la vigencia de las garantías del contrato en los términos del presente documento. **CLAUSULA TERCERO:** La presente modificación se entiende perfeccionada con la aceptación que corresponde a la firma electrónica de las partes a través de la plataforma del SECOP II. **CLAUSULA CUARTA:** Las demás condiciones y obligaciones del contrato de obra pública No. 137 de 2019, se mantienen sin modificación alguna.

*Elaboró: Renne Romero Hernández. Abogado Contratación FDLM.
Revisó: Ricardo Casas. Abogado de Despacho.*

Alcaldía Local de Los Mártires.
Calle 19 No. 28-60
Calles Centro Comercial
Piso 7 Torre Administrativa
Tel. 3756531 - 3511577

BOGOTÁ  **SECRETARÍA DE
GOBIERNO**

1170
1265

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CONTRATO CO-137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

A continuación se presenta la prórroga No.03:



REACTIVACIÓN No. 4 - PRORROGA No. 3 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 137 - 2019 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES Y CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. - CON & CON

No. Contrato	CO-137-2019
Objeto	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES
Contratista	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S - CON & CON NIT: 830.041.411-0
Valor incluido adiciones	\$8.283.121.103.
Plazo de Ejecución	Siete (07) de agosto del 2022
Fecha de Inicio	25 de febrero de 2020.
Fecha de Terminación Inicial	24 de septiembre de 2020.
Otrosl	<u>Modificación</u> de fecha 24 de marzo de 2020 (aspectos técnicos - perfiles trabajadores).
Adiciones	<u>Adición No. 1</u> ; \$2.845.236.531 de fecha 18 nov/2020.
Prórrogas	<u>Prórroga No. 1</u> : Dos (02) meses de fecha 18 nov/2020 hasta el 20 de marzo 2021.
	<u>Prórroga No. 2</u> : Dos (02) meses de fecha 17 jul/2021 hasta el 17 de septiembre 2021.
Suspensiones	<u>Suspensión No. 1</u> de fecha 24 de marzo de 2020 (01 mes) reiniciándose el 24 abril 2020.
	<u>Suspensión No. 2</u> de fecha 28 de noviembre de 2020 Veintitrés (23) días, esto es desde el 28 de noviembre 2020 hasta el 20 de diciembre de 2020.
	<u>Suspensión No. 3</u> de fecha 31 de marzo de 2021 (30 días) hasta el 30 abril 2021.
	<u>Suspensión No. 4</u> de fecha 16 de septiembre de 2021 (30 días) hasta el 16 mayo de 2022.
Reinicios	<u>Reinicio No. 1</u> de fecha 21 de julio de 2020.
	<u>Reinicio No. 2</u> de 28 de diciembre de 2020 con fecha de terminación 12 de abril del 2021.
	<u>Reinicio No. 3</u> de 29 de junio de 2021 con fecha de terminación 18 de julio del 2021.
	<u>Reinicio No. 4</u> de 17 de mayo de 2022 con fecha de terminación 15 de septiembre del 2022.
Fecha de Terminación Incluida Suspensiones y prórroga	Hasta el quince (15) de septiembre del 2022.

Alcaldía Local de Los Mártires.
Calle 19 No. 23-80
Calles Centro Comercial
Piso 7 Torre Administrativa
Tel 3759531 - 3511577

 **BOGOTÁ** SECRETARÍA DE GOBIERNO

1264

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO-137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

REACTIVACIÓN No. 4 - PRORROGA No. 3 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 137 - 2019 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES Y CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. - CON & CON

Entre los suscritos a saber, JUAN RACHIF CABARCAS RAHMAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.026.560.118 expedida en Bogotá en calidad de Alcalde Local de Los Mártires actuando en nombre y representación del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires con NIT. 899.999.061.9 en uso de las facultades y funciones delegadas mediante decreto No. 342 del 15 de septiembre de 2021 y Acta de posesión No. 237 del 24 de septiembre de 2021, con capacidad jurídica para suscribir la presente Reinicio No. 4 y prórroga No. 3 en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Distrital No. 374 de 2019 y demás disposiciones legales vigentes, quien en adelante y para los efectos del presente documento se denominará EL FONDO y JUAN PABLO RICCI RUIZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.417.377, quien obra en nombre y representación legal de la sociedad CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. - CON & CON S.A.S., identificada con NIT 830.041.411-0, quien para los efectos de este contrato se ha denominado como EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir el Reinicio No. 4 y prórroga No. 3 al contrato FDLM-CO-137-2019, la cual se registrará por las cláusulas descritas a continuación, previas las siguientes consideraciones: 1). Que, entre el FONDO y EL CONTRATISTA, se suscribió el contrato FDLM-CO-137-2019 cuyo objeto es: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES". 2). Que, el valor del contrato se pactó por la suma de CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$ 5.437.884.572) MCTE., incluido el IVA e impuestos a que haya lugar. 3). Que el plazo de ejecución del contrato se pactó por el término de SIETE (7) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución. 4). Que, el día 24 de marzo de 2020, se suscribió otro(s) modificatorio al contrato de FDLM-CO-137-2019, en el sentido de modificar en los documentos técnicos y de ejecución del proceso el personal profesional requerido. 5). Que, por cuenta de las restricciones de la pandemia del COVID-19 se suspendió la ejecución del contrato desde el 19 de marzo y a su vez el día 24 de marzo de 2020 a través de la plataforma SECOP II. 6). Que, el 21 de julio de 2020 se reinició el contrato FDLM-CO-137-2019 a través de la plataforma SECOP II. 7) Que, el 18 de noviembre de 2020, se suscribió la Prórroga y Adición No. 1 del Contrato FDLM-CO-137-2019, por la cual se amplió el plazo de ejecución del contrato en dos (02) meses y adición al valor del mismo la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$2.845.236.531). 8). Que, el 28 de noviembre de 2020 se suspendió por el término de VEINTITRÉS (23) días, hasta el 20 de diciembre de 2020. 9). Que, el 28 de diciembre de 2020 se reinició la ejecución del contrato a través de la plataforma SECOP II. 10). Que, la interventoría del contrato FDLM-CO-137-2019, mediante modificación contractual solicitó la Suspensión del Contrato la cual fue suscrita a través de la plataforma transaccional SECOP II el 31 de marzo de 2021 hasta el 30 de abril del 2021. 11) Que, cumplido el plazo de suspensión del contrato el Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires procedió a realizar el evento de reactivación, no obstante, EL CONTRATISTA solicitó la ampliación de la suspensión en dos (02) oportunidades, argumentando situaciones que impedían la ejecución del contrato relacionadas con problemas de orden público. 12) Que, teniendo en cuenta los motivos técnicos, jurídicos y financieros expuestos por la interventoría del contrato, ejecutada por la firma MIRS LATINOAMERICA S.A.S y manifestado en el oficio bajo radicación C&C-CO137-2019-132 de fecha 6 de abril de 2022, y de entrada al CDI mediante Radicado No. 20226410019592 del 6 de abril de 2022 y el día 26 de abril de 2022 mediante el oficio bajo radicación 20226410022742 y Memorando Radicado con número 20226420001933

Alcaldía Local de Los Mártires
Calle 19 No. 28-80
Calles Centro Comercial
Piso 7 Torre Administrativa
Tel. 3753531 - 3511577

BOGOTÁ  **SECRETARÍA DE GOBIERNO**

422
1265

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

**REACTIVACIÓN No. 4 - PRORROGA No. 3 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 137 - 2019
SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES Y
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. - CON & CON**

del 17 de mayo 2022, donde manifiestas que no generará ningún costo para el Fondo de Desarrollo de Los Mártires, los costos adicionales al presupuesto del contrato por servicios de la interventoría; ya que serán asumidos por el contratista del contrato de obra No. 137 de 2019, teniendo en cuenta los motivos técnicos, jurídicos y financieros expuestos en lo manifestado en los oficios, por tal motivo se reiniciara el contrato el día 17 de mayo 2022 a través de la plataforma SECOP II, hasta el 15 de septiembre del 2022 13). Que, en atención a las circunstancias presentadas en el informe de interventoría y demás documentos que hacen parte integral del presente trámite, se solicita el levantamiento de la suspensión del Contrato FDLM-CO-137-2019, en ese sentido, las partes acordaron tramitar la reactivación del contrato, de la siguiente manera. **CLAUSULA PRIMERA: REACTIVAR** la ejecución del Contrato FDLM-CO-137-2019 y, en consecuencia: **CLAUSULA SEGUNDA - PRORROGAR:** Prorrogar el plazo de ejecución del contrato de obra pública FDLM-137-2019, desde el diecisiete (17) de mayo de 2022 hasta el quince (15) de septiembre del 2022. Conforme a ello, se entiende modificada la Clausula Cuarta del contrato, relativa al plazo de ejecución del negocio jurídico mencionado. **CLAUSULA TERCERA:** El contratista se obliga a ampliar la vigencia de las garantías del contrato en los términos del presente documento. **CLAUSULA CUARTA:** La presente modificación se entiende perfeccionada con la aceptación que corresponde a la firma electrónica de las partes a través de la plataforma del SECOP II. **CLAUSULA QUINTA:** Las demás condiciones y obligaciones del contrato FDLM-CO-137-2019, se mantienen sin modificación alguna.

*Elaboró: Alfonso Luis Montes O. Contratista Grupo Contratación FDLM
Revisó: Daniel Rastin Rodríguez. Contratista Grupo Contratación FDLM
Revisó: Freddy Páez - Especialista Grupo de Contratación FDLM
Revisó: Alberto Orozco Profesional de Despacho FDLM*

Alcaldía Local de Los Mártires.
Calle 19 No. 23-80
Cafema Centro Comercial
Piso 7 Torre Administrativa
Tel 3759531 3511577

BOGOTÁ  **SECRETARÍA DE
GOBIERNO**

1260

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO-137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

5 CONTRATOS SUSCRITOS

5.1 CONTRATO DE OBRA No. CO-137-2019

A continuación se presentan los detalles de forma acerca de la suscripción del contrato de obra CO-137-2019:

Entre el representante legal del **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES** en adelante la "Entidad", por una parte; y por la otra el representante legal de **CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CON & CON SAS** (en adelante el "Contratista") identificados como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta convinieron celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

I. Que mediante Resolución No. 220 del 20 de Noviembre de 2019 la Entidad abrió el Proceso de Contratación número selección FDLM-LP-134-2019 con el fin de: **"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"**.

II. Que mediante Resolución No. 280 del 23 de diciembre de 2019 la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la "Parte", conjuntamente las "Partes"), acordaron que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y de Comercio y las demás normas legales aplicables a la materia.

5.2 GARANTIAS Y VIGENCIAS

A continuación se presenta el resumen de las pólizas vigentes en el contrato de la referencia:

Tabla 6 RELACION DE POLIZAS

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA No. CO-137-2019	
COMPAÑÍA ASEGURADORA	EQUIDAD SEGUROS O.C.
POLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL No.	AA007885
OBJETO DE LA POLIZA:	
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CO-137-2019 CELEBRADO EN LA PLATAFORMA SECOP II CUYO OBJETO ES CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES.	
FECHA DE EXPEDICIÓN	27/08/2021

1267

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO-137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

COBERTURAS	INICIAL	FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/07/2021	17/02/2022	\$2,484,936,330.90
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	17/07/2021	17/02/2022	\$2,484,936,330.90
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL	17/07/2021	17/02/2024	\$828,312,110.30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	17/07/2021	17/02/2026	\$2,484,936,330.90

COMPAÑÍA ASEGURADORA	EQUIDAD SEGUROS O.C.		
POLIZA R.C.E ENTIDAD ESTATAL No.	AA007887		
OBJETO DE LA POLIZA:			
GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CO-137-2019 CELEBRADO EN LA PLATAFORMA SECOP II CUYO OBJETO ES CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES.			
FECHA DE EXPEDICIÓN	27/08/2021		
COBERTURAS	INICIAL	FINAL	VALOR ASEGURADO
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	17/07/2021	17/09/2021	\$438,901,500.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	17/07/2021	17/09/2021	\$43,890,150.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	17/07/2021	17/09/2021	\$43,890,150.00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	17/07/2021	17/09/2021	\$43,890,150.00

FUENTE: CON&CON SAS / CO-137-2019

En el presente Informe no se ha dado actualización a las pólizas de la reactivación No.4-Prorroga N°3, ya que aseguradora La equidad denegó la solicitud el día 23 de mayo 2022, solicitando Cito textualmente (...) "En la suspensión N°4 de la de la reactivación No.4-Prorroga N°3, se afirma que la suspensión duro 30 días lo cual no corresponde los días del 16 de Septiembre del 2021 al 16 de mayo del 2022 ".con lo anterior se dio traslado al Fondo de Desarrollo local de Martires el día 23 de mayo del 2022 para dar corrección a dicha inconsistencia.

El día 31 de Mayo del 2022, el Fondo de desarrollo local de martires-FDLM, envía mediante Radicado No.20226420363921, la corrección de los días que corresponden a la suspensión No.4.

La aseguradora la equidad denegó la solicitud el día 01 de Junio 2022, solicitando Cito textualmente (...) "1. Acta de interventoría que indique el estado del riesgo junto con el % de avance de ejecución de obras, 2. Acta que indique el estado del anticipo, si este ya fue amortizado, fechas y valores en que se hicieron las amortizaciones, si estaba en fiducia y ya fue amortizado, acta de terminación del contrato con la fiducia y/o paz y salvo de esta, 3. Copia del pagaré y su custodia y 4. Acta de cierre del proceso" con lo anterior se da traslado a la interventoría MIRS Latinoamérica S.A.S, el día 07 de Junio del 2022 y mediante el oficio MIRS-MAR-167-2019: RESPUESTA A CORREO

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

ELECTRÓNICO "SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS, el día 07 de junio dan respuesta ha dicha solicitud.

El día 14 de Junio del 2022 ,la aseguradora denegó la actualización, solicitando Cito textualmente (...) "cierre del proceso de siniestro" por lo anterior se dio traslado al Fondo de desarrollo local de martires- FDLM.

6 INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

6.1 ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

En la tabla 12 se muestra el plan detallado de la inversión del anticipo que fue aprobado por parte de la interventoría, en donde se observa que corresponde al 30% del valor total del contrato, es decir \$ 1.631.365.371,60.

El día 27 de diciembre del 2019 se celebró el contrato de fiducia mercantil irrevocable para la administración de los recursos recibidos a título de anticipo, entre Consultoría y Construcción Con&Con S.A.S y Alianza Fiduciaria S.A., denominado FIDEICOMISO CON & CON – MARTIRES 2, el cual para efectos legales se identificará con el Nit. 830.053.812-2.

La finalidad del contrato de fiducia mercantil se describe en los siguientes literales:

- La transferencia del Fideicomitente a la Fiduciaria de los recursos recibidos por concepto de anticipo, a título de fiducia mercantil. Estos recursos son girados directamente por parte de la entidad estatal a la fiduciaria.
- La administración de los recursos recibidos de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en el contrato.
- La realización de los giros ordenados por el Fideicomitente con la aprobación del Interventor y/o Supervisor del Contrato Estatal, siempre y cuando tales giros correspondan exclusivamente a los rubros previstos en el Plan de Utilización o de Inversión del Anticipo.
- La transferencia a la Entidad Estatal por parte de la Fiduciaria de los recursos entregados por concepto de Anticipo así como sus remanentes cuando la Entidad Estatal le notifiquen el acto administrativo en que se declare la terminación unilateral o anticipada del Contrato Estatal, la caducidad administrativa o la nulidad del Contrato Estatal.

6.1.1 GESTIÓN FINANCIERA

A continuación se muestra el resumen del manejo del anticipo, en donde a la fecha de presente informe ya fue invertido en su totalidad.

Tabla 7 GESTIÓN FINANCIERA

No.	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO INICIAL	OTRO SI No.1 PLAN DE INVERSIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO
1	ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 132.000.000,00	\$ 132.000.000,00	\$ 132.000.000,00	\$ 0,00
2	MATERIALES GRANULARES	\$ 191.000.000,00	\$ 191.000.000,00	\$ 191.000.000,00	\$ 0,00
3	ASFALTO	\$ 537.000.000,00	\$ 500.000.000,00	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00
4	CONCRETOS	\$ 260.000.000,00	\$ 250.000.000,00	\$ 250.000.000,00	\$ 0,00
5	EQUIPO Y TRANSPORTE	\$ 237.756.547,60	\$ 284.756.547,60	\$ 284.756.547,60	\$ 0,00
6	DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	\$ 140.000.000,00	\$ 140.000.000,00	\$ 140.000.000,00	\$ 0,00
TOTAL		\$ 1.497.756.547,60	\$ 1.497.756.547,60	\$ 1.497.756.547,60	\$ 0,00

1176
1269

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

6.1.2 PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Tabla 8 PLAN DETALLADO INVERSIÓN DEL ANTICIPO

VALOR DEL CONTRATO:		\$ 5.437.884.572,00
ANTICIPO:	30 % Del Valor del Contrato	\$ 1.631.365.371,60
(-) TOTAL DESCUENTOS		-\$ 133.608.824,00
VALOR NETO A GIRAR DEL ANTICIPO		\$ 1.497.756.547,60
1 ESTUDIOS Y DISEÑOS	8,8132%	\$ 132.000.000,00
Subtotal	8,8132%	\$ 132.000.000,00
2 MATERIALES GRANULARES	12,7524%	\$ 191.000.000,00
Subtotal	12,7524%	\$ 191.000.000,00
3 ASFALTO	35,8536%	\$ 537.000.000,00
Subtotal	35,8536%	\$ 537.000.000,00
4 CONCRETOS	17,3593%	\$ 260.000.000,00
Subtotal	17,3593%	\$ 260.000.000,00
5 EQUIPO Y TRANSPORTE	15,8742%	\$ 237.756.547,60
Subtotal	15,8742%	\$ 237.756.547,60
6 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	9,3473%	\$ 140.000.000,00
Subtotal	9,3473%	\$ 140.000.000,00
Total	100,00%	\$ 1.497.756.547,60

FUENTE: CON&CON SAS / CO-137-2019

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO-137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

7 PRESUPUESTO CONTRATO DE OBRA

Tabla 9 PREUPUESTO OFICIAL – OFERTA ECONOMICA

FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL - OFERTA ECONÓMICA						
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES						
OBJETO DE LA LICITACIÓN:		EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES				
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S -CON&CON						
COD IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO OFERTADO INCLUYE COSTOS INDIRECTOS	SUBTOTAL OFERTADO
	1,0	PRELIMINARES				
3007	1,01	REPLANTEO GENERAL	M2	12.508,00	\$ 724,00	\$ 9.055.792,00
3710	1,02	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	M3	8.723,00	\$ 5.801,00	\$ 50.602.123,00
3464	1,03	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.	M3	133,00	\$ 33.726,00	\$ 4.485.558,00
3021	1,07	DEMOLUCION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para espesores max. 0.15m	M2	18.985,00	\$ 6.495,00	\$ 123.307.575,00
3022	1,08	DEMOLUCION PISOS DE CONCRETO (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para espesores de 0.20m.	M3	113,00	\$ 51.178,00	\$ 5.783.114,00
3011	1,09	DEMOLUCION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	ML	3.027,00	\$ 4.863,00	\$ 14.720.301,00
3017	1,10	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distanda de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	9.811,00	\$ 31.044,00	\$ 304.572.684,00
	2,0	RELLENOS				
3800	2,01	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	11.083,00	\$ 1.431,00	\$ 15.859.773,00
3454	2,02	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación Manual)	M3	3.284,00	\$ 78.969,00	\$ 259.334.196,00
4357	2,04	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	1.847,00	\$ 141.021,00	\$ 260.465.787,00
3443	2,08	SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibracompactor)	M3	1.149,00	\$ 70.233,00	\$ 80.697.717,00
4021	2,10	GEOTEXTIL NT 4000 PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Suministro e Instalación)	M2	7.799,00	\$ 15.849,00	\$ 123.606.351,00
	3,0	PAVIMENTOS				
4203	3,01	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (cemento asfáltico 80-100) (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	739,00	\$ 856.174,00	\$ 632.712.586,00
4200	3,02	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con vibracompactor y compactador de llantas)	M3	575,00	\$ 761.142,00	\$ 437.656.650,00
4712	3,03	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	493,00	\$ 1.242.531,00	\$ 612.567.783,00
3864	3,05	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	12.828,00	\$ 2.185,00	\$ 28.029.180,00
6425	3,09	GEODREN VIAL H= 1.0m o DRENAFLEX PLANAR H= 1.0m, TUBERÍA DE 100mm (Incluye colocación base granular clase C, suministro y colocación geodren)	ML	29,00	\$ 90.503,00	\$ 2.624.587,00
	4,0	ESPACIO PUBLICO				
		ANDENES				
4047	4,08	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 1:5)	ML	26,00	\$ 51.300,00	\$ 1.333.800,00
4054	4,09	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	ML	842,00	\$ 62.917,00	\$ 52.976.114,00
4041	4,10	SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado, Inc. Sumin, Formalete y Const.)	ML	667,00	\$ 38.623,00	\$ 25.761.541,00
4088	4,12	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	ML	216,00	\$ 46.150,00	\$ 9.968.400,00
4544	4,13	SARDINEL PREFABRICADO ALTO RAMPAS A86 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)	ML	10,00	\$ 53.083,00	\$ 530.830,00
4052	4,14	SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	UN	11,00	\$ 44.786,00	\$ 492.646,00
3748	4,22	LOSA DE CONCRETO MR45 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)	M3	1.693,00	\$ 649.279,00	\$ 1.099.229.347,00
3706	4,23	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	1.847,00	\$ 3.805,00	\$ 7.027.835,00
3425	4,28	ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) PREMEZCLADO e=0.10m (Incluye Suministro, Formaleteo, Fundida y Curado)	M2	390,00	\$ 63.984,00	\$ 24.953.760,00

1773
1271

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

	5,0	ESTRUCTURAS PARA REDES					
4834	5,04	RELLENO CON GRAVA ENTRE 3/4" Y 1/2" PARA FILTROS (RELACION 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACION. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACION).	MB	10,00	\$	127.318,00	\$ 1.273.180,00
	6,0	REDES DE ACUEDUCTO					
5186	6,61	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4" x 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (Incluye tubería PF, registros y accesorios, longitud promedio de 6.5m, Incluye cajilla en polipropileno para medidor)	UN	51,00	\$	332.048,00	\$ 16.934.448,00
		DADOS Y ANCLAJES					
3910	6,62	CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO (Hecho en Obra)	MB	5,00	\$	501.068,00	\$ 2.505.440,00
3706	6,63	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	123,00	\$	3.835,00	\$ 468.015,00
	7,0	REDES DE ALCANTARILLADO					
3009	7,01	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)	MB	26,00	\$	33.726,00	\$ 876.876,00
3017	7,02	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	MB	26,00	\$	30.651,00	\$ 796.926,00
		RELLENOS					
4792	7,06	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e Instalación Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28 KM).	MB	21,00	\$	71.543,00	\$ 1.502.408,00
5412	7,07	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACION)	MB	5,00	\$	111.601,00	\$ 558.005,00
3024	7,08	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	MB	5,00	\$	116.274,00	\$ 581.370,00
		TUBERIAS					
3043	7,27	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	21,00	\$	60.960,00	\$ 1.280.160,00
3044	7,28	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	10,00	\$	85.956,00	\$ 859.560,00
3045	7,29	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	5,00	\$	123.216,00	\$ 616.080,00
		POZOS					
4553	7,37	POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACION). INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA, CONO PREFABRICADO, PLACA FONDO.	UN	4,00	\$	3.063.309,00	\$ 12.253.236,00
3473	7,38	PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin, Formateo, Ref. Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)	UN	8,00	\$	656.443,00	\$ 5.251.544,00
3722	7,39	NIVELACION DE POZO (Hasta resante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0.15m. Incluye Suministro y Construcción)	UN	4,00	\$	97.346,00	\$ 389.384,00
		SUMIDEROS					
4558	7,42	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	UN	15,00	\$	5.189.244,00	\$ 77.838.660,00
3155	7,44	DEMOLUCION SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Cargue)	UN	8,00	\$	171.550,00	\$ 1.372.400,00
		DADOS Y ANCLAJES					
3202	7,48	CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	MB	4,00	\$	495.493,00	\$ 1.981.836,00
3708	7,49	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	154,00	\$	3.805,00	\$ 585.970,00
	9,00	SEÑALIZACION, DEMARCACION Y SEMAFORIZACION					
		SEÑALIZACION HORIZONTAL					
4240	9,01	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12m (e=2.3mm, Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Incl. Microesferas)	ML	872,00	\$	16.721,00	\$ 14.580.712,00
4241	9,02	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12m (e=2.3mm, Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Incl. Microesfera)	ML	800,00	\$	15.721,00	\$ 13.376.800,00
4242	9,03	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.15m (e=2.3mm, Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Incl. Microesferas)	ML	5.747,00	\$	21.169,00	\$ 121.658.243,00
4248	9,05	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (e=2.3mm, Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Incl. Microesferas)	M2	883,00	\$	141.127,00	\$ 124.615.141,00
4569	9,07	ESTOPELOS DE 10cm x 2.5 cm. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	3.900,00	\$	6.282,00	\$ 24.499.800,00
4245	9,08	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (e=2.3mm, Termoplástica. Inc. Sumin. y Aplic. con Equipo. Incl. Microesferas). Marca Vial para velocidades menores o iguales a 60 Km/h Area de la Marca: 2.18m2	UN	8,00	\$	303.759,00	\$ 2.430.072,00
4246	9,09	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (e=2.3mm, Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Incl. Microesferas). Marca Vial para velocidades menores o iguales a 60 Km/h Area de la Marca: 1.20 m2.	UN	8,00	\$	167.207,00	\$ 1.337.656,00
4244	9,10	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (e=2.3mm, Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Incl. Microesferas). Marca Vial para velocidades menores o iguales a 60 Km/h Area de la Marca: 1.51m2	UN	8,00	\$	210.402,00	\$ 1.683.216,00

1272

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Oficina de Planeación y Desarrollo Urbano</small>
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

COSTO TOTAL OBRAS INCLUYE REDES Y COSTOS INDIRECTOS, APROXIMADA AL PESO (A) =		\$	4.620.463.163,00
COSTO ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SST (B)		\$	136.604.472,00
COSTO ACTIVIDADES SOCIALES (C)		\$	125.654.686,00
COSTO PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (D)		\$	56.703.337,00
TOTAL OBRAS LICITACION (A+B+C+D)		\$	4.939.425.658,00
COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO (E) (INCLUYE AJUSTES E IVA)		\$	20.262.855,00
COSTO ESTIMADO DE AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (F) (INCLUYE IVA)		\$	337.110.102,00
VALOR TOTAL SIN AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (VALOR EVALUABLE) = A+B+C+D+E+F		\$	5.296.798.615,00
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (SOLO OBRA), INCLUYE COSTOS INDIRECTOS (G)		\$	141.085.957,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO APROXIMADO AL PESO = A+B+C+D+E+F+G		\$	5.437.884.572,00

VALOR TOTAL EN LETRAS:

NOTA 1: Las cantidades son estimadas, la ejecución final de las mismas dependerá de los diagnósticos, diseños y de la ejecución final. El valor del contrato y de la oferta incluyendo provisión para ajustes, obras complementarias y/o adicionales debe ser igual al valor del presupuesto oficial ya que el contrato se ejecuta a monto agotable (cualquier valor menor será tomado como propuesta parcial para todos los efectos, igualmente el cambio de descripción de los ítems, de las cantidades o de las unidades de medida).

NOTA 2: Los precios unitarios no deberán sobrepasar los precios tope utilizados por la Entidad (que fueron tomados de precios de referencia IDU), so pena de rechazo. Las fórmulas del formato son una guía, cada proponente será responsable de la edición de fórmulas y de los datos con que diligencia el formato. Por lo tanto no podrá endigar a la entidad supuestas inducciones a error. Igualmente debe tener en cuenta que los valores oficiales son una guía que no compromete a la Administración ni al proponente.

NOTA 3: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO de las obras se le adicionó el valor de los costos indirectos

NOTA 4: El precio unitario más costos indirectos se calculará con dos decimales. Las cantidades se deben trabajar con todos los decimales que aparecen en este cuadro (incluyendo decimales ocultos). El valor total del presupuesto se aproximará al peso: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 5: El A.I.U. y su discriminación deben estar en porcentaje (%), con dos decimales porcentuales.

NOTA 6: El reconocimiento económico de los costos para actividades ambientales y SST, sociales y plan de manejo de tráfico serán reconocidos al precio ofertado por el proponente que no podrá ser mayor al valor oficial y se pagará proporcionalmente al avance financiero de la obra calculado sobre los costos directos de obra pagados. Los ensayos de laboratorio se pagarán por reembolso de gastos, los ajustes a diseños se pagarán al precio ofertado por el proponente que no podrá ser mayor al valor oficial y se pagarán proporcionalmente al costo directo de las obras, pero sólo para aquellos segmentos que requieran dichos ajustes. Los costos indirectos que no hacen parte del A (impuestos y contribuciones y garantías, se cotizan en el formato adjunto, que hace parte integral de este Formulario 1, y se pagarán igualmente por reembolso de gastos, proporcionalmente al avance financiero de los costos directos de la obra.

NOTA 7: La provisión para ajustes, obras complementarias o adicionales, podrán ser utilizados dentro de las mismas segmentos viales u otras obras que requiera la Administración durante la ejecución, como parcheos u otras obras que requiera la comunidad. El valor ofertado no podrá ser menor que el valor oficial.

DESCRIPCION PORCENTAJE

A + COSTOS DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GARANTÍAS 22,83%

I= 1,00%

U= 7,00%

A.I.U.= 30,83%

Las notas de este formulario primarán sobre cualquier otra estipulación de los pliegos de condiciones o sus documentos anexos, teniendo en cuenta que son reglas específicas para el diligenciamiento de este

FIRMA 
 Juan Pablo Ricci Ruiz
 Consultor y Construcción S.A.S CON & CON

FUENTE: CON&CON SAS / CO-137-2019

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO-137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

Se muestra el presupuesto inicial que se obtuvo de acuerdo a los diseños de pavimentos aprobados y a las solicitudes de la EAAB, en cuanto a la adecuación y/o renovación de las redes de acueducto y alcantarillado.

Tabla 10 PRESUPUESTO INICIAL DEL CONTRATO CO-137-2019

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			CANTIDADES TOTALES	VALORES TOTALES
	DESCRIPCIÓN	UNID.	PRECIO UNIT.		
101	REPLANTEO GENERAL	M2	\$ 553	7.176,84	\$ 3.953.792
102	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	M3	\$ 4.432	7.053,55	\$ 31.058.343
103	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN Incluye cargue.	M3	\$ 25.767	2.627,31	\$ 67.697.897
107	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para espesores max. 0.15m	M2	\$ 4.963	5.791,40	\$ 28.742.718
109	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	ML	\$ 3.715	1.502,80	\$ 5.579.939
110	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente	M3	\$ 23.718	13.832,39	\$ 328.262.442
201	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	M2	\$ 1.093	7.177,49	\$ 7.844.823
204	SUBBASE GRANULAR B-209 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibracompactor)	M3	\$ 53.859	853,71	\$ 46.614.110
303	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	\$ 948.294	947,16	\$ 899.137.192
305	IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA CBL-0 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	\$ 1.659	13.629,26	\$ 22.847.275
309	GEODREN VIAL H= 1.0m o DRENAFLEX PLANAR H= 1.0m, TUBERIA DE 100mm (Incluye colocación base granular clase C, suministro y colocación geodren)	ML	\$ 69.144	329,09	\$ 26.897.816
409	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	ML	\$ 48.058	1.810,80	\$ 77.399.450
423	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	\$ 2.997	6.652,89	\$ 19.339.690
504	RELLENO CON GRAVA ENTRE 3/4" Y 1/2" PARA FILTROS (RELACION 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACION. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACION)	M3	\$ 97.270	116,70	\$ 11.351.453
601	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4" x 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (Incluye tubería PF, registros y accesorios, longitud promedio de 6.5m. Incluye cagile en polipropileno para medidor)	UN	\$ 253.685	28,88	\$ 7.103.129
701	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)	M3	\$ 25.767	901,82	\$ 23.237.196
720	PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio Incl. Sumin. Formalete. Ref. Incl. Incl. Concreto 2000 PSI de base)	UN	\$ 501.523	7,80	\$ 3.510.691
742	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA HS-047-1V4 EAAB	UN	\$ 3.964.504	36,80	\$ 142.725.024
903	DEMARCAACION LINEA CONTINUA A=0.15m (a=2.3mm, Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Incl. Microesferas)	ML	\$ 16.173	2.565,00	\$ 41.823.378
NP1	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibracompactor)	M3	\$ 126.267	1.853,92	\$ 234.028.917
NP2	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibracompactor)	M3	\$ 129.709	887,17	\$ 112.478.754
NP4	ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON RAJON. INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACION (Suministro, extendido a mano, nivelación y compactación con retroexcavadora sobre oruga y benne de 1 tonelada incluyen operario y combustible.	M3	\$ 107.660	2.792,06	\$ 299.993.759
NP5	DOVELAS ACERO USO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/2" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACION	KG	\$ 4.260	4.832,89	\$ 19.998.478
NP6	CANASTILLA PASAPULGAS (Incluye suministro y fijación)	KG	\$ 4.510	2.839,40	\$ 9.197.894
NP7	SELLO DE JUNTAS CON ICOPOR Y SIKAFLEX 1A SELLADO DE JUNTAS (300cc) (Incluye suministro e instalación)	ML	\$ 16.840	770,09	\$ 12.812.050
NP8	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Inc. Sum. Formalete. Refuerzo e Incl. Incl. Tapa en Polipropileno)	UN	\$ 1.875.596	15,80	\$ 28.133.940
NP10	DEMOLICION DE CONCRETO. ESPESORES 16cm A 25cm. (Incluye retiro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado)	M3	\$ 89.314	276,40	\$ 22.205.215
NP14	LOSA DE CONCRETO MRA5 ACCELERADO A 3 DIAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACION Y ACABADO. No incluye acero, curado y juntas).	M3	\$ 771.611	358,08	\$ 298.446.797

1279

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Equipo Local en Las Martires</small>
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			CANTIDADES TOTALES	VALORES TOTALES
	DESCRIPCIÓN	UND.	PRECIO UNIT.		
NP 17	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO, CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	\$ 1.733	231,00	\$ 400.323
NP 18	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const. Acero para Escaleras, Geotextil y Peñete Impermeab.)	ML	\$ 445.010	10,50	\$ 4.672.695
NP 22	REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGIA GRP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 18". ESPESOR 4.20 mm. EC = 14.200 MPA. (Incluye: Fabricación, importación, nacionalización, logística y suministro de materiales (Liner), proceso instalación, curado con luz ultravioleta, personal y actividades complementarias para finalizar la rehabilitación, Inspección final con equipo CCTV. (Entrega de video, informe pos rehabilitación e informe de protocolo del proceso de rehabilitación con norma técnica EAB).	ML	\$ 1.334.017	106,06	\$ 140.136.488
NP 23	REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGIA GRP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 20". ESPESOR 4.90 mm. EC = 14.200 MPA. (Incluye: Fabricación, importación, nacionalización, logística y suministro de materiales (Liner), proceso instalación, curado con luz ultravioleta, personal y actividades complementarias para finalizar la rehabilitación, Inspección final con equipo CCTV. (Entrega de video, informe pos rehabilitación e informe de protocolo del proceso de rehabilitación con norma técnica EAB)).	ML	\$ 1.459.258	30,47	\$ 45.163.461
NP 24	REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGIA GRP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 6". ESPESOR 4.90 mm. EC = 14.200 MPA. (Incluye: Fabricación, importación, nacionalización, logística y suministro de materiales (Liner), proceso instalación, curado con luz ultravioleta, personal y actividades complementarias para finalizar la rehabilitación, Inspección final con equipo CCTV. (Entrega de video, informe pos rehabilitación e informe de protocolo del proceso de rehabilitación con norma técnica EAB)).	ML	\$ 656.250	189,00	\$ 124.831.250
NP 26	INVESTIGACION DE REDES PARA CIRCUITOS DE SEMAFORIZACION	UN	\$ 1.253.595	4,00	\$ 5.014.320
NP 26	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 16" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACION MENOR DEL 30%. INCL MANO DE OBRA DÓNEA, SEÑALIZACION BASICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL IVA	ML	\$ 14.875	411,37	\$ 6.118.129
NP 27	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 18" Y 36" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACION MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO DE OBRA DÓNEA, SEÑALIZACION BASICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL IVA	ML	\$ 16.065	568,58	\$ 9.133.916
NP 28	INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36"	ML	\$ 10.710	979,93	\$ 10.455.850
NP 34	CARCAMO TIPO PLACA PARA PROTECCION DE TUBO EN POLIETILENO D= 10", 12", 14" Y 16" (Incluye relleno en arena de pefia, refuerzo concreto de 2000 PSI y 4000 PSI, formateo y transporte de petreos).	ML	\$ 197.441	165,88	\$ 32.712.025
NP 36	TRANSPORTE DE EQUIPO DE CINCO TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	VIAJE	\$ 309.725	30,00	\$ 11.891.750
NP 36	TRANSPORTE DE EQUIPO DE DIEZ TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	VIAJE	\$ 639.625	211,00	\$ 134.968.875
NP 40	BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO)	HURE	\$ 1.448.946	69,00	\$ 99.977.274
NP 41	CORTE Y AMPLIACION DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	ML	\$ 4.166	778,00	\$ 3.267.820
NP 42	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2	\$ 1.516	1.368,00	\$ 2.101.178
NP 43	ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 2: CONSTA DE POSTES ROLLIZOS DE 1.90m DE ALTURA LIBRE CON BASE EN CONCRETO 1500 PSI DE 30cm x 30cm, DOBLE CINTA PELIGRO CAL. 4, TELA PARA CERRAMIENTO (INCL INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACION)	MLASE	\$ 18.249	4.881,80	\$ 89.278.468
NP 44	BARRICADA METALICA TIPO IDU CON CERRADO REFLECTIVO NARANJA Y BLANCO GRADO INGENIERIA. MEDIDAS 2.40m x 1.50m - 3 BANDEJAS DE 20cm x 2.40m, TABLERO DE DESVIO DE 60cm. (Incluye cablete, suministro e instalación)	UNDAES	\$ 239.736	24,00	\$ 5.753.664
NP 45	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e instalación)	ML	\$ 42.945	169,00	\$ 7.730.100
NP 46	CUBION PVC TIPO U.M. D= 4" (Suministro e instalación)	UN	\$ 63.261	36,89	\$ 2.277.396

472
1275

 CONTRATO CO-137-2019	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES INFORME TÉCNICO No.12	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022 Versión 00	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Alcaldía Local No. 1 de los Martires</small>
--	--	--	--

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			CANTIDADES TOTALES	VALORES TOTALES
	DESCRIPCIÓN	UND.	PRECIO UNIT.		
NP 47	TEE HD EXTREMO LISO 4"x4" (Suministro e instalación)	UN	\$ 313.367	19,00	\$ 3.133.878
NP 48	CODO G.RAD. PVC 22.5" TIPO U.M. D=4" (Suministro e instalación)	UN	\$ 85.516	40,00	\$ 3.420.640
NP 49	CODO G.RAD. PVC 11.25" TIPO U.M. D=4" RDE 21 (Suministro e instalación)	UN	\$ 81.509	24,00	\$ 1.956.216
NP 50	UNION DRESSER D=3" (Suministro e instalación)	UN	\$ 113.808	5,00	\$ 589.040
NP 51	UNION DRESSER D=4" (Suministro e instalación)	UN	\$ 127.631	5,00	\$ 638.155
NP 52	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=4" (Suministro e instalación)	UN	\$ 75.661	20,00	\$ 1.513.220
NP 53	EMPATES DE TUBERIA EN PVC A AC 4" LINEAL SEGUN NORMA NS-023 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).	UN	\$ 272.156	24,00	\$ 6.531.744
NP 54	EMPATES DE TUBERIA EN PVC A AC 3" LINEAL SEGUN NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).	UN	\$ 196.509	10,00	\$ 1.965.090
NP 55	REDUCCIÓN CONCENTRICA HD EL 4" x 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	\$ 147.791	28,00	\$ 4.138.148
NP 56	REDUCCIÓN HD 4"x 3" J.H. (Suministro e instalación)	UN	\$ 130.877	15,00	\$ 1.963.165
NP 57	CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLÁSTICO CON CONCRETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	\$ 202.303	25,00	\$ 5.057.575
NP 58	CAJA DE INSPECCIÓN DE Ø 6x10 6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción Incluye Marco y Tapa. No inc. Base y Carúcel)	UN	\$ 326.649	139,00	\$ 45.682.211
NP 59	TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U.S. (Incluye Suministro e instalación)	ML	\$ 51.615	1.251,00	\$ 64.570.365
NP 60	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14" (Incluye Suministro e instalación)	ML	\$ 136.772	187,78	\$ 25.663.096
NP 61	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" (Incluye Suministro e instalación)	ML	\$ 179.340	108,48	\$ 19.887.917
NP 62	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20" (Incluye Suministro e instalación)	ML	\$ 296.845	52,08	\$ 15.435.940
NP 63	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=24" (Incluye Suministro e instalación)	ML	\$ 441.431	89,34	\$ 39.457.446
NP 64	YEE PVC SANITARIA D=6"x 12" (Incluye suministro e instalación).	UN	\$ 320.019	15,00	\$ 4.800.285
NP 65	YEE PVC SANITARIA D=6"x 14" (Incluye suministro e instalación).	UN	\$ 432.304	28,00	\$ 12.104.512
NP 66	YEE PVC SANITARIA D=6"x 16" (Incluye suministro e instalación).	UN	\$ 587.097	15,00	\$ 8.806.455
NP 67	YEE PVC SANITARIA D=6"x 18" (Incluye suministro e instalación).	UN	\$ 745.456	22,00	\$ 16.400.032
NP 68	CONEXIONES KIT SILLA YEE 500 x 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	\$ 346.831	19,00	\$ 6.590.789
NP 69	CONEXIONES KIT SILLA YEE 24" x 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	\$ 290.125	40,00	\$ 11.605.000
NP 70	AFOROS DE TRÁNSITO (MOTORIZADOS Y NO MOTORIZADOS) A PARTIR DE CAPTURA DE VIDEO Incluye diligenciar y entrega de base de datos en archivo Excel Incluye 3 estaciones maestras, 1 estación intermedia tipo 1 y 1 estación intermedia tipo 2. 22 estaciones muestrales o complementarias. Captura día hábil y no hábil con sus respectivos movimientos. Incluye todos los costos directos e indirectos.	HR	\$ 194.751	112,00	\$ 21.812.112
NP 71	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGUN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebros, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc)	M2	\$ 80.039	555,76	\$ 44.681.674
NP 72	TACHA REFLECTIVA BIDIREFLECTIVA (Incluye suministro e instalación).	UN	\$ 8.682	1.125,00	\$ 9.767.250
NP 73	SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA TIPO TRANSMILEND 40.5cmx15cmx8.5cm). SUMIN. E INSTAL.	UN	\$ 34.682	900,00	\$ 31.213.800
NP 74	ESTOPELEROS METALICOS CON ESPGO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	\$ 14.932	574,00	\$ 8.664.368
NP 75	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2m DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPOXICA.	M2	\$ 176.429	84,24	\$ 14.862.379
NP 76	REAPERTURA EN CONEXIÓN DOMICILIARIA CON EQUIPO ROBOTIZADO DE CORTE, PARA DIAMETROS DE TUBERÍA ENTRE 18" Y 22"	UN	\$ 436.363	36,00	\$ 15.709.068
NP 77	CORTE PARA ELIMINACIÓN DE OBSTRUCCIONES CON EQUIPO FRESADOR DE TUBERÍA ROBOTIZADO EASY CUTTER AUTOPROPULSADO, CON CÁMERA INCORPORADA, PARA DIAMETROS DE TUBERÍA ENTRE 18" Y 22"	UN	\$ 709.090	8,00	\$ 5.672.720
COSTO TOTAL OBRAS INCLUYE REDES Y COSTOS DIRECTOS, APROXIMADA AL PESO (A) =				\$	4.812.862.876
ADMINISTRACIÓN				22,89%	\$ 918.644.129
IMPREVISTOS				1,08%	\$ 40.128.821
UTILIDAD				7,88%	\$ 286.980.346
COSTO TOTAL A.U.U.				30,85%	\$ 1.239.573.885
COSTO TOTAL OBRA INCLUYE A.U.U.				-	\$ 6.252.436.171
COSTO ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SST (B)				2,96%	\$ 155.288.790
COSTO ACTIVIDADES SOCIALES (C)				2,72%	\$ 142.841.328
COSTO PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (D)				1,23%	\$ 84.468.836
TOTAL OBRAS LICITACION (A+B+C+D)				-	\$ 6.615.024.325
COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO (E) (INCLUYE AJUSTES E IVA)				0,41%	\$ 23.834.343
COSTO ESTIMADO DE AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (F) (INCLUYE IVA)				0,82%	\$ 337.110.182
VALOR TOTAL SIN AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (VALOR EVALUABLE) =				-	\$ 6.975.168.778
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (SOLO OBRA), INCLUYE COSTOS INDIRECTOS (G)				2,66%	\$ 185.155.879
VALOR TOTAL DEL CONTRATO APROXIMADO AL PESO =				-	\$ 7.160.324.657
					VALOR TOTAL CIV'S CONTRACTUALES

FUENTE: CON&CON SAS / CO-137-2019

1100
1276

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO-137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

8 ITEMS NO PREVISTOS

El día 09 de noviembre se radicó ante la Interventoría la actualización del acta de NPs No.01, debido a que fue necesario incluir dos actividades de obra referentes a la instalación temporal de semáforos solicitados por la SDM para la intervención de varios segmentos viales, dicha acta se muestra en la Tabla 12.

Tabla 11 ACTIVIDADES NO PREVISTAS

A. ACTIVIDADES NO PREVISTAS

Item	ITEMS NO PREVISTOS	Unidad	Código de Referencia IDU	Valor Unitario
NP1	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	4747	\$ 126.267,00
NP2	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	4743	\$ 129.709,00
NP3	BASE ESTABILIZADA CON ASFALTO EN CALIENTE MEZCLADA EN PLANTA (Incluye suministro, extendido, nivelación y compactación).	M3	7897	\$ 592.875,00
NP4	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (Suministro, extendido a mano, nivelación y compactación con retroexcavadora sobre oruga y benitón de 1 tonelada incluyen operario y combustible.	M3	6473	\$ 107.660,00
NP5	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/2" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	7713	\$ 4.260,00
NP6	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG	5404	\$ 4.510,00
NP7	SELLO DE JUNTAS CON IKOPOR Y SIKAFLEX 1A SELLADO DE JUNTAS (300cc) (Incluye suministro e instalación)	ML	6204	\$ 16.640,00
NP8	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Fundido en Sitio. Inc. Sum. Formateo, Refuerzo e Instal. Incl Tape en Polipropileno)	UN	4252	\$ 1.875.596,00
NP9	PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) GRAVA 1" 28 DIAS. ESTAMPADO e=0.10m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, INCLUYE CORTE Y SELLADO DE DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue manual). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M2	6137	\$ 176.905,00
NP10	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	3486	\$ 155.956,00
NP11	DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 8cm A 15cm. (Incluye retiro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado).	M3	4755	\$ 132.146,00
NP12	DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 16cm A 25cm. (Incluye retiro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado).	M3	5196	\$ 74.088,00
NP13	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DIAS (SUMINISTRO, FORMATEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. No incluye acero, curado y juntas).	M3	5197	\$ 80.314,00
NP14	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - RAMPAS VEHICULARES Y PEATONALES EXISTENTES. (Espesor variable hasta 0.10 m. Incluye Cargue, transporte y disposición final de sobrantes escombrera autorizada).	M3	7898	\$ 771.611,00
NP15	GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	M2	8606	\$ 9.530,00
NP16	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	M2	8622	\$ 7.178,00
NP17	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15m, D=5mm, 5mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)	ML	3811	\$ 1.733,00
NP18	CILINDRO POZO INSP EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const. Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)	KG	4233	\$ 3.854,00
NP19	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 x 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML	3471	\$ 445.010,00
NP20	CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 x 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	4878	\$ 110.670,00
NP21	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGIA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL DIÁMETRO 18". ESPESOR 4.20 mm. EC = 14.200 MPA. (Incluye: Fabricación, importación, nacionalización, logística y suministro de materiales (Lmer), proceso instalación, curado con luz ultravioleta, personal y actividades complementarias para finalizar la rehabilitación, inspección final con equipo CCTV. (Entrega de video, informe pos rehabilitación e informe de protocolo del proceso de rehabilitación con norma técnica EAB)).	UN	4879	\$ 186.414,00
NP22		ML	8006	\$ 1.334.017,00

 <p>CONTRATO CO-137-2019</p>	<p>CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES</p> <p>INFORME TÉCNICO No.12</p>	<p>17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022</p> <p>Versión 00</p>	 <p>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>
--	---	---	--

NP23	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGIA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL DIÁMETRO 20". ESPESOR 4.00 mm. EC = 14.200 MPA. (Incluye: Fabricación, importación, nacionalización, logística y suministro de materiales (Liner), proceso instalación, curado con luz ultravioleta, personal y actividades complementarias para finalizar la rehabilitación, Inspección final con equipo CCTV. (Entrega de video, informe pos rehabilitación e informe de protocolo del proceso de rehabilitación con norma técnica EAB)).	ML	8007	\$	1.460.250,00
NP24	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGIA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL DIÁMETRO 6". ESPESOR 4.00 mm. EC = 14.200 MPA. (Incluye: Fabricación, importación, nacionalización, logística y suministro de materiales (Liner), proceso instalación, curado con luz ultravioleta, personal y actividades complementarias para finalizar la rehabilitación, Inspección final con equipo CCTV. (Entrega de video, informe pos rehabilitación e informe de protocolo del proceso de rehabilitación con norma técnica EAB)).	ML	N.A.	\$	656.250,00
NP25	INVESTIGACION DE REDES PARA CIRCUITOS DE SEMAFORIZACION	UN	N.A.	\$	1.253.525,00
NP26	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 18" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL IVA	ML	6438	\$	14.875,00
NP27	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 18" Y 36" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL IVA	ML	6439	\$	16.065,00
NP28	INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS MAYORES A 36"	ML	6160	\$	13.690,00
NP29	INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36"	ML	6161	\$	10.710,00
NP30	EQUIPO VÁCTOR - SONDEO - LIMPIEZA - RECOLECCIÓN DE LODOS NO PELIGROSOS	HR	7892 INSUMOS	\$	261.800,00
NP31	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS NO PELIGROSOS PROVENIENTES DE ALCANTARILLADO	KG	9434 INSUMOS	\$	288,00
NP32	CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA - VIAJE	VIAJE	9325 INSUMOS	\$	175.000,00
NP33	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	6486	\$	42.033,00
NP34	CARCAMO TIPO PLACA PARA PROTECCIÓN DE TUBO EN POLIETILENO D= 10", 12", 14" Y 16" (Incluye relleno en arena de pefia, refuerzo, concreto de 2000 PSI y 4000 PSI formaleta y transporte de peñeros).	ML	5251	\$	197.441,00
NP35	TRANSPORTE DE EQUIPO DE CINCO TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	VIAJE	9706 INSUMOS	\$	389.725,00
NP36	TRANSPORTE DE EQUIPO DE DIEZ TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	VIAJE	9707 INSUMOS	\$	639.625,00
NP37	TRANSPORTE DE EQUIPO DE QUINCE TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	VIAJE	9708 INSUMOS	\$	887.145,00
NP38	ENTIBADO EC-8 CONTINUO MADERA CON PERFILES DE METALICOS Y PARALES TELESCÓPICOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	7527	\$	57.230,00
NP39	GEOTEXTIL T. RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 kN/m PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Sumin. e Instalación)	M2	4032	\$	9.902,00
NP40	BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO).	H/M/E	4630	\$	1.448.948,00
NP41	CORTE Y AMPLIACION DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	ML	4239	\$	4.108,00
NP42	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2	3806	\$	1.516,00
NP43	ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 2: CONSTA DE POSTES ROLLIZOS DE 1.90mt DE ALTURA LIBRE CON BASE EN CONCRETO 1500 PSI DE 30cm x 30cm, DOBLE CINTA PELIGRO CAL. 4, TELA PARA CERRAMIENTO (INCL. INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACION).	ML/ME	4946	\$	18.240,00
NP44	BARRICADA METÁLICAS C-20 CON TRES BANDEJAS DE 23cm x 150cm. (ALQUILER). INCLUYE TABLERO DE 60cm DE DIÁMETRO "DESvío" REFLECTIVO GRADO INGENIERIA COMERCIAL. SUMINISTRO E INSTALACION Y TRASLADO INTERNO EN OBRA.	UN/MES	6059	\$	41.575,00
NP45	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)	ML	3226	\$	42.945,00

1
1
1
1

123

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Oficina Local de Las Martires</small>
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

NP46	UNION PVC TIPO U.M. D= 4" (Suministro e Instalación)	UN	3602	\$	63.261,00
NP47	TEE HD EXTREMO LISO 4"x4" (Suministro e Instalación)	UN	3282	\$	313.367,00
NP48	CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=4" (Suministro e Instalación)	UN	3531	\$	85.516,00
NP49	CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=4" RDE 21 (Suministro e Instalación)	UN	3539	\$	81.509,00
NP50	UNION DRESSER D=3" (Suministro e Instalación)	UN	4384	\$	113.823,00
NP51	UNION DRESSER D=4" (Suministro e Instalación)	UN	4385	\$	127.631,00
NP52	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=4" (Suministro e Instalación)	UN	4420	\$	75.631,00
NP53	EMPATES DE TUBERIA EN PVC A AC 4" LINEAL SEGUN NORMA NS-023 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).	UN	4842	\$	272.156,00
NP54	EMPATES DE TUBERIA EN PVC A AC 3" LINEAL SEGUN NORMA NS-023 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).	UN	4843	\$	196.509,00
NP55	REDUCCION CONCENTRICA HD EL 4" x 3". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	4872	\$	147.791,00
NP56	REDUCCION HD 4"x 3" J.H. (Suministro e Instalación).	UN	4899	\$	130.877,00
NP57	CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLASTICO CON CONCRETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	5977	\$	202.303,00
NP58	CAJA DE INSPECCION DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañueta)	UN	3778	\$	328.640,00
NP59	TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U.S. (Incluye Suministro e Instalación)	ML	4144	\$	51.615,00
NP60	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	6538	\$	136.772,00
NP61	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	3046	\$	179.340,00
NP62	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	3047	\$	229.540,00
NP63	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	3048	\$	296.845,00
NP64	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=24" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	3919	\$	441.431,00
NP65	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=30" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	7435	\$	1.148.347,00
NP66	YEE PVC SANITARIA D=6"x 8" (Incluye suministro e instalación).	UN	8350	\$	219.561,00
NP67	YEE PVC SANITARIA D=6"x 10" (Incluye suministro e instalación).	UN	N.A.	\$	299.387,00
NP68	YEE PVC SANITARIA D=6"x 12" (Incluye suministro e instalación).	UN	N.A.	\$	320.019,00
NP69	YEE PVC SANITARIA D=6"x 14" (Incluye suministro e instalación).	UN	N.A.	\$	432.304,00
NP70	YEE PVC SANITARIA D=6"x 16" (Incluye suministro e instalación).	UN	N.A.	\$	587.697,00
NP71	YEE PVC SANITARIA D=6"x 18" (Incluye suministro e instalación).	UN	N.A.	\$	745.249,00

 CONTRATO CO-137-2019	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES INFORME TÉCNICO No.12	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022 Versión 00	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Oficina Local de Los Martires</small>
--	--	--	---

NP72	CONEXIONES KIT SILLA YEE 500 x 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	6618	\$	346.831,00
NP73	CONEXIONES KIT SILLA YEE 24" x 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	7835	\$	427.176,00
NP74	AFOROS DE TRANSITO (MOTORIZADOS Y NO MOTORIZADOS) A PARTIR DE CAPTURA DE VIDEO. Incluye digitación y entrega de base de datos en archivo Excel. Incluye 3 estaciones maestras, 1 estación intermedia tipo 1 y 1 estación intermedia tipo 2. 22 estaciones muestrales o complementarias. Captura día hábil y no hábil, con sus respectivos movimientos. Incluye todos los costos directos e indirectos.	HR	8015	\$	194.751,00
NP75	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebraz, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	8566	\$	80.039,00
NP76	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (Incluye suministro e instalación).	UN	5241	\$	8.682,00
NP77	SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA. TIPO TRANSMILENIO 40.5cmx15cmx8.5cm). SUMIN. E INSTAL.	UN	4832	\$	34.682,00
NP78	ESTOPEROLES METALICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	7881	\$	14.032,00
NP79	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2cm DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA.	M2	7858	\$	176.429,00
NP80	REAPERTURA EN CONEXIÓN DOMICILIARIA CON EQUIPO ROBOTIZADO DE CORTE, PARA DIAMETROS DE TUBERÍA ENTRE 18"	UN	N.A.	\$	454.545,00
NP81	CORTE PARA ELIMINACIÓN DE OBSTRUCCIONES CON EQUIPO FRESADOR DE TUBERÍA ROBOTIZADO EASY CUTTER AUTOPROPULSADO, CON CÁMRA INCORPORADA, PARA DIAMETROS DE TUBERÍA ENTRE 18" Y 22"	UN	N.A.	\$	738.636,00
NP82	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y RETIRO DE AMOBLAMIENTO SEMAFÓRICO TEMPORAL DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SDM	GL	N.A.	\$	7.504.860,00
NP83	ALQUILER DE AMOBLAMIENTO SEMAFORICO TEMPORAL DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SDM	MES	N.A.	\$	3.800.860,00

FUENTE: CON&CON SAS / CO-137-2019

9 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

9.1 FACTURACIÓN MENSUAL

Al corte del presente informe se presentó el Acta de Obra No.06 correspondiente al periodo comprendido entre 18 de agosto de 2021 al 16 de septiembre de 2021, con un valor total de \$620.119.381; el detalle de la misma se presenta en la tabla No.13.

Tabla 12 DETALLE DEL ACTA DE OBRA No.06

DESCRIPCIÓN	ACTAS ANTERIORES					OBRA EJECUTADA	
						PRESENTE ACTA	ACUMULADA
SU TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS CIVILES + PESES	\$ -	\$ 437.412.317,00	\$ 527.519.595,00	\$ 1.105.578.554,00	\$ 616.583.658,00	\$ 388.511.126	\$ 3.086.004.220,00
ANU COSTO INDIRECTO 34,80%	\$ -	\$ 150.116.084,72	\$ 182.350.484,73	\$ 341.513.215,30	\$ 190.586.252,00	\$ 133.100.087	\$ 953.285.704,00
COSTO TOTAL OBRA EJECUTADA	\$ -	\$ 577.528.401,72	\$ 690.869.040,73	\$ 1.447.091.769,30	\$ 807.169.910,00	\$ 521.611.213	\$ 4.039.270.924,00
COSTO TOTAL COMPONENTES	\$ -	\$ 38.523.153,00	\$ 47.884.081,00	\$ 66.886.478,00	\$ 55.748.835,00	\$ 36.008.198	\$ 278.841.235,00
COSTO ENSAYOS LABORATORIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PROTOCOLO DE BIENESTAR - TRANSPORTE SEGURO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 112.500.000,00	\$ 82.500.000	\$ 175.000.000,00
ADICIONAL 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COSTO TOTAL OBRAS AJUSTES	\$ -	\$ 612.652.134,72	\$ 738.133.910,73	\$ 1.546.988.247,33	\$ 975.818.545,00	\$ 620.119.381	\$ 4.423.112.218,54
FFPO COMPONENTE CONSULTORIA (DIAGNOSTICO + ESO)	\$ 283.285.800,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 283.285.800,00
IVA COSTO INDIRECTO 19,80%	\$ 53.824.302,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53.824.302,00
COSTO TOTAL FFPO COMPONENTE CONSULTORIA	\$ 337.110.102,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 337.110.102,00
COSTO TOTAL DE OBRA + CONSULTORIA	\$ 337.110.102,00	\$ 612.652.134,72	\$ 738.133.910,73	\$ 1.546.988.247,33	\$ 975.818.545,00	\$ 620.119.381	\$ 4.830.222.320,54
MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (34%)	\$ 96.133.031,00	\$ 163.815.640,42	\$ 221.443.173,22	\$ 464.088.474,20	\$ 292.746.564,00	\$ 196.835.814	\$ 1.440.098.504,83
MENOS RETENCIÓN GARANTÍA	\$ 30.711.010,00	\$ 61.265.213,47	\$ 73.813.391,07	\$ 154.888.824,73	\$ 97.581.855,00	\$ 62.811.338	\$ 483.022.232,28
TOTAL A PAGAR	\$ 202.268.061,00	\$ 387.571.280,83	\$ 442.883.346,44	\$ 928.102.948,40	\$ 585.401.126,00	\$ 372.871.623	\$ 2.888.133.391,43

 CON & CON <small>CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA</small>	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"
CONTRATO No. 137 DE 2019	INFORME GESTIÓN AMBIENTAL

Suspensión No. 3 05 de abril de 2021
Fecha de reinicio 29 de junio de 2021
Suspensión No. 4 16 de septiembre de 2021

FUENTE: Consultoría y Construcción SAS

3.2. Localización del proyecto

Este proyecto contempla los tramos correspondientes a los siguientes segmentos a intervenir:

Tabla 2 Segmentos a intervenir

14001469	CL 1F	KR 24A	KR 24B	SANTA ISABEL	EL VERGEL	REHABILITACION
14001481	CL 1F	KR 24	KR 24 ^a	SANTA ISABEL	EL VERGEL	REHABILITACION
14000772	KR 25A	AC 6	CL 6BIS	LA SABANA	RICAURTE	REHABILITACION
14000741	KR 25A	CL 6BIS	CL 6 ^a	LA SABANA	RICAURTE	REHABILITACION
14000718	KR 25A	CL 6A	CL 7	LA SABANA	RICAURTE	REHABILITACION
14001678	KR 25A	CL 7	CL 7BIS	LA SABANA	RICAURTE	REHABILITACION
14001545	CL 1ABIS	AC 1	KR 26	SANTA ISABEL	SANTA ISABEL SUR	REHABILITACION
14001517	KR 26	CL 1ABIS	CL 1B	SANTA ISABEL	SANTA ISABEL SUR	REHABILITACION
14001156	CL 2B	KR 25A	KR 26	SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	REHABILITACION
14001367	CL 1B	KR 27A	KR 28	LA SABANA	SANTA ISABEL	MANTENIMIENTO
14000126	KR 24	CL 22A	DG 22B BIS	LA SABANA	SAMPER MENDOZA	MANTENIMIENTO
14000550	CL 12A	KR 20	KR 21	LA SABANA	LA SABANA	MANTENIMIENTO
14001058	KR 26	CL 2C	CL 3	SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	REHABILITACION
14000205	CL 17	KR 28A	KR 30	LA SABANA	PALOQUEMAO	REHABILITACION
14001506	KR 18	CL 2	CL 3	SANTA ISABEL	EDUARDO SANTOS	MANTENIMIENTO
14001265	KR 25	CL 2	CL 2 ^a	SANTA ISABEL	VERGEL	MANTENIMIENTO
14000282	CL 15	KR 27	KR 28 ^a	LA SABANA	PALOQUEMAO	REHABILITACION
14001619	CL 1C	KR 19A	KR 19BBIS	SANTA ISABEL	EDUARDO SANTOS	REHABILITACION
14001616	CL 1C	KR 19BBIS	KR 19C	SANTA ISABEL	EDUARDO SANTOS	REHABILITACION
14000565	CL 12	KR 20A	KR 21	LA SABANA	LA SABANA	REHABILITACION



	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

10 INFORME TÉCNICO

10.1 EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICOS EN CADA CIV

En la Tabla 14 se presenta la clasificación de los segmentos conformados por pavimentos flexibles, basados en los coeficientes estructurales (Ie) y los índices de PCI levantados en campo y en la Tabla 14 los segmentos conformados por pavimento rígidos en función de los valores de PCI calculados

Tabla 13 CLASIFICACIÓN Y TIPO DE INTERVENCIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE

CIV	PCI	CLASIFICACION	CÓDIGO	Ie	CÓDIGO	CLASIFICACIÓN FINAL	INTERVENCIÓN
14000126	23		D	0.88	2	2D	Rehabilitación
14000550	36	MALO	C	1.21	1	1C	Man. Periódico
14001058	10		D	0.55	3	3D	Rehabilitación
14001156	0		D	0.73	2	2D	Rehabilitación
14001265	29	MALO	C	0.69	3	3C	Rehabilitación
14001506	19		D	0.61	3	3D	Rehabilitación
14001469	1		D	0.41	4	4D	Reconstrucción
14001481	0		D	0.50	3	3D	Rehabilitación
14001619	20		D	0.74	2	2D	Rehabilitación
14001616	51	REGULAR	C	0.64	3	3C	Rehabilitación
14001517	35	MALO	C	1.04	1	1C*	Rehabilitación
14001545	13		D	1.12	1	1D*	Rehabilitación
14001367	10		D	0.76	2	2D	Rehabilitación

FUENTE: CON&CON SAS / CO-137-2019

Tabla 14 CLASIFICACIÓN Y TIPO DE INTERVENCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO

CIV	PCI	CLASIFICACION	CÓDIGO	INTERVENCIÓN
14000205	22		D	Reconstrucción
14000282	44	REGULAR	C	Rehabilitación
14001678	20		D	Reconstrucción
14000718	34	MALO	C	Rehabilitación
14000741	46	REGULAR	C	Rehabilitación
14000772	40	MALO	C	Rehabilitación

FUENTE: CON&CON SAS / CO-137-2019

1282

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Provincia Local de la Nación</small>
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

A continuación, se muestran los diseños de pavimentos en calzada y andén que fueron aprobados para los segmentos viales de la adición:

Ilustración 3 Diseño de Pavimento alternativa 1 y 2. CIV 14000178-14000206

14000178 - 14000206		14000178 - 14000206	
CAPA	Espesor (cm)	CAPA	Espesor (cm)
Asfalto caucho	20	Asfalto caucho	20
BG Reciclada	15	BG Reciclada	15
SBG Reciclada	20	SBG Reciclada	18
	10		2
			15
Rajon	30		
Espesor de la estructura	95	Espesor de la estructura	70

Ilustración 4 Diseño de Pavimento alternativa 1 y 2. CIV 14000233

14000233		14000233	
CAPA	Espesor (cm)	CAPA	Espesor (cm)
Asfalto caucho	14	Asfalto caucho	14
BG Reciclada	10	BG Reciclada	10
SBG Reciclada	15	SBG Reciclada	10
	10		2
			15
Rajon	30		
Espesor de la estructura	79	Espesor de la estructura	51

Ilustración 5 Diseño de Pavimento alternativa 1 y 2. CIV 14000266

14000266		14000266	
CAPA	Espesor (cm)	CAPA	Espesor (cm)
Asfalto caucho	14	Asfalto caucho	14
BG Reciclada	15	BG Reciclada	11
SBG Reciclada	25	SBG Reciclada	30
	10		15
Rajon	30		
Espesor de la estructura	94	Espesor de la estructura	70

1283

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Alcaldía Local de los Martires</small>
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

Ilustración 6 Diseño de Pavimento alternativa 1 y 2. CIV 14001154-14001098

14001154 - 14001098		14001154 - 14001098	
CAPA	Espesor (cm)	CAPA	Espesor (cm)
Asfalto caucho	12	Asfalto caucho	11
BG Reciclada	10	BG Reciclada	10
SBG Reciclada	15	SBG Reciclada	15
Sello	10		2
Rajon	30		15
Espesor de la estructura	77	Espesor de la estructura	53

Ilustración 7 Diseño de Pavimento alternativa 1 y 2. CIV 14000565-14000573-14000615

14000565 - 14000573 - 14000615	
CAPA	Espesor (cm)
Asfalto caucho	14
BG Reciclada	15
	38
	14
Espesor de la estructura	81

Y para el caso del diseño en andenes se tiene la siguiente alternativa: Esta estructura fue avalada mediante comité de seguimiento de obra.

Ilustración 8 Diseño para andenes TIPO

ESTRUCTURA	ESPESOR (cm)
CONCRETO - MR 4 Mpa	10
SUBBASE GRANULAR TIPO SBG-PEA	20
GEOTEXTIL TEJIDO	-

1190
1274

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

A continuación, se muestran los diseños de pavimentos en calzada que fueron aprobados para los siguientes CIVs:

Ilustración 10 Diseño de Pavimento alternativa 1 y 2. CIV 14001678-14000718-14000741-14000772

14001678-14000718-14000741-14000772	
CAPA	Espesor (cm)
LOSA MR 45 Kg/cm ²	28
SBG Reciclada	20
Sello	10
Rajon	30
Espesor de la estructura	88

Ilustración 9 Diseño de Pavimento alternativa 1 y 2. CIV 14001156

14001156		14001156	
CAPA	Espesor (cm)	CAPA	Espesor (cm)
Asfalto caucho	11	Asfalto caucho	11
BG Reciclada	10	BG Reciclada	15
SBG Reciclada	20	SBG Reciclada	20
Sello	10	Sello	5
Rajon	30	Rajon	15
Espesor de la estructura	81	GEOTEXTIL TR4000	
		Espesor de la estructura	66

Ilustración 11 Diseño de Pavimento alternativa 1 y 2. CIV 14001517-14001545

14001517-14001545	
CAPA	Espesor (cm)
Asfalto caucho	20
BG Reciclada	15
SBG Reciclada	40
Sello	10
Rajon	30
Espesor de la estructura	115

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Capital del Valle de los Rios</small>
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

Ilustración 12 Diseño de Pavimento alternativa 1 y 2. CIV 14001367

14001367		14001367	
CAPA	Espesor (cm)	CAPA	Espesor (cm)
Asfalto caucho	19	Asfalto caucho	19
BG Reciclada	15	BG Reciclada	20
SBG Reciclada	30	SBG Reciclada	35
	10		5
			15
Rajon	30		
Espesor de la estructura	104	Espesor de la estructura	94

Ilustración 13 Diseño de Pavimento alternativa 1 y 2. CIV 1400126

1400126		1400126	
CAPA	Espesor (cm)	CAPA	Espesor (cm)
Asfalto caucho	17	Asfalto caucho	17
BG Reciclada	20	BG Reciclada	15
SBG Reciclada	20	SBG Reciclada	25
	10		5
			15
Rajon	30		
Espesor de la estructura	97	Espesor de la estructura	77

Ilustración 14 Ilustración 13 Diseño de Pavimento alternativa 1 y 2. CIV 14001506

14001506		14001506	
CAPA	Espesor (cm)	CAPA	Espesor (cm)
Asfalto caucho	15	Asfalto caucho	15
BG Reciclada	15	BG Reciclada	15
SBG Reciclada	25	SBG Reciclada	30
	10		5
			15
Rajon	30		
Espesor de la estructura	95	Espesor de la estructura	80

1280

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

Ilustración 15 Ilustración 13 Diseño de Pavimento alternativa 1 y 2. CIV 14001619-14001616

14001619-14001616	
CAPA	Espesor (cm)
Asfalto caucho	15
BG Reciclada	15
SBG Reciclada	25
Sello	10
Rajon	30
Espesor de la estructura	95

14001619-14001616	
CAPA	Espesor (cm)
Asfalto caucho	14
BG Reciclada	15
SBG Reciclada	30
Geocelda	5
	15
Espesor de la estructura	
79	

11 BALANCE DE OBRA

Una vez elaborado el balance de obra contractual con respecto a las cantidades reales de ejecución en cada uno de los CIV's y debidamente aprobada por MIRS LATINOAMERICA S.A.S como interventor de este contrato, se evidencia un saldo a favor al fondo de desarrollo local de Mártires (FLM), el cual se encuentra sujeto a valoración debido a que las intervenciones en la modalidad de ACCIONES DE MOVILIDAD, conlleva una modalidad distinta y no se puede verificar totalmente su alcance hasta su intervención.


El balance de los CIV's a intervenir es el siguiente:

Tabla 15 BALANCE ACTUALIZADO

N.º	Cod.	BARRIO	PK-ID	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA	VALOR PRESUPUESTADO
1	14001469	EL VERGEL-CONSOLATA	182872	CALZADA	CL 1F	KR 24A	KR 24B	\$ 295.367.657,00
			70632	ANDEN Y CINTA DE AJUSTE				\$ 30.549.444,00
			70633					
2	14001481	EL VERGEL-CONSOLATA	182871	CALZADA	CL 1F	KR 24	KR 24A	\$ 242.916.869,00
			70630	ANDEN Y CINTA DE AJUSTE				\$ 33.571.309,00
			70631					
3	14000772	RICAURTE-TALLERES	183235	CALZADA	KR 25A	AC 6	CL 6BIS	\$ 213.784.434,00
			71323	ANDEN				\$ 59.899.001,00
			71324					
4	14000741	RICAURTE-TALLERES	183236	CALZADA	KR 25A	CL 6BIS	CL 6A	\$ 238.309.683,00

1407
1207

43		MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA				MEMORIA		CON & CON																																																																																																																																																																																																																									
CONTROL DE OBRA																																																																																																																																																																																																																																	
CONTRATISTA	OBRA	CONTRATISTA	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION - CON & CON S.A.S.			R/T	EOL041411-0																																																																																																																																																																																																																										
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTINES																																																																																																																																																																																																																																	
ACTA	PERIODO DE CUANTO	17/05/2022 AL 18/05/2022			ELABORO	ING. EUSEBIO RAMIREZ																																																																																																																																																																																																																											
7	LA SABANA	BARRIO	LA SABANA			CU	14994120																																																																																																																																																																																																																										
IMP	NP 4	DEscripción	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (suministro, extensión a mano, nivelación y compactación con retroexcavadora sobre oruga y berrín de 1 tonnellada incluyen operador y combustible).			UNIDAD	M3																																																																																																																																																																																																																										
REGISTRO FOTOGRAFICO						<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ELEMENTO</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th colspan="6">DIMENSIONES</th> <th rowspan="2">MEDIDA TOTAL</th> </tr> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>AREA</th> <th>VOLUMEN</th> <th>UBIEMENTO</th> </tr> </thead> <tr> <td>CALZADA</td> <td>Acercamiento del Acto 6</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>419.30</td> <td>-</td> <td>1.00</td> <td>419.30</td> </tr> <tr> <td>CALZADA</td> <td>ESTABILIZACION CON RAJON DE LA VIA</td> <td>111.23</td> <td>10.73</td> <td>0.30</td> <td>-</td> <td>368.05</td> <td>-</td> <td>1.00</td> <td>368.05</td> </tr> <tr> <td>CALZADA</td> <td>FALLO EN SUBRASANTE COSTADO DERECHO ACTA 2</td> <td>17.98</td> <td>4.83</td> <td>0.80</td> <td>-</td> <td>68.01</td> <td>-</td> <td>1.60</td> <td>88.01</td> </tr> <tr> <td>CALZADA</td> <td>FALLO POR SUBRASANTE BLANDA ACTA 3</td> <td>13.20</td> <td>5.20</td> <td>0.70</td> <td>-</td> <td>48.05</td> <td>-</td> <td>1.00</td> <td>48.05</td> </tr> <tr> <td>CALZADA</td> <td>FALLO POR TUBERIA GRES COLAPSADA ACTA 3</td> <td>21.80</td> <td>5.80</td> <td>0.80</td> <td>-</td> <td>101.62</td> <td>-</td> <td>1.00</td> <td>101.62</td> </tr> <tr> <td>CALZADA</td> <td>FALLO POR TUBERIA GRES COLAPSADA ACTA 3</td> <td>23.00</td> <td>4.90</td> <td>0.80</td> <td>-</td> <td>90.16</td> <td>-</td> <td>1.00</td> <td>90.16</td> </tr> <tr> <td>CALZADA</td> <td>BOCA CALLE 1 TRIANGULOS COST. SUR</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0.30</td> <td>4.58</td> <td>1.40</td> <td>-</td> <td>2.00</td> <td>2.78</td> </tr> <tr> <td>CALZADA</td> <td>BOCA CALLE 2 ORIENTAL</td> <td>11.50</td> <td>1.00</td> <td>0.30</td> <td>-</td> <td>3.80</td> <td>-</td> <td>2.00</td> <td>7.81</td> </tr> <tr> <td>CALZADA</td> <td>BOCA CALLE 2 TRIANGULO ORIENTAL</td> <td>1.10</td> <td>0.55</td> <td>0.30</td> <td>-</td> <td>0.18</td> <td>-</td> <td>2.00</td> <td>0.37</td> </tr> <tr> <td>CALZADA</td> <td>BOCA CALLE 4 OCCIDENTAL</td> <td>6.80</td> <td>5.50</td> <td>0.30</td> <td>-</td> <td>11.40</td> <td>-</td> <td>1.00</td> <td>11.40</td> </tr> <tr> <td>CALZADA</td> <td>BOCA CALLE 4 TRIANGULOS OCCIDENTAL</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0.30</td> <td>2.95</td> <td>0.90</td> <td>-</td> <td>2.00</td> <td>1.80</td> </tr> <tr> <td>CALZADA</td> <td>BOCA CALLE 3</td> <td>11.00</td> <td>10.33</td> <td>0.30</td> <td>-</td> <td>34.82</td> <td>-</td> <td>1.00</td> <td>34.82</td> </tr> <tr> <td>CALZADA</td> <td>DESCUENTO DE POZO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0.30</td> <td>2.27</td> <td>0.99</td> <td>-</td> <td>1.00</td> <td>0.99</td> </tr> <tr> <td colspan="6">SUBTOTAL</td> <td colspan="4">364.83</td> </tr> <tr> <td colspan="10">OBSERVACIONES:</td> </tr> <tr> <td colspan="5">CONTRATISTA</td> <td colspan="5">INTERVISTORA</td> </tr> <tr> <td colspan="5">APROBO</td> <td colspan="5">APROBO</td> </tr> <tr> <td colspan="5">FIRMA:</td> <td colspan="5">FIRMA:</td> </tr> <tr> <td colspan="5">VICTOR MANUEL ARIZA</td> <td colspan="5">EUSEBIO RAMIREZ</td> </tr> <tr> <td colspan="5">DIRECTOR DE OBRA</td> <td colspan="5">DIRECTOR DE INTERVENCION</td> </tr> </table>					ELEMENTO	DESCRIPCION	DIMENSIONES						MEDIDA TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UBIEMENTO	CALZADA	Acercamiento del Acto 6	-	-	-	-	419.30	-	1.00	419.30	CALZADA	ESTABILIZACION CON RAJON DE LA VIA	111.23	10.73	0.30	-	368.05	-	1.00	368.05	CALZADA	FALLO EN SUBRASANTE COSTADO DERECHO ACTA 2	17.98	4.83	0.80	-	68.01	-	1.60	88.01	CALZADA	FALLO POR SUBRASANTE BLANDA ACTA 3	13.20	5.20	0.70	-	48.05	-	1.00	48.05	CALZADA	FALLO POR TUBERIA GRES COLAPSADA ACTA 3	21.80	5.80	0.80	-	101.62	-	1.00	101.62	CALZADA	FALLO POR TUBERIA GRES COLAPSADA ACTA 3	23.00	4.90	0.80	-	90.16	-	1.00	90.16	CALZADA	BOCA CALLE 1 TRIANGULOS COST. SUR	-	-	0.30	4.58	1.40	-	2.00	2.78	CALZADA	BOCA CALLE 2 ORIENTAL	11.50	1.00	0.30	-	3.80	-	2.00	7.81	CALZADA	BOCA CALLE 2 TRIANGULO ORIENTAL	1.10	0.55	0.30	-	0.18	-	2.00	0.37	CALZADA	BOCA CALLE 4 OCCIDENTAL	6.80	5.50	0.30	-	11.40	-	1.00	11.40	CALZADA	BOCA CALLE 4 TRIANGULOS OCCIDENTAL	-	-	0.30	2.95	0.90	-	2.00	1.80	CALZADA	BOCA CALLE 3	11.00	10.33	0.30	-	34.82	-	1.00	34.82	CALZADA	DESCUENTO DE POZO	-	-	0.30	2.27	0.99	-	1.00	0.99	SUBTOTAL						364.83				OBSERVACIONES:										CONTRATISTA					INTERVISTORA					APROBO					APROBO					FIRMA:					FIRMA:					VICTOR MANUEL ARIZA					EUSEBIO RAMIREZ					DIRECTOR DE OBRA					DIRECTOR DE INTERVENCION				
ELEMENTO	DESCRIPCION	DIMENSIONES						MEDIDA TOTAL																																																																																																																																																																																																																									
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UBIEMENTO																																																																																																																																																																																																																										
CALZADA	Acercamiento del Acto 6	-	-	-	-	419.30	-	1.00	419.30																																																																																																																																																																																																																								
CALZADA	ESTABILIZACION CON RAJON DE LA VIA	111.23	10.73	0.30	-	368.05	-	1.00	368.05																																																																																																																																																																																																																								
CALZADA	FALLO EN SUBRASANTE COSTADO DERECHO ACTA 2	17.98	4.83	0.80	-	68.01	-	1.60	88.01																																																																																																																																																																																																																								
CALZADA	FALLO POR SUBRASANTE BLANDA ACTA 3	13.20	5.20	0.70	-	48.05	-	1.00	48.05																																																																																																																																																																																																																								
CALZADA	FALLO POR TUBERIA GRES COLAPSADA ACTA 3	21.80	5.80	0.80	-	101.62	-	1.00	101.62																																																																																																																																																																																																																								
CALZADA	FALLO POR TUBERIA GRES COLAPSADA ACTA 3	23.00	4.90	0.80	-	90.16	-	1.00	90.16																																																																																																																																																																																																																								
CALZADA	BOCA CALLE 1 TRIANGULOS COST. SUR	-	-	0.30	4.58	1.40	-	2.00	2.78																																																																																																																																																																																																																								
CALZADA	BOCA CALLE 2 ORIENTAL	11.50	1.00	0.30	-	3.80	-	2.00	7.81																																																																																																																																																																																																																								
CALZADA	BOCA CALLE 2 TRIANGULO ORIENTAL	1.10	0.55	0.30	-	0.18	-	2.00	0.37																																																																																																																																																																																																																								
CALZADA	BOCA CALLE 4 OCCIDENTAL	6.80	5.50	0.30	-	11.40	-	1.00	11.40																																																																																																																																																																																																																								
CALZADA	BOCA CALLE 4 TRIANGULOS OCCIDENTAL	-	-	0.30	2.95	0.90	-	2.00	1.80																																																																																																																																																																																																																								
CALZADA	BOCA CALLE 3	11.00	10.33	0.30	-	34.82	-	1.00	34.82																																																																																																																																																																																																																								
CALZADA	DESCUENTO DE POZO	-	-	0.30	2.27	0.99	-	1.00	0.99																																																																																																																																																																																																																								
SUBTOTAL						364.83																																																																																																																																																																																																																											
OBSERVACIONES:																																																																																																																																																																																																																																	
CONTRATISTA					INTERVISTORA																																																																																																																																																																																																																												
APROBO					APROBO																																																																																																																																																																																																																												
FIRMA:					FIRMA:																																																																																																																																																																																																																												
VICTOR MANUEL ARIZA					EUSEBIO RAMIREZ																																																																																																																																																																																																																												
DIRECTOR DE OBRA					DIRECTOR DE INTERVENCION																																																																																																																																																																																																																												

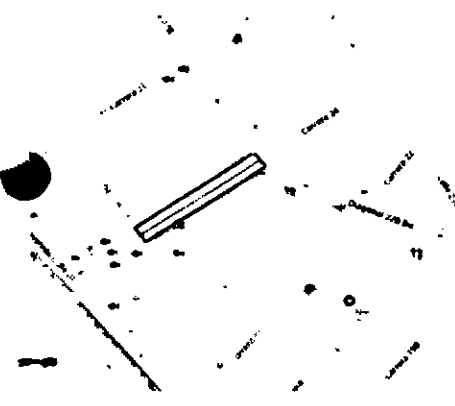

1288

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Nº 1000000 Alcaldes Locales de las Alcaldías
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

N.º	Cod.	BARRIO	PK-ID	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA	VALOR PRESUPUESTADO
			71325 71326	ANDEN				\$ 58.503.050,00
5	14000718	RICAUURTE-TALLERES	183237 71327 71328	CALZADA ANDEN	KR 25A	CL 6A	CL 7	\$ 156.336.760,00 \$ 42.157.841,00
6	14001678	RICAUURTE-TALLERES	472640 467505 467506	CALZADA ANDEN	KR 25A	CL 7	CL 7BIS	\$ 189.367.750,00 \$ 59.782.262,00
7	14001545	SANTA ISABEL SUR	182815	CALZADA	CL 1ABIS	AC 1	KR 26	\$ 6.037.281,00
8	14001517	SANTA ISABEL SUR	182654	CALZADA	KR 26	CL 1ABIS	CL 1B	\$ 3.116.016,00
9	14001156	SANTA ISABEL-2B	70861 70862 182992	CALZADA Y CINTA DE AJUSTE	CL 2B	KR 25A	KR 26	\$ 295.488.390,00
10	14001367	SANTA ISABEL-1B	182827 70542 70543	CALZADA ANDEN	CL 1B	KR 27A	KR 28	\$ 408.727.519,00 \$ 120.094.100,00
11	14000126	PESQUERAS	183733 72263 72264	CALZADA CINTA AJUSTE	KR 24	CL 22A	DG 22B BIS	\$ 538.077.548,00 \$ 13.486.302,00
15	14001506	TAPICERIAS	182491 69902 69903	CALZADA ANDEN	KR 18	CL 2	CL 3	\$ 281.474.006,00 \$ 64.713.546,00
18	14001619	COLEGIOS	182788 70476 70477	CALZADA ANDEN	CL 1C	KR 19A	KR 19BBIS	\$ 165.944.470,00 \$ 29.017.868,00
19	14001616	COLEGIOS	182789 70478 70479	CALZADA ANDEN	CL 1C	KR 19BBIS	KR 19C	\$ 152.556.046,00 \$ 31.228.493,00
20	14000178	ADICION 1 HOJALDRES	183819 72430 72431	CALZADA CINTA AJUSTE	CL22 A	KR 19 A	KR 19B	\$ 334.866.380,00 \$ 5.915.682,00
25	14001098	ADICION 1-A	182856	CALZADA	CLL 1D BIS	KR 29B	AV. NQS	\$ 300.951.644,00
23	14000233	ADICION 1-B	183801	CALZADA	CLL 22	KR 18B	KR 19	\$ 297.248.076,00

1289

 CONTRATO CO-137-2019	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Alcaldía Local de Los Martires</small>
	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

N°	Cod.	BARRIO	PK+D	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA	VALOR PRESUPUESTADO
24	14000615	ADICION 1-C	183438	CALZADA	CL 12	KR 19	KR 19A	\$ 3.116.016,00
3-A	14000434	ACCION DE MOVILIDAD: RICAURTE	183403	CALZADA	CLL 10	KR 29	AV KR 30	\$ 151.420.226,00
11-A	14001474	ACCION DE MOVILIDAD: EDUARDO SANTOS	512891	CALZADA	CL 3	KR 17A	KR 18	\$ 48.942.525,00
12-A	14000389	ACCION DE MOVILIDAD: SAMPER MENDOZA	183633	CALZADA	CLL 20	KR 18	CRUCE	\$ 139.954.373,00
16-A	14000469	ACCION DE MOVILIDAD: EL LISTON	183587	CALZADA	KR 20	CL 14	CL 15	\$ 184.364.112,00
COSTO TOTAL OBRAS INCLUYE REDES Y COSTOS DIRECTOS, APROXIMADA AL PESO (A) =								\$ 5.197.286.681,00
ADMINISTRACIÓN						\$ 1.189.658.921,00	\$ 1.188.874.647,00	
IMPREVISTOS						\$ 51.972.867,00	\$ 51.938.604,00	
UTILIDAD						\$ 363.810.068,00	\$ 363.570.228,00	
COSTO TOTAL A.I.U.						\$ 1.605.441.856,00	\$ 1.604.383.479,00	
COSTO TOTAL OBRA INCLUYE A.I.U.								\$ 6.802.728.537,00
COSTO ACTIVIDADES AMBIENTALES y SST (B)						\$ 201.123.374,00	\$ 200.990.785,00	
COSTO ACTIVIDADES SOCIALES (C)						\$ 185.001.955,00	\$ 184.879.994,00	
COSTO PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (D)						\$ 83.484.576,00	\$ 83.429.540,00	
TOTAL OBRAS LICITACION (A+B+C+D)								\$ 7.272.338.442,00
COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO (E) (INCLUYE AJUSTES E IVA)						\$ 29.833.082,00	\$ 29.813.425,00	
COSTO ESTIMADO DE AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (F) (INCLUYE IVA)						\$ 337.110.102,00	\$ 337.110.102,00	
VALOR TOTAL SIN AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (VALOR EVALUABLE) =								\$ 7.639.281.636,00
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (SOLO OBRA) , INCLUYE COSTOS INDIRECTOS (G)						\$ 208.144.381,00	\$ 208.144.381,00	
VALOR TOTAL DELCONTRATO APROXIMADO AL PESO =								\$ 7.847.426.017,00
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD -TRANSPORTE SEGURO (CONSIDERADO 5 FRENTES DE OBRA)								\$ 250.000.000,00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO + PROTOCOLOS								\$ 8.097.426.017
								97.8%

41.5
496
D-1

 CONTRATO CO-137-2019	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

12.1.1 RESPUESTA AL INCUMPLIMIENTO DEL ASPECTO TÉCNICO

Teniendo en cuenta, tal y como se manifestó en el oficio C&C-CO137-2019-119: RESPUESTA COMUNICADO MIRS-MAR-132-2021; CITACIÓN AUDIENCIA SANCIONATORIO CONTRATO DE OBRA No. 137-2019, Numeral 2. Respuesta al incumplimiento del Aspecto Técnico, se evidencia que los segmentos- Elementos PK-ID CALZADA que actualmente están abiertos, se encuentran con un avance del 90% faltando por ejecutar la construcción de sumideros y la demarcación, así, como se presenta en la tabla 16.

Tabla 17 ACTIVIDADES A EJECUTAR PK-ID CALZADA

No	Cod.	BARRIO	PK-ID	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR AJECUTADO	% EJECUCION
1	14001469	EL VERGEL-CONSOLATA	182872	CALZADA	CL 1F	KR 24A	KR 24B	\$ 295.367.657	\$ 280.460.343	95%
2	14001481	EL VERGEL-CONSOLATA	182871	CALZADA	CL 1F	KR 24	KR 24A	\$ 242.916.869	\$ 229.728.084	95%
3	14000772	RICAURTE-TALLERES	183235	CALZADA	KR 25A	AC 6	CL 6BIS	\$ 213.784.434	\$ 206.380.979	97%
4	14000741	RICAURTE-TALLERES	183236	CALZADA	KR 25A	CL 6BIS	CL 6A	\$ 238.309.683	\$ 230.803.229	97%
5	14000718	RICAURTE-TALLERES	183237	CALZADA	KR 25A	CL 6A	CL 7	\$ 156.336.760	\$ 148.907.057	95%
6	14000678	RICAURTE-TALLERES	183546	CALZADA	KR 25A	CL 7	CL 7BIS	\$ 189.367.750	\$ 182.383.074	96%
9	14001156	SANTA ISABEL-2B	70861 70862 182992	CALZADA Y CINTA DE AJUSTE	CL 2B	KR 25A	KR 26	\$ 295.488.390	\$ 272.297.642	92%
10	14001367	SANTA ISABEL-1B	182827	CALZADA	CL 1B	KR 27A	KR 28	\$ 408.727.519	\$ 401.729.649	98%
11	14000126	PESQUERAS	183733	CALZADA	KR 24	CL 22A	DG 22B BIS	\$ 535.982.932	\$ 506.892.735	94%
15	14001506	TAPICERIAS	182491	CALZADA	KR 18	CL 2	CL 3	\$ 281.474.006	\$ 137.899.625	37%
18	14001619	COLEGIOS	182788	CALZADA	CL 1C	KR 19A	KR 19BBIS	\$ 165.944.470	\$ 157.866.558	95%
19	14001616	CIOLEGIOS	182789	CALZADA	CL 1C	KR 19BBIS	KR 19C	\$ 152.556.046	\$ 143.361.704	94%
20	14000178	ADICION 1 HOJALDRES	183819	CALZADA	CL 22A	KR 19A	KR 19B	\$ 348.761.354	\$ 300.342.602	90%
PROMEDIO DE EJECUCION DE LOS FRETES ACTIVOS										90%

FUENTE: CON&CON SAS / CO-137-2019

Se hace la aclaración que el CIV's 14001506 del elemento calzada tiene un avance del 90%; falta la conformación de la estructura de la calzada occidental y la verificación del estado de la calzada

1202
 1197

 CONTRATO CO-137-2019	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

oriental.

Los segmentos CIV's 14001469 14001481, 14001619, 14001616 y 14001367, presentan una demarcación parcial por parte de Secretaria Distrital de Movilidad, aun cuando los elementos PK-ID, se encuentra reservado para ejecución en este contrato, por tal motivo se realizó nuevamente actualización de presupuesto y avance físico de los frentes.

Los segmentos- Elementos PK-ID ANDEN costado sur, que actualmente se hallan abiertos, CIV's 14001619, se encuentran en capa granular; se debe hacer la verificación del estado en que se encuentra el frente así, como se presenta en Tabla No.17.

Tabla 18 ACTIVIDADES A EJECUTAR PK-ID ANDENES

No	Cod.	BARRIO	PK-ID	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR AJECUTADO	% EJECUCION
18	14001619	COLEGIOS	182788	CALZADA	CL 1C	KR 19A	KR 19BBIS	\$ 165.944.470	\$ 157.866.558	96%
			70478-70477	CINTA DE AJUSTE -ANDEN				\$ 29.017.868	\$ 5.803.574	20%
19	14001616	COLEGIOS	182789	CALZADA	CL 1C	KR 19BBIS	KR 19C	\$ 152.556.046	\$ 143.361.704	94%
			70478-70479	CINTA DE AJUSTE -ANDEN				\$ 31.228.493	\$ 1.550.000	5%

FUENTE: CON&CON SAS / CO-137-2019

A la fecha del presunto incumplimiento no se cuenta con la reserva ante el IDU, por parte del Fondo de Desarrollo local de Mártires la asignación de los nuevos segmentos a intervenir los cuales se relacionan en la Tabla No.18.

Tabla 19 ASIGNACION DE SEGMENTOS A INTERVENIR

No	Cod.	BARRIO	PK-ID	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA
1	14001469	EL VERGEL-CONSOLATA	70632 70633	ANDEN	CL 1F	KR 24A	KR 24B
2	14001481	EL VERGEL-CONSOLATA	70630 70631	ANDEN	CL 1F	KR 24	KR 24A
3	14000772	RICAU RTE-TALLERES	71323 71324	ANDEN	KR 25A	AC 6	CL 6BIS
4	14000741	RICAU RTE-TALLERES	71325 71326	ANDEN	KR 25A	CL 6BIS	CL 6A
5	14000718	RICAU RTE-TALLERES	71327 71328	ANDEN	KR 25A	CL 6A	CL 7
6	14001678	RICAU RTE-TALLERES	467505 467506	ANDEN	KR 25A	CL 7	CL 7BIS

1293-

 CONTRATO CO-137-2019	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES INFORME TÉCNICO No.12	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022 Versión 00	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
--	--	--	---

No	Cod.	BARRIO	PK-ID	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA
10	14001367	SANTA ISABEL-1B	70542 70543	ANDEN	CL 1B	KR 27A	KR 28
15	14001506	TAPICERIAS	69902 69903	ANDEN	KR 18	CL 2	CL 3

FUENTE: CON&CON SAS / CO-137-2019

Así las cosas, considerando las situaciones o circunstancias que se han dado para la inclusión de estos nuevos frentes, solicitamos que se genere la asignación por parte del FDLM, ya que estos frentes en la actualidad pueden estar en evaluación y/o asignación a terceros.

El 2 de agosto del 2021, en comité de obra la Supervisión por parte de la Alcaldía de mártires hace entrega del listado de "SOLICITUD DE INTERVENCIONES CON ACCIONES DE MOVILIDAD DE LOCALIDAD DE MARTIRES". Actualmente de los dieciséis (16) frentes de obra entregados por el FDLM, se evidencio que el frente de obra No 5 esta repetido en el frente de obra No 7, dichos frente corresponde al CIV 14001471, por esta razón se evaluarán un total de quince (15) frentes de obra entregados FDLM, de los cuales once (11) frentes se encuentran ejecutados por terceros de acuerdo a la Tabla No.19.

Tabla 20 SEGMENTOS EXCLUIDOS POR EJECUCIÓN DE TERCEROS

PRIORIZADO	BARRIO	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA	ACTIVIDADES POR EJECUTAR
1	SAMPER MENDOZA	14000068 14001670	KR 25	CL 23	CL 24	Ejecutado por terceros
2	SAMPER MENDOZA	14000087 14000080	KR 24	CL 23	CL 24	Ejecutado por terceros
4	VOTO NACIONAL	14000971	CL 8	CR 17	CR 18	Ejecutado por terceros
5	EDUARDO SANTOS	14001471	DIAG 2	KR 18A	CL 3	Ejecutado por terceros
6	EDUARDO SANTOS	14001447	CL 3	CR 18A	DIAG 2	Ejecutado por terceros
8	EDUARDO SANTOS	14001588	CR 16	CL 23	CL 2BIS	Ejecutado por terceros
9	EDUARDO SANTOS	14001571	CR 16	CL 2BIS	CL 3	Ejecutado por terceros
10	EDUARDO SANTOS	14001510	CL 3	CR 16	CR 17	Ejecutado por terceros
12	SAMPER MENDOZA	14000389	CL 20	KR 16	CRUCE	Ejecutado por terceros
13	SAMPER MENDOZA	14000362	CL 20	KR 16A	CRUCE	Ejecutado por terceros
14	SAMPER MENDOZA	14000312	CL 20	KR 18A	CRUCE	Ejecutado por terceros

1199
1294

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO-137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

Es de aclarar que este listado fue entregado a la UMV, mediante Radicado 20216420269461; por lo tanto, el contratista advierte que los cuatro (4) frentes dispuestos para su ejecución, pueden estar programados para ejecución por parte de la UMV.

La Interventoría es la encargada de velar y verificar la ejecución de los ajustes que se requieran de acuerdo con las observaciones de la SDM. Dentro de las actividades ejecutadas por el Contratista se encuentra el trámite y aprobación de los Planes de Manejo de Trafico, señalización y desvíos ante la secretaria Distrital de Movilidad SDM.

El Contratista presento ante la secretaria Distrital de Movilidad SDM la radicación y subsanación de los requerimientos, así, como se presentan a continuación.

Tabla 21 REQUERIMIENTOS DE SECRETARIA DE MOVILIDAD

OFICIO DE ENTRADA	ASUNTO	OFICIO DE RESPUESTA	ASUNTO
Radicado SDM N° 20213120637751 del 04 de febrero de 2021 Radicado a Con y Con 09 de febrero de 2021	Suspensión por Obra sin iniciar	No requiere respuesta	No requiere respuesta
Radicado SDM N°20213122334561 del 22 abril de 2021 Radicado a Con y Con 03 de mayo de 2021	Terminación de obra	C&C-CO137-2019-086 Del 05-05-2021	Respuesta radicada SDM N°20213122334561 – solicitud de terminación de PMT Radicado SDM 20216120768412
Radicado SDM N°20213123334111 del 19 de mayo de 2021 Radicado a Con y Con 21 de mayo de 2021	Incumplimientos en la implementación de PMT	C&C-CO137-2019-106 del 25-08-2021	Respuesta radicada SDM N°20213123334111 rad SDM 20216121421272
Radicado SDM N°20213125295801 del 06 de julio de 2021 Radicado a Con y Con 30 de junio de 2021	Terminación de obra	C&C-CO137-2019-094 del 08-07-2021	Respuesta radicada SDM N°20213125295801 – solicitud de terminación de PMT Radicado SDM 20216121123912
Radicado SDM N° 20213125899761 del 30 de julio de 2021 Radicado a Con y Con 04 de agosto de 2021	Suspensión por Obra sin iniciar	No requiere respuesta	No requiere respuesta
Radicado SDM N°20213126408431 del 07 de septiembre de 2021 Radicado a Con y Con 09 de septiembre de 2021	Incumplimientos en la implementación de PMT y obra sin PMT vigente	C&C-CO137-2019-116 del 16-09-2021	Respuesta radicada SDM N°20213126408431– Radicado SDM

FUENTE: CON&CON SAS / CO-137-2019

12.1.2 PROPUESTA PARA CULMINACION DE LOS FRENTES DEL CONTRATO DE OBRA

No. 137-2019

Acorde a lo requerido en la citación de audiencia del posible incumplimiento que se llevó a cabo el día viernes 26 de noviembre del 2021 y a las mesas de trabajo el Fondo de Desarrollo Local de mártires-FDLM, solicita una propuesta para dar culminacion al objeto contractual.

1201
1295

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

GRUPO No.2

En el siguiente cuadro se presentan los CIV que se tiene contemplado iniciarlos en el segundo grupo, ver tabla No.22.

Tabla 23 FRENTE A EJECUTAR-GRUPO 2

No	Cod.	BARRIO	PK-ID	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA	% EJECUCION	ACTIVIDADES POR EJECUTAR
1	14001469	EL VERGEL- CONSOLATA	182872	CALZADA	CL 1F	KR 24A	KR 24B	95%	1.SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB
			70632 70633	ANDEN Y CINTA DE AJUSTE				0%	1.CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA ANDEN Y CINTA DE AJUSTE
2	14001481	EL VERGEL- CONSOLATA	182871	CALZADA	CL 1F	KR 24	KR 24A	86%	1.SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB 2.CONFORMACION DE LA BOCACALLE KR 24A 3.TERMINACIÓN DE POZO Y CARGUE
			70630 70631	ANDEN Y CINTA DE AJUSTE				0%	1.CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA ANDEN Y CINTA DE AJUSTE
3	14000772	RICAURTE- TALLERES	183235	CALZADA	KR 25A	AC 6	CL 6BIS	97%	1.DEMARCACION Y MOBILIARIO (TACHAS, ESTOPEROLES) 2. TAPA DE SUMIDERO
			71323 71324	ANDEN				0%	1.CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA ANDEN
4	14000741	RICAURTE- TALLERES	183236	CALZADA	KR 25A	CL 6BIS	CL 6A	97%	1.DEMARCACION Y MOBILIARIO (TACHAS, ESTOPEROLES)
			71325- 71326	ANDEN				0%	1.CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA ANDEN
5	14000718	RICAURTE- TALLERES	183237	CALZADA	KR 25A	CL 6A	CL 7	95%	1.DEMARCACION Y MOBILIARIO (TACHAS, ESTOPEROLES)
			71327- 71328	ANDEN				0%	1.CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA ANDEN
6	14000678	RICAURTE- TALLERES	183546	CALZADA	KR 25A	CL 7	CL 7BIS	96%	1.DEMARCACION Y MOBILIARIO (TACHAS, ESTOPEROLES)
			71914- 71915	ANDEN				0%	1.CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA ANDEN

FUENTE: CON&CON SAS / CO-137-2019

GRUPO No.3

En el siguiente cuadro se presentan los CIV que tiene contemplado iniciarlos en tercer grupo, ver tabla No.23.

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO-137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

Tabla 24 FRENTE A EJECUTAR-GRUPO 3

No	Cod.	BARRIO	PK-ID	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA	% EJECUCION	ACTIVIDADES POR EJECUTAR
20	14000178	ADICION 1 HOJALDRES	183819	CALZADA	CL 22	KR 19A	KR 19B	90%	1. SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB 2. DEMARCACION Y MOBILIARIO (TACHAS, ESTOPEROS. ETC
			72430-72431	CINTA AJUSTE				0%	1. CONTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCION Y CONFORMACION DE CINTA DE AJUSTE DE ANDEN. 2. VERIFICACION DEL ESTADO SARDINEL.
11	14000126	PESQUERAS	183733	CALZADA	KR 24	CL 22A	DG 22B BIS	94%	1. SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB 2. DEMARCACION Y MOBILIARIO (TACHAS, ESTOPEROS. ETC
			72263 72264	CINTA AJUSTE				0%	1. CONTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCION Y CONFORMACION DE CINTA DE AJUSTE DE ANDEN.
9	14001156	SANTA ISABEL-2B	472640 708061 70862	CALZADA Y CINTA AJUSTE	CL 2B	KR 25A	KR 26	92%	1. SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB 2. DEMARCACION Y MOBILIARIO (TACHAS, ESTOPEROS. ETC

FUENTE: CON&CON SAS / CO-137-2019

GRUPO No.4

En el siguiente cuadro se presentan los CIV que tiene contemplado iniciarlos en cuarto grupo, ver tabla No.24.

Tabla 25 FRENTE A EJECUTAR-GRUPO 4

No	Cod.	BARRIO	PK-ID	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA	ACTIVIDADES POR EJECUTAR
25	14001098	ADICION 1-A	182856	CALZADA	CLL 22	KR 18B	AK 19	1. CONFORMACION DE LA CALZADA 2. SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB 3. DEMARCACION Y MOBILIARIO (TACHAS, ESTOPEROS. ETC
23	14000233	ADICION 1-B	183801	CALZADA	CLL 22A	KR 19A	KR 19B	1. CONFORMACION DE LA CALZADA 2. SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB 3. DEMARCACION Y MOBILIARIO (TACHAS, ESTOPEROS. ETC

FUENTE: CON&CON SAS / CO-137-2019

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	 <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small>
CONTRATO CO-137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

GRUPO No.5

En el siguiente cuadro se presentan los CIV que tiene contemplado iniciarlos en quinto grupo, ver tabla No.25.

Tabla 26 FRENTE A EJECUTAR-GRUPO 5

No	Cod.	BARRIO	PK-ID	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA
3-A	14000434	ACCION DE MOVILIDAD: RICAURTE	183403	CALZADA	CLL 10	KR 29	AV KR 30
11-A	14001447	ACCION DE MOVILIDAD: EDUARDO SANTOS	512891	CALZADA	CL 3	KR 17A	KR 18
12-A	14000389	ACCION DE MOVILIDAD: SAMPER MENDOZA	183633	CALZADA	CLL 20	KR 16	CRUCE
16-A	14000469	ACCION DE MOVILIDAD: EL LISTON	183587	CALZADA	KR 20	CL 14	CL 15

FUENTE: CON&CON SAS / CO-137-2019

13 RESUMEN DE VERIFICACIÓN POR CIV

13.1 INDICADORES DE INTERVENCIÓN

A continuación, se presenta el resumen del avance financiero del contrato:

PROGRAMADO SEGÚN EL VALOR DEL CONTRATO		EJECUTADO SEGÚN EL VALOR DEL CONTRATO	
VALOR PRESUPUESTADO	\$8.283.121.103		
TOTAL CONTRATO	ACUMULADO		
Trabajo Programado	58%	Trabajo Ejecutado	58.31%
Valor del Trabajo Programado	\$4.804.210.239	Valor del Trabajo Ejecutado	\$4.830.222.321

Es importante aclarar que el indicador difiere en el avance financiero si tenemos en cuenta que a la fecha del presente informe no se tiene el valor total presupuestado, por lo tanto se presenta el avance real del contrato.

PROGRAMADO SEGÚN LO PRESUPUESTADO		EJECUTADO SEGÚN LO PRESUPUESTADO	
VALOR PRESUPUESTADO	\$7.548.849.510,03		
TOTAL CONTRATO	ACUMULADO		
Trabajo Programado	64%	Trabajo Ejecutado	64%
Valor del Trabajo Programado	\$4.830.222.321	Valor del Trabajo Ejecutado	\$4.830.222.321

1204
1298

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO</small>
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

A la fecha, se encuentra un avance del 64% con respecto a los frentes que están en ejecución y con el valor presupuestado.

13.2 PROGRAMACIÓN DE OBRA

A continuación, se presenta la reprogramación de obra No.02, correspondiente a la reactivación No.4-Prorroga N°3, en donde se incluyen tanto los segmentos iniciales del contrato, como los de la adición, teniendo como fecha límite de terminación el 15 de septiembre del 2022.

Tabla 27 PROGRAMACION DE OBRA " REACTIVACION No4"

NOMBRE DE TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN
CONTRATO-CO-137	100 días	mar 17/05/22	vie 16/09/22
GRUPO 1	92 días	mar 17/05/22	mié 7/09/22
TAPICERIAS - 14001506 -	92 días	mar 17/05/22	mié 7/09/22
TAPICERIAS - 14001506 - CALZADA	92 días	mar 17/05/22	mié 7/09/22
TRAMITE SOLICITUD PMT-CALZADA	15 días	mar 17/05/22	jue 2/06/22
RELLENOS CALZADA ORIENTAL	8 días	jue 2/06/22	lun 13/06/22
EVALUACION TECNICA ESTRUCTURA CONSTRUIDA	3 días	jue 2/06/22	lun 6/06/22
SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO	4 días	jue 2/06/22	mar 7/06/22
BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO	4 días	mar 7/06/22	lun 13/06/22
PREFABRICADOS ORIENTAL	3 días	lun 13/06/22	mié 15/06/22
INSTALACION SARDINEL	3 días	lun 13/06/22	mié 15/06/22
ASFALTO CALZADA-ORIENTAL	4 días	lun 13/06/22	jue 16/06/22
IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	4 días	lun 13/06/22	jue 16/06/22
MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO- PRIMERA CAPA-PROTEGER BASE	4 días	lun 13/06/22	jue 16/06/22
RELLENOS CALZADA OCCIDENTAL	23 días	jue 2/06/22	vie 1/07/22
EVALUACION TECNICA ESTRUCTURA CONSTRUIDA	7 días	jue 2/06/22	vie 10/06/22
ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN	7 días	jue 2/06/22	vie 10/06/22
RELLENO EN TRITURADO DE 3/4"	3 días	vie 10/06/22	mar 14/06/22
RELLENO EN RECEBO COMUN	3 días	mar 14/06/22	vie 17/06/22

1205
1299

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Alcalde Local de Los Martires</small>
CONTRATO CO-137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

NOMBRE DE TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN
SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO	5 días	vie 17/06/22	vie 24/06/22
BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO	5 días	vie 24/06/22	vie 1/07/22
PREFABRICADOS	3 días	vie 1/07/22	jue 7/07/22
INSTALACION SARDINEL	3 días	vie 1/07/22	jue 7/07/22
ASFALTO CALZADA-COMPLEMENTO Y TOTAL	4 días	lun 13/06/22	jue 16/06/22
IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	4 días	lun 13/06/22	jue 16/06/22
MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO	4 días	lun 13/06/22	jue 16/06/22
SUMIDEROS	10 días	jue 16/06/22	jue 30/06/22
SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	10 días	jue 16/06/22	jue 30/06/22
SEÑALIZACION CALZADA	92 días	mar 17/05/22	mié 7/09/22
DISEÑO-SEÑALIZACION	88 días	mar 17/05/22	vie 2/09/22
PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA. TIPO TRANSMILENIO 40.5cmx15cmx8.5cm)	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
ESTOPEROLAS METÁLICAS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2cm DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA.	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
DEMARCAACION LINEA CONTINUA A=0.15m	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

NOMBRE DE TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN
TAPICERIAS - 14001506 - ANDEN	45 días	mar 17/05/22	mar 12/07/22
TRAMITE SOLICITUD PMT-ANDEN	15 días	mar 17/05/22	jue 2/06/22
REPLANTEO ANDEN ORIENTAL	1 día	jue 2/06/22	vie 3/06/22
REPLANTEO GENERAL COSTADO ORIENTE	1 día	jue 2/06/22	vie 3/06/22
DEMOLICION ANDEN	5 días	vie 3/06/22	jue 9/06/22
DEMOLICION COSTADO ORIENTE	5 días	vie 3/06/22	jue 9/06/22
EXCAVACION ANDEN	4 días	jue 9/06/22	mar 14/06/22
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN COSTADO ORIENTE	4 días	jue 9/06/22	mar 14/06/22
RELLENO ANDEN	3 días	mar 14/06/22	vie 17/06/22
GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	3 días	mar 14/06/22	vie 17/06/22
SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	3 días	mar 14/06/22	vie 17/06/22
REDES ANDEN	6 días	vie 10/06/22	vie 17/06/22
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela)	6 días	vie 10/06/22	vie 17/06/22
CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	6 días	vie 10/06/22	vie 17/06/22
CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLÁSTICO CON CONCRETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	2 días	mié 15/06/22	vie 17/06/22
CONCRETO ANDEN	2 días	vie 17/06/22	mar 21/06/22
PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) G	2 días	vie 17/06/22	mar 21/06/22
REPLANTEO ANDEN OCCIDENTAL	1 día	vie 17/06/22	mar 21/06/22
REPLANTEO GENERAL COSTADO OCCIDENTE	1 día	vie 17/06/22	mar 21/06/22
DEMOLICION ANDEN	5 días	mar 21/06/22	mar 28/06/22
DEMOLICION COSTADO OCCIDENTE	5 días	mar 21/06/22	mar 28/06/22
EXCAVACION ANDEN	4 días	mar 28/06/22	vie 1/07/22

1207
1301

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

NOMBRE DE TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN COSTADO OCCIDENTE	4 días	mar 28/06/22	vie 1/07/22
RELLENO ANDEN	3 días	vie 1/07/22	jue 7/07/22
GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	3 días	vie 1/07/22	jue 7/07/22
SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	3 días	vie 1/07/22	jue 7/07/22
REDES ANDEN	10 días	mié 29/06/22	mar 12/07/22
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela)	6 días	mié 29/06/22	jue 7/07/22
CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	6 días	mié 29/06/22	jue 7/07/22
CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLÁSTICO CON CONCRETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	6 días	mar 5/07/22	mar 12/07/22
CONCRETO ANDEN	4 días	jue 7/07/22	mar 12/07/22
PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) G	4 días	jue 7/07/22	mar 12/07/22
COLEGIOS - 14001619 -MURO	30 días	mar 17/05/22	mar 21/06/22
COLEGIOS - 14001619 -CALZADA	30 días	mar 17/05/22	mar 21/06/22
TRAMITE SOLICITUD PMT-CALZADA	15 días	mar 17/05/22	jue 2/06/22
SUMIDEROS	15 días	jue 2/06/22	mar 21/06/22
SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	15 días	jue 2/06/22	mar 21/06/22
COLEGIOS - 14001619 -ANDEN-SUR	30 días	mar 17/05/22	mar 21/06/22
TRAMITE SOLICITUD PMT-ANDEN	15 días	mar 17/05/22	jue 2/06/22
REPLANTEO ANDEN ORIENTAL	1 día	jue 2/06/22	vie 3/06/22
REPLANTEO GENERAL	1 día	jue 2/06/22	vie 3/06/22
SUR REVISION ESTRUCTURA CONSTRUIDA-ANDEN	4 días	vie 3/06/22	mié 8/06/22
SUR REVISION ESTRUCTURA PARA ANDEN COSTADO	4 días	vie 3/06/22	mié 8/06/22

1208
1302

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Asesoria Local en Los Martires
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

NOMBRE DE TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN
RELLENO ANDEN SUR	4 días	mié 8/06/22	lun 13/06/22
SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	4 días	mié 8/06/22	lun 13/06/22
REDES ANDEN SUR	7 días	vie 10/06/22	mar 21/06/22
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela)-INSTALAR MARCO-TAPAS	6 días	lun 13/06/22	mar 21/06/22
CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	6 días	lun 13/06/22	mar 21/06/22
CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLÁSTICO CON CONCRETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	2 días	vie 10/06/22	lun 13/06/22
CONCRETO ANDEN SUR	3 días	mar 14/06/22	jue 16/06/22
PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) G	3 días	mar 14/06/22	jue 16/06/22
REDES ANDEN NORTE	3 días	jue 16/06/22	mar 21/06/22
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela)-INSTALAR MARCO-TAPAS	2 días	jue 16/06/22	mar 21/06/22
CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	2 días	jue 16/06/22	mar 21/06/22
CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLÁSTICO CON CONCRETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	1 día	mar 21/06/22	mar 21/06/22
COLEGIOS - 14001616 -V.AZUL	30 días	mar 17/05/22	mar 21/06/22
COLEGIOS - 14001616-CALZADA	30 días	mar 17/05/22	mar 21/06/22
TRAMITE SOLICITUD PMT-CALZADA	15 días	mar 17/05/22	jue 2/06/22
SUMIDEROS	15 días	jue 2/06/22	mar 21/06/22
SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	15 días	jue 2/06/22	mar 21/06/22
COLEGIOS - 14001619 -ANDEN-SUR	28 días	mar 17/05/22	vie 17/06/22
TRAMITE SOLICITUD PMT-ANDEN	15 días	mar 17/05/22	jue 2/06/22

1210
1304

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	 <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 2019</small>
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

NOMBRE DE TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN
CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLÁSTICO CON CONCRETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	2 días	mié 15/06/22	vie 17/06/22
1B- 14001367	70 días	mar 17/05/22	jue 11/08/22
1B - 14001367-CALZADA	52,13 días	mar 17/05/22	jue 21/07/22
TRAMITE SOLICITUD PMT-CALZADA	15 días	mar 17/05/22	jue 2/06/22
SUMIDEROS	37,13 días	jue 2/06/22	jue 21/07/22
SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	21 días	jue 2/06/22	jue 21/07/22
1B- 14001367 -ANDEN-SUR	70 días	mar 17/05/22	jue 11/08/22
TRAMITE SOLICITUD PMT-ANDEN-SUR Y NORTE	15 días	mar 17/05/22	jue 2/06/22
REPLANTEO ANDEN-SUR	1 día	mié 22/06/22	mié 22/06/22
REPLANTEO GENERAL COSTADO SUR	1 día	mié 22/06/22	mié 22/06/22
DEMOLICION ANDEN	7 días	mié 22/06/22	vie 1/07/22
SUR DEMOLICION PISOS DE CONCRETO COSTADO	7 días	mié 22/06/22	vie 1/07/22
EXCAVACION ANDEN	7 días	jue 23/06/22	mar 5/07/22
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN COSTADO SUR	7 días	jue 23/06/22	mar 5/07/22
RELLENO ANDEN	7 días	mié 6/07/22	jue 14/07/22
GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	7 días	mié 6/07/22	jue 14/07/22
SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO	7 días	mié 6/07/22	jue 14/07/22
REDES ANDEN	14 días	vie 24/06/22	jue 14/07/22
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela)-INSTALAR MARCO-TAPAS	7 días	vie 24/06/22	mié 6/07/22
CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	7 días	mar 28/06/22	jue 7/07/22
CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLÁSTICO CON CONCRETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	2 días	mar 12/07/22	jue 14/07/22

1211
1305

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 2019
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

NOMBRE DE TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN
CONCRETO ANDEN	3 días	jue 14/07/22	lun 18/07/22
PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) G	3 días	jue 14/07/22	lun 18/07/22
REPLANTEO ANDEN-NORTE	1 día	lun 18/07/22	mar 19/07/22
REPLANTEO GENERAL COSTADO NORTE	1 día	lun 18/07/22	mar 19/07/22
DEMOLICION ANDEN	7 días	mar 19/07/22	jue 28/07/22
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO COSTADO NORTE	7 días	mar 19/07/22	jue 28/07/22
EXCAVACION ANDEN	7 días	jue 21/07/22	vie 29/07/22
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN COSTADO NORTE	7 días	jue 21/07/22	vie 29/07/22
RELLENO ANDEN	7 días	vie 29/07/22	vie 5/08/22
GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	7 días	vie 29/07/22	vie 5/08/22
SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO	7 días	vie 29/07/22	vie 5/08/22
REDES ANDEN	13 días	vie 22/07/22	vie 5/08/22
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cafueña)-INSTALAR MARCO-TAPAS	6 días	vie 22/07/22	vie 29/07/22
CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	6 días	sáb 23/07/22	vie 29/07/22
CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLÁSTICO CON CONCRETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	2 días	jue 4/08/22	vie 5/08/22
CONCRETO ANDEN	4 días	sáb 6/08/22	jue 11/08/22
PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) G	4 días	sáb 6/08/22	jue 11/08/22
GRUPO 2	92 días	mar 17/05/22	mié 7/09/22
CONSOLATA-BAHIA 14001469	92 días	mar 17/05/22	mié 7/09/22
CONSOLATA-BAHIA - 14001469 -CALZADA	92 días	mar 17/05/22	mié 7/09/22
TRAMITE SOLICITUD PMT-CALZADA	15 días	mié 8/06/22	mié 29/06/22
REPLANTEO CALZADA	2 días	mié 29/06/22	jue 30/06/22
REPLANTEO GENERAL	1 día	mié 29/06/22	mié 29/06/22

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

NOMBRE DE TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN
BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2cm DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA.	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
DEMARCAION LINEA CONTINUA A=0.15m	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
CONSOLATA-BAHIA - 14001469 -ANDEN	37 días	mié 29/08/22	vie 12/08/22
TRAMITE SOLICITUD PMT-ANDEN	15 días	mié 29/06/22	lun 18/07/22
REPLANTEO ANDEN NORTE	1 día	vie 22/07/22	vie 22/07/22
REPLANTEO GENERAL ANDEN COSTADO NORTE	1 día	vie 22/07/22	vie 22/07/22
DEMOLICION ANDEN NORTE	3 días	sáb 23/07/22	mié 27/07/22
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO COSTADO NORTE	3 días	sáb 23/07/22	mié 27/07/22
EXCAVACION ANDEN	3 días	lun 25/07/22	jue 28/07/22
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN COSTADO NORTE	3 días	lun 25/07/22	jue 28/07/22
RELLENO ANDEN	3 días	sáb 30/07/22	mié 3/08/22
GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	3 días	sáb 30/07/22	mié 3/08/22
SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO	3 días	sáb 30/07/22	mié 3/08/22
REDES CALZADA	7 días	mar 26/07/22	mié 3/08/22
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela)-INSTALAR MARCO-TAPAS	4 días	mar 26/07/22	vie 29/07/22
CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	4 días	mié 27/07/22	lun 1/08/22
CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLÁSTICO CON CONCRETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	2 días	lun 1/08/22	mié 3/08/22
CONCRETO ANDEN	3 días	mié 3/08/22	vie 5/08/22
PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) G	3 días	mié 3/08/22	vie 5/08/22

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

NOMBRE DE TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN
EVALUACION TECNICA -ESTRUCTURA CONSTRUIDA	1 día	jue 30/06/22	jue 30/06/22
EXCAVACION CALZADA	4 días	jue 30/06/22	jue 7/07/22
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN- BOCA CALLE-CRA 24A	4 días	jue 30/06/22	jue 7/07/22
RELLENO CALZADA	8 días	jue 7/07/22	vie 15/07/22
SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) -BOCA CALLE-CRA 24A	4 días	jue 7/07/22	mar 12/07/22
BASE GRANULAR CLASE B (BG_B)-BOCA CALLE- CRA 24A	4 días	mar 12/07/22	vie 15/07/22
REDES CALZADA	19 días	vie 15/07/22	mar 9/08/22
PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC.-BOCA CALLE-CRA 24A	1 día	vie 15/07/22	lun 18/07/22
SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	15 días	vie 22/07/22	mar 9/08/22
ASFALTO CALZADA	4 días	vie 15/07/22	vie 22/07/22
IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA-BOCA CALLE-CRA 24A	4 días	vie 15/07/22	vie 22/07/22
MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO- BOCA CALLE-CRA 24A	4 días	vie 15/07/22	vie 22/07/22
SEÑALIZACION CALZADA	92 días	mar 17/05/22	mié 7/09/22
DISEÑO-SEÑALIZACION	88 días	mar 17/05/22	vie 2/09/22
PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA. TIPO TRANSMILENIO 40.5cmx15cmx8.5cm)	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

NOMBRE DE TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN
REPLANTEO ANDEN SUR	1 día	sáb 6/08/22	lun 8/08/22
REPLANTEO GENERAL ANDEN COSTADO SUR	1 día	sáb 6/08/22	lun 8/08/22
DEMOLICION ANDEN	2 días	lun 8/08/22	mié 10/08/22
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO COSTADO SUR	2 días	lun 8/08/22	mié 10/08/22
EXCAVACION ANDEN	2 días	mié 10/08/22	vie 12/08/22
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN COSTADO SUR	2 días	mié 10/08/22	vie 12/08/22
REDES ANDEN	3 días	lun 8/08/22	jue 11/08/22
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela)-INSTALAR MARCO-TAPAS	3 días	lun 8/08/22	jue 11/08/22
CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	2 días	mar 9/08/22	jue 11/08/22
CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLÁSTICO CON CONCRETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	1 día	mar 9/08/22	mié 10/08/22
CONCRETO ANDEN	1 día	vie 12/08/22	vie 12/08/22
PISO EN CONCRETO	1 día	vie 12/08/22	vie 12/08/22
CONSOLATA - 14001481	41 días	mié 29/06/22	vie 19/08/22
CONSOLATA 14001481 -CALZADA	38 días	mié 29/06/22	mar 16/08/22
TRAMITE SOLICITUD PMT-CALZADA	15 días	mié 29/06/22	lun 18/07/22
REPLANTEO CALZADA	2 días	lun 18/07/22	jue 21/07/22
REPLANTEO GENERAL	1 día	lun 18/07/22	mar 19/07/22
EVALUACION TECNICA -ESTRUCTURA CONSTRUIDA	1 día	mar 19/07/22	jue 21/07/22
EXCAVACION CALZADA	1 día	jue 21/07/22	vie 22/07/22
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN- BOCA CALLE-CRA 24A	1 día	jue 21/07/22	vie 22/07/22
RELLENO CALZADA	4 días	vie 22/07/22	mié 27/07/22
SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B)-BOCA CALLE-CRA 24A	2 días	vie 22/07/22	lun 25/07/22
BASE GRANULAR CLASE B (BG_B)-BOCA CALLE-CRA 24A	2 días	lun 25/07/22	mié 27/07/22

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

NOMBRE DE TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN
REDES CALZADA	16 días	mié 27/07/22	mar 16/08/22
PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC.-BOCA CALLE-CRA 24A	1 día	mié 27/07/22	jue 28/07/22
SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	15 días	jue 28/07/22	mar 16/08/22
ASFALTO CALZADA	1 día	mié 27/07/22	jue 28/07/22
IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA-BOCA CALLE-CRA 24A	1 día	mié 27/07/22	jue 28/07/22
MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO- BOCA CALLE-CRA 24A	1 día	mié 27/07/22	jue 28/07/22
CONSOLATA-14001481 ANDEN	41 días	mié 29/06/22	vie 19/08/22
TRAMITE SOLICITUD PMT-ANDEN	15 días	mié 29/06/22	lun 18/07/22
REPLANTEO ANDEN NORTE	1 día	jue 28/07/22	vie 29/07/22
REPLANTEO GENERAL ANDEN COSTADO NORTE	1 día	jue 28/07/22	vie 29/07/22
DEMOLICION ANDEN NORTE	3 días	vie 29/07/22	mar 2/08/22
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO COSTADO NORTE	3 días	vie 29/07/22	mar 2/08/22
EXCAVACION ANDEN	3 días	sáb 30/07/22	mié 3/08/22
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN COSTADO NORTE	3 días	sáb 30/07/22	mié 3/08/22
RELLENO ANDEN	3 días	vie 5/08/22	mar 9/08/22
GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	3 días	vie 5/08/22	mar 9/08/22
SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO	3 días	vie 5/08/22	mar 9/08/22
REDES CALZADA	7 días	lun 1/08/22	mar 9/08/22
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela)-INSTALAR MARCO-TAPAS	4 días	lun 1/08/22	vie 5/08/22
CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	4 días	mar 2/08/22	vie 5/08/22

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

NOMBRE DE TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN
CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLÁSTICO CON CONCRETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	2 días	sáb 6/08/22	mar 9/08/22
CONCRETO ANDEN	3 días	mar 9/08/22	vie 12/08/22
PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) G	3 días	mar 9/08/22	vie 12/08/22
REPLANTEO ANDEN SUR	1 día	vie 12/08/22	vie 12/08/22
REPLANTEO GENERAL ANDEN COSTADO SUR	1 día	vie 12/08/22	vie 12/08/22
DEMOLICION ANDEN	2 días	sáb 13/08/22	mié 17/08/22
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO COSTADO SUR	2 días	sáb 13/08/22	mié 17/08/22
EXCAVACION ANDEN	2 días	mié 17/08/22	vie 19/08/22
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN COSTADO SUR	2 días	mié 17/08/22	vie 19/08/22
REDES ANDEN	3 días	sáb 13/08/22	jue 18/08/22
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela)-INSTALAR MARCO-TAPAS	3 días	sáb 13/08/22	jue 18/08/22
CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	2 días	mar 16/08/22	jue 18/08/22
CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLÁSTICO CON CONCRETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	1 día	mié 17/08/22	jue 18/08/22
CONCRETO ANDEN	1 día	jue 18/08/22	vie 19/08/22
PISO EN CONCRETO	1 día	jue 18/08/22	vie 19/08/22
TALLERES - 14000772	92 días	mar 17/05/22	mié 7/09/22
TALLERS- 14000772-CALZADA	92 días	mar 17/05/22	mié 7/09/22
TRAMITE SOLICITUD PMT-CALZADA	15 días	mié 29/06/22	lun 18/07/22
SEÑALIZACION CALZADA	92 días	mar 17/05/22	mié 7/09/22
DISEÑO-SEÑALIZACION	88 días	mar 17/05/22	vie 2/09/22
PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22

127
1311

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

NOMBRE DE TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN
TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA. TIPO TRANSMILENIO 40.5cmx15cmx8.5cm)	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
ESTOPEROLAS METÁLICAS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2cm DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA.	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
DEMARCAACION LINEA CONTINUA A=0.15m	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
TALLERS- 14000772-ANDEN	45 días	mié 29/06/22	mié 24/08/22
TRAMITE SOLICITUD PMT-ANDEN COSTADO ORIENTAL	15 días	mié 29/06/22	lun 18/07/22
REPLANTEO ANDEN ORIENTAL	1 día	lun 18/07/22	mar 19/07/22
REPLANTEO GENERAL-COSTADO ORIENTAL	1 día	lun 18/07/22	mar 19/07/22
DEMOLICION ANDEN	5 días	mar 19/07/22	mar 26/07/22
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO-COSTADO ORIENTAL	5 días	mar 19/07/22	mar 26/07/22
EXCAVACION ANDEN	5 días	jue 21/07/22	mié 27/07/22
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	5 días	jue 21/07/22	mié 27/07/22
RELLENO ANDEN	5 días	mié 27/07/22	mar 2/08/22
GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	5 días	mié 27/07/22	mar 2/08/22
SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO	5 días	mié 27/07/22	mar 2/08/22
REDES ANDEN	10 días	vie 22/07/22	mié 3/08/22

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

NOMBRE DE TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela)-INSTALAR MARCO-TAPAS	5 días	vie 22/07/22	jue 28/07/22
CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	5 días	sáb 23/07/22	vie 29/07/22
CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLÁSTICO CON CONCRETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	2 días	lun 1/08/22	mié 3/08/22
CONCRETO ANDEN	3 días	mar 2/08/22	vie 5/08/22
PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) G	3 días	mar 2/08/22	vie 5/08/22
REPLANTEO ANDEN NORTE	1 día	vie 5/08/22	vie 5/08/22
REPLANTEO GENERAL-COSTADO OCCIDENTAL	1 día	vie 5/08/22	vie 5/08/22
DEMOLICION ANDEN	5 días	sáb 6/08/22	vie 12/08/22
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO-COSTADO OCCIDENTAL	5 días	sáb 6/08/22	vie 12/08/22
EXCAVACION ANDEN	5 días	lun 8/08/22	vie 12/08/22
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	5 días	lun 8/08/22	vie 12/08/22
RELLENO ANDEN	5 días	sáb 13/08/22	sáb 20/08/22
GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	5 días	sáb 13/08/22	sáb 20/08/22
SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO	5 días	sáb 13/08/22	sáb 20/08/22
REDES ANDEN	25 días	vie 22/07/22	lun 22/08/22
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela)-INSTALAR MARCO-TAPAS	5 días	vie 22/07/22	jue 28/07/22
CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	5 días	sáb 23/07/22	vie 29/07/22

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Alcaldía Local de Los Martires
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

NOMBRE DE TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN
CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLÁSTICO CON CONCRETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	2 días	vie 19/08/22	lun 22/08/22
CONCRETO ANDEN	3 días	sáb 20/08/22	mié 24/08/22
PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) G	3 días	sáb 20/08/22	mié 24/08/22
TALLERES - 14000741	92 días	mar 17/05/22	mié 7/09/22
TALLERES- 14000741-CALZADA	92 días	mar 17/05/22	mié 7/09/22
TRAMITE SOLICITUD PMT-CALZADA	15 días	mié 29/06/22	lun 18/07/22
DISEÑO-SEÑALIZACION	88 días	mar 17/05/22	vie 2/09/22
PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA. TIPO TRANSMILENIO 40.5cmx15cmx8.5cm)	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
ESTOPEROS METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2cm DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA.	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
DEMARCAACION LINEA CONTINUA A=0.15m	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
TALLERES- 14000741-ANDEN	37 días	mié 29/06/22	vie 12/08/22
TRAMITE SOLICITUD PMT-ANDEN COSTADO ORIENTAL	15 días	mié 29/06/22	lun 18/07/22
REPLANTEO ANDEN ORIENTAL	1 día	lun 18/07/22	mar 19/07/22
REPLANTEO GENERAL-COSTADO ORIENTAL	1 día	lun 18/07/22	mar 19/07/22
DEMOLICION ANDEN	5 días	mar 19/07/22	mar 26/07/22

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

NOMBRE DE TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO-COSTADO ORIENTAL	5 días	mar 19/07/22	mar 26/07/22
EXCAVACION ANDEN	5 días	jue 21/07/22	mié 27/07/22
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	5 días	jue 21/07/22	mié 27/07/22
RELLENO ANDEN	5 días	vie 22/07/22	jue 28/07/22
GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	5 días	vie 22/07/22	jue 28/07/22
SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO	5 días	vie 22/07/22	jue 28/07/22
REDES ANDEN	6 días	vie 22/07/22	vie 29/07/22
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela)-INSTALAR MARCO-TAPAS	5 días	vie 22/07/22	jue 28/07/22
CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	5 días	vie 22/07/22	jue 28/07/22
CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLÁSTICO CON CONCRETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	2 días	mié 27/07/22	vie 29/07/22
CONCRETO ANDEN	3 días	jue 28/07/22	lun 1/08/22
PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) G	3 días	jue 28/07/22	lun 1/08/22
REPLANTEO ANDEN ORIENTAL	1 día	lun 1/08/22	mar 2/08/22
REPLANTEO GENERAL-COSTADO OCCIDENTAL	1 día	lun 1/08/22	mar 2/08/22
DEMOLICION ANDEN	5 días	mar 2/08/22	lun 8/08/22
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO-COSTADO OCCIDENTAL	5 días	mar 2/08/22	lun 8/08/22
EXCAVACION ANDEN	5 días	mié 3/08/22	mar 9/08/22
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	5 días	mié 3/08/22	mar 9/08/22
RELLENO ANDEN	5 días	jue 4/08/22	mié 10/08/22

1221
1315

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

NOMBRE DE TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN
GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	5 días	jue 4/08/22	mié 10/08/22
SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO	5 días	jue 4/08/22	mié 10/08/22
REDES ANDEN	17 días	vie 22/07/22	jue 11/08/22
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela)-INSTALAR MARCO-TAPAS	5 días	vie 22/07/22	jue 28/07/22
CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	5 días	vie 22/07/22	jue 28/07/22
CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLÁSTICO CON CONCRETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	2 días	mar 9/08/22	jue 11/08/22
CONCRETO ANDEN	3 días	mié 10/08/22	vie 12/08/22
PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) G	3 días	mié 10/08/22	vie 12/08/22
TALLERES - 14000718	92 días	mar 17/05/22	mié 7/09/22
TALLERS- 14000718-CALZADA	92 días	mar 17/05/22	mié 7/09/22
TRAMITE SOLICITUD PMT-CALZADA	15 días	mié 29/06/22	lun 18/07/22
SEÑALIZACION CALZADA	92 días	mar 17/05/22	mié 7/09/22
DISEÑO-SEÑALIZACION	88 días	mar 17/05/22	vie 2/09/22
PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA. TIPO TRANSMILENIO 40.5cmx15cmx8.5cm)	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
ESTOPEROLAS METÁLICAS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22

1222
1316

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Alcalde Local de Los Martires</small>
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

NOMBRE DE TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN
BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2cm DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA.	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
DEMARCAION LINEA CONTINUA A=0.15m	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
TALLERS- 14000718-ANDEN	34 días	mié 29/06/22	mié 10/08/22
TRAMITE SOLICITUD PMT-ANDEN COSTADO ORIENTAL	15 días	mié 29/06/22	lun 18/07/22
REPLANTEO ANDEN ORIENTAL	1 día	lun 18/07/22	mar 19/07/22
REPLANTEO GENERAL-COSTADO ORIENTAL	1 día	lun 18/07/22	mar 19/07/22
DEMOLICION ANDEN	5 días	mar 19/07/22	mar 26/07/22
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO-COSTADO ORIENTAL	5 días	mar 19/07/22	mar 26/07/22
EXCAVACION ANDEN	5 días	jue 21/07/22	mié 27/07/22
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	5 días	jue 21/07/22	mié 27/07/22
RELLENO ANDEN	5 días	vie 22/07/22	jue 28/07/22
GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	5 días	vie 22/07/22	jue 28/07/22
SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO	5 días	vie 22/07/22	jue 28/07/22
REDES ANDEN	6 días	vie 22/07/22	vie 29/07/22
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cafueta)-INSTALAR MARCO-TAPAS	5 días	vie 22/07/22	jue 28/07/22
CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	5 días	sáb 23/07/22	vie 29/07/22
CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLÁSTICO CON CONCRETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	2 días	mié 27/07/22	vie 29/07/22
CONCRETO ANDEN	3 días	jue 28/07/22	lun 1/08/22

123
1317

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	 <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ Alcalde Local de Los Martires</small>
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

NOMBRE DE TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN
PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) G	3 días	jue 28/07/22	lun 1/08/22
REPLANTEO ANDEN ORIENTAL	1 día	jue 28/07/22	vie 29/07/22
REPLANTEO GENERAL-COSTADO OCCIDENTAL	1 día	jue 28/07/22	vie 29/07/22
DEMOLICION ANDEN	5 días	vie 29/07/22	jue 4/08/22
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO-COSTADO OCCIDENTAL	5 días	vie 29/07/22	jue 4/08/22
EXCAVACION ANDEN	5 días	sáb 30/07/22	vie 5/08/22
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	5 días	sáb 30/07/22	vie 5/08/22
RELLENO ANDEN	5 días	lun 1/08/22	vie 5/08/22
GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	5 días	lun 1/08/22	vie 5/08/22
SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO	5 días	lun 1/08/22	vie 5/08/22
REDES ANDEN	6 días	lun 1/08/22	lun 8/08/22
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cafueta)-INSTALAR MARCO-TAPAS	5 días	lun 1/08/22	vie 5/08/22
CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	5 días	lun 1/08/22	vie 5/08/22
CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLÁSTICO CON CONCRETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	2 días	vie 5/08/22	lun 8/08/22
CONCRETO ANDEN	3 días	sáb 6/08/22	mié 10/08/22
PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) G	3 días	sáb 6/08/22	mié 10/08/22
TALLERES - 14001678	92 días	mar 17/05/22	mié 7/09/22
TALLERS- 14001678-CALZADA	92 días	mar 17/05/22	mié 7/09/22
TRAMITE SOLICITUD PMT-CALZADA	15 días	mié 29/06/22	lun 18/07/22
DISEÑO-SEÑALIZACION	88 días	mar 17/05/22	vie 2/09/22

1224
1318

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

NOMBRE DE TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN
PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA. TIPO TRANSMILENIO 40.5cmx15cmx8.5cm)	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
ESTOPEROS METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2cm DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA.	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
DEMARCAION LINEA CONTINUA A=0.15m	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
TALLERS- 14001678-ANDEN	40 días	mié 29/06/22	jue 18/08/22
TRAMITE SOLICITUD PMT-ANDEN COSTADO ORIENTAL	15 días	mié 29/06/22	lun 18/07/22
REPLANTEO ANDEN ORIENTAL	1 día	lun 18/07/22	mar 19/07/22
REPLANTEO GENERAL-COSTADO ORIENTAL	1 día	lun 18/07/22	mar 19/07/22
DEMOLICION ANDEN	5 días	mar 19/07/22	mar 26/07/22
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO-COSTADO ORIENTAL	5 días	mar 19/07/22	mar 26/07/22
EXCAVACION ANDEN	5 días	jue 21/07/22	mié 27/07/22
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	5 días	jue 21/07/22	mié 27/07/22
RELLENO ANDEN	5 días	vie 22/07/22	jue 28/07/22
GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	5 días	vie 22/07/22	jue 28/07/22
SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO	5 días	vie 22/07/22	jue 28/07/22


	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Oficina de Planeación</small>
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

NOMBRE DE TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN
REDES ANDEN	6 días	vie 22/07/22	vie 29/07/22
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela)-INSTALAR MARCO-TAPAS	5 días	vie 22/07/22	jue 28/07/22
CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	5 días	vie 22/07/22	jue 28/07/22
CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLÁSTICO CON CONCRETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	2 días	mié 27/07/22	vie 29/07/22
CONCRETO ANDEN	3 días	jue 28/07/22	lun 1/08/22
PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) G	3 días	jue 28/07/22	lun 1/08/22
REPLANTEO ANDEN ORIENTAL	1 día	lun 1/08/22	mar 2/08/22
REPLANTEO GENERAL-COSTADO OCCIDENTAL	1 día	lun 1/08/22	mar 2/08/22
DEMOLICION ANDEN	5 días	mar 2/08/22	lun 8/08/22
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO-COSTADO OCCIDENTAL	5 días	mar 2/08/22	lun 8/08/22
EXCAVACION ANDEN	5 días	vie 5/08/22	jue 11/08/22
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	5 días	vie 5/08/22	jue 11/08/22
RELLENO ANDEN	5 días	lun 8/08/22	vie 12/08/22
GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	5 días	lun 8/08/22	vie 12/08/22
SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO	5 días	lun 8/08/22	vie 12/08/22
REDES ANDEN	7 días	sáb 6/08/22	mar 16/08/22
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela)-INSTALAR MARCO-TAPAS	2 días	sáb 6/08/22	mar 9/08/22
CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	2 días	sáb 6/08/22	mar 9/08/22

1226
1320

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

NOMBRE DE TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN
CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLÁSTICO CON CONCRETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	2 días	vie 12/08/22	mar 16/08/22
CONCRETO ANDEN	3 días	sáb 13/08/22	jue 18/08/22
PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) G	3 días	sáb 13/08/22	jue 18/08/22
GRUPO 3	92 días	mar 17/05/22	mié 7/09/22
2B- 14001156-	92 días	mar 17/05/22	mié 7/09/22
2B- 14001156-CALZADA	92 días	mar 17/05/22	mié 7/09/22
TRAMITE SOLICITUD PMT-ANDEN COSTADO ORIENTAL	15 días	mar 12/07/22	vie 29/07/22
DISEÑO-SEÑALIZACION	88 días	mar 17/05/22	vie 2/09/22
SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	15 días	sáb 30/07/22	jue 18/08/22
PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA. TIPO TRANSMILENIO 40.5cmx15cmx8.5cm)	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2cm DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA.	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
DEMARCAACION LINEA CONTINUA A=0.15m	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
PESQUERAS - 14000126	92 días	mar 17/05/22	mié 7/09/22
PESQUERAS- 1400126-CALZADA	92 días	mar 17/05/22	mié 7/09/22
TRAMITE SOLICITUD PMT-ANDEN COSTADO ORIENTAL	15 días	mar 12/07/22	vie 29/07/22



1227
1321

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO-137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

NOMBRE DE TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN
DISEÑO-SEÑALIZACION	88 días	mar 17/05/22	vie 2/09/22
SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	15 días	sáb 30/07/22	jue 18/08/22
PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA. TIPO TRANSMILENIO 40.5cmx15cmx8.5cm)	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
ESTOPEROS METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2cm DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA.	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
DEMARCAACION LINEA CONTINUA A=0.15m	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
PESQUERAS- 1400126-ANDEN	29 días	mar 12/07/22	mié 17/08/22
TRAMITE SOLICITUD PMT-ANDEN COSTADO ORIENTAL	15 días	mar 12/07/22	vie 29/07/22
REPLANTEO ANDEN ORIENTAL	1 día	sáb 30/07/22	lun 1/08/22
REPLANTEO GENERAL	1 día	sáb 30/07/22	lun 1/08/22
PREFABRICADOS	2 días	lun 1/08/22	mié 3/08/22
REVISION DEL SARDINEL CONSTRUIDO	2 días	lun 1/08/22	mié 3/08/22
DEMOLICION ANDEN	2 días	mié 3/08/22	vie 5/08/22
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO	2 días	mié 3/08/22	vie 5/08/22
EXCAVACION ANDEN	2 días	vie 5/08/22	lun 8/08/22
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	2 días	vie 5/08/22	lun 8/08/22
REDES ANDEN	4 días	mié 3/08/22	lun 8/08/22

1228
1322

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

NOMBRE DE TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela)-INSTALAR MARCO-TAPAS	3 días	mié 3/08/22	vie 5/08/22
CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	3 días	jue 4/08/22	lun 8/08/22
CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLÁSTICO CON CONCRETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	2 días	jue 4/08/22	vie 5/08/22
CONCRETO ANDEN	1 día	sáb 6/08/22	lun 8/08/22
PISO EN CONCRETO	1 día	sáb 6/08/22	lun 8/08/22
REPLANTEO ANDEN OCCIDENTAL	1 día	lun 8/08/22	mar 9/08/22
REPLANTEO GENERAL	1 día	lun 8/08/22	mar 9/08/22
PREFABRICADOS	2 días	mar 9/08/22	jue 11/08/22
REVISION DEL SARDINEL CONSTRUIDO	2 días	mar 9/08/22	jue 11/08/22
DEMOLICION ANDEN	2 días	jue 11/08/22	vie 12/08/22
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO	2 días	jue 11/08/22	vie 12/08/22
EXCAVACION ANDEN	2 días	sáb 13/08/22	mié 17/08/22
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	2 días	sáb 13/08/22	mié 17/08/22
REDES ANDEN	4 días	jue 11/08/22	mié 17/08/22
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela)-INSTALAR MARCO-TAPAS	3 días	jue 11/08/22	mar 16/08/22
CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	3 días	vie 12/08/22	mié 17/08/22
CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLÁSTICO CON CONCRETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	2 días	vie 12/08/22	mar 16/08/22
CONCRETO ANDEN	1 día	mar 16/08/22	mié 17/08/22
PISO EN CONCRETO	1 día	mar 16/08/22	mié 17/08/22
HOJALDRES - 14000178	92 días	mar 17/05/22	mié 7/09/22
HOJALDRES- 1400178-CALZADA	92 días	mar 17/05/22	mié 7/09/22
TRAMITE SOLICITUD PMT-ANDEN COSTADO ORIENTAL	15 días	mar 12/07/22	vie 29/07/22

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

NOMBRE DE TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN
DISEÑO-SEÑALIZACION	88 días	mar 17/05/22	vie 2/09/22
SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	6 días	sáb 30/07/22	vie 5/08/22
PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA. TIPO TRANSMILENIO 40.5cmx15cmx8.5cm)	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2cm DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA.	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
DEMARCAION LINEA CONTINUA A=0.15m	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
HOJALDRES- 1400178-ANDEN	29 días	mar 12/07/22	mié 17/08/22
TRAMITE SOLICITUD PMT-ANDEN COSTADO NORTE	15 días	mar 12/07/22	vie 29/07/22
REPLANTEO ANDEN NORTE	1 día	sáb 30/07/22	lun 1/08/22
REPLANTEO GENERAL	1 día	sáb 30/07/22	lun 1/08/22
PREFABRICADOS	2 días	lun 1/08/22	mié 3/08/22
REVISION DEL SARDINEL CONSTRUIDO	2 días	lun 1/08/22	mié 3/08/22
DEMOLICION ANDEN	2 días	mié 3/08/22	vie 5/08/22
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO	2 días	mié 3/08/22	vie 5/08/22
EXCAVACION ANDEN	2 días	vie 5/08/22	lun 8/08/22
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	2 días	vie 5/08/22	lun 8/08/22
REDES ANDEN	4 días	mié 3/08/22	lun 8/08/22

1380
1324

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	 <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Oficina Local de los Martires</small>
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

NOMBRE DE TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela)-INSTALAR MARCO-TAPAS	3 días	mié 3/08/22	vie 5/08/22
CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	3 días	jue 4/08/22	lun 8/08/22
CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLÁSTICO CON CONCRETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	2 días	jue 4/08/22	vie 5/08/22
CONCRETO ANDEN	1 día	sáb 6/08/22	lun 8/08/22
PISO EN CONCRETO	1 día	sáb 6/08/22	lun 8/08/22
REPLANTEO ANDEN SUR	1 día	lun 8/08/22	mar 9/08/22
REPLANTEO GENERAL	1 día	lun 8/08/22	mar 9/08/22
PREFABRICADOS	2 días	mar 9/08/22	jue 11/08/22
REVISION DEL SARDINEL CONSTRUIDO	2 días	mar 9/08/22	jue 11/08/22
DEMOLICION ANDEN	2 días	jue 11/08/22	vie 12/08/22
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO	2 días	jue 11/08/22	vie 12/08/22
EXCAVACION ANDEN	2 días	sáb 13/08/22	mié 17/08/22
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	2 días	sáb 13/08/22	mié 17/08/22
REDES ANDEN	4 días	jue 11/08/22	mié 17/08/22
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela)-INSTALAR MARCO-TAPAS	3 días	jue 11/08/22	mar 16/08/22
CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	3 días	vie 12/08/22	mié 17/08/22
CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLÁSTICO CON CONCRETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	2 días	vie 12/08/22	mar 16/08/22
CONCRETO ANDEN	1 día	mar 16/08/22	mié 17/08/22
PISO EN CONCRETO	1 día	mar 16/08/22	mié 17/08/22
GRUPO 4	100 días	mar 17/05/22	vie 16/09/22
ADICION 1-A - 14001098	100 días	mar 17/05/22	vie 16/09/22
ADICION 1-A- 14001098-CALZADA	100 días	mar 17/05/22	vie 16/09/22

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

NOMBRE DE TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN
TRAMITE SOLICITUD PMT-ANDEN COSTADO ORIENTAL	15 días	mié 6/07/22	lun 25/07/22
REPLANTEO CALZADA	1 día	lun 25/07/22	mar 26/07/22
REPLANTEO GENERAL	1 día	lun 25/07/22	mar 26/07/22
DEMOLICION CALZADA	4 días	mar 26/07/22	vie 29/07/22
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO	4 días	mar 26/07/22	vie 29/07/22
DEMOLICION SARDINEL EXISTENTE	4 días	mar 26/07/22	vie 29/07/22
EXCAVACION CALZADA	7 días	sáb 30/07/22	lun 8/08/22
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	5 días	sáb 30/07/22	vie 5/08/22
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.	6 días	lun 1/08/22	lun 8/08/22
PREFABRICADOS	5 días	sáb 30/07/22	vie 5/08/22
INSTALACION DE SARDINEL	5 días	sáb 30/07/22	vie 5/08/22
RELLENO ANDEN	11 días	lun 1/08/22	vie 12/08/22
NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	5 días	lun 8/08/22	vie 12/08/22
GEOTEXTIL NT 4000 PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Suministro e Instalación)	5 días	lun 8/08/22	vie 12/08/22
ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN	5 días	lun 1/08/22	vie 5/08/22
RELLENO EN TRITURADO DE 3/4"	5 días	mar 2/08/22	lun 8/08/22
RELLENO EN RECEBO B-200	5 días	mar 2/08/22	lun 8/08/22
RELLENO EN RECEBO COMUN	5 días	mar 2/08/22	lun 8/08/22
SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO	5 días	jue 4/08/22	mié 10/08/22
BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO	5 días	sáb 6/08/22	vie 12/08/22
REDES CALZADA	19 días	lun 1/08/22	mié 24/08/22
PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin. Formalet, Ref. Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)	1 día	mié 3/08/22	jue 4/08/22
CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const. Acero para Escaleras, Geotextil y Pafiete Impermeab.)	5 días	jue 4/08/22	mié 10/08/22

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

NOMBRE DE TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN
PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Inc. Sum, Formalet., Refuerzo e Inst. Incl. Tapa en Polipropileno)	1 día	mié 10/08/22	jue 11/08/22
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10"	5 días	lun 1/08/22	vie 5/08/22
DEMOLICION DE SUMIDEROS	5 días	mié 3/08/22	mar 9/08/22
SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	15 días	vie 5/08/22	mié 24/08/22
ASFALTO CALZADA	100 días	mar 17/05/22	vie 16/09/22
IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	3 días	mié 24/08/22	sáb 27/08/22
MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO	3 días	mié 24/08/22	sáb 27/08/22
DISEÑO-SEÑALIZACION	94 días	mar 17/05/22	vie 9/09/22
PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	6 días	vie 9/09/22	vie 16/09/22
TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL	6 días	vie 9/09/22	vie 16/09/22
SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA. TIPO TRANSMILENIO 40.5cmx15cmx8.5cm)	6 días	vie 9/09/22	vie 16/09/22
ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	6 días	vie 9/09/22	vie 16/09/22
BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2cm DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA.	6 días	vie 9/09/22	vie 16/09/22
DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.15m	6 días	vie 9/09/22	vie 16/09/22
ADICION 1-B - 14000233	100 días	mar 17/05/22	vie 16/09/22
ADICION 1-B- 14000233-CALZADA	100 días	mar 17/05/22	vie 16/09/22

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Oficina de Planeación y Desarrollo Urbano</small>
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

NOMBRE DE TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN
TRAMITE SOLICITUD PMT-ANDEN COSTADO ORIENTAL	15 días	mié 6/07/22	lun 25/07/22
REPLANTEO CALZADA	1 día	lun 25/07/22	mar 26/07/22
REPLANTEO GENERAL	1 día	lun 25/07/22	mar 26/07/22
DEMOLICION CALZADA	4 días	mar 26/07/22	vie 29/07/22
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO	4 días	mar 26/07/22	vie 29/07/22
DEMOLICION SARDINEL EXISTENTE	4 días	mar 26/07/22	vie 29/07/22
EXCAVACION CALZADA	7 días	sáb 30/07/22	lun 8/08/22
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	5 días	sáb 30/07/22	vie 5/08/22
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.	6 días	lun 1/08/22	lun 8/08/22
PREFABRICADOS	5 días	sáb 30/07/22	vie 5/08/22
INSTALACION DE SARDINEL	5 días	sáb 30/07/22	vie 5/08/22
RELLENO ANDEN	11 días	lun 1/08/22	vie 12/08/22
NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	5 días	lun 8/08/22	vie 12/08/22
GEOTEXTIL NT 4000 PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Suministro e Instalación)	5 días	lun 8/08/22	vie 12/08/22
ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN	5 días	lun 1/08/22	vie 5/08/22
RELLENO EN TRITURADO DE 3/4"	5 días	mar 2/08/22	lun 8/08/22
RELLENO EN RECEBO B-200	5 días	mar 2/08/22	lun 8/08/22
RELLENO EN RECEBO COMUN	5 días	mar 2/08/22	lun 8/08/22
SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO	5 días	jue 4/08/22	mié 10/08/22
BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO	5 días	sáb 6/08/22	vie 12/08/22
REDES CALZADA	19 días	lun 1/08/22	mié 24/08/22
PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin. Formalet, Ref. Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)	1 día	mié 3/08/22	jue 4/08/22
CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const. Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)	5 días	jue 4/08/22	mié 10/08/22

1234
1328

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>POB 07800</small> <small>Problemas Locales de Los Martires</small>
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

NOMBRE DE TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN
PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Inc. Sum, Formalet, Refuerzo e Inst. Incl.Tapa en Polipropileno)	1 día	mié 10/08/22	jue 11/08/22
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10"	5 días	lun 1/08/22	vie 5/08/22
DEMOLICION DE SUMIDEROS	5 días	mié 3/08/22	mar 9/08/22
SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	15 días	vie 5/08/22	mié 24/08/22
ASFALTO CALZADA	100 días	mar 17/05/22	vie 16/09/22
IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	3 días	mié 24/08/22	sáb 27/08/22
MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO	3 días	mié 24/08/22	sáb 27/08/22
DISEÑO-SEÑALIZACION	94 días	mar 17/05/22	vie 9/09/22
PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	6 días	vie 9/09/22	vie 16/09/22
TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL	6 días	vie 9/09/22	vie 16/09/22
SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA. TIPO TRANSMILENIO 40.5cmx15cmx8.5cm)	6 días	vie 9/09/22	vie 16/09/22
ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	6 días	vie 9/09/22	vie 16/09/22
BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2cm DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA.	6 días	vie 9/09/22	vie 16/09/22
DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.15m	6 días	vie 9/09/22	vie 16/09/22
GRUPO 5	28 días	sáb 30/07/22	vie 2/09/22
ACCION DE MOVILIDAD-14000434 -	7 días	sáb 30/07/22	lun 8/08/22
ACCION DE MOVILIDAD-14000434 -	7 días	sáb 30/07/22	lun 8/08/22

1285
1329

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO-137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

NOMBRE DE TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN
ACCION DE MOVILIDAD-14001447 -	7 días	lun 8/08/22	mié 17/08/22
ACCION DE MOVILIDAD-14001447 -	7 días	lun 8/08/22	mié 17/08/22
ACCION DE MOVILIDAD-14000389 -	7 días	mié 17/08/22	jue 25/08/22
ACCION DE MOVILIDAD-14000389 -	7 días	mié 17/08/22	jue 25/08/22
ACCION DE MOVILIDAD-14000469 -	7 días	jue 25/08/22	vie 2/09/22
ACCION DE MOVILIDAD-14000469 -	7 días	jue 25/08/22	vie 2/09/22

FUENTE: CON&CON SAS / CO-137-2019

14 ACTAS DE SEGUIMIENTO DESARROLLADAS EN EL PERIODO

14.1 REUNIONES EXTRAORDINARIAS

Para el presente corte no se tienen actas de reuniones realizadas.

14.2 ACTAS DE COMITÉ

Para el presente corte no se tienen actas de reuniones realizadas.

15 INFORME DE TRANSITO

15.1 PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

Tabla 28 GESTIÓN DE PMT

SEG	NOMBRE DEL FRETE	DIRECCION	CIV'S	ELEMENTO	SOLICITUD INICIAL SDM						
					FECHA DE RADICACION	Nº RADICADO	OBSERVACIONES SDA	FECHA DE APROBACION	APROBACION COI	INICIO	FIN
18 19	COLEGIOS	CALLE 1C ENTRE CARRERA 19A Y CARRERA 19C	14001619 14001616	ANDEN	21/05/2022	202261201294072		26/05/2022	COI No. 21 MAYO 26 DE 2022	27/05/2022	15/09/2022
10	IB	CALLE 1B ENTRE CARRERA 27A Y CARRERA 28	14001367	ANDEN	2/06/2022	202261201434322	7/06/2022				

FUENTE: CON&CON SAS / CO-137-2019

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	 <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO Municipal de la Capital</small>
CONTRATO CO-137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

15.1.1 PROBLEMAS PRESNETADOS PARA LA APROBACIÓN DE LOS PMT's

- **CL 1B ENTRE KR 27A – KR 28 (PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDÉN Y CIERRE PARCIAL DE CALZADA). (ALTO IMPACTO)**

OBSERVACIONES GENERALES:

1. Conforme al horario de trabajo (07:00 – 19:00) y de cierre presentado (24 horas), se debe presentar actas de socialización con los PREDIOS RESIDENCIALES, COMERCIALES Y PARQUEADEROS adyacentes a la zona de obra, ANDÉN COSTADO SUR CL 1B ENTRE KR 27A Y KR 28, donde se evidencie el conocimiento del proyecto, cambios de sentido viales, desvíos, obras a realizar, medidas de contingencia a implementar, duración de las actividades, manejo peatonal y vehicular en los diferentes accesos y salidas, fechas tentativas de inicio del cierre y horarios de intervención. Lo anterior, conforme a lo señalado en el Concepto Técnico para Gestionar Planes de Manejo de Tránsito, numeral 10.5 "**Anexo 5. Acta de Socialización del PMT**" – (según aplique). Se recuerda que, para sitios especiales (centros comerciales, parqueaderos, colegios, hospitales, etc.), debe adjuntar acta específica.
2. Para vías de 3 o más carriles las señales de reducción son informativas, donde se indica cual es al carril que se está cerrando, por lo anterior cambiar la señal de reducción de calzada que se encuentra sobre la CL 1B.

OBSERVACIONES DE MODELACIÓN:

1. Se deben presentar volúmenes de modos motorizados (autos, buses, camiones y motos) y volúmenes de modos no motorizados (biciusuarios) en periodos de una (1) hora contados cada quince (15) minutos (incluir tablas por movimiento) en todo el periodo de toma de información, para los cuales es necesario que se calcule la hora de máxima demanda (HMD) a partir del total de vehículos equivalentes durante una hora y teniendo en cuenta la suma de movimientos afectados por la intervención y los desvíos propuestos (si aplican).
2. Se deben presentar histogramas de volúmenes horarios contados cada quince (15) minutos para todo el periodo de toma de información por movimientos (haciendo énfasis en los movimientos afectados por la intervención y los desvíos propuestos, e incluyendo un histograma adicional con la suma de estos).
3. Se deben presentar en medio magnético, registro fotográfico y copia de los formatos de campo empleados para la toma de información base utilizada como insumo para la elaboración del análisis de tránsito (modelación).
4. Se debe presentar análisis de tránsito (modelación) e informe del mismo con los criterios y requisitos mínimos para soportar técnicamente la propuesta presentada del PMT (numeral más abajo).
5. Se debe efectuar calibración del modelo para la situación actual por volúmenes (preferiblemente estadístico GEH) y velocidades (se anexa tabla), adicionalmente es necesario que se detalle el procedimiento o metodología empleada para la obtención de las velocidades observadas.

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

6. El análisis de tránsito (modelación) debe comprender el área de influencia del cierre (incluidos desvíos), e incluir red vial consistente con el inventario vial (número de carriles, anchos de carriles, giros permitidos, etc.), estado de la vía, dispositivos de regulación del tránsito (semaforización, señalización, reductores de velocidad) y la definición de rutas y paraderos del SITP, para el caso de la situación actual o de línea base.
7. Para las intersecciones semaforizadas (en caso que existan) es necesario incluir los tiempos del planeamiento semaforico consistentes con la HMD, y de conformidad con lo programado por el grupo de Semaforización de la SDM para estas.
8. El modelo de la situación actual y situación con PMT debe contener todos los tipos de vehículo (auto, bus, camión, moto) ya sea en vehículos mixtos o en vehículos equivalentes, para el primer caso es necesario definir el porcentaje de vehículos pesados dentro del modelo e incluir las motos como autos con su factor de equivalencia en caso que el software no permita la desagregación de vehículos, y para el segundo caso el porcentaje de vehículos pesados debe ser igual a 0%.
9. Se debe entregar medio magnético con las modelaciones.
10. Es necesario que se presente un informe del análisis de tránsito (modelación) con mínimo lo siguiente:
 - Software empleados para el análisis.
 - Figuras y descripción de las geometrías, escenarios, fases o etapas (incluye situación actual) en el modelo.
 - Diagrama de cargas vehiculares para la hora pico a.m. y p.m. o HMD en las intersecciones evaluadas y/o analizadas, dentro del área de influencia de la intervención y/u obra.
 - Tablas resumen y comparativas de resultados agregados (red o sistema):
 - Velocidad de la red.
 - Demora por vehículo en la red.
 - Tiempo de viaje total en la red.
 - Demora total en la red.
 - Vehículos ingresados a la red (volúmenes aforados con balanceo de la red).
 - Vehículos efectivos que ingresan a la red.
 - Vehículos que salen de la red.
 - Tablas resumen de resultados desagregados (intersección, nodo, corredor):
 - Demora por vehículo.
 - Nivel de servicio.
 - Velocidad (sólo para el caso de corredores).
 - Longitudes de cola.
 - Conclusiones del proceso de análisis de tránsito (modelación).

15.1.2 COMITES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (COI)

A continuación se presentan los siguientes COI.

- COI No.21 del 26 de Mayo del 2022

La SDM público su concepto con respecto a los siguientes pmt, Asi, mismo ver Anexo 3:

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

1. Prevo a la intervención se debe socilizara las actividades de PMT y demás restricciones con la comunidad directamente afectaday es respo0nsabilidad de la interventoria y entidad contratante verificar el cumplimiento de esta condición.
2. En caso de existir obras dentro del área directa del proyecto debe realizar la respectiva coordinación antes de iniciar las actividades.
3. Para trabajos nocturnos se debe contar con la autorización por parte de la alcaldioa local de acuerdo con lo estipulado en eldecreto 948, Artículo 56.
4. Garantizar acceso peatonal seguro y cómodo a todos los predios junto al cierre durante todo el proyecto.
5. Se debe cumplir con toda la normatividad vigente y garantizar todas las condiciones de seguridad para el movimiento y desplazamiento de maquina y vehículos de obra.

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Alcalde Local de Los Martires</small>
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

16 CALIDAD

16.1 RESULTADOS DE LABORATORIO E INSPECCIONES CONTRATO DE OBRA

Durante este periodo no se presentan los certificados de calidad

16.2 CERTIFICADOS DE CALIDAD

Durante este periodo no se presentan los certificados de calidad.

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

17 CONCLUSIONES

El presente informe muestra todas las actividades realizadas para el periodo comprendido del 17 de mayo hasta el 16 de junio del 2022, En este mes se realizo principalmente la solicitud a Secretaria de movilidad los PMT de acuerdo a la programación aprobada mediante la Prorroga N°3, locual se llegó a las siguientes conclusiones:

- Teniendo en cuenta que el contrato estuvo suspendido ocho (8) meses, se tuvo que realizar la solicitud del PMT de todos los frentes a intervenir, lo cual genero mayor tiempo en el nuevo diseño de movilidad por las condiciones actuales .
- De acuerdo a la programación aprobada por la interventoria se tramito los pmts del Grupo N°1 (Civ's 14001616-14001619, Civ 14001367 y Civ 14001506), de los cuales requerían Modelacion de Calzada y Modelacion para andenes; De acuerdo a la circular 20222240002101 de SECRETARIA DE MOVILIDAD, donde se evidencia los periodos típicos de la toma de informacion primaria de trasito, cito Textualmente (...) "*se informa que las fechas consideradas como periodos típicos para toma de información primaria con el fin de caracterizar el comportamiento del tránsito peatonal, de ciclistas y vehicula, son las siguientes: De abril 18 a 19 de junio de 2022* " el periodo definido anteriormente se sustentan en las fechas del calendario académico para el año 2022 determinados por la Resolución 2204 del 29 de octubre de 2021, emitida por la Secretaría de Educación de Bogotá, por lo cual en este periodo no se pudo obtener los volúmenes de transito vehicular y peatonal, esto ocasiono restrasos de mas de 45 dias, por lo que la firma CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S y avalada por la interventoria MIRS LATINOAMERICA, realizo nuevamente un ajuste a la programación atendiendo los requerimientos de Secretaria de movilidad.

1241
1335

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>GOBIERNO</small> <small>Localidad de Los Martires</small>
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

18 **ANEXOS**

1342
1336

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Oficina Local de Los Martires</small>
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

18.1 ANEXO 1 CORRESPONDENCIA ENVIADA



VF 201.041.911.0

C&C-CO137-2019-119

Bogotá D.C., 25 De noviembre de 2021

Señores
ALCALDIA LOCAL DE MARTIRES
Atn. Dr. Juan Rachif Cabarcas Rahman
Alcalde Local de Martires
Avenida calle 19 No. 28-80, Piso 7
Ciudad

26/11/21 14:51

Sticker web

Alcaldía Local de Martires

R No. 2021-641-006545-2

2021-11-26 14:51 - Folio: 01 Anexos: 0

Destino: Area de Gestión de Desarr.

Rem D. CONSULTORIA Y CONSTRUCCION



Referencia: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO-137-2019 cuyo objeto es CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE, CON FORMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES**

Asunto: **RESPUESTA COMUNICADO MIRS-MAR-132-2021; CITACION AUDIENCIA SANCIONATORIO CONTRATO DE OBRA No. 137-2019**

Cordial saludo.

En relación a su comunicación 20216420448521 de fecha 13-09-2021 y recibida en nuestras oficinas el pasado 13 DE septiembre de 2021 en la cual solicitan dar inicio al proceso de posible incumplimiento del contrato de obra pública COP-137-2019 suscrito entre el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES y CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS, se tienen los siguientes comentarios.

I. ANTECEDENTES

- a) El contrato de obra pública No. 137 de 2019, fue suscrito entre el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES y CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS el día 26 de diciembre de 2019
- b) El plazo pactado en el contrato es de Siete (07) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio entre el Supervisor del contrato y el Contratista, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
- c) El acta de inicio para la ejecución del contrato, fue suscrita por las partes el día 25 de febrero de 2020, estableciéndose como fecha de terminación del contrato el día 19 de diciembre de 2019.
- d) El día 19 de marzo se suspendió el contrato por cuenta de la pandemia del COVID-19. Se reinició el contrato el 21 de julio del 2020.
- e) El 18 de noviembre, se suscribió la prórroga y adición N°1 del contrato de obra pública 137 de 2019, por lo cual se amplió el plazo de contrato en dos (2) meses y se adiciono el valor del mismo DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS



11 130 047 411-0

MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$2 845.236 531) MONEDA LEGAL, de igual manera se modificó el a contrato agregando una nueva cláusula (cláusula 29).

- f) El 28 de noviembre de 2020 se suspendió el contrato y se reinició el 28 de diciembre del 2020.
- g) El 31 de marzo de 2021 se suspendió la ejecución del contrato y se reinició el 29 de junio del 2021.
- h) El 17 de julio se prorrogó el plazo de ejecución del contrato de obra pública No.137 de 2019, por el término del dos (2) meses, con nueva fecha de terminación el día diecisiete (17) de septiembre del 2021.

1.2 Respecto a los incumplimientos de los requerimientos técnicos:

En el anexo técnico de los pliegos de condiciones del contrato: Documentos Técnicos, se establece:

- a) Mediante la comunicación C&C-137-2019-025-2021-DC, de fecha agosto 30 de 2021, el Contratista remite al FDLM la actualización de las garantías de la póliza de Cumplimiento No AA007885 y la póliza de responsabilidad civil No AA007887, así, como se presenta en *anexo No 1*
- b) En el anexo técnico de los pliegos de condiciones del contrato numeral 14. Documentos Técnicos adicionales, se establece. El Contratista deberá garantizar el adecuado funcionamiento de las actividades que ejecute (...) *Realización de las labores Ambientales, Seguridad y Salud en Trabajo y Gestión Social*.

A continuación, se presenta relación de los oficios recibidos y las respuestas entregadas por parte de CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN SAS, así, como se presentan en *anexo No.2*.

OFICIO DE ENTRADA	OFICIO DE RESPUESTA
MIRS-MAR-131-2019 del Asunto: Llamado de atención por presunto incumplimiento de obligaciones contractuales en las áreas ambiental, SST y social.	C&C-CO137-2019-115 del 16 de septiembre de 2021 Asunto: Respuesta radicado MIRS-MAR-131-2019
MIRS-MAR-109-2019 del 13 de julio de 2021 Asunto: Llamado de atención por presunto incumplimiento de obligaciones contractuales en las áreas ambiental, SST y social.	C&C-CO137-2019-098 del 16 de julio de 2021 Asunto: Respuesta radicado MIRS-MAR-109-2019
MIRS-MAR-108-2019 del 08 de julio de 2021 Asunto: Llamado de atención por presunto incumplimiento de obligaciones contractuales en las áreas ambiental, SST y social.	C&C-CO137-2019-098 del 13 de julio de 2021 Asunto: Respuesta radicado MIRS-MAR-108-2019

- Por otra parte, se ha realizado la entrega oportuna de los productos e información adicional solicitado por el Fondo de Desarrollo local de mártires y la interventoría MIRS LATINOAMERICA S.A.S.; dando cumplimiento al compromiso contractual.

En el anexo técnico de los pliegos de condiciones del contrato numeral 4 plazo para la ejecución se establece:

1. ANTECEDENTES DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Dentro de las condiciones contractuales modificadas mediante adición No 1, del proyecto se determinó la intervención de los siguientes segmentos viales:

No FRENTE	CIV	EJE	DESDE	HASTA	SEGMENTOS ESTABLECIDOS
1	14001489	CL 1F	KR 24A	KR 24B	INTERVENCION
	14001481	CL 1F	KR 24	KR 24A	INTERVENCION
2	14000772	KR 25A	AC 6	CL 6BIS	INTERVENCION
	14000741	KR 25A	CL 6BIS	CL 6A	INTERVENCION
	14000718	KR 25A	CL 6A	CL 7	INTERVENCION
	14001678	KR 25A	CL 7	CL 7BIS	INTERVENCION
3	14001545	CL 1ABIS	AC 1	KR 26	EXCLUSION FACTORES TECNICOS
4	14001517	KR 26	CL 1ABIS	CL 1B	EXCLUSION FACTORES TECNICOS
5	14001367	CL 1B	KR 27A	KR 28	INTERVENCION
6	14000126	KR 24	CL 22A	DG 22B BIS	INTERVENCION
7	14001506	KR 18	CL 2	CL 3	INTERVENCION
8	14001819	CL 1C	KR 19A	KR 19BBIS	INTERVENCION
	14001818	CL 1C	KR 19BBIS	KR 19C	INTERVENCION
9	14001058	KR 26	CL 2C	CL 3	INTERVENCION POR TERCEROS
10	14000178	CLL 22A	KR 19A	KR 19B	INTERVENCION
11	14001098	CL 1D BIS	KR 28B	KR 30	INTERVENCION
12	14000233	CLL 22	KR 18B	AK 19	INTERVENCION
13	14000131	CLL 22C	KR 20	KR 22	INTERVENCION POR TERCEROS
14	14000206	CLL 22A	KR 18B	AK 19	INTERVENCION POR TERCEROS
15	14000266	KR 18	CLL 22A	CL 22C BIS	INTERVENCION POR TERCEROS
16	14000425	KR 21	CL 14	CL 15	INTERVENCION POR TERCEROS
17	14000440	KR 21	CL 13A	CL 14	INTERVENCION POR TERCEROS
18	14000403	KR 21	AC 13	CL 13A	INTERVENCION POR TERCEROS
19	14000615	CL 12	KR 19	KR 19A	EXCLUSION FACTORES TECNICOS

Tabla 1 Frentes inicialmente priorizados y adición No 1

- El Contratista Con & Con, en los diferentes comités de obra ha informado a la Supervisión por parte de la Alcaldía de mártires y a la Interventoría que los CIVs asignados en la adición No 1, mediante revisión conjunta con la interventoría, se determinaron que varios de los CIVs ya se encontraban intervenidos por otro tercero o excluido por factores técnicos (CIVs 14001545, 14001517 y 14001058); así entonces se priorizaron la intervención de los CIVs que se encuentran en la Tabla No 2 y se acordó la inclusión de nuevos CIVs para llegar al alcance y monto del contrato.

No	Cod.	BARRIO	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA	VALOR PRESUPUESTADO
1	14001489	EL VERGEL-CONSOLATA	CALZADA	CL 1F	KR 24A	KR 24B	\$ 501.452.806,67
2	14001481	EL VERGEL-CONSOLATA	CALZADA	CL 1F	KR 24	KR 24A	\$ 433.165.026,29
3	14000772	RICAUURTE-TALLERES	CALZADA	KR 25A	AC 6	CL 6BIS	\$ 371.835.905,70
4	14000741	RICAUURTE-TALLERES	CALZADA	KR 25A	CL 6BIS	CL 6A	\$ 430.473.951,62
5	14000718	RICAUURTE-TALLERES	CALZADA	KR 25A	CL 6A	CL 7	\$ 251.686.093,34
6	14001678	RICAUURTE-TALLERES	CALZADA	KR 25A	CL 7	CL 7BIS	\$ 279.675.052,36

No	Cod.	BARRIO	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA	VALOR PRESUPUESTADO
8	14001545	SANTA ISABEL SUR	CALZADA	CL 1ABIS	AC 1	KR 26	\$ 13.311.420,00
9	14001517	SANTA ISABEL SUR	CALZADA	KR 26	CL 1ABIS	CL 1B	\$ 11.010.325,33
9	14001150	SANTA ISABEL-2B	CALZADA	CL 2B	KR 26A	KR 26	\$ 459.110.191,34
10	14001367	SANTA ISABEL-1B	CALZADA	CL 1B	KR 27A	KR 28	\$ 725.208.581,10
11	14000126	SANTA ISABEL PESQUEROS	CALZADA	KR 24	CL 22A	DG 22B BIS	\$ 736.133.022,86
12	14001508	TAPICERIAS	CALZADA	KR 18	CL 2	CL 3	\$ 505.319.942,58
13	14001619	COLEGIOS	CALZADA	CL 1C	KR 19A	KR 19BBIS	\$ 208.542.964,11
14	14001616	COLEGIOS	CALZADA	CL 1C	KR 19BBIS	KR 19C	\$ 2.730.742,19
15	14000178	ADICION 1 HOJALDRES	CALZADA	CL 12	KR 20A	KR 21	\$ 472.239.314,34
16	14001088	ADICION 2	CALZADA	CLL 22	KR 18B	AK 19	\$ 373.677.000,00
17	14000233	ADICION 3	CALZADA	CLL 22A	KR 19A	KR 19B	\$ 390.319.175,14

COSTO TOTAL DEL PROYECTO + PROTOCOLOS

\$ 6.528.737.386,58

Tabla 2 Frentes a ejecutar

- Una vez evaluado y analizado el presupuesto de obra general, con base a la exclusión de segmentos y/o Elementos que se encontraron intervenidos por terceros, se le informo al apoyo a la supervisión por parte del FOLM la actualización de elementos a ejecutar PK-ID para andenes.
- Teniendo en cuenta la intervención realizada en los frentes inicialmente priorizados se ve la necesidad desde el requerimiento social, hacer la intervención de los andenes ya que solo se tenía contemplado la cinta de ajuste del bordillo y el andén existente y la construcción de las cajas de inspección, generando inconformidades con la comunidad, es por esto que se atendió los requerimientos de la comunidad los cuales se encuentran en la Tabla No.3 en compañía de la interventoría el 15 de Septiembre del 2021 se realizó la actualización de los presupuesto con alcance en los elementos a ejecutar PK-ID para andenes y calzada.

No	Cod.	BARRIO	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA	VALOR PRESUPUESTADO
1	14001469	EL VERGEL-CONSOLATA	ANDEN	CL 1F	KR 24A	KR 24B	\$ 48.318.586,69
2	14001461	EL VERGEL-CONSOLATA	ANDEN	CL 1F	KR 24	KR 24A	\$ 51.415.389,02
10	14001367	SANTA ISABEL-1B	ANDEN	CL 1B	KR 27A	KR 28	\$ 163.704.815,49
13	14001619	COLEGIOS	ANDEN	CL 1C	KR 19A	KR 19BBIS	\$ 45.570.795,61
14	14001616	COLEGIOS	ANDEN	CL 1C	KR 19BBIS	KR 19C	\$ 49.042.448,20

COSTO TOTAL DEL PROYECTO + PROTOCOLOS

\$ 362.742.036,02

Tabla 3 inclusión de PK ID Andenes

- El 2 de agosto en comité de obra la Supervisión por parte de la Alcaldía de mártires hace entrega del listado de "SOLICITUD DE INTERVENCIONES CON ACCIONES DE MOVILIDAD DE LOCALIDAD DE MARTIRES". Como se verifica en el anexo No.3



TEL: 310 544 411-0

El Contratista Con & Con actualizo el balance de acuerdo al presupuesto de los 16 segmentos y/o elemento, pero se evidencio que los segmentos ya se encontraban ejecutados por la UMV

Actualmente de los dieciséis (16) Segmentos solo se pueden ejecutar cuatro (4) segmentos y/o elementos de acuerdo a la *Tabla No.4* de los dieciséis (16) que fueron entregados por la supervisión. Es de aclarar que este listado fue entregado a la UM; mediante Radicado 20216420269461, por lo tanto, el contratista advierte que estos frentes pueden estar programados para ejecutar por la UMV, como los anteriores

No	Cod.	BARRIO	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA	VALOR PRESUPUESTADO
18	14000434	RICARTE	CALZADA	CLL 10	KR 29	AV KR 30	\$ 189.330.005,06
19	14001447	EDUARDO SANTOS	CALZADA	CL 3	KR 17A	KR 18	\$ 62.334.172,81
20	14000389	SAMPER MENDOZA	CALZADA	CLL 20	KR 18	CRUCE	\$ 175.246.876,00
21	14000469	EL LISTON	CALZADA	KR 20	CL 14	CL 15	\$ 230.332.172,23

COSTO TOTAL DEL PROYECTO + PROTOCOLOS \$ 657.370.087,45

Tabla 4 Acciones de Movilidad

A la fecha el contrato de obra N° CO-137-2019 presenta el siguiente balance económico

	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR DEL PRESUPUESTO
COSTO TOTAL OBRAS INCLUYE REDES Y COSTOS DIRECTOS, APROXIMADA AL PESO (A) =	\$ 5.329.454.297,00	\$ 4.806.839.000,00
ADMINISTRACIÓN 22,89%	\$ 1.218.912.089,58	\$ 1.100.285.853,11
IMPREVISTOS 1,00%	\$ 53.294.542,97	\$ 48.060.339,00
UTILIDAD 7,00%	\$ 373.061.800,79	\$ 336.478.793,00
COSTO TOTAL A.L.U. 30,89%	\$ 1.645.268.432,00	\$ 1.484.832.845,11
COSTO TOTAL OBRA INCLUYE A.L.U.	\$ 6.975.722.729,00	\$ 6.291.672.745,11
COSTO ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SST (B) 2,96%	\$ 206.237.865,00	\$ 186.013.955,40
COSTO ACTIVIDADES SOCIALES (C) 2,72%	\$ 189.706.577,00	\$ 171.403.661,11
COSTO PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (D) 1,23%	\$ 85.607.589,00	\$ 77.212.787,41
TOTAL OBRAS LICITACION (A+B+C+D)	\$ 7.467.274.809,00	\$ 6.726.003.160,03
COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO (E) (INCLUYE AJUSTES E IVA) 0,41%	\$ 30.581.751,00	\$ 27.591.977,00
COSTO ESTIMADO DE AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (F) (INCLUYE IVA) 6,82%	\$ 337.110.102,00	\$ 337.110.102,00
VALOR TOTAL SIN AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (VALOR EVALUABLE) =	\$ 7.824.976.722,00	\$ 7.090.705.129,03
PROVISIÓN PARA AJUSTES (ES) OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (SOLO OBRA) INCLUYE COSTOS INDIRECTOS (G) 2,66%	\$ 208.144.381,00	\$ 208.144.381,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO APROXIMADO AL PESO =	\$ 8.033.121.103,00	\$ 7.298.849.510,03
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD -TRANSPORTE SEGURO(CONSIDERADO 5 FRENTES DE OBRA)	\$ 250.000.000,00	\$ 250.000.000,00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO + PROTOCOLOS	\$ 8.283.121.103,00	\$ 7.548.849.510,03

Tabla 5 Balance General Cto 137-2019

- De acuerdo al Balance general de acuerdo a la *Tabla No. 5*, del contrato se determina que el listado actualizado de intervención (Calzadas, Andenes y Acciones de movilidad) para la ejecución del contrato de obra CO-137-2019 con el Fondo de Desarrollo de Los Mártires – FDLM no son suficientes para



Código 1341-411-0

lograr la meta física prevista de \$ 8.283.121.103, para la terminación del objeto del contrato de referencia.

A la fecha se está a la espera de la asignación y verificación (CIVS) de la reserva de ejecución por parte de la Supervisión de la Alcaldía de mártires, con el fin de poder iniciar la revisión de los estudios presupuestados y realizar la inclusión de estos CIV en el objeto del contrato y así poder iniciar con los trámites preliminares.

2. Respuesta al incumpliendo del Aspecto Técnico

- c) Se presenta a continuación el listado de los CIVs que se tienen en ejecución por parte del Contratista y en los cuales se está trabajando en la actualidad.

No	Cod.	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	% AVANCE TOTAL
1	14001469	CALZADA	CL 1F	KR 24*	KR 24B	\$ 501.452.806,67	\$ 442.411.970	88%
2	14001481	CALZADA	CL 1F	KR 24	KR 24A	\$ 433.165.026,29	\$ 309.604.653	90%
3	14000772	CALZADA	KR 25A	AC 6	CL 6BIS	\$ 371.835.905,70	\$ 277.600.321	75%
4	14000741	CALZADA	KR 25A	CL 6BIS	CL 6A	\$ 430.473.951,62	\$ 385.756.771	89%
5	14000718	CALZADA	KR 25A	CL 6*	CL 7	\$ 257.686.093,34	\$ 220.247.254	86%
6	14001678	CALZADA	KR 25A	CL 7	CL 7BIS	\$ 279.675.052,36	\$ 239.597.557	86%
7	14001545	CALZADA	CL 1ABIS	AC 1	KR 26	\$ 16.515.608,00	\$ 16.460.546	100%
8	14001517	CALZADA	KR 26	CL 1ABIS	CL 1B	\$ 11.010.405,33	\$ 10.973.693	100%
9	14001156	CALZADA	CL 2B	KR 25*	KR 26	\$ 459.118.701,34	\$ 409.818.134	89%
10	14001357	CALZADA	CL 1B	KR 27*	KR 28	\$ 725.258.561,10	\$ 672.718.796	93%
11	14000126	CALZADA	KR 24	CL 22*	OG 22B BIS	\$ 735.130.022,65	\$ 659.925.605	91%
12	14001506	CALZADA	KR 16	CL 2	CL 3	\$ 505.319.942,38	\$ 192.237.858	38%
13	14001619	CALZADA	CL 1C	KR 19*	KR 19B BIS	\$ 288.542.934,11	\$ 257.533.641	89%
14	14001616	CALZADA	CL 1C	KR 19B BIS	KR 19C	\$ 277.306.742,19	\$ 235.583.629	85%
15	14000178	CALZADA	CL 12	KR 20*	KR 21	\$ 472.236.314,54	\$ 420.240.911	89%

COSTO TOTAL DEL PROYECTO + PROTOCOLOS	\$ 6.764.741.207,81	\$ 4.830.221.462,00	71%
---------------------------------------	---------------------	---------------------	-----

Tabla 6 Porcentaje de ejecución del Cto 137-201

- A la fecha, se encuentra un avance del 89% con respecto a los frentes que se encuentran actualmente en ejecución costo total, es de aclarar. Cito textualmente (...) "Existe un atraso grave en cada uno de los tramos viales"; dicha apreciación se debe considerar teniendo en cuenta que se debe evaluar por los elementos a ejecutar PK-ID para andenes y calzadas y que a la fecha no se ha dado respuesta por parte de la supervisión de la alcaldía de mártires en la asignación de reserva para la ejecución de los frentes que se encuentran presupuestados en la Tabla No 3



0041411-0

- Teniendo en cuenta que una vez evaluada y analizada la ejecución de la obra en general se consideró las situaciones o circunstancias que se han dado en la ejecución de las obras en estos últimos meses y teniendo en cuenta que el plazo del contrato pendiente, no es suficiente para ejecutar la totalidad de los tramos que se tienen presupuestados, iniciar la ejecución de nuevos frentes de obra sin tener la plena seguridad de que sean finalizados en el plazo restante, sería perjudicial tanto para los residentes y los comerciantes de estos sectores como para la Administración, interventoría y contratista.
- En cuanto a la programación de obra y debido a los atrasos que se vienen presentando por situaciones ajenas al Contratista tales como entrega tardía de segmentos viales por parte del FDLM, que no cumplen con el alcance del contrato, a la fecha no es posible presentar un cronograma y presupuesto real que cope el valor total del contrato, ya que como no se tienen los presupuestos totales de los CIV a intervenir, no es posible determinar el presupuesto total del contrato a ejecutar.
- d) En el marco de la ejecución del Contrato de Obra Pública No. 137 de 2019 celebrado con el FDLM, desde el componente de seguridad y salud en trabajo -SST- se realizan entre otras actividades
- Capacitaciones, charlas informativas con alcance a todos los niveles del personal cuyos soportes son entregados de manera mensual a la interventoría en los informes mensuales de gestión SSTMA, en los cuales se tratan temas de que promueven estilos de vida saludables, prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, prevención y mitigación del contagio por COVID-19
- Entrega de dotación y reposición de EPP, cuyos soportes son entregados de manera mensual a la interventoría en los informes mensuales de gestión SSTMA, así, como se presenta en *anexo No 4*
- Implementación de Protocolo de Bioseguridad, se han dispuesto de todos los recursos necesarios para garantizar la desinfección del personal, herramientas y zonas de trabajo, tales como alcohol, gel antimaterial y jabón de manos. Así mismo, se cuenta con unidades sanitarias fijas y puntos de desinfección en los campamentos de obra de los frentes en ejecución, se realiza la entrega de tapabocas a los trabajadores, de los cuales también se entregan soportes en los informes de gestión mensual
- Mediante oficio C&c-137-2019-121; Respuesta a radicado MIRS-MAR-133-2019. Radicado el día 16 de septiembre del 2021. Se subsana los requerimientos del pago de los servicios prestados del señor Lester García -, como se presenta en *anexo No. 5*

Como principal muestra de lo anterior y de la gestión realizada desde el componente SSTMA, se tienen:

- Los indicadores de accidentalidad, los cuales, se han mantenido en ceros durante la ejecución del contrato.
- Baja tasa de contagios por COVID-19 en la ejecución del proyecto, a lo largo de la ejecución del proyecto solo se han presentado dos (2) casos positivos dentro del personal administrativo y cero (0) casos en el personal operativos

Comités componentes SSTMA, listados de chequeo y calificación del componente ambiental y SST de carácter mensual diligenciados por la interventoría y socializados entre las partes, en los cuales se hacen

observaciones las cuales son atendidas como allí mismo se sustentan y no se habla en los mismos de (...) "evidencia sobre la existencia de un presunto incumplimiento por parte del personal de los frentes de obra por falta del suministro, acceso seguro he implementación eficientemente de elementos como baños portátiles, bioseguridad, dotación, entre otros", tampoco se ve soportado por el porcentaje de calificación que la otorga a dicho componente

e) En el anexo técnico de los pliegos de condiciones del contrato numeral 12 permisos, licencias y autorizaciones, se indica:

La Interventoría es la encargada de velar y verificar la ejecución de los ajustes que se requieran de acuerdo con las observaciones de la SDM. Dentro de las actividades ejecutadas por el Contratista se encuentra el trámite y aprobación de los Planes de Manejo de Tráfico, señalización y desvíos ante la secretaria Distrital de Movilidad SDM.

El Contratista presento ante la secretaria Distrital de Movilidad SDM la radicación y subsanación de los requerimientos, así, como se presentan a continuación, ver *anexo No 6*.

OFICIO DE ENTRADA	ASUNTO	OFICIO DE RESPUESTA	ASUNTO
Radicado SDM N° 20213120637751 del 04 de febrero de 2021 Radicado a Con y Con 09 de febrero de 2021	Suspensión por Obra sin iniciar	No requiere respuesta	No requiere respuesta
Radicado SDM N° 20213122334561 del 22 abril de 2021 Radicado a Con y Con 03 de mayo de 2021	Terminación de obra	C&C-CO137-2019-086 Del 05-05-2021	Respuesta radicada SDM N° 20213122334561 - solicitud de terminación de PMT Radicado SDM 20216120768412
Radicado SDM N° 20213123334111 del 19 de mayo de 2021 Radicado a Con y Con 21 de mayo de 2021	Incumplimientos en la implementación de PMT	C&C-CO137-2019-106 del 25-08-2021	Respuesta radicada SDM N° 20213123334111 rad SDM 20216121421272
Radicado SDM N° 20213125295801 del 06 de junio de 2021 Radicado a Con y Con 30 de junio de 2021	Terminación de obra	C&C-CO137-2019-094 del 08-07-2021	Respuesta radicada SDM N° 20213125295801 solicitud de terminación de PMT Radicado SDM 20216121123912
Radicado SDM N° 20213125899761 del 30 de julio de 2021 Radicado a Con y Con 04 de agosto de 2021	Suspensión por Obra sin iniciar	No requiere respuesta	No requiere respuesta
Radicado SDM N° 20213126408431 del 07 de septiembre de 2021 Radicado a Con y Con 09 de septiembre de 2021	Incumplimientos en la implementación de PMT y obra sin PMT vigente	C&C-CO137-2019-116 del 16-09-2021	Respuesta radicada SDM N° 20213126408431 - Radicado SDM

II. PRUEBAS

Dentro de los derechos procesales que nos asisten, le solicitamos a la entidad se dictaminen las siguientes pruebas con el ánimo de verificar el contenido de nuestros argumentos:

- Revisión de todos los oficios incluidos en el informe del incumplimiento SST y Movilidad Y Social, de manera conjunta interventoría, supervisión y contratista.
- Revisión de las fechas en las cuales se determinaron la asignación de los CIVS para su intervención.



C.O. 041 411.0

- Determinar el alcance de ejecución del contrato por CIVS al momento de iniciar el proceso sancionatorio, esto con la finalidad de establecer el valor real del contrato para así mismo saber el valor que no está incluido en el contrato inicial y su adición.
- Revisar y comparar los CIVS asignados en el contrato inicial y su adición vs los CIVS intervenidos
- Las anteriores pruebas, se deberán realizarse en compañía de nuestro personal de obra con la finalidad de proporcionar nuestras inquietudes y solicitudes del caso.

III. SOLICITUD

De acuerdo a lo manifestado por el CON & CON SAS, se solicita al Fondo de Desarrollo Local de mártires se desista del proceso de INCUMPLIMIENTO como consecuencias derivadas del supuesto incumplimiento en la gestión SSTMA y atraso en el tiempo de ejecución del contrato, según los siguientes parámetros.

En la actualidad solo se encuentra asignados \$ 7.529.573 725,54 de los \$ 8.283.121.103 millones que se deben ejecutar, en algunos de los casos los segmentos de las acciones de movilidad no se podría ejecutar o fijar un alcance, ya que estos CIV's, se encuentran ejecutados por UMV.

Como ha quedado aquí demostrado en cada uno de los argumentos, es necesario entonces reprogramación de obra y reasignación de CIV, que ajusten los plazos contractuales

Cordialmente,

JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

Anexo (171), Folios

Anexo No.1 Actualización de las garantías de la póliza- Prorroga N°2

Anexo No.2 Requerimientos del componente SSTMA

Anexo No.3 Intervención de las acciones de Movilidad

Anexo No.4 Entrega de dotación y reposición de EPP

Anexo No.5 Requerimientos del pago de servicios prestados del señor Lester Garcia

Anexo No.6 Requerimientos de secretaría de Movilidad

Anexo C.C. Archivo Consultoría y Construcción S.A.S.

Anexo C.C. Interventoría MIRS LATINOAMERICA S.A.S.- Representante Legal-Nick Randy Almeida Gamarriz

Anexo C.C. La Ecuidad Seguros Generales Organismo Cooperativo-Dr. Nestor Raul Hernández Ospina

1282
1346



Anexo No.1: Actualización de las garantías de la póliza- Prorroga
Nº2



Bogotá D.C. Agosto 30 de 2021

C&C-137-2019-025-2021-DC

Señores:

MIRS LATINOAMERICA S.A.A
Ant, Ing Nick Randy Almeida Gamarra
Representante Legal
Interventoria
CALLE 23F# 85a-31
Ciudad

Ref: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 137-2019 CUYO OBJETO ES CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES.

ASUNTO: ENVIO DOCUMENTOS – GARANTIAS

Cordial saludo,

Para los fines pertinentes y de acuerdo con la **SUSPENSION 3 REINICIO DE LA SUSPENSION N 3 Y PRORROGA N 2** del contrato citado en referencia, adjuntamos los siguientes documentos:

- Póliza de Cumplimiento N° AA007885
- Póliza de responsabilidad civil N° AA007887

Agradecemos su gentil atención.

Cordialmente,

JUAN PABLO RICCI RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

Mfn

FIRMA TOMADOR

1285
1349

SEGURO
R.C.E. ENTIDAD ESTATAL

equidad

PÓLIZA
AA007887

FACTURA
AA029079

NIT 860028415

INFORMACIÓN GENERAL

DOCUMENTO Modificación
CERTIFICADO AA027851
AGENCIA LEONARDO JOSE VURCIA RAMIREZ
PRODUCTO R.C.E. ENTIDAD ESTATAL
FORMA DE PAGO Contado
TELÉFONO 7639829
DIRECCIÓN CARRERA 26 #82-80. Piso 3
FECHA DE EXPEDICIÓN 30 07 2021
VIGENCIA DE LA POLIZA
DESDE 05 04 2021
HASTA 18 07 2021
HORA 00:00
HORA 12:00
FECHA DE IMPRESIÓN 30 07 2021
ORDEN
USUARIO ELCODE771

DATOS GENERALES

TOMADOR CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS
DIRECCIÓN AK 110 127-48 OFC 1006

EMAIL CONTABILIDAD@CONYCON.COM.CO

NIT/CC 860028415
TEL/MOVL 4641111

TEXTOS Y/O OBSERVACIONES DE LA ORDEN

ESTA POLIZA SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 25-02-2015-1501-P-06-0000000001007 EL CUAL SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REGISTRADO POR LA EQUIDAD SEGUROS O.C ANTE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PARA SU CONSULTA FAVOR INGRESAR A www.laequidadseguros.coop

OBJETO
GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CO- 137-2019 CELEBRADO EN LA PLATAFORMA SECON II CUYO OBJETO ES CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

ASEGURADO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES NIT NIT 899.999.061 - 9 Y/O CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S NIT 899.999.061 - 9

BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS Y/O FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES NIT NIT 899.999.061 - 9

LA PRESENTE POLIZA AMPARO LO DESCRITOS EN EL NUMERAL 3º DEL ARTICULO 2.2.1.2.3.2.9 DEL DECRETO 1062 DE 2015.

COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE
COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
COBERTURA EXPRESA DE LA RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, SALVO QUE EL SUBCONTRATISTA TENGA SU PROPIO SEGURO DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL CON LOS MISMOS AMPAROS ACUI REQUERIDOS
COBERTURA EXPRESA DE AMPARO PATRONAL
COBERTURA EXPRESA DE VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

MODIFICACION
POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGUN ACTA DE INICIO DEL 25 DE FEBRERO DE 2020 SE MODIFICA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS ARRIBA CITADOS

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES

MODIFICACION

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGUN EL ACTA DE SUSPENSION No 1 DEL 24 DE MARZO DE 2020

SE SUSPENDE EL CONTRATO DESDE EL 24 DE MARZO DE 2020 HASTA EL 21 DE JULIO DE 2020

SE REINICIA CONTRATO EL 21 DE JULIO DE 2020

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

MODIFICACION

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGUN PRORROGA Y ADICION No 1 DEL 25 DE SEPTIEMBRE

PRORROGA POR 2 MESES

FECHA FINAL DEL CONTRATO 20 DE MARZO DE 2021

ADICION DE 2.345.236.531

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 8.283.121.103

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

MODIFICACION

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE ACLARA LA FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO

FECHA FINAL DEL CONTRATO 20 DE MARZO DE 2021

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES

MODIFICACION

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGUN ACTAS DE SUSPENSION Y REINICIO SE AJUSTA VIGENCIA

FIRMA AUTORIZADA
LA EQUIDAD SEGUROS O.C.

FIRMA TOMADOR



APROVECHANDO NUESTRA PAGINA WEB PODRA CONSULTAR LA VIGENCIA DE SU SEGURO
CONSULTE NUESTRA PAGINA WEB WWW.EQUIDADSEGROS.CO PARA CONSULTAR LA VIGENCIA DE SU SEGURO

VIGILADO

1256
1350

SEGURO
R.C.E. ENTIDAD ESTATAL

PÓLIZA
AA007887

FACTURA
AA029079

equidad

NIT 860028415

INFORMACIÓN GENERAL

DOCUMENTO	Modificación	PRODUCTO	R.C.E. ENTIDAD ESTATAL				ORDEN				
CERTICADO	AA027887	FORMA DE PAGO	Contado	TELEFONO	7039828		USUARIO	LIPPEZ			
AGENCIA	LEONARDO JOSE MURCIA RAMIREZ		DIRECCIÓN		CARRERA 26 #62-60 PISO 3						
FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA POLIZA				FECHA DE IMPRESIÓN				
30	07	2021	DESDE	05	04	2021	HORA	00:00	30	07	2021
			HASTA	18	07	2021	HORA	12:00			

DATOS GENERALES

TOMADOR CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS
DIRECCIÓN AK 7 NO. 127-48 OFC 1006

EMAIL CONTABILIDAD@CONYCON.COM.CO

NIT/CC 853641611
TEL/MOVL 482188

TEXTOS Y/O OBSERVACIONES DE LA ORDEN

ACTA DE SUSPENSION DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2020 SUSPENSION 23 DIAS A PARTIR DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2020 HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2020

ACTA DE REINICIO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2020 FECHA TERMINACION DEL CONTRATO 12 DE ABRIL DE 2021

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

*** MODIFICACION ***

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN SUSPENSION NO. 3 DEL 05 DE ABRIL DE 2021 Y SEGUN REACTIVACION NO. 3 DEL 29 DE JUNIO DE 2021 SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS A LA POLIZA ARRIBA CITADA

SUSPENSION NO. 3 DEL 05 DE ABRIL DE 2021 POR EL TÉRMINO DE 30 DÍAS CALENDARIO, DESDE EL 31 DE MARZO 2021 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021.

REACTIVACION NO. 3 DEL 29 DE JUNIO DE 2021.

ACTA DE INICIO DEL 25 DE FEBRERO DE 2020.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 18 DE JULIO DE 2021

LOS DEMAS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

VIGILADO

FIRMA AUTORIZADA
LA EQUIDAD SEGUROS O.C.

FIRMA TOMADOR



APROPIO CLIENTE PARA MAYOR INFORMACION DEL PRODUCTO DEL SEGURO
CONSULTE NUESTRA PAGINA WEB WWW.EQUIDADSEGUROS.CO
Equidad Seguros 015003019038

1254
1351

**SEGURO
CUMPLIMIENTO ESTATAL**

CODIGO DE RECAUDO
111071029078

PÓLIZA
AA007885

FACTURA
AA029078

equidad
SEGUROS

NIT 860028415

INFORMACIÓN GENERAL

COD. PRODUCTO 0403 **PRODUCTO** CUMPLIMIENTO ESTATAL
COD. AGENCIA 0007 **CERTIFICADO** AA027850 **DOCUMENTO** Modificación **TEL:** 7039828
AGENCIA FRANQUICIA AGENCIA DE SEGUROS BERACA Y CIA LTDA **DIRECCIÓN** CARRERA 25 # 62-60 PISO 3

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA PÓLIZA				FECHA DE IMPRESIÓN		
30	07	2021	DESDE	05	04	2021	HORA	00:00	30
			HASTA	18	07	2026	HORA	12:00	07

DATOS GENERALES

TOMADOR	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS	E-MAIL	CONTABILIDAD@CONYCON.COM.CO	NIT/CC	839041411
DIRECCIÓN	AK 7 NO. 127-48 OFC. 1006			TEL/MOVI	4821681
ASEGURADO	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	E-MAIL	WWW.CONTRATACION@BOGOTA.GOV.CO	NIT/CC	854990611
DIRECCIÓN	CALLE 13 NO. 37-35			TEL/MOVI	3541360
BENEFICIARIO	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	E-MAIL	WWW.CONTRATACION@BOGOTA.GOV.CO	NIT/CC	855590311
DIRECCIÓN	CALLE 13 NO. 37-35			TEL/MOVI	3241001
AFIANZADO	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS	E-MAIL	CONTABILIDAD@CONYCON.COM.CO	NIT/CC	839041411
DIRECCIÓN	AK 7 NO. 127-48 OFC. 1006			TEL/MOVI	4821681

INFORMACIÓN RIESGO ASEGURADO

DESCRIPCIÓN	DETALLE
Ciudad (Ubicación del Riesgo) Departamento Localidad Comuna o Barrio Dirección (Ubicación del Riesgo) TIPO DE CONTRATO	BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. MARTIRES MARTIRES EJECUCION OBRAS Y REPARACIONES

INFORMACIÓN RIESGO ASEGURADO	
GARANTÍAS OTORGADAS	VALOR AFIANZADO
Cumplimiento del Contrato	\$2,484,936,330.90
Seguro de Morte y Coste de Inversión del Anticipo	\$2,484,936,330.90
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización Laboral	\$828,312,110.00
Seguridad y Calidad De Obra	\$2,484,936,330.90

VIGENCIAS GARANTÍA		
FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DÍAS DE VIGENCIA
05/04/2021	18/12/2021	257
05/04/2021	18/12/2021	257
05/04/2021	18/07/2024	1260
18/07/2021	18/07/2026	1826

VALOR ASEGURADO TOTAL \$8,283,121,103.00

NÚMERO DE RIESGOS

PRIMA NETA	GASTOS	IVA	TOTAL POR PAGAR
\$1,653,722	\$	\$260,297	\$1,914,019

FORMA DE PAGO Contado

ENTIDAD BANCARIA

COASEGURO	
COMPANIA	PARTICIPACIÓN
	%

INTERMEDIARIO Y/O FUERZA COMERCIAL DIRECTA		
CÓDIGO	NOMBRE	PARTICIPACIÓN
11187004	LEONARDO JOSE MURCIA RAMIREZ	

La mora en el pago de la prima o certificados que se expidan con fundamento en ella producirá la terminación automática del contrato y dará derecho a La Equidad Seguros O.C. para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. El pago extemporáneo de la prima, no convalida la mora ni reactiva la póliza terminada automáticamente, caso en el cual se devolverá la prima a que haya lugar.
Con la firma del presente documento certifico que he leído de manera anticipada en la página web de La Equidad <http://www.laequidadseguros.com.co>, el clausulado anexo a la póliza contratada, el cual adicionalmente me fue explicado por la compañía de seguros; Información que en todo caso, declaro que conozco y entiendo clara, suficiente y expresamente, en especial lo relacionado con las condiciones generales, el contenido de la cobertura, las exclusiones y las garantías del contrato de seguro.

FIRMA AUTORIZADA
LA EQUIDAD SEGUROS O.C.

FIRMA TOMADOR



AVISO AL CLIENTE PARA MAYOR INFORMACIÓN: VISITE NUESTRO SITIO WEB
CONSULTE NUESTRA PAGINA WEB WWW.LAEQUIDADSEGUROS.COM.CO
Versión Seguros 01/03/2019 13:30
4364

VIGILADO

1258
1352

**SEGURO
CUMPLIMIENTO ESTATAL**

**CODIGO DE RECAUDO
111071029078**

**PÓLIZA
AA007885**

**FACTURA
AA029078**

equidad
SEGUROS

INFORMACIÓN GENERAL

COD. PRODUCTO 0402 **PRODUCTO** CUMPLIMIENTO ESTATAL
COD. AGENCIA 00071 **CERTIFICADO** AA027850 **DOCUMENTO** Modificación **TEL:** 7039978
AGENCIA FRANQUICIA AGENCIA DE SEGUROS BERACA Y CIA LTDA **DIRECCIÓN** CARRETERA 26 # 62-60 PISO 3

FECHA DE EXPEDICION			VIGENCIA DE LA PÓLIZA				FECHA DE IMPRESIÓN		
30	07	2021	DESDE	05	04	2021	HORA	00:00	30 07 2021
			HASTA	18	07	2026	HORA	12:00	

DATOS GENERALES

TOMADOR CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS
DIRECCIÓN AK 7 NO. 127-48 OFC 1006

E-MAIL CONTABILIDAD@CONYCON.COM.CO

NIT/CC 930047411
TEL/MOVIL 4871191

TEXTOS Y/O OBSERVACIONES DE LA PÓLIZA

ESTA PÓLIZA SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 14082019-1501-P-05-0000000000000403-DIJO, EL CUAL SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REGISTRADO POR LA EQUIDAD SEGUROS O.C. ANTE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. PARA SU CONSULTA FAVOR INGRESAR A www.equidadsegueros.coop.

EL PRESENTE SEGURO Y LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ÉL, NO EXPIRARÁN POR MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA NI PLURAN.
SE REVOCAN UNILATERAL POR EL TOMADOR O AFIANZADO DE LA PÓLIZA O DE LA ASEGURADORA

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ARTICULO 2.2.1.2 3.2.5

OBJETO
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y O INDENIZACION
LABORAL Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CO- 137-2019 CELEBRADO EN LA PLATAFORMA SECCP II CUYO OBJETO ES CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES.

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA ES DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA Y RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA ENTIDAD

ASEGURADO/BENEFICIARIO: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES NIT NIT 899.690.061-6

MODIFICACION

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGÚN ACTA DE INICIO DEL 25 DE FEBRERO DE 2020 SE MODIFICA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS ARRIBA CITADOS.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

MODIFICACION

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGÚN EL ACTA DE SUSPENSIÓN No 1 DEL 24 DE MARZO DE 2020

SE SUSPENDE EL CONTRATO DESDE EL 24 DE MARZO DE 2020 HASTA EL 20 DE JULIO DE 2020.

SE REINICIA CONTRATO EL 21 DE JULIO DE 2020

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES

MODIFICACION

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGÚN PRORROGA Y ADICIÓN No 1 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 137-2019.
SE PRORROGA VIGENCIA POR 2 MESES

FECHA FINAL CONTRATO 20 DE MARZO DE 2021

ADICIÓN AL CONTRATO DE 2.845.236.531

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 8.283.131.103

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

**FIRMA AUTORIZADA
LA EQUIDAD SEGUROS O.C.**

FIRMA TOMADOR



PRECIADO CLIENTE PARA MAYOR INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CONSULTAR CON SU AGENTE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.EQUIDADSEGUROS.CO O AL 7039978
Equidad Seguros 3160097016
0324

VIGILADO

1259
1353

CODIGO DE RECAUDO
111071029078

PÓLIZA
AA007885

SEGURO
CUMPLIMIENTO ESTATAL

FACTURA
AA029078

equidad
seguros

INFORMACIÓN GENERAL

COD. PRODUCTO 0403 **PRODUCTO** CUMPLIMIENTO ESTATAL
COD. AGENCIA 00071 **CERTIFICADO** AA027850 **DOCUMENTO** Modificación **TEL:** 753 1828
AGENCIA FRANQUICIA AGENCIA DE SEGUROS BERACA Y CIA LTDA **DIRECCIÓN** CARRERA 26 # 62-69, PISO 3

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA PÓLIZA					FECHA DE IMPRESIÓN			
30	07	2021	DESDE	05	04	2021	HORA	00:00	30	07	2021
			HASTA	18	07	2026	HORA	12:00			

DATOS GENERALES

TOMADOR CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS
DIRECCIÓN AK 7 NO. 127-48 OFC 1006
E-MAIL CONTABILIDAD@CONYCON.COM.CO
NIT/CC 830641411
TEL/MOVI 4821681

TEXTOS Y/O OBSERVACIONES DE LA PÓLIZA

MODIFICACIÓN

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGUN ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO SE AJUSTA VIGENCIA
ACTA DE SUSPENSION DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2020
SUSPENSION: 23 DIAS
A PARTIR DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2020 HASTA 20 DE DICIEMBRE DE 2020
ACTA DE REINICIO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA TERMINACION DEL CONTRATO 12 DE ABRIL DE 2021
TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

*** MODIFICACIÓN ***

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN SUSPENSION NO. 3 DEL 05 DE ABRIL DE 2021 Y SEGUN REACTIVACION NO. 3 DEL 29 DE JUNIO DE 2021 SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS A LA PÓLIZA ARRIBA CITADA.
SUSPENSION NO. 3 DEL 05 DE ABRIL DE 2021; POR EL TÉRMINO DE 30 DÍAS CALENDARIO DESDE EL 31 DE MARZO 2021 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021
REACTIVACION NO. 3 DEL 29 DE JUNIO DE 2021.
ACTA DE INICIO DEL 26 DE FEBRERO DE 2020.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 18 DE JULIO DE 2021
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

[Firma Autorizada]

FIRMA AUTORIZADA
LA EQUIDAD SEGUROS O.C.

[Firma Tomador]

FIRMA TOMADOR



APRECIADO CLIENTE PARA MAYOR INFORMACION DEL PRODUCTO CONTRATADO
CONSULTE NUESTRA PAGINA WEB WWW.EQUIDADSEGUROS.CO
Unidad Seguros 1804015032
#114

VIGILADO

1260
1354

SEGURO
R.C.E. ENTIDAD ESTATAL

PÓLIZA
AA007887

FACTURA
AA029457

equidad

NIT 860028415

INFORMACIÓN GENERAL

DOCUMENTO Modificación **PRODUCTO** R.C.E. ENTIDAD ESTATAL **ORDEN** 1
CERTICADO AA028293 **FORMA DE PAGO** Contado **TELÉFONO** 7039028 **USUARIO** 1100527
AGENCIA LEONARDO JOSÉ MURCIA RAMÍREZ **DIRECCIÓN** CARRERA 25 # 62-03 PISO 3
FECHA DE EXPEDICIÓN 27 08 2021 **VIGENCIA DE LA PÓLIZA** **FECHA DE IMPRESIÓN** 27 08 2021

DESDE	HASTA	HORA
17 07 2021	17 09 2021	12 00

DATOS GENERALES

TOMADOR CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS
DIRECCIÓN AK 7 NO. 127-48 OFC 1000
ASEGURADO BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN AV. CALLE 26 # 57 - 53 TORRE 7 PISOS 8 13, 14, 16
BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS
DIRECCIÓN TERRITORIO NACIONAL

EMAIL CONTABILIDAD@CONYCON.COM.CO
EMAIL WWW.CONTRATACION@BOGOTA.GOV.CO
EMAIL notiene@notiene.com

NIT/CC 860028415
TEL/MOVL 4611111
NIT/CC 860028415
TEL/MOVL 2241000
NIT/CC 860028415
TEL/MOVL 2241000

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

DETALLE	DESCRIPCIÓN
BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. MARTIRES MARTIRES Franquicia	

COBERTURAS Y VALOR ASEGURADO

DESCRIPCIÓN	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE VALOR	PRIMA
Seguros de Vida y Derrames	\$438.901.500.00	10.00%	\$43.890.150.00	3.00%
Seguros de Vida y Derrames	\$43.890.150.00	10.00%	\$4.389.015.00	3.00%
Seguros de Vida y Derrames	\$43.890.150.00	10.00%	\$4.389.015.00	3.00%
Seguros de Vida y Derrames	\$43.890.150.00	10.00%	\$4.389.015.00	3.00%

VALOR ASEGURADO TOTAL \$438.901.500.00 **PRIMA NETA** \$267.730.00 **GASTOS** **IVA** \$51.835.00 **TOTAL POR PAGAR** \$319.565.00

COASEGURO **INTERMEDIARIO Y/O FUERZA COMERCIAL DIRECTA**

COMPANIA	PARTICIPACIÓN	CÓDIGO	NOMBRE	PARTICIPACIÓN
		11167931	LEONARDO JOSÉ MURCIA RAMÍREZ	

Se mora en el pago de la prima o certificados que se expidan con fundamento en ella producirá la terminación automática del contrato y dará derecho a la Equidad Seguros O.C. para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. El pago extemporáneo de la prima no convalida la mora ni reactiva la póliza terminada automáticamente, caso en el cual se devolverá la prima a que haya lugar.
Con la firma del presente documento certifico que he leído de manera anticipada en la página web de La Equidad <http://www.laequidadseguros.co>, el contenido anexo a la póliza contratada, el cual adicionalmente me fue explicado por la compañía de seguros; Información que en todo caso declaro que conozco y entiendo, para suficiente y expresamente, en especial lo relacionado con las condiciones generales, el contenido de la cobertura, las exclusiones y las garantías del contrato de seguro. De igual forma, en el evento que corresponda, certifico que me fue entregada la tarjeta de asistencia y/o camé correspondiente a la póliza.

CLAUSULADO N°.



VIGILADO

FIRMA AUTORIZADA
LA EQUIDAD SEGUROS O.C.

FIRMA TOMADOR

APROBADO POR LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA
SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN DE BOGOTÁ, D.C.
BOGOTÁ, D.C. 2021

1261
1355

SEGURO
R.C.E. ENTIDAD ESTATAL

PÓLIZA
AA007887

FACTURA
AA029457

equidad

NIT 860028415

INFORMACIÓN GENERAL

DOCUMENTO Modificación	PRODUCTO R.C.E. ENTIDAD ESTATAL	ORDEN								
CERTIFICADO AA07887	FORMA DE PAGO Contado	USUARIO 00000000								
AGENCIA EDUARDO JOSE MURCIA RAMIREZ	DIRECCION CARRERA 26 #62-60 P.503									
FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DE LA POLIZA	FECHA DE IMPRESION								
27 08 2021	<table border="1"><tr><td>DESDE</td><td>17 07 2021</td><td>HORA</td><td>00:00</td></tr><tr><td>HASTA</td><td>17 09 2021</td><td>HORA</td><td>12:00</td></tr></table>	DESDE	17 07 2021	HORA	00:00	HASTA	17 09 2021	HORA	12:00	27 08 2021
DESDE	17 07 2021	HORA	00:00							
HASTA	17 09 2021	HORA	12:00							

DATOS GENERALES

TOMADOR CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS
DIRECCION AK 7 NO 127-48 OFC 1006

EMAIL CONTABILIDAD@CONYCON.COM.CO

NIT/CC 850047411
TEL/MOVIL 4811211

TEXTOS Y/O OBSERVACIONES DE LA ORDEN

ESTA POLIZA SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 25-02-2015-1501-P-06-0000000001007, EL CUAL SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REGISTRADO POR LA EQUIDAD SEGUROS O.C. ANTE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. PARA SU CONSULTA FAVOR INGRESAR A www.laequidadseguros.coop

OBJETO
GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CO-137/2019 CELEBRADO EN LA PLATAFORMA SECOP II CUYO OBJETO ES CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

ASEGURADOR FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES NIT NIT 859.999.061-9 Y/O CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS NIT 859.999.061-9

BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS Y/O FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES NIT NIT 859.999.061-9

LA PRESENTE POLIZA AMPARO LO DESCRITOS EN EL NUMERAL 3º DEL ARTICULO 2.2.1 2.3.2.9 DEL DECRETO 1082 DE 2015

COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS POR DANO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE
COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES
COBERTURA EXPRESA DE LA RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, SALVO QUE EL SUBCONTRATISTA TENGA SU PROPIO SEGURO DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL CON LOS MISMOS AMPAROS AQUÍ REQUERIDOS
COBERTURA EXPRESA DE AMPARO PATRONAL
COBERTURA EXPRESA DE VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.

MODIFICACION
POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGUN ACTA DE INICIO DEL 25 DE FEBRERO DE 2020 SE MODIFICA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS ARRIBA CITADOS

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES

MODIFICACION

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGUN EL ACTA DE SUSPENSION No 1 DEL 24 DE MARZO DE 2020

SE SUSPENDE EL CONTRATO DESDE EL 24 DE MARZO DE 2020 HASTA EL 21 DE JULIO DE 2020

SE REINICIA CONTRATO EL 21 DE JULIO DE 2020

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES

MODIFICACION

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGUN PRORROGA Y ADICION No 1 DEL 25 DE SEPTIEMBRE

PRORROGA POR 2 MESES

FECHA FINAL DEL CONTRATO 20 DE MARZO DE 2021

ADICION DE 2.845.236.531

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 8.283.121.103

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

MODIFICACION

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE ACLARA LA FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO

FECHA FINAL DEL CONTRATO 20 DE MARZO DE 2021

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES

MODIFICACION

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGUN ACTAS DE SUSPENSION Y REINICIO SE AJUSTA VIGENCIA

[Firma Autorizada]

FIRMA AUTORIZADA
LA EQUIDAD SEGUROS O.C.

[Firma Tomador]

FIRMA TOMADOR



APLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II PARA LA VERIFICACION DE LA AUTENTICIDAD DE LA POLIZA
TRABAJAR EN LA PLATAFORMA SECOP II PARA LA VERIFICACION DE LA AUTENTICIDAD DE LA POLIZA

VIGILADO

1262
1356

SEGURO
R.C.E. ENTIDAD ESTATAL

PÓLIZA
AA007887

FACTURA
AA029457

equidad

NIT 860028415

INFORMACIÓN GENERAL

DOCUMENTO Modificación

CERTIFICADO AA028203

AGENCIA LEONARDO JOSE MURCIA RAMIREZ

PRODUCTO

R.C.E. ENTIDAD ESTATAL

FORMA DE PAGO Contado

TELÉFONO 7539828

DIRECCIÓN CARRERA 25 # 62-60. PISO 3

ORDEN 1

USUARIO LOPEZ77

FECHA DE EXPEDICIÓN

27 08 2021

VIGENCIA DE LA PÓLIZA

DESDE	17	07	2021	HORA	00:00
HASTA	17	09	2021	HORA	12:00

FECHA DE IMPRESIÓN

27 08 2021

DATOS GENERALES

TOMADOR CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS

DIRECCIÓN AK 7 NO 127-48 OFC 1005

EMAIL CONTABILIDAD@CONYCON.COM.CO

NIT/CC 83004441

TEL/MÓVIL 3121581

TEXTOS Y/O OBSERVACIONES DE LA ORDEN

- ACTA DE SUSPENSIÓN DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2020 SUSPENSIÓN 23 DÍAS A PARTIR DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2020 HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2020

- ACTA DE REINICIO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2020 FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO 12 DE ABRIL DE 2021

TODOS LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

*** MODIFICACIÓN ***

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN SUSPENSIÓN NO. 3 DEL 05 DE ABRIL DE 2021 Y SEGÚN REACTIVACIÓN NO. 3 DEL 29 DE JUNIO DE 2021 SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS A LA PÓLIZA ARRIBA CITADA.

SUSPENSIÓN NO. 3 DEL 05 DE ABRIL DE 2021 POR EL TÉRMINO DE 30 DÍAS CALENDARIO, DESDE EL 31 DE MARZO 2021 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021.

REACTIVACIÓN NO. 3 DEL 29 DE JUNIO DE 2021

ACTA DE INICIO DEL 25 DE FEBRERO DE 2020.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 18 DE JULIO DE 2021

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

*** MODIFICACIÓN ***

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN PRORROGA NO. 2 DEL 17 DE JULIO DE 2021 SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS A LA PÓLIZA ARRIBA CITADA.

ACTA DE INICIO DEL 25 DE FEBRERO DE 2020.

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VIGILADO

FIRMA AUTORIZADA
LA EQUIDAD SEGUROS O.C.

FIRMA TOMADOR



AFECADO CLIENTE PARA MAYOR INFORMACIÓN DEL PRODUCTO, VISITE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.EQUIDADSEGUROS.COM
o llame al 01122000000

120
1357

SEGURO
CUMPLIMIENTO ESTATAL

CODIGO DE RECAUDO
111071029456

PÓLIZA
AA007885

FACTURA
AA029456

equidad
seguros

NIT 860028415

INFORMACIÓN GENERAL

COD. PRODUCTO 0403 **PRODUCTO** CUMPLIMIENTO ESTATAL
COD. AGENCIA 00071 **CERTIFICADO** AA028202 **DOCUMENTO** Modificación **TEL:** 7029828
AGENCIA FRANQUICIA AGENCIA DE SEGUROS BERACA Y CIA LTDA **DIRECCIÓN** CARRERA 26 # 62-60 1 PISO 3

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA PÓLIZA				FECHA DE IMPRESIÓN		
27	08	2021	DESDE	17	07	2021	27	08	2021
			HASTA	17	09	2026			
						HORA			
							00:00		
							12:00		

DATOS GENERALES

TOMADOR CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS
DIRECCIÓN AK 7 NO. 127-48 OFC 1006
E-MAIL CONTABILIDAD@CONYCON.COM.CO
ASEGURADO BOGOTA DC SECRETARIA DE EDUCACION
E-MAIL WWW.CONTRATACION@BOGOTA.GOV.CO
DIRECCIÓN AV CALLE 26 # 57 - 83 TORRE 7 PISOS 6, 13, 14, 16
E-MAIL WWW.CONTRATACION@BOGOTA.GOV.CO
BENEFICIARIO BOGOTA DC SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCIÓN AV CALLE 26 # 57 - 83 TORRE 7 PISOS 6, 13, 14, 16
E-MAIL CONTABILIDAD@CONYCON.COM.CO
AFIANZADO CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS
DIRECCIÓN AK 7 NO. 127-48 OFC 1006
E-MAIL CONTABILIDAD@CONYCON.COM.CO

NIT/CC 83004141
TEL/MOVIL 4921681
NIT/CC 889598261
TEL/MOVIL 3741000
NIT/CC 83004141
TEL/MOVIL 4821681

INFORMACIÓN RIESGO ASEGURADO

DESCRIPCIÓN	DETALLE
Ciudad (Ubicación del Riesgo) Departamento Localidad Comuna o Barrio Dirección (Ubicación del Riesgo) TIPO DE CONTRATO	BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. MARTÍRES MARTÍRES EJECUCIÓN OBRAS Y REPARACIONES

INFORMACIÓN RIESGO ASEGURADO		VIGENCIAS GARANTÍA		
GARANTÍAS OTORGADAS	VALOR AFIANZADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DÍAS DE VIGENCIA
Plumamiento del Contrato	\$2,484,936,330.90	17/07/2021	17/02/2022	210
Plan Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	\$2,484,936,330.90	17/07/2021	17/02/2022	210
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización Laboral	\$836,312,110.30	17/07/2021	17/09/2024	1112
Saludables y Calidad De Obra	\$2,484,936,330.90	17/09/2021	17/09/2024	1076

VALOR ASEGURADO TOTAL \$8,283,121,403.00

NUMERO DE RIESGOS

PRIMA NETA	GASTOS	IVA	TOTAL POR PAGAR
\$ 158,635	\$5,000	\$221,251	\$1,385,317

FORMA DE PAGO Contado

ENTIDAD BANCARIA

COASEGURO	
COMPANIA	PARTICIPACIÓN
	%

INTERMEDIARIO Y/O FUERZA COMERCIAL DIRECTA		
CÓDIGO	NOMBRE	PARTICIPACIÓN
11187504	LEONARDO JOSE MURCIA RAMIREZ	%

La mora en el pago de la prima o certificados que se expidan con fundamento en ella producirá la terminación automática del contrato y dará derecho a La Equidad Seguros O.C. para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. El pago extemporáneo de la prima no convalida la mora ni reactiva la póliza terminada automáticamente, caso en el cual se devolverá la prima a que haya lugar.
Con la firma del presente documento certifico que he leído de manera anticipada en la página web de La Equidad <http://www.laequidadseguros.com.co/> el contenido anexo a la póliza contratada, el cual adicionalmente me fue explicado por la compañía de seguros. Información que en todo caso, declaro que conozco y entiendo clara, suficiente y expresamente, en especial lo relacionado con las condiciones generales, el contenido de la cobertura, las exclusiones y las garantías del contrato de seguro.

FIRMA AUTORIZADA
LA EQUIDAD SEGUROS O.C.

FIRMA TOMADOR



APROPIADO CUENTE PARA MAYOR INFORMACIÓN EN PROF. LIC. D. CONTRATO
CONSULTE NUESTRA PAGINA WEB: WWW.LAEQUIDADSEGUROS.COM.CO/
Línea Seguros 010001919511
#124

VIGILADO

VIGILADO

1268
1359

CODIGO DE RECAUDO
111071029456

SEGURO
CUMPLIMIENTO ESTATAL

PÓLIZA
AA007885

FACTURA
AA029456



INFORMACIÓN GENERAL

COD. PRODUCTO 0493 **PRODUCTO** CUMPLIMIENTO ESTATAL
COD. AGENCIA 00071 **CERTIFICADO** AA028202 **DOCUMENTO** Modificación **TEL:** 7138626
AGENCIA FRANQUICIA AGENCIA DE SEGUROS BERACA Y CIA LTDA **DIRECCIÓN** CARRERA 20 #62-63, PISO 3

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA PÓLIZA				FECHA DE IMPRESIÓN		
27	08	2021	DESDE	17	07	2021	HORA	00:00	27 08 2021
			HASTA	17	09	2026	HORA	12:00	

DATOS GENERALES

TOMADOR CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS
DIRECCIÓN Av. NO 127-48 OFC 1006 **E-MAIL** CONTABILIDAD@CONYCON.COM.CO **NIT/CC** 530047411
TEL/MOVIL 31271681

TEXTOS Y/O OBSERVACIONES DE LA PÓLIZA

*****MODIFICACION****

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGUN ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO SE AJUSTA VIGENCIA

ACTA DE SUSPENSION DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2020

SUSPENSION 23 DIAS

A PARTIR DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2020 HASTA 20 DE DICIEMBRE DE 2020

ACTA DE REINICIO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA TERMINACION DEL CONTRATO 12 DE ABRIL DE 2021

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

*****MODIFICACION*****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN SUSPENSION NO. 3 DEL 05 DE ABRIL DE 2021 Y SEGUN REACTIVACION NO. 3 DEL 29 DE JUNIO DE 2021 SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS A LA POLIZA ARRIBA CITADA

SUSPENSION NO. 3 DEL 05 DE ABRIL DE 2021 POR EL TERMINO DE 30 DIAS CALENDARIO DESDE EL 27 DE MARZO 2021 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

REACTIVACION NO. 3 DEL 29 DE JUNIO DE 2021

ACTA DE INICIO DEL 25 DE FEBRERO DE 2020.

NUEVA FECHA DE TERMINACION: 18 DE JULIO DE 2021.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

*****MODIFICACION*****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN PRORROGA NO. 2 DEL 17 DE JULIO DE 2021 SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS A LA POLIZA ARRIBA CITADA

ACTA DE INICIO DEL 25 DE FEBRERO DE 2020.

NUEVA FECHA DE TERMINACION: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

[Firma Autorizada]

FIRMA AUTORIZADA
LA EQUIDAD SEGUROS O.C.

[Firma Tomador]

FIRMA TOMADOR



APROPIADO CLIENTE PARA MAYOR INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y LA TARIFA
CONSULTE NUESTRA PAGINA WEB WWW.LAEQUIDADSEGUROS.CO
Res Seguro 11071029456
654

VIGILADO



NIT 830.041.411-0

Copia
C4C
1266
1360

C&C-CO137-2019-115

Bogotá D.C., 15 de septiembre de 2021

Señores
MIRS LATINOAMERICA S.A.S
Atn. Sandra Mónica Cardozo Rojas
Directora de interventoría
Bogotá D.C.

17/9/21 8:07

Sticker web

Alcaldía Local de Martires

R No. 2021-641-005065-2

2021-09-17 08:07 - Folios: 10 Anexos: 50

Destino: Area de Gestion de Desarr

Rem D: CON & CON - CONSULTORIA Y



Referencia: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO-137-2019 cuyo objeto es "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"**

Asunto: **RESPUESTA RADICADO MIRS-MAR-131-2019**

Cordial Saludo,




Teniendo en cuenta el oficio relacionado en el asunto, en el que se realizan observaciones respecto a los componentes SSTMA del segmento 15 correspondiente al CIV 14001506, por medio del presente evidenciamos la subsanación de las mismas en el desarrollo de las actividades constructivas y se realizan además aclaraciones a lo afirmado en el oficio en mención.


- Las observaciones que realiza la interventoría se atienden de forma oportuna teniendo en cuenta la gestión que se debe desarrollar para la subsanación de las mismas, pero siempre se ha mantenido comunicación directa e información clara con el par de los componentes. En caso de no poder subsanar de manera inmediata se han explicado los motivos y medidas correctivas adoptadas mientras se soluciona de manera efectiva.

Es incorrecto afirmar, cito textualmente "(...) El contratista a la fecha no ha dado respuesta a las observaciones emitidas por interventoría de manera formal (...)"; mediante el oficio **C&C-CO137-2019-095** radicado el día 13 de julio de 2021 y el oficio **C&C-CO137-2019-098** radicado el día 16 de julio de 2021, se dio alcance a las observaciones realizadas por esta interventoría, como se evidencia en el anexo 1.

- En el segmento en mención, desde el 10 de septiembre de 2021 se realizó el lleno con material de la excavación realizada para la instalación de una acometida de

alcantarillado en el espacio público, por tanto, se subsana la observación ya que no se necesita plafonado ni señalización, cabe aclarar además que sí se señaló dicha zona como se evidencia en el registro fotográfico a continuación:

	
<p>Lleno de material segmento 15 CIV 14001506</p>	<p>Señalización excavación segmento 15 CIV 14001506</p>
	
<p>Lleno de material segmento 15 CIV 14001506</p>	<p>Lleno de material segmento 15 CIV 14001506</p>

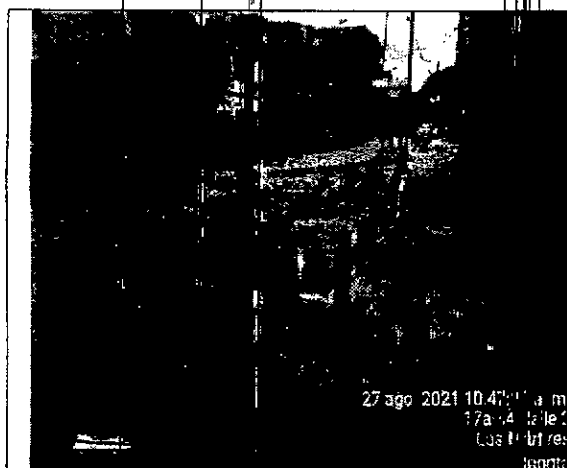

Señalización excavación segmento 15 CIV
14001506




Señalización excavación segmento 15 CIV
14001506


- Se retiró del frente de obra el personal y maquinaria que no contaba con aprobación. A la fecha no se encuentra maquinaria en obra sin señalizar y toda cuenta con aprobación de la interventoría.
- Se realiza el cambio y mantenimiento del cerramiento de obra en el segmento en mención como se evidencia en el registro fotográfico, se implementan broches con polisombra verde para facilitar la visibilidad de los vehículos que transitan por el carril oriental y de esa manera evitar accidentes vehiculares. Como se evidenció, en la comunicación **C&C-CO137-2019-098** radicado el día 16 de julio de 2021, se hizo cambio total del cerramiento de obra, implementando el cerramiento tipo 1 que consta de señalizadores tubulares (por las condiciones de seguridad se implementaron colombinas hechas con concreto) y triple cinta peligro cal. 4 teniendo en cuenta el movimiento de maquinaria y el avance de las actividades constructivas en el costado que occidental del carril en intervención y se implementó un cerramiento tipo 2 que consta de postes rollizos de 1.90mt, doble cinta peligro cal. 4, tela para cerramiento y polisombra en el resto del segmento vial. Sin embargo, teniendo en cuenta que se presenta un movimiento de tierra permanente y las basuras que son arrojadas en el costado occidental, el cerramiento se deteriora y ensucia muy rápido. Por ejemplo, el día 14 de septiembre de 2021 se instaló polisombra nueva y el día 15 de septiembre de 2021 a primera hora el personal de obra encontró la misma quemada por la comunidad.




Cerramiento segmento 15 CIV 14001506

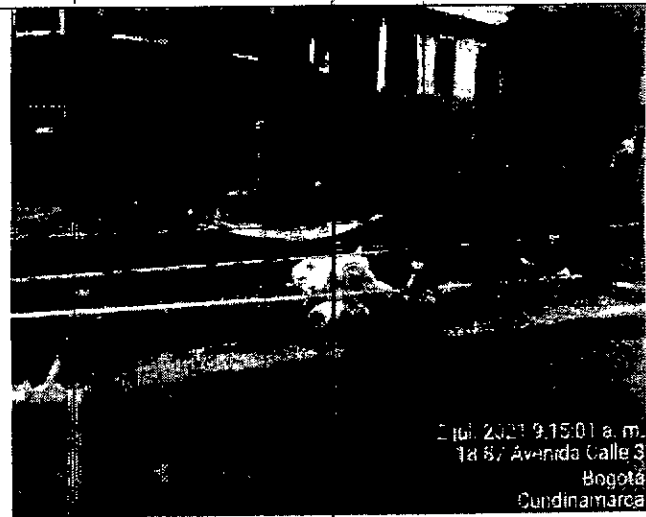


Cerramiento segmento 15 CIV 14001506

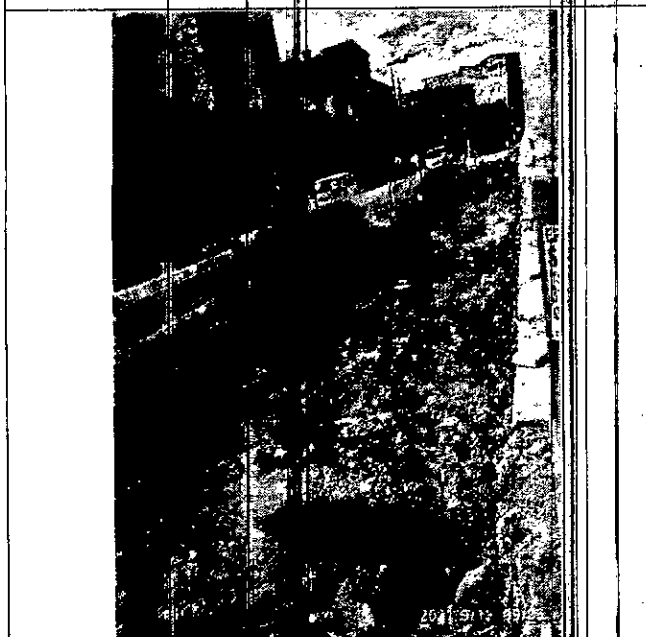

Cerramiento segmento 15 CIV 14001506



Mantenimiento segmento 15 CIV 14001506



Cerramiento segmento 15 CIV 14001506




Cerramiento segmento 15 CIV 14001506



Mantenimiento segmento 15 CIV 14001506



Cerramiento segmento 15 CIV 14001506

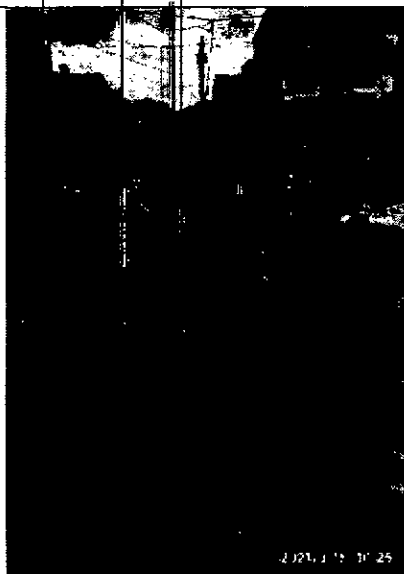

Mantenimiento segmento 15 CIV 14001506



Mantenimiento segmento 15 CIV 14001506




Señalización segmento 15 CIV 14001506




Señalización segmento 15 CIV 14001506

- Se hace cambio de cascos azules por grises.

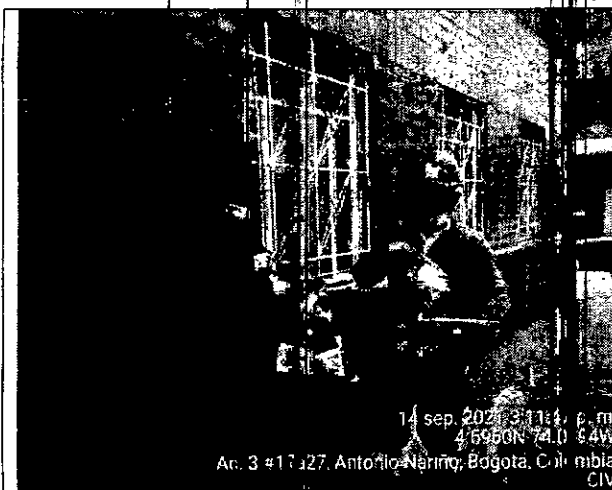

Entrega de cascos grises

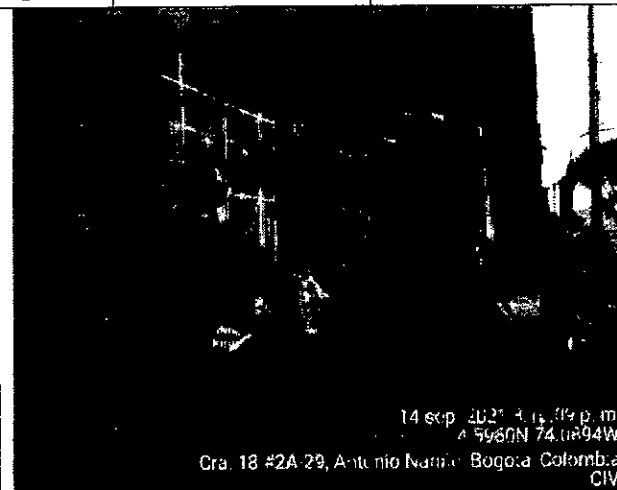


Entrega de cascos grises

- Se instala señalización en el frente de obra y se realiza cambio de la misma de manera continua como se ha evidenciado en el registro fotográfico de los informes mensuales, grupo de WhatsApp y respuesta a oficios, es importante resaltar que la señalización referente a los protocolos de bioseguridad está instalada en el campamento, donde los trabajadores realizan el cambio de sus ropas, protocolos de desinfección y lavado de manos.



Instalación de señalización segmento 15 CIV
14001506

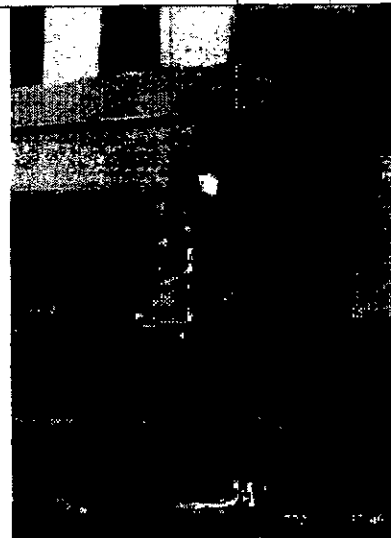

Instalación de señalización segmento 15
CIV 14001506



Instalación de señalización segmento 15 CIV 14001506




Señalización protocolo de bioseguridad segmento 15 CIV 14001506







Señalización segmento 15 CIV 14001506




Señalización segmento 15 CIV 14001506

	
<p>Señalización protocolo de bioseguridad segmento 15 CIV 14001506</p>	<p>Señalización segmento 15 CIV 14001506</p>
	
<p>Señalización protocolo de bioseguridad segmento 15 CIV 14001506</p>	<p>Señalización protocolo de bioseguridad segmento 15 CIV 14001506</p>

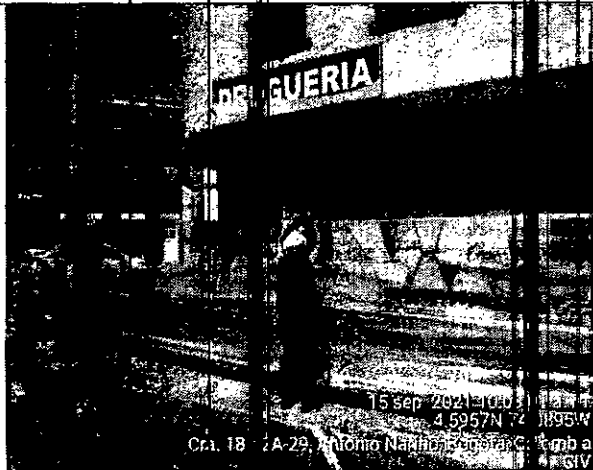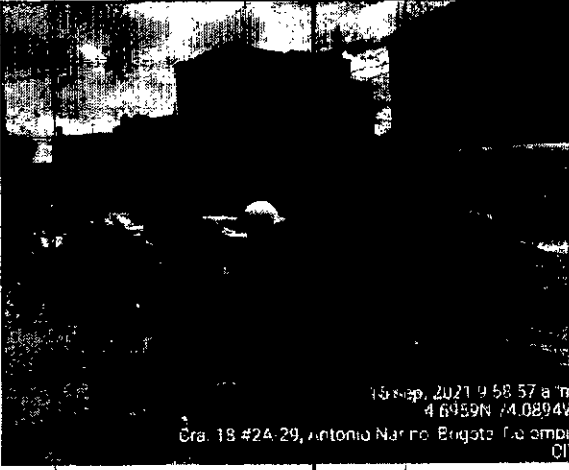
	
Señalización protocolo de bioseguridad segmento 15 CIV 14001506	Señalización protocolo de bioseguridad segmento 15 CIV 14001506
	
Instalación de señalización segmento 15 CIV 14001506	Instalación de señalización segmento 15 CIV 14001506

- Se realiza instalación de PMT de acuerdo a lo aprobado por SDM, la cual ha sido hurtada en diversas ocasiones lo que genera que se deba iniciar procesos internos de compras y logística para la reinstalación de las mismas y poder subsanar en el menor tiempo posible. Una vez sea instalada nuevamente en el frente de obra se informará a interventoría para verificación en campo. De la misma forma, se informa que se realiza el trámite de solicitud de prórroga para el PMT del tramo en mención.

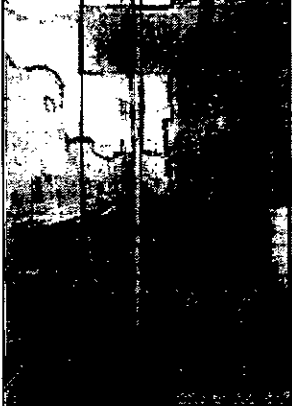


	
PMT etapa II segmento 15 CIV 14001506	PMT etapa II segmento 15 CIV 14001506
	
PMT etapa II segmento 15 CIV 14001506	PMT etapa II segmento 15 CIV 14001506

- Se entrega hidratación al personal en obra.

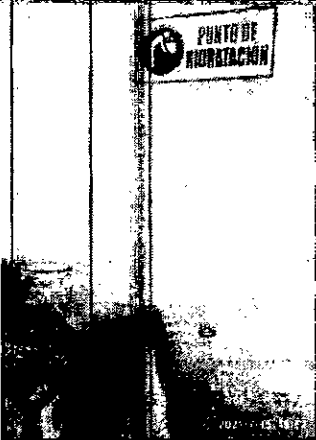	
Punto de hidratación segmento 15 CIV 14001506	Entrega de hidratación segmento 15 CIV 14001506



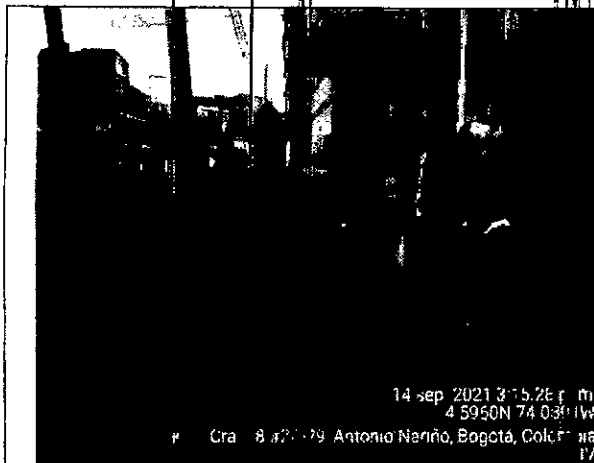

Entrega de hidratación segmento 15 CIV
14001506



Entrega de hidratación segmento 15 CIV
14001506


- Se realiza mantenimiento a los sumideros en obra.




Protección sumideros segmento 15 CIV
14001506



Protección sumideros segmento 15 CIV
14001506



Protección sumideros segmento 15 CIV
14001506



Protección sumideros segmento 15 CIV
14001506

- Se ha dado respuesta a los oficios de SDM de manera oportuna como se evidencia en el anexo 2. A continuación, se relacionan los oficios allegados junto con su respectiva respuesta.

Oficio de entrada	Asunto	Oficio de respuesta	Asunto
Radicado SDM N° 20213120637751 del 04 de febrero de 2021 Radicado a ConyCon 09 de febrero de 2021	Suspensión por Obra sin iniciar	No requiere respuesta	No requiere respuesta
Radicado SDM N° 20213122334561 del 22 de abril de 2021 Radicado a ConyCon 03 de mayo de 2021	Terminación de obra	C&C-CO137-2019-086 Del 05-05-2021	Respuesta radicado SDM N° 20213122334561 – solicitud de terminación de PMT Radicado SDM 20216120768412
Radicado SDM N° 20213123334111 del 19 de mayo de 2021 Radicado a ConyCon 21 de mayo de 2021	Incumplimientos en la implementación de PMT	C&C-CO137-2019-106 del 25-08-2021	Respuesta radicado SDM N° 20213123334111 rad SDM 20216121421272
Radicado SDM N° 20213125295801 del 06 de julio de 2021 Radicado a ConyCon 30 de junio de 2021	Terminación de obra	C&C-CO137-2019-094 del 08-07-2021	Respuesta radicado SDM N° 20213125295801 – solicitud de terminación de PMT Radicado SDM 20216121123912
Radicado SDM N° 20213125899761 del 30 de julio de 2021 Radicado a ConyCon 04 de agosto de 2021	Suspensión por Obra sin iniciar	No requiere respuesta	No requiere respuesta
Radicado SDM N° 20213126408431 del 07 de septiembre de 2021	Incumplimientos en la implementación	C&C-CO137-2019-116 del 16-09-2021	Respuesta radicado SDM N° 20213126408431–



NIT 830.041.411-0


1278
1372

Radicado a ConyCon 09 de septiembre de 2021	de PMT y obra sin PMT vigente	Radicado SDM 20216121580862
---	----------------------------------	--------------------------------

- De acuerdo a la solicitud, se presenta el listado de personal activo en el proyecto y la documentación pertinente al personal que ingresa en el anexo 3.
- Se registra ingreso de personal BOAL para el segmento de 15 CIV 14001506 del señor Carlos Rodríguez, cuya documentación se presenta en el anexo 4 y se relaciona de la siguiente manera: Examen médico ocupacional de ingreso, certificado afiliaciones ARL, FPU, CCF, EPS y planilla de pago de aportes a la seguridad social.
- Teniendo en cuenta lo estipulado en la resolución 392 del 25 de marzo de 2021, en donde se establece que cada empresa realizará las adaptaciones correspondientes a su actividad, definiendo las diferentes estrategias que garanticen un distanciamiento físico y adecuados procesos de higiene y protección en el trabajo. Se estableció que como medida de protección a los trabajadores que presenten síntomas asociados a covid-19 NO SE PRESENTARAN A TRABAJAR y reportaran sus síntomas al área sst y/o gestión humana de manera remota; es por ello, que ya no se considera necesario tener carpas de aislamiento toda vez que el aislamiento lo debe realizar el empleado en su lugar de residencia.
En el caso que un empleado presente los síntomas una vez iniciada su jornada laboral; es reportado a su EPS y remitido a casa y/o centro de salud de acuerdo al direccionamiento de la entidad prestadora de salud.
Adicionalmente en las diferentes charlas sst que se realizan en el proyecto se replica, aclara y refuerza esta medida de protección.
- De acuerdo al protocolo de bioseguridad aprobado por la interventoría y el Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires, este se implementa en todos los niveles del personal del proyecto, se hace reposición de EPP, se tiene instalada en los frentes de obra información sobre el lavado de manos y protocolos de desinfección, así como sus respectivos insumos, y además, se realizan capacitaciones y charlas informativas sobre el covid-19 y prevención del contagio. Es importante resaltar, que como principal indicador de que el protocolo se aplica correctamente en el proyecto tenemos la baja tasa de contagios, presentado dos (2) contagios positivos a lo largo de la pandemia, haciendo énfasis que el reporte de casos positivos en personal operativo es de cero (0).



Entrega de tapabocas

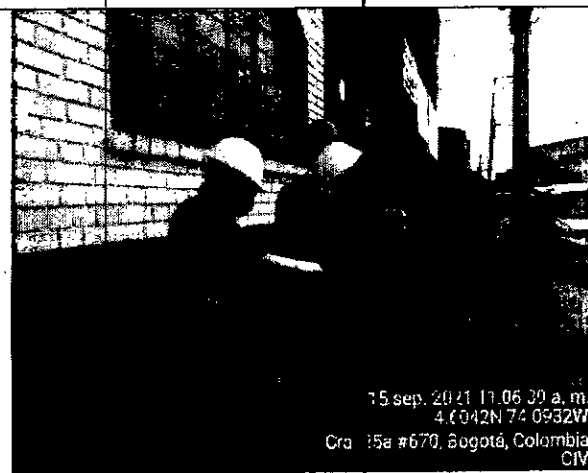


Entrega de tapabocas



Capacitaciones personal



Capacitaciones personal



Capacitación lavado de manos



NIT 830.041.411-0


1280
1374

- Respecto a la afirmación en el comunicado MIRS-MAR-131-2019, cito textualmente "(...)En los recorridos permanentes realizados por la presente interventoría, se sigue evidenciando que por parte del contratista de obra se viene presentando poca presencia de los profesionales en los frentes de obra (...)" respecto a los componentes SSTMA se hace presencia permanente de personal capacitado e idóneo para dichos componentes, superando los porcentajes de dedicación exigidos por la entidad contratante e incluso se cuenta con personal de apoyo, por tanto, solicitamos amablemente a la interventoría se abstenga de hacer este tipo de juicios ya que no son ciertos así como tampoco han sido tratados en comité de seguimiento de obra o se ha llamado la atención al respecto como lo afirman en la comunicación relacionada.

Como prueba de ello, se cuenta con las actas de los comités SSTMA celebrados de manera quincenal con los profesionales de las áreas, en las cuales no se hace referencia a lo afirmado por la interventoría y en cambio, evidencia que los profesionales de Consultoría y Construcción SAS sí tienen presencia en la ejecución del proyecto soportado además por la calificación de los listados de chequeo que entrega de manera mensual en los informes de gestión ambiental esta interventoría.


Con lo anterior, evidenciamos que fueron subsanadas de forma inmediata las observaciones realizadas por esta interventoría.

Atentamente,


JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

C.C. Archivo C.C./ Archivo Consultoría y Construcción S.A.S./ Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires- Ing. Jaime Valba- Apoyo a la supervisión
COP-137-FDLM-2019
Anexo Folios (60)



030 341.41 40

C&C-CO137-2019-094

Bogotá D.C., 08 de julio de 2021

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
MARTHA CECILIA BAYONA GÓMEZ
Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito
contactociudadano@movilidadbogota.gov.co
Bogotá D.C.

Referencia: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO-137-2019 cuyo objeto es "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"**

Asunto: **RESPUESTA RADICADO N° 20213125295801 – SOLICITUD DE TERMINACIÓN DE PMT**


Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta el radicado del asunto y la finalización de las actividades constructivas en los CIV intervenidos, solicitamos a la entidad amablemente la terminación de los PMT aprobados a partir de la fecha que se encuentran relacionados en la tabla 1. Informamos a la entidad que de ser necesario para actividades constructivas en andenes se realizará una solicitud una vez se vayan a intervenir cumpliendo con la normatividad vigente.

Tabla 1. Frentes de obra finalizados

Dirección	Actividad desarrollada	COI de aprobación	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Carrera 24 entre calle 22ª y Dg 22BBis	Rehabilitación vial	03 de 2021	22-01-2021	15-07 2021
Calle 22ª entre carrera 19ª y carrera 19B	Rehabilitación vial	51 de 2020	21-12-2020	15-07-2021

Atentamente,


JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
DIRECTOR DE OBRA - COP-137-2019

18
1276
1376

CODIGO	FORMATO	VERSION
CODIGO FORMATO	RECEPCION DE REQUERIMIENTOS CIUDADANOS	2.0

Secretaria de Movilidad
<https://www.movilidadbogota.gov.co/>
Correo electronico: atciudadano@movilidadbogota.gov.co
direccion: movilidad


RADICADO No 20216121421272

Fecha de Radicado:	2021-08-25	Canal de recepcion:	Virtual - Correo electronico
Remitente:	CON Y CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION ()	C.C / NIT:	
Direccion de correspondencia:	CARRERA 7 127 48 OFICINA 1006 (D.C./BOGOTA)	Telefonos:	4821681
Nombre Ciudadano (a):	JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA	C.C / NIT:	11789
Direccion de correspondencia:	CARRERA 7 127 48 OF 1006 (D.C./BOGOTA)	Telefonos:	4821681
Cta. Contrato / RQ:		Sector:	
CRD:		Causal/Tipologia:	

Descripción del requerimiento:

MIT-COP-137-FDLM-2019 - RESPUESTA COMUNICADO SPMT 20213123334111- C&C-CO137-2019-106-

Atendido por:	Punto de atención:
2 RADICADOR DE CORRESPONDENCIA 11	





1285
1377

C&C-CO137-2019-106

Bogotá D.C., 08 de julio de 2021

Señores

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito
Martha Cecilia Bayona Gómez
contactociudadano@movilidadbogota.gov.co
Bogotá D.C.

Referencia: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO-137-2019 cuyo objeto es:**
"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD
DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"

Asunto: **RESPUESTA RADICADO N° 20213123334111 – INCUMPLIMIENTOS**
EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PMT

Apreciados Señores,

Por medio de la presente se da respuesta al comunicado relacionado en el asunto, en el cual informan de los incumplimientos a lo establecido en PMT para cada uno de los segmentos viales visitados. A continuación, se presenta la evidencia de las acciones correctivas adoptadas con el fin de subsanar las observaciones realizadas.

Carrera 25ª entre Av. Calle 6 y Calle 7 bis:


- Auxiliares de tránsito durante las actividades de cargue y descargue, movimiento de maquinaria y para el paso seguro de peatones.
- Se implementa barricada en la Carrera 25ª por Calle 7 Bis.
- Se implementa señalización de aproximación al cierre, sin embargo, dadas las condiciones de inseguridad de la zona, se presenta hurto permanente de las señales que se instalan.
- Se realiza implementación de Sendero Peatonal en Calle 7 Bis.



01/11/13



Habilitación senderos peatonales

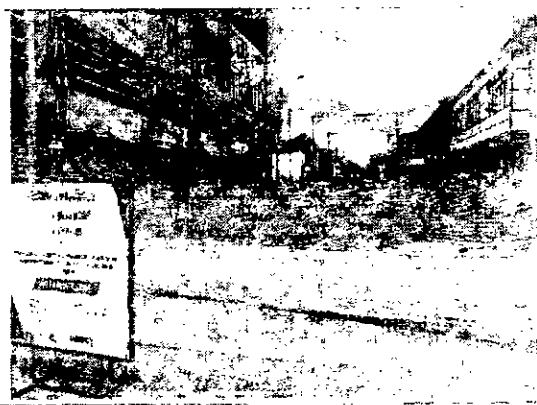

Habilitación senderos peatonales



Mantenimiento cerramiento perimetral



Mantenimiento cerramiento perimetral




Barricadas



Barricadas y vallas informativas



Proyecto 001-001-001

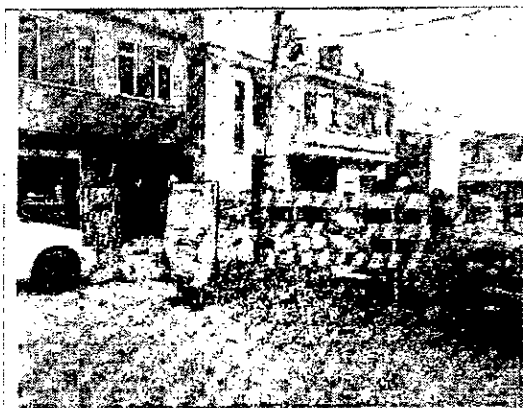

Barricadas y vallas informativas



Auxiliar de tráfico



Señalización PMT



Señalización PMT



Evidencia hurto señalización



Evidencia hurto señalización



S.O. 1411




Señalización PMT



Señalización PMT



Señalización PMT

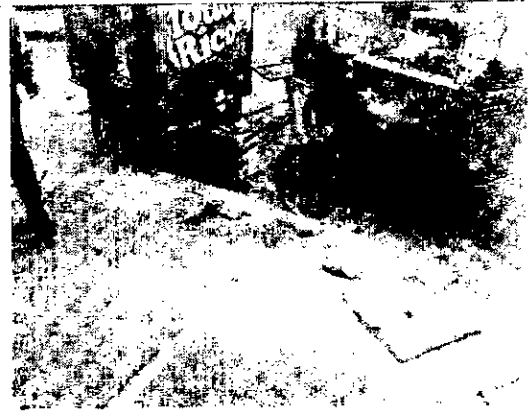

Evidencia hurto señalización

Calle 1B entre Carrera 27ª y Carrera 28:

- Se implementa señalización de aproximación al cierre.
- Auxiliares de tránsito presentes en actividades de cargue y descargue, movimiento de maquinaria y para el paso seguro de peatones.
- Implementación de barricada.
- Por condiciones de seguridad en la zona y para garantizar que la señalización permanezca en campo, se adoptan medidas con elementos que aportan la funcionalidad y se realiza el cambio de los mismos cada vez que sea necesario.




2014-01-01-1014



Señalización PMT



Auxiliar de tránsito

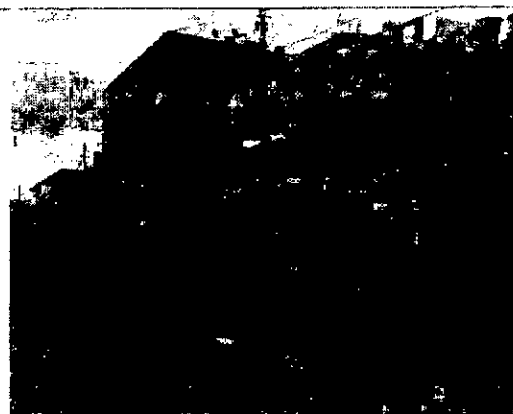

Señalización PMT



Señalización PMT



Señalización PMT



Señalización PMT



SUR 041 411-0



Auxiliar de tránsito




Auxiliar de tránsito

Calle 1F entre Carrera 24 y Carrera 24b:

- Implementación de senderos peatonales.
- Auxiliares de tránsito presentes en actividades de cargue y descargue, movimiento de maquinaria y para el paso seguro de peatones.
- Implementación de barricadas y vallas informativas.




Senderos peatonales Carrera 24

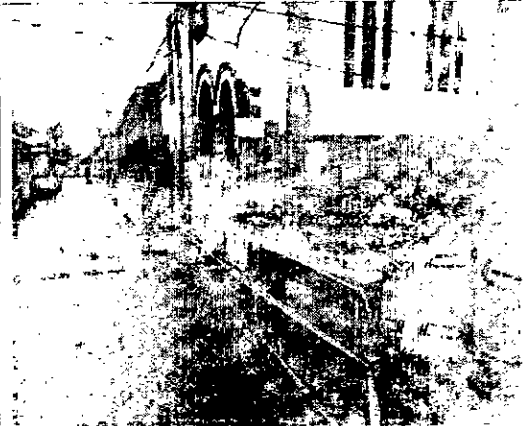

Senderos peatonales Carrera 24



Senderos peatonales Carrera 24



Senderos peatonales Carrera 24B



Senderos peatonales Carrera 24B

Con la evidencia anterior, realizamos la subsanación a las observaciones realizadas en la visita técnica.

Atentamente,

JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
DIRECTOR DE OBRA - CO-137-2019

CC Archivo

CÓDIGO CÓDIGO DE FORMATO	FORMATO RECEPCIÓN DE REQUERIMIENTOS CIUDADANOS	VERSIÓN 1.0	
SECRETARIA DE MOVILIDAD www.movilidadbogota.gov.co correo electronico: atn Ciudadano@movilidadbogota.gov.co Sede principal		RADICADO No. 20216121580862 	
Fecha de Radicado:	2021-09-16	Canal de recepción:	Virtual - Correo electrónico
Remitente:	CON Y CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION ()	C.C. / NIT:	
Dirección de correspondencia:	CARRERA 7 127 48 OFICINA 1006 (D.C. BOGOTÁ)	Telefonos:	4821681
Nombre ciudadano(a):	--	C.C. / NIT:	
Dirección de correspondencia:	-- ()	Telefonos:	
Cta / Contrato / RQ:	C&C-CO137-2019-116	Sector:	
TRD:	//	Causal/Tipología:	
Descripción del requerimiento: PMI - COP-137-FDLM-2019 - RESPUESTA COMUNICADO SPMI 20213126408431 - C&C-CO137-2019-116			
Atendido por: 472 RADICADOR DE CORRESPONDENCIA 10		Punto de atención:	

Ver Archivo Pdf

COLOCAR PDF COMO IMAGEN DEL RADICADO

AA
Recibido:
16/09/21
9:00 PM



Nº 350.041.414.0



Habilitación Calle 1f entre carrera 24 y
carrera 24b



Retiro semaforización provisional




Habilitación cruce semafórico carrera 24
calle 1F



Retiro semaforización provisional

Carrera 18 entre Calle 3 y Calle 2:

- Se implementa señalización de aproximación al cierre.
- Auxiliares de tránsito presentes en actividades de cargue y descargue, movimiento de maquinaria y para el paso seguro de peatones.
- Implementación de barricada.



441 54 7 100

Con la evidencia anterior, realizamos la subsanación a las observaciones realizadas en la visita técnica.

Atentamente,

Wm. C. C. C.

JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

1.1. Archivo C.C. Archivo Consultoría y Construcción S.A.S.
 1.2. Empresa MIRS LATINOAMERICA SAS
 1.3. Empresa MIRS LATINOAMERICA SAS

· 199 · **PRIMERS LATINOAMERICA SAS**

45. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$



00 24 127-48

1243
1387
C&C-137-2019-123

Bogotá D.C., septiembre 17 de 2021

Señores
MIRS LATINOAMERICA S.A.S
Atn. Sandra Mónica Cardozo Rojas
Directora de interventoría
Bogotá D.C.

Referencia: **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 137 - 2019 "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE POR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"**

Asunto: **RADICACION ACTA PARCIAL N°6**

Cordial Saludo.

En cumplimiento con el contrato 137-2019, se hace entrega del Acta Parcial N°6, correspondiente al informe técnico N°10, del periodo del 18 de julio del 2021 al 17 de agosto del 2021, por medio de la presente remitimos la documentación en físico para fines pertinentes.

Atentamente,

JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

Archivo C.C// Archivo Consultoría y Construcción S.A.S.
Anexo Folios (66)

124

1308

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S


CON & CON
 CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

 Resolución de facturación electrónica
 DIAN No. 18764006684600 del
 30/10/2020, numeración autorizada del
 No. FECC 1 al FECC 1.000.

AV CRA 7 N° 127 - 48 OF 1006

4821681

BOGOTÁ

contabilidad@conycon.com.co

www.conycon.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA

FECC

TIMBRADO

2021-09-16 21:33:01

NIT: 830.841.411-0 - IVA RÉGIMEN COMÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA 74211 6.9 X 1000

Cliente: SECRETARÍA DE HACIENDA

Nit: 899999061

Tel:

Dirección: CRA 30 N 25 90

e-mail:

Reg. Fiscal: Responsable de Impuesto a las Ventas (48)

Fiscal: R-99-PN

ORDEN DE COMPRA NO	FECHA
0	16 9 2021
CIUDAD	VENCE
BOGOTÁ	16 10 2021
FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
FORMA DE PAGO 30 DÍAS	Crédito

Item	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	Vr Total
	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES			
	ACTA N 6 CONTRATO DE OBRA PUBLICA 137 DE 2019			
1	COSTO DIRECTO	1.00	398,511,126.00	398,511,126.00
2	AIU 30.89%	1.00	123,100,087.00	123,100,087.00
	COSTO TOTAL OBRA EJECUTADA \$ 521,611,213			
3	COSTO TOTAL COMPONENTES	1.00	36,008,168.00	36,008,168.00
4	PROTOCOLO BIOSEGURIDAD - TRANSPORTE SEGURO	1.00	62,500,000.00	62,500,000.00
	VALOR TOTAL ACTA N 6 \$ 620,119,381			
	MENOS AMORTIZACION ANTICIPO 30% \$ 186,035,814			
	MENOS RETENCION EN GARANTIA \$ 62,011,938			
	VALOR TOTAL A PAGAR ACTA N 6 \$ 372,071,629			

Valor en Letras:	SEISCIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS	Vr Bruto	620,119,381
Observaciones:	Favor consignar y/o hacer transferencia a: Banco AVVILLAS cuenta corriente N° 649-001005	Administración:	0
CUFE:	0591902a1636ebbe210c7e77bb7b59d4a256eb6b994015fa8b4ab8dc77eec960a21915ba807a49cef21d6ca41e82a3fd	Imprevistos:	0
Acceptada:		Utilidad:	0
		I.V.A.	0
		Subtotal	620,119,381.00
		ReteFuente:	12,402,388
		ReteIva:	0
		ReteIca:	4,278,824
		Total	603,438,169.00

Fecha y Firma Autorizada


 RAZON SOCIAL: PROASISTEMAS SA; NIT: 800.042.928; NOMBRE SOFTWARE: HELISA; NOMBRE PROVEEDOR TECNOLÓGICO: ATEB COLOMBIA SAS;
 NIT: 900.965.992; PLATAFORMA: COFIDE



7/10/21 11:28

Sticker web

Alcaldía Local de Martires

R No. 2021-641-005554-2

2021-10-07 11:26 - Folios: 5 Anexos: 0

Destino: Area de Gestion de Despl

Rem: D- CONSULTORIA Y CONSTRUCCION



J137-2019-124

Bogotá D.C., 06 de octubre de 2021

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito
Martha Cecilia Bayona Gómez
contactociudadano@movilidadbogota.gov.co
Bogotá D.C.

Referencia: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO-137-2019 cuyo objeto es:**
"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD
DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"

Asunto: **RESPUESTA RADICADO SPMT 20213126489371 -**
INCUMPLIMIENTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE
MANEJO DE TRÁNSITO

Apreciados Señores,

Por medio de la presente se da respuesta al comunicado relacionado en el asunto, en el cual se informa del incumplimiento a lo establecido en PMT para el segmento vial visitado.

A continuación, se presenta la evidencia de las acciones correctivas adoptadas con el fin de subsanar las observaciones realizadas.


Carrera 25A entre Av. Calle 6 y Calle 7Bis:

- Se finalizaron actividades constructivas en los segmentos viales CIV 14000772 - 14000741 - 14000781 - 14001678 como se evidencia en el anexo 1 del presente documento, se retiró toda la señalización pertinente al PMT aprobado y dicho segmento cuenta con tráfico y operación normal. Adicionalmente, el día 01 de octubre de 2021 se solicitó a la entidad la terminación del PMT aprobado mediante radicado 20216121693402.

1296
1390



NIT 830 041 411 0

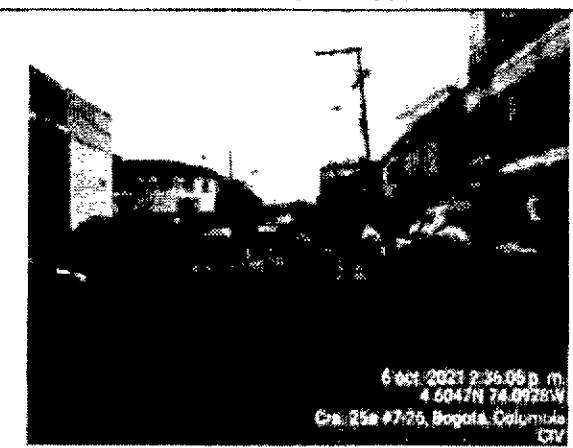	 <p>6 oct 2021 2:18:12 p.m. 4.60846174 89.279W Cra. 7 42a 47, Los Mártires, Bogotá, Colombia CIV</p>
Habilitación CIV 14000718	Habilitación CIV 14001678
 <p>6 oct 2021 2:35:06 p.m. 4.6047N 74.0978W Cra. 25a #7-25, Bogotá, Colombia CIV</p>	
Habilitación CIV 14001678	Habilitación CIV 14000741
 <p>6 oct 2021 2:41:33 p.m. 4.6031N 74.0935W Cra. 25a #615, Bogotá, Colombia CIV</p>	
Habilitación CIV 14000772	



Castillo y Asociados
Ingenieros AS

Bogotá, D.C. 01 de octubre 2021

IND-CYC-577-TRA

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Subdirección de Planes de Manejo de Transito
Ing. Martha Bayona
Ciudad.

Asunto: Plan de Manejo de Transito localidad de Los Mártires.

Respetados señores,

Por medio le presente solicito de su amable colaboración dar por terminado el PMT para el siguiente frente de obra:

- Kr. 25A entre Ac 6 y Cl. 7Bis (CIV 14000772-14000741-14000781 - 14001678) COI 37 radicado 20216121534592, dado que las obras ya culminaron.

Ing. Martha Roció Castillo Fernández
Especialista en Transito
Cel: 320 2747569
Cr. 34F No 39B-25 Sur

CON Y CON CHAPINERO



NIT 830 041 411-0

1298
1392

C&C-CO137-2019-125

Bogotá D.C., 22 de octubre de 2021

Señores

MIRS LATINOAMERICA S.A.S.

Ing. NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA

Calle 23F N° 85A – 31

Ciudad

Referencia: **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CO-137-2019 cuyo objeto es CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE, CON FORMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES**

Asunto: **SOLICITUD DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°4**

Cordial saludo,

Con el objeto de cumplir con las condiciones contractuales solicitamos amablemente viabilizar y tramitar la ampliación N°1 a la suspensión N°4 al contrato de referencia, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

I. CONSIDERACIONES

1. El Fondo de desarrollo local de Mártires- FDLM, avanza un posible incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo de la firma CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S, razón por la cual se debe solicitar la ampliación N°1 a la suspensión N°4, hasta que se pueda determinar e impartir la decisión que dé lugar a las medidas técnicas , jurídicas y financieras del contrato, Sin embargo, esta situación deber ser analizada con detenimiento entre las partes antes de que se termine el plazo contractual. Por lo tanto, en pro de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

II. SOLICITUD

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S-CON&CON SAS advierte la necesidad de

Dirección: Av. Cr 7 No.127-48 Oficina 1006 Teléfono: 4 821681- 5203971 Bogotá D.C. Email: conycon.martires137@gmail.com

25/10/21
Dijet

1/12/21 8:22

Gmail - C&C-CO137-2019-126: PROPUESTA PARA CULMINACION DE LOS FRENTES DEL CONTRATO DE OBRA No. 137-2019

1299
1393



conycon martires <conycon.martires137@gmail.com>

C&C-CO137-2019-126: PROPUESTA PARA CULMINACION DE LOS FRENTES DEL CONTRATO DE OBRA No. 137-2019

2 mensajes

conycon martires <conycon.martires137@gmail.com>

30 de noviembre de 2021, 17:55

Para: cdi.martires@gobiernobogota.gov.co, alcalde.martires@gobiernobogota.gov.co, Arq.villalba@gmail.com, jairo.pena@gobiernobogota.gov.co
Cc: juan.ricci@conycon.com.co, mirsilda@gmail.com, victor.gomez@vgenlacelegal.com

C&C-CO137-2019-126

Bogotá D.C., 30 De noviembre de 2021

Señores

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES

Atn: Dr. Juan Rachif Cabarcas Rahman


Alcalde Local de Mártires

Avenida calle 19 No. 28-80, Piso 7

Ciudad

1/12/21 12:09

Sticker web



Referencia: **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CO-137-2019 cuyo objeto es CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE, CON FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES**

Asunto: **PROPUESTA PARA CULMINACIÓN DE LOS FRENTES DEL CONTRATO DE OBRA No. 137-2019**

ING. PAOLA GÓMEZ
CONTRATO 137 DE 2019
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN - CON & CON S.A.S.
BOGOTÁ - COLOMBIA

2 adjuntos

126. PROPUESTA PARA LA CULMINACION DE LOS FRENTES COTRACTUALES CTO 137-2019.pdf
233K

Anexo No.1 CRONOGRAMA DE OBRA CTO137-2019.pdf
4447K

CDI Martires <cdi.martires@gobiernobogota.gov.co>
Para: conycon martires <conycon.martires137@gmail.com>

1 de diciembre de 2021, 7:33

buenos días, este oficio quedo radicado con el No.

20216410066072



NIT 830.041.411-0

SANCIONATORIO CONTRATO DE OBRA No. 137-2019, Numeral 2. *Respuesta al incumplimiento del Aspecto Técnico*, se evidencia que los segmentos- Elementos PK-ID CALZADA, se encuentran con un avance del 89% faltando por ejecutar la construcción de sumideros y la demarcación; exceptuando el segmento CIV's (14001506) que debido las condiciones técnicas "Aprobación PMT media Calzada" y proceso constructivo hace falta la conformación de la estructura de la calzada oriental, así, como se presenta en Tabla No.1

No	Cod.	BARRIO	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA	ACTIVIDADES A EJECUTAR
1	14001506	TAPICERIAS	CALZADA	KR 18	CL 2	CL 3	1. CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA COSTADO ORIENTAL CAPA GRANULAR
2	14001469	EL VERGEL-CONSOLATA	CALZADA	CL 1F	KR 24A	KR 24B	1. SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB.
3	14001481			CL 1F	KR 24	KR 24A	
4	14000772	RICAURTE-TALLERES	CALZADA	KR 25A	AC 6	CL 6BIS	1. SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB.
5	14000741			KR 25A	CL 6BIS	CL 6A	
6	14000718			KR 25A	CL 6A	CL 7	
7	14001678			KR 25A	CL 7	CL 7BIS	
8	14001367	SANTA ISABEL-1B	CALZADA	CL 1B	KR 27A	KR 28	1. SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB.)
9	14001156	SANTA ISABEL-2B	CALZADA	CL 2B	KR 25A	KR 26	1. SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB.
10	14001367			CL 1B	KR 27A	KR 28	
11	14000126	SANTA ISABEL PESQUEROS	CALZADA	KR 24	CL 22A	DG 22B BIS	1. SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB.
12	14000178	ADICION 1 HOJALDRES	CALZADA	CL 12	KR 20A	KR 21	1. SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB.

Tabla 1 Actividades a ejecutar PK-ID calzada- Primera Etapa

De igual manera, los elementos PK-ID anden de los segmentos CIV's (14001616 y 14001619), se encuentran en capa granular, así, como se presenta en Tabla No.2

No	Cod.	BARRIO	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA	ACTIVIDADES A EJECUTAR
18	14001619	COLEGIOS	ANDEN CALZADA	CL 1C	KR 19A	KR 19BBIS	1. CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA ANDEN
19	14001616	CIOLEGIOS		CL 1C	KR 19BBIS	KR 19C	

Tabla 2 Tabla 1 Actividades a ejecutar PK-ID Andenes - Primera Etapa



NIT 830.041.411-0

No	Cod.	BARRIO	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA	ACTIVIDADES A EJECUTAR
			ANDEN	CL 1F	KR 24A	KR 24B	1.CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA ANDEN
2	14001481	EL VERGEL-CONSOLATA	CALZADA	CL 1F	KR 24	KR 24A	1.DEMARCACION Y MOVILIARIO (TACHAS, ESTOPEROS, ETC)
			ANDEN	CL 1F	KR 24	KR 24A	1.CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA ANDEN
3	14000772	RICAUURTE-TALLERES	CALZADA	KR 25A	AC 6	CL 6BIS	1.DEMARCACION Y MOVILIARIO (TACHAS, ESTOPEROS, ETC)
			ANDEN	KR 25A	AC 6	CL 6BIS	1.CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA ANDEN
4	14000741	RICAUURTE-TALLERES	CALZADA	KR 25A	CL 6BIS	CL 6A	1.DEMARCACION Y MOVILIARIO (TACHAS, ESTOPEROS, ETC)
			ANDEN	KR 25A	CL 6BIS	CL 6A	1.CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA ANDEN
5	14000718	RICAUURTE-TALLERES	CALZADA	KR 25A	CL 6A	CL 7	1.DEMARCACION Y MOVILIARIO (TACHAS, ESTOPEROS, ETC)
			ANDEN	KR 25A	CL 6A	CL 7	1.CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA ANDEN
6	14001678	RICAUURTE-TALLERES	CALZADA	KR 25A	CL 7	CL 7BIS	1.DEMARCACION Y MOVILIARIO (TACHAS, ESTOPEROS, ETC)
			ANDEN	KR 25A	CL 7	CL 7BIS	1.CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA ANDEN
9	14001156	SANTA ISABEL-2B	CALZADA	CL 2B	KR 25A	KR 26	1.DEMARCACION Y MOVILIARIO (TACHAS, ESTOPEROS, ETC)
10	14001367	SANTA ISABEL-1B	CALZADA	CL 1B	KR 27A	KR 28	1. DEMARCACION Y MOVILIARIO (TACHAS, ESTOPEROS, ETC)
			ANDEN	CL 1B	KR 27A	KR 28	1.CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA ANDEN
11	14000126	SANTA ISABEL PESQUEROS	CALZADA	KR 24	CL 22A	DG 22B BIS	1.DEMARCACION Y MOVILIARIO (TACHAS, ESTOPEROS, ETC)
15	14001506	TAPICERIAS	CALZADA	KR 18	CL 2	CL 3	1.DEMARCACION Y MOVILIARIO (TACHAS, ESTOPEROS, ETC)
			ANDEN	KR 18	CL 2	CL 3	1.CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA ANDEN
18	14001619	COLEGIOS	CALZADA	CL 1C	KR 19A	KR 19BBIS	1.SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB 2. DEMARCACION Y MOVILIARIO (TACHAS, ESTOPEROS, ETC)
19	14001616	CIOLEGIOS	CALZADA	CL 1C	KR 19BBIS	KR 19C	1.SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB 2. DEMARCACION Y MOVILIARIO (TACHAS, ESTOPEROS, ETC)
20	14000178	ADICION 1 HOJALDRES	CALZADA	CL 12	KR 20A	KR 21	1.DEMARCACION Y MOVILIARIO (TACHAS, ESTOPEROS, ETC)
25	14001098	ADICION 2	CALZADA	CLL 22	KR 18B	AK 19	1. CONFORMACION DE LA CALZADA 2. SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB 3.DEMARCACION Y MOVILIARIO (TACHAS, ESTOPEROS, ETC)
23	14000233	ADICION 3	CALZADA	CLL 22A	KR 19A	KR 19B	1. CONFORMACION DE LA CALZADA 2. SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB 3.DEMARCACION Y MOVILIARIO (TACHAS, ESTOPEROS, ETC)
3-A	14000434	RICAUURTE	CALZADA	CLL 10	KR 29	AV KR 30	1. ACCIONES DE MOVILIDAD PUNTUAL CALZADA
11-A	14001447	EDUARDO SANTOS	CALZADA	CL 3	KR 17A	KR 18	1. ACCIONES DE MOVILIDAD PUNTUAL CALZADA
12-A	14000389	SAMPER MENDOZA	CALZADA	CLL 20	KR 18	CRUCE	1 ACCIONES DE MOVILIDAD PUNTUAL CALZADA
16-A	14000469	EL LISTON	CALZADA	KR 20	CL 14	CL 15	1. ACCIONES DE MOVILIDAD PUNTUAL CALZADA

Tabla 4 Actividades a ejecutar PK-ID Calzada y Andenes - Segunda Etapa



NIT 830.041.411-0

Como complemento a la propuesta por parte de CON&CON se debe tener en cuenta el plazo necesario propuesto en el cronograma de obra (Ver anexo No.1). Esto con el fin de garantizar la ejecución de las obras previstas y sus complementarias.

Para lograr el alcance total del contrato CO-137-2019 cuyo objeto es **CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES**, se requiere viabilizar la propuesta de la firma CON&CON, con el fin de garantizar el cumplimiento de todas las obras contractuales como adicionales

II. CRONOGRAMA ACTUALIZADO DE OBRA

El cronograma de obra actualizado incluye el plazo requerido para la culminación de los frentes, correspondiente a los NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO, el cual se anexa al presente documento.

Cordialmente,

JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

Anexo (1) CRONOGRAMA DE OBRA

Archivo C.C// Archivo Consultoría y Construcción S.A.S.

Archivo C.C// Interventoría MIRS LATINOAMERICA S.A.S- Representante Legal-Nick Randy Almeida Gamarra

Archivo C.C// La Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo-Dr Néstor Raúl Hernández Ospina



Tel: 830 041 411-0

1303
1397

C&C-137-2019-127

Bogotá D.C., diciembre 02 de 2021

Señora:

ANA MORENO

chanotica@hotmail.com

Ciudad

Referencia: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO-137-2019 cuyo objeto es CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE, CON FORMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

Asunto: DERECHO DE PETICIÓN DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD ARREGLO DE ANDEN

Cordial saludo,

De acuerdo con su Derecho de Petición enviado con fecha 12 de octubre de 2021 sobre el Asunto, damos respuesta a su solicitud de la siguiente manera:

1. Por medio de la presente solicitamos comedidamente, sea reparado lo mas pronto posible el anden enfrente de mi propiedad, desbaratado a causa de la obra CIVS 14001367 (137-2019) que empezó en enero del 2021 en la calle 1b entre 27ª y 28, santa Isabel y que tomo un tiempo DESPROPORCIONADO en su ejecución.

Respuesta: Se informa que el contrato de obra publica 137-2019 se encuentra en suspensión desde el día 17 de septiembre del 2021, información que fue proporcionada mediante llamada telefónica realizada por la señora Ana Moreno al número de atención al usuario 3166944172 del contrato 137-2019, por parte de la profesional social encarga y en conversación mediante whatsapp.

Sin embargo, manifestamos que estamos en el proceso de reinicio del contrato 137-2019 y de las actividades necesarias para terminar en el menor tiempo posible estas obras y así poder mitigar los impactos negativos que se han presentado en la comunidad.

Como contratistas manifestamos nuestras excusas por las afectaciones causadas, reiterando nuestro interés por finalizar estas obras, implementado un cronograma de

~~1304~~
1398



VIT 830 041 411 0

actividades para superar estas demoras. Espero haber dado respuesta clara y concreta a las inquietudes manifestadas en su derecho de petición, sin embargo, continuamos atentos en el Punto de Atención al Ciudadano – PAC o en los correos electrónicos establecidos para cualquier otra inquietud.

Cordialmente,

JUAN PABLO RICCIO RUIZ

Representante Legal

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS C.C.

2/12/21 11:03

Gmail - Respuesta derecho de petición

1394



Consultoria y construcción CON & CON <socialmartires137@gmail.com>

Respuesta derecho de petición

1 mensaje

Consultoria y construcción CON & CON <socialmartires137@gmail.com>

2 de diciembre de 2021, 11:02

Para: MIRS LATINOAMERICA <contrato141@gmail.com>

Cordial saludo

Adjunto derecho de petición de la señora Ana Moreno y respuesta del mismo, para fines pertinentes.

--

Yurani Parra
Residente Social de Obra
Consultoría y Construcción S.A.S
COP 137 de 2019
Número y WhatsApp PAC 3166944172

2 archivos adjuntos

127 RESPUESTA DERECHO DE PETICION ANA MORENO CL 1B 02 de diciembre.pdf
143K

con&con derecho (2).pdf
2857K

2/12/21 11:11

Gmail - solicito solución

1206
1400



Consultoria y construcción CON & CON <socialmartires137@gmail.com>

solicito solución

Consultoria y construcción CON & CON <socialmartires137@gmail.com>

2 de diciembre de 2021, 10:59

Para: "Ana Rosita M." <chanotica@hotmail.com>, MIRS LATINOAMERICA <contrato141@gmail.com>

Cordial saludo

Sra Ana Moreno, se adjunta respuesta al derecho de petición radicado vía correo electrónico

Texto citado (oculto)

➔ 127 RESPUESTA DERECHO DE PETICION ANA MORENO CL 1B 02 de diciembre.pdf
143K



NIT 830.041.411-0

C&C-CO137-2019-128

Bogotá D.C., 10 De diciembre de 2021

Señores
ALCALDIA LOCAL DE MARTIRES
Atn: Dr. Juan Rachif Cabarcas Rahman
Alcalde Local de Mártires
Avenida calle 19 No. 28-80, Piso 7
Ciudad

No Dedicado 2021-12-10

Referencia. Contrato de Obra Pública No. 137 de 2019 suscrito entre la Alcaldía Local de Mártires y CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS CON&CON SAS. / 20216420659591.

Asunto. Notificación de la existencia de controversia contractual y convocatoria a la etapa de arreglo directo.

Respetado Doctor Cabarcas.

Por medio de la presente comunicación, me permito declarar la existencia de una controversia de orden contractual entre las Partes y convocar a la apertura de la etapa de arreglo directo de acuerdo con lo que establecía el art. 68 de la ley 80 de 1993, lo que hoy establece la ley 1563 de 2012 y la cláusula 27 del contrato que señala:

"Cláusula 27.- Solución de Controversias. Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente.

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleando las instancias y procedimientos contemplados en los artículos 68 y siguiente de la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes".

Lo anterior, teniendo en cuenta que durante la ejecución del contrato 137 de 2019 se presentaron circunstancias, no imputables a la responsabilidad del Contratista, que han afectado de manera contundente el devenir contractual e impactado de manera grave el cumplimiento de las actividades contractuales dentro de los términos y condiciones inicialmente pactados por las Partes

A continuación, nos permitimos presentar un resumen de las diferencias de orden técnico y fáctico ocurridas durante la ejecución contractual, las cuales sustentan la presente declaratoria de controversia y convocatoria de la etapa de arreglo directo, lo anterior basados en la propuesta suministrada vía correo electrónico el día 7 de diciembre de 2021.

- Segmentos viales, los cuales no se intervinieron por causas ajenas y externas al FDLM y a Consultoría y Construcción SAS.



NIT 830.041.411-0

- Definición de nuevos segmentos viales, de acuerdo con la propuesta entregada el día 7 de diciembre de 2021.
- Ampliación del plazo de ejecución del contrato, con la finalidad de ejecutar los nuevos segmentos viales sugeridos.

CONSIDERACIONES Y SOLICITUD

Por todo lo expuesto en este escrito, es claro que en el devenir contractual se han presentado situaciones que configuran un grave incumplimiento de las obligaciones contraídas por la Entidad Contratante en el marco del Contrato configurando la existencia de una excepción de contrato no cumplido, que según lo establecido en el art. 1609 del Código Civil consiste en que ninguna de las Partes se encuentra en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras la otra no cumpla o se disponga a cumplir.

Consecuencia de lo anterior se solicita:

Primera. - Darse por notificada la existencia de controversia de orden contractual y proceder de conformidad con lo estipulado en la cláusula 27 del contrato.

Segunda. - Instalar de manera inmediata las mesas de trabajo para llevar a cabo la etapa de arreglo directa previamente planteada y designar el grupo de profesionales que los representará y participará en las definiciones técnicas que se requieran para abordar la controversia existente entre las Partes.

Tercera. - Proceder con la suspensión del procedimiento sancionatorio instaurado por la Alcaldía en contra del Contratista, de conformidad con lo expreso por Colombia Compra Eficiente mediante consulta No. 4201713000003874 de 2 de agosto de 2017, en la cual señaló que, las diferencias surgidas deben ser resultas en la etapa de arreglo directo previo a la imposición de sanciones, el cual se allega a este escrito.

Por lo mencionado, le informo que quedo atento a la programación de la reunión de apertura de la etapa de arreglo directo, la cual debe realizarse dentro de los plazos contemplados en la cláusula precitada.

Sin otro en particular.

Atentamente,

JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

Archivo C.C// Archivo Consultoría y Construcción S.A.S.

Archivo C.C// Interventoría MIRS LATINOAMERICA S.A S- Representante Legal-Nick Randy Almeida Gamarra

Archivo C.C// La Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo-Dr. Néstor Raúl Hernández Ospina

Dirección: Av. Cr 7 No.127-48 Oficina 1006 Teléfono: 4 821681- 5203971 Bogotá D.C. Email: conycon.martires137@gmail.com



NIT 830.041.411-0

1403

C&C-CO137-2019-130

Bogotá D.C., 7 de febrero del 2022

Doc Radicado No. 2022641000623.

Señores

ALCALDIA LOCAL DE MARTIRES

Atn: Dr. Juan Rachif Cabarcas Rahman

Alcalde Local de Mártires

Avenida calle 19 No. 28-80, Piso 7

Ciudad

Referencia: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO-137-2019 cuyo objeto es CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE, CON FORMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES.**

Asunto: **Repuesta a Derecho de Petición con RN°2021-641-006888-2**

Respetado Doctor Cabarcas,

Por medio de la presente comunicación, la firma CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S, hace las siguientes aclaraciones de acuerdo con el requerimiento del señor JUAN DE JESUS CALDERON, mediante el derecho de petición:

CONSIDERACIONES:

En el acta de vecindad se refiere en la pagina 4 de 6 del 19 de octubre del 2020, en el párrafo Baño, cito Textualmente (...) "Piso en cerámica con desgaste normal por uso, fisuras generales y resane por arreglo de tubería. Muros con baldosín, con fisuras y resanes en general de los 4 muros del mismo, techo con baldosín, grietas y fisuras al lado de la bombilla. Marco y puesta en madera, abre y cierra normal, presenta desgaste normal por el uso" ***El subrayado es propio*** (Ver Anexo N°1).

SOLICITUD:

1. El señor Juan de Jesús Calderón, solicito a la interventoría realizar visita del área técnica de contratista y la interventoría para validar si la obra había generado fisuras en el segundo piso (Baño), por lo cual se programó visita el día 08/ Octubre/2021 (Ver Anexo N°2).



NIT 830.041.411-0

En la visita de diagnostico Técnico de la Firma CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S, aclaro que las fisuras son la prolongación del desgaste normal del baldosín y de las reparaciones ya existentes, se explico al propietario del inmueble que el desarrollo de la obra NO genero la continuidad de las fisuras.

Se adjunta registro fotográfico el cual se evidencia el estado en que se encontraba el inmueble antes de la intervención y se ratifica desde el área técnica que no hay afectación directa y que esto es producto a que no se ha generado mantenimientos rutinarios al inmueble. (Ver Anexo N°3).

Por lo anterior se aclara que se ha atendido de manera oportuna las solicitudes del señor Juan Jesús Calderón.

Sin otro en particular,

JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

Archivo C.C// Archivo Consultoría y Construcción S.A.S.


Archivo C.C// Interventoría MIRS LATINOAMERICA S.A.S- Representante Legal-Nick Randy Almeida Gamarra

Anexo N°1 Acta de Vecindad

Anexo N°2 Acta de visita 08/10/2021

Anexo N°3 Registro fotográfico del Acta de vecindad

1371
1405



NIT 830.041.411-0

C&C-CO137-2019-129

Bogotá D.C., 13 de enero de 2022

No Radicado No 202241000122

Señores
ALCALDIA LOCAL DE MARTIRES
Attn: Dr. Juan Rachif Cabarcas Rahman
Alcalde Local de Mártires
Avenida calle 19 No. 28-80, Piso 7
Ciudad

Referencia CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO-137-2019 cuyo objeto es CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE, CON FORMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES.

SOLICITUD DE MESA DE TRABAJO PARA LA REVISION DE PROPUESTA PARA LA CULMINACION DEL CONTRATO DE OBRA No. 137-2019

Respetado Doctor Cabarcas

Por medio de la presente comunicación, la firma CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. sugiere realizar una mesa de verificación técnica con la supervisión del contrato y la interventoría MIRS LATINOAMERICA S.A.S, para la validación de la propuesta enviada, mediante oficio C&C-CO137-2019-126; PROPUESTA PARA CULMINACION DE LOS FRENTES DEL CONTRATO DE OBRA No. 137-2019 con Radicado 20216410066072 del día 01 de diciembre 2021. Lo cual fue requerido en la citación de audiencia del posible incumplimiento que se llevó a cabo el viernes 26 de noviembre del 2021.

Por lo mencionado, le informo que quedo atento a la programación de la mesa de trabajo, para así poder garantizar el cumplimiento de todas las obras contractuales como adicionales.

Sin otro en particular,

JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

Archivo: C.C// Archivo Consultoría y Construcción S.A.S.
Archivo: C.C// Interventoría MIRS LATINOAMERICA S.A.S- Representante Legal-Nick Randy Almeida Gamarra



Tel: 230 041 411-0

1312
1406

131
C&C-CO137-2019-126

Bogotá D.C., 14 de marzo de 2022

Señores

ALCALDIA LOCAL DE MARTIRES

Atn: Dr. Juan Rachif Cabarcas Rahman

Alcalde Local de Mártires

Avenida calle 19 No. 28-80, Piso 7

Ciudad

16/3/22, 9:24

Sticker web

Alcalde Local de Mártires

R No. 2022-641-001494-2

2022-03-16 09:24 - FOLIO 1 Acepta: S.P.

Distan. Área de Gestión de Destar

Rem/D. CON & CON CONSULTORIA Y



Referencia: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO-137-2019 cuyo objeto es CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES.**

Asunto: **Respuesta Oficio MIRS-MAR-152-2019: COPIA- RESPUESTA A OFICIO No 20216420854581 -SOLICITUD CONCEPTO JURIDICO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO, FRENTE A PROPUESTA PARA CULMINACION DE LOS FRENTES DEL CONTRATO DE OBRA No. 137-2019.**

Cordial saludo,

Acorde con las observaciones hechas por la interventoría mediante el Oficio MIRS-MAR-152-2019, nos permitimos hacer las siguientes consideraciones:

Una vez elaborado el balance de obra contractual con respecto a las cantidades reales de ejecución en cada uno de los CIV's y debidamente aprobada por MIRS LATINOAMERICA S.A.S como Interventor de este contrato, se evidencia un saldo a favor al fondo de desarrollo local de Mártires (FLM), el cual se encuentra sujeto a valoración debido a que las intervenciones en la modalidad de ACCIONES DE MOVILIDAD, conlleva una modalidad distinta y no se puede verificar totalmente su alcance hasta su intervención.

El balance de los CIV's a intervenir es el siguiente:

Recibido
25 de Mayo 2022
15:00
F. F.



TEL 130 641 4110

135
1407

N°	Cod.	BARRIO	PK-ID	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA	VALOR PRESUPUESTADO
1	14001429	EL VERGEL-CONSOLATA	182872	CALZADA	CL 1F	KR 24A	KR 24B	\$ 295 357 557.00
			70632 70633	ANDEN Y CINTA DE AJUSTE				\$ 30 549 444.00
2	14001481	EL VERGEL-CONSOLATA	182871	CALZADA	CL 1F	KR 24	KR 24A	\$ 242 516 800.00
			70630 70631	ANDEN Y CINTA DE AJUSTE				\$ 33 571 300.00
3	14000772	RICAURTE-TALLERES	183235	CALZADA	KR 25A	AC 6	CL 6B-S	\$ 213 784 434.00
			71323 71324	ANDEN				\$ 59 400 000.00
4	14000741	RICAURTE-TALLERES	183236	CALZADA	KR 25A	CL 6B-S	CL 6A	\$ 238 905 600.00
			71325 71326	ANDEN				\$ 58 500 050.00
5	14000718	RICAURTE-TALLERES	183237	CALZADA	KR 25A	CL 6A	CL 7	\$ 156 333 700.00
			71327 71328	ANDEN				\$ 42 157 841.00
6	14001878	RICAURTE-TALLERES	472540	CALZADA	KR 25A	CL 7	CL 7B-S	\$ 139 367 500.00
			467505 467506	ANDEN				\$ 59 782 262.00
7	14001545	SANTA ISABEL SUR	182815	CALZADA	CL 1ABIS	AC 1	KR 28	\$ 6 037 281.00
8	14001517	SANTA ISABEL SUR	182854	CALZADA	KR 28	CL 1ABIS	CL 1B	\$ 3 115 015.00
9	14001156	SANTA ISABEL-2B	70861 70862 182862	CALZADA Y CINTA DE AJUSTE	CL 2B	KR 25A	KR 28	\$ 295 403 300.00
10	14001367	SANTA ISABEL-1B	182827	CALZADA	CL 1B	KR 27A	KR 28	\$ 406 727 519.00
			70542 70543	ANDEN				\$ 120 084 100.00
11	14000126	PESQUERAS	183733	CALZADA	KR 24	CL 22A	OG 22B BIS	\$ 533 077 543.00
			72263 72264	CINTA AJUSTE				\$ 13 486 302.00
15	14001508	TAPICERIAS	182491	CALZADA	KR 18	CL 2	CL 3	\$ 281 474 006.00
			69902 69903	ANDEN				\$ 64 713 546.00
18	14001619	COLEGIOS	182768	CALZADA	CL 1C	KR 19A	KR 19BBIS	\$ 165 344 470.00
			70476 70477	ANDEN				\$ 29 017 543.00
19	14001615	COLEGIOS	182789	CALZADA	CL 1C	KR 19BBIS	KR 19C	\$ 152 558 046.00
			70478 70479	ANDEN				\$ 31 271 493.00
20	14000178	ADICION 1 HOJALDRES	183619	CALZADA	CL 22 A	KR 19 A	KR 19B	\$ 334 860 300.00
			72430 72431	CINTA AJUSTE				\$ 5 915 682.00



NIT 830 341 411 0

1314
1408

N.º	Cod.	BARRIO	PK+D	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA	VALOR PRESUPUESTADO
25	14001098	ADICION 1-A	182856	CALZADA	CLL 1D BIS	KR 285	AV NOC	\$ 300 951 044.00
23	14000233	ADICION 1-B	183801	CALZADA	CLL 22	KR 183	KR 19	\$ 297 243 075.00
24	14000615	ADICION 1-C	183438	CALZADA	CL 12	KR 19	KR 19A	\$ 3 116 111.00
3-A	14000434	ACCION DE MOVILIDAD: RICAURTE	183403	CALZADA	CLL 10	KR 29	AV KR 30	\$ 151 420 228.00
11-A	14001474	ACCION DE MOVILIDAD: EDUARDO SANTOS	512891	CALZADA	CL 5	KR 17A	KR 18	\$ 48 942 520.00
12-A	14000359	ACCION DE MOVILIDAD: SAMPER MENDOZA	183633	CALZADA	CLL 20	KR 18	CRUCE	\$ 139 954 373.00
15-A	14000409	ACCION DE MOVILIDAD: EL LISTON	183587	CALZADA	KR 20	CL 14	CL 15	\$ 184 364 112.00

COSTO TOTAL OBRAS INCLUYE REDES Y COSTOS DIRECTOS, APROXIMADA AL PESO (A) =		\$ 5.197.288.681,00
ADMINISTRACIÓN	\$ 1.189.658.921,00	\$ 1.188.874.647,00
IMPREVISTOS	\$ 51.972.867,00	\$ 51.938.604,00
UTILIDAD	\$ 363.810.068,00	\$ 363.510.228,00
COSTO TOTAL A.I.U.	\$ 1.605.441.856,00	\$ 1.604.363.479,00
COSTO TOTAL OBRA INCLUYE A.I.U.		\$ 6.802.728.537,00
COSTO ACTIVIDADES AMBIENTALES y SST (B)	\$ 201.123.374,00	\$ 200.034.755,00
COSTO ACTIVIDADES SOCIALES (C)	\$ 185.001.955,00	\$ 184.879.934,00
COSTO PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (D)	\$ 83.484.576,00	\$ 83.426.540,00
TOTAL OBRAS LICITACION (A+B+C+D)		\$ 7.272.338.442,00
COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO (E) (INCLUYE AJUSTES E IVA)	\$ 29.833.092,00	\$ 29.813.425,00
COSTO ESTIMADO DE AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (F) (INCLUYE IVA)	\$ 337.110.102,00	\$ 337.110.112,00
VALOR TOTAL SIN AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (VALOR EVALUABLE) =		\$ 7.639.281.638,00
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (SOLO OBRA) , INCLUYE COSTOS INDIRECTOS (G)	\$ 208.144.381,00	\$ 208.144.381,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO APROXIMADO AL PESO =		\$ 7.847.426.017,00
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD -TRANSPORTE SEGURO (CONSIDERADO 5 FRENTES DE OBRA)		\$ 250.000.000,00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO + PROTOCOLOS		\$ 8.097.426.017
		97,8%

Tabla 1 Balance General del Proyecto

Teniendo en cuenta, tal y como se manifestó en el oficio C&C-CO137-2019-119: RESPUESTA COMUNICADO MIRS-MAR-132-2021; CITACION AUDIENCIA SANCIONATORIO CONTRATO DE OBRA No. 137-2019, Numeral 2. Respuesta al

incumplimiento del Aspecto Técnico, se evidencia que los segmentos- Elementos PK-ID CALZADA que actualmente están abiertos, se encuentran con un avance del 90% faltando por ejecutar la construcción de sumideros y la demarcación, así, como se presenta en Tabla No.2.

No	Cod.	BARRIO	PK-ID	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR AJECUTADO	% EJECUCION
1	14001469	EL VERGEL-CONSOLATA	182872	CALZADA	CL 1F	KR 24A	KR 24B	\$ 285 367.657	\$ 280.460.343	95%
2	14001481	EL VERGEL-CONSOLATA	182871	CALZADA	CL 1F	KR 24	KR 24A	\$ 242 918.879	\$ 228 728.094	95%
3	14000772	RICAUURTE-TALLERES	183235	CALZADA	KR 25A	AC 6	CL 6BIS	\$ 213.704.434	\$ 206.360.979	97%
4	14000741	RICAUURTE-TALLERES	183236	CALZADA	KR 25A	CL 6BIS	CL 6A	\$ 238.309.683	\$ 230.603.229	97%
5	14000718	RICAUURTE-TALLERES	183237	CALZADA	KR 25A	CL 6A	CL 7	\$ 156.335.760	\$ 149.907.057	95%
6	14000678	RICAUURTE-TALLERES	183546	CALZADA	KR 25A	CL 7	CL 7BIS	\$ 189.367.750	\$ 182.383.074	96%
9	14001156	SANTA ISABEL-2B	70861 70862 182902	CALZADA Y CINTA DE AJUSTE	CL 2B	KR 25A	KR 26	\$ 295.488.380	\$ 272.297.642	92%
10	14001367	SANTA ISABEL-1B	182827	CALZADA	CL 1B	KR 27A	KR 28	\$ 408.727.519	\$ 401.729.646	98%
11	14000126	PESQUERAS	183733	CALZADA	KR 24	CL 22A	DG 22B BIS	\$ 535.882.932	\$ 506.892.735	94%
15	14001506	TAPICERIAS	182461	CALZADA	KR 18	CL 2	CL 3	\$ 281.474.006	\$ 137.899.825	37%
18	14001619	COLEGIOS	182788	CALZADA	CL 1C	KR 19A	KR 19B BIS	\$ 165.944.470	\$ 157.866.558	95%
19	14001616	COLEGIOS	182789	CALZADA	CL 1C	KR 19B BIS	KR 19C	\$ 152.568.045	\$ 143.381.704	94%
20	14000178	ADICION 1 HOJALDRES	183819	CALZADA	CL 22A	KR 19A	KR 19B	\$ 348.761.354	\$ 308.342.602	90%
PROMEDIO DE EJECUCION DE LOS FRETES ACTIVOS										90%

Tabla 2 Actividades a ejecutar PK-ID calzada

Se hace la aclaración que el CIV's 14001506 del elemento calzada tiene un avance del 90%, falta la conformación de la estructura de la calzada occidental y la verificación del estado de la calzada oriental, una vez se reinicie el contrato se realizará la revisión técnica del estado del frente.

Los segmentos CIV's 14001469 14001481, 14001619, 14001616 y 14001367, presentan una demarcación parcial por parte de Secretaría Distrital de Movilidad, aun cuando los



030 041 411-0

1316
1410

elementos PK-ID, se encuentra reservado para ejecución en este contrato, por tal motivo se realizó nuevamente actualización de presupuesto y avance físico de los frentes

Los segmentos- Elementos PK-ID ANDEN costado sur, que actualmente se hallan abiertos, CIV's 14001619, se encuentran en capa granular; se debe hacer la verificación del estado en que se encuentra el frente así, como se presenta en Tabla No.3.

No	Cod.	BARRIO	PK-ID	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR AJECUTADO	% EJECUCION
18	14001619	COLEGIOS	182788	CALZADA	CL 1C	KR 19A	KR 19BIS	\$ 165 044 470	\$ 157 008 558	96%
			70476-70477	CINTA DE AJUSTE -ANDEN				\$ 29 017 858	\$ 5 023 574	20%
19	14001616	COLEGIOS	182789	CALZADA	CL 1C	KR 19BIS	KR 19C	\$ 152 556 046	\$ 143 361 704	94%
			70478-70479	CINTA DE AJUSTE -ANDEN				\$ 31 228 493	\$ 1 550 000	5%

Tabla 3 Actividades a ejecutar PK-ID Andenes

A la fecha no se cuenta con la reserva ante el IDU, por parte del Fondo de Desarrollo local de Mártires la asignación de los nuevos segmentos a intervenir los cuales se relacionan en la Tabla No.4.

No	Cod.	BARRIO	PK-ID	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA
1	14001469	EL VERGEL-CONSOLATA	70632 70633	ANDEN	CL 1F	KR 24A	KR 24B
2	14001481	EL VERGEL-CONSOLATA	70630 70631	ANDEN	CL 1F	KR 24	KR 24A
3	14000772	RICAURTE-TALLERES	71323 71324	ANDEN	KR 25A	AC 6	CL 6B-S
4	14000741	RICAURTE-TALLERES	71325 71326	ANDEN	KR 25A	CL 6BIS	CL 6A
5	14000718	RICAURTE-TALLERES	71327 71328	ANDEN	KR 25A	CL 6A	CL 6
6	14001678	RICAURTE-TALLERES	467505 467506	ANDEN	KR 25A	CL 7	CL 7B-S
10	14001367	SANTA ISABEL-18	70542 70543	ANDEN	CL 1B	KR 27A	KR 28
15	14001506	TAPICERIAS	69902 69903	ANDEN	KR 18	CL 2	CL 3

Tabla 4 Asignación de segmentos a intervenir

Así las cosas, considerando las situaciones o circunstancias que se han dado para la

114



N.º 30 347 411-0

inclusión de estos nuevos frentes, solicitamos que se genere la asignación por parte del FDLM, ya que estos frentes en la actualidad pueden estar en evaluación y/o asignación a terceros.

El 2 de agosto del 2021, en comité de obra la Supervisión por parte de la Alcaldía de mártires hace entrega del listado de "SOLICITUD DE INTERVENCIONES CON ACCIONES DE MOVILIDAD DE LOCALIDAD DE MARTIRES". Actualmente de los dieciséis (16) frentes de obra entregados por el FDLM, se evidencio que el frente de obra No 5 esta repetido en el frente de obra No 7, dichos frente corresponde al CIV 14001471, por esta razón se evaluarán un total de quince (15) frentes de obra entregados FDLM, de los cuales once (11) frentes se encuentran ejecutados por terceros de acuerdo a la Tabla No.5

PRIORIZADO	BARRIO	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA	ACTIVIDADES POR EJECUTAR
1	SAMPER MENDOZA	14000068 14001670	KR 25	CL 23	CL 24	Ejecutado por terceros
2	SAMPER MENDOZA	14000087 14000080	KR 24	CL 23	CL 24	Ejecutado por terceros
4	VOTO NACIONAL	14000971	CL 8	CR 17	CR 18	Ejecutado por terceros
5	EDUARDO SANTOS	14001471	DIAG 2	KR 18A	CL 3	Ejecutado por terceros
6	EDUARDO SANTOS	14001447	CL 3	CR 18A	DIAG 2	Ejecutado por terceros
8	EDUARDO SANTOS	14001568	CR 16	CL 23	CL 2BIS	Ejecutado por terceros
9	EDUARDO SANTOS	14001571	CR 16	CL 2B'S	CL 3	Ejecutado por terceros
10	EDUARDO SANTOS	14001510	CL 3	CR 16	CR 17	Ejecutado por terceros
12	SAMPER MENDOZA	14000389	CL 20	KR 16	CRUCE	Ejecutado por terceros
13	SAMPER MENDOZA	14000362	CL 20	KR 16A	CRUCE	Ejecutado por terceros
14	SAMPER MENDOZA	14000312	CL 20	KR 18A	CRUCE	Ejecutado por terceros

Tabla 5 Segmentos excluidos por ejecución de terceros

Es de aclarar que este listado fue entregado a la UMV, mediante Radicado 20216420269461; por lo tanto, el contratista advierte que los cuatro (4) frentes dispuestos para su ejecución, pueden estar programados para ejecución por parte de la UMV, como los anteriores.

No	Cod.	BARRIO	PK-ID	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA	% EJECUCION	ACTIVIDADES POR EJECUTAR
1	14001463	EL VERGEL-CONSOLATA	182872	CALZADA	CL 1F	KR 24A	KR 24B	95%	1 SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB
			70632-70633	ANDEN Y CINTA DE AJUSTE				0%	1 CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA ANDEN Y CINTA DE AJUSTE
2	14001481	EL VERGEL-CONSOLATA	182871	CALZADA	CL 1F	KR 24	KR 24A	86%	1 SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB 2 CONFORMACION DE LA BOCACALLE KR 24A 3 TERMINACION DE POZO Y CARGUE
			70630-70631	ANDEN Y CINTA DE AJUSTE				0%	1 CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA ANDEN Y CINTA DE AJUSTE
3	14000772	RICAURTE-TALLERES	183235	CALZADA	KR 25A	AC 6	CL 6BIS	97%	1 DEMARCAACION Y MOBILIARIO (TACHAS ESTOPEROLES)
			71323-71324	ANDEN				0%	2 TAPA DE SUMIDERO 1 CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA ANDEN
4	14000741	RICAURTE-TALLERES	183236	CALZADA	KR 25A	CL 6BIS	CL 6A	97%	1 DEMARCAACION Y MOBILIARIO (TACHAS ESTOPEROLES)
			71325-71326	ANDEN				0%	1 CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA ANDEN
5	14000718	RICAURTE-TALLERES	183237	CALZADA	KR 25A	CL 6A	CL 7	95%	1 DEMARCAACION Y MOBILIARIO (TACHAS ESTOPEROLES)
			71327-71328	ANDEN				0%	1 CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA ANDEN
6	14000678	RICAURTE-TALLERES	183546	CALZADA	KR 25A	CL 7	CL 7BIS	96%	1 DEMARCAACION Y MOBILIARIO (TACHAS ESTOPEROLES)
			71914-71915	ANDEN				0%	1 CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA ANDEN

Tabla 7 Frentes a ejecutar Grupo 2

3. GRUPO No.3

En el siguiente cuadro se presentan los CIV que tiene contemplado iniciarlos en tercer grupo, ver anexo No.4.

No	Cod.	BARRIO	PK-ID	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA	% EJECUCION	ACTIVIDADES POR EJECUTAR
20	14000178	ADICION 1 HOJALDRES	183818	CALZADA	CL 22	KR 19A	KR 19B	90%	1 SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047 1V4 EAAB 2 DEMARCAACION Y MOBILIARIO (TACHAS ESTOPEROLES ETC)
			72430-72431	CINTA AJUSTE				0%	1 CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCION Y



NIT 3.50 041 411-0

1413

No	Cod.	BARRIO	PK+D	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA	% EJECUCION	ACTIVIDADES POR EJECUTAR
11	14000126	PESQUERAS	183733	CALZADA	KR 24	CL 22A	DG 22B BIS	94%	CONFORMACION DE CINTA DE AJUSTE DE ANDEN 2 VERIFICACION DEL ESTADO SARDINEL 1 SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB 2 DEMARCACION Y MOBILIARIO (TACHAS ESTOPEROLES ETC
			72263 72264	CINTA AJUSTE				0%	1 CONTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCION Y CONFORMACION DE CINTA DE AJUSTE DE ANDEN 1 SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB 2 DEMARCACION Y MOBILIARIO (TACHAS ESTOPEROLES ETC
9	14001155	SANTA ISABEL-2B	472640 708061 70862	CALZADA Y CINTA AJUSTE	CL 2B	KR 25A	KR 26	92%	CONFORMACION DE CINTA DE AJUSTE DE ANDEN 2 VERIFICACION DEL ESTADO SARDINEL 1 SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB 2 DEMARCACION Y MOBILIARIO (TACHAS ESTOPEROLES ETC

Tabla 8 Frentes a ejecutar Grupo 3

4. GRUPO No.4

En el siguiente cuadro se presentan los CIV que tiene contemplado iniciarlos en cuarto grupo, ver anexo No.4.

No	Cod.	BARRIO	PK+D	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA	ACTIVIDADES POR EJECUTAR
25	14001098 1400233	ADICION 1-A	182856	CALZADA	CLL 22	KR 18B	AK 19	1. CONFORMACION DE LA CALZADA 2. SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB 3. DEMARCACION Y MOBILIARIO (TACHAS ESTOPEROLES ETC
23	14000233 14001098	ADICION 1-B	183801	CALZADA	CLL 22A	KR 19A	KR 30	1. CONFORMACION DE LA CALZADA 2. SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB 3. DEMARCACION Y MOBILIARIO (TACHAS ESTOPEROLES ETC

Tabla 9 Frentes a ejecutar Grupo 4

5. GRUPO No.5

En el siguiente cuadro se presentan los CIV que tiene contemplado iniciarlos en quinto grupo, ver anexo No.4.

No	Cod.	BARRIO	PK+D	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA
3-A	14000434	ACCION DE MOVILIDAD RICAURTE	183403	CALZADA	CLL 10	KR 29	AV KR 30
11-A	14001447	ACCION DE MOVILIDAD EDUARDO SANTOS	512891	CALZADA	CL 3	KR 17A	KR 18
12-A	14000389	ACCION DE MOVILIDAD SAMPER MENDOZA	183633	CALZADA	CLL 20	KR 16	CRUCE



1320
1414

11-200-047 411-0

No	Cod.	BARRIO	PK-ID	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA
16-A	14000489	ACCION DE MOVILIDAD EL LISTON	183587	CALZADA	KR 20	CL 14	CL 15

Tabla 10 Frentes a ejecutar Grupo 5

II. PLAN ESTRATÉGICO

Las estrategias para la prevención y el control de contingencias se definen como un conjunto de medidas y acciones diseñadas a partir de la evaluación de riesgos asociados a las actividades de construcción del proyecto, encaminadas en primer lugar a evitar la persistencia de los atrasos que afecten el buen desarrollo del proyecto, y a mitigar sus efectos en caso de que éstos ocurran.

A. Estrategias Preventivas.

El Contratista ajustará el cronograma de obra, implementación de medidas de Salud Ocupacional, Seguridad y Medio Ambiente que aplica para todas las actividades relacionadas con la ejecución del proyecto, el cual es de obligatorio cumplimiento tanto para el personal de CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S, como para su personal y subcontratistas, esto para los turnos a establecer en la obra.

B. Estrategia General en Frente de Obra Civil.

- En la ejecución de actividades solo intervendrán personas calificadas y preparadas para realizar las labores asignadas. Este personal será un grupo trabajadores especializados en este tipo de actividades y estarán asignados exclusivamente para las labores de mezcla asfáltica con asfalto caucho y demarcación, se busca no afectar al personal que interviene en las actividades de obra civil general.
- Se dispondrá de maquinaria y equipos que cumplen con las especificaciones técnicas y herramienta menor requerida en los sitios de trabajo a intervenir para garantizar la correcta ejecución de los trabajos.
- Se mantendrá al tanto al personal, que se encuentra en los frentes de trabajo, de los tiempos límites para la finalización de cada una de las actividades que se encuentran relacionadas en la propuesta.
- Se dispondrán de todos los materiales necesarios en los frentes de trabajo para mantener la eficiencia del cumplimiento de la programación de obra.



Nº 1 350 941 411-0

III. PROGRAMACION DE OBRA

Para la validación de la propuesta se hace entrega de la programación de obra actualizada y el flujo de caja según las actividades requeridas: la cual incluye el plazo requerido, correspondiente a ciento veintiún (121) DIAS CALENDARIO, el cual hace parte del anexo No.4 y 5 del presente documento.

IV. CONCEPTO JURÍDICO- ARREGLO DIRECTO

La firma CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS – CON Y CON, convoca a la ALCALDIA LOCAL DE MÁRTIRES a una etapa de arreglo directo con el objeto de que se resuelvan las dificultades acaecidas en el marco de la ejecución del Contrato de referencia Ver anexo No.6.

Cordialmente,

JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

Anexos:

Anexo N°1- Recurso de Mano de Obra

Anexo N°2- Reorganización y Priorización de las Actividades

Anexo N°3- Recurso de Maquinaria

Anexo N°4- Programación de obra

Anexo N°5- Flujo de Caja

Anexo N°6- Concepto jurídico- arreglo directo

Archivo C/1/ Archivo Consultoría y Construcción S.A.S.

Archivo C/2/ Interventoría MIRS LATINOAMERICA S A S- Representante Legal-Nick Randy Almeida Gamarra

Archivo C/3/ La Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo-Dr. Néstor Raul Hernández Ospina

1322
1416



TEL: 300 841 4110

C&C-CO137-2019-132

Bogotá D.C., 4 de abril de 2022

Señores

ALCALDIA LOCAL DE MARTIRES

Atn. Dr. Juan Rachif Cabarcas Rahman

Alcalde Local de Mártires

Avenida calle 19 No. 28-80, Piso 7

Ciudad

Referencia: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO-137-2019 cuyo objeto es CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES.**

Asunto: **Respuesta Oficio MIRS-MAR-154-2019: RESPUESTA A OFICIO No 20216420854581 -SOLICITUD CONCEPTO JURIDICO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO, FRENTE A PROPUESTA PARA CULMINACION DE LOS FRENTES DEL CONTRATO DE OBRA No. 137-2019.**

Cordial saludo,

- Acorde con las observaciones hechas por la interventoría mediante el Oficio MIRS-MAR-154-2019, el día veintiocho (28) de marzo del 2022, nos permitimos hacer las siguientes aclaraciones:

Una vez elaborado el balance de obra contractual con respecto a las cantidades reales de ejecución en cada uno de los CIV's y debidamente revisados por MIRS LATINOAMERICA S.A.S como Interventor de este contrato, se evidencia un saldo a favor al fondo de desarrollo local de Mártires (FLM), el cual se encuentra sujeto a valoración debido a que las intervenciones en la modalidad de ACCIONES DE MOVILIDAD, conlleva una modalidad distinta y no se puede verificar totalmente su alcance hasta su intervención.

El balance de los CIV's a intervenir es el siguiente:

[Handwritten signature and date]
Recibido 11:50 am
05 Abril de 2022



1323
1417

N°	Cod.	BARRIO	PK-ID	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA	VALOR PRESUPUESTADO
1	14001469	EL VERGEL-CONSOLATA	182872	CALZADA	CL 1F	KR 24A	KR 24B	\$ 295.367.657,00
			70632 70633	ANDEN Y CINTA DE AJUSTE				\$ 20.546.444,00
2	14001431	EL VERGEL-CONSOLATA	182871	CALZADA	CL 1F	KR 24	KR 24A	\$ 242.816.869,00
			70630 70631	ANDEN Y CINTA DE AJUSTE				\$ 33.571.303,00
3	14000772	RICAURTE-TALLERES	183235	CALZADA	KR 25A	CL 6	CL 6BIS	\$ 213.784.434,00
			71323 71324	ANDEN				\$ 53.852.051,00
4	14000741	RICAURTE-TALLERES	183236	CALZADA	KR 25A	CL 6BIS	CL 6A	\$ 238.309.693,00
			71325 71326	ANDEN				\$ 58.593.053,00
5	14000718	RICAURTE-TALLERES	183237	CALZADA	KR 25A	CL 6A	CL 7	\$ 156.326.785,00
			71327 71328	ANDEN				\$ 42.157.541,00
6	14001678	RICAURTE-TALLERES	472840	CALZADA	KR 25A	CL 7	CL 7BIS	\$ 189.367.750,00
			467505 467506	ANDEN				\$ 52.782.292,00
7	14001545	SANTA ISABEL SUR	182816	CALZADA	CL 1ABIS	AC 1	KR 26	\$ 6.037.281,00
8	14001517	SANTA ISABEL SUR	182854	CALZADA	KR 26	CL 1ABIS	CL 1B	\$ 3.116.016,00
9	14001155	SANTA ISABEL 2B	70861 70862 182992	CALZADA Y CINTA DE AJUSTE	CL 2B	KR 25A	KR 26	\$ 295.488.390,00
			182827	CALZADA				\$ 408.727.519,00
10	14001367	SANTA ISABEL-1B	70642 70643	ANDEN	CL 1B	KR 27A	KR 28	\$ 120.094.100,00
			183733	CALZADA				\$ 538.377.548,00
11	14000126	PESQUERAS	72262 72264	CINTA AJUSTE	KR 24	CL 22A	UG 22B BIS	\$ 13.406.302,00
			182491	CALZADA				\$ 281.474.008,00
12	14001506	TAPICERIAS	69902 69903	ANDEN	KR 18	CL 2	CL 3	\$ 64.713.646,00
			182768	CALZADA				\$ 165.944.470,00
13	14001619	COLEGIOS	70476 70477	ANDEN	CL 1C	KR 19A	KR 19BBIS	\$ 29.017.868,00
			182769	CALZADA				\$ 152.556.046,00
14	14001616	COLEGIOS	70478 70479	ANDEN	CL 1C	KR 19BBIS	KR 18C	\$ 31.128.493,00
			183819	CALZADA				\$ 134.866.380,00
15	14000173	ADICION 1 HUALDRES	72430 72431	CINTA AJUSTE	CL 22 A	KR 19 A	KR 19B	\$ 5.915.682,00



BOGOTÁ, D.C. 11110

N°	Cod	BARRIO	PK-ID	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA	VALOR PRESUPUESTADO
21	14001075	ADICION 1-A	182856	CALZADA	CLL 1D BIS	KR 29B	AV NCS	\$ 210.951.644,00
23	14000233	ADICION 1-B	183801	CALZADA	CLL 22	KR 18B	KR 19	\$ 297.248.075,00
24	14000815	ADICION 1-C	183438	CALZADA	CLL 12	KR 19	KR 19A	\$ 3.116.016,00
3-A	14000434	ACCION DE MOVILIDAD RICAURTE	183403	CALZADA	CLL 10	KR 29	AV KR 30	\$ 151.420.225,00
11-A	14001474	ACCION DE MOVILIDAD: EDUARDO SANTOS	512891	CALZADA	CLL 1	KR 17A	KR 18	\$ 48.942.521,00
12-A	14000373	ACCION DE MOVILIDAD: SAMPER MENDOZA	183633	CALZADA	CLL 20	KR 18	CRUCE	\$ 139.954.775,00
16-A	14000469	ACCION DE MOVILIDAD EL LISTON	183587	CALZADA	KR 20	CL 14	CL 15	\$ 184.364.112,00

COSTO TOTAL OBRAS INCLUYE REDES Y COSTOS DIRECTOS, APROXIMADA AL PESO (A) =		\$ 5.197.288.881,00
ADMINISTRACIÓN	\$ 1.189.658.921,00	\$ 1.188.874.647,00
IMPREVISTOS	\$ 51.872.867,00	\$ 51.933.604,00
UTILIDAD	\$ 363.810.068,00	\$ 363.570.128,00
COSTO TOTAL A.I.U.	\$ 1.605.441.856,00	\$ 1.604.383.479,00
COSTO TOTAL OBRA INCLUYE A.I.U.		\$ 6.802.728.837,00
COSTO ACTIVIDADES AMBIENTALES y SST (B)	\$ 201.123.374,00	\$ 200.880.786,00
COSTO ACTIVIDADES SOCIALES (C)	\$ 185.001.955,00	\$ 184.879.984,00
COSTO PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (D)	\$ 83.484.576,00	\$ 83.429.540,00
TOTAL OBRAS LICITACION (A+B+C+D)		\$ 7.272.338.442,00
COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO (E) (INCLUYE AJUSTES E IVA)	\$ 29.833.092,00	\$ 29.813.415,00
COSTO ESTIMADO DE AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (F) (INCLUYE IVA)	\$ 337.110.102,00	\$ 337.110.102,00
VALOR TOTAL SIN AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (VALOR EVALUABLE) =		\$ 7.639.281.836,00
PROMISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (SOLO OBRA) , INCLUYE COSTOS INDIRECTOS (G)	\$ 208.144.381,00	\$ 208.144.381,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO APROXIMADO AL PESO =		\$ 7.847.426.017,00
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD -TRANSPORTE SEGURO (CONSIDERADO 5 FRENTE DE OBRA)		\$ 250.000.000,00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO + PROTOCOLOS		\$ 8.097.426.017

378%

Tabla 1 Balance General del Proyecto

Teniendo en cuenta, tal y como se manifestó en el oficio C&C-CO137-2019-119; RESPUESTA COMUNICADO MIRS-MAR-132-2021; CITACION AUDIENCIA SANCIONATORIO CONTRATO DE OBRA No. 137-2019, Numeral 2. Respuesta al

incumplimiento del Aspecto Técnico, se evidencia que los segmentos- Elementos PK-ID CALZADA que actualmente están abiertos, se encuentran con un avance del 90% faltando por ejecutar la construcción de sumideros y la demarcación, así, como se presenta en Tabla No.2.

No	Cod	BARRIO	PK-ID	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR AJECUTADO	% EJECUCION
1	14001413	EL VERGEL-CONSOLATA	182872	CALZADA	CL 1F	KR 24A	KR 24B	\$ 245 337 657	\$ 229 462 343	93%
2	14001481	EL VERGEL-CONSOLATA	182871	CALZADA	CL 1F	KR 24	KR 24A	\$ 242 916 869	\$ 229 728 004	95%
3	14000772	RICAUARTE-TALLERES	183235	CALZADA	KR 25A	CL 6	CL 6BIS	\$ 213 784 434	\$ 206 370 975	97%
4	14000741	RICAUARTE-TALLERES	183236	CALZADA	KR 25A	CL 6BIS	CL 6A	\$ 238 309 683	\$ 230 800 229	97%
5	14000719	RICAUARTE-TALLERES	183237	CALZADA	KR 25A	CL 6A	CL 7	\$ 156 336 760	\$ 148 907 057	95%
6	14000878	RICAUARTE-TALLERES	183546	CALZADA	KR 25A	CL 7	CL 7BIS	\$ 189 397 780	\$ 182 383 074	96%
9	14001103	SANTA ISABEL-2B	70861 70862 182992	CALZADA Y CINTA DE AJUSTE	CL 7B	KR 25A	KR 26	\$ 295 488 390	\$ 272 297 642	92%
10	14001367	SANTA ISABEL-1B	182827	CALZADA	CL 1B	KR 27A	KR 28	\$ 408 727 519	\$ 401 770 649	98%
11	14001126	PESQUERAS	183733	CALZADA	KR 24	CL 22A	OG 22B BIS	\$ 535 982 932	\$ 506 112 735	94%
15	14001506	TAPICERIAS	182491	CALZADA	KR 18	CL 2	CL 3	\$ 281 474 006	\$ 137 699 625	37%
18	14001619	COLEGIOS	182768	CALZADA	CL 1C	KR 19A	KR 19BIS	\$ 155 944 470	\$ 157 896 555	98%
19	14001616	COLEGIOS	182769	CALZADA	CL 1C	KR 19BIS	KR 19C	\$ 152 556 048	\$ 143 761 704	94%
20	14001178	ADICION 1 HOJALDRES	183819	CALZADA	CL 22A	KR 19A	KR 19B	\$ 348 761 354	\$ 300 342 602	86%
PROMEDIO DE EJECUCION DE LOS FRETES ACTIVOS										90%

Tabla 2 Actividades a ejecutar PK-ID calzada

Se hace la aclaración que el CIV's 14001506 del elemento calzada tiene un avance del 37%; falta la conformación de la estructura de la calzada occidental y la verificación del estado de la calzada oriental, una vez se reinicie el contrato se realizará la revisión técnica del estado del frente.

Los segmentos CIV's 14001481, 14001619, 14001616 y 14001367, presentan una demarcación parcial por parte de Secretaria Distrital de Movilidad, aun cuando los



elementos PK-ID, se encuentra reservado para ejecución en este contrato, por tal motivo se realizó nuevamente actualización de presupuesto y avance físico de los frentes.

Los segmentos- Elementos PK-ID ANDEN costado sur, que actualmente se hallan abiertos, CIV's 14001619, se encuentran en capa granular; se debe hacer la verificación del estado en que se encuentra el frente así, como se presenta en Tabla No.3

No	Cod.	BARRIO	PK-ID	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR AJECUTADO	% EJECUCION
17	14001619	EDUARDO SANTOS	182788	CALZADA	CL 1C	KR 19A	KR 19BBIS	\$ 185.944.470	\$ 157.585.558	84,7
			70475-70477	CINTA DE AJUSTE-ANDEN				\$ 29.017.868	\$ 5.803.574	20,0
19	14001618	EDUARDO SANTOS	182789	CALZADA	CL 1C	KR 19BBIS	KR 19C	\$ 152.556.046	\$ 143.851.514	94,3
			70478-70479	CINTA DE AJUSTE-ANDEN				\$ 31.228.493	\$ 590.000	1,9

Tabla 3 Actividades a ejecutar PK-ID Andenes

A la fecha no se cuenta con la reserva ante el IDU, por parte del Fondo de Desarrollo local de Mártires la asignación de los nuevos segmentos a intervenir los cuales se relacionan en la Tabla No.4.

No	Cod.	BARRIO	PK-ID	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA
1	14001469	EL VERGEL CONSOLATA	70632 70633	ANDEN	CL 1F	KR 24A	KR 24B
2	14001481	EL VERGEL-CONSOLATA	70630 70631	ANDEN	CL 1F	KR 24	KR 24A
3	14000772	RICAURTE-TALLERES	71323 71324	ANDEN	KR 25A	AC 6	CL 5B
4	14000741	RICAURTE-TALLERES	71325 71326	ANDEN	KR 25A	CL 5BIS	CL 6A
5	14000718	RICAURTE-TALLERES	71327 71328	ANDEN	KR 25A	CL 6A	CL 7
6	14001678	RICAURTE-TALLERES	467505 467506	ANDEN	KR 25A	CL 7	CL 7P L
10	14001367	SANTA ISABEL-1B	70542 70543	ANDEN	CL 1B	KR 27A	KR 28
15	14001506	TAPICERIAS	69902 69903	ANDEN	KR 1E	CL 2	CL 3

Tabla 4 Asignación de segmentos a intervenir

Así las cosas, considerando las situaciones o circunstancias que se han dado para la

inclusión de estos nuevos frentes, solicitamos que se genere la asignación por parte del FDLM, ya que estos frentes en la actualidad pueden estar en evaluación y/o asignación a terceros

El 2 de agosto del 2021, en comité de obra la Supervisión por parte de la Alcaldía de mártires hace entrega del listado de "SOLICITUD DE INTERVENCIONES CON ACCIONES DE MOVILIDAD DE LOCALIDAD DE MARTIRES". Actualmente de los dieciséis (16) frentes de obra entregados por el FDLM, se evidencio que el frente de obra No 5 esta repetido en el frente de obra No 7, dichos frente corresponde al CIV 14001471, por esta razón se evaluarán un total de quince (15) frentes de obra entregados FDLM, de los cuales once (11) frentes se encuentran ejecutados por terceros de acuerdo a la Tabla No.5.

PRIORIZADO	BARRIO	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA	ACTIVIDADES POR EJECUTAR
1	SAMPER MENDOZA	14000058 14001670	KR 25	CL 23	CL 24	Ejecutado por terceros
2	SAMPER MENDOZA	14000087 14000080	KR 24	CL 23	CL 24	Ejecutado por terceros
4	VOTO NACIONAL	14000971	CL 8	CR 17	CR 18	Ejecutado por terceros
5	EDUARDO SANTOS	14001471	DIAG 2	KR 18A	CL 3	Ejecutado por terceros
6	EDUARDO SANTOS	14001447	CL 3	CR 18A	DIAG 2	Ejecutado por terceros
8	EDUARDO SANTOS	14001588	CR 16	CL 23	CL 2BIS	Ejecutado por terceros
9	EDUARDO SANTOS	14001571	CR 16	CL 2BIS	CL 3	Ejecutado por terceros
10	EDUARDO SANTOS	14001510	CL 3	CR 16	CR 17	Ejecutado por terceros
12	SAMPER MENDOZA	14000389	CL 20	KR 16	CRUCE	Ejecutado por terceros
13	SAMPER MENDOZA	14000362	CL 20	KR 16A	CRUCE	Ejecutado por terceros
14	SAMPER MENDOZA	14000312	CL 20	KR 18A	CRUCE	Ejecutado por terceros

Tabla 5 Segmentos excluidos por ejecución de terceros

Es de aclarar que este listado fue entregado a la UMV, mediante Radicado 20216420269461, por lo tanto, el contratista advierte que los cuatro (4) frentes dispuestos para su ejecución, pueden estar programados para ejecución por parte de la UMV, como los anteriores

I. PROPUESTA

Una vez evaluada y analizada la programación "costos-tiempo" que se requiere para la culminación de los frentes que actualmente se encuentra abiertos y los que se requieren iniciar (*Frentes de Adición y Acciones de Movilidad*), se propone la culminación de los frentes en cinco grupos, de acuerdo a las necesidades de la comunidad y de la programación de obra.

Así mismo, una vez se reinicie el contrato se dará trámite con secretaría de movilidad para la aprobación de los diseños de señalización y demarcación, tal como se evidencia en la programación de Obra.

1. GRUPO No.1

A continuación, se presentan los CIV que actualmente se encuentran en ejecución y tienen requerimientos por parte de la comunidad y se priorizan para iniciar en el Grupo No 1 ver anexo No.1.

No	Cod.	BARRIO	PK-ID	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA	% EJECUCION	ACTIVIDADES POR EJECUTAR
18	14001019	COLEGIOS	182788	CALZADA	CL 1C	KR 19A	KR 19BBIS	95%	1 SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB
			70476-70477	CINTA DE AJUSTE - ANDEN				20%	1 CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA ANDEN, CINTA DE AJUSTE Y FINALIZACION DE LAS CAJAS DE INSPECCION
19	14001516	COLEGIOS	182789	CALZADA	CL 1C	KR 19BBIS	KR 19C	34%	1 SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB
			70478-70479	CINTA DE AJUSTE - ANDEN				5%	1 CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA ANDEN, CINTA DE AJUSTE Y FINALIZACION DE LAS CAJAS DE INSPECCION
15	14001505	TAPICERIAS	182491	CALZADA	KR 1B	CL 2	CL 3	41%	1 CONFORMACION DE LA CALZADA COSTADO OCCIDENTAL 2 SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB 3 DEMARCACION Y MOBILIARIO (TACHAS, ESTOPERULES, ETC)
			63902-63903	ANDEN				0%	1 CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA ANDEN
10	14001567	SANTA ISABEL-1B	182827	CALZADA	CL 1B	KR 27A	KR 28	99%	1 SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB
			70542-70543	ANDEN				0%	1 CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA ANDEN

Tabla 6 Frentes a ejecutar Grupo 1

2 GRUPO No.2

En el siguiente cuadro se presentan los CIV que se tiene contemplado iniciarlos en el segundo grupo, ver anexo No.1.

No	Cod.	BARRIO	PK-ID	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA	% EJECUCION	ACTIVIDADES POR EJECUTAR
1	4001462	EL VERGEL CONSOLATA	182872	CALZADA	CL 1F	KR 24A	KR 24B	95%	1 SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NR.047 1V4 5 ACP
			70632 70633	ANDEN Y CINTA DE AJUSTE				0%	1 CONFIRMACION DE LA ESTRUCTURA ANDEN CINTA DE AJUSTE
2	4001481	EL VERGEL CONSOLATA	182871	CALZADA	CL 1F	KR 24	KR 24A	90%	1 SUMIDERO 4 CANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NR.047 1V4 5 ACP 2 CONFIRMACION DE LA BOCALCA A KR 24A 3 TERMINACION DE LA CARRETE
			70630 70631	ANDEN Y CINTA DE AJUSTE				0%	1 CONFIRMACION DE LA ESTRUCTURA ANDEN CINTA DE AJUSTE
3	4001712	RICAUURTE TALLERES	183235	CALZADA	KR 25A	AC 6	CL 6B-3	37%	1 DEMARCACION Y MOBILIARIO TACHAS ESTOPERILES 2 TAPAS DE SUMIDERO
			71323 71324	ANDEN				0%	1 CONFIRMACION DE LA ESTRUCTURA ANDEN
4	4001741	RICAUURTE TALLERES	183233	CALZADA	KR 25A	CL 6BIS	CL 6A	97%	1 DEMARCACION Y MOBILIARIO TACHAS ESTOPERILES
			71325 71326	ANDEN				0%	1 CONFIRMACION DE LA ESTRUCTURA ANDEN
5	4001718	RICAUURTE TALLERES	183237	CALZADA	KR 25A	CL 6A	CL 7	95%	1 DEMARCACION Y MOBILIARIO TACHAS ESTOPERILES
			71327 71328	ANDEN				0%	1 CONFIRMACION DE LA ESTRUCTURA ANDEN
6	400578	RICAUURTE TALLERES	183546	CALZADA	KR 25A	CL 7	CL 7B	90%	1 DEMARCACION Y MOBILIARIO TACHAS ESTOPERILES
			71914 71915	ANDEN				0%	1 CONFIRMACION DE LA ESTRUCTURA ANDEN

Tabla 7 Frentes a ejecutar Grupo 2

3. GRUPO No.3

En el siguiente cuadro se presentan los CIV que tiene contemplado iniciarlos en tercer grupo, ver anexo No.1.

No	Cod.	BARRIO	PK-ID	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA	% EJECUCION	ACTIVIDADES POR EJECUTAR
20	14000178	ADICION 1 ROJALDRES	183819	CALZADA	CL 22	KR 19A	KR 19B	90%	1 SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB 2 DEMARCACION Y MOBILIARIO (TACHAS, ESTOPEROS, ETC.) 3 CONTROL DE CALIDAD DE INSPECCION Y CONFORMACION DE CINTA DE AJUSTE DE ANCHURA 4 VERIFICACION DE ESTADO SARDINEI
			72430-72431	CINTA AJUSTE				0%	1 SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB 2 DEMARCACION Y MOBILIARIO (TACHAS, ESTOPEROS, ETC.) 3 CONTROL DE CALIDAD DE INSPECCION Y CONFORMACION DE CINTA DE AJUSTE DE ANCHURA
	4900126	PESQUERAS	183733	CALZADA	KR 24	CL 22A	OG 22B BIS	94%	1 SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB 2 DEMARCACION Y MOBILIARIO (TACHAS, ESTOPEROS, ETC.) 3 CONTROL DE CALIDAD DE INSPECCION Y CONFORMACION DE CINTA DE AJUSTE DE ANCHURA
			72263-72264	CINTA AJUSTE				0%	1 SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB 2 DEMARCACION Y MOBILIARIO (TACHAS, ESTOPEROS, ETC.)
21	14001156	SANTA ISABEL 2B	472640-708061-708852	CALZADA Y CINTA AJUSTE	CL 2B	KR 25A	KR 26	32%	1 SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB 2 DEMARCACION Y MOBILIARIO (TACHAS, ESTOPEROS, ETC.)

Tabla 8 Frentes a ejecutar Grupo 3

4 GRUPO No.4

En el siguiente cuadro se presentan los CIV que tiene contemplado iniciarlos en cuarto grupo ver anexo No.1.

No	Cod.	BARRIO	PK-ID	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA	ACTIVIDADES POR EJECUTAR
25	14001098	ADICION 1-A	182858	CALZADA	CL 22	KR 18B	AC 19	1 CONFORMACION DE LA CALZADA 2 SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB 3 DEMARCACION Y MOBILIARIO (TACHAS, ESTOPEROS, ETC.)
23	14001293	ADICION 1-B	183801	CALZADA	CLL 22A	KR 19A	KR 19B	1 CONFORMACION DE LA CALZADA 2 SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB 3 DEMARCACION Y MOBILIARIO (TACHAS, ESTOPEROS, ETC.)

Tabla 9 Frentes a ejecutar Grupo 4

5 GRUPO No.5

En el siguiente cuadro se presentan los CIV que tiene contemplado iniciarlos en quinto grupo ver anexo No.1.

No	Cod.	BARRIO	PK-ID	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA
3-A	14000434	ACCION DE MOVILIDAD RICAURTE	183403	CALZADA	CLL 10	KR 29	AV KR 30

No	Cod.	BARRIO	PK-ID	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA
11 A	14001447	ACCION DE MOVILIDAD EDUARDO SANTOS	512891	CALZADA	CL 3	KR 17A	KR 18
12 A	14000389	ACCION DE MOVILIDAD SAMPER MENDOZA	183533	CALZADA	CL 20	KR 16	CRUCE
16 A	14000489	ACCION DE MOVILIDAD EL LISTON	183567	CALZADA	KR 20	CL 14	CL 15

Tabla 10 Frentes a ejecutar Grupo 5

II. PLAN DE ACCION

Las estrategias para la prevención y el control de contingencias se definen como un conjunto de medidas y acciones diseñadas a partir de la evaluación de riesgos asociados a las actividades de construcción del proyecto, encaminadas en primer lugar a evitar la persistencia de los atrasos que afecten el buen desarrollo del proyecto, y a mitigar sus efectos en caso de que éstos ocurran. Ver anexo No.2.

A. Estrategias Preventivas.

El Contratista ajustará el cronograma de obra, implementación de medidas de Salud Ocupacional, Seguridad y Medio Ambiente que aplica para todas las actividades relacionadas con la ejecución del proyecto, el cual es de obligatorio cumplimiento tanto para el personal de CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S, como para su personal y subcontratistas, esto para los turnos a establecer en la obra.

B. Estrategia General en Frente de Obra Civil.

- En la ejecución de actividades solo intervendrán personas calificadas y preparadas para realizar las labores asignadas. Este personal será un grupo trabajadores especializados en este tipo de actividades y estarán asignados exclusivamente para las labores de mezcla asfáltica con asfalto caucho y demarcación, se busca no afectar al personal que interviene en las actividades de obra civil general
- Se dispondrá de maquinaria y equipos que cumplen con las especificaciones técnicas y herramienta menor requerida en los sitios de trabajo a intervenir para garantizar la correcta ejecución de los trabajos.
- Se mantendrá al tanto al personal, que se encuentra en los frentes de trabajo de los tiempos límites para la finalización de cada una de las actividades que se encuentran relacionadas en la propuesta.



- Se dispondrán de todos los materiales necesarios en los frentes de trabajo para mantener la eficiencia del cumplimiento de la programación de obra.

C. Estrategia Técnica De Intervención

Para la ejecución de las actividades se dispondrán diferentes Cuadrillas distribuidos de la siguiente manera.

TIPO DE CUADRILLA	CONFORMACION DE LA CUADRILLA
OC 1 - OBRA CIVIL	3 ayudantes
OC 2 - OBRA CIVIL	1 oficial 1 ayudante
OC 3 - OBRA CIVIL	1 oficial 2 ayudantes

- Las cuadrillas a usar se asignan con el número de personas a conformar cada grupo de trabajo
- El tipo de oficiales y ayudantes varía de acuerdo con la actividad y el grado de especialización que requiera la actividad a ejecutar.

Se han establecido conformar cuadrillas asignadas a actividades específicas ver Anexo No.3 las cuadrillas son las siguientes:

ACTIVIDADES A EJECUTAR	CONFORMACION DE LA CUADRILLA
OC 2- DEMOLICIONES	1 oficial 1 ayudante
OC 2- EXCAVACIONES MC	1 oficial 1 ayudante
OC 2- RELLENOS	1 oficial 1 ayudante
OC 2- INSTALACION DE PREFABRICADOS	1 oficial 1 ayudante
OC 2- REDES HUMEDAS	1 oficial 1 ayudante
OC 3- INSTALACION DE MEZCLA DE ASFALTO	2 cuadrillas de 1 oficial 2 ayudantes
OC 3- INSTALACION DE MR-41	1 oficial 2 ayudantes
OC 3- DEMARCACION MOBILIARIO	1 oficial Ayudantes

D. Reorganización y Priorización de las Actividades Para Realizar.

El proceso de reorganización y priorización de las actividades de obra se realizarán como se indica en anexo No.4.



E. Materiales, Equipos y Herramientas Requeridos para la Correcta Ejecución de la Obra.

Para el desarrollo de las actividades ya programadas se tendrán en cuenta las siguientes estrategias.

- Tener y mantener en obra un inventario amplio de materiales necesarios para cada actividad y frente de trabajo, para mantener un continuo e ininterrumpido ritmo de trabajo
- Contar con el equipo necesario para la ejecución de las actividades prevista tanto equipo mano portable, eléctrico y mecánico requerido.
- Mantener en orden los equipos de protección personal requeridos para todas y cada una de las actividades a ejecutar.

De acuerdo a las necesidades del proyecto y los tiempos limites de entrega de obra el Contratista contará con la maquinaria y el equipo necesario para atacar los diferentes segmentos viales y andenes, para esto ha establecido su uso de la siguiente manera, ver anexo No 5

TIPO DE MAQUINARIA	CANTIDAD	ZONA O FRENTE POR ATACAR	ACTIVIDADES PREVISTAS A EJECUTAR
Retorno lavadora tipo cat	1 un	CALZADA	Excavación para conformación de estructura de la vía
Minicargador Tipo BOBCat	1 un	CALZADA/ ANDENES	Excavación para conformación de estructura para fundación de andenes, conformación de estructura general
Vibro compactador de fondo	1 un	CALZADA/ ANDENES	Compactación de estructuras B.O.B.Cat y Subbase en las zonas de confort
Grader	1 un	CALZADA	Extender la mezcla asfáltica

Como complemento a la propuesta por parte de CON&CON se debe tener en cuenta el plazo necesario propuesto en la programación de obra Ver anexo No.1 Esto con el fin de garantizar la ejecución de las obras previstas y sus complementarias.

III. CONSIDERACIONES JURIDICAS

Las consideraciones desde el punto de vista del régimen jurídico aplicable a esta solicitud de prórroga, serán las previstas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, Decreto ley 019 de 2012 en lo que aplique y en el Decreto 1082 de 2015 o en las normas que los modifiquen o sustituyan.



De igual manera, los temas que no se encuentran particularmente regulados en el Estatuto General de Contratación, se regirán por las normas comerciales y civiles vigentes de conformidad con el artículo 13 de la Ley 80 de 1993

Las cláusulas que se verán afectadas por la solicitud de esta prórroga son

- PLAZO
- AMPLIACION DE GARANTÍAS

De acuerdo al consejo de Estado se tiene:

Más allá de la cláusula excepcional de modificación unilateral y los límites cuantitativos para el contrato adicional, no existe un desarrollo legal o reglamentario sobre las reglas aplicables a la modificación del contrato estatal.

Al no existir una regulación expresa sobre la modificación de los contratos estatales -en el ejercicio del "ius variandi" o surgido por mutuo acuerdo, han sido los aportes de la jurisprudencia de la función consultiva del Consejo de Estado y de la doctrina comparada, los que han permitido estructurar los límites y requisitos de la modificación que deben ser respetados por la entidad contratante, en especial cuando el contrato está precedido de un proceso de selección o de elegibilidad".

Entre los medios que puede utilizar la entidad estatal para el cumplimiento del objeto contractual, se encuentra su prerrogativa para introducir modificaciones a lo pactado dentro del marco de su facultad de dirección general del contrato.

El artículo 16 de la Ley 80 faculta a las entidades contratantes a modificar los contratos, de común acuerdo o de forma unilateral, cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado.

Con razón se señala que "la inmutabilidad del contrato no es una inmutabilidad del contenido, sino del fin, que prima en todo caso sobre aquel."

Este poder de modificación unilateral del contrato afecta uno de los presupuestos básicos de la institución contractual, el pacta sunt servanda, y la regla de que el contrato es ley para las partes, sustentado en los fines buscados por el contrato estatal.

A propósito de esta facultad, la Sala, en Concepto del 13 de agosto de 2009, Exp. 1952, señaló:

La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes



elementos del mismo (...), cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado.

(...) Un comentario inicial de este artículo consiste en distinguir entre las situaciones que permiten la modificación del contrato y los procedimientos para hacerlo. Las situaciones son la paralización y la afectación grave del servicio público, **y los procedimientos son dos: el común acuerdo, y el acto unilateral si no se obtiene aquel.** No existe una reglamentación en la ley para buscar el acuerdo, de manera que las partes pueden convenirlo, bien sea en una cláusula del contrato o cada vez que fuere necesario. Cabe anotar que, a pesar de su claridad, esta norma generalmente se interpreta y comenta bajo la exclusiva óptica de una potestad excepcional y por lo mismo unilateral, dejando de lado los necesarios análisis de la posibilidad de convenir modificaciones (negrilla fuera del texto).

La previsión legal limita esta modificación a situaciones excepcionales, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo.

Parte de la doctrina se orientó inicialmente a señalar una libertad casi absoluta en el ejercicio de esta prerrogativa, y límites como tal, estaban más referidos a los derechos del contratista y a la conservación del equilibrio financiero del contrato, hasta el punto de reconocerle la facultad de renuncia o de desistimiento del contrato".

F. SOLICITUD DE PRORROGA

Una vez evaluada y analizada la PROPUESTA, para la culminación de los frentes de obra con base en la programación que se encuentra debidamente avalada por MIRS LATINOAMERICA S.A.S como Interventor de este contrato.

Así las cosas, considerando las situaciones o circunstancias que se han dado en la ejecución de las obras en estos últimos meses y teniendo en cuenta que el plazo del contrato pendiente, se aprecia que no es suficiente para ejecutar la totalidad de los tramos que se tienen previstos, ya que iniciar la ejecución de nuevos frentes de obra sin tener la plena seguridad de que sean finalizados en el plazo restante, sería perjudicial tanto para los residentes y los comerciantes de estos sectores como para la Administración interventoria y contratista. Todas estas situaciones o circunstancias han incidido en la ejecución del contrato por lo que consideramos que para terminar la totalidad de las cantidades contratadas se requiere de un plazo adicional ciento veintiún (121) días por lo cual solicitamos se haga una prórroga del contrato en el tiempo indicado.

1336
1430



G. PROGRAMACION DE OBRA

Para la validación de la propuesta se hace entrega de la programación de obra actualizada y el flujo de caja según las actividades requeridas: la cual incluye el plazo requerido, correspondiente a ciento veintiún (121) DIAS CALENDARIO, el cual hace parte del anexo No.1 y 6 del presente documento.

Cordialmente,

JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

Anexo:

Anexo N°1: Programación de obra

Anexo N°2: Plan de Acción Frentes Tapicerías y colegios

Anexo N°3: Recurso de Mano de Obra

Anexo N°4: Reorganización y Priorización de las Actividades

Anexo N°5: Recurso de Maquinaria

Anexo N°6: Flujo de Caja

Archivo C/17: Archivo Consultoría y Construcción S.A.S.

Archivo C/18: Interventoría MIRS LATINOAMERICA S.A.S.- Representante Legal: Nick Randy Almeida Gamarra

Archivo C/19: La Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo-Dr. Nestor Raúl Hernández Ospina

~~1334~~
1431



I. ANEXOS

~~1338~~
1432



1. Programación de Obra.

~~1389~~

1433



2. Plan de Acción CIV-14001506- (Tapicerías) y CIV-14001649 – 14001616 (Colegios)

~~1347~~
1434

ANEXO 2

PLAN DE ACCION-CTO 137-FRENTES CIV-14001506 (TAPICERIAS) Y CIV 14001649-14001616 (COLEGIOS)

ORDEN	OBJETIVO	PROBLEMA	RECURSO APLICADO	FECHA

NO	OBJETIVO	PROBLEMA	RECURSOS ALICADO	SOLUCION

134
1436



3. Recurso Humano

項目	単位	数値	単位	数値
1. 総人口	人	1,234,567	2. 男性人口	人
3. 女性人口	人	654,321	4. 人口密度	人/平方キロメートル
5. 出生率	‰	12.3	6. 死亡率	‰
7. 自然増減率	‰	1.5	8. 平均年齢	歳
9. 総世帯数	世帯	345,678	10. 一人あたりGDP	円
11. 失業率	%	5.2	12. 労働参加率	%
13. 教育水準	年	12.5	14. 健康寿命	年
15. 生活満足度	点	7.8	16. 環境意識	点
17. 社会参加率	%	3.1	18. 政治参加率	%
19. 経済成長率	%	2.1	20. 物価上昇率	%
21. 財政赤字率	%	1.8	22. 外債比率	%
23. 貿易収支	億ドル	15.6	24. 観光収入	億ドル
25. 技術革新指数	点	8.9	26. 文化遺産数	件
27. 国際化指数	点	6.7	28. 社会安定指数	点
29. 環境持続可能性	点	7.5	30. 社会正義指数	点

[illegible][illegible]

GENERAL INFORMATION		PERFORMANCE DATA		TESTING DATA		ANALYSIS DATA	
TEST NO.	TEST DATE	TEST TIME	TEST TYPE	TEST RESULT	TEST UNIT	TEST METHOD	TEST RESULT
1	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
3	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
4	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
5	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
6	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
7	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
8	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
9	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
10	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
11	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
12	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
13	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
14	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
15	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
16	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
17	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
18	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
19	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
20	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
21	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
22	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
23	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
24	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
25	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
26	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
27	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
28	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
29	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
30	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
31	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
32	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
33	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
34	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
35	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
36	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
37	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
38	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
39	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
40	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
41	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
42	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
43	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
44	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
45	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
46	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
47	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
48	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
49	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
50	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
51	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
52	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
53	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
54	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
55	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
56	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
57	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
58	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
59	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
60	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
61	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
62	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
63	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
64	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
65	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
66	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
67	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
68	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
69	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
70	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
71	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
72	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
73	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
74	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
75	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
76	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
77	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
78	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
79	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
80	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
81	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
82	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
83	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
84	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
85	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
86	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
87	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
88	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
89	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
90	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
91	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
92	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
93	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
94	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
95	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
96	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
97	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
98	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
99	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
100	10/10/1998	10:00	1000	1000	1000	1000	1000

[illegible]

[illegible]

RESUMEN DE LA COLUMBIA	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

RESUMEN DE LA COLUMBIA	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100



4. Reorganización y Priorización de las Actividades.

REORGANIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA REALIZAR

[illegible]

REDES PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (incluye	8 días	jue 20/05/22	mar 11/05/22
REDES GRANULAR CLASE C (SBS_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO	8 días	jue 26/05/22	mar 11/05/22
REDES ANDEN	10 días	mar 24/05/22	vie 5/06/22
CAJA DE INSPECCION DE 0.6x0.6m (H=0.6m) Incluye Suministro y Construcción Incluye	6 días	mar 24/05/22	mar 24/05/22
CONCRETO SCS PARA REDES (Suministro y Colocación)	6 días	mar 24/05/22	mar 24/05/22
CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLASTICO CON CONCRETO SUMINISTRO F	5 días	vie 27/05/22	vie 27/05/22
CONCRETO ANDEN	4 días	mar 31/05/22	vie 3/06/22
CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 kg/cm2) G	4 días	mar 31/05/22	vie 3/06/22
COLEGIOS 14001619 - MURO	30 días	lun 11/04/22	mar 17/05/22
COLEGIOS 14001619 CALZADA	30 días	lun 11/04/22	mar 17/05/22
REPLANTEO GENERAL PANT ANDEN	15 días	lun 11/04/22	vie 10/04/22
SUMIDEROS	15 días	vie 29/04/22	mar 17/05/22
REPLANTEO ALANTARILLADO PLUVIAL EN VAS 047-1V4 EAAB	15 días	vie 29/04/22	mar 17/05/22
COLEGIOS 14001619 - ANDEN-SUR	30 días	lun 11/04/22	mar 17/05/22
REPLANTEO GENERAL PANT ANDEN	15 días	lun 11/04/22	vie 10/04/22
REPLANTEO ANDEN ORIENTAL	1 día	vie 29/04/22	lun 2/05/22
REPLANTEO GENERAL	1 día	vie 29/04/22	lun 2/05/22
REVISION ESTRUCTURA CONSTRUIDA-ANDEN SUR	4 días	lun 2/05/22	jue 5/05/22
REVISION ESTRUCTURA PARA ANDEN COSTADO SUR	4 días	lun 5/05/22	mar 10/05/22
HELLENDO ANDEN SUR	4 días	jue 5/05/22	mar 10/05/22
REDES GRANULAR CLASE C (SBS_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO	4 días	jue 5/05/22	mar 10/05/22
REDES ANDEN SUR	7 días	lun 9/05/22	mar 17/05/22
CAJA DE INSPECCION DE 0.6x0.6m (H=0.6m) Incluye Suministro y Construcción Incluye	6 días	mar 10/05/22	mar 17/05/22
CONCRETO SCS PARA REDES (Suministro y Colocación)	6 días	mar 10/05/22	mar 17/05/22
CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLASTICO CON CONCRETO SUMINISTRO F	4 días	lun 09/05/22	mar 17/05/22
CONCRETO ANDEN SUR	3 días	mar 11/05/22	vie 13/05/22
CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 kg/cm2) G	3 días	mar 11/05/22	vie 13/05/22
REDES ANDEN NORTE	3 días	vie 13/05/22	mar 17/05/22
CAJA DE INSPECCION DE 0.6x0.6m (H=0.6m) Incluye Suministro y Construcción Incluye	6 días	vie 13/05/22	mar 17/05/22
CONCRETO SCS PARA REDES (Suministro y Colocación)	6 días	vie 13/05/22	mar 17/05/22
CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLASTICO CON CONCRETO SUMINISTRO F	1 día	mar 17/05/22	lun 2/05/22
COLEGIOS 14001616 - V-AZUL	30 días	lun 11/04/22	mar 17/05/22
COLEGIOS 14001616 CALZADA	30 días	lun 11/04/22	mar 17/05/22
REPLANTEO GENERAL PANT CALZADA	15 días	lun 11/04/22	vie 10/04/22
SUMIDEROS	15 días	vie 29/04/22	mar 17/05/22
REPLANTEO ALANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	15 días	vie 29/04/22	mar 17/05/22
COLEGIOS 14001619 - ANDEN-SUR	28 días	lun 11/04/22	lun 16/05/22
REPLANTEO GENERAL PANT ANDEN	15 días	lun 11/04/22	vie 10/04/22
REPLANTEO ANDEN	1 día	vie 29/04/22	lun 2/05/22
REPLANTEO GENERAL	1 día	vie 29/04/22	lun 2/05/22
DEMOLICION ANDEN	5 días	lun 2/05/22	vie 6/05/22
DEMOLICION PAVOS DE CONCRETO COSTADO SUR	6 días	lun 2/05/22	vie 6/05/22
EXCAVACION ANDEN	4 días	mar 3/05/22	vie 6/05/22
EXCAVACION MANUAL EN MATERIA COMIN COSTADO ORIENTE	4 días	mar 3/05/22	vie 6/05/22
RELLERO ANDEN	4 días	mar 4/05/22	lun 9/05/22
REDES PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (incluye	4 días	mar 4/05/22	lun 9/05/22
REDES GRANULAR CLASE C (SBS_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO	4 días	mar 4/05/22	lun 9/05/22
REDES ANDEN SUR	2 días	mar 4/05/22	mar 11/05/22
CAJA DE INSPECCION DE 0.6x0.6m (H=0.6m) Incluye Suministro y Construcción Incluye	6 días	mar 4/05/22	mar 11/05/22
CONCRETO SCS PARA REDES (Suministro y Colocación)	6 días	mar 4/05/22	mar 11/05/22
CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLASTICO CON CONCRETO SUMINISTRO F	2 días	mar 5/05/22	lun 9/05/22
CONCRETO ANDEN SUR	3 días	lun 9/05/22	mar 11/05/22
CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 kg/cm2) G	3 días	lun 9/05/22	mar 11/05/22
REDES ANDEN NORTE	4 días	mar 11/05/22	lun 16/05/22
CAJA DE INSPECCION DE 0.6x0.6m (H=0.6m) Incluye Suministro y Construcción Incluye	2 días	mar 11/05/22	lun 16/05/22
CONCRETO SCS PARA REDES (Suministro y Colocación)	2 días	mar 11/05/22	lun 16/05/22
CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLASTICO CON CONCRETO SUMINISTRO F	2 días	jue 12/05/22	lun 16/05/22
IB 14001367	70 días	lun 11/04/22	jue 7/07/22
IB 14001367-CALZADA	40 días	lun 11/04/22	mar 17/05/22
REPLANTEO GENERAL PANT CALZADA	15 días	lun 11/04/22	vie 10/04/22
SUMIDEROS	15 días	vie 29/04/22	mar 17/05/22
REPLANTEO ALANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	15 días	vie 29/04/22	mar 17/05/22
IB 14001367 - ANDEN-SUR	70 días	lun 11/04/22	jue 7/07/22
REPLANTEO GENERAL PANT ANDEN SUR Y NORTE	15 días	lun 11/04/22	vie 10/04/22
REPLANTEO ANDEN-SUR	1 día	mar 18/05/22	mar 18/05/22

[illegible]

REPLANTEO CALZADA	7 dias	jue 16/06/22	mar 29/07/22
REPLANTEO CALZADA PARA REDES (suministro y colocación)	4 dias	jue 16/06/22	
REPLANTEO CALZADA PARA MEDIDOR EN POLIPLASTICO CON CONCRETO SUMINISTRO	3 dias	jue 16/06/22	
CONCRETO ANDEN	3 dias	mar 28/05/22	jue 28/06/22
CONCRETO ANDEN PARA REDES (suministro y colocación)	4 dias	jue 16/06/22	
REPLANTEO ANDEN SUR	1 dia	vie 1/07/22	vie 1/07/22
REPLANTEO ANDEN SUR PARA REDES (suministro y colocación)	4 dias	jue 16/06/22	
DEMOLICION ANDEN	2 dias	vie 1/07/22	vie 6/07/22
DEMOLICION ANDEN SUR PARA REDES (suministro y colocación)	2 dias	jue 16/06/22	vie 6/07/22
EXCAVACION ANDEN	2 dias	vie 6/07/22	vie 8/07/22
EXCAVACION ANDEN SUR PARA REDES (suministro y colocación)	2 dias	jue 16/06/22	vie 8/07/22
REDES ANDEN	3 dias	vie 1/07/22	jue 7/07/22
REDES ANDEN PARA REDES (suministro y colocación)	4 dias	jue 16/06/22	
REDES ANDEN PARA MEDIDOR EN POLIPLASTICO CON CONCRETO SUMINISTRO	3 dias	jue 16/06/22	
CONCRETO ANDEN	1 dia	vie 3/07/22	vie 8/07/22
CONCRETO ANDEN PARA REDES (suministro y colocación)	4 dias	jue 16/06/22	
CONCRETO ANDEN PARA MEDIDOR EN POLIPLASTICO CON CONCRETO SUMINISTRO	3 dias	jue 16/06/22	
CONSOLATA 14001481	41 dias	mar 24/05/22	jue 14/07/22
CONSOLATA 14001481 CALZADA	38 dias	mar 24/05/22	vie 1/07/22
CONSOLATA 14001481 CALZADA PARA REDES (suministro y colocación)	20 dias	mar 24/05/22	
REPLANTEO CALZADA	2 dias	jue 9/06/22	jun 13/06/22
REPLANTEO CALZADA PARA REDES (suministro y colocación)	4 dias	jue 16/06/22	
REPLANTEO CALZADA PARA MEDIDOR EN POLIPLASTICO CON CONCRETO SUMINISTRO	3 dias	jue 16/06/22	
EXCAVACION CALZADA	1 dia	jun 13/06/22	jun 14/06/22
EXCAVACION CALZADA PARA REDES (suministro y colocación)	4 dias	jue 16/06/22	
RELLENO CALZADA	4 dias	mar 14/06/22	vie 1/07/22
RELLENO CALZADA PARA REDES (suministro y colocación)	4 dias	jue 16/06/22	
RELLENO CALZADA PARA MEDIDOR EN POLIPLASTICO CON CONCRETO SUMINISTRO	3 dias	jue 16/06/22	
REDES CALZADA	16 dias	vie 17/06/22	jun 21/07/22
REDES CALZADA PARA REDES (suministro y colocación)	4 dias	jue 16/06/22	
REDES CALZADA PARA MEDIDOR EN POLIPLASTICO CON CONCRETO SUMINISTRO	3 dias	jue 16/06/22	
ASfalto CALZADA	1 dia	vie 17/06/22	mar 21/06/22
ASfalto CALZADA PARA REDES (suministro y colocación)	4 dias	jue 16/06/22	
ASfalto CALZADA PARA MEDIDOR EN POLIPLASTICO CON CONCRETO SUMINISTRO	3 dias	jue 16/06/22	
CONSOLATA 14001481 ANDEN	41 dias	mar 24/05/22	vie 14/07/22
CONSOLATA 14001481 ANDEN PARA REDES (suministro y colocación)	20 dias	mar 24/05/22	
REPLANTEO ANDEN NORTE	1 dia	mar 21/06/22	vie 22/06/22
REPLANTEO ANDEN NORTE PARA REDES (suministro y colocación)	4 dias	mar 21/06/22	
DEMOLICION ANDEN NORTE	3 dias	vie 22/06/22	vie 14/06/22
DEMOLICION ANDEN NORTE PARA REDES (suministro y colocación)	4 dias	jue 16/06/22	
EXCAVACION ANDEN	3 dias	jue 23/06/22	mar 18/06/22
EXCAVACION ANDEN PARA REDES (suministro y colocación)	4 dias	jue 16/06/22	
RELLENO ANDEN	3 dias	jue 30/06/22	mar 5/07/22
RELLENO ANDEN PARA REDES (suministro y colocación)	4 dias	jue 16/06/22	
RELLENO ANDEN PARA MEDIDOR EN POLIPLASTICO CON CONCRETO SUMINISTRO	3 dias	jue 16/06/22	
REDES CALZADA	7 dias	jue 23/06/22	mar 5/07/22
REDES CALZADA PARA REDES (suministro y colocación)	4 dias	jue 16/06/22	
REDES CALZADA PARA MEDIDOR EN POLIPLASTICO CON CONCRETO SUMINISTRO	3 dias	jue 16/06/22	
CONCRETO ANDEN	3 dias	mar 5/07/22	vie 3/07/22
CONCRETO ANDEN PARA REDES (suministro y colocación)	4 dias	jue 16/06/22	
CONCRETO ANDEN PARA MEDIDOR EN POLIPLASTICO CON CONCRETO SUMINISTRO	3 dias	jue 16/06/22	
REPLANTEO ANDEN SUR	1 dia	vie 8/07/22	jue 8/07/22
REPLANTEO ANDEN SUR PARA REDES (suministro y colocación)	4 dias	jue 16/06/22	
DEMOLICION ANDEN	2 dias	sab 9/07/22	mar 12/07/22
DEMOLICION ANDEN SUR PARA REDES (suministro y colocación)	4 dias	jue 16/06/22	
EXCAVACION ANDEN	2 dias	mar 12/07/22	jue 14/07/22
EXCAVACION ANDEN SUR PARA REDES (suministro y colocación)	4 dias	jue 16/06/22	
REDES ANDEN	3 dias	sab 9/07/22	vie 15/07/22
REDES ANDEN PARA REDES (suministro y colocación)	4 dias	jue 16/06/22	
REDES ANDEN PARA MEDIDOR EN POLIPLASTICO CON CONCRETO SUMINISTRO	3 dias	jue 16/06/22	
CONCRETO ANDEN	1 dia	vie 13/07/22	jue 14/07/22
CONCRETO ANDEN PARA REDES (suministro y colocación)	4 dias	jue 16/06/22	
CONCRETO ANDEN PARA MEDIDOR EN POLIPLASTICO CON CONCRETO SUMINISTRO	3 dias	jue 16/06/22	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

REPLANTEO ANDEN ORIENTAL	1 día	jue 23/06/22	jue 23/06/22
CONSTRUCCIÓN DE REDES	3 días	jue 23/06/22	jue 23/06/22
PREFABRICADOS	2 días	jue 23/06/22	mar 28/06/22
DEMOLICION ANDEN	2 días	jue 23/06/22	jue 30/06/22
EXCAVACION ANDEN	2 días	mar 28/06/22	jue 30/06/22
REDES ANDEN	4 días	jue 30/06/22	vie 1/07/22
CONCRETO ANDEN	1 día	vie 1/07/22	vie 1/07/22
REPLANTEO ANDEN OCCIDENTAL	1 día	vie 1/07/22	mar 5/07/22
PREFABRICADOS	2 días	mar 5/07/22	jue 1/07/22
DEMOLICION ANDEN	2 días	jue 1/07/22	vie 8/07/22
EXCAVACION ANDEN	2 días	sáb 9/07/22	mar 12/07/22
REDES ANDEN	4 días	jue 7/07/22	mar 12/07/22
CONCRETO ANDEN	1 día	lun 11/07/22	mar 12/07/22
HOJALDRES 14000178	92 días	lun 11/04/22	mar 5/08/22
HOJALDRES 1400178 CALZADA	92 días	lun 11/04/22	mar 5/08/22
REPLANTEO ANDEN ORIENTAL	1 día	jue 23/06/22	jue 23/06/22
CONSTRUCCIÓN DE REDES	3 días	jue 23/06/22	jue 23/06/22
PREFABRICADOS	2 días	jue 23/06/22	mar 28/06/22
DEMOLICION ANDEN	2 días	mar 28/06/22	jue 30/06/22
EXCAVACION ANDEN	2 días	jue 30/06/22	vie 1/07/22
REDES ANDEN	4 días	mar 28/06/22	vie 1/07/22
CONCRETO ANDEN	1 día	vie 1/07/22	vie 1/07/22
REPLANTEO ANDEN SUR	1 día	vie 1/07/22	mar 5/07/22
PREFABRICADOS	2 días	mar 5/07/22	jue 1/07/22
DEMOLICION ANDEN	2 días	jue 1/07/22	vie 8/07/22
EXCAVACION ANDEN	2 días	sáb 9/07/22	mar 12/07/22
REDES ANDEN	4 días	jue 7/07/22	mar 12/07/22
CONCRETO ANDEN	1 día	lun 11/07/22	mar 12/07/22

[illegible]

~~1358~~
1452



5. Recurso Maquinaria

ACTIVIDADES A REALIZAR	PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL				PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO				PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO				PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO			
	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
SECCION DE INGENIERIA																
ACTIVIDADES A REALIZAR	CONFERENCIA DE LA COMISIÓN				CONFERENCIA DE LA COMISIÓN				CONFERENCIA DE LA COMISIÓN				CONFERENCIA DE LA COMISIÓN			
RESPONSABLE	ING. J. M. GARCIA				ING. J. M. GARCIA				ING. J. M. GARCIA				ING. J. M. GARCIA			
FECHA DE EJECUCION	15/03/71				15/03/71				15/03/71				15/03/71			
FECHA DE CANCELACION																
FECHA DE EVALUACION																
FECHA DE REVISION																
FECHA DE CANCELACION																
FECHA DE EVALUACION																
FECHA DE REVISION																
FECHA DE CANCELACION																
FECHA DE EVALUACION																
FECHA DE REVISION																
FECHA DE CANCELACION																
FECHA DE EVALUACION																
FECHA DE REVISION																
FECHA DE CANCELACION																
FECHA DE EVALUACION																
FECHA DE REVISION																
FECHA DE CANCELACION																
FECHA DE EVALUACION																
FECHA DE REVISION																
FECHA DE CANCELACION																
FECHA DE EVALUACION																
FECHA DE REVISION																
FECHA DE CANCELACION																
FECHA DE EVALUACION																
FECHA DE REVISION																
FECHA DE CANCELACION																
FECHA DE EVALUACION																
FECHA DE REVISION																
FECHA DE CANCELACION																
FECHA DE EVALUACION																
FECHA DE REVISION																
FECHA DE CANCELACION																
FECHA DE EVALUACION																
FECHA DE REVISION																
FECHA DE CANCELACION																
FECHA DE EVALUACION																
FECHA DE REVISION																
FECHA DE CANCELACION																
FECHA DE EVALUACION																
FECHA DE REVISION																
FECHA DE CANCELACION																
FECHA DE EVALUACION																
FECHA DE REVISION																
FECHA DE CANCELACION																
FECHA DE EVALUACION																
FECHA DE REVISION																
FECHA DE CANCELACION																
FECHA DE EVALUACION																
FECHA DE REVISION																
FECHA DE CANCELACION																
FECHA DE EVALUACION																
FECHA DE REVISION																
FECHA DE CANCELACION																
FECHA DE EVALUACION																
FECHA DE REVISION																
FECHA DE CANCELACION																
FECHA DE EVALUACION																
FECHA DE REVISION																
FECHA DE CANCELACION																
FECHA DE EVALUACION																
FECHA DE REVISION																
FECHA DE CANCELACION																
FECHA DE EVALUACION																
FECHA DE REVISION																
FECHA DE CANCELACION																
FECHA DE EVALUACION																
FECHA DE REVISION																
FECHA DE CANCELACION																
FECHA DE EVALUACION																
FECHA DE REVISION																
FECHA DE CANCELACION																
FECHA DE EVALUACION																
FECHA DE REVISION																
FECHA DE CANCELACION																
FECHA DE EVALUACION																
FECHA DE REVISION																
FECHA DE CANCELACION																
FECHA DE EVALUACION																
FECHA DE REVISION																
FECHA DE CANCELACION																
FECHA DE EVALUACION																
FECHA DE REVISION																
FECHA DE CANCELACION																
FECHA DE EVALUACION																
FECHA DE REVISION																
FECHA DE CANCELACION																
FECHA DE EVALUACION																
FECHA DE REVISION																
FECHA DE CANCELACION																
FECHA DE EVALUACION																
FECHA DE REVISION																
FECHA DE CANCELACION																
FECHA DE EVALUACION																
FECHA DE REVISION																
FECHA DE CANCELACION																
FECHA DE EVALUACION																
FECHA DE REVISION																
FECHA DE CANCELACION																
FECHA DE EVALUACION																
FECHA DE REVISION																
FECHA DE CANCELACION																
FECHA DE EVALUACION																
FECHA DE REVISION																
FECHA DE CANCELACION																
FECHA DE EVALUACION																
FECHA DE REVISION																
FECHA DE CANCELACION																
FECHA DE EVALUACION																
FECHA DE REVISION																
FECHA DE CANCELACION																
FECHA DE EVALUACION																
FECHA DE REVISION																
FECHA DE CANCELACION																
FECHA DE EVALUACION																
FECHA DE REVISION																
FECHA DE CANCELACION																
FECHA DE EVALUACION																
FECHA DE REVISION																
FECHA DE CANCELACION																
FECHA DE EVALUACION																
FECHA DE REVISION																
FECHA DE CANCELACION																
FECHA DE EVALUACION																
FECHA DE REVISION																
FECHA DE CANCELACION																
FECHA DE EVALUACION																
FECHA DE REVISION																
FECHA DE CANCELACION																
FECHA DE EVALUACION																
FECHA DE REVISION																
FECHA DE CANCELACION																
FECHA DE EVALUACION																
FECHA DE REVISION																
FECHA DE CANCELACION																
FECHA DE EVALUACION																
FECHA DE REVISION																
FECHA DE CANCELACION																
FECHA DE EVALUACION																
FECHA DE REVISION																
FECHA DE CANCELACION																
FECHA DE EVALUACION																
FECHA DE REVISION																
FECHA DE CANCELACION																
FECHA DE EVALUACION																
FECHA DE REVISION																
FECHA DE CANCELACION																
FECHA DE EVALUACION																
FECHA DE REVISION																
FECHA DE CANCELACION																
FECHA DE EVALUACION			</													

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATIONS
500 5TH AVENUE
NEW YORK 17, N.Y.

[illegible]

~~1381~~
1455



6. Flujo de caja.



1302
1456

C&C-CO137-2019-133

Bogotá D.C., 25 de abril de 2022

Señores

MIRS LATINOAMERICA S.A.S.
NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA
Calle 23F N° 85A - 31
Ciudad

Referencia **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO-137-2019 cuyo objeto es CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES.**

Asunto **SOLICITUD DE REINICIO DEL CONTRATO DE OBRA FDLM-137-2019**

Cordial saludo,

Por medio de la presente, la firma CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S, solicita el reinicio del contrato de obra 137 de 2019 a partir del día 04 de mayo de 2022, teniendo en cuenta el estudio de la propuesta enviada para la culminación de los frentes mediante el oficio C&C-CO137-2019-132 Respuesta Oficio MIRS-MAR-154-2019. RESPUESTA A OFICIO No 20216420854581 -SOLICITUD CONCE-TO JURIDICO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO FRENTE A PROPUESTA PARA CULMINACION DE LOS FRENTES DEL CONTRATO DE OBRA No. 137-2019, Radicado a la interventoría el día 05 de abril del 2022 y aprobada por MIRS LATINOAMERICA S.A.S como Interventor de este contrato mediante el oficio MIRS-MAR-155-2019; AVAL A LA SOLICITUD DE PRORROGA N°3, SOLICITADA POR EL CONTRATISTA DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA CO-137-2019 y radicada al fondo el día 06 de abril del 2022, con No. Radicado2022-641-001958-2.

Para la validación de la prórroga N°3 se hace entrega de la siguiente documentación actualizada: Recurso de Mano de obra, Reorganización y Priorización de las actividades, Recurso de maquinaria, programación de obra y el flujo de caja según las actividades correspondientes para la culminación de los frentes con el objeto contractual y el cual incluye el plazo requerido, correspondiente a ciento veintiún (121) DIAS CALENDARIO.

Cordialmente

JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

Anexo 1: Recurso de Mano de Obra
Anexo 2: Reorganización y Priorización de las Actividades
Anexo 3: Recurso de Maquinaria
Anexo 4: Programación de obra
Anexo 5: Flujo de caja
Anexo 6: Archivo Consultoría y Construcción S.A.S



1363
1457

C&C-CO137-2019-134

Bogota D.C., 25 de abril de 2022

Señores
ETB S.A. E.S.P
DIANA LUCIA ADRADA CORDOBA
Carrera 6 No. 20-70 Piso 1.
Oficina correspondencia ETB
Ciudad

Referencia: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO-137-2019 cuyo objeto es CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE. LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES.**

Asunto: **RESPUESTA DAÑOS INFRAESTRUCTURA RED DE ETB. -VALORACION 7792**

Cordial saludo,

Por medio de la presente, la firma CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S, aclara que los daños perpetrados en la Carrera 19 C por la Calle 1F, por un valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS Y TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$2.392.558.38), no hacen parte de los segmentos de ejecución del contrato de obra de la referencia, por lo tanto solicitamos muy amablemente que soliciten al Fondo de Desarrollo local de Mártires la verificación de la firma constructora, que actualmente se encuentran interviniendo el segmento vial y realizar el cobro pertinente a los daños expuestos.

Cordialmente,

JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

Archivo C.C. / Archivo Consultoría y Construcción S.A.S.
Archivo C.C. / Interventoría MRS LATINOAMERICA S.A.S- Representante Legal: Nick Rorly America Latina
Archivo C.C. / ALCALDIA LOCAL DE MARTIRES- alcalde local de Mártires - Juan Radin Cabarcas Rahmón

Alcantarillado AGUA Y ALCAÑTARILLADO DE BOGOTÁ	COPIA DE ENTRADA	E-2022-036245 AUTORIZACIÓN
--	-------------------------	--------------------------------------

Información de Radicación

CON 8 CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION
AV CRA 7 N 127-48 OF 1006
☐ SI ☒ No

4821681

RESPUESTA TRASLADO RADICADO E-2022-10021678
3333002

3 Si Solicitud
C&C-CO137-2019-135
☐ SI ☒ NO

División Servicio Alcantarillado Zona 3-1
☒ Normal

☐ SI ☒ NO

CON 8 CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

FIRMA

Yudney Karinnier E. Lopez Montenegro

1459
~~1365~~



C&C-CO137-2019-135

Bogotá D.C. 10 mayo de 2022

Señores

ACUEDUCTO DE BOGOTÁ

MIGUEL ANGEL CASALLAS TORRES
Profesional Servicio Alcantarillado Zona 3
Av Calle 24 #37-15
Ciudad

Referencia **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO-137-2019 cuyo objeto es CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES.**

Asunto **RESPUESTA Traslado radicado E-2022-10021678, Sumideros Pluviales eliminados por obras FDLM, con R No.2022-641-002197-2 y traslado por competencia con No R.20226420194951.**

Cordial: saludo,

Por medio de la presente, la firma CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S, aclara que los sumideros pluviales que se encuentran ubicados en la calle 1B entre carrera 27 A y Carrera 28, no fueron eliminados como se expresa en el comunicado del asunto. Los sumideros se encuentran presupuestados tal como se evidencia en el oficio C&C-CO137-2019-126. Propuesta para la culminación de los frentes del contrato de obra No 137-2019, Radicado al Fondo de Desarrollo Local de Mártires-FDLM el día 1 de Diciembre del 2021 con No R 2021-641-006607-2.

Es importante resaltar que el contrato de referencia se encuentra suspendido desde el 16 de septiembre del 2021, el contratista CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S solicitó al FDLM el reinicio del contrato mediante el oficio C&C-CO137-2019-133, Radicado el 25 de abril del 2022, una vez se dé el reinicio por parte del fondo de desarrollo local de Mártires-FDLM, se expedirá un volante a la comunidad, donde se dará la fecha del inicio de las obras y las actividades constructivas que se requieren para la culminación de los presupuestados para este segmento.

Cordialmente

JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

Archivo C&C/ Archivo Consultoría y Construcción S.A.S.

Archivo C&C/ Interventoría MIRS LATINOAMÉRICA S.A.S- Representante Legal-Nick Randy Almeida Gamarra

Archivo C&C/ ALCALDÍA LOCAL DE MARTIRES- Alcaldía local de Mártires Juan Rachif Cabarcas Rahman

Entregado por correo
11/05/2022

S.A.S.

C&C-CO137-2019-136

Bogotá D.C., 17 de mayo de 2022

Señores

ALCALDIA LOCAL DE MARTIRES

Atr: Dr. Juan Rachif Cabarcas Rahman

Alcalde Local de Mártires

Avenida calle 19 No. 28-80, Piso 7

Ciudad

Referencia: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO-137-2019 cuyo objeto es CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES.**

Asunto: **Alcance Oficio C&C-CO137-2019-133; Solicitud de Reinicio del contrato.**

Cordial saludo,

Por medio de la presente, la firma CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. da alcance al oficio C&C-CO137-2019-133; Solicitud de Reinicio del contrato; Para la validación de la prórroga N°3 se hace entrega de la siguiente documentación actualizada: Recurso de Mano de obra, Reorganización y Priorización de las actividades, Recurso de maquinaria, programación de obra y el flujo de caja según las actividades correspondientes para la culminación de los frentes con el objeto contractual y el cual incluye el plazo requerido, correspondiente a ciento veintiún (121) DIAS CALENDARIO.

Cordialmente,

JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

Archivo C/ Archivo Consultoria y Construccion S.A.S.

Archivo C/ Inventario MIRS LATINOAMERICA S.A.S.- Representante Legal-Nick Randy Almeida Gamara

Archivo C/ ALCALDIA LOCAL DE MARTIRES- alcalde local de Martires - Juan Rachif Cabarcas Rahman

Enviado por correo
18/05/2022



BOGOTÁ D.C. 111111

Bogotá D.C., 18 de mayo de 2022

C&C-CO137-2019-137

Señores

MIRS LATINOAMERICA S.A.S.

Ing. NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA

Calle 23F N° 85A - 31

Ciudad

Referencia: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO-137-2019 cuyo objeto es CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES.**

Asunto: **INFORME DE SALDO DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 137-2019**

Cordial saludo,

Por medio de la presente, remitimos el informe del saldo del anticipo actualizado del contrato de obra de la referencia, para su conocimiento

Quedamos atentos a cualquier observación de su parte.

Cordialmente,

JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

ANEXO: INFORME DE FIDUCIA

Archivo C:/ Archivo Consultoría y Construcción S.A.S.

1462

~~1368~~



Alianza Fiduciaria
Remitente : NIDIA ISBBETH CARO ALBARRACIN
Destinatario : FIDEICOMISO CON A CON-MARTIRES 2
83829380
Fecha : 2021-04-23

FIDEICOMISO CON A CON-MARTIRES 2

R

010334 - FIDEICOMISO CON A CON-MARTIRES 2 (area 1170572)

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

(+57 1) 6447700

FIDEICOMISO CON & CON MARTIRES 2

Carrera 15 No. 62-95

Bogotá D.C. - Colombia

RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS - FIDEICOMISO CON & CON-MARTIRES 2

Periodo Informado: 2 de enero 2020 al 30 de marzo 2021

Código del Negocio: 1010334 - 391080

Nombre del Negocio: FIDEICOMISO CON & CON-MARTIRES 2

Ciudad de atención: BOGOTÁ

Director (a) de Gestión a Cargo: ELIZABETH CAMARGO CAMARGO
Tel (+57 1) 6447700
Correo electrónico: ecamargo@alianza.com.co

Director(a) Comercial a Cargo: NIDIA ISBBETH CAPO ALBARRACIN
Tel (+57 1) 6447700
Correo electrónico: ncapo@alianza.com.co

Estado del Negocio: LIQUIDADO

RENDICIÓN COMPROBADA DE CUENTAS

El objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 3 del artículo 1234 y numeral 4 del artículo 1236 del Código de Comercio y en concordancia con lo instruido en la Circular Externa 007 de 2017 que modificó la Circular Básica Jurídica, la Circular Básica Contable y la Circular de la Superintendencia Financiera de Colombia, a continuación presentamos la siguiente rendición de cuentas:

Por lo tanto, se comunicamos que la presente rendición comprobada de cuentas se adjunta en los soportes y documentos que comprueban la veracidad de la información. Los soportes documentales que acreditan las diversas actuaciones de la fiduciaria están a su disposición en nuestras oficinas en caso de requerir la verificación o revisión física de tales documentos. Para consultar las Direcciones de nuestras oficinas en la página de internet www.alianza.com.co, haciendo clic a la opción Servicio al cliente/oficina.

1. RESUMEN DEL NEGOCIO FIDUCIARIO**1.1 Constitución del negocio**

Forma jurídica: FIDUCIA MERCANTIL

Fecha: 02/01/2020

Constituido Mediante: DOCUMENTO PRIVADO

Escritura No: NO APLICA

Notaría: NO APLICA

1464
~~1340~~

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

FIDEICOMISO UN & CON MARTIRES S

01-57-1644700

Carrera 14 No. 52 No.

Bogotá D.C. Colombia

1.4 Puntos del contrato

1.4.1 Fideicomitentes

Fideicomitentes	Porcentaje
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S	100%

1.5 Beneficiarios

Los beneficiarios del negocio fiduciario las personas jurídicas y naturales que están actualmente registradas en las bases de datos de Alianza Fiduciaria S.A

Beneficiarios	Porcentaje
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S	100%

1.6 Acreedores garantizados y estado de las garantías

A la fecha de corte de la presente rendición de cuentas, el negocio fiduciario no tiene Acreedores garantizados

1.7 Cesionarios de los beneficios

A la fecha de corte de la presente rendición de cuentas no se han registrado cesionarios de los beneficios diferentes a los beneficiarios del numeral 1.5.2

1.8 Estado de las condiciones suspensivas o resolutorias que afectan la adquisición o pérdida de los derechos

A la fecha de corte, este negocio no presenta Condiciones suspensivas o resolutorias

2. ESTADO ACTUAL, LOCALIZACION E IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, el FIDEICOMISO UN & CON MARTIRES S no posee bienes inmuebles.

Los recursos líquidos del fideicomiso se administran en los siguientes productos financieros

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

FIDEICOMISO CON & CON-MARTIRES 2

Tel: (+57 3) 6447700

Carrera 15 No. 62-49

Bogotá D.C. Colombia

valididad administrativa, o la nulidad del Contrato de Obra. En este caso, el FIDEICOMITENTE(S) autoriza irrevocablemente a la Fiduciaria mediante la firma del presente Contrato de Fideicomiso Mercantil a entregar los recursos del Anticipo, así como los remanentes que conforman el Patrimonio Autónomo a la Entidad Estatal.

No delegar en ninguna persona, ni en otra sociedad fiduciaria sus deberes y obligaciones.

Proteger y defender los bienes que le hayan sido entregados por concepto de Anticipo contra cualquier acto de terceros o del FIDEICOMITENTE(S), así como las obligaciones previstas en el artículo 1224 del Código de Comercio Colombiano.

Pedir instrucciones al Superintendente Financiero cuando tenga fundadas dudas acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones o deba apartarse de las autorizaciones contenidas en el acto constitutivo, cuando así lo exijan las circunstancias.

Llevar la contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia.

Informar mensualmente al FIDEICOMITENTE(S) y a la Entidad Estatal sobre la situación financiera o estado de cuenta de los recursos del Patrimonio Autónomo, para lo cual dentro de los quince (15) primeros días de cada mes, debe presentar una relación detallada de los recursos del Patrimonio Autónomo que son administrados de acuerdo a la finalidad de este contrato, las inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros, y/o traslados realizados.

Rendir al FIDEICOMITENTE(S) cuentas comprobadas de su gestión cada seis (6) meses contados a partir de la celebración del presente contrato, así como a la terminación del FIDEICOMISO. Dicha rendición de cuentas deberá ser presentada y enviada al correo electrónico suministrado por el FIDEICOMITENTE(S) dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha del corte que se está informando, de conformidad con lo establecido en la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera).

3.2 Gestión y Ejecución Particular del Negocio Fiduciario

Durante el periodo objeto de la presente Rendición de cuentas, se presentó la siguiente gestión y ejecución particular del negocio fiduciario:

El día 21 de enero de 2020 mediante radicado número B2954545, Alianza remitió contrato de fiducia debidamente suscrito, junto con tarjetas de firmas para registrar las personas

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

FIDELCOMISO CON MARTÍNEZ

Tel: (+57 1) 6447700

Carrera 15 No. 82-99

Bogotá D.C., Colombia

El día 22 de julio de 2020 mediante radicado B3197840, Alianza remitió a los fideicomitantes rendición de Cuentas Semestral del periodo enero - junio de 2020.

El día 10 de agosto de 2020 mediante radicado B3231960, Alianza remitió a los fideicomitantes el informe mensual correspondiente al mes de julio de 2020.

El día 11 de septiembre de 2020 mediante radicado B3296016, Alianza remitió a los fideicomitantes el informe mensual correspondiente al mes de agosto de 2020.

El día 24 de septiembre de 2020 mediante radicado número B3322484, el fideicomitente remitió (Oficio No. 1) reprogramación del plan de inversión por el valor desembolsado por la entidad estatal a título de anticipo, el mismo por valor de \$1.407.756.547.60, debidamente suscrito por el fideicomitente e interventor (MIRS LATINOAMERICA)

El día 02 de octubre de 2020 mediante radicado B3362567, Alianza remitió a los fideicomitantes el informe mensual correspondiente al mes de septiembre de 2020.

El día 15 de octubre de 2020 mediante radicado número B3370932, Alianza remitió al fideicomitente la certificación de rendimientos del fideicomiso del periodo junio - septiembre 2020.

El día 19 de octubre de 2020 mediante radicado número B3377405, el fideicomitente remitió al oficio solicitando la liquidación del fideicomiso y adjuntando certificación bancaria del fideicomitente para el reintegro de remanentes de sus aportes (si hubieren).

El día 6 de noviembre de 2020 y en atención a la solicitud de liquidación del fideicomitente, se prerancela el fondo gobierno 58030003810-5 adscrito al fideicomiso.

El día 9 de noviembre de 2020 mediante radicado número B3424713, Alianza remitió al fideicomitente la certificación de rendimientos del periodo junio - noviembre 2020 por valor total de \$30.873.526.49, solicitando el recibo de pago para proceder con el reintegro de los mismos a la Entidad Estatal.

El día 10 de noviembre de 2020 mediante radicado B3443469, Alianza remitió a los fideicomitantes el informe mensual correspondiente al mes de octubre de 2020.

El día 10 de diciembre de 2020 mediante radicado B3542756, Alianza remitió a los fideicomitantes el informe mensual correspondiente al mes de noviembre de 2020.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

FIDEICOMISO CON & CON-MARTIRES 2

Teléfono: 6447700

Calle 15 No. 62-99
Bogotá D.C., Colombia

4. CUENTAS POR PAGAR A ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

A la fecha de corte, este negocio no presenta Cuentas por pagar pendientes a Alianza Fiduciaria S.A.

5. ORGANOS DE ADMINISTRACION Y/O CONTROL

5.1 Comité

El contrato de fiducia mercantil no contempla órganos de gobierno como Comité.

5.2 Junta

El contrato de fiducia mercantil no contempla órganos de gobierno como Junta.

5.3 Asamblea

El contrato de fiducia mercantil no contempla órganos de gobierno como Asamblea.

6. INFORME FINANCIERO

6.1 Evolución de los aportes y del patrimonio del negocio fiduciario

Tipo	Anticipo	Traslado GMF	Total Aportes
Aportes del Fideicomitente	\$ 1,497,756,548.00	\$ 6,139,000.00	\$ 1,503,895,548.00

Movimiento registrado en la Cuentas Aportes en Dinero de los estados financieros del fideicomiso, cuyo saldo al cierre del periodo objeto de rendición es \$0.00.

6.2 Fuentes y usos de los recursos

A la fecha de corte de la presente rendición de cuentas, la fuente de los recursos del negocio fiduciario proviene del Anticipo desembolsado por la Entidad Estatal y Aportes del Fideicomitente para cubrir gravamen al movimiento financiero.

Recursos ejecutados de acuerdo con las instrucciones del fideicomitente y previa aprobación del interventor.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

FIDEICOMISO CON & CON MARTIRES 2

Tel: (+57) 313 6447700

Carrera 15 No. 62-94
Bogotá D.C., Colombia

6.2.1 Partidas pendientes por identificar

Al cierre del periodo objeto de la presente Rendición Final de cuentas no se presentan partidas pendientes por identificar.

6.2.5 Gestiones realizadas para su identificación

A la fecha de corte de la presente Rendición Final de Cuentas no se presentan partidas pendientes por identificar, por tanto no se realizó gestión de identificación.

6.3 Créditos

6.3.1 Tipo crédito contratado, garantías otorgadas y relación de beneficiarios

En desarrollo del negocio fiduciario se informa que no tiene Créditos Registrados

6.3.2 Informe sobre estado de cada una de las obligaciones

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, indicamos que el negocio fiduciario no tiene créditos registrados.

7. TERCEROS VINCULADOS AL NEGOCIO FIDUCIARIO

En desarrollo del fideicomiso no se presentaron terceros vinculados al negocio fiduciario.

8. ESTADO DE LA COMISIÓN FIDUCIARIA

Durante el periodo correspondiente a esta Rendición de Cuentas, el negocio fiduciario presentó las siguientes causaciones de comisiones fiduciarias:

391080 - FIDEICOMISO CON & CON-MARTIRES 2				
Periodo	Tercero de Facturación	Factura	Valor	Estado
enero 2020	830041411	519951	\$ 522,593	Pagada
junio 2020	830041411	550555	\$ 1,044,586	Pagada
junio 2020	830041411	554745	\$ 1,044,536	Pagada
agosto 2020	830041411	571539	\$ 1,044,536	Pagada
septiembre 2020	830041411	579258	\$ 1,044,586	Pagada

1469
1375

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

FIDEICOMISO CON & CON MARTIRES 2

Tel: (+57) 3 6447700

Carrera 15 No. 67-94
Bogotá D.C., Colombia

Fondo	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-2021*
FONDO DE INVERSIÓN ALIANZA	0.216%	0.222%	0.285%	0.183%	0.210%	0.231%
FONDO DE INVERSIÓN ALIANZA	0.110%	0.106%	0.249%	0.174%	0.203%	0.211%
FONDO DE INVERSIÓN	0.210%	0.202%	0.110%	0.171%	0.177%	0.207%

10.4 Rentabilidad del portafolio y comportamiento durante el periodo reportado, expresadas en términos efectivos anuales

La información correspondiente a la rentabilidad y comportamiento del portafolio del Fondo de Inversión Colectivo puede ser consultada en la página Web: <https://www.alianza.com.co/rentabilidades> y adicionalmente puede ser visualizada en los extractos en la sección Rentabilidad Histórica (E.A).

11. ANEXOS

- a. Flujo de Caja al 30/03/2021
- b. Estados financieros al 30/03/2021
- c. Extractos de cuentas asociados al negocio 30/03/2021

d. Extractos de Fondo de Inversión Colectiva*

*Los Extractos de los Fondos de Inversión Colectiva correspondientes a los encargos a nombre del negocio fiduciario, pueden ser descargados a través del portal "Mi Finiera" iniciando sesión en el siguiente enlace <https://www.alianzaenlinea.com.co/>

Para realizar la descarga de sus extractos una vez haya iniciado sesión en [alianzaenlinea.com.co](https://www.alianzaenlinea.com.co) haga clic en sección "documentos" y seleccione "Extractos de Fondo de Inversión". También puede descargarlos en la sección "Movimientos Inversiones" haciendo clic en "Gestionar Extracto".

Si usted no es usuario y no tiene acceso:

- Persona Natural: Realice el auto registro en nuestra página web en el siguiente enlace: <https://www.alianzaenlinea.com.co/n/#/register>

- Persona Jurídica: Contacte a su Director Comercial o Director de Gestión para realizar el proceso de registro

El cumplimiento de lo dispuesto en las Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo - SARLAFT contenidas en la Parte I del

1470

1376

FIDELCOMISO CON & CON-MARTIRES 2

Origen del Fondo	444.706.144,00
Hasta el Fondo	64.000.000,00
Fecha Inicial	23.12.2011
Fecha Final	23.12.2012

Fecha	Monto	Id. Benef.	Beneficiario	Ingreso	Egreso	Acumulado
2012/01/23	APORTE - INICIAL	391080	FIDELCOMISO CON & CON-MARTIRES 2	\$ 1.270.000,00		\$ 1.270.000,00
2012/02/23	APORTE - INICIAL	391080	FIDELCOMISO CON & CON-MARTIRES 2	\$ 1.554.741,34		\$ 2.824.741,34
2012/03/23	APORTE - INICIAL	391080	FIDELCOMISO CON & CON-MARTIRES 2	\$ 1.527.898,40		\$ 4.352.639,74
2012/04/23	RENTAS	391080	FIDELCOMISO CON & CON-MARTIRES 2	\$ 204.425,07		\$ 4.557.064,81
2012/05/23	RENTAS	70061961	SOLUCIONES AVANZADAS DE INGENIERIA		\$ 122.700,00	\$ 4.434.364,81
2012/06/23	RENTAS	70061961	SOLUCIONES AVANZADAS DE INGENIERIA		\$ 547.200,00	\$ 3.887.164,81
2012/07/23	RENTAS	70100599	COMPAÑIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL COLOMBIANA SAS		\$ 1.120.000,00	\$ 2.767.164,81
2012/08/23	RENTAS	70100599	COMPAÑIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL COLOMBIANA SAS		\$ 22.000,00	\$ 2.547.164,81
2012/09/23	RENTAS	70100599	COMPAÑIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL COLOMBIANA SAS		\$ 20.000,00	\$ 2.347.164,81
2012/10/23	RENTAS	70100599	COMPAÑIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL COLOMBIANA SAS		\$ 500.000,00	\$ 1.847.164,81
2012/11/23	RENTAS	70100599	COMPAÑIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL COLOMBIANA SAS		\$ 1.000,00	\$ 847.164,81
2012/12/23	RENTAS	391080	FIDELCOMISO CON & CON-MARTIRES 2	\$ 3.125.000,00		\$ 1.172.164,81
2013/01/23	RENTAS	391080	FIDELCOMISO CON & CON-MARTIRES 2	\$ 2.250.000,00		\$ 3.422.164,81
2013/02/23	RENTAS	391080	FIDELCOMISO CON & CON-MARTIRES 2	\$ 1.000.000,00		\$ 4.422.164,81
2013/03/23	RENTAS	70061961	SOLUCIONES AVANZADAS DE INGENIERIA		\$ 1.000.000,00	\$ 3.422.164,81
2013/04/23	RENTAS	70061961	SOLUCIONES AVANZADAS DE INGENIERIA		\$ 1.000.000,00	\$ 2.422.164,81
2013/05/23	RENTAS	70100599	COMPAÑIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL COLOMBIANA SAS		\$ 10.000,00	\$ 2.312.164,81
2013/06/23	RENTAS	453226	COMUNICACIONES LUIS FARRER		\$ 1.000.000,00	\$ 1.312.164,81
2013/07/23	RENTAS	453226	COMUNICACIONES LUIS FARRER		\$ 1.000.000,00	\$ 312.164,81
2013/08/23	RENTAS	453226	COMUNICACIONES LUIS FARRER		\$ 1.000.000,00	\$ 1.312.164,81
2013/09/23	RENTAS	453226	COMUNICACIONES LUIS FARRER		\$ 1.000.000,00	\$ 312.164,81
2013/10/23	RENTAS	453226	COMUNICACIONES LUIS FARRER		\$ 1.000.000,00	\$ 1.312.164,81
2013/11/23	RENTAS	453226	COMUNICACIONES LUIS FARRER		\$ 1.000.000,00	\$ 312.164,81
2013/12/23	RENTAS	453226	COMUNICACIONES LUIS FARRER		\$ 1.000.000,00	\$ 1.312.164,81
2014/01/23	RENTAS	453226	COMUNICACIONES LUIS FARRER		\$ 1.000.000,00	\$ 312.164,81
2014/02/23	RENTAS	453226	COMUNICACIONES LUIS FARRER		\$ 1.000.000,00	\$ 1.312.164,81
2014/03/23	RENTAS	453226	COMUNICACIONES LUIS FARRER		\$ 1.000.000,00	\$ 312.164,81
2014/04/23	RENTAS	453226	COMUNICACIONES LUIS FARRER		\$ 1.000.000,00	\$ 1.312.164,81
2014/05/23	RENTAS	453226	COMUNICACIONES LUIS FARRER		\$ 1.000.000,00	\$ 312.164,81
2014/06/23	RENTAS	453226	COMUNICACIONES LUIS FARRER		\$ 1.000.000,00	\$ 1.312.164,81
2014/07/23	RENTAS	453226	COMUNICACIONES LUIS FARRER		\$ 1.000.000,00	\$ 312.164,81
2014/08/23	RENTAS	453226	COMUNICACIONES LUIS FARRER		\$ 1.000.000,00	\$ 1.312.164,81
2014/09/23	RENTAS	453226	COMUNICACIONES LUIS FARRER		\$ 1.000.000,00	\$ 312.164,81
2014/10/23	RENTAS	453226	COMUNICACIONES LUIS FARRER		\$ 1.000.000,00	\$ 1.312.164,81
2014/11/23	RENTAS	453226	COMUNICACIONES LUIS FARRER		\$ 1.000.000,00	\$ 312.164,81
2014/12/23	RENTAS	453226	COMUNICACIONES LUIS FARRER		\$ 1.000.000,00	\$ 1.312.164,81

1472

1378

Enviado por correo
24/05/2022



CON & CON

C&C-CO137-2019-138

Bogotá D.C., 24 de mayo de 2022

Señores

ALCALDIA LOCAL DE MARTIRES

Attn: Dr. Juan Rachif Cabarcas Rahman

Alcalde Local de Mártires

Avenida calle 19 No. 28-80, Piso 7

Ciudad

Referencia: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO-137-2019 cuyo objeto es CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES.**

Asunto: **OFICIO INFORMATIVO- ACTUALIZACION DE POLIZAS**

Cordial saludo,

Por medio de la presente informamos que para realizar la actualización de las pólizas de la REACTIVACIÓN No. 4 - PRORROGA No. 3 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 137 – 2019, la aseguradora solicita que el FDLM informe que la Suspensión No. 4 de fecha del 16 de septiembre de 2021 hasta el 16 mayo de 2022 equivalen a (240 días) y no a los (30 días) que se encuentra en el documento.

Quedamos atentos a la aclaración por parte de ustedes para continuar con el trámite correspondiente.

Cordialmente,

JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

Archivo C.C./ Archivo Consultoría y Construcción S.A.S.

Archivo C.C./ Interventoría MIRS LATINOAMERICA S.A.S.- Representante Legal-Nick Randy Almeida Gamara

1473

Enviado por correo
26/05/2022

1379



NIT 830.041.411-0

C&C-CO137-2019-139

Bogotá D.C., 26 de mayo de 2022

Señores

MIRS LATINOAMERICA S.A.S.

Ing. NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA

Calle 23F N° 85A – 31

Ciudad

Referencia: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO-137-2019 cuyo objeto es CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES.**

Asunto: **ACTUALIZACIÓN HOJAS DE VIDA-CTO 137-2019**

Cordial saludo,

Dando alcance al oficio MIRS-MAR-163-2019, Numeral 2, "*Actualización de las hojas de vida de los profesionales del contrato de obra.*", nos permitimos entregar las siguientes hojas de vida, que corresponden al reinicio N° 4, prórroga N° 3 del contrato COP 137-2019.

1. DIRECTOR DE OBRA.
2. RESIDENTE AMBIENTAL
3. RESIDENTE SOCIAL.

Quedamos atentos a cualquier observación de su parte.

JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

ANEXO: (23)FOLIOS

Archivo C.C// Archivo Consultoría y Construcción S.A.S.

1474
1385

ANEXO N° 13
RELACION DE EXPERIENCIA PERSONAL PROFESIONAL CLAVE Y CARTA DE COMPROMISO

CARGO PROPUESTO:	DIRECTOR DE OBRA
NOMBRES Y APELLIDOS:	VICTOR MANUEL ARIZA ACOSTA
TIPO Y N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	79.653.718 DE BOGOTA

ESTUDIOS REALIZADOS

DESCRIPCION	UNIVERSITARIOS	ESPECIALIZACIÓN	OTROS
TITULO OBTENIDO	INGENIERO CIVIL	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS	
INSTITUCIÓN	UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA	UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA	
FECHA DE GRADO	29/08/1997	28/06/2012	

No. TARJETA PROFESIONAL (Si se requiere): 25202-68050CND


EXPERIENCIA

ENTIDAD CONTRATANTE	FUNCIONES	CARGO DESEMPEÑADO	FECHA INICIO (DÍA-MES-AÑO)	FECHA TERMINACIÓN (DÍA-MES-AÑO)	EXPERIENCIA EN MESES
CON & CON		DIRECTOR DE OBRA	01-jul-14	31-jul-15	13,17
CON & CON		DIRECTOR DE OBRA	01-ago-15	29-feb-16	7,07
CON & CON		DIRECTOR DE OBRA	14-ene-10	26-abr-10	3,40
TIEMPO DE EXPERIENCIA HABILITANTE CERTIFICADA EN AÑOS					1,97

CARTA COMPROMISO

YO, **VICTOR MANUEL ARIZA ACOSTA** identificado con c.c. 79.653.718 acepto ser presentado por la empresa CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. - CON & CON como DIRECTOR DE OBRA dentro de la ejecución del contrato 137 de 2019 que tiene como objeto: **CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE POR MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO Y LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE LA MALLA VIAL Y DEL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES**, de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica y sus anexos. Por lo que me comprometo a formar parte del equipo de trabajo durante el plazo que dure el contrato con una dedicación del 50% para la ejecución del mismo.

Para constancia se firma a los 23 días del mes de mayo de 2022.



FIRMA PROFESIONAL

NOTA: Se deben anexar los siguientes documentos:

* Fotocopia del diploma o acta de grado

* Documento donde se certifique la terminación de materias (para contabilización de experiencia profesional en los casos en que aplique)

* Fotocopia de la tarjeta profesional con fecha de expedición o certificación donde conste la fecha de la expedición.

* Fotocopia de la convalidación del título (para títulos otorgados en el exterior)

* Fotocopia del documento de identificación

* Tarjeta profesional (cuando aplique)

* Certificaciones laborales que acrediten la experiencia requerida y demás documentos solicitados según el pliego de condiciones y sus anexos.




CERTIFICA

El Ingeniero **VICTOR MANUEL ARIZA ACOSTA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.653.718 de Bogotá D.C., y Tarjeta profesional No. 25202-68050 CND, trabajo para esta empresa y se desempeñó como **DIRECTOR DE OBRA** para los siguientes contratos:

No. Del Contrato	Objeto del contrato	Entidad Contratante	Fecha de iniciación	Fecha de finalización
102 de 2003	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA ARTICULADA CALLE 1E ENTRE CARRERAS 6 Y 7 DEL MUNICIPIO DE TENJO - CUNDINAMARCA.	MUNICIPIO DE TENJO	23-dic-2003	23-mar-2004
080 de 2003	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ANDENES PEATONALES PARA CHURUGUACO ALTO-SECTOR CEMENTERIO, EN EL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA.	MUNICIPIO DE TENJO	15-sep-2003	28-dic-2003
337 de 2008	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA QUE UNE LA AUTOPISTA NORTE CON EL COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL EN LA VEREDA VERGANZO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ ETAPA 1.	MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	10-feb-2009	13-ene-2010
014 de 2008	ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA Y ANDENES DE LA CARRERA SEXTA (6) ENTRE CALLES PRIMERA (1) Y OCTAVA (8) Y INTERVENCIÓN "PLAZA EL CHORRO" (VÍAS Y ANDENES CIRCUNDANTES) DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ (FASE I).	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ	14-ene-2010	26-abr-2010

La presente certificación se expide a los 26 días del mes de noviembre de 2010.

Cordialmente,


JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal

1476
1302

ANEXO N° 13
RELACION DE EXPERIENCIA PERSONAL PROFESIONAL CLAVE Y CARTA DE COMPROMISO

CARGO PROPUESTO	RESIDENTE AMBIENTAL
NOMBRES Y APELLIDOS	CESAR AUGUSTO FONSECA GASCA
TPO Y N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CC 12235424

ESTUDIOS REALIZADOS

DESCRIPCION	UNIVERSITARIOS	ESPECIALIZACIÓN	OTROS
TÍTULO OBTENIDO	INGENIERO CIVIL	ESPECIALIZACION EN	
INSTITUCION	UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA	ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL URBANA	
FECHA DE GRADO	25/03/1998		

No TARJETA PROFESIONAL (Si se requiere) 2520274546 CND

EXPERIENCIA

ENTIDAD CONTRATANTE	FUNCIONES	CARGO DESEMPEÑADO	FECHA INICIO (DIA-MES-AÑO)	FECHA TERMINACION (DIA-MES-AÑO)	EXPERIENCIA EN MESES
CONSORCIO ANILLO VIAL		ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL URBANA	2-nov-10	20-dic-11	23.60
CONSORCIO LAS VUELTAS		ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL URBANA	28-oct-13	30-ene-14	10.83

TIEMPO DE EXPERIENCIA HABILITANTE CERTIFICADA EN AÑOS

2.87

CARTA COMPROMISO

YO, CESAR AUGUSTO FONSECA GASCA, identificado con c.c. 12.235.424, acepto ser presentado por la empresa CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S como RESIDENTE AMBIENTAL dentro de la ejecución del contrato 137-2019 que tiene como objeto CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES. Por lo que me comprometo a formar parte del equipo de trabajo durante el plazo que dure el contrato con una dedicación del 40% para la ejecución del mismo.

Para constancia se firma a los 25 días del mes de mayo de 2022


FIRMA PROFESIONAL

1477
13-03

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 12.235.424

FONSECA GASCA

APELLIDOS

CESAR AUGUSTO

NOMBRES

[Handwritten signature]



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-JUN-1970

PITALITO
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74

ESTATURA

B+

G.S. RH

M

SEXO

25-NOV-1988 PITALITO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARNE SANDOZ TORRES



A 1503100-00254796-M 0012235424-20100910

0023855614A 1

1900918856



En nombre de la República de Colombia y
por autorización del Ministerio de Educación

La Universidad de San Juan de los Rios

en virtud de que

César Augusto Fonseca

C.C. 12.255.424 Pilalito, Huila

ha terminado los estudios y cumplido los demás requisitos académicos
exigidos por la ley y los estatutos universitarios, le confiere el título de

Ingeniero Civil

En testimonio, se expide el presente **Diploma**, firmado y sellado
con el sello mayor de la Universidad, en Santafé de Bogotá, el
día 26 de Marzo del año de 1996.

Expediente
F. Rector



Suministrado
El Decano

Secretario General

Registrado bajo oficio 1136

Actado al Folio 1136 del Libro 1136

Firma del Titular

Santafé de Bogotá, D.C. a 20 de Mayo de 1996

1479

LA CORPORACION

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

RECONOCIDA POR EL GOBIERNO NACIONAL Y LOS GOBIERNOS DE LOS DEPARTAMENTOS Y DISTRITO CAPITAL

CONFIERE EL TÍTULO DE

Especialista en Gestión Ambiental Urbana

A

César Augusto Fonseca Basca

CEDULA DE E. N.º 12235.424 EXPEDIDA EN Bogotá

QUIEN CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS ACADÉMICOS EXIGIDOS POR LA
UNIVERSIDAD, EN TESTIMONIO DE ELLO OTORGA EL PRESENTE DIPLOMA

EN LA CIUDAD DE Bogotá, EL DÍA 3 DEL MES DE Octubre DEL AÑO 2008

PROFESOR DE LA CORPORACION

SECTOR DE LA UNIVERSIDAD

DE AN. OF. A. P. 114

SECRETARÍA GENERAL DE LA CORPORACION

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

CALLE 13 N.º 107

BOGOTÁ, D. C.

TEL. 281 10 272

FAX 281 10 106


0731

1479
1385

1480

480
1300

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

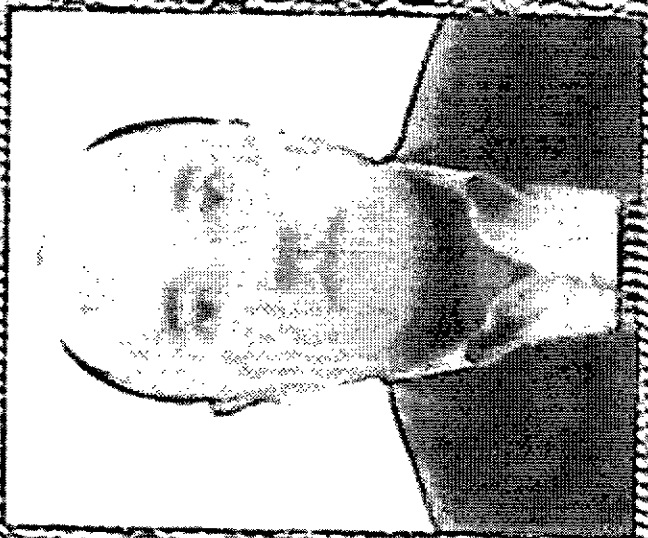

MATRÍCULA PROFESIONAL
262027418 CIVIL
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 23/11/1998
CESAR AUGUSTO
FONSECA GASCA
C.C. 12236194
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA



PRESIDENTE DEL CONSEJO

1481
~~1307~~



Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1362739

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que CESAR AUGUSTO FONSECA GASCA, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 12235424, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-74546 desde el 23 de Noviembre de 1998, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1403.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veinticinco (25) días del mes de Mayo del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firma del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas, la falta de firma del titular no invalida el Certificado.
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicando el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSORCIO ANILLO VIAL **900.371.196-0**

CERTIFICA:

Al Ingeniero CESAR AUGUSTO FONSECA GASCA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12 235 424 de Pitalito, y Paralelo consorcio No. 25202-74546 CND, desempeño sus labores como Esp. En Gestión de Proyectos, en el proyecto:

No. 147/2010
AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL
VERGANZO PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCO IPA
NOVIEMBRE 2 DE 2010
\$ 9.489.820.184
DICIEMBRE 20 DE 2011

Se presente certificación a los quince (15) días del mes de julio de 2011


RICARDO RUIZ
PRESIDENTE DEL CONSORCIO ANILLO VIAL

1433
~~1389~~

CONSORCIO LAS VUELTAS
NIT. 900.657.445-9


CERTIFICA

Que el Ingeniero CESAR AUGUSTO FONSECA GASCA identificado con cedula de ciudadanía No. 12.235.424 y tarjeta profesional No. 25202-74546 de Cundinamarca se desempeñó como ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL URBANA para:

No. Del Contrato	Objeto del contrato	Entidad Contratante	Fecha de iniciación del contrato	Fecha de aproximada terminación
007-2013	Mantenimiento y mejoramiento de la via las vueltas en el municipio de Cajicá - departamento de Cundinamarca en virtud del convenio no. 1620 suscrito con el Invias.	Municipio de Cajicá	Octubre 28 de 2013	Enero 30 de 2014

La presente certificación se expide a los 03 dias del mes de febrero de 2014.

Cordialmente,


LUIS CARLOS SANCHEZ JIMENEZ
Representante Legal

1484
1390

ANEXO N° 13
RELACION DE EXPERIENCIA PERSONAL PROFESIONAL CLAVE Y CARTA DE COMPROMISO

CARGO PROPUESTO:	RESIDENTE SOCIAL
NOMBRES Y APELLIDOS:	MONICA PATRICIA MURCIA ANDRADE
TIPO Y N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	CC 52.254.239

ESTUDIOS REALIZADOS

DESCRIPCION	UNIVERSITARIOS	ESPECIALIZACIÓN	OTROS
TITULO OBTENIDO	TRABAJADORA SOCIAL		
INSTITUCIÓN	UNIVERSIDAD DE LA SALLE		
FECHA DE GRADO	18/10/2002		

No. TARJETA PROFESIONAL (Si se requiere):


EXPERIENCIA

ENTIDAD CONTRATANTE	FUNCIONES	CARGO DESEMPEÑADO	FECHA INICIO (DÍA-MES-AÑO)	FECHA TERMINACIÓN (DÍA-MES-AÑO)	EXPERIENCIA EN MESES
UNION TEMPORAL VIAS CANDELARIA 2015		RESIDENTE SOCIAL	08-mar-16	15-jun-16	3.30
CONSORCIO VIAS URIBE		RESIDENTE SOCIAL	13-jun-16	26-dic-16	6.53
					-
TIEMPO DE EXPERIENCIA HABILITANTE CERTIFICADA EN AÑOS					0,82

CARTA COMPROMISO

Yo MONICA PATRICIA MURCIA ANDRADE identificada con c.c. 52.254.239 acepto ser presentada por la empresa CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. - CON & CON como RESIDENTE SOCIAL dentro de la ejecución del contrato 137 de 2019 que tiene como objeto: **CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES**, Por lo que me comprometo a formar parte del equipo de trabajo durante el plazo que dure el contrato con una dedicación del 60% para la ejecución del mismo.

Para constancia se firma a los 23 días del mes de mayo de 2022.


FIRMA PROFESIONAL

NOTA: Se deben anexar los siguientes documentos:

- * Fotocopia del diploma o acta de grado
- * Documento donde se certifique la terminación de materias (para contabilización de experiencia profesional en los casos en que aplique)
- * Fotocopia de la tarjeta profesional con fecha de expedición o certificación donde conste la fecha de la expedición
- * Fotocopia de la convalidación del título (para títulos otorgados en el exterior)
- * Fotocopia del documento de identificación
- * Tarjeta profesional (cuando aplique)
- * Certificaciones laborales que acrediten la experiencia requerida y demás documentos solicitados según el pliego de condiciones y sus anexos.

1485
1301

CONSORCIO VIAS URIBE
NIT.900.924.935-1

LA COORDINADORA DE GESTION HUMANA DE
CONSORCIO VIAS URIBE
NIT. 900.924.935-1


CERTIFICA

Que la señora MONICA PATRICIA MURCIA ANDRADE quien se identifica con cedula de ciudadanía numero 52254239 labora en esta Organización desde el 13 de Junio de 2016 hasta el 26 de Diciembre de 2016, ocupando el cargo de RESIDENTE DE OBRA en el contrato por Duración de obra o labor contratada y todas las prestaciones sociales de ley.

COP. FIDELUC - 166 DE 2015 "Contratar por el sistema de precios unitarios y a monto agotable la realización de obras de construcción y rehabilitación y o mantenimiento de segmentos de la red vial local y o andenes espacio público en la localidad Rafael Uribe Uribe

Este certificado se expide a solicitud de la interesada a los (Diez) 10 días del mes de febrero de mil dieciséis (2016).

Atentamente


DIANA MILEN HURTADO VIEGAS
Coordinadora de Gestión Humana



1486
1392

Enviado por correo
electrónico a
29/05/2022

C&C-CO137-2019-140

Bogotá D.C., 27 de mayo de 2022

Señores
MIRS LATINOAMERICA S.A.S.
Ing. NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA
Calle 23F N° 85A – 31
Ciudad

Referencia: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO-137-2019 cuyo objeto es CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES.**

Asunto: **INFORME DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 137-2019**

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que se dio reinició el contrato de Obra pública 137-2019, se hace un informe detallado del proceso realizado por parte del área social durante la ejecución del proyecto; teniendo en cuenta el Plan de Gestión Social y los requerimientos realizados por el fondo de Desarrollo Local de los Mártires, dentro del programa de Contratación mano de obra no calificada, el cual debe dar cumplimiento con el 50% de contratación de personal residente de la Localidad de Los Mártires.

La firma Consultoría y Construcción Con&Con S.A.S, durante la ejecución del proyecto de obra pública 137-2019, ha realizado actividades para la divulgación de la información referente a la contratación del personal de obra no calificada en la localidad mártires.


A continuación, se describen las actividades realizadas:

1. Mediante las reuniones de inicio de obra, se le informa a la comunidad que la firma consultoría y Construcción S.A.S, requiere personal de mano de obra no calificada que residan en la localidad de los Mártires, indicándoles los requisitos y las funciones del personal, esta información es transmitida por la residente social y adicional se hace entrega de un plegable que contiene la información. Este plegable se entrega a todos los asistentes a la reunión, con el fin de que la

información se replique y llegue a más personas del sector, (Se anexa formato plegable de inicio de obra y lista de asistencia).

Tabla 1. Reuniones de Inicio, entregas plegables

Consolidado Asistencia Reunión de Inicio						
Nº	Fecha de Realización	Barrio		Tramo N°	Segmento Vial	
		Nombre Contractual	Nombre Suministrado por la Comunidad		CV	Personas asistentes
1	9/10/2020	Santa Isabel	Santa Isabel	9	14001156	20
2	9/10/2020	El Vergel	El Vergel	1 y 2	14001459 y 14001481	22
3	15/10/2020	Eduardo Santos	Eduardo Santos	18 y 19	14001619 y 14001615	18
4	15/10/2020	Samper Mendoza	Samper Mendoza	11	14000126	28
5	3/12/2020	Santa Isabel	Santa Isabel	10	14001367	20
6	30/12/2020	Samper Mendoza	Samper Mendoza	11	14000126	8
7	13/01/2021	Samper Mendoza	Samper Mendoza	Adición	14000178	10
8	13/01/2021	Ricaurte	Ricaurte	3, 4, 5 y 6	14000772, 14000741, 14000718 y 14001678	8
9	5/03/2021	Eduardo Santos	Eduardo Santos	15	14001506	12
10	2/03/2021	Samper Mendoza	Samper Mendoza	Adición	14000233	20
11	2/03/2021	Santa Isabel	Santa Isabel	Adición	14001098	25
TOTAL						222



Plegable reunión de inicio de obra
Fuente: Con & Con Consultoría y Construcción



Registro Fotográfico reunión de inicio CIV 14001619 y 14001616


Fuente: Con & Con Consultoria y Construcción

- Desde el Área de Gestión Social, se ha dado cumplimiento con el programa de divulgación de información descrito en el Plan de Gestión Social aprobado, a través de la distribución del comunicado **MONC** convocando a la comunidad para que sean allegadas las hojas de vida y los documentos requeridos. Estos comunicados se hacen entrega en establecimientos de comercio y en los predios aledaños a los frentes de obra del contrato 137-2019. a continuación, se describe el consolidado de las piezas entregadas hasta la fecha. (Se anexa copia de formato de control entrega de volantes MONC y pieza comunicativa)

Tabla 2. Control piezas de divulgación

Consolidado Piezas de Divulgación Entregadas MONC								
N° Pieza de Divulgación	Tipo Pieza de Divulgación	Fecha de Entrega	Barrio		Segmento Vial			Total, Piezas Entregadas personalmente
			Nombre Contractual	Nombre Suministrado por la Comunidad	Tramo N°	CIV	Tramo	
Consolidado N°s	MONC	19/10/2020	El Vergel y Eduardo Santos	El Vergel y Eduardo Santos	1, 2, 18 y 19	14001481 14001469, 14001619 y 14001616	CL 1F ENTRE KR 24B Y KR 24 y CL 1F ENTRE KR 24B Y KR 24 CL 2B entre KR25 y	2
		19/10/2020	El Vergel y Santa Isabel	El Vergel y Santa Isabel	9 y 10	14001156 y 14001367	KR26 CL 1B entre KR 27A y KR28	1
		26/12/2020 06/01/2021 13/01/2021	El Vergel, Eduardo Santos, Santa Isabel, Ricaurte, Santa Fe y Sampedro Mendoza	El Vergel, Eduardo Santos, Santa Isabel, Ricaurte, Santa Fe y Sampedro Mendoza	General por la Localidad	General por la Localidad	General por la Localidad	3

Consolidado Piezas de Divulgación Entregadas MONC								
N° Pieza de Divulgación	Tipo Pieza de Divulgación	Fecha de Entrega	Barrio		Segmento Vial			Total Piezas Entregadas por segmento
			Nombre Contractual	Nombre Suministrado por la Comunidad	Tramo N°	CIV	Tramo	
		24/01/2021	Santa Isabel	Santa Isabel	General por la Localidad	General por la Localidad	General por la Localidad	15
		32/02/2021	El Vergel y Ricaurte	El Vergel y Ricaurte				
		04/02/2021						
		15/02/2021						
		16/03/2021	Vergel, La Fragueta y Santa Isabel	Vergel, La Fragueta y Santa Isabel	General por la Localidad	General por la Localidad	General por la Localidad	
		26/03/2021	Ricaurte, Eduardo Santos, San Fernando y Santa Isabel	Ricaurte, Eduardo Santos, San Fernando y Santa Isabel	General por la Localidad	General por la Localidad	General por la Localidad	
		02/04/2021						
		04/07/2021						
		09/07/2021						
TOTAL								100



Registro Fotográfico entrega pieza divulgativa MONC
Fuente: Con & Con Consultoria y Construcción



Registro Fotográfico entrega pieza divulgativa MONC



Fuente: Con & Con Consultoria y Construcción

3. Los Puntos Satélites de información, están ubicados en cada uno de los frentes de obra de manera permanente, se realiza la respectiva inspección y mantenimiento mensualmente de acuerdo a las condiciones que se encuentra el punto satélite, así la comunidad de la localidad y de localidades aledañas han podido observar la pieza comunicativa denominada **MONC**, a través de ello, se viene realizando una divulgación amplia y fija, buscando ampliar la recepción de las hojas de vida con la respectiva documentación, para así dar cumplimiento al ítem del PGS. (Se anexa copia formato Instalación Punto Satélite de Información).


Tabla 3. Puntos Satélites de Información Instalados


Consolidado PSI								
N°	Fecha de Realización	Nombre de quien autoriza	Barrio		Segmento Vial			ACTIVIDAD
			Nombre Contractual	Nombre Suministrado por la Comunidad	Tramo N°	CIV	Dirección	
1	19-01-2020	Manuel Molina	Santa Isabel	Santa Isabel	9	14001156	CL 2B CON KR25A	Instalación
2	22-01-2020	Leidy Esquivel	Eduardo Santos	Eduardo Santo	18 y 19	14001619 y 14001616	CL 1F ENTRE KR 24B Y KR 24	Instalación
3	4-01-2021	Mona Fernando Arandia "DisPez"	Samper Mendoza	Samper Mendoza	11	14000126	KR 24 N° 22-23	Instalación
4	4-01-2021	Alexander Alzate "Inversius Alzate"	Samper Mendoza	Samper Mendoza	11	14000126	KR 24 N° 22a-30	Mantenimiento
5	4-01-2021	Mana Rodriguez Araya	El Vergel	El Vergel	1 y 2	14001469 y 14001481	KR 24 N° 1F - 36	Instalación
6	14-01-2021	Karol Rodriguez "Boni Hojaladres y Cafe"	Samper Mendoza	Samper Mendoza	Adición	14000178	CR 22a N° 19F - 52	Instalación
7	14-01-2021	Fabian Nelson Gil "Supermercado La Abundancia"	Santa Isabel	Santa Isabel	10	14001367	CL 1B entre KR 27A y KR28	Instalación
8	21-01-2021	Importadora Power Full "Jhoan Camargo"	Ricaurte	Ricaurte	3,4,5 y 6	14000772, 14000741, 14000718 y 14001678	CL 6 N° 25 - 32	Instalación
9	21-01-2021	Tienda Leo	Ricaurte	Ricaurte	3,4,5 y 6	14000772, 14000741, 14000718 y 14001678	KR 25A N° 7 - 09	Mantenimiento
10	25-01-2021	Caseta Celaduna "Ángela Guerrero"	Santa Isabel	Santa Isabel	9	14001156	KR 25A N° 22 - 43	Mantenimiento
11	26-01-2021	Cafetería y Cigarrera Mamo "Ginna Gacha"	Ricaurte	Ricaurte	3,4,5 y 6	14000772, 14000741, 14000718 y 14001678	KR 25A N° 6A-10	Mantenimiento
12	29-01-2021	Miscelanea Angie	Samper	Samper Mendoza	Adición	14000178	KR 19 N° 22A -	Mantenimiento

1491
1349



Consolidado PSI								
N°	Fecha de Realización	Nombre de quien autoriza	Barrio		Segmento Vial			ACTIVIDAD
			Nombre Contratista	Nombre Suministrado por la Comunidad	Tramo N°	CIV	Dirección	
		"KR 19 N° 22A - 01"	Mendoza				51	
13	29/01/2021	El Delfín Dorado "William Guerrero"	Semper Mendoza	Semper Mendoza	11	1400126	KR 24 N° 22A-43	1 Mantenimiento
14	29/01/2021	Almocer Natalia "Andrea Vorela"	Semper Mendoza	Semper Mendoza	11	1400126	KR 24 N° 22A-68	1 Mantenimiento
15	29/01/2021	Maria Rodriguez	El Vergel	El Vergel	1 y 2	14001469 y 14001481	CL 1F N° 24-06	1 Mantenimiento
16	5/03/2021	Abel Gil "Tapicaria"	Eduardo Santos	Eduardo Santos	15	14001506	KR 18N°2a-02	1 Mantenimiento
19	3/06/2021	José Virguez	El Vergel	El Vergel	1 y 2	14001469-14001481	KR 24A No 1F-07	1 Mantenimiento
20	4/06/2021	Bianca Cecilia Loaza	Eduardo Santos	Eduardo Santos	15	14001506	KR 18 No 2-50	1 Mantenimiento
21	4/06/2021	Gina Carolina Gacha	Ricaurte	Ricaurte	3-4-5 y 6	14000772-14000741-14000718-14001678	Kr 24A No 6A-10	1 Mantenimiento
22	9/07/2021	Yuli Mar Vargas	Santa Isabel	Santa Isabel	10	14001367	Calle 18 No 27-20	1 Mantenimiento
23	13/07/2021	Jenny Garcia	Eduardo Santos	Eduardo Santos	18 y 19	14001619 y 14001616	Kr 19D No 10-05	1 Mantenimiento
24	10/03/2021	Afonso Patiño	Santa Isabel	Santa Isabel	9	14001156	KR 24 entre CL 22A Y DG 22B BIS	1 Mantenimiento
TOTAL								24

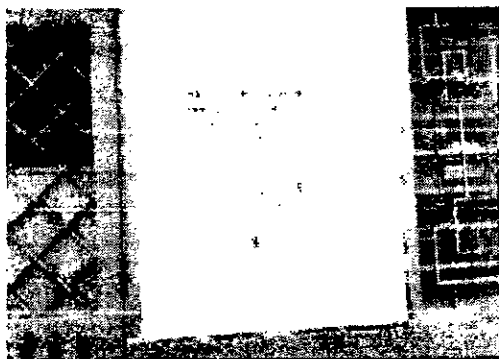

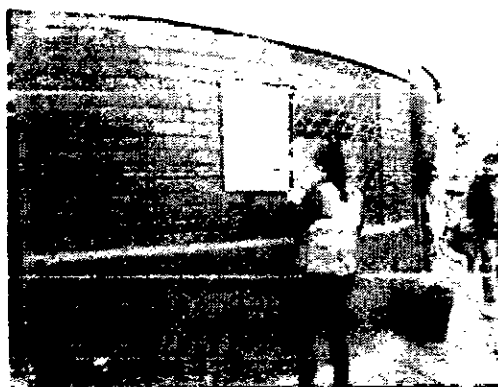

Registro Fotográfico Instalación Punto Satélite de Información CIV S 14001469-14001481-14001506-14000772-14001741-14000715-14001678

Puente Con & Con Consultoria y Construcción

4. En los horarios de atención del Punto PAC, se han venido recepcionando algunas hojas de vida que cumplen en su totalidad con la documentación requerida. (hoja de vida, fotocopia de la cédula y certificado de residencia de la Localidad de Los Mártires expedido por la Alcaldía Local de Los Mártires). Dicha documentación se ha revisado y se ha procedido al trámite para su comunicación e información sobre las condiciones contractuales. El área encargada de contratación de **CON&CON SAS** ha venido realizando la gestión correspondiente para la contratación del personal, acusando que algunas personas no contestan sus llamados o no han podido comunicarse por alguna razón con ellos, a las que se les ha dado información han manifestado que no les interesa las condiciones contractuales, las labores a ejecutar y no aceptan iniciar trabajos con la empresa. Así mismo, en algunas ocasiones se han citado a entrevista y no cumplen con dicha cita.
5. Se realiza divulgación de la pieza comunicativa MONC en el Fondo de Desarrollo Local de los Mártires, con el fin de transmitir la información a la comunidad residente de la localidad de los mártires. (Se anexa formato de control de entrega y pieza de divulgación).

De esta manera se evidencia la gestión realizada por el área social del contratista para dar cumplimiento a la divulgación y recepción de hojas de vida del personal Mano de Obra no Calificada de la localidad. Sin embargo, no se ha podido dar cumplimiento con el ítem descrito en el PGS, de igual manera, se ha venido realizando la contratación de



personal mano de obra no calificada de otras localidades.

Reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento de lo establecido para un adecuado desarrollo del proyecto, por tanto, continuaremos realizando la divulgación para la contratación de la mano de obra no calificada, pero solicitamos que se generen otras alternativas para el cumplimiento desde el componente social, si no se cumple con el 50% de la contratación del personal de obra no calificada.

Quedamos atentos a cualquier observación de su parte.

Cordialmente,

JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

Archivo C.C. / Archivo Consultoria y Construcción S.A.S.

1494
1405



01 041 411 0

ANEXO N°1

Copia formato entrega control de piezas y comunicado
MONC



Volante: 005 Fecha 2/10/20 Localidad: Los Mártires Contrato 137-2019

CONTRATACION MANO DE OBRA NO CALIFICADA

"Contratar a precios unitarios fijos por la modalidad de monto agotable, las obras y actividades para la conservación de la malla vial y espacio público de la Localidad de Los Mártires."

Con el inicio de las actividades de obra del contrato 137 de 2019 en la Localidad de Los Mártires; el Fondo de Desarrollo Local y la firma contratista encargada Con & Con SAS, invitan a la comunidad residente en esta Localidad a presentar su hoja de vida, para ser parte del equipo de construcción, presentando los siguientes documentos:

- Hoja de vida
- Fotocopia de cedula de ciudadanía
- Certificación de la Alcaldía Local de Los Mártires como residente de la localidad

Por favor enviar hoja de vida al correo electrónico: socialmartires137@gmail.com

Si desea solicitar más información sobre el proyecto, comuníquese con nuestro Punto de Atención al Ciudadano PAC.

Consultoría y Construcción CON & CON SAS – Contratista
NIT: 830.041.411 – 0

Residente Social contratista e interventoría
Jessica Naranjo Moreno - Adriana Gutiérrez

Carrera 26bis N°1G-10 (Primer Piso)

Martes y Jueves de 8:00 am a 12:00 pm

Teléfonos: 3166944172 ☎

socialmartires137@gmail.com

contrato141@gmail.com

Interventoría: 3103447467

BOGOTÁ

CONTRATO N° 137 2019

HUJA

FECHA

10/01/2020

DD MM AA

BOGOTÁ

TIPO DE ACTIVIDAD: SOLICITUD DE MANO DE OBRERA NO CALIFICADA

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO ACOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CANTIDAD ENTREGADA	HARRIO	DIRECCION	TELEFONO/ CELULAR	FIRMA
1	JOSE ALBERTO GARCIA	1	CONSTRUCCION	CALLE 17 # 17-10	305851383	[Firma]
2	JOSE ALBERTO GARCIA	1	CONSTRUCCION	CALLE 17 # 17-10	305851383	[Firma]
3	JOSE ALBERTO GARCIA	1	CONSTRUCCION	CALLE 17 # 17-10	305851383	[Firma]
4	JOSE ALBERTO GARCIA	1	CONSTRUCCION	CALLE 17 # 17-10	305851383	[Firma]
5	JOSE ALBERTO GARCIA	1	CONSTRUCCION	CALLE 17 # 17-10	305851383	[Firma]
6	JOSE ALBERTO GARCIA	1	CONSTRUCCION	CALLE 17 # 17-10	305851383	[Firma]
7	JOSE ALBERTO GARCIA	1	CONSTRUCCION	CALLE 17 # 17-10	305851383	[Firma]
8	JOSE ALBERTO GARCIA	1	CONSTRUCCION	CALLE 17 # 17-10	305851383	[Firma]
9	JOSE ALBERTO GARCIA	1	CONSTRUCCION	CALLE 17 # 17-10	305851383	[Firma]
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

RESPONSABLE

JESSICA NARANJO MORENO

RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA

[Firma]

INTERVENTORA

MÁ ADRIANA GUTIÉRREZ GARCÓN

RESIDENTE SOCIAL AGENTE INTERVENTORIA

[Firma]

CONTRATO No. 137 2019

Hoja de FECHA

DD MM AA

21 10 2019

TIPO DE ACTIVIDAD: SOCIALIZACIÓN MUNE

BOGOTÁ

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO ACOTABLE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

No.	NOMBRE Y APELLIDO	CANTIDAD ENTREGADA	BARRIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO/CELULAR	FIRMA
1	Diego Dorantes	1	San Felipe	Calle 22A # 19A - 44	3156337497	[Firma]
2	Diego Dorantes	1	Ricadite	Calle 25 # 82	3550259661	[Firma]
3	Vahany Quispe	1	Ricadite	Calle 25 # 810	3103485661	[Firma]
4	Concepción	1	Ricadite	Calle 25A # 4A - 10	38022510381	[Firma]
5	Marta Guiv	1	Ricadite	Calle 26 # 70	5118810121	[Firma]
6	Hana Elena Olla	1	Ricadite	Calle 20 # 25 - 13	3123791696	[Firma]
7	William Hernandez	1	Ricadite	Calle 27 # 749	3010514	[Firma]
8	Carla Pabon	1	Ricadite	Calle 25A # 794	3837906004	[Firma]
9	Yani Leon	1	Ricadite	Calle 25 # 763	3208808005	[Firma]
10	Francisco	1	Ricadite	Calle 25 # 719	313030415	[Firma]
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

NOMBRE: JESSICA NARANJO MORENO

CARGO: RESPONSABLE SOCINT CONTRATISTA

FIRMA: [Firma]

INTERVENIENTOS

MA ADRIANA GUTIERREZ

RESIDENTE SOCINT INTERVENIENTOS

FIRMA: [Firma]

CONTRATO No. 117-2019
Hoja de
FECHA 2020
MM AA

BOGOTÁ

CONTRATAP A PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA MODALIDAD DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

TIPO PIEZA	MONTO	NOMBRE Y APELLIDO	CANTIDAD EN REGISTRO	PARTIDO	DIRECCIÓN	TELÉFONO CELULAR	FIRMA
1		Robinson Ocampo	1	VERGEL	CALLE 246 N 310 208335		Robinson Ocampo
2		Marcelo Gomez	1	Santa Isabel	CALLE 250 N 314365140		Marcelo Gomez
3		Yolma Ruiz	1	Santa Isabel	CALLE 260 N 313347452		Yolma Ruiz
4		Jose TH Gualdo	1	Santa Isabel	CALLE 270 N 312530270		Jose TH Gualdo
5		David Moreno	1	Santa Isabel	CALLE 270 N 314282800		David Moreno
6		Meilany Rodriguez	1	SANTA ISABEL	CALLE 270 N 312475538		Meilany Rodriguez
7		Viviana Lopez	1	SANTA ISABEL	CALLE 270 N 310284300		Viviana Lopez
8		Diego Andres Lopez	1	SANTA ISABEL	CALLE 270 N 3012751		Diego Andres Lopez
9		William Moreno	1	Santa Isabel	CALLE 270 N 312501190		William Moreno
10		Jose Botero	1	Santa Isabel	CALLE 270 N 312501190		Jose Botero
11		John David Molina	1	Santa Isabel	CALLE 270 N 314433560		John David Molina
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

RESPONSABLE
JES. A. GUERRA GARCÓN
FIRMA

MA. ADRIANA GUERRA GARCÓN
RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORIA
FIRMA

LA STRATOPE 137-2019

HOJA de FECHA

17 de 20

MM

100. DE ACTIVIDAD SOCIAL (G.C.O. VOLANTE M.M.)

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MAJALIA Y EL SUBSISTENTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRIOS.

BOGOTÁ

TIPO PIEZA: MONC	NOMBRE Y APELLIDO	CANTIDAD ENTREGADA	BARRIO	DIRECCION	TELEFONO/CELULAR	FIRMA
1	Coello Vital	1	Santa Fe	Cl 22 # 18 B 09	3163226158	[Firma]
2	Monocuencia Lopez	1	Santa Fe	K 1019 # 22-49	3689942	Monocuencia Lopez
3	Lopez Garcia	1	Santa Fe	Cl 19 # 2201	312332740	[Firma]
4	Juan Alvarado	1	Santa Fe	Cl 19 # 18109	3191111792	[Firma]
5	Rosario Casapintero	1	Santa Fe	Cl 11522 # 19125	3222850114	Rosario Casapintero
6	Rosario Casapintero	1	Santa Fe	Cl 11522 # 19125	3132586672	Rosario Casapintero
7	Rosario Casapintero	1	Santa Fe	Cl 11522 # 19125	3132586672	Rosario Casapintero
8	Rosario Casapintero	1	Santa Fe	Cl 11522 # 19125	3132586672	Rosario Casapintero
9	Rosario Casapintero	1	Santa Fe	Cl 11522 # 19125	3132586672	Rosario Casapintero
10	Rosario Casapintero	1	Santa Fe	Cl 11522 # 19125	3132586672	Rosario Casapintero
11	Rosario Casapintero	1	Santa Fe	Cl 11522 # 19125	3132586672	Rosario Casapintero
12	Rosario Casapintero	1	Santa Fe	Cl 11522 # 19125	3132586672	Rosario Casapintero
13	Rosario Casapintero	1	Santa Fe	Cl 11522 # 19125	3132586672	Rosario Casapintero
14	Rosario Casapintero	1	Santa Fe	Cl 11522 # 19125	3132586672	Rosario Casapintero
15	Rosario Casapintero	1	Santa Fe	Cl 11522 # 19125	3132586672	Rosario Casapintero
16	Rosario Casapintero	1	Santa Fe	Cl 11522 # 19125	3132586672	Rosario Casapintero
17	Rosario Casapintero	1	Santa Fe	Cl 11522 # 19125	3132586672	Rosario Casapintero
18	Rosario Casapintero	1	Santa Fe	Cl 11522 # 19125	3132586672	Rosario Casapintero
19	Rosario Casapintero	1	Santa Fe	Cl 11522 # 19125	3132586672	Rosario Casapintero

NOMBRE: JESSICA MARINO MORENO

CARGO: RESPONSABLE

FIRMA: [Firma]

MA ADRIN... [Firma]

RES-DE... [Firma]

CONTRATO No. 137-2018		TIPO DE ACTIVIDAD: SOCIALIZACION MONC		BOGOTÁ			
Hoja de		"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE. LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"					
FECHA							
2021							
DD MM AA							
TIPO PIEZA: IMONC							
No	NOMBRE Y APELLIDO	CANTIDAD ENTREGADA	BARRIO	DIRECCION	TELEFONO/ CELULAR	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Andrés Gonzales	1	Santa Isabel	Kc 27 #16-95	3619709		Andrés Gonzales
2	Martínza Córdoba	1	Santa Isabel	Calle 27 #19-04	3138653694		Martínza Córdoba
3	Esperanza Peña	1	Santa Isabel	Calle 27 #27-B36	3156164181		Esperanza Peña
4	Yenny Mendoza	1	Santa Isabel	Calle 27 #29-05	3125009423		Yenny Mendoza
5	Osgna Luz Romero	1	Santa Isabel	Calle 27 #30	3102619091		Osgna Luz Romero
6	Fabian Ramirez Nieto	1	Santa Isabel	Calle 27 #33	3224563033		Fabian Ramirez Nieto
7	Losa Elena Martinez	1	Santa Isabel	Calle 3 #28-41	3133251637		Losa Elena Martinez
8	Olego Lea	1	Santa Isabel	Av 113 #22-26	311669496		Olego Lea
9	Gerardo Bu trago	1	Santa Isabel	Calle 27 #10	7500233		Gerardo Bu trago
10	Alejandro Restrepo	1	Santa Isabel	Av 113 #26-41	3929323		Alejandro Restrepo
11	Alison Ramirez	1	Santa Isabel	Av 113 #26-41	3122491665		Alison Ramirez
12	Erin Gil	1	Santa Isabel	Cil 3 #29A-41	3132147471		Erin Gil
13	Yosely Candela	1	Santa Isabel	Calle 27 #27-54	3222460794		Yosely Candela
14	Liana Cantaneda	1	Santa Isabel	Calle 27 #2-73	3123568895		Liana Cantaneda
15	Thian Bethman	1	Santa Isabel	Calle 3 #25-37	3202057434		Thian Bethman
16	Francisco Rico	1	Santa Isabel	Calle 3 #25-6	3168657556		Francisco Rico
17	Yosely Candela	1	Santa Isabel	Calle 27 #27-54	3222460794		Yosely Candela
18	Yidia Jaramilla	1	Santa Isabel	Calle 27 #27-54	3114704387		Yidia Jaramilla
19	Francisco Herera	1	Santa Isabel	Calle 27 #27-54	319454609		Francisco Herera
RESPONSABLE		JESSICA NARANJO MORENO				INTERVENIENTE	
CARGO		RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA				MA. ADRIANA GUTIERREZ GARZON	
FIRMA		[Firma]				RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA	

CONTRATO No. 137-2019		TIPO DE ACTIVIDAD: SUSTANCIACION MUNIC		BOGOTÁ			
Hoja de		FECHA					
24 DE 02 2021							
MM		AA					
TIPO PIEZA: MONC							
"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"							
No.	NOMBRE Y APELLIDO	CANTIDAD ENTREGADA	BARRIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO/CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Amarelly Vera	1	El Vergel	KR 24 # 1A-27	4090731		Amarelly Vera
2	Bianca Peña	1	Santa Isabel	KR 26 # 1A-14	3725422493		Bianca Peña
3	Luz Dary Noque	1	Santa Isabel	Calle 19B # 25A-20A-04	3707550734		Luz Dary Noque
4	José González	1	Santa Isabel	Calle 19B # 25A-20A-03	3112096347	0.0 Kendo@igrama.com.co	José González
5	Leonilda Vargas	1	Santa Isabel	Calle 19B # 20A-05	3773814994	4.0 MB@903070@gmail.com	Leonilda Vargas
6	Yarnid Aguilar	1	Santa Isabel	Av. 7 # 25A-12	3112936598		Yarnid Aguilar
7	Ofelia Rincón	1	Santa Isabel	Calle 20 # 1B-36	3142405306		Ofelia Rincón
8	Mileana Mender	1	Santa Isabel	Calle 10 # 26-07	3104414122	soatin.miler@net.com	Mileana Mender
9	Rubi Bernal	1	Santa Isabel	Calle 20 # 20A-11	3144206680		Rubi Bernal
10	Nubia Moreno	1	Santa Isabel	Calle 17 # 25A-13	3128313133	M.644C.90@gmail.com	Nubia Moreno
11	Ana Gabriela Alayón	1	Santa Isabel	Calle 26 # 1A-14	3603670		Ana Gabriela Alayón
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
RESPONSABLE		RESPONSABLE		INTERVENTORA			
JESSICA NARANJO MORENO		MA ADRIANA GUTIERREZ SARZON					
RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA		RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA					
FIRMA		FIRMA					

CONTRATO No. 137-2019		Hoja de		FECHA		TIPO DE ACTIVIDAD: SOCIALIZACION MONI	
DD		MM		AA		BOGOTÁ	
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTINES							
No.	NOMBRE Y APELLIDO	CANTIDAD ENTREGADA	BARRIO	DIRECCION	TELEFONO/ CELULAR	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Shirley Daza Amante	1	Bicuarita	Calle 27 No 15	3222924538	Daza Amante Shirley	[Firma]
2	Andres Bayas	1	Bicuarita	Calle 27 No 48	3115007215	Bayas Andres	[Firma]
3	Carlos Hurtado	1	Bicuarita	Calle 27 No 107	3118516572	Hurtado Carlos	[Firma]
4	Luz Marina Guenara	1	Bicuarita	Calle 27 No 208	3185393494	Guenara Luz Marina	[Firma]
5	Alex Portino	1	Bicuarita	Calle 27 No 03	3507418112	Portino Alex	[Firma]
6	Zuly Corrales	1	Bicuarita	Calle 27 No 76	3214922312	Corrales Zuly	[Firma]
7	Leonel Briceño	1	Bicuarita	Calle 27 No 76	3004605277	Briceño Leonel	[Firma]
8	Camilo Robles	1	Bicuarita	Calle 27 No 78	4649895	Robles Camilo	[Firma]
9	Enal Galdino	1	Bicuarita	Calle 27 No 28	3118703787	Galdino Enal	[Firma]
10	Patricia Ariles	1	Bicuarita	Calle 27 No 1607	3046581607	Ariles Patricia	[Firma]
11	Leonardo Peña	1	Bicuarita	Calle 27 No 28	31059492008	Peña Leonardo	[Firma]
12	Juan Gutierrez	1	Bicuarita	Calle 27 No 28	3705925	Gutierrez Juan	[Firma]
13	Felipe Gonzalez	1	Bicuarita	Calle 27 No 28	3135444	Gonzalez Felipe	[Firma]
14	Alexander Bastidas	1	Bicuarita	Calle 27 No 14	3102879740	Bastidas Alexander	[Firma]
15	Maria Paula Segura	1	Bicuarita	Calle 27 No 1-80	3167428500	Segura Maria Paula	[Firma]
16							
17							
18							
19							

RESPONSABLE		INTERVENTOR	
NOMBRE	JESSICA NARANJO MORENO	NOMBRE	MA. ADRIANA GUTIERREZ GARCÓN
CARGO	RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA	CARGO	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORIA
FIRMA	[Firma]	FIRMA	[Firma]

Bogotá D.C., 06 de junio de 2022

Señores
MIRS LATINOAMERICA S.A.S.
Ing. NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA
Calle 23F No 85A – 31
Ciudad

Referencia: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO-137-2019 cuyo objeto es CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES.**

Asunto: **INFORME DEL ESTADO DE LOS FRENTES- ACCIONES DE MOVILIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 137-2019**

Cordial saludo,

Con el objeto de cumplir con las condiciones contractuales, se realizó visita técnica el día 01 de junio del 2022, para verificar el estado de los frentes denominados "Acciones de movilidad" Grupo N°5, según la propuesta de CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S para la culminación de los frentes, mediante el comunicado C&C-CO137-2019-132:

De acuerdo a la propuesta por CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S, se tenía programado ejecutar los siguientes segmentos:

No	Cod.	BARRIO	PK-ID	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA	VALOR PRESUPUESTADO
3-A	14000434	RICAURTE	183403	CALZADA	CLL 10	KR 29	AV KR 30	\$ 151.420.226,00
11-A	14001447	EDUARDO SANTOS	512891	CALZADA	CL 3	KR 17A	KR 18	\$ 48.942.525,00
12-A	14000389	SAMPER MENDOZA	183633	CALZADA	CLL 20	KR 18	CRUCE	\$ 139.954.373,00
16-A	14000469	EL LISTON	183587	CALZADA	KR 20	CL 14	CL 15	\$ 184.364.112,00
COSTO TOTAL OBRAS INCLUYE REDES Y COSTOS DIRECTOS, APROXIMADA AL PESO (A) =								\$ 524.681.236,00
ADMINISTRACIÓN								22,88% \$ 120.099.534,92
IMPREVISTOS								1,00% \$ 5.246.812,36



141.571.0

UTILIDAD	7.00%	\$	36.727.686,52
COSTO TOTAL A.I.U.	30,89%	\$	162.074.033,80
COSTO TOTAL OBRA INCLUYE A.I.U.		\$	688.755.269,80
COSTO ACTIVIDADES AMBIENTALES y SST (B)	2,96%	\$	20.303.990,69
COSTO ACTIVIDADES SOCIALES (C)	2,72%	\$	18.676.486,48
COSTO PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (D)	1,23%	\$	8.428.011,25
VALOR TOTAL DEL CONTRATO APROXIMADO AL PESO =		\$	734.163.758,22

Tabla 1 Acciones de Movilidad

Una vez realizada la visita se evidencio que solo se pueden ejecutar los siguientes segmentos:

No	Cod.	BARRIO	PK-ID	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA	VALOR PRESUPUESTADO
1-A	14000434	RICAURTE	183403	CALZADA	CLL 10	KR 29	AV KR 30	\$ 15.426.226,00
16-A	14000469	EL LISTON	183587	CALZADA	KR 20	CL 14	CL 15	\$ 184.364.120,00
COSTO TOTAL OBRAS INCLUYE REDES Y COSTOS DIRECTOS, APROXIMADA AL PESO (A) =								\$ 335.784.338,00
ADMINISTRACIÓN								22,89% \$ 76.861.034,97
IMPREVISTOS								1,00% \$ 3.357.843,38
UTILIDAD								7,00% \$ 23.504.303,66
COSTO TOTAL A.I.U.								30,89% \$ 103.723.782,01
COSTO TOTAL OBRA INCLUYE A.I.U.								\$ 439.508.120,01
COSTO ACTIVIDADES AMBIENTALES y SST (B)								2,96% \$ 12.994.103,09
COSTO ACTIVIDADES SOCIALES (C)								2,72% \$ 11.952.536,55
COSTO PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (D)								1,23% \$ 5.393.740,01
COSTO TOTAL DEL PROYECTO + PROTOCOLOS								\$ 469.848.502

Es de aclarar que este listado fue entregado a la UMV, mediante Radicado 20216420269461.

Con lo anterior se está a la espera de la asignación y verificación (CIVS) de la reserva de ejecución por parte de la Supervisión de la Alcaldía de mártires, por un valor de \$264.315.256,22, con el fin de poder iniciar la revisión de los estudios, presupuestos y realizar la inclusión de estos CIV en el objeto del contrato.

Cordialmente,

JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS
Archivos C.C.C/ Archivo Consultoria y Construcción S.A.S



TEL: 437 4114

1506
C no ade po direc
c 11/1/2022

C&C-CO137-2019-142

Bogotá D.C., 06 de junio de 2022

Señores

MIRS LATINOAMERICA S.A.S.

Ing. NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA

Calle 23F N° 85A – 31

Ciudad

Referencia: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO-137-2019 cuyo objeto es CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES.**

Asunto: **Respuesta radicada SDA No.2021ER78651 del 29/04/2021- Remisión de plan de gestión de residuos de construcción y demolición, PIN 19049 para el proyecto" contrato de obra pública 137 de 2019"**

Cordial saludo,

Por medio de la presente, la firma CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S, solicita amablemente que el fondo de desarrollo local de Martires- FDLM de claridad en la solicitud de cierre de PIN 19049, ya que el proyecto se encuentra vigente hasta el 15 de septiembre del 2022., A continuación, se presenta la información relevante del contrato de obra CO-137-2019:

TABLA 1: INFORMACIÓN CONTRATO CO-137-2019

CONTRATISTA	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.
INTERVENTORIA	MIRS LATINOAMERICA S.A.S
CONTRATO No.	CO-137-2019
VALOR INICIAL DE LA OBRA	\$5.437.884.572
ANTICIPO	\$1.631.365.372
PLAZO DE EJECUCIÓN	Siete (7) meses
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	25 de febrero de 2020




C.C. 127-48-1-1-1

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	24 de septiembre de 2020
EDICIONES	\$2.845.236.531
PRORROGAS	Prórroga No. 1: Dos (02) meses de fecha 18 nov/2020 hasta el 20 de marzo 2021.
	Prórroga No. 2: Dos (02) meses de fecha 17 jul/2021 hasta el 17 de septiembre 2021.
SUSPENSIONES	Suspensión No. 1 de fecha 24 de marzo de 2020 (01 mes) reiniciándose el 24 abril 2020.
	Suspensión No. 2 de fecha 28 de noviembre de 2020 Veintitrés (23) días, esto es desde el 28 de noviembre 2020 hasta el 20 de diciembre de 2020.
	Suspensión No. 3 de fecha 31 de marzo de 2021 (30 días) hasta el 30 abril 2021.
	Suspensión No. 4 de fecha 16 de septiembre de 2021 (30 días) hasta el 16 mayo de 2022.
REINICIOS	Reinicio No. 1 de fecha 21 de julio de 2020.
	Reinicio No. 2 de 28 de diciembre de 2020 con fecha de terminación 12 de abril del 2021.
	Reinicio No. 3 de 29 de junio de 2021 con fecha de terminación 18 de julio del 2021.
	Reinicio No. 4 de 17 de mayo de 2022 con fecha de terminación 15 de septiembre del 2022.
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL INCLUIDA SUSPENSIÓN Y PRORROGA	15 de septiembre de 2021

Atendiendo a los requerimientos solicitados por SDA, nos permitimos hacer las siguientes aclaraciones:

- Mediante el oficio C&C-CO137-2019-096: Entrega de información para reporte de aplicativo Web SDA, radicado el día 13 de julio del 2021 y el oficio C&C-CO137-2019-097: Entrega informe primer semestre 2021 GCR, radicado el día 13 de julio del 2021; se realizó la entregan de los reportes de disposición final de RCD y aprovechamiento de material correspondientes al primer semestre del año 2021. (ver anexo 1 y 2)
- El cargue al aplicativo web, correspondiente al PIN 19049, de los reportes mensuales de disposición final de RCD y aprovechamiento de material, está a cargo del fondo de desarrollo local de Martires-FDLM, por tal motivo se solicita la



1503
1415

1503

verificación del cargue de la información suministrada por la firma CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

De acuerdo con lo anterior, la firma CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. ha cumplido con los requerimientos dispuestos en el plan de gestión de residuos de construcción y demolición, PIN 19049.

Cordialmente,

JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

Anexo No. 1: L&C-CO-137-2019-096: Entrega de información para reporte de aplicativo Web SDA

Anexo No. 2: L&C-CO-137-2019-097: Entrega informe primer semestre 2021 GCS Archivo

L&C Archivo Consultoría y Construcción S.A.S.



SECCION 001

ANEXO N°1



NIT 830.041.411-0

C&C-CO137-2019-096

Bogotá D.C., 12 de julio de 2021

Señores
MIRS LATINOAMERICA S.A.S
Atn. Sandra Mónica Cardozo Rojas
Directora de Interventoría
Bogotá D.C.

Referencia: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO-137-2019 cuyo objeto es "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"**

Asunto: **ENTREGA INFORMACIÓN PARA REPORTE APLICATIVO WEB SDA**

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, hacemos entrega formal de la información de los meses de octubre de 2020 a mayo de 2021 para realizar las modificaciones respectivas y el cargue correspondiente en el aplicativo web de la Secretaría Distrital de Ambiente-SDA bajo pin ambiental de obra 19049, una vez se cuente con su aprobación y sea remitida al Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires para los fines pertinentes.

Se hace entrega de la información en medio magnético para su revisión, en carpetas por mes, de acuerdo a los lineamientos de la SDA que incluyen:

1. Archivo excel formato .CSV con el reporte de los viajes de disposición
2. PDF con la información correspondiente a la disposición de RCD, contiene anexo 2, certificaciones e indicadores de PG-RCD.
3. PDF con la información correspondiente al aprovechamiento de RCD, contiene anexo 3 y certificaciones.

Atentamente,

JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA

Director de Obra - COP-137-2019
CC Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires
Anexos: 1 CD

1 AP
INTERVENIENDO
13/07/2021
9:15 AM



CON & CON

ANEXO N°2



NIT 830.041.411-0

C&C-CO137-2019-097

Bogotá D.C., 12 de julio de 2021

Señores
MIRS LATINOAMERICA S.A.S
Atn. Sandra Mónica Cardozo Rojas
Directora de interventoría
Bogotá D.C.


Referencia: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO-137-2019 cuyo objeto es "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"**


Asunto: **ENTREGA INFORME PRIMER SEMESTRE 2021 GCR**

Cordial Saludo,

Dando cumplimiento a los Decretos 442 de 2015 y 265 de 2016, "Artículo 10.- Aprovechamiento de llantas usadas en obras de infraestructura del transporte en el Distrito Capital (...) Parágrafo. Los informes de cumplimiento de este artículo, deberán ser reportados en el formato que para tal fin diseñe la Secretaría Distrital de Ambiente, los primeros quince (15) días del mes enero y julio de cada año, acompañados de los respectivos soportes de compra del Grano de Caucho Reciclado (GCR) ", remitimos el informe de cumplimiento para el primer semestre del 2021 del COP-137-FDLM-2019, junto con la certificación del proveedor y certificado de proveniencia del GCR, para los trámites pertinentes ante la autoridad ambiental.

Atentamente


JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
Director de Obra - COP-137-2019
Anexos. 1 CD


INTERVENIENTE
13/07/2021
9:15 AM

Código p. con
12/06/2022

P. 12/06/2022

C&C-CO137-2019-143

Bogotá D.C., 14 de junio de 2022

Señores

MIRS LATINOAMERICA S.A.S.

Ing. NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA

Calle 23F No 85A – 31

Ciudad

Referencia: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO-137-2019 cuyo objeto es CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES.**

Asunto: **RESPUESTA AL OFICIO MIRS-MAR-165-2019**

Cordial saludo,

De acuerdo con las observaciones realizadas mediante el oficio MIRS-MAR-165-2019, se adjunta las hojas de vida de los siguientes profesionales:

- Director de Obra: Víctor Manuel Ariza Acosta
- Residente social: Mónica Patricia Murcia Andrade.

Es importante dar claridad que el profesional Víctor Ariza deja de ser el especialista de Pavimentos a partir de la fecha, atendiendo, Cito textualmente (...) "Tomado de Anexo 1- Anexo Técnico definitivo 2019 - Numeral 7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: Para efectos del análisis de la información del personal, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones: b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberán cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes", con lo anterior se enviará la hoja del especialista de pavimentos cumpliendo con los requerimientos contractuales.

Cordialmente,

JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

Anexo: (14) Páginas

Archivo C.C./ Archivo Consultoría y Construcción S.A.S

ANEXO N° 13
RELACION DE EXPERIENCIA PERSONAL PROFESIONAL CLAVE Y CARTA DE COMPROMISO

CARGO PROPUESTO:	DIRECTOR DE OBRA
NOMBRES Y APELLIDOS:	VICTOR MANUEL ARIZA ACOSTA
TIPO Y N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	79 653.718 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN:	
TELÉFONO:	
CORREO ELECTRÓNICO:	


ESTUDIOS REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	UNIVERSITARIOS	ESPECIALIZACIÓN	OTROS		
TÍTULO OBTENIDO	INGENIERO CIVIL	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS			
INSTITUCIÓN	UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA	UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA			
FECHA DE GRADO	29/08/1997	28/06/2012			
No. TARJETA PROFESIONAL (Si se requiere): 25202-68050CND					
EXPERIENCIA					
ENTIDAD CONTRATANTE	FUNCIONES	CARGO DESEMPEÑADO	FECHA INICIO (DÍA-MES-AÑO)	FECHA TERMINACIÓN (DÍA-MES-AÑO)	EXPERIENCIA EN MESES
CON & CON		DIRECTOR DE OBRA	16-dic-19	17-dic-21	24,40
CON & CON		DIRECTOR DE OBRA	1-jul-14	31-jul-15	13,17
TIEMPO DE EXPERIENCIA HABILITANTE CERTIFICADA EN AÑOS					3,41

CARTA COMPROMISO

YO, **VICTOR MANUEL ARIZA ACOSTA** identificado con c.c. 79.653.718 acepto ser presentado por la empresa CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. - CON & CON como DIRECTOR DE OBRA dentro de la ejecución del contrato 137 de 2019 que tiene como objeto: **CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES** de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica y sus anexos. Por lo que me comprometo a formar parte del equipo de trabajo durante el plazo que dure el contrato con una dedicación del 50% para la ejecución del mismo.

Para constancia se firma a los 13 días del mes de junio de 2022.



FIRMA PROFESIONAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÓDIGO DE IDENTIFICACION

79.653.718

ARIZA ACOSTA

VICTOR MANUEL



20-MAY-1979

BOGOTÁ D.C.
CONDENA MARCA

1.66

O+

M

20 JUN 1979 BOGOTÁ D.C.





En nombre de la República de Colombia y
por autorización del Ministerio de Educación

Universidad de los Andes

en virtud de que

Victor Ramon Ariza Acosta

C.C. 70.653 712.400

ha terminado los estudios y cumplido las demás requisitos académicos exigidos por la ley y los estatutos universitarios, le confiere el título de:

Ingeniero Civil

En testimonio de lo expuesto el presente Diploma, firmado y sellado con el sello mayor de la Universidad, en Bogotá, D.C., el día 20 del mes de Agosto del año de 1957.

Fecha



Director General

En el día 20 de Agosto de 1957

En el día 20 de Agosto de 1957

En el día 20 de Agosto de 1957

En el día 20 de Agosto de 1957

VICTOR MANUEL ARIZA ACOSTA
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS
ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE PAVIMENTOS



1519
~~1420~~



Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1357933

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que VICTOR MANUEL ARIZA ACOSTA, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 79653718, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-68050 desde el 16 de Octubre de 1997, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1013.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintitres (23) días del mes de Mayo del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firma del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.




CERTIFICA


El Ingeniero **VICTOR MANUEL ARIZA ACOSTA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.653.718 de Bogotá D.C., y Tarjeta profesional No. 25202-68050 CND, trabajo para esta empresa y se desempeñó como **DIRECTOR DE OBRA** para los siguientes contratos:

No. Del Contrato	Objeto del contrato	Entidad Contratante	Fecha de iniciación	Fecha de finalización	Valor
034 de 2014	EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, INTERVENCIONES INTEGRALES DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA CON EL EMPLEO DE BASES ESTABILIZADAS CON ADITIVOS QUÍMICOS, MEDIANTE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS CONSTRUIDAS EN CARPETAS FLEXIBLES, RÍGIDAS O ARTICULADAS, INTERVENCIONES PUNTUALES Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS LOCALES A PARTIR DE DISEÑOS SUMINISTRADOS POR LA ENTIDAD (GRUPO 2)	ALCALDÍA LOCAL DE BOSA	01-jul-2014	31-jul-2015	\$ 8.038 600 228
069 de 2014	CONTRATAR A PRECIO GLOBAL FIJO EL DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE, EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA MALLA VIAL LOCAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C., CONFORME A LOS SEGMENTOS PRIORIZADOS EN LOS CABILDOS PARTICIPATIVOS REALIZADOS Y/U OTROS SEGMENTOS VIALES DE LA LOCALIDAD.	ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO	01-ago-2015	29-feb-2016	\$ 4.831 264 337

La presente certificación se expide a los 24 días del mes de septiembre de 2018.

Cordialmente,


JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal





NIT 830.041.411-0

CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

CERTIFICA QUE:

EL Ingeniero, **VICTOR MANUEL ARIZA ACOSTA** identificado con cédula de ciudadanía N° 79653718, laboró para esta compañía desde 16 de diciembre de 2019 hasta el 17 de diciembre de 2021, desempeñando el cargo de **DIRECTOR DE OBRA**, mediante contrato por obra o labor determinada. Para el proyecto 314 de 2019 cuyo objeto es: Ejecutar a precios unitarios y a monto agotable, las actividades necesarias para la ejecución de las Obras de conservación de la malla vial local intermedia, y espacio público de la localidad de Kennedy en la ciudad de Bogotá, D.C. Grupo 1

La presente certificación se expide por solicitud del interesado a los 13 días del mes de junio de 2022

Atentamente,



JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal

1522
429

ANEXO N° 13
RELACION DE EXPERIENCIA PERSONAL PROFESIONAL CLAVE Y CARTA DE COMPROMISO

CARGO PROPUESTO:	RESIDENTE SOCIAL
NOMBRES Y APELLIDOS:	MONICA PATRICIA MURCIA ANDRADE
TIPO Y N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	CC 52,254,239

ESTUDIOS REALIZADOS

DESCRIPCION	UNIVERSITARIOS	ESPECIALIZACIÓN	OTROS
TITULO OBTENIDO	TRABAJADORA SOCIAL		
INSTITUCIÓN	UNIVERSIDAD DE LA SALLE		
FECHA DE GRADO	18/10/2002		

No TARJETA PROFESIONAL (Si se requiere):

EXPERIENCIA

ENTIDAD CONTRATANTE	FUNCIONES	CARGO DESEMPEÑADO	FECHA INICIO (DÍA-MES-AÑO)	FECHA TERMINACIÓN (DÍA-MES-AÑO)	EXPERIENCIA EN MESES
CON & CON		RESIDENTE SOCIAL	25-ene-21	30-may-22	16,33
TIEMPO DE EXPERIENCIA HABILITANTE CERTIFICADA EN AÑOS					1 36

CARTA COMPROMISO

Yo MONICA PATRICIA MURCIA ANDRADE identificado con c.c 52,254,239 acepto ser presentada por la empresa CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. - CON & CON como RESIDENTE SOCIAL dentro de la ejecución del contrato 137 de 2019 que tiene como objeto: **CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES**, Por lo que me comprometo a formar parte del equipo de trabajo durante el plazo que dure el contrato con una dedicación del 80% para la ejecución del mismo

Para constancia se firma a los 13 días del mes de junio de 2022.


FIRMA PROFESIONAL



1523
1430

C&C-CO137-2019-145

Bogotá D.C., 15 junio de 2022

Señores

ACUEDUCTO DE BOGOTA

MIGUEL ANGEL CASALLAS TORRES

Profesional Servicio Alcantarillado Zona 3

Av Calle 24 #37-15

Ciudad

Referencia: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO-137-2019 cuyo objeto es CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES.**

Asunto: **Respuesta Traslado radicado E-2022-036245, Sumideros Pluviales eliminados por obras FDLM E-2022-10021678**

Por medio de la presente, la firma CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. informa que los sumideros pluviales, que hacen parte del contrato de referencia no han sido eliminados como se cita en el oficio Traslado radicado E-2022-036245, Sumideros Pluviales eliminados por obras FDLM E-2022-10021678. Así, como se manifestó en el oficio C&C-CO137-2019-135: RESPUESTA Traslado radicado E-2022-10021678, Sumideros Pluviales eliminados por obras FDLM, con R No.2022-641-002197-2 y traslado por competencia con No R.20226420194951, con Numero de Radicado E-2022-036245 el día 10 de mayo de 2022.

A continuación, se presenta la información relevante del contrato de obra CO-137-2019:

TABLA 1: INFORMACIÓN CONTRATO CO-137-2019

CONTRATISTA	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.
INTERVENTORIA	MIRS LATINOAMERICA S.A.S
CONTRATO No.	CO-137-2019
VALOR INICIAL DE LA OBRA	\$5.437.884.572
ANTICIPO	\$1.631.365.372
PLAZO DE EJECUCIÓN	Siete (7) meses
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	25 de febrero de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	24 de septiembre de 2020
EDICIONES	\$2.845.236.531
PRORROGAS	Prórroga No. 1: Dos (02) meses de fecha 18 nov/2020 hasta el 20 de marzo 2021.



	Prórroga No. 2: Dos (02) meses de fecha 17 jul/2021 hasta el 17 de septiembre 2021.
SUSPENSIONES	Suspensión No. 1 de fecha 24 de marzo de 2020 (01 mes) reiniciándose el 24 abril 2020.
	Suspensión No. 2 de fecha 28 de noviembre de 2020 Veintitrés (23) días, esto es desde el 28 de noviembre 2020 hasta el 20 de diciembre de 2020.
	Suspensión No. 3 de fecha 31 de marzo de 2021 (30 días) hasta el 30 abril 2021.
	Suspensión No. 4 de fecha 16 de septiembre de 2021 (30 días) hasta el 16 mayo de 2022.
REINICIOS	Reinicio No. 1 de fecha 21 de julio de 2020
	Reinicio No. 2 de 28 de diciembre de 2020 con fecha de terminación 12 de abril del 2021.
	Reinicio No. 3 de 29 de junio de 2021 con fecha de terminación 18 de julio del 2021.
	Reinicio No. 4 de 17 de mayo de 2022 con fecha de terminación 15 de septiembre del 2022.
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL INCLUIDA SUSPENSIÓN Y PRORROGA	15 de septiembre de 2022

Con lo anterior, se informa que el contrato de obra CO-137-2019, se reinició el día 17 de mayo del 2022, hasta el 15 de septiembre del 2022. La firma CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S, se encuentra en trámite para la aprobación del PMT, una vez se tenga la aprobación por parte de secretaria de Movilidad se expedirá un volante a la comunidad, donde se dará la fecha del inicio de las obras y las actividades constructivas que se requieren para la construcción de los sumideros pluviales.

Una vez se culminen las obras objeto de este contrato se solicitará a cada una de las dependencias la paz y salvos. Con esto, esperamos dar claridad que el contrato se encuentra vigente y que se encuentra programado la construcción de los sumideros pluviales para los segmentos viales que hacen parte del contrato de obra CO-137-2019.

Cordialmente,

JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

Aut. 001-2019 Alcaldía Consultoria y Construcción S.A.S.

Aut. 001-2019 Alcaldía MRS - ATRIOAMERICA S.A.S- Representante Legal: Nick Roney Almeida Gamboa

Aut. 001-2019 ALCALDIA LOCAL DE MARTIRES- alcalde local de Martires - Juan Rachil Cabares Roldán

IRS

LATINOAMERICA

MIRS-MAR-166-2019

Frente Calle 1B entre Kr 27A y Kr 28 CIV'S (14001367)



PMT'S

Se solicita enviar matriz de PMT's con soporte de trámites ante SDM, ya que es de conocimiento de la presente interventoría que el frente de la calle 1C cuenta con PMT aprobado y vigente, pero aún no se ha implementado, esto generando atrasos en la ejecución que no tiene una justificación y solo imputable al contratista de obra.

18	14001619	COLEGIOS	182788	CALZADA	CL 1C	KR 19A	KR 19BBIS
			70476	ANDEN			
			70477				
19	14001616	COLEGIOS	182789	CALZADA	CL 1C	KR 19BBIS	KR 19C
			70478	ANDEN			
			70479				

Dir : Calle 23 f # 85 A 31. Telefax: 8039343. Cel. 3014313648. Email:contrato141@gmail.com

1526
W33

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>GOBIERNO</small> <small>Localidad de Los Martires</small>
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

18.2 ANEXO 1 CORRESPONDENCIA RECIBIDA



MIRS-MAR-151-2019
MIRS-MAR-152-2019

Bogotá D.C., 24 de enero de 2022

Señores:

**ALCALDIA LOCAL DE MARTIRES
FONDO DE DESARROLLO LOCAL**

Av. Calle 19 #28-80 Centro Comercial Mall Plaza Piso 7
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 137-2019 CUYO OBJETO ES CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 141-2019 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SISO LOS PROCESOS SST - MA - SO - PMT, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FORMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

ASUNTO: ^{Copia} **RESPUESTA A OFICIO No 20216420854581 -SOLICITUD CONCEPTO JURIDICO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO, FRENTE A PROPUESTA PARA CULMINACION DE LOS FRENTES DEL CONTRATO DE OBRA No. 137-2019.**

Cordial saludo,

Por medio del presente oficio nos permitimos dar respuesta al oficio enviado a la presente interventoria por medio del correo electrónico cdi.martires@gobiernobogota.gov.co, a la dirección de correo contrato141@gmail.com, el día 20 de enero de 2022 a las 14:03, en donde se da traslado de la propuesta enviada por el contratista CON&CON SAS, para la culminación de la ejecución del contrato de obra CO-137-2019 suscrito ante el FDLN, el cual como consta en el oficio enviado cuenta con radicado ante el FDLN de número No. 20216410066072, y por medio del cual se solicita a la presente interventoria el dar concepto sobre la propuesta, mediante oficio del asunto.

A continuación, se emite concepto sobre la propuesta así:

- 1- Se solicita al contratista de obra que al relacionar el objeto contractual del contrato de obra se especifique correctamente, ya que en la referencia del oficio dice: "CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO-137-2019 cuyo objeto es CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE, CON FORMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES", aclarando que la subraya NO hace parte del objeto contractual. *ok*
- 2- En el numeral "A. ETAPA No.1", Se relaciona el oficio de número C&C-CO-137-2019-119, del cual se recibió una copia, mas no se le realizó el traslado correspondiente por competencia.

Dir: Calle 23 f # 85 A 31. Telefax: 8039343. Cel. 3014313648. Email: contrato141@gmail.com
Página 1 de 6

**MIRS-MAR-151-2019**

por parte del FDLM para una respuesta formal, de igual manera se responde a este en los mismos términos que se describen a continuación en el presente documento, ya que la propuesta y dicho oficio contemplan la misma información.

En el numeral "A. ETAPA No.1", se afirma "...se evidencia que los segmentos- Elementos PK-ID CALZADA, se encuentran con un avance del 89% faltando por ejecutar la construcción de sumideros y la demarcación; exceptuando el segmento CIV's (14001506) que debido las condiciones técnicas "Aprobación PMT media Calzada" y proceso constructivo hace falta la conformación de la estructura de la calzada oriental, así, como se presenta en Tabla No.1..."

Se ha relacionado que se conlleva "un avance del 89% faltando por ejecutar la construcción de sumideros y la demarcación", pero esto es con relación únicamente a los CIV's abiertos, es decir si contamos los frentes abiertos únicamente y su ejecución actual, pero no con relación a la generalidad del contrato, lo cual en términos reales si se mide con relación a la totalidad de los recursos, considerando que es un contrato a monto agotable es un avance del 58%, cabe anotar que según la propuesta y listado anexo, faltaría por asignar un 8.86% de los recursos del contrato tal como se había manifestado con anterioridad ante el FDL; considerando que únicamente se cuenta con finalización de trabajos sobre andenes en un frente de obra, la presente interventoría considera que el afirmar estos porcentajes únicamente ajustados a ciertos PK-ID, desvirtúan la información de la ejecución real del contrato de obra. Se debe considerar que a la fecha se han realizado (2) dos prórrogas y (1) una adición al contrato de obra.

En cuanto a los faltantes "... faltando por ejecutar la construcción de sumideros y la demarcación...", se aclara que a la fecha no se cuenta con el recibo de los diseños de demarcación de las calzadas, lo cual en reiteradas ocasiones se le ha manifestado al contratista de obra, y teniendo en cuenta que es una parte integral de las ejecuciones en las mismas calzadas.

En el documento NO tiene el PK-ID en ninguno de los elementos, el código es netamente CIV, recordando que cada código PK-ID, hará referencia a un elemento específico y costado, ya sea norte, sur, oriente u occidente según corresponda, por lo que dicha información relacionada está incompleta en las tablas relacionadas, se relaciona en que en el CIV 14001506 es calzada "Oriental", a la que le hace falta la conformación de la estructura, pero es el costado OCCIDENTAL, lo afirmado sobre la relación de la aprobación de los PMT a media calzada y la ejecución según "condiciones técnicas", no obedece a total realidad, ya que dicha calzada inicia actividades de demolición el día 11 de marzo de 2021 y presento demoras y/o abandono en diversas ocasiones a lo cual la presente interventoría realizó llamados de atención a su ejecución, los cuales hacen parte de los informes mensuales entregados al FDLM así como en el Informe de presunto incumplimiento de referencia MIRS-MAR-112-2019 del día 02 de agosto de 2021, radicado ante el FDLM No 2021-641-004016-2, lo que a la fecha de la suspensión del contrato de obra, al evaluar el avance con relación al tiempo de ejecución, demuestra atraso con responsabilidad únicamente por parte del contratista.



MIRS-MAR-151-2019

- 3- Con relación a la "Tabla No 1", se evidencia que no cuenta con la identificación PK-ID de los elementos relacionados, en el CIV 14001506, no se relaciona la falta la instalación de las domiciliarias del costado occidental, la conformación de estructura, así como la instalación de granulares, instalación de sardineles, instalación de carpeta asfáltica, construcción de sumideros y demarcación, además que la referencia de costado es el costado OCCIDENTAL.

Consola
Para los CIV 14001481 y 14001469, se aclara que en este frente de obra no solo hace falta esos sumideros si no la conformación de la bocacalle en la Kr 24A, terminación de pozo, instalación de cargue y asfalto, así como demarcación, teniendo en cuenta que según recorrido de verificación del estado actual de los frentes de obra realizado los días 11 y 12 de enero de 2022, y que se relaciona en oficio MIRS-MAR-150-2019 enviado al FDLM con numero de radicado 2021-641-000106-2, se evidencio que en el frente de obra al costado oriental del elemento 14001481, demarcación parcial para aproximación de ruta SITP, la cual fue ejecutada por terceros.

Talleres
Para los CIV 14000772, 1400741, 1400718 y 14001678, se relaciona que hace falta sumideros lo cual no es correcto, hace falta solo una tapa de sumidero de la esquina de la calzada del costado sur oriental del CIV 11400772.

En el número 10 de la lista, esta duplicado el CIV 14001367. *Quitar*

La dirección del CIV 14000178, esta errada, puesto que es la Calle 22A entre KR 19ª y KR 19B *colegio Fecha*

Colegios

- 4- No se relacionan en esta etapa la construcción de los sumideros ni demarcación en los CIV's 14001616 y 14001619, manifiestan que los elementos de andenes se encuentran en capa granular, pero a la fecha y según el tiempo que ha estado expuesta la base granular, se requiere su remplazo y esto obedece únicamente al PK-ID 70476, para el PK-ID 70478 solo se han ejecutado actividades de construcción de cajas de inspección pero están incompletas y no se han adelantado trabajos para rehabilitación de andén, siendo estos de mayor prioridad por estar al costado e inmediatos a dos colegios tal como se relaciona en el oficio MIRS-MAR-150-2019 enviado al FDLM por la presente interventoría el día 12 de enero de 2021, con numero de radicado 2021-641-000106-2, y como se ha solicitado en múltiples ocasiones tanto por el apoyo a la supervisión como por la presente interventoría, de igual manera y como antes expuesto según recorrido de verificación del estado actual de los frentes de obra realizado los días 11 y 12 de enero de 2022, se evidencio una demarcación parcial en el segmento ejecutada por terceros.

Ajustar por Terceros

- 4- Con relación a la "Tabla No 2", se evidencia que no cuenta con la identificación PK-ID de los elementos relacionados, se solicita corregir ortografía en la documentación enviada. *Verificar*
- 5- Según el documento enviado por el contratista de obra CON&CON SAS, las fechas dispuestas en el mismo no pueden ser avaladas, estas estarán sujetas a la aprobación y según disponga el FDLM con relación a reinicio, por lo que se requiere anexar una PROGRAMACION DE OBRA,



MIRS-MAR-151-2019

desglosada y con las actividades a realizar, con ruta crítica y tiempos más acordes y ajustados a la realidad, esto con relación que lo que se anexa en el ANEXO 1, es un CRONOGRAMA el cual no es legible ya que al exportar al formato PDF, se pierde el texto descriptivo de la actividad, lo que se alcanza a apreciar es que se encuentran actividades en calzada y andén que se sobreponen en tiempo, recordando que esto no es permitido en ningún caso por la SDM, por ejemplo los tiempos de ejecución de actividades como "DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO", "EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN" y "SUBBASE GRANULAR CLASE C", entre otros, para los elementos de andenes del CIV 14001506 son completamente desfazados y fuera de la realidad, llegando a manifestar que su demolición toma (14) catorce días calendario para demoler y otros (14) catorce días calendario para excavación manual, así como (15) quince días calendario para instalar sub-base granular, o tampoco se incluye la actividad de INSTALACION DE SARDINEL, También se evidencia que al ser solo un cronograma no está ajustado al desarrollo real de las actividades ya que se muestran algunas como lo son la construcción de las cajas de inspección, luego de todo este proceso descrito anteriormente, pero si nos remitimos a la realidad son actividades que se deben ejecutar de manera simultánea, dicho esto para poder realizar una verificación y seguimiento real y eficiente de las actividades a ejecutar en el contrato de obra para su continuación y culminación se necesita esta PROGRAMACION DE OBRA, incluyendo todos los segmentos y actividades, en formato PROJECT, para su revisión, ya que el tiempo descrito podría variar.

- 6- Con relación a lo mencionado en el numeral "B. ETAPA No.2:", donde manifiesta el contratista de obra lo siguiente: *"A la fecha no se cuenta con aprobación por parte del Fondo de Desarrollo local de Mártires la asignación de los nuevos segmentos a intervenir los cuales se relacionan en la Tabla No.3, es importante aclarar que los presupuestos fueron concertados por MIRS LATINOAMERICA S.A.S como Interventor de este contrato."*, se considera lo siguiente:

La aprobación de los segmentos tal como se describen en la tabla No 3 incluida en el documento, está sujeto únicamente a aprobación por parte del FDLM, teniendo en cuenta que la presente interventoría considera que los elementos allí descritos, primero considerando que esta tabla precisa de inexactitudes, son óptimos para su ejecución y se acogen a lo descrito en Anexo técnico definitivo 2019, para el contrato de obra 137 de 2019 en su numeral 3 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE- Intervención en el espacio público, que dice: *"La intervención en el espacio público de las vías preseleccionadas de la localidad, estará dirigida a las aceras asociadas a las calzadas que se van a intervenir y las actividades corresponden a realizar las labores necesarias para garantizar accesibilidad y continuidad. Estas intervenciones se adelantarán conservando el material de superficie existente (concreto o adoquín).*

Se ACLARA por parte de la presente interventoría que la "concertación" manifestada por el contratista de obra, obedece únicamente a una verificación técnica y cuantitativa del posible presupuesto para estas actividades pero, que de igual manera es susceptible a cambios, ya que la presente Interventoría MIRS, revisa la proyección de presupuesto y balance del contrato, más NO son los que aprueban, solo verifica.



MIRS-MAR-151-2019

- 7- En la Tabla No 3, se requiere el incluir como lo describen, el PK-ID de los elementos, ya que solo relacionan CIV y se recuerda que en algunos casos como lo es en el CIV 14001469 cuenta con (4) PK-ID, si bien se relaciona anden, cuenta con (2) PK-ID, se debe ajustar toda la tabla, para el CIV 14001506 no incluyen los (2) Dos PK-ID de ambos andenes, no se sabe cuál relacionan o si son ambos, se debe ajustar en toda la tabla, de igual manera se debe ajustar el nombre de los barrios en los numerales 15.23 y 25, así como se relacionan como "adición 2 y adición 3" lo cual es impreciso debido a que ambas calzadas están consignadas en la prórroga y adición N°1 al contrato de obra CO-137-2019, también ajustar las direcciones de los numerales 23 y 25.

Con relación a "Nota: Las Acciones de Movilidad No Requieren Tramite de PMT", que incluyen bajo la tabla, esto queda únicamente a consideración ante el FOLM.

- 8- Las fechas descritas para la ejecución de lo descrito en la Tabla No 4, y en el documento, se encuentran fuera de tiempo, las mismas se deberán ajustar según la PROGRAMACION DE OBRA, solicitada y lo descrito en el numeral 5 del presente documento.

La tabla No 4 precisa errores de ortografía corregir.

Se evidencia que se propone un tiempo de 90 días calendario para las actividades allí descritas, pero como se menciona anteriormente en el numeral 5 del presente documento no se comparte que los tiempos obedezcan a la ejecución real, de igual manera se aprecia que en la misma tabla en la columna "ACTIVIDADES A EJECUTAR" no se relacionan todas las actividades a realizar, o su generalidad real, ya que por ejemplo al relacionar "SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB" no se relaciona si es uno o que número de unidades a construir, tal como se describe en el numeral 7 del presente documento, se deben relacionar por ELEMENTO PK-ID, por que describen "ANDEN", mas no se especifica cual será, dentro de esta misma actividad y en consideración a que la construcción de las cajas de inspección para empate de las domiciliarias de cada vivienda con la reposición de la red de alcantarillado no se relaciona esta actividad, se debe incluir.

- 9- En el punto II CRONOGRAMA ACTUALIZADO DE OBRA, relacionan que son "NOVENTA DIAS CALENDARIO" lo cual según el Anexo 1, al documento es errado, ya que dicho cronograma de obra muestra una ejecución de (125) CIENTO VENTICINCO días calendario, no solo (90).

- 10- Se requiere para una correcta evaluación de esta propuesta, la inclusión de un plan de contingencia para la finalización de los frentes en ejecución y los próximos a ejecutar, en donde se contemple, numero de frentes en simultaneo a ejecutar, número de trabajadores en cada frente de obra, maquinaria a implementar en cada frente de obra, horarios para la ejecución, (si se contemplar trabajos en horario nocturno), obtención de permisos ante las entidades que así se requiera para las áreas SST-MA, días y horarios de las labores de área social para los frentes en finalización y para los nuevos, así como el flujo de caja para la prórroga descrita, y toda la demás información que se requiera para la correcta ejecución del contrato de obra. Todo esto

Verificar
si se puede

1

**MIRS-MAR-151-2019**

considerando el atraso que ya conlleva el contrato de obra, por ende no se considera que los tiempos propuestos sean convenientes para la entidad, ya que según el documento enviado solo refiere a un tiempo de ejecución pero teniendo en cuenta que la presente interventoría genero el Informe de presunto incumplimiento de referencia MIRS-MAR-112-2019 del día 02 de agosto de 2021, radicado ante el FDLM No 2021-641-004016-2, y según el oficio de solicitud de información proceso de presunto incumplimiento para el contrato de obra co-137-2019, oficio MIRS-MAR-150-2019 enviado al FDLM por la presente interventoría el día 12 de enero de 2021, con numero de radicado 2021-641-000106-2

- 11- La concertación de los elementos PK-ID, está sujeta a la revisión por parte del FDLM, con su posible adición y/o sustracción de los mismos, como es su competencia, por lo cual se hace de carácter urgente la emisión de concepto sobre esto.

CONCLUSIÓN:

Se recuerda que la propuesta fue enviada ya hace (51) días calendario, por lo cual se debe ajustar las etapas de ejecución, así como dar complemento según las observaciones dadas mediante el presente documento, para su evaluación final y posible aval, esto considerando lo descrito en el oficio MIRS-MAR-150-2019 enviado al FDLM por la presente interventoría el día 12 de enero de 2021, con numero de radicado 2021-641-000106-2, donde se manifiesta por parte de la presente interventoría el estado de los frentes de obra.

La presente interventoría considera que el visto bueno por parte de la presente interventoría para la prórroga solicitada, está sujeto a la revisión de la actualización y complemento de la propuesta enviada por el contratista de obra, según lo que se describe en el presente documento, ya que al no tener la información concreta para su completa verificación no se puede dar un aval definitivo a la misma, se recuerda que la presente interventoría únicamente genera un concepto a la solicitud, pero queda en manos del contratante en este caso el FDLM, el otorgar o no dicho aval. Así mismo el contratista de obra, según el concepto que se emita, si es favorable deberá solicitar formalmente dicha prórroga al contrato de la referencia y en los términos que se definan,

Atentamente,

NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA
R.L. MIRS LATINOAMERICA S.A.S

Anexos: Folios (L).
Proyecto JAF-C



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

1533
1440

Al contestar por favor citar estos datos:
Radicado No. 20216420854581
Fecha: 23-12-2021


20216420854581

Página 2 de 2

Adicionalmente, se solicita verificar y certificar el avance de la obra al momento de la suspensión, en relación con el avance del 89% que manifiesta en la solicitud para el relicto de la misma teniendo en cuenta que suspendida la obra, no es posible su ejecución.

Este despacho quedará atento a cualquier gestión que ustedes necesiten y que esté a nuestro alcance, por lo tanto, si usted desea más información puede hacerlo vía correo electrónico alcalde.martires@gobiernobogota.gov.co.

Cordialmente,


JUAN RACHIN CABARCAS RAHMAN

Alcalde Local de Los Mártires.

alcalde.martires@gobiernobogota.gov.co

Anexos: ocho (8) folios. Radicado FDLM No. 20216410066072 y anexos

Copia. CON&CON. Correo: conyon.martires137@gmail.com. Teléfono: 4 821681- 5203971

Proyecto: Stefanny Alonso Muñoz - contratista abogada, área Planeación FDLM

Revisó: Hans Dieter Van Strahlen Bartel - Profesional Especializado, área Planeación FDLM



MIRS-MAR-152-2019

Bogotá D.C., 09 de febrero de 2022

Señores:

Señores:

CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON

Cra 7 N° 127-48 - Oficina 1006

Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 137-2019 CUYO OBJETO ES CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 141-2019 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SISOLOS PROCESOS SST - MA - SO - PMT, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

ASUNTO: COPIA- RESPUESTA A OFICIO No 20216420854581 -SOLICITUD CONCEPTO JURIDICO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO, FRENTE A PROPUESTA PARA CULMINACION DE LOS FRENTE DEL CONTRATO DE OBRA No. 137-2019.

Cordial saludo,

Con relación a la propuesta enviada por ustedes para la continuidad del contrato de obra de la referencia y según el oficio 20216420854581, allegado a la presente interventoría por medio electrónico el día 20 de enero de 2022 en el cual la alcaldía local de los mártires, solicita el concepto sobre dicha propuesta se les remite a solicitud del apoyo a la supervisión por parte del FDLM, copia de esta respuesta la cual fue emitida y enviada mediante correo electrónico al cdi.martires@gobiernobogota.gov.co el día lunes 24 enero 2022 a las 12:49 radicado con el No. 20226410003052, para fines pertinentes,

Atentamente,

NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA
R.L. MIRS LATINOAMERICA S.A.S

Amazon Photos (14) PDF
Project: LAF2

Recibido
Cancillería
11 de febrero de 2022

Dir: Calle 23 f # 85 A 31. Telefax: 8039343. Cel. 3014313648. Email: contrato141@gmail.com

Página 1 de 1



MIRS-MAR-153-2019

Bogotá D.C., 25 de febrero de 2022

Señores:

CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON

Cra 7 N° 127-48 - Oficina 1006

Bogotá D.C.

Recibido
1-03-2022
Hora 8:16 a.m.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 137-2019 CUYO OBJETO ES CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 141-2019 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SISO LOS PROCESOS SST - MA - SO - PMT DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FORMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

ASUNTO: SOLICITUD DE MEDIDAS CORRECTIVAS A IMPLEMENTACION PMT Y ESTADO DE OBRAS, PARA EL CONTRATO DE OBRA CO-137-2019.

Cordial saludo,

Por medio del presente oficio nos permitimos solicitar seguimiento a las obras referentes al contrato de obra CO-137-2019 suscrito entre CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. CON&CON, y el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES, teniendo en cuenta las audiencias previas sostenidas anteriormente y que el día 26 de noviembre de 2021 a las 10:00 horas, se programó nueva audiencia, pero a la fecha no se tiene conocimiento de lo que resuelve el FONDO.

Según recorrido de verificación del estado actual de los frentes de obra realizado los días 11 y 12 de enero de 2022, por medio del cual se emite oficio de numero MIRS-MAR-150-2019 enviado al FDLM y secuencia visita realizada por la presente interventoría el día 17 de enero de 2022 y en recorrido realizado por parte de la personería local, representantes del FDLM, apoyo a la supervisión y la presente interventoría, se logra evidenciar que se presentan afectaciones considerables a las estructuras que, por la no culminación de los confinamientos, atraques, franjas de ajuste y/o andenes correspondientes, pueden sufrir posibles deflexiones y/o fallo estructural, así como están afectando de manera considerable la movilidad peatonal y vehicular en los frentes.

Por ejemplo esto es evidente en el caso del frente de obra de la Carrera 18 entre Calle 2 y calle 3, Barrio Eduardo Santos, CIV (14001506), el cual no cuenta con la finalización de la calzada y que solo está a nivel de base el costado oriental, el cual ya presenta fallo por el tiempo expuesto y que al costado occidental se encuentra a nivel de rajón sin sello y sin culminación de las domiciliarias, lo que ha generado que la misma comunidad cierre el paso vehicular afectando tanto la movilidad, como también el impacto ambiental a los residentes del segmento vial que al tener empozamiento de aguas negras por la falta de

Dir: Calle 23 f # 85 A 31. Telefax: 8039343. Cel. 3014313648. Email: contrato141@gmail.com



MIRS-MAR-153-2019

conducción que proporcionan las redes domiciliarias, como el vertimiento de escombros y basura, por no contar con un cerramiento para el frente de obra, generan condiciones inseguras e insalubres.



Dir: Calle 23 f # 85 A 31. Telefax: 8039343. Cel. 3014313648. Email: contrato141@gmail.com

Página 2 de 6



MIRS-MAR-153-2019




Fotografías 1, 2 3 y 4, estado actual del frente de obra CIV 14001506, Carrera 18 entre Calle 2 y calle 3 visita 11 y 12 de enero de 2022

En el frente de los CIV's 14001619 y 14001616, Calle 1C entre KR19A y KR 19C, se presenta que los mismos están inmediatamente al costado de dos colegios, El colegio técnico menorah y el la Institución

Dir: Calle 23 f # 85 A 31. Telefax: 8039343. Cel. 3014313648. Email:contrato141@gmail.com

**MIRS-MAR-153-2019**

educativa Distrital Eduardo Santos, en los cuales no se ha finalizado los trabajos en andenes, dejando en el tramo al costado norte por la calzada de los colegios, cajas de inspección sin tapas y con plafones que han sido deficientes en el tiempo, así como al costado sur en andenes, cajas de inspección sin plafones, extendido sin compactar de base granular la cual ya se encuentra segregada, sin fundida de andenes, lo cual afecta la movilidad de peatones y teniendo en cuenta que ya se ingresaron los colegios de manera presencial.

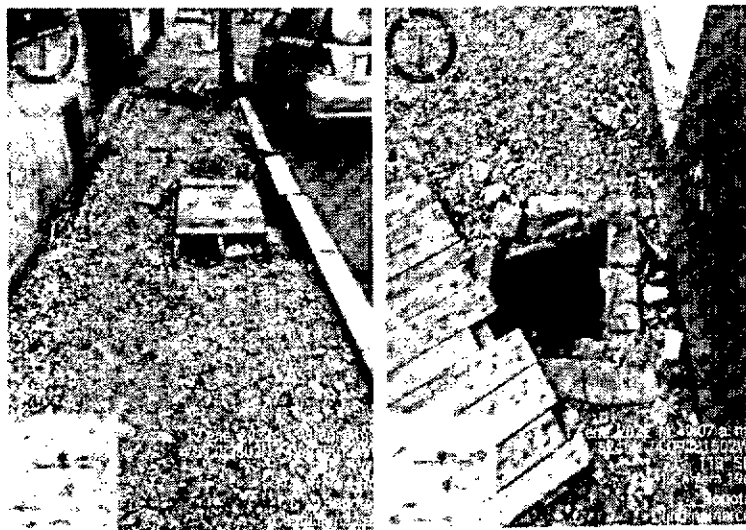


Fotografías 5, 6 y 7, costado Sur CIV 14001619 y , Calle 1C entre Kr 19A y Kr 19B BIS

MIRS S.A.S

LATINOAMERICA


MIRS-MAR-153-2019

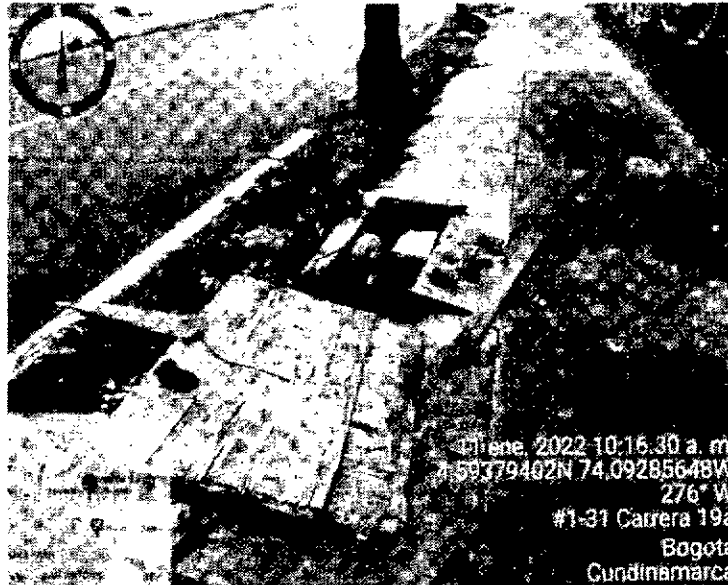

15411
1417

MIRS S.A.S. LATINOAMERICA

MIRS-MAR-153-2019

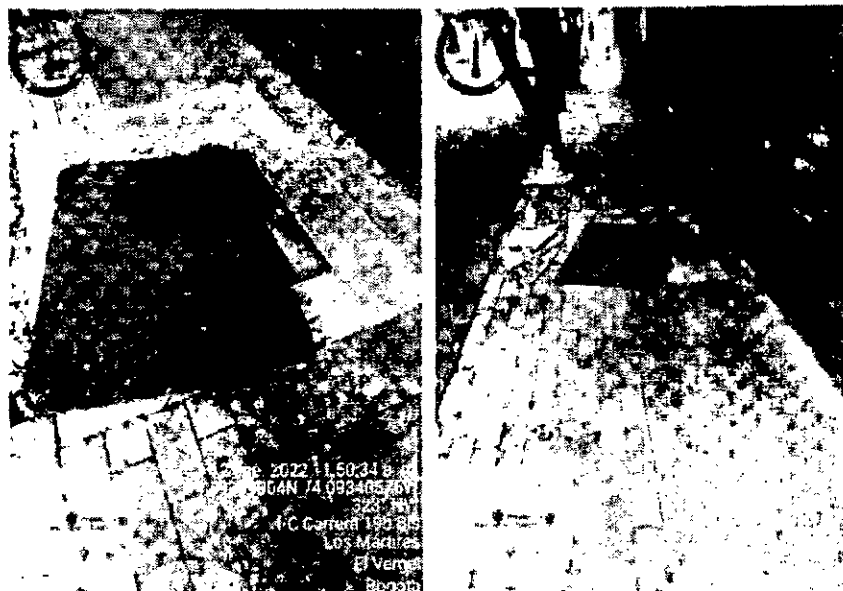

Fotografías 8, 9, 10 y 11, costado Norte CIV 14001619 y 14001616, Calle 1C entre Kr 19A y Kr 19C

Se solicita al contratista de obra, el tomar medidas con relación al flujo vehicular de la Carrera 18 entre Calle 2 y calle 3, Barrio Eduardo Santos, CIV (14001506), ya que en recorrido se evidencia que el mismo se aproxima por el costado occidental de la calzada y al no contar con un cerramiento completo en el momento se requiere complementar el mismo y/o el instalar una medida más visual como un Maletín, esto a criterio y en acuerdo con la presente interventoría, teniendo en cuenta que el cumplimiento del PMT se debe ejercer hasta la finalización de las obras.

Para el frente de los CIV's 14001619 y 14001616, Calle 1C entre KR19A y KR 19C, se solicita el tomar las medidas correctivas para el correcto plafonamiento y/o delimitación de las zonas que pudieren ser un riesgo para los estudiantes, todo esto en pro de evitar accidentes.

Atentamente,

NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA
R.L. MIRS LATINOAMERICA S.A.S

Anexos Folios (C):
Proyecto DAFC

CC ALCALDIA LOCAL DE MARTIRES
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
Av. Calle 19 #28-80 Centro Comercial Calima Piso 7
Bogotá D.C.

Dir: Calle 23 f # 85 A 31, Telefax: 8039343. Cel. 3014313648. Email:contrato141@gmail.com
Página 6 de 6



1541
14/18

MIRS-MAR-154-2019

Bogotá D.C., 24 de marzo de 2022

Señores:

**ALCALDIA LOCAL DE MARTIRES
FONDO DE DESARROLLO LOCAL**

Av. Calle 19 #28-80 Centro Comercial Mall Plaza Piso 7
Bogotá D.C.

25/3/22, 12:46

Sticker web

Avenida: Avenida de Martires

R No. 2022-641-001653-2

2022-03-23 12:46 - Telara - Andres

Justicia: Area de Gestión de Decretos

Ramita: MIRS FONDOS AMERICA S.A.S



REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 137-2019 CUYO OBJETO ES CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE. LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 141-2019 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SISO LOS PROCESOS SST - MA - SO - PMT, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FORMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO No 20216420854581 -SOLICITUD CONCEPTO JURIDICO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO, FRENTE A PROPUESTA PARA CULMINACION DE LOS FRENTE DEL CONTRATO DE OBRA No. 137-2019.

Cordial saludo,

Por medio del presente oficio nos permitimos dar respuesta al oficio enviado a la presente interventoria mediante el correo electrónico contrato141@gmail.com a la dirección de correo cdi.martires@gobiernobogota.gov.co, el día 14 de marzo de 2022 a las 15:13, en donde se da traslado copia de la propuesta enviada por el contratista CON&CON SAS, para la culminación de la ejecución del contrato de obra CO-137-2019 suscrito ante el FDLN, y como se informó por medio de la audiencia "Citación reanudación audiencia Contrato de Obra No. 137 de 2019. Póliza de Cumplimiento No. AA00788512 y AA007885 expedida por EQUIDAD SEGUROS Póliza RCE No. AA007887 expedida por EQUIDAD SEGUROS, sostenida el día 07 de marzo de 2022", y según la mesa de trabajo realizada el día 10 de marzo de 2022, por medio del cual se solicita a la presente interventoria el dar concepto sobre la propuesta, mediante oficio del asunto.

A continuación, se emite concepto sobre la propuesta así:

Se remite mediante oficio MIRS-MAR-151-2019, observaciones a la propuesta inicial y se da respuesta la cual fue emitida y enviada mediante correo electrónico a cdi.martires@gobiernobogota.gov.co, el día lunes 24 enero 2022 a las 12:49 radicado con el No. 20226410003052, y al correo contrato141@gmail.com, el día 09 de febrero de 2022, según indicaciones del apoyo a la supervisión.

Dir: Calle 23 f # 85 A 31, Telefax: 8039343. Cel. 3014313648. Email: contrato141@gmail.com

Página 1 de

MIRS-MAR-154-2019

Que luego de atender la citación a la reanudación de la audiencia anterior descrita, se estableció que se realizaría otra reunión en conjunto con apoyo a la supervisión el día 10 de marzo de 2022, en la cual se determinó que el contratista de obra ajustaría la propuesta enviada, según las consideraciones dadas por la presente interventoría mediante el oficio MIRS-MAR-151-2019 enviado al contratista CON&CON el día 09 de febrero mediante correo electrónico, a esto se aclara que la presente interventoría solo emite un concepto y visto bueno a la propuesta, pero es potestad netamente del FDLM el dar una Aval a la misma.

Con relación al oficio C&C-CO137-2019-126 del día 14 de marzo de 2022, enviado por el contratista de obra al FDLM y con copia a la presente interventoría por correo electrónico, y radicado en físico ante el FDLM en día 16 de marzo de 2022 de No 2022-641-001494-2, dando respuesta al oficio MIRS-MAR-152-2019, en el cual se remite copia del oficio MIRS-MAR-151-2019, radicado ante el FDLM, se tienen las siguientes consideraciones:

- a- Dentro de las observaciones que la presente interventoría había remitido al contratista de obra mediante oficio MIRS-MAR-151-2019, se observa que se atienden en su mayoría, pero quedando otras que no, como la de incluir un plan de contingencia ya que se debe considerar que a la fecha se han realizado (2) dos prórrogas y (1) una adición al contrato de obra, por lo cual se considera que no se realizó la aclaración del estado actual del contrato, a lo cual se adjunta la tabla resumen:

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"
NÚMERO DEL CONTRATO:	CO-137-2019
REPRESENTANTE LEGAL	Arq. JUAN PABLO RICCI
VALOR DEL CONTRATO.	\$ 5.437.884.572
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 5.437.884.572
ADICION N°1	\$2.845.236.531
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 8.283.121.103
CONTRATISTA:	COSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS CON&CON
INTERVENTORIA	MIRS LATINOAMERICA S.A.S
ENTIDAD CONTRATANTE:	Alcaldía Local de Los Mártires - FDLM
DURACION INICIAL DEL CONTRATO	Siete (07) meses
FECHA DE INICIO (Firma acta de inicio)	25 de Febrero de 2020
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN CONTRATO	24 de Septiembre de 2020

MIRS-MAR-154-2019

SUSPENSION N°1	24 de Marzo de 2020
REINICIO N°1	21 de Julio de 2020
PRORROGA N°1	Dos (02) meses
SUSPENSION N°2	28 de Noviembre de 2020
REINICIO N°2	22 de Diciembre de 2020
SUSPENSION N°3	05 de Abril de 2021
REINICIO N°3	29 de Junio de 2021
PRORROGA N°2	Dos (02) meses
SUSPENSION N°4	16 de Septiembre de 2021
FECHA DE TERMINACION DESPUES DE SUSPENSIONES Y PRORROGAS	17 de Septiembre de 2021


b- En cuanto a "... faltando por ejecutar la construcción de sumideros y la demarcación...", se aclara que a la fecha no se cuenta con el recibo de los diseños de demarcación de las calzadas, tal como se manifestó en el oficio MIRS-MAR-151-2019 numeral 2 párrafo 4.

c- se atienden observaciones con relación al a denominación de los elementos a ejecutar, identificados por medio de código PK-ID.

d- Se ajusta la descripción de las actividades faltantes dentro de los frentes activos.

El contratista de obra anexa según lo solicitado, PROGRAMACION DE OBRA, CRONOGRAMA, y anexos de maquinaria y personal, según como lo solicito el FDLM en reunión del día 10 de marzo de 2022. Si bien la presente interventoría se encontró presta a revisar la información enviada por el contratista de obra, se aclara que la programación obedece a unos tiempos mas acordes a la ejecución real y se registra por esta para su seguimiento, la fecha de reinicio marcara el seguimiento de la misma por lo cual las fechas podrian variar un poco.

Mediante las observaciones dadas por la presente interventoría, oficio MIRS-MAR-151-2019, al documento enviado, se solicitó: "Se requiere para una correcta evaluación de esta propuesta, la inclusión de un plan de contingencia para la finalización de los frentes en ejecución y los próximos a ejecutar, en donde se contemple, numero de frentes en simultaneo a ejecutar, número de trabajadores en cada frente de obra, maquinaria a implementar en cada frente de obra, horarios para la ejecución, (si se contemplan trabajos en horario nocturno), obtención de permisos ante las entidades que así se requiera para las áreas SST-MA, días y horarios de las labores de área social para los frentes en finalización y para los nuevos, así como el flujo de caja para la prórroga descrita, y toda la demás información que se requiera para la correcta ejecución del contrato de obra". Si bien el contratista de obra adjunta documentación para dichas



MIRS-MAR-154-2019

ejecuciones, solo consideraron los tiempos de ejecución en horarios tipo oficina y sin incluir días festivos, los cuales se "podrían" ejecutar y acortar en el tiempo dicha prórroga. Tampoco incluyen un plan de contingencia como se había solicitado, mediante oficio MIRS-MAR-151-2019.

Además de lo anterior, en donde se describe el plan de acción a implementar, mediante el oficio C&C-CO137-2019-126 del 14 de marzo de 2022, compartido por la entidad contratante para ser objeto de revisión por parte de esta interventoría, el contratista de obra CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS – CON Y CON, por medio de su apoderado, Javier Alejandro Mayorga Valencia, convoca a la Alcaldía Local de los Mártires a una etapa de arreglo directo con el objeto de que se resuelvan: "(...) las dificultades acaecidas en el marco de la ejecución del contrato de obra No. 137 de 2019 (...)", "(...)con el único fin de lograr llegar a un acuerdo que permita terminar en la ejecución del mencionado contrato (...)."

La solicitud anteriormente expuesta es basada en la cláusula 27 del contrato que estipula.

"(...) CLAUSULA 27 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte de la existencia de una diferencia y la explique someramente (...)."

Además, enuncia el solicitante algunas jurisprudencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, relacionada con la procedibilidad del arreglo directo como un mecanismo directo a la solución de conflictos y el concepto de Colombia Compra Eficiente que, de acuerdo con el solicitante, expresa:

"(...) Las Entidades Estatales deben buscar arreglos directos con sus contratistas cuando surja alguna controversia o discrepancia con ocasión del contrato (...)."

Es importante recordar que el arreglo directo (L.80/93, Art 68) es el primer mecanismo alternativo de solución de conflictos establecido por la ley y por la jurisprudencia dentro de la contratación pública, dado que es un mecanismo que depende exclusivamente del principio de autonomía de la voluntad de las partes (L.80/93, Art 13; CC, Art 1602).

La doctrina ha entendido por arreglo directo o negociación un sistema autocompositivo en donde las partes, sin ningún tipo de procedimiento previo establecido, y bajo el principio de la autonomía de la voluntad, deciden resolver sus problemas directamente. Esta es la forma más sencilla de resolver conflictos y se caracteriza porque depende de la libertad de las partes para definir su alcance y su efecto, dado que el producto de la negociación no es vinculante.

Por lo anterior, doctrinalmente se ha dicho que los mecanismos alternativos para la solución de conflictos (MASC) son herramientas para que las partes puedan solucionar de forma voluntaria, rápida, y amigable sus controversias.

MIRS-MAR-154-2019

Sin embargo, tanto la ley como la jurisprudencia impusieron límites al uso de los MASC, dado que estos solamente pueden utilizarse en asuntos de "(...) libre disposición o aquellos en que la ley autorice (...) " (L.1563/12, Art 1) y no resolver controversias relacionadas con el estado civil de las personas, los derechos de los incapaces, los derechos mínimos de los trabajadores u otros asuntos de orden público, como la legalidad de los actos proferidos por la administración (CConst C014/10, M. González Cuervo).

Lo anterior, desde el punto de vista de la contratación pública implica unas serias complicaciones dado que el fundamento del contrato público es la voluntad de las partes (L.80/93, Art 13 y 32) pero el fundamento de cualquier acto precontractual, así como los actos profendos en uso de las facultades excepcionales en la etapa contractual, es la voluntad de la administración (L.80/93, Art 23). En esta medida, no todos los asuntos pueden ser resueltos por medio de los MASC u otros instrumentos, aun cuando estos mecanismos sean una alternativa mucho más idónea y eficaz para garantizar la legalidad y la transparencia de las Entidades Estatales en sus Procesos de Contratación.

Por otra parte, el diccionario de la RAE, define controversia como:

"(...) Discusión de opiniones contrapuestas entre dos o más personas (...) "

Además de lo anterior, el contratista de obra por medio de su apoderado expresa:

1. *"(...) Respecto al principio de arreglo directo en la contratación estatal, la Corte Constitucional estableció en sentencia T-017-05, que este es un pilar fundamental bajo el cual se "edifica" (...) "*

Es importante que el contratista detalle en que parte de la sentencia se determina como pilar fundamental, según lo refuta en el texto.

2. *"(...) Respecto al arreglo directo, el Consejo de Estado ha establecido que este pacto puede ser acordado en el contratado inicial o puede ser suscrito de manera posterior, siendo posible ampliarlo o restringirlo por mutuo acuerdo de las partes (...) "*

El contratista debe aclarar en qué parte del radicado citado, el consejo de estado estableció lo mencionado y además aclarar a que se refiere al mencionar que se puede suscribir de manera posterior, no es claro posterior a que suceso o contexto.

3. *"(...) En conclusión, la figura del arreglo directo se encuentra vigente en el ordenamiento jurídico colombiano, y debe ser de uso continuo en la resolución de controversias que puedan darse en la contratación estatal, ya que es a través de este mecanismo que las partes podrían continuar con la prestación de determinados servicios, evitando la imposición de sanciones como primera instancia lo que perjudica en mayor medida los intereses del Estado y el mayor provecho de los recursos públicos (...) "*

Se debe aclarar que entidad o por medio de que regulación, el arreglo directo debe ser " de uso continuo

152.6
1483



MIRS-MAR-154-2019

presentados por el contratista de obra, en donde manifiesta falta de competencia por parte de la Alcaldía Local de Mártires y el impedimento para iniciar y terminar un proceso sancionatorio en periodo suspendido, es necesario mantener el contrato activo, toda vez que esto permitiría culminar con éxito las actividades contractuales suscritas y realizar un seguimiento y control frente a un proceso de incumplimiento que se pudiera presentar, esto una vez el contrato se encuentre activo y en ejecución y la entidad contratante resuelva o aclare el tema de falta de competencia que acusa el contratista de obra, por lo cual esta interventoría considera que la solicitud del contratista ~~no se puede considerar VIABLE~~ ya que no relaciona la supuesta controversia que pretende conciliar ni la explica siquiera someramente, además de no cumplir con el objetivo principal de culminar las actividades de obra a satisfacción y además sugiere respetuosamente que el proceso a seguir debería ser una prórroga de tiempo contractual en donde se contemplen las actividades necesarias para la culminación del contrato y de este modo culminar a satisfacción el presente contrato de obra y de este modo satisfacer a la población de influencia, teniendo total claridad que las actividades que se ejecutarían deben contar con la presencia de esta interventoría, para garantizar la calidad y correcta ejecución de las actividades y además lograr identificar situaciones que ameriten el inicio de un proceso sancionatorio por retrasos en tiempos contractuales o demás presuntos incumplimientos que pudiesen presentarse.

Se recalca por parte de MIRS LATINOAMERICA S.A.S, que una vez corregidas las observaciones emitidas por la presente interventoría, en cuanto al plan de acción propuesto por el contratista de obra para la culminación de las actividades, esta interventoría emitiría concepto de **VIABILIDAD** para ejecutar lo mencionado dentro de un plazo de prórroga contractual, en el cual se mantengan las garantías y especificación suscritas mediante el contrato principal de obra y su anexo, contrato de interventoría, entendiéndose que el FDLM, sería la entidad encargada de evaluar la necesidad y aprobación de una posible solicitud de prórroga y a su vez se menciona que esta interventoría no considera viable realizar el acuerdo directo que menciona el contratista de obra y **REITERAR LA POSICIÓN DE LA INTERVENTORÍA EN SU NEGATIVA POR LOS MOTIVOS YA EXPUESTOS.**

Agradecemos su atención y colaboración.

Cordialmente,

NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA
R.L. MIRS LATINOAMERICA S.A.S

Anexos: Folios (0)
Procedo: DAFC - ER
CC

CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS CON&CON - CO-137-2019 -

Dir: Calle 23 f # 85 A 31. Telefax: 8039343. Cel. 3014313648. Email:contrato141@gmail.com

Página 7 de 7

Respuesta: 080-00137-2019-134.

1547

1489

ETB

Bogotá D.C. 22 JUN 2022

Señores

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S- NIT 830.041.411.-0

MILENA MOLINA

Carrera 7 No. 124-48 Oficina 1006

Telefono 6014821681

Ciudad

Referencia: **DAÑOS INFRAESTRUCTURA RED DE ETB. – VALORACION 7792**

Asunto: **COBRO PREJURÍDICO DE DAÑOS**

Respetados Señores:

Nos permitimos informar que con ocasión de la ejecución del contrato de obra identificado con el No. 137-2019, celebrado por la Sociedad Consultoría y Constructores S.A.S y el Fondo de Desarrollo Local Los Mártires- Alcaldía Local Los Mártires, se afectó la infraestructura de red de propiedad de **ETB S.A. E.S.P.**, así:

VALORACIÓN	DAÑO	DIRECCIÓN	FECHA DAÑO	VALOR DAÑO
7792	-Red de Fibra Óptica	Carrera 19 C por Calle 1 F	17/12/2020	\$2.392.558,39
TOTAL				\$2.392.558,39
TOTAL INDEXADO CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2022				\$2.637.076,59

De la valoración de daños No. 7792, se establece que el valor total de los daños asciende a la suma de **DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS Y TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$2.392.558,39)**, a la cual una vez aplicada la respectiva corrección monetaria de conformidad con el último IPC publicado por el DANE, esto es, con corte a 31 de marzo de 2022, arroja un valor total de **DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETENTA Y SEIS PESOS Y CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$2.637.076,59)**.

Teniendo en cuenta lo anterior y en atención a la documentación que se adjunta con la presente comunicación, solicitamos se proceda a realizar el pago de los daños ocasionados a la infraestructura de red propiedad de **ETB S.A. E.S.P.** antes del **01 de junio de 2022**, para lo cual previamente requerimos que remita a esta Gerencia ubicada en la Carrera 8 No. 20-00 Piso 12º de la ciudad de Bogotá D.C. o a los correos atencionescontenciosos@etb.com.co o diana.aguadac@etb.com.co la información y/o documentos que se relacionan a continuación, los que le apliquen, con el fin de solicitar al área financiera la expedición de la factura correspondiente, la cual será enviada a la dirección por usted suministrada:

01-37 7-F-020-v 7

"Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado".

14/04/2021

Pág. 1

1543

1155

T b

eTb

Carrera 8 No 20 - 10 Piso 1 Oficina de Correspondencia ETR
Código Postal: 110311
Teléfono: 242 2030

CERTIFICADO DE EXISTENCIA INFRAESTRUCTURA

La Gerencia Red de Distribución, adscrita a la Vicepresidencia de Infraestructura, certifica que el cable acceso 70832 y la infraestructura que se encuentra construida en la carrera 19C con calle 1F en Bogotá, pertenecen a la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.

Características:

Número de Cable	70832
Tipo de cable	CABLE ACCESO
Capacidad	48 hilos de fibra óptica

La presente certificación se expide a los 31 días del mes de diciembre de 2020.



CARLOS ALBERTO BERMEO CALDERON
Profesional I
Gerencia Red de Distribución
Vicepresidencia de Infraestructura

1685年 12月 12日 星期三

DESCRIPTION OF ACTIVITIES

Atividade 1: caso de Francisco reunindo de 21 pessoas, 4 amigos e 2 amigos de 35 e controla de 10 em 2 paradas. Um copo de álcool? uma pena

RESUMEN DE GASTOS NO ENTREGADOS			
FECHA	TERMINA	USDA	DESCRIPCION
1964-01-01	1964-01-31		
1964-02-01	1964-02-28		
1964-03-01	1964-03-31		
1964-04-01	1964-04-30		
1964-05-01	1964-05-31		
1964-06-01	1964-06-30		
1964-07-01	1964-07-31		
1964-08-01	1964-08-31		
1964-09-01	1964-09-30		
1964-10-01	1964-10-31		
1964-11-01	1964-11-30		
1964-12-01	1964-12-31		
1965-01-01	1965-01-31		
1965-02-01	1965-02-28		
1965-03-01	1965-03-31		
1965-04-01	1965-04-30		
1965-05-01	1965-05-31		
1965-06-01	1965-06-30		
1965-07-01	1965-07-31		
1965-08-01	1965-08-31		
1965-09-01	1965-09-30		
1965-10-01	1965-10-31		
1965-11-01	1965-11-30		
1965-12-01	1965-12-31		
1966-01-01	1966-01-31		
1966-02-01	1966-02-28		
1966-03-01	1966-03-31		
1966-04-01	1966-04-30		
1966-05-01	1966-05-31		
1966-06-01	1966-06-30		
1966-07-01	1966-07-31		
1966-08-01	1966-08-31		
1966-09-01	1966-09-30		
1966-10-01	1966-10-31		
1966-11-01	1966-11-30		
1966-12-01	1966-12-31		
1967-01-01	1967-01-31		
1967-02-01	1967-02-28		
1967-03-01	1967-03-31		
1967-04-01	1967-04-30		
1967-05-01	1967-05-31		
1967-06-01	1967-06-30		
1967-07-01	1967-07-31		
1967-08-01	1967-08-31		
1967-09-01	1967-09-30		
1967-10-01	1967-10-31		
1967-11-01	1967-11-30		
1967-12-01	1967-12-31		
1968-01-01	1968-01-31		
1968-02-01	1968-02-28		
1968-03-01	1968-03-31		
1968-04-01	1968-04-30		
1968-05-01	1968-05-31		
1968-06-01	1968-06-30		
1968-07-01	1968-07-31		
1968-08-01	1968-08-31		
1968-09-01	1968-09-30		
1968-10-01	1968-10-31		
1968-11-01	1968-11-30		
1968-12-01	1968-12-31		
1969-01-01	1969-01-31		
1969-02-01	1969-02-28		
1969-03-01	1969-03-31		
1969-04-01	1969-04-30		
1969-05-01	1969-05-31		
1969-06-01	1969-06-30		
1969-07-01	1969-07-31		
1969-08-01	1969-08-31		
1969-09-01	1969-09-30		
1969-10-01	1969-10-31		
1969-11-01	1969-11-30		
1969-12-01	1969-12-31		
1970-01-01	1970-01-31		
1970-02-01	1970-02-28		
1970-03-01	1970-03-31		
1970-04-01	1970-04-30		
1970-05-01	1970-05-31		
1970-06-01	1970-06-30		
1970-07-01	1970-07-31		
1970-08-01	1970-08-31		
1970-09-01	1970-09-30		
1970-10-01	1970-10-31		</

24053

Genaro Lotano c

4-72 

ETB

ACTA RECONOCIMIENTO DE DAÑOS CAUSADOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE "RED" - ETB

En ciudad de Bogotá a los 17 días del mes de Diciembre del año 2020 el suscrito
funcionario Sergio Vasquez de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE
BOGOTÁ S.A. E.S.P. identificado con el Código Interno ETB 29090 puede constatar que: La firma
CONTRATISTA CON Y CON identificada con el NIT 830091411
y el número de contrato 137-2019 OCASIONÓ DAÑOS en la
INFRAESTRUCTURA de ETB ubicada en la siguiente DIRECCIÓN: Km 196 H 1C
BARRIO: Edvarado Cantón del cual tiene pleno conocimiento el señor (a)
Milena Molina identificado con cédula de ciudadanía N° 1013374876
en su calidad de Representante y/o Ingeniero Residente de Obra X y/o Interventor de
Obra que para efectos de cualquier reclamación registra la siguiente Dirección de Oficina
Km 97 H 127-48 y número telefónico 3008816855

Los daños causados afectaron la siguiente infraestructura:

Cable ☐ Cable ☒ Armado ☐ Otro ☒ (especifique cuál) Ducteria

DESCRIPCION DEL DAÑO Falla de fibra y ducteria por desperfectos

OBSERVACIONES

Caja de empalmes cubiertas y tapaderas de fibra

TESTIGO

El señor (a) Daniela Andres Medina identificado con c.c. N° 4030689248 B-28 con número
telefónico 3213221747 en su calidad de testigo de los hechos, suscribe la presente.

Firma de quienes intervienen en el diligenciamiento del presente documento.

REPRESENTANTE: ETB

Sergio Vasquez
E.B. FUNCIONARIO ETB

RESIDENTE OBRA: CONTRATISTA

Milena Molina
C.C. 1013374876 DE: P.R.O.

TESTIGO

Daniela Andres Medina
C.C. 4030689248

INTERVENTOR OBRA: CONTRATISTA

Daniela Andres Medina
C.C. 4030689248 DE:

PARA USO INTERNO "EXCLUSIVO" de la "EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P." en el diligenciamiento del FORMATO 20-02 DE AVALUO DEL DAÑO se debe anexar la presente "ACTA".

FORMAT 20-01

En:

Última actualización: Agosto/04 (L.1410)

GERENCIA ASEGURAMIENTO DE DAÑOS
15 de agosto de 20



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

1551
4458

Al contestar por favor cite estos datos

Radicado No. 20226420294951

Fecha: 27-04-2022

20226420294951

A Bogotá, D.C.

Señor:

NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA

Representante Legal MIRS Latinoamérica S.A.S.

Correo electrónico: contrato141@gmail.com

mer-ltda@gmail.com

En calidad:

ASUNTO: TRASLADO POR COMPETENCIA - COMUNICADO EAABB RADICADO E-2022-10021678, SUMIDEROS PLUVIALES ELIMINADOS POR OBRAS FDALM, EN LA CALLE 1B ENTRE CALLES 27ª A 28, EN EL BARRIO SANTA ISABEL

REFERENCIA: RADICADO FDML NO. 20226410021972

Estimados señores interventores del COP 137 de 2019,

La atención al asunto de tal referencia, me permitió realizar traslado por competencia para instaurar la acción de amparo y reclamo (PQR) y así darle trámite en el marco del contrato de obra 137 de 2019, cuyo objeto es, contratar e implementar trabajos fijos por la modalidad de monto agotable, las obras y actividades para la conservación de la mall vial y espacio público de la localidad de Los Mártires.

Todo lo anterior para dar respuesta al oficio radicado por la Empresa de Acueducto y alcantarillado de Bogotá por la que se realiza por el solicitante CARLOS ALBERTO CANO MEDINA, en cuanto al aseoamiento por los sumideros del CIV intervenido, identificado bajo el número 14001367, ubicado en la calle 1B entre calles 27ª a 28ª en el barrio Santa Isabel.

Quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional. Cordialmente,


JUAN RACHE CABARCAS RAHMAN.

Alcalde Local de Los Mártires

alcalde.martires@gobiernobogota.gov.co

En copia a: Oficina de Planeación y Gestión Urbana y Infraestructura FDLM PJ

Oficina de Planeación y Gestión Urbana y Infraestructura FDLM PJ

Oficina de Planeación y Gestión Urbana y Infraestructura FDLM PJ

Oficina de Planeación y Gestión Urbana y Infraestructura FDLM NO. 20226410021972

Alcalde local de Los Mártires

CDM G. 100106

Verónica C.

Fecha: 22 de febrero de 2022

Código: No. 2022000



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

1552
1454



Página 1 de 1
FACTURA VIRTUAL

3333002-S-20222-099000

Bogotá D.C., 12 de marzo de 2022

20/4/22 10:17

Stoken web

R No 2022-041-002197-2



https://cdi.gobiernobogota.gov.co/.../ar

Remite

Destinatario

Doctor

JUAN RACHIF CABARCAS RAHMAN

Alcalde Local de Los Mártires

Av. Calle 19 N°28-80 Centro Mall Plaza, piso 6 Torre parqueaderos

Código Postal 111411

Teléfono (601) 3759535

Bogotá D.C

Asunto: Traslado Radicado E-2022-10021678
sumideros pluviales eliminados por obras FDALM

Cordial saludo Doctor Cabarcas.

Por considerarlo de su competencia, la EAAB-ESP se da traslado del oficio radicado bajo el número E-2022-010021678 en el que el peticionario Carlos Alberto Cano Medina informa que existe "apostamiento" de aguas lluvias luego que contratistas que pavimentaron la vía Calle 1B entre carrera 27A y Carrera 28. CIV N°14001367, se eliminaron los sumideros. Lo cual la EAAB-ESP confirmó, como se observa el siguiente registro fotográfico:



Registro fotográfico N°1 Vista del estado Actual con encharcamiento en vía no existen sumideros luego de la obra de la Alcaldía Local de los Mártires



Imagen N°2 Tomada de Google Maps junio de 2019 donde se observan los dos sumideros construidos de la red pluvial de alcantarillado local.



SC701-1

Av. Calle 24 # 37-15 Código Postal 111321
PBX (571) 3447000 www.acueducto.com.co
Bogotá D.C. - Colombia

MPF00021F02-05



BOGOTÁ



acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ



Por lo anterior la EAAB-ESP solicita que dentro de las garantías y estabilidad de la obra y contrato del Fondo de Desarrollo de la Alcaldía Local de los Mártires # 137-2019 (según la información consignada en Sistema de Información del sistema SIGIDU), ordene a quien corresponda sea restituido el funcionamiento de la red de alcantarillado pluvial, con la construcción de los elementos (dos sumideros) suprimidos o eliminados unilateralmente por el contratista, interventoría y supervisor del contrato, cuya total y completa responsabilidad es de la alcaldía Local y eliminar la afectación que se origina en el corredor vial por el "encharcamiento" y la no captación y disposición de las aguas lluvias hacia el sistema de alcantarillado

La empresa queda a la espera de que se informe la fecha de la intervención, para verificar que los elementos cumplan las normas técnicas y especificaciones vigentes de la EAAB-ESP

Se remite copia del siguiente documento.

✓ Copia del oficio E-2022-10021678, en dos (2) folios.

Cordialmente,

Miguel Angel Casallas Torres
Profesional Servicio Alcantarillado Zona 3

Oficio E-2022-10021678

Emisor: M. Casallas, Profesional Servicio Alcantarillado Zona 3
Receptor: Jefe de CAD Division de ALCantarillado Zona 3



SC001

Av. Guay 24 # 37-15 Código Postal 111321
PBX: (571) 3447600 www.acueducto.com.co
Bogotá D.C. - Colombia

MP 00851702-05



BOGOTÁ

1554
~~1461~~

Bogotá martes, 15 marzo de 2022

Señores,

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – ESP (EAAB-ESP)

Atención al cliente zona ZN03

Ciudad

Asunto: DERECHO DE PETICIÓN CUENTA CONTRATO No.

10159875

Con fundamento en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", me dirijo a ustedes para formular la siguiente (señale con una X, la opción que corresponda).

Petición:

☒

Queja:

☐

Reclamo:

☐

Sugerencia:

☐

HECHOS:

al frente de mi casa hicieron una obra y taparon 2 alcantarillas y dejaron 2 habilitadas pero desde hace un mes las alcantarillas habilitadas están tapadas lo que genera el aposamiento del agua. se llamo y fue un carro hacer la visita pero no hicieron nada para destaparlas y a la fecha continua bastante agua aposada, lo que me preocupa con estas fuertes lluvias.
solicita la visita del carro vector para destapar las alcantarillas ubicadas en la cl 1b 27a 72 barrio santa isabel.

PRETENSIONES:

solicito la visita del carro vector para destapar las alcantarillas ubicadas en la cl 1b 27a 72 barrio santa isabel.

ANEXOS:



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos

Radicado No. 20226420311801

Fecha: 04-05-2022

20226420311801

Bogotá, D.C.

Respuesta CSC-20137-2019-131

642

Señores

NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA

Representante Legal MIRS Latinoamérica S.A.S.

Correo electrónico: contrato141@gmail.com

narslida@gmail.com

Ciudad

ASUNTO: TRASLADO POR COMPETENCIA – INFORME DE SALDO DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 137 DE 2019.


REFERENCIA: MEMORANDO RADICADO FDML NO. 20226420001613

Estimados señores interventores del COP 137 de 2019,

En atención al asunto de tal referencia, me permito realizar traslado por competencia, así solicito muy amablemente emitir un informe tanto de su firma como de la empresa CON & CON, para así darle trámite al memorando NO. 20226420001613 de fecha 27 de abril del año en curso suscrito por la profesional Betsabe Riveros Hernández, para establecer el estado del anticipo del contrato de obra 137 de 2019, que tiene por objeto: *"continuar a precios unitarios fijos por la modalidad de monto agotable, las obras y actividades para la construcción de la media vía y espacio público de la localidad de Los Mártires."*

Quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional.

Cordialmente,


JAIME HERNAN VILLALBA VARGAS.

Aprova a la supervisión LI 141 de 2019.

jaime.villalba@gobiernobogota.gov.co

Proyecto: Puente Angéles Inmaculada Támara – obra Infraestructura FDLM

Firma: Jaime Villalba Vargas – obra Infraestructura FDLM

Revisión: Profesional: Elvira V. Sotillo – Profesional Especializado: Área planeación FDLM

Acto de firma de la Sesión: radicado FDML NO. 302641002172

Alcaldía local de Los Mártires

Alcaldía Local de Los Mártires

Alcaldía Local de Los Mártires

Alcaldía Local de Los Mártires

Alcaldía Local de Los Mártires

Alcaldía Local de Los Mártires

Alcaldía Local de Los Mártires

GDI-LEPIS-0092

Versión: 07

Agencia: 22 de febrero de 2022

Código: No. 73100



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ



SECRETARÍA DE
AMBIENTE

RESPUESTA CA-1558-2022-19
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE Folios: 1 Anexos: No
Radicación: 2022EE127861 Proc: 5084508 Fecha: 2022-05-27 00:21
Tercero: 899999061-9 014 - ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES
Dep Radicadora: SUBDIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL AL
SECTOR PUBLICO (E)
Clase Doc: Salida Tipo Doc: Oficio de Salida

Bogotá DC

Señores

ALCALDIA LOCAL DE LOS MÁRTIRES

Aln. Juan Rachif Cabarcas

Alcalde Local

Av. Calle 19 #28-80 Centro Mall Plaza Piso 6 Torre parqueaderos

Teléfono: 3759535

1/8/22 17:38

Sticker web

Alcaldía Local de los Mártires

R. No. 2022-641-003109-2

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

Subdirección de Control Ambiental

Al Sector Público

Oficio de Salida

https://cdi.gobiernobogota.gov.co/cdi/rad

1/1

Referencia: Radicado SDA No. 2021ER78651 del 29/04/2021 – Remisión de Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, PIN 19049 para el Proyecto "Contrato de obra pública 137 de 2019".

Cordial saludo.

La Subdirección de Control Ambiental al Sector Público –SCASP- de la Secretaría Distrital de Ambiente –SDA, como autoridad ambiental del perímetro urbano del Distrito Capital, en cumplimiento de su misión según lo estipulado en el Decreto 109 de 2009 "Por el cual se modifica la estructura de la Secretaría Distrital de Ambiente y se dictan otras disposiciones", en atención al radicado de la referencia, en el cual la Alcaldía local de los Mártires, solicita cierre del **PIN 19049** para el Proyecto "Contrato de obra pública 137 de 2019", se permite informar lo siguiente:

A continuación, se relaciona la información consolidada del proyecto:

Fecha de inicio	19/10/2020
Fecha de finalización	20/05/2021
Volumen de RCD dispuesto legalmente (m³)	No informado
Volumen de RCD aprovechado (m³)	No informado
Volumen de material usado (m³)	No informado
Porcentaje de Aprovechamiento alcanzado	Conforme los reportes realizados en el aplicativo web, no se ha aprovechado material.

De acuerdo con lo anterior, se verificó la información diligenciada y la documentación adjunta en el aplicativo web, por lo cual, los profesionales adscritos a la SCASP se permiten informar lo siguiente:

Nombre del Proyecto: Contrato de Obra Pública 137 de 2019					
Fecha de revisión aplicativo: 19/04/2022					
PIN: 19049		DISPOSICIÓN FINAL		APROVECHAMIENTO	
Año	Mes	DF Total	Observaciones DF	APROV	Observaciones




Nombre del Proyecto: Contrato de Obra Pública 137 de 2019

Fecha de revisión aplicativo: 19/04/2022

PIN: 19049		DISPOSICIÓN FINAL		APROVECHAMIENTO	
Año	Mes	DF Total	Observaciones DF	APROV	Observaciones
		(m3)		(m3)	APROV
2020	Octubre	810	Cargan certificado de Disposición Final de GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO Y REX INGENIERIA S.A.	0	Cargan anexo 3
2020	Noviembre	315	Cargan certificado de Disposición Final de GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO Y REX INGENIERIA S.A.	0	Cargan anexo 3
2020	Diciembre	0	Certificado de No Disposición	0	Cargan anexo 3
TOTAL, DF		1125	TOTAL, APROV	0	

Imagen 1. Revisión reportes PIN 19049 aplicativo web SDA



Fuente: SCASP 2022





SECRETARÍA DE AMBIENTE

Considerando la tabla anterior, se solicita a la Alcaldía local de los Mártires, que realice el cargue de la información correspondiente al **PIN 19049**, para los meses faltantes de enero a mayo de 2021, además los reportes mensuales deberán estar acompañados de las correspondientes certificaciones de disposición final, emitidas por el sitio autorizado receptor; y de aprovechamiento, emitidas por la constructora con base en el contenido y forma propuestos en el anexo 3 de la Resolución 00932 de 2015. Para todos los casos, el documento debe estar debidamente firmado por el representante legal o el director de obra.

De igual manera se informa que mediante el radicado SDA 2021ER78651 del 29/04/2021, la Alcaldía Local de Mártires remitió el Plan de Gestión de Residuos de construcción y demolición versión 2.0, correspondiente al PIN 19049, el cual, ya cuenta con los ajustes solicitados mediante radicado SDA 2020EE239487 del 12/29/2020, relacionados con los aspectos No 1 Datos Generales de la Obra y No 2 Manejo de los RCD en obra, sin embargo, se solicita cargar el documento ajustado en el aplicativo web.

En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 01115 de 2012 "Por medio de la cual se adoptan los lineamientos Técnico - Ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el Distrito Capital" y la Resolución 0932 de 2015, se efectuó la revisión en el aplicativo web de los reportes mensuales de disposición final de RCD y aprovechamiento de material, evidenciando que hasta la fecha no se ha realizado el cargue de información para los meses enero a mayo de 2021. se deberán cargar los certificados junto al anexo 2 "Formato de seguimiento y aprovechamiento de los RCD en la obra", y los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad.

Conforme a lo anterior, **se requiere actualizar de manera inmediata** los reportes mensuales de generación y aprovechamiento de RCD en el aplicativo web de la obra bajo el **PIN 19049**, para los meses de enero a mayo de 2021.

Finalmente, la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público -SCASP informa que el cumplimiento del porcentaje de reutilización es **OBLIGATORIO**, según lo establecido en la Resolución 01115 de 2012, la cual en su artículo 4 indica lo siguiente:

"DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y CONSTRUCTORAS. Dentro del marco de la Gestión Integral de los Residuos de la Construcción y Demolición- RCD-, a partir de agosto del año 2013, las Entidades Públicas y Constructoras que desarrollen obras de infraestructura y construcción al interior del perímetro urbano del Distrito Capital, deberán incluir desde la etapa de estudios y diseños los requerimientos técnicos necesarios con el fin de lograr la utilización de elementos reciclados provenientes de los Centros de Tratamiento y/o Aprovechamiento de RCD legalmente constituidos y/o la reutilización de los generados por las etapas constructivas y de desmantelamiento, en un porcentaje no inferior al 5% del total



1561
~~1403~~



SECRETARÍA DE AMBIENTE

de volumen o peso de material usado en la obra a construir por la entidad anualmente. Mensualmente deberán reportar a la Secretaría Distrital de Ambiente a través de su portal web, la cantidad total de materiales usados, y el tipo de productos, volumen y/o peso de material reciclado proveniente de los centros de tratamiento y/o aprovechamiento de RCD que se haya utilizado en el mes anterior al reporte, en las obras de infraestructura o construcción desarrolladas por cada entidad o en desarrollo, indicando además los datos de los centros de aprovechamiento y/o tratamiento de donde provengan dichos materiales.

Parágrafo 1.- Cada año dicho porcentaje aumentará en cinco (5) unidades porcentuales hasta alcanzar mínimo un 25%. En caso de agotamiento comprobado de las reservas de material o que la obra o proyecto no pueda cumplir por razones técnicas con dichos porcentajes deberá, previo al inicio de obra, presentar informe técnico a la secretaría Distrital de Ambiente, que sustente amplia y suficientemente su no cumplimiento por parte del responsable del proyecto".

De acuerdo con lo anterior se efectuó revisión para el trámite de cierre del PIN 19049, considerando los ítems anteriores, se informa que **NO ES APROBADO**, por lo cual, los requerimientos aquí descritos deberán realizarse en un **plazo perentorio no mayor a ocho (8) días hábiles** contados a partir de la fecha de notificación del presente comunicado.

Finalmente, es importante recordar que con el fin de evaluar el cumplimiento de la Resolución 01115 de 2012, modificada por la Resolución 0932 de 2015, el Decreto 586 de 2015 "Por medio del cual se adopta el modelo eficiente y sostenible de gestión de los residuos de construcción y demolición -RCD en Bogotá D.C." y los lineamientos establecidos en la Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la Construcción, la Secretaría Distrital de Ambiente en su calidad de autoridad ambiental en el perímetro urbano del Distrito Capital, continuará realizando seguimiento y control a los proyectos constructivos.

Atentamente,

JUAN MANUEL ESTEBAN MENA
SUBDIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PUBLICO

Se anexa



Respuesta

C&C-CO137-2019-143



MIRS-MAR-165-2019

Bogotá D.C. 31 de mayo de 2020

Señores,

CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON

Cra 7 N° 127-48 - Oficina 1006

Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 137-2019 CUYO OBJETO ES CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 141-2019 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SISO LOS PROCESOS SST - MA - SO - PMT, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES

ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO C&C-CO137-2019-139 - ACTUALIZACIÓN HOJAS DE VIDA-CTO 137-2019

Cordial Saludo,

Dando respuesta al oficio del asunto nos permitimos realizar las siguientes observaciones:

CARGO	NOMBRE	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA (1) UNO Dedicación 50%	VÍCTOR MANUEL ARIZA	NO CUMPLE. Ya que la hoja de vida anterior, correspondiente al Ing. Javier Perilla Vacca, posee una experiencia habilitante en años de 3.08 y la anexada solo de 1.97. se debe ajustar según lo dispuesto en el numeral 6 del anexo técnico definitivo. se describe al final de esta tabla. En Anexo 13, se encuentra mal relaciona el objeto del contrato de obra el cual es "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES". Se evidencia que el ingeniero Víctor Anza hace parte del personal del contratista en el cargo de ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS, por lo cual se solicita claridad ya que según el Numeral 7, punto b, del Anexo técnico

IRSLA LATINOAMERICA

MIRS-MAR-165-2019

		definitivo, dice: <i>Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.</i> Por lo cual no se da remplazo para el ingeniero en el cargo de especialista.
RESIDENTE AMBIENTAL (1) UNO Dedicación 60%	CESAR AUGUSTO FONSECA GASCA	NO CUMPLE. Según lo dispuesto en el Otro sí, N°1 numeral 9. CLÁUSULA PRIMERA – MODIFICAR: como se describe al final de esta tabla. Se solicita es, <i>Profesional Ingeniero Ambiental y/o sanitario y/o Ingeniero de recursos hídricos y gestión ambiental</i> , por ende, se debe cumplir el requisito y ya que el ingeniero Cesar Fonseca posee el título profesional en ingeniería civil y una especialización en Gestión ambiental urbana. No cumple. De igual manera se anexan certificaciones como ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL URBANA , y lo que dice el otro sí es: <i>Experiencia Específica deberá acreditar experiencia como residente ambiental de mínimo de dos (2) contratos en proyectos de obra para la Construcción o Conservación o Rehabilitación o Mantenimiento de infraestructura vial urbana para tráfico automotor.</i> Por esto el perfil No cumple. Por otra parte, la dedicación descrita en el formato N° 13 esta mal, ya que es 60%.
RESIDENTE SOCIAL (1) UNO Dedicación 60%	MÓNICA PATRICIA MURCIA ANDRADE	NO CUMPLE. Ya que la hoja de vida anterior, correspondiente a la CS JESSICA JOHANNA NARANJO MORENO, posee una experiencia habilitante en años de 1.19 y la anexada solo de 0.82, se debe ajustar según lo dispuesto en el numeral 6 del anexo técnico definitivo, se describe al final de esta tabla. El certificado anexado de CONSORCIO VÍAS URIBE, no cumple ya que el cargo relacionado es RESIDENTE DE OBRA , pero el perfil requerido es: RESIDENTE SOCIAL , se debe revisar dicha certificación para su aprobación. Verificar la experiencia en

MIRSLA

LATINOAMERICA

MIRS-MAR-165-2019

		meses, porque la certificación de Consorcio vías Uribe solo comprendería desde el 16 de junio de 2016, dando solo 6.43 meses. Dada la dedicación descrita y que correría desde el día 16 de junio por intercambiar tiempos con la otra certificación presentada.
--	--	--

[...]

Numeral 6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO ..

Mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios para el normal y completo desarrollo del objeto contractual y tener disponible y emplear en la ejecución de las obras el personal requerido para la cumplida ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones. Si durante la ejecución del contrato se requiere el cambio de alguno de los profesionales, deberá reemplazarse por otro de iguales o de mayores calidades técnicas, previamente aprobado por el FONDO.

[...]

- Tomado de Anexo 1- Anexo Técnico definitivo 2019 - Cursiva y subraya por la interventoría.

[...]

Numeral 7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.

[...]

- Tomado de Anexo 1- Anexo Técnico definitivo 2019 - Cursiva y subraya por la interventoría.

Profesional Ofrecido para el Cargo	Requisitos de Experiencia General	Requisitos de Experiencia Específica
RESIDENTE AMBIENTAL (1) UNO (SEGÚN ANEXO TÉCNICO 1) Dedicación 60%	Profesional Ingeniero Ambiental y/o sanitario y/o Ingeniero de recursos hídricos y gestión ambiental No menor de cinco (5) años contados entre la	Experiencia Específica: deberá acreditar experiencia como residente ambiental de mínimo de dos (2) contratos en proyectos de obra para la Construcción

Calle 23F No. 85A 31 – Telefax: 4752424 – 8039343 Cel. 3014313648 – email: mirsltda@gmail.com

www.mirsla.com

Página 3 de 5

MIRSLA LATINOAMERICA

MIRS-MAR-165-2019

fecha de expedición de la matrícula y la fecha de cierre del plazo del presente proceso de selección.	o Conservación o Rehabilitación o Mantenimiento de infraestructura vial urbana para tráfico automotor
---	---

Profesional Ofrecido para el Cargo	Requisitos de Experiencia General	Requisitos de Experiencia Específica
RESIDENTE SOCIAL (1) UNO Dedicación 60%	Profesional en trabajo social y/o comunicador social. No menor de cinco (5) años contados entre la fecha de expedición de la matrícula y la fecha de cierre del plazo del presente proceso de selección.	Experiencia Específica. deberá acreditar experiencia como residente social de mínimo de dos (2) contratos en proyectos de obra para la Construcción o Conservación o Rehabilitación o Mantenimiento de infraestructura vial urbana para tráfico automotor.

- Tomado de OTRO SI No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 137 CON & CON 2019 - Cursiva y subraya por la interventoría

La solicitud de la copia de los contratos para poder acreditar y avalar las auto-certificaciones del personal requerido para la ejecución de contrato se basa en la respuesta dada por la entidad "Colombia Compra Eficiente" en comunicado a respuesta de consulta # 4201714000005270, de asunto "Acreditación personal de experiencia", tomado del siguiente enlace.

(https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/concepto/2018/4201714000005270_acreditacion_personal_de_experiencia/4201714000005270_acreditacion_personal_de_experiencia-original.pdf)

-Que dice lo siguiente:

1. Estimado señor,

Colombia Compra Eficiente responde su consulta de 06 de octubre de 2017 en ejercicio de la competencia otorgada por el numeral 5 del artículo 3 del Decreto 4170 de 2011.

• **PROBLEMA PLANTEADO** ¿Una Entidad Estatal puede aceptar autocertificaciones, es decir, aquellas certificaciones expedidas por el mismo proponente para acreditar su propia experiencia, certificándose a él mismo? ¿Una Entidad Estatal puede aceptar experiencia del proponente no registrada en el RUP? ¿Una Entidad Estatal puede aceptar certificaciones expedidas por el proponente para acreditar la experiencia de su equipo mínimo propuesto?

156
1473



MIRS-MAR-165-2019

• **COLOMBIA COMPRA EFICIENTE RESPONDE:** Las autocertificaciones no podrán ser aceptadas por las Entidades Estatales para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no se puede constatar la ejecución de contratos que deben ser certificados por los terceros que recibieron la obra, bien o servicio.

La experiencia del proponente se validará conforme a la información contenida única y exclusivamente en el RUP, la cual podrá ser ampliada por la Entidad si así lo considera, requiriendo certificaciones o contratos que deberán ser aportados por el proponente en la oferta.

Las Entidades Estatales son autónomas para estructurar sus Procesos de Contratación, y con el fin de aceptar la experiencia del equipo de trabajo certificada por el mismo proponente que lo postula, pueden exigir en sus Pliegos de Condiciones documentos de soporte como copias de contratos laborales o de prestación de servicios con el fin de constatar el vínculo laboral o contractual con los profesionales que el proponente oferta en su propuesta.

-Cursiva y subraya por la interventoría.

Se esta atentos al reenvío de la información de las hojas de vida a actualizar y/o cambiar para el desarrollo del contrato de obra de la referencia, en un plazo de un día hábil para revisión por parte de la interventoría, teniendo en cuenta que es de extrema importancia contar con esta información, para la legalización y reinicio de la ejecución contractual, para no generar retrasos en los tiempos estipulados en el contrato.

Atentamente

NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA
R.L. MIRS LATINOAMÉRICA S.A.S

At: F. J. J.

CC ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES
FONDO DE DESARROLLO LOCAL

Av. Calle 19 #28-80 Centro Comercial Calima Piso 7
Bogotá D.C.

MIRS LATINOAMERICA

MIRS-MAR-166-2019

Bogotá D.C. 06 de junio de 2022

Señores
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON
 Cra 7 N° 127-48 - Oficina 1006
 Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 137-2019 CUYO OBJETO ES CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 141-2019 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SISO LOS PROCESOS SST - MA - SO - PMT, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES.

ASUNTO: LLAMADO DE ATENCIÓN POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, ATRASO EN REINICIO N°4. PRORROGA N°3

Cordial Saludo.

En el adelanto del objeto contractual citado en la referencia del presente escrito (CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CI-141-2019, la Interventoría MIRS LATINOAMÉRICA S.A.S., realiza el seguimiento para la ejecución del CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° CO-137-2019, celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires FDLM y la Empresa CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CON&CON Consultoria y Construcción.

De acuerdo con lo anterior, y dando alcance al asunto del presente oficio, y en el desarrollo de las actividades propias de la presente interventoría, se realizó recorrido de seguimiento el día 06 junio del corriente año, a los tramos ubicados en:

N.º	Cod.	BARRIO	PK+D	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA
10	14001367	SANTA ISABEL-1B	182827	CALZADA	CL 1B	KR 27A	KR 28
			70542	ANDEN			
			70543				
15	14001506	TAPICERIAS	182491	CALZADA	KR 1B	CL 2	CL 3
			69902	ANDEN			
			69903				

Dir : Calle 23 f # 85 A 31. Telefax: 8039343. Cel. 3014313648. Email:contrato141@gmail.com

Página 1 de 6

Recibido
 FOLIO 14001367
 01/06/2022

156
2015

MIRS-MAR-166-2019

MRS-MAR-166-2019

16	14001619	COLEGIOS	182788	CALZADA	CL 1C	KR 18A	KR 18BIS
			70476	ANDEN			
			70477				
16	14001616	COLEGIOS	182789	CALZADA	CL 1C	KR 18BIS	KR 18C
			70478	ANDEN			
			70479				

Tabla de elementos a ejecución Grupo 1, según programación en Project, enviada para el remito N° 4

Se evidencia que no se han iniciado labores constructivas, ni preliminares en los segmentos descritos anteriormente como GRUPO 1, y se presenta el siguiente atraso por actividad según programación

ID	NOMBRE	COMIENZO	FIN	% COMPLETADO	TRABAJO RESTANTE	PREDECESORAS
16	TRAMITE SOLICITUD PMT-CALZADA	mar 17/05/22	jue 2/06/22	25%	0 horas	
17	EVALUACION TECNICA ESTRUCTURA CONSTRUIDA	jue 2/06/22	jun 6/06/22	0%	0 horas	5
18	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SRB) CON RECIKLADO DE CONCRETO	jue 2/06/22	mar 7/06/22	0%	0 horas	700
19	EVALUACION TECNICA ESTRUCTURA CONSTRUIDA	jue 2/06/22	vie 10/06/22	0%	0 horas	5
20	ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON RAJON	jue 2/06/22	vie 10/06/22	0%	0 horas	5
21	RENO-SEÑALIZACION	mar 17/05/22	vie 2/06/22	1%	0 horas	100
22	TRAMITE SOLICITUD PMT-ANDEN	mar 17/05/22	jue 2/06/22	25%	0 horas	100
23	REPLANTEO GENERAL COSTADO ORIENTE	jue 2/06/22	vie 3/06/22	0%	0 horas	10
24	DEMOLICION COSTADO ORIENTE	vie 3/06/22	jue 9/06/22	0%	0 horas	40
25	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	jue 2/06/22	mar 21/06/22	0%	0 horas	10
26	REPLANTEO GENERAL	jue 2/06/22	vie 3/06/22	0%	0 horas	75
27	REVISION ESTRUCTURA PARA ANDEN COSTADO SUR	vie 3/06/22	mar 8/06/22	0%	0 horas	77
28	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	jue 2/06/22	mar 21/06/22	0%	0 horas	94
29	REPLANTEO GENERAL	jue 2/06/22	vie 3/06/22	0%	0 horas	98
30	DEMOLICION PISOS DE CONCRETO COSTADO SUR	vie 3/06/22	jue 9/06/22	0%	0 horas	100
31	TRAMITE SOLICITUD PMT-CALZADA	mar 17/05/22	jue 2/06/22	50%	0 horas	500

IRS

LATINOAMERICA

MIRS-MAR-166-2019


12	COMPLEJO ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 14 N° 5-047-1194 E.A.A.B.	10/06/22	mar 21/06/22	0%	0 horas	120
4	TRAMITE SOLICITUD PMT-ANDEN-SUR ORTE	mar 17/05/22	10/06/22	50%	2 horas	50/1

- Tabla resumen de tareas atrasadas, según programación en Project, enviada para el reinicio N°4

La numeración que se describe anteriormente en el costado izquierda corresponde a la misma dada en la programación archivo Project y anexo REORGANIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA REALIZAR, enviados por el contratista de obra y avalada para el reinicio N°4 y prórroga N°3 al contrato de obra. A la fecha se presenta un avance de un 3%, frente a un 13% propuesto en el cronograma de obra, generando ya en este momento un atraso significativo a la ejecución contractual propuesta por ustedes para el reinicio N°4 y Prórroga N°3. Estos porcentajes son tomados desde el mismo archivo Project.

Se anexa registro fotográfico de vista frentes de obra

Frente Eduardo Santos (Tapicerías) Carrera 18 entre Calle 2 y Calle 3 CIV'S (14001506)

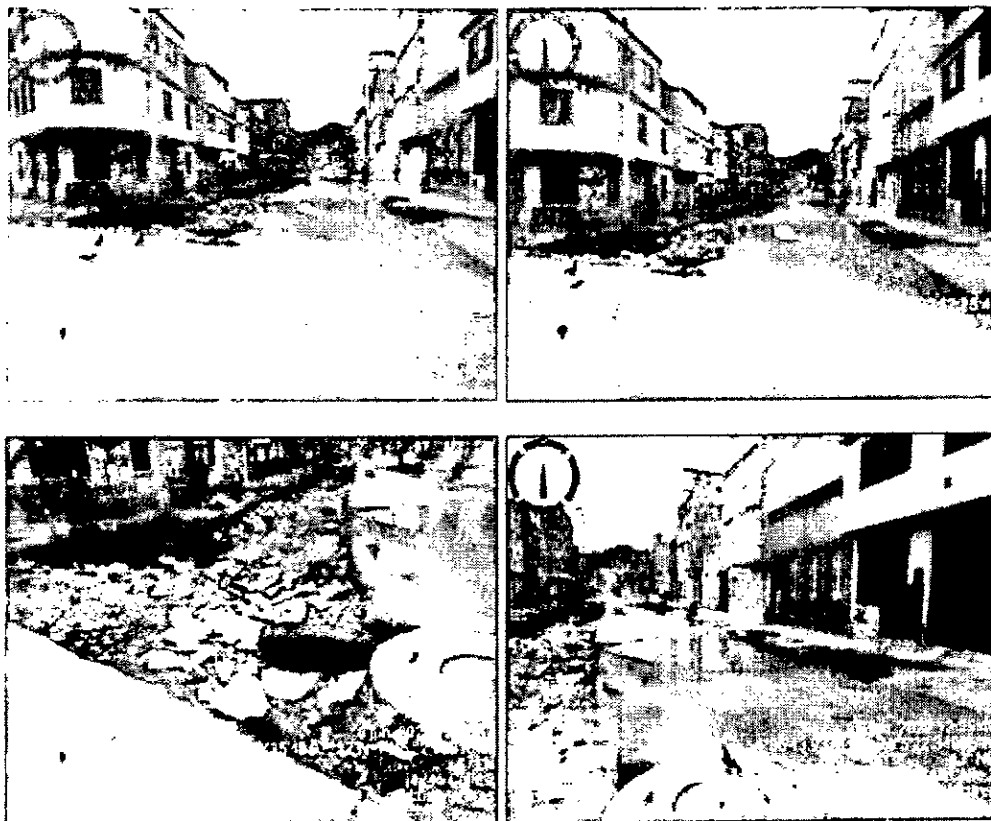

Dir : Calle 23 f # 85 A 31. Telefax: 8039343. Cel. 3014313648. Email:contrato141@gmail.com


Página 3 de 6

1570
~~1974~~

IRS LATINOAMERICA

MIRS-MAR-166-2019

Frente colegios Calle 1C entre Kr 19A y Kr 19C CIV'S (14001619-14001616)

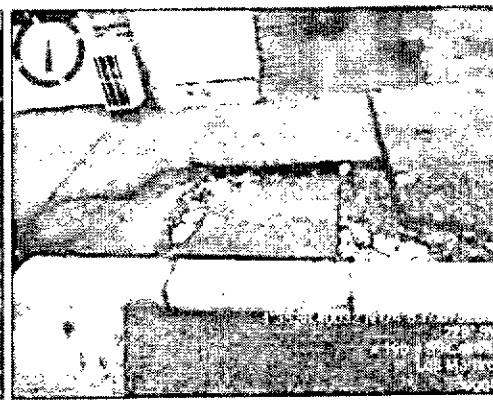



MIRS-MAR-166-2019

Se solicita al contratista el dar respuesta al oficio MIRS-MAR-163-2019 del día 18 de mayo de 2022, enviado vía correo electrónico a conycon.martires137@gmail.com, a las 16:53, donde se requiere la información preliminar para el reinicio de las actividades constructivas así como la actualización de la documentación de personal maquinaria y equipos, PMT's, y no se ha remitido dicha información, solo mediante oficio C&C-CO-137-2019-139 del 26 de mayo de 2022, se remite por parte del contratista de obra actualización a tres profesionales administrativos, a lo cual se da respuesta mediante oficio MIRS-MAR-165-2019 el día 31 de mayo de 2022 y a la fecha no se subsanan dichas hojas de vida, se recibe correo electrónico de cronograma de actividades sociales el día 20 de mayo de 2022, pero las mismas no se han adelantado como se evidencia en el registro fotográfico adjunto, entendiendo que las mismas dependen de la ejecución de las obras.

Por estas razones expuestas y las que son inherentes al contrato se le solicita al contratista una respuesta dentro de los 3 días siguientes a esta comunicación so pena de incurrir en incumplimiento de obligaciones contractuales y abandono de frentes de obra.

Atentamente,


SANDRA MONICA CARDOZO ROSAS
Directora Interventoría
MIRS LATINOAMERICA S.A.S

Anexos Folios (3)

Proyecto UAF 2

CC **ALCALDIA LOCAL DE MARTIRES**
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
Av. Calle 19 #28-80 Centro Comercial Calima Piso 7
Bogotá D.C.

1572
JHT

CÓDIGO DE BARRAS



MIRS-MAR-166-2019

Bogotá D.C. 06 de junio de 2022

Señores
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON
Cra 7 N° 127-48 - Oficina 1006
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 137-2019 CUYO OBJETO ES CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 141-2019 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SISO LOS PROCESOS SST-MA-SO-PMT, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FORMULA DE REAJUSTE. LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES.

ASUNTO: LLAMADO DE ATENCIÓN POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, ATRASO EN REINICIO N°4, PRORROGA N°3

Cord al Saludo,

En el adelanto del objeto contractual citado en la referencia del presente escrito (CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CI-141-2019, la Interventoría MIRS LATINOAMÉRICA S.A.S., realiza el seguimiento para la ejecución del CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° CO-137-2019, celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires FDLM y la Empresa CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CON&CON Consultoría y Construcción.

De acuerdo con lo anterior, y dando alcance al asunto del presente oficio, y en el desarrollo de las actividades propias de la presente interventoría, se realizó recorrido de seguimiento el día 06 junio del corriente año, a los tramos ubicados en:

N.º	Cod.	BARRIO	PK+0	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA
10	14001367	SANTA ISABEL-1B	182827	CALZADA	CI 1B	KR 27A	KR 28
			70542	ANDEN			
			70543				
15	14001506	IAPIGERIAS	182491	CALZADA	KR 1B	CL 2	CL 3
			69902	ANDEN			
			69903				

LATINOAMERICA

MIRS-MAR-166-2019

18

14001619

COLEGIOS

182788

CALZADA

CL 1C

KR 19A

KR 19BBIS

70476

ANDEN

70477

19

14001616

COLEGIOS

182789

CALZADA

CL 1C

KR 19BBIS

KR 19C

70478

ANDEN

70479

- Tabla de elementos a ejecución Grupo 1, según programación en Project, enviada para el reinicio N° 4

Se evidencia que no se han iniciado labores constructivos, ni preliminares en los segmentos descritos anteriormente como GRUPO 1, y se presenta el siguiente atraso por actividad según programación:

ID	NOMBRE	COMIENZO	FIN	% COMPLETADO	TIEMPO RESTRITO	PREDECESORAS
6	TRAMITE SOLICITUD PMT-CALZADA	mar 17/05/22	jue 2/06/22	25%	0 horas	
7	EVALUACION TECNICA ESTRUCTURA CONSTRUIDA	jue 2/06/22	lun 6/06/22	0%	0 horas	5
8	SUBBASE GRANULAR CLASE D (SSG B) CON RECICLADO DE CONCRETO	jue 2/06/22	mar 7/06/22	0%	0 horas	7CC
16	EVALUACION TECNICA ESTRUCTURA CONSTRUIDA	jue 2/06/22	vie 10/06/22	0%	0 horas	5
17	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJON	jue 2/06/22	vie 10/06/22	0%	0 horas	5
20	SEÑALIZACIÓN	mar 17/05/22	vie 2/06/22	1%	0 horas	5CC
38	TRAMITE SOLICITUD PMT-ANDEN	mar 17/05/22	jue 2/06/22	25%	0 horas	5CC
40	REPLANTEO GENERAL COSTADO ORIENTE	jue 2/06/22	vie 3/06/22	0%	0 horas	40
42	DEMOLICION COSTADO ORIENTE	vie 3/06/22	jue 9/06/22	0%	0 horas	40
71	SUMICERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VÍAS NS-047-1V4 EAAB	jue 2/06/22	mar 21/06/22	0%	0 horas	71
72	REPLANTEO GENERAL	jue 2/06/22	vie 3/06/22	0%	0 horas	75
78	REVISION ESTRUCTURA PARA ANDEN COSTADO SUR	vie 3/06/22	mié 8/06/22	0%	0 horas	77
94	SUMICERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VÍAS NS-047-1V4 EAAB	jue 2/06/22	mar 21/06/22	0%	0 horas	94
100	REPLANTEO GENERAL	jue 2/06/22	vie 3/06/22	0%	0 horas	100
102	DEMOLICION PISOS DE CONCRETO COSTADO SUR	vie 3/06/22	jue 9/06/22	0%	0 horas	100
120	TRAMITE SOLICITUD PMT-CALZADA	mar 17/05/22	jue 2/06/22	50%	0 horas	5CC

Dir : Calle 23 f # 85 A 31. Telefax: 8039343. Cel. 3014313648. Email:contrato141@gmail.com

IRS

LATINOAMERICA

MIRS-MAR-166-2019


122	SUMIDERO AL CANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	jue 21/06/22	mar 21/06/22	0%	0 horas	120
124	TRAMITE SOLICITUD PMT-ANDEN-SUR Y NORTE	mar 17/05/22	jue 21/06/22	50%	0 horas	500

- Tabla resumen de tareas atrasadas, según programación en Project, enviada para el reinicio N°4

La numeración que se describe anteriormente en el costado izquierda corresponde a la misma dada en la programación archivo Project y anexo REORGANIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA REALIZAR, enviados por el contratista de obra y avalada para el reinicio N°4 y prorroga N°3 al contrato de obra. A la fecha se presenta un avance de un 3%, frente a un 13% propuesto en el cronograma de obra, generando ya en este momento un atraso significativo a la ejecución contractual propuesta por ustedes para el reinicio N°4 y Prorroga N°3. Estos porcentajes son tomados desde el mismo archivo Project.

Se anexa registro fotográfico de visita frentes de obra

Frente Eduardo Santos (Tapicerías) Carrera 18 entre Calle 2 y Calle 3 CIV'S (14001506)

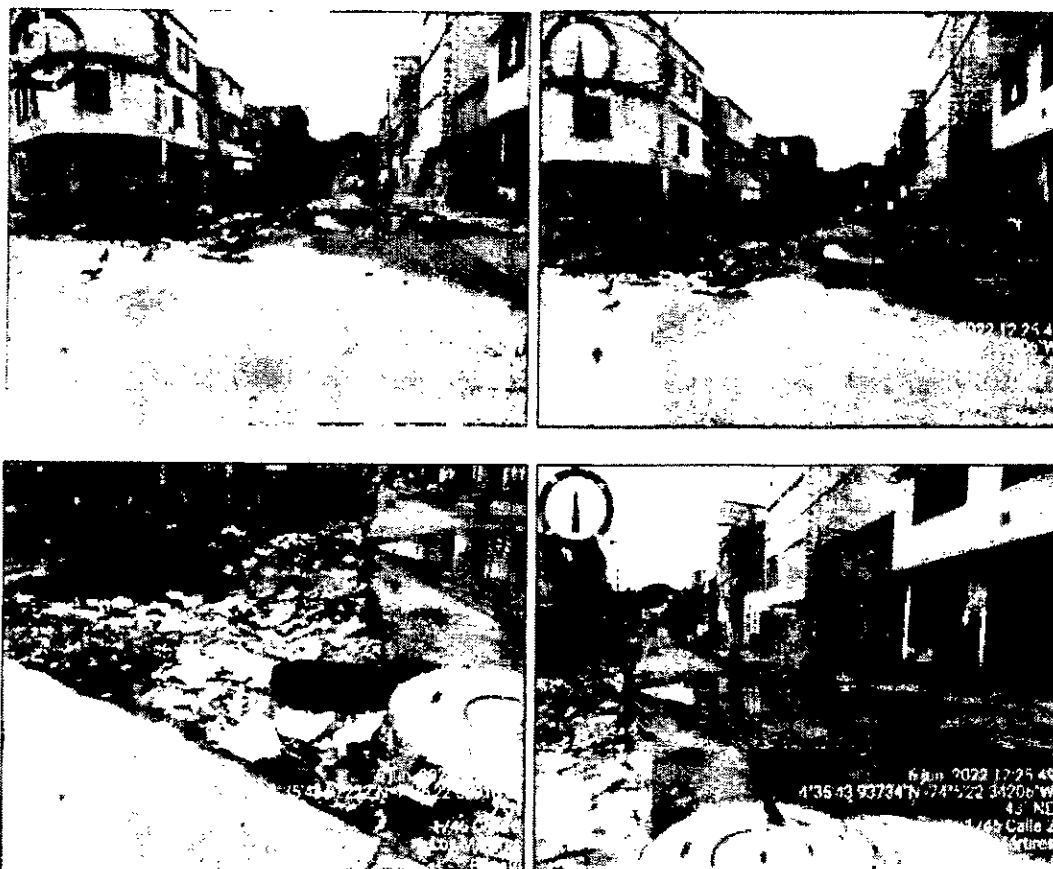


Dir : Calle 23 f # 85 A 31. Telefax: 8039343. Cel. 3014313648. Email:contrato141@gmail.com

1575
1493

IRS LATINOAMERICA

MIRS-MAR-166-2019

Frente Calle 1B entre Kr 27A y Kr 28 CIV'S (14001367)

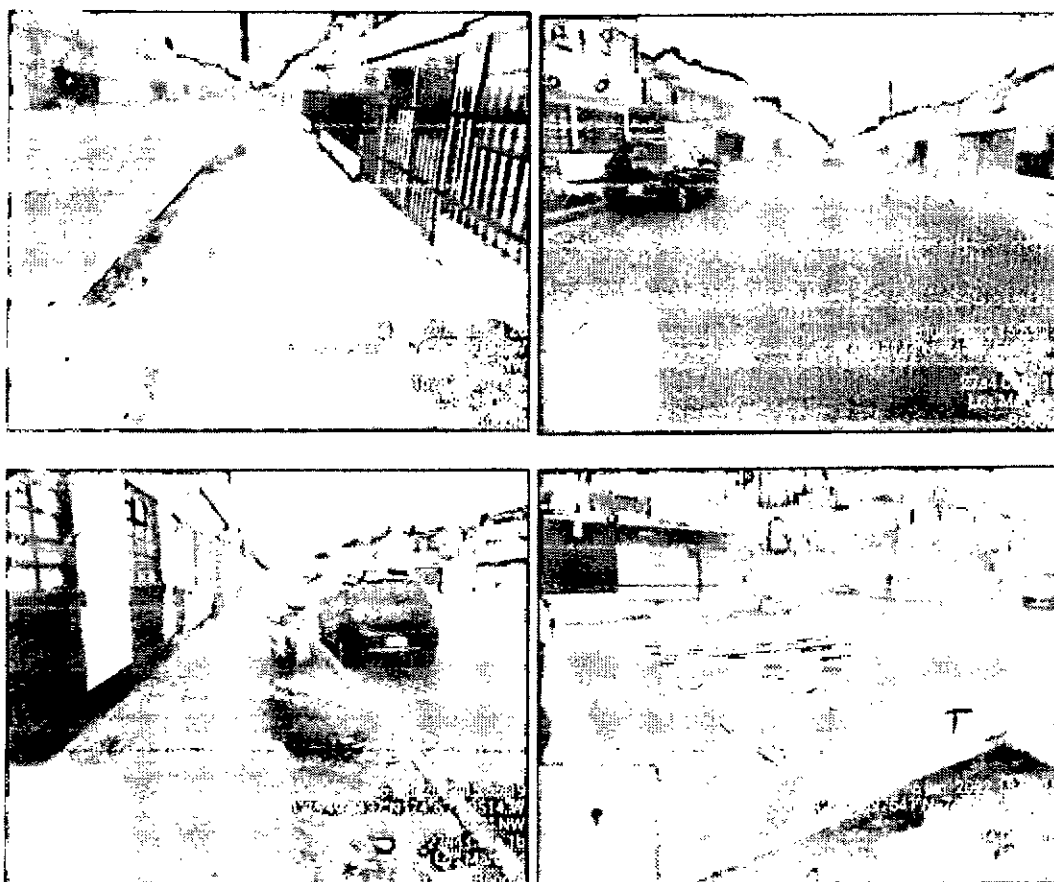


PMT'S

Se sol' cita enviar matriz de PMT's con soporte de trámites ante SDM, ya que es de conocimiento de la presente interventoría que el frente de la calle 1C cuenta con PMT aprobado y vigente, pero aún no se ha implementado esto generando atrasos en la ejecución que no tiene una justificación y solo imputable al contratista de obra.

18	14001619	COLEGIOS	182788	CALZADA	CL 1C	KR 19A	KR 19BBIS
			70476	ANDEN			
			70477				
19	14001616	COLEGIOS	182789	CALZADA	CL 1C	KR 19BBIS	KR 19C
			70478	ANDEN			
			70479				

Dir : Calle 23 f # 85 A 31. Telefax: 8039343. Cel. 3014313648. Email:contrato141@gmail.com



1577
~~1164~~



MIRS-MAR-166-2019

Se solicita al contratista el dar respuesta al oficio MIRS-MAR-163-2019 del día 18 de mayo de 2022, enviado vía correo electrónico a conycon.martires137@gmail.com, a las 16:53, donde se requiere la información preliminar para el reinicio de las actividades constructivas así como la actualización de la documentación de personal, maquinaria y equipos, PMT's, y no se ha remitido dicha información, solo mediante oficio C&C-CO-137-2019-139 del 26 de mayo de 2022, se remite por parte del contratista de obra actualización a tres profesionales administrativos, a lo cual se da respuesta mediante oficio MIRS-MAR-165-2019 el día 31 de mayo de 2022 y a la fecha no se subsanan dichas hojas de vida, se recibe correo electrónico de cronograma de actividades sociales el día 20 de mayo de 2022, pero las mismas no se han adelantado como se evidencia en el registro fotográfico adjunto, entendiéndose que las mismas dependen de la ejecución de las obras.

Por estas razones expuestas y las que son inherentes al contrato se le solicita al contratista una respuesta dentro de los 3 días siguientes a esta comunicación so pena de incurrir en incumplimiento de obligaciones contractuales y abandono de frentes de obra.

Atentamente,

SANDRA MÓNICA CARDOZO ROJAS

Directora Interventoría

MIRS LATINOAMERICA S.A.S

Asesoría, Planeación

y Ejecución

CC **ALCALDIA LOCAL DE MARTIRES**
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
Av. Calle 19 #28-80 Centro Comercial Calima Piso 7
Bogotá D.C.

1578
~~1445~~

CAC-01131-2019-45

Remitente

Acueducto
Calle 24 # 37-15
Código Postal 11121
Bogotá D.C.



AGUA Y ALICANTARILLO BOGOTÁ

Página 1

3333002-S-2022-150339
Bogotá D.C. 31 de mayo de 2022

15/06/2021
Recibido
Pavel B...

Destinatario

Acueducto
Calle 24 # 37-15
Código Postal 11121
Bogotá D.C.

Por
PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal
Autoría y Construcción SAS CON&CON SAS
Calle Carrera 7 N°127-48, oficina 1006
Código postal 110121
Teléfono (601) 4821681 / 5203971
Correo electrónico martires137@gmail.com
D.C.

Asunto: Traslado Radicado E-2022-036245, sumideros pluviales eliminados obras FDALM E-2022-10021678

Cordial saludo Doctor Ricci:

Esta dependencia da acuse de recibo de la comunicación del asunto en la que se informa que la obra del contrato No.137-2019 se encuentra suspendida y que luego de su reinicio se informara a la comunidad de las fechas de inicio y finalización de la obra, sin embargo lo anterior es la EAAB-ESP la que dentro de su competencia debe validar que los sumideros sean construidos dentro de la especificaciones y condiciones técnicas por el contratista y quien ultimas dará recibo a la obras y expedirá el Paz y salvo.

Por lo anterior solicitamos que una vez se reinició el contrato se informe a la EAAB-ESP al teléfono 3046265224 y correo electrónico mcasallas@acueducto.com.co para que se realice el acompañamiento técnico respectivo, quedamos a la espera de lo solicitado.

Cordialmente,

Miguel Angel Casallas Torres
Profesional Servicio Alcantarillado Zona 3

Atentamente,

Miguel Angel Casallas Torres
Profesional Servicio Alcantarillado Zona 3



SC7011

Av. Calle 24 # 37-15 Código Postal 11121
PAX (+571) 3447001 www.acueducto.com.co
Bogotá D.C. Colombia

Miguel Ricci Ruiz



BOGOTÁ

15.7

Respuesta Mediante oficio
por correo electrónico
L 14/06/2022



MIRS-MAR-168-2019

Bogotá D.C. 13 de junio de 2022

Señores:

CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON

Cra 7 N° 127-48 - Oficina 1006

Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 137-2019 CUYO OBJETO ES CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 141-2019 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SISO LOS PROCESOS SST MA - SO - PMT, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES.

ASUNTO: LLAMADO DE ATENCIÓN POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, NO ACTUALIZACIÓN PÓLIZAS DE REINICIO N°4, PRORROGA N°3

Cordial Saludo,

En e adelanto del objeto contractual citado en la referencia del presente escrito (CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CI-141-2019, la Interventoría MIRS LATINOAMÉRICA S.A.S., realiza el seguimiento para la ejecución del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CO-137-2019, celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires FDLM y la Empresa CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON.

A la fecha no se cuenta con el envío por parte de ustedes, de la actualización de las pólizas para el contrato de la referencia, lo que da lugar a un incumplimiento de las obligaciones contractuales en lo dispuesto en " REACTIVACIÓN No 4 OTROSÍ No 3 CTO FDLM-137-2019_220517_182125 (1). CLÁUSULA TERCERA El contratista se obliga a ampliar la vigencia de las garantías del contrato en los términos del presente documento... ". Se les recuerda que se solicitó dicha actualización mediante oficio MIRS-MAR-163-2019 del día 18 de mayo de 2022 enviado vía correo electrónico a conycon.martires137@gmail.com, a las 16:53, y por medio de oficio Llamado de atención 06 de junio de 2021 Oficio No MIRS MAR_166_2019 MIRS MAR_166_2019 LLAMADO ATENCIÓN_ATRASO_REINICIO_4. Recibido por CON&CON 07/06/2022-Paola Gómez,

Atentamente,

SANDRA MÓNICA CARDOZO ROJAS

Directora Interventoría

MIRS LATINOAMERICA S.A.S

Anexos: Folios 101

1. Anexo 1 - APL

CC **ALCALDIA LOCAL DE MARTIRES**
FONDO DE DESARROLLO LOCAL

Av. Calle 19 #28-80 Centro Comercial Calima Piso 7
Bogotá D.C

Dir : Calle 23 f # 85 A 31. Telefax: 8039343. Cel. 3014313648. Email:contrato141@gmail.com

Página 1 de 1

1580
207

MIRS LATINOAMERICA

MIRS-MAR-169-2019

Bogotá D.C. 16 de junio de 2022

Señores
ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
Av. Calle 19 #28-80 Centro Comercial Mallplaza Piso 7
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 137-2019 CUYO OBJETO ES CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 141-2019 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SISO LOS PROCESOS SST - MA - SO - PMT, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FORMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES.

ASUNTO: INFORME DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, ATRASO EN REINICIO N°4, PRORROGA N°3 -CONTRATO DE OBRA - CO-137-2019

Cordial Saludo,

En el adelanto del objeto contractual citado en la referencia del presente escrito (CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CI-141-2019, la Interventoría MIRS LATINOAMÉRICA S.A.S., realiza el seguimiento para la ejecución del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CO-137-2019, celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires FDLM y la Empresa CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON Consultoría y Construcción

En ese sentido, se hace entrega del informe de incumplimiento del contrato de obra, con el fin de que la entidad contratante, FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MÁRTIRES -- FDLM, inicie al proceso sancionatorio que corresponda al contratista de obra, puesto que presenta atraso en las actividades constructivas con fecha de corte del 16 de junio de 2022. A continuación, se dan a conocer los antecedentes, situaciones, hechos generadores, cláusulas que vulnera, material probatorio y la tasación de la multa.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"
NÚMERO DEL CONTRATO:	CO-137-2019



MIRS-MAR-169-2019

REPRESENTANTE LEGAL	Arq. JUAN PABLO RICCI
VALOR TOTAL CONTRATO.	\$ 5.437.884.572
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 5.437.884.572
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 5.437.884.572
CONTRATISTA:	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS CON&CON
INTERVENTORÍA	MIRS LATINOAMERICA S.A.S
ENTIDAD CONTRATANTE:	Alcaldía Local de Los Mártires - FOLM
DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	Siete (07) meses
FECHA DE INICIO (Firma acta de Inicio)	25 de Febrero de 2020
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN CONTRATO	24 de Septiembre de 2020

Tabla 1 - Descripción General inicial del Contrato de Obra. Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria a nivel nacional anteriormente presentada y las disposiciones del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES - FOLM frente a la misma, se suscribe las acta de suspensión para el contrato de obra No. 137 de 2019, las cuales abarcan en su totalidad desde el día 05 de abril de 2020 hasta el día 20 de julio de 2020:

- Suspensión N°1. 118 DÍAS TRES (3) MESES Y VEINTITRÉS DÍAS DEL VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE 2020 Y HASTA EL VEINTE (20) DE JULIO DE 2020.

Una vez se dio reinicio No 1 al contrato de obra No. 137 de 2019, la etapa de diagnóstico finalizo el 20 de septiembre de 2020, dejando como constancia el informe No 3 en el cual se relacionan los Estudios y Diseños. Durante la etapa de ejecución de obra se identificaron actividades No Previstas relacionadas con la renovación de reces de acueducto y alcantarillado que podrían afectar los tiempos de ejecución inicialmente establecidos, por lo cual se adelantaba el trámite de prórroga al plazo contractual, por lo cual se suscribe PRORROGA Y ADICIÓN No1 AL CONTRATO DE OBRA 137 DE 2019:

Se suscribió la Prorroga No. 1 con un plazo adicional de DOS (2) MESES, una adición presupuestal de \$2.845.236.531, (DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES, DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/C), y se incluyen los siguientes segmentos:

ADICIÓN									
CIV	PK ID	EJE	DESDE	HASTA	ELEMENTO	LONGITUD	INTERVENCIÓN	JPZ	CON ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CONTRATO 984 DE 2019
22	1460131	72474	CLL 22C	KR 20	KR 22	ANDEN	0.08	REHABILITACIÓN	LA SABANA
23	1460172	183419	CLL 22A	KR 18A	KR 18B	CAZADA	0.05	REHABILITACIÓN	LA SABANA
24	14601205	72426	CLL 22A	KR 18B	AK 19	ANDEN	0.11	REHABILITACIÓN	LA SABANA
25	14601432	183801	CLL 22	KR 18B	AK 19	CAZADA	0.10	REHABILITACIÓN	LA SABANA

582
1499



MIRS-MAR-169-2019

26	14000402	15030	KR 18	CLL 22A	CL 22C BIS	CALZADA	0.02	REHABILITACION	LA SABANA	CON ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CONTRATO 064 DE 2018
27	14000403	162150	CL 1D BIS	KR 29B	KR 30	CALZADA	0.10	REHABILITACION	SANTA ISABEL	CON ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CONTRATO 064 DE 2018
28	14000405	17013	KR 21	CL 14	CL 15	ANDEN	0.10	REHABILITACION	LA SABANA	CON ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CONTRATO 064 DE 2018
29	14000440	72011	KR 21	CL 13A	CL 14	ANDEN	0.04	REHABILITACION	LA SABANA	CON ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CONTRATO 064 DE 2018
30	14000463	72009	KR 21	AC 13	CL 13A	ANDEN	0.04	REHABILITACION	LA SABANA	CON ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CONTRATO 064 DE 2018
31	14000476	162420	CL 12	KR 19	KR 19A	CALZADA	0.01	REHABILITACION	LA SABANA	CON ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CONTRATO 064 DE 2018

Tabla 2 – Segmentos adicionales Adición No1. Fuente: Elaboración propia

Posterior a la adición y prórroga No1 dada por el FDLM y avalada por la presente interventoría se procede a la suscripción de la suspensión No 2 con fundamentada en la problemática manifestada por el contratista de obra por afectaciones climáticas en los procesos constructivos, como en el trámite ante Secretaría Distrital de Movilidad para la obtención de los PMT's (planes de manejo de tráfico) necesarios para la ejecución de las obras.

- Suspensión N°2: (23) VEINTITRES DIAS, DEL VEINTIOCHO (28) DE NOVIEMBRE DE 2020 Y HASTA EL VEINTE (21) DE DICIEMBRE DE 2020.

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"
NÚMERO DEL CONTRATO:	CO-137-2019
REPRESENTANTE LEGAL	Arq. JUAN PABLO RICCI
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 5.437.894.572
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 5.437.894.572
ADICION N°1	\$2.845.236.531
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 8.283.121.103
CONTRATISTA:	COSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS CON&CON
INTERVENTORIA	MIRS LATINOAMERICA S A S
ENTIDAD CONTRATANTE:	Alcaldía Local de Los Mártires - FDLM
DURACION INICIAL DEL CONTRATO	Siete (07) meses
FECHA DE INICIO (Firma acta de inicio)	25 de Febrero de 2020
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN CONTRATO	24 de Septiembre de 2020

LATINOAMERICA

MIRS-MAR-169-2019

SUSPENSION N°1	24 de Marzo de 2020
REINICIO N°1	21 de Julio de 2020
PRORROGA N°1	Dos (02) meses
SUSPENSION N°2	28 de Noviembre de 2020
REINICIO N°2	27 de Diciembre de 2020
SUSPENSION N°3	05 de Abril de 2021
REINICIO N°3	29 de Junio de 2021
PRORROGA N°2	Dos (02) meses
SUSPENSION N°4	16 de Septiembre de 2021
REINICIO N°4	17 de mayo de 2022
PRORROGA N°3	Ciento veintiún (121) días calendario
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE SUSPENSIONES Y PRORROGAS	15 de septiembre de 2022

Tabla 3 - Descripción General del Contrato de Obra actual. Fuente: Elaboración propia

I. ESTADO ACTUAL CON RELACIÓN A PLAN DE ACCIÓN Y CRONOGRAMA PRESENTADO REINICIO 4 Y PRORROGA 3

Con relación a la prórroga Numero 3 y reinicio Numero 4, al contrato de la referencia se tienen los siguientes antecedentes

II. ANTECEDENTES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Hasta la fecha el contratista de obra presenta un avance físico en la intervención de los CIV's designados de un **60%**, y ha radicado a la fecha (6) seis actas de recibo parcial de cobro ante la presente interventoria, las cuales han generado un cobro y avance financiero del **58.32%** con respecto al valor inicial del contrato y adición N°1.

Teniendo en cuenta lo propuesto por el contratista de obra para la ejecución de los segmentos a la fecha se encuentran así:

1 GRUPO No.1

A continuación, se presentan los CIV que actualmente se encuentran en ejecución y tienen requerimientos por parte de la comunidad y se priorizan para iniciar en el Grupo No.1, ver anexo No.1.

1534
1440

IRSLATINOAMERICA

MIRS-MAR-169-2019

No	Cod.	BARRIO	PK-ID	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA	% EJECUCION TOTAL	ACTIVIDADES POR EJECUTAR	% EJECUCION DESDE PRORROGA 3
12	1400177	COLEGIO	182788	CALZADA	CL 10	KR 19A	KR 138BIS	95%	1 SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	0%
			70475-70477	CINTA DE AJUSTE ANDEN				20%	1 CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA ANDEN, CINTA DE AJUSTE Y FINALIZACION DE LAS CAJAS DE INSPECCION	0%
13	1400177	COLEGIO	182789	CALZADA	CL 10	KR 138BIS	KR 19C	94%	1 SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	0%
			70475-70479	CINTA DE AJUSTE ANDEN				5%	1 CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA ANDEN, CINTA DE AJUSTE Y FINALIZACION DE LAS CAJAS DE INSPECCION	0%
14	14001506	TAPICERIAS	183491	CALZADA	KR 10	CL 2	CL 3	41%	1 CONFORMACION DE LA CALZADA COSTADO OCCIDENTAL 2 SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB 3 DEMARCACION Y MOBILIARIO (TACHAS, ESTOPEROLES, ETC)	0%
			68902-68903	ANDEN				0%	1 CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA ANDEN	0%
15	1400155	SANTA ISABEL	183287	CALZADA	CL 1B	KR 27A	KR 28	98%	1 SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	0%
			70542-70543	ANDEN				0%	1 CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA ANDEN	0%

Tabla 1 Frente a ejecutar Grupo 1

2. GRUPO No.2

En el siguiente cuadro se presentan los CIV que se tiene contemplado iniciarlos en el segundo grupo, ver anexo No.1.

No	Cod.	BARRIO	PK-ID	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA	% EJECUCION	ACTIVIDADES POR EJECUTAR	% EJECUCION DESDE PRORROGA 3
1	1400146	EL VERGEL CONSOJATA	182872	CALZADA	CL 1F	KR 24A	KR 24B	92%	1 SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	0%
			70632-70631	ANDEN Y CINTA DE AJUSTE				0%	1 CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA ANDEN Y CINTA DE AJUSTE	0%
2	1400146	EL VERGEL CONSOJATA	182871	CALZADA	CL 1F	KR 24	KR 24A	86%	1 SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB 2 CONFORMACION DE LA BUCACALLE KR 24A 3 TERMINACION DE POZO Y CARGUE	0%
			70630-70631	ANDEN Y CINTA DE AJUSTE				0%	1 CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA ANDEN Y CINTA DE AJUSTE	0%
3	1400177	RICAURTE TALLERES	183285	CALZADA	KR 25A	AC 6	CL 6BIS	97%	1 DEMARCACION Y MOBILIARIO (TACHAS, ESTOPEROLES) 2 TAPA DE SUMIDERO	0%
			71327-71324	ANDEN				0%	1 CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA ANDEN	0%
4	1400177	RICAURTE TALLERES	183286	CALZADA	KR 25A	CL 6BIS	CL 6A	97%	1 DEMARCACION Y MOBILIARIO (TACHAS, ESTOPEROLES)	0%
			71325-71326	ANDEN				0%	1 CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA ANDEN	0%
5	1400177	RICAURTE TALLERES	183287	CALZADA	KR 25A	CL 6A	CL 7	95%	1 DEMARCACION Y MOBILIARIO (TACHAS, ESTOPEROLES)	0%
			71327-71328	ANDEN				0%	1 CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA ANDEN	0%

MIRS-MAR-169-2019

No	Cod	BARRIO	PK-ID	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA	% EJECUCION	ACTIVIDADES POR EJECUTAR	% EJECUCION DESDE PRORROGA 3
1	1401101	PUERTO TALLERES	183546	CALZADA	KR 25A	CL 7	CL 7BIS	96%	1 DEMARCACION Y MOBILIARIO (TACHAS, ESTOPERILES, ETC.)	9%
			71914	ANDEIN				0%	1 CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA ANDEIN	0%

Tabla 2 Fuentes a ejecutar Grupo 2

3. GRUPO No.3

En el siguiente cuadro se presentan los CIV que tiene contemplado iniciarlos en tercer grupo, ver anexo No. 1.

No	Cod	BARRIO	PK-ID	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA	% EJECUCION	ACTIVIDADES POR EJECUTAR	% EJECUCION DESDE PRORROGA 3
1	1401101	PUERTO TALLERES	71915	CALZADA	CL 22	KR 18A	KR 19B	97%	1 SUMIDERO ALCANTARILLADO PUNTALES EN VIALIDAD VIAL 2 DEMARCACION Y MOBILIARIO (TACHAS, ESTOPERILES, ETC.)	0%
			72413-72414	CINTA AJUSTE				0%	1 CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCION Y CONFORMACION DE CINTA DE AJUSTE DE ANDEIN 2 VERIFICACION DEL ESTADO SANITARIO	0%
2	1401101	PUERTO TALLERES	72573	CALZADA	KR 24	CL 22A	DS 12B BIS	94%	1 SUMIDERO ALCANTARILLADO PUNTALES EN VIALIDAD VIAL 2 DEMARCACION Y MOBILIARIO (TACHAS, ESTOPERILES, ETC.)	0%
			72567-72568	CINTA AJUSTE				0%	1 CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCION Y CONFORMACION DE CINTA DE AJUSTE DE ANDEIN	0%
3	1401101	SANTA ISABEL 26	472646-472647-70832	CALZADA Y CINTA AJUSTE	CL 28	KR 24A	KR 25	92%	1 SUMIDERO ALCANTARILLADO PUNTALES EN VIALIDAD VIAL 2 DEMARCACION Y MOBILIARIO (TACHAS, ESTOPERILES, ETC.)	0%

Tabla 3 Fuentes a ejecutar Grupo 3

4. GRUPO No.4

En el siguiente cuadro se presentan los CIV que tiene contemplado iniciarlos en cuarto grupo, ver anexo No. 1.

No	Cod	BARRIO	PK-ID	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA	ACTIVIDADES POR EJECUTAR	% EJECUCION DESDE PRORROGA 3
1	1401101	PUERTO TALLERES	183556	CALZADA	CLL 22	KR 19B	KR 19	1 CONFORMACION DE LA CALZADA 2 SUMIDERO ALCANTARILLADO PUNTALES EN VIALIDAD VIAL 3 DEMARCACION Y MOBILIARIO (TACHAS, ESTOPERILES, ETC.)	0%
2	1401101	PUERTO TALLERES	719101	CALZADA	CLL 22A	KR 13A	KR 19B	1 CONFORMACION DE LA CALZADA 2 SUMIDERO ALCANTARILLADO PUNTALES EN VIALIDAD VIAL 3 DEMARCACION Y MOBILIARIO (TACHAS, ESTOPERILES, ETC.)	0%

Tabla 4 Fuentes a ejecutar Grupo 4

5. GRUPO No.5

En el siguiente cuadro se presentan los CIV que tiene contemplado iniciarlos en quinto grupo, ver anexo No. 1.



MIRS-MAR-169-2019

No	Cod.	BARRIO	PK-ID	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA	% EJECUCION DESDE PRORROGA 3
1	1400137	ACCION DE MOVILIDAD RICAURTE	181403	CALZADA	CL 13	KR 29	AV AR 57	0%
2	1400140	ACCION DE MOVILIDAD EDUARDO SANTOS	181805	CALZADA	CL 3	KR 17A	KR 18	0%
3	1400144	ACCION DE MOVILIDAD SAMPER MENDOZA	181813	CALZADA	CL 2	KR 6	CRUCE	0%
4	1400146	ACCION DE MOVILIDAD EL LUSCAN	181847	CALZADA	KR 29	CL 14	CL 15	0%

Tabla 5 Frentes a ejecutar Grupo 5

Las tablas anteriores y su Grupo, se han tomado de la prórroga número 3 al contrato de obra de la referencia, en la cual el contratista de obra manifiesta e informa un cronograma y plan de acción para el desarrollo del contrato a partir del reinicio N°4, a lo cual la presente interventoría informa:

III. ESTADO ACTUAL DE LOS FRENTES DE OBRA Y ATRASOS

De acuerdo con lo anterior, y dando alcance al asunto del presente oficio, y en el desarrollo de las actividades propias de la presente interventoría, se realizó recorrido de seguimiento el día 06, 13 Y 16 de junio del corriente año, a los tramos ubicados en:

N.º	Cod.	BARRIO	PK-ID	ELEMENTO	EJE	DESDE	HASTA
10	14001367	SANTA ISABEL-1B	182627	CALZADA	CL 1B	KR 27A	KR 28
			70542	ANDEN			
			70543				
15	14001506	TAPICERIAS	182491	CALZADA	KR 18	CL 2	CL 3
			69902	ANDEN			
			69903				
18	14001619	COLEGIOS	182788	CALZADA	CL 1C	KR 19A	KR 19BBIS
			70476	ANDEN			
			70477				
19	14001616	COLEGIOS	182789	CALZADA	CL 1C	KR 19BSIS	KR 19C
			70478	ANDEN			
			70479				

Tabla de elementos a ejecución Grupo 1, según programación en Project, enviada para el reinicio N°4

Se evidencia que no se han iniciado labores constructivas, ni preliminares en los segmentos descritos anteriormente como GRUPO 1, y se presenta el siguiente atraso por actividad según programación:

id	Nombre	Comienzo	Fin	Duración	% completado	Predecesoras EDT	Predecesoras
----	--------	----------	-----	----------	--------------	------------------	--------------

IRS

LATINOAMERICA

MIRS-MAR-169-2019

5	RAMITE SOLICITUD PMT CALZADA	Mar 17/05/22	jue 2/06/22	15 días	50%		
7	EVALUACIÓN TÉCNICA ESTRUCTURA CONSTRUIDA	jue 2/06/22	lun 8/06/22	3 días	0%	1.1.1.1	5
8	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SEGUNDO) CON RECICLADO DE CONCRETO	jue 2/06/22	mar 7/06/22	4 días	0%	1.1.1.2.1(CO)	700
9	BASE GRANULAR CLASE B (SEGUNDO) CON RECICLADO DE CONCRETO	mar 7/06/22	lun 13/06/22	4 días	0%	1.1.1.2.2	5
11	EVALUACIÓN TÉCNICA ESTRUCTURA CONSTRUIDA	jue 2/06/22	vie 10/06/22	7 días	0%	1.1.1.1	5
17	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON CAL	jue 2/06/22	vie 10/06/22	7 días	0%	1.1.1.1	5
18	RELLENO EN TROTUADO DE 34"	vie 10/06/22	mar 14/06/22	3 días	0%	1.1.1.5.2	17
22	DISPOSITIVO DE SEÑALIZACIÓN	mar 17/05/22	vie 10/06/22	88 días	0%	1.1.1.1(CO)	500
23	RAMITE SOLICITUD PMT ANDÉN	mar 17/05/22	jue 2/06/22	15 días	0%	1.1.1.1(CO)	500
30	REPLANTEO GENERAL COSTADO ORIENTE	jue 2/06/22	vie 3/06/22	1 día	0%	1.1.2.1	50
41	DEMOLICIÓN COSTADO ORIENTE	vie 3/06/22	jue 8/06/22	5 días	0%	1.1.2.2.1	40
44	PAQUETE DE MANEJO EN MATERIA COMÚN COSTADO ORIENTE	jue 8/06/22	mar 14/06/22	7 días	0%	1.1.2.5.1	40
47	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60x60cm (H=10cm) Incluye Sumidero y Conexión con Incluye Marco y Tapa No Incluye Base y Curbado	vie 10/06/22	vie 17/06/22	6 días	0%	1.1.2.4.1(CO+1 día)	400x1 día
50	CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Sumidero y Conexión)	vie 10/06/22	vie 17/06/22	6 días	0%	1.1.2.5.1(CO)	400
70	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VÍA NS-647-1V4 EAAB	jue 2/06/22	mar 21/06/22	15 días	0%	1.1.2.1	71
77	REPLANTEO GENERAL	jue 2/06/22	vie 3/06/22	1 día	0%	1.1.2.1	75
78	REVISIÓN ESTRUCTURA PARA ANDÉN COSTADO SUR	vie 3/06/22	mar 8/06/22	4 días	0%	1.1.2.2.1	71
81	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SEGUNDO) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Sumidero Externos de Manual, Humedecimiento y Compactación)	mie 8/06/22	lun 13/06/22	4 días	0%	1.1.2.2.1	79
84	CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLASTICO CON CONCRETO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	vie 10/06/22	lun 13/06/22	2 días	0%	1.1.2.6.1(CO+2 días)	2700x2 días
120	RAMITE SOLICITUD PMT CALZADA	mar 17/05/22	jue 2/06/22	15 días	50%	1.1.1.1(CO)	500
121	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VÍA NS-647-1V4 EAAB	jue 2/06/22	mar 21/06/22	15 días	0%	1.1.2.1	120
124	RAMITE SOLICITUD PMT ANDÉN SUR Y NORTE	mar 17/05/22	jue 2/06/22	15 días	50%	1.1.1.1(CO)	500

IRIS LATINOAMERICA


MIRS-MAR-169-2019

Tabla resumen de tareas atrasadas, según programación en Project, enviada para el reinicio N°4

La programación que se describe anteriormente en el costado izquierdo, corresponde a la misma dada en la programación archivo Project y anexo "REORGANIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA REALIZAR", enviados por el contratista de obra y avalada para el reinicio N°4 y prórroga N°3 al contrato de obra. A la fecha no presenta avance físico frente a lo propuesto en el cronograma de obra, generando la actualidad un atraso significativo a la ejecución contractual propuesta, por el contratista de obra para el reinicio N°4 y Prórroga N°3.

Se anexa registro fotográfico de visita frentes de obra:

Frente Eduardo Santos (Tapicerías) Carrera 18 entre Calle 2 y Calle 3 CIV'S (14001506)

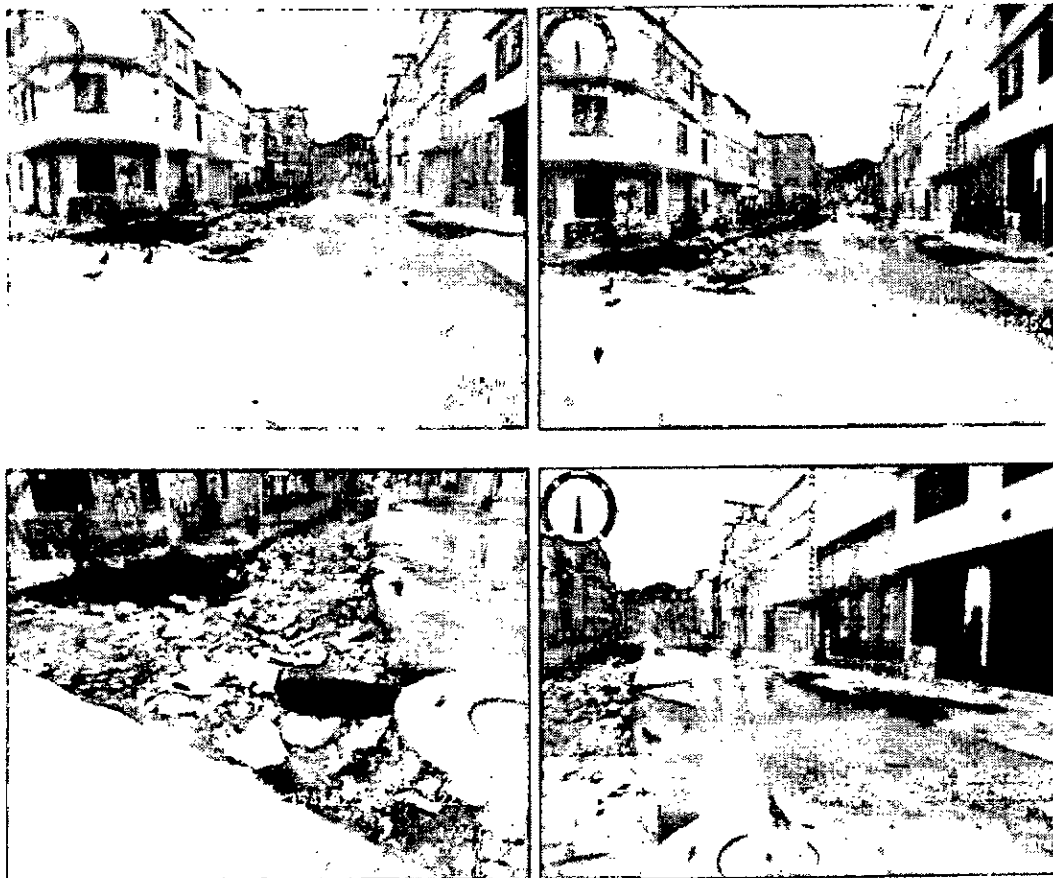


1589
163

IRS LATINOAMERICA

MIRS-MAR-169-2019


Frente colegios Calle 1C entre Kr 19A y Kr 19C CIV'S (14001619-14001616)

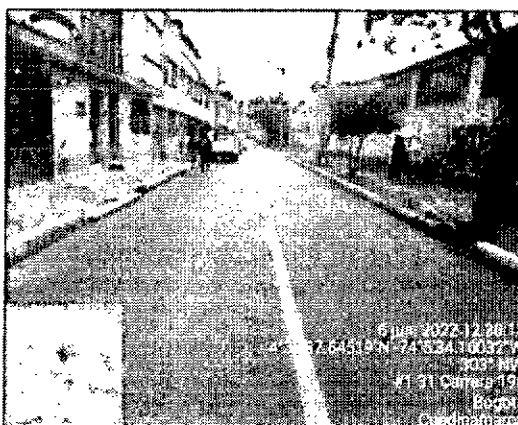


159C
1497

IRS LATINOAMERICA

MIRS-MAR-169-2019

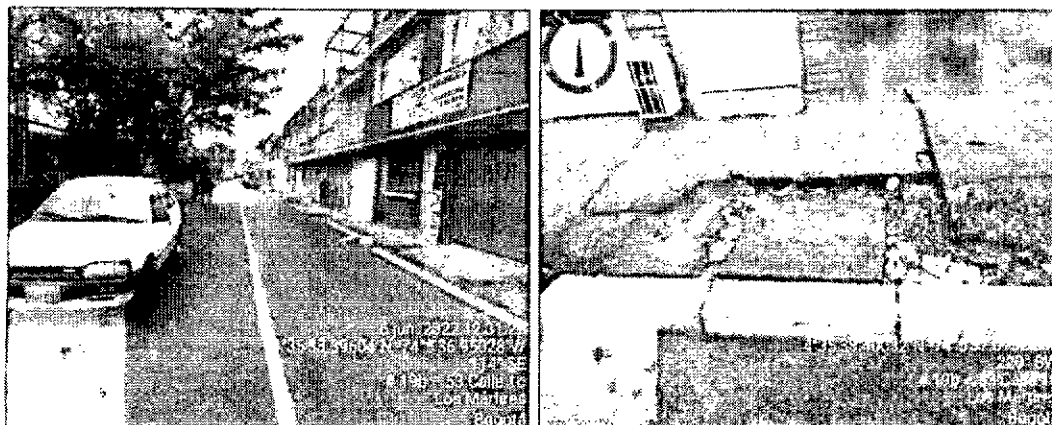

Frente Calle 1B entre Kr 27A y Kr 28 CIV'S (14001367)

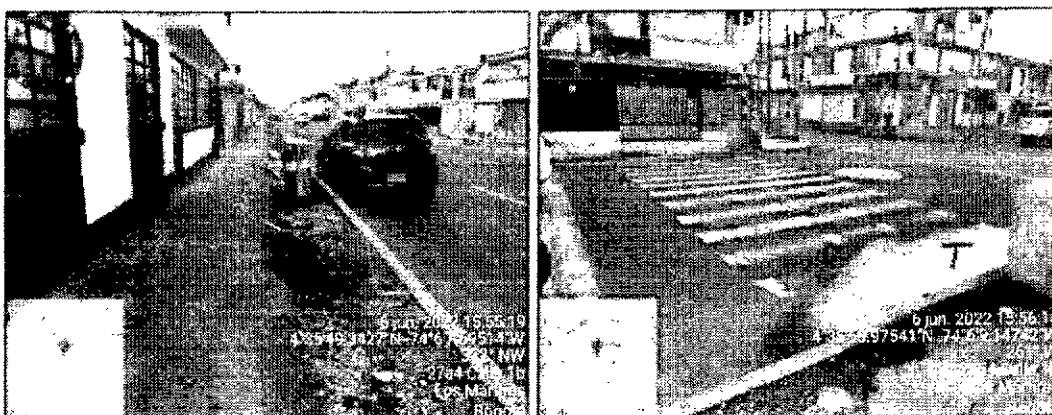

IRS

L A T I N O A M E R I C A

MIRS-MAR-169-2019

PMT'S

Se solicito al contratista enviar matriz de PMT's con soporte de trámites ante SDM, ya que es de conocimiento de la presente interventoria que el frente de la calle 1C cuenta con PMT aprobado y vigente, pero aún no se ha implementado, esto generando atrasos en la ejecución que no tienen una justificación y es solo imputable al contratista de obra.

18	14001619	COLEGIOS	182788	CALZADA	CL 1C	KR 19A	KR 19BBIS
			70476	ANDEN			
			70477				
19	14001615	COLEGIOS	182789	CALZADA	CL 1C	KR 19BBIS	KR 19C
			70478	ANDEN			
			70479				

Se evidencia que NO se cumple con lo descrito en el anexo "RECURSO DE MAQUINARIA", para el periodo y/o la semana 4 así:

18	14001506	TAPICERÍAS	182491	CALZADA	KR 18	CL 2	CL 3
			69902	ANDEN			
			69903				

Que informa:

TAPICERIAS		PERIODO DEL 17/05/2022 AL 16/06/2022			
ACTIVIDADES A EJECUTAR	CONFORMACION DE LA CUADRILLA	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
TRABAJO DE MUESTRAS	Minicargador Tipo Bobcat				
TRABAJO DE LA CARRETERA MC	Minicargador Tipo Bobcat				
TRABAJO DE RELLENO	Minicargador Tipo Bobcat y otro compactador de Cilindro				
TRABAJO DE INSTALACION DE MEZCLA DE ASFALTO	Finisher y otro compactador de Cilindro				

A la fecha NO se cuenta con el recurso descrito para este frente y periodo.

Se evidencia que NO se cumple con lo descrito en el anexo "RECURSO DE MANO DE OBRA", para el periodo y/o la semana 4 así:

1592

1499

LATINOAMERICA

MIRS-MAR-169-2019

SANTA ISABEL-1B		PERIODO DEL 17/05/2022 AL 16/06/2022			
ACTIVIDADES A EJECUTAR	CONFORMACION DE LA CUADRILLA	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
OC 2- DEMOLICIONES	1 oficial 1 ayudante				
OC 2- EXCAVACIONES MC	1 oficial 1 ayudante				
OC 2- RELLENOS	1 oficial 1 ayudante				
OC 2- REDES HUMEDAS	1 oficial 1 ayudante				
OT 3- INSTALACION DE MR-41	1 oficial 2 ayudantes				

A la fecha no se cuenta con el recurso descrito para este frente y periodo.

TAPICERIAS		PERIODO DEL 17/05/2022 AL 16/06/2022			
ACTIVIDADES A EJECUTAR	CONFORMACION DE LA CUADRILLA	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
OC 2- DEMOLICIONES	1 oficial 1 ayudante				
OC 2- EXCAVACIONES MC	1 oficial 1 ayudante				
OC 2- RELLENOS	1 oficial 1 ayudante				
OT 2- INSTALACION DE PREFABRICADOS	1 oficial 1 ayudante				
OC 2- REDES HUMEDAS	1 oficial 1 ayudante				
OT 3- INSTALACION DE MEZCLA DE ASFALTO	2 cuadrillas de 1 oficial 2 ayudantes.				
OT 3- INSTALACION DE MR-41	1 oficial 2 ayudantes.				
OT 3- DEMARCACION MOBILIARIO	1 oficial 2 ayudantes				

A la fecha no se cuenta con el recurso descrito para este frente y periodo.

COLEGIOS		PERIODO DEL 17/05/2022 AL 16/06/2022			
ACTIVIDADES A EJECUTAR	CONFORMACION DE LA CUADRILLA	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
OC 2- DEMOLICIONES	1 oficial 1 ayudante				
OC 2- EXCAVACIONES MC	1 oficial 1 ayudante				
OC 2- RELLENOS	1 oficial 1 ayudante				
OC 2- REDES HUMEDAS	1 oficial 1 ayudante				
OT 3- INSTALACION DE MR-41	1 oficial 2 ayudantes				

Dir : Calle 23 f# 85 A 31. Telefax: 8039343. Cel. 3014313648. Email: contrato141@gmail.com

Página 13 de 21

1593
1500

IRS LATINOAMERICA

MIRS-MAR-169-2019

A la fecha no se cuenta con el recurso descrito para este mismo periodo.

De igual manera se realiza verificación en campo de los siguientes elementos tales:

Frente Talleres Carrera 25 A entre AC 6 y Calle 7Bis




3	14000772	RICAURTE-TALLERES	183235	CALZADA	KR 25A	AC 6	CL 6BIS
			71323 71324	ANDEN			
4	14000741	RICAURTE-TALLERES	183236	CALZADA	KR 25A	CL 6BIS	CL 6A
			71325-71326	ANDEN			
5	14000718	RICAURTE-TALLERES	183237	CALZADA	KR 25A	CL 6A	CL 7
			71327-71328	ANDEN			
6	14000676	RICAURTE-TALLERES	183546	CALZADA	KR 25A	CL 7	CL 7BIS



1594
1504

IRS LATINOAMERICA

MIRS-MAR-169-2019

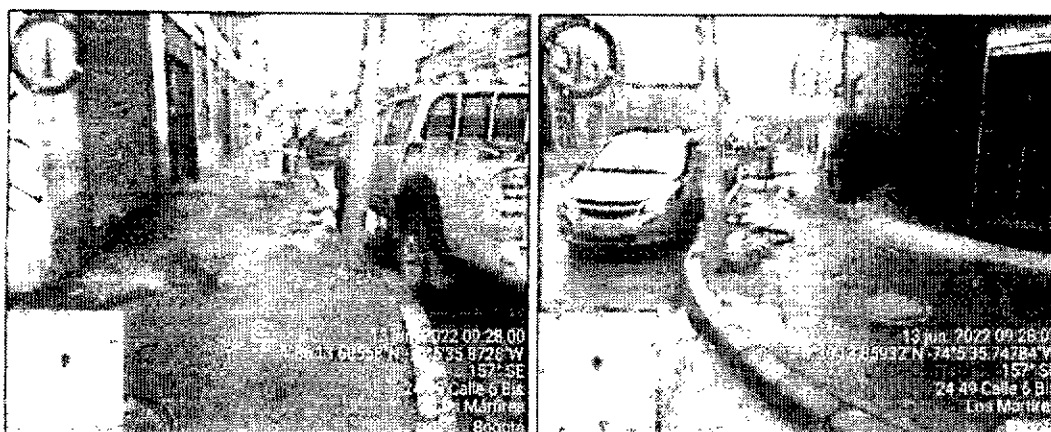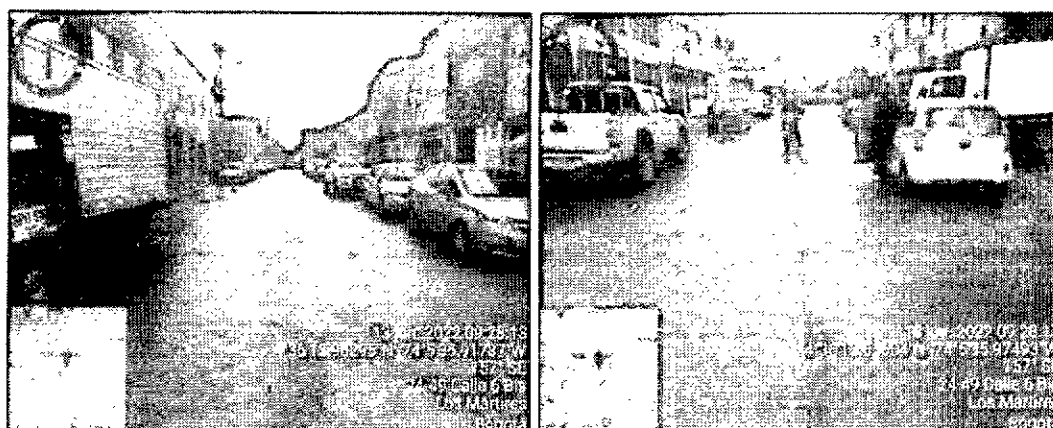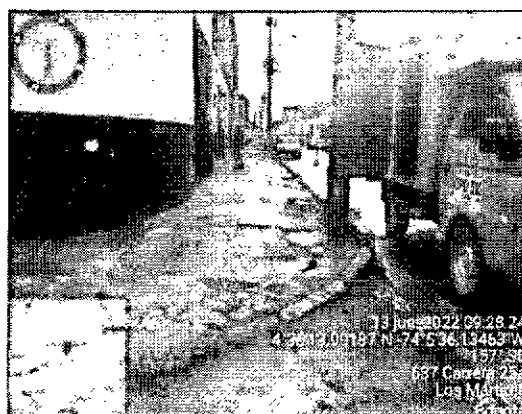




1595
1500

IRS LATINOAMERICA

MIRS-MAR-169-2019

Frente Pesqueras Carrera 24 A entre Calle 22A y DG 22B Bis

11	14000126	SAMPER MENDOZA	183733	CALZADA	KR 24	CL 22A	DG 22B BIS
			72263	CINTA AJUSTE			
			72264				

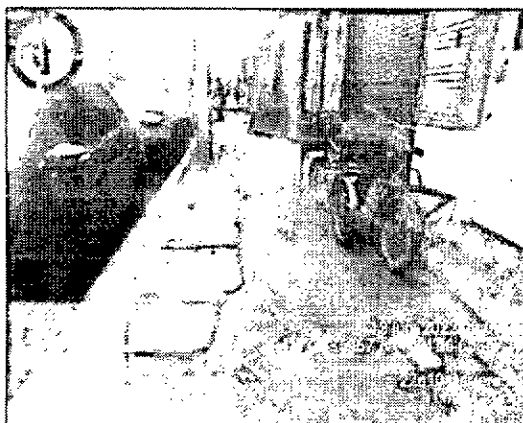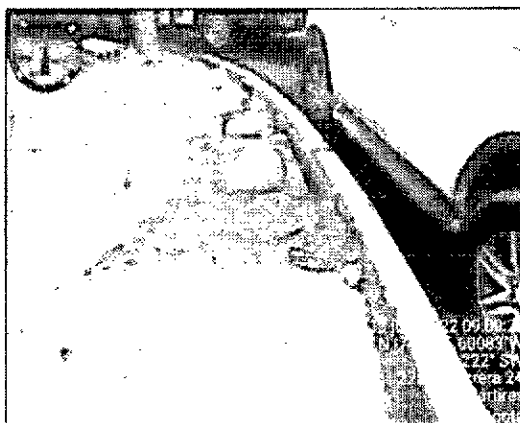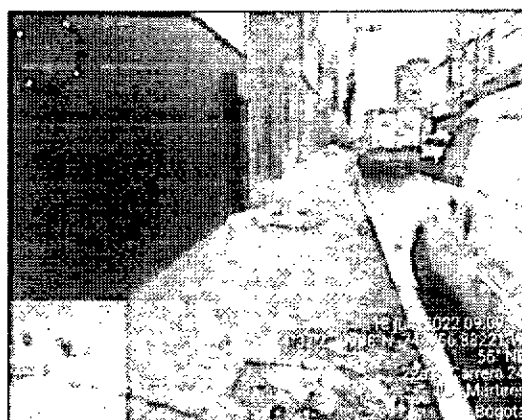

1596


~~1503~~

MIRS LATINOAMERICA

MIRS-MAR-169-2019

Frente Hojaldres Calle 22 A entre KR19 A y Kr 19B

20	14030178	SAMPER MENDOZA	183819 72430-72431	CALZADA CINTA AJUSTE	CL 22 A	KR 19A	KR 19B
----	----------	-------------------	-----------------------	-------------------------	---------	--------	--------

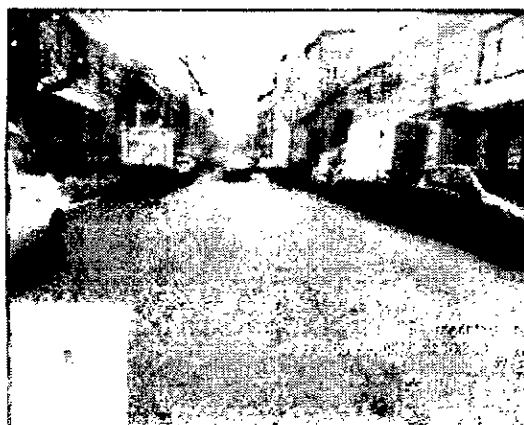

Se solicito al contratista el dar respuesta al oficio MIRS-MAR-163-2019 del día 18 de mayo de 2022, enviado via correo electrónico a conycon.martires137@gmail.com, a las 16:53, donde se requiere la información preliminar para el reinicio de las actividades constructivas, así como la actualización de la documentación de personal, maquinaria y equipos. PMI's, y no se ha remitido dicha información, solo mediante oficio C&C-CO-137-2019-139 del 26 de mayo de 2022, se presenta por parte del contratista de obra, actualización a tres profesionales administrativos, a lo cual se da respuesta mediante oficio MIRS-MAR-165-2019 el día 31 de mayo de 2022 y a la fecha no se subsanan dichas hojas de vida, se recibe correo electrónico de cronograma de actividades sociales el

Dir : Calle 23 f # 85 A 31. Telefax: 8039343. Cel. 3014313648. Email: contrato141@gmail.com

Página 17 de 21

2

159-
1504



MIRS-MAR-169-2019

día 20 de mayo de 2022, pero las mismas no se han adelantado como se evidencia en el registro fotográfico adjunto, entendiendo que las mismas dependen de la ejecución de las obras.

Se le radica al contratista de obra el llamado de atención:

- Llamado de atención 06 de junio de 2021 Oficio No MIRS_MAR_166_2019_SOLICITUDES DE REINICIO. Recibido por CON&CON 07/06/2022-Paola Gómez

Por estas razones expuestas y las que son inherentes al contrato se le solicito al contratista una respuesta dentro de los 3 días siguientes a dicha comunicación y se informa al FDLM del posible incumplimiento de obligaciones contractuales y abandono de frentes de obra, a la fecha no se tiene una respuesta formal al llamado de atención.

1. HECHO GENERADOR

El atraso en la ejecución de obra del contrato de obra No. 137 de 2019 por parte del contratista CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS CON&CON, producto del no acatamiento de las indicaciones e instrucciones dadas por la interventoría a lo largo del desarrollo del contrato, en cuanto a las actividades gerenciales y administrativas no se cuenta con el personal suficiente para dar una ejecución efectiva en los tiempos establecidos al contrato, estos lineamientos mencionados se pueden evidenciar mediante los oficios relacionados en esta comunicación. Como lo es el oficio MIRS-MAR-163-2019 del día 18 de mayo de 2022 y el Llamado de atención 06 de junio de 2021 Oficio No MIRS_MAR_166_2019_SOLICITUDES DE REINICIO. Recibido por CON&CON 07/06/2022-Paola Gómez

El presente atraso de obra es producto del no cumplimiento de la programación de obra aprobada para el **REINICIO N°4, PRORROGA N°3** y la no presentación de su actualización y/o del plan de contingencia requerido, así como el no acatamiento de las indicaciones e instrucciones dadas por la interventoría a lo largo del desarrollo del proyecto, lo cual, ha conducido a los siguientes resultados:

- El contratista no ha continuado y/o finalizado, ni cumplido con el cronograma de las actividades de obra en los frentes de trabajo que actualmente deberían estar en ejecución teniendo en todos pendientes y aun no inicia actividades de obra en ninguno de los tramos viales teniendo en cuenta el reinicio N°4 y prorroga N°3, generando que el contratista haya incurrido en atrasos en la ejecución generando problemáticas sociales con las comunidades de los segmentos abiertos hace más de 12 meses, incurre en abandono de frentes de obra y segmentos aun no iniciados lo que da que podría generar el que no pueda cumplir con las metas físicas esperadas en los plazos contractuales actualmente establecidos. Todo esto se puede verificar en las comunicaciones enviadas y copias anexas a este documento.

2. CLAUSULAS QUE VULNERA

A continuación, se presenta el marco normativo correspondiente:

- Constitución Política de Colombia,
- Ley 80 de octubre 28 de 1993, expedida por el Congreso de Colombia, "Por la cual se expide el Estatuto

1597
~~1500~~



MIRS-MAR-169-2019

General de Contratación de la Administración Pública".

- Ley 190 de junio 6 de 1995, expedida por el Congreso de Colombia, "Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa".
- Ley 1150 de julio 16 de 2007, expedida por el Congreso de Colombia, "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos".
- Ley 1474 de julio 12 de 2011, expedida por el Congreso de Colombia, "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública".
- Ley 1437 de enero 18 de 2011, expedida por el Congreso de Colombia, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".
- Ley 1564 de julio 12 de 2012, expedida por el Congreso de Colombia, "Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones" – En cuanto a materia de pruebas se refiere y cuando aplique.
- Decreto 019 de enero 10 de 2012, expedido por la Presidencia de la República de Colombia, "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública".
- Decreto 1082 de mayo 26 de 2015, expedido por la Presidencia de la República de Colombia, "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional".
- Decreto 445 de noviembre 9 de 2015, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., "Por medio del cual se asignan funciones en materia de representación legal, judicial y extrajudicial, y se dictan otras disposiciones".

A continuación, se describen las posibles cláusulas que a nuestro criterio ha vulnerado el contratista CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS CON&CON:

[...]

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de SIETE MESES a partir del punto de inicio] que impartirá [cargo dentro de la Entidad], previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

*El plazo pactado será cumplido con sujeción a lo previsto en el Pliego de Condiciones.
...]*



MIRS-MAR-169-2019

1. A la fecha no se cuenta con cronograma actualizado para verificación de los alcances de intervención de los segmentos tanto de objeto de la adición y prórroga N°1 como los contractuales iniciales, lo cual trunca significativamente la verificación hecha por esta interventoría en los segmentos viales y en los términos administrativos que esto conlleva, recordando que la presentación de la documentación requerida para la continuidad y verificación tanto de esta interventoría como del FDLM, es obligación según "Clausulado Minuta del Contrato 137-2019 Malla Vial - SECOP II- Clausula N°8 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, 9.1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación, 9.2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación, 9.3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, 9.4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones."

"[...] CLAUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

"9.1 Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.

9.2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación.

9.3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso (...)"

3. TASACIÓN: ATRASO Y MULTA

Considerando que el contratista de obra actualmente presenta un atraso en la finalización de los frentes de obra actualmente en ejecución y en el inicio de los tramos viales restantes, consideramos que se le debe iniciar el proceso de declaración de incumplimiento por las razones expuestas en este informe, no obstante, conminamos a la Entidad para que a CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS- CON&CON se le garantice el debido proceso y el derecho a la defensa.

De acuerdo al presente informe y a la evidencia presentada en el cuadro desarrollado anteriormente, esta interventoría se permite sugerir la aplicación de lo descrito en el contrato de obra No. 137 de 2019, así:

CLÁUSULA 13. MULTAS. 2) Por no cumplir con cualquiera de las obligaciones contenidas en el contrato o en los documentos que lo integran, o cumplirlas deficientemente o por fuera del tiempo estipulado, se causará una multa equivalente al uno por mil (1X1000) del valor total del contrato, por cada día calendario que transcurra desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta cuando estas efectivamente se cumplan. Si el retraso es de más de 30 días, se causará una multa equivalente al cinco por mil (5X1000) del valor total del contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: La imposición de la multa atenderá criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y gravedad de la obligación incumplida. PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago o deducción de las multas no exonerará al CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones emanadas del contrato. PARÁGRAFO TERCERO: En caso de proceder la imposición

1600
1504



MIRS-MAR-169-2019

de multas, de conformidad con la normativa vigente, el CONTRATISTA, autoriza expresamente a la Entidad con la firma del presente contrato, a realizar los descuentos correspondientes de los saldos a su favor, previo a efectuar las retenciones de tributos a que haya lugar, sobre dichos saldos a favor...]."

Conforme a lo anterior y al principio de proporcionalidad de la ley 1150 de 2007, a continuación, se presenta el cálculo respectivo de la sanción económica que esta interventoría sugiere sea aplicada, recalcando que se cuenta con 19 tramos viales en ejecución sin terminar y 6 sin iniciar actividades.

Valor total del contrato No. 137 de 2019: **\$ 8.283.121.103**

La cláusula expone que aplicara una multa del 1X1000 del valor total del contrato por cada día de atraso en el cumplimiento de las actividades constructivas, por lo cual tenemos (14) catorce días de atraso a día de hoy 16 de junio de 2022, en este cumplimiento, el cual debió ser el día 02 de junio de 2022 según el Anexo No.4 Programación de Obra-INICIO 17052021, para Reinicio N°4 y la Prorroga N°3 al contrato de obra 137 de 2019.

Es así que se tiene una suma de OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIÚN PESOS CON DIEZ (CENTAVOS O CENTÉSIMOS) MCTE (\$ 8.283.121,10) diarios, para un valor total de CIENTO QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS Y CUARENTA CENTAVOS MCTE (\$ 115.963.695,40) ✓, de los (14) días transcurridos de incumplimiento, suma que aumentara al transcurrir los días sin el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

4. RECOMENDACIÓN:

- Por lo anteriormente descrito se sugiere al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES iniciar proceso sancionatorio por el presunto incumplimiento en las obligaciones anteriormente descritas aplicando proceso y garantizando el derecho a la defensa convocando al contratista de obra a una audiencia de descargos.
- La tasación de la multa según la cláusula 13 de la minuta del contrato de obra 137 de 2019.

Atentamente,


SANDRA MÓNICA CARDOZO ROJAS
Directora Interventoría
MIRS LATINOAMÉRICA S.A.S

- Anexos: Folios (6). Copia de oficio - Llamado de atención 06 de junio de 2021 Oficio No MIRS_MAR_166_2019_SOLICITUDES DE REINICIO Recibida por CON&CON 07/06/2022-Paula Gomez- PDF

Pp: vecd. JAFC
CC

CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON - conycon.martires137@gmail.com
Cra 7 N. 127-48 - Oficina 1006
Bogotá D.C.

1604
1509

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CONSEJO ALCALDIA Local de Los Martires
CONTRATO CO- 137-2019	INFORME TÉCNICO No.12	Versión 00	

18.3 ANEXO 3 COI APROBADOS

COI No. 21
MAYO 26 DE 2022



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
SECRETARÍA DE TRANSPORTES

COLOMBIA - MAYO 2022

VERSION: 2.0

COI No. 21

MAYO 26 DE 2022

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO Y BAJO IMPACTO DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No.	DESCRIPCION DEL TRABAJO	DETALLE DE LA OBRA		FECHA	HORA DE INICIO	HORA DE TERMINO	HORA DE CIERRE	No. CONTRATO	OBSERVACIONES	AUTORIZADO	CATEGORIA	No. RESPONSABLE	No. AUTORIZADO
		INICIO	FIN										
15205	14001819	14001818	CL 10 N° 18A	CL 10 N° 18C	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE LA OBRA	27-may-22	14-may-22	07:00-18:00	24 HORAS	PRIVADO	PRIVADO	PRIVADO	PRIVADO
15206	14001819	14001818	CL 10 N° 18A	CL 10 N° 18C	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE LA OBRA	27-may-22	14-may-22	07:00-18:00	24 HORAS	PRIVADO	PRIVADO	PRIVADO	PRIVADO
15207	14001819	14001818	CL 10 N° 18A	CL 10 N° 18C	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE LA OBRA	27-may-22	14-may-22	07:00-18:00	24 HORAS	PRIVADO	PRIVADO	PRIVADO	PRIVADO
15208	14001819	14001818	CL 10 N° 18A	CL 10 N° 18C	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE LA OBRA	27-may-22	14-may-22	07:00-18:00	24 HORAS	PRIVADO	PRIVADO	PRIVADO	PRIVADO

NOTA: El presente documento es de uso interno y no debe ser utilizado para fines ajenos a los establecidos en el presente documento.

La Secretaría de Transportes de la Alcaldía de Bogotá, en el marco de sus competencias, ha establecido el presente documento con el fin de regular el uso de los espacios públicos para la realización de obras de medio y bajo impacto y bajo impacto de planes de manejo de tránsito.

A. ESPECIALIZACIÓN

1. El presente documento es de uso interno y no debe ser utilizado para fines ajenos a los establecidos en el presente documento.

2. El presente documento es de uso interno y no debe ser utilizado para fines ajenos a los establecidos en el presente documento.

3. El presente documento es de uso interno y no debe ser utilizado para fines ajenos a los establecidos en el presente documento.

4. El presente documento es de uso interno y no debe ser utilizado para fines ajenos a los establecidos en el presente documento.

5. El presente documento es de uso interno y no debe ser utilizado para fines ajenos a los establecidos en el presente documento.

6. El presente documento es de uso interno y no debe ser utilizado para fines ajenos a los establecidos en el presente documento.

7. El presente documento es de uso interno y no debe ser utilizado para fines ajenos a los establecidos en el presente documento.

8. El presente documento es de uso interno y no debe ser utilizado para fines ajenos a los establecidos en el presente documento.

9. El presente documento es de uso interno y no debe ser utilizado para fines ajenos a los establecidos en el presente documento.

10. El presente documento es de uso interno y no debe ser utilizado para fines ajenos a los establecidos en el presente documento.

11. El presente documento es de uso interno y no debe ser utilizado para fines ajenos a los establecidos en el presente documento.

12. El presente documento es de uso interno y no debe ser utilizado para fines ajenos a los establecidos en el presente documento.

5001

Ing. María Cecilia Barrantes
Subdirectora Técnica de Planificación y Desarrollo de Tránsito
Las Pautas de Tránsito de Bogotá, en el marco de sus competencias, ha establecido el presente documento.

