

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 1 DE 98

REPÚBLICA DE COLOMBIA



MUNICIPIO DE TUNJA

DEPARTAMENTO DE BOYACA

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1068 DE 2021

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°2

PERIODO DEL 05 DE DICIEMBRE AL 04 DE ENERO DE 2022

ING. CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ
INTERVENTOR

ENERO DE 2022

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1.	DATOS DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA.....	4
1.1	CONTRATO DE OBRA.....	4
1.2	CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	4
2.	CONTROL DE PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA.....	5
2.1	PERSONAL DE OBRA PROFESIONAL.....	5
2.2	PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA.....	5
2.3	MAQUINARIA MINIMA DE OBRA.....	5
3.	PERSONAL Y EQUIPO DE INTERVENTORIA.....	6
3.1	PERSONAL PROFESIONAL INTERVENTORIA.....	6
3.2	EQUIPO INTERVENTORIA.....	6
4.	CONTROL JURIDICO POLIZAS DEL CONTRATO.....	7
5.	CONTROL DE CORRESPONDENCIA.....	9
6.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.....	10
6.3	OBRAS Y SECTORES INTERVENIDOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO.....	10
7.	PLAN DE CALIDAD EN OBRAS.....	11
7.1	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO.....	12
7.2	SEGURIDAD INDUSTRIAL.....	13
7.3	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES.....	14
7.3.1	PINTURA PLASTICA EN FRIO.....	14
7.3.2	PINTURA ACRILICA.....	14
7.3.3	MICROESFERAS.....	14
7.4	CONTROL DE ESPESORES DE LA PINTURA PLASTICA EN FRIO, APLICADA CON EL METODO MANUAL "LLANA".....	15
7.5	RESULTADOS PRUEBA DE RETRORREFLECTIVIDAD.....	18
7.6	CONTROL DE LA FUNCIÓN AMBIENTAL Y DE LA GESTIÓN SOCIAL.....	20
8.	OBRA EJECUTADA.....	24
9.	CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA.....	25
10.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	26
11.	ANEXOS.....	27

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 11.1 DOCUMENTACION JURIDICA CONTRATOS DE OBRA Y DE INTERVENTORIA.

Anexo 11.2 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA y COMITES DE OBRA REALIZADOS.

Anexo 11.3 PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA DE OBRA.

Anexo 11.4 PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA DE OBRA

Anexo 11.5 PROGRAMACION DE OBRA.

ANEXO 11.6 CONTROL DE CALIDAD A LOS MATERIALES UTILIZADOS.

FICHAS TECNICAS PINTURAS

CERTIFICADOS DE CALIDAD PINTURAS

FICHAS TECNICAS MICROESFERAS

ANEXO 11.7 SOPORTES IMPLEMENTACION PLAN DE CALIDAD

ANEXO 11.8 SOPORTES IMPLEMENTACION PROGRAMA DE GERENCIA OBRA

ANEXO 11.9 COPIA BITACORA DE OBRA

ANEXO 11.10 INFORMES SEMANALES

ANEXO 11.11 MEMORIAS DE CANTIDADES

ANEXO 11.12 REGISTRO FOTOGRÁFICO

1. DATOS DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA.

1.1 CONTRATO DE OBRA.

Información General del contrato de Obra.

Contratante: MUNICIPIO DE TUNJA
Contratista: CUMBRE INGENIERIA SAS. NIT.900321674-6
Contrato No: 1036 de 2021.
Objeto: "CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA".
Valor del Contrato: \$ 642.638.556
Plazo de Ejecución: 3 meses.
Fecha de terminación: 04 de Febrero de 2022.

1.2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA

1 – Información General del contrato de Interventoría.

Contratante: MUNICIPIO DE TUNJA
Contratista: ING. CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ
Contrato No: 1068 de 2021
Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"
Valor del Contrato: \$ 37.074.450
Plazo de Ejecución: 3 meses.
Fecha de terminación: 04 de Febrero de 2022.
Supervisor: ING. LUIS FELIPE CARDENAS AVILA

2. CONTROL DE PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA.

2.1 PERSONAL DE OBRA PROFESIONAL

CARGO	NOMBRE	PROFESION	ESPECIALISTA
Director de Obra	Ing. Leonardo Ramírez Bernal	Ingeniero civil	Especialista en gerencia de construcciones
Residente de Obra	Ing. Estanislabo Estaba	Ingeniero civil	
Especialista de Tránsito	Ing. Víctor Manuel Reyes Caro	Ingeniero en transportes y vías	Magister en Ingeniería - Transporte

2.2 PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

NOMBRE	No. CÉDULA
OSMAN GILDARDO OVIEDO REYES	7.187.580
BLADIMIR FLOR LOPEZ	1.123.141.385
ORLANDO ALEXANDER PADILLA CAMPOS	80.762.581
FELIX ALBERTO ORTEGA QUIROGA	6.770.589
FRANCISCO JAVIER MALAGON	7.176.559
BRAYAN ALEXANDER AVILA REYES	1.002.367.112
CAMILO ANDRES MONROY ARCOS	7.183.657

2.3 MAQUINARIA MINIMA DE OBRA

TIPO	MARCA	MODELO	CAPACIDAD
CAMION DE APOYO	FOTON	2020	4500 KGR
PULIDORA CON DISCO	BLACK&DECKER	G720K	4 ½"
PLANTA ELECTRICA	BAUKER	GG2800	1.5 L
DOS HOYADORAS			
DOS PICAS			
NIVEL DE PRECISION	SOKKIA	B401-25	
BATEA			

3. PERSONAL Y EQUIPO DE INTERVENTORIA.

3.1 PERSONAL PROFESIONAL INTERVENTORIA

CARGO	NOMBRE	PROFESION	ESPECIALISTA
Director de Interventoría	Ing. Juan Galindo	Ingeniero en transportes y vías	Especialista en pavimentos
Residente de Interventoría	Ing. Fernando Rodríguez Numpaque	Ingeniero en transportes y vías	Especialista en Infraestructura Vial
Especialista en salud ocupacional	Ing. Fabián Silvestre Fonseca	Ingeniero civil	Especialista en salud ocupacional

3.2 EQUIPO INTERVENTORIA

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Vehículo tipo Camioneta	1
2	Equipo de computo	2
3	Herramienta Menor (cinta, metro, etc.)	2

4. CONTROL JURIDICO POLIZAS DEL CONTRATO

• CONTRATO DE OBRA :

4.1 Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual

PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	ANEXO 0	28/10/2021			
GARANTÍAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	895-74-994000003852	21/10/21	21/01/22	\$ 181.705.200,00

4.2 Póliza de cumplimiento (ANEXO 1)

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO		28/10/2021			
GARANTÍAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	895-74-994000006707	21/10/21	21/01//22	\$ 128.527.711,20
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		21/10/21	21/01/25	\$128.527.711,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		5 AÑOS a partir ACTA DE RECIBO		\$192.791.566,80

4.3 Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual (ANEXO 1)

PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	ANEXO 1	08/11/2021			
GARANTÍAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	895-74-994000003852	21/01/22	05/02/22	\$ 181.705.200,00

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 8 DE 98

4.4 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (ANEXO 2)

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO		08/11/2021			
GARANTÍAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	895-74-994000006707	05/11/21	05/02//22	\$ 128.527.711,20
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		05/11/21	05/02/25	\$128.527.711,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		5 AÑOS a partir ACTA DE RECIBO		\$192.791.566,80

• CONTRATO DE INTERVENTORIA :

4.5 Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual

PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		09/11/2021			
GARANTÍAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO	39-40-101034919	05/11/21	05/02/22	\$ 181.705.200,00

4.6 Póliza de cumplimiento

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO		09/11/2021			
GARANTÍAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	39-44-101131459	05/11/21	05/06/22	\$ 11.122.335
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS DEL ESTADO		05/11/21	05/02/25	\$7.414.890
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO		05/11/21	05/11/26	\$7.414.890

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 9 DE 98

5. CONTROL DE CORRESPONDENCIA

ENVIADA	RECIBIDA
ENV. 016. A SUPERVISOR. REMISION PMT VIA TUNJA-ARCABUCO.	SUPERVISION. DISEÑOS VIAS FLORIDA Y OTROS.
ENV. 017 A CONTRATISTA. SOLICITUD COMPLEMENTO INFORME MENSUAL 1.	SUPERVISION. AJUSTES DISEÑOS VIA TUNJA-ARCABUCO.
ENV. 018. A SUPERVISOR. SOLICITUD DE DISEÑOS TOTALES A EJECUTAR.	CONTRATISTA CUMBRE. PMT VIA TUNJA-ARCABUCO
ENV. 019. A SUPERVISOR. REMISION PMT VIA TUNJA-ARCABUCO DEFINITIVO.	CONTRATISTA CUMBRE. PMT INSTALACION SEÑALIZACION VERTICAL.
ENV. 020. A SUPERVISOR. REMISION PMT VIA TINSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL.	CONTRATISTA CUMBRE. PMT AJUSTADO VIA TUNJA-ARCABUCO
ENV. 021 A CONTRATISTA. REMISION LISTADO DE REDUCTORES A INTERVENIR.	SUPERVISION LISTADO DE REDUCTORES A INTERVENIR.
ENV. 022. A SUPERVISOR. REMISION REGISTRO FOTOGRAFICO SECTORES INTERVENIDOS.	

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

6.1 OBRAS Y SECTORES INTERVENIDOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO.

Para el presente periodo mensual se intervinieron los siguientes sectores:

#	SECTORES INTERVENIDOS
1	CARRERA 9 CON CALLE 25 (SALESIANO)
2	CARRERA 9 CON CALLE 22 (BRIGADA)
3	CARRERA 9 CON CALLE 12 (ASMEVET)
4	CARRERA 15 CON CALLE 19 (TOPO)
5	CARRERA 7 CON CALLE 17 (ANTIGUO TERMINAL)
6	CARRERA 7 CON CALLE 18
7	CARRERA 7 CON CALLE 19
8	CARRERA 7 CON CALLE 20
9	CARRERA 8 CON CALLE 18
10	CARRERA 8 CON CALLE 20 (PILA DEL MONO)
11	CARRERA 8 CON CALLE 23
12	CARRERA 8 CON CALLE 25
13	CARRERA 10 CON CALLE 21 (CAMOL)
14	CARRERA 11 CON CALLE 17 (LUMOL)
15	CARRERA 11 CON CALLE 21 A (HOTEL HUNZA)
16	CARRERA 12 CON CALLE 18 (PILA SALADA)
17	CARRERA 16 CON CALLE 32 (ESPERANZA)
18	COLEGIO GALILEO GALILEI
18	VIA TUNJA ARCABUCO (DEMARCAION HORIZONTAL Y VERTICAL)100%
20	CALLE 3 ENTRE CARRERAS 10 Y 14 (DEMARCAION HORIZONTAL Y VERTICAL)(falta tachas)
21	VIAS BARRIO LA FLORIDA (DEMARCAION HORIZONTAL y VERTICAL)
22	CARRERA 14 ENTRE CALLES 21 Y 26 (SEÑALIZACION VERTICAL)

Las actividades desarrolladas en los sectores fueron las siguientes:

- **Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frío alta duración metil-metacrilato 100% puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC-1360-1, para pasos peatonales, avisos en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehículos y peatones (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra):** esta actividad se inicia con el

barrido y limpieza del área donde se va a intervenir, seguido de la demarcación de las diferentes señales o dispositivos horizontales que se van a implementar en el sector según los planos de diseños, enseguida se procede a la aplicación de la pintura de plástico en frío manualmente con una llana metálica, esta aplicación se hace de manera uniforme garantizando que cubra todo la superficie del pavimento y tapando cualquier porosidad que se presente, además se garantiza el espesor mínimo contratado que es de 50 mils, inmediatamente aplicada la pintura se precede a la aspersión uniforme de las microesferas, finalmente se espera el tiempo de secado que para las condiciones de temperatura de la ciudad varía entre 30 y 60 minutos.

- **Suministro y aplicación de pintura acrílica con microesferas, líneas continuas y discontinuas de 12 cms según norma Invías:** esta actividad se inicia con el punteo del eje o borde de la línea que se va a pintar, la cual puede ser continua o discontinua según sea el diseño del tramo, seguido se realiza la aplicación de la pintura acrílica con un compresor instalado en un vehículo de señalización, garantizando el ancho de la línea 12 cms y el correcto alineamiento. Se realizan los controles de calidad establecidos en la norma NTC 4744-4.
- **Suministro e instalación de señales verticales:** esta actividad se inicia con la fabricación en taller de las señales, las cuales una vez terminadas se desplazan a punto donde se van a instalar, en el cual se realiza la localización según planos de diseños, una vez localizada se realiza la excavación manual para la instalación de la señal y se instala verticalmente cumpliendo la normatividad vigente, esta se asegura fundiendo un concreto en la base de cada señal.

Se informa que la empresa contratista subcontrató a la empresa Abraham Publicidad Ingeniería sas de la ciudad de Tunja, para la fabricación e instalación de las señales verticales del contrato.

- **Suministro e instalación de dispositivos de regulación del tránsito (hitos y tachones):** se inicia con la localización según planos de diseños, y una vez localizados se realiza el anclaje a la superficie utilizando tornillería apropiada para el caso.

7. PLAN DE CALIDAD EN OBRAS

7.1 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO


Se realiza la implementación de los respectivos Planes de Manejo de tránsito aprobados tanto por la interventoría como por la secretaria de tránsito y transporte de Tunja, en el cual se debe garantizar la respectiva señalización de la obra, tanto informativa como preventiva y la información de los cierres de las vías, con el objetivo que los conductores de los vehículos que transitan por el sector y los peatones que circulan por inmediaciones del tramo tengan la información necesaria de circulación. Se le exige al contratista la implementación de esta señalización, esto se puede evidenciar en los registros fotográficos anexos.



7.2 SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se exige al contratista la implementación Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG- SST), exigiendo el uso de los elementos de protección y seguridad del personal de obra, como cascos, botas punta de acero, chalecos reflexivos, guantes, tapa oídos, tapa bocas y gafas de seguridad para el personal que opera máquinas de corte. (ver informe de implementación del SG- SST),

A continuación se puede observar.

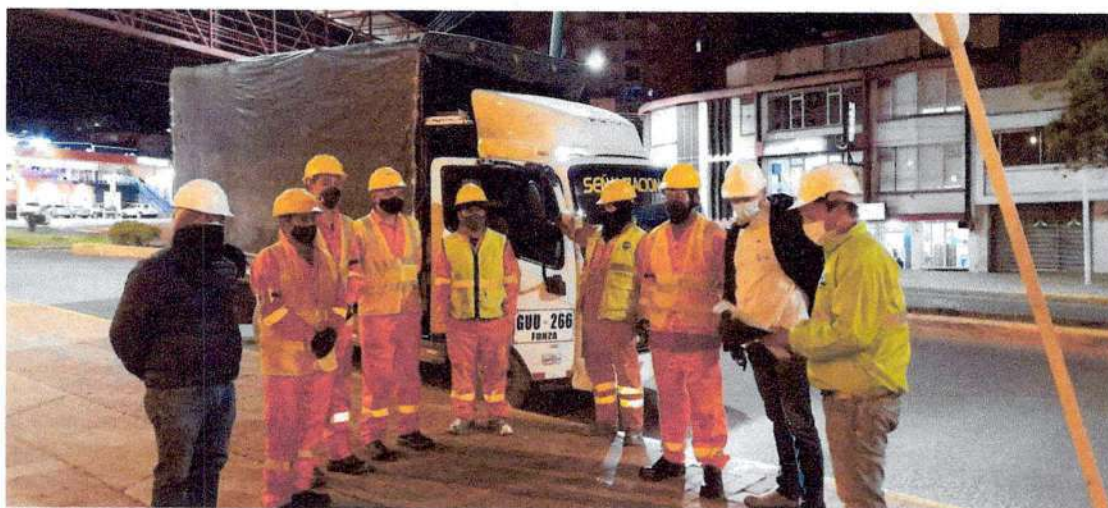

Nota: se adjunta planillas de entrega de dotación a los trabajadores y planillas de capacitación SG- SST,

7.3 CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

7.3.1 PINTURA PLASTICA EN FRIO

Calidad: Se controla la calidad de la pintura plástica que para el caso cumpla con la norma NTC 1360-1. Para este caso se solicita al contratista la ficha técnica de las pinturas plásticas que se está aplicando (marcas Pintuflex y Gmp). Estas fichas técnicas más el certificado de cumplimiento de calidad de las pinturas se encuentra anexas al presente informe.

Espesor de la película: Se controla el espesor de la pintura plástica cumpla con la lo contratado (50 mils). Para este caso se aplica el método establecido en la norma NTC 4744-4 y Norma ASTM D 4414, en el cual se utiliza un medidor rectangular con muescas, los resultados se encuentran en numeral 7.4 del presente informe.

Retroreflectividad: se realiza el control de la retroreflectividad de la pintura instalada siguiendo la especificación NTC 4744-3, los resultados se encuentra anexas al presente informe numeral 7.5.

7.3.2 PINTURA ACRILICA

Calidad: Se controla la calidad de la pintura acrílica que para el caso cumpla con la norma NTC 1360-1. Para este caso se solicita al contratista la ficha técnica de las pinturas que se está aplicando (marcas Pintuflex y Gmp). Estas fichas técnicas más el certificado de cumplimiento de calidad de las pinturas se encuentra anexas al presente informe.

Espesor de la película: Se controla el espesor de la pintura acrílica cumpla con el espesor mínimo establecido en la norma NTC 4744-4 Tabla 1. (9 mils). Para este caso se aplica el método establecido en la norma NTC 4744-4, numeral 4.7.2.3.1, los resultados se encuentra anexas al presente informe.

Retroreflectividad: se realiza el control de la retroreflectividad de la pintura instalada siguiendo la especificación NTC 4744-3, y la norma NTC 4744-4 numeral 4.7.2.3.2, los resultados se encuentra anexas al presente informe numeral 7.5.

7.3.3 MICROESFERAS

De igual manera se solicita la ficha técnica de las microesferas utilizadas, y se verifica el cumplimiento de la norma NTC 2072. Se anexa Ficha técnica.

7.3.4 SEÑALES VERTICALES

En la fabricación de las señales verticales se controlan que cumplan las especificaciones establecidas en el Manual de señalización vial, dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorutas de Colombia de 2015, como las características básicas, forma, color, tamaños, retrorreflexión, así como los materiales utilizados en el sistema de soporte, los materiales del tablero, las pinturas utilizadas, el papel reflectivo utilizado (marca 3 M), etc. En la instalación se controla la ubicación longitudinal y lateral, la altura y la orientación. Se anexan certificados de calidad del material reflectivo utilizado (marca 3M), ensayos de calidad de los ángulos de soportes de la señales y los ensayos del material galvanizado utilizado para los tableros. Además se controla la retrorreflectividad en las señales verticales campo, utilizando el aparato retrorreflectómetro.

7.3.5 DISPOSITIVOS DE REGULACION

Para los dispositivos de regulación del tránsito (Hitos, Tachones y tachas) se controlan que cumplan las especificaciones establecidas en el Manual de señalización vial, dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorutas de Colombia de 2015, como las características básicas, forma, color, tamaños, así como los materiales utilizados en el sistema de soporte, etc. En la instalación se controla la ubicación longitudinal y lateral, según planos de diseño. Se anexa ficha técnica de las tachas a utilizar.

7.4 CONTROL DE ESPESORES DE LA PINTURA PLASTICA EN FRIO, APLICADA CON EL METODO MANUAL "LLANA".

El control de espesores de la pintura plástica en frio se realiza por medio de la utilización de un medidor rectangular en aluminio con muescas, siguiendo el procedimiento de la norma ASTM 4414, con la cual se realiza la medición en unidades mils, en promedio el resultado ha sido de 60 mils, el cual cumple con el espesor contratado y sugerido por el fabricante de la pintura. Se deja en claro que la medición se hace con la pintura húmeda y no se aplica la fórmula de pintura seca (NTC4744-4) ya que el porcentaje de sólidos en volumen de la pintura es del 100% según la ficha técnica de la pintura.

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 16 DE 98

A continuación se relacionan algunas de las mediciones realizadas en los sectores intervenidos a la fecha:

N°	UBICACION	PRUEBA NORMA NTC 4744-4, ASTM D 4414 ESPESOR REQUERIDO (MILs)	PRUEBA NORMA NTC 4744-4, ASTM D 4414 ESPESOR PROMEDIO MEDIDO (MILs)	CUMPLE SI/NO
1	CARRERA 9 CON CALLE 25 (SALESIANO)	50	60	SI
2	CARRERA 9 CON CALLE 22 (BRIGADA)	50	60	SI
3	CARRERA 9 CON CALLE 12 (ASMEVET)	50	55	SI
4	CARRERA 15 CON CALLE 19 (TOPO)	50	55	SI
5	CARRERA 7 CON CALLE 17 (ANTIGUO TERMINAL)	50	55	SI
6	CARRERA 7 CON CALLE 18	50	55	SI
7	CARRERA 7 CON CALLE 19	50	60	SI
8	CARRERA 7 CON CALLE 20	50	60	SI
9	CARRERA 8 CON CALLE 18	50	55	SI
10	CARRERA 8 CON CALLE 20 (PILA DEL MONO)	50	60	SI
11	CARRERA 8 CON CALLE 23	50	55	SI
12	CARRERA 8 CON CALLE 25	50	55	SI
13	CARRERA 10 CON CALLE 21 (CAMOL)	50	55	SI
14	CARRERA 11 CON CALLE 17 (LUMOL)	50	55	SI
15	CARRERA 11 CON CALLE 21 A (HOTEL HUNZA)	50	55	SI
16	CARRERA 12 CON CALLE 18 (PILA SALADA)	50	60	SI
17	CARRERA 16 CON CALLE 32 (ESPERANZA)	50	60	SI
18	COLEGIO GALILEO GALILEI	50	60	SI
19	VIA TUNJA ARCABUCO (DEMARCAACION HORIZONTAL)	50	60	SI
20	CALLE 3 ENTRE CARRERAS 10 Y 14 (DEMARCAACION HORIZONTAL)	50	65	SI
21	VIAS BARRIO LA FLORIDA (DEMARCAACION HORIZONTAL)	50	55	SI

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA



HOJA No. 17 DE 98



"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 18 DE 98

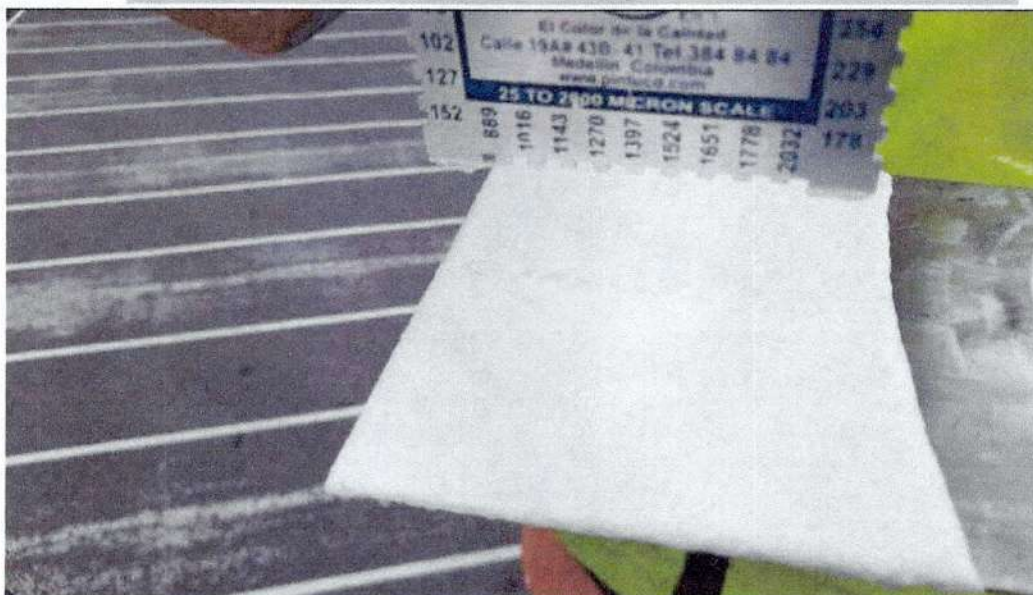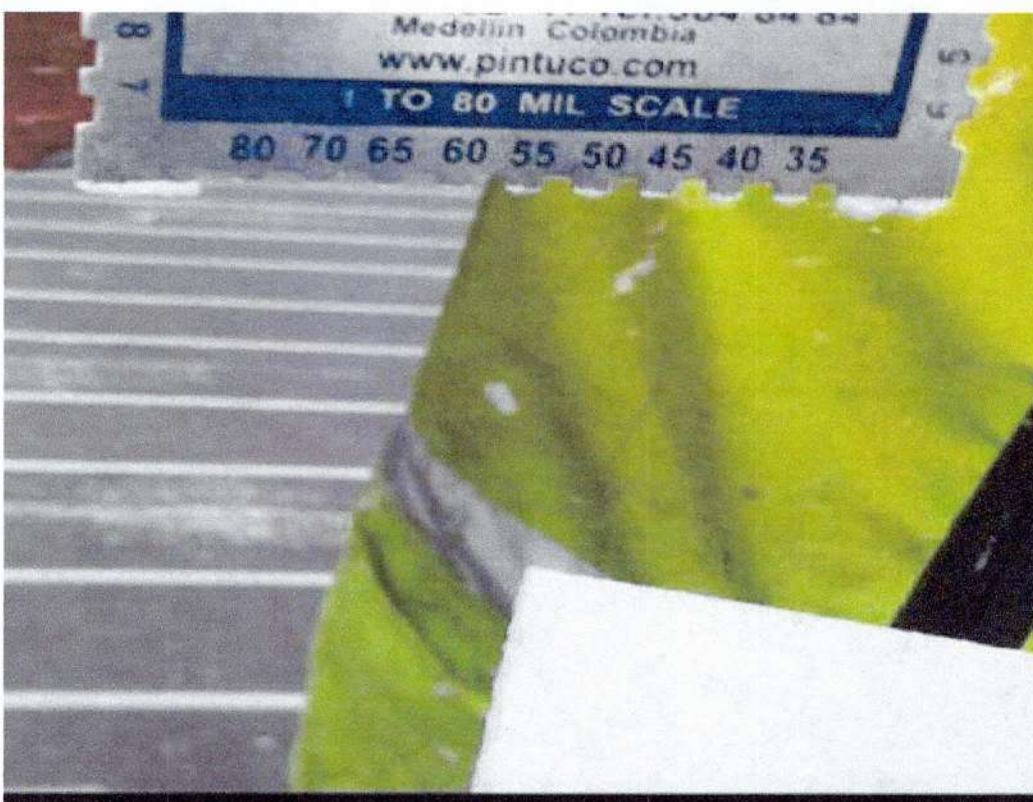

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 19 DE 98

7.5 RESULTADOS PRUEBA DE RETRORREFLECTIVIDAD EN PINTURA PLASTICA Y ACRILICA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, EQUIPO DE GEOMETRIA A 15M.

Mayor 250	Fecha direccional		255	SI
UBICACIÓN	COEF. MINIMO PRUEBA MCD/LUX/M2 NTC 4744-3	UBICACION	RESULTADO PINTURA SECA	CUMPLE
Calle 3 entre carreras 11 y 14	Mayor 250	Línea pare	268	SI
	Mayor 250	Cebra	260	SI
	Mayor 200	Línea centro	248	SI
	Mayor 200	Línea centro	261	SI
	Mayor 200	camellón	259	SI
	Mayor 200	camellón	249	SI
	Mayor 200	Línea centro	262	SI
	Mayor 200	Línea centro	312	SI
	Mayor 200	Línea centro	282	SI
Vía Tunja Arcabuco	Mayor 200	Línea continua doble	235	SI
	Mayor 200	Línea continua doble	276	SI
	Mayor 200	Línea continua doble	289	SI
	Mayor 200	Línea continua doble	386	SI
	Mayor 200	Línea continua doble	365	SI
	Mayor 200	Línea continua doble	300	SI
	Mayor 200	Línea continua doble	305	SI
	Mayor 200	Línea continua doble	313	SI
	Mayor 200	Línea continua doble	282	SI
	Mayor 200	Línea continua doble	374	SI
intersección carrera15 con Calle 19	Mayor 200	Camellón carrera 15	262	SI
	Mayor 200	Camellón carrera 15	259	SI
	Mayor 250	Fecha direccional	255	SI
	Mayor 250	Línea de pare calle 19	297	SI
	Mayor 200	Línea antibloqueo	348	SI
	Mayor 250	Cebra calle 19	280	SI
	Mayor 250	Fecha direccional	275	SI

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA



HOJA No. 20 DE 98



"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 21 DE 98

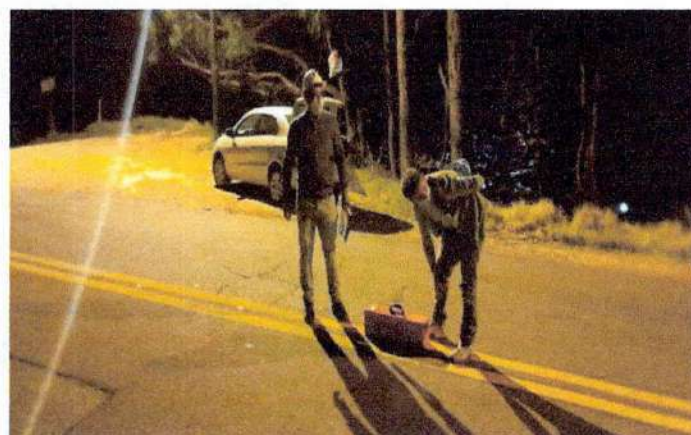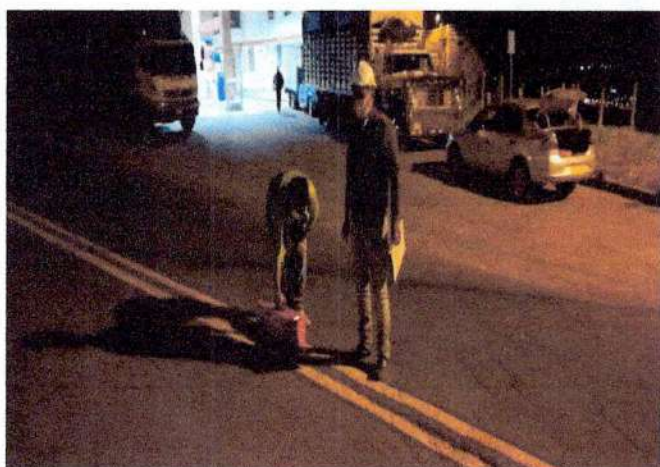

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 22 DE 98



7.6 CONTROL DE LA FUNCIÓN AMBIENTAL Y DE LA GESTIÓN SOCIAL.

La interventoría controló que:

- Que se realicen capacitaciones seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente.
- Protección zonas verdes e individuos arbóreos.
- Se haga un adecuado aseo en el sector que se ha intervenido.
- Se haga una disposición adecuada de residuos sólidos de los materiales utilizados.
- Se haga una disposición adecuada de residuos sólidos de los materiales utilizados.
- Que la secretaria de tránsito y transporte esté informada de los cierres viales y posibles afectaciones en los sectores intervenidos, para su respectiva divulgación.

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 24 DE 98

8. OBRA EJECUTADA

El siguiente cuadro muestra el acumulado de cantidades ejecutadas, además se anexan memorias de cálculo de las cantidades ejecutadas.

No.	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ACTUAL	
		UND	Cant	Vr Unidad	Vr Parcial	Cant	VALOR
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES REGLAMENTARIAS 60 x 60 CM	UND	486	\$ 414.160.00	\$ 201.281.760.00	108.00	\$ 44.729.280.00
2	MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRAFICO SEGUN NORMA INVIAS Y DISEÑO (INCLUYE MICROESFERAS)	M2	459.00	\$ 61.010.00	\$ 28.003.590.00	458.84	\$ 27.993.828.00
3	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frío alta duración metil-metacrilato 100% puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC-1360-1, para pasos peatonales, avisos en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehículos y peatones (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra)	M2	3.583.00	\$ 66.780.00	\$ 239.272.740.00	1.493.69	\$ 99.748.618.00
4	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS	ML	16.154.00	\$ 2.740.00	\$ 44.261.960.00	8.127.00	\$ 22.267.980.00
5	Suministro e instalación de Señalización vial vertical Doble (DUPLEX) en papel reflectivo 60 x 60 zona urbana, según especificaciones relacionadas en el Manual de Señalización vial adoptado por la resolución 1885 de 2015, numerales 2.2.2. y 2.1.6.2 (Incluye todos los elementos necesarios para su instalación entre ellos herramienta menor, excavación, concreto y ,mano de obra)	UND	30.00	\$ 507.370.00	\$ 15.221.100.00	3.00	\$ 1.522.110.00
6	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito preventivas SP-47B, tamaño 60 X 60 cm. Elaboradas en lamina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo marca 3M) pedestal elaborado en angulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostatica. Segun norma INVIAS.	UND	23.00	\$ 460.620.00	\$ 10.594.260.00	23.00	\$ 10.594.260.00
7	Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega en la respectiva Entidad Territorial (incluye señales sencillas y Dúplex)	UND	15.00	\$ 26.080.00	\$ 391.200.00	15.00	\$ 391.200.00
8	Suministro e instalación señales verticales sr-38, lámina galvanizada reflectividad tipo XI, grado diamante al cubo, con pedestal	UND	22.00	\$ 365.420.00	\$ 8.039.240.00	22.00	\$ 8.039.240.00
9	SEÑALES PREVENTIVAS (SP) Y REGLAMENTARIAS (SR) 60 X 60 CM REFLECTIVO VERDE LIMON	UND	4.00	\$ 311.170.00	\$ 1.244.680.00	2.00	\$ 622.340.00
10	SEÑALES DE TRANSITO DIMENSIONES 60*75 CMS (DELINEADORES DE CURVA) SEGUN NORMA INVIAS	UND	12.00	\$ 266.190.00	\$ 3.194.280.00	6.00	\$ 1.597.140.00
11	SEÑALES DE TRANSITO 0.90*1.13 MTS (INFORMATIVAS) SEGUN NORMA INVIAS	UND	6.00	\$ 616.420.00	\$ 3.698.520.00	3.00	\$ 1.849.260.00
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES	UND	6.176.00	\$ 9.480.00	\$ 58.548.480.00	-	\$ -
13	Suministro e instalacion de hitos (alto =75 cm d=8 cm) de color amarillo	UND	240.00	\$ 59.170.00	\$ 14.200.800.00	44.00	\$ 2.603.480.00
14	Suministro e instalacion de tachones 40*15*8 cm	UND	210.00	\$ 62.540.00	\$ 13.133.400.00	53.00	\$ 3.314.620.00
15	ESTOPEROS D=10 CM H=25 CMS	UND	65.00	\$ 7.710.00	\$ 501.150.00	-	\$ -
16	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	G	1.00	\$ 1.051.396.00	\$ 1.051.396.00	-	\$ -
SUB TOTAL (INCLUYE IVA 25%)				\$ 642.638.556.00			\$ 225.273.356.00
VALOR TOTAL				\$ 642.638.556.00			\$ 225.273.356.00
PORCENTAJE EJECUTADO							35.05%

9. CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA.

OBLIGACIÓN	OBSERVACIÓN
Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato	Cumple parcialmente, en varias ocasiones se incumplen actividades programadas en comité.
Llevar bitácora.	Se lleva en forma conjunta.
OBLIGACIÓN	OBSERVACIÓN
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la Secretaria de Transito y Transporte de Tunja y por conducto de la interventoría.	Cumplen
Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo.	Cumplen
Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato.	Cumplen.
Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad industrial e higiene.	Cumplen.
Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato.	El contratista entregó a la Interventoría, copias de planillas de seguridad social pagas del mes laborado.

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A la fecha del presente informe (04 Enero de 2022), se ha realizado la intervención de un total de 31 sectores, los cuales han sido priorizados por la secretaria de tránsito y transporte de Tunja, en cumplimiento de acciones populares y de las necesidades de movilidad y seguridad vial de la ciudad de Tunja. En estos sectores se ha ejecutado las actividades de demarcación horizontal con pintura plástica aplicada manualmente, así como también la aplicación de líneas de demarcación lineal con pintura reflectiva tipo acrílica, suministro e instalación de señales verticales y dispositivos de regulación de tránsito, cumpliendo con los diseños aportados por la entidad contratante.


El avance financiero acumulado a la fecha es del a \$ 225.273.356, equivalente al 35.05 % del valor total del contrato, comparado con lo programado en el flujo de caja del contrato de \$ 220.20.7652.equivalente al 34.27% del valor total del contrato, lo cual refleja que el contrato a la fecha se encuentra balanceado financieramente entre lo programado y lo ejecutado.

El avance temporal a la fecha es del 63% del tiempo contractual que es de 3 meses.

Por parte de la interventoría se realizaron los respectivos controles de calidad de los materiales utilizados verificando fichas técnicas, las certificaciones de calidad y verificando los espesores de la pintura plástica aplicada manualmente con llana, así mismo realizando los respectivos ensayos de retrorreflectividad.

Como recomendación se propone implementar al menos otro frente de trabajo con el objetivo de cumplir con las metas programas para el tercer mes de ejecución de actividades, ya que se presenta una mayor programación de ejecución de actividades.

Cordialmente,



Ing. Cesar Hernando Figueroa Báez
Interventor de Obra

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 27 DE 98

11. ANEXOS

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 28 DE 98

Anexo 11.1

DOCUMENTACION JURIDICA

CONTRATOS DE OBRA Y DE

INTERVENTORIA

	ALCALDIA DE TUNJA	FECHA: 21/09/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	VERSION: 02
	PROCESO: CONTRATACION	CODIGO: CON-F040
	FORMATO: ACTA DE INICIO	

FECHA PRESENTE ACTA: 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 CONTRATO No: Contrato No. 1036 de 2021

CONTRATANTE X	MUNICIPIO DE TUNJA
CONTRATISTA X	CUMBRE INGENIERIA S.A.S, identificada con NIT No. 900321674-6, representada legalmente por LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL, identificado con numero de cedula de ciudadanía 79.909.677 de Bogotá.
INTERVENTOR X	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ, CC. 7.172.415 de Tunja Interventor
OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.
VALOR DEL CONTRATO	SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (3842.638.656,00) APORTE MUNICIPIO: (Si se convierte digite) APORTE DE CONTRAPARTE: (Si se convierte digite)
PLAZO DE EJECUCION:	TRES (03) MESES

En la Ciudad de Tunja, a los cinco (05) días del mes de noviembre del año 2021, se reunieron en las oficinas de la Secretaría de Tránsito y Transporte, el señor CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 7.172.415 de TUNJA, quien obra como INTERVENTOR del CONTRATO No.1036 del año 2021 y el CUMBRE INGENIERIA S.A.S., identificado con NIT No. 900321674-6, representada legalmente por LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL, identificado con numero de cedula de ciudadanía 79.909.677 de Bogotá, en calidad de CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente ACTA DE INICIO.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios tanto para la legalización del contrato como para su ejecución.


OBSERVACIONES:

FIRMA:
NOMBRE: LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL
REP. LEGAL CUMBRE INGENIERIA S.A.S.

FIRMA:
NOMBRE: CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ
INTERVENTOR

Elaboró y Proyectó	Nombre	Cargo	Firma
		DIRECCION DE INTERVENCION	

Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual es presentado para la firma

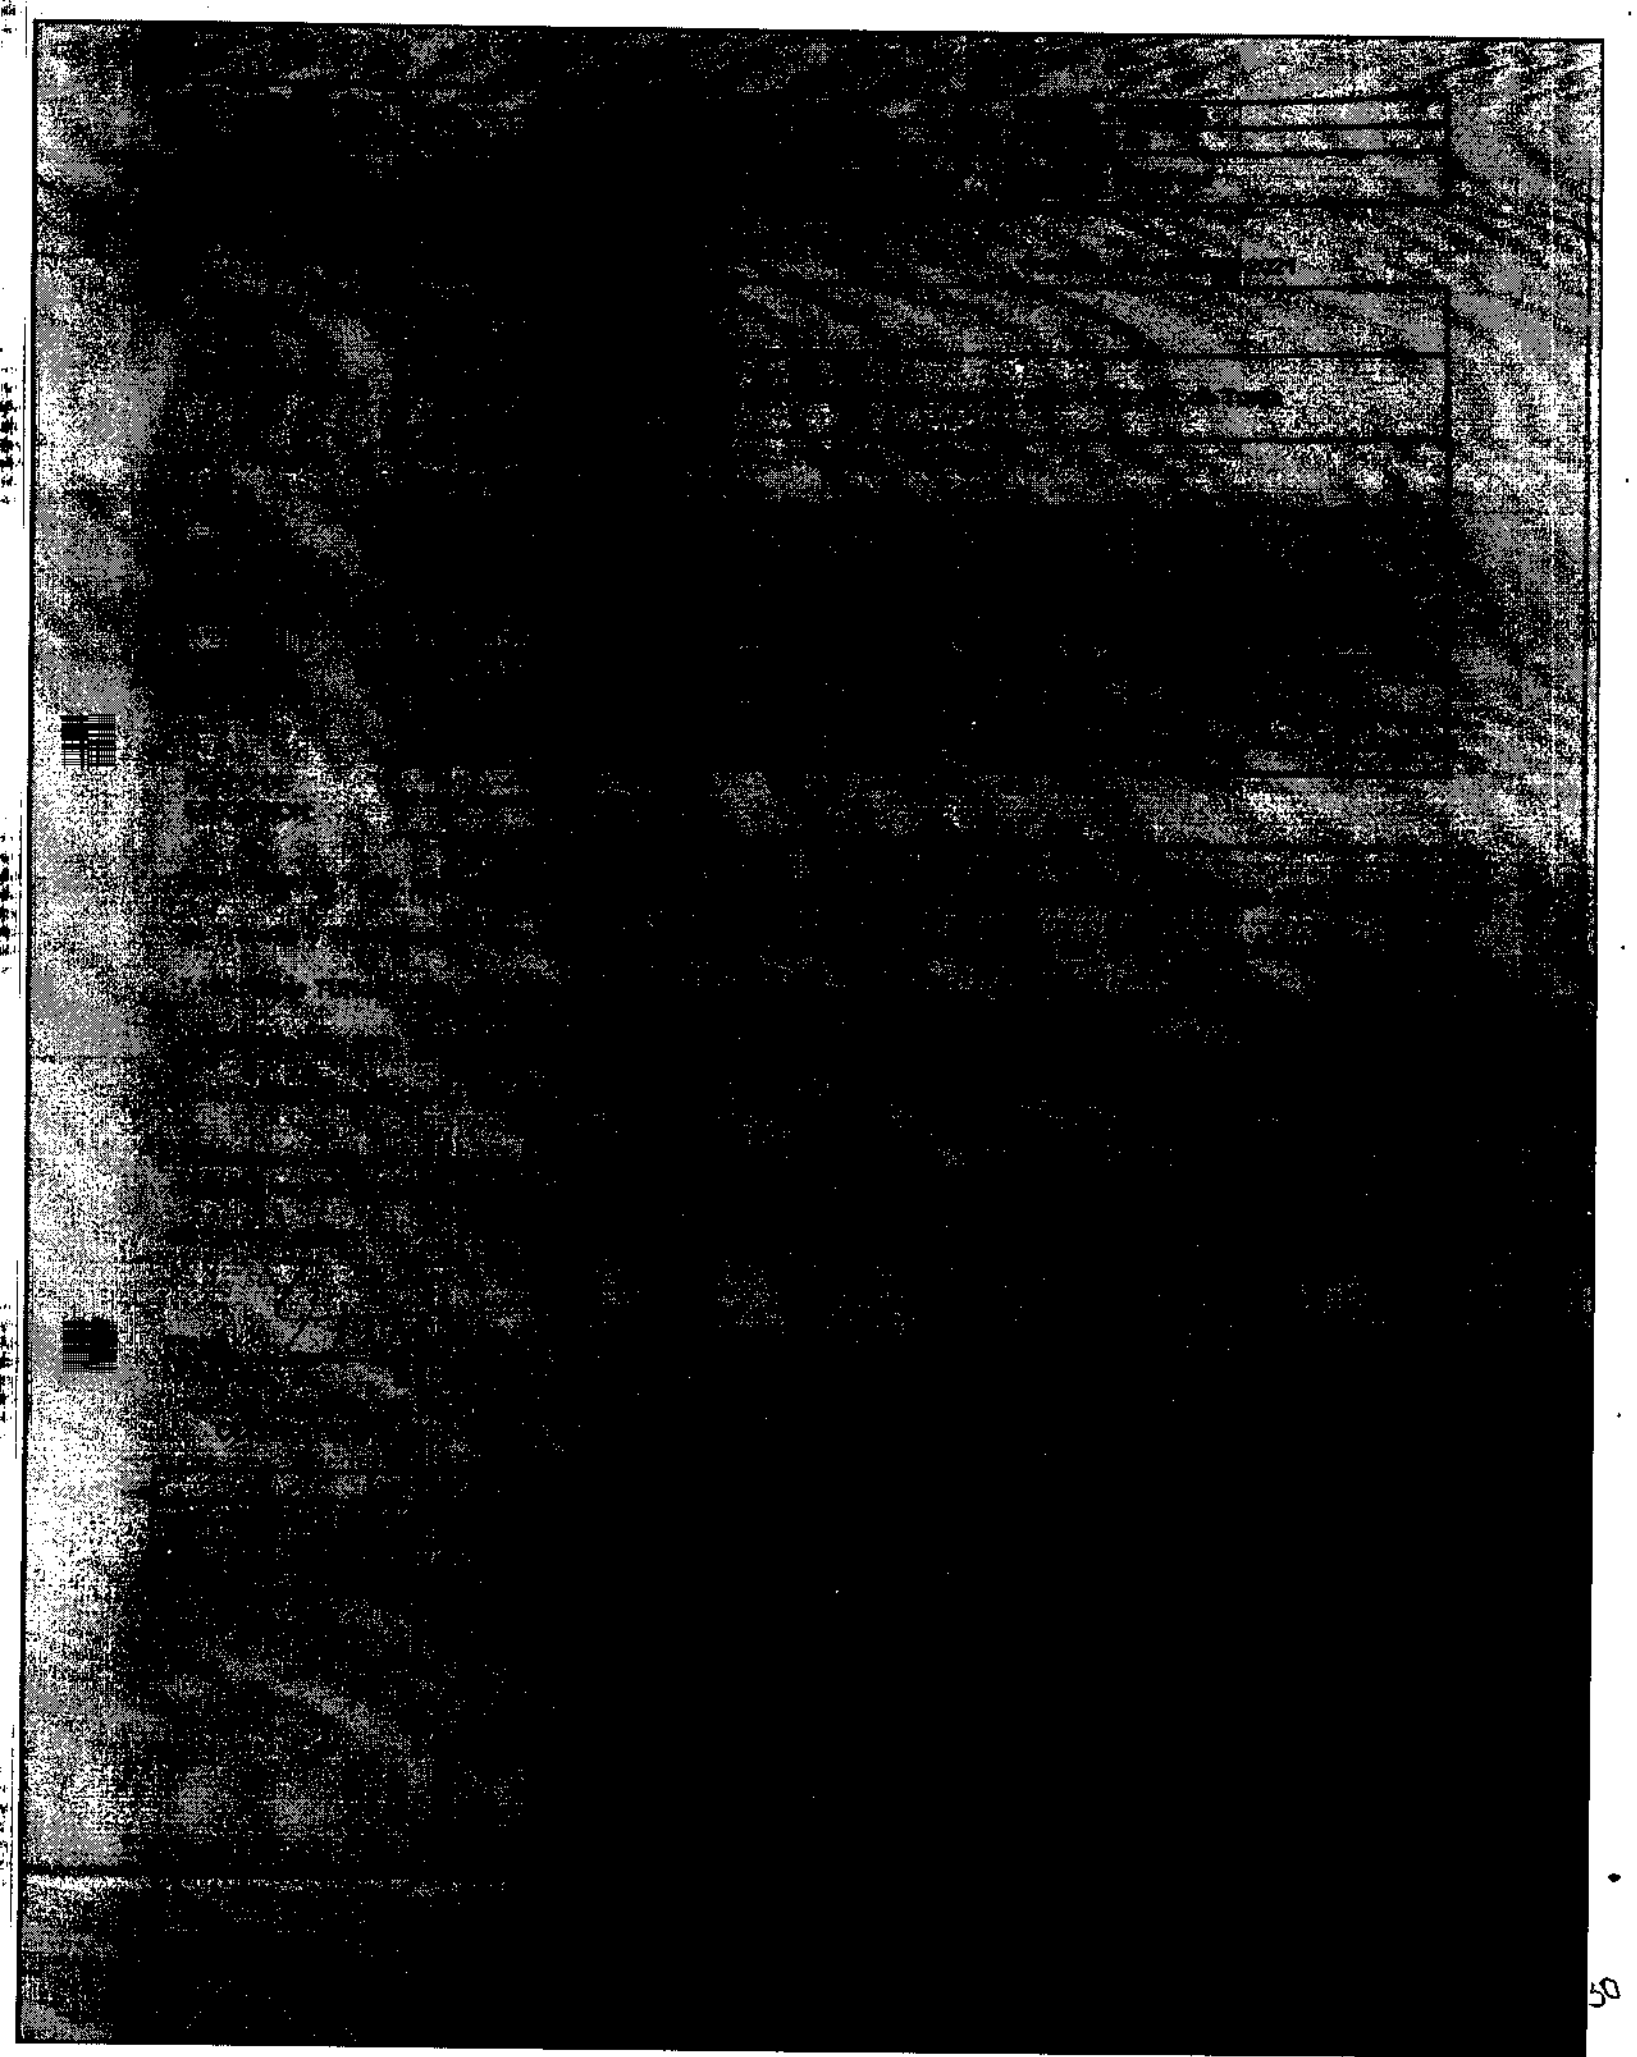

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS

8950592702

PÓLIZA No: 895 -74 - 994000003852 ANEXO:1

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS BOGOTÁ FÁCIL SEGUROS LTDA				COO.AGE: 895				RAMO: 74				PAP:			
DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	
08	11	2021		21	01	2022	23:59	05	02	2022	23:59	15			
FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA				FECHA DE IMPRESIÓN			
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL				A LAS				A LAS				DÍAS			

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA				VIGENCIA DEL ANEXO				DIA				MES				AÑO				HORAS				DÍAS															
				21				01				2022				23:59				05				02				2022				23:59				15			
				VIGENCIA DESDE				A LAS				VIGENCIA HASTA				A LAS																							

DATOS DEL TOMADOR				IDENTIFICACIÓN: NIT				900.321.674-6			
NOMBRE: CUMBRE INGENIERIA SAS											
DIRECCIÓN: CALLE 77 N. 13 - 47 OF 605				CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO: 3554197			

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO				IDENTIFICACIÓN: NIT				891.800.846-1			
ASEGURADO: MUNICIPIO DE TUNJA											
DIRECCIÓN: CALLE 19 9 95 EDIFICIO MUNICIPAL				CIUDAD: TUNJA, BOYACA				TELÉFONO: 7405770			
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS				IDENTIFICACIÓN: NIT				001-8			

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS				NIT : 891800846			
ASEGURADO: MUNICIPIO DE TUNJA							
ITEM: 1 DEPARTAMENTO: BOYACA				CIUDAD: TUNJA			
DIRECCIÓN: DONDE SE EJECUTE LA OBRA							
ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA							
TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO				TIPO DE RIESGO: SERVICIOS			
				MANZANA:			

DESCRIPCION		AMPAROS		SUMA ASEGURADA & INVAR		SUBLIMITE	
CONTRATO		FREDIOS, LABORES Y OPERACIONES		5 181,705,200.00		181,705,200.00	

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 10.00 SMLV en FREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

*** POLIZA CORRELATIVA DE CUMPLIMIENTO No. 994000006707 ***.

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 1036 DE 2021, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 05/11/2021, SE ACLARA QUE LA PRESENTE POLIZA INICIA EL 05/11/2021 HASTA EL 05/02/2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN MODIFICACION ALGUNA

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ***181,705,200.00	VALOR PRIMA: \$ *****	GASTOS EXPEDICION: \$ *****0.00	IVA: \$ *****0	TOTAL A PAGAR: \$ *****
--	--------------------------	------------------------------------	-------------------	----------------------------

INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO	
NOMBRE ABILITY AGENCIA DE SEGUROS E INVERSI	CLAVE 6141	%PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO
		%PART	VALOR ASEGURADO

LA HORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EDICAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EDOR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR		FIRMA TOMADOR	

DIRECCIÓN NOTIFICACION ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

C6D125780A06F87D57 CLIENTE CARACOSTA 0

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2009 DIOR9. REGIMEN COMIN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1062 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4



NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
8950591928

PÓLIZA No: 895-47-99400006707 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS BOGOTÁ FÁCIL SEGUROS LTDA

COO. AGENCIA: 895 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

DIA MES AÑO
08 11 2021

DIA MES AÑO
08 11 2021

FECHA DE EXPEDICIÓN

FECHA DE IMPRESIÓN

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: COMBRE INGENIERIA SAS

IDENTIFICACIÓN: NIT 900.321.674-6

DIRECCIÓN: CALLE 77 N. 13 - 47 OF 605

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL

TÉLEFONO: 3554197

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE TUNJA

IDENTIFICACIÓN: NIT 891.800.846-1

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TUNJA

IDENTIFICACIÓN: NIT 891.800.846-1

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA

SUMA ASEGURADA

CONTRATO CUMPLIMIENTO
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

05/11/2021

05/02/2022

128,527,711.20

05/11/2021

05/02/2025

128,527,711.20

VER NOTA ACLARATORIA

192,791,566.80

BENEFICIARIOS
NIT 891800846 - MUNICIPIO DE TUNJA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES, Y LA ESTABILIDAD DE LA OBRA, DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA No. 1036 DE 2021, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON LA SEÑALIZACION Y DEMARCAACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACION DE TRANSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.

NOTA: LA VIGENCIA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA SERA DE 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL A SATISFACCION DE LA OBRA.

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN CONDICIONES DEL CONTRATO SE ACLARAN LOS VALORES ASEGURADOS DE LA PRESENTE POLIZA

VALOR ASEGURADO TOTAL:
\$ ****449,846,989.20

VALOR PRIMA:
\$ *****0

GASTOS EXPEDICION:
\$ *****0.00

IVA:
\$ *****0

TOTAL A PAGAR:
\$ *****0

NOMBRE INTERMEDIARIO CLAVE %PART
ABILITY AGENCIA DE SEGUROS E INVERSI 6141 100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO %PART VALOR ASEGURADO

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS - TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria persigue en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS - CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR



(415)7701881000019(2020)0600000000070000350001928

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-43 Piso 5 y 12 Bogotá

CLIENTE

C6D125780A06F87D58



PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA PÓLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS BOGOTÁ FÁCIL SEGUROS LTDA

COD. AGENCIA: 895

RAMO: 47

Nº PÓLIZA: 994000006707 ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CUMBRE INGENIERIA SAS

IDENTIFICACIÓN: NIT 900.321.674-6

ASEGURADO: MUNICIPIO DE TUNJA

IDENTIFICACIÓN: NIT 891.800.846-1

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TUNJA

IDENTIFICACIÓN: NIT 891.800.846-1

TEXTO ITEM 1

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 05/11/2021, SE ACLARAN LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS DE LA PRESENTE PÓLIZA

LOS DEYAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN MODIFICACION ALCUNA

CLIENTE

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

**NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS**
8950592702

PÓLIZA No: 895 -74 - 994000003852 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS BOGOTÁ FÁCIL SEGUROS LTDA.				COD. AGE: 895				RAMO: 74				PAP:			
DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	
28	10	2021	21	10	2021	23:59		21	01	2022	23:59	92			
FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA				FECHA DE IMPRESIÓN			
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL				ALAS				ALAS				DÍAS			

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION				VIGENCIA DEL ANEXO				DIA				MES				AÑO				HORAS				DÍAS															
				21				10				2021				23:59				21				01				2022				23:59				92			
				VIGENCIA DESDE				ALAS				VIGENCIA HASTA				ALAS																							

DATOS DEL TOMADOR				IDENTIFICACIÓN: NIT				900.321.674-6			
NOMBRE: COMBRE INGENIERIA SAS											
DIRECCIÓN: CALLE 77 N. 13 - 47 OF 605				CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO: 3554197			

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO				IDENTIFICACIÓN: NIT				891.800.846-1			
ASEGURADO: MUNICIPIO DE TUNJA											
DIRECCIÓN: CALLE 19 9 95 EDIFICIO MUNICIPAL				CIUDAD: TUNJA, BOYACA				TELÉFONO: 7405770			
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS				IDENTIFICACIÓN: NIT				001-8			

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS				NIT : 891800846			
ASEGURADO: MUNICIPIO DE TUNJA							
ITEM: 1 DEPARTAMENTO: BOYACA				CIUDAD: TUNJA			
DIRECCIÓN: DONDE SE EJECUTE LA OBRA							
ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA							
TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO				TIPO DE RIESGO: SERVICIOS			
				MANZANA:			

DESCRIPCION		AMPAROS		SUMA ASEGURADA & INVAR		SUBLIMITE	
CONTRATO		PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES		\$ 181,705,200.00		181,705,200.00	
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 10.00 SMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES							
BENEFICIARIOS							
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS							

*** POLIZA CORRELATIVA DE CUMPLIMIENTO No. 994000006707 ***.

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 1036 DE 2021, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON LA SEÑALIZACION Y DEMARCAACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
\$ ***181,705,200.00	\$ *****91,599	\$ *****0.00	\$ *****17,404	\$ *****109,003

INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO	
NOMBRE	CLAVE	NOMBRE COMPAÑIA	VALOR ASEGURADO
ABILITY AGENCIA DE SEGUROS E INVERSI	6141		
SPART	100.00		

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR		FIRMA TOMADOR	
(416)7701821006018(8020)000000000700083003270			
DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá			

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC.83 - RÉGIMEN DONAT. - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601 - ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

NTT 000 009 574-5

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN TUNJA						SUCURSAL TUNJA						COD.SUC 39		NO.PÓLIZA 39-40-101034919		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO				
09	11	2021	05	11	2021	00:00		05	02	2022	23:59		ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: FIGUEROA BAEZ, CESAR HERNANDO		IDENTIFICACIÓN: CC: 7.172.415	
DIRECCIÓN: CR 4 B NRO. 41 A - 81		CIUDAD: TUNJA, BOYACA	TÉLEFONO: 747315

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE TUNJA		IDENTIFICACIÓN NIT: 891.800.846-1	
DIRECCIÓN: CALLE 19 N 9 - 123		CIUDAD: TUNJA, BOYACA	TÉLEFONO: 0
BENEFICIARIO: 891800846 - MUNICIPIO DE TUNJA		ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLAMAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO NO 1068 de 2021

CLASE: Interventoría

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE
 RESULTA DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES: CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCAACION VIAL
 MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACION DE TRANSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO. EN EL MUNICIPIO DE TUMIA

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEO ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SEMLV	05/11/2021	05/02/2022	\$181,705,200.00	

ACLARACIONES

SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 05/11/2021 SE ACLARA LA FECHA INICIAL DE LAS GARANTIAS DE RCE

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****77,859.00	\$ *****3,000.00	\$ *****15,363.00	\$ *****96,222.00	\$ *****181,705,200.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DE TRIBUNACIÓN COMERCIAL		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JAIME SUAREZ Y CIA LIMITADA	5242	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 10 NO. 21-33 OFC. 108 -202 - TELEFONO: 7409487 - TUNJA

1-Methyl-2-propylpyrrolidine, *n*-C₇H₁₅N, 98% min.

(Signature)

Longman 11/12

STANLEY W. WOLFSON

39-40-101034819-1060-101123-SUB C-FBI

FRANK TOMASEK

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 93-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2116977

ALEXANDRASAEENZ

1

24



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT: 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN TUNJA			SUCURSAL TUNJA			COD. SUC 39		NO. PÓLIZA 39-40-101034919		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 09 11 2021			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 05 11 2021			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 05 02 2022		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO									
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL FIGUEROA BAEZ, CESAR HERNANDO								IDENTIFICACIÓN CC: 7.172.415	
DIRECCIÓN: CR 4 B NRO. 41 A - 81						CIUDAD: TUNJA, BOYACA		TELÉFONO: 7473154	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO									
ASEGURADO: MUNICIPIO DE TUNJA								IDENTIFICACIÓN NIT: 891.800.846-1	
DIRECCIÓN: CALLE 19 N 9 - 123						CIUDAD: TUNJA, BOYACA		TELÉFONO: 0	
BENEFICIARIO: 891800846 - MUNICIPIO DE TUNJA									

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ÉLLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 10 NO. 21-33 OFC. 108 -202 - TELÉFONO: 7409487 - TUNJA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A.
CRA. 10 NO. 21-33 OFC. 108 -202 - TELÉFONO: 7409487 - TUNJA
39-40-101034919

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR
CC: 7.172.415

ALEXANDRA SAEZ

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-4

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN TUNJA			SUCURSAL TUNJA			COD.SUC 39	NO.PÓLIZA 39-44-101131459	ANEXO 5
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
09 11 2021	05 11 2021		00:00	05 11 2026		23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FIGUEROA BAEZ, CESAR HERNANDO	IDENTIFICACIÓN	CC: 7.172.415
DIRECCIÓN: CR 4 B NRO. 41 A - 81	CIUDAD: TUNJA, BOYACA		TÉLEFONO: 7473154

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE TUNJA	IDENTIFICACIÓN NIT: 891.800.846-1
DIRECCIÓN: CALLE 19 N 9 - 123	CIUDAD: TUNJA, BOYACA	
ADICIONAL:	TÉLEFONO: 0	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXIAN ECU0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO NO 1068 de 2021

CLASE: Interventoria

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTA DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES: CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACION DE TRANSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS

	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/11/2021	05/06/2022	\$11,122,335.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	05/11/2021	05/02/2025	\$7,414,890.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	05/11/2021	05/11/2026	\$7,414,890.00	

ACLARACIONES

SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 05/11/2021 SE ACLARA LA FECHA INICIAL DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****106,843.00	\$ *****8,000.00	\$ *****21,820.00	\$ *****136,663.00	\$ *****25,952,115.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURADO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JAIMES SUAREZ Y CIA LIMITADA	5242	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 10 NO. 21-33 OFC. 108 -202 - TELEFONO: 7409487 - TUNJA

SEGUROS DEL ESTADO S.A. - SEGUROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A. - SEGUROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A. - SEGUROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A. - SEGUROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A. - SEGUROS

39-44-101131459 - NIT. 860.009.578-4

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General



CC/7172.415

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 99-20 BOGOTÁ D.C. TELEFONO: 2186977

ALEXANDRASAENZ

1



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT: 860.009.576-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN TUNJA			SUCURSAL TUNJA			COD.SUC 39		NO.PÓLIZA 39-44-101131459		ANEXO 5	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 09 11 2021			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 05 11 2021			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 05 11 2026		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL FIGUEROA BAEZ, CESAR HERNANDO		IDENTIFICACIÓN CC: 7.172.415	
DIRECCIÓN: CR 4 B NRO. 41 A - 81		CIUDAD: TUNJA, BOYACA	
		TELÉFONO: 7473154	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TUNJA		IDENTIFICACIÓN NIT: 891.800.846-1	
DIRECCIÓN: CALLE 19 N 9 - 123		CIUDAD: TUNJA, BOYACA	
		TELÉFONO:	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 10 NO. 21-33 OFC. 108 -202 - TELÉFONO: 7409487 - TUNJA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A.
CRA. 10 NO. 21-33 OFC. 108 -202 - TELÉFONO: 7409487 - TUNJA
39-44-101131459

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR
CC/7172.415

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ALFONSO PRADO

Anexo 11.2
CORRESPONDENCIA ENVIADA Y
RECIBIDA y COMITES DE OBRA
REALIZADOS

CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ
INGENIERO CONTRATISTA

Cvo.Env.016-12-12-2021

Tunja, 12 de Diciembre de 2021

Ingeniero

LUIS FELIPE CARDENAS AVILA

Secretario de transito de Tunja

Supervisor contrato 1068 de 2021

Referencia: Contrato de interventoría N°1068 de 2021, cuyo objeto es: interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, ambiental y social al contrato que resulte del proceso de selección cuyo objeto es contrato de obra para la señalización y demarcación vial horizontal y vertical dentro del proyecto de mejoramiento de mecanismos de regulación de tránsito de acuerdo con especificaciones técnicas y alcance del objeto, en el municipio de Tunja.


Respetado ingeniero:

Por medio de la presente la interventoría en referencia, en cumplimiento de sus funciones estipuladas contractualmente, le informa que ha recibido el día 10 de Diciembre de 2021 por parte del contratista el Plan de manejo de tránsito de la vía Tunja-Arcabuco (km3), así mismo la interventoría ha revisado, solicitado ajustes y finalmente ha dado el visto bueno al documento.

La interventoría remite el mencionado documento a la secretaria de tránsito y transporte de Tunja, con el objetivo de que se realice su respectiva aprobación.

Nota: se adjunta copia digital de los documentos anteriormente mencionados.

Atentamente,



CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ
INTERVENTOR

Dirección: AV. Norte # 47-40 oficina 132, Correo electrónico: ingechfb@yahoo.es, Celular: 3132963393

ENV.017-12-12-2021

Tunja, 12 de Diciembre de 2021.

Ingeniero

LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL

Representante Legal cumbre Ingeniera SAS.

Contratista

Referencia: Contrato de Obra N°1036 de 2021, cuyo objeto es: Contrato de obra para la señalización y demarcación vial horizontal y vertical dentro del proyecto de mejoramiento de mecanismos de regulación de tránsito de acuerdo con especificaciones técnicas y alcance del objeto, en el municipio de Tunja.

Respetado ingeniero:


Por medio de la presente la interventoría de obra, le informa que una vez revisado el informe mensual N°1, remitido a esta interventoría el día 02 de Diciembre de 2021, no se evidencia la entrega de la siguiente documentación:

1. Información de actividades ejecutadas en obra. (se debe relacionar los tramos y las actividades ejecutadas la fecha).
2. Subcontratos con las empresas terceras que están participando en la ejecución del contrato.
3. Planillas de aportes parafiscales (salud, pensión y ARL).
4. Copia de la bitácora de obra a la fecha
5. Ficha técnica de los insumos (pinturas e imprimante) utilizados a la fecha. Anexar ficha técnica de la pintura plástica marca Pintuflex.
6. Resultados de todos los ensayos calidad ejecutados a la fecha. (Se deben presentar cronológicamente y por sectores intervenidos).
7. Informe de implantación del Plan Gerencia del Proyecto. (Anexar formatos propuestos en el documento entregado a la interventoría).
8. Informe de implantación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG- SST). (Anexar formatos propuestos en el documento entregado a la interventoría).
9. Informe de implantación del Plan de Manejo Ambiental. (Anexar formatos propuestos en el documento entregado a la interventoría).
10. Avance financiero de obra.
11. Avance temporal de la obra.

*CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ
INGENIERO CONTRATISTA*

Solicitamos remitir lo más antes posible este informe con el objetivo que la interventoría pueda remitir el informe mensual número 1 de interventoría a la entidad contratante.

Atentamente,



CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ
INTERVENTOR

Copia1. Ingeniero Luis Felipe Cárdenas Ávila
Supervisor Contrato de Interventoría N°1068 de 2021.

CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ
INGENIERO CONTRATISTA

Cvo.Env.017-12-12-2021

Tunja, 13 de Diciembre de 2021

Ingeniero

LUIS FELIPE CARDENAS AVILA

Secretario de transito de Tunja

Supervisor contrato 1068 de 2021


Referencia: Contrato de interventoría N°1068 de 2021, cuyo objeto es: interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, ambiental y social al contrato que resulte del proceso de selección cuyo objeto es contrato de obra para la señalización y demarcación vial horizontal y vertical dentro del proyecto de mejoramiento de mecanismos de regulación de tránsito de acuerdo con especificaciones técnicas y alcance del objeto, en el municipio de Tunja.

Respetado ingeniero:

Por medio de la presente la interventoría en referencia, solicita que se remitan los diseños definitivos de sectores que hacen falta y que son del alcance del contrato, con el objetivo de realizar el balance financiero actual del contrato.

Agradezco la atención prestada y agradecemos su oportuna colaboración.

Atentamente,



CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ
INTERVENTOR

CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ
INGENIERO CONTRATISTA

Cvo.Env.019-12-12-2021

Tunja, 15 de Diciembre de 2021

Ingeniero

LUIS FELIPE CARDENAS AVILA

Secretario de transito de Tunja

Supervisor contrato 1068 de 2021

Referencia: Contrato de interventoría N°1068 de 2021, cuyo objeto es: interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, ambiental y social al contrato que resulte del proceso de selección cuyo objeto es contrato de obra para la señalización y demarcación vial horizontal y vertical dentro del proyecto de mejoramiento de mecanismos de regulación de tránsito de acuerdo con especificaciones técnicas y alcance del objeto, en el municipio de Tunja.


Respetado ingeniero:

Por medio de la presente la interventoría en referencia, en cumplimiento de sus funciones estipuladas contractualmente, le informa que ha recibido el día 15 de Diciembre de 2021 por parte del contratista el Plan de manejo de tránsito de la vía Tunja-Arcabuco (km3), en el cual se proponen además de los trabajos nocturnos, trabajos en horarios diurnos con cierre de un carril para la instalación de señalización horizontal y vertical.

La interventoría remite el mencionado documento a la secretaria de tránsito y transporte de Tunja, con el objetivo de que se realice su respectiva aprobación.

Nota: se adjunta copia digital de los documentos anteriormente mencionados.

Atentamente,



CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ
INTERVENTOR

Dirección: AV. Norte # 47-40 oficina 132, Correo electrónico: ingechfb@yahoo.es, Celular: 3132963393

Cvo.Env.020-12-12-2021

Tunja, 15 de Diciembre de 2021

Ingeniero

LUIS FELIPE CARDENAS AVILA

Secretario de transito de Tunja

Supervisor contrato 1068 de 2021

Referencia: Contrato de interventoría N°1068 de 2021, cuyo objeto es: interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, ambiental y social al contrato que resulte del proceso de selección cuyo objeto es contrato de obra para la señalización y demarcación vial horizontal y vertical dentro del proyecto de mejoramiento de mecanismos de regulación de tránsito de acuerdo con especificaciones técnicas y alcance del objeto, en el municipio de Tunja.


Respetado ingeniero:

Por medio de la presente la interventoría en referencia, en cumplimiento de sus funciones estipuladas contractualmente, le informa que ha recibido el día 14 de Diciembre de 2021 por parte del contratista el Plan de manejo de tránsito para la instalación de la señalización vertical en los 25 sectores priorizados de Tunja, así mismo la interventoría ha revisado el PMT remitido dando su visto bueno.

La interventoría remite el mencionado documento a la secretaria de tránsito y transporte de Tunja, con el objetivo de que se realice su respectiva aprobación.

Nota: se adjunta copia digital de los documentos anteriormente mencionados.

Atentamente,



CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ
INTERVENTOR

ENV.021-12-12-2021

Tunja, 12 de Diciembre de 2021.

Ingeniero

LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL

Representante Legal cumbre Ingeniera SAS.


Contratista

Referencia: Contrato de Obra N°1036 de 2021, cuyo objeto es: Contrato de obra para la señalización y demarcación vial horizontal y vertical dentro del proyecto de mejoramiento de mecanismos de regulación de tránsito de acuerdo con especificaciones técnicas y alcance del objeto, en el municipio de Tunja.

Respetado ingeniero:

Por medio de la presente la interventoría de obra, le adjunta los estudios y diseños de 69 reductores de velocidad remitidos por la Secretaria de Tránsito y Transporte de Tunja, con el objetivo de que se programe su pronta ejecución.

Atentamente,



CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ
INTERVENTOR

Copia1. Ingeniero Luis Felipe Cárdenas Ávila

*CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ
INGENIERO CONTRATISTA*

Supervisor Contrato de Interventoría N°1068 de 2021.

Dirección: Av. Norte # 47-40 oficina 132, Correo electrónico: ingechfb@yahoo.es, Celular: 3132963393

CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ
INGENIERO CONTRATISTA

Cvo.Env.022-12-12-2021

Tunja, 22 de Diciembre de 2021

Ingeniero

LUIS FELIPE CARDENAS AVILA

Secretario de transito de Tunja


Supervisor contrato 1068 de 2021

Referencia: Contrato de interventoría N°1068 de 2021, cuyo objeto es: interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, ambiental y social al contrato que resulte del proceso de selección cuyo objeto es contrato de obra para la señalización y demarcación vial horizontal y vertical dentro del proyecto de mejoramiento de mecanismos de regulación de tránsito de acuerdo con especificaciones técnicas y alcance del objeto, en el municipio de Tunja.

Respetado ingeniero:

Por medio de la presente la interventoría en referencia, en cumplimiento de sus funciones estipuladas contractualmente, le remite según compromiso del pasado comité de obra número 6, registro fotográfico de los sectores intervenidos a la fecha.

Cordialmente,



CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ
INTERVENTOR

Dirección: Av. Norte # 47-40 oficina 132, Correo electrónico: ingechfb@yahoo.es, Celular: 3132963393

	ALCALDIA DE TUNJA	FECHA: 18/08/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	VERSION: 02
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FORMATO: ACTA DE REUNION COMITÉ OBRA CON SUPERVISIÓN DELEGADA	CÓDIGO: GIN-F019

ACTA OBRA No.	LUGAR:	FECHA:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL:
5	Virtual	10 de Diciembre de 2021	2:00 pm	3:00 pm

RESPONSABLE: Ing. Cesar Figueroa Báez. Interventor.

OBJETIVO

Avance físico y financiero del contrato de obra.

Temas varios.

CONTRATO: de Obra N°1036 de 2021, cuyo objeto es: Contrato de obra para la señalización y demarcación vial horizontal y vertical dentro del proyecto de mejoramiento de mecanismos de regulación de tránsito de acuerdo con especificaciones técnicas y alcance del objeto, en el municipio de Tunja.

ORDEN DEL DÍA

Para el desarrollo del presente comité de obra la interventoría desarrollara los siguientes puntos:

1. AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO.
2. INQUIETUDES, PROPOSICIONES Y VARIOS

CONTENIDO

1. El ingeniero Francisco Paolo López, solicita a la interventoría el avance físico y financiero del contrato a la fecha.
2. La interventoría informa que a la fecha 10 de Diciembre de 2021, se han intervenido 17 tramos de los 25 priorizados por la entidad contratante, dichos tramos son:



#	SECTORES INTERVENIDOS
1	AVENIDA MALDONADO, SECTOR GLORIETA DEL HUGOLINO
2	AVENIDA COLON, INTERSECCION NIEVES, MR KING.
3	AVENIDA COLON, INTERSECCION CON CALLE 24
4	AVENIDA COLON, INTERSECCION CON CARRERA 11
5	AVENIDA COLON, INTERSECCION CON CARRERA 15 (SALIDA A VILLA DE LEYVA)
6	CARRERA 9 CON CALLE 23 (PARQUE PINZON)
7	CARRERA 9 CON CALLE 24 (PARQUE PINZON)
8	CARRERA 9 CON CALLE 12 (ASMEVET)
9	CARRERA 9 CON CALLE 29 (MALDONADO)
10	SALIDA BARRIO SAN RAFAEL
11	CARRERA 9 CON CALLE 22 (BRIGADA)
12	CARRERA 9 CON CALLE 25 (SALESIANO)
13	CARRERA 7 CON CALLE 17 (ANTIGUO TERMINAL)
14	CARRERA 7 CON CALLE 18
15	CARRERA 8 CON CALLE 20 (PILA DEL MONO)
16	CARRERA 10 CON CALLE 21 (CAMOL)
17	CARRERA 15 CON CALLE 19 (TOPO)

	ALCALDIA DE TUNJA	FECHA: 18/08/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	VERSION: 02
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO: GIN-F019
	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OBRA CON SUPERVISIÓN DELEGADA	

3. En cuanto al avance financiero del contrato se ha ejecutado un 10.1% del presupuesto del contrato.
4. El avance temporal del contrato es del 40% del plazo contractual.
5. El ingeniero Estanislao Eslava, informa que según el flujo de caja programado al primer mes se debían haber ejecutado \$ 46.513.216.60, valor a que a la fecha se ha cumplido y superado.
6. El ingeniero Cesar Figueroa solicita al contratista realizar una reprogramación de obra definitiva para poder cumplir con el alcance del contrato en el tiempo contractual, es decir en lo que queda un mes y 20 días.
7. El ingeniero Cesar Figueroa solicita al contratista implementar al menos otro frente de trabajo lo más antes posible debido a que el segundo mes de ejecución de actividades tienen que ejecutar muchísimas más cantidades que le mes 1.
8. El ingeniero Estanislao Eslava, asegura que la próxima semana se implementará otra cuadrilla, con el objetivo de intervenir la vía Tunja Arcabuco y la calle 3 entre carreras 11 y 14.
9. El Ingeniero Francisco Paolo López, solicita tanto al contratista como a la interventoría, realizar el balance final del contrato de obra con el objetivo de tener claro el alcance y valor total a ejecutar en el contrato, pensando en un posible adicional. Este balance se debe realizar teniendo en cuenta los diseños definitivos remitos por la secretaria de tránsito y transporte de Tunja.
10. El ingeniero Francisco Paolo López, pregunta que cuando se van a realizar las pruebas de reflectividad de las demarcaciones ya ejecutadas.
11. El ingeniero Estanislao Eslava, afirma que le próximo martes llegará de Bogotá el equipo retroreflectómetro, para realizar las respectivas pruebas, además se realizaran conjuntamente con la interventoría.
12. El ingeniero Francisco Paolo López, sugiere que estas pruebas para las señales verticales se realicen una vez ya instaladas las señales.
13. El ingeniero Francisco Paolo López, pregunta que si ya se ejecutaron los 25 puntos priorizados por cumplimiento a acciones populares.
14. La interventoría informa que hacen falta 8 puntos, peor que el contratista va a intervenirlas en este fin de semana y más tardar el lunes estarán completamente intervenidos.
15. El ingeniero Francisco Paolo López, solicita a la interventoría entregar un reporte y registro fotográfico de los sectores intervenidos a la fecha.
16. La interventoría afirma que será entregado la próxima semana.
17. El ingeniero Francisco Paolo López, informa que en la semana del aguinaldo boyacense solo se puede trabajar en la noche en las vías principales y en las locales si se puede de día.
18. El ingeniero Francisco Paolo López, pregunta cuando se comienzan actividades en la vía Tunja Arcabuco,.
19. La interventoría informa que el PMT de la vía Tunja-Arcabuco fue remitido en horas del mediodía de hoy, e informa que a mas tardar el lunes será remitido a la secretaria de tránsito y transporte de Tunja para ser aprobado.
20. El ingeniero Francisco Paolo López, informa que una vez se radique se revisará y se le dará aprobación en el menor tiempo posible.
21. El ingeniero Estanislao Eslava, informa que de acuerdo con esa aprobación se iniciarían actividades el día martes o miércoles de la próxima semana.
22. La interventoría propone realizar un recorrido conjuntamente para mirar que puntos de la vía Tunja Arcabuco se pueden intervenir inmediatamente.
23. El ingeniero Francisco Paolo López, solicita instalar una señal de prohibido el ascenso de pasajeros y otra de prohibido el descenso de pasajeros en el sector de la intersección de las quintas, esquina del viva.

	ALCALDIA DE TUNJA	FECHA: 18/08/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	VERSION: 02
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO: GIN-F019
	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OBRA CON SUPERVISIÓN DELEGADA	

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN
Culminar los 25 tramos priorizados	Contratista	Antes del 16 de diciembre de 2021 o según programa de obra antes del 22 de diciembre
Reprogramación de obra y presupuesto o balance ajustado con los diseños definitivos.	Contratista e interventoría	Miércoles 15 de 2021.
Implementación nueva cuadrilla de trabajo	Contratista	Próximo Martes 14 de Diciembre de 2021
Iniciar con la intervención vía Tunja Arcabuco.	Contratista	Próximo Martes 14 de Diciembre de 2021
Realizar pruebas de reflectividad señalización ejecutada	Interventoría y contratista	Próxima semana

FIRMA DEL ACTA		
NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Ing. Francisco Paolo López	Ingeniero de apoyo Secretaria de Tránsito y transporte de Tunja.	
Ing. Fabián Parada	Ingeniero de apoyo Secretaria de Tránsito y transporte de Tunja.	
Ing. Francisco Gonzales.	Ingeniero de apoyo Secretaria de Tránsito y transporte de Tunja.	
Ing. Cesar Figueroa Báez	Interventor	
Ing. Fernando Rodríguez Numpaque	Residente de Interventoría	
Ing. Estanislao Eslava	Residente de Obra	

	ALCALDIA DE TUNJA	FECHA: 18/08/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	VERSION: 02
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FORMATO: ACTA DE REUNION COMITÉ OBRA CON SUPERVISIÓN DELEGADA	CÓDIGO: GIN-F019

ACTA OBRA No.	LUGAR:	FECHA:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL:
6	Virtual	17 de Diciembre de 2021	2:00 pm	3:00 pm

RESPONSABLE: Ing. Cesar Figueroa Báez. Interventor.

OBJETIVO

Avance físico y financiero y temporal del contrato de obra.

Temas varios.

CONTRATO: de Obra N°1036 de 2021, cuyo objeto es: Contrato de obra para la señalización y demarcación vial horizontal y vertical dentro del proyecto de mejoramiento de mecanismos de regulación de tránsito de acuerdo con especificaciones técnicas y alcance del objeto, en el municipio de Tunja.

ORDEN DEL DÍA

Para el desarrollo del presente comité de obra la interventoría desarrollara los siguientes puntos:

1. AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO.
2. INQUIETUDES, PROPOSICIONES Y VARIOS

CONTENIDO

1. El ingeniero Francisco Paolo López, solicita a la interventoría el avance físico, financiero y temporal del contrato de obra a la fecha.
2. La interventoría informa que a la fecha 17 de Diciembre de 2021, se han intervenido 28 tramos, dichos tramos son los siguientes:

#	SECTORES INTERVENIDOS
1	AVENIDA MALDONADO, SECTOR GLORIETA DEL HUGOLINO
2	AVENIDA COLON, INTERSECCION NIEVES, MR KING.
3	AVENIDA COLON, INTERSECCION CON CALLE 24
4	AVENIDA COLON, INTERSECCION CON CARRERA 11
5	AVENIDA COLON, INTERSECCION CON CARRERA 15 (SALIDA A VILLA DE LEYVA)
6	CARRERA 9 CON CALLE 23 (PARQUE PINZON)
7	CARRERA 9 CON CALLE 24 (PARQUE PINZON)
8	CARRERA 9 CON CALLE 12 (ASMEVET)
9	CARRERA 9 CON CALLE 29 (MALDONADO)
10	SALIDA BARRIO SAN RAFAEL
11	CARRERA 9 CON CALLE 22 (BRIGADA)
12	CARRERA 9 CON CALLE 25 (SALESIANO)
13	CARRERA 7 CON CALLE 17 (ANTIGUO TERMINAL)
14	CARRERA 7 CON CALLE 18
15	CARRERA 8 CON CALLE 20 (PILA DEL MONO)
16	CARRERA 10 CON CALLE 21 (CAMOL)
17	CARRERA 15 CON CALLE 19 (TOPO)
18	CARRERA 8 CON CALLE 18
19	CARRERA 8 CON CALLE 23

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Piso 4 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Teléfono: (57 8) 7 40 57

70 ext. 1409

Correo electrónico: infraestructura@tunja-boyaca.gov.co web: <http://www.tunja.gov.co>

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 18/08/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO: GIN-F019
	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OBRA CON SUPERVISIÓN DELEGADA	

20	CARRERA 8 CON CALLE 25
21	CARRERA 7 CON CALLE 19
22	CARRERA 7 CON CALLE 20 (ESQUINA CTI)
23	CARRERA 10 CON CALLE 21A (HOTEL HUNZA)
24	CARRERA 11 CON CALLE 17 (LUMOL)
25	CARRERA 16 CON CALLE 32
26	COLEGIO GALILEO GALILEI
27	CALLE 3 ENTRE CARRERAS 10 Y 14 (PARCIAL DEMARCACIÓN HORIZONTAL)
28	VIA TUNJA ARCABUCO (PARCIAL SEÑALIZACIÓN VERTICAL)

3. En cuanto al avance financiero del contrato que se ha ejecutado un 19% del presupuesto del contrato contra el 22% de avance financiero programado, es decir a la fecha se tiene un retraso del 3%.
4. El avance temporal del contrato es del 47% del plazo contractual.
5. La interventoría informa que a la fecha se han intervenido 24 de los 25 puntos priorizados, haciendo falta el punto de la carrera 12 con calle 18, ya que por lluvias en los días sábado y miércoles se sufrieron retrasos en las labores y se informa que se intervendrá este punto el fin de semana.
6. El arquitecto Alejandro Rojas, en vocería del contratista, informa que el avance refleja un retraso pequeño, pero que en realidad ya se tienen fabricadas 100 señales verticales más, que esperan instalar en la próxima semana.
7. El ingeniero Francisco Paolo López, pregunta que cuando se instalaran las señales verticales programadas
8. El arquitecto Alejandro Rojas, responde que esta semana que viene terminan la señalización vertical de la vía Tunja-Arcabuco, siguiendo con la calle 3 entre carreras 11 y 14 y el barrio la Florida. El compromiso es que este año quedan instalas las 172 señales que la entidad entrego diseño. Además informa que ellos tienen programado instalación de señalización vertical desde el 21 de Diciembre de 2021 hasta el 03 de Febrero de 2022 que es la fecha determinación del contrato, y que a la fecha se adelantó la actividad con el fin de acelerar la ejecución del contrato.
9. El ingeniero Francisco Paolo López, comunica que le día de ayer remitió un correo a la interventoría en el cual se encuentran 69 puntos de resaltos parabólicos, en los cuales se puede hacer ya demarcación horizontal y vertical.
10. El ingeniero Francisco Paolo López, solicita que se haga la próxima semana una vista conjunta con el ingeniero Fabián Parada, con el objetivo de visitar los puntos contractuales que se denominan barrios y se definan que señales verticales de deben instalar, remplazar o retirar. Se debe llevar el plano impreso del sector, se debe revisar conjuntamente y debe ser firmado por las partes con la idea que se lo lleve el contratista y ese sea ya el plano final a ejecutar.
11. El arquitecto Alejandro Rojas, comunica que inicialmente la entidad se habia comprometido con entregar todos los diseños de señalización vertical con el objetivo que el contratista tuviera un tiempo de un mes y medio para la fabricación de toda la señalización, situación que a la fecha no se ha cumplido y pues va a generar retrasos en la ejecución de la programación de obra, entonces pregunta que podemos hacer hay.
12. El ingeniero Francisco Paolo López contesta que lo importante es que el atraso sea menor del 6%.
13. El ingeniero Estanislao Eslava pregunta que se si puede realizar una reprogramación teniendo en cuenta la situación anteriormente expuesta.
14. El ingeniero Francisco Paolo López contesta que no hay problema.
15. El ingeniero Francisco Paolo López informa que se realizará una adición en recursos que se está definiendo el monto y de dos 2 meses en tiempo y que apenas salga esa adición se debe realizar una reprogramación. En esta adición se debe solicitar por lo menos un mes antes a la fecha de terminación del contrato y va a incluir todos los imprevistos y nuevos sectores a intervenir.
16. El arquitecto Alejandro Rojas, pregunta que si los precios no imprevistos presentados ya están aprobados.
17. El ingeniero Francisco Paolo López contesta que únicamente se aprobaran cuando se vaya a realizar la adición y que serán sujetos a la respectiva revisión y que los precios que no estén en precios gobernación se debe adjuntar 3 cotizaciones de los insumos.
18. El arquitecto Alejandro Rojas, informa que los precios no previstos se presentaron conforme a lo establecido por la entidad contratante.
19. El ingeniero Fabián Parada, informa que, en archivo de los resaltos parabólicos, se encuentra su dimensión, localización y coordenadas, así mismo informa que esta demarcación horizontal se haga con el método manual de pintura plástica en llana según especificaciones del manual, y se implemente señal SP 25ª en cada una de esas ubicaciones.
20. EL ingeniero Fernando Rodríguez, comunica que la vista de obra conjunta a la vía Tunja Arcabuco, se realizó el pasado martes, en la cual se concluyó que ya se puede intervenir la demarcación lineal de los 3000 metros, excepto dos sectores que se encuentran en un estado deterioro y no vale la pena intervenirlos, estos son en el ramal entrada a Motavita y en sector intermedio alrededor de una

Dirección: Calle 10 y 8-35 Piso 4 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Teléfono: (57 6) 7 40 57

70 ext. 1409

Correo electrónico: infraestructura@tunja-boyaca.gov.co web: <http://www.tunja.gov.co>





- escombrera, estos dos sectores son muy cortos, los cuales sumaran alrededor de unos 200 metros lineales, del resto de la longitud de la vía se puede intervenir.
21. El arquitecto Alejandro Rojas informa que el lunes estará una cuadrilla realizando la premarcada o punteo y que el martes el camión estará iniciando las labores de demarcación.
 22. La interventoría pregunta si los trabajos se realizaran de día o de noche, ya que en el último PMT recibido solicitan poder realizar trabajos diurnos.
 23. El arquitecto Alejandro Rojas contesta, que se realizaran trabajos diurnos y nocturnos de acuerdo a como se comporte el flujo vehicular.
 24. El ingeniero Estandisla Eslava informa que sería mucho mejor trabajar en horas diurnas y que los 6000 metros a demarcar los ejecutarían en 3 días trabajando en horas de la mañana y horas de la tarde.
 25. El ingeniero Fabián Parada, pregunta que si según el PMT se propone cerrar media calzada por tramos
 26. La interventoría contesta que sí, y se manejara con señalización y paleteros.
 27. El ingeniero Fabián Parada, pregunta que si según el PMT por cuanto longitud se estará cerrando el carril.
 28. El arquitecto Alejandro Rojas contesta que por tramos de 100 metros.
 29. La interventoría informa que el miércoles se ha iniciado con la instalación de señales verticales en la Vía Tunja Arcabuco y que a la fecha se han instalado aproximadamente 30 señales y las restantes se instaran señales se instalaran el fin de semana para llegar a un total 54 señales instadas según diseños proporcionados.
 30. El ingeniero Estandisla Eslava pregunta que las señales que se están retirando a donde se deben llevar.
 31. El ingeniero Francisco Paolo López contesta que se debe hacer un inventario de señales retiradas y realizar entrega a la secretaria de tránsito para darlas de baja y ser llevadas a al patio de la salida de Villa de Leiva.
 32. El ingeniero Francisco Paolo López solicita para el siguiente comité presentar un registro fotográfico del avance y sectores intervenidos.
 33. El ingeniero Francisco Paolo López afirma que se puede observar que la demarcación instalada esta cogiendo un color oscuro, entonces pregunta que si está bien instalada la pintura.
 34. La interventoría informa que esta situación se está presentando en todos los sectores intervenidos, y que se presenta debido al tráfico que está pasando por encima y a los factores climáticos que la afectan como la barro, el polvo, el mugre, etc, pero que se cuando llueve se alcance a limpiar nuevamente la demarcación y se ve más blanca.
 35. El ingeniero Cesar Figueroa afirma que para el recibo de las obras de demarcación debe estar en óptimas condiciones y que si el contratista ve la necesidad de realizar algún ajuste está a tiempo.
 36. El ingeniero Estandisla Eslava afirma que efectivamente nos dimos cuenta al día siguiente a la apertura de la demarcación esta se comienza a oscurecer, pero es que debido al paso vehicular lógicamente ensucia, pareciera que es la goma de las llantas la que ensucia, pero que la demarcación al ser limpiada o lavada retoma su color. También informa que la pintura aplicada cumple con las normas técnicas establecidas y que se han verificado las fichas técnicas de cada pintura instalada, así mismo informa que se están midiendo los espesores instalados que están alrededor de 60 mils y lo contratado es de 50 mils.
 37. El ingeniero Cesar Figueroa afirma que se debe estar muy atentos a ese tema y se evalué ya que las garantías finalmente recaerán sobre el contratista y la interventoría.
 38. El ingeniero Fabián Parada, pregunta que si se están haciendo las pruebas de espesor en terreno y se está controlando el tema de la calidad de la pintura.
 39. La interventoría contesta que si se están haciendo las respectivas tomas de espesores y como lo afirmo el ingeniero Estandisla Eslava están en promedio 60 mils lo cual cumple con lo contratado que es 50 mils.
 40. El ingeniero Francisco Paolo López pregunta que quien es el proveedor de la pintura.
 41. La interventoría contesta que hay 2 proveedores, una la marca Pintuflex y la otra marca GMP, a los cuales se han verificado las fichas técnicas que cumplan con la Normas Técnicas NTC establecidas.
 42. La interventoría informa que el día anterior se estuvieron realizando pruebas de retroreflectividad a la demarcación horizontal en los principales sectores, resultando que los valores están dentro del rango solicitado por la Norma técnica 4744-3.
 43. La interventoría informa que las pruebas de retroreflectividad se están realizando conjuntamente con un retroreflectómetro que se trajo de la ciudad de Bogotá.
 44. El ingeniero Estandisla Eslava afirma que el retroreflectómetro se trajo de Bogotá y lo facilito la marca Pintuco, y viene con todos los datos de calibración que se están teniendo en cuenta.
 45. La interventoría pregunta a el contratista que para cuando se entregara el informe mensual 1 completo.
 46. El ingeniero Estandisla Eslava contesta que el día de mañana se estará radicando el informe completo.
 47. La interventoría solicita al contratista que sean devueltos firmados los comités de obra N4 y # 5 que están en su poder, para poderlos enviar a la secretaria de tránsito.
 48. El ingeniero Estandisla Eslava contesta que el día de mañana se estarán enviado.
 49. El Francisco Paolo López pregunta que si ya se instalaron las señales que se solicitaron para la intersección de la esquina del viva.

	ALCALDIA DE TUNJA	FECHA: 18/08/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	VERSION: 02
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FORMATO: ACTA DE REUNION COMITÉ OBRA CON SUPERVISIÓN DELEGADA	CÓDIGO: GIN-F019

50. El ingeniero Estandisio Eslava contesta que ya se mandaron fabricar y que en la siguiente semana se podrán de acuerdo con el ingeniero Fabián Parada para su instalación.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
Visita de obra, conjuntamente las 3 partes a los Barrios con el objetivo de definir la señalización vertical a instalar.	Contratista, interventoría, secretaria de tránsito	20,21,22 de Diciembre de 2021
Iniciar con la demarcación lineal via Tunja Arcabuco.	Contratista	Próximo Martes 21 de Diciembre de 2021
Terminación de instalación señalización vertical via Tunja Arcabuco	Contratista	18 de Diciembre de 2021
Iniciar de instalación señalización vertical en la calle 3 entre carreras 11 y 14	Contratista	Próximo Lunes 20 de Diciembre de 2021
Entregar registro fotográfico sectores intervenidos a la fecha	Interventoría y contratista	Próxima semana

FIRMA DEL ACTA		
NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Ing. Francisco Paolo López	Ingeniero de apoyo Secretaría de Tránsito y transporte de Tunja.	
Ing. Fabián Parada	Ingeniero de apoyo Secretaría de Tránsito y transporte de Tunja.	
Ing. Cesar Figueroa Báez	Interventor	
Ing. Fernando Rodríguez Numpaque	Residente de Interventoría	
Arq. Alejandro Rojas	Coordinador de Obra	
Ing. Estandisio Eslava	Residente de Obra	

	ALCALDIA DE TUNJA		FECHA: 18/08/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		VERSION: 02
	PROCESO: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA		CÓDIGO: GIN-F019
	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OBRA CON SUPERVISIÓN DELEGADA		

ACTA OBRA No.	LUGAR:	FECHA:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL:
7	Virtual	24 de Diciembre de 2021	2:00 pm	3:00 pm

RESPONSABLE: Ing. Cesar Figueroa Báez. Interventor.

OBJETIVO

Avance físico y financiero y temporal del contrato de obra.

Temas varios.

CONTRATO: de Obra N°1036 de 2021, cuyo objeto es: Contrato de obra para la señalización y demarcación vial horizontal y vertical dentro del proyecto de mejoramiento de mecanismos de regulación de tránsito de acuerdo con especificaciones técnicas y alcance del objeto, en el municipio de Tunja.

ORDEN DEL DÍA

Para el desarrollo del presente comité de obra la interventoría desarrollara los siguientes puntos:

1. AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO.
2. INQUIETUDES, PROPOSICIONES Y VARIOS

CONTENIDO

1. El ingeniero Francisco Paolo López, solicita a la interventoría el avance físico, financiero y temporal del contrato de obra a la fecha.
2. La interventoría informa que a la fecha 24 de Diciembre de 2021, se han intervenido 28 tramos, dichos tramos son los siguientes:

#	SECTORES INTERVENIDOS
1	AVENIDA MALDONADO, SECTOR GLORIETA DEL HUGOLINO
2	AVENIDA COLON, INTERSECCION NIEVES, MR KING.
3	AVENIDA COLON, INTERSECCION CON CALLE 24
4	AVENIDA COLON, INTERSECCION CON CARRERA 11
5	AVENIDA COLON, INTERSECCION CON CARRERA 15 (SALIDA A VILLA DE LEYVA)
6	CARRERA 9 CON CALLE 29 (MALDONADO)
7	CARRERA 9 CON CALLE 25 (SALESIANO)
8	CARRERA 9 CON CALLE 24 (PARQUE PINZON)
9	CARRERA 9 CON CALLE 23 (PARQUE PINZON)
10	CARRERA 9 CON CALLE 22 (BRIGADA)
11	CARRERA 9 CON CALLE 12 (ASMEVET)
12	CARRERA 15 CON CALLE 19 (TOPO)
13	CARRERA 7 CON CALLE 17 (ANTIGUO TERMINAL)
14	CARRERA 7 CON CALLE 18
15	CARRERA 7 CON CALLE 19
16	CARRERA 7 CON CALLE 20
17	CARRERA 8 CON CALLE 18
18	CARRERA 8 CON CALLE 20 (PILA DEL MONO)
19	CARRERA 8 CON CALLE 23

Dirección: Calle 19 # 9-95 Piso 4 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Teléfono: (57 8) 7 40 57

70 ext. 1409

Correo electrónico: infraestructura@tunja-boyaca.gov.co web: <http://www.tunja.gov.co>

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 18/08/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FORMATO: ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OBRA CON SUPERVISIÓN DELEGADA	CÓDIGO: GIN-F019

20	CARRERA 8 CON CALLE 25
21	CARRERA 10 CON CALLE 21 (CAMOL)
22	CARRERA 11 CON CALLE 17 (LUMOL)
23	CARRERA 11 CON CALLE 21 A (HOTEL HUNZA)
24	CARRERA 12 CON CALLE 18 (PILA SALADA)
25	CARRERA 16 CON CALLE 32 (ESPERANZA)
26	COLEGIO GALILEO GALILEI
27	VIA TUNJA ARCABUO (DEMARCAION HORIZONTAL Y VERTICAL) (FALTA DEMARACION LINEAL)
28	CALLE 3 ENTRE CARRERAS 11 Y 14 (DEMARCAION HORIZONTAL Y VERTICAL)
29	VIAS BARRIO LA FLORIDA (PARCIAL DEMARCAION HORIZONTAL)

3. En cuanto al avance financiero del contrato que se ha ejecutado un 30% del presupuesto del contrato contra el 29.4% de avance financiero programado, es decir a la fecha se tiene un superávit del 0.6%. La interventoría informa que el contrato de obra se encuentra equilibrado en lo ejecutado versus lo programado
4. El avance temporal del contrato es de 7 semanas ejecutadas es decir el 57% del plazo contractual.
5. La interventoría informa que a la fecha ya se han intervenido los 25 puntos priorizados.
6. El arquitecto Alejandro Rojas, en vocería del contratista, informa que el avance refleja un en realidad es un poco mayor ya que se tienen fabricadas más señales verticales, que esperan instalar en la próxima semana.
7. El ingeniero Francisco Paolo López, afirma que estas señales solo se pueden incluir en el presupuesto una vez hayan sido instaladas.
8. El ingeniero Francisco Pablo López solicita que se realicen los recorridos de obra pendientes la próxima semana, estos recorridos se deben realizar con la presencia del contratista, la interventor y el ingeniero Fabián Parada, en los días Lunes, martes y miércoles con el objetivo de recorrer los diferentes barrios o sectores de la ciudad y así poder realizar en terreno los planos de señalización tanto horizontal como vertical que sean necesarios.
9. El ingeniero Francisco Paolo López solicita que en estos recorridos se incluya señalización lineal en los diferentes puntos visitados.
10. El ingeniero Francisco Paolo López, solicita que se realice señalización lineal en los 25 puntos priorizados.
11. El ingeniero Francisco Pablo López, solicita que se deben entregar informes semanales en cada comité para poder conocer el avance semanal del contrato así como el registro fotográfico y estos serán soporte del informe mensual.
12. La interventoría le informa a las secretaria de tránsito que remitió el día de ayer el respectivo registro fotográfico de todos los sectores intervenidos a la fecha, cumpliendo así el compromiso adquirido en el comité anterior.
13. La interventoría informa que el contratista no cumplió el compromiso adquirido en el comité pasado de iniciar con la señalización lineal de la vía Tunja arcabuco, por lo cual solicita el contratista mencionar el porqué del incumplimiento.
14. El contratista responde que ya se realizó el punteo de las líneas centrales, pero que tuvieron problemas con la adquisición de las microesferas, ya que están escasas en todo el país, pero que el día lunes o martes de la siguiente semana se estará ejecutando esta actividad.
15. La interventoría informa que la actividad de instalación de señalización vertical en la vía Tunja arcabuco se ha finalizado quedando únicamente pendientes instalación de dos señales informativas en el sector de la entrada Motavita, que según el contratista se instalarán la próxima semana.
16. Así mismo la interventoría informa que se ha realizado la el suministro e instalación de señalización vertical en toda la calle tercera entre carreras 11 y 14, cumpliendo con los compromisos adquiridos.
17. La interventoría informa que también se ha iniciado la el suministro e instalación de señalización vertical en las vías del Barrio la Florida.
18. El ingeniero Francisco Paola López comunica que con respecto a la señalización vertical y dispositivos de regulación instalados, estos deben ser entregados al almacén de la secretaria de tránsito mediante un acta de recibo a satisfacción, en la cual se encuentre la ubicación de la señal y el tipo de señal. Así mismo en el almacén de la secretaria de tránsito se debe realizar un acta de recepción de estas.
19. La interventoría informa que a la fecha no ha sido cumplido por parte del contratista el compromiso de entregar el informe mensual número 1 completo, por lo cual es interventoría no ha podido remitir el informe mensual número uno a la secretaria de tránsito.
20. El ingeniero Francisco Paolo López pregunta al contratista que para cuándo será entregado este informe.
21. El arquitecto Alejandro rojas se compromete para la próxima semana remitir el respectivo informe mensual número uno completo.
22. La interventoría informa que a la fecha el contratista no ha remitido a la interventoría las actas de los comités de obras revisados y firmados, los cuales los ha tenido en su poder semanalmente.
23. El contratista se compromete al entregarlos firmados la próxima semana.
24. El ingeniero Francisco Pablo López comunica que estuvo preguntando en la secretaria de contratación el tema de la radicación para el cobro el acta parcial número 1, para lo cual le informaron que era mejor pasar la preacta la primera semana del siguiente año, debido a que si se pasará en este año queda en cuentas

Dirección: Calle 19 # 9-95 Piso 4 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Teléfono: (57 8) 7 40 57





70 ext. 1409

Correo electrónico: infraestructura@tunja-boyaca.gov.co web: <http://www.tunja->

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 18/08/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO: GIN-F019
	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OBRA CON SUPERVISIÓN DELEGADA	

por pagar y podría ser más demorado el pago, mientras que si se pasará la primera semana del otro año el pago sería más rápido, así mismo informa que está preacta debe estar soportada por los respectivos informes semanales y mensuales que la fecha se tengan. Al igual informa que se puede cobra el avance que se lleve a la fecha y que no se limita al 30% inicial.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN
Visita de obra, conjuntamente las 3 partes a los Barrios, con el objetivo de definir la señalización vertical y horizontal a instalar.	Contratista, interventoría, secretaria de tránsito	27,28,29 de Diciembre de 2021
Iniciar con la demarcación lineal vía Tunja Arcabuco.	Contratista	Próximo Martes 28 de Diciembre de 2021
Entrega de informe mensual numero 1 completo	Contratista	Próximo Martes 28 de Diciembre de 2021

FIRMA DEL ACTA		
NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Ing. Francisco Paolo López	Ingeniero de apoyo Secretaria de Tránsito y transporte de Tunja.	
Ing. Fabián Parada	Ingeniero de apoyo Secretaria de Tránsito y transporte de Tunja.	
Ing. Cesar Figueroa Báez	Interventor	
Ing. Fernando Rodríguez Numpaque	Residente de Interventoría	
Arq. Alejandro Rojas	Coordinador de Obra	
Ing. Estanislao Eslava	Residente de Obra	

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 18/08/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FORMATO: ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OBRA CON SUPERVISIÓN DELEGADA	CÓDIGO: GIN-F019

ACTA OBRA No.	LUGAR:	FECHA:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL:
8	Virtual	31 de Diciembre de 2021	2:00 pm	3:00 pm
RESPONSABLE: Ing. Cesar Figueroa Báez. Interventor.				

OBJETIVO
<p>Avance físico y financiero y temporal del contrato de obra.</p> <p>Temas varios.</p> <p>CONTRATO: de Obra N°1036 de 2021, cuyo objeto es: Contrato de obra para la señalización y demarcación vial horizontal y vertical dentro del proyecto de mejoramiento de mecanismos de regulación de tránsito de acuerdo con especificaciones técnicas y alcance del objeto, en el municipio de Tunja.</p>

ORDEN DEL DIA
<p>Para el desarrollo del presente comité de obra la interventoría desarrollara los siguientes puntos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO. 2. INQUIETUDES, PROPOSICIONES Y VARIOS

CONTENIDO	
1.	El ingeniero Francisco Paolo López, solicita a la interventoría se informe el avance físico, financiero y temporal del contrato de obra a la fecha.
2.	La interventoría informa que en la presente semana a fecha 31 de Diciembre de 2021, se han intervenido los tramos siguientes:
2	VIA TUNJA ARCABUCO
2	CALLE 3 ENTRE CARRERAS 11 Y 14
2	VIAS BARRIO LA FLORIDA
3.	La interventoría informa que en la presente semana se intervinieron los siguientes tramos: La vía Tunja arcabuco en la cual se realizó demarcación lineal aproximadamente una longitud de 3500 metros lineales en doble línea es decir aproximadamente 7000 metros lineales de marcación lineal. Además también se intervino la calle tercera entre carrera 11 y carrera 14, aproximadamente 500 metros de doble Línea Amarilla para un total de 1000 metros lineales en esta calle, para un total ejecutado en la semana de alrededor de 8000 metros de pintura lineal. También se intervinieron las vías del Barrio la Florida con demarcación horizontal y vertical.
4.	En cuanto al avance financiero del contrato que se ha ejecutado un 37.2% del presupuesto del contrato contra el 36.5% de avance financiero programado, es decir a la fecha se tiene un superávit en ejecución del 0.7%. La interventoría informa que el contrato de obra se encuentra equilibrado en lo ejecutado versus lo programado.
5.	El avance temporal del contrato es de 8 semanas ejecutadas es decir el 67% del plazo contractual.
6.	La interventoría informa que entre el lunes y martes de la presente semana se realizaron las visitas de obra que se habían programado, en las cuales se visitaron los siguientes sectores: el sector de la calle 32 desde la vía Tunja arcabuco hasta la urbanización la Esperanza, las vías aledañas al barrio la Esperanza, el sector del colegio Club de Leones, un sector del barrio consuelo, un sector del barrio libertador, un sector del barrio rodeo y la carrera 14 desde la Plaza Real hasta el colegio Kennedy. En esa recorridos lo que se realizó fue el diseño mano alzada de la posible señalización tanto horizontal como vertical de cada sector y se realizaron unos planos tipo borrador que deben digitalizar por parte del especialista en tránsito del contratista y eso serán los diseños definitivos a implementar en estos sectores.
7.	El arquitecto Alejandro Rojas, afirma que no es del alcance del contratista dibujar y/o diseñar, entonces lo

Dirección: Calle 19 # 9-95 Piso 4 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Teléfono: (57 8) 7 40 57

70 ext. 1409

Correo electrónico: infraestructura@tunja-boyaca.gov.co web: <http://www.tunja.gov.co>

	ALCALDIA DE TUNJA	FECHA: 18/08/2016
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	VERSION: 02
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO: GIN-F019
	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OBRA CON SUPERVISIÓN DELEGADA	

que ellos han solicitado desde el 5 de Noviembre fecha de inicio es que por favor no se les hagan llegar la totalidad de los diseños con los cuales la entidad convoco el proceso, entonces afirma que el contratista va a realizar un comunicado manifestando eso que los diseños no han sido entregados y que en las próximas semanas el flujo de caja se va a disparar y sin los diseños ellos no pueden avanzar y el especialistas de transito de ellos efectivamente esta para dar conceptos cuando se soliciten, pero no para diseñar o dibujar, esa responsabilidad como contratista no la van a asumir,



8. El ingeniero Francisco Paolo López, contesta que con relación a eso que ellos han entregado los diseños necesarios para la ejecución del contrato, además también se entregaron la ubicación de unos resaltos que dan un avance más al contrato, y al tener esos diseños podemos definir que hay un avance no total de lo ejecutado pero si tenemos el suficiente avance para poder entregarles el resto de diseños que posiblemente nos hagan falta de señalización vertical, entonces esto es como un acuerdo entre las partes, Las visitas que se hicieron esta semana dan un apoyo significativo para el contrato, para poder dar un avance más al contrato. Como ya es conocido por ustedes la idea para el otro año es dar un adicional en recursos debido que nos hacen falta involucrar sectores que estamos terminando de diseñar para poder ejecutar y terminar con unos alcances que nos hacen falta. Entonces es importante mencionar que la ejecución a la fecha es buena, pero tenemos que recuperarnos en tiempo y ejecución para ese adicional y prorroga que se va a dar, Entonces el especialista en tránsito que se tiene contratado, al final del contrato tiene que entregar unos planos record de obra y que estos sectores que se visitaron esta semana van a hacer parte de esos planos record finales, entonces sería como hacer un adelanto a esos planos record que se tienen que entregar, entonces esperamos que la primera semana de enero culminar con toda la información necesaria para poder que tengan ustedes no solamente lo que tenemos que acabar con el contrato sino lo que se va a hacer en la adición del contrato.
9. El ingeniero Francisco Paolo López, solicita que para próxima semana se tenga un balance de obra involucrando lo que ya se ejecutó, más lo que se entregó para ejecutar esta semana de diseños, más los resaltos parabólicos que se tienen por ejecutar, La idea es que la otra semana se entregue el diseño de las quintas y de otros dos barrios que están pendientes para la adición, con eso ya se puede tener unas cantidades ya reales para poder calcular los presupuestos finales.
10. La interventoría le comenta al ingeniero Paolo López para poder realizar ese balance que está solicitando, se debe tenerse en tener todos los diseños por ejecutar incluidos los realizados esta semana en las visitas.
11. El ingeniero Francisco Pablo López contesta que los diseños se tienen simplemente que se deben digitalizar y que estos servirán como base los planos récord.
12. El arquitecto Alejandro rojas contesta que efectivamente contratista tiene que realizar los planos récord, pero qué en este momento no es función ni alcance del contratista dibujar y diseñar, entonces esa responsabilidad no va a hacer asumida en este momento, porque ellos desde el 17 de Noviembre están solicitando que se les remitan todos los diseños a ejecutar, además que ese trabajo de digitalizar no lo hace cualquier dibujante y el especialista en tránsito esta para dar conceptos mas no para dibujar. Entonces le solicita que nos entreguen los planos de diseño y nosotros sacamos las cantidades. Ahora se van a mandar fabricar 150 señales verticales más, ese es avance que las visitas de campo nos han ayudado.
13. El ingeniero Francisco Paolo López pregunta que entonces el contratista no tiene la disponibilidad de realizar la digitalización de los planos del recorrido de esta semana.
14. El arquitecto Alejandro rojas contesta que no señor y que el único avance es que pueden hacer es mandar fabricar 150 señales verticales bajo su propio riesgo.
15. El ingeniero Francisco Paolo López contesta que cuando se tiene n inconvenientes con la comunidad como lo que paso en el Barrio la Florida se deben realizar algunos ajustes, como el retiro o el complemento de otras señales, pero que estás se pueden utilizar en otros sectores de la ciudad.
16. El ingeniero Francisco Paolo López solicita que se le envíen esos planos escaneados al correo electrónico.
17. El contratista está de acuerdo.
18. El ingeniero Fabián Parada le solicita al Ingeniero Estanislao Eslava que nos colabore pasando esos planos en limpio ya que se realizaron a mano alzada con el objetivo que se puedan entender para ellos realizar la digitalización de los mismos.
19. El ingeniero Francisco Paolo López pregunta que para cuando están esos plano en limpio.
20. El ingeniero Estanislao Eslava contesta que para el miércoles.
21. El ingeniero Francisco Paolo López solicita que se tanto el contratista como la interventoría deben realizar un reporte o informe semanal con registro fotográfico para saber lo que se realizó en la semana.
22. La interventoría contesta que para el próximo comité estará al día con los informes semanales y procede a mostrar algunas fotografías de las actividades realizadas a la presente semana.
23. La interventoría informa que el día anterior se realizaron ensayos o tomas de retroreflectividad en los sectores donde se instaló la demarcación lineal, es decir la vía Tunja Arcabuco y la calle 3 entre carreras 11 y 14, además que los resultados están dentro de los valores solicitados por la respectiva norma NTC y que serán entregados en el respectivo informe mensual.

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 18/08/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO: GIN-F019
	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OBRA CON SUPERVISIÓN DELEGADA	

24. La interventoría informa que la próxima semana se traerá el retroreflectómetro para señales verticales.
25. El ingeniero Estanislao Eslava comunica que ya se tienen fabricadas 50 señales verticales en los sectores que se visitaron lunes y martes y que la próxima semana se dará vía libre para su instalación. Además que las 134 señales de los resaltos están en pintura electroestática y que la próxima semana llega la cinta 3m para su terminación e instalación.
26. La interventoría le comenta al contratista que tienen 69 ubicaciones de resaltos parabólicos que ya pueden intervenir, tanto en pintura horizontal como señales verticales.
27. El ingeniero Francisco Paolo López pregunta al contratista que cuando comienzan a intervenir los resaltos.
28. El ingeniero Estanislao Eslava contesta que la próxima semana ya que están escasas las microesferas, que apenas les lleguen comenzaran con la demarcación horizontal. Para el viernes estarían instalado señalización vertical
29. El arquitecto Alejandro rojas comunica que están trabajando a la marcha, pero que a la fecha están definidas 450 señales verticales pero que faltarían alrededor de otras 150 señales para llegar a la cantidad contratada, entonces solicita definir esas 150 señales faltantes.
30. El Ingeniero Francisco Paolo López contesta que esperan que dentro de ocho días ya se tengan todos los diseños faltantes y se puedan definir ya esas cantidades faltantes.
31. El ingeniero Francisco Paolo López vuelve a solicitar al contratista e interventoría entregar el informe semanal cada comité de obra para poder ver el avance financiero y el físico cada semana. Así mismo solicita la remisión de las actas de comité de obra que se realizan cada semana.
32. La interventoría informa que se han enviado las respectivas actas de comité al contratista y la fecha no las han devuelto firmadas por eso no se han podido remitir a la entidad contratante.
33. El ingeniero Estanislao Eslava contesta que las entrega firmadas por el día de ayer en el informe mensual 1.
34. El ingeniero Francisco Paolo López le contesta que la interventoría realiza la respectiva acta y se le remiten para ser revisadas y firmadas, una vez estén firmadas se deben remitir cada semana a la entidad.
35. El arquitecto Alejandro rojas comunica que el día lunes remitida los 6 comités firmados.
36. El ingeniero Francisco Paolo López pregunta que si queda como compromiso para le día lunes enviar las actas.
37. La interventoría como el contratista contestan que sí.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
Enviar planos realizados en visita escaneados en limpio	Contratista, interventoría,	Miércoles 05 de Enero de 2022
Realizar Balance a la fecha del contrato de obra	Contratista, interventoría,	Próximo comité
Entrega de informes semanales	Contratista, interventoría,	Próximo comité
Entrega de actas de comité de obra	Contratista, interventoría,	Lunes 03 de Enero de 2022

	ALCALDIA DE TUNJA		FECHA: 18/08/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		VERSION: 02
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA		CÓDIGO: GIN-F019
	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OBRA CON SUPERVISIÓN DELEGADA		

FIRMA DEL ACTA		
NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Ing. Francisco Paolo López	Ingeniero de apoyo Secretaria de Tránsito y transporte de Tunja.	
Ing. Fabián Parada	Ingeniero de apoyo Secretaria de Tránsito y transporte de Tunja.	
Ing. Cesar Figueroa Báez	Interventor	
Ing. Fernando Rodríguez Numpaque	Residente de Interventoría	
Ing. Alejandro Rojas	Coordinador de Obra	
Ing. Estanislao Eslava	Residente de Obra	

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 30 DE 98

Anexo 11.3

PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL

CONTRATISTA DE OBRA

CUMBRE
Ingeniería S.A.S.

Fecha: 08 DE NOVIEMBRE DE 2021

FAVOR FACTURAR A NOMBRE DE CUMBRE INGENIERÍA S.A.S NIT 900.321,674-6 ENTREGA DE LOS PRODUCTOS: MUNICIPIO DE
TUNJA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA. CONTACTO: ESTANISLAO ESLAVA / 3503455705

Aprobado.

LEONARDO IVÁN RAMÍREZ BERNAL
Representante Legal

CUMBRE INGENIERÍA S.A.S

NIT 900.321.674-6

**ORDEN DE SERVICIO**

No. 002 - MUNICIPIO DE TUNJA

SEÑORES: ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERÍA S.A.S
901.300.058-2**Atn:** ABRAHAM SUAREZ
3108123547**Fecha:** 08 DE NOVIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	UN	VR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL
Instalación de señal vertical SEÑALES REGLAMENTARIAS. Tablero en lámina galvanizada calibre 16 de 60cm X 60cm, recubierto por reflectivo tipo XI	UND	\$ 92.932,00	486,0	\$ 45.164.952,00
Instalación de Señalización vial vertical Doble (DUPLEX). Tablero en lámina galvanizada calibre 16 de 60cm X 60cm, recubierto por reflectivo tipo XI	UND	\$ 131.795,00	30,0	\$ 3.953.850,00
Instalación de señal vertical de tránsito preventivas SP-47B. Tablero en lámina galvanizada calibre 16 de 60cm X 60cm, recubierto por reflectivo tipo XI	UND	\$ 104.760,00	23,0	\$ 2.409.480,00
Retiro de Señales Verticales (incluye pedestal y tablero) con entrega en la respectiva Entidad Territorial (incluye señales sencillas y Dúplex)	UND	\$ 20.000,00	15,0	\$ 300.000,00
Instalación señales verticales sr-38. Tablero en lámina galvanizada calibre 16, recubierto por reflectivo tipo XI: Grado Diamante al Cubo (GD3 - Marca 3M)	UND	\$ 77.725,00	22,0	\$ 1.709.950,00
Instalación de SEÑALES PREVENTIVAS (SP) Y REGLAMENTARIAS (SR) 60 X 60CM REFLECTIVO VERDE LIMON - Tablero en lámina galvanizada calibre 16 de 60cm X 60cm, recubierto por reflectivo tipo XI	UND	\$ 104.760,00	4,0	\$ 419.040,00
Instalación de SEÑALES DE TRANSITO DIMENSIONES 60*75 CMS (DELINEADORES DE CURVA). Tablero en lámina galvanizada calibre 16, recubierto por reflectivo tipo XI	UND	\$ 91.243,00	12,0	\$ 1.094.916,00
Instalación de SEÑALES DE TRANSITO 0.90*1.13 MTS (INFORMATIVAS). Tablero en lámina galvanizada calibre 16, recubierto por reflectivo tipo XI	UND	\$ 141.933,00	6,0	\$ 851.598,00
SUBTOTAL				\$ 55.903.786,00
RETEFUENTE 2%				
ANTICIPO 50%				\$ 27.951.893,00
TOTAL COTIZACIÓN				\$ 27.951.893,00

FAVOR FACTURAR A NOMBRE DE CUMBRE INGENIERÍA S.A.S NIT 900.321.674-6 ENTREGA DE LOS PRODUCTOS: MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA. CONTACTO: ESTANISLAO ESLAVA / 3503455705

FORMA DE PAGO:	CONSIGNACIÓN
TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATO
FECHA DE ENTREGA:	INMEDIATO

Elaborado,

CUMBRE INGENIERÍA S.A.S

ALEJANDRO ROJAS PINEDA
Coordinador de Proyectos

Aprobado,

LEONARDO IVÁN RAMÍREZ BERNAL
Representante Legal200
67

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASIGNADA	FECHA INICIO (PLANIFICADO)	TIPO PLANILLA	FECHA FIN (CONGRESARIO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					IMPRESIONES
					10
					0
TOTAL A PAGAR					\$4,316,800

[illegible]

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CÓRREO
N	9002210746	CUABRE INGENIERIA SAS		CIT 77 13 47 ofc 605	3534197	corbali@ad.com@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL		DISTRITO	CÓRREO	CÓRREO
SUCURSAL	C - MIPYME	PRINCIPAL		BOGOTÁ D. C.	PRINCIPAL	BOGOTÁ D. C.
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						
SI						

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA NÚMERO	FECHA PAGO (DÍAS DE TRABAJO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS DE TRABAJO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UNC
PERÍODO SALDO	PERÍODO PERSONAS				10	0
2022-01	2021-12	E	29/12/2021	65687268	\$4,518,800	
				TOTAL A PAGAR		

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	TOTALIZ SALUD		Cobertura Obligada
	Nombre	NIT	
EPS002	Salud Total EPS	800132097-4	129.200
EPS005	Salud EPS	800251440-5	190.400
EPS008	Compensa EPS	880055842-7	272.800
EPS044	... MEDIMAS EPS SAS	901097073-5	17.400

UPC Adicional	Inscripción \$		Límite Intermedios		Diss. Mora	Valor Mora Comisión	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Atrasados
	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
0		0		0	0	0	0	109.300	3
0		0		0	0	0	0	196.400	2
0		0		0	0	0	0	272.600	4
0		0		0	0	0	0	17.400	1

TOTALS PENSION

TOTALES PERSONA			
Código AFP	Nombre	MET	Co-ización Co-termina
230001	Protección (PAG + Protección)	8002270739-0	89.400
230001	Proveer	8002214956-8	1.299.300
25-14	Colaborantes	8003356004-7	1.078.300

Agents Volunteer Attitude	Agents Volunteer Appearance	Agents FSP - Solidarity	Agents FSP - Substance	Days More Cautious	Value More Cautious	Value More FSP	Total # Paper No. Attitude
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	20,000	20,000	0	0	0	88,400
0	0	20,000	20,000	0	0	0	1,279,200
0	0	20,000	20,000	0	0	0	1,116,200
0	0	20,000	20,000	0	0	0	4

TOTALS NEGROS LABORALES

TOTALES PUESTOS LABORALES		
Código ARL	Nombre	INT
14-11	ARL SURA	8509903790-3
		677.700

Incapacidades		Aportes Otros		Valor Neto		Valor More		Subtotal		Valor Saldo a		Fondo		Total a Pagar		No. Attribudg	
No. Autorización	Valor	Sistemas		Cotización		Cotización		Cotización		Favor		Solidaridad					
				077,700	0	0	0	077,700					0,777	077,700		10	

TOTALES CAJAS

TOTALES CAJAS	
Código CCF	Moneda
CCF22	Contabilidad

WTF	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
860007356-2	581,300	0	0	581,300	10

TOTALES PARERCAIES

TOTALS PARAFSCALES					No. Articles
Valor Aporte	Disa More	Valor More Aporte	Total Aporte		
0	0	0	0	0	0
SENA					
0	0	0	0	0	0
ICF					
0	0	0	0	0	0
ESAP					
MEN					

TOTALS FOR SYSTEMS

TOTALS FOR SUBSYSTEM			
Type Administradora	No. Administradores Representados	Valor en US\$ CCE, LMA, RPT y otros	Total a Pagar
SALUD	4	595.900	955.500
Financiera	3	2.461.900	2.461.900
Riesgos Laborales	1	677.700	677.700
CCE	1	561.300	561.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	4.316.800	4.316.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARA AFILIADOS Y SALUD			
NI	00031874-8	CUADRE INGENIERIA SAS	CJ 17 11 47 de 405	3564197	comunidad.comboringenieros@gmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO					
SUCURSAL	C - NIPI/ME	PRINCIPAL	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.					

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA APORTADA	FECHA PAGO ADECUADA (CONTABILIZACIÓN)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (CONTABILIZACIÓN)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				
2021-12	2021-11	E	29/12/2021	55425979	44.778.400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	MT	Cobertura Obligación	UPC Adicional	Inscripción's		Lienzo Maternidad		No. Afiliados
					No. Acreditación	Valor	Valor	Valor	
EPS002	SALUD TONI EPS	60013007-4	91.000	0	0	0	0	0	91.000
EPS006	Sanitas EPS	60023140-8	180.000	0	0	0	0	0	180.000
EPS008	Compensar EPS	80005684-7	272.800	0	0	0	0	0	272.800
EPS017	Primavera EPS	83002356-7	18.200	0	0	0	0	0	18.200
EPS044	NERMAS EPS SAS	90107475-5	40.000	0	0	0	0	0	40.000
									447.800

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	MT	Cobertura Obligación	UPC Adicional	Inscripción's		Lienzo Maternidad		No. Afiliados
					No. Acreditación	Valor	Valor	Valor	
220201	Proteccion (RIS + Protección)	000225738-0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
220301	Seguros	800224808-8	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
25-14	Colombianos	900338004-7	1.078.200	0	0	0	0	0	1.078.200
									2.178.200

TOTALES RECURSOS LABORALES

Código ARL	Nombre	MT	Cobertura Obligación	UPC Adicional	Inscripción's		Lienzo Maternidad		No. Afiliados
					No. Acreditación	Valor	Valor	Valor	
14-11	ARL SURA	80003790-5	713.400	0	0	0	0	0	713.400
									713.400

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	MT	Valor Aporte	Valor Aporte	Valor Aporte	No. Afiliados
CC72	Compucaja	800007306-1	573.900	0	0	10
						573.900

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	800321674-6	CLAIRE INGENIERIA SAS	C177 13 43 apt 905	3554197	centinabla@combinetecnologia.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO				
SUCURSAL	C-IMPUNE	PRINCIPAL	PRINCIPAL	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.				

DATOS DE LA PLANILLA									
PLANILLA APORTANTE	FECHA PAGO APORTANTE	FECHA PAGO PLANILLA	FECHA PAGO PLANILLA (DAMESNADO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD				
PERIODO SALIR	2021-12	2021-11	2021-11	55428679	44,278,400				

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mens Aporte	Totales Pagar	No. Afectados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Admistración	No. Admistraciones	Valor total de ICE LMA	Valor total de ICE LMA	Totales Pagar
Salud	5	582,000	582,000	582,000
Prestos	3	2,407,100	2,407,100	2,407,100
Riesgos Laborales	1	713,400	713,400	713,400
CCP	1	573,000	573,000	573,000
ESAP	0	0	0	0
ICBF	0	0	0	0
MEN	0	0	0	0
SENA	0	0	0	0
TOTALES	10	4,278,400	4,278,400	4,278,400

PA G A D A

TIPO		NÚMERO		NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN		TELÉFONO		CORREO	
IN		900216745		CIABRE INGENIERIA SAS		C177 13 17 de 805		3554197		comunicacion@ciabre.com	
FORMA DE PRESENTACIÓN		CLASE APORTANTE		NOMBRE SUCURSAL		CÓDIGO		DEPARTAMENTO		CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL		C - MIPYME		PRINCIPAL		PRINCIPAL		BOGOTÁ D.C.		BOGOTÁ D.C.	
EXONERADO PAGO PARA FISCIALES Y SALUD											
SI											

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (participativo)	FECHA PAGO (COMBUSTIBLE)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD		PERIODO PENSIONES	
2021-12		2021-11	
			55425879
			\$4.278.400

DETALLE POR COTIZANTE											
INFORMACIÓN COTIZANTE											
No. de Cotizante	Apellido y Nombre	Sexo	Edad	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	OC 10790038	MARTÍNEZ SANTISTEBAN PALLA, KETHIAN	1	0	2	3	4	5	6	7	8
2	OC 16791078	OCOMEZ RIVERA LUIS ANDREA	1	0	2	3	4	5	6	7	8
3	OC 50020078	AGUIA PIEDRA PEDRO ALVARO	1	0	2	3	4	5	6	7	8
4	OC 29179195	BOMILLA ESCOBAR DORIS	2	0	2	3	4	5	6	7	8
5	OC 4253377	CARRICO LUIS ENRIQUE	1	0	2	3	4	5	6	7	8
6	OC 4835577	CARRICO LUIS ENRIQUE	1	0	2	3	4	5	6	7	8
7	OC 8277921	RAMIREZ REINALDO RAMIRO	1	0	2	3	4	5	6	7	8
8	OC 50020078	CANTAMAY REINALDO RAMIRO	1	0	2	3	4	5	6	7	8
9	OC 7919199	RODRIGUEZ DELGADO WILLIAM	1	0	2	3	4	5	6	7	8
10	OC 79113245	LOPEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	1	0	2	3	4	5	6	7	8
11	OC 79091677	RAMIREZ REINALDO RAMIRO	1	0	2	3	4	5	6	7	8

[illegible][illegible][illegible]

planilla pagada

TOTAL PAGADO:	\$ 1.523.700
----------------------	---------------------




Planilla pagada

[illegible]

COUNTRY	ADMIN. REGION	TOTAL OPERATIVE PERSONS	TOTAL PERSONNEL		EXP.		TOTALS	
			CONTRACTS	NO. CONTRACTS	CONTRACTS	NO. CONTRACTS	CONTRACTS	NO. CONTRACTS
ALGERIA			1,830,000	4	1,830,000	1	1,830,000	1
ARGENTINA			1,830,000	2	1,830,000	1	1,830,000	1
AUSTRALIA			1,830,000	2	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (F.R.G.)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Netherlands)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Luxembourg)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (France)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Germany)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Italy)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Spain)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Sweden)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Switzerland)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Austria)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Denmark)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Norway)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Finland)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Ireland)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Greece)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Portugal)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Spain)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Sweden)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Switzerland)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Austria)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Denmark)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Norway)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Finland)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Ireland)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Greece)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Portugal)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Spain)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Sweden)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Switzerland)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Austria)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Denmark)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Norway)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Finland)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Ireland)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Greece)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Portugal)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Spain)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Sweden)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Switzerland)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Austria)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Denmark)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Norway)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Finland)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Ireland)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Greece)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Portugal)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Spain)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Sweden)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Switzerland)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Austria)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Denmark)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Norway)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Finland)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Ireland)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Greece)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Portugal)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Spain)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Sweden)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Switzerland)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Austria)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Denmark)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Norway)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Finland)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Ireland)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Greece)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Portugal)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Spain)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Sweden)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Switzerland)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Austria)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Denmark)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Norway)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Finland)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Ireland)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Greece)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Portugal)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Spain)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Sweden)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Switzerland)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Austria)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Denmark)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Norway)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Finland)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Ireland)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Greece)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Portugal)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Spain)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Sweden)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Switzerland)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Austria)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Denmark)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Norway)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Finland)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Ireland)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Greece)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Portugal)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Spain)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Sweden)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Switzerland)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Austria)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Denmark)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Norway)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Finland)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Ireland)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Greece)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Portugal)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Spain)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Sweden)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Switzerland)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Austria)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Denmark)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Norway)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Finland)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Ireland)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Greece)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Portugal)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Spain)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Sweden)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Switzerland)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Austria)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Denmark)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Norway)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Finland)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Ireland)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Greece)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Portugal)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Spain)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Sweden)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Switzerland)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Austria)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Denmark)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Norway)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Finland)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Ireland)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Greece)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Portugal)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Spain)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Sweden)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Switzerland)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Austria)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Denmark)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Norway)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Finland)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Ireland)			1,830,000	1	1,830,000	1	1,830,000	1
BELGIUM (Greece)	</							

[illegible][illegible][illegible][illegible]

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

[illegible]


DATOS GENERALES DEL PARTICIPANTE		DATOS DE LA FAMILIA	
1. TIPO IDENTIFICACION:	2. NOMBRE DE IDENTIFICACION:	3. APELLIDO PATERNO:	4. APELLIDO MATERNO:
5. NOMBRE Y DISTRITO SOCIAL:	6. DISTRITO CAPITAL:	7. TIPO DE FAMILIA:	8. TIPO DE FAMILIA:
9. DISTRITO CAPITAL:	10. DISTRITO CAPITAL:	11. PERIODO DE COOPERACION:	12. PERIODO DE COOPERACION:
13. DISTRITO CAPITAL:	14. DISTRITO CAPITAL:	15. PERIODO DE COOPERACION:	16. PERIODO DE COOPERACION:
17. DISTRITO CAPITAL:	18. DISTRITO CAPITAL:	19. PERIODO DE COOPERACION:	20. PERIODO DE COOPERACION:
21. DISTRITO CAPITAL:	22. DISTRITO CAPITAL:	23. PERIODO DE COOPERACION:	24. PERIODO DE COOPERACION:
25. DISTRITO CAPITAL:	26. DISTRITO CAPITAL:	27. PERIODO DE COOPERACION:	28. PERIODO DE COOPERACION:
29. DISTRITO CAPITAL:	30. DISTRITO CAPITAL:	31. PERIODO DE COOPERACION:	32. PERIODO DE COOPERACION:
33. DISTRITO CAPITAL:	34. DISTRITO CAPITAL:	35. PERIODO DE COOPERACION:	36. PERIODO DE COOPERACION:
37. DISTRITO CAPITAL:	38. DISTRITO CAPITAL:	39. PERIODO DE COOPERACION:	40. PERIODO DE COOPERACION:
41. DISTRITO CAPITAL:	42. DISTRITO CAPITAL:	43. PERIODO DE COOPERACION:	44. PERIODO DE COOPERACION:
45. DISTRITO CAPITAL:	46. DISTRITO CAPITAL:	47. PERIODO DE COOPERACION:	48. PERIODO DE COOPERACION:
49. DISTRITO CAPITAL:	50. DISTRITO CAPITAL:	51. PERIODO DE COOPERACION:	52. PERIODO DE COOPERACION:
53. DISTRITO CAPITAL:	54. DISTRITO CAPITAL:	55. PERIODO DE COOPERACION:	56. PERIODO DE COOPERACION:
57. DISTRITO CAPITAL:	58. DISTRITO CAPITAL:	59. PERIODO DE COOPERACION:	60. PERIODO DE COOPERACION:
61. DISTRITO CAPITAL:	62. DISTRITO CAPITAL:	63. PERIODO DE COOPERACION:	64. PERIODO DE COOPERACION:
65. DISTRITO CAPITAL:	66. DISTRITO CAPITAL:	67. PERIODO DE COOPERACION:	68. PERIODO DE COOPERACION:
69. DISTRITO CAPITAL:	70. DISTRITO CAPITAL:	71. PERIODO DE COOPERACION:	72. PERIODO DE COOPERACION:
73. DISTRITO CAPITAL:	74. DISTRITO CAPITAL:	75. PERIODO DE COOPERACION:	76. PERIODO DE COOPERACION:
77. DISTRITO CAPITAL:	78. DISTRITO CAPITAL:	79. PERIODO DE COOPERACION:	80. PERIODO DE COOPERACION:
81. DISTRITO CAPITAL:	82. DISTRITO CAPITAL:	83. PERIODO DE COOPERACION:	84. PERIODO DE COOPERACION:
85. DISTRITO CAPITAL:	86. DISTRITO CAPITAL:	87. PERIODO DE COOPERACION:	88. PERIODO DE COOPERACION:
89. DISTRITO CAPITAL:	90. DISTRITO CAPITAL:	91. PERIODO DE COOPERACION:	92. PERIODO DE COOPERACION:
93. DISTRITO CAPITAL:	94. DISTRITO CAPITAL:	95. PERIODO DE COOPERACION:	96. PERIODO DE COOPERACION:
97. DISTRITO CAPITAL:	98. DISTRITO CAPITAL:	99. PERIODO DE COOPERACION:	100. PERIODO DE COOPERACION:

[illegible][illegible]

CODIGO	NOMBRE	NUMERO AUTORIZACION	NA CONTABLES	VIGENCIA INICIAL	PASO A OTRO REGISTRO	SALDO FINANC.	LESIONACION	VALOR	PLAZA	CONTABILIZAN	AMBITOS	VALOR PAGO
47	71-RENTES DE RENTA FIJA		4		11	11	11	\$ 28.00			\$ 28.00	123.36
AMBI TOTAL:								\$ 28.00			\$ 28.00	123.36

[illegible][illegible]

TOTAL	\$ 1,507,700
--------------	---------------------




Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Especialidad (FPA) o ACP	
REG-00300028	2	ABRAHAM PUEBLERO INCORPORADA SAS	B - AGENCIAS DE CREDITO FINANCIERO	PRINCIPAL	CARRERA 13 NO 42	TUACA BOTACIA	7431413	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Presión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Fecha	Valor	Valor
2021-11	2021-12	11-40773215	9420262774	€	3021121215	2021121215	2021121215		\$492,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

[illegible]



aportes
en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	de	Razon Social	Clima Aportante	Subsistema Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NT 9030028	3	ARMADIA PUBLICA BARRIO INGENIERIA SAS	8. APUROS DE 300 COTIZANTES	PRINCIPAL	CABEZA 19 NO 10 12	TURIA-BOYACA	747353		SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clase	Planilla	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Pago	Valor	
2021-11	2021-12	13-0772515	94700274	E	2021/12/15	2021/12/15	2021/12/15	2021/12/15	2021/12/15
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
APR (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS	21001	800.227.940	6	4	\$381,600	\$0	\$381,600		
COLFONOS	25-14	800.336.004	7	1	\$145,400	\$0	\$145,400		
POYCEIR	23001	800.274.808	8	1	\$145,400	\$0	\$145,400		
PROTECCION	23001	800.279.739	0	1	\$145,400	\$0	\$145,400		
ARE (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPATRIA ARP	14-4	800.002.183	9	4	\$19,200	\$0	\$19,200		
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COMFARJOY	CCF10	891.800.213	8	4	\$145,600	\$0	\$145,600		
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)									
FAMILIAR	EP5017	830.003.564	7	4	\$145,600	\$0	\$145,600		
SANTAS	EP5005	800.251.440	8	3	\$109,200	\$0	\$109,200		
TOTAL				4	\$892,000	\$0	\$892,000		



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 7187580

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
Nombre ó Razón Social	VRC INGENIERIA LTDA
Tipo Identificación	NIT
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Dirección	TRANSVERSAL 76 B # 51 B -41
Tipo Empresa	PRIVADA
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR
Forma Presentación	UNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	
SI	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
Número Planilla	7816549428
Período Cotización Otros	octubre / 2021
Días de Mora	0
Número Autorización	1195983304
Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Período Cotización Salud	noviembre / 2021
Fecha Pago	2021/11/08

INFORMACIÓN BÁSICA	
Nombres	OSSMAN GILDARDO
Tipo de Identificación	CC
Tipo cotizante	DEPEND
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	
SI	
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	\$ 1.822.000
Apellidos	OVEDO REYES
Número de Identificación	7187580
Subtipo Cotizante	
Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Tipo de Salario	FUJO

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
								01-30								

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL	
PENSIÓN	
Días	30
Tarifa	18,000 %
FSP - Solidaridad	\$ 0
Aportes Voluntarios Empleador	\$ 0
Indicador tarifa especial	Normal
Administradora	230301-PORVENIR
IBC	\$ 2.473.974
Cotización Obligatoria	\$ 395.900
FSP - Subsistencia	\$ 0
Aportes Voluntarios Cotizante	\$ 0
Total Aporte	\$ 395.900

SALUD	
Días	30
Tarifa	4,000 %
Nro Incapacidad por Enf. General	
Nro Licencia de Maternidad	
UPC Adicional	\$ 0
Administradora	EPS017-FAMISANAR
IBC	\$ 2.473.974
Cotización Obligatoria	\$ 99.000
Valor	\$ 0
Valor	\$ 0
Total Aporte	\$ 99.000

RIESGOS PROFESIONALES	
Días	30
Clase de Riesgo	V
Centro de Trabajo	
Administradora	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.
IBC	\$ 2.473.974
Tarifa	6,960 %
Total Aporte	\$ 172.200

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES				
Administradora	Días Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF21-CAFAM	30	4,000 %	\$ 2.473.974	\$ 99.000

TOTAL PAGADO:

\$ 766.100



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 80762581

6 DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
Nombre ó Razón Social	VRC INGENIERIA LTDA
Tipo Identificación	NIT
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Dirección	TRANSVERSAL 76 B # 51 B -41
Tipo Empresa	PRIVADA
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR
Forma Presentación	UNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	
SI	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
Número Planilla	7816549428
Período Cotización Otros	octubre / 2021
Días de Mora	0
Número Autorización	1195983304
Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Período Cotización Salud	noviembre / 2021
Fecha Pago	2021/11/08

INFORMACIÓN BÁSICA	
Nombres	ORLANDO ALEXANDER
Tipo de Identificación	CC
Tipo cotizante	DEPEND
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	
SI	
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	\$ 1.150.000
Apellidos	PADILLA CAMPOS
Número de Identificación	80762581
Subtipo Cotizante	
Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Tipo de Salario	FUJO

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
								01-30								

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL	
PENSIÓN	
Días	30
Tarifa	16,000 %
FSP - Solidaridad	\$ 0
Aportes Voluntarios Empleador	\$ 0
Indicador tarifa especial	Normal
Administradora	230201- PROTECCION
IBC	\$ 1.572.266
Cotización Obligatoria	\$ 251.800
FSP - Subsidencia	\$ 0
Aportes Voluntarios Cotizante	\$ 0
Total Aporte	\$ 251.800

SALUD	
Días	30
Tarifa	4,000 %
Nro Incapacidad por Enf. General	
Nro Licencia de Maternidad	
UPC Adicional	\$ 0
Administradora	EPS008-COMPENSAR
IBC	\$ 1.572.266
Cotización Obligatoria	\$ 62.900
Valor	\$ 0
Valor	\$ 0
Total Aporte	\$ 62.900

RIESGOS PROFESIONALES	
Días	30
Clase de Riesgo	V
Centro de Trabajo	
Administradora	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.
IBC	\$ 1.572.266
Tarifa	6,960 %
Total Aporte	\$ 109.500

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES				
Administradora	Días Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF21-CAFAM	30	4,000 %	\$ 1.572.266	\$ 62.900

TOTAL PAGADO: \$ 486.900

175

1980-1981 1982-1983 1984-1985 1986-1987 1988-1989 1990-1991 1992-1993 1994-1995 1996-1997 1998-1999 2000-2001 2002-2003 2004-2005 2006-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018-2019 2020-2021 2022-2023 2024-2025 2026-2027 2028-2029 2030-2031 2032-2033 2034-2035 2036-2037 2038-2039 2040-2041 2042-2043 2044-2045 2046-2047 2048-2049 2050-2051 2052-2053 2054-2055 2056-2057 2058-2059 2060-2061 2062-2063 2064-2065 2066-2067 2068-2069 2070-2071 2072-2073 2074-2075 2076-2077 2078-2079 2080-2081 2082-2083 2084-2085 2086-2087 2088-2089 2090-2091 2092-2093 2094-2095 2096-2097 2098-2099 2100-2101 2102-2103 2104-2105 2106-2107 2108-2109 2110-2111 2112-2113 2114-2115 2116-2117 2118-2119 2120-2121 2122-2123 2124-2125 2126-2127 2128-2129 2130-2131 2132-2133 2134-2135 2136-2137 2138-2139 2140-2141 2142-2143 2144-2145 2146-2147 2148-2149 2150-2151 2152-2153 2154-2155 2156-2157 2158-2159 2160-2161 2162-2163 2164-2165 2166-2167 2168-2169 2170-2171 2172-2173 2174-2175 2176-2177 2178-2179 2180-2181 2182-2183 2184-2185 2186-2187 2188-2189 2190-2191 2192-2193 2194-2195 2196-2197 2198-2199 2200-2201 2202-2203 2204-2205 2206-2207 2208-2209 2210-2211 2212-2213 2214-2215 2216-2217 2218-2219 2220-2221 2222-2223 2224-2225 2226-2227 2228-2229 2230-2231 2232-2233 2234-2235 2236-2237 2238-2239 2240-2241 2242-2243 2244-2245 2246-2247 2248-2249 2250-2251 2252-2253 2254-2255 2256-2257 2258-2259 2260-2261 2262-2263 2264-2265 2266-2267 2268-2269 2270-2271 2272-2273 2274-2275 2276-2277 2278-2279 2280-2281 2282-2283 2284-2285 2286-2287 2288-2289 2290-2291 2292-2293 2294-2295 2296-2297 2298-2299 2300-2301 2302-2303 2304-2305 2306-2307 2308-2309 2310-2311 2312-2313 2314-2315 2316-2317 2318-2319 2320-2321 2322-2323 2324-2325 2326-2327 2328-2329 2330-2331 2332-2333 2334-2335 2336-2337 2338-2339 2340-2341 2342-2343 2344-2345 2346-2347 2348-2349 2350-2351 2352-2353 2354-2355 2356-2357 2358-2359 2360-2361 2362-2363 2364-2365 2366-2367 2368-2369 2370-2371 2372-2373 2374-2375 2376-2377 2378-2379 2380-2381 2382-2383 2384-2385 2386-2387 2388-2389 2390-2391 2392-2393 2394-2395 2396-2397 2398-2399 2400-2401 2402-2403 2404-2405 2406-2407 2408-2409 2410-2411 2412-2413 2414-2415 2416-2417 2418-2419 2420-2421 2422-2423 2424-2425 2426-2427 2428-2429 2430-2431 2432-2433 2434-2435 2436-2437 2438-2439 2440-2441 2442-2443 2444-2445 2446-2447 2448-2449 2450-2451 2452-2453 2454-2455 2456-2457 2458-2459 2460-2461 2462-2463 2464-2465 2466-2467 2468-2469 2470-2471 2472-2473 2474-2475 2476-2477 2478-2479 2480-2481 2482-2483 2484-2485 2486-2487 2488-2489 2490-2491 2492-2493 2494-2495 2496-2497 2498-2499 2500-2501 2502-2503 2504-2505 2506-2507 2508-2509 2510-2511 2512-2513 2514-2515 2516-2517 2518-2519 2520-2521 2522-2523 2524-2525 2526-2527 2528-2529 2530-2531 2532-2533 2534-2535 2536-2537 2538-2539 2540-2541 2542-2543 2544-2545 2546-2547 2548-2549 2550-2551 2552-2553 2554-2555 2556-2557 2558-2559 2560-2561 2562-256

[illegible]

INVESTMENT										PROPERTY										SPENDING INVESTMENT									
INVESTMENT										PROPERTY										SPENDING INVESTMENT									
NO.	NAME	DATE	AMOUNT	CURR.	INT.	DIV.	YIELD	RISK	STATUS	NO.	NAME	DATE	AMOUNT	CURR.	INT.	DIV.	YIELD	RISK	STATUS	NO.	NAME	DATE	AMOUNT	CURR.	INT.	DIV.	YIELD	RISK	STATUS
1	ABC	1/1/78	1000	10%	5%	2%	15%	Low	Active	1	DEF	2/1/78	2000	12%	6%	3%	18%	Med	Active	1	GHI	3/1/78	3000	15%	8%	4%	20%	High	Active
2	ABC	1/1/78	1000	10%	5%	2%	15%	Low	Active	2	DEF	2/1/78	2000	12%	6%	3%	18%	Med	Active	2	GHI	3/1/78	3000	15%	8%	4%	20%	High	Active
3	ABC	1/1/78	1000	10%	5%	2%	15%	Low	Active	3	DEF	2/1/78	2000	12%	6%	3%	18%	Med	Active	3	GHI	3/1/78	3000	15%	8%	4%	20%	High	Active
4	ABC	1/1/78	1000	10%	5%	2%	15%	Low	Active	4	DEF	2/1/78	2000	12%	6%	3%	18%	Med	Active	4	GHI	3/1/78	3000	15%	8%	4%	20%	High	Active
5	ABC	1/1/78	1000	10%	5%	2%	15%	Low	Active	5	DEF	2/1/78	2000	12%	6%	3%	18%	Med	Active	5	GHI	3/1/78	3000	15%	8%	4%	20%	High	Active
6	ABC	1/1/78	1000	10%	5%	2%	15%	Low	Active	6	DEF	2/1/78	2000	12%	6%	3%	18%	Med	Active	6	GHI	3/1/78	3000	15%	8%	4%	20%	High	Active
7	ABC	1/1/78	1000	10%	5%	2%	15%	Low	Active	7	DEF	2/1/78	2000	12%	6%	3%	18%	Med	Active	7	GHI	3/1/78	3000	15%	8%	4%	20%	High	Active
8	ABC	1/1/78	1000	10%	5%	2%	15%	Low	Active	8	DEF	2/1/78	2000	12%	6%	3%	18%	Med	Active	8	GHI	3/1/78	3000	15%	8%	4%	20%	High	Active
9	ABC	1/1/78	1000	10%	5%	2%	15%	Low	Active	9	DEF	2/1/78	2000	12%	6%	3%	18%	Med	Active	9	GHI	3/1/78	3000	15%	8%	4%	20%	High	Active
10	ABC	1/1/78	1000	10%	5%	2%	15%	Low	Active	10	DEF	2/1/78	2000	12%	6%	3%	18%	Med	Active	10	GHI	3/1/78	3000	15%	8%	4%	20%	High	Active


TOTAL PAGADO:	\$ 378.100
----------------------	-------------------

105

[illegible][illegible]

planilla pagada

TOTAL PAGADO:	\$ 229.300
----------------------	-------------------



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 7183658


David

[illegible][illegible][illegible]**TOTAL PAGADO:**

planilla Pagada



Planilla pagada



PLANILLA INTEGRADA AUTOLICUACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 6770589

DAVINIENDA

PROYECTACIÓN:
NOMBRE O RUTIN SOCIAL
CUBIERTA POR
SECCION
TIPO CUBIERTA
FORMA DE PRESENTACION

NT MUNDO DE IDENTIFICACION
BOQUINADO CUBIERTA CAPITAL DEPARTAMENTO
TRANSACCIONAL N° 8841241 TELEFONO
CUBIERTA CUBIERTA CUBIERTA
CUBIERTA CUBIERTA CUBIERTA

MC MEMORIA LINA
BOQUINADO CUBIERTA CAPITAL DEPARTAMENTO
TRANSACCIONAL N° 8841241 TELEFONO
CUBIERTA CUBIERTA CUBIERTA

SECCION PUEBLO
BOQUINADO CUBIERTA CAPITAL DEPARTAMENTO
TRANSACCIONAL N° 8841241 TELEFONO
CUBIERTA CUBIERTA CUBIERTA

SECCION PUEBLO
BOQUINADO CUBIERTA CAPITAL DEPARTAMENTO
TRANSACCIONAL N° 8841241 TELEFONO
CUBIERTA CUBIERTA CUBIERTA

SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUEBLO									
SECCION SOCIAL										SECCION PUE									

[illegible][illegible][illegible]

planilla pagada

TOTAL PAGADO:	\$ 185.900
----------------------	-------------------



Planilla pagada

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 31 DE 98

Anexo 11.4

PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENTORIA DE OBRA

PAGOS
S.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC 7172415	0	CESAR HERNANDO FERRERA BAEZ	A	01	ARL SURIA - 14-11	SUCURSAL	7112	Natural	
MUNIDEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
15-1	CENTRO		7620874		INSCHEFF@GMAIL.COM		5		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA
2021-12	2022-01	22376608	N	2022-01-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	107.100	0
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
1	22376608	2022-01-08	Pagada						

EMPLEADO										NOVEDADES										DÍAS		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				TARIFA				PARAF				SEVA				ICBF				ESAP				MIN				TIP Cot				TIP Cot				Total				Estatus de Percepciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODULO DE SALARIO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE CÓDIGO		ARL	F. PRESENTACIÓN		ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1172415	0	CEAR HERMOSO PARRERA SAEZ	A	C3	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL		7112	Natural
MUN-DEP		DIRECCIÓN				TELÉFONO		EMAIL	
15-1		CENTRO				7622598		LA JAMARITANAZO@hotmail.com	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSION	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TÍPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORSA	ENTIDAD RECAUDO
2021-12	2021-12	22376651	N	2022-01-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	16.900	0	NEQUJI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	22376651	2022-01-06	Pagada							

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 7177415	0	CESAR FERNANDO FIGUEROA BAEZ	A	03	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	7172	N/A#N#
MUNDREP		DIRECCIÓN	TELÉFONO		EMAIL			
15-1		75252588			LE.MANRITIZADIA@MUNDREP.COM			
		CENTRO			N			

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO RENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INTERES Y MORSA	ENTIDAD RECAUDO
2021-12	2021-12	22376651	N	2022-01-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	16.900	0
NP AFILIADOS	REF. DE PAGO (PMA)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
1	22376651		Pagada						
				NEXUS					

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	0	IBC SALUD	0	IBC PARAF
			IBC RIESGOS	IBC CAJAS
			240,273	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
RRP(Administradores: 1)				1	16.900	0	0	0	16.900
ARL SURTA	14-11	890903790	5	1	16.900	0	0	0	16.900
Gran Total					16.900	0	0	0	16.900

PAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION		ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 7172415	0	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	A	01	ARL SURIA - 14-11	SUCURSAL		7112	Nat. ind
MUN-DEP	15-1	DIRECCION CENTRO			TELEFONO 74300-24		EMAIL INSECH@BOGOTAVIVA.COM		EXENTO DE PARAFISCALES

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDADO
2022-12	2022-01	22379708	E	2022-01-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	223.000	0	NECUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	22376708	2022-01-08	Pagada							

[illegible]

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 7172415	0	CESAR HERNANDO FIGUEROA BUEZ	A 01	ARL SURYA - 14-11	SUCURSAL	7112	Normal
MUN-DEP		DIRECCION CENTRO	TELEFONO		EMAIL		EVENTO DE PARAFISCALES
				740674	INGECHERO@COMI.COM		C

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO FISCAL	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DÉPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2021-12	2022-01	22376706	E	2022-01-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS		223.000	0	NECIIA
NP AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	22376708		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSION	908.526	IBC SALUD	908.526	IBC RIESGOS
			908.526	IBC CAJAS
				908.526
				IBC PADAF

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SÁLDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	145.400	0	0	0	145.400
PORVENIR	230301	800224808	8	1	145.400	0	0	0	145.400
EPS(Administradoras: 1)				1	36.400	0	0	0	36.400
MEDIMAS EPS	EPS044	901097473	5	1	36.400	0	0	0	36.400
ARAP(Administradoras: 1)				1	4.800	0	0	0	4.800
ARL SURA	14-11	693903790	5	1	4.800	0	0	0	4.800
CF(Administradoras: 1)				1	36.400	0	0	0	36.400
Gran Total					186.600	0	0	0	186.600

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	A	HTPS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIT DESCONT	VALOR A PAGAR
COMFABOY	007-10	691800213	8			36.400	0	0	0	36.400
Gran Total						223.000	0	0	0	223.000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL		CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 7172415	0	CESAR HERNÁNDO FUERZA BAZZ		A	03	POSITIVA - 1423	SUCURSAL	7112	NANJHI
MUNICIPIO	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EVENTO DE PARAFISCALES		
15-1	CENTRO		78255048		LILIAMARTINEZ@HOTMAIL.COM		N		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORSA	ENTIDAD RECAUDADO
2021-12	2021-12	22778636	N	2022-01-16	TOODS LOS CENTROS	TOODS	TOODS	15.500	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	22778636	2022-01-06	Pagada							

[illegible]

ASOPAGOS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CG 1172415	0	CESAR HERRAZO POLEROA BUEZ	A	03	POSTIVA - 14-23	SUCURSAL	7112	Natural	
MIRIN-DOP		DIRECCIÓN						EXENTO DE PATENTASCALES	
TS-1		CENTRO			TELEFONO			N	
					76255568			ELAMARITZANZINZEHOTMAIL.COM	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X HORA	ENTIDAD RECAUDADA
2024-12	2024-12	22376638	N	2022-01-16	TOCOS LOS CENTROS	TOCOS	TOCOS	14.930	0	NECIA
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	22376636		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSION	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	0	242.273	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NTT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORSA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
IRP/Administradoras: 1)				1	16.900	0	0	0	16.900
ARL SUR A	14-11	890903790	5	1	16.900	0	0	0	16.900
Gran Total					16.900	0	0	0	16.900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1172415	0	CESAR NERINADO FIDUEIRA BAZ	1	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	7112	Natural
MUN-DEP		DIRECCION		TELEFONO				EVENTO DE PARAFISCALES
15-1		CRA 48 11A 81		7407001			INSGEHEF87V4KH00 ES	5

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSION	PERÍODO SALID	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES Y MORA	ENTIDAD RECAUDO
2021-12	2021-12	22376384	1	2022-01-18	TODOS LOS DIHROS	TODOS	TODOS	318.300	0	NEOLJA
Nº AFILIADOS	REF DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	22376384	2022-01-06	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES										DIAS				PENSIÓN				SALUD			COF		RIESGOS		TARIFA PARAF		SENA	ICBF	ESAP	MIN	FC	Sub 990 Col	Financ de Pensiones	Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODULO DE SALARIO	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498	1499	1500	1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510	1511	1512	1513	1514	1515	1516	1517	1518	1519	1520	1521	1522	1523	1524	1525	1526	1527	1528	1529	1530	1531	1532	1533	1534	1535	1536	1537	1538	1539	1540	1541	1542	1543	1544	1545	1546	1547	1548	1549	1550	1551	1552	1553	1554	1555	1556	1557	1558	1559	1560	1561	1562	1563	1564	1565	1566	1567	1568	1569	1570	1571	1572	1573	1574	1575	1576	1577	1578	1579	1580	1581	1582	1583	1584	1585	1586	1587	1588	1589	1590	1591	1592	1593	1594	1595	1596	1597	1598	1599	1600	1601	1602	1603	1604	1605	1606	1607	1608	1609	1610	1611	1612	1613	1614	1615	1616	1617	1618	1619	1620	1621	1622	1623	1624	1625	1626	1627	1628	1629	1630	1631	1632	1633	1634	1635	1636	1637	1638	1639	1640	1641	1642	1643	1644	1645	1646	1647	1648	1649	1650	1651	1652	1653	1654	1655	1656	1657	1658	1659	1660	1661	1662	1663	1664	1665	1666	1667	1668	1669	1670	1671	1672	1673	1674	1675	1676	1677	1678	1679	1680	1681	1682	1683	1684	1685	1686	1687	1688	1689	1690	1691	1692	1693	1694	1695	1696	1697	1698	1699	1700	1701	1702	1703	1704	1705	1706	1707	1708	1709	1710	1711	1712	1713	1714	1715	1716	1717	1718	1719	1720	1721	1722	1723	1724	1725	1726	1727	1728	1729	1730	1731	1732	1733	1734	1735	1736	1737	1738	1739	1740	1741	1742	1743	1744	1745	1746	1747	1748	1749	1750	1751	1752	1753	1754	1755	1756	1757	1758	1759	1760	1761	1762	1763	1764	1765	1766	1767	1768	1769	1770	1771	1772	1773	1774	1775	1776	1777	1778	1779	1780	1781	1782	1783	1784	1785	1786	1787	1788	1789	1790	1791	1792	1793	1794	1795	1796	1797	1798	1799	1800	1801	1802	1803	1804	1805	1806	1807	1808	1809	1810	1811	1812	1813	1814	1815	1816	1817	1818	1819	1820	1821	1822	1823	1824	1825	1826	1827	1828	1829	1830	1831	1832	1833	1834	1835	1836	1837	1838	1839	1840	1841	1842	1843	1844	1845	1846	1847	1848	1849	1850	1851	1852	1853	1854	1855	1856	1857	1858	1859	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876	1877	1878	1879	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655

ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DW	RAZÓN SOCIAL	CLASE CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA		
OC 1172415	0	CEMAR HERNANDO PUIGUEIRA BAZZ	1 0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Natural		
MUNIDEP 15.1		DIRECCIÓN CRA 48 N° 81		TELÉFONO 7401907	EMAIL INACE@FARMACIO.ES			EXENTO DE PARAFISCALES 5	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN							
PERÍODO PENSION	2021-12	PERÍODO SALUD	2021-12	PLANELLA	227R334	TIPO PLANILLA	I
Nº AFILIADOS	1	REF. DE PAGO (PIN)	227R334			ESTADO PLANILLA	Pagada
						FECHA LÍMITE PAGO	
						FECHA PAGO	2022-01-18
						TODOS LOS CENTROS	TODOS
						DEPARTAMENTO	TODOS
						MUNICIPIO	TODOS
						VALOR PAGO	319,300
						INTERÉS X MONA	0
						ENTIDAD RECAUDO	NECLA

TOTALES IBC					
IBC PENSION		IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.100.000		1.100.000	1.100.000	9	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFPI(Administradoras: 1)				1	176.000	0	0	0	176.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	176.000	0	0	0	176.000
EPS(Administradoras: 1)				1	137.500	0	0	0	137.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	137.500	0	0	0	137.500
RPI(Administradoras: 1)				1	5.800	0	0	0	5.800
POSITIVA	14-23	850011153	6	1	5.800	0	0	0	5.800
Gran Total					319.300	0	0	0	319.300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e KBF	
NIT 676937	9	JUAN ANTONIO GALINDO ALVARADO	B - HEREDOS DE 200 COTIZANTES	001	CALLE 59 A N° 721	TUNJA-BOYACA	7436048	SI	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2021-12	2021-12	9-0288-48182	9-0288-48182	Y	2022/01/12	2022/01/04	0	\$380,500	

RESUMEN DE PAGO									
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$320,000	\$0	\$320,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$320,000	\$0	\$320,000	
COLPATRIA ANP		14-4	860,002,183	9	1	\$10,500	\$0	\$10,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$10,500	\$0	\$10,500	
NUEVA E.P.S.		EP5037	900,156,264	2	1	\$250,000	\$0	\$250,000	
					1	\$250,000	\$0	\$250,000	
TOTAL									
						\$320,000	\$0	\$320,000	

94

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 32 DE 98

ANEXO 11.5 PROGRAMACION DE OBRA

CONTRATO 1036 DE 2021
OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCAACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	<div> <div>17</div> <div>24</div> <div>31</div> <div>7</div> <div>14</div> <div>21</div> <div>28</div> <div>5</div> <div>12</div> <div>19</div> <div>26</div> <div>2</div> <div>9</div> <div>16</div> <div>23</div> <div>30</div> <div>6</div> <div>13</div> </div> <div> <div>nov '21</div> <div>dic '21</div> <div>ene '22</div> <div>feb '22</div> </div>													
1		CONTRATO 1036 DE 2021	63 dias	vie 5/11/21	vie 4/02/22														
2		CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCAACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.	63 dias	vie 5/11/21	vie 4/02/22														
3		ACTA DE INICIO	0 dias	vie 5/11/21	vie 5/11/21														
4		PRELIMINARES	10 dias	vie 5/11/21	vie 19/11/21														
5		INICIO PRELIMINARES	0 dias	vie 5/11/21	vie 5/11/21														
6		RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN, ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA INICIO DEL CONTRATO, REVISIÓN Y ARMONIZACIÓN DE LOS DISEÑOS, ENTREGA DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO Y AUTORIZACIÓN POR PARTE DE INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES	10 dias	vie 5/11/21	vie 19/11/21														
7		FIN DE PRELIMINARES	0 dias	vie 19/11/21	vie 19/11/21														
8		ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	53 dias	vie 19/11/21	vie 4/02/22														
9		INICIO ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	0 dias	vie 19/11/21	vie 19/11/21														
10		SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES REGLAMENTARIAS 60 x 60 CM	32 dias	mar 21/12/21	jue 3/02/22														
11		MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRAFICO SEGUN NORMA INVIA Y DISEÑO (INCLUYE MICROESFERAS)	43 dias	lun 6/12/21	vie 4/02/22														

*INICIO ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS - SUJETA A ENTREGA Y APROBACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE COMPRENDEN LA ETAPA DE PRELIMINARES.

97

Journal of Management Inquiry 22(1) 3-17
© The Author(s) 2013
Reprints and permissions: sagepub.com/journalsPermissions.nav
DOI: 10.1177/1056492613505501
<http://jmi.sagepub.com>

CONTRATO 1036 DE 2021
OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCAACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin																		
17		Suministro e instalación señales verticales sr-38, lámina galvanizada reflectividad tipo XI, grado diamante al cubo, con pedestal	8 días	vie 7/01/22	mié 19/01/22	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13
18		SEÑALES PREVENTIVAS (SP) Y REGLAMENTARIAS (SR) 60 X 60 CM REFLECTIVO VERDE LIMON	5 días	jue 20/01/22	mié 26/01/22																		
19		SEÑALES DE TRANSITO DIMENSIONES 60*75 CMS (DELINEADORES DE CURVA) SEGUN NORMA INVIAS	5 días	jue 27/01/22	mié 2/02/22																		
20		SEÑALES DE TRANSITO 0.90*1.13 MTS (INFORMATIVAS) SEGUN NORMA INVIAS	5 días	jue 27/01/22	mié 2/02/22																		
21		SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES	15 días	lun 17/01/22	vie 4/02/22																		
22		Suministro e instalacion de hitos (aito = 75 cm d=8 cm) de color amarillo	15 días	lun 17/01/22	vie 4/02/22																		
23		Suministro e instalacion de tachones 40*15*8 cm	15 días	lun 17/01/22	vie 4/02/22																		
24		ESTOPEROS D=10 CM H=25 CMS	10 días	lun 24/01/22	vie 4/02/22																		
25		FIN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	0 días	vie 4/02/22	vie 4/02/22																		
26		FIN DEL CONTRATO	0 días	vie 4/02/22	vie 4/02/22																		

*INICIO ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS - SUJETA A ENTREGA Y APROBACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE COMPRENDEN LA ETAPA DE PRELIMINARES.

2

FLUJO DE CAJA MENSUAL - CONTRATO 1036 DE 2021

Nombre de obra	Duración	Fin	Fin	05 a 30 de Noviembre	01 a 31 de Diciembre	01 a 31 de Enero	01 a 04 de Febrero	Consolidado
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO								
ACTA DE INICIO	0 días	vie 5/11/21	vie 5/11/21					
PRELIMINARES	10 días	vie 5/11/21	vie 19/11/21	\$ 32,653,456.00	\$ 201,561,534.53	\$ 338,913,075.72	\$ 69,510,489.75	\$ 642,638,556.00
INICIO PRELIMINARES	0 días	vie 5/11/21	vie 5/11/21					
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN, ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA INICIO DEL CONTRATO, REVISIÓN Y ARMONIZACIÓN DE LOS DISEÑOS, ENTREGA DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO Y AUTORIZACIÓN POR PARTE DE INTERVENORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES	10 días	vie 5/11/21	vie 19/11/21	\$ 1,051,396.00				
FIN DE PRELIMINARES	0 días	vie 19/11/21	vie 19/11/21					
ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	0 días	vie 19/11/21	vie 19/11/21					
INICIO ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	53 días	vie 19/11/21	vie 4/02/22					
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES REGLAMENTARIAS 60x 60 CM	0 días	vie 19/11/21	vie 19/11/21					
MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRÁFICO SEGUN NORMA INVIAS Y DISEÑO (INCLUYE MICROSEÑALES)	31 días	mar 21/12/21	jue 5/02/22		\$ 56,610,495.00	\$ 125,801,100.00	\$ 18,870,165.00	\$ 201,281,760.00
Suministro y aplicación manual (método línea) de pintura de plástico en filo alla duración media-mescladura 100% puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mic según norma NTC-1360-1, para pasos peatonales, avisos en la carretera y	43 días	jun 6/12/21	vie 4/02/22		\$ 12,373,679.30	\$ 13,024,925.58	\$ 2,604,985.12	\$ 28,003,590.00
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA CON MICROSEÑALES LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS	53 días	jun 22/11/21	vie 4/02/22	\$ 31,602,040.00	\$ 99,320,760.00	\$ 90,291,600.00	\$ 18,058,320.00	\$ 239,272,740.00
Suministro e instalación de señal vertical de tránsito preventivos SP-4/8, tamaño 60 X 60 cm, Elaboradas en lamina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (dilatante al cubo marca 3M) pederol elaborado en angulo de 2 x 2 x 1/4 pintura electrostat	43 días	jun 6/12/21	vie 4/02/22		\$ 19,557,610.23	\$ 20,586,956.14	\$ 4,117,591.63	\$ 44,261,960.00
Suministro e instalación de señalización vial vertical Doble (DUPLEX) en papel reflectivo 60 x 60 con una urbana, según especificaciones relacionadas en el Manual de Señalización vial adoptado por la resolución 1885 de 2015, numerales 2.2.2 y 2.1.6.2 (precio)	10 días	mar 21/12/21	jun 3/01/22		\$ 13,698,990.00	\$ 1,522,110.00		\$ 15,221,100.00
Suministro e instalación de señal vertical de tránsito preventivos SP-4/8, tamaño 60 X 60 cm, Elaboradas en lamina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (dilatante al cubo marca 3M) pederol elaborado en angulo de 2 x 2 x 1/4 pintura electrostat	10 días	mar 4/01/22	mar 18/01/22			\$ 10,594,260.00		\$ 10,594,260.00
Retiro de Señales Verticales (incluye peristal y tablero) con entrega en la respectiva Entidad Teritorial (incluye señales verticales y Duplex)	3 días	mar 4/01/22	jue 6/01/22			\$ 391,200.00		\$ 391,200.00
Suministro e instalación de señales verticales SP-8, (lmina galvanizada reflectividad tipo XI, orondo diamante al cubo, con pederol)	9 días	vie 7/01/22	mié 19/01/22			\$ 8,039,240.00		\$ 8,039,240.00
SENALES PREVENTIVAS (SP) Y REGLAMENTARIAS (SR) 60 X 60 CM REFLECTIVO VERDE LUMIN	5 días	jue 20/01/22	mié 26/01/22			\$ 1,244,680.00		\$ 1,244,680.00
SENALES DE TRANSITO DIMENSIONES 60*75 CMS (DELINEADORES DE CURVA) SEGUN NORMA INVIAS	5 días	jue 27/01/22	mié 2/02/22			\$ 1,916,568.00	\$ 1,277,312.00	\$ 3,194,280.00
SENALES DE TRANSITO 0.90*1.13 MTS INFORMATIVAS SEGUN NORMA INVIAS	5 días	jue 27/01/22	mié 2/02/22			\$ 2,219,112.00	\$ 1,479,408.00	\$ 3,698,570.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES	15 días	jun 17/01/22	vie 4/02/22			\$ 42,935,552.00	\$ 15,612,928.00	\$ 58,548,480.00
Suministro e instalación de hitos (alto = 75 cm d=8 cm) de color amarillo	15 días	jun 17/01/22	vie 4/02/22			\$ 10,413,320.00	\$ 3,786,880.00	\$ 14,200,800.00
ESTOPERILES D=10 CM H=25 CMS	10 días	jun 24/01/22	vie 4/02/22			\$ 9,631,160.00	\$ 3,502,240.00	\$ 13,133,400.00
FIN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	0 días	vie 4/02/22	vie 4/02/22			\$ 300,690.00	\$ 200,460.00	\$ 501,150.00
FIN DEL CONTRATO	0 días	vie 4/02/22	vie 4/02/22					
PROGRAMADO MENSUAL				\$ 32,653,456.00	\$ 201,561,534.53	\$ 338,913,075.72	\$ 69,510,489.75	\$ 642,638,556.00
PROGRAMADO MENSUAL %				5.08%	31.36%	57.74%	10.87%	100.00%
PROGRAMADO ACUMULADO MENSUAL				\$ 32,653,456.00	\$ 234,214,990.53	\$ 573,128,066.25	\$ 642,638,556.00	
PROGRAMADO ACUMULADO MENSUAL %				5.08%	36.45%	89.18%	100.00%	

2

C

+

CUMBRE INGENIERIA S.A.S.									
FLUJO DE CAJA MENSUAL - CONTRATO 1036 DE 2021									
Nombre de tarea	Duración	Fin	Fin	05 de Noviembre a 04 de Diciembre	05 de Diciembre a 04 de Enero	05 de Enero a 04 de Febrero	Consolidado		
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRANSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO									
ACTA DE INICIO									
PRELIMINARES	0 días	vie 5/11/21	vie 5/11/21						
INICIO PRELIMINARES	10 días	vie 5/11/21	vie 19/11/21						
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA INICIO DEL CONTRATO, REVISIÓN Y ARMONIZACIÓN DE LOS DISEÑOS, ENTREGA DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO Y AUTORIZACIÓN POR PARTE DE INTERVENIDORA Y ENTIDAD CONTRATANTE PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES	0 días	vie 5/11/21	vie 5/11/21						
FIN DE PRELIMINARES	10 días	vie 5/11/21	vie 19/11/21	\$ 1.051.396.00					\$ 1.051.396.00
ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS									
INICIO ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	0 días	vie 19/11/21	vie 19/11/21						
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES REGLAMENTARIAS 60x60 CM	53 días	vie 19/11/21	vie 4/02/22						
MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRÁFICO SEGUN NORMA INVIAS Y DISEÑO (INCLUYE MICROESFERAS)	32 días	mar 21/12/21	jue 3/02/22	\$ 0.00	\$ 68.135.798.40				\$ 68.135.798.40
Suministro y aplicación manual (método libre) de pintura de plástico en filo alta duración metilmetacrilato 100% puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC-1360-1, para pasos peatonales, avisos en la carretera y z	43 días	jun 6/12/21	vie 4/02/22	\$ 0.00	\$ 13.721.759.10				\$ 13.721.759.10
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS	53 días	jun 22/11/21	vie 4/02/22	\$ 45.461.820.60					\$ 45.461.820.60
Suministro e instalación de señal vertical de tránsito preventiva 54x71B, tamaño 60 X 60 cm, grado de reflexión 60 x 60 zona urbana, según especificaciones relacionadas en el Manual de Señalización vial adoptado por la resolución 1895 de 2015, numerales 2.2.2, y 2.1.6.2 (Inclu	43 días	jun 6/12/21	vie 4/02/22	\$ 0.00	\$ 21.688.360.40				\$ 21.688.360.40
Suministro e instalación de señal vertical de tránsito preventiva 54x71B, tamaño 60 X 60 cm, grado de reflexión 60 x 60 zona urbana, según especificaciones relacionadas en el Manual de Señalización vial adoptado por la resolución 1895 de 2015, numerales 2.2.2, y 2.1.6.2 (Inclu	10 días	mar 21/12/21	jun 3/01/22	\$ 0.00	\$ 15.221.100.00				\$ 15.221.100.00
Suministro e instalación de señal vertical de tránsito preventiva 54x71B, tamaño 60 X 60 cm, grado de reflexión 60 x 60 zona urbana, según especificaciones relacionadas en el Manual de Señalización vial adoptado por la resolución 1895 de 2015, numerales 2.2.2, y 2.1.6.2 (Inclu	10 días	mar 4/01/22	mar 18/01/22	\$ 0.00	\$ 1.059.426.00				\$ 1.059.426.00
Suministro e instalación de señal vertical de tránsito preventiva 54x71B, tamaño 60 X 60 cm, grado de reflexión 60 x 60 zona urbana, según especificaciones relacionadas en el Manual de Señalización vial adoptado por la resolución 1895 de 2015, numerales 2.2.2, y 2.1.6.2 (Inclu	3 días	mar 4/01/22	jue 6/01/22	\$ 0.00	\$ 179.096.00				\$ 179.096.00
Suministro e instalación de señal vertical de tránsito preventiva 54x71B, tamaño 60 X 60 cm, grado de reflexión 60 x 60 zona urbana, según especificaciones relacionadas en el Manual de Señalización vial adoptado por la resolución 1895 de 2015, numerales 2.2.2, y 2.1.6.2 (Inclu	8 días	vie 7/01/22	mié 19/01/22	\$ 0.00	\$ 0.00				\$ 0.00
Suministro e instalación de señal vertical de tránsito preventiva 54x71B, tamaño 60 X 60 cm, grado de reflexión 60 x 60 zona urbana, según especificaciones relacionadas en el Manual de Señalización vial adoptado por la resolución 1895 de 2015, numerales 2.2.2, y 2.1.6.2 (Inclu	5 días	jue 20/01/22	mié 24/01/22	\$ 0.00	\$ 0.00				\$ 0.00
SENALES DE TRANSITO DIMENSIONES 60x75 CMS (DELINEADORES DE CURVA) SEGUN NORMA INVIAS	5 días	jue 27/01/22	mié 2/02/22	\$ 0.00	\$ 0.00				\$ 0.00
SENALES DE TRANSITO 0.30x1.13 MTS (INFORMATIVAS) SEGUN NORMA INVIAS	5 días	jue 27/01/22	mié 2/02/22	\$ 0.00	\$ 0.00				\$ 0.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES	15 días	jun 17/01/22	vie 4/02/22	\$ 0.00	\$ 0.00				\$ 0.00
Suministro e instalación de hitos (pilo 75 cm d=8 cm) de color amarillo	15 días	jun 17/01/22	vie 4/02/22	\$ 0.00	\$ 0.00				\$ 0.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES	15 días	jun 17/01/22	vie 4/02/22	\$ 0.00	\$ 0.00				\$ 0.00
ESTOPESORES D=10 CM H=25 CMS	10 días	jun 24/01/22	vie 4/02/22	\$ 0.00	\$ 0.00				\$ 0.00
FIN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	0 días	vie 4/02/22	vie 4/02/22	\$ 0.00	\$ 0.00				\$ 0.00
FIN DEL CONTRATO	0 días	vie 4/02/22	vie 4/02/22	\$ 46.513.216.60	\$ 213.571.908.50	\$ 382.553.430.90			\$ 642.638.556.00
PROGRAMADO MENSUAL				\$ 46.513.216.60	\$ 213.571.908.50	\$ 382.553.430.90			\$ 642.638.556.00
PROGRAMADO MENSUAL %				7.24%	33.23%	59.53%			100.00%
PROGRAMADO ACUMULADO MENSUAL				\$ 46.513.216.60	\$ 260.085.125.10	\$ 642.638.556.00			\$ 642.638.556.00
PROGRAMADO ACUMULADO MENSUAL %				7.24%	40.47%	100.00%			100.00%

8

Tareas	Todos
--------	-------

				Datos		
Año	Trimestre	Semana	Día	Costo	Costo acumulado	
2021	T4	Semana 44	5	\$	105.139.60	\$ 105.139.60
			6	\$	-	\$ 105.139.60
		Semana 45	7	\$	-	\$ 105.139.60
			8	\$	105.139.60	\$ 210.279.20
			9	\$	105.139.60	\$ 315.418.80
			10	\$	105.139.60	\$ 420.558.40
			11	\$	105.139.60	\$ 525.698.00
			12	\$	105.139.60	\$ 630.837.60
			13	\$	-	\$ 630.837.60
		Semana 46	14	\$	-	\$ 630.837.60
			15	\$	-	\$ 630.837.60
			16	\$	105.139.60	\$ 735.977.20
			17	\$	105.139.60	\$ 841.116.80
			18	\$	105.139.60	\$ 946.256.40
			19	\$	105.139.60	\$ 1.051.396.00
			20	\$	-	\$ 1.051.396.00
		Semana 47	21	\$	-	\$ 1.051.396.00
			22	\$	4.514.580.00	\$ 5.565.976.00
			23	\$	4.514.580.00	\$ 10.080.556.00
			24	\$	4.514.580.00	\$ 14.595.136.00
			25	\$	4.514.580.00	\$ 19.109.716.00
			26	\$	4.514.580.00	\$ 23.624.296.00
			27	\$	-	\$ 23.624.296.00
		Semana 48	28	\$	-	\$ 23.624.296.00
			29	\$	4.514.580.00	\$ 28.138.876.00
			30	\$	4.514.580.00	\$ 32.653.456.00
			1	\$	4.514.580.00	\$ 37.168.036.00
			2	\$	4.514.580.00	\$ 41.682.616.00
			3	\$	4.514.580.00	\$ 46.197.196.00
			4	\$	-	\$ 46.197.196.00
		Semana 49	5	\$	-	\$ 46.197.196.00
			6	\$	6.195.174.19	\$ 52.392.370.19
			7	\$	6.195.174.19	\$ 58.587.544.37
			8	\$	-	\$ 58.587.544.37
			9	\$	6.195.174.19	\$ 64.782.718.56
			10	\$	6.195.174.19	\$ 70.977.892.74
			11	\$	-	\$ 70.977.892.74
		Semana 50	12	\$	-	\$ 70.977.892.74
			13	\$	6.195.174.19	\$ 77.173.066.93
			14	\$	6.195.174.19	\$ 83.368.241.12
			15	\$	6.195.174.19	\$ 89.563.415.30
			16	\$	6.195.174.19	\$ 95.758.589.49
			17	\$	6.195.174.19	\$ 101.953.763.67
			18	\$	-	\$ 101.953.763.67
		Semana 51	19	\$	-	\$ 101.953.763.67
			20	\$	6.195.174.19	\$ 108.148.937.86
			21	\$	14.007.339.19	\$ 122.156.277.05
			22	\$	14.007.339.19	\$ 136.163.616.23
			23	\$	14.007.339.19	\$ 150.170.955.42
			24	\$	14.007.339.19	\$ 164.178.294.60
			25	\$	-	\$ 164.178.294.60
		Semana 52	26	\$	-	\$ 164.178.294.60
			27	\$	14.007.339.19	\$ 178.185.633.79
			28	\$	14.007.339.19	\$ 192.192.972.98
			29	\$	14.007.339.19	\$ 206.200.312.16
			30	\$	14.007.339.19	\$ 220.207.651.35
			31	\$	14.007.339.19	\$ 234.214.990.53
			Total T4			
Total 2021				\$	234.214.990.61	\$ 234.214.990.53
2022	T1	Semana 52	1	\$	-	\$ 234.214.990.53
		Semana 1	2	\$	-	\$ 234.214.990.53
			3	\$	14.007.339.19	\$ 248.222.329.72

2022	T1	Semana 1	4	\$	13.675.055.19	\$	261.897.384.91
			5	\$	13.675.055.19	\$	275.572.440.09
			6	\$	13.675.055.19	\$	289.247.495.28
			7	\$	14.549.560.19	\$	303.797.055.47
			8	\$	-	\$	303.797.055.47
		Semana 2	9	\$	-	\$	303.797.055.47
			10	\$	-	\$	303.797.055.47
			11	\$	14.549.560.19	\$	318.346.615.65
			12	\$	14.549.560.19	\$	332.896.175.84
			13	\$	14.549.560.19	\$	347.445.736.02
			14	\$	14.549.560.19	\$	361.995.296.21
			15	\$	-	\$	361.995.296.21
		Semana 3	16	\$	-	\$	361.995.296.21
			17	\$	20.275.072.19	\$	382.270.368.40
			18	\$	20.275.072.19	\$	402.545.440.58
			19	\$	19.215.646.19	\$	421.761.086.77
			20	\$	18.459.677.19	\$	440.220.763.95
			21	\$	18.459.677.19	\$	458.680.441.14
			22	\$	-	\$	458.680.441.14
		Semana 4	23	\$	-	\$	458.680.441.14
			24	\$	18.509.792.19	\$	477.190.233.33
			25	\$	18.509.792.19	\$	495.700.025.51
			26	\$	18.509.792.19	\$	514.209.817.70
			27	\$	19.639.416.19	\$	533.849.233.88
			28	\$	19.639.416.19	\$	553.488.650.07
			29	\$	-	\$	553.488.650.07
		Semana 5	30	\$	-	\$	553.488.650.07
			31	\$	19.639.416.19	\$	573.128.066.26
			1	\$	19.639.416.19	\$	592.767.482.44
			2	\$	19.639.416.19	\$	612.406.898.63
			3	\$	18.260.856.19	\$	630.667.754.81
			4	\$	11.970.801.19	\$	642.638.556.00
	Total T1				\$	408.423.565.56	\$
Total 2022				\$	408.423.565.56	\$	642.638.556.00
Total general				\$	642.638.556.17	\$	642.638.556.00

		ACUMULADO	VALOR SEMANA
viernes, 5 de noviembre de 2021	jueves, 11 de noviembre de 2021	\$ 525.698.00	\$ 525.698.00
viernes, 12 de noviembre de 2021	jueves, 18 de noviembre de 2021	\$ 946.258.00	\$ 420.558.00
viernes, 19 de noviembre de 2021	jueves, 25 de noviembre de 2021	\$ 19.109.716.00	\$ 18.163.460.00
viernes, 26 de noviembre de 2021	jueves, 2 de diciembre de 2021	\$ 41.682.616.00	\$ 22.572.900.00
viernes, 3 de diciembre de 2021	jueves, 9 de diciembre de 2021	\$ 64.782.719.00	\$ 23.100.103.00
viernes, 10 de diciembre de 2021	jueves, 16 de diciembre de 2021	\$ 95.758.590.00	\$ 30.975.871.00
viernes, 17 de diciembre de 2021	jueves, 23 de diciembre de 2021	\$ 150.170.958.00	\$ 54.412.366.00
viernes, 24 de diciembre de 2021	jueves, 30 de diciembre de 2021	\$ 220.207.852.00	\$ 70.036.696.00
viernes, 31 de diciembre de 2021	jueves, 6 de enero de 2022	\$ 289.247.498.00	\$ 69.039.844.00
viernes, 7 de enero de 2022	jueves, 13 de enero de 2022	\$ 347.445.737.00	\$ 58.198.241.00
viernes, 14 de enero de 2022	jueves, 20 de enero de 2022	\$ 440.220.765.00	\$ 92.775.028.00
viernes, 21 de enero de 2022	jueves, 27 de enero de 2022	\$ 533.849.235.00	\$ 93.628.470.00
viernes, 28 de enero de 2022	viernes, 4 de febrero de 2022	\$ 642.638.556.00	\$ 108.789.321.00
			\$ 642.638.556.00

ANEXO 11.6
CONTROL DE CALIDAD A LOS
MATERIALES UTILIZADOS.
FICHAS TECNICAS PINTURAS
CERTIFICADOS DE CALIDAD PINTURAS
FICHAS TECNICAS MICROESFERAS



gmpaint



PINTURA GMPAIN MMA METILTRAFFIC 98:2 LLANA

Blanca - Componente A/ Resina Líquida + Componente B/ Catalizador en Pasta

Amarilla - Componente A/ Resina Líquida + Componente B/ Catalizador en Pasta

Negra - Componente A/ Resina Líquida + Componente B/ Catalizador en Pasta

SEÑALIZACIÓN DE VÍAS

DESCRIPCIÓN

Sistema Metil Metacrilato (MMA) - Plástico en frío, bicomponente cargado con microesferas de vidrio para mejorar la reflectividad y cargas antideslizantes. Libre de solventes, amigable con el medio ambiente y de alta durabilidad.

Especialmente formulada para demarcación de vías, en zonas de alto tráfico vehicular y propenso a condiciones abrasivas severas. Excelente reflectividad diurna y nocturna.

Formulado para aplicación con Llana. Incluye catalizador en pasta para aplicación manual.

USOS

Señalización y demarcación de vías, metro cuadrado en zonas urbanas, pasos peatonales, líneas logarítmicas, reductores de velocidad y zonas de poca iluminación nocturna con alto tráfico vehicular de alto nivel de durabilidad. No se recomienda su uso en parqueaderos, canchas deportivas, bodegas y otros espacios interiores y exteriores donde prime el aspecto estético de la aplicación de pintura frente al desempeño como elemento de señalización y demarcación.

CARACTERÍSTICAS

- Curado rápido que permite rápida apertura del tráfico.
- Fácil aplicación.
- Relación de mezcla 98:2 (Resina líquida Componente A + Catalizador pasta Componente B).

Fecha de Revisión: Abril de 2021

105 70

- Contiene agregados antideslizantes.
- Muy buena adherencia en concretos y asfaltos.
- Excelente retención de microesferas. Excelente visibilidad nocturna en sustratos húmedos y alta durabilidad de las propiedades retro-reflectivas.
- Mayor resistencia al desgaste que las pinturas convencionales.
- Posibilidad de aplicación en altos espesores.
- Posibilidad de curado a diferentes velocidades (rápido – lento).
- No requiere calentamiento para su aplicación pues es un sistema reactivo.
- Adherencia excepcionalmente alta en superficies repintadas
- Cadena polimérica que no sufre degradación por exposición a la humedad, la luz y la temperatura en exteriores.
- Alta estabilidad térmica y mecánica.
- Resiste diésel, gasolina, aceite, ácidos, bases y varios productos químicos.
- Amigable con el medio ambiente pues no posee solventes

PROPIEDADES

Parámetro	BLANCA	AMARILLA	NEGRA
Tiempo de No pickup @ 25°C (min)	10 - 12	10 - 12	10 - 12
Pot Life (min)	9 - 11	9 - 11	9 - 11
Viscosidad Stormer KU	110 - 120	110 - 120	110 - 120
Densidad (kg/gal)	7.2 - 7.4	7.2 - 7.4	7.2 - 7.4
Sólidos totales en peso (%)	100	100	100
	L: Min 90	L: 72 - 82	L: Max 23
Coordenadas de Color	a: 0.0 - (-2.2)	a: 18 - 27	a: -0.3 a -2
	b: 0 a 5	b: 74 - 86	b: -0.2 a 1

CONDICIONES RECOMENDADAS DE APLICACIÓN

Parámetro	
Espesor de aplicación seco recomendado (mils)	22 - 40
Temperatura de aplicación - Ambiente (°C)	10 - 40
Humedad Relativa en aplicación (%)	< 85
Tiempo de No pickup @ 25°C (min)	10 - 12
Pot Life (min)	9 - 11
Rendimiento promedio al espesor recomendado (gal/m ²)	3.7-5.0

*Espesores establecidos en la tabla 1 de la NTC 4744-4.

APLICACIÓN

El sistema MMA 98:2 Llana se compone de dos elementos:

Componente A: Resina Líquida MMA pre - acelerada

Componente B: Catalizador en Pasta

La preparación del sistema debe realizarse de la siguiente manera:

1. Homogenizar de manera separada el Componente A antes de su aplicación.
2. Adicionar el Componente B (Catalizador en pasta) a la resina y mezclar vigorosamente durante aproximadamente 1 minuto para asegurar una homogenización completa.
3. Aplicar sobre la superficie deseada con llana metálica o espátula a un espesor entre 22 y 40 mils

La dosificación usual entre el componente A y el componente B, corresponde a 1 tubo de A (Catalizador) por cada galón de B (Resina), sin embargo, en condiciones de bajas temperaturas, se puede aumentar el porcentaje de catalizador añadiendo hasta un tubo y medio por cada envase de 1 galón de resina o siguiendo la siguiente proporción:

Temperatura de Superficie (°C)	Cantidad de Catalizador (% Peso)*	Pot Life (min)	Tiempo de Secado (min)
10	2.5	14	45
10	1.7	18	50
20	1.7	10	30
20	0.85	15	35
30	0.85	8	20
30	0.425	12	30
40	0.425	6	18

*Proporción respecto al peso total de la formulación

La modificación de las proporciones del catalizador modificará los tiempos de Pot life y Secado de la pintura. Para más información y asesoría técnica, comuníquese con nosotros.

Los elementos utilizados deberán limpiarse inmediatamente después de la aplicación con paño o papel seco y de ser necesario acetato de etilo o xilol.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, libre de partículas de polvo o grasa y 100% libre de humedad. Para lograr una perfecta adherencia se recomienda remover señalizaciones anteriores; se recomienda extremar precauciones con aceites y/o recubrimientos de curado que los concretos pudieran tener, estos deben ser removidos por granallado. Superficies de concretos y asfaltos nuevos deberán dejarse curar mínimo por 30 días. En hormigón nuevo deben retirarse los agentes de curado residuales antes de aplicar la pintura, ya que pueden reducir la adherencia y afectar sus propiedades.

Previo a la aplicación de la pintura *Gmpaint MMA Metiltraffic 98:2 Llana* sobre pavimento flexible (de tipo asfáltico) recién instalado, se recomienda aplicar una capa de imprimante *Pintura Gmpaint Base Solvente Blanca* (o *Amarilla*, dependiendo si será aplicada pintura *MMA Metiltraffic 98:2 Llana Amarilla*). Asimismo, emplear como imprimante una capa de pintura Base Solvente Negra previo a la aplicación de pintura *Gmpaint MMA Metiltraffic*

Fecha de Revisión: Abril de 2021

108

98:2 Llana sobre pavimento rígido (concreto). De esta forma podrá mejorarse la visualización, en ambos casos, de la señalización, gracias al incremento de contraste.

CONDICIONES CLIMÁTICAS

La temperatura de la superficie, la temperatura ambiente y la humedad relativa son factores determinantes para una exitosa aplicación así como para la durabilidad de la pintura. NO debe ser aplicada a temperaturas menores a 10 °C ni temperaturas superiores a 45°C. La humedad relativa ambiental no debe ser superior al 85%.

Debe tenerse un pronóstico anticipado sin lluvias de 8 horas.

Aplicar las pinturas por fuera de las especificaciones anteriores puede ocasionar problemas significativos de secado y adherencia de la pintura.

MANIPULACIÓN SEGURA Y ALMACENAMIENTO

GMPAINT MMA LLANA tiene una vida útil de 5 meses aproximadamente, siempre y cuando se encuentre almacenado a la sombra, con el envase bien sellado y a temperatura entre 10 y 30°C. Una vez destapado el envase, debe aplicarse en el menor tiempo posible. Para su manipulación, se deben usar elementos de protección personal, como guantes de nitrilo, gafas de seguridad y mascarilla para vapores orgánicos cuando la ventilación sea insuficiente. Cerrar bien el recipiente cuando no se esté usando el producto. No verter el producto en desagües, alcantarillas o fuentes de agua. Si se presenta derrame accidental recoger el material con la ayuda de arena seca y disponer según las leyes locales. En caso de contacto del producto con fuentes de ignición usar agentes extintores de polvo químico seco.

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos Lavar con abundante agua durante al menos 15 minutos, remover los lentes de contacto. Evite tallar los ojos. Si existe irritación o molestia persistente, consulte a su médico.

Contacto con la piel Lavar con abundante agua y jabón. Si presenta irritación consultar al médico.

Ingestión No inducir al vómito ni dar de beber ninguna sustancia. Si el vómito ocurre de manera espontánea, verificar que todas las vías respiratorias se encuentren despejadas. Buscar atención médica inmediatamente.

Inhalación Retire a la víctima de la exposición y llévela a un lugar ventilado donde pueda recibir aire fresco. En caso de paro respiratorio, administre respiración mecánica empleando un equipo. Buscar atención médica inmediatamente.

En caso de emergencia llamar a la Línea de Atención de ARL SURA (CISTEMA) en Colombia 018000-51 14 14.

PRESENTACIÓN

Se suministra el Componente A + Componente B de la siguiente manera:

Componente A: Resina Blanca, Amarilla o Negra (1 galón por 7.3 kg)

Componente B: Catalizador en pasta (1 tubo por 85 gr)

Otras Presentaciones o Requerimientos: Bajo pedido especial.

Los productos referidos en esta ficha técnica cumplen con los requisitos específicos establecidos por la Normatividad Colombiana según Norma Técnica ICONTEC NTC-4744 / NTC-1360.

La información aquí suministrada contiene recomendaciones basadas en nuestra experiencia, es tomada como cierta según lo mejor de nuestro conocimiento y se presenta de buena fe. Debido a que las condiciones y métodos de aplicación y uso están más allá de nuestro control, estas sugerencias no implican garantía.

Solventraffic

PINTURA GMPAINT BASE SOLVENTE- SOLVENTRAFFIC

34001001 – Gmpaint Base Solvente Blanca

34001002 – Gmpaint Base Solvente Amarilla

34001003 – Gmpaint Base Solvente Negra

SEÑALIZACIÓN DE VÍAS

DESCRIPCIÓN

Pintura Acrílica base solvente de rápido secado, con excelente retención de microesferas de vidrio que le proporcionan una alta reflectividad diurna y nocturna

USOS

Señalización y demarcación de vías, metro cuadrado en zonas urbanas, pasos peatonales, líneas logarítmicas, zonas de poca iluminación nocturna y canchas deportivas.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente adherencia en concretos y asfaltos.
- Excelente retención de micro esferas.
- Alto rendimiento y durabilidad.
- Secado rápido.
- Acabado mate.

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

PARÁMETRO	ESTÁNDAR	LOTES 1052201
Color	Amarillo	Cumple
Densidad (kg/gal)	5.9 ± 0,1	5.94
Viscosidad Stormer a 25°C (KU)	80 ± 5	80.6
Molienda (Grados H)	>3	4
Tiempo de secado al tacto 25 °C (min)	10 - 15	15
Coordenadas de Color	L: 72 a 82	79.42
	a: 18 a 27	19.23
	b: 74 a 86	75.78
FECHA MANUFACTURA	Mes/Año	11/16
FECHA DE VENCIMIENTO	Mes/Año	11/17

MEDELLIN-COLOMBIA
Cr. 52 N° 7 Sur-96 Av. Guayabal
Conmutador: 444 66 56 Fax 361 67 87 / 361 65 96 A.A: 2089
LINEA GRATUITA: 01 8000 914 666 / 01 8000 114 666
www.gmp.com.co

PRESENTACIÓN

Galón - Cuñete x 5 Galones - Tambor x 50 Galones.

PROPIEDADES GENERALES

PROPIEDADES	BLANCA	AMARILLA	ROJA	NEGRA
Espesor de aplicación húmedo recomendado (mils)	12 - 15	12 - 15	12 - 15	12 - 15
Temperatura de aplicación - Ambiente (°C)	10 - 40	10 - 40	10 - 40	10 - 40
Temperatura de aplicación - Superficie (°C)	10 - 45	10 - 45	10 - 45	10 - 45
Humedad Relativa en aplicación (%)	< 85	< 85	< 85	< 85
Tiempo de No pickup @ 25°C	10 - 15	10 - 15	10 - 15	10 - 15
Rendimiento línea de 12 cm al espesor recomendado (m.l./gal)	~ 65	~ 65	~ 85	~ 85
Viscosidad Stomer, (KU) @ 25 °C	75 - 85	75 - 85	75 - 85	75 - 85
Densidad (kg/Gal)	5.8 - 6.0	5.8 - 6.0	5.9 - 6.1	6.1 - 6.3
Molienda (Grados Hegman)	> 3	> 3	> 3	> 3
Sólidos totales peso/ volumen (%)	>75 / >60	>75 / >60	>75 / >60	>75 / >60
Coordenadas de Color	L: Min 90 a: -2.2 a 0.0 b: 0 a 5	L: 72 a 82 a: 18 a 27 b: 74 a 86	L: 38 a 42 a: 49 a 59 b: 30 a 43	L: Max 23 a: -0.3 a 2 b: -0.2 a 1

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Superficies de concretos y asfaltos nuevos deben dejarse curar mínimo 30 días. La superficie debe estar limpia, seca, libre de contaminantes (grasa, aceite, polvo, arena, restos de pintura deteriorada o cualquier elemento que impida la adherencia de la pintura a la superficie). Si la superficie es de concreto y tiene textura lisa, debe generarse rugosidad mediante tratamiento mecánico para lograr una mejor adherencia. Se deben remover señalizaciones anteriores si están deterioradas o mal adheridas; se recomienda extremar precauciones con aceites o recubrimientos de curado que los concretos pudieran tener, estos deben ser removidos por granallado.

APLICACIÓN

Agitar la pintura antes de usar. Se recomienda el uso de un agitador mecánico. NO ES NECESARIO DILUIR LA PINTURA, EL PRODUCTO ESTÁ LISTO PARA APLICAR. Usar los elementos de protección personal apropiados.

La temperatura de la superficie debe estar entre 10° C y 45° C. La humedad relativa debe estar por debajo del 80%. Se recomienda hacer el sembrado de microesferas a razón de 2 a 3 kg por galón de pintura. El equipo utilizado deberá estar limpio previo a su aplicación. Al terminar la aplicación, se recomienda lavar el equipo y los elementos usados con una mezcla de agua y etanol. PARA MAYOR INFORMACIÓN, SOLICITE LA FICHA TÉCNICA AL ASESOR COMERCIAL

NOVIEMBRE-2016



**PRODUCTOS
QUÍMICOS S.A.S**
MATERIAS PRIMAS
(Sin Toda Seguridad)

MICROESFERAS GMPAINT AASHTO M247 TIPO II

MICROESFERAS DE VIDRIO

Código: 70 2 19 01 002

CERTIFICADO DE ANÁLISIS			
ANÁLISIS	ESPECIFICACIONES	UDS.	LOTE
			210806
Apariencia	Esferas Incoloras	--	Cumple
Redondez	Min 80	%	81.7
Índice de Refracción	Min 1.5	--	1.53
Gravedad Específica	2.4 - 2.6	--	2.48
% Sílica	Min 65	%	73
Tipo de Recubrimiento	Adherencia, Flotación	--	Dual
% Microesferas defectuosas	Máx 3	%	1
Resistencia a la Fractura(Retenido en Malla 30)	Min 178	N	200
Resistencia a la Fractura(Retenido en Malla 40)	Min 133	N	150
Distribución			
(Malla 16)	100	%	100
(Malla 20)	90 - 100	%	99.91
(Malla 30)	50-75	%	67.67
(Malla 40)	15 - 45	%	40.06
(Malla 50)	0 - 15	%	14.05
(Malla 80)	0 - 5	%	4.09
Contenido de Metales Pesados			
Arsénico	< 75	ppm	0
Plomo	< 100	ppm	0
Antimonio	< 200	ppm	0
FECHA FABRICACION			06-AGO-2021

EMPAQUE ORIGINAL: Saco papel X 25 kg.

NOTA: Los datos anotados, son los que aparecen en la ficha técnica y/o certificado de nuestro proveedor

17/11/2021

MEDELLIN-COLOMBIA

Cr. 52 N° 7 Sur-96 Av. Guayabal

Conmutador: 444 66 56 Fax: 361 67 87 / 361 65 96 A.A: 2089

LINEA GRATUITA: 01 8000 914 666 / 01 8000 114 666

www.gmp.com.co

114



SC 7123-1

**FICHA TÉCNICA PINTURA PARA TRÁFICO PLÁSTICO EN FRÍO TIPO LLANA ORBITEX®-FT-G.LAB-70****DESCRIPCIÓN:**

Pintura 100 % sólidos de dos componentes, el componente A es fabricado con resinas Metil-metacrilato puras, antideslizantes y pigmentos, el componente B es el catalizador. Diseñada para demarcación y señalización vial donde se requiera alta adherencia, resistencia a la abrasión severa y a gran cantidad de contaminantes, altísima duración y rápido secado.

CUMPLE NTC 1360**USOS:**

La PINTURA PARA TRAFICO PLASTICO EN FRIO TIPO LLANA ORBITEX® es ideal para la para la demarcación y señalización de autopistas, carreteras, pasos peatonales, zonas escolares, ciclo rutas, pavimento y concreto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Color	Amarillo, Blanco, Rojo, Azul, Negro
Viscosidad (Unidades Krebs)	86-92 Ku
Peso neto por galón	6.90 – 7.60 Kg/galón
Porcentaje de sólidos (%volumen)	99-100
Número de manos recomendadas	1 mano a 1,2 mm de espesor.

Método de aplicación	Llana o rasqueta
----------------------	------------------

Ajustador para dilución	No recomendada.
-------------------------	-----------------

Relación de Mezcla (%)	98-2
------------------------	------

Rendimiento práctico aproximado	3 m ² /galón
---------------------------------	-------------------------

Espesor de película seca de 1,2 mm	
------------------------------------	--

Condiciones de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura del sustrato: Entre 7°C y 45°C • Temperatura mínima de aplicación: 3°C por encima del punto de rocío. • Humedad relativa: Entre 30% y 85%. • La presencia de humedad o lluvia durante la aplicación ó durante el secado afectan la adherencia y retardan el secado.
---------------------------	--

Tiempo de secamiento a	• 10- 15 minutos
------------------------	------------------

30°C y 85% humedad relativa	• Para apertura de vía: 40-60 minutos
-----------------------------	---------------------------------------

Estabilidad al almacenamiento (entre 5°C-35°C)	6 meses
--	---------

USOS:

La PINTURA PARA TRAFICO PLASTICO EN FRIO TIPO LLANA ORBITEX® es ideal para la para la demarcación y señalización de autopistas, carreteras, pasos peatonales, zonas escolares, ciclo rutas, pavimento y concreto.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

- La superficie debe estar seca, libre de polvo, grasa, pintura deteriorada y material extraño.
- La limpieza se hace utilizando agua o aire a presión, escobas manuales o mecánicas.
- Para Aplicar sobre concreto nuevo o para mejorar la adherencia se debe utilizar IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO ORBITEX®, debido a la alcalinidad y porosidad de la superficie.

APLICACIÓN:

- Solo se puede aplicar sobre pavimentos rígidos o flexibles que lleven mínimo 30 días de construidos.
- Aplicar con llana metálica o rasqueta.
- Aplicar una mano para obtener un espesor de película seca de 1,25 mm.



SC 7123-1



- Demarcar con cinta de enmascarar el área de aplicación.
- Adicionar el componente B al componente A (Relación 98%-2% en peso) y agitar muy bien por uno o dos minutos hasta mezcla homogénea. Aplicar de inmediato, la mezcla tiene una vida útil de 10 a 15 minutos.
- Para evitar que las señalizaciones se dañen con el tráfico, se deben proteger con vallas o conos hasta que hayan secado bien.
- El producto no debe diluirse con otros disolventes ni mezclarse con esmaltes, lacas u otros productos.
- Los equipos de aplicación se pueden limpiar con Thinner.
- La durabilidad va a depender del tipo y estado de pavimento, volumen y tipo de tráfico, geometría de la vía, la preparación de superficie y la aplicación. En zonas donde se tiene arena continuamente, la durabilidad será afectada.

PRESENTACIÓN:

La **PINTURA PARA TRAFICO PLASTICO EN FRIO TIPO LLANA ORBITEX®** se encuentra disponible en:

- Componente A: 1 Galón
- Componente B: Frasco de Catalizador de 150 gramos.

SEGURIDAD Y AMBIENTE:

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Trabajar en un lugar con buena ventilación y alejado de toda fuente de calor, chispa o llama.
- Se recomienda el uso de máscara contra vapores orgánicos, overol, guantes y gafas de seguridad para mayor protección.
- En caso de contacto con la piel se debe lavar con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos se deben lavar con abundante agua durante varios minutos y buscar atención médica inmediata.
- En caso de ingestión buscar atención médica inmediata.
- En caso de inhalación prolongada llevar a un lugar bien ventilado.
- Este producto contiene materiales inflamables. En caso de contacto del envase con fuentes de calor o llama directa, usar agentes extintores de dióxido de carbono o polvo químico seco.
- En caso de derrame recoger el producto con arena o un material absorbente inerte (No usar aserrín u otro material inflamable para absorber el producto), depositar en un recipiente con tapa y trasladarlo a un lugar seguro.
- No verter por desagüe, sobre el suelo ni en cuerpos de agua.
- Los residuos secos del producto se disponen como residuos peligrosos.
- Para ampliar información, consultar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.

ALMACENAMIENTO:

- Debe almacenarse en los recipientes originales cerrados, en posición vertical; en sitios ventilados, protegidos de humedad excesiva, así como de altas temperaturas y alejado de toda fuente de calor, chispa o llama.
- Consérvese máximo seis (6) meses a partir de la fecha de fabricación. Es muy importante que se roten las existencias

Pintuflex S.A.S estamos comprometidos con el planeta!

La información contenida en esta Ficha Técnica es proporcionada de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de Pintuflex S.A.S. respecto a sus productos. La información se refiere únicamente al material especificado, y no es válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o bajo condiciones diferentes a las expresadas.

Pintuflex S.A.S ofrece garantía de las especificaciones técnicas de este producto más no garantiza las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento porque éstas son inherentes al manejo de quien lo usa y están fuera de nuestro control. Por lo tanto, la información suministrada no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto. Pintuflex S.A.S. no asumirá responsabilidad alguna por daños o perjuicios incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

Las especificaciones técnicas están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Para más información se recomienda consultar al Departamento Técnico - Comercial de Pintuflex S.A.S.

116



SC 7123-1



1

FICHA TÉCNICA PINTURA PARA TRÁFICO BASE SOLVENTE ORBITEX®- FT-G.LAB-11

DESCRIPCIÓN:

Pintura para demarcación de pavimentos, base solvente, mono componente, a base de resinas acrílicas que le confieren excelentes propiedades de adherencia, rápido secado, resistencia a la abrasión, al agua y a gran variedad de contaminantes.
(CUMPLE NTC 1360) 2011-04-13

USOS:

La PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE ORBITEX® es ideal para la señalización y demarcación de todo tipo de vías, pisos de fábricas, áreas de trabajo, canchas deportivas, bodegas, etc.

ESPECIFICACIONES:

Peso neto por galón	4.70 – 5.80 Kg/galón
Número de manos recomendadas	1 a 2 manos dependiendo de la porosidad de la superficie El equipo de aplicación se selecciona según el tipo de extensión de la superficie:
Método de aplicación	<ul style="list-style-type: none">• Brocha• Rodillo resistente a solventes• Máquina aplicadora (Consultar con el fabricante del equipo)
Ajustador para dilución	No recomendada. Xilol o thinner acrílico si es necesario.
Rendimiento práctico aproximado	Depende de la técnica de aplicación, tipo de superficie a cubrir y seguimiento de las recomendaciones suministradas sobre preparación de superficie.
Espesor de película seca de 1 mils (25 micrones)	65 – 75 m ² /galón
Espesor de película seca de 7 mils (175 micrones)	10 – 12 m ² /galón
Para líneas de 12 cm de ancho a un espesor de película seca de 7 mils (175 micrones)	90 – 105 m/galón
Condiciones de aplicación	<ul style="list-style-type: none">• Temperatura del sustrato: Entre 10°C y 35°C• Temperatura mínima de aplicación: 3°C por encima del punto de rocío.• Humedad relativa: Inferior a 85%• La presencia de humedad o lluvia durante la aplicación o durante el secado afectan la adherencia y retardan el secado.
Tiempo de secamiento a 25°C y 85% humedad relativa	<ul style="list-style-type: none">• Para pasar sin detenerse: 1 h• Para vías tráfico pesado: 1.5 h
Secamiento no (pick up) 25°C.	7-15 minutos

117



SC 7123-1



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

- La superficie debe estar seca, libre de polvo, grasa, pintura deteriorada y material extraño.
- La limpieza se hace utilizando agua o aire a presión, escobas manuales o mecánicas.
- Para usar sobre concreto, se debe tener un tiempo de curado mínimo de 30 días y neutralizar previamente la superficie con una solución de ácido muriático diluido al 10% en agua o con BUNKER® Limpiador de ladrillo (siguiendo las instrucciones), dejar actuar durante 15 minutos máximo, luego enjuagar con abundante agua, dejar secar muy bien y limpiar nuevamente antes de aplicar la pintura (para evitar problemas de adherencia o decoloración).

APLICACIÓN:

- Agitar el producto con una espátula limpia hasta obtener su completa uniformidad.
- Si el equipo de aplicación o las condiciones ambientales lo requieren diluir un galón de pintura con 5% de xilol o thinner acrílico y agitar con espátula limpia hasta alcanzar la consistencia adecuada.
- Aplicar una mano para obtener un espesor de película seca de 175 a 225 micrones.
- En cruces y áreas peatonales se recomienda aplicar dos manos para obtener un espesor de película seca de 400 micrones.
- El tiempo de secamiento varía con la temperatura del ambiente y el espesor de película aplicado, en condiciones normales el tiempo de secado al servicio es de 60 - 90 minutos aproximadamente, dependiendo del tráfico.
- Se requiere que la pintura sea reflectiva, sobre la película húmeda recién aplicada rociar microesferas tipo Drop - On en una cantidad de 300 a 400 gramos por metro cuadrado. El producto posee excelente retención de microesferas.
- Para evitar que las señalizaciones se dañen con el tráfico, se deben proteger con vallas o conos hasta que hayan secado bien.
- El producto no debe diluirse con otros disolventes ni mezclarse con esmaltes, lacas u otros productos.
- Se recomienda adicionar sin agitar, una pequeña cantidad de thinner al sobrante de producto para prevenir la formación de nata.
- Los equipos de aplicación se pueden limpiar con thinner.

PRESENTACIÓN:

PINTURA PARA TRAFICO ORBITEX® se encuentra disponible en:

- Tambor de 50 galones
- Cuñete de 5 galones
- Galón
- Cuarto de galón.

SEGURIDAD Y AMBIENTE:

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Aplicar en un lugar con buena ventilación y alejado de toda fuente de calor, chispa o llama.

- Se recomienda el uso de máscara contra vapores orgánicos, overol, guantes y gafas de seguridad para mayor protección.
- En caso de contacto con la piel se debe limpiar con estopa humedecida con thinner extrafino y lavar con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos se deben lavar con abundante agua durante varios minutos y buscar atención médica inmediata.
- En caso de ingestión buscar atención médica inmediata.
- En caso de inhalación prolongada llevar a un lugar bien ventilado.

El producto contiene materiales inflamables. En caso de contacto del envase con fuentes de calor o llama directa, usar agentes extinguidores de dióxido de carbono o polvo químico seco.

En caso de derrame recoger el producto con arena o un material absorbente inerte (No usar aserrín u otro material inflamable para absorber el producto), depositar en un recipiente con tapa y trasladarlo a un lugar seguro.

- No verter por desagüe, sobre el suelo ni en cuerpos de agua.
- Los residuos secos del producto se disponen como residuos peligrosos.
- Para ampliar información, consultar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.

ALMACENAMIENTO:

Debe almacenarse en los recipientes originales cerrados, en posición vertical; en sitios ventilados, protegidos de humedad excesiva, así como de altas temperaturas y alejado de toda fuente de calor, chispa o llama.

- No apilar más de 4 cuñetes, ni apilar más de cuatro bandejas de galones o cuartos.
- Consérvese máximo un (1) año a partir de la fecha de fabricación. Es muy importante que se roten las existencias de producto



SC 7123-1




¡En Pintuflex S.A.S estamos comprometidos con el planeta!

La información contenida en esta Ficha Técnica es proporcionada de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de Pintuflex S.A.S. respecto a sus productos. La información se refiere únicamente al material especificado, y no es válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o bajo condiciones diferentes a las expresadas.

Pintuflex S.A.S ofrece garantía de las especificaciones técnicas de este producto más no garantiza las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento porque éstas son inherentes al manejo de quien lo usa y están fuera de nuestro control. Por lo tanto, la información suministrada no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto. Pintuflex S.A.S. no asumirá responsabilidad alguna por daños o perjuicios incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

Las especificaciones técnicas están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Para más información se recomienda consultar al Departamento Técnico - Comercial de Pintuflex S.A.S.



CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CLIENTE: VRC INGENIERIA LTDA
NIT: 900155125
LUGAR Y FECHA: 24/11/2021
FACTURA Y/O PEDIDO: 8873



METODOLOGIA: De acuerdo a los métodos de ensayo de la NTC 1360, INVIAS ARTICULO 700 e Instructivos Internos

PRODUCTO: PINTURA TRAFICO PLASTICO EN FRIO TIPO LLANA BLANCO			
LOTE: P-0003402			
FECHA DE FABRICACION: 22/11/2021			
FECHA DE VENCIMIENTO: 22/05/2022			
VISOSMETRO (D-1) AGUA ALTA VISOSMETRO	90-92	SL-2	NTC 1360 NUMERAL 6.2
DEBILIDAD (Mpa a 23°C)	7.25-7.31	7.31	NTC 1360 NUMERAL 6.3
COLOR	85 ± 7.30 m*	SL-2	NTC 1360 NUMERAL 6.3
GRANULOMETRIA (µm)	95-100 µm	95	NTC 1360 NUMERAL 6.3
TIPO DE SECADO (seg. en 100°C)	7-15	7-15	NTC 1360 NUMERAL 6.3
COLOR	CARACTERISTICA COLOR L-2000 a-13.00 b-13.00	CARACTERISTICA COLOR L-2000 a-13.00 b-13.00	NTC 1360 NUMERAL 6.3
CONTENIDO DE SOLIDOS EN PESO (%)	40	40	NTC 1360 NUMERAL 6.3
CONTENIDO DE SOLIDOS EN VOLUMEN (%)	40-45	40-45	NTC 1360 NUMERAL 6.3
REDUCCION DE LA PINTURA	10-15	10	NTC 1360 NUMERAL 6.3
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO (%)	90-95	90	NTC 1360 NUMERAL 6.3
GRUEZA	10-15	10	NTC 1360 NUMERAL 6.3
GRUEZA	10-15	10	NTC 1360 NUMERAL 6.3
ELONGACION	PASA/NO PASA	PASA	NTC 1360 NUMERAL 6.3
RESISTENCIA AL AGUA	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	NTC 1360 NUMERAL 6.3
RESISTENCIA A LOS ALCALIS	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	NTC 1360 NUMERAL 6.3
RESISTENCIA A LA INTENSIDAD (Kgf/cm²)	200	200	NTC 1360 NUMERAL 6.3
OPACIDAD	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	NTC 1360 NUMERAL 6.3

ESPECTROFOTOMETRO BYK SPECTRO-GUIDE

PINTUFLEX 9.0.5 ofrece garantía de las especificaciones técnicas de este producto cuando se aplican las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento, siempre y cuando se adhiera al manual de instrucciones y al manual de seguridad. Para mayor información consulte la Hoja Técnica del producto antes de su utilización en.

JIMMY NIÑO PINZON
DIRECTOR TECNICO



CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CLIENTE: VRC INGENIERIA LTDA
NIT: 900155123
LUGAR Y FECHA: 09/12/2021
FACTURA Y/O PEDIDO: 58776

METODOLOGIA: De acuerdo a los métodos de ensayo de la NTC 1360, INVIAS ARTICULO 700 e Instructivos Internos

PRODUCTO: PINTURA TRAFICO PLASTICO EN FRIO TIPO LLANA AMARILLO			
FECHA DE FABRICACION: 05/11/2021			
FECHA DE VENCIMIENTO: 05/05/2022			
LOTE: P-0003233			
PARAMETRO	ESPECIFICACIONES	RESULTADO	NTC / INSTRUCTIVO INTERNO
TIEMPO DE DISPERSION (min)	90 ± 5	2	NTC 1360 A. 4.4.1.1.1 NTC 557
VISCOSIDAD FRIABLE A LA VISCOSIDAD (mPa.s)	85-90	87	NTC 1360 A. 4.4.1.1.2 NTC 557
DENSIDAD (g/cm³) a 25°C	0.90 ± 0.02	0.90	NTC 557
CO. OR.	AF ± 1.5 mPa.s	1.0	NTC 557
OPACIDAD (% TRANSMITENCIA)	80-90	96.25	NTC 557
PUNTO DE SECADO (NO. MINUTOS) EN 10 MINUTOS	7-35	15	NTC 1360 A. 4.4.1.1.3 NTC 572
CO. OR.	2000-40000 6.73-92.5 ± 0.01-0.02	CAPACIDAD DE CO. OR. L. 22 ± 20.45 ± 0.24	NTC 1360 A. 4.4.1.1.4 NTC 572
CONTENIDO DE SOLIDOS EN POLVO (%)	80-90 ± 1.0	100	NTC 1360 A. 4.4.1.1.5 NTC 572
CONTENIDO DE SOLIDOS EN VOLUMEN (%)	80-90 ± 1.0	99.7	NTC 1360 A. 4.4.1.1.6 NTC 572
STABILIDAD DE LA PINTURA	15%	15	NTC 541.2
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO	15% ± 5%	4.0%	NTC 1360 A. 4.4.1.1.7 NTC 572
BRILLO (%)	MANEJO 10	1	NTC 572
ADHESION	MANEJO 10	MANEJO	NTC 1360 A. 4.4.1.1.8 NTC 572
RESISTENCIA AL AGUA	CUMPLE	CUMPLE	NTC 1360 A. 4.4.1.1.9 NTC 572
RESISTENCIA A LOS ACIDOS	CUMPLE	CUMPLE	NTC 1360 A. 4.4.1.1.10 NTC 572
QUICK DRY	MANEJO 10	20	NTC 572
APLICACION A LA ABASION (F. 100)	MANEJO 10	100	NTC 1360 A. 4.4.1.1.11 NTC 572
APLICACION	CUMPLE	CUMPLE	NTC 1360 A. 4.4.1.1.12 NTC 572
-ESPECTROFOTOMETRO BYK SPECTRO GUIDE			

El presente certificado es válido para el lote de pintura que se indica y no es válido para otros lotes de pintura. La validez de este certificado depende de la correcta aplicación de la pintura en las condiciones de uso y almacenamiento. Para mayor información consulte el manual de uso y mantenimiento de la pintura en el sitio web de VRC Ingenieria Ltda.

JIMMY NIÑO PINZON
DIRECTOR TECNICO



**CERTIFICACIÓN DE GARANTÍA
 MATERIAL REFLECTIVO
 GRADO DIAMANTE DG3 SERIE 4000.**

3M Colombia S.A., con el respaldo de su Casa Matriz "3M Company" garantiza la calidad del producto reflectivo SCOTCHLITE Grado Diamante DG3 en los siguientes términos:

1. DESCRIPCIÓN

El material retrorreflectivo Grado Diamante al Cubo o DG3 es una lámina microprismática de microcubos completos diseñada para la producción de señales de control de tráfico y delineadores usados en posición vertical. La lámina Grado Diamante al Cubo o DG3 está diseñada para tener el mas alto desempeño en distancias viales cortas, medias y largas determinadas por los valores de retrorreflectividad (RA) medidos a ángulos de observación¹ 0.2°, 0.5° y 1.0°.

2. FOTOMETRIA

TABLA A - Coeficientes mínimos de Retrorreflexión R_A (Cd / Lux / m²)

COLOR	- 4° Angulo Entrada			30° Angulo Entrada		
	Angulo Observación			Angulo Observación		
	0.2°	0.5°	1.0°	0.2°	0.5°	1.0°
Blanco	580	420	120	220	150	45
Amarillo	435	315	90	165	110	34
Rojo	87	63	18	33	23	7
Verde	58	42	12	22	15	5
Azul	26	19	5	10	7	2
Café o marrón	17	13	4	7	5	1
Amarillo Fluorescente	350	250	72	130	90	27
Amarillo Limón Fluorescente	460	340	96	180	120	36
Naranja Fluorescente	175	125	36	66	45	14

Las medidas se efectuaron de acuerdo a Norma ASTM-E-810 "Método Normal de Prueba para el coeficiente de retrorreflexión de lámina retrorreflejante". Estos valores son el promedio de los valores medidos a 0° y a 90° respecto de la orientación de la lámina. Cumple con la norma NTC 4739-2011.

¹ Ángulos de Observación que representan las situaciones geométricas de visibilidad nocturna más comunes encontradas durante la conducción en vías públicas (urbanas y rurales) y las de mayor desventaja visual.

3. COLOR



El material Grado Diamante al Cubo o DG3 proporciona un alto impacto visual al conductor del vehículo bajo la luz día y noche, incluso en períodos de baja visibilidad como el amanecer, el atardecer, en días nublados, situaciones en las que el uso de los colores fluorescentes multiplica el efecto visual. Su medición se determina de acuerdo a ASTM - E -1164.

4. PERMANENCIA DEL COLOR

Resistencia al intemperismo por un período de 12 años para colores ordinarios y 10 para colores fluorescentes, siempre y cuando se sigan las instrucciones dadas por 3M en sus boletines informativo o de producto para la aplicación de los procesos de color 880I o 880N.

5. ADHESIVO

Las láminas Grado Diamante al Cubo o DG3 tienen un adhesivo sensible a la presión que se recomienda para su aplicación a temperatura ambiente. Esta se define como 18°C o mayor. No se recomienda aplicaciones a temperaturas inferiores a 4°C.

6. CORTE y APLICACIÓN

La lámina puede cortarse manualmente o por troquel, cortando una lámina a la vez. Cortada por sierra de banda o guillotina en paquetes o montones de máximo 50 hojas. Debe garantizarse que se utilice una cuchilla afilada para evitar cortes irregulares que pueden alterar la óptica de los microcubos.

Se recomienda que la aplicación sobre tableros se haga con rodillo neumático o similar que garantice una homogénea presión. La aplicación manual se recomienda tan solo para textos de leyendas.

En todo caso deben seguirse las indicaciones de las carpetas informativas

Folder de Información 1.5 Instrucciones para aplicación manual

Folder de Información 1.6 Instrucciones para aplicación manual y uso de rodillos

Folder de Información 1.7 Preparación de superficies

Folder de Información 1.10 Corte, prespaciado, preenmascarado

Folder de Información 1.11 Mantenimiento de las señales



7. PROCESAMIENTO POR SERIGRAFIA

La lámina reflectante Grado Diamante al Cubo o DG3 debe ser procesada en señales de tráfico por serigrafía, antes o después de montarse sobre un sustrato para señal, utilizando los colores de procesamiento Scotchlite Serie 880I. Las tintas de serie 880 de secado rápido se pueden serigrafiar de 16° a 38° C y una humedad relativa de 20% a 50%.

Se debe tener especial cuidado para evitar doblar las láminas antes y especialmente después del proceso de serigrafía, para así eliminar la posibilidad de fracturas por causa de un manejo inadecuado. Fallas asociadas a esto no son cubiertas por 3M.

En todo caso deben seguirse las indicaciones de la carpeta informativa Folder de Información 1.8 Instrucciones para el proceso de color

ANGULARIDAD

Las señales construidas en material Grado Diamante al Cubo o DG3 tendrán mayor desempeño frente a grandes ángulos de entrada (>50°), cuando las láminas retrorreflectivas que la conforman estén orientadas en el sentido paralelo al momento de extender la lámina enrollada (Orientación 0°)

Los materiales Grado Diamante al Cubo o DG3 poseen angularidades superiores a cualquier otro tipo de material reflectivo, ya que su eficiencia permite que sea visible a su máxima reflectividad por cualquier tipo de vehículo.

8. GARANTIA

3M garantiza que la Lámina Reflejante Grado Diamante al Cubo o DG3 de 3M que comercializa para usar como componente para señales para control de tráfico será efectiva para su uso y alcanzará los valores mínimos establecidos para coeficiente de retrorreflexión en aplicaciones de señales permanentes. La garantía está sujeta a las consideraciones de la Tabla B.

Tabla B – Porcentaje mínimo retenido del RA inicial de la Tabla A para aplicación de garantía en colores ordinarios (blanco, amarillo, rojo, verde, azul y marrón.)

Periodo de garantía	Porcentaje mínimo RA retenido
1 a 7 años	80%
8 a 12 años	70%



3M Colombia S.A.

Av. El Dorado No. 75-93
Bogotá D.C. Colombia
(571) 4161666/4161655 PBX
(571) 4161677 Fax
018000113636 Servicio al Cliente
11091 / 12693 Apartado Aéreo



3M garantiza que la Lámina Reflejante Fluorescente Grado Diamante al Cubo o DG3 de 3M que comercializa para usar como componente para señales para control de tráfico será efectiva para su uso y alcanzará el 70% de los valores mínimos de los coeficientes de retroreflexión de la tabla A según las consideraciones de la Tabla C.

Tabla C – Periodo de garantía para colores fluorescentes

Color	Periodo de Garantía
Amarillo Fluorescente	10 años
Amarillo Limón Fluorescente	10 años
Naranja Fluorescente	3 años

El porcentaje de RA retenido mencionados arriba aplica a todos los ángulos de entrada y observación presentados en Tabla A, y serán medidos de acuerdo con ASTM E 810. Todas las mediciones serán hechas después de la limpieza de acuerdo con las recomendaciones del 3M.

Condiciones de la garantía

La garantía del producto será válida siempre y cuando se cumpla con: Una superficie de señal Grado Diamante al Cubo o DG3 3M sea procesada y aplicada de acuerdo con todos los procedimientos de aplicación y fabricación de 3M proporcionados en los boletines de producto, folletos de información e información técnica, incluyendo el uso exclusivo de sistemas de componentes compatibles fabricados por 3M como las tintas de proceso de color, láminas reflectivas, películas de color, sobrelaminados y cintas de transferencia.

La falla sólo debe ser resultado de defectos de diseño y manufactura en lámina reflejante Grado Diamante al Cubo o DG3 y no de causas externas, como:

Fabricación, manipulación o mantenimiento inadecuado de las señales; aplicaciones donde la señal no esté instalada a más de +/- 10% de la vertical, uso de materiales no fabricados o indicados por 3M; uso de equipo de aplicación no recomendado por 3M; falla del sustrato de la señal; pérdida de la adhesión debido a sustratos inadecuados o incompatibles; exposición a químicos, abrasión y otros daños



125

99

3M Colombia S.A.

Av. El Dorado No. 75-93
Bogotá D.C. Colombia
(571) 4161666/4161655 PBX
(571) 4161677 Fax
018000113636 Servicio al Cliente
11091 / 12693 Apartado Aéreo



mecánicos como sujetadores usados para fabricar, trasladar, montar la señal entre otros; granizo o nieve; colisiones, vandalismo o maltrato.

3M se reserva el derecho de determinar el método de reemplazo. La lámina de reemplazo portará la garantía sin caducar de la lámina que reemplaza.

Los reclamos efectuados bajo esta garantía serán atendidos siempre y cuando las señales hayan sido fechadas en el momento de aplicación de la lámina, lo que constituye el inicio del período de garantía. Los reclamos efectuados bajo esta garantía serán atendidos sólo si se notifica a 3M acerca del problema dentro de un plazo de tiempo razonable, si se provee la información razonablemente solicitada por 3M, y si se permite a 3M verificar la causa del defecto.

Siguiendo los métodos de prueba ASTM E-810 – Método de prueba para el coeficiente de retroreflexión y ASTM E114 – Método de prueba de color. Este material cumple y excede las especificaciones de la norma NTC 4739 – 2016 tipo XI, y tipo XI según la ASTM D4956 – 2013

9. INFORMACIÓN DE VENTA

3M COLOMBIA expide la presente certificación el día **13 DE DICIEMBRE DEL 2021** a solicitud de la firma **V & S COMERCIAL S.A.S.NIT. 830051519**. Para ser entregada a **ABRAHAM PUBLICIDAD** por concepto de compra del siguiente material

Factura No del I21034 de 16 de Noviembre 2021
Descripción del producto
4090 GD3 BLANCO 0.61Mx45.7M
CANTIDAD: 75.03

Factura No del I24065 de 24 de Noviembre 2021
Descripción del producto
4090 GD3 BLANCO 0.61Mx45.7M
CANTIDAD: 75.03

Atentamente,
3M COLOMBIA S.A.
Bogotá 4108555 Op.2
Nacional 018000 113636 Op. 2
Mailto: 3Mcontacto@mmm.com
Chat en Línea - www.3m.com.co



126

100

3M Colombia S.A.

Av. El Dorado No. 75-93
Bogotá D.C. Colombia
(571) 4161666/4161655 PBX
(571) 4161677 Fax
018000113636 Servicio al Cliente
11091 / 12693 Apartado Aéreo



3M no asume responsabilidad por cualquier herida, pérdida o daño, por consecuencia de la utilización del producto que no es de nuestra fabricación. En donde se haga referencia en la literatura a un producto comercialmente disponible, hecho por otro fabricante, será la responsabilidad del usuario el averiguar las medidas de precaución para su utilización delineadas por el fabricante. La única obligación del vendedor y del fabricante será la de reemplazar tal cantidad del producto comprobado con defectos. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables por demanda o por contrato por cualquier pérdida o daño directo, incidental o consecuencia, resultante de la utilización o incapacidad de utilización del producto. Antes de utilizarlo, el usuario debe determinar si el producto es apropiado para la utilización intentada, y asume todo riesgo y responsabilidad cualquiera en conexión con esto. Ningún enunciado o recomendación no contenida aquí tendrá fuerza o efecto a menos que exista en un contrato firmado por personas responsables del vendedor y del fabricante.



127

101



GERDAU
DIACO

DIACO S/A

Carretera Central del Norte Km 27, Tuta, Colombia.
C.P. 150408 Tel/Fax: 7426350

REPORTE DE ENSAYOS

Nº: 10008131087478

CLIENTE FERRETERIA Y PERFILERIA HUNZA S.A.S	FACTURA 9007246656/40	Nº PEDIDO DEL CLIENTE OP. SRTA DIANA PIRAZ	PEDIDO DEL CLIENTE 10631482/0000040	ESPECIFICACIÓN NTC 1985 - 1020	PESO (Kg) 1.000
--	--------------------------	---	--	-----------------------------------	--------------------

MATERIAL		PRODUCTO		LOTE/COLADA		GRADO		COMPOSICION QUIMICA (%)										
								Ensayo según método ASTM E413										
								C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V
								0,20	0,75	0,010	0,034	0,17	0,25	0,13	0,13	0,04	0,007	0,001
108000554		ANG NTC 1985 2"x1/8" 6m		1724533901		GR 50												
								Rangos de referencia según norma										

MATERIAL		PRODUCTO		LOTE/COLADA		DESIG		PROPIEDADES MECÁNICAS					CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS						
								Ensayo según método NTC3353											
								R. Fluencia	R. Tracción	Alargamiento					Lado	Espeso	Dif. A		
								361	505	22.3					50.69	3.13	0.20		
								mín 345.0 MPa		mín 450.0 MPa		mín 18.00%		49.61 - 51.99		2.92 - 3.43			
								Rangos de referencia según norma						mm		mm			

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

TUTA, 20.11.2021

Paola Mateus

PAOLA KATHERIN MATEUS

128

108



GERDAU
DIACO

DIACO S/A

Carretera Central del Norte Km 27, Tuta, Colombia.
C.P - 150408 Tel/Fax: 7426350

REPORTE DE ENSAYOS

Nº: 100081310874

CLIENTE FERRETERIA Y PERFILERIA HUNZA S.A.S	FACTURA 9007246661/120	Nº PEDIDO DEL CLIENTE OP. SRTA DIANA PIRAZ	PEDIDO DEL CLIENTE 10631482/000120	ESPECIFICACIÓN NTC 1985 - 1020	PESO (Kg) 9,000
--	---------------------------	---	---------------------------------------	-----------------------------------	--------------------

MATERIAL PRODUCTO LOTE/COLADA GRADO

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V
106000553	0,21	0,70	0,016	0,032	0,16	0,25	0,08	0,14	0,03	0,007	0,001
106000553	0,21	0,75	0,017	0,036	0,16	0,35	0,10	0,15	0,02	0,008	0,001
106000553	0,20	0,73	0,017	0,030	0,17	0,27	0,13	0,19	0,03	0,009	0,002
106000553	0,20	0,72	0,015	0,035	0,18	0,32	0,09	0,12	0,02	0,007	0,001

Rangos de referencia según norma

MATERIAL PRODUCTO LOTE/COLADA DESIG

PROPIEDADES MECANICAS

Ensayo según método NTC3353

	R. Fluencia	R. Tracción	Alargamiento	Lado	Espesor	Dif. A
106000553	364	510	22,5	50,72	6,17	0,42
106000553	370	518	22,0	51,20	6,25	0,40
106000553	363	509	22,4	50,71	6,27	0,01
106000553	360	504	22,2	50,68	6,22	0,07

Rangos de referencia según norma

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

TUTA, 20.11.2021

Paola Katherin Mateus

PAOLA KATHERIN MATEUS

129

La lámina de acero galvanizado aquí descrito ha sido inspeccionado y ensayado por personal autorizado independiente del área de producción, con resultados satisfactorios en concordancia con los siguientes documentos: Plan de calidad de Lámina PD-CC-02-05; Especificación técnica de Lámina ET-CC-02-14; materia prima de acuerdo con la norma ASTM A653.


INFORMACIÓN BÁSICA

Fecha:	27/11/2021	Consecutivo N°:	CL21-5482
Línea:	CORTE	Remisión:	2095979
Norma:	ET-CC-02-14 ASTM A653	Cliente:	FERRETERIA Y PERFILERIA HUNZA
Referencia:	LAM.GLV.1.45 4' X 8'	N° Orden:	21008479
		Cantidad:	3420 KG

CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA PRIMA

Gr.	Propiedades Químicas				Propiedades Mecánicas			Recubrimiento (g/m2)
	C, máx	Mn, máx	P, máx	S, máx	Esfuerzo de Fluencia MPa	Esfuerzo Máximo MPa	% Elongación en 50 mm, mín.	
CS-B	0,02-0,15	0,60	0,030	0,035	205 - 380	300 - 400	≥ 20	≥ 120

PRUEBAS Y ENSAYOS

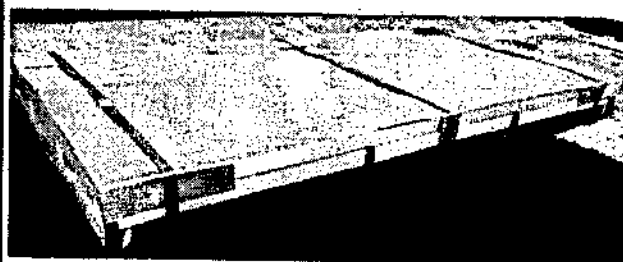

Materia Prima:	CONFORME
Espesor:	CONFORME
Longitud:	CONFORME
Ancho:	CONFORME
Diagonales:	CONFORME
Planitud:	CONFORME
Doble:	CONFORME
Recubrimiento:	CONFORME

Elaboró:

Camilo Vitola
CAMILO VITOLA
Aprendiz de Calidad

Aprobó:

Karen A Robles
KAREN A. ROBLES
Jefe de Control de Calidad

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 34 DE 98

ANEXO 11.7 SOPORTES IMPLEMENTACION PLAN DE CALIDAD

**ANEXO: SST SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Y ANEXOS AMBIENTALES**

OBRA: Comparto 1030-204 Promex
Estación 100 Eslova
Responsable de la Inspección

Escribir en la casilla de estado: **Bueno / B /** **Requiere Cambio (RC)**

[illegible]

OBSERVACIONES GENERALES: A la fecha todos los elementos de protección personal entregados se encuentran en buen estado.

President's order

CUMBRE		ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (Entrega inicial o periódica establecida por ley)			CODIGO	CUM_003_01
					VERSION	0
					FECHA	20/08/2021
DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO						
NOMBRE	Osuna Orlando Orlando Reyes		AREA	71800-01P		
CARGO	Supervisor		CEDULA	7187580		
COMPROMISO DEL TRABAJADOR						
<p>Yo comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación y los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud y seguridad en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico. Declamo que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.</p>						
DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS						
ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP LEGAL (Entrega inicial o periódica, establecida por la ley)				FIRMA RECIBIDO ENTREGA		
ITEM	DOTACIÓN O EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	TALLA	ENTREGA 1	ENTREGA 2	ENTREGA 3
1	Camisa / chaqueta	1	M			
2	Pantalón	1	30			
3	Casco con Barbiquejo	1	-			
4	Guañales	1	-			
5	Botas	1	39			
DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS						
ENTREGA 1	NOMBRE	Estanislao Esteva		CARGO	Responsable Obra	FIRMA
ENTREGA 2	NOMBRE			CARGO		FIRMA
ENTREGA 3	NOMBRE			CARGO		FIRMA
NOTA						
<p>La compañía cumple con la normatividad legal del C.S.T. numeral 239 donde contempla "Todo empleador que habitualmente ocupe uno (1) o más trabajadores permanentes, deberá suministrar cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, un (1) par de zapatos y un (1) vestido de labor al trabajador, cuya remuneración mensual sea hasta dos (2) meses el salario mínimo más alto vigente. Tiene derecho a esta prestación el trabajador que en las fechas de entrega de calzado y vestido haya cumplido más de tres (3) meses al servicio del empleador". Teniendo en cuenta lo anterior según lo contemplado en el numeral 233 del C.S.T. "El trabajador queda obligado a destinar a su uso en las labores contempladas el calzado y vestido que le suministra el empleador, y en el caso de que así no lo hiciere éste quedará admitido de hacerle el suministro en el período siguiente".</p>						

CUMBRE INDUSTRIAL S.A.S.		ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (Entrega inicial o periódica establecida por ley)			CODIGO	CUM_003_01
					VERSION	0
					FECHA	20/03/2021
DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO						
NOMBRE	Francisco Javier Hidalgo		AREA	Tecnico		
CARGO	Asesor		CEDULA	79.909.677		
COMPROMISO DEL TRABAJADOR						
Yo comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación y los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud y seguridad en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.						
DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS						
ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP LEGAL (Entrega inicial o periódica establecida por ley)						
ITEM	DOTACIÓN O EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	TALLA	ENTREGA 1	FIRMA RECIBIDO ENTREGA 2	ENTREGA 3
1	Camisa o chaqueta	1	L			
2	Pantalón	1	32			
3	Casco con Barbujero	1				
4	Guantos (carnaza)	1				
5	Bota	1	41			
DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS						
ENTREGA 1	NOMBRE	Estanislao Escalera		CARGO	Residente Obra	
ENTREGA 2	NOMBRE			CARGO		
ENTREGA 3	NOMBRE			CARGO		
FIRMA						
FIRMA						
FIRMA						
NOTA						
La compañía cumple con la normatividad legal del C.S.T. numeral 230 donde contempla "Todo empleador que habitualmente ocupe un (1) o más trabajadores permanentes, deberá suministrar cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, un (1) par de zapatos y un (1) vestido de labor al trabajador, cuya remuneración mensual sea hasta dos (2) meses el salario mínimo más alto vigente. Tiene derecho a esta prestación el trabajador que en las fechas de entrega de calzado y vestido haya cumplido más de tres (3) meses al servicio del empleador". Teniendo en cuenta lo anterior según lo contemplado en el numeral 233 del C.S.T. "El trabajador queda obligado a destinar a su uso en las labores contratadas el calzado y vestido que le suministra el empleador, y en el caso de que así no lo hiciera éste quedará obligado a hacerle el suministro en el periodo siguiente".						

137

206

CUCUMBRE S.A.		ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (Entrega inicial o periódica establecida por ley)			CODIGO	CUM_003_01
					VERSION	0
					FECHA	20/08/2021
DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO						
NOMBRE	Felix Ortega	ÁREA	Obrera - Limpieza	CEDULA	61970589	
CARGO	Asistente					
COMPROMISO DEL TRABAJADOR						
Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación y los elementos de protección personal recibidos y mantenimientos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud y seguridad en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.						
DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS						
ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP LEGAL (Entrega inicial o periódica establecida por la ley)						
ITEM	DOTACIÓN O EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	TALLA	ENTREGA 1	ENTREGA 2	ENTREGA 3
1	Camisa - Chayote	1	L	Felix Ortega		
2	Pantalón	1	32			
3	Casco con Barbijo	1				
4	Guantas	1				
5	Botas	1	40			
DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS						
ENTREGA 1	NOMBRE	Estanislao	CARGO	Residente Obra	FIRMA	
ENTREGA 2	NOMBRE		CARGO		FIRMA	
ENTREGA 3	NOMBRE		CARGO		FIRMA	
NOTA						
La compañía cumple con la normatividad legal del C.S.T. numeral 230 donde contempla "Todo empleador que habitualmente emplee más (1) o más trabajadores permanentes, deberá suministrar cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, un (1) par de zapatos y un (1) vestido de labor al trabajador, cuya remuneración mensual sea hasta dos (2) meses el salario mínimo más alto vigente. Tiene derecho a esta prestación el trabajador que en las fechas de entrega de vestido y zapatos haya cumplido más de tres (3) meses al servicio del empleador". Teniendo en cuenta lo anterior según lo contemplado en el numeral 233 del C.S.T. "El trabajador queda obligado a destinar a su uso en las labores contractuales el calzado y vestido que le suministre el empleador, y en el caso de que así no lo hiciera éste quedara eximido de suministrar en el período siguiente".						

CUMBRE		ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (Entrega Inicial o periódica establecida por ley)			CODIGO	CUM_003_01
					VERSION	0
					FECHA	20/06/2021
DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA ELEMENTO						
NOMBRE	Camilo Andres Ximenes A		AREA	7183.651		
CARGO	Ayudante		CEDULA	Obra - Pura		
COMPROMISO DEL TRABAJADOR						
Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación y los elementos de protección personal recibidos y mantenidos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud y seguridad en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.						
DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS						
ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP LEGAL (Entrega Inicial o periódica, establecida por la ley)						
ITEM	DOTACIÓN O EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	TALLA	ENTREGA 1	FIRMA RECIBIDO ENTREGA 2	ENTREGA 3
1	Camiso - Chageto	1	M			
2	Pantalón	1	32			
3	Casco con Barbique	1	-			
4	Gaantes	1	-			
5	Botas	1	M			
DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS						
ENTREGA 1	NOMBRE	Espinoza Eslova		CARGO	Revisor Obra	FIRMA
ENTREGA 2	NOMBRE			CARGO		FIRMA
ENTREGA 3	NOMBRE			CARGO		FIRMA
NOTA						
La compañía cumple con la normatividad legal del C.S.T. numeral 230 donde establece "Todo empleador que habitualmente ocupe uno (1) o más trabajadores permanentes, deberá suministrar cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, uno (1) par de zapatos y un (1) vestido de labor al trabajador, cuya remuneración tendrá por hasta dos (2) meses al salario mínimo más alta vigente. Tiene derecho a esta prestación el trabajador que en las fechas de entrega de vestido y zapatos haya cumplido más de tres (3) meses al servicio del empleador". Teniendo en cuenta lo anterior según lo contemplado en el numeral 233 del C.S.T. "El trabajador queda obligado a destinar a su uso en los labores contractados el vestido y zapatos que le suministre el empleador, y en el caso de que así no lo hiciera ésta quedara eximida de hacerle el suministro en el período siguiente".						

CUMBRE		ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (Entrega inicial o periódica establecida por ley)			CODIGO	CUM 003_01
					VERSION	0
					FECHA	20/08/2021
DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO						
NOMBRE	Bladimir Flan Lopez		AREA	181000 - Obo		
CARGO	Oficial		CEDULA	1123.141.385		
COMPROMISO DEL TRABAJADOR						
Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación y los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud y seguridad en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.						
DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS						
ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP LEGAL (Entrega inicial o periódica establecida por la ley)				FIRMA RECIBIDO ENTREGA		
ITEM	DOTACIÓN O EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	TALLA	ENTREGA 1	ENTREGA 2	ENTREGA 3
1	Camisa: chageta	1	M	Bladimir Flan		
2	Pantalón	1	30			
3	Casco con Barbujero	1	-			
4	Gantes Lanza	1	-			
5	Bota	1	38			
DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS						
ENTREGA 1	NOMBRE	Estanislao	CARGO	Reservista Obo	FIRMA	
ENTREGA 2	NOMBRE		CARGO		FIRMA	
ENTREGA 3	NOMBRE		CARGO		FIRMA	
NOTA						
La compañía cumple con la normatividad legal del C.S.T. numeral 230 donde contempla "Todo empleador que habitualmente ocupa uno: (1) o más trabajadores permanentes, deberá suministrar cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, un (1) par de zapatos y un (1) vestido de labor al trabajador, cuya remuneración mensual sea hasta dos (2) veces el salario mínimo más alto vigente. Tiene derecho a esta prestación el trabajador que en las fechas de entrega de calzado y vestido haya cumplido más de tres (3) meses al servicio del empleador". Teniendo en cuenta lo anterior según lo contemplado en el numeral 233 del C.S.T. "El trabajador queda obligado a destinar a su uso en las labores contratadas el calzado y vestido que le suministre el empleador, y en el caso de que así no lo hiciera éste quedará eximido de hacerlo el suministrado en el periodo siguiente".						

[illegible]

211

142

[illegible]



INSPECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Codigo

CUM_003_18

Version

0

Fecha

24/08/2021

FECHA: 05 / 08 / 2021

OBRA INSPECCIONADA:

INSPECCIONADO POR:

Marque con X el estado

S = Satisfactorio

D = Deficiente

A = Ausente

NA = No Aplica

Descripción existente en obra:

Compresor

Demarcación y Señalización de área (s) de trabajo.

Correas - engranajes - poleas - ejes.

Ajuste - limpieza.

Conexiones eléctricas (a tierra).

Sistema mecánico.

Tableros de control.

Condiciones de almacenamiento.

Estado general.

Descripción existente en obra:

Pisas - Barras

Estado en que se encuentra.

Condiciones de almacenamiento.

Pisas de seguridad.

Estado de llantas (carretillas).

Estado de puntas (Barras - Pisas).

Estado general.

Descripción existente en obra:

Pintura

Señalización e identificación con nombre

NFPA.

(Se encuentra almacenado sobre estibas o cajas de madera?)

Almacenados de acuerdo a su composición química.

Compresores.

Mangueras y cilindros de gas.

Baños

Campamento

Almacén

Almacenamiento de tuberías

Orden y limpieza de los puestos de trabajo.

Enfermería.

Botiquines.

Hojas de Seguridad.

Cerrillas.

Equipos Extinción.

(Se tienen en uso los equipos?)

El personal cuenta con Dotación?

Casco de seguridad (certificado).

Gafas de seguridad.

Protectores auditivos.

Protector respiratorio desechables.

Mascarilla respiratoria con Filtros

Botas de seguridad (punta de acero).

Guantes

A. AMBIENTAL

Disposición final productos químicos.

Almacenamiento de resto de tubería.

ILUMINACIÓN

(Hay presencia de iluminación natural y/o artificial suficiente en el área de trabajo?)

(Se encuentran las luminarias limpias y en buen estado?)

TOXICIDAD QUÍMICA

(Hay presencia de gases, vapores, material particulado o humo de cigarrillo?)

(Se encuentran visibles en (s) hoja (s) de seguridad de los productos?)

212

145



INSPECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Codigo

CUM_003_18

Version

0

Fecha

24/08/2021

FECHA: 24 / 08 / 2021

OBRA INSPECCIONADA: _____

INSPECCIONADO POR: _____

Marque con X el estado	S = Satisfactorio	D = Deficiente	A = Ausente	NA = No Aplica
Estado de las tijeras o cadenas	X			
Estado de los peldaños	X			
Estado de los anclajes	X			
Estado de los remaches en las juntas	X			
Estado general	X			
Estado de la escalera	X			
Estado de las cruces	X			
Estado de las buedas	X			
Estado de los pines	X			
Estado de los planchones	X			
Estado general	X			

Firma Quien Realizó Inspección

Residente Obra



INSPECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Código
Version
Fecha

CUM_003_18
0
24/08/2021

FECHA: 22/12/2021

OBRA INSPECCIONADA: Contrato 1036-2021

INSPECCIONADO POR: Estanislao Eslava

Marque con X el estado	S = Satisfactorio	D = Deficiente	A = Ausente	NA = No Aplica
Descripción existente en obra: Vehículo tipo Furgon UPR619				
Demarcación y Señalización de área (s) de trabajo.				
Cables - engranajes - poleas - ejes.	X			
Ajuste - limpieza.	X			
Conectores eléctricos (a tierra).	X			
Sistema mecánico.	X			
Tableros de control.	X			
Condiciones de almacenamiento.	X			
Estado general.	X			
Descripción existente en obra: Pólo cables - fijas				
Estado en que se encuentra.	X			
Condiciones de almacenamiento.	X			
Planes de seguridad.				
Estado de flautas (carretillas)				
Estado de puentes (Barras - Pisas)	X			
Estado general.	X			
Descripción existente en obra: Venturos - solvente				
Señalización e identificación con rumbo NFPA.	X			
¿Se encuentra almacenado sobre estibas o cajones de madera?	X			
Almacenados de acuerdo a su composición química.	X			
Comprobadores.	X			
Mangueras y cilindros de gas.				

Resident Ob



INSPECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

CUM_003_18

0

24/08/2021

FECHA: dd / mm / aaaa

OBRA INSPECCIONADA:

INSPECCIONADO POR:

Marque con X el estado	S = Satisfactorio	D = Deficiente	A = Ausente	NA = No Aplica
Baños				
Campamento				
Almacén				
Almacenamiento de Tuberías				
Orden y limpieza de los puestos de trabajo.				
Enfermería.				
Botiquines.				
Hojas de Seguridad.				
Camillas.				
Equipos Extinción.				
El personal cuenta con Dotación?				
Casco de seguridad (certificado).				
Gafas de seguridad.				
Protectores auditivos.				
Protector respiratorio desechables.				
Mascarilla respiratoria con Filtros				
Botas de seguridad (punta de acero).				
Guantes				
Disposición final productos químicos.				
Almacenamiento de retal de tubería.				
¿Hay presencia de iluminación natural y/o artificial suficiente en el área de trabajo?				
¿Se encuentran las luminarias limpias y en buen estado?				



INSPECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

CUM_003_18

0

24/08/2021

FECHA: 22/08/2021

OBRA INSPECCIONADA: Cantón 1036-2021

INSPECCIONADO POR: Estanislao Escalero

Marque con X el estado	S = Satisfactorio	D = Deficiente	A = Ausente	NA = No Aplica
¿Hay presencia de gases, vapores, material particulado o humo de cigarrillo?	X			
¿Se encuentran visibles la (s) hoja (s) de seguridad de los productos?	X			
Estado de las uñeras o cadenas	X			
Estado de los peldaños	X			
Estado de los antiderrizantes	X			
Estado de los remaches en las juntas	X			
Estado general.	X			
Estado de la escalera	X			
Estado de las cruces	X			
Estado de las Ruedas	X			
Estado de los pines	X			
Estado de los planchones	X			
Estado general.	X			

Firma Quien Realizó Inspección

Res. Ob.



INSPECCIÓN DE MAQUINARIA PESADA

CÓDIGO CUM_002_02
VERSIÓN 0
FECHA 18/08/2021

Fecha de Inspección: NA

Equipo a inspeccionar: NA

Interno: _____

Nombre operador: NA

Firma: _____

Nombre de quién realiza la inspección: _____

Firma: _____

Marque con una equis (X) según corresponda: SAT: SATISFACTORIO INS: INSATISFACTORIO N/A: NO APLICA

DESDE EL SUELO

	SAT	INS	N/A
Cucharón (Desgaste en exceso, daños, fisuras)			
Cuchilla (Desgaste en exceso, daños)			
Cilindros (Desgaste en exceso, daños, fugas)			
Brazo (Daños, fisuras)			
Pluma, cilindros (Desgaste, daños, fugas)			
Debajo de la máquina (Fugas, daños)			
Luces delanteras y traseras (funcionamiento, daños, limpieza)			
Peldaños, agarraderas, pasarelas (Condición, limpieza)			
Bastidor (Fisuras, daños)			
Tren de rodaje-Oruga (Desgaste, daños, tensión)			
Llantas (Desgastes, daños)			
Ejes - Mandos finales (Fugas, daños, desgastes)			
Compartimiento de la batería (Limpieza, tuercas y pernos flojos)			

COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

	SAT	INS	N/A
Niveles de fluidos (Aceites, refrigerante)			
Mangueras (Fisuras, marcas de desgaste, fugas)			
Correas (Tensión, desgaste, fisuras)			
Compartimiento del motor en general (Acumulación de residuos o tierra, fugas)			

EN LA MÁQUINA, FUERA DE LA CABINA

	SAT	INS	N/A
Parabrisas, ventanas (Vidrios rotos, limpieza)			
Limpaparabrisas (Desgastes, daños, nivel de fluido)			
Tanque de combustible (Daños, fugas, cuenta con tapa)			
Tanque de aceite hidráulico (Daños, fugas)			
Extintor (Carga, daños)			
Botiquín (Dotación)			
Escaleras (Daños, funcionamiento)			
Espejos (Daños)			
Puertas (Abren apropiadamente, estado de los vidrios)			
Cabina ROPS/FOPS (Daños, pernos de montaje flojos)			

DENTRO DE LA CABINA

	SAT	INS	N/A
Asiento (Ajuste, estado)			
Cinturón de seguridad (Daños, desgaste, ajuste)			
Alarma de retroceso (Funcionamiento correcto)			
Luces (Funcionamiento correcto)			
Bocina-Pito (Funcionamiento correcto)			
Aire acondicionado (Funcionamiento correcto)			
Interior de la cabina en general (Limpieza, no se almacenan combustibles)			

Hallazgo	Responsable	Acciones/Medidas Correctivas Tomadas	Fecha Corrección

214

150



CONSOLIDADO ENTREGA DOTACION Y EPP

CODIGO VERSION FECHA
0 26/01/2021


El trabajador conoce el uso adecuado del elemento de protección personal y los cuidados que se le deben dar.

AREA / CONTRATISTA: **CUMBRE INGENIERIA S.A.S**

ID	Nro. Cedula	NOMBRE	CARGO	FECHA	TIPO DOTACION				TIPO EPP				FIRMA
					Camisa	Pantalon	Botas	Otro	Tapa oído	Guantes	Casco	Gafas	
1	9706559	Francisco Monago	Asistente	11/11/21	X	X	X	X			X		Francisco Monago
2	97187580	Osman Orlando Lago	Supervisor	11/11/21	X	X	X	X			X		Osman Lago
3	5770589	Felix Ortega Quiroga	Asistente	19/11/21	X	X	X	X			X		Felix Ortega
4	110237112	Brayan A. A.	Asistente	19/11/21	X	X	X	X			X		Brayan A.
5	9706257	Camilo Acosta Monroy	Asistente	19/11/21	X	X	X	X			X		Camilo Acosta
6	112311135	Blasimir Flores	Oficial	11/11/21	X	X	X	X			X		Blasimir Flores
7	10702561	Orlando Tejada Carrero	Asistente	19/11/21	X	X	X	X			X		Orlando Tejada
8	7186864	Daniel Suarez	Asistente	21/12/21	X	X	X	X			X		Daniel Suarez
9	1099640738	Osair Suarez	Asistente	21/12/21	X	X	X	X			X		Osair Suarez
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													

RESPONSABLE:
[Signature]
Residente Obra

	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO		CODIGO	CUM_002_07	
	CONTRATO DE OBRA No. 1036 DE 2021 SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACION DE TRANSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA		VERSION	0	
			FECHA	15/11/2021	
LUGAR: <u>Glacieta Maldonado (Hugolino)</u> FECHA: <u>19/NOV/2021</u> NOMBRE DEL PROFESIONAL: <u>Estanislao Eslaya M</u> AREA: AMBIENTAL ☒ SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRAB ☐ TEMA: _____ HORA DE INICIO: <u>8:00 PM</u> HORA DE TERMINACION: <u>9:00 PM</u> TIPO INDUCCION ☒ CAPACITACION ☐ SENSIBILIZACION ☐ ENTRENAMIENTO ☐ OTRO ☐					
No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	ENTIDAD DEPENDENCIA	FIRMA
1	Francisco Malagon	7176.559	Asistente	CUMBRE	Francisco Malagon
2	Osman Oviedo Rezo	7187.580	Supervisor	"	Osman Oviedo
3	Felix Alberto Ortega	6770.589	Asistente	"	Felix Ortega
4	Bryan Alexander Pilo	1002.367.112	Asistente	"	Bryan A.
5	Camilo Andres Moron	7183.657	Asistente	"	Camilo M.
6	Blasimir Flores Lopez	1123.111.385	Defensor	"	Blasimir Flores
7	Orlando Paredes Campa	80787.591	Asistente	"	Orlando Paredes
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
OBSERVACION:			FIRMA:  C.C. <u>47208079</u> <u>Residente Obra</u>		

	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO		CODIGO	CUM_002_07	
	CONTRATO DE OBRA No. 1036 DE 2021 SEÑALIZACION Y DEMARCAION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACION DE TRANSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA		VERSION	0	
			FECHA	15/11/2021	
LUGAR: <u>Carrera 7 calle 20</u> FECHA: <u>27/Nov/2021</u> NOMBRE DEL PROFESIONAL: <u>Estanislao Esbaya</u> AREA: AMBIENTAL ☐ SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ☒ TEMA: _____ HORA DE INICIO: <u>8:00 PM</u> HORA DE TERMINACION: <u>9:00 PM</u> TIPO INDUCCION ☒ CAPACITACION ☒ SENSIBILIZACION ☐ ENTRENAMIENTO ☐ OTRO ☐					
No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	ENTIDAD DEPENDENCIA	FIRMA
1	Francisco Malagon	7176.559	Asistente	Cumbre	Francisco Malagon
2	Osman Oviedo Raza	7187.580	Supervisor	"	Osman Oviedo
3	Felix Alberto Ortega	61770.589	Asistente	"	Felix Ortega
4	Brayan Avila	11002.362112	Asistente	"	Brayan A.
5	Camilo Andres Henao	71183.657	Asistente	"	Camilo H.
6	Blasdimir Flores	1123.101.385	Asistente	"	Blasdimir Flores
7	Orlando Genib Compa	801762.581	Asistente	"	Orlando Rb/11a
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
OBSERVACION:			FIRMA:  C.C. <u>41208039</u>		



REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

CODIGO

CUM_002_07

VERSION

0

FECHA

15/11/2021

CONTRATO DE OBRA No. 1036 DE 2021
SEÑALIZACION Y DEMARCAACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO
DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

LUGAR:

Calle 19 Cra 11

FECHA:

10/Dic/2021

NOMBRE DEL PROFESIONAL

Estanislao Estani

AREA:

AMBIENTAL ☐SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ☒

TEMA:

General

HORA DE INICIO:

8:00 AM

HORA DE TERMINACIÓN:

9:00 AM

TIPO

INDUCCIÓN



CAPACITACIÓN



SENSIBILIZACIÓN



ENTRENAMIENTO



OTRO



No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	ENTIDAD DEPENDENCIA	FIRMA
1	Daniel Leonardo Suarez	7186884	Ayudante	Abraham P.	Daniel Suarez
2	Oscar Andres Sampedo	104940738	Ayudante	Abraham P.	Oscar S.
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

OBSERVACIÓN:

FIRMA:











C.C.


4208079

	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CODIGO VERSION FECHA	CUM 003 02 0 FECHA: 10/11/2021
	CONTRATO DE OBRA N°1036 DE 2021, "SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA".			
	NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA INDUCCIÓN FRANCISCO MALAGON		CEDULA 7'176.559	
CARGO Ayudante				
Modalidad de vinculación ☒ Obra/Labor ☐ Prestación de servicios ☐ Contratista ☐ Otro				
FECHA DE INDUCCIÓN 26/NOV/2021				
Cada una de las inducciones se relaciona con los diferentes temas que deben ser conocidos por el trabajador que ingresa mostrando la responsabilidad y el entendimiento de cada una de las temáticas en el momento en que es firmado y como proceso de re inducción una vez se encuentre vinculado con la empresa. Por favor marque con X, las casillas que sean socializadas al personal, según corresponda:				
INDUCCIÓN GENERAL				
☒ Presentación general de la empresa ☒ Historia y Cultura Organizacional ☒ Estructura Organizacional ☒ Misión ☒ Visión ☒ Principios y Valores		☒ Reglamento Interno de Trabajo ☒ Salario ☒ Vacaciones ☒ Cesantías ☒ Prima legal ☒ Permisos		
Firma del trabajador / cc 7'176.559		Nombre y firma del profesional asignado/ cc		
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
De acuerdo con el SG-SST vigente, señale los riesgos principales a los que estará expuesto el Trabajador.				
☒ Reglamento de higiene y seguridad industrial ☒ COPASST ☒ Comité de convivencia laboral ☒ Reporte de Accidente de trabajo / Incidente de trabajo		☒ Sistema de gestión de seguridad y Salud en el trabajo ☒ Accidente y Enfermedad Laboral ☒ Factores de riesgos a los que va a estar expuesto ☒ Uso de elementos de protección personal ☒ Protocolo de bioseguridad y riesgos frente al Covid-19		
Firma del trabajador / cc 7'176.559		Nombre y firma del responsable de SST		
PLAN DE EMERGENCIA				
☒ Plan de evacuación ☒ Prevención y control de incendios ☒ Primeros auxilios		☒ Punto de encuentro ☒ Brigada de emergencias ☒ Alarma de emergencia		
Firma del trabajador / cc 7'176.559		Nombre y firma del responsable de SST		
INDUCCIÓN ESPECIFICA EN EL PUESTO DE TRABAJO				
☒ Funciones del cargo ☒ Responsabilidades del cargo		☒ Procedimientos del SGSST en los cuales se enmarca el trabajo a realizar ☒ Presentación de Compañeros		
Firma del trabajador / cc 7'176.559		Nombre y firma del profesional asignado/ cc		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO				
☒ Duración del proyecto ☒ Tramos a intervenir		☒ Obras proyectadas		
Firma del trabajador / cc 7'176.559		Nombre y firma del profesional asignado/ cc		
PRESENTACION DEL PAGO O MANUAL DE MANEJO AMBIENTAL				
☒ Programas de Manejo Ambiental ☒ Seguimiento a las actividades constructivas		☐ Medidas de manejo de materiales de construcción ☐ Política Ambiental ☒ Señalización		
Firma del trabajador / cc		Nombre y firma del profesional asignado/ cc		
PARA DILIGENCIAR POR EL EMPLEADO				
Dejo constancia que he recibido y entendido los temas anteriormente descritos y me comprometo a participar y cumplir con las normas, reglamentos, políticas, sistema de gestión, y demás aspectos exigidos por la empresa.				
FIRMA TRABAJADOR: FRANCISCO MALAGON				

215





155

	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CODIGO CU31 003 02
			VERSION 0
			FECHA 10/11/2021
CONTRATO DE OBRA N°1036 DE 2021, "SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA".			
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA INDUCCIÓN Osmani Gilberto Cuello		CEDULA 7187.580	
CARGO Supervisor			
Modalidad de vinculación ☒ Obra/Labor ☐ Prestación de servicios ☐ Contratista ☐ Otro			
FECHA DE INDUCCIÓN 20/Nov/2021			
Cada una de las inducciones se relaciona con los diferentes temas que deben ser conocidos por el trabajador que ingresa mostrando la responsabilidad y el entendimiento de cada una de las temáticas en el momento en que es firmado y como proceso de re-inducción una vez se encuentre vinculado con la empresa. Por favor marque con X, las casillas que sean socializadas al personal, según corresponda:			
INDUCCIÓN GENERAL			
☒ Presentación general de la empresa ☒ Historia y Cultura Organizacional ☒ Estructura Organizacional ☒ Misión ☒ Visión ☒ Principios y Valores		☒ Reglamento Interno de Trabajo ☒ Salario ☒ Vacaciones ☒ Cesantías ☒ Prima legal ☒ Permisos	
Firma del trabajador / cc 		Nombre y firma del profesional asignado/ cc 	
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
De acuerdo con el SG-SST vigente, señale los riesgos principales a los que estará expuesto el Trabajador. ☒ Reglamento de higiene y seguridad industrial ☒ COPASST ☒ Comité de convivencia laboral ☒ Reporte de Accidente de trabajo / Incidente de trabajo		☒ Sistema de gestión de seguridad y Salud en el trabajo ☒ Accidente y Enfermedad Laboral ☒ Factores de riesgos a los que va a estar expuesto ☒ Uso de elementos de protección personal ☒ Protocolo de bioseguridad y riesgos frente al Covid-19	
Firma del trabajador / cc 		Nombre y firma del responsable de SST 	
PLAN DE EMERGENCIA			
☒ Plan de evacuación ☒ Prevención y control de incendios ☒ Primeros auxilios		☒ Punto de encuentro ☒ Brigada de emergencias ☒ Alarma de emergencia	
Firma del trabajador / cc 		Nombre y firma del responsable de SST 	
INDUCCIÓN ESPECÍFICA EN EL PUESTO DE TRABAJO			
☒ Funciones del cargo ☒ Responsabilidades del cargo		☒ Procedimientos del SGSST en los cuales se enmarca el trabajo a realizar ☒ Presentación de Compañeros	
Firma del trabajador / cc 		Nombre y firma del profesional asignado/ cc 	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO			
☒ Duración del proyecto ☒ Tramos a intervenir		☒ Obras proyectadas	
Firma del trabajador / cc 		Nombre y firma del profesional asignado/ cc 	
PRESENTACIÓN DEL PAGO O MANUAL DE MANEJO AMBIENTAL			
☒ Programas de Manejo Ambiental ☒ Seguimiento a las actividades constructivas		☒ Medidas de manejo de materiales de construcción ☒ Política Ambiental ☒ Señalización	
Firma del trabajador / cc 		Nombre y firma del profesional asignado/ cc 	
PARA DILIGENCIAR POR EL EMPLEADO			
Dejo constancia que he recibido y entendido los temas anteriormente descritos y me comprometo a participar y cumplir con las normas, reglamentos, políticas, sistema de gestión, y demás aspectos exigidos por la empresa.			
FIRMA TRABAJADOR: 			

	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CODIGO VERSION FECHA	CUM 003 02 9 FECHA: 10/11/2021
	CONTRATO DE OBRA N°1034 DE 2021, "SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA".			
	NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA INDUCCIÓN Felix Alberto Ortega		CEDULA 6770.589	
CARGO: Ayudante				
Modalidad de vinculación ☒ Obra/Labor ☐ Prestación de servicios ☐ Contratista ☐ Otro				
FECHA DE INDUCCIÓN 20/NOV/2021				
Cada una de las inducciones se relaciona con los diferentes temas que deben ser conocidos por el trabajador que ingresa mostrando la responsabilidad y el entendimiento de cada una de las temáticas en el momento en que es firmado y como proceso de re inducción una vez se encuentre vinculado con la empresa. Por favor marque con X, las casillas que sean socializadas al personal, según corresponda:				
INDUCCIÓN GENERAL				
☒ Presentación general de la empresa ☒ Historia y Cultura Organizacional ☒ Estructura Organizacional ☒ Misión ☒ Visión ☒ Principios y Valores		☒ Reglamento Interno de Trabajo ☒ Salario ☒ Vacaciones ☒ Cesantías ☒ Prima legal ☒ Permisos		
Felix Ortega Firma del trabajador / cc 6770589		 Estanislao Flax Nombre y firma del profesional asignado/ cc		
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
De acuerdo con el SG-SST vigente, señale los riesgos principales a los que estará expuesto el Trabajador.				
☒ Reglamento de higiene y seguridad industrial ☒ COPASST ☒ Comité de convivencia laboral ☒ Reporte de Accidente de trabajo / Incidente de trabajo		☒ Sistema de gestión de seguridad y Salud en el trabajo ☒ Accidente y Enfermedad Laboral ☒ Factores de riesgos a los que va a estar expuesto ☒ Uso de elementos de protección personal ☒ Protocolo de bioseguridad y riesgos frente al Covid-19		
Felix Ortega Firma del trabajador / cc 6770589		 Estanislao Flax Nombre y firma del responsable de SST		
PLAN DE EMERGENCIA				
☒ Plan de evacuación ☒ Prevención y control de incendios ☒ Primeros auxilios		☒ Punto de encuentro ☒ Brigada de emergencias ☒ Alarma de emergencia		
Felix Ortega Firma del trabajador / cc 6770589		 Estanislao Flax Nombre y firma del responsable de SST		
INDUCCIÓN ESPECIFICA EN EL PUESTO DE TRABAJO				
☒ Funciones del cargo ☒ Responsabilidades del cargo		☒ Procedimientos del SG-SST en los cuales se ampara el trabajo a realizar ☒ Presentación de Computero		
Felix Ortega Firma del trabajador / cc 6770589		 Estanislao Flax Nombre y firma del profesional asignado/ cc		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO				
☒ Duración del proyecto ☒ Tramos a intervenir		☒ Obras proyectadas		
Felix Ortega Firma del trabajador / cc		 Estanislao Flax Nombre y firma del profesional asignado/ cc		
PRESENTACIÓN DEL PAGA O MANUAL DE MANEJO AMBIENTAL				
☒ Programas de Manejo Ambiental ☒ Seguimiento a las actividades constructivas		☒ Medidas de manejo de materiales de construcción ☒ Política Ambiental ☒ Señalización		
Felix Ortega Firma del trabajador / cc		 Estanislao Flax Nombre y firma del profesional asignado/ cc		
PARA DILIGENCIAR POR EL EMPLEADO				
Dejo constancia que he recibido y entendido los temas anteriormente descritos y me comprometo a participar y cumplir con las normas, reglamentos, políticas, sistema de gestión, y demás aspectos exigidos por la empresa.				
FIRMA TRABAJADOR: Felix Ortega				

217

157

	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CODIGO VERSION FECHA	CUMI 003 02 0 FECHA: 10/11/2021
	CONTRATO DE OBRA N°1036 DE 2021, "SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA".			
	NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA INDUCCIÓN Drayon Alexander Ayala		CÉDULA 1'002.367.117	
CARGO: Ayudante				
Modalidad de vinculación ☒ Obra/labor ☐ Prestación de servicios ☐ Contratista ☐ Otro				
FECHA DE INDUCCIÓN 20/Nov/2021				
Cada una de las inducciones se relaciona con los diferentes temas que deben ser conocidos por el trabajador que ingresa mostrando la responsabilidad y el entendimiento de cada una de las temáticas en el momento en que es firmado y como proceso de re inducción una vez se encuentre vinculado con la empresa. Por favor marque con X, las casillas que sean socializadas al personal, según corresponda:				
INDUCCIÓN GENERAL				
☒ Presentación general de la empresa ☒ Historia y Cultura Organizacional ☒ Estructura Organizacional ☒ Misión ☒ Visión ☒ Principios y Valores		☒ Reglamento Interno de Trabajo ☒ Salario ☒ Vacaciones ☒ Cesantías ☒ Prima legal ☒ Permisos		
Firma del trabajador / cc Drayon A. 1002.367.117		Nombre y firma del profesional asignado/ cc 		
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
De acuerdo con el SO-SST vigente, señale los riesgos cruciales a los que estará expuesto el trabajador.				
☒ Reglamento de higiene y seguridad industrial ☒ COPASST ☒ Comité de convivencia laboral ☒ Reporte de Accidente de trabajo / Incidente de trabajo		☒ Sistema de gestión de seguridad y Salud en el trabajo ☒ Accidente y Enfermedad Laboral ☒ Factores de riesgos a los que va a estar expuesto ☒ Uso de elementos de protección personal ☒ Protocolo de bioseguridad y riesgos frente al Covid-19		
Firma del trabajador / cc Drayon A. 1002.367.117		Nombre y firma del responsable de SST 		
PLAN DE EMERGENCIA				
☒ Plan de evacuación ☒ Prevención y control de incendios ☒ Primeros auxilios		☒ Punto de encuentro ☒ Brigada de emergencias ☒ Alarma de emergencia		
Firma del trabajador / cc Drayon A. 1002.367.117		Nombre y firma del responsable de SST 		
INDUCCIÓN ESPECÍFICA EN EL PUESTO DE TRABAJO				
☒ Funciones del cargo ☒ Responsabilidades del cargo		☒ Procedimientos del SGSST en los cuales se enmarca el trabajo a realizar ☒ Presentación de Compañeros		
Firma del trabajador / cc Drayon A. 1002.367.117		Nombre y firma del profesional asignado/ cc 		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO				
☒ Duración del proyecto ☒ Tramos a intervenir		☒ Obras proyectadas		
Firma del trabajador / cc Drayon A. 1002.367.117		Nombre y firma del profesional asignado/ cc 		
PRESENTACIÓN DEL PAGA O MANUAL DE MANEJO AMBIENTAL				
☒ Programas de Manejo Ambiental ☒ Seguimiento a las actividades constructivas		☒ Medidas de manejo de materiales de construcción ☒ Política Ambiental ☒ Señalización		
Firma del trabajador / cc Drayon A. 1002.367.117		Nombre y firma del profesional asignado/ cc 		
PARA DILIGENCIAR POR EL EMPLEADO				
Dejo constancia que he recibido y entendido los temas anteriormente descritos y me comprometo a participar y cumplir con las normas, reglamentos, políticas, sistema de gestión, y demás aspectos exigidos por la empresa.				
FIRMA TRABAJADOR: Drayon A.				

	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CODIGO VERSION FECHA	CUM 003 02 0 FECHA: 10/11/2021
	CONTRATO DE OBRA N°1034 DE 2021, "SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA".			
	NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA INDUCCIÓN Camilo Andres Monroy		CEDULA 7'183.657	
CARGO: Ayudante				
Modalidad de vinculación ☒ Obra/labor ☐ Prestación de servicios ☐ Contratista ☐ Otro				
FECHA DE INDUCCIÓN 02/Nov/2021				
Cada una de las inducciones se relaciona con los diferentes temas que deben ser conocidos por el trabajador que ingresa mostrando la responsabilidad y el entendimiento de cada una de las temáticas en el momento en que es firmado y como proceso de re inducción una vez se encuentre vinculado con la empresa. Por favor marque con X, las casillas que sean socializadas al personal, según corresponda:				
INDUCCIÓN GENERAL				
☒ Presentación general de la empresa ☒ Historia y Cultura Organizacional ☒ Estructura Organizacional ☒ Misión ☒ Visión ☒ Principios y Valores		☒ Reglamento Interno de Trabajo ☒ Salario ☒ Vacaciones ☒ Cesantías ☒ Prima legal ☒ Permisos		
Firma del trabajador / cc 7'183.657		Nombre y firma del profesional asignado/ cc Estenislao Eslova		
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
De acuerdo con el SG-SST vigente, señale los riesgos principales a los que estará expuesto el Trabajador.				
☒ Reglamento de higiene y seguridad industrial ☒ COPASST ☒ Comité de convivencia laboral ☒ Reporte de Accidente de trabajo / Incidente de trabajo		☒ Sistema de gestión de seguridad y Salud en el trabajo ☒ Accidente y Enfermedad Laboral ☒ Factores de riesgos a los que va a estar expuesto ☒ Uso de elementos de protección personal ☒ Protocolo de bioseguridad y riesgos frente al Covid-19		
Firma del trabajador / cc 7'183.657		Nombre y firma del responsable de SST		
PLAN DE EMERGENCIA				
☒ Plan de evacuación ☒ Prevención y control de incendios ☒ Primeros auxilios		☒ Punto de encuentro ☒ Brigada de emergencias ☒ Alarma de emergencia		
Firma del trabajador / cc 7'183.657		Nombre y firma del responsable de SST		
INDUCCIÓN ESPECÍFICA EN EL PUESTO DE TRABAJO				
☒ Funciones del cargo ☒ Responsabilidades del cargo		☒ Procedimientos del SGSST en los cuales se enmarca el trabajo a realizar ☒ Presentación de Compañero		
Firma del trabajador / cc 7'183.657		Nombre y firma del profesional asignado/ cc		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO				
☒ Duración del proyecto ☒ Trámites e Intervenciones		☒ Obras proyectadas		
Firma del trabajador / cc 7'183.657		Nombre y firma del profesional asignado/ cc		
PRESENTACION DEL PAGA O MANUAL DE MANEJO AMBIENTAL				
☒ Programas de Manejo Ambiental ☒ Seguimiento a las actividades constructivas		☒ Medidas de manejo de materiales de construcción ☒ Política Ambiental ☒ Señalización		
Firma del trabajador / cc 7'183.657		Nombre y firma del profesional asignado/ cc		
PARA DILIGENCIAR POR EL EMPLEADO				
Dejo constancia que he recibido y entendido los temas anteriormente descritos y me comprometo a participar y cumplir con las normas, reglamentos, políticas, sistema de gestión, y demás aspectos exigidos por la empresa.				
FIRMA TRABAJADOR: Camilo Andres Monroy				

219

159

	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CODIGO VERSION FECHA	CUM 003 02 0 FECHA: 18/11/2021
	CONTRATO DE OBRA N° 1836 DE 2021, SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TURJA.			
	NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA INDUCCIÓN Bladimir Flores Lopez		CEDULA 1'123.141.385	
CARGO: Oficia				
Modalidad de vinculación ☒ Obra/labor ☐ Prestación de servicios ☐ Contratista ☐ Otro				
FECHA DE INDUCCIÓN 20/NOV/2021				
Cada una de las inducciones se relaciona con los diferentes temas que deben ser conocidos por el trabajador que ingresa mostrando la responsabilidad y el entendimiento de cada una de las temáticas en el momento en que es firmado y como proceso de re inducción una vez se encuentre vinculado con la empresa. Por favor marque con X, las casillas que sean socializadas al personal, según corresponda:				
INDUCCIÓN GENERAL				
☒ Presentación general de la empresa ☒ Historia y Cultura Organizacional ☒ Estructura Organizacional ☒ Misión ☒ Visión ☒ Principios y Valores		☒ Reglamento Interno de Trabajo ☒ Salario ☒ Vacaciones ☒ Cesantías ☒ Prima legal ☒ Permisos		
Firma del trabajador / cc Bladimir Flores 1'123.141.385		Nombre y firma del profesional asignado/ cc Esteban Esteban Esteban		
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
De acuerdo con el SG-SST vigente, señale los riesgos cruciales a los que estará expuesto el trabajador.				
☒ Reglamento de higiene y seguridad industrial ☒ COPASST ☒ Comité de convivencia laboral ☒ Reporte de Accidente de trabajo / Incidente de trabajo		☒ Sistema de gestión de seguridad y Salud en el trabajo ☒ Accidente y Enfermedad Laboral ☒ Factores de riesgos a los que va a estar expuesto ☒ Uso de elementos de protección personal ☒ Protocolo de bioseguridad y riesgos frente al Covid-19		
Firma del trabajador / cc Bladimir Flores		Nombre y firma del responsable de SST Esteban Esteban		
PLAN DE EMERGENCIA				
☒ Plan de evacuación ☒ Prevención y control de incendios ☒ Primeros auxilios		☒ Punto de encuentro ☒ Brigada de emergencias ☒ Alarma de emergencia		
Firma del trabajador / cc Bladimir Flores		Nombre y firma del responsable de SST Esteban Esteban		
INDUCCIÓN ESPECÍFICA EN EL PUESTO DE TRABAJO				
☒ Funciones del cargo ☒ Responsabilidades del cargo		☒ Procedimientos del SG-SST en los cuales se enmarca el trabajo a realizar ☒ Presentación de Compañeros		
Firma del trabajador / cc Bladimir Flores		Nombre y firma del profesional asignado/ cc Esteban Esteban		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO				
☒ Duración del proyecto ☒ Tramos a intervenir		☒ Obras proyectadas		
Firma del trabajador / cc Bladimir Flores		Nombre y firma del profesional asignado/ cc Esteban Esteban		
PRESENTACIÓN DEL PAGA O MANUAL DE MANEJO AMBIENTAL				
☒ Programas de Manejo Ambiental ☒ Seguimiento a las actividades constructivas		☒ Medidas de manejo de materiales de construcción ☒ Política Ambiental ☒ Señalización		
Firma del trabajador / cc Bladimir Flores		Nombre y firma del profesional asignado/ cc Esteban Esteban		
PARA DILIGENCIAR POR EL EMPLEADO				
Dejo constancia que he recibido y entendido los temas anteriormente descritos y me comprometo a participar y cumplir con las normas, reglamentos, políticas, sistema de gestión, y demás aspectos exigidos por la empresa.				
FIRMA TRABAJADOR: Bladimir Flores				

220

160

	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CODIGO VERSION FECHA	CLN 003 02 0 FECHA: 10/11/2021
	CONTRATO DE OBRA N°1036 DE 2021, "SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA".			
	NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA INDUCCIÓN Orlando Padilla Campa		CEBULA 80762.581	
CARGO: Ayudante				
Modalidad de vinculación ☒ Obra/Labor ☐ Prestación de servicios ☐ Contratista ☐ Otro				
FECHA DE INDUCCIÓN 20/NOV/2021				
Cada una de las inducciones se relaciona con los diferentes temas que deben ser conocidos por el trabajador que ingresa mostrando la responsabilidad y el entendimiento de cada una de las temáticas en el momento en que es firmado y como proceso de re inducción una vez se encuentre vinculado con la empresa. Por favor marque con X, las casillas que sean socializadas al personal, según corresponda:				
INDUCCIÓN GENERAL				
☒ Presentación general de la empresa ☒ Historia y Cultura Organizacional ☒ Estructura Organizacional ☒ Misión ☒ Visión ☒ Principios y Valores		☒ Reglamento Interno de Trabajo ☒ Salario ☒ Vacaciones ☒ Cesantías ☒ Prima legal ☒ Permisos		
Orlando Padilla Firma del trabajador / cc		Esteban Esquivel Nombre y firma del profesional asignado/ cc		
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
De acuerdo con el SG-SST vigente, señale los riesgos principales a los que estará expuesto el trabajador.				
☒ Reglamento de higiene y seguridad industrial ☒ COPASST ☒ Comité de convivencia laboral ☒ Reporte de Accidente de trabajo / Incidente de trabajo		☐ Sistema de gestión de seguridad y Salud en el trabajo ☐ Accidente y Enfermedad Laboral ☐ Factores de riesgos a los que va a estar expuesto ☒ Uso de elementos de protección personal ☒ Protocolo de bioseguridad y riesgos frente al Covid-19		
Orlando Padilla Firma del trabajador / cc		Esteban Esquivel Nombre y firma del responsable de SST		
PLAN DE EMERGENCIA				
☒ Plan de evacuación ☒ Prevención y control de incendios ☒ Primeros auxilios		☒ Punto de encuentro ☒ Brigada de emergencias ☒ Alarma de emergencia		
Orlando Padilla Firma del trabajador / cc		Esteban Esquivel Nombre y firma del responsable de SST		
INDUCCIÓN ESPECÍFICA EN EL PUESTO DE TRABAJO				
☒ Funciones del cargo ☒ Responsabilidades del cargo		☒ Procedimientos del SG-SST en los cuales se enmarca el trabajo a realizar ☒ Presentación de Compañeros		
Orlando Padilla Firma del trabajador / cc		Esteban Esquivel Nombre y firma del profesional asignado/ cc		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO				
☒ Duración del proyecto ☒ Tramos a intervenir		☒ Obras proyectadas		
Orlando Padilla Firma del trabajador / cc		Esteban Esquivel Nombre y firma del profesional asignado/ cc		
PRESENTACIÓN DEL PAGO O MANUAL DE MANEJO AMBIENTAL				
☒ Programas de Manejo Ambiental ☒ Seguimiento a las actividades constructivas		☒ Medidas de manejo de materiales de construcción ☒ Políticas Ambientales ☒ Señalización		
Orlando Padilla Firma del trabajador / cc		Esteban Esquivel Nombre y firma del profesional asignado/ cc		
PARA DILIGENCIAR POR EL EMPLEADO				
Dejo constancia que he recibido y entendido los temas anteriormente descritos y me comprometo a participar y cumplir con las normas, reglamentos, políticas, sistema de gestión, y demás aspectos exigidos por la empresa.				
FIRMA TRABAJADOR: Orlando Padilla				

CONTRATO DE OBRA N°1036 DE 2021, "SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA".

NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA INDUCCIÓN

Daniel Leonardo Scurra

CEBULA

7186884

CARGO:

Ayudante

Modalidad de vinculación

- ☒ Obra/labor
☐ Prestación de servicios
☐ Contratista
☐ Otro

FECHA DE INDUCCIÓN

15 / 10 / 2021

Cada una de las inducciones se relaciona con los diferentes temas que deben ser conocidos por el trabajador que ingresa mostrando la responsabilidad y el entendimiento de cada una de las temáticas en el momento en que es firmado y como proceso de re inducción una vez se encuentre vinculado con la empresa.

Por favor marque con X, las casillas que sean socializadas al personal, según corresponda:

INDUCCIÓN GENERAL

- ☒ Presentación general de la empresa
☒ Historia y Cultura Organizacional
☒ Estructura Organizacional
☒ Misión
☒ Visión
☒ Principios y Valores

- ☒ Reglamento Interno de Trabajo
☒ Salario
☒ Vacaciones
☒ Cesantías
☒ Prima legal
☒ Permisos

Daniel S.
Firma del trabajador / cc

Estanislao Esquivel
Nombre y firma del profesional asignado/ cc

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De acuerdo con el SG-SST vigente, señale los riesgos principales a los que estará expuesto el Trabajador.

- ☒ Reglamento de higiene y seguridad industrial
☒ COPASST
☒ Comité de convivencia laboral
☒ Reporte de Accidente de trabajo / Incidente de trabajo

- ☒ Sistema de gestión de seguridad y Salud en el trabajo
☒ Accidente y Enfermedad Laboral
☒ Factores de riesgos a los que va a estar expuesto
☒ Uso de elementos de protección personal
☒ Protocolo de bioseguridad y riesgos frente al Covid -19

Daniel S.
Firma del trabajador / cc

Estanislao Esquivel
Nombre y firma del responsable de SST

PLAN DE EMERGENCIA

- ☒ Plan de evacuación
☒ Prevención y control de incendios
☒ Primeros auxilios

- ☒ Punto de encuentro
☒ Brigada de emergencias
☒ Alarma de emergencia

Daniel S.
Firma del trabajador / cc

Estanislao Esquivel
Nombre y firma del responsable de SST

INDUCCIÓN ESPECÍFICA EN EL PUESTO DE TRABAJO

- ☒ Funciones del cargo
☒ Responsabilidades del cargo

- ☒ Procedimientos del SGSST en los cuales se enmarca el trabajo a realizar
☒ Presentación de Compañeros

Daniel S.
Firma del trabajador / cc

Estanislao Esquivel
Nombre y firma del profesional asignado/ cc

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO

- ☒ Duración del proyecto
☒ Tramos a intervenir

- ☒ Obras proyectadas

Daniel S.
Firma del trabajador / cc

Estanislao Esquivel
Nombre y firma del profesional asignado/ cc

PRESENTACIÓN DEL PAGO O MANUAL DE MANEJO AMBIENTAL

- ☒ Programas de Manejo Ambiental
☒ Seguimiento a las actividades constructivas

- ☒ Medidas de manejo de materiales de construcción
☒ Política Ambiental
☒ Señalización

Daniel S.
Firma del trabajador / cc

Estanislao Esquivel
Nombre y firma del profesional asignado/ cc

PARA DILIGENCIAR POR EL EMPLEADO

Dejo constancia que he recibido y entendido los temas anteriormente descritos y me comprometo a participar y cumplir con las normas, reglamentos, políticas, sistema de gestión, y demás aspectos exigidos por la empresa.

FIRMA TRABAJADOR:

Daniel S.

CONTRATO DE OBRA N°1036 DE 2021. "SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA".

NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA INDUCCIÓN

Oscar Saavedra S
Ayudante

CEDULA

1049640738

CARGO:

Modalidad de vinculación

- ☒ Obra/labor
☐ Prestación de servicios
☐ Contratista
☐ Otro

FECHA DE INDUCCIÓN

15/11/2021

Cada una de las inducciones se relaciona con los diferentes temas que deben ser conocidos por el trabajador que ingresa mostrando la responsabilidad y el entendimiento de cada una de las temáticas en el momento en que es firmado y como proceso de re inducción una vez se encuentre vinculado con la empresa.

Por favor marque con X, las casillas que sean socializadas al personal, según corresponda:

INDUCCIÓN GENERAL

- ☐ Presentación general de la empresa
☐ Historia y Cultura Organizacional
☐ Estructura Organizacional
☐ Misión
☐ Visión
☐ Principios y Valores

- ☐ Reglamento Interno de Trabajo
☐ Salario
☐ Vacaciones
☐ Cesantías
☐ Prima legal
☐ Permisos

Firma del trabajador / cc

Nombre y firma del profesional asignado/ cc

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De acuerdo con el SG-SST vigente, señale los riesgos principales a los que estará expuesto el Trabajador.

- ☐ Reglamento de higiene y seguridad industrial
☐ COPASST
☐ Comité de convivencia laboral
☐ Reporte de Accidente de trabajo / Incidente de trabajo

- ☐ Sistema de gestión de seguridad y Salud en el trabajo
☐ Accidente y Enfermedad Laboral
☐ Factores de riesgos a los que va a estar expuesto
☐ Uso de elementos de protección personal
☐ Protocolo de bioseguridad y riesgos frente al Covid -19

Firma del trabajador / cc

Nombre y firma del responsable de SST

PLAN DE EMERGENCIA

- ☐ Plan de evacuación
☐ Prevención y control de incendios
☐ Primeros auxilios

- ☐ Punto de encuentro
☐ Brigada de emergencias
☐ Alarma de emergencia

Firma del trabajador / cc

Nombre y firma del responsable de SST

INDUCCIÓN ESPECÍFICA EN EL PUESTO DE TRABAJO

- ☐ Funciones del cargo
☐ Responsabilidades del cargo

- ☐ Procedimientos del SGSSST en los cuales se enmarca el trabajo a realizar
☐ Presentación de Compañeros

Firma del trabajador / cc

Nombre y firma del profesional asignado/ cc

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO

- ☐ Duración del proyecto
☐ Tramos a intervenir

- ☐ Obras proyectadas

Firma del trabajador / cc

Nombre y firma del profesional asignado/ cc

PRESENTACIÓN DEL PAGA O MANUAL DE MANEJO AMBIENTAL

- ☐ Programas de Manejo Ambiental
☐ Seguimiento a las actividades constructivas

- ☐ Medidas de manejo de materiales de construcción
☐ Política Ambiental
☐ Señalización

Firma del trabajador / cc

Nombre y firma del profesional asignado/ cc

PARA DILIGENCIAR POR EL EMPLEADO

Dejo constancia que he recibido y entendido los temas anteriormente descritos y me comprometo a participar y cumplir con las normas, reglamentos, políticas, sistema de gestión, y demás aspectos exigidos por la empresa.

FIRMA TRABAJADOR:

Oscar S.

CONTRATO DE OBRA No. 1036 DE 2021
SEÑALIZACION Y DEMARCAACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE
MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

[illegible]

4. Observaciones

Una vez terminadas actividades en cada intersección el contratista verifica que no hallan quedado elementos de ningún tipo, en este contrato las actividades ejecutadas no generan impacto ambiental. Algunos
los residuos sólidos son retirados de manera inmediata

Responsable Informe:

Estanislao Esclavo

Residente Obis




	INSPECCIÓN DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL		CÓDIGO	CUM 002 02
			VERSIÓN	0
			FECHA	2021-11-14
CONTRATO DE OBRA No. 1036 DE 2021 SERIALIZACION Y DEMARCAACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA				

FECHA: 20/11/2021 SUBCONTRATISTA: _____ ABCISA: _____ TRAMO: _____ ACTIVIDAD: Aplicación de Pinturas en piso

ITEM	DESCRIPCIÓN / PROGRAMA	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	NA	
MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN E INSUMOS					
1	¿Los sitios de acopio temporal están desprovistos de cobertura vegetal?	X			
2	¿Los acopios temporales están demarcados y señalizados?		X		
3	¿Los materiales se encuentran almacenados de manera adecuada (confinados, cubiertos, y/o apilados correctamente)?	X			
4	¿El material particulado generado se esta controlando mediante la humectación de la zona afectada?			X	
5	¿La mezcla de concreto en los frentes de obra, se esta realizando sobre una plataforma metálica o plástico polietileno?			X	
6	¿Los residuos de asfalto se están reutilizando o disponiendo en escombrera o Zedmes autorizados?			X	
7	¿Se cuenta con canales perimetrales u otro mecanismo para la contención de derrames?			X	
8	¿El sitio de almacenamiento de combustible se encuentra impermeabilizado?			X	
9	¿En el sitio de almacenamiento de combustible se tienen las hojas de seguridad con sus 16 secciones?			X	
MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, LODOS Y MATERIALES DE EXCAVACIÓN					
1	¿Los materiales sobrantes (excavación, lodos y escombros) están siendo depositados en zonas verdes?			X	
10	¿Los materiales sobrantes (excavación, lodos y escombros) se están retirando en el tiempo establecido a un sitio de almacenamiento temporal y/o de disposición final?			X	
11	¿Los acopios temporales se están depositando a mas de 30 m de la ronda hídrica de ríos, quebradas y humedales?			X	
12	¿El transporte de los residuos se realiza en volquetas con buenas condiciones mecánicas y cerramiento del platón?			X	
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES					
13	¿El frente de obra cuenta con puntos ecológicos para la clasificación de residuos?			X	
14	¿La clasificación y disposición final de los residuos es clara de la manera adecuada?	X			
15	¿El frente de obra cuenta con sitio de almacenamiento temporal para los residuos sólidos?	X			
16	¿El frente de obra se encuentra libre de residuos sólidos?	X			
SEÑALIZACIÓN FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES					
17	¿La zona de trabajo está debidamente demarcada?	X			
18	¿Se dispone de señalización preventiva para caída a diferente nivel?			X	
19	¿Se dispone de colombinas, conos, maletrines y cinta reflectiva?	X			
20	¿Se cuenta con señalización preventiva de peligro de excavación profunda?			X	
MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES					
21	¿El sistema de captación se realiza por bombeo directo desde el cauce al vehículo encargado del transporte e irrigación?			X	
22	¿El mecanismo de succión se realiza con mangueras de polietileno en diámetros de 2" a 6" de acuerdo con el caudal solicitado?			X	
23	¿La motobomba cuenta con su respectivo caudalímetro o medidor de caudal?			X	
24	¿Los acoples de las mangueras que se usan para la captación de agua se encuentran ajustados?			X	
25	¿Existen barreras de contención en los puntos de captación para prevenir el arrastre de material a la fuente hídrica?			X	
26	¿Se realiza lavado de maquinaria y equipos en los cuerpos de agua cruzados por proyecto?			X	
MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS DOMESTICOS E INDUSTRIALES					
27	¿El frente de obra cuenta con baños portátiles acorde al número de personas?			X	
28	Los baños reciben mantenimiento por parte de una empresa autorizada? (ver registros)			X	
29	¿El frente de obra cuenta con kit contra derrames?			X	
30	¿Los integrantes del frente de obra han recibido Capacitación sobre el Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales?			X	
PROYECTO DE MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS					
31	¿Los vehículos y maquinaria cuentan con revisión técnico-mecánica y de gases vigente?	X			
32	¿Los mantenimientos preventivos a vehículos y maquinaria se realizan en los frentes de obra?		X		
33	¿Las volquetas cuentan con la carpa para prevenir derrames de material durante su recorrido?			X	

223

 166

	INSPECCIÓN DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL		CODIGO	CUM 002_02	
			VERSIÓN	0	
			FECHA	2021-11-14	
CONTRATO DE OBRA N.º 1038 DE 2021 SERIALIZACION Y DEMARCAACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA					
FECHA: 20/11/2021	SUBCONTRATISTA:	ABSCISA:	TRAMO:	ACTIVIDAD: Aplicación de pintura en piso	
ITEM	DESCRIPCIÓN / PROGRAMA	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	NA	
34	¿Para el lavado de las llantas de las volquetas se cuenta con algún sistema u otra alternativa?		X	X	
35	El lavado de maquinaria y equipos se realiza en sitios que cuentan con los permisos requeridos?			X	
36	¿Los integrantes del frente de obra han recibido Capacitación sobre el Manejo de maquinaria, equipos y vehículos?			X	
INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTOS					
37	¿Los campamentos o instalaciones temporales están ubicados a más de 30m respetando la ronda hidráulica de los cuerpos hídricos?			X	
38	¿Los campamentos cuentan con sistema de manejo y disposición de grasas y aceites?			X	
39	¿Los campamentos se encuentran debidamente señalizados con clara diferenciación entre áreas?			X	
40	¿Los campamentos cuentan con extintores, camilla y botiquines?	X			
41	¿Los campamentos cuentan con puntos ecológicos?			X	Se cuenta con Vehículo que transporta diariamente estos desechos
42	¿La clasificación y disposición final de los residuos se lleva de la manera adecuada?	X			
TOTAL					% Cumplimiento:
OBSERVACIONES GENERALES:					
Estanislao Esclavo NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA:		 FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA:		 NOMBRE ENCARGADO:	
				FIRMA ENCARGADO:	

CONTRATO DE OBRA No. 1036 DE 2021
SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

FECHA: SUBCONTRATISTA: ABCISA: TRAMO: ACTIVIDAD: *Aplicación de Pinturas en Pisos*

ITEM	DESCRIPCIÓN / PROGRAMA	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	NA	
MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN E INSUMOS					
1	¿Los sitios de acopio temporal están desprovistos de cobertura vegetal?	X			
2	¿Los acopios temporales están demarcados y señalizados?		X		
3	¿Los materiales se encuentran almacenados de manera adecuada (confinados, cubiertos, y/o apilados correctamente)?	X			
4	¿El material particulado generado se esta controlando mediante la humectación de la zona afectada?			X	
5	¿La mezcla de concreto en los frentes de obra, se esta realizando sobre una plataforma metálica o plástico polietileno?			X	
6	¿Los residuos de asfalto se están reutilizando o disponiendo en escombrera o Zedmes autorizados?			X	
	¿Se cuenta con canales perimetrales u otro mecanismo para la contención de derrames?			X	
	¿El sitio de almacenamiento de combustible se encuentra impermeabilizado?			X	
9	¿En el sitio de almacenamiento de combustible se tienen las hojas de seguridad con sus 16 secciones?			X	
MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, LODOS Y MATERIALES DE EXCAVACIÓN					
9	¿Los materiales sobrantes (excavación, lodos y escombros) están siendo depositados en zonas verdes?			X	
10	¿Los materiales sobrantes (excavación, lodos y escombros) se están retirando en el tiempo establecido a un sitio de almacenamiento temporal y/o de disposición final?			X	
11	¿Los acopios temporales se están depositando a mas de 30 m de la ronda hídrica de ríos, quebradas y humedales?			X	
12	¿El transporte de los residuos se realiza en volquetas con buenas condiciones mecánicas y cerramiento del material?			X	
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES					
13	¿El frente de obra cuenta con puntos ecológicos para la clasificación de residuos?			X	
14	¿La clasificación y disposición final de los residuos se lleva de la manera adecuada?	X			
15	¿El frente de obra cuenta con sitio de almacenamiento temporal para los residuos sólidos?	X			
16	¿El frente de obra se encuentra libre de residuos sólidos?	X			
SEÑALIZACIÓN FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES					
17	¿La zona de trabajo está debidamente demarcada?	X			
18	¿Se dispone de señalización preventiva para caída a diferente nivel?			X	
	¿Se dispone de colombinas, conos, maletines y cinta reflectiva?	X			
20	¿Se cuenta con señalización preventiva de peligro de excavación profunda?			X	
MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES					
21	¿El sistema de captación se realiza por bombeo directo desde el cauce al vehículo encargado del transporte e irrigación?			X	
22	¿El mecanismo de succión se realiza con mangueras de polietileno en diámetros de 2" a 6" de acuerdo con el caudal solicitado?			X	
23	¿La motobomba cuenta con su respectivo caudalímetro o medidor de caudal?			X	
24	¿Los acoples de las mangueras que se usan para la captación de agua se encuentran ajustados?			X	
25	¿Existen barreras de contención en los puntos de captación para prevenir el arrastre de material a la fuente hídrica?			X	
26	¿Se realiza lavado de maquinaria y equipos en los cuerpos de agua cruzados por proyecto?			X	
MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS DOMESTICOS E INDUSTRIALES					
27	¿El frente de obra cuenta con baños portátiles acorde al número de personas?			X	
28	Los baños reciben mantenimiento por parte de una empresa autorizada? (ver registros)			X	
29	¿El frente de obra cuenta con kit contra derrames?			X	
30	¿Los integrantes del frente de obra han recibido Capacitación sobre el Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales?			X	
PROYECTO DE MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS					
31	¿Los vehículos y maquinaria cuentan con revisión técnica mecánica y de gases vigente?	X			
32	¿Los mantenimientos preventivos a vehículos y maquinaria se realizan en los frentes de obra?		X		
33	¿Las volquetas cuentan con la carpa para prevenir derrames de material durante su recorrido?			X	



INSPECCIÓN DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

CÓDIGO	CUM 002_02
VERSIÓN	0
FECHA	2021-11-14

CONTRATO DE OBRA No. 1036 DE 2021
SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

FECHA:	SUBCONTRATISTA:	ABSCISA:	TRAMO:	ACTIVIDAD:	
ITEM	DESCRIPCIÓN / PROGRAMA	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	NA	
34	¿Para el lavado de las llantas de las volquetas se cuenta con algún sistema u otra alternativa?		X		
35	El lavado de maquinaria y equipos se realiza en sitios que cuentan con los permisos requeridos?			X	
36	¿Los integrantes del frente de obra han recibido Capacitación sobre el Manejo de maquinaria, equipos y vehículos?			X	
INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTOS					
37	¿Los campamentos o instalaciones temporales están ubicados a más de 30m respetando la ronda hidráulica de los cuerpos hídricos?			X	
38	¿Los campamentos cuentan con sistema de manejo y disposición de grasas y aceites?			X	
	¿Los campamentos se encuentran debidamente señalizados con clara diferenciación entre áreas?			X	
	¿Los campamentos cuentan con extintores, camilla y botiquines?			X	
41	¿Los campamentos cuentan con puntos ecológicos?	X			Vehículo de la empresa transporta a
42	¿La clasificación y disposición final de los residuos se lleva de la manera adecuada?	X			Diario todos los campamentos
TOTAL		X			% Cumplimiento:

OBSERVACIONES GENERALES:

<i>Estanislao Estovar</i> NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA:	<i>[Firma]</i> FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA:	<i>[Firma]</i> NOMBRE ENCARGADO:	<i>[Firma]</i> FIRMA ENCARGADO:
---	---	-------------------------------------	------------------------------------

	REGISTRO GENERACIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS				CODIGO	CJM_002_04
					VERSION	0
					FECHA	2021-11-13
CONTRATO DE OBRA No. 1038 DE 2021 SERIALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACION DE TRANSITO DE ACUENDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA						
RESPONSABLE:	Estanislao Estano		MES REPORTADO:	Dic-05-2021		
TIPO DE RESIDUO	CANTIDAD GENERADA	UNID	EMPRESA RECOLECTORA	TIPO DE TRATAMIENTO	LUGAR DE DISPOSICION	NO. DE SOPORTE
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)	N/A	m				
Combustibles y Aceites Usados	N/A	m				
Pierres Usados	N/A	m				
Materiales contaminados con hidrocarburos	N/A	m				
Residuos Usados	N/A	m				
Líquidos Fluorescentes	N/A	m				
Fluores o tintas de impresión	N/A	m				
Pierres	N/A	m				
OTR contaminado con hidrocarburos	N/A	m				
Contenedores, botes, envases, recipientes que hayan contenido sustancias químicas	28	m	Ecopapel Dynasty			
Aparatos		m				
Otros:						

Recipientes de pinturas plásticas y óxidos se acopian en bodega de parquizado en punto igiero Santo-Año de Tunja, para luego ser llevados y transportados por la empresa recolectora Ecopapel o Dynasty, ubicada en la ciudad de Bogotá


 Residente de Obra


PRESIDENTE OBRERA
Presidente de Obra

[Signature]
DIRECTOR DE OBRA

 CUMBRE <small>INGENIERIA S.A.S.</small>	RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS		CÓDIGO	CUM 002 08
			VERSION	0
			FECHA	2021-11-14
<p align="center"> CONTRATO DE OBRA No. 1038 DE 2021 SERIALIZACION Y DEMARCAACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL ORUETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA </p>				

GENERADOR: COMUNE INGENIERIA S.A.S
 TRAMITO: VAZIO
 MES REPORTADO: ① Noviembre 5 a Diciembre 4 de 2021
 ② 5 Diciembre 01 Enero 4 de 2022

[illegible]

224


PRESIDENTE OJEDA

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 35 DE 98

ANEXO 11.8

SOPORTES IMPLEMENTACION PROGRAMA GERENCIA DE OBRA

ANEXO FORMATO IMPLANTACION PLAN DE GERENCIA

CUMBRE INGENIERÍA SAS				
CONTRATO 1036 DE 2021				
GESTIÓN DEL VALOR GANADO				
PERIODO DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE				

	COSTO PRESUPUESTADO (PV)	COSTOS REALES (AC)	PORCENTAJES REALES	VALOR PLANEADO (PV)
MES 1	\$ 46,513,216.60	\$ 192,789,318.00	30%	\$ 46,513,216.60
MES 2	\$ 213,571,908.50	\$ -	0%	\$ 260,085,125.10
MES 3	\$ 382,553,430.90	\$ -	0%	\$ 642,638,556.00
TOTAL	\$ 642,638,556.00	\$ -	0%	\$ 642,638,556.00

CUMBRE INGENIERÍA SAS				
CONTRATO 1036 DE 2021				
VARIACIÓN DEL COSTO Y DESVIACIÓN DEL CRONOGRAMA				
PERIODO DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE				

	COSTO REAL (AC)	VALOR GANADO (EV)	VARIACIÓN DEL COSTO (CV) = EV-AC	DESVIACIÓN DEL CRONOGRAMA (SV) = EV-PV
MES 1	\$ 192,789,318.00	\$ 192,789,318.00	\$ -	\$ 146,276,101.40
MES 2				
MES 3				
TOTAL				

CUMBRE INGENIERÍA SAS				
CONTRATO 1036 DE 2021				
INDICE DE RENDIMIENTO DEL COSTO Y CRONOGRAMA				
PERIODO DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE				

	COSTO REAL (AC)	VALOR GANADO (EV)	INIDICE DE RENDIMIENTO DEL COSTO (CPI) = EV/AC	INIDICE DE RENDIMIENTO DEL CRONOGRAMA SPI = EV/PV
MES 1	\$ 192,789,318.00	\$ 192,789,318.00	1.00	414%
MES 2				
MES 3				
TOTAL				

CUMBRE INGENIERÍA SAS				
CONTRATO 1036 DE 2021				
GESTIÓN DEL VALOR GANADO				
PERIODO DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 04 DE ENERO DE 2022				

	COSTO PRESUPUESTADO (PV)	COSTOS REALES (AC)	PORCENTAJES REALES	VALOR PLANEADO (PV)
MES 1	\$ 46.513.216,60	\$ -	0%	\$ 46.513.216,60
MES 2	\$ 213.571.908,50	\$ 225.273.356,00	35%	\$ 260.085.125,10
MES 3	\$ 382.553.430,90	\$ -	0%	\$ 642.638.556,00
TOTAL	\$ 642.638.556,00	\$ -	0%	\$ 642.638.556,00

CUMBRE INGENIERÍA SAS				
CONTRATO 1036 DE 2021				
VARIACIÓN DEL COSTO Y DESVIACIÓN DEL CRONOGRAMA				
PERIODO DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 04 DE ENERO DE 2022				

	COSTO REAL (AC)	VALOR GANADO (EV)	VARIACIÓN DEL COSTO (CV) = EV-AC	DESVIACIÓN DEL CRONOGRAMA (SV) = EV-PV
MES 1	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 46.513.216,60
MES 2	\$ 225.273.356,00	\$ 225.273.356,00	\$ -	-\$ 34.811.769,10
MES 3				
TOTAL				

CUMBRE INGENIERÍA SAS				
CONTRATO 1036 DE 2021				
INDICE DE RENDIMIENTO DEL COSTO Y CRONOGRAMA				
PERIODO DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 04 DE ENERO DE 2022				

	COSTO REAL (AC)	VALOR GANADO (EV)	INDICE DE RENDIMIENTO DEL COSTO (CPI) = EV/AC	INDICE DE RENDIMIENTO DEL CRONOGRAMA SPI = EV/PV
MES 1	\$ -	\$ -	0	0%
MES 2	\$ 225.273.356,00	\$ 225.273.356,00	1	87%
MES 3				
TOTAL				

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 36 DE 98

ANEXO 11.9

COPIA BITACORA DE OBRA

[illegible]


120
170

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

4/DIC/2020

Página. 2/2


FIRMA DEL RESIDENTE DE CHINA



FIRMA RESIDENTE DEL MUNICIPIO

121
180

MUNICIPIO DE TUNJA		BITÁCORA DE OBRA		2021	
PROYECTO		CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.			Página: 1/2
CONTRATISTA		CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1036-2021	
INTERVENTORÍA		CÉSAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021	
FECHA		5 / DIC / 2021	HORARIO	8:00 PM - 5:00 AM	
ESTADO DEL TIEMPO		SOLEADO X NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
FRETE DE OBRA					
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA					
ACTIVIDAD REALIZADA		LOCALIZACIÓN		UNIDAD	CANTIDAD
Aplicación de pintura plástica en FVO (método llana)		Cra 9 calle 23		M ²	28.27
		Cra 9 calle 22		M ²	19.86
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒					
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA					
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN		LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO		SUMINISTRO DE MATERIALES	
CARGO	CANTIDAD				
DIRECTOR DE OBRA	1	Furgon URT 619		Pintura plástica	
RESIDENTE DE OBRA PROFESIONAL SISO				Microesferas	
INGENIERO AUXILIAR					
MAESTRO GENERAL	1				
OFICIALES	5				
AYUDANTES	1				
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1				
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1				
OTRO					
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL					
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES	
CASCO	X	GAFAS	X		
BOTAS	X	TAPA OÍDOS	X		
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X		
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA					
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Valla informativa			Información de vía cerrada X		
Barrera de madera			Cerrar la vía X		
Cinta de peligro		50ML	Canalización de obras		
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____					
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS					
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA					
FIRMA RESIDENTE INTERVENFORIA					

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

5/DK/2021
Página. 42



SIGNA DEL RESIDENTE DE LA ZONA



AGENCIA NACIONAL DE INTERVENCIÓN

MUNICIPIO DE TUNJA		BITÁCORA DE OBRA		2021	
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		CONTRATO No.	1036-2021	
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		CONTRATO No.	1068-2021	
FECHA	6 / DIC. / 2021		HORARIO	8:00PM - A 4:00AM	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO ☒	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
FRENTE DE OBRA					
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA					
ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		
- Aplicación manual de pintura plástica (método Harco) en filo	Cra 9 con Calle 29	172	30.00		
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒					
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA					
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA	
NO SE PRESENTARON					
PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA					
CARGO	CANTIDAD	MAQUINARIA Y EQUIPO		SUMINISTRO DE MATERIALES	
DIRECTOR DE OBRA	1	- Furgon ORP 619		- Pintura Plástica	
RESIDENTE DE OBRA	1			- Mano de obra para mano de obra	
PROFESIONAL SISO	1				
INGENIERO AUXILIAR	1				
MAESTRO GENERAL	1				
OFICIALES	1				
AYUDANTES	5				
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1				
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1				
OTRO					
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL					
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES	
CASCO	☒	GAFAS	☒		
BOTAS	☒	TAPA OÍDOS	☒		
GUANTES	☒	OTROS	Tapabocas ☒		
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA					
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Valla informativa			información de vía cerrada ☒		
Barrera de madera			Cerrar la vía ☒		
Cinta de peligro		60 ML	Canalización de obras ☒		
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____					
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS					
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA _____					
FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA _____					

6/DIC/2021

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Página: 2/2

- La interventoría solicita, se alleguen los pagos de soportes de pago de las planillas del personal que labora en obra, lo anterior correspondiente al mes de Diciembre.


FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA


FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA


MUNICIPIO DE TUNJA	BITÁCORA DE OBRA					
2021						
PROYECTO:	CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJÁ.					
Página:	<u>1/2</u>					
CONTRATISTA:	CUMBRE INGENIERÍA S.A.S.	CONTRATO No.	1895-2021			
INTERVENTORÍA:	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021			
FECHA:	<u>7 / DIC. / 2021</u>		HORARIO:	<u>8:00 PM - 2:00 AM</u>		
ESTADO DEL TIEMPO:	SOLEADO	NUBLADO ☒	NUBLADO Lluvias Leves	LlUVIAS MODERADAS	LlUVIAS INTENSAS	
FRENTÉ DE OBRA						
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA						
ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN		UNIDAD	CANTIDAD		
- Suministro y aplicación de pintura plástica en frío (método Línea) y microesferas para marcas viales	Carretera 9 entre 29		m ²	1587		
- Pintura acrílica en microesfera línea continuo coloriente	Mazonado		N.L.	800		
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒						
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCumplimientos presentados en la obra						
DESCRIPCION	ACCION DE CORRECCION		LIBERACION	RESPONSABLE	FECHA	
PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA						
CARGO	CANTIDAD	MAQUINARIA Y EQUIPO		SUMINISTROS DE MATERIALES		
DIRECTOR DE OBRA	-	-		-		
RESIDENTE DE OBRA	1	Vehículo Tipo Furgon ORP 819		Pintura plástica metacrilato		
PROFESIONAL SISQ	-	-		Microesferas para marca viales		
INGENIERO AUXILIAR	-	-		-		
MAESTRO GENERAL	-	-		-		
OFICIALES	2	-		-		
AYUDANTES	5	-		-		
DIRECTOR DE INTERVENORIA	-	-		-		
RESIDENTE DE INTERVENORIA	1	-		-		
OTRO	-	-		-		
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL						
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES		
Casco	X	GAFAS	X			
BOTAS	X	TAPA OÍDOS	X			
GUANTES	A	OTROS	Tapabocas X			
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA						
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES				
Valla informativa		Información de vía cerrada	X			
Barrera de madera		Cerrar la vía				
Cinta de peligro	50 ML	Canalización de obras				
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____						
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS						
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA	FIRMA RESPONSABLE INTERVENORIA					

7/DIC/2021

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Página: 2/2

- Culminados los trabajos en esta intersección, el contratista hace la solicitud de la entrega de los Diseños definitivos de Señalización Vertical y Horizontal para dar alcance a las cantidades contractuales.
- Para lo anterior la interventoría informa que ese tema se tocará en próximo comité técnico.


FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA


FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA		BITÁCORA DE OBRA		2021																																							
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página: 1/2																																						
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		CONTRATO No.	1035-2021																																							
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		CONTRATO No.	1068-2021																																							
FECHA	8 / DIC / 2021		HORARIO	9:00PM - 3:00AM																																							
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS																																						
<p align="center">FRENTE DE OBRA</p> <p align="center">RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDAD REALIZADA</th> <th>LOCALIZACIÓN</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Suministro y aplicación de pintura Camero Griscale 12 plástico en fno método línea</td> <td></td> <td>M2</td> <td>48.20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	- Suministro y aplicación de pintura Camero Griscale 12 plástico en fno método línea		M2	48.20																														
ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD																																								
- Suministro y aplicación de pintura Camero Griscale 12 plástico en fno método línea		M2	48.20																																								
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA ☐ SI ☒ NO																																											
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA																																											
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA</th> <th>MAQUINARIA Y EQUIPO</th> <th>SUMINISTRO DE MATERIALES</th> </tr> <tr> <th>CARGO</th> <th>CANTIDAD</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIRECTOR DE OBRA</td> <td>1</td> <td rowspan="5">- Vehículo Tipo Ejeper URP 619</td> <td rowspan="5">- Pintura plástica tipo duración</td> </tr> <tr> <td>RESIDENTE DE OBRA</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>PROFESIONAL SISO</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>INGENIERO AUXILIAR</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>MAESTRO GENERAL</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>OFICIALES</td> <td>1</td> <td></td> <td rowspan="3">- Hileras para monas vial</td> </tr> <tr> <td>AYUDANTES</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RESIDENTE DE INTERVENTORÍA</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES	CARGO	CANTIDAD			DIRECTOR DE OBRA	1	- Vehículo Tipo Ejeper URP 619	- Pintura plástica tipo duración	RESIDENTE DE OBRA	1	PROFESIONAL SISO	1	INGENIERO AUXILIAR	1	MAESTRO GENERAL	1	OFICIALES	1		- Hileras para monas vial	AYUDANTES	5		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1		RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1			OTRO			
PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES																																								
CARGO	CANTIDAD																																										
DIRECTOR DE OBRA	1	- Vehículo Tipo Ejeper URP 619	- Pintura plástica tipo duración																																								
RESIDENTE DE OBRA	1																																										
PROFESIONAL SISO	1																																										
INGENIERO AUXILIAR	1																																										
MAESTRO GENERAL	1																																										
OFICIALES	1		- Hileras para monas vial																																								
AYUDANTES	5																																										
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1																																										
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1																																										
OTRO																																											
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL																																											
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES																																							
CASCO	X	GAFAS	X																																								
BOTAS	X	TAPA OÍDOS	X																																								
GUANTES	X	OTROS	Tapebocas X																																								
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA																																											
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES																																								
Valla Informativa			Información de vía cerrada																																								
Barrera de madera			Cerrar la vía																																								
Cinta de peligro		80712	Calificación de obras																																								
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES ☐ SI ☒ NO CUÁL _____																																											
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS																																											
<p align="center">FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA</p> <p align="center">FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA</p>																																											

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

- La interventoría solicita el sitio de acopio de los materiales o tanques utilizados que sobran o desocupados, del proyecto
- El contratista informa que estos tanques provenientes de la planta utilizada son llevados al acopio o bodega dispuesto por el contratista, para posteriormente ser llevados y dispuestos a sitios o acopio que cumplen con las normas ambientales.


FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA


FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA		BITÁCORA DE OBRA		2021	
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		CONTRATO No.	1036-2021	
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		CONTRATO No.	1068-2021	
FECHA	9 / DIC / 2021		HORARIO		
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
FRETE DE OBRA					
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA					
ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		
Aplicación de pintura plástica en frío, método plano	Av. Coto Mta. Calle 19	M ²	45.84		
- Algunas Señales Pictas (Pictogramas)	Carrera B con Calle 19	M ²	24.60		
	Carrera B con Calle 20	M ²	8.00		
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA ☐ SI ☒ NO					
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA					
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA	
PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA					
CARGO	CANTIDAD	MAQUINARIA Y EQUIPO		SUMINISTRO DE MATERIALES	
DIRECTOR DE OBRA	1	Vehículo Furgón URP 018		= Pintura plástica	
RESIDENTE DE OBRA	1			= Manguera para mallas	
PROFESIONAL SISO	1			= Pintura acrílica	
INGENIERO AUXILIAR	1			con mallas	
MAESTRO GENERAL	1				
OFICIALES	1				
AYUDANTES	5				
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1				
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1				
OTRO					
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL					
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES	
CASCO	X	GAFAS	X		
BOTAS	X	TAPA OÍDOS	X		
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X		
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA					
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Valla informativa	1		Información de vía cerrada X		
Barrera de madera	1		Cerrar la vía X		
Cinta de peligro	10 ML		Canalización de obras		
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES ☐ SI ☒ NO CUÁL					
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS					
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA					
FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA					

9/DIC/2021

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Página: 2/2

- En la intersección de la Carretera 9 con calle 20, se aplicó pintura plástica en frío en algunas señales, para las señales faltantes se solicita la aprobación por parte de la interventoría y supervisor de la alcaldía de aplicar pintura acrílica, lo anterior debido al mal estado en que se encuentran algunas tramos de la vía.


FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA


FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA		BITÁCORA DE OBRA		2021	
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		CONTRATO No.	1036-2021	
INTERVENTORIA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		CONTRATO No.	1068-2021	
FECHA	10 / DIC / 2021		HORARIO	9:00 PM - 3:00 AM	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO ☒	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
FRETE DE OBRA					
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA					
ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		
Suministro e instalación de señales reglamentarias 60x60cm	Vial Tanga - Arriba	UN	30		
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA ☐ SI ☒ NO					
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA					
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA	
PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO		SUMINISTRO DE MATERIALES	
CARGO	CANTIDAD				
DIRECTOR DE OBRA	1	- Vehículo Tipo Furgón ORP 610		- Señales Verticales	
RESIDENTE DE OBRA	1			- Madera o Concreto	
PROFESIONAL SISO	1				
INGENIERO AUXILIAR	1				
MAESTRO GENERAL	1				
OFICIALES	3				
AYUDANTES	3				
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1				
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1				
OTRO					
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL					
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES	
CASCO	☒	SAFAS	☒		
BOTAS	☒	TAPA OÍDOS	☒		
GUANTES	☒	OTROS	Tapabocas ☒		
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA					
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Valla Informativa			Información de vía cerrada ☒		
Barrera de madera			Cerrar la vía ☒		
Cinta de peligro			Canalización de obras ☒		
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES ☐ SI ☒ NO CUÁL ☐					
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS					
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA			FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA		

10/DIC/2021


OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Página: 2/2

- Una Vez Verificados los sitios de instalación por parte de la interventoría, se procede a su instalación
- Igualmente se verifica y aprueba el tipo de Sano Vertical a instalar por parte de la interventoría, lo anterior, de acuerdo a los planos finales de Diseño entregados por el Municipio



FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA




FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA		BITÁCORA DE OBRA		2021	
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		CONTRATO No.	1096-2021	
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		CONTRATO No.	1068-2021	
FECHA	12/DIC/2021		HORARIO	8:00 PM - 12:00 PM	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO ☒	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
FREENTE DE OBRA					
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA					
ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		
- Suministro y aplicación de pintura plástica en filo	- Carrera B calle 15	M ²	14.00		
	- Carrera B calle 23	M ²	13.40		
	- Carrera D calle 15	M ²	62.60		
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒					
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA					
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA	
PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA					
CARGO	CANTIDAD	MAQUINARIA Y EQUIPO		SUMINISTRO DE MATERIALES	
DIRECTOR DE OBRA	1	- Vehículo Furgón URP 610		- Pintura plástica	
RESIDENTE DE OBRA	1				
PROFESIONAL SISO	-				
INGENIERO AUXILIAR	-				
MAESTRO GENERAL	-				
OFICIALES	1			- Microfreno	
AYUDANTES	5			- Marcos viales	
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	-				
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1				
OTRO					
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL					
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES	
CASCO	☒	GAFAS	☒		
BOTAS	☒	TAPA OÍDOS	☒		
GUANTES	☒	OTROS	Tapabocas ☒		
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA					
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Valla Informativa			Información de vía cerrada ☒		
Barrera de madera			Cerrar la vía		
Cono de peligro		100 ML	Canalización de obras		
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____					
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS					
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA					
FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA					

11/DIC./2021

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Página: 2/2


FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA


FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA		BITÁCORA DE OBRA		2021	
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página: <u>1/2</u>
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		CONTRATO No.	1036-2021	
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		CONTRATO No.	1068-2021	
FECHA	<u>13 DIC 2021</u>		HORARIO	<u>9:00 PM - 4:30 AM</u>	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO ☒	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA			
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA			
ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
<u>Aplicación de pintura Asfáltica</u>	<u>Ki 8 Calle 25</u>	<u>M²</u>	<u>26</u>
	<u>Ki 9 Calle 19</u>	<u>M²</u>	<u>29.30</u>
<u>Aplicación de pintura plástica (Hana)</u>	<u>Ki 11 Calle 17</u>	<u>M²</u>	<u>22.20</u>
	<u>Ki 7 Calle 20</u>	<u>M²</u>	<u>19.45</u>

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA				
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA


PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	<u>1</u>		
PROFESIONAL SISO			
INGENIERO AUXILIAR			
MAESTRO GENERAL			
OFICIALES	<u>1</u>		
AYUDANTES	<u>5</u>		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA			
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	<u>1</u>		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL				
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	☒	GAFAS	☒	
BOTAS	☒	TAPA OÍDOS	☒	
GUANTES	☒	OTROS	☒ Tapabocas	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA		
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Valla Informativa		Información de vía cerrada ☒
Barrera de madera		Cerrar la vía ☒
Cinta de peligro	<u>40m</u>	Canalización de obras ☒

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS	


 FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA



 FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA


13/DIC/2021

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Página: 2/2

- En algunos puntos o tramos se realizaron o aplicaron juntas acrílicas, lo anterior debido al mal estado en que se encuentran los tramos en estos lugares, la firma interventora autorizó estos trabajos, en común acuerdo con el contratista.


FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA


FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA		BITÁCORA DE OBRA		2021	
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		CONTRATO No.	1036-2021	
INTERVENTORIA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		CONTRATO No.	1068-2021	
FECHA	14 / DIC / 2021		HORARIO	9:00PM - 4:30AM	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO ☒	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
FRENTE DE OBRA					
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA					
ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		
- Aplicación de pintura plástica en piso	Ki 10 calle 21A	M ²	16.63		
- Instalación de Señales Verticales	Colegio Gabriel García	M ²	27.00		
	Calle 3 entre 11 y 14	UN	15		
	Edif. Floribey	UN	15		
	Zona - Higüero	UN	15		
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA ☐ SI ☒ NO					
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA					
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA	
PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA					
CARGO	CANTIDAD	MAQUINARIA Y EQUIPO		SUMINISTRO DE MATERIALES	
DIRECTOR DE OBRA	1			- Pintura plástica	
RESIDENTE DE OBRA	1			- Minoxepal para vías	
PROFESIONAL SISO	1				
INGENIERO AUXILIAR	1				
MAESTRO GENERAL	1				
OFICIALES	2				
AYUDANTES	5				
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1				
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1				
OTRO					
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL					
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES	
CASCO	☒	GAFAS	☒		
BOTAS	☒	TAPA OÍDOS	☒		
GUANTES	☒	OTROS	Tapabocas ☒		
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA					
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Valla informativa			Información de vía cerrada ☒		
Barrera de madera			Cerrar la vía ☒		
Cinta de peligro		ADHL	Canalización de obras ☒		
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES ☐ SI ☒ NO CUÁL ☐					
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS					
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA					
FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA					

En Visita conjunta Interventoria y Contralista, en la glorietta maldonado Sector Hipolito se definen las siguientes actividades:

- Retiro de 5 Tachones

- Suministro e instalación de 6 Hito

- Suministro e instalación de 10 Tachones

x Avenida Maldonado calle 25 Intersección (VIR KING)

- Suministro e instalación 22 Tachones

- Suministro e instalación 8 hitos

x Carrera 9 calle 25 (Salesiano)

- Suministro e instalación de 16 Tachones

- Suministro e instalación de 18 hitos

- Retiro de 12 hitos

x Carrera 8 calle 25 (Salesiano 2)

- Retiro de 12 Hito

- Suministro e instalación 12 Hito

- Suministro e instalación 2 Tachones

x Carrera 9 calle 23 (Pinzon)

- Suministro e instalación de 3 Tachones


Firma del Residente de Obra


Firma del Supervisor Interventoria

MUNICIPIO DE TUNJA		BITÁCORA DE OBRA		2021	
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página: 2/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		CONTRATO No.	1036-2021	
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		CONTRATO No.	1068-2021	
FECHA	15 / DIC / 2021		HORARIO	9:00 PM - 5:00 AM	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
FRENTE DE OBRA					
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA					
ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		
Kr 7 calle 17 Aplicación de pintura asfáltica	Kr 7 calle 17	M ²	14,000		
Retiro de tachos e hitos	Kr 8 calle 25 Kr 9 calle 25	UN UN	12 15		
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA ☐ SI ☒ NO					
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA					
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA	
PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO		SUMINISTRO DE MATERIALES	
CARGO	CANTIDAD				
DIRECTOR DE OBRA	1			- Pintura Asfáltica	
RESIDENTE DE OBRA	1				
PROFESIONAL SISO	1				
INGENIERO AUXILIAR	1				
MAESTRO GENERAL	1				
OFICIALES	1				
AYUDANTES	5				
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1				
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1				
OTRO					
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL					
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES	
CASCO	X	GAFAS	X		
BOTAS	X	TAPA OÍDOS	X		
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X		
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA					
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Valla Informativa			Información de vía cerrada X		
Barrera de madera			Cerrar la vía X		
Cinta de peligro		50 ML	Canalización de obras		
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES ☐ SI ☒ NO CUÁL					
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS					
Se autoriza la aplicación de pintura asfáltica en la zona peatonal ubicada en la carrera 17, igualmente los flechas					
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA			FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA		

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Página:

-Se autoriza el retiro de los techos e hitos que se encuentran deteriorados y se autoriza la instalacion de Nuevas unidades.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA


MUNICIPIO DE TUNJA	BITÁCORA DE OBRA	2023		
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAción VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJIA."	Página:		
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERÍA S.A.S.	CONTRATO No. 1035-2021		
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No. 1068-2021		
FECHA	16 / DIC / 2021	HORARIO 9:00 PM - 4:30 AM		
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO NUBLADO X NUBLADO LLUVIA LEVES LLUVIAS MODERADAS LLUVIAS INTENSAS			
FREENTE DE OBRA				
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA				
ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	
- Reparación horizontal (Delimitación y pintura)	Calle 3 entre 11 y 14	m ²	300	
- Instalación de Señales Verticales	Via Falsa Arroyo	un	10	
	Calle 3 entre 11 y 14	un	05	
	La Florida	un	10	
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒				
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA				
DESCRIPCION	ACCION DE CORRECCION	LIBERACION	RESPONSABLE	FECHA
PERSONAL QUE LABORO EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO		SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD			
DIRECTOR DE OBRA	=	Vehículo tipo furgon		Pintura plastica y Pintura Acilica
RESIDENTE DE OBRA	=			
PROFESIONAL SISQ	=			
INGENIERO AUXILIAR	=			
MAESTRO GENERAL	=			
OFICIALES	=			
AYUDANTES	=			
DIRECTOR DE INTERVENORIA	=			
RESIDENTE DE INTERVENORIA	=			
Otro				
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL				
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	x	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	x	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA				
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Valla informativa		Informacion de via cerrada X		
Barrera de madera		Cerrar la via X		
Cinta de peligro		Cancelacion de obra		
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUAL _____				
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS				
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA	FIRMA RESIDENTE INTERVENORIA			

16/DIC/2021

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Página: 2/2

- Se inician actividades de demarcación de líneas continuas y discontinuas, para luego aplicar la pintura acrílica.


FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA


FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA		BITÁCORA DE OBRA		2021																																																	
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página: 4/2																																																
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		CONTRATO No.	1036-2021																																																	
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		CONTRATO No.	1068-2021																																																	
FECHA	17 / DIC / 2021		HORARIO	9:00 PM - 4:30 AM																																																	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO NOCHE ☒	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS																																																
FRONTE DE OBRA																																																					
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA																																																					
ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD																																																		
Señalización Vertical Instalación	Calle 3 entre 11 y 14	UN	4																																																		
	La Florida	UN	25																																																		
	TRANSA Atacabuco	UN	9																																																		
	(Indicando Huelga) - delimitada																																																				
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA ☐ SI ☒ NO																																																					
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA																																																					
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA</th> <th>MAQUINARIA Y EQUIPO</th> <th>SUMINISTRO DE MATERIALES</th> </tr> <tr> <th>CARGO</th> <th>CANTIDAD</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIRECTOR DE OBRA</td> <td>1</td> <td>- Vehículo #026001 UP6 619</td> <td>- Señales reflectivas</td> </tr> <tr> <td>RESIDENTE DE OBRA</td> <td>1</td> <td></td> <td>- Madera o concreto</td> </tr> <tr> <td>PROFESIONAL SISO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INGENIERO AUXILIAR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MAESTRO GENERAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OFICIALES</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AYUDANTES</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RESIDENTE DE INTERVENTORÍA</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES	CARGO	CANTIDAD			DIRECTOR DE OBRA	1	- Vehículo #026001 UP6 619	- Señales reflectivas	RESIDENTE DE OBRA	1		- Madera o concreto	PROFESIONAL SISO				INGENIERO AUXILIAR				MAESTRO GENERAL				OFICIALES	1			AYUDANTES	5			DIRECTOR DE INTERVENTORÍA				RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1			OTRO			
PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES																																																		
CARGO	CANTIDAD																																																				
DIRECTOR DE OBRA	1	- Vehículo #026001 UP6 619	- Señales reflectivas																																																		
RESIDENTE DE OBRA	1		- Madera o concreto																																																		
PROFESIONAL SISO																																																					
INGENIERO AUXILIAR																																																					
MAESTRO GENERAL																																																					
OFICIALES	1																																																				
AYUDANTES	5																																																				
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA																																																					
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1																																																				
OTRO																																																					
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL																																																					
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES																																																	
CASCO	☒	GAFAS	☒																																																		
BOYAS	☒	TAPA OÍDOS	☒																																																		
GUANTES	☒	OTROS	Tapabocas ☒																																																		
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA																																																					
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES																																																		
Valla Informativa			Información de vía cerrada ☒																																																		
Barrera de madera			Cerrar la vía																																																		
Cinta de peligro		20 ML	Canalización de obras																																																		
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES ☐ SI ☒ NO CUÁL _____																																																					
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS																																																					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>  FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA </div> <div>  FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA </div> </div>																																																					

Una vez efectuada la visita de reconocimiento se
procede a la instalación de las señales verticales



FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA


MUNICIPIO DE TUNJA		BITÁCORA DE OBRA		2021	
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página: 2/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		CONTRATO No.	1036-2021	
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		CONTRATO No.	1068-2021	
FECHA	18 / DIC / 2021		HORARIO	9:00 PM - 4:00 AM	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
FREENTE DE OBRA					
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA					
ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		
Aplicación de pintura plástica en filo	Calle 3 entre 14 y 15	M ²	80		
Señalización Vertical	5 Puntos Verticales	UN	20		
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA ☐ SI ☒ NO					
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA					
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA	
PERSONAL QUE LABORO EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO		SUMINISTRO DE MATERIALES	
CARGO	CANTIDAD				
DIRECTOR DE OBRA	1	Vehículo Forjón 086 619		Pintura plástica	
RESIDENTE DE OBRA	1			Microesferas para marcas viales	
PROFESIONAL SISO	1				
INGENIERO AUXILIAR	1				
MAESTRO GENERAL	1				
OFICIALES	1				
AYUDANTES	1				
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1				
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1				
OTRO					
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL					
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES	
CASCO	☒	GAFAS	☒		
BOTAS	☒	TAPA OÍDOS	☒		
GUANTES	☒	OTROS	Tapabocas ☒		
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA					
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Valla informativa			Información de vía cerrada ☒		
Barrera de madera			Cerrar la vía ☒		
Cinta de peligro		30 ML	Canalización de obras ☒		
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES ☐ SI ☒ NO CUÁL ☐					
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS					
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA			FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA		

10/dic/2011 2/2

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Página:

Se realiza recorrido por todas las pautas o intersecciones
interventadas y se terminan de ejecutar los señales faltantes
en estos sitios.



FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA		BITÁCORA DE OBRA		2021	
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		CONTRATO No.	1038-2021	
INTERVENTORIA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		CONTRATO No.	1068-2021	
FECHA	20 / DIC / 2021		HORARIO	9:00PM - 5:00AM	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO ☒	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
FREENTE DE OBRA					
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA					
ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		
- Aplicación de pintura plástica en sitio	Barrido La Honda	M ²	80		
- Aplicación de pintura Acrílica	Sobre la Esplanada y Salcedo	M ²	120		
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA ☐ SI ☒ NO					
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA					
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA	
PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO		SUMINISTRO DE MATERIALES	
CARGO	CANTIDAD				
DIRECTOR DE OBRA					
RESIDENTE DE OBRA	1				
PROFESIONAL SISO					
INGENIERO AUXILIAR					
MAESTRO GENERAL					
OFICIALES	1				
AYUDANTES	5				
DIRECTOR DE INTERVENTORIA					
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1				
OTRO					
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL					
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES	
CASCO	☒	GAFAS	☒		
BOTAS	☒	TAPA OIDOS	☒		
GUANTES	☒	OTROS	Tapabocas ☒		
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA					
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Valla Informativa			información de vía cerrada ☒		
Barrera de madera			Cerrar la vía ☒		
Cinta de peligro		20HL	Canalización de obras ☒		
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES ☐ SI ☒ NO CUÁL: ☐					
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS					
FIRMA RESPONSABLE DE OBRA			FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA		

20/DIC/2021

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Página: 2/2

- Nuevamente se continúan con visitas a intersecciones intervenidas y se realizan las aplicaciones de pintura faltantes.
- Interventoria verifica la calidad y especificación de los trabajos y materiales suministrados a la obra.



FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA




FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA		BITÁCORA DE OBRA		2021	
PROYECTO		"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAción VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."			Página: 4/2
CONTRATISTA		CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		CONTRATO No.	1036-2021
INTERVENTORÍA		CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		CONTRATO No.	1068-2021
FECHA		21 / DIC / 2021		HORARIO	8:30 PM - 3:30 AM
ESTADO DEL TIEMPO		SOLEADO	NUBLADO ☒	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS
				LLUVIAS INTENSAS	
FREENTE DE OBRA					
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA					
ACTIVIDAD REALIZADA		LOCALIZACIÓN		UNIDAD	CANTIDAD
- Aplicación pintura plástica en filo		Varias Puntos		M2	100
- Instalación de tachones		Carrera 8 Calle 25		UN	25
- Instalación de hitos		Carrera 8 Calle 25		UN	16
		Carrera 8 Calle 28		UN	16
		Carrera 9 Calle 25		UN	16
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒					
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA					
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA	
PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO		SUMINISTRO DE MATERIALES	
CARGO	CANTIDAD				
DIRECTOR DE OBRA	1	- Vehículo Forgen VPR 619		- hitos	
RESIDENTE DE OBRA	1			- Tachones	
PROFESIONAL SISO	1			- Pintura	
INGENIERO AUXILIAR	1			- Microespaldas	
MAESTRO GENERAL	1				
OFICIALES	1				
AYUDANTES	5				
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA					
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1				
OTRO					
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL					
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES	
CASCO	☒	GAFAS	☒		
BOTAS	☒	TAPA OÍDOS	☒		
GUANTES	☒	OTROS	Tapabocas ☒		
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA					
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Valla informativa			información de vía cerrada ☒		
Barrera de madera			Cerrar la vía ☒		
Cinta de peligro		BONOL	Canalización de obras ☒		
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL: _____					
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS					
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA			FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA		

21/DIC/2021

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Página: 2/2


FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA


FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA		BITÁCORA DE OBRA		2021	
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		CONTRATO No.	1036-2021	
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		CONTRATO No.	1068-2021	
FECHA	22 / DIC / 2021		HORARIO	8:30 AM - 5:00 PM	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO NOCHE	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
FRENTE DE OBRA					
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA					
ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		
Instalación de Tachones	Calantera Matamoros	UN	10		
	Ri. 8 calle 25	UN	12		
Instalación de hitos	Ri. 9 calle 23	UN	3		
	Calantera Matamoros	UN	6		
	Ri. 8 calle 25	UN	2		
Aplicación de pintura asfáltica	Varios puntos	M ²	70		
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒					
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA					
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA	
PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA					
CARGO	CANTIDAD	MAQUINARIA Y EQUIPO		SUMINISTRO DE MATERIALES	
DIRECTOR DE OBRA					
RESIDENTE DE OBRA	1				
PROFESIONAL SISO					
INGENIERO AUXILIAR					
MAESTRO GENERAL					
OFICIALES	3				
AYUDANTES	3				
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA					
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1				
OTRO					
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL					
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES	
CASCO	X	GAFAS	X		
BOTAS	X	TAPA OÍDOS	X		
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X		
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA					
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Valla Informativa			Información de vía cerrada		
Barrera de madera			Cerrar la vía		
Cinta de peligro		50 ML	Canalización de obras		
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____					
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS					
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA					
FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA					

Página: 2/2

Página: 2/2

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

[Handwritten signature]

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

SIRMA RESIDENTE INTERVENTO

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA		BITÁCORA DE OBRA		2021	
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		CONTRATO No.	1036-2021	
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		CONTRATO No.	1068-2021	
FECHA	23 / DIC / 2021		HORARIO	8:30 PM - 4:30 AM	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO ☒	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
FREENTE DE OBRA					
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA					
ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		
- Señalización Vertical	K+14 - (calle 21m)	UN	10		
- Pintura Acústica aplicación	Varias pautas o intersecciones	M ²	89		
- Pintura Acústica aplicación	calle 3 entre 11 y 14	ML	240		
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒					
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA					
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA	
PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO		SUMINISTRO DE MATERIALES	
CARGO	CANTIDAD				
DIRECTOR DE OBRA	1	Vehículo Furgon UPR 619		- Pintura Acústica	
RESIDENTE DE OBRA	1			- Pintura Plástica	
PROFESIONAL SISO				- Micrófono	
INGENIERO AUXILIAR				- Mortero para Señales Verticales	
MAESTRO GENERAL					
OFICIALES	5				
AYUDANTES	5				
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA					
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1				
OTRO					
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL					
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES	
CASCO	☒	GAFAS	☒		
BOTAS	☒	TAPA OÍDOS	☒		
GUANTES	☒	OTROS	Tapebocas ☒		
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA					
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Valla informativa			Información de vía cerrada ☒		
Barrera de madera			Cerrar la vía ☒		
Cinta de peligro		100 ML	Canalización de obras ☒		
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL: _____					
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS					
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA			FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA		

23/DIC/2021

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Página: 2/2



FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA		BITÁCORA DE OBRA		2021	
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		CONTRATO No.	1036-2021	
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		CONTRATO No.	1068-2021	
FECHA	24 / DIC / 2021		HORARIO	8:00 AM - 3:00 PM	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO ☒	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
FRETE DE OBRA					
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA					
ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		
- Demarcación Lineal - líneas	Via Lengua Ancho	ML	2200		
Continuos y discontinuos (Puntos)		ML	3200		
- Fabricación Señalización Vertical		UN	30		
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA ☐ SI ☒ NO					
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA					
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA	
PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA					
CARGO	CANTIDAD	MAQUINARIA Y EQUIPO		SUMINISTRO DE MATERIALES	
DIRECTOR DE OBRA		Vehículo Furgon UPR 619		- Pintura para pintura	
RESIDENTE DE OBRA	1				
PROFESIONAL SISO					
INGENIERO AUXILIAR					
MAESTRO GENERAL					
OFICIALES	1/8				
AYUDANTES	8				
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA					
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1				
OTRO					
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL					
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES	
CASCO	☒	GAFAS	☒		
BOTAS	☒	TAPA OÍDOS	☒		
GUANTES	☒	OTROS	Tapabocas ☒		
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA					
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Valla informativa			Información de vía cerrada ☒		
Barrera de madera			Cerrar la vía		
Cinta de peligro			Canalización de obras		
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES ☐ SI ☒ NO CUÁL:					
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS					
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA					
FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA					

24/Dic/2021

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Página: 2/2

* Se realizan actividades de localización - replanteo y
punteo de la demarcación de líneas continuas y discontinuas
en la vía Tunja - Arcabuce.



FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA		BITÁCORA DE OBRA		2021	
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página: 4/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		CONTRATO No.	1036-2021	
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		CONTRATO No.	1068-2021	
FECHA	27 / DIC / 2021		HORARIO	2:00PM - 10:00PM	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
FRETE DE OBRA					
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA					
ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		
* Aplicación de pintura acrílica en Vial Tunja - Acuña		ML	2300		
arcosafos Líneas continuas					
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒					
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA					
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA	
PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA					
CARGO	CANTIDAD	MAQUINARIA Y EQUIPO		SUMINISTRO DE MATERIALES	
DIRECTOR DE OBRA	1	Vehículo Furgo OPR 619		- Pintura Acrílica	
RESIDENTE DE OBRA	1				
PROFESIONAL SISO					
INGENIERO AUXILIAR					
MAESTRO GENERAL					
OFICIALES	1				
AYUDANTES	8				
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA					
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1				
OTRO					
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL					
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES	
CASCO	X	GAFAS	X		
BOTAS	X	TAPA OÍDOS	X		
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X		
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA					
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Valla informativa			Información de vía cerrada X		
Barrera de madera			Cerrar la vía X		
Cinta de peligro			Canalización de obras		
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____					
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS					
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA					
FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA					

27/DIC/2021

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Página: 2/2

Se retoman actividades de aplicación de pintura acrílica
con microporos, líneas continuas y discontinuas en 2 tramos
de la vía Tunja - Arcabuco



FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

[illegible]

Se realizan actividades en el Barrio la Florida, se deja constancia que la comunidad interrumpe las actividades programadas a las 4:00PM, por el motivo de estar inconformes con los cambios del flujo vehicular diseñado y solicitó reunión con funcionarios de la Alcaldía de Tunja.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA		BITÁCORA DE OBRA		2021	
PROYECTO		CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.			Página: 4/2
CONTRATISTA		CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1036-2021	
INTERVENTORIA		CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021	
FECHA		29 / DIC / 2021		HORARIO	3:00 PM - 12:00 AM
ESTADO DEL TIEMPO		SOLEADO	NUBLADO X	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
FRENTES DE OBRA					
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA					
ACTIVIDAD REALIZADA		LOCALIZACIÓN		UNIDAD	CANTIDAD
= Instalación de Señalización Vertical Calle 3 entre 1 y 4				UN	14
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒					
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA					
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA	
PERSONAL QUE LABORO EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO		SUMINISTRO DE MATERIALES	
CARGO	CANTIDAD				
DIRECTOR DE OBRA					
RESIDENTE DE OBRA	1			= Mortero para anclaje de señales	
PROFESIONAL SISO					
INGENIERO AUXILIAR					
MAESTRO GENERAL OFICIALES	1/3				
AYUDANTES					
DIRECTOR DE INTERVENTORIA					
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1				
OTRO					
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL					
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES	
CASCOS	X	GAFAS	X		
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X		
GUANTES	A	OTROS	Tapabocas X		
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA					
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Valla Informativa			Información de vía cerrada		
Barrera de madera			Cerrar la vía		
Cinta de peligro			Canalización de obras		
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____					
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS					
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA			FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA		

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

29/DIC

Página: 2/2

- El contratista informa que por ser época de invierno los proveedores de insumos están incumpliendo con los suministros y se puede presentar retrasos e inconvenientes de rendimiento en los temas de Microesferas y Papel 3M.



FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA		BITÁCORA DE OBRA		2021	
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		CONTRATO No.	1036-2021	
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		CONTRATO No.	1058-2021	
FECHA	30 / DIC. / 2021		HORARIO	4:00 PM - 10:00 PM	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO ☒	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
FRENTE DE OBRA					
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA					
ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		
- Aplicación de pintura acrílica	Via Tunja - Arauca	HL	1000 x 2 líneas		
líneas (continuas y discontinuas)	Calle 3 entre 11 y 14	HL	500		
		N/L	300		
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA ☐ SI ☒ NO					
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA					
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA	
PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA					
CARGO	CANTIDAD	MAQUINARIA Y EQUIPO		SUMINISTRO DE MATERIALES	
DIRECTOR DE OBRA		Vehículo Forgen VPR 619		- Pintura Acrílica	
RESIDENTE DE OBRA	1				
PROFESIONAL SISO					
INGENIERO AUXILIAR					
MAESTRO GENERAL					
OFICIALES	5				
AYUDANTES					
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA					
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1				
OTRO					
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL					
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES	
CASCO	☒	GAFAS	☒		
BOTAS	☒	TAPA OÍDOS	☒		
GUANTES	☒	OTROS	Tapabocas ☒		
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA					
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Valla informativa			Información de vía cerrada ☒		
Barrera de madera			Cerrar la vía ☒		
Cinta de peligro			Canalización de obras		
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES ☐ SI ☒ NO CUÁL _____					
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS					
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA					
FIRMA RESIDENTE INTERVENTORÍA					

* Se aplica pintura acrílica para líneas continuas y discontinuas en los tramos aptos o en condiciones para su aplicación (Vía Tingo-Araucario)



FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA		BITÁCORA DE OBRA		2021	
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		CONTRATO No.	1036-2021	
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		CONTRATO No.	1068-2021	
FECHA	31 / DIC / 2021		HORARIO	8:00 A: 12:00 Y	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
FRETE DE OBRA					
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA					
ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		
* Visitas para verificación del estado actual de los cerros a intervenir	General	VN	40		
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒					
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA					
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA	
PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO		SUMINISTRO DE MATERIALES	
CARGO	CANTIDAD				
DIRECTOR DE OBRA	1				
RESIDENTE DE OBRA					
PROFESIONAL SISO					
INGENIERO AUXILIAR					
MAESTRO GENERAL					
OFICIALES					
AYUDANTES					
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA					
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1				
OTRO					
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL					
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES	
CASCO	X	GAFAS	X		
BOTAS	X	TAPA OÍDOS	X		
GUANTES	X	OTROS	Tape boca		
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA					
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Valla informativa			Información de vía cerrada		
Barrera de madera			Cerrar la vía		
Cinta de peligro			Canalización de obras		
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL					
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS					
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA			FIRMA RESIDENTE INTERVENTORÍA		


31/DIC/2021

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Página: 2/2

1

* Una vez efectuado el recorrido en las diferentes direcciones donde se aplicará la pintura plástica en frío para los resaltos, se evidencian el mal estado de algunos (Fisuras, concretos completamente fallados, piel de cocodrilo). Solicitamos se autorice aplicar imprimante donde se requiera y no aplicar en algunos que se encuentran en gran porcentaje destruidos o muy deteriorados.



FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA		BITÁCORA DE OBRA		2021	
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		CONTRATO No.	1036-2021	
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		CONTRATO No.	1068-2021	
FECHA	31 Enero 1/2020		HORARIO	8:00 PM - 2:00 AM	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
PRESENTE DE OBRA					
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA					
ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		
* Señalización Vertical	Barrio la Florida	UN	15		
* Aplicación pintura plastica en frío	1	ML	30		
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA					
SI ☐ NO ☒					
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA					
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA	
PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO		SUMINISTRO DE MATERIALES	
CARGO	CANTIDAD				
DIRECTOR DE OBRA		Vehículo Forgon UPR 619		- Microscopio	
RESIDENTE DE OBRA	1			- Pintura plastica	
PROFESIONAL SISO				- Mortero para cemento	
INGENIERO AUXILIAR					
MAESTRO GENERAL					
OFICIALES	1				
AYUDANTES	3				
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA					
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1				
OTRO					
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL					
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES	
CASCO	☒	GAFAS	☒		
BOTAS	☒	TAPA OÍDOS	☒		
GUANTES	☒	OTROS	Tapabocas ☒		
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA					
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Valla Informativa			Información de vía cerrada ☒		
Barrera de madera			Cerrar la vía ☒		
Cinta de peligro		40 ML	Canalización de obra ☒		
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES					
SI ☐ NO ☒ CUAL					
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS					
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA			FIRMA RESIDENTE INTERVENTORÍA		

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

3/ Enero/2021

Página: 2/2



FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA		BITÁCORA DE OBRA		2021		
PROYECTO		"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."			Página: 1/2	
CONTRATISTA		CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		CONTRATO No.	1036-2021	
INTERVENTORIA		CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		CONTRATO No.	1068-2021	
FECHA		4/ Enero /2022		HORARIO	8:00PM - 12:00 M	
ESTADO DEL TIEMPO		SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
PRESNTE DE OBRA						
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA						
ACTIVIDAD REALIZADA		LOCALIZACIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	
- Aplicación de Pintura plástica en frío		- Barrio Florido		M ²	10	
		- Diferentes puntos		M ²	80	
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA						
SI ☐ NO ☒						
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA						
DESCRIPCIÓN		ACCIÓN DE CORRECCIÓN		LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO		SUMINISTRO DE MATERIALES		
CARGO	CANTIDAD					
DIRECTOR DE OBRA	1	Vehículo Furgon UPR 6M		- Pintura plástica		
RESIDENTE DE OBRA	1			- Microcifras para marcas viales		
PROFESIONAL SISO						
INGENIERO AUXILIAR						
MAESTRO GENERAL						
OFICIALES	1					
AYUDANTES	5					
DIRECTOR DE INTERVENTORIA						
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1					
OTRO						
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL						
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES		
CASCO	X	GAFAS	X			
BOTAS	X	TAPA OÍDOS	X			
GUANTES	X	OTROS	Tapebocas X			
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA						
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES			
Valla Informativa			Información de vía cerrada X			
Barra de madera			Cerrar la vía X			
Cinta de peligro		30ML	Canalización de obras			
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES						
SI ☐ NO ☒ CUÁL _____						
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS						
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA						
FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA						


233

4/Enero/2022
2/2

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Página:

- Se realizan actividades de aplicación de pintura plástica en frío, y se efectúan las modificaciones de sentidos e direcciones viales en el Barrio la Florida, lo anterior de acuerdo al diseño modificado, entregados por la supervisión de la alcaldía de Tunja.



FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 37 DE 98

ANEXO 11.10 INFORMES SEMANALES

	ALCALDIA DE TUNJA		FECHA: 09/09/2019
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		VERSIÓN: 01
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA		CODIGO:GIN-F- 033
	FORMATO:INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		

* Esta versión aplica para los contratos que inician posteriormente a la fecha de la vigencia de este formato

FECHA	18 DE NOVIEMBRE DE 2021	PERIODO No.	5	DEL	03 DE DIC DE 2021	AL	09 DE DIC DE 2021
-------	-------------------------	-------------	---	-----	-------------------	----	-------------------

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"									
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE TUNJA									
CONTRATO DE INTERVENTORIA					CONTRATO DE OBRA					
CONTRATO No.:	1068 DE 2021				CONTRATO No.:	1036 DE 021				
PLAZO INICIAL:	3 MESES				PLAZO INICIAL:	3 MESES				
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021				FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021				
**FECHA DE SUSPENSIÓN:					**FECHA DE SUSPENSIÓN:					
**FECHA DE REINICIACIÓN:					**FECHA DE REINICIACIÓN:					
FECHA DE TERMINACIÓN:	04 DE FEBRERO DE 2022				FECHA DE TERMINACIÓN:	04 DE FEBRERO DE 2022				
PLAZO ACTUALIZADO:	92				PLAZO ACTUALIZADO:	92				
PLAZO TRANSCURRIDO:	35	EQUIVALE AL	38%		PLAZO TRANSCURRIDO:	35	EQUIVALE AL	38%		
VALOR INICIAL :	\$		37.074.450.00		VALOR INICIAL :	\$		642.638.556.00		
VALOR ADICION(ES):					VALOR ADICION(ES):					
VALOR ACTUALIZADO:	\$		37.074.450.00		VALOR ACTUALIZADO:	\$		642.638.556.00		
VALOR PAGADO:	<Valor acumulado efectivamente pagado al interventor>				VALOR PAGADO:	<Valor acumulado efectivamente pagado al Contratista (recuerde que el anticipo no es un pago)>				
VALOR POR PAGAR:					VALOR POR PAGAR:					
SUPERVISOR:	ING. LUIS FELIPE CARDENAS AVILA				INTERVENTOR:	ING. CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ				

2. CONTROL DE HITOS.

No.	DESCRIPCIÓN DE LOS ITEMS	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (OBLIGATORIO)	5/11/2021	5/11/2021	0
0	Recopilación de información, entrega de documentación para inicio del contrato, revisión y armonización de los diseños, entrega del plan de manejo de tráfico y autorización por parte de interventoría y entidad contratante para el inicio de las actividades	19/11/2021	19/11/2021	0
2	Marcas viales con pintura de trafico segun norma invias y diseño (incluye microesferas)	4/02/2022	4/02/2022	0
3	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio alta duración metil-metacrilato 100% puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma ntc-1360-1, para pasos peatonales, avisos en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehículos y peatones (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra)	4/02/2022	4/02/2022	0
4	Suministro y aplicación de pintura acrilica con microesferas, líneas continuas y discontinuas de 12 cms segun norma invias	4/02/2022	4/02/2022	0
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)	4/02/2022	4/02/2022	0
Plazo del proyecto en días		92	92	0

Inserte las filas que requiera según el número de items

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	\$ 64.782.719.00	10.08%	0.02%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la interventoría.	\$ 64.942.280.00	10.11%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (cronograma de actividades), Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental y Seguridad industrial

Con respecto al informe tecnico que contratista de obra presentó en el cual informa el estado actual de las vías priorizadas a intervención inicial, en el cual se puede observar que la mayoría de intersecciones se encuentran en un mal estado, por lo cual se hace necesario realizar un mantenimiento de estas, así mismo informa que la estabilidad de la obra sería reducida a solo 12 meses.

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
La entidad informa que respecto al estado crítico de algunos puntos de intervención, que el contrato de reparcho que se está ejecutando actualmente no contempla el arreglo de fisuras ni deterioros similares, entonces hay que acomodarnos a las condiciones el pavimento como estén, utilizando la pintura acrilica.	Secretaría de transito y transporte	

236

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:

a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría:

1. una vez realizado recorrido de obra el día 16 de Noviembre de 2021, se identifica que en algunos sectores se deben instalar estoperoles metálicos como dispositivo para reducción de velocidad, es el caso del sector de la avenida colon con carrera 12, avenida colon con calle 24 y calle 25 y la vía Tunja Arcabuco sector Barrio San Rafael.

b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APUS por parte de la Interventoría y del contratista: el día 25 de Noviembre del 2021, el contratista presenta los análisis de precios unitarios para el siguiente ítem: 1. NP04: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES METÁLICOS D=10CM H=2CMS (incluye: Planta Eléctrica, Taladro, Broca, Aditivo Epóxico, y demas elementos para su correcta instalación).

c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte del MUNICIPIO: la interventoría de obra realizará la revisión así mismo la entidad contratante realizará la respectiva revisión y aprobación.

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y trámites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:

1. Asistencia a comité virtual número 4, el día 03 de Diciembre de 2021, con asistencia del contratista de obra y supervisores de secretaría de tránsito y transporte, en el cual se informa avance físico, financiero y temporal del contrato, así como se fijan compromisos por las partes para avanzar en la ejecución del contrato.

2. Revisión de documentación remitida por el contratista y supervisor, a continuación se relaciona la documentación recibida y enviada, junto con la actuación de la interventoría:

FECHA DOCUMENTACIÓN APORTADA Y ACTUACIÓN INTERVENTORIA:

OFICIO RECIBIDO DEL CONTRATISTA 26-11-2021. Apus ítem no previsto Estoperoles metálicos. ACTUACIÓN INTERVENTORIA: Revisión.

OFICIO RECIBIDO DEL CONTRATISTA 01-12-2021. Solicitud mantenimiento vial a intervenir. ACTUACIÓN INTERVENTORIA: Revisión y remisión a entidad contratante.

OFICIO ENVIADO A SUPERVISOR del 02-12-2021. Remite a entidad contratante solicitud del contratista mantenimiento de vial a intervenir.

ACTIVIDADES FÍSICAS REALIZADAS: En la presente semana se intervinieron los siguientes sectores de la ciudad.

1. CARRERA 9 CON CALLE 22 (BRIGADA): se ejecuta demarcación horizontal con la aplicación de pintura plástica método manual a llana, según diseños.

2. CARRERA 9 CON CALLE 25 (SALESIANO): se ejecuta demarcación horizontal con la aplicación de pintura acrílica según diseños.

3. CARRERA 7 CON CALLE 17 (ANTIGUO TERMINAL): se ejecuta demarcación horizontal con la aplicación de pintura plástica método manual a llana y pintura acrílica, según diseños.

4. CARRERA 7 CON CALLE 18: se ejecuta demarcación horizontal con la aplicación de pintura plástica método manual a llana, según diseños.

5. CARRERA 8 CON CALLE 20 (PILA DEL MONO): se ejecuta demarcación horizontal con la aplicación de pintura plástica método manual a llana, según diseños.

6. CARRERA 10 CON CALLE 21 (CAMOL): se ejecuta demarcación horizontal con la aplicación de pintura plástica método manual a llana, según diseños.

7. CARRERA 15 CON CALLE 19 (TOPO): se ejecuta demarcación horizontal con la aplicación de pintura plástica método manual a llana y pintura acrílica, según diseños.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

ACTIVIDADES EJECUTADAS CARRERA 9 CON CALLE 22 (BRIGADA):



ACTIVIDADES EJECUTADAS CARRERA 9 CON CALLE 25 (SALESIANO)



CARRERA 7 CON CALLE 17 (ANTIGUO TERMINAL)



CARRERA 7 CON CALLE 18



ACTIVIDADES EJECUTADAS CARRERA 8 CON CALLE 20 (PILA DEL MONO)



ACTIVIDADES EJECUTADAS CARRERA 10 CON CALLE 21 (CAMOL)



ACTIVIDADES EJECUTADAS CARRERA 15 CON CALLE 19 (TOPO)





ENSAYOS PARA PRUEBA DE ESPESOR PINTURA PLASTICA

Para la aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frío alta duración metil-metacrilato 100% puro para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC-1360-1, para avisos en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehículos y peatones.



RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: ING. FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE

CONTRATISTA
NOMBRE: ING. CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma

	ALCALDÍA DE TUNJA		FECHA: 09/09/2019
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		VERSIÓN: 01
	PROCESO: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA		CODIGO: GIN-F- 033
	FORMATO: INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		

* Esta versión aplica para los contratos que inicien posteriormente a la fecha de la vigencia de este formato

FECHA	16 DE DICIEMBRE DE 2021	PERIODO No.	6	DEL	10 DE DIC DE 2021	AL	16 DE DIC DE 2021
1. INFORMACIÓN GENERAL							
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA*						
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE TUNJA						
CONTRATO DE INTERVENTORIA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	1068 DE 2021			CONTRATO No.:	1036 DE 021		
PLAZO INICIAL:	3 MESES			PLAZO INICIAL:	3 MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021			FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:				**FECHA DE SUSPENSIÓN:			
**FECHA DE REINICIACIÓN:				**FECHA DE REINICIACIÓN:			
FECHA DE TERMINACIÓN:	04 DE FEBRERO DE 2022			FECHA DE TERMINACIÓN:	04 DE FEBRERO DE 2022		
PLAZO ACTUALIZADO:	92			PLAZO ACTUALIZADO:	92		
PLAZO TRANSCURRIDO:	42 EQUIVALE AL 46%			PLAZO TRANSCURRIDO:	42 EQUIVALE AL 46%		
VALOR INICIAL :	\$ 37.074.450.00			VALOR INICIAL :	\$ 642.638.556.00		
VALOR ADICION(ES):				VALOR ADICION(ES):			
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 37.074.450.00			VALOR ACTUALIZADO:	\$ 642.638.556.00		
VALOR PAGADO:	<Valor acumulado efectivamente pagado al interventor			VALOR PAGADO:	<Valor acumulado efectivamente pagado al Contratista (recuerde que el anticipo no es un pago)>		
VALOR POR PAGAR:				VALOR POR PAGAR:			
SUPERVISOR:	ING. LUIS FELIPE CARDENAS AVILA			INTERVENTOR:	ING. CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		

2. CONTROL DE HITOS.				
No.	DESCRIPCIÓN DE LOS ITEMS	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (OBLIGATORIO)	5/11/2021	5/11/2021	0
0	Recopilación de información, entrega de documentación para inicio del contrato, revisión y armonización de los diseños, entrega del plan de manejo de tráfico y autorización por parte de interventoría y entidad contratante para el inicio de las actividades	19/11/2021	19/11/2021	0
1	Suministro e instalación de señales reglamentarias 60 x 60 cm	3/02/2022	3/02/2022	0
2	Marcas viales con pintura de tráfico según norma invías y diseño (incluye microesferas)	4/02/2022	4/02/2022	0
3	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frío alta duración metil-metacrilato 100% puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma ntc-1360-1, para pasos peatonales, avisos en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehículos y peatones (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra)	4/02/2022	4/02/2022	0
4	Suministro y aplicación de pintura acrílica con microesferas, líneas continuas y discontinuas de 12 cms según norma invías	4/02/2022	4/02/2022	0
5	Suministro e instalación de señalización vial vertical doble (duplex) en papel reflectivo 60 x 60 zona urbana, según especificaciones relacionadas en el manual de señalización vial adoptado por la resolución 1885 de 2015, numerales 2.2.2. Y 2.1.6.2 (incluye todos los elementos necesarios para su instalación entre ellos herramienta menor, excavación, concreto y mano de obra)	3/01/2022	3/01/2022	0
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)	4/02/2022	4/02/2022	0
Plazo del proyecto en días		92	92	0
Inserte las filas que requiera según el número de ítems				

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	\$ 95.758.590.00	14.90%	4.10%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	\$ 122.130.946.00	19.00%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS	
Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (cronograma de actividades), Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental y Seguridad Industrial	

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

242

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:

- Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la interventoría;
- Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoría y del contratista;
- Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte del MUNICIPIO;

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y trámites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al período del informe.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:

1. Asistencia a comité virtual número 4, el día 03 de Diciembre de 2021, con asistencia del contratista de obra y supervisores de secretaría de tránsito y transporte, en el cual se informa avance físico, financiero y temporal del contrato, así como se fijan compromisos por las partes para avanzar en la ejecución del contrato.

2. Revisión de documentación remitida por el contratista y supervisor, a continuación se relaciona la documentación recibida y enviada, junto con la actuación de la interventoría:

FECHA DOCUMENTACIÓN APORTADA Y ACTUACIÓN INTERVENTORIA:

OFICIO RECIBIDO DEL CONTRATISTA 10-12-2021. PMT vía Tunja Arcabuco. ACTUACIÓN INTERVENTORIA: Revisión y solicitud de ajustes..

OFICIO RECIBIDO DEL CONTRATISTA 14-12-2021. PMT señalización vertical. ACTUACIÓN INTERVENTORIA: Revisión y remisión a entidad contratante.

OFICIO RECIBIDO DEL CONTRATISTA 15-12-2021. PMT ajustado vía Tunja Arcabuco. ACTUACIÓN INTERVENTORIA: Revisión y remisión a entidad contratante..

OFICIO ENVIADO A SUPERVISOR 13-2-2021. Solicitud totalidad de estudios y diseños.

ACTIVIDADES FÍSICAS REALIZADAS: En la presente semana se intervinieron los siguientes sectores de la ciudad.

1. CARRERA 8 CON CALLE 18 : se ejecuta demarcación horizontal con la aplicación de pintura plástica método manual a llana, según diseños.

2. CARRERA 8 CON CALLE 23: se ejecuta demarcación horizontal con la aplicación de pintura plástica método manual a llana, según diseños.

3. CARRERA 6 CON CALLE 25: se ejecuta demarcación horizontal con la aplicación de pintura plástica método manual a llana y pintura acrílica, según diseños.

4. CARRERA 7 CON CALLE 19 se ejecuta demarcación horizontal con la aplicación de pintura plástica método manual a llana y pintura acrílica, según diseños.

5. CARRERA 7 CON CALLE 20 (ESQUINA CTI), se ejecuta demarcación horizontal con la aplicación de pintura plástica método manual a llana, según diseños.

6. CARRERA 10 CON CALLE 21A (HOTEL HUNZA): se ejecuta demarcación horizontal con la aplicación de pintura plástica método manual a llana, según diseños.

7. CARRERA 11 CON CALLE 17 (LUMOL): se ejecuta demarcación horizontal con la aplicación de pintura plástica método manual a llana y pintura acrílica, según diseños.

8. CARRERA 16

CON CALLE 32 (LA ESPERANZA) se ejecuta demarcación horizontal con la aplicación de pintura plástica método manual a llana y pintura acrílica, según diseños

9. COLEGIO GALILEO GALILEI se ejecuta demarcación horizontal con la aplicación de pintura plástica método manual a llana, según diseños

10. CALLE 3 ENTRE CARRERAS 10 Y 14 (PARCIAL DEMARCACIÓN HORIZONTAL): se ejecuta demarcación horizontal con la aplicación de pintura plástica método manual a llana y pintura acrílica, según diseños

11. VIA TUNJA ARCABUCO (PARCIAL SEÑALIZACIÓN VERTICAL): se ejecuta demarcación horizontal con la aplicación de pintura acrílica, según diseños

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

ACTIVIDADES EJECUTADAS CARRERA 8 CON CALLE 18



ACTIVIDADES EJECUTADAS CARRERA 8 CON CALLE 23



ACTIVIDADES EJECUTADAS CARRERA 8 CON CALLE 25



ACTIVIDADES EJEJUTADAS CARRERA 7 CON CALLE 19



ACTIVIDADES EJEJUTADAS CARRERA 7 CON CALLE 20 (ESQUINA CTI)



ACTIVIDADES EJEJUTADAS CARRERA 10 CON CALLE 21A (HOTEL HUNZA)



ACTIVIDADES EJECUTADAS CARRERA 11 CON CALLE 17 (LUMOL)



ACTIVIDADES EJECUTADAS CARRERA 16 CON CALLE 32



ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO GALILEO GALILEI



ACTIVIDADES EJECUTADAS CALLE 3 ENTRE CARRERAS 10 Y 14 (PARCIAL DEMARCACION HORIZONTAL)



ACTIVIDADES EJECUTADAS VIA TUNJA ARCABUCO (PARCIAL SEÑALIZACION VERTICAL)



[Handwritten signature]

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOMBRE: ING. FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE

[Handwritten signature]

CONTRATISTA

NOMBRE: ING. CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma

	ALCALDIA DE TUNJA		FECHA: 09/09/2019	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		VERSIÓN: 01	
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA		CODIGO:GIN-F-033	
	FORMATO: INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA			

* Esta versión aplica para los contratos que inicien posteriormente a la fecha de la vigencia de este formato

FECHA	23 DE DICIEMBRE DE 2021	PERIODO No.	7	DEL	19 DE DIC DE 2021	AL	23 DE DIC DE 2021
-------	-------------------------	-------------	---	-----	-------------------	----	-------------------

1. INFORMACIÓN GENERAL			
OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE TUNJA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	1068 DE 2021	CONTRATO No.:	1036 DE 021
PLAZO INICIAL:	3 MESES	PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	04 DE FEBRERO DE 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	04 DE FEBRERO DE 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	92	PLAZO ACTUALIZADO:	92
PLAZO TRANSCURRIDO:	49 EQUIVALE AL 53%	PLAZO TRANSCURRIDO:	49 EQUIVALE AL 53%
VALOR INICIAL:	\$ 37.074.450.00	VALOR INICIAL:	\$ 642.638.556.00
VALOR ADICION(ES):		VALOR ADICION(ES):	
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 37.074.450.00	VALOR ACTUALIZADO:	\$ 642.638.556.00
VALOR PAGADO:	<Valor acumulado efectivamente pagado al interventor	VALOR PAGADO:	<Valor acumulado efectivamente pagado al Contratista (recuerde que el anticipo no es un pago)>
VALOR POR PAGAR:		VALOR POR PAGAR:	
SUPERVISOR:	ING. LUIS FELIPE CARDENAS AVILA	INTERVENTOR:	ING. CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

2. CONTROL DE HITOS.				
No.	DESCRIPCIÓN DE LOS ITEMS	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (OBLIGATORIO)	5/11/2021	5/11/2021	0
0	Recopilación de información, entrega de documentación para inicio del contrato, revisión y armonización de los diseños, entrega del plan de manejo de tráfico y autorización por parte de interventoría y entidad contratante para el inicio de las actividades	19/11/2021	19/11/2021	0
1	Suministro e instalación de señales reglamentarias 60 x 60 cm	3/02/2022	3/02/2022	0
2	Marcas viales con pintura de tráfico según norma invías y diseño (incluye microesferas)	4/02/2022	4/02/2022	0
3	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frío alta duración metilmetacrilato 100% puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma ntc-1360-1, para pasos peatonales, avisos en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehículos y peatones (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra)	4/02/2022	4/02/2022	0
4	Suministro y aplicación de pintura acrílica con microesferas, líneas continuas y discontinuas de 12 cms según norma invías	4/02/2022	4/02/2022	0
5	Suministro e instalación de señalización vial vertical doble (duplex) en papel reflectivo 60 x 60 zona urbana, según especificaciones relacionadas en el manual de señalización vial adoptado por la resolución 1885 de 2015, numerales 2.2.2. Y 2.1.6.2 (incluye todos los elementos necesarios para si instalación entre ellos herramienta menor, excavación, concreto y mano de obra)	3/01/2022	3/01/2022	0
6	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito preventivas sp-47b, tamaño 60 x 60 cm. Elaboradas en lámina galvanizada cal.16 papel reflectivo grado xi (diamante al cubo marca 3m) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática. Según norma invías.	18/01/2022	18/01/2022	0
7	Retiro de señales verticales (incluye pedestal y tablero) con entrega en la respectiva entidad territorial (incluye señales sencillas y dúplex)	6/01/2022	6/01/2022	0
8	Suministro e instalación señales verticales sr-38, lámina galvanizada reflectividad tipo xi, grado diamante al cubo, con pedestal.	19/01/2022	19/01/2022	0
9	Señales preventivas (sp) y reglamentarias (sr) 60 x 60 cm reflectivo verde limón	26/01/2022	26/01/2022	0
10	Señales de tránsito dimensiones 60*75 cms (delineadores de curva) según norma invías	2/02/2022	2/02/2022	0
11	Señales de tránsito 0.90*1.13 mts (informativas) según norma invías	2/02/2022	2/02/2022	0
12	Suministro e instalación de tachas reflectivas unidireccionales y bidireccionales	4/02/2022	4/02/2022	0
13	Suministro e instalación de hitos (alto =75 cm d=8 cm) de color amarillo	4/02/2022	4/02/2022	0
14	Suministro e instalación de tachones 40*15*8 cm	4/02/2022	4/02/2022	0
15	Estoperoles d=10 cm h=25 cms	4/02/2022	4/02/2022	0
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)	4/02/2022	4/02/2022	0
Plazo del proyecto en días		92	92	0

Inserte las filas que requiera según el número de ítems

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	\$ 150.170.956.00	23.37%	6.64%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	\$ 192.812.963.00	30.00%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (cronograma de actividades), Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental y Seguridad Industrial

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:

- Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría;
- Avance o estado de elaboración de especificaciones y APUS por parte de la Interventoría y del contratista;
- Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte del MUNICIPIO;

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y trámites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al período del informe.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:

1. Asistencia a comité virtual número 17, el día 17 de Diciembre de 2021, con asistencia del contratista de obra y supervisores de secretaría de tránsito y transporte, en el cual se informa avance físico, financiero y temporal del contrato, así como se fijan compromisos por las partes para avanzar en la ejecución del contrato.

2. Revisión de documentación remitida por el contratista y supervisor, a continuación de relaciona la documentación recibida y enviada, junto con la actuación de la Interventoría:

FECHA DOCUMENTACIÓN APORTADA Y ACTUACIÓN INTERVENTORIA:

OFICIO RECIBIDO DE SUPERVISIÓN 17-12-2021. Reductores de velocidad a intervenir. ACTUACIÓN INTERVENTORIA: Revisión y remisión a contratista.

OFICIO ENVIADO AL CONTRATISTA 17-12-2021. Remisión Reductores de velocidad a intervenir.

OFICIO ENVIADO A SUPERVISIÓN 22-12-2021. Registro fotográfico sectores intervenidos a la fecha.

ACTIVIDADES FÍSICAS REALIZADAS: En la presente semana se intervinieron los siguientes sectores de la ciudad.

1. CARRERA 12 CON CALLE 18: se ejecuta demarcación horizontal con la aplicación de pintura plástica método manual a llana, según diseños.

2. CALLE 3 ENTRE CARRERAS 10 Y 14 (DEMARCAÇÃO HORIZONTAL Y DEMARCAÇÃO VERTICAL PARCIAL): se ejecuta demarcación horizontal con la aplicación de pintura plástica método manual a llana y pintura acrílica, según diseños y se realiza el suministro e instalación de señales verticales parcialmente.

3. VIA TUNJA ARCABUO (DEMARCAÇÃO HORIZONTAL Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL): se ejecuta demarcación horizontal con la aplicación de pintura acrílica, según diseños y se realiza el suministro e instalación de señales verticales.

4. VIAS INTERNAS BARRIO LA FLORIDA: se ejecuta demarcación horizontal con la aplicación de pintura plástica método manual a llana, según diseños.

5. Suministro e instalación de hitos (alto = 75 cm d=8 cm) de color amarillo: Se realiza la instalación de hitos en la isleta de la avenida maldonado sector glorieta maldonado, en la intersección de las nievas (sector mr king), en la intersección de la carrera 9 con calle 25 (esquina salesiano).

6. Suministro e instalación de tachones 40*15*8 cm: Se realiza la instalación de tachones en la isleta de la avenida maldonado sector glorieta maldonado, en la intersección de las nievas (sector mr king), en la intersección de la carrera 9 con calle 25 (esquina salesiano).

7. Retiro de señales verticales (incluye pedestal y tablero) con entrega en la respectiva entidad territorial (incluye señales sencillas y dúplex): se realiza retiro de señales verticales en la vía Tunja Arcahuo, en la calle 3 entre carreras 11 y 14.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

ACTIVIDADES EJECUTADAS CARRERA 12 CON CALLE 18



ACTIVIDADES VIAS INTERNAS BARRIO LA FOLRIDA



ACTIVIDADES EJECUTADAS CALLE 3 ENTRE CARRERAS 10 Y 14 (DEMARCACION HORIZONTAL)



ACTIVIDADES EJECUTADAS CALLE 3 ENTRE CARRERAS 10 Y 14 (INSTALACION SEÑALES VERTICALES)



ACTIVIDADES EJECUTADAS VIA TUNJA ARCABUCO (SEÑALIZACION VERTICAL)



ACTIVIDADES EJECUTADAS SUMINISTRO E INSTALACION DE HITOS Y TACHONES



ACTIVIDADES EJECUTADAS RETIRO DE SEÑALES VERICALES



RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOMBRE: ING. FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE

CONTRATISTA

NOMBRE: ING. CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma

Dirección: Calle 19 # 9 - 95 Piso 4 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Teléfono: (57 8) 7 40 57 70 ext. 1409
Correo electrónico: infraestructura@tunja-boyaca.gov.co web: <http://www.tunja-boyaca.gov.co>
Código postal: 150001

	ALCALDIA DE TUNJA				FECHA: 09/09/2019	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION				VERSIÓN: 01	
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA				CODIGO:GIN-F- 033	
	FORMATO:INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA					

* Esta versión aplica para los contratos que inicien posteriormente a la fecha de la vigencia de este formato

FECHA	30 DE NOVIEMBRE DE 2021	PERIODO No.	8	DEL	24 DE DIC DE 2021	AL	30 DE DIC DE 2021
-------	-------------------------	-------------	---	-----	-------------------	----	-------------------

1. INFORMACIÓN GENERAL			
OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE TUNJA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	1068 DE 2021	CONTRATO No.:	1036 DE 021
PLAZO INICIAL:	3 MESES	PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	04 DE FEBRERO DE 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	04 DE FEBRERO DE 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	92	PLAZO ACTUALIZADO:	92
PLAZO TRANSCURRIDO:	56 EQUIVALE AL 61%	PLAZO TRANSCURRIDO:	56 EQUIVALE AL 61%
VALOR INICIAL :	\$ 37.074.450.00	VALOR INICIAL :	\$ 642.638.556.00
VALOR ADICION(ES):		VALOR ADICION(ES):	
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 37.074.450.00	VALOR ACTUALIZADO:	\$ 642.638.556.00
VALOR PAGADO:	<Valor acumulado efectivamente pagado al Contratista (recuerde que el anticipo no es un pago)>		
VALOR POR PAGAR:		VALOR POR PAGAR:	
SUPERVISOR:	ING. LUIS FELIPE CARDENAS AVILA	INTERVENTOR:	ING. CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

2. CONTROL DE HITOS.				
No.	DESCRIPCIÓN DE LOS ITEMS	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (OBLIGATORIO)	5/11/2021	5/11/2021	0
0	Recopilación de información, entrega de documentación para inicio del contrato, revisión y armonización de los diseños, entrega del plan de manejo de tráfico y autorización por parte de interventoría y entidad contratante para el inicio de las actividades	19/11/2021	19/11/2021	0
1	Suministro e instalacion de señales reglamentarias 60 x 60 cm	3/02/2022	3/02/2022	0
2	Marcas viales con pintura de trafico segun norma invias y diseño (incluye microesferas)	4/02/2022	4/02/2022	0
3	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio alta duración metilmetacrilato 100% puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma ntc-1360-1, para pasos peatonales, avisos en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehículos y peatones (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra)	4/02/2022	4/02/2022	0
4	Suministro y aplicacion de pintura acrilica con microesferas, líneas continuas y discontinuas de 12 cms segun norma invias	4/02/2022	4/02/2022	0
5	Suministro e instalacion de señalización vial vertical doble (duplex) en papel reflectivo 60 x 60 zona urbana, según especificaciones relacionadas en el manual de señalización vial adoptado por la resolución 1885 de 2015, numerales 2.2.2. Y 2.1.6.2 (incluye todos los elementos necesarios para si instalacion entre ellos herramienta menor, excavación, concreto y mano de obra)	3/01/2022	3/01/2022	0
6	Suministro e instalacion de señal vertical de transito preventivas sp-47b, tamaño 60 x 60 cm. Elaboradas en lamina galvanizada cal.16 papel reflectivo grado xi (diamante al cubo marca 3m) pedestal elaborado en angulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostatica. Segun norma invias..	18/01/2022	18/01/2022	0
7	Retiro de señales verticales (incluye pedestal y tablero) con entrega en la respectiva entidad territorial (incluye señales sencillas y dúplex)	6/01/2022	6/01/2022	0
8	Suministro e instalacion señales verticales sr-38, lámina galvanizada reflectividad tipo xi, grado diamante al cubo, con pedestal.	19/01/2022	19/01/2022	0
9	Señales preventivas (sp) y reglamentarias (sr) 60 x 60 cm reflectivo verde limon	26/01/2022	26/01/2022	0
10	Señales de transito dimensiones 60*75 cms (delineadores de curva) según norma invias	2/02/2022	2/02/2022	0
11	Señales de transito 0.90*1.13 mts (informativas) segun norma invias	2/02/2022	2/02/2022	0
12	Suministro e instalacion de tachas reflectivas unidireccionales y bidireccionales	4/02/2022	4/02/2022	0
13	Suministro e instalacion de hitos (alto =75 cm d=8 cm) de color amarillo	4/02/2022	4/02/2022	0
14	Suministro e instalacion de tachones 40*15*8 cm	4/02/2022	4/02/2022	0
15	Estoperoles d=10 cm h=25 cms	4/02/2022	4/02/2022	0
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)	4/02/2022	4/02/2022	0
Plazo del proyecto en días		92	92	0

Inserte las filas que requiera según el número de ítems

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	\$ 220.207.652.00	34.27%	2.93%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	\$ 239.054.163.00	37.20%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (cronograma de actividades), Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental y Seguridad Industrial

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:

- Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría:
- Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la Interventoría y del contratista:
- Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte del MUNICIPIO:

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y trámites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:

1. Asistencia a comilla virtual numero 7, el día 24 de Diciembre de 2021, con asistencia del contratista de obra y supervisores de secretaria de tránsito y transporte, en el cual se informa avance físico, financiero y temporal del contrato, así como se fijan compromisos por las partes para avanzar en la ejecución del contrato.

2. Revisión de documentación remitida por el contratista y supervisor, a continuación se relaciona la documentación recibida y enviada, junto con la actuación de la interventoría:

FECHA DOCUMENTACION APORTADA Y ACTUACION INTERVENTORIA:

OFICIO RECIBIDO DE CONTRATISTA 30-12-2021. Remision informe mensual numero 1 . ACTUACION INTERVENTORIA:Revisión..

ACTIVIDADES FISICAS REALIZADAS: En la presente semana se intervinieron los siguientes sectores de la ciudad.

1. CALLE 3 ENTRE CARRERAS 10 Y 14 (DEMARCACION HORIZONTAL Y DEMARACACION VERTICAL): se ejecuta demarcacion de la línea de 12 cms de ancho con la aplicación de pintura acrílica, según planos diseños, en una longitud aproximada de 500 metros lineales y se continúa con el suministro e instalación de señales verticales.



2. VIA TUNJA ARCABUCO (DEMARACION LINEAL): se ejecuta demarcacion de la línea doble continua con la aplicación de pintura acrílica, según planos diseños, en una longitud aproximada de 3500 metros lineales.


4. VIAS INTERNAS BARRIO LA FLORIDA :se ejecuta demarcacion horizontal con la aplicación de pintura plastica metodo manual a llana, según diseños y se realiza suministro e instalación de señales verticales, según planos de diseño.

5. Se realiza ensayos de retroflectividad en la demarcacion horizontal en la vía Tunja Arcabuco, Calle 3 entre carreras 11 y 14, Resultados acordes a los exigido en la norma NTC 4744-C.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

ACTIVIDADES EJECUTADAS CALLE 3 ENTRE CARRERAS 10 Y 14 DEMARCACION LINEA DE 12 CMS

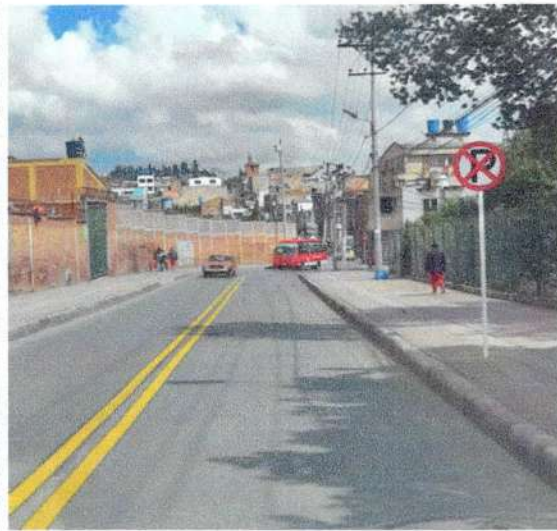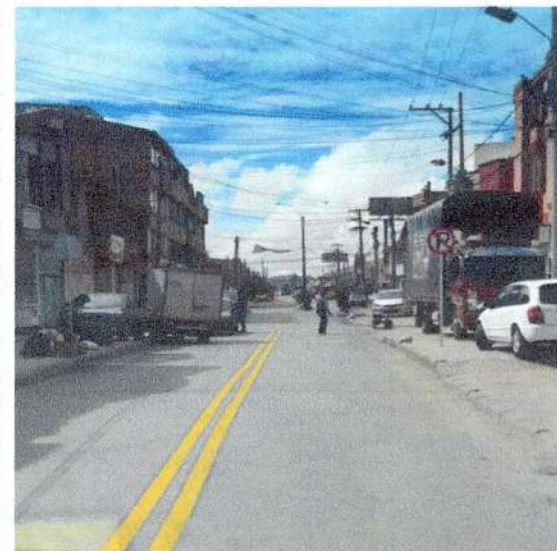


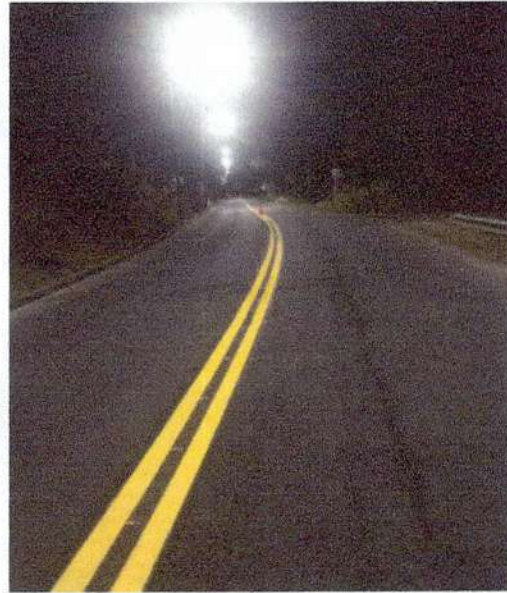


ENSAYOS Y TOMA DE PRUEBAS DE RETROFELCTIVIDAD







RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: ING. FERNANDO RODRIGUEZ MUMPAQUE



CONTRATISTA
NOMBRE: ING. CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma

Dirección: Calle 19 # 8 -95 Piso 4 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Teléfono: (57 8) 7 40 57 70 ext. 1409
Correo electrónico: infraestructura@tunja-boyaca.gov.co web: <http://www.tunja-boyaca.gov.co>
Código postal: 150001

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 38 DE 98

ANEXO 11.11 MEMORIAS DE CANTIDADES

OBJETO: CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁFICO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA	
CONTRATISTA: CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	ACTA PARCIAL DI OBRA N°1
CONTRATO N° 1035-2021	INTERVENIOR: CESAR HERNANDO FIGUEROA PAEZ
PERIODO DEL CORTE DE OBRA: 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL 04 DE ENERO DE 2022	CONTRATO N° 1065-2021

No.	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				A. SUMADO ACTA ANTERIOR		ACTA N°1		ACUMULADO ACTUAL		SALDO X EJECUTAR	
		UND	Cant	Vf Unidad	Vf Parcial	Cant	VALOR	Cant	Vf Parcial	Cant	VALOR	Cant	VALOR
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES REGULATORIAS 60 x 60 CM	UND	486	\$ 414,160.00	\$ 201,281,760.00	108.00	\$ 44,729,280.00	108.00	\$ 44,729,280.00	378.00	\$ 156,552,480.00		
2	MARCAS VALES CON PINTURA DE TRAFICO SEGUN NORMA INVAS Y DISEÑO (INCLUYE MICROSEFIRMAS)	M2	459.00	\$ 61,010.00	\$ 28,003,590.00	459.84	\$ 27,993,829.00	459.84	\$ 27,993,829.00	0.16	\$ 9,762.00		
3	Suministro y aplicación manual (pintado laraj) de pintura de plástico en filo alta duración metil-reducido 100%, puro con microesferas para marcas: vales de espesor saca de 50 mils según norma NTC-1350-1, para pases peatonales, avisos en la carretera y zonas donde se presente avarias severas por parte de los vehículos y peatones (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra)	M2	3,583.00	\$ 66,780.00	\$ 239,272,740.00	1,493.89	\$ 99,748,616.00	1,493.89	\$ 99,748,616.00	2,089.31	\$ 139,524,172.00		
4	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA CON MICROSEFIRMAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGUN NORMA INVAS	ML	16,154.00	\$ 2,740.00	\$ 44,261,960.00	8,127.00	\$ 22,287,960.00	8,127.00	\$ 22,287,960.00	8,027.00	\$ 21,993,980.00		
5	Suministro e instalación de Señalización vial vertical Doble (DUPLEX) en papel reflectivo 60 x 60 para urbana, según especificaciones relacionadas en el Manual de Señalización vial aprobado por la resolución 1085 de 2015, numeradas 2.2.2 y 2.1.6.2 (incluye todos los elementos necesarios para la instalación entre ellos: herramienta menor, excavación, concreto y mano de obra)	UND	30.00	\$ 507,370.00	\$ 15,221,100.00	3.00	\$ 1,522,110.00	3.00	\$ 1,522,110.00	27.00	\$ 13,694,950.00		
6	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito preventiva SP-47B, tamaño 60 x 60 cm. Elaboradas en lamina galvanizada Cal 16 papel reflectivo grado XI (sumante al codo marca 3M) pedestal elaborado en ángulo de 27 x 27 x 1/4 pintura electrostatica. Según norma INVAS.	UND	23.00	\$ 460,620.00	\$ 10,594,260.00	23.00	\$ 10,594,260.00	23.00	\$ 10,594,260.00	-	\$ -		
7	Retiro de Señales Verticales (incluye pedestal y tablero) con entoga en la respectiva Entidad Teritorial (incluye señales sencillas y dobles)	UND	15.00	\$ 26,080.00	\$ 391,200.00	15.00	\$ 391,200.00	15.00	\$ 391,200.00	-	\$ -		
8	Suministro e instalación señales verticales sr-38, lamina galvanizada reflectividad tipo XI, grado diamante al codo, con pedestal	UND	22.00	\$ 365,420.00	\$ 8,039,240.00	22.00	\$ 8,039,240.00	22.00	\$ 8,039,240.00	-	\$ -		
9	SENALES PREVENTIVAS (SP) Y REGULATORIAS (SR) 60 X 60 CM REFLECTIVO VERDE LUMIN	UND	4.00	\$ 311,170.00	\$ 1,244,680.00	2.00	\$ 622,340.00	2.00	\$ 622,340.00	2.00	\$ 622,340.00		
10	SENALES DE TRANSITO 60X71.3 MTS (INFORMATIVAS) (OBLINADORES DE CURVA) SEGUN NORMA INVAS	UND	12.00	\$ 266,190.00	\$ 3,194,280.00	6.00	\$ 1,597,140.00	6.00	\$ 1,597,140.00	6.00	\$ 1,597,140.00		
11	SENALES DE TRANSITO 60X71.3 MTS (INFORMATIVAS) SEGUN NORMA INVAS	UND	6.00	\$ 616,420.00	\$ 3,698,520.00	3.00	\$ 1,849,260.00	3.00	\$ 1,849,260.00	3.00	\$ 1,849,260.00		
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES	UND	6,176.00	\$ 9,480.00	\$ 58,548,480.00	-	\$ -	-	\$ -	6,176.00	\$ 58,548,480.00		
13	Suministro e instalación de hnos (foto 75 cm x 45 cm) de color amarillo	UND	240.00	\$ 59,170.00	\$ 14,200,800.00	44.00	\$ 2,603,480.00	44.00	\$ 2,603,480.00	196.00	\$ 11,597,320.00		



OBJETO: CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DEL TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA
ATA PARCIAL DE OBRA N°1
CONTRATISTA: CUMBRE INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO N° 1036-2021
INTERVENTOR: CESAR HERNANDO FIGUEROA PAEZ
CONTRATO N° 1066-2021
PERIODO DEL CORTE DE OBRA: 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL 04 DE ENERO DE 2022



CONDICIONES CONTRACTUALES						ACUMULADO ACTA ANTERIOR		ACTA N°1		ACUMULADO ACTUAL	
No.	DESCRIPCION	UND	Cant	Vr Unidad	Vr Parcial	Cant	VALOR	Cant	Vr Parcial	Cant	VALOR
14	Suministro e instalacion de tachones 40'15'8 cm	UND	210.00	\$ 62.540,00	\$ 13.133,40 0,00			53.00	\$ 3.314.620,00	53.00	\$ 3.314.620,00
15	ESTOPEPOLES D=10 CM H=25 CMS	UND	65.00	\$ 7.710,00	\$ 501.150,00				-	-	-
16	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	G	1,00	\$ 1.051.396,00	\$ 1.051.396,00				-	-	-
SUB TOTAL (INCLUYE IVA 25%)					\$ 642.836,51 6,00				\$ 225.273.356,00		\$ 225.273.356,00
VALOR TOTAL					\$ 642.836,51 6,00				\$ 225.273.356,00		\$ 225.273.356,00
PORCENTAJE EJECUTADO									35,05%		35,05%

CONTRATISTA:

CUMBRE INGENIERIA S.A.S.

NIT. 900.321.674-4

R.L. LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL

INTERVENTOR

ING. CESAR HERNANDO FIGUEROA PAEZ


NIT. C.C. 7.172.415 DE TUNJA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N°1				VERSION	CUMBRE	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ
CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCAACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACION DE TRANSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA				1.0	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
CONTRATO DE OBRA No		1006-2021	CONTRATISTA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUNJA
CONTRATO INTERVENTORIA No.		1066-2021	INTERVENTORIA		HOJA	1 DE 1
CAPITULO		GENERAL	ITEM	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES REGULAMENTARIAS 80 x 80 CM	
					UNIDAD	UND

ITEM	LOCALIZACION / DESCRIPCION	DIMENSIONES		AREA M2	CANTIDAD	UNIDAD	LOCALIZACION PLANIMETRICA		
TRAMO CALLE 3 ENTRE CARRERAS 11 Y 14									
SR-01					9.00	1			
SR-02					9.00	1			
SR-03					9.00	1			
SR-04					9.00	1			
SR-05					9.00	1			
TRAMO VIA TUNJA - ARCABUCO									
SR-06					11.00	1			
SR-07					10.00	1			
SR-08					10.00	1			
SR-09					10.00	1			
SR-10					10.00	1			
BARRIO LA FLORIDA									
SR-11					8.00	1			
SR-12					17.00	1			
SR-13					1.00	1			
SR-14					10.00	1			
SR-15					6.00	1			
CARRERA 14 ENTRE CALLE 21 Y 26									
SR-16					10.00	1			
SR-17					6.00	1			
SR-18					2.00	1			
SR-19					1.00	1			
SR-20					1.00	1			
SUBTOTAL								UND	108.00
TOTAL								UND	108.00

OBSERVACIONES:	

CONTRATISTA DE OBRA		INTERVENTORIA	
Nombre	ESTANISLAO ELAYA	Nombre	FERNANDO RODRIGUEZ
Cargo	RESIDENTE DE OBRA	Cargo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

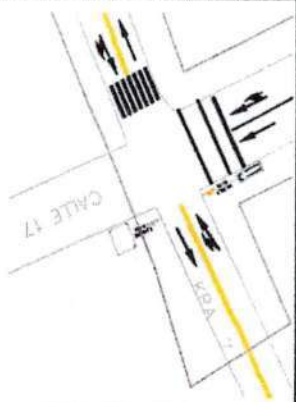		MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N°1				VERSION 	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	
CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION VIAL, HORIZONTAL Y VERTICAL, DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACION DE TRANSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA		1.0		CONTRATISTA		INTERVENTORIA		
CONTRATO DE OBRA No. 1036-2021	CONTRATISTA INTERVENTORIA	ENTIDAD CONTRATANTE MOJA	MUNICIPIO DE TUNJA	DE	1	DE	1	
CAPITULO GENERAL		ITEM 2	MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRAFICO SEGUN NORMA INVIAS Y DISEÑO (INCLUYE MICROSEFERRAS)					
LOCALIZACIÓN / DESCRIPCION CARRERA 7 CON CALLE 17 (TERMINAL)		DIMENSIONES ANCHO LARGO AREA M2		CANTIDAD TOTAL		LOCALIZACION PLANIMETRICA		
FLECHA DE FRENTE FLECHA DOBLE IZQUIERDA FLECHA GIRO IZQUIERDA - DERECHA CEBRA (PASTILLAS RECTANGULARES) LINEA PARE SENDERO		1,20 1,20 0,40 0,60 0,30		3,00 3,00 7,00 1,00 1,00		3,60 3,60 11,20 3,30 2,40		
0,30 8,00 0,30		2,40 1,00 1,50		2,40 1,00 1,50		 		
OBSERVACIONES:		SUBTOTAL TOTAL		M2 M2		26,60 25,60		
CONTRATISTA DE OBRA ESTANISLAO ESTAYAN RESIDENTE DE OBRA		INTERVENTORIA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA				

CONTRATO DE OBRA No.	CONTRATISTA	1	ENTIDAD CONTRATANTE	MANEJO DE TUNAJA	
CONTRATO INTERVENTORIA No. 1058-2021	INTERVENTORIA	CESA I HERRANDO FIGUEROA BAEZ	HOJA	1	DE 1
CAPITULO GENERAL					
ITEM 2		MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRAFICO SEGUN NORMA INVIAS Y DISEÑO (INCLUYE MICROESFERAS)		UNIDAD	M2

[illegible]



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA A CTA PARCIAL N°1

VERSION



CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACION DE TRANSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

1.0

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA No

CONTRATO INTERVENTORIA No.

1036-2021

CONTRATISTA INTERVENTORIA

CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

ENTIDAD CONTRATANTE

HOJA

1 DE 1

MUNICIPIO DE TUNJA

CAPITULO

GENERAL

ITEM

2

MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRAFICO SEGUN NORMA INVIAS Y DISEÑO (INCLUYE MICROESFERAS)

UNIDAD

M2

LOCALIZACION PLANIMETRICA

LOCALIZACION / DESCRIPCION

CARRERA 16 CON CALLE 32 (LA ESPERANZA)

ITEM

LOCALIZACION / DESCRIPCION

ITEM

LOCALIZACION / DESCRIPCION

ITEM

LOCALIZACION / DESCRIPCION

ITEM

LOCALIZACION / DESCRIPCION

ITEM

LOCALIZACION / DESCRIPCION

ITEM

LOCALIZACION / DESCRIPCION

ITEM

LOCALIZACION / DESCRIPCION

ITEM

LOCALIZACION / DESCRIPCION

ITEM

LOCALIZACION / DESCRIPCION

ITEM

LOCALIZACION / DESCRIPCION

ITEM

LOCALIZACION / DESCRIPCION

ITEM

LOCALIZACION / DESCRIPCION

ITEM

LOCALIZACION / DESCRIPCION

ITEM

LOCALIZACION / DESCRIPCION

ITEM

LOCALIZACION / DESCRIPCION

ITEM

LOCALIZACION / DESCRIPCION

ITEM

LOCALIZACION / DESCRIPCION

ITEM

LOCALIZACION / DESCRIPCION

ITEM

LOCALIZACION / DESCRIPCION

ITEM

SUBTOTAL

M2

72.54

TOTAL

M2

72.54

CONTRATISTA DE OBRA

Firma

Nombre

Cargo

RESIDENTE DE OBRA


INTERVENTORIA

Firma

Nombre

Cargo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

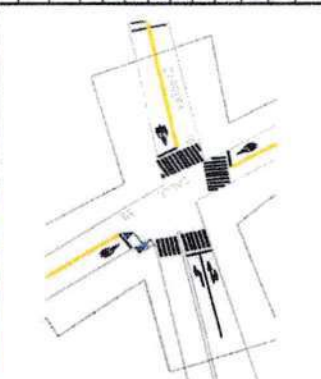

260

CONTRATISTA DE OBRA		INTERVENTORIA	
Fecha		Fecha	
Nombre		Nombre	
Cargo	ES MANEJO ESCALA RESIDENTE DE OBRA	Cargo	INTERVENCIÓN DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENCIÓN


CONTRATO DE OBRA No.	1036-2021	CONTRATISTA	LUMBRE INGENIERIA SAS	ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TORUA	
CONTRATO INTERVENTORIA No.	1036-2021	INTERVENTORIA	CESA : HERNANDO FIGUEROA BAEZ	HOLA	1	DE
CAPITULO	GENERAL	ITEM	2	MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRAFICO SEGUN NORMA INVIAS Y DISEÑO (INCLUYE MICROESFERAS)		UNIDAD
						m2

ITEM	LOCALIZACION / DESCRIPCION	D I M E N S I O N E S		CANTIDAD	TOTAL
		ANCHO	LARGO		
CARRERA 9 CON CALLE 25 (SALESIANO)					
FLECHA DE GIRO				1.53	2.00
FLECHA DOBLE DERECHA				2.20	1.00
CEBRA (PASTILLAS RECTANGULARES)		0.40	4.00	1.60	35.00
REDUCTOR DE VELOCIDAD		3.10	6.10	18.91	1.00
		3.10	8.15	25.27	1.00
		1.10	6.00	6.60	1.00
		1.20	6.00	7.20	1.00
PICTOGRAMA CRUCE ESCOLAR				5.80	3.00
TEXTO ZONA ESCOLAR				11.66	2.00
SUBTOTAL				M2	159.96
TOTAL				M2	159.96

OBSERVACIONES:

LOCALIZACION PLANIMETRICA


CONTRATISTA DE OBRA		INTERVENTORIA	
Firma  Nombre ESTANISLAO HEREDIA Campo RESIDENTE DE OBRA	F. (m) 1999 Mes 01 Día 01	 F. (m) 1999 Mes 01 Día 01	PERSONA INTERVENCIONISTA RESIDENTE DE INTERVENTORIA



ITEM	LOCALIZACION / DESCRIPCION	DIMENSIONES ANCHO LARGO	AREA M ²	CANTIDAD	TOTAL	LOCALIZACION PLANIMETRICA
	AVENIDA MALDONADO (SECTOR HUOLIMO)					
	FLECHA DE FRENTE		1,20	12,00	14,40	
	FLECHA DOBLE DERECHA		2,20	2,00	4,40	
	PICTOGRAFIA CEDA EL PADO		1,53	5,00	7,65	
	CEBRA (PASTILLAS RECTANGULARES)	0,40	1,60	13,00	20,80	
	SENDERO	0,30	4,20	4,00	5,04	
	LINEA CEDA EL PASO	0,40	0,90	0,32	28,00	
	LINEA LOGARITMICA	0,20	6,10	1,22	4,00	
	LINEA DE PAISE	0,60	4,80	2,88	1,00	
		0,60	4,10	2,46	1,00	
	COLEGIO LA PRESENTACION					
	PICTOGRAFIA CRUCE ESCOLAR		5,80	2,00	11,60	
	TEXTO ZONA ESCOLAR		11,66	2,00	23,32	
OBSERVACIONES		SUBTOTAL	M2	106,39		
		TOTAL	M2	106,39		

CONTRATISTA DE OBRA		INTERVENTORIA	
Firma 	Firma		
Nombre ES, ANISAO ESTIVA	Nombre	JUAN CARLOS RODRIGUEZ	
Cargo RESIDENTE DE OBRA	Cargo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	

 MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA / ACTA PARCIAL N°1				VERSION	 CUMBRE	CEAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	
CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACION DE TRANSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA				1.0	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	
CONTRATO DE OBRA N°		1006-2021	CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA SAS	MUNICIPIO DE TUNJA		
CONTRATO INTERVENTORIA N°		1006-2021	INTERVENTORIA	CI SA + HERNANDO FIGUEROA BAEZ	HOJA	1	
CAPITULO		GENERAL	ITEM	3	Suministro y aplicación manual (método filar) de pintura de plásticos en filo alta duración (medida estándar 100% puro con microesferas para marcas viales de espesor peso de 50 mls según norma NTC-1350-1, para pases peatonales, avisos en la carretera y zona donde se presente atracción severa por parte de los vehículos y peatonales (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra)	UNIDAD	M2
ITEM		LOCALIZACION / DESCRIPCION	DIMENSIONES		LOCALIZACION PLANIMETRICA		
		ANCHO	LARGO	AREA M2			
CALLE 22 CARRERA 15 (SALIDA LEVIA)							
FLECHA TRIPLE				3,21	2,00	6,42	
FLECHA DOBLE DERECHA				2,20	2,00	4,40	
CEBRA (PASTILLAS RECTANGULARES)		0,40	4,00	1,60	43,00	68,80	
LINEA DE PAIRE		0,60	4,20	2,52	1,00	2,52	
		0,60	4,70	2,82	1,00	2,82	
		0,60	3,40	2,04	1,00	2,04	
ANTIBLOQUEO		0,60	3,97	2,38	1,00	2,38	
		0,30	16,40	4,92	1,00	4,92	
		0,30	10,00	3,00	1,00	3,00	
		0,30	17,15	5,15	1,00	5,15	
		0,30	13,30	3,99	1,00	3,99	
		0,30	16,20	4,86	1,00	4,86	
		0,30	18,20	5,46	1,00	5,46	
OBSERVACIONES				SUBTOTAL	M2	116,76	
				TOTAL	M2	116,76	
CONTRATISTA DE OBRA		Firma		Firma			
ESTANISLAO ESPIÑA							
RESIDENTE DE OBRA		FERNANDO RODRIGUEZ		RESIDENTE DE INTERVENTORIA			

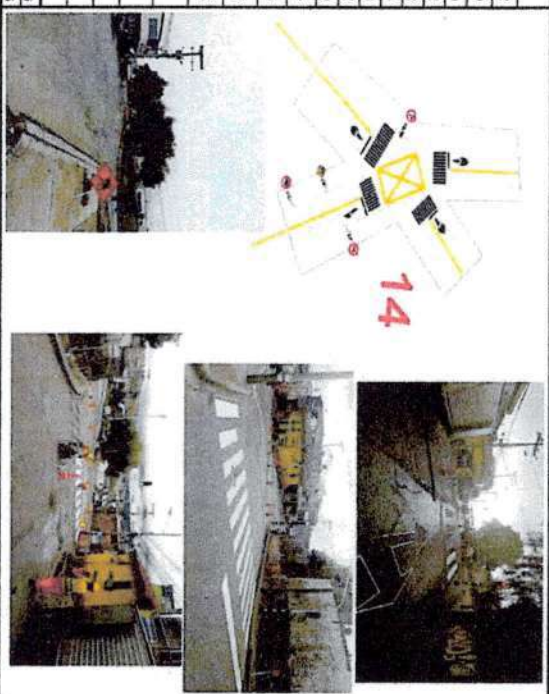


CONTRATO DE OBRA NO	1066-2021	CONTRATISTA	L. LAMIRE INGENIERIA SAS	ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUNJA
CONTRATO INTERVENTORIA NO.	1066-2021	INTERVENTORIA	CESA I HERNANDEZ FIGUEROA BAEZ	HOJA	1
CAPITULO	GENERAL	ITEM	3	Suministro y aplicacion manual (método lijado) de pintura de plastico en frio alta duracion meli-melachlarato 100% puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils segun norma NTC-1350-1, para pases peatonales, avisos en carretera y zonas donde se presente abrasion severa por parte de los vehiculos y pastores. (incluye todos los elementos necesarios para su aplicacion y mano de obra)	UNIDAD
					M2

ITEM	LOCALIZACION / DESCRIPCION	D I M E N S I O N E S		CANTIDAD	TOTAL
		ANCHO	LARGO		
	CARRERA 9 CALLE 12 (ASMEVET)				-
	FLECHA DE FRENTE			1.00	1.20
	FLECHA DOBLE DERECHA			1.00	2.20
	CEBRA (PASTILLAS RECTANGULARES)	0.40	4.00	28.00	44.80
	</				

CONTRATISTA/A DE OBRA		INTERVENTOR/A	
Forma		Firma	
Nombre	ESTANISLAO ESCAM	Nombre	ESCRIBANA MORALES
Código	RESIDENTE DE OBRA	Código	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA DE OBRA		INTERVENTORA	
Firma 	Fecha 11/07/11	Firma 	Fecha 11/07/11
Nombre ESTANISLAO SOLAÑA		Nombre FERNANDO RODRIGUEZ	
Cargo RESIDENTE DE OBRA		Cargo RESIDENTE DE INTERVENTORA	



ITEM	LOCALIZACION / DESCRIPCION	DIMENSIONES ANCHO LARGO	AREA M ²	CANTIDAD	TOTAL	LOCALIZACION PLANIMETRICA
	AVENIDA COLON CALLE 24 (PARQUE LOS SEMAFOROS, BAJA)				-	
	FLECHA DE FRENTE		1.20	3.00	3.60	
	FLECHA DOBLE DERECHAE IZQUIERDA		2.20	2.00	4.40	
	CEBRA (PASILLAS RECTANGULARES)	0.40	4.00	21.50	86.00	
	SENDERO	0.30	6.50	1.95	7.95	
		0.30	5.10	1.00	5.10	
OBSERVACIONES	SUBTOTAL	M2	45.86			
	TOTAL	M2	45.86			


CONTRATISTA DE OBRA		INTERVENTORA	
Forma			
Nombre	ESTANISLAO ESCOBAR	FERNANDO RODRÍGUEZ	
Campo	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORA	
	1. 1971		
	2. 1972		
	3. 1973		
	4. 1974		
	5. 1975		
	6. 1976		
	7. 1977		
	8. 1978		
	9. 1979		
	10. 1980		
	11. 1981		
	12. 1982		
	13. 1983		
	14. 1984		
	15. 1985		
	16. 1986		
	17. 1987		
	18. 1988		
	19. 1989		
	20. 1990		
	21. 1991		
	22. 1992		
	23. 1993		
	24. 1994		
	25. 1995		
	26. 1996		
	27. 1997		
	28. 1998		
	29. 1999		
	30. 2000		
	31. 2001		
	32. 2002		
	33. 2003		
	34. 2004		
	35. 2005		
	36. 2006		
	37. 2007		
	38. 2008		
	39. 2009		
	40. 2010		
	41. 2011		
	42. 2012		
	43. 2013		
	44. 2014		
	45. 2015		
	46. 2016		
	47. 2017		
	48. 2018		
	49. 2019		
	50. 2020		
	51. 2021		
	52. 2022		
	53. 2023		
	54. 2024		
	55. 2025		
	56. 2026		
	57. 2027		
	58. 2028		
	59. 2029		
	60. 2030		
	61. 2031		
	62. 2032		
	63. 2033		
	64. 2034		
	65. 2035		
	66. 2036		
	67. 2037		
	68. 2038		
	69. 2039		
	70. 2040		
	71. 2041		
	72. 2042		
	73. 2043		
	74. 2044		
	75. 2045		
	76. 2046		
	77. 2047		
	78. 2048		
	79. 2049		
	80. 2050		
	81. 2051		
	82. 2052		
	83. 2053		
	84. 2054		
	85. 2055		
	86. 2056		
	87. 2057		
	88. 2058		
	89. 2059		
	90. 2060		
	91. 2061		
	92. 2062		
	93. 2063		
	94. 2064		
	95. 2065		
	96. 2066		
	97. 2067		
	98. 2068		
	99. 2069		
	100. 2070		
	101. 2071		
	102. 2072		
	103. 2073		
	104. 2074		
	105. 2075		
	106. 2076		
	107. 2077		
	108. 2078		
	109. 2079		
	110. 2080		
	111. 2081		
	112. 2082		
	113. 2083		
	114. 2084		

CONTRATO DE OBRA N°	1006-2021	CONTRALISTA	JUMBE INGENIERIA SAS	ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TULUA
CONTRATO INTERVENORIA N°	1006-2021	INTERVENORIA	CE SA 3 HERNANDO FLORES BAEZ	HOJA	1 DE 1
CAPITULO	GENERAL	ITEM	3	<p>Suministro y aplicación manual (método llano) de pintura de plástico en frío alta duración meli-metacrilato 100% puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC-1360-1, para pasos peatonales, avisos en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehículos y pastones (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra)</p>	
				UNIDAD	M2

ITEM	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCION	DIMENSIONES ANCHIO LARGO	AREA M ²	CANTIDAD	TOTAL	LOCALIZACION PLANIMETRICA
	CARRERA 9 CALLE 23 (PARQUE PINCON)					
	FLECHA DE FRENTE		1,20	1,00	1,20	
	FLECHA GIRO DERECHO E IZQUIERDO		1,53	2,00	3,06	
	CEBRA (PASTILLAS RECTANGULARES)	0,40	4,00	1,80	7,20	
	SENDERO	0,30	3,90	1,17	11,20	
		0,30	8,00	2,40	1,00	
		0,30	7,60	2,28	1,00	
	LINEA DE PARE	0,30	7,60	2,28	1,00	
		0,60	3,90	2,34	2,00	
					4,68	
OBSERVACIONES:		SUBTOTAL	M2	28,37		
		TOTAL	M2		28,37	
CONTRATISTA DE OBRA						INTERVENTORA
Firma					Firma 1	
Nombre	EJECUTIVA				Nombre	FERNANDO RODRIGUEZ
Cargo	RESIDENTE DE OBRA				Cargo	RESIDENTE DE INTERVENTORA

 Tijuana <small>Municipio de Tijuana</small>		MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N°1		VERSION 1.0	 CUMBRE	CESAR HERNANDO FLORES BAEZ INTERVENTORIA
CONTRATO DE OBRA N° 1008-2021		CONTRATISTA CUMBRE INGENIERIA SAS		ENTRADA CONTRATANTE HOJA 1		MUNICIPIO DE TIJUA DE 1
CONTRATO INTERVENTORIA N° 1008-2021		INTERVENTORIA CESAR HERNANDO FLORES BAEZ		HOJA 1		DE 1
CAPITULO GENERAL		ITEM 3		Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plastico en fno alta duración impermeabilizado 100% puro con microesteras para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC-1350-1, para pasos peatonales, avisos en la carretera y zonas donde se presente atracción severa por parte de los vehículos y pedestres (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra)		
LOCALIZACION / DESCRIPCION CARRERA 9 CALLE 24 (PARQUE PINZON, ZONA BAJA)		DIMENSIONES ANCHO LARGO AREA M2		CANTIDAD TOTAL		
FLECHA DE FRENTE				1.20 1.00 1.20		
FLECHA GIRO DERECHO E IZQUIERDO				1.53 1.00 1.53		
FLECHA DOBLE DERECHA				2.20 1.00 2.20		
CEBRA (PASTILLAS RECTANGULARES)				0.40 4.00 1.60 13.00 20.80		
LINEA DE PARE				0.60 5.30 3.18 1.00 3.18		
ANTIBLOQUEO				0.30 4.45 1.34 1.00 1.34		
				0.30 4.70 1.41 1.00 1.41		
				0.30 5.60 1.68 1.00 1.68		
				0.30 5.80 1.74 1.00 1.74		
				0.30 4.80 1.44 1.00 1.44		
				0.30 7.00 2.10 1.00 2.10		
				0.30 7.20 2.16 1.00 2.16		
OBSERVACIONES		SUBTOTAL TOTAL		M2 40.78 M2 40.78		
CONTRATISTA DE OBRA ESTANISLAO ELLAVA RESIDENTE DE OBRA		INTERVENTORIA HERNANDO RODRIGUEZ RESIDENTE DE INTERVENTORIA		Fm 1 DE 1		

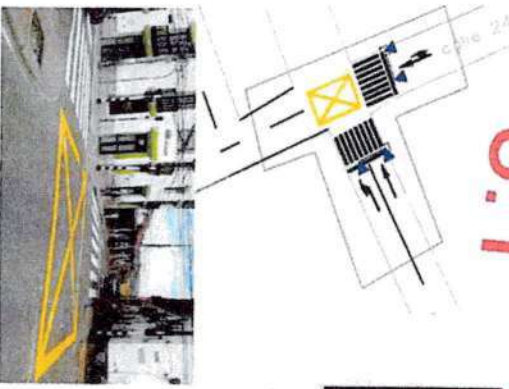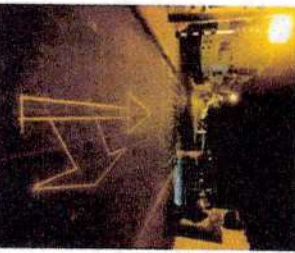				MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA / ACTA PARCIAL N°1		VERSION		CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ
CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACION DE TRANSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA				1.0		CONTRATISTA		INTERVENTORIA
CONTRATO DE OBRA No.		1036-2021	CONTRATISTA		CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	ENTIDAD CONTRATANTE		MUNICIPIO DE TUNJA
CONTRATO INTERVENTORIA No.		1068-2021	INTERVENTORIA			HOLA		1 DE 1
CAPITULO		GENERAL	ITEM		3	UNIDAD		M2
Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frío alta duración meli-mebestriato 100% puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC-1350-1, para pasos peatonales, avisos en la carretera y zonas donde se presente atracción severa por parte de los vehículos y peatones (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra)								
LOCALIZACION PLANIMETRICA								
								
ITEM	LOCALIZACION / DESCRIPCION	DIMENSIONES		CANTIDAD	TOTAL			
	CARRERA 9 CALLE 29	ANCHO	LARGO	AREA M2				
	FLECHA TRIPLE	0.40	4.00	3.21	3.00	9.63		
	CEBRA (PASTILLAS RECTANGULARES)	0.60	4.00	1.60	20.00	32.00		
	LINEA DE PARE	0.60	4.00	2.64	1.00	2.64		
		0.40	4.00	1.60	1.00	1.60		
OBSERVACIONES:		SUBTOTAL		M2	45.87			
		TOTAL		M2	45.87			
CONTRATISTA DE OBRA				INTERVENTORIA				
Firma				Firma				
Nombre				Nombre				
Cargo				Cargo				

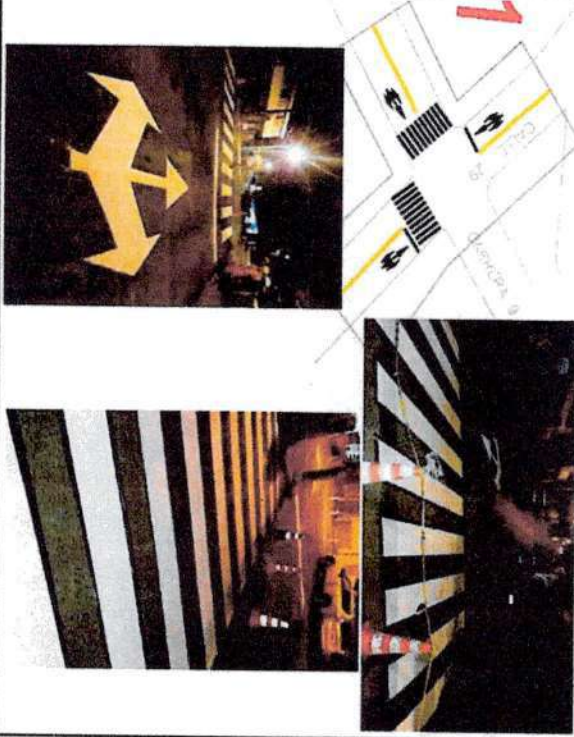CONTRATO DE OBRA No	1096-2021	CONTRATISTA	CIEMPRE INGENIERIA SAS	ENTIDAD CONTRATANTE			MUNICIPIO DE TUNJA		
CONTRATO INTERVENTORIA No.	1068-2021	INTERVENTORIA	CESA + HERNANDO FIGUEROA BAEZ	HOLA			1	DE	1

CAPITULO	GENERAL	ITEM	3	Suministro y aplicación manual (método llano) de pintura de plástico en frío alta duración meli-metacrilato 100% puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC-1360-1, para pasos peatonales, avisos en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehículos y pastones (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra)	UNIDAD	M/2
----------	---------	------	---	---	--------	-----

[illegible]

CONTRATISTA DE OBRA		INTERVENIORA	
			
Nombre ESTANISLAO ESCOBAR		F. to. 1987 10 25	
Cargo RESIDENTE DE OBRA		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F. to. 1987 10 25	
		F.	



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N°1

VERSION



CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL, DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACION DE TRANSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

1.0

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA No

1008-2021

CONTRATISTA

CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

ENTIDAD CONTRATANTE

MUNICIPIO DE TUNJA

CONTRATO DE OBRA No

1008-2021

CONTRATISTA

CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

ENTIDAD CONTRATANTE

MUNICIPIO DE TUNJA

CAPITULO

GENERAL

ITEM

3

Suministro y aplicación manual (método lijado) de pintura de plástico en frío alta duración metilmetacrilato 100%, puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC-1360-1, para pasos peatonales, avisos en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehículos y peatones (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra)

UNIDAD

M2

ITEM

LOCALIZACION / DESCRIPCION

ANCHO

LARGO

AREA M2

CANTIDAD

TOTAL

LOCALIZACION PLANIMETRICA

AVENIDA MALDONADO CALLE 25

INTERSECCION MR KING

1.20

8.00

9.60

2.20

FLECHA DOBLE DERECHA

0.40

4.00

1.60

63.00

2.43

CEBRA (PASTILLAS RECTANGULARES)

0.60

4.05

2.43

1.00

2.43

LINEA DE PARE

0.60

3.75

2.25

1.00

4.56

0.60

7.60

4.56

1.00

4.08

0.60

6.80

4.08

1.00

4.08

0.60

6.80

4.08

1.00

4.08

0.60

6.80

4.08

1.00

4.08

0.60

6.80

4.08

1.00

4.08

0.60

6.80

4.08

1.00

4.08

0.60

6.80

4.08

1.00

4.08

0.60

6.80

4.08

1.00

4.08

0.60

6.80

4.08

1.00

4.08

0.60

6.80

4.08

1.00

4.08

0.60

6.80

4.08

1.00

4.08

0.60

6.80

4.08

1.00

4.08

0.60

6.80

4.08

1.00

4.08

0.60

6.80

4.08

1.00

4.08

0.60

6.80

4.08

1.00

4.08

0.60

6.80

4.08

1.00

4.08

0.60

6.80

4.08

1.00

4.08

0.60

6.80

4.08

1.00

4.08

SUBTOTAL

M2

123.92

123.92

OBSERVACIONES

SUBTOTAL

M2

123.92

123.92

CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA P.C.TA PARCIAL N°1

CONTRATO D OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCAACION VIAL HORIZONTAL VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACION DE TRANSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

1.0



CESAR HERNANDO FIGUEROA GAEZ


INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA NO CONTRATO INTERVENTORIA Nº.	1036-2021	CONTRATISTA INTERVENTORIA	LUMBRE INGENIERIA SAS CESA : HERNANDO FIGUEROA BAEZ	ENTIDAD CONTRATANTE HOJA	MUNICIPIO DE TUTUA	1	DE	1
--	-----------	------------------------------	--	-----------------------------	--------------------	---	----	---


CAPITULO	GENERAL	ITEM	UNIDAD
		3	M2

[illegible]

Firma		Firma	
			
Nombre		Nombre	
ESPOSADO/ESUNA		FERNANDO MORAGUER	
Cargo		Cargo	
RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	

				MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N°1		VERSION		CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ
CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACION DE TRANSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA				1.0		CONTRATISTA		INTERVENTORIA
CONTRATO DE OBRA No 1036-2021				CONTRATISTA		CUMBRE INGENIERIA SAS		ENTIDAD CONTRATANTE
CONTRATO INTERVENTORIA No 1036-2021				INTERVENTORIA		CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		HOJA 1 DE 1
CAPITULO GENERAL				ITEM 3		Suministro y aplicación manual (método lijado) de pintura de plástico en frío alta duración multi-estancado 100% puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC-1380-1, para pisos peatonales, avisos en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehículos y peatones (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra)		
LOCALIZACION PLANIMETRICA								
ITEM LOCALIZACION / DESCRIPCION				DIMENSIONES		CANTIDAD		
				ANCHO LARGO AREA M2		TOTAL		
CARRERA 11 CON CALLE 17 LUMOL								
FLECHA DE FRENTE				1.20		1.20		
FLECHA DOBLE DERECHA				2.20		2.20		
CEBRA (PASTILLAS RECTANGULARES)				0.40 4.00 1.60		14.00 22.40		
LINEA DE PARE				0.60 7.00 4.20		1.00 4.20		
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL M2 32.20				
				TOTAL M2 32.20				
CONTRATISTA DE OBRA				INTERVENTORIA				
Firma: 				Firma: 				
Nombre: CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ				Nombre: CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ				
Cargo: RESIDENTE DE OBRA				Cargo: RESIDENTE DE OBRA				

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N°1		VERSION	CUMBRE	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ
 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACION DE TRANSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA		1.0	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
CONTRATO DE OBRA No. 1036-2021		CONTRATISTA	LUMBRE INGENIERIA SAS	
CONTRATO INTERVENTORIA No. 1068-2021		INTERVENTORIA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	
ENTIDAD CONTRATANTE		HOLA		1
MUNICIPIO DE TUNJA		DE		1
CAPITULO	GENERAL	ITEM	3	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frío alta duración meli-metilacrilato 100%, puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC-1360-1, para pasos peatonales, avisos en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehículos y peatones (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra)
LOCALIZACION PLANIMETRICA				
ITEM	LOCALIZACION / DESCRIPCION	DIMENSIONES		CANTIDAD
		ANCHO	LARGO	AREA M2
	CARRERA 11 CON CALLE 21A HUNZA			
	FLECHA DE FRENTE			1.20
	FLECHA GYRO DERECHA			1.00
	CEBRA (PASTILLAS RECTANGULARES)			2.20
	LINEA DE PARE	0.40	4.00	1.60
	SENDERO	0.60	4.20	2.52
		0.30	4.20	1.26
		0.30	7.50	2.25
				1.00
				2.25
OBSERVACIONES:		SUBTOTAL		M2
		TOTAL		16.63
CONTRATISTA DE OBRA		INTERVENTORIA		
Firma		Firma		
Nombre	ESTANISLAO ESCOBAR	Nombre	FERNANDO RODRIGUEZ	
Cargo	RESIDENTE DE OBRA	Cargo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	






22



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N°1										VERSION		CEGAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ			
CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACION DE TRANSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y AL CANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA										1.0	CONTRATISTA	INTERVENTORIA			
CONTRATO DE OBRA No.		1036-2021	CONTRATISTA		CUMBRE INGENIERIA SAS		ENTIDAD CONTRATANTE		HOJA		1	DE	1		
CONTRATO INTERVENTORIA No.		1068-2021	INTERVENTORIA		CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		MUNICIPIO DE TUNJA								
CAPITULO	GENERAL		ITEM		3		Suministro y aplicación manual (rodillo llano) de pintura de plástico en frío alta duración mel-enfitechilato 100%, puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils, según norma NTC-1380-1, para pasos peatonales, puentes en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehículos y peatones (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra)								
LOCALIZACION PLANIMETRICA															
ITEM	LOCALIZACION / DESCRIPCION	DIMENSIONES		CANTIDAD		TOTAL									
		ANCHO	LARGO	AREA M2											
	CARRERA 8 CON CALLE 18														
	FLECHA DE FRENTE			1.20	2.00		2.40								
	FLECHA DOBLE DERECHA			2.20	2.00		4.40								
	CEBRA (PASTILLAS RECTANGULARES)	0.40	4.00	1.60	7.00		11.20								
	LINEA DE PARE	0.60	5.50	3.30	1.00		3.30								
	SENDERO	0.30	5.50	1.65	1.00		1.65								
		0.30	5.50	1.65	1.00		1.65								
OBSERVACIONES		SUBTOTAL		M2		24.60									
		TOTAL		M2		24.60									
CONTRATISTA DE OBRA															
Firma												Firma			
Nombre		CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ										Nombre		FERNANDO RODRIGUEZ	
Cargo		RESIDENTE DE OBRA										Cargo		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	

		MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N°1		VERSION 	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ
CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCAACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACION DE TRANSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y AL CANCÉ DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA					
CONTRATO DE OBRA No 1036-2021		CONTRATISTA INTERVENTORIA		CUMBRE INGENIERIA SAS CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	
CONTRATO INTERVENTORIA No.		ENTIDAD CONTRATANTE HOJA		MUNICIPIO DE TUNJA	
CAPTULO GENERAL		ITEM 3		Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en tipo alta duración metalmecánica 100% puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma HTG-1360-1, para pasos peatonales, avisos en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehículos y peatones (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra)	
LOCALIZACION / DESCRIPCION CARRERA 8 CON CALLE 23		DIMENSIONES ANCHO LARGO AREA M2		CANTIDAD 1 TOTAL	
FLECHA GIRO IZQUIERDA		2.20		1.00	
CEBRA (PASTILLAS RECTANGULARES)		0.40 4.00 1.60		7.00 11.20	
OBSERVACIONES		SUBTOTAL TOTAL		M2 M2	
CONTRATISTA DE OBRA CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ RESIDENTE DE OBRA		INTERVENTORIA		CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ RESIDENTE DE INTERVENTORIA	

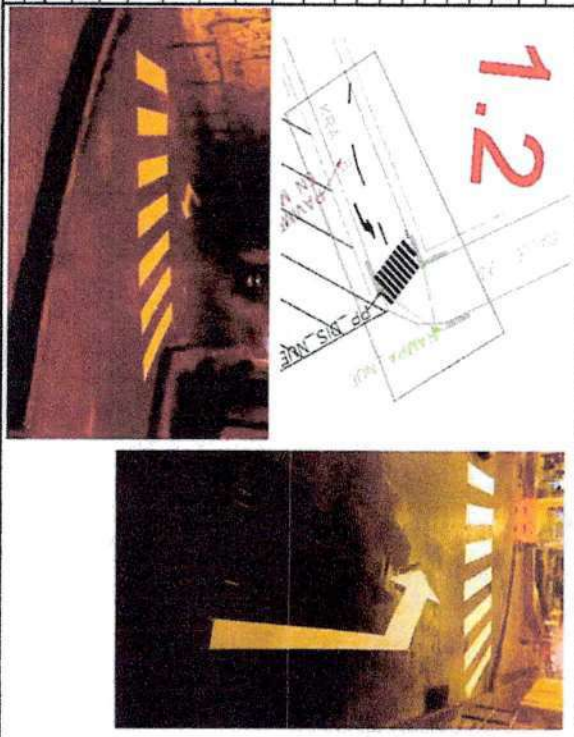


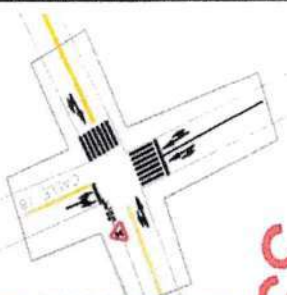
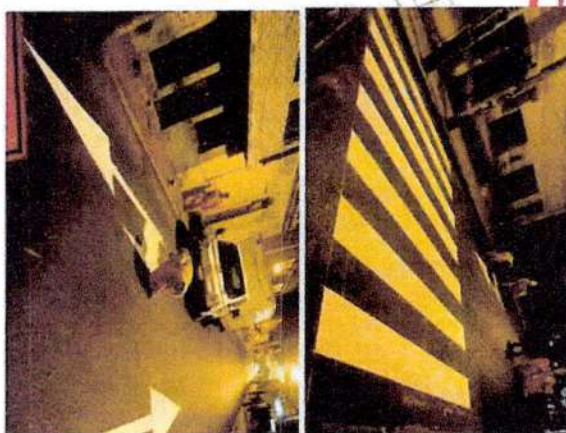
		MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N°1		VERSION 	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ
CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACION DE TRANSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA					
CONTRATO DE OBRA No 1026-2021 1069-2021		CONTRATISTA INTERVENTORIA	CUMBRE INGENIERIA SAS CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	ENTIDAD CONTRATANTE MUNICIPIO DE TUNJA	HOJA 1 DE 1
CAPITULO GENERAL	ITEM 3	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frío sin duración multitemperatura 100% puro con propiedades para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC-1350-1, para pasos peatonales, avisos en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehículos y pastones (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra)			
LOCALIZACION / DESCRIPCION CARRERA 7 CON CALLE 18		DIMENSIONES ANCHO LARGO AREA M2	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION PLANIMETRICA 	
FLECHA DOBLE IZQUIERDA FLECHA GIRO IZQUIERDA - DERECHA CEBRA (PASTILLAS RECTANGULARES) LINEA PARE		1.20 2.20 0.40 0.60 0.60 5.20	4.00 1.00 14.00 1.00 1.00 3.12		
OBSERVACIONES:		SUBTOTAL TOTAL	M2 M2	34.32 34.32	
CONTRATISTA DE OBRA CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ RESIDENTE DE OBRA		INTERVENTORIA HERNANDO FIGUEROA BAEZ RESIDENTE DE INTERVENTORIA			

CONTRATO DE OBRA N°	1009-2021	CONTRATISTA	LUYBRE INGENIERIA SAS	ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUNJA	
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1008-2021	INTERVENTORIA	CESAI HERNANDO FIGUEROA BAEZ	ROLA	1	DE 1

CAPÍTULO	GENERAL	ITEM	UNIDAD	M2
		3	Suministro y aplicación manual (método llano) de pintura de plástico en frío alta duración metil-metacrilato 100% puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma MTG-1360-1, para pasos peatonales, avisos en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehículos y peatones (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra)	


[illegible]

CONTRATISTA DE OBRA		INTERVENTORIA	
Fecha		Fecha	
Nombre	ESTANISLAO ESCOBAR	Nombre	TERENCIO MORALES
Cargo	RESIDENTE DE OBRA	Cargo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

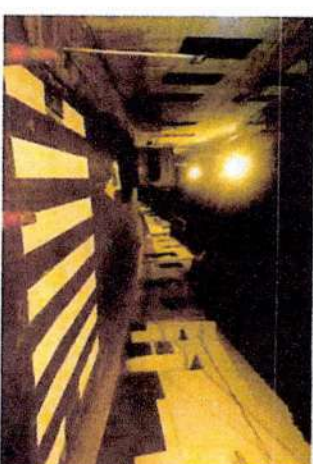				MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N°1		VERSION 	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ
CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRANSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA				VERSION 1.0	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	
CONTRATO DE OBRA No 1038-2021		CONTRATISTA INTERVENTORIA		ENTIDAD CONTRATANTE MUNICIPIO DE TUNJA		DE 1	
CONTRATO INTERVENTORIA No 1038-2021		INTERVENTORIA CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		HOLA 1		DE 1	
CAPITULO GENERAL		ITEM 3		Suministro y aplicación manual (metodo lijado) de pintura de plastico en frio alta duracion meli-metacrilato 100%, puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según normas NTC-1360-1, para pasos peatonales, apilotes en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehículos y peatones (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra)		UNIDAD M2	
LOCALIZACIÓN / DESCRIPCION CARRERA 7 CON CALLE 20		DIMENSIONES ANCHO LARGO AREA M2		CANTIDAD TOTAL		LOCALIZACIÓN PLANIMETRICA	
FLECHA DOBLE DERECHA O IZQUIERDA 0.40 4.00 1.20 2.00 2.40		CEBRA (PASTILLAS RECTANGULARES) 0.60 5.00 3.00 7.00 11.20		LINEA PARE 0.30 5.00 1.00 3.00 3.00		SENDERO 0.30 4.50 1.35 1.00 1.35	
OBSERVACIONES:		SUBTOTAL M2 TOTAL M2		19.45 19.45			
CONTRATISTA DE OBRA ESTANISLAO ESCAYA RESIDENTE DE OBRA		INTERVENTORIA FERNANDO RODRIGUEZ RESIDENTE DE INTERVENTORIA					

282

				MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N°1			VERSION 	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ
CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACION DE TRANSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA				VERSION 1.0	CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
CONTRATO DE OBRA No CONTRATO INTERVENTORIA No.		CONTRATISTA 1006-2021	INTERVENTORIA 1006-2021	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	ENTIDAD CONTRATANTE HOJA	MUNICIPIO DE TUNJA 1 DE 1		
CAPITULO	GENERAL	ITEM 3	Suministro y aplicación manual (método llano) de pintura de plástico en frío alta duración meli-metacrilato 100%, puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC-1380-1, para pasos peatonales, vialos en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehículos y peatones (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra)					
LOCALIZACION / DESCRIPCION				LOCALIZACION PLANIMETRICA				
ITEM	LOCALIZACION / DESCRIPCION	ANCHO	LARGO	AREA M2	CANTIDAD	TOTAL		
	CARRERA 12 CALLE 18							
	FLECHA DE FRENTE			1.20	2.00	2.40		
	FLECHA DOBLE DERECHA - IZQUIERDA			2.20	4.00	8.80		
	FLECHA TRIPLE			3.21	1.00	3.21		
	CEBRA (PASTILLAS RECTANGULARES)	0.40	4.00	1.60	48.00	76.80		
	LÍNEA DE PARE	0.60	3.50	2.10	1.00	2.10		
		0.60	7.20	4.32	1.00	4.32		
		0.60	3.50	2.10	1.00	2.10		
		0.60	3.40	2.04	1.00	2.04		
OBSERVACIONES				SUBTOTAL	M2	TOTAL		
						101.77		
				TOTAL	M2	TOTAL		
						101.77		
CONTRATISTA DE OBRA  ESTANISLAO ESALVA RESIDENTE DE OBRA							INTERVENTORIA  HERNANDO RODRIGUEZ RESIDENTE DE INTERVENTORIA	

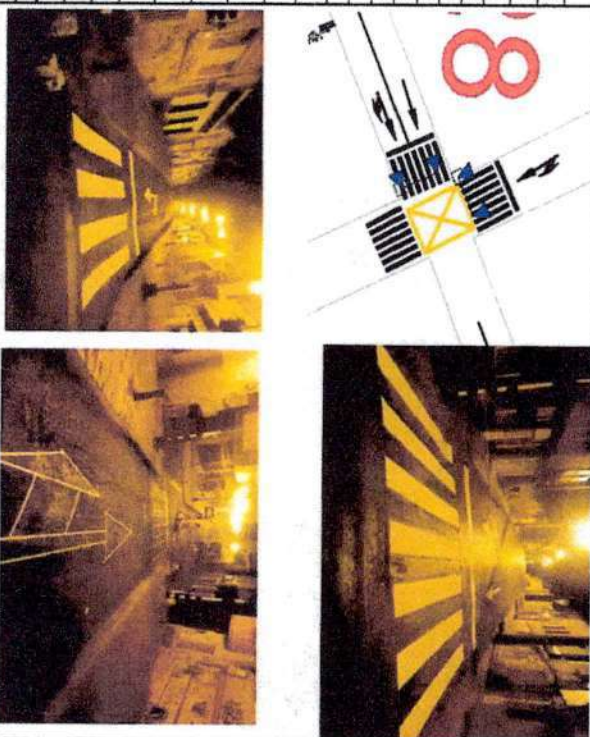



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N°1

VERSION



CEAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACION DE TRANSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

1.0

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA No

CONTRATO INTERVENTORIA

1038-2021

CONTRATISTA

CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

ENTIDAD CONTRATANTE

MUNICIPIO DE TUNJA

DE

1

CAPITULO

GENERAL

ITEM

3

Suministro y aplicación manual (rodillo llana) de pintura de plástico en frío alta duración meli-metacrilato 100%, puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils, según norma NTC-1356-1, para pasos peatonales, avisos en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehículos y peatones (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra)

UNIDAD

M2

ITEM LOCALIZACION / DESCRIPCION

ANCHO

LONGO

AREA M2

CANTIDAD

TOTAL

LOCALIZACION PLANIMETRICA

VIA ENTRADA COLEGIO GALLEO GALLEI

PICTOGRAMA CRUCE ESCOLAR

TEXTO ZONA ESCOLAR

5.80

11.88

2.00

23.32

11.80

23.32



SUBTOTAL

TOTAL

M2

M2

34.92

34.92

CONTRATISTA CS OBRA

Firma

Nombre

Cargo

ESTANISLAO ESCOBAR

RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA

Firma

Nombre

Cargo

HERNANDO HERNANDEZ

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA A ACTA PARCIAL N°1				VERSION	 CUMBRE	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ
CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACION DE TRANSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA				1.0	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
CONTRATO DE OBRA No CONTRATO INTERVENTORIA No.		1008-2021	CONTRATISTA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUNJA
CAPITULO		GENERAL	ITEM	3	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frío para duración mediana (hasta 100% puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC-1380-1, para pasos peatonales, avisos en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehículos y peatones (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra)	
LOCALIZACION / DESCRIPCION		LOCALIZACION PLANIMETRICA				
ITEM	ANCHO	LARGO	AREA M2	CANTIDAD	TOTAL	
VIA TUNJA ARCABUCO						
ENTRADA COLEG. NORMAL						
FLECHA DOBLE DERECHA - IZQUIERDA			2.20	1.00	2.20	
CEBRA (PASTILLAS RECTANGULARES)	0.40	4.00	1.60	11.00	17.60	
LINEA CEDA EL PASO	0.60	3.45	2.07	1.00	2.07	
LINEA DE PARE	0.60	3.50	2.10	1.00	2.10	
ENTRADA BARRIO SAN RAFAEL			2.20	2.00	4.40	
FLECHA DOBLE DERECHA - IZQUIERDA			2.54	1.00	2.54	
CEBRA (PASTILLAS RECTANGULARES)	0.40	4.00	1.60	18.00	28.80	
LINEA DE PARE	0.60	3.50	2.10	1.00	2.10	
	0.60	3.55	2.13	1.00	2.13	
OBSERVACIONES				 		
SUBTOTAL				M2	65.74	
TOTAL				M2	65.74	
CONTRATISTA DE OBRA CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ RESIDENTE DE OBRA						
INTERVENTORIA CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ RESIDENTE DE INTERVENTORIA						

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA A.C.T.A PARCIAL N°1

VERS



CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

CONTRATO DIOBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCAACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACION DE TRANSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

1.0

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA NO.	1036-2021	CONTRATISTA	COMARTE INGENIERIA SAS	ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUNJA	
CONTRATO INTERVENTORIA NO.	1036-2021	INTERVENTORIA	CE SA (HERNANDO FIGUEROA BAEZ	HOJA	1	
CAPITULO	GENERAL	ITEM	3	Suministro y aplicacion manual (metodo lijado) de pintura de plastico en trio alta duracion mell-mestecrilato 100%, puro con microfibras para marcas viales de espesor seco de 50 mils segun norma NTC-1360-1, para paises pastosales, avises en la carretera y zonas donde se presente abrasion severa por parte de los vehiculos y pastones (incluye todos los elementos necesarios para su aplicacion y mano de obra)	UNIDAD	M2

ITEM	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	ANCHO	DIMENSIONES LARGO	ÁREA M2	CANTIDAD	TOTAL
	CALLE 3 ENTRE CARRERA 11 Y 14					
	ENTRADA CALLE 3 CARRERA 11					
	FECHA DE FRENTE					
	FECHA DOBLE DERECHA - (IZQUIERDA)			1,20	1,00	1,20
	CERBA (PASTILLAS RECTANGULARES)	0,40	4,00	1,60	1,00	2,20
						12,80
	CALLE 3A ENTRE CARRERA 12 Y 13 A					
	FECHA DOBLE DERECHA - (IZQUIERDA)			2,20	6,00	13,20
	CERBA (PASTILLAS RECTANGULARES)	0,40	4,00	1,60	8,00	12,80
	LÍNEA DE SENDERO					
		0,30	6,30	1,89	1,00	1,89
		0,30	11,50	3,45	1,00	3,45
		0,30	4,10	1,23	1,00	1,23
		0,30	6,10	1,83	1,00	1,83
		0,60	2,85	1,71	1,00	1,71
	CALLE 3 ENTRE CARRERA 12A Y 13 (REFORMATORIO)					
	FECHA DOBLE DERECHA - (IZQUIERDA)			2,20	2,00	4,40
	FECHA GIRO			1,53	1,00	1,53
	CERBA (PASTILLAS RECTANGULARES)	0,40	4,00	1,60	18,00	28,80
		0,60	3,60	2,16	1,00	2,16
		0,60	3,70	2,22	1,00	2,22
	LÍNEA DE PARE					
		0,60	4,40	2,64	1,00	2,64
		0,30	7,15	2,15	1,00	2,15
	LÍNEA DE SENDERO					
		0,30	10,50	3,15	1,00	3,15
	PARADERO AUTOBUS	0,30	3,40	1,02	8,00	8,16
	PINTOGRAMA SOLO BUS	2,80	5,30	14,84	1,00	14,84
	SUBTOTAL				M2	122,38
	TOTAL				M2	122,38

CONCEJALIA DE OBRA

ESTADO EST. LUN

RESIDENTE DE OBRA

INTERVENCIÓN

PREVADO RODRIGUEZ

RESIDENTE DE INTERVENCIÓN










ITEM	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	D I M E N S I O N E S			CANTIDAD	TOTAL
		ANCHO	LARGO	AREA M2		
	CALLE 3 ENTRE CARRERA 11 Y 14					
	CARRERA 14 CALLE 1 ESTE					
	FLECHA DE FRENTE			1,20		-
	FLECHA DOBLE DERECHA - DQUEIRDA			2,20	2,00	4,40
	CEBPA (PASTILLAS RECTANGULARES)	0,40	4,00	1,60	18,00	28,80
	LINEA DE PARE	0,60	3,70	2,22	1,00	2,22
		0,60	3,20	1,92	1,00	1,92
	CARRERA 14 ENTRE 1 ESTE Y FINAL					-
	FLECHA DOBLE DERECHA - DQUEIRDA			2,20	3,00	6,60
	LINEA DE SENDERO	0,30	5,70	1,71	1,00	1,71
		0,30	8,10	2,43	1,00	2,43
		0,30	3,50	1,05	1,00	1,05
		0,30	6,00	1,80	1,00	1,80
		0,30	5,00	1,50	1,00	1,50
		0,30	5,40	1,62	1,00	1,62

462

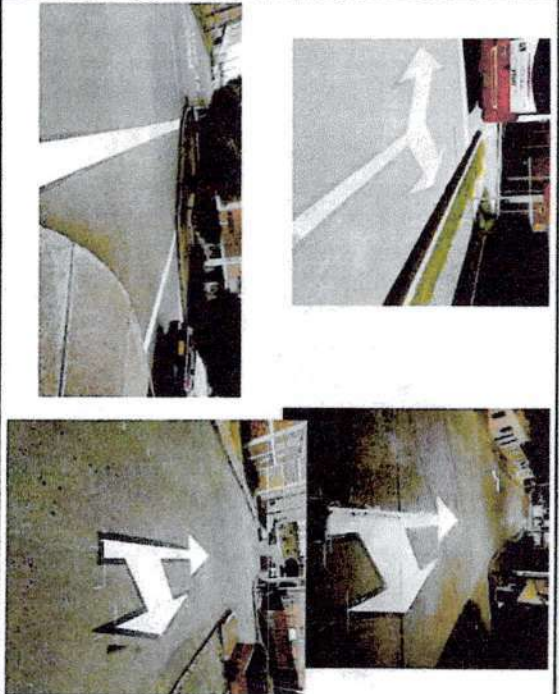		MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N°1		VERSION 	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ
CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACION DE TRANSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y AL CANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA					
CONTRATO DE OBRA No. CONTRATO INTERVENTORIA No.		1036-2021 1068-2021	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CESA I HERNANDO FIGUEROA BAEZ	ENTIDAD CONTRATANTE HOJA
CAPITULO GENERAL		ITEM 3		Suministro y aplicación manual (método llano) de pintura de plástico en frío alta duración metil-metacrilato 100%, puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils, según norma NTC-1380-1, para pasos peatonales, avisos en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehículos y peatonas (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra)	
LOCALIZACION / DESCRIPCION BARRIO LA FLORIDA CALLE 1 CON CARRERA 10 FLECHA TRIPLE LINEA DE PARE LINEA DE SENDERO CARRERA 8D CALLE 1-A FLECHA DOBLE DERECHA - IZQUIERDA FLECHA DOBLE GIRO LINEA DE PARE TEXO DE ZONA ESCOLAR CARRERA 6 CON CALLE 1A FLECHA DOBLE DERECHA - IZQUIERDA FLECHA DOBLE GIRO LINEA DE PARE LINEA DE SENDERO		DIMENSIONES ANCHO LARGO AREA M2 3.21 4.00 12.84 0.60 3.50 2.10 2.00 4.20 0.60 3.45 2.07 1.00 2.07 0.30 5.70 1.71 1.00 1.71 0.30 5.40 1.62 1.00 1.62 0.30 5.90 1.77 1.00 1.77 0.30 6.00 1.80 1.00 1.80 2.20 1.00 2.20 2.54 1.00 2.54 2.10 1.00 2.10 2.19 1.00 2.19 11.66 2.00 23.32 2.20 2.00 4.40 2.54 1.00 2.54 0.60 3.20 1.92 1.00 1.92 0.30 5.90 1.77 1.00 1.77 0.30 6.20 1.86 1.00 1.86		CANTIDAD TOTAL 12.84 4.20 2.07 1.71 1.62 1.77 1.80 2.20 2.54 2.10 2.19 23.32 4.40 2.54 1.92 1.77 1.86	
OBSERVACIONES:		LOCALIZACION PLANIMETRICA 			
Firma Nombre Cargo		Firma Nombre Cargo		Firma Nombre Cargo	
ESTANISLAO ESTAYAN RESIDENTE DE OBRA		ESTANISLAO ESTAYAN RESIDENTE DE OBRA		FERNANDO RODRIGUEZ RESIDENTE DE INTERVENTORIA	



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N°1


CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACION DE TRANSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y AL CANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

VERSION 1.0
CONTRATISTA CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ
INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA No	1026-2021	CONTRATISTA	1. LUMBRE INGENIERIA SAS	ENTIDAD CONTRATANTE	MOJA	1	DE	1
CONTRATO INTERVENTORIA No	1068-2021	INTERVENTORIA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	MOJA	1	DE	1	

CAPITULO	GENERAL	ITEM	3	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frío alta duración multi-metabolito 100% puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma MT-C-1360-1, para pasos peatonales, avisos en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehículos y peatones (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra)				
				UNIDAD	M2			

ITEM	LOCALIZACION / DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	LOCALIZACION PLANIMETRICA
		ANCHO	LARGO	AREA M2			
	BARRIO LA FLORIDA						
	CARRERA 6 CON CALLE 2						
	FLECHA DOBLE DERECHA - IZQUIERDA			3.21	1.00	3.21	
	LINEA DE PARE	0.60	2.60	1.56	2.00	3.12	
	LINEA DE SENDERO	0.30	5.85	1.76	1.00	1.76	
		0.30	5.85	1.76	1.00	1.76	
		0.30	6.10	1.83	1.00	1.83	
		0.30	6.00	1.80	1.00	1.80	
	CARRERA 6D CALLE 1						
	FLECHA DOBLE DERECHA - IZQUIERDA			2.20	2.00	4.40	
	FLECHA DOBLE GIRO			2.54	1.00	2.54	
	LINEA DE PARE	0.60	3.50	2.10	1.00	2.10	
	PICTORAMA ZONA ESCOLAR			5.60	1.00	5.60	
	LINEA DE SENDERO	0.30	6.00	1.80	1.00	1.80	
		0.30	5.95	1.79	1.00	1.79	
		0.30	5.80	1.74	1.00	1.74	
		0.30	6.10	1.83	1.00	1.83	
	CARRERA 6D CALLE 2						
	FLECHA DOBLE DERECHA - IZQUIERDA			2.20	2.00	4.40	
	FLECHA DOBLE GIRO	0.60	3.20	1.92	1.00	1.92	
	LINEA DE PARE	0.30	6.20	1.86	1.00	1.86	
	LINEA DE SENDERO	0.30	5.80	1.74	1.00	1.74	
		0.30	5.90	1.77	1.00	1.77	
		0.30	5.90	1.77	1.00	1.77	
	OBSERVACIONES:						
				SUBTOTAL	M2	46.20	
				TOTAL	M2	46.20	

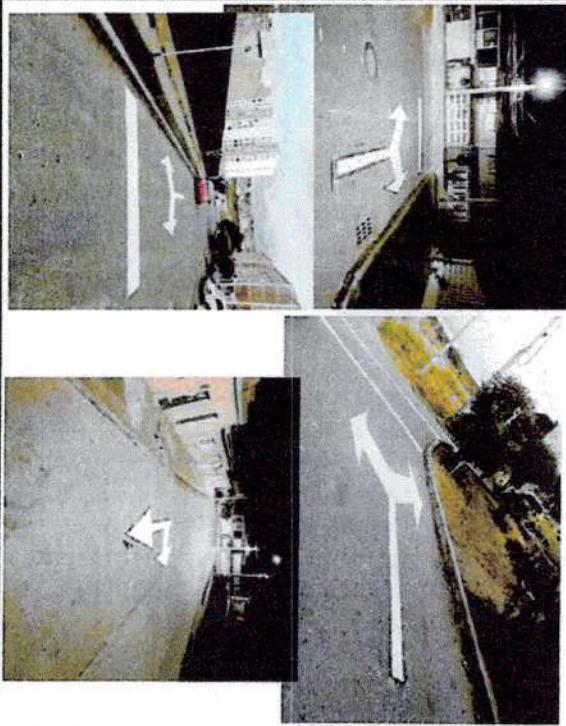

Fecha		Interventoria	
Nombre	ESTANISLAO ESCOBAR	Interventoria	
Cargo	RESIDENTE DE OBRA	Interventoria	
		Interventoria	

		MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N°1		VERSION		CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ
CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACION DE TRANSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA				1.0	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
CONTRATO DE OBRA No. 1036-2021		CONTRATISTA 1036-2021		CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		MUNICIPIO DE TUNJA
CONTRATO INTERVENTORIA No. 1036-2021		INTERVENTORIA		HOJA 1		DE 1
CAPITULO GENERAL		ITEM 3		Suministro y aplicación manual (fotodo llano) de pintura de plástico en filo sin duración metil-metacrilato 100%, puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma MTC-1360.1, para pasos peatonales, avisos en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehículos y peatones (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra)		
LOCALIZACION / DESCRIPCION		DIMENSIONES		LOCALIZACION PLANIMETRICA		
RESALTOS		ANCHO LARGO AREA M2		CANTIDAD TOTAL		
CALLE 4 N° 3-02		1.00	7.25	7.25	1.00	7.25
CALLE 4 N° 3-28		1.00	6.90	6.90	1.00	6.90
CALLE 4 N° 3-29		1.00	5.25	5.25	1.00	5.25
CALLE 4 N° 6A-59		1.05	6.00	6.30	1.00	6.30
CALLE 5 N° 2-26 (ZONA ALTA)		1.15	7.38	8.48	1.00	8.48
CALLE 5 N° 3-16 (ZONA ALTA)		1.10	7.50	8.25	1.00	8.25
CALLE 5 N° 3-05 (ZONA ALTA)		1.10	7.52	8.27	1.00	8.27
CALLE 4 N° 4A-100		1.20	4.52	2.20	1.00	2.20
CALLE 4 N° 4A-22		1.00	5.90	2.20	1.00	2.20
VILLA BACHUE						
CALLE 6 N° 5-135		3.35	5.30	17.76	1.00	17.76
CALLE 6 N° 4C-36		3.47	5.28	5.90	1.00	5.90
CARRERA 4 N° 5B-60		1.05	6.60	6.63	1.00	6.63
JORDAN						
CALLE 12 N° 6-35		3.70	7.45	27.57	1.00	27.57
CALLE 12 N° 6-02		3.70	8.60	31.82	1.00	31.82
OBSERVACIONES:		SUBTOTAL		M2	148.14	148.14
TOTAL				M2	148.14	148.14
CONTRATISTA DE OBRA		INTERVENTORIA				
Firma		Firma				
Nombre		Nombre				
Cargo		Cargo				
ESTANISLAO ESCOBAR		ESTANISLAO ESCOBAR				
RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE OBRA				
Firma		Firma				
Nombre		Nombre				
Cargo		Cargo				
CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ				
RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE OBRA				

		MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA / ACTA PARCIAL N°1		VERSION 1.0	 CUMBRE	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ INTERVENTORIA
CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA						
CONTRATO DE OBRA No 1006-2021		CONTRATISTA INTERVENTORIA		CUMBRE INGENIERIA SAS CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		ENTIDAD CONTRATANTE MUNICIPIO DE TUNJA
CONTRATO INTERVENTORIA No. 1006-2021		INTERVENTORIA		HOJA 1		DE 1
CAPITULO		GENERAL		ITEM	4	
				SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS		
				UNIDAD		
				ML		
LOCALIZACIÓN PLANIMETRICA						
ITEM	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCION	DIMENSIONES ANCHO LARGO AREA M2		CANTIDAD	TOTAL	
	AVENIDA MALDONADO (SECTOR HUGOLINO), AV MALDONADO CALLE 25 INTERSECC.					
	LINEA DISCONTINUA	3.00		200.00	600.00	
	LINEA CONTINUA	20.00		4.00	80.00	
	AVENIDA MALDONADO CALLE 25 INTERS.					
	LINEA CONTINUA	20.00		9.00	180.00	
	VIA TUNJA - ARCABUCO					
	LINEA CONTINUA	3.130.00		2.00	1.260.00	
	CALLE 3 ENTRE CARRERA 11 Y 14					
	LINEA CONTINUA	105.00		2.05	210.00	
	LINEA DISCONTINUA	79.00		1.00	79.00	
	LINEA CONTINUA	349.00		2.00	698.00	
	LINEA CONTINUA FRENTE A AMPARO N°1	20.00		1.00	20.00	
OBSERVACIONES				VENEN	ML	
				TOTAL	ML	8.127.00
CONTRATISTA DE OBRA  CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ REPRESENTANTE DE OBRA						
INTERVENTORIA  CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA						
FOTOGRAFIA   						

CONTRATO DE OBRA No	1036-2021	CONTRATISTA	JMBRE INGENIERIA SAS	ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUNJA
CONTRATO INTERVENTORIA No.	1065-2021	INTERVENTORIA	CI SA 3 HERNANDO FIGUEROA BAEZ	HOJA	1
				DE	1
CAPITULO	GENERAL	ITEM	\$	UNIDAD	UN
			Suministro e instalación de Señalización vial vertical flexible (DUPLEX) en papel reflective 60 x 90 cm urbana, según especificaciones relacionadas en el Manual de Señalización vial, parte 5, capítulos 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.1.6.2 (incluye todos los elementos necesarios para el funcionamiento de ellos: herramentales menor, excavación, concreto y mano de obra)		

[illegible]



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N°1

VERSION



CLEAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL, DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACION DE TRANSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

1.0

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA No.

1006-2021

CONTRATISTA

CUMBRE INGENIERIA SAS

ENTIDAD CONTRATANTE

HOJA

1

DE

1

CAPITULO

GENERAL

ITEM

6

Suministro e instalacion de señal vertical de tránsito preventivas SP-478, tamaño 60 X 60 cm. Elaboradas en lamina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diámetro al cubo marca 3M) pedestal elaborando en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrositica. Segun norma INVIAS.

UNIDAD

UN

ITEM LOCALIZACION / DESCRIPCION

ANCHO

LARGO

AREA M2

CANTIDAD

TOTAL

LOCALIZACION PLANIMETRICA

CALLE 3 ENTRE CARRERA 11 Y 14

10.00

10.00

VIA TUNJA - ARCABUCO SP-46B

2.00

2.00

BARRIO LA FLORIDA SP 47B

4.00

4.00

BARRIO LA FLORIDA SP 46B

7.00

7.00

OBSERVACIONES

VENEN

UN

23.00

CONTRATISTA DE OBRA

INTERVENTORIA

Firma

Nombre

ESPECIALISTA EN OBRA

RESIDENTE DE OBRA

Fecha

10/01/2021

10/01/2021

INTERVENTORIA

FERNANDO RODRIGUEZ

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N°1

VERSION



CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

10

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA NO
CONTRATO INTERVENTORIA NO.

1036-2021
1068-2021

CONTRATISTA
INTERVENTORIA

JUMPRE INGENIERIA SAS
C/SA R HERNANDO FIGUEROA

ENTIDAD

ANTE	
	1

MUNICIPIO DE TUNJA	DE
--------------------	----

1		
---	--	--

CAPITULO

GENERAL

ITEM

Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega en la respectiva Entidad Territorial (Incluye señales sencillas y Duplex)

UNIDAD

UN

[illegible]

[illegible]

CONTRATISTA DE OBRA		INTERVENTORA	
<div> <div>  </div> <div> Firma Nombre Campo </div> </div>	ESTANISLAO ESCOBAR RESIDENTE DE OBRA	<div> <div>  </div> <div> Firma Nombre Campo </div> </div>	GERMANINO RODRIGUEZ RESIDENTE DE INTERVENTORA

CONTRATISTA DE GUÍA		INTERVENTORA	
	PRIMARIO		FERNANDA RODRIGUEZ
ESTANISLAO ESCOBAR		RESIDENTE DE INTERVENTORA	
RESIDENTE DE GUÍA			

		MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA / ACTA PARCIAL N°1		VERSIÓN		CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ
<p>CONTRATO DE OBRA PARA LA SERIALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACION DE TRANSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA</p>		1.0		CONTRATISTA		INTERVENTORIA
CONTRATO DE OBRA No	1036-2021	CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA SAS		ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUNJA
CONTRATO INTERVENITORIA No.	1066-2021	INTERVENITORIA	C/ SR. J. HERNANDO FIGUEROA BAEZ	HOJA	1	DE 1
CAPITULO	GENERAL	ITEM	11	SEÑALES DE TRANSITO 0.90*1.13 MTS. (INFORMATIVAS) SEGUN NORMA INVIAS		UNIDAD UN

[illegible]

CAPITULO	GENERAL	ITEM	UNIDAD
		13	UNO

[illegible]

CONTRATISTA DE OBRAS		INTERVENTORA
Firma	(Firma)	(Firma)
Razon Social	GRANISIAO ESCOVA	SERGIANO RODRIGUEZ
Categoría	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORA



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA / ACTA PARCIAL N°1

VERSION



CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCAACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACION DE TRANSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

1.0

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA No.

1038-2021

CONTRATISTA

CUABARE INGENIERIA SAS

ENTIDAD CONTRATANTE

MUNICIPIO DE TUNJA

CONTRATO INTERVENTORIA No.

1065-2021

INTERVENTORIA

CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

HOJA

1

DE

1

CAPITULO

GENERAL

ITEM

14

Suministro e instalacion de tachones 40*15*8 cm

UNIDAD

UND

ITEM	LOCALIZACION / DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	LOCALIZACION PLANIMETRICA
		ANCHO	LARGO	AREA M2			
	AVENIDA MALDONADO SECTOR HUGOLINO				10.00	10.00	
	AVENIDA MALDONADO CALLE 25 INTERS.				22.00	22.00	
	CARRERA 9 CALLE 25				16.00	16.00	
	CARRERA 8 CALLE 25				2.00	2.00	
	CARRERA 9 CALLE 23				3.00	3.00	
OBSERVACIONES:							
					VENEN	UND	
					TOTAL	31.00	

CONTRATISTA DE OBRA	INTERVENTORIA
Firma	Firma
Nombre	Nombre
Cargo	Cargo
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 39 DE 98

ANEXO 11.12 REGISTRO FOTOGRÁFICO

1. CARRERA 9 CON CALLE 25 (SALESIANO)



"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 41 DE 98



"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 42 DE 98



"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 43 DE 98




"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 44 DE 98

2. CARRERA 9 CON CALLE 22 (BRIGADA)

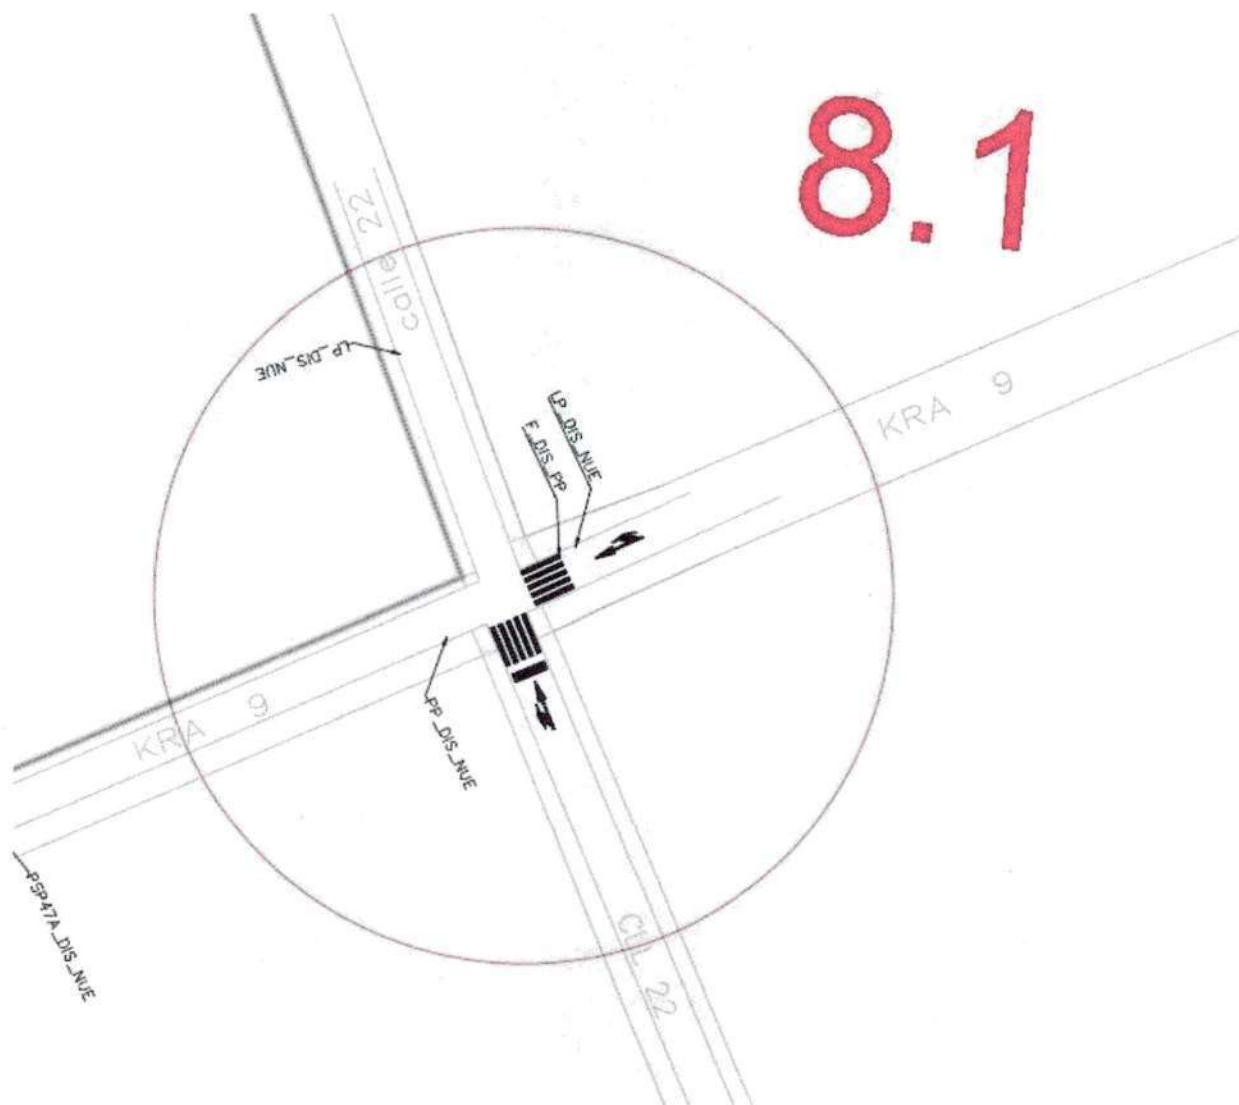

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 45 DE 98




"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 46 DE 98



3. CARRERA 15 CON CALLE 19 TOPO)

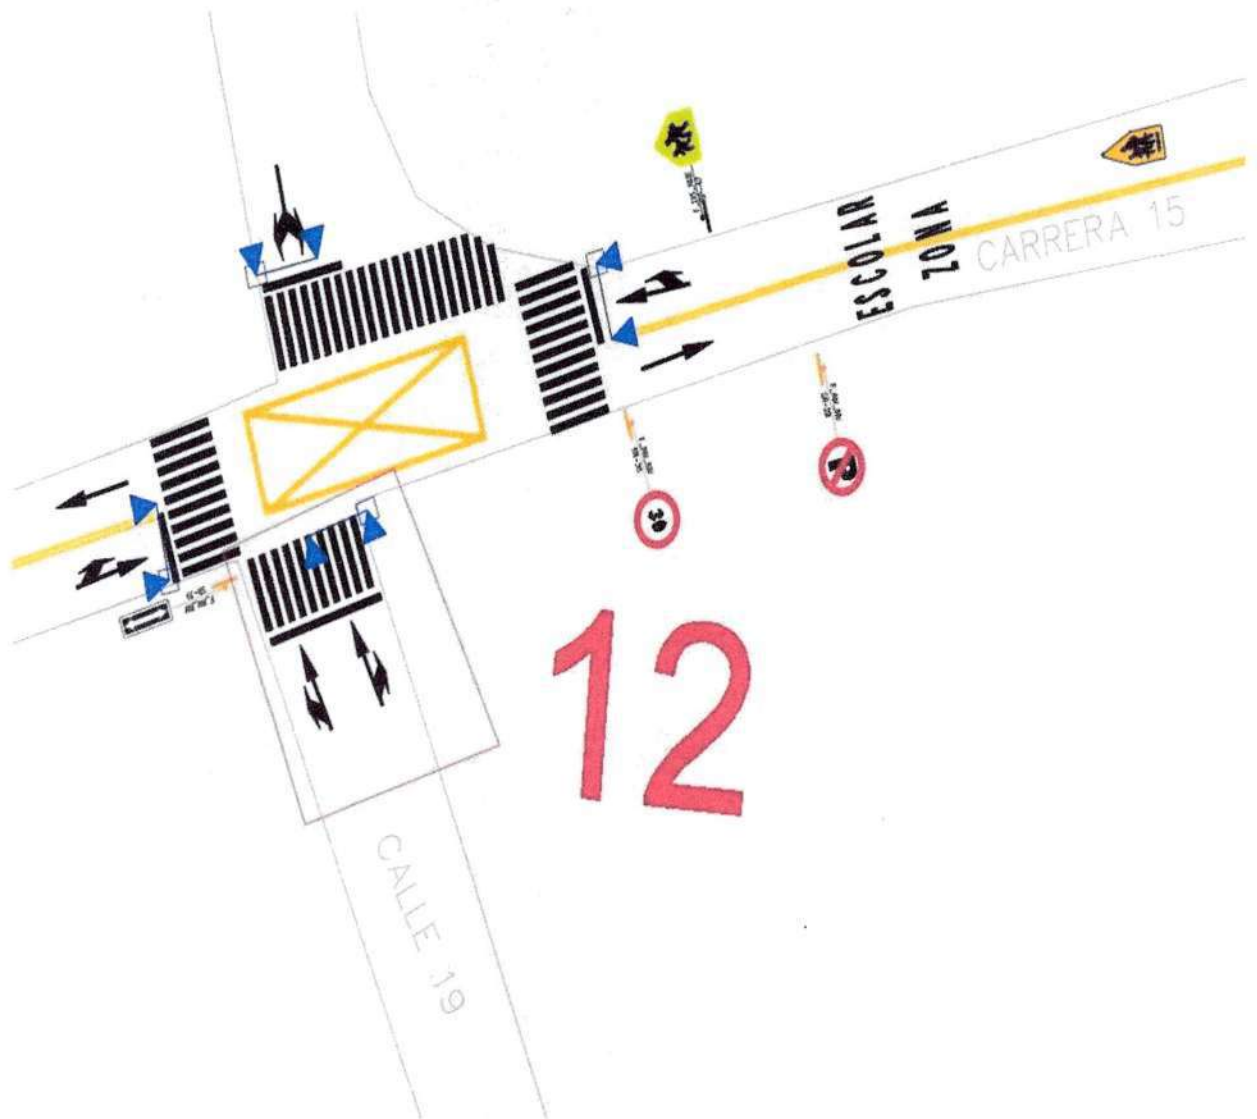

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 48 DE 98



"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 49 DE 98



"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 50 DE 98




"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 51 DE 98

4. CARRERA 7 CON CALLE 17 (ANTIGUO TERMINAL).

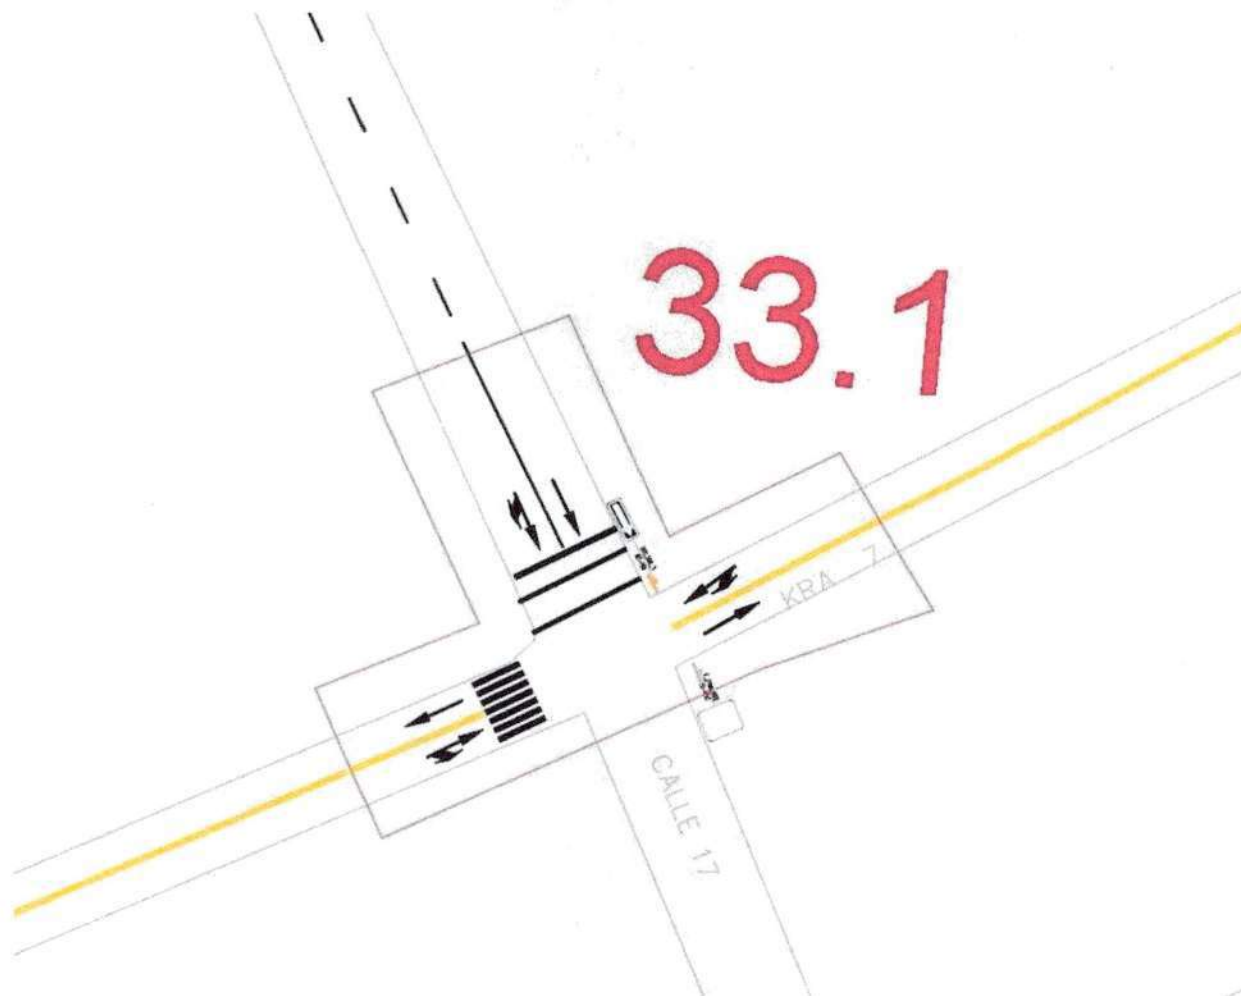

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 52 DE 98




"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 53 DE 98



5. CARRERA 7 CON CALLE 18.

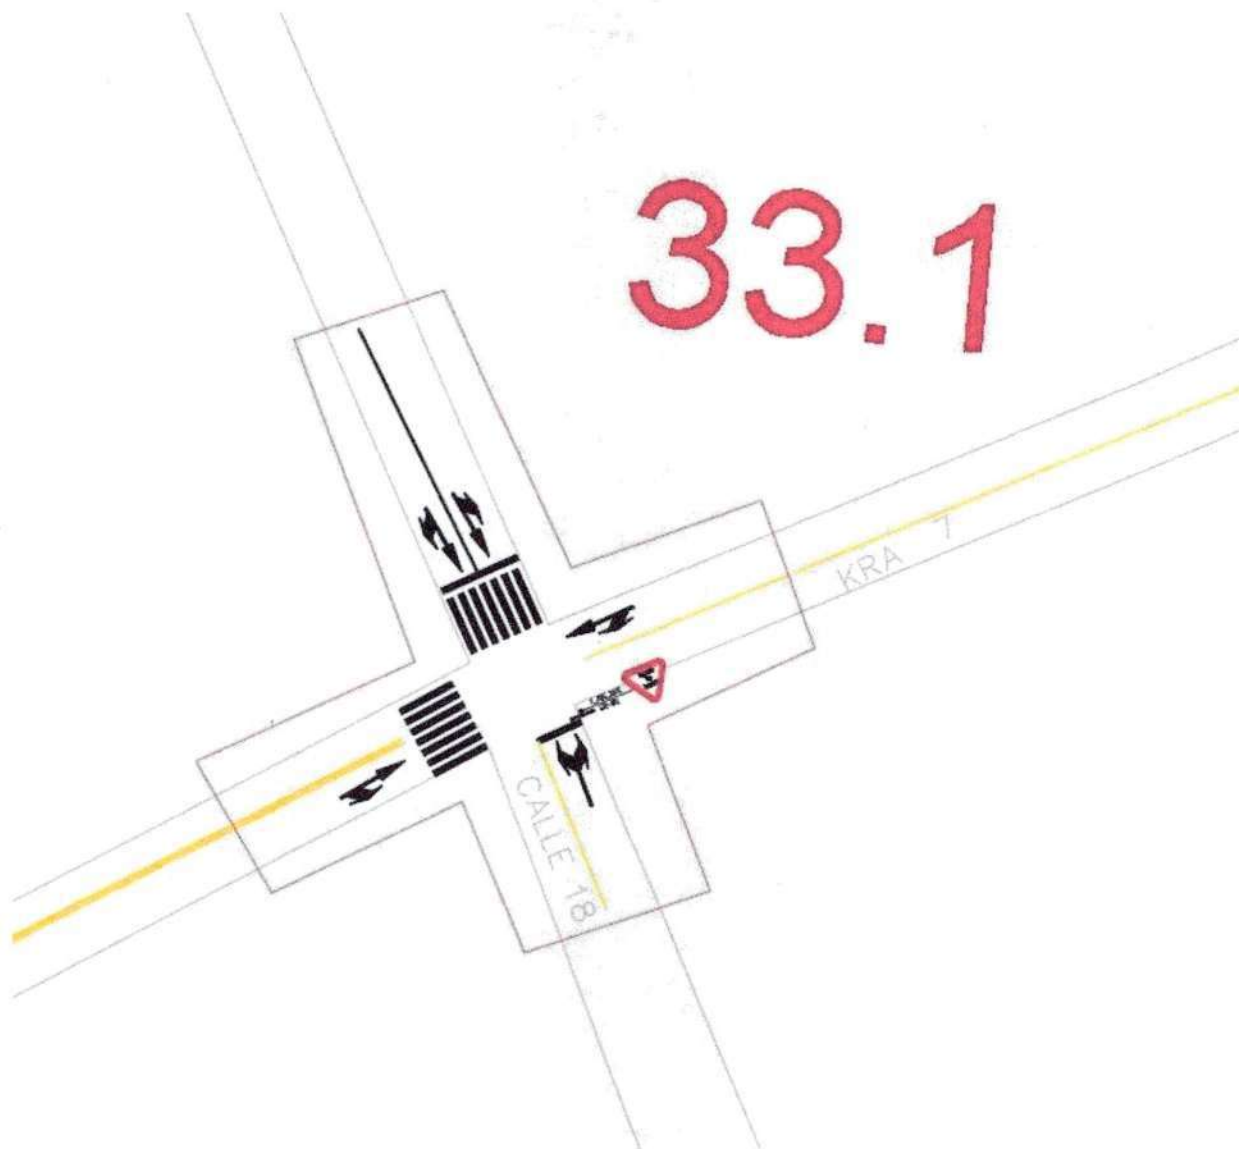

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 55 DE 98




"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 56 DE 98




6. CARRERA 7 CON CALLE 19

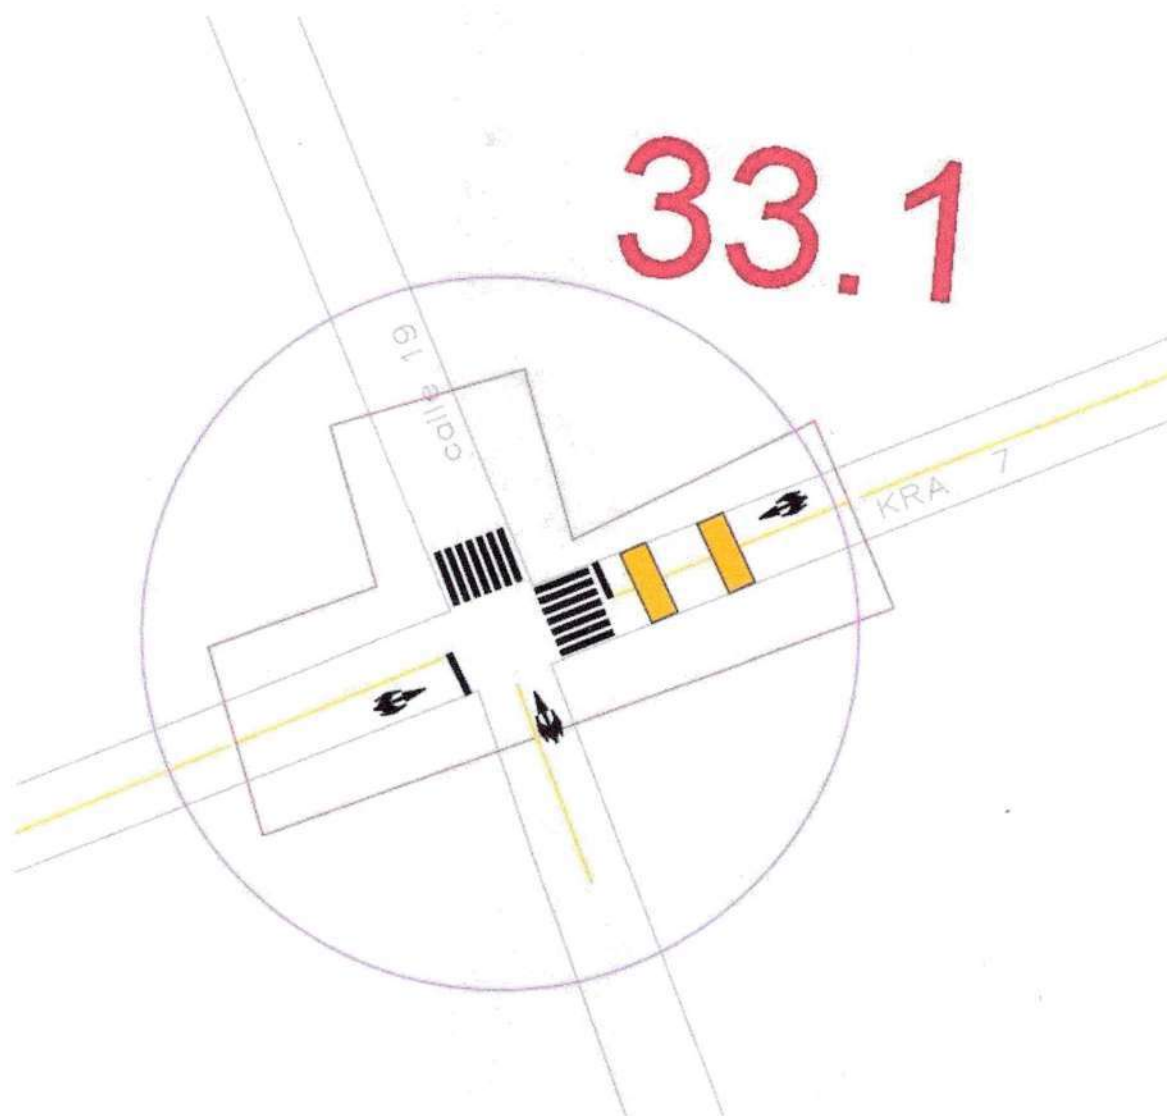

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 58 DE 98

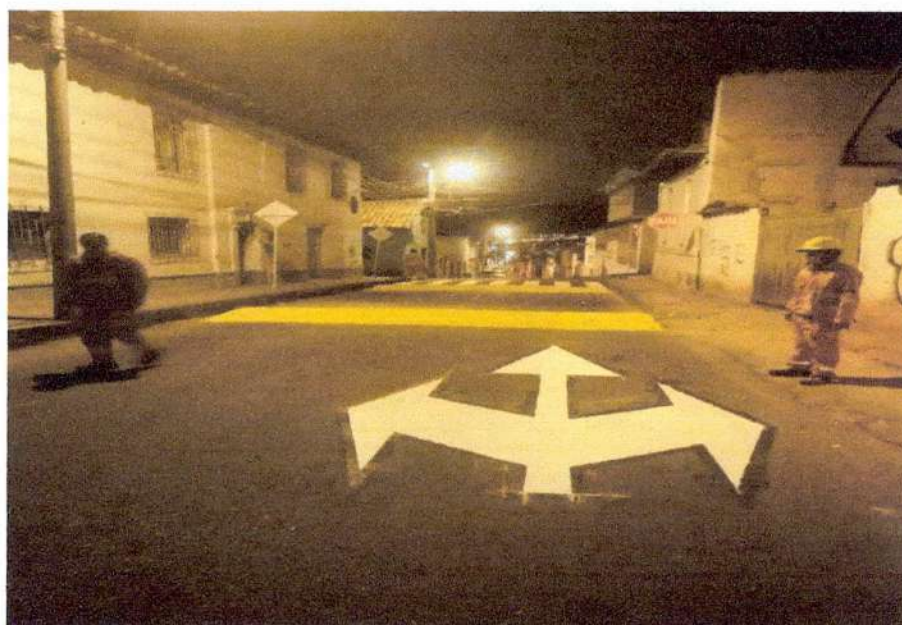

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 59 DE 98




"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 60 DE 98

7. CARRERA 7 CON CALLE 20

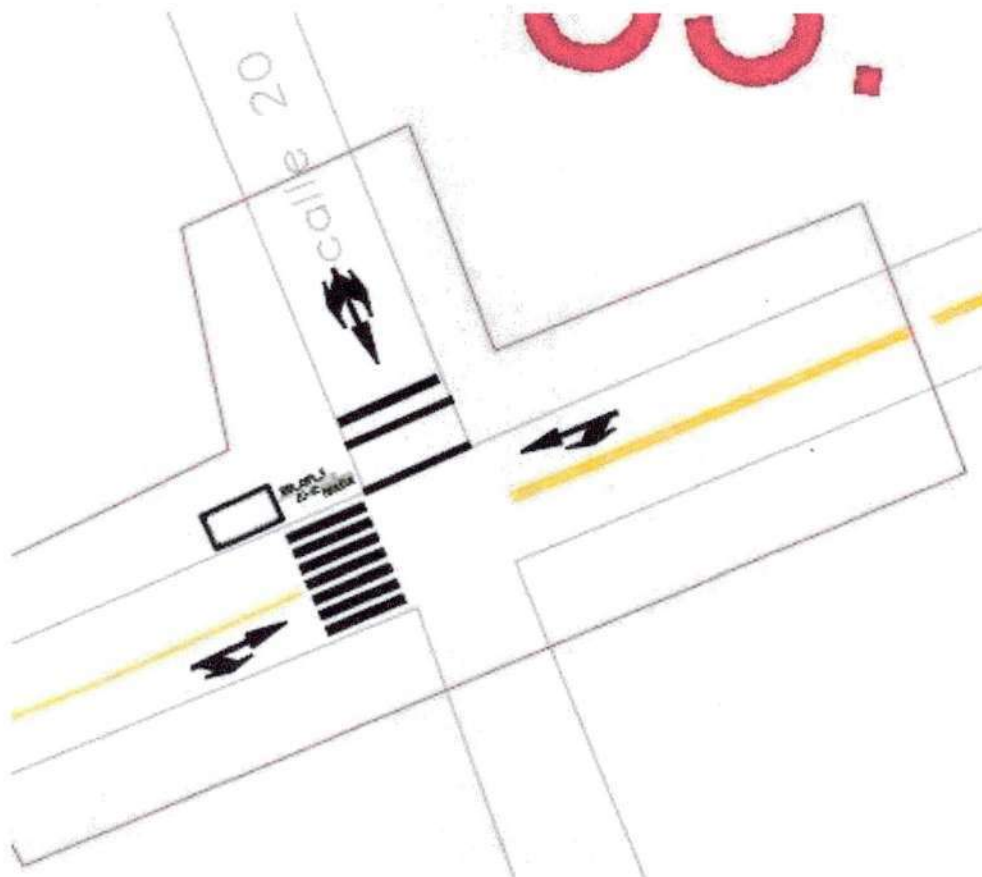


"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 61 DE 98



8. CARRERA 8 CON CALLE 18

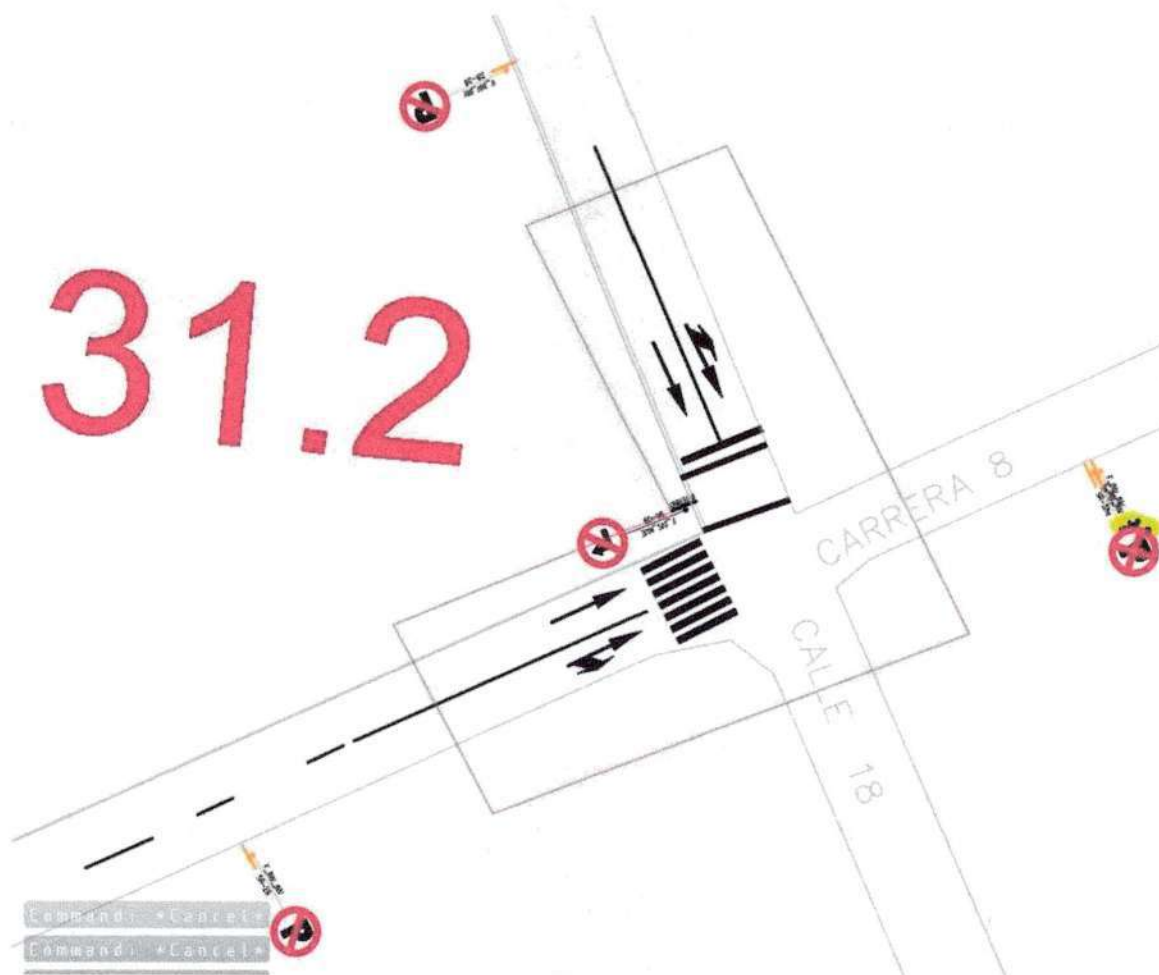

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 63 DE 98




9. CARRERA 8 CON CALLE 20. (PILA DEL MONO)



"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 65 DE 98

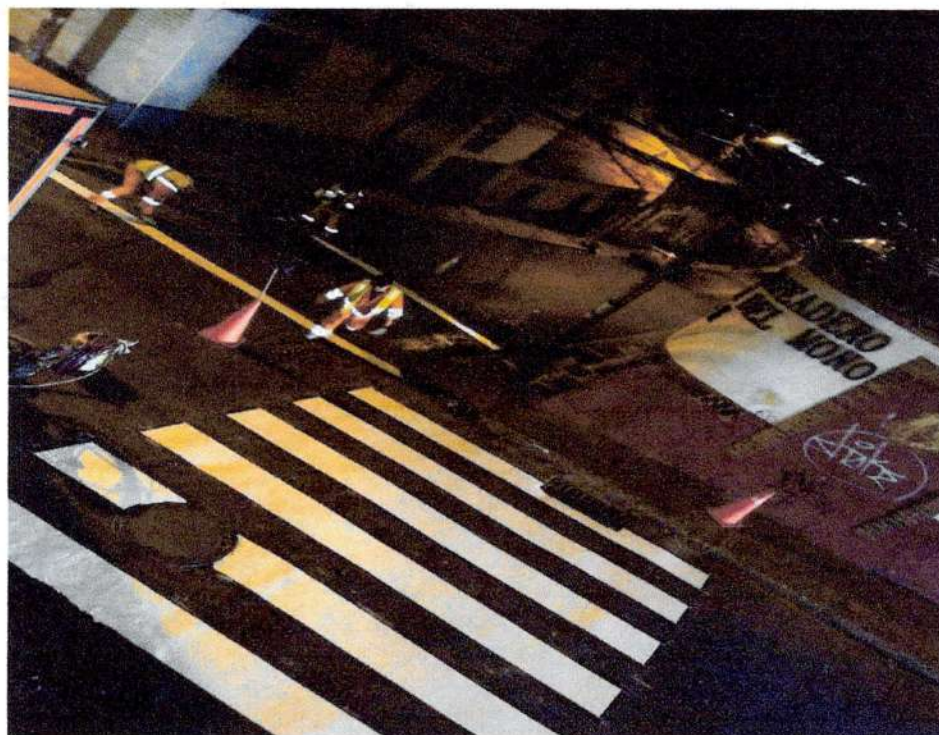

333

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 66 DE 98




"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 67 DE 98

10. CARRERA 8 CON CALLE 23

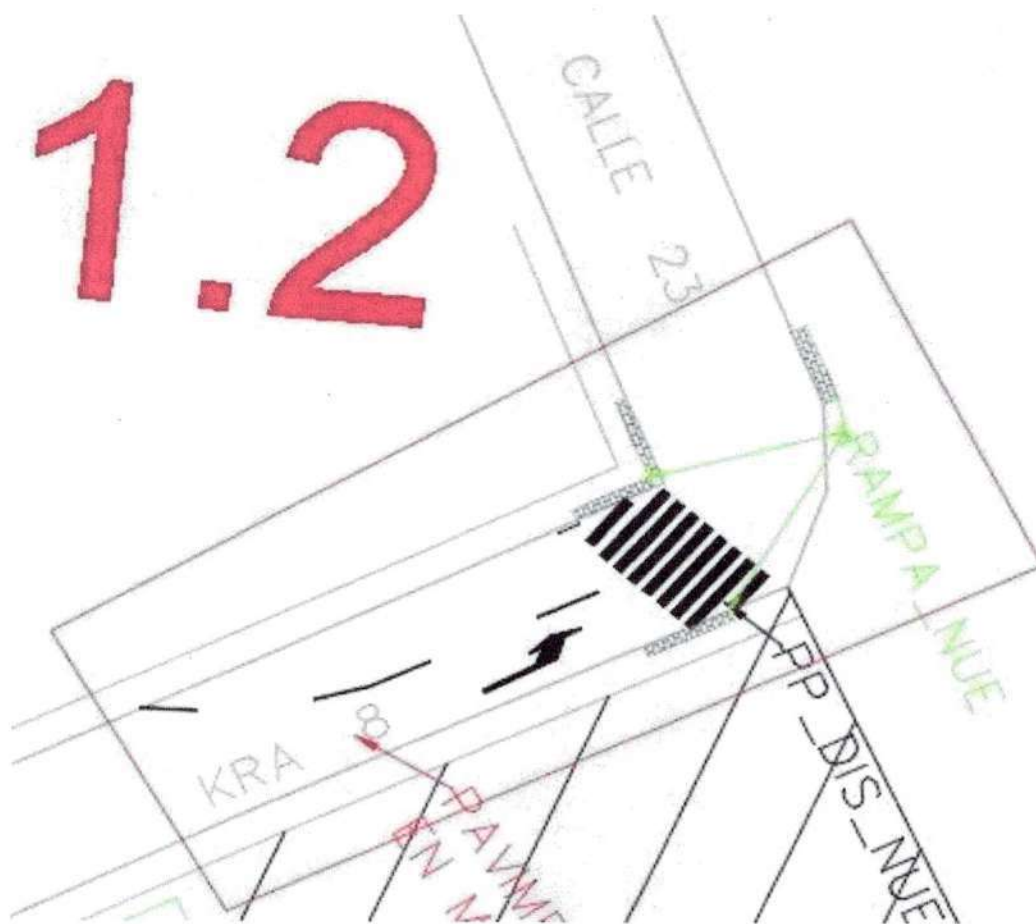

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"


INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 68 DE 98



326

11. CARRERA 8 CON CALLE 25

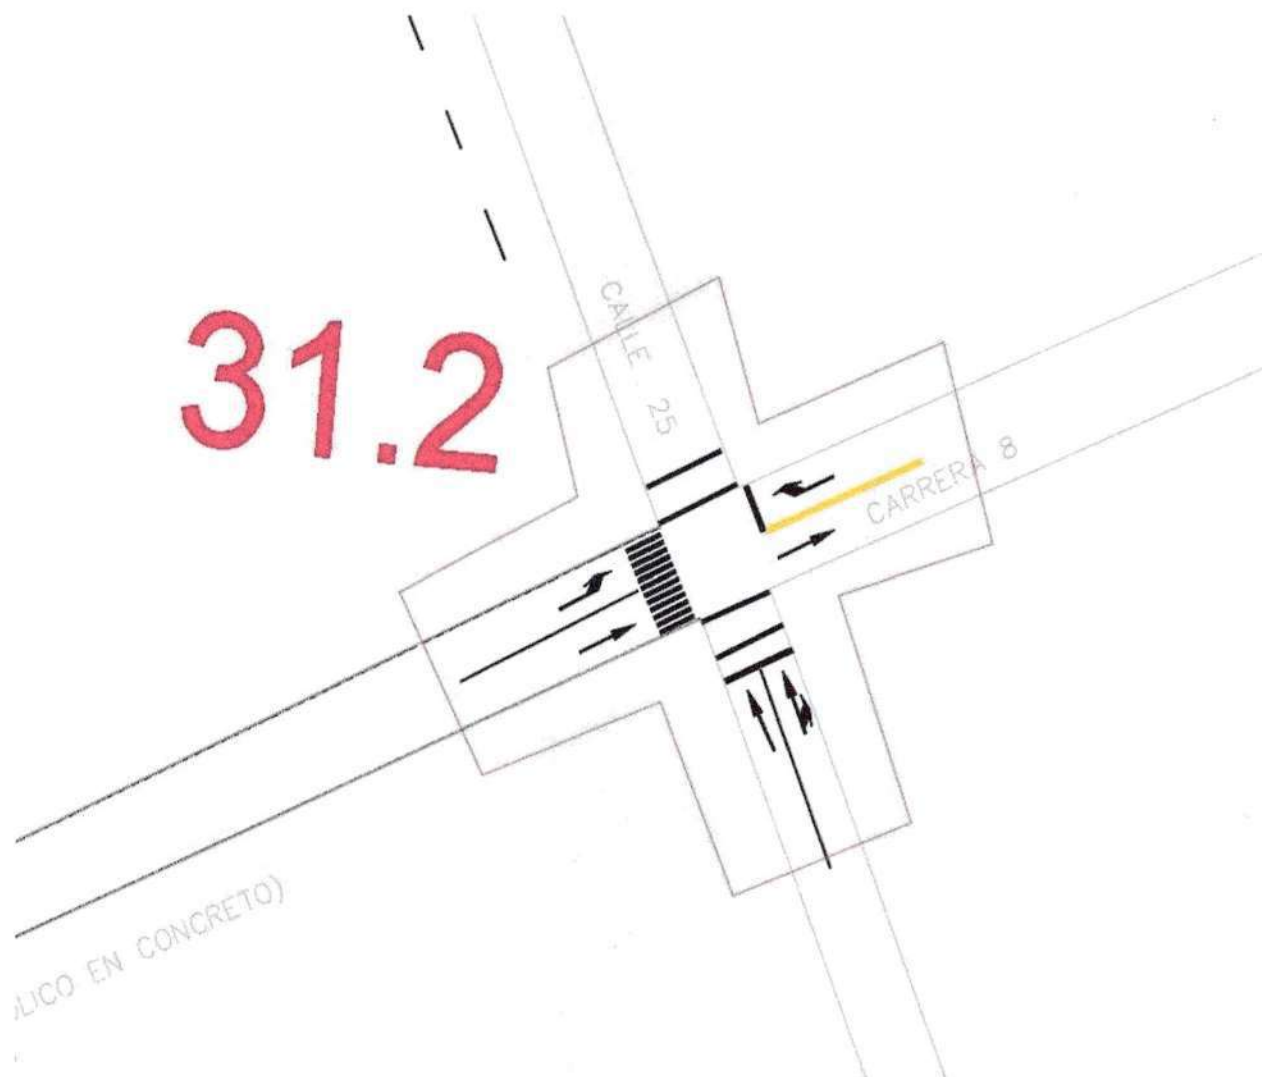

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 70 DE 98



"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 71 DE 98




"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 73 DE 98



12. CARRERA 10 CON CALLE 21. (CAMOL).

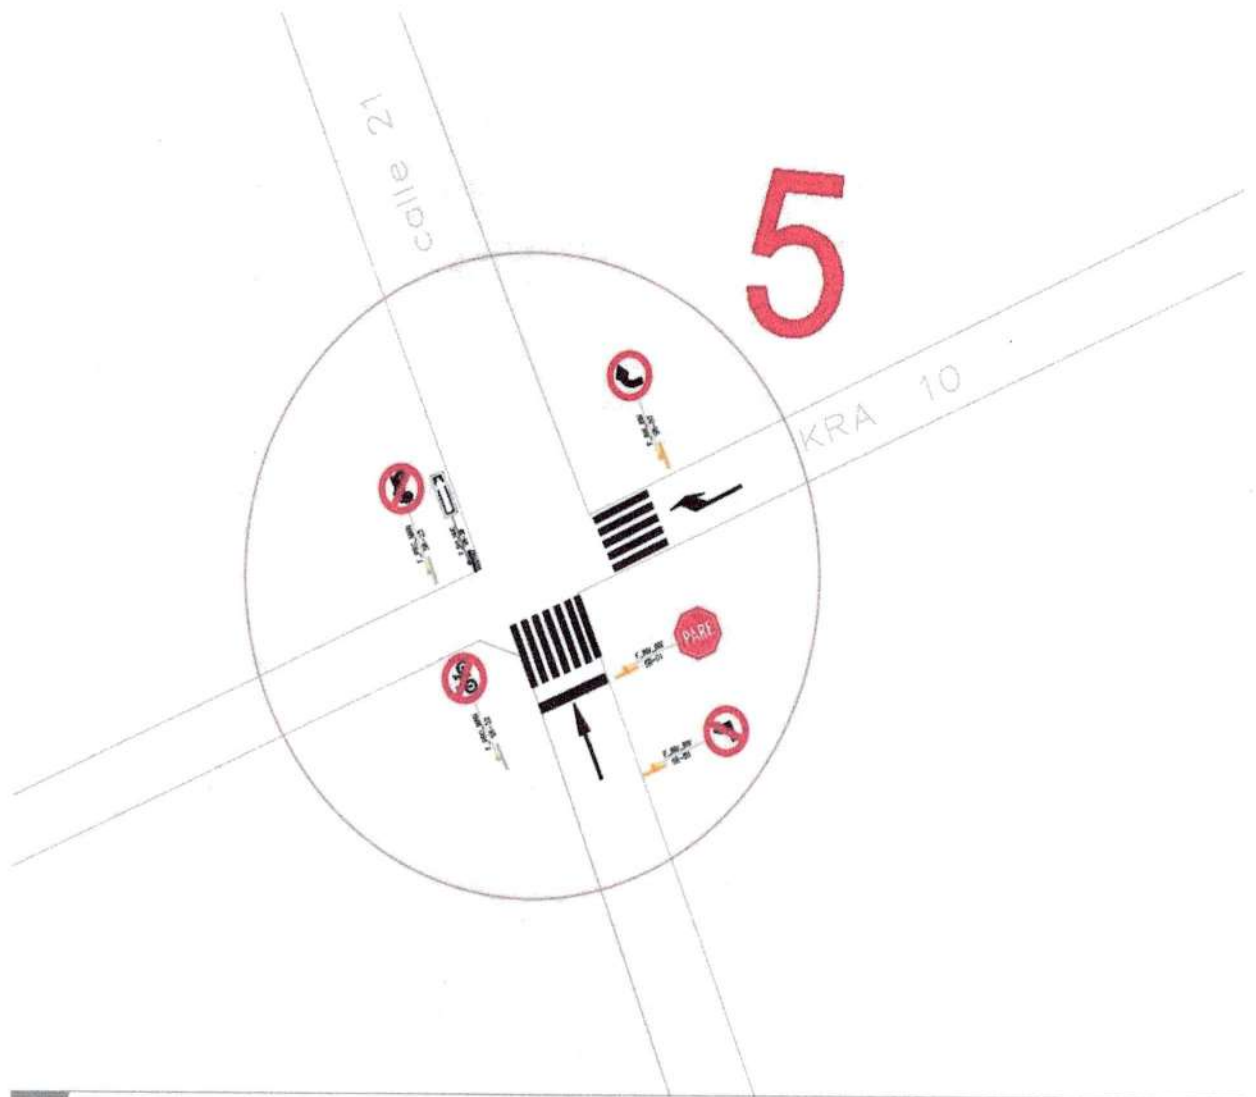


"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 74 DE 98

13. CARRERA 11 CON CALLE 17 (LUMOL)

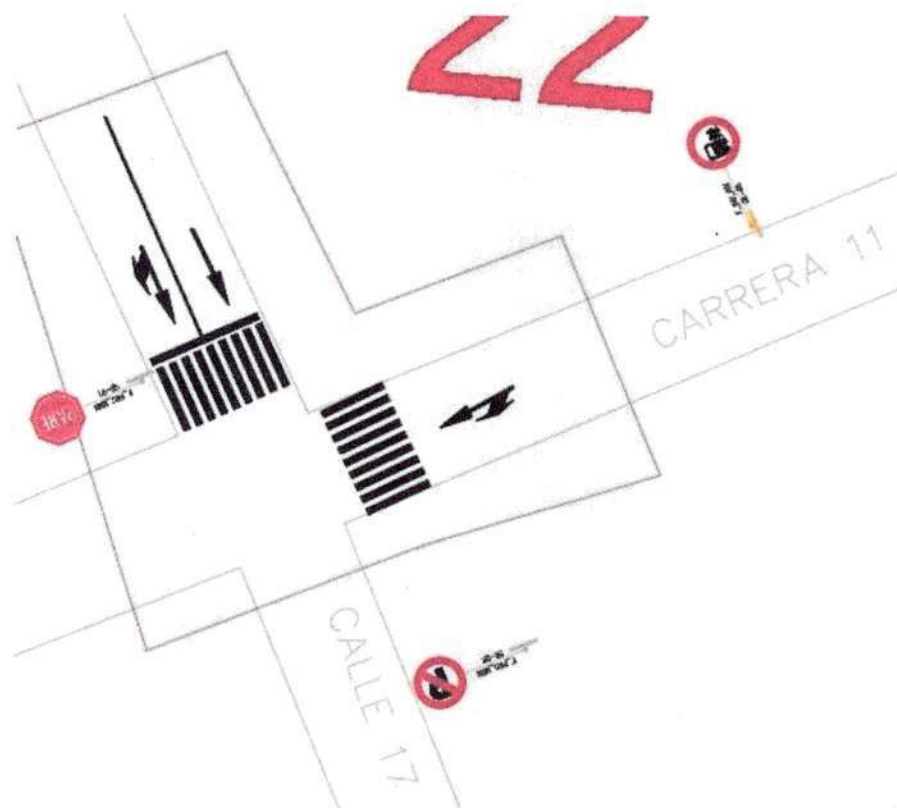

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 75 DE 98




"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 76 DE 98

14. CARRERA 11 CON CALLE 21ª (HOTEL HUNZA)

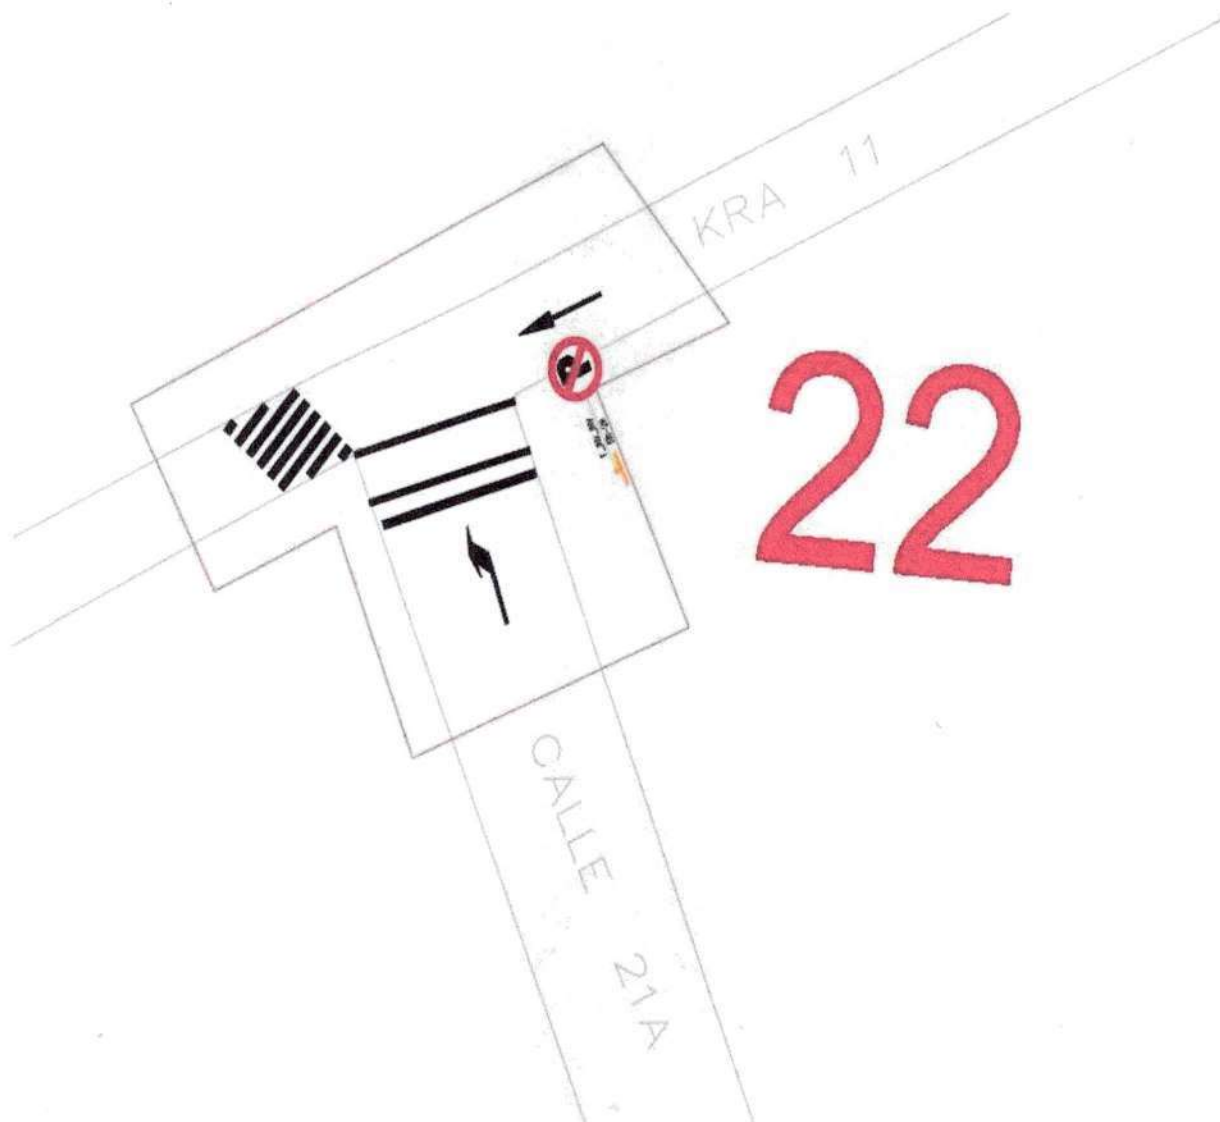


"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 77 DE 98



15. CARRERA 12 CON CALLE 18

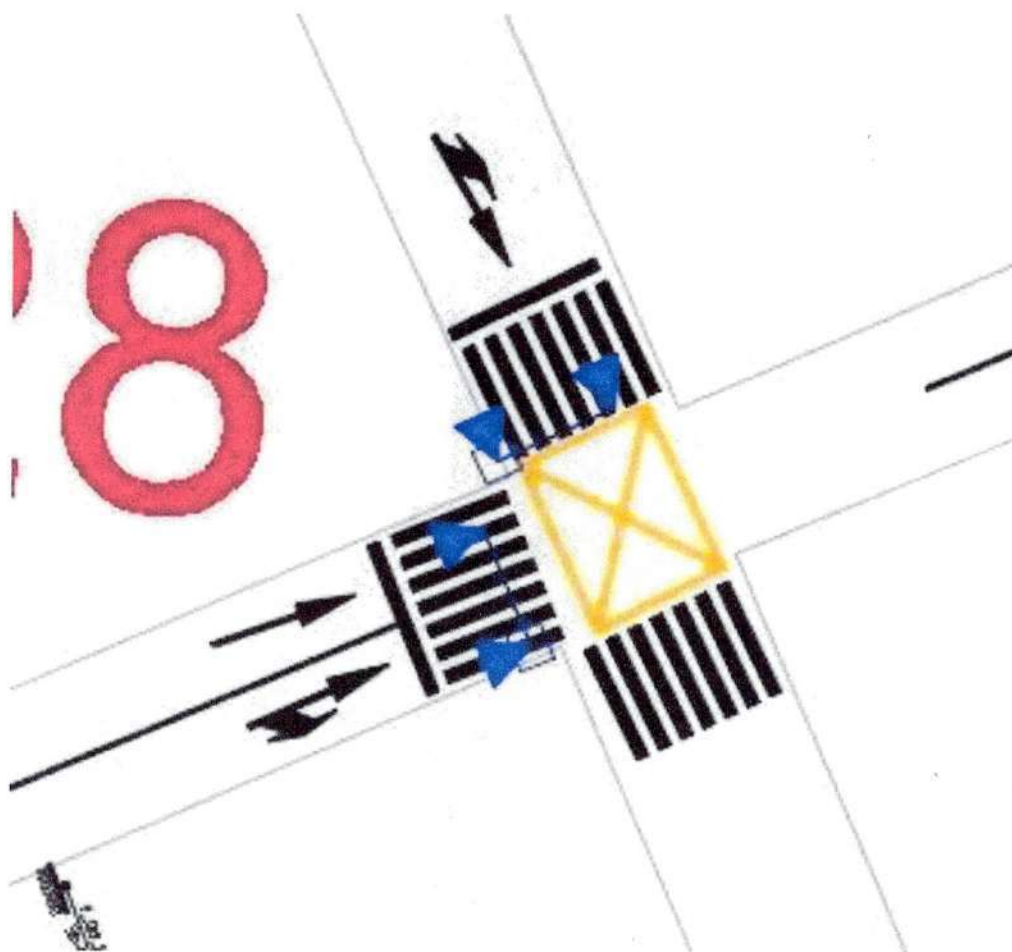

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 79 DE 98



"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 80 DE 98




"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 81 DE 98

16. CARRERA 16 CON CALLE 32 (LA ESPERANZA)

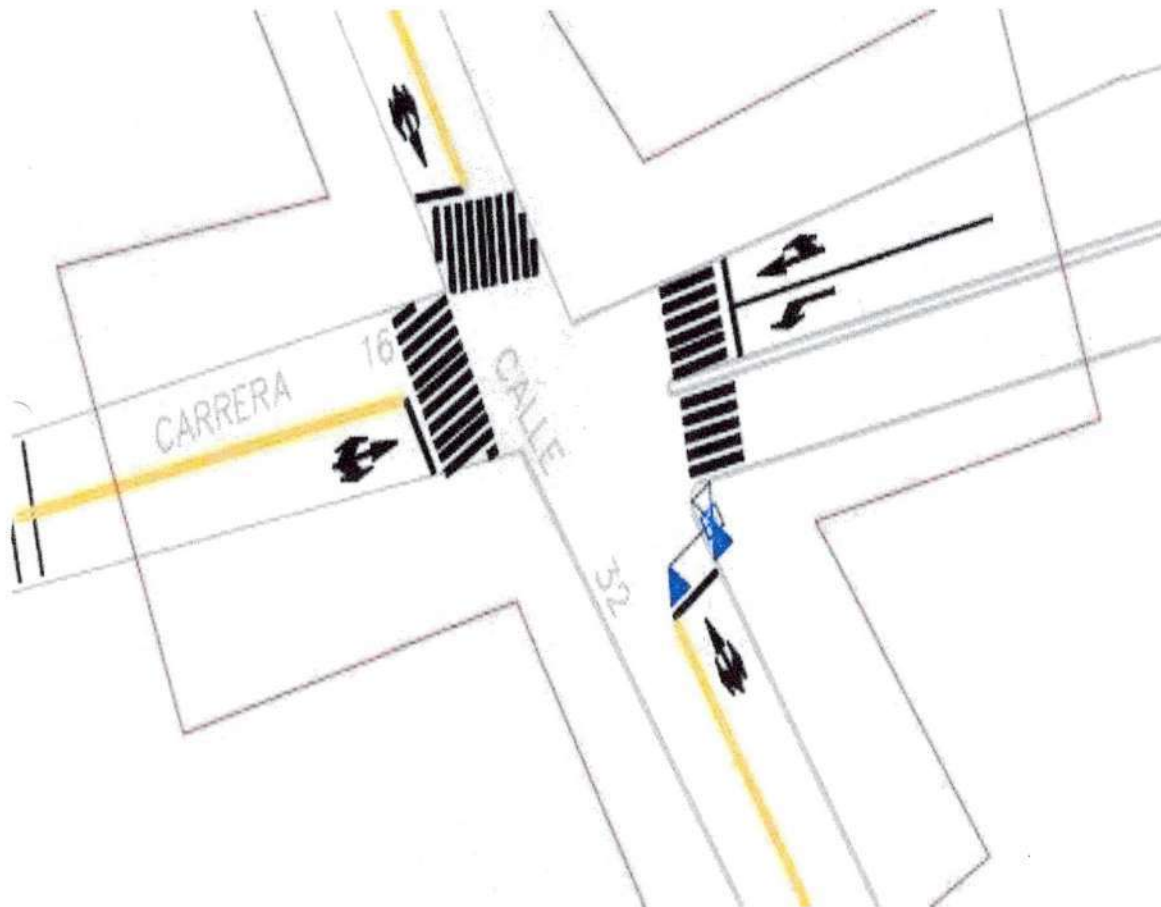

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 82 DE 98



"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 83 DE 98



"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 84 DE 98

17. ENTRADA COLEGIO GALILEO GALILEI



"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 85 DE 98

18. VIA TUNJA – ARCABUCO. (SEÑALIZACION VERTICAL)



"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 86 DE 98



354

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 87 DE 98



"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 88 DE 98

19. CALLE 3 ENTRE CARRERA 11 Y 14.



3586

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 89 DE 98



"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA


HOJA No. 90 DE 98



"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 91 DE 98

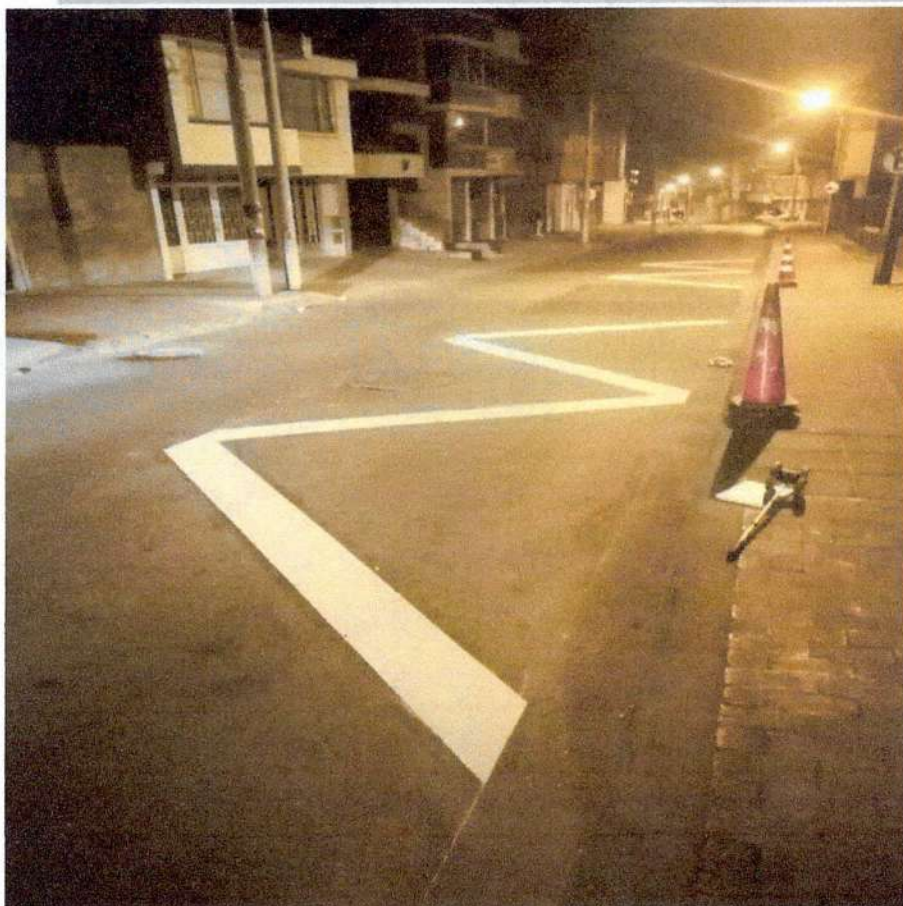

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 92 DE 98



"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 93 DE 98


20. CALLE 3 ENTRE CARRERA 11 Y 14. (SEÑALIZACION VERTICAL)



"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 94 DE 98

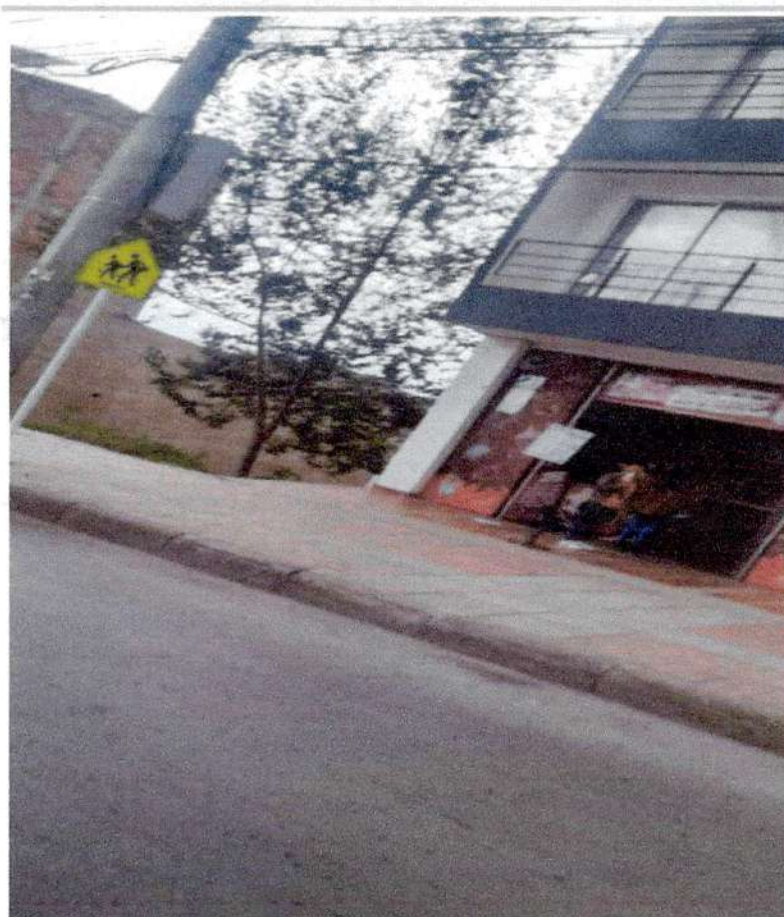

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 95 DE 98

21. VIAS BARRIO LA FLORIDA. (DEMARCAACION HORIZONTAL)



"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 96 DE 98



"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 97 DE 98

22. VIAS BARRIO LA FLORIDA. (INSTALACION SEÑALES VERTICALES)



"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 98 DE 98

23. CARRERA 14 ENTRE CALLES 21 Y 26. (INSTALACION SEÑALES VERTICALES)

