

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 1 DE 78

REPÚBLICA DE COLOMBIA



MUNICIPIO DE TUNJA

DEPARTAMENTO DE BOYACA

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1068 DE 2021

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

PERIODO DEL 29 DE MARZO AL 10 DE MAYO DE 2022

ING. CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ
INTERVENTOR

MAYO DE 2022

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1.	DATOS DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA	4
1.1	CONTRATO DE OBRA	4
1.2	CONTRATO DE INTERVENTORÍA	5
2.	CONTROL DE PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA	6
2.1	PERSONAL DE OBRA PROFESIONAL	6
2.2	PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA	6
2.3	MAQUINARIA MINIMA DE OBRA	6
3.	PERSONAL Y EQUIPO DE INTERVENTORIA	7
3.1	PERSONAL PROFESIONAL INTERVENTORIA	7
3.2	EQUIPO INTERVENTORIA	7
4.	CONTROL JURIDICO POLIZAS DEL CONTRATO (ACTUALIZADAS SEGÚN ADICIONAL N°1 Y PROROGA N°1) 8	
5.	CONTROL DE CORRESPONDENCIA	13
6.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.	14
6.1	OBRAS Y SECTORES INTERVENIDOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO.	14
7.	PLAN DE CALIDAD EN OBRAS	18
7.1	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO	18
7.2	SEGURIDAD INDUSTRIAL	19
7.3	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES	20
7.3.1	PINTURA PLASTICA EN FRIO	20
7.3.2	PINTURA ACRILICA	20
7.3.3	PINTURA ACRILICA IMPRIMANTE	21
7.3.4	MICROESFERAS	21
7.3.5	SEÑALES VERTICALES	21
7.3.6	DISPOSITIVOS DE REGULACION	22
7.3.7	REGISTRO DE CONTROL: Conjuntamente si realizan los respectivos registros de control interno de calidad de los materiales utilizados. Se anexan planillas de registro. (ANEXO 11.7 SOPORTES IMPLEMENTACION PLAN DE CALIDAD).	22
7.4	CONTROL DE ESPESORES DE LA PINTURA PLASTICA EN FRIO, APLICADA CON EL METODO MANUAL "LLANA"	23
7.5	RESULTADOS PRUEBA DE RETRORREFLECTIVIDAD EN PINTURA PLASTICA Y ACRILICA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, EQUIPO DE GEOMETRIA A 15M.	26
7.6	CONTROL DE ESPESORES DE LA PINTURA ACRILICA IMPRIMANTE	28
7.7	CONTROL DE LA FUNCIÓN AMBIENTAL Y DE LA GESTIÓN SOCIAL	29
8.	OBRA EJECUTADA	32
9.	CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA.	33
10.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	43
11.	ANEXOS	44
		45

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 11.1 DOCUMENTACION JURIDICA CONTRATOS DE OBRA Y DE INTERVENTORIA.
Anexo 11.2 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.
Anexo 11.3 PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA DE OBRA.
Anexo 11.4 PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA DE OBRA
Anexo 11.5 PROGRAMACION DE OBRA.
ANEXO 11.6 CONTROL DE CALIDAD A LOS MATERIALES UTILIZADOS.
FICHAS TECNICAS PINTURAS, CERTIFICADOS DE CALIDAD PINTURAS
ANEXO 11.7 SOPORTES IMPLEMENTACION PLAN DE CALIDAD
ANEXO 11.8 SOPORTES IMPLEMENTACION PROGRAMA DE GERENCIA OBRA
ANEXO 11.9 COPIA BITACORA DE OBRA
ANEXO 11.10 INFORMES SEMANALES
ANEXO 11.11 MEMORIAS DE CANTIDADES
ANEXO 11.12 REGISTRO FOTOGRÁFICO

1. DATOS DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA.

1.1 CONTRATO DE OBRA.

Información General del contrato de Obra.

PLAZO DE EJECUCION:	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO:	5/11/2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	4/02/2022
FECHA DE SUSPENSION INICIAL	28/01/2022
TIEMPO DE SUSPENSION INICIAL	15 DIAS CALENDARIO
FECHA DE AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	12 DE FEBRERO DE 2022
TIEMPO DE AMPLIACIÓN No. 1	15 DIAS CALENDARIO
FECHA DE AMPLIACIÓN No. 2 SUSPENSIÓN No. 1	25 DE FEBRERO DE 2022
TIEMPO DE AMPLIACIÓN No. 2	8 DIAS CALENDARIO
FECHA DE AMPLIACIÓN No. 3 SUSPENSIÓN No. 1	04 DE MARZO DE 2022
TIEMPO DE AMPLIACIÓN No. 3	10 DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO:	15/03/2022
FECHA DE TERMINACION 2	22/03/2022
FECHA DE INICIO PRORROGA 1:	23/03/2022
FECHA DE TERMINACION 3	22 DE MAYO DE 2022

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 5 DE 78

1.2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA

1 – Información General del contrato de Interventoría.

PLAZO DE EJECUCION:	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO:	5/11/2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	4/02/2022
FECHA DE SUSPENSION INICIAL	28/01/2022
TIEMPO DE SUSPENSION INICIAL	15 DIAS CALENDARIO
FECHA DE AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	12 DE FEBRERO DE 2022
TIEMPO DE AMPLIACIÓN No. 1	15 DIAS CALENDARIO
FECHA DE AMPLIACIÓN No. 2 SUSPENSIÓN No. 1	25 DE FEBRERO DE 2022
TIEMPO DE AMPLIACIÓN No. 2	8 DIAS CALENDARIO
FECHA DE AMPLIACIÓN No. 3 SUSPENSIÓN No. 1	04 DE MARZO DE 2022
TIEMPO DE AMPLIACIÓN No. 3	10 DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO:	15/03/2022
FECHA DE TERMINACION 2	22/03/2022
FECHA DE INICIO PRORROGA 1:	23/03/2022
FECHA DE TERMINACION 3	22 DE MAYO DE 2022

2. CONTROL DE PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA.

2.1 PERSONAL DE OBRA PROFESIONAL

CARGO	NOMBRE	PROFESION	ESPECIALISTA
Director de Obra	Ing. Leonardo Ramírez Bernal	Ingeniero civil	Especialista en gerencia de construcciones
Residente de Obra	Ing. Estanislabo Estaba	Ingeniero civil	
Especialista de Tránsito	Ing. Víctor Manuel Reyes Caro	Ingeniero en transportes y vías	Magister en Ingeniería - Transporte

2.2 PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

NOMBRE	No. CÉDULA
OSMAN GILDARDO OVIEDO REYES (VRC)	7.187.580
BLADIMIR FLOR LOPEZ (VRC)	1.123.141.385
EDUARD YOVANY PARRADO VEGA (VRC)	1.024.518.230
DANIEL LEONARDO SUAREZ (ABRAHAM)	6.763.529
OSCAR SAAVEDRA SANTIESTEBAN (ABRAHAM)	1.049.640.738

2.3 MAQUINARIA MINIMA DE OBRA

TIPO	MARCA	MODELO	CAPACIDAD
CAMION DE APOYO	FOTON	2020	4500 KGR
PULIDORA CON DISCO	BLACK&DECKER	G720K	4 ½"
PLANTA ELECTRICA	BAUKER	GG2800	1.5 L
DOS HOYADORAS			
DOS PICAS			
NIVEL DE PRECISION	SOKKIA	B401-25	
BATEA			

3. PERSONAL Y EQUIPO DE INTERVENTORIA.

3.1 PERSONAL PROFESIONAL INTERVENTORIA

CARGO	NOMBRE	PROFESION	ESPECIALISTA
Director de Interventoría	Ing. Juan Galindo	Ingeniero en transportes y vías	Especialista en pavimentos
Residente de Interventoría	Ing. Fernando Rodríguez Numpaque	Ingeniero en transportes y vías	Especialista en Infraestructura Vial
Especialista en salud ocupacional	Ing. Fabián Silvestre Fonseca	Ingeniero civil	Especialista en salud ocupacional

3.2 EQUIPO INTERVENTORIA

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Vehículo tipo Camioneta	1
2	Equipo de computo	3
3	Herramienta Menor (cinta, metro, galga, etc.)	3

4. CONTROL JURIDICO POLIZAS DEL CONTRATO (ACTUALIZADAS SEGÚN ADICIONAL N°1 Y PRORORGA N°1)

• CONTRATO DE OBRA:

4.1 Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual

PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	ANEXO 0	28/10/2021			
GARANTÍAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	895-74-994000003852	21/10/21	21/01/22	\$ 181.705.200,00

4.2 Póliza de cumplimiento (ANEXO 1)

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO		28/10/2021			
GARANTÍAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	895-74-994000006707	21/10/21	21/01//22	\$ 128.527.711,20
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		21/10/21	21/01/25	\$128.527.711,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		5 AÑOS a partir ACTA DE RECIBO		\$192.791.566,80

4.3 Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual (ANEXO 1)

PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	ANEXO 1	08/11/2021			
GARANTÍAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	895-74-994000003852	21/01/22	05/02/22	\$ 181.705.200,00

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 9 DE 78

4.4 Póliza de cumplimiento (ANEXO 2)

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	ANEXO 1	08/11/2021			
GARANTÍAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	895-74-994000006707	05/11/21	05/02//22	\$ 128.527.711,20
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		05/11/21	05/02/25	\$128.527.711,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		5 AÑOS a partir ACTA DE RECIBO		\$192.791.566,80

4.5 Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual (ANEXO 6) (PRORROGA Y ADICION #1)

PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		130043667	30/07/2021			
GARANTÍAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No PÓLIZA	VIGENCIA		CERTI-MODIF	VALOR ASEGURADO
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	895-74-994000003852	21/05/22	24/05/22		\$ 200.000.000,00

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 10 DE 78

4.6 Póliza de cumplimiento (ANEXO 7) (PRORROGA Y ADICION #1)

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO		130043665	30/03/2022			
GARANTÍAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No PÓLIZA	VIGENCIA		CERTI-MODIF	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	895-74-99400000670 7	05/11/21	24/05//22		\$ 190.127.711,20
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		05/11/21	24/02/25		\$190.127.711,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		5 AÑOS a partir AERF			\$258.191.566,80

• CONTRATO DE INTERVENTORIA:

4.7 Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual

PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	ANEXO 4	09/11/2021			
GARANTÍAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO	39-40-101034919	05/11/21	05/02/22	\$ 181.705.200,00

4.8 Póliza de cumplimiento

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	ANEXO 5	09/11/2021			
GARANTÍAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	39-44-101131459	05/11/21	05/06/22	\$ 11.122.335
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS DEL ESTADO		05/11/21	05/02/25	\$7.414.890
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO		05/11/21	05/11/26	\$7.414.890

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 11 DE 78

4.9 Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual (reinicio de contrato #1)

PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	ANEXO 5	17/03/2022			
GARANTÍAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO	39-40- 101034919	05/11/21	25/03/22	\$ 200.000.000,00

4.10 Póliza de cumplimiento (reinicio de contrato #1)

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	ANEXO 6	17/03/2022			
GARANTÍAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	39-44- 101131459	05/11/21	25/07/22	\$ 11.122.335
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS DEL ESTADO		05/11/21	30/03/25	\$7.414.890
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO		05/11/21	05/11/26	\$7.414.890

4.11 Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual (Prorroga y adicional #1)

PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	ANEXO 6	24/03/2022			
GARANTÍAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO	39-40- 101034919	05/11/21	25/05/22	\$ 200.000.000,00

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 12 DE 78

4.12 Póliza de cumplimiento (Prorroga y adicional #1)

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	ANEXO 8	30/03/2022			
GARANTÍAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	39-44-101131459	05/11/21	25/09/22	\$ 16.452.981
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS DEL ESTADO		05/11/21	30/05/25	\$10.986.654
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO		05/11/21	22/05/27	\$10.968.654

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 13 DE 78

5. CONTROL DE CORRESPONDENCIA

ENVIADA	RECIBIDA
	CRC.046 DEL 31-03-2022. DE CONTRATISTA. CONCEPTO TECNICO UTILIZACION PINTURA ACRILICA SECTORES EN MAL ESTADO.

Nota: se anexan oficios mencionados.

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

6.1 OBRAS Y SECTORES INTERVENIDOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO.

Para el presente periodo se intervinieron los siguientes sectores:

#	ACTIVIDADES Y SECTORES INTERVENIDOS					
	PERIODO No.	14	DEL	23 DE MARZO DE 2022	AL	31 DE MARZO DE 2022
1	1. PUENTE Y VIAS DEL BARRIO LAS QUINTAS: Se realiza la intervención del puente vehicular y las vías aledañas del Barrio las quintas, se realiza según el diseño entregado por la secretaria de tránsito de Tunja, para la cual se realiza imprimación y la aplicación de pintura de plástico en frio y pintura acrílica para la demarcación horizontal. Además, también se realiza la demarcación lineal del puente y de las vías del barrio las Quintas realizando la respectiva imprimación y demarcación con pintura tipo acrílica. Así mismo se ejecuta la señalización vertical tanto del puente como de las vías aledañas. Además, según diseños se realiza la instalación de dispositivos para la canalización del tránsito tachones e hitos. Se construye separador en la salida del puente.					
2	2. DEMARCACION HORIZONTAL Y VERTICAL RESALTOS O REDUCTORES DE VELOCIDAD: Se realiza la intervención de un listado de reductores de velocidad proporcionado por la secretaria de tránsito de Tunja, para la cual se realiza imprimación y la aplicación de pintura de plástico en frio para la demarcación horizontal. Así mismo se termina la señalización vertical de estos, labor que ya se venía adelantando.					
3	3. DEMARCACION LINEAL SECTORES PRIORIZADOS DE LAS CIUDAD: Se realiza la intervención de sectores priorizados por la secretaria de tránsito de Tunja, para la cual se realiza imprimación y la aplicación de pintura de tipo acrílica. Entre estos sectores se encuentra la avenida Colon entre carrera 16 y calle 25, la avenida Maldonado entre la calle 25 y la glorieta del Hugolino, las vías del barrio la florida, la calle 32 entre carrera 16 y vía Tunja-Arcabuco y alrededor de 15 puntos o intersecciones del centro histórico de la ciudad.					
	PERIODO No.	15	DEL	01 DE ABRIL DE 2022	AL	07 DE ABRIL DE 2022
4	1. Suministro y aplicación de imprimante y pintura de plástico en frio (método manual en llana) en los siguientes sectores: 1.1 Intersección de la avenida universitaria con carrera 2 este o esquina del colegio de los Ángeles. 1.2. Intersección de la carrera 11 con avenida colon o esquina de la universidad Juan de castellanos. 1.3. Intersección de la carrera 9 con calle 18 (Esquina Colegio del Rosario). 1.4. Intersección de la carrera 11 con calle 16.					

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 15 DE 78

	1.5. Intersección de la carrera 12 con calle 21A. 1.6. Intersección de la carrera 9 con calle 21. 1.7. Resaltos avenida Universitaria. .					
	PERIODO No.	16	DEL	08 DE ABRIL DE 2022	AL	22 DE ABRIL DE 2022
5	1. Suministro e instalación de señalización vertical en los siguientes sectores: 1.1 Hospital ESE San Antonio 1.2. Entrada Barrio Santa Inés. 1.3. Centro histórico de Tunja. 1.4. Glorieta del gobernador					
6	2. Retiro de señales en mal estado centro histórico de la ciudad.					
7	3. Suministro e instalación de estoperoles metálicos en los siguientes sectores: 3.1 Entrada Barrio San Rafael y Colegio Normal Femenina, sobre la Vía Tunja-Arcabuco. 3.2 Entrada Barrio Santa Inés. 3.3 Calle 4 con carrera 16. 3.4 Avenida colon con calle 13.					
	PERIODO No.	17	DEL	23 DE ABRIL DE 2022	AL	29 DE ABRIL DE 2022
8	1. Suministro e instalación de señalización vertical en los siguientes sectores: 1.1. Glorieta del gobernador. 1.2. Centro histórico de Tunja 1.3. Esquina centro comercial viva. 1.4 Barrio el Rodeo.					
9	2. Retiro de señales en mal estado glorieta del gobernador (delineadores de curva).					
10	3. Suministro y aplicación de imprimante y de pintura de plástico en frío (método manual en llana) en los siguientes sectores: 3.1 Vías internas barrio el Consuelo					
	PERIODO No.	18	DEL	30 DE ABRIL DE 2022	AL	06 DE MAYO DE 2022
11	1. Suministro y aplicación de imprimante y de pintura de plástico en frío (método manual en llana) en los siguientes sectores: 1.1 Vías internas barrio el Consuelo 1.2 Glorieta Green Hills.					
12	2. Suministro y aplicación de imprimante y pintura acrílica para la demarcación lineal Vía Tunja Arcabuco.					
13	3. Suministro e instalación de dispositivos de regulación del tránsito (hitos, tachones, estoperoles) en las vías del barrio Consuelo.					
	PERIODO No.	19	DEL	07 DE MAYO DE 2022	AL	13 DE MAYO DE 2022
14	1. Suministro y aplicación de imprimante y de pintura de plástico en frío (método manual en llana) en los siguientes sectores: 1.1 Glorieta del Gobernador. .					

15	2. Suministro e instalación de estoperoles: Avenida olímpica.
16	3. Construcción bandas reductoras de velocidad. Glorieta del gobernador.

Nota: ver informes semanales de interventoría anexos.

Las actividades desarrolladas en los sectores fueron las siguientes:

- **Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frío alta duración metil-metacrilato 100% puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC-1360-1, para pasos peatonales, avisos en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehículos y peatones (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra):** esta actividad se inicia con el barrido y limpieza del área donde se va a intervenir, seguido de la demarcación de las diferentes señales o dispositivos horizontales que se van a implementar en el sector según los planos de diseños, enseguida se procede a la aplicación de la pintura de plástico en frío manualmente con una llana metálica, esta aplicación se hace de manera uniforme garantizando que cubra toda la superficie del pavimento y tapando cualquier porosidad que se presente, además se garantiza el espesor mínimo contratado que es de 50 mils, inmediatamente aplicada la pintura se precede a la aspersión uniforme de las microesferas, finalmente se espera el tiempo de secado que para las condiciones de temperatura de la ciudad varía entre 30 y 60 minutos.
- **Suministro y aplicación de pintura acrílica con microesferas, líneas continuas y discontinuas de 12 cms según norma Invías:** esta actividad se inicia con el punteo del eje o borde de la línea que se va a pintar, la cual puede ser continua o discontinua según sea el diseño del tramo, seguido se realiza la aplicación de la pintura acrílica con un compresor instalado en un vehículo de señalización, garantizando el ancho de la línea 12 cms y el correcto alineamiento. Se realizan los controles de calidad establecidos en la norma NTC 4744-4.
- **Suministro e instalación de señales verticales:** esta actividad se inicia con la fabricación en taller de las señales, las cuales una vez terminadas se desplazan a punto donde se van a instalar, en el cual se realiza la localización según planos de diseños, una vez localizada se realiza la excavación manual para la instalación de la señal y se instala verticalmente cumpliendo la normatividad vigente, esta se asegura fundiendo un concreto en la base de cada señal.

Se informa que la empresa contratista tiene subcontratado a la empresa Abraham Publicidad Ingeniería sas de la ciudad de Tunja, la fabricación e instalación de las señales verticales del contrato.

- **Suministro e instalación de dispositivos de regulación del tránsito (hitos y tachones):** se inicia con la localización según los planos de diseños, enseguida se realiza el anclaje a la superficie utilizando tornillería apropiada para el caso.

Se informa que la empresa contratista tiene subcontratado a la VRC Ingeniería sas de la ciudad de Tunja, la instalación de las diferentes pinturas utilizadas en obra, así como la instalación de dispositivos de tránsito.

7. PLAN DE CALIDAD EN OBRAS

7.1 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO

Se realiza la implementación de los respectivos Planes de Manejo de tránsito aprobados tanto por la interventoría como por la secretaria de tránsito y transporte de Tunja, en el cual se debe garantizar la respectiva señalización de la obra, tanto informativa como preventiva y la información de los cierres de las vías, con el objetivo que los conductores de los vehículos que transitan por el sector y los peatones que circulan por inmediaciones del tramo tengan la información necesaria de circulación. Se le exige al contratista la implementación de esta señalización, esto se puede evidenciar en los registros fotográficos anexos.



7.2 SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se exige al contratista la implementación Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG- SST), exigiendo el uso de los elementos de protección y seguridad del personal de obra, como cascos, botas punta de acero, chalecos reflexivos, guantes, tapa oídos, tapa bocas y gafas de seguridad para el personal que opera máquinas de corte. (ver informe de implementación del SG- SST), (ANEXO 11.7 SOPORTES IMPLEMENTACION PLAN DE CALIDAD).

A continuación, se puede observar.



Nota: se adjunta planillas de entrega de dotación a los trabajadores y planillas de capacitación SG- SST,

7.3 CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

7.3.1 PINTURA PLASTICA EN FRIO

Calidad: Se controla la calidad de la pintura plástica que para el caso cumpla con la norma NTC 1360-1. Para este caso se solicita al contratista la ficha técnica de las pinturas plásticas que se está aplicando (marcas Pintuflex y Gmp). Estas fichas técnicas más el certificado de cumplimiento de calidad de las pinturas se encuentra anexas al presente informe. (ANEXO 11.6 CONTROL DE CALIDAD A LOS MATERIALES UTILIZADOS).

Espesor de la película: Se controla el espesor de la pintura plástica cumpla con la lo contratado (50 mils). Para este caso se aplica el método establecido en la norma NTC 4744-4 y Norma ASTM D 4414, en el cual se utiliza un medidor rectangular con muescas (galga), los resultados se encuentran en numeral 7.4 del presente informe.

Retrorreflectividad: se realiza el control de la retrorreflectividad de la pintura instalada siguiendo la especificación NTC 4744-3, los resultados se encuentra anexas al presente informe numeral 7.5.

7.3.2 PINTURA ACRILICA

Calidad: Se controla la calidad de la pintura acrílica que para el caso cumpla con la norma NTC 1360-1. Para este caso se solicita al contratista la ficha técnica de las pinturas que se está aplicando (marcas Pintuflex y Gmp). Estas fichas técnicas más el certificado de cumplimiento de calidad de las pinturas se encuentra anexas al presente informe. (ANEXO 11.6 CONTROL DE CALIDAD A LOS MATERIALES UTILIZADOS).

Espesor de la película: Se controla el espesor de la pintura acrílica cumpla con el espesor mínimo establecido en la norma NTC 4744-4 Tabla 1. (mínimo 9 mils). Para este caso se aplica el método establecido en la norma NTC 4744-4, numeral 4.7.2.3.1, los resultados se encuentran en numeral 7.7 del presente informe.

Retrorreflectividad: se realiza el control de la retrorreflectividad de la pintura instalada siguiendo la especificación NTC 4744-3, y la norma NTC 4744-4 numeral 4.7.2.3.2, los resultados se encuentra anexas al presente informe numeral 7.5.

7.3.3 PINTURA ACRILICA IMPRIMANTE

Calidad: Se controla la calidad de la pintura acrílica que para el caso cumpla con la norma NTC 1360-1. Para este caso se solicita al contratista la ficha técnica de las pinturas que se está aplicando (marcas Pintuflex y Gmp). Estas fichas técnicas más el certificado de cumplimiento de calidad de las pinturas se encuentra anexas al presente informe. (ANEXO 11.6 CONTROL DE CALIDAD A LOS MATERIALES UTILIZADOS).

Espesor de la película: Se controla el espesor de la pintura acrílica cumpla con el espesor mínimo establecido en la norma NTC 4744-4 Tabla 1. (mínimo 9 mils). Para este caso se aplica el método establecido en la norma NTC 4744-4, numeral 4.7.2.3.1, los resultados se encuentran en numeral 7.6 del presente informe.

7.3.4 MICROESFERAS

De igual manera se solicita la ficha técnica de las microesferas utilizadas, y se verifica el cumplimiento de la norma NTC 2072. Se anexa Ficha técnica. (ANEXO 11.6 CONTROL DE CALIDAD A LOS MATERIALES UTILIZADOS).

7.3.5 SEÑALES VERTICALES

En la fabricación de las señales verticales se controlan que cumplan las especificaciones establecidas en el Manual de señalización vial, dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorutas de Colombia de 2015, como las características básicas, forma, color, tamaños, retrorreflexión, así como los materiales utilizados en el sistema de soporte, los materiales del tablero, las pinturas utilizadas, el papel reflectivo utilizado (marca 3 M), etc. En la instalación se controla la ubicación longitudinal y lateral, la altura y la orientación. Se anexan certificados de calidad del material reflectivo utilizado (marca 3M), ensayos de calidad de los ángulos de soportes de las señales y los ensayos del material galvanizado utilizado para los tableros. Además, se controla la retrorreflectividad en las señales verticales campo, utilizando el aparato retrorreflectómetro. (ANEXO 11.6 CONTROL DE CALIDAD A LOS MATERIALES UTILIZADOS).

7.3.6 DISPOSITIVOS DE REGULACION

Para los dispositivos de regulación del tránsito (Hitos, Tachones y tachas) se controlan que cumplan las especificaciones establecidas en el Manual de señalización vial, dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorutas de Colombia de 2015, como las características básicas, forma, color, tamaños, así como los materiales utilizados en el sistema de soporte, etc. En la instalación se controla la ubicación longitudinal y lateral, según planos de diseño. Se anexa ficha técnica de las tachas a utilizar. (ANEXO 11.6 CONTROL DE CALIDAD A LOS MATERIALES UTILIZADOS).

7.3.7 REGISTRO DE CONTROL: Conjuntamente si realizan los respectivos registros de control interno de calidad de los materiales utilizados. Se anexan planillas de registro. (ANEXO 11.7 SOPORTES IMPLEMENTACION PLAN DE CALIDAD).

7.4 CONTROL DE ESPESORES DE LA PINTURA PLASTICA EN FRIO, APLICADA CON EL METODO MANUAL "LLANA".

El control de espesores de la pintura plástica en frio se realiza por medio de la utilización de un medidor rectangular en aluminio con muescas, siguiendo el procedimiento de la norma ASTM 4414 y en norma Invias INv.700, numeral 700.4.3.1 con la cual se realiza la medición en unidades mils, en promedio el resultado ha sido de 55 mils, el cual cumple con el espesor contratado y sugerido por el fabricante de la pintura. Se deja en claro que la medición se hace con la pintura húmeda y no se aplica la fórmula de pintura seca (NTC4744-4) ya que el porcentaje de sólidos en volumen de la pintura es del 100% según la ficha técnica de la pintura.

A continuación, se relacionan algunas de las mediciones realizadas en los sectores intervenidos a la fecha:

N°	UBICACION	PRUEBA NORMA NTC 4744-4, ASTM D 4414 ESPESOR REQUERIDO (MILS)	PRUEBA NORMA NTC 4744-4, ASTM D 4414 ESPESOR PROMEDIO MEDIDO (MILS)	CUMPLE SI/NO
1	Puente y vías internas Barrio las Quintas	50	55	
2	Reductores de velocidad dispersos ciudad de Tunja	50	60	
3	Intersección de la avenida universitaria con carrera 2 este o esquina del colegio de los Ángeles.	50	50	SI
4	Intersección de la carrera 11 con avenida colon o esquina de la universidad Juan de castellanos.	50	55	SI
5	Intersección de la carrera 9 con calle 18 (Esquina Colegio del Rosario).	50	55	SI
6	Intersección de la carrera 11 con calle 16.	50	60	SI
7	Intersección de la carrera 12 con calle 21A.	50	60	SI
8	Intersección de la carrera 9 con calle 21	50	55	SI

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 24 DE 78

9	Resaltos avenida Universitaria.	50	50	SI
10	Vías internas barrio el Consuelo	50	55	SI
11	Glorieta Green Hills	50	60	SI
12	Glorieta Gobernador.	50	55	SI



"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 25 DE 78



"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 26 DE 78

7.5 RESULTADOS PRUEBA DE RETRORREFLECTIVIDAD EN PINTURA PLASTICA Y ACRILICA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, EQUIPO DE GEOMETRIA A 15M.

UBICACIÓN	COEF. MINIMO PRUEBA MCD/LUX/M2 NTC 4744-3	UBICACION	RESULTADO PINTURA SECA	CUMPLE
Avenida colon entre carrera 16 y calle 25	Mayor 200	Línea continua doble	272	SI
	Mayor 200	Línea continua doble	258	SI
	Mayor 200	Línea continua doble	293	SI
	Mayor 200	Línea continua doble	279	SI
	Mayor 200	Línea continua doble	275	SI
	Mayor 200	Línea continua doble	313	SI
	Mayor 200	Línea continua doble	282	SI
Avenida Maldonado entre calle 25 y glorieta Hugolina	Mayor 200		262	SI
	Mayor 250	Línea discontinua centro	314	SI
	Mayor 250	Línea continua centro	296	SI
	Mayor 200	Línea continua borde derecha	298	SI
	Mayor 200	Línea continua borde izquierda	281	SI
	Mayor 250	Línea continua centro	331	SI
	Mayor 250	Línea continua centro	296	SI
Intersección de la carrera 11 con avenida colon o esquina de la universidad Juan de castellanos.	Mayor 250	Cebra carrera 11	295	SI
	Mayor 250	Fecha direccional	315	SI
	Mayor 250	Línea pare	295	SI
	Mayor 250	Cebra avenida colon	300	SI
Resaltos avenida Universitaria.	Mayor 250	Resaltos av universitaria	355	SI
	Mayor 250	Resaltos av universitaria	350	SI
	Mayor 250	Resaltos av universitaria	375	SI
	Mayor 250	Resaltos av universitaria	385	SI

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 27 DE 78

Vías internas Barrio el Consuelo	Mayor 250	Achurado calle 12 con carrera 9	295	SI
	Mayor 250	Achurado calle 12 con carrera 7	305	SI
	Mayor 250	Cebra carrera 8 con calle 16	325	SI
	Mayor 250	Pictograma zona escolar	295	SI
Glorieta Green Hills.	Mayor 250	Cebra acceso sur-norte	325	SI
	Mayor 250	Reductor virtual	385	SI
	Mayor 250	Cebra acceso occidente-orient	315	SI
	Mayor 250	Fecha de frente	320	SI
	Mayor 200	Línea continua centro glorieta	303	SI
	Mayor 200	Línea continua centro eje	317	SI
Glorieta Gobernador	Mayor 250	Cebra acceso norte-sur	365	SI
	Mayor 250	Cebra acceso sur-norte	385	SI
	Mayor 250	Cebra acceso oriente-occidente	315	SI
	Mayor 250	Fecha de frente	335	SI
	Mayor 200	Línea continua centro glorieta	345	SI
	Mayor 200	Línea continua centro eje	355	SI
	Mayor 200	Línea continua centro eje	335	SI

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 28 DE 78



7.6 CONTROL DE ESPESORES DE LA PINTURA ACRILICA IMPRIMANTE

El control de espesores de la pintura acrílica imprimante se realiza por medio de la utilización de un medidor rectangular en aluminio con muescas, siguiendo el procedimiento de la norma ASTM 4414 y en norma Invias INv.700, numeral 700.4.3.1 con la cual se realiza la medición en unidades mils, en promedio el resultado ha sido de más de 9 mils seca, el cual cumple con el espesor contratado y sugerido por el fabricante de la pintura. Se deja en claro que la medición se hace con la pintura húmeda y se aplica la fórmula para convertirla en pintura seca (NTC4744-4), el porcentaje de sólidos en volumen de la pintura es del 60% según la ficha técnica de la pintura.

A continuación, se relacionan algunas de las mediciones realizadas en los sectores intervenidos a la fecha:

N°	UBICACION	ELEMENTO	PRUEBA NORMA NTC 4744-4, ASTM D 4414 ESPESOR REQUERIDO SECA (MILS)	PRUEBA NORMA NTC 4744-4, ASTM D 4414 ESPESOR PROMEDIO MEDIDO SECO (MILS)	CUMPLE SI/NO
1	PUENTE LAS QUINTAS	Línea continua centro	9	10	SI
2	PUENTE LAS QUINTAS	Cebra de salida puente	9	11	SI
	PUENTE LAS QUINTAS	Línea continua borde	9	12	SI
3	VIAS BARRIO LAS QUINTAS	Cebra vías internas las Quintas	9	10	SI
	VIAS BARRIO LAS QUINTAS	Línea continua vías internas las Quintas	9	10	SI
	VIAS BARRIO LAS QUINTAS	Achurado entrada puente las quintas	9	10	SI
4	AVENIDA COLON ENTRE CARRERA 16 Y CALLE 25	Línea continua doble	9	10	SI
5	AVENIDA COLON ENTRE CARRERA 16 Y CALLE 25	Línea continua doble	9	10	SI

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 30 DE 78

6	AVENIDA COLON ENTRE CARRERA 16 Y CALLE 25	Línea continua doble	9	11	SI
7	AVENIDA MALDONADO ENTRE CALLE 25 Y GLORIETA MALDONADO	Línea continua doble	9	10	SI
8	AVENIDA MALDONADO ENTRE CALLE 25 Y GLORIETA MALDONADO	Línea continua centro	9	10	SI
9	AVENIDA MALDONADO ENTRE CALLE 25 Y GLORIETA MALDONADO	Línea continua borde	9	11	SI
10	AVENIDA MALDONADO ENTRE CALLE 25 Y GLORIETA MALDONADO	Línea continua borde	9	11	SI
11	CEBRA ACCESO PUENTE QUINTAS		9	11	SI
12	LINEAS REDUCTORAS DE CARRIL		9	11	SI
13	ACHURADO PUENTE		9	11	SI
14	PROMEDIO REDUCTORES DE VELOCIDAD	Reductores	9	10	SI
15	Intersección de la avenida universitaria con carrera 2 este o esquina del colegio de los Ángeles.	Promedio demarcación horizontal realizada	9	11	SI
16	Intersección de la carrera 11 con avenida colon o esquina de la universidad Juan de castellanos.	Promedio demarcación horizontal realizada	9	11	SI
17	Intersección de la carrera 9 con calle 18 (Esquina Colegio del Rosario).	Promedio demarcación horizontal realizada	9	10	SI
18	Intersección de la carrera 11 con calle 16.	Promedio demarcación horizontal realizada	9	11	SI
19	Intersección de la carrera 12 con calle 21A.	Promedio demarcación horizontal realizada	9	10	SI

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 31 DE 78

20	Intersección de la carrera 9 con calle 21	Promedio demarcación horizontal realizada	9	10	SI
21	Resaltos avenida Universitaria.	Promedio demarcación horizontal realizada	9	12	SI
22	Vías internas barrio el Consuelo	Promedio demarcación horizontal realizada	9	11	SI
23	Glorieta Green hills	Promedio demarcación horizontal realizada	9	12	SI
24	Glorieta Gobernador	Promedio demarcación horizontal realizada	9	11	SI

7.7 CONTROL DE LA FUNCIÓN AMBIENTAL Y DE LA GESTIÓN SOCIAL.

La interventoría controló que:

- Que se realicen capacitaciones seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente.
 - Protección zonas verdes e individuos arbóreos.
 - Se haga un adecuado aseo en el sector que se ha intervenido.
 - Se haga una disposición adecuada de residuos sólidos de los materiales utilizados.
 - Se haga una disposición adecuada de residuos sólidos de los materiales utilizados.
 - Que la secretaria de tránsito y transporte esté informada de los cierres viales y posibles afectaciones en los sectores intervenidos, para su respectiva divulgación.
-
-

8. OBRA EJECUTADA

El siguiente cuadro muestra el acumulado total de cantidades ejecutadas a la fecha:

No.	DESCRIPCIÓN	UND	Cant	VALOR
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES REGLAMENTARIAS 60 x 60 CM	UND	403.00	\$ 166.906.480.00
2	MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRAFICO SEGUN NORMA INVIAS Y DISEÑO (INCLUYE MICROESFERAS)	M2	724.86	\$ 44.223.709.00
3	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio alta duración metil-metacrilato 100% puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC-1360-1, para pasos peatonales, avisos en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehículos y peatones (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra)	M2	4.275.81	\$ 285.538.592.00
4	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS	ML	14.798.14	\$ 40.546.895.00
5	Suministro e Instalación de Señalización vial vertical Doble (DUPLEX) en papel reflectivo 60 x 60 zona urbana, según especificaciones relacionadas en el Manual de Señalización vial adoptado por la resolución 1885 de 2015, numerales 2.2.2. y 2.1.6.2 (Incluye todos los elementos necesarios para si instalación entre ellos herramienta menor, excavación, concreto y ,mano de obra)	UND	17.00	\$ 8.625.290.00

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 34 DE 78

6	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito preventivas SP-47B, tamaño 60 X 60 cm. Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo marca 3M) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática. Según norma INVIAS.	UND	45.00	\$ 20.727.900.00
7	Retiro de Señales Verticales (incluye pedestal y tablero) con entrega en la respectiva Entidad Territorial (incluye señales sencillas y Dúplex)	UND	35.00	\$ 912.800.00
8	Suministro e instalación señales verticales sr-38, lámina galvanizada reflectividad tipo XI, grado diamante al cubo, con pedestal	UND	57.00	\$ 20.828.940.00
9	SEÑALES PREVENTIVAS (SP) Y REGLAMENTARIAS (SR) 60 X 60 CM REFLECTIVO VERDE LIMON	UND	8.00	\$ 2.489.360.00
10	SEÑALES DE TRANSITO DIMENSIONES 60*75 CMS (DELINEADORES DE CURVA) SEGÚN NORMA INVIAS	UND	12.00	\$ 3.194.280.00
11	SEÑALES DE TRANSITO 0.90*1.13 MTS (INFORMATIVAS) SEGUN NORMA INVIAS	UND	3.00	\$ 1.849.260.00
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES	UND	1.562.00	\$ 14.807.760.00
13	Suministro e instalación de hitos (alto =75 cm d=8 cm) de color amarillo	UND	131.00	\$ 7.751.270.00
14	Suministro e instalación de tachones 40*15*8 cm	UND	397.00	\$ 24.828.380.00

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 35 DE 78

15	ESTOPEROLES D=10 CM H=25 CMS	UND	-	\$ -
16	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	G	1.00	\$ 1.051.396.00
ACTIVIDADES NO PREVISTAS				
17	NP-01 SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPRIMANTE EN PINTURA ACRILICA , LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 15 CMS SEGÚN NORMA INVIAS (espesor seco mínimo 9 mils)	ML	10.948.28	\$ 35.417.686.00
18	NP-02 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE EN PINTURA DE TRAFICO ACRILICA, (Espesor seco mínimo de 9 mils)	M2	2.497.03	\$ 119.707.618.00
19	NP-03 RETIRO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD BASE DE HITOS, BASE DE TACHONES	UND	50.00	\$ 1.218.450.00
20	NP-04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES METALICOS D=10 CM H=2CMS (Incluye, Planta Electrica, Taladro, Broca, Aditivo Epóxico, y demas elementos para su correcta instalación).	UND	877.00	\$ 17.647.871.00
21	NP-05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTAFAROS	UND	100.00	\$ 2.288.700.00
22	NP-06 BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA.	M2	23.13	\$ 15.782.848.00

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 36 DE 78

23	NP-07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL CHEVRON DE 40CM X90CM (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática).	UND	1.00	\$ 464.558.00
24	NP-08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DOL DE 20CM X90CM (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática).	UND	1.00	\$ 389.558.00
25	NP-09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PARA CICLORUTA – EN ANDÉN, (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en tubi de 2", pintura electrostática).	UND	6.00	\$ 2.881.098.00
26	NP-10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PARA CICLORUTA -ANCLADA EN PUENTE VEHICULAR (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática).	UND	2.00	\$ 1.224.050.00
27	NP-11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL TIPO DELINEADOR DE CURVA 60CM X 75CM - ANCLADA EN PUENTE VEHICULAR. (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática):	UND	5.00	\$ 3.738.250.00

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 37 DE 78

28	NP-12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA O REGLAMENTARIA DE 60CM X 60CM - ANCLADA EN PUENTE VEHICULAR. (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática):	UND	4.00	\$ 2.530.600.00
29	NP-13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA DE 1,77CM X 0,44CM (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática	UND	3.00	\$ 2.989.224.00
30	NP-14 SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H0.40 MTS - A=0.2 MTS, CONCRETO DE 2500 PSI	ML	66.00	\$ 3.988.050.00
31	NP-15 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)	M3	3.30	\$ 272.837.00
32	NP-16 CORTE DE PAVIMENTO ARTICULADO EN ADOQUIN DE ARCILLA	ML	132.00	\$ 695.640.00
	SUB TOTAL (INCLUYE IVA 25%)			\$ 855.519.350.00
	valor ajuste			
	VALOR TOTAL			\$ 855.519.350.00
	PORCENTAJE EJECUTADO			89.99%

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 38 DE 78

El siguiente cuadro se muestran las cantidades ejecutadas durante el presente periodo, además se anexan memorias de cálculo de las cantidades ejecutadas.

No.	DESCRIPCIÓN	UND	Cant	Vr Parcial
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES REGLAMENTARIAS 60 x 60 CM	UND	79.00	\$ 32.718.640.00
2	MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRAFICO SEGUN NORMA INVIAS Y DISEÑO (INCLUYE MICROESFERAS)	M2	42.79	\$ 2.610.618.00
3	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frío alta duración metil-metacrilato 100% puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC-1360-1, para pasos peatonales, avisos en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehículos y peatones (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra)	M2	1.221.96	\$ 81.602.489.00
4	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS	ML		\$ -
5	Suministro e Instalación de Señalización vial vertical Doble (DUPLEX) en papel reflectivo 60 x 60 zona urbana, según especificaciones relacionadas en el Manual de Señalización vial adoptado por la resolución 1885 de 2015, numerales 2.2.2. y 2.1.6.2 (Incluye todos los elementos necesarios para su instalación entre ellos herramienta menor, excavación, concreto y ,mano de obra)	UND	9.00	\$ 4.566.330.00
6	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito preventivas SP-47B, tamaño 60 X 60 cm. Elaboradas en lamina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo marca 3M) pedestal elaborado en angulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostatica. Segun norma INVIAS.	UND	13.00	\$ 5.988.060.00

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 39 DE 78

7	Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega en la respectiva Entidad Territorial (incluye señales sencillas y Dúplex)	UND	20.00	\$	521.600.00
8	Suministro e instalación señales verticales sr-38, lámina galvanizada reflectividad tipo XI, grado diamante al cubo, con pedestal	UND	4.00	\$	1.461.680.00
9	SEÑALES PREVENTIVAS (SP) Y REGLAMENTARIAS (SR) 60 X 60 CM REFLECTIVO VERDE LIMON	UND	3.00	\$	933.510.00
10	SEÑALES DE TRANSITO DIMENSIONES 60*75 CMS (DELINEADORES DE CURVA) SEGÚN NORMA INVIAS	UND	6.00	\$	1.597.140.00
11	SEÑALES DE TRANSITO 0.90*1.13 MTS (INFORMATIVAS) SEGUN NORMA INVIAS	UND		\$	-
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES	UND		\$	-
13	Suministro e instalacion de hitos (alto =75 cm d=8 cm) de color amarillo	UND	37.00	\$	2.189.290.00
14	Suministro e instalacion de tachones 40*15*8 cm	UND	120.00	\$	7.504.800.00
15	ESTOPEROLAS D=10 CM H=25 CMS	UND		\$	-
16	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	G		\$	-
ACTIVIDADES NO PREVISTAS					

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 40 DE 78

17	NP-01 SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPRIMANTE EN PINTURA ACRILICA , LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 15 CMS SEGÚN NORMA INVIA (espesor seco mínimo 9 mils)	ML	4.312.28	\$	13.950.226.00
18	NP-02 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE EN PINTURA DE TRAFICO ACRILICA, (Espesor seco mínimo de 9 mils)	M2	1.217.68	\$	58.375.579.00
19	NP-03 RETIRO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD BASE DE HITOS, BASE DE TACHONES	UND	50.00	\$	1.218.450.00
20	NP-04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES METALICOS D=10 CM H=2CMS (Incluye, Planta Electrica, Taladro, Broca, Aditivo Epóxico, y demas elementos para su correcta instalación).	UND	877.00	\$	17.647.871.00
21	NP-05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTAFAROS	UND	100.00	\$	2.288.700.00
22	NP-06 BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA.	M2	23.13	\$	15.782.848.00
23	NP-07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL CHEVRON DE 40CM X90CM (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática).	UND	1.00	\$	464.558.00
24	NP-08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DOL DE 20CM X90CM (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática).	UND	1.00	\$	389.558.00

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 41 DE 78

25	NP-09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PARA CICLORUTA – EN ANDÉN, (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en tubi de 2", pintura electrostática).	UND	6.00	\$	2.881.098.00
26	NP-10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PARA CICLORUTA -ANCLADA EN PUENTE VEHICULAR (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática).	UND	2.00	\$	1.224.050.00
27	NP-11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL TIPO DELINEADOR DE CURVA 60CM X 75CM - ANCLADA EN PUENTE VEHICULAR. (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática):	UND	5.00	\$	3.738.250.00
28	NP-12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA O REGLAMENTARIA DE 60CM X 60CM - ANCLADA EN PUENTE VEHICULAR. (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática):	UND	4.00	\$	2.530.600.00
29	NP-13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA DE 1,77CM X 0,44CM (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática	UND	3.00	\$	2.989.224.00
30	NP-14 SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H0.40 MTS - A=0.2 MTS, CONCRETO DE 2500 PSI	ML	66.00	\$	3.988.050.00
31	NP-15 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)	M3	3.30	\$	272.837.00

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 42 DE 78

22	NP-16 CORTE DE PAVIMENTO ARTICULADO EN ADOQUIN DE ARCILLA	ML	132.00	\$ 695.640.00
	SUB TOTAL (INCLUYE IVA 25%)			\$ 270.131.696.00
	valor ajuste			
	VALOR TOTAL			\$ 270.131.696.00
	PORCENTAJE EJECUTADO			28.42%

9. CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA.

OBLIGACIÓN	OBSERVACIÓN
Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato	Cumple parcialmente, en varias ocasiones se incumplen actividades programadas.
Llevar bitácora.	Se lleva en forma conjunta.
OBLIGACIÓN	OBSERVACIÓN
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Tunja y por conducto de la interventoría.	Cumplen
Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo.	Cumplen
Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato.	Cumplen.
Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad industrial e higiene.	Cumplen.
Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato.	El contratista remite a la interventoría, copias de planillas de seguridad social pagas del periodo laborado.

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A la fecha del presente informe (10 mayo de 2022), se ha realizado en total la intervención de un total de más 100 sectores de la ciudad, los cuales han sido priorizados por la secretaria de tránsito y transporte de Tunja, en cumplimiento de acciones populares y de las necesidades de movilidad y seguridad vial de la ciudad de Tunja. En estos sectores se ha ejecutado las actividades de demarcación horizontal con pintura plástica aplicada manualmente, así como también la aplicación de líneas de demarcación lineal con pintura reflectiva tipo acrílica, suministro e instalación de señales verticales y dispositivos de regulación de tránsito, cumpliendo con los diseños aportados por la entidad contratante.


El avance financiero acumulado a la fecha es de \$ 855.519.350, equivalente al 89.99 % del valor total del contrato, comparado con la última programación de obra aprobada en el flujo de caja del contrato de \$ 817.002.742 equivalente al 85.94% del valor total del contrato, lo cual refleja que el contrato a la fecha se presenta un porcentaje de adelanto del 4.05% financieramente entre lo programado y lo ejecutado.

Durante el presente periodo el avance financiero fue de \$ 270.131.696, equivalente al 28.42 % del valor total del contrato, comparado con la última programación de obra aprobada en el flujo de caja del contrato de \$ 343.590.827 equivalente al 36.14% del valor total del contrato, lo cual refleja que se ejecutó menos de lo programado en el periodo, pero en el acumulado total se evidencia un adelanto como ya se indicó en el numeral anterior.

El avance temporal a la fecha es 138 días que equivale al 92% del tiempo total que es de 5 meses.

Por parte de la interventoría se realizaron los respectivos controles de calidad de los materiales utilizados verificando fichas técnicas, las certificaciones de calidad y verificando los espesores de la pintura plástica aplicada manualmente con llana y de la pintura acrílica, así mismo realizando los respectivos ensayos de retrorreflectividad.

Cordialmente,



Ing. Cesar Hernando Figueroa Báez
Interventor de Obra

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 45 DE 78

11. ANEXOS

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 46 DE 78

Anexo 11.1

DOCUMENTACION JURIDICA

CONTRATOS DE OBRA Y DE INTERVENTORIA

	ALCALDÍA DE TUNJA		FECHA: 01/06/2017
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		VERSIÓN: 03
	PROCESO: CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CON-F044
	FORMATO: ACTA DE SEGUIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN		

FECHA PRESENTE ACTA
CONTRATO X CONVENIO _____

OBJETO

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO:

PLAZO DE EJECUCIÓN

CONTRATANTE _X_ PARTE _____

CONTRATISTA _X_ CONTRAPARTE _____

INTERVENTOR _X_ SUPERVISOR _____

FECHA DE INICIO

ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1

AMPLIACIÓN No. 1 AL ACTA DE
SUSPENSIÓN N° 1

AMPLIACIÓN No. 2 AL ACTA DE
SUSPENSIÓN N° 1

AMPLIACIÓN No. 3 AL ACTA DE
SUSPENSIÓN N° 1

ACTA DE REINICIO N° 1

ADICIONAL N° 1 VALOR \$

PRORROGA N° 1

PERIODO DE PAGO

10 de Mayo de 2022		ACTA N°: 3	
No. 1036-2021	FECHA	20 de Octubre del 2021	
OBJETO: CONTRATO DE OBRA PARA LA SENALIZACIÓN Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA			
VALOR TOTAL: \$950.638.556,00 NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE.			
APORTE MUNICIPIO: (N.A.)			
APORTE DE CONTRAPARTE: (N.A.)			
TRES (3) MESES			
MUNICIPIO DE TUNJA			
CUMBRE INGENIERIA S.A.S.			
CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ			
5/11/2021			
28/01/2022			
11/02/2022			
25/02/2022			
4/03/2022			
15/03/2022			
\$308.000.000,00 TRESCIENTOS OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE			
DOS (2) MESES			
29 de marzo de 2022 al 10 de mayo de 2022			

En la Ciudad de Tunja, a los diez (10) días del mes de mayo de 2022, en la Secretaría de TRÁNSITO Y TRANSPORTE del Municipio, se reunió el ingeniero CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.172.415 de TUNJA, en su calidad de Interventor del CONTRATO No. 1036 de 2021 y el señor (a) LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL identificado con la cédula de ciudadanía número 79.909.677 de BOGOTÁ, en su calidad de representante legal del CONTRATISTA, CUMBRE INGENIERIA S.A.S., NIT 901.321.674-4, con el fin de suscribir la presente ACTA DE SEGUIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN N°. 3, correspondiente al periodo de pago del 29 de marzo de 2022 al 10 de mayo de 2022, en los siguientes términos:

BALANCE DE PAGO		
CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato actualizado	\$ 950.638.556	
Anticipo		
Valor de la presente acta seguimiento y recibo a satisfacción		\$ 270.131.696
Valor actas pagadas		\$ 585.387.654
Saldo por ejecutar		\$ 95.119.206
Sumas iguales	\$ 950.638.556	\$ 950.638.556

El suscrito interventor del CONTRATO en mención, manifiesta que ha recibido a satisfacción el informe correspondiente al periodo de pago mencionado, presentado por el CONTRATISTA, quien cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el contrato; igualmente certificó que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión y riesgos profesionales de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 58289025, N° 58949155, N° 59678621, N° 9433001181, N° 9434286786 y N° 9436170422 del mes de marzo, abril y mayo de 2022 de conformidad con la normatividad vigente.

*En visita al lugar de los trabajos y/o en la entrega de los bienes, servicios y demás, se constató que lo ejecutado está de acuerdo con el porcentaje equivalente al 89,99 % encontrándose como soportes los informes allegados junto con sus anexos que hacen parte de la presente acta.

*No Aplica para contratos de prestación de servicios

OBSERVACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

FIRMA:

NOMBRE: LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL
R/L. CUMBRE INGENIERIA S.A.S.
CONTRATISTA

FIRMA:

NOMBRE: CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ
INTERVENTOR

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE (CUANDO APLIQUE)
ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE) E INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

Elaboró y Proyectó:	Nombre	Cargo	Firma
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 47 DE 78

Anexo 11.2

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Bogotá, D.C., marzo 31 de 2022
CUMBRE-076-2022



Señores
Atn. ING. CÉSAR HERNANDO FIGUEROA BÁEZ.
Director de interventoría
Avenida Norte No. 47-40 Oficina 132 - Tel. 7172415
Correo: ingechfb@yahoo.es
Tunja, Boyacá

REFERENCIA:

CONTRATO No. 1036 DE 2021 "CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."

ASUNTO:

CONCEPTO TÉCNICO – PINTURA ACRILICA.

Cordial saludo,

Por medio del presente y conforme a los compromisos adquiridos en el comité de obra del pasado 25 de marzo de 2022, me permito remitir los siguientes documentos para su revisión y trámite pertinente:

- Concepto Técnico – Especialista en Tránsito – Pintura Acrilica.

Atentamente,



LEONARDO IVÁN RAMÍREZ BERNAL
Director de Obra.

ANEXO: LO ANUNCIADO EN () FOLIOS.
COPIA: ARCHIVO.
ELABORO: ARP 31/03/2022.



VRC INGENIERÍA LTDA

**INGENIEROS ESPECIALISTAS EN TRÁNSITO, TRANSPORTE,
DISEÑO DE VÍAS, IMPACTO AMBIENTAL
Y GERENCIA DE OBRAS**

Comunicación No. VRC-VAR-3791

Bogotá D.C., 31 de Marzo de 2022

Señores:
CUMBRE INGENIERÍA SAS
Atn. Ing. LEONARDO IVAN RAMIREZ
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO 1036 DE 2021.

ASUNTO: CONCEPTO TÉCNICO – PINTURA ACRILICA.

Respetado Ingeniero:

De acuerdo a su solicitud relacionada con la implementación de pintura acrílica conceptuamos al respecto:

- ✓ De acuerdo al mal estado de los pavimentos del área de influencia del proyecto se aplicó pintura acrílica tipo base solvente Amarillo y Blanco; Se anexa la ficha técnica del certificado de análisis del producto expedida por el proveedor. Quien indica que la garantía de la calidad del producto depende de la preparación de la superficie donde se va aplicar.
- ✓ Se descartó la aplicación de pintura en larga duración toda vez que por el mal estado de los pavimentos, la calidad y durabilidad del producto no se garantiza. Como propuesta de solución se eligió aplicar pintura acrílica base solvente que cumple las mismas funciones de seguridad vial a un menor costo.
- ✓ Otro factor a considerar es el TPD (Transito promedio diario) elevado conformado por el transporte publico, transporte de carga mediana y todo el transito particular que circula por estos corredores viales.

Fotos 1 y 2. Desgaste prematuro de marcas viales por deterioro del pavimento.



Fuente: Toma propia.

Página 1



VRC INGENIERÍA LTDA

**INGENIEROS ESPECIALISTAS EN TRÁNSITO, TRANSPORTE,
DISEÑO DE VÍAS, IMPACTO AMBIENTAL
Y GERENCIA DE OBRAS**

Comunicación No. VRC-VAR-3791

- ✓ Las acciones iniciales de implementación de la demarcación y las razones por las cuales se requieren acciones de repinte, se soporta en la Ley 769 de 2002, Artículo 115, Parágrafo 2. "En todo contrato de construcción, pavimentación o rehabilitación de una vía urbana o rural, será obligatorio incluir la demarcación vial correspondiente, so pena de incurrir el responsable, en causal de mala conducta."
- ✓ Las actividades de repinte en los sectores donde se presente desgaste prematuro o la retroreflectividad no cumpla, se debe realizar de acuerdo a la Norma Técnica Colombiana - NTC 4744, Numeral 5.2 -Requisitos de desempeño.

Quedamos atentos a cualquier duda e inquietud.

Cordialmente,

VRC INGENIERÍA LTDA


ING. Msc. VÍCTOR MANUEL REYES CARO

Anexo: Ficha técnica de pintura acrílica en dos (2) folios

C.C. Archivo

Página 2



CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CLIENTE: VRC INGENIERIA LTDA
NIT : 900155125
LUGAR Y FECHA: 21/04/2021
FACTURA Y/O PEDIDO: 55727

METODOLOGIA : De acuerdo a los métodos de ensayo de la NTC 1560, INVIAS ARTICULO 700 e instructivos internos			
PRODUCTO: TRAFICO BASE SOLVENTE ORBITEX® AMARILLO			
16 FECHA DE FABRICACION: 25 DE MARZO DE 2021			
FECHA DE VENCIMIENTO: 25 DE MARZO DE 2022			
		LOTE	P-0002190
PARAMETRO	ESPECIFICACIONES	RESULTADO	NTC / INSTRUCTIVO INTERNO
FIGURA DE DISPERSION (CM)	Número 4	4	NTC 1360 NUMERAL 6.2 NTC 957
VISCOSIDAD (cU a 25°C)	60 - 80	83	NTC 1360 NUMERAL 6.6 NTC 539
DENSIDAD (Kg/m³ a 25°C)	6.40 - 6.50	5.5	NTC 1360 NUMERAL 6.1 NTC 101
DENSIDAD DEL PRODUCTO (g/ml a 25°C)	Número 1.4	1.43	NTC 1360 NUMERAL 6.1.4 NTC 561
COLOR*	ΔE = 1.5 max.	1	ISO 9132
COLOR *	CARACTERISTICA COLOR JULIO L 72.02 ± 2.07 a 74.94	CARACTERISTICA JULIO L 78.4 ± 17.51 b 68.33	NTC 1360 NUMERAL 6.3.1
PODERA CUBIENDE (L)	50 LITROS	93.23	NTC 1360 NUMERAL 6.2.6
TIEMPO DE SECADO (NO PICK UP EN MINUTOS)	7 - 15	07 D: 71% TEMPERATURA: 18°C	NTC 1360 NUMERAL 6.2.4 NTC 9734
CONTENIDO DE SÓLIDOS (EN PESO (%))	Número 60	64	NTC 1360 NUMERAL 6.1.2 NTC 1232
CONTENIDO DE SÓLIDOS (EN VOLUMEN (%))	Número 50	50.2	NTC 1360 NUMERAL 6.1.3 NTC 1755
BRILLO 85°	30 MAXIMO	10	NTC 1360 NUMERAL 6.3 NTC 1501-1
SEDIMENTACIÓN DE LA PINTURA	perfecto 0: Tinta blanca que no se puede incorporar	10	NTC 845-2
ESTABILIDAD AL ALVEZUMIENTO	Máximo 5 UN	4 UN	NTC 1360 NUMERAL 6.1.3.2 NTC 6106
ELONGACION	PASA / NO PASA	PASA	NTC 1360 NUMERAL 6.1.7 NTC 1115
ESTABILIDAD A LA DILUCION (85% MUESTRA Y 15% XÍLOL)	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	ISO 1132
RESISTENCIA AL AGUA	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	NTC 1360 NUMERAL 6.3.2.2.1
RESISTENCIA A LOS ALCALIS	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	NTC 1360 NUMERAL 6.3.1.2.2.4
RESISTENCIA A LA ABRASION 600	200	200	NTC 1360 NUMERAL 6.3.1.2.2.16
ADHESION	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	NTC 1360 NUMERAL 6.3.1.2.10

* ESPECTROPOTOMETRO BYK SPECTRO GUIDE

En Pintuflex® estamos comprometidos con el planeta!

PINTUFLEX S.A.S ofrece garantía de las especificaciones técnicas de este producto mas no garantiza las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento porque éstas son inherentes al manejo de quien lo usa y están fuera de nuestro control. Para mayor información consultar la Ficha Técnica del producto antes de su utilización en www.pintuflexltda.com

JONATHAN QUIROGA HERNÁNDEZ
JEFE DE LABORATORIO



CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CLIENTE: VAC INGENIERIA LTDA
NIT : 900133125
LUGAR Y FECHA: 07/04/2021
FACTURA Y/O PEDIDO: 53344

METODOLOGIA : De acuerdo a los métodos de ensayo de la NTC 1360, INVIAS ARTICULO 700 e Instructivos Internos			
PRODUCTO: TRAFICO BASE SOLVENTE ORBITEX® AMARILLO			
16 FECHA DE FABRICACION: MARZO DE 2021			
FECHA DE VENCIMIENTO: MARZO DE 2022			
		LOTE	P-0002079
PARAMETRO	ESPECIFICACIONES	RESULTADO	NTC / INSTRUCTIVO INTERNO
FORMULA DE DISPERSION (LPI)	Monofase 1	4	NTC 1750 NUMERAL 8.2 NTC 557
VISCOSIDAD (mPa.s a 25°C)	80 ± 10	80	NTC 1360 NUMERAL 8.6 NTC 559
DENSIDAD (Kg/m³ a 25°C)	0.90 ± 0.05	0.90	NTC 1360 NUMERAL 8.5 NTC 560
DENSIDAD DEL PRODUCTO (g/cm³ a 25°C)	Máximo 1.4	1.45	NTC 1360 NUMERAL 8.4 NTC 553
COLOR*	SE = 1.5 MAX.	0.94	IGP-132
COLOR *	CARACTERISTICA COLOR TILLO L 75.43 ± 10.37 b 34.06	CARACTERISTICA TILLO L 75.34 ± 10.10 b 34.1	NTC 1360 NUMERAL 8.3
PODER CUMPLIENTE (%)	60 MINIMO	66.10	NTC 1360 NUMERAL 8.2.8
TIEMPO DE SECADO (HRS) PICA LPI EN MINUTOS	7 - 16	07 75% TEMPERATURA: 18°C	NTC 1360 NUMERAL 8.2.4 NTC 573A
CONTENIDO DE SOLIDOS EN PESO (%)	Máximo 50	65.23	NTC 1360 NUMERAL 8.1.3 NTC 1237
CONTENIDO DE SOLIDOS EN VOLUMEN (%)	Máximo 30	50.15	NTC 1360 NUMERAL 8.1.3 NTC 1786
BALEO 85*	30 MAXIMO	30	NTC 1360 NUMERAL 8.3 NTC 592-1
SEDIMENTACION DE LA PINTURA	perfecta 0: Toda Pintura que no se puede intercambiar	10	NTC 845-2
ESTABILIDAD AL VACIAMIENTO	Máximo 5 LK	4 LK	NTC 1360 NUMERAL 8.2.2 NTC 848
ELUCIDACION	PASAJE PASA	PASA	NTC 1360 NUMERAL 8.17 NTC 1115
ESTABILIDAD A LA DILUCION (85% MUESTRA Y 15% XILOL)	CUMPLEO CUMPLE	CUMPLE	IGP-132
RESISTENCIA AL AGUA	CUMPLEO CUMPLE	CUMPLE	NTC 1360 NUMERAL 8.3.3 (B.15)
RESISTENCIA A LOS ALCALIS	CUMPLEO CUMPLE	CUMPLE	NTC 1360 NUMERAL 8.3.3 (B.14)
RESISTENCIA A LA ABRASION 60/3	100	212	NTC 1360 NUMERAL 6.9.2 (B.14)
APARIENCIA	CUMPLEO CUMPLE	CUMPLE	NTC 1360 NUMERAL 6.3.7 (B.10)

* ESPECTROFOTOMETRO BYX SPECTRO GUIDE

En Pintuflex® estamos comprometidos con el planeta!

PINTUFLEX S.A.S ofrece garantía de las especificaciones técnicas de este producto pero no garantiza las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento porque éstas son inherentes al manejo de uso y están fuera de nuestro control. Para mayor información consultar la Ficha Técnica del producto antes de su utilización en www.pintuflexltda.com

JIMMY NIÑO PINZON
DIRECTOR TECNICO

Bogotá, D.C., mayo 07 de 2022
CUMBRE-126-2022



Señores
Atn. ING. CÉSAR HERNANDO FIGUEROA BÁEZ.
Director de interventoría
Avenida Norte No. 47-40 Oficina 132 - Tel. 7172415
Correo: ingechfb@yahoo.es –
Tunja, Boyacá

REFERENCIA:

CONTRATO No. 1036 DE 2021 "CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."

ASUNTO:

REPORTE DEL CLIMA – 06 Y 07 DE MAYO DE 2022.

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito informar que el día 06 de mayo y lo transcurrido del 07 de mayo de 2022, se han presentado fuertes precipitaciones en el municipio de Tunja, que no han permitido ejecutar en forma óptima las actividades programadas (Demarcación Horizontal) en la glorieta del gobernador y en barrio en consuelo, se relaciona registro fotográfico.





Atentamente,

LEONARDO IVÁN RAMÍREZ BERNAL
Director de Obra.

ANEXO: NINGUNO.
COPIA: ARCHIVO.
ELABORO: ARP 07/05/2022.

Anexo 11.3

PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA DE OBRA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
Nº	900321674-6	CUABRE INGENIERIA SAS		CL 77 13 47 ofc 603	3554197	contabilidad.cuabreingenieria@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL		CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
SUCURSAL	C - NÚMERO	PRINCIPAL		PRINCIPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
				9	0
PERIODO SALDO	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR	
2022-04	2022-03	E	90289022	\$4,273,000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD			
Código EPS	Nombre	MIT	Cotización Obligatoria
EP3002	Salud Total EPS	800130507-4	120.000
EP3005	Sanitas EPS	800251440-6	188.400
EP3006	Compensar EPS	650069542-7	290.000

UPC Adicional	Inespecificadas		Licencia Matemática		Días Mora	Valor Mora Colización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
0		0		0	0	0	0	120.000	3
0		0		0	0	0	0	182.400	2
0		0		0	0	0	0	280.000	4

TOTALES PENSION

TOTALES PERSONA				
Código AFP	Nombre	NIT	Contratación Obligatoria	
230301	Poverini	900224806-8	1.237.400	
25-14	Colpaciones	900336004-2	1.120.000	

Aporta Voluntario Afiliado	Aporta Voluntario Aportante	Aporta FSP - Solidaridad	Aporta FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Capitalización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	20,000	20,000	0	0	0	1,277,400	5
0	0	20,000	20,000	0	0	0	1,160,000	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTAL RESGOS LABORALES			
Código ARL	Nombre	MIT	Cotización Obligatoria
14-11	ARL SURA	0809603700-5	656.500

Incapacidades		Aportes Otros Sistemas		Vólor Neto	Días Mora	Vólor Mora	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Vólor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Atendida
A. Anticipación	Vólor			Cotización	Mora	Cotización						
				658.000	0	0	658.000		658.000	6.598	658.000	9

TOTALES CAJAS

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aportes	Total a Pagar	No. Afiliados
CSFZ	Colombiano	860007336-1	559.400	0	0	559.400	9

TOTALES PARAFISCALES

TOTALES PARAFISCALES					No. Afiliados
Valor Aporte	Dise Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar		
SENA					
0	0	0	0	0	0
ICBF					
0	0	0	0	0	0
ESAP					
MEN					

TOTALES POR SUBSISTEMA

TOTALS FOR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de IGE, LMA, IPR y Ilera	Total a Pagar
Salud	3	539.400	539.400
Pensión	2	2.437.400	2.437.400
Riesgos Laborales	1	559.500	559.500
OCF	1	539.400	539.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	4.273.000	4.273.000

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
NI	900321874-6	CIAMBRE INGENIERIA SAS	Cl 77 13 47 ofc 605	3554187	contabilidad.cambrenge@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN SUCURSAL	CLASE APORTANTE C - MIPYME	NOMBRE SUCURSAL PRINCIPAL	DÉPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO	
			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	Sí

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIANES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIANES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
					0
PERIODO SALDO	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-04	2022-03	E	06/05/2002	56289025	\$4,373,000

[illegible]

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
NI	900321974-6	CIAMBRE INGENIERIA SAS		C/ 77 13 47 c/c-605	3554137	comercialidad.cambreingenierias@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN SUCURSAL	CLASE APORTANTE C - MIPTIME	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
		PRINCIPAL	PRINCIPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D. C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (CUARTESIAÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (CUARTESIAÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
					8
					0
PERIODO SALDO					TOTAL A PAGAR
2022-05	2022-04	E	13/06/2022	58949155	\$4,092,900

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD		
Código EPS	Nombre	MIT
EP5002	Salud Total EPS	900130907-A
EP5005	Sanitas EPS	900251400-B
EP5003	Compensar EPS	900069542-7
		120.000
		160.000
		290.000

UPC Adicional	Incapacidades		Días More	Valor Mora Capitalización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliado
	No. Autorización	Valor					
0		0	0	0	0	120.000	3
0		0	0	0	0	160.000	1
0		0	0	0	0	260.000	4

TOTALES PENSION

TOTALES PENSION			
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
23-001	Pension	800224908-9	1.120.000
25-14	Cooperativa	900336004-7	1.120.000

Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Subsididad	Aporte FSP - Subsidencia	Días Mors	Valor Mors Cotización	Valor Mors	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	20,000	20,000	0	0		1,160,000	4
0	0	20,000	20,000	0	0		1,160,000	4

TOTALES RESCOS LABORALES

TOTALES REZOSOS LABORALES			
Código ARL	Nombre	NIT	Colización Obligatorio
14-11	ARL SUPA	800903790-5	852.000

Incapacidades	V.
Autotrición	

Aportes Otros Sistemas		Valor Neto		Días		Valor Mora		Subtotal		No. Radiado		Valor Saldos a Favor		Fondo		Total a Pagar		No. Afiliados	
		Coligación		Mora		Coligación		Coligación		Saldos a Favor		Saldos a Favor		Solidaridad					
		0		0		0		652.900		652.900				6.529		652.900		8	

TOTALES CAJAS

TOTALES CAJAS			
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte
CCF22	Colsubido	860007304-1	560.000

Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	560.000	8

TOTALES PARAFISCALES

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aportes	Dota Mena	Valor Mena Aportes	Total a Pagar	No. Afiliados
		SENA		
0	0	0	0	0
		ICBF		
0	0	0	0	0
		ESAP		
		MEN		

TOTALES POR SUBSISTEMA

TOTALES POR SUBSISTEMA		
Typo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de IOP LMA, RCP y Afili
Salud	3	560.000
Pensión	2	2.320.000
Riesgos Laborales	1	632.900
CCF	1	560.000
ESAP	0	0
ICBSF	0	0
MEN	0	0
SENA	0	0
TOTALES	7	4.052.900

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD		
				EMPLACADOS	UNC	
				8	0	
				TOTAL A PAGAR		
PERIODO SALIDA 2022-05	PERIODO PERSONAS 2022-04	E	13/06/2022	58949155	\$4,092,800	

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	47	Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NT 90031674	6	CHIMBE INGENIERIA S.A.S	8 - MENOS DE 100 COTIZANTES	TONIA	CALLE 77 13 47 OF 605	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3554197	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Días Mora	Valor	
2022-03	1445505216	9433001161	E		2022/04/20	2022/05/06	16	\$309,600	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
EMPLEADO					NOVEDADES								PENSION				SALUD			CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tol	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	lao	l

PENSION										
SALUD										
CCF										
RIESGOS										
PARAFISCALES										
No	Identificación	Nombre	NOVEDADES							
			Ing	ret	tol	lao	lao	lao	lao	lao
1	CC8079	ESLVA ESTANGLAO								
Total			Atribución 3)							

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900371474	6	CIUDADE INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 100 COTIZANTES	TUNJA	CALLE 77 13 47 OF 605	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3554197	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Fecha	Pago			
2022-03	2022-04	144505826	94330011B1	E	2022/04/20	2022/05/06	SANCOLOMBIA	16	\$309,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	dv	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$160,000	\$0	\$0	\$0	\$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$160,000	\$0	\$0	\$0	\$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$69,600	\$0	\$0	\$0	\$69,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$69,600	\$0	\$0	\$0	\$69,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$40,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$40,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$40,000
COMPENSAUR	EPS008	860,066,942	7	1	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$40,000
TOTAL				1	\$309,600	\$0	\$0	\$0	\$309,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEHA e ICBF	
NIT 900321674	6	CUMBRE INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TUNJA	CALLE 77 13 47 OF 605	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3554197	SI	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-05	1499934204	943-026706	£	2022/05/17	2022/06/13	BANCOLOMBIA	27	\$209,600

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dy	Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 90021474	6	CIEMBEZ INGENIERIA S.A.S	B : MENOS DE 200 COTIZANTES	TUNJA	CALLE 77 13 47 OF 405	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3554197	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2022-04	2022-05	1499934204	9434285786		2022/05/17	2022/06/13			\$309,600
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	dy	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ATP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$69,600	\$0	\$0	\$69,600	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$69,600	\$0	\$0	\$69,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
TOTAL				1	\$309,600	\$0	\$0	\$309,600	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Nombre ó Razón Social	VRC INGENIERIA LTDA		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	900155125
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	TRANSVERSAL 76 B # 51 B -41	Teléfono	6318786
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Construcción de otras obras de
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	C-MIPYME MENOS DE 200
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número Planilla	7832820964	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	marzo / 2022	Periodo Cotización Salud	abril / 2022
Días de Mora	0	Fecha Pago	2022/04/05
Número Autorización	1400070162		

INFORMACIÓN BÁSICA			
Nombres	VICTOR MANUEL	Apellidos	REYES CARO
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	7164000
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	\$ 5.500.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES													
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC
							01-30						

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	25-14 COLPENSIONES
Días	30	IBC	\$ 5.500.000
Tarifa	16,000 %	Cotización Obligatoria	\$ 880.000
FSP - Solidaridad	\$ 27.500	FSP - Subsistencia	\$ 27.500
Aportes Voluntarios Empleador	\$ 0	Aportes Voluntarios Cotizante	\$ 0
Indicador tarifa especial	Normal	Total Aporte	\$ 935.000

SALUD		Administradora	EPS005-SANITAS S.A.
Días	30	IBC	\$ 5.500.000
Tarifa	4,000 %	Cotización Obligatoria	\$ 220.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Valor	\$ 0
Nro Licencia de Maternidad		Valor	\$ 0
Valor ADRES	\$ 0	Total Aporte	\$ 220.000

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.
Días	30	IBC	\$ 5.500.000
Clase de Riesgo	V	Tarifa	6,960 %
Centro de Trabajo		Total Aporte	\$ 382.800

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES				
Administradora	Días Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF21-CAFAM	30	4,000 %	\$ 5.500.000	\$ 220.000

TOTAL PAGADO:

\$ 1.757.800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900155125
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	VRC INGENIERIA LTDA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	TRANSVERSAL 76 B # 51 B -41 TELÉFONO:	6318786
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7836840196	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	AÑO: 2022
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/05/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		1446230665

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 935.000
SUBTOTAL:			1	\$ 935.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 220.000
SUBTOTAL:			1	\$ 220.000
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860013570	CCF21	CCF21-CAFAM	1	\$ 220.000
SUBTOTAL:			1	\$ 220.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860002503	14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	\$ 382.800
SUBTOTAL:			1	\$ 382.800

TOTAL PAGADO:	\$ 1.757.800
----------------------	---------------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				
Nombre ó Razón Social		VRC INGENIERIA LTDA		
Tipo Identificación		NIT	Número de Identificación	900155125
Ciudad/Municipio		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección		TRANSVERSAL 76 B # 51 B -41	Teléfono	6318786
Tipo Empresa		PRIVADA	Actividad Económica	Construcción de otras obras de
Tipo Aportante		01-EMPLEADOR	Clase Aportante	C-MIPYME MENOS DE 200
Forma Presentación		ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				
SI				

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número Planilla	7834035431	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	marzo / 2022	Periodo Cotización Salud	abril / 2022
Días de Mora	0	Fecha Pago	2022/04/11
Número Autorización	1408204804		

INFORMACIÓN BÁSICA				
Nombres	OSSMAN GILDARDO	Apellidos	OVIEDO REYES	
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	7187580	
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante		
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO	
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
Salario Básico	\$ 2.000.000	Tipo de Salario	FIJO	

NOVEDADES														
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL				
PENSIÓN		Administradora 230301-PORVENIR		
Días	30	IBC	\$ 2.000.000	
Tarifa	16,000 %	Cotización Obligatoria	\$ 320.000	
FSP - Solidaridad	\$ 0	FSP - Subsistencia	\$ 0	
Aportes Voluntarios Empleador	\$ 0	Aportes Voluntarios Cotizante	\$ 0	
Indicador tarifa especial	Normal	Total Aporte	\$ 320.000	

SALUD		Administradora EPS017-FAMISANAR		
Días	30	IBC	\$ 2.000.000	
Tarifa	4,000 %	Cotización Obligatoria	\$ 80.000	
Nro Incapacidad por Enf. General		Valor	\$ 0	
Nro Licencia de Maternidad		Valor	\$ 0	
Valor ADRES	\$ 0	Total Aporte	\$ 80.000	

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora 14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.		
Días	30	IBC	\$ 2.000.000	
Clase de Riesgo	V	Tarifa	6,960 %	
Centro de Trabajo		Total Aporte	\$ 139.200	

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES				
Administradora	Días Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF21-CAFAM	30	4,000 %	\$ 2.000.000	\$ 80.000

TOTAL PAGADO: \$ 619.200

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 7187580

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Nombre ó Razón Social	VRC INGENIERIA LTDA		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	900155125
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	TRANSVERSAL 76 B # 51 B -41	Teléfono	6318786
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Construcción de otras obras de
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	C-MIPYME MENOS DE 200
Forma Presentación	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número Planilla	7837164887	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	abril / 2022	Periodo Cotización Salud	mayo / 2022
Días de Mora	0	Fecha Pago	2022/05/06
Número Autorización	1446198114		

INFORMACIÓN BÁSICA			
Nombres	OSSMAN GILDARDO	Apellidos	OVIDEO REYES
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	7187580
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	\$ 2.000.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301-PORVENIR
Días	30	IBC	\$ 2.000.000
Tarifa	16,000 %	Cotización Obligatoria	\$ 320.000
FSP - Solidaridad	\$ 0	FSP - Subsistencia	\$ 0
Aportes Voluntarios Empleador	\$ 0	Aportes Voluntarios Cotizante	\$ 0
Indicador tarifa especial	Normal	Total Aporte	\$ 320.000

SALUD		Administradora	EPS017-FAMISANAR
Días	30	IBC	\$ 2.000.000
Tarifa	4,000 %	Cotización Obligatoria	\$ 80.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Valor	\$ 0
Nro Licencia de Maternidad		Valor	\$ 0
Valor ADRES	\$ 0	Total Aporte	\$ 80.000

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.
Días	30	IBC	\$ 2.000.000
Clase de Riesgo	V	Tarifa	6,960 %
Centro de Trabajo		Total Aporte	\$ 139.200

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES				
Administradora	Días Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF21-CAFAM	30	4,000 %	\$ 2.000.000	\$ 80.000

TOTAL PAGADO:	\$ 619.200
----------------------	-------------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Nombre ó Razón Social	VRC INGENIERIA LTDA		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	900155125
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	TRANSVERSAL 76 B # 51 B -41	Teléfono	6318786
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Construcción de otras obras de
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	C-MIPYME MENOS DE 200
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número Planilla	7834035431	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	marzo / 2022	Periodo Cotización Salud	abril / 2022
Días de Mora	0	Fecha Pago	2022/04/11
Número Autorización	1408204804		

INFORMACIÓN BÁSICA			
Nombres	EDUARD YOVANY	Apellidos	PARRADO VEGA
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1024518230
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	\$ 1.300.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	IRP
								01-30							

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301-PORVENIR
Días	30	IBC	\$ 1.920.750
Tarifa	16,000 %	Cotización Obligatoria	\$ 307.400
FSP - Solidaridad	\$ 0	FSP - Subsistencia	\$ 0
Aportes Voluntarios Empleador	\$ 0	Aportes Voluntarios Cotizante	\$ 0
Indicador tarifa especial	Normal	Total Aporte	\$ 307.400

SALUD		Administradora	EPS037-NUEVA EPS
Días	30	IBC	\$ 1.920.750
Tarifa	4,000 %	Cotización Obligatoria	\$ 76.900
Nro Incapacidad por Enf. General		Valor	\$ 0
Nro Licencia de Maternidad		Valor	\$ 0
Valor ADRES	\$ 0	Total Aporte	\$ 76.900

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.
Días	30	IBC	\$ 1.920.750
Clase de Riesgo	V	Tarifa	6,960 %
Centro de Trabajo		Total Aporte	\$ 133.700

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES				
Administradora	Días Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF21-CAFAM	30	4,000 %	\$ 1.920.750	\$ 76.900

TOTAL PAGADO:	\$ 594.900
----------------------	-------------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Nombre ó Razón Social	VRC INGENIERIA LTDA		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	900155125
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	TRANSVERSAL 76 B # 51 B -41	Teléfono	6318786
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Construcción de otras obras de
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	C-MIPYME MENOS DE 200
Forma Presentación	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número Planilla	7837164887	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	abril / 2022	Periodo Cotización Salud	mayo / 2022
Días de Mora	0	Fecha Pago	2022/05/06
Número Autorización	1446196114		

INFORMACIÓN BÁSICA			
Nombres	EDUARD YOVANY	Apellidos	PARRADO VEGA
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1024518230
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	\$ 1.300.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	IRP
								01-30							

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301-PORVENIR
Días	30	IBC	\$ 1.556.750
Tarifa	16,000 %	Cotización Obligatoria	\$ 249.100
FSP - Solidaridad	\$ 0	FSP - Subsistencia	\$ 0
Aportes Voluntarios Empleador	\$ 0	Aportes Voluntarios Cotizante	\$ 0
Indicador tarifa especial	Normal	Total Aporte	\$ 249.100

SALUD		Administradora	EPS037-NUEVA EPS
Días	30	IBC	\$ 1.556.750
Tarifa	4,000 %	Cotización Obligatoria	\$ 62.300
Nro Incapacidad por Enf. General		Valor	\$ 0
Nro Licencia de Maternidad		Valor	\$ 0
Valor ADRES	\$ 0	Total Aporte	\$ 62.300

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.
Días	30	IBC	\$ 1.556.750
Clase de Riesgo	V	Tarifa	6,960 %
Centro de Trabajo		Total Aporte	\$ 108.400

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES				
Administradora	Días Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF21-CAFAM	30	4,000 %	\$ 1.556.750	\$ 62.300

TOTAL PAGADO:	\$ 482.100
----------------------	-------------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Nombre ó Razón Social	VRC INGENIERIA LTDA		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	900155125
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	TRANSVERSAL 76 B # 51 B -41	Teléfono	6318786
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Construcción de otras obras de
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	C-MIPYME MENOS DE 200
Forma Presentación	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número Planilla	7834035431	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	marzo / 2022	Periodo Cotización Salud	abril / 2022
Días de Mora	0	Fecha Pago	2022/04/11
Número Autorización	1408204804		

INFORMACIÓN BÁSICA			
Nombres	BLADIMIR	Apellidos	FLOR LOPEZ
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1123141385
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	\$ 1.072.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
								01-30								

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301-PORVENIR
Días	30	IBC	\$ 1.601.188
Tarifa	16,000 %	Cotización Obligatoria	\$ 256.200
FSP - Solidaridad	\$ 0	FSP - Subsistencia	\$ 0
Aportes Voluntarios Empleador	\$ 0	Aportes Voluntarios Cotizante	\$ 0
Indicador tarifa especial	Normal	Total Aporte	\$ 256.200

SALUD		Administradora	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS
Días	30	IBC	\$ 1.601.188
Tarifa	4,000 %	Cotización Obligatoria	\$ 64.100
Nro Incapacidad por Enf. General		Valor	\$ 0
Nro Licencia de Maternidad		Valor	\$ 0
Valor ADRES	\$ 0	Total Aporte	\$ 64.100

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.
Días	30	IBC	\$ 1.601.188
Clase de Riesgo	V	Tarifa	6,960 %
Centro de Trabajo		Total Aporte	\$ 111.500

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES				
Administradora	Días Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF21-CAFAM	30	4,000 %	\$ 1.601.188	\$ 64.100

TOTAL PAGADO:	\$ 495.900
----------------------	-------------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Nombre ó Razón Social	VRC INGENIERIA LTDA		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	900155125
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	TRANSVERSAL 76 B # 51 B -41	Teléfono	6318786
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Construcción de otras obras de
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	C-MIPYME MENOS DE 200
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número Planilla	7837164887	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	abril / 2022	Periodo Cotización Salud	mayo / 2022
Días de Mora	0	Fecha Pago	2022/05/06
Número Autorización	1446196114		

INFORMACIÓN BÁSICA			
Nombres	BLADIMIR	Apellidos	FLOR LOPEZ
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1123141385
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	\$ 1.072.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT
								01-30							

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301-PORVENIR
Días	30	IBC	\$ 1.356.750
Tarifa	16,000 %	Cotización Obligatoria	\$ 217.100
FSP - Solidaridad	\$ 0	FSP - Subsistencia	\$ 0
Aportes Voluntarios Empleador	\$ 0	Aportes Voluntarios Cotizante	\$ 0
Indicador tarifa especial	Normal	Total Aporte	\$ 217.100

SALUD		Administradora	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS
Días	30	IBC	\$ 1.356.750
Tarifa	4,000 %	Cotización Obligatoria	\$ 54.300
Nro Incapacidad por Enf. General		Valor	\$ 0
Nro Licencia de Maternidad		Valor	\$ 0
Valor ADRES	\$ 0	Total Aporte	\$ 54.300

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.
Días	30	IBC	\$ 1.356.750
Clase de Riesgo	V	Tarifa	6,960 %
Centro de Trabajo		Total Aporte	\$ 94.500

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES				
Administradora	Días Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF21-CAFAM	30	4,000 %	\$ 1.356.750	\$ 54.300

TOTAL PAGADO:	\$ 420.200
----------------------	-------------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901300058	2	ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 15 NO 20 62	TUNJA-BOYACA	7423853	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-04	1426460475	9434000188	E	2022/04/18	2022/04/25	BANCO DAVIVIENDA		\$981,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES														
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	lde	tae	lop	lap	vop	cor	vet	sln	lge	lma	vac	avp	vct	lrf	vlp		Codigo	Dias	IBC	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes							
1	ICC	1051954604																				231001	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF10	30	\$1,000,000	\$5,000	14-4	30	\$1,000,000	\$5,000	30	\$245,300
2	ICC	1049640738																				230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF10	30	\$1,000,000	\$5,000	14-4	30	\$1,000,000	\$5,000	30	\$245,300
3	ICC	9763529																				25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF10	30	\$1,000,000	\$5,000	14-4	30	\$1,000,000	\$5,000	30	\$245,300
4	ICC	7186884																				230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF10	30	\$1,000,000	\$5,000	14-4	30	\$1,000,000	\$5,000	30	\$245,300
Total		Afiliados(4)																						\$4,000,000	\$160,000			\$4,000,000	\$21,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$981,200				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901300058	2	ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 15 NO 20 62	TUNJA-BOYACA	7423853	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-03	2022-04	1426460475	9434000188	E	2022/04/18	2022/04/25	BANCO DAVIVIENDA		\$981,200
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					4	\$640,000	\$0		\$640,000
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	1	\$160,000	\$0		\$160,000
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$160,000	\$0		\$160,000
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$160,000	\$0		\$160,000
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$160,000	\$0		\$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$21,200	\$0		\$21,200
COLPATRIA ARP		14-4	860,002,183	9	4	\$21,200	\$0		\$21,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$160,000	\$0		\$160,000
COMFABOY		CCF10	891,800,213	8	4	\$160,000	\$0		\$160,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)					4	\$160,000	\$0		\$160,000
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	1	\$40,000	\$0		\$40,000
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	3	\$120,000	\$0		\$120,000
TOTAL					4	\$981,200	\$0		\$981,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901300058	2	ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 15 NO 20 62	TUNJA-BOYACA	7423853	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Plantilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
Pensión							
2022-04	1477091668	9435427563	E	2022/05/13	2022/05/27	14	\$981,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																							
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION					SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct	lri	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
1	CC	1051954624																		231001	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF10	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF10	30	\$1,000,000	\$5,300	30	\$0	SI	\$245,300
2	CC	1049640738																		230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF10	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF10	30	\$1,000,000	\$5,300	30	\$0	SI	\$245,300
3	CC	6763529																		25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF10	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF10	30	\$1,000,000	\$5,300	30	\$0	SI	\$245,300
4	CC	7186884																		230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF10	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF10	30	\$1,000,000	\$5,300	30	\$0	SI	\$245,300
Total		Afiliados(4)																																		\$0	\$981,200		



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901300058	2	ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL	CARRERA 15 NO 20 62	TUNJA-BOYACA	7423853	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-05	1477091668	9435427563	E	2022/05/13	2022/05/27	BANCO DAVIVIENDA	14	\$981,200
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				4	\$640,000	\$0	\$0	\$640,000	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$21,200	\$0	\$0	\$21,200	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	4	\$21,200	\$0	\$0	\$21,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$120,000	\$0	\$0	\$120,000	
TOTAL				4	\$981,200	\$0	\$0	\$981,200	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/SEMANA)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/SEMANA)	CANTIDAD		
				EMPLEADOS	UPC	
				6	0	
PERIODO SALDO	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR		
2022-05	2022-04	E	13/06/2022	\$4,092,900		

TOTALES SALUD

TOTALES SALUD												
	NIT	Contratación Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Contratación	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
\$	600130907.4	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	3
	800251402-8	160.000	0		0		0	0	0	0	160.000	1
\$	860069342.7	280.000	0		0		0	0	0	0	280.000	4

TOTALES PENSION

Aportes Voluntarios Afiliado	Aportes Voluntarios Aportantes	Aportes FSP - Sustentancia	Días More	Valor More Cotización	Valor More FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	20,000	0	0		1,180,000	4
0	0	20,000	0	0		1,180,000	4

TOTAL PERSONS LABORING

Aportes Otros		Valor Neto Contracción	Diseño Mora	Valor Mora Contracción	Subtotal Contracción	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
Sistemas										
		652,900	0	0	652,900			6,529	652,900	8

TOTAL PSCAJAS

Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	960.000	9

TOTAL EXPENSES: 15

TOTALES PARAFISCALS			
As More	Valor More Aporta	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA			
0	0	0	0
ICBF			
0	0	0	0
ESAP			
MEN			

TOTAL F4 POR SISTEMA

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIANE/BAJO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIANE/BAJO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLAZADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-05	2022-04	E	13/06/2022	58948155	\$4.092.900	

[illegible]

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES **SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 7164000**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				
Nombre o Razón Social	VRC INGENIERIA LTDA			
Tipo de identificación	NIT	Número de identificación	900155125	
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	
Dirección	TRANSVERSAL 76 B # 51 B -41	Telefono	6318786	
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Construcción de otras obras de ingeniería civil.	
Tipo de Aportante	01-EMPLEADOR	Clase de aportante	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES	
Forma de presentación	ÚNICO			
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
Número de planilla	7840078738	Tipo de planilla
Periodo de Cotización Otros Subsistemas	2022-05	Periodo de cotización salud
Días de Mora	0	Fecha de pago
Número de autorización	1488089071	

INFORMACIÓN BÁSICA		
No. (consecutivo)	1	
Nombres	VICTOR MANUEL	Apellidos
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación
Tipo de cotizante	DEPEND	Subtipo de cotizante
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)		NO
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio
Salario Básico	\$5.500.000	Tipo de Salario

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL		
PENSION	Administradora	25-14 COLPENSIONES
Días	30 IBC	\$5.500.000
Tarifa	16% Cotización Obligatoria	\$880.000
FSP - Solidaridad	\$27.500 FSP - Subsistencia	\$27.500
Aportes Voluntarios Empleador	\$0 Aportes Voluntarios Cotizante	\$0
Total Aporte	\$935.000	
SALUD	Administradora	EPS005-SANITAS S.A.
Días	30 IBC	\$5.500.000
Tarifa	4% Cotización Obligatoria	\$220.000
UPC Adicional	\$0	Total Aporte
		\$220.000
RIESGOS PROFESIONALES	Administradora	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.
Días	30 IBC	\$5.500.000
Clase de Riesgo	V Tarifa	6,96%
Centro de Trabajo	Total Aporte	\$382.800

APORTE REALIZADOS A PARAFISCALES				
Administradora	Días Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF21-CAFAM	30	4%	\$5.500.000	\$220.000

TOTAL PAGADO	\$1.757.800
---------------------	--------------------

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 7187580

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Nombre ó Razón Social	VRC INGENIERIA LTDA		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	900155125
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	TRANSVERSAL 76 B # 51 B -41	Teléfono	6318786
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Construcción de otras obras de
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	C-MIPYME MENOS DE 200
Forma Presentación	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número Planilla	7840292251	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	mayo / 2022	Periodo Cotización Salud	junio / 2022
Días de Mora	0	Fecha Pago	2022/06/03
Número Autorización	1488097627		

INFORMACIÓN BÁSICA			
Nombres	OSSMAN GILDARDO	Apellidos	OVIEDO REYES
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	7187580
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	\$ 2.000.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
								01-30								

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301-PORVENIR
Días	30	IBC	\$ 2.621.667
Tarifa	16,000 %	Cotización Obligatoria	\$ 419.500
FSP - Solidaridad	\$ 0	FSP - Subsistencia	\$ 0
Aportes Voluntarios Empleador	\$ 0	Aportes Voluntarios Cotizante	\$ 0
Indicador tarifa especial	Normal	Total Aporte	\$ 419.500

SALUD		Administradora	EPS017-FAMISANAR
Días	30	IBC	\$ 2.621.667
Tarifa	4,000 %	Cotización Obligatoria	\$ 104.900
Nro Incapacidad por Enf. General		Valor	\$ 0
Nro Licencia de Maternidad		Valor	\$ 0
Valor ADRES	\$ 0	Total Aporte	\$ 104.900

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.
Días	30	IBC	\$ 2.621.667
Clase de Riesgo	V	Tarifa	6,960 %
Centro de Trabajo		Total Aporte	\$ 182.500

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES				
Administradora	Días Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF21-CAFAM	30	4,000 %	\$ 2.621.667	\$ 104.900

TOTAL PAGADO:	\$ 811.800
----------------------	-------------------

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1024518230

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Nombre ó Razón Social	VRC INGENIERIA LTDA		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	900155125
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	TRANSVERSAL 76 B # 51 B -41	Teléfono	6318786
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Construcción de otras obras de
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	C-MIPYME MENOS DE 200
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número Planilla	7840292251	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	mayo / 2022	Periodo Cotización Salud	junio / 2022
Días de Mora	0	Fecha Pago	2022/06/03
Número Autorización	1488097627		

INFORMACIÓN BÁSICA			
Nombres	EDUARD YOVANY	Apellidos	PARRADO VEGA
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1024518230
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	\$ 1.300.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
								01-30								

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301-PORVENIR
Días	30	IBC	\$ 2.038.969
Tarifa	16,000 %	Cotización Obligatoria	\$ 326.300
FSP - Solidaridad	\$ 0	FSP - Subsistencia	\$ 0
Aportes Voluntarios Empleador	\$ 0	Aportes Voluntarios Cotizante	\$ 0
Indicador tarifa especial	Normal	Total Aporte	\$ 326.300

SALUD		Administradora	EPS037-NUEVA EPS
Días	30	IBC	\$ 2.038.969
Tarifa	4,000 %	Cotización Obligatoria	\$ 81.600
Nro Incapacidad por Enf. General		Valor	\$ 0
Nro Licencia de Maternidad		Valor	\$ 0
Valor ADRES	\$ 0	Total Aporte	\$ 81.600

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.
Días	30	IBC	\$ 2.038.969
Clase de Riesgo	V	Tarifa	6,960 %
Centro de Trabajo		Total Aporte	\$ 142.000

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES				
Administradora	Días Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF21-CAFAM	30	4,000 %	\$ 2.038.969	\$ 81.600

TOTAL PAGADO:	\$ 631.500
----------------------	-------------------

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1123141385

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Nombre ó Razón Social	VRC INGENIERIA LTDA		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	900155125
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	TRANSVERSAL 76 B # 51 B -41	Teléfono	6318786
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Construcción de otras obras de
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	C-MIPYME MENOS DE 200
Forma Presentación	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número Planilla	7840292251	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	mayo / 2022	Periodo Cotización Salud	junio / 2022
Días de Mora	0	Fecha Pago	2022/06/03
Número Autorización	1488097627		

INFORMACIÓN BÁSICA			
Nombres	BLADIMIR	Apellidos	FLOR LOPEZ
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1123141385
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	\$ 1.072.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
								01-30								

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301-PORVENIR
Días	30	IBC	\$ 1.875.107
Tarifa	16,000 %	Cotización Obligatoria	\$ 300.100
FSP - Solidaridad	\$ 0	FSP - Subsistencia	\$ 0
Aportes Voluntarios Empleador	\$ 0	Aportes Voluntarios Cotizante	\$ 0
Indicador tarifa especial	Normal	Total Aporte	\$ 300.100

SALUD		Administradora	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS
Días	30	IBC	\$ 1.875.107
Tarifa	4,000 %	Cotización Obligatoria	\$ 75.100
Nro Incapacidad por Enf. General		Valor	\$ 0
Nro Licencia de Maternidad		Valor	\$ 0
Valor ADRES	\$ 0	Total Aporte	\$ 75.100

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.
Días	30	IBC	\$ 1.875.107
Clase de Riesgo	V	Tarifa	6,960 %
Centro de Trabajo		Total Aporte	\$ 130.600

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES				
Administradora	Días Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF21-CAFAM	30	4,000 %	\$ 1.875.107	\$ 75.100

TOTAL PAGADO:	\$ 580.900
----------------------	-------------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901300038	2	ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 15 NO 20 62	TUNJA-BOYACA	7423853	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Fecha		Pago		Banco		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2022-05	2022-06	15/1532178	9436203472	2022/06/14	2022/06/21	BANCO DAVIVIENDA		\$981,200	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES														
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	lde	tase	ldp	lap	isp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	arp	vct	tri	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes						
1	CC	1051954604	CARDENAS RUEDA GINA PAOLA																	231001	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF10	30	\$1,000,000	\$40,000	14-4	30	\$1,000,000	\$5,300	30	\$0	\$0	\$245,300
2	CC	1049640738	SAVEDRA SANTISTEBAN OSCAR ANDRES																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF10	30	\$1,000,000	\$40,000	14-4	30	\$1,000,000	\$5,300	30	\$0	\$0	\$245,300
3	CC	6763329	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM																	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF10	30	\$1,000,000	\$40,000	14-4	30	\$1,000,000	\$5,300	30	\$0	\$0	\$245,300
4	CC	7186884	SUAREZ CANARIA DANIEL LEONARDO																	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF10	30	\$1,000,000	\$40,000	14-4	30	\$1,000,000	\$5,300	30	\$0	\$0	\$245,300
Total		Afiliados(4)																				\$4,000,000	\$640,000			\$4,000,000	\$160,000			\$4,000,000	\$21,200		\$0	\$0	\$981,200				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901300058	2	ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 15 NO 20 62	TUNJA-BOYACA	7423853	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago		Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	1511532178	9436203472	E	2022/06/14	2022/06/21	BANCO DAVIVIENDA		\$981,200

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$640,000	\$0	\$640,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$160,000	\$0	\$160,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$160,000	\$0	\$160,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$160,000	\$0	\$160,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	4	\$21,200	\$0	\$21,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	\$160,000	\$0	\$160,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)								
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$40,000	\$0	\$40,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$120,000	\$0	\$120,000	
TOTAL				4	\$981,200	\$0	\$981,200	

Anexo 11.4

PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENTORIA DE OBRA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CO 712415	0	CEMAR HERNÁNDEZ FLORES CA. BAEZ	1	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	7112	Natural	
MUN-DEP		DIRECCIÓN			TELÉFONO	EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
15-1		CRA 48-14-81			*401901	INGECHIBUYAHOOES		\$	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECA JOD
2022-1-4	2022-04	23165981	I	2022-06-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	319.300	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	23165981	2022-05-15	Pagada							

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 7172415	0	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	I 0	POSITIVA - 14-23	UNICA	7112	Natural
MUN-DEP 15-1		DIRECCION CRA 4B #14 81		TELEFONO 74073001		EMAIL INGECHEB@YAHOO.ES	EXENTO DE PARAFISCALES *02

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDADA
2022-04	2022-04	23165881	I	2022-06-01	TODCS LOS SENTROS	TODCS		319,390	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	23165891		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	1.100.000	IBC SALUD	1.100.000	IBC CAJAS
			1.100.000	IBC PARAF
				0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MOFA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 1)				1	176.000	0	0	0	176.000
PORVEIR	230301	800224808	8	1	176.000	0	0	0	176.000
PS (Administradoras: 1)				1	137.500	0	0	0	137.500
SANTAS	EPS005	800251440	6	1	137.500	0	0	0	137.500
ARP (Administradoras: 1)				1	5.800	0	0	0	5.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	5.800	0	0	0	5.800
Gran Total					319.300	0	0	0	319.300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
IDENTIFICACIÓN		DV	RAZÓN SOCIAL		CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN		ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
C07172415		0	CEBARI HERNANDEZ PEREZ DIA BAEZ		A	01	A L SURIA - 14-11	SUCURS/AL	7112		Natural
MUN-DEP			DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
15-1			CENTRO		7650974		INGECHEBINGAL.COM		5		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES Y MORA	ENTIDAD RECAUDADORA
2022-2-4	2022-05	8619639255	E	2022-06-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	402 500	0	Banco Agrario
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8619639255	2022-05-13	Pagada							

1	8619839755	2022-05-05	Pagada
---	------------	------------	--------

[illegible]

 ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
IDENTIFICACIÓN		DV	RAZÓN SOCIAL		CLASE	CÓDIGO	APL	F. PRESENTACIÓN		ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CG 7172415		0	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		A	01	APL SUISA - 4-11	SUCURSAL	7112		Natural
MUN-DEP			DIRECCIÓN CENTRO		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
					78206724		INGECHE@GMAIL.COM		S		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDON
2022-04	2022-05	861883655	E	2022-06-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	-462.500	0	Banco Agrario
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8618833955		Pagada							

1	8619839755	Pagada
---	------------	--------

TOTALES IBC				
IBC PENSION	1.300.000	IBC SALUD	1.300.000	IBC CAJAS
				IBC RIESGOS
				1.300.000
				1.300.000
				IBC PARAF
				1.300.000

	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	1.300.000	1.300.000	1.300.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	D/V	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MOFA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 1)				1	208.000	0	0	0	208.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	208.000	0	0	0	208.000
EPS (Administradoras: 1)				1	52.000	0	0	0	52.000
SANTAS	EPS005	800231440	6	1	52.000	0	0	0	52.000
AFP (Administradoras: 1)				1	90.500	0	0	0	90.500
ARL SURA	14-11	890933790	5	1	90.500	0	0	0	90.500
CCF (Administradoras: 1)				1	52.000	0	0	0	52.000
Gran Total					350.500	0	0	0	350.500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
IDENTIFICACIÓN		DV	RAZÓN SOCIAL		CLASE CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN		ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CÓ-772415		0	CESAR HERNÁNDO FIGUEROA BAZ		A	01	A.L SURTA - 14-11		7112	Natural
MUN-DEP			DIRECCIÓN			TELÉFONO		EMAIL		
15-1						7820974		INGECHFR86@GMAIL.COM		
								S		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDADORA
2022-1-4	2022-05	86196395-40	E	2022-06-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	294.300	0	Banco Agrario
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	86196395-40	2022-05-15	Pasada							

EMPLEADO										NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD				RIESGOS		TARIFA		PARAF		SENA		ICBF		ESA-3		MIN		Total		Evento de Particularidad																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
N.	ID	EMPLEADO		SALARIO		MODALIDAD DE SALARIO		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS		DÍAS	

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	COORGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC 7172415	0	DESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	A	01	ARL SUBA - 4-11	SUCURSAL	7112	Natural	
MUN-DEP	15-1	DIRECCION	TELEFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
		CENTRO	7800074		BACEHERNANDEZ.COM				

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDADA
2022-14	2022-05	56196305-40	E	2022-06-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2994.500	0	Banco Agrario
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	56196305-40		Pasada							

TOTALES IBC

TOTALES IBC				
IBC PENSION	1.200.000	IBC SALUD	1.200.000	IBC RIESGOS
			1.200.000	IBC CAJAS
				1.200.000
				IBC PARAF
				1.200.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MOFA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP/Administradoras: 1)				1	192.000	0	0	0	192.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	192.000	0	0	0	192.000
PSI/Administradoras: 1)				1	48.000	0	0	0	48.000
NUEVA E.P.S.A.	EPS037	900156264	2	1	48.000	0	0	0	48.000
ARP/Administradoras: 1)				1	6.300	0	0	0	6.300
ARL SUHA	14-11	890903790	5	1	6.300	0	0	0	6.300
ACF/Administradoras: 1)				1	48.000	0	0	0	48.000
Grn Total					246.300	0	0	0	246.300



RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
IDENTIFICACIÓN		DV	RAZON SOCIAL		CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 7172415		0	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		A	03	A.L. SURTA - 14-11	SUCURSIL	7112	Natural
MUN-DEP			DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1			CENTRO		7625589			LUJANARITZADIZ@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
PERIODO PENSION	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO
2022-04	2022-04	2022-04	2022-04	2022-04	2022-04	2022-04	2022-04	2022-04	2022-04
Nº AFILIADOS	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO
2	8618234637	Y	2022-05-15	2022-05-15	2022-05-15	2022-05-15	2022-05-15	2022-05-15	2022-05-15

EMPLEADO		NOVEDADES										PENSIÓN										SALUD				CCF		RIESGOS		TARIFA		PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo de Cot.		Sub. Tot. Cot.		Exento de Parafiscales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	RET	TDE	TAE	TAP	VTE	VTE	VAE	VAE	APV	VOT	EPST	APPT	AS	ES	CE	TE	NOMBRE	IBC	Cot	PRICOL	PRIGAR	HOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	AVIL	IBC	Cot.	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Cot.	Cot.	Total	Exento de Parafiscales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	CC 0769937	LILIANA ALVARADO	1.000.000												0		0	0	30	SINAF-P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
PERIODO PENSION	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO
2022-04	2022-04	2022-04	2022-04	2022-04	2022-04	2022-04	2022-04	2022-04	2022-04
Nº AFILIADOS	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO
2	8618234637	Y	2022-05-15	2022-05-15	2022-05-15	2022-05-15	2022-05-15	2022-05-15	2022-05-15

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
PERIODO PENSION	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO
2022-04	2022-04	2022-04	2022-04	2022-04	2022-04	2022-04	2022-04	2022-04	2022-04
Nº AFILIADOS	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO
2	8618234637	Y	2022-05-15	2022-05-15	2022-05-15	2022-05-15	2022-05-15	2022-05-15	2022-05-15

TOTALES IBC									
IBC PENSION	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO			
0	0	2.000.000	0	0	0	0			

TOTALES IBC									
IBC PENSION	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO			
0	0	2.000.000	0	0	0	0			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE												
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF				
NIT 6769937	9	JUAN ANTONIO GALINDO ALVARADO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	007	CALLE 59 A N° 7-21	TUNJA-BOYACA	743-6048	SI				
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION												
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor			
2022-04	2022-04	9435014703	9435014703	Y	2022/05/10	2022/05/20	BANCO BOGOTA	10	\$580,500			
RESUMEN DE PAGO												
RIESGO					CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)												
PROTECCION					230201	800,229,739	0	1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000
COLPATRIA ARP					14-4	860,002,183	9	1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500
NUEVA E.P.S.					EPS037	900,156,264	2	1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000
TOTAL								1	\$580,500	\$0	\$0	\$580,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
IDENTIFICACIÓN		DV	RAZÓN SOCIAL		CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN		ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CO 7172415		0	CESAR REINOLDO FIGUEROA BAEZ		I	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	7112		Natural
MUN-DEP			DIRECCIÓN				TELÉFONO	EMAIL			EVENTO DE PARAFISCALES
15-1			CRA 4B-11A-81				7401901	INSCHEFB@YAHOO.ES			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAJDO
2022-15	2022-05	23563392	1	2022-06-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	319.300	0	BANCOLOMBIA
2022-16	2022-06	23563392	ESTADO PLANILLA PAGO							
1	2022-06-15	23563392	Pasada							

1	23563502	2022-06-06	Pagada
---	----------	------------	--------

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
IDENTIFICACION		DV	RAZÓN SOCIAL		CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. EGO	TIPO DE EMPRESA
CC 7172415		0	CESARI HERNANDO FIGUEROA BMEZ		1	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	7112	Natural
MUN-DEP 15-1			DIRECCIÓN CRA 4B #1A 81		TELÉFONO 7401901			EMAIL INGEGHERB@VAHOOC.F3		EXENTO DE PARAFISCALES 02

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDADA
2022-06	2022-05	23583392	1	2022-06-15	TODCS LOS CENTROS	TODCS	TODCS	319.590	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	235833/02		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSION	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MOPA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP/Administradoras: 1)									
PORVENIR	230301	800224808	8	1	176.000	0	0	0	176.000
PS/Administradoras: 1)				1	176.000	0	0	0	176.000
SAMITAS	EPS/05	800251440	6	1	137.500	0	0	0	137.500
RP/Administradoras: 1)				1	137.500	0	0	0	137.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	5.800	0	0	0	5.800
					5.800	0	0	0	5.800
Gran Total					319.300	0	0	0	319.300

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

SISTEMA GENERAL DE SALUD

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

APORTES PARA FISCALES

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
\$ 138,700	\$ 34,700	\$ 60,400	\$ 34,700	\$ 268,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CG 7172415	0	CESAR HERNANDO FLORES BAEZ	A	08	POSITIVA - 14-28	SUCURSAL	7112	Natural	
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
15-1	CENTRO		7625588			LLAMARITZADIAZ@HOTMAIL.COM		N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO
2022-05	2022-05-01	2022-05-01	2022-05-01	2022-05-01	2022-05-01	2022-05-01	2022-05-01	2022-05-01	2022-05-01
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	ENTIDAD RECAUDADA
2	801824637	2022-05-01	Y	2022-05-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	93.000	Banco Agrario

EMPLEADO									
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE PAGO	NOVEDADES	DÍAS	PENSIÓN	SALUD	RIESGOS
1	CT 716937	VALERIO ALVARADO	1.000.000	R	0	0	0	0	0
2	CC 8992665	ROSALBA VILLASCO	1.000.000	R	0	0	0	0	0
TOTAL									
46.500									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE												
IDENTIFICACION		DV	RAZON SOCIAL		CLASE CODIGO		ARL	F. PRESENTACIÓN		ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC 7172415		0	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		A	08	POSITIVA - 14-28	SUCURSAL	7112		Natural	
MUN-DEP				DIRECCION		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
15-1				CENTRO		7625588		LLAMARITZADIAZ@HOTMAIL.COM		N		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO
2022-05	2022-05-01	2022-05-01	2022-05-01	2022-05-01	2022-05-01	2022-05-01	2022-05-01	2022-05-01	2022-05-01
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	ENTIDAD RECAUDADA
2	801824637	2022-05-01	Y	2022-05-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	93.000	Banco Agrario

TOTALES IBC									
IBC PENSIÓN	0	IBC SALUD	0	IBC RIESGOS	1.333.334	IBC CAJAS	0	IBC PARAF	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MOFA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP (Administradoras: 1)				2	93.000	0	0	0	93.000
ARL SUPA	14-11	890503790	5	2	93.000	0	0	0	93.000
Gran Total					93.000	0	0	0	93.000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Ciudad-Departamento	Exonerado SENA o ICBF
NT 6769937	9	JUAN ANTONIO GALINDO ALVARADO	TUNJA-BOYACA	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Identificación	Clave	Clase Aportante	Dirección	Exonerado SENA o ICBF
NT 6769937	9435809278	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CALLE 59 A N° 7-21	SI

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES														
EMPLEADO					NOVEDADES					PENSION				
No.	Identificación	Nombre	Ing	Ret	Lde	Tae	Idp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Ski	Ige	Una
1	6769937	GALINDO ALVARADO JUAN ANTONIO												
Total Afiliados(1)														

SALUD					CCF					RIESGOS				
Codigo	Dias	Aporte	IBC	Valor	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Valor	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Valor
14-4	30	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	14-4	30	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	14-4	30	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000
Total Afiliados(1)														

CONSULTA EMPLEADO

RAZON SOCIAL	CESAR HERMANO RIVERA BAEZ
IDENTIFICACION APORTANTE	CC-7172115
SUCURSAL	01
FECHA FAGO	2022-06-21
IDENTIFICACION EMPLEADO	CC-104926665
NOMBRE EMPLEADO	FABIAN SILVESTRE PONCE VELA
EPS	NOVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	FORVENIR
CAJA COMPENSACION	Unidad de Compensación Familiar de Boyaca COMFABOY
ARL	ARL SUR - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NUMERO PLANILLA	841803987
REFERENCIA PAGOPFN	869837783
TIPO PLANILLA	E
PERIODO PENSION	2022-05
PERIODO SALUD	2022-06
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Salario
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	2022-05-20

NO	Fecha PDG	RET	Fecha RET	TAE	TDE	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SUN	Fecha de pago	Fecha de fin	IOE	Fecha de inicio	Fecha de fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha VAC inicio	Fecha VAC fin	VCT	Fecha VCT inicio	Fecha VCT fin	IPL	Fecha IPL inicio	Fecha IPL fin
		X																										

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria	Aportante	Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subistencia	Valor no retenido
20	800.000	0,1600000	\$ 128.000	\$ 0	\$ 0	\$ 128.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPCO adicional	Intercesiones E.G	Libertad de Maternidad o
20	800.000	0,0400000	\$ 32.000	\$ 0	0	0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
20	800.000	0,0522000	\$ 4.200	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar	Sena	ICBF	ESAP	MIN DE EDUCACIÓN
20	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria
20	800.000	0,0400000	\$ 32.000	\$ 0	0,0000000

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
\$ 128.000	\$ 32.000	\$ 4.200	\$ 32.000	\$ 196.200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 6769937	9	JUAN ANTONIO GALINDO ALVARADO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		007	CALLE 59 A N° 7-21	TUNJA-BOYACA	743-0048	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05		9435809278		9435809278	Y	2022/06/09	2022/06/06	BANCO BOGOTA	0
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPATRIA ARP		14-4	860,002,183	9	1	\$10,500	\$0	\$0	\$320,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500
						\$250,000	\$0	\$0	\$250,000
						\$250,000	\$0	\$0	\$250,000
TOTAL					1	\$580,500	\$0	\$0	\$580,500

ANEXO 11.5 PROGRAMACION DE OBRA

CONTRATO 1036 DE 2021					
OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA					
Semestre 1, 2022					
O N D F E					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					
M A M J J					

OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Semestre 1, 2022											
						O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	J	J
14		Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frío alta duración metil-metacrilato 100% puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC-1360-1, para pasos peatonales - ETAPA 2	22 días	jue 21/04/22	vie 20/05/22												
15		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGÚN NORMA INVIAS - ETAPA 1	19 días	jue 21/04/22	mar 17/05/22												
16		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGÚN NORMA INVIAS - ETAPA 2	6 días	vie 13/05/22	vie 20/05/22												
17		Suministro e instalación de Señalización vial vertical Doble (DÚPLEX) en papel reflectivo 60 x 60 zona urbana, según especificaciones relacionadas en el Manual de Señalización vial adoptado por la resolución 1885 de 2015, numerales 2.2.2. y 2.1.6.2 (Inclu	5 días	jue 7/04/22	mié 13/04/22												
18		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito preventivas SP-47B, tamaño 60 X 60 cm. Elaboradas en lámina galvanizada Cal 16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo marca 3M) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostat	4 días	jue 7/04/22	mar 12/04/22												
19		Retiro de Señales Verticales (incluye pedestal y tablero) con entrega en la respectiva Entidad Territorial (incluye señales sencillas y Dúplex)	3 días	jue 7/04/22	lun 11/04/22												
20		Suministro e instalación señales verticales sr-38, lámina galvanizada reflectividad tipo XI, grado diamante al cubo, con pedestal	2 días	mar 12/04/22	mié 13/04/22												
21		SEÑALES PREVENTIVAS (SPI Y REGLAMENTARIAS (SR) 60 X 60 CM REFLECTIVO VERDE LIMON	5 días	jue 7/04/22	mié 13/04/22												

OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Semestre 1, 2022											
22		SEÑALES DE TRÁNSITO DIMENSIONES 60*75 CMS (DELINEADORES DE CURVA) SEGÚN NORMA INVIA	5 días	jue 7/04/22	mié 13/04/22												
23		SEÑALES DE TRÁNSITO 0.90*1.13 MTS (INFORMATIVAS) SEGÚN NORMA INVIA	5 días	jue 7/04/22	mié 13/04/22												
24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES	62 días	mar 4/01/22	jue 19/05/22												
25		Suministro e instalación de hitos (alto = 75 cm d=8 cm) de color amarillo - ETAPA 1	5 días	mar 4/01/22	mar 11/01/22												
26		Suministro e instalación de hitos (alto = 75 cm d=8 cm) de color amarillo - ETAPA 2	5 días	vie 13/05/22	jue 19/05/22												
27		Suministro e instalación de tachones 5 días 40*15*8 cm - ETAPA 1	5 días	mar 4/01/22	mar 11/01/22												
28		Suministro e instalación de tachones 5 días 40*15*8 cm - ETAPA 2	5 días	vie 13/05/22	jue 19/05/22												
29		ESTOPEROS D=10 CM H=25 CMS	1 día	vie 5/11/21	vie 5/11/21												
30		NO PREVISTOS	40 días	jue 24/03/22	vie 20/05/22												
31		NP-01 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE EN PINTURA ACRILICA, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 15 CMS SEGÚN NORMA INVIA (espesor seco mínimo 9 mils)	28 días	jue 7/04/22	mié 18/05/22												
32		NP-02 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE EN PINTURA DE TRAFICO ACRILICA, (Especor seco mínimo de 9 mils)	28 días	jue 7/04/22	mié 18/05/22												
33		NP-03 RETIRO DE DISPOSITIVOS DE 2 días SEGURIDAD BASE DE HITOS, BASE DE TACHONES	2 días	mié 11/05/22	jue 12/05/22												
34		NP-04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 5 días DE ESTOPEROS METALICOS D=10 CM H=2CMS (Incluye: Planta Eléctrica, Taladro, Broca, Aditivo Epóxico, y demás elementos para su correcta instalación).	5 días	jue 12/05/22	mié 18/05/22												
35		NP-05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 4 días DE CAPTAFAROS	4 días	jue 12/05/22	mar 17/05/22												

CONTRATO 1036 DE 2021

OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Semestre 1, 2022											
						O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	J	J
36	ES	NP-06 BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2CM DE ALTURA, CONSTRUÍDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA. [Elaboradas en lámina galvanizada Cal. 16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo)] pedestal elaborado en	5 días	jue 12/05/22	mié 18/05/22												
37	ES	NP-07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 1 día DE SEÑAL CHEVRON DE 40CM X90CM [Elaboradas en lámina galvanizada Cal. 16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo)] pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática].	1 día	jue 19/05/22	jue 19/05/22												
38	ES	NP-08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 1 día DE SEÑAL DOL DE 20CM X90CM [Elaboradas en lámina galvanizada Cal. 16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo)] pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática].	1 día	jue 19/05/22	jue 19/05/22												
39	ES	NP-09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 1 día DE SEÑAL PARA CICLORUTA - EN ANDÉN, [Elaboradas en lámina galvanizada Cal. 16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo)] pedestal elaborado en tubo de 2", pintura electrostática].	1 día	jue 19/05/22	jue 19/05/22												
40	ES	NP-10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 1 día DE SEÑAL PARA CICLORUTA - ANCLADA EN PUENTE VEHICULAR [Elaboradas en lámina galvanizada Cal. 16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo)] pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática].	1 día	jue 19/05/22	jue 19/05/22												

OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Semestre 1, 2022											
						O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	J	J
41		NP-11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 1 día DE SEÑAL TIPO DELINEADOR DE CURVA 60CM X 75CM - ANCLADA EN PUENTE VEHICULAR. (Elaboradas en lámina galvanizada Cal. 16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura elect	1 día	jue 19/05/22	jue 19/05/22												
42		NP-12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 1 día DE SEÑAL PREVENTIVA O REGLAMENTARIA DE 60CM X 60CM - ANCLADA EN PUENTE VEHICULAR. (Elaboradas en lámina galvanizada Cal. 16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura	1 día	jue 19/05/22	jue 19/05/22												
43		NP-13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 1 día DE SEÑAL INFORMATIVA DE 1.77CM X 0.44CM (Elaboradas en lámina galvanizada Cal. 16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática	1 día	jue 19/05/22	jue 19/05/22												
44		NP-14 SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H-0.40 MTS - A-0.2 MTS, CONCRETO DE 2500 PSI	10 días	jue 24/03/22	mié 6/04/22												
45		NP-15 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)	10 días	jue 24/03/22	mié 6/04/22												
46		NP-16 CORTE DE PAVIMENTO ARTICULADO EN ADOQUIN DE ARCILLA	10 días	jue 24/03/22	mié 6/04/22												
47		FIN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	0 días	vie 20/05/22	vie 20/05/22												
48		FIN DEL CONTRATO	0 días	vie 20/05/22	vie 20/05/22												

Tareas	Todos
--------	-------

			Datos	
Año	Trimestre	Semana	Costo	Costo acumulado
2021	T4	Semana 44	\$ 105.139,60	\$ 105.139,60
		Semana 45	\$ 525.698,00	\$ 630.837,60
		Semana 46	\$ 420.558,40	\$ 1.051.396,00
		Semana 47	\$ 17.995.085,18	\$ 19.046.481,18
		Semana 48	\$ 17.995.085,18	\$ 37.041.566,36
		Semana 49	\$ 16.653.892,15	\$ 53.695.458,51
		Semana 50	\$ 23.337.824,61	\$ 77.033.283,12
		Semana 51	\$ 33.419.662,32	\$ 110.452.945,44
		Semana 52	\$ 33.419.662,32	\$ 143.872.607,77
		Total T4		\$ 143.872.607,76
Total 2021			\$ 143.872.607,76	\$ 143.872.607,77
2022	T1	Semana 52	\$ -	\$ 143.872.607,77
		Semana 1	\$ 45.974.973,29	\$ 189.847.581,06
		Semana 2	\$ 30.989.680,83	\$ 220.837.261,89
		Semana 3	\$ 35.278.201,03	\$ 256.115.462,92
		Semana 4	\$ 28.222.560,83	\$ 284.338.023,75
		Semana 5	\$ -	\$ 284.338.023,75
		Semana 6	\$ -	\$ 284.338.023,75
		Semana 7	\$ -	\$ 284.338.023,75
		Semana 8	\$ -	\$ 284.338.023,75
		Semana 9	\$ -	\$ 284.338.023,75
		Semana 10	\$ -	\$ 284.338.023,75
		Semana 11	\$ 28.222.560,83	\$ 312.560.584,58
		Semana 12	\$ 28.294.946,03	\$ 340.855.530,61
	Semana 13	\$ 17.464.078,85	\$ 358.319.609,46	
	Total T1		\$ 214.447.001,69	\$ 358.319.609,46
	T2	Semana 14	\$ 45.656.329,26	\$ 403.975.938,73
		Semana 15	\$ 69.214.774,62	\$ 473.190.713,34
		Semana 16	\$ 59.217.667,22	\$ 532.408.380,55
		Semana 17	\$ 84.751.028,18	\$ 617.159.408,73
		Semana 18	\$ 84.751.028,18	\$ 701.910.436,91
Semana 19		\$ 115.092.305,21	\$ 817.002.742,12	
Semana 20		\$ 133.635.787,88	\$ 950.638.530,00	
Total T2		\$ 592.318.920,55	\$ 950.638.530,00	
Total 2022			\$ 806.765.922,24	\$ 950.638.530,00
Total general			\$ 950.638.530,00	\$ 950.638.530,00

ANEXO 11.6
CONTROL DE CALIDAD A LOS MATERIALES
UTILIZADOS.
FICHAS TECNICAS PINTURAS
CERTIFICADOS DE CALIDAD PINTURAS
FICHAS TECNICAS DISPOSITIVOS DE
REGULACION

Ficha de datos de seguridad

Pintura GMPAINT Base Solvente Blanca Solventraffic

Sección 1: Identificación del producto

- | | |
|---|---|
| 1.1. Identificación del producto | Pintura GMPAINT Base Solvente Blanca Solventraffic |
| 1.2. Otros nombres o sinónimos | Pintura Base Solvente blanca
Código: 34001023
34004023 |
| 1.3. Uso recomendado del producto químico y restricciones | Pintura Base Solvente Blanca para demarcación vial sobre pavimento y concreto. No recomendada para aplicaciones verticales o arquitectónicas. |
| 1.4. Datos sobre el fabricante |  <p>GMP Productos Químicos S.A
Cr 52 # 7 Sur-96 Medellín/ Colombia
Teléfono: +574 444 66 56. Fax: 375 50 00
www.gmp.com.co</p> |
| 1.5. Número de teléfono para emergencias | Centro de Información de Sustancias químicas, Emergencias y Medio Ambiente (CISTEMA)
018000 511414; servicio para todo el país 24 horas |

Sección 2: Peligros

Clasificación de Peligros según el SGA/ONU (acorde con la regulación EC 1272/2008):

Indicaciones de Peligro

Líquido inflamable. Categoría 3 - H226
 Toxicidad aguda oral. Categoría 4 - H302
 Peligro por aspiración. Categoría 1 - H304
 Irritación cutánea. Categoría 2 - H315
 Irritación ocular. Categoría 2 - H320
 Carcinogenicidad. Categoría 2 - H360
 Toxicidad para la reproducción - Feto. Categoría 1 - H360
 Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única. Categoría 3 - H335
 Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas. Categoría 2 - H373

Indicaciones de Peligro

H226 - Peligro líquido y vapores inflamables
 H335 - Puede irritar las vías respiratorias
 H302 - Nocivo en caso de ingestión
 H315 - Provoca irritación cutánea
 H360 - Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto
 H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas y repetidas

Consejos de prudencia

P201 - Procurarse las instrucciones antes de uso
 P202 - No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad
 P210 - Mantener alejado del calor/de chispa/ de llamas al descubierto/de superficies calientes. No fumar
 P233 - Mantener el recipiente herméticamente cerrado
 P240 - Toma de tierra/entace equipotencial del recipiente y del equipo receptor
 P241 - Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/... antideflagrante
 P242 - No utilizar herramientas que produzcan chispas
 P243 - Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas
 P260 - No respirar vapores
 P261 - Evitar respirar polvos/gases/vapores
 P271 - Utilizar solo al aire libre o en un lugar bien ventilado

P264 - Lavarse cuidadosamente después de la manipulación
 P280 - Usar guantes y equipo de protección para los ojos/la cara

Intervención

P303+P361+P353 - En caso de contacto con la piel (o el pelo): quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. enjuagar la piel con agua/ducharse
 P370/P378 - En caso de incendio utilizar medios apropiados para la extinción.
 P314- En caso de ingestión llamar inmediatamente al médico
 P321 - Tratamiento específico
 P305+P351+P338 - En caso de contacto con los ojos enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado
 P337+P313 - Si la irritación ocular persiste consultar al médico.

Almacenamiento

P403+P235 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco
 P405 - Guardar bajo llave

Eliminación

P501 - Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación local.

Pictogramas SGA



Palabra de Advertencia
 PELIGRO

Sección 3. Composición

Componentes Peligrosos según SGA/ONU

Componente	N° CAS		Contenido (%)
Xileno	1330-20-7	Liq. Flam 3; Tox.Agud. 4; Irr cutan. 2; Irritac. Ocul. 2; STOT SE 3; STOT RE 2; Tox. Asp. 1; H226, H312, H315, H319, H335, H373, H304	Max 20
Eter de petroleo	64742-82-1	Liq. Flam 3; H226; Pel. Asp. 1, H304	Max 0.5
Bis(2-etilhexil)ftalato	117-81-7	Tox. Rep. 1B H360;	Max 2

Sección 4. Medidas de Primeros Auxilios

Inhalación: Los vapores pueden ocasionar irritación del tracto respiratorio, igualmente pueden provocar mareos o sofocación. Trasladar a la persona al aire fresco. Si no respira administrar respiración artificial; si lo hace con dificultad suministrar oxígeno. Mantener a la víctima abrigada y en reposo. Buscar atención médica inmediatamente.

Ingestión: Al ser ingerido puede producir irritación del tracto gastrointestinal, náuseas y vómito. Lavar la boca con abundante agua si la víctima está consciente. No inducir el vómito; si éste se presenta, inclinar a la víctima hacia adelante. Buscar atención médica inmediatamente. Si está inconsciente NO suministre nada vía oral

Contacto con la Piel: Puede causar irritación con enrojecimiento. La sensibilidad a algunos de sus componentes puede causar alergia. Retirar la ropa y calzado contaminados, retirar el exceso de pintura con papel o paño seco. Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón; si la irritación persiste, buscar atención médica de inmediato.

Contacto con los Ojos: Al contacto con los ojos puede ocasionar irritación severa. Produce enrojecimiento,

lagrimeo y visión borrosa. Lavar con abundante agua mínimo durante 15 minutos. Levantar y separar los párpados para asegurar la remoción del químico. Si la irritación persiste repetir el lavado y buscar atención médica especializada.

Nota para el médico: No administre sustancias neutralizantes que puedan generar reacción exotérmica y lesionar más los tejidos. Una intubación endotraqueal podría ser necesaria para el caso de un edema de glotis. Para individuos con inhalación significativa por exposición, controle contaminación en la sangre y aplique rayos x al pecho.

Sección 5: Lucha contra incendios

Medios de Extinción Adecuados: Polvo químico seco, CO2, rocío de agua o espuma regular.

Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad: No se conocen

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla: Líquido inflamable. Volátil. El envase puede ocasionar sobrepresión interna por vapores al ser calentado; los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Las fugas de éste producto pueden ocasionar incendio o explosión al contacto con fuentes de ignición.

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios: No almacenar o manipular el producto cerca del fuego o una superficie caliente. Se puede incendiar por calor, chispas o llamas. Mantener tapados los recipientes que contienen pintura y durante su manipulación o almacenamiento, debe procurarse ventilación natural o mecánica en el lugar.

Incendio pequeño: se puede controlar con polvo químico seco, CO2, espuma regular. Utilizar rocío de agua y no aplicar chorros directos. Si es posible, mover del sitio el producto en riesgo. Utilizar protección respiratoria SCBA. Evacuar el área por lo menos 300 metros y ubicarse a favor del viento. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección

Sección 6: Medidas de control de derrames y fugas

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: Eliminar toda fuente de ignición. El equipo que se use durante el manejo del producto deberá estar conectado eléctricamente a tierra. No caminar sobre material derramado.

Si es posible sin incurrir en riesgo, detener la fuga. No permitir que caiga en fuentes de agua y alcantarillado, sótanos o áreas confinadas. Evacuar o aislar el área de peligro y ubicarse a favor del viento. Usar equipo de protección personal. Absorber el derrame con arena o material inerte y depositarlo en un recipiente limpio, seco y con cierre hermético. Lavar el área con agua a presión.

Precauciones relativas al medio ambiente: Usar siempre protección personal así sea corta la exposición o la actividad que realice con el producto. Para su manipulación, debe utilizarse protección visual tipo gafa de seguridad o mono gafa sello hermético y protección respiratoria contra vapores orgánicos. Para trabajos en lugares cerrados, asegurar una buena ventilación natural o mecánica. Mantener estrictas normas de higiene, no fumar, ni comer en el sitio de trabajo. Conocer la ubicación del equipo de lavado (lava ojos). Leer las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto. Rotular los recipientes adecuadamente. Tener a mano, en áreas de almacenamiento y durante el transporte, las hojas de seguridad de los productos.

Métodos y material de contención y de limpieza: Cantidades mayores - Recoger de forma mecánica (evacuar por bomba). Tomar en consideración la protección contra explosión. Pequeñas cantidades y/o restos: Absorber con aglomerantes de líquido (por ejemplo arena seca o serrín). Eliminar en conformidad con los reglamentos.

Sección 7: Almacenamiento y manipulación

Manipulación: Usar siempre protección personal así sea corta la exposición o la actividad que realice con el producto. Para su manipulación, debe utilizarse protección visual tipo gafa de seguridad o mono gafa sello hermético y protección respiratoria contra vapores orgánicos.

Para trabajos en lugares cerrados, asegurar una buena ventilación natural o mecánica. Mantener estrictas normas de higiene, no fumar, ni comer en el sitio de trabajo. Conocer la ubicación del equipo de lavado (lava ojos). Leer las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto. Rotular los recipientes adecuadamente. Tener a mano, en áreas de almacenamiento y durante el transporte, las hojas de seguridad de los productos.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades: En lugares ventilados, frescos y secos, temperatura ambiente y lejos de la humedad y de fuentes de calor e ignición. Rotular los recipientes adecuadamente.

Sección 8: Control de exposición y protección personal

Componente	CAS Nº	% en peso	OSHA		ACGIH	
			TWA	STEL	TWA	STEL
Xileno (mezcla de isómeros)	1330-20-7	0 - 40	100ppm	150ppm	100ppm	150ppm

Protección Respiratoria: Usar un equipo respiratorio y de protección adecuada, con suficiente aire (respirador aprobado por NIOSH/MSHA).

Protección de las Manos: Guantes de nitrilo, neopreno o PVC. Después del trabajo procurar limpieza y cuidado a fondo de la piel. Los guantes protectores se deberán sustituir con regularidad, especialmente después de un contacto prolongado con el producto.

Protección de la Piel y del Cuerpo: Usar vestidos de protección adecuados. Guantes y vestidos en PVC darán protección muy limitada. Materiales como el Neopreno y PVA ofrecen mejoras en la protección. Materiales de múltiples capas darán la mejor protección. Materiales en PVA no son adecuados para usos que tengan que ver con manejo de agua. Los vestidos de protección deberán ser seleccionados y usados de acuerdo con Pautas para Selección de Vestuario en Protección Química publicado por ACGIH.

Sección 7: Propiedades físicas y químicas.

Propiedad	Resultado
Estado Físico	Líquido
Color	Blanco
Olor	Característico
Punto de Fusión	Sin Datos Disponibles
Punto de Ebullición	Sin Datos Disponibles
Inflamabilidad	Si
Límites inferior y superior de Explosión	No Aplica
Punto de Inflamación	21°C
Temperatura de Ignición Espontánea	Sin Datos Disponibles
Temperatura de Descomposición	Sin Datos Disponibles
pH	10
Viscosidad	75 – 95 KU
Solubilidad	Insoluble en agua, parcial en xilol
Coeficiente de reparto n – octanol/agua	Sin Datos Disponibles
Presión de Vapor	Sin Datos Disponibles
Densidad	1.64 g/ml
Densidad de Vapor relativa	Sin Datos Disponibles

Sección 8: Estabilidad y reactividad.

Estabilidad Química: No hay descomposición si se utiliza conforme a las instrucciones.

Posibilidades de Reacciones Peligrosas: Ninguna

Condiciones que deben evitarse: Calor y llamas

Materiales Incompatibles: Agentes Oxidantes Fuertes

Productos de Descomposición peligrosos: Ninguno si se utiliza apropiadamente

Sección 9: Información toxicológica.

- Xileno:

Carcinogenicidad:

IARC: 2B – GRUPO 2B : Posiblemente carcinogénica para humanos (Etilbenceno)

IARC: 3-GRUPO 3: No clasificado como carcinogénico para humanos 8Xileno)

- Eter de petróleo:

Toxicidad:

Inhalación, contacto ocular, contacto con la piel.

Órganos específicos: ojos, piel, sistema respiratorio, sistema nervioso central

Síntomas: Síntomas de irritación en el tracto respiratorio, absorción,

Toxicidad aguda estimada: >20 mg/L; 4 h

Toxicidad dérmica aguda: >2,000mg/Kg

Irritación cutánea:

Efecto desecante que genera una piel áspera y agrietada.

Dermatitis

Irritación ocular: irritación leve

Toxicidad específica en determinados órganos- única exposición:

La sustancia o mezcla no es clasificada como tóxica en determinados órganos- única exposición

Toxicidad específica en determinados órganos- exposición repetida:

La sustancia o mezcla no es clasificada como tóxica en determinados órganos- exposición repetida

Peligro por aspiración:

La aspiración puede causar edema pulmonar y neumonía.

Carcinogenicidad:

IARC: 2B – GRUPO 2B : Posiblemente carcinogénica para humanos (Etilbenceno)

- Bis(2-etilhexil)ftalato:

Toxicidad aguda:

LD50 Oral – Rata- 30,000 mg/Kg (Bis(2-etilhexil)ftalato)

LD50 DERMICO – Conejo -25,000 mg/Kg(Bis(2-etilhexil)ftalato)

Corrosión /Irritación cutánea:

Piel - Conejo(Bis(2-etilhexil)ftalato)

Resultado: leve irritación ocular – 24h

Irritación ocular/daño ocular serio(Bis(2-etilhexil)ftalato):

Resultado: leve irritación ocular – 24h

Sensación respiratoria ó cutánea:

Test de Maximización – Cerdo de Guinea (Bis(2-etilhexil)ftalato)

Resultado: No causa irritación cutánea (OECD TEST Guideline 406)

Carcinogenicidad:

Este producto o contiene un componente reportado como con posible clasificación de carcinogenicidad (Bis(2-etilhexil)ftalato)

IARC: 2B- GRUPO 2B: Posiblemente carcinogénico para humanos (Bis(2-etilhexil)ftalato)

Toxicidad en la reproducción:

Puede causar malformación congénita en el feto (Bis(2-etilhexil)ftalato)

Se presume como tóxico en la reproductibilidad (Bis(2-etilhexil)ftalato)

Puede causar desórdenes reproductivos (Bis(2-etilhexil)ftalato)

Sección 12: Información toxicológica

- Xileno:

No hay información disponible

- Eter de petróleo:

No hay información disponible

- Bis(2-etilhexil)ftalato:

Toxicidad en peces:

LC50 – Pimephales promelas (carpa cabezona)- >0.67 mg/l – 96h (Bis(2-etilhexil)ftalato)

LC50 – Oncorhynchus mykiss (trucha arcoíris)- >0.32 mg/l – 96h (Bis(2-etilhexil)ftalato)

LC50 – Cyprinodon variegatus (sheepshead minnow)- >0.17 mg/l – 96h (Bis(2-etilhexil)ftalato)

LC50 – Lepomis macrochirus (bluegill)- >0.20 mg/l – 96h (Bis(2-etilhexil)ftalato)

NOEC – Otros peces - >0.3 mg/l – 96h (Bis(2-etilhexil)ftalato)

Toxicidad para dafnia y otros invertebrados acuáticos:

Inmovilización EC50-Dafnia magna (pulga de agua) - >0.16 mg/l – 48h (Bis(2-etilhexil)ftalato)

Persistencia y degradabilidad:

Biodegradabilidad – Resultado: fácilmente biodegradable
(OECD Test guideline 301)

Bioacumulación potencial:

Bioacumulación: Oncorhynchus mykiss (trucha arcoíris) – 100d

Mobilidad en suelo

No hay datos disponibles

Resultados de evaluación PBT y vPvB

Esta sustancia o mezcla no contiene componentes considerados como persistentes, bioacumulables y tóxicos (PBT), o muy persistentes y muy bioacumulativos (vPvB) a niveles de 0.1% o mayores.

Sección 13: Información sobre el medio ambiente

General: Evítese su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido/recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos, conforme a la reglamentación local / regional / nacional o internacional.

Precauciones especiales: Residuos peligrosos debido al contenido en metales pesados.

Sección 14: Información sobre el transporte

Transporte Terrestre ADR/RID

Número ONU: 1263

Clase : 3

Contaminante Marino: No

Grupo de Embalaje: III

Transporte Acuático ADN/IMDG

Número ONU: 1263

Clase : 3

Contaminante Marino: No

Grupo de Embalaje: III

Transporte Aéreo IATA:

Número ONU: 1263

Clase: 3

Contaminante Marino: No

Grupo de Embalaje: III



Pictogramas para transporte
Palabra de advertencia: PELIGRO

SECCIÓN 9: REGLAMENTACIÓN

Decreto 1079 de 2015

Norma Técnica Colombiana (NTC) 1692

Norma Técnica Colombiana (NTC) 4435

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Legislación Nacional:

No existen más datos relevantes disponibles

SECCIÓN 10: OTRAS INFORMACIONES

Fecha de Revisión : Marzo de 2019

Versión: 2.0

Últimas modificaciones: Se ajusta formato de acuerdo a SGA Sistema Globalmente Armonizado.

Esta hoja de datos de seguridad del material (MSDS) está preparada por GMP Productos Químicos La información que contiene se ofrece de buena fe y se considera exacta a la fecha de preparación de esta MSDS. Esta MSDS se provee sólo con el propósito de brindar información relativa a salud, seguridad y medio ambiente. No se proporciona ninguna garantía explícita ni implícita. Las precauciones de salud y seguridad pueden no ser adecuadas para todos los individuos y/o situaciones. Es obligación del usuario evaluar y usar este producto en forma segura y acatar todas las leyes y reglamentos aplicables.

---FIN DE LA HDS---

Ficha de datos de seguridad

Pintura GMPAINT Base Solvente Negra Solventraffic

Sección 1: Identificación del producto

1.1. Identificación del producto	Pintura GMPAINT Base Solvente Negra Solventraffic
1.2. Otros nombres o sinónimos	Pintura Base Solvente Negra Código: 34001065 34004065
1.3. Uso recomendado del producto químico y restricciones	Pintura Base Solvente Negra para demarcación vial sobre pavimento y concreto. No recomendada para aplicaciones verticales o arquitectónicas.
1.4. Datos sobre el fabricante	 GMP Productos Químicos S.A. Cr 52 # 7 Sur-96 Medellín/ Colombia Teléfono: +574 444 66 56. Fax: 375 50 00 www.gmp.com.co
1.5. Número de teléfono para emergencias	Centro de Información de Sustancias químicas, Emergencias y Medio Ambiente (CISTEMA) 018000 511414; servicio para todo el país 24 horas

Sección 2: Identificación de peligros

Clasificación de Peligros según el SGA/ONU (acorde con la regulación EC 1272/2008):

Indicaciones de Peligro

Líquido inflamable. Categoría 3 - H226
Toxicidad aguda oral. Categoría 4 - H302
Peligro por aspiración. Categoría 1- H304
Iritación cutánea. Categoría 2 - H315
Iritación ocular. Categoría 2 - H320
Carcinogenicidad. Categoría 2 - H360
Toxicidad para la reproducción – Feto. Categoría 1 - H360
Toxicidad específica en determinados órganos – exposición única. Categoría 3 - H335
Toxicidad específica en determinados órganos – exposiciones repetidas. Categoría 2 - H373

Indicaciones de Peligro

H226 - Peligro líquido y vapores inflamables
H335 – Puede irritar las vías respiratorias
H302 - Nocivo en caso de ingestión
H315 - Provoca irritación cutánea
H360 - Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto
H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas y repetidas

Consejos de prudencia

P201 - Procurarse las instrucciones antes de uso
P202 - No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad
P210 - Mantener alejado del calor/de chispa/ de llamas al descubierto/de superficies calientes. no fumar
P233 - Mantener el recipiente herméticamente cerrado
P240 - Toma de tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor
P241 - Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/... antideflagrante
P242 - No utilizar herramientas que produzcan chispas
P243 - Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas
P260 - No respirar vapores
P261-Evitar respirar polvos/gases/vapores
P271-Utilizar solo al aire libre o en un lugar bien ventilado

P264 - Lavarse cuidadosamente después de la manipulación
 P280 - Usar guantes y equipo de protección para los ojos/la cara

Intervención

P303+P361+P353 - En caso de contacto con la piel (o el pelo): quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse
 P370/P378 - En caso de incendio utilizar medios apropiados para la extinción.
 P314 - En caso de ingestión llamar inmediatamente al médico
 P321 - Tratamiento específico
 P305+P351+P338 - En caso de contacto con los ojos enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado
 P337+P313 - Si la irritación ocular persiste consultar al médico.

Almacenamiento

P403+P235 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco
 P405 - Guardar bajo llave

Eliminación

P501 - Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación local.

Pictogramas SGA



Palabra de Advertencia
PELIGRO

Sección 3: Composición

Componentes Peligrosos según SGA/ONU

Componente	Nº CAS	Contenido (%)
Xileno	1330 - 20 - 7	Liq. Flam 3; Tox.Agud. 4; Irr cutan. 2; Irritac. Ocul. 2; STOT SE 3; STOT RE 2; Tox. Asp. 1; H226, H312, H315, H319, H335, H373, H304
Eter de petroleo	64742 - 82 - 1	Liq. Flam 3; H226; Pel. Asp. 1, H304
Bis(2-etilhexil)ftalato	117 - 81 - 7	Tox. Rep. 1B H360;

Sección 4: Medidas de primeros auxilios

Inhalación: Los vapores pueden ocasionar irritación del tracto respiratorio, igualmente pueden provocar mareos o sofocación. Trastadar a la persona al aire fresco. Si no respira administrar respiración artificial; si lo hace con dificultad suministrar oxígeno. Mantener a la víctima abrigada y en reposo. Buscar atención médica inmediatamente.

Ingestión: Al ser ingerido puede producir irritación del tracto gastrointestinal, náuseas y vómito. Lavar la boca con abundante agua si la víctima está consciente. No inducir el vómito; si éste se presenta, inclinar a la víctima hacia adelante. Buscar atención médica inmediatamente. Si está inconsciente NO suministre nada vía oral

Contacto con la Piel: Puede causar irritación con enrojecimiento. La sensibilidad a algunos de sus componentes puede causar alergia. Retirar la ropa y calzado contaminados, retirar el exceso de pintura con papel o paño seco. Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón; si la irritación persiste, buscar atención médica de inmediato.

Contacto con los Ojos: Al contacto con los ojos puede ocasionar irritación severa. Produce enrojecimiento, lagrimeo y visión borrosa. Lavar con abundante agua mínimo durante 15 minutos. Levantar y separar los

párpados para asegurar la remoción del químico. Si la irritación persiste repetir el lavado y buscar atención médica especializada.

Nota para el médico: No administre sustancias neutralizantes que puedan generar reacción exotérmica y lesionar más los tejidos. Una intubación endo-traqueal podría ser necesaria para el caso de un edema de glotis. Para individuos con inhalación significativa por exposición, controle contaminación en la sangre y aplique rayos x al pecho.

Señales de Peligro/Incendios

Medios de Extinción Adecuados: Polvo químico seco, CO2, rocío de agua o espuma regular.

Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad: No se conocen

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla: Líquido inflamable. Volátil. El envase puede ocasionar sobrepresión interna por vapores al ser calentado; los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Las fugas de éste producto pueden ocasionar incendio o explosión al contacto con fuentes de ignición.

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios: No almacenar o manipular el producto cerca del fuego o una superficie caliente. Se puede incendiar por calor, chispas o llamas. Mantener tapados los recipientes que contienen pintura y durante su manipulación o almacenamiento, debe procurarse ventilación natural o mecánica en el lugar.

Incendio pequeño: se puede controlar con polvo químico seco, CO2, espuma regular. Utilizar rocío de agua y no aplicar chorros directos. Si es posible, mover del sitio el producto en riesgo. Utilizar protección respiratoria SCBA. Evacuar el área por lo menos 300 metros y ubicarse a favor del viento. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección

Señales de Peligro/Incendio/Ataque accidental

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: Eliminar toda fuente de ignición. El equipo que se use durante el manejo del producto deberá estar conectado eléctricamente a tierra. No caminar sobre material derramado.

Si es posible sin incurrir en riesgo, detener la fuga. No permitir que caiga en fuentes de agua y alcantarillado, sótanos o áreas confinadas. Evacuar o aislar el área de peligro y ubicarse a favor del viento. Usar equipo de protección personal. Absorber el derrame con arena o material inerte y depositarlo en un recipiente limpio, seco y con cierre hermético. Lavar el área con agua a presión.

Precauciones relativas al medio ambiente: Usar siempre protección personal así sea corta la exposición o la actividad que realice con el producto. Para su manipulación, debe utilizarse protección visual tipo gafa de seguridad o mono gafa sello hermético y protección respiratoria contra vapores orgánicos. Para trabajos en lugares cerrados, asegurar una buena ventilación natural o mecánica. Mantener estrictas normas de higiene, no fumar, ni comer en el sitio de trabajo. Conocer la ubicación del equipo de lavado (lava ojos). Leer las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto. Rotular los recipientes adecuadamente. Tener a mano, en áreas de almacenamiento y durante el transporte, las hojas de seguridad de los productos.

Métodos y material de contención y de limpieza: Cantidades mayores - Recoger de forma mecánica (evacuar por bomba). Tomar en consideración la protección contra explosión. Pequeñas cantidades y/o restos: Absorber con aglomerantes de líquido (por ejemplo arena seca o serrín). Eliminar en conformidad con los reglamentos

Señales de Peligro/Ataque accidental/Ataque accidental

Manipulación: Usar siempre protección personal así sea corta la exposición o la actividad que realice con el producto. Para su manipulación, debe utilizarse protección visual tipo gafa de seguridad o mono gafa sello hermético y protección respiratoria contra vapores orgánicos.

Para trabajos en lugares cerrados, asegurar una buena ventilación natural o mecánica. Mantener estrictas normas de higiene, no fumar, ni comer en el sitio de trabajo. Conocer la ubicación del equipo de lavado (lava ojos). Leer las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto. Rotular los recipientes adecuadamente. Tener a mano, en áreas de almacenamiento y durante el transporte, las hojas de seguridad de los productos.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades: En lugares ventilados, frescos y secos, temperatura ambiente y lejos de la humedad y de fuentes de calor e ignición. Rotular los recipientes adecuadamente.

Sección 2: Componentes, Exposición y Peligrosidad

Componente	CAS N°	% en peso	OSHA		ACGIH	
			TWA	STEL	TWA	STEL
Xileno (mezcla de isómeros)	1330-20-7	0 - 40	100ppm	150ppm	100ppm	150ppm

Protección Respiratoria: Usar un equipo respiratorio y de protección adecuada, con suficiente aire (respirador aprobado por NIOSH/MSHA).

Protección de las Manos: Guantes de nitrilo, neopreno o PVC. Después del trabajo procurar limpieza y cuidado a fondo de la piel. Los guantes protectores se deberán sustituir con regularidad, especialmente después de un contacto prolongado con el producto.

Protección de la Piel y del Cuerpo: Usar vestidos de protección adecuados. Guantes y vestidos en PVC darán protección muy limitada. Materiales como el Neopreno y PVA ofrecen mejoras en la protección. Materiales de múltiples capas darán la mejor protección. Materiales en PVA no son adecuados para usos que tengan que ver con manejo de agua. Los vestidos de protección deberán ser seleccionados y usados de acuerdo con pautas para Selección de Vestuario en Protección Química publicado por ACGIH.

Sección 3: Propiedades Físicas y Químicas

Propiedad	Resultado
Estado Físico	Líquido
Color	Negro
Olor	Característico
Punto de Fusión	Sin Datos Disponibles
Punto de Ebullición	Sin Datos Disponibles
Inflamabilidad	Si
Límites inferior y superior de Explosión	No Aplica
Punto de Inflamación	21°C
Temperatura de Ignición Espontánea	Sin Datos Disponibles
Temperatura de Descomposición	Sin Datos Disponibles
pH	10
Viscosidad	75 – 95 KU
Solubilidad	Insoluble en agua, parcial en xilol
Coefficiente de reparto n – octanol/agua	Sin Datos Disponibles
Presión de Vapor	Sin Datos Disponibles
Densidad	5.9 Kg/gal
Densidad de Vapor relativa	Sin Datos Disponibles

Sección 4: Estabilidad y Reactividad

Estabilidad Química: No hay descomposición si se utiliza conforme a las instrucciones.

Posibilidades de Reacciones Peligrosas: Ninguna

Condiciones que deben evitarse: Calor y Llamas

Materiales Incompatibles: Agentes Oxidantes Fuertes

Productos de Descomposición peligrosos: Ninguno si se utiliza apropiadamente

Sección 5: Información sobre Peligrosidad

- Xileno:

Carcinogenicidad:

IARC: 2B – GRUPO 2B : Posiblemente carcinogénica para humanos (Etilbenceno)
IARC: 3-GRUPO 3: No clasificada como carcinogénica para humanos (Xileno)

- Eter de petróleo:

Toxicidad:

Inhalación, contacto ocular, contacto con la piel.

Órganos específicos: ojos, piel, sistema respiratorio, sistema nervioso central

Síntomas: Síntomas de irritación en el tracto respiratorio, absorción

Toxicidad aguda estimada: >20 mg/L; 4 h

Toxicidad dérmica aguda: >2,000mg/Kg

Irritación cutánea:

Efecto desecante que genera una piel áspera y agrietada.

Dermatitis

Irritación ocular: irritación leve

Toxicidad específica en determinados órganos- única exposición:

La sustancia o mezcla no es clasificada como tóxica en determinados órganos- única exposición

Toxicidad específica en determinados órganos- exposición repetida:

La sustancia o mezcla no es clasificada como tóxica en determinados órganos- exposición repetida

Peligro por aspiración:

La aspiración puede causar edema pulmonar y neumonía.

Carcinogenicidad:

IARC: 2B – GRUPO 2B : Posiblemente carcinogénica para humanos (Etilbenceno)

- Bis(2-etilhexil)ftalato:

Toxicidad aguda:

LD50 Oral – Rata- 30,000 mg/Kg (Bis(2-etilhexil)ftalato)

LD50 DERMICO – Conejo -25,000 mg/Kg(Bis(2-etilhexil)ftalato)

Corrosión /Irritación cutánea:

Piel - Conejo(Bis(2-etilhexil)ftalato)

Resultado: leve irritación ocular – 24h

Irritación ocular/daño ocular serio (Bis(2-etilhexil)ftalato):

Resultado: leve irritación ocular – 24h

Sensación respiratoria ó cutánea:

Test de Maximización – Cerdo de Guinea (Bis(2-etilhexil)ftalato)

Resultado: No causa irritación cutánea (OECD TEST Guideline 406)

Carcinogenicidad:

Este producto e o contiene un componente reportado como con posible clasificación de carcinogenicidad (Bis(2-etilhexil)ftalato)

IARC: 2B- GRUPO 2B: Posiblemente carcinogénica para humanos (Bis(2-etilhexil)ftalato)

Toxicidad en la reproducción:

Puede causar malformación congénita en el feto (Bis(2-etilhexil)ftalato)

Se presume como tóxico en la reproductibilidad (Bis(2-etilhexil)ftalato)

Puede causar desórdenes reproductivos (Bis(2-etilhexil)ftalato)

- Tetraóxido de Trihierro

Toxicidad aguda:

- LD50 Oral – Rata- 5,000 mg/Kg (Tetraóxido de Trihierro)

Corrosión /Irritación cutánea:

Piel – Conejo (Tetraóxido de Trihierro)

Resultado: no hay irritación

Irritación ocular/daño ocular serio (Tetraóxido de Trihierro)

Resultado: no hay irritación ocular

Sensación respiratoria ó cutánea:

Test de Maximización – Cerdo de Guinea (Tetraóxido de Trihierro)

Resultado: No causó irritación cutánea

Carcinogenicidad:

IARC: Ningún componente de este producto presenta probabilidad a niveles mayores o iguales a 0,1%, posible o confirmado en humanos.

Toxicidad en la reproducción:

No hay datos disponibles

Sección 12: Información sobre toxicología

- Xileno:

No hay información disponible

- Eter de petróleo:

No hay información disponible

- Bis(2-etilhexil)ftalato:

Toxicidad en peces:

LC50 – Pimephales promelas (carpa cabezona)- >0.67 mg/l – 96h (Bis(2-etilhexil)ftalato)

LC50 – Oncorhynchus mykiss (trucha arcoíris)- >0.32 mg/l – 96h (Bis(2-etilhexil)ftalato)

LC50 – Cyprinodon variegatus (sheepshead minnow)- >0.17 mg/l – 96h (Bis(2-etilhexil)ftalato)

LC50 – Lepomis macrochirus (bluegill)- >0.20 mg/l – 96h (Bis(2-etilhexil)ftalato)

NOEC – Otros peces - >0.3 mg/l – 96h (Bis(2-etilhexil)ftalato)

Toxicidad para dafnia y otros invertebrados acuáticos:

Inmovilación EC50-Dafnia magna (pulga de agua) - >0.16 mg/l – 48h (Bis(2-etilhexil)ftalato)

Persistencia y degradabilidad:

Biodegradabilidad – Resultado: fácilmente biodegradable
(OECD Test guideline 301)

Bioacumulación potencial:

Bioacumulación: Oncorhynchus mykiss (trucha arcoíris) – 100d

Movilidad en suelo

No hay datos disponibles

Resultados de evaluación PBT y vPvB

Esta sustancia o mezcla no contiene componentes considerados como persistentes, bioacumulables y tóxicos (PBT), o muy persistentes y muy bioacumulativos (vpvb_) a niveles de 0.1% o mayores.

Sección 13: Información sobre etiqueta

General: Evítese su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido/recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos, conforme a la reglamentación local / regional / nacional o internacional.

Precauciones especiales: Residuos peligrosos debido al contenido en metales pesados.

SECCION 7. INFORMACION DE EMERGENCIAS**Transporte por tierra**

Número UN: 1263

Denominación: PINTURAS o PRODUCTOS PARA LA PINTURA

Grupo de Embalaje: III

Líquido Inflamable Clase 3

Transporte Terrestre ADR/RID

Número ONU: 1263

Clase 3: 3

Contaminante Marino:
No

Grupo de Embalaje: III

Transporte Acuático ADN/IMDG

Número ONU: 1263

Clase 3: 3

Contaminante Marino: No

Grupo de Embalaje: III


Transporte Aéreo IATA:

Número ONU: 1263

Clase 3: 3

Contaminante Marino:
No

Grupo de Embalaje: III



Pictogramas para transporte

Palabra de advertencia: PELIGRO

SECCION 8. INFORMACION DE OTROS DATOS

Decreto 1079 de 2015

Norma Técnica Colombiana (NTC) 1692

Norma Técnica Colombiana (NTC) 4435

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Legislación Nacional:

No existen más datos relevantes disponibles

Sección 10: Información de Emergencia


Fecha de Revisión : Marzo de 2019

Versión: 2.0

Últimas modificaciones: Se ajusta formato de acuerdo a SGA Sistema Globalmente Armonizado.

Esta hoja de datos de seguridad del material (MSDS) está preparada por GMP Productos Químicos La información que contiene se ofrece de buena fe y se considera exacta a la fecha de preparación de esta MSDS. Esta MSDS se provee sólo con el propósito de brindar información relativa a salud, seguridad y medio ambiente. No se proporciona ninguna garantía explícita ni implícita. Las precauciones de salud y seguridad pueden no ser adecuadas para todos los individuos y/o situaciones. Es obligación del usuario evaluar y usar este producto en forma segura y acatar todas las leyes y reglamentos aplicables.

----FIN DE LA HDS----



FICHA TECNICA TACHON CON REFLECTIVO

GENERALIDADES	PROPIEDADES FISICAS
DESCRIPCION	DIMENSIONES GENERALES

TACHON PLÁSTICO INYECTADO, DE ALTA RESISTENCIA CON PERNOS PARA INSTALACIÓN.

USO

LOS TACHONES SE INSTALAN EN EL PAVIMENTO COMO CANALIZADORES DE TRÁFICO VEHICULAR EN AVENIDAS O EN LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO, CICLORUTAS Y TAMBIÉN PARA CANALIZAR CRUCES PELIGROSOS O AGUJAS EN LAS ZONAS DE CANALIZACION.

INSTALACION


PARA INSTALAR LA PIEZA SE DEBE LIMPIAR PRIMERO LA ZONA DESIGNADA, LIBRE DE AGUA Y POLVO. A CONTINUACION, SE REALIZA LA DISTRIBUCION DE ACUERDO AL PLANO APROBADO PARA LA OBRA. PARA SU INSTALACION SE ENTREGAN LOS PERNOS DE ANCLAJE DE 5/8", PERFORE A 10 cm DE PROFUNDIDAD CON BROCA DE 3/4" DE DIAMETRO, AGREGUE EL PEGANTE, A CONTINUACION INTRODUSCA EL TACHON CON LOS PERNOS Y TUERCAS, ESPERE A QUE EL PEGANTE HAYA POLIMERIZADO, APIRIETE LAS TUERCAS.

OTRAS CONSIDERACIONES DE INSTALACION

EL PERSONAL ENCARGADO DE LA INSTALACION DEBE ASEGURARSE QUE NO HAYA HUMEDAD EN LA ZONA. NUNCA INSTALE EN CONDICIONES DE LLUVIA O PISO HUMEDO, ASEGURESE DE QUE LA ZONA ESTE LIBRE DE POLVO, ACEITE, OTROS. NO REALIZAR UN CORRECTO PROCEDIMIENTO PUEDE AFECTAR LA ADHERENCIA DEL PRODUCTO.

MANTENIMIENTO

SE RECOMIENDA LAVAR PERIODICAMENTE LAS PIEZAS CON SISTEMA DE AGUA A PRESION CON EL FIN DE RETIRAR EL POLVO Y HOLIN QUE SE ADHIERE A LA PIEZA.

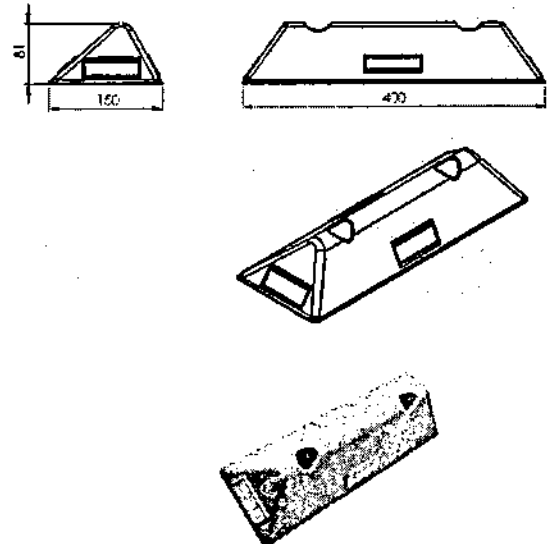

MATERIAL

PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO COLOR AMARILLO


EMBALAJE

EMPAQUE: LONAS DE 20 UNIDADES
PESO: 18 KG
VOLUMEN: 42 X 24 X 70 CM. 0.70 M3


GARANTIA LIMITADA

NOTA: ASEGURESE DE UTILIZAR LOS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL NECESARIOS PARA TRABAJOS VIALES CHALECO REFLECTIVO, GUANTES, GAFAS TAPABOCAS Y BOTAS DE SEGURIDAD ADEMÁS DE UN APROPIADO CERRAMIENTO DE SEÑALIZACIÓN VIAL ANTES DE INICIAR SUS TRABAJOS DE INSTALACIÓN.

GARANTIA LIMITADA NUESTRA GARANTIA LIMITADA CONTEMPLA DEFECTOS DE FABRICACION EN PLANTA, COMO MATERIALES, PROCESAMIENTO Y DISEÑO. EL PROCEDIMIENTO DE INSTALACION ES UNA GUIA. NO GARANTIZA LA PERMANENCIA DEL PRODUCTO EN EL PAVIMENTO. EL PERIODO OFRECIDO DE GARANTIA ES DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION. LA PINTURA NO TIENE GARANTIA.



gmpaint[®]



PINTURA GMPAINT MMA METILTRAFFIC 98:2 LLANA

Blanca- Componente A/ Resina Líquida + Componente B/ Catalizador en Pasta
Amarilla- Componente A/ Resina Líquida + Componente B/ Catalizador en Pasta
Azul- Componente A/ Resina Líquida + Componente B/ Catalizador en Pasta
Roja- Componente A/ Resina Líquida + Componente B/ Catalizador en Pasta

SEÑALIZACIÓN DE VÍAS

DESCRIPCIÓN

Sistema Metil Metacrilato (MMA) - Plástico en frío, bicomponente cargado con microesferas de vidrio para mejorar la reflectividad y cargas antideslizantes. Libre de solventes, amigable con el medio ambiente y de alta durabilidad.

Especialmente formulada para demarcación de vías, en zonas de alto tráfico vehicular y propenso a condiciones abrasivas severas. Excelente reflectividad diurna y nocturna.

Formulado para aplicación con Llana. Incluye catalizador en pasta para aplicación manual.

USOS

Señalización y demarcación de vías, metro cuadrado en zonas urbanas, pasos peatonales, líneas logarítmicas, reductores de velocidad y zonas de poca iluminación nocturna con alto tráfico vehicular.

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

PARÁMETRO	ESTÁNDAR (NTC 1360)	LOTE 210840
Color	AMARILLA	Cumple
Densidad (kg/gal)	7.3 ± 0,1	7.2
Viscosidad Stormer a 25°C	110-120	120
Tiempo de No pick up 25 °C (min)	10 - 12	12
Pot Life (min)	9 - 11	11
Coordenadas de Color	L: 72 A 82	79
	a: 18 a 27	24
	b: 74 a 86	80
FECHA MANUFACTURA	Mes/Año	04/2021
FECHA DE VENCIMIENTO	Mes/Año	09/2021

CARACTERÍSTICAS

- Curado rápido; rápida apertura del tráfico.
- Fácil aplicación.
- Relación de mezcla 98:2 (Resina líquida Componente A + Catalizador en pasta Componente B).
- Contiene agregados antideslizantes.
- Muy buena adherencia en concretos y asfaltos.
- Excelente retención de microesferas. Excelente visibilidad nocturna en sustratos húmedos y alta durabilidad de las propiedades retrorreflectivas.
- Mayor resistencia al desgaste que las pinturas convencionales.

PRESENTACIÓN


Cuñete x 1 galón

PROPIEDADES GENERALES

PROPIEDADES	BLANCA		AMARILLA		ROJA		AZUL	
Espesor de aplicación seco recomendado (mils)*	22 – 40		22 – 40		22 – 40		22 – 40	
Temperatura de aplicación - Ambiente (°C)	10 – 40		10 – 40		10 – 40		10 – 40	
Humedad Relativa en aplicación (%)	< 85		< 85		< 85		< 85	
Tiempo de No pickup @ 25°C	10 - 12		10 - 12		10 - 12		10 - 12	
Rendimiento al espesor recomendado (gal/m2)	~ 3.7		~ 3.7		~ 3.7		~ 3.7	
Viscosidad Stormer @ 25 °C (KU)	110-120		110-120		110-120		110-120	
Densidad (kg/Gal)	7.3± 0.1		7.3± 0.1		7.3± 0.1		7.3± 0.1	
Coordenadas de Color	L:	Min 90	L:	72 a 82	L:	38 a 42	L:	44 a 50
	a:	0.0 a -2.2	a:	18 a 27	a:	49 a 59	a:	-9 a -7.2
	b:	0 a 5	b:	74 a 86	b:	30 a 43	b:	-41.5 a -37.2

*Espesores establecidos en la tabla 1 de la NTC 4744-4.

PARA MAYOR INFORMACIÓN, SOLICITE LA FICHA TÉCNICA AL ASESOR COMERCIAL



Diana Catalina Sánchez S.
Desarrollo de producto y calidad
GMP PRODUCTOS QUÍMICOS S.A

MEDELLÍN-COLOMBIA
Cr. 52 N° 7 Sur-96 Av. Guayabal
Conmutador: 444 66 56 Fax: 361 67 87 / 361 65 96 A.A: 2089
LINEA GRATUITA: 01 8000 914 666 / 01 8000 114 666
www.gmp.com.co



CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CLIENTE: VRC INGENIERIA LTDA

NIT : 900155125

LUGAR Y FECHA: 07/04/2021

FACTURA Y/O PEDIDO: 55544

METODOLOGIA : De acuerdo a los métodos de ensayo de la NTC 1360, INVIAS ARTICULO 700 e instructivos internos

PRODUCTO: IMPRIMANTE BASE SOLVENTE ORBITEX® NEGRO

LOTE		P-0001956	
FECHA DE FABRICACION: 28/1/2021			
FECHA DE VENCIMIENTO: 28/1/2022			
PARAMETRO	ESPECIFICACIONES	RESULTADO	NTC / INSTRUCTIVO INTERNO
FINURA DE DISPERSION (UM)	Mínimo 3	4	NTC 1360 NUMERAL 8.2 NTC 557
VISCOSIDAD (KV a 25°C)	80 - 90	88	NTC 1360 NUMERAL 8.6 NTC 559
DENSIDAD (kg/gal a 25°C)	5,45 - 5,85	5,63	NTC-561
COLOR	ΔE = 1 máx	0,19	I-GP-132
OPACIDAD/CUBRIMIENTO (%)	98-100	99	I-GP-132
TIEMPO DE SECADO (NO PICK UP EN MINUTOS)	7 - 15	7 Humedad: 64% Temperatura: 19°C	NTC 1360 NUMERAL 6.2.4 NTC 5734
CONTENIDO DE SOLIDOS EN PESO EN %	Mínimo 60	60,3	NTC 1360 NUMERAL 6.1.2 NTC 1227
CONTENIDO DE SOLIDOS EN VOLUMEN EN %	Mínimo 50	50,1	NTC 1360 NUMERAL 6.1.3 NTC 1786
SEDIMENTACION DE LA PINTURA	perfecta 0: Torta firme que no se puede incorporar	10	NTC B-15-2
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO	Máximo 5 UK	4 UK	NTC 1360 NUMERAL 6.1.6.2 NTC 6105
BRILLO 85°	10 MAXIMO	3,2	I-GP-132
ESTABILIDAD A LA DILUCION (85% MUESTRA Y 15% XILOL)	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	I-GP-132
ELONGACION	PASA / NO PASA	PASA	NTC 1360 NUMERAL 8.17 NTC 1115
RESISTENCIA AL AGUA	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	NTC 1360 NUMERAL 6.3.2 / 8.15
RESISTENCIA A LOS ALCALIS	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	NTC 1360 NUMERAL 6.3.1 / 8.14
RESISTENCIA A LA ABRASION (dm3)	>80	200	NTC 1360 NUMERAL 6.3.3 / 8.16
APARIENCIA	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	NTC 1360 NUMERAL 6.2.3 / 8.10

*ESPECTROFOTOMETRO BYK SPECTRO GUIDE

En Pintuflex® estamos comprometidos con el planeta!

PINTUFLEX S.A.S ofrece garantía de las especificaciones técnicas de este producto mas no garantiza las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento porque éstas son inherentes al manejo de quien lo usa y están fuera de nuestro control. Para mayor información consultar la Ficha Técnica del producto antes de su utilización en www.pintuflexltda.com

JIMMY NIÑO

DIRECTOR TECNICO

MICROESFERAS GMPAINT AASHTO M247 TIPO II

MICROESFERAS DE VIDRIO

Código: 70 2 19 01 002

CERTIFICADO DE ANÁLISIS			
ANÁLISIS	ESPECIFICACIONES	UDS.	LOTE
			210806
Apariencia	Esferas Incoloras	--	Cumple
Redondez	Min 80	%	81.7
Índice de Refracción	Min 1.5	--	1.53
Gravedad Específica	2.4 – 2.6	--	2.48
% Sílica	Min 65	%	73
Tipo de Recubrimiento	Adherencia, Flotación	--	Dual
% Microesferas defectuosas	Máx 3	%	1
Resistencia a la Fractura(Retenido en Malla 30)	Min 178	N	200
Resistencia a la Fractura(Retenido en Malla 40)	Min 133	N	150
Distribución			
(Malla 16)	100	%	100
(Malla 20)	90 – 100	%	99.91
(Malla 30)	50-75	%	67.67
(Malla 40)	15 – 45	%	40.06
(Malla 50)	0 – 15	%	14.05
(Malla 80)	0 – 5	%	4.09
Contenido de Metales Pesados			
Arsénico	< 75	ppm	0
Plomo	< 100	ppm	0
Antimonio	< 200	ppm	0
FECHA FABRICACION			06-AGO-2021

EMPAQUE ORIGINAL: Saco papel X 25 kg.

NOTA: Los datos anotados, son los que aparecen en la ficha técnica y/o certificado de nuestro proveedor

17/11/2021

MEDELLIN – COLOMBIA

Cr. 52 N° 7 Sur-96 Av. Guayabal

Conmutador: 444 66 56 Fax: 361 67 87 / 361 65 96 A.A: 2089

LINEA GRATUITA: 01 8000 914 666 / 01 8000 114 666

www.gmp.com.co



Calle 78 # 68H 44 Bogotá
Cel: 318-8200400
Email: administracion@itvial.com
www.itvial.com

CERTIFICADO DE CALIBRACION No. H032022

OBJETO DE LA CERTIFICACION:

Retrореflectómetro Horizontal portátil para medición in situ del coeficiente de retrоreflexión de las marcas viales, con lectura directa en mCd/lx/m².
Con un ángulo de entrada de 86.5° y un ángulo de observación de 1.5° a una distancia simulada de 15m.
Con un ángulo de entrada de 88.76° y un ángulo de observación de 1.05° a una distancia simulada de 30m.

FABRICANTE: INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA VIAL SAS **NIT:** 900500429-6

LUGAR DE CALIBRACION: INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA VIAL SAS - BOGOTA - CALLE 78 # 68H 44

MODELO: SATLUX-HORIZONTAL 15/30

SERIE No. SLH-035

FECHA DE CALIBRACION: 04 febrero 2022

FECHA DE VENCIMIENTO: 04 febrero 2023

PROPIETARIO: GMP PRODUCTOS QUIMICOS SA. **NIT:** 800092723-2

RESULTADOS:

GEOMETRIA 15m **BLANCO:** 830 mCd/Lux/m² +/-10% **NEGRO:** 0 mCd/Lux/m² +/-10%
GEOMETRIA 30m **BLANCO:** 800 mCd/Lux/m² +/-10% **NEGRO:** 0 mCd/Lux/m² +/-10%

ESTADO PLACA DE REFERENCIA: OPTIMO

NOTAS:

1. Este Certificado anula y deja sin validez cualquier otro Certificado emitido con anterioridad a la fecha de expedición.
2. Este Certificado documenta la trazabilidad a los patrones nacionales y propio del objeto calibrado, los cuales representan las unidades de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).
3. Este certificado refleja los resultados obtenidos en la fecha que fueron realizadas las mediciones y en las condiciones que se practicaron.
4. Este Certificado de Calibración no podrá ser reproducido parcial ni totalmente sin autorización escrita de INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA VIAL S.A.S
5. Los resultados, consignados en este certificado se refieren únicamente al objeto sometido a calibración, al momento y condiciones en las que se realizaron las mediciones.
INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA VIAL S.A.S, no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los objetos calibrados o de este certificado.
6. Se recomienda re-calibrar el instrumento y verificar la placa de referencia por los siguientes motivos:
 - a. Dentro de un plazo no mayor a un año (12 meses) de expedido este certificado
 - b. Si se observan diferencias en el valor de calibración de la placa fuera del margen de tolerancia.
17. PARA CONFIRMAR LA LEGITIMIDAD DE ESTE CERTIFICADO COMUNICARSE AL CEL: 318-8200400 EN BOGOTA. CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: **FEB0122**

ITVIAL S.A.S.	Fecha de Expedición 04 febrero 2022	Emitido por:  INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA VIAL SAS INNOVACIÓN Y DESARROLLO
----------------------	---	--

**CERTIFICACIÓN DE GARANTÍA
 MATERIAL REFLECTIVO
 GRADO DIAMANTE DG3 SERIE 4000.**



3M Colombia S.A., con el respaldo de su Casa Matriz "3M Company" garantiza la calidad del producto reflectivo SCOTCHLITE Grado Diamante DG3 en los siguientes términos:

1. DESCRIPCIÓN

El material retrorreflectivo Grado Diamante al Cubo o DG3 es una lámina microprismática de microcubos completos diseñada para la producción de señales de control de tráfico y delineadores usados en posición vertical. La lámina Grado Diamante al Cubo o DG3 está diseñada para tener el mas alto desempeño en distancias viales cortas, medias y largas determinadas por los valores de retrorreflectividad (RA) medidos a ángulos de observación¹ 0.2°, 0.5° y 1.0°.

2. FOTOMETRIA

TABLA A - Coeficientes mínimos de Retrorreflexión R_A (Cd / Lux / m²)

COLOR	- 4° Angulo Entrada			30° Angulo Entrada		
	Angulo Observación			Angulo Observación		
	0.2°	0.5°	1.0°	0.2°	0.5°	1.0°
Blanco	580	420	120	220	150	45
Amarillo	435	315	90	165	110	34
Rojo	87	63	18	33	23	7
Verde	58	42	12	22	15	5
Azul	26	19	5	10	7	2
Café o marrón	17	13	4	7	5	1
Amarillo Fluorescente	350	250	72	130	90	27
Amarillo Limón Fluorescente	460	340	96	180	120	36
Naranja Fluorescente	175	125	36	66	45	14

Las medidas se efectuaron de acuerdo a Norma ASTM-E-810 "Método Normal de Prueba para el coeficiente de retroreflexión de lámina retroreflejante". Estos valores son el promedio de los valores medidos a 0° y a 90° respecto de la orientación de la lámina. Cumple con la norma NTC 4739-2011.

¹ Ángulos de Observación que representan las situaciones geométricas de visibilidad nocturna más comunes encontradas durante la conducción en vías públicas (urbanas y rurales) y las de mayor desventaja visual.



3. COLOR

El material Grado Diamante al Cubo o DG3 proporciona un alto impacto visual al conductor del vehículo bajo la luz día y noche, incluso en períodos de baja visibilidad como el amanecer, el atardecer, en días nublados, situaciones en las que el uso de los colores fluorescentes multiplica el efecto visual. Su medición se determina de acuerdo a ASTM - E -1164.

4. PERMANECIA DEL COLOR

Resistencia al intemperismo por un período de 12 años para colores ordinarios y 10 para colores fluorescentes, siempre y cuando se sigan las instrucciones dadas por 3M en sus boletines informativo o de producto para la aplicación de los procesos de color 880lo 880N.

5. ADHESIVO

Las láminas Grado Diamante al Cubo o DG3 tienen un adhesivo sensible a la presión que se recomienda para su aplicación a temperatura ambiente. Esta se define como 18°C o mayor. No se recomienda aplicaciones a temperatura inferiores a 4°C.

6. CORTE y APLICACIÓN

La lámina puede cortarse manualmente o por troquel, cortando una lámina a la vez. Cortada por sierra de banda o guillotina en paquetes o montones de máximo 50 hojas. Debe garantizarse que se utilice una cuchilla afilada para evitar cortes irregulares que pueden alterar la óptica de los microcubos.

Se recomienda que la aplicación sobre tableros se haga con rodillo neumático o similar que garantice una homogénea presión. La aplicación manual se recomienda tan solo para textos de leyendas.

En todo caso deben seguirse las indicaciones de las carpetas informativas

Folder de Información 1.5 Instrucciones para aplicación manual

Folder de Información 1.6 Instrucciones para aplicación manual y uso de rodillos

Folder de Información 1.7 Preparación de superficies

Folder de Información 1.10 Corte, prespaciado, preenmascarado

Folder de Información 1.11 Mantenimiento de las señales



7. PROCESAMIENTO POR SERIGRAFIA

La lámina reflectante Grado Diamante al Cubo o DG3 debe ser procesada en señales de tráfico por serigrafía, antes o después de montarse sobre un sustrato para señal, utilizando los colores de procesamiento Scotchlite Serie 880I. Las tintas de serie 880 de secado rápido se pueden serigrafiar de 16° a 38° C y una humedad relativa de 20% a 50%.

Se debe tener especial cuidado para evitar doblar las láminas antes y especialmente después del proceso de serigrafía, para así eliminar la posibilidad de fracturas por causa de un manejo inadecuado. Fallas asociadas a esto no son cubiertas por 3M.

En todo caso deben seguirse las indicaciones de la carpeta informativa Folder de Información 1.8 Instrucciones para el proceso de color

ANGULARIDAD

Las señales construidas en material Grado Diamante al Cubo o DG3 tendrán mayor desempeño frente a grandes ángulos de entrada ($>50^\circ$), cuando las láminas retrorreflectivas que la conforman estén orientadas en el sentido paralelo al momento de extender la lámina enrollada (Orientación 0°)

Los materiales Grado Diamante al Cubo o DG3 poseen angularidades superiores a cualquier otro tipo de material reflectivo, ya que su eficiencia permite que sea visible a su máxima reflectividad por cualquier tipo de vehículo.

8. GARANTIA

3M garantiza que la Lámina Reflejante Grado Diamante al Cubo o DG3 de 3M que comercializa para usar como componente para señales para control de tráfico será efectiva para su uso y alcanzará los valores mínimos establecidos para coeficiente de retrorreflexión en aplicaciones de señales permanentes. La garantía está sujeta a las consideraciones de la Tabla B.

Tabla B – Porcentaje mínimo retenido del RA inicial de la Tabla A para aplicación de garantía en colores ordinarios (blanco, amarillo, rojo, verde, azul y marrón.)

Periodo de garantía	Porcentaje mínimo RA retenido
1 a 7 años	80%
8 a 12 años	70%



3M garantiza que la Lámina Reflejante Fluorescente Grado Diamante al Cubo o DG3 de 3M que comercializa para usar como componente para señales para control de tráfico será efectiva para su uso y alcanzará el 70% de los valores mínimos de los coeficientes de retroreflexión de la tabla A según las consideraciones de la Tabla C.

Tabla C – Periodo de garantía para colores fluorescentes

Color	Periodo de Garantía
Amarillo Fluorescente	10 años
Amarillo Limón Fluorescente	10 años
Naranja Fluorescente	3 años

El porcentaje de RA retenido mencionados arriba aplica a todos los ángulos de entrada y observación presentados en Tabla A, y serán medidos de acuerdo con ASTM E 810. Todas las mediciones serán hechas después de la limpieza de acuerdo con las recomendaciones del 3M.

Condiciones de la garantía

La garantía del producto será válida siempre y cuando se cumpla con: Una superficie de señal Grado Diamante al Cubo o DG3 3M sea procesada y aplicada de acuerdo con todos los procedimientos de aplicación y fabricación de 3M proporcionados en los boletines de producto, folletos de información e información técnica, incluyendo el uso exclusivo de sistemas de componentes compatibles fabricados por 3M como las tintas de proceso de color, láminas reflectivas, películas de color, sobrelaminados y cintas de transferencia.

La falla sólo debe ser resultado de defectos de diseño y manufactura en lámina reflejante Grado Diamante al Cubo o DG3 y no de causas externas, como:

Fabricación, manipulación o mantenimiento inadecuado de las señales; aplicaciones donde la señal no esté instalada a más de +/- 10% de la vertical, uso de materiales no fabricados o indicados por 3M; uso de equipo de aplicación no recomendado por 3M; falla del sustrato de la señal; pérdida de la adhesión debido a sustratos inadecuados o incompatibles; exposición a químicos, abrasión y otros daños

3M Colombia S.A.

Av. El Dorado No. 75-93
Bogotá D.C. Colombia
(571) 4161666/4161655 PBX
(571) 4161677 Fax
018000113636 Servicio al Cliente
11091 / 12693 Apartado Aéreo



mecánicos como sujetadores usados para fabricar, trasladar, montar la señal entre otros; granizo o nieve; colisiones, vandalismo o maltrato.

3M se reserva el derecho de determinar el método de reemplazo. La lámina de reemplazo portará la garantía sin caducar de la lámina que reemplaza.

Los reclamos efectuados bajo esta garantía serán atendidos siempre y cuando las señales hayan sido fechadas en el momento de aplicación de la lámina, lo que constituye el inicio del período de garantía. Los reclamos efectuados bajo esta garantía serán atendidos sólo si se notifica a 3M acerca del problema dentro de un plazo de tiempo razonable, si se provee la información razonablemente solicitada por 3M, y si se permite a 3M verificar la causa del defecto.

Siguiendo los métodos de prueba ASTM E-810 – Método de prueba para el coeficiente de retroreflexión y ASTM E114 – Método de prueba de color. Este material cumple y excede las especificaciones de la norma NTC 4739 – 2016 tipo XI, y tipo XI según la ASTM D4956 – 2013

9. INFORMACIÓN DE VENTA

3M COLOMBIA expide la presente certificación el día **13 DE DICIEMBRE DEL 2021** a solicitud de la firma **V & S COMERCIAL S.A.S.NIT. 830051519**. Para ser entregada a **ABRAHAM PUBLICIDAD** por concepto de compra del siguiente material

Factura No del I21034 de 16 de Noviembre 2021

Descripción del producto
4090 GD3 BLANCO 0.61Mx45.7M
CANTIDAD: 75.03

Factura No del I24065 de 24 de Noviembre 2021

Descripción del producto
4090 GD3 BLANCO 0.61Mx45.7M
CANTIDAD: 75.03

Atentamente,
3M COLOMBIA S.A.
Bogotá 4108555 Op.2
Nacional 018000 113636 Op. 2
Mailto: 3Mcontacto@mmm.com
Chat en Línea - www.3m.com.co



3M Colombia S.A.

Av. El Dorado No. 75-93
Bogotá D.C. Colombia
(571) 4161666/4161655 PBX
(571) 4161677 Fax
018000113636 Servicio al Cliente
11091 / 12693 Apartado Aéreo



3M no asume responsabilidad por cualquier herida, pérdida o daño, por consecuencia de la utilización del producto que no es de nuestra fabricación. En donde se hace referencia en la literatura a un producto comercialmente disponible, hecho por otro fabricante, será la responsabilidad del usuario el averiguar las medidas de precaución para su utilización delineadas por el fabricante. La única obligación del vendedor y del fabricante será la de reemplazar tal cantidad del producto comprobado con defectos. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables por demanda o por contrato por cualquier pérdida o daño directo, incidental o consecuencia, resultante de la utilización o incapacidad de utilización del producto. Antes de utilizarlo, el usuario debe determinar si el producto es apropiado para la utilización intencional, y asume todo riesgo y responsabilidad cualquiera en conexión con esto. Ningún enunciado o recomendación no contenida aquí tendrá fuerza o efecto a menos que exista en un contrato firmado por personas responsables del vendedor y del fabricante.



DELINEADOR VIAL

DESCRIPCIÓN

Los delineadores viales de E&M S.A. elaborados en PVC brindan una excelente demarcación por su alta visibilidad gracias a sus colores fluorescentes. Ideal para demarcar vías o separar carriles, también para delimitar construcciones u obras y zonas en las que se necesite visibilidad tanto en el día como en la noche.

PRESENTACIÓN

Delineadores de colores brillantes, que le proporciona gran visibilidad durante el día y por estar provisto de tres bandas reflectivas de alta intensidad, tiene un excelente desempeño en horas de la noche.

RECOMENDACIONES

Debe ser almacenado únicamente en posición vertical.
Resiste a la intemperie y temperaturas ambientes hasta 40°C.
Debe transportarse verticalmente sin colocar peso en el delineador que pueda afectar la linealidad del mismo.

Características

Alta resistencia al impacto, no se deteriora ni quiebra debido a los golpes.

Su flexibilidad evita daños a los vehículos que lo impacten.

Estable, se mantiene en su posición vertical ideal para cumplir con su finalidad.

Visible en cualquier momento del día o la noche, gracias a su color y cintas reflectivas Tipo IV.

Fácil de limpiar.

5% de material reciclado en su fabricación.

Nuestro producto cuenta con un polímero de alto desempeño que contribuye a la linealidad y estabilidad del mismo.



Propiedades Físicas

Compuesto	PVC Flexible
Peso	Mínimo 1200 g
Altura	70 cm ± 1 cm
Diámetro	8 cm ± 0,5 cm
Diámetro de la base	21 cm ± 1 cm
Ancho cinta reflectiva	7,5 cm ± 0,2 cm
Espacio entre cintas	5 cm ± 0,2 cm
Cinta reflectiva	Alta Intensidad
Tipo	IV
Distancia entre punta y primera cinta	5 cm ± 0,2 cm

Especificaciones Técnicas

Prueba	Norma	Especificación
Rasgado	NTC 445	Mínimo 70 N/mm
Tensión	NTC 444	Mínimo 11 N/mm ²
Elongación	NTC 444	Mínimo 250%

PTE E&M®
PRODUCTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CALIDAD QUE UNE



Certificado ISO 9001

P29 Edición Agosto 2018



SC 7123-1

**FICHA TÉCNICA PINTURA PARA TRÁFICO PLÁSTICO EN FRÍO TIPO LLANA ORBITEX®-FT-G.LAB-70****DESCRIPCIÓN:**

Pintura 100 % sólidos de dos componentes, el componente A es fabricado con resinas Metil-metacrilato puras, antideslizantes y pigmentos, el componente B es el catalizador. Diseñada para demarcación y señalización vial donde se requiera alta adherencia, resistencia a la abrasión severa y a gran cantidad de contaminantes, altísima duración y rápido secado.

CUMPLE NTC 1360**USOS:**

La PINTURA PARA TRAFICO PLASTICO EN FRIO TIPO LLANA ORBITEX® es ideal para la para la demarcación y señalización de autopistas, carreteras, pasos peatonales, zonas escolares, ciclo rutas, pavimento y concreto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Color	Amarillo, Blanco, Rojo, Azul, Negro
Viscosidad (Unidades Krebs)	86-92 Ku
Peso neto por galón	6.90 – 7.60 Kg/galón
Porcentaje de sólidos (%volumen)	99-100
Número de manos recomendadas	1 mano a 1,2 mm de espesor.
Método de aplicación	Llana o rasqueta
Ajustador para dilución	No recomendada.
Relación de Mezcla (%)	98-2
Rendimiento práctico aproximado	3 m ² /galón
Espesor de película seca de 1,2 mm	
Condiciones de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura del sustrato: Entre 7°C y 45°C • Temperatura mínima de aplicación: 3°C por encima del punto de rocío. • Humedad relativa: Entre 30% y 85%. • La presencia de humedad o lluvia durante la aplicación ó durante el secado afectan la adherencia y retardan el secado.
Tiempo de secamiento a 30°C y 85% humedad relativa	<ul style="list-style-type: none"> • 10- 15 minutos • Para apertura de vía: 40-60 minutos
Estabilidad al almacenamiento (entre 5°C-35°C)	6 meses

COPIA CONTROLADA

USOS:

La PINTURA PARA TRAFICO PLASTICO EN FRIO TIPO LLANA ORBITEX® es ideal para la para la demarcación y señalización de autopistas, carreteras, pasos peatonales, zonas escolares, ciclo rutas, pavimento y concreto.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

- La superficie debe estar seca, libre de polvo, grasa, pintura deteriorada y material extraño.
- La limpieza se hace utilizando agua o aire a presión, escobas manuales o mecánicas.
- Para Aplicar sobre concreto nuevo o para mejorar la adherencia se debe utilizar IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO ORBITEX®, debido a la alcalinidad y porosidad de la superficie.

APLICACIÓN:

- Solo se puede aplicar sobre pavimentos rígidos o flexibles que lleven mínimo 30 días de construidos.
- Aplicar con llana metálica o rasqueta.
- Aplicar una mano para obtener un espesor de película seca de 1,25 mm.



SC 7123-1



- Demarcar con cinta de enmascarar el área de aplicación.
- Adicionar el componente B al componente A (Relación 98%-2% en peso) y agitar muy bien por uno o dos minutos hasta mezcla homogénea. Aplicar de inmediato, la mezcla tiene una vida útil de 10 a 15 minutos.
- Para evitar que las señalizaciones se dañen con el tráfico, se deben proteger con vallas o conos hasta que hayan secado bien.
- El producto no debe diluirse con otros disolventes ni mezclarse con esmaltes, lacas u otros productos.
- Los equipos de aplicación se pueden limpiar con Thinner.
- La durabilidad va a depender del tipo y estado de pavimento, volumen y tipo de tráfico, geometría de la vía, la preparación de superficie y la aplicación. En zonas donde se tiene arena continuamente, la durabilidad será afectada.

PRESENTACIÓN:

La PINTURA PARA TRAFICO PLASTICO EN FRIO TIPO LLANA ORBITEX® se encuentra disponible en:

- Componente A: 1 Galón
- Componente B: Frasco de Catalizador de 150 gramos.

SEGURIDAD Y AMBIENTE:

- Manténgase fuera del alcance de los niños.

Aplicar en un lugar con buena ventilación y alejado de toda fuente de calor, chispa o llama.

Se recomienda el uso de máscara contra vapores orgánicos, overol, guantes y gafas de seguridad para mayor protección.

En caso de contacto con la piel se debe lavar con abundante agua y jabón.

- En caso de contacto con los ojos se deben lavar con abundante agua durante varios minutos y buscar atención médica inmediata.

- En caso de ingestión buscar atención médica inmediata.

- En caso de inhalación prolongada llevar a un lugar bien ventilado.

- Este producto contiene materiales inflamables. En caso de contacto del envase con fuentes de calor o llama directa, usar agentes extintores de dióxido de carbono o polvo químico seco.

- En caso de derrame recoger el producto con arena o un material absorbente inerte (No usar aserrín u otro material inflamable para absorber el producto), depositar en un recipiente con tapa y trasladarlo a un lugar seguro.

- No verter por desagüe, sobre el suelo ni en cuerpos de agua.

- Los residuos secos del producto se disponen como residuos peligrosos.

- Para ampliar información, consultar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.

ALMACENAMIENTO:

- Debe almacenarse en los recipientes originales cerrados, en posición vertical; en sitios ventilados, protegidos de humedad excesiva, así como de altas temperaturas y alejado de toda fuente de calor, chispa o llama.

- Consérvese máximo seis (6) meses a partir de la fecha de fabricación. Es muy importante que se roten las existencias


COPIA CONTROLADA

En Pintuflex S.A.S estamos comprometidos con el planeta

La Información contenida en esta Ficha Técnica es proporcionada de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de Pintuflex S.A.S. respecto a sus productos. La información se refiere únicamente al material especificado, y no es válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o bajo condiciones diferentes a las expresadas.

Pintuflex S.A.S ofrece garantía de las especificaciones técnicas de este producto más no garantiza las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento porque éstas son inherentes al manejo de quien lo usa y están fuera de nuestro control. Por lo tanto, la información suministrada no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto. Pintuflex S.A.S. no asumirá responsabilidad alguna por daños o perjuicios incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

Las especificaciones técnicas están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Para más información se recomienda consultar al Departamento Técnico - Comercial de Pintuflex S.A.S.

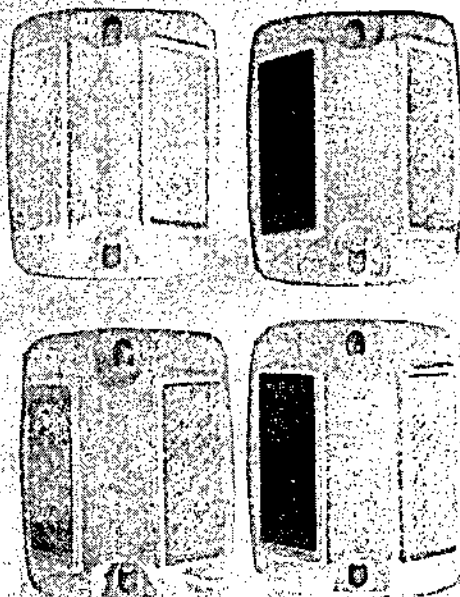

La Tacha Reflectiva para demarcación es un elemento para señalización vial, diseñado para complementar y alertar a los conductores de cambios en el camino, para mejorar la demarcación con pintura.




TABLA DE REFLECTIVIDAD LENTE 3M

290-WR White				
Sample	B2:	0°	-20°	+20°
Required:	140	-	-	-
46	788.4	698.0	728.5	
47	753.3	546.8	582.7	
48	730.2	679.8	703.9	
49	735.3	592.4	651.7	


290-WR Red				
Sample	B2:	0°	-20°	+20°
Required:	35	-	-	-
42	160.8	128.5	123.1	
43	133.8	88.5	98.1	
44	213.8	186.6	196.9	
45	183.3	107.6	122.2	

290-2Y Yellow				
Sample	B2:	0°	-20°	+20°
Required:	84	-	-	-
48A	444.9	182.4	203.7	
47B	573.7	408.4	442.3	
48B	468.8	277.5	314.0	
49A	438.3	231.4	248.8	

DIMENSIONES DIMENSIONS



Vista Frontal/ Front view

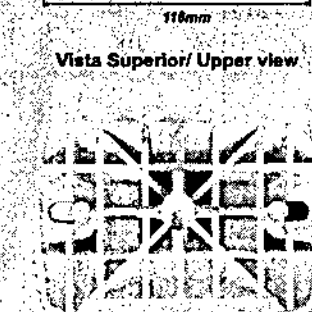

Vista Superior/ Upper view

Vista Inferior/ Bottom view

UTILIZACIÓN USES

Se instalan en caminos de asfalto concreto, en hileras con el fin de general vibración con lente reflectivo para mejorar la visualización en la noches.

MATERIAL MATERIALS

Polímero termoplástico de Ingeniería de alta resistencia al impacto y abrasión
Lente reflectivo de policarbonato recubierto con una capa resistente a la abrasión. Colores disponibles Blanco, Amarillo y blanco roja

De acuerdo con la norma BS EN 1463-1:2009
Lente reflector con capa resistente a la abrasión con las siguientes dimensiones:
2,730 x 0,930 pulgadas (69.34 x 23.95 mm)

Clasificada como:

- Permanente.
- Lente reflector resistente a la abrasión.
- No comprimible.

www.efexportsas.com



NEXO 11.7


SOPORTES IMPLEMENTACION PLAN DE CALIDAD


	INSPECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		Código	CUM_003_18
			Version	0
			Fecha	24/08/2021

FECHA: 9/ Abril / 2022
 OBRA INSPECCIONADA: CTO. 1036-2022
 INSPECCIONADO POR: Estanislao Esbora

ITEMS	S = Satisfactorio				D = Deficiente	A = Ausente	RESPONSABLE DE LA INTERVENCIÓN	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
	S	D	A	NA				
1. ¿Hay presencia de gases, vapores, material particulado o humo de cigarrillo?				X				9/ Abril / 2022
2. Se encuentran visibles la (s) hoja (s) de seguridad de los productos?	X							7,
11. ESCALERAS								
Estado de las tijeras o cadenas				X				7,
Estado de los poliaños				X				7,
Estado de los anclajes				X				7,
Estado de los ramalches en las juntas				X				7,
Estado general				X				7,
12. PASARELAS								
Estado de la escalera				X				7,
Estado de las crucetas				X				7,
Estado de las Ruedas				X				7,
Estado de los pines				X				7,
Estado de los pines				X				7,
Estado general				X				7,

Firma Quien Realizó Inspección





INSPECCIÓN DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

CÓDIGO	CUM-001-01
VERSIÓN	1
FECHA	2017-11-15

CONTRATO DE OBRA No. 1636 DE 2021
SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RECAMBIOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO
DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

FECHA: 20/Nov/2022 SUBCONTRATISTA: VRL-INGENIERIA AERONAUTICA PUBLICIDAD ASBCSA: TRAMO: ACTIVIDAD:

ITEM	DESCRIPCIÓN / PROGRAMA	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN E INSUMOS					
1	¿Los sitios de acopio temporal están desprovistos de cobertura vegetal?	X			
2	¿Los acopios temporales están demarcados y señalizados?		X		
3	¿Los materiales se encuentran almacenados de manera adecuada (contenidos, cubiertos, y/o apilados correctamente)?	X			
4	¿El material particulado generado se está controlando mediante la humectación de la zona afectada?	X			
5	¿La mezcla de concreto en los frentes de obra se está realizando sobre una plataforma metálica o plástico polietileno?	X			
6	¿Los residuos de asfalto se están reutilizando o disponiendo en escombros o Zedmes autorizados?			X	Es una cantidad mínima producida superior a 3 bultos donde
7	¿Se cuenta con canales perimetrales u otro mecanismo para la contención de derrames?			X	
8	¿El sitio de almacenamiento de combustible se encuentra impermeabilizado?	X			
9	¿En el sitio de almacenamiento de combustible se tienen las hojas de seguridad con sus 16 secciones?			X	
MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, LODOS Y MATERIALES DE EXCAVACIÓN					
9	¿Los materiales sobrantes (excavación, lodos y escombros) están siendo depositados en zonas verdes?		X		
10	¿Los materiales sobrantes (excavación, lodos y escombros) se están retirando en el tiempo establecido a un sitio de almacenamiento temporal y/o de disposición final?	X			
11	¿Los acopios temporales se están depositando a más de 30 m de la ronda hídrica de ríos, quebradas y humedales?			X	
12	¿El transporte de los residuos se realiza en volquetes con buenas condiciones mecánicas y cerramiento del cubo?	X			
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES					
13	¿El frente de obra cuenta con puntos ecológicos para la clasificación de residuos?			X	
14	¿La clasificación y disposición final de los residuos se lleva de la manera adecuada?	X			
15	¿El frente de obra cuenta con sitio de almacenamiento temporal para los residuos sólidos?			X	
16	¿El frente de obra se encuentra libre de residuos sólidos?	X			
SEÑALIZACIÓN FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES					
17	¿La zona de trabajo está debidamente demarcada?	X			
18	¿Se dispone de señalización preventiva para caída a diferente nivel?	X			
19	¿Se dispone de colchonetas, conos, señales y cinta reflectiva?	X			
20	¿Se cuenta con señalización preventiva de peligro de excavación profunda?			X	
MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES					
21	¿El sistema de captación se realiza por bombeo directo desde el cauce el vehículo encargado del transporte e irrigación?			X	
22	¿El mecanismo de succión se realiza con mangueras de polietileno en diámetros de 2" a 6" de acuerdo con el caudal solicitado?			X	
23	¿La motobomba cuenta con su respectivo caudalímetro o medidor de caudal?			X	
24	¿Los acoples de las mangueras que se usan para la captación de agua se encuentran ajustados?			X	
25	¿Existen barreras de contención en los puntos de captación para prevenir el arrastre de material a la fuente hídrica?			X	
26	¿Se realiza lavado de maquinaria y equipos en los cuerpos de agua cruzados por proyecto?			X	
MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES					
27	¿El frente de obra cuenta con baños portátiles acorde al número de personas?		X		
28	¿Los baños reciben mantenimiento por parte de una empresa autorizada? (ver registros)			X	
29	¿El frente de obra cuenta con kit contra derrames?			X	
30	¿Los integrantes del frente de obra han recibido Capacitación sobre el Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales?	X			
MANEJO DE RESIDUOS DE LA INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS					
31	¿Los vehículos y maquinaria cuentan con revisión técnica mecánica y de gases vigente?	X			
32	¿Los trabajos de mantenimiento a vehículos y maquinaria se realizan en las frentes de obra?		X		
33	¿Los trabajos de mantenimiento a vehículos y maquinaria se realizan en las frentes de obra?		X		



INSPECCIÓN DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

CÓDIGO	CUA 002 05
VERSIÓN	0
FECHA	2021-11-14

CONTRATO DE OBRA No. 1036 DE 2021
SERIALIZACION Y DEMARCAACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁMITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUMIA

FECHA:	SUBCONTRATISTA:	ABSCISA:	TRAMO:	ACTIVIDAD:
--------	-----------------	----------	--------	------------

ITEM	DESCRIPCIÓN / PROGRAMA	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
34	¿Para el lavado de las llantas de las volquetas se cuenta con algún sistema u otra alternativa?			X	
35	El lavado de maquinaria y equipos se realiza en áreas que cuenten con los permisos requeridos?			X	
36	¿Los integrantes del frente de obra han recibido Capacitación sobre el Manejo de maquinaria, equipos y vehículos?		X		
INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTOS					
37	¿Los campamentos o instalaciones temporales están ubicados a más de 30m respetando la ronda hidráulica de los cuerpos hídricos?			X	
38	¿Los campamentos cuentan con sistema de manejo y disposición de grasas y aceites?			X	
39	¿Los campamentos se encuentran debidamente señalizados con clara diferenciación entre áreas?			X	
40	¿Los campamentos cuentan con extintores, camilla y botiquines?			X	
41	¿Los campamentos cuentan con puntos ecológicos?			X	
42	¿La clasificación y disposición final de los residuos se lleva de la manera adecuada?	X			
TOTAL					% Cumplimiento:

OBSERVACIONES GENERALES:

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA:	FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA:	NOMBRE ENCARGADO:	FIRMA ENCARGADO:

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 53 DE 78

ANEXO 11.8

SOPORTES IMPLEMENTACION PROGRAMA GERENCIA DE OBRA

CUMBRE INGENIERIA SAS				
CONTRATO 1036 DE 2021				
GESTIÓN DEL VALOR GANADO				
PERIODO DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 10 DE MAYO DE 2022				

	COSTO PRESUPUESTADO (PV)	COSTOS REALES (AC)	PORCENTAJES REALES	VALOR PLANEADO (PV)
MES 1 (NOVIEMBRE)	\$ 26.244.515,25	\$ 225.273.356,00	23,7%	\$ 26.244.515,25
MES 2 (DICIEMBRE)	\$ 117.628.092,51			\$ 143.872.607,76
MES 3 (ENERO)	\$ 140.465.415,97			\$ 284.338.023,73
MES 4 (FEBRERO)	\$ -			\$ 284.338.023,73
MES 5 (MARZO)	\$ 70.488.769,93	\$ 360.114.298,00	37,9%	\$ 354.826.793,66
MES 6 (ABRIL - MAYO)	\$ 262.332.615,05	\$ 270.231.696,00	28,4%	\$ 617.159.408,71
MES 7 (MAYO)	\$ 333.479.147,29		0,0%	\$ 950.638.556,00
TOTAL	\$ 950.638.556,00			\$ 950.638.556,00

CUMBRE INGENIERIA SAS				
CONTRATO 1036 DE 2021				
VARIACIÓN DEL COSTO Y DESVIACIÓN DEL CRONOGRAMA				
PERIODO DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 10 DE MAYO DE 2022				

	COSTO REAL (AC)	VALOR GANADO (EV)	VARIACIÓN DEL COSTO (CV) = EV-AC	DESVIACIÓN DEL CRONOGRAMA (SV) = EV-PV
MES 1 (NOVIEMBRE)	\$ 225.273.356,00	\$ 225.273.356,00	\$ -	\$ 199.028.840,75
MES 2 (DICIEMBRE)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 143.872.607,76
MES 3 (ENERO)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 284.338.023,73
MES 4 (FEBRERO)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 284.338.023,73
MES 5 (MARZO)	\$ 360.114.298,00	\$ 585.387.654,00	\$ 225.273.356,00	\$ 230.560.860,34
MES 6 (ABRIL - MAYO)	\$ 270.231.696,00	\$ 855.619.350,00	\$ 585.387.654,00	\$ 238.459.941,29
MES 7 (MAYO)				
TOTAL				

CUMBRE INGENIERIA SAS				
CONTRATO 1036 DE 2021				
INDICE DE RENDIMIENTO DEL COSTO Y CRONOGRAMA				
PERIODO DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 10 DE MAYO DE 2022				

	COSTO REAL (AC)	VALOR GANADO (EV)	INDICE DE RENDIMIENTO DEL COSTO (CPI) = EV/AC	INDICE DE RENDIMIENTO DEL CRONOGRAMA SPI = EV/PV
MES 1 (NOVIEMBRE)	\$ 225.273.356,00	\$ 225.273.356,00	1,00	858%
MES 2 (DICIEMBRE)	\$ -	\$ -	0,00	0%
MES 3 (ENERO)	\$ -	\$ -	0,00	0%
MES 4 (FEBRERO)	\$ -	\$ -	0,00	0%
MES 5 (MARZO)	\$ 360.114.298,00	\$ 585.387.654,00	1,63	165%
MES 6 (ABRIL - MAYO)	\$ 270.231.696,00	\$ 855.619.350,00	3,17	139%
MES 7 (MAYO)				
TOTAL				



"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 54 DE 78

ANEXO 11.9

COPIA BITACORA DE OBRA

MUNICIPIO DE TUNJA		BITÁCORA DE OBRA		2021	
PROYECTO "CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2			
CONTRATISTA CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		CONTRATO No. 1036-2021			
INTERVENTORÍA CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		CONTRATO No. 1068-2021			
FECHA 29/ Marzo /2022		HORARIO 8:00 PM. - 5:00 AM			
ESTADO DEL TIEMPO SOLEADO NUBLADO ☒ NUBLADO LLUVIA LEVES LLUVIAS MODERADAS LLUVIAS INTENSAS					
FRENTE DE OBRA					
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA					
ACTIVIDAD REALIZADA		LOCALIZACIÓN		UNIDAD	CANTIDAD
- Suministro y aplicación de pintura para imprimante		- Sector las Quintas		M ²	150
- Suministro e instalación de Señales Verticales		- Sector las Quintas		UN	10
- Corte de plaza en adoquín		Fuente Barrio Las Quintas		M ²	132
- Suministro y aplicación de pintura plástica				M ²	80
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒					
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA					
DESCRIPCIÓN		ACCIÓN DE CORRECCIÓN		LIBERACIÓN	FECHA
PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO		SUMINISTRO DE MATERIALES	
CARGO	CANTIDAD				
DIRECTOR DE OBRA	1	- Vehículo Tipo Furgon		- Pintura Plástica	
RESIDENTE DE OBRA	1				
PROFESIONAL SISO	1				
INGENIERO AUXILIAR	1				
MAESTRO GENERAL	1				
OFICIALES	1				
AYUDANTES	4				
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1				
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1				
OTRO					
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL					
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES	
CASCO	☒	GAFAS	☐		
BOTAS	☒	TAPA OÍDOS	☐		
GUANTES	☒	OTROS	TAPABOCAS ☒		
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA					
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Valla informativa		1	información de vía cerrada ☒		
Barrera de madera		1	Cerrar la vía ☒		
Cinta de peligro		40 ML	Canalización de obras ☒		
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL: _____					
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS					
 FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA			 FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA		


OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

29/MARZO/2022

Página: 2/2



FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA		BITÁCORA DE OBRA		2021	
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		CONTRATO No.	1036-2021	
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		CONTRATO No.	1068-2021	
FECHA	30 / Marzo / 2022		HORARIO	8:00 AM - 12:00 PM	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO ☒	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
FRENTE DE OBRA					
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA					
ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		
- Suministro y aplicación de pintura para imprimante	- Las Quintas	M ²	80		
- Suministro e instalación de Señales Verticales	- Las Quintas	UN	10		
- Excavación manual en material común	- Las Quintas	M ³	3,30		
- Suministro y aplicación de pintura plástica	- Las Quintas	M ²	100		
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA ☐ SI ☒ NO					
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA					
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA	
PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA					
CARGO	CANTIDAD	MAQUINARIA Y EQUIPO		SUMINISTRO DE MATERIALES	
DIRECTOR DE OBRA	1	- Vehículo tipo Foron		- Pintura para imprimante	
RESIDENTE DE OBRA	1	- Compresor de Aire		- Mortero para imprimante	
PROFESIONAL SISO	1				
INGENIERO AUXILIAR	1				
MAESTRO GENERAL	1				
OFICIALES	1				
AYUDANTES	4				
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1				
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1				
OTRO					
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL					
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN			OBSERVACIONES		
CASCO	☒	GAFAS			
BOTAS	☒	TAPA OÍDOS			
GUANTES	☒	OTROS	TAPABOCAS ☒		
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA					
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES			
Valla informativa	1	Información de vía cerrada ☒			
Barrera de madera	1	Cerrar la vía ☒			
Cinta de peligro	50	Canalización de obras ☒			
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES ☐ SI ☒ NO ☐ CUAL ☐					
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS					
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA					
FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA					


30/MARZO/2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Página: 2/2



FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA		BITÁCORA DE OBRA		2021	
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página: 4/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		CONTRATO No.	1036-2021	
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		CONTRATO No.	1068-2021	
FECHA	31 / MARZO / 2022		HORARIO	8:00 AM - 12:00 PM	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO ☒	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
FRENTES DE OBRA					
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA					
ACTIVIDAD REALIZADA		LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	
- Suministro y aplicación de pintura para imprimante		- Sector las Quintas	M ²	728	
- Suministro y aplicación de pintura plástica en frío		- Resaltes Av. Universidad y 2014	M ²	100	
- Suministro y aplicación de pintura plástica en frío		- Sector las Quintas	M ²	728	
- Vaciado de concreto para cordón, in-situ		- Resaltes	M ²	100	
		- Puente las Quintas	M ²	164	
		- Sector las Quintas	M ²	66	
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒					
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA					
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA	
PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO		SUMINISTRO DE MATERIALES	
CARGO	CANTIDAD				
DIRECTOR DE OBRA	1	- Vehículo Tipo Furgón		- Pintura para imprimante	
RESIDENTE DE OBRA	1	- Compresor de aire		- Pintura plástica	
PROFESIONAL SISO	1			- Minoesfera	
INGENIERO AUXILIAR	1			- Mortero	
MAESTRO GENERAL	1				
OFICIALES	3				
AYUDANTES	3				
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1				
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1				
OTRO					
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL					
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES	
CASCO	☒	GAFAS	☐		
BOTAS	☒	TAPA OÍDOS	☐		
GUANTES	☒	OTROS	TAPABOCAS ☒		
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA					
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Valla informativa		1	información de vía cerrada ☒		
Barrera de madera		1	Cerrar la vía ☒		
Cinta de peligro		1	Canalización de obras ☐		
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL: _____					
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS					
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA			FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA		

01 / MARZO / 2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Página: 2/2



FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA						BITÁCORA DE OBRA		2021	
PROYECTO		"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAción VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."							Página: 1/2
CONTRATISTA		CUMBRE INGENIERIA S.A.S.				CONTRATO No.		1036-2021	
INTERVENTORÍA		CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ				CONTRATO No.		1068-2021	
FECHA		1/Abs/1/2021				HORARIO		8:00 AM - 4:00 PM	
ESTADO DEL TIEMPO		SOLEADO		NUBLADO		NUBLADO LLUVIA LEVES X		LLUVIAS MODERADAS	
								LLUVIAS INTENSAS	
FRENTE DE OBRA									
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA									
ACTIVIDAD REALIZADA			LOCALIZACIÓN			UNIDAD		CANTIDAD	
- Suministro e instalación de Señales Verticales			- Reseller Colegio Inm Calle 24 entre Rr 15 y 18			UA		8	
- Suministro y aplicación de Pintura plástica en frío			- Reseller Av. Universit. Colegio Inm - calle 24 km 15			H ²		80	
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒									
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA									
DESCRIPCIÓN		ACCIÓN DE CORRECCION		LIBERACIÓN		RESPONSABLE		FECHA	
PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO				SUMINISTRO DE MATERIALES			
CARGO	CANTIDAD								
DIRECTOR DE OBRA	1	Vehículo Tipo Furgon				- Pintura plástica			
RESIDENTE DE OBRA	1					- Mordiente			
PROFESIONAL SISO	1								
INGENIERO AUXILIAR	1								
MAESTRO GENERAL	1								
OFICIALES	2								
AYUDANTES	3								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1								
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1								
OTRO									
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL									
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES					
CASCO	X	GAFAS							
BOTAS	X	TAPA OIDOS							
GUANTES	X	OTROS	TAPABOCAS X						
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA									
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA				CANTIDAD		OBSERVACIONES			
Valla informativa				1		información de vía cerrada			
Barrera de madera				1		Cerrar la vía			
Cinta de peligro				1		Canalización de obras			
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____									
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>  FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA </div> <div>  FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA </div> </div>									

1 / Abril / 2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Página: 2/2



FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA




FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA		BITÁCORA DE OBRA		2021		
PROYECTO		CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA			Página: 1/2	
CONTRATISTA		CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		CONTRATO No.	1036-2021	
INTERVENTORÍA		CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		CONTRATO No.	1068-2021	
FECHA		21 Abril / 2022		HORARIO	8:00 PM - 8:00 PM	
ESTADO DEL TIEMPO		SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS X
FRENTE DE OBRA						
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA						
ACTIVIDAD REALIZADA		LOCALIZACIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	
Petido a punto lluvias presentado en horas del día - tarde y noche no fue posible efectuar Actividades						
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA ☐ SI ☒ NO						
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA						
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN		LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA	
PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO		SUMINISTRO DE MATERIALES		
CARGO	CANTIDAD					
DIRECTOR DE OBRA	—					
RESIDENTE DE OBRA	1					
PROFESIONAL SISO	—					
INGENIERO AUXILIAR	—					
MAESTRO GENERAL	—					
OFICIALES	—					
AYUDANTES	—					
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—					
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1					
OTRO						
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL						
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES		
CASCO	—	GAFAS	—			
BOTAS	—	TAPA OÍDOS	—			
GUANTES	—	OTROS	TAPABOCAS			
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA						
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES			
Valla informativa			Información de vía cerrada			
Barrera de madera			Cerrar la vía			
Cinta de peligro			Canalización de obras			
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES ☐ SI ☒ NO CUÁL _____						
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS						
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA						
FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA						

21 Abr / 2022
Página: 2/2

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS


FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA


FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA		BITÁCORA DE OBRA		2021	
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página: <u>4/2</u>
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		CONTRATO No.	1036-2021	
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		CONTRATO No.	1068-2021	
FECHA	<u>4 / Abril / 2022</u>		HORARIO	<u>8:00 AM - 4:00 PM</u>	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS <u>X</u>	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA			
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA			
ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Aplicación de imprimante (Pintura)	- Colegio Los Angeles	M ²	124.82
- Aplicación de pintura plástica con llomo	- Colegio Los Angeles	M ²	124.82

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA				
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD	<u>- Vehículo Tipo Furgón</u> <u>- Compresor de Aire</u>	<u>- Pintura plástica</u> <u>- Pintura para imprimante</u> <u>- Microesferas</u>
DIRECTOR DE OBRA	<u>1</u>		
RESIDENTE DE OBRA	<u>1</u>		
PROFESIONAL SISO	<u>1</u>		
INGENIERO AUXILIAR	<u>1</u>		
MAESTRO GENERAL	<u>1</u>		
OFICIALES	<u>3</u>		
AYUDANTES	<u>3</u>		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA			
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	<u>1</u>		
OTRO			


SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL			
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN			OBSERVACIONES
CASCO	<u>X</u>	GAFAS	
BOTAS	<u>X</u>	TAPA OÍDOS	
GUANTES	<u>X</u>	OTROS	TAPABOCAS <u>X</u>

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA		
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Valla informativa	<u>1</u>	información de vía cerrada <u>X</u>
Barrera de madera	<u>1</u>	Cerrar la vía <u>X</u>
Cinta de peligro	<u>20 ML</u>	Canalización de obras <u>X</u>

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS


FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

4 / Abril / 2022

Página: 2/2


FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA


FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA		BITÁCORA DE OBRA		2021	
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		CONTRATO No.	1036-2021	
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		CONTRATO No.	1068-2021	
FECHA	5/ Abril / 2022		HORARIO	8:00 PM - 4:00 AM	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO ☒	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
FRENTE DE OBRA					
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA					
ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		
- Suministro y aplicación de pintura para imprimante	Km 12 - Av. Colón	M2	99.24		
- Suministro y aplicación de pintura plástica en filo	Km 12 - Av. Colón	M2	99.24		
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA ☐ SI ☒ NO					
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA					
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA	
PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO		SUMINISTRO DE MATERIALES	
CARGO	CANTIDAD				
DIRECTOR DE OBRA	—	- Vehículo Tipo Jergon		- Pintura para Imprimante	
RESIDENTE DE OBRA	1	- Compresor Aire		- Pintura plástica	
PROFESIONAL SISO	—			- M.Rioespejo	
INGENIERO AUXILIAR	—				
MAESTRO GENERAL	—				
OFICIALES	3				
AYUDANTES	—				
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—				
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1				
OTRO					
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL					
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES	
CASCO	☒	GAFAS			
BOTAS	☒	TAPA OÍDOS			
GUANTES	☒	OTROS	TAPABOCAS ☒		
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA					
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Valla informativa		—	información de vía cerrada ☒		
Barrera de madera		—	Cerrar la vía ☒		
Cinta de peligro		50AL	Canalización de obras ☒		
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES ☐ SI ☒ NO CUÁL ☐					
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS					
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA			FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA		


5/Abri/ 2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Página: 2/2



FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA




FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA		BITÁCORA DE OBRA		2021	
PROYECTO		"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."			Página: 4/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1036-2021		
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021		
FECHA	6 / Abril / 2022		HORARIO	8:00 PM - 4:00 AM	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO X	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
FRENTE DE OBRA					
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA					
ACTIVIDAD REALIZADA		LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	
- Aplicación de pintura para imprimante		- Kr II calle 16	M ²	46,50	
- Suministro y aplicación de pintura plástica en filo con micropesetas		- Kr II calle 16	M ^l	46,50	
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒					
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA					
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA	
PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO		SUMINISTRO DE MATERIALES	
CARGO	CANTIDAD				
DIRECTOR DE OBRA	—	- Vehículo Tipo Furgon		- Pintura para imprimante	
RESIDENTE DE OBRA	3	- Computador de Área		- Pintura Plástica	
PROFESIONAL SISO	—			- Micropesetas	
INGENIERO AUXILIAR	—				
MAESTRO GENERAL	—				
OFICIALES	9				
AYUDANTES	3				
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	—				
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1				
OTRO					
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL					
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES	
CASCO	X	GAFAS			
BOTAS	X	TAPA OIDOS			
GUANTES	X	OTROS	TAPABOCAS X		
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA					
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Valla informativa	—	—	información de vía cerrada X		
Barrera de madera	—	—	Cerrar la vía X		
Cinta de peligro	50	—	Canalización de obras —		
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____					
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS					
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA			FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA		

6 / Abril / 2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Página: 2/2


FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA


FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA		BITÁCORA DE OBRA		2021	
PROYECTO		"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."			
CONTRATISTA		CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		CONTRATO No.	1036-2021
INTERVENTORÍA		CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		CONTRATO No.	1068-2021
FECHA		7 / Abril / 202		HORARIO	8:00 PM - 5:00 AM
ESTADO DEL TIEMPO		SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES ☒	LLUVIAS MODERADAS
					LLUVIAS INTENSAS
FRETE DE OBRA					
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA					
ACTIVIDAD REALIZADA		LOCALIZACIÓN		UNIDAD	CANTIDAD
- Pintura Acrílica para Imprimante		K. 9 calle 18		M ²	46,14
- Suministro y aplicación de pintura		K. 9 calle 21		M ²	19,18
plástica en frío con microesferas		K. 9 calle 18		M ²	46,14
		K. 9 calle 21		M ²	19,18
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒					
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA					
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA	
PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO		SUMINISTRO DE MATERIALES	
CARGO	CANTIDAD				
DIRECTOR DE OBRA	1	- Vehículo Tipo Jergon		- Pintura para imp. acrílica	
RESIDENTE DE OBRA	1	- Compresor Aire		- Pintura plástica	
PROFESIONAL SISO	1			- Microesferas	
INGENIERO AUXILIAR	1				
MAESTRO GENERAL	1				
OFICIALES	3				
AYUDANTES	3				
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1				
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1				
OTRO					
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL					
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES	
CASCO	☒	GAFAS			
BOTAS	☒	TAPA OIDOS			
GUANTES	☒	OTROS	TAPABOCAS ☒		
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA					
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Valla informativa	1		Información de vía cerrada ☒		
Barrera de madera	1		Cerrar la vía ☒		
Cinta de peligro	30 M		Canalización de obras ☒		
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL: 					
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS					
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA			FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA		


7 / Abril / 2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Página: 2/2



FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA		BITÁCORA DE OBRA		2021	
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página: 2/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		CONTRATO No.	1036-2021	
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		CONTRATO No.	1068-2021	
FECHA	8 / Abril / 2022		HORARIO	8:00 PM - 5:00 AM	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO ☒	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRETE DE OBRA			
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA			
ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Suministro y aplicación de pintura acrílica para impermeante	- Calle 22 Kr 12	M ²	39.75
- Suministro y aplicación de pintura plástica en filo de microesferas	- Calle 22 Kr 12	M ²	39.75

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA				
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA


PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	1	- Vehículo Tipo Furgo	- Pintura Acrílica
RESIDENTE DE OBRA	1	- Compresor de Aire	- Pintura Plástica
PROFESIONAL SISO	1		- Microesferas
INGENIERO AUXILIAR	1		
MAESTRO GENERAL	1		
OFICIALES	3		
AYUDANTES	3		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			


SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL			
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN		OBSERVACIONES	
CASCO	☒	GAFAS	
BOTAS	☒	TAPA OÍDOS	
GUANTES	☒	OTROS	TAPABOCAS ☒

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA		
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Valla informativa	1	información de vía cerrada ☒
Barrera de madera	1	Cerrar la vía ☒
Cinta de peligro	30 ML	Canalización de obras ☒

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS	


 FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA


 FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

01/09/2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Página: 2/2



FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA		BITÁCORA DE OBRA		2021	
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		CONTRATO No.	1036-2021	
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		CONTRATO No.	1068-2021	
FECHA	9 / Abril / 2022		HORARIO	8:00 PM - 4:00 AM	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTES DE OBRA				
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA				
ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	
- Pintura acrílica para impermeante	- Resaca Av. Universidad	M ²	125.77	
- Pintura plástica en frío con microperforación	- K ^o 15 N ^o 4-59 y 109 - Resaca Av. Universidad - K ^o 15 N ^o 4-59 y 109	M ²	125.77	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA				
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	1	- Vehículo Tipo Furgo	- Pintura Acrílico
RESIDENTE DE OBRA	1	- Compresor Aire	- Pintura Plástico
PROFESIONAL SISO	1		- Microperforación
INGENIERO AUXILIAR	1		
MAESTRO GENERAL	1		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	3		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			


SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL			
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN		OBSERVACIONES	
CASCO	☒	GAFAS	
BOTAS	☒	TAPA OÍDOS	
GUANTES	☒	OTROS	TAPABOCAS ☒

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA		
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Valla informativa	1	Información de vía cerrada ☒
Barrera de madera	1	Cerrar la vía ☒
Cinta de peligro	1	Canalización de obras ☒

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS


FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA


FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

01 / Abril / 2022



OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Página: 2/2

- Se autoriza por parte de la supervisión la aplicación de pintura para imprimante y pintura plástica para resaltes en la Av. Universitaria Km 15 con calle 19A y Frente a Univ. Antonio Narino


FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA


FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA		BITÁCORA DE OBRA		2021	
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página: <u>1/2</u>
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		CONTRATO No.	1036-2021	
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		CONTRATO No.	1068-2021	
FECHA	<u>11 / Abril / 2022</u>		HORARIO	<u>8:00 AM - 5:00 PM</u>	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO ☒	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
FRENTE DE OBRA					
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA					
ACTIVIDAD REALIZADA		LOCALIZACIÓN		UNIDAD	CANTIDAD
<u>Suministro e Instalación de Señales Verticales</u>		<u>Hospital San Antonio</u>		<u>UN</u>	<u>26</u>
		<u>SR-02 SR-30 SR-16</u>			
		<u>SR-46A SR-29 SR-42</u>			
		<u>SR-01</u>			
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒					
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA					
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION		LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO		SUMINISTRO DE MATERIALES	
CARGO	CANTIDAD				
DIRECTOR DE OBRA	<u>1</u>				
RESIDENTE DE OBRA	<u>1</u>				
PROFESIONAL SISO	<u>1</u>				
INGENIERO AUXILIAR	<u>1</u>				
MAESTRO GENERAL	<u>1</u>				
OFICIALES	<u>1</u>				
AYUDANTES	<u>2</u>				
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	<u>1</u>				
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	<u>1</u>				
OTRO					
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL					
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES	
CASCO	☒	GAFAS			
BOTAS	☒	TAPA OIDOS			
GUANTES	☒	OTROS	TAPABOCAS ☒		
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA					
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Valla informativa		<u>1</u>	informacion de via cerrada <u>1</u>		
Barrera de madera		<u>1</u>	Cerrar la via <u>1</u>		
Cinta de peligro		<u>1</u>	Canalización de obras <u>1</u>		
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL <u> </u>					
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS					
 FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA			 FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA		


11 / Abr / 2022


OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Página: 2/2

- Una vez verificados los diseños de Señalización Vertical entregados por la Supervisión, se efectúan los visitas y se verifica la necesidad de cada una de ellas, constatando que algunas señales no son requeridas, ya que no se han construido los resaltes, por lo tanto no se procede a su instalación.


FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA


FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA						BITÁCORA DE OBRA						2021	
PROYECTO		"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."									Página: 1/2		
CONTRATISTA		CUMBRE INGENIERIA S.A.S.						CONTRATO No.		1036-2021			
INTERVENTORÍA		CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ						CONTRATO No.		1068-2021			
FECHA		12 / Abril / 2022						HORARIO		8:00AM - 5:00PM			
ESTADO DEL TIEMPO		SOLEADO		NUBLADO X		NUBLADO LLUVIA LEVES		LLUVIAS MODERADAS		LLUVIAS INTENSAS			
FRENTE DE OBRA													
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA													
ACTIVIDAD REALIZADA							LOCALIZACIÓN		UNIDAD		CANTIDAD		
Retiro de Señales Verticales							Centro Histórico		VN		20		
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒													
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA													
DESCRIPCIÓN				ACCIÓN DE CORRECCION			LIBERACIÓN		RESPONSABLE		FECHA		
PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA				MAQUINARIA Y EQUIPO					SUMINISTRO DE MATERIALES				
CARGO		CANTIDAD											
DIRECTOR DE OBRA		1							Mortero				
RESIDENTE DE OBRA		1											
PROFESIONAL SISO		1											
INGENIERO AUXILIAR		1											
MAESTRO GENERAL		1											
OFICIALES		1											
AYUDANTES		2											
DIRECTOR DE INTERVENTORIA		1											
RESIDENTE DE INTERVENTORIA		1											
OTRO													
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL													
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN							OBSERVACIONES						
CASCO		X		GAFAS		X							
BOTAS		X		TAPA OIDOS									
GUANTES		X		OTROS		TAPABOCAS X							
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA													
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA							CANTIDAD		OBSERVACIONES				
Valla informativa							1		informacion de via cerrada				
Barrera de madera							1		Cerrar la via				
Cinta de peligro							1		Canalización de obras				
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____													
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS													
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>  FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA </div> <div>  FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA </div> </div>													

12 / Abril / 2022


OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Página: 2/2


- Por Solicitud de la supervisión del contrato, se realiza el retiro de las señales verticales, ubicadas en el centro histórico, y zonas dispersas.



FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA		BITÁCORA DE OBRA		2021	
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1036-2021		
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021		
FECHA	13 / Abril / 2022		HORARIO	9:00 AM - 5:00 PM	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO ☒	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
FRENTES DE OBRA					
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA					
ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		
- Suministro e instalación de Señales Verticales	Barrio Santa Ines	UN	9		
- Suministro e instalación de estoposoles	Barrio San Rafael	UN	200		
	Normal Fernando (Vía Tunja - Anobuco)	UN	200		
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒					
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA					
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA	
PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO		SUMINISTRO DE MATERIALES	
CARGO	CANTIDAD	Vehículo Tipo Furgón Taladro Percutor		Mortero Anclaje Epoxico Estoposoles	
DIRECTOR DE OBRA	1				
RESIDENTE DE OBRA	1				
PROFESIONAL SISO	1				
INGENIERO AUXILIAR	1				
MAESTRO GENERAL	1				
OFICIALES	1				
AYUDANTES	2				
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1				
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1				
OTRO					
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL					
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES	
CASCO	X	GAFAS			
BOTAS	X	TAPA OÍDOS			
GUANTES	X	OTROS	TAPABOCAS X		
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA					
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Valla informativa		1	información de vía cerrada		
Barrera de madera		1	Cerrar la vía		
Cinta de peligro		20 m	Canalización de obras		
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL: _____					
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS					
 FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA			 FIRMA RESIDENTE INTERVENTORÍA		

MUNICIPIO DE TUNJA		BITÁCORA DE OBRA		2021	
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1036-2021		
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021		
FECHA	13 / Abril / 2022		HORARIO	9:00 AM - 5:00 PM	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO ☒	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
FRENTES DE OBRA					
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA					
ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		
- Suministro e instalación de Señales Verticales	Barrio Santa Ines SR-28 SR-10 SR-61 SR-26	UN	9		
- Suministro e instalación de estoposoles	Barrio San Rafael Normal Femenino (Vía Tunja-Ambato)	UN UN	200 200		
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒					
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA					
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA	
PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO		SUMINISTRO DE MATERIALES	
CARGO	CANTIDAD				
DIRECTOR DE OBRA	1	- Vehículo Tipo Furgón	- Mortero		
RESIDENTE DE OBRA	1	- Taladro Percutor	- Anclaje		
PROFESIONAL SISO	1		- Epoxico		
INGENIERO AUXILIAR	1		- Estoposoles		
MAESTRO GENERAL	1				
OFICIALES	1				
AYUDANTES	2				
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1				
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1				
OTRO					
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL					
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES	
CASCO	X	GAFAS			
BOTAS	X	TAPA OÍDOS			
GUANTES	X	OTROS	TAPABOCAS X		
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA					
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Valla informativa			información de vía cerrada		
Barrera de madera			Cerrar la vía		
Cinta de peligro		20 m	Canalización de obras		
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL					
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS					
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA			FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA		

13 / Abril / 2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Página: 2/2



FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA		BITÁCORA DE OBRA		2021	
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		CONTRATO No.	1036-2021	
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		CONTRATO No.	1068-2021	
FECHA	14 / Abril / 2022		HORARIO	8:00 AM - 5:00 PM	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO ☒	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTES DE OBRA			
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA			
ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro e instalación de Señalización - Centro Histórico	SR-28A SR-28 SR-01	UN	11
	SR-01 / SR-03 SR-38		
	SR-40 SR-06 SR-06 / SR-21		

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA				
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA


PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	1		Mortero
RESIDENTE DE OBRA	1		
PROFESIONAL SISO	1		
INGENIERO AUXILIAR	1		
MAESTRO GENERAL	1		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	2		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			


SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL				
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	☒	GAFAS	☒	
BOTAS	☒	TAPA OÍDOS		
GUANTES	☒	OTROS	TAPABOCAS ☒	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA		
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Valla informativa	1	información de vía cerrada
Barrera de madera	1	Cerrar la vía
Cinta de peligro	1	Canalización de obras

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS	


FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

14 / Abril / 2022

Página: 42


FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA


FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA		BITÁCORA DE OBRA		2021	
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		CONTRATO No.	1036-2021	
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		CONTRATO No.	1068-2021	
FECHA	15 / Abril / 2022		HORARIO	8:00 AM - 5:00 PM	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO ☒	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA			
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA			
ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Suministro e instalación de señales Verticales - Glorieta Gobernador	SP-465 SP-75 SP-96A	UN	10

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA				
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA


PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	1		- Mortero
RESIDENTE DE OBRA	1		
PROFESIONAL SISO	1		
INGENIERO AUXILIAR	1		
MAESTRO GENERAL	1		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	2		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			


SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL			
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN		OBSERVACIONES	
CASCO	GAFAS		
BOTAS	TAPA OÍDOS		
GUANTES	OTROS		
	TAPABOCAS ☒		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA		
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Valla informativa	1	Información de vía cerrada 1
Barrera de madera	1	Cerrar la vía 1
Cinta de peligro	1	Canalización de obras 1

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS


 FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA


 FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA


15 / April / 2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Página: 42



FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA		BITÁCORA DE OBRA		2021	
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		CONTRATO No.	1036-2021	
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		CONTRATO No.	1068-2021	
FECHA	26 / Abril / 2021		HORARIO	8:00 AM - 5:00 PM	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
				X	
FRENTE DE OBRA					
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA					
ACTIVIDAD REALIZADA		LOCALIZACIÓN		UNIDAD	CANTIDAD
- Suministro e instalación de Señales Verticales		- Chiseta Gobernador OR-02 SP/24-SR-30 SP-461		UN	10
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒					
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA					
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION		LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA					
CARGO	CANTIDAD	MAQUINARIA Y EQUIPO		SUMINISTRO DE MATERIALES	
DIRECTOR DE OBRA	1			- Mortero	
RESIDENTE DE OBRA	1				
PROFESIONAL SISO	1				
INGENIERO AUXILIAR	1				
MAESTRO GENERAL	1				
OFICIALES	1				
AYUDANTES	2				
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1				
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1				
OTRO					
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL					
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN			OBSERVACIONES		
CASCO	X	GAFAS			
BOTAS	X	TAPA OIDOS			
GUANTES	X	OTROS	TAPABOCAS	X	
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA					
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Valla informativa		1	Información de vía cerrada		
Barrera de madera		1	Cerrar la vía		
Cinta de peligro		1	Canalización de obras		
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____					
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS					
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA			FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA		

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

16 / Abril / 2022

Página: 2/2

- Debido a la presencia de fuertes lluvias presentadas en horas de la noche anterior y durante el día, no se efectuaron actividades de Aplicación de pinturas plásticas y acrílicas.
- Solo se realizaron actividades en horas de la tarde (Señalización Vertical).



FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA		BITÁCORA DE OBRA		2021																																													
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página: 4/2																																												
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		CONTRATO No.	1036-2021																																													
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		CONTRATO No.	1068-2021																																													
FECHA	18 / Abril / 2022		HORARIO	8:00AM - 5:00PM																																													
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS																																												
FRENTE DE OBRA																																																	
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA																																																	
ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN		UNIDAD	CANTIDAD																																													
Suministro e instalación de estopos	Av. Colon Calle 13		UN	164																																													
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒																																																	
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA																																																	
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA</th> <th>MAQUINARIA Y EQUIPO</th> <th>SUMINISTRO DE MATERIALES</th> </tr> <tr> <th>CARGO</th> <th>CANTIDAD</th> <th> </th> <th> </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIRECTOR DE OBRA</td> <td>1</td> <td rowspan="5">- Vehículo Tipo Furgón</td> <td>- Epóxico</td> </tr> <tr> <td>RESIDENTE DE OBRA</td> <td>1</td> <td>- Anclajes</td> </tr> <tr> <td>PROFESIONAL SISO</td> <td>1</td> <td>- Estopos</td> </tr> <tr> <td>INGENIERO AUXILIAR</td> <td>1</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>MAESTRO GENERAL</td> <td>1</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>OFICIALES</td> <td>1</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>AYUDANTES</td> <td>4</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</td> <td>1</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>RESIDENTE DE INTERVENTORÍA</td> <td>1</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>OTRO</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>						PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES	CARGO	CANTIDAD			DIRECTOR DE OBRA	1	- Vehículo Tipo Furgón	- Epóxico	RESIDENTE DE OBRA	1	- Anclajes	PROFESIONAL SISO	1	- Estopos	INGENIERO AUXILIAR	1		MAESTRO GENERAL	1		OFICIALES	1			AYUDANTES	4			DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1			RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1			OTRO			
PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES																																														
CARGO	CANTIDAD																																																
DIRECTOR DE OBRA	1	- Vehículo Tipo Furgón	- Epóxico																																														
RESIDENTE DE OBRA	1		- Anclajes																																														
PROFESIONAL SISO	1		- Estopos																																														
INGENIERO AUXILIAR	1																																																
MAESTRO GENERAL	1																																																
OFICIALES	1																																																
AYUDANTES	4																																																
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1																																																
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1																																																
OTRO																																																	
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL																																																	
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES																																													
CASCO	☒	GAFAS																																															
BOTAS	☒	TAPA OÍDOS																																															
GUANTES	☒	OTROS	TAPABOCAS ☒																																														
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA																																																	
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES																																														
Valla informativa		1	informacion de via cerrada ☒																																														
Barrera de madera		1	Cerrar la via ☒																																														
Cinta de peligro		504L	Canalización de obras ☒																																														
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL <input type="text"/>																																																	
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS																																																	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA </div> <div style="width: 45%;">  FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA </div> </div>																																																	

18 / Abril / 2022


OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Página: 2/2


FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA


FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA		BITÁCORA DE OBRA		2021	
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."			Página: 4/2	
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		CONTRATO No.	1036-2021	
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		CONTRATO No.	1068-2021	
FECHA	18 / Abril / 2022		HORARIO	8:00 AM - 5:00 PM	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA			FREENTE DE OBRA		
ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		
Suministro e instalación de estopos	Av. Colon Calle 13	un	164		
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA					
SI ☐ NO ☒					
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA					
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA	
PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO		SUMINISTRO DE MATERIALES	
CARGO	CANTIDAD				
DIRECTOR DE OBRA	1	- Vehículo Tipo Furgón		- Epóxico	
RESIDENTE DE OBRA	1			- Anchete	
PROFESIONAL SISO	1			- Estopos	
INGENIERO AUXILIAR	1				
MAESTRO GENERAL	1				
OFICIALES	1				
AYUDANTES	4				
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1				
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1				
OTRO					
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL					
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN		OBSERVACIONES			
CASCO	X	GAFAS			
BOTAS	X	TAPA OÍDOS			
GUANTES	X	OTROS	TAPABOCAS	X	
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA					
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Valla informativa					
Barrera de madera			Información de vía cerrada		
Cinta de peligro		504L	Cerrar la vía		
			Canalización de obras		
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES					
SI ☐ NO ☒ CUÁL					
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS					
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA					
FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA					

MUNICIPIO DE TUNJA		BITÁCORA DE OBRA		2021	
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		CONTRATO No.	1036-2021	
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		CONTRATO No.	1068-2021	
FECHA	19/Abril/21		HORARIO		
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
				X	X
FRENTE DE OBRA					
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA					
ACTIVIDAD REALIZADA		LOCALIZACIÓN		UNIDAD	CANTIDAD
Suministro e instalación de estoperoles		Calle 4 K 14 A 16		UN	198
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒					
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA					
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION		LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO		SUMINISTRO DE MATERIALES	
CARGO	CANTIDAD				
DIRECTOR DE OBRA	—	Vehículo Tipo Furgon		Anclaje estoperoles epoxico	
RESIDENTE DE OBRA	1				
PROFESIONAL SISO	—				
INGENIERO AUXILIAR	—				
MAESTRO GENERAL	—				
OFICIALES	1				
AYUDANTES	2				
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—				
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1				
OTRO					
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL					
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN		SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA		OBSERVACIONES	
CASCO	☒	GAFAS	☒		
BOTAS	☒	TAPA OIDOS	☐		
GUANTES	☒	OTROS	TAPABOCAS ☒		
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD		OBSERVACIONES	
Valla informativa				Información de vía cerrada ☒	
Barrera de madera				Cerrar la vía ☒	
Cinta de peligro		50ML		Canalización de obras ☐	
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____					
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS					
 FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA			 FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA		

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

19 / 06 / 2022
Página: 2/2



FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA		BITÁCORA DE OBRA		2021																																							
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página: 4/2																																						
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		CONTRATO No.	1036-2021																																							
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		CONTRATO No.	1068-2021																																							
FECHA	20 / Abril / 2022		HORARIO	12:00PM - 4:00PM																																							
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS X																																						
FREENTE DE OBRA																																											
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA																																											
ACTIVIDAD REALIZADA		LOCALIZACIÓN		UNIDAD	CANTIDAD																																						
- Suministro e instalación de estopos		- Barrio Santo Inés		UN	50																																						
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒																																											
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA																																											
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA</th> <th>MAQUINARIA Y EQUIPO</th> <th>SUMINISTRO DE MATERIALES</th> </tr> <tr> <th>CARGO</th> <th>CANTIDAD</th> <th> </th> <th> </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIRECTOR DE OBRA</td> <td>1</td> <td rowspan="6">- Vehículo Tipo Furgo</td> <td rowspan="6">- Estopos - Anclajes - Epoxicos</td> </tr> <tr> <td>RESIDENTE DE OBRA</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>PROFESIONAL SISO</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>INGENIERO AUXILIAR</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>MAESTRO GENERAL</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>OFICIALES</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>AYUDANTES</td> <td>3</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</td> <td>1</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>RESIDENTE DE INTERVENTORÍA</td> <td>1</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>OTRO</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>						PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES	CARGO	CANTIDAD			DIRECTOR DE OBRA	1	- Vehículo Tipo Furgo	- Estopos - Anclajes - Epoxicos	RESIDENTE DE OBRA	1	PROFESIONAL SISO	1	INGENIERO AUXILIAR	1	MAESTRO GENERAL	1	OFICIALES	1	AYUDANTES	3			DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1			RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1			OTRO			
PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES																																								
CARGO	CANTIDAD																																										
DIRECTOR DE OBRA	1	- Vehículo Tipo Furgo	- Estopos - Anclajes - Epoxicos																																								
RESIDENTE DE OBRA	1																																										
PROFESIONAL SISO	1																																										
INGENIERO AUXILIAR	1																																										
MAESTRO GENERAL	1																																										
OFICIALES	1																																										
AYUDANTES	3																																										
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1																																										
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1																																										
OTRO																																											
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL																																											
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN		OBSERVACIONES																																									
CASCO	X	GAFAS																																									
BOTAS	X	TAPA OÍDOS																																									
GUANTES	X	OTROS	TAPABOCAS X																																								
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA																																											
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES																																								
Valla informativa																																											
Barrera de madera																																											
Cinta de peligro																																											
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL																																											
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS																																											
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA </div> <div style="width: 45%;">  FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA </div> </div>																																											

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

20 / Abril / 2022

Página: 2/2



FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA

BITÁCORA DE OBRA

2021

PROYECTO

"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."

Página:

1/2

CONTRATISTA

CUMBRE INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO No.

1036-2021

INTERVENTORÍA

CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

CONTRATO No.

1068-2021

FECHA

23 / Abril / 2022

HORARIO

8:00 AM - 5:00 PM

ESTADO DEL TIEMPO

SOLEADO

NUBLADO

X NUBLADO LLUVIA LEVES

LLUVIAS MODERADAS

LLUVIAS INTENSAS

X

FRETE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA

LOCALIZACIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

- Retiro de Señalización Vertical - Glorito Concreto

UN

6

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI ☐NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN

ACCIÓN DE CORRECCIÓN

LIBERACIÓN

RESPONSABLE

FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA

MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTRO DE MATERIALES

CARGO

CANTIDAD

DIRECTOR DE OBRA

1

RESIDENTE DE OBRA

1

PROFESIONAL SISO

1

INGENIERO AUXILIAR

1

MAESTRO GENERAL

1

OFICIALES

3

AYUDANTES

3

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

1

RESIDENTE DE

INTERVENTORÍA

1

OTRO

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

CASCO

X

GAFAS

OBSERVACIONES

BOTAS

X

TAPA OÍDOS

GUANTES

X

OTROS

TAPABOCAS

X

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA

CANTIDAD

OBSERVACIONES

Valla informativa

1

Barrera de madera

1

Cinta de peligro

1

Información de vía cerrada

X

Cerrar la vía

Canalización de obras

X

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES

SI ☐NO ☒

CUÁL

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

23 / Abril / 2012

Página: 2/2

- Se presentaron fuertes lluvias en horas de la tarde y noche



FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA		BITÁCORA DE OBRA		2021	
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página: <i>1/2</i>
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		CONTRATO No.	1036-2021	
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		CONTRATO No.	1068-2021	
FECHA	<i>25 / Abril / 2022</i>		HORARIO	<i>8:00 AM - 5:00 PM</i>	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS <i>X</i>
FRENTE DE OBRA					
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA					
ACTIVIDAD REALIZADA		LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	
<i>- Debido a fuertes lluvias, no se efectuaron actividades el día hoy</i>					
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒					
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA					
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA	
PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO		SUMINISTRO DE MATERIALES	
CARGO	CANTIDAD				
DIRECTOR DE OBRA	<i>1</i>				
RESIDENTE DE OBRA	<i>1</i>				
PROFESIONAL SISO	<i>1</i>				
INGENIERO AUXILIAR	<i>1</i>				
MAESTRO GENERAL	<i>1</i>				
OFICIALES	<i>1</i>				
AYUDANTES	<i>3</i>				
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	<i>1</i>				
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	<i>1</i>				
OTRO					
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL					
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES	
CASCO		GAFAS			
BOTAS		TAPA OIDOS			
GUANTES		OTROS	TAPABOCAS		
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA					
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Valla informativa			Información de vía cerrada		
Barrera de madera			Cerrar la vía		
Cinta de peligro			Canalización de obras		
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☐ CUÁL _____					
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS					
<i>[Firma]</i> FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA			<i>[Firma]</i> FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA		


25 / Abr / 2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS


Página: 2/2



FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA		BITÁCORA DE OBRA		2021	
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página: 2/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		CONTRATO No.	1036-2021	
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		CONTRATO No.	1068-2021	
FECHA	26 / Abril / 2022		HORARIO	8:00 AM - 5:00 PM	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
FRENTE DE OBRA					
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA					
ACTIVIDAD REALIZADA		LOCALIZACIÓN		UNIDAD	CANTIDAD
<i>Suministro de Señalización Vertical</i>		<i>Centro Histórico</i>		<i>UN</i>	<i>10</i>
		<i>SR-2B SR-01</i>			
		<i>SR-28A CC.VIVA</i>			
		<i>- SITIO DISPERSO (Retro)</i>			
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒					
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA					
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN		LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO		SUMINISTRO DE MATERIALES	
CARGO	CANTIDAD				
DIRECTOR DE OBRA	<i>1</i>				
RESIDENTE DE OBRA	<i>1</i>			<i>Mortero</i>	
PROFESIONAL SISO	<i>1</i>				
INGENIERO AUXILIAR	<i>1</i>				
MAESTRO GENERAL	<i>1</i>				
OFICIALES	<i>1</i>				
AYUDANTES	<i>3</i>				
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	<i>1</i>				
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	<i>1</i>				
OTRO					
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL					
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES	
CASCO	☒	GAFAS	☐		
BOTAS	☒	TAPA OÍDOS	☐		
GUANTES	☒	OTROS	TAPABOCAS ☒		
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA					
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Valla informativa		<i>1</i>	información de vía cerrada <i>1</i>		
Barrera de madera		<i>1</i>	Cerrar la vía <i>1</i>		
Cinta de peligro		<i>1</i>	Canalización de obras <i>1</i>		
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL <i> </i>					
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS					
 FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA			 FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA		

26/Abril/2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Página: 2/2

- La interventoría solicita se incluyan Cuadritas para las actividades de Señalización horizontal para el Bando el Consuelo



FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA		BITÁCORA DE OBRA		2021	
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		CONTRATO No.	1036-2021	
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		CONTRATO No.	1068-2021	
FECHA	27 / Abril / 2020		HORARIO	8:00 AM - 5:00 PM	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO ☒	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
FRETE DE OBRA					
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA					
ACTIVIDAD REALIZADA		LOCALIZACIÓN		UNIDAD	CANTIDAD
- Suministro y aplicación de pintura acrílica para imprimante		- Barrio El Consuelo		M ²	100
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA ☐ SI ☒ NO					
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA					
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA	
PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO		SUMINISTRO DE MATERIALES	
CARGO	CANTIDAD				
DIRECTOR DE OBRA	1	- Vehículo Tipo Furgón		- Pintura Acrílica	
RESIDENTE DE OBRA	1				
PROFESIONAL SISO	1				
INGENIERO AUXILIAR	1				
MAESTRO GENERAL	1				
OFICIALES	1				
AYUDANTES	4				
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1				
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1				
OTRO					
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL					
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN		OBSERVACIONES			
CASCO	☒	GAFAS	☐		
BOTAS	☒	TAPA OÍDOS	☐		
GUANTES	☒	OTROS	TAPABOCAS ☒		
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA					
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Valla informativa		1	información de vía cerrada ☒		
Barrera de madera		1	Cerrar la vía ☒		
Cinta de peligro		50m	Canalización de obras ☐		
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES ☐ SI ☒ NO CUÁL ☐					
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS					
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA					
FIRMA RESIDENTE INTERVENTORÍA					

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

27 / Abr / 2022

Página: 2/2

- Una vez entregado el diseño definitivo para la instalación de la Señalización horizontal del Sector Bordo del Consuelo, se procedió a efectuar su aplicación en horas de la noche.



FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA		BITÁCORA DE OBRA		2021	
PROYECTO		"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."			
CONTRATISTA		CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		CONTRATO No.	1036-2021
INTERVENTORÍA		CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		CONTRATO No.	1068-2021
FECHA		28 / Agosto / 2021		HORARIO	8:00 PM - 5:00 AM
ESTADO DEL TIEMPO		SOLEADO	NUBLADO ☒	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS
					LLUVIAS INTENSAS
FRENTES DE OBRA					
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA					
ACTIVIDAD REALIZADA		LOCALIZACIÓN		UNIDAD	CANTIDAD
Suministro y aplicación de pintura acrílica para imprimante		Barrio El Consuelo		M ²	100
Suministro y aplicación de pintura plástica en finc. Microempresa		Barrio El Consuelo		M ²	60
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA ☐ SI ☒ NO					
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA					
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN		LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO		SUMINISTRO DE MATERIALES	
CARGO	CANTIDAD				
DIRECTOR DE OBRA	1	Vehículo tipo Furgon		Pintura Acrílica	
RESIDENTE DE OBRA	1	Compresor Aire		Pintura plástica	
PROFESIONAL SISO	1			Microempresa	
INGENIERO AUXILIAR	1				
MAESTRO GENERAL	1				
OFICIALES	1				
AYUDANTES	3				
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1				
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1				
OTRO					
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL					
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES	
CASCO	☒	GAFAS	☐		
BOTAS	☒	TAPA OÍDOS	☐		
GUANTES	☒	OTROS	TAPABOCAS ☒		
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA					
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Valla Informativa		1	Información de vía cerrada ☒		
Barrera de madera		1	Cerrar la vía ☒		
Cinta de peligro		50m	Canalización de obras ☐		
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES ☐ SI ☒ NO CUÁL					
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS					
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA					
FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA					

28 / Abril / 2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Página: 2/2



FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA




FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA		BITÁCORA DE OBRA		2021	
PROYECTO		"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."			Página: 1/2
CONTRATISTA		CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		CONTRATO No.	1036-2021
INTERVENTORÍA		CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		CONTRATO No.	1068-2021
FECHA		29 / Abril / 2022		HORARIO	8:00 PM - 5:00 AM
ESTADO DEL TIEMPO		SOLEADO	NUBLADO ☒	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS
					LLUVIAS INTENSAS
FRENTE DE OBRA					
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA					
ACTIVIDAD REALIZADA		LOCALIZACIÓN		UNIDAD	CANTIDAD
- Suministro y aplicación de pintura Asfáltica para imprimante		- Barrio el Consuelo		M ²	100
- Suministro y aplicación de pintura plástica epoxy con microesfera		- Barrio el Consuelo		M ²	80
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA ☐ SI ☒ NO					
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA					
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA	
PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO		SUMINISTRO DE MATERIALES	
CARGO	CANTIDAD				
DIRECTOR DE OBRA	1	- Vehículo Tipo Lujon		- Pintura Asfáltica	
RESIDENTE DE OBRA	1	- Compresor Aire		-	
PROFESIONAL SISO	1				
INGENIERO AUXILIAR	1				
MAESTRO GENERAL	1				
OFICIALES	3				
AYUDANTES	3				
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1				
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1				
OTRO					
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL					
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES	
CASCO	☒	GAFAS	☐		
BOTAS	☒	TAPA OÍDOS	☐		
GUANTES	☒	OTROS	TAPABOCAS ☒		
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA					
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Valla informativa		1	información de vía cerrada ☒		
Barrera de madera		1	Cerrar la vía ☒		
Cinta de peligro		1	Canalización de obras ☐		
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES ☐ SI ☒ NO CUÁL _____					
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS					
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA					
FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA					

29/Abil/2022
Página: 2/2

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS



FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA		BITÁCORA DE OBRA		2021	
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAción VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		CONTRATO No.	1036-2021	
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		CONTRATO No.	1068-2021	
FECHA	30 / Abril / 2022		HORARIO	8:00 PM - 5:00 AM	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES ☒	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
FREENTE DE OBRA					
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA					
ACTIVIDAD REALIZADA		LOCALIZACIÓN		UNIDAD	CANTIDAD
- Suministro y aplicación de pintura Acrílica para impermeabilización		- Barrio el Consuelo		M ²	18,67
- Suministro y aplicación de pintura plástica a frío con microesfera		- Barrio el Consuelo		M ²	80
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒					
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA					
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN		LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO		SUMINISTRO DE MATERIALES	
CARGO	CANTIDAD				
DIRECTOR DE OBRA	1	- Vehículo Tipo Furgon		- Pintura Acrílica	
RESIDENTE DE OBRA	1	- Compressor Aire		- Pintura Plástica	
PROFESIONAL SISO	1			- Microesferas	
INGENIERO AUXILIAR	1				
MAESTRO GENERAL	1				
OFICIALES	1				
AYUDANTES	3				
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1				
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1				
OTRO					
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL					
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES	
CASCO	☒	GAFAS			
BOTAS	☒	TAPA OÍDOS			
GUANTES	☒	OTROS	TAPABOCAS ☒		
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA					
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Valla informativa		1	información de vía cerrada ☒		
Barrera de madera		1	Cerrar la vía ☒		
Cinta de peligro		50M	Canalización de obras ☒		
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL: _____					
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS					
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA			FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA		

30 / Abr / 2022
Página: 2/2

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS


FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA


FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA


MUNICIPIO DE TUNJA		BITÁCORA DE OBRA		2021	
PROYECTO		"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."			
CONTRATISTA		CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		CONTRATO No. 1036-2021	
INTERVENTORÍA		CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		CONTRATO No. 1068-2021	
FECHA		21 MAYO / 2022		HORARIO 8:00 PM - 5:00 AM	
ESTADO DEL TIEMPO		SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS
					LLUVIAS INTENSAS
FREENTE DE OBRA					
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA					
ACTIVIDAD REALIZADA		LOCALIZACIÓN		UNIDAD	CANTIDAD
- Suministro y aplicación de pintura plástica en trazo con microesferas		Barrio el Consuelo		M ²	60
- Suministro de pintura Acrílica para Impregnante		Green Hills Glorieta		M ²	65.91
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒					
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA					
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA	
PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO		SUMINISTRO DE MATERIALES	
CARGO	CANTIDAD				
DIRECTOR DE OBRA	1	- Vehículo Tipo Furgon		- Pintura plástica - Microesferas - Pintura Acrílico	
RESIDENTE DE OBRA	1				
PROFESIONAL SISO	1				
INGENIERO AUXILIAR	1				
MAESTRO GENERAL	1				
OFICIALES	1				
AYUDANTES	3				
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1				
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1				
OTRO					
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL					
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES	
CASCO	X	GAFAS			
BOTAS	X	TAPA OÍDOS			
GUANTES	X	OTROS	TAPABOCAS X		
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA					
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Valla informativa		1	información de vía cerrada X		
Barrera de madera		1	Cerrar la vía X		
Cinta de peligro		5042	Canalización de obras		
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____					
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS					
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA			FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA		

2 / MAYO / 2022
Página: 2/2

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS



FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA		BITÁCORA DE OBRA		2021	
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		CONTRATO No.	1035-2021	
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		CONTRATO No.	1068-2021	
FECHA	31 Mayo / 2022		HORARIO	8:00 AM - 4:00 PM	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
			X		
FRENTE DE OBRA					
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA					
ACTIVIDAD REALIZADA		LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	
- Suministro e instalación de pintura		- Puente el Casap	M ²	88.67	
- Suministro y aplicación de pintura		- Glorieta Green Hills	M ²	50	
- Suministro Pintura Plástica en frío		- Glorieta Green Hills	M ²	80	
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒					
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA					
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN		LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO		SUMINISTRO DE MATERIALES	
CARGO	CANTIDAD				
DIRECTOR DE OBRA	1	- Vehículo Tipo Tercero		- Pintura plástica	
RESIDENTE DE OBRA	1			- Bricopse	
PROFESIONAL SISO	1				
INGENIERO AUXILIAR	1				
MAESTRO GENERAL	1				
OFICIALES	3				
AYUDANTES	1				
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1				
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1				
OTRO					
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL					
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES	
CASCO	X	GAFAS			
BOTAS	X	TAPA OÍDOS			
GUANTES	X	OTROS	TAPABOCAS ☒		
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA					
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Valla informativa		1	Información de vía cerrada ☒		
Barrera de madera		1	Cerrar la vía ☒		
Cinta de peligro		30M	Canalización de obras ☒		
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL: _____					
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS					
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA			FIRMA RESIDENTE INTERVENTORÍA		


OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

3/MAYO/2022
Página: 2/2

- Se presentaron fuertes lluvias en horas de tarde



FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA


MUNICIPIO DE TUNJA						BITÁCORA DE OBRA		2021		
PROYECTO		"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."							Página:	1/2
CONTRATISTA		CUMBRE INGENIERIA S.A.S.				CONTRATO No.		1036-2021		
INTERVENTORÍA		CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ				CONTRATO No.		1068-2021		
FECHA		4 / MAYO / 2022				HORARIO		8:00 AM - 4:00 PM		
ESTADO DEL TIEMPO		SOLEADO		NUBLADO X		NUBLADO LLUVIA LEVES		LLUVIAS MODERADAS		LLUVIAS INTENSAS
FRENTES DE OBRA										
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA										
ACTIVIDAD REALIZADA				LOCALIZACIÓN		UNIDAD		CANTIDAD		
Suministro y aplicación de pintura acrílica para imprimante				Glaceta Green Hills		M ²		100		
Suministro y aplicación de pintura plástica en filo				Glaceta Green Hills		M ²		50		
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒										
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA										
DESCRIPCIÓN		ACCIÓN DE CORRECCIÓN		LIBERACIÓN		RESPONSABLE		FECHA		
PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO				SUMINISTRO DE MATERIALES				
CARGO	CANTIDAD									
DIRECTOR DE OBRA	1	Vehículo tipo Jipón				Pintura Acrílica				
RESIDENTE DE OBRA	1	Compresor de Aire				Pintura Plástica				
PROFESIONAL SISO	1					Microesferas				
INGENIERO AUXILIAR	1									
MAESTRO GENERAL	1									
OFICIALES	3									
AYUDANTES	3									
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1									
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1									
OTRO										
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL										
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN						OBSERVACIONES				
CASCO	X	GAFAS								
BOTAS	X	TAPA OIDOS								
GUANTES	X	OTROS	TAPABOCAS X							
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA										
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA				CANTIDAD		OBSERVACIONES				
Valla informativa				=		información de vía cerrada X				
Barrera de madera				=		Cerrar la vía X				
Cinta de peligro				=		Canalización de obras =				
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____										
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA</div> <div>FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA</div> </div>										

4/Mayo/2022
Página: 2/2



OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS



FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA			BITÁCORA DE OBRA					2021	
PROYECTO		CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.							Página: 4/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.		1036-2021					
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.		1068-2021					
FECHA	5 / Mayo / 2022			HORARIO		8:00 AM - 3:00 PM			
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO ☒	NUBLADO LLUVIA LEVES		LLUVIAS MODERADAS		LLUVIAS INTENSAS		
FRENTE DE OBRA									
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA									
ACTIVIDAD REALIZADA				LOCALIZACIÓN		UNIDAD	CANTIDAD		
Suministro y aplicación de pintura acrílica para marcas viales complementarias				Vía Páez-Ambato		M ^L	4312		
Suministro y aplicación de pintas Acrylic				Via Páez-Ambato		M ^L	4312		
Suministro e instalación de Dispositivo				El Consultorio Autos Trafficar		UF VN	20 20		
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒									
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCumplimientos presentados en la obra									
DESCRIPCION		Acción de correccion		LIBERACION		RESPONSABLE		FECHA	
PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO				SUMINISTRO DE MATERIALES			
CARGO	CANTIDAD	Vehículo Tipo Furgoneta				Pintura Acrilica			
DIRECTOR DE OBRA	1	Compresor de Aire				Pintura plástica			
RESIDENTE DE OBRA	1					Hidroestera			
PROFESIONAL SESO	1								
INGENIERO AUXILIAR	()								
MAESTRO GENERAL OFICIALES	2								
AYUDANTES	3								
DIRECTOR DE INTERVENORIA	1								
RESIDENTE DE INTERVENORIA	1								
Otro									
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL									
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN					OBSERVACIONES				
Casco	X	GAFAS							
BOTAS	X	TAPA OIDOS							
GUANTES	X	OTROS	TAPABOCAS	✓					
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA									
SEñalización UTILIZADA					CANTIDAD	OBSERVACIONES			
Valta informativa					=	Información de vía cerrada X			
Barrera de madera					=	Cerrar la vía ✓			
Cinta de peligro					=	Canalización de obras =			
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____									
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS									
 FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA					 FIRMA RESPONSABLE INTERVENTORIA				

5/MAYO/2022

Página: 2/2

- Una vez verificado el estado actual de algunos tramos de vía, (Tunja - Arcabuco), se solicita por parte de la interventoría se aplique imprimante en pintura acrílica y se proceda a pintar.


FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA
FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA


MUNICIPIO DE TUNJA		BITÁCORA DE OBRA		2021	
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		CONTRATO No.	1036-2021	
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		CONTRATO No.	1068-2021	
FECHA	6/ MAYO / 2022		HORARIO	8:00AM - 3:00AM	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS X
FRENTES DE OBRA					
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA					
ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		
Suministro y aplicación de pintura plástica en firme en microespera	- Glorieta Gran Hito	M2	135,91		
Suministro e instalación de Depósitos	- Punto de conexión	UN	17		
	- Hitos	UN	115		
	- Estacionamiento	UN	180		
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒					
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA					
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA	
PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA					
CARGO	CANTIDAD	MAQUINARIA Y EQUIPO		SUMINISTRO DE MATERIALES	
DIRECTOR DE OBRA	1	- Vehículo Tipo Furgón		- Pintura Plástica	
RESIDENTE DE OBRA	1			- Microespera	
PROFESIONAL SISO	1				
INGENIERO AUXILIAR	1				
MAESTRO GENERAL	1				
OFICIALES	2				
AYUDANTES	3				
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1				
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1				
OTRO					
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL					
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES	
CASCO	X	GAFAS			
BOTAS	X	TAPA OÍDOS			
GUANTES	X	OTROS	TAPABOCAS X		
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA					
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Valla informativa		1	información de vía cerrada X		
Barrera de madera		1	Cerrar la vía X		
Cinta de peligro		40 ml	Canalización de obras X		
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____					
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS					
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA					
FIRMA RESIDENTE INTERVENTORÍA					


OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

6 / MAYO / 2022

Página: 2/2


FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA		BITÁCORA DE OBRA		2021	
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		CONTRATO No.	1036-2021	
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		CONTRATO No.	1068-2021	
FECHA	7/MAYO/2022		HORARIO	8:00 PM - 4:00 AM	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
			X		
FRETE DE OBRA					
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA					
ACTIVIDAD REALIZADA		LOCALIZACIÓN		UNIDAD	CANTIDAD
<i>Suministro e instalación de pintura acrílica para impermeabilización</i>		<i>- Glacieta Externo</i>		<i>M²</i>	<i>60</i>
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒					
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA					
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN		LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO		SUMINISTRO DE MATERIALES	
CARGO	CANTIDAD				
DIRECTOR DE OBRA	<i>1</i>	<i>- Vehículo tipo Ford</i>		<i>- Pintura Acrílica</i>	
RESIDENTE DE OBRA	<i>1</i>	<i>- Compresor de Aire</i>			
PROFESIONAL SISO	<i>1</i>				
INGENIERO AUXILIAR	<i>1</i>				
MAESTRO GENERAL	<i>1</i>				
OFICIALES	<i>1</i>				
AYUDANTES	<i>3</i>				
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	<i>1</i>				
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	<i>1</i>				
OTRO					
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL					
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES	
CASCO	☒	GAFAS			
BOTAS	☒	TAPA OÍDOS			
GUANTES	☒	OTROS	TAPABOCAS ☒		
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA					
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Valla Informativa		<i>1</i>	Información de vía cerrada ☒		
Barrera de madera		<i>1</i>	Cerrar la vía ☒		
Cinta de peligro		<i>50 M</i>	Canalización de obras ☒		
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____					
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS					
 FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA			 FIRMA RESIDENTE INTERVENTORÍA		

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

7/MAYO/2022
Página: 27


FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA


FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA		BITÁCORA DE OBRA		2021	
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		CONTRATO No.	1036-2021	
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		CONTRATO No.	1068-2021	
FECHA	9 / MAYO / 2022		HORARIO	9:00 PM - 3:00 AM	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	X	LLUVIAS MODERADAS
					LLUVIAS INTENSAS
FRENTE DE OBRA					
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA					
ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		
- Suministro y aplicación de pintura	- Glorieta Gobernador	M ²	96,48		
- Suministro y aplicación de pintura	- Glorieta Gobernador	M ²	50		
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA					
SI ☐ NO ☒					
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA					
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA	
PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA					
CARGO	CANTIDAD	MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES		
DIRECTOR DE OBRA	1	- Vehículo Tipo Furgón	- Pintura Acrílica		
RESIDENTE DE OBRA	1	- Compresor de Aire			
PROFESIONAL SISO	1				
INGENIERO AUXILIAR	1				
MAESTRO GENERAL	1				
OFICIALES	3				
AYUDANTES	3				
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1				
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1				
OTRO					
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL					
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES	
CASCO	X	GAFAS			
BOTAS	X	TAPA OÍDOS			
GUANTES	X	OTROS	TAPABOCAS	X	
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA					
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES			
Varita Informativa	1	Información de vía cerrada			
Barrera de madera	1	Cerrar la vía			
Cinta de peligro	50m	Canalización de obras			
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES					
SI ☐ NO ☒ CUÁL					
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS					
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA					
FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA					

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

9/MAYO/2022

Página: 2/2

- Se solicita por parte de la supervisión el otorgado de algunas
placas y demarcaciones con imprimante en la zona de la Glorieta
del gobernador


FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA
FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA			BITÁCORA DE OBRA			2022
PROYECTO	CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.					Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1036-2021			
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021			
FECHA	10/Mayo/2022		HORARIO	10:00 PM - 2:00 AM		
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	X	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
FRENTES DE OBRA						
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA						
ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD			
- Suministro y aplicación de pintura plástica en frío, con microesfera	Glorieta Gobernador	M ²	40			
- Aplicación de bandas reductoras de velocidad	Glorieta Gobernador	M ²	18			
SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒						
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA						
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA		
PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA						
CARGO	CANTIDAD	MAQUINARIA Y EQUIPO		SUMINISTRO DE MATERIALES		
DIRECTOR DE OBRA	I	Vehículo tipo Furgón		Pintura plástica		
RESIDENTE DE OBRA	I			Microesferas		
PROFESIONAL SISO	III			Grava 19mm		
INGENIERO AUXILIAR	II			Epóxido para bandos		
MAESTRO GENERAL	I					
OFICIALES	I					
AYUDANTES	I					
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	I					
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	I					
OTRO						
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL						
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES		
CASCOS	X	GAFAS				
BOTAS	X	TAPA OÍDOS				
GUANTES	X	OTROS	TAPABOCAS X			
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA						
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES				
Valla informativa	=	Información de vía cerrada X				
Barrera de madera		Cerrar la vía X				
Cinta de peligro	Seml	Canalización de obras =				
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____						
OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS						
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA						
FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA						

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

10 / MAYO / 2017

Página: 2/2


FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA


FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 55 DE 78

ANEXO 11.10 INFORMES SEMANALES

	ALCALDIA DE TUNJA		FECHA: 09/09/2019	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		VERSIÓN: 01	
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA		CODIGO:GIN-F-033	
	FORMATO:INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA			
* Esta versión aplica para los contratos que inicien posteriormente a la fecha de la vigencia de este formato				
FECHA	31 DE MARZO DE 2022	PERIODO No.	14	DEL 23 DE MARZO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022
1. INFORMACIÓN GENERAL				
OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE TUNJA			
CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA		
CONTRATO No.:	1068 DE 2021	CONTRATO No.:	1036 DE 021	
PLAZO INICIAL:	3 MESES	PLAZO INICIAL:	3 MESES	
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021	
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	28 DE ENERO DE 2022	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	28 DE ENERO DE 2022	
TIEMPO DE SUSPENSIÓN INICIAL	15 DIAS CALENDARIO	TIEMPO DE SUSPENSIÓN INICIAL	15 DIAS CALENDARIO	
FECHA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN #1	12 DE FEBRERO DE 2022	FECHA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN #1	12 DE FEBRERO DE 2022	
TIEMPO DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN #1	15 DIAS CALENDARIO	TIEMPO DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN #1	15 DIAS CALENDARIO	
FECHA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN #2	25 DE FEBRERO DE 2022	FECHA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN #2	25 DE FEBRERO DE 2022	
TIEMPO DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN #2	6 DIAS CALENDARIO	TIEMPO DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN #2	6 DIAS CALENDARIO	
FECHA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN #3	04 DE MARZO DE 2022	FECHA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN #3	04 DE MARZO DE 2022	
TIEMPO DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN #3	10 DIAS CALENDARIO	TIEMPO DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN #3	10 DIAS CALENDARIO	
**FECHA DE REINICIACIÓN:	15 DE MARZO DE 2022	**FECHA DE REINICIACIÓN:	15 DE MARZO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN 2:	22 DE MARZO DE 2022	FECHA DE TERMINACIÓN 2:	22 DE MARZO DE 2022	
**FECHA DE INICIO PRORROGA #1:	23 DE MARZO DE 2022	**FECHA DE INICIO PRORROGA #1:	23 DE MARZO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN 3:	22 DE MAYO DE 2022	FECHA DE TERMINACIÓN 3:	22 DE MAYO DE 2022	
PLAZO ACTUALIZADO:	150	PLAZO ACTUALIZADO:	150	
PLAZO TRANSCURRIDO:	98 EQUIVALE AL 65%	PLAZO TRANSCURRIDO:	98 EQUIVALE AL 65%	
VALOR INICIAL:	\$ 37.074.450,00	VALOR INICIAL:	\$ 842.638.556,00	
VALOR ADICION(ES):	\$ 17.768.822,00	VALOR ADICION(ES):	\$ 308.000.000,00	
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 54.843.272,00	VALOR ACTUALIZADO:	\$ 950.638.556,00	
VALOR PAGADO:	\$ -	VALOR PAGADO:	\$ 225.273.356,00	
VALOR POR PAGAR:	\$ 54.843.272,00	VALOR POR PAGAR:	\$ 725.365.200,00	
SUPERVISOR:	ING. LUIS FELIPE CARDENAS AVILA	INTERVENTOR:	ING. CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	

2. CONTROL DE HITOS.				
No.	DESCRIPCIÓN DE LOS ITEMS	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (OBLIGATORIO)	5/11/2021	5/11/2021	0
0	Recopilación de información, entrega de documentación para inicio del contrato, revisión y armonización de los diseños, entrega del plan de manejo de tráfico y autorización por parte de interventoría y entidad contratante para el inicio de las actividades	19/11/2021	19/11/2021	0
1	Suministro e instalación de señales reglamentarias 60 x 60 cm	13/05/2022	13/05/2022	0
2	Marcas viales con pintura de tráfico según norma invías y diseño (incluye microesferas)	18/05/2022	18/05/2022	0
3	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frío alta duración metil-metacrilato 100% puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma ntc-1360-1, para pasos peatonales, avisos en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehículos y postes (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra)	20/05/2022	20/05/2022	0
4	Suministro y aplicación de pintura acrílica con microesferas, líneas continuas y discontinuas de 12 cms según norma invías	20/05/2022	20/05/2022	0
5	Suministro e instalación de señalización vial vertical doble (duplex) en papel reflectivo 60 x 60 zona urbana, según especificaciones relacionadas en el manual de señalización vial adoptado por la resolución 1885 de 2015, numerales 2.2.2. Y 2.1.6.2 (incluye todos los elementos necesarios para su instalación entre ellos herramienta menor, excavación, concreto y mano de obra)	13/04/2022	13/04/2022	0
6	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito preventivas sp-47b, tamaño 60 x 60 cm, Elaboradas en lámina galvanizada cat.16 papel reflectivo grado xi (diamante al cubo marca 3m) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática. Según norma invías..	12/04/2022	12/04/2022	0
7	Retiro de señales verticales (incluye pedestal y tablero) con entrega en la respectiva entidad territorial (incluye señales sencillas y duplex)	11/04/2022	11/04/2022	0
8	Suministro e instalación señales verticales sr-35, lámina galvanizada reflectividad tipo xi, grado diamante al cubo, con pedestal.	13/04/2022	13/04/2022	0
9	Señales preventivas (sp) y reglamentarias (sr) 60 x 60 cm reflectivo verde limón	13/04/2022	13/04/2022	0
10	Señales de tránsito dimensiones 60*75 cms (delineadores de curva) según norma invías	13/04/2022	13/04/2022	0
11	Señales de tránsito 0.90*1,13 mts. (informativas) según norma invías	13/04/2022	13/04/2022	0
12	Suministro e instalación de tachas reflectivas unidireccionales y bidireccionales	19/05/2022	19/05/2022	0
13	Suministro e instalación de hitos (alto =75 cm d=8 cm) de color amarillo	19/05/2022	19/05/2022	0
14	Suministro e instalación de tachones 40*15*8 cm	19/05/2022	19/05/2022	0
15	Estoperoles d=10 cm h=25 cms	5/11/2021	5/11/2021	0
16	PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO	22/05/2022	22/05/2022	0
	ITEMS NO PREVISTOS			

17	NP-01 SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPRIMANTE EN PINTURA ACRILICA , LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 15 CMS SEGUN NORMA INVÍAS (espesor seco mínimo 9 mils)	18/05/2022	18/05/2022	0
18	NP-02 SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPRIMANTE EN PINTURA DE TRAFICO ACRILICA, (Espesor seco mínimo de 9 mils)	18/05/2022	18/05/2022	0
19	NP-03 RETIRO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD BASE DE HITOS, BASE DE TACHONES	12/05/2022	12/05/2022	0
20	NP-04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTÓPEROLES METALICOS D=10 CM H=2CMS (Incluye, Planta Eléctrica, Taladro, Broca, Aditivo Epóxico, y demas elementos para su correcta instalación).	18/05/2022	18/05/2022	0
21	NP-05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTAFAROS	17/05/2022	17/05/2022	0
22	NP-06 BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPOXICA. (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo)	18/05/2022	18/05/2022	0
23	NP-07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL CHEVRON DE 40CM X90CM (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática).	19/05/2022	19/05/2022	0
24	NP-08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DOL DE 20CM X90CM (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática).	19/05/2022	19/05/2022	0
25	NP-09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PARA CICLORUTA – EN ANDÉN, (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en tubi de 2", pintura electrostática).	19/05/2022	19/05/2022	0
26	NP-10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PARA CICLORUTA -ANCLADA EN PUENTE VEHICULAR (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática).	19/05/2022	19/05/2022	0
27	NP-11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL TIPO DELINEADOR DE CURVA 60CM X 75CM - ANCLADA EN PUENTE VEHICULAR. (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática):	19/05/2022	19/05/2022	0
28	NP-12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA O REGLAMENTARIA DE 60CM X 60CM - ANCLADA EN PUENTE VEHICULAR. (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática):	19/05/2022	19/05/2022	0
29	NP-13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA DE 1,77CM X 0,44CM (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática	19/05/2022	19/05/2022	0
30	NP-14 SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H0.40 MTS - A=0.2 MTS, CONCRETO DE 2500 PSI	6/04/2022	6/04/2022	0
31	NP-15 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)	6/04/2022	6/04/2022	0
32	NP-16 CORTE DE PAVIMENTO ARTICULADO EN ADOQUIN DE ARCILLA	6/04/2022	6/04/2022	0
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)	20/05/2022	20/05/2022	0
Plazo del proyecto en días		150	150	0
Inserte las filas que requiera según el número de ítems				

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	\$ 358.319.609.46	37.89%	31.85%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	\$ 661.059.045.00	89.54%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (cronograma de actividades), Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental y Seguridad Industrial

Se aprueba la programación de obra en la cual se presentan las actividades del adicional en recursos 1 y una prórroga en tiempo de 2 meses.

Se evidencia un porcentaje ejecutado superior al programado, lo cual es bueno para el desarrollo del contrato

Se evidencia la implementación de 4 cuadrillas de trabajo, una en la parte de demarcación lineal, la segunda en demarcación horizontal de resaltes, la tercera en instalación de señalización vertical de resaltes y una cuarta específica en trabajos de demarcación y señalización del puente de las quintas.

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:

a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría: En común acuerdo entre las partes se acuerda la necesidad de realizar un adicional en recursos y una prórroga en tiempo del contrato de obra, esto se deja aportado en el ítem de obra número 13 del 15 de Marzo de 2022. El contratista presenta análisis de precios unitarios no previstos, para la ejecución del adicional número 1 del contrato.

b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la Interventoría y del contratista: la Interventoría pretende a realizar la respectiva revisión de los análisis de precios unitarios no previstos, se da su visto bueno a estos y son remitidos a la entidad contratante para su aprobación.

c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte del MUNICIPIO: la entidad procede a realizar la revisión de los análisis de precios unitarios no previstos entregados por el contratista y de su respectiva aprobación.

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique Informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y trámites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:

1. Suscripción de adicional en recursos #1 y prórroga en tiempo #1, apartir del día 23 de Marzo de 2022.

2. Revisión de documentación remitida por el contratista y supervisor, a continuación de relación la documentación recibida y enviada, junto con la actuación de la Interventoría:

FECHA DOCUMENTACIÓN APORTADA Y ACTUACIÓN INTERVENTORIA:

OFICIO RECIBIDO DE CONTRATISTA 24-03-2022. Entrega de Programación de obra para adicional en recursos y prórroga número 1.

OFICIO ENVIADO A CONTRATISTA 24-03-2022. Observaciones a Programación de obra para adicional en recursos y prórroga número 1.

OFICIO RECIBIDO DE CONTRATISTA 25-03-2022. Entrega de complemento programación de obra para adicional en recursos y prórroga número 1.

y

ACTIVIDADES FÍSICAS REALIZADAS: En la presente semana se intervinieron los siguientes sectores de la ciudad.

1. PUENTE Y VÍAS DEL BARRIO LAS QUINTAS: Se realiza la intervención del puente vehicular y las vías adyacentes del Barrio las quintas, se realiza según el diseño entregado por la secretaría de tránsito de Tunja, para la cual se realiza imprimación y la aplicación de pintura de plástico en frío y pintura acrílica para la demarcación horizontal. Además también se realiza la demarcación lineal del puente y de las vías del barrio las Quintas realizando la respectiva imprimación y demarcación con pintura tipo acrílica. Así mismo se ejecuta la señalización vertical tanto del puente como de las vías adyacentes. Además según diseños se realiza la instalación de dispositivos para la canalización del tránsito tachones e hitos. Se construye superavanzador en la salida del puente.

2. DEMARCAÇÃO HORIZONTAL Y VERTICAL RESALTOS O REDUCTORES DE VELOCIDAD: Se realiza la intervención de un listado de reductores de velocidad proporcionado por la secretaría de tránsito de Tunja, para la cual se realiza imprimación y la aplicación de pintura de plástico en frío para la demarcación horizontal. Así mismo se termina la señalización vertical de estos, labor que ya se venía adelantando.

3. DEMARCAÇÃO LINEAL SECTORES PRIORIZADOS DE LAS CIUDAD: Se realiza la intervención de sectores priorizados por la secretaría de tránsito de Tunja, para la cual se realiza imprimación y la aplicación de pintura de tipo acrílica. Entre estos sectores se encuentra la avenida Colon entre carrera 16 y calle 25, la avenida maldonado entre la calle 25 y la glorieta del hulgolino, las vías del barrio la Florida, la calle 32 entre carrera 16 y vía Tunja-Arcabuco y alrededor de 15 puntos o intersecciones del centro histórico de la ciudad.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE EL PRESENTE PERIODO


INTERVENCION PUENTE Y VIAS BARRIO LAS QUINTAS







INTERVENCION REDUCTORES DE VELOCIDAD DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD




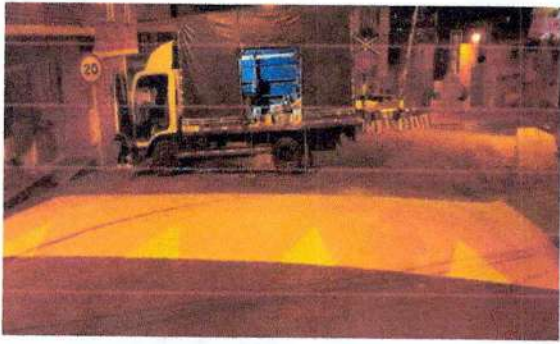

DEMARCAACION LINEAL SECTORES PRIORIZADOS DE LA CIUDAD




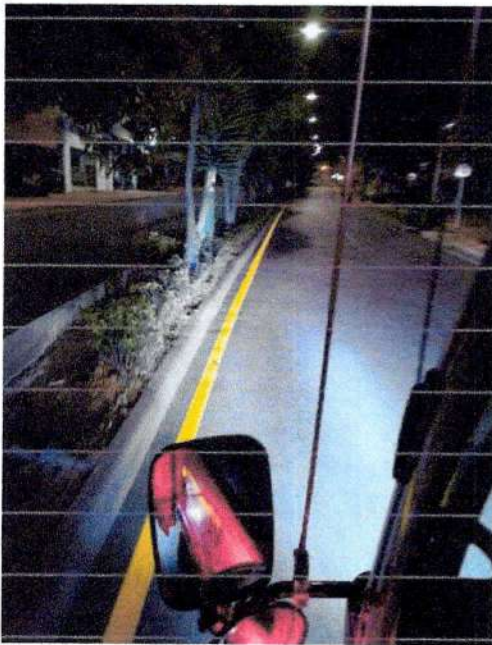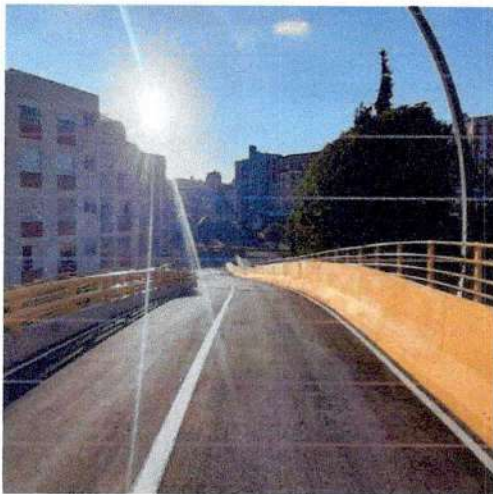



RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOMBRE: ING. FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE



CONTRATISTA

NOMBRE: ING. CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma

Director: Calle 18 # 9-85 Piso 4 Edificio Municipal Turpa, Boyacá - Teléfono: (57 8) 7 40 57 70 ext. 1400
Correo electrónico: infraestructura@turpa-boyaca.gov.co web: <http://www.turpa-boyaca.gov.co>
Código postal: 150001



ALCALDÍA DE TUNJA

FECHA: 09/09/2022

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

VERSIÓN: 01

PROCESO: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

CODIGO: GN-F-

FORMATO: INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Esta versión aplica para los contratos que inicien posteriormente a la fecha de la vigencia de este formato.

FECHA	07 DE ABRIL DE 2022	PERIODO No.	15	DEL	01 DE ABRIL DE 2022	AL	07 DE ABRIL DE 2022
1. INFORMACIÓN GENERAL							
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA						
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE TUNJA						
CONTRATO DE INTERVENTORIA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	1069 DE 2021			CONTRATO No.:	1036 DE 021		
PLAZO INICIAL:	3 MESES			PLAZO INICIAL:	3 MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021			FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021		
FECHA DE SUSPENSIÓN:	28 DE ENERO DE 2022			FECHA DE SUSPENSIÓN:	28 DE ENERO DE 2022		
TIEMPO DE SUSPENSIÓN INICIAL:	15 DÍAS CALENDARIO			TIEMPO DE SUSPENSIÓN INICIAL:	15 DÍAS CALENDARIO		
FECHA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN #1:	12 DE FEBRERO DE 2022			FECHA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN #1:	12 DE FEBRERO DE 2022		
TIEMPO DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN #1:	15 DÍAS CALENDARIO			TIEMPO DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN #1:	15 DÍAS CALENDARIO		
FECHA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN #2:	25 DE FEBRERO DE 2022			FECHA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN #2:	25 DE FEBRERO DE 2022		
TIEMPO DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN #2:	8 DÍAS CALENDARIO			TIEMPO DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN #2:	8 DÍAS CALENDARIO		
FECHA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN #3:	04 DE MARZO DE 2022			FECHA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN #3:	04 DE MARZO DE 2022		
TIEMPO DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN #3:	10 DÍAS CALENDARIO			TIEMPO DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN #3:	10 DÍAS CALENDARIO		
FECHA DE REINICIACIÓN:	15 DE MARZO DE 2022			FECHA DE REINICIACIÓN:	15 DE MARZO DE 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN 2:	22 DE MARZO DE 2022			FECHA DE TERMINACIÓN 2:	22 DE MARZO DE 2022		
FECHA DE INICIO PRORROGA #1:	23 DE MARZO DE 2022			FECHA DE INICIO PRORROGA #1:	23 DE MARZO DE 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN 3:	22 DE MAYO DE 2022			FECHA DE TERMINACIÓN 3:	22 DE MAYO DE 2022		
PLAZO ACTUALIZADO:	150			PLAZO ACTUALIZADO:	150		
PLAZO TRANSCURRIDO:	106 EQUIVALE AL 71%			PLAZO TRANSCURRIDO:	106 EQUIVALE AL 71%		
VALOR INICIAL:	\$ 37,074,450.000			VALOR INICIAL:	\$ 642,638,556.00		
VALOR ADICION(ES):	\$ 17,768,822.00			VALOR ADICION(ES):	\$ 508,000,000.00		
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 54,843,272.00			VALOR ACTUALIZADO:	\$ 1,150,638,556.00		
VALOR PAGADO:	\$ -			VALOR PAGADO:	\$ 225,273,356.00		
VALOR POR PAGAR:	\$ 54,843,272.00			VALOR POR PAGAR:	\$ 725,365,200.00		
SUPERVISOR:	ING. LUIS FELIPE CARDENAS AVILA			INTERVENTOR:	ING. CESAR HERNANDEZ ENRIQUETA RAEZ		

2. CONTROL DE HITOS.				
No.	DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMES	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (OBLIGATORIO)	5/11/2021	5/11/2021	0
0	Recopilación de información, entrega de documentación para inicio del contrato, revisión y autorización de los diseños, entrega del plan de manejo de tráfico y autorización por parte de interventoría y entidad contratante para el inicio de las actividades	19/11/2021	19/11/2021	0
1	Suministro e instalación de señales reglamentarias 60 x 60 cm	13/05/2022	13/05/2022	0
2	Marcas viales con pintura de tráfico según norma invías y diseño (incluye microesferas)	18/05/2022	18/05/2022	0
3	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frío alta duración metil-metacrilato 100% puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma ms-1360-1, para pases peatonales, avisos en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehículos y peatones (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra)	20/05/2022	20/05/2022	0
4	Suministro y aplicación de pintura acrílica con microesferas, líneas continuas y discontinuas de 12 cms según norma invías	20/05/2022	20/05/2022	0
5	Suministro e instalación de señalización vial vertical doble (duplex) en papel reflectivo 60 x 60 zona urbana, según especificaciones relacionadas en el manual de señalización vial adoptado por la resolución 1885 de 2015, normativas 2.2.2. Y 2.1.6.2 (incluye todos los elementos necesarios para su instalación entre ellos horma en la mejor, preparación, concreto y mano de obra)	13/04/2022	13/04/2022	0
6	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito preventivo tipo 47b, tamaño 60 x 60 cm. Elaboradas en lámina galvanizada cal 16 papel reflectivo grado 4 (diamante al cubo marca 3m) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática. Según norma invías.	12/04/2022	12/04/2022	0
7	Retiro de señales verticales (incluye pedestal y tablero) con entrega en la respectiva entidad territorial (incluye señales sencillas y duplex)	11/04/2022	11/04/2022	0
8	Suministro e instalación señales verticales sr-38, lámina galvanizada reflectividad tipo xl, grado diamante al cubo, con pedestal.	13/04/2022	13/04/2022	0
9	Señales preventivas (sp) y reglamentarias (sr) 60 x 60 cm reflectivo verde limón	13/04/2022	13/04/2022	0
10	Señales de tránsito dimensiones 60*75 cms (delimitadores de curva) según norma invías	13/04/2022	13/04/2022	0
11	Señales de tránsito 0.90*1.13 mts (informativas) según norma invías	13/04/2022	13/04/2022	0
12	Suministro e instalación de tachas reflectivas unidireccionales y bidireccionales	19/05/2022	19/05/2022	0
13	Suministro e instalación de hitos (alto 75 cm d=8 cm) de color amarillo	19/05/2022	19/05/2022	0
14	Suministro e instalación de tachones 40*15*8 cm	19/05/2022	19/05/2022	0
15	Estoperales d=10 cm h=25 cms	5/11/2021	5/11/2021	0
16	PLAN DE MANEJO DEL TRÁNSITO	22/05/2022	22/05/2022	0
ÍTEMES NO PREVISTOS				

17	NP-01 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE EN PINTURA ACRILICA, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 15 CMS SEGUN NORMA INVIAS (espesor seco mínimo 9 mils)	18/05/2022	18/05/2022	0
18	NP-02 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE EN PINTURA DE TRAFICO ACRILICA, (Espesor seco mínimo de 9 mils)	18/05/2022	18/05/2022	0
19	NP-03 RETIRO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD BASE DE HITOS, BASE DE TACHONES	12/05/2022	12/05/2022	0
20	NP-04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROS METALICOS D=10 CM H=2CMS (Incluye, Planta Eléctrica, Taladro, Broca, Aditivo Epóxico, y demás elementos para su correcta instalación).	18/05/2022	18/05/2022	0
21	NP-05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTAFAROS	17/05/2022	17/05/2022	0
22	NP-06 BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPOXICA, (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo)	18/05/2022	18/05/2022	0
23	NP-07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL CHEVRON DE 40CM X90CM (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática).	19/05/2022	19/05/2022	0
24	NP-08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DOL DE 20CM X90CM (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática).	19/05/2022	19/05/2022	0
25	NP-09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PARA CICLORUTA - EN ANDÉN, (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en tubi de 2", pintura electrostática).	19/05/2022	19/05/2022	0
26	NP-10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PARA CICLORUTA -ANCLADA EN PUENTE VEHICULAR (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática).	19/05/2022	19/05/2022	0
27	NP-11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL TIPO DELINEADOR DE CURVA 60CM X 75CM - ANCLADA EN PUENTE VEHICULAR, (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática).	19/05/2022	19/05/2022	0
28	NP-12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA O REGLAMENTARIA DE 60CM X 60CM - ANCLADA EN PUENTE VEHICULAR, (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática).	19/05/2022	19/05/2022	0
29	NP-13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA DE 1,77CM X 0,44CM (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática).	19/05/2022	19/05/2022	0
30	NP-14 SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H:0.40 MTS - A=0.2 MTS, CONCRETO DE 2500 PSI	6/04/2022	6/04/2022	0
31	NP-15 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)	6/04/2022	6/04/2022	0
32	NP-16 CORTE DE PAVIMENTO ARTICULADO EN ADOQUIN DE ARCILLA	6/04/2022	6/04/2022	0
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)	20/05/2022	20/05/2022	0
Plazo del proyecto en días		150	150	0
Inserte las filas que requiera según el número de Items				

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.		42.50%	33.66%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	\$ 403,975,916.73	78.16%	
		\$ 723,967,739.00		

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (cronograma de actividades), Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental y Seguridad Industrial.

Se evidencia un porcentaje ejecutado superior al programado, lo cual es bueno para el desarrollo del contrato

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:

- Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría;
- Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU's por parte de la Interventoría y del contratista;
- Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte del MUNICIPIO;

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de flujos, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y trámites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otras. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:

1. Suscripción de adicional en recurso #1 y prórroga en tiempo #1, según del día 23 de marzo de 2022.

2. Revisión de documentación enviada por el contratista y supervisor, a continuación de relación la documentación recibida y enviada, junto con la actuación de la interventoría. No hubo.

ACTIVIDADES FÍSICAS REALIZADAS: En la presente semana se intervienen los siguientes sectores de la ciudad.

1. Suministro y aplicación de imprimante y pintura de plástico en frío (método manual en línea) en los siguientes sectores:

1.1. Intersección de la avenida universitaria con carrera 2 este o esquina del colegio de los Angeles.

1.2. Intersección de la carrera 11 con avenida colon o esquina de la universidad Juan de castillohno.

1.3. Intersección de la carrera 9 con calle 18 (Esquina Colegio del Rosario).

1.4. Intersección de la carrera 11 con calle 16.

1.5. Intersección de la carrera 12 con calle 21A.

1.6. Intersección de la carrera 9 con calle 21.

1.7. Rotaflex avenida Universitaria.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE EL PRESENTE PERIODO

COLEGIO DE LOS ANGELES



INTERSECCION AV COLON CON CARRERA 11 (ESQUINA JUAN DE CASTELLANOS)



INTERSECCION CARRERA 9 CON CALLE 18 (ESQUINA COLEGIO EL ROSARIO)



INTERSECCION CARRERA 11 CON CALLE 16



INTERSECCION CARRERA 9 CON CALLE 21



INTERVENCION REDUCTORES DE VELOCIDAD AVENIDA UNIVERSITARIA



RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOMBRE: ING. FERNANDO RODRIGUEZ HUMPAQUE

CONTRATISTA

NOMBRE: ING. CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma

Dirección: Calle 19 # 9-10 Piso 4 Edificio Municipal Turja, Boyacá - Teléfono: (57 8) 740 5173 ext. 1408
Correo electrónico: infraestructura@turja-boyaca.gov.co Web: <http://www.turja-boyaca.gov.co>
Código postal: 190001



ALCALDIA DE TUNJA

FECHA: 09/09/20

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

VERSIÓN: 01

PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA

CODIGO:GIN-F-0

FORMATO: INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

* Esta versión aplica para los contratos que inicien posteriormente a la fecha de la vigencia de este formato

FECHA	22 DE ABRIL DE 2022	PERIODO No.	16	DEL	08 DE ABRIL DE 2022	AL	22 DE ABRIL DE 2022
-------	---------------------	-------------	----	-----	---------------------	----	---------------------

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"						
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE TUNJA						
CONTRATO DE INTERVENTORIA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	1068 DE 2021			CONTRATO No.:	1036 DE 021		
PLAZO INICIAL:	3 MESES			PLAZO INICIAL:	3 MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021			FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	28 DE ENERO DE 2022			**FECHA DE SUSPENSIÓN:	28 DE ENERO DE 2022		
TIEMPO DE SUSPENSIÓN INICIAL	15 DIAS CALENDARIO			TIEMPO DE SUSPENSIÓN INICIAL	15 DIAS CALENDARIO		
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSION #1	12 DE FEBRERO DE 2022			FECHA DE AMPLIACION SUSPENSION #1	12 DE FEBRERO DE 2022		
TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSION #1	15 DIAS CALENDARIO			TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSION #1	15 DIAS CALENDARIO		
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSION #2	25 DE FEBRERO DE 2022			FECHA DE AMPLIACION SUSPENSION #2	25 DE FEBRERO DE 2022		
TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSION #2	8 DIAS CALENDARIO			TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSION #2	8 DIAS CALENDARIO		
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSION #3	04 DE MARZO DE 2022			FECHA DE AMPLIACION SUSPENSION #3	04 DE MARZO DE 2022		
TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSION #3	10 DIAS CALENDARIO			TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSION #3	10 DIAS CALENDARIO		
**FECHA DE REINICIACIÓN:	15 DE MARZO DE 2022			**FECHA DE REINICIACIÓN:	15 DE MARZO DE 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN 2:	22 DE MARZO DE 2022			FECHA DE TERMINACIÓN 2:	22 DE MARZO DE 2022		
**FECHA DE INICIO PRORROGA #1:	23 DE MARZO DE 2022			**FECHA DE INICIO PRORROGA #1:	23 DE MARZO DE 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN 3:	22 DE MAYO DE 2022			FECHA DE TERMINACIÓN 3:	22 DE MAYO DE 2022		
PLAZO ACTUALIZADO:	150			PLAZO ACTUALIZADO:	150		
PLAZO TRANSCURRIDO:	120 EQUIVALE AL 80%			PLAZO TRANSCURRIDO:	120 EQUIVALE AL 80%		
VALOR INICIAL :	\$ 37.074.450.00			VALOR INICIAL :	\$ 642.638.556.00		
VALOR ADICION(ES):	\$ 17.768.822.00			VALOR ADICION(ES):	\$ 308.000.000.00		
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 54.843.272.00			VALOR ACTUALIZADO:	\$ 950.638.556.00		
VALOR PAGADO:	\$ 12.994.594.73			VALOR PAGADO:	\$ 225.273.356.00		
VALOR POR PAGAR:	\$ 41.848.677.28			VALOR POR PAGAR:	\$ 725.365.200.00		
SUPERVISOR:	ING. LUIS FELIPE CARDENAS AVILA			INTERVENTOR:	ING. CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		

2. CONTROL DE HITOS.

No.	DESCRIPCIÓN DE LOS ITEMS	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (OBLIGATORIO)	5/11/2021	5/11/2021	0
0	Recopilación de información, entrega de documentación para inicio del contrato, revisión y armonización de los diseños, entrega del plan de manejo de tráfico y autorización por parte de interventoría y entidad contratante para el inicio de las actividades	19/11/2021	19/11/2021	0
1	Suministro e instalacion de señales reglamentarias 60 x 60 cm	13/05/2022	13/05/2022	0
2	Marcas viales con pintura de trafico segun norma invias y diseño (incluye microesferas)	18/05/2022	18/05/2022	0
3	Suministro y aplicación manual (método liana) de pintura de plástico en frio alta duración metil-metacrilato 100% puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma ntc-1360-1, para pasos peatonales, avisos en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehículos y peatones (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra)	20/05/2022	20/05/2022	0
4	Suministro y aplicación de pintura acrílica con microesferas, líneas continuas y discontinuas de 12 cms segun norma invias	20/05/2022	20/05/2022	0
5	Suministro e instalación de señalización vial vertical doble (duplex) en papel reflectivo 60 x 60 zona urbana, según especificaciones relacionadas en el manual de señalización vial adoptado por la resolución 1885 de 2015, numerales 2.2.2. Y 2.1.6.2 (incluye todos los elementos necesarios para si instalación entre ellos herramienta menor, excavación, concreto y ,mano de obra)	13/04/2022	13/04/2022	0
6	Suministro e instalación de señal vertical de transito preventivas sp-47b, tamaño 60 x 60 cm. Elaboradas en lamina galvanizada cal.16 papel reflectivo grado xi (diamante al cubo marca 3m) pedestal elaborado en angulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostatica. Segun norma invias..	12/04/2022	12/04/2022	0
7	Retiro de señales verticales (incluye pedestal y tablero) con entrega en la respectiva entidad territorial (incluye señales sencillas y dúplex)	11/04/2022	13/04/2022	-2
8	Suministro e instalación señales verticales sr-38, lámina galvanizada reflectividad tipo xi, grado diamante al cubo, con pedestal.	13/04/2022	13/04/2022	0
9	Señales preventivas (sp) y reglamentarias (sr) 60 x 60 cm reflectivo verde limon	13/04/2022	13/04/2022	0
10	Señales de transito dimensiones 60*75 cms (delineadores de curva) según norma invias	13/04/2022	13/04/2022	0

11	Señales de tránsito 0.90*1.13 mts (informativas) según norma invias	13/04/2022	13/04/2022	0
12	Suministro e instalación de tachas reflectivas unidireccionales y bidireccionales	19/05/2022	19/05/2022	0
13	Suministro e instalación de hitos (alto =75 cm d=8 cm) de color amarillo	19/05/2022	19/05/2022	0
14	Suministro e instalación de tachones 40*15*8 cm	19/05/2022	19/05/2022	0
15	Estoperoles d=10 cm h=25 cms	5/11/2021	5/11/2021	0
16	PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO	22/05/2022	22/05/2022	0
	ITEMS NO PREVISTOS			
17	NP-01 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE EN PINTURA ACRILICA , LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 15 CMS SEGÚN NORMA INVIA (espesor seco mínimo 9 mils)	18/05/2022	18/05/2022	0
18	NP-02 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE EN PINTURA DE TRAFICO ACRILICA, (Espesor seco mínimo de 9 mils)	18/05/2022	18/05/2022	0
19	NP-03 RETIRO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD BASE DE HITOS, BASE DE TACHONES	12/05/2022	12/05/2022	0
20	NP-04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES METALICOS D=10 CM H=2CMS (Incluye, Planta Electrica, Taladro, Broca, Aditivo Epóxico, y demas elementos para su correcta instalación).	18/05/2022	18/05/2022	0
21	NP-05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTAFAROS	17/05/2022	17/05/2022	0
22	NP-06 BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA. (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo)	18/05/2022	18/05/2022	0
23	NP-07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL CHEVRON DE 40CM X90CM (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática).	19/05/2022	19/05/2022	0
24	NP-08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DOL DE 20CM X90CM (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática).	19/05/2022	19/05/2022	0
25	NP-09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PARA CICLORUTA – EN ANDÉN, (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en tubi de 2", pintura electrostática).	19/05/2022	19/05/2022	0
26	NP-10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PARA CICLORUTA -ANCLADA EN PUENTE VEHICULAR (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática).	19/05/2022	19/05/2022	0
27	NP-11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL TIPO DELINEADOR DE CURVA 60CM X 75CM -ANCLADA EN PUENTE VEHICULAR. (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática):	19/05/2022	19/05/2022	0
28	NP-12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA O REGLAMENTARIA DE 60CM X 60CM - ANCLADA EN PUENTE VEHICULAR. (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática):	19/05/2022	19/05/2022	0
29	NP-13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA DE 1,77CM X 0,44CM (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática)	19/05/2022	19/05/2022	0
30	NP-14 SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H0.40 MTS - A=0.2 MTS, CONCRETO DE 2500 PSI	6/04/2022	6/04/2022	0
31	NP-15 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)	6/04/2022	6/04/2022	0
32	NP-16 CORTE DE PAVIMENTO ARTICULADO EN ADOQUIN DE ARCILLA	6/04/2022	6/04/2022	0
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)	20/05/2022	20/05/2022	0
Plazo del proyecto en días		150	150	0
Insértese las filas que requiera según el número de ítems				

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	\$ 532.406.380,55	58.01%	25.30%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	\$ 772.878.059,00	81.30%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (cronograma de actividades), Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental y Seguridad industrial

Se evidencia lluvias fuertes durante el presente periodo, por lo cual no fue posible realizar actividades de demarcación horizontal.

Se evidencia un porcentaje ejecutado superior al programado.

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:

- Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría;
- Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la Interventoría y del contratista;
- Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte del MUNICIPIO;

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y trámites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:

1. Revisión de documentación remitida por el contratista y supervisor, a continuación se relaciona la documentación recibida y enviada, junto con la actuación de la Interventoría: No hubo.

ACTIVIDADES FÍSICAS REALIZADAS: En la presente semana se intervinieron los siguientes sectores de la ciudad.

- Suministro e instalación de señalización vertical en los siguientes sectores:
Hospital ESE San Antonio
- Entrada Barrio Santa Inés.
- Centro histórico de Tunja.
- Glorieta del gobernador.
- Retiro de señales en mal estado centro histórico de la ciudad.
- Suministro e instalación de estoperoles metálicos en los siguientes sectores:
1. Entrada Barrio San Rafael y Colegio Normal Femenino, sobre la Vía Tunja-Arcabuco.
- Entrada Barrio Santa Inés.
- Calle 4 con carrera 16.
- Avenida colon con calle 13.

SEÑALIZACION VERTICAL HOSPITAL ESE SAN ANTONIO



SEÑALIZACION VERTICAL ENTRADA BARRIO SANTA INES




SEÑALIZACION VERTICAL CENTRO HISTORICO TUNJA



RETIRO DE SEÑALES EN MAL ESTADO CENTRO HISTORICO TUNJA






INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL GLORIETA DEL GOBERNADOR

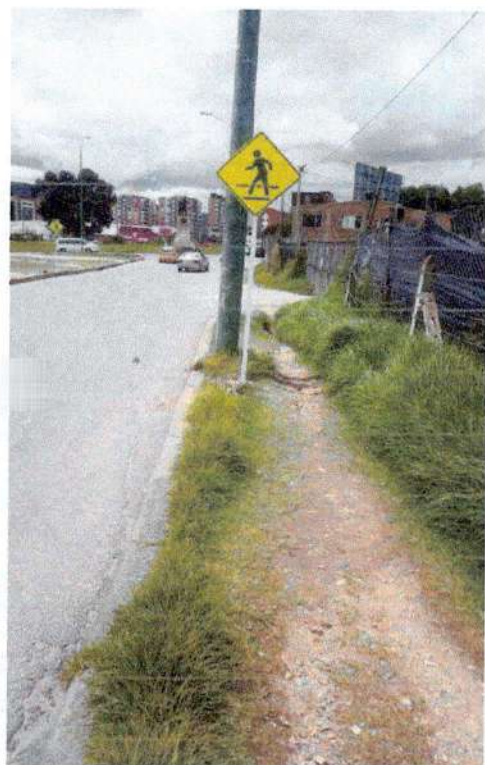




INSTALACION DE ESTOPEROS

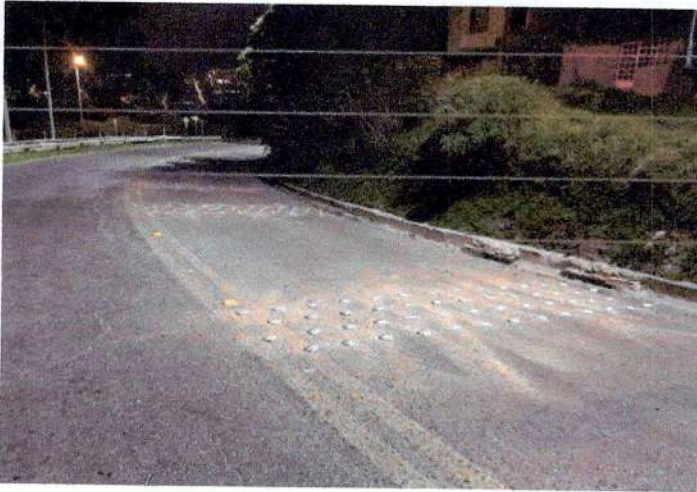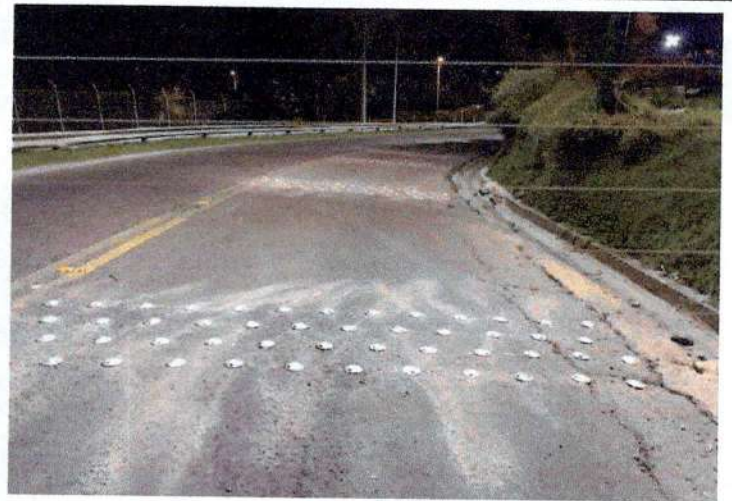



RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOMBRE: ING. FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE



CONTRATISTA

NOMBRE: ING. CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma

Dirección: Calle 10 # 9 -95 Piso 4 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Teléfono: (57 8) 7 40 57 70 ext. 1409
Correo electrónico: Infraestructura@tunja-boyaca.gov.co web: <http://www.tunja-boyaca.gov.co>
Código postal: 150001

	ALCALDIA DE TUNJA		FECHA: 09/09/20	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		VERSIÓN: 01	
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA		CODIGO:GIN-F-0	
	FORMATO:INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA			

* Esta versión aplica para los contratos que inicien posteriormente a la fecha de la vigencia de este formato

FECHA	30 DE ABRIL DE 2022	PERIODO No.	17	DEL	23 DE ABRIL DE 2022	AL	29 DE ABRIL DE 2022
-------	---------------------	-------------	----	-----	---------------------	----	---------------------

1. INFORMACIÓN GENERAL							
OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"						
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE TUNJA						
CONTRATO DE INTERVENTORIA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	1068 DE 2021			CONTRATO No.:	1036 DE 021		
PLAZO INICIAL:	3 MESES			PLAZO INICIAL:	3 MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021			FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	28 DE ENERO DE 2022			**FECHA DE SUSPENSIÓN:	28 DE ENERO DE 2022		
TIEMPO DE SUSPENSIÓN INICIAL	15 DIAS CALENDARIO			TIEMPO DE SUSPENSIÓN INICIAL	15 DIAS CALENDARIO		
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN #1	12 DE FEBRERO DE 2022			FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN #1	12 DE FEBRERO DE 2022		
TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSIÓN #1	15 DIAS CALENDARIO			TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSIÓN #1	15 DIAS CALENDARIO		
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN #2	25 DE FEBRERO DE 2022			FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN #2	25 DE FEBRERO DE 2022		
TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSIÓN #2	8 DIAS CALENDARIO			TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSIÓN #2	8 DIAS CALENDARIO		
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN #3	04 DE MARZO DE 2022			FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN #3	04 DE MARZO DE 2022		
TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSIÓN #3	10 DIAS CALENDARIO			TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSIÓN #3	10 DIAS CALENDARIO		
**FECHA DE REINICIACIÓN:	15 DE MARZO DE 2022			**FECHA DE REINICIACIÓN:	15 DE MARZO DE 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN 2:	22 DE MARZO DE 2022			FECHA DE TERMINACIÓN 2:	22 DE MARZO DE 2022		
**FECHA DE INICIO PRORROGA #1:	23 DE MARZO DE 2022			**FECHA DE INICIO PRORROGA #1:	23 DE MARZO DE 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN 3:	22 DE MAYO DE 2022			FECHA DE TERMINACIÓN 3:	22 DE MAYO DE 2022		
PLAZO ACTUALIZADO:	150			PLAZO ACTUALIZADO:	150		
PLAZO TRANSCURRIDO:	127 EQUIVALE AL 85%			PLAZO TRANSCURRIDO:	127 EQUIVALE AL 85%		
VALOR INICIAL :	\$ 37.074.450.00			VALOR INICIAL :	\$ 642.638.556.00		
VALOR ADICION(ES):	\$ 17.768.822.00			VALOR ADICION(ES):	\$ 308.000.000.00		
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 54.843.272.00			VALOR ACTUALIZADO:	\$ 950.638.556.00		
VALOR PAGADO:	\$ 12.994.594.73			VALOR PAGADO:	\$ 225.273.356.00		
VALOR POR PAGAR:	\$ 41.848.677.28			VALOR POR PAGAR:	\$ 725.365.200.00		
SUPERVISOR:	ING. LUIS FELIPE CARDENAS AVILA			INTERVENTOR:	ING. CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		

2. CONTROL DE HITOS.				
No.	DESCRIPCIÓN DE LOS ITEMS	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (OBLIGATORIO)	5/11/2021	5/11/2021	0
0	Recopilación de información, entrega de documentación para inicio del contrato, revisión y armonización de los diseños, entrega del plan de manejo de tráfico y autorización por parte de interventoría y entidad contratante para el inicio de las actividades	19/11/2021	19/11/2021	0
1	Suministro e instalacion de señales reglamentarias 60 x 60 cm	13/05/2022	13/05/2022	0
2	Marcas viales con pintura de trafico segun norma invias y diseño (incluye microesferas)	18/05/2022	18/05/2022	0
3	Suministro y aplicacion manual (método llana) de pintura de plástico en frio alta duración metil-metacrilato 100% puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma ntc-1360-1, para pasos peatonales, avisos en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehículos y peatones (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra)	20/05/2022	20/05/2022	0
4	Suministro y aplicacion de pintura acrílica con microesferas, líneas continuas y discontinuas de 12 cms segun norma invias	20/05/2022	20/05/2022	0
5	Suministro e instalación de señalización vial vertical doble (duplex) en papel reflectivo 60 x 60 zona urbana, según especificaciones relacionadas en el manual de señalización vial adoptado por la resolución 1885 de 2015, numerales 2.2.2. Y 2.1.6.2 (incluye todos los elementos necesarios para si instalación entre ellos herramienta menor, excavación, concreto y ,mano de obra)	22/05/2022	13/04/2022	39
6	Suministro e instalación de señal vertical de transito preventivas sp-47b, tamaño 60 x 60 cm. Elaboradas en lamina galvanizada cal.16 papel reflectivo grado xi (diamante al cubo marca 3m) pedestal elaborado en angulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostatica. Segun norma invias..	1/05/2022	12/04/2022	19
7	Retiro de señales verticales (incluye pedestal y tablero) con entrega en la respectiva entidad territorial (incluye señales sencillas y duplex)	30/04/2022	13/04/2022	17
8	Suministro e instalación señales verticales sr-38, lámina galvanizada reflectividad tipo xi, grado diamante al cubo, con pedestal.	30/04/2022	13/04/2022	17
9	Señales preventivas (sp) y reglamentarias (sr) 60 x 60 cm reflectivo verde limon	30/04/2022	13/04/2022	17
10	Señales de transito dimensiones 60*75 cms (delineadores de curva) según norma invias	30/04/2022	13/04/2022	17

11	Señales de tránsito 0.90*1.13 mls (informativas) según norma invías	22/05/2022	13/04/2022	39
12	Suministro e instalación de tachas reflectivas unidireccionales y bidireccionales	22/05/2022	19/05/2022	3
13	Suministro e instalación de hitos (alto =75 cm d=8 cm) de color amarillo	22/05/2022	19/05/2022	3
14	Suministro e instalación de tachones 40*15*8 cm	22/05/2022	19/05/2022	3
15	Estoperoles d=10 cm h=25 cms	5/11/2021	5/11/2021	0
16	PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO	22/05/2022	22/05/2022	0
ITEMS NO PREVISTOS				
17	NP-01 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE EN PINTURA ACRILICA, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 15 CMS SEGÚN NORMA INVÍAS (espesor seco mínimo 9 mls)	18/05/2022	18/05/2022	0
18	NP-02 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE EN PINTURA DE TRAFICO ACRILICA, (Espesor seco mínimo de 9 mls)	18/05/2022	18/05/2022	0
19	NP-03 RETIRO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD BASE DE HITOS, BASE DE TACHONES	12/05/2022	12/05/2022	0
20	NP-04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES METALICOS D=10 CM H=2CMS (Incluye, Planta Eléctrica, Taladro, Broca, Aditivo Epóxico, y demás elementos para su correcta instalación).	18/05/2022	18/05/2022	0
21	NP-05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTAFAROS	17/05/2022	17/05/2022	0
22	NP-06 BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA. (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo)	18/05/2022	18/05/2022	0
23	NP-07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL CHEVRON DE 40CM X90CM (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática).	19/05/2022	19/05/2022	0
24	NP-08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DOL DE 20CM X90CM (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática).	19/05/2022	19/05/2022	0
25	NP-09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PARA CICLORUTA - EN ANDÉN, (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en tubi de 2", pintura electrostática).	19/05/2022	19/05/2022	0
26	NP-10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PARA CICLORUTA -ANCLADA EN PUENTE VEHICULAR (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática).	19/05/2022	19/05/2022	0
27	NP-11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL TIPO DELINEADOR DE CURVA 60CM X 75CM - ANCLADA EN PUENTE VEHICULAR. (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática);	19/05/2022	19/05/2022	0
28	NP-12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA O REGLAMENTARIA DE 60CM X 60CM - ANCLADA EN PUENTE VEHICULAR. (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática);	19/05/2022	19/05/2022	0
29	NP-13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA DE 1,77CM X 0,44CM (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática	19/05/2022	19/05/2022	0
30	NP-14 SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H0.40 MTS - A=0.2 MTS, CONCRETO DE 2500 PSI	6/04/2022	6/04/2022	0
31	NP-15 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)	6/04/2022	6/04/2022	0
32	NP-16 CORTE DE PAVIMENTO ARTICULADO EN ADOQUIN DE ARCILLA	6/04/2022	6/04/2022	0
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)		20/05/2022	20/05/2022	0
Plazo del proyecto en días		150	150	0
Inserir las filas que requiera según el número de ítems				

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	\$ 617.159.400.73	64.92%	18.76%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	\$ 795.498.093.00	83.68%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (cronograma de actividades), Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental y Seguridad industrial

Se evidencia lluvias fuertes durante el presente periodo, motivo por el retrasa los trabajos de demarcación horizontal.

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:

- Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría;
- Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la Interventoría y del contratista;
- Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte del MUNICIPIO;

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y trámites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:

1. Revisión de documentación remitida por el contratista y supervisor, a continuación se relaciona la documentación recibida y enviada, junto con la actuación de la Interventoría. No hubo.

ACTIVIDADES FÍSICAS REALIZADAS: En la presente semana se intervinieron los siguientes sectores de la ciudad.

1. Suministro e instalación de señalización vertical en los siguientes sectores:

- Glorieta del gobernador.
- Centro histórico de Tunja
- Esquina centro comercial viva.
- Barrio el Rodeo.

Retiro de señales en mal estado glorieta del gobernador (delineadores de curva).

Suministro y aplicación de imprimante y de pintura de plástico en frío (método manual en llana) en los siguientes sectores:

1 Vías Internas barrio el Consuelo






REGISTRO FOTOGRAFICO DEMARCACION HORIZONTAL VIAS BARRIO EL CONSUELO



REGISTRO DEMARCON HORIZONTAL VIAS BARRIO EL CONSUELO

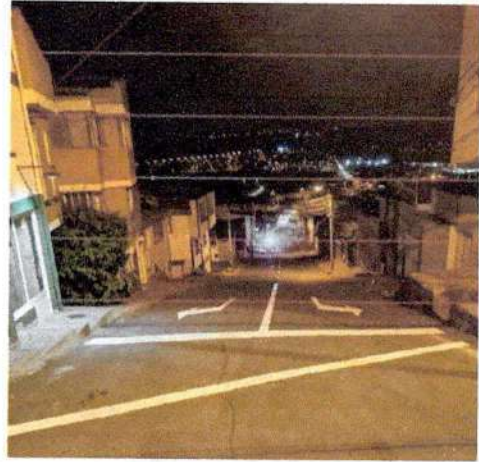



ALCALDIA DE TUNJA		FECHA: 09/09/20
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		VERSIÓN: 01
PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA		CODIGO:GIN-F-0
FORMATO:INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		

* Esta versión aplica para los contratos que inicien posteriormente a la fecha de la vigencia de este formato

FECHA	07 DE MAYO DE 2022	PERIODO No.	18	DEL	30 DE ABRIL DE 2022	AL	06 DE MAYO DE 2022
-------	--------------------	-------------	----	-----	---------------------	----	--------------------


1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE TUNJA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	1068 DE 2021	CONTRATO No.:	1036 DE 021
PLAZO INICIAL:	3 MESES	PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	28 DE ENERO DE 2022	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	28 DE ENERO DE 2022
TIEMPO DE SUSPENSIÓN INICIAL	15 DIAS CALENDARIO	TIEMPO DE SUSPENSIÓN INICIAL	15 DIAS CALENDARIO
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN #1	12 DE FEBRERO DE 2022	FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN #1	12 DE FEBRERO DE 2022
TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSIÓN #1	15 DIAS CALENDARIO	TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSIÓN #1	15 DIAS CALENDARIO
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN #2	25 DE FEBRERO DE 2022	FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN #2	25 DE FEBRERO DE 2022
TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSIÓN #2	8 DIAS CALENDARIO	TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSIÓN #2	8 DIAS CALENDARIO
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN #3	04 DE MARZO DE 2022	FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN #3	04 DE MARZO DE 2022
TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSIÓN #3	10 DIAS CALENDARIO	TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSIÓN #3	10 DIAS CALENDARIO
**FECHA DE REINICIACIÓN:	15 DE MARZO DE 2022	**FECHA DE REINICIACIÓN:	15 DE MARZO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN 2:	22 DE MARZO DE 2022	FECHA DE TERMINACIÓN 2:	22 DE MARZO DE 2022
**FECHA DE INICIO PRORROGA #1:	23 DE MARZO DE 2022	**FECHA DE INICIO PRORROGA #1:	23 DE MARZO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN 3:	22 DE MAYO DE 2022	FECHA DE TERMINACIÓN 3:	22 DE MAYO DE 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	150	PLAZO ACTUALIZADO:	150
PLAZO TRANSCURRIDO:	134 EQUIVALE AL 89%	PLAZO TRANSCURRIDO:	134 EQUIVALE AL 89%
VALOR INICIAL :	\$ 37.074.450.00	VALOR INICIAL :	\$ 642.638.556.00
VALOR ADICION(ES):	\$ 17.768.822.00	VALOR ADICION(ES):	\$ 308.000.000.00
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 54.843.272.00	VALOR ACTUALIZADO:	\$ 950.638.556.00
VALOR PAGADO:	\$ 12.994.594.73	VALOR PAGADO:	\$ 225.273.356.00
VALOR POR PAGAR:	\$ 41.848.677.28	VALOR POR PAGAR:	\$ 725.365.200.00
SUPERVISOR:	ING. LUIS FELIPE CARDENAS AVILA	INTERVENTOR:	ING. CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

2. CONTROL DE HITOS.


No.	DESCRIPCIÓN DE LOS ITEMS	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (OBLIGATORIO)	5/11/2021	5/11/2021	0
0	Recopilación de información, entrega de documentación para inicio del contrato, revisión y armonización de los diseños, entrega del plan de manejo de tráfico y autorización por parte de interventoría y entidad contratante para el inicio de las actividades	19/11/2021	19/11/2021	0
1	Suministro e instalacion de señales reglamentarias 60 x 60 cm	13/05/2022	13/05/2022	0
2	Marcas viales con pintura de trafico segun norma invias y diseño (incluye microesferas)	18/05/2022	18/05/2022	0
3	Suministro y aplicación manual (método liana) de pintura de plástico en frio alta duración metil-metacrilato 100% puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma ntc-1360-1, para pasos peatonales, avisos en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehículos y peatones (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra)	20/05/2022	20/05/2022	0
4	Suministro y aplicación de pintura acrílica con microesferas, líneas continuas y discontinuas de 12 cms segun norma invias	20/05/2022	20/05/2022	0
5	Suministro e instalación de señalización vial vertical doble (duplex) en papel reflectivo 60 x 60 zona urbana, según especificaciones relacionadas en el manual de señalización vial adoptado por la resolución 1885 de 2015, numerales 2.2.2. Y 2.1.6.2 (incluye todos los elementos necesarios para su instalación entre ellos herramienta menor, excavación, concreto y ,mano de obra)	22/05/2022	13/04/2022	39
6	Suministro e instalación de señal vertical de transito preventivas sp-47b, tamaño 60 x 60 cm. Elaboradas en lamina galvanizada cal.16 papel reflectivo grado xi (diamante al cubo marca 3m) pedestal elaborado en angulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostatica. Segun norma invias..	1/05/2022	12/04/2022	19
7	Retiro de señales verticales (incluye pedestal y tablero) con entrega en la respectiva entidad territorial (incluye señales sencillas y dúplex)	30/04/2022	13/04/2022	17
8	Suministro e instalación señales verticales sr-38, lámina galvanizada reflectividad tipo xi, grado diamante al cubo, con pedestal.	30/04/2022	13/04/2022	17
9	Señales preventivas (sp) y reglamentarias (sr) 60 x 60 cm reflectivo verde limon	30/04/2022	13/04/2022	17
10	Señales de transito dimensiones 60*75 cms (delineadores de curva) según norma invias	30/04/2022	13/04/2022	17

11	Señales de tránsito 0.90*1.13 mts (informativas) según norma invias	22/05/2022	13/04/2022	39
12	Suministro e instalación de tachas reflectivas unidireccionales y bidireccionales	22/05/2022	19/05/2022	3
13	Suministro e instalación de hitos (alto =75 cm d=8 cm) de color amarillo	22/05/2022	19/05/2022	3
14	Suministro e instalación de tachones 40*15*8 cm	22/05/2022	19/05/2022	3
15	Estoperoles d=10 cm h=25 cms	5/11/2021	5/11/2021	0
16	PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO	22/05/2022	22/05/2022	0
ITEMS NO PREVISTOS				
17	NP-01 SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPRIMANTE EN PINTURA ACRILICA, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 15 CMS SEGÚN NORMA INVIA (espesor seco mínimo 9 mils)	18/05/2022	18/05/2022	0
18	NP-02 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE EN PINTURA DE TRAFICO ACRILICA, (Especor seco mínimo de 9 mils)	18/05/2022	18/05/2022	0
19	NP-03 RETIRO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD BASE DE HITOS, BASE DE TACHONES	12/05/2022	12/05/2022	0
20	NP-04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES METALICOS D=10 CM H=2CMS (Incluye, Planta Eléctrica, Taladro, Broca, Aditivo Epóxico, y demás elementos para su correcta instalación).	18/05/2022	18/05/2022	0
21	NP-05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTAFAROS	17/05/2022	17/05/2022	0
22	NP-06 BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA. (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo)	18/05/2022	18/05/2022	0
23	NP-07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL CHEVRON DE 40CM X90CM (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática).	19/05/2022	19/05/2022	0
24	NP-08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DOL DE 20CM X90CM (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática).	19/05/2022	19/05/2022	0
25	NP-09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PARA CICLORUTA – EN ANDÉN, (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en tubi de 2", pintura electrostática).	19/05/2022	19/05/2022	0
26	NP-10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PARA CICLORUTA -ANCLADA EN PUENTE VEHICULAR (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática).	19/05/2022	19/05/2022	0
27	NP-11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL TIPO DELINEADOR DE CURVA 60CM X 75CM -ANCLADA EN PUENTE VEHICULAR. (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática):	19/05/2022	19/05/2022	0
28	NP-12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA O REGLAMENTARIA DE 60CM X 60CM - ANCLADA EN PUENTE VEHICULAR. (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática):	19/05/2022	19/05/2022	0
29	NP-13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA DE 1,77CM X 0,44CM (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática)	19/05/2022	19/05/2022	0
30	NP-14 SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H0.40 MTS - A=0.2 MTS, CONCRETO DE 2500 PSI	6/04/2022	6/04/2022	0
31	NP-15 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)	6/04/2022	6/04/2022	0
32	NP-16 CORTE DE PAVIMENTO ARTICULADO EN ADOQUIN DE ARCILLA	6/04/2022	6/04/2022	0
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)		20/05/2022	20/05/2022	0
Plazo del proyecto en días		150	150	0
inserte las filas que requiera según el número de ítems				



RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOMBRE: ING. FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE



CONTRATISTA

NOMBRE: ING. CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

* Una vez sea revisado y aceptado este Informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	\$ 701.910.435.91	73.84%	17.71%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	\$ 670.310.967.00	91.55%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (cronograma de actividades), Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental y Seguridad Industrial

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:

- Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría;
- Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la Interventoría y del contratista;
- Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte del MUNICIPIO;

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique Informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y trámites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al período del informe.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:

1. Revisión de documentación remitida por el contratista y supervisor, a continuación se relaciona la documentación recibida y enviada, junto con la actuación de la Interventoría: No hubo.

ACTIVIDADES FÍSICAS REALIZADAS: En la presente semana se intervinieron los siguientes sectores de la ciudad.

- Suministro y aplicación de imprimante y de pintura de plástico en frío (método manual en llana) en los siguientes sectores:
 - Vías internas barrio el Consuelo
 - Glorieta Green Hills.
- Suministro y aplicación de imprimante y pintura acrílica para la demarcación lineal Vía Tunja Arcebuco.
- Suministro e instalación de dispositivos de regulación del tránsito (hitos, tachones, estoperoles) en las vías del barrio Consuelo.


REGISTRO DEMARCON HORIZONTAL E INSTALACION DE DISPOSITIVOS VIAS BARRIO EL CONSUELO





DEMARCACION HORIZONTAL GLORIETA GREEN HILLS




DEMARCACION HORIZONTAL GLORIETA GREEN HILLS

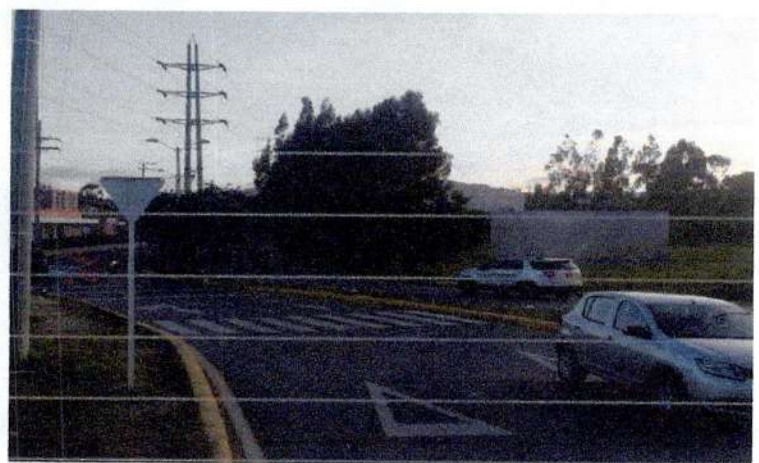


DEMARCACION HORIZONTAL LINEAL VIA TUNJA ARCABUCO

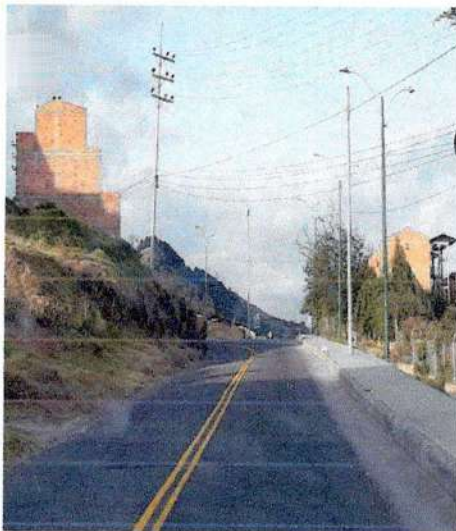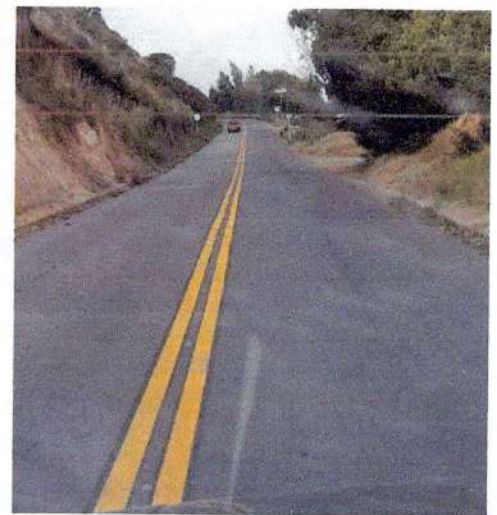



RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOMBRE: ING. FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE



NOMBRE: ING. CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

* Una vez sea revisado y aceptado este Informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma

Dirección: Calle 19 # 9-95 Piso 4 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Teléfono: (57 8) 7 40 57 70 ext. 1409
Correo electrónico: infraestructura@tunja-boyaca.gov.co web: <http://www.tunja-boyaca.gov.co>
Código postal: 150001



ALCALDIA DE TUNJA

FECHA: 09/09/20

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

VERSIÓN: 01

PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA

FORMATO: INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

CODIGO: GIN-F-0

* Esta versión aplica para los contratos que inicien posteriormente a la fecha de la vigencia de este formato

FECHA	14 DE MAYO DE 2022	PERIODO No.	19	DEL	07 DE MAYO DE 2022	AL	13 DE MAYO DE 2022
1. INFORMACIÓN GENERAL							
OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"						
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE TUNJA						
CONTRATO DE INTERVENTORIA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	1068 DE 2021			CONTRATO No.:	1036 DE 021		
PLAZO INICIAL:	3 MESES			PLAZO INICIAL:	3 MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021			FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	28 DE ENERO DE 2022			**FECHA DE SUSPENSIÓN:	28 DE ENERO DE 2022		
TIEMPO DE SUSPENSIÓN INICIAL	15 DIAS CALENDARIO			TIEMPO DE SUSPENSIÓN INICIAL	15 DIAS CALENDARIO		
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN #1	12 DE FEBRERO DE 2022			FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN #1	12 DE FEBRERO DE 2022		
TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSIÓN #1	15 DIAS CALENDARIO			TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSIÓN #1	15 DIAS CALENDARIO		
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN #2	25 DE FEBRERO DE 2022			FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN #2	25 DE FEBRERO DE 2022		
TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSIÓN #2	8 DIAS CALENDARIO			TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSIÓN #2	8 DIAS CALENDARIO		
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN #3	04 DE MARZO DE 2022			FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN #3	04 DE MARZO DE 2022		
TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSIÓN #3	10 DIAS CALENDARIO			TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSIÓN #3	10 DIAS CALENDARIO		
**FECHA DE REINICIACIÓN:	15 DE MARZO DE 2022			**FECHA DE REINICIACIÓN:	15 DE MARZO DE 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN 2:	22 DE MARZO DE 2022			FECHA DE TERMINACIÓN 2:	22 DE MARZO DE 2022		
**FECHA DE INICIO PRORROGA #1:	23 DE MARZO DE 2022			**FECHA DE INICIO PRORROGA #1:	23 DE MARZO DE 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN 3:	22 DE MAYO DE 2022			FECHA DE TERMINACIÓN 3:	22 DE MAYO DE 2022		
PLAZO ACTUALIZADO:	150			PLAZO ACTUALIZADO:	150		
PLAZO TRANSCURRIDO:	141	EQUIVALE AL	94%	PLAZO TRANSCURRIDO:	134	EQUIVALE AL	89%
VALOR INICIAL :	\$	37.074.450.00		VALOR INICIAL :	\$	642.638.556.00	
VALOR ADICION(ES):	\$	17.768.822.00		VALOR ADICION(ES):	\$	308.000.000.00	
VALOR ACTUALIZADO:	\$	54.843.272.00		VALOR ACTUALIZADO:	\$	950.638.556.00	
VALOR PAGADO:	\$	12.994.594.73		VALOR PAGADO:	\$	225.273.356.00	
VALOR POR PAGAR:	\$	41.848.677.28		VALOR POR PAGAR:	\$	725.365.200.00	
SUPERVISOR:	ING. LUIS FELIPE CARDENAS AVILA			INTERVENTOR:	ING. CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		

2. CONTROL DE HITOS.

No.	DESCRIPCIÓN DE LOS ITEMS	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (OBLIGATORIO)				
		5/11/2021	5/11/2021	0
0	Recopilación de información, entrega de documentación para inicio del contrato, revisión y armonización de los diseños, entrega del plan de manejo de tráfico y autorización por parte de interventoría y entidad contratante para el inicio de las actividades	19/11/2021	19/11/2021	0
1	Suministro e instalación de señales reglamentarias 60 x 60 cm	13/05/2022	13/05/2022	0
2	Marcas viales con pintura de tráfico según norma invías y diseño (incluye microesferas)	18/05/2022	18/05/2022	0
3	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frío alta duración metil-metacrilato 100% puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma ntc-1360-1, para pasos peatonales, avisos en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehículos y peatones (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra)	20/05/2022	20/05/2022	0
4	Suministro y aplicación de pintura acrílica con microesferas, líneas continuas y discontinuas de 12 cms según norma invías	20/05/2022	20/05/2022	0
5	Suministro e instalación de señalización vial vertical doble (duplex) en papel reflectivo 60 x 60 zona urbana, según especificaciones relacionadas en el manual de señalización vial adoptado por la resolución 1885 de 2015, numerales 2.2.2. Y 2.1.6.2 (incluye todos los elementos necesarios para su instalación entre ellos herramienta menor, excavación, concreto y mano de obra)	22/05/2022	13/04/2022	39
6	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito preventivas sp-47b, tamaño 60 x 60 cm. Elaboradas en lámina galvanizada cal.16 papel reflectivo grado xi (diamante al cubo marca 3m) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática. Según norma invías..	1/05/2022	12/04/2022	19
7	Retiro de señales verticales (incluye pedestal y tablero) con entrega en la respectiva entidad territorial (incluye señales sencillas y duplex)	30/04/2022	13/04/2022	17
8	Suministro e instalación señales verticales sr-38, lámina galvanizada reflectividad tipo xi, grado diamante al cubo, con pedestal.	30/04/2022	13/04/2022	17
9	Señales preventivas (sp) y reglamentarias (sr) 60 x 60 cm reflectivo verde limón	30/04/2022	13/04/2022	17
10	Señales de tránsito dimensiones 60*75 cms (delineadores de curva) según norma invías	30/04/2022	13/04/2022	17

11	Señales de tránsito 0.90*1.13 mts (informativas) según norma invias	22/05/2022	13/04/2022	39
12	Suministro e instalación de tachas reflectivas unidireccionales y bidireccionales	22/05/2022	19/05/2022	3
13	Suministro e instalación de hitos (alto =75 cm d=8 cm) de color amarillo	22/05/2022	19/05/2022	3
14	Suministro e instalación de tachones 40*15*8 cm	22/05/2022	19/05/2022	3
15	Estoperoles d=10 cm h=25 cms	5/11/2021	5/11/2021	0
16	PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO	22/05/2022	22/05/2022	0
	ITEMS NO PREVISTOS			
17	NP-01 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE EN PINTURA ACRILICA, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 15 CMS SEGÚN NORMA INVIAS (espesor seco mínimo 9 mils)	18/05/2022	18/05/2022	0
18	NP-02 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE EN PINTURA DE TRAFICO ACRILICA, (Especor seco mínimo de 9 mils)	18/05/2022	18/05/2022	0
19	NP-03 RETIRO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD BASE DE HITOS, BASE DE TACHONES	12/05/2022	12/05/2022	0
20	NP-04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES METALICOS D=10 CM H=2CMS (Incluye, Planta Eléctrica, Taladro, Broca, Aditivo Epóxico, y demás elementos para su correcta instalación).	18/05/2022	18/05/2022	0
21	NP-05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTAFAROS	17/05/2022	17/05/2022	0
22	NP-06 BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPOXICA. (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo)	18/05/2022	18/05/2022	0
23	NP-07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL CHEVRON DE 40CM X90CM (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática).	19/05/2022	19/05/2022	0
24	NP-08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DOL DE 20CM X90CM (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática).	19/05/2022	19/05/2022	0
25	NP-09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PARA CICLORUTA - EN ANDÉN, (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en tubi de 2", pintura electrostática).	19/05/2022	19/05/2022	0
26	NP-10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PARA CICLORUTA -ANCLADA EN PUENTE VEHICULAR (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática).	19/05/2022	19/05/2022	0
27	NP-11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL TIPO DELINEADOR DE CURVA 60CM X 75CM ANCLADA EN PUENTE VEHICULAR. (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática):	19/05/2022	19/05/2022	0
28	NP-12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA O REGLAMENTARIA DE 60CM X 60CM - ANCLADA EN PUENTE VEHICULAR. (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática):	19/05/2022	19/05/2022	0
29	NP-13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA DE 1,77CM X 0,44CM (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática)	19/05/2022	19/05/2022	0
30	NP-14 SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H0.40 MTS - A=0.2 MTS, CONCRETO DE 2500 PSI	6/04/2022	6/04/2022	0
31	NP-15 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)	6/04/2022	6/04/2022	0
32	NP-16 CORTE DE PAVIMENTO ARTICULADO EN ADOQUIN DE ARCILLA	6/04/2022	6/04/2022	0
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)	20/05/2022	20/05/2022	0
Plazo del proyecto en días		150	150	0
Inserte las filas que requiera según el número de ítems				

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	\$ 817.002.742.12	85.94%	8.15%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	\$ 894.718.001.00	94.12%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (cronograma de actividades), Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental y Seguridad Industrial)

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:

- Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría;
- Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la Interventoría y del contratista;
- Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte del MUNICIPIO;

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y trámites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:


- Revisión de documentación remitida por el contratista y supervisor, a continuación de relación la documentación recibida y enviada, junto con la actuación de la Interventoría. No hubo.


ACTIVIDADES FÍSICAS REALIZADAS: En la presente semana se intervinieron los siguientes sectores de la ciudad.

- Suministro y aplicación de imprimante y de pintura de plástico en frío (método manual en llana) en los siguientes sectores:
 - Glorieta del Gobernador . .
- Suministro e instalación de estoperoles: Avenida olímpica.
- Construcción bandas reductoras de velocidad. Glorieta del gobernador.

DEMACACION HORIZONTAL GLORIETA DEL GOBERNADOR




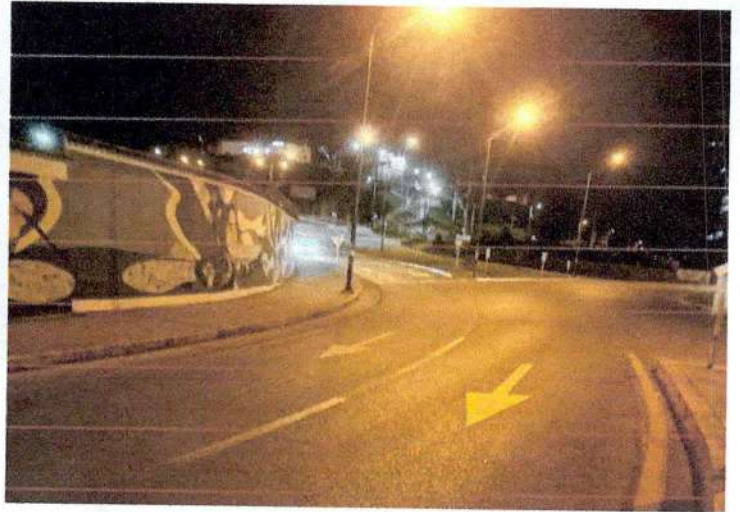



RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOMBRE: ING. FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE



LUNTAIA

NOMBRE: ING. CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma

Dirección: Calle 19 # 9-85 Paso 4 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Teléfono: (57 8) 7 40 57 70 ext. 1409
Correo electrónico: infraestructura@tunja-boyaca.gov.co web: <http://www.tunja-boyaca.gov.co>
Código postal: 150001

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 56 DE 78

ANEXO 11.11 MEMORIAS DE CANTIDADES

	ALCALDÍA DE TUNJA		FECHA: 01/06/2017
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		VERSIÓN: 03
	PROCESO: CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CON-F044
	FORMATO: ACTA DE SEGUIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN		

FECHA PRESENTE ACTA
CONTRATO X CONVENIO ____

OBJETO

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO:

PLAZO DE EJECUCIÓN

CONTRATANTE _X_ PARTE ____

CONTRATISTA _X_ CONTRAPARTE ____

INTERVENTOR _X_ SUPERVISOR ____

FECHA DE INICIO

ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1

AMPLIACIÓN No. 1 AL ACTA DE
SUSPENSIÓN N° 1

AMPLIACIÓN No. 2 AL ACTA DE
SUSPENSIÓN N° 1

AMPLIACIÓN No. 3 AL ACTA DE
SUSPENSIÓN N° 1

ACTA DE REINICIO N° 1

ADICIONAL N° 1 VALOR \$

PRORROGA N° 1

PERIODO DE PAGO

10 de Mayo de 2022		ACTA N°: 3	
No. 1036-2021	FECHA	20 de Octubre del 2021	
OBJETO: CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA			
VALOR TOTAL: \$950.638.556,00 NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/C.TE.			
APORTE MUNICIPIO: (N.A.)			
APORTE DE CONTRAPARTE: (N.A.)			
TRES (3) MESES			
MUNICIPIO DE TUNJA			
CUMBRE INGENIERIA S.A.S.			
CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ			
5/11/2021			
28/01/2022			
11/02/2022			
25/02/2022			
4/03/2022			
15/03/2022			
\$308.000.000,00 TRESCIENTOS OCHO MILLONES DE PESOS M/C.TE			
DOS (2) MESES			
29 de marzo de 2022 al 10 de mayo de 2022			

En la Ciudad de Tunja, a los diez (10) días del mes de mayo de 2022, en la Secretaría de TRÁNSITO Y TRANSPORTE del Municipio, se reunió el ingeniero CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.172.415 de TUNJA, en su calidad de Interventor del CONTRATO No. 1036 de 2021 y el señor (a) LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.909.677 de BOGOTÁ, en su calidad de representante legal del CONTRATISTA, CUMBRE INGENIERIA S.A.S., NIT 901.321.674-4, con el fin de suscribir la presente ACTA DE SEGUIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN N°. 3, correspondiente al periodo de pago del 29 de marzo de 2022 al 10 de mayo de 2022, en los siguientes términos:

BALANCE DE PAGO		
CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato actualizado	\$ 950.638.556	
Anticipo		
Valor de la presente acta seguimiento y recibo a satisfacción		\$ 270.131.696
Valor actas pagadas		\$ 585.387.654
Saldo por ejecutar		\$ 95.119.206
Sumas iguales	\$ 950.638.556	\$ 950.638.556

El suscrito interventor del CONTRATO en mención, manifiesta que ha recibido a satisfacción el informe correspondiente al periodo de pago mencionado, presentado por el CONTRATISTA, quien cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el contrato; igualmente certificó que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión y riesgos profesionales de acuerdo a la(s) planilla(s) N° 58289025, N°58949155, N°59678621, N°9433001181, N°9434286786 y N°9436170422 del mes de marzo, abril y mayo de 2022 de conformidad con la normatividad vigente.

*En visita al lugar de los trabajos y/o en la entrega de los bienes, servicios y demás, se constató que lo ejecutado está de acuerdo con el porcentaje equivalente al 89,99 % encontrándose como soportes los informes allegados junto con sus anexos que hacen parte de la presente acta.

*No Aplica para contratos de prestación de servicios

OBSERVACIONES: _____

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

FIRMA:

NOMBRE: LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL

R/L. CUMBRE INGENIERIA S.A.S.

CONTRATISTA

FIRMA:

NOMBRE: CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

INTERVENTOR

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE (CUANDO APLIQUE)
ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE) E INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:		
Los dos firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.		



OBJETO: CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA									
CONTRATISTA: CUMBRE INGENIERIA S.A.S.									
CONTRATO N° 1038-2021									
PERIODO DEL CORTE DE OBRA: 20 DE MARZO DE 2022 AL 10 DE MAYO DE 2022									
INTERVENIENTOR: CESAR HERNANDO FIGUEROA PAEZ									
CONTRATO N° 1069-2021									
ACTA PARCIAL DE OBRA N°3									
CUMBRE INGENIERIA S.A.S.									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									
CANTON									

		OBJETO: CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA																			
		CONTRATISTA: CUMBRE INGENIERIA S.A.S.				ACTA PARCIAL DE OBRA N°3				INTERVENIENTE: CESAR HERNANDO FIGUEROA PAEZ											
		CONTRATO N° 1038-2021								CONTRATO N° 1068-2021											
		PERIODO DEL CORTE DE OBRA: 29 DE MARZO DE 2022 AL 10 DE MAYO DE 2022																			
		CONDICIONES CONTRACTUALES				NUEVAS CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACION N°2				ACUMULADO ACTAS ANTERIORES N°1 Y N°2				ACTA N°3				ACUMULADO ACTUAL			
Nº	DESCRIPCION	UNID	Cant	Vr Unidad	Vr Parcial	Cant	Vr Parcial	Cant	VALOR	Cant	Vr Parcial	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR				
18	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	G	1,00	\$ 1.051.396,00	\$ 1.051.396,00	1,00	\$ 1.051.396,00	1,00	\$ 1.051.396,00	1,00	\$ 1.051.396,00	-			\$ 1.051.396,00	1,00	\$ 1.051.396,00				
ACTIVIDADES NO PREVISTAS																					
17	NP-01 SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPRIMANTE EN PINTURA ACRILICA LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 15 CMs SEGUN NORMA INVIAS (espesor seco minimo 9 mils)	ML		\$ 3.335,00	\$ -	10.948,28	\$ 35.417.896,03			6.036,00	\$ 21.467.460,00			4.312,26	\$ 13.950.276,00	10.948,28	\$ 35.417.896,00				
18	NP-02 SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPRIMANTE EN PINTURA DE TRAFICO ACRILICA (Especior seco minimo de 9 mils)	M2		\$ 47.940,00	\$ -	2.500,06	\$ 113.896.022,03			1.279,35	\$ 61.332.039,00			1.217,68	\$ 58.375.579,00	2.497,33	\$ 119.707.618,00				
19	NP-03 RETIRO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD BASE DE HITOS, BASE DE TACHONES	UND		\$ 21.369,00	\$ -	50,00	\$ 1.218.450,03				\$ -			50,00	\$ 1.218.450,00	50,00	\$ 1.218.450,00				
20	NP-04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTOPEPOLES METALICOS D=10 CM H=2CMS (Inchuye: Planta Eléctrica, Talledo, Broca, Aditivo Epoxico y demas elementos para su correcta instalacion).	UND		\$ 20.123,00	\$ -	897,00	\$ 18.056.331,03			-	\$ -			877,00	\$ 17.847.871,00	877,00	\$ 17.847.871,00				
21	NP-05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPTAFARCS	UND		\$ 23.897,00	\$ -	125,00	\$ 2.986.875,03			-	\$ -			100,00	\$ 2.368.700,00	100,00	\$ 2.368.700,00				
22	NP-06 BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACION BLANCA Y RESINA EPÓXICA,	M2		\$ 682.354,00	\$ -	46,49	\$ 31.722.637,03			-	\$ -			23,13	\$ 15.702.846,00	23,13	\$ 15.702.846,00				
23	NP-07 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL CHEVRON DE 40CM X90CM (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (cemento al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pinturas electostáticas).	UND		\$ 464.538,00	\$ -	6,00	\$ 2.787.348,03			-	\$ -			1,00	\$ 464.538,00	1,00	\$ 464.538,00				
24	NP-08 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DOL DE 20CM X90CM (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (cemento al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pinturas electostáticas).	UND		\$ 388.538,00	\$ -	1,00	\$ 388.538,03			-	\$ -			1,00	\$ 388.538,00	1,00	\$ 388.538,00				

		OBJETO: CONTRATO DE OBRA PARA LA REALIZACIÓN Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA														
		CONTRATISTA: CUMBRE INGENIERIA S.A.S.				CONTRATO N° 1036-2021				CONTRATISTA: CUMBRE INGENIERIA S.A.S.						
		PERIODO DEL CORTE DE OBRA: 29 DE MARZO DE 2022 AL 10 DE MAYO DE 2022				CONTRATO N° 1036-2021				INTERVENIENTOR: CESAR HERNANDO FIGUEROA PAEZ						
		ACTA PARCIAL DE OBRA N°3				CONTRATO N° 1036-2021				CONTRATO N° 1036-2021						
No.	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			NUEVAS CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACION N°2			ACUMULADO ACTAS ANTERIORES N°1 Y N°2			ACTA N°3			ACUMULADO ACTUAL	
			Cant	Vr. Unidad	Vr. Parcial	Cant	Vr. Parcial	Cant	VALOR	Cant	Vr. Parcial	Cant	VALOR			
25	NP-09 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENAL PARA CICLORUTA - EN ANDEN. (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en tubi de 2", pintura electrosalica).	UND		\$ 480.183,00	\$ -	6,00	\$ 2.881.098,03	-	\$ -	-	\$ -	6,00	\$ 2.881.098,00	6,00	\$ 2.881.098,00	
26	NP-10 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENAL PARA CICLORUTA -ANCLADA EN PUENTE VEHICULAR (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrosalica).	UND		\$ 612.023,00	\$ -	2,00	\$ 1.224.050,03	-	\$ -	-	\$ -	2,00	\$ 1.224.050,00	2,00	\$ 1.224.050,00	
27	NP-11 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENAL TIPO DELINEADOR DE CURVA 60CM X 75CM - ANCLADA EN PUENTE VEHICULAR. (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrosalica).	UND		\$ 747.650,00	\$ -	5,00	\$ 3.738.250,03	-	\$ -	-	\$ -	5,00	\$ 3.738.250,00	5,00	\$ 3.738.250,00	
28	NP-12 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENAL PREVENTIVA O REGULAMENTARIA DE ZONA DE OCHO EN ANCLADA EN PUENTE VEHICULAR. (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrosalica).	UND		\$ 637.650,00	\$ -	6,00	\$ 3.795.900,03	-	\$ -	-	\$ -	4,00	\$ 2.530.600,00	4,00	\$ 2.530.600,00	
29	NP-13 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENAL PREVENTIVA DE 177CM X 0.41CM (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrosalica).	UND		\$ 996.408,00	\$ -	1,00	\$ 996.408,03	-	\$ -	-	\$ -	3,00	\$ 2.988.050,00	3,00	\$ 2.988.050,00	
30	NP-14 SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H0 40 MTS - A=0,2 MTS. CONCRETO DE 2500 PSI	ML		\$ 60.425,00	\$ -	83,00	\$ 5.015.275,03	-	\$ -	-	\$ -	66,00	\$ 3.988.050,00	66,00	\$ 3.988.050,00	
31	NP-15 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUIRE RETIRO)	MS		\$ 82.678,00	\$ -	3,32	\$ 274.491,03	-	\$ -	-	\$ -	3,30	\$ 272.837,00	3,30	\$ 272.837,00	
32	NP-16 CORTE DE PAVIMENTO ARTICULADO EN AZOQUINI DE ARCILLA	ML		\$ 5.270,00	\$ -	136,00	\$ 716.720,03	-	\$ -	-	\$ -	132,00	\$ 695.640,00	132,00	\$ 695.640,00	
SUB TOTAL (INCLUIRE IVA 25%)				\$ 942.638.556,00	\$ 953.638.556,03	\$ 585.317.664,00	\$ 270.131.696,00	\$ 855.918.350,00								
VALOR TOTAL				\$ 942.638.556,00	\$ 953.638.556,03	\$ 585.317.664,00	\$ 270.131.696,00	\$ 855.918.350,00								
PORCENTAJE EJECUTADO																

CONTRATISTA:
CUMBRE INGENIERIA S.A.S.
NIT. 900.21.974-4
RL LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL

INTERVENIENTOR
ING. CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ
NIT. C.C. /172.415 DE TUNJA

		MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N°3						CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	
CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCAACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACION DE TRANSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA		VERSION		1.0		CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
CONTRATO DE OBRA No. 1036-2021 CONTRATO INTERVENTORIA No. 1089-2021		CONTRATISTA CUMBRE INGENIERIA SAS		ENTIDAD CONTRATANTE CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		MUNICIPIO DE TUNJA			
CAPITULO		GENERAL		ITEM 1		SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES REGLAMENTARIAS 60 x 60 CM		UNIDAD UNO	
ITEM	LOCALIZACION / DESCRIPCION	ANCHO	LARGO	AREA M2	CANTIDAD	TOTAL	LOCALIZACION PLANIMETRICA		
SR-28	PLAZA DE MERCADO DEL SUR				6.00	6.00			
SR-05	BARRIO EL CONSUELO				2.00	2.00			
SR-04					2.00	2.00			
SR-01					4.00	4.00			
UNO A UNO	RESALTOS				2.00	2.00			
SP-25A					8.00	8.00			
SR-07	BARRIO EL RODEO				1.00	1.00			
SR-04					1.00	1.00			
SR-08	FRENTE A C.C. VIVA				1.00	1.00			
SR-41	CENTRO HISTORICO				1.00	1.00			
SR-28					2.00	2.00			
SR-01					2.00	2.00			
SR-40					2.00	2.00			
SR-28A					2.00	2.00			
SR-41					1.00	1.00			
SR-06					1.00	1.00			
OBSERVACIONES						SUBTOTAL UNO 38.00 TOTAL UNO 38.00			
Firma						Firma			
Nombre:						Nombre:			
Cargo:						Cargo:			
CONTRATISTA DE OBRA						INTERVENTOR A			
ES PINISAO ESLEYA RESIDENTE DE OBRA						HERNANDO RODRIGUEZ RESIDENTE DE INTERVENTORIA			



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N°3

CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA



VERSION


1.0

CONTRATISTA

CUMBRE

CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

CONTRATO DE OBRA No	1035-2021	CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA SAS	ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUNJA	
CONTRATO INTERVENTORIA No.	1065-2021	INTERVENTORIA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	HOJA	1	DE 1
CAPITULO	GENERAL		ITEM	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES REGLAMENTARIAS 60 x 60 CM	UNIDAD
LOCALIZACION PLANIMETRICA						
ITEM	LOCALIZACION / DESCRIPCION	DIMENSIONES		CANTIDAD	TOTAL	
		ANCHO	LARGO	AREA M2		
SR-01	CARRERA 9 CON CALLE 58				1,00	1,00
	CALLE 45 CON AVENIDA UNIVERSITARIA				-	-
SR-18	CALLE 16 A TRIGALES				2,00	2,00
					-	-
SR-18					1,00	1,00
	AV. UNIVERSITARIA CALLE 47 Y 48				-	-
SR-06					1,00	1,00
SR-28					1,00	1,00
	HOSPITAL SAN ANTONIO				-	-
SR-02					1,00	1,00
SR-30					4,00	4,00
SR-16					3,00	3,00
SR-29					2,00	2,00
SR-40					1,00	1,00
SR-01	BARRIO SANTA INES				6,00	6,00
					-	-
SR-28					6,00	6,00
SR-01					1,00	1,00
SR-06					1,00	1,00
SR-10					1,00	1,00
	VIA TUNJA - ARCABUCO				-	-
SR-26					3,00	3,00
	GLORIETA GOBERNADOR				-	-
SR-02					6,00	6,00
					-	-
OBSERVACIONES						
					SUBTOTAL	41,00
					TOTAL	41,00



CONTRATISTA DE OBRA

Firma

Nombre: CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

Cargo: RESIDENTE DE OBRA



INTERVENTORIA

Firma

Nombre: FERNANDO RODRIGUEZ

Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA



		MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N°3				VERSION		CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ
CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCAACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACION DE TRANSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA						1.0	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
CONTRATO DE OBRA No 1038-2021		CONTRATISTA		CUMBRE INGENIERIA SAS		ENTIDAD CONTRATANTE		
CONTRATO INTERVENTORIA No. 1068-2021		INTERVENTORIA		CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		MUNICIPIO DE TUNJA		
CAPITULO		GENERAL		ITEM	2	MARCAS WALES CON PINTURA DE TRAFICO SEGUN NORMA INVIAS Y DIBERO (INCLUYE MICROSEFÉRAS)		
LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES		CANTIDAD	TOTAL	LOCALIZACIÓN PLANIMETRICA		
ITEM	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	ANCHO	LARGO	AREA M2	CANTIDAD	TOTAL	LOCALIZACIÓN PLANIMETRICA	
PUENTE LAS QUINTAS								
	NEW JERSEY	1,10	2,00	2,20	10,00	22,00		
	LETRERO DESPACHO	-	-	4,07	1,00	4,07		
BARRIO EL CONSUELO								
	CALLE 12 ENTRE CARRERA 7 Y 9							
	LINEA DE CENTRO	0,17	15,00	2,55	1,00	2,55		
	LINEA METRO A METRO	0,17	1,00	0,17	12,00	2,04		
CALLE 12 CARRERA 7								
	LINEA ISLETA	0,19	24,05	4,57	1,00	4,57		
	FLECHA DE ACHURADO	0,90	3,00	2,70	1,00	2,70		
		0,90	4,10	3,69	1,00	3,69		
		0,90	1,30	1,17	1,00	1,17		
						-		
						-		
						-		
OBSERVACIONES:						SUBTOTAL	M2	42,79
						TOTAL	M2	42,79
CONTRATISTA DE OBRA								
Firma		Nombre:		Cargo:		INTERVENTORIA		
		ESTEBAN ESQUIVEL		RESIDENTE DE OBRA				
Nombre:		ESTEBAN ESQUIVEL		RESIDENTE DE OBRA		Nombre:		
Cargo:		RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE OBRA		Cargo:		
Cargo:		RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE OBRA		Cargo:		

		MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N°3						CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	
CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCAACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACION DE TRANSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA		VERSION		1.0		CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
CONTRATO DE OBRA No. 1036-2021		CONTRATISTA		CUMBRE INGENIERIA SAS		ENTIDAD CONTRATANTE		MUNICIPIO DE TUNJA	
CONTRATO INTERVENTORIA No. 1068-2021		INTERVENTORIA		CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		HOJA		1 DE 1	
CAPITULO		GENERAL		ITEM		3		Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frío alta duración metil-metacrilato 100% puro con microesferas para marcas viales de espesor saco de 50 mils según norma NTC-1360-1, para pasos peatonales, avisos en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehículos y peatones (incluya todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra)	
UNIDAD		M2							




ITEM	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
		ANCHO	LARGO	AREA M2		
RESALTOS						
	AV. UNIVERSITARIA FRENTE A COLEGIO SAN VIATUR	3,80	6,50	24,70	1,00	24,70
		3,30	6,80	22,44	1,00	22,44
	AVENIDA UNIVERSITARIA FRENTE A CLINICA CANCEROLOGICA	3,85	7,10	27,34	1,00	27,34
		3,90	8,78	34,24	1,00	34,24
	CARRERA 15 N°9A-109	1,45	5,60	8,12	1,00	8,12
	CARRERA 15 N°9A-59	1,50	5,62	8,43	1,00	8,43
OBSERVACIONES:						
<div> <div>   </div> <div>   </div> </div>						
SUBTOTAL					M2	125,27
TOTAL					M2	125,27


CONTRATISTA DE OBRA		INTERVENTORIA	
Firma	Firma	Nombre:	Nombre:
ESTANISLAO ESLAVA	FERNANDO RODRIGUEZ	Cargo:	Cargo:
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA		

[illegible]

						MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N°3						VERSIÓN CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ			
						CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA						CONTRATISTA			
CONTRATO DE OBRA No.						1036-2021		CONTRATISTA		CUMBRE INGENIERIA SAS		ENTIDAD CONTRATANTE		MUNICIPIO DE TUNJA	
CONTRATO INTERVENTORIA No.						1088-2021		INTERVENTORIA		CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		HOJA		1 DE 1	
CAPITULO						GENERAL		ITEM		3		Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frío alta duración medil-metacrilato 100% puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 milis según norma NTC-1360-1, para pasos peatonales, avisos en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehículos y peatones (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra)		UNIDAD M2	
ITEM		LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES		CANTIDAD		TOTAL		LOCALIZACIÓN PLANIMETRICA					
		CARRERA 9 CON CALLE 21													
				ANGHO		LARGO		AREA M2							
	CERAS			0.40		4.00		1.60	8.00	12.80					
	FLECHA FRENTE Y GIRO							2.20	2.00	4.40					
	LÍNEA DE PARE			0.60		3.30		1.98	1.00	1.98					
OBSERVACIONES:										SUBTOTAL M2		19.18			
										TOTAL		19.18			
CONTRATISTA DE OBRA															
Firma: _____ Nombre: ESTANISLAO ESLAVA Cargo: RESIDENTE DE OBRA															
INTERVENTORIA															
Firma: _____ Nombre: FERNANDO RODRIGUEZ Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA															

	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N°3							CUMBRE	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	
CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA										
CONTRATO DE OBRA No.	1036-2021	CONTRATISTA		CUMBRE INGENIERIA SAS		ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUNJA			
CONTRATO INTERVENTORIA No.	1088-2021	INTERVENTORIA		CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		HOJA	DE	1	1	
CAPITULO	GENERAL		ITEM	3	Suministro y aplicación manual (método línea) de pintura de plástico en frío alta duración metil-metacrilato 100% puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC-1360-1, para pasos peatonales, avisos en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehículos y peatones (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra)					M2
ITEM	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCION	DIMENSIONES		CANTIDAD	TOTAL	LOCALIZACIÓN PLANIMETRICA				
	CARRERA 9 CON CALLE 18	ANCHFO	LARGO	AREA M2						
				-	-					
	CEERAS	0.40	4.00	1.60	13.00	20.80				
	FLECHA FRENTE Y GIRO			2.20	2.00	4.40				
	LINEA DE PARE	0.60	5.70	3.42	1.00	3.42				
		0.60	3.35	2.01	2.00	4.02				
	FLECHA DE FRENTE			1.20	1.00	1.20				
	ANTIBLOQUEO	0.30	41.00	12.30	1.00	12.30				
					-	-				
OBSERVACIONES:					SUBTOTAL	M2	46.14			
				TOTAL	M2	46.14				
CONTRATISTA DE OBRA										
Firma: [Signature]										
Nombre: ESTANISLAO ESIJAYA										
Cargo: RESIDENTE DE OBRA										
INTERVENTORIA										
Firma: [Signature]										
Nombre: CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ										
Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA										

		MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N°3				VERSIÓN 1.0		CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ
CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCAACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACION DE TRANSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA						CONTRATISTA	INTERVENTORIA	
CONTRATO DE OBRA No 1038-2021		CONTRATISTA CUMBRE INGENIERIA SAS		CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		MUNICIPIO DE TUNJA		
CONTRATO INTERVENTORIA No. 1068-2021		INTERVENTORIA		HOJA 1		DE 1		
CAPITULO		GENERAL		ITEM 3		UNIDAD M2		
				Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frío alta duración metil-metacrilato 100% puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC-1360-1, para pasos peatonales, avisos en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehículos y peatones (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra)				
LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN GLORIETA GREEN HILLS		DIMENSIONES ANCHO LARGO		CANTIDAD TOTAL		LOCALIZACIÓN PLANIMETRICA		
								
CEBRAS (PASTILLAS)		0,40 4,00		1,60 52,00				
FLECHA FRENTE Y GIRO		3,00 7,50		22,50 3,00				
RESALTO VIRTUAL		3,00 6,10		18,30 1,00				
		3,05 7,50		22,88 1,00				
		3,05 6,10		18,61 1,00				
		3,90 5,45		21,26 1,00				
		4,05 6,70		27,14 1,00				
FLECHA DE FRENTE				1,20 3,00				
TEXTO ESPACIO		0,15 4,00		0,60 1,00				
BANDAS LINEA LOGARITMICA		0,60 6,70		4,02 4,00				
		0,60 4,90		2,94 1,00				
PICTOGRAMA CEDA EL PASO		0,60 6,70		4,02 4,00				
				1,53 4,00				
OBSERVACIONES		SUBTOTAL M2		TOTAL M2		INTERVENTORIA		
		285,91		285,91				
CONTRATISTA DE OBRA		CONTRATISTA DE OBRA		CONTRATISTA DE OBRA		CONTRATISTA DE OBRA		
ESTANISLAO ESILAVA RESIDENTE DE OBRA		ESTANISLAO ESILAVA RESIDENTE DE OBRA		ESTANISLAO ESILAVA RESIDENTE DE OBRA		ESTANISLAO ESILAVA RESIDENTE DE OBRA		
FERNANDO RODRIGUEZ RESIDENTE DE INTERVENTORIA		FERNANDO RODRIGUEZ RESIDENTE DE INTERVENTORIA		FERNANDO RODRIGUEZ RESIDENTE DE INTERVENTORIA		FERNANDO RODRIGUEZ RESIDENTE DE INTERVENTORIA		

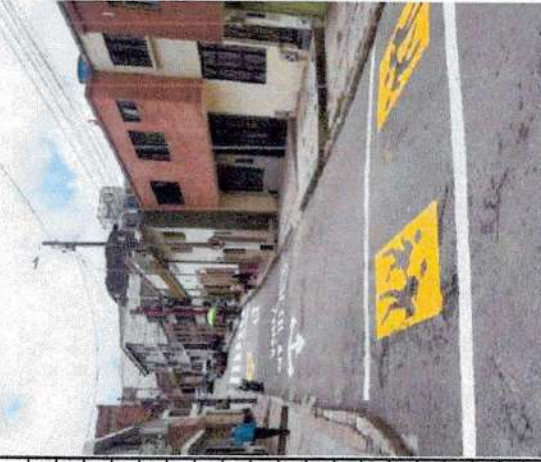		MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N°3					CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ
CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCAACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRANSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA		VERSIÓN 1.0		CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
CONTRATO DE OBRA No. 1036-2021		CONTRATISTA INTERVENTORIA		CUMBRE INGENIERIA SAS		MUNICIPIO DE TUNJA	
CONTRATO INTERVENTORIA No. 1068-2021		INTERVENTORIA		CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		HOJA 1 DE 1	
CAPITULO		GENERAL		ITEM 3		Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frío alta duración metil-metacrilato 100% puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC-1360-1, para pasos peatonales, avisos en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehículos y peatones (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra)	
UNIDAD M2		LOCALIZACION PLANIMETRICA					
ITEM	LOCALIZACION / DESCRIPCION	DIMENSIONES		CANTIDAD	TOTAL		
	BARRIO EL CONSUELO (CR 8 CON CALLE 15D)	ANCHO	LARGO	AREA M2			
	CEERAS (PASTILLAS)	0.40	4.00	1.60	30.00	48.00	
	PICTOGRAMA CASITA			5.80	1.00	5.80	
	PICTOGRAMA CRUCE ESCOLAR			3.25	4.00	13.00	
	LINEA DE PARE	0.60	2.80	1.68	1.00	1.68	
		0.60	2.62	1.57	1.00	1.57	
	FLECHA DE FRENTE Y GIRO			2.20	2.00	4.40	
	TEXTO DE ZONA ESCOLAR			6.50	2.00	13.00	
	FLECHA TRIPLE			3.20	1.00	3.20	
	LINEA DE SENDERO	0.30	5.90	1.77	1.00	1.77	
		0.30	7.30	2.19	1.00	2.19	
		0.30	9.75	2.93	1.00	2.93	
		0.30	5.75	1.73	1.00	1.73	
	FLECHA DE FRENTE			1.20	2.00	2.40	
	FLECHA DE GIRO			1.53	1.00	1.53	
	FLECHA DOBLE GIRO			2.53	2.00	5.06	
	LINEA ANTIBLOQUEO	0.30	44.75	13.43	1.00	13.43	
OBSERVACIONES:					SUBTOTAL	M2	121.69
					TOTAL	M2	121.69
CONTRATISTA DE OBRA							
Firma		Firma		INTERVENTORIA			
Nombre: ESTANISLAC ESLAVA		Nombre: FERNANDO RODRIGUEZ					
Cargo: RESIDENTE DE OBRA		Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA					


	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N°3						VERSIÓN	CUMBRE	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ
CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRANSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA									
CONTRATO DE OBRA No.	1036-2021	CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA SAS				ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUNJA	
CONTRATO INTERVENTORIA No.	1068-2021	INTERVENTORIA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ				HOJA	1 DE 1	
CAPITULO	GENERAL	ITEM	3	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frío alta duración melt-metacrilato 100% puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 30 mils según norma MTC-1360-1, para pasos peatonales, avisos en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehículos y peatones (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra)			UNIDAD	M2	
LOCALIZACION / DESCRIPCION		DIMENSIONES		CANTIDAD	TOTAL	LOCALIZACION PLANIMETRICA			
ITEM	LOCALIZACION / DESCRIPCION	ANCHO	LARGO				AREA M2		
	BARRIO EL CONSUELO (CALLE 13 CARRERA 7)								
	FLECHA DE GIRO			1.53	1.53				
	LINEA DE SENDERO	0.30	11.40	3.42	3.42				
	LINEA DE PARE	0.60	2.70	1.62	1.62				
	CALLE 13 CARRERA 8								
	FLECHA DOBLE GIRO			2.53	2.53				
	LINEA DE SENDERO	0.30	22.60	6.78	13.56				
	LINEA DE PARE	0.60	3.05	1.83	1.83				
	RESALTO	1.40	6.90	9.66	9.66				
	CALLE 13 CARRERA 18A -07			-	-				
	FLECHA DE GIRO			1.53	1.53				
	LINEA DE PARE	0.60	3.10	1.86	1.86				
	LINEA DE SENDERO	0.30	28.73	8.62	8.62				
	CARRERA 7 Y 8 CON CALLE 15								
	FLECHA DE FRENTE / GIRO			2.20	2.20				
	FLECHA DE GIRO			1.20	3.60				
	LINEA DE SENDERO	0.30	9.25	2.78	2.78				
SUBTOTAL				M2	54.71				
TOTAL				M2	54.71				
OBSERVACIONES:									
CONTRATISTA DE OBRA							INTERVENTORIA		
Firma							Firma		
NOMBRE	ESTEBAN ESPINOSA						NOMBRE		
CARGO	RESIDENTE DE OBRA						CARGO		
							RESIDENTE DE INTERVENTORIA		

		MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N°3				VERSIÓN 1.0		CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	
CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA									
CONTRATO DE OBRA No. 1038-2021		CONTRATISTA CUMBRE INGENIERIA SAS		ENTIDAD CONTRATANTE CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		MUNICIPIO DE TUNJA			
CONTRATO INTERVENTORIA No. 1068-2021		INTERVENTORIA		HOJA 1		DE 1			
CAPITULO		GENERAL		ITEM 3		Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frío alta duración metil-metacrilato 100% puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC-1360-1, para pasos peatonales, avisos en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehículos y peatones (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra)			
LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN BARRIO EL CONSUELO (CALLE 15 CARRERA 7B-05)		ANCHO 0,30		LARGO 16,35		AREA M2 4,91		LOCALIZACIÓN PLANIMETRICA	
LINEA DE SENDERO		0,30		16,35		4,91			
CARRERA 7B CALLE 15-03		0,30		8,30		2,49			
LINEA DE SENDERO		0,30		8,30		2,49			
FLECHA DE FRENTE Y GIRO		0,60		3,30		1,98			
CARRERA 7B CON CALLE 15-54		0,30		12,00		3,60			
FLECHA DE FRENTE		0,30		12,00		3,60			
FLECHA DOBLE GIRO		0,20		15,00		3,00			
LINEA DE PARE		0,20		15,00		3,00			
CALLE 15 CON CARRERA 8		0,30		12,00		3,60			
LINEA DE SENDERO		0,30		12,00		3,60			
FLECHA DE GIRO		0,20		15,00		3,00			
LINEA DE CENTRO		0,20		15,00		3,00			
OBSERVACIONES		SUBTOTAL M2		SUBTOTAL M2		SUBTOTAL M2			
CONTRATISTA DE OBRA		ESTANISLAO ESPIÑA RESIDENTE DE OBRA		SUBTOTAL M2		SUBTOTAL M2			
INTERVENTORIA		FERNANDO RODRIGUEZ RESIDENTE DE INTERVENTORIA		SUBTOTAL M2		SUBTOTAL M2			

[illegible]

		MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N°3					CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ
CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA		VERSIÓN 1.0		CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
CONTRATO DE OBRA No. 1036-2021		CONTRATISTA CUMBRE INGENIERIA SAS		ENTIDAD CONTRATANTE CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		MUNICIPIO DE TUNJA	
CONTRATO INTERVENTORIA No. 1068-2021		INTERVENTORIA		HOJA 1		DE 1	
CAPITULO		GENERAL		ITEM 5		UNIDAD UN	
Suministro e Instalación de Señalización vial vertical Doble (DUPLEX) en papel reflectivo 60 x 60 zona urbana, según especificaciones relacionadas en el Manual de Señalización vial adoptado por la resolución 1885 de 2015, numerales 2.2.2. y 2.1.6.2 (Incluye todos los elementos necesarios para la instalación entre ellos herramienta menor, excavación, concreto y mano de obra)							
LOCALIZACIÓN / DESCRIPCION		DIMENSIONES ANCHO LARGO AREA M2		CANTIDAD TOTAL		LOCALIZACIÓN PLANIMETRICA	
GLORIETA GOBERNADOR		-		-			
SP24/SR-30		-		2.00			
AV COLON CON CALLE 23		-		-			
SR-06/SR-41		-		1.00			
CALLE 22 CARRERA 8 ESQUINA		-		1.00			
SR-01/SR-08		-		1.00			
BARRIO EL CONSUELO		-		-			
SP-47B/SR-30		-		3.00			
SP-46A/SR-30		-		2.00			
OBSERVACIONES:		VIENEN TOTAL UN UN		9.00			
CONTRATISTA DE OBRA		INTERVENTORIA		Firma		FERNANDO RODRIGUEZ	
Nombre:		Nombre:		Nombre:		Nombre:	
Cargo:		Cargo:		Cargo:		Cargo:	

		MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N°3				VERSIÓN 1.0		CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ
CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA						ENTIDAD CONTRATANTE CUMBRE	CONTRATISTA CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	INTERVENTORIA
CONTRATO DE OBRA No. 1036-2021		CONTRATISTA CUMBRE INGENIERIA SAS		ENTIDAD CONTRATANTE MUNICIPIO DE TUNJA				
CONTRATO INTERVENTORIA No. 1068-2021		INTERVENTORIA CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		HOJA 1 DE 1				
CAPITULO		GENERAL		ITEM 6		UNIDAD UN		
Suministro e instalación de señal vertical de tránsito preventiva: SP-47B, tamaño 60 X 60 cm. Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo marca 3M) pedestal elaborado en arguilo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática. Según norma INVÍAS.								
LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES ANCHO LARGO AREA M2		CANTIDAD		TOTAL		
GLORIETA GREEN HILLS								
SP-46B				6,00		6,00		
GLORIETA GOBERNADOR								
SP-46B				7,00		7,00		
OBSERVACIONES								
CONTRATISTA DE OBRA		ESTANISLAO ESLAVA RESIDENTE DE OBRA		VIENEN TOTAL		UN UN 13,00		
CONTRATISTA DE OBRA		INTERVENTORIA		INTERVENTORIA				
Firma		Firma		Nombre:		Nombre:		
Nombre:		Nombre:		Cargo:		Cargo:		
Cargo:		Cargo:		Cargo:		Cargo:		

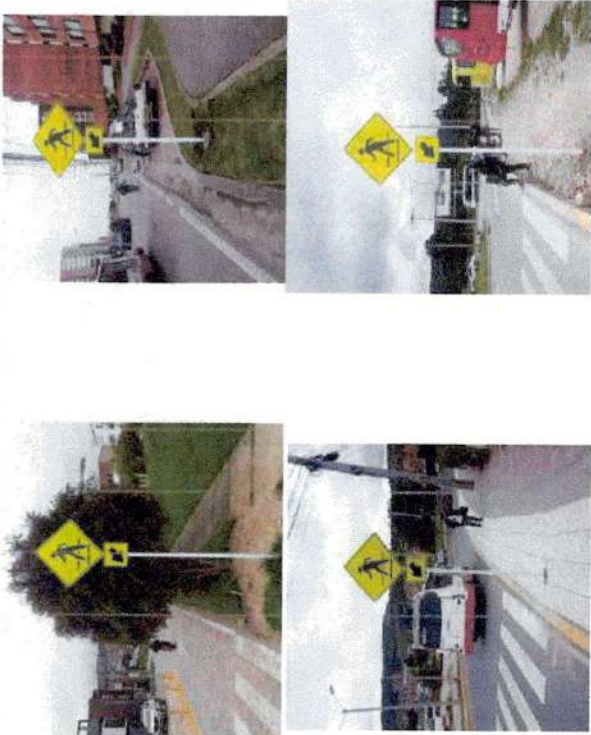




		MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N°3						CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	
CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCAACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACION DE TRANSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA		VERSION		CONTRATISTA		INTERVENTORIA			
CONTRATO DE OBRA No. 1035-2021		CONTRATISTA CUMBERE INGENIERIA SAS		ENTIDAD CONTRATANTE MUNICIPIO DE TUNJA		1.0			
CONTRATO INTERVENTORIA No. 1065-2021		INTERVENTORIA CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		HOJA 1		DE 1			
CAPITULO		GENERAL		ITEM 8		Suministro e instalación señales verticales sr-38, lámina galvanizada reflectividad tipo Xi, grado diamante al cubo, con pedestal			
LOCALIZACIÓN / DESCRIPCION		DIMENSIONES		CANTIDAD		TOTAL			
BARRIO EL CONSUELO		ANCHO LARGO AREA M2		1,00		1,00			
SR-38				1,00		1,00			
CALLE 14 ENTRE CARRERAS 21 Y 26				1,00		1,00			
SR-38				1,00		1,00			
CARRERA 9 CON CALLE 21 ESQUINA				1,00		1,00			
SR-38				1,00		1,00			
BARRIO EL RODEO CARRERA 6 CALLE 19				1,00		1,00			
SR-38				1,00		1,00			
OBSERVACIONES		VIENEN TOTAL		UN UN		4,00			
CONTRATISTA DE OBRA		Firma		Firma		INTERVENTORIA			
Nombre: ESTANISLAO ESLAVA		Nombre: FERNANDO RODRIGUEZ		Nombre:		RESIDENTE DE OBRA			
Cargo: RESIDENTE DE OBRA		Cargo:		Cargo:		RESIDENTE DE INTERVENTORIA			




[illegible]

		MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N°3				VERSION CUMERE		CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	
CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCAACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACION DE TRANSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA		VERSION 1.0		CONTRATISTA		INTERVENTORIA			
CONTRATO DE OBRA No 1039-2021		CONTRATISTA CUMBRE INGENIERIA SAS		ENTIDAD CONTRATANTE CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		MUNICIPIO DE TUNJA			
CONTRATO INTERVENTORIA No. 1069-2021		INTERVENTORIA		HOJA 1		DE 1			
CAPITULO		GENERAL		ITEM 10		SEÑALES DE TRANSITO DIMENSIONES 60*75 CMS (DELINEADORES DE CURVA) SEGÚN NORMA INVIAS			
LOCALIZACIÓN / DESCRIPCION		DIMENSIONES		CANTIDAD		TOTAL			
GLORIETA GOBERNADOR		ANCHO		LARGO		AREA M2			
DELINEADORES DE CURVA		6,00		6,00		6,00			
OBSERVACIONES:		LOCALIZACION PLANIMETRICA							
CONTRATISTA DE OBRA		INTERVENTORIA		Firma		Firma			
Nombre: ESTANISLAO ESALVA		Nombre: CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		Nombre: CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		Nombre: CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ			
Cargo: RESIDENTE DE OBRA		Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA		Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA		Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA			

		MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N°3				VERSIÓN 1.0		CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ
CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA								
CONTRATO DE OBRA No	1036-2021	CONTRATISTA	CUMBERE INGENIERIA SAS		ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUNJA		
CONTRATO INTERVENTORIA No.	1068-2021	INTERVENTORIA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		HOJA	1	DE	1
CAPITULO	GENERAL		ITEM	18	NP-02 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE EN PINTURA DE TRAFICO ACRILICA, (Espesor seco mínimo da 9 mils)			
LOCALIZACIÓN / DESCRIPCION			DIMENSIONES		LOCALIZACIÓN PLANIMETRICA			
RESALTOS			ANCHO	LARGO	AREA M2	CANTIDAD	TOTAL	
AV. UNIVERSITARIA FRENTE A DOLEGIO SAN VATUR			3,80	6,50	24,70	1,00	24,70	
AVENIDA UNIVERSITARIA FRENTE A CLINICA CANCEROLOGICA			3,30	6,80	22,44	1,00	22,44	
CARRERA 15 N°9A-1C9			3,85	7,10	27,34	1,00	27,34	
CARRERA 15 N°9A-5E			3,90	8,78	34,24	1,00	34,24	
CARRERA 11 CON CALLE 10			1,45	5,60	8,12	1,00	8,12	
CEBRAS (PASTILLAS)			1,50	5,62	8,43	1,00	8,43	
FLECHA FRENTE Y GIRO			0,40	4,00	1,60	43,00	68,80	
FLECHA DE FRENTE					2,20	4,00	8,80	
LINEA DE FARE			0,60	15,35	9,21	1,00	9,21	
LINEA DE SENDERO			0,30	16,75	5,03	1,00	5,03	
CARRERA 11 CON CALLE 16								
CEBRAS (PASTILLAS)			0,40	4,00	1,60	21,00	33,60	
FLECHA FRENTE Y GIRO					2,20	1,00	2,20	
FLECHA DE FRENTE					1,20	1,00	1,20	
LINEA DE FARE			0,60	10,00	6,00	1,00	6,00	
LINEA DE SENDERO			0,30	11,65	3,50	1,00	3,50	
OBSERVACIONES			SUBTOTAL		M2		266,01	
			TOTAL		M2		266,01	

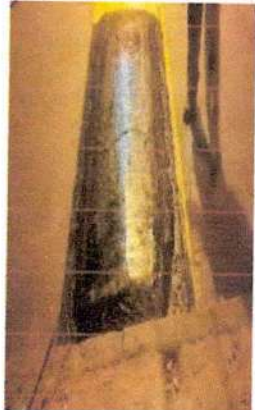CONTRATISTA DE OBRA		INTERVENTORIA	
Firma		Firma	
Nombre:	ESTANISLAO ESCLAVA	Nombre:	BERNARDO RODRIGUEZ
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

		MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N°3						CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	
CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCAACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACION DE TRANSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA		VERSION		1.0		CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
CONTRATO DE OBRA No. 1035-2021		CONTRATISTA		CUMBRE INGENIERIA SAS		ENTIDAD CONTRATANTE		MUNICIPIO DE TUNJA	
CONTRATO INTERVENTORIA No. 1068-2021		INTERVENTORIA		CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		HOJA		1 DE 1	
CAPITULO		GENERAL		ITEM		18		NP-42 SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPRIMANTE EN PINTURA DE TRAFICO ACRILICA, (Espesor seco minimo de 9 mils)	
LOCALIZACION / DESCRIPCION		DIMENSIONES		CANTIDAD		TOTAL		LOCALIZACION PLANIMETRICA	
BARRIO EL CONSUELO (C.R. 8' CON CALLE 15D)		ANCHO LARGO		AREA M2		TOTAL			
CEBRAS (PASTILLAS)		0.40 4.00		1.60		30.00			
PICTOGRAMA CASITA				5.80		1.00			
PICTOGRAMA CRUCE ESCOLAR				3.25		4.00			
LINEA DE PARE		0.60 2.80		1.68		1.00			
		0.60 2.62		1.57		1.00			
FLECHA DE FRENTE Y GIRO				2.20		2.00			
TEXTO DE ZONA ESCOLAR				6.50		2.00			
FLECHA TRIPLE		0.30 5.90		1.77		1.00			
LINEA DE SENDERO		0.30 7.30		2.19		1.00			
		0.30 9.75		2.93		1.00			
		0.30 5.75		1.73		1.00			
FLECHA DE FRENTE				1.20		2.00			
FLECHA DE GIRO				1.53		1.00			
FLECHA DOBLE GIRO				2.53		2.00			
LINEA ANTIBLOQUEO		0.30 44.75		13.43		1.00			
OBSERVACIONES:									
SUBTOTAL				M2		121.69			
TOTAL				M2		121.69			
CONTRATISTA DE OBRA		Firma		Nombre		Cargo		INTERVENTORIA	
				ESTANISLAO ESCALVA		RESIDENTE DE OBRA			

		MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N°3					CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	
		CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACION DE TRANSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA				1.0	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
CONTRATO DE OBRA No 1038-2021		CONTRATISTA CUMABRE INGENIERIA SAS		ENTIDAD CONTRATANTE MUNICIPIO DE TUNJA				
CONTRATO INTERVENTORIA No. 1068-2021		INTERVENTORIA CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		HOJA 1		DE 1		
CAPITULO		GENERAL		ITEM 18		NP-02 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE EN PINTURA DE TRAFICO ACRILICA, (Espesor seco mínimo de 9 mils)		
						LOCALIZACION PLANIMETRICA		
ITEM	LOCALIZACION / DESCRIPCION	ANCHO	LARGO	AREA M2	CANTIDAD	TOTAL		
	BARRIO EL CONSEJO (CARRERA 9 CON CALLE 12 ASMEVET)							
	ETRERO 30			3.35	3.00	10.05		
	PICTOGRAMA PEATON (RECTANGULO)			3.00	2.00	6.00		
	PICTOGRAMA PEATON (DIAMANTE)			4.18	2.00	8.36		
	LINEA DE BORDE ISLETA	0.20	79.50	15.90	1.00	15.90		
	LINEA DE SENDERO	0.30	17.10	5.13	1.00	5.13		
	CALLE 12 ENTRE CARRERA 7 Y 9							
	LINEA DE PARE	0.60	6.25	3.75	1.00	3.75		
	FLECHA DE GIRO	0.30	8.50	2.55	1.00	2.55		
	LINEA DE SENDERO	0.30	6.90	2.07	1.00	2.07		
	CALLE 12 CARRERA 7							
	LINEA DE SENDERO	0.30	25.90	7.77	1.00	7.77		
	PICTOGRAMA PEATON (RECTANGULO)			3.00	4.00	12.00		
	PICTOGRAMA PEATON (DIAMANTE)			4.18	1.00	4.18		
	DIAGONAL 11 CARRERA 8							
	LINEA DE PARE	0.60	3.10	1.86	1.00	1.86		
	LINEA DE SENDERO	0.30	11.95	3.59	1.00	3.59		
	CALLE 12 ENTRE CARRERA 7 Y 9							
	LINEA DE CENTRO	0.17	15.00	2.55	1.00	2.55		
	LINEA METRO A METRO	0.17	1.00	0.17	12.00	2.04		
OBSERVACIONES.				SUBTOTAL	M2	95.26		
				TOTAL	M2	95.26		
						CONTRATISTA DE OBRA		
						INTERVENTORIA		
Firma						Firma		
Nombre: ESTANISLAO ESALVA						Nombre: HERNANDO RODRIGUEZ		
Cargo: RESIDENTE DE OBRA						Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA		

		MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N°3				CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ
CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRANSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA		VERSIÓN	1.0	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	
CONTRATO DE OBRA No. 1036-2021	CONTRATISTA CUMBRE INGENIERIA SAS	ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUNJA			
CONTRATO INTERVENTORIA No. 1068-2021	INTERVENTORIA CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	HOJA	1	DE	1	
CAPITULO	GENERAL	ITEM	18	NP-02 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE EN PINTURA DE TRAFICO ACRILICA, (Espesor seco mínimo de 9 mils)	UNIDAD M2	
LOCALIZACIÓN PLANIMETRICA						
ITEM	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	ANCHO	LARGO	DIMENSIONES AREA M2	CANTIDAD	
BARRIO EL CONSUELO (CALLE 13 CARRERA 7)						
	FLECHA DE GIRO			1.53	1.00	
	LINEA DE SENDERO	0.30	11.40	3.42	1.00	
	LINEA DE PARE	0.60	2.70	1.62	1.00	
CALLE 13 CARRERA 8						
	FLECHA DOBLE GIRO			2.53	1.00	
	LINEA DE SENDERO	0.30	22.60	6.78	2.00	
	LINEA DE PARE	0.60	3.05	1.83	1.00	
	RESALTO	1.40	6.90	9.66	1.00	
CALLE 13 CARRERA 18A -07						
	FLECHA DE GIRO			1.53	1.00	
	LINEA DE PARE	0.60	3.10	1.86	1.00	
	LINEA DE SENDERO	0.30	28.73	8.62	1.00	
CARRERA 7 Y 8 CON CALLE 15						
	FLECHA DE FRENTE Y GIRO			2.20	1.00	
	FLECHA DE GIRO			1.20	3.00	
	LINEA DE SENDERO	0.30	9.25	2.78	1.00	
CALLE 12 CARRERA 7						
	LINEA ISLETA	0.19	24.05	4.57	1.00	
	FLECHA DE ACHURADO	0.90	3.00	2.70	1.00	
		0.90	4.10	3.69	1.00	
		0.90	1.30	1.17	1.00	
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL	66.87	
				TOTAL	66.87	
CONTRATISTA DE OBRA						
Firma	Firma	INTERVENTORIA				
Nombre: ESTANISLAO ESPIVA	Nombre: CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ					
Cargo: RESIDENTE DE OBRA	Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA					



		MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N°3					CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	
CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCAACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACION DE TRANSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA						VERSIÓN 1.0	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
CONTRATO DE OBRA No 1036-2021		CONTRATISTA CUMBRE INGENIERIA SAS		ENTIDAD CONTRATANTE MUNICIPIO DE TUNJA				
CONTRATO INTERVENTORIA No. 1066-2021		INTERVENTORIA CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		HOJA 1		DE 1		
CAPITULO GENERAL		ITEM 18		NP-02 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE EN PINTURA DE TRAFICO ACRILICA, (Espesor seco mínimo de 9 mils)		UNIDAD M2		
LOCALIZACION / DESCRIPCION		DIMENSIONES		CANTIDAD		LOCALIZACION PLANIMETRICA		
BARRIO EL CONSUELO (CALLE 15 CARRERA 7B-05)		ANCHO LARGO AREA M2		TOTAL				
LINEA DE SENDERO CARRERA 7B CALLE 15-03		0,30 16,35 4,91		1,00 4,91				
LINEA DE SENDERO FLECHA DE FRENTE Y GIRO CARRERA 7B CON CALLE 15-54		0,30 8,30 2,49 2,20		1,00 2,49 1,00 2,20				
FLECHA DE FRENTE		1,20 1,20		1,00 1,20				
FLECHA DOBLE GIRO		2,53 2,53		1,00 2,53				
LINEA DE PARE		0,60 3,30 1,98		1,00 1,98				
CALLE 15 CON CARRERA 8								
LINEA DE SENDERO		0,30 12,00 3,60		1,00 3,60				
FLECHA DE GIRO		1,53 1,53		2,00 3,06				
LINEA DE CENTRO		0,20 15,00 3,00		1,00 3,00				
GLORIETA GOBERNADOR								
FLECHA DE FRENTE		1,20 1,20		16,00 19,20				
PICTOGRAMA DE CEDA EL PASO		1,53 1,53		8,00 12,24				
LINEA DE CEDA EL PASO		0,40 0,80 0,32		42,00 13,44				
CEBRAS (PASTILLAS)		0,40 4,00 1,60		53,50 85,60				
PICTOGRAMA PEATON		5,80 5,80		2,00 11,60				
OBSERVACIONES:								
SUBTOTAL M2				167,05				
TOTAL M2				167,05				
CONTRATISTA DE OBRA		CUMBRE INGENIERIA SAS		INTERVENTORIA				
Firma		Firma		INTERVENTORIA				
Nombre:		Nombre:		INTERVENTORIA				
Cargo:		Cargo:		INTERVENTORIA				
RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE OBRA		INTERVENTORIA				

		MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N°3						CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	
CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCAACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA		CONTRATISTA		CONTRATISTA		INTERVENTORIA			
CONTRATO DE OBRA No. 1036-2021		CONTRATISTA CUMBRE INGENIERIA SAS		ENTIDAD CONTRATANTE MUNICIPIO DE TUNJA					
CONTRATO INTERVENTORIA No. 1068-2021		INTERVENTORIA CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		HOJA 1 DE 1					
CAPITULO		GENERAL		ITEM 21		NP-35 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTAFAROS		UNIDAD UN	
LOCALIZACIÓN / DESCRIPCION		DIMENSIONES		CANTIDAD		TOTAL		LOCALIZACIÓN PLANIMETRICA	
PUNTE LAS QUINTAS		ANCHO LARGO AREA M2		100.00		100.00			
OBSERVACIONES		SUBTOTAL		UN		100.00			
		TOTAL		UN		100.00			
Firma		Firma		Firma		Firma		INTERVENTORIA	
Nombre: ESTANISLAO ESPIÑA		Nombre:		Nombre:		Nombre:		FERNANDO RODRIGUEZ	
Cargo: RESIDENTE DE OBRA		Cargo:		Cargo:		Cargo:		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	

		MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N°3				VERSIÓN 1.0	CUMABRE 	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ
CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACION DE TRANSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA								
CONTRATO DE OBRA No 1036-2021		CONTRATISTA CUMBRE INGENIERIA SAS		ENTIDAD CONTRATANTE CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		MUNICIPIO DE TUNJA		
CONTRATO INTERVENTORIA No. 1068-2021		INTERVENTORIA		HOJA 1		DE 1		
CAPITULO		GENERAL		ITEM 22		NP-06 BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACION BLANCA Y RESINA EPOXICA.		
LOCALIZACION / DESCRIPCION		DIMENSIONES ANCHO LARGO AREA M2		CANTIDAD		LOCALIZACION PLANIMETRICA		
PUEBLO LAS QUINTAS		0,50 6,50 3,25		1,00				
BARRIO LAS QUINTAS		0,50 4,70 2,35 0,50 3,30 1,65 0,50 3,10 1,55 0,50 3,40 1,70		1,00 1,00 1,00 1,00				
GLORIETA GOBERNADOR		0,50 3,40 1,70 0,50 2,50 1,25 0,50 2,55 1,28		1,00 1,00 1,00				
OBSERVACIONES:		SUBTOTAL TOTAL		M2 M2		23,13 23,13		
CONTRATISTA DE OBRA		INTERVENTORIA		INTERVENTORIA				
Firma Nombre: Cargo:		Firma Nombre: Cargo:		INTERVENTORIA CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ RESIDENTE DE INTERVENTORIA				

		MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N°3				VERSION		CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ
		CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCAACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACION DE TRANSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA				1.0	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
CONTRATO DE OBRA No		1036-2021	CONTRATISTA		CUMBRE INGENIERIA SAS	ENTIDAD CONTRATANTE		MUNICIPIO DE TUNJA
CONTRATO INTERVENTORIA No.		1068-2021	INTERVENTORIA		CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	HOJA	1	DE 1
CAPITULO		GENERAL		ITEM	26	NP-10 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PARA CICLORUTA-ANCLADA EN PUENTE VEHICULAR (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado Xi (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática).		
LOCALIZACION PLANIMETRICA								
ITEM	LOCALIZACION / DESCRIPCION	DIMENSIONES		CANTIDAD	TOTAL			
		ANCHO	LARGO	AREA M2				
	PUENTE LAS QUINTAS				-			
					2,00			
					-			
					-			
					-			
					-			
					-			
					-			
OBSERVACIONES					SUBTOTAL		UN	2,00
					TOTAL		UN	2,00
CONTRATISTA DE OBRA								
Firma		Firma		INTERVENTORIA				
Nombre:		Nombre:		FERNANDO RODRIGUEZ				
Cargo:		Cargo:		RESIDENTE DE INTERVENTORIA				

		MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N°3				VERSIÓN		CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ
CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA		1.0				CONTRATISTA		
CONTRATO DE OBRA No. 1036-2021		CONTRATISTA CUMBERE INGENIERIA SAS		ENTIDAD CONTRATANTE MUNICIPIO DE TUNJA		MUNICIPIO DE TUNJA		
CONTRATO INTERVENTORIA No. 1068-2021		INTERVENTORIA CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		HOJA 1 DE 1		DE 1		
CAPITULO		GENERAL		ITEM 27		NP-11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SERIAL TIPO DELINEADOR DE CURVA 60CM X 73CM - ANCLADA EN PUENTE VEHICULAR. (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática):		
LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN		ANCHO LARGO		AREA M2		LOCALIZACIÓN PLANIMETRICA		
PUENTE LAS QUINTAS		5,00		5,00				
DELINEADORES DE CURVA		5,00		5,00		UN		
OBSERVACIONES		SUBTOTAL		TOTAL		UN 5,00		
CONTRATISTA DE OBRA		INTERVENTORIA		UN 5,00		UN 5,00		
Firma		Firma		INTERVENTORIA		UN 5,00		
Nombre: ESTANISLAO ESILVA		Nombre:		INTERVENTORIA		UN 5,00		
Cargo: RESIDENTE DE OBRA		Cargo:		INTERVENTORIA		UN 5,00		
Cargo: RESIDENTE DE OBRA		Cargo:		INTERVENTORIA		UN 5,00		

		MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N°3					CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ
CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCAACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACION DE TRANSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA		VERSIÓN		CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
CONTRATO DE OBRA No		CONTRATISTA		ENTIDAD CONTRATANTE		MUNICIPIO DE TUNJA	
CONTRATO INTERVENTORIA No.		INTERVENTORIA		HOJA		DE	
CAPITULO		GENERAL		ITEM		UNIDAD	
LOCALIZACION / DESCRIPCION		ANCHO		LARGO		AREA M2	
PUENTE LAS QUINTAS		1,00		1,00		1,00	
SEÑAL INFORMATIVA		1,00		1,00		1,00	
E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO		2,00		2,00		2,00	
SEÑAL INFORMATIVA		2,00		2,00		2,00	
NP-13 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL INFORMATIVA DE 1,77CM X 0,44CM (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrosistémica)		29		29		UN	
LOCALIZACION PLANIMETRICA							
OBSERVACIONES:							
CONTRATISTA DE OBRA		CONTRATISTA DE OBRA		CONTRATISTA DE OBRA		CONTRATISTA DE OBRA	
Firma		Firma		Firma		Firma	
Nombre:		Nombre:		Nombre:		Nombre:	
Cargo:		Cargo:		Cargo:		Cargo:	
RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE OBRA	
RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE OBRA	

		MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N°3					CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ
CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCAACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACION DE TRANSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA		VERSION	1.0	CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
CONTRATO DE OBRA No. 1036-2021		CUMBERE INGENIERIA SAS		MUNICIPIO DE TUNJA			
CONTRATO INTERVENTORIA No. 1068-2021		CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		HOJA 1 DE 1			
CAPITULO		GENERAL		ITEM 30	NP-14 SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H0.40 MTS - A=0.2 MTS, CONCRETO DE 2500 PSI	UNIDAD ML	
LOCALIZACION PLANIMETRICA							
ITEM	LOCALIZACION / DESCRIPCION	DIMENSIONES ANCHO LARGO AREA M2		CANTIDAD	TOTAL		
	BARRIO LAS QUINTAS			66.00	66.00		
				SUBTOTAL ML	66.00		
				TOTAL ML	66.00		
OBSERVACIONES:							
<div>   </div>							
CONTRATISTA DE OBRA				INTERVENTORIA			
Firma				Firma			
Nombre: CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	Nombre: CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ			Nombre: CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	Nombre: CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		
Cargo: RESIDENTE DE OBRA	Cargo: RESIDENTE DE OBRA			Cargo: RESIDENTE DE OBRA	Cargo: RESIDENTE DE OBRA		

		MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N°3					CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ
CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACION DE TRANSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA		VERSION 1.0		CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
CONTRATO DE OBRA No 1036-2021		CONTRATISTA CUMBRE INGENIERIA SAS		ENTIDAD CONTRATANTE MUNICIPIO DE TUNJA			
CONTRATO INTERVENTORIA No. 1068-2021		INTERVENTORIA CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		HOJA 1 DE 1			
CAPITULO		GENERAL		ITEM 31		UNIDAD M3	
LOCALIZACION / DESCRIPCION BARRIO LAS QUINTAS		DIMENSIONES ANCHO LARGO ALTO		CANTIDAD TOTAL		LOCALIZACION PLANIMETRICA	
		0.25 66.00 0.20		1.00 3.30			
OBSERVACIONES:		SUBTOTAL		M3		3.30	
		TOTAL		M3		3.30	
CONTRATISTA DE OBRA		CONTRATISTA DE OBRA		INTERVENTORIA			
Firma		Firma		Firma			
Nombre		Nombre		Nombre			
Cargo		Cargo		Cargo			
ESTANISLAO ESPIVA RESIDENTE DE OBRA		HERNANDO RODRIGUEZ RESIDENTE DE INTERVENTORIA					

		MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N°3						CESA 3 HERNANDO FIGUEROA BAEZ	
		CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCAACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACION DE TRANSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA				CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
		1.0							
CONTRATO DE OBRA No. 1036-2021		CONTRATISTA		CUMBRE INGENIERIA SAS		ENTIDAD CONTRATANTE		MUNICIPIO DE TUNJA	
CONTRATO INTERVENTORIA No. 1068-2021		INTERVENTORIA		CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		HOJA 1		DE 1	
CAPITULO		GENERAL		ITEM 32		NP-16 CORTE DE PAVIMENTO ARTICULADO EN ADOQUIN DE ARCILLA		UNIDAD ML	
LOCALIZACION PLANIMETRICA									
ITEM	LOCALIZACION / DESCRIPCION	DIMENSIONES ANCHO LARGO ALTO			CANTIDAD	TOTAL			
	BARRIO LAS QUINTAS		66.00		2.00	132.00			
							SUBTOTAL ML 132.00		
							TOTAL ML 132.00		
OBSERVACIONES:									
CONTRATISTA DE OBRA							INTERVENTORIA		
Firma: 							Firma: 		
Nombre: ESTANISLAO ESQUIVA							Nombre: FERNANDO RODRIGUEZ		
Cargo: RESIDENTE DE OBRA							Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA		

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 57 DE 78


ANEXO 11.12 REGISTRO FOTOGRÁFICO

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 58 DE 78

INTERVENCION REDUCTORES DE VELOCIDAD AVENIDA UNIVERSITARIA

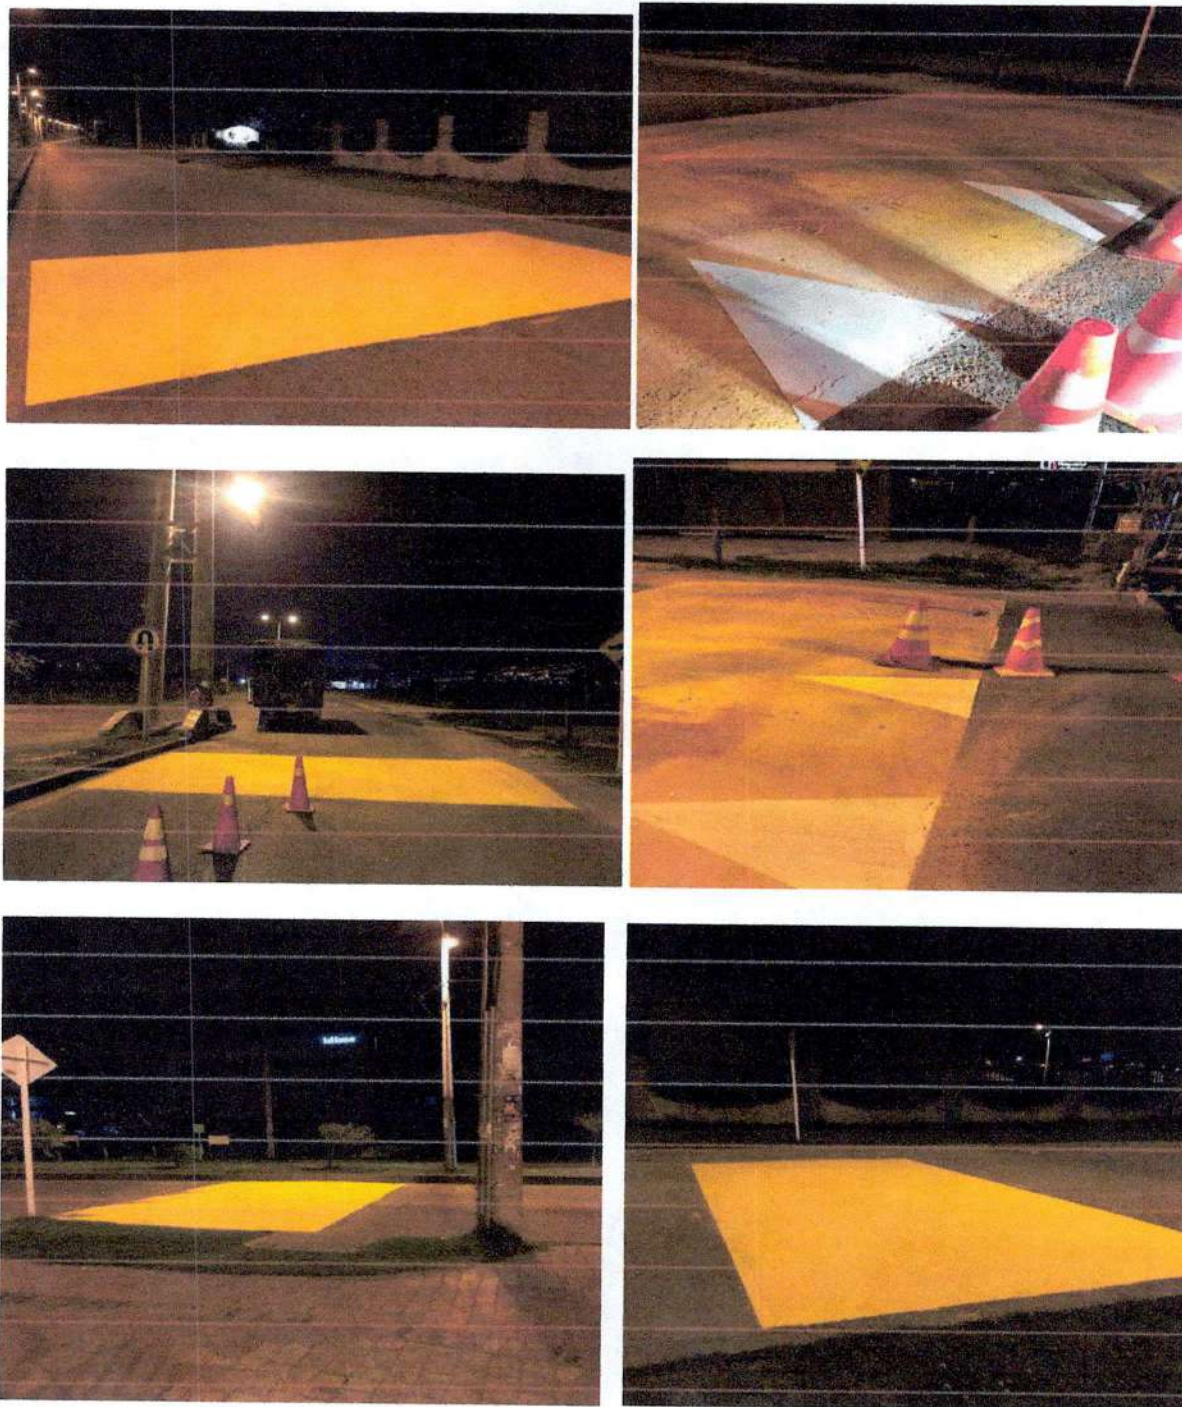

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 59 DE 78

COLEGIO DE LOS ANGELES



"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 60 DE 78

INTERSECCION AV COLON CON CARRERA 11 (ESQUINA JUAN DE CASTELLANOS)



"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 61 DE 78

INTERSECCION CARRERA 9 CON CALLE 18 (ESQUINA COLEGIO EL ROSARIO)



"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 62 DE 78

INTERSECCION CARRERA 11 CON CALLE 16



INTERSECCION CARRERA 9 CON CALLE 21



"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 63 DE 78

SEÑALIZACION VERTICAL HOSPITAL ESE SAN ANTONIO



"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 64 DE 78

SEÑALIZACION VERTICAL ENTRADA BARRIO SANTA INES




"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 65 DE 78

SEÑALIZACION VERTICAL CENTRO HISTORICO TUNJA

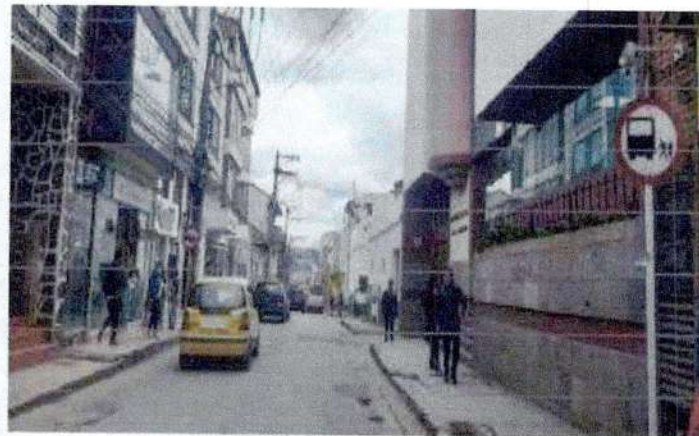

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 66 DE 78

RETIRO DE SEÑALES EN MAL ESTADO CENTRO HISTORICO TUNJA




"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 67 DE 78

INSTALACION DE SEÑALIZACIONN VERTICAL GLORIETA DEL GOBERNADOR

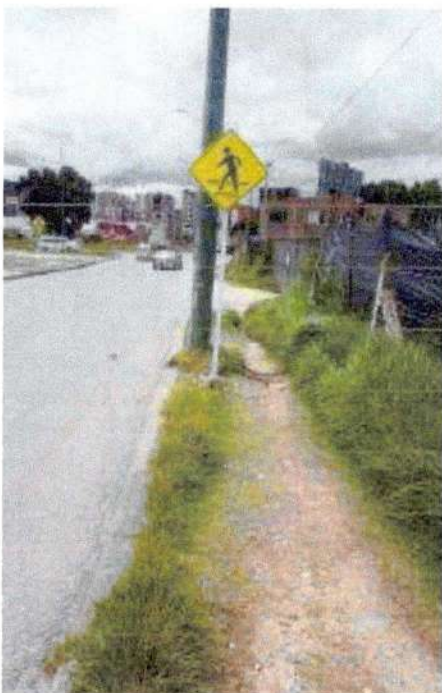

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 68 DE 78



"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 69 DE 78

SEÑALES VERTICALES OTROS SECTORES



"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 70 DE 78

INSTALACION DE ESTOPEROLES



"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 71 DE 78


DEMARCAACION HORIZONTAL VIAS INTERNAS BARRIO EL CONSUELO



"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 72 DE 78

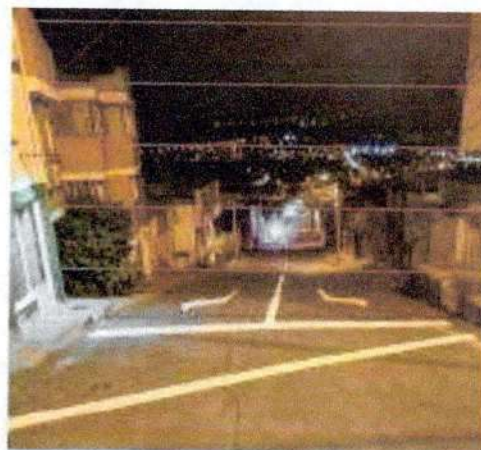

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 73 DE 78



"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 74 DE 78

DEMARCAACION HORIZONTAL GLORIETA GREEN HILLS



"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 75 DE 78



"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 76 DE 78

EMARCACION LINEAL VIA TUNJA ARCABUCO



"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 77 DE 78

DEMARCAACION HORIZONTAL GLORIETA GOBERNADOR



"CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1068 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

INFORME N°4 DE INTERVENTORIA

HOJA No. 78 DE 78

