



Educación

**CONVENIO
CO1.PCCNTR.4762508 DE 2023
CUMBRE AGRARIA**

Agosto 26 de 2024




Hacienda

PROYECTOS CUMBRE AGRARIA

CONVENIO CO1.PCCNTR.4762508 DE 2023

No. CONTRATO	CO1.PCCNTR.4762508 DE 2023
OBJETO	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, EN SEDES EDUCATIVAS QUE SEAN DEFINIDAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SU POLÍTICA, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE CUMBRE AGRARIA Y OLA INVERNAL.
VALOR	\$ 35.001.322.987,00 (\$ 32.772.774.331 Proyectos y ola invernal y \$2.228.548.656,00 para AT).
CLIENTE	Ministerio de Educación Nacional - MEN
PLAZO	16 meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Orden de inicio: 27 de marzo 2023 Terminación: 16 de Diciembre de 2024
UBICACIÓN	- Valledupar (13 sedes) - Cumaribo (4 sedes) - Nariño (1 sede) - Tumaco (1 sede) - Buenavista (3 sedes) - Bahía Solano (3 sedes) - La Paz (1 sede) - Nazareth (3 sedes)
ESTADO	En ejecución

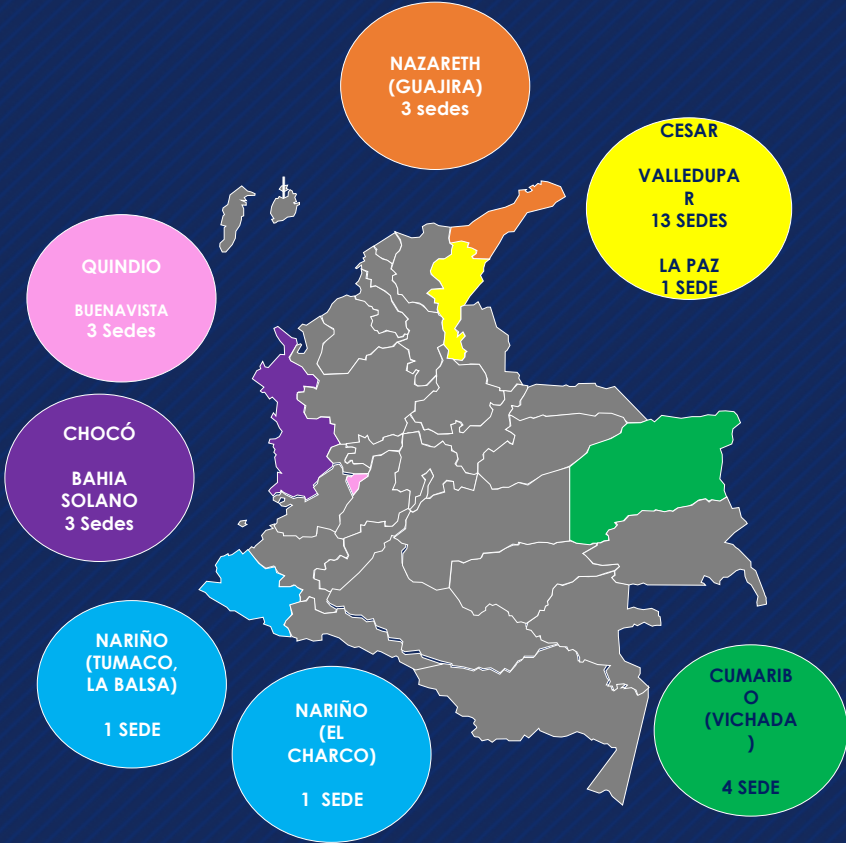

29 Proyectos viabilizados:

- 4 en el Departamento de Vichada
- 2 en el Departamento de Nariño
- 14 en el Departamento de Cesar
- 3 en el Departamento de Chocó
- 3 en el Departamento de Quindío
- 3 en el Departamento de La Guajira

Cumbre Agraria | Contrato No. 4762508-2023

GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ETC	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	VALOR OBRA	VALOR INTERVENTORIA	AVANCE (%)
1	CESAR	VALLEDUPAR	CESAR	I.E. SAN ISIDRO LABRADOR	ESCUELA NUEVA LAS FLORES	31/07/2023	20/05/2024	\$ 283.676.105,51	\$ 20.360.787,54	100%
	CESAR	VALLEDUPAR	CESAR	I.E. GUATAPURI DE PROMOCIÓN SOCIAL DE GUATAPURÍ - CHEMESQUEMENA	ESCUELA RURAL MIXTA DE CHEMESQUEMENA	31/07/2023	20/05/2024	\$ 848.053.938,22	\$ 54.283.600,33	100%
	CESAR	VALLEDUPAR	CESAR	I.E. GUATAPURI DE PROMOCIÓN SOCIAL DE GUATAPURÍ - CHEMESQUEMENA	I.E. GUATAPURI DE PROMOCIÓN SOCIAL DE GUATAPURÍ - CHEMESQUEMENA - SEDE PRINCIPAL	31/07/2023	20/05/2024	\$ 1.009.783.820,51	\$ 65.467.880,25	100%
	CESAR	VALLEDUPAR	CESAR	I.E. GUATAPURI DE PROMOCIÓN SOCIAL DE GUATAPURÍ - CHEMESQUEMENA	ESCUELA NUEVA GUATAPURI y PRINCIPAL	31/07/2023	20/05/2024	\$ 1.048.755.360,41	\$ 65.145.720,05	100%
	CESAR	VALLEDUPAR	CESAR	I.E. SAN ISIDRO LABRADOR	CONC ESC LUCILA CARRILLO DE DIAZ	31/07/2023	20/05/2024	\$ 769.287.098,64	\$ 51.016.762,35	100%
	CESAR	VALLEDUPAR	CESAR	I.E. SAN ISIDRO LABRADOR	LICEO SAN ISIDRO LABRADOR	31/07/2023	20/05/2024	\$ 668.768.565,78	\$ 40.938.848,89	100%
	CESAR	VALLEDUPAR	CESAR	I.E. SAN ISIDRO LABRADOR	ESCUELA NUEVA PONTON	31/07/2023	20/05/2024	\$ 261.946.409,20	\$ 19.406.830,25	100%
2	CESAR	VALLEDUPAR	CESAR	INSTITUTO AGRICOLA LA MINA	INSTITUTO AGRICOLA LA MINA	24/08/2023	08/05/24024	\$ 1.329.521.307,00	\$ 90.325.528,05	100%
	CESAR	VALLEDUPAR	CESAR	INSTITUTO AGRICOLA LA MINA	ESCUELA RURAL MIXTA EL MOJAO	24/08/2023	08/05/24024	\$ 418.754.390,00	\$ 28.442.598,20	100%
	CESAR	VALLEDUPAR	CESAR	INSTITUTO AGRICOLA LA MINA	ESC NUEVA HATICO NO 1	24/08/2023	08/05/24024	\$ 257.471.390,00	\$ 17.505.150,13	100%
	CESAR	VALLEDUPAR	CESAR	INSTITUTO AGRICOLA LA MINA	ESCUELA NUEVA RAMALITO	24/08/2023	08/05/24024	\$ 569.987.775,00	\$ 38.725.892,68	100%
	CESAR	VALLEDUPAR	CESAR	INSTITUTO AGRICOLA LA MINA	ESCUELA NUEVA RANCHO DE LA GOYA	24/08/2023	08/05/24024	\$ 631.778.506,00	\$ 42.912.475,66	100%
	CESAR	VALLEDUPAR	CESAR	INSTITUTO AGRICOLA LA MINA	SAN FERNANDO DE RIO SECO	24/08/2023	08/05/24024	\$ 643.974.616,00	\$ 43.749.792,28	100%

GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ETC	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ESTADO	VALOR OBRA	VALOR INTERVENTORIA	AVANCE (%)
3	VICHADA	CUMARIBO	VICHADA	I.E. INTERNADO SANTA TERESITA DEL TUPARRO	I.E. INTERNADO SANTA TERESITA DEL TUPARRO - SEDE PRINCIPAL	17/04/2024	15/04/2025	EN EJECUCION	\$ 2.897.583.738,00	\$ 184.696.520,00	1,78%
	VICHADA	CUMARIBO	VICHADA	I.E. INTERNADO RAYA - BAKATSOL OWA	I.E. INTERNADO RAYA - BAKATSOL OWA - SEDE PRINCIPAL	17/04/2024	15/04/2025	EN EJECUCION	\$ 2.014.026.109,00	\$ 184.696.520,00	1,78%
4	VICHADA	CUMARIBO	VICHADA	I.E. INTERNADO CADANAPAY	I.E. INTERNADO CADANAPAY - SEDE PRINCIPAL	16/02/2024	18/04/2025	EN EJECUCION	\$ 4.953.455.325,000	\$ 369.471.120,00	3,65%
	VICHADA	CUMARIBO	VICHADA	CENTRO EDUCATIVO VILLALUZ	C.E. VILLALUZ - SEDE PRINCIPAL	16/02/2024	18/04/2025	EN EJECUCION	\$ 1.490.531.805,000	\$ 123.157.070,00	3,65%
5	NARIÑO	TUMACO	NARIÑO	IE ALTO MIRA FRONTERA	SEDE # 10 LA BALSA	8/08/2023	8/07/2024	EN EJECUCION	\$ 713.981.203,000	\$ 150.433.297,00	78,6%
	NARIÑO	EL CHARCO	NARIÑO	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL TAPAJE	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL TAPAJE FASE I	8/08/2023	8/07/2024	EN EJECUCION	\$ 5.141.660.187,000	\$ 204.875.597,00	23,7%
6	QUINDIO	BUENA VISTA	QUINDIO	INSTITUCION EDUCATIVA RIO VERDE BAJO	LA CABAÑA	31/01/2024	31/03/2024	TERMINADO Y ENTREGADO	\$ 270.886.032,08	\$ 36.225.070,27	100%
	QUINDIO	BUENA VISTA	QUINDIO	INSTITUCION EDUCATIVA RIO VERDE BAJO	EL BALSO	31/01/2024	31/03/2024	TERMINADO Y ENTREGADO	\$ 143.218.961,21	\$ 26.132.740,67	100%
	QUINDIO	BUENA VISTA	QUINDIO	INSTITUCION EDUCATIVA RIO VERDE BAJO	LOS SAUCES	31/01/2024	31/03/2024	TERMINADO Y ENTREGADO	\$ 184.849.506,71	\$ 21.249.359,07	100%
7	CHOCO	BAHIA SOLANO	CHOCO	CE INDÍGENA MARIA AUXILIADORA DEL BRAZO	CE INDÍGENA MARIA AUXILIADORA DEL BRAZO - SEDE PRINCIPAL	N/A	N/A	ESTUDIOS PREVIOS	\$ 179.803.200,000	\$ 20.000.000,00	0%
	CHOCO	BAHIA SOLANO	CHOCO	CE INDÍGENA MARIA AUXILIADORA DEL BRAZO	SEDE INDÍGENA SANTA MARIA	N/A	N/A	ESTUDIOS PREVIOS	\$ 179.803.200,000	\$ 20.000.000,00	0%
	CHOCO	BAHIA SOLANO	CHOCO	CE INDÍGENA MARIA AUXILIADORA DEL BRAZO	SEDE INDÍGENA DUMA	N/A	N/A	ESTUDIOS PREVIOS	\$ 179.803.200,000	\$ 20.000.000,00	0%
8	CESAR	LA PAZ	CESAR	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE SAN JOSE DE ORIENTE	EL MIRADOR	N/A	N/A	RADICADO, PROXIMAMENTE CONTRATACION DIRECTA CON J.A.C	\$117.159.914,50	N/A	0%
9	GUAJIRA	URIBIA	GUAJIRA	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA DE NAZARETH	KAJASHIWOU	N/A	N/A	RADICADO EP OBRA	\$332.076.347,00	\$33.207.634,00	0%
	GUAJIRA	URIBIA	GUAJIRA	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA DE NAZARETH	SAN BENITO	N/A	N/A	RADICADO EP OBRA	\$241.893.296,00	\$24.189.328,00	0%
	GUAJIRA	URIBIA	GUAJIRA	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA DE NAZARETH	SAMUTPANA	N/A	N/A	RADICADO EP OBRA	\$241.893.296,00	\$24.189.328,00	0%

Cumbre Agraria | Contrato No. 4762508-2023

\$ 35.001

Millones de pesos



Fecha inicio: 27/03/2023

Fecha Fin: 16/12/2024

16 dic 24 – Fin Interadministrativo

Grupo	Departamentos / Municipios	Estado Actual	2024											
			ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sept	oct	nov	dic
G1 [7 sedes]	Cesar Valledupar	Terminado y Entregado [100%]	31/07/2023 – 30/06/2024											
G2 [6 sedes]	Cesar Valledupar	En Ejecución [100%]	24/08/2024 – 30/06/2024											
G3 [2 sedes]	Vichada Cumaribo	En Ejecución [1,61%]												
G4 [2 sedes]	Vichada Cumaribo	En Ejecución [3,65%]							17/04/2024 – 15/04/2025					
G5 [2 sedes]	Nariño Tumaco El charco	En Ejecución [26,94%]							16/02/2024 – 18/04/2025					
G6 [3 sedes]	Quindío Buenavista	Terminado y Entregado [100,00%]	08/08/2023 - 08/12/2024											
G7 [3 sedes]	Chocó Bahía Solano	Convenio solidario Comunidad Indígena [Estructuración]												
G8 [1 sede]	Cesar La paz	Estudios previos Radicados, PROXIMAMENTE CONTRATACION DIRECTA CON J.A.C												
G9 [3 sedes]	La guajira Uribia	Estudio Previo Obra Radicado - Estudio previo Interventoría en estructuración												
Dotación	Cesar y Nariño	En convocatoria												

REGISTRO FOTOGRAFICO



Guatapurí Nueva - Valledupar



San Isidro - Valledupar



Guatapurí PPL - Valledupar



Las Flores - Valledupar



Chemesquemena - Valledupar



Pontón - Valledupar



Lucila Carrillo - Valledupar

REGISTRO FOTOGRAFICO



La Mina - Valledupar



Mojao – Valledupar



Haticos No. 1 – Valledupar



Ramalito - Valledupar



Rancho de la Goya – Valledupar



Rio Seco - Valledupar

REGISTRO FOTOGRAFICO

SITUACION ACTUAL VALIDADO
INTERVENTORIA



Estado
de vías

ARGUMENTO CONTRATISTA :

- Con base en lo anteriormente expuesto, SITTCA SAS concluye que existen circunstancias nuevas imprevisibles, que afectan los tiempos del plazo y las actividades programadas, tal como lo es, el traslado de los insumos a cada sede educativa y los mayores costos de la mano de obra local, la cual en primera instancia se debe cumplir que: “(...) “Vincular a la ejecución de la obra, como mínimo en un setenta por ciento (70%) del personal de obra no calificado de la región...”; obligación que se hace en estos momentos inviable.
- Sobrecostos en el transporte de materiales debido al mal estado de las vías entre Villavicencio y Cumaribo
- Dificultad en la consecución de materiales de cantera de la zona por el invierno

ACCIONES:

Ante la imposibilidad de ejecutar las actividades ocasionados por factores que han afectado variables sensibles como:

- 1- planteamiento de alternativas tales como sistema constructivo, ejecución de alcance actividades con el rubro existente y adición presupuestal

El día 22/07/2024, se llevó a **Votación del Comité Técnico No. 43** la **Solicitud de ampliación 1 a la suspensión 1 de los Contratos PAF-ATMEN4-O-073-2023 y PAF-ATMEN4-I-008-2024**, obra e interventoría respectivamente, **obteniéndose votación favorable..**

El día 31/07/2024, se llevó a **Votación del Comité Técnico No. 44** la **Solicitud de ampliación 2 a la suspensión 1 de los Contratos PAF-ATMEN4-O-073-2023 y PAF-ATMEN4-I-008-2024**, obra e interventoría respectivamente, **obteniéndose votación favorable..**

GRUPO 3 –

Valor contractual actual: \$ 6.192.557.693.50 – Valor con adición: \$ 7.431.069.232.50

OPCION 1:

Valor actual contrato:
\$ 6.192.557.693.50

Valor adición:
\$ 1.238.511.539

Valor Total contrato
con adición:
\$ 7.431.069.232.50

NOTA.- CON LA ADICION SE EJECUTA LA TOTALIDAD DE LO CONTRATADO Y REFERENCIADO EN ESTA FILMINA CON ELIPSES ROJAS.

Alcance determinado a ejecutar:


Alcance: Santa Teresita de Tuparro
-3 Baterías sanitarias 514,00 m²
-2 Zonas de Aula Múltiple y sala de Estar
366,00 M²
-Circulación, rampas escaleras:
152,20m²



PLANOS GENERALES DOS SEDES

Alcance: Raya Bakatsol Owa

- Bloque aulas 245,60 m²
- Aula de Estar 201,00 m²
- Baterías sanitarias 25,00 m²
- Espacio Deportivo 859,95 m²
- Circulación, rampas escaleras 125,53 m²

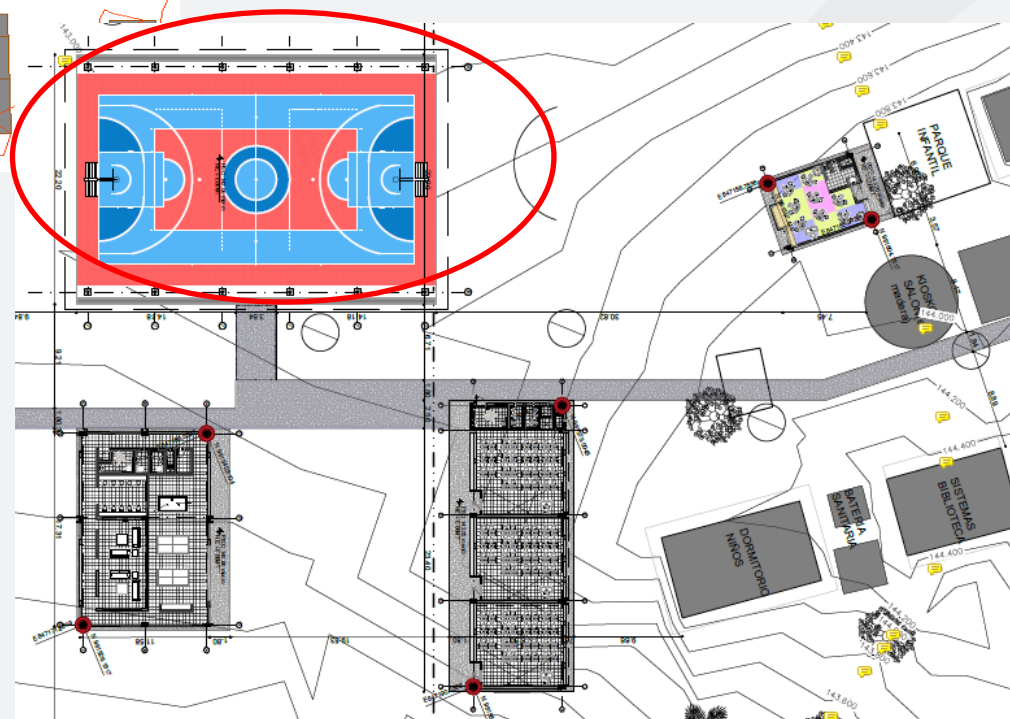

GRUPO 3 – SANTA TERESITA Balance y Alcances Proyectados

Valor contractual actual: \$ 4.383.928.291,87

OPCION 1:

Valor actual contrato:
\$ 3.653.273.576,87

Valor adición No.1:
\$ 730.654.715


Valor Total contrato
con adición:
\$ 4.383.928.291,87

Alcance:


- Baterías sanitarias 514,00 m²
- 2 Zonas de Aula Múltiple y sala de Estar 366,00 M²
- Circulación, rampas escaleras: 152,20m²

NOTA.- CON LA ADICION SE EJECUTA LA TOTALIDAD DE LO CONTRATADO Y REFERENCIADO EN ESTA FILMINA.


Alcance determinado a ejecutar:

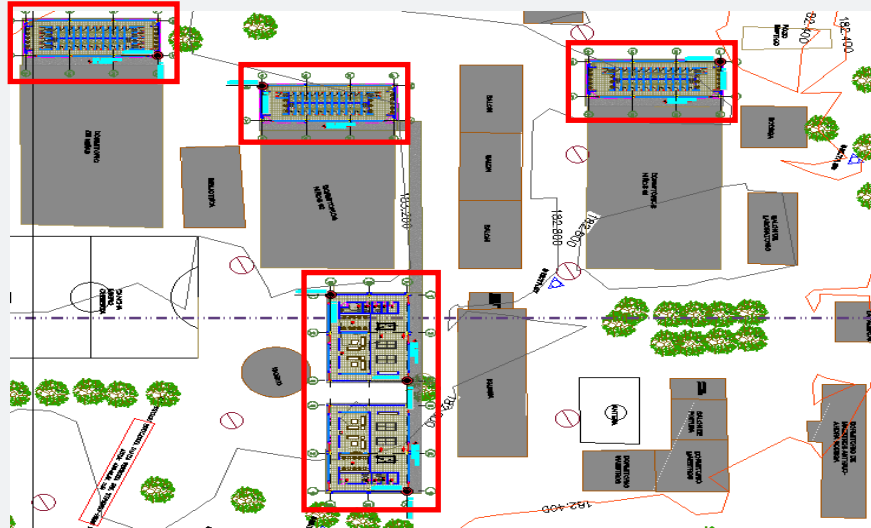

PLANO GENERAL

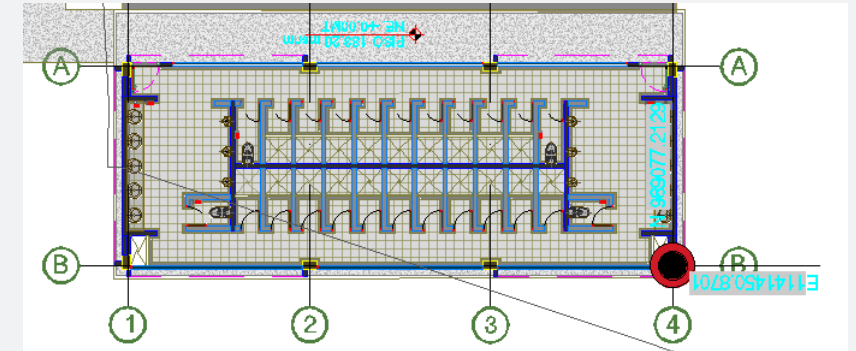

BATERIA DE BAÑOS

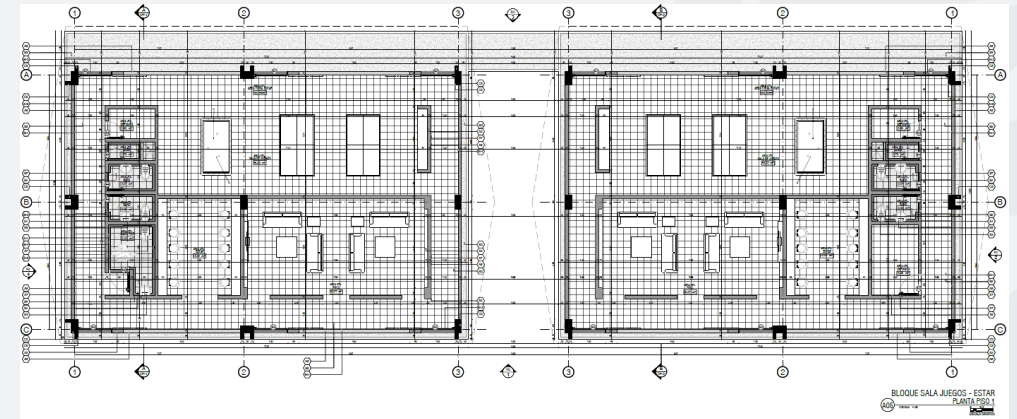

AULA DE ESTAR

GRUPO 3 – RAYA BAKATSOL OWA - Balance y Alcances Proyectados

Valor contractual actual: \$ 2.539.284.117

Alcance determinado a ejecutar:

OPCION 1:

Valor actual contrato:
\$ 2.539.284.118


Valor adición No.1:
\$ 507.856.824

Valor Total contrato
con adición :
\$ 3.047.140.941


Alcance:

- Bloque aulas 245,60 m²
- Aula de Estar 201,00 m²
- Baterías sanitarias 25,00 m²
- Espacio Deportivo 859,95 m²
- Circulación, rampas escaleras 125,53 m²


NOTA.- CON LA ADICION SE EJECUTA LA TOTALIDAD DE LO CONTRATADO Y REFERENCIADO EN ESTA FILMINA.

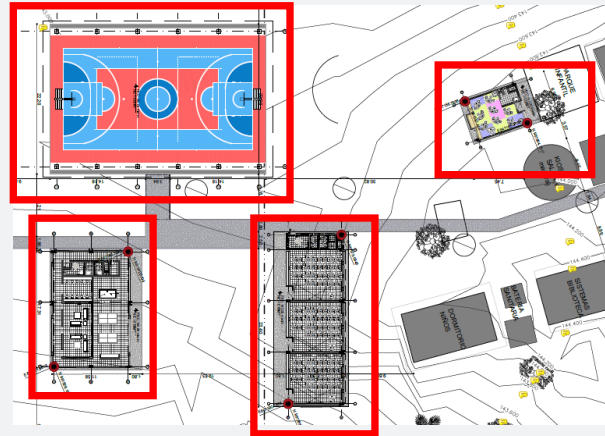


PLANO GENERAL

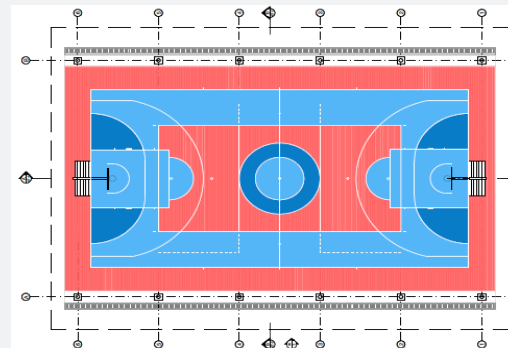

POLIDEPORTIVO

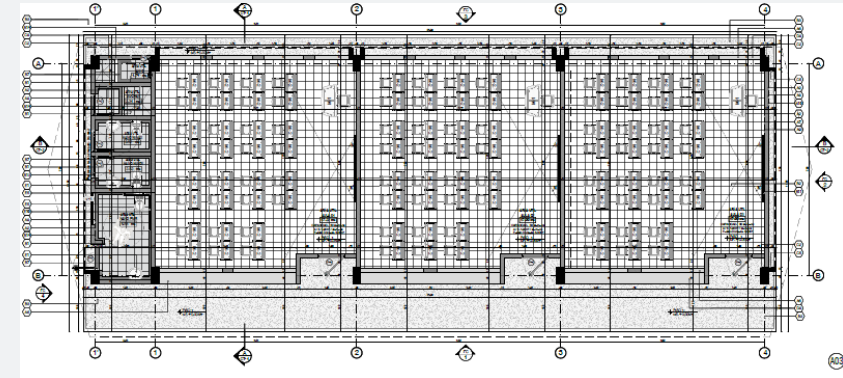

BLOQUE AULAS

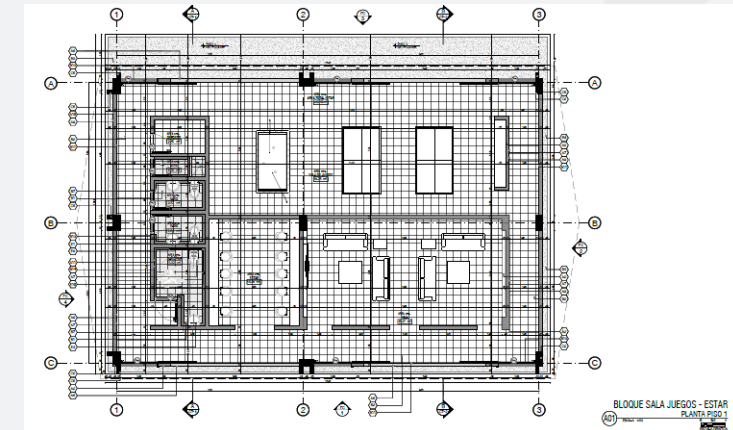

AULA DE ESTAR

GRUPO 3 – Balance y Alcances Proyectados (disminución obras)

Valor contractual actual: \$ 6.192.557.693.50



OPCION 2:

Valor actual
contrato:
\$6.192.557.693.50

Santa Teresita
Valor Total contrato:
\$ 3.653.273.576,87

Raya Bakatsol Owa
Valor Total contrato
\$ 2.539.284.118

NOTA. CON EL DINERO CONTRACTUAL DEJARIAMOS DE HACER UNA AULA MENOS, UNA BATERIA SANITARIA MENOS Y EL ESPACIO DEPORTIVO.

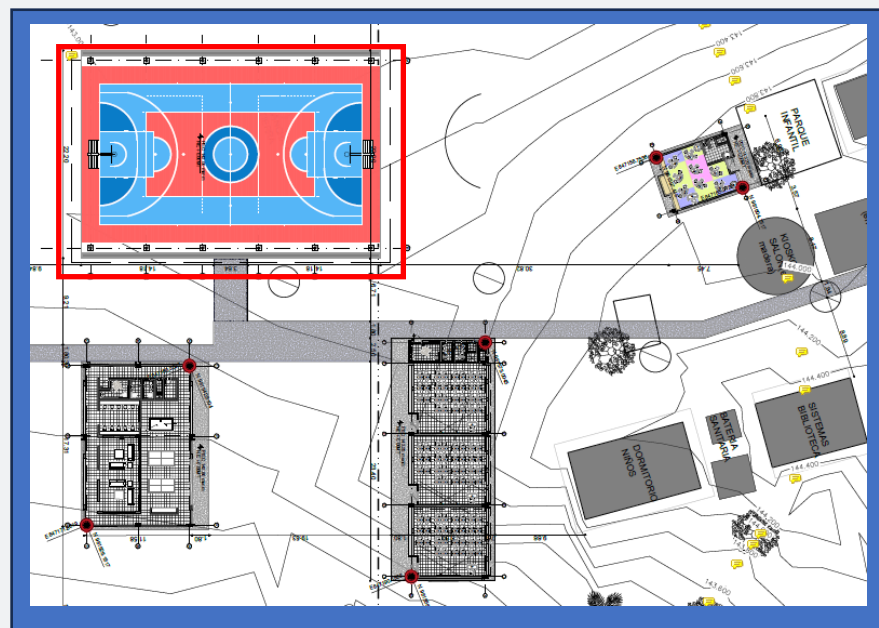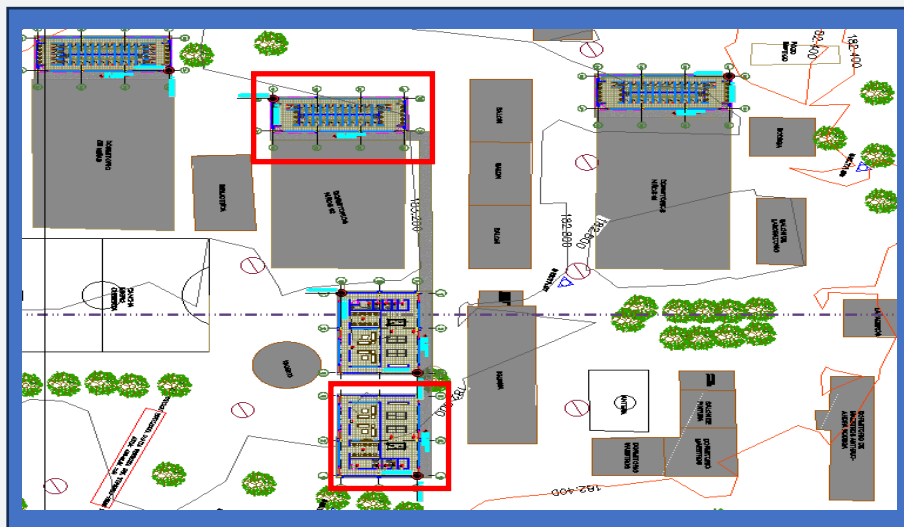

Alcance determinado a ejecutar:

Santa Teresita de Tuparro

Alcance:

- 3 Baterías sanitarias 454,39m²
- 2 Zonas de Estar 207,82M²
- Circulación, escaleras, rampas: 152,20m²

Raya Bakatsol Owa

Alcance:

- Bloque aulas (190 m2)
- Aula de Estar (200,66m2)
- Baterías sanitarias (19,20m2)
- Aulas preescolares (49,86m2)
- Biblioteca (710,44m2)
- -Circulación, escaleras, rampas: (94,86m²)

Nota: no se realizará la cancha polideportiva. La sede quedaria funcional en una primera fase

GRUPO 3 – Resumen

NOTA. CON EL DINERO CONTRACTUAL DEJARIAMOS DE HACER:

EN EL INTERNADO DE SANTA TERESITA DE TUPARRO:


UNA AULA MENOS, UNA BATERIA SANITARIA MENOS.

SIN EMBARGO ESTO NO IMPIDE LA FUNCIONALIDAD DE LA SEDE EDUCATIVA EN UNA PRIMERA FASE

EN EL INTERNADO DE RAYA BKATSOL OWA: ESPACIO DEPORTIVO.

SIN EMBARGO ESTO NO IMPIDE LA FUNCIONALIDAD DE LA SEDE EDUCATIVA EN UNA PRIMERA FASE

REGISTRO FOTOGRAFICO SITUACION ACTUAL VALIDADO INTERVENTORIA

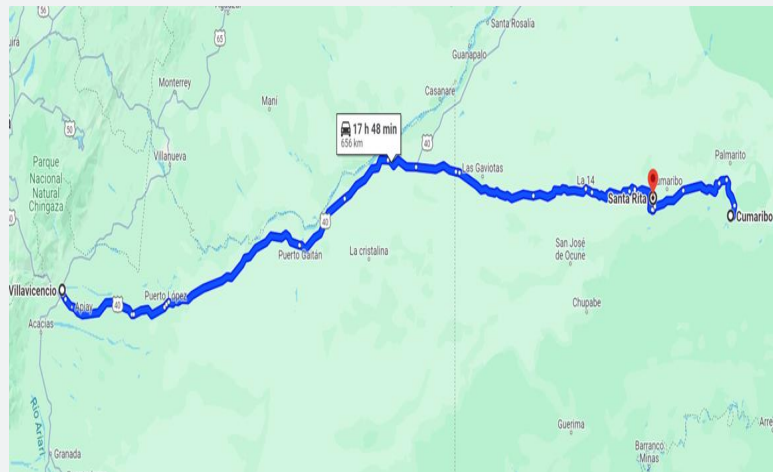

Distancias y tiempos entre Villavicencio y Cumaribo 17 horas 48 minutos en condiciones normales de clima seco



ARGUMENTO CONTRATISTA:

- Por temas climáticos el transporte debe ser hasta puerto mosco y de ahí en planchones o remolcadores hasta cada sede, esto se debe negociar, no hay proveedor que asuma los mayores costos por tiempo asociado al estado de las vías.

Con base en lo anteriormente expuesto, SITTCA SAS concluye que existen circunstancias nuevas imprevisibles, que afectan los tiempos del plazo y las actividades programadas, tal como lo es, el traslado de los insumos a cada sede educativa y los mayores costos de la mano de obra local, la cual en primera instancia se debe cumplir que: “(...) “Vincular a la ejecución de la obra, como mínimo en un setenta por ciento (70%) del personal de obra no calificado de la región...”; obligación que se hace en estos momentos inviable.

• ACCIONES:

Ante la imposibilidad de ejecutar las actividades ocasionados por factores que han afectado variables sensibles como:

- 1- planteamiento de alternativas tales como sistema constructivo, ejecución de alcance actividades con el rubro existente y adición presupuestal

El día 18/07/2024, se llevó a Votación del Comité Técnico No. 42 la Solicitud de ampliación 1 a la suspensión 1 de los Contratos PAF-ATMEN4-O-121-2023 y PAF-ATMEN4-I-039-2023, obra e interventoría respectivamente, obteniéndose votación favorable.

El día 31/07/2024, se llevó a Votación del Comité Técnico No. 44 la Solicitud de ampliación 2 a la suspensión 1 de los Contratos PAF-ATMEN4-O-121-2023 y PAF-ATMEN4-I-039-2023, obra e interventoría respectivamente, obteniéndose votación favorable.

GRUPO 4 – CADANAPAY y VILLALUZ

Valor contractual actual: \$ 8.085.659.173.00 – Valor con adición: \$ 9.324.170.712,00

OPCION 1:

Valor actual contrato:
\$ 8.085.659.173.00

Valor adición:
\$ 1.238.511.539


Valor Total contrato
con adición:
\$ 9.324.170.712.00

NOTA.- CON LA ADICION SE EJECUTA LA TOTALIDAD DE LO CONTRATADO Y REFERENCIADO EN ESTA FILMINA CON ELIPSES ROJAS.

Alcance determinado a ejecutar:

Alcance:

4 aulas
3 Baterías sanitarias
1 Aula múltiple sala estar
2 dormitorios
1 comedores
1 cocinas
1 sala TIC
Circulaciones cubiertas
Circulaciones abiertas

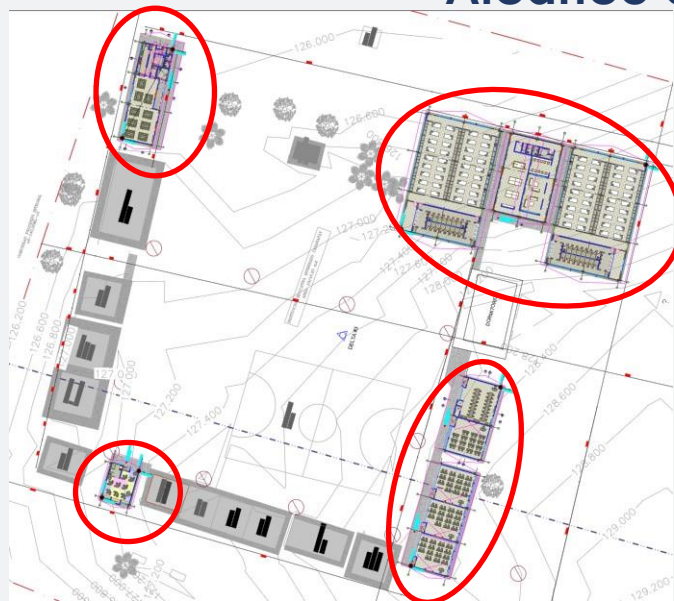

PLANOS GENERALES DOS SEDES

Alcance:

4 aulas
1 Baterías sanitarias
1 Aula múltiple sala estar
1 comedor
1 cocina
1 sala TIC
Circulaciones cubiertas



GRUPO 4 – CADANAPAY - Balance y Alcances Proyectados

Valor contractual actual: \$ 6.214.196.300.00

OPCION 1:

Valor actual contrato:
\$ 6.214.196.300.00

Valor adición No.1: \$
1.242.839.260.00


Valor Total contrato
con adición:
\$ 7.457.035.560.00

Alcance:


Baterías sanitarias 514,00m²
2 Zonas de Aula Múltiple y
sala de Estar 366,00 M²
Circulación, rampas
escaleras: 152,20m²

**NOTA.- CON LA ADICION
SE EJECUTA LA TOTALIDAD
DE LO CONTRATADO Y
REFERENCIADO EN ESTA
FILMINA.**

Alcance determinado a ejecutar:

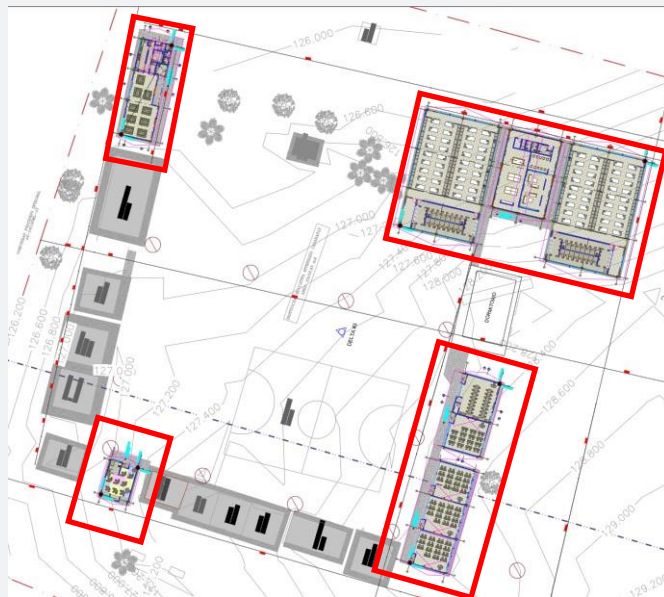

PLANO GENERAL

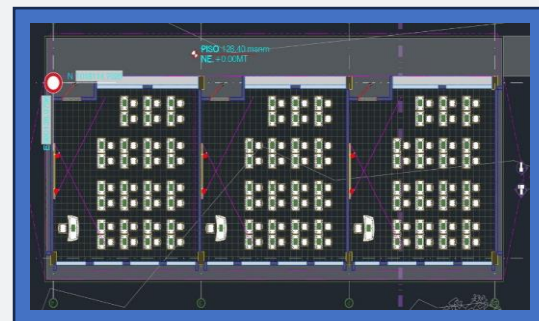


AULAS DE CLASE




COMEDOR - COCINA



SALA PRE-ESCOLAR

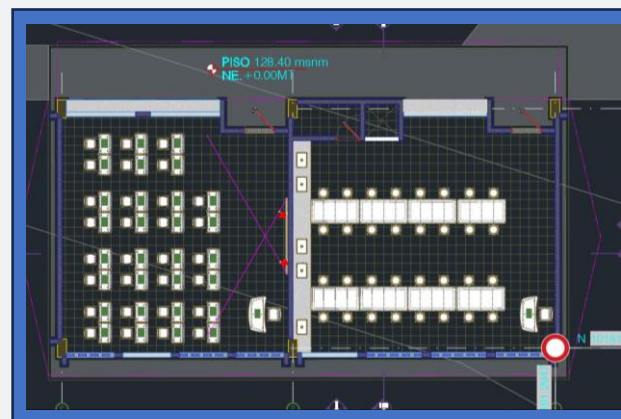

AULA CLASE Y LABORATORIO

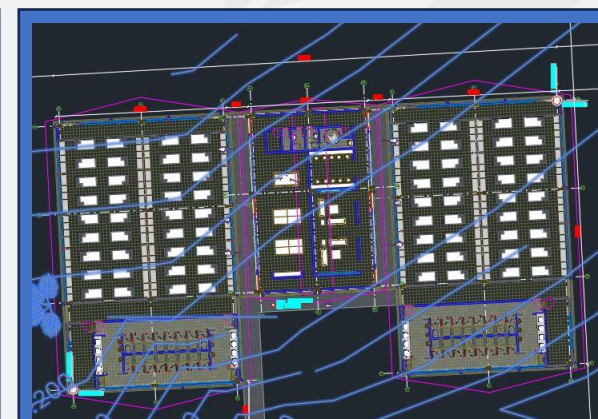

DORMITORIOS

GRUPO 4 – VILLALUZ - Balance y Alcances Proyectados

Valor contractual actual: \$ 2.245.755.448

Alcance determinado a ejecutar:

OPCION 1:

Valor actual contrato:
\$ **1.871.462.873.00**

Valor adición No.1:
\$ **374.292.575.00**

Valor Total contrato
con adición :
\$ **2.245.755.448.00**

Alcance:

- Bloque aulas 245,60 m²
- Aula de Estar 201,00 m²
- Baterías sanitarias 25,00 m²
- Espacio Deportivo 859,95 m²
- Circulación, rampas escaleras 125,53 m²


**NOTA.- CON LA ADICION
SE EJECUTA LA TOTALIDAD
DE LO CONTRATADO Y
REFERENCIADO EN ESTA
FILMINA.**




PLANO GENERAL




SALA PRE-ESCOLAR

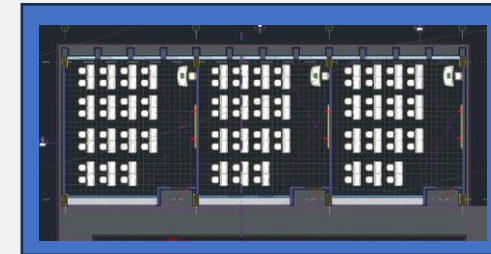


AULAS DE CLASE

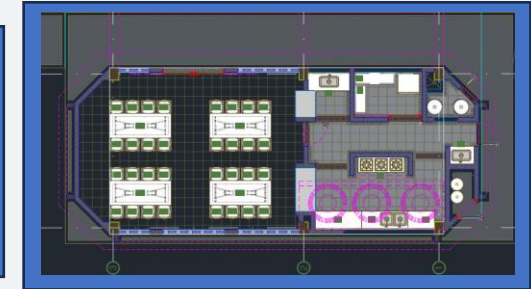

COMEDOR - COCINA

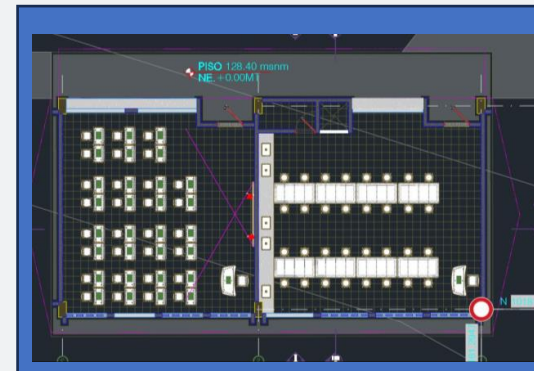

AULA CLASE Y LABORATORIO

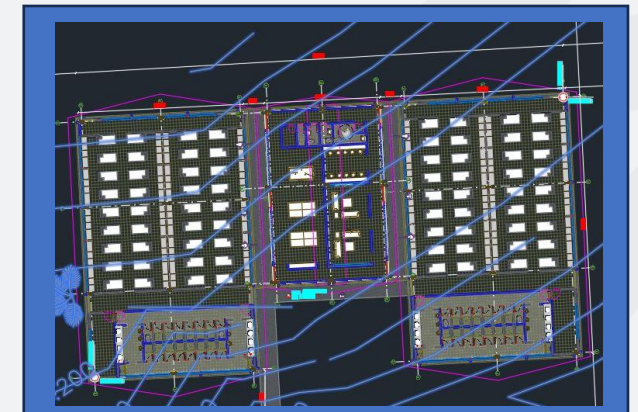

DORMITORIOS

GRUPO 4 – Balance y Alcances Proyectados (disminución obras)

Valor contractual actual: \$ 8.085.659.173.00



OPCION 2:

Valor actual contrato:
\$ 8.085.659.173.00

Cadanapay
Valor Total contrato:
\$ 6.214.196.300.00

Villaluz
Valor Total contrato
\$ 1.871.462.873.00

NOTA. CON EL DINERO CONTRACTUAL DEJARIAMOS DE HACER UNA AULA MENOS, UNA BATERIA SANITARIA MENOS Y EL ESPACIO DEPORTIVO. LA SEDE QUEDARA FUNCIONAL CON LA MATRICULA EXISTENTE PUEDE DISTRIBUIRSE EN LAS 3 AULAS DE CLASES

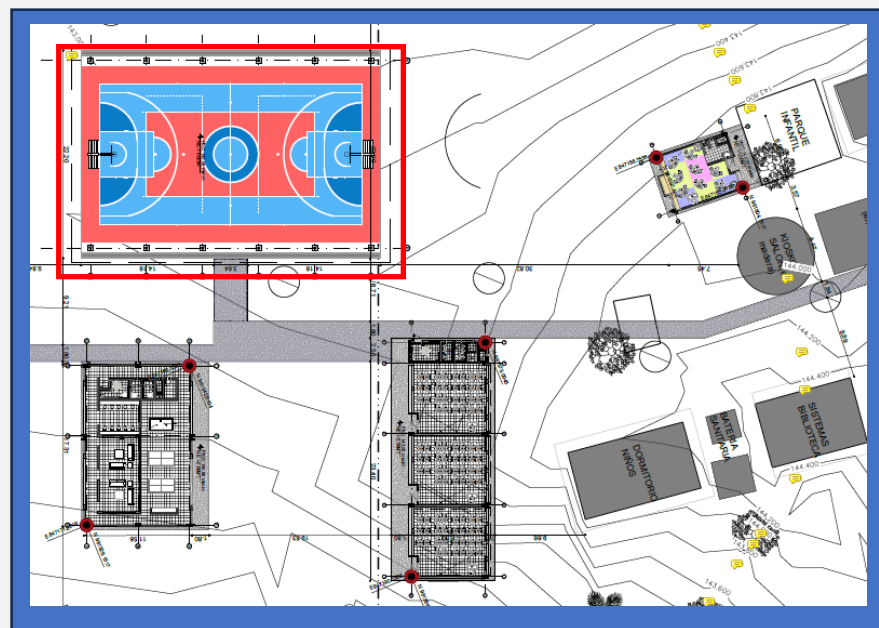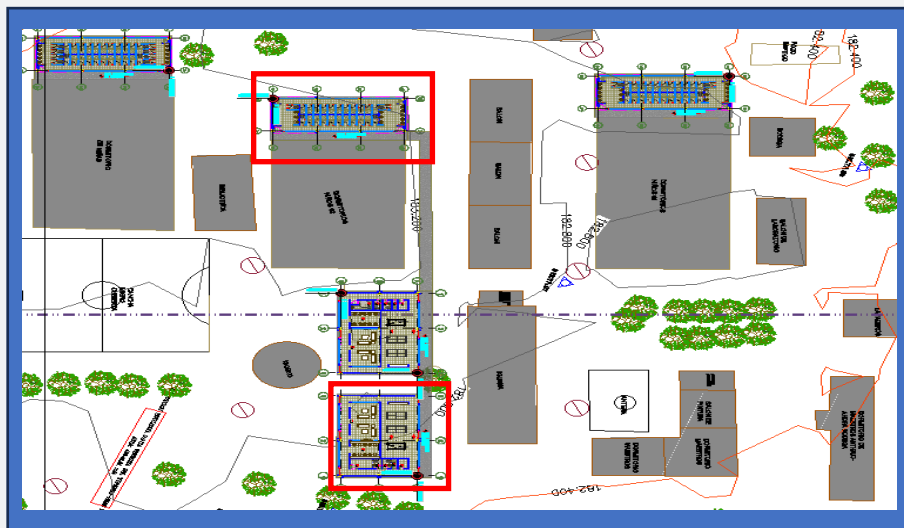

Alcance determinado a ejecutar:

Cadanapay

Alcance:

- 4 aulas
- 3 Baterías sanitarias
- 1 Aula múltiple sala estar
- 2 dormitorios
- 1 comedores
- 1 cocinas
- 1 sala TIC
- Circulaciones cubiertas
- Circulaciones abiertas

Villaluz

Alcance:

- 3 aulas
- 1 Baterías sanitarias
- 1 Aula múltiple sala estar
- 1 comedor
- 1 cocina
- 1 sala TIC
- Circulaciones cubiertas

GRUPO 4 – RESUMEN

NOTA. CON EL DINERO CONTRACTUAL DEJARIAMOS DE HACER:

EN EL INTERNADO DE CADANAPAY:

UNA AULA MENOS (falencia educativa), y EL LABORATORIO (falencia educativa), LA SEDE QUEDARA FUNCIONAL CON LA MATRICULA EXISTENTE PUEDE DISTRIBUIRSE EN LAS AULAS DE CLASES DISPONIBLES A CONSTRUIRSE Y EN UNA SEGUNDA FASE SE PODRIA OPTAR POR CULMINAR EN SU TOTALIDAD

EN EL INTERNADO DE VILLALUZ:

UN AULA DE CLASES (falencia educativa) y AULA MULTIPLE – SALA DE ESTAR (no habría problema eventualmente.) LA SEDE QUEDARA FUNCIONAL CON LA MATRICULA EXISTENTE PUEDE DISTRIBUIRSE EN LAS 3 AULAS DE CLASES LA SEDE QUEDARA FUNCIONAL CON LA MATRICULA EXISTENTE PUEDE DISTRIBUIRSE EN LAS 3 AULAS DE CLASES

REGISTRO FOTOGRAFICO



I.E. ALTO MIRA FRONTERA, LA Balsa (NARIÑO) – 20/08/2024



I.E. SAN JOSE DEL TAPAJE, EL CHARCO (NARIÑO) – 20/08/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



I.E. RÍO VERDE BAJO, SEDE EL BALSO

I.E. RÍO VERDE BAJO, SEDE LA CABAÑA

I.E. RÍO VERDE BAJO, SEDE LOS SAUCES

REGISTRO FOTOGRAFICO



SEDE DUMA, BAHIA SOLANO (CHOCÓ) – 07/2023



SEDE MARIA AUXILIADORA, BAHIA SOLANO (CHOCÓ) – 07/2023



SEDE SANTA MARIA, BAHIA SOLANO (CHOCÓ) – 07/2023



SE ELABORARON LOS ESTUDIOS PREVIOS PARA CONVOCATORIA PUBLICA SEGÚN LAS OBSERVACIONES DEL MEN, Y YA SE CUENTA CON APROBACION SOCIAL Y DE CONTRATACIO. SE ESTA A LA ESPERA DE VALIDACIONES FINALES.

NO OSBTANTE, SE RECIBIERON COMUNICACIONES POR PARTE DE OFERENTES INTERESADOS DE LA ZONA, POR LO QUE SE SOLIICITA REVISION DEL EP POR PARTE DEL MINISTERIO, EN CASO DE QUE SE REQUIERA SACAR LA CONVOCATORIA DE MANERA DIRECTA

- IROLDO OPUA
- VICTOR FAJARDO, CONSTRUCTORA ANTARES

SEDES INTERVENIDAS:

OBJETO	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADA EN EL MARCO DE LAS INICIATIVAS DE LA CUMBRE AGRARIA EN SEDES DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DE GRUPO 8
--------	---

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	IE	SEDE	VALOR INTERVENCIÓN	NIÑOS BENEFICIADOS
CESAR	LA PAZ	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE SAN JOSE DE ORIENTE	EL MIRADOR	\$117.159.914,50	PENDIENTE

AVANCE Y ESTADO DE LA CONTRATACIÓN:	Posterior a la indicación del MEN para la intervención de esta sede por el convenio de CUMBRE AGRARIA, se procede a la estructuración de los Estudios Previos, costeos y soportes requeridos por el área jurídica de Findeter para el proceso de contratación a la Junta de Acción Comunal. Estudio Previo se encuentra radicado en Jefatura de Contratacion, donde se surten los trámites para llevar a Comité de Contratación la contratación con J.A.C. Se estima la publicación de los EP para inicio de la semana de septiembre y de acuerdos a los tiempos de contratación, queda adjudicado la tercera semana de septiembre.
-------------------------------------	---

SEDES INTERVENIDAS:

OBJETO	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADA EN EL MARCO DE LAS INICIATIVAS DE LA CUMBRE AGRARIA EN SEDES DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DE GRUPO 9
--------	---


DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	IE	SEDE	VALOR INTERVENCIÓN	NIÑOS BENEFICIADOS
LA GUAJIRA	URIBIA	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA DE NAZARETH	KAJASHIWOU	\$266.000.000	38
LA GUAJIRA	URIBIA	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA DE NAZARETH	SAN BENITO	\$266.000.000	25
LA GUAJIRA	URIBIA	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA DE NAZARETH	SAMUTPANA	\$365.000.000	74

AVANCE Y ESTADO DE LA CONTRATACIÓN:	Posterior a la indicación del MEN para la intervención de estas 3 sedes por el convenio de CUMBRE AGRARIA, se procede a la estructuración de los Estudios Previos, costeos y soportes requeridos por el área jurídica de Findeter para el proceso de contratación pública. Se radicó el Estudio Previo para revisión del área jurídica, tecnica. Se estima la publicación de los EP para finales de la primera semana de septiembre y de acuerdos a los tiempos de contratación, queda adjudicado la primera semana de octubre.
-------------------------------------	---

REGISTRO FOTOGRAFICO



SEDE - KAJASHIWOU

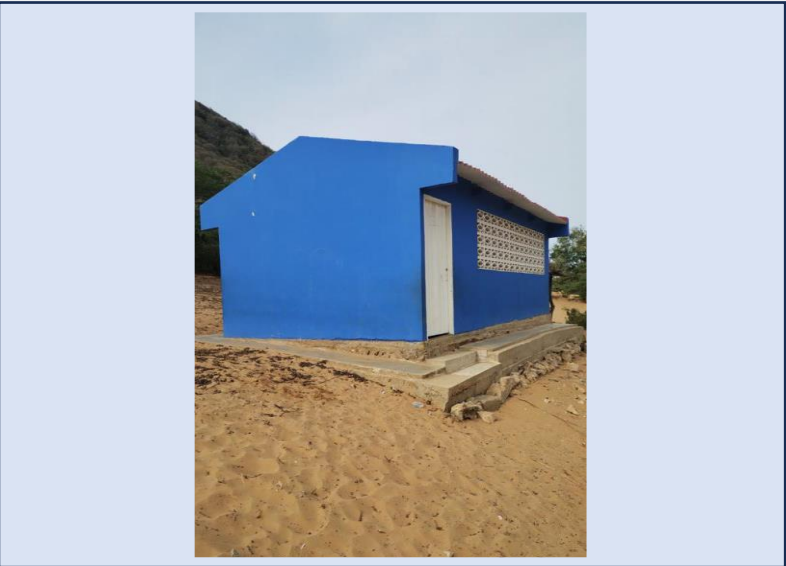

SEDE - KAJASHIWOU



SEDE – SAN BENITO



SEDE – SAN BENITO



SEDE - SAMUTPANÁ



SEDE - SAMUTPANA

CONTRATO 0200 – 2024

CONTRATISTA : MANUFACTURAS SUMAPAZ
Nit. 800,028,3446-5

VALOR DEL CONTRATO : \$ 812,960,000

FECHA INICIO : JULIO 12-2024

FECHA TERMINACION : ENERO 12-2025

*OBJETO : CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN, ENTREGA E INSTALACIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MEN PARA APORTAR AL DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE A LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS”.
DURCION: 6 MESES.*

INFORME : SE REALIZO VISITA A LA PLANTA PARA APROBACION DE LOS PROTOTIPOS DEL MOBILIARIO CON LA MARCA DE FINDETER.

SE PROGRAMA ENTREGAS A PARTIR DEL 23 DE AGOSTO.

AVANCE : LA FABRICACION DE LOS MUEBLES ESTA EN UN 60%.

