

SEMANA No. 68

DEL

lunes, 06 de enero de 2025

AL

domingo, 12 de enero de 2025

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA:

TIEMPO RESTANTE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

NOMBRE DEL SUPERVISOR DE MINDEPORTE:

15

DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: BARRIOVEREDA:

LA VIRGINIA

INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA:

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CCS-1072-2021 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, PRESUPUESTAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL COLISEO MUNICIPAL ROBERTO NARANJO DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CORRESPONDIENTE AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1233 DE 2020.

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA O CONSULTORIA: "EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL COLISEO MUNICIPAL ROBERTO NARANJO DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RISARALDA".

CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORIA				CONTRATO DE OBRA			
Interventor o Consultor:	BERAKAH INGENIERIA S.A.S			Contratista:	CONSORCIO COLISEO 2021		
Contrato No.	CCS-1072-2021			Contrato No.	004 del 04 de agosto de 2021		
Tiempo inicial (meses)	7,5			Tiempo (meses)	8		
Valor Inicial:	\$ 231.787.970,00			Valor Inicial:	\$ 4.312.504.995,00		
Valor anticipo -(si aplica)	N/A			Valor anticipo -(si aplica)	N/A		
Valor adición(es) MinDeporte:	\$ 79.964.985,00			Valor adición(es) MinDeporte:	N/A		
Valor adición(es) No. 1 Ente territorial	\$ 40.008.990,00			Valor adición(es) No. 1 Ente territorial	\$ 524.051.457,00		
Valor adición(es) No. 2 Ente territorial	\$ 26.253.780,00			Valor adición(es) No. 2 Ente territorial	\$ 494.196.522,51		
Valor adición(es) No. 3 Ente territorial	\$ 54.444.245,00			Valor adición(es) No. 3 Ente territorial	\$ 46.699.894,00		
Valor adición(es) No. 4 Ente territorial	\$			Valor adición(es) No. 4 Ente territorial	\$ 340.071.700,75		
Valor Actualizado:	\$ 432.459.970,00			Valor Actualizado:	\$ 5.717.524.569,26		
Valor pagado:	\$ 268.753.167,00			Valor pagado:	\$ 5.145.826.709,00		
Saldo por pagar:	\$ 163.706.803,00			Saldo por pagar:	\$ 571.697.860,26		
Plazo Inicial (días):	225 días, es decir, siete (7) meses y quince (15) días,			Plazo Inicial (días):	245 días, es decir, ocho (8) meses		
Fecha de Inicio:	22 de Noviembre 2021			Fecha de Inicio:	25 de marzo 2022		
Modificatorio No. 01	Suscrito el 20 de diciembre 2021			Modificatorio No. 01	N/A		
Suspensión No. 01 y fecha:	Del 22 de Diciembre 2021 al 22 de enero 2022 (Firmado el 22 de diciembre 2021 en SECOP)			Suspensión No. 01 y fecha:	Del 10 de Junio 2022 al 10 de Julio 2022 (Firmado el 03 de Junio 2022 en SECOP)		
Prórroga No. 01 de la Suspensión No. 01 y fecha:	Del 22 de enero 2022 al 23 de febrero 2022 (Firmado el 21 de enero 2022 en SECOP)			Suspensión No. 02 y fecha:	Del 11 de Julio 2022 al 11 de Agosto 2022 (Firmado el 10 de Julio del 2022 en SECOP)		
Prórroga No. 02 de la Suspensión No. 01 y fecha:	Del 24 de febrero 2022 al 24 de marzo 2022 (Firmado el 23 de febrero 2022 en SECOP)			Prórroga No. 02 de la Suspensión No. 01 y fecha:	N/A		
Reinicio No. 01 y fecha:	25 de marzo 2022			Reinicio No. y fecha:	12 de agosto de 2022		
Suspensión No. 02 y fecha:	Del 10 de Junio 2022 al 10 de Julio 2022 (Firmado el 03 de Junio 2022 en SECOP)			Suspensión No. 03 y fecha:	9 de diciembre de 2022		
Prórroga No. 01 de la Suspensión No. 02 y fecha:	Del 11 de Julio 2022 al 11 de Agosto 2022 (Firmado el 10 de Julio del 2022 en SECOP)			Prórroga No. 01 de la Suspensión No. 02 y fecha:	10 de febrero de 2023		
Prórroga No. 02 de la Suspensión No. 02 y fecha:	N/A			Prórroga No. 02 de la Suspensión No. 02 y fecha:	11 de abril de 2023		
Reinicio No. 02 y fecha:	12 de agosto de 2022			Reinicio No. 02 y fecha:	12 de mayo de 2023		
Suspensión No. 03 y fecha:	9 de diciembre de 2022 hasta 9 de febrero de 2023			Suspensión No. 04 y fecha:	17 de octubre de 2023 al 17 de noviembre de 2023		
Prórroga No. 01 de la Suspensión No. 03 y fecha:	10 de febrero de 2023			Prórroga No. 01 de la Suspensión No. 03 y fecha:	N/A		
Prórroga No. 02 de la Suspensión No. 03 y fecha:	11 de abril de 2023			Prórroga No. 02 de la Suspensión No. 03 y fecha:	N/A		
Reinicio No. 03 y fecha:	12 de mayo de 2023			Reinicio No. 03 y fecha:	18 de noviembre de 2023		
Suspensión No. 04 y fecha:	17 de octubre de 2023 al 17 de noviembre de 2023			Suspensión No. 05 y fecha:	13 de diciembre de 2023 al 13 de febrero de 2024		
Reinicio No. 04 y fecha:	18 de noviembre de 2023			Reinicio No. 04 y fecha:	20 de mayo de 2024		
Suspensión No. 05 y fecha:	18 de diciembre de 2023 al 18 de febrero de 2024			Prórroga No. 01 de la Suspensión No. 04 y fecha:	13 de febrero de 2024 al 13 de marzo de 2024		
Reinicio No. 05 y fecha:	18 de mayo de 2024			Prórroga No. 02 de la Suspensión No. 04 y fecha:	13 de marzo de 2024 al 13 de abril de 2024		
Prórroga No. 01 de la Suspensión No. 05 y fecha:	18 de febrero de 2024 al 17 de marzo de 2024			Prórroga No. 03 de la Suspensión No. 04 y fecha:	13 de abril de 2024 al 13 de mayo de 2024		
Prórroga No. 02 de la Suspensión No. 05 y fecha:	18 de marzo de 2024 al 17 de abril de 2024			Prórroga No. 04 de la Suspensión No. 04 y fecha:	13 de mayo de 2024 al 28 de mayo de 2024		
Prórroga No. 03 de la Suspensión No. 05 y fecha:	18 de abril de 2024 al 17 de mayo de 2024			Reinicio No. 04 y fecha:	20 de mayo de 2024		
Suspensión No. 06 y fecha:	15 de julio de 2024 al 14 de agosto de 2024			Suspensión No. 06 y fecha:	15 de julio de 2024 al 14 de agosto de 2024		
Prórroga No. 01 de la Suspensión No. 06 y fecha:	15 de agosto de 2024 al 14 septiembre de 2024			Prórroga No. 01 de la Suspensión No. 06 y fecha:	14 de agosto de 2024 al 14 de septiembre de 2024		
Prórroga No. 02 de la Suspensión No. 06 y fecha:	15 de septiembre de 2024 al 14 de octubre de 2024			Prórroga No. 02 de la Suspensión No. 06 y fecha:	15 de septiembre de 2024 al 15 de octubre de 2024		
Prórroga No. 03 de la Suspensión No. 06 y fecha:	15 de octubre de 2024 al 14 de noviembre de 2024			Prórroga No. 03 de la Suspensión No. 06 y fecha:	15 de octubre de 2024 al 14 de noviembre de 2024		
Prórroga No. 04 de la Suspensión No. 06 y fecha:	15 de noviembre de 2024 al 02 de diciembre de 2024			Prórroga No. 04 de la Suspensión No. 06 y fecha:	15 de noviembre de 2024 al 02 de diciembre de 2024		
Reinicio No. 06 y fecha:	2 de diciembre de 2024			Reinicio No. 06 y fecha:	2 de diciembre de 2024		
Fecha de Terminación Actualizada	27 de enero de 2025			Fecha de Terminación Actualizada	27 de enero de 2025		
Días Transcurridos	527			Días Transcurridos	477		
Plazo Actualizado Incluyendo Fase Preconstrucion:	542			Plazo Actualizado:	492		

2. PROGRAMACIÓN			
% DE AVANCE OBRA PROGRAMADO	ACUMULADO	% DE AVANCE OBRA EJECUTADO	ACUMULADO
	84,18%		92,59%
	\$ 4.812.875.828,62		\$ 4.905.931.141,73


% DE ATRASO/ADELANTO	ACUMULADO
	8,41%
	\$ 445.512.240,69

% DE AVANCE OBRA							
CAPITULOS	INICIO	FIN	DURACIÓN (DÍAS)	% PESO ACTIVIDAD	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO	% ATRASO/ADELANTO
CAPITULO I-PRELIMINARES	vie 25/03/22	mar 28/01/25	196 días	8,54%	84,18%	92,59%	8,41%
CAPITULO II-EXCAVACIONES Y LLENOS	lun 15/08/22	jue 17/11/22	100 días	0,76%	100,00%		
CAPITULO III-CONCRETOS	vie 7/10/22	vie 9/12/22	214 días	5,11%	100,00%		
CAPITULO IV-CUBIERTA Y ACEROS	mar 22/11/22	vie 25/11/22	330 días	38,03%	100,00%		
Acero Fy = 60.000 psi d=1/4"	sáb 26/11/22	lun 5/12/22	8 días	2,03%	100,00%		0,00%
Estructura Metalica de Cubierta	lun 22/05/23	mié 30/08/23	87 días	26,69%	100,00%		100,00%
Cubierta Standing Seam Cal. 24 x 1.5" tipo Sandwich con aislamiento en poliuretano	vie 6/12/23		3 días	9,31%	100,00%		
CAPITULO V-MAMPISTERIA Y ACABADOS	sáb 9/12/23	lun 16/12/24	844 días	9,32%	48,46%		
CAPITULO VI-PISO EN MADERAMEN	sáb 9/12/23	sáb 9/12/23	0 días	0,00%	0,00%		
Suministro e instalacion de piso en maderamen	sáb 9/12/23	sáb 9/12/23	0 días	0,00%	0,00%		0,00%
CAPITULO VII-CARPINTERIA METALICA	jue 2/01/25	mar 28/01/25	23 días	5,45%	0,00%		
CAPITULO VIII-INSTALACIONES HIDRAULICAS	mié 20/09/23	mié 13/12/23	73 días	0,50%	100,00%		
CAPITULO IX-OBRAS HIDROSANITARIOS	lun 28/03/22	vie 8/12/23	524 días	1,60%	100,00%		
CAPITULO X-INSTALACIONES ELECTRICAS	vie 29/11/24	jue 23/01/25	48 días	5,29%	0,00%		
ACOMETIDA	mar 3/12/24	mar 14/01/25	37 días	0,58%	0,00%		
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN	jue 26/12/24	lun 20/01/25	22 días	0,62%	0,00%		
ILUMINACION CANCHA Y GRADERÍAS	lun 23/12/24	jue 9/01/25	16 días	2,12%	0,00%		
INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS	jue 26/12/24	vie 10/01/25	14 días	1,43%	100,00%		
Salida de iluminación 110 voltios en emt ø 3/4" con accesorios, distancia promedio 6.0m. conductores n° 12 awg 1lhr-ls, cajas octogonales (cajas 4"x4" donde se requiera).	lun 6/01/25	jue 9/01/25	4 días	0,29%	100,00%		100,00%

Salida de interruptor de accionamiento tubería emt 3/4", sencillo o doble (se debe incluir el cable n°12 lhr-ls, interruptor de accionamiento, caja, tapas)	lun 6/01/25	lun 6/01/25	1 día	0.11%	100,00%	100,00%
Salida tomacorriente doble normal, con polo a tierra en cable n°12 lhr-ls tubería emt 3/4" long. prom. 6.0m	mar 31/12/24	mar 31/12/24	1 día	0.11%	100,00%	100,00%
Salida tomacorriente doble gfcí en cable n°12 lhr-ls tubería emt	lun 30/12/24	lun 30/12/24	1 día	0.04%	100,00%	100,00%
Luminaria tipo led hermética tipo t8 40w - 120cm	mar 31/12/24	vie 3/01/25	4 días	0.16%	100,00%	100,00%
Luminaria de colgar tipo panel led 45w - 60x60cm	mar 31/12/24	mié 1/01/25	2 días	0.12%	100,00%	100,00%
Luminaria led tipo panel redondo 18w	lun 30/12/24	lun 30/12/24	2 días	0.03%	100,00%	100,00%
Lámpara emergencia led r1 2x1.6w	jue 2/01/25	vie 3/01/25	2 días	0.07%	100,00%	100,00%
Aviso de emergencia salida	sáb 28/12/24	sáb 28/12/24	1 día	0.02%	100,00%	100,00%
Luminaria emergencia tipo aplique 20w	sáb 4/01/25	sáb 4/01/25	1 día	0.02%	100,00%	100,00%
Luminaria tipo reflector led 50w	lun 6/01/25	lun 6/01/25	1 día	0.03%	100,00%	100,00%
Construcción de circuitos ramales de tomacorrientes 110 voltios conductores n° 12 awg lhr-ls en emt ø 3/4" con accesorios	vie 27/12/24	sáb 4/01/25	8 días	0.44%	100,00%	100,00%
SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA	jue 12/12/24	lun 23/12/24	10 días	0.62%	100,00%	
Sistema de puesta a tierra general en configuración tipo malla. Incluye cable de cu 2/0, 4 varillas de cu 5/8" x 2.40 mt, soldadura exotérmica 150g, conectores/soldadura, caja de inspección en concreto 30x30, medición resistencia de puesta a tierra.	jue 12/12/24	jue 12/12/24	1 día	0.06%	100,00%	100,00%
Sistema de apantallamiento, 16 pararrayo tipo franklin h=1,50 m, cable aluminio cubierto n° 1/0 awg	vie 13/12/24	sáb 14/12/24	2 días	0.27%	100,00%	100,00%
Sistema de puesta a tierra de apantallamiento. Incluye cable perimetral 1/0 awg cu, 10 varillas de cu 5/8" x 2.40 mt, conectores/soldadura, 4 cajas de inspección en concreto 30x30 con tapa, medición resistencia de puesta a tierra	lun 16/12/24	lun 16/12/24	1 día	0.28%	100,00%	100,00%
RED DE VOZ/DATOS	vie 3/01/25	vie 17/01/25	13 días	0.03%	0,00%	
Cámara de inspección telecomunicaciones 0,6 x 0,6 x 0,8 mt	mar 7/01/25	mié 8/01/25	2 días	0.00%	0,00%	0,00%
Ducto pvc 2" subterráneo para acometida telecomunicaciones	vie 3/01/25	vie 3/01/25	1 día	0.00%	0,00%	0,00%
Suministro y tendido de tubería emt 3/4" red de datos. Incluye accesorios para completar actividad	sáb 4/01/25	sáb 4/01/25	1 día	0.01%	100,00%	100,00%
Conduleta tipo t rosca salida de 3/4"	mié 8/01/25	mié 8/01/25	1 día	0.00%	100,00%	100,00%
Gabinete rack de pared puerta metálica 9u 50x45x60 - no incluye equipos	vie 3/01/25	vie 3/01/25	1 día	0.00%	0,00%	0,00%
Salida de datos incluye caja metálica, jack rj45 cat. 6a, faceplate doble angular	mar 7/01/25	mar 7/01/25	1 día	0.01%	100,00%	100,00%
Salida voz y datos, longitud promedio 15.0 m (incluye ductería,	lun 6/01/25	lun 6/01/25	1 día	0.00%	0,00%	0,00%
Certificación punto red	lun 13/01/25	lun 13/01/25	1 día	0.00%	0,00%	0,00%
CAPITULO XI-MOBILIARIO	mar 7/01/25	vie 10/01/25	4 días	0.08%	100,00%	
Suministro e instalación de torniquete de personas control de acceso	mar 7/01/25	mar 7/01/25	1 día	0.00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de paradero de bicicletas en acero inoxidable a= 0,50m, h= 0,60m	mié 8/01/25	mié 8/01/25	1 día	0.00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de aviso en letras en material acrílico con la frase colíseo municipal roberto naranjo duque	mié 8/01/25	jue 9/01/25	2 días	0.08%	100,00%	100,00%
CAPITULO XII-ITEMS NO PREVISTOS	lun 5/09/22	mar 28/01/25	749 días	25,31%	57,22%	
Demolición manual de concreto DEL MEJORAMIENTO	mar 6/09/22	mié 14/09/22	8 días	0.02%	100,00%	100,00%
Corte con disco PLACA PISO	vie 9/09/22	mar 13/09/22	4 días	0.13%	100,00%	100,00%
DEMOLICION MURO CEMENTO INCLUYE DOBELAS REBOQUE Y ENCHAPE	vie 9/09/22	sáb 1/10/22	20 días	0.32%	100,00%	100,00%
Desmonte MURO ETERBOARD	lun 12/09/22	lun 10/10/22	25 días	0.29%	100,00%	100,00%
ESCARIFICACION COLUMNA DE 0 A 2 m	lun 5/09/22	mié 21/09/22	15 días	0.06%	100,00%	100,00%
ESCARIFICACION COLUMNA DE 2 A 7 m	mar 6/09/22	vie 30/09/22	22 días	0.21%	100,00%	100,00%
PILOTES 40CM DE ESPESOR INCLUYE PERFORACION, REFUERZO, BENTONITA, CONCRETO	mar 20/09/22	mar 20/09/22	0 días	0.00%	0,00%	0,00%
Excavación en material común de 0 - 2 m manual BAJO RELLENO CON RECEO COMUN	mar 20/09/22	sáb 24/09/22	5 días	0.18%	100,00%	100,00%
Viga de AMARRE DE MUROS base, 25 X 25 en concreto de 20,7 Mpa, incluye refuerzo	mié 5/10/22	lun 24/10/22	16 días	0.39%	100,00%	100,00%
Columneta en concreto de 20,7 Mpa para amarre MAMAPOSTERIA, 15 X 20	jue 6/10/22	vie 4/11/22	25 días	0.14%	100,00%	100,00%
Viga de AMARRE DE MUROS AEREA, 15 X 20 en concreto de 20,7 Mpa, incluye refuerzo	mar 4/10/22	jue 10/11/22	31 días	0.27%	100,00%	100,00%
CONCRETO CICLOPEO 60% - 40% MEJORAMIENTO SUELO ZAPATAS	mar 20/09/22	lun 3/10/22	12 días	0.10%	100,00%	100,00%
MEJORAMIENTO RECEO CEMENTO proporcion peso 8%	mar 20/09/22	jue 22/09/22	3 días	0.20%	100,00%	100,00%
ANCLAJE PARA CONCRETO DE 0 A 20 CM	mié 14/09/22	lun 19/09/22	5 días	1.53%	100,00%	100,00%
SISTEMA DE PRESION CONSTANTE HIDRO FLOW	jue 16/01/25	sáb 18/01/25	3 días	0.18%	0,00%	0,00%
CAMA DE ARENA PARA TUBERIA	mar 6/09/22	jue 8/09/22	3 días	0.12%	100,00%	100,00%
INSTALACION TANQUES DE 1000 LIT CON ACCESORIOS	mar 14/01/25	mié 15/01/25	2 días	0.03%	0,00%	0,00%
RED DE VENTILACION	jue 18/05/23	mié 21/06/23	30 días	0.21%	100,00%	100,00%
PILOTES 40CM DE ESPESOR INCLUYE PERFORACION, REFUERZO, BENTONITA, CONCRETO TIPO 2	lun 31/10/22	vie 2/12/22	27 días	2.13%	100,00%	100,00%
Suministro e instalación de piso SINTETICO MULTIFUNCIONAL	vie 10/01/25	lun 27/01/25	15 días	8.22%	13.33%	6.31%
FLANCHE 40CM LAMINA GALVANIZADA CAL 22	mié 15/01/25	sáb 18/01/25	4 días	0.06%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION BARANDAS 2 HILOS, TUBERIA DE HG 2" C 14	lun 20/01/25	lun 20/01/25	1 día	0.15%	0,00%	0,00%
CABALLETE SOBRE CUBIERTA TIPO SANDWICH	jue 16/01/25	jue 16/01/25	1 día	0.06%	0,00%	0,00%
CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA C 22, LONG DE DESARROLLO 1,00 M	lun 9/10/23	lun 9/10/23	1 día	0.51%	100,00%	100,00%
RESANES DE MUROS PARA COLUMNAS PISO A TECHO, INCLUYE CORTE A DOS COSTADOS, LADRILLO FAROL Y REVOQUE H= 2 - 4 MTS	mié 13/09/23	jue 14/09/23	2 días	0.06%	100,00%	100,00%
RESANES DE MUROS PARA COLUMNAS PISO A TECHO, INCLUYE CORTE A DOS COSTADOS, LADRILLO FAROL Y REVOQUE H= 2 - 4 MTS	mar 19/09/23	mié 20/09/23	2 días	0.07%	100,00%	100,00%
RESANES DE MUROS PARA COLUMNAS PISO A TECHO, INCLUYE CORTE A DOS COSTADOS, LADRILLO FAROL Y REVOQUE H= 4 - 8 MTS	jue 21/09/23	vie 22/09/23	2 días	0.15%	100,00%	100,00%
Enchape en cerámica de 1ra. de 30 x 60 cm BLANCO	sáb 23/09/23	mar 17/10/23	21 días	0.52%	100,00%	100,00%
RESANES Y COSTURA DE MUROS EXISTENTES INCLUYE MORTERO 1:3 Y ACERO DE 3/8" @ 10 CM L=45 CM	sáb 23/09/23	jue 28/09/23	5 días	0.05%	100,00%	100,00%
Base y cañuela para cajas de inspección en concreto de 20,7 mpa	sáb 23/09/23	jue 28/09/23	5 días	0.05%	100,00%	100,00%
RESANES RECUADRO DE CALADOS MURO 2 - 4 MTS 1 CARA	sáb 23/09/23	jue 28/09/23	5 días	0.01%	100,00%	100,00%
Sanitario/INSTITUCIONAL TIPO ADRIATICO O SIMILAR Blanco con flumómetro	lun 2/10/23	sáb 7/10/23	6 días	0.82%	100,00%	100,00%
LAVADO FACHADA HIDRO LAVADORA	vie 22/09/23	sáb 30/09/23	8 días	0.04%	100,00%	100,00%
LAVADO GRADERIAS HIDRO LAVADORA	mié 22/11/23	vie 1/12/23	9 días	0.17%	100,00%	100,00%
Suministro e Instalación de baldosa DURO PISO 33 x 33 y/o FORMATO SIMILAR, pulido no incluye mortero.	vie 18/08/23	mar 26/09/23	34 días	0.53%	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACION POSTE DE 12 M X 750 KG-F	jue 16/01/25	jue 16/01/25	1 día	0.05%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA EN SUSPENSIÓN PIN SENCILLO PARA NIVEL DE TENSIÓN 2 EN POSTE DE	vie 17/01/25	lun 20/01/25	3 días	0.04%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION AEREA PARA NIVEL DE TENSIÓN 2 CONTRASFORMADOR TRIFASICO, INCLUYE	vie 17/01/25	lun 20/01/25	3 días	0.40%	0,00%	0,00%

SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ECOLOGICO PARA PUESTES EN M.T	vie 17/01/25	vie 17/01/25	1 día	0,00%	0,00%	0,00%
DERECHOS ANTE CHEC POR CORTES DE ENERGÍA, REVISIÓN Y DE CONEXIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO	mié 18/12/24	jue 2/01/25	14 días	0,00%	0,00%	0,00%
DERECHOS PARA CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD RETIE	vie 3/01/25	sáb 18/01/25	14 días	0,00%	0,00%	0,00%
ELABORACIÓN DE PLANOS RÉCORD, ACTUALIZACIÓN DE MEMORIAS Y MANUAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN	lun 20/01/25	vie 24/01/25	5 días	0,06%	0,00%	
SERVICIO DE CARRO CANASTA PARA TRABAJOS EN LINEA VIVA	vie 17/01/25	sáb 18/01/25	2 días	0,12%	0,00%	
Mampara en placa de fibrocemento e= 6 mm o similar 1 cara incluye pintura ALTURA De trabajo 3 a 6 metros	jue 2/01/25	mié 8/01/25	6 días	1,08%	100,00%	
Mampara en placa de fibrocemento e= 6 mm o similar 1 cara incluye pintura ALTURA De trabajo 9 a 12 metros	lun 6/01/25	mié 15/01/25	9 días	1,13%	96,67%	0,58%
Mampara en placa de fibrocemento e= 6 mm o similar 1 cara incluye pintura ALTURA De trabajo 12 a 15 metros	jue 9/01/25	lun 13/01/25	4 días	1,02%	75,00%	
Mampara en placa de fibrocemento e= 6 mm o similar 2 caras incluye pintura ALTURA De trabajo 6 a 9 metros	mar 14/01/25	jue 16/01/25	3 días	0,96%	0,00%	0,55%
Bandeja portacable tipo canasta CABLOFIL 54 x 100 mm, colgada	mar 3/12/24	sáb 28/12/24	23 días	0,09%	100,00%	
Soporte Colgante Bandeja Portacable Tipo Canasta CABLOFIL de 100 mm	lun 2/12/24	vie 27/12/24	23 días	0,01%	100,00%	
REFLECTOR LED JETA 100W DL. Incluye 1.5 m de cable encauchetado y clavija	vie 17/01/25	mar 21/01/25	4 días	0,09%	0,00%	
Salida iluminación en aplique exterior, tubería IMC ø 3/4", incluye accesorios de fijación a estructura, longitud promedio	mar 14/01/25	jue 16/01/25	3 días	0,09%	0,00%	
CANALIZACION SUBTERRANEA EN 2 PULGADAS	jue 2/01/25	sáb 4/01/25	3 días	0,04%	100,00%	
ACOMETIDA ALIMENTACIÓN TABLERO ALTERNO	lun 6/01/25	lun 6/01/25	1 día	0,17%	100,00%	
Tablero general de baja tensión, según diseños del proyecto según diagrama unifilar.	jue 9/01/25	mar 14/01/25	5 días	0,24%	60,00%	
TOTAL				92,59%	92,59%	0,00%

3. RECURSOS DE INTERVENTORIA O CONSULTORIA:			VISTA DE LA OBRA
PERSONAL DE INTERVENTORIA	CARGO	CANTIDAD (DIAS)	
Diana Milena Pérez Cuevas	Directora de Interventoría	527	
Alexander Molina	Residente de Interventoría	527	
Luisa Fernanda Trejos	Inspectora de Interventoría	485	
Jose Alfredo García Aragón	Profesional HSE	485	
Jorge Cardenas	Profesional SST	457	
Jhon Ardila / Eduardo Lopez Garzón	Topógrafo y cadenero con comisión	N/A	
Nota:	Lo correspondiente a los profesionales especialistas debido a la dedicación del proyecto presentaran ordenes de servicio y se adjuntará la planilla de seguridad social perteneciente a cada periodo.		
ENSAYOS / ANÁLISIS / LABORATORIOS / EQUIPOS / OTROS	OBSERVACIONES / RESULTADO		
0	N/A Para el presente Periodo		

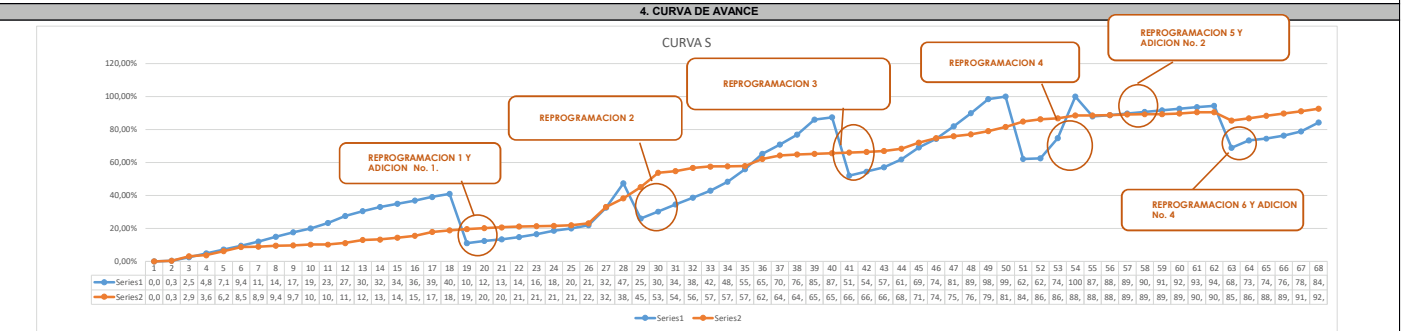

En la semana No. 68 comprendida del 06 al 12 de enero 2025, el porcentaje programado acumulado en dicho periodo corresponde al 84,18% y el porcentaje ejecutado acumulado de la semana es del 92,59%, con un avance semanal del 1,45%. Frente a la nueva reprogramación presentada por el contratista el 02 de diciembre de 2024 entendiendo en cuenta el reinicio No 05 del 02 de diciembre del 2024 y la prorroga No. 4 al contrato de obra por cuarenta y cinco (45) días avalada por la interventoría; a la fecha se tendría un adelanto equivalente del 8,41%. El contratista continúa con la búsqueda; la interventoría reiteró al contratista, ente territorial y Ministerio del Deporte a lo largo de la vigencia contractual la preocupación en la constante disminución del personal de mano de obra que debe vincularse a las actividades faltantes por ejecutarse para el proyecto. La interventoría deja las alertas respectivas a la entidad contratante, Ministerio del Deporte y Municipio La Virginia del avance y situaciones encontradas desde el reinicio No. 5 del contrato de obra; a la fecha del presente informe no se han subsanado las observaciones dejadas por la interventoría se deja la respectiva alerta por el posible no cumplimiento del objeto contractual en el plazo actualmente previsto. Se percibe por la interventoría con el reinicio No. 5 del contrato de obra, que el contratista agilizó algunas actividades en tiempo de suspensión, pese a las recomendaciones y a lo estipulado en las diferentes actas que justifican dicha actuación.

5. ACTIVIDADES		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA		
SEMANA 68 - DEL	6 de enero de 2025	AL 12 de enero de 2025
<ul style="list-style-type: none">Aseo y limpieza general de la obra.Elaboración e instalación de mamparas de 6 a 9 a 2 carasElaboración e instalación de mamparas de 9 a 12 a 1 cara		
SITUACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PRESENTADAS EN LA SEMANA		

- El 02 de diciembre del 2024, el Municipio de la Virginia, realizó al contrato la legalización y suscripción del reinicio No. 4 del contrato de obra, con la inclusión de un nuevo modificatorio por la ampliación del plazo del proyecto por dos (45) días adicionales, con una adición presupuestal de \$ 340.071.700,75, por lo tanto, la nueva fecha de finalización del contrato de obra es el próximo 27 de enero del 2025.
- Interventoría reitera la solicitud al contratista presentar las pólizas actualizadas del contrato de obra y certificado de aprobación por parte del Municipio de la Virginia, teniendo en cuenta el reinicio No 5 y la prorroga del contrato de referencia por (45) días y según lo establecido en el Contrato de Obra CLAUSULA 17 – GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO,
- Se realiza ajuste a la curva S, con la actualización de la reprogramación actualizada y presentada por el contratista en la última semana del vencimiento del plazo contractual, teniendo en cuenta el reinicio del obra No. 5 y la prorroga No 4 del Contrato de Obra.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
ATRASO/ADELANTO DE ACTIVIDADES A LA FECHA:
<ol style="list-style-type: none">En la semana 68 se evidencia un adelanto del +8,41% en el porcentaje de avance del proyecto, Interventoría continúa rSe deja reporte de las actividades que el contratista agilizó en la presente semana, los ítems relacionados corresponden a:La Interventoría lo largo del tiempo de ejecución del proyecto solicitó al contratista presentar el control y seguimiento en la agilización de las compras de insumos y materiales de acabado, que eran necesarios para la ejecución del proyecto; lo cual, es requerido en la obra para el proceso constructivo que se venía desarrollando y poder culminar en los tiempos contractualmente previstos.Se realizó ajuste a la curva S con la actualización de la reprogramación No. 6 presentada por el contratista, teniendo en cuenta el reinicio No. 5, y la adición No. 4 del Contrato de Obra.

DE ORDEN ADMINISTRATIVO

	<p>1. A fecha de elaboración del presente Informe semanal de interventoría, se informa que, desde el reinicio No. 5 del contrato de obra, el Consorcio Coliseo 2021, se reporta un adelanto del +8,41%..</p> <p>2. A la fecha el contratista no ha realizado la entrega de las pólizas actualizadas teniendo en cuenta el reinicio No. 5 y la prorroga No. 4 y al contrato de obra por cuarenta y cinco (45) días</p> <p>3. Se recuerda al Contratista de Obra que la entrega de los Informes del componente SST, se deberán entregar de manera oportuna (los 25 de cada mes) para ser revisado por parte del profesional SST de interventoría.</p>	
	<p>DE ORDEN TÉCNICO</p> <p>1. A fecha de presentación del presente Informe se reporta la ejecución de las actividades relacionadas a continuación:</p> <p>a. Mamparas b. Fachada flotante</p> <p>Durante la presente semana no se evidencio personal en obra, interventoría solicita al contratista, vincular nuevas cuadrillas de personal (Solicitud consignada en comités operativos y con anotaciones en bitácora de obra) : ya que continua con áreas de trabajo donde podría estar realizando obras, a la fecha del presente informe se presenta en obra el siguiente personal operativo. El personal de interventoría realiza recorridos, verificaciones y acompañamiento general en la obra.</p> <p>• (3) Oficiales, • (4) Ayudantes</p> <p>2. La Interventoría reitera que es importante que el Contratista de Obra presente el informe de las gestiones y trámites respecto a las compras de los elementos de acabados para el proyecto, contemplando los tiempos que se tienen para la disposición final en el sitio, dado que esto genera afectación al cumplimiento de los tiempos establecidos contractualmente y así mismo la consolidación de actas parciales de obra.</p> <p>3. Continua pendiente la respuesta a la solicitud realizada al Contratista de Obra, realizada mediante comunicado de interventoría CLV-203 , y reiterado mediante comunicado CLV-261 de fecha 24 DE MAYO DE 2024 ,para la entrega de pruebas:</p> <p>*Proctor modificado (losas de contrapiso) * Resultados de pruebas de presión de la tubería PVC. * Prueba de tintas penetrantes en la estructura metálica de acuerdo con la norma ASTM E 165 * Prueba de torque cerrado en estructuras metálicas. * Pruebas y/o resultados de resistencia a la compresión del concreto (fallantes). Ensayos y pruebas que ala fecha no han sido entregados por parte del Contratista de Obra para conocimiento de interventoría</p> <p>4. A la fecha no se ha entregado por parte del contratista de obra del Informe mensual correspondiente al periodo comprendido entre el 20 de mayo de 2024 y el 20 de junio del 2024 , esto teniendo en cuenta el reinicio No.4 de las obras el pasado 20 de mayo de 2024</p>	
	<p>REPORTE DE ACTIVIDADES SISOMA</p>	
	<p>1. ÁREA SST: Interventoría reporta que el Contratista de Obra realiza labores en compañía de la el profesional SST, sin embargo Interventoría solicita se realice acciones de mejora en los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Entrega de documentos de vinculación de personal (contrato, ARL, EPS, y Caja de compensacion)• Entrega de seguridad social del mes de diciembre del 2024 (Sin cumplir)• Utilización de andamios certificados (Sin cumplir)• Adecuación de punto de atención a emergencias (Corregido)• Recargas de extintores (Corregido)• Hojas de vida, fichas técnicas y certificados de calidad de armés, eslingas y líneas de vida (Corregido)• Punto de hidratación (Corregido)• Unidades sanitarias (Corregido)• Señalización (Corregido)• Exámenes de ingreso (En proceso)• Exámenes de egreso del personal retirado (Sin cumplir)• Paz y salvo del personal retirado (Sin cumplir) <p>El Contratista de Obra, realizó jornadas de orden y aseo con el fin de mantener la obra en óptimas condiciones. Se mantiene la señalización de acopios de (madera, hierro, material granular), se mantiene señalización en áreas del proyecto que se están interviniendo.</p> <p>2. ÁREA AMBIENTAL: Se realizó seguimiento a las actividades contempladas dentro del plan de manejo ambiental, el 23 de junio del 2023 y por medio de correo electronico, el profesional Ambiental de interventoría solicito al contratista, se subsanen los siguientes requerimientos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Rotulación, separación, y almacenamiento de sustancias peligrosas de carpintería metálica. (Cumplido)- Separación y gestión de bolsas de cemento. (Cumplido)- Orden y aseo general. (Cumplido)- Instalación y adecuación de baños para hombres y mujeres. (Cumplido)- Cerramiento y señalización. (Cumplido)- Relación de viajes, recibos de pago y certificación de escombrera. (En proceso)- Inspección de maquinaria, equipos y herramientas utilizadas en obra. (En proceso) <p>3. SEGUIMIENTO COVID: El Contratista de Obra no esta ejecutado el protocolo de bioseguridad, oficializa que de acuerdo al decreto presentado por el Municipio La Virginia, ya no es necesario continuar con los lineamientos del ministerio de Salud. La interventoría solicita se emita el respectivo comunicado oficial.</p> <p>4. PAPS0: En la presente semana se realizó seguimiento para el cumplimiento de esta actividad en conjunto con el Contratista de Obra, se evidenció en los diferentes recorridos la instalación de los elementos que dan constancia del cumplimiento del PAPS0.</p>	
	<p>6. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA</p>	
	<p>1. La interventoría recomienda nuevamente al Contratista de Obra agilizar los medios necesarios, para disponer en obra de los materiales, insumos y personal (<i>Aumento de cuadrillas</i>), requeridos para la ejecución del proyecto. Se continua con el seguimiento puntual a la reprogramación. Lo anterior cuenta con las respectivas anotaciones en bitácora de obra.</p> <p>2. Realizar la entrega mes a mes de las planillas parafiscales, estas deberán incorporarse al informe mensual respectivo del Contratista de obra.</p> <p>3. Se solicita al Contratista de Obra, adelantar la logística pertinente para las actividades de Sobrefachada en estructura metálica y lamina perforada ref. Hunter Douglas, Rollformados o equivalente, Piso sintético multifuncional, entre otras. El contratista debe disponer de dichos materiales en obra, para el correcto desarrollo de la obra en los tiempos estipulados contractualmente .</p> <p>4. Se solicita al Contratista de Obra, realizar la entrega de los Informes Mensuales de obra y cortes de actas parciales que se encuentren pendientes dentro de los plazos establecidos para la revisión preliminar de la interventoría para la emisión del concepto respectivo a nuestro cargo.</p> <p>5. Se recomienda al contratista al contratista que se realicen los trámites necesarios para obtener a conformidad todas las actividades de transformación ante el operador de red, actividades relacionadas e incorporadas al presupuesto general avalado por esta interventoría con la nueva prórroga, garantizando la ejecución del objeto contractual en los plazos otorgados. Las fechas que pueda suministrar el contratista permitirán igualmente a esta interventoría, realizar un control y verificación contra la actual reprogramación de obra; la información que necesaria para conocer el proceso de las gestiones del contratista CONSORCIO COLISEO 2021 en los plazos establecidos contractualmente para la correcta y oportuna terminación del proyecto</p> <p>6. Interventoría solicita se realicen pruebas complementarias a la red de apantallamiento, que se esta ejecutando en obra. Igualmente se solicita todas las fichas técnicas de los materiales, antes del suministro e instalación en la obra correspondientes a los componentes electricos, hidrosanitarios, de acabados, etc.</p> <p>7. El 4 de diciembre de 2023, la interventoría mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-234 ,con numero de radicado ante Ministerio del Deporte 2023ER0034840 se recomienda a la entidad contratante del CONSORCIO COLISEO 2021 ,como ordenadora del gasto, la aplicacion por segunda ocasión de la clausula decima quinta multas al contrato de obra dado el presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales .</p> <p>8. El día 13 de diciembre de 2023, conjuntamente entre el contratista de obra y el MUNICIPIO DE LA VIRGINIA RISARALDA este ultimo como ordenador del gasto, formalizaron el acta de suspensión No. 5 del contrato de obra a partir del 13 de diciembre de 2023 hasta el 14 de febrero de 2024, posteriormente se amplió dicha suspensión hasta el 20 de mayo, tiempo en el cual, se dió el reinicio No. 4 de obra.</p> <p>9. El día 14 de diciembre de 2023 interventoría mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-239 ,con numero de radicado ante ministerio del deporte 2023ER0035562 ,se recomienda a la entidad contratante Ministerio del Deporte suspender el contrato de interventoría dado que las obras se suspendieron desde el día 13 de diciembre de 2023 ,a partir del 14 de diciembre de 2023 y hasta el 14 de febrero del 2024 .</p> <p>10. El día 18 de diciembre de 2023 se suscribio por las partes interventoría y ministerio del deporte acta de suspension No 5 del contrato de interventoría a partir del 18 de diciembre de 2023 hasta el próximo 17 de febrero de 2024, es de aclarar que las actividades en obra cesaron por suspension el día 13 de diciembre de 2023 fecha hasta la cual se cuantificaron cantidades y de las cuales, se registran el presente informe semanal.</p> <p>11. El día 18 de diciembre de 2023 interventoría mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-240 ,con numero de radicado ante ministerio del deporte 2023ER0035831 ,se remitió al Municipio de la Virginia como ordenador del gasto y Contratante del Consorcio Coliseo 2021, la Solicitud de Gestiones ,Alerta y postura a razon de la nueva suspension del Contrato de Obra.</p> <p>12. El día 18 de diciembre de 2023 interventoría mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-241 ,con numero de radicado ante ministerio del deporte 2023ER0035562 ,se remitió al Contratista de obra ESTADO E INVENTARIO DE LA OBRA POR ESPACIOS – RECOMENDACIONES Y PETICIONES DE INTERVENTORÍA A LA SUBSANACION DE ACTIVIDADES A CORTE DE SUSPENSIÓN N.5 DEL PASADO 13 DE DICIEMBRE DE 2023.</p> <p>13. El día 8 de febrero de 2024 interventoría mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-248 ,con numero de radicado ante ministerio del deporte 2024ER0003266 ,se recomienda a la entidad contratante Ministerio del Deporte prorrogar la suspension del contrato de interventoría dado que las causas que llevaron a la suspension del contrato deobra no habian sido subanadas ,la prorroga se solicito por un mes.</p> <p>14. El día 8 de febrero de 2024 interventoría mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-249 ,con numero de radicado ante ministerio del deporte 2024ER0004092 ,se notifico a la entidad contratante Ministerio del Deporte el cambio de de la cuenta bancaria para pagos del contrato de interventoría.</p> <p>15. El día 19 de febrero de 2024 interventoría mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-251 ,con numero de radicado ante ministerio del deporte 2024ER0004092 ,se solicito a la entidad contratante Ministerio del Deporte ADICIÓN No. 05 y PRÓRROGA No. 06 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA .</p> <p>16. El día 11 de marzo de 2024 interventoría mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-252 ,con numero de radicado ante ministerio del deporte 2024ER0004822 ,se recomienda a la entidad contratante Ministerio del Deporte prorrogar por segunda ocaocion la suspension del contrato de interventoría dado que las causas que llevaron a la suspension del contrato deobra no habian sido subanadas ,la prorroga se solicito por un mes.</p> <p>17. El día 14 de marzo de 2024 interventoría mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-253 ,con numero de radicado ante ministerio del deporte 2023ER0007317 ,se remitió al Municipio de la Virginia como ordenador del gasto y Contratante del Consorcio Coliseo 2021, la RECOMENDACIÓN DE INTERVENTORÍA AL PRESUPUESTO ELECTRICO - NECESIDAD DEL TRANSFORMADOR COMO CUENTA UNICA PARA EL COLISEO MUNICIPIO LA VIRGINIA – PRONUNCIAMIENTO FINAL.</p> <p>18. El día 26 de marzo de 2024 interventoría mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-254 ,con numero de radicado ante ministerio del deporte 2024ER0009379 ,se remitió al municipio de la Virginia Risaralda recomendación de prorroga No.4 para terminación del proyecto –al Contrato de obra 004 de 2021.</p> <p>19. El día 5 de abril de 2024 interventoría mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-255 ,con numero de radicado ante ministerio del deporte 2023ER0009378 ,se remitió al Municipio de la Virginia como ordenador del gasto y Contratante del Consorcio Coliseo 2021, la RESPUESTA A COMUNICADO DEL 4 DE ABRIL DE 2024 Y CORREO DEL 5 DE ABRIL DE 2024 CON ASUNTO "SOLICITUD CONCEPTO DEFINITIVO OFICIO NO. CLV-161-2024-CONTRATISTA DE OBRA</p> <p>20. El día 9 de abril de 2024 interventoría mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-256 ,con numero de radicado ante ministerio del deporte 2024ER0009579 ,se recomienda a la entidad contratante Ministerio del Deporte prorrogar por tercera ocaocion la suspension del contrato de interventoría dado que las causas que llevaron a la suspension del contrato deobra no habian sido subanadas ,la prorroga se solicito por un mes, a partir del 17 de abril de 204 y hasta el 17de mayo de 2024.</p> <p>21. El día 9 de mayo de 2024 interventoría mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-258 ,con numero de radicado ante ministerio del deporte 2024ER0012761 ,se remite a la entidad contratante Ministerio del Deporte alcance a comunicado CLV-251 SOLICITUD DE ADICIÓN No. 05 y PRÓRROGA No. 06 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA .</p> <p>22. Se da el reinicio del contrato de interventoría el día 18 de mayo de 2024 y el contrato de obra el día 20 de mayo de 2024 con nuevas fechas de terminacion el 18 de julio de 2024 y 25 de julio de 2024 respectivamente,</p> <p>23. Se otorgó a la Interventoría por parte del Ministerio del Deporte la modificación No. 8 correspondiente a la Ampliación del plazo de Interventoría por (2) meses y una adición presupuestal de \$54.444.245 . Periodo actualizado de terminación para el contrato de interventoría el 18 de julio de 2024.</p> <p>24. El día 20 de mayo de 2024 interventoría mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-259 ,con numero de radicado ante ministerio del deporte 2024ER0009579 ,2024ER003756 ,se remite a la entidad contratante Ministerio del deporte la formalizacion de los informes semanales de interventoría 51,52,53 y 54.</p> <p>25. El 21 de mayo del 2024, el municipio de la Virginia otorgó modificación de Adición N°3: \$46'699.894, correspondiente a obras eléctricas complementarias (Instalación de transformador)</p> <p>26. El 20 de mayo del 2024, el Municipio de la Virginia, realizó el reinicio No. 4 del proyecto, adicionalmente, se aumentó el plazo del proyecto por dos (02) meses, teniendo como nueva fecha de finalización del contrato de obra el próximo 25 de julio del 2024.</p> <p>27. El día 22 de mayo de 2024 interventoría mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-261 ,con numero de radicado ante ministerio del deporte 2024ER0014056 ,se solicita a el Contratista de Obra Consorcio Coliseo 2021 SOLICITUD DE AJUSTE A REPROGRAMACION SEGÚN REINICIO DE FECHA 18 DE MAYO 2024 AJUSTADO A PRORROGA No. 4 Y SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE POLIZAS CON RESPECTO A LAS NOVEDADES SUSCRITAS DESDES LA SUSPENSIÓN No. 5 DEL CONTRATO DE OBRA EFECTUADA EL PASADO 13 DE DICIEMBRE DE 2023.</p> <p>28. Así mismo, mediante los diferentes comunicados de interventoría No. CLV-MINDEPORTE-2021-182 del pasado 13 de junio de 2023, con copia al MINDEPORTE mediante radicado 2023ER0015243 del pasado 15 de junio de 2023; comunicado de interventoría No. CLV-MINDEPORTE-2021-263 del pasado 24 de mayo de 2024, con copia al MINDEPORTE mediante radicado 2024ER0014455 del pasado 28 de mayo de 2024, se ha solicitado y reiterado al contratista se presenten:</p> <p>29. El día 28 de mayo de 2024 interventoría mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-262, con numero de radicado ante ministerio del deporte 2024ER0014553, se remitió a el Municipio de La Virginia REMISIÓN REPROGRAMACIÓN No. 5 - FLUJO DE INVERSIÓN CONTRA ADICIÓN No. 2 Y PRORROGA No. 4 DEL CONTRATO DE OBRA No. 004-2021 – CONCEPTO DE INTERVENTORÍA,</p>	

30.El día 28 de mayo de 2024 intervectoria mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-263,con numero de radicado ante ministerio del deporte 2024ER0014555,se solicito a el Contratista de obra CONSORCIO COLISEO 2021 SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE COMPRAS, PRESENTACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS Y PRUEBAS DE CALIDAD PARA EL PROYECTO SEGÚN REPROGRAMACIÓN DE OBRA No. 5
31.El día 9 de junio de 2024 intervectoria mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-264,con numero de radicado ante ministerio del deporte 2024ER0015672,se remito a el Contratista de obra CONSORCIO COLISEO 2021 ESTADO E INVENTARIO DE LA OBRA, SOLICITUD DE VICULACION DE PERSONAL – RECOMENDACIONES Y PETICIONES DE INTERVENTORIA A LA SUBSANACION DE ACTIVIDADES A CORTE DEL REINICIO NO. 4 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2024,
32.El día 9 de junio de 2024 intervectoria mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-265,con numero de radicado ante ministerio del deporte 2024ER0015673,se remito a el Contratista de obra CONSORCIO COLISEO 2021 RESPUESTA A SUS COMUNICADOS No. CLV-0208 y CLV-0209 DE FECHAS 28 Y 29 DE MAYO DE 2024, RESPECTO A LA RESPUESTA AL COMUNICADO DE INTERVENTORIA No. CLV-MINDEPORTE-2021-263.
33.El día 14 de junio de 2024 intervectoria mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-266,con numero de radicado ante ministerio del deporte 2024ER001696,se remito a el Municipio de La virginia Risaralda ALCANCE AL CONCEPTO DE INTERVENTORIA RESPECTO DEL COMUNICADO No. CLV-MINDEPORTE-2021-262 REMISIÓN DE LA REPROGRAMACIÓN No. 5 - FLUJO DE INVERSIÓN CONTRA ADICIÓN No. 2 Y PRORROGA No. 4 DEL CONTRATO DE OBRA No. 004-2021...todo esto teniendo en cuenta el alcance de la reprogramacion presentada por el Contratista de Obra del día 12 de junio de 2024 ,donde se incluyen los Nps actividades justificacion de la prorruga del contrato de obra hasta el 25 de julio de 2024.
34.El día 21 de junio de 2024 intervectoria mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-268,con numero de radicado ante ministerio del deporte 2024ER0017416,se remito a elMinisterio del Deporte la FORMALIZACION EN LA REMSION DE INFORMES SEMNALES SEMANALES 56 Y 57 DE INTERVENTORIA DESPUES DEL REINCIO DE OBRA EFECTUADO EL 20 DE MAYO DE 2024.
35.El día 21 de junio de 2024 intervectoria mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-269,con numero de radicado ante ministerio del deporte 2024ER0017415,se remito a elMinisterio del Deporte la FORMALIZACION EN LA REMSION DE INFORMES SEMNAL SEMANAL 58 DE INTERVENTORIA DESPUES DEL REINCIO DE OBRA EFECTUADO EL 20 DE MAYO DE 2024.
36.El día 24 de junio de 2024 intervectoria mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-270 ,con numero de radicado ante ministerio del deporte 2024ER0017725,se remito a el CONSORCIO COLISEO 2021 ALERTA POR ATRASO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA, LLAMADO AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y DE COMPROMISOS, SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 004-2021...esto teniendo en cuenta los atrasos presentados en la obras que a la fecha contaban con un -1,43 %
37.El día 25 de junio de 2024 intervectoria mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-272 ,con numero de radicado ante ministerio del deporte 2024ER0017803,se remito a elMUNICIPIO DE LA VIRGINIA como ordenador del gasto ALERTA POR ATRASO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA, LLAMADO AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y DE COMPROMISOS, SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 004-2021
38.El día 27 de junio de 2024 intervectoria mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-273,con numero de radicado ante ministerio del deporte 2024ER0018346,se remito a elMinisterio del Deporte comunicado la SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL ACTUAL PROCESO DEL CONTRATO DE OBRA DE LA REFERENCIA, esto teniendo en cuenta los atrasos presentados en las obras .
39..El día 27 de junio de 2024 intervectoria mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-274 ,con numero de radicado ante ministerio del deporte 2024ER0018174,se remito a elMinisterio del Deporte comunicado la REMSION DE HOJA DE VIDA DEL NUEVO PROFESIONAL SST DE INTERVENTORIA PARA APROBACION,dado que el profesional que venia desempeñando sus funciones renuncio.
40.El día 28 de junio de 2024 intervectoria mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-277 ,con numero de radicado ante ministerio del deporte 2024ER0018345,se remito a el CONSORCIO COLISEO 2021 la SOLICITUD INFORME MENSUAL DE OBRA DESPUES DEL REINICIO No. 4 DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20 DE MAYO 2024 Y EL 20 DE JUNIO DE 2024, solicitud que a la fecha de la entrega de este informe semanal no ha sido subsanada.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en (Lugar), a los

TRECE	(13)	días del mes de	ENERO	de	2025
(Día en letras)	(Día en números)		(Mes)		(Año)

Original:

Mindeporte

1era copia :


Interventor

2da copia :

Supervisor Ente Territorial

INTERVENTORIA O CONSULTORIA:

Firma:



Nombre: DIANA MILENA PÉREZ CUEVAS

Cargo: DIRECTORA DE INTERVENTORIA

ARO, ALEXANDER MOLINA

Vo.Ba. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Elaboró: Grupo de Trabajo de la Interventoría
