




VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA TRÁMITE DE PAGOS DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS


CONTRATISTA	INGENIERIA R Y D SAS		
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	901.499.915-4		
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA CUENTA	24 de febrero de 2025		
PERIODO DE PAGO	21 de enero a 20 de febrero de 2025		
VALOR PARA PAGAR	Ciento cincuenta millones novecientos treinta y siete mil setecientos noventa y cinco pesos (\$150.937.795=) MCTE.		
SUPERVISOR	OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO		
CARGO DEL SUPERVISOR	Jefe Oficina Asesora de Planeación		
NÚMERO DE CONTRATO	SAMC 003 de 2024		
TIPO DE CONTRATO	Contrato de obra publica		
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS DE SANTA MARTA Y SANTA BARBARADEL MUNICIPIO DE MATANZA, SANTANDER"		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS (\$356.890.619,00) MCTE.		
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	TRES (3) MESES		
DOCUMENTOS ADJUNTOS	PRESENTA	NO PRESENTA	NO APLICA
Certificado de verificación del pago de salud, pensión y ARL	X		
Informe del contratista	X		
Informe de supervisión	X		
Acta de ejecución número 01	X		
Acta de pago parcial número 01	X		
Acta de terminación			X
Acta de liquidación			X
Certificado de RETEFUENTE			X
Cuenta de cobro y/o factura	X		
Estampilla	X		
OBSERVACIONES	 CONTRATISTA		



ALCALDÍA DE MATANZA

SECRETARÍA GENERAL
Y DE GOBIERNO

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA PAGOS

OBSERVACIONES	Vo Bo  SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO
OBSERVACIONES	Vo Bo TESORERÍA
OBSERVACIONES	Vo Bo COPIA ORIGINAL ENTREGADA PARA EXPEDIENTE CONTRACTUAL



INGENIERIA RYD S.A.S

Bucaramanga, 24 de febrero de 2025

Señores:

MUNICIPIO DE MATANZA

Matanza, Santander.

REFERENCIA: Contrato de obra No. 003 de 2025 cuyo objeto es la "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias mediante la construcción de placa huellas en las veredas de Santa Marta y Santa Barbaradel Municipio de Matanza, Santander"

Respetados señores:

SAILY YESENIA AGUILAR APARICIO, identificada con cédula de ciudadanía número 37.615.950, de Piedecuesta – Santander, en mi condición de **Revisor Fiscal** de INGENIERÍA RYD SAS, con NIT 901.499.915-4 CERTIFICO que los aportes a la seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), fueron pagadas por la compañía durante el tiempo de ejecución del contrato de la referencia a la fecha.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuestos en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, del inciso segundo del artículo 41 de la ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Así mismo, certifico que la INGENIERÍA RYD SAS, acogiendo a la ley 1819 de 2016, por dar cumplimiento a los requisitos expuestos en ella, está exonerada de realizar el pago de aportes parafiscales en cuanto al instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Dada en Bucaramanga, a los veinticuatro (24) días del mes de febrero de 2025.

SAILY YESENIA AGUILAR APARICIO

C.C. 37.615.950 de Piedecuesta

REVISOR FISCAL

T.P. 225421-T

CALLE 35 # 17 -77 EDIFICIO BANCOQUIA – BUCARAMANGA

TELEFONO: 3105394780

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

225421-T

SAILY YESENIA AGUILAR APARICIO
C.C. 37615950
RES. INSCRIPCION 116 DEL 10/02/2017
CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y DESARROLLO





OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

229397 241794

Identificación Plástica S.A. 170014/0117


República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **37.615.950**

AGUILAR APARICIO

APELLIDOS

SAILY YESENIA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-SEP-1980**

PIEDECUESTA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.55
ESTATURA

B+
G.S. RH

F
SEXO

28-OCT-1998 **PIEDECUESTA**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-2708200-00778926-F-0037615950-20151222

0047821240A 1

7183673409

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 6 B B D 0 4 8 F 0 B 3 0 3 A 4


LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **SAILY YESENIA AGUILAR APARICIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37615950 de PIEDECUESTA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 225421-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Diciembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
MIT 901499915	4	INGENIERIA RYD SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MATANZA	VEREDA SANTA BARBARA	MATANZA-SANTANDER	3115111438	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2025-02	9481956302	E	2025/03/06	2025/02/21	\$1,743,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
			ing	ret	tdc	tas	tdp	esp	vsp	con	vsr	sin	lpe	lun	vac	avp	lct	lrf	vfp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
1	CC	91211286	HERNANDEZ RIOS LUIS ALONSO															25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	E95010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF462	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	SI	\$440,900
2	CC	109867117	URIBE MARQUEZ EDGAR MARIICO															230301	30	\$1,423,500	\$227,800	E95010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF462	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	SI	\$440,900
3	CC	91224464	URIBE URIBE JORGE															25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	E95017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF462	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	SI	\$440,900
4	CC	107360784	VELAZQUEZ PEREZ JORGE ELIECER															230201	30	\$1,423,500	\$227,800	E95037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF462	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	SI	\$440,900
Total	Afiliados(4)																			\$5,694,000	\$911,200			\$5,694,000	\$228,000			\$5,694,000	\$396,400			\$5,694,000	\$396,400			\$5,694,000	\$396,400	SI	\$1,743,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 90149915	4	INGENIERIA RYD SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MATANZA	VEREDA SANTA BARBARA	MATANZA-SANTANDER	3115111638	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2025-02	9481936302	E	2025/03/04	2025/02/21	0	\$1,763,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)								
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$911,200	\$0	\$0	\$911,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$455,600	\$0	\$0	\$455,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	\$396,400	\$0	\$0	\$396,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	4	\$228,000	\$0	\$0	\$228,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)								
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,068,702	2	4	\$228,000	\$0	\$0	\$228,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
TOTAL				4	\$1,763,600	\$0	\$0	\$1,763,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901499915	4	INGENIERIA RYD SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MANTANZA	VEREDA SANTA BARBARA	MATANZA-SANTANDER	3115111638	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2025-02	1283237905	948195453	E	2025/02/06	2025/02/21	BANCO DAVIVIENDA	15	\$594,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)								
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$304,000	\$3,200	\$0	\$307,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$152,000	\$1,600	\$0	\$153,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$76,000	\$800	\$0	\$76,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	\$132,400	\$1,400	\$0	\$133,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	4	\$76,000	\$800	\$0	\$76,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)								
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$76,000	\$800	\$0	\$76,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$38,000	\$400	\$0	\$38,400
TOTAL				4	\$588,400	\$6,200	\$0	\$594,600



INGENIERIA RYD S.A.S

INFORME DE OBRA N.º 01 ACTA DE RECIBO PARCIAL Y PAGO N.º 01

INFORMACION DEL CONTRATO

DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDIA DE MATANZA SANTANDER
No. DEL CONTRATO:	CONTRATO SAMC 003 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS DE SANTA MARTA Y SANTA BARBARADEL MUNICIPIO DE MATANZA, SANTANDER"
SUPERVISORA:	OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO, jefe Oficina Asesora de Planeación
CONTRATISTA:	INGENIERIA R Y D S.A.S – NIT. 901.499.915-4– R.L. YEIMY ALEXANDER VELASCO ANGARITA.
VALOR FISCAL:	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS (\$356.890.619,00) MCTE.
PLAZO DEL CONTRATO:	TRES (03) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO:	21 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	20 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE ELABORACIÓN:	24 DE FEBRERO DE 2025
INFORME DE OBRA No:	01
ELABORADO POR:	ING. RESIDENTE JAIME ANDRES PINZON ARDILA
REVISADO POR:	ING. OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO



INGENIERIA RYD S.A.S

1. GARANTIAS CONTRACTUALES

Las garantías contractuales del Contrato SAMC 003/2024 son las siguientes:

- Póliza Seguro de Cumplimiento Entidades Estatales N° B-100057467 expedida por SEGUROS MUNDIAL, el 15-01-2025.

AMPAROS	VALOR	VIGENCIA DESDE- HASTA
Cumplimiento	\$ 71.378.123,80=	21/01/2025 HASTA 21/10/2025
Salarios y Prestaciones Sociales	\$ 35.689.061,90=	21/01/2025 HASTA 21/04/2028
Estabilidad de la obra	\$ 107.067.185,70=	21/04/2025 HASTA 21/04/2030

- Póliza Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual N° B-100015576 expedida por SEGUROS MUNDIAL, el 15-01-2025.

AMPAROS	VALOR	VIGENCIA DESDE-HASTA
Predios, labores y operaciones	\$284.700.000,00=	10/12/2024 HASTA 10/02/2025

2. SEGURIDAD SOCIAL

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES PLANILLA MES DE ENERO APORTES EN LINEA N° 9481955653 Y PLANILLA MES DE FEBRERO APORTES EN LINEA N° 9481956302 ADJUNTO SOPORTE DE PAGO

	PERÍODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR
	MES-AÑO	AÑO-MES-DÍA	PAGADO
PENSIÓN	2025-01	2025-02-21	\$ 307.200,00
SALUD	2025-02	2025-02-21	\$ 133.800,00



INGENIERIA RYD S.A.S

RIESGOS PROFESIONALES	2025-01	2025-02-21	\$ 76.800,00
CAJA DE COMPENSACION	2025-01	2025-02-21	\$ 76.800,00

	PERÍODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
	MES-AÑO	AÑO-MES-DÍA	
PENSIÓN	2025-01	2025-02-07	\$ 694.000,00
SALUD	2025-02	2025-02-07	\$ 174.000,00
RIESGOS PROFESIONALES	2025-01	2025-02-07	\$ 302.600,00
CAJA DE COMPENSACION	2025-01	2025-02-07	\$ 174.000,00

	PERÍODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
	MES-AÑO	AÑO-MES-DÍA	
PENSIÓN	2025-02	2025-02-21	\$ 911.200,00
SALUD	2025-03	2025-02-21	\$ 396.400,00
RIESGOS PROFESIONALES	2025-02	2025-02-21	\$ 228.000,00
CAJA DE COMPENSACION	2025-02	2025-02-21	\$ 228.000,00


3. DESCRIPCION DEL PROYECTO.



INGENIERIA RYD S.A.S

En el desarrollo del objeto, el contratista se compromete con el municipio de Matanza Santander a realizar las obras planteadas en el presupuesto, cumpliendo cabalmente con las especificaciones planteadas y en las cantidades mínimas contratadas para el mejoramiento de las vías terciarias mediante la construcción de placa huellas en las veredas de santa marta y santa bárbara del municipio de Matanza, Santander.

LOCALIZACION

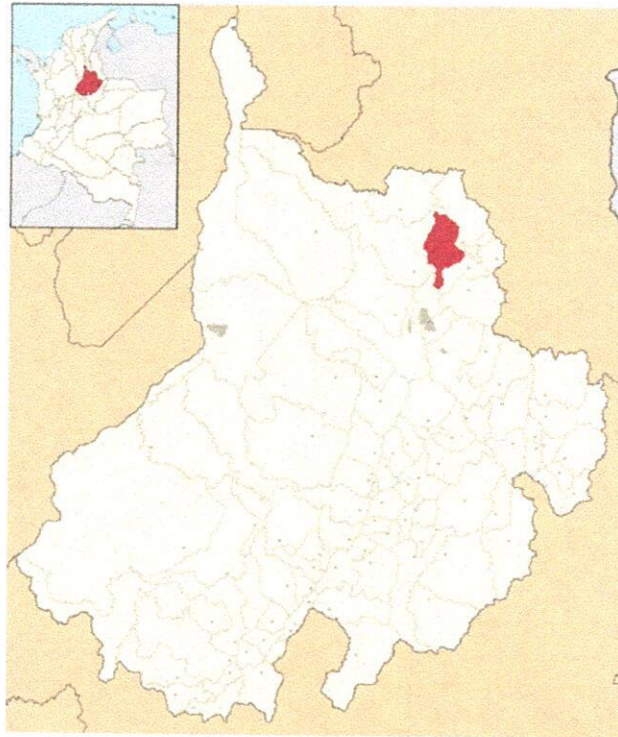

El objetivo del proyecto está establecido para ser ejecutado en el Municipio de Matanza Santander, seccionado en dos puntos de intervención ubicados la vereda Santa marta y la vereda santa bárbara área rural del Municipio.

ACTIVIDADES EJECUTADAS



INGENIERIA RYD S.A.S

EL proyecto cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias mediante la construcción de placa huellas en las veredas de Santa Marta y Santa Barbaradel Municipio de Matanza, Santander"; Tiene como actividades ejecutadas las siguientes:

CANTIDADES EJECUTADAS								
ACTA DE PAGO 01								
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
CAP.1		MOVIMIENTO DE TIERRAS						
	1.1		ART.210	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO	m3	410,00	\$61.255,00	\$25.114.550,00
	1.2		ART.220	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION	m3	0,00	\$47.893,00	\$-
	1.3		ART.210	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. INCLUYE TRANSPORTE	m3	443,00	\$66.025,00	\$29.249.075,00
Subtotal MOVIMIENTO DE TIERRAS								\$ 54.363.625,00
CAP.2		COMPONENTE DISEÑO ESTRUCTURA DE PLACA HUELLA						
	2.1		ART.320	MATERIAL TIPO SUB-BASE CLASE A DE ESPESOR 0,15. INCLUYE TRANSPORTE.	m3	121,125	\$235.569,00	\$28.533.295,00
	2.2		ART.500	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA ESTRUCTURAS DE PLACA HUELLA	m3	24,864	\$934.840,00	\$23.243.862,00
	2.3		ART.640	ACERO DE REFUERZO DE 4200 MPA PARA PLACAS, VIGAS, CUNETAS Y BORDILLOS.	kg	3291,32	\$11.246,00	\$37.014.128,00
	2.4		ART.500	CONCRETO TIPO CICLOPEO DE 3.000 PSI. PORCENTAJE DE PIEDRA PEGADA DE 40% Y DE CONCRETO 60%	m3	9,88	\$787.582,00	\$7.782.885,00
Subtotal COMPONENTE DISEÑO ESTRUCTURA DE PLACA HUELLA								\$ 96.574.170,00
SUBTOTAL OBRAS							\$	150.937.795,00
PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (P.M.T)								
PRESUPUESTO PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL (P.A.G.A)								
VALOR TOTAL							\$	150.937.795,00



4. ALCANCE DEL PROYECTO.

El alcance del contrato contempla la construcción de dos tramos de placa huellas; tramo Vereda Santa Barbara con una longitud de ochenta (80) metros lineales y un ancho total de cuatro (4) metros con veinticinco (25) centímetros desagregada de la siguiente manera, dos cintas cada una de noventa (90) cm de ancho por quince (15) centímetros de espesor, centro con ciclópeo de noventa (90) cm de ancho y quince (15) centímetros de espesor, vigas transversales cada tres (3) metros de veinte (20) ancho por una altura de veinticinco (25) centímetros cuneta en V de 85 cm de ancho y 15 cm de espesor a un costado y al otro costado cuneta en L con un ancho de 55 cm y espesor de 15 cm, un bordillo de 15 cm de ancho. Tramo Vereda Santa Marta con una longitud de ciento treinta (130) metros lineales y un ancho total de cuatro (4) metros con veinticinco (25) centímetros desagregada de la siguiente manera, dos cintas cada una de noventa (90) cm de ancho por quince (15) centímetros de espesor, centro con ciclópeo de noventa (90) cm de ancho y quince (15) centímetros de espesor, vigas transversales cada tres (3) metros de veinte (20) ancho por una altura de veinticinco (25) centímetros cuneta en V de 85 cm de ancho y 15 cm de espesor a un costado y al otro costado cuneta en L con un ancho de 55 cm y espesor de 15 cm, un bordillo de 15 cm de ancho, mejorando la calidad de las vías terciarias del municipio de matanza Santander.

a) Periodo

El actual reporte de la obra ejecutada corresponde desde el día veintiuno (21) de enero hasta el día veinte (20) de febrero del año 2025.

b) Recursos Dispuestos.

Los recursos provistos para la ejecución del presente proyecto se establecieron de la siguiente manera:

- **Humano:** con un personal conformado por:

Personal	Cantidad
Director de obra	1
Residente de obra	1
Profesional en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	1
Maestro de obra	1
Auxiliar de obra	4



INGENIERIA RYD S.A.S

- **Equipos**


EQUIPO	CANTIDAD	TIPO O CAPACIDAD
Retrocargador (Pajarita)	1	420D
Volqueta sencilla	1	8 m3
Minicargador	1	S175
Compactador manual	1	Diesel

- b) **Sistema de seguridad social e industrial:** La empresa INGENIERIA RYD SAS realiza la entrega de elementos de protección personal (botas, cascos, gafas, guantes, tapa oídos, pantalones, entre otros); elementos de **bioseguridad** como (tabocas, gel antibacterial, guantes, toallas de papel, jabón líquido, alcohol.) además, se presta el acompañamiento diario con personal capacitado perteneciente a la empresa contratista; con reportes diarios de encuestas de síntomas de salud con toma de temperatura al ingresar a la obra, con charlas que permitan disminuir la probabilidad de accidentes en el trabajo y de prevención de la pandemia del Covid-19.

Salud: Se realizó el pago mensual mediante PLANILLA ASOPAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL No. 9481955653, No 9481956302 y No. 9481457670.

- ✚ **Pensión:** Se realizó el pago mensual mediante PLANILLA ASOPAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL No. 9481955653, No 9481956302 y No. 9481457670.
- ✚ **Administradora de riesgos profesionales:** Los riesgos laborales están a cargo de ARL COLSANITAS. No 9481955653, No 9481956302 y No. 9481457670.
- ✚ **Caja de compensación familiar:** La caja de compensación familiar vinculada es Comfenalco. No 9481955653, No 9481956302 y No. 9481457670.


- c) **Actividades Realizadas:** Cantidades de obra en anexo 01 de pago 01 y REGISTRO FOTOGRAFICO

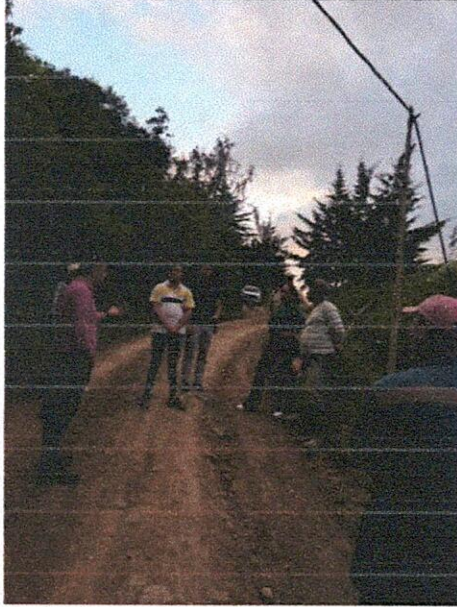

Socialización de inicio de actividades.



Socialización de inicio de actividades.

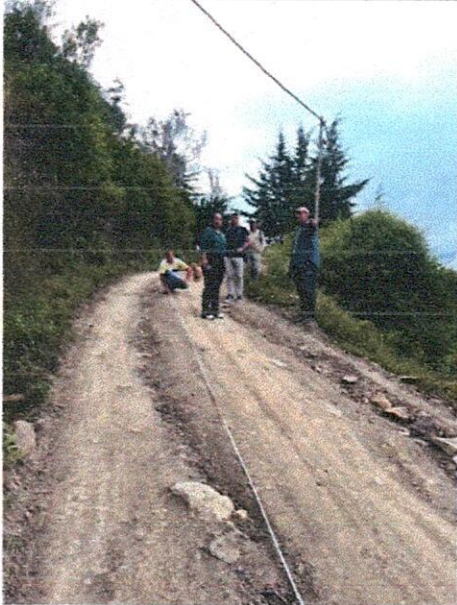

Socialización de inicio de actividades.




Socialización de inicio de actividades.



INGENIERIA RYD S.A.S



Socialización de inicio de actividades.

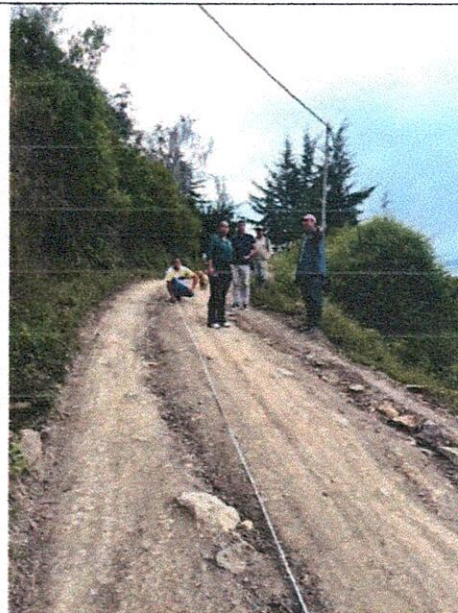

Socialización de inicio de actividades.




Excavaciones varias en material común.




Excavaciones varias en material común.



INGENIERIA RYD S.A.S

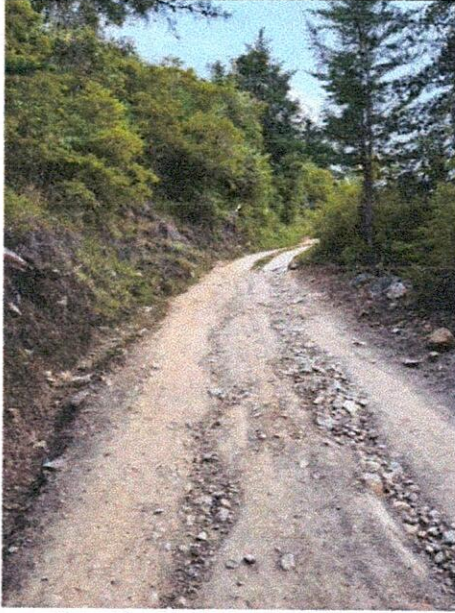

Excavaciones varias en material común.

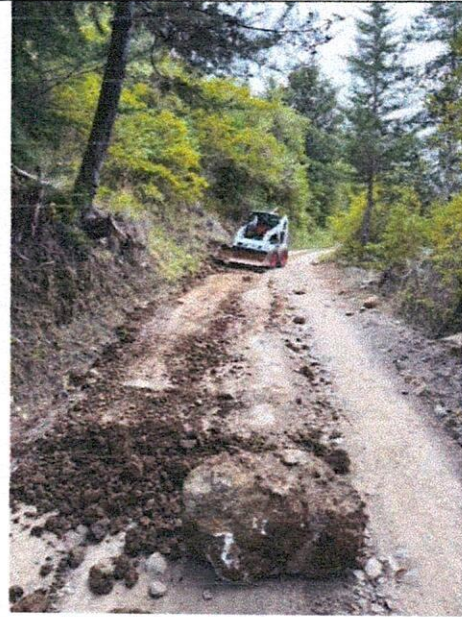

Excavaciones varias en material común.



Excavaciones varias en material común.




Excavaciones varias en material común.



INGENIERIA RYD S.A.S




Excavaciones varias en material común.

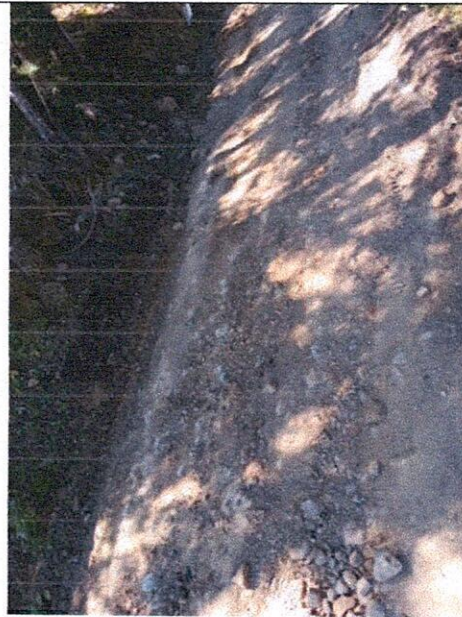


Excavaciones varias en material común.




Excavaciones varias en material común.

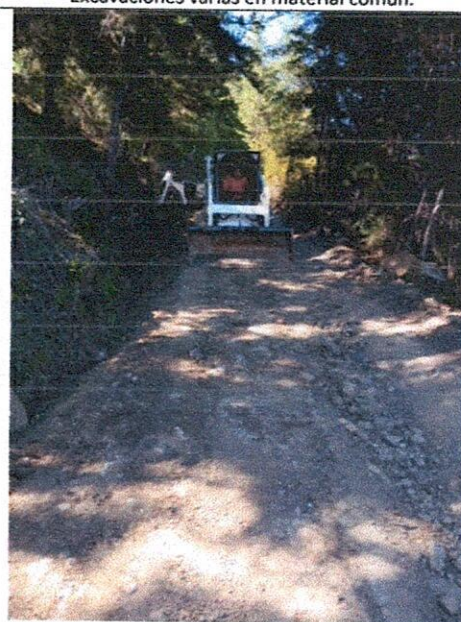


Excavaciones varias en material común.

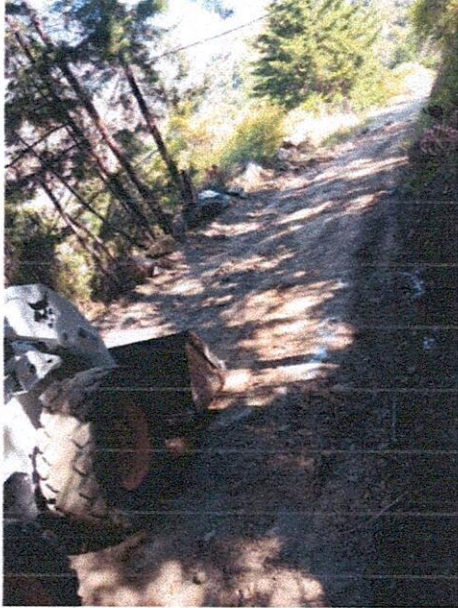


Excavaciones varias en material común.

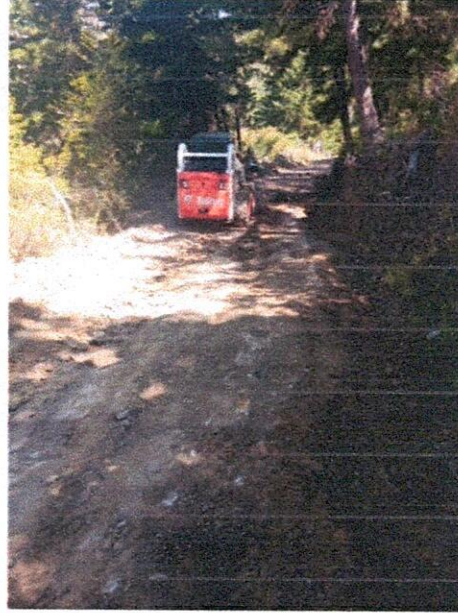


Excavaciones varias en material común.

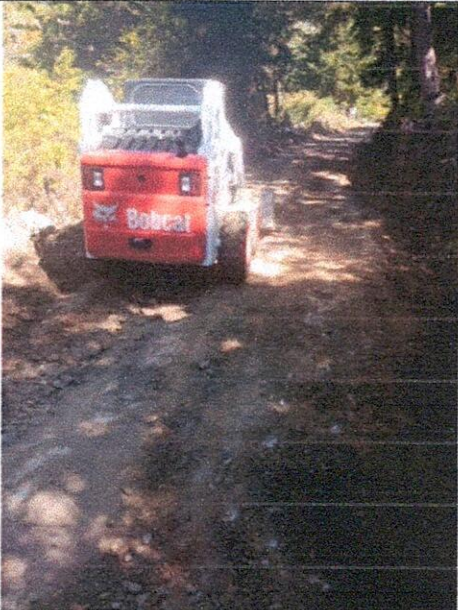

Excavaciones varias en material común.

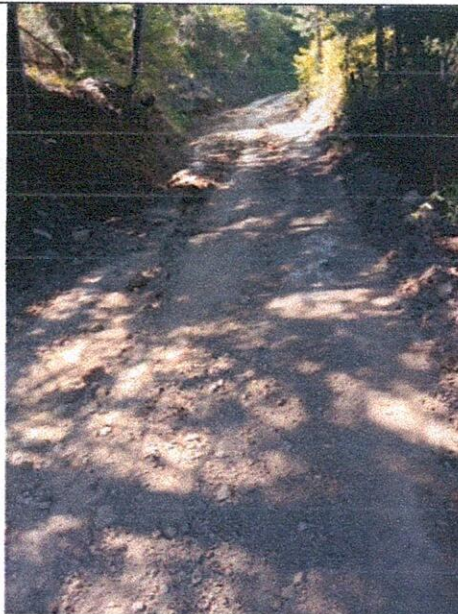


Excavaciones varias en material común.

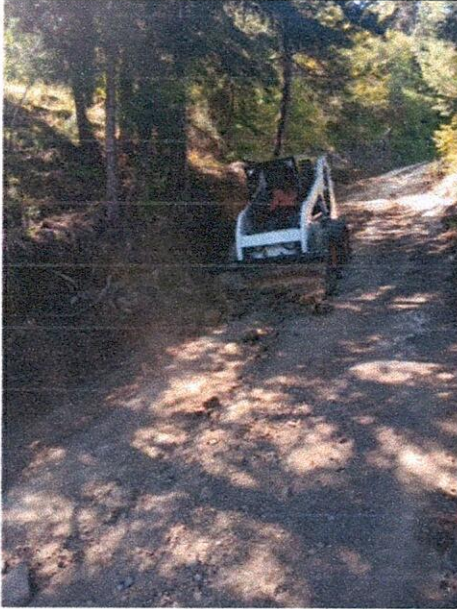

Excavaciones varias en material común.



Excavaciones varias en material común.

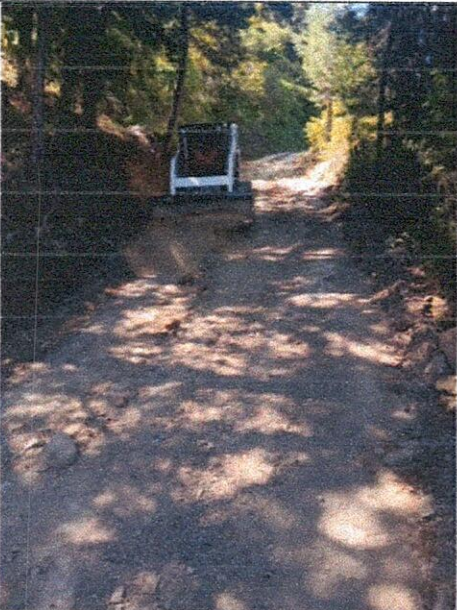

Excavaciones varias en material común.




Excavaciones varias en material común.



INGENIERIA RYD S.A.S



Excavaciones varias en material común.

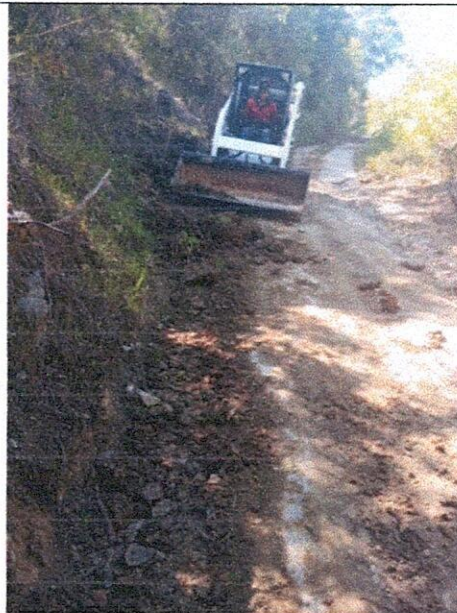

Excavaciones varias en material común.




Replanteo y excavaciones varias en material común.




Replanteo y excavaciones varias en material común.




INGENIERIA RYD S.A.S

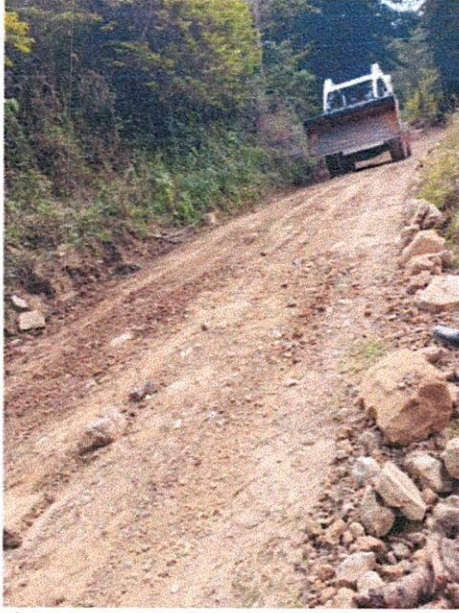


Replanteo y excavaciones varias en material común.

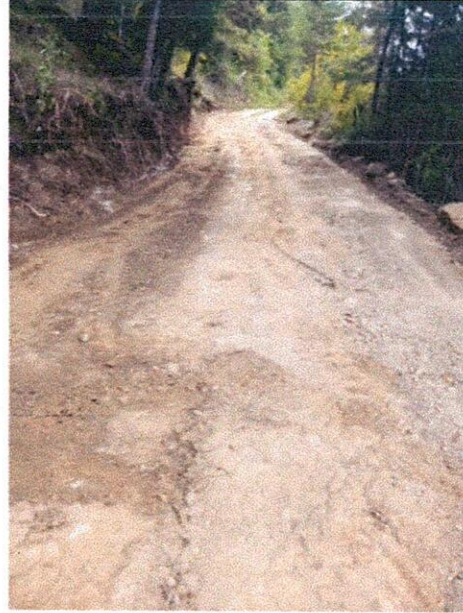

Replanteo y excavaciones varias en material común.

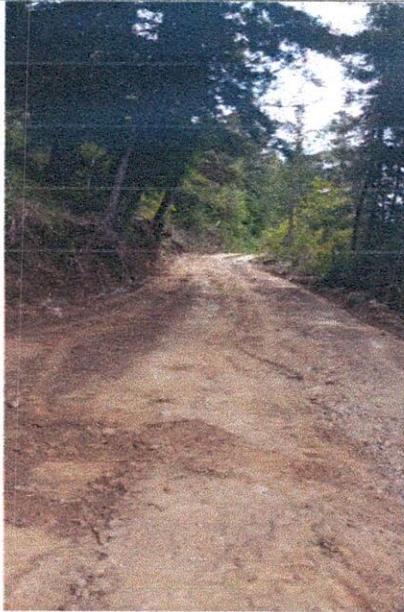

Replanteo y excavaciones varias en material común.

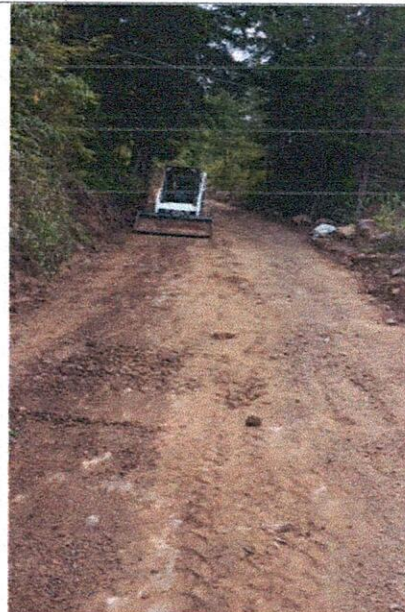

Replanteo y excavaciones varias en material común.




INGENIERIA RYD S.A.S



Replanteo y excavaciones varias en material común.



Replanteo y excavaciones varias en material común.

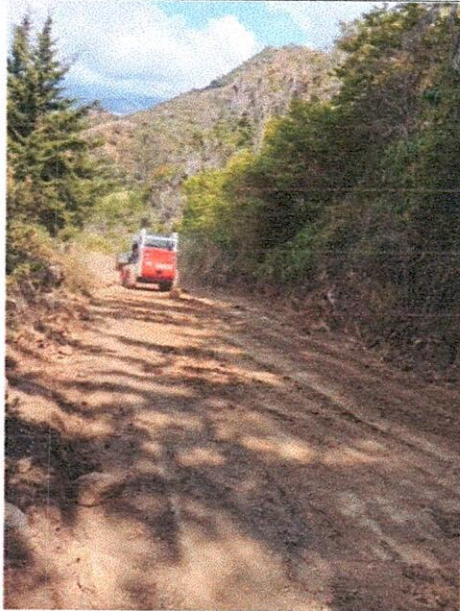

Replanteo y excavaciones varias en material común.



Excavaciones varias en material común.




INGENIERIA RYD S.A.S



Excavaciones varias en material común.



Excavaciones varias en material común.

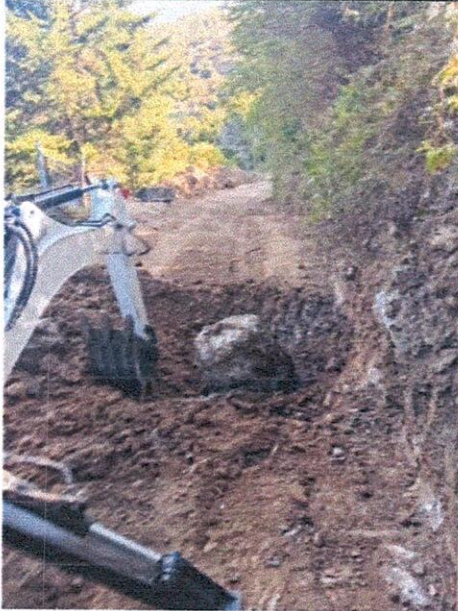

Replanteo y excavaciones varias en material común.



Excavaciones varias en material común.




INGENIERIA RYD S.A.S




Excavaciones varias en material común.



Excavaciones varias en material común.

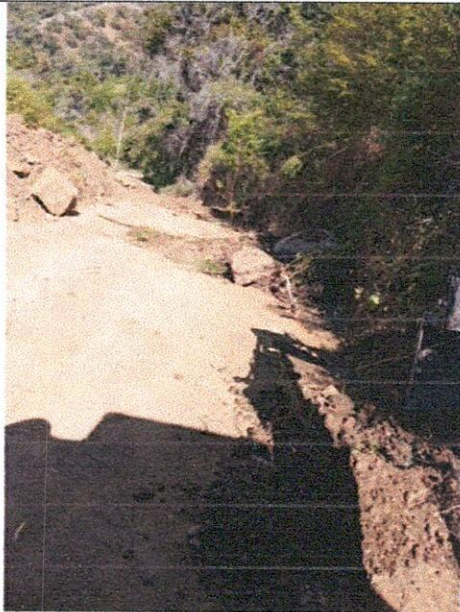

Excavaciones varias en material común.

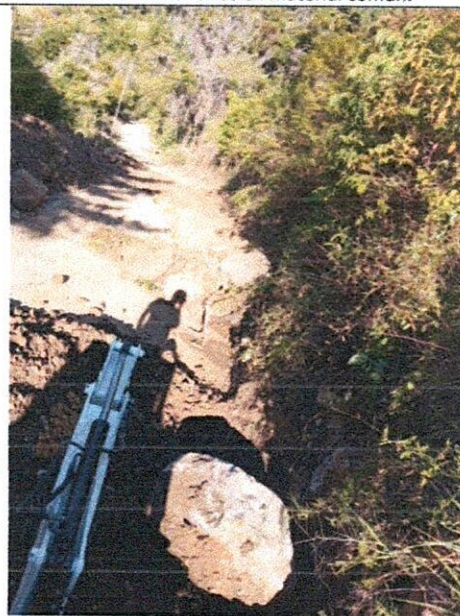


Excavaciones varias en material común.



Excavaciones varias en material común.



Excavaciones varias en material común.

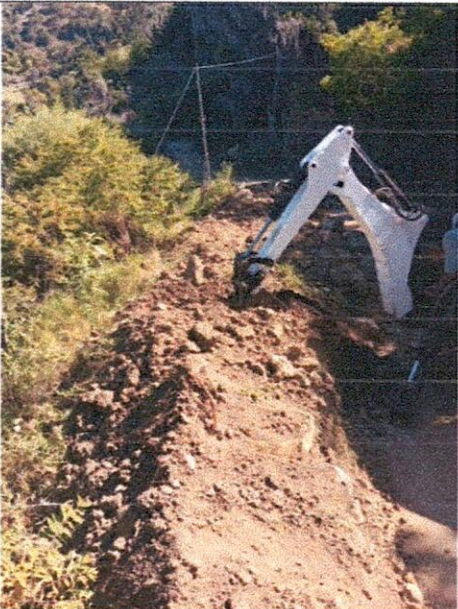


Excavaciones varias en material común.



Excavaciones varias en material común.



INGENIERIA RYD S.A.S

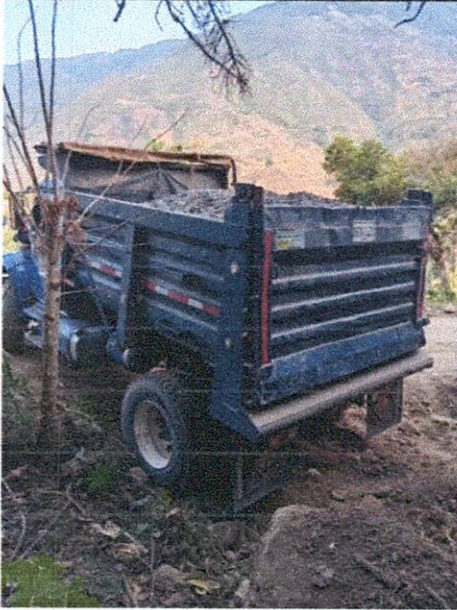

Retiro de material sobrante producto de las excavaciones.
Incluye transporte



Retiro de material sobrante producto de las excavaciones.
Incluye transporte



Retiro de material sobrante producto de las excavaciones.
Incluye transporte



Material tipo sub-base clase a de espesor 0,15. Incluye transporte.



INGENIERIA RYD S.A.S




Material tipo sub-base clase a de espesor 0,15. Incluye transporte.



Material tipo sub-base clase a de espesor 0,15. Incluye transporte.



Material tipo sub-base clase a de espesor 0,15. Incluye transporte.

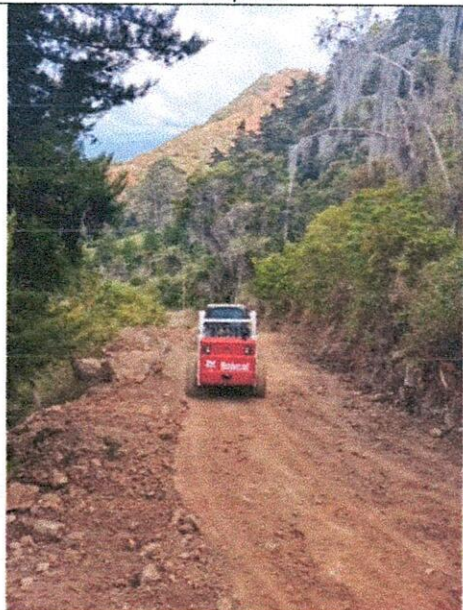

Replanteo y excavaciones varias en material común.




INGENIERIA RYD S.A.S




Retiro de material sobrante producto de las excavaciones.
Incluye transporte



Retiro de material sobrante producto de las excavaciones.
Incluye transporte

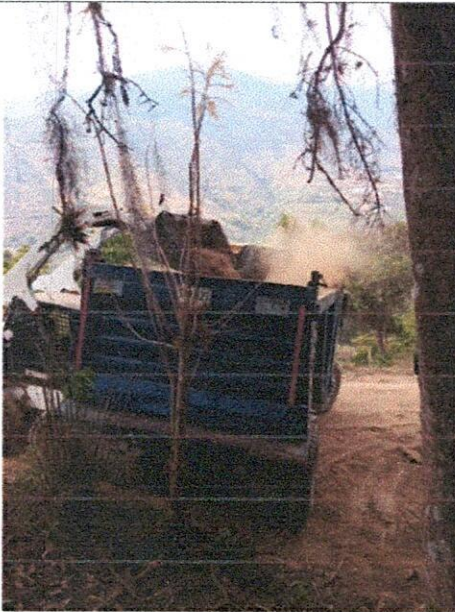

Retiro de material sobrante producto de las excavaciones.
Incluye transporte

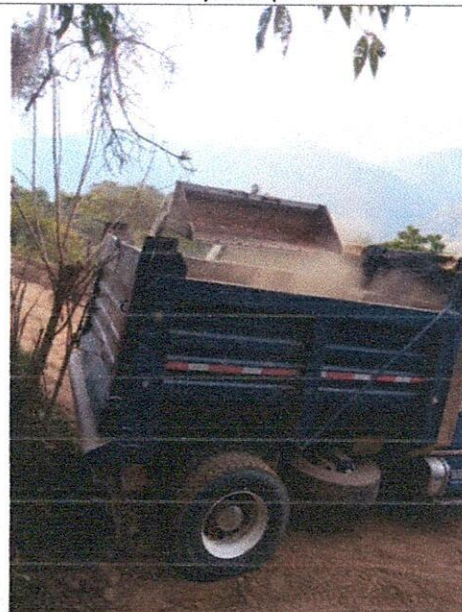

Retiro de material sobrante producto de las excavaciones.
Incluye transporte



INGENIERIA RYD S.A.S



Retiro de material sobrante producto de las excavaciones.
Incluye transporte



Retiro de material sobrante producto de las excavaciones.
Incluye transporte



Retiro de material sobrante producto de las excavaciones.
Incluye transporte



Retiro de material sobrante producto de las excavaciones.
Incluye transporte



INGENIERIA RYD S.A.S




Retiro de material sobrante producto de las excavaciones.
Incluye transporte




Retiro de material sobrante producto de las excavaciones.
Incluye transporte



Retiro de material sobrante producto de las excavaciones.
Incluye transporte

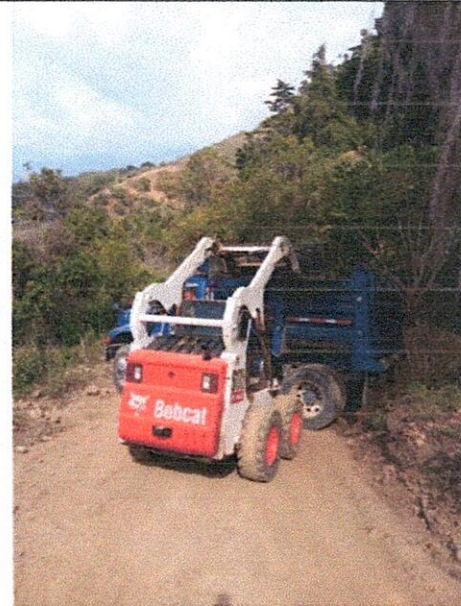


Retiro de material sobrante producto de las excavaciones.
Incluye transporte

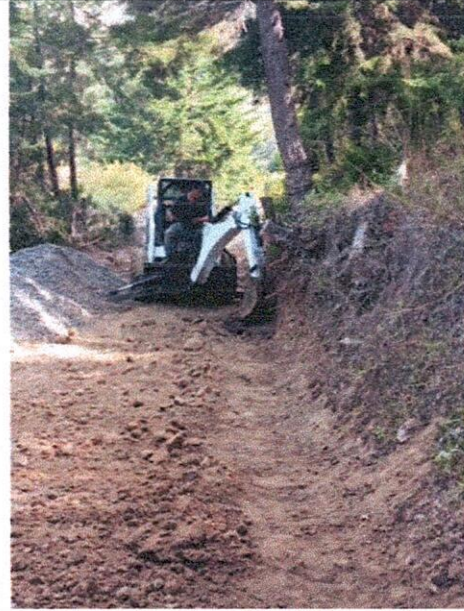

Replanteo y excavaciones varias en material común.



Replanteo y excavaciones varias en material común.

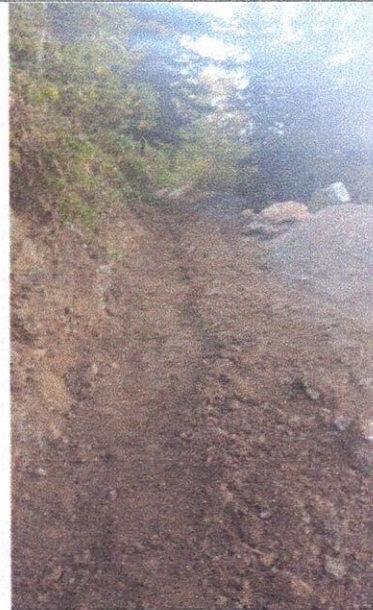

Replanteo y excavaciones varias en material común.



INGENIERIA RYD S.A.S



Replanteo y excavaciones varias en material común.




Replanteo y excavaciones varias en material común.



Replanteo y excavaciones varias en material común.



Material tipo sub-base clase a de espesor 0,15. Incluye transporte.




Material tipo sub-base clase a de espesor 0,15. Incluye transporte.




Material tipo sub-base clase a de espesor 0,15. Incluye transporte.




Material tipo sub-base clase a de espesor 0,15. Incluye transporte.

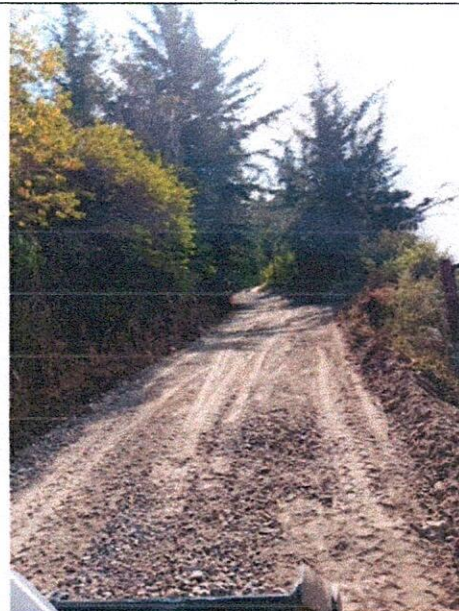

Material tipo sub-base clase a de espesor 0,15. Incluye transporte.

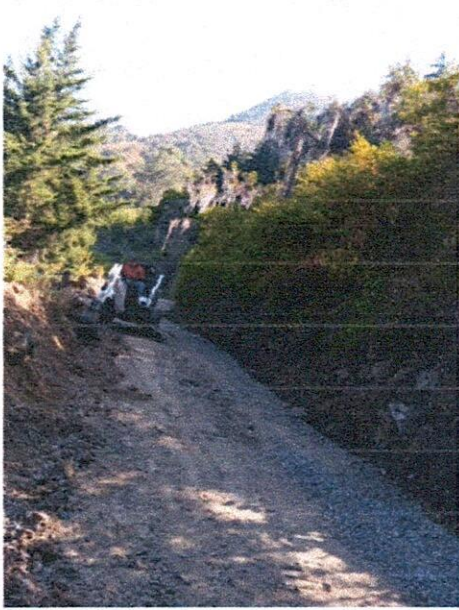


Material tipo sub-base clase a de espesor 0,15. Incluye transporte.

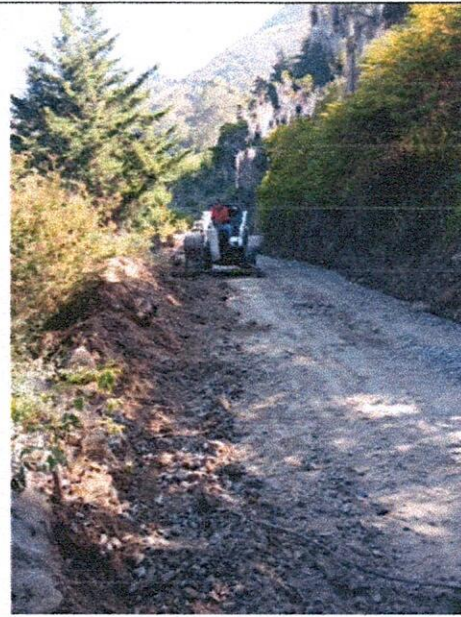


Material tipo sub-base clase a de espesor 0,15. Incluye transporte.



Material tipo sub-base clase a de espesor 0,15. Incluye transporte.

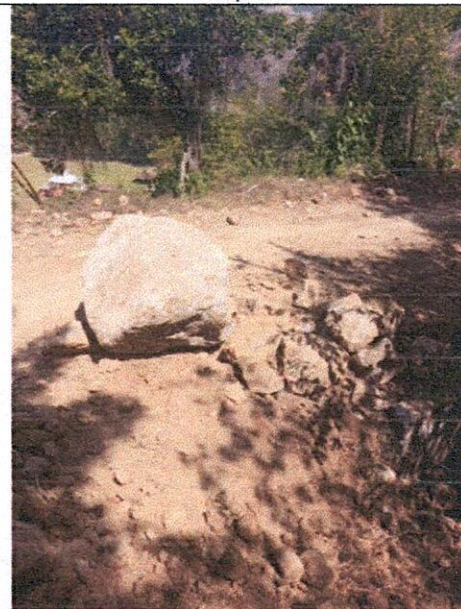


Replanteo y excavaciones varias en material común.

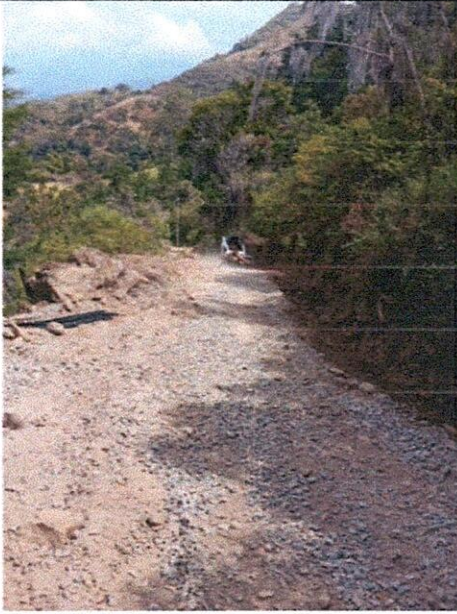


Material tipo sub-base clase a de espesor 0,15. Incluye transporte.




Material tipo sub-base clase a de espesor 0,15. Incluye transporte.

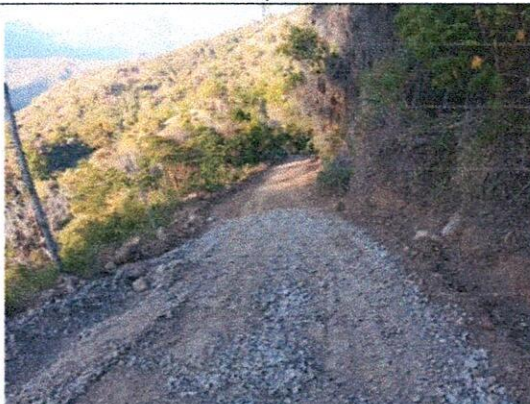


Material tipo sub-base clase a de espesor 0,15. Incluye transporte.

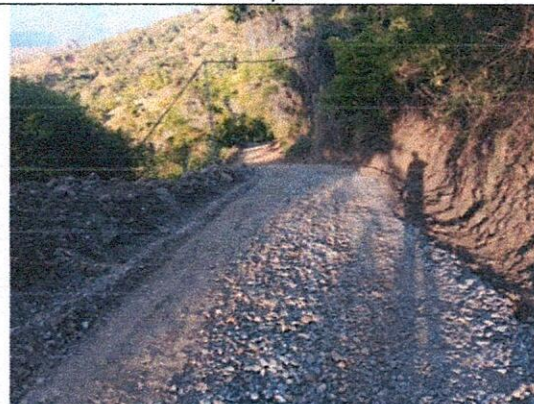


Material tipo sub-base clase a de espesor 0,15. Incluye transporte.

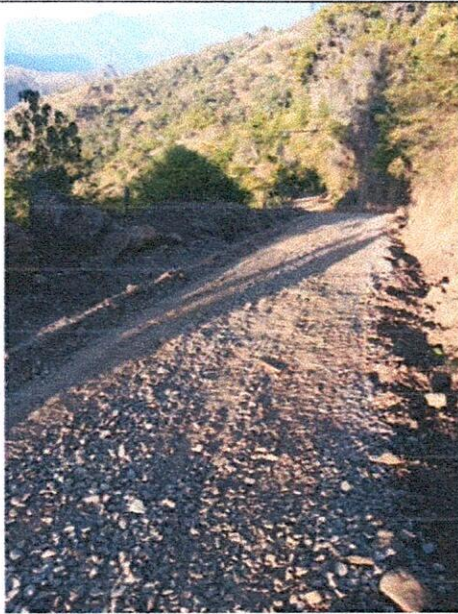

Material tipo sub-base clase a de espesor 0,15. Incluye transporte.

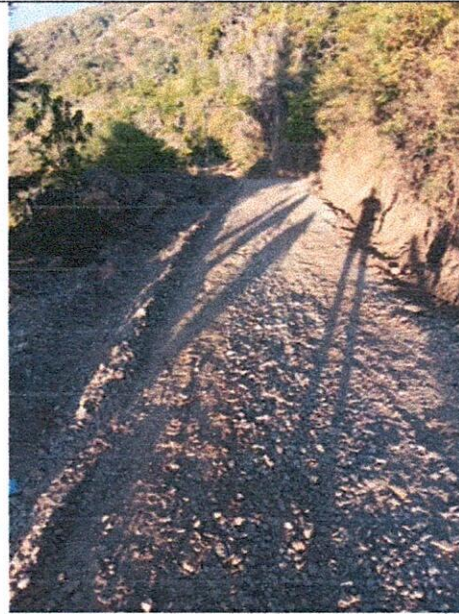

Material tipo sub-base clase a de espesor 0,15. Incluye transporte.

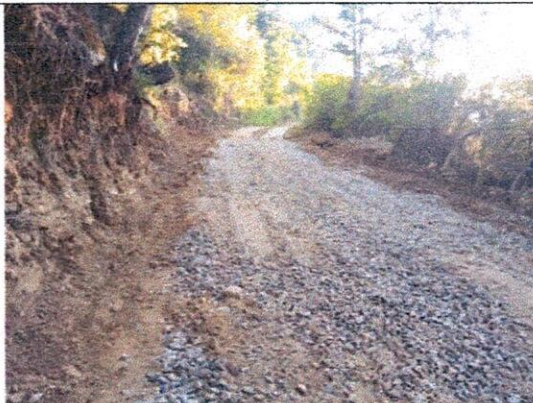


Material tipo sub-base clase a de espesor 0,15. Incluye transporte.



Material tipo sub-base clase a de espesor 0,15. Incluye transporte.



INGENIERIA RYD S.A.S

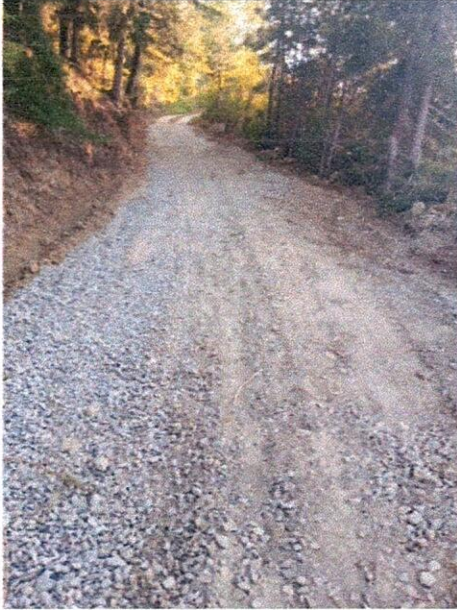

Material tipo sub-base clase a de espesor 0,15. Incluye transporte.



Material tipo sub-base clase a de espesor 0,15. Incluye transporte.



Material tipo sub-base clase a de espesor 0,15. Incluye transporte.




Material tipo sub-base clase a de espesor 0,15. Incluye transporte.



INGENIERIA RYD S.A.S



Campamento

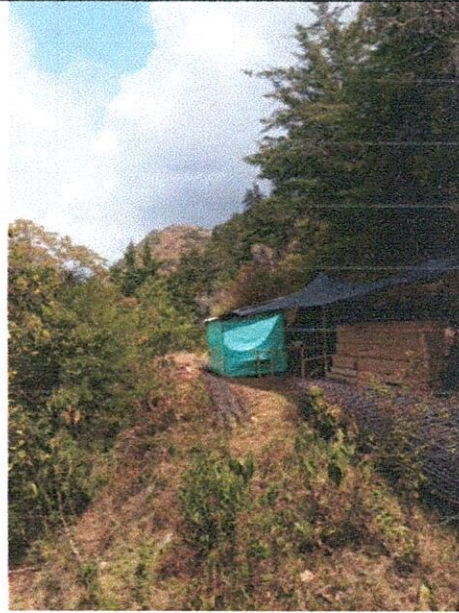

Campamento



Suministro y figurado de acero de refuerzo de 4200 mpa para placas, vigas, cunetas y bordillos.





Suministro y figurado de acero de refuerzo de 4200 mpa para placas, vigas, cunetas y bordillos.



INGENIERIA RYD S.A.S



Suministro y figurado de acero de refuerzo de 4200 mpa para placas, vigas, cunetas y bordillos.

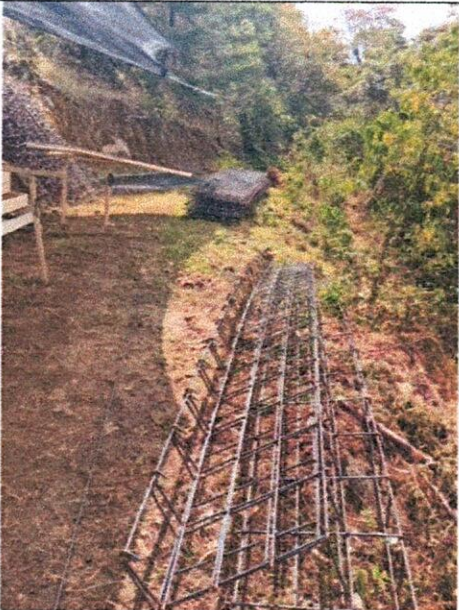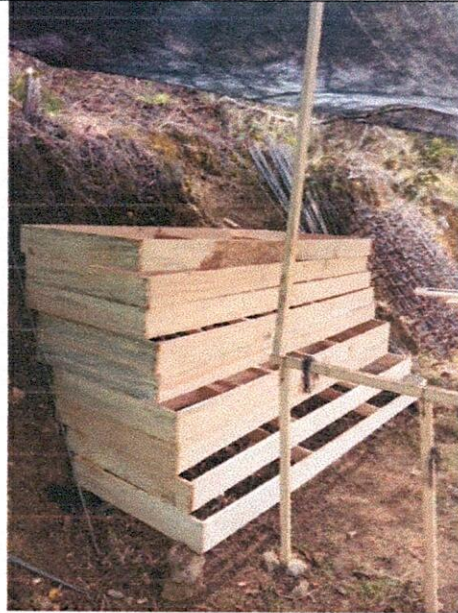

Suministro y figurado de acero de refuerzo de 4200 mpa para placas, vigas, cunetas y bordillos.



Suministro y figurado de acero de refuerzo de 4200 mpa para placas, vigas, cunetas y bordillos.




INGENIERIA RYD S.A.S



Suministro y figurado de acero de refuerzo de 4200 mpa para placas, vigas, cunetas y bordillos.



Suministro y figurado de acero de refuerzo de 4200 mpa para placas, vigas, cunetas y bordillos.

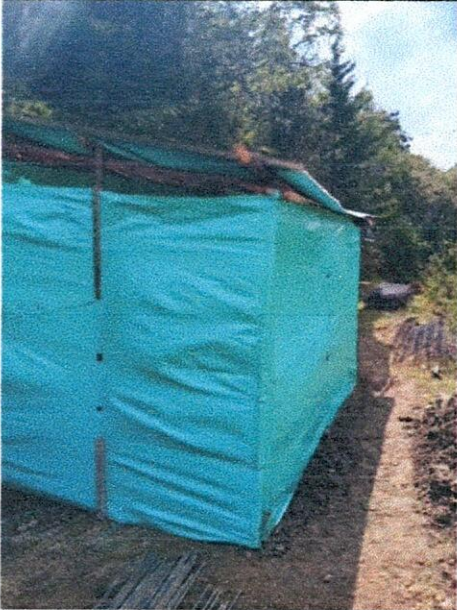

Campamento



Campamento




Preparación para fundir huellas y vigas.



Preparación para fundir huellas y vigas.



Suministro e instalación de concreto de 3.000 psi para estructuras de placa huella

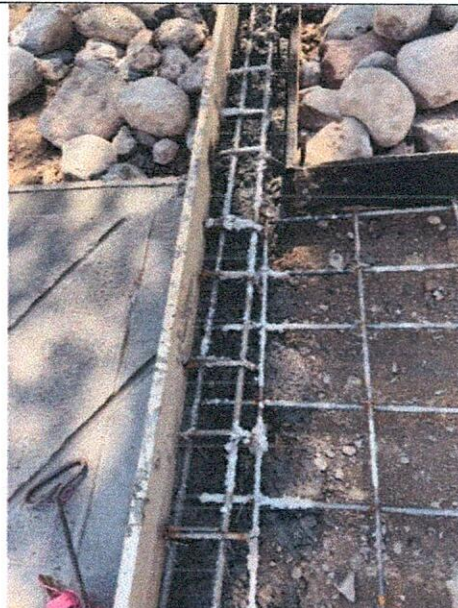

Acero de refuerzo de 4200 mpa para placas, vigas, cunetas y bordillos.



INGENIERIA RYD S.A.S



Suministro e instalación de concreto de 3.000 psi para estructuras de placa huella



Acero de refuerzo de 4200 mpa para placas, vigas, cunetas y bordillos.



Suministro e instalación de concreto de 3.000 psi para estructuras de placa huella



Suministro e instalación de concreto de 3.000 psi para estructuras de placa huella



INGENIERIA RYD S.A.S



Acero de refuerzo de 4200 mpa para placas, vigas, cunetas y bordillos.




Acero de refuerzo de 4200 mpa para placas, vigas, cunetas y bordillos.



Suministro e instalación de concreto de 3.000 psi para estructuras de placa huella



Suministro e instalación de concreto de 3.000 psi para estructuras de placa huella



INGENIERIA RYD S.A.S



Suministro e instalación de concreto de 3.000 psi para estructuras de placa huella




Acero de refuerzo de 4200 mpa para placas, vigas, cunetas y bordillos.




Suministro e instalación de concreto de 3.000 psi para estructuras de placa huella




Suministro e instalación de concreto de 3.000 psi para estructuras de placa huella

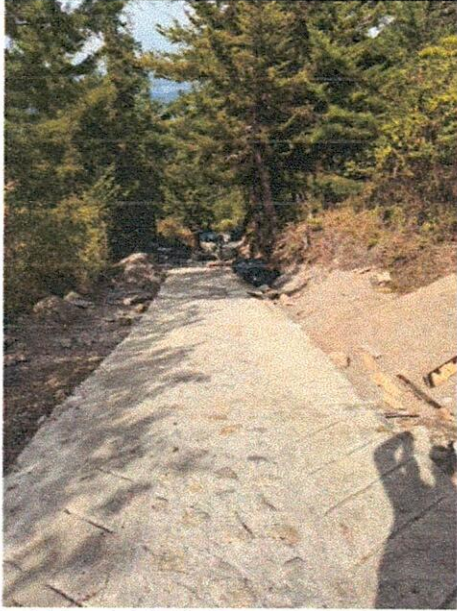


Suministro e instalación de concreto de 3.000 psi para estructuras de placa huella

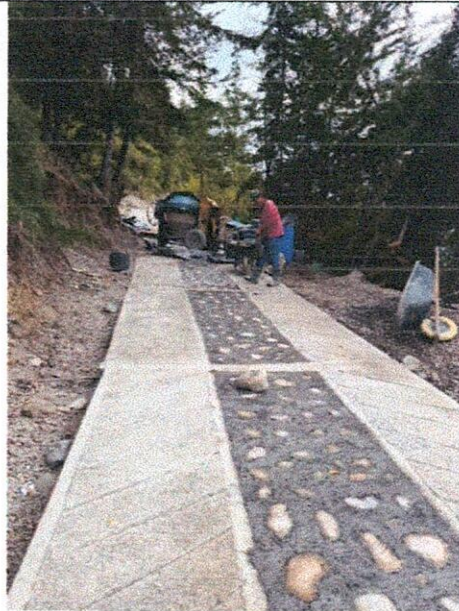

Suministro e instalación de concreto de 3.000 psi para estructuras de placa huella

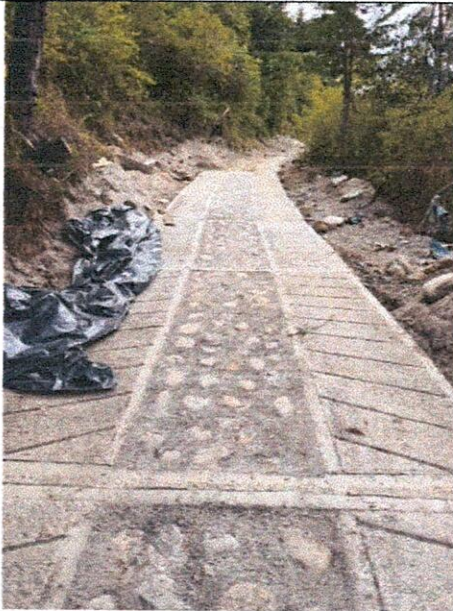


Suministro e instalación de concreto de 3.000 psi para estructuras de placa huella

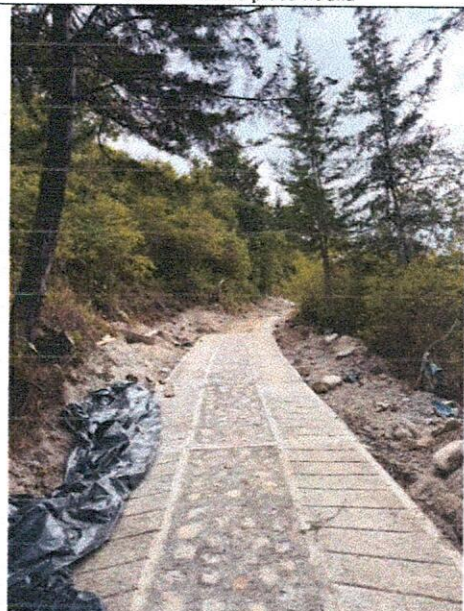

Suministro e instalación de concreto de 3.000 psi para estructuras de placa huella



INGENIERIA RYD S.A.S

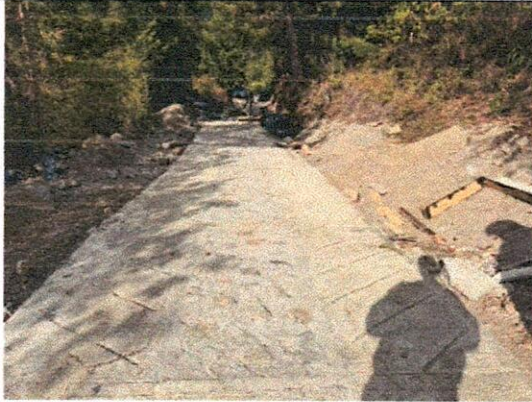

Suministro e instalación de concreto de 3.000 psi para estructuras de placa huella



Suministro e instalación de concreto de 3.000 psi para estructuras de placa huella



Acero de refuerzo de 4200 mpa para placas, vigas, cunetas y bordillos.




Suministro e instalación de concreto de 3.000 psi para estructuras de placa huella




INGENIERIA RYD S.A.S



Suministro e instalación de concreto de 3.000 psi para estructuras de placa huella

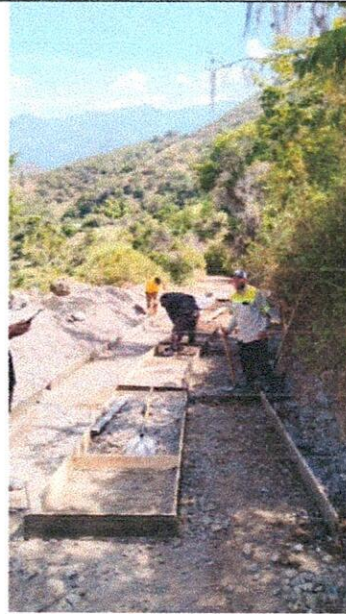


Preparación para fundir huellas y vigas.

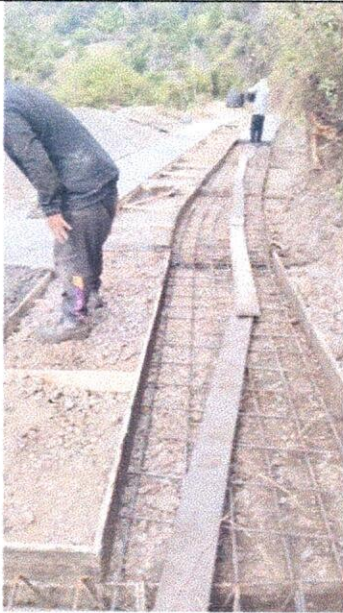


Acero de refuerzo de 4200 mpa para placas, vigas, cunetas y bordillos.




Suministro e instalación de concreto de 3.000 psi para estructuras de placa huella

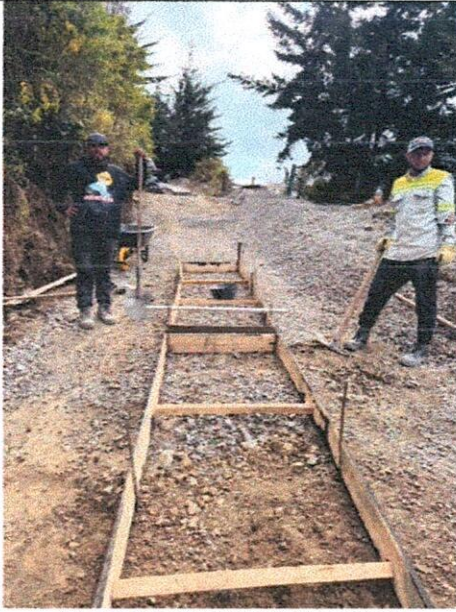


Preparación para fundir huellas y vigas.

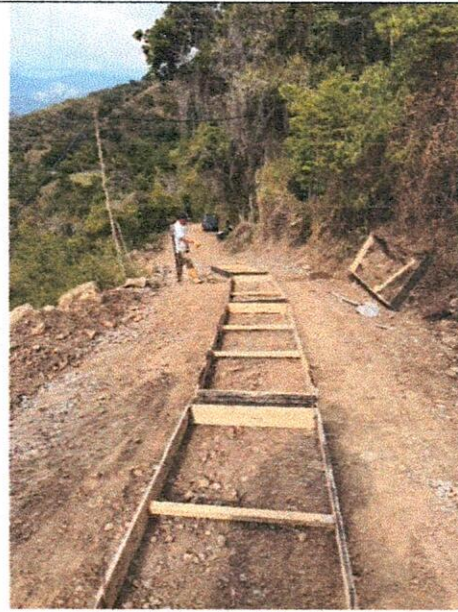

Preparación para fundir huellas y vigas.

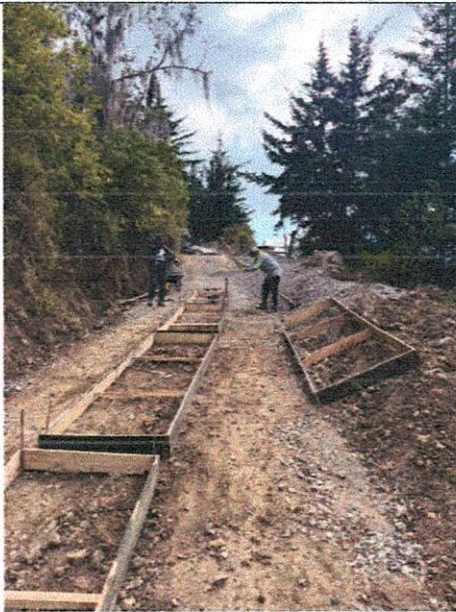

Preparación para fundir huellas y vigas.

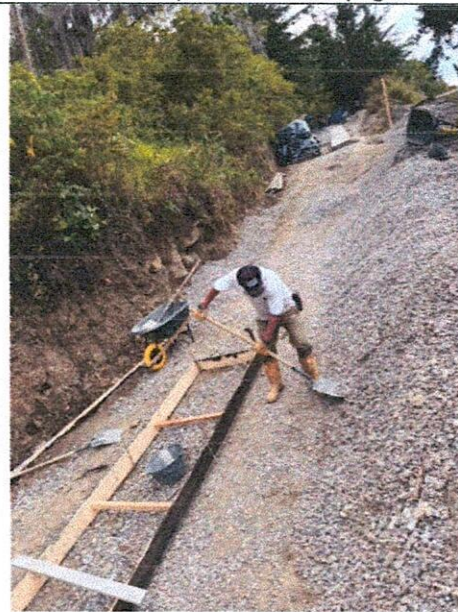

Preparación para fundir huellas y vigas.



Preparación para fundir huellas y vigas.



Acero de refuerzo de 4200 mpa para placas, vigas, cunetas y bordillos.



Suministro e instalación de concreto de 3.000 psi para estructuras de placa huella



Suministro e instalación de concreto de 3.000 psi para estructuras de placa huella



INGENIERIA RYD S.A.S




Suministro e instalación de concreto de 3.000 psi para estructuras de placa huella



Suministro e instalación de concreto de 3.000 psi para estructuras de placa huella



Acero de refuerzo de 4200 mpa para placas, vigas, cunetas y bordillos.

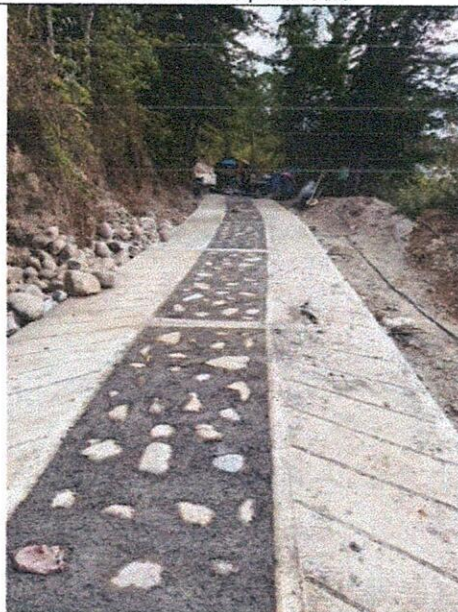

Suministro e instalación de concreto de 3.000 psi para estructuras de placa huella




Suministro e instalación de concreto de 3.000 psi para estructuras de placa huella



Suministro e instalación de concreto de 3.000 psi para estructuras de placa huella

TRAMO SANTA MARTA

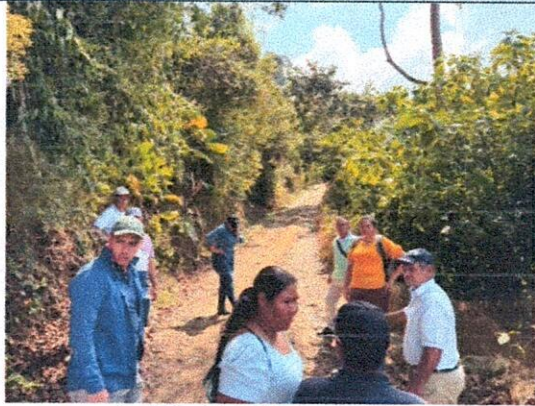

Socialización inicio de actividades.




Socialización inicio de actividades.



Socialización inicio de actividades.




Socialización inicio de actividades.

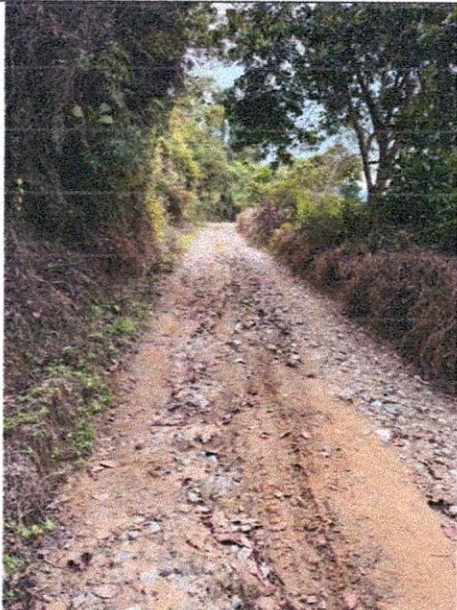

Antes de inicio de actividades.



Antes de inicio de actividades.

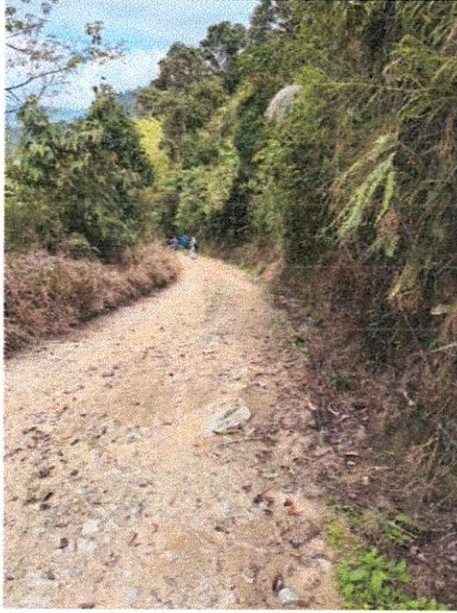

Antes de inicio de actividades.



Antes de inicio de actividades.



Antes de inicio de actividades.



Antes de inicio de actividades.



Replanteo y excavaciones varias en material común.




Replanteo y excavaciones varias en material común.




Replanteo y excavaciones varias en material común.




Replanteo y excavaciones varias en material común.

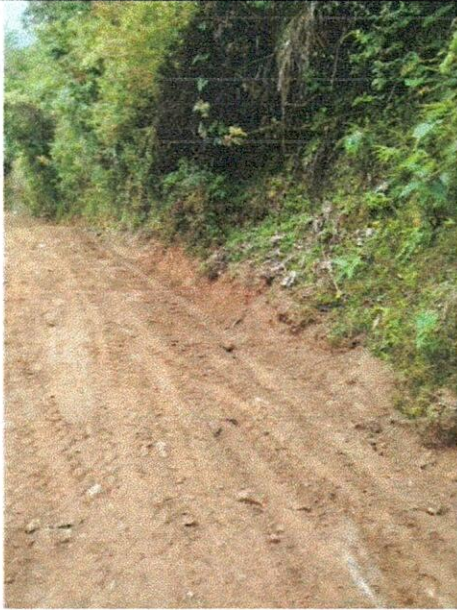

Replanteo y excavaciones varias en material común.

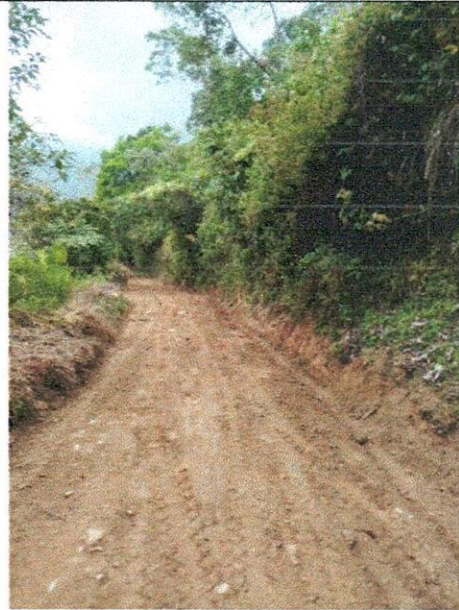


Replanteo y excavaciones varias en material común.

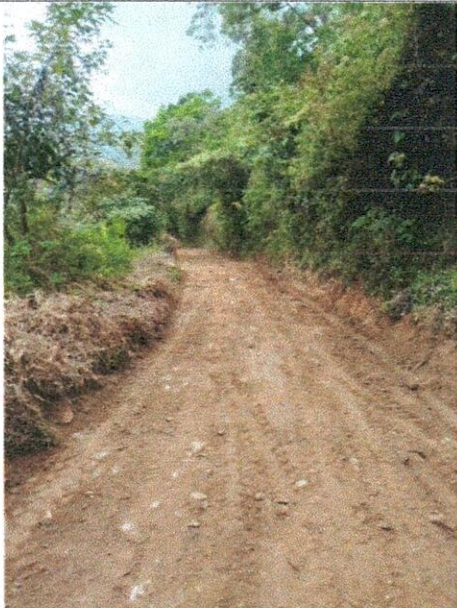

Replanteo y excavaciones varias en material común.



Replanteo y excavaciones varias en material común.

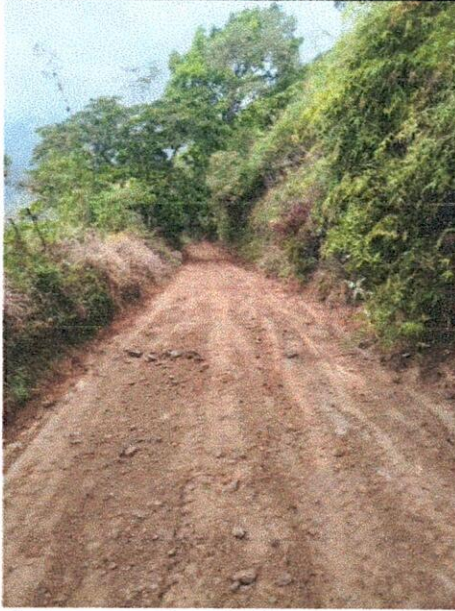


Replanteo y excavaciones varias en material común.



Replanteo y excavaciones varias en material común.



Replanteo y excavaciones varias en material común.

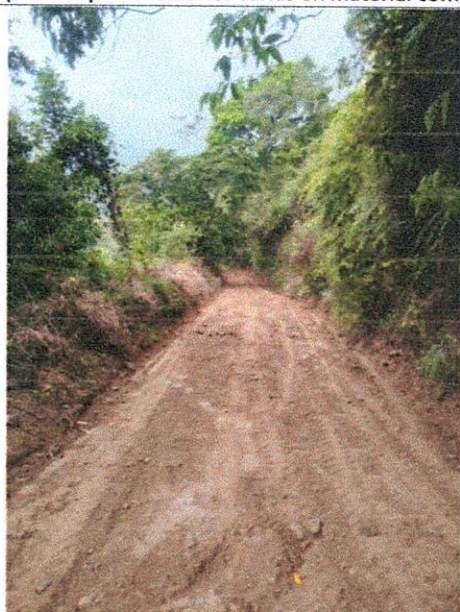

Replanteo y excavaciones varias en material común.



INGENIERIA RYD S.A.S




Replanteo y excavaciones varias en material común.



Replanteo y excavaciones varias en material común.



Replanteo y excavaciones varias en material común.

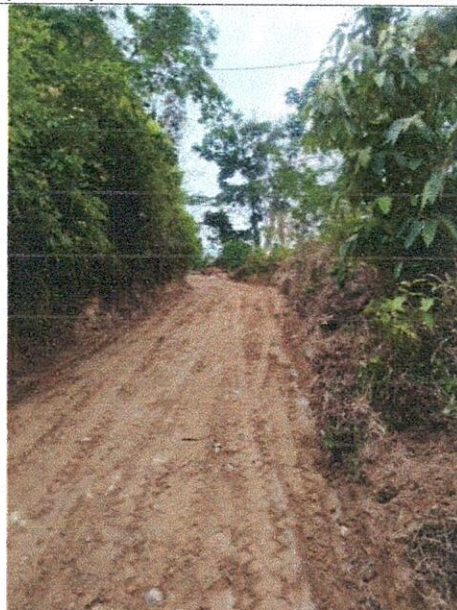

Replanteo y excavaciones varias en material común.




Replanteo y excavaciones varias en material común.



Replanteo y excavaciones varias en material común.




Replanteo y excavaciones varias en material común.

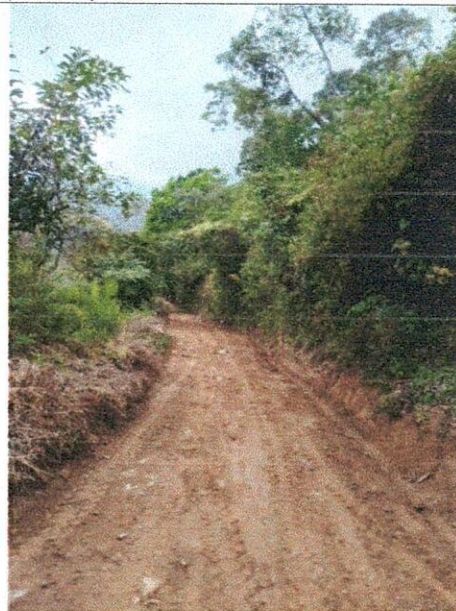

Replanteo y excavaciones varias en material común.



Replanteo y excavaciones varias en material común.

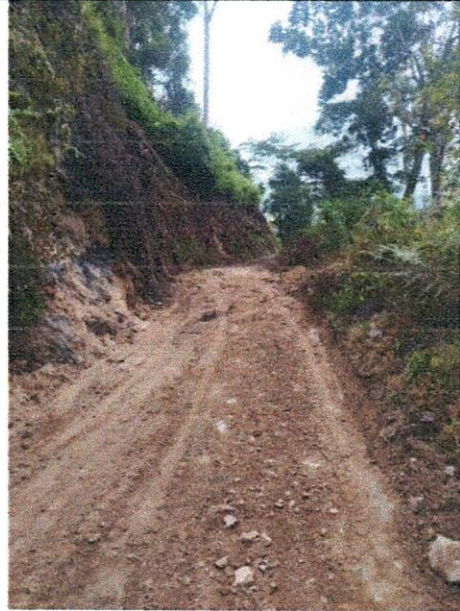

Replanteo y excavaciones varias en material común.



Replanteo y excavaciones varias en material común.





Material tipo sub-base clase a de espesor 0,15. Incluye transporte.

Material tipo sub-base clase a de espesor 0,15. Incluye transporte.



INGENIERIA RYD S.A.S




Material tipo sub-base clase a de espesor 0,15. Incluye transporte.




Material tipo sub-base clase a de espesor 0,15. Incluye transporte.



Material tipo sub-base clase a de espesor 0,15. Incluye transporte.

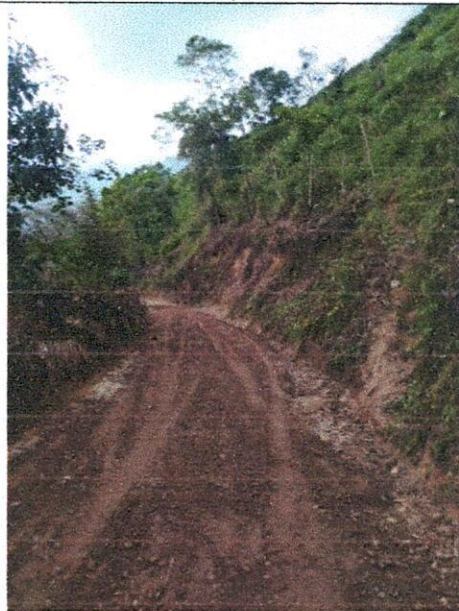


Material tipo sub-base clase a de espesor 0,15. Incluye transporte.



INGENIERIA RYD S.A.S



Material tipo sub-base clase a de espesor 0,15. Incluye transporte.

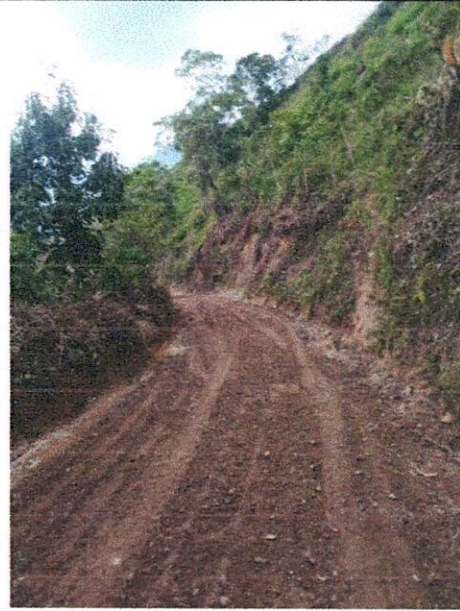

Material tipo sub-base clase a de espesor 0,15. Incluye transporte.



Material tipo sub-base clase a de espesor 0,15. Incluye transporte.



Material tipo sub-base clase a de espesor 0,15. Incluye transporte.




INGENIERIA RYD S.A.S



Material tipo sub-base clase a de espesor 0,15. Incluye transporte.




Material tipo sub-base clase a de espesor 0,15. Incluye transporte.

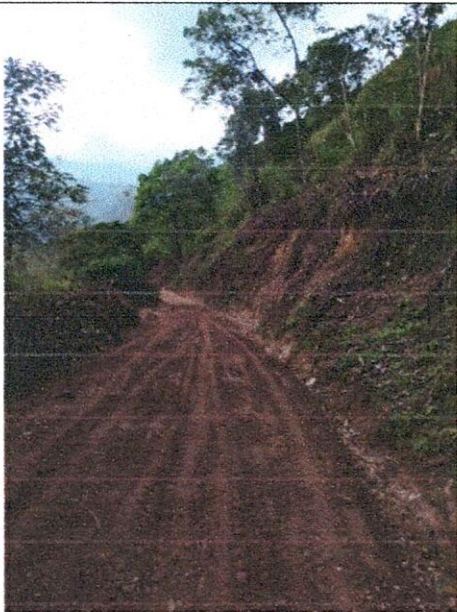

Material tipo sub-base clase a de espesor 0,15. Incluye transporte.




Material tipo sub-base clase a de espesor 0,15. Incluye transporte.

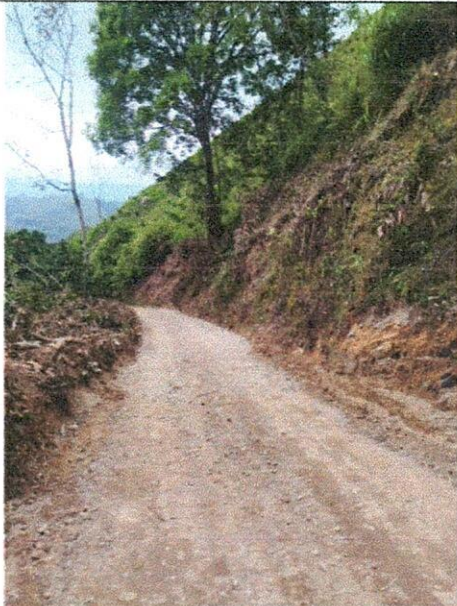


Material tipo sub-base clase a de espesor 0,15. Incluye transporte.



Material tipo sub-base clase a de espesor 0,15. Incluye transporte.

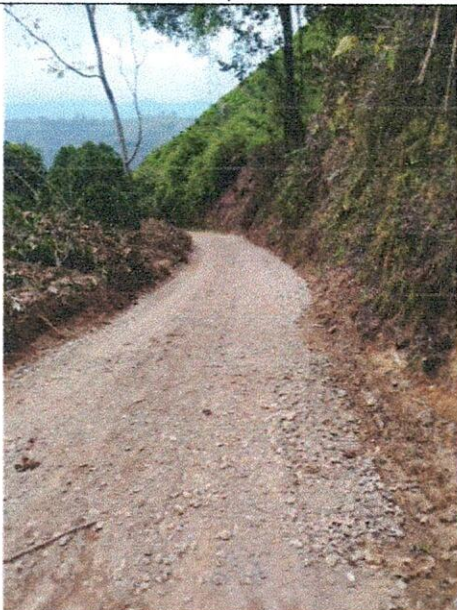

Material tipo sub-base clase a de espesor 0,15. Incluye transporte.

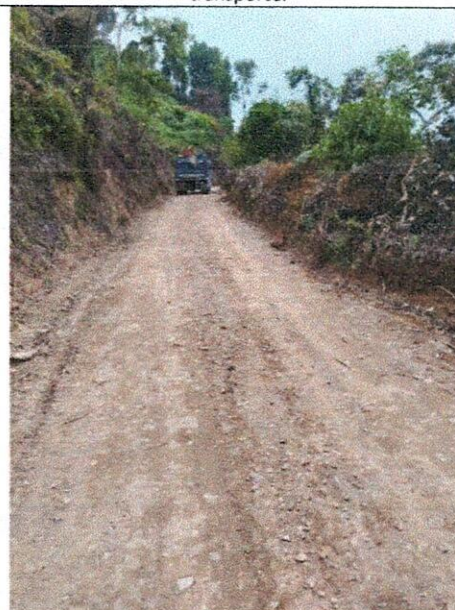

Material tipo sub-base clase a de espesor 0,15. Incluye transporte.

6. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

6.1 ACTAS DE PAGO.

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL No 01	\$ 150.937.795,00=



INGENIERIA RYD S.A.S

VALOR TOTAL ACOMULADO	\$ 150.937.795,00=
-----------------------	--------------------

6.2 BALANCE TÉCNICO-FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL	\$ 356.890.619,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 356.890.619,00
% Ejecutado	42,29%
Tiempo ejecutado	32,22%

7. GRAFICOS








INGENIERIA RYD S.A.S

Porcentaje Ejecutado

■ EJECUTADO ■ POR EJECUTAR

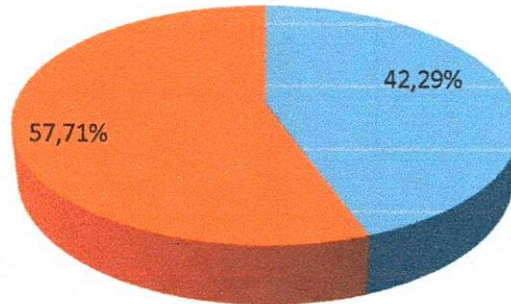

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	SUPERVISOR
INGENIERIA R Y D SAS R�p. Legal: YEIMY ALEXANDER VELASCO ANGARITA	OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO Jefe Oficina Asesora de Planeaci�n



ACTA DE EJECUCIÓN No. 001

I. INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
NÚMERO DE CONTRATO	SAMC 003 de 2024		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA		
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias mediante la construcción de placa huellas en las veredas de Santa Marta y Santa Barbaradel Municipio de Matanza, Santander"		
VALOR INICIAL	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS (\$356.890.619,00) MCTE.		
VALOR ADICIONAL	N/A.		
VALOR TOTAL	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS (\$356.890.619,00) MCTE.		
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES		
PLAZO ADICIONAL	N/A		
PLAZO TOTAL	TRES (3) MESES		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14 de enero de 2025		
FECHA DE INICIO	21 de enero de 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN	20 de abril de 2025		
CONTRATISTA	INGENIERIA R Y D SAS		
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	901.499.915-4		
SUPERVISOR	OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO		
CARGO DEL SUPERVISOR	Jefe Oficina Asesora de Planeación		
INTERVENTOR	N/A		
NÚMERO DEL CONTRATO DEL INTERVENTOR	N/A		
ANTICIPO	N/A		
NÚMERO DE PÓLIZA	Cumplimiento Entidades Estatales N° B-100057467 Póliza Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual N° B-100015576		
FECHA DE PÓLIZA	15 de enero de 2025		
II. INFORMACIÓN FINANCIERA			
DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA	VALOR
CDP	CDR20241210001	10-12-2024	\$363.932.154=
RP	RPR2025001	17-01-2025	\$356.890.619=
PERIODO DE EJECUCIÓN	21 de enero a 20 de febrero de 2025		
NÚMERO DE INFORME	01		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	42,29%		
VALOR DE PAGO EN TRÁMITE	Ciento cincuenta millones novecientos treinta y siete mil setecientos noventa y cinco pesos (\$150.937.795=) MCTE.		
III. INFORMACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL			
VALOR IBC	OPERADOR PILA	No. DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
\$474.500=	Aportes en línea Enero	9481955653	21-02-2025
\$1.423.500=	Aportes en línea Febrero	9481956302	21-02-2025



ALCALDÍA DE MATANZA

SECRETARÍA GENERAL
Y DE GOBIERNO

ACTA DE EJECUCIÓN

\$1.423.500=	Aportes en línea Enero	9481457670	07-02-2025
EPS		FONDO DE PENSIÓN	
Sura y Nueva eps		Colpensiones, porvenir y protección.	
		ASEGURADORA	
		Sura	
VALOR APOORTE A SALUD	VALOR APOORTE A PENSIÓN	VALOR APOORTE A ARL	TOTAL APORTES
\$133.800=	\$307.200=	\$76.800=	\$ 594.600=
\$396.400=	\$911.200=	\$228.000=	\$ 1.763.600=
\$174.000=	\$694.000=	\$302.600=	\$1.344.600=
<p>Con la presente acta se certifica que el contratista dio cumplimiento con el objeto y obligaciones contractuales en el periodo comprendido entre el 21 de enero y el 20 de febrero de 2025, según el informe de actividades presentado y que fueron revisados los pagos de sus aportes a seguridad social en los cuales no presentó ninguna inconsistencia.</p> <p>En constancia de lo anterior se firma en Matanza, a los veinticuatro (24) días del mes de febrero de 2025.</p>			
 OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO SUPERVISOR		 INGENIERIA R Y D SAS CONTRATISTA	



ACTA DE PAGO No. 001

NÚMERO DE CONTRATO	SAMC 003 de 2024
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias mediante la construcción de placa huellas en las veredas de Santa Marta y Santa Barbaradel Municipio de Matanza, Santander"
VALOR INICIAL	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS (\$356.890.619,00) MCTE.
VALOR ADICIONAL	N/A.
VALOR TOTAL	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS (\$356.890.619,00) MCTE.
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES
PLAZO ADICIONAL	N/A
PLAZO TOTAL	TRES (3) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14 de enero de 2025
FECHA DE INICIO	21 de enero de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	20 de abril de 2025
CONTRATISTA	INGENIERIA R Y D SAS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	901.499.915-4
SUPERVISOR	OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO
CARGO DEL SUPERVISOR	Jefe Oficina Asesora de Planeación
INTERVENTOR	N/A
NÚMERO DEL CONTRATO DEL INTERVENTOR	N/A
ANTICIPO	N/A
NÚMERO DE PÓLIZA	Cumplimiento Entidades Estatales N° B-100057467 Póliza Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual N° B-100015576
FECHA DE PÓLIZA	15 de enero de 2025

En el municipio de Matanza, a los veinticuatro (24) días del mes de febrero de 2025, se reunieron **OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO**; Jefe Oficina Asesora de Planeación, en calidad de Supervisor **INGENIERIA R Y D SAS**, como Contratista, con el fin de elaborar la presente Acta de Pago número 01 correspondiente al periodo comprendido del **21 de enero al 20 de febrero de 2025**, de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el informe del contratista, así como en el informe del Supervisor.



CONSIDERANDO

1. SOPORTE JURÍDICO

Dentro del contrato de obra pública SAMC-003-2024 suscrito entre el municipio de Matanza, Santander, y INGENIERIA R Y D SAS, se especifica la forma de pago de la siguiente manera: El valor para el presente proceso contractual es la suma de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS (\$356.890.619,00=)** M/CTE, donde el municipio cancelará al contratista el valor presente mediante Un primer pago cuando se demuestre un avance igual o superior al 30% de ejecución de la obra, y después de ello actas parciales de obra hasta completar el 90% de acuerdo con el avance de obra y el restante 10% con el acta de liquidación, previa presentación del respectivo informe que relacione las actividades efectuadas a entera satisfacción del supervisor del contrato. Los pagos se efectuarán previa presentación, por parte del contratista, del recibo de pago de los aportes a Seguridad Social y estampillas departamentales.

2. SOPORTE FINANCIERO

DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA	VALOR
CDP	CDR20241210001	10-12-2024	\$363.932.154=
RP	RPR2025001	17-01-2025	\$356.890.619=

3. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	FECHA	PORCENTAJE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$356.890.619=	14-01-2025	100%
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	\$0=		00%
ACTA DE PAGO No 01	\$150.937.795=	24-02-2025	42,29%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$205.952.824=	24-02-2025	57,71%

4. RELACIÓN DE SOPORTES DE LA PRESENTE ACTA

- El contratista presentó informe de actividades ejecutadas en cumplimiento del objeto contractual.
- El contratista allegó soporte de pago de la planilla de seguridad social correspondiente al mes de enero y febrero de 2025.

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	IBC	VALOR DEL APORTE
SALUD ENERO	21-02-2025	\$474.500=	\$133.800=
SALUD ENERO	07-02-2025	\$1.423.500=	\$174.000=
SALUD FEBRERO	21-02-2025	\$1.423.500=	\$396.400=
PENSIÓN ENERO	21-02-2025	\$474.500=	\$307.200=
PENSIÓN ENERO	07-02-2025	\$1.423.500=	\$694.000=
PENSIÓN FEBRERO	21-02-2025	\$1.423.500=	\$911.200=
ARL ENERO	21-02-2025	\$474.500=	\$76.800=
ARL ENERO	07-02-2025	\$1.423.500=	\$302.600=
ARL FEBRERO	21-02-2025	\$1.423.500=	\$228.000=
CAJA DE COMPENSACION ENERO	21-02-2025	\$474.500=	\$76.800=



ALCALDÍA DE MATANZA

SECRETARÍA GENERAL
Y DE GOBIERNO

ACTA DE PAGO

CAJA DE COMPENSACION ENERO	07-02-2025	\$1.423.500=	\$174.000=
CAJA DE COMPENSACION FEBRERO	21-02-2025	\$1.423.500=	\$228.000=

- Informe de supervisión por parte del supervisor del contrato.

ACUERDAN

Autorizar el pago de **CIENTO CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (\$150.937.795=) M/CTE**, correspondiente al Acta de Pago 01, por el periodo entre **21 de enero al 20 de febrero de 2025**.

En constancia de lo anterior se firma en Matanza, a los veinticuatro (24) días del mes de febrero de 2025.


OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO
SUPERVISOR


INGENIERIA R Y D SAS
CONTRATISTA



OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN
DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS DE SANTA MARTA Y SANTA

PROSUPUESTO

ACTA DE PAGO 01


Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
MOVIMIENTO DE TIERRAS								
CAP.1								
	1.1		ART.210	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO	m3	418.00	\$61,255.00	\$25,114,550.00
	1.2		ART.220	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION	m3	0.00	\$47,893.00	\$-
	1.3		ART.210	RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. INCLUYE TRANSPORTE	m3	443.00	\$66,025.00	\$29,249,075.00
Subtotal MOVIMIENTO DE TIERRAS								\$ 54,363,625.00
COMPONENTE DISEÑO ESTRUCTURA DE PLACA HUELLA								
CAP.2								
	2.1		ART.320	MATERIAL TIPO SUB-BASE CLASE A DE ESPESOR 0,15. INCLUYE TRANSPORTE.	m3	121.125	\$235,569.00	\$28,533,295.00
	2.2		ART.500	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA ESTRUCTURAS DE PLACA HUELLA	m3	24.864	\$934,840.00	\$23,243,862.00
	2.3		ART.640	ACERO DE REFUERZO DE 4200 MPA PARA PLACAS, VIGAS, CUNETAS Y BORDILLOS.	kg	3291.32	\$11,246.00	\$37,014,128.00
	2.4		ART.500	CONCRETO TIPO CICLOPEO DE 3.000 PSI. PORCENTAJE DE PIEDRA PEGADA DE 40% Y DE CONCRETO 60%	m3	9.88	\$787,582.00	\$7,782,885.00
Subtotal COMPONENTE DISEÑO ESTRUCTURA DE PLACA HUELLA								\$ 96,574,170.00
SUBTOTAL OBRAS								\$ 150,937,795.00
PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (P.M.T)								
PRESUPUESTO PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL (P.A.G.A)								
VALOR TOTAL								\$ 150,937,795.00


NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A=	20%
IMPREVISTO	I=	1%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	35%


ING. OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR


YEIMY ALEXANDER VELASCO ANGARITA
INGENIERIA RYD SAS
CONTRATISTA

ACTA DE PAGO 01 - ANEXO 01
 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS DE SANTA MARTA Y SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE MATALZA, SANTAFÉ.

N°	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS (ACTA PARCIAL No. 01)		VALOR
	GENERAL	PARTICULAR						CANT.	VR. PARCIAL	
CONDICIONES INICIALES										
CAP.1	1.1	ART.210	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO A MANO	m3	419.00	\$61,255.00	\$25,114,550.00	410.00	25,114,550.00	25,114,550.00
	1.2	ART.220	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION	m3	98.00	\$47,693.00	\$4,310,378.00	0.00		
	1.3	ART.210	RETIRO DE MATERIAL SOBREPORTE PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. INCLUYE TRANSPORTE	m3	443.00	\$66,025.00	\$29,249,075.00	443.00	29,249,075.00	29,249,075.00
			Subtotal				\$ 98,673,995.00	Subtotal	\$ 54,363,625.00	54,363,625.00
COMPONENTE DISEÑO ESTRUCTURA DE PLACA HUELLA										
CAP.2	2.1	ART.320	MATERIAL TIPO SUR- BASE CLASE A DE ESPESOR 0.15. INCLUYE TRANSPORTE.	m3	126.075	\$235,569.00	\$29,699,362.00	121.25	28,532,295.00	28,532,295.00
	2.2	ART.500	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3,000 PSI PARA ESTRUCTURAS DE PLACA HUELLA	m3	146.275	\$934,840.00	\$136,743,721.00	24.864	23,243,882.00	23,243,882.00
	2.3	ART.640	ACERO DE REFUERZO DE 4200 MPA PARA PLACAS, VIGAS, CUNETAS Y BORDILLOS	kg	8775.10	\$11,246.00	\$98,604,775.00	3291.315	37,014,128.00	37,014,128.00
	2.4	ART.500	CONCRETO TIPO CICLORED DE 3,000 PSI. PORCENTAJE DE PIEDRA PEGADA DE 48% Y DE CONCRETO 68%	m3	27.249918598283	\$787,582.00	\$21,454,451.00	9.892	7,782,865.00	7,782,865.00
			Subtotal				\$ 286,582,304.00	Subtotal	\$ 96,574,170.00	96,574,170.00
			SUBTOTAL OBRAS				\$ 345,256,304.00	Subtotal	\$ 150,937,795.00	150,937,795.00
			PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (P.M.T)				\$ 5,206,965.00			
			PRESUPUESTO PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL (P.A.G.A)				\$ 6,227,350.00			
			VALOR TOTAL				\$ 358,890,619.00		\$ 150,937,795.00	150,937,795.00


ING. OSCAR IVAN CHARRO APARICIO
 SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
 SUPERVISOR


YEIMY ALEXANDER VELLASCO ANGARITA
 INGENIERIA RYD SAS
 CONTRATISTA



ALCALDIA DE MATANZA
NIT:890.206.696-0

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
MUNICIPIO MATANZA, SANTANDER
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS DE SANTA MARTA Y SANTA BARBARADEL MUNICIPIO DE MATANZA, SANTANDER".
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
ACTA DE PAGO 01

TRAMO VEREDA SANTA BARBARA MUNICIPIO DE MATANZA - SANTANDER

1.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.1	TRAMO VEREDA SANTA BARBARA MUNICIPIO DE MATANZA - SANTANDER	CANT.	Largo / radio	ANCHO / PI	Alto / Espesor	Area M2	Vol M3
	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO						
	Excavación ancho de vía		80.00	1.00	1.00		149.80
	Excavación replanteo de vía		80.00	4.30	0.20		88.80

1.1	TRAMO VEREDA SANTA MARTA MUNICIPIO DE MATANZA - SANTANDER	CANT.	Largo / radio	ANCHO / PI	Alto / Espesor	Area M2	Vol M3
	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO						
	Excavación ancho de vía		130.00	1.15	1.00		261.20
	Excavación replanteo de vía		130.00	4.30	0.20		111.80
	TOTAL ITEM 1.1						410.00

1.2	TRAMO VEREDA SANTA BARBARA MUNICIPIO DE MATANZA - SANTANDER	CANT.	Largo / radio	ANCHO / PI	Alto / Espesor	Area M2	Vol M3
	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION						

1.2	TRAMO VEREDA SANTA MARTA MUNICIPIO DE MATANZA - SANTANDER	CANT.	Largo / radio	ANCHO / PI	Alto / Espesor	Area M2	Vol M3
	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION						
	TOTAL ITEM 1.2						

1.3	TRAMO VEREDA SANTA BARBARA MUNICIPIO DE MATANZA - SANTANDER	CANT.	Largo / radio	ANCHO / PI	Alto / Espesor	Area M2	Vol M3
	RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. INCLUYE TRANSPORTE						
	Excavación ancho de vía		80.00	1.00	1.00		149.80
	Excavación replanteo de vía		80.00	4.30	0.20		88.80

1.3	TRAMO VEREDA SANTA MARTA MUNICIPIO DE MATANZA - SANTANDER	CANT.	Largo / radio	ANCHO / PI	Alto / Espesor	Area M2	Vol M3
	RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. INCLUYE TRANSPORTE						
	Excavación ancho de vía		130.00	1.15	1.00		261.20
	Excavación replanteo de vía		130.00	4.30	0.20		111.80
	% expansión						122.81
	Material para relleno						90.00
	TOTAL ITEM 1.3						443.00

2.00 COMPONENTE DISEÑO ESTRUCTURA DE PLACA HUELLA

2.1	TRAMO VEREDA SANTA BARBARA MUNICIPIO DE MATANZA - SANTANDER	CANT.	Largo / radio	ANCHO / PI	Alto / Espesor	Area M2	Unidad
	MATERIAL TIPO SUB-BASE CLASE A DE ESPESOR 0,15. INCLUYE TRANSPORTE.						
	Placa huella completa		80.00	4.25	0.15		51.00



INGENIERIA RYD S.A.S.
 NIT 901.499.915-4
 CALLE 35 # 17 -77
 Tel: (037) 6703719
 Bucaramanga - Colombia
 ingenieriaryd@gmail.com



**Factura electrónica de venta
 No. FVE 18**

Señores	MUNICIPIO DE MATANZA		
NIT	890.206.696-0	Teléfono	(607) 6298024 - Ext. 000 - (000) 3173806585 - Ext. 000
Dirección	CRA 5 5 85	Ciudad	Matanza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/02/2025, 18:31
Expedición	21/02/2025, 18:31
Vencimiento	21/02/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Rete.
1	Acta parcial No. 1 Contrato de obra pública No. SAMC-003-2024. cuyo objeto es: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS DE SANTA MARTA Y SANTA BÁRBARA DEL MUNICIPIO DE MATANZA, SANTANDER.	1.00	150,937,795.00	0 %

Total items: 1

Valor en Letras:

Ciento cincuenta millones novecientos treinta y siete mil setecientos noventa y cinco pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 150,937,795.00

Total Bruto	150,937,795.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	150,937,795.00

Observaciones:

Favor Cancelar el Valor de la Presente factura a la cuenta corriente: Banco SCOTIABANK COLPATRIA No. 401011609 a Nombre de INGENIERIARYD SAS.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764085348005 aprobado en 20241213 prefijo FVE desde el número 15 al 10000 Vigencia: 12 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 6.9
 CUCFE: 622bf25e0a9c1ea23b8535e111a18b725740a209a1344e4228ea6af98fa3dc7f3964099420ec9cdbc1e66ee1df4df108

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nubs. Firma electrónica: ver en el XML

SCOTIABANK COLPATRIA S.A.

NIT. 860.034.594-1

CERTIFICA

Que nuestro cliente **INGENIERIA RYD SAS**, identificado(a) con Nit. No. **9,014,999,154******* se encuentra vinculado(a) a través de la cuenta corriente No. **401.011.609**, con fecha de apertura **20 de Diciembre de 2024** la cual se encuentra activa.

La cuenta en mención ha sido manejada de acuerdo con las normas establecidas por la entidad.

La presente se expide a solicitud del interesado en la ciudad de **BOGOTÁ**, a los **Diciembre 20 del 2024**.

Este documento es válido para los fines que se requiera.

Cordialmente,



Banca Pyme
BOGSANM012
11897386

 **Línea de Atención**

Bogotá: 6017561616 - Cali: 6024891616 - Medellín: 6046041616 - Barranquilla: 6053851616 - Ibagué: 6082771616 - Pereira: 6063401616 - Cartagena: 6056931616 - Neiva: 6088631616 - Bucaramanga: 6076971616 - Cúcuta: 6075955195 - Santa Marta: 6054365966 - Villavicencio: 6086836126 - Valledupar: 6055898480 - Popayán: 6028353735 - Resto del país: 018000 522222

@Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario

 www.scotiabankcolpatria.com
