

COPIA NO CONTROLADA

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL	Adquisición de Bienes y Servicios	CODIGO:ABS- FO-003
		Informe de supervisión	VERSIÓN:002
			FECHA VIGENCIA:2023- 04-24

INFORME PARCIAL

☒

INFORME FINAL

☐**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Y SU EJECUCIÓN:****1.1. INFORME No. 3****1.2. PERÍODO DEL INFORME**

(Del) Día: 11 Mes: enero Año: 2025 (Al) Día: 10 Mes: febrero Año: 2025

1.3. CONTRATO: No. 053 de fecha 2024 UAEJPMP de 24 de octubre de 2024.**1.4. OBJETO:**

Interventoría para la ejecución del contrato de obra cuyo objeto corresponde a realizar las adecuaciones a la infraestructura física para uso de la Justicia Penal Militar y Policial en las instalaciones del batallón de A.S.P.C. No. 30 “Guasimales” – BAS30 ubicado en Cúcuta.

1.5. NOMBRE DEL CONTRATISTA: PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.**1.6. CÉDULA O NIT:** 901.835.570-9**1.7. CORREO ELECTRÓNICO:**
gerencia@equilateroapp.com**1.8. DIRECCIÓN:** CR 27 # 36-38 OFICINA
209 Bucaramanga**1.9. TELÉFONO:** 3016455603

1.10 MODIFICACIONES DEL CONTRATO**(incluir las adiciones, prórrogas, reducciones etc.)**

TIPO	FECHA	VALOR DE LA OPERACIÓN	OBJETO
Adición y prórroga	27/12/2024	\$68.656.855	Se adicionó en la suma de SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$68.656.855) incluido IVA y demás erogaciones a que haya lugar y se prorrogó el plazo de ejecución del contrato de consultoría No. 053-2024 UAEJPMP, hasta el 15 de marzo de 2025.

SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN

No. ACTA	FECHA SUSCRIPCIÓN DE ACTA SUSPENSIÓN	INICIO SUSPENSIÓN DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA DE REANUDACIÓN	FECHA REANUDACIÓN DE CONTRATO
N/A				

CESIÓN SÍ ☐ NO ☒ Día _____ Mes _____ Año _____**1.11 FECHA DE INICIO:** Día: 28 Mes: octubre Año: 2024

Requisitos de ejecución del contrato:

Suscripción del contrato	☒	Registro presupuestal	☒
Aprobación de garantía	☒	Acta de Inicio	☐

1.12. FECHA TERMINACIÓN: *(Aplica solo para el informe final)***2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES)****2.1. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):**

NIXON HERNANDO LÓPEZ PERDIGÓN.

2.2. DEPENDENCIA: Grupo Administrativo**2.3. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO**

TEL: 6015169563

EXT. 1025

2.4. CORREO ELECTRÓNICO: nixon.lopez@justiciamilitar.gov.co**2.5. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES) DESIGNADO (S):** N/A**2.6. DEPENDENCIA:** N/A**2.7. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO:** N/A

2.8. CORREO ELECTRÓNICO: N/A

3. RESUMEN FINANCIERO

3.1. VALOR DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA:

Inicialmente por la suma de NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE (\$91.646.921,00), una vez establecida la adición y prórroga que corresponde a SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$68.656.855), se define el valor total por la suma de **CIENTO SESENTA MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$160.303.776)** incluido IVA y demás erogaciones a que haya lugar, de conformidad con la propuesta presentada a través del Portal Colombia Compra Eficiente – Sistema Electrónico de la Contratación Pública - SECOP II.

3.2. VIGENCIAS FUTURAS: SÍ ☐ NO ☒

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	No RADICADO	VALOR	No. CRP
N/A			
TOTAL			

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3. NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal
134024	24/10/2024

(Agregar tantas filas como se requieran)

4. OTROS ASPECTOS

4.1. **ACTA DE LIQUIDACIÓN:** (Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato o aceptación de oferta ésta aplica). N/A

4.2. ESTADO DE AVANCE FINANCIERO A LA FECHA

77,2%

FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso de que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	% DE AVANCE FINANCIERO
19/12/2024	\$91.646.921,00	0\$	\$50.222.515	\$41.424.406	54,8%%
25/01/2025	\$160.303.776	\$50.222.515	\$36.908.669	\$73.172.592	54,35%
17/02/2025	\$160.303.776	\$87.131.184	\$36.680.427	\$36.492.165	77,23%

77,2 % DE AVANCE FINANCIERO**4.3. ESTADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN A LA FECHA (%)**

77,5%

La ejecución contractual que objeta la interventoría se ha desarrollado con normalidad.

4.4 DOCUMENTOS DE CERTIFICADO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**4.4.1 PERSONA NATURAL***Cuadro 5 – Persona Natural*

OBLIGACIONES	NÚMERO Y FECHA DE LA PLANILLA DE PAGO POR CADA PAGO REALIZADO
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N/A

(Si no aplica colocar N/A)**4.4.2 PERSONA JURÍDICA**

Aporta certificado con fecha del 03 de febrero de 2025, firmado por el representante legal con los soportes correspondientes.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y

jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato o aceptación de oferta:

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

ASPECTOS A VERIFICAR	SÍ	NO	EXPLIQUE	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X		En cumplimiento y en ejecución del contrato.	
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.				X
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato				X
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X		En cumplimiento y en ejecución del contrato.	
Los bienes fueron ingresados al almacén				X
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.				X
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.				X
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X		En cumplimiento y en ejecución del contrato.	
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X			
Cumplimiento de las obligaciones contractuales	X		De conformidad con lo establecido para la obra.	
(*) Se dio algún cambio dentro de la ejecución del contrato				X

(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca N/A)

Si su respuesta es “SÍ” al último punto (*), explicar:

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato o Aceptación de Oferta, mediante los siguientes

documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- Soporte de recibo de ingreso a almacén.
- Soporte documental donde se evidencie la prestación del servicio objeto del contrato.
- Documentos o actas suscritas en virtud del recibo del bien o servicio prestado a entera satisfacción de cada una de las entregas.
- Listas de asistencia a la trasferencia de conocimientos o capacitación.
- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

INFORMES ANEXOS: SI

☒

NO

☐

N/A

☐

Relación, tipo y detalle del informe:

1. Informes de interventoría
2. Factura FE-5 de 17 de febrero 2025

5.1. EL CONTRATISTA “CUMPLIÓ” SÍ

☒

NO

☐

JUSTIFIQUE SU RESPUESTA: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

El contratista ha cumplido con el objeto contractual y la ejecución de las obligaciones del mismo.

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:

Se recibe a entera satisfacción de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato/Aceptación de Oferta No. _____ y que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ÍTE M	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA	PENDIENTE POR EJECUTAR
N/A					

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
(si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL, de los servicios prestados pactados en el **Contrato o Aceptación de Oferta** No. 053 de 2024 UAEJPMP

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: (Solo debe ser diligenciado para el informe final y se refiere a la calidad del servicio)

MALO ☐ BUENO ☒

JUSTIFIQUE LA CALIFICACIÓN: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

El contratista da cumplimiento al objeto contractual mediante el normal desarrollo de la obra requerida.

OBSERVACIONES:

FIRMA RESPONSABLES



Supervisor (es)

NOMBRE: Nixon Hernando López Perdigón

CÉDULA: 1.014.207.567

CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C. (03/03/2025)

"Este documento es propiedad de la UAE JPMP y No está autorizado su reproducción total o parcial"

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
97ec385b5c9780aa50dea4ad44f1f8754b6365111bc0bf552d15573512829af055ea098483534b2a9f342f811b687d0d

Número de Factura: FE-5

Fecha de Emisión: 17/02/2025

Fecha de Vencimiento: 19/03/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS

Nombre Comercial: PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS

Nit del Emisor: 901835570

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 7112

País: Colombia

Departamento: Santander

Municipio / Ciudad: Bucaramanga

Dirección: CARRERA 27 # 36 - 38 OFICINA 209

Teléfono / Móvil: 3016455603

Correo: PALO.ARQUITECTURAINGENIERIA@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 900384997

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Santander

Municipio / Ciudad: Bucaramanga

Dirección: CR 46 20 C 01 ED PALACIO DE JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLI

Teléfono / Móvil: 6013150111

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	CONTRATO DE INTERVENTORIA 053 2024 UAEJPMP	INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A REALIZAR LAS ADECUACIONES A LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA USO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL EN LAS INSTALACIONES DEL BATALLON DE ASPC No 30 GUASIMALES	UM	1,00	\$ 30.823.888,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.856.538,76	19.00			\$ 30.823.888,24

Notas Finales

#\$15-21-00;053/2024UAEJPMP;nixon.lopez@justiciamilitar.gov.co#\$

INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A REALIZAR LAS ADECUACIONES A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA USO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL EN LAS INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE A.S.P.C. No. 30 "GUASIMALES" – BAS 30 UBICADO EN CÚCUTA

ACTA N°3

FAVOR CONSIGNAR EN DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS N. 108900492308 A NOMBRE DE PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
17/02/2025 08:24:34
Documento validado por la
DIAN:
17/02/2025 08:24:34
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	30823888.24
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	30823888.24
IVA	5856538.76
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	5856538.76
Total neto factura (=)	36680427
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 36680427

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	30.823.888,24
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	30.823.888,24
IVA	5.856.538,76
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	5.856.538,76
Total neto factura (=)	36.680.427,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 36.680.427,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764071569989 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-05-28

PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS

Nit. 901.835.570-9

Bucaramanga, 03 de febrero de 2025


CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO APORTES PARA FISCALES

REFERENCIA: "INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A REALIZAR LAS ADECUACIONES A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA USO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL EN LAS INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE A.S.P.C. No. 30 "GUASIMALES" – BAS30 UBICADO EN CÚCUTA."

Yo, **JUAN CARLOS JAIMES ACERO**, con cédula de ciudadanía número 91.514.205 de Bucaramanga, quien represento a **PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT 901.835.570-9, certifico que he cumplido y me encuentro al día con las obligaciones provenientes del pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, y Caja de Compensación Familiar), durante los últimos seis meses, legalmente exigibles a la fecha de presentación del ACTA 3 del contrato en referencia.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes.

Cordialmente,



JUAN CARLOS JAIMES ACERO

C.C. 91.514.205 de Bucaramanga

Representante Legal

PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS

NIT. 901.835.570-9

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

139290-T

MARIA ELENA AMAYA RIOS
C.C. 63555505
RES. INSCRIPCION 10
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

DEL 12/02/2009

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

149086

282649



Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A889709E8FF05109

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MARIA ELENA AMAYA RIOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63555505 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 139290-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Diciembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **63.555.505**

AMAYA RIOS

APELLIDOS

MARIA ELENA

NOMBRES

Maria E Amaya

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-AGO-1984**
AGUSTIN CODAZZI
(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.59

O+

F

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

11-DIC-2002 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2701900-00317447-F-0063555505-20110729

0027597989A 1

7151359218

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
91.514.205
NUMERO

JAIMES ACERO
APELLIDOS

JUAN CARLOS
NOMBRES

Juan Carlos Jaimes Acero
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-NOV-1982**
BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

11-DIC-2000 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-2700100-59128882-M-0091514205-20040913 0593604257A 02 162948785

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que TEAMWORKING EST SAS identificado con NI 901002452 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para JEISON EDUARDO RODRIGUEZ SANCHEZ identificado con CC 1093783507:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades													Liquidación			AFP			
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	I N G	R E T	T D E	T A E	T D P	T A P	V S P	V S T	S L N	I G E	L M A	V A C	A V P	V C T	I R L	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9481578066	E	2025/01	2025/02/13	1263056680	AFP	230301	PORVENIR																30	16%	\$480.000	\$0	\$0
9481578066	E	2025/01	2025/02/13	1263056680	ARP	14-11	ARL SURA																30	6.96%	\$208.800	\$0	\$0
9481578066	E	2025/01	2025/02/13	1263056680	CCF	CCF37	COMFANORTE																30	4%	\$120.000	\$0	\$0
9481578066	E	2025/02	2025/02/13	1263056680	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD																30	4%	\$120.000	\$0	\$0

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1098704765	LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ		CARRERA 33, 117-65 APTO 102B	6961041	leidycaro1210@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			SANTANDER	FLORIDABLANCA	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2025-01	2025-01	I	12/02/2025	83724020	TOTAL A PAGAR \$613.100

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	212.500	0		0		0	0	0	0	212.500	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	272.000	0	0	0	0	0	0		272.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	118.400				118.400	0	0	118.400			1.184	118.400	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre				NIT	Valor Aporte	Días Mora
CCF39	Cajasan				890200106-1	10.200	0
						0	
						0	
						10.200	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	212.500	212.500
Pensión	1	272.000	272.000
Riesgos Laborales	1	118.400	118.400
CCF	1	10.200	10.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	613.100	613.100

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	I	12/02/2025	83724020	\$613.100	

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES								PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																			
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subgrupo	Extranjero	Cotom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	TSP	VS	SLN	IDE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CONEXIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clases de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1098704765	HERNANDEZ MARTINEZ LEIDY CAROLINA	57	0			N						X											230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS010	1.700.000	212.500	14-11	1.700.000	5	118.400	CCF39	1.700.000	10.200	0	0	0	0	0

PAGADA

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que TEAMWORKING EST SAS identificado con NI 901002452 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para VIANEY MILENA PEÑALOZA RICO identificado con CC 37276287:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades													Liquidación			AFP			
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	I N G	R E T	T D E	T A E	T D P	T A P	V S P	V S T	S L N	I G E	L M A	V A C	A V P	V C T	I R L	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9481578066	E	2025/01	2025/02/13	1263056680	AFP	25-14	COLPENSIONES																30	16%	\$294,100	\$0	\$0
9481578066	E	2025/01	2025/02/13	1263056680	ARP	14-11	ARL SURA																30	6.96%	\$128,000	\$0	\$0
9481578066	E	2025/01	2025/02/13	1263056680	CCF	CCF37	COMFANORTE																30	4%	\$73,600	\$0	\$0
9481578066	E	2025/02	2025/02/13	1263056680	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.																30	4%	\$73,600	\$0	\$0

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: Versión:1 Fecha de aprobación: Clasificación: Clasificada
--	---	---

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA NO. # 3

***INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y
JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
DENOMINADO “ADECUACIONES A LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA USO DE LA
JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL EN LAS
INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 30
“GUASIMALES” – BAS30 UBICADO EN CÚCUTA”,
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER”***

31/01/2025

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: Versión:1 Fecha de aprobación: Clasificación: Clasificada
--	---	---

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO	2
INTRODUCCIÓN.....	3
1. DATOS GENERALES	4
2. DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA.....	4
3. DATOS DE LA INTERVENTORÍA.....	5
4. ACTIVIDADES DEL MES	5
4.1. Seguimiento al cumplimiento del cronograma	5
4.2. Seguimiento al avance financiero contrato de interventoría.....	7
4.3. Informes semanales.....	7
5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO.....	7
5.1. Plan Ambiental	7
5.1.1. Manejos de demoliciones, escombros y desechos de construcción.....	7
5.1.2. Manejo de residuos sólidos ordinarios, reciclables y peligrosos.....	7
5.1.3. Programa de almacenamiento y manejo de materiales de construcción	8
5.1.4. Manejo de campamentos e instalaciones temporales	8
5.2. Plan SST	8
6. CONTROL DE PERSONAL	9
6.1. Control de personal:.....	9
7. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO.....	9
8. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA.....	10
8.1. Correspondencia Enviada:	10
8.2. Correspondencia Recibida:	12
9. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES	13
10. REGISTRO FOTOGRÁFICO.....	14

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: Versión:1 Fecha de aprobación: Clasificación: Clasificada
--	---	---

INTRODUCCIÓN

Con la finalidad de realizarse las adecuaciones a la infraestructura física para uso de la justicia penal militar y policial en las instalaciones del batallón de A.S.P.C. NO. 30 “GUASIMALES” – BAS30 ubicado en Cúcuta, departamento norte de Santander, el proyecto en referencia con recursos asignados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, busca optimizar mediante estrategias de buenas prácticas de construcción y el uso de materiales idóneos que respondan debidamente a las necesidades del proyecto, un espacio para el correcto funcionamiento de las instalaciones anteriormente mencionadas donde se tendrán en cuenta Zonas Duras, zonas administrativas, zonas de servicio.

El informe de interventoría presenta el seguimiento y control ejercido al contratista CONSORCIO VENTURA de los estudios, diseños, obtención de licencias y permisos requeridos del contrato de obra No. 055-2024 el cual tiene por objeto *“ADECUACIONES A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA USO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL EN LAS INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 30 “GUASIMALES” – BAS30 UBICADO EN CÚCUTA”, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER*” y la supervisión y control se realiza a través del contrato de Consultoría No. 053-2024 UAEJPMP, cuyo objeto es *“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “ADECUACIONES A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA USO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL EN LAS INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 30 “GUASIMALES” – BAS30 UBICADO EN CÚCUTA”, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER*” el cual se encuentra comprendido en un plazo de ejecución de dos meses.

A continuación, se presenta información general de los contratos de obra e interventoría, las actividades realizadas, y anexos como lo son el Informe Mensual de Interventoría, Control Modificaciones Actualización Pólizas, Control de Aportes Legales, Parafiscales, Formato Acta verificación diseños, Formato Relación de documentos, Relación de correspondencia, Actas de Comités de Seguimiento e Informes Semanales.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: Versión:1 Fecha de aprobación: Clasificación: Clasificada
--	---	---

1. DATOS GENERALES

FECHA:	31 enero de 2025	INFORME No.	3
---------------	------------------	--------------------	---

PERIODO No.	3	DEL:	01 de enero	AL:	31 de enero
--------------------	---	-------------	-------------	------------	-------------

OBJETO DEL CONTRATO:	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “ADECUACIONES A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA USO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL EN LAS INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 30 “GUASIMALES” – BAS30 UBICADO EN CÚCUTA”
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Cúcuta / Norte de Santander

2. DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE:	OBRA
CONTRATO No.:	055-2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO VENTURA N.I.T. 900.384.997-1 RL: MARÍA JOSÉ HERRERA GUZMÁN, CON C.C. 52.452.955
PLAZO INICIAL:	Dos (2) meses
FECHA DE INICIO:	05 de noviembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de diciembre de 2024
PLAZO ACTUALIZADO (incluido prorrogas):	15 de marzo de 2025
PLAZO TRANSCURRIDO:	88 días calendario
VALOR INICIAL:	961.926.037,00
VALOR ADICIONES:	0
VALOR ACTUALIZADO (Incluido adiciones):	961.926.037,00

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: Versión:1 Fecha de aprobación: Clasificación: Clasificada
--	---	---

3. DATOS DE LA INTERVENTORÍA

CONTRATO DE:	INTERVENTORÍA
CONTRATO No.:	053-2024
CONTRATISTA:	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.
PLAZO INICIAL:	Dos (2) meses
FECHA DE INICIO:	05 de noviembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de diciembre de 2024
PLAZO ACTUALIZADO (<i>incluido prorrogas</i>):	15 de marzo de 2025
PLAZO TRANSCURRIDO:	88 días calendario
VALOR INICIAL:	\$ 91.646.921,00
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR ACTUALIZADO (<i>Incluido adiciones</i>):	\$ 91.646.921,00

4. ACTIVIDADES DEL MES

- Acompañamiento semanal al ejecutor mediante reuniones internas con el fin de verificar cada una de las subsanaciones requeridas por parte de UAEJPMP en los comités de seguimiento realizados.
- Seguimiento a la programación para llevar control de avance ejecutado en cada una de las actividades.
- Acompañamiento en el desarrollo de los diseños y proyecto.
- Realización de comités técnicos semanales.
- Respuesta oportuna a los requerimientos realizados.
- Revisión de documentación enviada por parte del ejecutor, como son los diseños, planes requeridos y radicaciones realizadas.
- Solicitud de subsanación a los diseños Arquitectónicos, eléctricos, programación de obra, A.P.U contractuales e informes mensuales.

4.1. Seguimiento al cumplimiento del cronograma

A la fecha el porcentaje programado sobre el valor del contrato es del 48.78% y el porcentaje ejecutado sobre el valor del contrato es del 20.19%, lo que evidencia un porcentaje de atraso del



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Código:
Versión:1
Fecha de aprobación:
Clasificación: Clasificada


28.60%, hay que tener en cuenta que hay actividades que generan atraso por el tiempo de fabricación y el porcentaje de rendimiento no es el óptimo para genera un avance significativo.

Seguimiento al avance financiero contrato objeto de interventoría:

Ítem	Valor
Valor contrato (pesos)	\$961.926.037,00
Valor adicional (pesos)	N/A
Valor programado mensual (pesos)	\$ 273.812.347
Valor ejecutado mensual (pesos)	\$ 83.615.386
Porcentaje mensual ejecutado (%)	8.79%
Porcentaje mensual programado (%)	28.71%

El porcentaje mensual ejecutado representa el porcentaje de avance durante el periodo del 1 de enero al 31 de enero del 2025, con respecto al valor del contrato.

CURVA "S" EJECUTADO VS PROGRAMADO

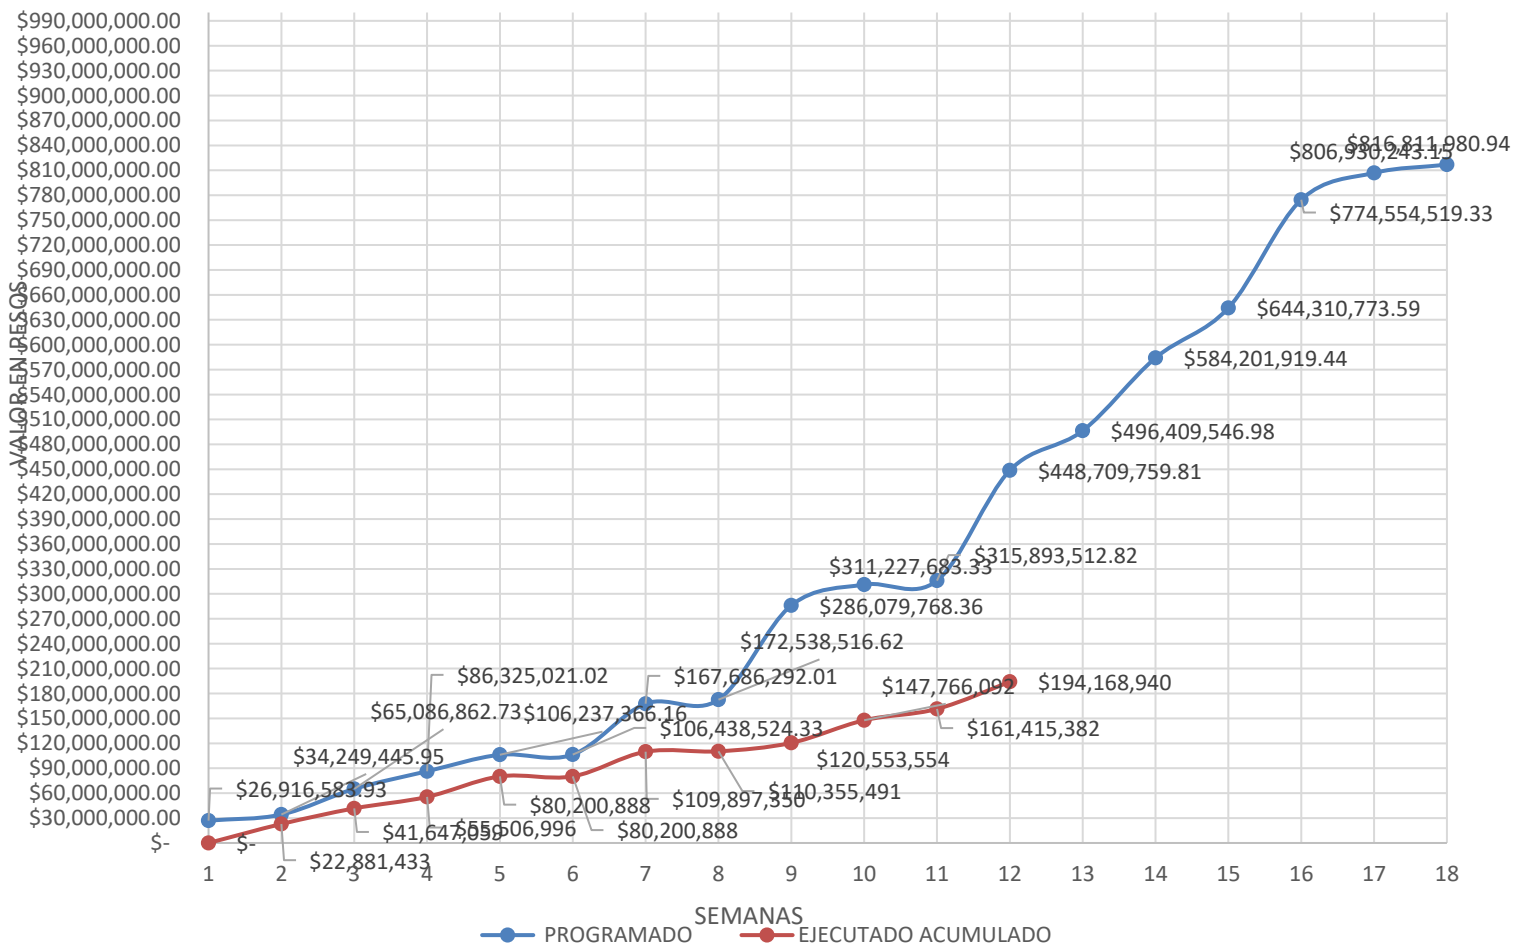

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: Versión:1 Fecha de aprobación: Clasificación: Clasificada
--	---	---

4.2. Seguimiento al avance financiero contrato de interventoría

Seguimiento al avance financiero contrato de interventoría:

Ítem	Valor
Valor contrato Inicial (pesos)	\$91.646.921,00
Valor adicional (pesos)	N/A
Valor programado mensual (pesos)	\$ 45.823.460,5
Valor ejecutado mensual (pesos)	\$ 45.823.460,5
Porcentaje mensual ejecutado (%)	50%
Porcentaje ejecutado acumulado (%)	50%

4.3. Informes semanales

No. Informe	Periodo
9	31 de diciembre del 2024 al 6 de enero del 2025
10	7 de enero al 13 de enero del 2025
11	14 de enero al 20 de enero del 2025
12	21 de enero al 27 de enero del 2025

**Informes Semanales Anexos*

5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO

5.1. Plan Ambiental

5.1.1. Manejos de demoliciones, escombros y desechos de construcción

Durante el periodo recorrido en el presente informe, el contratista CONSORCIO VENTURA ha realizado actividades de demoliciones y desmontes de cubierta, las cuales generan una cantidad de escombros, los cuales son acopiados en un punto temporal hasta su retiro al sitio de disposición final.

Así mismo, la interventoría solicita al contratista la documentación correspondiente al sitio de disposición final, con el fin de verificar su certificación y autorización ante la entidad ambiental competente. Sin embargo, a la fecha no se evidencia la certificación emitida por la escombrera autorizada certificando las cantidades dispuestas.

5.1.2. Manejo de residuos sólidos ordinarios, reciclables y peligrosos

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: Versión:1 Fecha de aprobación: Clasificación: Clasificada
--	---	---

En lo recorrido del presente informe y del periodo anterior, la interventoría le solicita al contratista en reiteradas ocasiones realizar la instalación de los puntos ecológicos según las nuevas disposiciones legales sobre la separación, clasificación, transporte y disposición final de los residuos a la entidad correspondiente, Resolución No. 2184 de 2019 expedida por el Ministerio del Medio Ambiente, que comenzó a regir en el 2021 y establece el NUEVO CÓDIGO DE COLORES PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, blanco, negro y verde, rojo para la separación de residuos en la fuente.

A la fecha, el contratista no ha realizado la implementación de dichos puntos ecológicos los cuales son fundamentales para la clasificación de residuos ordinarios desde la fuente y así minimizar el impacto generado al medio ambiente.

5.1.3. Programa de almacenamiento y manejo de materiales de construcción

El contratista realiza el almacenamiento de materiales en el frente activo de trabajo, en un área designada para tal fin dentro del alistamiento de trabajo y debidamente señalizado, así mismo, se requiere al contratista, realizar el cubrimiento del material sobrante para garantizar que su composición no se vea afectada por el entorno.

Se destaca que, durante el periodo recorrido en el presente informe, se solicitó al contratista los soportes de permisos de cantera de donde se obtienen los materiales pétreos utilizados en obra.

5.1.4. Manejo de campamentos e instalaciones temporales

Durante la ejecución de actividades el contratista realiza la instalación algunos campamentos temporales para el acopio de material y almacenamiento de insumos.

Cabe mencionar que, el contratista hace uso de las instalaciones de la entidad para realizar sus actividades administrativas dotando el lugar de elementos de oficina como mesas, sillas, papel y demás insumos requeridos para este tipo de labores. Así mismo, el contratista hace uso del sanitario existente en el área.

5.2. Plan SST

La interventoría durante el periodo realizó seguimiento al plan de seguridad del contratista, evidenciando en otras, las siguientes actividades:

- Afiliaciones y pago a seguridad social del personal de obra
- Jornadas de capacitación e Inducción HSEQ.
- Acordonamiento y demarcación de zonas de trabajo
- Inspecciones preoperacionales
- Señalización y delimitación de áreas de trabajo
- Revisión del estado y uso de los elementos de protección personal

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: Versión:1 Fecha de aprobación: Clasificación: Clasificada
--	---	---

De acuerdo con el desarrollo de las actividades en obra, el contratista realiza capacitaciones periódicas, así como inducciones al personal nuevo, todo esto con el fin de divulgar, educar y concientizar a los trabajadores prevenir o minimizar riesgos.

6. CONTROL DE PERSONAL

6.1. Control de personal:

CARGO A DESEÑPAÑAR	NOMBRE	PROFESIÓN
Director de interventoría	Leidy Carolina Hernández Martínez	Ingeniera civil
Residente Interventoría	Jeison Eduardo Rodríguez Sánchez	Ingeniera civil
Inspector de Obra	Vianey Milena Peñaloza Rico	Tecnóloga en Obras Civiles
Especialista eléctrico	Ricardo Alvarado Jaimes	Ingeniero electricista
Profesional ambiental	Ruby Stefany Cáceres Quintero	Ingeniera ambiental

7. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO.

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA

Póliza No.	Aseguradora	Póliza de Seguro	Vigencia	Valor Aseg.	Expedición	Aprobación
21-40- 101242390	SEGUROS DEL ESTADO S.A	PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTU AL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	DESDE 25/10/2024 HASTA 20/12/2024	\$260.000.000,00	28/10/2024	28/10/2024
21-44- 101454340	SEGUROS DEL ESTADO S.A	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	DESDE 25/10/2024 HASTA 20/12/2029	\$961,926,037.00	28/10/2024	28/10/2024

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Póliza No.	Aseguradora	Amparo	Vigencia	Valor Aseg.	Expedición	Aprobación
------------	-------------	--------	----------	-------------	------------	------------

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: Versión:1 Fecha de aprobación: Clasificación: Clasificada
--	---	---

56-40- 101003808	SEGUROS DEL ESTADO S.A	PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDA D CIVIL EXTRA CONTRACT UAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	DESDE 24/10/2024 HASTA 31/12/2024	\$260.000.000,0 0	24/10/2024	24/10/2024
56-44- 101008769	SEGUROS DEL ESTADO S.A	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	DESDE 24/10/2024 HASTA 31/12/2029	\$64.152.844,10	24/10/2024	24/10/2024

8. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA.

En las siguientes tablas se relaciona la correspondencia enviada y recibida del contrato en mención.

8.1. Correspondencia Enviada:

TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA				
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	REMITENTE	DESTINATARIO
02/11/2024	OFICIO	Remisión de hojas de vida.	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL
11/11/2024	INT-CUC-001	Solicitud de programación de obra y análisis de precios unitarios.	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	CONSORCIO VENTURA
13/11/2024	INT-CUC-002	Requerimientos del área HSEQ.	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	CONSORCIO VENTURA
20/11/2024	INT-CUC-003	Solicitud de actividades de alto riesgo.	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	CONSORCIO VENTURA
25/11/2024	INT-CUC-004	Informe de actividades realizadas durante la visita técnica.	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	ING.NIXON LOPEZ Y ARQ. EMANUEL LOMBANA(SUPERVISION)
26/11/2024	INT-CUC-005	Informe de visita técnica CENS.	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	ING.NIXON LOPEZ Y ARQ. EMANUEL LOMBANA(SUPERVISION)
29/11/2024	INT-CUC-006	Solicitud Análisis de Precios Unitarios (APU) imprevistos.	PALO ARQUITECTURA	CONSORCIO VENTURA

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: Versión:1 Fecha de aprobación: Clasificación: Clasificada
--	---	---

			E INGENIERIA SAS	
02/12/2024	INT-CUC-007	Solicitud de proyección de presupuesto y cálculos para la instalación de transformador nuevo	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	CONSORCIO VENTURA
03/12/2024	INT-CUC-008	Solicitud Análisis de Precios Unitarios del ítem de redistribución de la cubierta.	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	CONSORCIO VENTURA
05/12/2024	INT-CUC-009	Solicitud de prórroga al contrato de obra y solicitud de adicional y prórroga al contrato de interventoría.	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	ING.NIXON LOPEZ Y ARQ. EMANUEL LOMBANA(SUPERVISION)
09/12/2024	INT-CUC-010	Solicitud de información y acciones correctivas	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	CONSORCIO VENTURA
12/12/2024	INT-CUC-011	Reiteración de Solicitud de Análisis de Precios Unitarios del ítem de redistribución de la cubierta.	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	CONSORCIO VENTURA
12/12/2024	INT-CUC-012	Reiteración de incremento de personal e información de suministro de material	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	CONSORCIO VENTURA
26/12/2024	INT-CUC-013	Observaciones al plan de manejo ambiental y al SG SST	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	CONSORCIO VENTURA
26/12/2024	INT-CUC-014	Solicitud de Programación Actualizada y Ejecución de Actividades Pendientes	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	CONSORCIO VENTURA
27/12/2024	INT-CUC-015	Solicitud de ingreso personal y ejecución inmediata de actividades	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	CONSORCIO VENTURA
27/12/2024	INT-CUC-016	Revisión APU ítems asociados a las actividades eléctricas.	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	CONSORCIO VENTURA
27/12/2024	INT-CUC-017	Solicitud de información sobre materiales pendientes.	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	CONSORCIO VENTURA
02/01/2025	INT-CUC-018	Solicitud de ingreso inmediato del personal asignado al proyecto	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	CONSORCIO VENTURA

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: Versión:1 Fecha de aprobación: Clasificación: Clasificada
--	---	---

04/01/2025	INT-CUC-019	Revisión APU ítems asociados a las actividades eléctricas.	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	CONSORCIO VENTURA
07/01/2025	INT-CUC-020	Reiteración solicitud de ingreso inmediato del personal asignado al proyecto.	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	CONSORCIO VENTURA
16/01/2025	INT-CUC-021	Reiteración solicitud Plan de Acciones Correctivas.	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	CONSORCIO VENTURA
17/01/2025	INT-CUC-022	Reiteración entrega inmediata Plan de Acciones Correctivas por atraso en el desarrollo de actividades.	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	CONSORCIO VENTURA
30/01/2025	INT-CUC-023	Solicitud de entrega de certificado de idoneidad para actividad de soldadura	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	CONSORCIO VENTURA
30/01/2025	INT-CUC-024	Incumplimiento entrega Plan de Acciones Correctivas.	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	CONSORCIO VENTURA

8.2. Correspondencia Recibida:

TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA				
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	REMITENTE	DESTINATARIO
07/11/2024	CV-UAEJPM-001-2024	SOLICITUD ACLARACIONES TECNICAS	CONSORCIO VENTURA	ING.NIXON LOPEZ Y ARQ. EMANUEL LOMBANA(SUPERVISION), PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS
21/11/2024	SOLICITUD	SOLICITUD VISITA CENS 1	CONSORCIO VENTURA	ING.NIXON LOPEZ Y ARQ. EMANUEL LOMBANA(SUPERVISION), PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS
22/11/2024	CONSULTA	CONSULTA ESTRUCTURAL	CONSORCIO VENTURA	ING.NIXON LOPEZ Y ARQ. EMANUEL LOMBANA(SUPERVISION), PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS
29/11/2024	RESPUESTA INT-CUC-006	ÍTEMS NO PREVISTOS	CONSROCIO VENTURA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: Versión:1 Fecha de aprobación: Clasificación: Clasificada
--	---	---

29/11/2024	INFORME TÉCNICO	INFORME ELÉCTRICO DE VISITA REALIZADA CON EL PROFESIONAL DE CENS	CONSORCIO VENTURA	ING.NIXON LOPEZ Y ARQ. EMANUEL LOMBANA(SUPERVISION), PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS
05/12/2024	CV-UAEJPMP-006-2024	SOLICITUD DE PRORROGA EN TIEMPO DE EJECUCION	CONSORCIO VENTURA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS
13/12/2024	CV-UAEJPMP-008-2024	RESPUESTA A OFICIO No. INT-CUC-012	CONSORCIO VENTURA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS
18/12/2024	CV-UAEJPMP-009-2024	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1	CONSORCIO VENTURA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS
30/12/2024	CV-UAEJPMP-010-2024	RESPUESTA A OBSERVACIONES DE APUS NO PREVISTOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES ELÉCTRICAS.	CONSORCIO VENTURA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS
07/01/2025	CV-INTCUC-009-2024	Planimetría Diseño Eléctrico y Cuadro de Cargas	CONSORCIO VENTURA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS
08/01/2025	CV-INTCUC-010-2025	Ficha técnica transformador 115Kva	CONSORCIO VENTURA	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS

9. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

- Durante este periodo interventoría realizó acompañamiento al ejecutor en la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta cada una de las observaciones realizadas por UAEJPMP en los comités de seguimiento realizados.
- Actualmente se presenta un porcentaje de atraso del 28.60%, esto debido a que a la fecha se presentan las siguientes novedades: hay actividades que generan atraso significativo debido al tiempo de fabricación, Algunas actividades no están terminadas al 100%, la falta de personal hace que no se vea reflejado un avance significativo con respecto a la programación. La programación de obra y el análisis de precios unitarios presentados se revisaron por parte de los especialistas de interventoría, y se envió al ejecutor un informe vía correo electrónico donde se le solicita el ajuste de estos, con el fin de realizar un correcto seguimiento a la programación para llevar control de avance ejecutado en cada una de las actividades.
- Se le ha solicitado al contratista el ingreso de más personal para tener un mayor avance en las actividades que no han sido terminadas en un 100%. Cabe resaltar que, aunque el contratista de obra ha ingresado 3 oficiales, 2 ornamentadores y 1 eléctrico en el último mes, aun se presenta un atraso significativo, por lo cual se ha reiterado un plan de contingencia que permita nivelar los atrasos presentados a la fecha.
- Por parte de interventoría se le solicita la contratista plan de contingencia mediante comité y oficio, sin que dicho plan haya sido entregado por el contratista de obra., ya que el tiempo para finalizar el contrato es de 6 semanas y se requiere mayor presencia de personal, se surge trabajar doble turno para poder cumplir con el tiempo contractual.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Código:
Versión:1
Fecha de aprobación:
Clasificación: Clasificada

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO





INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA


Código:
Versión:1
Fecha de aprobación:
Clasificación: Clasificada





INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA


Código:
Versión:1
Fecha de aprobación:
Clasificación: Clasificada

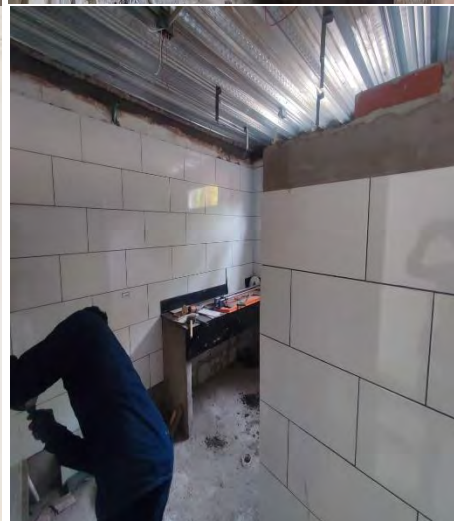



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Código:
Versión:1
Fecha de aprobación:
Clasificación: Clasificada

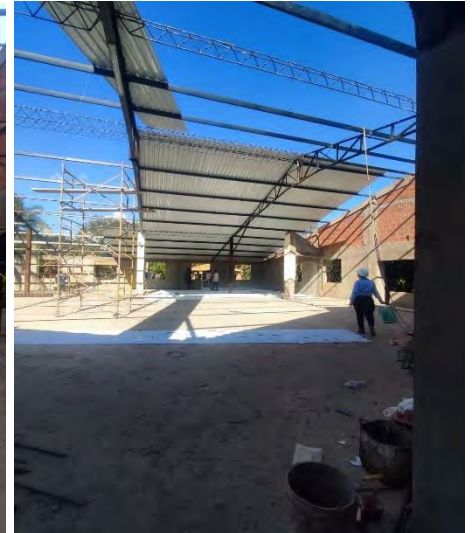

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: Versión:1 Fecha de aprobación: Clasificación: Clasificada
--	---	--

ANEXOS:

- Anexo 1: Bitácora
- Anexo 2: Comités de Seguimiento
- Anexo 3: Informes Semanales
- Anexo 4: Relación de Correspondencia
- Anexo 5: Informe SST Interventoría

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: Versión:1 Fecha de aprobación: Clasificación: Clasificada
--	--	--

Anexo 1: Bitácora



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Código:
Versión:1
Fecha de aprobación:
Clasificación: Clasificada

29

Por los 31 de diciembre. -2024

Se inician actividades a las 7:00 am.
se continua con la actividad de ponerle
en muros (zona de evidencias). personal de obra
(1) oficial, (1) ayudante, (1) Residente, (1) Residente
Siso, se terminaron actividades a las 12:00pm

Residente Int.

Inspector Interventor

Jueves 02 de Enero del -2025

Se inician actividades a las 7:00am.
Se continua con la actividad de ponerle sobre
muros zona de Evidencias, se hace el envío de
la respuesta solicitada al contratista, aclarando
que los aires son (16) unidades de aires acondicionados
con sus manipuladora, con respecto a los equipos de
computo se debe contemplar mínimo un equipo por
area de trabajo. Se dejó la anotación del personal
de obra (1) Residente, (1) Residente Siso, (1) Oficial
(1) Ayudante.

Se terminan actividades a las 5:00pm

Residente Int.

Inspector Interventor

Viernes 03 de Enero del 2025.

Se inician actividades a las 7:00 am.

Se continua con ponerle de muros en zona
de Evidencias, personal de obra (1) oficial
(1) ayudante, (1) Residente, (1) Residente Siso
se terminan actividades a la 5:00pm
sin ninguna novedad.

Residente Int.

Inspector Interventor

líder





INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Código:
Versión:1
Fecha de aprobación:
Clasificación: Clasificada

30



Sábado 04 de Enero del 2025

Se inician actividades a las 7:00 am.
Se continúa con pañete sobre muros
en zona de archivo, se registra (1) oficial
(1) Ayudante, (1) Residente, (1) Residente más
no se registra ingreso de personal se
terminan actividades a las 12:00 m

 Residente Int.  Inspector Interventor

Montes 07 de Enero del 2025.

Se inician actividades a las 7:00 am
Se Retoma la actividad de desmonte de
ventanas en zona de policía judicial, Excavación
para vigas de cimentación, Personal de obra
(3) oficiales, (2) ayudantes, se inicia con la
manipostería para tapar vanos de ventanas
existentes, se terminan actividades a las
5:00 pm.

 Residente Int.  Inspector Interventor

Viernes 08 de Enero del 2025.

Se inician actividades a las 7:00 am
Se Retoma con la actividad de los cortes de
vanos en zona de policía judicial, se recomienda
usar un equipo con guardas de seguridad, se
continúa con la excavación con retomado en
zona de sala de audiencias para vigas de

líder=



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Código:
Versión:1
Fecha de aprobación:
Clasificación: Clasificada

31

Cimentación, Personal de obra (3) oficiales, (2) ayudantes (1) Residente, (1) Residente SJO.

Se terminan actividades a las 5:00 pm

Jueves 09 de Enero 2025.

✓ *Elene Peruleros*
Inspector Interventor

Se inician actividades a las 7:00 am.

Se continua con la actividad de conformación de vanos en zona policia judicial, que consta de suministro de marcos, puertas existentes corte de mamposteria para poner ventanas y mamposteria para vanos, se continua con paredes en zona oficinas policia judicial, mamposteria en muro perimetral oficinas armada de acero y fundición de vigas cimentación, se fundido O concreto de limpieza, se inicia con mamposteria en Placa cubierta para soporte de tanque aereo.

Personal de obra (4) oficiales (2) ayudantes (1) Residente de obra (1) Residente SJO.

Se Terminan actividades a las 5:00 pm

✓ *J.R.F.*

✓ *Elene Peruleros*
Inspector Interventor

Viernes 10 de Enero 2025.

Se inician actividades a las 7:00 am.

Se continua con las actividades de mamposteria perimetral, conformación de vigas de Cimentación, pared en zona policia judicial Se inicia con la actividad de enchape en Muros de Baños Sanitarios, se hace revision de

líder=



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Código:
Versión:1
Fecha de aprobación:
Clasificación: Clasificada

32

altura y modulación, Personal de Obra
(4) Oficiales, (2) ayudantes, (1) Residente de
Obra, (1) Residente Srso. Se registra ingreso de Arena
Se Terminan actividades a las 5:00pm

Residente Trd.

Inspector Interventor

Sábado 11 de Enero - 2025

Se inician actividades a las 7:00 am
Se continúa con la actividad de pañetes en
Policía Judicial, Mampostería perimetral
Vigas de confinamiento, armado de acero, en
cúpula y fundido de columnetas, Se Retoma
las actividades de instalación de Estructura en
cubierta, se continúa con Enchape en muros
bajos, se registra el ingreso de material
para actividades eléctricas, se hace retiro
de material de Escombro. (1 viaje), personal
de obra (4) Oficiales, (2) ayudantes, (1) Electricista,
(1) Oficial Ornamentación, (1) Residente,
(1) Residente Srso. se terminan actividades a las 12:00 medio día.

Residente Trd.

Inspector Interventor

Domingo 13 de Enero - 2025.

Se inician actividades a las 7:00 am
Se retoma la actividad de instalación de
malla para placa contrapiso, se inicia la
instalación de tubería pvc. conduit, se continúa
con la instalación de Estructura para cubierta
Se continúa con la mampostería, Armado y
Fundido de viga dintel y de confinamiento

líder=



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Código:
Versión:1
Fecha de aprobación:
Clasificación: Clasificada

33

al igual que armada y fundida de columnetas, se continua con la actividad de Enchape en muros, baterías sanitarias. Personal de obra, (3) oficiales, (2) ayudantes, (1) Electricista, (1) Documentador, (1) Residente de obra, (1) Residente SISO. Terminando actividades a los 5:00 pm.

Residente SISO

Inspectores de Interventoría

Partes 4 de Enero - 2025

Se inician actividades a los 7:00 am

Se continua con la actividad de limpieza de area para la Fundida de losa contrapiso la interventoria sugiere que se instalen los separadores con el fin de garantizar el aislamiento de la malla, al igual que es indispensable la limpieza y retiro de toda partícula suelta, casco para proseguir al vareado del concreto. Se continua con el vareado de concreto preparado en obra para las columnetas de con finamiento de mamposteria, instalación de estructura para cubierta y instalación de tubería p.u.r. para conexiones y redes electricas. personal de obra, personal de obra, (3) oficiales, (3) ayudantes, (1) Electricista, (1) Documentador, (1) Residente, (1) Residente SISO. El día de ayer en horas de la tarde al terminar jornada (5:30 pm) se registra el ingreso de un viaje de mixto (tintado 3/4 y Asera gruesa), se terminan actividades a las 5:00 pm

Residente SISO

Inspectores de Obra

líder=



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Código:
Versión:1
Fecha de aprobación:
Clasificación: Clasificada

34

Viernes 15 de Enero. - 2025
Se inician actividades a las 7:00 am
Se continua con el realce de la mampostería
armada y fundida de columnetas de enjambio.
mientes y viga cinta concreto preparado en
obra, igualmente se continua con armadura
de acero para columnas, se continua con armada
de cubierta, estructura, instalación de tubería
p.v.c. eléctrica en los diferentes pisos, pasillo
y Bañeros sanitarios. El día de hoy se registra
el ingreso de (1) obrero y 1 ayudante para
un total de (4) obreros, (3) ayudantes (1) Elec-
trico (1) Ornamentador, (1) Residente, (1) Gerente
Srso. Se terminan actividades a las 3:00 pm

Residente Snt.

Hilario Muñoz Rueda
Inspector de Interventoría

Jueves 16 de Enero 2025
Se inician actividades a las 7:00 am
Se continúan con las actividades de mampostería
armada y fundida para elementos de confinamiento
en mampostería, se continua con la ejecución
manual, armada de acero y fundida de
zapata en paruto existente, se continua con
la armada de estructura para cubierta, se
Retorna con la actividad de fundida de
losa contrapiso con concreto y
en obra, instalación y cableado para red
eléctrica, se registra el ingreso de un
traje de mixto (Trabajo 3/4 y acero), estibas
para columnas, Personal de obra (4) obreros
(3) ayudantes, (1) ornamentador, (1) Electricista
(1) Residente, (1) Residente Srso.

líder=



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Código:
Versión:1
Fecha de aprobación:
Clasificación: Clasificada

35

Se Terminan actividades a las 5:00pm

Residente Int.

Residente Int.

Inspector de obra

Miércoles 17 de Enero 2025.

Se inician actividades a las 7:00am

Se continua con la mampostería para
Redke e instalación para estructura de
cubierta, Se continua con armadura y fundida
de columnetas y vigas de confinamiento.

Se continua con ponete sobre mampostería

Se hace cableado de la zona de sala de
audiencias. Se registra el ingreso de un

Viñe de mixto (Arera gruesa y Tripulador)

personal de obra (1) Residente, (1) Residente siso

(5) oficiales, (3) ayudantes, (1) oficial Electri-

cista. Se hace armadura de acero y enco-

frada para fundida de columna en
muro existente.

Se Terminan actividades a las 5:00pm

Residente Int.

Residente Int.

Inspector de obra

Sábado 19 de Enero 2025

Se inician actividades a las 7:00 am

Se continua con mampostería ponete en

muros, Se hace el vacado de concreto

para columna en muro existente, con

concreto preparado en obra, Se continua con

el armado de acero y fundida para

columnetas de confinamiento, Personal de

obra (1) Residente, (1) Residente siso, (5) Oficia-

(3) ayudantes, (1) Electricista, se terminan


líder=



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA



Código:
Versión:1
Fecha de aprobación:
Clasificación: Clasificada

36

actividades a los 12:00 media día
  Jairo Pineda Snt.  Wilson Pineda
Inspector Interventor

Lunes 20 de Enero - 2025.

Se inician actividades a los 7:00 am
se continua con la actividad de marmos-
tería, panele, armado y fundido de
columnas en muro existente se hace Retiro
de escombros material de excavación
el día de hoy se registra el ingreso de
la lamina Arquitectonica para cubierta,
Ingreso del transformador, se Realiza des-
carga manual, se hace encofrado, y fundida
de columnas para soporte cubierta,
Personal de obra (1) Residente, (1) Residente Siso
(1) Electricista, (5) Oficiales, (4) Ayudantes, se
terminan actividades a las 5 pm.

  Jairo Pineda Snt.  Wilson Pineda
Inspector de Interventura
Martes 21 de Enero del 2025.

Se inician actividades a los 7:00 am
se continua con la actividad de marm-
postera, armado y fundido de vigas y
columnetas de confinamiento, panele en
muro, armado y fundido en columna
nueva en muro existente, la interventura
Realiza la necesidad de pintar la estructura
de la cubierta con pintura anticorrosiva
antes de esto se deben limpiar los
elementos que se encuentran o presentan
gran cantidad de oxido, de acuerdo a.

líder=



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Código:
Versión:1
Fecha de aprobación:
Clasificación: Clasificada

37

los especificaciones en los planos item 1.25, el cual dice que se debe aplicar dos capas de pintura anticorrosiva en todos los casos de cada uno de los elementos instalados, y ya que en obra se evidencia que a estos elementos no se les aplicó correctamente la pintura, ya que se evidencia partes sin la misma, igualmente las columnas instaladas presentan óxido en todo el elemento y se debe retirar antes de aplicar la pintura, se requiere que se realice la actividad completa con el fin de evitar atrasos en la instalación de los lumineros, se hace aplicación de pintura a una sola mano y se procede a instalar la lumineros de cubierta.

Personal de obra (1) Residente, (1) Residente siso, (5) operarios, (4) ayudante, (1) Electricista se terminan actividades a las 5:00pm.

Residente Int.

Inspector de Interventoría

Viernes 22 de Enero -2025.

Se inician actividades a las 7:00 am.

Se continúa con la mampostería para redre e instalación de estructura para cubierta.

se continúa con pañet sobre muros en fachada (zona jardinera). Instalación de tubería para redes eléctricas, Instalación de cubierta, excavación para zapata columna refuerzo muro existente. Se continúa con armadura de acero, encofrado y fundición

líder=



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Código:
Versión:1
Fecha de aprobación:
Clasificación: Clasificada

38

de columnetas para confinamiento de mampostería. Se reitera al contratista la importancia de pintar la estructura antes de instalar las lamina de las cubiertas ya que se evidencia que no es homogénea la pintura aplicada a la misma persona de obra (1) Residente (1) Residente SDO. (5) Oficiales, (4) ayudantes. (1) Electricista. Se Terminan actividades a las 5:00 pm

Residente Int.

Jueves 23 de enero - 2025

Se inician actividades a las 7:00 am.

Se continúa con la mampostería para reate instalación cubierta, muro perimetral, se realiza armadura de acero, encofrado y fundido de columnas en fachada, armadura de acero encofrado y fundido de columnetas de confinamiento, armadura de acero y fundido de zapata para peaje de muro existente, se hace concreto tipo ciclopeo, con concreto mezclados en obra. Se continúa con el portes en muros internos y fachada, se continúa con la instalación de cubierta, Instalación de tubería en zona de ofiás. personal de obra (1) Residente (1) Residente SDO, (5) Oficiales (4) ayudantes (1) Electricista. Se terminan actividades a las 5:00 pm.

Residente Int.

Viernes 24 de Enero - 2025.

se inician actividades a las 7:00 am

líder=



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Código:
Versión:1
Fecha de aprobación:
Clasificación: Clasificada

39

se continua con las actividades siguientes.
• Armado de mampostería en muro Fachada,
• Ponete en muros de Fachada, armadura y
Fundida de columnetas y vigas para confino.
mimiento, armadura de columna para refuerzo
muro existente, armadura y fundida de viga
superior, Instalación de cubiertas, personal de
obra, (1) Residente (1) Residente siso, (5) Oficiales
(4) ayudantes, Se terminan actividades a los
5:00pm

Residente Int

Filipe Mendez
Inspector de Interventoría

Saludo 25 de Enero 2025.

Se iniciaron actividades a los 7:00am
El día de hoy se realiza jornada de
limpieza, orden y recolección de ma-
teriales, se continua con la mampostería
realce para cubiertas se continua con ponete
de muros en zonas exteriores, Armadura
y fundida de columnas para Fachadas, con
concreto mezclado en obra, se realiza la
Fundida de la losa de concreto antepono
faltante, personal de obra (1) Residente (1) Residente
siso, (5) Oficiales (4) ayudantes (1) Electricista
se termina las actividades de instalación de
tubería p.v.c. para conexiones externas.
Se terminan actividades a los 12:00 medio
día

Residente Int

Filipe Mendez
Inspector de Interventoría

líder=



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Código:
Versión:1
Fecha de aprobación:
Clasificación: Clasificada

40

Jueves 27 de Enero - 2025.

Se iniciaron actividades a las 7:00am.

Se continua con armada de acero en columnetas y vigas de confinamiento, encofrado y vaciado de concreto en columnetas con concreto mez-





clado en obra, se continua con paneles sobre muros de mampostería, Armada y fundida de viga corona, se continua con instalación de cubierta, se inicia con excavación para caja de

Inspección eléctrica, mampostería para coque.

En zona de cableado, se continua con mampostería para realce, armada de acero para (muro) columna en muro existente.

Se realiza committe de obra, se cuenta con la presencia del Supervisor, se hace replanteo de los muros para pagos o reales instalación de ventanas. Se continua con instalación de tubería eléctrica y cableado, personal de obra (5) operarios (4) ayudantes, (1) electricista.

(1) Residente (1) Residente siso, el día de hoy se registra el ingreso de material pedreo (arena). Se terminan actividades a las 5:00pm

  
Residente Int. 
Firmado Interventor

Viernes 28 de Enero - 2025

Se iniciaron actividades a las 7:00am.

Se continua con la excavación para caja de Inspección eléctrica, se hace mampostería para coque en centro de cableado, se

continua con mampostería realce para instalación de cubierta, se continua con paneles sobre mampostería, se reforma la instalación de enchufes en muros laterales sanitarios

líder=



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA


Código:
Versión:1
Fecha de aprobación:
Clasificación: Clasificada

41

Se continúa con el cableado para ved eléctrica, se inicia un parete para columnas armadas y tendida de columna refuerzo para muro existente, personal de obra.

(5) Oficiales, (4) ayudantes, (1) Electricista (1) ayudante electricista, (1) Residente (1) Residente s/o.

Se registra Retiro de escombros, se terminan actividades a las 5:00 pm


  Jefe de Interventoría
Residente Int.

Viernes 29 de Enero - 2025.

Se inician actividades a las 7:00 am.

Se continúa con la actividad de parete sobre muros exteriores, mampostería para realce, armada de acero y encofrado de Vigas de confinamiento, se continúa con enchape en muro de los muros, se continúa con actividades en centro de cableado y caja de inspección, se hace replanteo de niveles para cielo raso, (Armado de estructura). personal de obra (5) operarios (4) ayudantes (3) Electricistas, (1) Residente (1) Residente s/o.

Se Terminan actividades a las 5:00 pm

  Jefe de Interventoría
Residente Int.

Jueves 30 de Enero 2025.

Se inician actividades a las 7:00 am

Se continúa con mampostería, para realce de soporte cubata, armada de acero y encofrado para columnetas y vigas de confinamiento, concreto preparado en

líder=



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Código:
Versión:1
Fecha de aprobación:
Clasificación: Clasificada

42

obra, pañete sobre muros en zona de sala de oficinas, Recepción de documentos, en zona policía judicial se inicia con la actividad de Embase, filos para Vanos de Ventanilla se continua con la actividad de enchape sobre muros en baterías sanitarias. Se continua con la excavación para caja de Inspección eléctrica, El día de hoy se autoriza el ingreso de 10 personal y (1) ayudantes quienes realizaron actividades de ornamentación, (6) Oficiales (4) ayudantes (2) electricistas, (2) Ornamentadores, (1) Residente (1) Residente Siso, se Terminan actividades a las 5:00pm.

Residente Int.

Inspector Interventor

Inspector Interventor

Viernes 31 de Enero del 2025.

Se inician actividades a las 7:00am se continua con la Armado y Fundido de Vigas de confinamiento para mampostera, pañete sobre muros internos y externos, Instalación de estructura para cielo raso, Filos y embases en ventanillas policía judicial, Instalación de enchape en baterías sanitarias (Muro) Armado de caja inspección eléctrica, colocación en zona de cableado, Instalación de Estructura metálica para confinamiento en zona de oficinas, (muros) demarcación de zonas para pisos divisiones oficinas. Personal de obra (1) Residente, (1) Residente Siso, (6) Oficiales (4) ayudantes (2) Ornamentadores (2) Electricistas, se Terminan actividades a las 5:00pm

líder=

Residente Int.

Inspector Interventor

Inspector Interventor

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: Versión:1 Fecha de aprobación: Clasificación: Clasificada
--	--	--

Anexo 2: Comités de Seguimiento

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: Versión:1 Fecha de aprobación: Clasificación: Clasificada
--	---	--

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL					
SECRETARIA GENERAL					
GRUPO ADMINISTRATIVO					
ACTA DE COMITÉ DE OBRA					
CÓDIGO: UAEJPMP / F-06	VERSIÓN: 01	EMISIÓN: 21 AGOSTO 2024			

LUGAR Y FECHA		ACTA DE COMITÉ No X			
CIUDAD - UBICACIÓN		DÍA	MES	AÑO	
CUCUTA NORTE DE SANTANDER - BATALLON A.S.P.C.No.30 "GUASIMALES"-BAS30		13	1	2025	
N° DE CONTRATO	055-2024-UAEJPMP	HORA INICIO	8:00	HORA CIERRE	8:30

INTERVIENEN	
Jhoan Manuel Orjuela	Contratista de obra
Jorge Morales	Residente de Obra
Leidy Carolina Hernández	Directora Interventoría
Jeison Rodriguez	Residente de Interventoria
Milena Peñalosa	Inspectora de Interventoria
Fernando Puentes García	Auxiliar de Interventoría

PUNTOS POR TRATAR / ORDEN DEL DÍA	
• Avance del proyecto. • Compra y suministro de materiales. • Observaciones estructurales cubierta. • Diseño enchape de los baños. • Diseño eléctrico.	

VERIFICACIÓN COMPROMISOS ACTA ANTERIOR	
No aplica.	



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Código:
Versión:1
Fecha de aprobación:
Clasificación: Clasificada

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 08:00 a. m. del día 13 de enero del presente año, se reunieron de forma virtual el contratista de obra y la interventoría con el fin de realizar el seguimiento del proyecto.

- La interventoría socializó los porcentajes de avance de la obra, informando que, a la fecha, el proyecto presenta un avance ejecutado del 12,53%, frente a un avance programado del 32,16%. Esto implica un atraso del 19,63%, por lo cual se solicitó al contratista presentar un plan de contingencia para mitigar los retrasos, toda vez, que a la fecha nos encontramos a 2 meses para la terminación del proyecto, y si el contratista no entrega un plan de contingencia, la interventoría evidencia que no podrá terminar en el tiempo contractualmente establecido.

- Asimismo, la interventoría consultó sobre el personal en obra. El contratista informó que actualmente cuenta con siete trabajadores de obra civil, un ornamentador y un electricista. Además, se espera el ingreso de un oficial y un ayudante durante la semana. La interventoría solicitó incluir el incremento de personal en el plan de contingencia.

- En cuanto al suministro de materiales, el contratista se comprometió a adquirir el transformador en mismo día y confirmó que las actividades eléctricas ya habían iniciado. Respecto a la adquisición de tejas para la cubierta, indicó que la compra se realizará durante la semana, mientras que los pisos y enchapes ya se encuentran disponibles, ya que se realizó la compra.

- El contratista expresó su preocupación respecto a la instalación de drywall en las oficinas, ya que peso adicional de aproximadamente 2,5 toneladas podría comprometer la estructura. Solicitó un concepto técnico sobre la necesidad de reforzar la estructura o garantizar que no se presentarán problemas. La interventoría respondió que el contratista debía enviar la modulación de la cubierta conforme ya se había manifestado, ya que se realizó una modificación solicitada por el contratista para dar mayor garantía de la cubierta, y esta aun no ha sido recibida. Así mismo la interventoría recalca que se observó que los perfiles se estaban colocando pegados a las cerchas mediante platinas. Solicitó al contratista justificar esta práctica, señalando posibles malas prácticas constructivas. El contratista respondió que las platinas utilizadas cuentan con un grosor adecuado y que enviará las especificaciones técnicas correspondientes, además que las correas se están instalando con un cordón superior e inferior y manifiesta que no se pueden realizar cortes para acoplarlo mejor porque se estaría perdiendo la rigidez del elemento. No obstante, expresó su preocupación por una posible deflexión en las cerchas, dado que la estructura soportará un peso similar al de la teja de asbesto-cemento reemplazada. La interventoría pidió fotografías para evaluar y revisar la instalación con un ingeniero estructural y solicitó nuevamente la modulación de la cubierta, la interventoría manifiesta que no puede quedar la correa soldada a una platina y de la platina a la cercha dejando un espacio entre ellas.

- La interventoría informó que enviará en el transcurso del día las correcciones de los análisis de precios unitarios (APU) presentados por el contratista con las observaciones realizadas.

- El contratista expresó su desacuerdo con la disposición del enchape en los baños, señalando que los cerámicos se instalaron de forma trabada, con una dilatación de 3 mm, lo cual podría generar un alabeo perceptible al tacto y visualmente. La interventoría explicó que esta disposición busca minimizar los pandeos característicos de los formatos de 60 cm y destacó que no se espera que esto represente problemas a largo plazo, dejando constancia en el acta, además ya se realizó la instalación en dos muros de esta cerámica, se generarían retrocesos.

- Finalmente, la interventoría señaló que el diseño eléctrico está siendo revisado por el especialista

CONCLUSIONES / ACUERDOS / RECOMENDACIONES

Con base en el atraso presentado en la ejecución del proyecto se solicita presentar e implementar un plan de contingencia con medidas efectivas para mitigar el atraso y cumplir con el cronograma contractual, incluyendo el ingreso de nuevo personal a la obra.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Código:
Versión:1
Fecha de aprobación:
Clasificación: Clasificada

AVANCE PROYECTADO: 32,16%

AVANCE EJECUTADO: 12,53%

El presente informe mensual de intervención, tiene como objetivo informar a la Junta de Vigilancia de la Salud, sobre el avance de los trabajos de intervención en el municipio de...

En el mes de marzo de 2014, se realizaron actividades de intervención en el municipio de...



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Código:
Versión:1
Fecha de aprobación:
Clasificación: Clasificada

COMPROMISOS PACTADOS

Por parte del contratista:

- Enviar el plan de contingencia.
- Realizar la compra del transformador - 13/01/2025
- Ejecutar la compra de las tejas de la cubierta - 18/02/2025
- Enviar a interventoría la modulación de la cubierta.
- Radicar una vez sea aprobado el diseño eléctrico ante la electrificadora.

Por parte de interventoría:

- Enviar las observaciones a los APU presentados por el contratista - 13/01/2025
- Presentar las observaciones del diseño eléctrico.
- Emitir concepto técnico estructural sobre la estructura de la cubierta.

ELABORÓ

Arq. Emanuel Lombana Reyes apoyo a la supervisión

NOMBRE: Ledy hernandez
CARGO: Directora de interventoria

NOMBRE: Ricardo Rosales
CARGO: Inspector de Interventoria

NOMBRE: Joselyn Rodriguez
CARGO: Residente Interventoria

NOMBRE: BRUCE F. HORACER
CARGO: RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE: SEBASTIAN DE OBRA
CARGO: SEBASTIAN DE OBRA

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: Versión:1 Fecha de aprobación: Clasificación: Clasificada
--	---	--

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL SECRETARÍA GENERAL GRUPO ADMINISTRATIVO ACTA DE COMITÉ DE OBRA			
CÓDIGO: UAEJPM / F-06	VERSIÓN: 01	EMISIÓN: 21 AGOSTO 2024	

LUGAR Y FECHA		ACTA DE COMITÉ No		
CIUDAD - UBICACIÓN		DÍA	MES	AÑO
CUCUTA NORTE DE SANTANDER - BATALLON A.S.P.C.No.30 "GUASIMALES"-BAS30		20	1	2025
N° DE CONTRATO	055-2024-UAEJPM	HORA INICIO	8:30	HORA CIERRE
				8:50
INTERVIENEN				
Nixon Hernando López Perdigón		Supervisor		
Emanuel Lombana Reyes		Apoyo a la Supervisión		
Jhoan Manuel Orjuela		Ingeniero		
Jorge Morales		Residente de Obra		
Leidy Carolina Hernández		Directora Interventoría		
Jeison Rodríguez		Residente de Interventoria		
Milena Peñalosa		Inspectora de Interventoria		
Fernando Puentes García		Auxiliar de Interventoría		
PUNTOS POR TRATAR / ORDEN DEL DÍA				
•Socialización avance de la obra. •Solicitud plan de contingencia. •Solicitud aprobación estructura cielorraso. •Revisión presupuesto disponible.				
VERIFICACIÓN COMPROMISOS ACTA ANTERIOR				



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Código:
Versión:1
Fecha de aprobación:
Clasificación: Clasificada

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 08:30 a. m. del día 20 de enero del presente año, se reunieron de forma virtual la supervisión, el contratista de obra y la interventoría con el fin de realizar el seguimiento del proyecto.

- La Interventoría socializa los porcentajes de avance obra, teniendo a fecha del comité un porcentaje ejecutado de 15,36% y un porcentaje programado de 34,82%. Asimismo, solicitó información sobre el personal en obra, confirmándose que hay nueve trabajadores y un eléctrico. Además, reiteró al contratista la necesidad de presentar un plan de contingencia para nivelar los atrasos detectados y garantizar el cumplimiento del plazo contractual, solicitud que ya había sido realizada durante el comité anterior y mediante oficio, sin obtener respuesta hasta la fecha.
- El contratista respondió que se compromete a entregar el plan de contingencia el viernes 24 de enero. Sin embargo, aclaró que, aunque no ha presentado el plan por escrito, en la obra se han implementado medidas y decisiones necesarias para la correcta ejecución del proyecto. Por ejemplo, mencionó que, aunque no fue posible adquirir las tejas en Cúcuta debido a un tiempo de entrega de 15 días, se optó por comprarlas en Bogotá, por lo cual ya fueron recibidas en obra. También, informó que el transformador ya fue comprado y llega en el transcurso de la mañana, esperando dejarlo instalado el viernes 24 de enero.
- El contratista explicó que los atrasos también se deben a imprevistos en la obra, como la situación del muro que previamente se recomendó derribar, pero que no se demolió debido a que no se contaba con los recursos. Sin embargo, durante el desarrollo de las conexiones de mampostería, se evidenció que el muro no tenía la rigidez adecuada, por lo que se decidió comprar acero de 5/8, se construyó una parrilla de 1,20 m, se excavó a una profundidad de 1,20 m y se levantó una columna de aproximadamente 50 x 30 cm para rigidizarlo, a pesar de que esta actividad no estaba contemplada en el contrato. El contratista reafirmó que se han presentado varios imprevistos, que han sido solucionados y que se están tomando las medidas y correctivos necesarios para entregar la obra en el plazo establecido, afirmando su compromiso de culminar la obra el 15 de marzo. Asimismo, reiteró que el viernes presentará el plan de contingencia a la interventoría y que, durante la semana, se desarrollarán actividades cruciales como los trabajos eléctricos y la instalación de la cubierta.
- Adicionalmente, el contratista solicitó a la interventoría la aprobación de la estructura propuesta para cielorraso. Indicó que, tras conversar con el ingeniero Nixon López, la estructura es necesaria para soportar los aires acondicionados y la tubería eléctrica. A pesar de ello, mencionó que iniciará esta actividad durante la semana, ya que cuenta con disponibilidad. Además, planea contratar un ornamentador, quien ingresará el 21 de enero. La interventoría responde que, en la obra, se presentó un esquema del apoyo del cielorraso, el cual fue aprobado en ese mismo momento. Sin embargo, el contratista indicó que no tenía conocimiento de esta aprobación y se comprometió a adquirir el material y comenzar la instalación el día siguiente, trabajando de manera simultánea en la cubierta, la mampostería y el cielorraso.
- La interventoría manifestó que se realizaron algunas recomendaciones, basadas en lo discutido en el comité anterior, en obra con el residente de interventoría y el residente de obra, relacionadas con los apoyos de la cubierta. El contratista indicó que, siguiendo estas indicaciones, se colocó una riostra en la cercha más larga para aumentar su resistencia. Asimismo, aclaró que, aunque la cubierta no representa un peso significativo, su preocupación inicial era el peso adicional del cielorraso, situación que ya fue solucionada. Además, informó que se instaló un refuerzo inferior de correa a correa, tal como se había solicitado.
- El contratista consulta a la interventoría si puede enviar las correcciones de los no previstos solicitadas por correo el 21 de enero, a lo que la interventoría responde que no hay inconveniente.
- La interventoría socializa las actividades en ejecución, mencionando que se está armando el acero de columna de refuerzo del muro, avanzando con la mampostería de la fachada y el armado de acero de las vigas de amarre en dicha zona. Asimismo, informa que se iniciará el enchape de los baños, se está trabajando en el cableado eléctrico y en el armado de columnetas de confinamiento.
- El supervisor solicita una aclaración sobre los porcentajes programados, ya que la semana pasada se registró un porcentaje programado del 32% y esta semana es del 34,82%, lo que parece no ser congruente. El contratista responde que la semana pasada estuvo rectificando el avance en obra con la programación enviada, y para ese día correspondía un porcentaje programado del 27%. Asegura que el porcentaje presentado en el comité actual por la interventoría es asertivo, ya que refleja un incremento del 5%. El supervisor pregunta si la programación para las últimas 7 semanas, es la que muestra una curva de ascenso, de acuerdo con la programación presentada por el contratista. El contratista responde que la reprogramación se realizó debido a problemas como el ingreso de personal a fin de año. Por esta razón, se optó por enviar personal conocido al proyecto. Añade que se espera un avance significativo de aquí al 15 de febrero, y por lo mismo en la programación se dejaron las principales actividades para las últimas fases del proyecto.
- El supervisor manifiesta que comprende que no es fácil conseguir mano de obra a fin de año y expresa su confianza en el compromiso del contratista con el desarrollo de la obra. Sin embargo, señala que le preocupa que los imprevistos, como el del muro, requieren recursos y tiempo, por lo que solicita que se procure percibirlos con celeridad, y si bien es cierto que el contratista debe contar con un plan de contingencia para este tipo de situaciones, también sugiere que la interventoría realice una revisión de la estructura total para



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Código:
Versión:1
Fecha de aprobación:
Clasificación: Clasificada

verificar si se requiere alguna modificación adicional.

- Asimismo, recalca que confía en el criterio del contratista para incorporar el personal necesario, conforme avance la obra. En relación al refuerzo de la cubierta con elementos rigidizadores y la suspensión de las guayas del cielorraso, el supervisor manifiesta que no le inquieta el peso del cielorraso, pero considera que esos mismos elementos pueden aprovecharse para instalar los aires acondicionados tipo cassette. Dado que la cubierta tiene una cota considerable de 4 a 4,7 metros, sugiere que sería más conveniente contar con elementos de menor altura para asegurar los equipos de aire acondicionado.

- Por último, señala que este tipo de actividades debe ser reconocido dentro del balance, por lo que solicita un panorama actualizado sobre el presupuesto, a lo cual tanto la interventoría como el contratista responden que, hasta el momento, no es necesario realizar adiciones al presupuesto. Sin embargo, el supervisor hace una invitación a realizar una revisión minuciosa sobre el comportamiento de la obra en los dos meses restantes, ya que, en caso de que se necesite una adición, será complicado debido al plan de austeridad que ha iniciado la nación. Por lo tanto, solicita que, en caso de requerir un adicional, se informe a la mayor brevedad posible.

Se da por terminado el comité de obra a las 08:50 am.

CONCLUSIONES / ACUERDOS / RECOMENDACIONES

Se destaca el compromiso del contratista para terminar el proyecto en el tiempo contractual, a pesar de los imprevistos que han afectado el avance, como la compra de materiales en lugares alternativos y el desarrollo de actividades no previstas. Sin embargo, se reitera la necesidad de presentar un plan de contingencia, para mitigar los atrasos y nivelar el avance con el cronograma, así como el incremento de personal para el desarrollo de actividades.

Se hace preciso revisar detalladamente las posibles actividades no previstas que sean necesarias para la terminación adecuada del proyecto. Con el fin de realizar un balance y determinar con claridad si será necesario solicitar una adición presupuestal para asegurar el cumplimiento de los objetivos sin afectar el desarrollo de la obra.

AVANCE PROYECTADO: 34,82%

AVANCE EJECUTADO: 15,36%



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Código:
Versión:1
Fecha de aprobación:
Clasificación: Clasificada

COMPROMISOS PACTADOS

Por parte del contratista:

- Presentar plan de contingencia - 24 de enero de 2025.
- Instalación transformador - 24 de enero de 2025.
- Ingreso ornamentador - 21 de enero de 2025.
- Correcciones no previstos - 21 de enero de 2025.

ELABORÓ

Arq. Emanuel Lombana Reyes apoyo a la supervisión

NOMBRE: Nixon Fernando Lopez Perdigón
CARGO: Supervisor

NOMBRE: Viviana Patricia Roca
CARGO: Inspector Interventoría

NOMBRE: Jerson Eduardo Rodríguez Sánchez
CARGO: Residente Interventoría

NOMBRE: RESIDENTE DE PROYECTO
CARGO: RESIDENTE DE PROYECTO

NOMBRE: JOSÉ E. MORALES RUIZ
CARGO: RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Código:
Versión:1
Fecha de aprobación:
Clasificación: Clasificada

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL		
SECRETARIA GENERAL		
GRUPO ADMINISTRATIVO		
ACTA DE COMITÉ DE OBRA		
CÓDIGO: UAEJPMF / F-06	VERSIÓN: 01	EMISIÓN: 21 AGOSTO 2024

LUGAR Y FECHA		ACTA DE COMITÉ No		
CIUDAD - UBICACIÓN		DÍA	MES	AÑO
CUCUTA NORTE DE SANTANDER - BATALLON ASP.C.MU.30 GUERRILLAS BPS		27	01	25
N° DE CONTRATO	HORA INICIO	HORA CIERRE		
055-2024-UAEJPMF				
INTERVIENEN				
NOMBRE	CARGO			
Nixon Hernando Lopez Perdigon	Supervisor			
Jhoan Manuel Cajula	Ingeniero			
Jorge Morales	Residente de Obra			
Jeison Rodriguez	Residente de Interventoria			
Milena Penaloza	Auxiliar Interventoria			
Eddy Gisela Perez Grimaldos	Residente SST			

PUNTOS POR TRATAR / ORDEN DEL DÍA
- Plan de Contingencia - Conexiones de Actividades no previstas. - Instalación Transformador - Pintura de Estructura de Cubierta - Certificado de Calidad de Teja - Estructura Adicional para Soporte Cieloraso

VERIFICACIÓN COMPROMISOS ACTA ANTERIOR
- Al día de hoy no se han Recibido el plan de Contingencia que se debía presentar el 24/01/25. y la Conexión de las Actividades no previstas que estaba para entrega el 24/01/25. - Instalación del Transformador no se ha realizado y estaba programado para el 24/01/25. - No se Instaló la Estructura Adicional para soporte Cieloraso que el contratista se había comprometido empezar el 22/01/25.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Código:

Versión:1

Fecha de aprobación:

Clasificación: Clasificada

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 02:08 pm del día 27 de enero del presente año, se reunieron el supervisor, el contratista de obra y la Interventoría, queda pendiente por entrega esta semana de los NP, y esta pendiente esta semana por parte de la electrificadora para la instalación del transformador y bettera el personal para la grabación del RETIE, se compromete para el día de mañana buscar un ornamentador para la instalación de la estructura adicional, y se compromete para el día 29/01/25 entregar los NPs, se deben hacer ajustes de precios en el Balance, los sugiere el supervisor. por parte del contratista sugiere solo instalar un tanque de 2000 litros en vez de 2 de 2000 litros, para no recargar la placa existente. Se sugiere no instalar el tanque de abastecimiento de aguas lluvias y hacer actividades necesarias.

- por parte de Interventoría esta pendiente entrega de Recomendaciones de la parte eléctrica.
- Las divisiones de vidrio, se pagaron y esta en espera de llegada.
- El contratista avisa que esta en respuesta por parte de Corona para la entrega de porcelanato.
- El personal de Aires acondicionados queda pendiente llegar a la obra esta semana.
- Queda pendiente respuesta para el trabajo del cenamiento
- Se sugiere resolver la parte eléctrica con brevedad.

Se da por terminado el comité de obra a las 2:44 pm.

CONCLUSIONES / ACUERDOS / RECOMENDACIONES

- Se recomienda la pintura de estructura de cubierta con una limpieza antes de aplicar.
- Actualizar los precios de actividades contractuales y NPs. para actualizar el Balance de Obra.

AVANCE PROYECTADO: 44,38 %

AVANCE EJECUTADO: 20,14 %



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Código:
Versión:1
Fecha de aprobación:
Clasificación: Clasificada

COMPROMISOS PACTADOS

- Entrega de Actividades no previstos el día 24/01/25.
- Ingreso de personal Ornamentador el día 28/01/25.
- Se está ejecutando el proceso para la Instalación del transformador por parte de CERS, que se compromete a resolver esta semana.
- Se Requiere entrega de certificado de calidad de Teja de Cubierta.

ELABORÓ

Arq. Emanuel Lombana Reyes apoyo a la supervisión

NOMBRE: Wilson Jerez Garcia
CARGO: Asesor interventor

NOMBRE: Nivaldo Hernandez Lopez Padillon
CARGO: Supervisor

NOMBRE: Germán Páez
CARGO: Gerente Proyectos

NOMBRE: Eddy Gisela Perez G
CARGO: Residente SST

NOMBRE: Jhon Eduardo Padriguez Sanchez
CARGO: Residente de Antenas/antena

NOMBRE: JORGE ENRIQUE R.
CARGO: RESIDENTE OBU

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: Versión:1 Fecha de aprobación: Clasificación: Clasificada
--	--	--

Anexo 3: Informes Semanales

		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA					Código: Versión: 1 Fecha de Aprobación: Clasificación: Pública			
FECHA		06 de Enero del 2025			PERIODO No.	9	DEL	31/12/2024	AL	6/01/2025
1. INFORMACIÓN GENERAL										
OBJETO DEL CONTRATO		INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A REALIZAR LAS ADECUACIONES A LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA USO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL EN LAS INSTALACIONES DEL BATALLON DE A.S.P.C N° 30"GUASIMALES"-BAS30 UBICADO EN CUCUTA.								
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO		CUCUTA-NORTE DE SANTANDER								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA					CONTRATO DE OBRA					
CONTRATO No.:		053-2024 UAEJPMP			CONTRATO No.:		055-2024 UAEJPMP			
PLAZO INICIAL:		CINCUENTA Y SEIS (56) DIAS			PLAZO INICIAL:		CINCUENTA Y SEIS DIAS (56)			
PLAZO TOTAL(DIAS):		131			PLAZO TOTAL -(DIAS):		131			
PLAZO TRANSCURRIDO(DIAS):		63 EQUIVALE AL 48%			PLAZO TRANSCURRIDO(DIAS):		63 EQUIVALE AL 48%			
VALOR INICIAL ETAPA 1 :		\$ 91,646,921.00			VALOR INICIAL ETAPA 1 :		\$ 961,924,875.00			
VALOR ADICION(ES):		N/A			VALOR ADICION(ES):		N/A			
VALOR ACTUALIZADO:		N/A			VALOR ACTUALIZADO:		\$ 961,924,875.00			
VALOR PAGADO:		\$ -			VALOR PAGADO:		\$ -			
VALOR POR PAGAR:		\$ 91,646,921.00			VALOR POR PAGAR:		\$ 961,924,875.00			
SUPERVISOR:		NIXON HERNANDEZ LOPEZ PERDIGON			INTERVENTOR:		PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S			
No.	INDICADORES				VALORES		PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO		DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO	
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.				\$ 309,334,729.84		32.16%		-19.63%	
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.				\$ 120,553,553.66		12.53%			
No.	CAPITULOS	INICIO	FIN	DURACION (DIAS)	% PESO ACTIVIDAD	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO		% ATRASO	
1.01	Demolición y desmonte de cielo raso en lamina de yeso-cartón con su estructura, templetes, y todo lo implementado para su soporte. Incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	31/10/2024	1/11/2024	2	0.24%	0.21%	0.21%		-0.02%	
1.02	Demolición y desmonte de cielo raso en esterilla de guadua, con yeso y estuco + estructura, templetes, y todo lo implementado para su soporte. Incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	4/11/2024	7/11/2024	3	0.37%	0.37%	0.37%		0.00%	
1.03	Desmonte y demolición de cubierta en teja de fibrocemento incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	6/11/2024	9/11/2024	4	1.59%	1.59%	1.59%		0.00%	
1.04	Demolición muro en mampostería. Incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	12/11/2024	15/11/2024	4	0.74%	0.59%	0.59%		-0.15%	
1.05	demolición de poyo de hasta 0,15m de altura, en mampostería y/o concreto.incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	6/11/2024	7/11/2024	1	0.01%	0.01%	0.01%		0.00%	
1.07	Demolición de mesones en concreto + soportes verticales y horizontales + acabado , incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	8/11/2024	11/11/2024	3	0.06%	0.05%	0.05%		-0.01%	
1.08	desmonte de luminarias existentes, incluye retiro y disposición final certificada.	12/11/2024	14/11/2024	2	0.09%	0.09%	0.09%		0.00%	
1.09	desmonte de guardaescoba existente, incluye empaque, cargue, transporte y disposición final certificada.	14/11/2024	18/11/2024	3	0.41%	0.33%	0.33%		-0.08%	
1.1	desmonte mobiliario fijo en madera, incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	16/11/2024	18/11/2024	2	0.06%	0.06%	0.06%		0.00%	
1.11	desmonte de dispositivos electricos supendidos incluye soportes, aparatado, cancelación de punto electrico y todo lo correcto para su desinstalación + empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	14/11/2024	15/11/2024	1	0.02%	0.02%	0.02%		0.00%	
1.12	Desmonte de unidades sanitarias (inodoros, urinales, lavamanos) incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	14/11/2024	16/11/2024	2	0.06%	0.06%	0.06%		0.00%	
1.13	Desmonte de espejos incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	31/10/2024	1/11/2024	2	0.005%	0.005%	0.00%		0.00%	



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:
Versión: 1
Fecha de Aprobación:
Clasificación: Pública

FECHA		06 de Enero del 2025				PERIODO No.		9	DEL	31/12/2024	AL	6/01/2025
1.15	Demolición de enchapes tipo ceramico en muros, incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	15/11/2024	19/11/2024	4	0.788%	0.788%			0.79%		0.00%	
1.16	Demolición de enchapes tipo ceramico en pisos, incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	18/11/2024	23/11/2024	6	2.04%	1.64%			1.64%		-0.41%	
1.17	Realización de regatas para instalación de tubería 3 x 1" desde punto 0 de datos y eléctricos hasta ubicación final, incluye empaque y disposición final certificada de los escombros.	21/11/2024	23/11/2024	2	0.08%	0.00%			0.00%		-0.08%	
1.18	Cancelado de puntos hidraulicos y/o sanitarios, incluye tapones, pegante, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	20/11/2024	22/11/2024	2	0.01%	0.00%			0.00%		-0.01%	
1.19	Placa en concreto 0,15m de 3000 psi, incluye malla electrosoldada 4mm 15 x 15, incluye excavación hasta 30cm, material de compactación tipo recebo B-400, debe dejarse el alitado con mortero autonivelante, para instalación del acabado. Plástico como impermeabilizante, formaleta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	19/11/2024	21/11/2024	2	0.07%	0.00%			0.00%		-0.07%	
1.23	Suministro e instalacion de puerta metalica collrold de color negro calibre 22 totalmente lisa, con chapa de seguridad challenguer y marco metalico. P-4	19/11/2024	21/11/2024	3	0.60%	0.00%			0.00%		-0.60%	
1.25	Suministro e instalación de estructura de cubierta en perfleria metalica 100x60mm + 90x40mm Y/O cerchas en acero corrugado, soldadura, dos capas de pintura anticorrosiva por todas sus caras, + pintura tipo esmalte aplicada en todas sus caras como acabado se incluyen tiras, correas, templetes, fijaciones y todo lo necesario para su correcta instalación.	14/11/2024	19/11/2024	5	0.00%	0.00%			0.00%		0.00%	
1.44	Suministro e instalación enchape de pared en baldosa ceramica blanca formato 60x60cm, incluye pegante para ceramica, dilatadores plásticos, y emboquillado general.	28/11/2024	3/12/2024	12	3.08%	0.00%			0.00%		-3.08%	
1.45	suministro e instalación de wing curvo en aluminio crudo, para filos de muros en enchape. Incluye pegante, boquilla y todo lo necesario para su correcta instalación	3/12/2024	6/12/2024	4	0.14%	0.00%			0.00%		-0.14%	
1.46	Suministro e instalación enchape de piso en porcelanato formato 60x60cm, incluye pegante para porcelanato, dilatadores plásticos, y emboquillado general.	1/01/2024	17/02/2024	45	9.08%	0.00%			0.00%		-9.08%	
1.56	regatas en mamposteria y/o concreto y derivación de punto hidraulico, incluye accesorios pegante, limpiador y todo lo correcto para su funcionamiento	21/11/2024	23/11/2024	2	0.12%	0.00%			0.00%		-0.12%	
NP04	Excavación, para vigas de cimentación de hasta 0,60mts de profundidad.	19/11/2024	21/11/2024	4	0.04%	0.02%			0.02%		-0.02%	
NP34	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EXISTENTES (INCLUIDO MARCO), TODO TAMAÑO MADERA-METÁLICAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	15/11/2024	19/11/2024	5	0.082%	0.082%			0.08%		0.00%	
NP12	desmonte de estructura metalica	21/12/2024	2/12/2024	10	1.25%	1.25%			1.25%		0.00%	
NP01	Zapata en concreto de 21 MPa (3000 psi) para columnas de confinamiento (incluye refuerzo)	7/12/2024	16/12/2024	8	0.32%	0.16%			0.16%		-0.16%	
NP02	Fundida de dados de 0,80x1.00mts en concreto ciclopeo de 2500psi para hincado de columnas metalicas, incluye excavacion h: 1.00mt	24/12/2024	27/12/2024	4	0.10%	0.10%			0.10%		0.00%	



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:
Versión: 1
Fecha de Aprobación:
Clasificación: Pública

FECHA		06 de Enero del 2025				PERIODO No.		9	DEL	31/12/2024	AL	6/01/2025
NP05	Suministro e instalacion de concreto de 2000 PSI para solado de viga de cimentación de 0,30 x 0,25mts.	7/12/2024	11/12/2024	4	0.19%	0.10%				0.10%		-0.10%
NP06	Viga de cimentacion en concreto 3000psi 0,30 x 0,25m + refuerzo principal 4#4, anclado a elementos estructurales horizontales + flejes #2@15cm, Incluye formaleta y todo lo necesario para su ejecución.	17/12/2024	25/12/2024	8	3.36%	1.68%				1.68%		-1.68%
NP14	Instalación de cercha metálica de angulo y varilla lisa.estructura metalica	6/12/2024	25/12/2024	18	1.48%	0.74%				0.74%		-0.74%
NP44	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	14/21/2024	16/12/2024	2	0.02%	0.00%				0.00%		-0.02%
NP45	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO DE 3" (INCLUYE ACCESORIOS Y TUBERIA HASTA 1,50 Mts)	10/12/2024	12/12/2024	2	0.01%	0.00%				0.00%		-0.01%
NP47	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCPC RDE 11 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	25/12/2024	26/12/2024	2	0.02%	0.00%				0.00%		-0.02%
NP48	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO DE 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS Y TUBERIA HASTA 1,50 Mts)	28/12/2024	31/12/2024	2	0.00%	0.00%				0.00%		0.00%
NP08	Placa en concreto de contrapiso con espesor promedio de 0,09m de 2500 psi, incluye malla electrosoldada 4mm 15 x 15.	21/12/2024	1/01/2025	10	2.81%	1.41%				1.41%		-1.41%
NP37	Suministro e Instalacion de acometida electrica provisional en conductores de cobre aislado 2#8 (fase+neutro) por tuberia EMT 1/2" (Incluye, Caja metalica de 50X50, Tablero de 6 circuitos, 2 Tomas Normales 110V, 2 tomas naranjas 110V, un totalizador 2X40 amp, un totalizador doble 2X20 amp + un totalizador 1 X20 Amp, con varilla de cobre + caja concreto para puesta a tierra y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	9/11/2024	20/12/2024	41	0.17%	0.17%				0.17%		0.00%
NP03	Suministro e instalacion de Columnas de 4.80mts de altura (incluido la profundidad de anclaje al pedestal) en estructura metalica perfil C pareada de medidas 220x80x2.5mm, incluye tapa en lamina metalica lisa de 1/8 sobre la parte superior de la columna, soldadura, dos capas de pintura anticorrosiva por todas sus caras, + pintura tipo esmalte aplicada en todas sus caras como acabado final y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	1/01/2025	4/01/2025	4	0.22%	0.22%				0.22%		0.00%
NP09	Instalación de alistado de piso en morterio 1:3, H 4cm	4/01/2025	11/01/2025	6	0.78%	0.16%				0.16%		-0.63%
NP13	Suministro e instalación de Perfil estructural 10x40x1,5 para cubierta	1/01/2025	11/01/2025	10	1.58%	0.63%				0.63%		-0.95%
NP49	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS Y TUBERIA HASTA 1,50 Mts)	31/11/2025	2/01/2025	2	0.01%	0.00%				0.00%		-0.01%
NP50	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO VALVULA DE BOLA 3/4"	2/01/2025	3/01/2025	2	0.01%	0.00%				0.00%		-0.01%
NP51	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE CORTINA SELLO METALICO 3/4"	4/01/2025	4/01/2025	1	0.02%	0.00%				0.00%		-0.02%
TOTAL					32.16%	12.53%				12.53%		-19.63%


CURVA "S" EJECUTADO VS PROGRAMADO

[illegible]



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:
Versión: 1
Fecha de Aprobación:
Clasificación: Pública

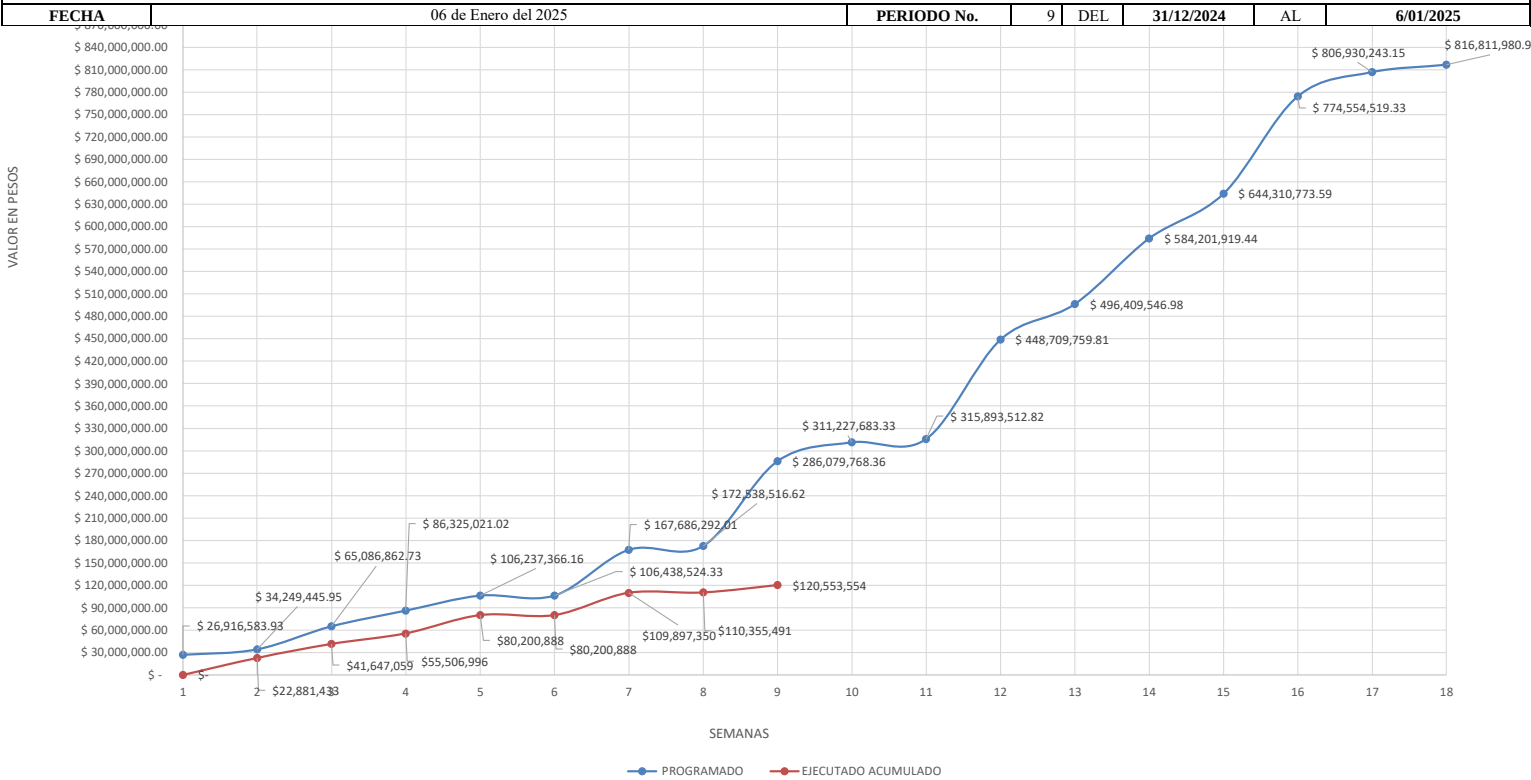

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES	
NP03	Suministro e instalacion de Columnas de 4.80mts de altura (incluido la profundidad de anclaje al pedestal) en estructura metalica perfil C pareada de medidas 220x80x2.5mm, incluye tapa en lamina metalica lisa de 1/8 sobre la parte superior de la columna, soldadura, dos capas de pintura anticorrosiva por todas sus caras, + pintura tipo esmalte aplicada en todas sus caras como acabado final y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.
NP09	Instalación de alistado de piso en mortero 1:3, H 4cm
NP13	Suministro e instalación de Perfil estructural 10x40x1,5 para cubierta
NP49	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS Y TUBERIA HASTA 1,50 Mts)
NP50	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO VALVULA DE BOLA 3/4"
NP51	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE CORTINA SELLO METÁLICO 3/4"
6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR	
1.Se hace seguimiento a las actividades de mamposteri de mocheta bodega policia judicial. Se registra por parte de interventoria el siguiente personal de obra,(1) residente de obra,(1) residente Siso,(2) oficiles,(1) ayudantes. 2.Se verifica pañete de zona de bodega 3.Se esta a la espera de diseño definitivo electrico. 4.Por parte de interventoria se envia correo con observaciones de los NPS electricos y de prediseño enviado. 5.Sen esta semana no se registra mayor avance ya que no se cuenta con el personal para realizar las actividades, debido a festividades de fin de año. Y se espera el ingreso de mas personal para que se puedan ver avances significativos la proxima semana.	



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:
Versión: 1
Fecha de Aprobación:
Clasificación: Pública

FECHA	06 de Enero del 2025	PERIODO No.	9	DEL	31/12/2024	AL	6/01/2025
-------	----------------------	-------------	---	-----	------------	----	-----------

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



DIRECTORA DE INTERVENTORIA
NOMBRE: LEIDY CAROLINA HERNANDEZ


		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA				Código: Versión: 1 Fecha de Aprobación: Clasificación: Pública			
FECHA		13 de Enero del 2025		PERIODO No.	10	DEL	7/01/2025	AL	13/01/2025
1. INFORMACIÓN GENERAL									
OBJETO DEL CONTRATO		INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A REALIZAR LAS ADECUACIONES A LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA USO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL EN LAS INSTALACIONES DEL BATALLON DE A.S.P.C N° 30"GUASIMALES"-BAS30 UBICADO EN CUCUTA.							
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO		CUCUTA-NORTE DE SANTANDER							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA					CONTRATO DE OBRA				
CONTRATO No.:		053-2024 UAEJPM			CONTRATO No.:		055-2024 UAEJPM		
PLAZO INICIAL:		CINCUENTA Y SEIS (56) DIAS			PLAZO INICIAL:		CINCUENTA Y SEIS DIAS (56)		
PLAZO TOTAL(DIAS):		131			PLAZO TOTAL -(DIAS):		131		
PLAZO TRANSCURRIDO(DIAS):		70 EQUIVALE AL 53%			PLAZO TRANSCURRIDO(DIAS):		70 EQUIVALE AL 53%		
VALOR INICIAL ETAPA 1 :		\$ 91,646,921.00			VALOR INICIAL ETAPA 1 :		\$ 961,924,875.00		
VALOR ADICION(ES):		N/A			VALOR ADICION(ES):		N/A		
VALOR ACTUALIZADO:		N/A			VALOR ACTUALIZADO:		\$ 961,924,875.00		
VALOR PAGADO:		\$ -			VALOR PAGADO:		\$ -		
VALOR POR PAGAR:		\$ 91,646,921.00			VALOR POR PAGAR:		\$ 961,924,875.00		
SUPERVISOR:		NIXON HERNANDEZ LOPEZ PERDIGON			INTERVENTOR:		PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S		
No.	INDICADORES				VALORES		PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO		DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.				\$ 334,947,845.80		34.82%		-19.46%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.				\$ 147,766,091.69		15.36%		
No.	CAPITULOS	INICIO	FIN	DURACION (DIAS)	% PESO ACTIVIDAD	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO	% ATRASO	
1.01	Demolición y desmonte de cielo raso en lamina de yeso-cartón con su estructura, templetes, y todo lo implementado para su soporte. Incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	31/10/2024	1/11/2024	2	0.24%	0.21%	0.21%	-0.02%	
1.02	Demolición y desmonte de cielo raso en esterilla de guadua, con yeso y estuco + estructura, templetes, y todo lo implementado para su soporte. Incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	4/11/2024	7/11/2024	3	0.37%	0.37%	0.37%	0.00%	
1.03	Desmonte y demolición de cubierta en teja de fibrocemento incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	6/11/2024	9/11/2024	4	1.59%	1.59%	1.59%	0.00%	
1.04	Demolición muro en mampostería, Incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	12/11/2024	15/11/2024	4	0.74%	0.74%	0.74%	0.00%	
1.05	demolición de poyo de hasta 0,15m de altura, en mampostería y/o concreto, incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	6/11/2024	7/11/2024	1	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	
1.07	Demolición de mesones en concreto + soportes verticales y horizontales + acabado , incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	8/11/2024	11/11/2024	3	0.06%	0.06%	0.06%	0.00%	
1.08	desmonte de luminarias existentes, incluye retiro y disposición final certificada.	12/11/2024	14/11/2024	2	0.09%	0.09%	0.09%	0.00%	
1.09	desmonte de guardaescoba existente, incluye empaque, cargue, transporte y disposición final certificada.	14/11/2024	18/11/2024	3	0.41%	0.41%	0.41%	0.00%	
1.1	desmonte mobiliario fijo en madera, incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	16/11/2024	18/11/2024	2	0.06%	0.06%	0.06%	0.00%	
1.11	desmonte de dispositivos electricos suspendidos incluye soportes, aparatado, cancelación de punto electrico y todo lo correcto para su desinstalación + empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	14/11/2024	15/11/2024	1	0.02%	0.02%	0.02%	0.00%	
1.12	Desmonte de unidades sanitarias (inodoros, urinales, lavamanos) incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	14/11/2024	16/11/2024	2	0.06%	0.06%	0.06%	0.00%	

		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA						Código: Versión: 1 Fecha de Aprobación: Clasificación: Pública			
FECHA		13 de Enero del 2025				PERIODO No.	10	DEL	7/01/2025	AL	13/01/2025
1.13	Desmante de espejos incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	31/10/2024	1/11/2024	2	0.005%	0.005%			0.00%		0.00%
1.15	Demolición de enchapes tipo ceramico en muros, incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	15/11/2024	19/11/2024	4	0.788%	0.788%			0.79%		0.00%
1.16	Demolición de enchapes tipo ceramico en pisos, incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	18/11/2024	23/11/2024	6	2.04%	2.04%			2.04%		0.00%
1.17	Realización de regatas para instalación de tubería 3 x 1" desde punto 0 de datos y eléctricos hasta ubicación final, incluye empaque y disposición final certificada de los escombros.	21/11/2024	23/11/2024	2	0.08%	0.00%			0.00%		-0.08%
1.18	Cancelado de puntos hidraulicos y/o sanitarios, incluye tapones, pegante, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	20/11/2024	22/11/2024	2	0.01%	0.00%			0.00%		-0.01%
1.19	Placa en concreto 0,15m de 3000 psi, incluye malla electrosoldada 4mm 15 x 15, incluye excavación hasta 30cm, material de compactación tipo recebo B-400, debe dejarse el alistado con mortero autonivelante, para instalación del acabado. Plástico como impermeabilizante, formaleta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	19/11/2024	21/11/2024	2	0.07%	0.00%			0.00%		-0.07%
1.2	Limpieza, retiro de escombros, parchado de grietas con sellador tipo resina liquida de poliuretano o similar, alisado de superficies irregulares, limpieza de bajantes, nivelado de la placa para dar la pendiente hacia bajantes con mortero autonivelante reforzado con fibra de vidrio, aplicación de manto asfáltico con foil de aluminio, fijaciopn mediante brea liquida y aplicación de calor	19/11/2024	21/11/2024	3	0.43%	0.13%			0.13%		-0.30%
1.23	Suministro e instalacion de puerta metalica collrold de color negro calibre 22 totalmente lisa, con chapa de seguridad challenguer y marco metalico. P-4	19/11/2024	21/11/2024	3	0.60%	0.00%			0.00%		-0.60%
1.25	Suministro e instalación de estructura de cubierta en perfleria metalica 100x60mm + 90x40mm Y/O cerchas en acero corrugado, soldadura, dos capas de pintura anticorrosiva por todas sus caras, + pintura tipo esmalte aplicada en todas sus caras como acabado se incluyen tiras, correas, templetes, fijaciones y todo lo necesario para su correcta instalación.	14/11/2024	19/11/2024	5	0.00%	0.00%			0.00%		0.00%
1.26	Suministro e instalación de teja en acero arquitectonica trapezoidal Cal.22 color blanco, incluye fijaciones, refuerzos, cortes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	11/01/2025	27/01/2025	15	2.09%	0.00%			0.00%		-2.09%
1.44	Suministro e instalación enchape de pared en baldosa ceramica blanca formato 60x60cm, incluye pegante para ceramica, dilatadores plásticos, y emboquillado general.	28/11/2024	3/12/2024	12	3.08%	0.15%			0.15%		-2.93%
1.45	suministro e instalación de wing curvo en aluminio crudo, para filos de muros en enchape. Incluye pegante, boquilla y todo lo necesario para su correcta instalación	3/12/2024	6/12/2024	4	0.14%	0.00%			0.00%		-0.14%
1.46	Suministro e instalación enchape de piso en porcelanato formato 60x60cm, incluye pegante para porcelanato, dilatadores plásticos, y emboquillado general.	1/01/2024	17/02/2024	45	9.08%	0.00%			0.00%		-9.08%
1.56	regatas en mampostería y/o concreto y derivación de punto hidraulico, incluye accesorios pegante, limpiador y todo lo correcto para su funcionamiento	21/11/2024	23/11/2024	2	0.12%	0.00%			0.00%		-0.12%
NP04	Excavación, para vigas de cimentación de hasta 0,60mts de profundidad.	19/11/2024	21/11/2024	4	0.04%	0.03%			0.03%		-0.01%

		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA						Código: Versión: 1 Fecha de Aprobación: Clasificación: Pública			
FECHA		13 de Enero del 2025				PERIODO No.	10	DEL	7/01/2025	AL	13/01/2025
NP34	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EXISTENTES (INCLUIDO MARCO), TODO TAMAÑO MADERA-METÁLICAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	15/11/2024	19/11/2024	5	0.082%	0.082%			0.08%		0.00%
NP12	desmante de estructura metalica	21/12/2024	2/12/2024	10	1.25%	1.25%			1.25%		0.00%
NP01	Zapata en concreto de 21 MPa (3000 psi) para columnas de confinamiento (incluye refuerzo)	7/12/2024	16/12/2024	8	0.32%	0.26%			0.26%		-0.06%
NP02	Fundida de dados de 0,80x1,00mts en concreto ciclopeo de 2500psi para hincado de columnas metalicas, incluye excavacion h: 1.00mt	24/12/2024	27/12/2024	4	0.10%	0.10%			0.10%		0.00%
NP05	Suministro e instalacion de concreto de 2000 PSI para solado de viga de cimentación de 0,30 x 0,25mts.	7/12/2024	11/12/2024	4	0.19%	0.15%			0.15%		-0.04%
NP06	Viga de cimentacion en concreto 3000psi 0,30 x 0,25m + refuerzo principal 4#4, anclado a elementos estructurales horizontales + flejes #2@15cm, Incluye formaleta y todo lo necesario para su ejecución.	17/12/2024	25/12/2024	8	3.36%	2.69%			2.69%		-0.67%
NP14	Instalación de cercha metálica de angulo y varilla lisa.estructura metalica	6/12/2024	25/12/2024	18	1.48%	0.74%			0.74%		-0.74%
NP43	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	6/12/2024	25/12/2024	19	0.11%	0.00%			0.00%		-0.11%
NP44	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	14/21/2024	16/12/2024	2	0.02%	0.00%			0.00%		-0.02%
NP45	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO DE 3" (INCLUYE ACCESORIOS Y TUBERIA HASTA 1,50 Mts)	10/12/2024	12/12/2024	2	0.01%	0.00%			0.00%		-0.01%
NP47	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCP RDE 11 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	25/12/2024	26/12/2024	2	0.02%	0.00%			0.00%		-0.02%
NP48	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO DE 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS Y TUBERIA HASTA 1,50 Mts)	28/12/2024	31/12/2024	2	0.00%	0.00%			0.00%		0.00%
NP08	Placa en concreto de contrapiso con espesor promedio de 0,09m de 2500 psi, incluye malla electrosoldada 4mm 15 x 15.	21/12/2024	1/01/2025	10	2.81%	1.97%			1.97%		-0.84%
NP37	Suministro e Instalacion de acometida electrica provisional en conductores de cobre aislado 2#8 (fase+neutro) por tuberia EMT 1/2" (Incluye, Caja metalica de 50X50, Tablero de 6 circuitos, 2 Tomas Normales 110V, 2 tomas naranjas 110V, un totalizador 2X40 amp, un totalizador doble 2X20 amp + un totalizador 1 X20 Amp, con varilla de cobre + caja concreto para puesta a tierra y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	9/11/2024	20/12/2024	41	0.17%	0.17%			0.17%		0.00%
NP03	Suministro e instalacion de Columnas de 4.80mts de altura (incluido la profundidad de anclaje al pedestal) en estructura metalica perfil C pareada de medidas 220x80x2.5mm, incluye tapa en lamina metalica lisa de 1/8 sobre la parte superior de la columna, soldadura, dos capas de pintura anticorrosiva por todas sus caras, + pintura tipo esmalte aplicada en todas sus caras como acabado final y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	1/01/2025	4/01/2025	4	0.22%	0.22%			0.22%		0.00%
NP09	Instalación de alistado de piso en morterio 1:3, H 4cm	4/01/2025	11/01/2025	6	0.78%	0.16%			0.16%		-0.63%

		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA							Código: Versión: 1 Fecha de Aprobación: Clasificación: Pública		
FECHA		13 de Enero del 2025				PERIODO No.	10	DEL	7/01/2025	AL	13/01/2025
NP13	Suministro e instalación de Perfil estructural 10x40x1,5 para cubierta	1/01/2025	11/01/2025	10	1.58%	0.79%	0.79%		-0.79%		
NP49	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS Y TUBERIA HASTA 1,50 Mts)	31/11/2025	2/01/2025	2	0.01%	0.00%	0.00%		-0.01%		
NP50	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO VALVULA DE BOLA 3/4"	2/01/2025	3/01/2025	2	0.01%	0.00%	0.00%		-0.01%		
NP51	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE CORTINA SELLO METÁLICO 3/4"	4/01/2025	4/01/2025	1	0.02%	0.00%	0.00%		-0.02%		
NP52	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	8/01/2025	10/01/2025	2	0.03%	0.00%	0.00%		-0.03%		
TOTAL					34.82%	15.36%	15.36%		-19.46%		

CURVA "S" EJECUTADO VS PROGRAMADO

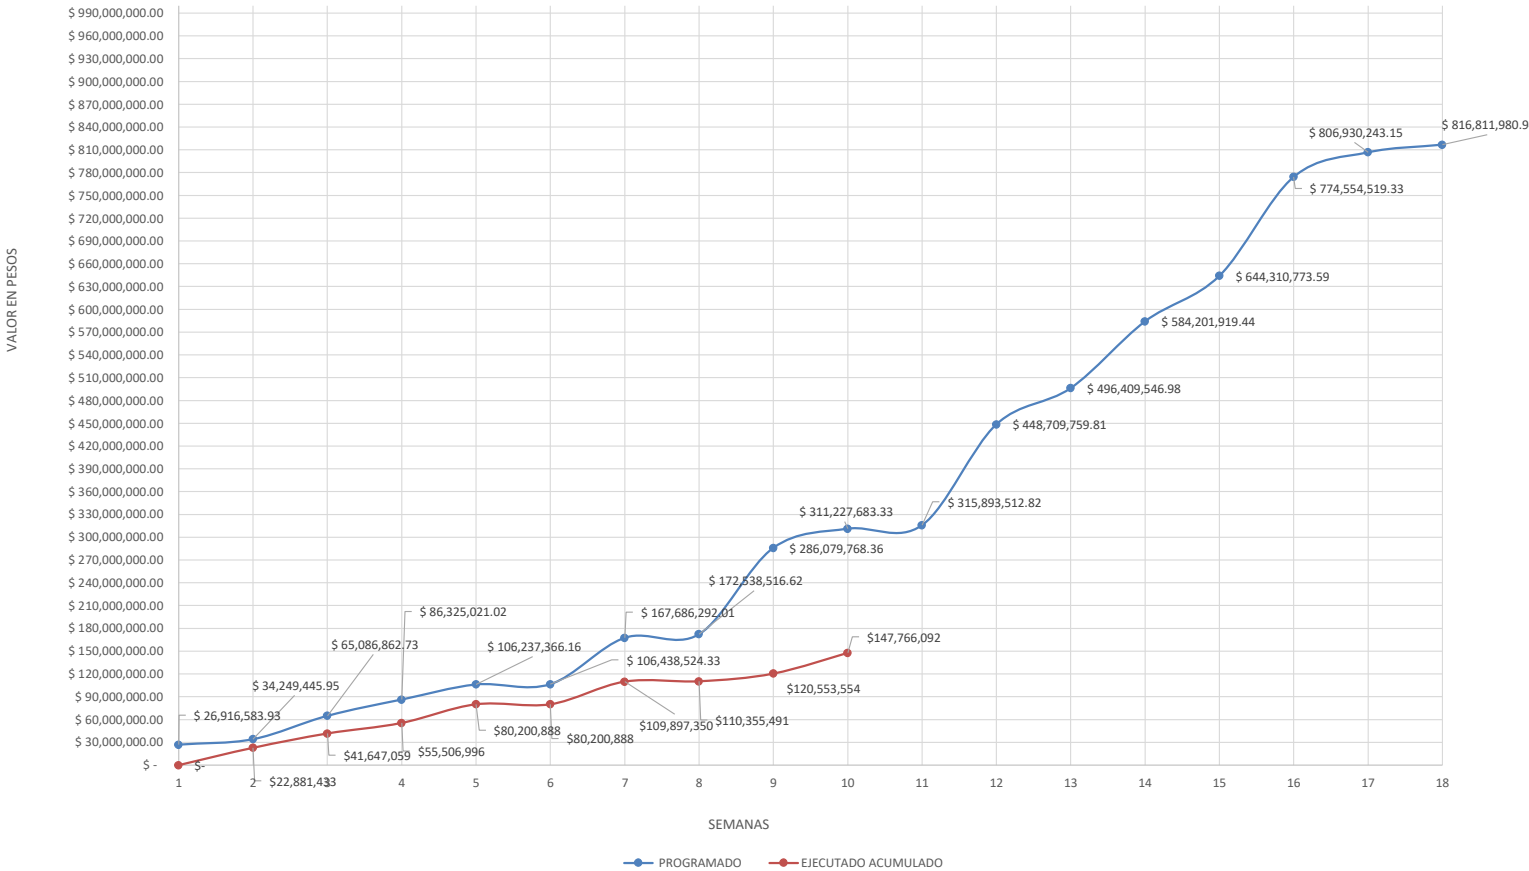

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

NP52	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO
------	---

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

- Se registra por parte de interventoria el siguiente personal de obra,(1) residente de obra,(1) residente Siso,(3) oficales,(2) ayudantes, (1)Oficial ornamentador, (1)electricista
- Se verifica pañete de policia judicial
- Se realiza mamposteria encima de placa y zona de cocina.
- Se retoman actividades de desmonte de ventana y conformacion de vanos. Ampliacion de ventanas existentes.
- Se inicia enchape de muros en bateria sanitaria caballeros.
- Se continua con fundida de vigas y zapatas zona cocina y fachada.
- Se retoma instalacion de perfil estructural de cubierta.



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:
Versión: 1
Fecha de Aprobación:
Clasificación: Pública

FECHA	13 de Enero del 2025	PERIODO No.	10	DEL	7/01/2025	AL	13/01/2025
-------	----------------------	-------------	----	-----	-----------	----	------------

8. Se inicia con la instalacion de tuberia electrica en zona de policia judicial.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:
Versión: 1
Fecha de Aprobación:
Clasificación: Pública

FECHA	13 de Enero del 2025	PERIODO No.	10	DEL	7/01/2025	AL	13/01/2025
-------	----------------------	-------------	----	-----	-----------	----	------------



DIRECTORA DE INTERVENTORIA
NOMBRE: LEIDY CAROLINA HERNANDEZ

		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA					Código: Versión: 1 Fecha de Aprobación: Clasificación: Pública			
FECHA		20 de Enero del 2025			PERIODO No.	11	DEL	14/01/2025	AL	20/01/2025
1. INFORMACIÓN GENERAL										
OBJETO DEL CONTRATO		INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A REALIZAR LAS ADECUACIONES A LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA USO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL EN LAS INSTALACIONES DEL BATALLON DE A.S.P.C N° 30"GUASIMALES"-BAS30 UBICADO EN CUCUTA.								
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO		CUCUTA-NORTE DE SANTANDER								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA					CONTRATO DE OBRA					
CONTRATO No.:		053-2024 UAEJPMP			CONTRATO No.:		055-2024 UAEJPMP			
PLAZO INICIAL:		CINCUENTA Y SEIS (56) DIAS			PLAZO INICIAL:		CINCUENTA Y SEIS DIAS (56)			
PLAZO TOTAL(DIAS):		131			PLAZO TOTAL -(DIAS):		131			
PLAZO TRANSCURRIDO(DIAS):		77 EQUIVALE AL 59%			PLAZO TRANSCURRIDO(DIAS):		77 EQUIVALE AL 59%			
VALOR INICIAL ETAPA 1 :		\$ 91,646,921.00			VALOR INICIAL ETAPA 1 :		\$ 961,924,875.00			
VALOR ADICION(ES):		N/A			VALOR ADICION(ES):		N/A			
VALOR ACTUALIZADO:		N/A			VALOR ACTUALIZADO:		\$ 961,924,875.00			
VALOR PAGADO:		\$ -			VALOR PAGADO:		\$ -			
VALOR POR PAGAR:		\$ 91,646,921.00			VALOR POR PAGAR:		\$ 961,924,875.00			
SUPERVISOR:		NIXON HERNANDEZ LOPEZ PERDIGON			INTERVENTOR:		PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S			
No.	INDICADORES				VALORES		PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO		DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO	
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.				\$ 339,573,822.07		35.30%		-18.52%	
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.				\$ 161,415,381.61		16.78%			
No.	CAPITULOS	INICIO	FIN	DURACION (DIAS)	% PESO ACTIVIDAD	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO		% ATRASO	
1.01	Demolición y desmonte de cielo raso en lamina de yeso-cartón con su estructura, templetes, y todo lo implementado para su soporte. Incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	31/10/2024	1/11/2024	2	0.24%	0.24%	0.24%		0.00%	
1.02	Demolición y desmonte de cielo raso en esterilla de guadua, con yeso y estuco + estructura, templetes, y todo lo implementado para su soporte. Incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	4/11/2024	7/11/2024	3	0.37%	0.37%	0.37%		0.00%	
1.03	Desmonte y demolición de cubierta en teja de fibrocemento incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	6/11/2024	9/11/2024	4	1.59%	1.59%	1.59%		0.00%	
1.04	Demolición muro en mampostería, Incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	12/11/2024	15/11/2024	4	0.74%	0.74%	0.74%		0.00%	
1.05	demolición de poyo de hasta 0,15m de altura, en mampostería y/o concreto, incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	6/11/2024	7/11/2024	1	0.01%	0.01%	0.01%		0.00%	
1.07	Demolición de mesones en concreto + soportes verticales y horizontales + acabado , incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada..	8/11/2024	11/11/2024	3	0.06%	0.06%	0.06%		0.00%	
1.08	desmonte de luminarias existentes, incluye retiro y disposición final certificada.	12/11/2024	14/11/2024	2	0.09%	0.09%	0.09%		0.00%	
1.09	desmonte de guardaescoba existente, incluye empaque, cargue, transporte y disposición final certificada.	14/11/2024	18/11/2024	3	0.41%	0.41%	0.41%		0.00%	
1.1	desmonte mobiliario fijo en madera, incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	16/11/2024	18/11/2024	2	0.06%	0.06%	0.06%		0.00%	
1.11	desmonte de dispositivos electricos suspendidos incluye soportes, aparato, cancelación de punto electrico y todo lo correcto para su desinstalación + empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	14/11/2024	15/11/2024	1	0.02%	0.02%	0.02%		0.00%	
1.12	Desmonte de unidades sanitarias (inodoros, urinales, lavamanos) incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	14/11/2024	16/11/2024	2	0.06%	0.06%	0.06%		0.00%	




INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:
Versión: 1
Fecha de Aprobación:
Clasificación: Pública

FECHA		20 de Enero del 2025				PERIODO No.	11	DEL	14/01/2025	AL	20/01/2025
1.13	Desmante de espejos incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	31/10/2024	1/11/2024	2	0.005%	0.005%			0.00%		0.00%
1.15	Demolición de enchapes tipo ceramico en muros, incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	15/11/2024	19/11/2024	4	0.788%	0.788%			0.79%		0.00%
1.16	Demolición de enchapes tipo ceramico en pisos, incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	18/11/2024	23/11/2024	6	2.04%	2.04%			2.04%		0.00%
1.17	Realización de regatas para instalación de tubería 3 x 1" desde punto 0 de datos y eléctricos hasta ubicación final, incluye empaque y disposición final certificada de los escombros.	25/11/2024	27/11/2024	2	0.08%	0.00%			0.00%		-0.08%
1.18	Cancelado de puntos hidraulicos y/o sanitarios, incluye tapones, pegante, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	23/11/2024	26/11/2024	2	0.01%	0.00%			0.00%		-0.01%
1.19	Placa en concreto 0,15m de 3000 psi, incluye malla electrosoldada 4mm 15 x 15, incluye excavación hasta 30cm, material de compactación tipo recebo B-400, debe dejarse el alisado con mortero autonivelante, para instalación del acabado. Plástico como impermeabilizante, formaleta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	19/11/2024	21/11/2024	2	0.07%	0.00%			0.00%		-0.07%
1.2	Limpieza, retiro de escombros, parchado de grietas con sellador tipo resina liquida de poliuretano o similar, alisado de superficies irregulares, limpieza de bajantes, nivelado de la placa para dar la pendiente hacia bajantes con mortero autonivelante reforzado con fibra de vidrio, aplicación de manto asfáltico con foil de aluminio, fijaciopn mediante brea liquida y aplicación de calor	10/01/2024	25/01/2024	15	0.43%	0.13%			0.13%		-0.30%
1.23	Suministro e instalacion de puerta metalica coltroid de color negro calibre 22 totalmente lisa, con chapa de seguridad challenguer y marco metalico. P-4	29/11/2024	2/12/2024	2	0.60%	0.00%			0.00%		-0.60%
1.25	Suministro e instalación de estructura de cubierta en perfilera metalica 100x60mm + 90x40mm Y/O cerchas en acero corrugado, soldadura, dos capas de pintura anticorrosiva por todas sus caras, + pintura tipo esmalte aplicada en todas sus caras como acabado se incluyen tiras, correas, templates, fijaciones y todo lo necesario para su correcta instalación.	14/11/2024	19/11/2024	5	0.00%	0.00%			0.00%		0.00%
1.26	Suministro e instalación de teja en acero arquitectonica trapezoidal Cal.22 color blanco, incluye fijaciones, refuerzos, cortes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	11/01/2025	27/01/2025	15	2.09%	0.00%			0.00%		-2.09%
1.27	Caballette para teja trapezoidal, minimo 0,60m de ancho, color blanco incluye fijaciones, refuerzos, cortes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	18/01/2025	23/01/2025	5	0.14%	0.00%			0.00%		-0.14%
1.44	Suministro e instalación enchape de pared en baldosa ceramica blanca formato 60x60cm, incluye pegante para ceramica, dilatadores plásticos, y emboquillado general.	28/11/2024	3/12/2024	12	3.08%	0.15%			0.15%		-2.93%
1.45	suministro e instalación de wing curvo en aluminio crudo, para filos de muros en enchape. Incluye pegante, boquilla y todo lo necesario para su correcta instalación	6/12/2024	10/12/2024	4	0.14%	0.00%			0.00%		-0.14%
1.46	Suministro e instalación enchape de piso en porcelanato formato 60x60cm, incluye pegante para porcelanato, dilatadores plásticos, y emboquillado general.	1/01/2025	17/02/2025	45	9.08%	0.00%			0.00%		-9.08%

		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA						Código: Versión: 1 Fecha de Aprobación: Clasificación: Pública			
FECHA		20 de Enero del 2025				PERIODO No.	11	DEL	14/01/2025	AL	20/01/2025
1.55	poceta en mampostería maciza, tipo tolete común, de 60cm x 60 cm de base x 75cm de altura, sobreposito en concreto impermeabilizado de 10cm pegado y pañetado con mortero 1:3 impermeabilizado, enchapada con acabado identico al circUn.ante, inclulle win de aliminio en las esquinas y filos, grifería metálica tipo llave jardín,	16/01/2025	20/01/2025	3	0.05%	0.00%			0.00%		-0.05%
1.56	regatas en mampostería y/o concreto y derivación de punto hidraulico, incluye accesorios pegante, limpiador y todo lo correcto para su funcionamiento	21/12/2024	24/12/2024	2	0.12%	0.00%			0.00%		-0.12%
1.61	suministro e instalación poyo, en mampostería maciza tipo tolete, ancho de 15cm, y altura de 25cm, fijado al piso de concreto, mortero de pega y pañete 1:3, afinado estucado y pintado.	21/12/2024	24/12/2024	3	0.29%	0.00%			0.00%		-0.29%
NP04	Excavación, para vigas de cimentación de hasta 0,60mts de profundidad.	19/11/2024	21/11/2024	4	0.04%	0.04%			0.04%		0.00%
NP34	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EXISTENTES (INCLUIDO MARCO), TODO TAMAÑO MADERA-METÁLICAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	15/11/2024	19/11/2024	5	0.082%	0.082%			0.08%		0.00%
NP12	desmonte de estructura metálica	21/12/2024	2/12/2024	10	1.25%	1.25%			1.25%		0.00%
NP01	Zapata en concreto de 21 MPa (3000 psi) para columnas de confinamiento (incluye refuerzo)	7/12/2024	16/12/2024	8	0.32%	0.32%			0.32%		0.00%
NP02	Fundida de dados de 0,80x1,00mts en concreto ciclopeo de 2500psi para hincado de columnas metálicas, incluye excavacion h: 1.00mt	24/12/2024	27/12/2024	4	0.10%	0.10%			0.10%		0.00%
NP05	Suministro e instalacion de concreto de 2000 PSI para solado de viga de cimentación de 0,30 x 0,25mts.	7/12/2024	11/12/2024	4	0.19%	0.19%			0.19%		0.00%
NP06	Viga de cimentacion en concreto 3000psi 0,30 x 0,25m + refuerzo principal 4#4, anclado a elementos estructurales horizontales + flejes #2@15cm, Incluye formaleta y todo lo necesario para su ejecución.	17/12/2024	25/12/2024	8	3.36%	3.36%			3.36%		0.00%
NP14	Instalación de cercha metálica de angulo y varilla lisa.estructura metálica	6/12/2024	25/12/2024	18	1.48%	1.04%			1.04%		-0.45%
NP43	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	10/12/2024	12/12/2024	19	0.11%	0.00%			0.00%		-0.11%
NP44	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	14/21/2024	16/12/2024	2	0.02%	0.00%			0.00%		-0.02%
NP45	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO DE 3" (INCLUYE ACCESORIOS Y TUBERIA HASTA 1,50 Mts)	10/12/2024	12/12/2024	2	0.01%	0.00%			0.00%		-0.01%
NP47	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCP RDE 11 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	25/12/2024	26/12/2024	2	0.02%	0.00%			0.00%		-0.02%
NP48	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO DE 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS Y TUBERIA HASTA 1,50 Mts)	28/12/2024	31/12/2024	2	0.00%	0.00%			0.00%		0.00%
NP08	Placa en concreto de contrapiso con espesor promedio de 0,09m de 2500 psi, incluye malla electrosoldada 4mm 15 x 15.	21/12/2024	1/01/2025	10	2.81%	1.97%			1.97%		-0.84%

		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA						Código: Versión: 1 Fecha de Aprobación: Clasificación: Pública			
FECHA		20 de Enero del 2025				PERIODO No.	11	DEL	14/01/2025	AL	20/01/2025
NP37	Suministro e Instalacion de acometida electrica provisional en conductores de cobre aislado 2#8 (fase+neutro) por tuberia EMT 1/2" (Incluye, Caja metalica de 50X50, Tablero de 6 circuitos, 2 Tomas Normales 110V, 2 tomas naranjas 110V, un totalizador 2X40 amp, un totalizador doble 2X20 amp + un totalizador 1 X20 Amp, con varilla de cobre + caja concreto para puesta a tierra y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	9/11/2024	20/12/2024	41	0.17%	0.17%			0.17%		0.00%
NP03	Suministro e instalacion de Columnas de 4.80mts de altura (incluido la profundidad de anclaje al pedestal) en estructura metalica perfil C pareada de medidas 220x80x2.5mm, incluye tapa en lamina metalica lisa de 1/8 sobre la parte superior de la columna, soldadura, dos capas de pintura anticorrosiva por todas sus caras, + pintura tipo esmalte aplicada en todas sus caras como acabado final y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	1/01/2025	4/01/2025	4	0.22%	0.22%			0.22%		0.00%
NP09	Instalación de alistado de piso en mortero 1:3, H 4cm	4/01/2025	11/01/2025	6	0.78%	0.16%			0.16%		-0.63%
NP13	Suministro e instalación de Perfil estructural 10x40x1,5 para cubierta	1/01/2025	11/01/2025	10	1.58%	1.11%			1.11%		-0.47%
NP49	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS Y TUBERIA HASTA 1.50 Mts)	31/11/2025	2/01/2025	2	0.01%	0.00%			0.00%		-0.01%
NP50	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO VALVULA DE BOLA 3/4"	2/01/2025	3/01/2025	2	0.01%	0.00%			0.00%		-0.01%
NP51	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE CORTINA SELLO METÁLICO 3/4"	4/01/2025	4/01/2025	1	0.02%	0.00%			0.00%		-0.02%
NP52	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	8/01/2025	10/01/2025	2	0.03%	0.00%			0.00%		-0.03%
TOTAL					35.30%	16.78%			16.78%		-18.52%

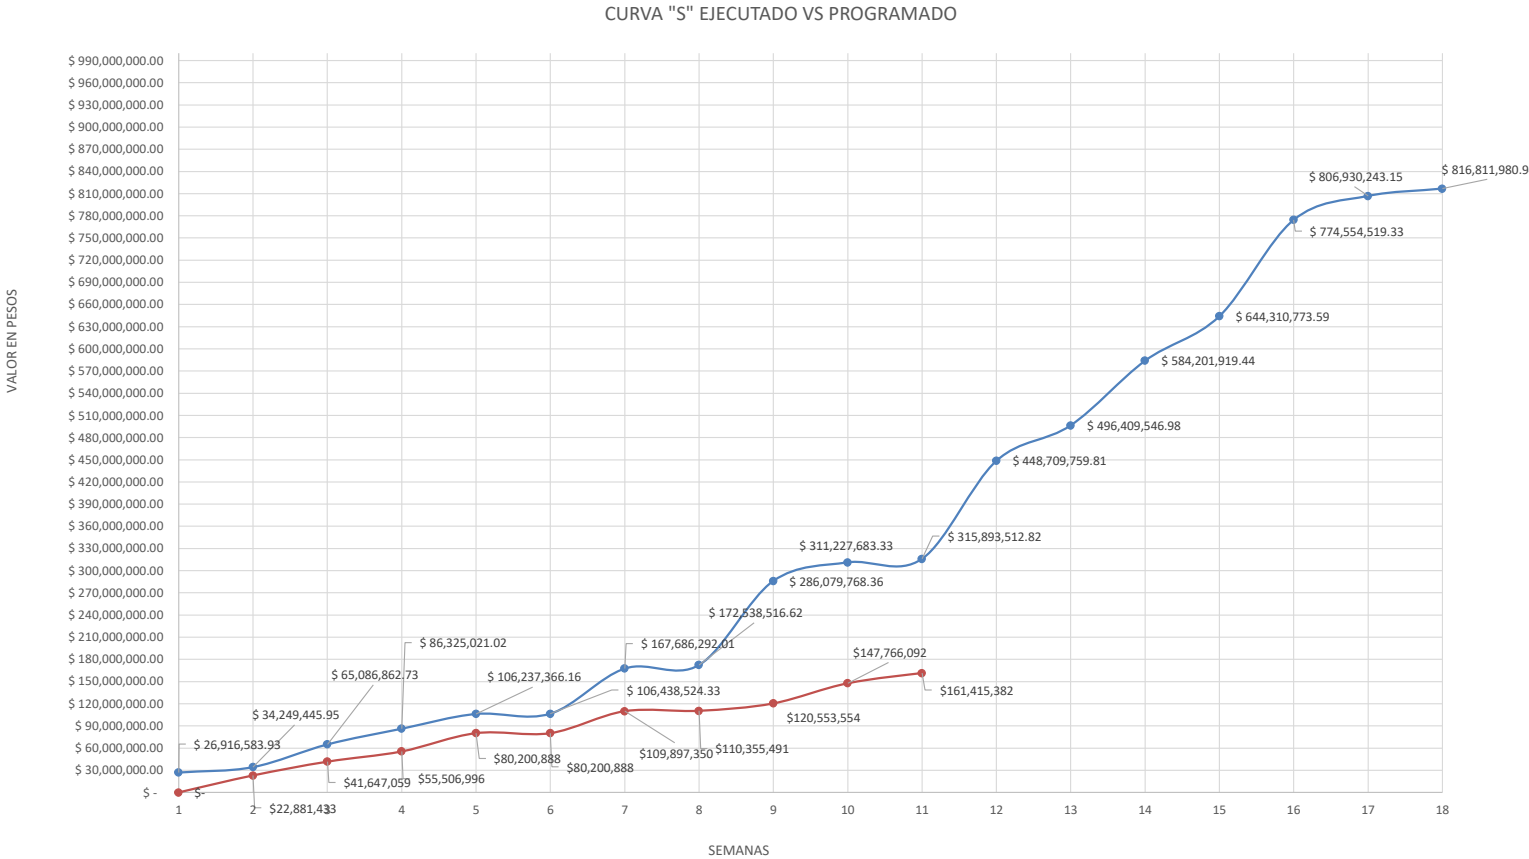



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:
Versión: 1
Fecha de Aprobación:
Clasificación: Pública

FECHA: 20 de Enero del 2025 PERIODO No. 11 DEL 14/01/2025 AL 20/01/2025

PROGRAMADO EJECUTADO ACUMULADO

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

NP01	Zapata en concreto de 21 MPa (3000 psi) para columnas de confinamiento (incluye refuerzo)
NP04	Excavación, para vigas de cimentación de hasta 0,60mts de profundidad.
NP05	Suministro e instalacion de concreto de 2000 PSI para solado de viga de cimentación de 0,30 x 0,25mts.
NP06	Viga de cimentacion en concreto 3000psi 0,30 x 0,25m + refuerzo principal 4#4, anclado a elementos estructurales horizontales + flejes #2@15cm, Incluye formoleta y todo lo necesario para su ejecución.
NP13	Suministro e instalación de Perfil estructural 10x40x1,5 para cubierta
NP14	Instalación de cercha metálica de angulo y varilla lisa.estructura metalica

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

1. Se registra por parte de interventoria el siguiente personal de obra,(1) residente de obra,(1) residente Siso,(5) oficiles,(4) ayudantes, (1)Oficial ornamentador, (1)electricista
2. Se verifica fundida de piso en concreto
3. Se realiza mamposteria en fachada
- 4.Se instalan perfiles metalicos en cubierta con un avance del 70%
5. Se continua con instalacion de solado para vigas de cimentacion y zapatas.
6. Se continua con excavacion, fundida de vigas de cimentacion y zapatas en zona de fachada
7. Se continua con instalacion de mamposteria en fachada.
8. Se arma acero de zapata y se funde, se arma acero de columna 50x30 y se funde para apoyo y refuerzo de muro posterior existente.
9. Se cablea zona de sala de audiencias y se continua con instalacion de tuberia electrica en pasillos, baños y zona policia judicial.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:
Versión: 1
Fecha de Aprobación:
Clasificación: Pública

FECHA

20 de Enero del 2025

PERIODO No.

11

DEL

14/01/2025

AL

20/01/2025



DIRECTORA DE INTERVENTORIA

NOMBRE: LEIDY CAROLINA HERNANDEZ

		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA					Código: Versión: 1 Fecha de Aprobación: Clasificación: Pública				
FECHA		27 de Enero del 2025			PERIODO No.		12	DEL	21/01/2025	AL	27/01/2025
1. INFORMACIÓN GENERAL											
OBJETO DEL CONTRATO		INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A REALIZAR LAS ADECUACIONES A LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA USO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL EN LAS INSTALACIONES DEL BATALLON DE A.S.P.C N° 30"GUASIMALES"-BAS30 UBICADO EN CUCUTA.									
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO		CUCUTA-NORTE DE SANTANDER									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA					CONTRATO DE OBRA						
CONTRATO No.:		053-2024 UAEJPMP			CONTRATO No.:		055-2024 UAEJPMP				
PLAZO INICIAL:		CINCUENTA Y SEIS (56) DIAS			PLAZO INICIAL:		CINCUENTA Y SEIS DIAS (56)				
PLAZO TOTAL (DIAS):		131			PLAZO TOTAL -(DIAS):		131				
PLAZO TRANSCURRIDO(DIAS):		84 EQUIVALE AL 64%			PLAZO TRANSCURRIDO(DIAS):		84		EQUIVALE AL		64%
VALOR INICIAL ETAPA 1 :		\$ 91.646.921,00			VALOR INICIAL ETAPA 1 :		\$ 961.924.875,00				
VALOR ADICION(ES):		N/A			VALOR ADICION(ES):		N/A				
VALOR ACTUALIZADO:		N/A			VALOR ACTUALIZADO:		\$ 961.924.875,00				
VALOR PAGADO:		\$ -			VALOR PAGADO:		\$ -				
VALOR POR PAGAR:		\$ 91.646.921,00			VALOR POR PAGAR:		\$ 961.924.875,00				
SUPERVISOR:		NIXON HERNANDEZ LOPEZ PERDIGON			INTERVENTOR:		PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S				
No.	INDICADORES				VALORES		PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO		DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO		
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.				\$ 469.255.629,07		48,78%		-28,60%		
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.				\$ 194.168.939,59		20,19%				
No.	CAPITULOS	INICIO	FIN	DURACION (DIAS)	% PESO ACTIVIDAD	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO		% ATRASO		
1,01	Demolición y desmonte de cielo raso en lamina de yeso-cartón con su estructura, templetes, y todo lo implementado para su soporte. Incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	31/10/2024	1/11/2024	2	0,24%	0,24%	0,24%		0,00%		
1,02	Demolición y desmonte de cielo raso en esterilla de guadua, con yeso y estuco + estructura, templetes, y todo lo implementado para su soporte. Incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	4/11/2024	7/11/2024	3	0,37%	0,37%	0,37%		0,00%		
1,03	Desmonte y demolición de cubierta en teja de fibrocemento incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	6/11/2024	9/11/2024	4	1,59%	1,59%	1,59%		0,00%		
1,04	Demolición muro en mampostería, Incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	12/11/2024	15/11/2024	4	0,74%	0,74%	0,74%		0,00%		
1,05	demolición de poyo de hasta 0,15m de altura, en mamposteria y/o concreto,incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	6/11/2024	7/11/2024	1	0,01%	0,01%	0,01%		0,00%		
1,07	Demolición de mesones en concreto + soportes verticales y horizontales + acabado , incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	8/11/2024	11/11/2024	3	0,06%	0,06%	0,06%		0,00%		
1,08	desmonte de luminarias existentes, incluye retiro y disposición final certificada.	12/11/2024	14/11/2024	2	0,09%	0,09%	0,09%		0,00%		
1,09	desmonte de guardaesoba existente, incluye empaque, cargue, transporte y disposición final certificada.	14/11/2024	18/11/2024	3	0,41%	0,41%	0,41%		0,00%		
1,1	desmonte mobiliario fijo en madera, incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	16/11/2024	18/11/2024	2	0,06%	0,06%	0,06%		0,00%		
1,11	desmonte de dispositivos electricos suspendidos incluye soportes, aparatado, cancelación de punto eléctrico y todo lo correcto para su desinstalación + empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	14/11/2024	15/11/2024	1	0,02%	0,02%	0,02%		0,00%		
1,12	Desmonte de unidades sanitarias (inodoros, urinales, lavamanos) incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	14/11/2024	16/11/2024	2	0,06%	0,06%	0,06%		0,00%		



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:
Versión: 1
Fecha de Aprobación:
Clasificación: Pública

FECHA		27 de Enero del 2025				PERIODO No.	12	DEL	21/01/2025	AL	27/01/2025
1,13	Desmonte de espejos incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	31/10/2024	1/11/2024	2	0,005%	0,005%			0,00%		0,00%
1,15	Demolición de enchapes tipo ceramico en muros, incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	15/11/2024	19/11/2024	4	0,788%	0,788%			0,79%		0,00%
1,16	Demolición de enchapes tipo ceramico en pisos, incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	18/11/2024	23/11/2024	6	2,04%	2,04%			2,04%		0,00%
1,17	Realización de regatas para instalación de tubería 3 x 1" desde punto 0 de datos y eléctricos hasta ubicación final, incluye empaque y disposición final certificada de los escombros.	25/11/2024	27/11/2024	2	0,08%	0,00%			0,00%		-0,08%
1,18	Cancelado de puntos hidraulicos y/o sanitarios, incluye tapones, pegante, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	23/11/2024	26/11/2024	2	0,01%	0,00%			0,00%		-0,01%
1,19	Placa en concreto 0,15m de 3000 psi, incluye malla electrosoldada 4mm 15 x 15, incluye excavación hasta 30cm, material de compactación tipo recebo B-400, debe dejarse el alistado con mortero autonivelante, para instalación del acabado. Plástico como impermeabilizante, formaleta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	19/11/2024	21/11/2024	2	0,07%	0,00%			0,00%		-0,07%
1,2	Limpieza, retiro de escombros, parchado de grietas con sellador tipo resina liquida de poliuretano o similar, alisado de superficies irregulares, limpieza de bajantes, nivelado de la placa para dar la pendiente hacia bajantes con mortero autonivelante reforzado con fibra de vidrio, aplicación de manto asfáltico con foil de aluminio, fijaciopn mediante brea liquida y aplicación de calor	10/01/2024	25/01/2024	15	0,43%	0,13%			0,13%		-0,30%
1,23	Suministro e instalacion de puerta metalica collroid de color negro calibre 22 totalmente lisa, con chapa de seguridad challenguer y marco metalico. P-4	29/11/2024	2/12/2024	2	0,60%	0,00%			0,00%		-0,60%
1,25	Suministro e instalación de estructura de cubierta en perfilera metalica 100x60mm + 90x40mm Y/O cercas en acero corrugado, soldadura, dos capas de pintura anticorrosiva por todas sus caras, + pintura tipo esmalte aplicada en todas sus caras como acabado se incluyen tiras, correas, templetes, fijaciones y todo lo necesario para su correcta instalación.	14/11/2024	19/11/2024	5	0,00%	0,00%			0,00%		0,00%
1,26	Suministro e instalación de teja en acero arquitectonica trapezoidal Cal.22 color blanco, incluye fijaciones, refuerzos, cortes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	11/01/2025	27/01/2025	15	2,09%	1,46%			1,46%		-0,63%
1,27	Caballote para teja trapezoidal, minimo 0,60m de ancho, color blanco incluye fijaciones, refuerzos, cortes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	18/01/2025	23/01/2025	5	0,14%	0,00%			0,00%		-0,14%
1,29	Muro en Mampostería de e:15 cm en Bloque #5, afirmado y pañetado por ambas caras con mortero 1:3 incluye grapas de fijación a muros existentes, corte de acabado e instalado sobre placa estructural.	22/01/2025	6/02/2025	15	1,35%	0,94%			0,94%		-0,40%
1,44	Suministro e instalación enchape de pared en baldosa ceramica blanca formato 60x60cm, incluye pegante para ceramica, dilatadores plásticos, y emboquillado general.	28/11/2024	3/12/2024	12	3,08%	0,15%			0,15%		-2,93%
1,45	suministro e instalación de wing curvo en aluminio crudo, para filos de muros en enchape. Incluye pegante, boquilla y todo lo necesario para su correcta instalación	6/12/2024	10/12/2024	4	0,14%	0,00%			0,00%		-0,14%

		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA						Código: Versión: 1 Fecha de Aprobación: Clasificación: Pública				
FECHA		27 de Enero del 2025				PERIODO No.		12	DEL	21/01/2025	AL	27/01/2025
1,46	Suministro e instalación enchape de piso en porcelanato formato 60x60cm, incluye pegante para porcelanato, dilatadores plásticos, y emboquillado general.	1/01/2025	17/02/2025	45	9,08%	0,00%			0,00%			-9,08%
1,47	Suministro e instalación de guarda escoba en porcelanato negro liso sin textura con altura de 10cm. Incluye pegante para porcelanato, o pegante epoxico tipo sicalflex o similar, incluye emboquillado en juntas y superior con remate de pintura color negro	22/01/2025	11/02/2025	20	2,58%	0,00%			0,00%			-2,58%
1,55	poceta en mampostería maciza, tipo tolete común, de 60cm x 60 cm de base x 75cm de altura, sobre piso en concreto impermeabilizado de 10cm pegado y pañetado con mortero 1:3 impermeabilizado, enchapada con acabado identico al circUn.ante, incluelle win de aliminio en las esquinas y filos, grifería metálica tipo llave jardín,	16/01/2025	20/01/2025	3	0,05%	0,00%			0,00%			-0,05%
1,56	regatas en mampostería y/o concreto y derivación de punto hidraulico, incluye accesorios pegante, limpiador y todo lo correcto para su funcionamiento	21/12/2024	24/12/2024	2	0,12%	0,00%			0,00%			-0,12%
1,58	Suministro e instalación de divisiones en vidrio laminado 4+4, con perfilera en aluminio anodizado negro (marco en perfil tipo VP 3831 o equivalente) proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye película autoadhesiva (Sand blasting) tipo frost. D-1	22/01/2025	15/03/2025	51	8,96%	0,00%			0,00%			-8,96%
1,61	suministro e instalación poyo, en mampostería maciza tipo tolete, ancho de 15cm, y altura de 25cm, fijado al piso de concreto, mortero de pega y pañete 1:3, afinado estucado y pintado.	21/12/2024	24/12/2024	3	0,29%	0,00%			0,00%			-0,29%
NP04	Excavación, para vigas de cimentación de hasta 0,60mts de profundidad.	19/11/2024	21/11/2024	4	0,04%	0,04%			0,04%			0,00%
NP34	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EXISTENTES (INCLUIDO MARCO), TODO TAMAÑO MADERA-METÁLICAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	15/11/2024	19/11/2024	5	0,082%	0,082%			0,08%			0,00%
NP12	desmote de estructura metálica	21/12/2024	2/12/2024	10	1,25%	1,25%			1,25%			0,00%
NP01	Zapata en concreto de 21 MPa (3000 psi) para columnas de confinamiento (incluye refuerzo)	7/12/2024	16/12/2024	8	0,32%	0,32%			0,32%			0,00%
NP02	Fundida de dados de 0,80x1,00mts en concreto ciclopeo de 2500psi para hincado de columnas metálicas, incluye excavacion h: 1.00mt	24/12/2024	27/12/2024	4	0,10%	0,10%			0,10%			0,00%
NP05	Suministro e instalacion de concreto de 2000 PSI para solado de viga de cimentación de 0,30 x 0.25mts.	7/12/2024	11/12/2024	4	0,19%	0,19%			0,19%			0,00%
NP06	Viga de cimentacion en concreto 3000psi 0.30 x 0.25m + refuerzo principal 4#4, anclado a elementos estructurales horizontales + flejes #2@15cm, Incluye formaleta y todo lo necesario para su ejecución.	17/12/2024	25/12/2024	8	3,36%	3,36%			3,36%			0,00%
NP07	Pañete de muros en mampostería 1:3, incluye filos y dilataciones lineales	23/01/2025	28/01/2025	8	0,24%	0,72%			0,72%			0,48%
NP14	Instalación de cercha metálica de angulo y varilla lisa.estructura metálica	6/12/2024	25/12/2024	18	1,48%	1,04%			1,04%			-0,45%
NP43	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	10/12/2024	12/12/2024	19	0,11%	0,00%			0,00%			-0,11%



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:
Versión: 1
Fecha de Aprobación:
Clasificación: Pública

FECHA		27 de Enero del 2025				PERIODO No.		12	DEL	21/01/2025	AL	27/01/2025
NP44	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCs 2" INCLUYE ACCESORIOS	14/21/2024	16/12/2024	2	0,02%	0,00%		0,00%		-0,02%		
NP45	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO DE 3" (INCLUYE ACCESORIOS Y TUBERIA HASTA 1,50 Mts)	10/12/2024	12/12/2024	2	0,01%	0,00%		0,00%		-0,01%		
NP47	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCp RDE 11 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	25/12/2024	26/12/2024	2	0,02%	0,00%		0,00%		-0,02%		
NP48	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO DE 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS Y TUBERIA HASTA 1,50 Mts)	28/12/2024	31/12/2024	2	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		
NP08	Placa en concreto de contrapiso con espesor promedio de 0,09m de 2500 psi, incluye malla electrosoldada 4mm 15 x 15.	21/12/2024	1/01/2025	10	2,81%	1,97%		1,97%		-0,84%		
NP37	Suministro e Instalacion de acometida electrica provisional en conductores de cobre aislado 2#8 (fase+neutro) por tuberia EMT 1/2" (Incluye, Caja metalica de 50X50, Tablero de 6 circuitos, 2 Tomas Normales 110V, 2 tomas naranjas 110V, un totalizador 2X40 amp, un totalizador doble 2X20 amp + un totalizador 1 X20 Amp, con varilla de cobre + caja concreto para puesta a tierra y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	9/11/2024	20/12/2024	41	0,17%	0,17%		0,17%		0,00%		
NP03	Suministro e instalacion de Columnas de 4.80mts de altura (incluido la profundidad de anclaje al pedestal) en estructura metalica perfil C pareada de medidas 220x80x2.5mm, incluye tapa en lamina metalica lisa de 1/8 sobre la parte superior de la columna, soldadura, dos capas de pintura anticorrosiva por todas sus caras, + pintura tipo esmalte aplicada en todas sus caras como acabado final y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	1/01/2025	4/01/2025	4	0,22%	0,22%		0,22%		0,00%		
NP09	Instalación de alistado de piso en morterio 1:3, H 4cm	4/01/2025	11/01/2025	6	0,78%	0,16%		0,16%		-0,63%		
NP11	Construccion de dinteles en concreto 3000psi 0,10 x 0,12m + refuerzo principal 2#4, anclado a elementos estructurales horizontales + flejes en S #2@15cm, Incluye formaleta y todo lo necesario para su ejecución.	22/01/2025	25/01/2025	4	0,19%	0,17%		0,17%		-0,02%		
NP13	Suministro e instalación de Perfil estructural 10x40x1,5 para cubierta	1/01/2025	11/01/2025	10	1,58%	1,11%		1,11%		-0,47%		
NP35	CONSTRUCCION DE VIGAS CINTA EN CONCRETO 3000 PSI DE 10X10 CM (INCLUYE FORMALETAS, VIBRADO, CURADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	26/01/2025	30/01/2025	6	0,16%	0,11%		0,11%		-0,05%		
NP49	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS Y TUBERIA HASTA 1,50 Mts)	31/11/2025	2/01/2025	2	0,01%	0,00%		0,00%		-0,01%		
NP50	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO VALVULA DE BOLA 3/4"	2/01/2025	3/01/2025	2	0,01%	0,00%		0,00%		-0,01%		
NP51	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE CORTINA SELLO METÁLICO 3/4"	4/01/2025	4/01/2025	1	0,02%	0,00%		0,00%		-0,02%		
NP52	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	8/01/2025	10/01/2025	2	0,03%	0,00%		0,00%		-0,03%		
TOTAL					48,78%	20,19%		20,19%		-28,60%		




INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:
Versión: 1
Fecha de Aprobación:
Clasificación: Pública

FECHA 27 de Enero del 2025 PERIODO No. 12 DEL 21/01/2025 AL 27/01/2025

CURVA "S" EJECUTADO VS PROGRAMADO

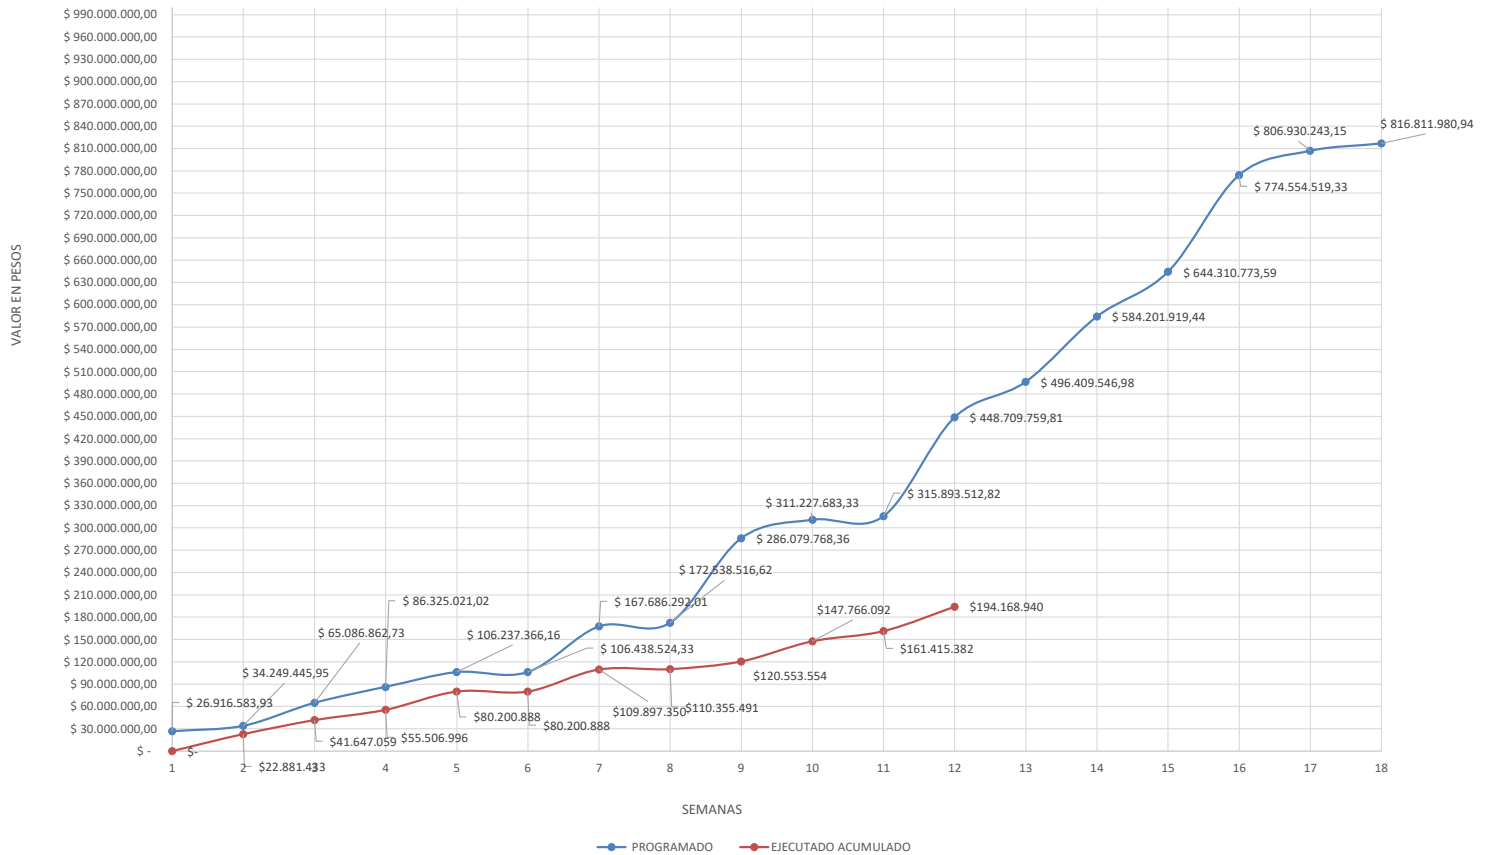

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

NP07	Pañete de muros en mampostería 1:3, incluye filos y dilataciones lineales
NP11	Construccion de dinteles en concreto 3000psi 0,10 x 0,12m + refuerzo principal 2#4, anclado a elementos estructurales horizontales + flejes en S #2@15cm, Incluye formaleta y todo lo necesario para su ejecución.
NP35	CONSTRUCCION DE VIGAS CINTA EN CONCRETO 3000 PSI DE 10X10 CM (INCLUYE FORMALETAS, VIBRADO, CURADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

- Se registra por parte de interventoria el siguiente personal de obra,(1) residente de obra,(1) residente Siso,(5) oficales,(4) ayudantes, (1)Oficial ornamentador, (1)electricista
- Se verifica fundida de dinteles,vigas cinta y vigas de confinamiento en fachada
- Se avanza en mamposteria de fachada
- Se instalan tejas de cubierta al 70%
- Se continua con pañete exterior
- Se funde columna 50x40 de confinamiento para muro posterior
- Se continua con enchape de baño caballero
- Se instala tubería eléctrica y cableado bajo cubierta, instalacion de tableros electricos en cuarto de cableado






INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:
Versión: 1
Fecha de Aprobación:
Clasificación: Pública

FECHA	27 de Enero del 2025	PERIODO No.	12	DEL	21/01/2025	AL	27/01/2025
-------	----------------------	-------------	----	-----	------------	----	------------

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

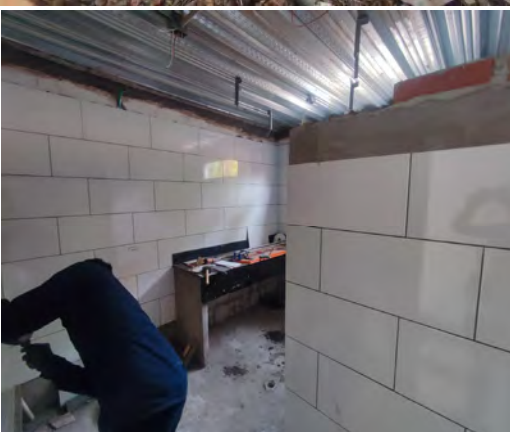



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:
Versión: 1
Fecha de Aprobación:
Clasificación: Pública

FECHA	27 de Enero del 2025	PERIODO No.	12	DEL	21/01/2025	AL	27/01/2025
-------	----------------------	-------------	----	-----	------------	----	------------



DIRECTORA DE INTERVENTORIA
NOMBRE: LEIDY CAROLINA HERNANDEZ

		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA					Código: Versión: 1 Fecha de Aprobación: Clasificación: Pública			
FECHA		03 de Febrero del 2025			PERIODO No.	13	DEL	28/01/2025	AL	3/02/2025
1. INFORMACIÓN GENERAL										
OBJETO DEL CONTRATO		INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A REALIZAR LAS ADECUACIONES A LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA USO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL EN LAS INSTALACIONES DEL BATALLON DE A.S.P.C N° 30"GUASIMALES"-BAS30 UBICADO EN CUCUTA.								
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO		CUCUTA-NORTE DE SANTANDER								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA					CONTRATO DE OBRA					
CONTRATO No.:		053-2024 UAEJPMP			CONTRATO No.:		055-2024 UAEJPMP			
PLAZO INICIAL:		CINCUENTA Y SEIS (56) DIAS			PLAZO INICIAL:		CINCUENTA Y SEIS DIAS (56)			
PLAZO TOTAL(DIAS):		131			PLAZO TOTAL -(DIAS):		131			
PLAZO TRANSCURRIDO(DIAS):		91 EQUIVALE AL 69%			PLAZO TRANSCURRIDO(DIAS):		91 EQUIVALE AL 69%			
VALOR INICIAL ETAPA 1 :		\$ 91,646,921.00			VALOR INICIAL ETAPA 1 :		\$ 961,924,875.00			
VALOR ADICION(ES):		N/A			VALOR ADICION(ES):		N/A			
VALOR ACTUALIZADO:		N/A			VALOR ACTUALIZADO:		961,924,875.00			
VALOR PAGADO:		\$ -			VALOR PAGADO:		\$ -			
VALOR POR PAGAR:		\$ 91,646,921.00			VALOR POR PAGAR:		\$ 961,924,875.00			
SUPERVISOR:		NIXON HERNANDEZ LOPEZ PERDIGON			INTERVENTOR:		PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S			
No.	INDICADORES				VALORES		PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO		DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO	
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.				\$ 514,096,278.14		53.44%		-28.46%	
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.				\$ 240,336,890.26		24.98%			
No.	CAPITULOS	INICIO	FIN	DURACION (DIAS)	% PESO ACTIVIDAD	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO		% ATRASO	
1.01	Demolición y desmonte de cielo raso en lamina de yeso-cartón con su estructura, templetes, y todo lo implementado para su soporte. Incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	31/10/2024	1/11/2024	2	0.24%	0.24%	0.24%		0.00%	
1.02	Demolición y desmonte de cielo raso en esterilla de guadua, con yeso y estuco + estructura, templetes, y todo lo implementado para su soporte. Incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	4/11/2024	7/11/2024	3	0.37%	0.37%	0.37%		0.00%	
1.03	Desmonte y demolición de cubierta en teja de fibrocemento incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	6/11/2024	9/11/2024	4	1.59%	1.59%	1.59%		0.00%	
1.04	Demolición muro en mampostería, Incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	12/11/2024	15/11/2024	4	0.74%	0.74%	0.74%		0.00%	
1.05	demolición de poyo de hasta 0,15m de altura, en mampostería y/o concreto, incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	6/11/2024	7/11/2024	1	0.01%	0.01%	0.01%		0.00%	
1.07	Demolición de mesones en concreto + soportes verticales y horizontales + acabado , incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada..	8/11/2024	11/11/2024	3	0.06%	0.06%	0.06%		0.00%	
1.08	desmonte de luminarias existentes, incluye retiro y disposición final certificada.	12/11/2024	14/11/2024	2	0.09%	0.09%	0.09%		0.00%	
1.09	desmonte de guardaesoba existente, incluye empaque, cargue, transporte y disposición final certificada.	14/11/2024	18/11/2024	3	0.41%	0.41%	0.41%		0.00%	
1.1	desmonte mobiliario fijo en madera, incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	16/11/2024	18/11/2024	2	0.06%	0.06%	0.06%		0.00%	
1.11	desmonte de dispositivos electricos suspendidos incluye soportes, aparatado, cancelación de punto electrico y todo lo correcto para su desinstalación + empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	14/11/2024	15/11/2024	1	0.02%	0.02%	0.02%		0.00%	
1.12	Desmonte de unidades sanitarias (inodoros, urinales, lavamanos) incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	14/11/2024	16/11/2024	2	0.06%	0.06%	0.06%		0.00%	



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:
Versión: 1
Fecha de Aprobación:
Clasificación: Pública

FECHA		03 de Febrero del 2025				PERIODO No.	13	DEL	28/01/2025	AL	3/02/2025
1.13	Desmonte de espejos incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	31/10/2024	1/11/2024	2	0.005%	0.005%			0.00%		0.00%
1.15	Demolición de enchapes tipo ceramico en muros, incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	15/11/2024	19/11/2024	4	0.788%	0.788%			0.79%		0.00%
1.16	Demolición de enchapes tipo ceramico en pisos, incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	18/11/2024	23/11/2024	6	2.04%	2.04%			2.04%		0.00%
1.17	Realización de regatas para instalación de tubería 3 x 1" desde punto 0 de datos y eléctricos hasta ubicación final, incluye empaque y disposición final certificada de los escombros.	25/11/2024	27/11/2024	2	0.08%	0.02%			0.02%		-0.06%
1.18	Cancelado de puntos hidraulicos y/o sanitarios, incluye taponés, pegante, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	23/11/2024	26/11/2024	2	0.01%	0.00%			0.00%		-0.01%
1.19	Placa en concreto 0,15m de 3000 psi, incluye malla electrosoldada 4mm 15 x 15, incluye excavación hasta 30cm, material de compactación tipo recebo B-400, debe dejarse el alizado con mortero autonivelante, para instalación del acabado. Plástico como impermeabilizante, formaleta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	19/11/2024	21/11/2024	2	0.07%	0.00%			0.00%		-0.07%
1.2	Limpieza, retiro de escombros, parchado de grietas con sellador tipo resina liquida de poliuretano o similar, alisado de superficies irregulares, limpieza de bajantes, nivelado de la placa para dar la pendiente hacia bajantes con mortero autonivelante reforzado con fibra de vidrio, aplicación de manto asfáltico con foil de aluminio, fijaciopn mediante brea liquida y aplicación de calor	10/01/2024	25/01/2024	15	0.43%	0.13%			0.13%		-0.30%
1.23	Suministro e instalacion de puerta metálica collroid de color negro calibre 22 totalmente lisa, con chapa de seguridad challenguer y marco metálico. P-4	29/11/2024	2/12/2024	2	0.60%	0.06%			0.06%		-0.54%
1.24	Revoque de muro de fachada con acabado tipo esgrafiado texturizado o similar impermeabilizado, aplicado sobre pañete, incluye raspado de pintura existente, color blanco con zócalo negro de 0,90m de altura.	1/02/2025	11/02/2025	10	1.49%	0.00%			0.00%		-1.49%
1.25	Suministro e instalación de estructura de cubierta en perfleria metálica 100x60mm + 90x40mm Y/O cerchas en acero corrugado, soldadura, dos capas de pintura anticorrosiva por todas sus caras, + pintura tipo esmalte aplicada en todas sus caras como acabado se incluyen tiras, correas, templates, fijaciones y todo lo necesario para su correcta instalación.	14/11/2024	19/11/2024	5	0.00%	0.00%			0.00%		0.00%
1.26	Suministro e instalación de teja en acero arquitectonica trapezoidal Cal.22 color blanco, incluye fijaciones, refuerzos, cortes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	11/01/2025	27/01/2025	15	2.09%	1.57%			1.57%		-0.52%
1.27	Caballote para teja trapezoidal, minimo 0,60m de ancho, color blanco incluye fijaciones, refuerzos, cortes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	18/01/2025	23/01/2025	5	0.14%	0.07%			0.07%		-0.07%
1.29	Muro en Mampostería de e:15 cm en Bloque #5, afirmado y pañetado por ambas caras con mortero 1:3 incluye grapas de fijación a muros existentes, corte de acabado e instalado sobre placa estructural.	22/01/2025	6/02/2025	15	1.35%	1.08%			1.08%		-0.27%
1.3	Columneta de confinamiento en concreto 3000psi 0,25 x 0,12, con refuerzo principal 4#4, anclado a elementos estructurales, superior e inferior + flejes #2 cada 0,15cm. Incluye formaleta y todo lo necesario para su ejecución.	28/01/2025	3/02/2025	6	0.71%	0.71%			0.71%		0.00%

		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA						Código: Versión: 1 Fecha de Aprobación: Clasificación: Pública			
FECHA		03 de Febrero del 2025				PERIODO No.	13	DEL	28/01/2025	AL	3/02/2025
1.31	Vigueta de confinamiento en concreto 3000psi 0,25 x 0,12m + refuerzo principal 4#4, anclado a elementos estructurales horizontales + flejes #2@15cm, Incluye formaleta y todo lo necesarrio para su ejecución.	1/02/2025	6/02/2025	4	0.60%	0.60%			0.60%		0.00%
1.4	Refuerzo y conformado de vanos en estructura metálica coldrolled tubo rectangular 90x50mm fijado a piso y estructura superior, incluye fijaciones, soldadura, dos manos de pintura anticorrosiva por todas sus caras, previo al conformado del muro, y todo lo necesario para su correcta instalación.	1/02/2025	5/02/2025	5	0.07%	0.00%			0.00%		-0.07%
1.42	Pintura interior sobre muros, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos	1/02/2025	13/02/2025	12	1.40%	0.00%			0.00%		-1.40%
1.44	Suministro e instalación enchape de pared en baldosa ceramica blanca formato 60x60cm, incluye pegante para ceramica, dilatadores plásticos, y emboquillado general.	28/11/2024	3/12/2024	12	3.08%	2.16%			2.16%		-0.92%
1.45	suministro e instalación de wing curvo en aluminio crudo, para filos de muros en enchape. Incluye pegante, boquilla y todo lo necesario para su correcta instalación	6/12/2024	10/12/2024	4	0.14%	0.14%			0.14%		0.00%
1.46	Suministro e instalación enchape de piso en porcelanato formato 60x60cm, incluye pegante para porcelanato, dilatadores plásticos, y emboquillado general.	1/01/2025	17/02/2025	45	9.08%	0.10%			0.10%		-8.98%
1.47	Suministro e instalación de guarda escoba en porcelanato negro liso sin textura con altura de 10cm. Incluye pegante para porcelanato, o pegante epoxico tipo sicaflex o similar, incluye emboquillado en juntas y superior con remate de pintura color negro	22/01/2025	11/02/2025	20	2.58%	0.00%			0.00%		-2.58%
1.55	poceta en mampostería maciza, tipo tolete común, de 60cm x 60 cm de base x 75cm de altura, sobrepiso en concreto impermeabilizado de 10cm pegado y pañetado con mortero 1:3 impermeabilizado, enchapada con acabado identico al circUn.ante, inclucle win de aliminio en las esquinas y filos, grifería metálica tipo llave jardin,	16/01/2025	20/01/2025	3	0.05%	0.00%			0.00%		-0.05%
1.56	regatas en mampostería y/o concreto y derivación de punto hidraulico, incluye accesorios pegante, limpiador y todo lo correcto para su funcionamiento	21/12/2024	24/12/2024	2	0.12%	0.00%			0.00%		-0.12%
1.58	Suministro e instalación de divisiones en vidrio laminado 4+4, con perfilera en aluminio anodizado negro (marco en perfil tipo VP 3831 o equivalente) proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye película autoadhesiva (Sand blasting) tipo frost. D-1	22/01/2025	15/03/2025	51	8.96%	0.90%			0.90%		-8.07%
1.61	suministro e instalación poyo, en mamposteria maciza tipo tolete, ancho de 15cm, y altura de 25cm, fijado al piso de concreto, mortero de pega y pañete 1:3, afinado estucado y pintado.	21/12/2024	24/12/2024	3	0.29%	0.00%			0.00%		-0.29%
1.83	Pedestal para banderas dimensiones 0,8 x 1,6 h 0,40 en mampostería maciza tipo tolete, afirmado y pañetado con mortero de pega 1:3, incluye dados en concreto pañetados, 0,40 x 0,40 h 0,20 X 2 + 0,40 x 0,40 h 0,40 X 1, con acabado estuco plástico para exteriores, y pintura premium para exteriores. + Tubos agua negra 2 ½ pulgadas, 2 x 3,50m y 1 x 4,50m, pintado con anticorrosivo, 2 manos, y como acabado pintura tipo esmalte color negro, las astas incluyen la polea superior, y argolla soldadas y pintadas, la punta del asta incluye remate tipo bola de bronce o similar. INCLUYE EXCAVACIÓN Y SOBRECIMIENTO	1/02/2025	5/02/2025	4	0.40%	0.00%			0.00%		-0.40%

		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA						Código: Versión: 1 Fecha de Aprobación: Clasificación: Pública			
FECHA		03 de Febrero del 2025				PERIODO No.	13	DEL	28/01/2025	AL	3/02/2025
NP04	Excavación, para vigas de cimentación de hasta 0,60mts de profundidad.	19/11/2024	21/11/2024	4	0.04%	0.04%			0.04%		0.00%
NP34	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EXISTENTES (INCLUIDO MARCO), TODO TAMAÑO MADERA-METÁLICAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	15/11/2024	19/11/2024	5	0.082%	0.082%			0.08%		0.00%
NP12	desmnte de estructura metalica	21/12/2024	2/12/2024	10	1.25%	1.25%			1.25%		0.00%
NP01	Zapata en concreto de 21 MPa (3000 psi) para columnas de confinamiento (incluye refuerzo)	7/12/2024	16/12/2024	8	0.32%	0.32%			0.32%		0.00%
NP02	Fundida de dados de 0,80x1,00mts en concreto ciclopeo de 2500psi para hincado de columnas metalicas, incluye excavacion h: 1.00mt	24/12/2024	27/12/2024	4	0.10%	0.10%			0.10%		0.00%
NP05	Suministro e instalacion de concreto de 2000 PSI para solado de viga de cimentación de 0.30 x 0,25mts.	7/12/2024	11/12/2024	4	0.19%	0.19%			0.19%		0.00%
NP06	Viga de cimentacion en concreto 3000psi 0,30 x 0,25m + refuerzo principal 4#4, anclado a elementos estructurales horizontales + flejes #2@15cm, Incluye formaleta y todo lo necesario para su ejecución.	17/12/2024	25/12/2024	8	3.36%	3.36%			3.36%		0.00%
NP07	Pañete de muros en mamposteria 1:3, incluye filos y dilataciones lineales	23/01/2025	28/01/2025	8	0.24%	0.10%			0.10%		-0.14%
NP14	Instalación de cercha metálica de angulo y varilla lisa.estructura metalica	6/12/2024	25/12/2024	18	1.48%	1.04%			1.04%		-0.45%
NP43	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	10/12/2024	12/12/2024	19	0.11%	0.02%			0.02%		-0.08%
NP44	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	14/21/2024	16/12/2024	2	0.02%	0.00%			0.00%		-0.02%
NP45	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO DE 3" (INCLUYE ACCESORIOS Y TUBERIA HASTA 1,50 Mts)	10/12/2024	12/12/2024	2	0.01%	0.00%			0.00%		-0.01%
NP47	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCP RDE 11 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	25/12/2024	26/12/2024	2	0.02%	0.00%			0.00%		-0.02%
NP48	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO DE 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS Y TUBERIA HASTA 1,50 Mts)	28/12/2024	31/12/2024	2	0.00%	0.00%			0.00%		0.00%
NP08	Placa en concreto de contrapiso con espesor promedio de 0,09m de 2500 psi, incluye malla electrosoldada 4mm 15 x 15.	21/12/2024	1/01/2025	10	2.81%	2.53%			2.53%		-0.28%



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:
Versión: 1
Fecha de Aprobación:
Clasificación: Pública

03 de Febrero del 2025											
FECHA		03 de Febrero del 2025				PERIODO No.	13	DEL	28/01/2025	AL	3/02/2025
NP37	Suministro e Instalacion de acometida electrica provisional en conductores de cobre aislado 2#8 (fase+neutro) por tuberia EMT 1/2" (Incluye, Caja metalica de 50X50, Tablero de 6 circuitos, 2 Tomas Normales 110V, 2 tomas naranjas 110V, un totalizador 2X40 amp, un totalizador doble 2X20 amp + un totalizador 1 X20 Amp, con varilla de cobre + caja concreto para puesta a tierra y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	9/11/2024	20/12/2024	41	0.17%	0.17%			0.17%		0.00%
NP03	Suministro e instalacion de Columnas de 4.80mts de altura (incluido la profundidad de anclaje al pedestal) en estructura metalica perfil C pareada de medidas 220x80x2.5mm, incluye tapa en lamina metalica lisa de 1/8 sobre la parte superior de la columna, soldadura, dos capas de pintura anticorrosiva por todas sus caras, + pintura tipo esmalte aplicada en todas sus caras como acabado final y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	1/01/2025	4/01/2025	4	0.22%	0.22%			0.22%		0.00%
NP09	Instalación de alisto de piso en mortero 1:3, H 4cm	4/01/2025	11/01/2025	6	0.78%	0.16%			0.16%		-0.63%
NP11	Construccion de dinteles en concreto 3000psi 0,10 x 0,12m + refuerzo principal 2#4, anclado a elementos estructurales horizontales + flejes en S #2@15cm, Incluye formaleta y todo lo necesario para su ejecución.	22/01/2025	25/01/2025	4	0.19%	0.17%			0.17%		-0.02%
NP13	Suministro e instalación de Perfil estructural 10x40x1,5 para cubierta	1/01/2025	11/01/2025	10	1.58%	1.11%			1.11%		-0.47%
NP35	CONSTRUCCION DE VIGAS CINTA EN CONCRETO 3000 PSI DE 10X10 CM (INCLUYE FORMALETAS, VIBRADO, CURADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	26/01/2025	30/01/2025	6	0.16%	0.11%			0.11%		-0.05%
NP49	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS Y TUBERIA HASTA 1,50 Mts)	31/11/2025	2/01/2025	2	0.01%	0.00%			0.00%		-0.01%
NP50	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO VALVULA DE BOLA 3/4"	2/01/2025	3/01/2025	2	0.01%	0.00%			0.00%		-0.01%
NP51	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE CORTINA SELLO METÁLICO 3/4"	4/01/2025	4/01/2025	1	0.02%	0.00%			0.00%		-0.02%
NP52	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	8/01/2025	10/01/2025	2	0.03%	0.00%			0.00%		-0.03%
NP40	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ALL 4" INCLUYE ACCESORIOS	1/02/2025	5/02/2025	4	0.12%	0.02%			0.02%		-0.09%
NP41	CANAL AMAZONAS 0,16x0,14x3,00 MTS, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS)	3/02/2025	7/02/2025	4	0.14%	0.00%			0.00%		-0.14%
TOTAL					53.44%	24.98%			24.98%		-28.46%



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:
Versión: 1
Fecha de Aprobación:
Clasificación: Pública

FECHA 03 de Febrero del 2025 PERIODO No. 13 DEL 28/01/2025 AL 3/02/2025

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:
Versión: 1
Fecha de Aprobación:
Clasificación: Pública

FECHA	03 de Febrero del 2025	PERIODO No.	13	DEL	28/01/2025	AL	3/02/2025
-------	------------------------	-------------	----	-----	------------	----	-----------



DIRECTORA DE INTERVENTORIA
NOMBRE: LEIDY CAROLINA HERNANDEZ

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: Versión:1 Fecha de aprobación: Clasificación: Clasificada
--	--	--

Anexo 4: Relación de Correspondencia

PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS

Nit. 901.835.570-9

Bucaramanga, 02 de enero de 2025

INT-CUC-018

Señores

CONSORCIO VENTURA

Ciudad

Referencia: CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 053-2024 UAEJPMP – “Interventoría para la ejecución del contrato de obra cuyo objeto corresponde a realizar las adecuaciones a la infraestructura física para uso de la Justicia Penal Militar y Policial en las instalaciones del batallón de A.S.P.C. No. 30 “Guasimales” – BAS30 ubicado en Cúcuta.

Asunto: Solicitud de ingreso inmediato del personal asignado al proyecto.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, nos permitimos informar que, a la fecha de hoy, solo se están presentando dos trabajadores para el desarrollo de las actividades contempladas en el contrato, generando demoras significativas en el cumplimiento del cronograma establecido.

En este sentido, se solicita de manera inmediata la incorporación del personal requerido para garantizar la continuidad y avance de las labores en el proyecto. Cabe resaltar que, de no realizarse el ingreso del personal necesario en el menor tiempo posible, la interventoría no podrá asegurar que el contrato se ejecute y finalice dentro del tiempo contractual estipulado.

La adecuada dotación de personal es fundamental para cumplir con los compromisos adquiridos y evitar posibles retrasos o inconvenientes que puedan afectar el desarrollo del proyecto. Agradecemos su atención a este requerimiento y quedamos atentos a su pronta respuesta.

Cordialmente,



JUAN CARLOS JAIMES ACERO

C.C. 91.514.205 de Bucaramanga

Representante Legal

PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS

Nit: 901.835.570-9

PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS

Nit. 901.835.570-9

Bucaramanga, 4 de enero de 2025

INT-CUC-019

Señores
CONSORCIO VENTURA
Ciudad

Referencia: CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 053-2024 UAEJPMP – “Interventoría para la ejecución del contrato de obra cuyo objeto corresponde a realizar las adecuaciones a la infraestructura física para uso de la Justicia Penal Militar y Policial en las instalaciones del batallón de A.S.P.C. No. 30 “Guasimales” – BAS30 ubicado en Cúcuta.

Asunto: Revisión APU ítems asociados a las actividades eléctricas.

Cordial saludo, El presente comunicado tiene como propósito informarles que, tras revisar los planos eléctricos adjuntos a este correo, se han identificado algunas carencias de información relevante. Específicamente, se observa que no se incluye lo siguiente:

1. **Legendas constructivas:** No se especifica el montaje de Conduit PVC.
2. **Distribuciones eléctricas:** No se detallan las características de los tableros (monofásico, bifásico, trifásico) ni la identificación de las salidas eléctricas asociadas a cada alimentador o tablero.
3. **Características de conductores eléctricos:** No se presentan los datos necesarios para cada salida.
4. **Cálculos de diseño:** Faltan los cálculos correspondientes, tales como las capacidades de los equipos a conectar y los diagramas unifilares.
5. **Bajantes de transformador:** En el plano se muestra una excavación para tubería de 3" PVC, mientras que lo presentado en el APU es para tubería de 4" PVC, incluida la excavación.

Adicionalmente, se adjunta el archivo Excel modificado conforme a los criterios establecidos en los libros de interventoría:

- **Libros 15, 16, 17, 18 y 21:** Se ha eliminado el equipo de cortadora de ladrillo, ya que, según los materiales, el Conduit PVC se instalará a la vista.
- **Libro 23:** Se debe revisar la celda denominada "Transporte por parte del constructor" para que se incluyan los costos asociados con el traslado del transformador al terreno.
- **Libro 25:** Se ha agregado una nota respecto al material denominado "capacete", ya que este debe revisarse para ajustar el costo.

Agradezco su atención a los puntos mencionados y quedo atento a cualquier comentario o aclaración adicional.

Cordialmente,



JUAN CARLOS JAIME ACERO
C.C. 91.514.205 de Bucaramanga
Representante Legal
PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS
Nit: 901.835.570-9

PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS

Nit. 901.835.570-9

Bucaramanga, 07 de enero de 2025

INT-CUC-020

Señores

CONSORCIO VENTURA

Ciudad

Referencia: CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 053-2024 UAEJPMP – “Interventoría para la ejecución del contrato de obra cuyo objeto corresponde a realizar las adecuaciones a la infraestructura física para uso de la Justicia Penal Militar y Policial en las instalaciones del batallón de A.S.P.C. No. 30 “Guasimales” – BAS30 ubicado en Cúcuta.

Asunto: Reiteración solicitud de ingreso inmediato del personal asignado al proyecto.

Cordial saludo,


Por medio de la presente, nos permitimos reiterar la solicitud urgente de incorporación del personal requerido para garantizar la continuidad y el avance de las labores en el proyecto. Al día de hoy, se ha registrado únicamente el ingreso de tres personas, alcanzando un total de cinco trabajadores en obra, cifra que resulta insuficiente para el adecuado desarrollo de las actividades programadas.

Esta situación ha generado retrasos significativos en el cumplimiento del cronograma establecido, lo que podría comprometer seriamente los tiempos previstos para la ejecución del contrato.

Es importante resaltar que, de no realizarse el ingreso del personal necesario a la mayor brevedad posible, la interventoría no podrá garantizar que el contrato se ejecute y finalice dentro de los plazos contractuales estipulados.

Agradecemos su atención a este requerimiento y quedamos atentos a su pronta respuesta.

Cordialmente,



JUAN CARLOS JAIMES ACERO

C.C. 91.514.205 de Bucaramanga

Representante Legal

PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS

Nit: 901.835.570-9

PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS

Nit. 901.835.570-9

Bucaramanga, 16 de enero de 2025

INT-CUC-021

Señores

CONSORCIO VENTURA

Ciudad

Referencia: CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 053-2024 UAEJPMP – “Interventoría para la ejecución del contrato de obra cuyo objeto corresponde a realizar las adecuaciones a la infraestructura física para uso de la Justicia Penal Militar y Policial en las instalaciones del batallón de A.S.P.C. No. 30 “Guasimales” – BAS30 ubicado en Cúcuta.

Asunto: Reiteración solicitud Plan de Acciones Correctivas.

Cordial saludo,

En atención al seguimiento efectuado al avance del Contrato de Obra No. 053-2024 UAEJPMP, me permito reiterar la solicitud presentada durante el comité realizado el pasado 13 de enero de 2025, respecto a la entrega inmediata del plan de acción de medidas correctivas del proyecto en mención.

Aunque durante esta semana se ha incorporado nuevo personal para apoyar las actividades previstas, persiste una preocupación, ya que, a la fecha, se registra un retraso acumulado del 20% en el desarrollo de las actividades programadas.

Ante esta situación y con el propósito de garantizar el cumplimiento del cronograma establecido y los objetivos contractuales, reitero la necesidad de que se remita un plan de acciones correctivas detallado que permita superar los atrasos presentados. Dicho plan deberá incluir, entre otros aspectos:

1. Estrategias para incrementar la mano de obra para el desarrollo oportuno de las actividades.
2. Revisión y ajustes al cronograma actual, especificando actividades críticas y tiempos de ejecución.

PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS


Nit. 901.835.570-9

3. Medidas específicas para mitigar riesgos adicionales asociados al retraso actual y para prevenir futuros incumplimientos.
4. Compromisos claros con fechas y responsables designados para la implementación de dichas acciones.

Cabe recalcar que, de no implementarse y acogerse estas medidas, la presente interventoría no podrá garantizar el cumplimiento del contrato dentro del tiempo estipulado contractualmente.

Agradecemos su atención a este requerimiento y quedo atento a su pronta respuesta.

Cordialmente,



JUAN CARLOS JAIMES ACERO

C.C. 91.514.205 de Bucaramanga

Representante Legal

PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS

Nit: 901.835.570-9

PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS

Nit. 901.835.570-9

Bucaramanga, 17 de enero de 2025

INT-CUC-022

Señores
CONSORCIO VENTURA
Ciudad

A/A
Ing. NIXON HERNANDO LÓPEZ PERDIGÓN
Supervisor
Ciudad

Referencia: CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 053-2024 UAEJPMP – “Interventoría para la ejecución del contrato de obra cuyo objeto corresponde a realizar las adecuaciones a la infraestructura física para uso de la Justicia Penal Militar y Policial en las instalaciones del batallón de A.S.P.C. No. 30 “Guasimales” – BAS30 ubicado en Cúcuta.

Asunto: Reiteración entrega inmediata Plan de Acciones Correctivas por atraso en el desarrollo de actividades.

Cordial saludo,

Por medio del presente, me permito reiterar la solicitud de la entrega inmediata del plan de acción que permita dar solución a los atrasos presentados en el desarrollo del proyecto en mención.

Adicionalmente, se evidencia que las siguientes actividades presentan atrasos o, en su defecto, no se han iniciado conforme a lo programado:

ITEM	ACTIVIDAD	UND	INICIO	FIN	ESTADO
1,17	Realización de regatas para instalación de tubería 3 x 1" desde punto 0 de datos y eléctricos hasta ubicación final, incluye	m	25/11/24	27/11/24	NO SE ESTA EJECUTANDO

PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS

Nit. 901.835.570-9

	empaque y disposición final certificada de los escombros.				
1,18	Cancelado de puntos hidráulicos y/o sanitarios, incluye tapones, pegante, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	m	23/11/24	26/11/24	NO SE ESTA EJECUTANDO
1,19	Placa en concreto 0,15m de 3000 psi, incluye malla electrosoldada 4mm 15 x 15, incluye excavación hasta 30cm, material de compactación tipo recebo B-400, debe dejarse el alistado con mortero autonivelante, para instalación del acabado. Plástico como impermeabilizante, formaleta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m ²	19/11/24	21/11/24	NO SE ESTA EJECUTANDO
1,20	Limpieza, retiro de escombros, parchado de grietas con sellador tipo resina liquida de poliuretano o similar, alisado de superficies irregulares, limpieza de bajantes, nivelado de la placa para dar la pendiente hacia bajantes con mortero autonivelante reforzado con fibra de vidrio, aplicación de manto asfáltico con foil de aluminio, fijación mediante brea liquida y aplicación de calor .	m ²	10/01/25	25/01/25	SE EJECUTO UN 30% PERO NO SE HA REGISTRADO MAS AVANCE
1,23	Suministro e instalación de puerta metálica collrold de color negro calibre 22 totalmente lisa, con chapa de seguridad challenguer y marco metálico. P-4.	m ²	29/11/24	02/12/24	NO SE ESTA EJECUTANDO
1,26	Suministro e instalación de teja en acero arquitectónica trapezoidal Cal.22 color blanco, incluye fijaciones, refuerzos, cortes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m ²	11/01/25	27/01/25	NO SE ESTA EJECUTANDO
1,44	Suministro e instalación enchape de pared en baldosa cerámica blanca formato 60x60cm, incluye pegante para cerámica, dilatadores plásticos, y emboquillado general.	m	30/11/24	06/12/24	SE HA JECUTADO UN 15% PERO NO SE HAN REGISTRADO MAS AVANCES
1,45	Suministro e instalación de wing curvo en aluminio crudo, para filos de muros en enchape. Incluye pegante, boquilla y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	6/12/24	10/12/24	NO SE ESTA EJECUTANDO
1,46	Suministro e instalación enchape de piso en porcelanato formato 60x60cm, incluye pegante para porcelanato, dilatadores plásticos, y emboquillado general.	m ²	1/01/25	17/02/25	NO SE ESTA EJECUTANDO
1,56	Regatas en mampostería y/o concreto y derivación de punto hidráulico, incluye accesorios pegantes, limpiador y todo lo correcto para su funcionamiento	m	22/12/24	14/12/24	NO SE ESTA EJECUTANDO
NP01	Zapata en concreto de 21 MPa (3000 psi) para columnas de confinamiento (incluye refuerzo).	m ³	24/12/24	16/12/24	ESTA ACTIVIDAD SE ESTA EJECUTANDO Y LLEVA UN AVANCE

PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS

Nit. 901.835.570-9

					DEL 80%
NP05	Suministro e instalación de concreto de 2000 PSI para solado de viga de cimentación de 0,30 x 0,25mts.	m ²	07/12/24	11/12/24	ESTA ACTIVIDAD SE ESTA EJECUTANDO Y LLEVA UN AVANCE DEL 80%
NP04	Excavación, para vigas de cimentación de hasta 0,60mts de profundidad.	m ³	30/11/24	06/12/24	ESTA ACTIVIDAD SE ESTA EJECUTANDO Y LLEVA UN AVANCE DEL 80%
NP06	Viga de cimentación en concreto 3000psi 0,30 x 0,25m + refuerzo principal 4#4, anclado a elementos estructurales horizontales + flejes #2@15cm, Incluye formaleta y todo lo necesario para su ejecución.	m ³	17/12/24	25/12/24	ESTA ACTIVIDAD SE ESTA EJECUTANDO Y LLEVA UN AVANCE DEL 80%
NP08	Placa en concreto de contrapiso con espesor promedio de 0,09m de 2500 psi, incluye malla electrosoldada 4mm 15 x 15.	m ²	21/12/24	01/01/25	ESTA ACTIVIDAD SE ESTA EJECUTANDO Y LLEVA UN AVANCE DEL 70%
NP09	Instalación de alizado de piso en mortero 1:3, H 4cm	m ²	04/01/25	11/01/25	ESTA ACTIVIDAD SE ESTA EJECUTANDO Y LLEVA UN AVANCE DEL 20%
NP13	Suministro e instalación de Perfil estructural 10x40x1,5 para cubierta	m	01/01/25	11/01/25	ESTA ACTIVIDAD SE ESTA EJECUTANDO Y LLEVA UN AVANCE DEL 80%
NP14	Instalación de cercha metálica de Angulo y varilla lisa. Estructura metálica	m ²	06/12/24	25/12/24	ESTA ACTIVIDAD SE ESTA EJECUTANDO Y LLEVA UN AVANCE DEL 70%
NP43	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	m	10/12/24	20/12/24	NO SE ESTA EJECUTANDO
NP44	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	m	14/12/24	16/12/24	NO SE ESTA EJECUTANDO
NP45	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO DE 3" (INCLUYE ACCESORIOS Y TUBERIA HASTA 1,50 Mts)	Und	17/12/24	18/12/24	NO SE ESTA EJECUTANDO
NP47	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCP RDE 11 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	m	25/12/24	26/12/24	NO SE ESTA EJECUTANDO
NP48	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO DE 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS Y TUBERIA HASTA 1,50 Mts)	Und	28/12/24	31/12/24	NO SE ESTA EJECUTANDO
NP49	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS Y TUBERIA HASTA 1,50 Mts)	Und	31/12/24	01/01/25	NO SE ESTA EJECUTANDO

PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS

Nit. 901.835.570-9

NP50	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO VALVULA DE BOLA 3/4"	Und	02/01/25	03/01/25	NO SE ESTA EJECUTANDO
NP51	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE CORTINA SELLO METÁLICO 3/4"	Und	04/01/25	04/01/25	NO SE ESTA EJECUTANDO
NP52	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	m	08/01/25	10/01/25	NO SE ESTA EJECUTANDO

Por lo anterior, se solicita informar sobre el inicio de estas actividades y presentar un plan de acción que contemple las medidas correctivas necesarias, los tiempos estimados para su ejecución y el compromiso de cumplimiento con los plazos establecidos.

Cabe recalcar que la omisión en la entrega del presente requerimiento compromete la finalización del proyecto dentro del tiempo contractualmente establecido.

Agradecemos su atención y quedo atento a su pronta respuesta.

Cordialmente,



JUAN CARLOS JAIMES ACERO

C.C. 91.514.205 de Bucaramanga

Representante Legal

PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS

Nit: 901.835.570-9

PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS

Nit. 901.835.570-9

Bucaramanga, 26 de diciembre de 2024

INT-CUC-023

Señores

CONSORCIO VENTURA

Ciudad

Referencia: CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 053-2024 UAEJPMMP – “Interventoría para la ejecución del contrato de obra cuyo objeto corresponde a realizar las adecuaciones a la infraestructura física para uso de la Justicia Penal Militar y Policial en las instalaciones del batallón de A.S.P.C. No. 30 “Guasimales” – BAS30 ubicado en Cúcuta.

Asunto: SOLICITUD DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE IDONEIDAD PARA ACTIVIDAD DE SOLDADURA

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito solicitar la entrega de los soportes de certificación de idoneidad del personal que realice las actividades de ornamentación, toda vez que no se evidencia dicho anexo en la documentación de ingreso del personal presentado, el cual es un requerimiento por parte de la interventoría para garantizar el correcto desarrollo de la actividad bajo las normas de seguridad establecidas, así como dar cumplimiento a la norma ISO 3834 la cual dispone los procesos de calidad de los procesos de soldadura

Así lo expuesto, la interventoría no autoriza el ingreso de dicho personal hasta que no se realice la entrega de la certificación de idoneidad de quien realice la actividad de soldadura

Cordialmente,



JUAN CARLOS JAIMÉS ACERO

C.C. 91.514.205 de Bucaramanga

Representante Legal

PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS

Nit: 901.835.570-9

PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS

Nit. 901.835.570-9

Bucaramanga, 30 de enero de 2025

INT-CUC-024

Señores

CONSORCIO VENTURA

Ciudad

A/A

Ing. NIXON HERNANDO LÓPEZ PERDIGÓN

Supervisor

Ciudad

Referencia: CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 053-2024 UAEJPMP – “Interventoría para la ejecución del contrato de obra cuyo objeto corresponde a realizar las adecuaciones a la infraestructura física para uso de la Justicia Penal Militar y Policial en las instalaciones del batallón de A.S.P.C. No. 30 “Guasimales” – BAS30 ubicado en Cúcuta.

Asunto: Incumplimiento entrega Plan de Acciones Correctivas.

Cordial saludo,

En atención al seguimiento realizado al avance del Contrato de Obra No. 53-2024 UAEJPMP, me permito informar el incumplimiento de la solicitud presentada en el comité del 13 de enero de 2025, así como en los oficios INT-CUC-021 del 16 de enero de 2025 e INT-CUC-022 del 17 de enero de 2025, en los cuales se solicitó la entrega inmediata del plan de acción con medidas correctivas para el proyecto en mención.

Han transcurrido 17 días desde que la presente interventoría requirió la remisión del documento, y a la fecha aún no ha sido recibido. Es importante recalcar que la no entrega de este documento constituye un incumplimiento de los compromisos pactados, con el riesgo de incurrir en multas y sanciones.

Asimismo, se reitera que la no entrega del plan de acción y su respectivo cumplimiento impiden a la presente interventoría garantizar la culminación del contrato dentro del plazo establecido contractualmente. Preocupa, además, que, a 44 días de la finalización del contrato, no se estén abordando varios frentes de trabajo o en su defecto presenten atrasos, entre ellos:

- Pañete en zonas exteriores: Actualmente solo hay un oficial asignado, se recomienda reforzar el equipo.

PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS

Nit. 901.835.570-9

- Mortero de nivelación: Pendiente en la zona de policía judicial, baños, pasillo y sala de audiencias.
- Instalación de la red de presión para el área de cocina.
- Filos en ventanas y columnas: Se requiere aumentar el personal asignado, ya que solo hay un oficial.
- Revoque en muros de fachada e internos.
- Cielo raso: Solo un oficial está armando la estructura; el día de hoy la actividad no se está ejecutando.
- Impermeabilización de placas: Únicamente se ha impermeabilizado la placa de policía judicial; es necesario continuar con esta actividad.
- Terminación de mampostería.
- Instalación de cubierta: Suspendida desde el 28 de enero de 2025 debido a correcciones pendientes en la estructura.

Ante este panorama, se recomienda evaluar la implementación de una jornada doble y reforzar las cuadrillas de trabajo, ya que actualmente solo se cuenta con 6 oficiales, 4 ayudantes, 3 trabajadores en actividades eléctricas y 2 ornamentadores, buscando garantizar así el cumplimiento del objeto contractual dentro de los plazos establecidos.

Finalmente, se recalca que la omisión en la entrega de este requerimiento compromete la finalización del proyecto dentro del tiempo contractual establecido, por lo cual se solicita que sea enviado a mas tardar el día 31 de enero de 2025.

Agradecemos su atención y quedo atento a su pronta respuesta.

Cordialmente,



JUAN CARLOS JAIMES ACERO

C.C. 91.514.205 de Bucaramanga

Representante Legal

PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS

Nit: 901.835.570-9

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: Versión:1 Fecha de aprobación: Clasificación: Clasificada
--	--	--

Anexo 5: Informe de SST Interventoría

PALO Arquitectura e Ingeniería	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	
--	---	--

INFORME DE INTERVENTORIA

“INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A REALIZAR LAS ADECUACIONES A LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA USO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL EN LAS INSTALACIONES DEL BATALLON DE A.S.P.C N° 30"GUASIMALES"-BAS30 UBICADO EN CUCUTA.”

INFORME HSEQ No. 3

PALO
Arquitectura E Ingeniería SAS

PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2025
CUCUTA, NORTE DE SANTANDER

DALO Arquitectura e Ingeniería	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	
--	---	--

Contenido

INTRODUCCIÓN	3
INFORMACIÓN DEL PROYECTO.	¡Error! Marcador no definido.
1. RECURSOS HUMANOS INTERVENTORIA	4
2. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA	4
3. INFORME MENSUAL HSEQ	5
3.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	5
3.1.1 MANEJO DE DEMOLICIONES, ESCOMBROS Y DESECHOS DE CONSTRUCCIÓN.	5
Indicadores de Seguimiento Programa	6
Indicadores de seguimiento programa	¡Error! Marcador no definido.
3.1.3 PROGRAMA ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	7
3.1.4 MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES	7
3.1.5 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y TRANSPORTE	8
3.1.6 MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS.	¡Error! Marcador no definido.
3.1.7 MANEJO DE ESTRUCTURAS Y ASEO DE LA OBRA.	¡Error! Marcador no definido.
3.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	9
3.2.1 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO	9
3.2.1.1 Exámenes Medico ocupacionales:	10
3.2.2 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	14
3.2.2.1 SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE SST	14
3.2.2.2 PROGRAMA DE CAPACITACIONES	15
3.2.3 SEGUIMIENTO AL PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA (PAPSO)	¡Error! Marcador no definido.
OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES	¡Error! Marcador no definido.

DALO Arquitectura e Ingeniería	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	
--	---	--

INTRODUCCIÓN

El siguiente informe tiene como objeto dar a conocer el seguimiento HSEQ que se ha realizado por parte de la Interventoría, al contrato de obra No. 142-2022 durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2025; que corresponde al **Informe HSEQ de Interventoría No. 3** y describe cada uno de los factores e indicadores de control establecidos y cubiertos por el contrato de interventoría No. 053-2024, cuyo objeto es realizar la *“Interventoría para la ejecución del contrato de obra cuyo objeto corresponde a realizar las adecuaciones a la infraestructura física para uso de la Justicia Penal Militar y Policial en las instalaciones del batallón de A.S.P.C. No. 30 “Guasimales” – BAS30 ubicado en Cúcuta”*

DALO Arquitectura e Ingeniería	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	
--	---	--

1. RECURSOS HUMANOS INTERVENTORIA

CARGO	NOMBRE	FECHA RETIRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ	
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	JEISON EDUARDO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	
PROFESIONAL HSEQ	RUBY CACERES QUINTERO	
INGENIERO ELECTRICISTA	RICARDO ALVARADO JAIMES	
INSPECTOR DE INTERVENTORIA	VIANEY MILENA PEÑALOZA RICO	

Tabla 1. Personal de Interventoría

NOTA: En el anexo 1. Se adjunta el pago de seguridad social del personal de interventoría durante el periodo.

2. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA

PROFESIONALES CONTRATISTA- OBRA		
NOMBRE	CARGO	RETIRO
JHOAM MANUEL ORJUELA CARRERO	DIRECTOR DE OBRA	
JORGE ELIECER MORALES RUIZ	RESIDENTE DE OBRA	
EDDY GISELA PEREZ GRIMALDOS	PROFESIONAL HSEQ	
HAENZZ GONZALEZ ORTIZ	ING ELECTRICISTA	

Tabla 2. Relación de Profesionales – Contratista de Obra

N°	NOMBRES	APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
CONSORCIO VENTURA PERSONAL OPERATIVOS						
1	NESTOR ENRIQUE	AVILA	1077320582	OFICIAL DE OBRA	6/11/2024	
2	CELY DANIEL	VILLALOBOS SANCHEZ	86076301	AUXILIAR DE OBRA	6/11/2024	14/01/2025
3	EDGAR JOSE	BARRETO	1127387023	AUXILIAR DE OBRA	7/11/2024	
4	WILLIAM EDILSON	GONZALEZ PIRAQUIVE	79954942	ORNAMENTADOR	19/11/2024	
5	PEDRO	HERNANDEZ ROPERO	88311594	OFICIAL DE OBRA	2/12/2024	
6	LUIS FELIPE	MEDINA SALCEDO	1093142064	OFICIAL DE OBRA	25/11/2024	
7	LUIS ALFREDO	HERNANDEZ MONROY	1094427923	OFICIAL DE OBRA	7/01/2025	
8	JOSE ALBERTO	RAMIREZ HEREDIA	PT 7527491	AUXILIAR DE OBRA	7/01/2025	10/01/2025
9	JOSE ALCIDES	MARTINEZ GUERRERO	1073599257	OFICIAL DE OBRA	9/01/2025	

DALO Arquitectura e Ingeniería	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	
--	---	--

10	REINALDO	MORANTES BALAGUERA	13199229	OFICIAL DE OBRA	15/01/2025	
11	DEIVIN ADRIAN	MORANTES MORA	1127656667	AUXILIAR DE OBRA	15/01/2025	
12	SANTOS EDUARDO	RAMIREZ FIGUEROA	1026267003	OFICIAL DE OBRA	20/01/2025	
13	DAIRON STIWAR	RAMIREZ CARRILLO	1004804856	AUXILIAR DE OBRA	20/01/2025	
CONSTRUCCIONES ARKITEK BPO S.A.S..						
1	JORGE ISAAC	ARANGO CAMACHO	13447196	ELECTRICISTA	27/01/2025	
2	JESUS ENRIQUE	RANGEL BUENI	13459748	ELECTRICISTA	27/01/2025	
GRUPO EMPRESARIAL ASOVITAL SAS						
1	JOSE DAVID	ROMANO GOMEZ	PT 6692521	ORNAMENTADOR	30/01/2025	
2	RAMIRO	PINEDA MARIN	13195172	ORNAMENTADOR	30/01/2025	

Tabla 3. Relación de personal operativo - Contratista de Obra

NOTA: En el anexo 2. Se adjuntan las afiliaciones de ingreso del personal del contratista

3. INFORME MENSUAL HSEQ

3.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL COOMPONENTE AMBIENTAL

3.1.1 MANEJO DE DEMOLICIONES, ESCOMBROS Y DESECHOS DE CONSTRUCCIÓN.

Durante el periodo recorrido en el presente informe, el contratista **CONSORCIO VENTURA** ha realizado actividades de demoliciones y desmontes de cubierta, las cuales generan una cantidad de escombros, los cuales son acopiados en un punto temporal hasta su retiro al sitio de disposición final.

Así mismo, la interventoría solicita al contratista la documentación correspondiente al sitio de disposición final, con el fin de verificar su certificación y autorización ante la entidad ambiental competente.

CONSOLIDADO DE ESCOMBROS DISPUESTOS				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PERIODO	CANTIDAD CERTIFICADA
ESCOMBROS	21	m ³	1 al 31 de enero de 2025	0 m ³

Tabla 4. Consolidado de Escombros Dispuestos

NOTA: El ejecutor no realiza la entrega de la certificación remitida por la escombrera de la cantidad de escombros dispuestos para este mes, sin embargo, se adjunta los vales remitidos por el contratista del transporte de dichos materiales. Ver Anexo 3.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO PROGRAMA

#	MANEJO DE DEMOLICIONES, ESCOMBROS Y DESECHOS DE CONSTRUCCIONES
01	Volumen de escombros dispuestos adecuadamente/ Volumen de escombros totales Generados * 100. % Escombros Dispuestos Escombrera= $\frac{21 \text{ m}^3}{21 \text{ m}^3} * 100$ % Escombros Dispuestos Escombrera = 100%

Tabla 5. Indicador de seguimiento

3.1.2 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS, RECICLABLES Y PELIGROSOS.

A la fecha del presente informe, el contratista no realiza la implementación total en obra de los puntos ecológicos según las nuevas disposiciones legales sobre la separación, clasificación, transporte y disposición final de los residuos a la entidad correspondiente, Resolución No. 2184 de 2019 expedida por el Ministerio del Medio Ambiente, que comenzó a regir en el 2021 y establece el **NUEVO CÓDIGO DE COLORES PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS**, blanco, negro y verde, rojo para la separación de residuos en la fuente.

NOTA: No se ha realizado la implementación de dichos puntos ecológicos los cuales son fundamentales para la clasificación de residuos ordinarios desde la fuente y así minimizar el impacto generado al medio ambiente.

3.1.3 PROGRAMA ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

Durante el presente periodo, el contratista continúa realizando el almacenamiento de materiales en el frente de trabajo, en un área designada para tal fin dentro del alistamiento de trabajo y debidamente señalizado, así mismo, se requiere al contratista, realizar el cubrimiento del material sobrante para garantizar que su composición no se vea afectada por el entorno

Durante el periodo comprendido en el presente informe, el contratista adquiere el siguiente tipo de material

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD
ARENA FINA	14 m ³
ARENA GRUESA	7 m ³
MIXTO (ARENA GRUESA-TRITURADO)	28 m ³

Tabla 6. Material adquirido.

NOTA: Ver anexo 4. Control de ingreso de material por cantidad

Indicadores de Seguimiento Programa

#	ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
01	Acopio de material señalizado en los frentes de obra / Acopio de material en los frentes de obra x 100. % Señalización de Acopios = $\frac{2}{2} * 100$ % Señalización de Acopios = 100%

Tabla 7. Indicadores de Seguimiento

3.1.4 MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES

Durante la ejecución de actividades el contratista realiza la instalación algunos campamentos temporales para el acopio de material y almacenamiento de insumos.

Cabe mencionar que, el contratista hace uso de las instalaciones de la entidad para realizar sus actividades administrativas dotando el lugar de elementos de oficina como mesas, sillas, papel y demás insumos requeridos para este tipo de labores.

Así mismo, el contratista hace uso del sanitario existente en el área.

Indicadores de Seguimiento Programa

#	MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES
01	Cantidad de USP instaladas / Cantidad de baños requeridos según # de trabajadores * 100 $\% \text{ Cantidad de USP Instaladas} = \frac{1}{1} * 100$ $\% \text{ Cantidad de USP Instaladas} = 100 \%$

Tabla 8. Indicadores de Seguimiento Programa

3.1.5 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y TRANSPORTE.

En el inicio del presente proyecto no se evidenció uso de maquinaria amarilla, sin embargo, el contratista realiza el ingreso de vehículos tipo volqueta, para el abastecimiento de materiales, así como el retiro de material RCD.

A continuación, se relacionan los equipos y/o vehículos presentes en obra durante el periodo comprendido en el presente informe:

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD / PLACA	CAPACIDAD
Mezcladora de concreto	1	1 bulto
Taladro	1	750 w
Pulidora	1	NA
Equipo de soldadura	1	250 A
Taladro demoledor	1	2.000 W
Descripción	Vehículos	
Volqueta	OWG 545	7 m ³

Tabla 9. Listado de Vehículos y Maquinaria en Obra

NOTA: El contratista presenta la documentación actualizada del vehículo tipo volqueta OWG 545, el cual realiza el transporte de materiales. Ver anexo 5. Documentación de vehículos. Ver anexo 6. Inspección de equipos y herramientas

Por otra parte, durante el presente periodo, no se presentaron emergencias por derrame de combustibles ni emergencias ambientales generadas por las actividades propias de la obra.

Indicadores de Seguimiento Programa

#	MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y TRANSPORTE
01	No. de vehículos con certificados técnico mecánica/No. Total, de vehículos que requieren revisión tecnicomencánica * 100 $\% \text{ Vehículos con CTM} = \frac{1}{1} * 100$ % Vehículos con CTM = 100 %

Tabla 10. Indicadores de Seguimiento

3.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

3.2.1 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

La medicina preventiva es esa área que se ocupa de difundir actividades y políticas de prevención de enfermedades en el ámbito laboral. Su fin es estudiar las condiciones y el ambiente de trabajo, y de esta forma establecer las condiciones en las que se desarrollan las actividades en esa área y cómo esas circunstancias afectan la salud de los empleados. Otra de sus funciones es mantener a los trabajadores en constante información y educación en cuanto a la prevención de riesgos laborales.


Las principales actividades evidenciadas por la interventoría en el presente periodo son:

- Capacitaciones en Seguridad y Salud en el trabajo
- Entrega de dotación
- Reposición de elementos de protección personal
- Pausas activas
- Implementación de equipos de emergencia

Número de casos atendidos en el período:

TIPO DE ATENCIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	TOTAL
Atención por Enfermería	0	0	0
Traslados en Ambulancia	0	0	0
Remisión EPS	0	0	0
Remisión ARL	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Tabla 11. Tipo de atenciones en el periodo.



Grafica 1. Tipo de atenciones en el periodo

NOTA: Durante el periodo del presente informe, no se presentaron accidentes de trabajo ni reportes de enfermedades laborales


3.2.1.1 EXÁMENES MEDICO OCUPACIONALES:

El contratista debe realizar el examen médico de ingreso a los trabajadores por medio de la IPS contratada, previo a su vinculación laboral, para identificar restricciones y su aptitud laboral para ejecutar las tareas para los cuales va a ser contratado.

Durante este periodo el contratista realizó el ingreso de 7 personas directamente vinculadas, sin embargo, a la fecha solo ha remitido el soporte de 2 exámenes de ingreso realizados

TIPO DE EXAMEN	CONTRATISTA		
	Ingreso	Periódico	Retiro
Examen medico	2	0	0

Tabla 12. Exámenes Médicos Ocupacionales

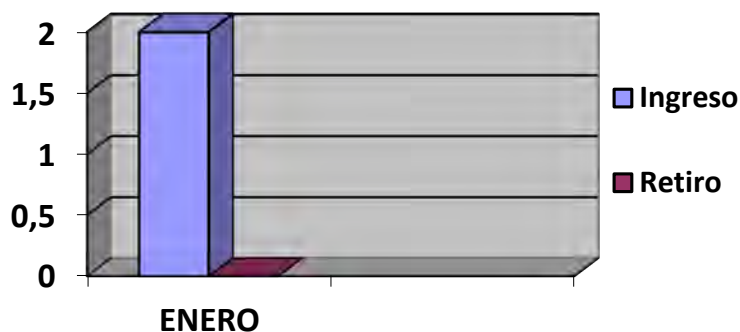

Grafica 2. Exámenes médicos ocupacionales

NOTA: Ver anexo 7. Consolidado de exámenes de ingreso del periodo de informe.

3.2.1.2 CONSOLIDADO DE INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD

Interventoría: Durante el periodo comprendido en este informe en el equipo de interventoría NO presenta accidentes de trabajo

De acuerdo a lo anterior, el resultado de los índices estipulados en la Resolución 0312 de 2019 es:

Índice de severidad: 0.00%
 Índice de frecuencia: 0,00%
 Índice de lesión incapacitante: 0.00%

Accidentalidad e Incidentalidad por frentes de trabajo


INDICADOR FRENTE	N° IT	N° IT Investigados	N° AT	N° AT investigados	N° días incapacidad	N° Trabajadores	Tasa AT
TRABAJO DE OFICINA	0	0	0	0	0	1	0%
TRABAJO DE CAMPO	0	0	0	0	0	3	0%
TOTAL	0	0	0	0	0	4	0%

Tasa Accidentalidad Acumulado Interventoría


MES	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	TOTALES
INDICADOR				
Número Trabajadores mes	4	4	4	4
Número AT	0	0	0	0
Número de Incidentes	0	0	0	0
Tasa AT (%)	0	0	0	0
Días Incapacidad	0	0	0	0

Fórmulas Tasa De Accidentalidad: = (No. Accidentes /No. Promedio trabajadores acumulados) x 100 %

Gráficas de la Tendencia de la accidentalidad de la Interventoría

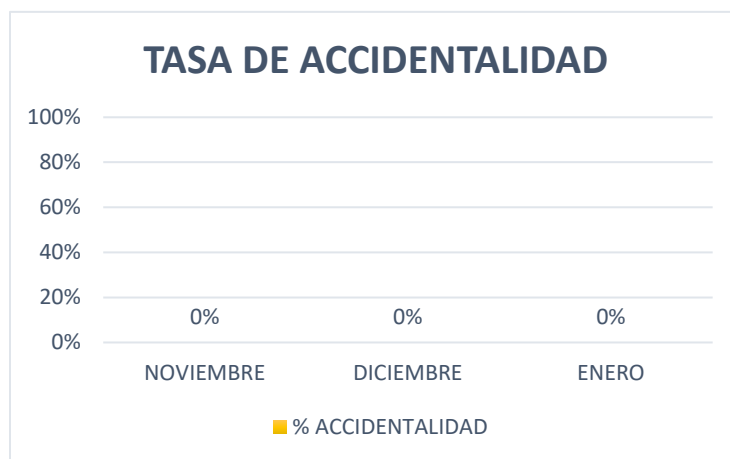

Gráfica 3. Tasa de accidentalidad por mes



Gráfica 4. N° de accidentes de trabajo mensual

Contratista: Para el tiempo comprendido en este periodo no se presentan accidentes de trabajo

Accidentalidad e Incidentalidad por frentes de trabajo


INDICADOR	N° IT	N° IT Investigados	N° AT	N° AT investigados	N° días incapacidad	N° Trabajadores	Tasa AT
FRENTE							
TRABAJO DE CONTRATISTA	0	0	0	0	0	15	0%
TRABAJO DE SUB CONTRATISTAS	0	0	0	0	0	4	0%
TOTAL	0	0	0	0	0	19	0%

Tasa Accidentalidad Acumulado Contratista


MES	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	TOTALES
INDICADOR				
Número Trabajadores mes	9	10	19	12,6
Número AT	0	0	0	0
Número de Incidentes	0	0	0	0
Tasa AT (%)	0	0	0	0
Días Incapacidad	0	0	0	0

Fórmulas Tasa De Accidentalidad: = (No. Accidentes /No. Promedio trabajadores acumulados) x 100 %

Gráficas de la Tendencia de la accidentalidad del Contratista



Gráfica 5. Tasa de accidentalidad por mes

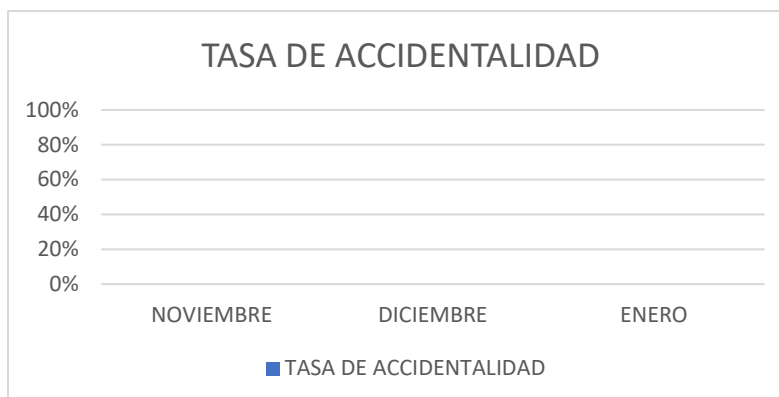

Gráfica 6. N° de accidentes de trabajo mensual

3.2.2 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL


Sus actividades comprenden la identificación, evaluación, análisis de riesgos ocupacionales y las recomendaciones específicas para su control, a través de la elaboración de panoramas de riesgo, visitas de inspección a las áreas de trabajo, mediciones ambientales, entre otras.

3.2.2.1 SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE SST

Porcentaje de actividades cumplidas por el contratista en el mes según cronograma

N° Capacitaciones programadas	N° Capacitaciones ejecutadas	% Cumplimiento
4	4	100%

Tabla 13. Actividades Cumplidas en el mes

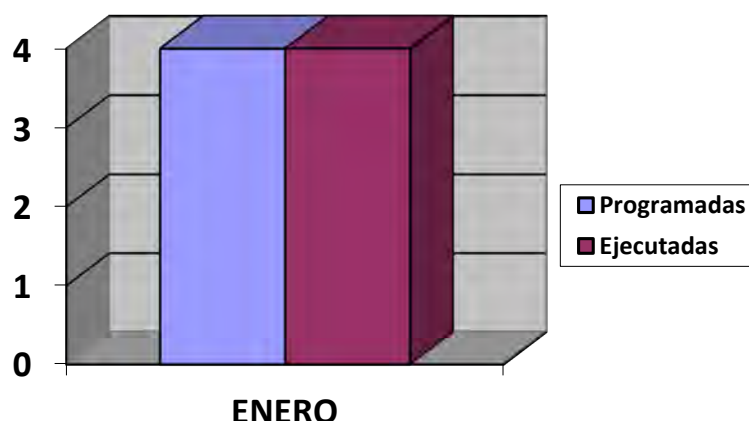

Grafica 7. Porcentaje de Actividades Cumplidas en el mes por el contratista

La interventoría durante el periodo realizó seguimiento al plan de seguridad del contratista, evidenciando en otras, las siguientes actividades:

- ✓ Afiliaciones y pago a seguridad social del personal de obra
- ✓ Jornadas de capacitación e Inducción HSEQ.
- ✓ Acordonamiento y demarcación de zonas de trabajo
- ✓ Inspecciones pre operacionales
- ✓ Señalización y delimitación de áreas de trabajo
- ✓ Revisión del estado y uso de los elementos de protección personal

3.2.2.2 PROGRAMA DE CAPACITACIONES

De acuerdo al desarrollo de las actividades en obra, el contratista realiza capacitaciones periódicas, así como inducciones al personal nuevo, todo esto con el fin de divulgar y concientizar a los trabajadores prevenir o minimizar riesgos.

Durante el periodo se realizan las siguientes capacitaciones y charlas.

DESCRIPCIÓN	FECHA	TIPO DE FORMACIÓN		No. DE ASISTENTES
		AMB	SST	
Charla e inducción en sitio	07/01/2025		X	11
Ergonomía e Higiene postural	18/01/2025		X	8
Pausas activas	20/01/2025		X	10
Cuidado de las manos	31/01/2025		X	10

Tabla 14. Relación capacitaciones en el periodo-CONTRATISTA

NOTA: Ver anexo 8. ASISTENCIA CAPACITACIONES PERSONAL DE CONTRATISTA

3.2.2.3 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

El contratista e interventoría cuentan con su política de elementos de protección personal dentro de la implementación de su SG SST, la cual es divulgada y socializada al personal. Así mismo, la interventoría cuenta con su matriz de Elementos de Protección Personal, de acuerdo a las funciones realizadas en obra

Por otra parte, constantemente la interventoría realiza inspección visual del uso adecuado de los elementos de protección personal y del estado en el que se evidencian.

Durante el presente periodo la interventoría evidenció la entrega y reposición de los siguientes elementos de protección personal

ELEMENTO DE PROTECCION ENTREGADO	CANTIDAD
Dotación (botas, camisas etc.)	4
Lentes	6
Guantes	6
Casco	6
Tapabocas	2
Guantes de vaqueta	3

NOTA: Ver Anexo 9. Entrega de EPP durante el periodo

3.2.2.4 PLAN DE CONTINGENCIA

El Plan de Contingencia es una herramienta valiosa que permite implementar medidas de tipo preventivo que mitiguen o eviten la ocurrencia de accidentes, tanto del personal vinculado directamente, como al personal ajeno al proyecto pero que son cercanos al área de influencia que sean vulnerables ante cualquier tipo de amenaza que provenga del proyecto.

Por tanto, el contratista establecer las medidas de prevención, atención y control requeridas que se debería tomar para afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva, ante la eventualidad de incidentes, accidentes y/o estados de emergencias que pudieran ocurrir en el área de influencia del contrato.

Interventoría: El equipo de interventoría en campo, se apropia del plan de contingencia de obra establecido por el contratista ya que nuestros trabajadores se desempeñarán dentro de la obra en ejecución.

Contratista: A la fecha el contratista no realiza la implementación de los equipos de emergencia requeridos en reiteradas ocasiones por la interventoría y que deben estar compuestos por (Botiquín, Camilla y extintores) en cada frente de trabajo.

UBICACIÓN FRENTES ACTIVOS DE TRABAJO	EXTINTOR	BOTIQUÍN	CAMILLAS
BATALLÓN DE A.S.P.C N° 30 "GUASIMALES"	1	1	1

NOTA: Según la información contenida en el anterior cuadro, se evidencia que el contratista ha implementado el equipo de emergencia necesario para la atención de cualquier eventualidad que así lo requiera.


PAJO Arquitectura e Ingeniería	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	
--	---	--

OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES

1. Durante el periodo del presente informe el contratista realiza el pago de los aportes a seguridad social del personal operativo y administrativo dentro de los plazos establecidos, así mismo, realiza la entrega de dichos soportes para su verificación.
2. La interventoría realiza la verificación oportuna de las afiliaciones a seguridad social del personal nuevo para ingreso, el cual debe contar con las certificaciones a ARL, EPS, AFP y examen de ingreso
3. El contratista realiza las capacitaciones del área SST programadas, sin embargo, del área ambiental no se evidencio cumplimiento de este cronograma.
4. Se evidencia en campo la implementación del equipo de emergencia el cual consta de camilla con inmovilizador de cuello, botiquín y extintor, los cuales son sometidos a inspecciones por parte del contratista para verificar su estado
5. La interventoría realiza constantemente recorridos e inspecciones a las áreas de trabajo y sus condiciones, así mismo, se realiza supervisión del uso y estado de los elementos de protección personal

ANEXOS

ANEXO 1. SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA
 ANEXO 2. SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA
 ANEXO 3. DISPOSICION DE RCD
 ANEXO 4. CONTROL DE INGRESO DE MATERIAL PETREO
 ANEXO 5. DOCUMENTACION DE VEHICULO
 ANEXO 6. INSPECCION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
 ANEXO 7. EXAMENES DE INGRESO DICIEMBRE
 ANEXO 8. ASISTENCIA CAPACITACIONES
 ANEXO 9. ENTREGA DE EPP
 ANEXO 10. REGISTRO FOTOGRAFICO



RUBY CÁCERES QUINTERO
PROFESIONAL HSEQ DE INTERVENTORIA



REGISTRO FOTOGRAFICO HSEQ

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL



PAUSAS ACTIVAS AL PERSONAL DE OBRA





CAPACITACIONES AL PERSONAL



SEÑALIZACION



EQUIPO DE EMERGENCIA



Anexo 1: Seguridad Social Interventoría

DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	
CC	1098704765	LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ		CARRERA 33, 117-65 APTO 102B	6961041	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			SANTANDER	FLORIDABLANCA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	I	13/01/2025	82936534	\$468.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	90.500				90.500	0	0	90.500			905	90.500	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre				NIT	Valor Aporte	Días Mora
CCF39	Cajasan				890200106-1	7.800	0

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	90.500	90.500
CCF	1	7.800	7.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	468.800	468.800

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1098704765	LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ		CARRERA 33, 117-65 APTO 102B	6961041	leidycaro1210@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			SANTANDER	FLORIDABLANCA	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-12	2024-12	I	13/01/2025	82936534	10
					TOTAL A PAGAR
					\$468.800

DETALLE POR COTIZANTE																																																			
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres					Cotizante	Sueldo	Excedente	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	IVA	IVA	AVP	VCT	IRL	CONEXIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1098704765	HERNANDEZ MARTINEZ LEIDY CAROLINA					57	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0		0	0	EPS010	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF39	1.300.000	7.800	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901835570-9	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS		CR 27 #36-38 OF 209	3162790804	contabilidad@equilateroapp.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	CONTRATO CUCU	002	SANTANDER	BUCARAMANGA	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	13/01/2025	82936756	\$402.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	90.500				90.500	0	0	90.500			905	90.500	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF39	Cajasan	890200106-1	52.000	0	0	52.000	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	52.000	52.000
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	90.500	90.500
CCF	1	52.000	52.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	402.500	402.500

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901835570-9	PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS		CR 27 #36-38 OF 209	3162790804	contabilidad@equilateroapp.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	CONTRATO CUCU	002	SANTANDER	BUCARAMANGA	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-01	2024-12	E	13/01/2025	82936756	10
					TOTAL A PAGAR
					\$402.500

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Clase de Riesgo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	MAA	MAE	APB	VCT	RL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1095940261	CACERES QUINTERO RUBY STEFANY	1	0		S																	230301	1.300.000	208.000	0	0		0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF39	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que TEAMWORKING EST SAS identificado con NI 901002452 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para JEISON EDUARDO RODRIGUEZ SANCHEZ identificado con CC 1093783507:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades													Liquidación			AFP			
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	I N G	R E T	T D E	T A E	T D P	T A P	V S P	V S T	S L N	I G E	L M A	V A C	A V P	V C T	I R L	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9480277772	E	2024/12	2025/01/14	1193331422	AFP	230301	PORVENIR	X															21	16%	\$336,000	\$0	\$0
9480277772	E	2024/12	2025/01/14	1193331422	ARP	14-11	ARL SURA	X															21	6.96%	\$146,200	\$0	\$0
9480277772	E	2024/12	2025/01/14	1193331422	CCF	CCF37	COMFANORTE	X															21	4%	\$84,000	\$0	\$0
9480277772	E	2025/01	2025/01/14	1193331422	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	X															21	4%	\$84,000	\$0	\$0

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que TEAMWORKING EST SAS identificado con NI 901002452 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para VIANEY MILENA PEÑALOZA RICO identificado con CC 37276287:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades													Liquidación			AFP			
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	I N G	R E T	T D E	T A E	T D P	T A P	V S P	V S T	S L N	I G E	L M A	V A C	A V P	V C T	I R L	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9480277772	E	2024/12	2025/01/14	1193331422	AFP	25-14	COLPENSIONES	X															21	16%	\$205,900	\$0	\$0
9480277772	E	2024/12	2025/01/14	1193331422	ARP	14-11	ARL SURA	X															21	6.96%	\$89,600	\$0	\$0
9480277772	E	2024/12	2025/01/14	1193331422	CCF	CCF37	COMFANORTE	X															21	4%	\$51,500	\$0	\$0
9480277772	E	2025/01	2025/01/14	1193331422	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	X															21	4%	\$51,500	\$0	\$0

Anexo 2: Seguridad Social Contratista

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**CERTIFICA QUE**

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a LUIS ALFREDO HERNANDEZ MONROY identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **1094427923** se encuentra afiliado/a desde **6/01/2025** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 6 de enero de 2025.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 06/01/2025VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA**DATOS DE LA EMPRESA**

Tipo documento:	NI	Número de documento:	901550907	Cédula Usuario:	CC 52452955
Nombre:	CONSORCIO VENTURA				
Dirección:	KR 54 153 75 TO 2 512				
Departamento:	BOGOTA D.C.		Municipio:	BOGOTA D.C.	
Correo electrónico:	CLAVECAL@YAHOO.COM				
Teléfono:	3105587676		Tarifa:	6.960	
Actividad Económica:	5421001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL, INCLUYE LA CONSTRUCCION, CONSERVACION Y REPARACION DE CARRETERAS, CALLES Y OTRAS VIAS, PUENTES Y VIADUCTOS, TUNELES, LINEAS DE FERROCARRIL Y DE METRO, PISTAS DE AEROPUERTOS				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 52452955	MARIA JOSE HERRERA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	222	07/01/2025	CC 1094427923	HERNANDEZ MONTOY LUIS	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

00AC0B9DD97AE7133C188C6CA8ED7E9A

Certificado impreso el día 1/6/2025 7:02:56 PM por el portal de empresas Edesk



Positiva Compañía de Seguros S.A. • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170,
Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co

 Positiva Compañía de Seguros

 @PositivaCol

 PositivaColombia



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda



EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Dirijase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá **(601) 330 7000**.

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS

**LUIS ALFREDO
HERNANDEZ MONTOY**

1094427923

CONSORCIO VENTURA

901550907

Este carné es personal e intransferible.

016/01/2025



(Lea las instrucciones que se encuentran al respaldo antes de diligenciar este formulario)

165352341

I. DATOS DEL TRÁMITE

1. Tipo de Trámite A. Afiliación ☒ B. Reporte de Novedades		2. Tipo de Afiliación A. Individual: Cotizante o Cabeza de Familia ☒ B. Colectiva ☐ D. De Oficio ☐ Beneficiario o Afiliado adicional ☐ C. Institucional ☐		3. Régimen A. Contributivo ☒ B. Subsidiado ☐
4. Tipo de Afiliado A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐		5. Tipo de Cotizante A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐		Código (a registrar por la EPS)

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (Del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres Primer Apellido: Hernandez Segundo Apellido: Monroy		Primer Nombre: Luis Segundo Nombre: Alfredo	
7. Tipo de documento de identidad CN TI CE CD RC CC PA SC		8. Número del documento de identidad 1094427923	9. Sexo Femenino ☐ Masculino ☒
		10. Fecha de nacimiento 05/04/1999	

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos Personales			
11. Etnia	12. Discapacidad Tipo F N M Condición T P	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL Positivo		16. Administradora de Pensiones Colpensiones	17. Ingreso base de cotización - IBC 1423.500
18. Residencia Dirección: Calle 30 No 25-91			
Teléfono Celular: 3105918034		Correo Electrónico: luis.hernandez@gmail.com	
Municipio / Distrito: Durania	Zona: Urbana Rural	Localidad / Comuna: Centro	Departamento: Norte de Santander

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos Básicos de Identificación del Cónyuge o compañero(a) permanente cotizante			
19. Apellidos y nombres Primer Apellido: Segundo Apellido:		Primer Nombre: Segundo Nombre:	
20. Tipo de documento de identidad CN TI CE CD RC CC PA SC		21. Número del documento de identidad	22. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐
23. Fecha de nacimiento			
Datos Básicos de Identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales			
24. Apellidos y nombres Primer Apellido: Segundo Apellido: Primer Nombre: Segundo Nombre:			
B1			
B2			
B3			
B4			
B5			
Datos Complementarios			
25. Tipo de documento de identidad		26. Número del documento de identidad	27. Sexo Femenino Masculino
28. Fecha de nacimiento		29. Parentesco	
B1			
B2			
B3			
B4			
B5			
30. Etnia		31. Discapacidad Tipo Condición	32. Datos de Residencia Municipio/Distrito Zona Departamento Teléfono Fijo y/o Celular
B1		F N M T P	Urbana Rural
B2		F N M T P	Urbana Rural
B3		F N M T P	Urbana Rural
B4		F N M T P	Urbana Rural
B5		F N M T P	Urbana Rural
33. Valor de la UPC del Afiliado Adicional (a registrar por la EPS)			
Selección de la IPS Primaria			
34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS			
Código de la IPS (a registrar por la EPS)			

35. Nombre o razón social Consorcio Ventura	36. Tipo documento de identificación NT CC TI PA CE CD	37. Número del documento de identificación 901550907	38. Tipo de aportante o pagador de Pensiones (a registrar por la EPS) Empleado
39. Ubicación Dirección cr 54 N° 153-75	Municipio / Distrito Bogotá		Departamento Bogotá
Correo Electrónico	Teléfono Fijo 310558786		

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- | | |
|--|---|
| ☐ 1. Modificación de datos básicos de identificación. | ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas |
| ☐ 2. Corrección de datos básicos de identificación. | ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas |
| ☐ 3. Actualización del documento de identidad. | ☐ 13. Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo |
| ☐ 4. Actualización y corrección de datos complementarios. | ☐ ☐ B. Régimen Subsidiado |
| ☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS. | ☐ 14. Traslado: ☐ A. Mismo Régimen |
| Código <input type="text"/> | ☐ ☐ B. Diferente Régimen |
| ☐ 6. Reinscripción en la EPS. | ☐ 15. Reporte de fallecimiento. |
| ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales. | ☐ 16. Reporte del trámite de protección al cesante |
| ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales | ☐ 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado. |
| ☒ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar. | ☐ 18. Reporte de la calidad de Pensionado |
| ☐ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando | |

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad CN TI CE CD RC CC PA SC	Número del documento de identidad	Sexo Femenino Masculino	Fecha de nacimiento	42. Fecha
				07/01/2025

43. EPS anterior

44. Motivo de traslado

45. Caja de compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- ☐ 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- ☐ 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- ☐ 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- ☐ 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- ☐ 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- ☐ 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- ☐ 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- ☐ 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario

55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institución o de oficio

IX. ANEXOS

- | | | | |
|---|-------------------------|----------|-------|
| ☐ 56. Anexo copia del documento de identidad: | CN RC TI CC PA CE CD SC | Cantidad | TOTAL |
| ☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente. | | | |
| ☐ 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. | | | |
| ☐ 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital. | | | |
| ☐ 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor. | | | |
| ☐ 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia. | | | |
| ☐ 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres. | | | |
| ☐ 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. | | | |
| ☐ 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas. | | | |
| ☐ 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio. | | | |

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL


66. Identificación de la Entidad Territorial Código del Municipio Código del Departamento	67. Datos del SISBEN Número de ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de Radicación	69. Fecha de Validación

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre

Tipo de documento	Número de documento de identidad	71. Firma del Funcionario

Observaciones:



Asesorías Comerciales Integrales
282038

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a JOSE ALBERTO RAMIREZ HEREDIA identificado/a con documento de identidad **Permiso Por Proteccion Temporal** número **7527491** se encuentra afiliado/a desde **6/01/2025** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 6 de enero de 2025.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 06/01/2025VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA**DATOS DE LA EMPRESA**

Tipo documento:	NI	Número de documento:	901550907	Cédula Usuario:	CC 52452955
Nombre:	CONSORCIO VENTURA				
Dirección:	KR 54 153 75 TO 2 512				
Departamento:	BOGOTA D.C.		Municipio:	BOGOTA D.C.	
Correo electrónico:	CLAVECAL@YAHOO.COM				
Teléfono:	3105587676		Tarifa:	6.960	
Actividad Económica:	5421001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL, INCLUYE LA CONSTRUCCION, CONSERVACION Y REPARACION DE CARRETERAS, CALLES Y OTRAS VIAS, PUENTES Y VIADUCTOS, TUNELES, LINEAS DE FERROCARRIL Y DE METRO, PISTAS DE AEROPUERTOS				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 52452955	MARIA JOSE HERRERA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	221	07/01/2025	PT 7527491	RAMIREZ HEREDIA JOSE	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

00AC0B9DD97AE7133C188C6CA8ED7E9A

Certificado impreso el día 1/6/2025 6:57:24 PM por el portal de empresas Edesk



Positiva Compañía de Seguros S.A. • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170,
Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co

 Positiva Compañía de Seguros

 @PositivaCol

 PositivaColombia



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda



EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Dirijase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá **(601) 330 7000**.

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS

**JOSE ALBERTO
RAMIREZ HEREDIA**

7527491

CONSORCIO VENTURA

901550907

Este carné es personal e intransferible.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

nueva
eps
gente cuidando gente

HT, 900.190.264-2

FECHA DE RENDICIÓN
DÍA MES AÑO

I. DATOS DEL TRÁMITE

Lea atentamente las instrucciones antes de diligenciar este formulario

1. TIPO DE TRÁMITE A. AFILIACIÓN ☐ B. REPORTE DE NOVEDADES ☐	2. TIPO DE AFILIACIÓN A. Individual: a) Cotizante o cabeza de familia ☐ b) Beneficiario o afiliado adicional ☐ B. Colectiva ☐ C. Institucional ☐ D. De oficio ☐	3. RÉGIMEN A. Contributivo ☐ B. Subsidio ☐
4. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA SI ☐ NO ☐	5. TIPO DE AFILIADO A. Cotizante ☐ B. Cabeza de familia ☐ C. Beneficiario ☐ D. Afiliado adicional ☐	6. TIPO DE COTIZANTE A. Dependiente ☐ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐ D. Cónyuge ☐

A. AFILIACIÓN B. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (Del cotizante o cabeza de familia)

PRIMER APELLIDO Ramirez	SEGUNDO APELLIDO Heredia	PRIMER NOMBRE Jose	SEGUNDO NOMBRE Alberto
8. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD ppt	10. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD 7527491	11. SEXO BIOLÓGICO M	12. SEXO IDENTIFICACIÓN M
13. LUGAR DE NACIMIENTO Venezuela	14. LUGAR DE NACIMIENTO Venezuela	15. FECHA NACIMIENTO 13 04 1987	16. SEXO IDENTIFICACIÓN M
17. COMUNIDAD INDÍGENA SI ☐ NO ☐	18. DISCAPACIDAD CAT. DE DISCAPACIDAD SI ☐ NO ☐	19. TIENE ENFERMEDAD CRÓNICA SI ☐ NO ☐	20. CLASIFICACIÓN SÍMBOLO 21. GRUPO Población Especial
22. APP Polpensionado 1423500	23. TERAPIA CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA 21 13 20 51	24. RESIDENCIA TELEFONO DEL LUGAR	25. TELEFONO FIJO 3105587676
DIRECCIÓN URBANA	LOCALIDAD/COMUNA Cucuta	ZONA Caracas	DEPARTAMENTO Porto Santander

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR - Datos de identificación del beneficiario (cónyuge o cónyuge (a) permanente del cotizante)

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE
26. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	28. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	29. SEXO BIOLÓGICO	30. SEXO IDENTIFICACIÓN
31. NACIONALIDAD	32. LUGAR DE NACIMIENTO	33. PAÍS	34. FECHA NACIMIENTO

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

35. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DE LOS BENEFICIARIOS	36. TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	37. NÚMERO DE IDENTIDAD	38. NACIONALIDAD	39. SEXO BIOLÓGICO	40. SEXO IDENTIFICACIÓN	41. LUGAR DE NACIMIENTO	42. FECHA DE NACIMIENTO
43. FUNDACIÓN	44. SEXO BIOLÓGICO	45. SEXO IDENTIFICACIÓN	46. CLASIFICACIÓN SÍMBOLO	47. TIENE ENFERMEDAD CRÓNICA	48. DISCAPACIDAD CAT. DE DISCAPACIDAD	49. TIENE ENFERMEDAD CRÓNICA	50. CLASIFICACIÓN SÍMBOLO
51. Datos de residencia	52. DIRECCIÓN	53. LOCALIDAD/COMUNA	54. CORREO ELECTRÓNICO	55. ZONA	56. DEPARTAMENTO	57. MUNICIPIO	58. FECHA

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES Y/O INDEPENDIENTE POR PRESTACIÓN DE SERVICIO O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

59. Nombre a razón social Consorcio Venturo	60. Tipo documento de identificación NIT	61. Número del documento de identificación 9001350907	62. Tipo de negocio 3105587676	63. Tipo de actividad económica Empleador
64. Dirección Ur 54 # 153-75	65. Ciudad Bogota	66. Departamento Bogota	67. Municipio Bogota	68. Fecha 06-01-2025

B. REPORTE DE NOVEDADES

69. TIPO DE NOVEDAD	70. INICIO DE RELACIÓN LABORAL O ADSCRIBIÓN DE CONDICIONES PARA COTIZAR	71. TRÁMITE DE LA RELACIÓN LABORAL O PÉRDIDA DE LAS CONDICIONES PARA SEGUIR COTIZANDO	72. TRÁMITE DE LA RELACIÓN LABORAL O PÉRDIDA DE LAS CONDICIONES PARA SEGUIR COTIZANDO
73. INSCRIPCIÓN EN LA EPS	74. INSCRIPCIÓN EN LA EPS	75. INSCRIPCIÓN EN LA EPS	76. INSCRIPCIÓN EN LA EPS
77. INSCRIPCIÓN EN LA EPS	78. INSCRIPCIÓN EN LA EPS	79. INSCRIPCIÓN EN LA EPS	80. INSCRIPCIÓN EN LA EPS

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE
81. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	82. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	83. SEXO BIOLÓGICO	84. SEXO IDENTIFICACIÓN
85. FECHA NACIMIENTO	86. PAÍS	87. LUGAR DE NACIMIENTO	88. FECHA NACIMIENTO

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

89. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales: Declaro bajo la gravedad de juramento que el(los) Beneficiario(s) reportado(s) dependen económicamente de mí.	90. Declaración de existencia de relaciones de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la entrega de los documentos que acrediten la condición de beneficiarios. Anexo soporte de la Entidad.
91. Declaración de no intermediación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una institución Prestadora de Servicios de Salud.	92. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
93. Autorización para que la EPS reporte la información que se genera de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieren.	94. Autorización para que la EPS realice el manejo de los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. De acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.

VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

79. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que hará cargo del pago de la Contribución Solidaria

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE
81. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	82. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	83. SEXO BIOLÓGICO	84. SEXO IDENTIFICACIÓN

IX. FIRMAS

80. El cotizante, cabeza de familia, beneficiario cuando aplique o afiliado adicional	81. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio
---	---

X. ANEXOS

82. Anexo copia del documento de identidad: CN, MS, RC, TI, CC, CE, SC, PA, CD, AB, PT	83. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.	84. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.	85. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escrutura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.	86. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.	87. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.	88. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración sujeción por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.	89. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud numeral 4 y 5 del artículo 2.1.7.3 del Decreto 780 de 2016.	90. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.	91. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en las que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.
--	---	---	--	--	---	--	---	--	--

XI. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL Y/O INSTITUCIONES RESPONSABLES DE POBLACIONES ESPECIALES

92. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD TERRITORIAL	Código del Municipio	Código del departamento	93. NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
--	----------------------	-------------------------	------------------------------

XII. DATOS DE LA INSTITUCIÓN Y DEL FUNCIONARIO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

94. APELLIDOS Y NOMBRES	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE
95. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	96. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	97. SEXO BIOLÓGICO	98. SEXO IDENTIFICACIÓN	99. FECHA NACIMIENTO

OBSERVACIONES:

Declaro que con la firma del funcionario, el afiliado suscriptor la veracidad de la información contenida y de las declaraciones realizadas en el presente formulario.



MEDIPAZ IPS

NIT. 830.136.311-5

MEDIPAZ IPS



CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA OCUPACIONAL

(TRABAJO SEGURO EN ALTURAS Y/O ESPACIOS CONFINADOS)

FECHA: 02/12/2024

TIPO DE EXAMEN: INGRESO ☒ PERIODICO ☐ RETIRO ☐

INFORMACION GENERAL:

NOMBRE DEL TRABAJADOR: JOSE ALCIDES MARTIN GUERRERO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CC. ☒ T.I. ☐ C.E. ☐ NUMERO: 1.073.599.257

EPS: Nueva EPS

Empresa: CONSORCIO VENTURA

Sexo: ☒ M

Edad: 39 AÑOS



RESULTADO EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

EXAMEN REALIZADO	RESULTADO	OBSERVACIONES
GLICEMIA	NORMAL	
PERFIL LIPIDICO	NORMAL	
PSICOTEST DE ALTURAS	NORMAL	
ENFASIS OSTEOMUSCULAR	NORMAL	
AUDIOMETRIA (ESCALA LARSEN)	SIN PATOLOGIA OCUPACIONAL	
ESPIROMETRIA (KNUDSON)	SIN PATOLOGIA OCUPACIONAL	
OPTOMETRIA	SIN PATOLOGIA OCUPACIONAL	
PRUEBAS NEUROLOGICAS CLINICAS	SIN PATOLOGIA OCUPACIONAL	
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL ENFASIS EN ALTURAS	SIN PATOLOGIA OCUPACIONAL	
HEMOCLASIFICACION	O +	
ESTATURA	1.79 CM	
PESO	64 KG	

CONCLUSIONES

1. RECOMENDACIONES: Remisión EPS – IPS SI ☐ NO ☒ Tratamiento: SI ☐ NO ☒ ¿Cuál?

2. Otras Recomendaciones: REALIZAR PAUSA ACTIVA, HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE, HÁBITOS DE HIGIENE POSTURALES ADECUADOS, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN VISUAL, AUDITIVA Y PERSONAL DURANTE LA JORNADA LABORAL, SEGUIR PROCEDIMIENTOS Y NORMAS DE TRABAJO SEGURO. CAPACITACIONES SEGÚN CARGO, HACER PERIÓDICAMENTE LOS EXÁMENES DE VALORACIÓN OCUPACIONAL.

CONCEPTO DE APTITUD PARA EL OFICIO

EXAMEN DE INGRESO		
APTO PARA EL CARGO ☒	APTO PARA TRABAJAR ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS ☒	APTO CON RESTRICCIONES ☐
NO APTO ☐		
OBSERVACIONES:		
EXAMEN PERIODICO		
APTO PARA CONTINUAR DESEMPEÑANDO EL CARGO SI ☐ NO ☐	REQUIERE DE REUBICACIÓN LABORAL SI ☐ NO ☐	
APTO PARA TRABAJAR ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS ☐		
OBSERVACIONES:		
EXAMEN DE EGRESO		
¿Se encuentran alteraciones clínicas con respecto al examen de ingreso? SI ☐ NO ☐ CUÁL:		
¿Estas alteraciones afectan la futura capacidad laboral del trabajador? SI ☐ NO ☐		

RECOMENDACIONES: USO DE LOS EPP FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19 SELECCIONADOS EN FUNCION DEL PELIGRO PARA EL TRABAJADOR. NO PRESENTA MORBILIDADES PREEXISTENTES SEGUN CIRCULAR 030 DEL 2020.

Valoración médica ocupacional y paraclínicos según resolución N° 4272 de 2021 El examinado CERTIFICA que no omitió ningún dato sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta.

Responsable: Dra. Karen Briffi Ibañez Hernández
Médico esp. En salud ocupacional
RM: 1144147508
Universidad libre de Cali
Licencia salud ocupacional
1436-19
Cali

FIRMA DEL ESPECIALISTA

FIRMA

NOMBRE

DOC. N°

PACIENTE

Calle 27 No 14 – 48 sur Barrio Olaya Tel: 3209945151 Bogotá. D.C – Colombia Página web <https://medipazips.com/>

Declaración de CONFIDENCIALIDAD: el presente certificado se expide con fines exclusivos del programa de salud Ocupacional. En constancia con la RESOLUCION 2346 de julio de 2017, se respeta la confidencialidad de la historia clínica y no se emiten diagnósticos clínicos en este documento

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 03/12/2024

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento: NI
Nombre: CONSORCIO VENTURA
Dirección: KR 54 153 75 TO 2 512
Departamento: BOGOTA D.C.
Correo electrónico: CLAVECAL@YAHOO.COM
Teléfono: 3105587676
Actividad Económica: 5421001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL, INCLUYE LA CONSTRUCCION, CONSERVACION Y REPARACION DE CARRETERAS, CALLES Y OTRAS VIAS, PUENTES Y VIADUCTOS, TUNELES, LINEAS DE FERROCARRIL Y DE METRO, PISTAS DE AEROPUERTOS

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario: CC 52452955
Nombres y Apellidos del Usuario: MARIA JOSE HERRERA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1 220	04/12/2024	CC 1073599257	MARTIN GUERRERO JOSE	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor dirijase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

81CC04413BF562344C40E7D3B16A4A18

Certificado Impreso el día 12/3/2024 1:51:31 PM por el portal de empresas Edesk

Positiva Compañía de Seguros S.A. • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170,
Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co

Positiva Compañía de Seguros @PositivaCol PositivaColombia



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda



EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Dirijase a la Institución Prestadora de Salud (IPS) asignada en la línea Positiva 01 8000 111 170, en Bogotá (601) 330 7000.

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS



JOSE ALCIDES

MARTIN GUERRERO

1073599257

CONSORCIO VENTURA

901550907

nueva
eps
gente cuidando gente
TEL. 605.187.2647

Escaneado con CamScanner

Bogotá D.C., diciembre 17 de 2024

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que JOSE ALCIDES MARTIN GUERRERO, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1073599257, registra la siguiente información de capacitación laboral :

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS TRABAJADOR AUTORIZADO

OFERENTE DE CAPACITACIÓN: INSTITUTO RR

ENTRENADOR: LINA STEPHANY GIRALDO GARZON

SEDE DONDE SE FORMÓ: INSTITUTO RR SAS - ALTURAS

EMPLEADOR: CONSORCIO VENTURA

ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES DEL TRABAJADOR: POSITIVA

SECTOR ECONÓMICO: OFICIAL DE OBRA

FECHAS DE FORMACIÓN: 01/12/2024 a 04/12/2024

INTENSIDAD HORARIA: 32 horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día diciembre 17 de 2024

CERTIFICADO

DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA
TRABAJO EN ALTURAS Y CONFINADOS

CENTRO DE ENTRENAMIENTO HACE CONSTAR QUE:
JOSE ALCIDES MARTIN GUERRERO

Identificado con
Cédula de ciudadanía N° 1073599257

EMPRESA: CONSORCIO VENTURA
NIT: 901550907-2
R. LEGAL: HERRERA GUZMAN MARIA JOSE
ARL: POSITIVA


Cursó y aprobó la acción de formación en

TRABAJADOR AUTORIZADO

Realizado en Bogotá del (01) del mes de diciembre de 2024 al (04) del mes de diciembre de 2024 con una intensidad de 32 horas.



EDWIN ORLANDO SAAVEDRA PAEZ
1022964049



Edwin Johan Rivera
C.C. 1.023.911.376
Representante Legal
Instituto Educativo RR

0612

En testimonio de lo anterior, se firma en Bogotá a los (04) del mes de diciembre de 2024



De conformidad con la AUTORIZACIÓN N° 08SE2024220000000051285 del 31 de Octubre de 2024 emitida por el ministerio de trabajo, con certificación de calidad # 30.512 emitida por CELAC con acreditación de la ONAC 18-CPR-002, licencia en salud ocupacional LIC. SST N° 17245 DE 7/05/2014 que autoriza a la empresa INSTITUTO RR S.A.S ubicada en Bogotá D.C en Cr 72D No.38 B Sur 57, con NIT 901807119. Para la capacitación y entrenamiento para trabajo en alturas en cumplimiento a la resolución 4272 de 2021.
VERIFICACIÓN correo Rr.edusas@gmail.Com



Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección


NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **MARTIN GUERRERO JOSE ALCIDES** identificado(a) con CC número **1.073.599.257** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 22 de febrero de 2014 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 03 de diciembre de 2024.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

2024120315553

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

REINALDO MORANTES BALAGUERA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **13.199.229**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 14 de Enero del 2025.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 14/01/2025

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	Número de documento:	901340813
Nombre:	ALTAVISTA CONSTRUCTION GROUP SAS		
Dirección:	KR 54 153 75 TO 2 OF 512		
Departamento:	BOGOTA D.C.	Municipio:	BOGOTA D.C.
Correo electrónico:	altavistacgsas@outlook.com		
Teléfono:	3105587676	Tarifa:	6,96000
Actividad Económica:	5711001 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, PLANIFICACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑ		

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Documento Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC - 52452955	MARIA JOSE HERRERA GUZMAN

DATOS AFILIADOS RADICADOS

#	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	2025-01-011-319801	15/01/2025	CC 13199229	REINALDO MORANTES BALAGUERA	5	6,96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
 Positiva Compañía de Seguros S.A.

Código: 7I+jrNIY0ESU4k/XQC7xBQ==

Certificado impreso el día 14/01/2025 5:59:02 p. m. por el portal de empresas Edesk

Positiva Compañía de Seguros S.A.

Nit: 860.011.153-6 · Línea gratuita nacional: 01-8000-111-170 Teléfono: (601) 330-7000

Defensor del Consumidor Financiero: Ana María Giraldo Rincón · defensordelcliente@positiva.gov.co

Carrera 11A No 96 - 51 Oficina 206 Bogotá. Teléfono: (601) 610 8164

LA ASEGURADORA
 DE TODOS LOS
 COLOMBIANOS



EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Dirijase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá **(601) 330 7000**.

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS

**REINALDO
MORANTES BALAGUERA**

CC - 13199229

ALTAVISTA CONSTRUCTION GROUP SAS
901340813

Este carné es personal e intransferible.


Descriptive statistics of the 1000 (2nd) questionnaire, of altitude respondents in accordance to the information collected by the 1000 Descriptive questionnaire, of altitude respondents

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **DEIVIN ADRIAN MORANTES MORA** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **1127656667**, se encuentra afiliado/a desde **05/12/2024** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 14 de enero de 2025.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 14/01/2025VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA**DATOS DE LA EMPRESA**

Tipo documento:	NI	Número de documento:	901550907	Cédula Usuario:	CC 52452955
Nombre:	CONSORCIO VENTURA				
Dirección:	KR 54 153 75 TO 2 512				
Departamento:	BOGOTA D.C.		Municipio:	BOGOTA D.C.	
Correo electrónico:	CLAVECAL@YAHOO.COM				
Teléfono:	3105587676		Tarifa:	6.960	
Actividad Económica:	5421001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL, INCLUYE LA CONSTRUCCION, CONSERVACION Y REPARACION DE CARRETERAS, CALLES Y OTRAS VIAS, PUENTES Y VIADUCTOS, TUNELES, LINEAS DE FERROCARRIL Y DE METRO, PISTAS DE AEROPUERTOS				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 52452955	MARIA JOSE HERRERA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	224	15/01/2025	CC 1127656667	MORANTES MORA DEIVIN	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

BB75C1A5A045CE31169A970F104295C4

Certificado impreso el día 1/14/2025 6:35:01 PM por el portal de empresas Edesk



Positiva Compañía de Seguros S.A. • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170,
Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co

 Positiva Compañía de Seguros

 @PositivaCol

 PositivaColombia



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda



EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Dirijase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá **(601) 330 7000**.

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS

DEIVIN ADRIAN

MORANTES MORA

1127656667

CONSORCIO VENTURA

901550907

Este carné es personal e intransferible.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

nueva
eps
entre cada cinco años
NT 389-169-2014

FECHA DE REGISTRO
14-01-2025

1. DATOS DEL TRÁMITE		2. TIPO DE AFILIACIÓN	
1.1. TIPO DE TRÁMITE	1.2. TIPO DE AFILIACIÓN	2.1. TIPO DE AFILIACIÓN	2.2. TIPO DE AFILIACIÓN
A. AFILIACIÓN	B. REPORTE DE NOVEDADES	1.3. TIPO DE AFILIACIÓN	1.4. TIPO DE AFILIACIÓN
1.5. TIPO DE AFILIACIÓN	1.6. TIPO DE AFILIACIÓN	1.7. TIPO DE AFILIACIÓN	1.8. TIPO DE AFILIACIÓN
1.9. TIPO DE AFILIACIÓN	1.10. TIPO DE AFILIACIÓN	1.11. TIPO DE AFILIACIÓN	1.12. TIPO DE AFILIACIÓN
1.13. TIPO DE AFILIACIÓN	1.14. TIPO DE AFILIACIÓN	1.15. TIPO DE AFILIACIÓN	1.16. TIPO DE AFILIACIÓN
1.17. TIPO DE AFILIACIÓN	1.18. TIPO DE AFILIACIÓN	1.19. TIPO DE AFILIACIÓN	1.20. TIPO DE AFILIACIÓN
1.21. TIPO DE AFILIACIÓN	1.22. TIPO DE AFILIACIÓN	1.23. TIPO DE AFILIACIÓN	1.24. TIPO DE AFILIACIÓN
1.25. TIPO DE AFILIACIÓN	1.26. TIPO DE AFILIACIÓN	1.27. TIPO DE AFILIACIÓN	1.28. TIPO DE AFILIACIÓN
1.29. TIPO DE AFILIACIÓN	1.30. TIPO DE AFILIACIÓN	1.31. TIPO DE AFILIACIÓN	1.32. TIPO DE AFILIACIÓN
1.33. TIPO DE AFILIACIÓN	1.34. TIPO DE AFILIACIÓN	1.35. TIPO DE AFILIACIÓN	1.36. TIPO DE AFILIACIÓN
1.37. TIPO DE AFILIACIÓN	1.38. TIPO DE AFILIACIÓN	1.39. TIPO DE AFILIACIÓN	1.40. TIPO DE AFILIACIÓN
1.41. TIPO DE AFILIACIÓN	1.42. TIPO DE AFILIACIÓN	1.43. TIPO DE AFILIACIÓN	1.44. TIPO DE AFILIACIÓN
1.45. TIPO DE AFILIACIÓN	1.46. TIPO DE AFILIACIÓN	1.47. TIPO DE AFILIACIÓN	1.48. TIPO DE AFILIACIÓN
1.49. TIPO DE AFILIACIÓN	1.50. TIPO DE AFILIACIÓN	1.51. TIPO DE AFILIACIÓN	1.52. TIPO DE AFILIACIÓN
1.53. TIPO DE AFILIACIÓN	1.54. TIPO DE AFILIACIÓN	1.55. TIPO DE AFILIACIÓN	1.56. TIPO DE AFILIACIÓN
1.57. TIPO DE AFILIACIÓN	1.58. TIPO DE AFILIACIÓN	1.59. TIPO DE AFILIACIÓN	1.60. TIPO DE AFILIACIÓN
1.61. TIPO DE AFILIACIÓN	1.62. TIPO DE AFILIACIÓN	1.63. TIPO DE AFILIACIÓN	1.64. TIPO DE AFILIACIÓN
1.65. TIPO DE AFILIACIÓN	1.66. TIPO DE AFILIACIÓN	1.67. TIPO DE AFILIACIÓN	1.68. TIPO DE AFILIACIÓN
1.69. TIPO DE AFILIACIÓN	1.70. TIPO DE AFILIACIÓN	1.71. TIPO DE AFILIACIÓN	1.72. TIPO DE AFILIACIÓN
1.73. TIPO DE AFILIACIÓN	1.74. TIPO DE AFILIACIÓN	1.75. TIPO DE AFILIACIÓN	1.76. TIPO DE AFILIACIÓN
1.77. TIPO DE AFILIACIÓN	1.78. TIPO DE AFILIACIÓN	1.79. TIPO DE AFILIACIÓN	1.80. TIPO DE AFILIACIÓN
1.81. TIPO DE AFILIACIÓN	1.82. TIPO DE AFILIACIÓN	1.83. TIPO DE AFILIACIÓN	1.84. TIPO DE AFILIACIÓN
1.85. TIPO DE AFILIACIÓN	1.86. TIPO DE AFILIACIÓN	1.87. TIPO DE AFILIACIÓN	1.88. TIPO DE AFILIACIÓN
1.89. TIPO DE AFILIACIÓN	1.90. TIPO DE AFILIACIÓN	1.91. TIPO DE AFILIACIÓN	1.92. TIPO DE AFILIACIÓN
1.93. TIPO DE AFILIACIÓN	1.94. TIPO DE AFILIACIÓN	1.95. TIPO DE AFILIACIÓN	1.96. TIPO DE AFILIACIÓN
1.97. TIPO DE AFILIACIÓN	1.98. TIPO DE AFILIACIÓN	1.99. TIPO DE AFILIACIÓN	1.100. TIPO DE AFILIACIÓN



COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DÍA 11/10/2024

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	Número de documento:	901550907	Cédula Usuario:	CC 52452955
Nombre:	CONSORCIO VENTURA				
Dirección:	KR 54 153 75 TO 2 512				
Departamento:	BOGOTÁ D.C.		Municipio:	BOGOTÁ D.C.	
Correo electrónico:	CLAVECAL@YAHOO.COM				
Teléfono:	3105587676		Tarifa:	6.960	
Actividad Económica:	5421001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL, INCLUYE LA CONSTRUCCION, CONSERVACION Y REPARACION DE CARRETERAS, CALLES Y OTRAS VIAS, PUENTES Y VIADUCTOS, TUNELES, LINEAS DE FERROCARRIL Y DE METRO, PISTAS DE AEROPUERTOS				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 52452955	MARIA JOSE HERRERA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	191	12/10/2024	CC 1026267003	RAMIREZ FIGUEROA SANTOS	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor dirijase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

- CERTIFICADO DE FP

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **RAMIREZ FIGUEROA SANTOS EDUARDO** identificado(a) con CC número **1.026.267.003** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a **PROTECCIÓN**, desde el día 01 de agosto de 2019 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 22 de octubre de 2024.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes



TRINISALUD YOPAL IPS S.A.S

NIT. 900597531-6

Carrera 26 No 14 A - 38 Int 8 6356935 - 3203185756-3125069424

Barrio los Helechos - Email: trinisaludyopal@gmail.com



Nombre Paciente: Santos Eduardo Ramirez Figueroa

Identificacion

1026267003

Codigo Unico Paciente:

38840

Empresa:

CONSORCIO VENTURA

Fecha Nacimiento:

23/03/1989

Direccion:

yopal

Página 1 de 1

Ingreso Nro.	Sexo:	Edad:		Estado Civil:	Nivel Educativo:	Ciudad:	Fecha Consulta	
70381	Masculino	35	Años	Soltero	10 - 11 (Media Tecnica)	YOPAL	17/10/2024 09:35:50	
Objetivo:	Ingreso		E.P.S.:	CAPITAD SALUD	A.R.L.:	NO REFIERE	Cargo:	CONTRATISTA
Contrato:				Clasificacion del Riesgo:		CLASE III	Estrato:	[3] - Medio Bajo

CONCEPTO DE APTITUD LABORAL

Los Resultados de Paraclínicos y Valoración del Paciente fueron consignados en una Historia Clínica Ocupacional que reposa en los archivos de Salud Ocupacional de la IPS. Y se obtuvo el siguiente result

CONCEPTO INGRESO:

☒	APTO para el Cargo
☐	No APTO para el Cargo
☐	Aplazado

TRABAJOS ESPECIALES:

Alturas	* APTO *
Espacios Confinados	
Manipulacion de Alimentos	

CONCEPTO EGRESO:

☐	Satisfactoria
☐	No Satisfactoria
Valoracion por:	E.P.S. ☐ A.R.L. ☐

☐	PERIODICO, CAMBIO DE OCUPACION O POST-INCAPACIDAD	☐ Reubicar Trabajador	☐ Continua en el Cargo
--------------------------	---	--	---

PREVENCION EN RIESGO LABORALES - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

☐ Auditivo ☐ Visual ☐ CardioVascular ☐ Respiratorio ☐ Ergonomico ☐ Dermatologia ☐ Otros

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES EXAMENES Y/O PROCEDIMIENTOS

Se Realizaron los siguientes exámenes: VALORACION VISUAL- OPTOMETRIA, AUDIOMETRIA OCUPACIONAL, EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL -TRABAJO EN ALTURAS. CUADRO HEMATICO, PERFIL LIPIDICO, GLICEMIA.

DESCRIPCION RESULTADOS DEL CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

Apto: Clínicamente no Presenta Alteración de la Salud limitante o que pueda agravarse o complicarse con la exposición laboral .

RESTRICCIONES

Ninguna para el Cargo

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Uso EPP necesarios para ejecutar labor contratada, higiene postural y de columna, pausas activas, control periódico ocupacional, ejercicio 150 minutos por semana, protección UV, estilos de vida saludable.

Autorizo al (a la) doctor(a) abajo mencionado(a), a realizar en mi el examen medico y/o paraclínico(s) ocupacional(es), registrado(s) en este documento. El(la) doctor(a) abajo mencionado(a) me ha explicado la naturaleza y proposito del examen medico y/o paraclínico(s) ocupacional(es). He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el proposito, los beneficios, la interpretacion, las limitaciones y riesgos del examen medico y/o paraclínico(s) ocupacional(es), a partir de la asesoria brindada antes de la respectiva toma de las pruebas. Entiendo que la realizacion de esta(s) prueba(s) es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que se realizara el(los) examen(es). Fui informado de las medidas que tomara TRINISALUD IPS SAS. Para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mi en este(os) examen(es) estan completas y son veridicas. Autorizo a TRINISALUD YOPAL IPS SAS para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislacion vigente, la informacion registrada en este documento, para el buen cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional y para las situaciones contempladas en la misma legislacion. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Tue Nov 2024 11/05/24 09:35:39

GONZALO AGUIRRE / RM: MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL RM: 85527/05 LSO:06501/2020

5/11/2024 10:26:50

Generado por SGMI - TERRASOFT, NIT. 74814574-9. www.terrasoft.co

Thu Oct 2024 10/17/24 09:34:24

Firma y Huella del Paciente o Responsable



Indice Derecho

Bogotá D.C., diciembre 11 de 2024

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que SANTOS EDUARDO RAMIREZ FIGUEROA, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1026267003, registra la siguiente información de capacitación laboral :

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS REENTRENAMIENTO SECTORIAL 4272

OFERENTE DE CAPACITACIÓN: JRD CONSULTORES SAS

ENTRENADOR: DAYANN STEPHANIE SANCHEZ PEREZ

SEDE DONDE SE FORMÓ: JRD CONSULTORES SAS

EMPLEADOR: CONSORCIO VENTURA

ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES DEL TRABAJADOR: POSITIVA

SECTOR ECONÓMICO: SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

FECHAS DE FORMACIÓN: 15/10/2024 a 15/10/2024

INTENSIDAD HORARIA: 8 horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día diciembre 11 de 2024

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901550907-2	CONSORCIO VENTURA		Carrera 54 No. 153-75 Torre 2 Apto. 512	3105587676	altavistacgsas@aol.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					27	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	08/01/2025	83187011	\$11.461.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	81.300	0		0		0	5	300	0	81.600	1
EPS001	ALIANSA EPS S.A.	830113831-0	162.500	0		0		0	5	600	0	163.100	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	390.100	0		0		0	5	1.300	0	391.400	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	325.000	0		0		0	5	1.100	0	326.100	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	314.200	0		0		0	5	1.000	0	315.200	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.126.900	0		0		0	5	3.600	0	1.130.500	10
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	395.600	0		0		0	5	1.300	0	396.900	4
EPSC25	Capresoca EPS	891856000-7	189.700	0		0		0	5	600	0	190.300	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	325.000	0		0		0	5	1.100	0	326.100	2

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.324.400	0	0	0	0	5	4.200	0	1.328.600	8	
230301	Porvenir	800224808-8	2.406.300	0	0	0	0	5	7.600	0	2.413.900	16	
25-14	Colpensiones	900336004-7	506.200	0	0	0	0	5	1.600	0	507.800	3	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.843.900				1.843.900	5	5.800	1.849.700			18.439	1.849.700	27

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	381.400	5	1.200	382.600	11
CCF69	Comfacasanare	844003392-8	522.300	5	1.700	524.000	16

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901550907-2	CONSORCIO VENTURA		Carrera 54 No. 153-75 Torre 2 Apto. 512	3105587676	altavistacgsas@aol.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						NO

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
452.000	5	1.500	453.500	27
ICBF				
678.400	5	2.200	680.600	27
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-01	2024-12	E	08/01/2025	83187011	27
TOTAL A PAGAR					0
					\$11.461.900

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	3.310.300	3.321.200
Pensión	3	4.236.900	4.250.300
Riesgos Laborales	1	1.843.900	1.849.700
CCF	2	903.700	906.600
ESAP	0	0	0
ICBF	1	678.400	680.600
MEN	0	0	0
SENA	1	452.000	453.500
TOTALES	17	11.425.200	11.461.900

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901550907-2	CONSORCIO VENTURA		Carrera 54 No. 153-75 Torre 2 Apto. 512	3105587676	altavistacgsas@aol.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y
SALUD

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					27	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	08/01/2025	83187011	\$11.461.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES												
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SLN	IOE	IVA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1006555682	PEREZ QUITIAN ANDERSON CAMILO	1	0				N	X															230301	433.334	69.400	0	0	0	0	0	EPS037	433.334	54.200	14-23	433.334	5	30.200	CCF69	433.334	17.400	433.334	8.700	13.100	0	0
2	CC	1026251053	ORJUELA CARRERO JOAM MANUEL	1	0				N																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS001	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	910.000	36.400	910.000	18.200	27.300	0	0
3	CC	1026267003	RAMIREZ FIGUEROA SANTOS EDUARDO	1	0				N																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPSC34	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF69	910.000	36.400	910.000	18.200	27.300	0	0
4	CC	1057572709	FONSECA MOLINA MARTHA LILIANA	1	0				N	X															230301	1.213.334	194.200	0	0	0	0	0	EPS041	1.213.334	151.700	14-23	1.213.334	5	84.500	CCF69	1.213.334	48.600	1.213.334	24.300	36.500	0	0
5	CC	1073599257	MARTIN GUERRERO JOSE ALCIDES	1	0				N	X	X														230201	433.334	69.400	0	0	0	0	0	EPS037	433.334	54.200	14-23	433.334	5	30.200	CCF69	433.334	17.400	433.334	8.700	13.100	0	0
6	CC	1077320582	AVILA RINCON NESTOR ENRIQUE	1	0				N	X															230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	910.000	36.400	910.000	18.200	27.300	0	0
7	CC	1116776322	VANEGAS VELASQUEZ JESUS ORLANDO	1	0				N	X															230301	650.000	104.000	0	0	0	0	0	EPS041	650.000	81.300	14-23	650.000	5	45.300	CCF69	650.000	26.000	650.000	13.000	19.500	0	0
8	CC	1118070597	MURCIA ROMERO ALEXIS	1	0				N	X															230301	1.213.334	194.200	0	0	0	0	0	EPS017	1.213.334	151.700	14-23	1.213.334	5	84.500	CCF69	1.213.334	48.600	1.213.334	24.300	36.500	0	0
9	CC	1118547369	CERON MARTINEZ GINETH MARITZA	1	0				N	X															230301	650.000	104.000	0	0	0	0	0	EPSC25	650.000	81.300	14-23	650.000	5	45.300	CCF69	650.000	26.000	650.000	13.000	19.500	0	0
10	CC	13481963	MORALES RUIZ JORGE ELIECER	1	0				N																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	910.000	36.400	910.000	18.200	27.300	0	0
11	CC	37441623	PEREZ GRIMALDOS EDDY GISELA	1	0				N																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	910.000	36.400	910.000	18.200	27.300	0	0
12	CC	49658352	SANTANA ACOSTA MARIA LUISA	1	0				N	X															230301	1.213.334	194.200	0	0	0	0	0	EPS005	1.213.334	151.700	14-23	1.213.334	5	84.500	CCF69	1.213.334	48.600	1.213.334	24.300	36.500	0	0
13	CC	1093142064	MEDINA SALCEDO LUIS FELIPE	1	0				N																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	910.000	36.400	910.000	18.200	27.300	0	0
14	CC	1096236096	QUINTERO AHUMADA BAIRON ARLEX	1	0				N	X															230301	650.000	104.000	0	0	0	0	0	EPS041	650.000	81.300	14-23	650.000	5	45.300	CCF69	650.000	26.000	650.000	13.000	19.500	0	0
15	CC	1115854706	ARISTIZABAL CAMPIO JOSE DANIEL	1	0				N	X															230301	866.667	138.700	0	0	0	0	0	EPS037	866.667	108.400	14-23	866.667	5	60.400	CCF69	866.667	34.700	866.667	17.400	26.100	0	0
16	CC	86076301	VILLALOBOS SANCHEZ CELY DANIEL	1	0				N	X															230201	650.000	104.000	0	0	0	0	0	CCFC55	650.000	81.300	14-23	650.000	5	45.300	CCF24	650.000	26.000	650.000	13.000	19.500	0	0
17	CC	88311594	HERNANDEZ ROPERO PEDRO ANTONIO	1	0				N	X															230201	693.334	111.000	0	0	0	0	0	EPS005	693.334	86.700	14-23	693.334	5	48.300	CCF24	693.334	27.800	693.334	13.900	20.900	0	0
18	CC	9529091	MURILLO RODRIGUEZ JOSE DEL CARMEN	1	0				N	X															230301	216.667	34.700	0	0	0	0	0	EPS037	216.667	27.100	14-23	216.667	5	15.100	CCF69	216.667	8.700	216.667	4.400	6.600	0	0
19	CC	1118564573	AVENDAÑO ROJAS LUIS MIGUEL	1	0				N	X															230301	866.667	138.700	0	0	0	0	0	EPSC25	866.667	108.400	14-23	866.667	5	60.400	CCF69	866.667	34.700	866.667	17.400	26.100	0	0
20	CC	1118571442	TUMAY SIGUA JOSE DUVAN	1	0				N	X															230301	650.000	104.000	0	0	0	0	0	EPS037	650.000	81.300	14-23	650.000	5	45.300	CCF69	650.000	26.000	650.000	13.000	19.500	0	0
21	CC	1127387023	BARRETO EDGAR JOSE	1	0				N																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	910.000	36.400	910.000	18.200	27.300	0	0
22	CC	9656505	GONZALEZ ROJAS SEGUNDO	1	0				N	X															230301	1.213.334	194.200	0	0	0	0	0	EPS037	1.213.334	151.700	14-23	1.213.334	5	84.500	CCF69	1.213.334	48.600	1.213.334	24.300	36.500	0	0
23	PT	5105802	PACHECO BETANCOURT ANDREUS	1	0				N	X															25-14	650.000	104.000	0	0	0	0	0	EPS041	650.000	81.300	14-23	650.000	5	45.300	CCF69	650.000	26.000	650.000	13.000	19.500	0	0
24	PT	5841106	ANGEL VALERO CARIBAY DEL VALLE	1	0				N																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	910.000	36.400	910.000	18.200	27.300	0	0
25	CC	74360018	ROSE RO GONZALEZ ANDRES MAURICIO	1	0				N	X															25-14	1.213.334	194.200	0	0	0	0	0	EPS005	1.213.334	151.700	14-23	1.213.334	5	84.500	CCF69	1.213.334	48.600	1.213.334	24.300	36.500	0	0
26	CC	79920871	GONZALEZ ORTIZ HAENZ	1	0				N																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	910.000	36.400	910.000	18.200	27.300	0	0
27	CC	79954942	GONZALEZ PIRAQUIVE WILLIAM EDILSON	1	0				N																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPSC34	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	910.000	36.400	910.000	18.200	27.300	0	0

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

DAIRON STIWAR RAMIREZ CARRILLO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.004.804.856**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 17 de Enero del 2025.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 17/01/2025VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA**DATOS DE LA EMPRESA**

Tipo documento:	NI	Número de documento:	901550907	Cédula Usuario:	CC 52452955
Nombre:	CONSORCIO VENTURA				
Dirección:	KR 54 153 75 TO 2 512				
Departamento:	BOGOTA D.C.		Municipio:	BOGOTA D.C.	
Correo electrónico:	CLAVECAL@YAHOO.COM				
Teléfono:	3105587676		Tarifa:	6.960	
Actividad Económica:	5421001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL, INCLUYE LA CONSTRUCCION, CONSERVACION Y REPARACION DE CARRETERAS, CALLES Y OTRAS VIAS, PUENTES Y VIADUCTOS, TUNELES, LINEAS DE FERROCARRIL Y DE METRO, PISTAS DE AEROPUERTOS				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 52452955	MARIA JOSE HERRERA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	225	18/01/2025	CC 1004804856	RAMIREZ CARRILLO DAIRON	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

DF674470663629A11F7C44793F7E04D6

Certificado impreso el día 1/17/2025 6:38:28 PM por el portal de empresas Edesk



Positiva Compañía de Seguros S.A. • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170,
Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co

 Positiva Compañía de Seguros

 @PositivaCol

 PositivaColombia



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda



EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Dirijase a la Institución Prestadora de Salud (IPS) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá **(601) 330 7000**.

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS

DAIRON STIWAR

RAMIREZ CARRILLO

1004804856

CONSORCIO VENTURA

901550907

Este carné es personal e intransferible.

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901550907-2	CONSORCIO VENTURA		Carrera 54 No. 153-75 Torre 2 Apto. 512	3105587676	altavistacgsas@aol.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					27	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	08/01/2025	83187011	\$11.461.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	81.300	0		0		0	5	300	0	81.600	1
EPS001	ALIANSA EPS S.A.	830113831-0	162.500	0		0		0	5	600	0	163.100	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	390.100	0		0		0	5	1.300	0	391.400	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	325.000	0		0		0	5	1.100	0	326.100	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	314.200	0		0		0	5	1.000	0	315.200	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.126.900	0		0		0	5	3.600	0	1.130.500	10
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	395.600	0		0		0	5	1.300	0	396.900	4
EPSC25	Capresoca EPS	891856000-7	189.700	0		0		0	5	600	0	190.300	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	325.000	0		0		0	5	1.100	0	326.100	2

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.324.400	0	0	0	0	5	4.200	0	1.328.600	8	
230301	Porvenir	800224808-8	2.406.300	0	0	0	0	5	7.600	0	2.413.900	16	
25-14	Colpensiones	900336004-7	506.200	0	0	0	0	5	1.600	0	507.800	3	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.843.900				1.843.900	5	5.800	1.849.700			18.439	1.849.700	27

TOTALES CAJAS								
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte	Días Mora
CCF24	Compensar Caja					860066942-7	381.400	5
CCF69	Comfacasanare					844003392-8	522.300	5
								Valor Mora Aporte
								Total a Pagar
								No. Afiliados

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901550907-2	CONSORCIO VENTURA		Carrera 54 No. 153-75 Torre 2 Apto. 512	3105587676	altavistacgsas@aol.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						NO

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
452.000	5	1.500	453.500	27
ICBF				
678.400	5	2.200	680.600	27
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-01	2024-12	E	08/01/2025	83187011	27
TOTAL A PAGAR					0
					\$11.461.900

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	3.310.300	3.321.200
Pensión	3	4.236.900	4.250.300
Riesgos Laborales	1	1.843.900	1.849.700
CCF	2	903.700	906.600
ESAP	0	0	0
ICBF	1	678.400	680.600
MEN	0	0	0
SENA	1	452.000	453.500
TOTALES	17	11.425.200	11.461.900

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901550907-2	CONSORCIO VENTURA		Carrera 54 No. 153-75 Torre 2 Apto. 512	3105587676	altavistacgsas@aol.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					27	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	08/01/2025	83187011	\$11.461.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES										
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Subjugo	Exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	IOE	IVA	VAC	VCT	RL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1006555682	PEREZ QUITIAN ANDERSON CAMILO	1	0				N	X													230301	433.334	69.400	0	0	0	0	0	EPS037	433.334	54.200	14-23	433.334	5	30.200	CCF69	433.334	17.400	433.334	8.700	13.100	0	0
2	CC	1026251053	ORJUELA CARRERO JOAM MANUEL	1	0				N														230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS001	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	910.000	36.400	910.000	18.200	27.300	0	0
3	CC	1026267003	RAMIREZ FIGUEROA SANTOS EDUARDO	1	0				N														230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPSC34	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF69	910.000	36.400	910.000	18.200	27.300	0	0
4	CC	1057572709	FONSECA MOLINA MARTHA LILIANA	1	0				N	X													230301	1.213.334	194.200	0	0	0	0	0	EPS041	1.213.334	151.700	14-23	1.213.334	5	84.500	CCF69	1.213.334	48.600	1.213.334	24.300	36.500	0	0
5	CC	1073599257	MARTIN GUERRERO JOSE ALCIDES	1	0				N	X	X												230201	433.334	69.400	0	0	0	0	0	EPS037	433.334	54.200	14-23	433.334	5	30.200	CCF69	433.334	17.400	433.334	8.700	13.100	0	0
6	CC	1077320582	AVILA RINCON NESTOR ENRIQUE	1	0				N	X													230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	910.000	36.400	910.000	18.200	27.300	0	0
7	CC	1116776322	VANEGAS VELASQUEZ JESUS ORLANDO	1	0				N	X													230301	650.000	104.000	0	0	0	0	0	EPS041	650.000	81.300	14-23	650.000	5	45.300	CCF69	650.000	26.000	650.000	13.000	19.500	0	0
8	CC	1118070597	MURCIA ROMERO ALEXIS	1	0				N	X													230301	1.213.334	194.200	0	0	0	0	0	EPS017	1.213.334	151.700	14-23	1.213.334	5	84.500	CCF69	1.213.334	48.600	1.213.334	24.300	36.500	0	0
9	CC	1118547369	CERON MARTINEZ GINETH MARITZA	1	0				N	X													230301	650.000	104.000	0	0	0	0	0	EPSC25	650.000	81.300	14-23	650.000	5	45.300	CCF69	650.000	26.000	650.000	13.000	19.500	0	0
10	CC	13481963	MORALES RUIZ JORGE ELIECER	1	0				N														230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	910.000	36.400	910.000	18.200	27.300	0	0
11	CC	37441623	PEREZ GRIMALDOS EDDY GISELA	1	0				N														230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	910.000	36.400	910.000	18.200	27.300	0	0
12	CC	49658352	SANTANA ACOSTA MARIA LUISA	1	0				N	X													230301	1.213.334	194.200	0	0	0	0	0	EPS005	1.213.334	151.700	14-23	1.213.334	5	84.500	CCF69	1.213.334	48.600	1.213.334	24.300	36.500	0	0
13	CC	1093142064	MEDINA SALCEDO LUIS FELIPE	1	0				N														230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	910.000	36.400	910.000	18.200	27.300	0	0
14	CC	1096236096	QUINTERO AHUMADA BAIRON ARLEX	1	0				N	X													230301	650.000	104.000	0	0	0	0	0	EPS041	650.000	81.300	14-23	650.000	5	45.300	CCF69	650.000	26.000	650.000	13.000	19.500	0	0
15	CC	1115854706	ARISTIZABAL CAMPIO JOSE DANIEL	1	0				N	X													230301	866.667	138.700	0	0	0	0	0	EPS037	866.667	108.400	14-23	866.667	5	60.400	CCF69	866.667	34.700	866.667	17.400	26.100	0	0
16	CC	86076301	VILLALOBOS SANCHEZ CELY DANIEL	1	0				N	X													230201	650.000	104.000	0	0	0	0	0	CCFC55	650.000	81.300	14-23	650.000	5	45.300	CCF24	650.000	26.000	650.000	13.000	19.500	0	0
17	CC	88311594	HERNANDEZ ROPERO PEDRO ANTONIO	1	0				N	X													230201	693.334	111.000	0	0	0	0	0	EPS005	693.334	86.700	14-23	693.334	5	48.300	CCF24	693.334	27.800	693.334	13.900	20.900	0	0
18	CC	9529091	MURILLO RODRIGUEZ JOSE DEL CARMEN	1	0				N	X													230301	216.667	34.700	0	0	0	0	0	EPS037	216.667	27.100	14-23	216.667	5	15.100	CCF69	216.667	8.700	216.667	4.400	6.600	0	0
19	CC	1118564573	AVENDAÑO ROJAS LUIS MIGUEL	1	0				N	X													230301	866.667	138.700	0	0	0	0	0	EPSC25	866.667	108.400	14-23	866.667	5	60.400	CCF69	866.667	34.700	866.667	17.400	26.100	0	0
20	CC	1118571442	TUMAY SIGUA JOSE DUVAN	1	0				N	X													230301	650.000	104.000	0	0	0	0	0	EPS037	650.000	81.300	14-23	650.000	5	45.300	CCF69	650.000	26.000	650.000	13.000	19.500	0	0
21	CC	1127387023	BARRETO EDGAR JOSE	1	0				N														230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	910.000	36.400	910.000	18.200	27.300	0	0
22	CC	9656505	GONZALEZ ROJAS SEGUNDO	1	0				N	X													230301	1.213.334	194.200	0	0	0	0	0	EPS037	1.213.334	151.700	14-23	1.213.334	5	84.500	CCF69	1.213.334	48.600	1.213.334	24.300	36.500	0	0
23	PT	5105802	PACHECO BETANCOURT ANDREUS	1	0				N	X													25-14	650.000	104.000	0	0	0	0	0	EPS041	650.000	81.300	14-23	650.000	5	45.300	CCF69	650.000	26.000	650.000	13.000	19.500	0	0
24	PT	5841106	ANGEL VALERO CARIBAY DEL VALLE	1	0				N														230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	910.000	36.400	910.000	18.200	27.300	0	0
25	CC	74360018	ROSE RO GONZALEZ ANDRES MAURICIO	1	0				N	X													25-14	1.213.334	194.200	0	0	0	0	0	EPS005	1.213.334	151.700	14-23	1.213.334	5	84.500	CCF69	1.213.334	48.600	1.213.334	24.300	36.500	0	0
26	CC	79920871	GONZALEZ ORTIZ HAENZ	1	0				N														230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	910.000	36.400	910.000	18.200	27.300	0	0
27	CC	79954942	GONZALEZ PIRAQUIVE WILLIAM EDILSON	1	0				N														25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPSC34	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	910.000	36.400	910.000	18.200	27.300	0	0

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	13447196
NOMBRES	JORGE ISAAC
APELLIDOS	ARANGO CAMACHO
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO	CUCUTA

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.	CONTRIBUTIVO	01/03/2022	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión: 01/20/2025 10:19:49 Estación de origen: 2801:12:c800:2070::1

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES”.

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el



SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR
PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del
FONDO DE CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.170.043-7

CERTIFICA QUE:

JORGE ISAAC ARANGO CAMACHO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **13.447.196**, se encuentra afiliado(a) al **AL FONDO DE CESANTÍAS PORVENIR**.

La presente certificación se expide el 16 de Diciembre del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes



Medellín, 24 de January de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSTRUCCIONES ARKITEK BPO S.A.S..

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0005332001 OPERARIO		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6.96 %		
C13447196	ARANGO CAMACHO JORGE ISAAC	25/01/2025		25238173	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/01/2025 12:04:25 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 152.203.15.24, 192.230.104.11, 172.16.42.57



CE-006 - 0000000100 – 2024

CERTIFICA

Que la(s) persona(s) relacionada(s) a continuación está(n) o ha(n) estado afiliada(s) a

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 13447196
NOMBRES Y APELLIDOS	Arango Camacho,Jorge Isaac
TIPO DE AFILIADO	Titular
TIPO DE TRABAJADOR	Dependiente, Independiente
FECHA DE AFILIACIÓN AL REGIMEN	01/03/2022
ESTADO DE AFILIACIÓN	Vigente
ESTADO DE SERVICIO	Habilitado
REGIMEN	Contributivo

La presente se expide a nombre de Arango Camacho,Jorge Isaac, a los 16 días del mes de diciembre del año 2024.

NOTA: Esta certificación no constituye aprobación de traslado, ni es documento válido para solicitar servicios médicos.

Banny Yeritza Sarmiento Vanegas
Coordinador Gestión de la Afiliación



CE-006 - 0000000169 – 2025

CERTIFICA

Que la(s) persona(s) relacionada(s) a continuación está(n) o ha(n) estado afiliada(s) a

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 13447196
NOMBRES Y APELLIDOS	Arango Camacho, Jorge Isaac
TIPO DE AFILIADO	Titular
TIPO DE TRABAJADOR	Dependiente
FECHA DE AFILIACIÓN AL REGIMEN	01/08/2018
ESTADO DE AFILIACIÓN	Vigente
ESTADO DE SERVICIO	Habilitado
REGIMEN	Contributivo

La presente se expide a nombre de Arango Camacho, Jorge Isaac, a los 24 días del mes de enero del año 2025.

NOTA: Esta certificación no constituye aprobación de traslado, ni es documento válido para solicitar servicios médicos.

Banny Yeritza Sarmiento Vanegas
Coordinador Gestión de la Afiliación

Medellín, 23 de January de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:


Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSTRUCCIONES ARKITEK BPO S.A.S..

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0005411201 OBRERO				Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %
C13459748	RANGEL BUENO JESUS ENRIQUE	24/01/2025		032S1542	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 23/01/2025 17:48:53 .

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 152.203.15.24, 192.230.104.11, 172.16.42.57

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **JESUS ENRIQUE RANGEL BUENO** identificado(a) con **CC** número **13459748** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 22 de marzo de 1996 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 27 de enero de 2025.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:

Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**

Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**

www.proteccion.com

2025012707285

COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A
NIT 900.226.715 - 3

CERTIFICA:

El suscrito afiliado relacionado a continuación se encuentra o ha estado registrado en la EPS, con los siguientes datos:

Tipo y No. de documento: CC-13459748

Nombres: JESUS ENRIQUE

Apellidos: RANGEL BUENO

No. de Carnet: 9873497E3953FEE1E053020213ACCB2B

Tipo de afiliado: CABEZA DE FAMILIA

Fecha de afiliación:

Estado de afiliación: Activo

Régimen: Contributivo

IPS:

Departamento - Municipio: NORTE DE SANTANDER-LOS PATIOS

OBSERVACIONES:

ESTA CERTIFICACIÓN NO APLICA PARA SERVICIOS MÉDICOS NO VALIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

La anterior certificación se expide y firma el Friday, January 24, 2025, a solicitud del interesado y es válida hasta el Monday, February 24, 2025


CARLOS TORRES SALAZAR
SUBDIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NACIONAL



LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.

CERTIFICA QUE:

La empresa
GRUPO EMPRESARIAL ASOVITAL SAS
Identificada con NT No. 900724748

Compañía de Seguros Bolívar S.A.

Se encuentra amparada en caso de accidente de trabajo y enfermedad laboral según lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus normas reglamentarias, a través del contrato de Riesgos Laborales número 1060666502409, a partir del 01 de Noviembre del año 2024.

La(s) persona(s) que se relaciona(n) a continuación se encuentran en nuestra base de datos de la siguiente manera:

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL EMPLEADO	CENTRO DE TRABAJO	CLASE	TASA	FECHA INICIO COBERTURA	FECHA DE RETIRO	TIPO COTIZANTE	ESTADO
PT	6692521	JOSE DAVID ROMANO GOMEZ	OPERATIVO CLASE V SAN GIL	5	6.96%	30/01/2025		DEPENDIENTE	ACTIVO

Se expide a solicitud del interesado el 29 de Enero del año 2025.

Firma Representante Legal



CE-006 - 0000000100 – 2025

CERTIFICA

Que la(s) persona(s) relacionada(s) a continuación está(n) o ha(n) estado afiliada(s) a

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	PT 6692521
NOMBRES Y APELLIDOS	Romano Gomez Jose David
TIPO DE AFILIADO	Titular
TIPO DE TRABAJADOR	Dependiente
FECHA DE AFILIACIÓN AL REGIMEN	24/04/2023
ESTADO DE AFILIACIÓN	Vigente
ESTADO DE SERVICIO	Habilitado
REGIMEN	Contributivo

La presente se expide a nombre de Romano Gomez Jose David, a los 29 días del mes de enero del año 2025.

NOTA: Esta certificación no constituye aprobación de traslado, ni es documento válido para solicitar

Banny Yeritza Sarmiento Vanegas
Coordinador Gestión de la Afiliación

servicios médicos.

A handwritten signature in black ink, reading "Banny Sarmiento". The signature is written in a cursive, flowing style.

Banny Yeritza Sarmiento Vanegas
Coordinador Gestión de la Afiliación

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **JOSE DAVID ROMANO GOMEZ** identificado/a con documento de identidad **Permiso por Protección Temporal** número **6692521**, estuvo afiliado/a al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES** y su estado es ACTIVO.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 29 de enero de 2025.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.



LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.

CERTIFICA QUE:

La empresa
GRUPO EMPRESARIAL ASOVITAL SAS
Identificada con NT No. 900724748

Compañía de Seguros Bolívar S.A.

Se encuentra amparada en caso de accidente de trabajo y enfermedad laboral según lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus normas reglamentarias, a través del contrato de Riesgos Laborales número 1060666502409, a partir del 01 de Noviembre del año 2024.

La(s) persona(s) que se relaciona(n) a continuación se encuentran en nuestra base de datos de la siguiente manera:

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL EMPLEADO	CENTRO DE TRABAJO	CLASE	TASA	FECHA INICIO COBERTURA	FECHA DE RETIRO	TIPO COTIZANTE	ESTADO
CC	13195172	RAMIRO PINEDA MARIN	OPERATIVO CLASE V SAN GIL	5	6.96%	30/01/2025		DEPENDIENTE	ACTIVO

Se expide a solicitud del interesado el 29 de Enero del año 2025.

Firma Representante Legal

**EL PROGRAMA DE EPS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
COMPENSAR
NIT 860.066.942-7**

CERTIFICA QUE

Que el(la) señor(a) RAMIRO PINEDA MARIN identificado(a) con cedula ciudadanía 13195172, se encuentra Activo en el Plan de Beneficios de Salud PBS, de la EPS Compensar por la Empresa 'EMPRESA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS Y ASESORIAS SAS' NIT 900724748, en calidad de DEPENDIENTE según información contenida a la fecha en nuestra base de datos.

Fecha Afiliación	Fecha Retiro
20220717	No Registrada

El presente certificado se expide a solicitud del (la) interesado(a), a los 29 días del mes de Enero de 2.025

Observaciones:

Con destino a:

A QUIEN INTERESE

Información sujeta a verificación por parte de COMPENSAR EPS, cualquier aclaración con gusto será atendida en la línea (601) 4441234 - Documento no válido como autorización de traslado ni aclaración de multifiliación en el SGSSS..

Cordialmente,
COMPENSAR EPS.


Elaboró: Portal corporativo Compensar EPS
CER-AFI 27642557

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **RAMIRO PINEDA MARIN** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **13195172**, estuvo afiliado/a al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES** y su estado es **TRASLADADO A OTRO FONDO**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 29 de enero de 2025.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Anexo 3: Disposición de RCD

FUNAMBIENTE

CONCEPTO: LIQUIDACIÓN DE TARIFA POR SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL EN LA ESCOMBRERA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

DECRETO No. 0277 DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2003
A FAVOR DE: CONCESIONARIO ESCOMBRERA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
FUNAMBIENTE NIT. 800.134.180-5

RECIBO Nº **13671**

SOLICITANTE: CONSORCIO VENTURA - NIT. 901 550 9072

DIRECCIÓN: Batallon - FECHA: 07 -01 -2025 -

CONDUCTOR: Victor Rivero - PLACA: OW6-545 M3: 5.5-

VIAJES DE ESCOMBRO: 1 UNO VALOR POR VIAJE: 2500 X M³ VALOR TOTAL: 13750

FUNAMBIENTE ESCOMBRERA MUNICIPAL CANCELADO
JEFE DE PATIO

PROTECCION DEFENSA Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES
Avenida 2 No. 10-18 centro. Edificio Ovni Oficina 202 Tel: 5891113 CÚCUTA NORTE DE SANTANDER

FUNAMBIENTE

CONCEPTO: LIQUIDACIÓN DE TARIFA POR SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL EN LA ESCOMBRERA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

DECRETO No. 0277 DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2003
A FAVOR DE: CONCESIONARIO ESCOMBRERA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
FUNAMBIENTE NIT. 800.134.180-5

RECIBO Nº **13760**

SOLICITANTE: CONSORCIO VENTURA - NIT. 901 550 9072

DIRECCIÓN: Batallon - FECHA: 25 -01 -2025 -

CONDUCTOR: Victor Rivero - PLACA: OW6-545 M3: 5.6-

VIAJES DE ESCOMBRO: 1 UNO VALOR POR VIAJE: 2500 X M³ VALOR TOTAL: 14000

FUNAMBIENTE ESCOMBRERA MUNICIPAL CANCELADO
JEFE DE PATIO

PROTECCION DEFENSA Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES
Avenida 2 No. 10-18 centro. Edificio Ovni Oficina 202 Tel: 5891113 CÚCUTA NORTE DE SANTANDER

FUNAMBIENTE

CONCEPTO: LIQUIDACIÓN DE TARIFA POR SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL EN LA ESCOMBRERA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

DECRETO No. 0277 DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2003
A FAVOR DE: CONCESIONARIO ESCOMBRERA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
FUNAMBIENTE NIT. 800.134.180-5

RECIBO Nº **13789**

SOLICITANTE: CONSORCIO VENTURA - NIT. 901 550 9072

DIRECCIÓN: Batallon - FECHA: 29 -01 -2025

CONDUCTOR: Victor Rivero PLACA: OW6-545 M3: 5.4-

VIAJES DE ESCOMBRO: 1 UNO VALOR POR VIAJE: 2500 X M³ VALOR TOTAL: 13500-

FUNAMBIENTE ESCOMBRERA MUNICIPAL CANCELADO
JEFE DE PATIO

PROTECCION DEFENSA Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES
Avenida 2 No. 10-18 centro. Edificio Ovni Oficina 202 Tel: 5891113 CÚCUTA NORTE DE SANTANDER

Anexo 4: Control de Ingreso de Material Pétreo

Anexo 5: Documentación Vehículo

SOAT

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA
AÑO MES DÍA	DESDE LAS 00 HORAS DEL
2024 11 29	2024 11 30
	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
	2025 11 29



SEGUROS
COMERCIALES
BOLÍVAR

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
931001036390100	OWG545	VOLQUETA	PUBLICO	6200	1961
PASAJEROS	MARCA	CARRROCERÍA			
2	MERCURY	17 - PLATON			
LÍNEA VEHÍCULO	SIN LINEA				
No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.		
467TM2U135564	M60CE110614		6.0		
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR		TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
OMAR VEGA VILLAMIZAR			CC	88202042	CUCUTA
CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN	
45268	9310	45268	9310010271701	BOGOTA	
TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT	AMPAIOS POR VICTIMA	
320	\$953,500.00	\$585,800.00	\$2,100.00	A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	
TOTAL A PAGAR				HASTA	
\$1.398,900.00				263,13 ¹	
				701,68 ²	
				8,77	
				HASTA	
				180	
				750	
				SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES	
FIRMA AUTORIZADA				D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	

¹Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
²Para las demás tarifas no citadas en (1).

El SOAT digital, además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad**, también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas**.



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde poner siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos: el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información".



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE



CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 177591117

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LA 19 LOS PATIOS
NIT: 901480986 No. de Certificado de Acreditación: 21-CDA-080
Fecha de expedición: 2024/12/02 Fecha de vencimiento: 2025/12/02



DATOS VEHÍCULO

PLACA:	OWG545	CLASE:	VOLQUETA
MARCA:	MERCURY	MODELO:	1961
SERVICIO:	Público	COMBUSTIBLE:	DIESEL
CILINDRAJE:	6200	NRO. MOTOR:	467TM2U135564
NRO. CHASIS:	M60CE110614	VIN:	
LÍNEA:	SIN LINEA		
COLOR:	ROJO		
NOMBRE PROPIETARIO:	OMAR VEGA V.		




FIRMA DEL RESPONSABLE


CARLOS EDUARDO VILLAMIZAR CAMARGO

Anexo 6: Inspección de Equipos y Herramientas

		FORMATO INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES		CV-FR-IHM-04	
				Fecha	
				15/10/2024	
				Versión	
		1			
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		16 al 31 - Enero - 25		HORA	7:00
RESPONSABLE		Eddy Gisela Pérez 6		LUGAR	Ciudad H/S
PROYECTO		Adecuaciones Barrio Mh de ASPC #50		CONTRATO	055-2024
ESTÁNDARES DE SEGURIDAD		ESTADO		OBSERVACIONES	
MARTILLOS / MACETAS		B M			
Los mangos no cuentan con astillados o están ásperos.		☒			
Los Mangos se encuentran bien sujetos y seguros.		☒			
Las cabezas de los martillos están libres de rebabas.		☒			
APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)		SI ☒ NO ☐			
ALICATE, TENAZA, CAJAMÁN		B M			
Los mangos no se encuentra deformados.		☒			
Las Mandíbulas no se encuentran gastadas o sueltas.		☒			
Filo de la parte cortante mellado.		☒			
El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de las quijadas.		☒			
APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)		SI ☒ NO ☐			
SIERRAS, SERRUCHOS		B M			
Los Mangos no se encuentran sueltos, partidos o ásperos.		☒			
Los Dientes desafilados o maltratados.		☒			
APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)		SI ☒ NO ☐			
PICA, PALA, BARRA		B M			
Los mangos no cuentan con astillados o están ásperos.		☒			
Los Mangos se encuentran bien sujetos y seguros.		☒			
La punta, pala nose encuentran deformes, con grietas o fisuradas.		☒			
APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)		SI ☒ NO ☐			
LLAVES MIXTAS		B M			
La Bocas o dientes no se encuentran desgastados, deformados o con grietas		☒			
Las llaves conservan su forma original, no están torcidas o dobladas.		☒			
Hay llaves suficientes en tamaños y dimensiones.		☒			
APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)		SI ☒ NO ☐			
DESTORNILLADORES		B M			
Los mangos están libres de roturas, sueltos o partidos		☒			
La hoja y el vástago están alineados, sin torceduras.		☒			
Las palas están a escuadra, las estrias afiladas y limpias.		☒			
Los mangos aislados.		☒			
APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)		SI ☒ NO ☐			
PUNTOS, CINCELES		B M			
Las Cabezas no están astilladas, saltadas o con rebordes.		☒			
El Vástago no es demasiado cortos y permite un manejo seguro.		☒			
Los Filos no están rotos o saltados.		☒			
APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)		SI ☒ NO ☐			
PLANAS, LLANAS, ESPÁTULAS Y PALUSTRE		B M			
Los mangos no se encuentran desastillados, rotos o mal soldados.		☒			
Las hojas no están curvadas, agrietadas o rotas.		☒			
APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)		SI ☒ NO ☐			
PLAN DE ACCIÓN					
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	FECHA COMPROBACIÓN	OBSERVACIONES	
OBSERVACIONES: Se adquirió una carretilla, una escalera de 4 pasos y un codal o boquilla					
 INSPECCIONA		 JEFE DE AREA			

CONSORCIO VENTURA		FORMATO INSPECCION DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS				CV-FR-IHE-05
						Fecha
						15/10/2024
						Versión
						1
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	16 al 31 - Enero - 23		HORA	7:00	LUGAR	Ciudad NLS
RESPONSABLE	Eddy Gisela Jerez 6		CARGO	Residente SST		
PROYECTO	Adecuaciones Pasadillo de ASPC #30		CONTRATO	1055-2024		
		ESTÁNDARES DE SEGURIDAD		ESTADO		OBSERVACIONES
		PULIDORA		B M		
	Protección del disco. (Guardas o carcasa de seguridad disco), Fijas, en buenas condiciones, (que no estén rotas, sin fisuras) y en la posición correcta.		X			1 pulidora 9" grande de
	Disco Correctamente Ajustado, sin fragmentaciones, sin fisuras y sin desgaste acentuado.		X			
	Mangos o puntos de apoyo, Que estén en perfecto estado, (que no están rotos y sin fisuras), aislados y fijos.		X			
	Disco cumple con las revoluciones de la pulidora.					
	Cuerpo de la pulidora Que este ensamblado, completo, debidamente aislado y sin fisuras.		X			
	Interruptores o pulsadores fijos, de fácil acceso, en buenas condiciones de (encendido y apagado), sin cables eléctricos expuestos.		X			
	Extensiones con longitud suficiente de alcance de la toma al área de trabajo, debidamente aisladas, conectadas y sin empalmes.		X			
	Usa los EPI gafas de seguridad, casco, careta, protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza).		X			
	Sin vibraciones Movimientos o ruidos anormales y escobillas en buen estado (verifique que no emitan chispas).		X			
	APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)		SI		☒	
		TALADRO		B M		OBSERVACIONES
	El mandril esta en buen estado.		X			Dos (2) Taladros Inalámbrico 1 por cable
	El cable electrico de conexión esta en buenas condiciones.		X			
	Cuenta con llave para abrir y cerrar el mandril (buen estado).		X			
	El switch de encendido funciona correctamente.		X			
	El enchufe se encuentra en buen estado y con su cable a tierra.		X			
	Cuenta con manilla de agarre.		X			
Las brocas se encuentran en buen estado.		X				
APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)		SI		☒		NO ☐
		MARTILLO DEMOLEDOR		B M		OBSERVACIONES
	Cable de alimentación en buen estado.		X			
	Enchufe en buen estado, sin cables salidos?		X			
	La carcasa se encuentra limpia y en buen estado?		X			
	El seguro del cincel se encuentra operativo y en buenas condiciones.		X			
	Interruptor de partida se encuentra operativo?		X			
	Los Mangos o puños de agarre, se encuentran firmes y en buen estado?		X			
	Los cincelos, se encuentran en buen estado?		X			
Verificar funcionamiento general (con el martillo energizado).		X				
APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)		SI		☒		NO ☐
		EXTENSIONES ELÉCTRICAS		B M		OBSERVACIONES
	Son confeccionadas con cordones de tres conductores (monofásicos, 220 v).		X			
	Su aislación está en buen estado (sin cortes cables expuestos, etc.).		X			
	Los enchufes macho y hembra son aprobados para servicio pesado del tipo industrial.		X			
	La conexión a enchufes macho y hembra tiene cables a la vista.		X			
	Las cajas de enchufes múltiples están protegidas contra golpes.		X			
	Las extensiones eléctricas son extendidas por vía aérea o de forma segura por el suelo.		X			
La extensión es encauchetada.		X				
La clavija no esta suelta y no esta sulfatada.		X				
APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)		SI		☒		NO ☐
RECOMENDACIONES						
EJECUTAR LAS INSPECCIONES CON LA FRECUENCIA INDICADA.						
OPERAR EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE EJECUTAR LA INSPECCIÓN PRE USO.						
OPERAR EL EQUIPO SOLAMENTE SI ESTÁ AUTORIZADO Y CAPACITADO						
EN LA INSPECCIÓN MARQUE:		SI SE OBSERVA ALGUNA EVENTUALIDAD, INFORME INMEDIATAMENTE AL SUPERVISOR, SST O JEFE PARA SU VERIFICACIÓN.				
B:	BUENO					
M:	MALO					
PLAN DE ACCIÓN						
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	FECHA COMPROBACIÓN	OBSERVACIONES		
E. GISCIA Jerez 6		2		JEFE DE AREA		
INSPECCIONA						

 CONSORCIO VENTURA	FORMATO INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES				CV-FR-IHM-04	
					Fecha	
					15/10/2024	
					Versión 1	
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		02 Oct 15 - Enero - 25	HORA		LUGAR	Escuela N/S
RESPONSABLE		Eddy Gisela Pérez 6	CARGO		Residente SST	
PROYECTO		Adecuaciones Batallón de ASPC #30		CONTRATO		055 - 2024
ESTÁNDARES DE SEGURIDAD			ESTADO		OBSERVACIONES	
MARTILLOS / MACETAS			B	M		
	Los mangos no cuentan con astillados o están ásperos.		☒	☐		
	Los Mangos se encuentran bien sujetos y seguros.		☒	☐		
	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas.		☒	☐		
APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)			SI	☒	NO	☐
ALICATE, TENAZA, CAJIMÁN			B	M	OBSERVACIONES	
	Los mangos no se encuentran deformados.		☒	☐		
	Las Mandíbulas no se encuentran gastadas o sueltas.		☒	☐		
	Filo de la parte cortante mellado.		☒	☐		
	El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de las quijadas.		☒	☐		
APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)			SI	☒	NO	☐
SIERRAS, SERRUCHOS			B	M	OBSERVACIONES	
	Los Mangos no se encuentran sueltos, partidos o ásperos.		☒	☐		
	Los Dientes desafilados o maltratados.		☒	☐		
APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)			SI	☒	NO	☐
PICA, PALA, BARRA			B	M	OBSERVACIONES	
	Los mangos no cuentan con astillados o están ásperos.		☒	☐		
	Los Mangos se encuentran bien sujetos y seguros.		☒	☐		
	La punta, pala nose encuentran deformes, con grietas o fisuradas.		☒	☐		
APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)			SI	☒	NO	☐
LLAVES MIXTAS			B	M	OBSERVACIONES	
	La Bocas o dientes no se encuentran desgastados, deformados o con grietas		☒	☐		
	Las llaves conservan su forma original, no están torcidas o dobladas.		☒	☐		
	Hay llaves suficientes en tamaños y dimensiones.		☒	☐		
APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)			SI	☒	NO	☐
DESTORNILLADORES			B	M	OBSERVACIONES	
	Los mangos están libres de roturas, sueltos o partidos		☒	☐		
	La hoja y el vástago están alineados, sin torceduras.		☒	☐		
	Las palas están a escuadra, las estrías afiladas y limpias.		☒	☐		
	Los mangos aislados.		☒	☐		
APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)			SI	☒	NO	☐
PUNTOS, CINCELES			B	M	OBSERVACIONES	
	Las Cabezas no estan astilladas, saltadas o con rebordes.		☒	☐		
	El Vástago no es demasiado cortos y permite un manejo seguro.		☒	☐		
	Los Filos no estan rotos o saltados.		☒	☐		
APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)			SI	☒	NO	☐
PLANAS, LLANAS, ESPÁTULAS Y PALUSTRE			B	M	OBSERVACIONES	
	Los mangos no se encuentran desastillados, rotos o mal soldados.		☒	☐		
	Las hojas no estan curvadas, agrietadas o rotas.		☒	☐		
APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)			SI	☒	NO	☐
PLAN DE ACCIÓN						
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	FECHA COMPROBACIÓN	OBSERVACIONES		
OBSERVACIONES: Se adquirió una carretilla, una escalera de 4 pasos y un codal o boquilla						
 INSPECCIONA			 JEFE DE AREA			

	FORMATO INSPECCION DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS				CV-FR-IHE-05	
					Fecha	
					15/10/2024	
					Versión 1	
FECHA DE DIAGNOSTICAMIENTO	02 al 15 - Enero - 25	HORA	7:00	LUGAR	Cucuta A/S	
RESPONSABLE	Eddy Gisela Jerez	6	CARGO	Residente SST		
PROYECTO	Adecuaciones Batallon de ASPC # 30	CONTRATO	1055-2024			
ESTÁNDARES DE SEGURIDAD		ESTADO		OBSERVACIONES		
PULIDORA		B	M			
	Protección del disco: (Guardas o carcasa de seguridad disco), fijos, en buenas condiciones, (que no estén rotos, sin fisuras) y en la posición correcta.		✓	2 pulidoras de 4 1/2" - pequeña 1 pulidora de 9" - grande		
	Disco Correctamente Ajustado, sin fragmentaciones, sin fisuras y sin desgaste acentuado.	✓				
	Mangos o puntos de apoyo, Que estén en perfecto estado, (que no estén rotos y sin fisuras), aislados y fijos.	✓				
	Disco cumple con las revoluciones de la pulidora.	✓				
	Cuerpo de la pulidora Que este ensamblado, completo, debidamente aislado y sin fisuras.	✓				
	Interruptores o pulidores fijos, de fácil acceso, en buenas condiciones de (encendido y apagado) sin cables eléctricos expuestos.	✓				
	Extensiones con longitud suficiente de alcance de la toma al área de trabajo, debidamente aisladas, conectadas y sin empalmes.	✓				
	Usa los EPI gafas de seguridad, casco, careta, protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza).	✓				
	Sin vibraciones Movimientos o ruidos anormales y escobillas en buen estado (verifique que no emitan chispas).	✓				
	APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)		SI			
TALADRO		B	M	OBSERVACIONES		
	El mandril esta en buen estado.	✓		Dos taladros inalámbricos 1 mo por cable		
	El cable electrico de conexión esta en buenas consiciones.	✓				
	Cuenta con llave para abrir y cerrar el mandril (buen estado).	✓				
	El switch de encendido funciona correctamente.	✓				
	El enchufe se encuentra en buen estado con su cable a tierra.	✓				
	Cuenta con manilla de agarre.	✓				
APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)		SI	☒	NO	☐	
MARTILLO DEMOLEDOR		B	M	OBSERVACIONES		
	Cable de alimentación en buen estado.	✓				
	Enchufe en buen estado, sin cables calidos?	✓				
	La carcasa se encuentra limpia y en buen estado?	✓				
	El seguro del cincel se encuentra operativo y en buenas condiciones.	✓				
	Interruptor de partida se encuentra operativo?	✓				
	Los Mangos o puños de agarre, se encuentran firmes y en buen estado?	✓				
	Los cincelos, se encuentran en buen estado?	✓				
Verificar funcionamiento general (con el martillo energizado).		✓				
APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)		SI	☒	NO	☐	
EXTENSIONES ELÉCTRICAS		B	M	OBSERVACIONES		
	Son confeccionadas con cordones de tres conductores (monofásicos, 220 v).	✓				
	Su aislación está en buen estado (sin cortes, cables expuestos, etc).	✓				
	Los enchufes macho y hembra son aprobados para servicio pesado del tipo industrial.	✓				
	La conexión a enchufes macho y hembra tiene cables a la vista.	✓				
	Las cajas de enchufes múltiples están protegidas contra golpes.	✓				
	Las extensiones eléctricas son extendidas por vía aérea o de forma segura por el suelo.	✓				
La extensión es encauchetada.		✓				
La clavija no esta suelta y no esta sulfatada.		✓				
APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)		SI	☒	NO	☐	
RECOMENDACIONES						
EJECUTAR LAS INSPECCIONES CON LA FRECUENCIA INDICADA.						
OPERAR EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE EJECUTAR LA INSPECCIÓN PRE USO.						
OPERAR EL EQUIPO SOLAMENTE SI ESTÁ AUTORIZADO Y CAPACITADO						
EN LA INSPECCIÓN MARQUE:		SI SE OBSERVA ALGUNA EVENTUALIDAD, INFORME INMEDIATAMENTE AL SUPERVISOR, SST O JEFE PARA SU VERIFICACIÓN.				
B: BUENO						
M: MALO						
PLAN DE ACCIÓN						
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	FECHA COMPROBACIÓN	OBSERVACIONES		
 INSPECCIONA		 JEFE DE AREA				

Anexo 7: Exámenes de Ingreso Diciembre



MEDIPAZ IPS

NIT. 830.136.311-5

MEDIPAZ IPS



CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA OCUPACIONAL

(TRABAJO SEGURO EN ALTURAS Y/O ESPACIOS CONFINADOS)

FECHA: 02/12/2024

TIPO DE EXAMEN: INGRESO ☒ PERIODICO ☐ RETIRO ☐

INFORMACION GENERAL:

NOMBRE DEL TRABAJADOR: JOSE ALCIDES MARTIN GUERRERO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CC. ☒ T.I. ☐ C.E. ☐ NUMERO: 1.073.599.257

EPS: Nueva EPS

Empresa: CONSORCIO VENTURA

Sexo: ☒ M

Edad: 39 AÑOS



RESULTADO EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

EXAMEN REALIZADO	RESULTADO	OBSERVACIONES
GLICEMIA	NORMAL	
PERFIL LIPIDICO	NORMAL	
PSICOTEST DE ALTURAS	NORMAL	
ENFASIS OSTEOMUSCULAR	NORMAL	
AUDIOMETRIA (ESCALA LARSEN)	SIN PATOLOGIA OCUPACIONAL	
ESPIROMETRIA (KNUDSON)	SIN PATOLOGIA OCUPACIONAL	
OPTOMETRIA	SIN PATOLOGIA OCUPACIONAL	
PRUEBAS NEUROLOGICAS CLINICAS	SIN PATOLOGIA OCUPACIONAL	
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL ENFASIS EN ALTURAS	SIN PATOLOGIA OCUPACIONAL	
HEMOCLASIFICACION	O +	
ESTATURA	1.79 CM	
PESO	64 KG	

CONCLUSIONES

1. RECOMENDACIONES: Remisión EPS – IPS SI ☐ NO ☒ Tratamiento: SI ☐ NO ☒ ¿Cuál?
2. Otras Recomendaciones: REALIZAR PAUSA ACTIVA, HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE, HÁBITOS DE HIGIENE POSTURALES ADECUADOS, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN VISUAL, AUDITIVA Y PERSONAL DURANTE LA JORNADA LABORAL, SEGUIR PROCEDIMIENTOS Y NORMAS DE TRABAJO SEGURO. CAPACITACIONES SEGÚN CARGO, HACER PERIÓDICAMENTE LOS EXÁMENES DE VALORACIÓN OCUPACIONAL.

CONCEPTO DE APTITUD PARA EL OFICIO

EXAMEN DE INGRESO		
APTO PARA EL CARGO ☒	APTO PARA TRABAJAR ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS ☒	APTO CON RESTRICCIONES ☐
NO APTO ☐		
OBSERVACIONES:		
EXAMEN PERIODICO		
APTO PARA CONTINUAR DESEMPEÑANDO EL CARGO SI ☐ NO ☐	REQUIERE DE REUBICACIÓN LABORAL SI ☐ NO ☐	
APTO PARA TRABAJAR ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS ☐		
OBSERVACIONES:		
EXAMEN DE EGRESO		
¿Se encuentran alteraciones clínicas con respecto al examen de ingreso? SI ☐ NO ☐ CUÁL:		
¿Estas alteraciones afectan la futura capacidad laboral del trabajador? SI ☐ NO ☐		

RECOMENDACIONES: USO DE LOS EPP FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19 SELECCIONADOS EN FUNCION DEL PELIGRO PARA EL TRABAJADOR. NO PRESENTA MORBILIDADES PREEXISTENTES SEGUN CIRCULAR 030 DEL 2020.

Valoración médica ocupacional y paraclínicos según resolución N° 4272 de 2021 El examinado CERTIFICA que no omitió ningún dato sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta.

Responsable: Dra. Karen Briceño Ibañez Hernández
Médico esp. En salud ocupacional
RM: 1144147508
Universidad libre de Cali
Licencia salud ocupacional
1436-19
Cali

FIRMA DEL ESPECIALISTA

FIRMA

NOMBRE

DOC. N°

PACIENTE

Calle 27 No 14 – 48 sur Barrio Olaya Tel: 3209945151 Bogotá. D.C – Colombia Página web <https://medipazips.com/>

Declaración de CONFIDENCIALIDAD: el presente certificado se expide con fines exclusivos del programa de salud Ocupacional. En constancia con la RESOLUCION 2346 de julio de 2017, se respeta la confidencialidad de la historia clínica y no se emiten diagnósticos clínicos en este documento



TRINISALUD YOPAL IPS S.A.S

NIT. 900597531-6

Carrera 26 No 14 A - 38 Int 8 6356935 - 3203185756-3125069424

Barrio los Helechos - Email: trinisaludyopal@gmail.com



Nombre Paciente: Santos Eduardo Ramirez Figueroa

Identificacion

1026267003

Codigo Unico Paciente:

38840

Empresa:

CONSORCIO VENTURA

Fecha Nacimiento:

23/03/1989

Direccion:

yopal

Página 1 de 1

Ingreso Nro.	Sexo:	Edad:		Estado Civil:	Nivel Educativo:	Ciudad:	Fecha Consulta	
70381	Masculino	35	Años	Soltero	10 - 11 (Media Tecnica)	YOPAL	17/10/2024 09:35:50	
Objetivo:	Ingreso		E.P.S.:	CAPITAD SALUD	A.R.L.:	NO REFIERE	Cargo:	CONTRATISTA
Contrato:				Clasificacion del Riesgo:		CLASE III	Estrato:	[3] - Medio Bajo

CONCEPTO DE APTITUD LABORAL

Los Resultados de Paraclínicos y Valoración del Paciente fueron consignados en una Historia Clínica Ocupacional que reposa en los archivos de Salud Ocupacional de la IPS. Y se obtuvo el siguiente result

CONCEPTO INGRESO:

☒	APTO para el Cargo
☐	No APTO para el Cargo
☐	Aplazado

TRABAJOS ESPECIALES:

Alturas	* APTO *
Espacios Confinados	
Manipulacion de Alimentos	

CONCEPTO EGRESO:

☐	Satisfactoria
☐	No Satisfactoria
Valoracion por:	E.P.S. ☐ A.R.L. ☐

☐	PERIODICO, CAMBIO DE OCUPACION O POST-INCAPACIDAD	☐ Reubicar Trabajador	☐ Continua en el Cargo
--------------------------	---	--	---

PREVENCION EN RIESGO LABORALES - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

☐ Auditivo ☐ Visual ☐ CardioVascular ☐ Respiratorio ☐ Ergonomico ☐ Dermatologia ☐ Otros

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES EXAMENES Y/O PROCEDIMIENTOS

Se Realizaron los siguientes exámenes: VALORACION VISUAL- OPTOMETRIA, AUDIOMETRIA OCUPACIONAL, EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL -TRABAJO EN ALTURAS. CUADRO HEMATICO, PERFIL LIPIDICO, GLICEMIA.

DESCRIPCION RESULTADOS DEL CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

Apto: Clínicamente no Presenta Alteración de la Salud limitante o que pueda agravarse o complicarse con la exposición laboral .

RESTRICCIONES

Ninguna para el Cargo

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Uso EPP necesarios para ejecutar labor contratada, higiene postural y de columna, pausas activas, control periódico ocupacional, ejercicio 150 minutos por semana, protección UV, estilos de vida saludable.

Autorizo al (a la) doctor(a) abajo mencionado(a), a realizar en mi el examen medico y/o paraclínico(s) ocupacional(es), registrado(s) en este documento. El(la) doctor(a) abajo mencionado(a) me ha explicado la naturaleza y proposito del examen medico y/o paraclínico(s) ocupacional(es). He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el proposito, los beneficios, la interpretacion, las limitaciones y riesgos del examen medico y/o paraclínico(s) ocupacional(es), a partir de la asesoria brindada antes de la respectiva toma de las pruebas. Entiendo que la realizacion de esta(s) prueba(s) es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que se realizara el(los) examen(es). Fui informado de las medidas que tomara TRINISALUD IPS SAS. Para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mi en este(os) examen(es) estan completas y son veridicas. Autorizo a TRINISALUD YOPAL IPS SAS para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislacion vigente, la informacion registrada en este documento, para el buen cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional y para las situaciones contempladas en la misma legislacion. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Tue Nov 2024 11/05/24 09:35:39

GONZALO AGUIRRE / RM: MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL RM: 85527/05 LSO:06501/2020

5/11/2024 10:26:50

Generado por SGMI - TERRASOFT, NIT. 74814574-9. www.terrasoft.co

Thu Oct 2024 10/17/24 09:34:24

Firma y Huella del Paciente o Responsable



Indice Derecho

Anexo 8: Asistencia Capacitaciones



FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN

CV-FR-AS-01

Fecha

15/10/2024

Version

1

Proyecto

Adecuaciones - Batallón ASPC #30

Tema

Ergonomía e Higiene Postural

Lugar

Ciudad N/S

Aplicado a

Todos los trabajadores

Fecha

18-01-2025

Expositor

Eddy Gisela Pérez G.

Nº	Nombre completo	Documento	Cargo	Telefono	Contratista	Firma
1	Edgar Barreto	112287023	Aux ob		CV	Edgar Barreto
2	Nestor Avila	107720502	OF. obra		CV	Nestor Avila
3	Luis Felipe Madrazo	1093112064	OF. Ob.		CV	Luis Felipe Madrazo
4	Luis Hernandez	1094427923	Aux ob		CV	Luis Hernandez
5	Rene Hernandez	08328524	OF. obra		CV	Rene Hernandez
6	Renaldo morantes	13189229	OF obra		CV	Renaldo morantes
7	Deivin Morantes	1727656662	Aux obra		CV	Deivin Morantes
8	Jose Aldean Martin	1073599251	Oficial	3145738815	C. Ventura	Jose Aldean Martin
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
OBSERVACIONES						



FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN

CV-FR-AS-01

Proyecto: Adecuaciones - Batallón AS PG #30
Lugar: Cicuta N/S
Fecha: Enero - 2025
Tema: Inducción SUT - en sitio
Aplicado a: Ingresos Nuevos ENERO
Expositor: Eddy Gisela Heras

Fecha: 15/10/2024
Version: 1

Nº	Nombre completo	Documento	Cargo	Telefono	Contratista	Firma
1	Reinaldo Morantes Babiza	13199229	Oficial Ob	13-01-2025	CV	Reinaldo Morantes
2						Reinaldo M
3	Luis Alfredo Hernandez	1094427923	Aux. de obra	08-01-2025	CV	Luis Hernandez
4	Deivin Adrian Morantes	112765666	Aux de obra	18-01-25	CV	Deivin Morantes
5	Jose Alvaro Chacón	107359251	Oficial		CV	Jose Alvaro
6	Pablo Alvarado	10934544	Oficial		CV	Pablo Alvarado
7	Ramiro Carrillo	1004804856	Aux de obra	20-01-25	CV	Ramiro Carrillo
8	Luis Felipe	109314264	Oficial		CV	Luis Felipe
9	Rosay Avila	107739257	Oficial		CV	Rosay Avila
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
OBSERVACIONES		Se realiza inducción del personal nuevo en compañía del oficial a quien va a apoyar en las actividades				



FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN

CV-FR-AS-01

Proyecto	Adecuaciones - Batallón ASPC + 30	Tema	Pausas Activas	Fecha	15/10/2024
Lugar	Cócuta N/S	Aplicado a	Todo el personal	Version	
Fecha	27 - ENERO - 2025	Expositor	Eddy Gisela Perez Giraldo	Version	1

Nº	Nombre completo	Documento	Cargo	Telefono	Contratista	Firma
1	Santos EDUARDO	102626003	Oficial		CV	
2	Luis Hernandez	1094427923	Aux obra		CV	Luis Hernandez
3	Edgar Barreto	1122387023	Aux obra		CV	Edgar Barreto
4	Rafael Morantes	13194229	Oficial		CV	Rafael Morantes
5	Socorro Alides Martin	1073599251	Oficial		CV	
6	Deivid Ariza Morantes	7727656662	Ayudante		CV	Deivid Morantes
7	Ramiro Suarez	88311701	Oficial		CV	Ramiro Suarez
8	Ramiro Carrillo	1004804856	Aux obra		CV	Ramiro Carrillo
9	Nestor Ayala	1077325582	Oficial		CV	Nestor Ayala
10	Luis Felipe Mora	106731476811	Oficial		CV	
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

OBSERVACIONES	
---------------	--



CONSORCIO
VENTURA

FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN

CV-FR-AS-01

Fecha

15/10/2024

Version

1

Proyecto Adecuaciones - Batallón ASPC #30

Tema

Cuidado de las manos

Lugar

Cocota N/S

Aplicado a

Todo el personal

Fecha

31- ENERO - 2025

Expositor





Edy Gisela Perez Giraldo

Nº	Nombre completo	Documento	Cargo	Telefono	Contratista	Firma
1	Santos EDUARDO	102626003	Oficial		CV	
2	Luis Hernandez	1094427923	Aux obra		CV	Luis Hernandez
3	Edgar Barreto	1122387023	Aux obra		CV	Edgar Barreto
4	RICARDO MORALES	13194229	Oficial		CV	RICARDO MORALES
5	José Alides CLARIN	1073599251	Oficial		CV	
6	DEIVID ADRIAN MORALES	7723656667	Ayudante		CV	DEIVID MORALES
7	Ramiro GARCIA	88347741	Oficial		CV	Ramiro Garcia
8	Ramiro carrillo	1004804856	Aux obra		CV	Ramiro carrillo
9	Nestor Avila	1077325582	Oficial		CV	Nestor Avila
10	Luis Felipe MEA	10071447011	Oficial		CV	
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

OBSERVACIONES

Se entraga EPP para el cuidado de las manos, sensibilizando con el video "Manos a la obra", que busca la prevención de situaciones de riesgo en las mano

Anexo 9: Entrega de EPP

 CONSORCIO VENTURA	CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL		CV-FR-EPI-02	
			Version	
			1	
			Fecha	
				15/10/2024
Apellidos y Nombres del Trabajador:		Santos Eduardo Ramirez F.		Identificación
Lugar del proyecto:		Cucuta H/S - Batellon		Cargo:
Fecha de Ingreso:		27 - Enero - 2023		Oficial de Obra
N°	EPI ENTREGADO		Fecha de Entrega	Firma de Recibido
	Descripción	Cantidad		
1	lentes	1	27-01-23	
2	Guaantes	1	27-01-23	
3	Casco	1	27-01-23	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
COMPROMISO				
Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los Elementos de Protección Individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.				
Usando correctamente los equipos, herramientas y Elementos de Protección Individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo como elemento de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos.				
El presente compromiso aplica para los Elementos de Protección Individual entregados.				
RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS			RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO	
Nombre	Eddy Gisela Perez Grimaldo		 Firma y cedula	
Identificación	32-441-623			
Cargo	Residente SIT			
Firma				



CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

CV-FR-EPI-02

Version

1

Fecha

15/10/2024

Apellidos y Nombres del Trabajador:

Dairon Stiven Ramirez Camillo

Identificación

1004804836

Lugar del proyecto:

Cucuta N/S - Batallan

Cargo:

Aux. de Obra

Fecha de Ingreso:

20-Enero-2025

N°	EPI ENTREGADO		Fecha de Entrega	Firma de Recibido
	Descripción	Cantidad		
1	Casco	1	20-01-25	Dairon Ramirez
2	lentes	1	20-01-25	Dairon Ramirez
3	Guentas	1	20-01-25	Dairon Ramirez
4	Tapabocas	1	20-01-25	Dairon Ramirez
5		1	20-01-25	Dairon Ramirez
6		1	20-01-25	Dairon Ramirez
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los Elementos de Protección Individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando correctamente los equipos, herramientas y Elementos de Protección Individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo como elemento de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos.

El presente compromiso aplica para los Elementos de Protección Individual entregados.

RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS		RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO
Nombre	Edry Gisela Benitez Giraldo	Dairon Ramirez
Identificación	37.441.623	
Cargo	Residente SST	
Firma	S. Gisela Benitez	



CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

CV-FR-EPI-02

Version

1

Fecha

15/10/2024

Apellidos y Nombres del Trabajador: Devin Adrian Morantes M. Identificación 1127656667
Lugar del proyecto: Ciudad N/3 - Batullon Cargo: Aux de obra
Fecha de Ingreso: 15-Enero-2025

N°	EPI ENTREGADO		Fecha de Entrega	Firma de Recibido
	Descripción	Cantidad		
1	Casco	1	15-01-25	Devin Morantes
2	Lentes	1	15-01-25	Devin Morantes
3	Gaunas	1	15-01-25	Devin Morantes
4	Dotación	1	15-01-25	Devin Morantes
5	Gauche de vaqueta	1	20-01-25	Devin Morantes
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los Elementos de Protección Individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando correctamente los equipos, herramientas y Elementos de Protección Individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo como elemento de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos.

El presente compromiso aplica para los Elementos de Protección Individual entregados.

RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS		RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO
Nombre	<u>Eduy Gisela Perez Baralbo</u>	<u>Devin Morantes</u> <u>*7727656667</u> Firma y cedula
Identificación	<u>27.441.623</u>	
Cargo	<u>Residente SST</u>	
Firma	<u>E. GISELA PEREZ B</u>	



CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

CV-FR-EPI-02

Version

1

Fecha

15/10/2024

Apellidos y Nombres del Trabajador: Reinaldo Morantes Balaguera Identificación: 13.199.229
Lugar del proyecto: Cucuta N/S - Batallon Cargo: Oficial de Obra
Fecha de Ingreso: 15-enero-2025

N°	EPI ENTREGADO		Fecha de Entrega	Firma de Recibido
	Descripción	Cantidad		
1	Casco	1	15-01-25	REYNALDO MORANTES
2	Lentes	1	15-01-25	REYNALDO MORANTES
3	Gauchos	1	15-01-25	REYNALDO MORANTES
4	Botucón	1	15-01-25	REYNALDO MORANTES
5	Gauchos de Vaqueta	1	20-01-25	REYNALDO MORANTES
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los Elementos de Protección Individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando correctamente los equipos, herramientas y Elementos de Protección Individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo como elemento de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos.

El presente compromiso aplica para los Elementos de Protección Individual entregados.

RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

Nombre: Eddy Gisela Perez Giraldo
Identificación: 37.441.623
Cargo: Residente SST
Firma: E. Gisela Perez G

RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO

REYNALDO MORANTES
Firma y cedula

 CONSORCIO VENTURA	CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL		CV-FR-EPI-02	
			Version	
			1	
			Fecha	
				15/10/2024

Apellidos y Nombres del Trabajador:	José Alcides Martínez G		Identificación	1073599257
Lugar del proyecto:	Cucuta N/S - Pastallón	Cargo:	Oficial de Obra	
Fecha de Ingreso:	09-Enero-2025			



N°	EPI ENTREGADO		Fecha de Entrega	Firma de Recibido
	Descripción	Cantidad		
1	Casco	1	09-01-25	
2	Guentas	1	09-01-25	
3	Guentas	1	09-01-25	
4	Dotación	1	09-01-25	
5	Tapabocas	1	20-01-25	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				


COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los Elementos de Protección Individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando correctamente los equipos, herramientas y Elementos de Protección Individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo como elemento de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos.

El presente compromiso aplica para los Elementos de Protección Individual entregados.

RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS		RECIBE EL ELEMENTO Y LEER COMPROMISO	
Nombre	Eddy Gisela Pérez Brimaldo	 Firma y cedula 1073599257	
Identificación	37.441.63		
Cargo	Presidente SST		
Firma			

 CONSORCIO VENTURA	CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL		CV-FR-EPI-02	
			Version	
			1	
			Fecha	
				15/10/2024
Apellidos y Nombres del Trabajador:		Luis Alfredo Hernandez M.		Identificación
Lugar del proyecto:		Cucuta NIS - Batallon		Cargo:
Fecha de Ingreso:		07 - Enero - 2025		Aux de Obra
N°	EPI ENTREGADO		Fecha de Entrega	Firma de Recibido
	Descripción	Cantidad		
1	Casco	1	07-01-25	Luis Hernandez
2	Lentes	1	07-01-25	Luis Hernandez
3	Gautes	1	07-01-25	Luis Hernandez
4	Dotacion	1	07-01-25	Luis Hernandez
5	Gautes vaqueta	1	20-01-25	Luis Hernandez
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
COMPROMISO				
Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los Elementos de Protección Individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.				
Usando correctamente los equipos, herramientas y Elementos de Protección Individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo como elemento de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos.				
El presente compromiso aplica para los Elementos de Protección Individual entregados.				
RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS			RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO	
Nombre	Eddy Gisela Perez Grimaldos		 Firma y cedula	
Identificación	37.441.623			
Cargo	Residente SST			
Firma	
