

	<p align="center">INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</p> <p align="center">PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</p> <p align="center">MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</p> <p align="center">LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA</p>	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No.	MT-LP-002 DE 2023	Contratista:	CONSFUCOL SAS.
Contrato de Interventoría No.	1667 -2022	Interventoría:	CONSTRUCOLING SAS.

Objeto Contrato de Obra:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL -NACIONAL

INFORME MENSUAL No.	3	MES O PERIODO:	1 JULIO -31 JULIO DE 2023
----------------------------	----------	-----------------------	----------------------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	INTRODUCCIÓN		8
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		9
2.1	Localización		10
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		10
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		11
2.4	Características técnicas del proyecto		12
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		14
3.1	Información general del contrato		14
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		15
3.3	Seguimiento Items no previstos		15
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		15
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		16
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	31
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	43
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	44
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	45
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	46
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N/A
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	40
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	N/A
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N/A
	• Seguimiento Programa de Obra	MEPI-MN-IN-2-FR-2	N/A
	• Seguimiento Programa de Inversiones		
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N/A
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-6-FR-2	N/A
		MEPI-MN-IN-14-FR-1	49
		MEPI-MN-IN-14-FR-2	N/A
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		19
5.1	Información general del contrato		19
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		20
5.3	Informes especialistas y profesionales		24
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		24
5.5	Informe matriz de riesgos.		24
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		24
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		24
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		24
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	52
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	53
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	56
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	57
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N/A
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
		MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	Conclusiones y recomendaciones		26
8	Anexos		26
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		26
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		26
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		26
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		26

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firmado digitalmente por
ELIAS JAIMES FERNANDEZ


Firma: _____

Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. 3684 de 24/11/2021

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

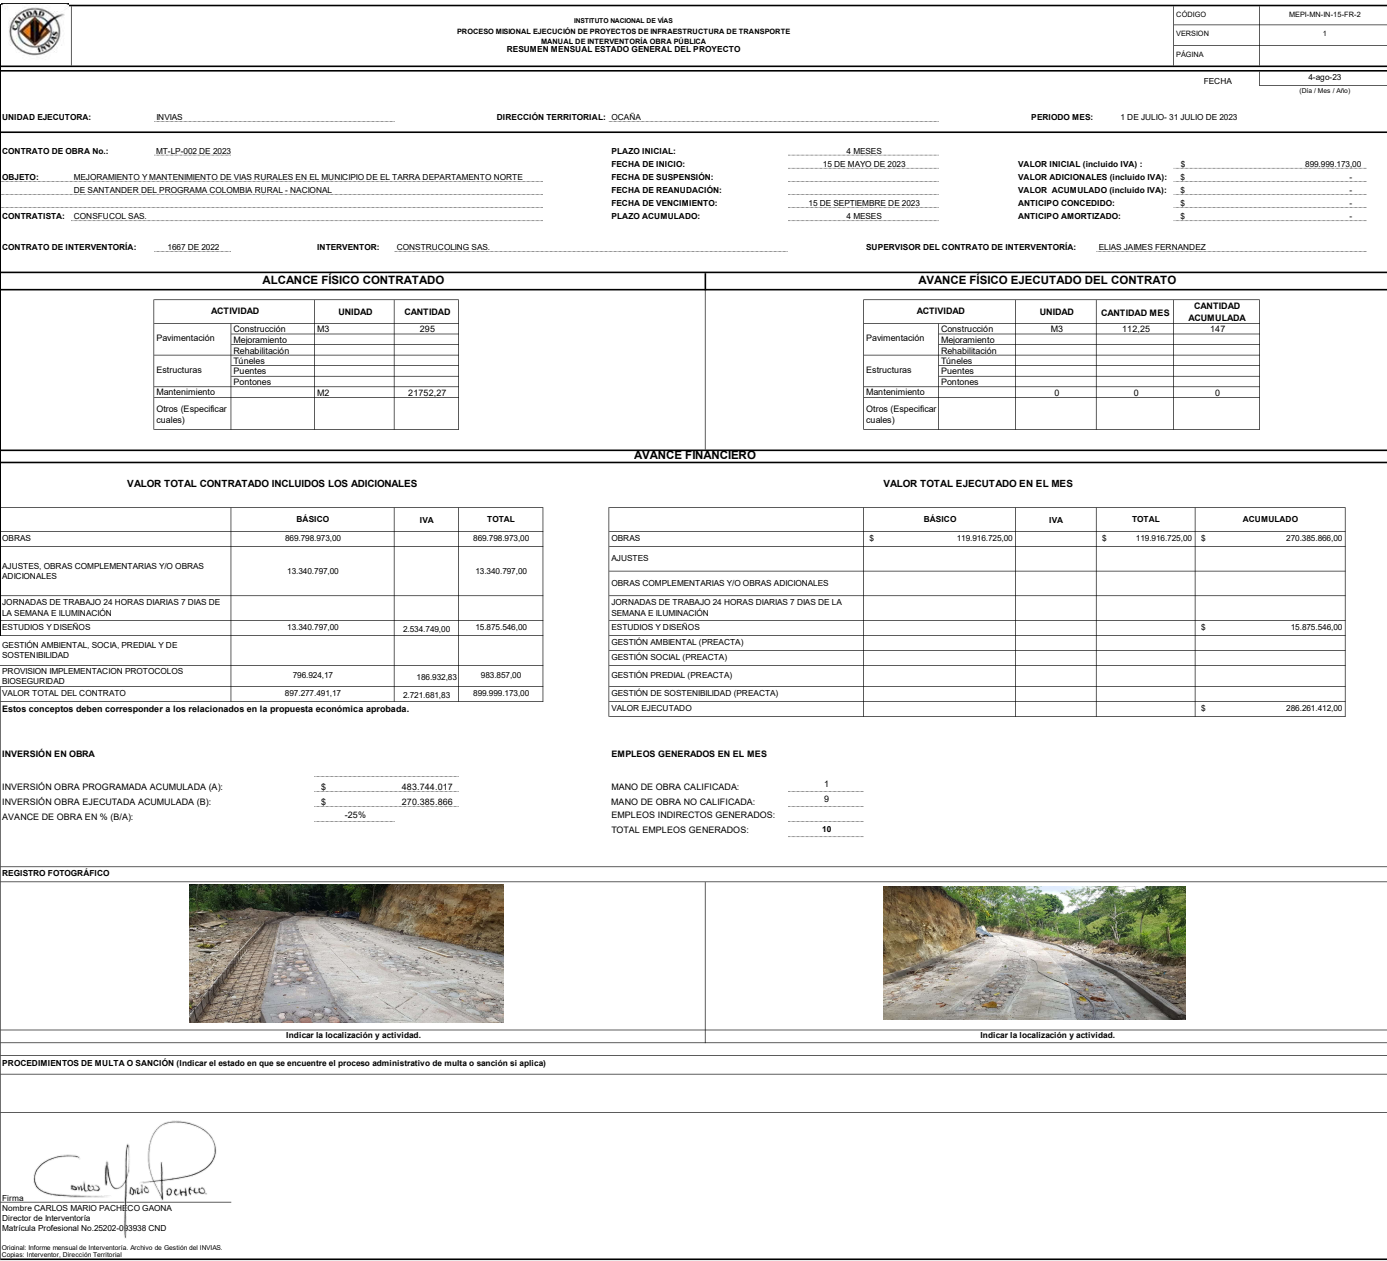

 CONSTRUCOLING S.A.S <small>NIT. 901.506.138-9</small>	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 1 PERIODO: JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023	Página 1 de 29

**MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

CONSTRUCOLING SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1667 DE 2022

OBJETO

**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE
EL TARRA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA
COLOMBIA RURAL**

CONTRATO DE OBRA No 002 DE 2023



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 1
Original

PERIODO
1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

NORTE DE SANTANDER
JULIO DE 2023

 CONSTRUCOLING S.A.S <small>NIT. 901.506.138-9</small>	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 1 PERIODO: JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023	Página 2 de 29

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 01
1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

**INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,
 GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA
 DUITAMA PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y
 NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA
 "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1**

ELABORÓ:	Director de Interventoría CARLOS MARIO PACHECO GAONA M. P. N°: 25202-093938 CND
REVISÓ Y APROBÓ:	Director de Interventoría CARLOS MARIO PACHECO GAONA M. P. N°: 25202-093938 CND
VERSION:	0.0

Todos los derechos reservados. Este documento es de propiedad única del TERRITORIAL NORTE SANTANDER - SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL - INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. Ninguna parte de este Documento de autoría de CONSTRUCOLING SAS puede reproducirse, o transmitirse, de ninguna forma incluyendo fotocopias, grabaciones magnéticas o cualquier medio de almacenamiento de información y sistema de recuperación sin la previa autorización escrita del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, entidad contratante.

	<p>MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL</p>	<p>REV.: 0</p>
	<p>INFORME MENSUAL No. 1 PERIODO: JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023</p>	<p>Página 3 de 29</p>

TABLA DE CONTENIDO

PÁG.

1. INTRODUCCIÓN.....	6
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO.....	7
2.1 LOCALIZACIÓN.....	8
2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA.....	9
2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO.....	10
3. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA.....	12
3.1 INFORMACIÓN GENERAL	12
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES	13
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS.....	13
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	13
4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA.....	14
4.1 INFORMES SEMANALES	14
4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA.....	14
4.3 PERSONAL CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA.....	14
4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	14
4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	14
4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	14
4.7 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	14
4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA;Error! Marcador no definido.....	
4.9 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	14
4.10 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA.....	15
4.11 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES	17
4.12 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA.....	17
4.13 ACTA DE REUNIÓN	17
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	18
5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.....	18
5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR	19
TÉCNICAS	19
SOCIAL.....	19
COMPONENTE AMBIENTAL	19
GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	19
5.3 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC	22
6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	23
6.1 EQUIPO Y VEHICULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	23

 <p>CONSTRUCCOLING S.A.S. NIT. 901.506.138-9</p>	<p>MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL</p>	<p>REV.: 0</p>
	<p>INFORME MENSUAL No. 1 PERIODO: JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023</p>	<p>Página 4 de 29</p>

6.2	PERSONAL CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA.....	23
6.3	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	23
6.4	SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	23
6.5	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	23
6.6	SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	24
6.7	PLAN DE CARGAS O REPOGRAMACION AL PLAN DE CARGAS APROBADO	24
6.8	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS	24
7	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	25
8	ANEXOS	26

 CONSTRUCOLING S.A.S <small>NIT. 901.506.138-9</small>	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 1 PERIODO: JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023	Página 5 de 29

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Sectores críticos 1.	9
Tabla 2. Sectores críticos 2.	10
Tabla 3. Información Contrato de Obra.	12
Tabla 4. Póliza Única y de Responsabilidad Civil del Contrato.	13
Tabla 5. Programa de Inversiones contrato de Obra 002 de 2023.	15
Tabla 6. Actas de reunión.	17
Tabla 7. Información Contrato de Interventoría.	18
Tabla 9. Personal contratista diciembre.	20
Tabla 11 Programa Anual de Caja- PAC.	22

LISTA DE IMÁGENES

Imagen 1. Localización del proyecto.	8
Imagen 2. Localización del proyecto.	8
Imagen 3. Estado inicial tramo 1.	9
Imagen 4. Estado inicial tramo 1.	10
Imagen 9. Programa de Inversiones contrato de obra 002 de 2023.	16

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 1 PERIODO: JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023	Página 6 de 29

1. INTRODUCCIÓN

El programa del gobierno nacional "COLOMBIA RURAL", tiene por objetivo mantener y mejorar la transitabilidad y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de ejecución y financiación.

Con el fin de hacer seguimiento y control en la ejecución de los trabajos objeto del contrato de obra, el INVIAS celebró el contrato 1667 de 2022 (INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL) con la firma CONSTRUCOLING SAS.

Para el acompañamiento por parte de la Entidad al contrato de Interventoría y obra, fueron designados como Odenador del Gasto y Supervisor Tecnico del Contrato al Ingeniero **ELIAS JAIMES FERNANDEZ**.

El presente documento corresponde al **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°1** del periodo comprendido entre el 015 de mayo hasta el 31 de mayo de 2023, elaborado por CONSTRUCOLING SAS, en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Interventoría del Instituto Nacional de Vías.

En este informe se hace una descripción general de las actividades ejecutadas por el Contratista y las labores de control desarrolladas por la Interventoría durante el período en cuestión.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 1 PERIODO: JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023	Página 7 de 29

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa “COLOMBIA RURAL” que tiene como objetivo mantener y mejorar la transitabilidad y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de ejecución y financiación.

El Ente Territorial (Municipio El Tarra), se encuentra adelantando el proceso contractual bajo la modalidad de Licitación Pública, tendiente a contratar las obras que se deriven del Convenio Interadministrativo suscrito con el INVIAS, con el fin de llevar a cabo la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MARCO DE LA DECLARACIÓN DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 razón por la cual se requiere realizar las labores de Interventoría para efectuar el control y seguimiento al contrato de obra que suscriba el citado municipio.

 CONSTRUCOLING S.A.S <small>NIT. 901.506.138-9</small>	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 1 PERIODO: JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023	Página 8 de 29

2.1 LOCALIZACIÓN



Imagen 1. Localización del proyecto.

2.2 DESCRIPCION DE LOS MUNICIPIOS QUE HACEN PARTE DEL CORREDOR.

Las obras por construir se encuentran ubicadas en municipio de El Tarra del Departamento de NORTE DE SANTANDER

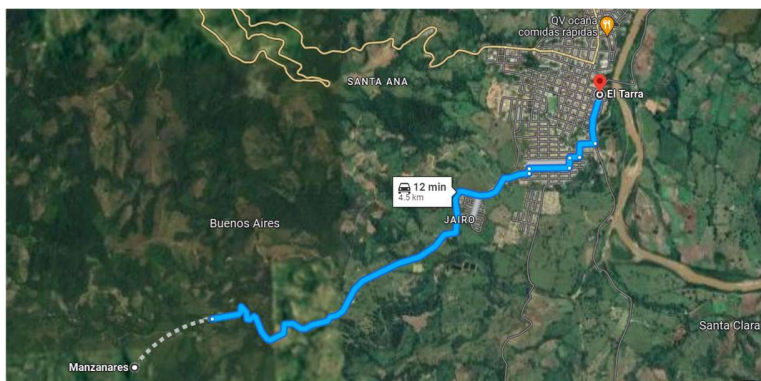


Imagen 2. Localización del proyecto

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 1 PERIODO: JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023	Página 9 de 29

El área del proyecto se encuentra ubicada en el departamento de Norte de Santander, municipio de El Tarra, el corredor vial inicia en la cabecera municipal K0+000 (N 8°34'8,40" / W 73°5'56,6") y llega hasta el K8+200 (N 8°33'15,07" / W 73°9'1,69"). Las obras por ejecución son derivadas del objeto del convenio 1458 de 2022 y se encuentran a lo largo de los 8,2 km de vía terciaria, corredor denominado El Tarra-Manzanares.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

Se intervendrán dos tramos en los cuales no cuentan con una estructura de vía, evidenciando alto deterioro en la capa de rodadura debido a la alta escorrentías y la carencia de estructuras hidráulicas para el manejo de estas.

Tabla 1. Sectores críticos 1.

LOCALIZACION DEL TRAMO						
TRAMO	DESCRIPCION	LONGITUD (ML)	LOCALIZACIÓN DE TRAMO			
			ELEMENTO	ABCISA	COORDENADA	
1	MANZANARES	280	INICIO DEL TRAMO	K2+570	N:	1438437.6
					E:	1106337.6
			FIN DEL TRAMO	K2+850	N:	1438346.4
					E:	1106091.0



Imagen 3. Estado inicial tramo 1.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 1 PERIODO: JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023	Página 10 de 29

Tabla 2. Sectores críticos 2

LOCALIZACION DEL TRAMO					
TRAMO	DESCRIPCION	LONGITUD (ML)	LOCALIZACIÓN DE TRAMO		
			ELEMENTO	ABCISA	COORDENADA
1	MANZANARES	147	INICIO DEL TRAMO	K6+710	N: 1438022.08
					E: 1103172.29
			FIN DEL TRAMO	K6+857	N: 1438013.58
					E: 1103044.46



Imagen 4. Estado inicial tramo 1.

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades sobre las obras a ejecutar las cuales esta interventoría deberá supervisar en el proyecto y que deben ser supervisadas, controladas, verificadas, aprobadas, medidas y constatadas por la interventoría, como resultado del presente proceso, comprenden entre otras, las siguientes:

-  Construcción Placa Huella
-  Construcción y/o reparación de obras de drenaje

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 1 PERIODO: JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023	Página 11 de 29

Para la ejecución de las obras se deberá realizar el control de la construcción, dando estricto cumplimiento a lo establecido en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, última actualización (2022) y a las especificaciones particulares para su ejecución y a las Normas de Ensayo de Materiales del Instituto Nacional de Vías, adoptado por Resolución No. 1524 del 06 de mayo de 2022, de igual manera, se tendrán en cuenta las cartillas del programa Colombia Rural para la construcción de placa huella, obras de drenaje y estructuras viales.

- ✚ Conformación de la calzada existente
- ✚ Mejoramiento de la subrasante con adición de material

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 1 PERIODO: JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023	Página 12 de 29

3. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 3. Información Contrato de Obra.

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA	
Número de proceso de selección	MT-LP-002-2023
Número del contrato	002-2023
Fecha de suscripción	11 DE ABRIL DEL 2023
Objeto	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL
Contratista	CONSFUCOL SAS
NIT	900178027-8
Valor Total Inicial	\$ 899.999.173,00
Adiciones	
Valor acumulado del contrato	\$ 899.999.173,00
Modificaciones	
Aclaraciones	
Suspensiones	
Cesiones de participación contractual	
Plazo	CUATRO (4) MESES
Fecha de Inicio	15 DE MAYO DE 2023
Fecha de Terminación Actual del contrato	15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Dirección	Carrera 4 No 9-55- Brr. San Isidro
Número de Teléfono	(097)8835539

 CONSTRUCOLING S.A.S <small>NIT. 901.506.138-9</small>	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 1 PERIODO: JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023	Página 13 de 29

Tabla 4. *Póliza Única y de Responsabilidad Civil del Contrato.*

AMPAROS	DESDE (DD-MM-AA)	HASTA (DD-MM-AA)	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	15/05/2023	14/09/2028	\$ 544,762,167.6
Responsabilidad civil	15/05/2023	14/09/2023	\$ 232,000,000.00

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades realizadas por parte del Contratista e Interventoría durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio del 2022, fueron las siguientes:

- Levantamiento de carteras topográficas
- Seguimiento de calidad a los materiales
- Verificación de avances de obra para adelantar solicitudes de prorroga
- Revisión y seguimiento a acta de obra

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

Durante el periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de julio del 2022, no se presentaron actas de ítems no previstos:

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Debido a las altas precipitaciones en la zona se han presentado atrasos en el avance de obra, donde se logra terminar en su totalidad el tramo No.2. LA interventoria realizo un balance de obra para evaluar el tiempo restante para dar terminación al proyecto, con lo anteriormente expuesto se adelantan solicitudes de prorroga por 1.5 meses.

A su vez la interventoria adelanta seguimiento a procesos constructivos y seguimiento a la calidad.

 CONSTRUCOLIG S.A.S <small>NIT. 901.506.138-9</small>	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 1 PERIODO: JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023	Página 14 de 29

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 INFORMES SEMANALES

Se presentan en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA.

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Se presenta en el formato diligenciado ANEXO formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA.

4.3 PERSONAL CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-6 CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA.

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR10 ESTADO DEL TIEMPO.

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO.

4.7 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.

4.8 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

 CONSTRUCOLING S.A.S <small>NIT. 901.506.138-9</small>	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 1 PERIODO: JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023	Página 15 de 29

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN-IN-2-FR-2 SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO.


4.9 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

Teniendo como base el Programa y flujo de inversión presentado por la firma Contratista CONFUCOL SAS:

Tabla 5. *Programa de Inversiones contrato de Obra 002 de 2023*

PERIODO MENSUAL		PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO
MES 1	may-23	\$0	\$0	\$0	\$0
MES 2	jun-23	\$150'000.000	\$150'000.000	\$ 150'469.141	\$ 150.469.141
MES 3	jul-23	\$ 333'744.018	\$483'744.018	\$ 119.916.725	\$ 270.385.866
MES 4	Ago-23	\$ 306'955.809	\$790'739.827		
MES 5	Sep-23	\$ 79'059.146	\$ 869'798.973		
TOTAL			\$869'798.973		\$ 270.385.866

Imagen 5. Programa de Inversiones contrato de obra 002 de 2023.

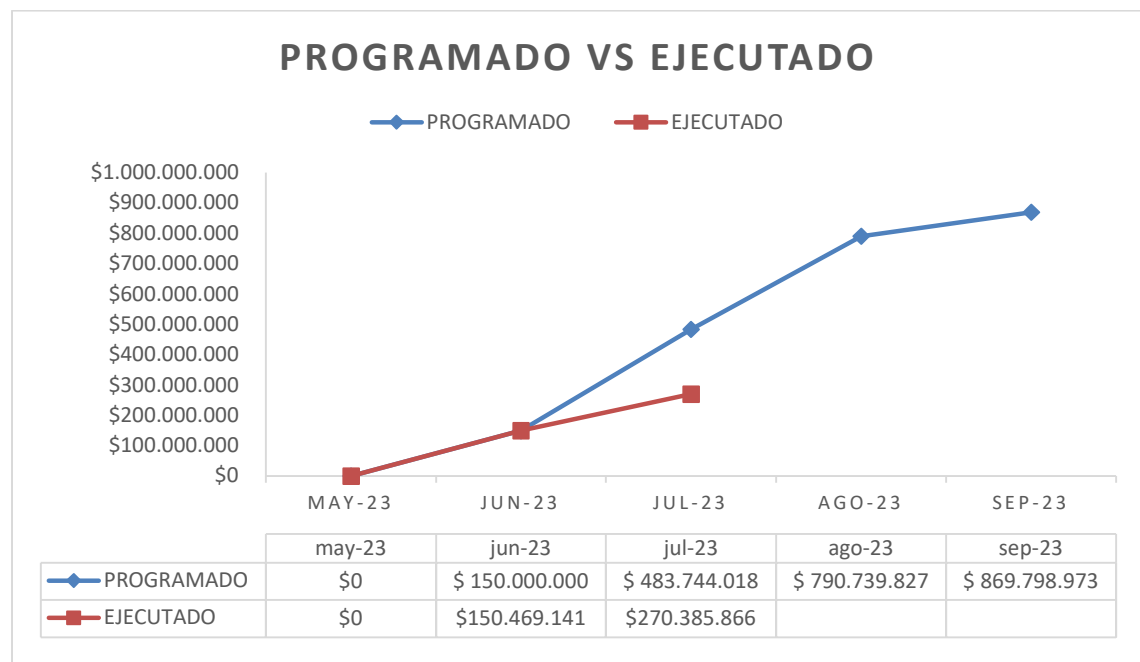

 CONSTRUCOLING S.A.S NIT. 901.506.138-9	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 15 PERIODO: JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023	Página 17 de 29

4.10 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN-IN-6-FR-2 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES.

4.11 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Durante el transcurso del mes de JULIO de 2023 se realizaron un (1) comités técnicos de obra los días:

- Viernes 2 de junio de 2023, Vereda manzanares.
- Viernes 30 de junio de 2023, Meet
- Martes 25 de julio de 2023, Meet

Se presenta como ANEXO formato diligenciado MEPI-MN-IN-14-FR-1 ACTA DE COMITÉ DE OBRA.

4.12 ACTA DE REUNIÓN

Durante el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo de 2022, se realizaron una (1) acta de reunión.

Tabla 6. *Actas de reunión.*

ID	FECHA	LUGAR	COMPONENTE	OBJETIVO DE LA REUNIÓN
1	16/05/2023	CALLE 11 # 15 -10 OFICINA 402 EDIFICIO INACOS – Ocaña, Norte de Santander	Técnico	ACTA DE REUNION TECNICA INICIAL

 CONSTRUCOLING S.A.S <small>NIT. 901.506.138-9</small>	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 15 PERIODO: JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023	Página 18 de 29

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tabla 7. Información Contrato de Interventoría.

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Número de proceso de selección	IP-DT-OCA-010-2022
Número del contrato	1667 DE 2022
Fecha de suscripción	26/12/2022
Objeto	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.
Contratista	CONSTRUCOLING SAS
NIT	901506138-9
Valor Total Inicial	\$76.160.000,00
Adiciones	\$ -
Valor acumulado del contrato	\$ -
Modificaciones	N/A
Aclaraciones	N/A
Suspensiones	27/12/2022 AL 16/05/2023
Cesiones de participación contractual	N/A
Plazo	4 MESES
Fecha de Inicio	26 DE DICIEMBRE DEL 2022
Fecha de Terminación Actual del contrato	15 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Dirección	CALLE 11 # 15-10 OF 402
Número de Teléfono	3154071325

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 15 PERIODO: JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023	Página 19 de 29

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Las actividades generales desarrolladas por la Interventoría durante el presente período fueron las siguientes:

TÉCNICAS

-  Se hace acompañamiento en la priorización de actividades y estudios y diseños adelantados por el contratista.
-  Se hace seguimiento a documentación habilitante para el inicio de actividades
-  Revisión y aprobación de estudios y diseños
-  Seguimiento de procesos constructivos
-  Verificación de niveles de subbase según diseño geométrico.
-  Control de concretos para placa huella

SOCIAL

En el periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio, la interventoría realizó seguimiento a y divulgación de las obras a realizar en zonas aledañas.

COMPONENTE AMBIENTAL

Para el presente informe se relacionan las actividades correspondientes al seguimiento, control y verificación por parte de la interventoría COSNTRUCOLING SAS a la gestión ambiental desarrollada por el contratista CONSFUCOL SAS, donde se estudia la validación del PAGA radicado por el contratista.

GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El contratista indica que este proyecto tiene como objetivo brindar a los trabajadores de obra un área segura de trabajo e informar a los usuarios de la vía sobre la obra que se está ejecutando.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 15 PERIODO: JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023	Página 20 de 29

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se realizaron actividades para la planificación de los diferentes temas de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de ellos tenemos:

- Análisis de trabajo seguro
- Permisos de trabajo
- Charlas de seguridad
- Capacitaciones
- Inspecciones

La interventoría sugiere que para este componente sea evidenciadas cada una de las actividades que se realizaron durante el periodo (Análisis de trabajo seguro, permisos de trabajo, charlas de seguridad, capacitaciones, inspecciones). De igual forma se reitera la importancia de implementar estas medidas antes de iniciar los frentes de obra.

EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO

Se manifiesta por parte del contratista que todo el personal que ingresa con la Organización se debe realizar el examen médico ocupacional. Para el periodo comprendido desde el 15 al 31 de mayo de 2023.

La interventoría da revisión a la documentación presentada por parte del contratista, dentro de los cuales se encuentran los exámenes médicos de ingreso, afiliaciones de ARL, EPS, fondo de pensiones y caja de compensación.

Por parte de la interventoría durante el periodo comprendido del 1 al 30 de mayo del 2022, no se realizó ingreso de personal.

CONTRATACIÓN DE PERSONAL

El contratista describe el número de trabajadores contratados para el periodo comprendido desde el 1 al 31 de mayo del 2022, mediante la siguiente tabla.

Tabla 8. *Personal contratista diciembre*

PERSONAL CONTRATADO	NUMERO DE TRABAJADORES MES DE MAYO
ADMINISTRATIVOS	1
OPERATIVOS	9
TERCEROS	
TOTAL	10

Fuente: CONFUCOL

 CONSTRUCOLING S.A.S <small>NIT. 901.506.138-9</small>	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 15 PERIODO: JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023	Página 21 de 29

La interventoría da revisión al número de trabajadores ingresados en el periodo comprendido del 1 al 31 de Julio, mediante los documentos del personal presentados por el contratista y se da claridad que por parte de la interventoría no se presenta el ingreso de trabajadores.

INDUCCIONES SST

El contratista manifiesta que dentro de las principales actividades se tiene la inducción del personal que ingresa, en este proceso se hace una introducción a temas asociados con la empresa y su sistema de gestión, la información específica que es suministrada se relaciona a continuación:

➤ SST:

- Uso de elementos de protección personal, capacitación en cuanto al uso, importancia y sanciones disciplinarias
- Normas generales que se deben cumplir durante la ejecución de las actividades.
- Política de prevención para el consumo de alcohol, tabaquismo y sustancias psicoactivas.
- Planes de emergencia en cada uno de los frentes.
- Se divulga el procedimiento de llamados de atención y sanciones disciplinarias por incumplimiento a las normas de seguridad industrial. (Proceso de descargos).
- Identificación de peligros y riesgos en las zonas de trabajo.
- Reglamento de higiene y seguridad industrial.
- Conocimiento del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. Matriz de peligros.
- Análisis de seguro de trabajo.

➤ GENERALIDADES DE LA EMPRESA

- Presentación de la empresa.
- Formas de pago (Compensación flexible).
- Beneficios corporativos (Oficina/obras).
- Seguridad social.
- Derechos y deberes empleados.
- Dotación/Uniformes.
- Horarios de trabajo. Permisos.
- Manual de convivencia.
- Perfiles de cargo (Responsabilidades).
- Reglamento interno del trabajo e Higiene y seguridad industrial.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 15 PERIODO: JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023	Página 22 de 29

ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

El contratista manifiesta que, durante el periodo del 1 al 31 de julio, se realizó la entrega de elementos de protección personal a todo el personal que labora en los diferentes frentes de obra.

Se realizó el debido seguimiento y reposición al uso de los elementos de protección personal.

Antes de iniciar labores y una vez realizada la revisión de las afiliaciones o autoliquidaciones de EPS, ARL, AFP y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR y que el personal haya asistido a la inducción inicial, el trabajador procede a retirar su dotación y elementos de protección personal de acuerdo al cargo, que básicamente consiste en:

- Camisa de dril y pantalón jeans
- Botas de seguridad de caucho y cuero con puntera de acero Casco de seguridad
- Protector auditivo de copa o inserción (según el cargo y la necesidad)
- Protección respiratoria (mascarilla desechable y/o respirador con filtros o cartuchos)
- Guantes de vaqueta, carnaza, soldador, nitrilo, poliuretano o caucho de acuerdo a la actividad.
- Gafas de seguridad (lente oscuro y transparente)

Por otra parte, cada vez que se deterioran los elementos, se realizan las respectivas reposiciones.

El interventor da revisión a los formatos de entrega de elementos de protección personal (EPP).

5.3 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

Tabla 9 Programa Anual de Caja- PAC.

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Saldo Registro Presupuestal	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

 CONSTRUCOLING S.A.S NIT. 901.506.138-9	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 15 PERIODO: JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023	Página 23 de 29

5.4 INFORME MATRIZ DE RIESGOS

5.5 INFORMACION OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA.

6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 EQUIPO Y VEHICULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-15 -FR 5 EQUIPO Y VEHICULOS DE INTERVENTORÍA.

6.2 PERSONAL CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-15-FR-7 PERSONAL CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se presentada en el ANEXO. MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-15-FR-13 el SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-15-FR-15 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

 CONSTRUCOLING S.A.S NIT. 901.506.138-9	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 15 PERIODO: JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023	Página 24 de 29

6.6 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN-IN-3-FR-1 y MEPI-MN-IN-3-FR-2. INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

6.7 PLAN DE CARGAS O REPOGRAMACION AL PLAN DE CARGAS APROBADO

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN-IN-9-FR-2 PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACION AL PLAN DE CARGAS APROBADO CONTRATO DE INTERVENTORIA.

6.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-9-FR-3 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 15 PERIODO: JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023	Página 25 de 29

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Los tiempos de entrega para estudios y diseños estuvieron dentro de los términos acordados, por esta razón se lleva una programación adecuada.
- El contratista con acompañamiento de la interventoría viene adelantando las socializaciones con la comunidad para el inicio de actividades.
- Se ha presentado mal tiempo, afectando los avances de obra
- Se debe solicitar prorroga al contrato debido a los atrasos presentados por las altas precipitaciones

	<p>MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL</p>	<p>REV.: 0</p>
	<p>INFORME MENSUAL No. 15 PERIODO: JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023</p>	<p>Página 26 de 29</p>

8 ANEXOS



	<p>MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL</p>	<p>REV.: 0</p>
	<p>INFORME MENSUAL No. 15 PERIODO: JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023</p>	<p>Página 27 de 29</p>



	<p>MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL</p>	<p>REV.: 0</p>
	<p>INFORME MENSUAL No. 15 PERIODO: JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023</p>	<p>Página 28 de 29</p>



	<p>MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL</p>	<p>REV.: 0</p>
	<p>INFORME MENSUAL No. 15 PERIODO: JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023</p>	<p>Página 29 de 29</p>





INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 25/07/2023
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: COLOMBIA RURAL

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA SEMANA No.: 8 del 10/07/2023 al 16/07/2023 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIAS JAIMES FERNANDEZ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ELIAS JAIMES FERNANDEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
SE realizara la pvimentacion mediante placa huella entre el K2+570 al K2+850 y el K6+710 al K6+857 estas con una longitud total de 427ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa “COLOMBIA RURAL” que tiene como objetivo mantener y mejorar la transitabilidad y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de ejecución y financiación.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA: CONSFUCOL SAS				INTERVENTOR: CONSTRUCOLING SAS			
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No. MT-LP-002 DE 2023		VALOR INICIAL: \$ 899.999.173,00		CONTRATO No. 1667 DE 2022		VALOR INICIAL: \$ 76.160.000,00	
FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO DE 2023		VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 26 DE DICIEMBRE DE 2022		VALOR ADICIONES: \$ -	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		VALOR ACUMULADO: \$ -		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 26 DE ABRIL DE 2023		VALOR ACUMULADO: \$ 76.160.000,00	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		\$ -		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		VALOR ANTICIPO: \$ -	
		\$ -				VALOR AMORTIZADO: \$ -	
		\$ 899.999.173,00				SALDO POR AMORTIZAR: \$ -	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023			
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 899.999.173			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 899.999.173			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 76.160.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 76.160.000			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA			
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 869.798.973,00		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 316.872.008,50	36%	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 233.433.856,00	27%	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ (83.438.152,50)	-10%	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 16.859.403,00	2%	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 333.731.411,50	38%	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 250.293.259,00	29%	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ (83.438.152,50)	-25%	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 83.436.004,00	10%	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 50.869.732,50	6%	
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI NO		
		X	
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:			
PERIODO FACTURADO:			
VALOR FACTURA:	\$ -		
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			
Observaciones:			

INTERVENTORÍA			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 24.180.800,00	32%	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 24.180.800,00	32%	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 4.165.000,00	5%	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 4.165.000,00	5%	
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI NO		
	x		
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:			
PERIODO FACTURADO:			
VALOR FACTURA:	\$ -		
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			
Observaciones:			

ANTICIPOS	
Otorgado \$	
Amortizado \$	
Saldo \$	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado \$	
Amortizado \$	
Saldo \$	

III. AVANCE FISICO

Meta Fisica Programada % 14% Avance o Atraso Fisico % 2%
Meta Fisica Ejecutada % 16%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Fisica (Programa de Obra) Línea Base					Meta Fisica Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Fisica Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Fisico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
PLACA HUELLA	ML	427	2023		Prog		105		105	25%
					Ejec		110		110	26%
* ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$	\$ 15.875.546,00	2023		Prog	\$ 7.937.773,00	\$ 7.937.773,00		\$ 15.875.546,00	100%
					Ejec	\$ 7.937.773,00	\$ 7.937.773,00		\$ 15.875.546,00	100%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance fisico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: K2+570 al K2+850 TRAMO Y/O SECTOR 2: K6+710 al K6+857
TRAMO Y/O SECTOR (n):

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18	1	1
Vibro compactador, potencia 153 HP, peso 10 ton]	1	1
Carrotanque de agua(1000 Galones)]	1	1
Total	3	3

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES				PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL			
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI DISPONIBLE NO	ZONAS DE DEPOSITO:	SI	NO	N/A
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
UBICACIÓN:				APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
		PERMISO MINERO:	SI NO	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
				VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
				EMISIONES:	SI	NO	N/A
				OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A
OBSERVACIONES:				OBSERVACIONES:			

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: VIGENTE

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER				
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	3	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:		OBSERVACIONES:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:						
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	13					

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:		OBSERVACIONES:			
FICHAS PEDIALES APROBADAS:					
AVALÚOS APROBADOS:					
PREDIOS ADQUIRIDOS:					

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Construccion de placa huella

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
Contruccion de placa huella y estructuras de drenaje	
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS	
<div><div><div>PROGRAMADO</div><div>EJECUTADO</div></div><div><div>12/172</div><div>12/163</div><div>16/712</div><div>16/687</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>MEJORAMIENTO</div><div>SUBBASE</div><div>PLACA HUELLA</div><div>SEÑALIZACION</div></div></div> <p>El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.</p> <div><div>XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO</div><div><div><div>Indicar localización y actividad</div></div><div><div>Indicar localización y actividad</div></div><div><div>Indicar localización y actividad</div></div></div><div><div>NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.</div><div><div>XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA</div><div><div>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</div><div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE: CARLOS MARIO PACHECO GAONA</div><div>Matrícula Profesional No.: 25202-093938 CND</div></div></div></div><div><div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</div><div>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</div></div></div></div>	



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 11/07/2023
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: COLOMBIA RURAL

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA SEMANA No.: 7 del 3/07/2023 al 8/07/2023 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIAS JAIMES FERNANDEZ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ELIAS JAIMES FERNANDEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
SE realizara la pvimentacion mediante placa huella entre el K2+570 al K2+850 y el K6+710 al K6+857 estas con una longitud total de 427ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa “COLOMBIA RURAL” que tiene como objetivo mantener y mejorar la transitabilidad y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de ejecución y financiación.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSFUCOL SAS			INTERVENTOR:	CONSTRUCOLING SAS		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	MT-LP-002 DE 2023	VALOR INICIAL:	\$ 899.999.173,00	CONTRATO No.	1667 DE 2022	VALOR INICIAL:	\$ 76.160.000,00
FECHA DE INICIO:	15 DE MAYO DE 2023	VALOR ADICIONES:	\$ -	FECHA DE INICIO:	26 DE DICIEMBRE DE 2022	VALOR ADICIONES:	\$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	\$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	26 DE ABRIL DE 2023	VALOR ACUMULADO:	\$ 76.160.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:			\$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ANTICIPO:	\$ -
			\$ -			VALOR AMORTIZADO:	\$ -
			\$ 899.999.173,00			SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023			
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 899.999.173			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 899.999.173			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 76.160.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 76.160.000			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA			
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 869.798.973,00		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 233.436.004,00	27%	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 184.479.958,00	21%	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ (48.956.046,00)	-21%	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 16.859.403,00	2%	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 201.339.361,00	23%	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 233.436.004,00	27%	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ 32.096.643,00	16%	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 83.436.004,00	10%	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 50.869.732,50	6%	
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI NO		
		X	
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:			
PERIODO FACTURADO:			
VALOR FACTURA:	\$ -		
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			
Observaciones:			

INTERVENTORÍA			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 20.015.800,00	26%	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 20.015.800,00	26%	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 4.165.000,00	5%	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 4.165.000,00	5%	
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI NO		
	x		
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:			
PERIODO FACTURADO:			
VALOR FACTURA:	\$ -		
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			
Observaciones:			

ANTICIPOS	
Otorgado \$	
Amortizado \$	
Saldo \$	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado \$	
Amortizado \$	
Saldo \$	

III. AVANCE FISICO

Meta Fisica Programada % 14% Avance o Atraso Fisico % 2%
Meta Fisica Ejecutada % 16%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Fisica (Programa de Obra) Línea Base					Meta Fisica Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Fisica Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Fisico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
PLACA HUELLA	ML	427	2023		Prog		60		60	14%
					Ejec		70		70	16%
* ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$	\$ 15.875.546,00	2023		Prog	\$ 7.937.773,00	\$ 7.937.773,00		\$ 15.875.546,00	100%
					Ejec	\$ 7.937.773,00	\$ 7.937.773,00		\$ 15.875.546,00	100%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance fisico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: K2+570 al K2+850 TRAMO Y/O SECTOR 2: K6+710 al K6+857
TRAMO Y/O SECTOR (n):

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18	1	1
Vibro compactador, potencia 153 HP, peso 10 ton]	1	1
Carrotanque de agua(1000 Galones)]	1	1
Total	3	3

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES				PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL			
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI DISPONIBLE NO	ZONAS DE DEPOSITO:	SI	NO	N/A
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
UBICACIÓN:				APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
		PERMISO MINERO:	SI NO	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
				VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
				EMISIONES:	SI	NO	N/A
				OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A
OBSERVACIONES:				OBSERVACIONES:			

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: VIGENTE

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	3		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:				
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:				
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:				
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	13			

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:		OBSERVACIONES:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:		
AVALÚOS APROBADOS:		
PREDIOS ADQUIRIDOS:		

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Construccion de placa huella

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
Contruccion de placa huella		
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS		
<div><div><div>PROGRAMADO</div><div>EJECUTADO</div></div><div><div><div>K2+570</div><div>K2+850</div><div>K6+710</div><div>K6+857</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>MEJORAMIENTO</div><div>SUBBASE</div><div>PLACA HUELLO</div><div>SEÑALIZACION</div></div></div></div> <p>El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs</p>		
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
<div><p>Indicar localización y actividad</p></div>	<div><p>Indicar localización y actividad</p></div>	<div><p>Indicar localización y actividad</p></div>
<p>NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.</p>		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
		<div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE: CARLOS MARIO PACHECO GAONA</div><div>Matrícula Profesional No.: 25202-093938 CND</div></div>
<p>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</p>		



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 25/07/2023
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: COLOMBIA RURAL

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA SEMANA No.: 9 del 17/07/2023 al 23/07/2023 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIAS JAIMES FERNANDEZ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ELIAS JAIMES FERNANDEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
SE realizara la pvimentacion mediante placa huella entre el K2+570 al K2+850 y el K6+710 al K6+857 estas con una longitud total de 427ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa “COLOMBIA RURAL” que tiene como objetivo mantener y mejorar la transitabilidad y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de ejecución y financiación.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSFUCOL SAS			INTERVENTOR:	CONSTRUCOLING SAS		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	MT-LP-002 DE 2023	VALOR INICIAL:	\$ 899.999.173,00	CONTRATO No.	1667 DE 2022	VALOR INICIAL:	\$ 76.160.000,00
FECHA DE INICIO:	15 DE MAYO DE 2023	VALOR ADICIONES:	\$ -	FECHA DE INICIO:	26 DE DICIEMBRE DE 2022	VALOR ADICIONES:	\$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	\$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	26 DE ABRIL DE 2023	VALOR ACUMULADO:	\$ 76.160.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:			\$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ANTICIPO:	\$ -
			\$ -			VALOR AMORTIZADO:	\$ -
			\$ 899.999.173,00			SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023			
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 899.999.173			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 899.999.173			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 76.160.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 76.160.000			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA			
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 869.798.973,00		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 400.308.012,50	46%	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 250.409.782,00	29%	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ (149.898.230,50)	-17%	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 16.859.403,00	2%	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 417.167.415,50	48%	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 267.269.185,00	31%	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ (149.898.230,50)	-36%	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 83.436.004,00	10%	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 50.869.732,50	6%	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____

PERIODO FACTURADO: _____

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado \$	
Amortizado \$	
Saldo \$	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado \$	
Amortizado \$	
Saldo \$	

III. AVANCE FISICO

Meta Fisica Programada % 34% Avance o Atraso Fisico %
Meta Fisica Ejecutada % 34%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Fisica (Programa de Obra) Línea Base					Meta Fisica Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Fisica Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Fisico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
PLACA HUELLA	ML	427	2023		Prog		147		147	34%
					Ejec		147		147	34%
* ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$	\$ 15.875.546,00	2023		Prog	\$ 7.937.773,00	\$ 7.937.773,00		\$ 15.875.546,00	100%
					Ejec	\$ 7.937.773,00	\$ 7.937.773,00		\$ 15.875.546,00	100%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance fisico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: K2+570 al K2+850 TRAMO Y/O SECTOR 2: K6+710 al K6+857
TRAMO Y/O SECTOR (n):

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18	1	1
Vibro compactador, potencia 153 HP, peso 10 ton]	1	1
Carrotanque de agua(1000 Galones)]	1	1
Total	3	3

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES				PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL			
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI DISPONIBLE NO	ZONAS DE DEPOSITO:	SI	NO	N/A
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI NO	APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
				OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
				VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
				EMISIONES:	SI	NO	N/A
				OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A
OBSERVACIONES:				OBSERVACIONES:			

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: VIGENTE

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER				
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	3	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:		OBSERVACIONES:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:						
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	13					

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:		OBSERVACIONES:
FICHAS PEDIALES APROBADAS:		
AVALÚOS APROBADOS:		
PREDIOS ADQUIRIDOS:		

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Construccion de placa huella

Construccion de estructuras de drenaje		IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS			
<div><div><div>PROGRAMADO</div><div>EJECUTADO</div></div><div><div><div>02-170</div><div>02-180</div><div>06-1710</div><div>06-187</div></div><div><div>MEJORAMIENTO</div><div>SUBBASE</div><div>PLACA HUELLA</div><div>SEÑALIZACION</div></div></div></div> <p>El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.</p>			
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
<div></div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div></div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div></div> <div>Indicar localización y actividad</div>	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		<div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE: CARLOS MARIO PACHECO GAONA</div><div>Matrícula Profesional No.: 25202-093938 CND</div></div>	
<div><div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</div><div>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</div></div>			



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 31/07/2023
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: COLOMBIA RURAL

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA SEMANA No.: 10 del 24/07/2023 al 30/07/2023 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIAS JAIMES FERNANDEZ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ELIAS JAIMES FERNANDEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
SE realizara la pvimentacion mediante placa huella entre el K2+570 al K2+850 y el K6+710 al K6+857 estas con una longitud total de 427ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa “COLOMBIA RURAL” que tiene como objetivo mantener y mejorar la transitabilidad y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de ejecución y financiación.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSFUCOL SAS			INTERVENTOR:	CONSTRUCOLING SAS		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	MT-LP-002 DE 2023	VALOR INICIAL:	\$ 899.999.173,00	CONTRATO No.	1667 DE 2022	VALOR INICIAL:	\$ 76.160.000,00
FECHA DE INICIO:	15 DE MAYO DE 2023	VALOR ADICIONES:	\$ -	FECHA DE INICIO:	26 DE DICIEMBRE DE 2022	VALOR ADICIONES:	\$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	\$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	26 DE ABRIL DE 2023	VALOR ACUMULADO:	\$ 76.160.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:			\$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ANTICIPO:	\$ -
			\$ -			VALOR AMORTIZADO:	\$ -
			\$ 899.999.173,00			SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023			
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 899.999.173			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 899.999.173			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 76.160.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 76.160.000			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

83436004

OBRA			
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 869.798.973,00		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 483.744.016,50	56%	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 270.385.866,00	31%	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ (213.358.150,50)	-25%	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 16.859.403,00	2%	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 500.603.419,50	58%	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 287.245.269,00	33%	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ (213.358.150,50)	-25%	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 83.436.004,00	10%	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 50.869.732,50	6%	
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI NO		
		X	
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:			
PERIODO FACTURADO:			
VALOR FACTURA:	\$ -		
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			
Observaciones:			

INTERVENTORÍA			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 32.510.800,00	43%	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 32.510.800,00	43%	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 4.165.000,00	5%	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 4.165.000,00	5%	
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI NO		
	x		
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:			
PERIODO FACTURADO:			
VALOR FACTURA:	\$ -		
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			
Observaciones:			

ANTICIPOS	
Otorgado \$	
Amortizado \$	
Saldo \$	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado \$	
Amortizado \$	
Saldo \$	

III. AVANCE FISICO

Meta Fisica Programada % 45% Avance o Atraso Fisico % 11%
Meta Fisica Ejecutada % 34%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Fisica (Programa de Obra) Línea Base					Meta Fisica Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Fisica Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Fisico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
PLACA HUELLA	ML	427	2023		Prog		147		147	34%
					Ejec		147		147	34%
* ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$	\$ 15.875.546,00	2023		Prog	\$ 7.937.773,00	\$ 7.937.773,00		\$ 15.875.546,00	100%
					Ejec	\$ 7.937.773,00	\$ 7.937.773,00		\$ 15.875.546,00	100%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance fisico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: K2+570 al K2+850 TRAMO Y/O SECTOR 2: K6+710 al K6+857
TRAMO Y/O SECTOR (n):

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18	1	1
Vibro compactador, potencia 153 HP, peso 10 ton]	1	1
Carrotanque de agua(1000 Galones)]	1	1
Total	3	3

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES				PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL			
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI DISPONIBLE NO	ZONAS DE DEPOSITO:	SI	NO	N/A
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI NO	APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
				OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
				VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
				EMISIONES:	SI	NO	N/A
				OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A
OBSERVACIONES:				OBSERVACIONES:			

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: VIGENTE

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	3	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:				
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	13		OBSERVACIONES:	

VI. GESTIÓN PREDIAL


TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:		OBSERVACIONES:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:		
AVALÚOS APROBADOS:		
PREDIOS ADQUIRIDOS:		


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Construccion de cunetas

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
Se iniciara tramo No1 y contruccion de cunetas		
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS		
<div><div><div>PROGRAMADO</div><div>EJECUTADO</div></div><div><div><div>IC+570</div><div>IC+650</div><div>IC+710</div><div>IC+857</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>MEJORAMIENTO</div><div>SUBBASE</div><div>PLACA HUELLA</div><div>SEÑALIZACION</div></div></div></div> <p>El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.</p>		
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
<div></div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div></div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div></div> <div>Indicar localización y actividad</div>
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
		<div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE: CARLOS MARIO PACHECO GAONA</div><div>Matrícula Profesional No.: 25202-093938 CND</div></div>
<div><div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</div><div>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</div></div>		

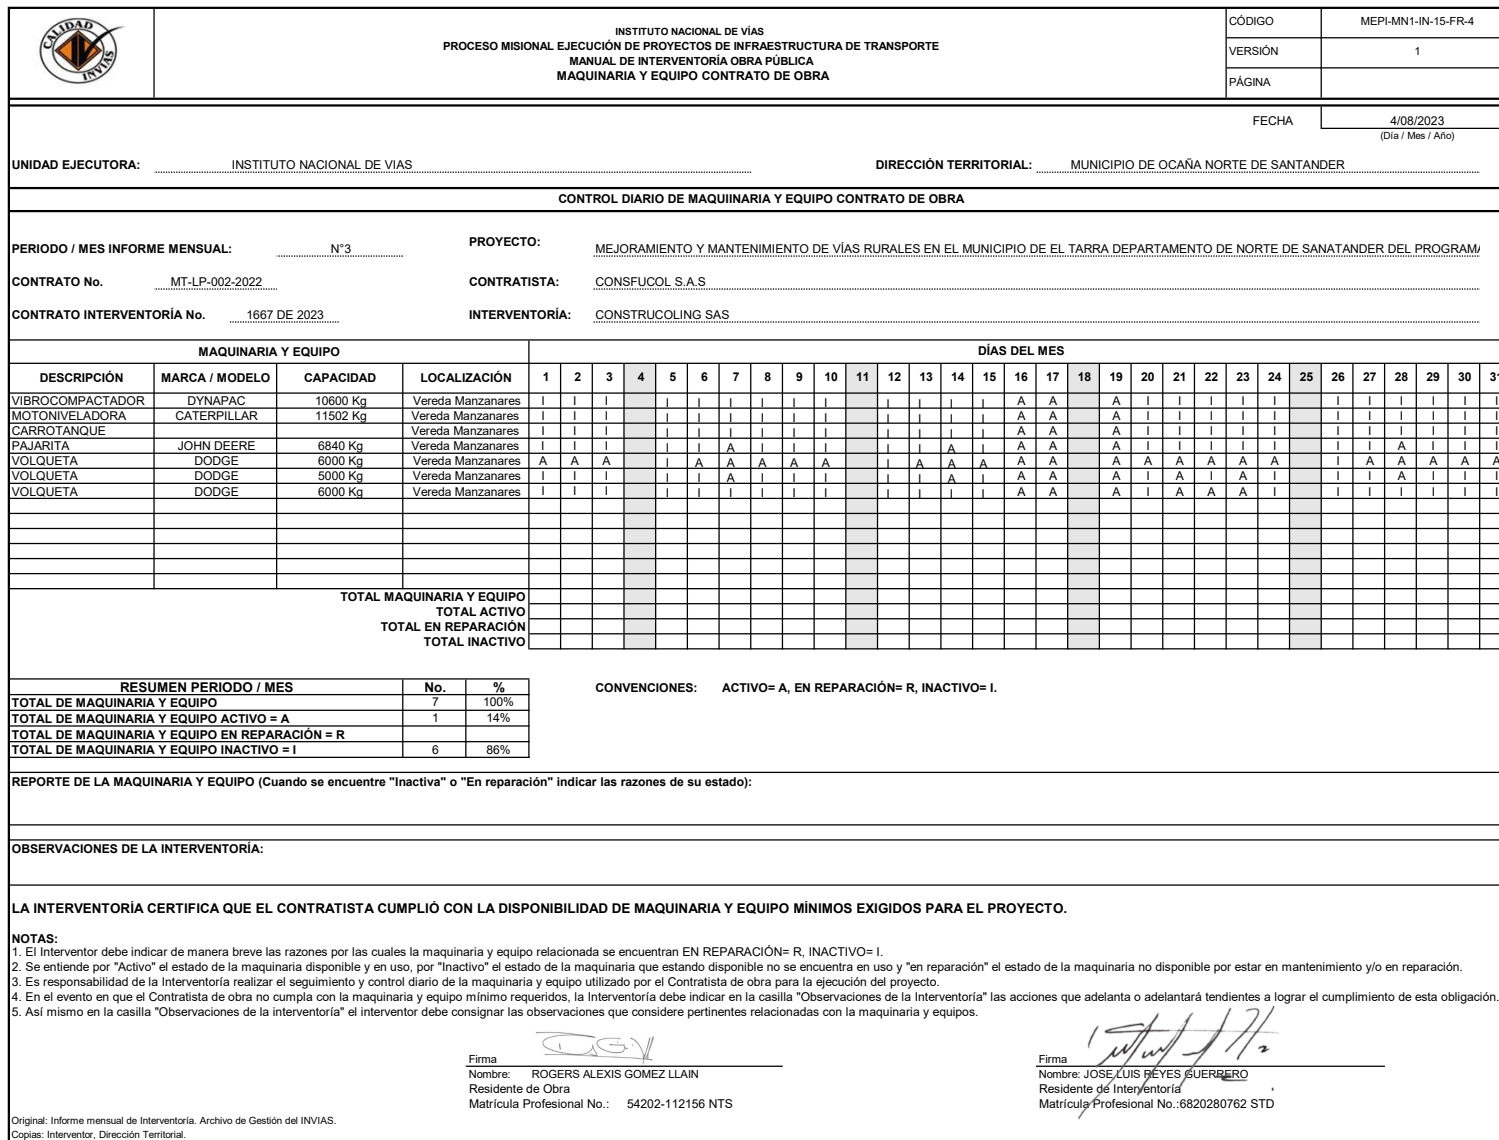



VERSIÓN	1
---------	---

PÁGINA	
--------	--

FECHA	4/08/2023 (Día / Mes / Año)
-------	--------------------------------

DIRECCION TERRITORIAL: MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:	
---	--

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.


NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y sea la ejecución del contrato la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato indicando mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumple con la dedicación del personal profesional tendiente a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectúa por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
6. El evento es el responsable de la verificación de pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que los contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma: _____
Nombre: ROGERS ALEXIS GOMEZ LLAIN
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-112156 NTS

Firma	
Nombre: CARLOS MARIO PACHECO GAONA	
Director de Interventoría	
Matrícula Profesional No.: 25202-093938 CND	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8			
											VERSIÓN	1			
											PÁGINA				
											FECHA	4/08/2023 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: INVIAS											DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA				
CONTRATO DE OBRA No: 002 DE 2023											CONTRATISTA: CONSFUCOL SAS.				
MES INFORME MENSUAL: JULIO DE 2023											MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA PROYECTO: COLOMBIA RURAL - NACIONAL				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1667 DE 2022											INTERVENTOR: CONSTRUCCOLING SAS				
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior								
2023	DP 01111	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL	1.3.3.11.07 - R.B	NACION	002 DE 2023	\$ 900.000.000									
TOTAL															
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 899.999.173.00															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
1	OBRA	JUNIO	\$ 239.953.109	\$ 2.721.675	\$ 242.674.784	-	\$ 242.674.784	0	DP 01111	\$ 657.325.216	\$ 657.324.391		SI	NO	
TOTALES			\$ 239.953.109	\$ 2.721.675	\$ 242.674.784		\$ 242.674.784			\$ 657.325.216	\$ 657.324.391				
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.															
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO															
		VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL									
VALOS BASICO DE OBRA		\$ 225.815.388				\$ 225.815.388									
COMPLEMENTACION Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$ 13.340.797		\$ 2.534.751		\$ 15.875.548									
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD		\$ 826.771		\$ 157.086		\$ 983.857									
*															
*															
*															
*															
*															
VALOR TOTAL		\$ 239.982.956		\$ 2.691.837		\$ 242.674.793									
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.															
NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.															
<div><div> Firma Nombre: ROGERS ALEXIS GOMEZ LLAIN Director de Obra Matricula Profesional No.:54202-112156 NTS</div><div> Firma Nombre: CARLOS MARIO PACHECO GAONA Director de Interventoría Matricula Profesional No.:25202-093938 CND</div></div>															
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.															



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 4/08/2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: MT-LP-002 DE 2023 CONTRATISTA: CONFUCOL SAS.
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 31 DE JULIO DE 2023 PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1667 DE 2022 INTERVENTOR: CONSTRUCCOLING SAS.
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	X	X	X			X		X	X	X		X	X	X		X	X		X	X	X		X	X		X		X	X	X	X	23
Lluvias moderadas				X	X		X				X				X			X				X			X		X					9
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24	24			24		24	24	24		24	24	24		24	24		24	24	24		24	24		24		24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:

Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Los días de lluvias moderadas fueron aproximadamente entre 4 a 5 horas

Firma

Nombre: EDWIN TRIGOS QUINTANA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202086214 NTS

Firma

Nombre: JOSÉ LUIS REYES GUERRERO
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 6820280762 STD

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

	FECHA
	4/08/2023 <small>(Día / Mes / Año)</small>

UNIDAD EJECUTORA: <u>INVIAS</u>	DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>OCAÑA</u>
---------------------------------	-------------------------------------

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: <u>1667 DE 2022</u>	INTERVENTOR: <u>CONSTRUCOLING SAS</u>
--	---------------------------------------

OBJETO DEL CONTRATO:
 INTERVENTORIA TECNICA , ADMINISTRATIVA , FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO: <u>26 DE DICIEMBRE DE 2022</u>	
PLAZO INICIAL: <u>4 MESES</u>	
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: <u>16 DE SEPTIEMBRE</u> <small>(Incluye prórrogas y suspensiones)</small>	
VALOR INICIAL: \$ <u>76.160.000,00</u>	
VALOR ACUMULADO: \$ <u>-</u> <small>(Incluye adiciones)</small>	

 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ELIAS JAIMES FERNANDEZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Cumplimiento	10%	\$ 7.616.000,00	Desde			Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			20	12	2022	1	7	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 15.232.000,00	Día	Mes	Año			
Calidad del servicio	30%	\$ 22.848.000,00	20	12	2022	31	12	2025
			31	12	2022	31	12	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. <u>400-47-994000088581</u> Certificado de modificación o anexo No.: <u>0</u> <small>(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: <u>ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA</u> Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: <u>22/12/2022</u>	
---	--

GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Cumplimiento	10%	\$ 7.616.000,00	Desde			Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			20	12	2022	1	11	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 15.232.000,00	Día	Mes	Año			
Calidad del servicio	30%	\$ 22.848.000,00	20	12	2022	30	4	2026
			31	12	2022	30	4	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. <u>400-47-994000088581</u> Certificado de modificación o anexo No.: <u>1</u> <small>(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: <u>ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA</u> Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: <u>27/12/2022</u>	
--	--

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

	FECHA	4/07/2023
--	-------	-----------

Cumplimiento	10%	\$ 7.616.000,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales	20%	\$ 15.232.000,00
Calidad del servicio	30%	\$ 22.848.000,00

20	12	2022
Día	Mes	Año
20	12	2022
31	12	2022

1	11	2023
30	4	2026
30	4	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400-47-
994000088581

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA


Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 30/05/2023

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las

Firma 

Nombre: CARLOS MARIO PACHECO GAONA
 Director de Interventoría
 Matricula Profesional No.: 25202-093938 CND

Firma  Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
 Supervisor Contrato de Interventoría
 Matricula Profesional No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 3

FECHA 25/07/2023
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 3
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No. MT-LP-002 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSFUCOL SAS. R/L. ROGERS ALEXIS GOMEZ LLAIN

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1667 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSTRUCCOLING SAS. R/L. CARLOS MARIO PACHECO GAONA

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
Se realiza lectura de acta anterior donde se dio cumplimiento a los compromisos pactados.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

En el presente comité se tocarán los siguientes temas:

1. Avance de obra
3. Presentar Actas de obra



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 de 3

FECHA 25/07/2023
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

La interventoría da inicio al comité de obra número tres manifestando la preocupación debido a los atrasos que presenta la obra de un 17%, donde el contratista responde que el atraso que se presenta es debido a las altas precipitaciones que se han presentado generando daños en rasante y estructuras de drenaje, debido a estas circunstancias el contratista solicita iniciar evaluar un prorroga al contrato.

La interventoría expresa que se evaluara la posibilidad de una prórroga debido a las altas precipitaciones que se han presentado, pero de igual forma se solicita un aumento de personal.

El residente de interventoría le solicita una fecha de inicio para la intervención del tramo numero uno donde el contratista expresa que se iniciaran actividades el 31 de julio.

La interventoría le solicita al contratista la radicación del acta donde el contratista afirma que se pasara en la ultima semana del mes de julio



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 de 3

FECHA 25/07/2023
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día / Mes / Año)	RESPONSABLES
INICIO OBRAS EN EL TRAMO No. 1	lunes, 31 de julio de 2023	LAURA AGUILAR


FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 4/08/2023
(Día / Mes / Año)


NOTAS:

- Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
- Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtir de manera previa el trámite interno correspondiente.
- Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
CARLOS MARIO PACHECO GAONA	DIRECTOR INTERVENTORIA	CONSTRUCOLING SAS	
JOSE LUIS REYES GUERRERO	RESIDENTE INTERVENTORIA	CONSTRUCOLING SAS	
LAURA AGUILAR	AUXILIAR DE OBRA	CONFUCOL SAS	
ROGERS ALEXIS GOMEZ LLAIN	DIRECTOR DE OBRA	CONFUCOL SAS	
EDWIN HERNANDO TRIGOS	RESIDENTE DE OBRA	CONFUCOL SAS	

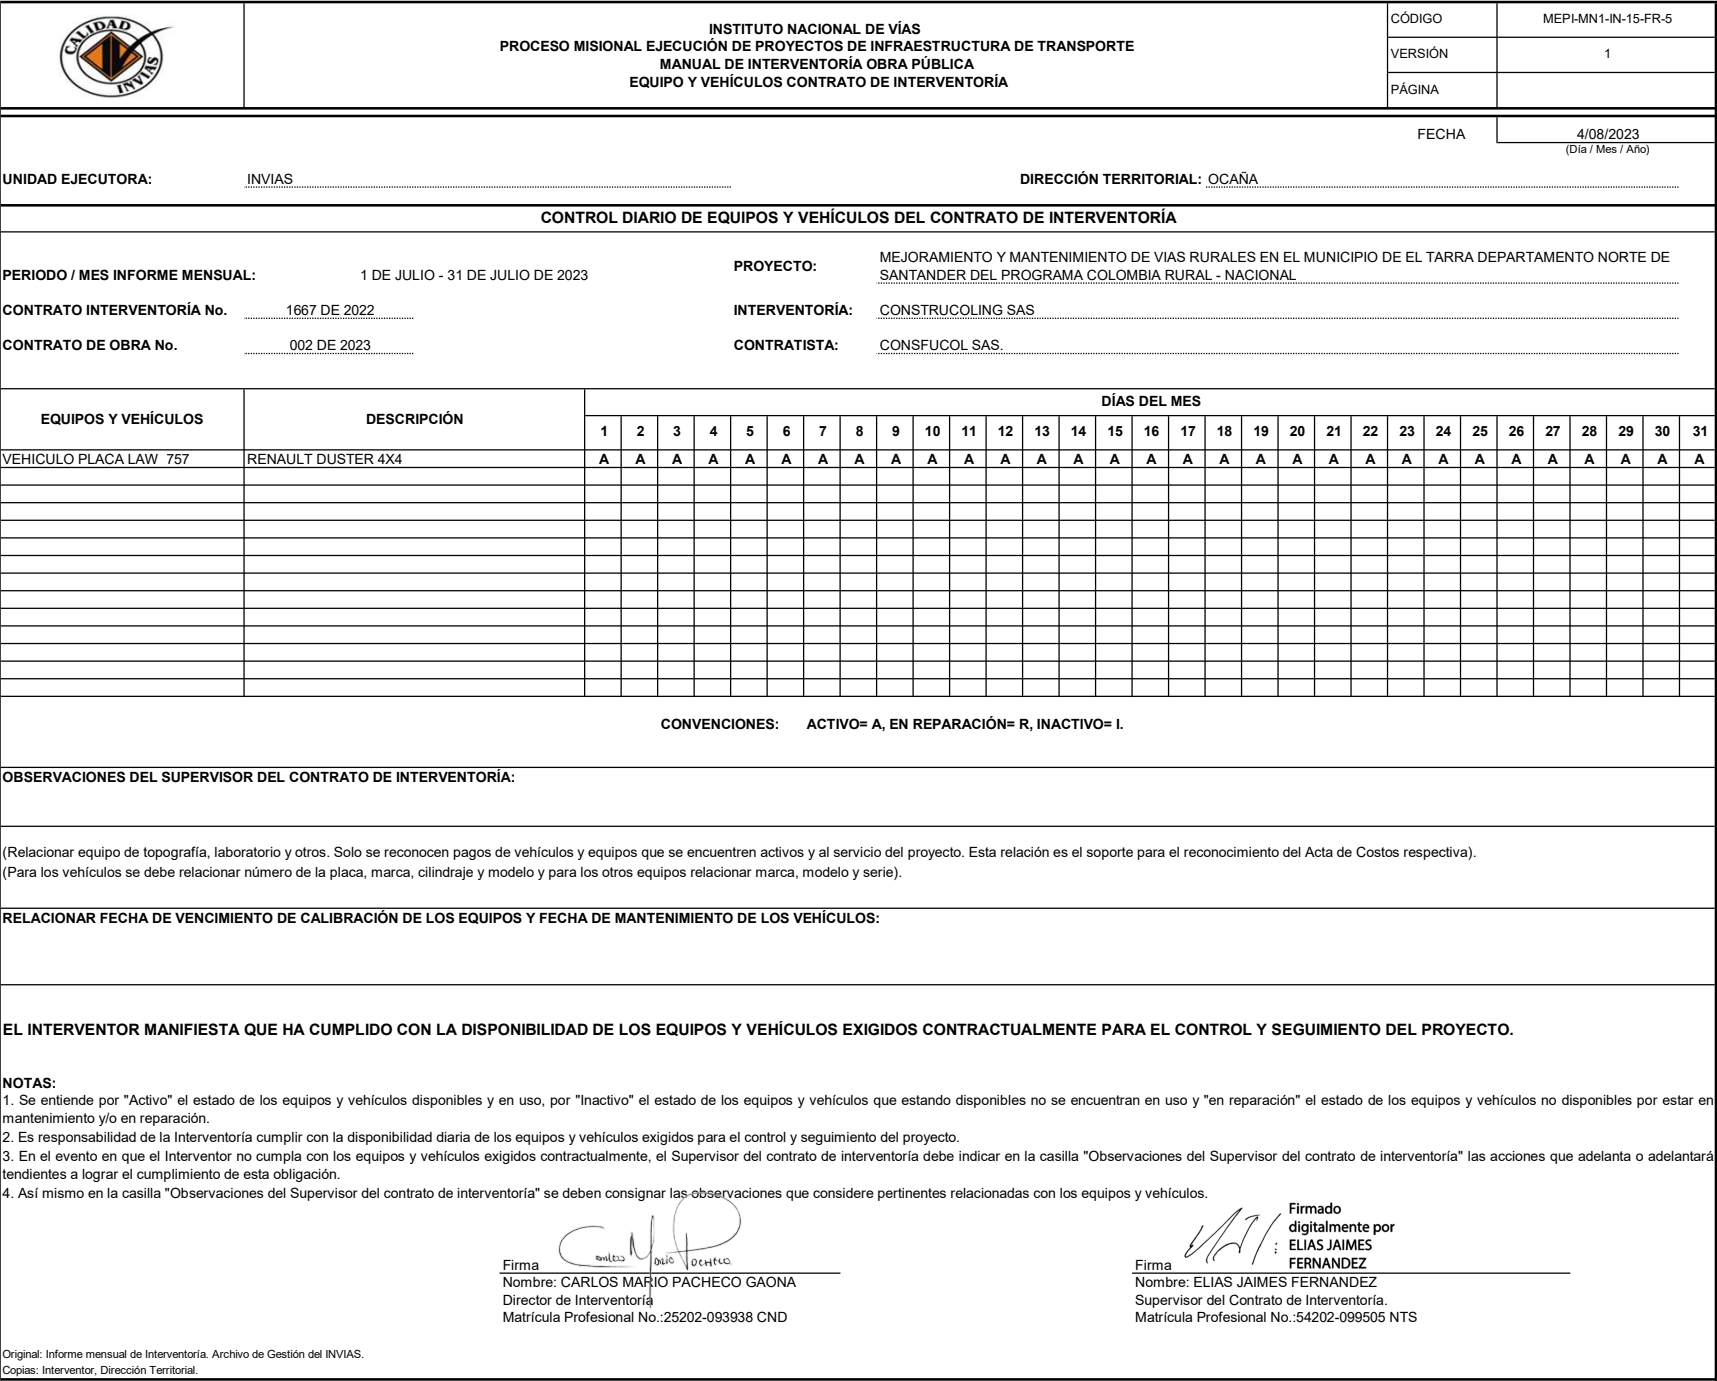

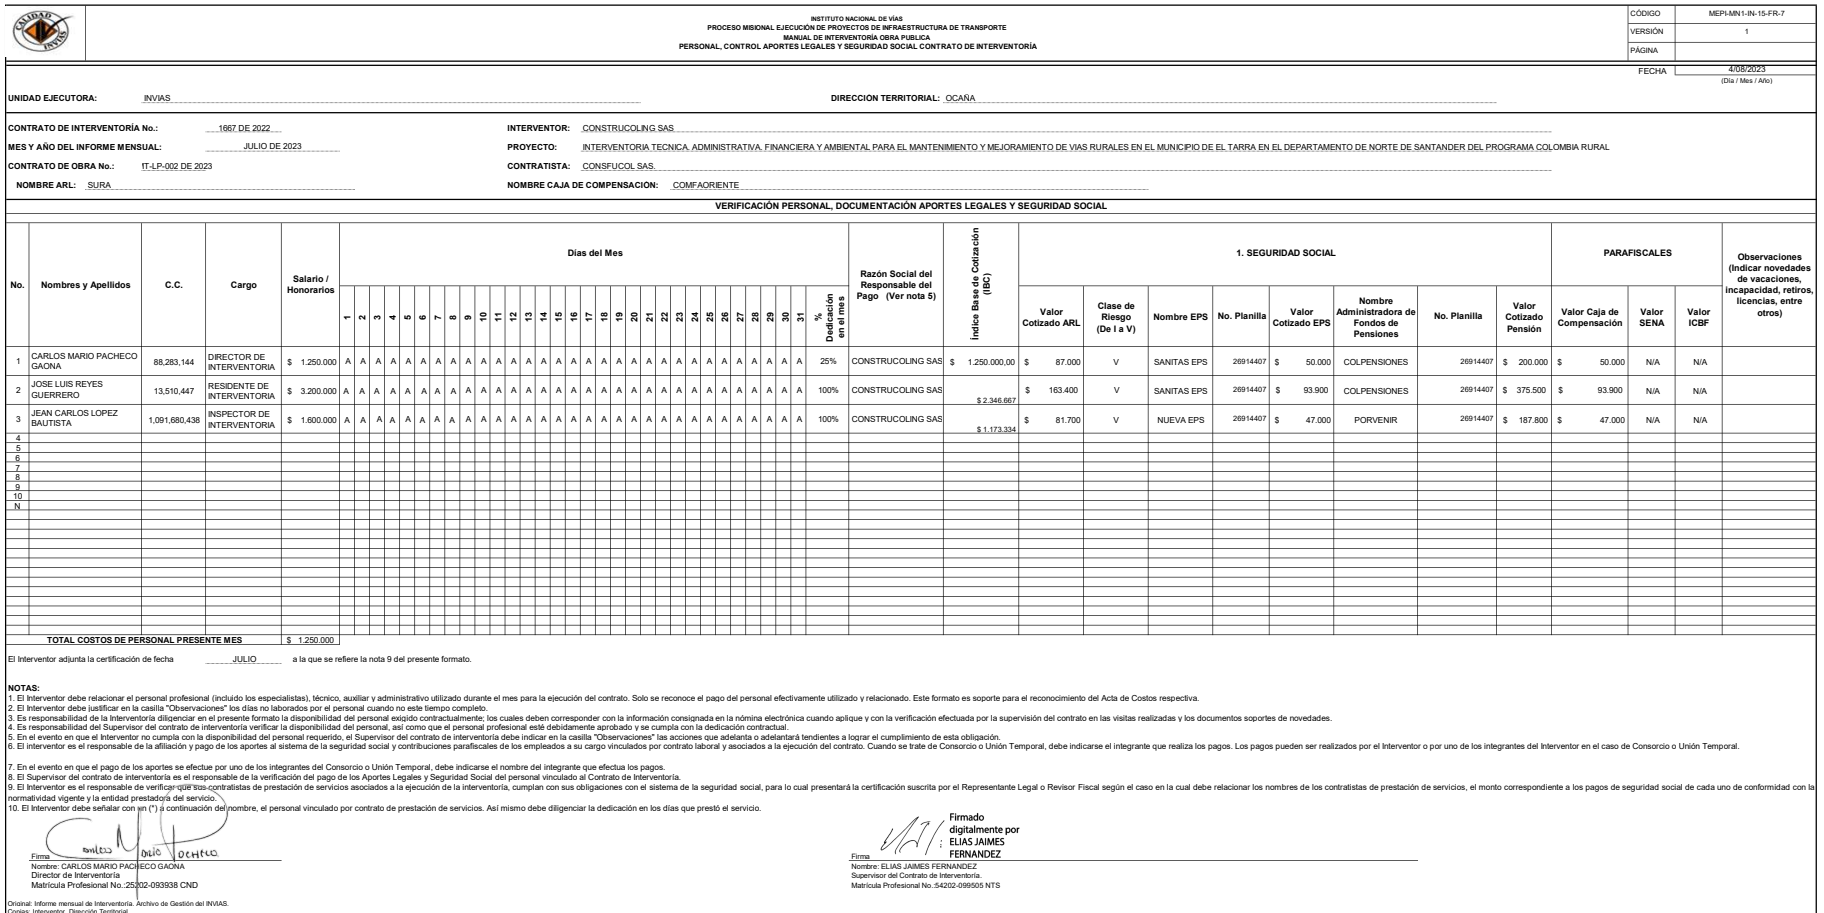

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901506138	9	CONSTRUCOLING SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-498	CLL 10 N 15 10		5623956			CONSTRUCOLINGSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-07	2023-08	27216983	E	2023-08-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.157.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	27216983	2023-08-10	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DIAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	VSN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL						IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.
1	CC 13510447	REYES GUERRERO JOSE LUIS	3.200.000		F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.200.000	512.000	0	0	SANITAS-EPS005	3.200.000	128.000	COMFAORIE NTE-CCF36	3.200.000	128.000	3.200.000	222.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	990.800	S	5742101
2	CC 88283144	PACHECO GAONA CARLOS MARIO	1.250.000		F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.250.000	200.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.250.000	50.000	COMFAORIE NTE-CCF36	1.250.000	50.000	1.250.000	87.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	387.000	S	5742101
3	CC 1091677817	SUAREZ GAONA ANGIEE TORCOROMA	1.160.000		F															0			30	30	30	30	PROTECCION 230201	1.160.000	185.600	0	0	COMFAORIE NTE-CCFC50	1.160.000	46.400	COMFAORIE NTE-CCF36	1.160.000	46.400	1.160.000	6.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	284.500	S	1742101
4	CC 1091680438	LOPEZ BAUTISTA JEAN CARLOS	1.600.000		F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.600.000	256.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.600.000	64.000	COMFAORIE NTE-CCF36	1.600.000	64.000	1.600.000	111.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	495.400	S	5742101

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901506138	9	CONSTRUCOLING SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-498	CLL 10 N 15 10		5623956			CONSTRUCOLINGSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-07	2023-08	27216983	E	2023-08-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.157.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	27216983		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN		IBC SALUD		IBC RIESGOS
7.210.000		7.210.000		7.210.000
				IBC CAJAS
				7.210.000
				IBC PARAF
				0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				4	1.153.600	0	0	0	1.153.600
PORVENIR	230301	800224808	8	1	256.000	0	0	0	256.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	712.000	0	0	0	712.000
PROTECCION	230201	800229739	0	1	185.600	0	0	0	185.600
EPS(Administradoras: 3)				4	288.400	0	0	0	288.400
COMFAORIENTE	CCFC50	890500675	6	1	46.400	0	0	0	46.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	64.000	0	0	0	64.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	178.000	0	0	0	178.000
ARP(Administradoras: 1)				4	427.300	0	0	0	427.300
Gran Total					1.442.000	0	0	0	1.442.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARL SURA	14-11	890903790	5	4	427.300	0	0	0	427.300
CCF(Administradoras: 1)				4	288.400	0	0	0	288.400
COMFAORIENTE	CCF36	890500675	6	4	288.400	0	0	0	288.400
Gran Total					2.157.700	0	0	0	2.157.700

ASOPAGOS
s.a.

PAGADO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

	FECHA	4	8	2023
	(Día)	(Mes)	(Año)	

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS	DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA
--------------------------	------------------------------

CONTRATO DE OBRA No. MT-LP-002 DE 2023	CONTRATISTA: CONSFUCOL SAS.
--	-----------------------------

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

FECHA DE INICIO:	15 DE MAYO DE 2023
PLAZO INICIAL:	4 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 <small>(Incluye prórrogas y suspensiones)</small>
VALOR INICIAL:	\$ 899.999.173,00
VALOR ACUMULADO:	\$ - <small>(Incluye adiciones)</small>
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ 15.875.546,00
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1667 DE 2022	INTERVENTOR: CONSTRUCOLING SAS
--	--------------------------------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Cumplimiento	10%	\$ 89.999.917,30	Desde			Hasta		
			15	5	2023	14	1	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 179.999.834,60	15	5	20223	14	9	2026
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 269.999.751,90	14	9	2023	14	9	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101030326	Certificado de modificación o anexo No.: 0 <small>(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.R. Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 23/05/2023
--	--

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	\$ 232.000.000,00	Desde			Hasta		
			15	5	2023	14	9	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009657	OTRAS PÓLIZAS No.
Certificado de modificación o anexo No.: 2 <small>(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.R. Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 23/05/2023	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA	4	7	2023
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIÓN

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIÓN

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año


PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma: _____

Nombre: CARLOS MARIO PACHECO GAONA

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 25202-093938 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.
