

	<p align="center">INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</p> <p align="center">PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</p> <p align="center">MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</p> <p align="center">LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA</p>		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

Contrato de Obra No.	MT-LP-002 DE 2023	Contratista:	CONSFUCOL SAS.
Contrato de Interventoría No.	1667 -2022	Interventoría:	CONSTRUCOLING SAS.

Objeto Contrato de Obra:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL -NACIONAL

INFORME MENSUAL No.	5	MES O PERIODO:	1 SEPTIEMBRE -30 SEPTIEMBRE DE 2023
----------------------------	---	-----------------------	-------------------------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	INTRODUCCIÓN		8
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		9
2.1	Localización		10
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		10
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		11
2.4	Características técnicas del proyecto		12
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		14
3.1	Información general del contrato		14
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		15
3.3	Seguimiento Items no previstos		15
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		15
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		16
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	31
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	43
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	44
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	45
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	46
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N/A
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	40
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	N/A
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N/A
	• Seguimiento Programa de Obra	MEPI-MN-IN-2-FR-2	N/A
	• Seguimiento Programa de Inversiones		
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N/A
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-6-FR-2	N/A
		MEPI-MN-IN-14-FR-1	49
		MEPI-MN-IN-14-FR-2	N/A
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		19
5.1	Información general del contrato		19
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		20
5.3	Informes especialistas y profesionales		24
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		24
5.5	Informe matriz de riesgos.		24
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		24
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		24
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		24
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	52
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	53
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	56
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	57
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N/A
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	Conclusiones y recomendaciones		26
8	Anexos		26
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		26
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		26
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		26
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		26

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firmado digitalmente por
 ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Firma: _____

Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. 3684 de 24/11/2021

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO

MEPI-MN-IN-15-FR-2

VERSION

1

PÁGINA

FECHA

5-oct-23

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

INVIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OCAÑA

PERIODO MES:

1 DE SEPTIEMBRE- 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE OBRA No.:

MT-LP-002 DE 2023

PLAZO INICIAL:

4 MESES

FECHA DE INICIO:

15 DE MAYO DE 2023

VALOR INICIAL (incluido IVA) :

\$ 899.999.173,00

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

FECHA DE SUSPENSIÓN:

VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

\$ -

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO:

8 DE OCTUBRE DE 2023

ANTICIPO CONCEDIDO:

\$ -

PLAZO ACUMULADO:

4.77 MESES

ANTICIPO AMORTIZADO:

\$ -

CONTRATISTA:

CONSPUCOL SAS.

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

1687 DE 2022

INTERVENTOR:

CONSTRUCCOLING SAS.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

ELIAS JAMES FERNANDEZ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	
Pavimentación	Construcción	M3	295
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	M2	2.1752,27	
Otros (Especificar cuales)			

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	
Pavimentación	Construcción	M3	80	295
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento	0	0	0	
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	869.796.973,00		869.796.973,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	13.340.797,00		13.340.797,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	13.340.797,00	2.534.749,00	15.875.546,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD	796.924,17	186.932,83	983.857,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	897.277.491,17	2.721.681,83	899.999.173,00

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	\$ 312.760.449,00		\$ 312.760.449,00	\$ 818.272.461,00
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				\$ 818.272.461,00

INVERSIÓN EN OBRA

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):

\$ 846.969.688

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

\$ 831.613.258

AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

98%

MANO DE OBRA CALIFICADA:

1

MANO DE OBRA NO CALIFICADA:

9

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

10

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Indicar la localización y actividad.

Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre CARLOS MARIO PACHECO SAONA

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No. 25202-093933 CND

Original: Informe mensual de Interventoría Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Interventor, Dirección Territorial

 CONSTRUCOLING S.A.S <small>NIT. 901.506.138-9</small>	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 5 PERIODO: SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023	Página 1 de 30

**MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

CONSTRUCOLING SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1667 DE 2022

OBJETO

**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE
EL TARRA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA
COLOMBIA RURAL**

CONTRATO DE OBRA No 004 DE 2023



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 4
Original

PERIODO
1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

NORTE DE SANTANDER
SEPTIEMBRE DE 2023

 CONSTRUCOLING S.A.S <small>NIT. 901.506.138-9</small>	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 5 PERIODO: SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023	Página 2 de 30

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 05
1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

**INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,
 GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA
 DUITAMA PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y
 NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA
 "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1**

ELABORÓ:	Director de Interventoría CARLOS MARIO PACHECO GAONA M. P. N°: 25202-093938 CND
REVISÓ Y APROBÓ:	Director de Interventoría CARLOS MARIO PACHECO GAONA M. P. N°: 25202-093938 CND
VERSION:	0.0

Todos los derechos reservados. Este documento es de propiedad única del TERRITORIAL NORTE SANTANDER - SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL - INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. Ninguna parte de este Documento de autoría de CONSTRUCOLING SAS puede reproducirse, o transmitirse, de ninguna forma incluyendo fotocopias, grabaciones magnéticas o cualquier medio de almacenamiento de información y sistema de recuperación sin la previa autorización escrita del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, entidad contratante.

 CONSTRUCOLING S.A.S <small>NIT. 901.506.138-9</small>	<p>MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL</p>	<p>REV.: 0</p>
	<p>INFORME MENSUAL No. 5 PERIODO: SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023</p>	<p>Página 3 de 30</p>

TABLA DE CONTENIDO

PÁG.

1. INTRODUCCIÓN.....	6
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO.....	7
2.1 LOCALIZACIÓN.....	8
2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA.....	9
2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO.....	10
3. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA.....	12
3.1 INFORMACIÓN GENERAL	12
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES	13
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS.....	13
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	13
4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA.....	14
4.1 INFORMES SEMANALES	14
4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA.....	14
4.3 PERSONAL CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA.....	14
4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	14
4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	14
4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	14
4.7 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	14
4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA;Error! Marcador no definido.....	14
4.9 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	14
4.10 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA.....	15
4.11 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES	17
4.12 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA.....	17
4.13 ACTA DE REUNIÓN	17
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	18
5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.....	18
5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR	19
TÉCNICAS	19
SOCIAL.....	19
COMPONENTE AMBIENTAL	19
GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	19
5.3 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC	22
6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	23
6.1 EQUIPO Y VEHICULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	23

 CONSTRUCCOLING S.A.S <small>NIT. 901.506.138-9</small>	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 5 PERIODO: SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023	Página 4 de 30

6.2	PERSONAL CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA.....	23
6.3	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	23
6.4	SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	23
6.5	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	23
6.6	SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	24
6.7	PLAN DE CARGAS O REPOGRAMACION AL PLAN DE CARGAS APROBADO	24
6.8	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS	24
7	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	25
8	ANEXOS	26

 CONSTRUCOLING S.A.S <small>NIT. 901.506.138-9</small>	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 5 PERIODO: SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023	Página 5 de 30

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Sectores críticos 1.	9
Tabla 2. Sectores críticos 2.	10
Tabla 3. Información Contrato de Obra.	12
Tabla 4. Póliza Única y de Responsabilidad Civil del Contrato.	13
Tabla 5. Programa de Inversiones contrato de Obra 002 de 2023.	15
Tabla 6. Actas de reunión.	17
Tabla 7. Información Contrato de Interventoría.	18
Tabla 9. Personal contratista diciembre.	20
Tabla 11 Programa Anual de Caja- PAC.	22

LISTA DE IMÁGENES

Imagen 1. Localización del proyecto.	8
Imagen 2. Localización del proyecto.	8
Imagen 3. Estado inicial tramo 1.	9
Imagen 4. Estado inicial tramo 1.	10
Imagen 9. Programa de Inversiones contrato de obra 002 de 2023.	16

 CONSTRUCOLING S.A.S <small>NIT. 901.506.138-9</small>	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 5 PERIODO: SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023	Página 6 de 30

1. INTRODUCCIÓN

El programa del gobierno nacional "COLOMBIA RURAL", tiene por objetivo mantener y mejorar la transitabilidad y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de ejecución y financiación.

Con el fin de hacer seguimiento y control en la ejecución de los trabajos objeto del contrato de obra, el INVIAS celebró el contrato 1667 de 2022 (INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL) con la firma CONSTRUCOLING SAS.

Para el acompañamiento por parte de la Entidad al contrato de Interventoría y obra, fueron designados como Ordenador del Gasto y Supervisor técnico del Contrato al Ingeniero **ELIAS JAIMES FERNANDEZ**.

El presente documento corresponde al **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5** del periodo comprendido entre el 1 de septiembre hasta el 31 de septiembre de 2023, elaborado por CONSTRUCOLING SAS, en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Interventoría del Instituto Nacional de Vías.

En este informe se hace una descripción general de las actividades ejecutadas por el Contratista y las labores de control desarrolladas por la Interventoría durante el período en cuestión.

 CONSTRUCOLING S.A.S <small>NIT. 901.506.138-9</small>	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 5 PERIODO: SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023	Página 7 de 30

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa “COLOMBIA RURAL” que tiene como objetivo mantener y mejorar la transitabilidad y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de ejecución y financiación.

El Ente Territorial (Municipio El Tarra), se encuentra adelantando el proceso contractual bajo la modalidad de Licitación Pública, tendiente a contratar las obras que se deriven del Convenio Interadministrativo suscrito con el INVIAS, con el fin de llevar a cabo la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MARCO DE LA DECLARACIÓN DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 razón por la cual se requiere realizar las labores de Interventoría para efectuar el control y seguimiento al contrato de obra que suscriba el citado municipio.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 5 PERIODO: SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023	Página 8 de 30

2.1 LOCALIZACIÓN



Imagen 1. Localización del proyecto.

2.2 DESCRIPCION DE LOS MUNICIPIOS QUE HACEN PARTE DEL CORREDOR.

Las obras por construir se encuentran ubicadas en municipio de El Tarra del Departamento de NORTE DE SANTANDER

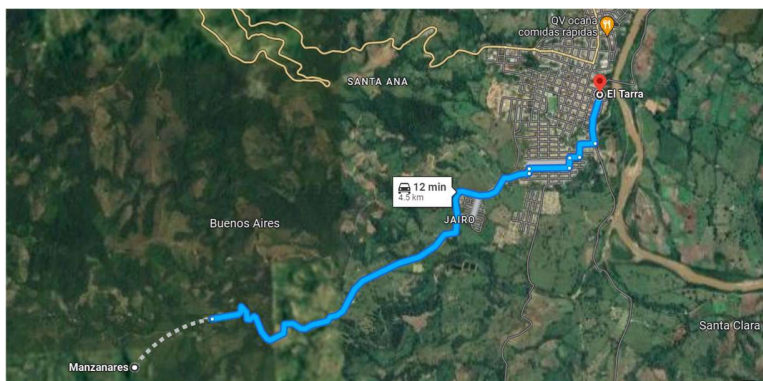


Imagen 2. Localización del proyecto

 CONSTRUCOLIG S.A.S <small>NIT. 901.506.138-9</small>	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 5 PERIODO: SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023	Página 9 de 30

El área del proyecto se encuentra ubicada en el departamento de Norte de Santander, municipio de El Tarra, el corredor vial inicia en la cabecera municipal K0+000 (N 8°34'8,40" / W 73°5'56,6") y llega hasta el K8+200 (N 8°33'15,07" / W 73°9'1,69"). Las obras por ejecución son derivadas del objeto del convenio 1458 de 2022 y se encuentran a lo largo de los 8,2 km de vía terciaria, corredor denominado El Tarra-Manzanares.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

Se intervendrán dos tramos en los cuales no cuentan con una estructura de vía, evidenciando alto deterioro en la capa de rodadura debido a la alta escorrentías y la carencia de estructuras hidráulicas para el manejo de estas.

Tabla 1. *Sectores críticos 1.*

LOCALIZACION DEL TRAMO						
TRAMO	DESCRIPCION	LONGITUD (ML)	LOCALIZACIÓN DE TRAMO			
			ELEMENTO	ABCISA	COORDENADA	
1	MANZANARES	280	INICIO DEL TRAMO	K2+570	N:	1438437.6
					E:	1106337.6
			FIN DEL TRAMO	K2+850	N:	1438346.4
					E:	1106091.0



Imagen 3. *Estado inicial tramo 1.*

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 5 PERIODO: SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023	Página 10 de 30

Tabla 2. Sectores críticos 2

LOCALIZACION DEL TRAMO					
TRAMO	DESCRIPCION	LONGITUD (ML)	LOCALIZACIÓN DE TRAMO		
			ELEMENTO	ABCISA	COORDENADA
1	MANZANARES	147	INICIO DEL TRAMO	K6+710	N: 1438022.08
					E: 1103172.29
			FIN DEL TRAMO	K6+857	N: 1438013.58
					E: 1103044.46



Imagen 4. Estado inicial tramo 1.

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades sobre las obras a ejecutar las cuales esta interventoría deberá supervisar en el proyecto y que deben ser supervisadas, controladas, verificadas, aprobadas, medidas y constatadas por la interventoría, como resultado del presente proceso, comprenden entre otras, las siguientes:

-  Construcción Placa Huella
-  Construcción y/o reparación de obras de drenaje

 CONSTRUCCOLING S.A.S <small>NIT. 901.506.138-9</small>	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 5 PERIODO: SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023	Página 11 de 30

Para la ejecución de las obras se deberá realizar el control de la construcción, dando estricto cumplimiento a lo establecido en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, última actualización (2022) y a las especificaciones particulares para su ejecución y a las Normas de Ensayo de Materiales del Instituto Nacional de Vías, adoptado por Resolución No. 1524 del 06 de mayo de 2022, de igual manera, se tendrán en cuenta las cartillas del programa Colombia Rural para la construcción de placa huella, obras de drenaje y estructuras viales.

-  Conformación de la calzada existente
-  Mejoramiento de la subrasante con adición de material

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 5 PERIODO: SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023	Página 12 de 30

3. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 3. Información Contrato de Obra.

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA	
Número de proceso de selección	MT-LP-002-2023
Número del contrato	002-2023
Fecha de suscripción	11 DE ABRIL DEL 2023
Objeto	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL
Contratista	CONSFUCOL SAS
NIT	900178027-8
Valor Total Inicial	\$ 899.999.173,00
Adiciones	
Valor acumulado del contrato	\$ 899.999.173,00
Modificaciones	
Aclaraciones	
Suspensiones	
Cesiones de participación contractual	
Plazo	CUATRO (4.77) MESES
Fecha de Inicio	15 DE MAYO DE 2023
Fecha de Terminación Actual del contrato	8 DE OCTUBRE DE 2023
Dirección	Carrera 4 No 9-55- Brr. San Isidro
Número de Teléfono	(097)8835539

 CONSTRUCOLING S.A.S <small>NIT. 901.506.138-9</small>	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 5 PERIODO: SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023	Página 13 de 30

Tabla 4. *Póliza Única y de Responsabilidad Civil del Contrato.*

AMPAROS	DESDE (DD-MM-AA)	HASTA (DD-MM-AA)	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	15/05/2023	14/09/2028	\$ 544,762,167.6
Responsabilidad civil	15/05/2023	14/09/2023	\$ 232,000,000.00

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades realizadas por parte del Contratista e Interventoría durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 30 de septiembre del 2023, fueron las siguientes:

- Construcción de estructura de rodadura
- Construcción de estructuras de drenaje
- Sello de juntas
- Seguimiento a la calidad de materiales y procesos constructivos.
- Revisión y seguimiento de los planes de inversión

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

Durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 30 de septiembre del 2023, no se presentaron actas de ítems no previstos:

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

El contratista ha mejorado sus rendimientos debido a los atrasos presentados en el mes de julio los cuales generaron atrasos en el programa de obra.

La interventoría al realizar un seguimiento de rendimientos y avances de obra actual se ha determinado un prorroga por 23 días para dar terminación a los compromisos contractuales. A su vez la interventoría adelanta seguimiento a procesos constructivos y seguimiento a la calidad.

 CONSTRUCOLIG S.A.S <small>NIT. 901.506.138-9</small>	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 5 PERIODO: SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023	Página 14 de 30

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 INFORMES SEMANALES

Se presentan en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA.

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Se presenta en el formato diligenciado ANEXO formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA.

4.3 PERSONAL CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-6 CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA.

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR10 ESTADO DEL TIEMPO.

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO.

4.7 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.

4.8 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

 CONSTRUCOLING S.A.S <small>NIT. 901.506.138-9</small>	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 5 PERIODO: SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023	Página 15 de 30

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN-IN-2-FR-2 SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO.


4.9 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

Teniendo como base el Programa y flujo de inversión presentado por la firma Contratista CONFUCOL SAS:

Tabla 5. *Programa de Inversiones contrato de Obra 002 de 2023*

PERIODO MENSUAL		PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO
MES 1	may-23	\$0	\$0	\$0	\$0
MES 2	jun-23	\$150'000.000	\$150'000.000	\$ 150'469.141	\$ 150.469.141
MES 3	jul-23	\$ 333'744.018	\$483'744.018	\$ 119.916.725	\$ 270.385.866
MES 4	Ago-23	\$ 306'955.809	\$790'739.827	\$ 314.893.620	\$ 630.279.489
MES 5	Sep-23	\$ 40'873.431	\$ 831'613.258	\$ 201.333.769	\$ 831.613.258
MES 6	OCT-23	\$ 38'185.715	\$ 869'798.973		
TOTAL			\$869'798.973		\$ 831.613.258

Imagen 5. Programa de Inversiones contrato de obra 002 de 2023.

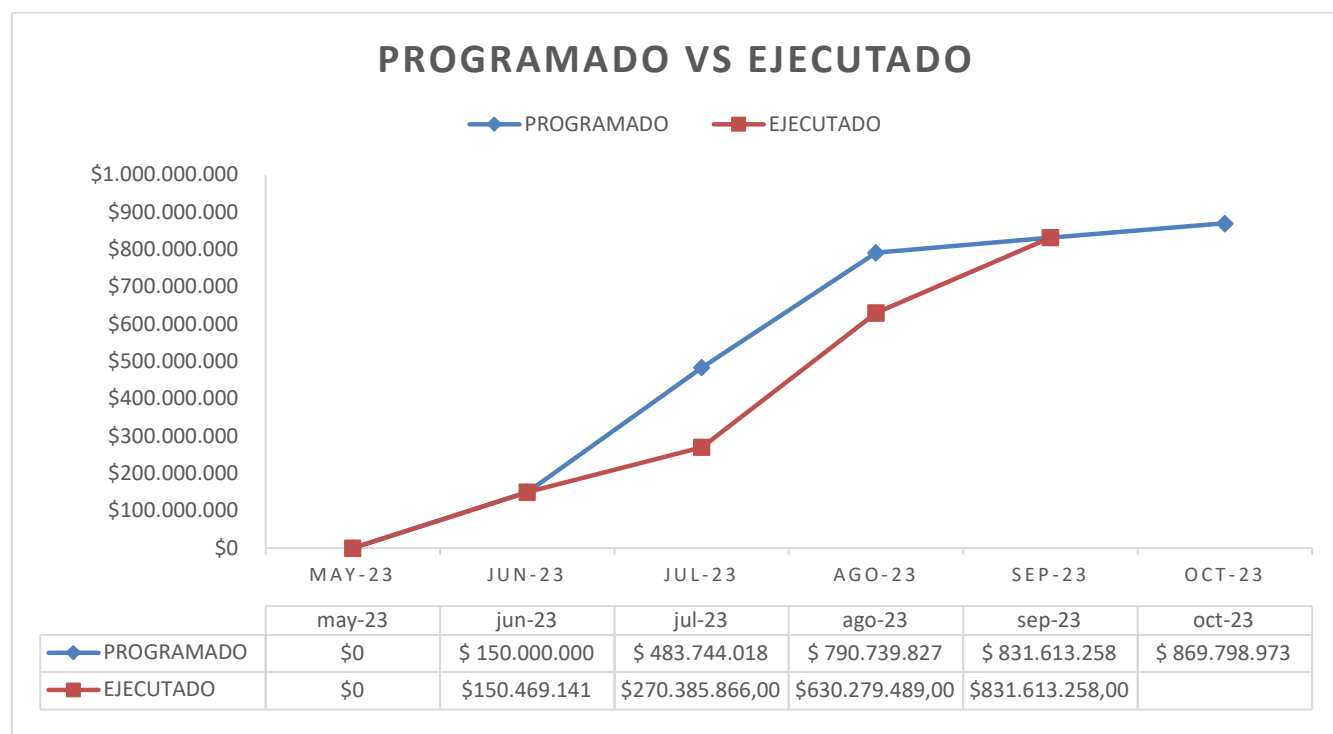

 CONSTRUCOLING S.A.S NIT. 901.506.138-9	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 5 PERIODO: SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023	Página 17 de 30

4.10 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN-IN-6-FR-2 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES.

4.11 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Durante el transcurso del mes de JULIO de 2023 se realizaron un (1) comités técnicos de obra los días:

- Viernes 2 de junio de 2023, Vereda manzanares.
- Viernes 30 de junio de 2023, Meet
- Martes 25 de julio de 2023, Meet

Se presenta como ANEXO formato diligenciado MEPI-MN-IN-14-FR-1 ACTA DE COMITÉ DE OBRA.

4.12 ACTA DE REUNIÓN

Durante el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo de 2022, se realizaron una (1) acta de reunión.

Tabla 6. *Actas de reunión.*

ID	FECHA	LUGAR	COMPONENTE	OBJETIVO DE LA REUNIÓN
1	16/05/2023	CALLE 11 # 15 -10 OFICINA 402 EDIFICIO INACOS – Ocaña, Norte de Santander	Técnico	ACTA DE REUNION TECNICA INICIAL

 CONSTRUCOLING S.A.S <small>NIT. 901.506.138-9</small>	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 5 PERIODO: SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023	Página 18 de 30

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tabla 7. Información Contrato de Interventoría.

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Número de proceso de selección	IP-DT-OCA-010-2022
Número del contrato	1667 DE 2022
Fecha de suscripción	26/12/2022
Objeto	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.
Contratista	CONSTRUCOLING SAS
NIT	901506138-9
Valor Total Inicial	\$76.160.000,00
Adiciones	\$ -
Valor acumulado del contrato	\$ -
Modificaciones	N/A
Aclaraciones	N/A
Suspensiones	27/12/2022 AL 16/05/2023
Cesiones de participación contractual	N/A
Plazo	4.77 MESES
Fecha de Inicio	26 DE DICIEMBRE DEL 2022
Fecha de Terminación Actual del contrato	8 DE OCTUBRE DE 2023
Dirección	CALLE 11 # 15-10 OF 402
Número de Teléfono	3154071325

 CONSTRUCOLING S.A.S NIT. 901.506.138-9	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 5 PERIODO: SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023	Página 19 de 30

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Las actividades generales desarrolladas por la Interventoría durante el presente período fueron las siguientes:

TÉCNICAS

-  Se hace acompañamiento en la priorización de actividades y estudios y diseños adelantados por el contratista.
-  Se hace seguimiento a documentación habilitante para el inicio de actividades
-  Revisión y aprobación de estudios y diseños
-  Seguimiento de procesos constructivos
-  Verificación de niveles de subbase según diseño geométrico.
-  Control de concretos para placa huella

SOCIAL

En el periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 30 de septiembre, la interventoría realizó seguimiento a y divulgación de las obras a realizar en zonas aledañas.

COMPONENTE AMBIENTAL

Para el presente informe se relacionan las actividades correspondientes al seguimiento, control y verificación por parte de la interventoría COSNTRUCOLING SAS a la gestión ambiental desarrollada por el contratista CONSFUCOL SAS, donde se estudia la validación del PAGA radicado por el contratista.

GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El contratista indica que este proyecto tiene como objetivo brindar a los trabajadores de obra un área segura de trabajo e informar a los usuarios de la vía sobre la obra que se está ejecutando.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 5 PERIODO: SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023	Página 20 de 30

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se realizaron actividades para la planificación de los diferentes temas de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de ellos tenemos:

- Análisis de trabajo seguro
- Permisos de trabajo
- Charlas de seguridad
- Capacitaciones
- Inspecciones

La interventoría sugiere que para este componente sea evidenciadas cada una de las actividades que se realizaron durante el periodo (Análisis de trabajo seguro, permisos de trabajo, charlas de seguridad, capacitaciones, inspecciones). De igual forma se reitera la importancia de implementar estas medidas antes de iniciar los frentes de obra.

EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO

Se manifiesta por parte del contratista que todo el personal que ingresa con la Organización se debe realizar el examen médico ocupacional. Para el periodo comprendido desde el 1 de septiembre al 30 de septiembre.

La interventoría da revisión a la documentación presentada por parte del contratista, dentro de los cuales se encuentran los exámenes médicos de ingreso, afiliaciones de ARL, EPS, fondo de pensiones y caja de compensación.

Por parte de la interventoría durante el periodo comprendido del 1 al 30 de septiembre del 2023, no se realizó ingreso de personal.

CONTRATACIÓN DE PERSONAL

El contratista describe el número de trabajadores contratados para el periodo comprendido desde el 1 al 30 de septiembre del 2023, mediante la siguiente tabla.

Tabla 8. *Personal contratista diciembre*

PERSONAL CONTRATADO	NUMERO DE TRABAJADORES MES DE MAYO
ADMINISTRATIVOS	1
OPERATIVOS	9
TERCEROS	
TOTAL	10

Fuente: CONFUCOL

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 5 PERIODO: SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023	Página 21 de 30

La interventoría da revisión al número de trabajadores ingresados en el periodo comprendido del 1 al 30 de septiembre, mediante los documentos del personal presentados por el contratista y se da claridad que por parte de la interventoría no se presenta el ingreso de trabajadores.

INDUCCIONES SST

El contratista manifiesta que dentro de las principales actividades se tiene la inducción del personal que ingresa, en este proceso se hace una introducción a temas asociados con la empresa y su sistema de gestión, la información específica que es suministrada se relaciona a continuación:

➤ SST:

- Uso de elementos de protección personal, capacitación en cuanto al uso, importancia y sanciones disciplinarias
- Normas generales que se deben cumplir durante la ejecución de las actividades.
- Política de prevención para el consumo de alcohol, tabaquismo y sustancias psicoactivas.
- Planes de emergencia en cada uno de los frentes.
- Se divulga el procedimiento de llamados de atención y sanciones disciplinarias por incumplimiento a las normas de seguridad industrial. (Proceso de descargos).
- Identificación de peligros y riesgos en las zonas de trabajo.
- Reglamento de higiene y seguridad industrial.
- Conocimiento del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. Matriz de peligros.
- Análisis de seguro de trabajo.

➤ GENERALIDADES DE LA EMPRESA

- Presentación de la empresa.
- Formas de pago (Compensación flexible).
- Beneficios corporativos (Oficina/obras).
- Seguridad social.
- Derechos y deberes empleados.
- Dotación/Uniformes.
- Horarios de trabajo. Permisos.
- Manual de convivencia.
- Perfiles de cargo (Responsabilidades).
- Reglamento interno del trabajo e Higiene y seguridad industrial.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 5 PERIODO: SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023	Página 22 de 30

ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

El contratista manifiesta que, durante el periodo del 1 al 31 de julio, se realizó la entrega de elementos de protección personal a todo el personal que labora en los diferentes frentes de obra.

Se realizó el debido seguimiento y reposición al uso de los elementos de protección personal.

Antes de iniciar labores y una vez realizada la revisión de las afiliaciones o autoliquidaciones de EPS, ARL, AFP y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR y que el personal haya asistido a la inducción inicial, el trabajador procede a retirar su dotación y elementos de protección personal de acuerdo al cargo, que básicamente consiste en:

- Camisa de dril y pantalón jeans
- Botas de seguridad de caucho y cuero con puntera de acero Casco de seguridad
- Protector auditivo de copa o inserción (según el cargo y la necesidad)
- Protección respiratoria (mascarilla desechable y/o respirador con filtros o cartuchos)
- Guantes de vaqueta, carnaza, soldador, nitrilo, poliuretano o caucho de acuerdo a la actividad.
- Gafas de seguridad (lente oscuro y transparente)

Por otra parte, cada vez que se deterioran los elementos, se realizan las respectivas reposiciones.

El interventor da revisión a los formatos de entrega de elementos de protección personal (EPP).

5.3 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

Tabla 9 Programa Anual de Caja- PAC.

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Saldo Registro Presupuestal	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

 CONSTRUCOLING S.A.S <small>NIT. 901.506.138-9</small>	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 5 PERIODO: SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023	Página 23 de 30

5.4 INFORME MATRIZ DE RIESGOS

5.5 INFORMACION OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA.

6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 EQUIPO Y VEHICULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-15 -FR 5 EQUIPO Y VEHICULOS DE INTERVENTORÍA.

6.2 PERSONAL CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-15-FR-7 PERSONAL CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se presentada en el ANEXO. MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-15-FR-13 el SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-15-FR-15 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

 CONSTRUCOLING S.A.S NIT. 901.506.138-9	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 5 PERIODO: SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023	Página 24 de 30

6.6 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN-IN-3-FR-1 y MEPI-MN-IN-3-FR-2. INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

6.7 PLAN DE CARGAS O REPOGRAMACION AL PLAN DE CARGAS APROBADO

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN-IN-9-FR-2 PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACION AL PLAN DE CARGAS APROBADO CONTRATO DE INTERVENTORIA.

6.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-9-FR-3 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 5 PERIODO: SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023	Página 25 de 30


7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Los tiempos de entrega para estudios y diseños estuvieron dentro de los términos acordados, por esta razón se lleva una programación adecuada.
- El contratista con acompañamiento de la interventoría viene adelantando las socializaciones con la comunidad para el inicio de actividades.
- Se ha mejorados los rendimientos de obra disminuyendo el atraso presentado en el mes de julio por fuertes lluvias
- Se adelanta prorroga en tiempo por 23 días para así dar culminación a los compromisos contractuales
- Se terminaron todas las estructuras hidráulicas previstas en el presupuesto
-

CARLOS MARIO PACHECO GAONA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	<p>MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL</p>	<p>REV.: 0</p>
	<p>INFORME MENSUAL No. 5 PERIODO: SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023</p>	<p>Página 26 de 30</p>

8 ANEXOS

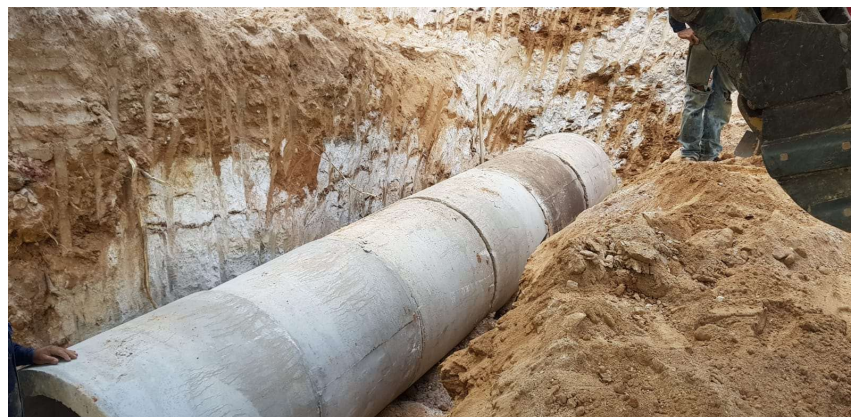

	<p>MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL</p>	<p>REV.: 0</p>
	<p>INFORME MENSUAL No. 5 PERIODO: SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023</p>	<p>Página 27 de 30</p>



	<p>MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL</p>	<p>REV.: 0</p>
	<p>INFORME MENSUAL No. 5 PERIODO: SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023</p>	<p>Página 28 de 30</p>



	<p>MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL</p>	<p>REV.: 0</p>
	<p>INFORME MENSUAL No. 5 PERIODO: SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023</p>	<p>Página 29 de 30</p>



	<p>MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS COLOMBIA RURAL</p>	<p>REV.: 0</p>
	<p>INFORME MENSUAL No. 5 PERIODO: SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023</p>	<p>Página 30 de 30</p>





INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 7/09/2023
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:	COLOMBIA RURAL		
UNIDAD EJECUTORA:	INVIAS	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	OCAÑA
SEMANA No.:		15 del 27/08/2023	al 2/09/2023. Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	ELIAS JAIMES FERNANDEZ		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:
ELIAS JAIMES FERNANDEZ			
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):			
SE realizara la pvimentacion mediante placa huella entre el K2+570 al K2+850 y el K6+710 al K6+857 estas con una longitud total de 427ml			

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa “COLOMBIA RURAL” que tiene como objetivo mantener y mejorar la transitabilidad y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de ejecución y financiación.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSFUCOL SAS			INTERVENTOR:	CONSTRUCOLING SAS		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	MT-LP-002 DE 2023	VALOR INICIAL:	\$ 899.999.173,00	CONTRATO No.	1667 DE 2022	VALOR INICIAL:	\$ 76.160.000,00
FECHA DE INICIO:	15 DE MAYO DE 2023	VALOR ADICIONES:	\$ -	FECHA DE INICIO:	26 DE DICIEMBRE DE 2022	VALOR ADICIONES:	\$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	\$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	26 DE ABRIL DE 2023	VALOR ACUMULADO:	\$ 76.160.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:			\$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ANTICIPO:	\$ -
			\$ -			VALOR AMORTIZADO:	\$ -
			\$ 899.999.173,00			SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023			
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 899.999.173			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 837.308.502			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 62.690.671			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 76.160.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 51.736.440			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 24.423.560			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

83436004

OBRA			
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$	869.798.973,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	820.449.098,74	94%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	632.917.232,00	73%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	(187.531.866,74)	-22%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	16.859.403,00	2%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	837.308.501,74	93%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	649.776.635,00	72%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	(187.531.866,74)	-21%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	69.321.634,27	8%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	37.281.964,87	4%
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO	
		X	
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____			
PERIODO FACTURADO: _____			
VALOR FACTURA:	\$	_____	
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			
Observaciones:			

INTERVENTORIA			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	51.736.440,00	68%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	51.736.440,00	68%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	4.165.000,00	5%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	4.165.000,00	5%
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO	
	x		
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____			
PERIODO FACTURADO: _____			
VALOR FACTURA: \$ _____ - _____			
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			
Observaciones:			

ANTICIPOS	
Otorgado \$	
Amortizado \$	
Saldo \$	

	INDICADOR I/C
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado \$	
Amortizado \$	
Saldo \$	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 95% Avance o Atraso Físico % 9%
Meta Física Ejecutada % 86%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total
PLACA HUELLA	ML	427	2023		Prog	260	147		407
					Ejec	220	147		367
* ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$	\$ 15.875.546,00	2023		Prog	\$ 7.937.773,00	\$ 7.937.773,00		\$ 15.875.546,00
					Ejec	\$ 7.937.773,00	\$ 7.937.773,00		\$ 15.875.546,00
*					Prog				
					Ejec				
*					Prog				
					Ejec				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: K2+570 al K2+850
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2: K6+710 al K6+857

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton	1	1
Vibro compactador, potencia 153 HP, peso 10 ton]	1	1
Carrotanque de agua(1000 Galones)]	1	1
Total	3	3

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI
LICENCIA AMBIENTAL: SI

DISPONIBLE
NO
NO

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI
LICENCIA AMBIENTAL: SI

NO
NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A
VERTIMIENTOS: SI NO N/A
EMISIONES: SI NO N/A
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: VIGENTE

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL


TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PEDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Construccion de placa huella



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Indicar localización y actividad



Indicar localización y actividad



Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CARLOS MARIO PACHECO GAONA

Matrícula Profesional No.: 24202-093938 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
					VERSIÓN	1	
					PÁGINA		

FECHA				20/09/2023 (Día / Mes / Año)	
-------	--	--	--	---------------------------------	--

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:	COLOMBIA RURAL				
UNIDAD EJECUTORA:	INVIAS	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	OCAÑA	SEMANA No.:	17 del 10/09/2023 al 16/09/2023 Último Informe Semanal SI ☐
				(Numeración consecutiva)	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	ELIAS JAIMES FERNANDEZ		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	ELIAS JAIMES FERNANDEZ	
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL				
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):					
SE realizara la pvimentacion mediante placa huella entre el K2+570 al K2+850 y el K6+710 al K6+857 estas con una longitud total de 427ml					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa “COLOMBIA RURAL” que tiene como objetivo mantener y mejorar la transitabilidad y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de ejecución y financiación.					

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA: CONSFUCOL SAS				INTERVENTOR: CONSTRUCOLING SAS			
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No. MT-LP-002 DE 2023		VALOR INICIAL: \$ 899.999.173,00		CONTRATO No. 1667 DE 2022		VALOR INICIAL: \$ 76.160.000,00	
FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO DE 2023		VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 26 DE DICIEMBRE DE 2022		VALOR ADICIONES: \$ -	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		VALOR ACUMULADO: \$ -		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 26 DE ABRIL DE 2023		VALOR ACUMULADO: \$ 76.160.000,00	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		\$ -		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		VALOR ANTICIPO: \$ -	
		\$ -				VALOR AMORTIZADO: \$ -	
		\$ 899.999.173,00				SALDO POR AMORTIZAR: \$ -	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023			
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 899.999.173			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 886.658.376			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 13.340.797			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 76.160.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 60.066.440			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 16.093.560			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

83436004

OBRA			
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 883.139.770,00		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 869.798.973,00	98%	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 831.613.258,00	94%	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ (38.185.715,00)	-4%	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 16.859.403,00	2%	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 886.658.376,00	99%	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 848.472.661,00	94%	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ (38.185.715,00)	-4%	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 39.529.573,00	4%	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 59.981.994,00	7%	

SI

NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 60.066.440,00	79%	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 60.066.440,00	79%	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 4.165.000,00	5%	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 4.165.000,00	5%	

SI

NO

x

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado \$	
Amortizado \$	
Saldo \$	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado \$	
Amortizado \$	
Saldo \$	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 100% Avance o Atraso Físico %
Meta Física Ejecutada % 100%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
PLACA HUELLA	ML	427	2023		Prog	280	147		427	100%
					Ejec	280	147		427	100%
* ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$	\$ 15.875.546,00	2023		Prog	\$ 7.937.773,00	\$ 7.937.773,00		\$ 15.875.546,00	100%
					Ejec	\$ 7.937.773,00	\$ 7.937.773,00		\$ 15.875.546,00	100%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: K2+570 al K2+850
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2: K6+710 al K6+857

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton	1	1
Vibro compactador, potencia 153 HP, peso 10 ton]	1	1
Carro tanque de agua(1000 Galones)]	1	1
Total	3	3

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES					PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL				
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	<u>DISPONIBLE</u>	NO	ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
			LICENCIA AMBIENTAL:		SI	NO	N/A		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
			LICENCIA AMBIENTAL:		SI	NO	N/A		
OBSERVACIONES:					CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
					OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
					VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
					EMISIONES:	SI	NO	N/A	
					OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	
OBSERVACIONES:					OBSERVACIONES:				

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: VIGENTE

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER		
10	3			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:				
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:				
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:				
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:			13	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:		OBSERVACIONES:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:		
AVALÚOS APROBADOS:		
PREDIOS ADQUIRIDOS:		

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

--

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Construccion de placa huella

Sello de juntas en placa huella		
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS		
<div><div><div>PROGRAMADO</div><div>EJECUTADO</div></div><div><div><div>KG-570</div><div>KG-650</div><div>KG-770</div><div>KG-857</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>MEJORAMIENTO</div><div>SUBBASE</div><div>PLACA HUELLA</div><div>SEÑALIZACION</div></div></div></div> <p>El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.</p>		
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
<div><div>Indicar localización y actividad</div></div>	<div><div>Indicar localización y actividad</div></div>	<div><div>Indicar localización y actividad</div></div>
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
		<div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE: CARLOS MARIO PACHECO GAONA</div><div>Matrícula Profesional No.: 25202-093938 CND</div></div>
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.		

<div><div><div></div><div>INVIAS</div></div></div>	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL				<div><div>CÓDIGO</div><div>MEPI-MN1-IN-15-FR-3</div></div> <div><div>VERSIÓN</div><div>1</div></div> <div><div>PÁGINA</div><div></div></div>
FECHA					12/09/2023 (Día / Mes / Año)
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: COLOMBIA RURAL					
UNIDAD EJECUTORA: INVIAS		DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA		SEMANA No.: 16 del 3/09/2023 al 9/09/2023 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIAS JAIMES FERNANDEZ		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ELIAS JAIMES FERNANDEZ			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): SE realizara la pvimentacion mediante placa huella entre el K2+570 al K2+850 y el K6+710 al K6+857 estas con una longitud total de 427ml					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa “COLOMBIA RURAL” que tiene como objetivo mantener y mejorar la transitabilidad y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de ejecución y financiación.					
CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA: CONSFUCOL SAS			INTERVENTOR: CONSTRUCOLING SAS		
INTEGRANTES: CONTRATO No. MT-LP-002 DE 2023 FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO DE 2023 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:			INTEGRANTES: CONTRATO No. 1667 DE 2022 FECHA DE INICIO: 26 DE DICIEMBRE DE 2022 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 26 DE ABRIL DE 2023 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
VALOR INICIAL: \$ 899.999.173,00 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ - \$ - \$ - \$ 899.999.173,00			VALOR INICIAL: \$ 76.160.000,00 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 76.160.000,00 VALOR ANTICIPO: \$ - VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ -		
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2023			
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 899.999.173			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 847.128.803			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 52.870.370			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 76.160.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 55.901.440			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 20.258.560			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos) 83436004					
<div><div><div>OBRA</div><div>VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 869.798.973,00 INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 830.269.400,00 95% INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 692.899.226,00 80% AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ (137.370.174,00) -16% OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ 16.859.403,00 2% (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 847.128.803,00 94% TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 709.758.629,00 79% AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ (137.370.174,00) -15% INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 39.529.573,00 5% INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 59.981.994,00 7% RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <div>SI NO</div><div>X</div> No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: PERIODO FACTURADO: VALOR FACTURA: \$ - (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite) Observaciones:</div><div><div>INTERVENTORÍA</div><div>TOTAL INVERSIÓN \$ 55.901.440,00 73% PROGRAMADA: TOTAL INVERSIÓN \$ 55.901.440,00 73% EJECUTADA: \$ 4.165.000,00 5% INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 4.165.000,00 5% RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <div>SI NO</div><div>x</div> No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: PERIODO FACTURADO: VALOR FACTURA: \$ - (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite) Observaciones:</div></div></div></div>					

ANTICIPOS	
Otorgado \$	
Amortizado \$	
Saldo \$	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado \$	
Amortizado \$	
Saldo \$	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %100%

Meta Física Ejecutada %98%

Avance o Atraso Físico %2%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
PLACA HUELLA	ML	427	2023		Prog	280	147		427	100%
					Ejec	270	147		417	98%
* ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$	\$ 15.875.546,00	2023		Prog	\$ 7.937.773,00	\$ 7.937.773,00		\$ 15.875.546,00	100%
					Ejec	\$ 7.937.773,00	\$ 7.937.773,00		\$ 15.875.546,00	100%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:K2+570 al K2+850

TRAMO Y/O SECTOR 2:K6+710 al K6+857

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:PERMISO MINERO: SINO LICENCIA AMBIENTAL: SINO

UBICACIÓN:PERMISO MINERO: SINO LICENCIA AMBIENTAL: SINO

OBSERVACIONES:

DISPONIBLE

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SINO N/A

LICENCIA AMBIENTAL: SINO N/A

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SINO N/A

CONCESIÓN DE AGUAS: SINO N/A

OCUPACIÓN DE CAUCES: SINO N/A

VERTIMIENTOS: SINO N/A

EMISIONES: SINO N/A

OTROS (Especificar cual) SINO N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: VIGENTE

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA10	INTER3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: FICHAS PREDIALES APROBADAS: AVALÚOS APROBADOS: PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Construccion de placa huella

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
Construccion de placa huella y estructuras hidráulicas		
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS		
<div><div><div>PROGRAMADO</div><div>EJECUTADO</div></div><div><div><div>0+4570</div><div>0+4580</div><div>0+7720</div><div>0+4587</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>MEJORAMIENTO</div><div>SUBBASE</div><div>PLACA HUELLA</div><div>SEÑALIZACION</div></div></div></div> <p>El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.</p>		
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
<div></div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div></div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div></div> <div>Indicar localización y actividad</div>
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
		<div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE: CARLOS MARIO PACHECO GAONA</div><div>Matrícula Profesional No.: 25202-093938 CND</div></div>
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
					VERSIÓN	1	
					PÁGINA		
					FECHA	2/10/2023 (Día / Mes / Año)	
I. INFORMACIÓN GENERAL							
PROYECTO: COLOMBIA RURAL							
UNIDAD EJECUTORA: INVIAS		DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA		SEMANA No.: 18 del 17/09/2023 al 23/09/2023 Último Informe Semanal SI ☐			
			(Numeración consecutiva)				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIAS JAIMES FERNANDEZ		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ELIAS JAIMES FERNANDEZ					
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL							
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):							
SE realizara la pvimentacion mediante placa huella entre el K2+570 al K2+850 y el K6+710 al K6+857 estas con una longitud total de 427ml							
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO							
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa “COLOMBIA RURAL” que tiene como objetivo mantener y mejorar la transitabilidad y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de ejecución y financiación.							
CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA: CONSFUCOL SAS				INTERVENTOR: CONSTRUCOLING SAS			
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No. MT-LP-002 DE 2023		VALOR INICIAL: \$ 899.999.173,00		CONTRATO No. 1667 DE 2022		VALOR INICIAL: \$ 76.160.000,00	
FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO DE 2023		VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 26 DE DICIEMBRE DE 2022		VALOR ADICIONES: \$ -	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		VALOR ACUMULADO: \$ -		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 26 DE ABRIL DE 2023		VALOR ACUMULADO: \$ 76.160.000,00	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		\$ -		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		VALOR ANTICIPO: \$ -	
		\$ -				VALOR AMORTIZADO: \$ -	
		\$ 899.999.173,00				SALDO POR AMORTIZAR: \$ -	
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO							
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:							
CONTRATO	VIGENCIA	2023					
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 899.999.173					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 886.658.376					
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 13.340.797					
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 76.160.000					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 64.231.440					
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 11.928.560					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)							
(Indicar valores en pesos) 83436004							
OBRA							
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):		\$ 883.139.770,00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ 869.798.973,00	98%				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ 846.969.688,00	96%				
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ (22.829.285,00)	-3%				
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ 16.859.403,00	2%				
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)							
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ 886.658.376,00	99%				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 863.829.091,00	96%				
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ (22.829.285,00)	-3%				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ 15.356.430,00	2%				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ 15.000.000,00	2%				
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		SI NO					
			X				
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:							
PERIODO FACTURADO:							
VALOR FACTURA:		\$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)							
Observaciones:							
INTERVENTORÍA							
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ 64.231.440,00	84%				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 64.231.440,00	84%				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ 4.165.000,00	5%				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ 4.165.000,00	5%				
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		SI NO					
		x					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:							
PERIODO FACTURADO:							
VALOR FACTURA:		\$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)							
Observaciones:							

ANTICIPOS	
Otorgado \$	
Amortizado \$	
Saldo \$	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado \$	
Amortizado \$	
Saldo \$	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 100% Avance o Atraso Físico %
Meta Física Ejecutada % 100%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
PLACA HUELLA	ML	427	2023		Prog	280	147		427	100%
					Ejec	280	147		427	100%
* ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$	\$ 15.875.546,00	2023		Prog	\$ 7.937.773,00	\$ 7.937.773,00		\$ 15.875.546,00	100%
					Ejec	\$ 7.937.773,00	\$ 7.937.773,00		\$ 15.875.546,00	100%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton	1	1
Vibro compactador, potencia 153 HP, peso 10 ton]	1	1
Carrotanque de agua(1000 Galones)]	1	1
Total	3	3

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: K2+570 al K2+850 TRAMO Y/O SECTOR 2: K6+710 al K6+857
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES					PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL				
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	DISPONIBLE NO	ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OBSERVACIONES:					OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
					VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
					EMISIONES:	SI	NO	N/A	
					OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	
					OBSERVACIONES:				

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: VIGENTE

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER				
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	3	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:		OBSERVACIONES:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:						
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	13					

VI. GESTIÓN PREDIAL


TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:		OBSERVACIONES:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:		
AVALÚOS APROBADOS:		
PREDIOS ADQUIRIDOS:		


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Construccion de placa huella

Sello de juntas en placa huella		
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS		
<div><div><div>PROGRAMADO</div><div>EJECUTADO</div></div><div><div><div>KG-570</div><div>KG-650</div><div>KG-770</div><div>KG-857</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>MEJORAMIENTO</div><div>SUBBASE</div><div>PLACA HUELLA</div><div>SEÑALIZACION</div></div></div></div> <p>El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.</p>		
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
<div><p>Indicar localización y actividad</p></div>	<div><p>Indicar localización y actividad</p></div>	<div><p>Indicar localización y actividad</p></div>
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
		<div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE: CARLOS MARIO PACHECO GAONA</div><div>Matrícula Profesional No.: 25202-093938 CND</div></div>
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.		

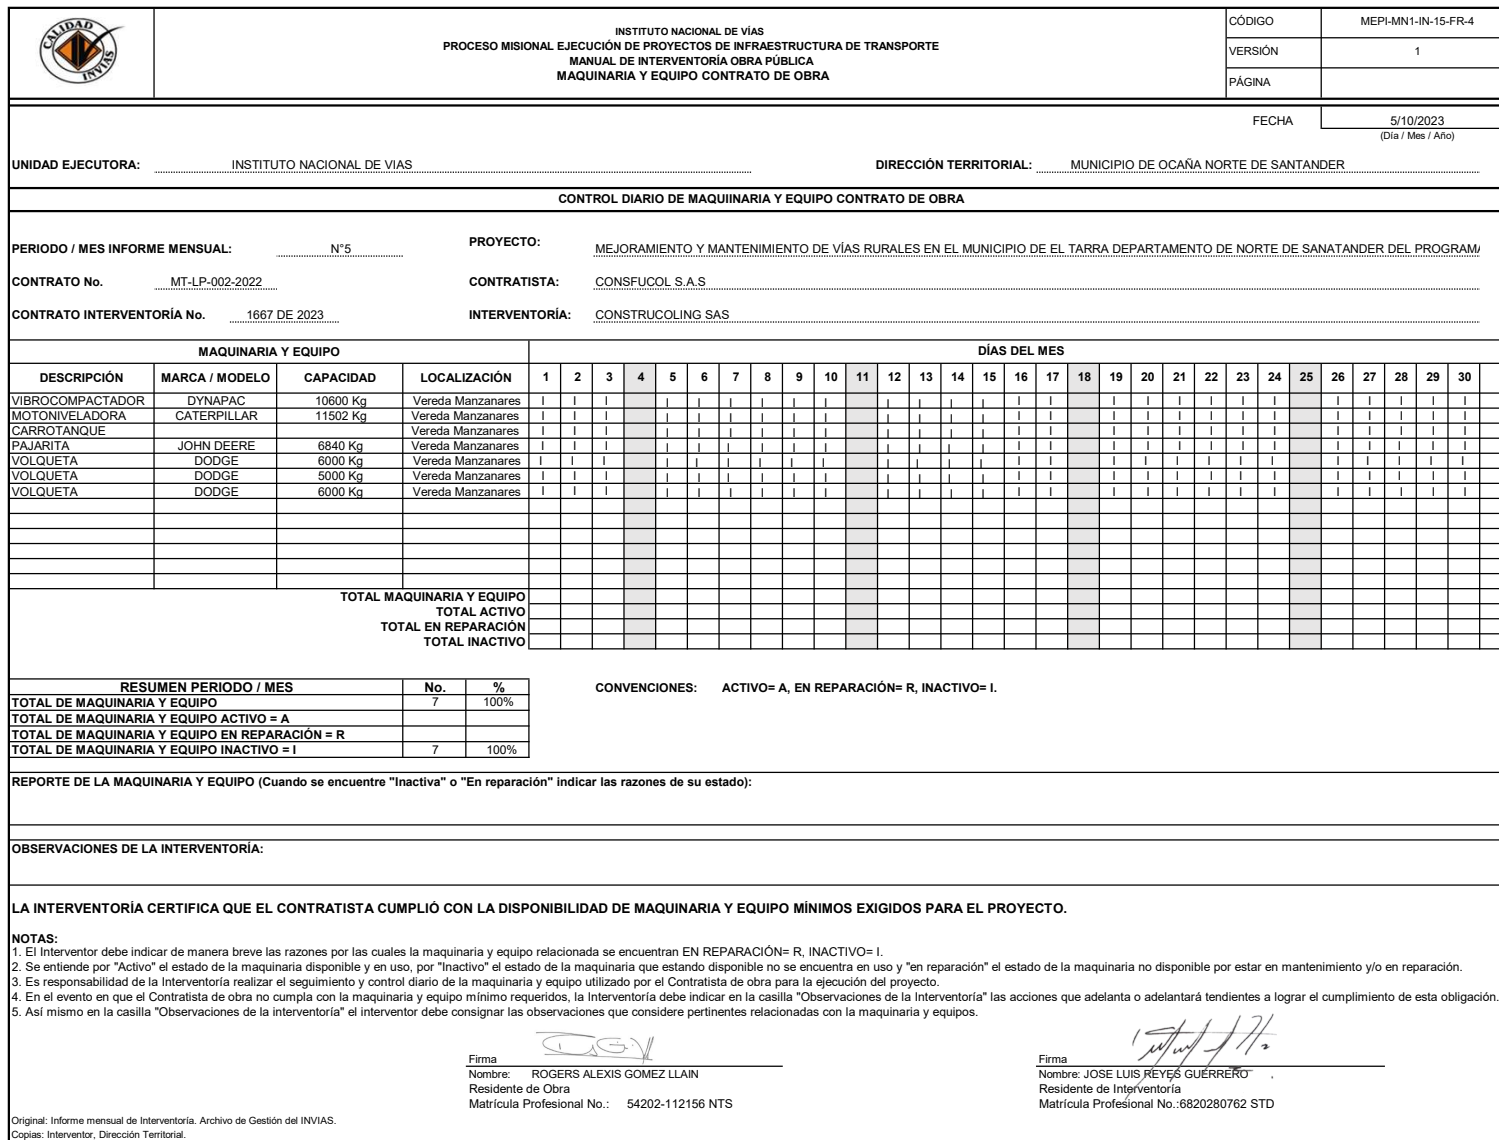



FECHA	5/10/2023 (Día / Mes / Año)
-------	--------------------------------

CONTRATO DE OBRA No:	MT-LP-002-2023	CONTRATISTA:	CONFUCOL S.A.S.
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:	SEPTIEMBRE DE 2023	PROYECTO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA DEPARTAMNTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	1667 DE 2022	INTERVENTOR:	CONSTRUCCOLING SAS
NOMBRE ARL:	POSITIVA	NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:	

[illegible]


El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluyendo más de una categoría y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En caso en que el Contratista no cumple con la dedicación del personal profesionalmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" en las columnas de "Observaciones" que adelanta pendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El Contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectúa por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: CARLOS MARIO PACHECO GAONA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-093938 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

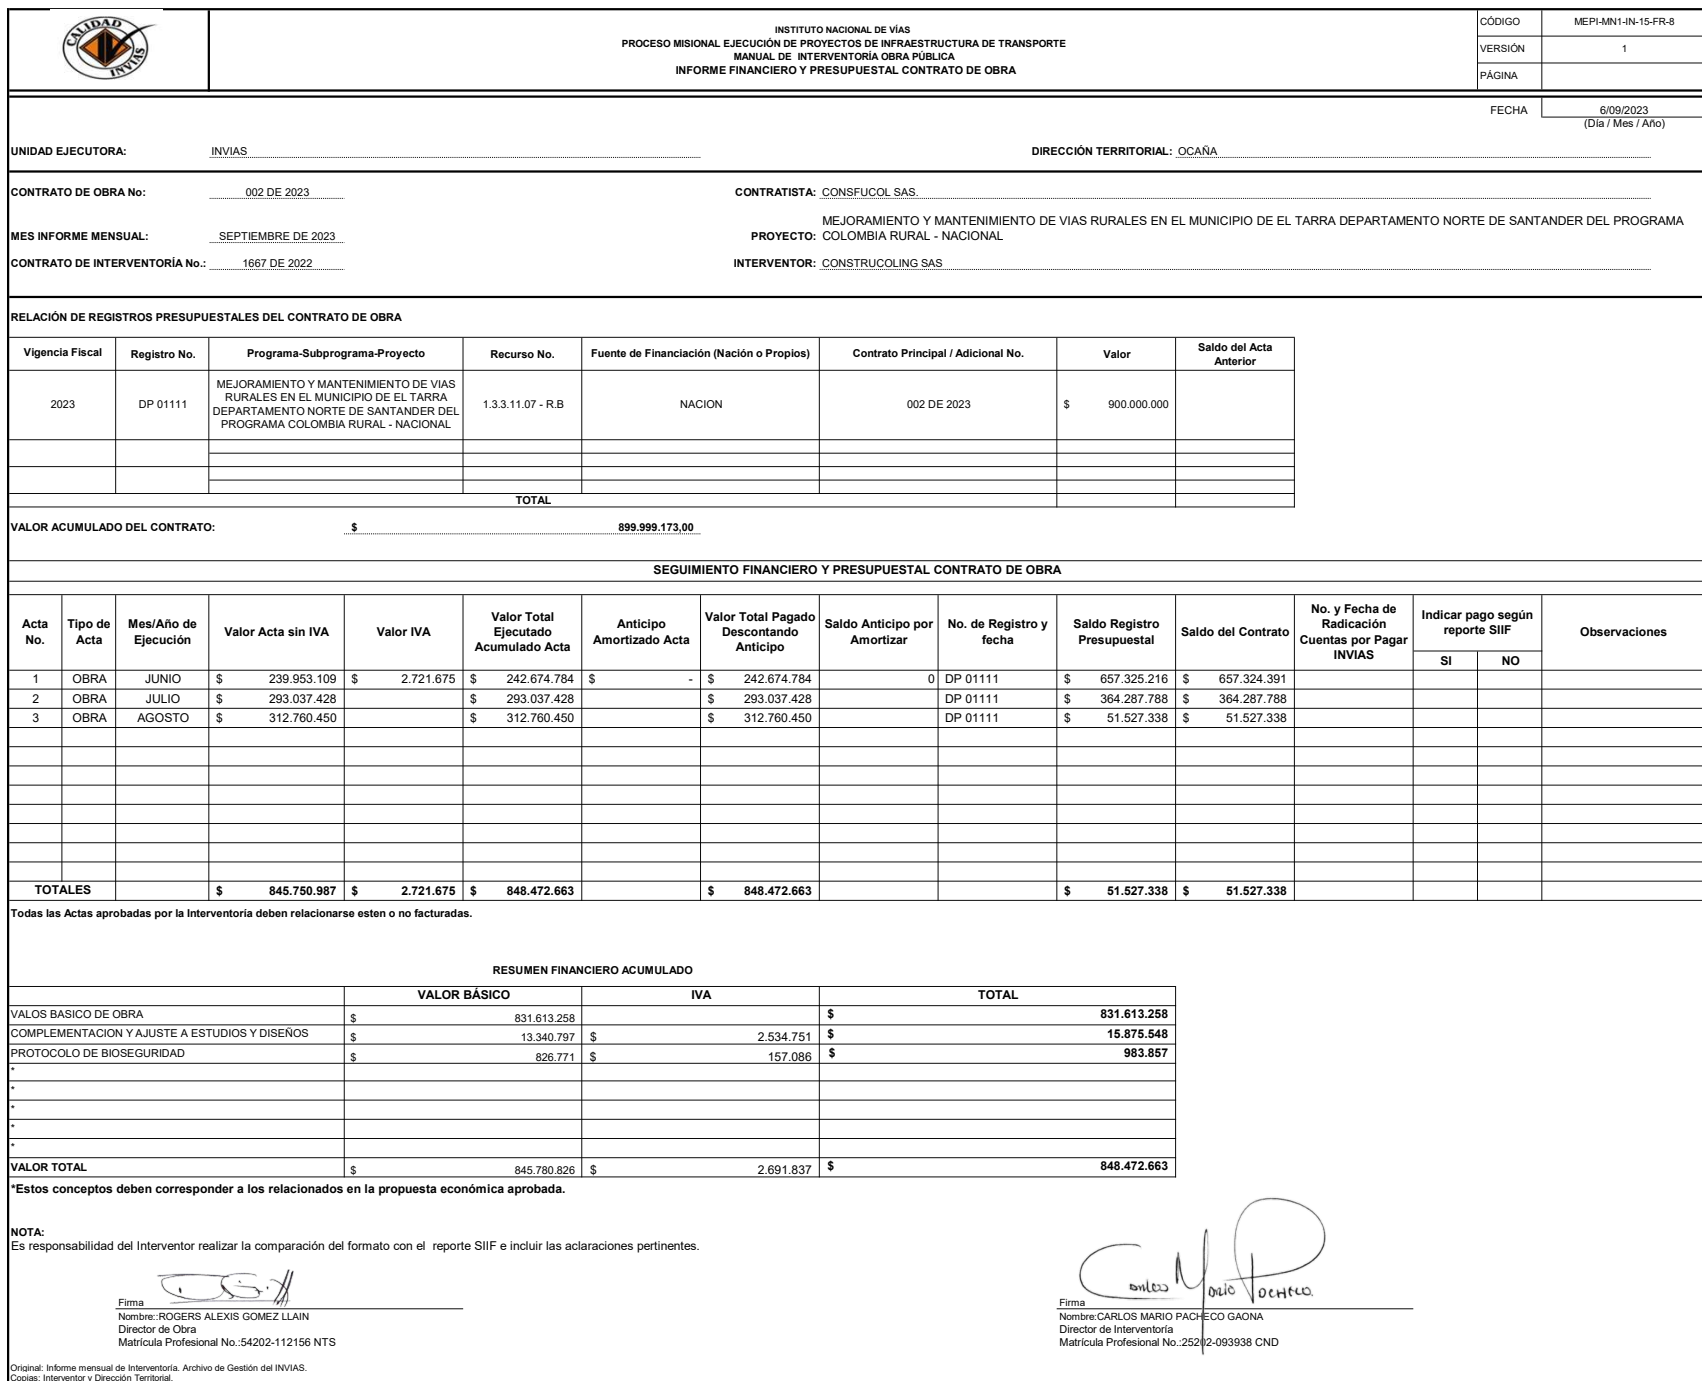

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

	FECHA	6	10	2023
	(Día)	(Mes)	(Año)	

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS	DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA
--------------------------	------------------------------

CONTRATO DE OBRA No. MT-LP-002 DE 2023	CONTRATISTA: CONSFUCOL SAS.
--	-----------------------------

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

FECHA DE INICIO:	15 DE MAYO DE 2023
PLAZO INICIAL:	4,77 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	8 DE OCTUBRE DE 2023 <small>(Incluye prórrogas y suspensiones)</small>
VALOR INICIAL:	\$ 899.999.173,00
VALOR ACUMULADO:	\$ - <small>(Incluye adiciones)</small>
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ 15.875.546,00
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1667 DE 2022	INTERVENTOR: CONSTRUCOLING SAS
--	--------------------------------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Cumplimiento	10%	\$ 89.999.917,30	Desde			Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			15	5	2023	14	1	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 179.999.834,60	Día	Mes	Año			
Calidad de Estudios y Diseños			15	5	20223	14	9	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 269.999.751,90	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
			14	9	2023	14	9	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101030326	Certificado de modificación o anexo No.: 0 <small>(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</small>
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.R.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	23/05/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	\$ 232.000.000,00	Desde			Hasta		
Otros			15	5	2023	14	9	2023
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009657	OTRAS PÓLIZAS No.
Certificado de modificación o anexo No.: 0 <small>(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</small>	
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.R.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:	23/05/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA	6	10	2023
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIÓN

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 89.999.917,30	15	5	2023	7	2	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 179.999.834,60	15	5	2023	7	10	2026
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 269.999.751,90	14	9	2023	14	9	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101030326
Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.R.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIÓN

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	\$ 232.000.000,00	15	5	2023	14	9	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año


PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-10109657 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.R.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: CARLOS MARIO PACHECO GAONA

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 25202-093938 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 4/10/2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: MT-LP-002 DE 2023 CONTRATISTA: CONFUCOL SAS.
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1667 DE 2022 INTERVENTOR: CONSTRUCCOLING SAS. DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Seco	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X				X	X			22
Lluvias moderadas						X							X								X			X	X	X			X	X	8
Lluvias intensas																															
Total horas						24							24								24			24	24	24			24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
Los días de lluvias moderadas fueron aproximadamente entre 5 a 9 horas

Firma
Nombre: EDWIN TRIGOS QUINTANA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202086214 NTS

Firma
Nombre: JOSE LUIS REYES GUERRERO
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 6820280762 STD

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

	FECHA	6/10/2023 <small>(Día / Mes / Año)</small>
--	-------	---

UNIDAD EJECUTORA: <u>INVIAS</u>	DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>OCAÑA</u>
---------------------------------	-------------------------------------

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: <u>1667 DE 2022</u>	INTERVENTOR: <u>CONSTRUCOLING SAS</u>
--	---------------------------------------

OBJETO DEL CONTRATO:
 INTERVENTORIA TECNICA , ADMINISTRATIVA , FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO: <u>26 DE DICIEMBRE DE 2022</u>	
PLAZO INICIAL: <u>4,77 MESES</u>	
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: <u>8 DE OCTUBRE</u> <small>(Incluye prórrogas y suspensiones)</small>	
VALOR INICIAL: \$ <u>76.160.000,00</u>	
VALOR ACUMULADO: \$ <u>-</u> <small>(Incluye adiciones)</small>	

 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ELIAS JAIMES FERNANDEZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Cumplimiento	10%	\$ 7.616.000,00	Desde			Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			20	12	2022	1	7	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 15.232.000,00	Día	Mes	Año			
Calidad del servicio	30%	\$ 22.848.000,00	20	12	2022	31	12	2025
			31	12	2022	31	12	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. <u>400-47-994000088581</u> Certificado de modificación o anexo No.: <u>0</u> <small>(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: <u>ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA</u> Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: <u>22/12/2022</u>	
---	--

GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Cumplimiento	10%	\$ 7.616.000,00	Desde			Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			1	7	2022	1	11	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 15.232.000,00	Día	Mes	Año			
Calidad del servicio	30%	\$ 22.848.000,00	20	12	2022	30	4	2026
			31	12	2022	30	4	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. <u>400-47-994000088581</u> Certificado de modificación o anexo No.: <u>1</u> <small>(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: <u>ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA</u> Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: <u>27/12/2022</u>	
--	--

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

	FECHA	6/10/2023
		(Día / Mes / Año)

Cumplimiento	10%	\$	7.616.000,00	20	12	2022	1	11	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales	20%	\$	15.232.000,00	20	12	2022	30	4	2026
Calidad del servicio	30%	\$	22.848.000,00	31	12	2022	30	4	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400-47-
994000088581

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 30/05/2023

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)							
Cumplimiento	10%	\$	7.616.000,00	20	12	2022	12	4	204
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales	20%	\$	15.232.000,00	20	12	2022	12	10	2026
Calidad del servicio	30%	\$	22.848.000,00	31	12	2022	12	10	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400-47-
994000088581

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 07-09-2023


OBSERVACIONES:

NOTAS:

- El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
- El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las

 Firma Nombre: CARLOS MARIO PACHECO GAONA Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202-093938 CND	 Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ Firma Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ Supervisor Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: 54202-099505 NTS
--	--

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

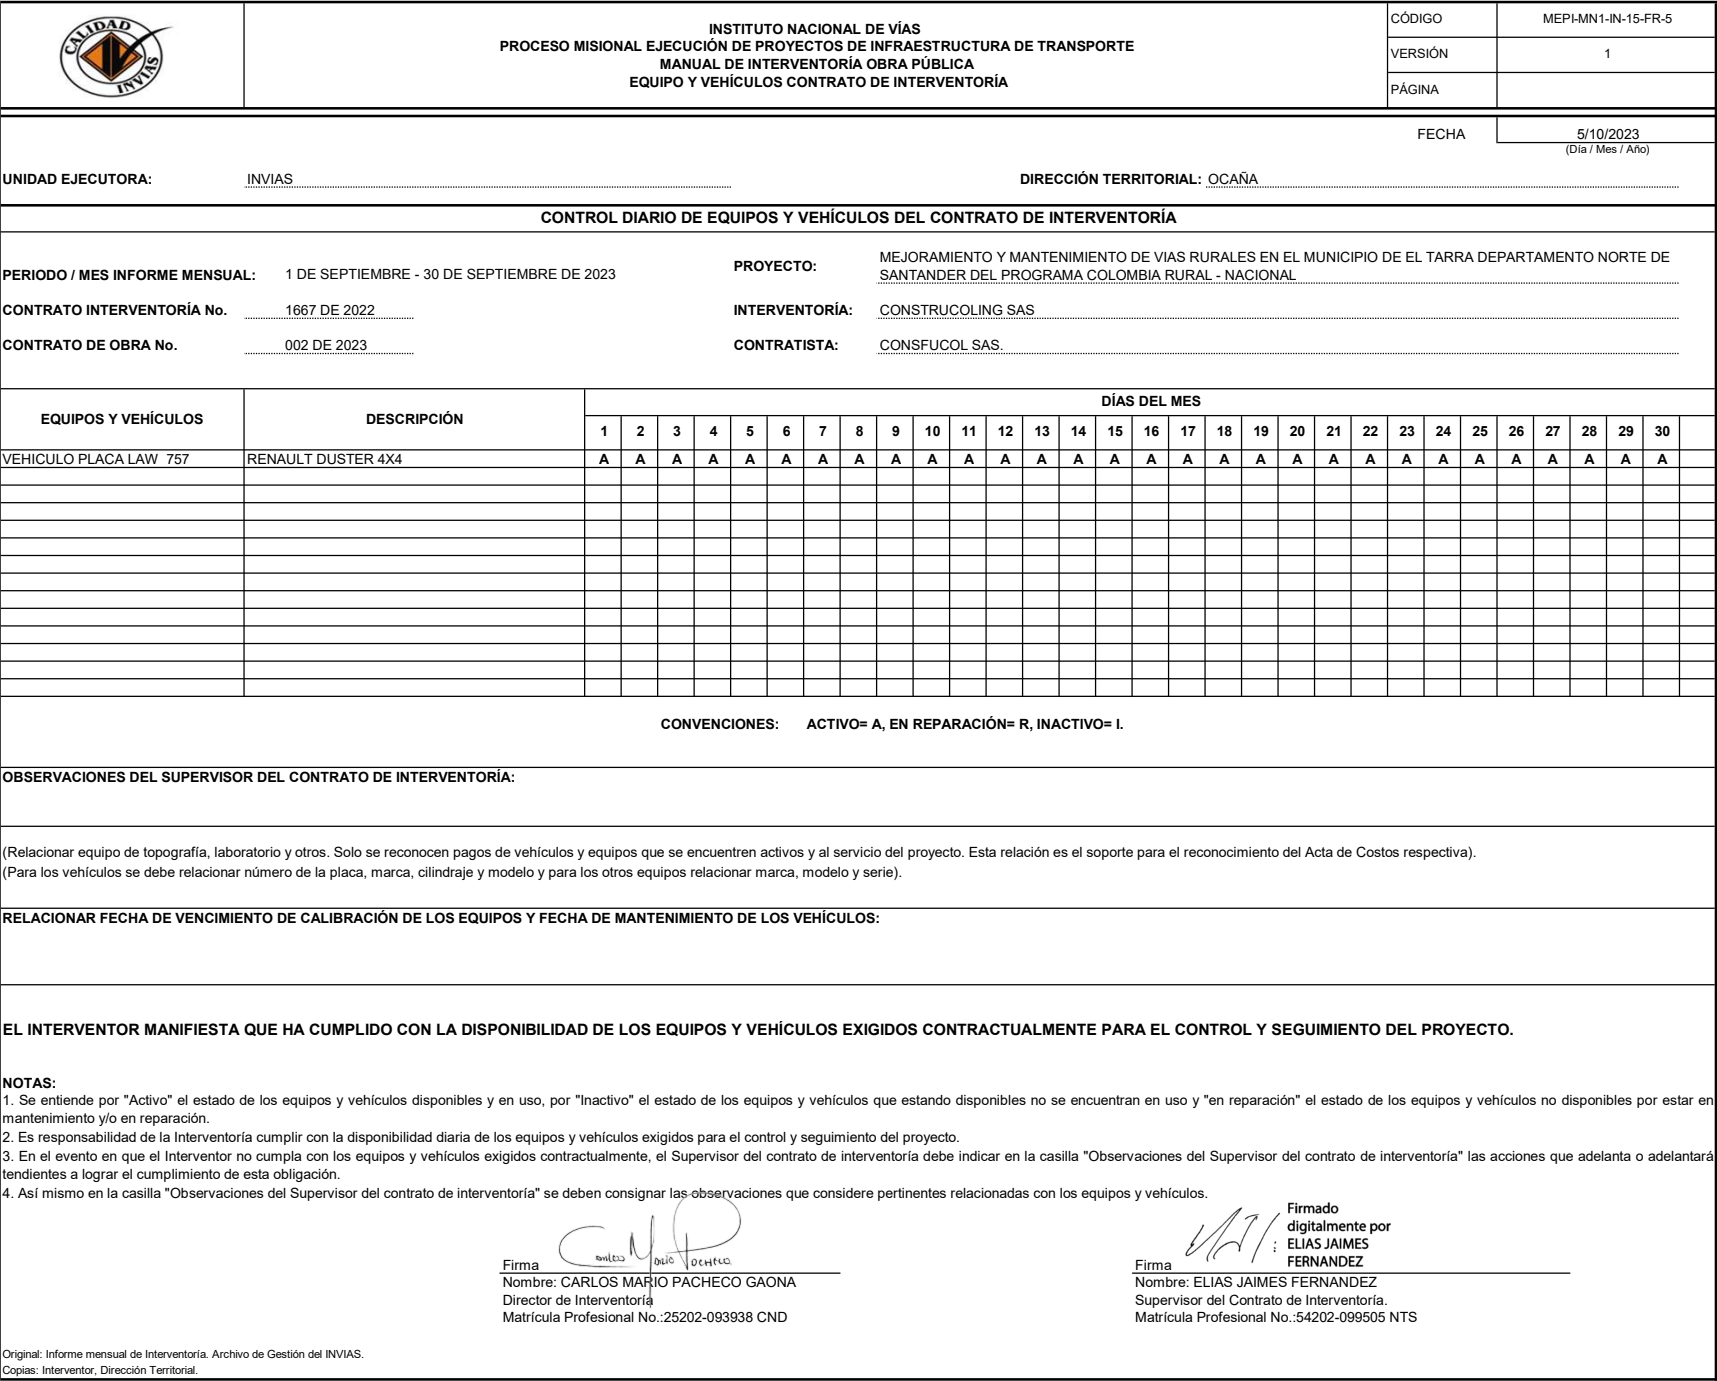

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MBIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA															CÓDIGO MEPI/MI-1-IN-15-FR-7																															
																	VERSIÓN 1																															
																	PÁGINA																															
																	FECHA 5/10/2023 (Día / Mes / Año)																															
UNIDAD EJECUTORA: INVIA		DIRECCION TERRITORIAL: OCAÑA																																														
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1667 DE 2022		INTERVENTOR: CONSTRUCCOLING SAS																																														
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2023		PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL																																														
CONTRATO DE OBRA No.: IT-4-P-002 DE 2023		CONTRATISTA: CONSFUCOL SAS																																														
NOMBRE ARL: SURA		NOMBRE CAJA DE COMPENSACION: COMFAORIENTE																																														
VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL																																																
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidades, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			% Deducciones en el mes	Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	
1	CARLOS MARIO PACHECO GAONA	88.283.144	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	\$ 1.250.000	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	25%	CONSTRUCCOLING SAS	\$ 1.250.000,00	\$ 87.000	V	SANTITAS EPS	27799289	\$ 50.000	COLPENSIONES	27496477	\$ 200.000	\$ 50.000	N/A	N/A			
2	JOSE LUIS REYES GUERRERO	13.510.447	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	\$ 3.200.000	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	100%	CONSTRUCCOLING SAS	\$ 2.346.967	\$ 163.400	V	SANTITAS EPS	27799289	\$ 93.900	COLPENSIONES	27496477	\$ 375.500	\$ 93.900	N/A	N/A			
3	JEAN CARLOS LOPEZ BAUTISTA	1.091.680.438	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	\$ 1.600.000	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	100%	CONSTRUCCOLING SAS	\$ 1.173.334	\$ 81.700	V	NUEVA EPS	27799289	\$ 47.000	PORVENIR	27496477	\$ 187.800	\$ 47.000	N/A	N/A			
4																																																
5																																																
6																																																
7																																																
8																																																
9																																																
10																																																
N																																																
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				\$ 1.250.000																																												
El Interventor adjunta la certificación de fecha SEPTIEMBRE a la que se refiere la nota 9 del presente formato.																																																
NOTAS:																																																
1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.																																																
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.																																																
3. Es responsabilidad de la Interventoria diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal asignado contractualmente, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.																																																
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoria verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.																																																
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoria debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelantó o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.																																																
6. El Interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.																																																
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.																																																
8. El Supervisor del contrato de interventoria es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoria.																																																
9. El Interventor es el responsable de verificar que los contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoria, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normalidad vigente y la entidad prestadora del servicio.																																																
10. El Interventor debe señalar con en (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.																																																
<div><div></div><div>Firma Nombre: CARLOS MARIO PACHECO GAONA Director de Interventoria Matricula Profesional No.: 25302-093938 CND</div></div> <div><div></div><div>Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ Supervisor del Contrato de Interventoria Matricula Profesional No.: 54202-099505 NTS</div></div>																																																
Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVAS. Copias: Interventor, Direccion Territorial.																																																

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901506138	9	CONSTRUCOLING SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
54-498	CLL 10 N 15 10		5623956		CONSTRUCOLINGSAS@GMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-09	2023-10	27799289	E	2023-10-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.747.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	27799289	2023-10-10	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DIAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SIN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.						Cot.	Cot.	Cot.	
1	CC 13510447	REYES GUERRERO JOSE LUIS	3.200.000		F	X														0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.200.000	512.000	0	0	SANITAS- EPS005	3.200.000	128.000	COMFAORIE NTE-CCF36	3.200.000	128.000	3.200.000	222.800	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	990.800	S	4429001	
2	CC 88283144	PACHECO GAONA CARLOS MARIO	1.250.000		F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.250.000	200.000	0	0	SANITAS- EPS005	1.250.000	50.000	COMFAORIE NTE-CCF36	1.250.000	50.000	1.250.000	87.000	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	387.000	S	4429001	
3	CC 1003258302	JARAMILLO MINORTA LUCAS FERNANDO	1.400.000		F															0			30	30	30	30	PORVENIR- 230301	1.400.000	224.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.400.000	56.000	COMFAORIE NTE-CCF36	1.400.000	56.000	1.400.000	97.500	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	433.500	S	4429001	
4	CC 1091677817	SUAREZ GAONA ANGIEE TORCOROMA	1.160.000		F															0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.160.000	185.600	0	0	COMFAORIE NTE-CCFC50	1.160.000	145.000	COMFAORIE NTE-CCF36	1.160.000	46.400	1.160.000	6.100	0,00522	1.160.000	23.200	34.800	0	0	0	0	01	0	441.100	N	1701001
5	CC 1091680438	LOPEZ BAUTISTA JEAN CARLOS	1.600.000		F															0			30	30	30	30	PORVENIR- 230301	1.600.000	256.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.600.000	64.000	COMFAORIE NTE-CCF36	1.600.000	64.000	1.600.000	111.400	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	495.400	S	4429001	

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901506138	9	CONSTRUCOLING SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
54-498	CLL 10 N 15 10		5623956		CONSTRUCOLINGSAS@GMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-09	2023-10	27799289	E	2023-10-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.747.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	27799289		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN		IBC SALUD		IBC RIESGOS
8.610.000		8.610.000		8.610.000
				IBC CAJAS
				8.610.000
				IBC PARAF
				1.160.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				5	1.377.600	0	0	0	1.377.600
PROTECCION	230201	800229739	0	1	185.600	0	0	0	185.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	712.000	0	0	0	712.000
PORVENIR	230301	800224808	8	2	480.000	0	0	0	480.000
EPS(Administradoras: 3)				5	443.000	0	0	0	443.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	178.000	0	0	0	178.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	120.000	0	0	0	120.000
Gran Total					1.675.600	0	0	0	1.675.600

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
COMFAORIENTE	CCFC50	890500675	6	1	145.000	0	0	0	145.000
ARP(Administradoras: 1)				5	524.800	0	0	0	524.800
ARL SURA	14-11	890903790	5	5	524.800	0	0	0	524.800
CCF(Administradoras: 1)				5	344.400	0	0	0	344.400
COMFAORIENTE	CCF36	890500675	6	5	344.400	0	0	0	344.400
SENA(Administradoras: 1)				1	23.200	0	0	0	23.200
SENA	PASENA	899999034	1	1	23.200	0	0	0	23.200
ICBF(Administradoras: 1)				1	34.800	0	0	0	34.800
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	34.800	0	0	0	34.800
Gran Total					2.747.800	0	0	0	2.747.800

PAGADO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
				VERSION	1
				PÁGINA	

FECHA 5/10/2023
(Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECTORA: INVIÁS DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1667 DE 2022 INTERVENIENTE: CONSTRUCCOLING SAS
MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE PROYECTO: TARRA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL
CONTRATO DE OBRA No: 002 DE 2023 CONTRATISTA: CONSUFUOL SAS.

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	238522	COLOMBIA RURAL	13328422	NACION	1667 de 2022	\$ 76.160.000	\$ 28.588.560
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 76.160.000

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	MAYO	\$ 2.200.000	\$ 418.000	\$ 2.618.000,00	0	0	0	238522-23/09/2022	\$ 73.542.000	\$ 73.542.000,00	RADICADO 41862 ZLJWQ3S23	
2	JUNIO	\$ 9.776.000	\$ 1.857.440	\$ 11.633.440,00	0	0	0	238522-23/09/2022	\$ 61.908.560	\$ 61.908.560	RADICADO 10455 ZLLAJCQ23	
3	JULIO	\$ 14.000.000	\$ 2.660.000	\$ 16.660.000,00	0	0	0	238522-23/09/2023	\$ 45.248.560	\$ 45.248.560	RADICADO 17555 IMAQS23	
4	AGOSTO	\$ 14.000.000	\$ 2.660.000	\$ 16.660.000,00	0	0	0	238522-23/09/2023	\$ 28.588.560	\$ 28.588.560	RADICADO 91117 JSSBFP3	
5	SEPTIEMBRE	\$ 22.000.000	\$ 4.180.000	\$ 26.180.000,00	0	0	0	238522-23/09/2023	\$ 2.408.560	\$ 2.408.560		
TOTALES		\$ 61.976.000	\$ 11.775.440	\$ 73.751.440					\$ 2.408.560	\$ 2.408.560		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTO PERSONAL	\$ 53.426.000	\$ 10.150.940	\$ 63.576.940
COSTOS DIRECTOS	\$ 8.550.000	\$ 1.624.500	\$ 10.174.500
*			
VALOR TOTAL			\$ 73.751.440

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

- Es responsabilidad del Interveniente realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
- Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre CARLOS MARIO PACHECO GAONA
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.25202-093938 CND

Firmado digitalmente por
ELIAS JAMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoria
Matricula Profesional No.54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interveniente y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 3

FECHA 25/07/2023
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 3
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No. MT-LP-002 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSFUCOL SAS. R/L. ROGERS ALEXIS GOMEZ LLAIN

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1667 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSTRUCCOLING SAS. R/L. CARLOS MARIO PACHECO GAONA

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
Se realiza lectura de acta anterior donde se dio cumplimiento a los compromisos pactados.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

En el presente comité se tocarán los siguientes temas:

1. Avance de obra
3. Presentar Actas de obra



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 de 3

FECHA 25/07/2023
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

La interventoría da inicio al comité de obra número tres manifestando la preocupación debido a los atrasos que presenta la obra de un 17%, donde el contratista responde que el atraso que se presenta es debido a las altas precipitaciones que se han presentado generando daños en rasante y estructuras de drenaje, debido a estas circunstancias el contratista solicita iniciar evaluar un prorroga al contrato.

La interventoría expresa que se evaluara la posibilidad de una prórroga debido a las altas precipitaciones que se han presentado, pero de igual forma se solicita un aumento de personal.

El residente de interventoría le solicita una fecha de inicio para la intervención del tramo numero uno donde el contratista expresa que se iniciaran actividades el 31 de julio.

La interventoría le solicita al contratista la radicación del acta donde el contratista afirma que se pasara en la ultima semana del mes de julio



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 de 3

FECHA 25/07/2023
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día / Mes / Año)	RESPONSABLES
INICIO OBRAS EN EL TRAMO No. 1	lunes, 31 de julio de 2023	LAURA AGUILAR

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 4/08/2023
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

- Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
- Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtir de manera previa el trámite interno correspondiente.
- Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
CARLOS MARIO PACHECO GAONA	DIRECTOR INTERVENTORIA	CONSTRUCOLING SAS	
JOSE LUIS REYES GUERRERO	RESIDENTE INTERVENTORIA	CONSTRUCOLING SAS	
LAURA AGUILAR	AUXILIAR DE OBRA	CONFUCOL SAS	
ROGERS ALEXIS GOMEZ LLAIN	DIRECTOR DE OBRA	CONFUCOL SAS	
EDWIN HERNANDO TRIGOS	RESIDENTE DE OBRA	CONFUCOL SAS	
