

CONTRATO DE OBRA

Nº. SA-EDU-009-2024

OBJETO: Construcción y/o Reconstrucción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación de Vías urbanas, canales, boxculvert, y Obras complementarias para el programa Barrios a la Obra Etapa VIII, modulo IV, en el distrito de Barranquilla

CONTRATISTA: Consorcio G3 Paximentar Barranquilla 24

INTERVENTORIA: Consorcio DS

FECHA ACTA INICIO: Abril 26 de 2024

28-09-024 (Sábado).

personal: 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 sst, 1 trabajador Social, 2 inspectores, 1 maestro, ayudantes, 1 ing. residente, 1 director obra.

actividad:

fundida en la Calle SOE entre Kra 39 y Sur Bordinillos y andenes Costado DR. o' margen Izquierda. en long. 77.50 mts. para un Vol. total. de 80 m³ de 3000 psi.

probab:

DDP

Edwin Sandoval
Ing. Residente

29-09-024: (Domingo).

Anuncio lloviendo.

Se prolonga por todo el día lluvias.
no se labora:

DDP

Edwin Sandoval
Ing. Residente

30-09-024: (Lunes).

Reunión con interventores: ing. Vladimir Dovan Camacho, Justina (topografía). Encargo para revisar porciones y ajustar algunos arreglos de acabados entre ellos el Kra 34 sur y Calle SOE. Se continúa con cajeo en la Calle SOB entre Kra 39 y # Sur, long. 15.0 mts. Koto 050 a la Koto 065. Lluvias de 7.0 am a 9.0 am.

DDP

Edwin Sandoval
Ing. Residente

01-10-024: (Martes).

personal: 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 sst, 1 trabajador Social, 2 inspectores de obra, 1 maestro, ayudantes, 1 ing. residente, 1 director obra.

actividad: Reparación en muro Casa Esquina calle SOB. Us. Kra 34, dirección Kra 34 # 53 d-40.

Cajeo Che SOB entre Kra 39 y Sur Koto 055 - Koto 070. Lluvias desde 12:30 pm a 3:30 pm.

Edwin Sandoval
Ing. Residente

02-10-024: (viernes).

personal: 1 topógrafo, 1 cadenero, 2 inspectores obra
1 maestro, ayudantes, 1 sst, 1 trabajador Social
1 ing. residente, 1 director obra.

actividad: Reparaciones Calle SOE, Bordinillos
y anden Casa Esq. Kra 3A. Cte SOE # casa 508-40.
lloviendo desde las 9:15 am hasta 11:30 am.

DDP

Edwin Sanguino
Ing. res. del

03-10-024: (viernes).

1 topógrafo, 1 cadenero, 2 inspectores obra, 1 sst.
1 maestro, Ayudantes, 1 trabajador Social,
1 ing. Residente de obra, 1 director obra.

actividad: Reparación Bordinillos y muro.

Casa Esquina Kra 3A. Calle SOE. Cegón en la
Calle SOE entre Kra 3 y 4 Sur. y Suelo Cemento.
en la fuga de arveducto. punto ciego. ϕ 6" Asbesto
Cemento, Kotos y aldaño pozo. 11. entrada
Cte SOE. Us. Kra 3 Sur. ; Resque de placa Kra 3A Sur.
en unidad de cuadra; Inicia cuadratura Luis Cantillo.
lloviendo desde 12:30 pm hasta 3:00 pm.
aguarero torrencial.

DDP

Edwin Sanguino
Ing. res. del

04-10-024: (viernes).

personal: 2 topógrafos, 1 cadenero, 1 sst, 2 maestros.
Ayudantes, 2 inspectores obra, 2 operarios.
1 ing. Residente, 1 director obra.

actividad: Cegón y Sacada Escambros Cte SOB vs Kra 4
abscisa kot 070.

y Replanteo para colocación rieles, abscisa kot 05
al kot 050. Cte SOB entre Kra 3 y 4 Sur.
en Calle SOB entre Kra 4 y 5 Sur prueba Ladrastanca
a la sb. polietileno, ϕ 4" potable

la cuadrilla de Luis Cantillo instala la tubería ϕ 8" PVC.
maestro Edinson. inicia instalación. ϕ 8" p-10 a p-17.

30
en Calle 508. V.S. Kva 3 Sur.
Yra Soleado.

DDP

Edwi Sangua Or
Ing. resid.

05-10-024: (Sábado).

personal: 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 sst, 2 inspectores
obra, 2 maestros, ayudantes, 1 ing. residente.
1 director obra,

actividad: figurado Hicim base manilla intercepcion
Calle 508. V.S. Kva 3 Sur, alistado Hicim para
fundición de placa abscisa K0+08. al K0+40.
Calle 508 V.S. Kva 3 y 4 Sur.

Yra Soleado, trabajos hasta 1/2 día.

DDP

Edwi Sangua Or
Ing. resid.

06-10-024: (Domingo).

Lluvias desde 11:30 am hasta 3:00 pm.

no se labora

Edwi Sangua Or
Ing. resid.

07-10-024: (Lunes).

personal: 1 topógrafo, 1 cadenero, ayudantes,
1 trabajador social, 1 sst, 1 ing. residente
1 director de obra,

actividad: Conformacion base Doble Cemento
K0+08 al K0+40 Calle 508 entre Kva 3 y 4 Sur
instalacion de 1 tubo Ø8" PVC Sanitario, entre
Kva 4 y 5 Sur. p-13 al p-14;

Lluvias fuertes desde 12:30 pm a 2:20 pm.

DDP

Edwi Sangua Or
Ing. resid.

08-10-024: (Martes)

personal: 1 topógrafo, 1 cadenero, 2 maestros, ayudantes,
1 trabajador social, 1 sst, 1 ing. residente, 1 director obra
actividad:

Conformacion base Doble Cemento, Calle 508 Kva 3 y 4 Sur
absc. K0+00 - al K0+038. Cuspale Ø8" p-013. 1 tubo hacia
pozo 14; lluvias en la noche. DDP

Edwi Sangua Or

09-10-024: (viernes).

1 topografo, 1 cadenero, 1 maestro, 1 sst, ayudantes.
2 inspectores obra, ing. residente, 1 Director obra
actividad:

fundida concreto MR 39. Calle 505 entre Kra 3 y 4
Sur, K04010 - K04038. y adecuacion de andén
o reparacion en la Calle 505. Us. Kra 4 Sur
aptos. Kra 4 # 505-40 2do piso.
posibilidad de lluvias sereno al Elvis Sandoval
mediodia, Ing. res. obra.

DOP

10-10-024: (sabes).

personal: 1 topografo, 1 cadenero, 1 sst, 2 inspectores
de obra, 2 maestros, ayudantes, 1 ing. residente
1 Director obra.

actividad: Conformacion andén c/c 505
entre Kra 3 y 4 Sur, K04010 al K04038.
lluvias desde 7:00 am, y sereno moderado
toda la mañana, y lluvias desde 2:00 pm
hasta 3:30 pm.

DOP

Elvis Sandoval
Ing. res. obra.

11-10-024: (viernes).

personal: 1 topografo, 1 cadenero, 1 sst, 1 trabajador
social, 2 maestros, ayudantes, 1 ing. res. obra.
obra, 1 Director obra,

actividad: Conformacion banca. K0401 al
K04010, y K04038 al K04047. y arreglo andén
c/c 505 entre Kra 3 y 4 Sur.

Dia nublado.

DOP

Elvis Sandoval
Ing. res. obra.

12-10-024: (Sabado).

Topografo, 1 cadenero, 1 sst, 2 inspectores obra,
1 maestro, ing. res. obra, 1 Director obra, Dia Soleado.

actividad: Concreto MR-39. K0401 al K04010 y K04038 al K04047
en calle 505. entre Kra 3 y 4 Sur, lluvias 5:00 pm Elvis Sandoval
hasta 7:00 pm

13-10-024 (viernes).

día opaco - no se laboró

DDP

Elvis Lirio
Ing. Residente

14-10-024 (viernes).

día nublado, lluvia: 4:00 pm a 6:00 pm.

no se laboró

DDP

Elvis Lirio
Ing. Residente

15-10-024 (martes).

día Opaco:

personal: 1 topógrafo, 1 Cadenero, 1 SSB, 1 Jefe de Obra,

2 inspectores obra, 1 Ing. Residente,

1 Director obra,


actividad: Construcción Zudenes, Cilesos. entre

km 384; e instalación de tubería $\Phi 8"$ en los

pozos frente oficina Kra 24 y 3 por la calle sob

$L = 21.0$ mts y 5 fcs $\Phi 8" \times 6"$ Domo de lianas,

Juntas de concreto hasta 1:30 pm.

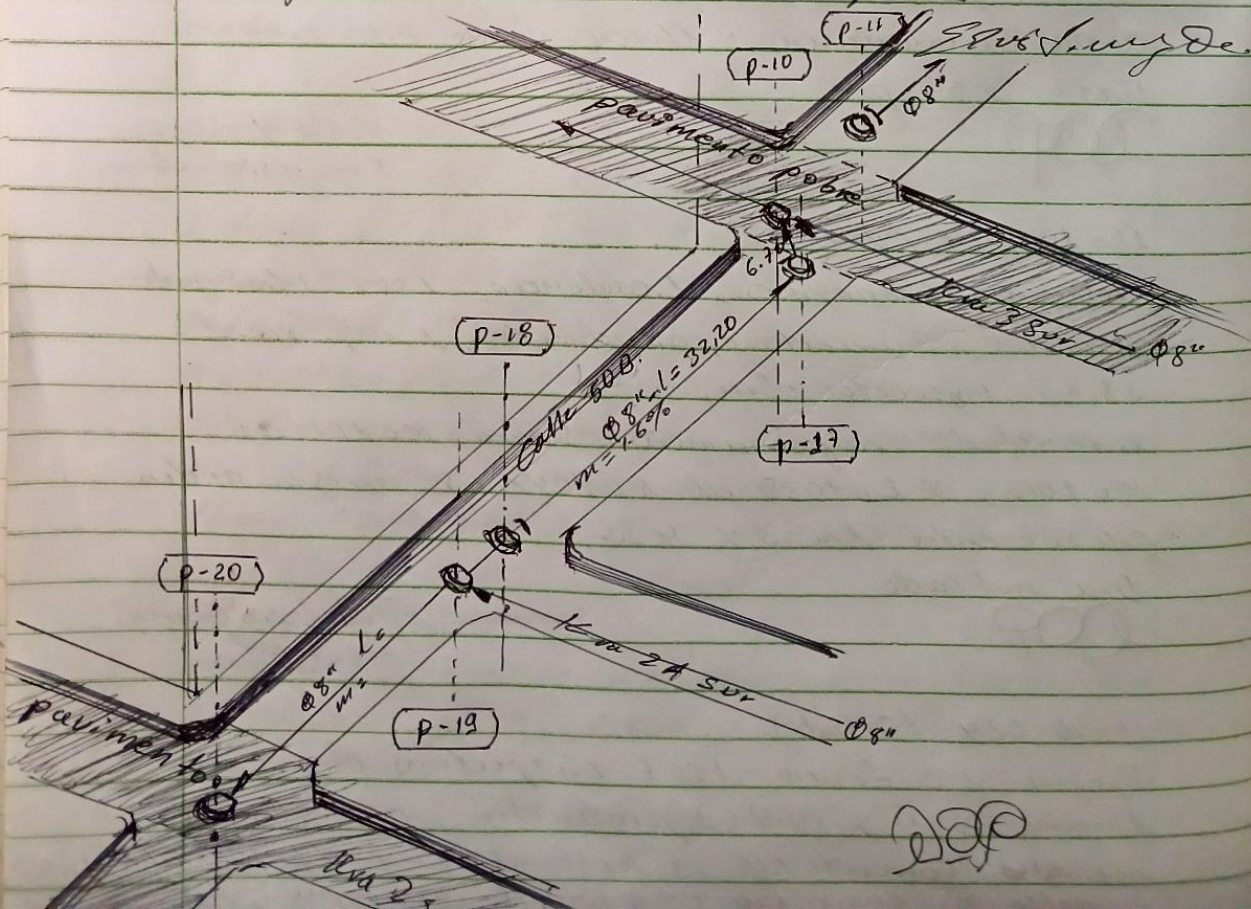

DDP

16-10-024: (miercoles)

personal: 1 topografo, 1 cadenero, 1 sst, 2 inspectores obra, 2 maestros, ayudantes, 1 ing. residente, 1 Director obra.

actividad: Conformacion andenes Cte 506 entre Km 3 y 4 Sur. Long= 40 mts. abscisa K0 +00 - al K0 +040; lluvias de 12:00 am, a 2:30 pm.

DDP

Eduardo Linares De.

17-10-024: (Jueves)

personal: 1 topografo, 1 cadenero, 1 sst, 2 inspectores obra, 1 maestro, ayudantes, 1 ing. residente, 1 Director obra, Conformacion andenes abscisa K0 +042 al K0 +048. Cte 506 entre Km 3 y 4 Sur. — hasta aqui laboro Edinson (maestro de list + ayud). Lluvias desde 2:00 pm a 3:45 pm.

DDP

Eduardo Linares De.
Ing. resp. obra

18-10-024: (viernes)

personal: 1 topografo, 1 cadenero, 1 sst, 2 inspectores de obra, 1 trabajador social, 1 maestro, ayudantes, 1 ing. residente de obra, 1 Director obra,

actividad: Continúa cajeo en calles 505 vs. Kva 4 Sur. K0 +000 al K0 +091; Vol corte $11 \times 4.0 \times 0.60 =$
E excavacion para 2 registros en Calle 506 entre Kva 2A y 3 Sur. Costado Elec. o' derecho.

Dia Soleado.

DDP

Eduardo Linares De.

19-10-024: (Sabado)

personal: 1 topografo, 1 cadenero, 1 maestro, ayudantes, 1 sst, 2 inspectores de obra, 1 trabajador social, 1 ing. residente, 1 Director obra,

actividad: aplicacion Suelo Cemento y conformacion. Cte 506 vs. Kva 3 y 4 Sur. abscisas K0 +050 al K0 +080 y construccion Registro Domiciliario 2 unid. y de Calle 506 entre Km 2A y 3 Sur.

Dia Soleado.

20-10-024: (Domingo).

lluvias fuertes $\frac{1}{2}$ día y en la tarde.

no se laboró

DDP

Elvira Sanguinetti

21-10-024: (Lunes)

personal: 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 maestro, 1 oficial, ayudantes, 1 sst, 2 inspectores obra, 1 trabajador Social, 1 ing. Residente, 1 Director obra.

actividad: Excavación para registros (3) entre km 2A y 3 Sur, y conformación base y velamento. Calle 508 entre km 3 y 4 Sur. abscisa K0+46 al K0+290. y conformación andenes y arreglo Conductores de agua K0+05 al K0+46. tiempo opaco probabilidad lluvias en la noche.

DDP

Elvira Sanguinetti
Ing. res. obra.

22-10-024: (Martes).

personal: 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 maestro, 1 oficial, ayudantes, 1 sst, 2 inspectores obra, 1 trabajador Social, 1 ing. Residente, 1 Director obra,

actividad: colocación de andenes Calle 508 entre Kms 3 y 4 Sur. K0+02 al K0+46. y fundición de andenes. K0+02 al K0+46 ambos lados Calle 508 entre Kms 3 y 4 Sur. lluvias desde 11:45 am hasta 2:30 pm.

fundición andenes Vol. 90 cm³

DDP

Elvira Sanguinetti
Ing. res. obra.

23-10-024: (Miércoles).

personal: 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 sst, 2 inspectores obra, 1 maestro, ayudantes, 1 ing. Residente, 1 Director obra.


actividad: Suelo cemento en la calle 508, entre Kms 3 y 4 abscisa K0+050 al K0+091.

Construcción registros 2 mud. en la calle 508 entre Kms 2A Sur y 3 Sur. Carril IZQ. 2 Sur - 33 y 2 Sur - 41.

lluvia de 10:30 a 12:00 y de 12:30 a 1:30 pm

Elvira Sanguinetti
Ing. res. obra.

Nota: Realizado recorrido 23/10/2024 Por los distintos frentes
activos. Se le recomienda al contratista realizar limpieza
general en los frentes, y callas de acceso a cada una
ya que evidencian incómodidad Por Parte de la comunidad
Por el acceso a los Predios y la circulación


EDUARD S.A.

24-10-024: (Lunes).


personal: 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 SST, 2 inspectores
de obra, 1 maestro, 2 oficiales, ayudantes.

1 Ing. Residente, 1 Director obra.

actividad: Cajo en Calle 503 entre Kms 4 y 4A Sur.
del borde del arroyo hacia Kms 4. L=10 mts. aparcie.
nivel practico alto.

y conformación banca compactación y alisado de
nieles para fundir Alce 503 entre Kms 3 y 4. abscisa K0+046
al K0+065.

- Excavación para registros y tubería 6" 2 gomas laterales
entre Alce 503 y Kms 4 y 3. Costado OR.
ya solzado.




Edgar Sandoval
Ing. res. el.

25-10-024: (Viernes)

personal: 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 SST, 2 inspectores obra
1 maestro, ayudantes, 1 Ing. residente, 1 Director obra.
1 trabajador Social.

actividad: Cajo en la Calle 503 entre Kms 4 y 4A.
L=19.0 mts abscisa K0+030 al K0+049.

Replanteo en la Calle 503 entre 3 y 4 base Sollo Cemento.
abscisas K0+045 al K0+063.



Edgar Sandoval
Ing. res. el.

26-10-024: (Sábado)

personal: 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 maestro, ayudantes, 1 sst, 1 trabajador Social, 2 inspectores de obra, 1 ing. residente, 1 director obra.

actividad: Conformación de la cimentación de las alcantarillas entre Kra 3 y 4 Sur. Conformación y Enrocado pto en la alcantarilla 100+45 Contiguo al curvo en medio de la calle 503 entre Kra 4 y 4A.

fundición concreto MK-39 en alcantarillas 100+46 al 100+070. C/c 503 entre Kra 3 y 4 Sur long. 23 mts. 2 carros cto de 7:25 m³/c/a.

[Signature]

Cilindros #3.

[Signature]
Ing. resd.

27-10-024: (Domingo)

Día Soleado, no se labora.

28-10-024: (Lunes)

personal: 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 sst, 2 inspectores de obra, 1 maestro, Ayudantes, 1 ing. residente, 1 director obra,

actividad: Cajeo Calle 503 entre Kra 4 y 5. long. 15.0 mts.; y alisado rieles en 15.0 mts lineales C/c 503 entre Kra 3 y 4 Sur abscisa 100+063 al 100+080.

[Signature]

[Signature]
Ing. resd.

29-10-024: (Martes)

personal: 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 sst, 2 inspectores, 1 maestro, ayudantes, 1 trabajador Social,

1 Ing. residente, 1 director obra, 3 operarios empujando actividad: instalación tubería $\phi 8"$ y sbcs $\phi 8" \times 6'$ entre Kra 2A y Kra 2 por la Calle 504; entre pozos p-19 y p-20 l=28.0 mts. tot. $\phi 8"$ y Replanteo Conformación Andén alisado de rieles para alinear Bordinlos C/c 503 entre Kra 3 y 4; 23 mts. 100+046 al 100+070.

[Signature]
[Signature]

30-10-024: (miércoles)

personal: 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 sst, 2 inspectores obra, 1 maestro, 2 oficiales, ayudantes,

1 ingeniero Residente, 1 Director obra,

actividad: fundición concreto 3000 psi para bordillos


Koto 46 - al Koto 70 calles entre Kra 3 y 4, y

andenes en la Esquina Kra 3A vs. Calle 50E,

dirección Kra 3A # 50d-39 y Kra 3A # 50d-40.

y trazo de bordillo en los 6 aptos esquina Calle 50E con Kra 4. predio Kra 4 # 50d-40.

Vol. cto = 7.0 m³ fluido de 3000 psi



Elvis J. Jarama
Ing. Residente obra.

31-10-024: (Jueves)

personal: 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 sst, 2 inspectores

1 maestro, ayudantes, 1 Ing. Residente, 1 Director obra,

actividad: Cayón en Calle 50S. Koto 00 al Koto 20.

entre Kra 4 y 4A.

Replanteo e instalación rieles absc. Koto 070 al.

Koto 090. en calle 50S entre Kra 3 y 4 Sur. para
alistado pista para fundir.



Elvis J. Jarama
Ing. Residente.

01-11-024: (viernes)
