

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
CORRESPONDIENTE AL ACTA DE COSTOS No. 09
CONTRATO NÚMERO 1053 DE 2022**

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS
TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE
DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.**



**PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MAYO DE 2023**

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	18
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	20
2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.....	21
2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	23
2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA.....	26
2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO.....	39
3. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA	44
3.1. CONTRATO DE OBRA LP-OP-001- 2022 – MUNICIPIO DE SANTIAGO	45
3.1.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas.	45
3.1.1.1. Actividades Administrativas.....	45
3.1.1.2. Actividades Técnicas.....	46
3.1.1.3. Actividades ambientales.....	47
3.1.1.4. Actividades Sociales.	49
3.1.1.5. Actividades SST.....	52
3.1.2. Seguimiento Ítems No Previstos.....	54
3.1.3. Estado de avance del proyecto.	55
3.1.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.	55
3.1.3.2. Etapa de Construcción.	56
3.2. CONTRATO DE OBRA 146 DE 2022 – MUNICIPIO DE HERRÁN.....	58
3.2.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas.	58

3.2.1.1.	Actividades Administrativas.....	58
3.2.1.2.	Actividades Técnicas.....	60
3.2.1.3.	Actividades ambientales.....	60
3.2.1.4.	Actividades Sociales.	60
3.2.1.5.	Actividades SST.....	60
3.2.2.	Seguimiento Ítems No Previstos.....	60
3.2.3.	Estado de avance del proyecto.	60
3.2.3.1.	Etapas de Actualización Estudios y Diseños.	60
3.2.3.2.	Etapas de Construcción.	62
3.3.	CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.3879052 – MUNICIPIO DE OCAÑA	63
3.3.1.	Descripción de las Actividades Ejecutadas.	63
3.3.1.1.	Actividades Administrativas.....	63
3.3.1.2.	Actividades Técnicas.....	64
3.3.1.3.	Actividades ambientales.....	65
3.3.1.4.	Actividades Sociales	69
3.3.1.5.	Actividades SST.....	75
3.3.2.	Seguimiento Ítems No Previstos.....	78
3.3.3.	Estado de avance del proyecto.	78
3.3.3.1.	Etapas de Actualización Estudios y Diseños.	79
3.3.3.2.	Etapas de Construcción.	81
3.4.	CONTRATO DE OBRA 160 DE 2022 – MUNICIPIO DE CÁCHIRA.....	82
3.4.1.	Descripción de las Actividades Ejecutadas.....	82
3.4.1.1.	Actividades Administrativas.....	82

3.4.1.2.	Actividades Técnicas.....	83
3.4.1.3.	Actividades ambientales.....	84
3.4.1.4.	Actividades Sociales	84
3.4.1.5.	Actividades SST.....	84
3.4.2.	Seguimiento Ítems No Previstos.....	84
3.4.3.	Estado de avance del proyecto.	84
3.4.3.1.	Etapas de Actualización Estudios y Diseños.	84
3.4.3.2.	Etapas de Construcción.	85
3.5.	CONTRATO DE OBRA 252 DE 2022 – MUNICIPIO DE ABREGO.....	86
3.5.1.	Descripción de las Actividades Ejecutadas.....	86
3.5.1.1.	Actividades Administrativas.....	86
3.5.1.2.	Actividades Técnicas.....	87
3.5.1.3.	Actividades ambientales.....	88
3.5.1.4.	Actividades Sociales.	89
3.5.1.5.	Actividades SST.....	93
3.5.2.	Seguimiento Ítems No Previstos.....	95
3.5.3.	Estado de avance del proyecto.	96
3.5.3.1.	Etapas de Actualización Estudios y Diseños.	96
3.5.3.2.	Etapas de Construcción.	99
3.6.	CONTRATO DE OBRA LP-004 DE 2022 – MUNICIPIO DE LA PLAYA.....	100
3.6.1.	Descripción de las Actividades Ejecutadas.....	100
3.6.1.1.	Actividades Administrativas.....	100
3.6.1.2.	Actividades Técnicas.....	101

3.6.1.3.	Actividades ambientales.....	102
3.6.1.4.	Actividades Sociales.	102
3.6.1.5.	Actividades SST.....	104
3.6.2.	Seguimiento Ítems No Previstos.....	105
3.6.3.	Estado de avance del proyecto.	105
3.6.3.2.	Etapas de Actualización Estudios y Diseños.	105
3.6.3.3.	Etapas de Construcción.	107
3.7.	CONTRATO DE OBRA 202 DE 2022 – MUNICIPIO DE PAMPLONITA.....	107
3.7.1	Descripción de las Actividades Ejecutadas.....	107
3.7.1.1.	Actividades Administrativas.....	108
3.7.1.2.	Actividades Técnicas.....	108
3.7.1.3.	Actividades ambientales.....	109
3.7.1.4.	Actividades Sociales.	109
3.7.1.5.	Actividades SST.....	110
3.7.2.	Seguimiento Ítems No Previstos.....	110
3.7.3.	Estado de avance del proyecto.	110
3.7.3.1.	Etapas de Actualización Estudios y Diseños.	110
3.7.3.2.	Etapas de Construcción.	111
3.8.	CONTRATO DE OBRA 02590 DE 2022 – GOBERNACIÓN 1943.....	112
3.8.1	Descripción de las Actividades Ejecutadas.....	112
3.8.1.1.	Actividades Administrativas.....	112
3.8.1.2.	Actividades Técnicas.....	113
3.8.1.3.	Actividades ambientales.....	113

3.8.1.4.	Actividades Sociales.	114
3.8.1.5.	Actividades SST.....	116
3.8.2.	Seguimiento Ítems No Previstos.....	116
3.8.3.	Estado de avance del proyecto.	116
3.8.3.1.	Etapas de Actualización Estudios y Diseños.	116
3.8.3.2.	Etapas de Construcción.	117
3.9.	CONTRATO DE OBRA 02332 DE 2022 – GOBERNACIÓN 2052.....	118
3.9.1	Descripción de las Actividades Ejecutadas.....	118
3.9.1.1.	Actividades Administrativas.....	118
3.9.1.2.	Actividades Técnicas.....	119
3.9.1.3.	Actividades ambientales.....	119
3.9.1.4.	Actividades Sociales.	120
3.9.1.5.	Actividades SST.....	120
3.9.2.	Seguimiento Ítems No Previstos.....	120
3.9.3.	Estado de avance del proyecto.	120
3.9.3.1.	Etapas de Actualización Estudios y Diseños.	120
3.9.3.2.	Etapas de Construcción.	121
3.10.	CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.4352407 – OCAÑA 1814	122
3.10.1.	Descripción de las Actividades Ejecutadas.....	122
3.10.1.1.	Actividades Administrativas.....	122
3.10.1.2.	Actividades Técnicas.....	123
3.10.1.3.	Actividades ambientales.....	123
3.10.1.4.	Actividades Sociales.	124

3.10.1.5. Actividades SST.....	125
3.10.2. Seguimiento Ítems No Previstos	125
3.10.3. Estado de avance del proyecto.....	125
3.10.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.....	126
3.10.3.2. Etapa de Construcción.....	126
3.11. Acciones a seguir por parte de la Interventoría.	127
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATOS DE OBRA:.....	128
4.1. PROYECTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	128
4.7.1. Reporte Informe Semanal.	128
4.7.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	128
4.7.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	129
4.7.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.....	129
4.1.5. Reporte del Estado General del Tiempo.....	130
4.7.5. Resumen Ensayos de Laboratorio	130
4.7.6. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.....	130
4.7.7. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	130
4.7.8. Seguimiento Programa de Inversiones.....	131
4.7.9. Actas de Comité y/o Reunión de Obra	131
4.2. PROYECTO MUNICIPIO DE HERRÁN.	132
4.2.1. Reporte Informe Semanal.	132
4.2.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	132
4.2.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	132

4.2.4.	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.....	132
4.2.5.	Reporte del Estado General del Tiempo.....	132
4.2.6.	Resumen Ensayos de Laboratorio	132
4.2.7.	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.....	133
4.2.8.	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	134
4.2.9.	Seguimiento Programa de Inversiones.....	134
4.2.10.	Actas de Comité y/o Reunión de Obra.....	134
4.3.	PROYECTO MUNICIPIO DE OCAÑA 1758.	135
4.3.1.	Reporte Informe Semanal.	135
4.3.2.	Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	135
4.3.2.1.	Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	136
4.3.3.	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.....	137
4.3.4.	Reporte del Estado General del Tiempo.....	137
4.3.5.	Resumen Ensayos de Laboratorio	137
4.3.6.	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.....	138
4.3.7.	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	139
4.3.8.	Seguimiento Programa de Inversiones.....	139
4.3.9.	Actas de Comité y/o Reunión de Obra	139
4.4.	PROYECTO MUNICIPIO DE CACHIRA.....	140
4.4.1.	Reporte Informe Semanal.	140
4.4.2.	Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.....	140
4.4.3.	Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	140

4.4.4.	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.....	140
4.4.5.	Reporte del Estado General del Tiempo.....	140
4.4.6.	Resumen Ensayos de Laboratorio	140
4.4.7.	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.....	140
4.4.8.	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	141
4.4.9.	Seguimiento Programa de Inversiones.....	141
4.4.10.	Actas de Comité y/o Reunión de Obra.....	141
4.5.	PROYECTO MUNICIPIO DE ABREGO.	141
4.5.1.	Reporte Informe Semanal.	141
4.5.2.	Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	142
4.5.3.	Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	142
4.5.4.	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.....	143
4.5.5.	Reporte del Estado General del Tiempo.....	143
4.5.6.	Resumen Ensayos de Laboratorio	143
4.5.7.	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.....	144
4.5.8.	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	144
4.5.9.	Seguimiento Programa de Inversiones.....	144
4.5.10.	Actas de Comité y/o Reunión de Obra.....	144
		145
4.6.	PROYECTO MUNICIPIO DE LA PLAYA.....	145
4.6.1.	Reporte Informe Semanal.	145
4.6.2.	Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	145

4.6.3.	Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	145
4.6.4.	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.....	146
4.6.5.	Reporte del Estado General del Tiempo.....	146
4.6.6.	Resumen Ensayos de Laboratorio	146
4.6.7.	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.....	146
4.6.8.	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	146
4.6.9.	Seguimiento Programa de Inversiones.....	147
4.6.10.	Actas de Comité y/o Reunión de Obra.....	147
		147
4.7.	PROYECTO MUNICIPIO DE PAMPLONITA.....	147
4.7.1.	Reporte Informe Semanal.	147
4.7.2.	Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.....	148
4.7.3.	Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	148
4.7.4.	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.....	148
4.7.5.	Reporte del Estado General del Tiempo.....	148
4.7.6.	Resumen Ensayos de Laboratorio	148
4.7.7.	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.....	148
4.7.8.	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	149
4.7.9.	Seguimiento Programa de Inversiones.....	149
4.7.10.	Actas de Comité y/o Reunión de Obra.....	149
		149
4.8.	PROYECTO GOBERNACIÓN 1943.....	150

4.8.1.	Reporte Informe Semanal.	150
4.8.2.	Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.....	150
4.8.3.	Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	150
4.8.4.	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.....	150
4.8.5.	Reporte del Estado General del Tiempo.....	151
4.8.6.	Resumen Ensayos de Laboratorio	151
4.8.7.	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.....	151
4.8.8.	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	151
4.8.9.	Seguimiento Programa de Inversiones.....	151
4.8.10.	Actas de Comité y/o Reunión de Obra.....	152
		152
4.9.	PROYECTO GOBERNACIÓN 2052.....	152
4.9.1.	Reporte Informe Semanal.	152
4.9.2.	Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.....	152
4.9.3.	Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	153
4.9.4.	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.....	153
4.9.5.	Reporte del Estado General del Tiempo.....	153
4.9.6.	Resumen Ensayos de Laboratorio	153
4.9.7.	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.....	153
4.9.8.	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	154
4.9.9.	Seguimiento Programa de Inversiones.....	154
4.9.10.	Actas de Comité y/o Reunión de Obra.....	154

4.10.	PROYECTO OCAÑA 1814	154
4.10.1.	Reporte Informe Semanal.....	154
4.10.2.	Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	154
4.10.3.	Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	155
4.10.4.	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	155
4.10.5.	Reporte del Estado General del Tiempo	155
4.10.6.	Resumen Ensayos de Laboratorio	155
4.10.7.	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	155
4.10.8.	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.....	156
4.10.9.	Seguimiento Programa de Inversiones	156
4.10.10.	Actas de Comité y/o Reunión de Obra.....	156
		156
5.	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	157
5.1.	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.....	157
5.2.	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor	157
5.2.1	Municipio De Santiago - Contrato No. LP-OP-01-2022.	157
5.2.2.	Municipio De Herrán - Contrato No. 146 de 2022.....	159
5.2.3.	Municipio De Ocaña - Contrato No. CO1.PCCNTR.3879052	160
5.2.5.	Municipio De Cáchira - Contrato No. 160 de 2022	163
5.2.5.	Municipio De Abrego - Contrato No. 252 de 2022	164
5.2.6.	Municipio De La Playa - Contrato No. MP-LP-004-2022	166
5.2.7.	Municipio De Pamplonita - Contrato No. 202 de 2022.....	168

5.2.8. Gobernación 1943 - Contrato No. 02590 DE 2022	170
5.2.9. Gobernación 2052 - Contrato No. 02332 del 2022	172
5.2.10. Ocaña 1814 - Contrato No. CO1.PCCNTR.4352407.....	173
5.2.9. Instituto Nacional De Vías - INVIAS.	175
5.2.10. Actividades administrativas	177
5.2.11. Actividades técnicas.....	177
5.2.12. Actividades financieras	178
5.2.13. Informes especialistas y profesionales.....	178
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.	180
6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	180
6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría 180	
6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	181
6.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	181
6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría.....	182
6.6. Bitácora de Obra.....	182
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.	183
8. ANEXOS.....	186

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Municipios a ejecutar dentro del objeto del Contrato	22
Tabla 2 Beneficios de los Municipios a ejecutar	25
Tabla 3 Características Técnicas del proyecto por Municipio en Ejecución	43
Tabla 4 Información del estado de los Contratos de Obra.....	44
Tabla 5 Condiciones Iniciales Municipio de Santiago.....	45
Tabla 6 Estado Documentos preconstrucción Municipio de Santiago	46
Tabla 7 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Santiago.....	56
Tabla 8 Condiciones Iniciales Municipio de Herrán.....	58
Tabla 9 Estado Documentos preconstrucción Municipio de Herrán	59
Tabla 10 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Herrán.....	61
Tabla 11 Condiciones Iniciales Municipio de Ocaña	63
Tabla 12 Estado Documentos preconstrucción Municipio de Ocaña.....	64
Tabla 13 Cantidades Ejecutadas Municipio de Ocaña	65
Tabla 14 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Ocaña 1758	81
Tabla 15 Estado Documentos preconstrucción Municipio de Cachira	83
Tabla 16 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Cáchira.....	85
Tabla 17 Condiciones Iniciales Municipio de Abrego	86
Tabla 18 Estado Documentos preconstrucción Municipio de Abrego.....	87
Tabla 19 Cantidades Ejecutadas Municipio de Abrego	88
Tabla 19 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Abrego	96
Tabla 21 Condiciones Iniciales Municipio de La Playa	100
Tabla 22 Estado Documentos preconstrucción Municipio de La Playa.....	101

Tabla 23 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de La Playa	106
Tabla 24 Condiciones Iniciales Municipio de Pamplonita	107
Tabla 25 Estado Documentos preconstrucción Municipio de Pamplonita.....	108
Tabla 26 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Pamplonita	110
Tabla 27 Condiciones Iniciales Cto. Gobernación 1943	112
Tabla 28 Estado Documentos preconstrucción Gobernación 1943	113
Tabla 29 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de La Playa	116
Tabla 30 Condiciones Iniciales Cto. Gobernación 2052	118
Tabla 31 Estado Documentos preconstrucción Gobernación 2052	119
Tabla 32 Trazabilidad Estudios y Diseños Gobernación 2052	120
Tabla 33 Condiciones Iniciales Cto. Municipio de Ocaña 1814	122
Tabla 34 Estado Documentos preconstrucción – Ocaña 1814.....	123
Tabla 35 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio Ocaña 1814	126
Tabla 36 Reporte informes semanales Municipio de Santiago	128
Tabla 37 Relación de Maquinaria y Equipo Municipio de Santiago.	129
Tabla 38 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Santiago	129
Tabla 39 Garantías Municipio de Santiago	130
Tabla 40 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Santiago	131
Tabla 41 Reporte de Maquinaria y Equipo Municipio de Herrán.....	132
Tabla 42 Garantías Municipio de Herrán.....	133
Tabla 43 Actualización Garantías Municipio de Herrán de Acuerdo a la Prorroga No. 1	133
Tabla 44 Reporte informes semanales Municipio de Ocaña	135
Tabla 45 Maquinaria y Equipo - Municipio de Ocaña.....	135

Tabla 46 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Ocaña – Mayo -2023	136
Tabla 47 Estado Financiero y Presupuestal municipio de Ocaña.....	137
Tabla 48 Ensayos de Laboratorio Municipio de Ocaña	138
Tabla 49 Garantías Municipio de Ocaña	138
Tabla 50 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Ocaña.....	139
Tabla 51 Garantías Municipio de Cáchira	141
Tabla 52 Reporte informes semanales Municipio de Abrego	142
Tabla 53 Maquinaria y Equipo - Municipio de Abrego	142
Tabla 54 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Abrego – Mayo -2023	143
Tabla 55 Ensayos de Laboratorio Municipio de Abrego	143
Tabla 56 Garantías Municipio de Abrego	144
Tabla 57 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Abrego.....	145
Tabla 58 Reporte informes semanales Municipio de Playa	145
Tabla 59 Garantías Municipio de La Playa.....	146
Tabla 60 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de La Playa	147
Tabla 61 Reporte informes semanales Municipio de Pamplonita	147
Tabla 62 Garantías Municipio de Pamplonita.....	149
Tabla 63 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Pamplonita	149
Tabla 64 Reporte informes semanales Gobernación 1943.....	150
Tabla 65 Garantías Gobernación 1943	151
Tabla 66 Actas de Comité u/o Reunión Gobernación 1943.....	152
Tabla 67 Reporte informes semanales Gobernación 2052.....	152

Tabla 68 Garantías Gobernación 2052	153
Tabla 69 Reporte informes semanales Municipio de Ocaña 1814.....	154
Tabla 70 Garantías Municipio de Ocaña 1814	156
Tabla 71 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Ocaña 1814	156
Tabla 72 Información Contrato de Interventoría 1053 de 2022.....	157
Tabla 73 Información Financiera Contrato de Interventoría 1053 de 2022.	178
Tabla 74 Vehículos Contrato de Interventoría 1053 de 2022.	180
Tabla 75 Personal Contrato de Interventoría 1053 de 2022.	180
Tabla 76 Seguimiento Financiero Interventoría.....	181
Tabla 77 Garantías Contrato de Interventoría 1053 de 2022.	181

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Ubicación general de los municipios del Proyecto en el Departamento de Norte de Santander.....	22
Ilustración 2 Soporte de Consulta Previa enviado al Ministerio del Interior.....	89
Ilustración 3 Actas de Vecindad levantadas por el Contratista, corredor uno (1).	90
Ilustración 4 Socialización inicio de obra, corredor uno (1).....	91
Ilustración 5 Socialización inicio de obra, corredor dos (2).	92
Ilustración 6 Reporte cifras de contratación mayo de 2023.	93
Ilustración 7 Solicitud de Consulta previa y Oficio enviado por esta Interventoría.	103
Ilustración 8 Reporte cifras de contratación mayo de 2023.	104
Ilustración 9 Oficio de información sobre la elaboración del PAGA.	115
Ilustración 10 Comunicación de cumplimiento a documentos preconstructivos.....	115
Ilustración 11 Conformación y aprobación comité de veeduría ciudadana.	124

Ilustración 12 Socialización y aprobación por parte de la veeduría de los tramos a intervenir.....	125
--	-----

LISTA DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Santiago	26
Fotografía 2 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Herrán	27
Fotografía 3 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Ocaña	28
Fotografía 4 Estado actual del corredor vial a intervenir PH – Municipio de Ocaña.....	29
Fotografía 5 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Cachira.....	30
Fotografía 6 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Abrego	31
Fotografía 7 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de La Playa	32
Fotografía 8 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Pamplonita	33
Fotografía 9 Estado actual del corredor vial a intervenir – Ocaña-1814	34
Fotografía 10 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943- Arboledas	35
Fotografía 11 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943- Gramalote	36
Fotografía 12 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943- Los Patios	37
Fotografía 13 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2052- Los Patios	38

LISTA DE GRAFICAS

Gráfico 1 Avance Financiero Municipio de Santiago	57
Gráfico 2 Avance Financiero Municipio de Ocaña-1758.....	81
Gráfico 3 Avance Financiero Municipio de Abrego.....	99

1. INTRODUCCIÓN

Con el presente informe, GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES, en su calidad de Interventor, del contrato No. 1053 DE 2022, cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” LOTE 2.” adjudicado previo Concurso de Méritos No CMA-DTE-SEP-197-2021, reporta a la Entidad el cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por Los Contratistas a cargo de los contratos de obra que se desarrollan dentro del marco del programa “COLOMBIA RURAL” Mantenimiento y Mejoramiento De la Red Terciaria 2019 – 2022, cuyas obras tienen como objetivos: mantener y mejorar la transitabilidad y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento.

A través de este informe se presenta a la entidad contratante, INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, el seguimiento a los once convenios Interadministrativos suscritos entre el INVIAS y municipios del Departamento de Norte de Santander y sus contratos de obra derivados que se relacionan a continuación: Municipio de Ocaña: Convenio Interadministrativo 1758-2021, Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.3879052 adjudicado a CONSORCIO OK 2022 por valor de \$ 1.711.146.620,00. Municipio de Santiago: Convenio Interadministrativo 1821-2021, Contrato de Obra No. LP-OP-01-2022 adjudicado a UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022 por valor de \$ 4.430.879.655,00. Municipio de Herrán: Convenio Interadministrativo 1861-2021, Contrato de Obra No. 146 de 2022 adjudicado a UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLAS HERRAN 2022 por valor de \$ 1.781.999.648,00. Municipio de Cachira: Convenio Interadministrativo 1859-2021, Contrato de Obra No. 160 de 2022 adjudicado a CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA por valor de \$ 2.658.435.877,00. Municipio de Abrego: Convenio Interadministrativo 1791-2021, adjudicado a CONSORCIO AD VÍAS por valor de \$ 4.314.324.054,00. Municipio de Ocaña: Convenio Interadministrativo 1814-2021, Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.4352407 adjudicado a UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022 por valor de \$ 2.499.989.139,00, Municipio de la Playa de Belén: Convenio Interadministrativo 1863-2021, Contrato de Obra No. LP-004-2022 adjudicado a CONSORCIO LA PLAYA 2022 por valor de \$ 2.203.091.392,61. Municipio de Pamplonita: Convenio Interadministrativo 1878-2021 Contrato de Obra No. 202 de 2022 adjudicado a UNION TEMPORAL COLOMBIA por valor de \$ 1.703.523.226,00. Gobernación: Convenios Interadministrativos 1943-2021, adjudicado a UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590 por valor de \$ 16.898.027.326,00, Convenio Interadministrativo 2033-2021 adjudicado a EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL NIVEL DEPARTAMENTAL FARO DEL CATATUMBO S.A.S. por valor de \$ 10.000.000.000,00 y, Convenio Interadministrativo 2052-2021,

Contrato de Obra No. 02332 DEL 2022 adjudicado a UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 por valor de \$ 2.499.989.139,00.

Para el control y vigilancia el INVIAS designó al Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE como Supervisor del Contrato de Interventoría. Así mismo, el INVIAS designó a la Ingeniero WILMAR RANGEL ROPERO, como Gestor Técnico del Proyecto.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Para el Gobierno Nacional y en consecuencia para la gestión del Instituto nacional de Vías – INVIAS es de gran importancia brindar una red vial segura para los usuario y que contribuya al desarrollo sostenible e integración del país a través de vías terciarias eficientes, cómodas y seguras, para el cumplimiento de este el INVIAS ejecuta diferentes actividades a través de cada una de sus Unidades Ejecutoras; por lo tanto con la ejecución de este proyecto, se busca el cumplimiento de mantener y mejorar la transitabilidad y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento.

Para dar cumplimiento al objetivo del proyecto el INVIAS a suscrito convenios Interadministrativos con los municipios de Ocaña, Abrego, Santiago, Cachira, Herrán, La Playa de Belén, Pamplonita, y 3 Convenios con la Gobernación de Norte de Santander. Teniendo en cuenta lo anterior, los Entes Territoriales adelantaron procesos contractuales bajo la modalidad de Licitación Pública tendiente a contratar las obras que se deriven de cada uno de los Convenios Interadministrativos suscritos a fin de llevar a cabo la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

De acuerdo al objeto del contrato de Interventoría se requiere realizar labores de control y seguimiento a los contratos de obra derivados de los convenios Interadministrativos que se suscribieron entre el INVIAS y Municipios del Departamento de Norte de Santander.

Entre las Principales actividades por ejecutar que serán supervisadas, controladas, Verificadas y aprobadas en el desarrollo del proyecto se encuentran las siguientes:

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

- Construcción de Placa Huella
- Pavimentos Convencionales
- Construcción y/o reparación de obras de drenaje, muros de contención, pontones y puentes.
- Construcción de Filtros y/o cunetas
- Bases Estabilizadas
- Tecnologías Alternativas

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO

- Conformación de la calzada existente

- Mejoramiento de la subrasante con adición de material
- Suministro e instalación de afirmado

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

- Desmante y limpieza en zonas no boscosas
- Rocería
- Reparación de baches
- Limpieza de alcantarillas y descoles
- Remoción de derrumbes menores (sin maquinaria y/o equipo) únicamente con herramienta menor
- Perfilado y/o reconstrucción de cunetas y/o reconstrucción de zanjas de coronación, que no requieran maquinaria y/o equipo, encoles y descoles.

ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA

- Caracterización vial e inventario vial del corredor productivo seleccionado, de acuerdo a la Resolución 1321 del 2018 o la legislación vigente emitida por el Ministerio de Transporte.
- Implementación y adaptación de los diseños tipo de la CARTILLA OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL a las obras a ejecutar en el corredor postulado.

Para la ejecución de las obras se realizará el control con base en el Manual de Mantenimiento de Carreteras y especificaciones generales de mantenimiento de carreteras y a las especificaciones particulares para su ejecución y a las Normas de Ensayo de Materiales del Instituto Nacional de Vías.

2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Dentro del Objeto del proyecto se realizará seguimiento y control a 11 convenios Interadministrativos con el Departamento de Norte de Santander, los cuales cuentan con la ejecución de 29 Municipios los cuales se detallan a continuación:

No.	CONVENIO CON	No. CONVENIO	MUNICIPIO
1	ABREGO	1791-2021	ABREGO
2	LA PLAYA	1863-2021	LA PLAYA
3	OCAÑA	1814-2021	OCAÑA
4	OCAÑA	1758-2021	OCAÑA
5	CACHIRA	1859-2021	CACHIRA
6	HERRAN	1861-2021	HERRAN
7	PAMPLONITA	1878-2021	PAMPLONITA
8	SANTIAGO	1821-2021	SANTIAGO

No.	CONVENIO CON	No. CONVENIO	MUNICIPIO
9	GOBERNACION	1943-2021	ARBOLEDAS
			GRAMALOTE
			LOS PATIOS (Vía principal acceso vereda californa)
10	GOBERNACION	2052-2021	LOS PATIOS (La Mutis)
11	GOBERNACION	2033-2021	VILLACARO
			PAMPLONITA
			HERRAN
			EI ZULIA
			GRAMALOTE
			LOURDES
			MUTISCUA
			PAMPLONA
			PUERTO SANTANDER
			CACOTA
			SALAZAR DE LAS PALMAS
			CACHIRA
			CUCUTA
			VILLA DEL ROSARIO
			SAN CAYETANO
			SANTIAGO
			SILOS

Tabla 1 Municipios a ejecutar dentro del objeto del Contrato

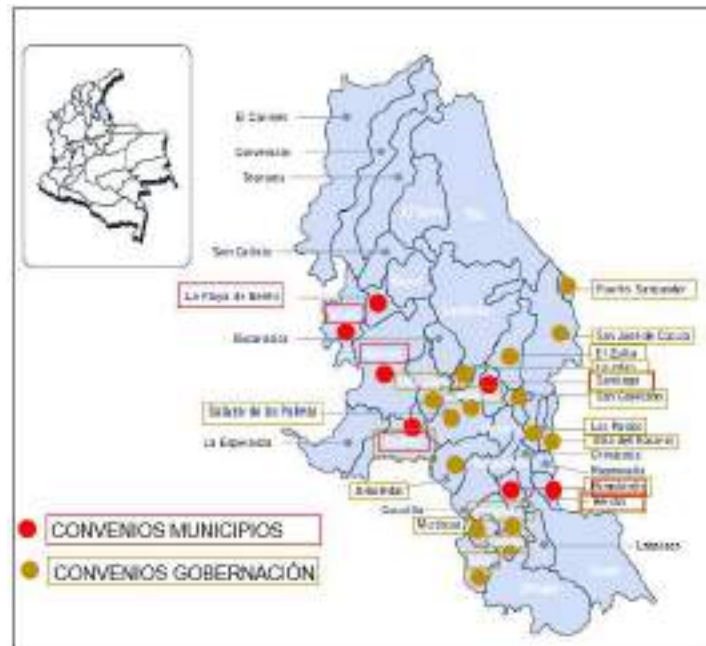


Ilustración 1 Ubicación general de los municipios del Proyecto en el Departamento de Norte de Santander

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este contrato por ser supervisión a un contrato multiproyecto se divide en 29 municipios que serán beneficiados dentro del programa “COLOMBIA RURAL”, los cuales se describen a continuación:

CORREDOR A INTERVENIR	MUNICIPIO	BENEFICIOS
VÍA LAS BRISAS DEL TARRA-LA ARENOSA VÍA SANTA LUCÍA - CANOAS.	ABREGO	Construcción de 1320 mts de placa huella y 9 alcantarillas entre el Tramo de SANTA LUCÍA-CANOAS y Construcción de 1285 mts de placa huella y 28 alcantarillas entre el Tramo de BRISAS DEL TARRA-LA ARENOSA
LLANO GRANDE – SAN PEDRO, ESPERANZA – ESPERANCITA – CLAVELLINOS	LA PLAYA DE BELEN	Construcción de 800 mts de placa huella y 4 alcantarillas en el tramo LLANO GRANDE – SAN PEDRO y Construcción de 600 mts de placa huella y 7 alcantarillas en el tramo ESPERANZA – ESPERANCITA – CLAVELLINOS.
CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA	OCAÑA - 1814	Construcción de 1890 mts de placa huella y 10 alcantarillas y 2 muros de gavión.
CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON	OCAÑA -1758	Construcción de 730 m3de parcheo, 692 mts de placa huella, 4 alcantarillas y 4 muros de gavión.
CORREDORES EL LUCERO-ALTO DE LA PAZ, LA CARRERA - EL CARBÓN Y EL LLANO Y LA CARAMBA	CACHIRA	corredor El Lucero- Alto de la Paz: construcción de 7 alcantarillas y construcción de 600 metros lineales de placa huellas. corredor La Carrera - El Carbón: construcción de 2 alcantarillas y construcción de 200 metros lineales de placa huellas. Corredor El Llano y La Caramba: construcción de 8 alcantarillas y construcción de 566 metros lineales de placa huellas.
VIA TERCIARIA VEREDA EL RAMAL	HERRAN	Construcción de 1.717 mts de placa huella y 6 alcantarillas.
MUNICIPIO DE PAMPLONITA-ZON RURAL – VEREDA BATAGA	PAMPLONITA	Construcción de 2.140 mts de Placa Huella y 4 unidades de Alcantarillas.
VIA RURAL CUPERENA – AZUL ALTO	SANTIAGO	Construcción de 4.997 mts de placa huella y 12 alcantarillas.

CORREDOR A INTERVENIR	MUNICIPIO	BENEFICIOS
VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE ARBOLEDAS, GRAMALOTE Y LOS PATIOS	GOBERNACIÓN-1943	Arboledas con una longitud de 6.970 metros lineales de placa huella, comprendidos en 8 tramos ubicados en las veredas Santo Domingo- Volcán – Potreros- Chicagua Bajo- La Rinconada- Cinera- El Helechar - Juan Bueno, 51 und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36”, Municipio de Gramalote con una longitud de 4.543 metros lineales de placa huella, comprendidos en 3 tramos ubicados en la vereda Boyaca – San Isidro – Santa Anita, 18 und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36” y Municipio de Los Patios con una longitud de 4.500 metros lineales de placa huella, comprendidos en 5 tramos ubicados en la vereda Corozal - California, 15 und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36” y 50 m3 de muro en gaviones.
LOS MANGOS LA CARRER. VÍA CHINÁVEGA. PASO DE LOS RIOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA LAS DELICIAS-EL MAMÓN LA GARZA-ZUMBADOR HERRAN-SIBERIA LOURDES-CAMPORICO MUTISCUA - MINAS DE CAL - LA ARAÑITA - LA MESETA VIA LA UNION VÍA PÁRAMO - PICA PICA PUENTE ISABEL CELIS HASTA EL DAVE SAN ANTONIO- LA QUINTA- ALTO DE SAN ANTONIO ANILLO VIAL SAN ISIDRO- GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA - ALTO FRIO LOS RINCON - LA COPITA VIA EL MOLINO PUERTO RICO CORREDOR VIAL LA PARADA- JUAN FRIO	GOBERNACIÓN-2033	Adelantar las actividades de Mejoramiento en la vía 1)LOS MANGOS LA CARRER. 2) VÍA CHINÁVEGA. 3) PASO DE LOS RIOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA 4) LAS DELICIAS-EL MAMÓN 5) LA GARZA-ZUMBADOR 6) HERRAN-SIBERIA 7) LOURDES-CAMPORICO 8) MUTISCUA - MINAS DE CAL - LA ARAÑITA - LA MESETA 9) VIA LA UNION 10) VÍA PÁRAMO - PICA PICA 11) PUENTE ISABEL CELIS HASTA EL DAVE 12) SAN ANTONIO- LA QUINTA-ALTO DE SAN ANTONIO 13) ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA 14) LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA - ALTO FRIO 15) LOS RINCON - LA COPITA 16) VIA EL MOLINO PUERTO RICO 17) CORREDOR VIAL LA PARADA- JUAN FRIO.

CORREDOR A INTERVENIR	MUNICIPIO	BENEFICIOS
LA VÍA LA GARITA – LA MUTIS EN EL TRAMO PR0+000 – PR 12+900, CUYA INTERVENCIÓN ES DE 12.90 KM DE LONGITUD.	GOBERNACIÓN- 2052	Construcción de 6.180 mts de placa huella y 25 alcantarillas y 60 M3 de muros de gavión

Tabla 2 Beneficios de los Municipios a ejecutar

Gracias a la intervención de estos proyectos se logrará mejorar las condiciones de vida de los habitantes aledaños a los corredores viales de los municipios, obteniendo beneficios de crecimiento económico; dentro del cual los campesinos se verán beneficiados al obtener mejores condiciones para el transporte de sus productos y beneficios de crecimiento social; dentro del cual se mejoran las condiciones de movilidad mejorando de esta forma su calidad de vida y por otro lado permitiendo el fácil acceso de los sistemas de salud y educación del sector.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA

A la fecha de corte del presente informe, se tienen adjudicados la totalidad de los convenios suscritos entre el Invias y el departamento de Norte de Santander. De los cuales se encuentran en ejecución 10 correspondientes a los municipios de SANTIAGO, HERRAN, OCAÑA-1758, OCAÑA-1814, CACHIRA, ABREGO, LA PLAYA, PAMPLOITA, GOBERNACIÓN 1943 y GOBERNACIÓN 2052. A continuación, se presenta el estado actual del corredor a intervenir en los convenios ejecutados a la fecha.

2.3.1. Inventario y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Santiago.

	
Vía Rural Cuperena – Azul Alto	Vía Rural Cuperena – Azul Alto
	
Vía Rural Cuperena – Azul Alto	Vía Rural Cuperena – Azul Alto

Fotografía 1 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Santiago

2.3.2. Inventario y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Herrán.

	 <p>Dirección Territorial: N 7° 31' 37.295", W 72° 28' 59.481" 13/10/2022, 11:45:55 a.m.</p>
<p>Tramo K3+000 hasta el K3+100 vereda el Ramal.</p>	<p>Tramo K6+600 hasta el K6+800 vereda el Ramal.</p>
 <p>Dirección Territorial: N 7° 27' 15.406", W 72° 29' 50.043" 14/10/2022, 11:47:39 a.m.</p>	 <p>Dirección Territorial: N 7° 29' 25.211", W 72° 30' 30.600" 14/10/2022, 11:58:25 a.m.</p>
<p>Tramo K6+900 hasta el K6+700 vereda el Ramal.</p>	<p>Tramo K9+400 hasta el K9+700 vereda el Ramal.</p>

Fotografía 2 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Herrán

2.3.3. Inventario y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Ocaña 1758.

Sector 1: Avenida Francisco Fernández de Contreras, pasando por el sector del lago en la cual se requiere de intervenciones de parcheo desde el punto PR 00+0070 hasta el punto PR 06+0180.

	
PR 01+420, Calle 2 21B-123, municipio de Ocaña	PR 01+0510 Calle 2 22A – 38, municipio de Ocaña
	
PR 01+0690 Calle 2 18B-1-18B-7, municipio de Ocaña	PR 01+0710 Calle 2 16-14, municipio de Ocaña

Fotografía 3 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Ocaña

Sector 2: Vía terciaria limites-Morrincon hasta el punto PR 18+0200.

	
PR 13+900, Corredor la Samaritana	PR 14+700, Corredor la Samaritana
	
PR 15+400, Corredor la Samaritana	PR 18+300, Corredor la Samaritana

Fotografía 4 Estado actual del corredor vial a intervenir PH – Municipio de Ocaña

2.3.4. Inventario y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Cáchira.

	
Sector el Lucero, municipio de Cachira	Sector La Caramba, municipio de Cachira
	
Sector La Caramba, municipio de Cachira	Sector La Carrera, municipio de Cachira

Fotografía 5 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Cachira

2.3.5. Inventario y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Abrego.

	
<p>Sector la vega el tigre, municipio de Abrego</p>	<p>Sector los Milagros, municipio de Abrego</p>
	
<p>Sector el chorro, municipio de Abrego</p>	<p>Sector la sabana, municipio de Abrego</p>

Fotografía 6 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Abrego

2.3.6. Inventario y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de La Playa

	
Corredor Corral Viejo – Llano Grande	Corredor 2 - Clavelinas
	
Corredor 2 - Clavelinas	Corredor 1 Corral Viejo – Llano Grande

Fotografía 7 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de La Playa

2.3.7. Inventario y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Pamplonita.

	
Vereda Bataga	Vereda Bataga
	
Vereda Bataga	Vereda Bataga

Fotografía 8 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Pamplonita

2.3.8. Inventario y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Ocaña 1814.



Fotografía 9 Estado actual del corredor vial a intervenir – Ocaña-1814

2.3.9. Inventario y Estado Inicial de las Vías del contrato de la Gobernación-1943.

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Arboledas.



*Fotografía 10 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943-
Arboledas*

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Gramalote.



*Fotografía 11 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943-
Gramalote*

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Los Patios.



*Fotografía 12 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943-
Los Patios*

2.3.10. Inventario y Estado Inicial de las Vías del contrato de la Gobernación-2052.

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de los Patios.



*Fotografía 13 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2052-
Los Patios*

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

A la fecha de corte del presente informe se tienen adjudicados la totalidad de los convenios suscritos entre el Invias y el departamento de Norte de Santander, de los cuales están en ejecución 10 correspondientes a los municipios de SANTIAGO, HERRAN, OCAÑA-1758, OCAÑA-1814, CACHIRA, ABREGO, LA PLAYA, PAMPLONITA, GOBERNACIÓN 1943 Y 2052. A continuación, se presentan sus características técnicas.

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERÍSTICAS
SANTIAGO	CUPERENA – AZUL ALTO	<p>Existen actualmente 7 Kilómetros de vía en condiciones de mal estado, por la cual las comunidades del sector utilizan para sacar sus productos provenientes de las actividades agropecuarias en vehículos. La superficie de rodadura actual es en afirmado en mal estado de conservación por falta de mantenimiento y drenajes insuficientes.</p> <p>A raíz de la ola invernal de los últimos años en el país, el corredor no permite un tránsito vehicular adecuado, incrementando los tiempos de recorrido, el riesgo de accidentalidad e interrupción del flujo vehicular.</p> <p>Es por esto, que se hace necesario la intervención de 4.997 mts de placa huella y 12 alcantarillas para mejorar las condiciones actuales del corredor vial.</p>
HERRAN	VÍA TERCIARIA VEREDA EL RAMAL	<p>La red vial del municipio de Herrán está conformada en su mayoría por vías terciarias, las cuales se encuentran en material de afirmado, sin mejoramiento definitivo con pavimentación en alguno de sus modalidades.</p> <p>A raíz de la ola invernal de los últimos años en el país, el corredor no permite un tránsito vehicular adecuado, incrementando los tiempos de recorrido, el riesgo de accidentalidad e interrupción del flujo vehicular.</p> <p>Es por esto que se hace necesario el mejoramiento de la vía en la vereda El Ramal, en el cual se establece la construcción de 1.717 mts de placa huella y 6 alcantarillas.</p>

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERISTICAS
OCAÑA	OCAÑA-LIMITES-MORRISON	En la vía a intervenir se presenta bajo nivel de servicio en la en la vía rural que comunica en este punto la zona rural con la cabecera municipal, debido a un alto deterioro de la superficie de rodadura, deficiente drenaje superficial, con una superficie desgastada por la escorrentía de las aguas lluvia y el paso de vehículos pesados. Ante esta situación se observa la necesidad de construir sobre la vía en menciones tramos de placa huella con señalización, además de la construcción de alcantarillas para el manejo de la escorrentía y la construcción de muros en gaviones con el fin de estabilizar la banca en algunos tramos críticos.
CACHIRA	CORREDORES EL LUCERO- ALTO DE LA PAZ, LA CARRERA - EL CARBÓN Y EL LLANO Y LA CARAMBA	<p>Algunos tramos de los corredores viales presentan puntos críticos que condicionan la transitabilidad de vehículos debido a fenómenos de remoción en masa, deslizamientos, el deterioro en el tiempo de la calzada, pérdida y afectación de cunetas, el deterioro y/o colapso de tuberías de paso o alcantarillas, le erosión laminar y por surcos; también la pérdida de la bancada de algunos tramos y la baja frecuencia de mantenimiento rutinarios.</p> <p>Por lo anteriormente mencionado el municipio estableció que se requieren intervenciones y obras específicas tales como placa huellas y alcantarillas que permitan el mejoramiento de tramos de vías terciarias.</p>
ABREGO	VÍA LAS BRISAS DEL TARRA-LA ARENOSA VÍA SANTA LUCÍA - CANOAS.	<p>El municipio de Abrego cuenta con una precaria infraestructura vial terciaria acorde a las necesidades de competitividad que se requiere para su desarrollo socioeconómico y para realizar mejoras en el nivel de vida de sus habitantes.</p> <p>Las vías terciarias se encuentran principalmente sin capa de rodadura o en estado regular a malo, dificultando la</p>

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERISTICAS
		<p>transitabilidad y movilidad rural, generando espacios que afectan la calidad de vida de los habitantes, así mismo, la atención de las vías se dificulta puesto que no se cuenta con información sobre las condiciones de la red vial.</p> <p>La vía Brisas del Tarra- La Arenosa y la vía Santa lucia-Canoas, se encuentra destapada, que en épocas de fuertes precipitaciones se dificulta el acceso, generando el aumento en recorridos, dificultades de traslado a servicios médicos, inasistencia de estudiantes a los centros educativos e incremento en los costos de transporte de carga y pasajeros.</p> <p>Por lo anteriormente mencionado el municipio estableció que se requieren intervenciones y obras específicas tales como placa huellas y alcantarillas que permitan el mejoramiento de tramos de vías terciarias.</p>
LA PLAYA DE BELÉN	LLANO GRANDE – SAN PEDRO ESPERANZA – ESPERANCITA - CLAVELLINOS	<p>En los últimos años, las inclemencias del clima y el paso del tiempo han causado daños en la malla vial terciaria del municipio, afectando con ello la transitabilidad por las diferentes carreteras que unen las veredas de nuestro municipio con el casco urbano y/o con la vía nacional, dificultando sobre todo en tiempos de lluvias el tránsito vehicular por estas vías y afectándose consecuentemente a las diferentes familias que a lo largo de nuestro territorio rural residen y que requieren de esta red vial para diferentes fines como por ejemplo sacar sus productos con el fin de comercializarlos, desplazarse a adquirir bienes y/o servicios a nuestro casco urbano o a los demás municipios del departamento.</p> <p>Es por ello que para mejorar el tránsito seguro y más cómodo por estas vías terciarias, se suscribió en el año 2021 el</p>

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERISTICAS
		convenio No 1863 con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS
PAMPLONITA	VIA TERCARIA VEREDA BATAGA	<p>En los últimos años, las inclemencias del clima y el paso del tiempo han causado daños en la malla vial terciaria del municipio, afectando con ello la transitabilidad por las diferentes carreteras que unen las veredas de nuestro municipio con el casco urbano y/o con la vía nacional, dificultando sobre todo en tiempos de lluvias el tránsito vehicular por estas vías y afectándose consecuentemente a las diferentes familias que a lo largo de nuestro territorio rural residen y que requieren de esta red vial para diferentes fines como por ejemplo sacar sus productos con el fin de comercializarlos, desplazarse a adquirir bienes y/o servicios a nuestro casco urbano o a los demás municipios del departamento, etc.</p> <p>Es por ello que para mejorar le transito seguro y más cómodo por estas vías terciarias, se suscribió en el año 2021 el convenio No 1878 con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, convenio con el cual se busca intervenir de manera puntual la vía terciaria ubicada en la VEREDA BATAGA EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 6.4 Km específicamente en los sectores BATAGA – LA VIRGEN iniciando del PR 0 + 000 al PR 3 + 300 y BATAGA – CUENCA iniciando del PR 0 + 000 al PR 3 + 100</p>
OCAÑA 1814	CORREDOR VIAL PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA	<p>Actualmente se presenta dificultad en la movilidad y bajo nivel de servicio en la vía rural que comunica todo el corregimiento de Buenavista, debido a un alto deterioro de la superficie de rodadura, deficiente drenaje superficial, con una superficie desgastada por la escorrentía de las aguas lluvias y el paso de vehículos pesados.</p> <p>Con el presente proyecto se pretende mejorar las vías rurales del municipio de Ocaña corregimiento de Buenavista, en una longitud</p>

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERISTICAS
		de 1890ml de placa huella, construcción de 10 Alcantarillas de 36" y 2 Muros de contención.
GOBERNACIÓN 1943	VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, GRAMALOTE Y LOS PATIOS	Con el presente proyecto se pretende mejorar las vías rurales en los municipios de Arboledas, Gramalote y Los Patios del Departamento Norte de Santander, distribuidos de la siguiente manera: Municipio de Arboledas en una longitud de 6.970 metros lineales de placa huella, comprendidos en 8 tramos ubicados en las veredas Santo Domingo- Volcán – Potreros-Chicagua Bajo- La Rinconada- Cinera- El Helechar - Juan Bueno, 51 und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36", Municipio de Gramalote en una longitud de 4.543 metros lineales de placa huella, comprendidos en 3 tramos ubicados en la vereda Boyaca – San Isidro – Santa Anita, 18 und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36" y Municipio de Los Patios en una longitud de 4.500 metros lineales de placa huella, comprendidos en 5 tramos ubicados en la vereda Corozal -California, 15 und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36" y 50 m3 de muro en gaviones.
GOBERNACIÓN 2052	VÍA TERCERÍA EN LA ZONA SUR QUE CONECTA LAS VEREDAS DE LA GARITA- LA MUTIS	Actualmente esta vía tercería en la zona sur que conecta las veredas de La Garita- La Mutis cuenta con tramos en placa huella y afirmado, durante el recorrido se evidencian algunos problemas como la falta de intervención para el mejoramiento, mantenimiento y condiciones de drenaje inadecuadas, existen cambio del ancho de la vía, erosión en algunos costados generados por mal manejo de agua. Con el presente proyecto se pretende mejorar las vías rurales del municipio de la Mutis, en las veredas La Garita – La Mutis, en una longitud de 6180 ml de placa huella, construcción de 25 Alcantarillas de 36" y 2 Muros de contención.

Tabla 3 Características Técnicas del proyecto por Municipio en Ejecución

3. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA

El contrato se encuentra distribuido en 11 convenios interadministrativos con el INVIAS, de los cuales se realizará mejoramiento y mantenimiento de corredores viales en 29 Municipios del Departamento de Norte de Santander, a la fecha ya se encuentran adjudicados la totalidad de los convenios, derivados en 11 contratos de obra, en la siguiente tabla se presenta el detalle del proceso de adjudicación de los convenios.

Municipio	Estado	No. Convenio y No. Contrato de obra	Contratista
Abrego	Adjudicado En Ejecución	1791-2021 Contrato de Obra No. 252 de 2022	CONSORCIO AD VIAS
La Playa de Belén	Adjudicado En Ejecución	1863-2021 Contrato de Obra No. LP-004 de 2022	CONSORCIO LA PLAYA 2022
Ocaña	Adjudicado En Ejecución	1758-2021 Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.3879052	CONSORCIO OK 2022
Ocaña	Adjudicado En Ejecución	1814-2021 Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.4352407	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022
Cáchira	Adjudicado Suspendido	1859-2021 Contrato de Obra No.160 De 2022	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA
Herrán	Adjudicado Suspendido	1861-2021 Contrato de Obra No.146 De 2022	UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS HERRAN 2022
Pamplonita	Adjudicado En Ejecución	1878-2021 Contrato de Obra No. 202 de 2022	UNION TEMPORAL COLOMBIA
Santiago	Adjudicado En Ejecución	1821-2021 Contrato de Obra No. LP-OP-001-2022	UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022
Gobernación- 1943	Adjudicado En Ejecución	1943-2021 Contrato de Obra No. 02590 DE 2022	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590
Gobernación- 2033	Adjudicado	2033-2021 Contrato de Obra Interadministrativo No. 4164 DE 2022	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL NIVEL DEPARTAMENTAL FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
Gobernación- 2052	Adjudicado En Ejecución	2052-2021 Contrato de Obra No. 02332 DE 2022	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022

Tabla 4 Información del estado de los Contratos de Obra

A continuación, se hace un recuento detallado de cada uno de los contratos que a la fecha de corte del presente informe se encuentran en ejecución.

3.1. CONTRATO DE OBRA LP-OP-001- 2022 – MUNICIPIO DE SANTIAGO

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	LP-OP-001- 2022
Objeto:	CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.
Contratista:	UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	29 de julio de 2022
Valor Inicial:	\$ 4.430.879.655,00 M/CTE
Fecha de inicio:	18 de octubre de 2022
Fecha de terminación inicial:	17 de junio de 2023
Fecha de Suspensión:	15 de marzo de 2023
Fecha de Reinicio:	30 de marzo de 2023
Prorroga 1:	
Fecha Nueva de terminación:	02 de julio de 2023
Fecha de terminación Final:	02 de julio de 2023

Tabla 5 Condiciones Iniciales Municipio de Santiago

3.1.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas.

A la fecha de corte del presente informe se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.1.1.1. Actividades Administrativas.

Dentro de las actividades administrativas el contratista hace entrega de los documentos de preconstrucción, a la fecha el contratista está realizando actividades de subsanación a los documentos observados por la Interventoría. A continuación, se presenta el estado de los documentos de preconstrucción presentados por el Contratista a corte del 31 de mayo de 2023.

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-110-22 del 20-Dic-22
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-168-22 del 06-Ene-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-043-22 del 17-Nov-22
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-080-22 del 05-Dic-22
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-080-22 del 05-Dic-22
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-066-22 del 28-Nov-22
Equipo Mínimo Obligatorio	Observado	GIC-INVIAS-NTS-222-22 del 26-Ene-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-073-22 del 29-Nov-22
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-066-22 del 28-Nov-22
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-218-22 del 24-Ene-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Observado	GIC-INVIAS-NTS-393-22 del 21-Mar-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-226-22 del 30-Ene-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-645-22 del 09-May-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-231-22 del 30-Ene-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-347-22 del 08-Mar-23
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-313-22 del 27-Feb-23
Plan De Gerencia	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-191-22 del 18-Ene-23

Tabla 6 Estado Documentos preconstrucción Municipio de Santiago

Por otra parte, el contratista continúa solicitando el ajuste a los APU's del proyecto ya que manifiestan tener un desequilibrio económico, por lo tanto, la Interventoría durante este periodo está revisando los documentos soportes entregados por el Contratista con la solicitud y se encuentra realizando visitas técnicas para determinar la posible afectación en términos financieros del proyecto.

3.1.1.2. Actividades Técnicas.

Dentro de las actividades desarrolladas en este periodo por parte del Contratista se han adelantado las siguientes actividades.

- Se realizan actividades de mejoramiento en la vía, con el fin de ingresar con facilidad al sitio de trabajo los materiales y maquinaria.

- El contratista realiza actividades de ingreso de material, adicional a esto continúan con la contratación del personal para la ejecución del proyecto.
- Se realizaron actividades de perfilado, nivelación y compactación de la subrasante, se instalan 234 m³ de subbase granular entre la abscisa K0+015 al K0+328.
- Se realiza el cerramiento del lote para acopio del material en el K1+000, se continua con el acopio del material granular (material de subbase granular, triturado, arena, cemento, acero de refuerzo).

Debido a las fuertes lluvias ocasionadas el material de subbase granular instalado en las abscisas K0+015 al K0+328 se perdió totalmente, debido a esta situación presentada el contratista deberá nuevamente conformar la vía, y volver a realizar la instalación del material perdido a causa del invierno.

La maquinaria línea amarilla se encuentra ubicada en el casino ubicado en el sector de Cuperena.

El contratista tiene en el proyecto cinco (5) volquetas que se encuentran llevando material desde el municipio del zulia hasta el acopio de la obra, adicional a esto acondicionaron una camioneta tipo tripton para realizar viajes internos dentro del proyecto.

Desde el inicio del proyecto se ubican tres guarda ganados que se encuentran localizados dentro de la vía, la placa huella debe construirse de manera tal que los guarda ganados no queden por fuera del proyecto y se deberá demoler el bordillo para que quede a nivel con la placa huella a construir, se tiene un estimado aproximadamente de un kilómetro y medio en donde se encuentran ubicados.

Se inició la adecuación del campamento habitacional para el personal que está laborando en el proyecto, esto con el fin que las personas no se estén trasladando hasta las diferentes veredas aledañas al sitio de trabajo debido a que en este sector cuando llueve se vuelve intransitable y el personal o llega muy tarde por el difícil acceso a la obra, o en su defecto no pueden subir en sus motos a trabajar.

Al presente informe se anexa el registro fotográfico de la ejecución del proyecto.

3.1.1.3. Actividades ambientales.

Las actividades realizadas en el componente ambiental fueron las siguientes:

- 03/05/2023: Se participó en la socialización con la comunidad para el inicio de la obra, donde participaron Alcaldía municipal, Invias, Interventoría, Contratista, en

donde se mencionó el alcance del proyecto a ejecutar y la presentación del equipo de trabajo por parte de la interventoría.

- 30/05/2023: Se realiza mesa de trabajo con la profesional ambiental del contratista sobre los permisos existente como contrato de exploración y explotación minera y licencia ambiental para dar el respectivo aprobado de la FUENTE DE MATERIALES.
- 31/05/2023: Se realizó visita a la empresa Triturado Concretos El Zulia SAS (CTZ), con el fin de verificar información en cuanto a la FUENTE DE MATERIALES.
- 31/05/2023: Se realizó visita a la obra ubicada en la vereda Cuperena, Zul Alto, del municipio, llevando a cabo el respectivo seguimiento que debe ejecutar el contratista en obra referente a los proyectos contemplados en cada programa del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA), enfocado en el componente ambiental.

REGISTRO FOTOGRAFICO VISITA A OBRA VEREDA CUPERENA Y ZUL ALTO.	
	
Visita a Triturados y Concretos El Zulia SAS (CTZ),	Material de construcción.

REGISTRO FOTOGRAFICO VISITA A OBRA VEREDA CUPERENA Y ZUL ALTO.


Estacionamiento de maquinaria.



Centro de Acopio material de construcción.

3.1.1.4. Actividades Sociales.

Los días 18 y 22 de mayo de 2023, se adelantaron dos mesas de trabajo con la profesional social del Contratista, Yury Marcela Peña, con el objetivo de dar respuesta a inquietudes que tenía sobre los Programas de Gestión Social, su ejecución e indicadores de los mismos; esto con el fin de avanzar en las observaciones dadas por esta Interventoría sobre el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA).

Igualmente, el día 11 de mayo de 2023, se envía oficio con radicado GIC-INVIAS-NTS-529-22, con asunto “Solicitud cumplimiento de documentos previos al inicio de obra”, al Consorcio Unión Temporal Placa Huella Santiago 2022, con cinco (5) puntos, de los cuales ya a dada cumplimiento a dos (2).

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.

El día 03 de mayo de 2023, se llevo a cabo por parte de la Alcaldía Municipal y el Consorcio Unión Temporal Placa Huella Santiago 2022, la correspondiente socialización de inicio de obra, con asistencia de veintitrés (23) personas entre funcionarios de la Alcaldía (Alcalde y Secretario de Planeación), Contratista (Director de Obra), Interventoría (Residente Técnica, Profesional Social y Ambiental), representante de Invias y habitantes pertenecientes al Área de Influencia del proyecto.

En esta socialización se les indicó por parte del Director de Obra del Contratista, el alcance final del proyecto, los beneficios que traerá esta ejecución; de igual forma, se manifestó la labor social que adelantará el Consorcio en cuanto a la contratación de mano de obra

perteneciente al Área de Influencia Directa del proyecto, así como los programas a ejecutarse durante el periodo en el que se tienen previstas las obra.

La comunidad una vez terminada la presentación del Contratista, la Alcaldía y la Interventoría, acepto el alcance a darse con la ejecución del proyecto, y esperan con gran ansiedad el inicio de esta obra, la cual beneficiará grandemente a la comunidad de la vereda Cuperena – Azul Alto, perteneciente al municipio de Santiago, Norte de Santander.

Socialización de inicio de obra, comunidad de Cuperena y Azul Alto.

	
<p>Participación del señor Alcalde de Santiago.</p>	<p>Intervención del Director de Obra del Contratista.</p>
	
<p>Actuación por parte del representante de Invias.</p>	<p>Explicación y presentación del equipo de Interventoría por parte de la Residente Técnica.</p>



ALCALDIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS		ACTA	SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
<p>ACTA No. 1</p> <p>DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: <u>Santiago de los Caballeros</u></p> <p>FECHA: <u>01 de mayo de 2023</u></p> <p>LUGAR: <u>Vereda de los Caballeros</u></p> <p>INTERVENIENTES A OBRAS: <u>Comunidad de los Caballeros</u></p> <p>OBJETIVO: <u>Realizar la socialización de inicio de obra</u></p> <p>ASISTENTES: <u>Los miembros de la comunidad</u></p> <p>TEMAS: <u>1. Socialización de inicio de obra</u></p> <p>DESARROLLO Y CONCLUSIONES: <u>Se realizó la socialización de inicio de obra, donde se explicó el plan de obra y se escucharon las inquietudes de la comunidad. Se concluyó con la firma del acta de socialización.</u></p>			
<p>ALCALDE: <u>[Firma]</u></p> <p>SECRETARIO DE PLANEACIÓN: <u>[Firma]</u></p> <p>DIRECTOR DE OBRAS: <u>[Firma]</u></p> <p>ASISTENTES: <u>[Firma]</u></p>			

Acta de Socialización de Inicio de Obra.



Inquietudes de la Comunidad, resueltas por el Secretario de Planeación y el Director de Obra del Contratista.

Fuente: Gavinco Ingenieros Consultores.

PROGRAMA DE CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.

El Programa de Cultura Vial y Participación Comunitaria está conformado por dos actividades básicas: la primera se refiere a la estructuración y desarrollo de talleres pedagógicos con el objeto de concienciar a la población educativa, a la comunidad en general, a líderes del AID y a los miembros del Comité de Participación Comunitaria en el cambio de actitudes que conduzcan a la sostenibilidad de la obra, a la gestión integral de la biodiversidad de acuerdo a las características ambientales del territorio, a evitar la generación de accidentes durante el proceso constructivo y en la operación del proyecto. La segunda hace referencia a la conformación y consolidación del Comité de Participación Comunitaria del proyecto.



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

En este caso, haremos referencia a la conformación del Comité de Participación Comunitaria (Veeduría Ciudadana), el cual ya se encuentra con la correspondiente aprobación por parte de la Personería Municipal de Santiago; este se encuentra integrado por cuatro (4) personas pertenecientes al Área de Influencia del proyecto, quienes tienen la responsabilidad de darle un seguimiento pertinente y eficiente a la obra a ejecutarse.

Acta de conformación y aprobación del Comité de Participación Ciudadana (Veeduría).

ACTA DE CONFORMACIÓN DE VEEDURÍA CIUDADANA "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VÍA RURAL, CUMPIERNA - ZUL, ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NOROCCIDENTAL"																							
<p>En el Municipio de Santiago el día 15 mayo del 2022, se reunió una Asamblea convocada por el Comité de Participación Comunitaria a residentes del sector de Cumpierna - Zul Alto del municipio de Santiago Noro Occidental, con el fin de conformar una veeduría ciudadana según los lineamientos de la Ley 850 de 2003 y la Ley 1757 de 2019.</p> <p>CONSIDERANDO:</p> <p>Que la Constitución Política de Colombia le reconoce a cada ciudadano y ciudadana el derecho a participar en las decisiones que afectan su desarrollo y a vigilar la gestión pública;</p> <p>Que existe en la comunidad un compromiso con el trabajo comunitario, con el manejo de la política y con la vigilancia ciudadana de los recursos del Estado;</p> <p>DECIDIENDO:</p> <p>Formar el grupo de veedores (as) como veeduría ciudadana a los (as) siguientes ciudadanos (as) según el artículo 9 de la Ley 850 de 2003:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre y apellidos</th> <th>Documento de identidad</th> <th>Identificación y Teléfono</th> <th>Residencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>German Camacho Molina</td> <td>1.895.029</td> <td>CE 7 8 3 28</td> <td>Via</td> </tr> <tr> <td>Jaime Andres Camargo Prieto</td> <td>1.054.858.258</td> <td>Vozes del Zul</td> <td>Via</td> </tr> <tr> <td>Alejandro Prieto Prieto</td> <td>8.437.906</td> <td>Vozes del Zul</td> <td>Via</td> </tr> <tr> <td>Luisa Sofía Ruiz Parrales</td> <td>79.140.008</td> <td>Vozes del Zul</td> <td>Via</td> </tr> </tbody> </table> <p>RECONOCIENDO: La veeduría se denominará "Punto Huella en la Vía Rural Cumpierna - Zul Alto", ubicada en el sector de Cumpierna - Zul Alto y tendrá una duración del tiempo de ejecución del proyecto, al cual tiene como objetivo: "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VÍA RURAL, CUMPIERNA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NOROCCIDENTAL".</p> <p>La Asamblea aprueba esta designación y la lista de veedores a todo momento de presencia sobre campo para el seguimiento y control de la obra de la veeduría ciudadana.</p>				Nombre y apellidos	Documento de identidad	Identificación y Teléfono	Residencia	German Camacho Molina	1.895.029	CE 7 8 3 28	Via	Jaime Andres Camargo Prieto	1.054.858.258	Vozes del Zul	Via	Alejandro Prieto Prieto	8.437.906	Vozes del Zul	Via	Luisa Sofía Ruiz Parrales	79.140.008	Vozes del Zul	Via
Nombre y apellidos	Documento de identidad	Identificación y Teléfono	Residencia																				
German Camacho Molina	1.895.029	CE 7 8 3 28	Via																				
Jaime Andres Camargo Prieto	1.054.858.258	Vozes del Zul	Via																				
Alejandro Prieto Prieto	8.437.906	Vozes del Zul	Via																				
Luisa Sofía Ruiz Parrales	79.140.008	Vozes del Zul	Via																				
<p>TERCERO: El grupo de veedores (as) elige democráticamente como su coordinador(a) al presidente(a) a GERMAN CAMACHO MOLINA y como secretario(a) a JAIME ANDRES CAMARGO PRIETO.</p> <p>CUARTO: El grupo de control social se compromete a realizar informes periódicos de su labor y a servir de interlocutor entre las instancias ejecutoras de los proyectos y la comunidad. Todos sus reportes seguirán los principios que rigen el control social, consignados en la Ley 850 de 2003, y el funcionamiento interno de la veeduría se basará en la conversación y el diálogo.</p> <p>QUINTO: Las veedores y los veedores ratifican el compromiso que adquieren ante la comunidad, bajo los parámetros de la Ley 850 de 2003 y las demás normas que rigen la participación ciudadana, ratificando su firma.</p> <p>FIRMAS:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre y apellidos</th> <th>C.C.</th> <th>Firma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>German Camacho Molina</td> <td>1.895.029</td> <td>[Firma]</td> </tr> <tr> <td>Jaime Andres Camargo Prieto</td> <td>1.054.858.258</td> <td>[Firma]</td> </tr> <tr> <td>Alejandro Prieto Prieto</td> <td>8.437.906</td> <td>[Firma]</td> </tr> <tr> <td>Luisa Sofía Ruiz Parrales</td> <td>79.140.008</td> <td>[Firma]</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nota: Se pudo anexar el Detalle de asistentes.</p>				Nombre y apellidos	C.C.	Firma	German Camacho Molina	1.895.029	[Firma]	Jaime Andres Camargo Prieto	1.054.858.258	[Firma]	Alejandro Prieto Prieto	8.437.906	[Firma]	Luisa Sofía Ruiz Parrales	79.140.008	[Firma]					
Nombre y apellidos	C.C.	Firma																					
German Camacho Molina	1.895.029	[Firma]																					
Jaime Andres Camargo Prieto	1.054.858.258	[Firma]																					
Alejandro Prieto Prieto	8.437.906	[Firma]																					
Luisa Sofía Ruiz Parrales	79.140.008	[Firma]																					

Acta de conformación Comité de Participación Ciudadana (Veeduría Ciudadana"

PERSONERÍA MUNICIPAL		SECCIÓN																																									
<p>ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (VEEDURÍA CIUDADANA)</p> <p>En el Municipio de Santiago el día 15 mayo del 2022, se reunió una Asamblea convocada por el Comité de Participación Comunitaria a residentes del sector de Cumpierna - Zul Alto del municipio de Santiago Noro Occidental, con el fin de conformar una veeduría ciudadana según los lineamientos de la Ley 850 de 2003 y la Ley 1757 de 2019.</p> <p>CONSIDERANDO:</p> <p>Que la Constitución Política de Colombia le reconoce a cada ciudadano y ciudadana el derecho a participar en las decisiones que afectan su desarrollo y a vigilar la gestión pública;</p> <p>Que existe en la comunidad un compromiso con el trabajo comunitario, con el manejo de la política y con la vigilancia ciudadana de los recursos del Estado;</p> <p>DECIDIENDO:</p> <p>Formar el grupo de veedores (as) como veeduría ciudadana a los (as) siguientes ciudadanos (as) según el artículo 9 de la Ley 850 de 2003:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre y apellidos</th> <th>Documento de identidad</th> <th>Identificación y Teléfono</th> <th>Residencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>German Camacho Molina</td> <td>1.895.029</td> <td>CE 7 8 3 28</td> <td>Via</td> </tr> <tr> <td>Jaime Andres Camargo Prieto</td> <td>1.054.858.258</td> <td>Vozes del Zul</td> <td>Via</td> </tr> <tr> <td>Alejandro Prieto Prieto</td> <td>8.437.906</td> <td>Vozes del Zul</td> <td>Via</td> </tr> <tr> <td>Luisa Sofía Ruiz Parrales</td> <td>79.140.008</td> <td>Vozes del Zul</td> <td>Via</td> </tr> </tbody> </table> <p>RECONOCIENDO: La veeduría se denominará "Punto Huella en la Vía Rural Cumpierna - Zul Alto", ubicada en el sector de Cumpierna - Zul Alto y tendrá una duración del tiempo de ejecución del proyecto, al cual tiene como objetivo: "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VÍA RURAL, CUMPIERNA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NOROCCIDENTAL".</p> <p>La Asamblea aprueba esta designación y la lista de veedores a todo momento de presencia sobre campo para el seguimiento y control de la obra de la veeduría ciudadana.</p>		Nombre y apellidos	Documento de identidad	Identificación y Teléfono	Residencia	German Camacho Molina	1.895.029	CE 7 8 3 28	Via	Jaime Andres Camargo Prieto	1.054.858.258	Vozes del Zul	Via	Alejandro Prieto Prieto	8.437.906	Vozes del Zul	Via	Luisa Sofía Ruiz Parrales	79.140.008	Vozes del Zul	Via	<p>SECCIÓN DE REGISTRO</p> <p>En el Municipio de Santiago el día 15 mayo del 2022, se reunió una Asamblea convocada por el Comité de Participación Comunitaria a residentes del sector de Cumpierna - Zul Alto del municipio de Santiago Noro Occidental, con el fin de conformar una veeduría ciudadana según los lineamientos de la Ley 850 de 2003 y la Ley 1757 de 2019.</p> <p>CONSIDERANDO:</p> <p>Que la Constitución Política de Colombia le reconoce a cada ciudadano y ciudadana el derecho a participar en las decisiones que afectan su desarrollo y a vigilar la gestión pública;</p> <p>Que existe en la comunidad un compromiso con el trabajo comunitario, con el manejo de la política y con la vigilancia ciudadana de los recursos del Estado;</p> <p>DECIDIENDO:</p> <p>Formar el grupo de veedores (as) como veeduría ciudadana a los (as) siguientes ciudadanos (as) según el artículo 9 de la Ley 850 de 2003:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre y apellidos</th> <th>Documento de identidad</th> <th>Identificación y Teléfono</th> <th>Residencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>German Camacho Molina</td> <td>1.895.029</td> <td>CE 7 8 3 28</td> <td>Via</td> </tr> <tr> <td>Jaime Andres Camargo Prieto</td> <td>1.054.858.258</td> <td>Vozes del Zul</td> <td>Via</td> </tr> <tr> <td>Alejandro Prieto Prieto</td> <td>8.437.906</td> <td>Vozes del Zul</td> <td>Via</td> </tr> <tr> <td>Luisa Sofía Ruiz Parrales</td> <td>79.140.008</td> <td>Vozes del Zul</td> <td>Via</td> </tr> </tbody> </table> <p>RECONOCIENDO: La veeduría se denominará "Punto Huella en la Vía Rural Cumpierna - Zul Alto", ubicada en el sector de Cumpierna - Zul Alto y tendrá una duración del tiempo de ejecución del proyecto, al cual tiene como objetivo: "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VÍA RURAL, CUMPIERNA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NOROCCIDENTAL".</p> <p>La Asamblea aprueba esta designación y la lista de veedores a todo momento de presencia sobre campo para el seguimiento y control de la obra de la veeduría ciudadana.</p>		Nombre y apellidos	Documento de identidad	Identificación y Teléfono	Residencia	German Camacho Molina	1.895.029	CE 7 8 3 28	Via	Jaime Andres Camargo Prieto	1.054.858.258	Vozes del Zul	Via	Alejandro Prieto Prieto	8.437.906	Vozes del Zul	Via	Luisa Sofía Ruiz Parrales	79.140.008	Vozes del Zul	Via
Nombre y apellidos	Documento de identidad	Identificación y Teléfono	Residencia																																								
German Camacho Molina	1.895.029	CE 7 8 3 28	Via																																								
Jaime Andres Camargo Prieto	1.054.858.258	Vozes del Zul	Via																																								
Alejandro Prieto Prieto	8.437.906	Vozes del Zul	Via																																								
Luisa Sofía Ruiz Parrales	79.140.008	Vozes del Zul	Via																																								
Nombre y apellidos	Documento de identidad	Identificación y Teléfono	Residencia																																								
German Camacho Molina	1.895.029	CE 7 8 3 28	Via																																								
Jaime Andres Camargo Prieto	1.054.858.258	Vozes del Zul	Via																																								
Alejandro Prieto Prieto	8.437.906	Vozes del Zul	Via																																								
Luisa Sofía Ruiz Parrales	79.140.008	Vozes del Zul	Via																																								

Aprobación del Comité de Participación Ciudadana (Veeduría) por la Personería Municipal.

Fuente: Consorcio Unión Temporal Placa Huella Santiago 2022.

3.1.1.5. Actividades SST.

Durante este periodo se ha reportado por parte del contratista el inicio de actividades de obra, dentro de las actividades ejecutadas se encuentran las siguientes:

1. Exámenes de ingreso

Registra el ingreso de personal y sus respectivos exámenes médicos ocupacionales.

No	NOMBRE	CARGO	CEDULA
1	MELISA CARDENAS REMOLINA	INGENIERA AUXILIAR	1090386915
2	YORDAN ALEXANDER CACERES RONDON	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	1.005.058.758
3	WILSON ORLANDO RODRIGUEZ	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	1.005.085.614
4	JESUS RUBIEL AGUILAR MELO	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	1.093.293.685
5	EUDES BLADIMIR PEÑARANDA BARAJAS	OPERADOR	1.094.166.681
6	MARLON SAUL REALES	OPERADOR	1.090.472.764
7	CRISTIAN FERNANDO CELIS	OPERADOR	1.092.156.255
8	LUIS ENRIQUE JAIMES PEREZ	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	1.094.859.342
9	MARBEL TATIANA BOHORQUEZ RAMIREZ	TOPOGRAFO	1.094.351.277
10	ANYI YULIANA URBINA	AUXILIAR SST	1.005.035.950
11	NORBERTO JOSE GALVIS PATIÑO	VIGILANTE	5.450.083

2. Ausentismo Laboral

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no se registran ausentismo por causa de enfermedades laborales o accidentes laborales.

3. Procedimiento de trabajos seguros

Se realiza el seguimiento a los procedimientos de seguridad ejecutados en cada una de las obras que se encuentran en ejecución para el proyecto de Santiago.

4. Maquinaria y Equipo

La interventoría hace revisión documental de la maquinaria previo al inicio y durante la ejecución de las obras, a continuación, se muestra la maquinaria que se encuentra en obra por parte del Contratista.



Maquinaria y Equipo Municipio de Santiago

5. Equipos de Emergencia

Para la ejecución de este componente, se cuenta en obra con los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

Se realizaron las inspecciones requeridas y se realizó la verificación de las condiciones en las que se encuentran.

6. Estadísticas SST

Durante este periodo no ha presentado incidentes en su ejecución, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de Mayo de 2023.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
UNION PLACA HUELLA SANTIAGO	0	0	0

7. Inducciones y Capacitaciones

Durante este periodo el contratista no presento ninguna inducción ni capacitación de los trabajadores.

8. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
UNION PLACA HUELLA SANTIAGO	Mayo	0

3.1.2. Seguimiento Ítems No Previstos

A la fecha no se han presentado ítem con actividades no previstas en el proyecto.

3.1.3. Estado de avance del proyecto.

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales, de las cuales se describe su avance a continuación.

3.1.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

A la fecha el Contratista ya tiene aprobados la totalidad de los Estudios y Diseños; dentro de los cuales quedaron con algunas observaciones de forma el componente de Topografía para lo cual se espera sean subsanados para revisión y aprobación definitiva de la Interventoría.

A la fecha el estado de avance ejecutado de Estudios y Diseños acumulado es del 98.32% que una vez cuantificadas las cantidades ejecutadas equivale a en pesos a \$ 51.619.190,22 vs un programado del 100% que equivale en pesos a \$ 52.501.570,00.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS		COMUNICACIÓN
Informe de suelos y Geotecnia		<ul style="list-style-type: none"> - Entrega documento con PHS2022 – 011 – 2022 del 05-Dic-22 - GIC-INVIAS-NTS-096-22 del 16-Dic-22 - OBSERVACIONES - Entrega RESPUESTAS al documento con PHS2022–030–2022 del 23-Ene-23 - GIC-INVIAS-NTS-243-22 del 01-Feb-23 - OBSERVACIONES - Entrega RESPUESTAS al documento con PHS2022 – 037 – 2022 del 22-Feb-23 - GIC-INVIAS-NTS-341-22 del 08-Mar-23 – OBSERVACIONES - GIC-INVIAS-NTS-388-22 del 17-Mar-23 - APROBADO
TOPOGRAFIA	Se solicita con el Comunicado GIC-INVIAS-NTS-024-22 del 18/10/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Entrega documento con PHS2022 – 011 – 2022 del 05-Dic-22 - GIC-INVIAS-NTS-082-22 del 06-Dic-22 - OBSERVACIONES - Entrega documento con PHS2022 – 019 – 2022 del 28-Dic-22 - GIC-INVIAS-NTS-158-22 del 04-Ene-23 – OBSERVACIONES - Entrega documento con PHS2022 – 027 – 2022 del 23-Ene-23 - GIC-INVIAS-NTS-217-22 del 24-Ene-23 - OBSERVACIONES (se solicita la entrega de poligonal) - GIC-INVIAS-NTS-223-22 del 26-Ene-23 - APROBADO CON OBSERVACIONES
	• Plano de perfil longitudinal de la vía a intervenir.	
	• Plano en planta de la vía a intervenir.	
	• Archivos de puntos en formato CSV.	
	• Plano en AutoCAD de las curvas y levantamiento general del proyecto.	
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS		<ul style="list-style-type: none"> - Entrega documento con correo del 16-Dic-22 - GIC-INVIAS-NTS-128-22 del 23-Dic-22 - OBSERVACIONES - Entrega documento con PHS2022 – 029 – 2022 del 23-Ene-23 - Se lleva a cabo Mesa de Trabajo 25-01-23 - OBSERVACIONES

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	<ul style="list-style-type: none"> - Entrega documento con PHS2022 – 036 – 2022 del 22-Feb-23 - GIC-INVIAS-NTS-306-22 del 23-Feb-23 – OBSERVACIONES - Entrega documento con correo del 07-Mar-23 - GIC-INVIAS-NTS-352-22 del 09-Mar-23 – OBSERVACIONES - Entrega documento con PHS2022 – 047 – 2022 del 17-Mar-23 - GIC-INVIAS-NTS-391-22 del 21-Mar-23 – APROBADO
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	<ul style="list-style-type: none"> - Entrega documento con correo del 16-Dic-22 - GIC-INVIAS-NTS-119-22 del 22-Dic-22 – OBSERVACIONES - Entrega documento con PHS2022 – 025 – 2022 del 18-Ene-23 - GIC-INVIAS-NTS-243-22 del 01-Feb-23 – OBSERVACIONES - Entrega RESPUESTAS al documento con PHS2022 – 037 – 2022 del 22-Feb-23 - GIC-INVIAS-NTS-341-22 del 08-Mar-23 – OBSERVACIONES - falta plano modulación - Entrega documento con correo del 10-Mar-23 - GIC-INVIAS-NTS-388-22 del 17-Mar-23 – APROBADO
Informe estructural	<ul style="list-style-type: none"> - Entrega documento con PHS2022 – 016 – 2022 del 16-Dic-22 - GIC-INVIAS-NTS-175-22 del 12-Ene-23 – OBSERVACIONES - Entrega documento con PHS2022 – 025 – 2022 del 18-Ene-23 - GIC-INVIAS-NTS-210-22 del 24-Ene-23 – APROBADO
Informe hidráulico	<ul style="list-style-type: none"> - Entrega documento con PHS2022 – 021 – 2023 del 09-Ene-23 - GIC-INVIAS-NTS-173-22 del 11-Ene-23 – OBSERVACIONES - Entrega documento con PHS2022 – 028 – 2022 del 23-Ene-23 - GIC-INVIAS-NTS-221-22 del 25-Ene-23 – OBSERVACIONES - Entrega documento con PHS2022 – 039 – 2022 del 24-Feb-23 - GIC-INVIAS-NTS-343-22 del 08-Mar-23 – OBSERVACIONES - Entrega documento con PHS2022 – 046 – 2022 del 15-Mar-23 - GIC-INVIAS-NTS-410-22 del 28-Mar-23 – APROBADO

Tabla 7 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Santiago.

3.1.3.2. Etapa de Construcción.

A la fecha de corte del informe, El contratista Inicia actividades de obra el 15 de mayo de 2023, a partir de esta fecha el contratista ha realizado actividades de Traslado de maquinaria, acopio de materiales de obra y afiliación de personal, por otra parte, ha realizado actividades de mejoramiento de la vía con el fin de hacer mas transitable el corredor vial y de esta manera trasladar los materiales necesarios para la ejecución del proyecto.

Con corte al 31 de mayo de 2023, el estado de avance ejecutado acumulado es del 1.16% que una vez cuantificadas las cantidades ejecutadas equivale a en pesos a \$ 51.619.190,22 vs un programado del 94.24% que equivale en pesos a \$ 4.175.633.689,77.

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 1 Avance Financiero Municipio de Santiago

A la fecha el contrato de obra presenta un atraso del 93.07% esto se debe a que el contratista ya debería tener ejecutado en un 94% la construcción de Placa Huella y en un 100% la construcción de Alcantarillas, además de lo anterior el contratista solicito suspensión del contrato en un termino de 15 días y, realizo solicitudes de ampliación a esta suspensión la cual fue denegada por el municipio, sin embargo el contratista no reinicio sus obligaciones aumentando de esta manera el atraso presentado, por otra parte la interventoría a solicitado un Plan de Contingencia con nuestro comunicado GIC-INVIAS-NTS-571-22 del 24 de mayo de 2023 para poder minimizar el atraso presentado, el cual no ha sido presentado por el contratista.

3.2. CONTRATO DE OBRA 146 DE 2022 – MUNICIPIO DE HERRÁN

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	146 de 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.
Contratista:	UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS HERRAN 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	27 de septiembre de 2022
Valor Inicial:	\$ 1.781.999.648,00 M/CTE
Fecha de inicio:	19 de octubre de 2022
Fecha de terminación inicial:	31 de diciembre de 2022
Fecha de Suspensión:	10 de marzo de 2023
Fecha de Reinicio:	
Prorroga 1:	4 meses
Fecha Nueva de terminación:	30 de abril de 2023
Fecha de terminación Final:	Treinta (30) de abril de 2023

Tabla 8 Condiciones Iniciales Municipio de Herrán

3.2.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas.

A la fecha de corte del presente informe, el contrato se encuentra suspendido, de acuerdo al Acta de Suspensión No. 1, y su Prorroga No. 1 a la Suspensión.

3.2.1.1. Actividades Administrativas.

Dentro de las actividades administrativas el contratista hace entrega de los documentos de preconstrucción, a la fecha el contrato se encuentra suspendido. A continuación, se presenta el estado de los documentos de preconstrucción presentados por el Contratista a corte del 31 de mayo de 2023.

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-111-22 del 20-Dic-22
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-199-22 del 23-Ene-23
Hojas de Vida	Aprobado con Observaciones	GIC-INVIAS-NTS-088-22 del 09-Dic-22
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-192-22 del 19-Ene-23
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-192-22 del 19-Ene-23
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-067-22 del 28-Nov-22
Equipo Mínimo Obligatorio	Observado	GIC-INVIAS-NTS-233-22 del 31-Ene-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-075-22 del 30-Nov-22
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-067-22 del 28-Nov-22
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-234-22 del 31-Ene-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Observado	GIC-INVIAS-NTS-289-22 del 21-Feb-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-230-22 del 30-Ene-23
Fuente de Materiales	Observado	GIC-INVIAS-NTS-405-22 del 27-Mar-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-300-22 del 23-Feb-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-216-22 del 24-Ene-23
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-315-22 del 27-Feb-23

Tabla 9 Estado Documentos preconstrucción Municipio de Herrán

El contrato se suspendió el pasado 10 de marzo de 2023, por un periodo de 30 días, esto debido a la presentación de ajuste a los APUs del proyecto ya que el Contratista manifiesta tener un desequilibrio económico, por lo tanto, la Interventoría durante este periodo está revisando los documentos soportes entregados por el Contratista con la solicitud de ajuste a los APUs.

Teniendo en cuenta que no se han superado las situaciones que dieron lugar a la suspensión del proyecto, el 09 de abril de 2023, se reúnen Municipio -Interventoría- Contratista para firmar el acta de Prorroga 1 a la suspensión en la cual se amplía la suspensión en 60 días más, y queda como nueva fecha de reiniciado el próximo 09 de junio de 2023.

3.2.1.2. Actividades Técnicas.

No se realizaron actividades en este periodo, Contrato Suspendido.

3.2.1.3. Actividades ambientales.

No se realizaron actividades en este periodo, Contrato Suspendido.

3.2.1.4. Actividades Sociales.

No se realizaron actividades en este periodo, Contrato Suspendido.

3.2.1.5. Actividades SST.

No se realizaron actividades en este periodo, Contrato Suspendido.

3.2.2. Seguimiento Ítems No Previstos

A la fecha no se han presentado ítem con actividades no previstas en el proyecto.

3.2.3. Estado de avance del proyecto.

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación, cabe resaltar que el contrato se encuentra suspendido y el avance presentado a continuación corresponde al avance realizado a la fecha de suspensión.

3.2.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

A la fecha el Contratista ya tiene aprobados la totalidad de los Estudios y Diseños; dentro de los cuales quedaron con algunas observaciones de forma el componente de Topografía y Diseño Geométrico para lo cual se espera sean subsanados para revisión y aprobación definitiva de la Interventoría.

A la fecha el estado de avance ejecutado de Estudios y Diseños acumulado es del 99% que una vez cuantificadas las cantidades ejecutadas equivale a en pesos a \$ 20.486.185,83 vs un programado del 100% que equivale en pesos a \$ 20.693.117,00.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental del estado actual de los componentes a Estudios y Diseños que se encuentran observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos y Geotecnia	<ul style="list-style-type: none"> - Entrega documento con PHE2022 – 018 – 2022 del 11-Ene-23 - GIC-INVIAS-NTS-180-22 del 16-Ene-23 – OBSERVACIONES - Entrega documento con oficio PHE2022 –022 – 2022 del 25-Ene-23 - GIC-INVIAS-NTS-232-22 del 30-Ene-23 – OBSERVACIONES - Entrega documento con correo del 24-Feb-23 - GIC-INVIAS-NTS-328-22 del 06-Mar-23 - APROBADO
TOPOGRAFIA	<ul style="list-style-type: none"> - Entrega documento con correo del 16-Dic-22 - GIC-INVIAS-NTS-134-22 del 26-Dic-22 – OBSERVACIONES - Entrega documento con oficio PHE2022 – 021 – 2022 del 24-Ene-23 - GIC-INVIAS-NTS-229-22 del 30-Ene-23 - APROBADO CON OBSERVACIONES
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	<ul style="list-style-type: none"> - Entrega documento con PHE2022 – 013 – 2022 del 16-Dic-22 - GIC-INVIAS-NTS-127-22 del 23-Dic-22 – OBSERVACIONES - Entrega documento con oficio PHE2022 –026 – 2022 del 28-Ene-23 - GIC-INVIAS-NTS-242-22 del 01-Feb-23 - OBSERVACIONES - Entrega documento con correo del 18-Feb-23 - GIC-INVIAS-NTS-293-22 del 21-Feb-23 - OBSERVACIONES - Entrega documento con correo del 23-Feb-23 - GIC-INVIAS-NTS-310-22 del 24-Feb-23 - APROBADO CON OBSERVACIONES
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	<ul style="list-style-type: none"> - Entrega documento con PHE2022 – 013 – 2022 del 16-Dic-22 - GIC-INVIAS-NTS-120-22 del 22-Dic-22 – OBSERVACIONES - Entrega documento con oficio PHE2022 –021 – 2022 del 24-Ene-23 - GIC-INVIAS-NTS-232-22 del 30-Ene-23 – OBSERVACIONES - Entrega documento con oficio PHE2022 –029 – 2022 del 31-Ene-23 - Entrega documento con correo del 24-Feb-23 - GIC-INVIAS-NTS-328-22 del 06-Mar-23 - APROBADO
Informe estructural	<ul style="list-style-type: none"> - Entrega documento con PHE2022 – 013 – 2022 del 16-Dic-22 - GIC-INVIAS-NTS-186-22 del 17-Ene-23 – OBSERVACIONES - Entrega documento con oficio PHE2022 – 021– 2022 del 24-Ene-23 - GIC-INVIAS-NTS-224-22 del 26-Ene-23 - APROBADO
Informe hidráulico	<ul style="list-style-type: none"> - Entrega documento con PHE2022 – 016 – 2022 del 30-Dic-22 - GIC-INVIAS-NTS-156-22 del 03-Ene-23 – OBSERVACIONES - Entrega documento con oficio PHE2022 – 030 – 2022 del 02-Feb-23 - GIC-INVIAS-NTS-247-22 del 03-Feb-23 - OBSERVACIONES - GIC-INVIAS-NTS-252-22 del 03-Feb-23 - APROBADO CON OBSERVACIONES - Entrega documento con correo del 18-Feb-23 - GIC-INVIAS-NTS-284-22 del 20-Feb-23 - APROBADO CON OBSERVACIONES - Entrega documento con oficio PHE2022 – 039 – 2022 del 28-Feb-23 - GIC-INVIAS-NTS-322-22 del 03-Mar-23 - APROBADO

Tabla 10 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Herrán

3.2.3.2. Etapa de Construcción.

A la fecha el Contratista ya tiene aprobados la totalidad de los Estudios y Diseños; dentro de los cuales quedaron con algunas observaciones de forma el componente de Topografía y Diseño Geométrico para lo cual se espera sean subsanados para revisión y aprobación definitiva de la Interventoría.

Por otra parte, el contrato se encuentra suspendido desde el 10 de marzo de 2023.

3.3. CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.3879052 – MUNICIPIO DE OCAÑA

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	CO1.PCCNTR.3879052
Objeto:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRISON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
Contratista:	CONTRATISTA OK 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	10 de agosto del 2022
Valor Inicial:	\$ 1.711.146.620,00 M/CTE
Fecha de inicio:	01 de noviembre de 2022
Fecha de terminación inicial:	30 de abril de 2023
Fecha finalización Prorroga 1:	30 de junio de 2023
Fecha Nueva de terminación:	30 de junio de 2023

Tabla 11 Condiciones Iniciales Municipio de Ocaña

3.3.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas.

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.3.1.1. Actividades Administrativas.

Dentro de las actividades administrativas que ha venido adelantando el Contratista se encuentra el ajuste de los documentos de preconstrucción, a continuación, se presenta el estado de los documentos de preconstrucción presentados por el Contratista a corte del 31 de mayo de 2023.

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-179-22 del 16-Ene-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado con observaciones	GIC-INVIAS-NTS-165-22 del 06-Ene-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-056-22 del 24-Nov-22

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-098-22 del 16-Dic-22
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-098-22 del 16-Dic-22
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-121-22 del 22-Dic-22
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-497-22 del 05-May-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-058-22 del 24-Nov-22
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-178-22 del 13-Ene-23
Plan de Manejo de Tránsito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-057-22 del 24-Nov-22
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado con Observaciones	GIC-INVIAS-NTS-592-22 del 26-Mar-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-252A-22 del 06-Feb-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-403-22 del 27-Mar-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-112-22 del 20-Dic-22
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-397-22 del 24-Mar-22
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-385-22 del 17-Mar-22

Tabla 12 Estado Documentos preconstrucción Municipio de Ocaña

3.3.1.2. Actividades Técnicas.

En el mes de abril de 2023 el contratista realizó actividades de construcción de Placa Huella en el sector de la Samaritana, entre las actividades desarrolladas se encuentran; Excavación, conformación de la vía, instalación y compactación de subbase, Figurado de acero y fundida de concreto de 21 Mpa y 14 Mpa. Las cuales se detallan a continuación:

- Nivelación de terreno natural del PR 15+0810 al Pr 15+0330
- Replanteo de ejes desde el PR 15+0810 al Pr 15+0330
- Instalación de Subbase Granular del PR 15+0810 al Pr 15+0330
- Instalación de acero en huella, viga riostra y cuneta del PR 15+0810 al Pr 15+0330
- Fundida de huella, conta huella y viga riostra del PR 15+0810 al Pr 15+0330.
- Fundida Rampa de Inicio PR 15+0815.

Además de lo anterior, también se ejecutaron actividades de trabajos topográficos como nivelación de terreno.



A continuación, se presenta el resumen de actividades ejecutadas a la fecha.

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES AL 30-MAYO-23	
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 692 MTS						Cant.	Total
1	600.1.1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	\$ 40,896.00	\$ 3,931,701.00	-	\$ -
2	630.4	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	\$ 697,659.00	\$ 256,872,400.00	169.92	\$ 118,546,217.28
3	640.1	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	\$ 7,674.00	\$ 142,839,729.00	9,568.44	\$ 73,428,208.56
4	320.3	Sub - Base Granular clase C	m3	\$ 180,365.00	\$ 91,250,795.00	277.50	\$ 50,051,287.50
5	630.7	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	\$ 377,182.00	\$ 56,836,028.00	76.97	\$ 29,031,698.54
6		Sello de Juntas	m	\$ 14,021.00	\$ 59,950,978.00	-	\$ -
Subtotal					\$ 611,681,631.00	-	\$ -
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (4) UND							
7	600.1.1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	\$ 40,896.00	\$ 7,197,696.00	31.22	\$ 1,276,773.12
8	630.4	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	\$ 697,659.00	\$ 21,766,961.00	6.52	\$ 4,548,736.68
9		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	\$ 33,692.00	\$ 1,437,975.00	15.40	\$ 518,856.80
10	661.2	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	\$ 780,444.00	\$ 21,852,432.00	5.00	\$ 3,902,220.00
11	630.4	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	\$ 502,830.00	\$ 1,609,056.00	-	\$ -
12	640.1	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	\$ 7,674.00	\$ 17,769,914.00	852.13	\$ 6,539,245.62
Subtotal					\$ 71,634,034.00		
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN (GAVION): (4) UND							
13	600.1.1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	\$ 40,896.00	\$ 6,952,320.00	-	\$ -
14	681.1	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	m3	\$ 262,291.00	\$ 62,425,258.00	-	\$ -
15	630.4	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	\$ 502,830.00	\$ 13,073,580.00	-	\$ -
16		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	\$ 33,692.00	\$ 1,853,060.00	-	\$ -
17	610.2	RELLENO CON GRAVILLA	m3	\$ 134,307.00	\$ 4,432,131.00	-	\$ -
18	673.1.1	GEOTEXTIL TIPO NT - 2500 O SIMILAR NO TEJIDO	m2	\$ 9,459.00	\$ 2,279,619.00	-	\$ -
Subtotal					\$ 91,015,968.00		
PARCHEO Y/O BACHEO: (730) m3							
19	421.1	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	\$ 1,711.00	\$ 18,274,541.00	3,422.32	\$ 5,855,589.52
20	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (Incluye transporte)	m3	\$ 680,033.00	\$ 726,317,406.00	323.66	\$ 220,099,480.78
21	460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m2	\$ 17,874.00	\$ 12,207,942.00	-	\$ -
22	465.1	Excavación para Reparación de Pavimento Asfáltico existente Incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas subyacentes	m3	\$ 101,820.00	\$ 7,178,310.00	1,744.92	\$ 177,667,754.40
23	320.1.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE A SBG-50	m3	\$ 156,888.00	\$ 81,660,204.00	513.36	\$ 80,540,023.68
24	330.1.1	BASE GRANULAR CLASE A GRADACION FINA	m3	\$ 173,590.00	\$ 60,409,320.00	513.96	\$ 89,218,316.40
NP						-	\$ -
		TERRAPLENES	m3	\$ 113,357.00	\$ 1,768,369.00	394.32	\$ 44,698,932.24
					TOTAL		\$ 905,923,341.12

Tabla 13 Cantidades Ejecutadas Municipio de Ocaña

3.3.1.3. Actividades ambientales.

Las actividades realizadas en el componente ambiental fueron las siguientes:

03/05/2023: Se envió oficio sobre el incumplimiento de los requerimientos ambientales del PAGA (Plan Adaptación Guía a la Adaptación Ambiental) y de los compromisos adquiridos en obra.

10/05/2023: Se recibió borrador del PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) con las observaciones subsanadas por parte del contratista, a su vez se recibió registro fotográfico con el cumplimiento de algunos compromisos adquiridos durante la visita obra.

16/05/2023: Durante la semana se recibió oficio N° OK-095-2022 por parte del contratista con las observaciones subsanadas al documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación).

23/05/2023 – 24/05/2023: Se realizó visita a la obra ubicada en la Samaritana del municipio, llevando a cabo el respectivo seguimiento que debe ejecutar el contratista en obra referente a los proyectos contemplados en cada programa del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA), enfocado en el componente ambiental, a su vez se adquirieron los siguientes compromisos donde algunos han sido subsanados y otros no, por parte del contratista, a continuación monitoreo y seguimiento a los programas contemplados en el documento:

PROGRAMA	PROYECTO	Artículo EG	OBSERVACIONES	
			SUBSANADO	SIN SUBSANAR
1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	1. CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL. • Acta de comité • Organigrama.	DAGA- 1.1-01		X
	2. CAPACITACIÓN Y CONCIENCIACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA OBRA. • Registro de asistencia • Registro fotográfico	DAGA - 1.2-02		X
	3. CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES • Contrato de concesión minera (Explotación de fuente de materiales) • Licencia ambiental (Explotación de fuente de materiales)	DAGA - 1.3-03	X	
2. PROGRAMA ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	1. PROYECTO MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN • Resumen de cantidades de material en obra. Base. - Súbase. - Triturado. - Arena – Asfalto.	PAC-2.1- 04	X	
	2. PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN FRENTE DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES • Listado de señalización • Registro fotográfico	PAC-4.3- 06		X
	3. PROYECTO DE MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y LODOS	PAC-2.4- 07	X	

PROGRAMA	PROYECTO	Artículo EG	OBSERVACIONES	
			SUBSANADO	SIN SUBSANAR
	<ul style="list-style-type: none"> Certificación de la escombrera, disposición final. 			
	4. PROYECTO DE MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES <ul style="list-style-type: none"> Certificación ambiental de la empresa de servicios públicos para la disposición final de los residuos sólidos. Cantidades recibidas de residuos sólidos. Certificación de la recicladora. Tabla de control y seguimiento de los residuos sólidos. 	PAC-2.5- 08		X
5. PROGRAMA MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.	2. PROYECTO DE MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS <ul style="list-style-type: none"> Formato de inspección de maquinaria 	PMIT-5.3- 17		X

REGISTRO FOTOGRAFICO VISITA A OBRA VEREDA LA SAMARITANA

Centro de acopio para herramientas de construcción.

Actividades realizadas en obra

Guardian para los residuos peligrosos.

Manejo de herramientas y material de construcción.

26/05/2023: Se recibe por parte del contratista documento PAGA (Plan de Adaptación a la Guía Ambiental), para su revisión.

26/05/2023: Se envía oficio N° GIC-INVIAS-NTS-592-22 al contratista APROBADO CON OBSERVACIONES del documento PAGA (Plan de Adaptación a la Guía Ambiental) a su vez se les solicita el envío nuevamente del documento definitivo con todas las observaciones subsanadas incluyendo el componente social.

30/05/2023: Se recibí por parte del CONSORCIO OK 2022, documento definitivo del PAGA (Plan de Adaptación a la Guía Ambiental).

3.3.1.4. Actividades Sociales

PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

El objetivo del programa es dar a conocer el proyecto “MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LÍMITES-MORRISON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER”, garantizando de esta forma la atención a los habitantes de las comunidades que hacen parte del Área de Influencia Directa (AID) del proyecto, promoviendo una comunicación directa y eficiente al momento de llevar a cabo dicho programa.

Esta Interventoría informa que, el programa brinda a las comunidades y usuarios que hacen parte del AID, una atención permanente, aclaración de dudas e inquietudes, y acompañamiento con el fin de garantizar y mantener relaciones de confianza, disminuyendo de esta manera las diversas tensiones que puedan surgir entre la comunidad y el Contratista.

Igualmente, la profesional social del Contratista socializa el Sistema de Atención al Usuario (SAU), con el fin de recibir, atender y tramitar las diferentes Peticiones, Quejas, Reclamos o Sugerencias (PQRS), que la comunidad pueda presentar, contribuyendo a la satisfacción de los usuarios, garantizando el avance del proyecto y consolidando una imagen institucional que genere reconocimiento y confianza.

Por lo anterior, el Consorcio OK, determino colocar tres (3) puntos fijos de atención a la comunidad, siendo estos ubicados, uno (1) en la Alcaldía Municipal, uno (1) en la oficina del Consorcio OK y uno (1) se encuentra ubicado en obra.

Las oficinas fijas y el punto en obra están atendiendo al público de lunes a viernes en los horarios de 08:00a.m. a 12:00m y de 02:00pm a 06:00p.m.

Puntos de atención a la comunidad.


OFICINA	MUNICIPIO	DIRECCIÓN
Oficina Fija 1	Ocaña	Alcaldía Municipal
Oficina Fija 2 (Punto de Atención en Obra)	Ocaña	Vereda Samaritana, PR 15+0780
Oficina Fija 3	Ocaña	Calle 5 # 41-35 Edificio Santamaría Segundo piso.

Fuente: Gavinco Ingenieros Consultores SAS.

Durante el mes de mayo de 2023, no se recibió por parte del Consorcio Ok y la Alcaldía Municipal de Ocaña, ninguna Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia (PQRS) de la comunidad del área de influencia directa (AID) e indirecta (AII), sobre los trabajos constructivos adelantados en el sector de la Samaritana y Juna XXII.

En visita realizada al municipio de Ocaña, esta Interventoría pudo verificar y observar que, la oficina fija localizada en la Alcaldía Municipal de Ocaña, Norte de Santander, específicamente en la Secretaría de vías, infraestructura y vivienda, cuenta con instalaciones adecuadas para prestar un servicio optimo a los usuarios AID y público en general que puedan presentar inquietudes sobre las obras de construcción; de igual forma, el Contratista cuenta con un punto de atención a la comunidad en el edificio Santamaría, segundo piso, en el centro del municipio, donde se reciben todas las posibles PQRS o interrogantes sobre la ejecución del proyecto por parte de la comunidad.

Oficina de Atención a la Comunidad, Alcaldía de Ocaña, Norte de Santander.



Fuente: Gavinco Ingenieros Consultores SAS.

Oficina fija, Edf. Santamaría, Ocaña, Norte de Santander.



Fuente: Gavinco Ingenieros Consultores SAS.

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.

En lo correspondiente al programa de información y divulgación establecido por el Consorcio OK, para la ejecución del proyecto “MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LÍMITES-MORRISON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER”, esta Interventoría indica que, el diseño y desarrollo del sistema de comunicación comunitaria implementada por el Contratista, integra estrategias tales como la creación de volantes informativos, la instalación de un punto satélite de información (Cartelera) y visitas casa a casa, las cuales han ayudado a mantener informada a la comunidad sobre los diferentes avances de construcción, además de las líneas telefónicas, correo y dirección del Consorcio, fortaleciendo de esta forma las relaciones sociales, culturales y mediáticas del entorno donde se ejecuta la obra, construyéndose una imagen sólida del proyecto dentro del Área de Influencia Directa (AID) del proyecto.

Se recalca que, el Contratista llevo a cabo una reunión de socialización extraordinaria con la comunidad del barrio Juan XXIII, donde se dio a conocer a las personas asistentes la continuidad en la ejecución de obra en el sector, puesto que, se adelantará el trabajo de alcantarillado gracias a un convenio de gestión comunal entre la Junta de Acción Comunal del barrio y la Alcaldía Municipal de Ocaña; de esta manera, se iniciaran los trabajos de parcheo faltantes por parte del Contratista en el tramo faltante.

Socialización extraordinaria con la comunidad del barrio Juan XXIII.



Fuente: Consorcio OK.

Esta Interventoría pudo evidenciar que, el Contratista a ubicado en sitios estratégicos de la obra, una (1) cartelera informativa y un (1) buzón satélite, donde la comunidad puede estar informada de diferentes actividades que se desarrollan en la obra como son las líneas de atención a la comunidad, correo electrónico y ubicación de las oficinas fijas, además de información de interés sobre el avance de la obra.

Cartelera informativa y buzón satélite en obra.



Fuente: Gavinco Ingenieros Consultores SAS.

Además, el Consorcio Ok, realizó una campaña de divulgación de sus líneas de atención y correo electrónico mediante volantes informativos, esto con el fin de que los habitantes del sector puedan comunicarse con el Contratista cuando surjan preguntas, inquietudes o problemas en campo, durante la ejecución de labores constructivas en el sector de Juan XXIII.

Entrega de volantes informativos, sector Juan XXIII.



Fuente: Consorcio OK.

PROGRAMA DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y DE SERVICIOS PÚBLICOS.

El programa tiene como fin el registrar el estado físico de todas las construcciones e infraestructura, previo al inicio de las actividades constructivas, para de esta forma evitar conflictos con las comunidades del Área de Influencia Directa (AID) del proyecto.

Es por ello que, el Contratista realizó el levantamiento de las distintas actas de vecindad de las construcciones aledañas a las actividades de obra de los sectores de Juan XXII, por el comienzo de las obras de parcheo, registrando el estado físico de las construcciones, viviendas, locales de actividades económicas y unidades productivas que se encontraban a lado y lado del lugar a donde se lleva a cabo esta actividad.

Levantamiento Actas de Vecindad.



Fuente: Consorcio OK.

PROGRAMA DE CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.

Durante el mes, se ejecutó por parte de los profesionales SST y Social del Contratista en los dos frentes de obra sobre el adecuado uso de la dotación, en ella, se contó con la participación de los nueve (09) trabajadores nuevos, que se sumaron a las actividades constructivas del proyecto en los sectores de La Samaritana y Juna XXIII, donde el profesional les dio a conocer la importancia del uso de los implementos de seguridad como es el casco, gafas protectoras, guantes y botas, esto con el fin de que no se presente ningún tipo de incidente o accidente que pueda llegar a lastimar o dañar la integridad de los trabajadores; por otra parte, la profesional social les dio a conocer donde se encuentran ubicadas las carteleras informativas, así como los buzones satélites, en llegado caso de que la comunidad les pregunte sobre las líneas de atención que tiene el Contratista, Así mismo, hizo referencia sobre el respeto que deben de tener hacia las personas de la comunidad, no bajar las frutas de los árboles, no llevarse verduras o matas plantadas en sus jardines y colaborar a las personas que transitan por el sector con el trasbordo de sus alimentos.

Capacitación por parte de los profesionales SST y Social.



Fuente: Consorcio OK.

PROGRAMA CONTRATACIÓN MANO DE OBRA.

Desde el programa de Contratación Mano de Obra, la gestión social del proyecto “MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LÍMITES-MORRISON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER”, busca garantizar la transparencia en el proceso de contratación de personal, priorizando a aquellos que viven en el municipio de Ocaña y vereda La Samaritana, mediante la presentación de certificaciones de las Juntas de Acción Comunal, las cuales constatan que el trabajador habita dentro del Área de Influencia Directa (AID) del proyecto.


Reporte cifras de contratación, mayo 2023.

TRABAJADORES VINCULADOS AL PROYECTO			ORIGEN		CATEGORÍA	
DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	AID	AII	MOC	MONC
6	17	23	23	0	8	15

Fuente: Consorcio OK.

Personal contratación Directa: 26.09%
 Personal contratación Indirecta: 73.91%
 Personal Área de Influencia Directa: 100%
 Personal Área de Influencia Indirecta: 0%
 Mano de Obra Calificada: 34.8%
 Mano de Obra No Calificada: 65.21%

Reporte cifras de contratación mayo de 2023.

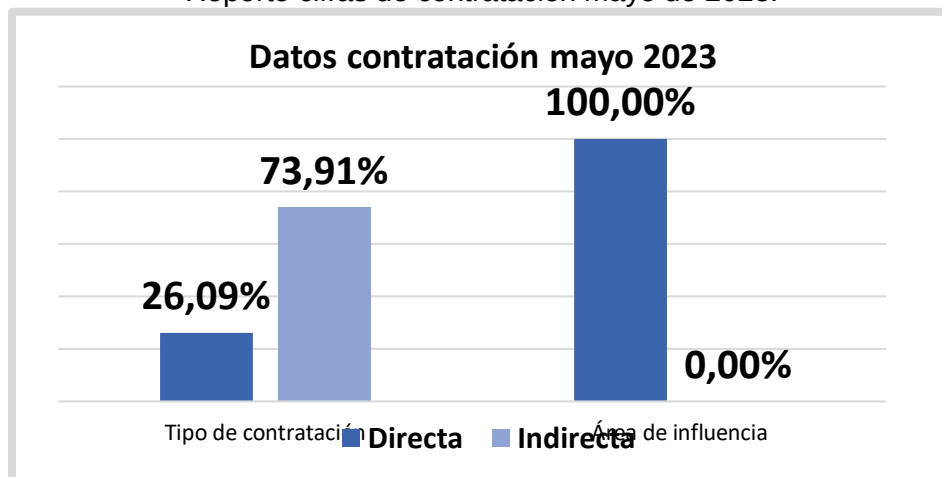

Fuente: Consorcio OK.

Relevancia por categoría en comparativo de contratación abril-mayo de 2023.

CATEGORÍA		N° DE TRABAJADORES VINCULADOS		CAMBIO EN CIFRA
		Abril 2023	Mayo 2023	
Área de influencia	Directo	5	6	+1
	Indirecto	17	17	0
Calificación de mano de obra	Calificada	8	8	0
	No calificada	14	15	+1

Fuente: Gavinco Ingenieros Consultores.

3.3.1.5. Actividades SST

Durante este periodo se ha reportado por parte del contratista el inicio de actividades de obra, dentro de las actividades ejecutadas se encuentran las siguientes:

1. Exámenes de ingreso

Registra el ingreso de personal y sus respectivos exámenes médicos ocupacionales.

No	NOMBRE	CARGO	CEDULA
1	ALVARO ANDRES SEPULVEDA BARBOSA	1090478612	AYUDANTE
2	NAID SERNA SERNA	88279438	VIGILANTE

No	NOMBRE	CARGO	CEDULA
3	DEIMER VACA ARENAS	1067809787	AYUDANTE
4	TEOFILO RAPALINO PONTON	15174219	AYUDANTE
5	ORLANDO RINCON REYES	1007945707	AYUDANTE
6	CARLOS ALBERTO NAVARRO CAÑIZARES	1007912734	AYUDANTE
7	JOSE GREGORIO CASADIEGO QUINTERO	9715347	AYUDANTE

2. Ausentismo Laboral

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no se registran ausentismo por causa de enfermedades laborales o accidentes laborales.

3. Procedimiento de trabajos seguros

Se continua con la construcción de placa huella en la vereda la Samaritana. Se realiza visita el 23 y 24 de mayo, para verificar el cumplimiento de la ejecución del SG-SST.

4. Dotación elementos de Protección Personal

En la visita realizada por parte de interventoría el día 23 y 24 de mayo se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP



5. Maquinaria y Equipo

La interventoría hace revisión documental de la maquinaria previo al inicio y durante la ejecución de las obras, a continuación, se muestra la maquinaria que se encuentra en obra por parte del Contratista.



Maquinaria y Equipo Municipio de Ocaña 1758

6. Equipos de Emergencia

Para la ejecución de este componente, se cuenta en obra con los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

Se realizaron las inspecciones requeridas y se realizó la verificación de las condiciones en las que se encuentran.



Equipos de Emergencia Municipio de Ocaña

7. Estadísticas SST

Durante este periodo no ha presentado incidentes en su ejecución, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de Mayo de 2023.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
CONSORCIO OK 2022	0	0	0

8. Inducciones y Capacitaciones

Durante este periodo el contratista realizo 2 inducciones y 2 capacitaciones a los trabajadores.

CONTRATISTA	INDUCCIONES	CAPACITACIONES	TEMAS DE CAPACITACION
CONSORCIO OK	7	2	Los accidentes no son casuales Nadie trata de echarle la culpa a nadie

9. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
CONSORCIO OK	Mayo	0

3.3.2. Seguimiento Ítems No Previstos

Teniendo en cuenta la necesidad del proyecto en cuanto a su estabilidad en la zona de Juan XXIII, el contratista propuso el mejoramiento de la subrasante teniendo en cuenta la baja capacidad portante del suelo, por lo cual fue necesaria la presentación de un Ítem No Previsto con material de Terraplén de acuerdo a las especificaciones INVIAS.

De acuerdo a lo anterior el contratista mediante su comunicado OK-042-2022 del 27 de enero de 2023 hace entrega de los documentos soporte a esta solicitud. La Interventoría por su parte mediante su comunicado GIC-INVIAS-NTS-228-22 del 30 de enero de 2023, el Contratista subsana el APU NP con su comunicado OK-055-2022 del 08 de febrero de 2023, el cual una vez revisado por la Interventoría se da viabilidad al mismo.

Ítem	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
CONSORCIO OK	Mayo	\$ 96.084,00	416	\$ 39.970.944,00

3.3.3. Estado de avance del proyecto.

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.3.2.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

A la fecha el Contratista ya tiene aprobados la totalidad de los Estudios y Diseños; dentro de los cuales quedaron con algunas observaciones de forma el componente de Topografía, Diseño Geométrico e Hidráulico para lo cual se espera sean subsanados para revisión y aprobación definitiva de la Interventoría.

A la fecha el estado de avance ejecutado acumulado es del 90.0% que una vez cuantificadas las cantidades ejecutadas equivale a en pesos a \$ 11.167.204,80 vs un programado del 100% que equivale en pesos a \$ 12.419.602,00.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- Hace entrega con el Comunicado OK-017-2022 del 15-Dic-2022
	- GIC-INVIAS-NTS-118-22 del 22-Dic-22 - OBSERVACIONES
	- Hace entrega de capacidad portante con el Comunicado OK-024-2022 del 06-Ene-23
	- Hace entrega con el Comunicado OK-026-2022 del 10-Ene-2023
	- GIC-INVIAS-NTS-172-22 del 10-Ene-2023 - OBSERVACIONES CAPACIDAD PORTAN
	- MESA DE TRABAJO EL 13-Ene-23
	- GIC-INVIAS-NTS-194-22 del 20-Ene-2023 - OBSERVACIONES ESTUSIO SUELOS
	- Hace entrega con el Comunicado OK-045-2022 del 31-Ene-2023
	- Hace entrega con el Comunicado OK-045-2022 del 31-Ene-2023 - Subsanación Juan 23
	- Hace entrega con el Comunicado OK-058-2022 del 16-Feb-2023 - subsanación diseño de pavimentos
	- GIC-INVIAS-NTS-342-22 del 08-Mar-2023 - OBSERVACIONES placa huella
	- GIC-INVIAS-NTS-346-22 del 08-Mar-2023 - APROBACIÓN JUAN 23-PAV FLEX
	- Hace entrega con el Comunicado OK-076-2022 del 30-Mar-2023 - SUBSANACIÓN PH
	- GIC-INVIAS-NTS-451-22 del 17-Abr-2023 - APROBACIÓN PH

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
TOPOGRAFIA	<ul style="list-style-type: none"> - Hace entrega con el Comunicado OK-017-2022 del 15-Dic-2022 - GIC-INVIAS-NTS-102-22 del 16-Dic-22 – OBSERVACIONES - Se lleva a cabo Mesa de Trabajo 30-12-22 - Hace entrega con el Comunicado OK-025-2022 del 10-Ene-2023 - GIC-INVIAS-NTS-176-22 del 12-Ene-23 – OBSERVACIONES - Hace entrega con correo del 25-Ene-2023 - GIC-INVIAS-NTS-237-22 del 31-Ene-23 – OBSERVACIONES - Hace entrega con el Comunicado OK-049-2022 del 01-Feb-2023 - GIC-INVIAS-NTS-257-22 del 07-Feb-23 – OBSERVACIONES - Hace entrega con el Comunicado OK-073-2022 del 27-Mar-2023 - GIC-INVIAS-NTS-418-22 del 30-Mar-23 – OBSERVACIONES - Hace entrega con el Comunicado OK-085-2022 del 24-Abr-2023 - GIC-INVIAS-NTS-470-22 del 27-Abr-23 - OBSERVACIONES - Hace entrega con el Comunicado OK-09-2022 del 05- May- 2023 - GIC-INVIAS-NTS-536-22 del 12-May-23 - OBSERVACIONES - Hace entrega con el Comunicado OK-096-2022 del 16- May- 2023 - GIC-INVIAS-NTS-557-22 del 23-May-23 - OBSERVACIONES
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	<ul style="list-style-type: none"> - Hace entrega con el Comunicado OK-019-2022 del 21-Dic-2022 - GIC-INVIAS-NTS-138-22 del 27-Dic-22 – OBSERVACIONES - Se lleva a cabo Mesa de Trabajo 30-12-22 - Hace entrega con correo del 25-Ene-2023 - GIC-INVIAS-NTS-237-22 del 31-Ene-23 – OBSERVACIONES - Hace entrega con el Comunicado OK-049-2022 del 01-Feb-2023 - GIC-INVIAS-NTS-257-22 del 07-Feb-23 - OBSERVACIONES - Hace entrega con el Comunicado OK-059-2022 del 22-Feb-2023 - GIC-INVIAS-NTS-317-22 del 28-Feb-23 - APROBADO CON OBSERVACIONES - SOBREANCHO DEL PR 15+664 AL PR15+694 PLACA HUELLA del 05-May-23 - GIC-INVIAS-NTS-539-22 del 12-May-2023 - NO VIABLE
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	<ul style="list-style-type: none"> - Hace entrega con el Comunicado OK-017-2022 del 15-Dic-2022 - GIC-INVIAS-NTS-118-22 del 22-Dic-22 – OBSERVACIONES - Hace entrega con el Comunicado OK-026-2022 del 10-Ene-2023 - GIC-INVIAS-NTS-194-22 del 20-Ene-2023 - OBSERVACIONES - Hace entrega con el Comunicado OK-045-2022 del 31-Ene-2023 - Hace entrega con el Comunicado OK-058-2022 del 16-Feb-2023 - subsanación diseño de pavimentos - GIC-INVIAS-NTS-342-22 del 08-Mar-2023 - OBSERVACIONES placa huella - GIC-INVIAS-NTS-346-22 del 08-Mar-2023 - APROBACIÓN JUAN 23-PAV FLEX - Hace entrega con el Comunicado OK-076-2022 del 30-Mar-2023 - SUBSANACIÓN PH - GIC-INVIAS-NTS-451-22 del 17-Abr-2023 - APROBACIÓN PH
INFORME ESTRUCTURAL	<ul style="list-style-type: none"> - Hace entrega con el Comunicado OK-076-2022 del 30-Mar-2023 - SUBSANACIÓN PH - GIC-INVIAS-NTS-451-22 del 17-Abr-2023 - APROBACIÓN PH
INFORME HIDRÁULICO	<ul style="list-style-type: none"> - Hace entrega con el Comunicado OK-017-2022 del 15-Dic-2022 - GIC-INVIAS-NTS-097-22 del 16-Dic-22 – OBSERVACIONES - Hace entrega con el Comunicado OK-020-2022 del 22-Dic-2022 - GIC-INVIAS-NTS-129-22 del 26-Dic-22 – OBSERVACIONES



ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	<ul style="list-style-type: none"> - Hace entrega con el Comunicado OK-033-2022 del 28-Ene-2023 (D. Alcantarilla) - GIC-INVIAS-NTS-190-22 del 18-Ene-23 - OBSERVACIONES - Hace entrega con el Comunicado OK-052-2022 del 02-Feb-2023 - GIC-INVIAS-NTS-245-22 del 03-Feb-23 - OBSERVACIONES - GIC-INVIAS-NTS-268-22 del 15-Feb-23 - OBSERVACIONES - ALCANTARILLA - Hace entrega con el Comunicado OK-057-2022 del 16-Feb-2023 (D. Alcantarilla) - GIC-INVIAS-NTS-274-22 del 17-Feb-23 - APROBADO (D. Alcantarilla) - Hace entrega con el Comunicado OK-062-2022 del 23-Feb-23 - Placa huella - GIC-INVIAS-NTS-344-22 del 08-Mar-23 - OBSERVACIONES PH - Hace entrega con el Comunicado OK-072-2022 del 23-Mar-23 - Placa huella - GIC-INVIAS-NTS-455-22 del 18-Abr-23 – APROBADO - OBSERVACIONES PH

Tabla 14 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Ocaña 1758

3.3.2.2. Etapa de Construcción.

Con corte al 30 de mayo de 2023, el estado de avance ejecutado acumulado es del 52.79% que una vez cuantificadas las cantidades ejecutadas equivale en pesos a \$ 903.229.922,43 vs un programado del 72.98% que equivale en pesos a \$ 1.248.783.582,98.

El Contratista presento con su comunicado OK-087-2022 del 04 de mayo de 2023 la Reprogramación No. 1 al contrato de acuerdo a la Prorroga 1 con nueva fecha de terminación del proyecto el 30 de junio de 2023, la Interventoría da aprobación al documento con comunicado GIC-INVIAS-NTS-538-22 del 12 mayo de 2023.

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 2 Avance Financiero Municipio de Ocaña-1758

3.4. CONTRATO DE OBRA 160 DE 2022 – MUNICIPIO DE CÁCHIRA

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	160 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER
Contratista:	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	04 de octubre de 2022
Valor Inicial:	\$ 2.658.435.877,00 M/CTE
Fecha de inicio:	16 de noviembre de 2022
Fecha de terminación inicial:	16 de marzo de 2023
Fecha de Suspensión:	10 de marzo de 2023
Fecha de Reinicio:	
Prorroga 1:	
Fecha Nueva de terminación:	
Fecha de terminación Final:	16 de marzo de 2023

Tabla 19 Condiciones Iniciales Municipio de Cáchira

3.4.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas.

A la fecha de corte del presente informe, el contrato se encuentra suspendido desde el 10 de marzo de 2023.

3.4.1.1. Actividades Administrativas.

Dentro de las actividades administrativas el contratista hace entrega de los documentos de preconstrucción, a continuación, se presenta el estado de los documentos de preconstrucción presentados por el Contratista a corte del 31 de mayo de 2023.

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-152-22 del 28-Dic-22
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-201-22 del 23-Ene-23

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-150-22 del 28-Dic-22
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NST-203-22 del 24-Ene-23
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NST-334-22 del 07-Mar-23
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-304-22 del 23-Feb-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Observado	GIC-INVIAS-NTS-206-22 del 23-Ene-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-309-22 del 23-Feb-23
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-312-22 del 24-Feb-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-291-22 del 21-Feb-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Observado	GIC-INVIAS-NST-411-22 del 28-Mar-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-227-22 del 30-Ene-23
Fuente de Materiales	Observado	GIC-INVIAS-NTS-406-22 del 27-Mar-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-302-22 del 23-Feb-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-349-22 del 08-Mar-22
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-349-22 del 08-Mar-22

Tabla 15 Estado Documentos preconstrucción Municipio de Cachira

El contrato se suspendió el pasado 10 de marzo de 2023, por un periodo de 30 días, esto debido a la presentación de ajuste a los APUs del proyecto ya que el Contratista manifiesta tener un desequilibrio económico, por lo tanto, la Interventoría durante este periodo está revisando los documentos soportes entregados por el Contratista con la solicitud de ajuste a los APUs.

Por otra parte, se firma Acta de Prorroga 1 a la Suspensión 1 por un periodo de 20 días calendario, debido a que las razones que dieron lugar a la suspensión no fueron superadas se realiza Prorroga 2 a la suspensión 1 por un término de 15 días.

3.4.1.2. Actividades Técnicas.

Contrato Suspendido.

3.4.1.3. Actividades ambientales.

Contrato Suspendido.

3.4.1.4. Actividades Sociales

Contrato Suspendido.

3.4.1.5. Actividades SST

Contrato Suspendido.

3.4.2. Seguimiento Ítems No Previstos

A la fecha no se han presentado ítem con actividades no previstas en el proyecto.

3.4.3. Estado de avance del proyecto.

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación. cabe resaltar que el contrato se encuentra suspendido y el avance presentado a continuación corresponde al avance realizado a la fecha de suspensión.

3.4.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

El Contratista se encuentra en proceso de subsanación de los documentos correspondientes a los estudios y diseños, para lo cual se espera sean entregados los productos, para revisión y aprobación por parte de la Interventoría.

A la fecha el estado de avance ejecutado acumulado es del 25.33% que una vez cuantificadas las cantidades ejecutadas equivale a en pesos a \$ 3.165.694,00 vs un programado del 100% que equivale en pesos a \$ 12.487.307,00

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS		COMUNICACIÓN	
Informe de suelos e Informe geotécnico		-	Entrega documento con Oficio MATI-CACHI-011-22 del 28-Ene-23
		-	GIC-INVIAS-NTS-253-22 del 06-Feb-23 - OBSERVACIONES
TOPOGRAFIA	Se solicita con el Comunicado GIC-INVIAS-NTS-024-22 del 18/10/2022	-	Entrega documento con MATICCES - CACHI – 016 -2022 del 16-Feb-23
		-	GIC-INVIAS-NTS-275-22 del 17-Feb-23 – OBSERVACIONES
		-	Entrega documento con correo del 10-Mar-23
	• Plano de perfil longitudinal de la vía a intervenir.	-	Entrega documento con MATICCES - CACHI – 030 -2022 del 17-May-23
		-	GIC-INVIAS-NTS-596-22 del 29-May-23 - APROBADO CON OBSERVACIONES



ESTUDIOS Y DISEÑOS		COMUNICACIÓN
	<ul style="list-style-type: none"> • Plano en planta de la vía a intervenir. • Archivos de puntos en formato CSV. • Plano en AutoCAD de las curvas y levantamiento general del proyecto. 	
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS		<ul style="list-style-type: none"> - Entrega documento con correo del 13-Feb-23 - Entrega documento con MATICCES - CACHI – 016 -2022 del 15-Feb-23 - GIC-INVIAS-NTS-275-22 del 17-Feb-23 – OBSERVACIONES - Entrega documento con MATICCES - CACHI – 025 -2022 del 15-Mar-23 - Entrega documento con MATICCES - CACHI – 028 -2022 del 13-Abr-23 - GIC-INVIAS-NTS-458-22 del 19-Abr-23 - OBSERVACIONES
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)		<ul style="list-style-type: none"> - Entrega documento con correo del 14-Feb-23 - Entrega documento con MATICCES - CACHI – 016 -2022 del 15-Feb-23 - GIC-INVIAS-NTS-327-22 del 06-Mar-23 - OBSERVACIONES
INFORME ESTRUCTURAL		Se solicita con el Comunicado GIC-INVIAS-NTS-070-22 del 28/11/2022
INFORME HIDRÁULICO		Se solicita con el Comunicado GIC-INVIAS-NTS-070-22 del 28/11/2022

3.4.3.2. Etapa de Construcción.

A la fecha de corte del informe, no se ha iniciado la etapa de construcción, toda vez que no se ha dado aprobación a los Estudios y Diseños por parte de la Interventoría para proceder a la construcción de la meta física del proyecto. Etapa que se ejecutara una vez se tengan aprobada la totalidad de los documentos de Estudios y Diseños.

Por otra parte, el contrato se encuentra suspendido desde el 10 de marzo de 2023.

3.5. CONTRATO DE OBRA 252 DE 2022 – MUNICIPIO DE ABREGO

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	252 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL
Contratista:	CONSORCIO AD VIAS
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	24 de noviembre de 2022
Valor Inicial:	\$ 4.314.324.054,00 M/CTE
Fecha de inicio:	16 de enero de 2023
Fecha de terminación inicial:	16 de septiembre de 2023
Prorroga 1:	
Fecha Nueva de terminación:	
Fecha de terminación Final:	16 de septiembre de 2023

Tabla 17 Condiciones Iniciales Municipio de Abrego

3.5.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas.

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.5.1.1. Actividades Administrativas.

Dentro de las actividades administrativas el contratista se encuentra ajustando los documentos de preconstrucción observados por la Interventoría, a continuación, se presenta el estado de los documentos de preconstrucción presentados por el Contratista a corte del 31 de mayo de 2023.

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-314-22 del 27-Feb-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-244-22 del 12-Feb-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-329-22 del 06-Mar-23
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-265-22 del 14-Feb-23

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-244-22 del 02-Feb-23
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-259-22 del 09-Feb-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-290-22 del 21-Feb-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-240-22 del 01-Feb-23
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-250-22 del 03-Feb-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-255-22 del 07-Feb-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Observaciones	GIC-INVIAS-NTS-447-22 del 14-Abr-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-278-22 del 17-Feb-23
Fuente de Materiales	Observaciones	GIC-INVIAS-NTS-481-22 del 03-May-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-260-22 del 08-Feb-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-348-22 del 08-Mar-23
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-373-22 del 15-Mar-23

Tabla 18 Estado Documentos preconstrucción Municipio de Abrego

3.5.1.2. Actividades Técnicas.

Dentro de las actividades desarrolladas en este periodo por parte del Contratista se han adelantado actividades de Topografía en terreno, se ha realizado replanteo del corredor 1. con el fin de localizar las abscisas del corredor y la localización de las alcantarillas.

Se realizaron actividades con maquinaria (motoniveladora, pajarita, irrigador de agua y vibro compactador en los tramos de Santa Lucía, Yee Del Chorro y Pie De Cruz en perfilado del terreno existente e instalación de sub base un $e=0.30\text{cm}$ instalado en capas de 10cm, compactación y toma de densidades. En el tramo del chorro 1 y chorro 2 se realizó perfilado de cunetas y compactación de la subrasante. Se realizo acopio de material granular en todos los tramos.

A continuación, se presenta el resumen de actividades ejecutadas a la fecha.



No	DESCRIPCION	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES AL 31 MAYO 2023	
CORREDOR 1: SANTA LUCIA - CANOAS						
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 1320 MTS					CANT.	TOTAL
1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	\$ 50,374.00	\$ 13,500,232	-	\$ -
2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	\$ 742,260.00	\$ 742,897,800	-	\$ -
3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	\$ 8,128.00	\$ 423,257,472	-	\$ -
4	Sub - Base Granular clase C	m3	\$ 190,862.00	\$ 212,487,792	1,110.00	\$ 211,856,820.00
5	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	\$ 400,909.00	\$ 169,183,598	-	\$ -
6	Sello de Juntas	m	\$ 14,837.00	\$ 177,495,031	-	\$ -
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (9) UND						
7	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	\$ 50,374.00	\$ 19,948,104	-	\$ -
8	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	\$ 742,260.00	\$ 50,632,452	-	\$ -
9	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	\$ 35,653.00	\$ 3,423,758	-	\$ -
10	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	\$ 832,991.00	\$ 52,478,433	-	\$ -
11	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	\$ 534,825.00	\$ 3,850,740	-	\$ -
12	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	\$ 8,128.00	\$ 42,347,693	-	\$ -
CORREDOR 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA					-	\$ -
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 1285 MTS						
1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	\$ 50,374.00	\$ 13,147,614	-	\$ -
2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	\$ 812,847.00	\$ 751,146,294	-	\$ -
3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	\$ 8,217.00	\$ 412,032,704	-	\$ -
4	Sub - Base Granular clase C	m3	\$ 208,607.00	\$ 259,900,446	-	\$ -
5	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	\$ 441,176.00	\$ 181,323,336	-	\$ -
6	Sello de Juntas	m	\$ 14,837.00	\$ 172,776,865	-	\$ -
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (28) UND						
7	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	\$ 50,374.00	\$ 62,060,768	-	\$ -
8	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	\$ 812,847.00	\$ 170,467,534	-	\$ -
9	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	\$ 35,653.00	\$ 10,651,690	-	\$ -
10	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	\$ 925,603.00	\$ 181,418,188	-	\$ -
11	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	\$ 590,380.00	\$ 13,224,512	-	\$ -
12	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	\$ 8,217.00	\$ 131,748,378	-	\$ -
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD						
13	Postes de referencia corredor1	und	377,759.00	\$ 2,266,554	-	\$ -
14	Postes de referencia corredor 2	und	377,759.00	\$ 3,777,590	-	\$ -
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA					\$	211,856,820.00

Tabla 19 Cantidades Ejecutadas Municipio de Abrego

3.5.1.3. Actividades ambientales.

Las actividades realizadas en el componente ambiental fueron las siguientes:


- 03/05/2023: Se envió oficio N°GIC-INVIAS-NTS-481-22, sobre observación FUENTE DE MATERIALES.
- 08/05/2023: Se realizó mesa de trabajo con la directora de obra Claudia Rangel, con el fin de brindar asesoría acerca de entrega de la documentación en cuanto a la fuente de materiales.

- 10/05/2023: Se realizó mesa de trabajo con el profesional ambiental, sobre la matriz de capacitación del documento PAGA (Plan Adaptación Guía a la Adaptación Ambiental).
- 11/05/2023: Se realizó mesa de trabajo con el profesional ambiental, sobre el programa de almacenamiento de combustible en obra del documento PAGA (Plan Adaptación Guía a la Adaptación Ambiental).

3.5.1.4. Actividades Sociales.

El Contratista envía el respectivo soporte de la solicitud adelantada de Consulta Previa ante el Ministerio del Interior, con el fin de determinar si procede o no esta consulta sobre grupos étnicos y afrodescendientes, por ende, el Consorcio se encuentra a la espera de una de una respuesta definitiva por parte del Ministerio mencionado, para de esta forma cumplir con lo requerido contractualmente.

Ilustración 2 Soporte de Consulta Previa enviado al Ministerio del Interior.

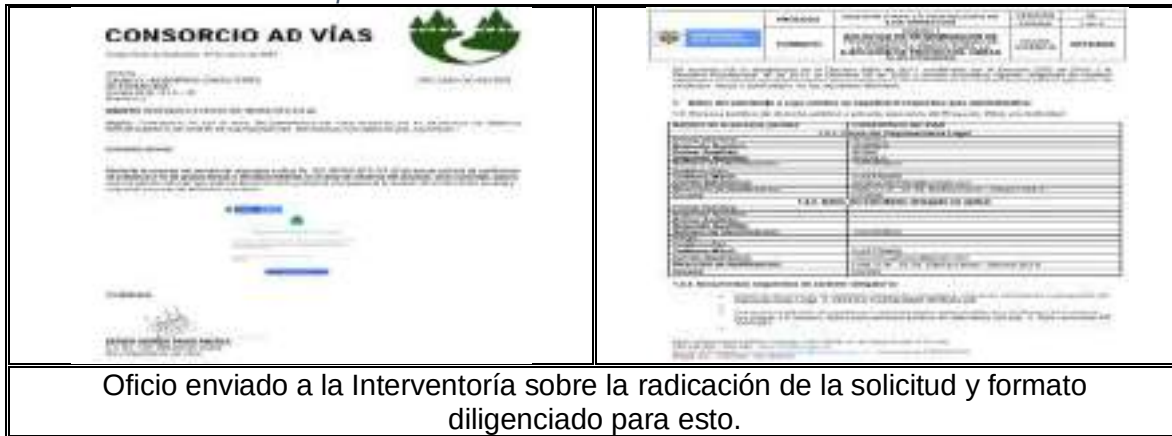


Oficio enviado a la Interventoría sobre la radicación de la solicitud y formato diligenciado para esto.

Fuente: Consorcio AD VIAS.

PROGRAMA DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y DE SERVICIOS PÚBLICOS.

De igual forma, el Consorcio envía a esta Interventoría todas las Actas de Vecindad levantadas en el corredor uno (1), las cuales son cuatro (4) de unidades sociales y tres (3) de cercados los cuales se encuentran al lado de donde se adelantarán los trabajos constructivos.

Ilustración 3 Actas de Vecindad levantadas por el Contratista, corredor uno (1).

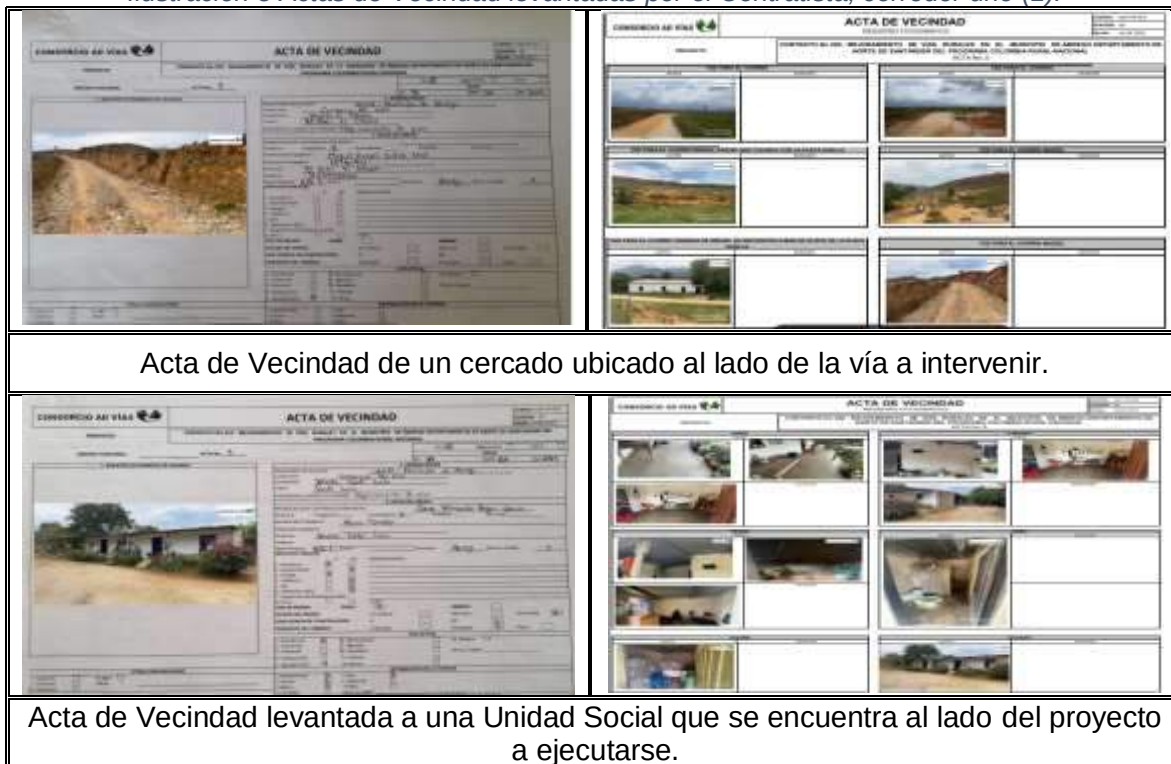

Fuente; Consorcio AD VÍAS.

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

Se realiza por parte del Contratista y la Alcaldía Municipal, con asistencia de la Interventoría, la respectiva socialización de inicio de obra en los tramos 1 y 2, con el fin de dar a conocer a los habitantes del área a intervenir los estudios y diseños adelantados, el alcance del proyecto y los programas de Gestión social a ejecutarse.

En la socialización del primer tramo, asistieron un total de veinte (20) personas, a las cuales se les indico todos los aspectos concernientes al proyecto, además de responder las diferentes inquietudes que tenían sobre el tiempo, dinero que se va a invertir y cuando se comenzaría con las obras.



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

Ilustración 4 Socialización inicio de obra, corredor uno (1).

Acta de socialización inicio de obra.



Socialización Técnica, Ambiental y Social a los habitantes del área de influencia del proyecto.

Fuente: Consorcio AD VÍAS y Gavinco Ingenieros Consultores.

Igualmente, en la socialización de inicio de obra del corredor dos (2) asistieron un total de veinte nueve (29) personas, las cuales realizaron preguntas sobre el desarrollo del proyecto, el cómo escogieron los sitios a intervenir y cuando se iniciarían los respectivos trabajos de construcción.



Ilustración 5 Socialización inicio de obra, corredor dos (2).



Acta de Socialización inicio de obra.

Asistencia de los habitantes del área a intervenir.

Fuente: Consorcio AD VÍAS y Gavinco Ingenieros Consultores.

PROGRAMA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA.

El objetivo de este programa es el de no generar migración de población residente en otros municipios al Área de Influencia Directa (AID) para vincularse laboralmente al proyecto, puesto que el incremento de población foránea puede generar impactos de naturaleza negativa, puesto que tendrán como resultado el desmejoramiento de la calidad de vida de los residentes permanentes de los sectores donde se ejecuta la obra. La línea de base del componente socioeconómico y cultural realizado por el Contratista, indica la dinámica del empleo en el AID, los perfiles laborales que hay en el área y conocen la disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada, estableciendo de esta forma el porcentaje de mano de obra a contratar para el desarrollo del proyecto.


Reporte cifras de contratación, mayo 2023.

TRABAJADORES VINCULADOS AL PROYECTO			ORIGEN		CATEGORÍA	
DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	AID	AII	MOC	MONC
10	2	12	12	0	7	5

Fuente: Consorcio OK.

Personal contratación Directa: 83.3%
 Personal contratación Indirecta: 16.7%
 Personal Área de Influencia Directa: 100%
 Personal Área de Influencia Indirecta: 0%
 Mano de Obra Calificada: 58.3%
 Mano de Obra No Calificada: 41.7%

Ilustración 6 Reporte cifras de contratación mayo de 2023.

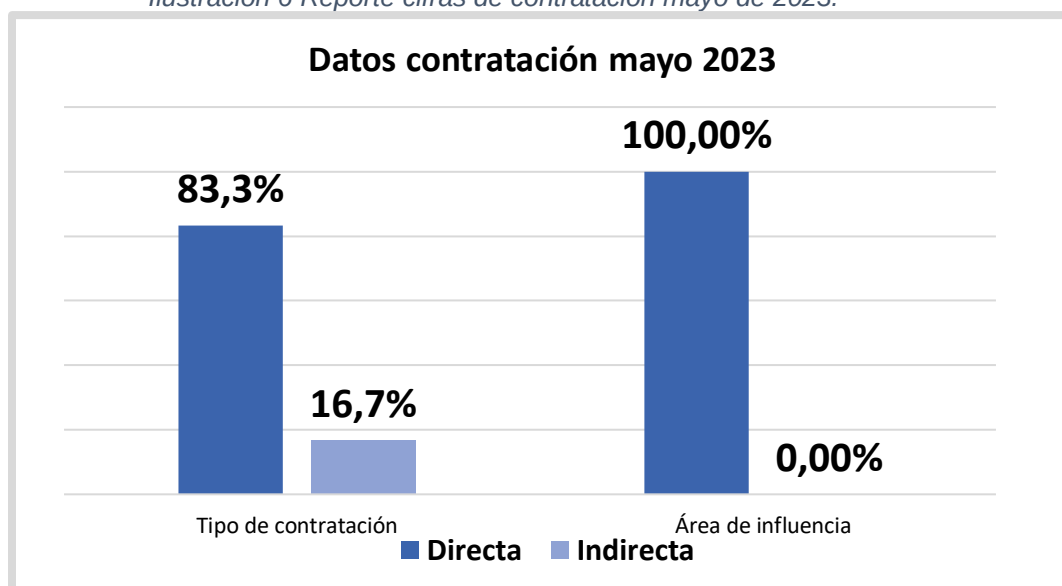

Fuente: Consorcio AD VÍAS.

3.5.1.5. Actividades SST

Durante este periodo se ha reportado por parte del contratista el inicio de actividades de obra, dentro de las actividades ejecutadas se encuentran las siguientes:

1. Exámenes de Ingreso

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no se presenta ingreso de personal por lo cual no se realizaron exámenes de Ingreso.

2. Ausentismo Laboral

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no se registran ausentismo por causa de enfermedades laborales o accidentes laborales.

3. Procedimiento de trabajos seguros

Se continua con la construcción de placa huella. Durante el Periodo se realizan actividades con maquinaria, realizando procedimientos adecuados en campo.

4. Dotación elementos de Protección Personal

A continuación, se evidencia el cumplimiento de la utilización de los EPP



5. Maquinaria y Equipo

La interventoría hace revisión documental de la maquinaria previo al inicio y durante la ejecución de las obras, a continuación, se muestra la maquinaria que se encuentra en obra por parte del Contratista.



Maquinaria y Equipo Municipio de Ocaña 1758

6. Equipos de Emergencia

Para la ejecución de este componente, se cuenta en obra con los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

7. Estadísticas SST

Durante este periodo no se han presentado incidentes en su ejecución, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de Mayo de 2023.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
CONSORCIO AD VIAS	0	0	0

8. Inducciones y Capacitaciones

Durante este periodo el contratista no reporto información referente a inducciones o capacitaciones.

9. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
CONSORCIO AD VIAS	Mayo	0

3.5.2. Seguimiento Ítems No Previstos

A la fecha no se han presentado ítem con actividades no previstas en el proyecto.

3.5.3. Estado de avance del proyecto.

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.5.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

A la fecha el Contratista ya tiene aprobados los Estudios y Diseños del corredor 1; dentro de los cuales quedaron con algunas observaciones de forma el componente de Topografía, Diseño Geométrico, Diseño de Pavimentos para lo cual se espera sean subsanados para revisión y aprobación definitiva de la Interventoría. En cuanto al Corredor 2, se tiene aprobado el componente Estructural e Hidráulico y, los componentes de Diseño de Pavimentos y Diseño Geométrico aprobado con observaciones.

A la fecha el estado de avance ejecutado acumulado es del 93% que una vez cuantificadas las cantidades ejecutadas equivale a en pesos a \$ 16.767.615,42 vs un programado del 100% que equivale en pesos a \$ 18.029.694,00

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	<ul style="list-style-type: none"> - Entrega con correo electrónico del 06-Feb-23 - GIC-INVIAS-NTS-256-22 del 07-Feb-23 – OBSERVACIONES - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-010-2023 del 13-Feb-23 CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-296-22 del 22-Feb-23 - OBSERVACIONES CORREDOR 1 - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-017-2023 del 22-Feb-23 CORREDOR 2 - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-017-2023 del 22-Feb-23 CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-345-22 del 08-Mar-23 - OBSERVACIONES CORREDOR 2

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
TOPOGRAFIA	<ul style="list-style-type: none"> - Entrega con correo electrónico del 04-Feb-23 - Entrega con OFC-CADV-GIC-012-2023 del 15-Feb-23 - CORREDOR 1, T 1, 2, 3, 4 - GIC-INVIAS-NTS-276-22 del 17-Feb-23 – OBSERVACIONES - Entrega con OFC-CADV-GIC-019-2023 del 22-Feb-23 - CORREDOR 1, T 1, 2, 3, 4 - GIC-INVIAS-NTS-311-22 del 24-Feb-23 - OBSERVACIONES CORREDOR 1 - Entrega con OFC-CADV-GIC-022-2023 del 25-Feb-23 - CORREDOR 2 - Entrega con OFC-CADV-GIC-022-2023 del 25-Feb-23 - CORREDOR 2 - Entrega con OFC-CADV-GIC-027-2023 del 03-Mar-23 - CORREDOR 2 - Entrega con OFC-CADV-GIC-026-2023 del 03-Mar-23 - CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-331-22 del 06-Mar-23 - OBSERVACIONES CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-353-22 del 10-Mar-23 - OBSERVACIONES CORREDOR 1 - Entrega con OFC-CADV-GIC-033-2023 del 14-Mar-23 - CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-383-22 del 16-Mar-23 - OBSERVACIONES CORREDOR 1 - Entrega con OFC-CADV-GIC-034-2023 del 21-Mar-23 - CORREDOR 2 - Entrega con OFC-CADV-GIC-039-2023 del 22-Mar-23 - CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-402-22 del 24-Mar-23 - APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-409-22 del 27-Mar-23 - APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 1 - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-078-2023 del 24-May-2023 - CORREDOR 2 - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-077-2023 del 24-May-2023 - CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-583-22 del 26-May-2023 – OBSERVADO CORREDOR 1 Y 2
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	<ul style="list-style-type: none"> - Entrega con correo electrónico del 04-Feb-23 - MESA DE TRABAJO 06-02-2023 - Entrega con OFC-CADV-GIC-012-2023 del 15-Feb-23 - CORREDOR 1, T 1, 2, 3, 4 - GIC-INVIAS-NTS-276-22 del 17-Feb-23 – OBSERVACIONES - Entrega con OFC-CADV-GIC-018-2023 del 22-Feb-23 - CORREDOR 1, T 1, 2, 3, 4 - Entrega con OFC-CADV-GIC-020-2023 del 23-Feb-23 - CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-321-22 del 03-Mar-23 - OBSERVACIONES CORREDOR 1 - Entrega con OFC-CADV-GIC-029-2023 del 08-Mar-23 - CORREDOR 1 - aclaración observaciones - GIC-INVIAS-NTS-350-22 del 08-Mar-23 - OBSERVACIONES CORREDOR 2 - Entrega con OFC-CADV-GIC-035-2023 del 21-Mar-23 - CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-400-22 del 24-Mar-23 - APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 1(La Ye, Pie de la Cruz y Santa Lucía) - GIC-INVIAS-NTS-401-22 del 24-Mar-23 - OBSERVACIONES CORREDOR 1 TRAMO EL CHORRO 1 Y 2 - Entrega con OFC-CADV-GIC-048-2023 del 04-Abr-23 - CORREDOR 2 - Entrega con OFC-CADV-GIC-051-2023 del 05-Abr-23 - CORREDOR 1

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	<ul style="list-style-type: none"> - GIC-INVIAS-NTS-440-22 del 11-Abr-23 - OBSERVACIONES CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-448-22 del 17-Abr-23 - APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 1 - Entrega con OFC-CADV-GIC-065-2023 del 15-May-23 - CORREDOR 2 - Entrega con OFC-CADV-GIC-073-2023 del 18-May-23 - CORREDOR 1 chorro 1 y 2 - GIC-INVIAS-NTS-553-22 del 18-May-23 - OBSERVACIONES CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-568-22 del 23-May-23 - OBSERVACIONES CORREDOR 1 CHORRO 1Y2 - Hacen entrega con documento OFC-CADV-082-2023 del 30-mayo de 2023 CORREDOR 2
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	<ul style="list-style-type: none"> - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-014-2023 del 17-Feb-23 CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-296-22 del 22-Feb-23 - OBSERVACIONES CORREDOR 1 - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-017-2023 del 22-Feb-23 CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-345-22 del 08-Mar-23 - OBSERVACIONES CORREDOR 2
INFORME ESTRUCTURAL	<ul style="list-style-type: none"> - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-014-2023 del 17-Feb-23 - GIC-INVIAS-NTS-301-22 del 23-Feb-23 – OBSERVACIONES - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-025-2023 del 02-Mar-23 - GIC-INVIAS-NTS-323-22 del 03-Mar-23 - APROBADO COOREADOR 1 - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-030-2023 del 07-Mar-23 - CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-399-22 del 24-Mar-23 - OBSERVACIONES - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-042-2023 del 24-Mar-23 - CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-460-22 del 20-Abr-23 - OBSERVACIONES CORREDOR 2 - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-074-2023 del 18-May-2023 - CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-574-22 del 25-May-23 - APROBADO COOREADOR 2
INFORME HIDRÁULICO	<ul style="list-style-type: none"> - Entrega documento con OFC-CADV-GIC-013-23 del 16-Feb-23 CORREDOR 1, T 1, 2, 3, 4 - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-017-2023 del 22-Feb-23 CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-305-22 del 23-Feb-23 - OBSERVACIONES CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-308-22 del 24-Feb-23 - OBSERVACIONES CORREDOR 2 - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-024-2023 del 01-Mar-23 CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-357-22 del 10-Mar-23 - OBSERVACIONES CORREDOR 1 - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-038-2023 del 21-Mar-23 CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-395-22 del 22-Mar-23 - OBSERVACIONES CORREDOR 1

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	<ul style="list-style-type: none"> - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-041-2023 del 24-Mar-23 CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-412-22 del 28-Mar-23 - OBSERVACIONES CORREDOR 1 - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-044-2023 del 28-Mar-23 CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-413-22 del 29-Mar-23 - APROBADO COOREDOR 1 - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-049-2023 del 04-Abr-23 CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-454-22 del 18-Abr-23 - APROBADO CON OBSERVACIONES COOREDOR 2 - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-054-2023 del 18-Abr-23 CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-464-22 del 24-Abr-23 - APROBADO CORREDOR 2

Tabla 20 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Abrego

3.5.3.2. Etapa de Construcción.

Con corte al 30 de mayo de 2023, el estado de avance ejecutado acumulado es del 4.91% que una vez cuantificadas las cantidades ejecutadas equivale en pesos a \$ 211.856.820 vs un programado del 53.86% que equivale en pesos a \$ 2.323.661.087,56.

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

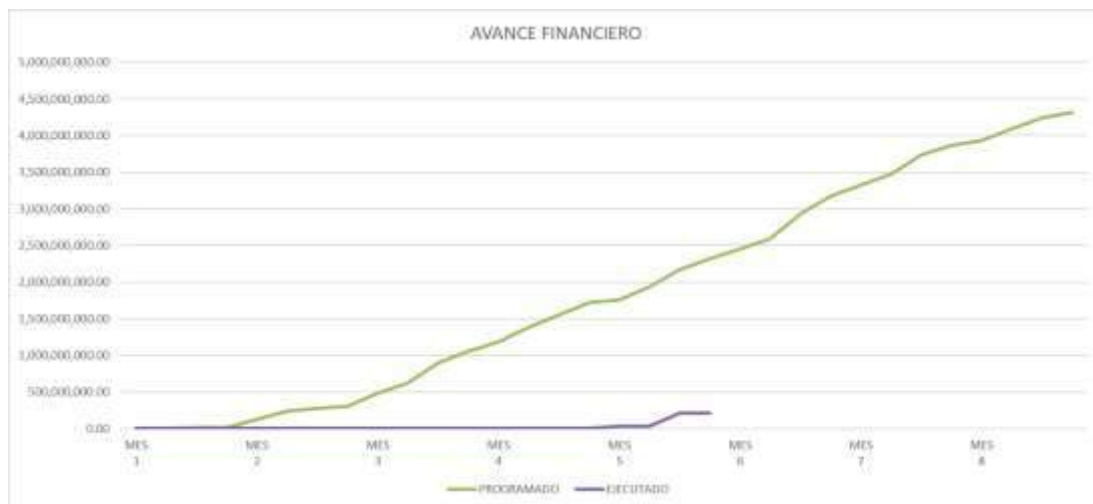


Gráfico 3 Avance Financiero Municipio de Abrego

Por otra parte, continúa realizando actividades de subsanación a los estudios y diseños del corredor 2, con el fin de dar pronto inicio a las obras en este corredor.

3.6. CONTRATO DE OBRA LP-004 DE 2022 – MUNICIPIO DE LA PLAYA

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	LP-004 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO No. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.
Contratista:	CONSORCIO LA PLAYA 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	27 de enero de 2023
Valor Inicial:	\$ 2.203.091.392,61 M/CTE
Fecha de inicio:	06 de marzo de 2023
Fecha de terminación inicial:	06 de septiembre de 2023
Prorroga 1:	
Fecha Nueva de terminación:	
Fecha de terminación Final:	06 de septiembre de 2023

Tabla 21 Condiciones Iniciales Municipio de La Playa

3.6.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas.

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.6.1.1 Actividades Administrativas.

Dentro de las actividades administrativas el contratista se encuentra adelantando la elaboración de los documentos de preconstrucción que a la fecha se encuentran observados por la Interventoría, continuación, se presenta el estado de los documentos de presentados por el contratista a corte del 31 de mayo de 2023:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-433-22 del 10-Abr-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-435-22 del 10-Abr-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-364-22 del 14-Mar-23
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-452-22 del 17-Abr-23
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-452-22 del 17-Abr-23
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-365-22 del 14-Mar-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-366-22 del 14-Mar-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-386-22 del 17-Mar-23
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-367-22 del 14-Mar-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-370-22 del 14-Mar-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Observado	GIC-INVIAS-NTS-425-22 del 31-Mar-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-434-22 del 10-Abr-23
Fuente de Materiales	Observado	GIC-INVIAS-NTS-482-22 del 02-May-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-427-22 del 03-Abr-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-473-22 del 28-Abr-23 GIC-INVIAS-NTS-467-22 del 25-Abr-23
Caracterización Material Granular	No ha presentado	

Tabla 22 Estado Documentos preconstrucción Municipio de La Playa

3.6.1.2. Actividades Técnicas.

Dentro de las actividades desarrolladas en este periodo por parte del Contratista se han adelantado actividades de Topografía dentro de las cuales se está llevando a cabo el levantamiento topográfico del corredor intervenir con el fin de localizar las abscisas del corredor y la localización de las alcantarillas. Así mismo se han adelantado actividades del componente de geotecnia en campo.

Por otra parte, han entregado a la Interventoría versión 2 de los Estudios y Diseños los cuales presentaron observaciones y se encuentran en subsanación por parte del contratista.

3.6.1.3. Actividades ambientales.

Las actividades realizadas en el componente ambiental fueron las siguientes:

- 03/05/2023: Se envió oficio N° GIC-INVIAS-NTS-482-22, con las observaciones que no fueron subsanadas en cuanto a la explotación y extracción de la FUENTE DE MATERIALES.
- 04/05/2023: Se realiza comité donde se dejó fecha estipulada para la entrega del documento PAGA (Plan a la Guía Adaptación Ambiental), el 05 de mayo de 2023.
- 28/04/2023 – 04/05/2023: INFORMES SEMANALES # 09, FUENTE DE MATERIALES: Durante la semana en el componente ambiental, se les envía oficio por parte de la interventoría dando respuesta al oficio N° OFC-CLP-GIC-020-2023 FUENTE DE MATERIALES, enviado por el contratista, en donde se reitera la importancia de que el proveedor cuente con la licencia ambiental.
- 05/05/2023- 11/05/2023: INFORMES SEMANALES # 10 Durante la semana se ha realizado mesas de trabajo con el profesional ambiental del contratista aclarando dudas para subsanar en las observaciones enviadas, los temas tratados fueron la formulación de la matriz de capacitación y como realizar el programa de almacenamiento de combustible en obra, en el PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), en cuanto a la fuente de materiales se aclaró que es de gran importante contar con la licencia ambiental para poder realizar la explotación y exploración del material, de lo contrario se debe cambiar de proveedor.
- 18/05/2023: Se realizó comité en donde se dejó fecha estipulada para la entrega del documento PAGA (Plan a la Guía Adaptación Ambiental), el 2 de junio de 2023.
- 19/05/2023- 25/05/2023: INFORMES SEMANALES # 12 La interventora se encuentra a la espera de recibir documentación con observaciones subsanadas por el contratista respecto a la FUENTE DE MATERIALES y documento PAGA.
- 25/05/2023: Se realizó comité donde se menciona nuevamente que el contratista envía documento PAGA (Plan Adaptación Guía a la Adaptación Ambiental) el 02 de junio de 2023.

3.6.1.4. Actividades Sociales.

Esta Interventoría se encuentra a la espera de las subsanaciones del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA), así como de las actas de vecindad y la conformación del comité de veeduría ciudadana.

Se desarrolla una mesa de trabajo de manera virtual, el día 19 de mayo de 2023, con la asistencia de la coordinadora del proyecto y la profesional social del Consorcio, en esta reunión se explicó que se deben de presentar antes del inicio de trabajos físicos, documentos tales como: Certificado de territorialidad o soporte de las Juntas de Acción Comunal pertenecientes al Área de Influencia Directa del proyecto, donde se certifique que los trabajadores vinculados pertenecen al AID; de igual forma, se debe de enviar a la Interventoría, el acta de conformación y aprobación del Comité de Veeduría Ciudadana, Actas de Vecindad y Socialización de Inicio de Obra.

Así mismo, se informó sobre como se debe de elaborar el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA) en cuanto a sus ítems de Impactos Ambientales desde el componente socioeconómico, evaluación de los impactos y lo correspondiente a la descripción y caracterización del medio socioeconómico; así mismo, se recordaron los cinco (5) programas de Gestión Social que debe de ejecutar el Contratista una vez se comiencen la obra.

Por otra parte, el Consorcio presentó ante el Ministerio del Interior, la respectiva solicitud de Consulta previa, para preguntar si esta procede o no en el área donde se desarrollará las obras constructivas; igualmente, se envía un oficio el día 12 de mayo de 2023 con radicado GIC-INVIAS-NTS-535-22 con asunto “Solicitud cumplimiento de documentos previos al inicio de obra”.

Ilustración 7 Solicitud de Consulta previa y Oficio enviado por esta Interventoría.



Fuente: Consorcio La Playa 2020 y Gavinco Ingenieros Consultores.

En cuanto a las cifras de contratación de mano de obra del proyecto realizada durante este mes de mayo, a continuación, se presentan las cifras:


Reporte cifras de contratación, mayo 2023.

TRABAJADORES VINCULADOS AL PROYECTO			ORIGEN		CATEGORÍA	
DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	AID	AII	MOC	MONC
2	4	6	6	0	6	0

Fuente: Consorcio La Playa 2020.

Personal contratación Directa: 33.3%
 Personal contratación Indirecta: 66.7%
 Personal Área de Influencia Directa: 100%
 Personal Área de Influencia Indirecta: 0%
 Mano de Obra Calificada: 100%
 Mano de Obra No Calificada: 0%

Ilustración 8 Reporte cifras de contratación mayo de 2023.

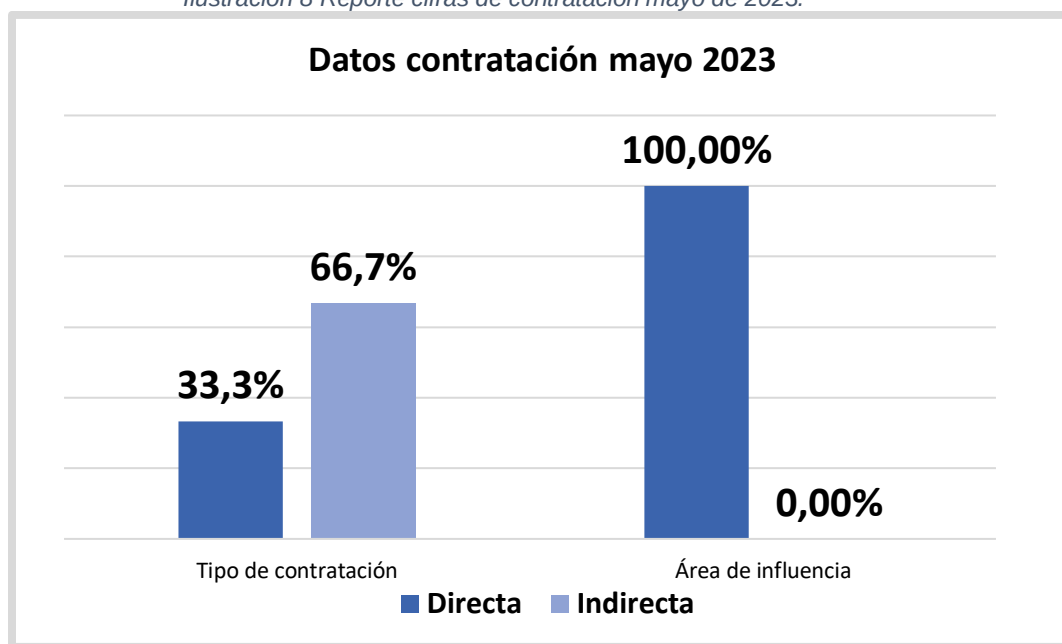

Fuente: Consorcio La Playa 2020.

3.6.1.5. Actividades SST

Durante el periodo del presente informe no se ha dado inicio a las labores de obra, razón por la cual no se hace un reporte de esta área.

3.6.2. Seguimiento Ítems No Previstos

A la fecha no se han presentado ítem con actividades no previstas en el proyecto.

3.6.3. Estado de avance del proyecto.

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.6.3.2. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

El Contratista se encuentra en proceso de subsanación de los documentos correspondientes a los estudios y diseños observados por la Interventoría, para lo cual se espera sean entregados en su versión 2, para revisión y aprobación por parte de la Interventoría.

A la fecha el estado de avance ejecutado acumulado es del 88.24% que una vez cuantificadas las cantidades ejecutadas equivale a en pesos a \$ 10.834.444,95 vs un programado del 100% que equivale en pesos a \$ 12.279.038,00

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	<ul style="list-style-type: none"> - Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-007-2023 del 29-Mar-2023 CORREDOR 1 Y 2 - GIC-INVIAS-NTS-426-22 del 31-Mar-23 - OBSERVACIONES CORREDOR 1 Y 2 - Hace entrega de las respuestas a las observaciones realizadas por la Interventoría con comunicado OFC-CLP-GIC-0013-2023 del 05-Abr-2023 CORREDOR 1 Y 2 - GIC-INVIAS-NTS-444-22 del 12-Abr-23 - OBSERVACIONES CORREDOR 1 Y 2 - Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-019-2023 del 27-Abr-2023 CORREDOR 1 y 2 - GIC-INVIAS-478-21 del 02-May-23 - OBSERVACIONES CORREDOR 1 Y 2
TOPOGRAFIA	<ul style="list-style-type: none"> - Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-004-2023 del 27-Mar-2023 CORREDOR 1 Y 2 - GIC-INVIAS-NTS-421-22 del 30-Mar-23 - OBSERVACIONES CORREDOR 1 Y 2 - Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-021-2023 del 04 de Mayo de 2023 CORREDOR 1 Y 2 - GIC-INVIAS-NTS-515-22 del 09-May-23 - APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 1 Y 2 - Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-030-2023 del 17-05-2023 CORREDOR 1 Y 2



ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	<ul style="list-style-type: none"> - GIC-INVIAS-NTS-597-22 del 29-May-23 - APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 1 Y 2
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	<ul style="list-style-type: none"> - Hace entrega con Comunicado OFC-CLP-GIC-026-2023 del 08-May-2023 CORREDOR 1 Y 2 - GIC-INVIAS-542-21 del 15-May-23 - OBSERVACIONES CORREDOR 1 Y 2 - Hace entrega con Comunicado OFC-CLP-GIC-029-2023 del 16-05-2023 CORREDOR 1 Y 2 - GIC-INVIAS-556-21 del 23-May-23 - OBSERVACIONES CORREDOR 1 Y 2
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	<ul style="list-style-type: none"> - Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-008-2023 del 29-Mar-2023 CORREDOR 1 - Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-009-2023 del 30-Mar-2023 CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-426-22 del 31-Mar-23 - OBSERVACIONES CORREDOR 1 Y 2 - Hace entrega de las respuestas a las observaciones realizadas por la Interventoría con comunicado OFC-CLP-GIC-0013-2023 del 05-Abr-2023 CORREDOR 1 Y 2 - GIC-INVIAS-NTS-444-22 del 12-Abr-23 - OBSERVACIONES CORREDOR 1 Y 2
INFORME ESTRUCTURAL	<ul style="list-style-type: none"> - Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-008-2023 del 29-Mar-2023 CORREDOR 1 - Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-009-2023 del 30-Mar-2023 CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-461-22 del 20-Abr-23 - OBSERVACIONES CORREDOR 1 Y 2 - Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-026-2023 del 08-May-2023 RESPUESTA A OFICIO GIC-INVIAS-NTS-461-22 - GIC-INVIAS-NTS-547-22 del 18-May-23 - OBSERVACIONES CORREDOR 1 Y 2 - Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-031-2023 del 24-May-2023 C 1Y2 - GIC-INVIAS-NTS-602-22 del 30-May-23 - APROBADO CORREDOR 1 Y 2
INFORME HIDRÁULICO	<ul style="list-style-type: none"> - Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-017-2023 del 21-Abr-2023 CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-466-22 del 24-Abr-23 - APROBADO CORREDOR 1 - Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-023-2023 del 04-May-2023 CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-600-22 del 29-May-23 - OBSERVACIONES

Tabla 23 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de La Playa

3.6.3.3. Etapa de Construcción.

A la fecha de corte del informe, no se ha iniciado la etapa de construcción, toda vez que el Contratista no ha realizado entrega de manera completa a los Estudios y Diseños para revisión y aprobación por parte de la Interventoría para proceder a la construcción de la meta física del proyecto. Etapa que se ejecutara una vez se tengan aprobados todos los documentos de Estudios y Diseños.

3.7. CONTRATO DE OBRA 202 DE 2022 – MUNICIPIO DE PAMPLONITA

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	202 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO NO. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.
Contratista:	UNION TEMPORAL COLOMBIA
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	21 de Noviembre de 2022
Valor Inicial:	\$ 1.703.523.226,00 M/CTE
Fecha de inicio:	14 de abril de 2023
Fecha de terminación inicial:	13 de octubre de 2023
Prorroga 1:	
Fecha Nueva de terminación:	
Fecha de terminación Final:	13 de octubre de 2023

Tabla 24 Condiciones Iniciales Municipio de Pamplonita

3.7.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas.

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.7.1.1. Actividades Administrativas.

Dentro de las actividades administrativas el contratista se encuentra adelantando la elaboración de los documentos de preconstrucción que a la fecha no han sido entregados por el Contratista para revisión de la Interventoría, a continuación, se presenta el estado de los documentos presentados por el contratista a corte del 31 de mayo de 2023:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad	OBSERVADO	GIC-INVIAS-NTS-606-22 del 31-May-2023
Protocolo de Bioseguridad	OBSERVADO	GIC-INVIAS-NTS-581-22 del 26-May-2023
Hojas de Vida		No ha presentado
Programa de Obra	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-578-22 del 26-May-2023
Flujo de Caja	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-578-22 del 26-May-2023
Programa de Generación de Empleo		En Revisión de Interventoría
Equipo Mínimo Obligatorio		No ha presentado
Análisis de Precios Unitarios		En Revisión de Interventoría
Instalaciones Provisionales		En Revisión de Interventoría
Plan de Manejo de Transito - PMT	OBSERVADO	GIC-INVIAS-NTS-579-22 del 26-May-2023
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	OBSERVADO	GIC-INVIAS-NTS-598-22 del 29-May-2023
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	OBSERVADO	GIC-INVIAS-NTS-580-22 del 26-May-2023
Fuente de Materiales	OBSERVADO	GIC-INVIAS-NTS-599-22 del 29-May-2023
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio		En Revisión de Interventoría
Diseño de Mezcla		No ha presentado
Caracterización Material Granular		No ha presentado

Tabla 25 Estado Documentos preconstrucción Municipio de Pamplonita

3.7.1.2. Actividades Técnicas.

Dentro de las actividades desarrolladas en este periodo por parte del Contratista se han adelantado actividades de Topografía dentro de las cuales se está llevando a cabo el levantamiento topográfico del corredor intervenir con el fin de localizar las abscisas del corredor y la localización de las alcantarillas. Así mismo se han adelantado actividades del componente de geotecnia en campo para la entrega de los estudios y diseños.

3.7.1.3. Actividades ambientales.

Las actividades realizadas en el componente ambiental fueron las siguientes:

- 23/05/2023: Se recibió documentación en cuanto a la FUENTE DE MATERIALES.
- 23/05/2023: Se recibió documentación en cuanto al PAGA (Plan Adaptación Guía a la Adaptación Ambiental).
- 26/05/2023: Se envió oficio N°GIC-INVIAS-NTS-598-22, PAGA (Plan Adaptación Guía a la Adaptación Ambiental), con observaciones que deben ser subsanadas por el contratista.
- 26/05/2023: Se envió oficio N° GIC-INVIAS-NTS-599-22, con observación a subsanar por parte del contratista en cuanto a la FUENTE DE MATERIALES.
- 19/05/2023: Se realizó comité con la participación de todos los componentes involucrados en el proyecto, en donde se mencionó que la interventoría se encontraba a la espera de recibir documentación PAGA (Plan Adaptación Guía a la Adaptación Ambiental).
- En los informes semanales del mes de mayo, se mencionó que la interventoría se encuentra a la espera de recibir documentación en cuanto al PAGA Y FUENTE DE MATERIALES por parte del contratista.

3.7.1.4. Actividades Sociales.

El Contratista envía el correspondiente Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA) el día 22 de mayo de 2023.

El día 29 de mayo de 2023 con radicado GIC-INVIAS-NTS-598-22, esta Interventoría envía las correspondientes observaciones a subsanar en el documento PAGA, ya que ciertos aspectos no fueron tenidos en cuenta por parte del Contratista.

Igualmente, el día 11 de mayo de 2023, la Interventoría envía una comunicación al Consorcio Unión Temporal Colombia con radicado GIC-INVIAS-NTS-532-22 y asunto “Solicitud de presentación de documentos – inicio del contrato de obra – componente social”, con el propósito de que el Contratista tenga presente los distintos documentos reconstructivos que debe de enviar.

3.7.1.5. Actividades SST

Durante el periodo del presente informe no se ha dado inicio a las labores de obra, razón por la cual no se hace un reporte de esta área.

3.7.2. Seguimiento Ítems No Previstos

A la fecha no se han presentado ítem con actividades no previstas en el proyecto.

3.7.3. Estado de avance del proyecto.

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.7.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

El Contratista se encuentra en proceso de elaboración de los documentos correspondientes a los estudios y diseños, a la fecha han sido entregados los componentes de Topografía, geotecnia y diseño de pavimentos.

A la fecha el estado de avance ejecutado acumulado es del 20% que una vez cuantificadas las cantidades ejecutadas equivale a en pesos a \$ 4.848.027,60 vs un programado del 100% que equivale en pesos a \$ 20.902.728,00

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 005 – 2023 del 18-05-2023 - GIC-INVIAS-NTS-552-22 del 19-May-2023 - OBSERVACIONES
TOPOGRAFIA	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 003 – 2023 del 18-05-2023 - GIC-INVIAS-NTS-557-22 del 25-May-2023 - OBSERVACIONES
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	NO HA PRESENTADO
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 003 – 2023 del 18-05-2023 - GIC-INVIAS-NTS-590-22 del 26-May-2023 - OBSERVACIONES
INFORME ESTRUCTURAL	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 003 – 2023 del 18-05-2023 - GIC-INVIAS-NTS-605-22 del 31-May-2023 - APROBADO
INFORME HIDRÁULICO	NO HA PRESENTADO

Tabla 26 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Pamplonita

3.7.3.2. Etapa de Construcción.

A la fecha de corte del informe, no se ha iniciado la etapa de construcción, toda vez que el Contratista no ha realizado entrega de manera completa a los Estudios y Diseños para revisión y aprobación por parte de la Interventoría para proceder a la construcción de la meta física del proyecto. Etapa que se ejecutara una vez se tengan aprobados todos los documentos de Estudios y Diseños.

3.8. CONTRATO DE OBRA 02590 DE 2022 – GOBERNACIÓN 1943

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	02590 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS
Contratista:	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	23 de diciembre de 2022
Valor Inicial:	\$ 16.898.027.326,00 M/CTE
Fecha de inicio:	10 de Abril de 2023
Fecha de terminación inicial:	09 de Diciembre de 2023
Prorroga 1:	
Fecha Nueva de terminación:	
Fecha de terminación Final:	09 de Diciembre de 2023

Tabla 27 Condiciones Iniciales Cto. Gobernación 1943

3.8.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas.

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.8.1.1. Actividades Administrativas.

Dentro de las actividades administrativas el contratista se encuentra adelantando la elaboración de los documentos de preconstrucción que a la fecha se encuentran observados por la Interventoría y/o sin entregar, continuación, se presenta el estado de los documentos de presentados por el contratista a corte del 31 de mayo de 2023:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad		No ha presentado
Protocolo de Bioseguridad		No ha presentado
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-475-22 del 28-Abr-23

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-566-22 del 23-May-23
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-566-22 del 23-May-23
Programa de Generación de Empleo		No ha presentado
Equipo Mínimo Obligatorio	Observado	GIC-INVIAS-NTS-476-22 del 28-Abr-23
Análisis de Precios Unitarios	En Revisión	Entrega documento con comunicado UTET-02590-004 del 17-Abr-2023
Instalaciones Provisionales		No ha presentado
Plan de Manejo de Transito - PMT		No ha presentado
Plan De Manejo Ambiental - PAGA		No ha presentado
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo		No ha presentado
Fuente de Materiales		No ha presentado
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio		No ha presentado
Diseño de Mezcla		No ha presentado
Caracterización Material Granular		No ha presentado

Tabla 28 Estado Documentos preconstrucción
 Gobernación 1943

3.8.1.2. Actividades Técnicas.

Dentro de las actividades desarrolladas en este periodo por parte del Contratista se han adelantado actividades de Topografía dentro de las cuales se está llevando a cabo el levantamiento topográfico del corredor intervenir con el fin de localizar las abscisas del corredor y la localización de las alcantarillas. Así mismo se han adelantado actividades del componente de geotecnia en campo.

Por otra parte, se han adelantado recorridos en conjunto INVIAS-Gobernación-Interventoría-Contratista, con el fin de definir el punto 0 de cada corredor a intervenir.

3.8.1.3. Actividades ambientales.

Las actividades realizadas en el componente ambiental fueron las siguientes:

- 09/05/2023: Se recibió oficio N° UTET-02590-011 por parte del contratista en donde se solicitaba, información al respecto de la elaboración PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), su alcance y compensación ambiental.
- 04/05/2023: Se realizó comité con la participación de todos los componentes involucrados en el proyecto, en donde se les dio sugerencia en el componente ambiental en cuanto a la formulación del documento PAGA (Plan Adaptación Guía a la Adaptación Ambiental).
- 05/05/2023 – 11/05/2023: INFORMES SEMANALES # 05, FUENTE DE MATERIALES: Se recibió oficio N° UTET-02590-011 por parte del contratista en donde se solicitaba, información al respecto de la elaboración PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) y su alcance en cuanto a la compensación ambiental. comité en donde se menciona el alcance y compensación ambiental del documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental).
- 11/05/2023: Durante el comité, se aclaró que la formulación del PAGA se encuentra en el ítem, en otras obras ejecutadas donde menciona el estudio diseño, gestión predial, social, ambiental y otros, y no en las compensaciones ambientales ya que estas consisten en el desarrollo y la aplicación de planes correctivos para subsanar el daño generado a los ecosistemas naturales, dentro del presupuesto.
- 12/05/2023 – 18/05/2023: INFORMES SEMANALES # 06, FUENTE DE MATERIALES, La interventoría se encuentra a la espera de recibir la respectiva documentación en cuanto al componente ambiental como lo es el PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), y los permisos existentes

3.8.1.4. Actividades Sociales.

El día 06 de mayo de 2023, esta Interventoría envía un oficio con radicado GIC-INVIAS-NTS-503-22 y asunto “Información al respecto de la información mínima para la elaboración del del paga (plan guía a la adaptación ambiental)”, esto a solicitud del Contratista, ya que necesita una guía en lo que consiste el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA), en su componente social y ambiental, pues informa que la elaboración del documento mencionado anteriormente, no hace parte del Contrato firmado entre las partes para la ejecución del proyecto.

Ilustración 9 Oficio de información sobre la elaboración del PAGA.

[illegible]

Fuente: Gavinco Ingenieros Consultores.

De igual forma, el día 11 de mayo de 2023, esta Interventoría envió una comunicación con radicado GIC-INVIAS-NTS-530-22 y asunto “Solicitud cumplimiento de documentos previos al inicio de obra”, con el fin de darle a conocer al Contratista los cinco (5) documentos preconstructivos importantes que se deben de presentar.

Ilustración 10 Comunicación de cumplimiento a documentos preconstructivos.

[illegible]

Fuente: Gavinco Ingenieros Consultores.

3.8.1.5. Actividades SST

Durante el periodo del presente informe no se ha dado inicio a las labores de obra, razón por la cual no se hace un reporte de esta área.

3.8.2. Seguimiento Ítems No Previstos

A la fecha no se han presentado ítem con actividades no previstas en el proyecto.

3.8.3. Estado de avance del proyecto.

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.8.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

El Contratista se encuentra en proceso de elaboración de los documentos correspondientes a los estudios y diseños, se está a la espera de la subsanación de los componentes de Diseño Geométrico, por otra parte, no se han entregado los componentes de Estudio de Topografía y Suelos, Diseño de Pavimentos, Estructural e Hidráulico, para lo cual se espera sean entregados en su versión 0, para revisión y aprobación por parte de la Interventoría.

A la fecha el estado de avance ejecutado acumulado es del 4% que una vez cuantificadas las cantidades ejecutadas equivale a en pesos a \$ 8.180.796,56 vs un programado del 10.25% que equivale en pesos a \$ 20.982.294,00

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	NO HA PRESENTADO
TOPOGRAFIA	NO HA PRESENTADO
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	<ul style="list-style-type: none"> - Entrega documento con comunicado UTET-02590-013 del 15-May-2023 - Vía de la vereda de Santo Domingo del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-567-22 del 23-May-2023 – OBSERVADO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-014 del 23-May-2023 - Vía de la Helechar del municipio de Arboledas.
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	NO HA PRESENTADO
INFORME ESTRUCTURAL	NO HA PRESENTADO
INFORME HIDRÁULICO	NO HA PRESENTADO

Tabla 29 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de La Playa

3.8.3.2. Etapa de Construcción.

A la fecha de corte del informe, no se ha iniciado la etapa de construcción, toda vez que el Contratista no ha realizado entrega de manera completa a los Estudios y Diseños para revisión y aprobación por parte de la Interventoría para proceder a la construcción de la meta física del proyecto. Etapa que se ejecutara una vez se tengan aprobados todos los documentos de Estudios y Diseños.

3.9. CONTRATO DE OBRA 02332 DE 2022 – GOBERNACIÓN 2052

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	02332 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS
Contratista:	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	23 de diciembre de 2022
Valor Inicial:	\$ 5.159.028.732,00 M/CTE
Fecha de inicio:	11 de Mayo de 2023
Fecha de terminación inicial:	10 de Noviembre de 2023
Prorroga 1:	
Fecha Nueva de terminación:	
Fecha de terminación Final:	10 de Noviembre de 2023

Tabla 30 Condiciones Iniciales Cto. Gobernación 2052

3.9.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas.

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.9.1.1. Actividades Administrativas.

Dentro de las actividades administrativas el contratista se encuentra adelantando la elaboración de los documentos de preconstrucción que a la fecha se encuentran observados por la Interventoría y/o sin entregar, continuación, se presenta el estado de los documentos de presentados por el contratista a corte del 31 de mayo de 2023:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad		No ha presentado
Protocolo de Bioseguridad	En Revisión	Hace entrega con documento PHM2022-003-2022 el 30-Mayo-2023

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Hojas de Vida		No ha presentado
Programa de Obra		No ha presentado
Flujo de Caja		No ha presentado
Programa de Generación de Empleo	En Revisión	Hace entrega con documento PHM2022-005-2022 el 30-Mayo-2023
Equipo Mínimo Obligatorio		No ha presentado
Análisis de Precios Unitarios	En Revisión	Hace entrega con documento PHM2022-005-2022 el 30-Mayo-2023
Instalaciones Provisionales	En Revisión	Hace entrega con documento PHM2022-005-2022 el 30-Mayo-2023
Plan de Manejo de Transito - PMT	En Revisión	Hace entrega con documento PHM2022-005-2022 el 30-Mayo-2023
Plan De Manejo Ambiental - PAGA		No ha presentado
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo		No ha presentado
Fuente de Materiales		No ha presentado
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	En Revisión	Hace entrega con documento PHM2022-005-2022 el 30-Mayo-2023
Diseño de Mezcla		No ha presentado
Caracterización Material Granular	En Revisión	Hace entrega con documento PHM2022-005-2022 el 30-Mayo-2023

Tabla 31 Estado Documentos preconstrucción
Gobernación 2052

3.9.1.2. Actividades Técnicas.

Dentro de las actividades desarrolladas en este periodo por parte del Contratista se han adelantado actividades de Topografía dentro de las cuales se está llevando a cabo el levantamiento topográfico del corredor intervenir con el fin de localizar las abscisas del corredor y la localización de las alcantarillas. Así mismo se han adelantado actividades del componente de geotecnia en campo.

3.9.1.3. Actividades ambientales.

La interventoría se encuentra a la espera de recibir la documentación, en cuanto a la realización del documento en el PAGA (Plan Adaptación Guía a la Adaptación Ambiental) y a los permisos ambientales requeridos para la explotación de la FUENTE DE MATERIALES.

3.9.1.4. Actividades Sociales.

La Interventoría se encuentra a la espera de la presentación del documento PAGA.

3.9.1.5. Actividades SST

Durante el periodo del presente informe no se ha dado inicio a las labores de obra, razón por la cual no se hace un reporte de esta área.

3.9.2. Seguimiento Ítems No Previstos

A la fecha no se han presentado ítem con actividades no previstas en el proyecto.

3.9.3. Estado de avance del proyecto.

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.9.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

El Contratista se encuentra en proceso de elaboración de los documentos correspondientes a los estudios y diseños, la Interventoría está a la espera de la entrega de la versión 0, para revisión y aprobación.

A la fecha el contratista no ha realizado la entrega de la programación de obra para medir los avances del proyecto. La Interventoría ha solicitado la programación con su comunicado GIC-INVIAS-NTS-513-22 del 09 de mayo de 2023.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	NO HA PRESENTADO
TOPOGRAFIA	NO HA PRESENTADO
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	NO HA PRESENTADO
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	NO HA PRESENTADO
INFORME ESTRUCTURAL	NO HA PRESENTADO
INFORME HIDRÁULICO	NO HA PRESENTADO

Tabla 32 Trazabilidad Estudios y Diseños Gobernación 2052

3.9.3.2. Etapa de Construcción.

A la fecha de corte del informe, no se ha iniciado la etapa de construcción, toda vez que el Contratista no ha realizado la entrega de los Estudios y Diseños para revisión y aprobación por parte de la Interventoría para proceder a la construcción de la meta física del proyecto. Etapa que se ejecutara una vez se tengan aprobados todos los documentos de Estudios y Diseños.

3.10. CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.4352407 – OCAÑA 1814

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	CO1.PCCNTR.4352407
Objeto:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.
Contratista:	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	27 de diciembre de 2022
Valor Inicial:	\$ 2.499.989.139,00 M/CTE
Fecha de inicio:	02 de Mayo de 2023
Fecha de terminación inicial:	01 de Septiembre de 2023
Prorroga 1:	
Fecha Nueva de terminación:	
Fecha de terminación Final:	01 de Septiembre de 2023

Tabla 33 Condiciones Iniciales Cto. Municipio de Ocaña 1814

3.10.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas.

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.10.1.1. Actividades Administrativas.

Dentro de las actividades administrativas el contratista se encuentra adelantando la elaboración de los documentos de preconstrucción que a la fecha se encuentran observados por la Interventoría y/o sin entregar, continuación, se presenta el estado de los documentos de presentados por el contratista a corte del 31 de mayo de 2023:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-558-22 del 23-May-23
Protocolo de Bioseguridad	En Revisión	Hace entrega con comunicado GBE-011-2022 del 31 - May - 2023

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Hojas de Vida	Observado	GIC-INVIAS-NTS-559-22 del 23-May-23
Programa de Obra	Observado	GIC-INVIAS-NTS-562-22 del 23-May-23
Flujo de Caja	Observado	GIC-INVIAS-NTS-562-22 del 23-May-23
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-560-22 del 23-May-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Observado	GIC-INVIAS-NTS-563-22 del 23-May-23
Análisis de Precios Unitarios	En Revisión	Hace entrega con comunicado GBE-002-2022 del 24-Mar-2023
Instalaciones Provisionales		No ha presentado
Plan de Manejo de Transito - PMT	Observado	GIC-INVIAS-NTS-564-22 del 23-May-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Observado	GIC-INVIAS-NTS-462-22 del 20-Abr-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Observado	GIC-INVIAS-NTS-438-22 del 10-Abr-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-463-22 del 20-Abr-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Observado	GIC-INVIAS-NTS-561-22 del 23-May-23
Diseño de Mezcla		No ha presentado
Caracterización Material Granular	En Revisión	Hace entrega con comunicado GBE- 008- 2022 del 29 - May - 2023

Tabla 34 Estado Documentos preconstrucción – Ocaña 1814

3.10.1.2. Actividades Técnicas.

Dentro de las actividades desarrolladas en este periodo por parte del Contratista se han adelantado actividades de Topografía dentro de las cuales se está llevando a cabo el levantamiento topográfico del corredor intervenir con el fin de localizar las abscisas del corredor y la localización de las alcantarillas. Así mismo se han adelantado actividades del componente de geotecnia en campo.

3.10.1.3. Actividades ambientales.

La interventoría no ha recibido hasta el momento documentación con las observaciones subsanadas en el documento PAGA (Plan Adaptación Guía a la Adaptación Ambiental), desde el mes de abril, por parte del contratista UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022.

3.10.1.4. Actividades Sociales.

Es enviado por parte del Contratista el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA) para ser revisado por esta Interventoría; una vez observado el documento, se envía al Consorcio las diferentes observaciones dadas al documento, toda vez que se encontraron ítems los cuales se deben de profundizar y modificar, para de esta forma tener un PAGA adecuado a las condiciones y al área donde se va a ejecutar el proyecto.

Los miembros del Comité de Participación Comunitaria (Veeduría Ciudadana) asumieron ser residentes y/o tener alguna actividad económica en el AID, ser mayores de edad, ser multiplicadores de la información que reciben sobre el proyecto, divulgar información clara y veraz a la comunidad, comprometerse a participar en la resolución de conflictos y no a generarlos, aportar elementos e información sobre las características culturales de la comunidad, participar en los talleres pedagógicos de sostenibilidad y ser dinámicos y creativos.

Así mismo, es remitido a esta Interventoría el acta de conformación del Comité de Veeduría Ciudadana, conformado por cinco (5) habitantes del área de influencia directa, los cuales darán juicioso seguimiento a las obras que adelantará el Contratista.

Ilustración 11 Conformación y aprobación comité de veeduría ciudadana.



Fuente: Consorcio Unión Temporal Ocaña GBE

Por otra parte, se adelantó una reunión con el comité de veeduría ciudadana, con el fin de dar la respectiva aprobación a los tramos a intervenir, dándose la aprobación de siete (7) tramos viales y trece (13) alcantarillas; de esta forma se demuestra que el Contratista trabaja de manera mancomunada con la comunidad, con el objetivo de brindar transparencia en la ejecución del proyecto.



Ilustración 12 Socialización y aprobación por parte de la veeduría de los tramos a intervenir.



Fuente: Consorcio Unión Temporal Ocaña GBE.

3.10.1.5. Actividades SST

Durante el periodo del presente informe no se ha dado inicio a las labores de obra, razón por la cual no se hace un reporte de esta área.

Por otra parte, se esta a la espera de la subsanación del SG-SST observado con comunicado GIC-INVIAS-NTS-438-22 del 10 de abril de 2023.

3.10.2. Seguimiento Ítems No Previstos

A la fecha no se han presentado ítem con actividades no previstas en el proyecto.

3.10.3. Estado de avance del proyecto.

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.10.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

El Contratista se encuentra en proceso de elaboración de los documentos correspondientes a los estudios y diseños, se está a la espera de la subsanación de los componentes de Topografía, Geotecnia y Diseño de Pavimentos por otra parte, no se han entregado los componentes de Diseño Geométrico, Estructural e Hidráulico, para lo cual se espera sean entregados en su versión 0, para revisión y aprobación por parte de la Interventoría.

A la fecha el contratista no ha realizado el ajuste a la programación de obra, la cual fue observada por la interventoría con su comunicado GIC-INVIAS-NTS-562-22 del 23 mayo de 2023.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- Hace entrega con comunicado GBE-004-2022 del 16-May-2023 - GIC-INVIAS-NTS-551-22 del 19-May-23 - OBSERVACIONES
TOPOGRAFIA	- Hace entrega con comunicado GBE-007-2022 del 23-May-2023 - GIC-INVIAS-NTS-588-22 del 26-May-23 - OBSERVACIONES
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	NO HA PRESENTADO
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Hace entrega con comunicado GBE-004-2022 del 16-May-2023 - GIC-INVIAS-NTS-551-22 del 19-May-23 - OBSERVACIONES
INFORME ESTRUCTURAL	NO HA PRESENTADO
INFORME HIDRÁULICO	NO HA PRESENTADO

Tabla 35 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio Ocaña 1814

3.10.3.2. Etapa de Construcción.

A la fecha de corte del informe, no se ha iniciado la etapa de construcción, toda vez que el Contratista no ha realizado la entrega de los Estudios y Diseños para revisión y aprobación por parte de la Interventoría para proceder a la construcción de la meta física del proyecto. Etapa que se ejecutara una vez se tengan aprobados todos los documentos de Estudios y Diseños.

3.11. Acciones a seguir por parte de la Interventoría.

Entre las acciones a seguir por parte de la interventoría se tienen las siguientes:

1. Realizar mesas de trabajo con los especialistas del Contratista con el fin de no generar más de 1 versión en la elaboración y revisión de estudios y diseños.
2. Realizar comités de seguimiento a los contratos de obra, con el fin de generar compromisos y que sean cumplidos en un periodo no superior a 8 días calendario.
3. Realizar la revisión de los documentos entregados por los contratistas de obra y de encontrarse de acuerdo al pliego de condiciones dar concepto aprobatorio.
4. Realizar gestiones en el Invias para llevar a feliz término los contratos de obra.
5. Realizar recorridos de obra en los corredores a intervenir con el fin de tener una visual general del proyecto y poder culminarlo en pro de beneficiar a la comunidad del sector.
6. Realizar seguimiento, control y vigilancia a los contratos de obra con el fin de cumplir con el Manual y las Especificaciones Generales de Mantenimiento de Carreteras.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATOS DE OBRA:

A la fecha de corte del presente Informe, se tienen en ejecución 8 de los 11 Convenios interadministrativos suscritos con el Invias, de los cuales a la fecha para los municipios de, Herrán, Cáchira, La Playa, Pamplonita, Ocaña 1814, Gobernación 1943 y Gobernación 2052 se encuentran en etapa de actualización a los Estudios y Diseños y los municipios de Ocaña-1758, Santiago y Abrego se encuentra en ejecución de obra física en la etapa de Construcción de Placa Huella y Alcantarillas.

Por lo anterior, únicamente se presentan reportes de obra para los contratos de los municipios de Santiago, Herrán, Ocaña-1758, Cáchira, Abrego, La Playa, Pamplonita, Ocaña 1814, Gobernación-1943 y Gobernación-2052.

4.1. PROYECTO MUNICIPIO DE SANTIAGO

El día 18 de octubre de 2022, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. LP-OP-001- 2022, cuyo objeto es CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.

4.7.1. Reporte Informe Semanal.

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
30	05/05/2023 al 11/05/2023
31	12/05/2023 al 18/05/2023
32	19/05/2023 al 25/05/2023
33	26/05/2023 al 01/06/2023

Tabla 36 Reporte informes semanales Municipio de Santiago

4.7.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe el contratista tiene aprobada la maquinaria y equipos del contrato, el Contratista está usando en campo la maquinaria que se relaciona en la siguiente tabla.

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
RETROEXCAVADORA	CATERPILLAR 2005	-
COMPACTADOR	CATERPILLAR 2005	-

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
VOLQUETA VIS 104	HINO	6 m3
VOLQUETA VIS 105	HINO	6 m3
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	

Tabla 37 Relación de Maquinaria y Equipo Municipio de Santiago.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

4.7.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe dentro del contrato se tienen afiliado al personal que se relaciona a continuación.

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo
1	MELISA CARDENAS REMOLINA	1090386915	INGENIERA AUXILIAR
2	YORDAN ALEXANDER CACERES RONDON	1.005.058.758	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN
3	WILSON ORLANDO RODRIGUEZ	1.005.085.614	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN
4	JESUS RUBIEL AGUILAR MELO	1.093.293.685	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN
5	EUDES BLADIMIR PEÑARANDA BARAJAS	1.094.166.681	OPERADOR
6	MARLON SAUL REALES	1.090.472.764	OPERADOR
7	CRISTIAN FERNANDO CELIS	1.092.156.255	OPERADOR
8	LUIS ENRIQUE JAIMES PEREZ	1.094.859.342	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA
9	MARBEL TATIANA BOHORQUEZ RAMIREZ	1.094.351.277	TOPOGRAFO
10	ANYI YULIANA URBINA	1.005.035.950	AUXILIAR SST
11	NORBERTO JOSE GALVIS PATIÑO	5.450.083	VIGILANTE

Tabla 38 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Santiago

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

4.7.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista no ha prestado actas de recibo parcial de obra.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

4.1.5. Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo del presente informe se presentaron periodos de lluvias moderadas y cortos periodos de lluvia intensa.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

4.7.5. Resumen Ensayos de Laboratorio

A la Fecha no se han realizado en sayos de laboratorio en campo.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

4.7.6. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA No. Póliza 475 47 994000054633 y 475 74 994000009416.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 443.087.965,50	29/07/2022	29/03/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 443.087.965,50	29/07/2022	29/03/2026
Calidad del servicio	\$ 443.087.965,50	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 400.000.000	29/07/2022	29/03/2023

Tabla 39 Garantías Municipio de Santiago

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.7.7. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

El Plan de Calidad fue aprobado por la Interventoría con comunicado GIC-INVIAS-NTS-110-22 del 20 de diciembre de 2022.

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

4.7.8. Seguimiento Programa de Inversiones

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2., soporte al seguimiento de la programación del proyecto.

4.7.9. Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

Comité de Obra No.	Fecha
14	19/05/2023
15	25/05/2023

Tabla 40 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Santiago

4.2. PROYECTO MUNICIPIO DE HERRÁN.

El día 19 de octubre de 2022, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. 146 de 2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL, en este periodo no se realizaron actividades porque el Contrato de Obra se encuentra suspendido desde el pasado 10 de marzo de 2023.

4.2.1. Reporte Informe Semanal.

No se presentaron informes semanales por estar suspendido el contrato de Obra.

4.2.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe el contratista tiene aprobada la maquinaria y equipos del contrato, en la siguiente tabla se relaciona la maquinaria aprobada:

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
MOTONIVELADORA 12 H	CATERPILLAR 2006	-
VOLQUETA VIS -105	HINO 2009	6 m3
VOLQUETA VIS-107	HINO 2009	6 m3
VIBROCOMPACTADOR CS44B	CATERPILLAR 2018	-
RETROEXCAVADORA 416	CATERPILLAR-2022	-

Tabla 41 Reporte de Maquinaria y Equipo Municipio de Herrán

4.2.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe el proyecto se encuentra suspendido.

4.2.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista no ha prestado actas de recibo parcial de obra.

4.2.5. Reporte del Estado General del Tiempo

A la fecha de corte del presente informe el proyecto se encuentra suspendido.

4.2.6. Resumen Ensayos de Laboratorio

A la Fecha no se han realizado actividades de Obra física, por lo tanto, no se han realizado ensayos de laboratorio.

4.2.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A No. Póliza 49-40-101009041 y 49-44-101028950.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 356.399.929,60	27/09/2022	27/06/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 89.099.982,40	27/09/2022	27/12/2025
Calidad del servicio	\$ 356.399.929,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 200.000.000	27/09/2022	30/12/2022

Tabla 42 Garantías Municipio de Herrán

En la Tabla 43, se presenta la actualización a las pólizas del contrato de acuerdo a la Prorroga No. 1, con la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A No. Póliza 49-40-101009041 Anexo 5 y 49-44-101028950 Anexo 5.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 356.399.929,60	19/10/2022	19/11/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 89.099.982,40	19/10/2022	18/05/2026
Calidad del servicio	\$ 356.399.929,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 200.000.000	19/10/2022	21/05/2023

Tabla 43 Actualización Garantías Municipio de Herrán de Acuerdo a la Prorroga No. 1

4.2.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

El Plan de Calidad fue aprobado por la Interventoría con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-111-22 del 20 de diciembre de 2022.

4.2.9. Seguimiento Programa de Inversiones

A la fecha de corte del presente informe el proyecto se encuentra suspendido.

4.2.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra

No se llevaron a cabo comités de Obra.

4.3. PROYECTO MUNICIPIO DE OCAÑA 1758.

El día 01 de noviembre de 2022, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.3879052, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DEL CORREDOR CIAL OCAÑA-LIMITES-MORRISON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER, en este periodo se han realizado actividades de ejecución en la construcción de Placa Huella sector la Samaritana.

4.3.1. Reporte Informe Semanal.

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
27	28/04/2023 al 04/05/2023
28	05/05/2023 al 11/05/2023
29	12/05/2023 al 18/05/2023
30	19/05/2023 al 25/05/2023
31	26/05/2023 al 01/06/2023

Tabla 44 Reporte informes semanales Municipio de Ocaña

4.3.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe el contratista tiene aprobada la maquinaria y equipos con el oficio GIC-INVIAS-NTS-497-22 del 05 de mayo de 2023, a continuación, se relaciona la maquinaria que se encuentra en obra:

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
PAJARITA	CAT 416E	
COMPACTADOR	WACKER RD27	3 TON
CORTADORA DE ASFALTO	-	-
COMPACTADOR	DYNAPAC	7 TON
MOTONIVELADORA	CHAMPION	710 A
TALADRO	-	-
CANGURO	-	-
MEZCLADORA	-	-
VOLQUETA SENCILLA		
VOLQUETA DOBLE TROQUE		
FINISHER		
HYSTER		

Tabla 45 Maquinaria y Equipo - Municipio de Ocaña

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

4.3.2.1. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe el Contratista ha entregado la seguridad social de los siguientes trabajadores que hacen parte de las actividades que se están ejecutando en el proyecto.

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo
1	LUIS JAVIER CARRASCAL	13363842	DIRECTOR DE OBRA
2	YESID CERVANTES PADILLA	18969276	INGENIERO RESIDENTE
3	FABIAN CAMILO FORERO GANDUR	91541702	PROFESIONAL SST
4	AURA CRISTINA TORRES DIAZ	1091673791	AUXILIAR DE INGENIERIA
5	LAURA DANIELA BARAHONA CARRASCAL	1091676848	PROFESIONAL SOCIAL
6	SANTOS MIGUEL GALVIS PIMIENTO	77184825	MAESTRO
7	CARMEN DAVID TARAZONA	88285207	AYUDANTE
8	WILMER JOSE CABRERA	13167792	AYUDANTE
9	JHONATAN GARAY PEREZ	1004858046	AYUDANTE
10	ELIADES URIBE SANJUAN	1091675828	AYUDANTE
11	JESUS ARMANDO BAYONA ROJAS	1091653265	OFICIAL
12	BLAID AYALA AVENDAÑO	1092672613	AYUDANTE
13	CARMEN JESUS DIAZ BARBOSA	5468850	AYUDANTE
14	ALBERTO REYES GUERRERO	5468745	AYUDANTE
15	ELEVITH URIBE SANJUAN	1007961847	AYUDANTE
16	MARCOS FAVIAN SEPULVEDA	1090989906	AYUDANTE
17	ARISTIDES BARBOSA ANGARITA	88276182	AYUDANTE
18	JAIME CARREÑO CARREÑO	88282173	AYUDANTE
19	SAID ALONSO AREVALO	88279758	AYUDANTE
20	ALVARO ANDRES SEPULVEDA BARBOSA	1090478612	AYUDANTE
21	NAID SERNA SERNA	88279438	VIGILANTE
22	DEIMER VACA ARENAS	1067809787	AYUDANTE
23	TEOFILO RAPALINO PONTON	15174219	AYUDANTE
24	ORLANDO RINCON REYES	1007945707	AYUDANTE
25	CARLOS ALBERTO NAVARRO CAÑIZARES	1007912734	AYUDANTE
26	JESUS FABIAN GALLARDO JACOME	13176940	ING AMBIENTAL
27	JOSE GREGORIO CASADIEGO QUINTERO	9715347	AYUDANTE
28	JHONATAN HENAO RAMOS	1002501012	CONDUCTOR DE VOLQUETA
29	LEONARDO BLANCO SANTOS	18903641	CONDUCTOR DE VOLQUETA
30	ENDEL DE JESUS ACÑA DE LA HOZ	1082372512	OPERADOR DE PAJARITA
31	YESENIA PAOLA VERGEL FLOREZ	37336753	TOPOGRAFA
32	URIEL ADOLFO DIAZ FLOREZ	1064838533	CADENERO

Tabla 46 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Ocaña – Mayo -2023

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

4.3.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista ha presentado el acta parcial No. 1 y 2 de obra, correspondiente al pago de las actividades realizadas en el periodo del 01-Nov-2022 al 16-Ene-2023 y del 17-Ene-2023 al 11-03-2023.

En la tabla No. 47, se presenta el valor cobrado y pago a la fecha de corte del presente informe, el cual corresponde al 36.97% del valor total del contrato.

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato
1	OBRA	01-11-22 AL 16-01-2023	\$ 201,440,735	\$ -	\$ 201,440,735	\$ 201,440,735	RP1147-10/08/2022	\$ 1,509,705,885.00	\$ 1,509,705,885.00
2	OBRA	17-01-2023 AL 11-03-2023	\$ 431,212,849	\$ -	\$ 632,653,584	\$ 431,212,849	RP1147-10/08/2023	\$ 1,078,493,036.00	\$ 1,078,493,036.00
TOTALES			\$632,653,584.00	\$0.00	\$ 632,653,584			\$ 1,078,493,036	\$ 1,078,493,036

Tabla 47 Estado Financiero y Presupuestal municipio de Ocaña

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

4.3.4. Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo se han presentado 29 horas de lluvias moderadas durante la ejecución del contrato.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

4.3.5. Resumen Ensayos de Laboratorio

Para el mes de mayo de 2023, el contratista a ejecutado actividades de obra en la construcción de Placa Huella en el sector de la Samaritana, a continuación, se presenta el cuadro de los ensayos realizados por el contratista y la Interventoría.



No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	1/05/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESION	INV E-410-13	LA SAMARITANA	1	>80%	80.91%	SI	RESISTENCIA A LOS 14 DIAS
2	2/05/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESION	INV E-410-13	LA SAMARITANA	1	>100%	101.01%	SI	RESISTENCIA A LOS 28 DIAS
3	5/05/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESION	INV E-410-13	LA SAMARITANA	1	>100%	105.40%	SI	RESISTENCIA A LOS 28 DIAS
4	10/05/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESION	INV E-410-13	LA SAMARITANA	1	>100%	100.27%	SI	RESISTENCIA A LOS 28 DIAS
5	12/05/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESION	INV E-410-13	LA SAMARITANA	1	>70%	77.41%	SI	RESISTENCIA A LOS 07 DIAS
6	15/05/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESION	INV E-410-13	LA SAMARITANA	1	>100%	103.93%	SI	RESISTENCIA A LOS 28 DIAS
7	19/05/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESION	INV E-410-13	LA SAMARITANA	1	>80%	87.93%	SI	RESISTENCIA A LOS 14 DIAS
8	26/05/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESION	INV E-410-13	LA SAMARITANA	1	>70%	71.68%	SI	RESISTENCIA A LOS 07 DIAS
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORIA									
1	5/05/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESION	INV E-410	LA SAMARITANA	1	>70%	98.03%	SI	MUESTRA #3 A LOS 7 DIAS
2	5/05/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESION	INV E-410	LA SAMARITANA	1	>70%	96.58%	SI	MUESTRA #2 A LOS 14 DIAS
3	12/05/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESION	INV E-410	LA SAMARITANA	1	>70%	107.09%	SI	MUESTRA #3 A LOS 14 DIAS
4	19/05/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESION	INV E-410	LA SAMARITANA	1	>70%	103.95%	SI	MUESTRA #2 A LOS 28 DIAS
5	26/05/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESION	INV E-410	LA SAMARITANA	1	>70%	122.86%	SI	MUESTRA #3 A LOS 28 DIAS

Tabla 48 Ensayos de Laboratorio Municipio de Ocaña

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

4.3.6. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL No. Póliza CG-1037616 y No. CG-1008105.

Polizas Contrato			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 171.114.662,00	10/08/2022	10/06/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 89.099.982,40	10/08/2022	10/02/2026
Calidad del servicio	\$ 171.114.662,00	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 200.000.000,00	10/08/2022	10/02/2028
Polizas Inicio Contrato			
Cumplimiento	\$ 171.114.662,00	10/08/2022	10/02/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 89.099.982,40	10/08/2022	10/02/2026
Calidad del servicio	\$ 171.114.662,00	5 años a partir del acta de recibo 10/02/2028	
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 200.000.000,00	10/08/2022	10/02/2023

Tabla 49 Garantías Municipio de Ocaña

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.3.7. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

El Plan de Calidad que aprobado por la interventoría con comunicado GIC-INVIAS-NTS-179-22 del 16 de enero de 2023.

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

4.3.8. Seguimiento Programa de Inversiones

Programación aprobada mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-098-22 del 16 de diciembre de 2022.

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

4.3.9. Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

Comité de Obra No.	Fecha
24	04/05/2023
25	11/05/2023
26	18/05/2023
27	25/05/2023

Tabla 50 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Ocaña

4.4. PROYECTO MUNICIPIO DE CACHIRA.

El día 16 de noviembre de 2022, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. 160-2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, Contrato suspendido desde el 10 de marzo de 2023.

4.4.1. Reporte Informe Semanal.

En el presente periodo no se presentaron informes semanales teniendo en cuenta la suspensión del contrato de Obra desde el 10 de marzo de 2023.

4.4.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe no se tiene maquinaria y equipos en obra. Contrato suspendido.

4.4.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe no se tienen planillas de seguridad social del personal de obra, contrato suspendido.

4.4.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista no ha prestado actas de recibo parcial de obra.

4.4.5. Reporte del Estado General del Tiempo

A la fecha de corte del presente informe el proyecto se encuentra suspendido.

4.4.6. Resumen Ensayos de Laboratorio

A la Fecha no se han realizado actividades de Obra física, por lo tanto, no se han realizado ensayos de laboratorio.

4.4.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL No. Póliza 1000227435 y 100052635.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 531.687.175,40	04/10/2022	04/06/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 132.921.793,85	04/10/2022	04/02/2026
Calidad del servicio	\$ 797.530.763,10	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 200.000.000	16/11/2022	16/03/2023

Tabla 51 Garantías Municipio de Cáchira

4.4.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

El Plan de Calidad fue aprobado por la interventoría con comunicado GIC-INVIAS-NTS-152-22 del 28 de diciembre de 2022.

4.4.9. Seguimiento Programa de Inversiones

Programación aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NST-203-22 del 24 de enero de 2023.

4.4.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra

No se realizaron comités en el presente periodo.

4.5. PROYECTO MUNICIPIO DE ABREGO.

El día 16 de enero de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. 252-2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL, en este periodo se han realizado actividades de Estudios y Diseños e inicio de obra en el corredor 1.

4.5.1. Reporte Informe Semanal.

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
17	05/05/2023 al 11/05/2023
18	12/05/2023 al 18/05/2023
19	19/05/2023 al 25/05/2023
20	26/05/2023 al 01/05/2023

Tabla 52 Reporte informes semanales Municipio de Abrego

4.5.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe el contratista tiene aprobada la maquinaria y equipos con el oficio GIC-INVIAS-NTS-290-22 del 21 de 2023, a continuación, se relaciona la maquinaria que se encuentra en obra:

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
PAJARITA	JOHN DEERE	-
COMPACTADOR	INGERSOLL RAND	7 TON
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	-
VOLQUETA	MACK	18.4 TON

Tabla 53 Maquinaria y Equipo - Municipio de Abrego

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

4.5.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe el Contratista ha entregado la seguridad social de los siguientes trabajadores que hacen parte de las actividades que se están ejecutando en el proyecto.

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo
1	SERGIO ARIAS	1091668650	REPRESENTANTE LEGAL
2	CLAUDIA LILIANA RANGEL	37334004	DIRECTO DE OBRA
3	JUAN SEBASTIAN AROCHA	1091670126	RESIDENTE DE OBRA
4	NALLELYT GUERRERO GARAY	1091673181	TRABAJADORA SOCIAL
5	ANDRES ALONSO MONTAÑA	1091673273	TOPOGRAFO
6	CARLOS MOISES MALDONADO ORTIZ	5408384	AYUDANTE
7	ARBHEY AURELIO BALLESTEROS	1091667473	INGENIERO RESIDENTE
8	JOSE ALEJANDRO ORTIZ LLAIN	1093060053	AYUDANTE
9	JAIDER MALDONADO MORA	1093060213	AYUDANTE
10	WILFREDO TORO MEJIA	13176730	OFICIAL
11	MARIO PEÑARANDA TORRADO	88287629	OFICIAL

12	GABRIEL JOSE HERRERA ZAMORA	6031129	OFICIAL
13	JAVIER ANTONIO MEJIA VERGEL	88.279.832	OPERADOR DE MAQUINARIA
14	JAVIER DAVID NAVARRO ARENIZ	1091660782	OPERADOR DE MAQUINARIA
15	ANIBAL PEREZ SANGUINO	5470312	OPERADOR DE MAQUINARIA

Tabla 54 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Abrego – Mayo -2023

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

4.5.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista no ha prestado actas de recibo parcial de obra.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

4.5.5. Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo se han presentado 49 horas de lluvias moderadas durante la ejecución del contrato.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

4.5.6. Resumen Ensayos de Laboratorio

Para el mes de mayo de 2023, el contratista a ejecutado actividades de obra en la construcción de Placa Huella en el corredor 1, a continuación, se presenta el cuadro de los ensayos realizados por el contratista.

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
1	13/05/2023	DENSIDADES SUB-BASE	INV E-161-13	YEE DE PIE DE CRUZ PR 07+0508	1	> 95%	95.20%	SI	
2	13/05/2023	DENSIDADES SUB-BASE	INV E-161-13	YEE DE PIE DE CRUZ PR 07+0478	1	> 95%	96.10%	SI	
3	13/05/2023	DENSIDADES SUB-BASE	INV E-161-13	YEE DE PIE DE CRUZ PR 07+0448	1	> 95%	95.10%	SI	
4	13/05/2023	DENSIDADES SUB-BASE	INV E-161-13	YEE DE PIE DE CRUZ PR 07+0410	1	> 95%	95.60%	SI	

Tabla 55 Ensayos de Laboratorio Municipio de Abrego

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

4.5.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO No. Póliza 21-44-101400517 y 21-40-101201370.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 431.432.405,40	24/11/2022	24/11/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$ 862.864.810,80	24/11/2022	24/07/2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 862.864.810,80	24/11/2022	24/07/2026
Calidad del servicio	\$ 1.294.297.216,20	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 400.000.000	24/11/2022	24/07/2023

Tabla 56 Garantías Municipio de Abrego

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.5.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

La Interventoría da aprobación al Plan de Calidad con comunicado GIC-INVIAS-NTS-314-22 del 27 de febrero de 2023

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

4.5.9. Seguimiento Programa de Inversiones

Programación aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NST-265-22 del 14 de febrero de 2023.

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

4.5.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

Comité de Obra No.	Fecha
12	04/05/2023
13	18/05/2023
14	25/05/2023

Tabla 57 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Abrego

4.6. PROYECTO MUNICIPIO DE LA PLAYA.

El día 27 de febrero de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra LP-004-2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO NO. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, en este periodo se han realizado actividades de Estudios y Diseños.

4.6.1. Reporte Informe Semanal.

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
10	05/05/2023 al 11/05/2023
11	12/05/2023 al 18/05/2023
12	19/05/2023 al 25/05/2023
13	26/05/2023 al 01/06/2023

Tabla 58 Reporte informes semanales Municipio de Playa

4.6.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe no se tiene maquinaria y equipos en obra.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

4.6.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe no se tienen planillas de seguridad social del personal de obra, ya que no se ha iniciado ejecución física del proyecto.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

4.6.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista no ha prestado actas de recibo parcial de obra.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

4.6.5. Reporte del Estado General del Tiempo

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

4.6.6. Resumen Ensayos de Laboratorio

A la Fecha no se han realizado actividades de Obra física, por lo tanto, no se han realizado ensayos de laboratorio.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

4.6.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora HDI SEGUROS No. Póliza 4001580 y 4007857.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 220.309.139.30	27/02/2023	27/12/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 220.309.139.30	27/02/2023	27/08/2028
Calidad del servicio	\$ 220.309.139.30	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	232.000.000	27/01/2023	27/08/2023

Tabla 59 Garantías Municipio de La Playa

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.6.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

La Interventoría da aprobación al Plan de Calidad con comunicado GIC-INVIAS-NTS-433-22 del 10 de abril de 2023

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

4.6.9. Seguimiento Programa de Inversiones

Programación aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NST-452-22 del 17 de abril de 2023.

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

4.6.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

Comité de Obra No.	Fecha
7	04/05/2023
8	18/05/2023
9	25/05/2023

Tabla 60 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de La Playa

4.7. PROYECTO MUNICIPIO DE PAMPLONITA

El día 14 de ABRIL de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra 202 DE 2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO N° 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, en este periodo se han realizado actividades de Actualización a Estudios y Diseños.

4.7.1. Reporte Informe Semanal.

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
4	05/05/2023 al 11/05/2023
5	12/05/2023 al 18/05/2023
6	19/05/2023 al 25/05/2023
7	26/05/2023 al 01/06/2023

Tabla 61 Reporte informes semanales Municipio de Pamplonita

4.7.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe el contratista no ha presentado la maquinaria y equipos para el proyecto

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

4.7.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe no se tienen planillas de seguridad social del personal de obra, ya que no se ha iniciado ejecución física del proyecto.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

4.7.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista no ha prestado actas de recibo parcial de obra.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

4.7.5. Reporte del Estado General del Tiempo

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

4.7.6. Resumen Ensayos de Laboratorio

A la Fecha no se han realizado actividades de Obra física, por lo tanto, no se han realizado ensayos de laboratorio.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

4.7.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora NACIONAL DE SEGUROS No. Póliza 400047393 y 400047383.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 180.000.000,00	29/03/2023	29/09/2023

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 90.000.000,00	29/03/2023	29/09/2026
Calidad del servicio	\$ 180.000.000,00	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 348.000.000,00	29/03/2023	29/09/2023

Tabla 62 Garantías Municipio de Pamplonita

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.7.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

El contratista no ha presentado Plan de Calidad.

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

4.7.9. Seguimiento Programa de Inversiones

La programación queda aprobada por la Interventoría con comunicado GIC-INVIAS-NTS-578-22 del 26 mayo de 2023.

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

4.7.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

Comité de Obra No.	Fecha
1	11/05/2023
2	19/05/2023
3	25/05/2023

Tabla 63 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Pamplonita

4.8. PROYECTO GOBERNACIÓN 1943

El día 10 de ABRIL de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra 02590 DE 2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS, en este periodo se han realizado actividades de Actualización a Estudios y Diseños.

4.8.1. Reporte Informe Semanal.

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
5	05/05/2023 al 11/05/2023
6	12/05/2023 al 18/05/2023
7	19/0/2023 al 25/05/2023
8	26/05/2023 al 01/06/2023

Tabla 64 Reporte informes semanales Gobernación 1943

4.8.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe la maquinaria presentada por el contratista se encuentra observada con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-476-22 del 28 de Abril de 2023.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

4.8.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe no se tienen planillas de seguridad social del personal de obra, ya que no se ha iniciado ejecución física del proyecto.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

4.8.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista no ha prestado actas de recibo parcial de obra.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

4.8.5. Reporte del Estado General del Tiempo

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

4.8.6. Resumen Ensayos de Laboratorio

A la Fecha no se han realizado actividades de Obra física, por lo tanto, no se han realizado ensayos de laboratorio.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

4.8.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO SA No. Póliza 21-44-101403451 y 21-40-101203708.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	12/04/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	12/12/2026
Calidad del servicio	\$ 1.689.802.732,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 844,901,366.30	10/04/2023	12/12/2023

Tabla 65 Garantías Gobernación 1943

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.8.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

El contratista no ha presentado Plan de Calidad.

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

4.8.9. Seguimiento Programa de Inversiones

Programación de obra aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-566-22 del 23 mayo de 2023.

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

4.8.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

Comité de Obra No.	Fecha
1	27/04/2023
2	04/05/2023
3	11/05/2023
4	25/05/2023

Tabla 66 Actas de Comité u/o Reunión Gobernación 1943

4.9. PROYECTO GOBERNACIÓN 2052

El día 11 de mayo de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra 02332 DEL 2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, en este periodo se han realizado actividades de Actualización a Estudios y Diseños.

4.9.1. Reporte Informe Semanal.

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
1	12/05/2023 al 18/05/2023
2	19/0/2023 al 25/05/2023
3	26/05/2023 al 01/06/2023

Tabla 67 Reporte informes semanales Gobernación 2052

4.9.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe el contratista no ha presentado documentación para la maquinaria del proyecto.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

4.9.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe no se tienen planillas de seguridad social del personal de obra, ya que no se ha iniciado ejecución física del proyecto.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

4.9.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista no ha prestado actas de recibo parcial de obra.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

4.9.5. Reporte del Estado General del Tiempo

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

4.9.6. Resumen Ensayos de Laboratorio

A la Fecha no se han realizado actividades de Obra física, por lo tanto, no se han realizado ensayos de laboratorio.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

4.9.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL No. Póliza CCT-100004561 y CCT-100001101.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 515.902.873,20	28/12/2022	28/12/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 515.902.873,20	28/12/2022	28/06/2026
Calidad del servicio	\$ 515.902.873,20	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 400.000.000,00	28/12/2022	28/06/2023

Tabla 68 Garantías Gobernación 2052

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.9.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

El contratista no ha presentado Plan de Calidad.

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

4.9.9. Seguimiento Programa de Inversiones

El contratista no ha presentado Programación de obra.

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

4.9.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra

No se llevaron a cabo comités de obra en este periodo.

4.10. PROYECTO OCAÑA 1814

El día 02 de mayo de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4352407, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER., en este periodo se han realizado actividades de Actualización a Estudios y Diseños.

4.10.1. Reporte Informe Semanal.

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
1	02/05/2023 al 11/05/2023
2	12/0/2023 al 18/05/2023
3	19/05/2023 al 25/05/2023
4	26/05/2023 al 01/06/2023

Tabla 69 Reporte informes semanales Municipio de Ocaña 1814

4.10.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe el contratista no ha subsanado la documentación para la maquinaria del proyecto observada con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-563-22 del 23 de mayo de 2023 .

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

4.10.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe no se tienen planillas de seguridad social del personal de obra, ya que no se ha iniciado ejecución física del proyecto.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

4.10.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista no ha prestado actas de recibo parcial de obra.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

4.10.5. Reporte del Estado General del Tiempo

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

4.10.6. Resumen Ensayos de Laboratorio

A la Fecha no se han realizado actividades de Obra física, por lo tanto, no se han realizado ensayos de laboratorio.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

4.10.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO SA No. Póliza 21-44-101403960 y 21-40-101204283.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 249.998.913,90	29/12/2022	28/08/2023

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 124.999.456,95	29/12/2022	28/04/2026
Calidad del servicio	\$ 249.998.913,90	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 232.000.000,00	29/12/2022	29/04/2023

Tabla 70 Garantías Municipio de Ocaña 1814

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.10.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

El contratista no ha presentado Plan de Calidad.

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

4.10.9. Seguimiento Programa de Inversiones

El contratista no ha presentado Programación de obra.

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

4.10.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

Comité de Obra No.	Fecha
1	11/05/2023
2	18/05/2023
3	25/05/2023

Tabla 71 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Ocaña 1814

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	1053 de 2022
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.
Contratista:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Representante legal	LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
Fecha de Inicio:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Prorroga:	
Plazo acumulado:	VEINTISIETE (27) MESES
Valor Inicial:	\$ 4.288.164.910,00 M/CTE
Valor Adición:	
Valor Total:	\$ 4.288.164.910,00 M/CTE
Nueva de terminación:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

Tabla 72 Información Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

5.2. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

A continuación, se muestra un resumen detallado de las actividades realizadas por el interventor por cada municipio, correspondiente a este periodo.

5.2.1 Municipio De Santiago - Contrato No. LP-OP-01-2022.

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen

detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-486-22 del pasado 03 de mayo de 2023, la interventoría envía instructivo para la elaboración del Arte de la Valla.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-523-22 del pasado 10 de mayo de 2023, la Interventoría reitera solicitud de cumplimiento reintegro rendimientos financieros convenio interadministrativo no. 1821 de 2021, suscrito entre invias y municipio de Santiago.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-529-22 del pasado 11 de mayo de 2023, la interventoría solicita el cumplimiento de documentos previos al inicio de obra del componente Social para el municipio de Santiago.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-554-22 del pasado 19 de mayo de 2023, la interventoría solicita el cumplimiento de la entrega de los documentos previos al inicio de obra del componente SST para el municipio de Santiago.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-571-22 del pasado 24 de mayo de 2023, la interventoría solicita al contratista la entrega de un Plan de Contingencia para mitigar el atraso presentado en el proyecto.

5.2.1.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** La Interventoría da aprobación a los documentos entregados por el contratista, entre los cuales se encuentran aprobados el Diseño Geométrico, Estudio Geológico y Geotécnico, Diseño de Pavimentos, componente Estructural y el componente Hidráulico, adicionalmente se encuentra aprobado con observaciones el componente topográfico a la espera de la documentación definitiva para dicha aprobación.
- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales
- ✓ Elaboración de las actas de comités.
- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.
- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.
- ✓ Control de personal en obra.
- ✓ Diligenciamiento Bitácora.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría a realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un Inspector de Obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.2. Municipio De Herrán - Contrato No. 146 de 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-488-22 del pasado 03 de mayo de 2023, la interventoría envía instructivo para la elaboración del Arte de la Valla.
- Mediante oficio GIC-INVIASNTS-524-22 del pasado 10 de mayo de 2023, la interventoría reitera solicitud de cumplimiento reintegro rendimientos financieros convenio interadministrativo no. 1861 de 2021, suscrito entre invias y municipio de Herrán.

5.2.2.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** La Interventoría da aprobación a los documentos entregados por el contratista, entre los cuales se encuentran aprobados, Estudio Geológico y Geotécnico, Diseño de Pavimentos, componente Estructural y el componente Hidráulico, adicionalmente se encuentra aprobado con observaciones el componente topográfico y el Diseño Geométrico a la espera de la documentación definitiva para dicha aprobación.
- ✓ El contrato de encuentra suspendido desde el 10 de marzo de 2023.

5.2.3. Municipio De Ocaña - Contrato No. CO1.PCCNTR.3879052

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-483-22, del pasado 03 de mayo de 2023, la interventoría envía instructivo para la elaboración del Arte de la Valla.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-491-22, del pasado 03 de mayo de 2023, la interventoría envía informe de incumplimiento a los requerimientos del componente ambiental del proyecto.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-492-22, del pasado 04 de mayo de 2023, la interventoría solicita al municipio se informe acerca de la contratación de la intervención del segundo tramo de tubería de Gress en el sector de Juan XIII
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-493-22, del pasado 04 de mayo de 2023, la interventoría reitera al municipio la solicitud de cumplimiento reintegro rendimientos financieros convenio interadministrativo no. 1758 de 2021, suscrito entre invias y municipio de Ocaña.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-497-22, del pasado 05 de mayo de 2023, la interventoría da aprobación al Equipo Mínimo del contrato presentando por el contratista.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-501-22, del pasado 05 de mayo de 2023, la interventoría hace observaciones al informe SST presentado por el contratista.



- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-504-22, del pasado 08 de mayo de 2023, la interventoría solicita se mejoren los procedimientos y rendimientos en la ejecución de obra – incumplimiento plan de contingencia.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-516-22, del pasado 10 de mayo de 2023, la interventoría solicita al contratista se informe el seguimiento realizado para el cumplimiento del plan de calidad del proyecto.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-536-22, del pasado 12 de mayo de 2023, la interventoría envía observaciones al Componente De Topografía.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-537-22, del pasado 12 de mayo de 2023, la interventoría reitera al municipio el Oficio Gic-Invias-Nts-492-22 De Fecha 04 De mayo De 2023, Cuyo Asunto Es:” Solicitud Información Intervención Segundo Tramo Tubería De Gress Juan XIII”.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-538-22, del pasado 12 de mayo de 2023, la interventoría aprueba la reprogramación de obra de acuerdo con prorroga no. 1.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-539-22, del pasado 12 de mayo de 2023, la interventoría emite concepto del sobreancho de Placa Huella La Samaritana en el PR 15+664 AL PR15+694.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-544-22, del pasado 16 de mayo de 2023, la interventoría envió comunicado con el incumplimiento en la entrega de la subsanación del informe SST del mes de abril.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-548-22, del pasado 18 de mayo de 2023, la interventoría hace observaciones el informe SST del mes de abril.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-549-22, del pasado 18 de mayo de 2023, la interventoría da aprobación al informe SST del mes de marzo.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-557-22, del pasado 23 de mayo de 2023, la interventoría hace observaciones al componente de topografía entregado por el contratista.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-569-22, del pasado 24 de mayo de 2023, la interventoría solicita al municipio la entrega de la documentación contractual del proyecto.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-587-22, del pasado 26 de mayo de 2023, la interventoría hace recomendaciones a la programación remitida por el municipio

para la ejecución de las actividades de la renovación del alcantarillado de Juan XXIII.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-592-22, del pasado 26 de mayo de 2023, la interventoría da aprobación con observaciones al PAGA presentado por el contratista.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-594-22, del pasado 26 de mayo de 2023, la interventoría solicita al contratista la entrega del documento PAGA definitivo con la parte ambiental y social previamente aprobadas con observaciones para tener el documento definitivo.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-601-22, del pasado 30 de mayo de 2023, la interventoría envía recordatoria de la entrega del informe mensual.

5.2.3.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** El Contratista de obra, ha venido realizando ajuste a los estudios y diseños, por parte de la Interventoría se ha realizado actividades de seguimiento al proceso en campo, en el cual se ha evidenciado que se han realizado trabajos de Topografía y Geotecnia. Durante el periodo del informe el contratista ha realizado entregas de los componentes a estudios y diseños, los cuales una vez revisados por los especialistas de la Interventoría han sido observados a la fecha se encuentra aprobado con observaciones el componente de diseño geométrico.
- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales
- ✓ Elaboración de las actas de comités realizados.
- ✓ Supervisión en campo de las actividades ejecutadas en obra
- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.

- ✓ Control de personal en obra.
- ✓ Bitácora con reportes diarios.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un Inspector de Obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.5. Municipio De Cáchira - Contrato No. 160 de 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-487-22, del pasado 03 de mayo de 2023, la interventoría envía instructivo para elaboración del arte de la valla.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-502-22, del pasado 05 de mayo de 2023, la interventoría envía al municipio recomendación a la prórroga 2 a la suspensión No. 1.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-589-22, del pasado 26 de mayo de 2023, la interventoría hace observaciones al estudio Hidráulico e Hidrológico entregado por el contratista.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-591-22, del pasado 26 de mayo de 2023, la interventoría hace observaciones a la entrega del diseño de Pavimentos.

5.2.5.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** El Contratista de obra, ha venido realizando ajuste a los estudios y diseños, por parte de la Interventoría se ha realizado actividades de seguimiento al proceso en campo, en el cual se ha evidenciado que se han realizado trabajos de Topografía y Geotecnia. Durante el periodo del informe el contratista ha realizado entregas de los componentes de Topografía, Diseño Geométrico, Estudio de Suelos y Diseño de Pavimentos, los cuales se encuentran observados, se está a la espera de la subsanación de los documentos.
- ✓ El contrato de encuentra temporalmente suspendido desde el 10 de Marzo de 2023.

5.2.5. Municipio De Abrego - Contrato No. 252 de 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-479-22, del pasado 03 de mayo de 2023, la interventoría da respuesta al trámite del licenciamiento ambiental temporal posible fuente de materiales - distancias mayores de acarreo.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-481-22, del pasado 03 de mayo de 2023, la interventoría hace observaciones a la Fuente de Materiales.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-484-22, del pasado 11 de mayo de 2023, la interventoría envía instructivo para elaboración del arte de la valla.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-496-22, del pasado 05 de mayo de 2023, la interventoría da respuesta al oficio enviado por el contratista OFC-CADV-GIC-067-2023 de fecha 04 de mayo de 2023 cuyo asunto es: "compromisos pactados en comités de obra (presupuesto ajustado – valla informativa del proyecto)."
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-500-22, del pasado 05 de mayo de 2023, la interventoría da respuesta al contratista con su solicitud de actas mesas de trabajo y actas de comité.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-525-22, del pasado 10 de mayo de 2023, la interventoría reitera al municipio la solicitud de cumplimiento reintegro rendimientos financieros convenio interadministrativo no. 1791 de 2021, suscrito entre invias y municipio de Abrego.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-534-22, del pasado 12 de mayo de 2023, la interventoría solicita al contratista el cumplimiento de documentos Sociales previos al inicio de obra.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-541-22, del pasado 12 de mayo de 2023, la interventoría da respuesta al contratista sobre la entrega del plan de manejo de anticipo y sus soportes.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-553-22, del pasado 19 de mayo de 2023, la interventoría hace observaciones al diseño geométrico del corredor 2 entregado por el contratista.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-555-22, del pasado 23 de mayo de 2023, la interventoría solicita la entrega de documentos SST que se deben entregar al inicio y durante la ejecución del proyecto.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-568-22, del pasado 23 de mayo de 2023, la interventoría hace observaciones al diseño geométrico de los tramos chorro 1 y 2 del corredor 1.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-574-22, del pasado 25 de mayo de 2023, la interventoría da aprobación al diseño estructural del corredor 2.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-583-22, del pasado 26 de mayo de 2023, la interventoría reitera observaciones a la topografía del proyecto.

5.2.5.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** El Contratista de obra, ha venido realizando ajuste a los estudios y diseños, por parte de la Interventoría se ha realizado actividades de seguimiento al proceso en campo, en el cual se ha evidenciado que se han realizado trabajos de Topografía y Geotecnia. Durante el periodo del informe el contratista se ha realizado entregas de los componentes de Topografía del corredor 1 y 2, Diseño Geométrico del corredor 1 y 2, Estudio de

suelos y Diseño de Pavimentos del Corredor 1 y 2, y el Estudio Hidráulico del Corredor 1 y 2.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales
- ✓ Elaboración de las actas de comités.
- ✓ Supervisión en campo de las actividades ejecutadas en obra
- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.
- ✓ Control de personal en obra.
- ✓ Bitácora con reportes diarios.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un Inspector de Obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.6. Municipio De La Playa - Contrato No. MP-LP-004-2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-478-22, del pasado 02 de mayo de 2023, la interventoría hace observaciones al estudio de suelos presentado por el contratista.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-482-22, del pasado 03 de mayo de 2023, la interventoría hace observaciones a la fuente de materiales entregada por el contratista.



- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-489-22, del pasado 03 de mayo de 2023, la Interventoría envía instructivo para el arte de la valla.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-498-22, del pasado 05 de mayo de 2023, la interventoría da aprobación a la fuente de materiales.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-499-22, del pasado 05 de mayo de 2023, la interventoría hace entrega de las grabaciones y actas de comité del proyecto.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-515-22, del pasado 09 de mayo de 2023, la Interventoría hace observaciones a la topografía presentada por el contratista.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-526-22, del pasado 10 de mayo de 2023, la interventoría reitera al municipio la solicitud de cumplimiento reintegro rendimientos financieros convenio interadministrativo no. 1863 de 2021, suscrito entre invias y municipio de la playa de belén.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-535-22, del pasado 12 de mayo de 2023, la interventoría solicita el cumplimiento de documentos sociales previos al inicio de obra.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-547-22, del pasado 18 de mayo de 2023, la Interventoría hace observaciones al diseño estructural presentado por el contratista.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-556-22, del pasado 23 de mayo de 2023, la interventoría hace observaciones al diseño geométrico del corredor 2 presentado por el contratista de obra.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-582-22, del pasado 26 de mayo de 2023, la interventoría solicita los documentos SST que se deben entregar al inicio y durante la ejecución del proyecto.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-593-22, del pasado 26 de mayo de 2023, la interventoría da aprobación a los ensayos de caracterización de materiales pétreos presentados por el contratista.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-597-22, del pasado 29 de mayo de 2023, la interventoría reitera observaciones al estudio topográfico presentado por el contratista.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-600-22, del pasado 29 de mayo de 2023, la interventoría hace observaciones al estudio hidráulico presentado por el contratista.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-602-22, del pasado 30 de mayo de 2023, la interventoría se da aprobación al diseño estructural del proyecto.

5.2.6.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** El Contratista de obra, ha venido realizando ajuste a los estudios y diseños, por parte de la Interventoría se ha realizado actividades de seguimiento al proceso en campo, en el cual se ha evidenciado que se han realizado trabajos de Topografía y Geotecnia. Durante el periodo del informe el contratista se ha realizado entregas de los componentes de Topografía del corredor 1 y 2, Diseño Geométrico del corredor 1 y 2, Estudio de suelos, Diseño de Pavimentos del Corredor 1 y 2 y componente estructural del Corredor 1 y 2.
- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales
- ✓ Elaboración de las actas de comités.

5.2.7. Municipio De Pamplonita - Contrato No. 202 de 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-506-22, del pasado 08 de mayo de 2023, la interventoría solicita al contratista la entrega de los documentos de preconstrucción.



- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-507-22, del pasado 08 de mayo de 2023, la interventoría solicita al municipio el cumplimiento reintegro rendimientos financieros convenio interadministrativo no. 1878 de 2021, suscrito entre invias y municipio de Pamplonita.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-532-22, del pasado 11 de mayo de 2023, la interventoría solicita la presentación de documentos – inicio del contrato de obra – componente social.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-552-22, del pasado 19 de mayo de 2023, la interventoría hace observaciones al estudio de suelos presentado por el contratista.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-570-22, del pasado 24 de mayo de 2023, la interventoría solicita al municipio aclaración de los requisitos del personal mínimo del contrato de obra no. 202 de 2022.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-573-22, del pasado 25 de mayo de 2023, la interventoría hace observaciones a la topografía presentada por el contratista.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-578-22, del pasado 26 de mayo de 2023, la interventoría da aprobación a la programación de obra y flujo de caja.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-579-22, del pasado 26 de mayo de 2023, la interventoría hace observaciones al PMT presentado por el contratista de obra.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-580-22, del pasado 26 de mayo de 2023, la interventoría hace observaciones al SG-SST presentado por el contratista de obra.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-581-22, del pasado 26 de mayo de 2023, la interventoría hace observaciones al Protocolo de Bioseguridad presentado por el contratista de obra.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-590-22, del pasado 26 de mayo de 2023, la interventoría hace observaciones al Diseño de Pavimentos presentado por el contratista de obra.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-598-22, del pasado 29 de mayo de 2023, la interventoría hace observaciones al PAGA presentado por el contratista de obra.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-599-22, del pasado 29 de mayo de 2023, la interventoría hace observaciones a la fuente de Materiales presentado por el contratista de obra.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-605-22, del pasado 31 de mayo de 2023, la interventoría da aprobación al diseño estructural presentado por el contratista de obra.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-606-22, del pasado 31 de mayo de 2023, la interventoría hace observaciones al Plan de Calidad presentado por el contratista de obra.

5.2.7.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** El Contratista de obra, ha venido realizando ajuste a los estudios y diseños, por parte de la Interventoría se ha realizado actividades de seguimiento al proceso en campo, en el cual se ha evidenciado que se han realizado trabajos de Topografía. Por otra parte, el contratista a realizado la entrega de los componentes de Topografía, estudio de suelos y diseño de pavimentos y diseño estructural, quedando pendiente por entregar el diseño geométrico e hidraulico.
- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales
- ✓ Elaboración de las actas de comités.

5.2.8. Gobernación 1943 - Contrato No. 02590 DE 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos

necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen de las Actividades desarrolladas en el periodo.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-480-22, del pasado 03 de mayo de 2023, la interventoría da respuesta al comunicado del contratista donde solicita aclarar el alcance del ítem de estudios y diseños.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-490-22, del pasado 03 de mayo de 2023, la interventoría envía instructivo del arte de la valla.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-495-22, del pasado 05 de mayo de 2023, la interventoría da respuesta a su oficio UTET-02590-007 de fecha abril 24 de 2023 cuyo asunto es: "solicitud cambio actividad de alcantarillas utilizando tubería de plástico tipo PVC diámetro 36".
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-503-22, del pasado 05 de mayo de 2023, la interventoría le informa al contratista cual es la mínima para la elaboración del del PAGA (plan guía a la adaptación ambiental).
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-510-22, del pasado 09 de mayo de 2023, la interventoría envía al municipio solicitud de cumplimiento reintegro rendimientos financieros convenio interadministrativo no. 1943 de 2021, suscrito entre invias y la gobernación de norte de Santander.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-565-22, del pasado 23 de mayo de 2023, la interventoría hace observaciones a la programación de obra.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-566-22, del pasado 23 de mayo de 2023, la interventoría da aprobación a la programación de obra.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-567-22, del pasado 23 de mayo de 2023, la interventoría hace observaciones al diseño geométrico entregado por el contratista.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-577-22, del pasado 26 de mayo de 2023, la interventoría hace una Evaluación respecto a la solicitud del contratista de obra UNION TEMPORAL EDIVIAL TROJA 2590, sobre la solicitud de la actualización de precios presupuesto de obra 2022 a 2023.

5.2.8.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** El Contratista de obra, ha venido realizando ajuste a los estudios y diseños, el contratista a entregado 1 de los 12 corredores correspondiente al del Diseño Geométrico.
- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales
- ✓ Elaboración de las actas de comités.

5.2.9. Gobernación 2052 - Contrato No. 02332 del 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen de las Actividades desarrolladas en el periodo.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-509-22, del pasado 08 de mayo de 2023, la interventoría solicita al municipio el cumplimiento reintegro rendimientos financieros convenio interadministrativo no. 2052 de 2021, suscrito entre invias y la gobernación de norte de Santander.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-513-22, del pasado 09 de mayo de 2023, la interventoría solicita al contratista de obra la Presentación De Documentos – Inicio Del Contrato De Obra
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-575-22, del pasado 25 de mayo de 2023, la interventoría envía comunicado al contratista de obra y al municipio solicitud de cumplimiento de asistencia a los comités de seguimiento al contrato de obra 02332 de 2022.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-576-22, del pasado 25 de mayo de 2023, la interventoría reitera al contratista la presentación de documentos de preconstrucción.

5.2.7.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** El Contratista de obra, ha venido realizando ajuste a los estudios y diseños, por parte de la Interventoría se ha realizado actividades de seguimiento al proceso en campo, en el cual se ha evidenciado que se han realizado trabajos de Topografía.
- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales
- ✓ Elaboración de las actas de comités.

5.2.10. Ocaña 1814 - Contrato No. CO1.PCCNTR.4352407

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen de las Actividades desarrolladas en el periodo.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-485-22, del pasado 03 de mayo de 2023, la interventoría envía instructivo del arte de la valla.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-508-22, del pasado 08 de mayo de 2023, la interventoría solicita al municipio el cumplimiento reintegro rendimientos financieros convenio interadministrativo no. 1814 de 2021, suscrito entre invias y municipio de Ocaña.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-512-22, del pasado 09 de mayo de 2023, la interventoría solicita la presentación de documentos - inicio contrato de obra - Ocaña 1814.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-528-22, del pasado 11 de mayo de 2023, la interventoría reitera la solicita la presentación de documentos - inicio contrato de obra - Ocaña 1814.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-551-22, del pasado 19 de mayo de 2023, la interventoría hace observaciones al diseño estructural presentado por el contratista.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-558-22, del pasado 23 de mayo de 2023, la interventoría da aprobación al Plan de Calidad.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-559-22, del pasado 23 de mayo de 2023, la interventoría da aprobación a las Hojas de Vida.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-560-22, del pasado 23 de mayo de 2023, la interventoría da aprobación al programa de generación de empleo.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-561-22, del pasado 23 de mayo de 2023, la interventoría hace observaciones al certificado de disponibilidad de laboratorio.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-562-22, del pasado 23 de mayo de 2023, la interventoría hace observaciones a la programación de obra y flujo de caja.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-563-22, del pasado 23 de mayo de 2023, la interventoría hace observaciones al equipo mínimo.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-564-22, del pasado 23 de mayo de 2023, la interventoría hace observaciones al PMT.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-588-22, del pasado 26 de mayo de 2023, la interventoría hace observaciones a la Topografía del proyecto.

5.2.7.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** El Contratista de obra, ha venido realizando ajuste a los estudios y diseños, por parte de la Interventoría se ha realizado actividades de seguimiento al proceso en campo, en el cual se ha evidenciado que se han realizado trabajos de Topografía.
- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales
- ✓ Elaboración de las actas de comités.

5.2.9. Instituto Nacional De Vías - INVIAS.

A continuación, se muestra un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor, al Instituto Nacional De Vías - INVIAS.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-514-22, del pasado 09 de mayo de 2023, la interventoría remite Acta de costos he Informe mensual No. 07 de Interventoría correspondientes al periodo de MARZO de 2023.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-517-22, del pasado 10 de mayo de 2023, la interventoría reitera oficio GIC-INVIAS-NTS-238-22 remisión hoja de vida ingeniero residente de Interventoria 3 (Juan David Andrade Vega).
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-518-22, del pasado de 10 de mayo de 2023, la interventoría reitera oficio GIC-INVIAS-NTS-320-22 remisión hoja de vida residente de Interventoria -ing. Jose Torres.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-519-22, del pasado de 10 de mayo de 2023, la interventoría reitera oficio GIC-INVIAS-NTS-392-22 remisión hoja de vida ingeniero auxiliar de Interventoria - Ing Yorman Ortiz.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-520-22, del pasado 10 de mayo de 2023, la interventoría reitera - evaluación de la interventoría al respecto de la solicitud del contratista de obra UNION TEMPORAL PLACAHUELLAS SANTIAGO 2022, contrato lp-op-01-2022 realizada por oficio phs2022 – 052 – 2022 de fecha abril 17 de 2023 cuyo asunto es: “entrega balance n 02”
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-521-22, del pasado 10 de mayo de 2023, la interventoría reitera oficio gic-invias-nts-332-22 entrega plan de inversión del anticipo para el CTO 1053 de 2022.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-527-22, del pasado 11 de mayo de 2023, la interventoría solicita ingreso inspector -Abrego.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-531-22, del pasado 11 de mayo de 2023, la interventoría remite informes semanales de Interventoria del 28 de abril de 2023 al 4 de mayo de 2023.



- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-533-22, del pasado 12 de mayo de 2023, la interventoría hace traslado por competencia respecto a definición ítem “obras de compensación ambiental y/o complementarias” contrato de obra 2590 – contratista de obra UNION TEMPORAL EDIVIAL -TROJA 2590 – Convenio Interadministrativo 1943 Celebrado Con La Gobernación De Norte De Santander
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-540-22, del pasado 12 de mayo de 2023, la interventoría hace remisión devolución rendimientos financieros periodo marzo de 2022 a marzo de 2023 – municipio de la playa de belén – convenio 1863 de 2021.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-543-22, del pasado 16 de mayo de 2023, la interventoría da respuesta a su oficio DT-NSA 27001 de fecha 10-05-2023 cuyo asunto es: “Requerimiento – contrato de interventoría 1053 de 2022”.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-545-22, del pasado 16 de mayo de 2023, la interventoría hace entrega de los informes semanales de interventoría del 05 de mayo de 2023 al 11 de mayo de 2023.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-546-22, del pasado 23 de mayo de 2023, la interventoría entrega la Evaluación de la Interventoría al respecto de la solicitud del contratista de obra UNION TEMPORAL PLACAHUELLAS HERRAN 2022, contrato No. 146 de 2022 realizada por oficio PHE2022 – 044 – 2022 de fecha marzo 22 de 2023 cuyo asunto es: “ALCANCE OFICIO PHE – 042 - 2022”
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-550-22, del pasado 19 de mayo de 2023, la interventoría hace solicitud reingreso inspectora municipio de Santiago.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-584-22, del pasado 26 de mayo de 2023, la interventoría hace entrega de la devolución rendimientos financieros periodo ene - abr 2023 – municipio de Ocaña 1758– convenio 1758 de 2021.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-585-22, del pasado 26 de mayo de 2023, la interventoría hace entrega de la devolución rendimientos financieros periodo marzo de 2022 a abril de 2023 – municipio Ocaña1814 – convenio 1814 de 2021.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-586-22, del pasado 26 de mayo de 2023, la interventoría hace entrega de la devolución rendimientos financieros periodo dic de 2021 a abril de 2023 – municipio Cachira – convenio 1859 de 2021.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-586-22, del pasado 26 de mayo de 2023, la interventoría remite informes semanales de interventoría del 12 de mayo de 2023 al 18 de mayo de 2023.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-603-22, del pasado 31 de mayo de 2023, la interventoría da respuesta al llamado de atención de Herrán.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-604-22, del pasado 31 de mayo de 2023, la interventoría remite informes semanales de interventoría del 19 de mayo de 2023 al 25 de mayo de 2023.

5.2.10. Actividades administrativas

Durante el periodo del presente informe las actividades administrativas realizadas por la Interventoría fueron:

- ✓ Presencia permanente del Personal de la interventoría (director, Especialistas, coordinadora de proyectos, Residentes e Inspectores), realizando labores administrativas y técnicas, atendiendo las solicitudes del contratista, entidad contratante y Municipio.
- ✓ Seguimiento y control de la correspondencia enviada y recibida por el contratista de obra.
- ✓ Elaboración de informes semanales y presentados al INVIAS.
- ✓ Coordinación de reuniones y mesas de trabajo con el Contratista, Especialista e INVIAS.
- ✓ Elaboración de Informes mensuales y Actas de costos.

5.2.11. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la Interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** La Interventoría ha realizado seguimiento a las actividades realizadas en campo en el municipio de Herrán, Ocaña, Cachira, Abrego, La Playa de Belén, Pamplonita, Gobernación 1943 y Gobernación 2052..
- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales
- ✓ Elaboración de las actas de comités.
- ✓ Supervisión a las actividades de obra del municipio de Ocaña en las actividades de Parcheo y Bacheo, en el municipio de Abrego y Santiago en la construcción de Placa Huella y Alcantarillas.
- ✓ Cuantificación de cantidades de las obras que se encuentran en ejecución a la fecha de corte del presente informe.
- ✓ Reporte de bitácora.

5.2.12. Actividades financieras

El contrato de Interventoría a la fecha del presente informe, ha presentado al Invias las cuentas que se describen en la Tabla No. 73.

CONTROL FINANCIERO					
Acta No.	PERIODO	VALOR FACTURA	RADICADO INVIAS	RADICADO INVIAS EN CUENTAS POR PAGAR	No. FACTURA
1	sep-22	\$ -	-	-	-
2	oct-22	\$ 18.224.516,80	126144 DE 21-11-2022	135914 de 13/12/2022	FE402
3	nov-22	\$ 21.768.789,00	133999 del 7/12/2022	138491 de 16/12/2022	FE407
4	dic-22	\$ -	-	30405 de 28/03/2023	-
5	ene-23	\$ 133.892.136,00	25494 del 15/03/2023	30405 de 28/03/2023	FE472
6	feb-23	\$ 143.926.977,60	31127 del 29/03/2023	51262 de 24/05/2023	FE514 (notacredito) FE516 (RADICADA)
7	mar-23	\$ 188.412.604,80	V0 - 46080 del 10/05/2023 V1 - 59596 del 20/06/2023	80426 de 22/08/2023	FE556
8	abr-23	\$ 143.904.748,40	V0 - 59624 del 20/06/2023 V1 - 65006 del 05/07/2023	80425 de 22/08/2023	FE557

Tabla 73 Información Financiera Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

5.2.13. Informes especialistas y profesionales.

A la fecha del presente informe, se ha adelantado revisión a estudios y diseños, así como revisión de documentos de preconstrucción, adjunto a este informe se encuentran los

informes de los especialistas que durante el periodo generaron revisiones a los documentos presentados por los diferentes contratistas de obra.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

La Interventoría a la fecha cuenta con los siguientes vehículos en el proyecto:

Vehículo	Placa	Oficio Aprobación Invias	Dedicación
Renault Duster Dynamique	HWP 247	DT-NSA 75845 -08-12-2022	100%
Renault Duster Dynamique	USK 380	DT-NSA 75845 -08-12-2022	100%
Motocicleta	CBP23E	DT-NSA 8610 - 19-02-2023	100%

Tabla 74 Vehículos Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5.

6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

La Interventoría cuenta con el siguiente personal en el Proyecto:

Profesional	Especialidad	Oficio Aprobación Invias	Dedicación
Diego Efraín Pedraza Chaves	Director de Interventoría	SVR 55685 - 15-09-2022	65%
Adriana Gutiérrez de Piñeros	Residente Interventoría	SVR 55685 - 15-09-2022	100%
Rosana del Pilar Mattos Parra	Residente Interventoría	SVR 55685 - 15-09-2022	100%
Gerson Javier Buitrago Paez	Ingeniero Residente Auxiliar De Interventoría	SVR 15670 - 17-03-2023	100%
Katherine Navarro Carrascal	Profesional Ambiental	SVR 7374 - 13-02-2023	100%
Anuar Jesith Cabarcas Carrascal	Profesional Social	SVR 7374 - 13-02-2023	100%
Diana Roció Suarez Rincón	Profesional en Calidad	SVR 68051 - 03-11-2022	95%
Felipe Stand	Especialista en Estructuras	SVR 74180 - 01-12-2022	37%
Gicela Cordoba	Especialista en Diseño Geométrico	SVR 77764 - 16-12-2022	34%
Javier Millan	Especialista en Geotecnia	SVR 77764 - 16-12-2022	13%
Jairo Zorro	Especialista Hidráulico	SVR 60514 - 04-10-2022	15%
Giancarlo Avena	Especialista Ambiental	SVR 15670 - 17-03-2023	6%
Rubiela Molina Cortes	Inspectora SST	DT-NSA 76487 - 12-12-2022	100%
Fanny Amaya Gómez	Secretaria	DT-NSA 65465 - 24-10-2022	100%
Wilmer Salazar García	Conductor	DT-NSA 75845 -08-12-2022	100%
William Luna Melo	Conductor	DT-NSA 75845 -08-12-2022	100%
Luis Eduardo Estupiñan Gonzalez	Inspector de Intv. Ocaña 1758	DT-NSA 8610 - 19-02-2023	100%

Tabla 75 Personal Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7.

6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

A continuación, se hace un resumen del estado financiero y presupuestal del contrato de Interventoría.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA							
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS
1	sep-22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ 4.288.164.910,00	-
2	oct-22	\$ 15.314.720,00	\$ 2.909.796,80	\$ 18.224.516,80	\$ 21.775.483,20	\$ 4.269.940.393,20	135914 de 13/12/2022
3	nov-22	\$ 18.293.100,00	\$ 3.475.689,00	\$ 21.768.789,00	\$ 6.694,20	\$ 4.248.171.604,20	138491 de 16/12/2022
4	Dic-22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.694,20	\$ 4.248.171.604,20	
5	Ene-23	\$ 5.625,38	\$ 1.068,82	\$ 6.694,20	\$ -	\$ 4.248.164.910,00	
5	Ene-23	\$ 113.108.774,62	\$ 21.490.667,18	\$ 134.599.441,80	\$ 1.635.400.558,20	\$ 4.113.565.468,20	
6	Feb-23	\$ 120.947.040,00	\$ 22.979.937,60	\$ 143.926.977,60	\$ 1.491.473.580,60	\$ 3.969.638.490,60	51262 del 24/05/2023
7	Mar-23	\$ 158.329.920	\$ 30.028.684,80	\$ 188.412.604,80	\$ 1.303.060.975,80	\$ 3.781.225.885,80	
8	Abr-23	\$ 120.928.360,00	\$ 22.976.388,40	\$ 143.904.748,40	\$ 1.159.156.227,40	\$ 3.637.321.137,40	
9	May-23	\$ 106.743.040,00	\$ 20.281.177,60	\$ 127.024.217,60	\$ 1.032.132.009,80	\$ 3.510.296.919,80	
TOTALES		\$ 653.670.580,00	\$ 124.197.410,20	\$ 777.867.990,20	\$ 1.032.132.009,80	\$ 3.510.296.919,80	

Tabla 76 Seguimiento Financiero Interventoría

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9.

6.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de interventoría con la compañía aseguradora SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. No. Póliza 140991.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 428.816.491	24/06/2022	30/06/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$ 857.632.982	24/06/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 857.632.982	24/06/2022	31/12/2027
Calidad del servicio	\$ 1.286.449.473	31/12/2024	31/12/2029

Tabla 77 Garantías Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13.

6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

La Interventoría hace entrega para revisión y aprobación del INVIAS el Plan de Calidad mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-282-22 del pasado 20 de febrero de 2023.

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15.

6.6. Bitácora de Obra

Durante el presente periodo se han adelantado trabajos de obra en el municipio de Ocaña 1758, por lo cual se anexa la Bitácora que se relaciona a continuación:

1. Bitácora mes de mayo de 2023 Municipio de Ocaña 1758.
2. Bitácora mes de mayo de 2023 Municipio de Santiago.
3. Bitácora mes de mayo de 2023 Municipio de Abrego.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Para el presente periodo que representa el mes No. 09 de obra, dentro del contrato se ha logrado dar orden de inicio a 10 de los 11 convenios interadministrativos, correspondientes a los municipios de Santiago, Herrán, Ocaña-1758, Cachira, Abrego, La Playa de Belén, Pamplonita, Ocaña-1814, Gobernación 1943 y Gobernación 2052. Se encuentran adjudicado el convenio Interadministrativo de Gobernación 2033 el cual se encuentran a la espera de la orden de inicio del contrato.

En cuanto a los municipios que se encuentran en ejecución, el Municipio de Santiago firmo acta de inicio el pasado 18 de octubre de 2022, ya se cuenta con aprobación de la actualización de estudios y diseños, quedando pendiente por subsanar el componente de Topografía el cual está aprobado con observaciones; a la fecha de corte del presente informe el contrato de obra presenta un atraso del 93.07% esto se debe al atraso en el inicio de las actividades de la etapa de construcción de Placa Huellas y Alcantarillas del Proyecto. Por otra parte, también se está a la espera de que el INVIAS se manifieste frente a la solicitud del reconocimiento de los acarreo que fue remitida por la Interventoría para estudio del Instituto.

En el municipio de Herrán el Contratista ha manifestado un desequilibrio económico y ha solicitado al Municipio e Interventoría la Suspensión del contrato, por lo cual se da Suspensión al contrato desde el 10 de marzo de 2023, hasta cuando no se dé una solución a la solicitud presentada por el Contratista.

En el municipio de Ocaña se firmó acta de inicio el pasado 01 de noviembre de 2022, a partir de la fecha de inicio del contrato, se debió iniciado las labores correspondientes a la revisión de estudios y diseños en lo que concierne al tramo priorizado por parte del municipio en el que se pretende construir la estructura de placa huella; a la fecha no se ha dado aprobación total a estos documentos ya que por parte de los especialistas de la interventoría los documentos presentan observaciones de forma las cuales no han sido subsanadas en su totalidad para dar una aprobación definitiva de los documentos, teniendo en cuenta que las observaciones son de forma y no de fondo se da orden de inicio a la ejecución del tramo de la Samaritana. A la fecha el contratista ha venido desarrollando ejecución en el tramo la Samaritana.

Por otra parte, en la zona en la que se ha previsto realizar las actividades correspondientes al capítulo: PARCHEO Y/O BACHEO durante el periodo el contratista ha ejecutado las actividades de acuerdo al programa de obra. Está pendiente por ejecutar la zona de Juan XXIII en la cual se está a la espera de la ejecución del mejoramiento del alcantarillado de Gress para continuar con la intervención de la zona.

En el municipio de Cachira el Contratista ha manifestado un desequilibrio económico y ha solicitado al Municipio e Interventoría la Suspensión del contrato, por lo cual se da

Suspensión al contrato desde el 10 de marzo de 2023, hasta cuando no se dé una solución a la solicitud presentada por el Contratista.

En el municipio de Abrego se firmó acta de inicio el pasado 16 de enero de 2023, el contratista se encuentra en proceso de elaboración de los documentos correspondientes a la actualización de estudios y diseños, se da aprobación con observaciones al Corredor 1 y se está a la espera de la entrega del corredor 2; a la fecha de corte del presente informe el contrato de obra presenta un atraso del 48.56%, esto se debe a la falta de aprobación de los estudios y diseños del proyecto en el corredor 2, además el contratista y tendría que haber iniciado la ejecución en la construcción de Placa Huellas y Alcantarillas de los tramos del corredor 1. Teniendo en cuenta que del corredor 1 se da aprobación a los estudios y diseño dejando la salvedad de ajustar algunos pendientes de forma la Interventoría ha dado orden de inicio de obra física mediante su oficio GIC-INVIAS-NTS-423-22 del 31 de marzo de 2023. Durante el mes de Mayo el contratista a realizado actividades de instalación de subbase granular.

En el municipio de la Playa de Belén se firmó acta de inicio el pasado 06 de marzo de 2023, el contratista se encuentra en proceso de elaboración de los documentos correspondientes a la actualización de estudios y diseños; los cuales han sido observados por la Interventoría y se espera sean entregados para poder dar un concepto aprobatorio a los mismos. A la fecha de corte del presente informe el contrato de obra presenta un atraso del 32.20%, esto se debe a la falta de aprobación de los estudios y diseños del proyecto, además el contratista y tendría que tener en ejecución la construcción de Placa Huellas y Alcantarillas de los tramos 1.

En el municipio de Pamplonita se firmó acta de inicio el pasado 14 de abril de 2023, el contratista se encuentra en proceso de elaboración de los documentos correspondientes a la actualización de estudios y diseños. A la fecha de corte del presente informe el contrato de obra presenta un atraso del 1.25%, esto se debe a la falta de aprobación de los estudios y diseños del proyecto, además el contratista y tendría que tener en ejecución la construcción de Placa Huellas y Alcantarillas.

En el contrato de la Gobernación 1943 se firmó acta de inicio el pasado 10 de abril de 2023, el contratista se encuentra en proceso de elaboración de los documentos correspondientes a la actualización de estudios y diseños. A la fecha de corte del presente informe el contrato de obra presenta un atraso del 0.20%, esto se debe a la falta de aprobación de los estudios y diseños del proyecto que a la fecha ya tendrían que estar en un avance del 52%.

En el contrato de la Gobernación 2052 se firmó acta de inicio el pasado 11 de mayo de 2023, el contratista se encuentra en proceso de elaboración de los documentos correspondientes a la actualización de estudios y diseños. El contratista no ha presentado programación de obra por lo cual no se ha podido medir el avance del proyecto.

En el municipio de Ocaña 1814 se firmó acta de inicio el pasado 02 de mayo de 2023, el contratista se encuentra en proceso de elaboración de los documentos correspondientes a la actualización de estudios y diseños. El contratista no ha presentado programación de obra por lo cual no se ha podido medir el avance del proyecto.

En cuanto al contrato del convenio interadministrativo de la Gobernación 2033 se espera dar inicio a su ejecución en el mes de Julio de 2023, toda vez que sea superado el proceso de legalización de contratos de obra y entrega de pólizas a las entidades municipales.

Para la interventoría es importante la entrega de los documentos de estudios y diseños de los municipios que a la fecha se encuentran en ejecución, y recomienda a los contratistas tomar medidas que permitan agilizar las actividades correspondientes a esta etapa, para dar cumplimiento con la fecha de terminación estipulada en los contratos de obra. De igual manera se ha realizado seguimiento a los contratos que se encuentran adjudicados con el fin de que se de su inicio de ejecución en los tiempos establecidos y sin contratiempo.

8. ANEXOS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. N.A

Contratista: N.A

Contrato de Interventoría No. 1053 DE 2022

Interventoría: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

Objeto Contrato de Obra:

INFORME MENSUAL No. 8

MES O PERIODO:

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	
1	INTRODUCCIÓN		
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Items no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	Conclusiones y recomendaciones		
8	Anexos		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. 3036 de fecha 19/08/2022

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA



PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MAYO DE 2023

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

MUNICIPIO DE SANTIAGO
CONTRATO DE OBRA No. LP-OP-01-2022




PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MAYO DE 2023


VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO				CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2																																																																							
					VERSION	1																																																																							
					PÁGINA																																																																								
					FECHA	31/05/2023 (Día / Mes / Año)																																																																							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER PERIODO MES: MAYO																																																																													
CONTRATO DE OBRA No.: LP-OP-01-2022					PLAZO INICIAL:	8 MESES																																																																							
OBJETO: CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.					FECHA DE INICIO:	18/10/2022																																																																							
					FECHA DE SUSPENSIÓN:	15/03/2023																																																																							
					FECHA DE REANUDACIÓN:	31/03/2023																																																																							
					FECHA DE VENCIMIENTO:	2/07/2023																																																																							
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022					PLAZO ACUMULADO:	257.00																																																																							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 INTERVENTOR: GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S					SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE																																																																								
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO					AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																								
<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Otros (Especificar cuales)</td><td>Batea</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Box Culvert</td><td></td><td></td></tr></table>					ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción			Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)	Batea			Box Culvert			<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Otros (Especificar cuales)</td><td>Batea</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Box Culvert</td><td></td><td></td></tr></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción			Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)	Batea			Box Culvert		
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD																																																																										
Pavimentación	Construcción																																																																												
	Mejoramiento																																																																												
	Rehabilitación																																																																												
Estructuras	Túneles																																																																												
	Puentes																																																																												
	Pontones																																																																												
Mantenimiento																																																																													
Otros (Especificar cuales)	Batea																																																																												
	Box Culvert																																																																												
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																																										
Pavimentación	Construcción																																																																												
	Mejoramiento																																																																												
	Rehabilitación																																																																												
Estructuras	Túneles																																																																												
	Puentes																																																																												
	Pontones																																																																												
Mantenimiento																																																																													
Otros (Especificar cuales)	Batea																																																																												
	Box Culvert																																																																												
AVANCE FINANCIERO																																																																													
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																																									
	BÁSICO	IVA	TOTAL		BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																																					
OBRAS	\$ 4.430.879.655,00		\$ 4.430.879.655,00	OBRAS																																																																									
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ 443.087.966,00	84.186.713,54	\$ 527.274.679,54	AJUSTES																																																																									
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			\$ -	OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES																																																																									
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS				JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN																																																																									
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	\$ 443.087.966,00		\$ 443.087.966,00	ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 22.941.862,32																																																																								
MANTENIMIENTO PERIODICO			\$ -	GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)																																																																									
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 5.317.055.587,00	\$ 84.186.713,54	\$ 5.401.242.300,54	GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)																																																																									
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.				GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)																																																																									
				GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)																																																																									
				VALOR EJECUTADO																																																																									
INVERSIÓN EN OBRA				EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																																									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	\$ 22.941.862,32			MANO DE OBRA CALIFICADA:	1																																																																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 1.428.174.882,39			MANO DE OBRA NO CALIFICADA:																																																																									
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	26.44%			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:																																																																									
				TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	1																																																																								

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	
		FECHA	31/05/2023 (Día / Mes / Año)
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
Socializacion del proyecto, escuela de Zul- Alto.	Instalacion de subbase granular, sector de Cuperena hacia Zul-Alto		
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN			
La interventoría ha venido realizando solicitudes y seguimiento a las actividades de estudios, diseños, revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños que aun están pendientes.			
La Interventoria envia oficio a la Alcaldía Municipal sobre un proceso sancionatorio por posible incumplimiento de las obligaciones contractuales.			
<div></div> <div>Firma Nombre: Diego Efraín Pedraza Chaves Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 25202-109359 CND</div>			
<div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</div> <div>Copias: Interventor, Dirección Territorial</div>			

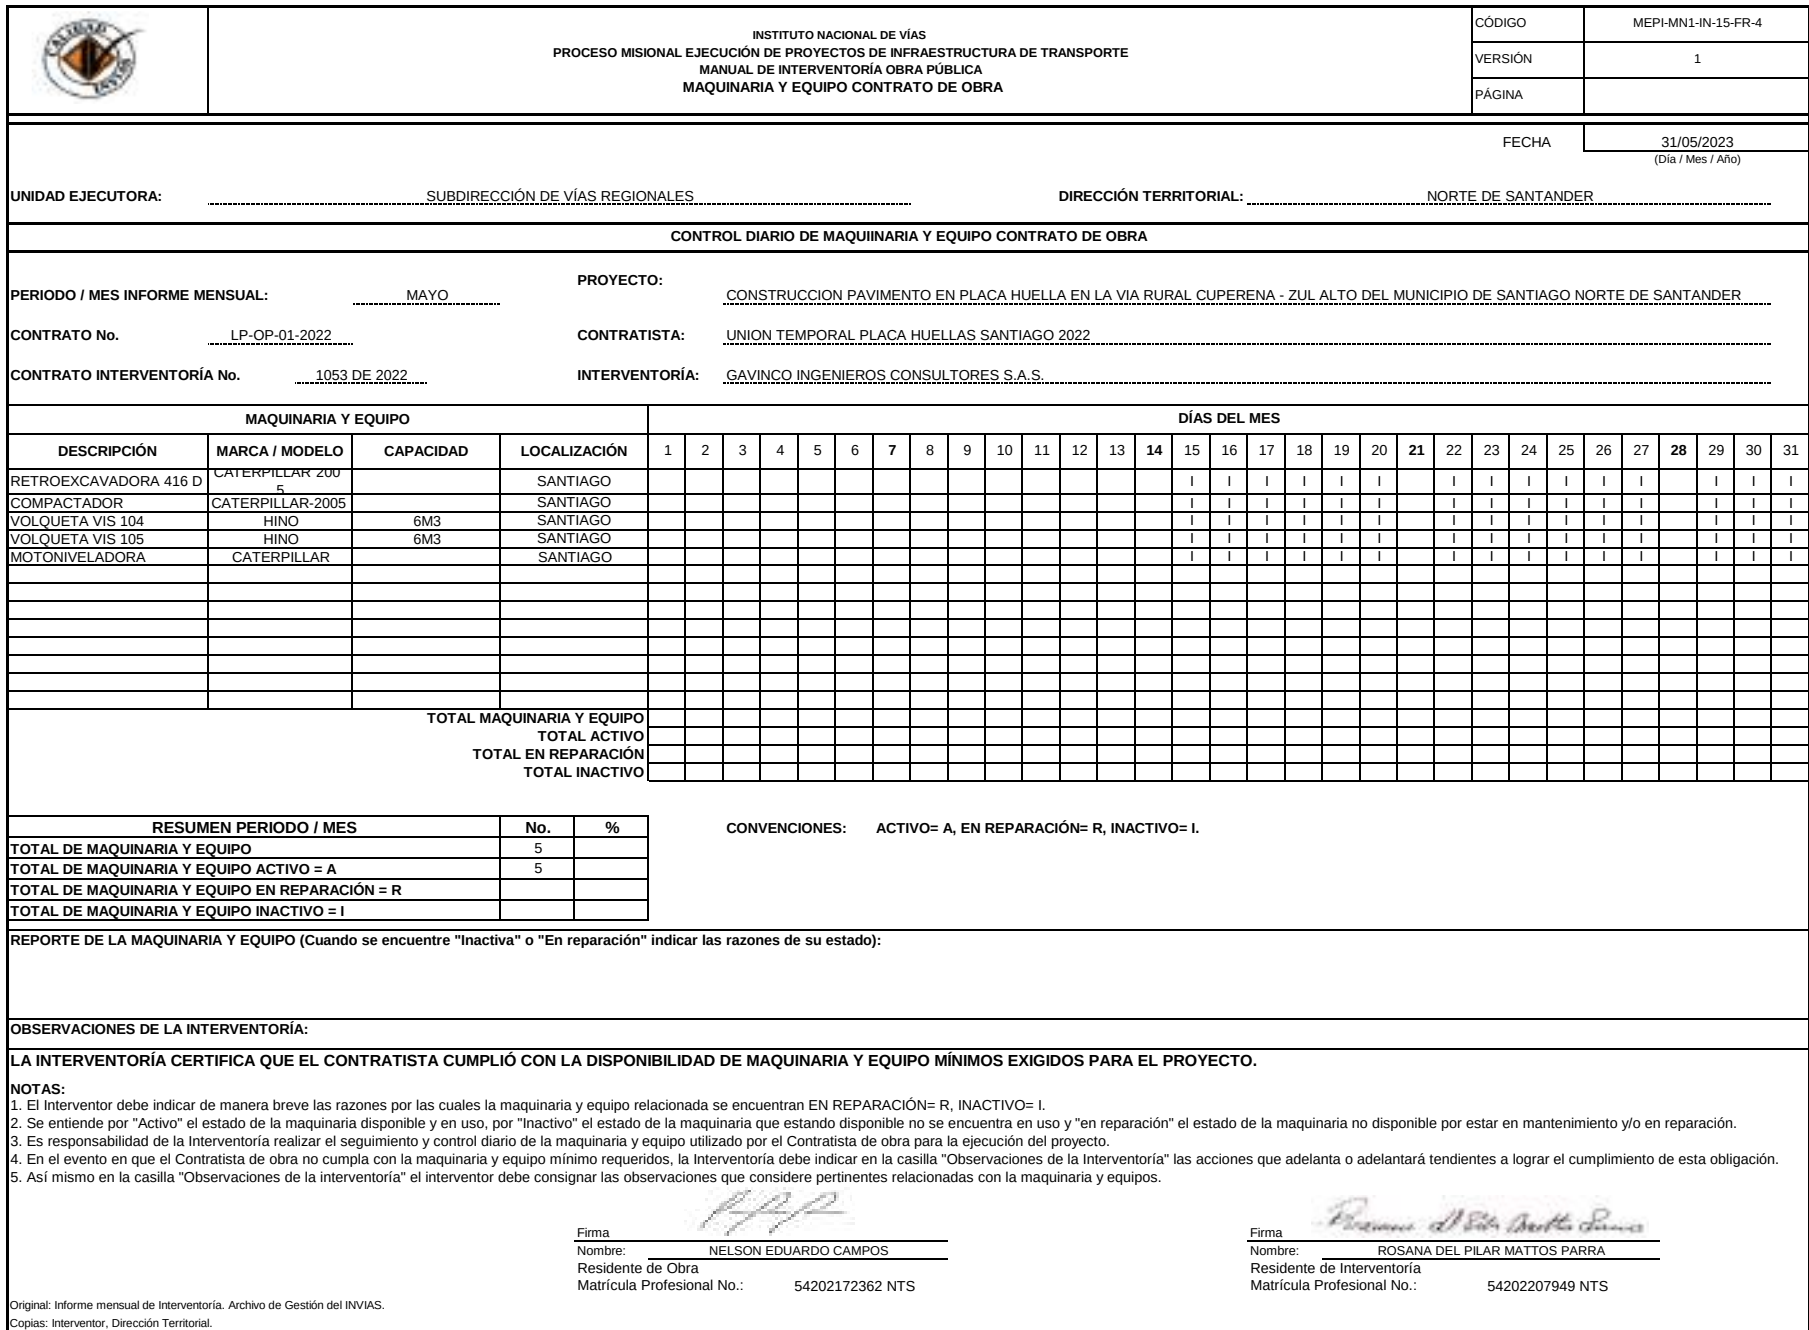



UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL									PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF		
1.	MELISA CARDENAS REMOLINA	1090386915	INGENIERA AUXILIAR	\$1.160.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UNIÓN TEMPORAL PLACAHUELLA SANTIAGO	\$ 1.160.000,00	\$ 80.800,00	V	NUEVA EPS	26694594	\$ 46.400	PROTECCIÓN	26694594	\$ 185.600	\$ 46.400	\$ -	\$ -	ACTIVA EN OBRA					
2.	YORDAN ALEXANDER CACERES RONDON	1.005.058.758	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	\$1.160.000,00											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UNIÓN TEMPORAL PLACAHUELLA SANTIAGO	\$ 1.160.000,00	\$ 45.800,00	V	NUEVA EPS	26694594	\$ 26.300	PORVENIR	26694594	\$ 105.200	\$ 26.300	\$ -	\$ -	ACTIVA EN OBRA					
3.	WILSON ORLANDO RODRIGUEZ	1.005.085.614	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	\$1.160.000,00										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UNIÓN TEMPORAL PLACAHUELLA SANTIAGO	\$ 1.160.000,00	\$ 45.800,00	V	SANTITAS	26694594	\$ 26.300	PROTECCIÓN	26694594	\$ 105.200	\$ 26.300	\$ -	\$ -	ACTIVA EN OBRA					
4.	JESUS RUBIEL AGUILAR MELO	1.093.293.685	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	\$1.160.000,00									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UNIÓN TEMPORAL PLACAHUELLA SANTIAGO	\$ 1.160.000,00	\$ 45.800,00	V	COMFAORIENTE	26694594	\$ 26.300	PROTECCIÓN	26694594	\$ 105.200	\$ 26.300	\$ -	\$ -	ACTIVA EN OBRA					
5.	EULES BLADIMIR PEÑARANDA BARAJAS	1.094.166.681	OPERADOR	\$1.160.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EXPORTE REPRESENTACIONES	\$ 1.160.000,00	\$ 80.800,00	V	COOSALUD	68349934	\$ 46.400	PORVENIR	68349934	\$ 185.600	\$ 46.600	\$ -	\$ -	ACTIVA EN OBRA					
6.	MARLON SAUL REALES	1.090.472.764	OPERADOR	\$1.160.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EXPORTE REPRESENTACIONES	\$ 1.160.000,00	\$ 80.800,00	V	NUEVA EPS	68349934	\$ 46.400	PORVENIR	68349934	\$ 185.600	\$ 46.600	\$ -	\$ -	ACTIVA EN OBRA					
7.	CRISTIAN FERNANDO CELIS	1.092.156.255	OPERADOR	\$1.160.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EXPORTE REPRESENTACIONES	\$ 1.160.000,00	\$ 80.800,00	V	NUEVA EPS	68349934	\$ 46.400	PORVENIR	68349934	\$ 185.600	\$ 46.600	\$ -	\$ -	ACTIVA EN OBRA					
8.	LUIS ENRIQUE JAIMES PEREZ	1.094.859.342	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	\$1.160.000,00																												INCEL													ACTIVA EN OBRA					
9.	MARBEL TATIANA BOHORQUEZ RAMIREZ	1.094.351.277	TOPOGRAFO	\$1.160.000,00																												INCEL													ACTIVA EN OBRA					
10.	ANYI YULIANA URBINA	1.005.035.950	AUXILIAR SST	\$1.160.000,00																						X	X	X	X	X		UNIÓN TEMPORAL PLACAHUELLA SANTIAGO	\$ 1.160.000,00	\$ 13.500,00	V	CONFAORIENTE	68349934	\$ 7.800	PORVENIR	68349934	\$ 31.000	\$ 7.800	\$ -	\$ -	ACTIVA EN OBRA					
11.	NORBERTO JOSE GALVIS PATINO	5.450.083	VIGILANTE	\$1.160.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UNIÓN TEMPORAL PLACAHUELLA SANTIAGO	\$ 1.160.000,00	\$ 80.800,00	V	CONFAORIENTE	68349934	\$ 46.400	SIN AFP	68349934	\$ -	\$ 46.400	\$ -	\$ -	RETIRADO					

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluido mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el contratista no cumpla con la dedicación del personal profesionalmente, el Interventoría debe diligenciar la casilla "Observaciones" en la casilla "Observaciones".
4. En el evento en que el contratista no cumpla con la dedicación del personal profesionalmente, el Interventoría debe diligenciar la casilla "Observaciones" en la casilla "Observaciones".
5. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
6. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
7. El Interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la nomatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
8. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la nomatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
9. El Interventoría debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma: 
Nombre: LUIS EDUARDO BLANCO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202107869 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

		
Firma Nombre: LUIS EDUARDO BLANCO Director de Obra Matricula Profesional No.: 54202107869 NTS		Firma Nombre: Diego Efraim Pedraza Chaves Director de Interventoria Matricula Profesional No.: 25202-109359 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8			
												VERSIÓN	1		
												PÁGINA			
												FECHA	31/05/2023 (Día 7 Mes 7 Año)		
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES												DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER			
CONTRATO DE OBRA No: LP-OP-01-2022												CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022			
MES INFORME MENSUAL: MAYO												PROYECTO: CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022												INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S			
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor	Saldo del Acta Anterior					
2022		CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.			INVIAS Y MUNICIPIO		LP-OP-01-2022		\$ 4.430.879.655						
TOTAL									\$ 4.430.879.655						
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: ..\$.....4.430.879.655.00..															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES			\$0,00	\$0,00	\$ -					\$ -	\$ -				
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.															

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</div> <div>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>MEPI-MN1-IN-15-FR-8</div>
		<div>VERSIÓN</div> <div>1</div>
		<div>PÁGINA</div> <div></div>

FECHA

31/05/2023
(Día 7 Mes 7 Año)

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO			
	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA			
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			\$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			\$ -
AJUSTES			\$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$ -
GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)			
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO			
VALOR TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma



Nombre: LUIS EDUARDO BLANCO

Director de Obra

Matrícula Profesional No.: 54202107869 NTS

Firma



Nombre: Diego Elfrain Pedraza Chaves

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA	31/05/2023 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: LP-OP-01-2022 CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: may-22 PROYECTO: CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	22	21	23	24	22	21	22	21	20	23	24	23	24	24	21	22	21	22	23	22	24	24	24	24	24	23	23	23	24	706
Lluvias moderadas			2	3	1		2	3	2	3	4	1		1			3	2	3	2	1	2						1	1	1		38
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:

Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma


Nombre: NELSON EDUARDO CAMPOS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202172362 NTS

Firma

Nombre: ROSANA DEL PILAR MATTOS PARRA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202207949 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

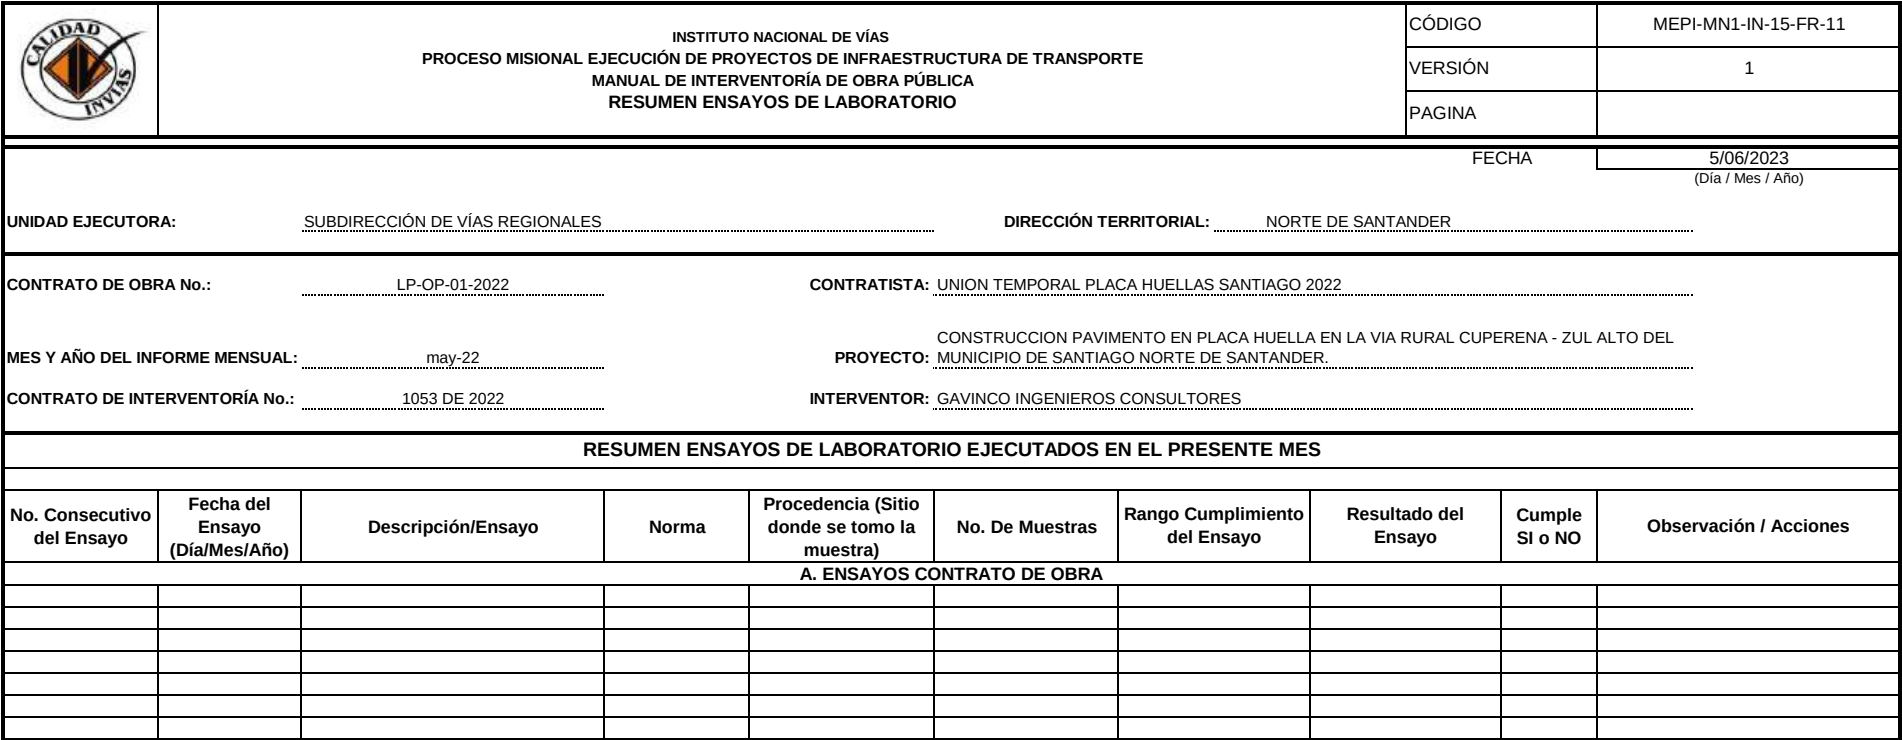

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</p> <p style="text-align: center;">PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</p> <p style="text-align: center;">MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA</p> <p style="text-align: center;">RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO</p>						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA		
								FECHA	5/06/2023 (Día / Mes / Año)
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
OBSERVACIONES:									
NOTAS:									
<p>1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.</p> <p>2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.</p> <p>3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.</p> <p>4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.</p> <p>5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.</p> <p>6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.</p>									
Firma Nombre: LUIS EDUARDO BLANCO Director de Obra Matrícula Profesional No.: 54202107869 NTS					Firma Nombre: Diego Efraín Pedraza Chaves Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

			FECHA	5/06/2023
			(Día) (Mes) (Año)	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
 DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. LP-OP-01-2022
(indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
 CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022

FECHA DE INICIO: 18/10/2022 PLAZO INICIAL: 8 MESES FECHA DE VENCIMIENTO: 2/07/2023
(indicar día, mes y año) (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022
(indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI NO ...X... APROBADO: SI NO VERSIÓN No. FECHA DE VERSIÓN:

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI NO No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:
 PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI NO No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI NO APROBADO: SI NO FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES:
 CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI NO

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
 La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
 La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes:0..... No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:
 No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:
 No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS


No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:0..... No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:0.....
 No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:0..... No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:0.....
 No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:0..... No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:0.....

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14				
		VERSIÓN	1				
		PÁGINA					
		FECHA	5/06/2023 (Día) (Mes) (Año)				
6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)							
Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)					
IG1: Índice de gestión 1 =							
IG2: Índice de gestión 2 =							
IG3: Índice de gestión 3 =							
IG4: Índice de gestión 4 =							
IG5: Índice de gestión 5 =							
IGn: Índice de gestión n =							
Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.							
OBSERVACIONES:							
7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).							
No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
OBSERVACIONES:							
NOTA: Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.							
<div><div> Firma Nombre: LUIS EDUARDO BLANCO Director de la Obra Matrícula Profesional No.: 54202107869 NTS</div><div> Firma Nombre: Diego Efraín Peñarza Chaves Director de la Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND</div><div> Firma Nombre: Profesional en Calidad Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.:</div></div>							
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.							

		PROCESO REGIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES		CÓDIGO: MEPI-MNL-IN-6-FR-1																																														
				VERSIÓN: 1																																														
				PÁGINA:																																														
				FECHA: 31/05/2023 (Día / Mes / Año)																																														
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER		PROGRAMA DE INVERSIONES I																																														
REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)																																																		
CONTRATO No.LP-OP-01.2022....		PLAZO INICIAL:8 MESES..... (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO:257.00..... (En meses según las prórogas sin suspensiones)																																														
OBJETO: CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 19/10/2022. (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 2023/03/23. (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)																																														
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022		FECHA DE SUSPENSIÓN:15/03/2023..... (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACION:31/03/2023..... (Indique día/mes/año)																																														
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: ...1053 DE 2022...		INTERVENIENTE: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$4.430.879.555,00..... (Según contrato original)																																														
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C-A+B): \$4.430.879.555,00.....																																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)</th> <th>VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA</th> <th>(%) OBRA PROGRAMADA</th> <th>(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA</th> <th>% Programado</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th></th> </tr> <tr> <th>\$ Valor programado</th> <th></th> <th></th> <th>\$ Valor Ejecutado</th> <th>Indicar mes y año</th> <th>Indicar mes y año</th> <th>Indicar mes y año</th> <th>Indicar mes y año</th> <th>Indicar mes y año</th> <th>Indicar mes y año</th> <th>Indicar mes y año</th> <th>Indicar mes y año</th> <th>Indicar mes y año</th> <th>Indicar mes y año N...</th> <th>%</th> </tr> <tr> <th>Miles de pesos</th> <th></th> <th></th> <th>Miles de pesos</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <!-- Data rows would follow here --> </tbody> </table>					GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		\$ Valor programado			\$ Valor Ejecutado	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...	%	Miles de pesos			Miles de pesos											
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																			
	\$ Valor programado			\$ Valor Ejecutado		Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...	%																																		
	Miles de pesos			Miles de pesos																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th>VALOR BÁSICO DE OBRA (A)</th> <th>VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <!-- Summary rows --> </tbody> </table>					VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																																												
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																																																	
<p>* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluir IVA, debe sumar el valor total del contrato.</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES</th> <th>%</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <!-- More summary rows --> </tbody> </table>					INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%																																												
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%																																																	
<p>NOTAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 80. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A'). El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra. <p>OBSERVACIONES:</p> <hr/>																																																		
<table style="width:100%; font-size: x-small;"> <tr> <td style="vertical-align: top; width: 33%;"> Aprobó Firma: _____ Nombre: JHON FREDDY QUINTERO LEON Representante legal o apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: _____ </td> <td style="vertical-align: top; width: 33%;"> Aprobó Firma: _____ Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor Representante legal o apoderado del Interventor Matrícula Profesional No.: _____ </td> <td style="vertical-align: top; width: 33%;"> Revisó Firma: _____ Nombre: N/A Titular Gerencia: N/A Matrícula Profesional No.: N/A </td> </tr> <tr> <td> Revisó Firma: _____ Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS </td> <td> Revisó Firma: _____ Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE Director Territorial Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS </td> <td> Revisó Firma: _____ Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO Gestor Técnico de Proyecto Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS </td> </tr> </table>					Aprobó Firma: _____ Nombre: JHON FREDDY QUINTERO LEON Representante legal o apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: _____	Aprobó Firma: _____ Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor Representante legal o apoderado del Interventor Matrícula Profesional No.: _____	Revisó Firma: _____ Nombre: N/A Titular Gerencia: N/A Matrícula Profesional No.: N/A	Revisó Firma: _____ Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS	Revisó Firma: _____ Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE Director Territorial Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS	Revisó Firma: _____ Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO Gestor Técnico de Proyecto Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS																																								
Aprobó Firma: _____ Nombre: JHON FREDDY QUINTERO LEON Representante legal o apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: _____	Aprobó Firma: _____ Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor Representante legal o apoderado del Interventor Matrícula Profesional No.: _____	Revisó Firma: _____ Nombre: N/A Titular Gerencia: N/A Matrícula Profesional No.: N/A																																																
Revisó Firma: _____ Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS	Revisó Firma: _____ Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE Director Territorial Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS	Revisó Firma: _____ Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO Gestor Técnico de Proyecto Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS																																																

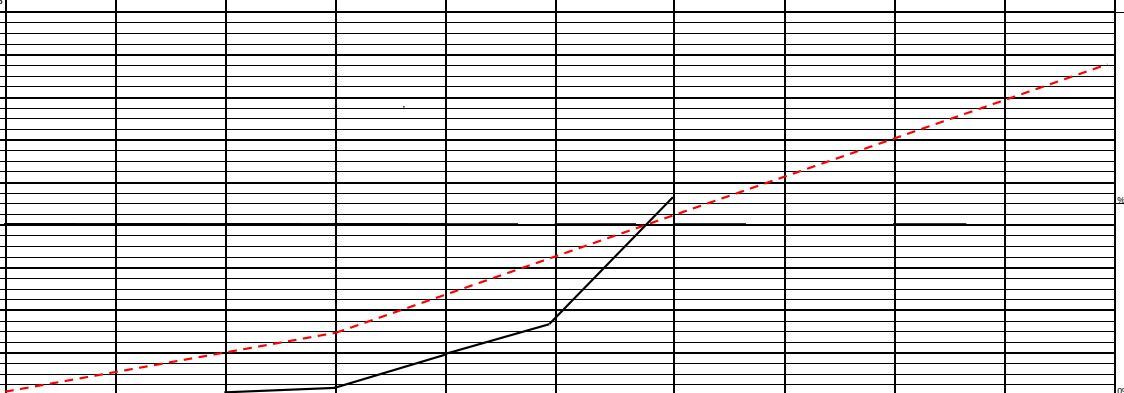	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES												CÓDIGO MEPI-MN1-INV-6-FR-2																																																																		
													VERSIÓN 1																																																																		
													PÁGINA 																																																																		
													FECHA 31/05/2023 (Día / Mes / Año)																																																																		
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. DE VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$.																																																																															
SEGUIMIENTO No. (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)																																																																															
CONTRATO No: 12-CP-2022...													PLAZO INICIAL: 15/05/2022 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 207.000 (En meses según los primeros sin suspensiones)																																																																		
OBJETO: CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.													FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 18/09/2022 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 20/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)																																																																		
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022.													FECHA DE SUSPENSIÓN: 16/08/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 31/03/2024 (Indique día/mes/año)																																																																		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1063 DE 2022. INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.													VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 4.430.878.655.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 4.430.878.655.00																																																																		
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	% Programado \$ Valor Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Ejecutado \$ Valor Ejecutado	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...																																																																	
GPP1				% P \$ P % E \$ E																																																																											
GPP2				% P \$ P % E \$ E																																																																											
GPP3				% P \$ P % E \$ E																																																																											
GPP4				% P \$ P % E \$ E																																																																											
GPP5				% P \$ P % E \$ E																																																																											
GPP6				% P \$ P % E \$ E																																																																											
GPP7				% P \$ P % E \$ E																																																																											
GPP8				% P \$ P % E \$ E																																																																											
TOTAL OTROS ITEMS				% P \$ P % E \$ E																																																																											
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)																0%																																																															
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																																																																															
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: 1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. 2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. 3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". 4. El Porcentaje de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). 5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.																																																																															
<table><tr><th colspan="3">CONVENCIONES</th></tr><tr><th>TIPO DE DEBILLO</th><th>PROGRAMADO</th><th>EJECUTADO</th></tr><tr><td>BARRAS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CURVAS</td><td></td><td></td></tr></table>																CONVENCIONES			TIPO DE DEBILLO	PROGRAMADO	EJECUTADO	BARRAS			CURVAS																																																						
CONVENCIONES																																																																															
TIPO DE DEBILLO	PROGRAMADO	EJECUTADO																																																																													
BARRAS																																																																															
CURVAS																																																																															
<table><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA</td><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA</td><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%															INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)															INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%															INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)														
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%																																																																														
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)																																																																														
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																																																																														
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)																																																																														
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.																																																																															
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	\$ -	\$ -	%																																																																												
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADOS (B')	\$ -	\$ -	%																																																																												
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ -																																																																														
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	\$ -																																																																														
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																																																																															

MUNICIPIO DE OCAÑA
CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.3879052



PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MAYO DE 2023

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO				CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2																																																																																													
					VERSION	1																																																																																													
					PÁGINA																																																																																														
					FECHA	31/05/2023 (Día / Mes / Año)																																																																																													
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER PERIODO MES: MAYO DE 2023																																																																																																			
CONTRATO DE OBRA No.: CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022					PLAZO INICIAL:	6 MESES																																																																																													
OBJETO: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.					FECHA DE INICIO:	1/11/2022																																																																																													
					FECHA DE SUSPENSIÓN:																																																																																														
					VALOR INICIAL (incluido IVA) :	\$ 1.711.146.620,00																																																																																													
					VALOR ADICIONALES (incluido IVA):																																																																																														
					FECHA DE VENCIMIENTO:	30/06/2023																																																																																													
CONTRATISTA: CONSORCIO OK 2022					ANTICIPO CONCEDIDO:																																																																																														
					ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ -																																																																																													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 DE 2022 INTERVENTOR: GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE																																																																																																			
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																																															
<table><thead><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td>ml</td><td>692</td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Mantenimiento</td><td>Parqueo</td><td>m3</td><td>730</td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Batea</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Alcantarillas</td><td>und</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>Box Culvert</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción			Mejoramiento			Rehabilitación	ml	692	Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento	Parqueo	m3	730	Otros (Especificar cuales)				Batea				Alcantarillas	und	4		Box Culvert			<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td>ML</td><td>70</td><td>70</td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Mantenimiento</td><td>Parqueo</td><td>m3</td><td>164</td><td>327</td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Batea</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Alcantarilla</td><td>und</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>Box Culvert</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción			Mejoramiento			Rehabilitación	ML	70	70	Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento	Parqueo	m3	164	327	Otros (Especificar cuales)					Batea					Alcantarilla	und	1	1		Box Culvert			
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD																																																																																																
Pavimentación	Construcción																																																																																																		
	Mejoramiento																																																																																																		
	Rehabilitación	ml	692																																																																																																
Estructuras	Túneles																																																																																																		
	Puentes																																																																																																		
	Pontones																																																																																																		
Mantenimiento	Parqueo	m3	730																																																																																																
	Otros (Especificar cuales)																																																																																																		
	Batea																																																																																																		
	Alcantarillas	und	4																																																																																																
	Box Culvert																																																																																																		
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																
Pavimentación	Construcción																																																																																																		
	Mejoramiento																																																																																																		
	Rehabilitación	ML	70	70																																																																																															
Estructuras	Túneles																																																																																																		
	Puentes																																																																																																		
	Pontones																																																																																																		
Mantenimiento	Parqueo	m3	164	327																																																																																															
	Otros (Especificar cuales)																																																																																																		
	Batea																																																																																																		
	Alcantarilla	und	1	1																																																																																															
	Box Culvert																																																																																																		
AVANCE FINANCIERO																																																																																																			
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																																																															
	BÁSICO	IVA	TOTAL		BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																																																											
OBRAS	\$ 1.688.290.377,96		\$ 1.688.290.377,96	OBRAS	\$ 232.610.343,31		\$ 232.610.343,31	\$ 465.220.686,62																																																																																											
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ 10.436.640,00		\$ 10.436.640,00	AJUSTES																																																																																															
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			\$ -	OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES																																																																																															
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 10.436.640,00	1.982.961,60	\$ 12.419.601,60	JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN																																																																																															
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 10.436.640,00	1.982.961,60	\$ 12.419.601,60	ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 208.732,80	\$ 39.659,23	\$ 248.392,03	\$ 248.392,03																																																																																											
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			\$ -	GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)																																																																																															
MANTENIMIENTO PERIODICO			\$ -	GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)																																																																																															
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 1.982.961,60	\$ 1.711.146.619,56	GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)																																																																																															
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.				GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)																																																																																															
				VALOR EJECUTADO				\$ 465.469.078,65																																																																																											
INVERSIÓN EN OBRA				EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																																																															
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	\$ 1.432.271.866,60			MANO DE OBRA CALIFICADA:	8																																																																																														
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 593.789.469,28			MANO DE OBRA NO CALIFICADA:																																																																																															
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	41,46%			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2																																																																																														
				TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10																																																																																														

REGISTRO FOTOGRÁFICO



UBICACIÓN: LA SAMARITANA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLA Y VIGA RIOSTRA



UBICACIÓN: LA SAMARITANA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CONTRA HUELLA CENTRAL Y LATERAL

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

La interventoría ha venido realizando solicitudes y seguimiento a las actividades de estudios, diseños, revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños que aun están pendientes.


Firma
Nombre: Diego Efraín Pedraza Chaves
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-109359 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

	FECHA	31/05/2023 <small>(Día / Mes / Año)</small>
--	-------	--

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER
---	---

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA		
PERIODO / MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2023	PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.	
CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022	CONTRATISTA: CONSORCIO OK 2022	
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022	INTERVENTORÍA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
PAJARITA	CAT 416E		LASAMARITANA Y JUAN XXIII	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	I	A	A	A	I	I	I	I	I	I	A	A	A	I	A	A	A	
VIBRADOR DE CONCRETO			LA SAMARITANA	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I
VOLQUETA SENCILLA			LA SAMARITANA Y JUAN XXIII	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
VOLQUETA DOBLE TROQUE CANGURO			LA SAMARITANA Y JUAN XXIII	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I
MEZCLADORA #1			LA SAMARITANA	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I
MEZCLADORA #2			LA SAMARITANA	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
TOTAL ACTIVO				0	6	6	6	6	6	0	6	6	7	7	7	7	0	7	7	7	6	6	6	0	6	6	6	7	7	7	0	7	7	4
TOTAL EN REPARACIÓN				7	1	1	1	1	1	7	1	1	0	0	0	0	7	0	0	0	1	1	1	7	1	1	1	0	0	0	7	0	0	4
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%	CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7	100%	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	6	86%	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	2	29%	

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
 1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
 2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
 3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
 4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
 5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma:  Nombre: YESID CERVANTES PADILLA Residente de Obra Matrícula Profesional No.:	Firma:  Nombre: ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES ANGARITA Residente de Interventoría Matrícula Profesional No.: 54202194523 NTS
---	---

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor, Dirección Territorial.

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PERSONAL, CONTROL, APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA															CÓDIGO MEP-MN1-IN-15-FR-6			
																	VERSIÓN 1			
																	PÁGINA			
																	FECHA 31/05/2023 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES										DIRECCIÓN TERRITORIAL:							NORTE DE SANTANDER	
CONTRATO DE OBRA No:		COLPCCNTR.3879052 DE 2022										CONTRATISTA:							CONSORCIO OK 2022	
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:		MAYO DE 2023										PROYECTO:							MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRISON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:		10591 DE 2022										INTERVENTOR:							GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	
NOMBRE ARL:		SEGUROS BOLIVAR-ARL SURA										NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:							CONFANORTE	
												</								





INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 31/05/2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: OC1.PCCNTR.3879052 CONTRATISTA: CONSORCIO OK 2022
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2023 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	22	24	24	21	22	23	23	22	24	24	23	24	19	20	24	24	19	24	21	24	715
Lluvias moderadas												2			3	2	1	1	2			1		5	4			5		3		29
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:

Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre: YESID CERVANTES PADILLA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202194523 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA		31	5	2023
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	NORTE DE SANTANDER	
-------------------	---------------------------------	------------------------	--------------------	--

CONTRATO DE OBRA No.	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022	CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022	
----------------------	----------------------------	--------------	-------------------	--

OBJETO DEL CONTRATO:				
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER				

FECHA DE INICIO:	1/11/2022			
PLAZO INICIAL:	6 MESES			
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	30/06/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)			
VALOR INICIAL:	\$	1.711.146.620,00		
VALOR ACUMULADO:	\$	1.711.146.620,00 (Incluye adiciones)		
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$	12.419.602,00		
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$	12.419.602,00		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1053 DE 2022,	INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	
-------------------------------	---------------	--------------	---------------------------------------	--

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL					
---	--	--	--	--	--

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Cumplimiento		\$ 171.114.662,00	Desde			Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			10	8	2022	10	6	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		\$ 85.557.331,00	10	8	2022	10	2	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ 171.114.662,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	CG-1037616
Certificado de modificación o anexo No.:	1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)	
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	11/10/2022

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL					
---	--	--	--	--	--

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 200.000.000,00	Desde			Hasta		
Otros			10	8	22	10	2	23

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	CG-1008105	OTRAS PÓLIZAS No.	
Certificado de modificación o anexo No.:	1		
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)			
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS MUNDIAL		
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:	12/10/2022		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:**

MODIFICACIÓN No.: **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y/o Calidad de Obra		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:**

MODIFICACIÓN No.: **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:**NOTAS:**

- El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
- El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma

Nombre: Diego Efraín Pedraza Chaves

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO			
	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	\$ 1,688,290,377.96		\$ 1,688,290,377.96
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 10,436,640.00		\$ 10,436,640.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			\$ -
AJUSTES			\$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 10,436,640.00	\$ 1,982,961.60	\$ 12,419,601.60
GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)			
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO			
VALOR TOTAL	\$ 1,709,163,657.96	\$ 1,982,961.60	\$ 1,711,146,619.56

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.


Firma
Nombre: LUIS JAVIER CARRASCAL
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 2520234541CND


Firma
Nombre: Diego Efraim Pedraza Chaves
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA		

FECHA							31/05/2023 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES							DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO DE OBRA No.: CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022							CONTRATISTA: CONSORCIO OK 2022		
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2023							MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN PROYECTO: EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022							INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	1/05/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESION	INV E-410-13	LA SAMARITANA	1	>80%	80.91%	SI	RESISTENCIA A LOS 14 DIAS
2	2/05/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESION	INV E-410-13	LA SAMARITANA	1	>100%	101.01%	SI	RESISTENCIA A LOS 28 DIAS
3	5/05/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESION	INV E-410-13	LA SAMARITANA	1	>100%	105.40%	SI	RESISTENCIA A LOS 28 DIAS
4	10/05/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESION	INV E-410-13	LA SAMARITANA	1	>100%	100.27%	SI	RESISTENCIA A LOS 28 DIAS
5	12/05/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESION	INV E-410-13	LA SAMARITANA	1	>70%	77.41%	SI	RESISTENCIA A LOS 07 DIAS
6	15/05/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESION	INV E-410-13	LA SAMARITANA	1	>100%	103.93%	SI	RESISTENCIA A LOS 28 DIAS
7	19/05/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESION	INV E-410-13	LA SAMARITANA	1	>80%	87.93%	SI	RESISTENCIA A LOS 14 DIAS
8	26/05/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESION	INV E-410-13	LA SAMARITANA	1	>70%	71.68%	SI	RESISTENCIA A LOS 07 DIAS
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	5/05/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESION	INV E-410	LA SAMARITANA	1	>70%	98.03%	SI	MUESTRA #3 A LOS 7 DIAS
2	5/05/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESION	INV E-410	LA SAMARITANA	1	>70%	96.58%	SI	MUESTRA #2 A LOS 14 DIAS
3	12/05/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESION	INV E-410	LA SAMARITANA	1	>70%	107.09%	SI	MUESTRA #3 A LOS 14 DIAS
4	19/05/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESION	INV E-410	LA SAMARITANA	1	>70%	103.95%	SI	MUESTRA #2 A LOS 28 DIAS
5	26/05/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESION	INV E-410	LA SAMARITANA	1	>70%	122.86%	SI	MUESTRA #3 A LOS 28 DIAS

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.

2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.

3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.

4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.

6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: LUIS JAVIER CARRASCAL QUIN

Director de Obra

Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: Diego Erraín Pedraza Chaves

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.



ENSAYOS DE LABORATORIO

Código: FR-LAB-24

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO

Versión: 03

NORMA INV E-410-13

Fecha: Diciembre 10 de 2022

Objeto: MEOSAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCCA, LÍMITES MORINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA CALAMBA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCCA, NORTE DE SANTANDER.

Localización: LA SAMARITANA

Fecha:

5/05/2023

Estructura: PLACA HUELLAS

Diseño (PSI):


3000

Solicitante: CONSORCIO DE 2022

Agregados del Monte:

Triturado 3/4", Arena de grano medio y Arena de vitrificación

Prueba	1	2	3	4	5	6
Descripción de la muestra	PLACA HUELLAS	PLACA HUELLAS	PLACA HUELLAS			
Dosificación	1:3:2	1:3:2	1:3:2			
Fecha Toma	4/04/2023	4/04/2023	4/04/2023			
Fecha Rotura	11/04/2023	18/04/2023	2/05/2023			
Diámetro (mm)	101.00	101.00	101.00			
Altura (mm)	202.00	201.00	202.00			
Peso (Kg)	3.754	3.761	3.781			
Área (mm ²)	8011.85	8011.85	8011.85			
Volumen (mm ³)	1618393.03	1610361.18	1618393.03			
Densidad (Kg/m ³)	2319.58	2335.47	2336.27			
Carga (KN)	185.91	213.91	259.82			
Edad (días)	7	14	28			
Resistencia Real (MPa)	14.95	17.20	20.89			
Resistencia Real (lb/pulg ²) PSI	2168.25	2494.79	3030.24			
Resistencia Real (Kg/cm ²)	152.44	175.40	213.04			
Resistencia Promedio Real (PSI)						
Porcentaje resistencia a la compresión	72.27%	83.16%	101.01%			
Tipo de falla	TIPO 2	TIPO 3	TIPO 2			

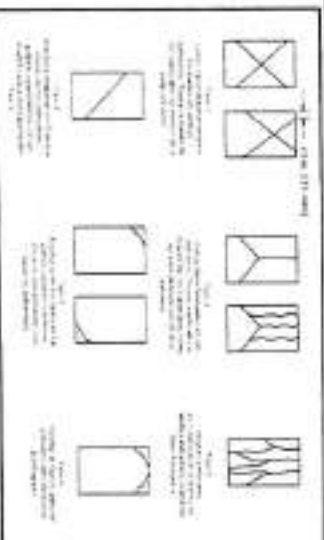

Resistencia a la compresión requerida	Resistencia requerida
7 días	> 70%
14 días	> 80%
28 días	> 100%

Ing. Víctor Manuel Pizarro Durán
M.P. 54280 251779 NTS
Especialista en Geotecnia Ambiental



LABORATORIO DE MATERIALES

SEDE PRINCIPAL OCCA N.º 5 Calle 20C N.º 146-02 Urb. Villas del Bosque - SEDE AGUACHICA CESAR Calle 118 N.º 104-64 Barrio Villa Country

CEL: 3146684953





ENSAYOS DE LABORATORIO

Código: PR-LAB-24

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO

Versión: 01

NORMA INV E-410-13

Fecha: Diciembre 10 de 2022

Objeto: MEDIDAMIENTO DEL CONCRETO VIAL OCANA LIMITES MORFOLÓGICOS PARA MEDIR DEL PROGRAMA COLCHERA BURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCANA NORTE DE SANTANDER.

Localización: LA SAMARITANA

Estructura: PLACA HUELLAS

Solicitante: CONSORCIO CM 2022

Fuente: Descripción:

Agregador del Norte.

Fecha:

Diseño (PSI):

3000

Prueba

1

2

3

4

5

6

Descripción de la muestra

Densificación

Fecha Toma

Fecha Rotura

Diámetro (mm)

Altura (mm)

Peso (Kg)

Área (mm²)Volumen (mm³)Densidad (Kg/m³)

Carga (KN)

Edad (días)

Resistencia Real (MPa)

Resistencia Real (lb/pulg²) PSIResistencia Real (Kg/cm²)

Resistencia Promedio Real (PSI)

Porcentaje resistencia a la compresión

Tipo de Falla

TIPO 4

TIPO 5

TIPO 3

TIPO 4

TIPO 5

TIPO 3

TIPO 4

TIPO 5

TIPO 3

TIPO 4

TIPO 5

TIPO 3

TIPO 4

TIPO 5

TIPO 3

TIPO 4

TIPO 5

TIPO 3

TIPO 4


TIPO 5

TIPO 3

TIPO 4

TIPO 5

TIPO 3

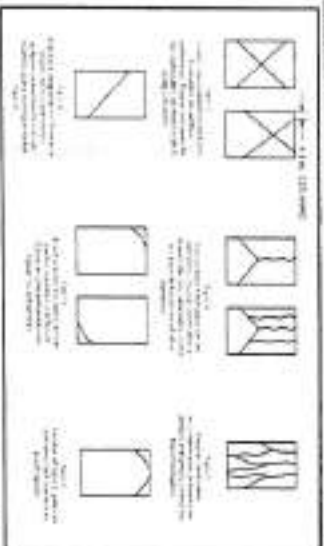

Resistencia a la compresión requerida	
Días	Resistencia requerida
7 días	> 70%
14 días	> 80%
28 días	> 100%

Ing. Víctor Alfredo Rivas Ojeda
M.P. 14282-21779 NTS
Ejecutivos en Ingeniería Ambiental

LABORATORIO DE MATERIALES
SEDE PRINCIPAL OCANA N.S Calle 20C N°141 02 Urb Villal del Rosario - SEDE AGUACHICA CUSAR Calle 11B N°10A-64 Barrio Villa Country

CEL: 3146684951





ENSAYOS DE LABORATORIO

Código: FR-JAS-24

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO

Versión: 03

NORMA INV E-410-13

Fecha: Diciembre 10 de 2022

Objeto: MEDIANAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCALA-QUINTAS ANDRÉS POR MEDIO DEL PROYECTO COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCALA NOROCCIDENTAL DE SANTANDER.

Localización: LA SAMARITANA

Estructura: PLACA HUELLAS

Solicitante: CONSORCIO DE 2022

Fuente: Descripción

Agregado del Norte

Fecha:

Diseño (PSI):

15/05/2023

3000

Prueba

1

2

3

4

5

6

Descripción de la muestra

PLACA HUELLAS

PLACA HUELLAS

PLACA HUELLAS

Dosificación

1:3:2

1:3:2

1:3:2

Fecha Toma

12/04/2023

12/04/2023

12/04/2023

Fecha Rotura

19/04/2023

26/04/2023

10/05/2023

Diámetro (mm)

101.00

101.00

101.00

Altura (mm)

200.00

202.00

200.00

Peso (Kg)

3.612

3.692

3.692

Área (mm²)

8011.85

8011.85

8011.85

Volumen (mm³)

1602365.33

1618193.03

1602369.33

Densidad (Kg/m³)

2254.16

2181.28

2304.09

Carga (KN)

182.01

208.92

257.92

Edad (días)

7

14

28

Resistencia Real (MPa)

14.64

16.80

20.74

Resistencia Real (lb/pulg²) PSI

2122.75

2436.60

3008.08

Resistencia Real (Kg/cm²)

149.24

171.31

211.49

Resistencia Promedio Real (PSI)

70.75%

81.22%

100.27%

Porcentaje resistencia a la compresión

Tipo de falla

TIPO 4

TIPO 5

TIPO 2

Resistencia a la compresión requerida

7 días

Resistencia requerida

> 70%

14 días

> 80%

28 días

> 100%

Resistencia a la compresión requerida

7 días

Resistencia requerida

> 70%

14 días

> 80%

28 días

> 100%

Resistencia a la compresión requerida

7 días

Resistencia requerida

> 70%

14 días

> 80%

28 días

> 100%

Resistencia a la compresión requerida

7 días

Resistencia requerida

> 70%

14 días

> 80%

28 días

> 100%

LABORATORIO DE MATERIALES
SEDE PRINCIPAL, OCALA N.S. Calle 20C N°341-02 Urb. Viterbo del Rosario - SEDE ADJACENTE, CESAR Calle 118 N°30A-64 Barrio Villa Country
CEL: 314668953

Resistencia a la compresión requerida

7 días

Resistencia requerida

> 70%

14 días

> 80%

28 días

> 100%

Ing. Víctor Alfonso Pérez Quiroz

M.P. 54303-251798 NTS

Expediente en Oficina Asesoría





ENSAYOS DE LABORATORIO

Código: PR-LAB-24

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO

Versión: 03

NORMA INV E-410-13

Fecha: Diciembre 10 de 2022

Objeto: MEDICAMENTO DEL CORRIENTE VIAL OCCASIONALES LIMITES NORMAS PARA MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCCALA NORTE DE SANTANDER

Localización: LA SAMANTANA

Estructura: PLACA HUELLAS

Solicitante: CONSORCIO DE 2022

Fuente: Descripción:

Agregado del Norte:


Fecha:

Diseño [PSI]:

20/05/2023

3000

Prueba	1	2	3	4	5	6
Descripción de la muestra	PLACA HUELLAS	PLACA HUELLAS	PLACA HUELLAS			
Dosificación	1:3:2	1:3:2	1:3:2			
Fecha Toma	17/04/2023	17/04/2023	17/04/2023			
Fecha Rotura	24/04/2023	1/05/2023	15/05/2023			
Diámetro (mm)	101.00	101.00	101.00			
Altura (mm)	202.00	200.00	200.00			
Peso (Kg)	3.679	3.655	3.661			
Área (mm ²)	8011.85	8011.85	8011.85			
Volumen (mm ³)	1618393.03	1602369.33	1602369.33			
Densidad (Kg/m ³)	2273.24	2281.00	2284.74			
Carga (KN)	181.12	208.12	267.34			
Edad (días)	7	14	28			
Resistencia Real (MPa)	14.56	16.74	21.50			
Resistencia Real (lb/pulg ²) PSI	2112.37	2427.27	3117.94			
Resistencia Real (Kg/cm ²)	148.51	170.65	219.21			
Resistencia Promedio Real (PSI)						
Porcentaje resistencia a la compresión	70.41%	80.91%	101.91%			
Tipo de falla	TIPO 4	TIPO 2	TIPO 3			

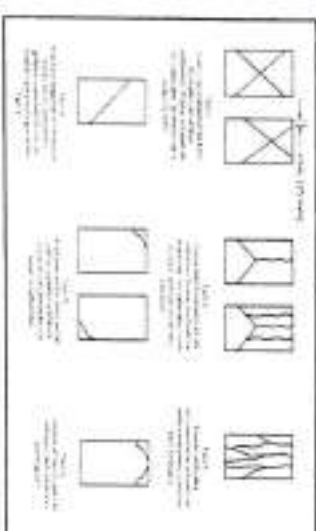

Resistencia a la compresión según la	
Días	Resistencia requerida
7 días	> 70%
14 días	> 80%
28 días	> 100%

Ing. Víctor Alfonso Reyes Quintero
M.P. 54202 20/08/2023
Especialista en Diseño Ambiental



LABORATORIO DE MATERIALES

SEDE PRINCIPAL OCCALA N.S Calle 20C N°16-02 Urb Villan del Romero - SEDE AGUACAPICA CESAR Calle 118 N°30A 64 Barrio Villa Country

CEL: 3146689933





ENSAYOS DE LABORATORIO

Código: FR-LAB-24

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO

Versión: 03

NORMA INV E-410-13

Fecha: Octubre 10 de 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO DEL CORRIDOR VIAL OCALA, LÍMITES MOSERSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCCIDENTE NOROCCIDENTE DE SANTANDER.

Localización: LA SERRANÍA

Estructura: PLACA HUELLAS

Solicitante: COMPROVIDOR OK 2022

Proveer: Fuente: Agregados del Norte.

Descripción: Descripción: Tratado 3/4", Arena de grano medio y Arena de filtración.

Fecha Toma: 19/05/2023

Fecha Rotura: 26/05/2023

Diámetro (mm): 101.00

Altura (mm): 201.00

Peso (Kg): 3.679

Área (mm²): 8011.85

Volumen (mm³): 1610381.18

Densidad (Kg/m³): 2284.55

Carga (KN): 184.38

Edad (días): 7

Resistencia Real (MPa): 14.83


Resistencia Real (lb/pulg²) PSI: 2150.39

Resistencia Real (Kg/cm²): 151.19

Resistencia Promedio Real (PSI):

Porcentaje resistencia a la compresión: 71.68%

Tipo de falla: TIPO 4

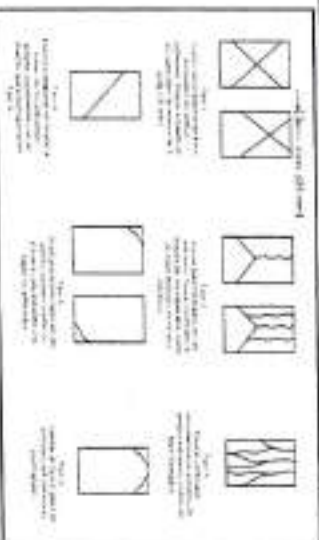

Resistencia a la compresión requerida	
Días	Resistencia requerida
7 días	> 70%
14 días	> 80%
28 días	> 100%

Ing. Víctor Alfredo Pérez Duran
M.P. 54200-251795 KTS
Especialista en Ingeniería Ambiental



LABORATORIO DE MATERIALES

SEDE PRINCIPAL OCCALA N.S Calle 205 N°141-02 Urb vital del Rosario - SEDE AGUACHICA CESAR Calle 118 N°304-64 Barrio Villa Country

CEL: 3146848553





DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA
Y LABORATORIO DE MATERIALES

RESULTADO DE ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION
CILINDROS DE CONCRETO

CONSTRUCCION PLACA HUELLA - VIA LA SAMARITANA
MUNICIPIO DE OCAÑA - NORTE DE SANTANDER

CONTROL DE CALIDAD - CONCRETO HIDRAULICO - RESISTENCIA A LA COMPRESION

PROYECTO	CONSTRUCCION PLACA HUELLA VIA LA SAMARITANA							
LOCALIZACION	VEREDA LA SAMARITANA - MUNICIPIO DE OCAÑA	SOLICITO	INTERVENTORIA - GAVINCO		FECHA DE ENSAYO	ABRIL 20 A MAYO 10 DE 2023	NORMA	INV E-410

ELEMENTO	PLACA HUELLA			DOSIFICACION	NO REGISTRA			RESISTENCIA f_c	21,0 Mpa			EQUIPO	PRENSA DOBLE RANGO PC-160 / MARCA PINZUAR		
----------	--------------	--	--	--------------	-------------	--	--	-------------------	----------	--	--	--------	---	--	--

LOCALIZACION DE LA MUESTRA	CILINDRO N°	MUESTRA	DOSIFICACION MEZCLA	FECHAS		EDAD (Dias)	DATOS DE LA PROBETA								CARGA APLICADA KN	RESISTENCIA CORREGIDA				PROCENTAJE RESPECTO f_c	TIPO DE FALLA
				TOMA	ROTURA		DIAMETRO (cm)	ALTURA (cm)	ESBELTEZ (L/D)	PESO (gr)	AREA (cm ²)	VOLUMEN (cm ³)	DENSIDAD (gr/cm ³)	FACTOR CORRECCION		REAL A LA FECHA Kg/cm ²	P.S.I	ESTIMADA A 28 DIAS Kg/cm ²	P.S.I		
PLACA HUELLA $f_c > 21,0$ MPa	CILINDRO 1	M1 LOTE 1	NO REGISTRA	12/04/2023	20/04/2023	8	15,30	30,30	1,980	12267	183,85	5570,78	2,20	0,9980	165,20	91,43	1305,6	154,7	2208,9	43,52%	LATERAL
	CILINDRO 2	M2 LOTE 1			26/04/2023	14	15,30	30,40	1,987	12293	183,85	5589,17	2,20	0,9986	226,10	125,22	1788,1			59,60%	CORTE
	CILINDRO 3	M3 LOTE 1			10/05/2023	28	15,25	30,60	2,007	12363	182,65	5589,23	2,21	1,0007	280,10	156,47	2234,3			74,48%	LATERAL
	CILINDRO 4	M4 LOTE 1					15,30	30,70	2,007	12338	183,85	5644,33	2,19	1,0007	293,30	162,77	2324,4			77,48%	CORTE

RESISTENCIA ESTIMADA EN % DE f_c				
EDAD - DIAS	3	7	14	28
RESISTENCIA f_c	40%	70%	80%	100%

FACTOR DE CORRECCION POR ESBELTEZ (L/D)				
(L/D)	1,75	1,50	1,25	1,00
Factor	0,98	0,96	0,93	0,87

TIPOS DE FALLA						
(A) CONO	(B) CONO/HENDEURA	(C) COLUMNAR	(D) CORTE	(E) CONO/CORTE	(F) LATERAL	(G) ACENTADA

NOTA: ESTOS RESULTADOS REFLEJAN UNICAMENTE LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO

ENSAYO	OMAR ASCANIO FLOREZ LABORATORISTA	REVISO	ING. ALDEMAR SALCEDO TORRES M.P. 15217 - 091719 BYC
--------	--------------------------------------	--------	--



ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION
CILINDROS NORMALES DE CONCRETO
NORMA INVIAS - E 410 / 2022

Barrio Villa Paraíso Ocaña - Norte de Santander / Colombia
Teléfonos: 3164527622 - 3024107818
aeotecminas@hotmail.com

Barrio Villa Paraíso Ocaña - Norte de Santander / Colombia

Tel: 3164527622 - 3024107818 - 3177269240

geotecminas@hotmail.com



DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA
Y LABORATORIO DE MATERIALES

RESULTADO DE ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION CILINDROS DE CONCRETO

CONSTRUCCION PLACA HUELLA - VIA LA SAMARITANA
MUNICIPIO DE OCAÑA - NORTE DE SANTANDER

CONTROL DE CALIDAD - CONCRETO HIDRAULICO - RESISTENCIA A LA COMPRESION

PROYECTO	CONSTRUCCION PLACA HUELLA VIA LA SAMARITANA								
LOCALIZACION	VEREDA LA SAMARITANA - MUNICIPIO DE OCAÑA	SOLICITO	INTERVENTORIA - GAVINCO			FECHA DE ENSAYO	ABRIL 28 A MAYO 19 DE 2023	NORMA	INV E-410

ELEMENTO	PLACA HUELLA	DOSIFICACION	NO REGISTRA	RESISTENCIA f _c	21,0 Mpa	EQUIPO	PRENSA DOBLE RANGO PC-160 / MARCA PINZUAR	
----------	--------------	--------------	-------------	----------------------------	----------	--------	---	--

LOCALIZACION DE LA MUESTRA	CILINDRO N°	MUESTRA	DOSIFICACION MEZCLA	FECHAS		EDAD (Dias)	DATOS DE LA PROBETA								CARGA APLICADA KN	RESISTENCIA CORREGIDA				PROCENTAJE RESPECTO F _c	TIPO DE FALLA
				TOMA	ROTURA		DIAMETRO (cm)	ALTURA (cm)	ESBELTEZ (L/D)	PESO (gr)	AREA (cm ²)	VOLUMEN (cm ³)	DENSIDAD (gr/cm ³)	FACTOR CORRECCION		REAL A LA FECHA Kg/cm ²	P.S.I	ESTIMADA A 28 DIAS Kg/cm ²	P.S.I		
PLACA HUELLA f _c > 21,0 MPa	CILINDRO 1	M1 LOTE 2	NO REGISTRA	21/04/2023	28/04/2023	7	15,20	30,50	2,007	12402	181,46	5534,49	2,24	1,0007	288,20	162,05	2314,1	246,3	3516,7	77,14%	COLUMNAR
	CILINDRO 2	M2 LOTE 2			05/05/2023	14	15,20	30,40	2,000	12448	181,46	5516,35	2,26	1,0000	361,10	202,90	2897,4			96,58%	CONO Y CORTE
	CILINDRO 3	M3 LOTE 2			19/05/2023	28	15,30	30,50	1,993	12744	183,85	5607,56	2,27	0,9993	384,70	213,19	3044,4			101,48%	LATERAL
	CILINDRO 4	M4 LOTE 2					15,25	30,50	2,000	12583	182,65	5570,96	2,26	1,0000	391,20	218,37	3118,4			103,95%	COLUMNAR

RESISTENCIA ESTIMADA EN % DE F _c				
EDAD - DIAS	3	7	14	28
RESISTENCIA f _c	40%	70%	80%	100%

FACTOR DE CORRECCION POR ESBELTEZ (L/D)				
(L/D)	1,75	1,50	1,25	1,00
Factor	0,98	0,96	0,93	0,87

TIPOS DE FALLA						
(A) CONO	(B) CONO/HENDEDURA	(C) COLUMNAR	(D) CORTE	(E) CONO/CORTE	(F) LATERAL	(G) ACENTADA

NOTA: ESTOS RESULTADOS REFLEJAN UNICAMENTE LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO

ENSAYO	OMAR ASCANIO FLOREZ LABORATORISTA	REVISO	ING. ALDEMAR SALCEDO TORRES M.P. 15217 - 091719 BYC
--------	--------------------------------------	--------	--



DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA
Y LABORATORIO DE MATERIALES

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION
CILINDROS NORMALES DE CONCRETO
NORMA INVIAS - E 410 / 2022

Barrio Villa Paraíso Ocaña - Norte de Santander / Colombia
Teléfonos: 3164527622 - 3024107818
aeotecminas@hotmail.com

Barrio Villa Paraíso Ocaña - Norte de Santander / Colombia

Tel: 3164527622 - 3024107818 - 3177269240

geotecminas@hotmail.com



DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA
Y LABORATORIO DE MATERIALES

RESULTADO DE ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION
CILINDROS DE CONCRETO

CONSTRUCCION PLACA HUELLA - VIA LA SAMARITANA
MUNICIPIO DE OCAÑA - NORTE DE SANTANDER

CONTROL DE CALIDAD - CONCRETO HIDRAULICO - RESISTENCIA A LA COMPRESION

PROYECTO	CONSTRUCCION PLACA HUELLA VIA LA SAMARITANA							
LOCALIZACION	VEREDA LA SAMARITANA - MUNICIPIO DE OCAÑA	SOLICITO	INTERVENTORIA - GAVINCO		FECHA DE ENSAYO	MAYO 05 A 26 DE 2023	NORMA	INV E-410

ELEMENTO	PLACA HUELLA	DOSIFICACION	NO REGISTRA	RESISTENCIA f _c	21,0 Mpa	EQUIPO	PRENSA DOBLE RANGO PC-160 / MARCA PINZUAR	
----------	--------------	--------------	-------------	----------------------------	----------	--------	---	--

LOCALIZACION DE LA MUESTRA	CILINDRO N°	MUESTRA	DOSIFICACION MEZCLA	FECHAS		EDAD (Días)	DATOS DE LA PROBETA								CARGA APLICADA	RESISTENCIA CORREGIDA				PROCENTAJE RESPECTO Fc	TIPO DE FALLA
				TOMA	ROTURA		DIAMETRO	ALTURA	ESBELTEZ	PESO	AREA	VOLUMEN	DENSIDAD	FACTOR		REAL A LA FECHA	ESTIMADA A 28 DIAS				
							(cm)	(cm)	(L/D)	(gr)	(cm2)	(cm3)	(gr/cm3)	CORRECCION		KN	Kg/cm2	P.S.I	Kg/cm2		
PLACA HUELLA fc > 21,0 MPa	CILINDRO 1	M1 LOTE 3	NO REGISTRA	28/04/2023	05/05/2023	7	15,30	30,50	1,993	12635	183,85	5607,56	2,25	0,9993	371,60	205,94	2940,8	300,9	4296,5	98,03%	LATERAL
	CILINDRO 2	M2 LOTE 3			12/05/2023	14	15,40	30,10	1,955	12749	186,27	5606,59	2,27	0,9954	412,90	224,98	3212,7			107,09%	COLUMNAR
	CILINDRO 3	M3 LOTE 3			26/05/2023	28	15,20	30,60	2,013	12452	181,46	5552,64	2,24	1,0014	453,00	254,90	3640,0			121,33%	CONO Y HENDEURA
	CILINDRO 4	M4 LOTE 3					15,10	30,40	2,013	12481	179,08	5444,00	2,29	1,0014	452,70	258,12	3685,9			122,86%	CORTE

RESISTENCIA ESTIMADA EN % DE F _c				
EDAD - DIAS	3	7	14	28
RESISTENCIA f _c	40%	70%	80%	100%

FACTOR DE CORRECCION POR ESBELTEZ (L/D)				
(L/D)	1,75	1,50	1,25	1,00
Factor	0,98	0,96	0,93	0,87



NOTA: ESTOS RESULTADOS REFLEJAN UNICAMENTE LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO

ENSAYO	OMAR ASCANIO FLOREZ LABORATORISTA	REVISO	ING. ALDEMAR SALCEDO TORRES M.P. 15217 - 091719 BYC
--------	--------------------------------------	--------	--



DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA
Y LABORATORIO DE MATERIALES

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION
CILINDROS NORMALES DE CONCRETO
NORMA INVIAS - E 410 / 2022

Barrio Villa Paraíso Ocaña - Norte de Santander / Colombia
Teléfonos: 3164527622 - 3024107818
aotecminas@hotmail.com

Barrio Villa Paraíso Ocaña - Norte de Santander / Colombia

Tel: 3164527622 - 3024107818 - 3177269240

geotecminas@hotmail.com



DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA
Y LABORATORIO DE MATERIALES

RESULTADO DE ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION
CILINDROS DE CONCRETO

CONSTRUCCION PLACA HUELLA - VIA LA SAMARITANA
MUNICIPIO DE OCAÑA - NORTE DE SANTANDER

CONTROL DE CALIDAD - CONCRETO HIDRAULICO - RESISTENCIA A LA COMPRESION

PROYECTO	CONSTRUCCION PLACA HUELLA VIA LA SAMARITANA							
LOCALIZACION	VEREDA LA SAMARITANA - MUNICIPIO DE OCAÑA	SOLICITO	INTERVENTORIA - GAVINCO		FECHA DE ENSAYO	ABRIL 28 A MAYO 05 DE 2023	NORMA	INV E-410


ELEMENTO	PLACA HUELLA	DOSIFICACION	NO REGISTRA	RESISTENCIA f_c	21,0 Mpa	EQUIPO	PRENSA DOBLE RANGO PC-160 / MARCA PINZUAR
----------	--------------	--------------	-------------	-------------------	----------	--------	---

LOCALIZACION DE LA MUESTRA	CILINDRO N°	MUESTRA	DOSIFICACION MEZCLA	FECHAS		EDAD (Días)	DATOS DE LA PROBETA								CARGA APLICADA	RESISTENCIA CORREGIDA				PROCENTAJE RESPECTO Fc	TIPO DE FALLA
				TOMA	ROTURA		DIAMETRO (cm)	ALTURA (cm)	ESBELTEZ (L/D)	PESO (gr)	AREA (cm2)	VOLUMEN (cm3)	DENSIDAD (gr/cm3)	FACTOR CORRECCION		REAL A LA FECHA	ESTIMADA A 28 DIAS				
																		KN	Kg/cm2		
PLACA HUELLA Fc > 21,0 MPa	CILINDRO 1	M1 LOTE 2	NO REGISTRA	21/04/2023	28/04/2023	7	15,20	30,50	2,007	12402	181,46	5534,49	2,24	1,0007	288,20	162,05	2314,1	246,3	3516,7	77,14%	COLUMNAR
	CILINDRO 2	M2 LOTE 2			05/05/2023	14	15,20	30,40	2,000	12448	181,46	5516,35	2,26	1,0000	361,10	202,90	2897,4			96,58%	CONO Y CORTE

RESISTENCIA ESTIMADA EN % DE f_c				
EDAD - DIAS	3	7	14	28
RESISTENCIA f_c	40%	70%	80%	100%

FACTOR DE CORRECCION POR ESBELTEZ (L/D)				
(L/D)	1,75	1,50	1,25	1,00
Factor	0,98	0,96	0,93	0,87

TIPOS DE FALLA



NOTA: ESTOS RESULTADOS REFLEJAN UNICAMENTE LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO

ENSAYO

OMAR ASCANIO FLOREZ
LABORATORISTA

REVISO

ING. ALDEMAR SALCEDO TORRES
M.P. 15217-091719 BYC



DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA
Y LABORATORIO DE MATERIALES

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION
CILINDROS NORMALES DE CONCRETO
NORMA INVIAS - E 410 / 2022

Barrio Villa Paraíso Ocaña - Norte de Santander / Colombia
Teléfonos: 3164527622 - 3024107818
aeotecminas@hotmail.com

Barrio Villa Paraíso Ocaña - Norte de Santander / Colombia

Tel: 3164527622 - 3024107818 - 3177269240

geotecminas@hotmail.com



DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA
Y LABORATORIO DE MATERIALES

RESULTADO DE ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION
CILINDROS DE CONCRETO

CONSTRUCCION PLACA HUELLA - VIA LA SAMARITANA
MUNICIPIO DE OCAÑA - NORTE DE SANTANDER

CONTROL DE CALIDAD - CONCRETO HIDRAULICO - RESISTENCIA A LA COMPRESION

PROYECTO	CONSTRUCCION PLACA HUELLA VIA LA SAMARITANA							
LOCALIZACION	VEREDA LA SAMARITANA - MUNICIPIO DE OCAÑA	SOLICITO	INTERVENTORIA - GAVINCO		FECHA DE ENSAYO	MAYO 05 A 12 DE 2023	NORMA	INV E-410

ELEMENTO	PLACA HUELLA			DOSIFICACION	NO REGISTRA	RESISTENCIA f'c	21,0 Mpa		EQUIPO	PRENSA DOBLE RANGO PC-160 / MARCA PINZUAR											
LOCALIZACION DE LA MUESTRA	CILINDRO N°	MUESTRA	DOSIFICACION MEZCLA	FECHAS		EDAD (Dias)	DATOS DE LA PROBETA								CARGA APLICADA	RESISTENCIA CORREGIDA				PROCENTAJE RESPECTO	TIPO DE FALLA
				TOMA	ROTURA		DIAMETRO	ALTURA	ESBELTEZ	PESO	AREA	VOLUMEN	DENSIDAD	FACTOR		REAL A LA FECHA	ESTIMADA A 28 DIAS				
							(cm)	(cm)	(L/D)	(gr)	(cm2)	(cm3)	(gr/cm3)	CORRECCION		KN	Kg/cm2	P.S.I	Kg/cm2		
PLACA HUELLA f'c > 21,0 MPa	CILINDRO 1	M1 LOTE 3	NO REGISTRA	28/04/2023	05/05/2023	7	15,30	30,50	1,993	12635	183,85	5607,56	2,25	0,9993	371,60	205,94	2940,8	300,9	4296,5	98,03%	LATERAL
	CILINDRO 2	M2 LOTE 3			12/05/2023	14	15,40	30,10	1,955	12749	186,27	5606,59	2,27	0,9954							

RESISTENCIA ESTIMADA EN % DE f_c				
EDAD - DIAS	3	7	14	28
RESISTENCIA f_c	40%	70%	80%	100%

FACTOR DE CORRECCION POR ESBELTEZ (L/D)				
(L/D)	1,75	1,50	1,25	1,00
Factor	0,98	0,96	0,93	0,87

TIPOS DE FALLA						
(A) CONO	(B) CONO/HENDEURA	(C) COLUMNAR	(D) CORTE	(E) CONO/CORTE	(F) LATERAL	(G) ACENTADA

NOTA: ESTOS RESULTADOS REFLEJAN UNICAMENTE LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO

ENSAYO	OMAR ASCANIO FLOREZ LABORATORISTA	REVISO	ING. ALDEMAR SALCEDO TORRES M.P. 15217 - 091719 BYC
--------	--------------------------------------	--------	--



DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA
Y LABORATORIO DE MATERIALES

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION
CILINDROS NORMALES DE CONCRETO
NORMA INVIAS - E 410 / 2022

Barrio Villa Paraíso Ocaña - Norte de Santander / Colombia
Teléfonos: 3164527622 - 3024107818
geotecminas@hotmail.com

Barrio Villa Paraíso Ocaña - Norte de Santander / Colombia

Tel: 3164527622 - 3024107818 - 3177269240

geotecminas@hotmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES										CÓDIGO MEPI-MN1-INV-6-FR-2																																																																				
										VERSIÓN 1																																																																					
										PÁGINA																																																																					
										FECHA 31/05/2023 (Día / Mes / Año)																																																																					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER										ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. DE VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$.																																																																					
SEGUIMIENTO No. (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)																																																																															
CONTRATO No.: 503155CUTR002W062.001.2022										PLAZO INICIAL: 6 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 241.001 (En meses según los primeros sin suspensiones)																																																																					
OBJETO: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCANA-LIMITES MORRISON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCANA, NORTE DE SANTANDER										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/11/2022 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2023																																																																					
CONTRATISTA: CONSORCIO CN 2022										FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)																																																																					
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1053 DE 2022 INTERVENIOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 1.711.146.620.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 1.711.146.620.00																																																																					
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	% Programado \$ Valor Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	\$ Valor Ejecutado % Ejecutado	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	%																																																																
GPP1				% P \$ P % E																																																																											
GPP2				% P \$ P % E																																																																											
GPP3				% P \$ P % E																																																																											
GPP4				% P \$ P % E																																																																											
GPP5				% P \$ P % E																																																																											
GPP6				% P \$ P % E																																																																											
GPP7				% P \$ P % E																																																																											
GPP8				% P \$ P % E																																																																											
TOTAL OTROS ITEMS				% P \$ P % E											0%																																																																
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)																																																																															
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																																																																															
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: 1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. 2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. 3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". 4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra sin incluir provisiones e IVA. 5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.																																																																															
<table><tr><th colspan="2">CONVENCIONES</th></tr><tr><td>TIPO DE DEBILLO</td><td>PROGRAMADO E EJECUTADO</td></tr><tr><td>BARRAS</td><td>\$ Valor</td></tr><tr><td>CURVAS</td><td>\$ Valor</td></tr></table>																CONVENCIONES		TIPO DE DEBILLO	PROGRAMADO E EJECUTADO	BARRAS	\$ Valor	CURVAS	\$ Valor																																																								
CONVENCIONES																																																																															
TIPO DE DEBILLO	PROGRAMADO E EJECUTADO																																																																														
BARRAS	\$ Valor																																																																														
CURVAS	\$ Valor																																																																														
<table><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA</td><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA</td><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%															INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)															INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%															INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)														
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%																																																																														
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)																																																																														
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																																																																														
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)																																																																														
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.																																																																															
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	\$ -	\$ -	%																																																																												
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADOS (B')	\$ -	\$ -	%																																																																												
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ -	\$ -	%																																																																												
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	\$ -	\$ -	%																																																																												
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																																																																															

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: 
Nombre: Luis Javier Carrascal
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 2520234541CND

Aprueba Firma: 
Nombre: Luz Andres Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

MUNICIPIO DE ABREGO
CONTRATO DE OBRA No. 252 DE 2022



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MAYO DE 2023

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO				CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2																																																																																							
					VERSION	1																																																																																							
					PÁGINA																																																																																								
					FECHA	31/05/2023 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																																																																							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER PERIODO MES: MAYO DE 2023																																																																																													
CONTRATO DE OBRA No.: 252 DE 2022					PLAZO INICIAL:	8 MESES																																																																																							
OBJETO:					FECHA DE INICIO:	16/01/2023																																																																																							
					FECHA DE SUSPENSIÓN:																																																																																								
					VALOR INICIAL (incluido IVA) :	\$ 4.314.324.054,00																																																																																							
					VALOR ADICIONALES (incluido IVA):																																																																																								
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL																																																																																													
					FECHA DE VENCIMIENTO:	16/09/2023																																																																																							
CONTRATISTA: CONSORCIO AD VIAS					ANTICIPO CONCEDIDO:																																																																																								
					ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ -																																																																																							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 DE 2022 INTERVENTOR: GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE																																																																																													
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																																									
<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Otros (Especificar cuales)</td><td>Batea</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Box Culvert</td><td></td><td></td></tr></table>				ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción			Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)	Batea			Box Culvert			<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Otros (Especificar cuales)</td><td>Batea</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Box Culvert</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción				Mejoramiento				Rehabilitación				Estructuras	Túneles				Puentes				Pontones				Mantenimiento					Otros (Especificar cuales)	Batea				Box Culvert										
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD																																																																																										
Pavimentación	Construcción																																																																																												
	Mejoramiento																																																																																												
	Rehabilitación																																																																																												
Estructuras	Túneles																																																																																												
	Puentes																																																																																												
	Pontones																																																																																												
Mantenimiento																																																																																													
Otros (Especificar cuales)	Batea																																																																																												
	Box Culvert																																																																																												
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																																																									
Pavimentación	Construcción																																																																																												
	Mejoramiento																																																																																												
	Rehabilitación																																																																																												
Estructuras	Túneles																																																																																												
	Puentes																																																																																												
	Pontones																																																																																												
Mantenimiento																																																																																													
Otros (Especificar cuales)	Batea																																																																																												
	Box Culvert																																																																																												
AVANCE FINANCIERO																																																																																													
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																																																									
<table><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 4.281.143.357,00</td><td></td><td>\$ 4.281.143.357,00</td></tr><tr><td>AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td>\$ 15.151.003,00</td><td></td><td>\$ 15.151.003,00</td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td><td></td><td></td><td>\$ -</td></tr><tr><td>ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$ 15.151.003,00</td><td>2.878.691,00</td><td>\$ 18.029.694,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD</td><td></td><td></td><td>\$ -</td></tr><tr><td>MANTENIMIENTO PERIODICO</td><td></td><td></td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>\$ 4.311.445.363,00</td><td>\$ 2.878.691,00</td><td>\$ 4.314.324.054,00</td></tr></table>					BÁSICO	IVA	TOTAL	OBRAS	\$ 4.281.143.357,00		\$ 4.281.143.357,00	AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ 15.151.003,00		\$ 15.151.003,00	JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			\$ -	ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 15.151.003,00	2.878.691,00	\$ 18.029.694,00	GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			\$ -	MANTENIMIENTO PERIODICO			\$ -	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 4.311.445.363,00	\$ 2.878.691,00	\$ 4.314.324.054,00	<table><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AJUSTES</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$ 5.978.266,96</td><td>\$ 332.125,94</td><td>\$ 6.310.392,90</td><td>\$ 6.310.392,90</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	OBRAS					AJUSTES					OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES					JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN					ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 5.978.266,96	\$ 332.125,94	\$ 6.310.392,90	\$ 6.310.392,90	GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)					GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)					GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)					GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)					VALOR EJECUTADO				
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																																																										
OBRAS	\$ 4.281.143.357,00		\$ 4.281.143.357,00																																																																																										
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ 15.151.003,00		\$ 15.151.003,00																																																																																										
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			\$ -																																																																																										
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 15.151.003,00	2.878.691,00	\$ 18.029.694,00																																																																																										
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			\$ -																																																																																										
MANTENIMIENTO PERIODICO			\$ -																																																																																										
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 4.311.445.363,00	\$ 2.878.691,00	\$ 4.314.324.054,00																																																																																										
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																																																									
OBRAS																																																																																													
AJUSTES																																																																																													
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES																																																																																													
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN																																																																																													
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 5.978.266,96	\$ 332.125,94	\$ 6.310.392,90	\$ 6.310.392,90																																																																																									
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)																																																																																													
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)																																																																																													
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)																																																																																													
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)																																																																																													
VALOR EJECUTADO																																																																																													
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																																																													
INVERSIÓN EN OBRA																																																																																													
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 897.505.726,61																																																																																													
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 12.620.785,80																																																																																													
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 1,41%																																																																																													
EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																																																													
MANO DE OBRA CALIFICADA: 2																																																																																													
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:																																																																																													
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 1																																																																																													
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 3																																																																																													

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CORREDOR BRISAS DEL TARRA- LA ARENOSA





CORREDOR 1 SANTA LUCIA -CANOAS

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN


Firma
Nombre: Diego Efraín Pedraza Chaves
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-109359 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4																																
			VERSIÓN	1																																
			PÁGINA																																	
			FECHA	31/05/2023 (Día / Mes / Año)																																
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER																																	
CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA																																				
PERIODO / MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2023			PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL																																	
CONTRATO No. 252 DE 2022			CONTRATISTA: CONSORCIO AD VIAS																																	
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022			INTERVENTORÍA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.																																	
MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																																
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
MOTONIVELADORA			CORREDOR 1								A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A		
COMPACTADOR		10 TON	CORREDOR 1								A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A		
PAJARITA			CORREDOR 1								A	A	A	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A		
IRRIGADOR			CORREDOR 1								A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A		
VOLQUETA			CORREDOR 1								A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A		
VOLQUETA			CORREDOR 1								A	A	A	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A		
VOLQUETA			CORREDOR 1													A	I	A	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A		
VOLQUETA			CORREDOR 1													A	I	A	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A		
VOLQUETA			CORREDOR 1																						A	A	A	A	A	A	I	A	A	A		
CANGURO			CORREDOR 1																							A	A	A	A	I	I	I	I	I		
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO											6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	10	10	10	10	10	10	10	10		
TOTAL ACTIVO											6	6	6	6	6	8	0	8	4	8	8	8	8	0	8	9	10	10	10	9	0	9	9	9		
TOTAL EN REPARACIÓN																																				
TOTAL INACTIVO											0	0	0	0	0	0	8	0	4	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	1	10	1	1	1		
RESUMEN PERIODO / MES				No.	%	CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.																														
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO				8	100%																															
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A																																				
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R																																				
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I																																				
REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):																																				
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: No se han iniciado actividades físicas del proyecto.																																				
LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.																																				
NOTAS:																																				
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.																																				
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.																																				
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.																																				
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.																																				
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.																																				
Firma: 																																				
Nombre: JUAN SEBASTIÁN AROCHA JIMENEZ																																				
Residente de Obra																																				
Matrícula Profesional No.: 2420238556 NTS																																				
Firma: 																																				
Nombre: ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES ANGARITA																																				
Residente de Interventoría																																				
Matrícula Profesional No.: 54202194523 NTS																																				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.																																				
Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																				



FECHA	31/05/2023
-------	------------

NORTE DE SANTANDER

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: _____ COMFAORIENTE

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	SERGIO ARIAS	1091668605	REPRESENTANTE LEGAL		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 1.200.000,00	\$ 6.300,00	5	SANITAS	9452110332	\$ 150.000	COLPENSIONES	9452110332	\$ 192.000	X						
2	CLAUDIA LILIANA RANGEL	37334004	DIRECTO DE OBRA	\$ 3.480.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 3.480.000,00	\$ 556.800,00	5	SANITAS	68452652	\$ 139.200	COLPENSIONES	68452652	\$ 556.800	\$ 139.200						
3	JUAN SEBASTIAN AROCHA	1091670126	RESIDENTE DE OBRA	\$ 1.972.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 1.972.000,00	\$ 137.300,00	5	SANITAS	68452652	\$ 78.900	PORVENIR	68452652	\$ 315.600	\$ 78.900						
4	NALLELY GUERRERO GARAY	1091673181	TRABAJADORA SOCIAL	\$ 1.740.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 1.740.000,00	\$ 121.200,00	5	SANITAS	68452652	\$ 69.600	PORVENIR	68452652	\$ 278.400	\$ 69.600						
5	ANDRES ALONSO MONTAÑA	1091673273	TOPOGRAFO	\$ 1.740.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 1.740.000,00	\$ 121.200,00	5	SURA	68452652	\$ 69.600	PORVENIR	68452652	\$ 278.400	\$ 69.600						
6	CARLOS MOISES MALDONADO ORTIZ	5408384	AYUDANTE	\$ 1.160.000,00																							X	X	X	X	X	X	X	\$ 270.667,00	\$ 18.900,00	5	NUEVA EPS	68452652	\$ 10.900	COLPENSIONES	68452652	\$ 43.400	\$ 10.900						
7	ARBEY AURELIO BALLESTEROS	1091667473	INGENIERO RESIDENTE	\$ 1.972.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 1.972.000,00	\$ 137.300,00	5	SANITAS	68452652	\$ 78.900	PORVENIR	68452652	\$ 315.600	\$ 78.900						
8	JOSE ALEJANDRO ORTIZ LLAIN	1093060053	AYUDANTE	\$ 1.160.000,00																							X	X	X	X	X	X	X	\$ 270.667,00	\$ 18.900	5	NUEVA EPS	68452652	\$ 10.900	PROTECCION	68452652	\$ 43.400	\$ 10.900						
9	JAIDER MALDONADO MORA	1093060213	AYUDANTE	\$ 1.160.000,00																							X	X	X	X	X	X	X	\$ 270.667,00	\$ 18.900	5	ASMET SALUD	68452652	\$ 10.900	PORVENIR	68452652	\$ 43.400	\$ 10.900						
10	WILFREDO TORO MEJIA	13176730	OFICIAL	\$ 1.160.000,00																							X	X	X	X	X	X	X	\$ 270.667,00	\$ 18.900	5	NUEVA EPS	68452652	\$ 10.900	PROTECCION	68452652	\$ 43.400	\$ 10.900						
11	MARIO PEÑARANDA TORRADO	88267829	OFICIAL	\$ 1.160.000,00																							X	X	X	X	X	X	X	\$ 270.667,00	\$ 18.900	5	NUEVA EPS	68452652	\$ 10.900	PORVENIR	68452652	\$ 43.400	\$ 10.900						

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.


1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los aportes Legales y Seguridad Social de la parte del contratista de la normalidad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El contratista es responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normalidad vigente y la entidad prestador del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor. Dirección Territorial.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor. Dirección Territorial.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor. Dirección Territorial.

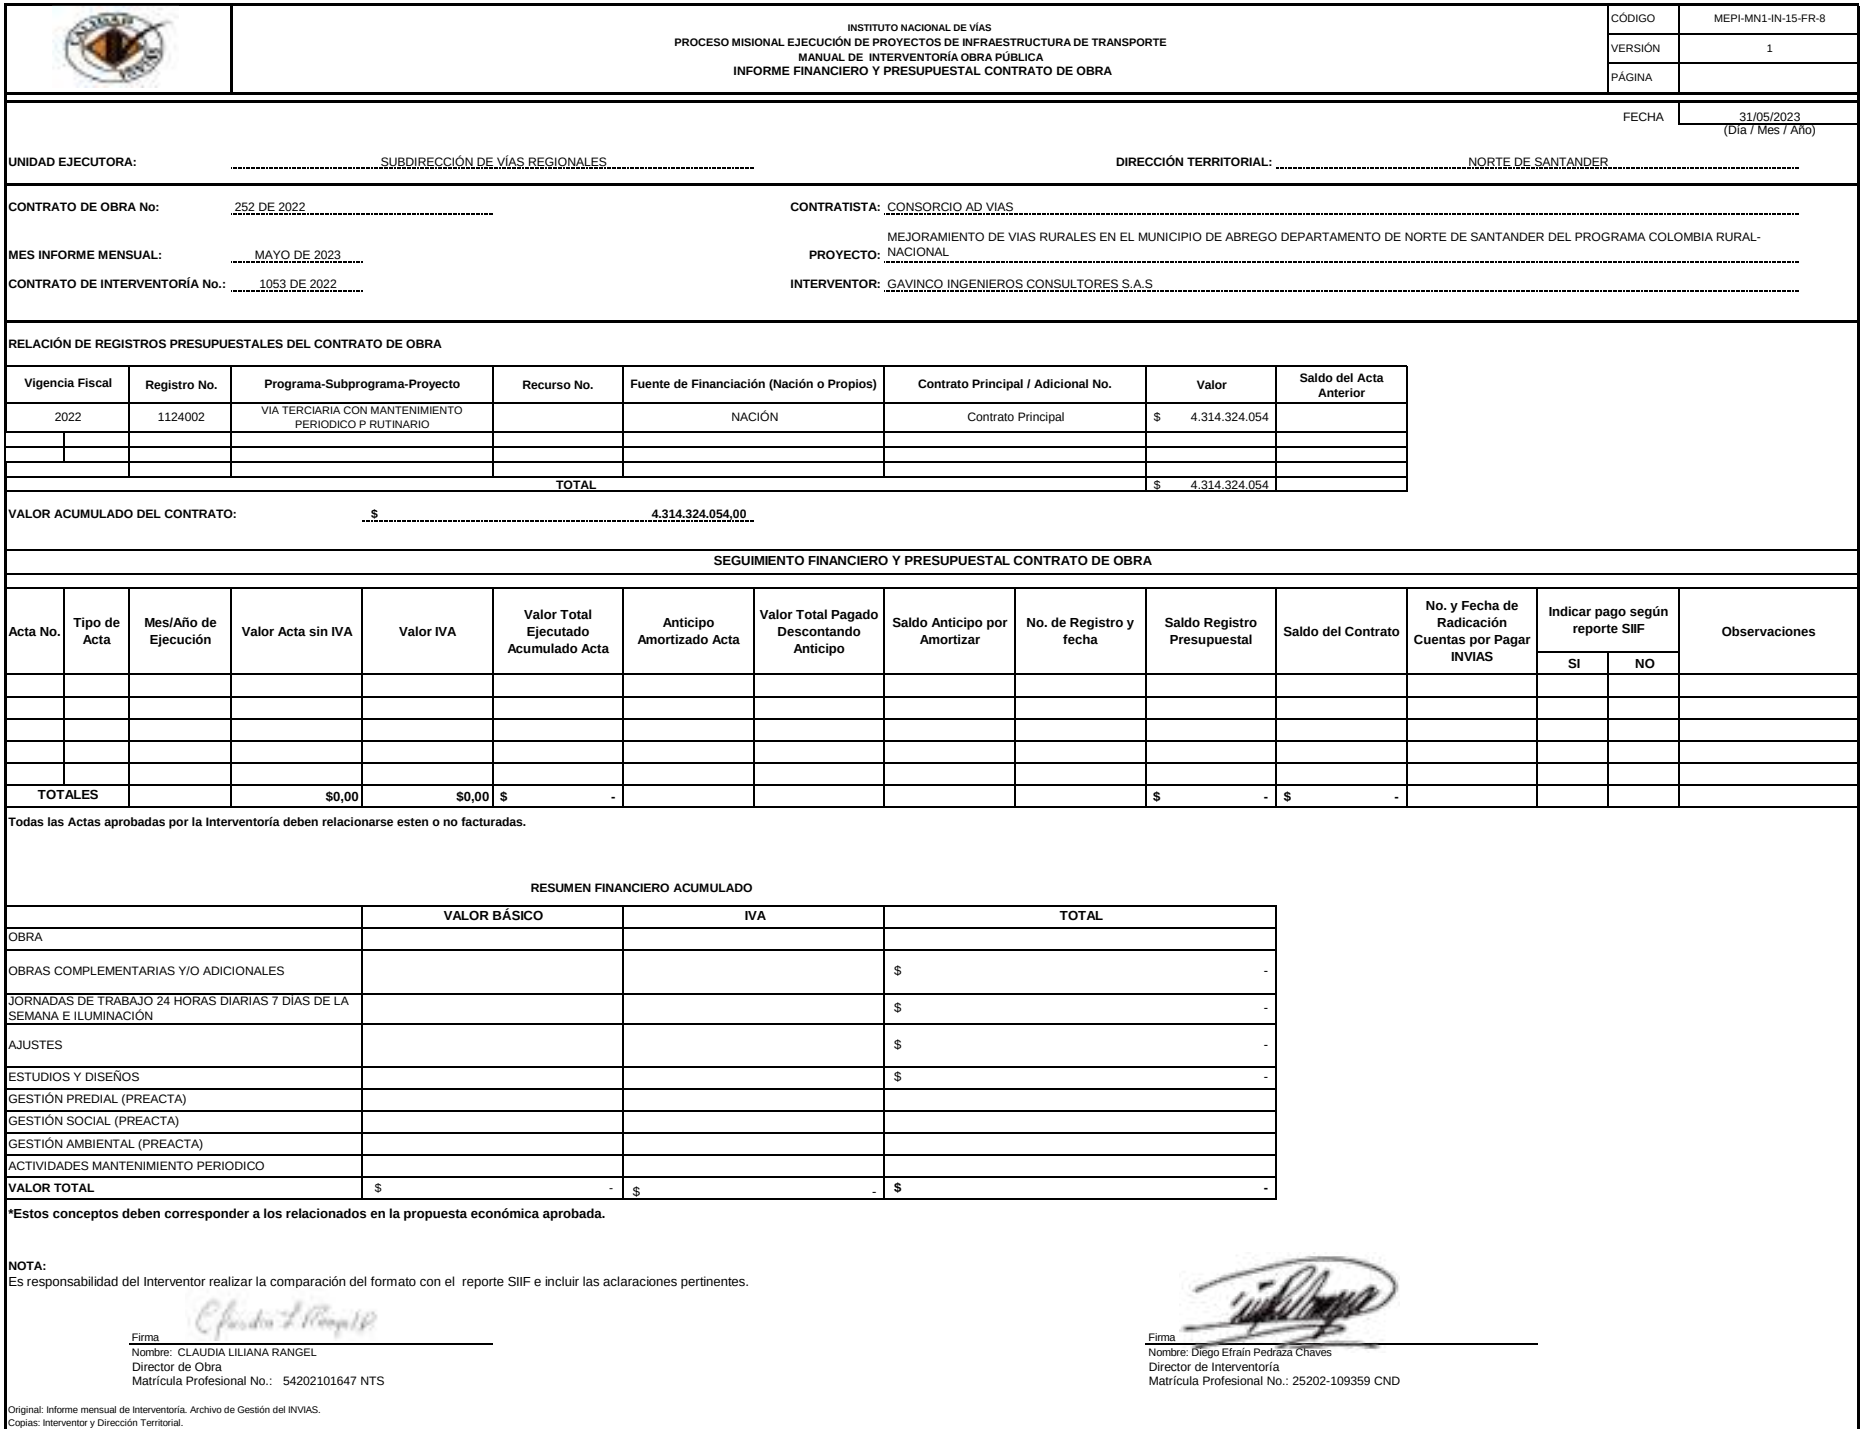



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 31/05/2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 252 de 2022 CONTRATISTA: CONSORCIO AD VIAS
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2023 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco								24	24	24	22	21	24	24	19	21	21	24	24	24	24	24	24	19	19	24	19	22	16	16	527	
Lluvias moderadas											2	3			5	3	3								5	5		5	2	8	8	49
Lluvias intensas																																0
Total horas	0	0	0	0	0	0	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:

Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

No se han Iniciado Actividades de Obra física.

Firma

Nom JUAN SEBASTIAN AROCHA JIMENEZ

Residente de Obra

Matrícula Profesional No.: 24202385562 NTS

Firma

Nombre: ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES ANGARITA

Residente de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 54202194523 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PÁGINA		
							FECHA	31/05/2023 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER									
CONTRATO DE OBRA No.: 252 DE 2022 CONTRATISTA: CONSORCIO AD VÍAS									
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2023 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S									
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
1	13/05/2023	DENSIDADES SUB-BASE	INV E-161-13	YEE DE PIE DE CRUZ PR 07+0508	1	> 95%	95,20%	SI	
2	13/05/2023	DENSIDADES SUB-BASE	INV E-161-13	YEE DE PIE DE CRUZ PR 07+0478	1	> 95%	96,10%	SI	
3	13/05/2023	DENSIDADES SUB-BASE	INV E-161-13	YEE DE PIE DE CRUZ PR 07+0448	1	> 95%	95,10%	SI	
4	13/05/2023	DENSIDADES SUB-BASE	INV E-161-13	YEE DE PIE DE CRUZ PR 07+0410	1	> 95%	95,60%	SI	
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORIA									
OBSERVACIONES:									
No se han Iniciado Actividades de Obra física.									
NOTAS:									
<p>1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.</p> <p>2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de ensayo.</p> <p>3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.</p> <p>4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.</p> <p>5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.</p> <p>6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.</p>									
Firma 					Firma 				
Nombre: CLAUDIA VIVIANA RANGEL Director de Obra Matrícula Profesional No.: 54202101647 NTS					Nombre: Diego Efraín Pedraza Chaves Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.									

		ENSAYOS LABORATORIO				Código: FR-LAB-20																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		ENSAYO DENSIDAD EN EL TERRENO				Versión: 02																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		NORMA INVE-153-13				Fecha: Diciembre 06 de 2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ÁBREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TIPO DE OBRA	Pavimentación en placa huella	LOCALIZACIÓN	Tramo 2 Sector "Y" Pie de Cruz, Abrego, Norte de Santander				FECHA	13/05/2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
SOLICITANTE	Consortio AD Via	MATERIAL	Subbase																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRUEBA No.</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ARSCRA</td> <td>K7-608</td> <td>K7-478</td> <td>K7-448</td> <td>K7-410</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COSTADO</td> <td>Derecho</td> <td>Izquierdo</td> <td>Eje</td> <td>Eje</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PROFUNDIDAD DEL ENSAYO (cm)</td> <td>10.0</td> <td>11.0</td> <td>11.0</td> <td>11.0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Peso de frasco + arena húmeda (grs.)</td> <td>7345.0</td> <td>7304.0</td> <td>7294.0</td> <td>7270.0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Peso de frasco + arena restante (grs.)</td> <td>2355.0</td> <td>3110.0</td> <td>2678.0</td> <td>2555.0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Peso de los retenidos en 3/4" (grs.)</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Peso de los retenidos en 3/4" seco (grs.)</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Porcentaje de material retenido en 3/4" seco</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Peso de arena total usada (grs.)</td> <td>4989.0</td> <td>4194.0</td> <td>4616.0</td> <td>4715.0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Constante del cono</td> <td>1775</td> <td>1775</td> <td>1775</td> <td>1775</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Peso de arena en el hueco (grs.)</td> <td>3214.0</td> <td>2419.0</td> <td>2841.0</td> <td>2940.0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Densidad de la arena (grs./cm³)</td> <td>1.409</td> <td>1.409</td> <td>1.609</td> <td>1.609</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Volumen del hueco (cm³)</td> <td>2281.06</td> <td>1716.82</td> <td>2016.32</td> <td>2085.06</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Peso del material extraído húmedo (grs.)</td> <td>4676.0</td> <td>3557.0</td> <td>4196.0</td> <td>4287.0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Porcentaje de material para 3/4" seco</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Peso del material extraído seco (grs.)</td> <td>4396.3</td> <td>3315.3</td> <td>3854.7</td> <td>4007.4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DENSIDAD DEL MATERIAL TOTAL (grs./cm³)</td> <td>1.914</td> <td>1.931</td> <td>1.912</td> <td>1.921</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DENSIDAD MÁXIMA DE LABORATORIO (grs./cm³)</td> <td>2.010</td> <td>2.010</td> <td>2.010</td> <td>2.010</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>% DE HUMEDAD ÓPTIMA DE LABORATORIO</td> <td>11.88%</td> <td>11.88%</td> <td>11.00%</td> <td>11.00%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>% DE COMPACTACIÓN DEL TERRENO</td> <td>95.2%</td> <td>96.1%</td> <td>95.1%</td> <td>95.6%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>% DE COMPACTACIÓN ESPECÍFICADO</td> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>95%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VERIFICACIÓN</td> <td>CUMPLE</td> <td>CUMPLE</td> <td>CUMPLE</td> <td>CUMPLE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONTENIDO DE HUMEDAD PARA 3/4"</td> <td>7.09%</td> <td>7.29%</td> <td>8.07%</td> <td>8.88%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONTENIDO DE HUMEDAD RETENIDO 3/4"</td> <td>1.00%</td> <td>1.00%</td> <td>1.00%</td> <td>1.00%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Número de resultados n</td> <td colspan="4">4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Constante K</td> <td colspan="4">0.819</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor promedio de la muestra Vm</td> <td colspan="4">95.68%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Desviación estándar de la muestra</td> <td colspan="4">0.43%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Promedio Estimado del lote VEP</td> <td colspan="4">95.18%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										PRUEBA No.	1	2	3	4						ARSCRA	K7-608	K7-478	K7-448	K7-410						COSTADO	Derecho	Izquierdo	Eje	Eje						PROFUNDIDAD DEL ENSAYO (cm)	10.0	11.0	11.0	11.0						Peso de frasco + arena húmeda (grs.)	7345.0	7304.0	7294.0	7270.0						Peso de frasco + arena restante (grs.)	2355.0	3110.0	2678.0	2555.0						Peso de los retenidos en 3/4" (grs.)	0.00	0.00	0.00	0.00						Peso de los retenidos en 3/4" seco (grs.)	0.00	0.00	0.00	0.00						Porcentaje de material retenido en 3/4" seco	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%						Peso de arena total usada (grs.)	4989.0	4194.0	4616.0	4715.0						Constante del cono	1775	1775	1775	1775						Peso de arena en el hueco (grs.)	3214.0	2419.0	2841.0	2940.0						Densidad de la arena (grs./cm ³)	1.409	1.409	1.609	1.609						Volumen del hueco (cm ³)	2281.06	1716.82	2016.32	2085.06						Peso del material extraído húmedo (grs.)	4676.0	3557.0	4196.0	4287.0						Porcentaje de material para 3/4" seco	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%						Peso del material extraído seco (grs.)	4396.3	3315.3	3854.7	4007.4						DENSIDAD DEL MATERIAL TOTAL (grs./cm ³)	1.914	1.931	1.912	1.921						DENSIDAD MÁXIMA DE LABORATORIO (grs./cm ³)	2.010	2.010	2.010	2.010						% DE HUMEDAD ÓPTIMA DE LABORATORIO	11.88%	11.88%	11.00%	11.00%						% DE COMPACTACIÓN DEL TERRENO	95.2%	96.1%	95.1%	95.6%						% DE COMPACTACIÓN ESPECÍFICADO	95%	95%	95%	95%						VERIFICACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						CONTENIDO DE HUMEDAD PARA 3/4"	7.09%	7.29%	8.07%	8.88%						CONTENIDO DE HUMEDAD RETENIDO 3/4"	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%						Número de resultados n	4									Constante K	0.819									Valor promedio de la muestra Vm	95.68%									Desviación estándar de la muestra	0.43%									Promedio Estimado del lote VEP	95.18%								
PRUEBA No.	1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ARSCRA	K7-608	K7-478	K7-448	K7-410																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
COSTADO	Derecho	Izquierdo	Eje	Eje																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PROFUNDIDAD DEL ENSAYO (cm)	10.0	11.0	11.0	11.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Peso de frasco + arena húmeda (grs.)	7345.0	7304.0	7294.0	7270.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Peso de frasco + arena restante (grs.)	2355.0	3110.0	2678.0	2555.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Peso de los retenidos en 3/4" (grs.)	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Peso de los retenidos en 3/4" seco (grs.)	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Porcentaje de material retenido en 3/4" seco	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Peso de arena total usada (grs.)	4989.0	4194.0	4616.0	4715.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Constante del cono	1775	1775	1775	1775																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Peso de arena en el hueco (grs.)	3214.0	2419.0	2841.0	2940.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Densidad de la arena (grs./cm ³)	1.409	1.409	1.609	1.609																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Volumen del hueco (cm ³)	2281.06	1716.82	2016.32	2085.06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Peso del material extraído húmedo (grs.)	4676.0	3557.0	4196.0	4287.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Porcentaje de material para 3/4" seco	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Peso del material extraído seco (grs.)	4396.3	3315.3	3854.7	4007.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DENSIDAD DEL MATERIAL TOTAL (grs./cm ³)	1.914	1.931	1.912	1.921																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DENSIDAD MÁXIMA DE LABORATORIO (grs./cm ³)	2.010	2.010	2.010	2.010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
% DE HUMEDAD ÓPTIMA DE LABORATORIO	11.88%	11.88%	11.00%	11.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
% DE COMPACTACIÓN DEL TERRENO	95.2%	96.1%	95.1%	95.6%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
% DE COMPACTACIÓN ESPECÍFICADO	95%	95%	95%	95%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
VERIFICACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CONTENIDO DE HUMEDAD PARA 3/4"	7.09%	7.29%	8.07%	8.88%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CONTENIDO DE HUMEDAD RETENIDO 3/4"	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Número de resultados n	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Constante K	0.819																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Valor promedio de la muestra Vm	95.68%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Desviación estándar de la muestra	0.43%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Promedio Estimado del lote VEP	95.18%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
 Ing. Víctor Alfonso Flores Doran MP: 54202-251799 NTS Especialista en Geotecnia Ambiental																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
LABORATORIO DE MATERIALES SEDE PRINCIPAL OCAÑA N.S Calle 20C N°141-02 Urb Villás del Rosario - SEDE AGUACHICA CESAR Calle 11B N°30A-64 Barrio Villa Country CEL: 3146884933																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA		31	5	2023
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	NORTE DE SANTANDER	
-------------------	---------------------------------	------------------------	--------------------	--

CONTRATO DE OBRA No.	252 DE 2022	CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS	
----------------------	-------------	--------------	-------------------	--

OBJETO DEL CONTRATO:				
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL				

FECHA DE INICIO:	16/01/2023			
PLAZO INICIAL:	8 MESES			
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	16/09/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)			
VALOR INICIAL:	\$	4.314.324.054,00		
VALOR ACUMULADO:	\$	4.314.324.054,00 (Incluye adiciones)		
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$	18.029.694,00		
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$	18.029.694,00		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1053 DE 2022	INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	
-------------------------------	--------------	--------------	---------------------------------------	--

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL					
---	--	--	--	--	--

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Cumplimiento		\$ 431.432.405,40	Desde			Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			24	11	2022	24	11	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		\$ 862.864.810,80	24	11	2022	24	7	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ 4.545.300,90	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	21-44-101400517	
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)	
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO	
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	13/12/2022	

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL					
---	--	--	--	--	--

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 400.000.000,00	Desde			Hasta		
Otros			24	11	2022	24	7	2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	100052635	OTRAS PÓLIZAS No.	
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)		
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO		
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:	13/12/2022		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.:

MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y/o Calidad de Obra		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.:

MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:**NOTAS:**

- El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
- El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma 

Nombre: Diego Efraín Pedraza Chaves
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES						CÓDIGO MEPI-MNL-IN-6-FR-1								
						VERSIÓN 1								
						PÁGINA								
						FECHA 31/05/2023 (Día / Mes / Año)								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER PROGRAMA DE INVERSIONES I														
REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____ (Se debe llevar de firma consecutiva la numeración)														
CONTRATO No.: 262 DE 2022 PLAZO INICIAL: 8 MESES PLAZO ACUMULADO: 243.00 (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)														
OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/01/2023 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/09/2023 (Indique el día/mes/año) (Indique el día/mes/año)														
CONTRATISTA: CONSORCIO AD VÍAS VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 4.314.324.054,00 VALOR INICIAL (incluido IVA) (B): \$ VALOR ADICIONES (incluido IVA) (C): \$ VALOR ADICIONES (incluido IVA) (D): \$ (Según contrato principal) (Según contrato principal)														
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: 1053 DE 2022 INTERVENIOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C+A+B): \$ 4.314.324.054,00														
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)														
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos		(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos		(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	\$ Valor Ejecutado % Ejecutado	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...
GPP1				% P \$ P \$ E % E										
GPP2				% P \$ P \$ E % E										
GPP3				% P \$ P \$ E % E										
GPP4				% P \$ P \$ E % E										
GPP5				% P \$ P \$ E % E										
GPP6				% P \$ P \$ E % E										
GPP7				% P \$ P \$ E % E										
GPP8				% P \$ P \$ E % E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P \$ P \$ E % E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')				% E										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES														
VALOR (Miles de Pesos)														
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA														
VALOR (Miles de Pesos)														
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES														
VALOR (Miles de Pesos)														
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA														
VALOR (Miles de Pesos)														
NOTAS:														
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.														
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.														
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.														
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".														
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 0.														
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').														
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.														
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.														
OBSERVACIONES:														
Aprobada Firma: [Firma] Nombre: Luz Andrea Arias Anzola Representante legal o apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: [Número]														
Revisó Firma: [Firma] Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS														
Aprobada Firma: [Firma] Nombre: RAUL ERNESTO VARGAS SOLANO Jefe de Unidad Ejecutora Matrícula Profesional No.: 68202091511 STD														
Revisó Firma: [Firma] Nombre: WILMAR RANGEL ROMERO Gestor Técnico de Proyecto Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS														
Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.														

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES										CÓDIGO MEPI-MN1-INV-6-FR-2																																																																				
										VERSIÓN 1																																																																					
										PÁGINA																																																																					
										FECHA 31/05/2023 (Día / Mes / Año)																																																																					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER										ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. DE VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$.																																																																					
SEGUIMIENTO No. (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)																																																																															
CONTRATO No.: 292 DE 2022										PLAZO INICIAL: 1 MES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 243.00 (En meses según los primeros sin suspensiones)																																																																					
OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/01/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/08/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)																																																																					
CONTRATISTA: CONSORCIO AD VÍAS										FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)																																																																					
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1053 DE 2022 INTERVENIOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 4.314.324.054.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 4.314.324.054.00																																																																					
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	% Programado \$ Valor Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Ejecutado \$ Valor Ejecutado	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...	%																																																																
GPP1				% P \$ P % E																																																																											
GPP2				% P \$ P % E																																																																											
GPP3				% P \$ P % E																																																																											
GPP4				% P \$ P % E																																																																											
GPP5				% P \$ P % E																																																																											
GPP6				% P \$ P % E																																																																											
GPP7				% P \$ P % E																																																																											
GPP8				% P \$ P % E																																																																											
TOTAL OTROS ITEMS				% P \$ P % E											0%																																																																
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)																																																																															
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																																																																															
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: 1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. 2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. 3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". 4. El Porcentaje de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). 5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.																																																																															
<table><tr><td colspan="3">CONVENCIONES</td></tr><tr><td>TIPO DE DEBILLO</td><td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td></tr><tr><td>BARRAS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CURVAS</td><td></td><td></td></tr></table>																CONVENCIONES			TIPO DE DEBILLO	PROGRAMADO	EJECUTADO	BARRAS			CURVAS																																																						
CONVENCIONES																																																																															
TIPO DE DEBILLO	PROGRAMADO	EJECUTADO																																																																													
BARRAS																																																																															
CURVAS																																																																															
<table><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA</td><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES</td><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA</td><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%															INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	%														INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	VALOR (Miles de Pesos)	%														INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	%													
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%																																																																														
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	%																																																																													
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	VALOR (Miles de Pesos)	%																																																																													
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	%																																																																													
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.																																																																															
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	\$ -	\$ -	%																																																																												
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADOS (B')	\$ -	\$ -	%																																																																												
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ -	\$ -																																																																													
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	\$ -	\$ -																																																																													

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: 
Nombre: Sergio Andres Arias Anzola
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: 
Nombre: Luz Andres Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

MUNICIPIO DE LA PLAYA
CONTRATO DE OBRA No. LP-004-2022



PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MAYO DE 2023

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO				CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2																																																																																
					VERSION	1																																																																																
					PÁGINA																																																																																	
					FECHA	31/05/2023 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																																																																
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER PERIODO MES: MAYO DE 2023																																																																																						
CONTRATO DE OBRA No.: LP-004 DE 2022					PLAZO INICIAL:	6 MESES																																																																																
OBJETO:					FECHA DE INICIO:	6/03/2023																																																																																
					FECHA DE SUSPENSIÓN:																																																																																	
					VALOR INICIAL (incluido IVA) :	\$ 2.203.091.392,61																																																																																
					VALOR ADICIONALES (incluido IVA):																																																																																	
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL																																																																																						
					FECHA DE VENCIMIENTO:	6/09/2023																																																																																
CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022					ANTICIPO CONCEDIDO:																																																																																	
					ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ -																																																																																
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 DE 2022 INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE																																																																																						
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																																		
<table><thead><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Otros (Especificar cuales)</td><td>Batea</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Box Culvert</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción			Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)	Batea			Box Culvert			<table><thead><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Otros (Especificar cuales)</td><td>Batea</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Box Culvert</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción				Mejoramiento				Rehabilitación				Estructuras	Túneles				Puentes				Pontones				Mantenimiento					Otros (Especificar cuales)	Batea				Box Culvert			
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD																																																																																			
Pavimentación	Construcción																																																																																					
	Mejoramiento																																																																																					
	Rehabilitación																																																																																					
Estructuras	Túneles																																																																																					
	Puentes																																																																																					
	Pontones																																																																																					
Mantenimiento																																																																																						
Otros (Especificar cuales)	Batea																																																																																					
	Box Culvert																																																																																					
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																																																		
Pavimentación	Construcción																																																																																					
	Mejoramiento																																																																																					
	Rehabilitación																																																																																					
Estructuras	Túneles																																																																																					
	Puentes																																																																																					
	Pontones																																																																																					
Mantenimiento																																																																																						
Otros (Especificar cuales)	Batea																																																																																					
	Box Culvert																																																																																					
AVANCE FINANCIERO																																																																																						
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																																																		
	BÁSICO	IVA	TOTAL		BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																																														
OBRAS	\$ 2.180.493.836,00		\$ 2.180.493.836,00	OBRAS																																																																																		
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ 10.318.519,00		\$ 10.318.519,00	AJUSTES																																																																																		
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			\$ -	OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES																																																																																		
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 10.318.519,00	1.960.518,61	\$ 12.279.037,61	JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN																																																																																		
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			\$ -	ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS																																																																																		
MANTENIMIENTO PERIODICO			\$ -	GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)																																																																																		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 2.201.130.874,00	\$ 1.960.518,61	\$ 2.203.091.392,61	GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)																																																																																		
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.				GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)																																																																																		
				GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)																																																																																		
				VALOR EJECUTADO																																																																																		
INVERSIÓN EN OBRA				EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																																																		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ -				MANO DE OBRA CALIFICADA: 1																																																																																		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -				MANO DE OBRA NO CALIFICADA:																																																																																		
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):				EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:																																																																																		
				TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 1																																																																																		

REGISTRO FOTOGRÁFICO




CORREDOR 1 LLANO GRANDE - SAN PEDRO

CORREDOR 2 ESPERANCITA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Firma 
Nombre: Diego Efraín Pedraza Chaves
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-109359 CND


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

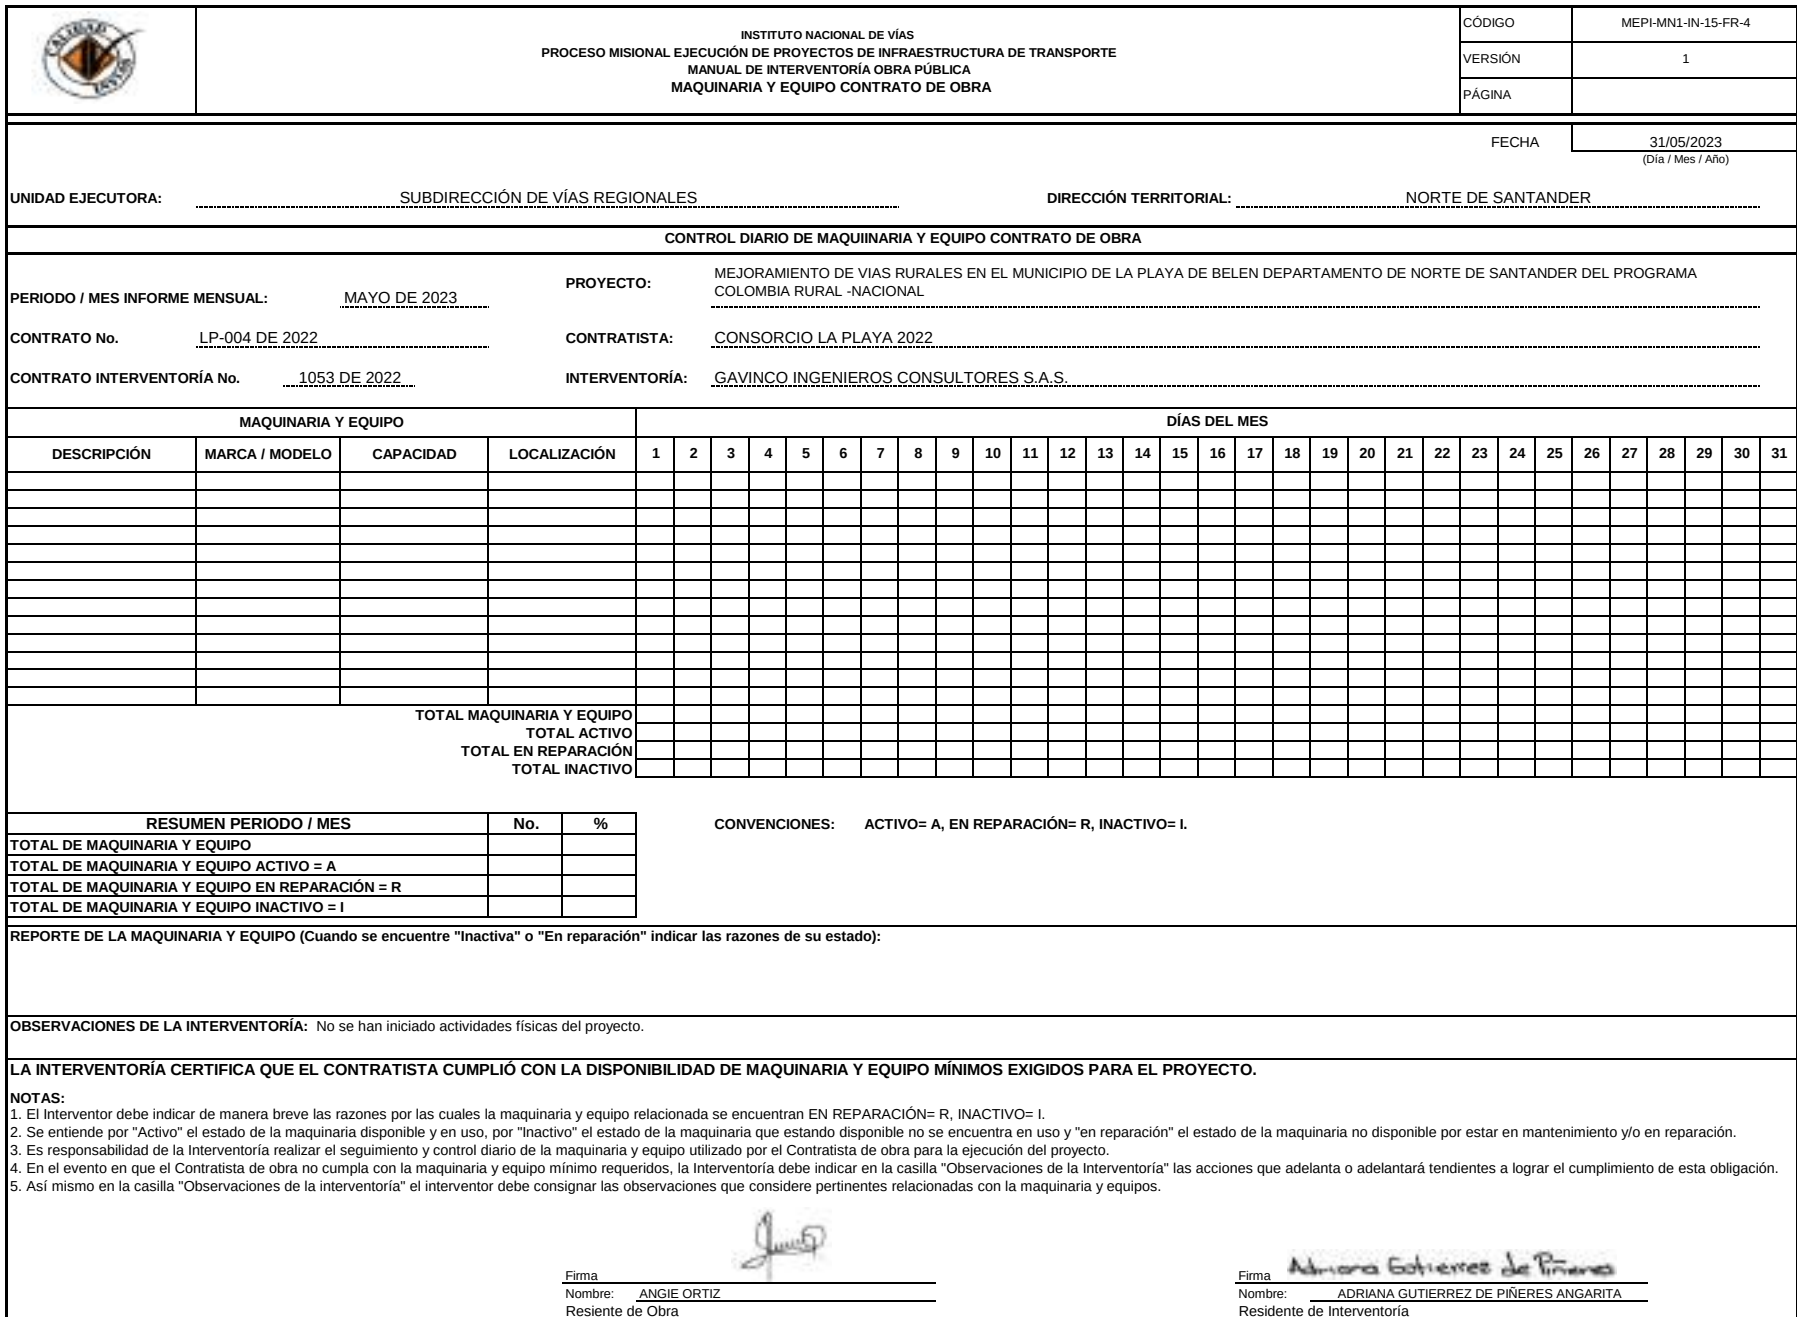

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Matrícula Profesional No.: 121037-0503283 NTS

Matrícula Profesional No.: 54202194523 NTS



CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
--------	---------------------

VERSIÓN	1
---------	---

PÁGINA	
--------	--

FECHA	31/05/2023
-------	------------

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA Nº: LP -004 DE 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2023

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA BELEN NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1053 DE 2022

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE ARL: SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CONFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL. DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA		Numeral 4. disponibilidad del personal requerido:
-----------------------------------	--	---

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelantará o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El Contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar, con un (X), la contribución por nombre, al personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que ostente el servicio.

Firma _____
Nombre: Sergio Andres Arias Anzola
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 5420

Firma 
Nombre: Diego Efraín Pedraza Chaves
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</div> <div>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>MEPI-MN1-IN-15-FR-8</div> <div>VERSIÓN</div> <div>1</div> <div>PÁGINA</div> <div></div>												
		<div>FECHA</div> <div>31/05/2023</div> <div>(Día 7 Mes 7 Año)</div>												
<div>UNIDAD EJECUTORA:</div> <div>SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES</div>		<div>DIRECCIÓN TERRITORIAL:</div> <div>NORTE DE SANTANDER</div>												
<div>CONTRATO DE OBRA No:</div> <div>LP-004 DE 2022</div>		<div>CONTRATISTA:</div> <div>CONSORCIO LA PLAYA 2022</div>												
<div>MES INFORME MENSUAL:</div> <div>MAYO DE 2023</div>		<div>PROYECTO:</div> <div>MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL</div>												
<div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:</div> <div>1053 DE 2022</div>		<div>INTERVENTOR:</div> <div>GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S</div>												
<div>RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA</div>														
<div>Vigencia Fiscal</div>	<div>Registro No.</div>	<div>Programa-Subprograma-Proyecto</div>	<div>Recurso No.</div>	<div>Fuente de Financiación (Nación o Propios)</div>	<div>Contrato Principal / Adicional No.</div>	<div>Valor</div>	<div>Saldo del Acta Anterior</div>							
2022	0916-02	VIA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO		NACIÓN	Contrato Principal	\$ 2.203.091.392,61								
TOTAL						\$ 2.203.091.392,61								
<div>VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:</div>		<div>\$ 2.203.091.392,61</div>												
			<div>SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA</div>											
<div>Acta No.</div>	<div>Tipo de Acta</div>	<div>Mes/Año de Ejecución</div>	<div>Valor Acta sin IVA</div>	<div>Valor IVA</div>	<div>Valor Total Ejecutado Acumulado Acta</div>	<div>Anticipo Amortizado Acta</div>	<div>Valor Total Pagado Descontando Anticipo</div>	<div>Saldo Anticipo por Amortizar</div>	<div>No. de Registro y fecha</div>	<div>Saldo Registro Presupuestal</div>	<div>Saldo del Contrato</div>	<div>No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS</div>	<div>Indicar pago según reporte SIIF</div>	<div>Observaciones</div>
													<div>SI</div> <div>NO</div>	
TOTALES			\$0,00	\$0,00	\$ -					\$ -	\$ -			
<div>Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.</div>														
<div>RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO</div>														
		VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL								
OBRA														
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES						\$ -								
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN						\$ -								
AJUSTES						\$ -								
ESTUDIOS Y DISEÑOS						\$ -								
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)														
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)														
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)														
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO														
VALOR TOTAL		\$ -		\$ -		\$ -								
<div>*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.</div>														
<div>NOTA:</div> <div>Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.</div>														
<div><div><div>Firma</div><div>SERGIO ANDRÉS ARIAS ANZOLA</div><div>Director de Obra</div><div>Matrícula Profesional No.: 54202-385544 NTS</div></div><div><div>Firma</div><div>Diego Efraín Pedraza Chaves</div><div>Director de Interventoría</div><div>Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND</div></div></div>														
<div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</div> <div>Copias: Interventor y Dirección Territorial.</div>														

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10																												
			VERSIÓN	1																												
			PÁGINA																													
			FECHA	31/05/2023 (Día / Mes / Año)																												
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER																													
CONTRATO DE OBRA No: LP-004 DE 2022			CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022																													
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2023			PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL																													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022			INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.																													
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco																																0
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total horas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto. Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																
OBSERVACIONES: No se han Iniciado Actividades de Obra física.																																
<div><div></div><div>Firma Nombre: ANGIE ORTIZ Residente de Obra Matrícula Profesional No.: 121037-0503283 NTS</div></div> <div><div></div><div>Firma Nombre: ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES ANGARITA Residente de Interventoría Matrícula Profesional No.: 54202194523 NTS</div></div>																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA		
							FECHA	31/05/2023 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER									
CONTRATO DE OBRA No.: LP-004 DE 2022 CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022									
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2023 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S									
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
OBSERVACIONES:									
No se han Iniciado Actividades de Obra física.									
NOTAS:									
<p>1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.</p> <p>2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.</p> <p>3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.</p> <p>4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.</p> <p>5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.</p> <p>6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.</p>									
Firma					Firma				
Nombre: SERGIO ANDRÉS ARIAS ANZOLA					Nombre: Diego Efraín Pedraza Chaves				
Director de Obra					Director de Interventoría				
Matrícula Profesional No.:					Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.									
Copias: Interventor, Dirección Territorial.									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA			

FECHA		31	5	2023
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	NORTE DE SANTANDER
-------------------	---------------------------------	------------------------	--------------------

CONTRATO DE OBRA No.	LP-004 DE 2022	CONTRATISTA:	CONSORCIO LA PLAYA 2022
----------------------	----------------	--------------	-------------------------

OBJETO DEL CONTRATO:	
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL	

FECHA DE INICIO:	6/03/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	6/09/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL:	\$ 2,203,091,392.61
VALOR ACUMULADO:	\$ 2,203,091,392.61 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ 12,279,037.61
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ 12,279,037.61

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1053 DE 2022	INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.
-------------------------------	--------------	--------------	---------------------------------------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL	
---	--

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento		\$ 220,309,139.30
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		\$ 220,309,139.30
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ 220,309,139.30

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
27	2	2023	27	12	2023
27	2	2023	27	8	2026
27	1	2023	27	1	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	4007857
Certificado de modificación o anexo No.:	1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:	HDI SEGUROS
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	14/03/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL	
---	--

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 232,000,000.00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
27	1	2023	27	8	2023


PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	4001580	OTRAS PÓLIZAS No.	
Certificado de modificación o anexo No.:	1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)		
Razón Social Compañía Aseguradora:	HDI SEGUROS		
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:	14/03/2023		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																							
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																							
ADICIONAL No.:			PRÓRROGA No.:			MODIFICACIÓN No.:			SUSPENSIÓN No.:																														
Amparo			% Amparo		Valor Asegurado (\$)																																		
Cumplimiento																																							
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones																																							
Calidad de Estudios y Diseños																																							
Estabilidad y/o Calidad de Obra																																							
<div><div><div>GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.</div><div>Certificado de modificación o anexo No.:</div><div>(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)</div><div>Razón Social Compañía Aseguradora:</div><div>Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:</div></div><div><div>SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES</div><div><div>ADICIONAL No.:</div><div>PRÓRROGA No.:</div><div>MODIFICACIÓN No.:</div><div>SUSPENSIÓN No.:</div></div><div><table><tr><td colspan="3">Seguro</td><td colspan="2">% Asegurado</td><td colspan="5">Valor Asegurado (\$)</td></tr><tr><td colspan="3">Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td colspan="2"></td><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="3">Otros</td><td colspan="2"></td><td colspan="5"></td></tr></table><div><div><div>VIGENCIA</div><div><div>Desde</div><div></div><div></div></div><div><div>Hasta</div><div></div><div></div></div></div></div></div></div><div><div><div>PÓLIZA DE SEGURO RCE No.</div><div>OTRAS PÓLIZAS No.</div></div><div><div>Certificado de modificación o anexo No.</div><div>(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</div><div>Razón Social Compañía Aseguradora:</div><div>Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:</div></div></div><div><div>OBSERVACIONES:</div><div></div></div><div><div>NOTAS:</div><div>1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.</div><div>2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros</div></div><div><div><div>Firma</div><div></div></div><div><div>Nombre: Diego Efraín Pedraza Chaves</div><div>Director de Interventoría</div><div>Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND</div></div></div><div><div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</div><div>Copias: Interventor y Dirección Territorial.</div></div></div>										Seguro			% Asegurado		Valor Asegurado (\$)					Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)										Otros									
Seguro			% Asegurado		Valor Asegurado (\$)																																		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)																																							
Otros																																							

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES										CÓDIGO MEPI-MNL-INV-6-FR-2																																																																				
										VERSIÓN 1																																																																					
										PÁGINA																																																																					
										FECHA 31/05/2023 (Día / Mes / Año)																																																																					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. DE VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$.																																																																															
SEGUIMIENTO No. (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)																																																																															
CONTRATO No.: 147-2014-126-2022										PLAZO INICIAL: 6 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 104.001 (En meses según los pronósticos sin suspensiones)																																																																					
OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BIELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 6/02/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 6/02/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)																																																																					
CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022										FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)																																																																					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 2.203.091.392.61 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 2.203.091.392.61																																																																					
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	% Programado \$ Valor Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Ejecutado \$ Valor Ejecutado	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...	%																																																																
GPP1				% P \$ P % E																																																																											
GPP2				% P \$ P % E																																																																											
GPP3				% P \$ P % E																																																																											
GPP4				% P \$ P % E																																																																											
GPP5				% P \$ P % E																																																																											
GPP6				% P \$ P % E																																																																											
GPP7				% P \$ P % E																																																																											
GPP8				% P \$ P % E																																																																											
TOTAL OTROS ITEMS				% P \$ P % E											0%																																																																
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)																																																																															
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																																																																															
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: 1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. 2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. 3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". 4. El Porcentaje de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). 5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.																																																																															
<table><tr><th colspan="2">CONVENCIONES</th></tr><tr><th>TIPO DE DEBILLO</th><th></th></tr><tr><td>BARRAS</td><td>PROGRAMADO \$ Valor EJECUTADO \$ Valor</td></tr><tr><td>CURVAS</td><td>PROGRAMADO \$ Valor EJECUTADO \$ Valor</td></tr></table>																CONVENCIONES		TIPO DE DEBILLO		BARRAS	PROGRAMADO \$ Valor EJECUTADO \$ Valor	CURVAS	PROGRAMADO \$ Valor EJECUTADO \$ Valor																																																								
CONVENCIONES																																																																															
TIPO DE DEBILLO																																																																															
BARRAS	PROGRAMADO \$ Valor EJECUTADO \$ Valor																																																																														
CURVAS	PROGRAMADO \$ Valor EJECUTADO \$ Valor																																																																														
<table><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA</td><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES</td><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA</td><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%															INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	%														INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	VALOR (Miles de Pesos)	%														INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	%													
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%																																																																														
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	%																																																																													
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	VALOR (Miles de Pesos)	%																																																																													
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	%																																																																													
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.																																																																															
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	\$ -	\$ -	%																																																																												
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADOS (B')	\$ -	\$ -	%																																																																												
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ -	\$ -																																																																													
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	\$ -	\$ -																																																																													

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Aprueba Firma: 
Nombre: Sergio Andres Arias Anzola
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: 
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

MUNICIPIO DE PAMPLONITA
CONTRATO DE OBRA No. 202 DE 2022



PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MAYO DE 2023

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

FECHA

31/05/2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

NORTE DE SANTANDER

PERIODO MES:

MAYO

CONTRATO DE OBRA No.:

202 de 2022

PLAZO INICIAL:

6 MESES

FECHA DE INICIO:

14/04/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REANUDACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

13/10/2023

PLAZO ACUMULADO:

182,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :

\$ 1.703.523.226,00

VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

\$ 1.703.523.226,00

ANTICIPO CONCEDIDO:

ANTICIPO AMORTIZADO:

\$ -

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.

CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

1053

INTERVENTOR:

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO				
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento				Mejoramiento			
	Rehabilitación				Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			Estructuras	Túneles			
	Puentes				Puentes			
	Pontones				Pontones			
Mantenimiento				Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Batea			Otros (Especificar cuales)	Batea			
	Box Culvert				Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES				
	BÁSICO	IVA	TOTAL		BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	\$ 1.703.523.226,00		\$ 1.703.523.226,00	OBRAS				
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			\$ -	AJUSTES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			\$ -	OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS				JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			\$ -	ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS				
MANTENIMIENTO PERIODICO			\$ -	GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1.703.523.226,00	\$ -	\$ 1.703.523.226,00	GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.				GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
				GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
				VALOR EJECUTADO				

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:

MANO DE OBRA NO CALIFICADA:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0


REGISTRO FOTOGRÁFICO





--	--

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

<div></div> <div>Firma Nombre: Diego Efraín Pedraza Chaves Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 25202-109359 CND</div>
<div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</div> <div>Copias: Interventor, Dirección Territorial</div>

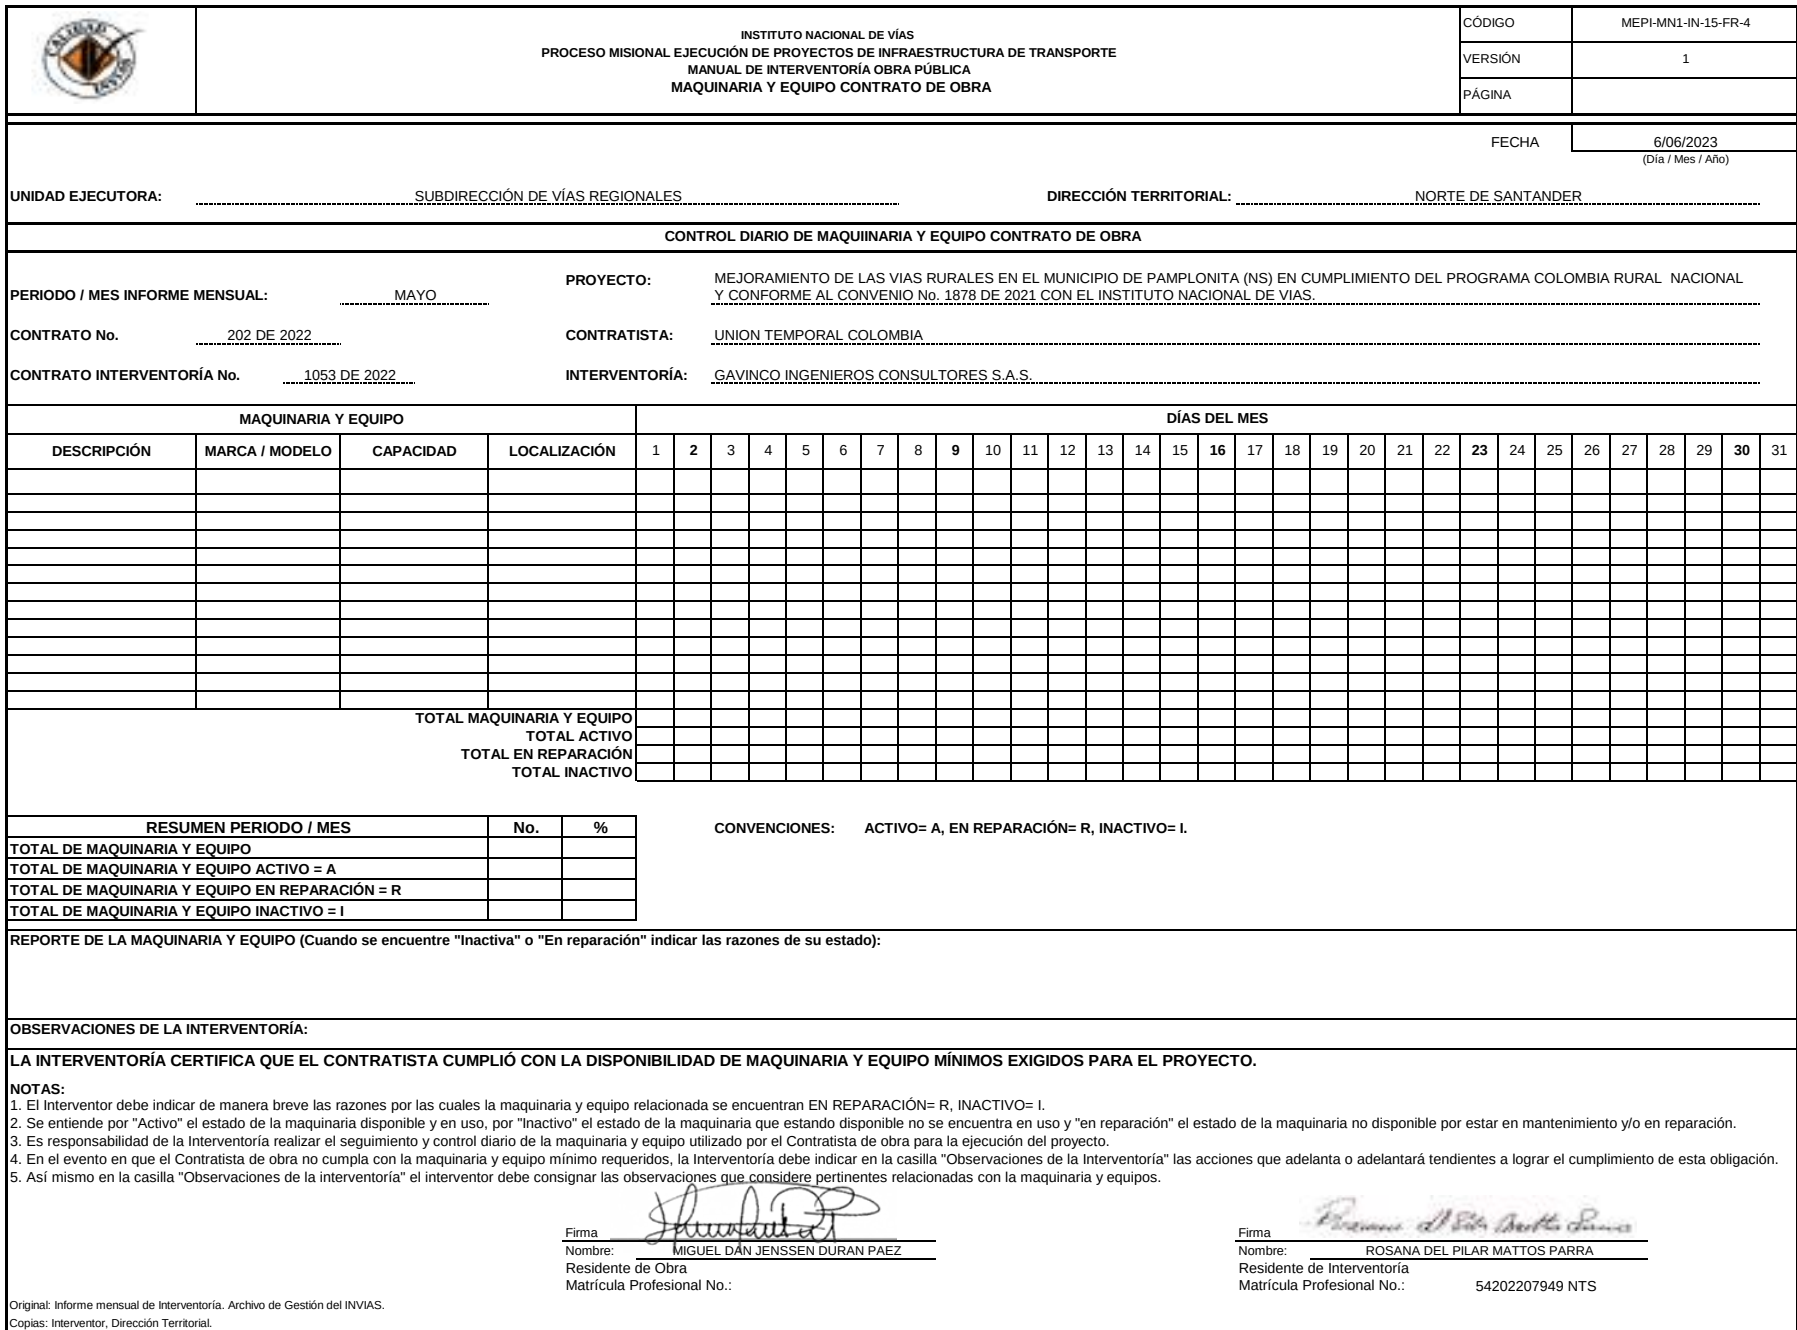

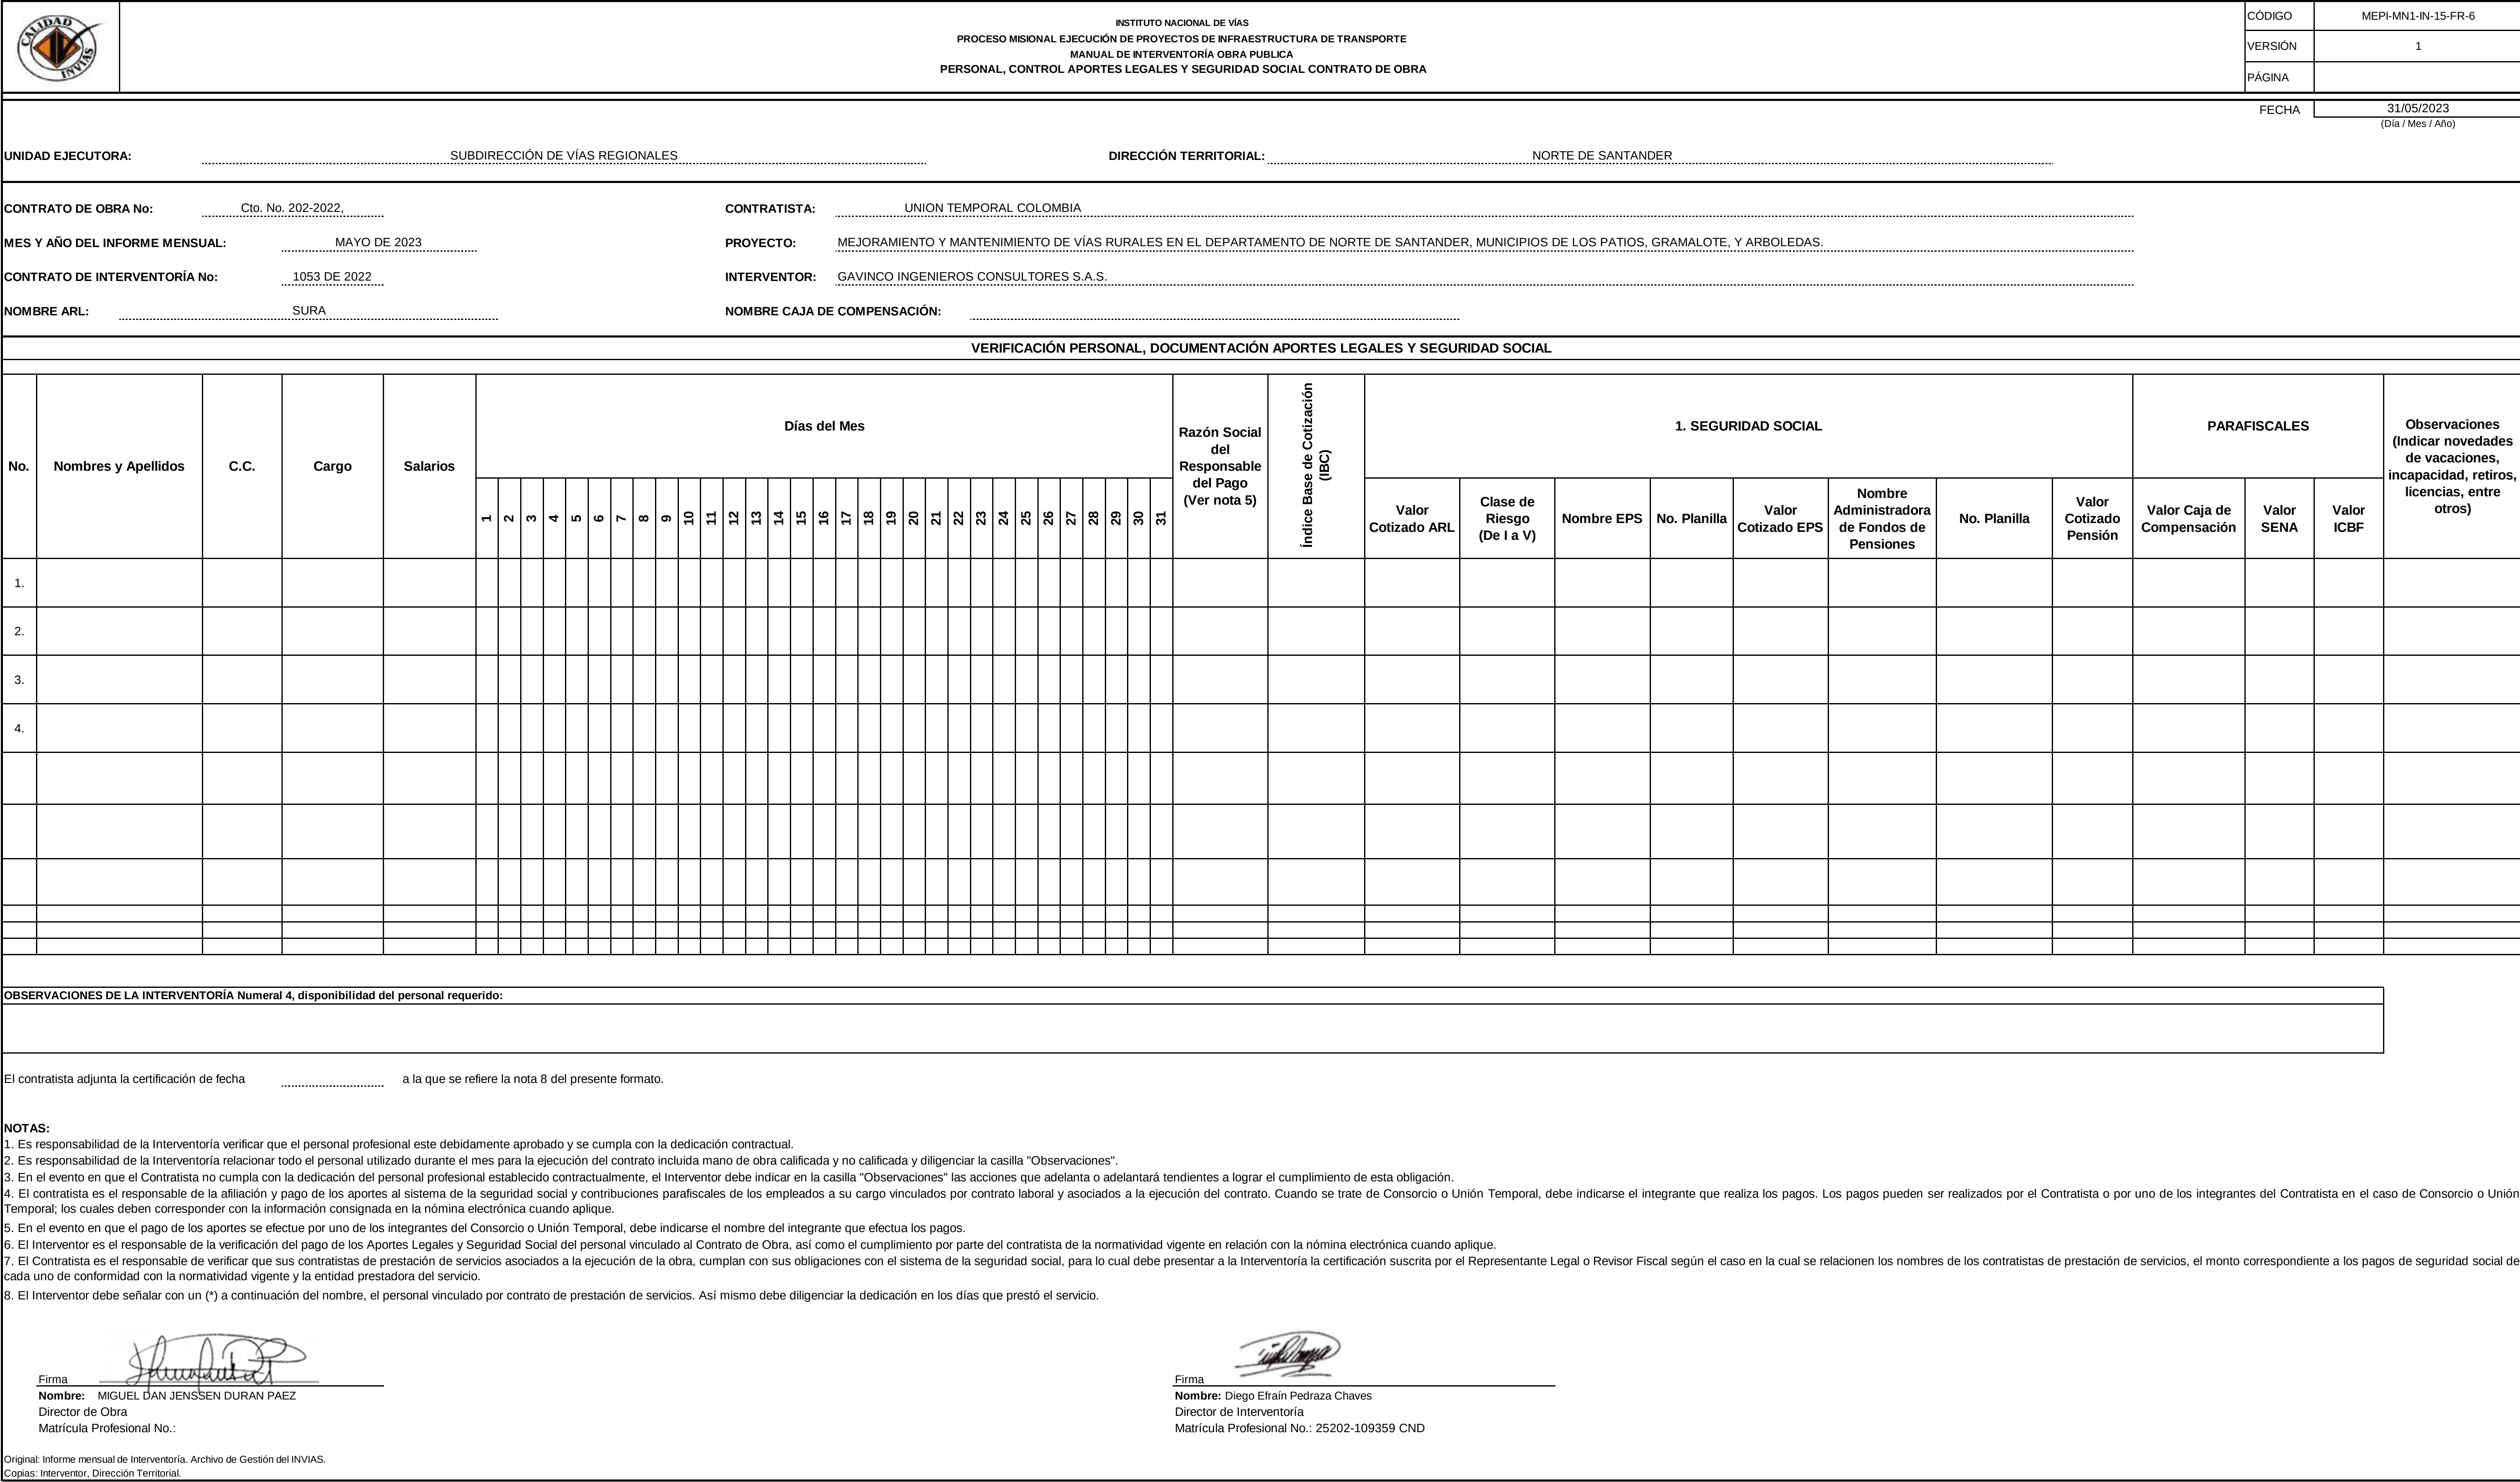

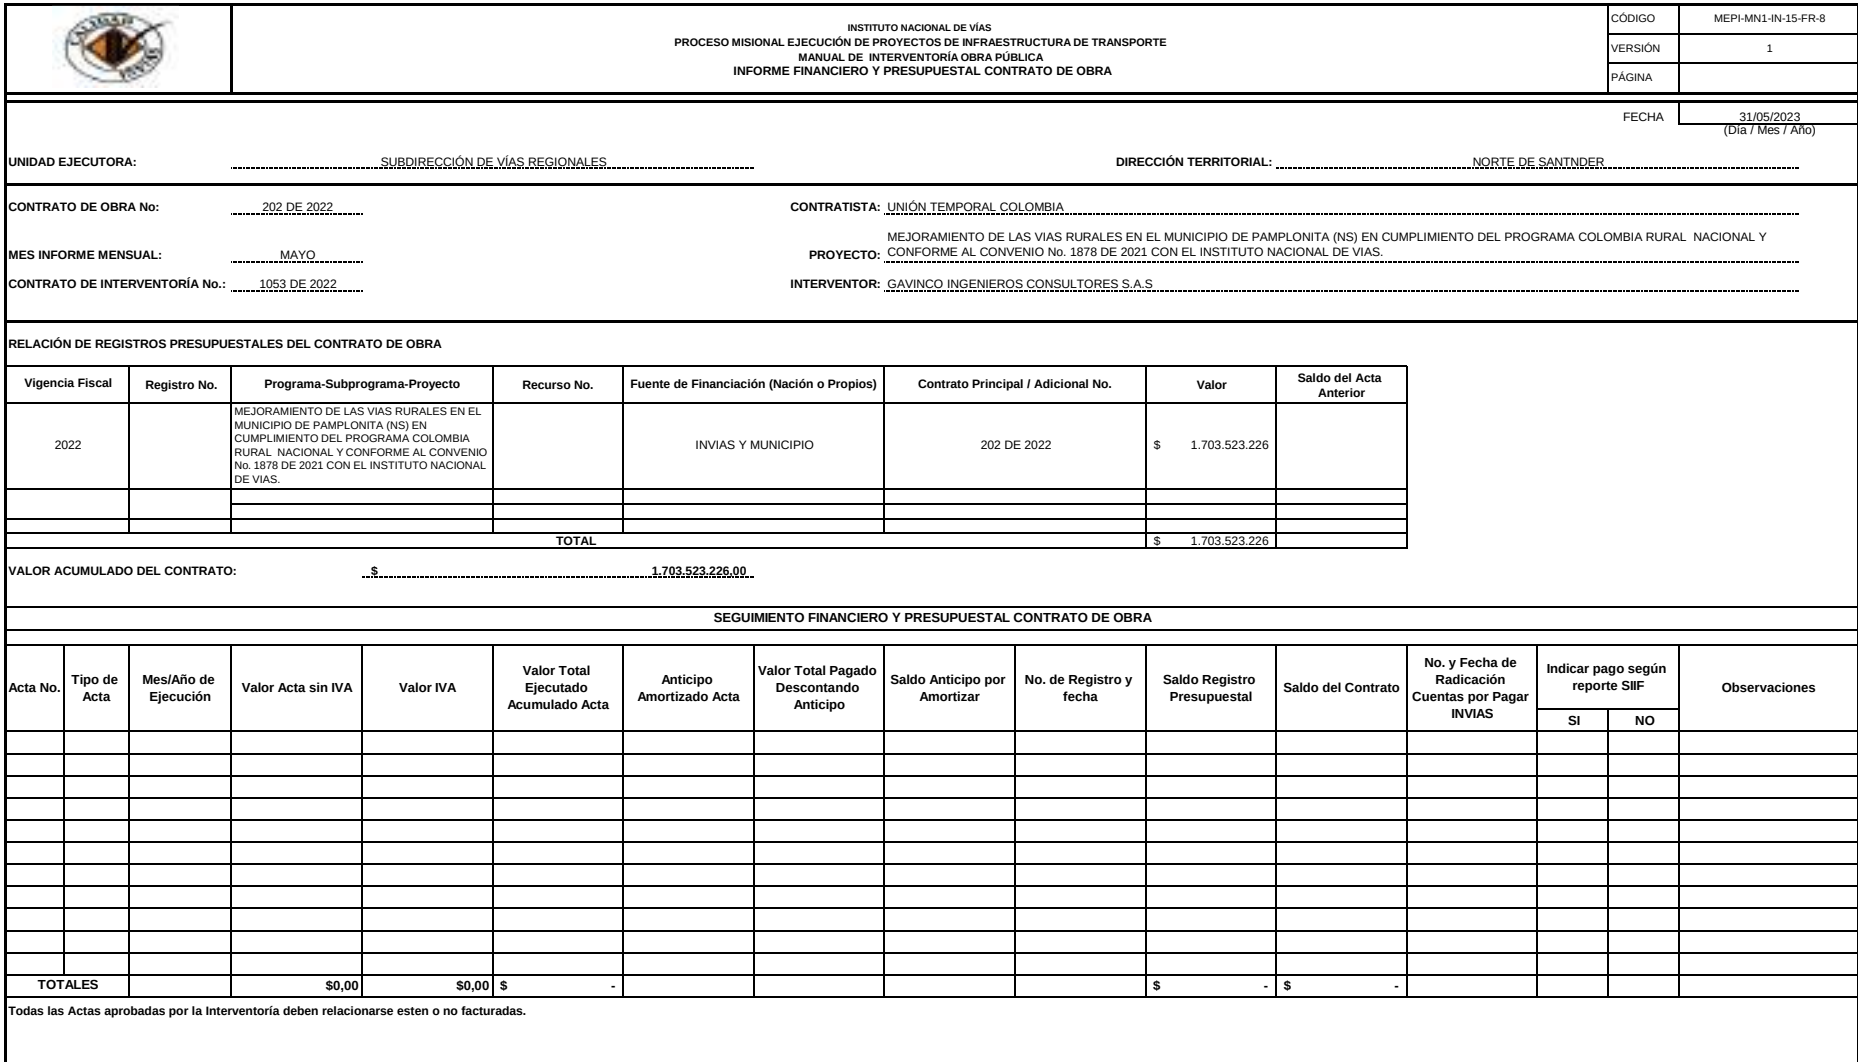

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</div> <div>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>MEPI-MN1-IN-15-FR-8</div>
		<div>VERSIÓN</div> <div>1</div>
		<div>PÁGINA</div> <div></div>

FECHA

31/05/2023
(Día 7 Mes 7 Año)


RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO			
	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA			
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			\$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			\$ -
AJUSTES			\$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO			
VALOR TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma



Nombre: MIGUEL DAN JANSSEN DURAN PAEZ

Director de Obra

Matrícula Profesional No.:

Firma



Nombre: Diego Efraín Pedraza Chaves

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO
MEPI-MN1-IN-15-FR-10
VERSIÓN
1
PÁGINA

FECHA
31/05/2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 202 DE 2022 CONTRATISTA: UNION TEMPORAL COLOMBIA
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: may-23 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco																																0
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total horas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:

Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre: MIGUEL DAN JENSSSEN DURAN PAEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:


Firma

Nombre: ROSANA DEL PILAR MATTOS PARRA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202207949 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
							VERSIÓN	1
							PAGINA	
							FECHA	31/05/2023 (Día / Mes / Año)
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA								
OBSERVACIONES:								
NOTAS:								
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.								
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.								
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.								
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.								
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.								
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.								
								
Firma				Firma				
Nombre: MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ				Nombre: Diego Efraín Pedraza Chaves				
Director de Obra				Director de Interventoría				
Matrícula Profesional No.:				Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.								
Copias: Interventor, Dirección Territorial.								

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12																																																														
		VERSIÓN	1																																																														
		PÁGINA																																																															
		FECHA	31 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)																																																												
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER																																																															
CONTRATO DE OBRA No. 202 de 2022		CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA																																																															
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.																																																																	
FECHA DE INICIO: 14/04/2023 PLAZO INICIAL: 6 MESES FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/10/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 1,703,523,226.00 VALOR ACUMULADO: \$ 1,703,523,226.00 (Incluye adiciones) VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 20,902,728.00 VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 20,902,728.00																																																																	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022,		INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.																																																															
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																																	
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td></td><td>\$ 180,000,000.00</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e</td><td></td><td>\$ 90,000,000.00</td></tr><tr><td>Calidad de Estudios y Diseños</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td></td><td>\$ 180,000,000.00</td></tr></tbody></table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento		\$ 180,000,000.00	Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		\$ 90,000,000.00	Calidad de Estudios y Diseños			Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ 180,000,000.00	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>29</td><td>3</td><td>2023</td><td>29</td><td>9</td><td>2023</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td>3</td><td>2023</td><td>29</td><td>9</td><td>2026</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">5 AÑOS</td><td colspan="3">5 AÑOS</td></tr></tbody></table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			29	3	2023	29	9	2023							29	3	2023	29	9	2026							5 AÑOS			5 AÑOS		
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																															
Cumplimiento		\$ 180,000,000.00																																																															
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																																																	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		\$ 90,000,000.00																																																															
Calidad de Estudios y Diseños																																																																	
Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ 180,000,000.00																																																															
VIGENCIA																																																																	
Desde			Hasta																																																														
29	3	2023	29	9	2023																																																												
29	3	2023	29	9	2026																																																												
5 AÑOS			5 AÑOS																																																														
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400047393																																																																	
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																																	
Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS																																																																	
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 13/04/2023																																																																	
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																																	
<table><thead><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td></td><td>\$ 348,000,000.00</td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 348,000,000.00	Otros			<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>29</td><td>3</td><td>2023</td><td>29</td><td>9</td><td>2023</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			29	3	2023	29	9	2023																																	
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																																															
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 348,000,000.00																																																															
Otros																																																																	
VIGENCIA																																																																	
Desde			Hasta																																																														
29	3	2023	29	9	2023																																																												
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400047383		OTRAS PÓLIZAS No.																																																															
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																																	
Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS																																																																	
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 13/12/2022																																																																	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																							
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																							
ADICIONAL No.:			PRÓRROGA No.:			MODIFICACIÓN No.:			SUSPENSIÓN No.:																														
Amparo			% Amparo		Valor Asegurado (\$)																																		
Cumplimiento																																							
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones																																							
Calidad de Estudios y Diseños																																							
Estabilidad y/o Calidad de Obra																																							
<div><div><div>GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.</div><div>Certificado de modificación o anexo No.:</div><div>(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)</div><div>Razón Social Compañía Aseguradora:</div><div>Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:</div></div><div><div>SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES</div><div><div>ADICIONAL No.:</div><div>PRÓRROGA No.:</div><div>MODIFICACIÓN No.:</div><div>SUSPENSIÓN No.:</div></div><div><table><tr><td colspan="3">Seguro</td><td colspan="2">% Asegurado</td><td colspan="5">Valor Asegurado (\$)</td></tr><tr><td colspan="3">Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td colspan="2"></td><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="3">Otros</td><td colspan="2"></td><td colspan="5"></td></tr></table><div><div><div>VIGENCIA</div><div><div>Desde</div><div></div><div></div></div><div></div><div><div>Hasta</div><div></div><div></div></div></div></div></div></div><div><div><div>PÓLIZA DE SEGURO RCE No.</div><div>OTRAS PÓLIZAS No.</div></div><div><div>Certificado de modificación o anexo No.</div><div>(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</div><div>Razón Social Compañía Aseguradora:</div><div>Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:</div></div></div><div><div>OBSERVACIONES:</div><div></div></div><div><div>NOTAS:</div><div>1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.</div><div>2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros</div></div><div><div><div>Firma</div><div></div></div><div>Nombre: Diego Efraín Pedraza Chaves</div><div>Director de Interventoría</div><div>Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND</div></div><div><div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</div><div>Copias: Interventor y Dirección Territorial.</div></div></div>										Seguro			% Asegurado		Valor Asegurado (\$)					Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)										Otros									
Seguro			% Asegurado		Valor Asegurado (\$)																																		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)																																							
Otros																																							

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

FECHA

31/05/2023
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.

202 DE 2022
(indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.

CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022

FECHA DE INICIO:

14/04/2023
(indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL:

6 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO:

13/10/2023
(incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

1053 DE 2022
(indicar número y año)

INTERVENTOR:

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI NO X APROBADO: SI NO VERSIÓN No. FECHA DE VERSIÓN:

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI NO No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI NO No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI NO APROBADO: SI NO FECHA DE APROBACIÓN: No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES: CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI NO

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:



OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0 No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: 0 No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14				
		VERSIÓN	1				
		PÁGINA					
		FECHA	31/05/2023 (Día) (Mes) (Año)				
6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)							
Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)					
IG1: Índice de gestión 1 =							
IG2: Índice de gestión 2 =							
IG3: Índice de gestión 3 =							
IG4: Índice de gestión 4 =							
IG5: Índice de gestión 5 =							
IGn: Índice de gestión n =							
Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.							
OBSERVACIONES:							
7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).							
No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
OBSERVACIONES:							
NOTA: Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.							
Firma  Nombre: MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ Director de la Obra Matrícula Profesional No.:	Firma  Nombre: Diego Efraín Pedraza Chaves Director de la Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND	Firma  Nombre: Profesional en Calidad Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.:					
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.							

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES													CÓDIGO MEPI-MNL-INV-6-FR-2																																																																	
														VERSIÓN 1																																																																	
														PÁGINA																																																																	
														FECHA 31/05/2023 (Día / Mes / Año)																																																																	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. DE VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$.																																																																															
SEGUIMIENTO No. (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)																																																																															
CONTRATO No.: 202-001-2022- PLAZO INICIAL: \$ 1.000.000,00 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: \$ 1.000.000,00 (En meses según los primeros sin suspensiones)																																																																															
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 14/04/2022 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/10/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)																																																																															
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 1.709.523.226,00 (Según contrato principal) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$.																																																																															
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1063 DE 2022 INTERVENIOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 1.709.523.226,00																																																																															
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado \$ Valor Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	\$ Valor Ejecutado % Ejecutado	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...																																																																	
GPP1				% P \$ P % E \$ E											%																																																																
GPP2				% P \$ P % E \$ E											%																																																																
GPP3				% P \$ P % E \$ E											%																																																																
GPP4				% P \$ P % E \$ E											%																																																																
GPP5				% P \$ P % E \$ E											%																																																																
GPP6				% P \$ P % E \$ E											%																																																																
GPP7				% P \$ P % E \$ E											%																																																																
GPP8				% P \$ P % E \$ E											%																																																																
TOTAL OTROS ÍTEMS				% P \$ P % E \$ E											%																																																																
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)																																																																															
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																																																																															
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: 1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. 2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. 3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". 4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra sin incluir provisiones e IVA. 5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.																																																																															
<table><tr><th colspan="3">CONVENCIONES</th></tr><tr><th>TIPO DE DEBILLO</th><th>PROGRAMADO</th><th>EJECUTADO</th></tr><tr><td>BARRAS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CURVAS</td><td></td><td></td></tr></table>																CONVENCIONES			TIPO DE DEBILLO	PROGRAMADO	EJECUTADO	BARRAS			CURVAS																																																						
CONVENCIONES																																																																															
TIPO DE DEBILLO	PROGRAMADO	EJECUTADO																																																																													
BARRAS																																																																															
CURVAS																																																																															
<table><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA</td><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA</td><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%															INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)															INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%															INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)														
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%																																																																														
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)																																																																														
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																																																																														
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)																																																																														
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.																																																																															
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	\$ -	\$ -	%																																																																												
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADOS (B')	\$ -	\$ -	%																																																																												
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ -	\$ -																																																																													
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	\$ -	\$ -																																																																													

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 1943
CONTRATO DE OBRA No. 02590 DE 2022



PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MAYO DE 2023

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO				CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2	
					VERSION	1	
					PÁGINA		

FECHA					31/05/2023 (Día / Mes / Año)	
-------	--	--	--	--	---------------------------------	--

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	NORTE DE SANTANDER	PERIODO MES:	MAYO
-------------------	---------------------------------	------------------------	--------------------	--------------	------

CONTRATO DE OBRA No.:	02590 DE 2022	PLAZO INICIAL:	8 MESES	VALOR INICIAL (incluido IVA) :	\$ 16.898.027.326,00
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.		FECHA DE INICIO:	10/04/2023	VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	
		FECHA DE SUSPENSIÓN:			
		FECHA DE REANUDACIÓN:		VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	\$ 16.898.027.326,00
		FECHA DE VENCIMIENTO:	9/12/2023	ANTICIPO CONCEDIDO:	
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 02590	PLAZO ACUMULADO:	243,00	ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	1053	INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	LEONEL VALERO ESCALANTE
----------------------------	------	--------------	--------------------------------------	---	-------------------------

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																																			
<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Otros (Especificar cuales)</td><td>Batea</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Box Culvert</td><td></td><td></td></tr></table>				ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción			Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)	Batea			Box Culvert			<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Otros (Especificar cuales)</td><td>Batea</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Box Culvert</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción				Mejoramiento				Rehabilitación				Estructuras	Túneles				Puentes				Pontones				Mantenimiento					Otros (Especificar cuales)	Batea				Box Culvert			
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD																																																																																				
Pavimentación	Construcción																																																																																						
	Mejoramiento																																																																																						
	Rehabilitación																																																																																						
Estructuras	Túneles																																																																																						
	Puentes																																																																																						
	Pontones																																																																																						
Mantenimiento																																																																																							
Otros (Especificar cuales)	Batea																																																																																						
	Box Culvert																																																																																						
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																																																			
Pavimentación	Construcción																																																																																						
	Mejoramiento																																																																																						
	Rehabilitación																																																																																						
Estructuras	Túneles																																																																																						
	Puentes																																																																																						
	Pontones																																																																																						
Mantenimiento																																																																																							
Otros (Especificar cuales)	Batea																																																																																						
	Box Culvert																																																																																						

AVANCE FINANCIERO			
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES			
	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	\$ 16.898.027.326,00		\$ 16.898.027.326,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			\$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			\$ -
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			\$ -
MANTENIMIENTO PERIODICO			\$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 16.898.027.326,00	\$ -	\$ 16.898.027.326,00
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.			
INVERSIÓN EN OBRA			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):			
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):			

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES				
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				
EMPLEOS GENERADOS EN EL MES				
MANO DE OBRA CALIFICADA:				
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:				
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:				
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:				


REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Arboledas	Municipio de los Patios
------------------------	-------------------------

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

<div> Firma Nombre: Diego Efraín Pedraza Chaves Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 25202-109359 CND <small>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial</small></div>

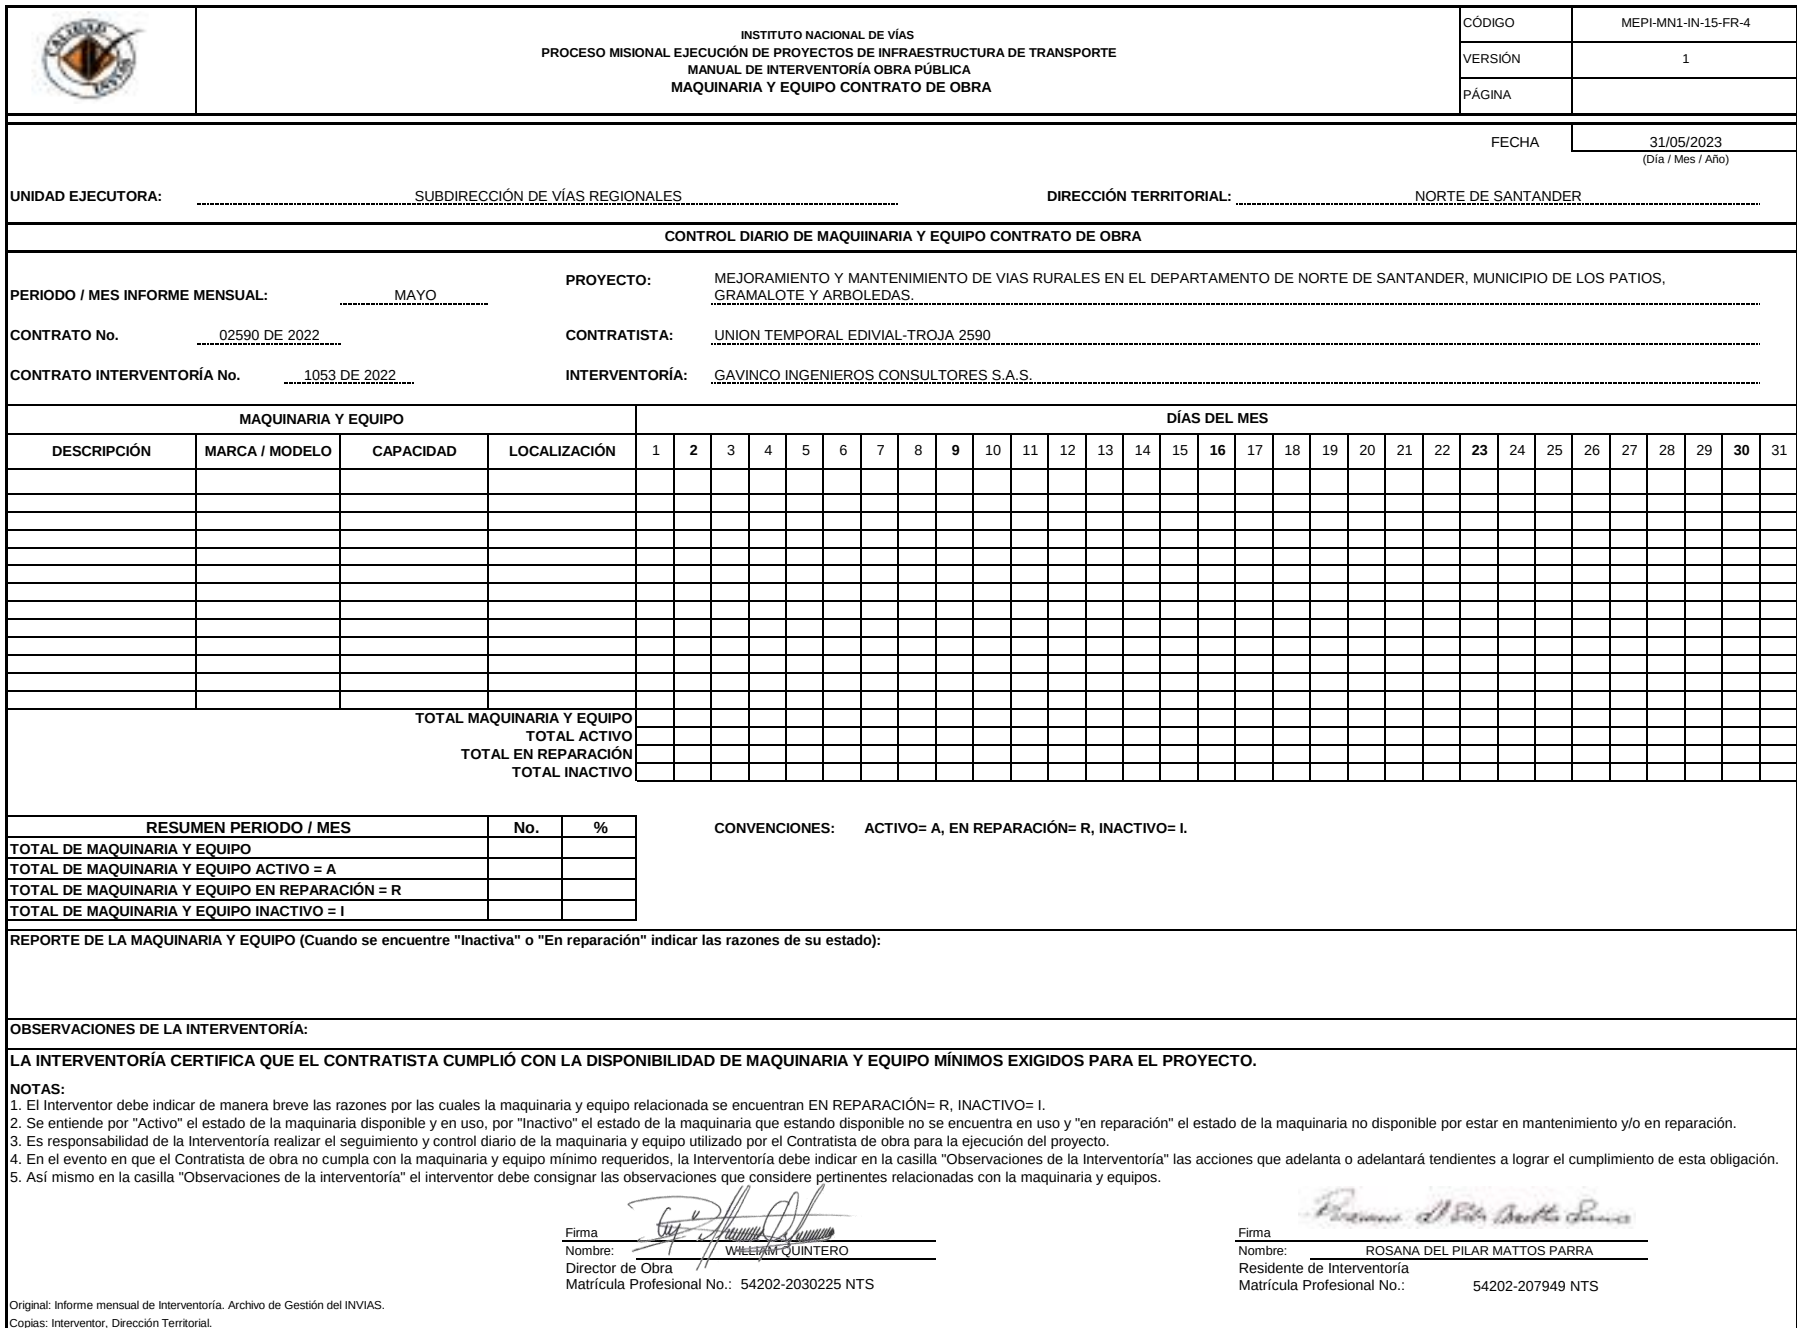



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

VERSIÓN

1

PÁGINA

FECHA

31/05/2023

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No:

LP-SV02590-2022

CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL EDIVIAL TROJA 2590

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:

MAYO DE 2023

PROYECTO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIOS DE LOS PATIOS, GRAMALOTE, Y ARBOLEDAS.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:

..1053 DE 2022..

INTERVENTOR:

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE ARL:

SURAMERICANA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

COMFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1.	Hector Fabio Acosta Garcia	1090423766	Auxiliar Contable	\$ 1.600.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Union Temporal Edivial Troja 2590	\$ 1.600.000		I	Crossalud eps			Porvenir	0	\$ -							
2.	Cesar Andres Cardenas Coll	1090393766	Residente de obra	\$ 2.000.000																													Union Temporal Edivial Troja 2590	\$ 2.000.000		V	Nueva eps			Porvenir	0	\$ -							
3.	Franklyn Aaron Giraldo Collantes	79685180	Coordinador de logística	\$ 2.000.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Union Temporal Edivial Troja 2590	\$ 2.000.000		V	Sanitas eps			Porvenir	0	\$ -							
4.	Leidy Yuliana Jaime Trillos	1091664068	Ingeniera Auxiliar	\$ 2.000.000									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Union Temporal Edivial Troja 2590	\$ 2.000.000		I	Sanitas eps			Porvenir	0	\$ -							
5.	Luis Ramón Nuñez Silva	1094426602	Inspector de obra	#####	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Union Temporal Edivial Troja 2590	\$ 1.800.000		V	Nueva eps			Porvenir	0								
6.	William Pabón Quintero	13278653	Director de obra	#####	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Union Temporal Edivial Troja 2590	\$3.000.000,00		V	Sanitas eps			Protección	0								
7.	Andrey Alexis Calderon Rodriguez	88219891	Responsable SST	#####	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Union Temporal Edivial Troja 2590	\$1.160.000,00		V	Nueva Eps			Protección	0	\$ -							

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha

a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.

6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma



Nombre:

William Quintero Pabon.

Director de Obra

Matrícula Profesional No.:

54202-230225 NTS

Firma



Nombre:

Diego Efraín Pedraza Chaves

Director de Interventoría


Matrícula Profesional No.:

25202-109359 CND

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del RNVIAS.

Copie: Interventor, Dirección Territorial.

[illegible]



MEPI-MN1-IN-15-FR-10

1

FECHA

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

[illegible]

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Nombre: WILLIAM QUINTERO

Matrícula Profesional No.: 54202-2300225 NTS

Nombre: ROSANA DEL PILAR MATTOS PARRA

Matrícula Profesional No.: 54202207949 NTS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA		
							FECHA	31/05/2023 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER									
CONTRATO DE OBRA No.: 02590 DE 2022 CONTRATISTA: UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2022									
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: may-23 PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIOS DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES									
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
OBSERVACIONES:									
NOTAS:									
<p>1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.</p> <p>2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.</p> <p>3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.</p> <p>4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.</p> <p>5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.</p> <p>6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.</p>									
Firma Nombre: WILLIAM QUINTERO PABON Director de Obra Matrícula Profesional No.: 54202-230225 NTS					Firma Nombre: Diego Efraín Pedraza Chaves Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

FECHA

31/05/2023
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.

02590 DE 2022
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIOS DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL EDIVIAL TROJA 2580

FECHA DE INICIO:

10/04/2023
(Indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL:

8 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO:

9/12/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

1053 DE 2022
(Indicar número y año)

INTERVENTOR:

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO:

SI

NO

APROBADO:

SI

NO

VERSIÓN No.

FECHA DE VERSIÓN:

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO:

SI

NO

No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS:

FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA:

SI

NO

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS:

FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO:

SI

NO

APROBADO:

SI

NO

FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES:

No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES:

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES:

SI

NO

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes:

0

No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:

No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:

0

No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:

0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:

0

No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:

0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:

0

No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:

0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA

31/05/2023

(Día) (Mes) (Año)

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.



Firma

Nombre: WILLIAM QUIÑERO PABON
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-230225 NTS



Firma

Nombre: Diego Efraín Pedraza Chaves
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND



Firma

Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA			

FECHA		31	5	2023
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	NORTE DE SANTANDER
-------------------	---------------------------------	------------------------	--------------------

CONTRATO DE OBRA No.	02590 DE 2022	CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590
----------------------	---------------	--------------	-----------------------------------

OBJETO DEL CONTRATO:			
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.			

FECHA DE INICIO:	10/04/2023
PLAZO INICIAL:	8 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	9/12/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL:	\$ 16,898,027,326.00
VALOR ACUMULADO:	\$ 16,898,027,326.00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ 204,519,914.00
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ 204,519,914.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1053 DE 2022,	INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.
-------------------------------	---------------	--------------	---------------------------------------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL												
Amparo			% Amparo		Valor Asegurado (\$)		VIGENCIA					
							Desde			Hasta		
Cumplimiento					\$ 1,689,802,732.00		10 4 2023			12 4 2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo												
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e					\$ 1,689,802,732.00		10 4 2023			12 12 2026		
Calidad de Estudios y Diseños												
Estabilidad y/o Calidad de Obra					\$ 1,689,802,732.00		5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.		21-44-101403451
Certificado de modificación o anexo No.:		2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)		
Razón Social Compañía Aseguradora:		SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:		13/04/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL												
Seguro			% Asegurado		Valor Asegurado (\$)		VIGENCIA					
							Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)					\$ 844,901,366.00		10 4 2023			12 12 2023		
Otros												

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	21-40-101203708	OTRAS PÓLIZAS No.	
Certificado de modificación o anexo No.:	2	(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)	
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO		
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:	12/04/2023		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y/o Calidad de Obra		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. OTRAS PÓLIZAS No.
Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma
Nombre: Diego Efraín Pedraza Chaves
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

[illegible]

PODSUMEN DE INFORMACIONES

[illegible]

FORMA DE SUBMITERE: ☐ ONLINE ☐ PE PAPER

NUMERUL DE INSCRIEREA: DATA INSCRIERII:

NUMERUL DE IDENTIFICARE: DATA IDENTIFICARII:

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 101–106

[illegible]

1. Qual è l'ordine di importanza dei fattori di rischio per la contaminazione ambientale in genere?

2. Quali sono le fonti d'origine antropica, in ordine?

3. Il "Piano Nazionale di Emergenza per la Gestione delle Emergenze Ambientali" è:

4. Come si può prevenire la contaminazione dell'aria da parte di impianti industriali e da parte di attività di traffico veicolare?

5. Quali sono le principali fonti di inquinamento dell'aria in Italia? Quali sono le principali fonti di inquinamento dell'acqua in Italia?

6. Quali sono le principali fonti di inquinamento del suolo in Italia? Quali sono le principali fonti di inquinamento delle acque sotterranee in Italia?

7. Quali sono le principali fonti di inquinamento delle acque superficiali in Italia? Quali sono le principali fonti di inquinamento delle acque marine in Italia?

8. Quali sono le principali fonti di inquinamento delle acque meteoriche in Italia? Quali sono le principali fonti di inquinamento delle acque di superficie in Italia?

9. Quali sono le principali fonti di inquinamento delle acque di falda in Italia? Quali sono le principali fonti di inquinamento delle acque di superficie in Italia?

10. Quali sono le principali fonti di inquinamento delle acque di falda in Italia? Quali sono le principali fonti di inquinamento delle acque di superficie in Italia?

[illegible]

1. Emisyonun Adı 2. Emisyonun Amacı 3. Emisyonun Tutarı 4. Emisyonun Tutarı (TL) 5. Emisyonun Tutarı (USD) 6. Emisyonun Tutarı (EUR) 7. Emisyonun Tutarı (GBP) 8. Emisyonun Tutarı (JPY) 9. Emisyonun Tutarı (AUD) 10. Emisyonun Tutarı (NZD) 11. Emisyonun Tutarı (HKD) 12. Emisyonun Tutarı (SGD) 13. Emisyonun Tutarı (KWD) 14. Emisyonun Tutarı (BHD) 15. Emisyonun Tutarı (QAR) 16. Emisyonun Tutarı (SAR) 17. Emisyonun Tutarı (TRY) 18. Emisyonun Tutarı (ZAR) 19. Emisyonun Tutarı (RUB) 20. Emisyonun Tutarı (INR) 21. Emisyonun Tutarı (PKR) 22. Emisyonun Tutarı (LKR) 23. Emisyonun Tutarı (BDT) 24. Emisyonun Tutarı (NPR) 25. Emisyonun Tutarı (MVR) 26. Emisyonun Tutarı (BTN) 27. Emisyonun Tutarı (MNT) 28. Emisyonun Tutarı (KHR) 29. Emisyonun Tutarı (LAK) 30. Emisyonun Tutarı (VND) 31. Emisyonun Tutarı (IDR) 32. Emisyonun Tutarı (MYR) 33. Emisyonun Tutarı (THB) 34. Emisyonun Tutarı (SGD) 35. Emisyonun Tutarı (USD) 36. Emisyonun Tutarı (EUR) 37. Emisyonun Tutarı (GBP) 38. Emisyonun Tutarı (JPY) 39. Emisyonun Tutarı (AUD) 40. Emisyonun Tutarı (NZD) 41. Emisyonun Tutarı (HKD) 42. Emisyonun Tutarı (SGD) 43. Emisyonun Tutarı (KWD) 44. Emisyonun Tutarı (BHD) 45. Emisyonun Tutarı (QAR) 46. Emisyonun Tutarı (SAR) 47. Emisyonun Tutarı (TRY) 48. Emisyonun Tutarı (ZAR) 49. Emisyonun Tutarı (RUB) 50. Emisyonun Tutarı (INR) 51. Emisyonun Tutarı (PKR) 52. Emisyonun Tutarı (LKR) 53. Emisyonun Tutarı (BDT) 54. Emisyonun Tutarı (NPR) 55. Emisyonun Tutarı (MVR) 56. Emisyonun Tutarı (BTN) 57. Emisyonun Tutarı (MNT) 58. Emisyonun Tutarı (KHR) 59. Emisyonun Tutarı (LAK) 60. Emisyonun Tutarı (VND) 61. Emisyonun Tutarı (IDR) 62. Emisyonun Tutarı (MYR) 63. Emisyonun Tutarı (THB) 64. Emisyonun Tutarı (SGD) 65. Emisyonun Tutarı (USD) 66. Emisyonun Tutarı (EUR) 67. Emisyonun Tutarı (GBP) 68. Emisyonun Tutarı (JPY) 69. Emisyonun Tutarı (AUD) 70. Emisyonun Tutarı (NZD) 71. Emisyonun Tutarı (HKD) 72. Emisyonun Tutarı (SGD) 73. Emisyonun Tutarı (KWD) 74. Emisyonun Tutarı (BHD) 75. Emisyonun Tutarı (QAR) 76. Emisyonun Tutarı (SAR) 77. Emisyonun Tutarı (TRY) 78. Emisyonun Tutarı (ZAR) 79. Emisyonun Tutarı (RUB) 80. Emisyonun Tutarı (INR) 81. Emisyonun Tutarı (PKR) 82. Emisyonun Tutarı (LKR) 83. Emisyonun Tutarı (BDT) 84. Emisyonun Tutarı (NPR) 85. Emisyonun Tutarı (MVR) 86. Emisyonun Tutarı (BTN) 87. Emisyonun Tutarı (MNT) 88. Emisyonun Tutarı (KHR) 89. Emisyonun Tutarı (LAK) 90. Emisyonun Tutarı (VND) 91. Emisyonun Tutarı (IDR) 92. Emisyonun Tutarı (MYR) 93. Emisyonun Tutarı (THB) 94. Emisyonun Tutarı (SGD) 95. Emisyonun Tutarı (USD) 96. Emisyonun Tutarı (EUR) 97. Emisyonun Tutarı (GBP) 98. Emisyonun Tutarı (JPY) 99. Emisyonun Tutarı (AUD) 100. Emisyonun Tutarı (NZD) 101. Emisyonun Tutarı (HKD) 102. Emisyonun Tutarı (SGD) 103. Emisyonun Tutarı (KWD) 104. Emisyonun Tutarı (BHD) 105. Emisyonun Tutarı (QAR) 106. Emisyonun Tutarı (SAR) 107. Emisyonun Tutarı (TRY) 108. Emisyonun Tutarı (ZAR) 109. Emisyonun Tutarı (RUB) 110. Emisyonun Tutarı (INR) 111. Emisyonun Tutarı (PKR) 112. Emisyonun Tutarı (LKR) 113. Emisyonun Tutarı (BDT) 114. Emisyonun Tutarı (NPR) 115. Emisyonun Tutarı (MVR) 116. Emisyonun Tutarı (BTN) 117. Emisyonun Tutarı (MNT) 118. Emisyonun Tutarı (KHR) 119. Emisyonun Tutarı (LAK) 120. Emisyonun Tutarı (VND) 121. Emisyonun Tutarı (IDR) 122. Emisyonun Tutarı (MYR) 123. Emisyonun Tutarı (THB) 124. Emisyonun Tutarı (SGD) 125. Emisyonun Tutarı (USD) 126. Emisyonun Tutarı (EUR) 127. Emisyonun Tutarı (GBP) 128. Emisyonun Tutarı (JPY) 129. Emisyonun Tutarı (AUD) 130. Emisyonun Tutarı (NZD) 131. Emisyonun Tutarı (HKD) 132. Emisyonun Tutarı (SGD) 133. Emisyonun Tutarı (KWD) 134. Emisyonun Tutarı (BHD) 135. Emisyonun Tutarı (QAR) 136. Emisyonun Tutarı (SAR) 137. Emisyonun Tutarı (TRY) 138. Emisyonun Tutarı (ZAR) 139. Emisyonun Tutarı (RUB) 140. Emisyonun Tutarı (INR) 141. Emisyonun Tutarı (PKR) 142. Emisyonun Tutarı (LKR) 143. Emisyonun Tutarı (BDT) 144. Emisyonun Tutarı (NPR) 145. Emisyonun Tutarı (MVR) 146. Emisyonun Tutarı (BTN) 147. Emisyonun Tutarı (MNT) 148. Emisyonun Tutarı (KHR) 149. Emisyonun Tutarı (LAK) 150. Emisyonun Tutarı (VND) 151. Emisyonun Tutarı (IDR) 152. Emisyonun Tutarı (MYR) 153. Emisyonun Tutarı (THB) 154. Emisyonun Tutarı (SGD) 155. Emisyonun Tutarı (USD) 156. Emisyonun Tutarı (EUR) 157. Emisyonun Tutarı (GBP) 158. Emisyonun Tutarı (JPY) 159. Emisyonun Tutarı (AUD) 160. Emisyonun Tutarı (NZD) 161. Emisyonun Tutarı (HKD) 162. Emisyonun Tutarı (SGD) 163. Emisyonun Tutarı (KWD) 164. Emisyonun Tutarı (BHD) 165. Emisyonun Tutarı (QAR) 166. Emisyonun Tutarı (SAR) 167. Emisyonun Tutarı (TRY) 168. Emisyonun Tutarı (ZAR) 169. Emisyonun Tutarı (

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)
 2. *Chlorophyll b* (Chl *b*)
 3. *Chlorophyll c* (Chl *c*)
 4. *Chlorophyll d* (Chl *d*)
 5. *Chlorophyll e* (Chl *e*)
 6. *Chlorophyll f* (Chl *f*)
 7. *Chlorophyll g* (Chl *g*)
 8. *Chlorophyll h* (Chl *h*)
 9. *Chlorophyll i* (Chl *i*)
 10. *Chlorophyll j* (Chl *j*)
 11. *Chlorophyll k* (Chl *k*)
 12. *Chlorophyll l* (Chl *l*)
 13. *Chlorophyll m* (Chl *m*)
 14. *Chlorophyll n* (Chl *n*)
 15. *Chlorophyll o* (Chl *o*)
 16. *Chlorophyll p* (Chl *p*)
 17. *Chlorophyll q* (Chl *q*)
 18. *Chlorophyll r* (Chl *r*)
 19. *Chlorophyll s* (Chl *s*)
 20. *Chlorophyll t* (Chl *t*)
 21. *Chlorophyll u* (Chl *u*)
 22. *Chlorophyll v* (Chl *v*)
 23. *Chlorophyll w* (Chl *w*)
 24. *Chlorophyll x* (Chl *x*)
 25. *Chlorophyll y* (Chl *y*)
 26. *Chlorophyll z* (Chl *z*)
 27. *Chlorophyll aa* (Chl *aa*)
 28. *Chlorophyll ab* (Chl *ab*)
 29. *Chlorophyll ac* (Chl *ac*)
 30. *Chlorophyll ad* (Chl *ad*)
 31. *Chlorophyll ae* (Chl *ae*)
 32. *Chlorophyll af* (Chl *af*)
 33. *Chlorophyll ag* (Chl *ag*)
 34. *Chlorophyll ah* (Chl *ah*)
 35. *Chlorophyll ai* (Chl *ai*)
 36. *Chlorophyll aj* (Chl *aj*)
 37. *Chlorophyll ak* (Chl *ak*)
 38. *Chlorophyll al* (Chl *al*)
 39. *Chlorophyll am* (Chl *am*)
 40. *Chlorophyll an* (Chl *an*)
 41. *Chlorophyll ao* (Chl *ao*)
 42. *Chlorophyll ap* (Chl *ap*)
 43. *Chlorophyll aq* (Chl *aq*)
 44. *Chlorophyll ar* (Chl *ar*)
 45. *Chlorophyll as* (Chl *as*)
 46. *Chlorophyll at* (Chl *at*)
 47. *Chlorophyll au* (Chl *au*)
 48. *Chlorophyll av* (Chl *av*)
 49. *Chlorophyll aw* (Chl *aw*)
 50. *Chlorophyll ax* (Chl *ax*)
 51. *Chlorophyll ay* (Chl *ay*)
 52. *Chlorophyll az* (Chl *az*)
 53. *Chlorophyll aza* (Chl *aza*)
 54. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 55. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
 56. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)
 57. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)
 58. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)
 59. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)
 60. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)
 61. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)
 62. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)
 63. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)
 64. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)
 65. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)
 66. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)
 67. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)
 68. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)
 69. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)
 70. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)
 71. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)
 72. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)
 73. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)
 74. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)
 75. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)
 76. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)
 77. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 78. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 79. *Chlorophyll azz* (Chl *azz*)
 80. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*)
 81. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 82. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
 83. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)
 84. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)
 85. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)
 86. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)
 87. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)
 88. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)
 89. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)
 90. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)
 91. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)
 92. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)
 93. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)
 94. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)
 95. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)
 96. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)
 97. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)
 98. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)
 99. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)
 100. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)
 101. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)
 102. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)
 103. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)
 104. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 105. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 106. *Chlorophyll azz* (Chl *azz*)
 107. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*)
 108. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 109. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
 110. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)
 111. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)
 112. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)
 113. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)
 114. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)
 115. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)
 116. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)
 117. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)
 118. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)
 119. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)
 120. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)
 121. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)
 122. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)
 123. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)
 124. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)
 125. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)
 126. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)
 127. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)
 128. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)
 129. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)
 130. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)
 131. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 132. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 133.



UNIDAD ADMINISTRATIVA: MINISTERIO DE SALUD NACIONAL UNIDAD TERRITORIAL: CENTRO DE ANÁLISIS DE DATOS N°: 10000000000000000000 VALOR BÚSQUEDA: 10000000000000000000

FECHA DE EMISIÓN: 10/01/2011 FECHA DE RECEPCIÓN: 10/01/2011

OBJETO: ESTADÍSTICA DE SALUD DE LA CIUDAD DE LA HABANA

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/01/2011 FECHA DE EMISIÓN: 10/01/2011

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/01/2011 FECHA DE EMISIÓN: 10/01/2011

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/01/2011 FECHA DE EMISIÓN: 10/01/2011

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/01/2011 FECHA DE EMISIÓN: 10/01/2011

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/01/2011 FECHA DE EMISIÓN: 10/01/2011

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/01/2011 FECHA DE EMISIÓN: 10/01/2011

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/01/2011 FECHA DE EMISIÓN: 10/01/2011

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/01/2011 FECHA DE EMISIÓN: 10/01/2011

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/01/2011 FECHA DE EMISIÓN: 10/01/2011

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/01/2011 FECHA DE EMISIÓN: 10/01/2011

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/01/2011 FECHA DE EMISIÓN: 10/01/2011

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/01/2011 FECHA DE EMISIÓN: 10/01/2011

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/01/2011 FECHA DE EMISIÓN: 10/01/2011

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/01/2011 FECHA DE EMISIÓN: 10/01/2011

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/01/2011 FECHA DE EMISIÓN: 10/01/2011

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/01/2011 FECHA DE EMISIÓN: 10/01/2011

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/01/2011 FECHA DE EMISIÓN: 10/01/2011

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/01/2011 FECHA DE EMISIÓN: 10/01/2011

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/01/2011 FECHA DE EMISIÓN: 10/01/2011

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/01/2011 FECHA DE EMISIÓN: 10/01/2011

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/01/2011 FECHA DE EMISIÓN: 10/01/2011

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/01/2011 FECHA DE EMISIÓN: 10/01/2011

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/01/2011 FECHA DE EMISIÓN: 10/01/2011

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/01/2011 FECHA DE EMISIÓN: 10/01/2011

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/01/2011 FECHA DE EMISIÓN: 10/01/2011

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/01/2011 FECHA DE EMISIÓN: 10/01/2011

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/01/2011 FECHA DE EMISIÓN: 10/01/2011

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/01/2011 FECHA DE EMISIÓN: 10/01/2011

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/01/2011 FECHA DE EMISIÓN: 10/01/2011

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/01/2011 FECHA DE EMISIÓN: 10/01/2011

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/01/2011 FECHA DE EMISIÓN: 10/01/2011

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/01/2011 FECHA DE EMISIÓN: 10/01/2011

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/01/2011 FECHA DE EMISIÓN: 10/01/2011

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/01/2011 FECHA DE EMISIÓN: 10/01/2011

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/01/2011 FECHA DE EMISIÓN: 10/01/2011

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/01/2011 FECHA DE EMISIÓN: 10/01/2011

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/01/2011 FECHA DE EMISIÓN: 10/01/2011

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/01/2011 FECHA DE EMISIÓN: 10/01/2011

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/01/2011 FECHA DE EMISIÓN: 10/01/2011

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/01/2011 FECHA DE EMISIÓN: 10/01/2011

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/01/2011 FECHA DE EMISIÓN: 10/01/2011

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/01/2011 FECHA DE EMISIÓN: 10/01/2011

GOBERNACIÓN 2052
CONTRATO DE OBRA No. 2332 DE 2023



**PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MAYO DE 2023**

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

FECHA

31/05/2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

NORTE DE SANTANDER

PERIODO MES:

MAYO

CONTRATO DE OBRA No.:

2332 DE 2023

PLAZO INICIAL:

6 MESES

FECHA DE INICIO:

11/05/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REANUDACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

10/11/2023

PLAZO ACUMULADO:

183,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :

\$ 5.159.028.732,00

VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

\$ 5.159.028.732,00

ANTICIPO CONCEDIDO:

ANTICIPO AMORTIZADO:

\$ -

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

1053

INTERVENTOR:

GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO				
Pavimentación	Construcción			Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento				Mejoramiento			
Estructuras	Rehabilitación			Estructuras	Rehabilitación			
	Túneles				Túneles			
	Puentes				Puentes			
Mantenimiento	Pontones			Mantenimiento	Pontones			
	Otros (Especificar cuales)				Otros (Especificar cuales)			
	Batea				Batea			
	Box Culvert				Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES				
	BÁSICO	IVA	TOTAL		BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	\$ 5.159.028.732,00		\$ 5.159.028.732,00	OBRAS				
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES		0,00	\$ -	AJUSTES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			\$ -	OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS				JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			\$ -	ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS				
MANTENIMIENTO PERIODICO			\$ -	GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 5.159.028.732,00	\$ -	\$ 5.159.028.732,00	GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.				GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
				GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
				VALOR EJECUTADO				

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:

MANO DE OBRA NO CALIFICADA:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de los patios, La Mutis.

Municipio de los patios, La Mutis.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

La interventoría ha venido realizando solicitudes y seguimiento a las actividades de estudios, diseños, revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños que aun están pendientes.

Firma

Nombre: Diego Efraín Pedraza Chaves


Director de Interventoría

Matrícula Profesional No. 25202-109359 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

[illegible]



FECHA	31/05/2023 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

CONTRATO DE OBRA No:	LP- SV 02332-2022	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:	MAYO DE 2023	PROYECTO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIOS DE LOS PATIOS, GRAMALOTE, Y ARBOLEDAS.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1053 DE 2022	INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.
NOMBRE ARL:		NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:	

[illegible]

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluido mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta a adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El Contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la entidad contratada del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.


5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.

6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

7. El Contratista es el responsable de verificar que los contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora de servicio.

8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el caso.

Firma 
Nombre: Diego Efraín Pedraza Chaves
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND

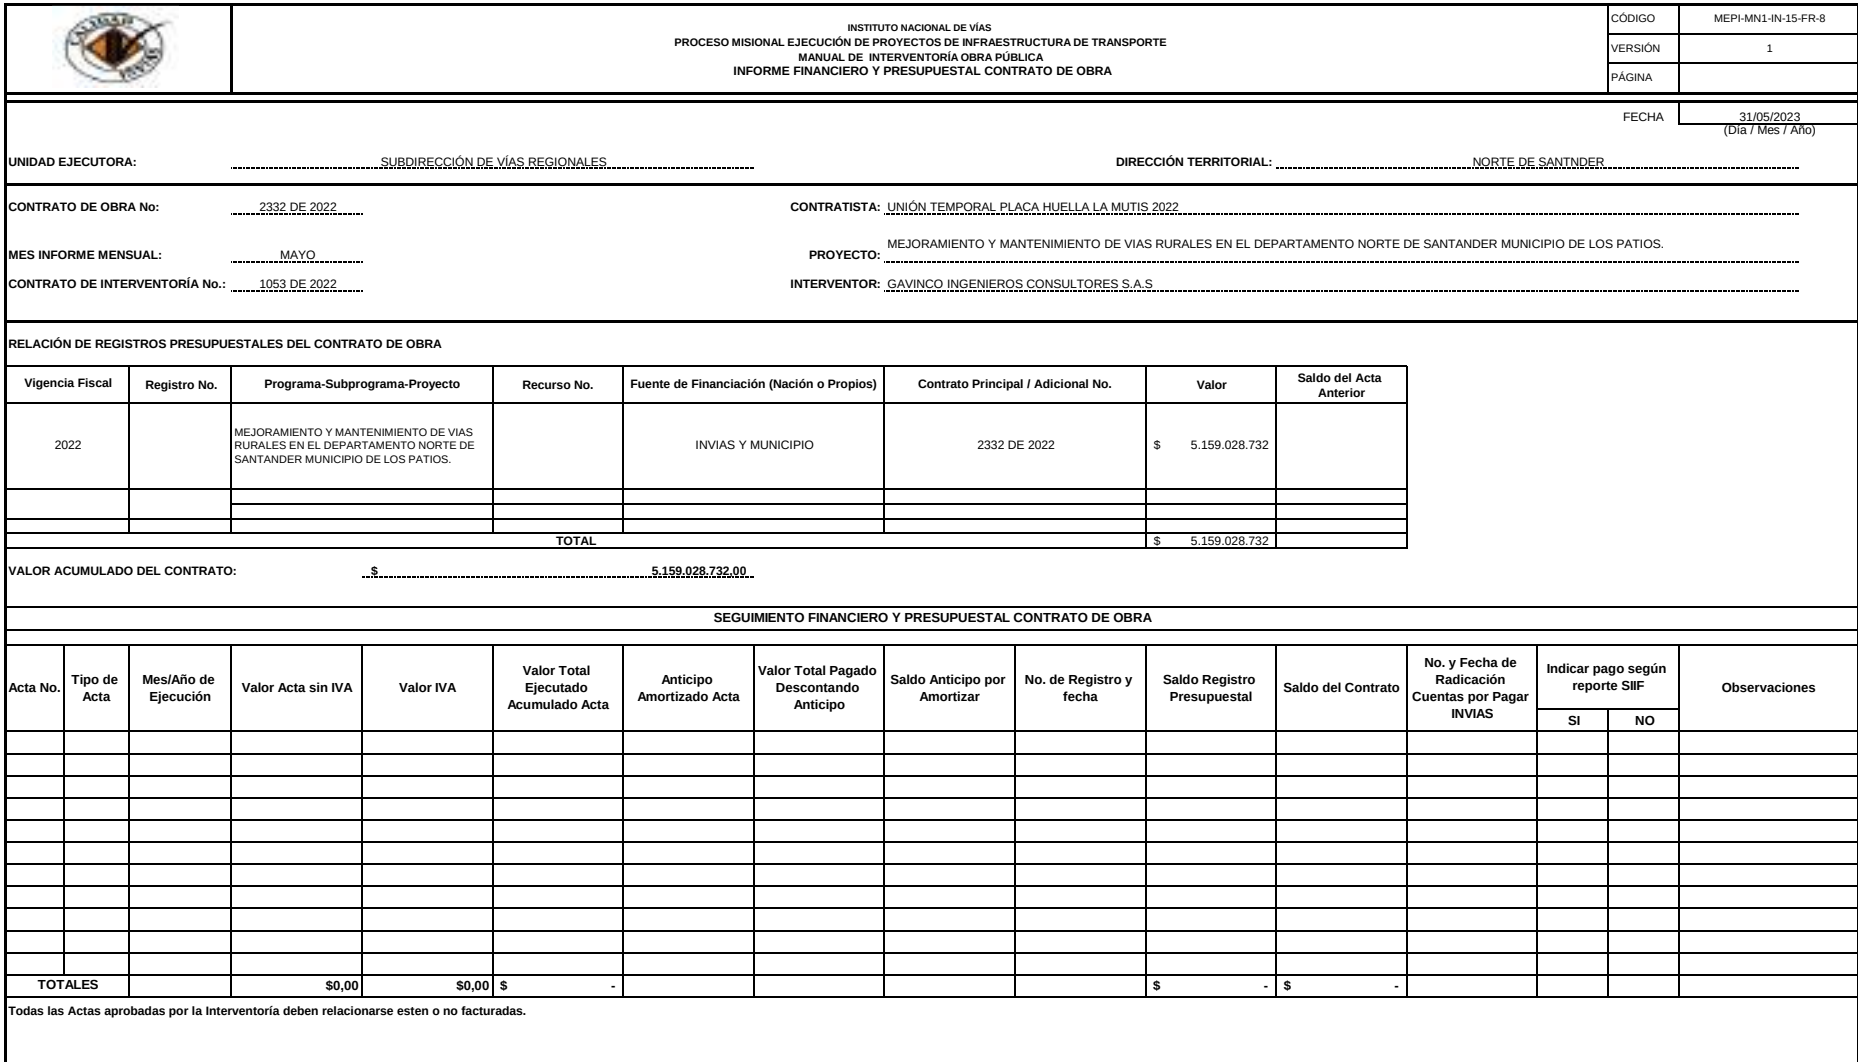

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</div> <div>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>MEPI-MN1-IN-15-FR-8</div>
		<div>VERSIÓN</div> <div>1</div>
		<div>PÁGINA</div> <div></div>

FECHA

31/05/2023
(Día 7 Mes 7 Año)

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO			
	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA			
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			\$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			\$ -
AJUSTES			\$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$ -
GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)			
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO			
VALOR TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma



Nombre: HUGO PEREZ ALVAREZ

Director de Obra

Matrícula Profesional No.:

Firma



Nombre: Diego Efraim Pedraza Chaves

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

FECHA			31/05/2023 <small>(Día / Mes / Año)</small>
-------	--	--	--

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER
---	---

CONTRATO DE OBRA No: 2332 DE 2022	CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS LA MUTIS 2022
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: may-22	PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022	INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco											24	24	24	24	24	20	23	22	24	24	24	24	24	24	24	18	23	24	24	24	23	489
Lluvias moderadas																2										3	1					6
Lluvias intensas																2	1	2								3					1	9
Total horas																														24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
 Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
 Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

<div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">  </div> <div> Firma Nombre: HUGO PEREZ ALVAREZ Residente de Obra Matrícula Profesional No.: </div>	<div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">  </div> <div> Firma Nombre: ROSANA DEL PILAR MATTOS PARRA Residente de Interventoría Matrícula Profesional No.: 54202207949 NTS </div>
---	---

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor, Dirección Territorial.



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
							VERSIÓN	1
							PAGINA	
							FECHA	31/05/2023 (Día / Mes / Año)
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA								
OBSERVACIONES:								
NOTAS:								
<p>1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.</p> <p>2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.</p> <p>3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.</p> <p>4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.</p> <p>5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.</p> <p>6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.</p>								
Firma								
Nombre: HUGO PEREZ ALVAREZ			Firma					
Director de Obra			Nombre: Diego Efraín Pedraza Chaves					
Matrícula Profesional No.:			Director de Interventoría					
			Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND					
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.								
Copias: Interventor, Dirección Territorial.								

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA		31	5	2023
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	NORTE DE SANTANDER	
-------------------	---------------------------------	------------------------	--------------------	--

CONTRATO DE OBRA No.	2332 DE 2023	CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022	
----------------------	--------------	--------------	---	--

OBJETO DEL CONTRATO:				
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.				

FECHA DE INICIO:	11/05/2023			
PLAZO INICIAL:	6 MESES			
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	10/11/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)			
VALOR INICIAL:	\$	5,159,028,732.00		
VALOR ACUMULADO:	\$	5,159,028,732.00 (Incluye adiciones)		
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$	62,805,170.00		
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$	62,805,170.00		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1053 DE 2022,	INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	
-------------------------------	---------------	--------------	---------------------------------------	--

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL											
Amparo			% Amparo		Valor Asegurado (\$)		VIGENCIA				
							Desde			Hasta	
Cumplimiento					\$ 5,159,027,873.20		28 12 2022			28 12 2023	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo											
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e					\$ 5,159,027,873.20		28 12 2022			28 6 2026	
Calidad de Estudios y Diseños											
Estabilidad y/o Calidad de Obra					\$ 5,159,027,873.20		5 AÑOS			5 AÑOS	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	CCT-100004561
Certificado de modificación o anexo No.:	0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)	
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	13/04/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL											
Seguro			% Asegurado		Valor Asegurado (\$)		VIGENCIA				
							Desde			Hasta	
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)					\$ 400,000,000.00		28 12 2022			28 6 2023	
Otros											

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	21-40-101203708	OTRAS PÓLIZAS No.	
Certificado de modificación o anexo No.:	2	(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)	
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO		
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:	12/04/2023		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.:

MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y/o Calidad de Obra		

VIGENCIA						
Desde				Hasta		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES	
---	--

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.:

MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		
Otros		

VIGENCIA						
Desde				Hasta		

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

OTRAS PÓLIZAS No. _____

Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma 
Nombre: Diego Efraín Pedraza Chaves
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

FECHA		31/05/2023
(Día) (Mes) (Año)		

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	NORTE DE SANTANDER
-------------------	---------------------------------	------------------------	--------------------

CONTRATO DE OBRA No.	2332 DE 2022
	(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.	

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS LA MUTIS 2022	
---	--

FECHA DE INICIO:	11/05/2023	PLAZO INICIAL:	6 MESES	FECHA DE VENCIMIENTO:	10/11/2023
	(Indicar día, mes y año)				(Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1053 DE 2022
	(Indicar número y año)

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
--------------	--------------------------------

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO:	SI	NO	X	APROBADO:	SI	NO	VERSIÓN No.	FECHA DE VERSIÓN:
-------------	----	----	---	-----------	----	----	-------------	-------------------

OBSERVACIONES:	
----------------	--

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO:	SI	NO	No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS:	FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA:	SI	NO	No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS:	FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES:	
----------------	--

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO:	SI	NO	APROBADO:	SI	NO	FECHA DE APROBACIÓN:
-------------	----	----	-----------	----	----	----------------------

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES:	No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES:
---	--

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES:	SI	NO
--------------------------------------	----	----

OBSERVACIONES:	
----------------	--

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes:	0	No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:	
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:		No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:	
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:			

OBSERVACIONES:	
----------------	--

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:	0	No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:	0
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:	0	No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:	0
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:	0	No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:	0

OBSERVACIONES:	
----------------	--

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14				
		VERSIÓN	1				
		PÁGINA					
		FECHA	31/05/2023 (Día) (Mes) (Año)				
6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)							
Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)					
IG1: Índice de gestión 1 =							
IG2: Índice de gestión 2 =							
IG3: Índice de gestión 3 =							
IG4: Índice de gestión 4 =							
IG5: Índice de gestión 5 =							
IGn: Índice de gestión n =							
Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.							
OBSERVACIONES:							
7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).							
No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
OBSERVACIONES:							
NOTA:				Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.			
							
Firma		Firma		Firma			
HUGO PEREZ ALVAREZ		Nombre: Diego Efraín Pedraza Chaves		Nombre:			
Director de la Obra		Director de la Interventoría		Profesional en Calidad Contrato de Interventoría			
Matrícula Profesional No.:		Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND		Matrícula Profesional No.:			
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.							

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES												CÓDIGO MEPI-MNL-INV-6-FR-2																																																																		
													VERSIÓN 1																																																																		
													PÁGINA																																																																		
													FECHA 31/05/2023 (Día / Mes / Año)																																																																		
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. DE VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$.																																																																															
SEGUIMIENTO No. (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)																																																																															
CONTRATO No.: 2022.056.2022 PLAZO INICIAL: 11/05/2022 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 10/11/2023 (En meses según los primeros sin suspensiones)																																																																															
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS. FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 11/05/2022 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 10/11/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)																																																																															
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLAS LA MUTIS 2022 FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 5.159.028.732.00 FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$.																																																																															
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1063 DE 2022 INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 5.159.028.732.00																																																																															
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado \$ Valor Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	\$ Valor Ejecutado % Ejecutado	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...																																																																	
GPP1				% P \$ P % E \$ E											%																																																																
GPP2				% P \$ P % E \$ E																																																																											
GPP3				% P \$ P % E \$ E																																																																											
GPP4				% P \$ P % E \$ E																																																																											
GPP5				% P \$ P % E \$ E																																																																											
GPP6				% P \$ P % E \$ E																																																																											
GPP7				% P \$ P % E \$ E																																																																											
GPP8				% P \$ P % E \$ E																																																																											
TOTAL OTROS ITEMS				% P \$ P % E \$ E																																																																											
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)				% E												0%																																																															
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																																																																															
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: 1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. 2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. 3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". 4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). 5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.																																																																															
<table><tr><th colspan="2">CONVENCIONES</th></tr><tr><th>TIPO DE DEBILLO</th><th></th></tr><tr><td>BARRAS</td><td>PROGRAMADO \$ Valor EJECUTADO \$ Valor</td></tr><tr><td>CURVAS</td><td>PROGRAMADO \$ Valor EJECUTADO \$ Valor</td></tr></table>																CONVENCIONES		TIPO DE DEBILLO		BARRAS	PROGRAMADO \$ Valor EJECUTADO \$ Valor	CURVAS	PROGRAMADO \$ Valor EJECUTADO \$ Valor																																																								
CONVENCIONES																																																																															
TIPO DE DEBILLO																																																																															
BARRAS	PROGRAMADO \$ Valor EJECUTADO \$ Valor																																																																														
CURVAS	PROGRAMADO \$ Valor EJECUTADO \$ Valor																																																																														
<table><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA</td><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA</td><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%															INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)															INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%															INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)														
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%																																																																														
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)																																																																														
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																																																																														
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)																																																																														
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.																																																																															
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																												
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	\$ -	\$ -	%																																																																												
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADOS (B')	\$ -	\$ -	%																																																																												
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ -	\$ -	%																																																																												
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	\$ -	\$ -	%																																																																												
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																																																																															

Aprueba Firma: 
Nombre: HUGO PEREZ ALVAREZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: 
Nombre: Luz Andres Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

MUNICIPIO DE OCAÑA 1814
CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4352407



PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MAYO DE 2023

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO				CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2																																																																																						
					VERSION	1																																																																																						
					PÁGINA																																																																																							
					FECHA	31/05/2023 (Día / Mes / Año)																																																																																						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER PERIODO MES: MAYO DE 2023																																																																																												
CONTRATO DE OBRA No.: CO1.PCCNTR.4352407 PLAZO INICIAL: 4 MESES VALOR INICIAL (incluido IVA) : \$ 2.499.989.139,00																																																																																												
OBJETO: FECHA DE INICIO: 2/05/2023 VALOR ADICIONALES (incluido IVA):																																																																																												
FECHA DE SUSPENSIÓN:																																																																																												
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER																																																																																												
FECHA DE VENCIMIENTO: 2/09/2023 ANTICIPO CONCEDIDO:																																																																																												
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GBE 2022 ANTICIPO AMORTIZADO: \$ -																																																																																												
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 DE 2022 INTERVENTOR: GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE																																																																																												
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																																								
<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td>ml</td><td>1890</td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Mantenimiento</td><td>Parqueo</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Batea</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Alcantarillas</td><td>und</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>Box Culvert</td><td></td><td></td></tr></table>				ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción			Mejoramiento			Rehabilitación	ml	1890	Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento	Parqueo			Otros (Especificar cuales)				Batea				Alcantarillas	und	10		Box Culvert			<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Mantenimiento</td><td>Parqueo</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Batea</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Alcantarilla</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Box Culvert</td><td></td><td></td></tr></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción			Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento	Parqueo			Otros (Especificar cuales)				Batea				Alcantarilla				Box Culvert		
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD																																																																																									
Pavimentación	Construcción																																																																																											
	Mejoramiento																																																																																											
	Rehabilitación	ml	1890																																																																																									
Estructuras	Túneles																																																																																											
	Puentes																																																																																											
	Pontones																																																																																											
Mantenimiento	Parqueo																																																																																											
	Otros (Especificar cuales)																																																																																											
	Batea																																																																																											
	Alcantarillas	und	10																																																																																									
	Box Culvert																																																																																											
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																																																									
Pavimentación	Construcción																																																																																											
	Mejoramiento																																																																																											
	Rehabilitación																																																																																											
Estructuras	Túneles																																																																																											
	Puentes																																																																																											
	Pontones																																																																																											
Mantenimiento	Parqueo																																																																																											
	Otros (Especificar cuales)																																																																																											
	Batea																																																																																											
	Alcantarilla																																																																																											
	Box Culvert																																																																																											
AVANCE FINANCIERO																																																																																												
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																																																								
	BÁSICO	IVA	TOTAL		BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																																																				
OBRAS	\$ 2.476.597.883,00		\$ 2.476.597.883,00	OBRAS	\$ -		\$ -	\$ -																																																																																				
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ 10.680.939,00		\$ 10.680.939,00	AJUSTES																																																																																								
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			\$ -	OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES																																																																																								
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 10.680.939,00	2.029.378,00	\$ 12.710.317,00	JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN																																																																																								
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			\$ -	ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																				
MANTENIMIENTO PERIODICO			\$ -	GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)																																																																																								
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 2.029.378,00	\$ 2.499.989.139,00	GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)																																																																																								
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.				GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)																																																																																								
				GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)																																																																																								
				VALOR EJECUTADO				\$ -																																																																																				
INVERSIÓN EN OBRA				EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																																																								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): -				MANO DE OBRA CALIFICADA: 8																																																																																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): -				MANO DE OBRA NO CALIFICADA: -																																																																																								
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%				EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2																																																																																								
				TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 10																																																																																								

REGISTRO FOTOGRÁFICO



UBICACIÓN: BUENAVISTA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: PLACA HUELLA


UBICACIÓN: BUENAVISTA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ALCANTARILLA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

La interventoría ha venido realizando solicitudes y seguimiento a las actividades de estudios, diseños, revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños que aun están pendientes.

Firma
Nombre: Diego Efraín Pedraza Chaves
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-109359 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial



FECHA	31/05/2023 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER


VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida la mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. En el contrato es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
6. En el evento es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normalidad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normalidad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (X) la continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma: 
Nombre: Diego Efraín Pedraza Chaves
 Director de Interventoría
 Matricula Profesional No.: 25202-109359 CND

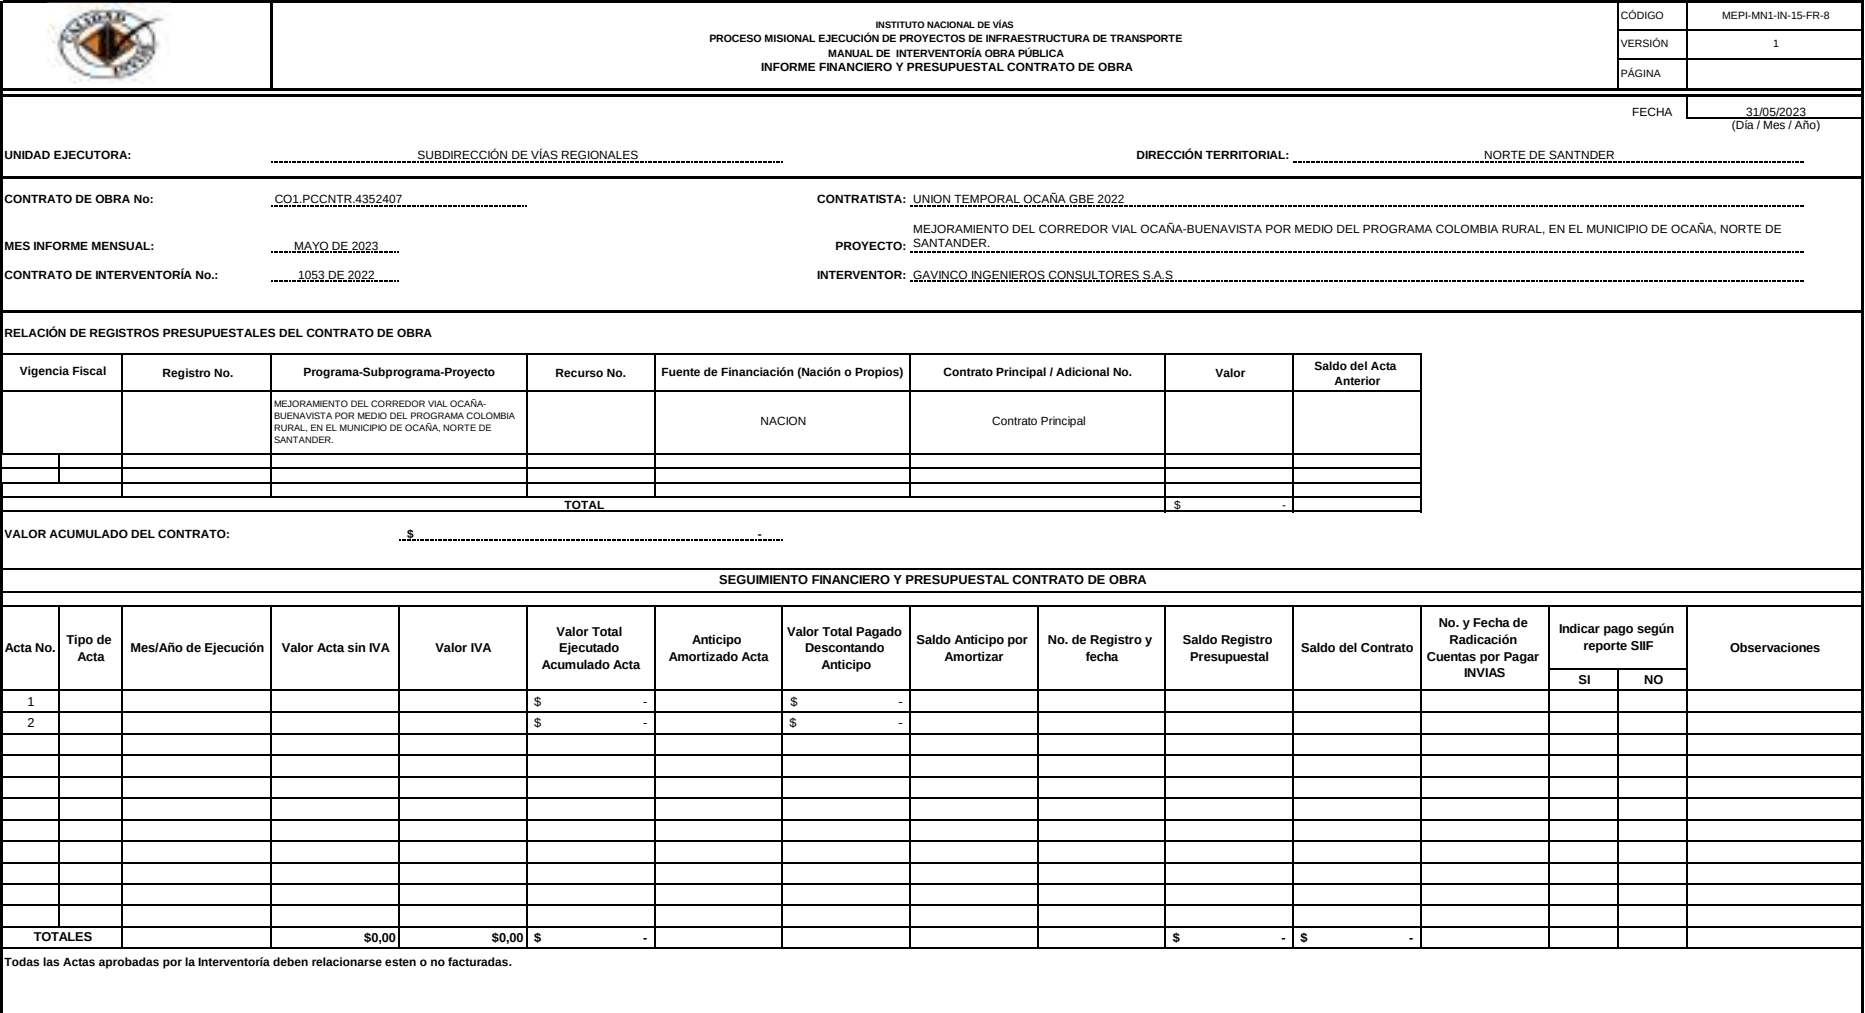

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO			
	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	\$ 2.476.597.883,00		\$ 2.476.597.883,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 10.680.939,00		\$ 10.680.939,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			\$ -
AJUSTES			\$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 10.680.939,00	\$ 2.029.378,00	\$ 12.710.317,00
GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)			
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO			
VALOR TOTAL	\$ 2.497.959.761,00	\$ 2.029.378,00	\$ 2.499.989.139,00

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma _____
Nombre: LUIS JAVIER CARRASCAL
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 2520234541CND

Firma _____
Nombre: Diego Efraín Pedraza Chaves
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MEPI-MN1-IN-15-FR-10 1
				FECHA 31/05/2023 <small>(Día / Mes / Año)</small>
	UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER	

CONTRATO DE OBRA No: CO1.PCCNTR.4352407	CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2023	PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022	INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco																																0
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total horas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
 Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
 Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.


 Firma
 Nombre: ENIER JESUS CAAMAÑO MARTINEZ
 Residente de Obra
 Matrícula Profesional No.:


 Firma
 Nombre: ADRIANA GUTIERREZ DE PINERES
 Residente de Interventoría
 Matrícula Profesional No.: 54202194523 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO					CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
						VERSIÓN	1
						PAGINA	

						FECHA	31/05/2023 <small>(Día / Mes / Año)</small>
--	--	--	--	--	--	-------	--

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER
---	---

CONTRATO DE OBRA No.: CO1.PCCNTR.4352407	CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022
--	--

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2023	PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.
---	--

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022	INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
---	---

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple Si o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1									
2									
3									
4									
5									

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.


Firma
Nombre: LUIS JAVIER CARRASCAL QUIN
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:


Firma
Nombre: Diego Efraín Pedraza Chaves
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA		31	5	2023
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	NORTE DE SANTANDER	
-------------------	---------------------------------	------------------------	--------------------	--

CONTRATO DE OBRA No.	CONTRATISTA:			
----------------------	--------------	--	--	--

OBJETO DEL CONTRATO:				
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.				

FECHA DE INICIO:	2/05/2023			
PLAZO INICIAL:	4 MESES			
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	2/09/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)			
VALOR INICIAL:	\$	2.499.989.139,00		
VALOR ACUMULADO:	\$	2.499.989.139,00 (Incluye adiciones)		
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$	12.710.317,00		
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$	12.710.317,00		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1053 DE 2022,	INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	
-------------------------------	---------------	--------------	---------------------------------------	--

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL					
---	--	--	--	--	--

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Cumplimiento		\$ 171.114.662,00	Desde			Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			10	8	2022	10	6	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		\$ 85.557.331,00	10	8	2022	10	2	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ 171.114.662,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	CG-1037616	
Certificado de modificación o anexo No.:	1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)	
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS MUNDIAL	
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	11/10/2022	

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 200.000.000,00	Desde			Hasta		
Otros			10	8	22	10	2	23

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	CG-1008105	OTRAS PÓLIZAS No.	
Certificado de modificación o anexo No.:	1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)		
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS MUNDIAL		
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:	12/10/2022		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.:

MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y/o Calidad de Obra		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.:

MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:**NOTAS:**

- El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
- El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma 

Nombre: Diego Efraín Pedraza Chaves
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES													CÓDIGO MEPI-MNL-INV-6-FR-2																																																																					
														VERSIÓN 1																																																																					
														PÁGINA																																																																					
														FECHA 31/05/2023 (Día / Mes / Año)																																																																					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. DE VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$.																																																																																			
SEGUIMIENTO No. (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)																																																																																			
CONTRATO No.: 503155C0076.6364492 PLAZO INICIAL: 1 MES 2023 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 123.00 (En meses según los pronósticos sin suspensiones)																																																																																			
OBJETO: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCANA-LIMITES MORRISON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCANA, NORTE DE SANTANDER FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/05/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 2/09/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)																																																																																			
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OCANA GRE 2022 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 2.499.989.138.00 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)																																																																																			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1053 DE 2022 INTERVENIOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 2.499.989.138.00 (Según contrato principal)																																																																																			
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(% OBRA PROGRAMADA)	(% EJECUTADO) VALOR OBRA PROGRAMADA	% Programado \$ Valor Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																					
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(% ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA)	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Ejecutado \$ Valor Ejecutado	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...	%																																																																				
GPP1				% P \$ P % E																																																																															
GPP2				% P \$ P % E																																																																															
GPP3				% P \$ P % E																																																																															
GPP4				% P \$ P % E																																																																															
GPP5				% P \$ P % E																																																																															
GPP6				% P \$ P % E																																																																															
GPP7				% P \$ P % E																																																																															
GPP8				% P \$ P % E																																																																															
TOTAL OTROS ITEMS				% P \$ P % E											0%																																																																				
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)																																																																																			
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																																																																																			
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: 1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. 2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. 3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". 4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). 5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.																																																																																			
<table><tr><th colspan="2">CONVENCIONES</th></tr><tr><th>TIPO DE DEBILLO</th><th></th></tr><tr><td>BARRAS</td><td>PROGRAMADO \$ Valor EJECUTADO \$ Valor</td></tr><tr><td>CURVAS</td><td>PROGRAMADO \$ Valor EJECUTADO \$ Valor</td></tr></table>																CONVENCIONES		TIPO DE DEBILLO		BARRAS	PROGRAMADO \$ Valor EJECUTADO \$ Valor	CURVAS	PROGRAMADO \$ Valor EJECUTADO \$ Valor																																																												
CONVENCIONES																																																																																			
TIPO DE DEBILLO																																																																																			
BARRAS	PROGRAMADO \$ Valor EJECUTADO \$ Valor																																																																																		
CURVAS	PROGRAMADO \$ Valor EJECUTADO \$ Valor																																																																																		
<table><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA</td><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA</td><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%															INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)															INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%															INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)																		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%																																																																																		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)																																																																																		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																																																																																		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)																																																																																		
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.																																																																																			
<table><tr><th>PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*</th><th>VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO</th><th>VALOR EJECUTADO</th><th>% DE EJECUCIÓN</th></tr><tr><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>%</td></tr><tr><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>%</td></tr><tr><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>%</td></tr><tr><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>%</td></tr><tr><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>%</td></tr><tr><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>%</td></tr><tr><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>%</td></tr><tr><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>%</td></tr><tr><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>%</td></tr><tr><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>%</td></tr><tr><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>%</td></tr><tr><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>%</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>%</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADOS (B')</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>%</td></tr><tr><td>VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>%</td></tr><tr><td>VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>%</td></tr></table>																PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	\$ -	\$ -	\$ -	%	VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	\$ -	\$ -	%	VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADOS (B')	\$ -	\$ -	%	VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ -	\$ -	%	VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	\$ -	\$ -	%
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN																																																																																
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																																
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																																
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																																
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																																
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																																
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																																
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																																
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																																
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																																
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																																
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																																
\$ -	\$ -	\$ -	%																																																																																
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	\$ -	\$ -	%																																																																																
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADOS (B')	\$ -	\$ -	%																																																																																
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ -	\$ -	%																																																																																
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	\$ -	\$ -	%																																																																																
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																																																																																			

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:

Nombre: Luis Javier Carrascal

Representante legal o apoderado del Contratista

Matrícula Profesional No.: 2520234541CND

Aprueba Firma:

Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor

Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.:

ACTAS DE REUNIÓN Y COMITÉ



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MAYO DE 2023

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 4

FECHA 11/05/2023
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCONTR.3879052 MUNICIPIO DE OCAÑA
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GBE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA - BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se presentan los compromisos adquiridos en el comité de obra No. 01, los cuales se encuentran en el siguiente estado:

Sin Cumplir:

- Documentos pendientes por entregar
- Certificado de Laboratorio
- Devolución de los Rendimientos Financieros.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Compromisos
- Aspectos técnicos
- Avance de entrega documental etapa Preconstrucción
- Temas pendientes próximo comité



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 de 4

FECHA 11/05/2023

(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo el 11 de mayo de 2023, la Interventoría a través del director del Proyecto el ingeniero Diego Pedraza, da inicio al comité de seguimiento No. 01.

La Interventoría comenta que el Contratista ha entregado la mayoría de los documentos de la etapa de pre construcción hace un tiempo, está pendiente por revisión por parte de la Interventoría, el equipo profesional que se presentó en el compendio de las hojas de vida para este contrato debería ser complementario en porcentaje de dedicación al del otro contrato, si la dedicación del otro contrato de los profesionales de todas las áreas corresponde al 100% difícilmente se va dar aprobación.

La Interventoría le pregunta al ingeniero Leonardo Carrascal que la ingeniera Lised Arenas envió el día de ayer por WhatsApp lo que suple al acta de inicio, según habían explicado en el comité anterior el acta de inicio habían cambiado el procedimiento y ya no se genera un documento firmado en digital o físico, pero si se genera una imagen en pantalla de unas aceptaciones en Secop II, luego un documento pero no es claro, no tiene una fecha y no se entiende, pregunta cuál fue la fecha del inicio del contrato.

El ingeniero Leonardo Carrascal comenta que tampoco tiene claro con este nuevo procedimiento que se esta utilizando, tiene entendido que es el 2 de mayo de 2023, se debe tener en cuenta es lo siguiente uno ya se conoce la metodología de Interventoría y del INVIAS, lo negativo es el plazo de ejecución donde es bastante corto, todo el proceso es en Placa Huella, tiene unos rendimientos bastantes deficientes se está tratando de emplear una forma diferente para que esto avance, acá el acceso es mucho más fácil que el otro proyecto de la Samaritana es un punto a favor de este proyecto.

El orden del día es el siguiente los compromisos, los avances en cifras, luego el avance de entrega documental etapa de pre construcción, posteriormente el avance de entrega documental revisión de Estudios y Diseños, después la información de SST a la fecha y luego un resumen de los componentes Ambiental y Social.

La Interventoría le pregunta al Contratista respecto a Estudios y Diseños, como va el tema y cuando tienen previsto entregar esos componentes para poderlo revisar.

El ingeniero Leonardo Carrascal comenta que primero fue acordar con la comunidad cuales eran los tramos a intervenir, eso tomó un tiempo considerable, ellos se demoraron en constituirse veeduría, desde el 2 de mayo de 2023 se hizo una reunión que el acta ya esta hecha falta es levantar las firmas de todos los participantes de esta reunión donde se definieron exactamente cuales son los tramos que se van a definir con este contrato.

El Contratista se compromete entregar la Topografía el día lunes 15 de mayo de 2023, así mismo el Diseño de Pavimentos y Geotecnia también haría entrega el día lunes 15 de mayo de 2023 para su verificación, el Estudio Hidráulico y el Diseño Geométrico lo entregan los profesionales en el transcurso de la semana entrante y dejando un tiempo para revisarlo y poder enviar, se compromete a enviar el día viernes 19 de mayo de 2023.

La Interventoría afirma que ni el convenio, ni el contrato derivado tiene estipulado un plazo limite para que se estructure la revisión de los Estudios y Diseños, estos hacen parte de un acuerdo de voluntad entre el Contratista e Interventoría es un cálculo subjetivo de parte del Contratista con respecto a los antecedentes que se ha tenido en los otros contratos.

La Interventoría comenta que el día de ayer envió un oficio a la alcaldía haciendo un énfasis que no se ha cumplido los Rendimientos Financieros.

Con respecto a los avances a la fecha se encuentran en ceros, la Interventoría se compromete para el próximo comité o antes dar respuesta a los documentos de programación de obra.

La Interventoría hace un resumen con el avance de entrega documental etapa pre construcción, en el caso para las hojas de vida desde el día 24 de marzo de 2023 se recibió y no se ha dado respuesta, hay algunos que se han dado respuesta que es el Plan de Calidad y el Protocolo de Bioseguridad en estos momentos esta en manos del Contratista que se encuentra con algunas observaciones.

Toma la palabra ingeniero Camilo Forero con respecto al Plan de Calidad y el Protocolo de Bioseguridad esas observaciones luego y se respondieron, comenta que no tiene las nuevas observaciones, solicita que le reenvíen al correo para que sea pronto y oportuna la respuesta.

Continuando con la revisión todos el Contratista ha hecho entrega de los siguientes documentos Plan de Manejo de Tránsito, Plan Seguridad y Salud en el Trabajo, PMA, Fuente de Materiales y Certificado y Disponibilidad de Laboratorio, en excepción los resultados de Laboratorio del material que se va usar en la construcción es decir la sub base, el Terraplén y el Diseño de Mezcla,



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 de 4

FECHA 11/05/2023
(Día / Mes / Año)

esos tres documentos están directamente relacionados con la Fuente de Materiales.

La Interventoria continua con el avance de entrega documental revisión de Estudios y Diseños a la fecha no han entregado ninguno, sin embargo, existe un compromiso por el Contratista de obra.

Respecto a información SST, la inspectora Rubiela Molina comenta que va revisar con respecto al oficio que no se ha enviado al correo del ingeniero Camilo Forero, esta pendiente con las observaciones del Protocolo de Bioseguridad y al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Toma la palabra el ingeniero Camilo Forero solicitando a Rubiela Molina hacer una mesa de trabajo el día lunes 15 de mayo de 2023 para aclarar unos puntos del componente del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se continua con el componente Ambiental, la ingeniera Katherine Navarro comenta en cuanto a la Fuente de Materiales ya se encuentra aprobada, en cuanto al PAGA el día 20 de abril de 2023 se envió un oficio por parte de la Interventoria con las observaciones a subsanar, hasta la fecha no se ha tenido respuesta de parte del Contratista, esta a la espera de recibir la documentación pertinente para avanzar con ese tema.

Con respecto al componente Social, el profesional Anuar Cabarcas comenta que el día 20 de abril de 2023 se envió un oficio por parte de la Interventoria con las observaciones a subsanar, hasta la fecha no se ha tenido respuesta de parte del Contratista, para poder realizar la socialización de inicio de obra se debe tener aprobados los Estudios y Diseños, se debe también indicar a la comunidad el alcance del proyecto los aspectos Sociales y Ambientales, que se van ejecutar durante la ejecución de la obra, así mismo indica sobre la solicitud ante el Ministerio de Interior de consulta previa la creación de la veeduría ciudadana que son eventos pre constructivos que se debe presentar ante la Interventoria, se debe realizar el levantamiento de las actas de vecindad donde se va ejecutar el proyecto antes del inicio de la obra.

Damos por terminado el comité de seguimiento del día de hoy, feliz tarde para todos.

COMPROMISOS PACTADOS

FECHA DE CUMPLIMIENTO
(Día / Mes / Año)

RESPONSABLES

Topografía	15/05/2023	CONTRATISTA
Diseño de Pavimentos y Geotecnia	15/05/2023	CONTRATISTA
Diseño Geometrico	19/05/2023	CONTRATISTA
Estudio Hidraulico	19/05/2023	CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 18/05/2023
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtir de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LEONARDO CARRASCAL	INGENIERO DE APOYO	UNION TEMPORAL GBE	
DIEGO PEDRAZA	DIRECTOR	GAVINCO S.A.S.	
LUIS EDUARDO ESTUPIÑAN	INSPECTOR	GAVINCO S.A.S.	

	<p align="center">INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</p> <p align="center">PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</p> <p align="center">MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</p> <p align="center">ACTA DE COMITÉ DE OBRA</p>		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	4 de 4

			FECHA	11/05/2023
			(Día / Mes / Año)	
.....				
RUBIELA MOLINA	PROFESIONAL SST	GAVINCO S.A.S.		
KATHERINE NAVARRO	INGENIERA AMBIENTAL	GAVINCO S.A.S.		
ANUAR CABARCAS	PROFESIONAL SOCIAL	GAVINCO S.A.S.		
LAURA DANIELA BARAHONA	PROFESIONAL SOCIAL	UNION TEMPORAL GBE		
CAMILO FORERO	PROFESIONAL SST	UNION TEMPORAL GBE		
MARIA CAMILA CARRASCAL	REPRESENTANTE LEGAL	UNION TEMPORAL GBE		
VICTOR SANTOS	INGENIERO DE APOYO	GAVINCO S.A.S.		

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

**MEET GAVINCO INGENIEROS C.A.**

Organizador

**Anuar Cabarcas (Invitado)**

Invitado de la reunión

**Camilo Forero (Invitado)**

Invitado de la reunión

**Diego Pedraza (Invitado)**

Invitado de la reunión

**Katherine Navarro (Invitado)**

Invitado de la reunión

**katherine navarr... (Invitado)**

Invitado de la reunión

**LAURA DANIELA BARAHONA CA...**

Externo

**Leonardo Carras... (Invitado)**

Invitado de la reunión

**luis estupifian (Invitado)**

Invitado de la reunión

**maria camila Car... (Invitado)**

Invitado de la reunión

**RUBIELA (Invitado)**

Invitado de la reunión





INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 4

FECHA 18/05/2023
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 2
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCONTR.3879052 MUNICIPIO DE OCAÑA
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GBE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA - BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se presentan los compromisos adquiridos en el comité de obra No. 02, los cuales se encuentran en el siguiente estado:

Sin Cumplir:

- Documentos pendientes por entregar
- Certificado de Laboratorio
- Devolución de los Rendimientos Financieros.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Compromisos
- Aspectos técnicos
- Avance de entrega documental etapa Preconstrucción
- Temas pendientes próximo comité



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 de 4

FECHA 18/05/2023

(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo el 18 de mayo de 2023, la Interventoría a través de la coordinadora del Proyecto la ingeniera Martha Soriano, da inicio al comité de seguimiento No. 2.

El objetivo de este comité es revisar los compromisos de la semana anterior, luego las cifras del avance, la entrega documental etapa pre construcción, luego de como se ha avanzado con la revisión de Estudios y Diseños, hacer una verificación de las actividades en obra de la semana anterior y luego haremos revisión de tres componentes el área SST, el área Ambiental y el área Social.

La Interventoria tenia como compromiso hacer la entrega de la revisión de los documentos de etapa de pre construcción las cuales a la fecha no se ha podido revisar, se compromete entregar las respuestas de todos los documentos el próximo viernes 26 de mayo de 2023.

Se da continuidad a los compromisos por parte del Contratista los documentos de Estudios y Diseños la cual estaba pendiente por entregar el 15 de mayo de 2023 correspondiente a la Topografía, Diseño de Pavimentos y el Estudio de suelos, se le pregunta al Contratista para cuando tiene la entrega de estos estudios.

El Contratista afirma que el día 16 de mayo de 2023 entregó el Diseño y Estructura de la Placa Huella y Geotecnia, en este momento hace entrega del levantamiento Topográfico de la Placa Huella de Buenavista.

La Interventoria confirma el recibido de la información enviada por el Contratista, una vez revisada por el Especialista se compromete dar respuesta el próximo miércoles 24 de mayo de 2023, cuando se tenga la Topografía se hará tramite se espera dar una pronta respuesta.

Por parte del municipio se tenia un compromiso con respecto a la Devolución de los Rendimientos Financieros se le pregunta a la ingeniera Lised arenas en que estado se encuentran la Devolución de estos Rendimientos.

La ingeniera Lised Arenas comenta con respecto a los Rendimientos Financieros se encuentra en el mismo estado del proyecto Morrison.

La Interventoria continua con el capitulo de avance en cifras, hace una aclaración donde el Contratista hizo entrega de la programación se compromete revisar a mas tardar el día de mañana para poder dar información de cómo va el proyecto.

Se continua con el avance de entrega documental etapa pre construcción el Contratista hizo entrega de la totalidad de los documentos a la fecha se ha dado respuesta correspondiente al Plan de Calidad, los Protocolos de Bioseguridad, Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y al PAGA, en cuanto a los demás documentos está en revisión por parte de la Interventoria se compromete dar respuesta de la totalidad de los documentos para la siguiente semana a más tardar el día viernes 26 de mayo de 2023.

Está pendiente la entrada por parte del Contratista los resultados de Laboratorio de los materiales granulares y los diseños de los materiales utilizados en el proyecto, se le pregunta al Contratista para cuando tienen la entrega de estos documentos.

El Contratista comenta que para los laboratorios de los materiales granulares y diseño de mezcla se compromete a entregar el día martes 23 de mayo de 2023.

La Interventoria continua con el avance de entrega documental revisión de Estudios y Diseños comenta que se recibió por parte del Contratista el Estudio de Suelos y al Diseño de Pavimentos el día 16 de mayo de 2023 se encuentra en revisión por parte de la Interventoria, en cuanto a la Topografía el Contratista se comprometió hacer entrega el día de hoy, con respecto al Diseño Geométrico y al Hidráulico se tiene el compromiso de entrega para el día viernes 19 de mayo de 2023.

Se continua con el informe semanal del SST, la inspectora Rubiela Molina comenta que había un compromiso con respecto a una mesa de trabajo no se pudo realizar por problemas de salud, se realizó una revisión en cuanto a las observaciones que se habían realizado, en resumen de esa observación es que los ligamentos están basados en la resolución 0312 que son los mínimos requisitos que se deben cumplir, en cuanto al tema SST es sencillamente guiarse por la normatividad, tener presente todas la observaciones hechas del otro contrato del municipio de Ocaña.

Dando continuidad al comité con el componente Ambiental, la ingeniera Katherine Navarro comenta que está en espera de recibir las observaciones subsanadas por parte del Contratista y en cuanto a la Fuente de Materiales se encuentra aprobado.

La Interventoria le pregunta al Contratista para cuando tiene la entrega de las subsanaciones del PAGA.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 de 4

FECHA 18/05/2023
(Día / Mes / Año)

Toma la palabra el ingeniero Fabian Gallardo solicita realizar una mesa de trabajo.

El Contratista hace una aclaración en el presente comité tiene relación de una Certificación o un pronunciamiento que realizó la OMS que es la Organización Mundial de la Salud donde anuncia que se levanta la Pandemia, afirmando que este tema de Bioseguridad no tenerlo más en cuenta, solicita saber si esa normatividad se encuentra vigente por parte del Ministerio de Salud.

Rubiela Molina se compromete en el día de hoy dar respuesta a la inquietud del Contratista y definir el Protocolo de Bioseguridad.

Se continua con el componente Social, el profesional Anuar Cabarcas comenta que esta en espera de la subsanación del PAGA, se le recuerda al Contratista antes de iniciar obra tener presente las actas de vecindad, se debe realizar una socialización de inicio, donde se realiza la conformación de comité de veeduría ciudadana, se debe realizar un oficio solicitando al ministerio de Interior sobre la consulta previa, si es viable o no y levantar las actas de compromisos ciudad rural llegado el caso que el Contratista solicite viviendas para guardar el material de la ejecución del proyecto.

El Contratista comenta con respecto al componente Social, inicialmente con la veeduría que ya se remitió por parte del Contratista ya firmada por los interesados que son los cinco veedores que son el municipio, la Interventoría y el Contratista, se eliminó un tramo que estaba inicialmente en el anexo técnico que se había identificado como el tramo #3 por cuanto la familia Meza que son los dueños hereditarios de ese lote manifestaron oposición a que se realizara una alcantarilla nueva, también se eliminó el tramo #6, 8 y 9.

Toma la palabra Rubiela Molina confirma que la resolución del Protocolo de Bioseguridad sigue vigente y hay que dar cumplimiento.

Damos por terminado el comité de seguimiento en el día de hoy, se les agradece a todos por la participación. Feliz día.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día / Mes / Año)	RESPONSABLES
Documentos de Estapa de pre construccion	26/05/2023	INTERVENTORIA
Topografia	24/05/2023	INTERVENTORIA
Ensayos de Laboratorio	23/05/2023	CONTRATISTA
Diseño Geometrico	19/05/2023	CONTRATISTA
Estudio Hidraulico	19/05/2023	CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 25/05/2023
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtir de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES	INGENIERO RESIDENTE	GAVINCO S.A.S.	
MARTHA SORIANO	COORDINADOR DEL PROYECTO	GAVINCO S.A.S.	

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	4 de 4

			FECHA	18/05/2023
			(Día / Mes / Año)	
.....				
FABIAN GALLARDO	INGENIERA AMBIENTAL	UNION TEMPORAL GBE		
RUBIELA MOLINA	PROFESIONAL SST	GAVINCO S.A.S.		
KATHERINE NAVARRO	INGENIERA AMBIENTAL	GAVINCO S.A.S.		
ANUAR CABARCAS	PROFESIONAL SOCIAL	GAVINCO S.A.S.		
LUIS CARRASCAL	INGENIERO RESIDENTE	UNION TEMPORAL GBE		
CAMILO FORERO	PROFESIONAL SST	UNION TEMPORAL GBE		
JUDITH MORALES	INGENIERO DE APOYO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
BRAYAN CAMILO CRIADO	INGENIERO DE APOYO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

**MEET GAVINCO INGENIEROS CO...**

Organizador

**Anuar Cabarcas ... (Invitado)**

Invitado de la reunión

**Brayan Camilo Criado Sa...**

Esterno

Salendo...

**Camilo Forero (Invitado)**

Invitado de la reunión

**Fanny Amaya (Invitado)**

Invitado de la reunión

**ING. Adriana (Invitado)**

Invitado de la reunión

**Ing. Fabian Galla... (Invitado)**

Invitado de la reunión

**Judith Morales (INVIAS) (Invitado)**

Invitado de la reunión

**Katherine Navarro (Invitado)**

Invitado de la reunión



BS

Bryan Camilo Uribe Sanjuan
Externo



CF

Camilo Forero (Invitado)
Invitado de la reunión



EA

Fanny Amaya (Invitado)
Invitado de la reunión



IA

ING. Adriana (Invitado)
Invitado de la reunión



IG

Ing. Fabian Galla... (Invitado)
Invitado de la reunión



JM

Judith Morales (INVITAS) (Invitado)
Invitado de la reunión



KN

Katherine Navarro (Invitado)
Invitado de la reunión



LA

Lisael Arenas (Invitado)
Invitado de la reunión



LC

LUIS CARRASCAL ...
Invitado de la reunión



R

RUBIELA (Invitado)
Invitado de la reunión



	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1					
		VERSIÓN	1					
		PÁGINA	1 de 4					
		FECHA	25/05/2023 (Día / Mes / Año)					
(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)								
ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 3 (La numeración será consecutiva)								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER						
CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCONTR.3879052 (Indicar número de contrato y año)		MUNICIPIO DE OCAÑA						
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GBE								
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA - BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 (Indicar número de contrato y año)								
INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.								
<table border="1"><tr><td>LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS</td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td>Se presentan los compromisos adquiridos en el comité de obra No. 03, los cuales se encuentran en el siguiente estado:</td></tr><tr><td>Sin Cumplir: -Documentos pendientes por entregar -Certificado de Laboratorio -Devolución de los Rendimientos Financieros.</td></tr></table>				LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS			Se presentan los compromisos adquiridos en el comité de obra No. 03, los cuales se encuentran en el siguiente estado:	Sin Cumplir: -Documentos pendientes por entregar -Certificado de Laboratorio -Devolución de los Rendimientos Financieros.
LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS								
Se presentan los compromisos adquiridos en el comité de obra No. 03, los cuales se encuentran en el siguiente estado:								
Sin Cumplir: -Documentos pendientes por entregar -Certificado de Laboratorio -Devolución de los Rendimientos Financieros.								
<table border="1"><tr><td>TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA</td></tr><tr><td>• Compromisos • Aspectos técnicos • Avance de entrega documental etapa Preconstrucción • Temas pendientes próximo comité</td></tr></table>				TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA	• Compromisos • Aspectos técnicos • Avance de entrega documental etapa Preconstrucción • Temas pendientes próximo comité			
TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA								
• Compromisos • Aspectos técnicos • Avance de entrega documental etapa Preconstrucción • Temas pendientes próximo comité								



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 de 4

FECHA 25/05/2023

(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo el 25 de mayo de 2023, la Interventoría a través de la ingeniera Residente Adriana Gutiérrez De Piñeres, da inicio al comité de seguimiento No. 3.

El objetivo de este comité es revisar los compromisos de la semana anterior, luego las cifras del avance, la entrega documental etapa pre construcción, luego de como se ha avanzado con la revisión de Estudios y Diseños, hacer una verificación de las actividades en obra de la semana anterior y luego haremos revisión de tres componentes el área SST, el área Ambiental y el área Social.

La Interventoría comenta que el municipio tiene un compromiso con respecto a la Devolución de los Rendimientos Financieros, se le pregunta a la ingeniera Yessica Carreño que información tiene al respecto.

La ingeniera Yessica Carreño comenta con respecto a los Rendimientos Financieros ya lo había mencionado en el comité anterior del proyecto Morrison, que la contadora está haciendo todo el trámite para radicar en el Banco y con respecto al acta de inicio se esta revisando el tema con relación al oficio que se recibió el día antes de ayer por parte de la Interventoría se realiza el orden del inicio como tal el contrato relacionado a la plata forma, pero como acta de inicio no.

La Interventoría comenta que le había solicitado al contratista un documento como acta de inicio que se ha firmado por las tres partes este con el fin de poder hacer la actualización de las pólizas, ya que por parte de la aseguradora solicita un documento para poder hacer este trámite, la ingeniera Lised Arenas había comentado en el comité pasado que se iba a revisar este tema y a generar dicho documento, se le pregunta a la ingeniera Yessica Carreño si sabe algo al respecto.

La ingeniera Yessica Carreño manifestó están en revisión y no se puede hacer doble documento eso lo manifestó el encargado de la parte contractual. Por eso se esta revisando este tema para poder saber que fecha se va sacar esa acta de inicio porque no se puede publicar en el Secop, porque se da una orden de inicio del 2 de mayo de 2023 ya hoy estamos a 25 de mayo de 2023 y hacer una publicación de un documento tan tardía genera repercusiones, se continuara revisando con los encargados del tema de contratación y se informara de manera formal.

Había un compromiso por parte del Contratista del 19 de mayo de 2023 del Diseño Geométrico y la parte del Diseño Hidráulico a la fecha no ha llegado información, se le pregunta al Contratista para cuando tendrían este documento.

El Contratista comenta con respecto al Diseño Geométrico le están haciendo unas correcciones se compromete hacer entrega el día lunes 29 de mayo de 2023 y lo mismo con el Diseño Hidráulico.

La Interventoría hace una recomendación al Contratista con respecto a la entrega del Diseño Geométrico e Hidráulico ya que tenía como fecha de entrega el día 19 de mayo de 2023 la cual no fue cumplido, si para la fecha del día lunes 29 de mayo de 2023 no hacen entrega de dicho documento se hará un proceso de incumplimiento por no entregar el documento referente a Estudios y Diseños.

Toma la palabra el ingeniero Wilmar Rangel le solicita al Contratista hacer cumplimiento al compromiso de la entrega de los documentos de los Diseños Geométrico e Hidráulico.

La Interventoría continua con el avance en cifras la cual a la fecha tiene un programado y ejecutado del 0%.

Se continua con el avance de entrega documental etapa pre construcción la cual se tiene observaciones pendientes de estos documentos se le pregunta al Contratista para cuando tendría fecha de entrega de estas observaciones que están pendiente.

El Contratista debe presentar para el día de mañana 26 de mayo de 2023 la Programación y el Flujo de Caja.

Se espera que para el próximo lunes 29 de mayo de 2023 el Contratista haga entrega del Equipo Mínimo.

Con respecto al documento PAGA esta observado desde el 20 de abril de 2023 se le pregunta al Contratista para cuando tiene fecha de entrega de este documento.

El Contratista se compromete comunicarse con el Especialista para cuando tiene el informe listo para la entrega de estas observaciones.

Está pendiente por entregar por parte del Contratista el Certificado de Disponibilidad de Laboratorio.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 de 4

	FECHA 25/05/2023 <small>(Día / Mes / Año)</small>
--	--

La Interventoria continua con el avance de entrega documental revisión de Estudios y Diseños, el Contratista todavía no ha hecho la entrega del Diseño Geométrico, se le recomienda las observaciones que se le ha hecho Geológico y Geotécnico, el de Pavimentos para tener esa parte concluida por el Contratista y la Interventoria.

La Interventoria afirma que la Topografía la entregaron el día martes 23 de mayo de 2023 la cual se encuentra en proceso de revisión, se espera dar una respuesta a mas tardar el día de mañana a este documento.

Con respecto a la información SST el Contratista tiene pendiente la entrega de los documentos para su respectiva revisión por parte de la Interventoria del Protocolo de Bioseguridad y del Sistema de Gestión SST.

En cuanto a la parte del componente Ambiental y Social esta pendiente la entrega de las subsanaciones del PAGA.

Se da por terminado el comité de seguimiento del día de hoy, se les agradece a los participantes. Feliz día para todos.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día / Mes / Año)	RESPONSABLES
Programacion y Flujo de Caja	26/05/2023	CONTRATISTA
Topografía	26/05/2023	INTERVENTORIA
Equipo Minimo	29/05/2023	CONTRATISTA
Diseño Geometrico	29/05/2023	CONTRATISTA
Estudio Hidraulico	29/05/2023	CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 1/06/2023
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

- Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
- Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtir de manera previa el trámite interno correspondiente.
- Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES	INGENIERO RESIDENTE	GAVINCO S.A.S.	
MARTHA SORIANO	COORDINADOR DEL PROYECTO	GAVINCO S.A.S.	
YESSICA CARREÑO	INGENIERO DE APOYO	MUNICIPIO	
MAURICIO RODRIGUEZ	INGENIERO DE APOYO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
WILMAR RANGEL	GESTOR TECNICO DE PROYECTO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
LUIS JAVIER CARRASCAL	DIRECTOR DE OBRA	UNION TEMPORAL GBE	
CAMILO FORERO	PROFESIONAL SST	UNION TEMPORAL GBE	
JUDITH MORALES	INGENIERO DE APOYO	INSTITUTO TERRITORIAL DE VIAS	

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</p> <p style="text-align: center;">PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</p> <p style="text-align: center;">MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</p> <p style="text-align: center;">ACTA DE COMITÉ DE OBRA</p>		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	4 de 4
			FECHA	25/05/2023 (Día / Mes / Año)
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>.....</p> <p>BRAYAN CAMILO CRIADO</p> </div> <div> <p>.....</p> <p>INGENIERO DE APOYO</p> </div> <div> <p>.....</p> <p>INSTITUTO TERRITORIAL DE VIAS</p> </div> </div>				
<p>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</p> <p>Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial</p>				

**MEET GAVINCO INGENIEROS CO...**

Organizador

**Camilo Forero (Invitado)**

Invitado de la reunión

**ING. Adriana (Invitado)**

Invitado de la reunión

**Judith Morales (INVIAS) (Invitado)**

Invitado de la reunión

**LUIS CARRASCAL ...**

Invitado de la reunión

**Luis estupeñan (Invitado)**

Invitado de la reunión

**Invitado (Invitado)**

Invitado de la reunión

Saliendo...

**Mauricio Rodrig... (Invitado)**

Invitado de la reunión

**Wilmar (Invitado)**

Invitado de la reunión



- MC** **MEET GAVINCO INGENIEROS C...** ...
Organizador
- CF** **Camilo Forero (Invitado)**
Invitado de la reunión
- IA** **ING. Adriana (Invitado)**
Invitado de la reunión
- JMA** **Judith Morales (INVIA5) (Invitado)**
Invitado de la reunión
- LC** **LUIS CARRASCAL ...**
Invitado de la reunión
- LE** **Luis estupiñan (Invitado)**
Invitado de la reunión
- I** **Invitado (Invitado)**
Invitado de la reunión **Sabendo...**
- W** **Wilmar (Invitado)**
Invitado de la reunión
- YE** **Yessica Carreño (Invitado)**
Invitado de la reunión



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 4

FECHA 11/05/2023
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 202 - 2022 MUNICIPIO DE PAMPLONITA
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: U.T. COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA - NORTE DE SANTANDER, EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No.1878 DEL 2021, SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se presentan los compromisos adquiridos en el comité de obra No. 01, los cuales se encuentran en el siguiente estado:

Sin Cumplir:

- Documentos pendientes por entregar
- Certificado de Laboratorio
- Devolución de los Rendimientos Financieros.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Compromisos
- Aspectos técnicos
- Avance de entrega documental etapa Preconstrucción
- Temas pendientes próximo comité



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 de 4

FECHA 11/05/2023
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo el 11 de mayo de 2023, la Interventoría a través del director del Proyecto el ingeniero Diego Pedraza, da inicio al comité de seguimiento No. 01.

El objetivo es dar a conocer el orden del día, primero es tomar los compromisos del comité anterior, se revisa el cumplimiento y en el caso de no ser cumplido se hace la reiteración del caso, se toma las acciones en el transcurso de la siguiente semana, avances en cifras, luego el avance de entrega documental etapa de pre construcción son documentos que debe ser entregados previo al inicio de las actividades de obra y que hace parte del compendio contractual, pasamos al avance de entrega documental revisión de Estudios y Diseños, Información SST y por ultimo los componentes Ambiental y Social.

A la fecha hay compromisos que no han sido cumplidos que son los documentos de pre construcción, el acta de inicio de este contrato fue firmado el día 14 de abril de 2023 hoy hace 27 días, se le pregunta al Contratista que ha pasado con los documentos de la etapa de pre construcción teniendo en cuenta que se deben presentar a los 5 días después de la firma del acta de inicio.

El Contratista comenta que efectivamente no ha hecho entrega de estos documentos, se compromete que el día de hoy quede los compromisos para que a partir del día lunes 15 de mayo de 2023 presentar todos los documentos.

La Interventoria le pregunta al Contratista referente a los 6 componentes pertenecientes a los estudios y diseños como han avanzado con este tema, cuando es la fecha prevista de entrega.

El Contratista comenta que el componente de Estudios y Diseños ya se ha avanzado, la Topografía ya esta culminada, en estos momentos se esta revisando el dibujo Arquitectónico, Topográfico para atender las solicitudes que le han hecho en los anteriores proyectos, se espera que el día martes 16 de mayo de 2023, la Topografía este radicada por parte del Contratista, el Estudio de Suelos el equipo consultor ya estuvo en campo, ya se hicieron los apiques, está a la espera que el Laboratorio entregue los resultados, se ha ido trabajando el Diseño de Pavimentos.

Toma la palabra el ingeniero Nixon Patiño con respecto al Estudio y Diseño ya esta bastante avanzado, ya se está procesando la información, se está compilando la información para poder hacer la entrega el día miércoles 17 de mayo de 2023, a su vez se estará entregando la parte de Diseño de Pavimentos, ya se hizo el Estudio de Tránsito y se caracterizaron los tipos de vehículo que transitan por la zona y también el Estructural y Alcantarillas.

Con respecto al compromiso por parte de la alcaldía son los Rendimientos Financieros, la Interventoria generó un oficio donde se le pregunta a la persona encargada de la alcaldía si recibió el oficio.

Toma la palabra el ingeniero Johan Pantaleón, secretario de Planeación se compromete comunicarse con Tesorería, de parte de la alcaldía no han remitido ningún documento.

La Interventoria confirma que envió a dos correos para la solicitud de los Rendimientos Financieros que son alcaldia@pamplonita-nortedesantander.gov.co y planeacion@pamplonita-nortedesantander.gov.co el día 8 de mayo de 2023.

La Interventoria le pregunta al Contratista con respecto a la autorización de pólizas, las actas de inicio, y como va ese tema.

El Contratista confirma que el día que se hizo la entrega del acta de inicio con firmas se le envió a la aseguradora el oficio, al día de hoy no la han entregado, se compromete el día de mañana entregar el documento siempre cuando la aseguradora la tenga lista.

Toma la palabra el señor alcalde Samuel Mejía comenta que este proceso se trata de agilizar lo más pronto posible, le preocupa que se ha venido pasando el tiempo y no se ve el avance de la obra, todos los días la comunidad esta solicitando información, los concejales también, es importante que cada 8 días se haga el comité de esa manera y se va revisando el avance, lo ideal es asignar fechas e ir organizando todo el tema de ejecución. Con respecto a los Rendimientos Financieros la parte contable, la secretaria de Hacienda y el asesor financiero se van a dedicar a eso, organizarlo para dejarlo como compromiso de la Devolución de esos Rendimientos.

La Interventoria sugiere que cuando se haga esa Devolución envíen un oficio indicando cuales son los meses de los Rendimientos Financieros que han devuelto y le anexen a ese documento el extracto, una Certificación del Banco donde conste el valor de los Rendimientos de esos meses o de ese mes y al final anexen ese certificado de transferencia.

Con respecto al avance de entrega documental etapa de pre construcción a la fecha no se ha recibido ningún documento, pero si hay compromisos, similar sucede con Estudios y Diseños no se ha recibido ningún componente.

Se continua con el componente Ambiental, la ingeniera Katherine Navarro comenta que inicialmente se solicita la formulación del PAGA, teniendo en cuenta los requerimientos que exige el INVIAS a la hora de hacer la formulación y también se tiene en cuenta la Fuente de Materiales que son los permisos pertinentes para la extracción de los mismos, en este caso es el contrato de concepción de los proveedores y la Licencia Ambiental que son los permisos pertinentes para el aprobado del mismo.

Con respecto al componente Social, el profesional Anuar Cabarcas comenta con respecto al PAGA esta conformado por dos componentes Ambiental y Social, a pesar que se presenta en un solo documento son apreciaciones totalmente diferentes, en cuanto al componente Social se genera un plan de gestión social que debe tener el Contratista ante la ejecución del proyecto, hay documentos que se deben presentar antes de la ejecución del mismo, como la conformación de la veeduría ciudadana, la cual debe ser aprobada por parte de la personería municipal, el levantamiento de las actas de vecindad de las propiedades e igualmente se debe presentar al inicio de obra e igual la socialización de inicio de obra donde se debe manejar tres componentes: el técnico la parte Ambiental y la parte Social la socialización se realiza una vez este aprobado



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-14-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

3 de 4

FECHA

11/05/2023

(Día / Mes / Año)

obra, donde se debe manejar tres componentes, el técnico, la parte ambiental y la parte social, la socialización se realiza una vez este aprobado los Estudios y Diseños por parte de la Interventoría e igualmente el Contratista debe elevar una solicitud ante el Ministerio del Interior sobre la consulta previa si hay o no en grupos étnicos o afrodescendientes dentro el tramo que se va ejecutar la obra, por ultimo se debe de realizar el levantamiento del acta de compromiso si el Contratista requiere de una propiedad, un predio o una casa donde guardar material, arena, concreto, etc., también por parte de la alcaldía se debe presentar ante la Interventoría unos certificados o soportes donde avalen las personas o los empleados que ha contratado el Contratista y haga parte del área influencia directa.

Damos por terminado el comité de seguimiento en el día de hoy, Feliz tarde para todos.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	4 de 4

FECHA 11/05/2023
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día / Mes / Año)	RESPONSABLES
Topografía	16/05/2023	CONTRATISTA
Suelos y Geotecnia	17/05/2023	CONTRATISTA
Diseño Geométrico	19/05/2023	CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 18/05/2023
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtir de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
DIEGO PEDRAZA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	GAVINCO S.A.S.	
KATHERINE NAVARRO	INGENIERO AMBIENTAL	GAVINCO S.A.S.	
ANUAR CABARCAS	PROFESIONAL SOCIAL	GAVINCO S.A.S.	
VICTOR SANTOS	COORDINADORA DE PROYECTO	GAVINCO S.A.S.	
ROSANA DEL PILAR MATTOS	RESIDENTE	GAVINCO S.A.S.	
NIXON PATIÑO	TOPOGRAFO	U.T. COLOMBIA	
JHON QUINTERO	REPRESENTANTE LEGAL	U.T. COLOMBIA	
JOHAN ANDRES PARADA	INGENIERO DE APOYO	MUNICIPIO	
SAMUEL MEJIA	ALCALDE	MUNICIPIO	
JOHAN PANTALEON	SECRETARIO DE PLANEACION	MUNICIPIO	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

- | | | |
|--|--|---|
|  | MEET GAVINCO INGENIEROS CO...
Organizador |  |
|  | ALCALDIA DE PA... (Invitado)
Invitado de la reunión |  |
|  | Anuar Cabarcas (Invitado)
Invitado de la reunión |  |
|  | Diego Pedraza (Invitado)
Invitado de la reunión |  |
|  | FANNY AMAYA (Invitado)
Invitado de la reunión |  |
|  | Jhonn Quintero (Invitado)
Invitado de la reunión |  |
|  | katherine navarr... (Invitado)
Invitado de la reunión |  |
|  | mauricio pantale... (Invitado)
Invitado de la reunión |  |
|  | Nixon Patiño (Invitado)
Invitado de la reunión |  |
|  | Rosana del Pilar ... (Invitado)
Invitado de la reunión |  |



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

1 de 4

FECHA 19/05/2023
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 2
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 202 - 2022 MUNICIPIO DE PAMPLONITA
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: U.T. COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA - NORTE DE SANTANDER, EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No.1878 DEL 2021, SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se presentan los compromisos adquiridos en el comité de obra No. 02, los cuales se encuentran en el siguiente estado:

Cumplido:

- Topografía.
- Estudio de Suelos.

Sin Cumplir:

- Equipo Mínimo.
- Devolución de los Rendimientos Financieros.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Compromisos
- Aspectos técnicos
- Avance de entrega documental etapa Preconstrucción
- Temas pendientes próximo comité



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 de 4

FECHA 19/05/2023
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo el 18 de mayo de 2023, la Interventoría a través de la coordinadora del Proyecto la ingeniera Martha Soriano, da inicio al comité de seguimiento No. 2.

El objetivo de este comité es hacer seguimiento a los compromisos de la semana anterior, luego el avance de entrega de documental etapa de pre construcción, revisar el avance de entrega documental revisión de Estudios y Diseños, información SST, y los componentes Ambiental y Social.

La Interventoría comenta que el Contratista tenía un compromiso de la entrega del Equipo Mínimo de la cual no lo han entregado, se le pregunta para cuando tendrían ese documento para dar revisión del mismo.

El Contratista se compromete que el martes 23 de mayo de 2023, hará llegar la documentación de la maquinaria.

El Contratista hizo entrega de la Topografía y el Estudio de Suelos está pendiente por entregar el Estudio Hidráulico, se le pregunta para cuando tendría este documento.

El Contratista se compromete hacer entrega del Estudio Hidráulico para el miércoles 24 de mayo de 2023 con un diseño total del corredor para su primera revisión, versión cero.

La Interventoría continua con el avance con corte al 11 de mayo de 2023, como no se ha tenido la aprobación de la programación la cual fue entregada el día de ayer en horas de la tarde, no se ha podido hacer una medición del avance, se compromete para el próximo comité en tener los datos del avance programado como el ejecutado que va del proyecto.

Se continua con el avance de entrega documental etapa pre construcción esta semana se recibió documentación el día 18 de mayo de 2023, las Hojas de Vida, la Programación, el Flujo de Caja y la entrega de la propuesta económica Análisis de Precios Unitarios, los demás documentos continua pendiente por entrega por parte del Contratista, sigue pendiente el Plan de Calidad, Protocolo de Bioseguridad, Programa de Generación de Empleo, Relación de Equipo Mínimo, Instalaciones Provisionales, el PMT, la Instalación de la Valla, el PAGA, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Fuente de Materiales, el Certificado de Disponibilidad de Laboratorio, todos los ensayos de resultados de Laboratorio y Diseño de Mezcla, se le pregunta al Contratista para cuando hace entrega de estos documentos.

El Contratista se compromete hacer entrega de estos documentos entre los días 24 y 25 de mayo de 2023.

Se presenta el avance de entrega documental revisión de Estudios y Diseños se comenta que ya se recibió el componente de topografía, Estudios de Suelos y diseño Estructural del proyecto, está pendiente de entregar el Diseño Geométrico, Diseño de Pavimentos e Informe Hidráulico que quedo el compromiso de la entrega el día 24 de mayo de 2023, se le pregunta al Contratista para cuando hace entrega de estos dos documentos el Diseño Geométrico, Diseño de Pavimentos.

El Contratista se compromete hacer entrega del Diseño Geométrico e Hidráulico para el día 24 de mayo de 2023, y el Diseño de Pavimentos para el día 23 de mayo de 2023.

Con la información SST está a la espera con respecto al Protocolo de Bioseguridad y el Sistema de Gestión SST para los días 24 y 25 de mayo de 2023 para la revisión del mismo.

Se continua con el componente Ambiental, la ingeniera Katherine Navarro comenta está a la espera de recibir la documentación del PAGA y los permisos pertinentes para la Fuente de Materiales.

Dando continuidad al componente social, el profesional Anuar Cabarcas comenta la semana anterior envió un oficio informativo al Contratista donde se daba a conocer los cinco documentos que debe tener antes de iniciar la obra como es la socialización, la conformación del comité de veeduría ciudadana, la solicitud de consulta previa del Ministerio del Interior, el levantamiento de las actas de vecindad, el Certificado de disponibilidad que debe solicitar en la alcaldía municipal que haga constar que el personal contratado en obra es perteneciente a la área influencia directa del proyecto.

Toma la palabra Astrid Diaz apoyo de la secretaria de Hacienda y Tesorería comenta con respecto a la Devolución de los Rendimientos Financieros del convenio que estos se realizan al finalizar el convenio, no tenía conocimiento de que cada cuanto se debía hacer esta Devolución, el dinero ya está en la cuenta de Bancolombia ya está generado el dinero del 2022 a la fecha del 2023, el proceso es un poco demorado por Bancolombia, se compromete en el transcurso del día hacer el reintegro de este dinero pregunta que cada cuanto se debe hacer la Devolución de estos Rendimientos.

La Interventoría comenta que la Devolución de los Rendimientos Financieros debe hacerse mes a mes, se debe enviar la Certificación Bancaria, el pantallazo vía cebra de la Devolución de los Rendimientos por mes y los extractos bancarios.

El Ingeniero Johan Pantaleón, secretario de Planeación comenta que el día martes 16 de mayo de 2023 se reunió la comunidad junto con los concejales y compañía con el señor alcalde Samuel Mejía que la gente está bastante cansada, que, si tenían que hacer una protesta frente a la alcaldía la hacían, sabiendo que ya hay un acta de inicio y no se ha comenzado la ejecución de la obra, está muy inconforme la comunidad y solicitan la presencia de parte de la Interventoría y Contratista.

La Interventoría le afirma que el contrato ya inició y se encuentra en la etapa de Estudios y Diseños una vez superada esta etapa teniendo la aprobación de todos los componentes se podría dar inicio a obra física.

La Interventoría hace una aclaración con respecto al inicio de obra física del proyecto, la comunidad no debe pretender que el día que se firma el



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

3 de 4

FECHA 19/05/2023

(Día / Mes / Año)

acta de inicio se inicie obras físicas porque hay un componente que tiene varias complejidades que es la revisión o complemento de Estudios y Diseños no debe tardar menos de 30 días, ya han pasado los 30 días y hasta ahora se ha recibido las primeras versiones de parte del Contratista, se le solicita al municipio transmitir esta información de que la Interventoría está trabajando y aun no hay aprobación a esta documentación.

Damos por terminado el comité de seguimiento del día de hoy, se les agradece a todos por su participación. Feliz día.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

4 de 4
FECHA 19/05/2023
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día / Mes / Año)	RESPONSABLES
Documentos SST	25/05/2023	CONTRATISTA
Protocolo de Bioseguridad	24/05/2023	CONTRATISTA
Diseño Geométrico e Hidráulico	24/05/2023	CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 25/05/2023
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

- Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
- Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtir de manera previa el trámite interno correspondiente.
- Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
DIEGO PEDRAZA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	GAVINCO S.A.S.	
KATHERINE NAVARRO	INGENIERO AMBIENTAL	GAVINCO S.A.S.	
ANUAR CABARCAS	PROFESIONAL SOCIAL	GAVINCO S.A.S.	
MARTHA SORIANO	COORDINADORA DE PROYECTO	GAVINCO S.A.S.	
JHON QUINTERO	REPRESENTANTE LEGAL	U.T. COLOMBIA	
JOHAN ANDRES PARADA	INGENIERO DE APOYO	MUNICIPIO	
SAMUEL MEJIA	ALCALDE	MUNICIPIO	
JOHAN PANTALEON	SECRETARIO DE PLANEACION	MUNICIPIO	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

- MC** MEET GAVINCO INGENIEROS CO.,...
Organizador 
- AP** ALCALDIA DE PA... (Invitado)
Invitado de la reunión 
- AG** Anuar Cabarcas ... (Invitado)
Invitado de la reunión 
- DP** Diego Pedraza (Invitado)
Invitado de la reunión En espera 
- FA** Fanny Amaya (Invitado)
Invitado de la reunión 
- JQ** Jhonn Quintero (Invitado)
Invitado de la reunión 
- KN** Katherine Navar... (Invitado)
Invitado de la reunión 



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

1 de 3

FECHA 25/05/2023
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 3
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 202 - 2022 MUNICIPIO DE PAMPLONITA
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: U.T. COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA - NORTE DE SANTANDER, EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No.1878 DEL 2021, SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se presentan los compromisos adquiridos en el comité de obra No. 03, los cuales se encuentran en el siguiente estado:

Cumplido:

- Topografía.
- Estudio de Suelos
- Informe Estructural.
- Plan de Calidad.
- PMT.
- PAGA.

Sin Cumplir:

- Equipo Mínimo.
- Devolución de los Rendimientos Financieros.
- Diseño Geométrico.
- Pavimentos.
- Hidráulico.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Compromisos
- Aspectos técnicos
- Avance de entrega documental etapa Preconstrucción
- Temas pendientes próximo comité



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

2 de 3

FECHA 25/05/2023
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo el 25 de mayo de 2023, la Interventoría a través de la ingeniera Residente Rosana Mattos, da inicio al comité de seguimiento No. 3.

El objetivo de este comité es hacer seguimiento a los compromisos de la semana anterior, luego el avance de entrega documental etapa de pre construcción, revisar el avance de entrega documental revisión de Estudios y Diseños, información SST, los componentes Ambiental y Social.

La Interventoría manifiesta que el Contratista tenía un compromiso de entregar el día 23 de mayo de 2023 la Relación de Equipo Mínimo, se le pregunta que ha pasado con esa información que no ha sido entregado.

El Contratista comenta que ya tiene la mayoría de los equipos, le hace falta dos equipos, se compromete en el día lunes 29 de mayo de 2023 tener y radicar ese compromiso.

Con respecto al Diseño Geométrico el Contratista tenía el compromiso de entregar el día 24 de mayo de 2023 la cual no ha sido entregado.

El Contratista comenta que no han terminado de hacer toda la modulación del Diseño, dicen que van hacer entregas parciales, se compromete a entregar el Diseño Geométrico el día martes 30 de mayo de 2023 y el Informe Hidráulico y la subsanación de Pavimentos hace entrega el día miércoles 31 de mayo de 2023.

Se continua con el avance en cifras continua con un porcentaje en 0%.

La Interventoría continua con el avance de entrega documental etapa pre-construcción, el Contratista no ha hecho entrega del Programa de Generación de Empleo.

El Contratista se compromete a entregar la Programación Generación de Empleo el día lunes 29 de mayo de 2023.

La Interventoría le pregunta por otro compromiso del Contratista que no ha cumplido y es la Instalación del arte de la valla y acopio de materiales.

El Contratista se compromete a ubicar el punto de acopio de materiales el lunes 29 de mayo de 2023.

La Interventoría le pregunta por otro compromiso del Contratista que no ha cumplido y es el arte de la Valla.

El Contratista comenta que ese tema de la Valla lo va dialogar y gestionar el día de hoy en las oficinas del INVIAS para ver como es el proceso, porque hay un nuevo memorando para radicar el arte de la Valla, se compromete hacer entrega el día martes 30 de mayo de 2023.

El Contratista comenta que la Fuente de Materiales está dentro del documento PAGA, sin embargo, no se ha entregado se compromete entregar el día lunes 29 de mayo de 2023.

Con respecto al Certificado de Disponibilidad de Laboratorio se compromete el Contratista entregar el día de mañana 26 de mayo de 2023 y los resultados de Laboratorio hará entrega el día martes 30 de mayo de 2023.

La Interventoría continua con el avance de entrega documental revisión de Estudios y Diseños, la Topografía ya fue entregada por el Contratista.

Con respecto al componente de la información SST esta pendiente por dar respuesta por parte de la Interventoría del documento que entregó el Contratista el día 22 de mayo de 2023, se compromete a mas tardar el día lunes 29 de mayo de 2023 hacer la respectiva revisión de la información SST y el Protocolo de Bioseguridad.

En cuanto a la revisión de los documentos de los componentes Ambiental y Social en estos momentos se encuentran en revisión por parte de los profesionales Katherine Navarro y Anuar Cabarcas, apenas se tenga el concepto se les hará llegar un oficio el día martes 30 de mayo de 2023.

Toma la palabra el ingeniero Mauricio Pantaleón, secretario de Planeación del Municipio, hace la recomendación al Contratista de cumplir con los documentos requeridos para dar inicio a la obra física lo más pronto posible, ya que la comunidad está un poco inquieta de la cual ellos desean participar en los comités para estar atentos de lo que esta sucediendo con el proyecto.

La Interventoría le pregunta al ingeniero Mauricio Pantaleón, secretario de Planeación del Municipio con respecto a los Rendimientos Financieros, el municipio tenía el compromiso de entregar los Rendimientos el día 23 de mayo de 2023 que ha sucedido con ese documento.

El ingeniero Mauricio Pantaleón comenta que se estará enviando los Rendimientos Financieros el día de mañana 26 de mayo de 2023.

Damos por terminado el comité de seguimiento del día de hoy, se les agradece la participación de todos. Feliz tarde.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

3 de 3

FECHA 25/05/2023
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día / Mes / Año)	RESPONSABLES
Programacion y Generacion de Empleo	29/05/2023	CONTRATISTA
Hidraulico y Pavimentos	31/05/2023	CONTRATISTA
Maquinaria y Equipo	29/05/2023	CONTRATISTA
Instalacion de Materiales	29/05/2023	CONTRATISTA
Certificado de Laboratorio	26/05/2023	CONTRATISTA
Componenetes Ambiental y Social	30/05/2023	INTERVENTORIA
Diseño Geometrico	30/05/2023	CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 1/06/2023
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
DIEGO PEDRAZA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	GAVINCO S.A.S.	
KATHERINE NAVARRO	INGENIERO AMBIENTAL	GAVINCO S.A.S.	
MARTHA SORIANO	COORDINADORA DE PROYECTO	GAVINCO S.A.S.	
JHON QUINTERO	REPRESENTANTE LEGAL	U.T. COLOMBIA	
JOHAN ANDRES PARADA	INGENIERO DE APOYO	MUNICIPIO	
MAURICIO PANTALEON	SECRETARIO DE PLANEACION	MUNICIPIO	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial



MEET GAVINCO INGENIEROS C.A. ...
Organizador



Jhonn Quintero (Invitado)

Invitado de la reunión



Katherine Navarrete (Invitado)

Invitado de la reunión



Mauricio Pantaleón (Invitado)

Invitado de la reunión



Rosana Del Pilar (Invitado)

Invitado de la reunión





INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

1 de 4

FECHA 4/05/2023
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 2
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 2590 MUNICIPIOS NORTE DE SANTANDER
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: U.T. EDIVAL TROJA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE MUNICIPIOS DE ARBOLEDAS, GRAMALOTE Y LOS PATIOS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se presentan los compromisos adquiridos en el comité de obra No. 01, los cuales se encuentran en el siguiente estado:

Sin Cumplir:

- Documentos pendientes por entregar
- Certificado de Laboratorio
- Devolución de los Rendimientos Financieros.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Compromisos
- Aspectos técnicos
- Avance de entrega documental etapa Preconstrucción
- Temas pendientes próximo comité



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 de 4

FECHA 4/05/2023
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo el día jueves 04 de mayo de 2023, la Interventoría a través del director del Proyecto el ingeniero Diego Pedraza, da inicio al comité de seguimiento No. 02.

El objetivo de este comité es revisar los avances respecto a los compromisos y otros temas documentales de la semana anterior, el orden del día se revisa compromisos, revisar el avance en porcentajes y en pesos a la fecha, posterior al avance de entrega documental etapa de pre construcción, el avance de entrega documental del componente de revisión a Estudios y Diseños, luego temas de los componentes SST, Ambiental y Social.

La Interventoría comenta de un compromiso se la semana anterior por parte del municipio que era la entrega del acta de la resolución de supervisión y efectivamente se allegó, el supervisor es el arquitecto Efraín Pacheco secretario de vías de la Gobernación y el segundo compromiso era la reunión que se debió de dar a fin de solucionar el tema de ubicación de las abscisas sobre todo al tramo de Los Patios, vereda California, se le pregunta a la ingeniera Rosana Mattos que estuvo presente en la reunión cuales fueron los resultados de esta reunión, si definieron los ceros de esta zona.

La ingeniera Rosana Mattos comenta que el día martes 2 de mayo de 2023 se tuvo una reunión en las instalaciones de la Gobernación, el ingeniero Jorge Arias manifestó verbalmente que el cero del tramo Los Patios inicia en la vereda Corozal que lo va informar mediante oficio.

Toma la palabra la ingeniera Joselyn Gutiérrez afirmando que es así, la idea es cumplir con el anexo técnico que se presentó en la licitación, el ingeniero Jorge Arias va notificar por medio de correo electrónico mediante oficio que se van a respetar esos ceros, con el fin que el Contratista de inicio a ese sector.

La Interventoría le pregunta a la ingeniera Joselyn Gutiérrez de haber revisado el tema y estando seguro de la información lo que resta es manifestar al Contratista, si esto quedo en acta o van a enviar un oficio que se aclare esta situación.

La ingeniera Joselyn Gutiérrez comenta que la reunión realizada el día martes 2 de mayo de 2023 se organizo con el Contratista el tema de las abscisas y se reviso vereda por vereda de cada uno de los tres municipios, el Contratista esta informado del todo, el ingeniero Jorge Arias lo va dejar formalmente por oficio, pero en el acta quedo escrito que están conforme con los puntos y las abscisas revisadas en el terreno.

La Interventoría continua con la revisión de avance, el Contratista efectivamente ha hecho entrega del documento, la programación venia en proyect y el Flujo de Caja, pero había algunas observaciones por parte de la Interventoría, como esta observado no se considera la definición definitiva luego no se puede medir avance a la fecha con respecto a ese documento, se le pregunta al ingeniero William Quintero o el ingeniero Alirio Cárdenas por favor confirmar si ha recibido el oficio con las observaciones por parte de la Interventoría y si es así cuando estiman hacer esas subsanaciones.

El ingeniero William Quintero afirma que se habló en el comité, se recibió las observaciones con respecto a la programación y que lo solicitaba en proyect, le manifestó a la ingeniera Rosana Mattos que dentro de las especificaciones del contrato no especificaba que se debía entregar en proyect que se podía presentar en Diagrama, se colocaba de acuerdo con las observaciones que notifico la ingeniera Rosana Mattos de los cortes de viernes a jueves y las demás se están atendiendo.

La Interventoría considera hacer la entrega de la información ya sea en Excel, o en un software equivalente diferente, la idea es que haya congruencia a las barras de Grant.

La Interventoría continua con el avance de entrega documental etapa pre construcción el Contratista ha remitido los documentos que se consideraron dentro contrato, la Interventoría no ha dado respuesta a la totalidad, ha tenido dificultad logística, se compromete tener respuesta de estos documentos para el próximo comité 11 de mayo de 2023 de acuerdo con el convenio hay algunos documentos que no quedaron plasmados en el contrato que se mencionara en nuestro oficio.

La Interventoría continua con el avance de entrega documental revisión de Estudios y Diseños a la fecha no se ha recibido ningún documento de este tipo por parte del Contratista, el día de ayer se le dio respuesta a un oficio, el Contratista preguntó cual es el alcance de Estudios y Diseños se le dio respuesta en instrucción al INVIAS que debe hacerse uso de los documentos de la Cartilla Colombia Rural y el manual Diseño para Placa Huellas, así mismo se adjuntaron unas listas de chequeo que usan los Especialistas para hacer la revisión a los documentos que entreguen.

Toma la palabra el ingeniero William Quintero solicita una explicación en un oficio o por escrito a que hace referencia al componente PAGA porque no esta en el contrato y este seria contractual, para que quede claro y definido para saber que alcance se va tener en cuenta en sus puntos porque es un ítem aparte que viene dentro del contrato del INVIAS y lo del Diseño de la Valla solicita también que se lo haga llegar para poder mandarlo a hacer, en el comité pasado indicaron que iban a dejar uno solo por municipio para dar información a la comunidad.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

3 de 4

FECHA 4/05/2023
(Día / Mes / Año)

La Interventoria comenta con respecto a la Valla que se ofició el día de ayer con base a un instructivo que envió el INVIAS, es bastante básico son dos páginas, es remitir una información básica del contrato a un correo del INVIAS se le pide que lo envíe con copia a la Interventoria para saber que el trámite está en proceso, y desde el INVIAS se encarga de generar el arte, con respecto al PAGA hay dos circunstancias, la primera la normatividad ambiental excede a los compromisos contractuales, en segunda medida sabiendo que los recursos fueron contratados la Gobernación de Norte de Santander proviene del Instituto Nacional de Vías en un convenio generado entre las dos entidades. En el INVIAS para poder liquidar un contrato, está incluyendo a las entidades territoriales si el PAGA no ha sido presentado aprobado y aplicado no se puede liquidar el contrato.

La Interventoria le pregunta al Contratista por favor confirmar si recibieron el día de ayer la respuesta del oficio de la pregunta solicitada por el Contratista del alcance del componente de Estudios y Diseños.

El Contratista afirma que le llegó un comunicado por parte del supervisor de la Gobernación, pregunta si es ese mismo.

La Interventoria responde que no es el mismo, el comunicado va dirigido de parte de la Interventoria y el asunto está relacionado a respuesta de su oficio preguntando cual era el alcance de Estudios y Diseños.

El Contratista afirma a ver recibido una cartilla especificando unos lineamientos de los Estudios tanto Geométrico, Hidráulico, Estructural, ese rubro para esa parte que correspondía.

La Interventoria afirma que en ninguna parte del convenio en el contrato de obra esta detallado de manera particular, cual es el valor de cada uno de los componentes, sin embargo, el Instituto Nacional de Vías con el suministro de la Cartilla Colombia Rural y complementando con el manual de Diseño Placa Huella se haga fácil el diseño, la Interventoria hace una aclaración que no fueron estructuradoras del presupuesto sin embargo si somos los encargados de enviar el mensaje.

La Cartilla Colombia Rural es un documento confirmatorio, lo que hace es tomar información de campo del punto de vista Topográfico de Suelos e Hidráulico, basado en una serie de cálculos y en un informe soportado, se toma una determinación por ejemplo en el caso de Placa Huella hay un espesor tanto de concreto como de sub base si es que hay un tipo de CBR de resistencia de suelo y un vehículo de diseño determinado.

La Interventoria pregunta como va el avance a la fecha, teniendo en cuenta con la Topografía realizada en los corredores, en los restantes Diseños como han avanzado.

El ingeniero William Quintero comenta que ya terminaron toda la parte de Topografía, complementados todos los municipios 100% y en estos momentos se encuentra materializando formación en oficina, trabajando de la mano con el equipo Topográfico para ser entregado el día martes 9 de mayo de 2023 como se había acordado desde un principio la información, en el comité del día martes 2 de mayo de 2023 se dejó claro que se necesitaba la definición de los PR cero para todos los municipios para poder entregar a tiempo y cumplir con la información el día 9 de mayo de 2023, estamos a la espera de la información por parte de la Interventoria respuesta de la actualización de precios.

La Interventoria afirma que se ha recibido dos oficios al respecto en donde pedían una fórmula de ajuste, el contrato se calculó con unos APUS a precio fijo que no permite ajuste luego aprobar un ajuste de precios nos llevaría a incurrir anomalía tipo contractual, la Interventoria sugiere que no habría que revisar otros temas desde el punto de vista de ejecución que de pronto pueda perjudicar su avance y su parte financiera.

La Interventoria propone realizar una mesa de trabajo presencial para que asista la Dirección Territorial Norte de Santander, representante de la Gobernación que tengan la facultad para decidir, el representante del Contratista y representante de la Interventoria para tocar el tema de ajuste de precios.

Toma la palabra la profesional SST Rubiela Molina, comenta que deben tener en cuenta el Decreto 1072 del 2.015 el capítulo 6 la resolución 0312 del 2.019 la cual nos envían unos lineamientos de los estándares mínimos que se deben cumplir en esta área, como somos empresa del área de construcción se debe manejar un riesgo 5 por lo tanto se debe dar un cumplimiento dentro del capítulo 3 de esa resolución 0312 es clara y dice que con mas de 50 trabajadores de riesgo 1, 2 y 3 o menos de 50 trabajadores es decir 5, 6 y 10 trabajadores pero que tengan el riesgo 5 deben cumplir estos lineamientos, hay que entregar el protocolo de bioseguridad con la última resolución y hay que entregar el Plan SST.

Se continua con el componente Ambiental, la ingeniera Katherine Navarro da unas recomendaciones que cuando vayan a empezar a culminar el PAGA deben tener en cuenta los requerimientos del INVIAS para evitar enviar observaciones, igualmente también si van a contratar proveedores de la Fuente de Materiales y la Licencia Ambiental para dar inicio la obra.

La Interventoria comenta que va proyectar un oficio donde se va definir el alcance con una lista de chequeo y también adicionar hacer una mesa de trabajo.

Se continua con el componente Social, el profesional Aymer Ceballos recomienda que antes de inicio de obra se debe realizar



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 4 de 4
4/05/2023

Se continua con el componente Social, el profesional Anuar Cabarcas recomienda que antes de inicio de obra se debe realizar primero la socialización de inicio del alcance tanto Técnico, Social y Ambiental, luego la creación de la veeduría ciudadana, realizar la solicitud ante el Ministerio al Interior después de la consulta previa, también las actas de vecindad.

Damos por terminado el comité de seguimiento del día de hoy, agradece a todos por la intervención. Feliz día para todos.

COMPROMISOS PACTADOS

FECHA DE CUMPLIMIENTO
(Día / Mes / Año)

RESPONSABLES

Topografía	9/05/2023	CONTRATISTA
------------	-----------	-------------

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 11/05/2023
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtir de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
DIEGO PEDRAZA	DIRECTOR	GAVINCO S.A.S.	
ALIRIO CARDENAS	REPRESENTANTE LEGAL	U.T. EDIVIAL TROJA	
WILLIAM QUINTERO	DIRECTOR DE OBRA	U.T. EDIVIAL TROJA	
JOSELYN GUTIERREZ	INGENIERO DE APOYO	SECRETARIA VIAL	
ROSANA MATTOS	INGENIERO RESIDENTE	GAVINCO S.A.S.	
GUSTAVO NIÑO	APOYO CONTABLE	U.T. EDIVIAL TROJA	
RUBIELA MOLINA	INSPECTOR SST	GAVINCO S.A.S.	
KATHERINE NAVARRO	INGENIERO AMBIENTAL	GAVINCO S.A.S.	
ANUAR CABARCAS	PROFESIONAL SOCIAL	GAVINCO S.A.S.	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial



MEET GAVINCO INGENIEROS C.A. ...
Organizador



Anuar Cabarcas (Invitado)
Invitado de la reunión



Diego Pedraza (Invitado)
Invitado de la reunión



Fanny Amaya (Invitado)
Invitado de la reunión



GUSTAVO NIÑO _ (Invitado)
Invitado de la reunión



Joselyn Gutierrez _ (Invitado)
Invitado de la reunión



Katherine Navarro (Invitado)
Invitado de la reunión



Rosana Del Pilar _ (Invitado)
Invitado de la reunión



RUBIELA (Invitado)
Invitado de la reunión



William Quintero (Invitado)
Invitado de la reunión





INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 4

FECHA 11/05/2023
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 3
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 2590 MUNICIPIOS NORTE DE SANTANDER
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: U.T. EDIVAL TROJA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE MUNICIPIOS DE ARBOLEDAS, GRAMALOTE Y LOS PATIOS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se presentan los compromisos adquiridos en el comité de obra No. 03, los cuales se encuentran en el siguiente estado:

Sin Cumplir:

- Documentos pendientes por entregar
- Certificado de Laboratorio
- Devolución de los Rendimientos Financieros.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Compromisos
- Aspectos técnicos
- Avance de entrega documental etapa Preconstrucción
- Temas pendientes próximo comité



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 de 4

FECHA 11/05/2023
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo el 11 de mayo de 2023, la Interventoría a través del director del Proyecto el ingeniero Diego Pedraza, da inicio al comité de seguimiento No. 03.

El objetivo es dar a conocer el orden del día, primero es tomar los compromisos del comité anterior, se revisa el cumplimiento y en el caso de no ser cumplido se hace la reiteración del caso, se toma las acciones en el transcurso de la siguiente semana, luego se revisa el porcentaje de avance de acuerdo con el ultimo corte entregado por el informe semanal al INVIAS, los cortes son de viernes a jueves de todas las semanas por lo que se genera una información oficial al INVIAS los días lunes, luego un breve resumen de como se ha entregado y revisado la parte documental etapa de pre construcción de las dos partes, pasamos al avance de entrega documental revisión de Estudios y Diseños, Información SST y por último los componentes Ambiental y Social.

Existen documentos que hacen parte de la responsabilidad de la Interventoría, el envío del acta de comité de seguimiento No.01 que fue enviado el día de ayer, se le pregunta al ingeniero William Quintero si recibió el documento.

El ingeniero William Quintero confirma que recibió el correo del acta de comité de seguimiento No.01.

Con respecto a los documentos de pre construcción la Interventoria tenía el compromiso de responder esos documentos, ya se dio respuesta a la mayoría de estos documentos del Contratista.

La Interventoria afirma que hizo una aclaración con respecto al documento del alcance del PAGA que se solicitó en el comité de la semana anterior, se recibió una respuesta en que se manifiesta que no hace parte de responsabilidad por parte del Contratista, sin embargo, preguntaron que el componente de compensación Ambiental que esta por el orden de \$171 millones de pesos en que debe ser usado pregunta el Contratista.

Toma la palabra la ingeniera Katherine Navarro profesional del componente Ambiental comenta que el oficio recibido por parte del Contratista que se mencionó anteriormente se pedía el alcance del proyecto, están confundiendo la determinación del PAGA con la compensación Ambiental, hay que tener en cuenta dentro del presupuesto la compensación Ambiental consiste en el Desarrollo y la aplicación de planes correctivos para subsanar los daños generados de los sistemas naturales dentro de la ejecución de la obra, sin embargo es un ítem que está dentro del presupuesto aparte de la formulación del PAGA, en el PAGA no se encontró otras obras ejecutadas que contempla el Estudio, el Diseño, la Gestión Predial, Social, Ambiental y Otros. Se le deja claro al Contratista que no van a encontrar la palabra PAGA dentro del presupuesto, ¿qué es el PAGA?, el PAGA es el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental. Por eso se les envió un oficio al Contratista solicitando el contenido del Plan de Guía y Adaptación Ambiental para que sepan que deben formular a la hora de empezar a Diseñar el PAGA.

El ingeniero William Quintero afirma haber recibido el oficio por parte de la Interventoria donde notifican la información respecto para la elaboración del PAGA.

El ultimo compromiso por parte de la Interventoría es la respuesta de la solicitud de la actualización de precios que ha generado el Contratista, se había mencionado en el comité anterior donde se recibió traslado por competencia en una solicitud similar que no tenían todos los soportes que envió el Contratista, en su solicitud directa de la Interventoría era generar una fórmula de ajuste de precios, se respondió en su momento a la Gobernación en el punto de vista de la Interventoría legal y contractual, con el objetivo que se definiera esta situación se convocó una reunión presencial la cual mencionó el ingeniero William Quintero que el día martes en la Dirección Territorial Norte de Santander desafortunadamente no fue conclusiva, al final la determinación no era la que se esperaba y se convocó una nueva reunión que todavía no se tiene fecha ni hora se espera que sea para la siguiente semana, la idea es que en el marco de esa reunión nuevamente se trate de estos puntos que se han tocado y que por parte de la Gobernación, del INVIAS y de la Interventoría se haga la manifestación del caso que se pueda llegar a un punto de acuerdo.

Respecto a los compromisos por parte del Contratista se encuentran dos que son Programación y Flujo de Caja, el Flujo de Caja fue observado, se considera que es un documento básico para poder medir los avances a la fecha sin embargo, en razón de la información que ha brindado el ingeniero William Quintero la sugerencia es que se ajuste a la revisión de entrega de Estudios y Diseños de acuerdo con la condiciones reales, que sean un plazo razonable, se le pregunta al ingeniero William Quintero cuando sería la entrega de este documento.

El ingeniero William Quintero comenta que una vez lo tenga hace entrega del documento, se espera realizarlo este fin de semana sábado 13 de mayo de 2023 se entregaría el cronograma del Flujo de Caja.

La Interventoria hace una aclaración el tema del componente de Estudios y Diseños el plazo contemplado dentro del contrato no solamente es para la entrega por parte del Contratista, sino que este plazo debe incluir las revisiones y al final la aprobación.

La Interventoría comenta que no han hecho la Devolución de Rendimientos Financieros, es preocupante porque aún no han hecho la



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 de 4

FECHA 11/05/2023
(Día / Mes / Año)

primera Devolución, se manifestó en un oficio el día de ayer.

Se continua con el avance en cifras, la programación no ha sido aprobada luego las cifras de Programado y Ejecutado que al final van a determinar un avance o atraso, no han sido determinadas por eso todas las cifras al día de hoy aparecen en cero, se espera la entrega de la reprogramación para el día sábado 13 de mayo de 2023, para poder mostrar un avance real en cifras.

La Interventoría continua con el tema del avance de entrega documental etapa de preconstrucción hay documentos que ya han sido entregados por parte del Contratista de hecho hay algunos que han sido aprobados como las Hojas de Vida y otros que tienen observaciones como la Programación de obra y la Relación de Equipo Mínimo que tiene observaciones ya hace algunos días desde el 28 de abril de 2023.

Con respecto al avance de entrega documental revisión de Estudios y Diseños a la fecha no se han recibido ninguno de los componentes, informó el ingeniero William Quintero con un acuerdo de una reunión presencial el día martes se ha determinado solicitar 15 días adicionales.

Se continua con la información SST, la inspectora Rubiela Molina comenta que hasta la fecha no ha recibido ninguna documentación del Plan SST, ni Protocolo de Bioseguridad para su respectiva revisión, está en la espera de la entrega de esa documentación.

El ingeniero William Quintero comenta que como no se ha iniciado ejecución de obra, están trabajando en oficina, pregunta que si se puede entregar la información del personal que se tiene por ahora, o sería cuando se comience la obra y así entregar esa información.

Se da continuidad al componente Social, el profesional Anuar Cabarcas comenta que hasta la fecha no se ha recibido información del PAGA, las actas de vecindad, conformación de comité de veeduría, como todavía no tienen los Estudios y Diseños no se puede realizar la socialización, tampoco se ha recibido lo que corresponde las actas de compromiso y consulta previa, la consulta previa que se debe realizar antes del inicio de obra física, esta se debe solicitar ante el Ministerio Interior sobre si hay presencia de grupos étnicos, afrodescendientes y las actas de vecindad que se debe levantar previamente a la ejecución de la obra y por último las actas de compromiso debe levantar el Contratista si requiere que sea prestado alguna propiedad de alguna persona por parte de la comunidad para reposar los materiales de construcción.

La Interventoría le solicita al profesional Anuar Cabarcas proyectar un oficio pidiendo esta información que acaba de mencionar.

Damos por terminado el comité de seguimiento del día de hoy, feliz tarde para todos.

COMPROMISOS PACTADOS

FECHA DE CUMPLIMIENTO
(Día / Mes / Año)

RESPONSABLES

Flujo de Caja	13/05/2023	CONTRATISTA
Reprogramación	13/05/2023	CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 18/05/2023
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtir de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
DIEGO PEDRAZA	DIRECTOR	GAVINCO S.A.S.	



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

4 de 4

FECHA 11/05/2023
(Día / Mes / Año)

VICTOR SANTOS	INGENIERO DE APOYO	GAVINCO S.A.S.
WILLIAM QUINTERO	DIRECTOR DE OBRA	U.T. EDIVIAL TROJA
ROSANA MATTOS	INGENIERO RESIDENTE	GAVINCO S.A.S.
GUSTAVO NIÑO	APOYO CONTABLE	U.T. EDIVIAL TROJA
RUBIELA MOLINA	INSPECTOR SST	GAVINCO S.A.S.
KATHERINE NAVARRO	INGENIERO AMBIENTAL	GAVINCO S.A.S.
ANUAR CABARCAS	PROFESIONAL SOCIAL	GAVINCO S.A.S.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

- | | | | |
|----|-----------------------------------|------------------------|-----|
| MC | MEET GAVINCO INGENIEROS CO... | Organizador | qps |
| AC | Anuar Cabarcas (Invitado) | Invitado de la reunión | qps |
| DP | Diego Pedraza (Invitado) | Invitado de la reunión | qps |
| GM | GUSTAVO LAMU... (Invitado) | Invitado de la reunión | ... |
| G2 | GUSTAVO NIÑO ... (Invitado) | Invitado de la reunión | qps |
| JB | Jonathan Francisco Bernal Becerra | Externo | qps |
| KN | Katherine Navarro (Invitado) | Invitado de la reunión | qps |
| KC | katherine navar... (Invitado) | Invitado de la reunión | qps |
| RM | Rosana del Pilar ... (Invitado) | Invitado de la reunión | qps |
| RM | Rosana Del Pilar ... (Invitado) | Invitado de la reunión | qps |
| R | RUBIELA (Invitado) | Invitado de la reunión | qps |
| WQ | William Quintero (Invitado) | Invitado de la reunión | qps |



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

1 de 4

FECHA 25/05/2023
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 4
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 2590 MUNICIPIOS NORTE DE SANTANDER
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: U.T. EDIVAL TROJA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE MUNICIPIOS DE ARBOLEDAS, GRAMALOTE Y LOS PATIOS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se presentan los compromisos adquiridos en el comité de obra No. 04, los cuales se encuentran en el siguiente estado:

Cumplidos:

- Programación y Flujo de Caja.
- Documentos pre construcción.

Sin Cumplir:

- PAGA.
- Protocolo de Bioseguridad.
- SST.
- Rendimientos Financieros.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Compromisos
- Aspectos técnicos
- Avance de entrega documental etapa Preconstrucción
- Temas pendientes próximo comité



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 de 4

FECHA 25/05/2023
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo el 25 de mayo de 2023, la Interventoría a través del director del Proyecto el ingeniero Diego Pedraza, da inicio al comité de seguimiento No. 04.

El objetivo es dar a conocer el orden del día, primero es tomar los compromisos del comité anterior, se revisa el cumplimiento y en el caso de no ser cumplido se hace la reiteración del caso, se toma las acciones en el transcurso de la siguiente semana, luego se revisa el porcentaje de avance de acuerdo con el último corte entregado por el informe semanal al INVIAS, pasamos al avance de entrega documental revisión de Estudios y Diseños, Información SST y por último los componentes Ambiental y Social.

La Interventoría comenta que el Contratista realizó la entrega de los documentos de la etapa de pre construcción y en el momento se encuentra en revisión por parte de la Interventoría, de acuerdo con nuestro concepto hay algunos documentos que no se adjuntaron, salvo a los Análisis de los Precios Unitarios, los demás se dio respuesta por parte de la Interventoría.

La Interventoría comenta con respecto a los Rendimientos Financieros como se sabe la cuenta es de manera conjunta y para poder hacer cualquier transición debe emitirse una Certificación que firmen las dos partes que el banco emita ya sea el cheque de gerencia o bien haga la transferencia electrónica vía cebra, hace dos semanas se recibió el trámite por parte de la Gobernación, ha generado este certificado al que se hace mención, se firmó en versión física, se envió a la ciudad de Cúcuta en presencia de la Interventoría en manera presencial en una reunión que se tuvo en la Gobernación en la Ciudad de Cúcuta exactamente el día viernes 19 de mayo de 2023, se le entregó personalmente en las manos de la doctora Cecilia Valderrama asesora jurídica de la oficina de vías, a la fecha no se ha recibido esos reportes que se haya hecho la Devolución pero tenemos cuenta que el trámite está avanzando, estamos atentos de hacer seguimiento.

La Interventoría pregunta al ingeniero William Quintero con respecto al comité de veeduría si tiene algún conocimiento de que se haya formalizado este procedimiento en el marco de estas reuniones que se han dado.

El ingeniero William Quintero comenta que aún no se ha conformado el comité de veeduría, como no se ha dado inicio a la etapa constructiva, una vez se inicie se formara esos comités en mano de la comunidad y los presidentes de la junta.

La socialización deberá darse única y exclusiva en el momento que se conozca los resultados de los Estudios y Diseños para compartir la información final a la comunidad, la conformación del comité es un proceso previo hay que tenerlo claro, las entidades territoriales delegan un poco esta responsabilidad en manos del Contratista de obra, se estará apoyando con nuestro profesional Social Anuar Cabarcas y si la Gobernación no actúa a tiempo tratar de hacer proactivos.

La Interventoría comenta que la semana inmediatamente anterior se tuvo un par de reuniones presenciales de las que participaron la dirección territorial de norte de Santander, el Contratista, representantes de la Gobernación, el secretario de vías y por supuesto la Interventoría presente en esta reunión, el objetivo era muy puntual de revisar una solicitud de ajustes de precios que el Contratista ha hecho a la Gobernación hace unos pocos días, la Gobernación le dio trámite a la Interventoría por competencia, se le dio respuesta a la Gobernación y la respuesta fue negativa con respecto al ajuste de precios, consecutivamente unos meses después el Contratista había radicado un compendio documental de 500 folios al que adjunta una serie de soportes donde asegura que existen unos incrementos de precios de insumos y mano de obra, que podría afectar teóricamente las condiciones contractuales que se han generado. En razón a esa reunión con posterior acompañado del área jurídica de las tres partes, está un abogado de la unión temporal, un abogado de la gobernación y el abogado por parte de la Interventoría se ha debatido al respecto, de cual debería ser el tratamiento legal que debería darse este asunto y en compendio se ha determinado que la Interventoría debería rendir una especie de evaluación al respecto de la información que nos ha entregado.

Toma la palabra el ingeniero William Quintero le pregunta a la Interventoría como va con la recopilación de los precios actuales.

La Interventoría tiene el compromiso en el día de mañana y la ingeniera Rosana Mattos está liderando el proceso para recopilar esa información documental de los precios, es cotizar en los comercios las condiciones de entrega, el desplazamiento y demás, se hará un oficio formal y se enviará el día de mañana en las horas de la tarde.

Se continua con el avance en cifras a la fecha hay un programado del 0,18% versus ejecutado del 0,02% este se calcula en función de la información de Estudios y Diseños que es una actividad contractual que ha entregado el Contratista a la medida que se va recibiendo esa información se va cargando a la medida que se va aprobando los valores, cuando esté aprobado la totalidad de los Estudios y Diseños el porcentaje será el equivalente en valor a lo que pesa Estudios y Diseños sobre el total del contrato, por ahora se presenta un pequeño atraso 0,16% teniendo en cuenta el volumen tan grande de vías de tramos viales que se van a intervenir, en Gramalote son 3, en Arboledas son 8 y en Los Patios es 2 es decir para un total de 12 tramos viales con longitudes importantes, inicialmente se previó al Contratista un plazo de 60 días calendario para ejecutar esta labor, el Contratista ha solicitado una Prórroga, es decir no Prórroga del Contrato sino una Prórroga de esta actividad de 15 días adicionales.

La Interventoría hace una aclaración el tema del componente de Estudios y Diseños el plazo contemplado dentro del contrato no solamente es para la entrega por parte del Contratista, sino que este plazo debe incluir las revisiones y al final la aprobación.

La Interventoría comenta que no han hecho la Devolución de Rendimientos Financieros, es preocupante porque aún no han hecho la



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

3 de 4
FECHA
25/05/2023
(Día / Mes / Año)

primera Devolución, se manifestó en un oficio el día de ayer.

Se continua con el avance en cifras, la programación no ha sido aprobada luego las cifras de Programado y Ejecutado que al final van a determinar un avance o atraso, no han sido determinadas por eso todas las cifras al día de hoy aparecen en cero, se espera la entrega de la reprogramación para el día sábado 13 de mayo de 2023, para poder mostrar un avance real en cifras.

La Interventoría continua con el tema del avance de entrega documental etapa de preconstrucción hay documentos que ya han sido entregados por parte del Contratista de hecho hay algunos que han sido aprobados como las Hojas de Vida y otros que tienen observaciones como la Programación de obra y la Relación de Equipo Mínimo que tiene observaciones ya hace algunos días desde el 28 de abril de 2023.

Con respecto al avance de entrega documental revisión de Estudios y Diseños a la fecha no se han recibido ninguno de los componentes, informó el ingeniero William Quintero con un acuerdo de una reunión presencial el día martes se ha determinado solicitar 15 días adicionales.

Se continua con la información SST, la inspectora Rubiela Molina comenta que hasta la fecha no ha recibido ninguna documentación del Plan SST, ni Protocolo de Bioseguridad para su respectiva revisión, está en la espera de la entrega de esa documentación.

El ingeniero William Quintero comenta que como no se ha iniciado ejecución de obra, están trabajando en oficina, pregunta que si se puede entregar la información del personal que se tiene por ahora, o sería cuando se comience la obra y así entregar esa información.

Se da continuidad al componente Social, el profesional Anuar Cabarcas comenta que hasta la fecha no se ha recibido información del PAGA, las actas de vecindad, conformación de comité de veeduría, como todavía no tienen los Estudios y Diseños no se puede realizar la socialización, tampoco se ha recibido lo que corresponde las actas de compromiso y consulta previa, la consulta previa que se debe realizar antes del inicio de obra física, esta se debe solicitar ante el Ministerio Interior sobre si hay presencia de grupos étnicos, afrodescendientes y las actas de vecindad que se debe levantar previamente a la ejecución de la obra y por último las actas de compromiso debe levantar el Contratista si requiere que sea prestado alguna propiedad de alguna persona por parte de la comunidad para reposar los materiales de construcción.

La Interventoría le solicita al profesional Anuar Cabarcas proyectar un oficio pidiendo esta información que acaba de mencionar.

Damos por terminado el comité de seguimiento del día de hoy, feliz tarde para todos.

COMPROMISOS PACTADOS

FECHA DE CUMPLIMIENTO
(Día / Mes / Año)

RESPONSABLES

Reprogramación

1/06/2023

CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA

1/06/2023
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtir de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
DIEGO PEDRAZA	DIRECTOR	GAVINCO S.A.S.	

	<p align="center"> INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA </p>		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	4 de 4

			FECHA	25/05/2023 (Día / Mes / Año)
LEIDY JAIME	INGENIERO DE APOYO	U.T. EDIVIAL TROJA		
WILLIAM QUINTERO	DIRECTOR DE OBRA	U.T. EDIVIAL TROJA		
WILMAR RANGEL	INGENIERO DE APOYO	INSTITUTO TERRITORIAL DE VIAS		
RUBIELA MOLINA	INSPECTOR SST	GAVINCO S.A.S.		
KATHERINE NAVARRO	INGENIERO AMBIENTAL	GAVINCO S.A.S.		
ANUAR CABARCAS	PROFESIONAL SOCIAL	GAVINCO S.A.S.		

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

- | | | | |
|----|---------------------------------|------------------------|--|
| MC | MEET GAVINCO INGENIEROS CO... | Organizador | |
| AG | Anuar Cabarcas ... (Invitado) | Invitado de la reunión | |
| DP | Diego Pedraza (Invitado) | Invitado de la reunión | |
| FA | Fanny Amaya (Invitado) | Invitado de la reunión | |
| HA | Hurtado Ramirez Natalia Andrea | Externo | |
| JG | Joselyn Gutiérrez... (Invitado) | Invitado de la reunión | |
| KN | Katherine Navarro (Invitado) | Invitado de la reunión | |
| LJ | Leidy Jaime (Invitado) | Invitado de la reunión | |
| R | RUBIELA (Invitado) | Invitado de la reunión | |
| UZ | UT EDIVIALTROJ... (Invitado) | Invitado de la reunión | |
| WQ | William Quintero (Invitado) | Invitado de la reunión | |
| WQ | WILLIAM QUINT... (Invitado) | Invitado de la reunión | |
| WQ | WILLIAM QUINT... (Invitado) | Invitado de la reunión | |
| W | Wilmar (Invitado) | Invitado de la reunión | |

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 4

FECHA		4/05/2023
		(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 7
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 1863 DE 2022 **MUNICIPIO LA PLAYA**
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS Se presentan los compromisos adquiridos en el comité de obra No. 07, los cuales se encuentran en el siguiente estado: Sin Cumplir: -Diseño Geométrico. -Rendimientos Financieros. -PAGA. -Topografía.
--

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA • Compromisos • Aspectos técnicos • Avance de entrega documental etapa Preconstrucción • Temas pendientes próximo comité



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 de 4

FECHA 4/05/2023
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo el 04 de mayo de 2023, la Interventoría a través del director del Proyecto el ingeniero Diego Pedraza, da inicio al comité de seguimiento No. 7.

El objetivo de este comité es hacer seguimiento a los compromisos establecidos de la semana anterior, luego el avance en cifras, verificar el avance de entrega documental etapa de pre construcción, revisar el avance de entrega documental revisión de Estudios y Diseños, información SST, y los componentes Ambiental y Social.

La Interventoria comenta de los compromisos que aun el Contratista no ha cumplido que son:

- Ensayos de Laboratorio de los materiales granulares que se van a usar en la construcción, estamos a la espera de recibir ese documento, se le pregunta al Contratista para cuando tiene la entrega de ese documento.

La ingeniera Claudia Rangel afirma que los Ensayos de Laboratorio ya envió la caracterización del material de la sub base granular el día 3 de mayo con el oficio No.024.

- No se ha recibido subsanación de los documentos Topografía, Diseño Geométrico, Hidráulico del corredor 2, se le pregunta al Contratista como ha avanzado con estos documentos.

La ingeniera Claudia Rangel afirma que ya envió el Hidráulico del corredor 2, el Diseño Geométrico y la Topografía fue enviada el día de hoy.

La Interventoria comenta que la Fuente de Materiales fue recibido por parte del Contratista, también se recibió y se observó el Diseño de Pavimentos, el Contratista hizo la subsanación del documento.

- El Informe Estructural esta pendiente, se le pregunta al Contratista si ya fue enviado.

La ingeniera Claudia Rangel afirma que ya envió el Informe Estructural comenta que el documento pendiente es la anotación que es la misma verificación de la formula.

- Con respecto a las actas de vecindad es un tema que se ha conversado en comités anteriores, el ingeniero Sergio Arias manifestó y la Interventoria es de acuerdo que las actas de vecindad para evitar inconvenientes con la comunidad se deberían generar en el momento de tener certeza del proceso de intervención.

El ingeniero Sergio Arias comenta que aun no ha iniciado con el tema de las actas de vecindad, es que la comunidad presiona con el tema de las longitudes, para evitar estos inconvenientes la idea es tener el tema ajustado. Se compromete realizar las actas de vecindad antes de empezar el proyecto físico.

La Interventoria comenta que el Estudio de suelos fue entregado, la parte de Geotecnia fue entregado por el Contratista se emitieron las observaciones al respecto.

Se continua con el avance en cifras teniendo en cuenta que no se ha iniciado obra física hay un atraso marcado del 7.20% se espera que la subsanación de la información de Estudios y Diseños afirma a ver recibido y se espera dar inicio lo más pronto posible.

La Interventoria continua con el avance de entrega documental etapa de pre construcción la mayoría de los documentos se encuentran entregados y aprobados, con respecto a la instalación de la Valla el día de ayer el INVIAS envió un documento oficial en donde indica como hacer el procedimiento para que se apruebe el arte de la Valla se le remitió al Contratista, se le pregunta si lo recibieron y cuando harían tramite a esa solicitud ante el INVIAS.

La ingeniera Claudia Rangel comenta que ya tienen el oficio para remitir al correo del INVIAS, pero allí dice que hay que enviar unos logos dice también opcional del municipio, se solicitó el día de ayer, afirma no tener los logos del municipio.

Toma la palabra el arquitecto Cesar Arévalo secretaria de Planeación comenta que envió un membrete en formato Word donde siempre se utiliza esos archivos para poder utilizarlos los logos, se compromete comunicarse con la persona encargada de publicidad para que envíe la imagen en JPG.

La Interventoria le pregunta al arquitecto Cesar Arévalo hay un tema que no se incluyó en el día de hoy con respecto a los Rendimientos Financieros donde están los recursos del convenio, esta devolución debe hacerse mensualmente, a la fecha no hay registro de que se halla hecho esa Devolución, le recomienda que cuando hagan esa Devolución de parte del municipio que envíen en un oficio el Extracto, Certificación Bancaria que conste la cifra que se está devolviendo y el Certificado de Devolución con el objetivo de esa información se pueda remitir al gestor en Bogotá del INVIAS, pueda descargar en el área Financiera, se le pregunta que información tiene al respecto.

El arquitecto Cesar Arévalo comenta que tiene unos Rendimientos Financiero que se lo entrego la secretaria de Hacienda con fecha del 27 de abril de 2023, unas transferencias vía cebra, ella dice que siempre lo hacer con el Tesoro Nacional, se compromete consultar para ver qué términos tiene esos Rendimientos Financieros y estos no se ha enviado al INVIAS.

La Interventoría comenta que hay dos documentos que se encuentran en observaciones que son el PAGA y la Fuente de Materiales.

La Interventoria continua con el avance de entrega documental revisión de Estudios y Diseños, el Contratista confirmó que entre los días de ayer y hoy subsanaron documentos que hay con observaciones incluyendo el Informe Estructural, en estos momentos están en manos de la Interventoria, con



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 de 4

FECHA	4/05/2023
	(Día / Mes / Año)

respecto al Informe Hidráulico fue aprobado el corredor 1.

Se continua con el componente SST la profesional Rubiela Molina comenta que todos los documentos se encuentran al día, está en espera del inicio de obra.

Toma la palabra la ingeniera Katherine Navarro del componente Ambiental comenta que esta en espera que el Contratista subsane las respectivas observaciones en cuanto a la Fuente de Materiales y al PAGA.

La Interventoria continua el componente Social el profesional Anuar Cabarcas comenta que esta en espera que el contratista se comprometió hacer entrega de las observaciones subsanadas el día de mañana, también esta pendiente por entregar por parte del Contratista las actas de vecindad, ya se recibió el documentos de la consulta previa, se le recuerda al Contratista las actas de compromiso y la socialización de inicio, una vez este aprobado las deferentes de Estudios y Diseños se debe realizar antes de iniciar las obras.

Damos por terminado el comité de seguimiento del día de hoy, se le agradece a todos los participantes. Feliz tarde para todos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4 de 4

FECHA		4/05/2023 (Día / Mes / Año)
-------	--	--------------------------------

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día / Mes / Año)	RESPONSABLES
Rendimientos Financieros	11/05/2023	MUNICIPIO
PAGA	11/05/2023	CONTRATISTA
Fuente de Materiales	11/05/2023	CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 11/05/2023
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

- Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
- Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtir de manera previa el trámite interno correspondiente.
- Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
DIEGO PEDRAZA	DIRECTOR	GAVINCO S.A.S.	
CLAUDIA RANGEL	INGENIERO DE APOYO	CONSORCIO LA PLAYA 2022	
MAURICIO RODRIGUEZ	INGENIERO DE APOYO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
SERGIO ARIAS	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO LA PLAYA 2022	
RUBIELA MOLINA	INSPECTOR SST	GAVINCO S.A.S.	
ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES	RESIDENTE	GAVINCO S.A.S.	
CESAR AREVALO	SECRETARIO DE PLANEACION	MUNICIPIO	
ANUAR CABARCAS	PROFESIONAL SOCIAL	GAVINCO S.A.S.	
KATHERINE NAVARRO	INGENIERO AMBIENTAL	GAVINCO S.A.S.	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

- | | | | |
|----|------------------------------------|------------------------|--|
| MC | MEET GAVINCO INGENIEROS CO... | Organizador | |
| AO | ANGIE ORTIZ (Invitado) | Invitado de la reunión | |
| AC | Anuar Cabarcas (Invitado) | Invitado de la reunión | |
| CR | CLAUDIA RANGEL (Invitado) | Invitado de la reunión | |
| CA | Cristiam Mauricio Rodriguez Ace... | Externo | |
| DP | Diego Pedraza (Invitado) | Invitado de la reunión | |
| EA | Fanny Amaya (Invitado) | Invitado de la reunión | |
| IA | ING. Adriana (Invitado) | Invitado de la reunión | |
| KN | Katherine Navarro (Invitado) | Invitado de la reunión | |
| IL | RUBIELA (Invitado) | Invitado de la reunión | |
| SP | SEC. PLANEACIO... (Invitado) | Invitado de la reunión | |
| SA | Sergio Arias (Invitado) | Invitado de la reunión | |

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

		FECHA	18/05/2023 (Día / Mes / Año)
--	--	-------	---------------------------------

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 8
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 1863 DE 2022 **MUNICIPIO LA PLAYA**
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS Se presentan los compromisos adquiridos en el comité de obra No. 08, los cuales se encuentran en el siguiente estado: Cumplido: -Ensayos de Laboratorio. -Componente topografía. -Informe Estructural. Sin Cumplir: -Diseño Geométrico. -Rendimientos Financieros. -PAGA. -Diseño Hidráulico.
--

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA • Compromisos • Aspectos técnicos • Avance de entrega documental etapa Preconstrucción • Temas pendientes próximo comité



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 de 2

FECHA 18/05/2023
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo el 18 de mayo de 2023, la Interventoría a través de la coordinadora del Proyecto la ingeniera Martha Soriano, da inicio al comité de seguimiento No. 8.

El objetivo de este comité es hacer seguimiento a los compromisos de la semana anterior, luego el avance de entrega de documental etapa de pre construcción, revisar el avance de entrega documental revisión de Estudios y Diseños, información SST, y los componentes Ambiental y Social.

La Interventoría comenta que el Contratista presento los Ensayos de Laboratorio la cual fue aprobado, en cuanto al arte de la Valla está pendiente por enviar al INVIAS teniendo en cuenta cuando se realice la socialización con la comunidad, se le pregunta al Contratista con respecto a las actas de vecindad del corredor 1 y 2 en que estado de avance se encuentra y para cuando haría entrega para la respectiva revisión.

El ingeniero Sergio Arias comenta con respecto a las actas de vecindad están en espera del aval de inicio de obra, el tema del presupuesto, las longitudes para que no suceda lo mismo de Abrego, tener algo definitivo para poder avanzar.

La Interventoría tenía como compromiso la revisión del componente de la Topografía el cual ya se dio respuesta con unas pequeñas observaciones, el Diseño Geométrico del corredor 1 y 2 se encuentra en revisión por parte de la Interventoría, se espera dar una respuesta el próximo martes 23 de mayo de 2023, en cuanto al Diseño Hidráulico del corredor 2 se encuentra en revisión por parte de la Interventoría se espera dar una respuesta el próximo martes 23 de mayo de 2023, con respecto al Informe Estructural se respondió el día de hoy, se espera la subsanación de los planos Estructurales.

La Interventoría continua con el avance general del proyecto con corte del 11 de mayo de 2023, se tiene un porcentaje programado de 13,03% y un ejecutado del 0,27% teniendo un atraso 12,75%.

En cuanto al avance de entrega documental etapa pre construcción a la fecha se encuentran la mayoría de los documentos aprobados en excepción del PAGA y la Fuente de Materiales.

Se continua con el avance de entrega documental revisión de Estudios y Diseños se tiene la Topografía aprobada con observaciones de forma, el Diseño Geométrico se encuentra en revisión por parte de la Interventoría, el Estudio de Suelos y Pavimentos depende de la aprobación del Diseño Geométrico, el Informe Estructural se encuentra en revisión por parte de la Interventoría, se compromete hacer entrega el 23 de mayo de 2023, en cuanto al Informe Hidráulico se encuentra en revisión el corredor 2 se espera dar una respuesta próximo miércoles 24 de mayo de 2023.

Se continua con el capítulo de información SST, la inspectora Rubiela Molina comenta que se encuentran al día con la documentación esta pendiente la fecha de inicio para la revisión de documentos.

Se da continuidad al componente Ambiental, la ingeniera Katherine Navarro comenta que esta a la espera que el Contratista envíe las observaciones subsanadas y en cuanto a la Fuente de Materiales esta pendiente en recibir la Licencia Ambiental de parte del Proveedor.

El Contratista se compromete hacer entrega del PAGA el próximo viernes 2 de junio de 2023.

La Interventoría continua con el componente Social el profesional Anuar Cabarcas comenta que esta a la espera del documento PAGA, con respecto a los documentos que debe presentar el Contratista antes de iniciar la obra, las actas de vecindad se pueden levantar ocho días antes, la socialización de ambos sectores se debe realizar dos o tres días antes de iniciar la obra.

Damos por terminado el comité del día de hoy, se les agradece a todos. Feliz tarde.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 de 3

FECHA 18/05/2023
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día / Mes / Año)	RESPONSABLES
Diseño Geometrico	23/05/2023	INTERVENTORIA
Informe Hidraulico	24/05/2023	INTERVENTORIA
PAGA	2/06/2023	CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 25/05/2023
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtir de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
DIEGO PEDRAZA	DIRECTOR	GAVINCO S.A.S.	
CLAUDIA RANGEL	INGENIERO DE APOYO	CONSORCIO LA PLAYA 2022	
MARTHA SORIANO	COORDINADORA DE PROYECTO	GAVINCO S.A.S.	
SERGIO ARIAS	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO LA PLAYA 2022	
RUBIELA MOLINA	INSPECTOR SST	GAVINCO S.A.S.	
ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES	RESIDENTE	GAVINCO S.A.S.	
ANUAR CABARCAS	PROFESIONAL SOCIAL	GAVINCO S.A.S.	
KATHERINE NAVARRO	INGENIERO AMBIENTAL	GAVINCO S.A.S.	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

-  **MEET GAVINCO INGENIEROS CO...**
Organizador
-  **Anuar Cabarcas ... (Invitado)**
Invitado de la reunión
-  **Claudia Rangel (Invitado)**
Invitado de la reunión
-  **Diego Pedraza (Invitado)**
Invitado de la reunión
-  **Fanny Amaya (Invitado)**
Invitado de la reunión
-  **ING. Adriana (Invitado)**
Invitado de la reunión
-  **Katherine Navero (Invitado)**
Invitado de la reunión
-  **RUBIELA (Invitado)**
Invitado de la reunión
-  **Sergio Andres Arias Anzola**
Externo

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA		25/05/2023
		(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 9
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 1863 DE 2022 MUNICIPIO LA PLAYA
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS Se presentan los compromisos adquiridos en el comité de obra No. 09, los cuales se encuentran en el siguiente estado: Cumplido: -Diseño Geométrico. -Informe Estructural. Sin Cumplir: -Rendimientos Financieros. -PAGA. -Diseño Hidráulico. -Fuente de Materiales.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA • Compromisos • Aspectos técnicos • Avance de entrega documental etapa Preconstrucción • Temas pendientes próximo comité



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 de 2

FECHA 25/05/2023
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo el 25 de mayo de 2023, la Interventoría a través de la residente Adriana Gutiérrez, da inicio al comité de seguimiento No. 9.

El objetivo de este comité es hacer seguimiento a los compromisos de la semana anterior, luego el avance de entrega de documental etapa de pre construcción, revisar el avance de entrega documental revisión de Estudios y Diseños, información SST, los componentes Ambiental y Social.

Hay un compromiso por parte de la Interventoria con respecto al Diseño Hidráulico del corredor 2 la cual se hará entrega de este documento el día de mañana 26 de mayo de 2023.

Por parte del Contratista tiene pendiente es el componente PAGA hará entrega el día 2 de junio de 2023, y la Fuente de Materiales.

Toma la palabra el ingeniero Sergio Arias afirmando que ya solicitó de nuevo a la Planta se compromete hacer entrega del documento de la Fuente de Materiales el lunes 29 de mayo de 2023.

Con respecto al avance en obra se tiene un programado de 26,41% versus un ejecutado del 0,35% se tiene un atraso de 26,06%.

Se continua con el avance de entrega documental etapa pre construcción la mayoría de los documentos se encuentran aprobados, en excepción dos que tienen observaciones que son el Plan de Manejo Ambiental y la Fuente de Materiales.

Toma la palabra la ingeniera Claudia Rangel comenta que el Plan de Manejo Ambiental se hará entrega de la corrección el día 2 de junio de 2023.

La Interventoria continua con el avance de entrega documental revisión de Estudios y Diseños en cuanto a la Topografía ya se encuentra aprobado, con respecto al Diseño Geométrico, Geológico, Pavimentos y el Informe Estructural se encuentran con observaciones, se le pregunta al Contratista para cuando tiene respuesta a estas observaciones.

El Contratista comenta con respecto al Informe Estructural la última subsanación lo enviaron el día de ayer 24 de mayo de 2023, era anexar los recubrimientos al Plano Estructural, se encuentra en manos de la Interventoria, el Diseño Geométrico afirman a ver entregado las correcciones el día 17 de mayo de 2023 y la Interventoria realizó observaciones el día 23 de mayo de 2023 la cual están pendientes por entregar.

Se continua con la información SST, la profesional Rubiela Molina comenta que el Contratista se encuentra al día todo lo que tiene que ver con Diseño, envió un oficio el día viernes 19 de mayo de 2023 para la entrega de la documentación inicial y la documentación que se debe entregar en el mes de ejecución se le pregunta al Contratista si tiene una duda al respecto.

El Contratista afirma de no tener el correo enviado por la profesional SST.

Rubiela Molina se compromete el día de hoy reenviar el documento al Contratista.

Se continua con el componente Ambiental, la ingeniera Katherine Navarro comenta que los compromisos que se mencionaron al inicio del comité esta a la espera de recibir las observaciones del documento PAGA, esta pendiente por entregar el día 2 de junio de 2023, a su vez estamos a la espera el documento de la Fuente de Materiales.

Con respecto al componente Social el profesional Anuar Cabarcas comenta que esta pendiente de las subsanaciones del PAGA, se le envió comunicación al Contratista referente a 5 puntos referente a los documentos que deben presentar al inicio de obra, aun no se ha recibido respuesta por parte de ellos, que fue enviado el día 12 de mayo de 2023, se le pregunta al Contratista para cuando tiene entrega de estos documentos, igualmente hay ciertos puntos de la socialización de la obra y la conformación del comité de la veeduría que no se va llevar a cabo porque no esta aprobado los Estudios y Diseños, conforme al levantamiento de actas de vecindad, los Certificados de territorial del personal que va trabajar del soporte de la junta de acción comunal, se solicita al Contratista que envíe como va avanzando el tema de la solicitud de consulta previa ante el Ministerio del Interior ya que hace dos meses fue enviado el soporte de consulta pero no se ha enviado corte de como ha estado el tramite ante el Ministerio, les recuerda que si se va necesitar un lote o vivienda donde vayan a guardar material, deben levantar las respectivas actas de compromisos para que mas adelante no se genere ningún tipo de problemática, todo lo correspondiente al inicio de obra.

Damos por terminado el comité de seguimientos del día de hoy, se les agradece a todos por su participación. Feliz día.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 de 3

FECHA 25/05/2023
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día / Mes / Año)	RESPONSABLES
Fuente de Materiales	29/05/2023	CONTRATISTA
Informe Hidraulico	26/05/2023	INTERVENTORIA
PAGA	2/06/2023	CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 1/06/2023
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtir de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
DIEGO PEDRAZA	DIRECTOR	GAVINCO S.A.S.	
CLAUDIA RANGEL	INGENIERO DE APOYO	CONSORCIO LA PLAYA 2022	
MARTHA SORIANO	COORDINADORA DE PROYECTO	GAVINCO S.A.S.	
SERGIO ARIAS	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO LA PLAYA 2022	
RUBIELA MOLINA	INSPECTOR SST	GAVINCO S.A.S.	
ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES	RESIDENTE	GAVINCO S.A.S.	
ANUAR CABARCAS	PROFESIONAL SOCIAL	GAVINCO S.A.S.	
KATHERINE NAVARRO	INGENIERO AMBIENTAL	GAVINCO S.A.S.	
JUDITH MORALES	INGENIERO DE APOYO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
MAURICIO RODRIGUEZ	INGENIERO DE APOYO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

-  **MEET GAVINCO INGENIEROS CO...**
Organizador 
-  **Anuar Cabarcas ...** (Invitado)
Invitado de la reunión 
-  **CLAUDIA RANG...** (Invitado)
Invitado de la reunión 
-  **Diego Pedraza** (Invitado)
Invitado de la reunión 
-  **Fanny Amaya** (Invitado)
Invitado de la reunión 
-  **ING. Adriana** (Invitado)
Invitado de la reunión 
-  **Judith Morales (INVIAS)** (Invitado)
Invitado de la reunión 
-  **Katherine Navarro** (Invitado)
Invitado de la reunión 
-  **Mauricio Rodríg...** (Invitado)
Invitado de la reunión 

 Compartir invitación

AG

ANAYAR CARRASCAS ... (Invitado)

Invitado de la reunión



CV

CLAUDIA RANG... (Invitado)

Invitado de la reunión



DP

Diego Pedraza (Invitado)

Invitado de la reunión



FA

Fanny Amaya (Invitado)

Invitado de la reunión



IA

ING. Adriana (Invitado)

Invitado de la reunión



JM

Judith Morales (INVITAS) (Invitado)

Invitado de la reunión



KN

Katherine Navarro (Invitado)

Invitado de la reunión



MI

Mauricio Rodrig... (Invitado)

Invitado de la reunión



R

RUBIELA (Invitado)

Invitado de la reunión



SA

Sergio Arias (Invitado)

Invitado de la reunión



	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 4

FECHA		4/05/2023 (Día / Mes / Año)
-------	--	--------------------------------

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 12
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 252 DE 2022 MUNICIPIO DE ABREGO
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO AD VIAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS Se presentan los compromisos adquiridos en el comité de obra No. 12, los cuales se encuentran en el siguiente estado: Cumplido: -Componentes Corredor 1. Sin Cumplir: -Componentes Corredor 2. -Actas de Vecindad. -La Veeduría Ciudadana. -La Socialización.
--

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA • Compromisos • Aspectos técnicos • Avance de entrega documental etapa Preconstrucción • Temas pendientes próximo comité



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 de 4

FECHA 4/05/2023
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo el 04 de mayo de 2023, la Interventoría a través del director del Proyecto el ingeniero Diego Pedraza, da inicio al comité de seguimiento No. 12.

El objetivo de este comité es verificar el avance de la semana anterior lo que tiene que ver en esta etapa documental, establecer compromisos, el orden del día es la siguiente revisión de compromisos, verificar cual es el porcentaje de avance a la fecha, como ha transcurrido la entrega documental de la etapa de pre construcción, luego revisar el avance de entrega documental de Estudios y Diseños y al final un breve resumen en los componentes de las áreas SST, Ambiental y Social.

La Interventoría comenta que ya fue subsanado el documento Fuente de Materiales por parte del Contratista.

Hay dos documentos que tienen que ver con los Estudios y Diseños a la fecha han sido observados no han sido subsanados, se le solicita al Contratista aclarar como ha evolucionado cuando es la fecha de estas subsanaciones.

El Ingeniero Sergio Arias comenta que si el tema de la subsanación del diseño Geométrico es la fórmula de la que se ha venido conversando tiempo atrás.

La Interventoría dice que no, es un tema que se habló cuatro comités anteriores, es el diseño de pavimentos de geotecnia había unos taludes que se metían en la vía, nuestro Especialista de Geotecnia dijo dígame como va a estabilizar los taludes, el Contratista manifestó que esos taludes no existen se hizo una visita, la ingeniera Adriana Gutiérrez de parte de la Interventoría acompañó a esa visita y se determinó que en realidad no era talud considerado sino que era un material dispuesto en la zona producto de erosión, retirando ese material se iba a mejorar las condiciones de ancho y al final esa curva muy cerrada lo mas probable es que si cabía el vehículo del diseño un camión tipo C3, se acordó que esa era la realidad de la situación pero que se debía ser ajustado en los planos.

El Ingeniero Sergio Arias comenta que el documento ya esta listo, se compromete en el transcurso del día lo envía.

Toma la palabra la ingeniera Claudia Rangel comenta con respecto al Informe Estructural que enviaron un oficio respuesta a la solicitud que la Interventoría hizo por parte del Especialista de la estructura de la Placa Huella.

El siguiente compromiso corresponde a la propuesta de acta de modificación, se basa en la diferencia de la distancia que hay para acarrear los materiales pétreos desde el punto que se consiguió en el presupuesto inicial versus la distancia real de acarreo. En una mesa de trabajo que se realizó la semana anterior estuvo el ingeniero Brayan Camilo Criado de parte del Instituto Nacional de Vías, estuvo el representante José Jiménez del municipio, también estuvo presente el Contratista de la Interventoría se reviso que sucedió, en el presupuesto original el INVIAS puso 30 kilómetros de distancia, si el municipio dice que es mayor la distancia agradece escribir las razones, el municipio respondió los tramites de la licencia ambiental temporal no procedieron por dos razones, una porque la situación climática no permite acceder a la zona de material de arrastre que permite el río el tarra, segundo manifestaron en razón en esta contaminación del río los materiales no gozan de la calidad que requiere el INVIAS.

Toma la palabra el ingeniero José Jiménez comenta tal como lo manifestó la Interventoría la mesa de trabajo que se realizó la semana pasada se trataron esos mismos temas con el fin de dar cierre financiero al proceso.

La Interventoría pregunta con respecto a la intervención del ingeniero José Jiménez según la cuenta de la propuesta está disminuyendo 216 metros de Placa Huella, 15 alcantarillas a un lado, 3 al otro, la pregunta es la siguiente a la hora de a ver este ejercicio se tuvo en cuenta los imprevistos, se incluyo en este rubro que existe una cuantía de imprevistos.

El ingeniero José Jiménez comenta que el presupuesto esta tal cual como se vio en la etapa inicial después del ajuste, los APUS no se tocaron simplemente lo único que se vio fue las longitudes de Placa Huella y cantidades de alcantarilla, el resto sigue igual, este presupuesto tiene el tema de sobre acarreo.

Toma la palabra el ingeniero Sergio Arias comenta que con respecto al presupuesto se debe tener en cuenta, no se maneja el tema de sobre acarreo, no se tuvo en cuenta en los imprevistos porque se va manejar un tema de disipadores.

El ingeniero José Jiménez hace una aclaración sobre el tema del presupuesto hay un AIU que esta contratado con el 30%, administración el 20%, los imprevistos del 5% y la utilidad del 5%, ese AIU se dejo tal y cual como esta contemplado en el presupuesto inicial.

La Interventoría da continuidad al capítulo de avance en cifras con una preocupación teniendo un atraso de 35.64%, se le pregunta al ingeniero José Jiménez que posibilidad hay que de parte del municipio se acceda e inicie el corredor 1.

El ingeniero José Jiménez ha manifestado en varias reuniones por parte del municipio es urgente que se de inicio a las obras, en este caso el mas cercano iniciar es el corredor 1, el alcalde dice que prefiere esperar a que todo este, lo que pasa es que el alcalde dice que los cálculos que se hicieron con lo concertado en la mesa de trabajo anterior se había acordado que todo el deface para el cierre financiero se le iba a dar al corredor 2, el dice que no, porque hay unas longitudes, unos compromisos con comunidades que no hay como disminuir cantidad, por eso se debía tocar el corredor 1.

La Interventoría da continuidad al avance de entrega documental etapa de pre construcción todos los documentos se encuentran aprobados en excepción en el componente PAGA y la Fuente de Materiales.

Se continua con el avance de entrega documental de revisión de Estudios y Diseños, se comenta que en el componente del Diseños Geométrico el ingeniero Sergio Arias se comprometió en el día de hoy hacer entrega de este documento.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 de 4

FECHA 4/05/2023

(Día / Mes / Año)

El ingeniero Sergio Arias comenta que no se va desestabilizar el talud, es hacer un movimiento de tierra, propone hacer una nota aclaratoria con las fotos y demás se evidencie que no se va desestabilizar lo que se va hacer es remover la tierra, pregunta si se aprueba esa nota.

La Interventoria considera que además del dibujo en la sección como hay una invasión en el talud de la curva, que el vehículo que señala es de C3 no gira, quitando ese talud probablemente el vehículo si giraba para que eso se debe tener el radio de curvatura 8.20 metros, es necesario que se ajuste, la Interventoria propone el documento goza de aprobación, sin embargo esa curva en general tiene una aclaración que hacer, que por favor el Contratista adquiera un compromiso que no es necesariamente el día de mañana sino el tiempo que se considere tomarse pero que no sea tan lejano, para que por favor se ajuste porque en cualquier caso si debe constar en el Diseño, con esto se pueda decir en un oficio resta esta curva en ajustar pero se considera aprobado.

La Ingeniera Claudia Rangel solicita que le especifique cual curva es, porque el profesional le solicita para tener claro y poder hacer esa modificación para la próxima semana.

La Interventoria se compromete al terminar el comité y les escribe el numero de la curva, la abscisa es la 9+600.

Se continua con las recomendaciones del área SST, la profesional Rubiela Molina comenta con respecto a los temas de inicio todos deben tener los exámenes médicos profesionales, las afiliaciones, las dotaciones, la inducción, al igual que la maquinaria tener las afiliaciones y que el personal cuente con los elementos de protección.

Toma la palabra la ingeniera Katherine Navarro del componente Ambiental comenta con respecto al PAGA están en observaciones por parte del Contratista, la semana pasada logro comunicarse con el profesional Ambiental del Contratista donde se pudo aclarar unas dudas que tenia con respecto al tema, en cuanto a la Fuente de Materiales el día de ayer antes de recibir el oficio por parte del Contratista, ya se había redactado el oficio donde se daba el requerimiento de la Licencia Ambiental de los proveedores quien le va suministrar la Fuente de Materiales de igual ya se recibió, después de enviar el oficio por parte del Contratista se recibió el oficio donde explicaban que se encontraba en trámite de la Licencia.

Se continua con el componente Social, el profesional Anuar Cabarcas comenta se le realizo el envío por parte del Contratista del ajuste y la subsanación de las actas de vecindad levantadas en el tramo 1 del municipio de Abrego, se recibió el soporte de la consulta previa, esta pendiente por presentar las actas de vecindad del tramo 2, la socialización de inicio de obra cuando este aprobado los Estudios y Diseños, también la conformación del comité de veeduría ciudadana, esta pendiente las actas de compromiso con las personas propietaria de los predios donde autoricen que dejan el material en su terreno almacenado.

Toma la palabra el ingeniero Mauricio Rodríguez comenta que, con respecto al municipio de los Rendimientos Financieros, segundo el tema de las Vallas si ya está el arte el modelo de la Valla para tramitar ese compromiso.

El ingeniero José Jiménez comenta que en reuniones pasadas donde manifestó en otros proyectos que se están manejando y se han manejado se va haciendo un Informe Financiero mensual y se va adjuntando el extracto bancario fin de mes donde se ve reflejado los Rendimientos Financieros y al final del ejercicio se hace un solo traslado.

El ingeniero Mauricio Rodríguez comenta que debe hacerse con base de lo que dice el convenio, debe hacerse es mes por mes, si así lo dice en el convenio debe hacerse.

El ingeniero José Jiménez se compromete comunicarse con el área financiero para que envíe los documentos mes a mes, apenas tenga los soportes lo comparte.

La Interventoria comenta que el día de ayer se genero un documento oficial por parte del INVIAS referido al arte, como se va generar el arte para las Vallas identificativas del convenio del contrato de obra, se remitió el documento que es un instructivo de dos paginas es muy sencillo, el día de hoy se le remitió al Consorcio AD vías, solicita la confirmación del recibido.

El ingeniero Sergio Arias confirma el recibido. Se compromete enviar respuesta al oficio el día lunes 8 de mayo de 2023.

Damos por terminado el comité de seguimiento del día de hoy, agradecemos por su asistencia. Feliz día para todos.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	4 de 4

FECHA 4/05/2023
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día / Mes / Año)	RESPONSABLES
PAGA	11/05/2023	CONTRATISTA
Diseño Geometrico corredor 1 y 2	11/05/2023	CONTRATISTA
Topografia corredor 2	11/05/2023	CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 11/05/2023
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtir de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES	RESIDENTE	GAVINCO S.A.S.	
DIEGO PEDRAZA	DIRECTOR	GAVINCO S.A.S.	
CLAUDIA RANGEL	DIRECTOR	CONSORCIO AD VIAS	
MAURICIO RODRIGUEZ	INGENIERO DE APOYO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
RUBIELA MOLINA	INSPECTOR SST	GAVINCO S.A.S.	
SERGIO ARIAS	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO AD VIAS	
JOSE JIMENEZ	INGENIERO DE APOYO SECRETARIA DE PLANEACION	MUNICIPIO	
ANUAR CABARCAS	PROFESIONAL SOCIAL	GAVINCO S.A.S.	
KATHERINE NAVARRO	INGENIERA AMBIENTAL	GAVINCO S.A.S.	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial



MEET GAVINCO INGENIEROS CO...

Organizador



Awaar Cabarcas (Invitado)

Invitado de la reunión



CLAUDIA RANGEL (Invitado)

Invitado de la reunión



Cristian Mauricio Rodriguez Ace...

Externo



Diego Pedraza (Invitado)

Invitado de la reunión



Fanny Amaya (Invitado)

Invitado de la reunión



ING. Adriana (Invitado)

Invitado de la reunión



Jose Jimenez - ... (Invitado)

Invitado de la reunión



Judith Morales (INVIAS) (Invitado)

Invitado de la reunión



RUBIELA (Invitado)

Invitado de la reunión



Sergio Arias (Invitado)

Invitado de la reunión



	<p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</p> <p style="text-align: center;">PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</p> <p style="text-align: center;">MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</p> <p style="text-align: center;">ACTA DE COMITÉ DE OBRA</p>	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

	FECHA	18/05/2023 <small>(Día / Mes / Año)</small>
--	-------	--

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 13
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 252 DE 2022 MUNICIPIO DE ABREGO
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO AD VIAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

<p>LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS</p> <p>Se presentan los compromisos adquiridos en el comité de obra No. 13, los cuales se encuentran en el siguiente estado:</p> <p>Cumplido:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Componentes Corredor 1. -Diseño Geométrico corredor 2. <p>Sin Cumplir:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Componentes Corredor 2. -Actas de Vecindad. -La Veeduría Ciudadana. -La Socialización.

<p>TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compromisos • Aspectos técnicos • Avance de entrega documental etapa Preconstrucción • Temas pendientes próximo comité



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 de 2

FECHA 18/05/2023
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo el 18 de mayo de 2023, la Interventoría a través de la coordinadora del Proyecto la ingeniera Martha Soriano, da inicio al comité de seguimiento No. 13.

El objetivo de este comité es hacer seguimiento a los compromisos de la semana anterior, luego el avance de entrega de documental etapa de pre construcción, revisar el avance de entrega documental revisión de Estudios y Diseños, información SST, y los componentes Ambiental y Social.

La Interventoría comenta que el Contratista hizo entrega del acta de modificación y el Diseño Geométrico del corredor 2, en la cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría, y el día de hoy se recibió subsanación del chorro 1 y 2 del corredor 1 y está en revisión por parte del Especialista, se espera dar respuesta el próximo miércoles 24 de mayo de 2023, afirma que se recibió el arte de la Valla por parte del Contratista, esta en manos del INVIAS para su aprobación, se le pregunta al municipio como va con la entrega de la Devolución de los Rendimientos Financieros.

Toma la palabra el ingeniero José Jiménez comenta que los Rendimientos Financieros el banco remitió la Certificación se espera a mas tardar mañana girar esa información.

Se continua con el comité el avance en cifras con corte al 11 de mayo de 2023 se tiene un programado de 40,84% versus un ejecutado de 1,04% teniendo un atraso de -39,80%.

El ingeniero José Jiménez recomienda brindar apoyo al Contratista para que el proyecto comience lo mas pronto posible para avanzar y no detener en tanta revisión que es lo se tiene retrasado el proceso.

La Interventoría continua con el avance de entrega documental etapa pre construcción la mayoría de documentos se encuentran aprobados a excepción del PAGA y la Fuente de Materiales, la cual se encuentra en estos momentos en revisión por parte del Contratista.

En cuanto al avance de entrega documental Revisión de Estudios y Diseños la Topografía del corredor 1 y 2 ya se encuentran aprobados con unas observaciones de forma, el Diseño Geométrico esta aprobado el corredor 1 con observaciones, en cuanto al corredor 2 el Contratista reitero el documento el 4 de mayo de 2023 el cual se encuentra en revisión, el Estudio Geotécnico la aprobación de este depende de la aprobación del Diseño Geométrico, una vez este aprobado se le envía al Especialista para que pueda emitir la aprobación definitiva, el Diseño Estructural se tiene observado el corredor 2 el cual se espera dar una pronta respuesta el día 23 de mayo de 2023 a este documento entregado el día 4 de mayo de 2023 en cuanto al Informe Hidráulico esta aprobado el corredor 1 y 2.

La ingeniera Adriana Gutiérrez comenta que se ha hecho la conformación de la vía del tramo la Y el chorro, el pie de cruz, chorro 1 y 2, la perfilación y la ecuación de cunetas y se ha instalado sub base de la Y del chorro y de pie de cruz, antes de ayer iniciaron Santa Lucia, haciendo la ecuación del desvío para intervenir este tramo, por la lluvia se ha tenido algunas dificultades de todas maneras se han ido avanzando.

Se da continuidad al capítulo de información SST la inspectora Rubiela Molina les recuerda al Contratista con respecto a las afiliaciones y la documentación de los empleados, agradece a la ingeniera Claudia Rangel por la constante comunicación y solución por vía WhatsApp a todas las inquietudes.

Se continua con el componente Ambiental la ingeniera Katherine Navarro comenta en cuanto al PAGA el Contratista aclaro una inquietudes para subsanar unas observaciones por Interventoría y con respecto a la Fuente de Materiales se había expresado mediante un oficio la Licencia Ambiental donde se solicita que el proveedor tiene la obligación de suministrar esta información al Contratista en el caso de que no lo haga se llevara a cabo el cambio de proveedor, dando tres días hábiles para que el proveedor facilite la entrega de la Licencia Ambiental.

Toma la palabra el ingeniero Sergio Arias afirma que no es que no se quiera entregar la Licencia Ambiental, o que la Planta no la quiera entregar, es que lo que siempre ellos han enviado el Rucón otro documento que ya se envió, sin embargo, el día de ayer ha estado solicitando nuevamente a la Planta le dicen que, si lo van a enviar, pero es un documento muy pesado.

Dando continuidad con el componente Social el profesional Anuar Cabarcas comenta que todavía esta en espera de las subsanaciones del PAGA, la cual el Contratista se compromete hacer entrega de estas subsanaciones el día 26 de mayo de 2023, en cuanto a las actividades sociales la semana pasada se envió un oficio al Contratista donde se daba a conocer una solicitud de cumplimiento en tres aspectos, uno la socialización de obra, el segundo la conformación y aprobación por parte de la persona del comité de veeduría y tercero el soporte o la certificación territorial de las personas que van a trabajar en la obra que hagan referencia de que si pertenece a la influencia directa.

La Interventoría afirma de tener en el proyecto de Abrego, actas de vecindad, conformación de veeduría para el corredor 1 que en estos momentos se encuentran en ejecución, incluso ya están en obra, para el corredor 2 esta pendiente en la aprobación del Diseño Geométrico para poder dar inicio a las obras físicas.

Toma la palabra la ingeniera Claudia Rangel comenta que según la socialización que se realizo en los dos corredores, no se ha podido conformar la veeduría de cada uno de los dos corredores, la idea es que cada uno de ellos se acerquen a la administración municipal ante la personería y conformar los comités, eso fue lo que se dejó claro en los dos corredores.

Toma la palabra el ingeniero José Jiménez, comenta que se hicieron las reuniones de la socialización en dos días diferentes, una en cada corredor, en esas reuniones se manifestó la comunidad la importancia de conformar las veedurías ciudadanas y las veedurías por parte de ellos, se les explico como se debe de hacer.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 de 3

FECHA 18/05/2023

(Día / Mes / Año)

Toma la palabra el profesional Social Anuar Cabarcas afirmando que, si es contractual que se realice la veeduría ciudadana, por parte del Contratista con ayuda de la alcaldía debe adelantar los tramites de la veeduría ciudadana si van hacer una para los dos tramos o dos para ambos tramos, ya que al momento de liquidar el contrato y de no estar todos los componentes ítems sociales verificados no se le puede dar inicio como tal.

Toma la palabra el ingeniero Diego Pedraza comenta que, si es importante que se realice el convenio, del capitulo que habla de las obligaciones del municipio es constituir el comité de veeduría es decir es obligatorio.

Damos por terminado el comité del día de hoy, agradeciendo la asistencia de todos, feliz día.

COMPROMISOS PACTADOS

FECHA DE CUMPLIMIENTO
(Día / Mes / Año)

RESPONSABLES

Diseño Estructural corredor 2

23/05/2023

CONTRATISTA

Diseño Geometrico corredor 2

24/05/2023

CONTRATISTA

PAGA

26/05/2023

CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA

25/05/2023

(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtir de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES	INGENIERO RESIDENTE	GAVINCO S.A.S.	
DIEGO PEDRAZA	DIRECTOR	GAVINCO S.A.S.	
CLAUDIA RANGEL	DIRECTOR	CONSORCIO AD VIAS	
MARTHA SORIANO	COORDINADORA DE PROYECTO	GAVINCO S.A.S.	
RUBIELA MOLINA	INSPECTOR SST	GAVINCO S.A.S.	
SERGIO ARIAS	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO AD VIAS	
JOSE JIMENEZ	INGENIERO DE APOYO SECRETARIA DE PLANEACION	MUNICIPIO	
ANUAR CABARCAS	PROFESIONAL SOCIAL	GAVINCO S.A.S.	
KATHERINE NAVARRO	INGENIERA AMBIENTAL	GAVINCO S.A.S.	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

- MC** MEET GAVINCO INGENIEROS CO...
Organizador
- AG** Anuar Cabarcas ... (Invitado)
Invitado de la reunión
- CR** CLAUDIA RANGEL (Invitado)
Invitado de la reunión
- FA** Fanny Amaya (Invitado)
Invitado de la reunión
- IA** ING. Adriana (Invitado)
Invitado de la reunión
- JJ** Jose Jimenez - ... (Invitado)
Invitado de la reunión
- KN** Katherine Navarro (Invitado)
Invitado de la reunión
- R** RUBIELA (Invitado)
Invitado de la reunión
- SA** Sergio Andres Arias Anzola
Externo

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 4

FECHA		25/05/2023 (Día / Mes / Año)
-------	--	---------------------------------

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 14
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 252 DE 2022 MUNICIPIO DE ABREGO
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO AD VIAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS Se presentan los compromisos adquiridos en el comité de obra No. 14, los cuales se encuentran en el siguiente estado: Cumplido: -Fuente de Materiales. -Diseño Geométrico corredor 1. Sin Cumplir: -PAGA. -Plan de Contingencia. -Diseño Estructural.
--

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA • Compromisos • Aspectos técnicos • Avance de entrega documental etapa Preconstrucción • Temas pendientes próximo comité



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 de 4

FECHA 25/05/2023
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo el 25 de mayo de 2023, la Interventoría a través del director el ingeniero Diego Pedraza, da inicio al comité de seguimiento No. 14.

El objetivo de este comité es hacer seguimiento a los compromisos de la semana anterior, luego el avance de entrega de documental etapa de pre construcción, revisar el avance de entrega documental revisión de Estudios y Diseños, información SST, y los componentes Ambiental y Social.

La Interventoría comenta los compromisos del Contratista la cual hizo entrega del documento de la Fuente de Materiales, con respecto al Plan de Contingencia presenta un atraso por varias razones, se le solicita al Contratista generar un documento en el que se permita visualizar la manera que se van usar los recursos de parte del Contratista se refiera al personal, la maquinaria, materiales y los tiempos que se tienen previsto usar el objetivo del corto plazo se mitigue estos atrasos, se le pregunta al Contratista si este documento ya está en proceso de estructurarse, cuando tienen prevista la entrega.

El Contratista afirma entregar el día de mañana el documento solicitado por la Interventoría.

La Interventoría da a conocer que los Rendimientos Financieros es una información no lo han entregado ni el primer mes, es un tema que se considera delicado se ha manifestado en dos o tres oficios de los comités de semana tras semana, no han dado cumplimiento, se ha hecho la solicitud en diferentes formas y no han cumplido a la fecha.

Toma la palabra el ingeniero José Jiménez comenta con respecto a los Rendimientos Financieros eso ya están en manos en Hacienda, si no está mal cree que ya le llegó las certificaciones del Banco, pregunta que se hizo un giro a la Fiducia para el anticipo del Contratista, esos Rendimientos que genera la Fiducia también se debe reintegrar.

La Interventoría afirma que los dineros que reposa en la Fiducia hasta tanto no sea amortizado por el Contratista, se considera recursos públicos por los movimientos que se genere debe ser devueltos en el Tesoro Nacional.

El ingeniero José Jiménez afirma que esta semana queda el giro de los primeros Rendimientos Financieros que se han generado.

La Interventoría le pregunta al municipio si han realizado el comité de veeduría.

El ingeniero José Jiménez comenta que por parte del municipio realizaron toda la tarea de convocar a todos los interesados presidentes de junta, líderes comunales, en las dos reuniones de socialización que se realizaron se les comento la importancia de la constitución de la veeduría ciudadana, que es una actividad que esta a cargo del municipio del componente Social, al cargo del Contratista de componente Social, ya seria por parte de el hacer un acercamiento mas insistente con la comunidad a ver si se logra constituir esos comités, así sea de manera directa los puntos de ejecución del proyecto, desde la fecha de la socialización a hoy no se ha tenido respuesta por parte de las comunidades.

La Interventoría le solicita a la comunidad remitir la información para todos, lo mejor es que nos manifieste por escrito que se hizo la tarea.

La Interventoría confirma que ya hizo cumplimiento en la entrega de las observaciones del Diseño Geométrico el 24 de mayo de 2023, respecto al Diseño Estructural no se ha respondido por parte de la Interventoría, se compromete en el día de hoy dar respuesta.

Toma la palabra el ingeniero Sergio Arias pregunta en ese orden de ideas para cuando dan aprobación a inicio de obra del corredor 2, teniendo en cuenta que la comunidad esta presionando, todo depende que la Interventoría apruebe, recomienda y solicita a la Interventoría hacer lo mismo en el corredor 1, aprobar observaciones, es decir en el corredor 1 todavía se esta subsanando esas observaciones y se ha ido trabajando, la idea es avanzar y salir de este proyecto lo más pronto posible.

La Interventoría tiene claro la solicitud por parte del Contratista, lo básico es tener definido el Diseño Geométrico porque sería difícil iniciar labores, porque en caso se haría un tipo de movimiento de tierra que es muy probable, el día 24 de mayo de 2023 radicarón lo correspondiente a la ultimas subsanaciones del tema Geométrico, se estima que este tema salga esta semana.

La Interventoría le pregunta al Contratista para cuando devuelve el documento subsanado del Diseño Geométrico del corredor 2 para poder proceder y aprobar con observaciones.

El Contratista comenta que el Diseño Geométrico del corredor 2 esta en manos del profesional para hacer una mesa de trabajo, para reunirse y corregir las ultimas observaciones que se envió el 19 de mayo de 2023.

El ingeniero Wilmar Rangel le pregunta al Contratista para cuando entregaría repuesta de las subsanaciones de esas observaciones.

La ingeniera Claudia Rangel recomienda hacer la mesa de trabajo y establecer una fecha específica para el día de mañana 26 de mayo de 2023 a las 10 a.m.

La Interventoría le solicita al Contratista un oficio señalando las observaciones de la cual no están de acuerdo de este tema que ya se había hablado en los comités anteriores, se han hecho una cantidad de mesas de trabajo, siempre manifiesta el Contratista que la Interventoría no acepta, existe una trazabilidad de la cual el Contratista no subsana.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 de 4

FECHA 25/05/2023

(Día / Mes / Año)

Toma la palabra el ingeniero Mauricio Rodríguez hay que tener en cuenta es lo siguiente, hay varias cosas que se están observando y hay que dejar claro de cada una de ellas, primero que todo es definir que si es cierto esto es Colombia Rural, INVIAS generó unas cartillas adecuadas para este tipo de trabajo, la idea es que sea mas resumido, a la final todo es normatividad y esta referido a todas las normas que tiene publicada INVIAS, lo que haga falta en la Cartilla Colombia Rural se remite a las diferentes cartillas o diferentes normatividad que existe en los documentos técnicos del INVIAS, la preocupación real de todo esto son las ejecuciones y los avances de obra.

El ingeniero José Jiménez manifiesta que le acabaron de compartir el Certificado de Egresos de los Rendimientos Financieros con corte 30 de abril de 2023, ya esos rendimientos se realizaron el 23 de mayo de 2023, se compromete en el transcurso del día compartir el Comprobante de Egreso.

La Interventoria le recomienda enviar el Certificado de Egreso anexar los extractos y la certificación Bancaria, esos tres documentos se remite al INVIAS porque si no se notifica de manera oficial no van a saber quién lo consignó.

Se continua con el resumen de la información SST, Rubiela Molina comenta que se envió un oficio donde se especifica la documentación inicial de ejecución y donde se especifica los documentos que se debe entregar en el informe, con respecto a la planilla del MEPI que se entrega el Contratista ya tiene el conocimiento si entra otro personal se debe ingresar los datos a la planilla de pago y demás.

La Interventoria continua con el componente Ambiental, la ingeniera Katherine Navarro comenta que está a la espera de recibir el documento PAGA con las observaciones subsanadas por parte del Contratista y en cuanto a la Fuente de Materiales ya se encuentra en revisión el documento se recibió el día de ayer, con el compromiso de parte del Contratista hacer entrega del documento del PAGA el día de mañana 26 de mayo de 2023.

Se da continuidad al componente Social el profesional Anuar Cabarcas comenta que el Contratista envió las Socializaciones de inicio de obra, el registro fotográfico y la asistencia, estamos a la espera de los soportes de la junta comunal, se le solicita al Contratista mostrar avances de la solicitud de la consulta previa ante el Ministerio Interior, afirma que hace dos meses no se recibe esta solicitud de la consulta previa, se adelanto una mesa de trabajo con la profesional Social y la directora de obra del Contratista, como ya se inicio obra en el tramo 1, se debe implementar el Plan de Gestión Social en el tramo de los 5 programas que en mesa de trabajo anteriores ya se habían confirmado que se iban a ejecutar, se encuentra a la espera de la subsanación del componente PAGA.

Damos por terminado el comité de seguimiento en el día de hoy, se les agradece a todos por la participación. Feliz día.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	4 de 4

FECHA 25/05/2023
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día / Mes / Año)	RESPONSABLES
Plan de Contingencia	26/05/2023	CONTRATISTA
Diseño Estructural	25/05/2023	INTERVENTORIA
Mesa de Trabajo	26/05/2023	TODAS LAS PARTES
PAGA	26/05/2023	CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 1/06/2023
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

- Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
- Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtir de manera previa el trámite interno correspondiente.
- Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES	RESIDENTE	GAVINCO S.A.S.	
DIEGO PEDRAZA	DIRECTOR	GAVINCO S.A.S.	
CLAUDIA RANGEL	DIRECTOR	CONSORCIO AD VIAS	
MARTHA SORIANO	COORDINADORA DE PROYECTO	GAVINCO S.A.S.	
RUBIELA MOLINA	INSPECTOR SST	GAVINCO S.A.S.	
SERGIO ARIAS	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO AD VIAS	
JOSE JIMENEZ	INGENIERO DE APOYO SECRETARIA DE PLANEACION	MUNICIPIO	
BRAYAN CAMILO CRIADO	INGENIERO DE APOYO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
JUDITH MORALES	INGENIERO DE APOYO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
WILMAR RANGEL	INGENIERO DE APOYO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
MAURICIO RODRIGUEZ	INGENIERO DE APOYO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
ANUAR CABARCAS	PROFESIONAL SOCIAL	GAVINCO S.A.S.	
KATHERINE NAVARRO	INGENIERA AMBIENTAL	GAVINCO S.A.S.	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

- 
MEET GAVINCO INGENIEROS CO...
 Organizador
- 
Anuar Cabarcas ... (Invitado)
 Invitado de la reunión
- 
Brayan Camilo Criado Sanjuan
 Esterno
- 
CLAUDIA RANG... (Invitado)
 Invitado de la reunión
- 
Diego Pedraza (Invitado)
 Invitado de la reunión
- 
Fanny Amaya (Invitado)
 Invitado de la reunión
- 
ING. Adriana (Invitado)
 Invitado de la reunión
- 
Jose Jimenez - ... (Invitado)
 Invitado de la reunión
- 
Jadith Morales (INVIAS) (Invitado)
 Invitado de la reunión
- 
Katherine Navarro (Invitado)

 Compartir invitación

-  Invitado de la reunión 
-  **ING. Adriana (Invitado)**
Invitado de la reunión 
-  **Jose Jimenez - ... (Invitado)**
Invitado de la reunión 
-  **Judith Morales (INVIAS) (Invitado)**
Invitado de la reunión 
-  **Katherine Navarro (Invitado)**
Invitado de la reunión 
-  **Mauricio Rodrig... (Invitado)**
Invitado de la reunión 
-  **RUBELA (Invitado)**
Invitado de la reunión 
-  **Sergio Arias (Invitado)**
Invitado de la reunión 
-  **Wilmar (Invitado)**
Invitado de la reunión 

▼ **Otros invitados (7)**

-  **Daniela Reyes**
Sin respuesta

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 5

FECHA	2/03/2023 (Día / Mes / Año)
-------	--------------------------------

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 14
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. LP-OP-01-2022 **MUNICIPIO DE SANTIAGO**
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - AZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS Se presentan los compromisos adquiridos en el comité de obra No. 14, los cuales se encuentran en el siguiente estado: Cumplidos: -Plan de Contingencia. -Diseño Hidráulico. -Diseño de Mezcla y Laboratorio. Sin Cumplir: -PAGA -El Arte de la Valla. -Maquinaria.
--

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA • Compromisos • Aspectos técnicos • Avance de entrega documental etapa Preconstrucción • Temas pendientes próximo comité

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA Siendo el 02 de marzo de 2023, la Interventoría a través de la coordinadora del Proyecto la ingeniera Martha Soriano, da inicio al comité de seguimiento No. 14. El objetivo del día es la revisión de compromisos, avances entregado documental de etapa de pre construcción, avances de entrega de documentos de revisión de Estudios y Diseños, una revisión del componente SST teniendo en cuenta que el día de ayer inicio por parte de la Interventoría el profesional Ambiental y Social, se va tener un espacio para tocar los temas Ambientales y Sociales del proyecto. La Interventoría da a conocer los compromisos de la semana anterior se tenía pendiente por parte del Contratista la entrega del documento PAGA la cual tenía fecha el 1 de marzo de 2023 y no fue entregada, se le pregunta al Contratista cómo va la subsanación de este documento. El Contratista comenta que la profesional está trabajando, pero ya que hoy inicia el componente Ambiental, le gustaría al igual como en otros componentes se ha venido trabajando para subsanar dudas, inquietudes y poder tener una comunicación entre ellas dos, para poder subsanar ese documento lo más pronto posible. La Interventoría propone programar una mesa de trabajo entre los dos especialistas Ambientales para subsanar dudas e inquietudes. La Interventoría da continuidad a los compromisos, el Contratista hizo entrega del Plan de Contingencia el día de antier y está en revisión por parte de la Interventoría para dar un concepto a favor de este Plan presentado por el Contratista y obviamente para poder hacer el seguimiento del cumplimiento del mismo, en cuanto a la maquinaria el Equipo Mínimo requerido para el proyecto no se ha dado la subsanación total, solamente estaba pendiente por aprobar la motoniveladora, por información de la ingeniera Rosana Mattos en campo ya se encuentra una motoniveladora pero la misma no ha sido aprobada por la Interventoría, se le solicita al Contratista enviar la documentación de esta motoniveladora que se encuentra en para dar la respectiva aprobación o si es el caso las observaciones de la misma. El Contratista comenta que ya hizo la solicitud al equipo de la maquinaria para que haga llegar los documentos y una vez los tenga los comparte a la Interventoría, se compromete hacer entrega el día de mañana 3 de marzo de 2023.
--

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 5
		FECHA	2/03/2023 (Día / Mes / Año)
<p>En cuanto al Diseño Hidráulico este ya fue entregado por el Contratista, está en revisión por parte de la Interventoría y el Diseño de Mezcla y Laboratorio ya fue entregado todos los laboratorios de la sub base granular y la misma ya fue aprobada. En cuanto al Diseño de Mezcla se le pregunta a la ingeniera Rosana Mattos nos ayude a refrescándonos un poquito sobre el tema, se había realizado unas observaciones y las mismas a la fecha no han sido subsanadas, nos puedes colaborar con este tema.</p> <p>La ingeniera Rosana Mattos nos comenta con respecto al Diseño de Mezcla el Contratista envió CBR, pero hay unos pendientes, el Diseño de Mezclas aún no está aprobado entonces para que por favor enviar completa la documentación para terminar con la aprobación total de esta documentación, se le pregunta al Contratista para cuándo haría entrega de la documentación completa sobre el Diseño de Mezcla.</p> <p>La Interventoría da continuidad con el comité con respecto al avance financiero del proyecto, el cuál sería para corte el 23 de febrero de 2023 un programado del 32.23% versus un ejecutado del 0.67% este ejecutado corresponde únicamente al avance que se ha tenido de la entrega y revisión de Estudios y Diseños lo cual a la fecha aún no ha sido aprobada en su totalidad teniendo un atraso de 31.57%.</p> <p>En cuanto al avance de entrega documental de etapa de pre construcción está pendiente la entrega de la documentación de la motoniveladora la cual ya quedó como compromiso de entrega el día de mañana, está pendiente la entrega del PAGA la cual se dijo que se va realizar una mesa de trabajo para poder subsanar los pendientes que se tienen en este componente, en revisión de parte de Interventoría tenemos la Fuente de Materiales la cual se espera dar una respuesta a más tardar el miércoles de la próxima semana.</p> <p>La Interventoría comenta respecto al avance de entrega documental revisión de Estudios y Diseños ya está aprobado la Topografía con observaciones las cuales se van a subsanar una vez se dé inicio de las obras físicas del proyecto.</p> <p>Se tiene observado el Diseño Geométrico en revisión por parte de la Interventoría se tiene el Diseño de Pavimentos y el Estudio de Suelo, el Informe Estructural ya se encuentra aprobado y el Informe Hidráulico se encuentran en revisión por parte de la Interventoría se espera dar respuesta de la parte de Suelos y Pavimentos a más tardar el día martes y el Hidráulico igualmente se espera enviar a más tardar el día lunes las respuestas esperando que la misma sea positiva para poder dar un inicio a las obras físicas del proyecto.</p> <p>La Interventoría le pregunta al Contratista en cuanto al Diseño Geométrico que avance tienen en la subsanación de las observaciones que se realizaron y qué fecha tentativa de entrega tienen.</p> <p>El Contratista comenta que ya se está trabajando en el tema y ha tenido comunicación directa con el ingeniero Iván Pinilla, ya se sabe cuáles son las observaciones puntuales, como compromiso es entregar el día de mañana 3 de marzo de 2023 esa información al correo.</p> <p>La Interventoría le solicita a la ingeniera Rubiela Molina con respecto a la presentación de la parte SST para que nos de sus apreciaciones y qué documentos se deben tener en cuenta para el inicio de obra.</p> <p>La ingeniera Rubiela Molina como lo mencionaba en el anterior comité los documentos que no deben faltar al inicio de obra es los exámenes ocupacionales, las afiliaciones EPS, ARL, Fondo de Pensiones, Caja de Compensación, Salud, la dotación con su respectivo anexo firmado por los trabajadores donde se haga verificación fotográfica pero también escrita firmada de la entrega de los productos de protección personal de la inducción que se le hace a todo el personal de la camilla, el extintor, los inmovilizadores, el baño e hidratación, algo importante si hay maquinaria en obra se le solicita los documentos de la maquinaria, la afiliación de los operadores que están en estos momentos en campo, se le pregunta al Contratista que si tiene algún ayudante.</p> <p>El Contratista comenta que en obra están los operadores y de la zona se tiene contratado dos personas a las cuales se le ha hecho los exámenes médicos operacionales, se le ha hecho la inducción, todos los documentos que acaba de mencionar se ha ido trabajando.</p> <p>El Contratista comenta que el día de ayer remitió un oficio para la Interventoría como a la alcaldía respecto al tema de los Análisis de Precios Unitarios para poder avanzar en obra, igual el proceso después de la revisión de Estudios y Diseños vendrá mayores y menores cantidades dependiendo del Estudio de Diseño que es una revisión que también se hace a fondo para poder saber el alcance directo al proyecto.</p> <p>La Interventoría le solicita a la ingeniera Ambiental que comentarios tiene del proyecto.</p> <p>la ingeniera Ambiental Katherine Navarro comenta que por el momento está en revisión, se está poniendo en contexto toda la información acerca de todos los proyectos, afirma que el PAGA se envió los oficios para subsanar algunas observaciones, recomienda hacer la mesa de trabajo para cuando se termine la revisión y poder subsanar las observaciones que se hicieron.</p> <p>Toma la palabra el profesional social Anuar Cabarcas en la cual solicita estar presente en la mesa de trabajo que se va realizar, reviso la información enviado por parte del Contratista de la cual ya tienen una acta de conformación de veeduría que se hizo el 15 de noviembre de 2022 y fue ratificado por la personería el 23 de noviembre de 2022 se le pregunta al Contratista cada cuanto se realiza esos comités de veeduría, cuáles son los temas tratados, si se han realizado reuniones y si se han enviado las actas de las mismas.</p> <p>El Contratista afirma que acta con reunión de veeduría no hay ninguna hasta el momento, por el hecho de que no hay avance en obra física, una vez se inicie las obras 100% la idea es que nuestro trabajador social o el componente social tenga línea directa con ese comité de veeduría y se les mantenga informado de la obra, de los avances y de lo que sea pertinente para que todo fluya.</p> <p>El profesional social Anuar Cabarcas comenta que revisando el acta de veeduría ya está conformado con tres personas y se comprometen a realizar informes periódicos de la labor ejecutada por parte de ellos para tenerlo en cuenta, se le pregunta al Contratista sobre las actas de socialización sobre el inicio del proyecto si han realizado las respectivas socializaciones de inicio avance o extraordinarias.</p> <p>El Contratista comenta que debería tener de la primera socialización que se hizo en la alcaldía del proyecto, pero del inicio como tal no se ha socializado directamente el avance físico, de la socialización a la comunidad si debe existir acta que debe reposar en la alcaldía o en su defecto en la Unión Temporal se debería tener algún acta.</p>			



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 de 5

FECHA 2/03/2023
(Día / Mes / Año)

El profesional social Anuar Cabarcas solicita al Contratista que por favor le envíen esas actas de socialización de inicio, otra pregunta con las comunidades se ha adelantado las respectivas socializaciones de inicio de avance porque comenta el asistió la comunidad del área de influencia del proyecto.

El Contratista se compromete solicitar las actas porque no está seguro si se tomaron actas por la alcaldía, por la Interventoría o por el Contratista va a revisar el tema.

Toma la palabra el ingeniero Andrés Ballesteros Secretario de Planeación del municipio, el Contratista ha comentando en su momento se han hecho algunas reuniones extraoficiales con parte de la comunidad, la socialización como tal del proyecto no se ha realizado porque obviamente en este momento no tenemos el alcance aún definido del proyecto, en realidad en su totalidad no tenemos en sí los Diseños aprobados como para decir que se le va enseñar o se le va a mostrar y si le va a hablar con más propiedad la comunidad simplemente son reuniones o encuentros de manera verbal con algunas personas de la comunidad donde se le ha hablado al groso modo y a nivel general más no a detalle sobre el proyecto en forma, simplemente son encuentros que se han presentado espontáneos en algunas visitas que se han hecho a la vereda y alguna que otro encuentro que se ha presentado directamente en el municipio.

El profesional social Anuar Cabarcas le pregunta al Contratista y a la alcaldía sobre las actas de vecindad han realizado el proceso sobre ellas, han ejecutado el proceso.

El Contratista confirma que no se ha adelantado todavía ese proceso, es de conocer que dentro del proyecto máximo hay como dos o tres casas colindantes al proyecto porque es una vereda y las casas que hay son bastante alejadas, el día de hoy queda el compromiso de que la profesional social ayude adelantar este trabajo.

El profesional social Anuar Cabarcas hace otra pregunta al Contratista sobre la divulgación de información del proyecto que se está realizando en estos momentos ya sea sobre el Plan de Manejo Ambiental, los programas que ustedes piensan ejecutar con las comunidades, por ejemplo, de que van a realizar el correspondiente proyecto en hacia el área de influencia directa.

El Contratista confirma que todo ha sido de manera telefónica, la alcaldía nos ha ayudado ese tema también porque los presidentes de juntas más que todo van directamente donde el alcalde o el secretario de planeación y nos informan cuando hay alguna reunión. Una vez se tengan aprobados todos los documentos tanto el PMA, el PMT toda documentación que se necesite se debe tener línea directa con la comunidad para poder socializarle a ellos esos documentos en propiedad para que ellos tengan claridad qué es lo que se ha invertir y no se quedan con falsas expectativas del proyecto.

Toma la palabra la ingeniera Residente del proyecto Rosana Mattos le pregunta al Contratista en vista que ya se ha ido avanzando la maquinaria está en obra, cuándo tendríamos o por lo menos presencia virtual en los comités del ingeniero Residente Nelson Campos debido a que ya se ha visto un poco de avance y también con el tema de la bitácora porque en estos momentos se encuentra la ingeniera Melisa Cárdenas como auxiliar, la Interventoría abrió bitácora el día 13 de febrero de 2023 ya se empezó a llenar y en el momento colocamos a la ingeniera Melissa Cárdenas pero nosotros también como residentes de obra y de Interventoría también debemos firmarla porque es nuestra responsabilidad, verificar la ejecución en campo.

El Contratista afirma que para la próxima reunión que se vaya a convocar el ingeniero Residente Nelson Campos estaría presente, para que cualquier duda e inquietud con él se pueda tener una comunicación clara.

El Contratista hace una aclaración que esta semana está el compromiso de entregar el Diseño Geométrico, la idea como lo menciona el señor secretario es que los Estudios y Diseños queden aprobados para poder entrar hacer un balance del contrato, porque inicialmente se hablaban de 9 a 12 alcantarillas según por parte del Diseño Hidráulico van 18 alcantarillas eso en parte va a afectar el alcance del proyecto, se tendría que hacer un análisis de cantidades de obra.

La Interventoría confirma que la solicitud que envió el Contratista se encuentra en este momento en revisión por parte jurídica al interior de la Interventoría, una vez se tenga como las directrices de parte de ellos, nos comunicaremos con ustedes y en cuanto a la parte de la actualización de mayores o menores cantidades de obras una vez se encuentre aprobados los Estudios y Diseños se hará el Balance correspondiente para saber finalmente cuál va a ser la meta física a ejecutar.

el ingeniero Andrés Ballesteros secretario de Planeación confirma con respecto al municipio de Santiago efectivamente ayer llegó el oficio enviado por la Unión Temporal lo mismo, está en revisión con el jurídico del municipio y en su momento se tendrán pronunciamiento por parte del municipio.

Damos por terminado el comité del día de hoy, deseándoles un feliz día a todos.

COMPROMISOS PACTADOS

FECHA DE CUMPLIMIENTO
(Día / Mes / Año)

RESPONSABLES

Documentos de la Maquinaria

viernes, 3 de marzo de 2023

CONTRATISTA

Diseño Geométrico

viernes, 3 de marzo de 2023

CONTRATISTA

Diseño de Mezcla

viernes, 3 de marzo de 2023

CONTRATISTA



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	4 de 5

FECHA 2/03/2023
(Día / Mes / Año)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 9/03/2023
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtir de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	5 de 5

FECHA 2/03/2023
(Día / Mes / Año)

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
KATHERINE NAVARRO	INGENIERA AMBIENTAL	GAVINCO S.A.S.	
LUIS ANDRES BALLESTEROS	APOYO DE PLANEACIÓN	MUNICIPIO	
MARTHA SORIANO	COORDINADORA DE PROYECTO	GAVINCO S.A.S.	
ANUAR CABARCAS	PROFESIONAL SOCIAL	GAVINCO S.A.S.	
JHON FREDDY QUINTERO	REPRESENTANTE LEGAL	U.T. P.H. SANTIAGO 2022	
ROSANA DEL PILAR MATTOS	INGENIERA RESIDENTE	GAVINCO S.A.S.	
RUBIELA MEDINA	INGENIERO SST	GAVINCO S.A.S.	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial



MEET GAVINCO INGENIEROS CO...
Organizador



Andrés Ballesteros (Invitado)
Invitado de la reunión



Anuar Cabarcas ... (Invitado)
Invitado de la reunión



Fanny Amaya (Invitado)
Invitado de la reunión



Jhonn Freddy Q... (Invitado)
Invitado de la reunión



Katherine Navarro (Invitado)
Invitado de la reunión



ROSANA DEL PIL... (Invitado)
Invitado de la reunión



Otros invitados (1)



Daniela Reyes
Sin respuesta

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 4

FECHA	25/05/2023 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 15
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. LP-OP-01-2022 **MUNICIPIO DE SANTIAGO**
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - AZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS Se presentan los compromisos adquiridos en el comité de obra No. 15, los cuales se encuentran en el siguiente estado: Cumplidos: -Pólizas. -Documentos SST. -Contratación de Personal. -Rendimientos Financieros. Sin Cumplir: -PAGA -El Arte de la Valla. -Maquinaria. -Plan de Contingencia. -Actas de Vecindad.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA • Compromisos • Aspectos técnicos • Avance de entrega documental etapa Preconstrucción • Temas pendientes próximo comité

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA Siendo el 25 de mayo de 2023, la Interventoría a través de la coordinadora del Proyecto la ingeniera Martha Soriano, da inicio al comité de seguimiento No. 15. El objetivo de este comité es hacer un recuento de los compromisos que había quedado antes de la suspensión del contrato, luego el avance de entrega documental de la etapa de pre-construcción, revisar el avance de entrega documental revisión de Estudios y Diseños, información SST, los componentes Ambiental, Social y un pequeño recuento de las actividades ejecutadas en obra. La Interventoría comenta que el Contratista no ha cumplido con la entrega del PAGA, el Equipo Mínimo, el Plan de Contingencia, Actas de Vecindad y el arte de la Valla, se le pregunta al Contratista cual es el estado de cada uno de los documentos. El Contratista comenta con respecto a la maquinaria es el modelo por el cual no se ha podido cumplir, la parte técnica ya están buscando la documentación de una maquinaria que cumpla con los 20 años, se espera que mañana este subsanado porque ha sido difícil conseguir el equipo, las actas de vecindad tiene entendido que la ingeniera Melissa Cárdenas ya las tiene en campo pero no ha podido entregarlas en la oficina, se compromete radicarlas el día lunes 29 de mayo de 2023; con respecto a las Pólizas comenta que ya se enviaron el día viernes 19 de mayo de 2023, van a presentar el Plan de Contingencia y solicitar una ampliación de tiempo hará entrega para el día de mañana 26 de mayo de 2023, se compromete enviar el documento PAGA el día lunes 29 de mayo de 2023, con respecto el arte de la Valla se llegara un acuerdo esta tarde en la reunión en el INVIAS. La Interventoría le pregunta a Rubiela Molina representante de SST, la contratación del personal, el envío de las planillas, las afiliaciones, si esos documentos ya fueron recibidos. La representante del área SST Rubiela Molina comenta que en el momento no ha recibido ninguna información, remitió un oficio que la ingeniera



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-14-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

2 de 4

FECHA

25/05/2023

(Día / Mes / Año)

La representante del área SST Rubiera Molina comenta que en el momento no ha recibido ninguna información, remitió un oficio que la ingeniera Martha Soriano se lo remitió al Contratista donde se especifica exactamente lo que se requiere para dar inicio a obra con respecto al área SST, y lo que se requiere durante la ejecución para que lo tengan presente, se hizo de manera oficial, al momento no se ha recibido ninguna información.

La Interventoría le pregunta al Contratista para cuando hace entrega de las planillas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 de 4
		FECHA	25/05/2023 (Día / Mes / Año)
<p>El Contratista se compromete al finalizar el comité solicitar las planillas y las hará llegar al correo de la Interventoría.</p> <p>La Interventoría confirma que el municipio realizó la entrega de los Rendimientos Financieros.</p> <p>Se continua con el avance en cifras la Interventoría hace una salvedad respecto a las cantidades ejecutadas, es una situación desafortunada que la Interventoría no ha podido corroborar en campo, en este momento no hay presencia 100% en obra, el programado presentado por el Contratista es el 86,25% versus un ejecutado de 1,16% hay un atraso por estas razones se requiere que se entregue el Plan de Contingencia buscando la manera de mitigar este atraso.</p> <p>La Interventoría continua con el avance de entrega documental etapa pre construcción la mayoría de los documentos se encuentran aprobados.</p> <p>Se da continuación con el avance de entrega documental revisión de Estudios y Diseños previo a la suspensión se aprobó, ya se tiene la totalidad de los componentes aprobados, una vez aprobado estos documentos se le solicita al Contratista que por favor remita el paquete completo original, de la versión aprobada firmado en original, en dos copias originales, con el objetivo se complete el trámite porque se debe remitir con un oficio generado por Interventoría para el INVIAS en la dirección territorial Cundinamarca, ubicada en la ciudad de Bogotá para poder realizar este trámite se necesita la versión física para que al final en la etapa de liquidación no se tengan inconvenientes. Se debe entregar lo más rápido posible, es decir en la primera semana de junio de 2023 sería mejor.</p> <p>Se continua con el componente Ambiental, la ingeniera Katherine Navarro comenta que la Interventoría está en la espera de recibir las observaciones subsanadas en cuanto al PAGA y a la Fuente de Materiales la cual se habían comprometido entregarlas el día 23 de mayo de 2023, no han cumplido con la fecha establecida del Contratista.</p> <p>El Contratista se compromete hacer entrega de esta información el lunes 29 de mayo de 2023 debe estar radicado.</p> <p>Se continua con el componente Social, el profesional Anuar Cabarcas comenta que como mencionó el Contratista que no ha entregado el PAGA debido al oficio que se le envió el día 12 de mayo de 2023, donde hay 5 puntos específicos hace parte al cumplimiento que debe tener el Contratista, en los documentos previos al inicio de obra, no tiene nada que ver con el PAGA de que se ha presentado, las observaciones que se le realizaron el PAGA al Contratista fueron enviado aproximadamente mes y medio.</p> <p>Toma la palabra la ingeniera Rosana Mattos hace un breve resumen de las actividades en obra, están realizando instalación de la sub base, iniciaron de Cuperena hacia arriba con la instalación y conformación de terreno, por el momento ha tenido conversación con la ingeniera Melisa Cárdenas en lo que le ha ido informando, ya que no se ha podido estar 100% en la obra como lo manifestó el ingeniero Diego Pedraza, se programara una visita para poder estar y dar un informe más detallado del avance y de lo que se está ejecutando por el momento en obra.</p> <p>Se espera que la próxima semana se encuentre en sitio de obra la inspectora Catherine Viveros e informe con más detalle las actividades de obra.</p> <p>Toma la palabra la inspectora Rubiela Molina le solicita al Contratista que en el lugar de trabajo donde están ejecutando la obra tener una AZ con la relación del personal, las afiliaciones y todo lo que vayan haciendo en la ejecución.</p> <p>Damos por terminado el comité de seguimiento en el día de hoy, se les agradece a los participantes. Feliz día para todos.</p>			
COMPROMISOS PACTADOS		FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Actas de Vecindad	lunes, 29 de mayo de 2023	CONTRATISTA	
PAGA	lunes, 29 de mayo de 2023	CONTRATISTA	
Componente Social	lunes, 29 de mayo de 2023	CONTRATISTA	
FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA		1/06/2023 (Día / Mes / Año)	
NOTAS:			
1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.			
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.			
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.			



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	4 de 4

FECHA 25/05/2023
(Día / Mes / Año)

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
DIEGO PEDRAZA	DIRECTOR	GAVINCO S.A.S.	
KATHERINE NAVARRO	INGENIERA AMBIENTAL	GAVINCO S.A.S.	
LUIS ANDRES BALLESTEROS	APOYO DE PLANEACIÓN	MUNICIPIO	
MARTHA SORIANO	COORDINADORA DE PROYECTO	GAVINCO S.A.S.	
ANUAR CABARCAS	PROFESIONAL SOCIAL	GAVINCO S.A.S.	
JHON FREDDY QUINTERO	REPRESENTANTE LEGAL	U.T. P.H. SANTIAGO 2022	
ROSANA DEL PILAR MATTOS	INGENIERA RESIDENTE	GAVINCO S.A.S.	
RUBIELA MEDINA	INGENIERO SST	GAVINCO S.A.S.	

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

- | | | |
|--|--|---|
|  | MEET GAVINCO INGENIEROS CO...
Organizador |  |
|  | Andrés Ballesteros (Invitado)
Invitado de la reunión |  |
|  | Anuar Cabarcas ... (Invitado)
Invitado de la reunión |  |
|  | Diego Pedraza (Invitado)
Invitado de la reunión |  |
|  | Fanny Amaya (Invitado)
Invitado de la reunión |  |
|  | Jhon Quintero (Invitado)
Invitado de la reunión |  |
|  | Katherine Navarro (Invitado)
Invitado de la reunión |  |
|  | Rosana del Pilar ... (Invitado)
Invitado de la reunión |  |
|  | RUBIELA (Invitado)
Invitado de la reunión |  |

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1											
		VERSIÓN	1											
		PÁGINA	1 de 5											
		FECHA	4/05/2023 (Día / Mes / Año)											
(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)														
ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 24 (La numeración será consecutiva)														
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER												
CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNT.3879052 (Indicar número de contrato y año)		MUNICIPIO DE OCAÑA												
CONTRATISTA: CONSORCIO OK 2022														
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTODELCORREDORVIALOCAÑA-LIMITES-MORRISONPORMEDIODELPROGRAMACOLOMBIARURAL,ENELMUNICIPIODEOCAÑA, NORTE DE SANTANDER.														
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 (Indicar número de contrato y año)														
INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.														
<table><tr><td>LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS</td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td>Se presentan los compromisos adquiridos en el comité de obra No. 24, los cuales se encuentran en el siguiente estado:</td></tr><tr><td>Se dio cumplimiento a:</td></tr><tr><td>-Componente Social.</td></tr><tr><td>No se han cumplido:</td></tr><tr><td>-PAGA.</td></tr><tr><td>-Topografía.</td></tr><tr><td>-Rendimientos Financieros.</td></tr><tr><td>-Informe Hidráulico.</td></tr></table>				LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS			Se presentan los compromisos adquiridos en el comité de obra No. 24, los cuales se encuentran en el siguiente estado:	Se dio cumplimiento a:	-Componente Social.	No se han cumplido:	-PAGA.	-Topografía.	-Rendimientos Financieros.	-Informe Hidráulico.
LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS														
Se presentan los compromisos adquiridos en el comité de obra No. 24, los cuales se encuentran en el siguiente estado:														
Se dio cumplimiento a:														
-Componente Social.														
No se han cumplido:														
-PAGA.														
-Topografía.														
-Rendimientos Financieros.														
-Informe Hidráulico.														
<table><tr><td>TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA</td></tr><tr><td>• Compromisos</td></tr><tr><td>• Aspectos técnicos</td></tr><tr><td>• Avance de entrega documental etapa Preconstrucción</td></tr><tr><td>• Temas pendientes próximo comité</td></tr></table>				TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA	• Compromisos	• Aspectos técnicos	• Avance de entrega documental etapa Preconstrucción	• Temas pendientes próximo comité						
TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA														
• Compromisos														
• Aspectos técnicos														
• Avance de entrega documental etapa Preconstrucción														
• Temas pendientes próximo comité														

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 5
		FECHA	4/05/2023 (Día / Mes / Año)
DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA			
<p>Siendo el 04 de mayo de 2023, la Interventoría a través del director del Proyecto el ingeniero Diego Pedraza, da inicio al comité de seguimiento No. 24.</p> <p>El objetivo del día de hoy es hacer seguimiento a las actividades que se han ejecutado de la semana anterior y el orden del día es el siguiente los compromisos, los avances en cifras, luego el avance de entrega documental etapa de pre construcción, posteriormente el avance de entrega documental revisión de Estudios y Diseños, luego el avance de las actividades en obra, después la información de SST a la fecha y luego un resumen de los componentes Ambiental y Social.</p> <p>La Interventoria menciona dos compromisos pendientes por parte del municipio que son el proceso de contratación alcantarillado Juan XXIII y los Rendimientos Financieros, se le pregunta a la ingeniera Lised Arenas que ha sucedido la cual ha transcurrido un tiempo importante, esta causando un atraso y afectación en la obra.</p> <p>La ingeniera Lised Arenas comenta con respecto al contrato que se viene realizando con el convenio de los servicio públicos para que sean ellos que lo ejecuten esta en manos de la oficina jurídica, en estos momentos no ha llegado a la parte técnica, no hay mucho conocimiento del avance, ha estado haciendo seguimiento al proceso, se ha esta realizando el convenio aún no se tiene fecha estimada para la entrega, se excusa porque este tipo de compromisos le ha quedado un poco difícil porque no tiene una alta jerarquía dentro del municipio para hacer presión a estos tipos de exigencias, sin embargo el proceso está en evolución, también informa que la parte contable están a la espera que los bancos hagan las devoluciones para poder entregar el informe Financiero a la Interventoria.</p> <p>La Interventoria le pregunta a la ingeniera Lised Arenas como surtió el tramite el acta de inicio del contrato de Buenavista.</p> <p>La ingeniera Lised Arenas comenta que efectivamente el día de ayer quedo en la plataforma el acta de inicio con fecha del 2 de mayo de 2023, el Contratista ya esta enterado, el día martes 2 de mayo de 2023 hubo una reunión con los veedores a través de esta reunión se va firmar un acta donde se aprueban los sectores que el Contratista esta realizando en Diseño lo que presentara la Interventoria.</p> <p>La Interventoria afirma que aún no ha recibido el acta de inicio para la respectiva firma.</p> <p>La ingeniera Lised Arenas afirma que el acta aun no se ha digitalizado para recoger las firmas de los asistentes y una vez el Contratista tenga digitalizado el acta lo envía para tener copia junto con la copia de las firmas de los asistentes. El acta de inicio no se hace como un documento como se hacía anteriormente solo se le da la aprobación en el Secop de inicio, el contrato de Buenavista tiene una duración de 4 meses de ejecución con fecha de terminación del 2 de septiembre de 2023. El contrato de Morrison tiene un plazo de 2 meses.</p> <p>El ingeniero Oscar Villareal comenta que sin autorización del instituto de la subdirección de vías regionales no se autoriza más Prórroga.</p> <p>La Interventoria comenta algunos compromisos de parte del Contratista la cual se refiere al informe Hidráulico que hace referencia a temas de forma en la zona de la Samaritana, lo mismo sucede con la Topografía también son ajustes de forma, ambos tienen aprobación, pero tienen algunas cosas que deben ser ajustadas, se le pregunta al Contratista cual es el avance de ese componente y la Topografía como está la atención a las subsanaciones.</p> <p>El Contratista comenta con respecto al tema del Informe Hidráulico se entregara con los planos record como se menciona la semana pasada no se hizo ninguna intervención de las alcantarillas por cuanto estas eran existentes, en ese orden de ideas consideran que en el plano record van a entregar cotas del encole y cotas de decole y en cuanto al tema de Topografía, el Topógrafo le indica que ya tiene listo las escalas, se compromete hacer entrega el día viernes 5 de mayo de 2023 la subsanación de la Topografía y el Informe Hidráulico se hará ajuste con los planos record.</p> <p>La Interventoria continua con otros compromisos que tenía el Contratista el Equipo mínimo se recibió hoy en las horas de la mañana y Reprogramación de obra se recibió el día de ayer, ambos documentos fueron recibidos. Otro compromiso es la generación del arte para la Valla, el Contratista hizo una propuesta de arte en su momento no había una aprobación por medio del Ministerio de Transporte respecto a este nuevo arte, el día de ayer se recibió una directriz de parte del ingeniero Wilmar Rangel del Gestor del Proyecto donde adjuntaron un memorando y un instructivo que tiene dos páginas, ayer mismo se ofició cada uno de los contratos al consorcio OK de como se debe proceder al arte. Se le pregunta al Contratista si recibió ese documento junto con nuestro oficio y segundo en el caso de que lo haya recibido teniendo en cuenta que un trámite básico, cuando estaría haciendo el trámite correspondiente al envío de este documento al INVIAS.</p> <p>El Contratista comenta que no ha recibió ese correo y solicita que por favor se lo reenvíen nuevamente, al recibir se compromete enviar hoy el documento de la información básica.</p> <p>La Interventoria continua con el avance físico, tiene un avance programado correspondiente a la versión inicial del contrato que tenía</p>			

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 de 5
		FECHA	4/05/2023 (Día / Mes / Año)
<p>La Interventoria continua con el avance físico, tiene un avance programado correspondiente a la versión inicial del contrato que tenía una fecha de terminación del 30 de abril de 2023, la reprogramación de obra con el nuevo plazo que incluye los dos meses solicitados en Prórroga que fueron aprobado por la Interventoria fue recibida el día de ayer no se tiene la nueva programación, el porcentaje ejecutado nos preocupa porque el plan de contingencia no se esta cumpliendo, se hizo un breve análisis de las cantidades ejecutadas de la semana anterior y los rendimientos están por debajo de lo que se esperaba se diera cumplimiento al contrato. Se le pregunta a la ingeniera Adriana Gutiérrez qué opinión tiene el proceso de ejecución de la semana anterior del que se comentó el día de ayer.</p> <p>La ingeniera Adriana Gutiérrez comenta en cuanto al rendimiento que se ha tenido en el avance en obra de estos 8 días, se ha hecho 30 metros lineales en la Placa Huella, lo que es fundida de huella, contra huellas y cunetas, hay una preocupación porque cada 8 días se hace el comité y el avance que se tiene no se ve reflejado en los compromisos que se hacen.</p> <p>El Contratista comenta que se tiene en la obra dos cuadrillas que están trabajando con equipos independientes de personal y de maquinaria, se ha tenido el inconveniente el trasiego del material porque queda muy retirado porque la misma Placa Huella impide el acceso de hacer la entrega de los materiales, se esta tratando de implementar otro sistema como esta se hace con carretilla, con tres personas que hace el cargue y el descargue en los frentes que se tiene, eso es lo que genera el atraso tan grande que se tiene actualmente.</p> <p>La Interventoria comenta que va a realizar un oficio para formalizar esta situación respecto a que los rendimientos actuales no nos va llevar a buenos términos, se le agradece al Contratista dar respuesta de como van a mejorar ese plan de Contingencia teniendo en cuenta que se sabía que había una Placa Huella intermedia que en la zona final se debía intervenir, se debe complementar haciendo seguimiento a ese Plan de Contingencia.</p> <p>El Contratista le pregunta a la ingeniera Adriana Gutiérrez si esta contemplado toda la sub base que se encuentra instalada a lo largo del proyecto, tiene entendido que tienen 250 metros lineales a 300 metros de sub base instalada, si dentro de ese valor ejecutado se encuentra esos 200 a 300 metros de sub base.</p> <p>La ingeniera Adriana Gutiérrez comenta que, si se encuentra contemplado unos metros lineales más, que todavía falta por terminar.</p> <p>Se continua con el avance de entrega documental etapa pre construcción la mayoría se encuentra aprobados en excepción la relación de equipo mínimo fue recibido el día de hoy por parte del Contratista, se espera que para el próximo comité estén todos los componentes aprobados.</p> <p>La Interventoria continua con el avance de entrega documental revisión de Estudios y Diseños para los componentes de Topografía e Informe Hidráulico el Contratista se comprometió hacer entrega.</p> <p>Damos continuidad a la información SST de Rubiela Molina comenta que esta pendiente la entrega de información, el informe mensual que era para el día 2 de mayo de 2023 y estamos a 4 de mayo de 2023 aun no se ha recibido esa información, solicita para el día de hoy hacer entrega del informe mensual.</p> <p>Se continua con actividades realizadas en obra de la semana pasada con la ingeniera Adriana Gutiérrez, se hizo instalación de acero Placa Huella, en cunetas, se hizo fundida de las mismas, se instalo sub base y se fundió contra huella, para un total ejecutado a la fecha se lleva 130 metros lineales al día de hoy se ha tomado muestra de ensayos de cilindros para el concreto que se está ejecutando.</p> <p>Toma la palabra la ingeniera Katherine Navarro del componente Ambiental comenta que ha sido difícil comunicarse, no atendieron a las observaciones que se les indicó en el comité de la semana pasada, se esperaba tener respuesta de parte del profesional del Contratista, se hizo oficial el comunicado se espera tener respuesta por parte del Contratista.</p> <p>La Interventoria afirma de enviar dos documentos al WhatsApp del Contratista el instructivo de las Vallas y el oficio proyectado por la ingeniera Katherine Navarro, comenta que el ingeniero Camilo Forero tiene problema de conexión, pero se compromete hacer entrega el día de hoy el informe pendiente del mes de abril de 2023, se solicita al ingeniero Ambiental del Contratista que por favor responda las llamadas o explique cuál es el mejor canal de comunicación.</p> <p>Toma la palabra el ingeniero Fabian Gallardo profesional Ambiental comenta que efectivamente la comunicación es algo compleja con la conexión, el tema del wifi, las redes no son tan eficiente, recomienda comunicarse por vía WhatsApp, se compromete revisar los ajustes con la profesional Social y retomar el envío.</p> <p>Continua con el componente Social, el profesional Anuar Cabarcas comenta que el contratista ha sido eficiente en cuanto a los</p>			

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1																																
		VERSIÓN	1																																
		PÁGINA	4 de 5																																
		FECHA	4/05/2023 (Día / Mes / Año)																																
<p>cumplimientos, ya se recibió el acta de reunión de la veeduría, la cual capacitaron el componente en cuanto a participación ciudadana y los mecanismos de participación e igualmente se refería a los soportes de consulta previa solicitado por el Contratista al Ministerio del Interior, fueron enviadas las actas de vecindad como de Juan XXIII y la Samaritana, ya está conformada el comité de veeduría ciudadana y aprobado por parte de la Personería, fueron enviadas las actas de compromiso, donde se dio a conocer el permiso por parte de los propietarios de la vivienda el aval para guardar el material de las casas, igualmente al visitar la obra se pudo dar fe que se estaba ejecutando el plan de gestión social de los 5 programas que esta conformado con el PAGA, gracias a la buena comunicación con la profesional Social del Contratista se ha realizado varias mesas de trabajo se dio el visto bueno al componente Social que va en el PAGA.</p> <p>La Interventoria afirma que el Contratista se encuentra al día con el componente Social.</p> <p>El Contratista se compromete reunirse con la ingeniera Adriana Gutiérrez para resolver el porcentaje en cifras.</p> <p>Toma la palabra el ingeniero Mauricio Rodríguez pregunta cómo va el municipio con respecto a los Rendimientos Financieros.</p> <p>La Interventoria comenta que a la fecha hay varios meses en mora en el cumplimiento de ese compromiso, la ingeniera Lised Arenas comentó que ha realizado seguimiento al interior de la alcaldía lo que le corresponde, en estos momentos se encuentra en manos del área Financiera aún no hay respuesta.</p> <p>La Interventoria solicita que por favor documente al respecto y se oficia, aunque este tema ha quedado registro en cada uno de las actas, es un documento contractual.</p> <p>Damos por terminado el comité de seguimiento del día de hoy, se le agradece la participación de todos. Feliz día.</p>																																			
<table><tr><th>COMPROMISOS PACTADOS</th><th>FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)</th><th>RESPONSABLES</th></tr><tr><td>Rendimientos Financieros</td><td>11/05/2023</td><td>MUNICIPIO</td></tr><tr><td>PAGA</td><td>11/05/2023</td><td>CONTRATISTA</td></tr><tr><td>Topografía</td><td>5/05/2023</td><td>CONTRATISTA</td></tr></table> <p>FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 11/05/2023 (Día / Mes / Año)</p> <p>NOTAS:</p> <p>1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.</p> <p>2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtir de manera previa el trámite interno correspondiente.</p> <p>3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.</p> <p>LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:</p> <table><tr><th>NOMBRE DEL PARTICIPANTE</th><th>CARGO</th><th>EMPRESA / ENTIDAD</th><th>FIRMA</th></tr><tr><td>ADRIANA GUTIERREZ</td><td>RESIDENTE</td><td>GAVINCO S.A.S.</td><td></td></tr><tr><td>DIEGO PEDRAZA</td><td>DIRECTOR</td><td>GAVINCO S.A.S.</td><td></td></tr><tr><td>JUDTH MORALES</td><td>INGENIERO DE APOYO</td><td>INSTITUTO TERRITORIAL DE VIAS</td><td></td></tr><tr><td>CAMILO FORERO</td><td>PROFESIONAL SST</td><td>CONSORCIO OK 2022</td><td></td></tr></table>				COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES	Rendimientos Financieros	11/05/2023	MUNICIPIO	PAGA	11/05/2023	CONTRATISTA	Topografía	5/05/2023	CONTRATISTA	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA	ADRIANA GUTIERREZ	RESIDENTE	GAVINCO S.A.S.		DIEGO PEDRAZA	DIRECTOR	GAVINCO S.A.S.		JUDTH MORALES	INGENIERO DE APOYO	INSTITUTO TERRITORIAL DE VIAS		CAMILO FORERO	PROFESIONAL SST	CONSORCIO OK 2022	
COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES																																	
Rendimientos Financieros	11/05/2023	MUNICIPIO																																	
PAGA	11/05/2023	CONTRATISTA																																	
Topografía	5/05/2023	CONTRATISTA																																	
NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA																																
ADRIANA GUTIERREZ	RESIDENTE	GAVINCO S.A.S.																																	
DIEGO PEDRAZA	DIRECTOR	GAVINCO S.A.S.																																	
JUDTH MORALES	INGENIERO DE APOYO	INSTITUTO TERRITORIAL DE VIAS																																	
CAMILO FORERO	PROFESIONAL SST	CONSORCIO OK 2022																																	

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	5 de 5
			FECHA	4/05/2023 (Día / Mes / Año)
..... RUBIELA MOLINA	 PROFESIONAL SST	 GAVINCO S.A.S.		
..... LUIS CARRASCAL	 INGENIERO RESIDENTE	 CONSORCIO OK 2022		
..... MAURICIO RODRIGUEZ	 INGENIERO DE APOYO	 INSTITUTO TERRITORIAL DE VIAS		
..... OSCAR VILLAREAL	 COORDINADOR	 INSTITUTO TERRITORIAL DE VIAS		
..... KATHERINE NAVARRO	 INGENIERA AMBIENTAL	 GAVINCO S.A.S.		
..... ANUAR CABARCAS	 PROFESIONAL SOCIAL	 GAVINCO S.A.S.		
..... AURA CRISTINA TORRES	 AUXILIAR RESIDENTE	 CONSORCIO OK 2022		
..... FERNANDO CARRASCAL	 INGENIERO DE APOYO	 CONSORCIO OK 2022		
..... LISED ARENAS	 SUPERVISOR	 MUNICIPIO		
..... MARTHA SORIANO	 COORDINADORA DE PROYECTO	 GAVINCO S.A.S.		
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial				

1. Resumen

Título de la reunión	Comité de seguimiento al contrato de obra No. CO1.PCCNTR.3879052 N
Participantes que asistieron	15
Hora de inicio	5/04/23, 7:53:09 AM
Hora de finalización	5/04/23, 9:03:01 AM
Duración de la reunión	1 h 9 min 51s
Tiempo medio de asistencia	57 min 48s

2. Participantes

Nombre	Primera entra	Última salida	Duración de la	Correo electrón	Id. de particip
MEET GAVINCO INGENIEROS	5/04/23, 7:54	5/04/23, 9:02	1 h 7 min 54s	meet@gavinc	meet@gavinc
ING. Adriana (Invitado)	5/04/23, 7:55	5/04/23, 9:02	1 h 7 min 44s		
LUIS CARRASCAL (Guest)	5/04/23, 7:55	5/04/23, 9:01	1 h 6 min 46s		
Diego Pedraza (Invitado)	5/04/23, 7:57	5/04/23, 9:03	1 h 5 min 18s		
Anuar Cabarcas	5/04/23, 7:57	5/04/23, 9:01	1 h 4 min 11s		
Cristiam Mauricio Rodriguez	5/04/23, 7:58	5/04/23, 9:02	1 h 4 min 24s	cmrodrigueza	cmrodrigueza
Ing. Fabian Gallardo (Invitado)	5/04/23, 7:58	5/04/23, 9:01	1 h 3 min 24s		
Fanny Amaya	5/04/23, 8:00	5/04/23, 8:59	59 min 46s		
Fernando Carrascal (Invitado)	5/04/23, 8:00	5/04/23, 9:02	1 h 1 min 20s		
RUBIELA (Invitado)	5/04/23, 8:01	5/04/23, 9:01	1 h 15s		
Camilo Forero	5/04/23, 8:03	5/04/23, 9:02	59 min 6s		
Lised Arenas	5/04/23, 8:03	5/04/23, 8:43	40 min 8s		
Katherine Navarro	5/04/23, 8:07	5/04/23, 9:02	54 min 44s		
Oscar Javier Villarreal Neira	5/04/23, 8:12	5/04/23, 8:56	44 min 13s	ovillarreal@in	ovillarreal@in
Pablo Emilio Quintero	5/04/23, 8:16	5/04/23, 8:43	27 min 40s		

3. Actividades de la reunión

Nombre	Hora de entra	Hora de salida	Duración	Correo electrón	Rol
MEET GAVINCO INGENIEROS	5/04/23, 7:54	5/04/23, 9:02	1 h 7 min 54s	meet@gavinc	Organizador
ING. Adriana (Invitado)	5/04/23, 7:55	5/04/23, 9:02	1 h 7 min 44s		Moderador
LUIS CARRASCAL (Guest)	5/04/23, 7:55	5/04/23, 9:01	1 h 6 min 46s		Moderador
Diego Pedraza (Invitado)	5/04/23, 7:57	5/04/23, 9:03	1 h 5 min 18s		Moderador
Anuar Cabarcas	5/04/23, 7:57	5/04/23, 9:01	1 h 4 min 11s		Moderador
Cristiam Mauricio Rodriguez	5/04/23, 7:58	5/04/23, 9:02	1 h 4 min 24s	cmrodrigueza	Moderador
Ing. Fabian Gallardo (Invitado)	5/04/23, 7:58	5/04/23, 9:01	1 h 3 min 24s		Moderador
Fanny Amaya	5/04/23, 8:00	5/04/23, 8:59	59 min 46s		Moderador
Fernando Carrascal (Invitado)	5/04/23, 8:00	5/04/23, 9:02	1 h 1 min 20s		Moderador
RUBIELA (Invitado)	5/04/23, 8:01	5/04/23, 9:01	1 h 15s		Moderador
Camilo Forero	5/04/23, 8:03	5/04/23, 9:02	59 min 6s		Moderador
Lised Arenas	5/04/23, 8:03	5/04/23, 8:43	40 min 8s		Moderador
Katherine Navarro	5/04/23, 8:07	5/04/23, 9:02	54 min 44s		Moderador
Oscar Javier Villarreal Neira	5/04/23, 8:12	5/04/23, 8:56	44 min 13s	ovillarreal@in	Moderador
Pablo Emilio Quintero	5/04/23, 8:16	5/04/23, 8:43	27 min 40s		Moderador

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 4

FECHA

11/05/2023
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 25
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNT.3879052
(Indicar número de contrato y año)

MUNICIPIO DE OCAÑA

CONTRATISTA: CONSORCIO OK 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTODELCORREDORVIALOCAÑA-LIMITES-MORRISONPORMEDIODELPROGRAMACOLOMBIARURAL,ENELMUNICIPIODEOCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se presentan los compromisos adquiridos en el comité de obra No. 25, los cuales se encuentran en el siguiente estado:

Se dio cumplimiento a:

-Componente Social.

No se han cumplido:

-PAGA.

-Topografía.

-Rendimientos Financieros.

-Informe Hidráulico.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Compromisos
- Aspectos técnicos
- Avance de entrega documental etapa Preconstrucción
- Temas pendientes próximo comité

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo el 11 de mayo de 2023, la Interventoría a través del director del Proyecto el ingeniero Diego Pedraza, da inicio al comité de seguimiento No. 25.

El objetivo del día de hoy es hacer seguimiento a las actividades que se han ejecutado de la semana anterior y el orden del día es el siguiente los compromisos, los avances en cifras, luego el avance de entrega documental etapa de pre construcción, posteriormente el avance de entrega documental revisión de Estudios y Diseños, luego el avance de las actividades en obra, después la información de SST a la fecha y luego un resumen de los componentes Ambiental y Social.

La Interventoria comenta respecto a los dos compromisos que tiene pendiente por parte del municipio que se han ido aplazando comité tras comité y de manera desafortunada se ha venido incumpliendo por razones que la ingeniera Lised Arenas ha explicado en su momento mas el Proceso de Contratación de Alcantarillado de Juan XXIII y los Rendimientos Financieros está causando serias dificultades con respecto al cumplimiento de la programación, la Interventoria manifiesta que ha generado un oficio al municipio preguntando de manera oficial por los dos compromisos sobre todo por el primero haciendo énfasis el incumplimiento reiterativo podría a conllevar el incumplimiento global del contrato, y no se diera en los plazos previstos, el contrato se vencía el 30 de abril de 2023, se otorgó una Prórroga por 60 días se debe terminar el 29 de junio de 2023, esta a punto de 49 días exactamente

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 4
		FECHA	11/05/2023 (Día / Mes / Año)
<p>al día de hoy, se le pregunta a la ingeniera Lised Arenas que ha pasado con la contratación de la empresa de servicios públicos para la Contratación de Alcantarillado de Juan XXIII.</p> <p>La ingeniera Lised Arenas comenta que la contratación de los servicios públicos está un poco lenta porque se cambiaron las líneas de contratación, no se va hacer contrato con servicio públicos, sino un contrato directo.</p> <p>La Interventoria le pregunta al contratista cual es el tiempo estimado que tiene para dar terminación a las obras de Juan XXIII de manera posterior a que se termine la ejecución del alcantarillado, que tiempo estiman para terminar esa obra.</p> <p>Toma la palabra el ingeniero Leonardo Carrascal socio del Consorcio ejecutor, comenta que dentro de la programación la reprogramación que se presentó se tenía contemplado desde el inicio de esta actividad esto de acuerdo lo que se había conversado antes y considerando que esto se iba a contratar por ESPO que la contratación fuera bastante rápida se tiene programado a partir de la semana entrante y al final de estos 60 días adicionales, es decir 50 días calendario aproximadamente, tiempo que se considera necesario para hacer esa actividad.</p> <p>La Interventoria manifiesta que el plazo, es decir el 19 de mayo de 2023, la contratación no haya sido finiquitada por parte del municipio no hay un documento firmado contractual por las partes y no haya una orden de inicio para dar inicio a las actividades, se recomienda al Instituto Nacional de Vías que haga la devolución que se termine la ejecución del contrato con las actividades que ya se dieron en la zona de Juan XXIII, y que una vez finalizado lo que tiene que ver con la Samaritana en el plazo previsto por el Contratista se devuelva los recursos que corresponde la intervención de esa zona de esos 150 metros que están por construir, por la razón de que ha tenido una demora grande, segundo porque sino logra en esa fecha como lo acaba de mencionar el ingeniero Leonardo Carrascal, difícilmente van a poder llegar a la fecha de terminación en el caso que sea previsto.</p> <p>La Interventoria comenta que el municipio no ha hecho entrega de los rendimientos Financieros de los meses febrero, marzo y abril de 2023 se le pregunta a la ingeniera Lised Arenas que ha sucedido y como han logrado avanzar la alcaldía con este tema.</p> <p>La ingeniera Lised Arenas comenta que la semana pasada tuvo una conversación con la contadora comenta que está esperando, por parte del banco ya se hizo, la contadora se encargara de hacer el informe y enviarlo formalmente. Aun no se tiene una fecha de este cumplimiento.</p> <p>Existen algunos compromisos por parte del Contratista como el Informe Hidráulico la Interventoria le realizó unas observaciones que se dibujaran que incluyeran dentro el plano de Diseño las alcantarillas existentes, este tema ya se había conversado en diferentes ocasiones y se acordó junto con el Contratista que se iba a manejar por medio de los planos record, para no tener que hacer modificaciones, se siguen llevando no se considera un incumplimiento pero es importante tenerlo presente, respecto a la Reprogramación de Obra fue entregada por el Contratista hace varios días, esta en manos de la Interventoria, en estos momentos aparece cumplido por parte del Contratista, ahora se convierte en un compromiso por parte de la Interventoria, se compromete entregar este compromiso mañana 12 de mayo de 2023, con respecto al arte de la Valla no se ha recibido se le solicita al Contratista que se lo envíe al INVIAS con copia a la Interventoria, se le pregunta al ingeniero Leonardo Carrascal porque no se ha enviado la información al INVIAS.</p> <p>El ingeniero Leonardo Carrascal comenta que el Contratista ya lo envió desde antes de ayer la información que le estaban solicitando para que les indiquen el arte de la Valla.</p> <p>La Interventoria confirma el correo enviado por el Contratista solicitada para el arte de la Valla.</p> <p>El Componente de Topografía fue subsanado el 5 de mayo de 2023, en estos momentos se encuentra en manos de la Interventoria, se compromete enviar respuesta antes del siguiente comité.</p> <p>Con respecto al avance en cifras el Contratista hizo entrega de la reprogramación hace aproximadamente 6 días, en estos momentos esta en manos de la Interventoria, el compromiso es aprobar la programación para el día mañana, se comenta que hay diferencias del ejecutado el Contratista refiere que hay unas cifras que no se este cuantificando en este porcentaje, la Interventoria se compromete dar conocimiento al ajuste se espera que sea una cifra superior, que los datos sean fiables.</p> <p>La Interventoria continua con el avance de entrega documental etapa pre construcción la totalidad de los documentos se encuentran aprobados, en excepción el PAGA que se encuentra pendiente.</p> <p>Con respecto al avance de entrega documental revisión de Estudios y Diseños se encuentran aprobados el Diseño Geométrico, Estudio Geológico, Geotécnico e Informe de Suelos y Diseño de Pavimentos.</p>			

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 de 4
		FECHA	11/05/2023 (Día / Mes / Año)
<p>Se continua con el capitulo de la Información SST, la inspectora Rubiela Molina comenta que se tenia un compromiso con la entrega del informe se recibió el día 5 de mayo de 2023, ese mismo día se dio respuesta porque tenía bastantes observaciones y al día de hoy 11 de mayo de 2023 no se ha recibido la información, agradece que por favor envíen esa información, que son documentos importantes.</p> <p>Toma la palabra el ingeniero Camilo Forero comenta que esta en espera de una información, apenas las tenga la envía, se compromete hacer entrega el día lunes 15 de mayo de 2023.</p> <p>Se continua con actividades que se ejecutaron hace una semana en obra, el inspector Luis Eduardo Estupiñán comenta que en estos momentos se encuentran en la Samaritana ejecutando por el momento van 190 metros lineales, en lo que tiene que ver con las contra huellas, a concreto de 21 metros de PSI, y los 14 metros PSI de ciclópeo, están en el PR 15+810 y conjuntamente está en el orden de las cunetas que son de 21 metros PSI, en estos momentos están 276 metros lineales.</p> <p>La Interventoria le pregunta al Contratista que acciones han tomado para mejorar esos rendimientos y llegar prontamente se espera que sea esta semana, alcanzar los rendimientos que se requiere para llegar a la final de la obra.</p> <p>Toma la palabra la ingeniera Aura Cristina Torres comenta con respecto al avance se esta ejecutando 10 metros lineales por día, se tienen dos cuadrillas, una en la parte de huellas y la otra está en bordillo cuneta, se tiene planteado terminar en 35 días con ese avance diario, el día de ayer se dio respuesta al oficio enviado por Interventoria donde se especificó el avance, que se tiene un avance hasta el día de ayer del 51%, no el 37% como se estipuló anteriormente.</p> <p>La Interventoria comenta con la manifestación que hacer el Contratista en el oficio corresponda a la realidad, está en revisión y en el momento que se termine la revisión que se este de acuerdo con el Contratista se informara de manera oficial.</p> <p>Se continua con el componente Ambiental, la ingeniera Katherine Navarro comenta que en el día de hoy recibió por parte del profesional Ambiental del Contratista el borrador las observaciones subsanadas están pendientes por revisar, son cosas muy mínimas que hacen falta, falta incluirlas en el documento para poder del aprobado lo más pronto posible ya que lleva varias versiones y no se ha dado el respectivo aprobado.</p> <p>El ingeniero Leonardo Carrascal comenta que el profesional Ambiental el ingeniero Fabian Gallardo, no se pudo conectar porque tenia otro compromiso a esta misma hora, sin embrago comento que había entregado esa información.</p> <p>La Interventoria aclara que el PAGA es un documento de obligatorio cumplimiento, segundo hace parte de los documentos contractuales previos a la etapa de liquidación, si el documento no esta aprobado y no se ha implementado de manera correcta y su implementado no goza de aprobación junto con los informes trimestrales el contrato no puede ser liquidado. Una vez la Interventoria de su aprobación inmediatamente el documento debe remitirse al gestor Ambiental del INVIAS y debe generar aprobación, eso puede tardar unos días más.</p> <p>La Interventoria le pregunta al ingeniero Fernando Carrascal para cuando tiene la subsanación de las observaciones de la manera total y completa para que se pueda tener una versión completa del PAGA.</p> <p>El ingeniero Fernando Carrascal se compromete presionar al profesional Ambiental Fabian Gallardo para que el próximo comité se tenga todos los puntos subsanados para su revisión y aprobación para pasarlo al INVIAS.</p> <p>Se continua con el componente Social, el profesional Anuar Cabarcas comenta que en cuanto al componente Social del PAGA como mencionó en el comité de la semana pasada el Contratista ya subsano todos los puntos indicados por la Interventoria, el Contratista ya envió las actas de vecindad del Lago, de la Samaritana, las actas de compromisos de los diferente propietarios de las viviendas, se viene cumpliendo con el Plan de Gestión Social, falta por subsanar los Certificados o los soportes de los trabajadores en obra donde se muestre que ellos hacen parte del programa de contratación de obra no calificada, recordarle al Contratista la capacitación con el comité de la veeduría ciudadana que se debe realizar de manera mensual, el mes pasado se adelantó una reunión con ellos, de igual manera se debe tener informada a la comunidad los diferentes medios de comunicación donde se pueden acercar si tienen algún tipo de quejas o reclamos, ya sea repartiendo volantes, folletos o visitando casa por casa.</p> <p>Damos por terminado el comité de seguimiento del día de hoy, feliz día para todos.</p>			

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4 de 4
		FECHA	11/05/2023 (Día / Mes / Año)
COMPROMISOS PACTADOS		FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Informe Hidraulico		12/05/2023	INTERVENTORIA
Informacion SST		15/05/2023	CONTRATISTA
PAGA		18/05/2023	CONTRATISTA
FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA		18/05/2023 (Día / Mes / Año)	
NOTAS:			
1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.			
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.			
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.			
LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:			
NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LEONARDO CARRASCAL	INGENIERO DE APOYO	CONSORCIO OK 2022	
DIEGO PEDRAZA	DIRECTOR	GAVINCO S.A.S.	
LUIS EDUARDO ESTUPIÑAN	INSPECTOR	GAVINCO S.A.S.	
RUBIELA MOLINA	PROFESIONAL SST	GAVINCO S.A.S.	
MAURICIO RODRIGUEZ	INGENIERO DE APOYO	INSTITUTO TERRITORIAL DE VIAS	
KATHERINE NAVARRO	INGENIERA AMBIENTAL	GAVINCO S.A.S.	
ANUAR CABARCAS	PROFESIONAL SOCIAL	GAVINCO S.A.S.	
AURA CRISTINA TORRES	AUXILIAR RESIDENTE	CONSORCIO OK 2022	
FERNANDO CARRASCAL	INGENIERO DE APOYO	CONSORCIO OK 2022	
LISED ARENAS	SUPERVISOR	MUNICIPIO	
VICTOR SANTOS	INGENIERO DE APOYO	GAVINCO S.A.S.	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial			

- **Aura Cristina (Invitado)**
Invitado de la reunión   
- **MEET GAVINCO INGENIEROS CO...**
Organizador 
- **Anuar Cabarcas (Invitado)**
Invitado de la reunión 
- **Camilo Forero (Invitado)**
Invitado de la reunión 
- **Cristian Mauricio Rodriguez Ace...**
Externo 
- **Diego Pedraza (Invitado)**
Invitado de la reunión 
- **Katherine Navarro (Invitado)**
Invitado de la reunión 
- **katherine navarr... (Invitado)**
Invitado de la reunión **En espera**
- **LAURA DANIELA BARAHONA CA...**
Externo 
- **Lised Arenas (Invitado)**
Invitado de la reunión 
- **luis estupiñan (Invitado)**
Invitado de la reunión 
- **RUBIELA (Invitado)**
Invitado de la reunión 



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 4

FECHA 18/05/2023
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 26
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNT.3879052 MUNICIPIO DE OCAÑA
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO OK 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRISON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se presentan los compromisos adquiridos en el comité de obra No. 26, los cuales se encuentran en el siguiente estado:

Se dio cumplimiento a:

-Componente Social.

No se han cumplido:

-PAGA.

-Topografía.

-Rendimientos Financieros.

-Informe Hidráulico.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Compromisos
- Aspectos técnicos
- Avance de entrega documental etapa Preconstrucción
- Temas pendientes próximo comité



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 de 4

FECHA 18/05/2023

(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo el 18 de mayo de 2023, la Interventoría a través de la coordinadora del Proyecto la ingeniera Martha Soriano, da inicio al comité de seguimiento No. 26.

El objetivo de este comité es revisar los compromisos de la semana anterior, luego las cifras del avance, la entrega documental etapa pre construcción, luego de como se ha avanzado con la revisión de Estudios y Diseños, hacer una verificación de las actividades en obra de la semana anterior y luego haremos revisión de tres componentes el área SST, el área Ambiental y el área Social.

La Interventoria comenta que hay un compromiso por parte del municipio del Proceso Contratación Alcantarillado Juan XXIII se le pregunta a la ingeniera Lised Arenas como va este proceso, en esta semana se envió un oficio solicitando que por favor informaran cuando va hacer la adjudicación del contrato y que fecha se va iniciar las obras teniendo en cuenta que el contrato se vence el próximo 30 de junio de 2023, lo mas probable es que no se haga más Prórroga al contrato.

La ingeniera Lised Arenas comenta que afortunadamente el municipio tiene la disponibilidad presupuestal el proceso se va realizar de forma directa, el día de ayer entregaron la disponibilidad presupuestal, hoy queda asignado el recurso para que pueda iniciar a ejecutar, en este orden de ideas, teniendo en cuenta que el proceso el cambio de red de alcantarillado tiene incluida las actividades demolición de pavimento, la ingeniera Lised Arenas solicita por medio de este comité al Contratista y a la Interventoria que den la autorización para que el Contratista inicie las actividades demolición y excavaciones de este tramo de vía.

Toma la palabra el Contratista pregunta que si el documento de parte del municipio del convenio ya esta firmado en este momento hoy 18 de mayo de 2023.

La ingeniera Lised Arenas comenta que el día de ayer salió la disponibilidad, hoy queda firmado el documento del convenio.

La Interventoria le pregunta al Contratista si para el día martes 23 de mayo de 2023 tienen la disponibilidad para poder hacer las actividades demolición, para que el día miércoles 24 de mayo de 2023 para que el Contratista comience con las actividades de la red de alcantarillado.

El Contratista comenta que a partir de hoy va oficiar directamente a ESPO porque en esa excavación se va encontrar con la tubería del acueducto que esta es asbesto cemento, ya que se va realizar el reemplazo de esa tubería de acueducto la empresa de ESPO haga el acompañamiento para que cierren las válvulas que tengan intervención con esta calle.

Se da continuidad con otro compromiso por parte del municipio la realización de la Devolución de los Rendimientos Financieros le pregunta a la ingeniera Lised Arenas en qué estado se encuentra la Devolución de estos Rendimientos.

La ingeniera Lised Arenas comenta que el mes de abril de 2023 el banco hizo el reporte de la Devolución de los Rendimientos Financieros, pero no tenia claro si eran del mes de abril de 2023 o era un acumulado desde diciembre de 2022 y había solicitado en el área de contabilidad el informe para poder hacer llegar a la Interventoria, está a la espera del informe, afirma que la contadora envió un pantallazo del movimiento del banco.

La Interventoria comenta que estaba pendiente la entrega del arte de la Valla por parte del Contratista la cual ya fue entregada al INVIAS, también comenta que estaba pendiente la entrega de información SST por parte del Contratista ya hizo la respectiva entrega del documento, por parte de la Interventoria se tenia el compromiso realizar la revisión de la programación enviada por el Contratista ya fue revisada y aprobada, al igual que la Topografía fue revisada se hizo algunas observaciones.

Se continua con el avance del proyecto con corte al 11 de mayo de 2023, el cual se tiene un programado 53.95% y un ejecutado de 46,76% con un atraso de 7,20% se aclara que este porcentaje ejecutado ya está actualizado con las actas de recibo parcial presentada por el Contratista.

La Interventoria continua con el avance de entrega documental etapa pre construcción la mayoría ya están aprobados, en excepción el PAGA en estos momentos se encuentra en revisión por parte de Interventoria después que el Contratista hizo entrega el día 16 de mayo de 2023 se compromete dar respuesta la próxima semana.

En cuanto al avance de entrega documental revisión de Estudios y Diseños con respecto a la Topografía tiene observaciones desde el 12 de mayo de 2023 se le pregunta al Contratista para cuando tiene las subsanaciones de las observaciones.

El Contratista afirma que entrego las subsanaciones de las observaciones de la Topografía el día 16 de mayo de 2023.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 de 4

FECHA 18/05/2023
(Día / Mes / Año)

El Informe Hidráulico se encuentra con observaciones la cual será subsanada apenas hagan entrega de los planos record.

Se continua con el capítulo de las actividades en obra, la ingeniera Adriana Gutiérrez De Piñeres comenta con respecto a las actividades en obra de esta semana se tiene un avance de 70 metros lineales de huella por lo que se va fundir el día de hoy.

Toma la palabra la ingeniera Aura Cristina Torres comenta que las cunetas están atrasadas, no han podido conseguir personal en Ocaña, ya hay dos oficiales uno se va ir a un costado, el otro se va cuneta derecha e izquierda con el fin de avanzar, no se ha podido avanzar porque no hay ayudantes de obra.

Se da continuidad a la información SST, la inspectora Rubiela Molina comenta que hace ocho días había un compromiso que era la entrega de la subsanación del informe del mes de abril de 2023, el compromiso era entregar el día lunes 15 de mayo de 2023, no se cumplió ese día pero lo entregaron en el transcurso de la semana ya se le dio respuesta en el día de hoy se le envía el oficio para generar unas nuevas observaciones de esas subsanaciones, agradece apenas llegue el oficio por favor dar respuesta para al final poder dar el aprobado.

Se continua con el componente Ambiental, la ingeniera Katherine Navarro comenta que el día martes 16 de mayo de 2023 recibió por parte del Contratista el documento PAGA, el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoria, el día de mañana se estará enviando respuesta con un oficio con observaciones a subsanar o en su defecto el aprobado.

La Interventoria continua con el componente Social, el profesional Anuar Cabarcas comenta que ha tenido conversaciones con la profesional Social del Contratista, se solicita los Certificados del personal que esta trabajando en obra, eso lo pueden adelantar en la alcaldía municipal, secretaria de desarrollo comunitario, en cuanto al alcantarillado de Juan XXIII les recuerda que antes de iniciar el trabajo se debe realizar una reunión a la comunidad donde se les informa que se va realizar en ese tramo y los cortes de agua que se va realizar, mantener informado ya sea por volantes los días y las horas que se van a cortar el agua, recordarles que se debe mantener en los sitios donde se llevó a cabo la cartelera informativa, se debe informar a la Interventoria sobre las diferente PQRS que se presenten ya sea de manera verbal o por medio de documentos.

La Interventoria le pregunta al Contratista si en el transcurso del proyecto se haya presentado algunas PQRS y si es así por favor enviar la información para nuestro conocimiento.

El Contratista comenta que el tramo de la Samaritana al inicio se presento un PQRS por cuenta del señor Viviano que fue el que colaboró con el almacenaje de los materiales de construcción e hizo una solicitud que es su ingreso a su vivienda que tuviera una cuneta más.

Damos por terminado el comité de seguimiento en el día de hoy, feliz día para todos.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día / Mes / Año)	RESPONSABLES
Actividades red de alcantarillado	24/05/2023	CONTRATISTA
PAGA	19/05/2023	INTERVENTORIA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 25/05/2023
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtir de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LEONARDO CARRASCAL	INGENIERO DE APOYO	CONSORCIO OK 2022	

	<p align="center">INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</p> <p align="center">PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</p> <p align="center">MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</p> <p align="center">ACTA DE COMITÉ DE OBRA</p>		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	4 de 4

			FECHA	18/05/2023
			(Día / Mes / Año)	
.....	COORDINADORA DEL PROYECTO			
MARTHA SORIANO		GAVINCO S.A.S.		
.....	INSPECTOR SST			
CAMILO FORERO		CONSORCIO OK 2022		
.....	PROFESIONAL SST			
RUBIELA MOLINA		GAVINCO S.A.S.		
.....	INGENIERA AMBIENTAL			
FABIAN GALLARDO		CONSORCIO OK 2022		
.....	INGENIERA AMBIENTAL			
KATHERINE NAVARRO		GAVINCO S.A.S.		
.....	PROFESIONAL SOCIAL			
ANUAR CABARCAS		GAVINCO S.A.S.		
.....	AUXILIAR RESIDENTE			
AURA CRISTINA TORRES		CONSORCIO OK 2022		
.....	INGENIERO DE APOYO			
FERNANDO CARRASCAL		CONSORCIO OK 2022		
.....	SUPERVISOR			
LISED ARENAS		MUNICIPIO		
.....	INGENIERO RESIDENTE			
ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES		GAVINCO S.A.S.		
.....	INGENIERO DE APOYO			
JUDITH MORALES		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
.....	DIRECTOR DE OBRA			
LUIS JAVIER CARRASCAL		CONSORCIO OK 2022		

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

En esta reunión (14)



MEET GAVINCO INGENIEROS CO...

Organizador



Anuar Cabarcas ... (Invitado)

Invitado de la reunión



Aura Cristina (Invitado)

Invitado de la reunión



Camilo Forero (Invitado)

Invitado de la reunión



Fanny Amaya (Invitado)

Invitado de la reunión



Fernando C (Invitado)

Invitado de la reunión



Ing Adriana (Invitado)

Invitado de la reunión



Ing Fabian Galla... (Invitado)

Invitado de la reunión



Judith Morales (INVIAS) (Invitado)

Invitado de la reunión



ado



ESP

8:12 a. m.

18/05/2023





Ing Adriana (Invitado)

Invitado de la reunión



Ing. Fabian Galla... (Invitado)

Invitado de la reunión



Judith Morales (INVITAS) (Invitado)

Invitado de la reunión



Katherine Navarro (Invitado)

Invitado de la reunión



Leonardo Carras... (Invitado)

Invitado de la reunión



Lised Arenas (Invitado)

Invitado de la reunión



LUIS CARRASCAL...

Invitado de la reunión



RUBIELA MOLINA (Invitado)

Invitado de la reunión



➤ Otros invitados (1)



Daniela Reyes

Sin respuesta



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 4

FECHA 25/05/2023
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 27
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNT.3879052 MUNICIPIO DE OCAÑA
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO OK 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRISON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se presentan los compromisos adquiridos en el comité de obra No. 27, los cuales se encuentran en el siguiente estado:

Se dio cumplimiento a:

- Proceso contratación alcantarillado Juan XXIII.
- Reprogramación.
- Topografía.
- Información SST.

No se han cumplido:

- Arte de la Valla.
- Inicio de Actividades de demolición de Juan XXIII.
- Rendimientos Financieros.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Compromisos
- Aspectos técnicos
- Avance de entrega documental etapa Preconstrucción
- Temas pendientes próximo comité



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 de 4

FECHA 25/05/2023

(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo el 25 de mayo de 2023, la Interventoría a través de la coordinadora del Proyecto la ingeniera Martha Soriano, da inicio al comité de seguimiento No. 27.

El objetivo de este comité es revisar los compromisos de la semana anterior, luego las cifras del avance, la entrega documental etapa pre construcción, luego de como se ha avanzado con la revisión de Estudios y Diseños, hacer una verificación de las actividades en obra de la semana anterior y luego haremos revisión de tres componentes el área SST, el área Ambiental y el área Social.

La Interventoria le pregunta al Contratista respecto a las labores logísticas para el inicio de la actividad de la demolición de Juan XXIII.

El Contratista comenta ya se tiene la maquinaria en el sitio, la retro, volquetas y personal, en estos momentos están radicando el oficio del PMT, el día de hoy se comienza a romper las losas, una vez radicado el oficio se envía copia a Interventoria.

La Interventoria le solicita al Contratista ajustar el Plan de Contingencia en la que se pueda contemplar esa simultaneidad y se pueda permitir llegar a la fecha final del contrato con la ejecución del 100% de las actividades. Teniendo en cuenta que no va haber mas Prórroga, este contrato tiene una fecha de terminación del 29 de junio de 2023.

El Contratista se compromete colocar en el Plan de Contingencia este nuevo frente con esto nos va aumentar la ejecución de obra porque ya se tiene la Samaritana en conjunto con el frente de Juan XXIII en ese orden se hará llegar una nueva reprogramación contemplando los dos frentes activos para fecha de cierre del 29 de junio de 2023.

El Contratista se compromete hacer entrega del Plan de Contingencia el día martes 30 de mayo de 2023.

La Interventoria le pregunta al municipio que una vez el Contratista inicie las actividades de demolición cual es el plazo contractual para la ejecución del alcantarillado, hace la aclaración que son dos contratos independiente, el contratos de alcantarillado es un contrato que se genero directamente de la alcaldía porque no involucra el alcance el objeto de este comité, siendo un contrato independiente y sabiendo que la ejecución de este contrato depende de esa ejecución se pregunta la fecha prevista de inicio de actividades físicas y cuál es la terminación.

Toma la palabra la ingeniera Yessica Carreño comenta que teniendo en cuenta que el municipio tiene un convenio con la junta de acción comunal, este convenio existe para hacer la reposición de todo sistema de acueducto y alcantarillado, ya se firmó ese convenio la semana pasada y el día de ayer se realizó el respectivo pago, este convenio tiene una duración de dos meses de ejecución.

La Interventoria le solicita al municipio compartir la programación de ejecución de este contrato de manera tal que todos estén en conocimiento cuales son los plazos y de esta manera el Contratista pueda replicar en su Plan de Contingencia en su reprogramación.

La ingeniera Yessica Carreño se compromete hacer entrega del documento el día 26 de mayo de 2023.

Toma la palabra el ingeniero Wilmar Rangel pregunta que en cuanto tiempo tienen contemplado ejecutar el tema del alcantarillado, cuando sería el inicio y cuantos días se llevarían ellos para la ejecución de la instalación, teniendo en cuenta que el contrato se vence en un mes.

La ingeniera Yessica Carreño comenta que en el convenio tiene un plazo estimado de dos meses como se realiza el desembolso inicial todo el valor del convenio firmado con la junta de acción comunal, teniendo vía libre pueden iniciar inmediatamente las actividades, lo que se demore es la ejecución y la instalación de dichas redes, el inicio depende que el Contratista realice la demolición del pavimento para que entren inmediatamente hacer la instalación de la tubería.

La Interventoria manifiesta una preocupación por los rendimientos financieros que se ha venidos hablando en varios comités, la ingeniera Lised Arenas envió el día martes unos Rendimientos Financieros pero eran repetidos es decir eran octubre, noviembre y diciembre de 2022. ya se había remitido estos rendimientos con un oficio el día 25 de enero de 2023 a la Planta Central. continua en Se continua con las actividades en obra, la ingeniera Adriana Gutiérrez con respecto a Juan XXIII esta a la espera de iniciar actividades ya que se encuentra la maquinaria en el sitio en disposición de las Volquetas y de la Retro, respecto a la Samaritana se ha ido fundiendo la Huella, la contrahuella y las cunetas, esta semana se ejecutó la fundida y la instalación del acero, la cuneta y la huella. La idea de esta semana es nivelar con el PR que se lleva la huella central para dejar el paño completo, también se hizo el levantamiento de chequeo de nivel y toma de datos iniciar los planos record por parte del Contratista del tramo que se ha ejecutado, aproximadamente 250 metros lineales ejecutados. El contratista ha implementado en estos días de lluvia proteger para ir avanzando porque en esa zona llueve ya sea en la mañana o bien sea por las horas de la tarde.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 de 4

FECHA 25/05/2023
(Día / Mes / Año)

La Interventoria le pregunta a la ingeniera Adriana Gutiérrez cual es la longitud terminada desde Placa Huella hacia la fecha.

La ingeniera Adriana Gutiérrez afirma que el Paño completo es de 200 metros lineales, en total son 500 metros lineales.

La Interventoria le solicita al inspector Luis Estupiñán por favor semana a semana reportar actividades completas de la manera que se pueda corroborar, que cada semana se ejecute por lo menos 60 metros lineales es decir para la siguiente semana contemos con un reporte de 260 metros lineales confirmar que el rendimiento esta llegando al final de los tiempos previstos.

El Contratista comenta que en la época de lluvia ha afectado, en ese orden se deja asentado esta situación del régimen de lluvias, esta lloviendo por la mañana y por la tarde, porque toca suspender las obras y poner a la gente a limpiar o hacer otra cosa diferente que no es precisamente la ejecución de la obra como tal, tener presente por parte de todos que la lluvia entorpece directamente a la ejecución de la obra, sin embargo el Contratista está atento a recuperar esos tiempos de la mejor manera.

La Interventoria aclara que la cuenta de los 30 días corresponde a días laborales sin embargo a fecha de hoy son 34 días, recomienda en tener en cuenta esos cuatro días suman mas del 10% de restante plazo contractual, esos cuatro días permiten subsanar los días que el clima no permita trabajar para tenerlo en cuenta.

Se continua con el componente Ambiental, la ingeniera Katherine Navarro comenta que por parte de la Interventoria se encuentra en revisión en el componente PAGA, que fue enviado la semana pasada, se estará enviando el día de mañana las observaciones dadas o aprobado respectivo, cabe mencionar que dentro de los compromisos en obra falta dar las capacitaciones al personal de obra. El Contratista tiene observaciones pendientes por subsanar.

El Contratista se compromete hacer entrega de las subsanaciones de las observaciones del PAGA el día lunes 29 de mayo de 2023.

Respecto al componente social, el profesional Anuar Cabarcas comenta que la visita realizada en obra del día de ayer se dio cuenta que el Contratista si cumple las oficinas de atención al usuario tanto en obra y como oficina propia, la alcaldía municipal cuenta con una oficina donde se recibe PQRS según hablado con la persona encargada de dar seguimiento, en cuanto a los compromisos del Contratista esta en espera de los Certificados del personal que hacen parte de área influencia directa del proyecto e igualmente se dio cuenta en visitas realizadas en ciertas viviendas de JUAN XXIII y hablado con los habitantes de que hay cierta desinformación que se va adelantar en JUAN XXIII y se esta ocasionando que se hagan comentario mal intencionados en cuanto a los recursos que se van a ejecutar,. Se le recomienda al Contratista hacer una campaña de información para los habitantes en el sector de JUAN XXIII donde reparten volantes dando a conocer la línea de atención y correo electrónico donde puedan enviar PQRS. En cuanto a la visita del sector la Samarita el Contratista llevo a tres acuerdos en cuanto a los bordillos de 15 cms que afectaba la entrada y salida de las personas de la tercera edad que habitaban en estas viviendas lo que se genero una cuneta triangular, en esta visita se logró verificar que en la vivienda de la señora Ana Graciela si se cumplió con el compromiso pro en la vivienda del señor Viviano no se adelantó ningún compromiso. Se le pregunta al Contratista para cuando tiene previsto adelantar este compromiso porque el documento del acta enviada por porte de la Interventoria fue el 25 de abril de 2023 y hoy estamos 25 de mayo de 2023 ya hace un mes y no se ha cumplido ese compromiso, para cuando harían este cumplimiento.

La profesional Social del Contratista comenta que la idea es hacer una rampa en el acceso de la vivienda del señor Viviano con material de sub base y luego se hará la intervención con el concreto para cumplir con el compromiso del señor Viviano, se compromete hacer la intervención el día viernes 2 de junio de 2023.

Damos por terminado el comité de seguimiento del día de hoy, se les agradece a todos por su asistencia. Buen día para todos.

COMPROMISOS PACTADOS

FECHA DE CUMPLIMIENTO
(Día / Mes / Año)

RESPONSABLES

Plan de Contingencia	30/05/2023	CONTRATISTA
Informacion SST	2/06/2023	CONTRATISTA
PAGA	29/05/2023	CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA

1/06/2023
(Día / Mes / Año)



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	4 de 4

FECHA 25/05/2023
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtir de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
DIEGO PEDRAZA	DIRECTOR	GAVINCO S.A.S.	
MARTHA SORIANO	COORDINADORA DEL PROYECTO	GAVINCO S.A.S.	
CAMILO FORERO	INSPECTOR SST	CONSORCIO OK 2022	
RUBIELA MOLINA	PROFESIONAL SST	GAVINCO S.A.S.	
YESSICA CARREÑO	INGENIERO DE APOYO	MUNICIPIO	
KATHERINE NAVARRO	INGENIERA AMBIENTAL	GAVINCO S.A.S.	
ANUAR CABARCAS	PROFESIONAL SOCIAL	GAVINCO S.A.S.	
WILMAR RANGEL	GESTOR TECNICO DE PROYECTO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
BRAYAN CAMILO CRIADO	INGENIERO DE APOYO	GAVINCO S.A.S.	
LISED ARENAS	SUPERVISOR	MUNICIPIO	
ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES	INGENIERO RESIDENTE	GAVINCO S.A.S.	
JUDITH MORALES	INGENIERO DE APOYO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
LUIS CARRASCAL	INGENIERO RESIDENTE	CONSORCIO OK 2022	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

-  **MEET GAVINCO INGENIEROS CO...**
Organizador 
-  **Anuar Cabarcas ... (Invitado)**
Invitado de la reunión 
-  **Camilo Forero (Invitado)**
Invitado de la reunión 
-  **Daniel Clavijo - ... (Invitado)**
Invitado de la reunión 
-  **Diego Pedraza (Invitado)**
Invitado de la reunión 
-  **ING. Adriana (Invitado)**
Invitado de la reunión 
-  **Judith Morales (INVIA5) (Invitado)**
Invitado de la reunión 
-  **Katherine Navarro (Invitado)**
Invitado de la reunión 
-  **LUIS CARRASCAL...**
Invitado de la reunión 
-  **luis estupiñan (Invitado)** 

- IA** ING. Adriana (Invitado)
Invitado de la reunión
- JM** Judith Morales ...
Invitado de la reunión
- KN** Katherine Navarro (Invitado)
Invitado de la reunión
- LC** LUIS CARRASCAL ...
Invitado de la reunión
- LE** Luis estupiñan (Invitado)
Invitado de la reunión
- R** RUBIELA (Invitado)
Invitado de la reunión
- W** Wilmar (Invitado)
Invitado de la reunión
- YC** Yessica Carneño (Invitado)
Invitado de la reunión

Otros invitados (1)

- DR** Daniela Reyes
Sin respuesta

INFORMES SEMANALES



PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MAYO DE 2023

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

FECHA		12/05/2023 (Día / Mes / Año)
-------	--	---------------------------------

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.									
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER		SEMANA No.: 30		del 5/05/2023		al 11/05/2023 Último Informe Semanal SI	

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	LEONEL VALERO ESCALANTE	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	WILMAR RANGEL ROPERO	SANTIAGO
------------------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------	-----------------

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA-ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VIA SANTIAGO CUPERENA-ZUL ALTO MUNICIPIO DE SANTIAGO.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

PLACA HUELLA EN LA VIA SANTIAGO CUPERENA-ZUL ALTO MUNICIPIO DE SANTIAGO.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022				INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S			
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No. LP-OP-01-2022		VALOR INICIAL:	\$ 4,430,879,655.00	CONTRATO No. 1053 DE 2022		VALOR INICIAL:	\$ 4,288,164,910.00
FECHA DE INICIO: 18 DE OCTUBRE DE 2022		VALOR ADICIONES:	\$ -	FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2022		VALOR ADICIONES:	\$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 17 DE JUNIO DE 2023		VALOR ACUMULADO:	\$ 4,430,879,655.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024		VALOR ACUMULADO:	\$ 4,288,164,910.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 17 DE JUNIO DE 2023			\$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE 2024		VALOR ANTICIPO:	N/A
			\$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			\$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 4,430,879,655.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 4,430,879,655.00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	40,000,000.000	1,770,000,000.000	2,478,164,910.000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	40,000,000.000	1,770,000,000.000	2,478,164,910.000	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

		OBRA	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$	4,430,879,655.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	3,642,297,821.76	82.20%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):			
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	(3,642,297,821.76)	-82.20%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	47,207,293.62	89.92%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	3,642,297,821.76	82.20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	47,207,293.62	1.07%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	(3,595,090,528.14)	-81.14%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	183,807,739.53	4.15%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	11,029,741.50	0.25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	☐	☒

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Programación aprobada mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-080-22 del 05-Dic-22

INTERVENIORIA							
TOTAL INVERSIÓN	..\$	2,084,556,320.00	48,61%				
PROGRAMADA:							
TOTAL INVERSIÓN	..\$	731,939,024.20	17,07%				
EJECUTADA:							
INVERSIÓN	..\$	65,958,725.00	1,54%				
PROGRAMADA EN LA							
INVERSIÓN	..\$	37,500,000.00	0,87%				
EJECUTADA EN LA							
<table><tr><th>SI</th><th>NO</th></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table>				SI	NO		X
SI	NO						
	X						
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:							
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:							
PERIODO FACTURADO:							
VALOR FACTURA:							
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)							
Observaciones:							

ANTICIPOS	
Otorgado \$	
Amortizado \$	
Saldo \$	

	INDICADOR I/O
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado \$	
Amortizado \$	
Saldo \$	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %	82.73%	Avance o Atraso Físico %	-81.2%	
Meta Física Ejecutada %	1.50%			MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1				100.0%
					Ejec	0.90				89.9%
Construcción De Placa Huella	ML	4997			Prog	3357.50				67.2%
					Ejec					
Construcción De Alcantarillas	UND	12			Prog	11.52				96.0%
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Fier					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: _____ TRAMO Y/O SECTOR 2: _____
 TRAMO Y/O SECTOR (n): _____

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES		DISPONIBLE	
UBICACIÓN: _____ _____ _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		
UBICACIÓN: _____ _____ _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		
OBSERVACIONES: La documentación de acuerdo a permisos ambientales pertinentes para la extracción y explotación de fuente de materiales esta por definir, ya que no coincide la información contemplada en el PAGA (Programa de Adaptación a la Guía Ambiental), con los tramites ambientales presentado.		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ EMISIONES: SI _____ NO _____ OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____	N/A _____ X _____ N/A _____ X _____ N/A _____ X _____ N/A _____ X _____ N/A _____ X _____ N/A _____ X _____ N/A _____ X _____ N/A _____ X _____
OBSERVACIONES: Esta por definir.			

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES
ESTADO:	Documento Observado con oficio GIC-INVIAS-NTS-393-22 del 21-Mar-23	

			V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			OBRA	INTER	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			1	14	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			1	11	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			1	4		
			1	11		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15						
VI. GESTIÓN PREDIAL						
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:			N/A		OBSERVACIONES: N/A	
FICHAS PREDIALES APROBADAS:			N/A			
AVALÚOS APROBADOS:			N/A			
PREDIOS ADQUIRIDOS:			N/A			
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD						
N/A						
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS						
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS						
Esta interventoría a realizado oficios al contrato de la referencia que se relacionan a continuación:						
GIC-INVIAS-NTS-520-22: REITERACION - Evaluación de la Interventoría al respecto de la solicitud del contratista de obra UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022, contrato LP-OP-01-2022 realizada por oficio PHS2022 – 052 – 2022 de fecha abril 17 de 2023 cuyo asunto es: "ENTREGA BALANCE N 02"						
ACTIVIDADES TÉCNICAS						
En espera a que se de el reinicio de las obras físicas del proyecto.						
ACTIVIDADES AMBIENTALES						
Durante la semana la interventoría se encuentra a la espera del reinicio del proyecto, con el fin de recibir las observaciones subsanadas por parte del contratista, en cuanto al PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) y Fuente de materiales.						
ACTIVIDADES SOCIALES						
En espera al reinicio del proyecto para realizar la supervisión de las actividades del Plan de Gestión Social.						
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA						
En espera al reinicio del proyecto para realizar la supervisión de las actividades físicas de la obra.						
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS						
<div><div><div>PROGRAMADO</div><div>EJECUTADO</div></div><div><div></div><div></div></div><div><div>PROGRAMADO</div><div>MANTENIMIENTO</div><div>CONSTRUCCION</div><div>MEJORAMIENTO</div><div>SEÑALIZACIÓN</div><div>TRAMO FUERA DEL</div><div>PUENTE</div></div></div> <div><div>K0+000</div><div>K4+997</div></div>						
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.						
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
<div><div>N.A</div><div>N.A</div><div>N.A</div></div>						
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.						
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA					DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención. Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito. Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.					FIRMA:  NOMBRE: DIEGO FERRÁN PEDRAZA CHAVES Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.						

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-3

VERSIÓN

1

PÁGINA

FECHA

19/05/2023
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 31 del 12/05/2023 al 18/05/2023 Último Informe Semanal Si

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO SANTIAGO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA-ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VIA SANTIAGO CUPERENA-ZUL ALTO MUNICIPIO DE SANTIAGO.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
PLACA HUELLA EN LA VIA SANTIAGO CUPERENA-ZUL ALTO MUNICIPIO DE SANTIAGO.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

INTEGRANTES:

CONTRATO No. LP-OP-01-2022 VALOR INICIAL: \$ 4,430,879,655.00

CONTRATO No. 1053 DE 2022 VALOR INICIAL: \$ 4,288,164,910.00

FECHA DE INICIO: 18 DE OCTUBRE DE 2022 VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2022 VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 02 DE JULIO DE 2023 VALOR ACUMULADO: \$ 4,430,879,655.00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024 VALOR ACUMULADO: \$ 4,288,164,910.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 02 DE JULIO DE 2023 VALOR ANTICIPO: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: VALOR AMORTIZADO: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 4,430,879,655.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 4,430,879,655.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40,000,000.000	1,770,000,000.000	2,478,164,910.000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	40,000,000.000	1,770,000,000.000	2,478,164,910.000	

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 4,430,879,655.00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 3,821,746,132.96 86.25%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ (3,770,126,942.74) -85.09%

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ (3,821,746,132.96) -86.25%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ 51,619,190.22 98.32%

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 3,821,746,132.96 86.25%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 51,619,190.22 1.16%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ (3,770,126,942.74) -85.09%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 179,448,311.21 4.05%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 4,411,896.60 0.10%

SI NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Programación aprobada mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-080-22 del 05-Dic-22

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN \$ 2,148,902,595.00 50.11%

PROGRAMADA: \$ -

TOTAL INVERSIÓN \$ 756,939,024.20 17.65%

EJECUTADA:

INVERSIÓN \$ 64,346,275.00 1.50%

PROGRAMADA EN LA

INVERSIÓN \$ 66,666,666.67 1.55%

EJECUTADA EN LA

SI NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS

Otorgado \$

Amortizado \$

Saldo \$

INDICADOR I/C

En el mes:

Acumulado:

ANTICIPOS

Otorgado \$

Amortizado \$

Saldo \$

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 90.22% Avance o Atraso Físico % -88.6%

Meta Física Ejecutada % 1.64%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1				100.0%
					Ejec	0.98				98.3%
* Construcción De Placa Huella	ML	4997			Prog	4280.61				85.7%
					Ejec					
* Construcción De Alcantarillas	UND	12			Prog	12.00				100.0%
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR (n): TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora 120H	1	100%
Retrocargador	1	100%
Total		2

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI DISPONIBLE NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES: La documentación de acuerdo a permisos ambientales pertinentes para la extracción y explotación de fuente de materiales esta por definir, ya que no coincide la información contemplada en el PAGA (Programa de Adaptación a la Guía Ambiental), con los tramites ambientales presentado.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A X

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A X

Ocupación de CAUCES: SI NO N/A X

VERTIMIENTOS: SI NO N/A X

EMISIONES: SI NO N/A X

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X

OBSER VACIONES: Esta por definir.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Documento Observado con oficio GIC-INVIAS-NTS-393-22 del 21-Mar-23

OBSERVACIONES

			V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	N/A	OBSERVACIONES: Una vez sea entregado por parte del Contratista la Ubicación del punto de atención a la comunidad se actualizara la información aquí solicitada.	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	1	14	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	N/A		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		11	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	10				
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15						
VI. GESTIÓN PREDIAL						
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:			N/A			
FICHAS PREDIALES APROBADAS:			N/A			
AVALÚOS APROBADOS:			N/A			
PREDIOS ADQUIRIDOS:			N/A			
OBSERVACIONES: N/A						
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD						
N/A						
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS						
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS						
Durante la presente semana se han realizado mesas de trabajo entre el Contratista, Municipio e Interventoría con el fin de revisar el tema referente a la solicitud de reconocimiento de acarreos realizada por el Contratista de obra.						
ACTIVIDADES TECNICAS						
En la presente semana el contratista continua realizandole el respectivo mejoramiento a la via para asi poder ingresar con facilidad al sitio de trabajo, como tambien se observa el ingreso de material para la via en mencion, adicional a esto continuan con la contratacion del personal para la ejecucion del proyecto.						
ACTIVIDADES AMBIENTALES						
La interventoria se encuentra a la espera de recibir documento con las observaciones subsanadas por parte del contratista en cuanto al PAGA (Plan Guia a la Adaptación Ambiental) y fuente de materiales.						
ACTIVIDADES SOCIALES						
Se envía oficio con radicado GIC-INVIAS-NTS-529-22 y asunto "SOLICITUD CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS PREVIOS AL INICIO DE OBRA"; Así mismo, la profesional social del Contratista se comunica de manera telefónica con el área social de Interventoría, con el fin de preguntar sobre las fichas sociales que debe de llevar el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA), los indicadores de los programas y como se deben de implementar en campo.						
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA						
En espera al reinicio del proyecto para realizar la supervisión de las actividades físicas de la obra.						
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS						
<div><div><div>PROGRAMADO</div><div>EJECUTADO</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div>MANTENIMIENTO</div><div>CONSTRUCCION</div><div>MEJORAMIENTO</div><div>SEÑALIZACION</div><div>TRAMO FUERA DEL ALCANCE DEL CONTRATO</div><div>PUENTE</div></div></div></div>						
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.						
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
<div><div>N.A</div><div>N.A</div><div>N.A</div></div>						
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.						
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA			DIRECTOR DE INTERVENTORÍA			
De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención. Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito. Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.			<div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE:</div><div>Matrícula Profesional No.:</div><div><div></div><div>DIEGO EFRAIN PEDRAZA CHAVES</div><div>25202-109359 CND</div></div></div>			
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.						
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.						

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</p> <p style="text-align: center;">PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</p> <p style="text-align: center;">MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</p> <p style="text-align: center;">INFORME SEMANAL</p>	CÓDIGO	MEPI-MN1-RV-15-FR-3
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA		26/05/2023 (Día / Mes / Año)
-------	--	---------------------------------

I. INFORMACION GENERAL									
PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.									
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCION TERRITORIAL:		NORTE DE SANTANDER		SEMANA No.: 32 del 19/05/2023 al 25/05/2023 Último Informe Semanal Si ☐	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:		LEONEL VALERO ESCALANTE		GESTOR TECNICO DE PROYECTO:		WILMAR RANGEL ROPERO		SANTIAGO	
OBJETO CONTRATO DE OBRA:		CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA-ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER							
ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): PLACA HUELLA EN LA VIA SANTIAGO CUPERENA-ZUL ALTO MUNICIPIO DE SANTIAGO.									
DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO:									
PLACA HUELLA EN LA VIA SANTIAGO CUPERENA-ZUL ALTO MUNICIPIO DE SANTIAGO.									

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022				INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S			
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No. LP-OP-01-2022		VALOR INICIAL:	\$ 4.430.879.655,00	CONTRATO No. 1053 DE 2022		VALOR INICIAL:	\$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO: 18 DE OCTUBRE DE 2022		VALOR ADICIONES:	\$ -	FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2022		VALOR ADICIONES:	\$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 02 DE JULIO DE 2023		VALOR ACUMULADO:	\$ 4.430.879.655,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024		VALOR ACUMULADO:	\$ 4.288.164.910,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 02 DE JULIO DE 2023			\$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE 2024		VALOR ANTICIPO:	N/A
			\$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			\$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 4.430.879.655,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 4.430.879.655,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		1.770.000.000,000	2.478.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	40.000.000,000	1.770.000.000,000	2.478.164.910,000	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$	4.430.879.655,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	3.998.689.911,37	90,25%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	38.316.798,00	0,86%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	(3.960.373.113,37)	-89,38%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	51.619.190,22	98,32%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	3.998.689.911,37	90,25%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	89.935.988,22	2,03%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	(3.908.753.923,15)	-88,22%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	176.943.778,41	3,99%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	38.316.798,00	0,86%

SI

NO

X

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____

PERIODO FACTURADO: _____

VALOR FACTURA: \$ _____

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Programación aprobada mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-080-22 del 05-Dic-22

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	2.213.248.870,00	51,61%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	781.939.024,20	18,23%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	\$	64.346.275,00	1,50%
	\$	34.000.000,00	0,79%

SI

NO

X

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____

PERIODO FACTURADO: _____

VALOR FACTURA: _____

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS

Otorgado \$	
Amortizado \$	
Saldo \$	

INDICADOR I/C

En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS

Otorgado \$	
Amortizado \$	
Saldo \$	

Meta Física Programada % 90,22%

Meta Física Ejecutada % 1,96%

Avance o Atraso Físico % -88,3%

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1				100,0%
					Ejec	0,98				98,3%
					Prog	4280,61				85,7%
Construcción De Placa Huella	ML	4997			Ejec	47,51647				1,0%
					Prog	12,00				100,0%
					Ejec					
Construcción De Alcantarillas	UND	12			Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motorizadora 120H	1	100%
Retrocargador	1	100%
Vibrocompactador	1	100%
Total		3

Equipo mínimo corresponde al existido en el pleigo de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: _____

TRAMO Y/O SECTOR (n): _____

TRAMO Y/O SECTOR 2: _____

IV. GESTIÓN AMBIENTAL							
FUENTES DE MATERIALES				PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL			
				<u>DISPONIBLE</u>			
UBICACIÓN:	:	PERMISO MINERO:	SI _____ NO _____		N/A	X	
:	:	LICENCIA AMBIENTAL:	SI _____ NO _____		N/A	X	
UBICACIÓN:	:	PERMISO MINERO:	SI _____ NO _____		N/A	X	
:	:	LICENCIA AMBIENTAL:	SI _____ NO _____		N/A	X	
OBSERVACIONES:				OBSERVACIONES:			
La documentación de acuerdo a permisos ambientales pertinentes para la extracción y explotación de fuente de materiales estapor definir, ya que no coincide la información contemplada en el PAGA (Programa de Adaptación a la Guía Ambiental), con los tramites ambientales presentado.				Esta por definir.			

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES
ESTADO:	Documento Observado con oficio GIC-INVIAS-NTS-393-22 del 21-Mar-23	

V. GESTIÓN SOCIAL				
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A OBSERVACIONES: Una vez sea entregado por parte del Contratista la Ubicación de los puntos de atención a la comunidad, se actualizará la información aquí solicitada. En espera del inicio de la obra.	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	15		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6	11		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	4		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:		21		
VI. GESTIÓN PREDIAL				
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A		OBSERVACIONES: N/A	
FICHAS PEDIALES APROBADAS:	N/A			
AVALÚOS APROBADOS:	N/A			
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A			
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD				
N/A				
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS En la presente semana se enviaron oficios al contratista que se relacionan a continuación: GIC-INVIAS-NTS-554-22 DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ENTREGAR AL INICIO Y DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO. GIC-INVIAS-NTS-571-22 SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA				
ACTIVIDADES TÉCNICAS En la presente semana se realizaron actividades de perfilado, nivelacion, cunetaje y compactacion de la subrasante, se instalaron 234 m3 de subbase granular, se realiza el cerramiento del lote para acopio del material en el K1+000, se continua con el acopio del material granular (arena, triturado y subbase)				
ACTIVIDADES AMBIENTALES La interventoria se encuentra a la espera de recibir documento con las observaciones subsanadas por parte del contratista en cuanto al PAGA (Plan Guia a la Adaptación Ambiental) y fuente de materiales.				
ACTIVIDADES SOCIALES Se realizó una reunión vía meet con la profesional social del Contratista, donde se trataron temas tales como los indicadores que deben de llevar los cinco (5) programas de Gestión Social a ejecutarse en el área de influencia del proyecto, de igual manera, se le informó a la profesional que debe de ajustar ciertos ítems de la descripción del AID y la caracterización socioeconómica realizada. Por otra parte, en la misma mesa de trabajo, se le indico sobre la importancia de realizar el levantamiento de las actas de vecindad, realizar la consulta previa ante el Ministerio del Interior, la elaboración de actas de compromiso y adelantar el proceso con la Alcaldía Municipal o con las Juntas de Acción Comunal para el certificado de territorialidad o constancia que soporte que el personal contratado hace parte del AID.				
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
Continuar con la supervisión a las actividades ejecutadas por el contratista.				
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS				
<div><div><div>PROGRAMADO</div><div>EJECUTADO</div></div><div><div></div><div></div></div><div><div>PROGRAMADO</div><div>MANTENIMIENTO</div><div>CONSTRUCCION</div><div>MEJORAMIENTO</div><div>SEÑALIZACION</div><div>TRAMO FUERA DEL ALCANCE DEL CONTRATO</div><div>PUENTE</div></div></div>				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.				
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO				
<div><div></div><div></div><div></div></div>				
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		
Nosotros como interventoria exigire celeridad al contratista en cuanto a la ejecución del proyecto, ya que es indispensable el avance de la obra física para que puedan cumplir con las obligaciones contractuales.		FIRMA NOMBRE: DIEGO EFRAIN PEDRAZA CHAVES Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND		
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.				

V. GESTIÓN SOCIAL		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	15
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6	11
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	10
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:		21
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1		
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A		
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A		
OBSERVACIONES: Una vez sea entregado por parte del Contratista la Ubicación de los puntos de atención a la comunidad, se actualizará la información aquí solicitada. En espera del inicio de la obra.		
VI. GESTIÓN PREDIAL		
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A	OBSERVACIONES: N/A
FICHAS PEDIALES APROBADAS:	N/A	
AVALÚOS APROBADOS:	N/A	
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A	
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD		
N/A		
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
ACTIVIDADES TÉCNICAS En la presente semana se presentaron fuertes lluvias en el sector de cuperena zul alto lo que ocasiono atraso en el avance del proyecto, ya que el material instalado de subbase granular fue arrastrado por el invierno ocasionado en estos dias, se observan las volquetas llevando el material de subbase granular, triturado y arena al acopio denominado el mamon, ubicado en el K1+000.		
ACTIVIDADES AMBIENTALES Durante la semana, se realizó visita a la triturado Concretos y Triturados El Zulia SAS (CTZ), con el fin de verificar información en cuanto a la FUENTE DE MATERIALES, se realizó visita a la obra ubicada en la vereda Cuperena, Zul Alto, del municipio, llevando a cabo el respectivo seguimiento que debe ejecutar el contratista en obra referente a los proyectos contemplados en cada programa del Plan de Adaptacion a la Guia Ambiental (PAGA), enfocado en el componente ambiental.		
ACTIVIDADES SOCIALES El Contratista realiza una reunión vía meet con el profesional social de Interventoría, con motivo de dar claridad a los programas de Gestión Social a ejecutarse, el cronograma de los mismos y los indicadores para el correspondiente seguimiento;.		
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
Continuar con la supervisión a las actividades ejecutadas por el contratista.		
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS		
<div><div><div>PROGRAMADO</div><div>EJECUTADO</div></div><div><div><div>K0+000</div><div>K4+997</div></div><div><div></div><div></div></div></div></div> <div><div>PROGRAMADO</div><div>MANTENIMIENTO</div><div>CONSTRUCCION</div><div>MEJORAMIENTO</div><div>SEÑALIZACION</div><div>TRAMO FUERA DEL ALCANCE DEL CONTRATO</div><div>PUENTE</div></div>		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.		
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
Descargue de material triturado.	Terreno a conformar para construccion de placa huella.	Ubicación de segundo guarda ganado para incluirlo dentro de la placa huella
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Nosotros como interventoria exigirle celeridad al contratista en cuanto a la ejecucion del proyecto, ya que es indispensable el avance de la obra fisica para que puedan cumplir con las obligaciones contractuales.		FIRMA NOMBRE: DIEGO EFRAIN PEDRAZA CHAVES Matricula Profesional No.: 25202-109359 CND
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.		

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</p> <p style="text-align: center;">PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</p> <p style="text-align: center;">MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA</p> <p style="text-align: center;">INFORME SEMANAL</p>	CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA		5/05/2023 (Día / Mes / Año)
-------	--	--------------------------------

I. INFORMACIÓN GENERAL									
PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.									
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER			SEMANA No.: 27 del 28/04/2023 al 4/05/2023. Último Informe Semanal Si ☐		(Numeración consecutiva)		
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO			OCAÑA				
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRISON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.									
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRISON.									

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
Construcción de Placa Huella rural, Actividades de Parcheo, Construcción de Alcantarillas en puntos críticos para el manejo de escorrentía y Muros en Gaviones para contención de taludes en el corredor vial OCAÑA-LIMITES-MORRISON.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CO1PCCNTR.3879052	VALOR INICIAL:	\$ 1.711.146.620,00	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	\$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	1 DE NOVIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	\$ -	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	\$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	3 DE ABRIL 2023	VALOR ACUMULADO:	\$ 1.711.146.620,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	\$ 4.288.164.910,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	3 DE ABRIL 2023		\$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
			\$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			\$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1.711.146.620,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 1.711.146.620,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 40.000.000	\$ 1.770.000.000	\$ 2.478.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 40.000.000	\$ 1.770.000.000	\$ 2.478.164.910	
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					

OBRA						
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 1.711.146.620,00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 1.685.717.544,00	98,51%				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 670.619.579,12	39,19%				
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ (1.015.097.964,88)	-59,32%				
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	\$ 10.958.472,00	88,24%				
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 1.685.717.544,00	98,51%				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 681.578.051,12	39,83%				
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ (1.004.139.492,88)	-58,68%				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 20.000.000,00	1,17%				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 42.981.432,72	2,51%				
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	<table border="1" style="display: inline-table; width: 100px;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">SI</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>	SI	NO		X	
SI	NO					
	X					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____						
PERIODO FACTURADO: _____						
VALOR FACTURA: \$ _____						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)						
Observaciones: Programación aprobada con comunicado GIC-INVIAS-NTS-098-22 del 16-Dic-2022						

INTERVENTORIA						
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 1.886.680.145,00	44,00%				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 588.526.419,40	13,72%				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN	\$ 65.958.725,00	1,54%				
EJECUTADA EN LA INVERSIÓN	\$ 37.087.912,09	0,86%				
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	<table border="1" style="display: inline-table; width: 100px;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">SI</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>	SI	NO		X	
SI	NO					
	X					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____						
PERIODO FACTURADO: _____						
VALOR FACTURA: _____						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)						
Observaciones:						

ANTICIPOS	
Otorgado \$	
Amortizado \$	
Saldo \$	

INDICADOR I/C
En el mes:
Acumulado:

ANTICIPOS	
Otorgado \$	
Amortizado \$	
Saldo \$	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

96,75%

Avance o Atraso Físico %

-92,99%

Meta Física Ejecutada %

3,76%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1.00				100,0%
					Ejec					
Parcheo y/o Bacheo	M3	730			Prog	690,00				94,5%
					Ejec					
Construcción De Muro De Contención (GAVION)	UND	4			Prog	4.00				100,0%
					Ejec					
Construcción De Alcantarillas	UND	4			Prog	3.80				95,0%
					Ejec					
Construcción De Placa Huella	ML	692			Prog	652,00				94,2%
					Ejec	130,00				18,8%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
COMPACTADOR WACKER		1
PAJARITA CAT 416E		1
CORTADORA DE ASFALTO		1
CACORRO PARA ASFALTO		1
MOTONIVELADORA		1
VIBROCOMPACTADOR		1
Total		6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pleigo de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL										
FUENTES DE MATERIALES					PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN:		RICARDO CASADIEGO SANJUAN			DISPONIBLE					
		Vereda el Hatillo y la Madera			PERMISO MINERO: SI		X		NO	
					LICENCIA AMBIENTAL: SI		X		NO	
UBICACIÓN:		N/A			PERMISO MINERO: SI				NO	
					LICENCIA AMBIENTAL: SI				NO	
OBSERVACIONES:					OBSERVACIONES:					
El municipio de Ocaña cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO.					Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto					

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Entregado por el Contratista el pasado 8 de noviembre de 2022. Observada por parte de la Interventoría.
ESTADO:	OBSERVACIONES CON EL COMUNICADO GIC-INVIAS-NTS-338-22	

V. GESTIÓN SOCIAL				
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10	15	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	N/A
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	8	11	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	3
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	4		
	10	10		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 25				
VI. GESTIÓN PREDIAL				
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A	OBSERVACIONES: N/A		
FICHAS PEDIALES APROBADAS:	N/A			
AVALÚOS APROBADOS:	N/A			
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A			
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD				
N/A				
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
Se llevo a cabo comité de obra No. 24 el 04 de mayo de 2023				
1.GIC-INVIAS-NTS-483-22, INSTRUCTIVO ELABORACION ARTE VALLA IDENTIFICATIVA				
2.GIC-INVIAS-NTS-491-22, NCUPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL COMPONENTE AMBIENTAL				
3.GIC-INVIAS-NTS-492-22, SOLICITUD INFORMACIÓN INTERVENCIÓN SEGUNDO TRAMO TUBERIA DE GRESS JUAN XIII				
4.GIC-INVIAS-NTS-493-22, REITERACION SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1758 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE OCAÑA				
ACTIVIDADES TÉCNICAS				
Durante la presente semana se llevaron a cabo las siguientes actividades:				
Actividad placa huella La Samaritana, se realizan trabajos de instalación y compactación de subbase PR 15+0600 al PR 15+0440, Fundida de cuneta completa (margen derecho e izquierdo) hasta el PR 15+0694, Fundida de huella y contra huella hasta el PR 15+0660.				
ACTIVIDADES AMBIENTALES				
Durante la semana en el componente ambiental se les envía oficio al contratista por parte de la interventoría donde se menciona el INCUMPLIMIENTO, ya que no se tenida ninguna respuesta sobre las observaciones subsanadas en el PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) y los compromisos que se adquirieron en obra cuando se realizo la visita en el mes de marzo.				
ACTIVIDADES SOCIALES				
Es enviado por parte del Contratista las Actas de Vecindad del corredor vial, vereda La Samaritana, para la correspondiente revisión por parte de esta Interventoría.				
La Interventoría realiza observaciones puntuales a las Actas de Vecindad recibidas por el Contratista del sector, vereda La Samaritana; estas son subsanadas, no se tiene objeción de las mismas.				
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
Se realizara la ejecución de placa huella sector La Samaritana en instalación y compactación de subbase, instalación de acero y fundida en concreto hidráulico en cuneta, huella, contra huella y viga riostra.				
Se procederá con la revisión detallada y si es el caso la aprobación de la documentación entregada por el Contratista.				
Realizar seguimiento de la documentación aprobada al contratista para inicio a las actividades de construcción en campo.				
Seguimiento a la alcaldía en cuanto a la devolución de rendimientos financieros.				
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS				
<div><div><div>PARCHEO Y BACHEO</div><div>PROGRAMADO</div><div>EJECUTADO</div></div><div><div>MEJORAMIENTO</div><div>PROGRAMADO</div><div>EJECUTADO</div></div></div> <div><div>MANTENIMIENTO</div><div>CONSTRUCCION</div><div>MEJORAMIENTO</div><div>SEÑALIZACION</div><div>TRAMO FUERA DEL ALCANCE DEL CONTRATO</div><div>PUENTE</div></div>				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.				
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO				
<div><div></div><div></div><div></div></div>				
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA				
De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.				
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.				
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.				
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA				
FIRMA				
NOMBRE: DIEGO EFRAIN PEDRAZA CHAVES				
Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND				

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 3

OBSERVACIONES: El contratista cuentas con tres (3) puntos de atención a la comunidad, uno en punto de obra en la vereda la Samaritana, un segundo en la Alcaldía de Ocaña y el último en las instalaciones del Consorcio OK.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se llevo a cabo comité de obra No. 26 el 18 de mayo de 2023

- 1.GIC-INVIAS-NTS-536-22, COMPONENTE DE TOPOGRAFIA – OBSERVACIONES 6
- 2.GIC-INVIAS-NTS-537-22, REITERACION OFICIO GIC-INVIAS-NTS-492-22 DE FECHA 04 DE MAYO DE 2023, CUYO ASUNTO ES:” SOLICITUD INFORMACION INTERVENCIÓN SEGUNDO TRAMO TUBERIA DE GRESS JUAN XIII
- 3.GIC-INVIAS-NTS-538-22, REPROGRAMACION DE OBRA DE ACUERDO CON PRORROGA No. 1 - APROBACION
- 4.GIC-INVIAS-NTS-539-22, RESPUESTA A SU OFICIO OK-089-2022 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2023 CUYO ASUNTO ES: “SOBREANCHO DEL PR 15+664 AL PR15+694 PLACA HUELLA LA SAMARITANA”
- 5.GIC-INVIAS-NTS-544-22, INCUMPLIMIENTO ENTREGA SUBSANACION INFORME MES DE ABRIL

ACTIVIDADES TÉCNICAS

Durante la presente semana se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Actividad placa huella La Samaritana, se realiza trabajo topografico en replanteo de alineamiento, nivelcion de placa huella PR 15+0540, adecuacion de cuneta PR 15+0410, instalacion de sub base PR 15+0570, FUNDIDA de cuneta margen izquierdo 4 ml y por la derecha 24 ml , FUNDIDA de placa huella PR 15+0620 al PR 15+0550, fundida de contra huella central 18 ml hasta el PR 15+0602, fundida de contra huella lateral 15 ml hasta el PR 15+0605, fundida de viga riostra 20 ml hasta el PR 15+0670

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana se recibió oficio N° OK-095-2022 por parte del contratista con las observaciones subsanadas al documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación), por lo tanto se encuentra en revisión por parte de la interventoría.

ACTIVIDADES SOCIALES

Se realizó junto con la profesional social del Contratista una mesa de trabajo, con el fin de presentar por parte de este, los soportes o certificados de territorialidad del personal en obra, para de esta manera determinar si pertenecen o no al área de influencia directa del proyectcto

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Se realizara la ejecución de placa huella sector La Samaritana en instalación y compactación de subbase, instalación de acero y fundida en concreto hidráulico en cuneta, huella, contra huella y viga riostra

Se procederá con la revisión detallada y si es el caso la aprobación de la documentación entregada por el Contratista.

Realizar seguimiento de la documentación aprobada al contratista para inicio a las actividades de construcción en campo

Seguimiento a la alcaldía en cuanto a la devolución de rendimientos financieros.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

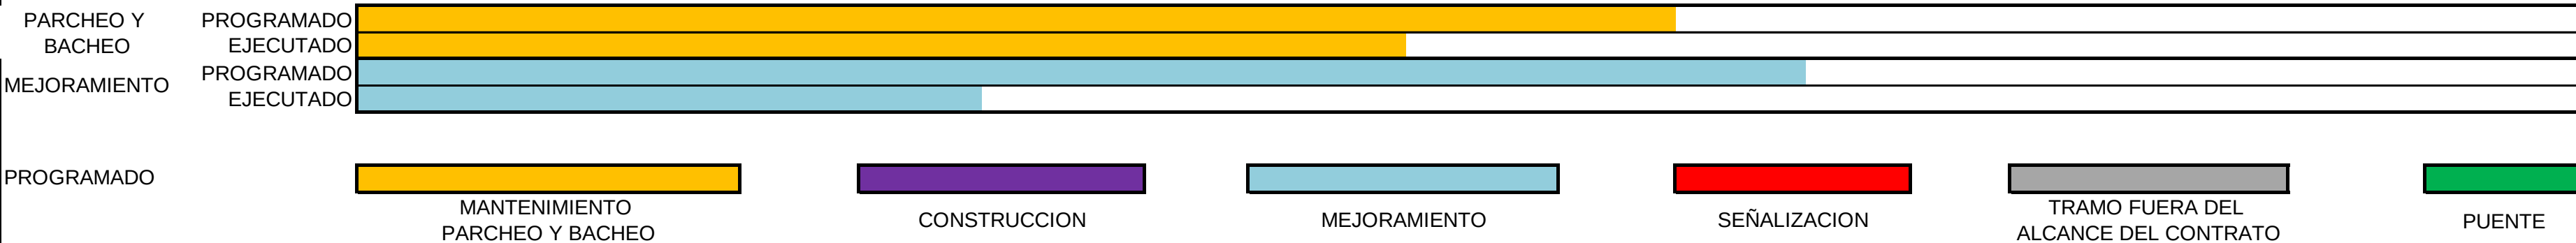

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se le hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.

Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.

Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: 
NOMBRE: DIEGO EFRAÍN PEDRAZA CHAVES
Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</p> <p style="text-align: center;">PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</p> <p style="text-align: center;">MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA</p> <p style="text-align: center;">INFORME SEMANAL</p>	CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-15-FR-3
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA		26/05/2023 (Día / Mes / Año)
-------	--	---------------------------------

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:				MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.											
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES				DIRECCIÓN TERRITORIAL:				NORTE DE SANTANDER				SEMANA No.: 30 del 19/05/2023 al 25/05/2023. Último Informe Semanal Si ☐	
										(Numeración consecutiva)					
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:		LEONEL VALERO ESCALANTE				GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:				WILMAR RANGEL ROPERO				OCAÑA	
OBJETO CONTRATO DE OBRA:		MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRISON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.													

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRISON.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
--

Construcción de Placa Huella rural, Actividades de Parcheo, Construcción de Alcantarillas en puntos críticos para el manejo de escorrentía y Muros en Gaviones para contención de taludes en el corredor vial OCANA-LIMITES-MORRISON.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENORIA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022			INTERVENIOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	COI PCCNTR.3879052	VALOR INICIAL:	\$ 1.711.146.620,00	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	\$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	1 DE NOVIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	\$ -	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	\$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	30 DE JUNIO 2023	VALOR ACUMULADO:	\$ 1.711.146.620,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ADICIONES:	\$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 DE JUNIO 2023		\$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	\$ 4.288.164.910,00
			\$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			\$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1.711.146.620,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 1.711.146.620,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 40.000.000	\$ 1.770.000.000	\$ 2.478.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 40.000.000	\$ 1.770.000.000	\$ 2.478.164.910	

(Ejecutado de la vigencia correspondiente al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)			
OBRA			
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$	1.711.146.620,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	1.019.852.554,40	59,60%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	870.287.651,81	50,86%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	(149.564.902,60)	-8,74%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	\$	11.167.204,80	90,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	1.019.852.554,40	59,60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	881.454.856,61	51,51%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	(138.397.697,80)	-8,09%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	114.626.230,50	6,70%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	63.883.505,18	3,73%
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">SI</div> <div style="text-align: center;">NO</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto; text-align: center;">X</div> </div>			
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: _____			
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____			
PERIODO FACTURADO: _____			
VALOR FACTURA: \$ _____			
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			
Observaciones: Programación aprobada con comunicado GIC-INVIAS-NTS-098-22 del 16-Dic-2022			

INTERVENTORIA			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	2.213.248.870,00	51,61%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	781.939.024,20	18,23%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	64.346.275,00	1,50%
	\$	34.000.000,00	0,79%
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">SI</div> <div style="text-align: center;">NO</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto; text-align: center;">X</div> </div>			
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: _____			
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____			
PERIODO FACTURADO: _____			
VALOR FACTURA: _____			
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			
Observaciones:			

ANTICIPOS		INDICADOR I/C	ANTICIPOS	
Otorgado \$			Otorgado \$	
Amortizado \$			Amortizado \$	
Saldo \$			Saldo \$	

III. AVANCE FÍSICO	
--------------------	--

Meta Física Programada %	53,20%	Avance o Atraso Físico %	-31,96%
Meta Física Ejecutada %	21,25%		

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00				100,0%
* Parcheo y/o Bacheo	M3	730			Ejec	0,90				89,9%
					Prog	477,67				65,4%
* Construcción De Alcantarillas	UND	4			Ejec	327,00				44,8%
					Prog	0,68				17,1%
					Ejec	1,00				
* Construcción De Placa Huella	ML	692			Prog	577,81				83,5%
					Ejec	247,00				35,7%
* Construcción De Muros	UND	4			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:	_____	TRAMO Y/O SECTOR 2:	_____
TRAMO Y/O SECTOR (n):	_____		_____

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES				PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL				
		DISPONIBLE						
UBICACIÓN:	RICARDO CASADIEGO SANJUAN	PERMISO MINERO:	SI X NO	ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
	Vereda el Hatillo y la Madera	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X NO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X	N/A
				APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	X	N/A
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI NO	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	X	N/A
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	Ocupación de CAUCES:	SI	NO	X	N/A
				VERTIMIENTOS:	SI	NO	X	N/A
				EMISIONES:	SI	NO	X	N/A
				OTROS (Especificar cual)	SI	NO	X	N/A

OBSERVACIONES:
 El municipio de Ocaña cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO.

OBSERVACIONES:
 Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto

<p>P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)</p>		<p>OBSERVACIONES: Entregado por el Contratista el pasado 25 de mayo de 2023. Observada por parte de la Interventoría.</p>
ESTADO:	OBSERVACIONES CON EL COMUNICADO GIC-INVIAS-NTS-338-22	

			V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			22	15		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			5	11		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			17	4		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			22	10		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:			32			
VI. GESTIÓN PREDIAL						
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:			N/A		OBSERVACIONES: N/A	
FICHAS PREDIALES APROBADAS:			N/A			
AVALÚOS APROBADOS:			N/A			
PREDIOS ADQUIRIDOS:			N/A			
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD						
N/A						
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS						
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS						
Se llevo a cabo comité de obra No. 27 el 25 de mayo de 2023						
Durante la presente semana se han realizado actividades de revisión a documentos como se relaciona a continuación:						
1.GIC- INVIAS-NTS-557-22, RESPUESTA A SU OFICIO OK-096-2022 DE FECHA 18-05-2023 CUYO ASUNTO ES: " DOCUMENTOS DE SUBASANACION TOPOGRAFIA LA SAMARITANA. " OBSERVACIONES						
2.GIC-INVIAS-NTS-569-22, SOLICITUD DE INFORMACION DOCUMENTAL (CONDICIONES CONTRATO DE OBRA – ACTA DE INICIO) – Contrato de obra CO1.PCCNTR.4352407 derivado del convenio interadministrativo de la referencia						
3.GIC-INVIAS-NTS-587-22, RESPUESTA A PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN ALCANTARILLADO JUAN XXIII						
4.GIC-INVIAS-NTS-592-22, RESPUESTA A SU OFICIO OK-095-2022 DE FECHA 16-05-2023 CUYO ASUNTO ES: " Documento de subsanación Plan de Gestión Ambiental. " APROBADO CON OBSERVACIONES						
ACTIVIDADES TÉCNICAS						
Durante la presente semana se llevaron a cabo las siguientes actividades:						
Actividad placa huella La Samaritana, se realiza trabajo topografico en levantamiento de placa huella construida PR 15+0810 al PR 15+0500, Fundida de cuneta 66 ml hasta PR 15+0626, fundida de contra huella central 51 ml hasta el PR 15+0542, fundida de contra huella lateral 30 ml hasta el PR 15+0607, fundida de viga riostra 50 ml hasta el PR 15+0616, Fundida de huella 42 ml hasta PR 15+0530.						
Sector JUAN XXIII, inicio de retiro capa asfáltica existente 60ml.						
ACTIVIDADES AMBIENTALES						
Durante la semana se hace visita a obra los días 23 y 24 con el fin de evidenciar si el contratista esta cumpliendo con los programas que estan contemplados en el PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), verificando que algunos compromisos adquiridos en visitas anteriores fueron cumplidos como:						
La instalación del guardian, y el cerramiento de los materiales de construcción.						
ACTIVIDADES SOCIALES						
Se realiza por parte de la Interventoría una reunión vía meet para dar con la profesional del Contratista con el objetivo de darle seguimiento al Plan de Gestión Social implementado por éste, durante la ejecución del proyecto.						
Igualmente, se desarrolla una visita presencial a la obra los días 23 y 24 de mayo, donde se pudo evidenciar que el Contratista a implementado de manera adecuada los cinco (5) programas de Gestión Social en el Área de Influencia del proyecto, ya que cuenta con tres (3) oficinas para la atención de PORS que se puedan presentar por parte de la comunidad, la adecuación de carteleras informativas y buzones de sugerencias, capacitaciones al comité de veeduría ciudadana, elaboración de actas de compromiso y distribución de volantes con información concerniente a las líneas de atención y correo electrónico del Consorcio.						
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA						
Se realizara la ejecución de placa huella sector La Samaritana en instalación y compactación de subbase, instalación de acero y fundida en concreto hidráulico en cuneta, huella, contra huella y viga riostra.						
Se continuara en el sector de JUAN XXIII con el retiro de la capa asfáltica y excavación para estructura de vía.						
Se procederá con la revisión detallada y si es el caso la aprobación de la documentación entregada por el Contratista.						
Realizar seguimiento de la documentación aprobada al contratista para inicio a las actividades de construcción en campo.						
Seguimiento a la alcaldía en cuanto a la devolución de rendimientos financieros.						
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS						
<div><div><div>PARCHEO Y BACHEO</div><div>PROGRAMADO</div><div>EJECUTADO</div></div><div><div>MEJORAMIENTO</div><div>PROGRAMADO</div><div>EJECUTADO</div></div></div> <div><div>PROGRAMADO</div><div>MANTENIMIENTO PARCHEO Y BACHEO</div><div>CONSTRUCCION</div><div>MEJORAMIENTO</div><div>SEÑALIZACION</div><div>TRAMO FUERA DEL ALCANCE DEL CONTRATO</div><div>PUENTE</div></div>						
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.						
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
levantamiento de placa huella construida PR 15+0810		Fundida de contra huella central PR 15+0568		Retiro de capa asfáltica Barrio JUAN XXIII		
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.						
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA				DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		
De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención. Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito. Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.				FIRMA NOMBRE: DIEGO EFRAIN PEDRAZA CHAVES Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND		
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.						

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</p> <p style="text-align: center;">PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</p> <p style="text-align: center;">MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA</p> <p style="text-align: center;">INFORME SEMANAL</p>	CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-15-FR-3
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA		2/06/2023 (Día / Mes / Año)
-------	--	--------------------------------

I. INFORMACION GENERAL									
PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.									
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		NORTE DE SANTANDER		SEMANA No.: 31 del 26/05/2023 al 1/06/2023. Último Informe Semanal Si ☐	
						(Numeración consecutiva)			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:		LEONEL VALERO ESCALANTE		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:		WILMAR RANGEL ROPERO		OCAÑA	
OBJETO CONTRATO DE OBRA:		: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRISON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.							
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):									
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRISON.									
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:									
Construcción de Placa Huella rural, Actividades de Parcheo, Construcción de Alcantarillas en puntos críticos para el manejo de escorrentía y Muros en Gaviones para contención de taludes en el corredor vial OCAÑA-LIMITES-MORRISON.									

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CO1PCCNTR.3879052	VALOR INICIAL:	\$ 1.711.146.620,00	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	\$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	1 DE NOVIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	\$ -	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	\$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	30 DE JUNIO 2023	VALOR ACUMULADO:	\$ 1.711.146.620,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	\$ 4.288.164.910,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 DE JUNIO 2023		\$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
			\$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			\$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES POR DISTRIBUCIÓN DE OBRA POR VIGENCIA:					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1.711.146.620,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 1.711.146.620,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 40.000.000	\$ 1.770.000.000	\$ 2.478.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 40.000.000	\$ 1.770.000.000	\$ 2.478.164.910	
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
<div><div>OBRA</div><div>VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): AVANCE O ATRASO DE OBRA: OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: PERIODO FACTURADO: VALOR FACTURA: (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite) Observaciones: Programación aprobada con comunicado GIC-INVIAS-NTS-098-22 del 16-Dic-2022</div><div><div>INTERVENTORÍA</div><div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: PERIODO FACTURADO: VALOR FACTURA: (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite) Observaciones:</div></div></div>					
<div><div>ANTICIPOS</div><div>Otorgado \$ Amortizado \$ Saldo \$</div></div> <div><div>INDICADOR IIC</div><div>En el mes: Acumulado:</div></div> <div><div>ANTICIPOS</div><div>Otorgado \$ Amortizado \$ Saldo \$</div></div>					

Meta Física Programada % 53,20%

Meta Física Ejecutada % 22,38%

Avance o Atraso Físico % -30,83%

III. UPAVE

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00				100,0%
					Ejec	0,90				89,9%
* Parqueo y/o Bacheo	M3	730			Prog	477,67				65,4%
					Ejec	327,00				44,8%
* Construcción De Alcantarillas	UND	4			Prog	0,68				17,1%
					Ejec	1,00				
Construcción De Placa Huella	ML	692			Prog	577,81				83,5%
					Ejec	278,30				40,2%
* Construcción De Muros	UND	4			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VIBRADOR DE CONCRETO		1
PAJARITA CAT 416E		1
MEZCLADORAS		2
Total		4

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: _____

TRAMO Y/O SECTOR (n): _____

TRAMO Y/O SECTOR 2: _____

IV. GESTIÓN AMBIENTAL									
FUENTES DE MATERIALES				PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN:		RICARDO CASADIEGO SANJUAN		DISPONIBLE		ZONAS DE DEPOSITO		N/A	
		Vereda el Hatillo y la Madera		PERMISO MINERO: SI ☒ NO ☐		LICENCIA AMBIENTAL: SI ☐ NO ☒		N/A	
				LICENCIA AMBIENTAL: SI ☒ NO ☐		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI ☐ NO ☒		N/A	
UBICACIÓN:		N/A		PERMISO MINERO: SI ☐ NO ☐		CONCESIÓN DE AGUAS:		N/A	
				LICENCIA AMBIENTAL: SI ☐ NO ☐		OCUPACIÓN DE CAUCES:		N/A	
						VERTIENTOS:		N/A	
						EMISIONES:		N/A	
						OTROS (Especificar cual)		N/A	
OBSERVACIONES:				OBSERVACIONES:					
El municipio de Ocaña cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO.				Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto					

<p>P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)</p>		<p>OBSERVACIONES:</p>
<p>ESTADO:</p>	<p>OBSERVACIONES CON EL COMUNICADO GIC-INVIAS-NTS-592-22, APROBADO CON OBSERVACIONES.</p>	

V. GESTIÓN SOCIAL				
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	31	15	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	1
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	11	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	3
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	26	4		
	31	10		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 46.				
OBSERVACIONES: El contratista cuentas con tres (3) puntos de atención a la comunidad, uno en punto de obra en la vereda la Samaritana, un segundo en la Alcaldía de Ocaña y el último en las instalaciones del Consorcio OK.				
Igualmente, se realiza por parte del Contratista una capacitación sobre mecanismos de participación ciudadana al comité de veeduría ciudadana conformado por cinco (5) personas que habitan el Área de Influencia del proyecto.				
VI. GESTIÓN PREDIAL				
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A	OBSERVACIONES: N/A		
FICHAS PEDIALES APROBADAS:	N/A			
AVALÚOS APROBADOS:	N/A			
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A			
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD				
N/A				
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
Se llevo a cabo comité de obra No. 28 el 01 de Junio de 2023				
Durante la presente semana se han realizado actividades de revisión a documentos como se relaciona a continuación:				
1.GIC-INVIAS-NTS-601-22, RECORDATORIO ENTREGA DE INFORME MENSUAL				
2.GIC-INVIAS-NTS-608-22, RESPUESTA SUBSANACION INFORME SST MES DE ABRIL DE 2023 - OCAÑA 1758				
3.GIC-INVIAS-NTS-609-22, SOLICITUD INFORMES TRIMESTRALES Y CUMPLIMIENTO DE EJECCUCION PAGA - OCAÑA 1758				
4.GIC-INVIAS-NTS-610-22, SOLICITUD FORMULACION PAGA DEFINITIVO - OCAÑA 1758				
ACTIVIDADES TÉCNICAS				
Durante la presente semana se llevaron a cabo las siguientes actividades:				
Actividad placa huella La Samaritana, Fundida de cuneta 186,6 ml hasta PR 15+0530, fundida de contra huella central 39 ml hasta el PR 15+0504, fundida de contra huella lateral 171 ml hasta el PR 15+0504, fundida de viga riostra 195 ml hasta el PR 15+0530, Fundida de huella 34 ml hasta PR 15+0504.				
Sector JUAN XXIII, actividad de excavacion para estructura de via.				
ACTIVIDADES AMBIENTALES				
se envío al contratista oficio GIC-INVIAS-NTS-609-22, SOLICITUD INFORMES TRIMESTRALES Y CUMPLIMIENTO DE EJECCUCION PAGA y oficio N° GIC-INVIAS-NTS-610-22, SOLICITUD FORMULACION PAGA DEFINITIVO, la interventoria se encuentra a la espera de recibir documentacion con los oficios anteriormente mencionados por parte del contratista.				
ACTIVIDADES SOCIALES				
El Contratista realiza una socialización extraordinaria con la comunidad del sector de Juan XXIII, con el proposito de darle a conocer el reinicio de las actividades de obra en el sector; así mismo, se realiza una campaña de divulgación, donde se reparten volantes con las líneas de atención y correo electrónico del Contratista; por último, se informa que el Contratista adelnata y ejecuta de manera eficiente el Plan de Gestión social, conformado por cinco (5) programas.				
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
Se realizara la ejecución de placa huella sector La Samaritana en instalación y compactación de subbase, instalación de acero y fundida en concreto hidráulico en cuneta, huella, contra huella y viga riostra.				
Se continuara en el sector de JUAN XXIII con la excavación para estructura de via.				
Se procederá con la revisión detallada y si es el caso la aprobación de la documentación entregada por el Contratista.				
Realizar seguimiento de la documentación aprobada al contratista para inicio a las actividades de construcción en campo.				
Seguimiento a la alcaldía en cuanto a la devolución de rendimientos financieros.				
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS				
<div><div><div>PARCHEO Y BACHEO</div><div>PROGRAMADO</div><div>EJECUTADO</div></div><div><div>MEJORAMIENTO</div><div>PROGRAMADO</div><div>EJECUTADO</div></div></div> <div><div>PROGRAMADO</div><div>MANTENIMIENTO</div><div>CONSTRUCCION</div><div>MEJORAMIENTO</div><div>SEÑALIZACION</div><div>TRAMO FUERA DEL ALCANCE DEL CONTRATO</div><div>PUENTE</div></div> <div><div>PARCHEO Y BACHEO</div><div>CONSTRUCCION</div><div>MEJORAMIENTO</div><div>SEÑALIZACION</div><div>TRAMO FUERA DEL ALCANCE DEL CONTRATO</div><div>PUENTE</div></div>				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.				
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO				
<div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div>Excavacion Barrio Juan XXIII</div><div>Instalacion de acero cuneta margen derecho PR 15+0593</div><div>Placa huellaPR 15+0610</div></div>				
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA			DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención. Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito. Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.			FIRMA _____ NOMBRE: DIEGO EFRAIN PEDRAZA CHAVES Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.				



ESTADO: Documento Observado con el oficio GIC-INVIAS-NTS-360-222

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

OBRA

5

15

5

11

N/A

4

5

10

INTER

15

11

4

10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

N/A

N/A

N/A

OBSERVACIONES:

Una vez el contratista instale la respectiva oficina de atención al usuario se actualizará la información

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

20

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

N/A

N/A

N/A

N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante la semana se realizaron actividades de revisión de documentos de proconstrucción los cuales se describen a continuación:

1. GIC-INVIAS-NTS-496-22, RESPUESTA A SU OFICIO OFC-CADV-GIC-067-2023 DE FECHA 04 DE MAYO DE 2023 CUYO ASUNTO ES: "COMPROMISOS PACTADOS EN COMITES DE OBRA (PRESUPUESTO AJUSTADO – VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO)."

2. GIC-INVIAS-NTS-500-22, RESPUESTA A SU OFICIO OFC-CADV-GIC-064-2023 DE FECHA 28-04-2023 CUYO ASUNTO ES "SOLICITUD DE ACTAS MESAS DE TRABAJO Y ACTAS DE COMITE)

3. GIC-INVIAS-NTS-525-22, REITERACIÓN SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1791 DE 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE ABREGO

ACTIVIDADES TÉCNICAS

Durante la presente semana se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Actividad placa huella corredor Santa Lucia - Canoas, se realizan actividades de perfilado, compactación e instalación de subbase y compactación de la misma en los corredores La Yee del Chorro y Pie de Cruz.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana se ha realizado mesas de trabajo con el profesional ambiental del contratista aclarando dudas para subsanar en las observaciones enviadas, los temas tratados fueron la formulacion de la matriz de capacitacion y como realizar el programa de almacenamiento de combustible en obra, en el PAGA (Plan Guía a la Adaptacion Ambiental), en cuanto a la fuente de materiales se aclaro que es de gran importante contar con la licencia ambiental para poder realizar la explotación y exploración del material, de lo contrario se debe cambiar de proveedor.

ACTIVIDADES SOCIALES

Se envía por parte de esta Interventoría un oficio, solicitando dar el respectivo cumplimiento a los documentos preconstructivos; así mismo, nos encontramos a la espera de las subsanaciones al documento PAGA.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuará con actividades de instalación y compactación de subbase y toma de densidades en los corredores La Yee del Chorro y Pie de Cruz.

Se procederá con la revisión detallada y si es el caso la aprobación de la documentación entregada por el Contratista.

Realizar seguimiento de la documentación aprobada al contratista para inicio a las actividades de construcción en campo.

Seguimiento a la alcaldía en cuanto a la devolución de rendimientos financieros.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

TRAMO 1

MEJORAMIENTO

PROGRAMADO

EJECUTADO

TRAMO 2

MEJORAMIENTO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

MANTENIMIENTO
PARCHEO Y BACHEO

CONSTRUCCION

MEJORAMIENTO

SEÑALIZACION

TRAMO FUERA DEL
ALCANCE DEL CONTRATO

PUENTE

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Instalación de subbase Correo, 1 La Yee del Chorro



Instalación de subbase Corredor 1, La Yee del Chorro



Compactación de subbase Corredor 1, Pie de Cruz

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención. Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito. Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.

FIRMA

NOMBRE:

Matrícula Profesional No.:



DIEGO EFRAIM PORAZA CHAVES

25202-109359 CND

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

			V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	N/A	OBSERVACIONES: Una vez el contratista instale la respectiva oficina de atención al usuario se actualizará la información	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	15	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	N/A		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	N/A	4	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	10				
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 20						
VI. GESTIÓN PREDIAL						
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:		N/A	OBSERVACIONES:			
FICHAS PEDIALES APROBADAS:		N/A				
AVALÚOS APROBADOS:		N/A				
PREDIOS ADQUIRIDOS:		N/A				
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD						
N/A						
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS						
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Se llevo a cabo comité de el 18 de mayo de 2023 Durante la semana se realizaron actividades de revisión de documentos de proconstrucción los cuales se describen a continuación: 1. GIC-INVIAS-NTS-534-22, SOLICITUD CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS PREVIOS AL INICIO DE OBRA 2. GIC-INVIAS-NTS-541-22, RESPUESTA A SU OFICIO OFC-CADV-GIC-071-2023 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2023 CUYO ASUNTO ES: "ENTREGA PLAN DE MANEJO DE ANTICIPO – SOPORTES"						
ACTIVIDADES TÉCNICAS Durante la presente semana se llevaron a cabo las siguientes actividades: Actividad placa huella corredor Santa Lucia - Canoas, se realizan actividades de perfilado y conformacion de cunetas, compactación e instalación de subbase y compactación de la misma en los corredores La Yee del Chorro, Pie de Cruz., el chorro 1, el chorro 2 y Santa Lucia.						
ACTIVIDADES AMBIENTALES La interventoria se encuentra a la espera de recibir documentación con observaciones subsanadas por parte del contratista en cuanto al PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) y fuente de materiales.						
ACTIVIDADES SOCIALES En la semana se envió oficio mediante radicado GIC-INVIAS-NTS-534-22, con asunto "SOLICITUD CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS PREVIOS AL INICIO DE OBRA" el día 12 de mayo de 2022; por otra parte, se recibe por parte de la profesional del Contratista una llamada telefónica, con el fin de realizar una reunión virtual por la plataforma MEET el día 19 de mayo de 2023, para dialogar y definir como se deben de presentar los diferentes ítems solicitados en el oficio.						
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA Se continuará con actividades de instalación y compactación de subbase y toma de densidades en los corredores La Yee del Chorro, Pie de Cruz, El Chorro1 , El Chorro2 y Santa Lucia Se procederá con la revisión detallada y si es el caso la aprobación de la documentación entregada por el Contratista. Realizar seguimiento de la documentación aprobada al contratista para inicio a las actividades de construcción en campo. Seguimiento a la alcaldía en cuanto a la devolución de rendimientos financieros.						
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS						
TRAMO 1 MEJORAMIENTO PROGRAMADO EJECUTADO						
TRAMO 2 MEJORAMIENTO PROGRAMADO EJECUTADO						
PROGRAMADO MANTENIMIENTO PARCHEO Y BACHEO CONSTRUCCION MEJORAMIENTO SEÑALIZACION TRAMO FUERA DEL ALCANCE DEL CONTRATO PUENTE						
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.						
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
 Socializacion Corredor 1		 Toma de Densidades Corredor 1, La Yee del Chorro		 Instalacion de sub-base Corredor 1, Pie de Cruz		
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.						
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA				DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		
De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención. Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito. Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.				FIRMA NOMBRE: DIEGO EFRAIN PEDRAZA CHAVES Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND		
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.						

V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	15	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	11	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4		
	5	10	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 20			
VI. GESTIÓN PREDIAL			
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A	OBSERVACIONES:	
FICHAS PEDIALES APROBADAS:	N/A		
AVALUOS APROBADOS:	N/A		
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A		
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD			
N/A			
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Se llevo a cabo comité de el 25 de mayo de 2023 Durante la semana se realizaron actividades de revisión de documentos de proconstrucción los cuales se describen a continuación: 1. GIC-INVIAS-NTS-553-22, RESPUESTA A SU OFICIO OFC-CADV-GIC-065-2023 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2023 CUYO ASUNTO ES: "RESPUESTA A OFICIO GIC-INVIAS-NTS-440-22 SUBSANACIÓN DISEÑO GEOMETRICO CORREDOR 2 " OBSERVACIONES 2. GIC-INVIAS-NTS-555-22, DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ENTREGAR AL INICIO Y DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO. 3. GIC-INVIAS-NTS-568-22, RESPUESTA A SU OFICIO OFC-CADV-GIC-073-2023 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2023 CUYO ASUNTO ES: "RESPUESTA A OFICIO GIC-INVIAS-NTS-448-22. DISEÑO GEOMETRICO TRAMO CHORRO 1 Y 2. OBSERVACIONES." OBSERVACIONES 4. GIC-INVIAS-NTS-574-22, RESPUESTA A SU OFICIO OFC-CADV-GIC-074-2023 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2023 CUYO ASUNTO ES: "RESPUESTA A OFICIO GIC-INVIAS-NTS-460-22 INFORME ESTRUCTURAL CORREDOR 2. OBSERVACIONES." APROBADO 5. GIC-INVIAS-NTS-583-22, RESPUESTA A SU OFICIO OFC-CADV-GIC-077 Y 078-2023 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2023 CUYO ASUNTO ES: " RESPUESTA A OFICIO No GIC-INVIAS-NTS-402-22 ENTREGA ESTUDIO TOPOGRAFICO CORREDOR 1 Y 2 -APROBADO CON OBSERVACIONES." PERSISTEN OBSERVACIONES			
ACTIVIDADES TÉCNICAS Durante la presente semana se llevaron a cabo las siguientes actividades: Actividad placa huella corredor Santa Lucia - Canoas, se realizan actividades de perfilado y conformacion de cunetas, compactación e instalación de subbase y compactación de la misma en los corredores La Yee del Chorro, Pie de Cruz. y Santa Lucia.			
ACTIVIDADES AMBIENTALES Durante la semana se recibe documentacion acerca de la fuente de materiales y se encuentra en revisión, en cuanto al PAGA (Plan Guia a la Adaptación Ambiental), la interventoria se encuentra a la espera de recibir documentacion con observaciones subsanadas.			
ACTIVIDADES SOCIALES Se llevó a cabo una reunión por medio de la plataforma meet, con el objetivo de dar claridad sobre los indicadores y acciones que deben de implementar el Contratista respecto a los programas de Gestión Social, así mismo, se le informó a la profesional social y directora de obra que, si en llegado caso la comunidad es quien NO quiere conformar el Comité de Veeduría Ciudadana, deben de presentar un acta de reunión con los presidentes de juntas y la Alcaldía Municipal, donde se describa el desinterés de los habitantes para con la creación del comité, igualmente, deben de adjuntar documentos u oficios que soporten la gestión realizada por el Contratista y la Alcaldía, para formar la veeduría ciudadana.			
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA Se continuará con actividades de instalación y compactación de subbase y toma de densidades en los corredores La Yee del Chorro, Pie de Cruz, El Chorro1 , El Chorro2 y Santa Lucia Se procederá con la revisión detallada y si es el caso la aprobación de la documentación entregada por el Contratista. Realizar seguimiento de la documentación aprobada al contratista para inicio a las actividades de construcción en campo. Seguimiento a la alcaldia en cuanto a la devolución de rendimientos financieros.			
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS			
TRAMO 1			
MEJORAMIENTO	PROGRAMADO	<div></div>	
	EJECUTADO	<div></div>	
TRAMO 2			
MEJORAMIENTO	PROGRAMADO	<div></div>	
	EJECUTADO	<div></div>	
PROGRAMADO	<div><div></div>MANTENIMIENTO PARCHEO Y BACHEO</div> <div><div></div>CONSTRUCCION</div> <div><div></div>MEJORAMIENTO</div> <div><div></div>SEÑALIZACION</div> <div><div></div>TRAMO FUERA DEL ALCANCE DEL CONTRATO</div> <div><div></div>PUENTE</div>		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.			
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
<div><div></div><div></div><div></div></div>			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
De parte de nosotros como interventoria, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención. Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito. Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.		<div></div> <div>FIRMA NOMBRE: DIEGO EFRAIN PEDRAZA CHAVES Matricula Profesional No.: 25202-109359 CND</div>	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

V. GESTIÓN SOCIAL				
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	15		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	10	11		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	4		
		12	10	OBSERVACIONES: Una vez el contratista instale las respectivas oficinas de atención al usuario, se actualizará la información.
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 27				
VI. GESTIÓN PREDIAL				
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A		OBSERVACIONES:	
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A			
AVALÚOS APROBADOS:	N/A			
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A			
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD				
N/A				
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Se llevo a cabo comité de el 01 de Junio de 2023				
ACTIVIDADES TÉCNICAS Durante la presente semana se llevaron a cabo las siguientes actividades: Actividad placa huella corredor Santa Lucia - Canoas, se realizan actividades de perfilado y conformación de cunetas, compactación e instalación de subbase y compactación de la misma en los corredores La Yee del Chorro, Pie de Cruz. y Santa Lucia.				
ACTIVIDADES AMBIENTALES Durante la semana se realizo una mesa de trabajo con la Directora de obra Claudia Liliana Rangel, con el fin de subsanar unas observaciones en cuanto a la Licencia ambiental de los proveedores para la explotación y exploración de la fuente de materiales, en cuanto al Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA) la interventoría se encuentra a la espera de recibir el documento con observaciones subsanadas por parte del contratista.				
ACTIVIDADES SOCIALES Es solicitado por parte de esta interventoría el número total del personal vinculado al proyecto, así como las cifras de empleos directos e indirectos y de mano de obra calificada y no calificada que hace parte de las obras; de forma seguida, el Contratista responde a la solicitud enviando la información requerida; por otra parte, la Interventoría se encuentra a la espera de las subsanaciones al Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA).				
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
Se continuará con actividades de instalación y compactación de subbase y toma de densidades en los corredores La Yee del Chorro, Pie de Cruz, El Chorro1 , El Chorro2 y Santa Lucia Se procederá con la revisión detallada y si es el caso la aprobación de la documentación entregada por el Contratista. Realizar seguimiento de la documentación aprobada al contratista para inicio a las actividades de construcción en campo. Seguimiento a la alcaldía en cuanto a la devolución de rendimientos financieros.				
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS				
TRAMO 1				
MEJORAMIENTO	PROGRAMADO	<div></div>		
	EJECUTADO	<div></div>		
TRAMO 2				
MEJORAMIENTO	PROGRAMADO	<div></div>		
	EJECUTADO	<div></div>		
PROGRAMADO	<div><div></div>MANTENIMIENTO PARCHEO Y BACHEO<div></div>CONSTRUCCION<div></div>MEJORAMIENTO<div></div>SEÑALIZACION<div></div>TRAMO FUERA DEL ALCANCE DEL CONTRATO<div></div>PUENTE</div>			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.				
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
Compactación de sub base Tramo Santa Lucia		Instalación de sub-base Tramo Santa Lucia		
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		
De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención. Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito. Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.		FIRMA NOMBRE: DIEGO EFRAIN PEDRAZA CHAVES Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND		
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.				

<div></div>		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA		MEPI-MNI-IN-15-FR-3 1																																																																																																																																																									
						FECHA 12/05/2023 (Día / Mes / Año)																																																																																																																																																									
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																																																																																															
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) ENCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL																																																																																																																																																															
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 10 del 5/05/2023 al 11/05/2023 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)																																																																																																																																																															
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO LA PLAYA																																																																																																																																																															
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO No. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS																																																																																																																																																															
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VÍAS RURALES CORREDOR 1: LLANO GRANDE – SAN PEDRO Y CORREDOR 2: ESPERANZA – ESPERANCITA - CLAVELLINOS																																																																																																																																																															
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: Construcción de Placa Huellas y Construcción de Alcantarillas.																																																																																																																																																															
CONTRATO DE OBRA:CONTRATO DE INTERVENTORÍA:																																																																																																																																																															
CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES CITEGAL - 10% COOPERATIVA DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE COLOMBIA CODENCO - 90%				INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S																																																																																																																																																											
INTEGRANTES: CONTRATO No. LP-004 DE 2022 VALOR INICIAL: \$ 2.203.091.392.64 FECHA DE INICIO: 06 DE MARZO DE 2023 VALOR ADICIONES: \$ - FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 VALOR ACUMULADO: \$ 2.203.091.392.64 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 \$ -				INTEGRANTES: CONTRATO No. 1053 DE 2022 VALOR INICIAL: \$ 4.288.164.910.00 FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2022 VALOR ADICIONES: \$ - FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024 VALOR ACUMULADO: \$ 4.288.164.910.00 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE 2024 VALOR ANTICIPO: N/A VALOR AMORTIZADO: N/A SALDO POR AMORTIZAR: N/A																																																																																																																																																											
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																																																																																															
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																																																																																															
<table><tr><th>CONTRATO</th><th>VIGENCIA</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr><tr><td rowspan="3">OBRA</td><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td>\$ 2.203.091.392.64</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SALDO DE VIGENCIA</td><td>\$ 2.203.091.392.64</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">INTERVENTORÍA</td><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td>\$ 40.000.000</td><td>\$ 1.770.000.000</td><td>\$ 2.478.164.910</td><td></td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SALDO DE VIGENCIA</td><td>\$ 40.000.000</td><td>\$ 1.770.000.000</td><td>\$ 2.478.164.910</td><td></td></tr></table> (Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)								CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025	OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 2.203.091.392.64				EJECUTADO DE LA VIGENCIA					SALDO DE VIGENCIA	\$ 2.203.091.392.64				INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 40.000.000	\$ 1.770.000.000	\$ 2.478.164.910		EJECUTADO DE LA VIGENCIA					SALDO DE VIGENCIA	\$ 40.000.000	\$ 1.770.000.000	\$ 2.478.164.910																																																																																																																			
CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025																																																																																																																																																										
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 2.203.091.392.64																																																																																																																																																													
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA																																																																																																																																																														
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 2.203.091.392.64																																																																																																																																																													
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 40.000.000	\$ 1.770.000.000	\$ 2.478.164.910																																																																																																																																																											
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA																																																																																																																																																														
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 40.000.000	\$ 1.770.000.000	\$ 2.478.164.910																																																																																																																																																											
<table><tr><th colspan="4">OBRA</th><th colspan="4">INTERVENTORÍA</th></tr><tr><td>VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):</td><td>\$ 2.658.435.877.00</td><td></td><td></td><td>TOTAL INVERSIÓN</td><td>\$ 2.084.556.320.00</td><td>48.61%</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$ 346.262.184.21</td><td>13.03%</td><td></td><td>PROGRAMADA:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$ -</td><td>0.27%</td><td></td><td>TOTAL INVERSIÓN</td><td>\$ 731.939.024.20</td><td>17.07%</td><td></td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$ (346.262.184.21)</td><td>-13.03%</td><td></td><td>EJECUTADA:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$ 7.222.963.30</td><td>58.82%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ 346.262.184.21</td><td>13.03%</td><td></td><td>INVERSIÓN</td><td>\$ 65.958.725.00</td><td>1.54%</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ 7.222.963.30</td><td>0.27%</td><td></td><td>PROGRAMADA EN</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$ (339.039.220.91)</td><td>-12.75%</td><td></td><td>INVERSIÓN</td><td>\$ 37.500.000.00</td><td>0.87%</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>EJECUTADA EN LA</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 148.640.457.14</td><td>5.59%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 1.031.851.90</td><td>0.04%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">RADIO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</td><td colspan="4">RADIO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</td></tr><tr><td colspan="4">No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:</td><td colspan="4">No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:</td></tr><tr><td colspan="4">PERIODO FACTURADO:</td><td colspan="4">PERIODO FACTURADO:</td></tr><tr><td colspan="4">VALOR FACTURA:</td><td colspan="4">VALOR FACTURA:</td></tr><tr><td colspan="4">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td><td colspan="4">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr><tr><td colspan="4">Observaciones: Programación Aprobada con oficio GIC-INVIAS-NST-452-22 del 17 Abril de 2023</td><td colspan="4">Observaciones:</td></tr></table>								OBRA				INTERVENTORÍA				VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 2.658.435.877.00			TOTAL INVERSIÓN	\$ 2.084.556.320.00	48.61%		INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 346.262.184.21	13.03%		PROGRAMADA:				INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	0.27%		TOTAL INVERSIÓN	\$ 731.939.024.20	17.07%		AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ (346.262.184.21)	-13.03%		EJECUTADA:				OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 7.222.963.30	58.82%						(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)								TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 346.262.184.21	13.03%		INVERSIÓN	\$ 65.958.725.00	1.54%		TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 7.222.963.30	0.27%		PROGRAMADA EN				AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ (339.039.220.91)	-12.75%		INVERSIÓN	\$ 37.500.000.00	0.87%						EJECUTADA EN LA				INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 148.640.457.14	5.59%						INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 1.031.851.90	0.04%						RADIO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:				RADIO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:				No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:				No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:				PERIODO FACTURADO:				PERIODO FACTURADO:				VALOR FACTURA:				VALOR FACTURA:				(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				Observaciones: Programación Aprobada con oficio GIC-INVIAS-NST-452-22 del 17 Abril de 2023				Observaciones:			
OBRA				INTERVENTORÍA																																																																																																																																																											
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 2.658.435.877.00			TOTAL INVERSIÓN	\$ 2.084.556.320.00	48.61%																																																																																																																																																									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 346.262.184.21	13.03%		PROGRAMADA:																																																																																																																																																											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	0.27%		TOTAL INVERSIÓN	\$ 731.939.024.20	17.07%																																																																																																																																																									
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ (346.262.184.21)	-13.03%		EJECUTADA:																																																																																																																																																											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 7.222.963.30	58.82%																																																																																																																																																													
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)																																																																																																																																																															
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 346.262.184.21	13.03%		INVERSIÓN	\$ 65.958.725.00	1.54%																																																																																																																																																									
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 7.222.963.30	0.27%		PROGRAMADA EN																																																																																																																																																											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ (339.039.220.91)	-12.75%		INVERSIÓN	\$ 37.500.000.00	0.87%																																																																																																																																																									
				EJECUTADA EN LA																																																																																																																																																											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 148.640.457.14	5.59%																																																																																																																																																													
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 1.031.851.90	0.04%																																																																																																																																																													
RADIO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:				RADIO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:																																																																																																																																																											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:				No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:																																																																																																																																																											
PERIODO FACTURADO:				PERIODO FACTURADO:																																																																																																																																																											
VALOR FACTURA:				VALOR FACTURA:																																																																																																																																																											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																																																																																																											
Observaciones: Programación Aprobada con oficio GIC-INVIAS-NST-452-22 del 17 Abril de 2023				Observaciones:																																																																																																																																																											
<table><tr><th colspan="2">ANTICIPOS</th><th colspan="2">INDICADOR I/C</th><th colspan="2">ANTICIPOS</th></tr><tr><td>Otorgado \$</td><td></td><td>En el mes:</td><td></td><td>Otorgado \$</td><td></td></tr><tr><td>Amortizado \$</td><td></td><td>Acumulado:</td><td></td><td>Amortizado \$</td><td></td></tr><tr><td>Saldo \$</td><td></td><td></td><td></td><td>Saldo \$</td><td></td></tr></table>								ANTICIPOS		INDICADOR I/C		ANTICIPOS		Otorgado \$		En el mes:		Otorgado \$		Amortizado \$		Acumulado:		Amortizado \$		Saldo \$				Saldo \$																																																																																																																																	
ANTICIPOS		INDICADOR I/C		ANTICIPOS																																																																																																																																																											
Otorgado \$		En el mes:		Otorgado \$																																																																																																																																																											
Amortizado \$		Acumulado:		Amortizado \$																																																																																																																																																											
Saldo \$				Saldo \$																																																																																																																																																											
III. AVANCE FÍSICO																																																																																																																																																															
<table><tr><td>Meta Física Programada %</td><td>22.70%</td><td>Avance o Atraso Físico %</td><td>-22.60%</td></tr><tr><td>Meta Física Ejecutada %</td><td>0.10%</td><td></td><td></td></tr></table>								Meta Física Programada %	22.70%	Avance o Atraso Físico %	-22.60%	Meta Física Ejecutada %	0.10%																																																																																																																																																		
Meta Física Programada %	22.70%	Avance o Atraso Físico %	-22.60%																																																																																																																																																												
Meta Física Ejecutada %	0.10%																																																																																																																																																														
<table><tr><th colspan="6">Meta Física (Programa de Obra) Línea Base</th><th colspan="4">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</th></tr><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th><th>Vigencia</th><th>Vigencia (n)</th><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector 3</th><th>Total</th><th>%</th></tr><tr><td rowspan="2">Estudios y diseños</td><td rowspan="2">UND</td><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>Prog</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td>1.00</td><td>100.0%</td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.59</td><td>0.59</td><td></td><td>0.59</td><td>58.8%</td></tr><tr><td rowspan="2">Placa Huellas</td><td rowspan="2">ML</td><td rowspan="2">1400</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>Prog</td><td>526.49</td><td></td><td></td><td>526.49</td><td>37.6%</td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Alcantarillas</td><td rowspan="2">UND</td><td rowspan="2">11</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>Prog</td><td>3.3</td><td></td><td></td><td>3.30</td><td>30.0%</td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> * El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).								Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%	Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1		1.00	100.0%	Ejec	0.59	0.59		0.59	58.8%	Placa Huellas	ML	1400			Prog	526.49			526.49	37.6%	Ejec						Alcantarillas	UND	11			Prog	3.3			3.30	30.0%	Ejec											Prog											Ejec																																																															
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada																																																																																																																																																									
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%																																																																																																																																																					
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1		1.00	100.0%																																																																																																																																																					
					Ejec	0.59	0.59		0.59	58.8%																																																																																																																																																					
Placa Huellas	ML	1400			Prog	526.49			526.49	37.6%																																																																																																																																																					
					Ejec																																																																																																																																																										
Alcantarillas	UND	11			Prog	3.3			3.30	30.0%																																																																																																																																																					
					Ejec																																																																																																																																																										
					Prog																																																																																																																																																										
					Ejec																																																																																																																																																										
TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:																																																																																																																																																															
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																																																																																																															
<table><tr><th colspan="4">FUENTES DE MATERIALES</th><th colspan="4">PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</th></tr><tr><td>UBICACIÓN:</td><td>CONCRETOS & TRITURADOS ALGODONAL : Vereda Oropoma del Municipio de Abrego</td><td>PERMISO MINERO:</td><td>SI</td><td>DISPONIBLE</td><td>NO</td><td>ZONAS DE DEPOSITO</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td></td><td>LICENCIA AMBIENTAL:</td><td>SI</td><td></td><td>X</td><td>LICENCIA AMBIENTAL:</td><td>SI</td><td>NO</td><td>X</td><td>N/A</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>APROVECHAMIENTO FORESTA</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>CONCESIÓN DE AGUAS:</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>OCCUPACIÓN DE CAUCES:</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>VERTIMIENTOS:</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>EMISIONES:</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>OTROS (Especificar cual)</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td><td>X</td></tr></table> OBSERVACIONES: El municipio de La Playa solo se va abastecer de proveedores locales del proveedor CONCRETOS Y TRITURADOS ALGODONAL - CTA, ubicada Vereda Oropoma del Municipio de Abrego. En cuanto a los requerimientos legales solo cuentan con el Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o título minero, no se ha evidenciado la licencia ambiental. OBSERVACIONES: Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.								FUENTES DE MATERIALES				PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL				UBICACIÓN:	CONCRETOS & TRITURADOS ALGODONAL : Vereda Oropoma del Municipio de Abrego	PERMISO MINERO:	SI	DISPONIBLE	NO	ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X			LICENCIA AMBIENTAL:	SI		X	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X	N/A							APROVECHAMIENTO FORESTA	SI	NO	N/A	X							CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X							OCCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X							VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X							EMISIONES:	SI	NO	N/A	X							OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X																																																								
FUENTES DE MATERIALES				PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																																																																																																																											
UBICACIÓN:	CONCRETOS & TRITURADOS ALGODONAL : Vereda Oropoma del Municipio de Abrego	PERMISO MINERO:	SI	DISPONIBLE	NO	ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X																																																																																																																																																					
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		X	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X	N/A																																																																																																																																																					
						APROVECHAMIENTO FORESTA	SI	NO	N/A	X																																																																																																																																																					
						CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X																																																																																																																																																					
						OCCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X																																																																																																																																																					
						VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X																																																																																																																																																					
						EMISIONES:	SI	NO	N/A	X																																																																																																																																																					
						OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X																																																																																																																																																					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)																																																																																																																																																															
ESTADO: Documento Observado con Oficio GIC-INVIAS-NTS-425-22 del 31-Mar-23																																																																																																																																																															

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	15
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	11
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	N/A	4
	2	10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
 DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:
 Una vez el contratista comience los trabajos de obra, se actualizará la respectiva información.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
 FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
 AVALÚOS APROBADOS: N/A
 PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante la presente semana se han realizado actividades de revisión a documentos como se relaciona a continuación:

GIC-INVIAS-NTS-498-22, RESPUESTA A SU OFICIO OFC-CLP-GIC-024-2023 DE FECHA 03-05-2023 CUYO ASUNTO ES "ENTREGA DE CARACTERIZACIÓN DE MATERIAL DE SUB-BASE GRANULAR." APROBADO
 GIC-INVIAS-NTS-499-22, RESPUESTA A SU OFICIO OFC-CLP-GIC-022-2023 DE FECHA 28-04-2023 CUYO ASUNTO ES "SOLICITUD DE (ACTAS DE COMITÉ Y GRABACIONES)" - LA PLAYA DE BELEN
 GIC-INVIAS-NTS-526-22, REITERACION SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1863 DE 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN

ACTIVIDADES TECNICAS

Durante la semana el contratista a realizado actividades de ajuste a los documentos de Estudios y Diseños que han sido observados por la Interventoría. Con el fin de agilizar el proceso se han llevado a cabo mesas de trabajo con los especialistas de ambas partes con el fin de aclarar dudas y poder dar pronta aprobación a los documentos remitidos.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana se ha realizado mesas de trabajo con el profesional ambiental del contratista aclarando dudas para subsanar en las observaciones enviadas, los temas tratados fueron la formulacion de la matriz de capacitacion y como realizar el programa de almacenamiento de combustible en obra, en el PAGA (Plan Guia a la Adaptacion Ambiental), en cuanto a la fuente de materiales se aclaro que es de gran importante contar con la licencia ambiental para poder realizar la explotación y exploracion del material, de lo contrario se debe cambiar de proveedor.


ACTIVIDADES SOCIALES

Se realiza un oficio solicitando al Contratista dar cumplimiento a documentos preconstructivo antes del inicio de obra, igualmente, se avanza en las subsanaciones al Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA).

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA




Se procederá con la revisión detallada y si es el caso la aprobación de la documentación que entregue el Contratista, Realizar seguimiento de la documentación aprobada al contratista para inicio a las actividades de construcción en campo. Seguimiento a la alcaldía en cuanto a la devolución de rendimientos financieros.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

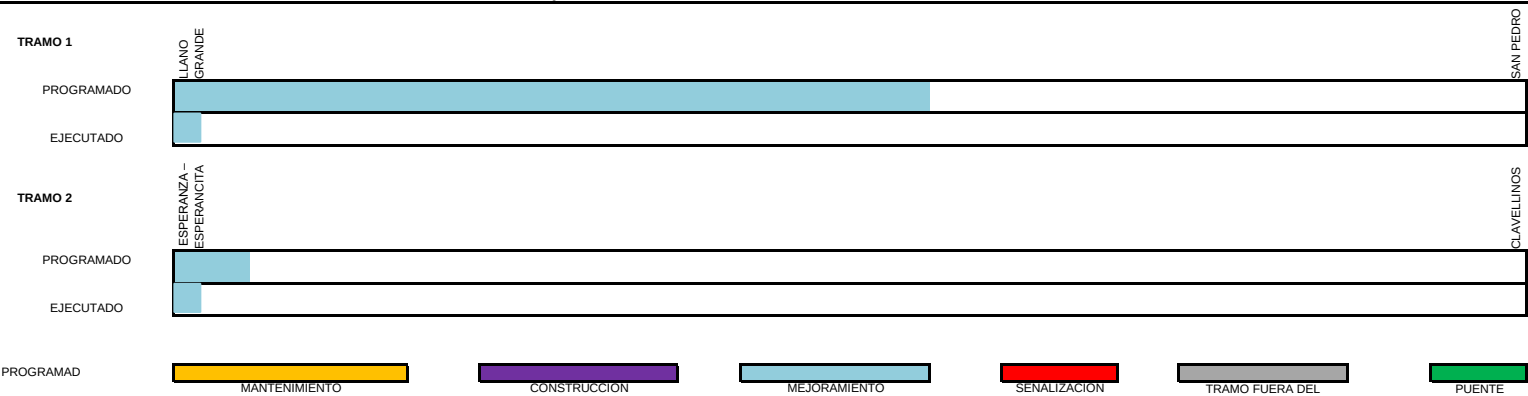

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención. Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito. Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
 NOMBRE: DIEGO EFRAIM PEDRAZA CHAVES
 Matricula Profesional No.: 25202-109359 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) ENCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 11 del 12/05/2023 al 18/05/2023 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

LA PLAYA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMLENT DE NORTE DE SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO No. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS RURALES CORREDOR 1: LLANO GRANDE – SAN PEDRO Y CORREDOR 2: ESPERANZA – ESPERANCITA - CLAVELLINOS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
Construcción de Placa Huellas y Construcción de Alcantarillas.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022				INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S			
INTEGRANTES: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES CINTEGRAL - 10% COOPERATIVA DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE COLOMBIA CODENCO - 90%				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	LP-004 DE 2022	VALOR INICIAL:	\$ 2,203,091,392.64	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	\$ 4,288,164,910.00
FECHA DE INICIO:	06 DE MARZO DE 2023	VALOR ADICIONES:	\$ -	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	\$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	\$ 2,203,091,392.64	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	\$ 4,288,164,910.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2023		\$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
			\$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			\$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 2,203,091,392.64			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 2,203,091,392.64			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 40,000,000	\$ 1,770,000,000	\$ 2,478,164,910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 40,000,000	\$ 1,770,000,000	\$ 2,478,164,910	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA		
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 2,658,435,877.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 702,109,555.64	26.41%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ (702,109,555.64)	-26.41%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 9,286,667.10	75.63%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 702,109,555.64	26.41%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 9,286,667.10	0.35%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ (692,822,888.54)	-26.06%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 148,640,457.14	5.59%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 1,031,851.90	0.04%
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		
PERIODO FACTURADO:		
VALOR FACTURA:	\$	-
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)		
Observaciones: Programación Aprobada con oficio GIC-INVIAS-NST-452-22 del 17 Abril de 2023		

ANTICIPOS	
Otorgado \$	
Amortizado \$	
Saldo \$	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA						
TOTAL INVERSIÓN	\$ 2,148,902,595.00	50.11%				
PROGRAMADA:						
TOTAL INVERSIÓN	\$ 756,939,024.20	17.65%				
EJECUTADA:						
INVERSIÓN	\$ 65,958,725.00	1.54%				
PROGRAMADA EN						
INVERSIÓN	\$ 66,666,666.67	1.55%				
EJECUTADA EN LA						
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		<table><tr><th>SI</th><th>NO</th></tr><tr><td>☐</td><td>☒</td></tr></table>	SI	NO	☐	☒
SI	NO					
☐	☒					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:						
PERIODO FACTURA						
VALOR FACTURA:						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)						
Observaciones:						

ANTICIPOS	
Otorgado \$	
Amortizado \$	
Saldo \$	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 22.70% Avance o Atraso Físico % -22.58%
Meta Física Ejecutada % 0.13%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1		1.00	100.0%
* Placa Huellas	ML	1400			Ejec	0.76	0.76		0.76	75.6%
					Ejec	526.49			526.49	37.6%
* Alcantarillas	UND	11			Prog	3.3			3.30	30.0%
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: CONCRETOS &TRITURADOS ALGODONAL Vereda Oropoma del Municipio de Abrego

UBICACIÓN:

OBSERVACIONES:
El municipio de La Playa solo se va abastecer de proveedores locales del proveedor CONCRETOS Y TRITURADOS ALGODONAL - CTA, ubicada Vereda Oropoma del Municipio de Abrego. En cuanto a los requerimientos legales solo cuentan con el Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o título minero, no se ha evidenciado la licencia ambiental.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO X
APROVECHAMIENTO FOREST/ SI NO N/A X
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A X
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A X
VERTIMIENTOS: SI NO N/A X
EMISIONES: SI NO N/A X
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Documento Observado con Oficio GIC-INVIAS-NTS-425-22 del 31-Mar-23

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA 2	INTER 15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	N/A	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	10
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:17.....		
VI. GESTIÓN PREDIAL		
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A	OBSERVACIONES: N/A
FICHAS PEDIALES APROBADAS:	N/A	
AVALÚOS APROBADOS:	N/A	
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A	
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD		
N/A		
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Se llevo a cabo comité de obra el 18 de Mayo de 2023 Durante la presente semana se han realizado actividades de revisión a documentos como se relaciona a continuación: GIC-INVIAS-NTS-535-22, SOLICITUD CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS PREVIOS AL INICIO DE OBRA. GIC-INVIAS-NTS-542-22, RESPUESTA A SU OFICIO OFC-CLP-GIC-026-2023 DE FECHA 08-05-2023 CUYO ASUNTO ES "ENTREGA DE INFORME DISEÑO GEOMETRICO CORREDOR 1-2 - LA PLAYA." - OBSERVACIONES ACTIVIDADES TECNICAS Durante la semana el contratista a realizado actividades de ajuste a los documentos de Estudios y Diseños que han sido observados por la Interventoría. Con el fin de agilizar el proceso se han llevado a cabo mesas de trabajo con los especialistas de ambas partes con el fin de aclarar dudas y poder dar pronta aprobación a los documentos remitidos. ACTIVIDADES AMBIENTALES Durante la semana la interventoría se encuentra a la espera de recibir las observaciones subsanadas enviadas en el PAGA (Plan Guia a la Adaptacion Ambiental), en cuanto a la fuente de materiales nos encontramos a la espera de recibir documentacion de la licencia ambiental para poder realizar la explotación y exploracion del material, de lo contrario se debe cambiar de proveedor. ACTIVIDADES SOCIALES Esta Interventoría se encuentra a la espera de las subsanaciones por parte del Contratista correspondientes al documento PAGA.		
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
Se procederá con la revisión detallada y si es el caso la aprobación de la documentación que entregue el Contratista, Realizar seguimiento de la documentación aprobada al contratista para inicio a las actividades de construcción en campo. Seguimiento a la alcaldía en cuanto a la devolución de rendimientos financieros.		
X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
<div><div><div>TRAMO 1</div><div>PROGRAMADO</div><div>EJECUTADO</div></div><div>LLANO GRANDE</div><div>SAN PEDRO</div></div> <div><div><div>TRAMO 2</div><div>PROGRAMADO</div><div>EJECUTADO</div></div><div>ESPERANZA – ESPERANCITA</div><div>CLAVELLINOS</div></div> <div><div>MANTENIMIENTO</div><div>CONSTRUCCION</div><div>MEJORAMIENTO</div><div>SEÑALIZACION</div><div>TRAMO FUERA DEL</div><div>PUENTE</div></div>		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.		
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
<div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div></div>		
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención. Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito. Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.		FIRMA  NOMBRE: DIEGO EFRAIN PEDRAZA CHAVES Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.		

			V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			4		15	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			4		11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:					4	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			4		10	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:			19			
VI. GESTIÓN PREDIAL						
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:			N/A		OBSERVACIONES: N/A	
FICHAS PEDIALES APROBADAS:			N/A			
AVALUOS APROBADOS:			N/A			
PREDIOS ADQUIRIDOS:			N/A			
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD						
N/A						
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS						
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS						
Se llevo a cabo comité de obra el 25 de Mayo de 2023						
Durante la presente semana se han realizado actividades de revisión a documentos como se relaciona a continuación:						
GIC-INVIAS-NTS-556-22, RESPUESTA A SU OFICIO OFC-CLP-GIC-029-2023 DE FECHA 16-05-2023 CUYO ASUNTO ES "RESPUESTA A OFICIO GIC-INVIAS-NTS-542-22 OBSERVACIONES DISEÑO GEOMETRICO CORREDOR 1 – 2 LA PLAYA." - OBSERVACIONES						
GIC-INVIAS-NTS-593-22, RESPUESTA A SU OFICIO OFC-CLP-GIC-028-2023 DE FECHA 25-05-2023 CUYO ASUNTO ES "RESPUESTA A OFICIO GIC-INVIAS-NTS-498-22 ENSAYOS SUB BASE GRANULAR" - APROBADO						
ACTIVIDADES TECNICAS						
Durante la semana el contratista a realizado actividades de ajuste a los documentos de Estudios y Diseños que han sido observados por la Interventoría. Con el fin de agilizar el proceso se han llevado a cabo mesas de trabajo con los especialistas de ambas partes con el fin de aclarar dudas y poder dar pronta aprobación a los documentos remitidos.						
ACTIVIDADES AMBIENTALES						
La interventoría se encuentra a la espera de recibir documentación con observaciones subsanadas por el contratista respecto a la FUENTE DE MATERIALES y documento PAGA.						
ACTIVIDADES SOCIALES						
Se realiza una reunión vía meet con la profesional social y la directora de proyecto, con el proposito de contestar interrogantes sobre los programas de Gestión Social que se deben de desarrollar durante la ejecución del proyecto, así mismo, se les informa sobre la importancia de levantar las respectivas actas de vecindad ocho días antes de iniciar con los trabajos de obra, llevar a cabo la socialización de inicio de obra, solicitar ante el Ministerio del Interior la "Consulta Previa" sobre si procede o no, conformar el comité de veeduría ciudadana y elaborar actas de compromisos si se necesita almacenar en lotes o viviendas de terceros materiales de construcción.						
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA						
Se procederá con la revisión detallada y si es el caso la aprobación de la documentación que entregue el Contratista,						
Realizar seguimiento de la documentación aprobada al contratista para inicio a las actividades de construcción en campo.						
Seguimiento a la alcaldía en cuanto a la devolución de rendimientos financieros.						
X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS						
<div><div><div><div>TRAMO 1</div><div>PROGRAMADO</div><div>EJECUTADO</div></div><div>LLANO GRANDE</div><div>SAN PEDRO</div></div><div><div><div>TRAMO 2</div><div>PROGRAMADO</div><div>EJECUTADO</div></div><div>ESPERANZA - ESPERANZITA</div><div>CLAVELLINOS</div></div><div><div>PROGRAMADO</div><div>MANTENIMIENTO</div><div>CONSTRUCCION</div><div>MEJORAMIENTO</div><div>SEÑALIZACION</div><div>TRAMO FUERA DEL</div><div>PUENTE</div></div></div>						
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEP1-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.						
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO						
<div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div></div>						
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.						
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA						
<div><div>De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.</div><div>Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.</div><div>Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.</div></div> <div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE:</div><div>Matrícula Profesional No.:</div></div> <div><div></div><div>DIEGO EFRAIN PEDRAZA CHAVES</div><div>25202-109359 CND</div></div>						
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.						
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.						

			V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6	15		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			2	11		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			4	4		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			6	10		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 21						
VI. GESTIÓN PREDIAL						
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:			N/A		OBSERVACIONES: N/A	
FICHAS PEDIALES APROBADAS:			N/A			
AVALUOS APROBADOS:			N/A			
PREDIOS ADQUIRIDOS:			N/A			
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD						
N/A						
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS						
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Se llevo a cabo comité de obra el 01 de Junio de 2023						
ACTIVIDADES TECNICAS Durante la semana el contratista a realizado actividades de ajuste a los documentos de Estudios y Diseños que han sido observados por la Interventoría. Con el fin de agilizar el proceso se han llevado a cabo mesas de trabajo con los especialistas de ambas partes con el fin de aclarar dudas y poder dar pronta aprobación a los documentos remitidos.						
ACTIVIDADES AMBIENTALES Se realiza mesa de trabajo con la directoria del proyecto del contratista, con el fin de subsanar algunas observaciones con respecto a la fuente de materiales, la interventoria se encuentra a la espera de recibir documentacion respecto al PAGA (Plan de Adaptacion a la Guía Ambiental).						
ACTIVIDADES SOCIALES Es enviado por parte del Contratista las cifras del personal vinculado de manera directa e indirecta, así como el número de empleados de mano de obra calificada y no calificada que hace parte del proyecto; igualmente, se realiza una reunión vía meet con la profesional social del Consorcio, dándole a conocer los documentos de preconstrucción que hacen falta por presentar en el componente y mostrarle como es la estructura que deben de tener las fichas del Plan de Gestión Social a ejecutarse.						
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA						
Se procederá con la revisión detallada y si es el caso la aprobación de la documentación que entregue el Contratista, Realizar seguimiento de la documentación aprobada al contratista para inicio a las actividades de construcción en campo. Seguimiento a la alcaldía en cuanto a la devolución de rendimientos financieros.						
X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS						
<div><div><div>TRAMO 1</div><div>LLANO GRANDE</div><div><div>PROGRAMADO</div><div>EJECUTADO</div></div></div><div><div>TRAMO 2</div><div>ESPERANZA - ESPERANCTIA</div><div><div>PROGRAMADO</div><div>EJECUTADO</div></div></div><div><div>PROGRAMAD</div><div>MANTENIMIENTO</div><div>CONSTRUCCION</div><div>MEJORAMIENTO</div><div>SENALIZACIÓN</div><div>TRAMO FUERA DEL</div><div>PUENTE</div></div><div><div>SAN PEDRO</div><div>CLAVELLINOS</div></div></div>						
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEP1-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.						
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
<div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div></div>						
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.						
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA					DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención. Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito. Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.					<div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE:</div><div>Matrícula Profesional No.:</div></div> <div><div></div><div>DIEGO EFRAIN PEDRAZA CHAVES</div><div>25202-109359 CND</div></div>	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.						



12/04/2023
Día / Mes / Año

PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PAMPLONITA.

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Programación Observadas con comunicado GIC-INVIAS-NTS-477-22 del 28-Abr-23

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado \$	
Amortizado \$	
Saldo \$	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES

			V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	N/A	OBSERVACIONES: En espera al inicio de las obras.	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	1	15	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	N/A		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	10				
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:						
VI. GESTIÓN PREDIAL						
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:		N/A	OBSERVACIONES: N/A			
FICHAS PREDIALES APROBADAS:		N/A				
AVALÚOS APROBADOS:		N/A				
PREDIOS ADQUIRIDOS:		N/A				
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD						
N/A						
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS						
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS						
Se envia oficio al contratista que se relaciona a continuacion: GIC-INVIAS-NTS-532-22 SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS – INICIO DEL CONTRATO DE OBRA – COMPONENTE SOCIAL						
Esta semana se dio inicio al comité de seguimiento virtual No.1, espacio donde nos comunicamos todas las partes interesadas del proyecto para hacer un control a todos los componentes que incluyen al contrato, de esta manera el contratista nos informa cuales dias de la siguiente semana nos enviara los documentos de la etapa de preconstruccion y de estudios y diseños.						
ACTIVIDADES TECNICAS						
En cuanto se termine la etapa de revision, observaciones si las hay, y aprobacion de los documentos en mencion por parte de esta interventoria, se dara inicio a las actividades fisicas del proyecto.						
ACTIVIDADES SOCIALES						
Se sostiene comunicación telefónica con el profesional encargado del PAGA, donde se resuelven ciertas inquietudes referente a los impactos a calificar y el marco legal socioeconómico del mismo.						
ACTIVIDADES AMBIENTALES						
Durante la semana la interventoria se encuentra a la espera de recibir la respectiva documentación en cuanto al componente ambiental como lo es el PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), y los permisos existente tramitados por las autoridades ambientales para la explotación y exploración de la FUENTE DE MATERIALES.						
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA						
En espera al inicio del proyecto para realizar la supervisión de las actividades físicas de la obra.						
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS						
<div><div><div>PROGRAMADO</div><div>EJECUTADO</div></div><div><div></div><div></div></div></div>						
PROGRAMADO	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
	MANTENIMIENTO	CONSTRUCCION	MEJORAMIENTO	SEÑALIZACION	TRAMO FUERA DEL	PUENTE
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.						
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO						
<div><div></div><div></div><div></div></div>						
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.						
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA				DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		
De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado,				<div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE: DIEGO EFRATÍN PEDRAZA CHAVES</div><div>Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND</div></div>		
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.						
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.						
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.						



19/05/2023
(Día / Mes / Año)

OBSERVACIONES

			V. GESTIÓN SOCIAL		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	N/A	OBSERVACIONES: En espera al inicio de las obras.
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	1	15	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	N/A	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	10			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:					
VI. GESTIÓN PREDIAL					
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:		N/A	OBSERVACIONES: N/A		
FICHAS PREDIALES APROBADAS:		N/A			
AVALÚOS APROBADOS:		N/A			
PREDIOS ADQUIRIDOS:		N/A			
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD					
N/A					
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Esta interventoría se encuentra en la revision de los entregables por parte del contratista, etapa documentos de preconstruccion y estudios y diseños.					
ACTIVIDADES TECNICAS En cuanto se termine la etapa de revision, observaciones si las hay, y aprobacion de los documentos en mencion por parte de esta interventoría, se dara inicio a las actividades fisicas del proyecto.					
ACTIVIDADES SOCIALES El profesional del Contratista hace referencia a los programas de gestión social que se implementarán durante la ejecución del proyecto; por lo anterior, esta Interventoría le informa que son cinco (5) los programas de gestión social que se deben de implemtar por la duración del proyecto.					
ACTIVIDADES AMBIENTALES Durante la semana la interventoria se encuentra a la espera de recibir la respectiva documentación en cuanto al componente ambiental como lo es el PAGA (Plan Guia a la Adaptación Ambiental), y los permisos existente tramitados por las autoridades ambientales para la explotación y exploración de la FUENTE DE MATERIALES.					
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
En espera al inicio del proyecto para realizar la supervisión de las actividades físicas de la obra.					
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS					
<div><div><div>PROGRAMADO</div><div>EJECUTADO</div></div><div><div>PROGRAMADO</div><div>MANTENIMIENTO</div><div>CONSTRUCCION</div><div>MEJORAMIENTO</div><div>SEÑALIZACION</div><div>TRAMO FUERA DEL</div><div>PUENTE</div></div></div>					
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.					
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
<div><div></div><div></div><div></div></div>					
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.					
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA				DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado.				<div>FIRMA </div> <div>NOMBRE: DIEGO EFRAIN PEDRAZA CHAVES</div> <div>Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND</div>	
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.					
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.					

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</p> <p style="text-align: center;">PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</p> <p style="text-align: center;">MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</p> <p style="text-align: center;">INFORME SEMANAL</p>	CÓDIGO	MEPI-MN1-RV-15-FR-3
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA	26/05/2023 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

1. INFORMACION GENERAL			
PROYECTO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL		
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCION TERRITORIAL:	NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 6 del 19/05/2023 al 25/05/2023 Último Informe Semanal Si ☐
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:	LEONEL VALERO ESCALANTE	GESTOR TECNICO DE PROYECTO:	WILMAR RANGEL ROPERO
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO N° 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.		
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):			
PLACA HUELLA EN LA VIA DE PAMPLONITA			
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:			
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PAMPLONITA.			

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL COLOMBIA				INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S			
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No. 202 DE 2022 VALOR INICIAL: \$ 1.703.523.226,00				CONTRATO No. 1053 DE 2022 VALOR INICIAL: \$ 4.288.164.910,00			
FECHA DE INICIO: 14 – ABRIL – 2023 VALOR ADICIONES: \$ -				FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2022 VALOR ADICIONES: \$ -			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 13 – OCTUBRE - 2023 VALOR ACUMULADO: \$ 1.703.523.226,00				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024 VALOR ACUMULADO: \$ 4.288.164.910,00			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13 – OCTUBRE - 2023 \$ -				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE 2024 VALOR ANTICIPO: N/A			
\$ -				VALOR AMORTIZADO: N/A			
\$ -				SALDO POR AMORTIZAR: N/A			

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1.703.523.226,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 1.703.523.226,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		1.770.000.000,000	2.478.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		1.770.000.000,000	2.478.164.910,000	

OBRA			
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$	1.703.523.226,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	17.651.192,47	1,04%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	-	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	(17.651.192,47)	-1,04%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	2.424.013,80	10,00%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	17.651.192,47	1,04%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	2.424.013,80	0,14%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	(15.227.178,67)	-0,89%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	3.251.535,53	0,19%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	2.424.013,80	0,14%
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div>SI</div> <div>NO</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto; text-align: center;">X</div> </div>			
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: _____			
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____			
PERIODO FACTURADO: _____			
VALOR FACTURA: \$ _____			
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			
Observaciones: Programación Observadas con comunicado GIC-INVIAS-NTS-477-22 del 28-Abr-23			

INTERVENTORIA			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	2.213.248.870,00	51,61%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	781.939.024,20	18,23%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	\$	64.346.275,00	1,50%
	\$	34.000.000,00	0,79%
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div>SI</div> <div>NO</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto; text-align: center;">X</div> </div>			
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: _____			
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____			
PERIODO FACTURADO: _____			
VALOR FACTURA: _____			
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			
Observaciones:			

ANTICIPOS	
Otorgado \$	
Amortizado \$	
Saldo \$	

INDICADOR I/C
En el mes:
Acumulado:

ANTICIPOS	
Otorgado \$	
Amortizado \$	
Saldo \$	

III. AVANCE FÍSICO										
Meta Física Programada %										
Meta Física Ejecutada %										
	Avance o Atraso Físico %									
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base										
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
* Estudios y diseños	UND				Prog					
Ejec										
* Construcción De Placa Huella	ML				Prog					
Ejec										
* Construcción De Alcantarillas	UND				Prog					
Ejec										
*					Prog					
Ejec										
*					Prog					
Ejec										
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).										
TRAMO Y/O SECTOR 1: _____ TRAMO Y/O SECTOR (n): _____										

MAQUINARIA Y EQUIPO		
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		
Equipo mínimo corresponde al existido en el pleigo de condiciones.		

IV. GASTOS DE CAPITAL	
Gasto de Capital programado	
Gasto de Capital ejecutado	
Porcentaje de ejecución	

V. RECURSOS ASIGNADOS	
Recursos asignados	
Recursos ejecutados	
Porcentaje de ejecución	

IV. GESTION AMBIENTAL															
FUENTES DE MATERIALES				PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL											
UBICACIÓN:				DISPONIBLE		ZONAS DE DEPOSITO		SI		NO		N/A		X	
.....				PERMISO MINERO: SI				LICENCIA AMBIENTAL: SI				N/A			
.....				LICENCIA AMBIENTAL: SI				APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI				N/A			
UBICACIÓN:				PERMISO MINERO: SI				CONCESIÓN DE AGUAS: SI				N/A			
.....				LICENCIA AMBIENTAL: SI				OCUPACIÓN DE CAUCES: SI				N/A			
.....				LICENCIA AMBIENTAL: SI				VERTIENTOS: SI				N/A			
.....				LICENCIA AMBIENTAL: SI				EMISIONES: SI				N/A			
.....				LICENCIA AMBIENTAL: SI				OTROS (Especificar cual) SI				N/A			
OBSERVACIONES: La interventoria se encuentra a la espera de recibir los requerimientos legales como Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o título minero y licencia ambiental.				OBSERVACIONES: Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.											

<p>P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)</p> <p>ESTADO: _____</p>	<p>OBSERVACIONES</p>
---	----------------------

V. GESTIÓN SOCIAL																														
<table><tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td><td>OBRA</td><td>INTER</td></tr><tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td><td>3</td><td>15</td></tr><tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td>3</td><td>11</td></tr><tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td><td>1</td><td>4</td></tr><tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td><td>1</td><td>10</td></tr></table>			TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	15	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	11	EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	4	EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	10	<table><tr><td>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:</td><td>N/A</td></tr></table>				No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	N/A	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	N/A	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A	<div>OBSERVACIONES: En espera al inicio de las obras. Una vez el Contratista informe sobre donde quedarán ubicadas las oficinas de atención a la comunidad se actualizará la información de la casilla.</div>		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER																												
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	15																												
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	11																												
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	4																												
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	10																												
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	N/A																													
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	N/A																													
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A																													
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18																														
VI. GESTIÓN PREDIAL																														
<table><tr><td>TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>FICHAS PEDIALES APROBADAS:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>AVALÚOS APROBADOS:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>PREDIOS ADQUIRIDOS:</td><td>N/A</td></tr></table>			TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A	FICHAS PEDIALES APROBADAS:	N/A	AVALÚOS APROBADOS:	N/A	PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A	<div>OBSERVACIONES: N/A</div>																			
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A																													
FICHAS PEDIALES APROBADAS:	N/A																													
AVALÚOS APROBADOS:	N/A																													
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A																													
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD																														
N/A																														
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																														
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS En la presente semana se enviaron oficios que se relacionan a continuación: GIC-INVIAS-NTS-552-22 RESPUESTA A SU OFICIO PHP2022-005-2023 DE FECHA 18-05-2023 CUYO ASUNTO ES " RESPUESTA OFICIO GIC-INVIAS-NTS-506-22 ESTUDIO DE SUELOS" - OBSERVACIONES GIC-INVIAS-NTS-573-22 RESPUESTA A SU OFICIO PHP2022-003-2023 DE FECHA 17-05-2023 CUYO ASUNTO ES "RESPUESTA OFICIO GIC-INVIAS-NTS-506-22, HDV, TOPOGRAFIA, ESTRUCTURAL Y APU" - TOPOGRAFIA- OBSERVACIONES ACTIVIDADES TECNICAS En cuanto se termine la etapa de revision, observaciones si las hay, y aprobacion de los documentos en mencion por parte de esta interventoria, se dara inicio a las actividades fisicas del proyecto. ACTIVIDADES SOCIALES En espera a que el Contratista envíe el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA), para su correspondiente verificación. ACTIVIDADES AMBIENTALES La interventoria se encuentra a la espera de recibir documentación por parte del contratista en cuanto al PAGA (Plan Guia a la Adaptación Ambiental) .																														
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																														
En espera al inicio del proyecto para realizar la supervisión de las actividades físicas de la obra.																														
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																														
<table><tr><td>PROGRAMADO</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td>EJECUTADO</td><td colspan="6"></td></tr></table> <table><tr><td>PROGRAMADO</td><td>MANTENIMIENTO</td><td>CONSTRUCCION</td><td>MEJORAMIENTO</td><td>SENALIZACION</td><td>TRAMO FUERA DEL</td><td>PUENTE</td></tr></table> El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.										PROGRAMADO							EJECUTADO							PROGRAMADO	MANTENIMIENTO	CONSTRUCCION	MEJORAMIENTO	SENALIZACION	TRAMO FUERA DEL	PUENTE
PROGRAMADO																														
EJECUTADO																														
PROGRAMADO	MANTENIMIENTO	CONSTRUCCION	MEJORAMIENTO	SENALIZACION	TRAMO FUERA DEL	PUENTE																								
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO																														
<div></div> <div></div> <div></div>																														
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																														
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA					DIRECTOR DE INTERVENTORÍA																									
De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado. Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.					<div></div> <table><tr><td>FIRMA</td><td>_____</td></tr><tr><td>NOMBRE:</td><td>DIEGO EFRAIN PEDRAZA CHAVES</td></tr><tr><td>Matrícula Profesional No.:</td><td>25202-109359 CND</td></tr></table>					FIRMA	_____	NOMBRE:	DIEGO EFRAIN PEDRAZA CHAVES	Matrícula Profesional No.:	25202-109359 CND															
FIRMA	_____																													
NOMBRE:	DIEGO EFRAIN PEDRAZA CHAVES																													
Matrícula Profesional No.:	25202-109359 CND																													
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																														

V. GESTIÓN SOCIAL						
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	N/A	OBSERVACIONES: En espera al inicio de las obras. Una vez el Contratista informe sobre donde quedarán ubicadas las oficinas de atención a la comunidad se actualizará la información de la casilla.	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	15	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	N/A		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	11	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	10				
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	18					
VI. GESTIÓN PREDIAL						
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A		OBSERVACIONES: N/A			
FICHAS PEDIALES APROBADAS:	N/A					
AVALÚOS APROBADOS:	N/A					
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A					
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD						
N/A						
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS						
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS En la presente semana se enviaron oficios al contratista que se relacionan a continuacion: GIC-INVIAS-NTS-578-22: RESPUESTA A SU OFICIO PHP2022-006-2023 DE FECHA 18-05-2023 CUYO ASUNTO ES "PROGRAMACIÓN OBRA" - APROBADO GIC-INVIAS-NTS-579-22: RESPUESTA A SU OFICIO PHP2022-007-2023 DE FECHA 22-05-2023 CUYO ASUNTO ES "RESPUESTA OFICIO GIC-INVIAS-NTS-506-22 ENTREGA DOCUMENTOS PRECONSTRUCCIÓN" – PMT OBSERVADO GIC-INVIAS-NTS-580-22: RESPUESTA A SU OFICIO PHP2022-007-2023 DE FECHA 22-05-2023 CUYO ASUNTO ES "RESPUESTA OFICIO GIC-INVIAS-NTS-506-22 ENTREGA DOCUMENTOS PRECONSTRUCCIÓN" – SG-SST - OBSERVADO GIC-INVIAS-NTS-581-22: RESPUESTA A SU OFICIO PHP2022-007-2023 DE FECHA 22-05-2023 CUYO ASUNTO ES "RESPUESTA OFICIO GIC-INVIAS-NTS-506-22 ENTREGA DOCUMENTOS PRECONSTRUCCIÓN" – PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD - OBSERVADO GIC-INVIAS-NTS-590-22: RESPUESTA A SU OFICIO PHP2022-003-2023 DE FECHA 17-05-2023 CUYO ASUNTO ES "RESPUESTA OFICIO GIC-INVIAS-NTS-506-22, HDV, TOPOGRAFIA, ESTRUCTURAL Y APU" - PAVIMENTOS - OBSERVADO GIC-INVIAS-598-22 : RESPUESTA A SU OFICIO PHP2022-007-2023 DE FECHA 22-05-2023 CUYO ASUNTO ES "RESPUESTA OFICIO GIC-INVIAS-NTS-506-22 ENTREGA DOCUMENTOS PRECONSTRUCCIÓN" - PAGA – OBSERVADO GIC-INVIAS-NTS-605-22 : RESPUESTA A SU OFICIO PHP2022 – 003 – 2023 DE FECHA 17-05-2023 CUYO ASUNTO ES "RESPUESTA OFICIO GIC-INVIAS-NTS-506-22" – APROBACION GIC-INVIAS-NTS-606-22: PLAN DE CALIDAD - OBSERVACIONES						
ACTIVIDADES TECNICAS En cuanto se termine la etapa de revision, observaciones si las hay, y aprobacion de los documentos en mencion por parte de esta interventoria, se dara inicio a las actividades fisicas del proyecto.						
ACTIVIDADES SOCIALES A la espera que sea enviado el Plan de Adaptacion a la guía Ambiental (PAGA) por parte del Contratista y al inicio de las obras.						
ACTIVIDADES AMBIENTALES Se envía oficios N° GIC-INVIAS-NTS-598-22 PAGA (Plan de Adaptacion a la Guía Ambiental), con observaciones a subsanar por parte del contratista.						
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA						
En espera al inicio del proyecto para realizar la supervisión de las actividades fisicas de la obra.						
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS						
PROGRAMADO						
EJECUTADO						
PROGRAMADO	MANTENIMIENTO	CONSTRUCCION	MEJORAMIENTO	SEÑALIZACION	TRAMO FUERA DEL	PUENTE
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.						
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
<div></div> <div></div> <div></div>						
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.						
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA				DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		
De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, Exigirle al contratista la subsanación de las observaciones realizadas por esta interventoría, para poder realizar la revision lo mas pronto posible y dar concepto aprobatorio, para que asi puedan dar inicio con las actividades fisicas del proyecto.				FIRMA NOMBRE: DIEGO EFRAIN PEDRAZA CHAVES Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND		
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.						

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CODIGO VERSION PÁGINA		MEP-MNI-IN-15-FR-3 1																																																																																																																																									
						FECHA 12/05/2023 (Día / Mes / Año)																																																																																																																																									
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																																																																															
PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.																																																																																																																																															
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 5 del 5/05/2023 al 11/05/2023. Último Informe Semanal SI																																																																																																																																															
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: LEONEL VALERO ESCALANTE GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO GOBERNACION - 1943																																																																																																																																															
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.																																																																																																																																															
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):																																																																																																																																															
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS																																																																																																																																															
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:																																																																																																																																															
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.																																																																																																																																															
CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																																																																																											
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590				INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S																																																																																																																																											
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:																																																																																																																																											
CONTRATO No. 02590 DE 2022 VALOR INICIAL: \$ 16,898,027,326.00				CONTRATO No. 1053 DE 2022 VALOR INICIAL: \$ 4,288,164,910.00																																																																																																																																											
FECHA DE INICIO: 10 DE ABRIL DE 2023 VALOR ADICIONES: \$				FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2022 VALOR ADICIONES: \$ -																																																																																																																																											
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 10 DE DICIEMBRE DE 2023 VALOR ACUMULADO: \$ 16,898,027,326.00				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024 VALOR ACUMULADO: \$ 4,288,164,910.00																																																																																																																																											
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 10 DE DICIEMBRE DE 2023 VALOR ACUMULADO: \$				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE 2024 VALOR ANTICIPO: N/A																																																																																																																																											
				VALOR AMORTIZADO: N/A																																																																																																																																											
				SALDO POR AMORTIZAR: N/A																																																																																																																																											
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																																																																															
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																																																																															
<table><tr><th>CONTRATO</th><th>VIGENCIA</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr><tr><td rowspan="3">OBRA</td><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td>\$ 16,898,027,326.00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SALDO DE VIGENCIA</td><td>\$ 16,898,027,326.00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">INTERVENTORIA</td><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td>40,000,000.000</td><td>1,770,000,000.000</td><td>2,478,164,910.000</td><td></td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SALDO DE VIGENCIA</td><td>40,000,000.000</td><td>1,770,000,000.000</td><td>2,478,164,910.000</td><td></td></tr></table>								CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025	OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 16,898,027,326.00				EJECUTADO DE LA VIGENCIA					SALDO DE VIGENCIA	\$ 16,898,027,326.00				INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	40,000,000.000	1,770,000,000.000	2,478,164,910.000		EJECUTADO DE LA VIGENCIA					SALDO DE VIGENCIA	40,000,000.000	1,770,000,000.000	2,478,164,910.000																																																																																																			
CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025																																																																																																																																										
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 16,898,027,326.00																																																																																																																																													
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA																																																																																																																																														
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 16,898,027,326.00																																																																																																																																													
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	40,000,000.000	1,770,000,000.000	2,478,164,910.000																																																																																																																																											
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA																																																																																																																																														
	SALDO DE VIGENCIA	40,000,000.000	1,770,000,000.000	2,478,164,910.000																																																																																																																																											
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																																																																																															
<table><tr><th colspan="4">OBRA</th><th colspan="4">INTERVENTORIA</th></tr><tr><td colspan="4">VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 16,898,027,326.00</td><td colspan="4">TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 2,084,556,320.00 48.61%</td></tr><tr><td colspan="4">INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td colspan="4">TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 731,939,024.20 17.07%</td></tr><tr><td colspan="4">INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td colspan="4">INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN \$ 65,958,725.00 1.54%</td></tr><tr><td colspan="4">AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -</td><td colspan="4">INVERSIÓN EJECUTADA EN LA INVERSIÓN \$ 37,500,000.00 0.87%</td></tr><tr><td colspan="4">OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)</td><td colspan="4">RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X</td></tr><tr><td colspan="4">TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -</td><td colspan="4">No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:</td></tr><tr><td colspan="4">TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -</td><td colspan="4">PERIODO FACTURADO:</td></tr><tr><td colspan="4">AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -</td><td colspan="4">VALOR FACTURA:</td></tr><tr><td colspan="4">INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td colspan="4">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr><tr><td colspan="4">INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td colspan="4">Observaciones:</td></tr><tr><td colspan="4">RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="4">No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="4">PERIODO FACTURADO:</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="4">VALOR FACTURA: \$ -</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="4">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="4">Observaciones: Programación Observadas con comunicado GIC-INVIAS-NTS-477-22 del 28-Abr-23</td><td colspan="4"></td></tr></table>								OBRA				INTERVENTORIA				VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 16,898,027,326.00				TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 2,084,556,320.00 48.61%				INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:				TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 731,939,024.20 17.07%				INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):				INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN \$ 65,958,725.00 1.54%				AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -				INVERSIÓN EJECUTADA EN LA INVERSIÓN \$ 37,500,000.00 0.87%				OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)				RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X				TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -				No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:				TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -				PERIODO FACTURADO:				AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -				VALOR FACTURA:				INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA				(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA				Observaciones:				RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X								No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:								PERIODO FACTURADO:								VALOR FACTURA: \$ -								(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)								Observaciones: Programación Observadas con comunicado GIC-INVIAS-NTS-477-22 del 28-Abr-23							
OBRA				INTERVENTORIA																																																																																																																																											
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 16,898,027,326.00				TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 2,084,556,320.00 48.61%																																																																																																																																											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:				TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 731,939,024.20 17.07%																																																																																																																																											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):				INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN \$ 65,958,725.00 1.54%																																																																																																																																											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -				INVERSIÓN EJECUTADA EN LA INVERSIÓN \$ 37,500,000.00 0.87%																																																																																																																																											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)				RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X																																																																																																																																											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -				No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:																																																																																																																																											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -				PERIODO FACTURADO:																																																																																																																																											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -				VALOR FACTURA:																																																																																																																																											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA				(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																																																																																											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA				Observaciones:																																																																																																																																											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X																																																																																																																																															
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:																																																																																																																																															
PERIODO FACTURADO:																																																																																																																																															
VALOR FACTURA: \$ -																																																																																																																																															
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																																																																																															
Observaciones: Programación Observadas con comunicado GIC-INVIAS-NTS-477-22 del 28-Abr-23																																																																																																																																															
<table><tr><th colspan="3">ANTICIPOS</th><th colspan="2">INDICADOR IIC</th><th colspan="3">ANTICIPOS</th></tr><tr><td>Otorgado \$</td><td></td><td></td><td>En el mes:</td><td></td><td>Otorgado \$</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Amortizado \$</td><td></td><td></td><td>Acumulado:</td><td></td><td>Amortizado \$</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Saldo \$</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Saldo \$</td><td></td><td></td></tr></table>								ANTICIPOS			INDICADOR IIC		ANTICIPOS			Otorgado \$			En el mes:		Otorgado \$			Amortizado \$			Acumulado:		Amortizado \$			Saldo \$					Saldo \$																																																																																																										
ANTICIPOS			INDICADOR IIC		ANTICIPOS																																																																																																																																										
Otorgado \$			En el mes:		Otorgado \$																																																																																																																																										
Amortizado \$			Acumulado:		Amortizado \$																																																																																																																																										
Saldo \$					Saldo \$																																																																																																																																										
III. AVANCE FÍSICO																																																																																																																																															
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %																																																																																																																																															
Meta Física Ejecutada %																																																																																																																																															
MAQUINARIA Y EQUIPO																																																																																																																																															
<table><tr><th colspan="6">Meta Física (Programa de Obra) Línea Base</th><th colspan="6">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</th></tr><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th><th>Vigencia</th><th>Vigencia (n)</th><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr><tr><td>Estudios y diseños</td><td>UND</td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>* Construcción De Placa Huella</td><td>ML</td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>* Construcción De Alcantarillas</td><td>UND</td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>*</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>*</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Estudios y diseños	UND				Prog											Ejec						* Construcción De Placa Huella	ML				Prog											Ejec						* Construcción De Alcantarillas	UND				Prog											Ejec						*					Prog											Ejec						*					Prog											Ejec								
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada																																																																																																																																									
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																																																																																					
Estudios y diseños	UND				Prog																																																																																																																																										
					Ejec																																																																																																																																										
* Construcción De Placa Huella	ML				Prog																																																																																																																																										
					Ejec																																																																																																																																										
* Construcción De Alcantarillas	UND				Prog																																																																																																																																										
					Ejec																																																																																																																																										
*					Prog																																																																																																																																										
					Ejec																																																																																																																																										
*					Prog																																																																																																																																										
					Ejec																																																																																																																																										
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).																																																																																																																																															
TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:																																																																																																																																															
TRAMO Y/O SECTOR (n):																																																																																																																																															
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																																																																																															
FUENTES DE MATERIALES																																																																																																																																															
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO DISPONIBLE LICENCIA AMBIENTAL: SI NO																																																																																																																																															
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO																																																																																																																																															
OBSERVACIONES:																																																																																																																																															
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																																																																																																															
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X																																																																																																																																															
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X																																																																																																																																															
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A X																																																																																																																																															
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A X																																																																																																																																															
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A X																																																																																																																																															
VERTIMIENTOS: SI NO N/A X																																																																																																																																															
EMISIONES: SI NO N/A X																																																																																																																																															
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X																																																																																																																																															
OBSERVACIONES: Esta por definir.																																																																																																																																															
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)																																																																																																																																															
ESTADO:																																																																																																																																															
OBSERVACIONES																																																																																																																																															

			V. GESTIÓN SOCIAL																								
<table><tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td><td>OBRA</td><td>INTER</td></tr><tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td><td>1</td><td>14</td></tr><tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td>1</td><td>11</td></tr><tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td><td></td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td>11</td></tr></table>			TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	1	14	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	11	EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		4			11	<table><tr><td>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:</td><td>N/A</td></tr></table>		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	N/A	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	N/A	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A	<div>OBSERVACIONES: En espera al inicio de las obras.</div>	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER																									
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	1	14																									
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	11																									
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		4																									
		11																									
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	N/A																										
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	N/A																										
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A																										
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15																											
VI. GESTIÓN PREDIAL																											
<table><tr><td>TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>FICHAS PREDIALES APROBADAS:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>AVALÚOS APROBADOS:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>PREDIOS ADQUIRIDOS:</td><td>N/A</td></tr></table>			TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A	FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A	AVALÚOS APROBADOS:	N/A	PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A	<div>OBSERVACIONES: N/A</div>																
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A																										
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A																										
AVALÚOS APROBADOS:	N/A																										
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A																										
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD																											
N/A																											
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																											
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Esta interventoría se encuentra haciendo las revisiones pertinentes en cuanto a la entrega documental realizada por el contratista de obra, si cumplen con los requerimientos serán aprobados dichos entregables, de lo contrario se harán las respectivas observaciones para que sean subsanadas en el menor tiempo posible. Se envían oficios al contratista que se relacionan a continuación: GIC-INVIAS-NTS-495-22: RESPUESTA A SU OFICIO UTET-02590-007 DE FECHA ABRIL 24 DE 2023 CUYO ASUNTO ES: "SOLICITUD CAMBIO ACTIVIDAD DE ALCANTARILLAS UTILIZANDO TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC DIAMETRO 36". Se participa en reunión el día martes 09 de mayo, en las instalaciones del INVIAS, en donde participaron el contratista de obra, el supervisor por parte de la Gobernación, supervisor por parte del INVIAS y la Interventoría, se trataron temas como la solicitud por parte del contratista del reajuste a los precios contractuales, adicional a esto un plazo de 15 días mas para poder dar alcance a la entrega documental que hace parte de la etapa de preconstruction y estudios y diseños, de acuerdo a lo expuesto por parte del contratista se analizará la situación y en próximo comité se informará como va el análisis de acuerdo a lo conversado.																											
ACTIVIDADES TÉCNICAS En espera al inicio de las actividades físicas del proyecto.																											
ACTIVIDADES SOCIALES Se envía al Contratista un oficio solicitando dar cumplimiento a la presentación de documentos preconstructivos.																											
ACTIVIDADES AMBIENTALES Se recibió oficio N° UTET-02590-011 por parte del contratista en donde se solicitaba, información al respecto de la elaboración PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) y su alcance en cuanto a la compensación ambiental, el día 11 del mes de mayo durante el comité, se aclaró que la formulación del PAGA se encuentra en el ítem, en otras obras ejecutadas donde menciona el estudio diseño, gestión predial, social, ambiental y otros, y no en las compensaciones ambientales ya que estas consisten en el desarrollo y la aplicación de planes correctivos para subsanar el daño generado a los ecosistemas naturales, dentro del presupuesto.																											
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																											
En espera al inicio del proyecto para realizar la supervisión de las actividades físicas de la obra.																											
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																											
<table><tr><td>PROGRAMADO</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>EJECUTADO</td><td colspan="5"></td></tr></table> <table><tr><td>PROGRAMADO</td><td>MANTENIMIENTO</td><td>CONSTRUCCIÓN</td><td>MEJORAMIENTO</td><td>SEÑALIZACIÓN</td><td>TRAMO FUERA DEL</td><td>PUENTE</td></tr></table> El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.							PROGRAMADO						EJECUTADO						PROGRAMADO	MANTENIMIENTO	CONSTRUCCIÓN	MEJORAMIENTO	SEÑALIZACIÓN	TRAMO FUERA DEL	PUENTE		
PROGRAMADO																											
EJECUTADO																											
PROGRAMADO	MANTENIMIENTO	CONSTRUCCIÓN	MEJORAMIENTO	SEÑALIZACIÓN	TRAMO FUERA DEL	PUENTE																					
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO																											
<div></div> <div></div> <div></div>																											
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																											
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA				DIRECTOR DE INTERVENTORÍA																							
De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención. Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.				<div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE: DIEGO EFRAIN PEREZ CHAVES</div><div>Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND</div></div>																							
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																											



19/05/2023

I. INFORMACIÓN GENERAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 6 del 12/05/2023 al 18/05/2023 Último Informe Semanal SI ☐

GOBERNACION - 1943

PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS

PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Programación Observadas con comunicado GIC-INVIAS-NTS-477-22 del 28-Abr-23

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado \$	
Amortizado \$	
Saldo \$	

MAQUINARIA Y EQUIPO

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO

Esta por definir.

ESTADO: EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO

OBSERVACIONES

			V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	N/A	OBSERVACIONES: En espera al inicio de las obras.	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	1	14	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	N/A		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		11				
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15						
VI. GESTIÓN PREDIAL						
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:		N/A	OBSERVACIONES: N/A			
FICHAS PREDIALES APROBADAS:		N/A				
AVALÚOS APROBADOS:		N/A				
PREDIOS ADQUIRIDOS:		N/A				
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD						
N/A						
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS						
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Esta interventoría se encuentra haciendo las revisiones pertinentes en cuanto a la entrega documental realizada por el contratista de obra, si cumplen con los requerimientos serán aprobados dichos entregables, de lo contrario se harán las respectivas observaciones para que sean subsanadas en el menor tiempo posible. Se envían oficios al contratista que se relacionan a continuación: GIC-INVIAS-NTS-533-22: TRASLADO POR COMPETENCIA RESPECTO A DEFINICION ITEM "OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS" CONTRATO DE OBRA 2590 – CONTRATISTA DE OBRA UNION TEMPORAL EDIVIAL -TROJA 2590 – CONVENIO INTERADMINSITRATIVO 1943 CELEBRADO CON LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER Se participa en reunión el día jueves 18 de mayo, en las instalaciones del INVIAS, en donde participaron el contratista de obra, el supervisor por parte de la Gobernación, supervisor por parte del INVIAS y la Interventoría GAVINCO, se trataron temas como la solicitud del reajuste a los precios contractuales por parte del contratista de obra, ya que se nos fue entregado un compendio documental, de esta manera podremos corroborar dicha informacion entregada por el contratista.						
ACTIVIDADES TECNICAS En espera al inicio de las actividades físicas del proyecto.						
ACTIVIDADES SOCIALES Se envía oficio con radicado GIC-INVIAS-NTS-530-22 y asunto "SOLICITUD CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS PREVIOS AL INICIO DE OBRA"; de igual forma, esta Interventoría se encuentra a la espera del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental y al inicio de trabajos en obra.						
ACTIVIDADES AMBIENTALES La interventoría se encuentra a la espera de recibir la respectiva documentación en cuanto al componente ambiental como lo es el PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), y los permisos existentes tramitados por las autoridades ambientales para la explotación y exploración de la fuente de materiales.						
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA						
En espera al inicio del proyecto para realizar la supervisión de las actividades físicas de la obra.						
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS						
<div><div><div>PROGRAMADO</div><div>EJECUTADO</div></div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div>PROGRAMADO</div><div>MANTENIMIENTO</div><div>CONSTRUCCION</div><div>MEJORAMIENTO</div><div>SEÑALIZACION</div><div>TRAMO FUERA DEL</div><div>PUENTE</div></div>						
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.						
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
<div><div></div><div></div><div></div></div>						
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.						
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA				DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		
De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención. Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.				FIRMA  NOMBRE: DIEGO EFRAÍN PEDRAZA CHAVES Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND		
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.						

V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: <div>OBSERVACIONES: En espera al inicio de las obras. Una vez se remita la información por parte del Contratista sobre las oficinas de atención a la comunidad se actualizará la respectiva casilla.</div>
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	15	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6	11	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	4	
		10	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 21			
VI. GESTIÓN PREDIAL			
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	 N/A		OBSERVACIONES: N/A
FICHAS PEDIALES APROBADAS:	 N/A		
AVALÚOS APROBADOS:	 N/A		
PREDIOS ADQUIRIDOS:	 N/A		
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD			
N/A			
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Esta interventoría se encuentra haciendo las revisiones pertinentes en cuanto a la entrega documental realizada por el contratista de obra, si cumplen con los requerimientos serán aprobados dichos entregables, de lo contrario se harán las respectivas observaciones para que sean subsanadas en el menor tiempo posible. Se envían oficios al contratista que se relacionan a continuación: GIC-INVIAS-NTS-565-22: RESPUESTA A SU OFICIO UTET-02590-013 DE FECHA 13-05-2023 CUYO ASUNTO ES: "ENTREGA DE PROGRAMACIÓN DE OBRA CON FLUJO DE INVERSIÓN Y PRIMERA ENTREGA DISEÑO GEOMÉTRICO DE VÍA." - APROBADO FLUJO DE CAJA - OBSERVACIONES PROGRAMACIÓN. GIC-INVIAS-NTS-566-22: ALCANCE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-565-22 CUYO ASUNTO ES "RESPUESTA A SU OFICIO UTET-02590-013 DE FECHA 13-05-2023 CUYO ASUNTO ES: "ENTREGA DE PROGRAMACIÓN DE OBRA CON FLUJO DE INVERSIÓN Y PRIMERA ENTREGA DISEÑO GEOMÉTRICO DE VÍA." - APROBADO FLUJO DE CAJA - OBSERVACIONES PROGRAMACIÓN" APROBACIÓN PROGRAMACIÓN. GIC-INVIAS-NTS-567-22 RESPUESTA A SU OFICIO UTET-02590-013 DE FECHA 13-05-2023 CUYO ASUNTO ES: "ENTREGA DE PROGRAMACIÓN DE OBRA CON FLUJO DE INVERSIÓN Y PRIMERA ENTREGA DISEÑO GEOMÉTRICO DE VÍA." - DISEÑO GEOMÉTRICO DE VÍA – SANTO DOMINGO - OBSERVACIONES			
ACTIVIDADES TECNICAS En espera al inicio de las actividades físicas del proyecto.			
ACTIVIDADES SOCIALES No se ha enviado por parte del Contratista el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA). A la espera que se inicien las actividades de obras			
ACTIVIDADES AMBIENTALES La interventoría se encuentra a la espera de recibir la respectiva documentación en cuanto al componente ambiental como lo es el PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental).			
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA En espera al inicio del proyecto para realizar la supervisión de las actividades físicas de la obra.			
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS			
<div><div>PROGRAMADO</div><div>EJECUTADO</div><div>PROGRAMADO</div><div>MANTENIMIENTO</div><div>CONSTRUCCION</div><div>MEJORAMIENTO</div><div>SENALIZACION</div><div>TRAMO FUERA DEL</div><div>PUENTE</div></div>			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.			
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
<div><div></div><div></div><div></div></div>			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención. Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.		FIRMA NOMBRE: DIEGO EFRAIN PEDRAZA CHAVES Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

		PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MEPI-MN1-IV-15-FR-3
				VERSIÓN	1
				PÁGINA	
				FECHA	2/06/2023 <small>(Día / Mes / Año)</small>
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 8 del 26/05/2023 al 1/06/2023 Último Informe Semanal SI ☐					
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: LEONEL VALERO ESCALANTE GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO GOBERNACION - 1943					
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS. ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.					
CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590			INTERVENIOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES: CONTRATO No. 02590 DE 2022 VALOR INICIAL: \$ 16.898.027.326,00			INTEGRANTES: CONTRATO No. 1053 DE 2022 VALOR INICIAL: \$ 4.288.164.910,00		
FECHA DE INICIO: 10 DE ABRIL DE 2023 VALOR ADICIONES: \$ -			FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2022 VALOR ADICIONES: \$ -		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 10 DE DICIEMBRE DE 2023 VALOR ACUMULADO: \$ 16.898.027.326,00			FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024 VALOR ACUMULADO: \$ 4.288.164.910,00		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 10 DE DICIEMBRE DE 2023 \$ -			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE 2024 VALOR ANTICIPO: N/A		
\$ -			VALOR AMORTIZADO: N/A		
\$ -			SALDO POR AMORTIZAR: N/A		
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 16.898.027.326,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 16.898.027.326,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000.000	1.770.000.000.000	2.478.164.910.000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	40.000.000.000	1.770.000.000.000	2.478.164.910.000	
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
<div><div><div>OBRA</div><div>VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 16.898.027.326,00</div><div>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 41.400.766,39 0,25%</div><div>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ (41.400.766,39) -0,25%</div><div>AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ 8.180.796,56 4,00%</div><div>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)</div><div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 41.400.766,39 0,25%</div><div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 8.180.796,56 0,05%</div><div>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ (33.219.969,83) -0,20%</div><div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 5.298.330,57 0,03%</div><div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 2.045.199,14 0,01%</div><div>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X</div><div>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____</div><div>PERIODO FACTURADO: _____</div><div>VALOR FACTURA: \$ _____</div><div>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</div><div>Observaciones: Programación Observadas con comunicado GIC-INVIAS-NTS-477-22 del 28-Abr-23</div></div><div><div>INTERVENTORIA</div><div>TOTAL INVERSIÓN \$ 2.245.422.007,50 52,36%</div><div>PROGRAMADA: \$ 786.939.024,20 18,35%</div><div>EJECUTADA:</div><div>INVERSIÓN \$ 64.346.275,00 1,50%</div><div>PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN \$ 34.000.000,00 0,79%</div><div>EJECUTADA EN LA</div><div>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X</div><div>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____</div><div>PERIODO FACTURADO: _____</div><div>VALOR FACTURA: _____</div><div>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</div><div>Observaciones: _____</div></div></div> <div><div>ANTIPIOS</div><div>Otorgado \$</div><div>Amortizado \$</div><div>Saldo \$</div></div> <div>INDICADOR I/C</div> <div>En el mes:</div> <div>Acumulado:</div> <div>ANTIPIOS</div> <div>Otorgado \$</div> <div>Amortizado \$</div> <div>Saldo \$</div>					

III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico % Meta Física Ejecutada %											
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base											
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND				Prog						
					Ejec						
* Construcción De Placa Huella	ML				Prog						
					Ejec						
* Construcción De Alcantarillas	UND				Prog						
					Ejec						
*					Prog						
					Ejec						
*					Prog						
					Ejec						
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).											
TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR (n):						TRAMO Y/O SECTOR 2:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO DISPONIBLE LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						ZONAS DE DEPÓSITO SI NO N/A X					
						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X					
						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A X					
						CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A X					
						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A X					
						VERTIENTOS: SI NO N/A X					
						EMISIONES: SI NO N/A X					
						OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X					
OBSERVACIONES: La interventoría se encuentra a la espera de recibir los requerimientos legales como Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o título minero y licencia ambiental.						OBSERVACIONES: Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES					
ESTADO: EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO											

V. GESTIÓN SOCIAL				
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A	OBSERVACIONES: En espera al inicio de las obras. Una vez se remita la información por parte del Contratista sobre las oficinas de atención a la comunidad se actualizará la respectiva casilla.
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	15		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6	11		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	10		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 21				
VI. GESTIÓN PREDIAL				
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A		OBSERVACIONES: N/A	
FICHAS PEDIALES APROBADAS:	N/A			
AVALÚOS APROBADOS:	N/A			
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A			
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD				
N/A				
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Esta interventoría se encuentra haciendo las revisiones pertinentes en cuanto a la entrega documental realizada por el contratista de obra, si cumplen con los requerimientos serán aprobados dichos entregables, de lo contrario se harán las respectivas observaciones para que sean subsanadas en el menor tiempo posible. Se envían oficios al contratista que se relacionan a continuación: GIC-INVIAS-NTS-577-22 Evaluación de la Interventoría al respecto de la solicitud del contratista de obra UNION TEMPORAL EDIVIAL TROJA 2590, contrato 2590 DE 2022 realizada a la GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER por oficio UTET -02590-003 de fecha marzo 29 de 2023 cuyo asunto es: "SOLICITUD ACTUALIZACION DE PRECIOS PRESUPUESTO DE OBRA 2022 A 2023"				
ACTIVIDADES TECNICAS En espera al inicio de las actividades físicas del proyecto.				
ACTIVIDADES SOCIALES A la espera que sea enviado por parte del Contratista el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA) y al inicio de las obras.				
ACTIVIDADES AMBIENTALES La interventoría se encuentra a la espera de recibir documentación correspondiente al PAGA (Plan de Adaptacion a la Guía Ambiental)				
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
En espera al inicio del proyecto para realizar la supervisión de las actividades físicas de la obra.				
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS				
<div><div>PROGRAMADO</div><div>EJECUTADO</div><div>PROGRAMADO</div><div>MANTENIMIENTO</div><div>CONSTRUCCION</div><div>MEJORAMIENTO</div><div>SENALIZACION</div><div>TRAMO FUERA DEL</div><div>PUENTE</div></div>				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
<div><div></div><div></div><div></div></div>				
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		
De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención. Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.		<div><div>FIRMA:</div><div>NOMBRE: DIEGO EFRAIN PEDRAZA CHAVES</div><div>Matrícula Profesional No.: 26202-109359 CND</div></div>		
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.				

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

MEPMN1-IN-15-FR-3

1

FECHA

19/05/2023
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

NORTE DE SANTANDER

SEMANA No.:

1

 del

12/05/2023

 al

18/05/2023

 Último Informe Semanal Si ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

LEONEL VALERO ESCALANTE

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

WILMAR RANGEL ROPERO

LOS PATIOS

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

PLACA HUELLA EN LA VIAS DE LOS PATIOS, LA MUTIS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

PLACA HUELLA EN LA VIAS DE LOS PATIOS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022

INTERVENIOR:

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

INTEGRANTES:

INTEGRANTES:

CONTRATO No.

02332 DE 2022

CONTRATO No.

1053 DE 2022

FECHA DE INICIO:

11- MAYO DE 2023

FECHA DE INICIO:

26 DE SEPTIEMBRE 2022

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

10 - NOVIEMBRE - 2023

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31 DE DICIEMBRE 2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

10 - NOVIEMBRE - 2023

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

31 DE DICIEMBRE 2024

VALOR INICIAL:

\$ 5.159.028.732,00

VALOR INICIAL:

\$ 4.288.164.910,00

VALOR ADICIONES:

\$ -

VALOR ADICIONES:

\$ -

VALOR ACUMULADO:

\$ 5.159.028.732,00

VALOR ACUMULADO:

\$ 4.288.164.910,00

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO

VIGENCIA

2022

2023

2024

2025

OBRA

RECURSOS POR VIGENCIA

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

SALDO DE VIGENCIA

RECURSOS POR VIGENCIA

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

SALDO DE VIGENCIA

INTERVENTORIA

RECURSOS POR VIGENCIA

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

SALDO DE VIGENCIA

RECURSOS POR VIGENCIA

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

SALDO DE VIGENCIA

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):

\$ 5.159.028.732,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

-

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

-

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

\$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

\$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:

-

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:

-

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI NO
X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

-

PERIODO FACTURADO:

-

VALOR FACTURA:

\$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

-

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):

\$ 5.159.028.732,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

-

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

-

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

\$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

\$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:

-

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:

-

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI NO
X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

-

PERIODO FACTURADO:

-

VALOR FACTURA:

\$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

-

ANTIPOIS

INDICADOR I/C

ANTIPOIS

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

-

Meta Física Ejecutada %

-

Avance o Atraso Físico %

-

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física Contractual

Unidad

Cantidad

Vigencia

Vigencia (n)

Avance Físico

Tramo y/o sector 1

Tramo y/o sector 2

Tramo y/o sector (n)

Total

%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

-

TRAMO Y/O SECTOR (n):

-

TRAMO Y/O SECTOR 2:

-

FUENTES DE MATERIALES

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

UBICACIÓN:

-

UBICACIÓN:

-

OBSERVACIONES: La interventoría se encuentra a la espera de recibir los requerimientos legales como Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o título minero y licencia ambiental.

OBSERVACIONES: Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES

ESTADO:

V. GESTIÓN SOCIAL						
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A	OBSERVACIONES: En espera al inicio de las obras. Una vez se tenga conocimiento de la ubicación de las oficinas de atención a la comunidad situadas por el Contratista, se actualizará la información de la casilla.		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	1	15				
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	11				
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	4				
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:			10			
VI. GESTIÓN PREDIAL						
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A		OBSERVACIONES: N/A			
FICHAS PEDIALES APROBADAS:	N/A					
AVALÚOS APROBADOS:	N/A					
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A					
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD						
N/A						
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS						
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS En espera a que el contratista de obra nos envíe la documentación solicitada de la etapa de pre-construcción y de estudios y diseños, para ir realizando las respectivas revisiones, y de no haber observaciones se emitirá oficio de Aprobado de dicho documento, en caso contrario, si se evidencias observaciones se le hará saber al contratista mediante oficio para que realice las subsanaciones en el menor tiempo posible.						
ACTIVIDADES TECNICAS En cuanto se termine la etapa de revision, observaciones si las hay, y aprobacion de los documentos en mencion por parte de esta interventoria, se dará inicio a las actividades físicas del proyecto.						
ACTIVIDADES SOCIALES En espera del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA) y al inicio de actividades de obra.						
ACTIVIDADES AMBIENTALES La interventoría se encuentra a la espera de recibir documentación por parte del contratista en cuanto al PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) .						
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA						
En espera al inicio del proyecto para realizar la supervisión de las actividades físicas de la obra.						
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS						
PROGRAMADO						
EJECUTADO						
PROGRAMADO	MANTENIMIENTO	CONSTRUCCION	MEJORAMIENTO	SEÑALIZACIÓN	TRAMO FUERA DEL	PUENTE
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.						
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
<div></div> <div></div> <div></div>						
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.						
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA				DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		
De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.				FIRMA NOMBRE: DIEGO EFRAIN PEDRAZA CHAVES Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND		
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.						

V. GESTIÓN SOCIAL						
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A OBSERVACIONES: En espera al inicio de las obras. Una vez se tenga conocimiento de la ubicación de las oficinas de atención a la comunidad situadas por el Contratista, se actualizará la información de la casilla.			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	1	15				
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	11				
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	4				
		10				
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:						
VI. GESTIÓN PREDIAL						
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A		OBSERVACIONES: N/A			
FICHAS PEDIALES APROBADAS:	N/A					
AVALÚOS APROBADOS:	N/A					
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A					
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD						
N/A						
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS						
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS						
En la presente semana se envía oficio al contratista que se relaciona a continuación: GIC-INVIAS-NTS-575-22: SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE ASISTENCIA A LOS COMITÉS DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA 02332 DE 2022						
En espera a que el contratista de obra nos envíe la documentación solicitada de la etapa de pre-construcción y de estudios y diseños, para ir realizando las respectivas revisiones, y de no haber observaciones se emite oficio de Aprobado de dicho documento, en caso contrario, si se evidencian observaciones se le hará saber al contratista mediante oficio para que realice las subsanaciones en el menor tiempo posible.						
ACTIVIDADES TÉCNICAS						
En cuanto se termine la etapa de revisión, observaciones si las hay, y aprobación de los documentos en mención por parte de esta interventoría, se dará inicio a las actividades físicas del proyecto.						
ACTIVIDADES SOCIALES						
ACTIVIDADES AMBIENTALES						
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA						
En espera al inicio del proyecto para realizar la supervisión de las actividades físicas de la obra.						
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS						
PROGRAMADO						
EJECUTADO						
PROGRAMADO	MANTENIMIENTO	CONSTRUCCION	MEJORAMIENTO	SENALIZACION	TRAMO FUERA DEL	PUENTE
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.						
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
<div></div> <div></div> <div></div>						
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.						
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA				DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		
De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.				FIRMA:  NOMBRE: DIEGO EFRAÍN PEDRAZA CHAVES Matrícula Profesional No.: 25202-109399 CND		
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.						

V. GESTIÓN SOCIAL																														
<table><tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td><td>OBRA</td><td>INTER</td></tr><tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td><td>1</td><td>15</td></tr><tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td>1</td><td>11</td></tr><tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td><td>1</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td>10</td></tr></table>			TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	1	15	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	11	EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	4			10	<table><tr><td>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:</td><td>N/A</td></tr></table>				No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	N/A	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	N/A	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A	<div>OBSERVACIONES: En espera al inicio de las obras. Una vez se tenga conocimiento de la ubicación de las oficinas de atención a la comunidad situadas por el Contratista, se actualizará la información de la casilla.</div>		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER																												
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	1	15																												
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	11																												
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	4																												
		10																												
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	N/A																													
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	N/A																													
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A																													
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16																														
VI. GESTIÓN PREDIAL																														
<table><tr><td>TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>FICHAS PEDIALES APROBADAS:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>AVALÚOS APROBADOS:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>PREDIOS ADQUIRIDOS:</td><td>N/A</td></tr></table>			TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A	FICHAS PEDIALES APROBADAS:	N/A	AVALÚOS APROBADOS:	N/A	PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A	<div>OBSERVACIONES: N/A</div>																			
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A																													
FICHAS PEDIALES APROBADAS:	N/A																													
AVALÚOS APROBADOS:	N/A																													
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A																													
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD																														
N/A																														
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																														
<p>ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS En la presente semana se envía oficio al contratista que se relaciona a continuación: GIC-INVIAS-NTS-612-22: RESPUESTA A ENVIO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD – GOBERNACION 2052 En espera a que el contratista de obra nos envíe la documentación solicitada de la etapa de pre-construcción y de estudios y diseños, para ir realizando las respectivas revisiones, y de no haber observaciones se emitirá oficio de Aprobado de dicho documento, en caso contrario, si se evidencias observaciones se le hará saber al contratista mediante oficio para que realice las subsanaciones en el menor tiempo posible.</p> <p>ACTIVIDADES TÉCNICAS En cuanto se termine la etapa de revisión, observaciones si las hay, y aprobación de los documentos en mención por parte de esta interventoría, se dará inicio a las actividades físicas del proyecto.</p> <p>ACTIVIDADES SOCIALES En espera se se envíe por parte del Consorcio del correspondiente Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA) y al inicio de obras físicas</p> <p>ACTIVIDADES AMBIENTALES La interventoría se encuentra a la espera de recibir documentación correspondiente al PAGA (Plan de Adaptación a la Guía Ambiental)</p>																														
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																														
En espera al inicio del proyecto para realizar la supervisión de las actividades físicas de la obra.																														
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																														
<table><tr><td>PROGRAMADO</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>EJECUTADO</td><td colspan="5"></td></tr></table> <div><div>PROGRAMADO</div><div><div>MANTENIMIENTO</div><div>CONSTRUCCION</div><div>MEJORAMIENTO</div><div>SENALIZACION</div><div>TRAMO FUERA DEL</div><div>PUENTE</div></div></div> <p>El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.</p>										PROGRAMADO						EJECUTADO														
PROGRAMADO																														
EJECUTADO																														
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO																														
<div><div></div><div></div><div></div></div>																														
<p>NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.</p> <table><tr><td><p>XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA</p><p>De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado. Exigirle al contratista la subsanación de las observaciones realizadas por esta Interventoría en el menor tiempo posible, para poder revisar y dar concepto de aprobado y de esta manera puedan dar inicio a la ejecución del proyecto.</p></td><td><p>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</p><div></div><p>FIRMA _____ NOMBRE: DIEGO EFRAÍN PEDRAZA CHAVES Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND</p></td></tr></table>										<p>XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA</p> <p>De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado. Exigirle al contratista la subsanación de las observaciones realizadas por esta Interventoría en el menor tiempo posible, para poder revisar y dar concepto de aprobado y de esta manera puedan dar inicio a la ejecución del proyecto.</p>	<p>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</p> <div></div> <p>FIRMA _____ NOMBRE: DIEGO EFRAÍN PEDRAZA CHAVES Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND</p>																			
<p>XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA</p> <p>De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado. Exigirle al contratista la subsanación de las observaciones realizadas por esta Interventoría en el menor tiempo posible, para poder revisar y dar concepto de aprobado y de esta manera puedan dar inicio a la ejecución del proyecto.</p>	<p>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</p> <div></div> <p>FIRMA _____ NOMBRE: DIEGO EFRAÍN PEDRAZA CHAVES Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND</p>																													
<p>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</p>																														

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-3

VERSIÓN

1

PÁGINA

FECHA

3/11/2022
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 1 del 2/05/2023 al 11/05/2023 Último Informe Semanal SI I (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO OCAÑA-1814

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: Construcción de Placa Huella rural, Construcción de Alcantarillas en puntos críticos para el manejo de escorrentía en el corredor vial OCAÑA-BUENAVISTA.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022

INTEGRANTES:

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4352407

FECHA DE INICIO: 2 DE MAYO DE 2023

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VALOR INICIAL: \$ 2,499,989,139.00

VALOR ADICIONES: \$

VALOR ACUMULADO: \$ 2,499,989,139.00

\$

\$

\$

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 1053 DE 2022

FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2022

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE 2024

VALOR INICIAL: \$ 4,288,164,910.00

VALOR ADICIONES: \$

VALOR ACUMULADO: \$ 4,288,164,910.00

VALOR ANTICIPO: N/A

VALOR AMORTIZADO: N/A

SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 2,499,989,139.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 2,499,989,139.00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 40,000,000	\$ 1,770,000,000	\$ 2,478,164,910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 40,000,000	\$ 1,770,000,000	\$ 2,478,164,910	

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 2,499,989,139.00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - %

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - %

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - %

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - %

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - %

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - %

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - %

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: PERIODO FACTURADO: VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN \$ 2,084,556,320.00 48.61%

PROGRAMADA:

TOTAL INVERSIÓN \$ 731,939,024.20 17.07%

EJECUTADA:

INVERSIÓN \$ 65,958,725.00 1.54%

PROGRAMADA EN

INVERSIÓN \$ 37,500,000.00 0.87%

EJECUTADA EN LA

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: PERIODO FACTURADO: VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS

Otorgado \$	
Amortizado \$	
Saldo \$	

INDICADOR I/C

En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS

Otorgado \$	
Amortizado \$	
Saldo \$	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR (n): TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: RICARDO CASADIEGO SANJUAN VEREDA EL HATILLO Y LA MADERA

PERMISO MINERO: SI X NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

UBICACIÓN: N/A

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

DISPONIBLE

OBSERVACIONES: El municipio de Ocaña cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROB ADO.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X

LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO N/A

APROVECHAMIENTO FORESTA SI NO N/A X

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A X

Ocupación de CAUCES: SI NO N/A X

VERTIMIENTOS: SI NO N/A X

EMISIONES: SI NO N/A X

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X

OBSERVACIONES: Aplica LICENCIA AMBIENTAL solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-462-22 del 20-Abr-23

OBSERVACIONES:

			V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	N/A	OBSERVACIONES: Una vez sea entregado por parte del Contratista laUbicación del puntot de atención a la comunidad se actualizará la información aquí solicitada.	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	1	3	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	N/A		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	3	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	2				
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4						
VI. GESTIÓN PREDIAL						
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:			N/A			
FICHAS PEDIALES APROBADAS:			N/A			
AVALÚOS APROBADOS:			N/A			
PREDIOS ADQUIRIDOS:			N/A			
OBSERVACIONES: N/A						
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD						
N/A						
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS						
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Se firma Acta de Inicio del Contrato de Obra el 02-05-2023. Se llevo a cabo comité de obra No. 1 el 011 de Mayo de 2023 1.GIC-INVIAS-NTS-508-22, SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1814 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE OCAÑA. 2.GIC-INVIAS-NTS-512-22, SOLICITUD DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS - INICIO CONTRATO DE OBRA - OCAÑA 1814 3.GIC-INVIAS-NTS-528-22, SOLICUTD CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS PREVIOS AL INICIO DE OBRA - OCAÑA 1814						
ACTIVIDADES TÉCNICAS El Contratista se encuentra realizando actividades de Levantamiento d einformación en campo para la actualización a Estudios y Diseños del proyecto.						
ACTIVIDADES AMBIENTALES La interventoría se encuentra a la espera de recibir documento PAGA (Plan Guia a la Adaptación Ambiental), con las observaciones subsanadas por parte del contratista						
ACTIVIDADES SOCIALES En la semana se avanzo junto con la profesional social del Contratista, con las subsanaciones al documento PAGA, realizando una reunión vía meet; así mismo, se dio la NO OBJECCIÓN por parte de esta Interventoría, al formato usado para el levantamiento de las actas de vecindad que se encuentren dentro del corredor vial.						
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA						
Se procederá con la revisión detallada y si es el caso la aprobación de la documentación entregada por el Contratista. Realizar seguimiento de la documentación aprobada al contratista para inicio a las actividades de construcción en campo. Seguimiento a la alcaldía en cuanto a la devolución de rendimientos financieros.						
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS						
<div><div>PROGRAMADO</div><div>EJECUTADO</div></div> <div><div>PROGRAMAD</div><div>MANTENIMIENTO</div><div>CONSTRUCCIÓN</div><div>MEJORAMIENTO</div><div>SEÑALIZACIÓN</div><div>TRAMO FUERA DEL</div><div>PUENTE</div></div>						
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.						
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
<div>N/A</div> <div>Indicar localización y actividad</div>		<div>N/A</div> <div>Indicar localización y actividad</div>		<div>N/A</div> <div>Indicar localización y actividad</div>		
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.						
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA				DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		
De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mencion. Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito. Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.				FIRMA NOMBRE: DIEGO EFRAIN BARRAZA CHAVES Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND		
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.						

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-3

VERSIÓN

1

PÁGINA

FECHA

19/05/2023
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 2 del 12/05/2023 al 18/05/2023 Último Informe Semanal Si ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL RÓPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: : MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huella rural, Construcción de Alcantarillas en puntos críticos para el manejo de escorrentía en el corredor vial OCAÑA-BUENAVISTA.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

INTEGRANTES:

INTEGRANTES:

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4352407

CONTRATO No. 1053 DE 2022

FECHA DE INICIO: 2 DE MAYO DE 2023

FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2022

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE 2024

VALOR INICIAL: \$ 2,499,989,139.00

VALOR INICIAL: \$ 4,288,164,910.00

VALOR ADICIONES: \$ -

VALOR ADICIONES: \$ -

VALOR ACUMULADO: \$ 2,499,989,139.00

VALOR ACUMULADO: \$ 4,288,164,910.00

\$ -

VALOR ANTICIPO: N/A

\$ -

VALOR AMORTIZADO: N/A

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 2,499,989,139.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 2,499,989,139.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 40,000,000	\$ 1,770,000,000	\$ 2,478,164,910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 40,000,000	\$ 1,770,000,000	\$ 2,478,164,910	

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 2,499,989,139.00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - %

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - %

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - %

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - %

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - %

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - %

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - %

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Programaci n observada por la interventoría con comunicado GIC-INVIAS-NTS-562-22

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN \$ 2,148,902,595.00 50.11%

PROGRAMADA:

TOTAL INVERSIÓN \$ 756,939,024.20 17.65%

EJECUTADA:

INVERSIÓN \$ 65,958,725.00 1.54%

PROGRAMADA EN

INVERSIÓN \$ 66,666,666.67 1.55%

EJECUTADA EN LA

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURAR:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS

Otorgado \$

Amortizado \$

Saldo \$

INDICADOR I/C

En el mes:

Acumulado:

ANTICIPOS

Otorgado \$

Amortizado \$

Saldo \$

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
*					Ejec					
					Prog					
*					Ejec					
					Prog					
*					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: RICARDO CASADIEGO SANJUAN PERMISO MINERO: SI X NO LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO Vereda el Hatillo y la Madera

UBICACIÓN: N/A PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES: El municipio de Ocaña- Buenavista cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X

LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO N/A

APROVECHAMIENTO FORESTA SI NO N/A X

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A X

OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A X

VERTIMENTOS: SI NO N/A X

EMISIONES: SI NO N/A X

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X

OBSE R VACIONES: Aplica LICENCIA AMBIENTAL solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-462-22 del 20-Abr-23

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	1	15
EMPL EOS DIRECTOS GENERADOS:	1	11
EMPL EOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPL EOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:
Una vez sea entregado por parte del Contratista laUbicación del punot de atención a la comunidad se actualizara la información aquí solicitada..

En espera a que se inicien las obras.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se llevo a cabo comité de obra No. 2 el 18 de Mayo de 2023

ACTIVIDADES TÉCNICAS

El Contratista se encuentra realizando actividades de Levantamiento de información en campo para la actualización a Estudios y Diseños del proyecto.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana la interventoría se encuentra a la espera de recibir documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), con las observaciones subsanadas por parte del contratista.

ACTIVIDADES SOCIALES


Se realiza una reunión vía meet y telefónica con la profesional social del Contratista, en ella, se llegaron a acuerdos sobre los programas de gestión social a ser implementados y los impactos ambientales a evaluarse.

Igualmente, es enviado por el Contratista un acta de reunión con el comité de veeduría ciudadana, el cual, da la respectiva aprobación a los sectores a intervenir en la vereda.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se procederá con la revisión detallada y si es el caso la aprobación de la documentación entregada por el Contratista, Realizar seguimiento de la documentación aprobada al contratista para inicio a las actividades de construcción en campo. Seguimiento a la alcaldía en cuanto a la devolución de rendimientos financieros.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N/A	N/A	N/A
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mencion. Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito. Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.	<div>FIRMA </div> <div>NOMBRE: DIEGO EFRAIN PEDRAZA CHAVES</div> <div>Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND</div>

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL

CODIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-3

VERSION

1

PÁGINA

FECHA

26/05/2023
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

NORTE DE SANTANDER

SEMANA No.:

3

del

19/05/2023

al

25/05/2023

Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

LEONEL VALERO ESCALANTE

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

WILMAR RANGEL ROPERO

OCAÑA-1814

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huella rural, Construcción de Alcantarillas en puntos críticos para el manejo de escorrentía en el corredor vial OCAÑA-BUENAVISTA.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022

INTEGRANTES:

CONTRATO No.

CO1.PCCNTR.4352407

VALOR INICIAL:

\$

2.499.989.139,00

FECHA DE INICIO:

2 DE MAYO DE 2023

VALOR ADICIONES:

\$

-

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

1 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VALOR ACUMULADO:

\$

2.499.989.139,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

1 DE SEPTIEMBRE DE 2023

\$

-

\$

-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

INTEGRANTES:

CONTRATO No.

1053 DE 2022

VALOR INICIAL:

\$

4.288.164.910,00

FECHA DE INICIO:

26 DE SEPTIEMBRE 2022

VALOR ADICIONES:

\$

-

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31 DE DICIEMBRE 2024

VALOR ACUMULADO:

\$

4.288.164.910,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

31 DE DICIEMBRE 2024

VALOR ANTICIPO:

N/A

VALOR AMORTIZADO:

N/A

SALDO POR AMORTIZAR:

N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 2.499.989.139,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 2.499.989.139,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 40.000.000	\$ 1.770.000.000	\$ 2.478.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 40.000.000	\$ 1.770.000.000	\$ 2.478.164.910	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):

\$

2.499.989.139,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

\$

-

%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

\$

-

%

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

\$

-

%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

\$

-

%

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$

-

%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$

-

%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

\$

-

%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$

-

%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$

-

%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI

NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

\$

-

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

Programaci n observada por la interventoría con comunicado GIC-INVIAS-NTS-562-22

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN

\$

2.213.248.870,00

51,61%

PROGRAMADA:

TOTAL INVERSIÓN

\$

781.939.024,20

18,23%

EJECUTADA:

INVERSIÓN

\$

64.346.275,00

1,50%

PROGRAMADA EN

INVERSIÓN

\$

34.000.000,00

0,79%

EJECUTADA EN LA

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI

NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURA

VALOR FACTURA:

\$

-

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS

Otorgado \$

Amortizado \$

Saldo \$

INDICADOR IIC

En el mes:

Acumulado:

ANTICIPOS

Otorgado \$

Amortizado \$

Saldo \$

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
*					Ejec					
					Prog					
*					Ejec					
					Prog					
*					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

RICARDO CASADIO SANJUAN

Vereda el Hatillo y la Madera

PERMISO MINERO:

SI

X

NO

LICENCIA AMBIENTAL:

SI

X

NO

UBICACIÓN:

N/A

PERMISO MINERO:

SI

NO

LICENCIA AMBIENTAL:

SI

NO

OBSERVACIONES:

El municipio de Ocaña- Buenavista cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cu ales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO

SI

NO

N/A

X

LICENCIA AMBIENTAL:

SI

X

NO

N/A

APROVECHAMIENTO FORESTAL

SI

NO

N/A

X

CONCESIÓN DE AGUAS:

SI

NO

N/A

X

Ocupación de CAUCES:

SI

NO

N/A

X

VERTIMIENTOS:

SI

NO

N/A

X

EMISIONES:

SI

NO

N/A

X

OTROS (Especificar cual)

SI

NO

N/A

X

OBSERVACIONES:

Aplica LICENCIA AMBIENTAL solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

Observado mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-462-22 del 20-Abr-23

OBSERVACIONES:

<table><tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td><td>5</td><td>15</td></tr><tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td><td>5</td><td>11</td></tr><tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td>4</td></tr><tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td><td>5</td><td>10</td></tr></table>			TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	15	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	11	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4	EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	10	<table><tr><td>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:</td><td>1</td></tr><tr><td>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:</td><td>1</td></tr><tr><td>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:</td><td>N/A</td></tr></table>		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	1	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A	<div>OBSERVACIONES: Una vez sea entregado por parte del Contratista laubicación del punto de atención a la comunidad se actualizara la información aquí solicitada. En espera a que se inicien las obras.</div>
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	15																					
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	11																					
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4																					
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	10																					
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1																						
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	1																						
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A																						
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 20																							
VI. GESTIÓN PREDIAL																							
<table><tr><td>TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>FICHAS PREDIALES APROBADAS:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>AVALÚOS APROBADOS:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>PREDIOS ADQUIRIDOS:</td><td>N/A</td></tr></table>		TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A	FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A	AVALÚOS APROBADOS:	N/A	PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A	<div>OBSERVACIONES: N/A</div>													
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A																						
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A																						
AVALÚOS APROBADOS:	N/A																						
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A																						
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD																							
N/A																							
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																							
<div>ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS</div> <p>Se llevo a cabo comité de obra No. 3 el 25 de Mayo de 2023 Durante la presente semana se han realizado actividades de revisión a documentos como se relaciona a continuación:</p> <p>GIC-INVIAS-NTS-551-22, RESPUESTA A SU OFICIO GBE-004-2022 DE FECHA 16-05-2023 CUYO ASUNTO ES " DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE PLACA HUELLA Y GEOTECNIA (OCAÑA-BUENA VISTA)" - OBSERVACIONES GIC-INVIAS-NTS-558-22, RESPUESTA A SU OFICIO GBE-003-2022 DE FECHA 19-04-2023 CUYO ASUNTO ES "PLAN DE CALIDAD" - APROBADO GIC-INVIAS-NTS-559-22, RESPUESTA A SU OFICIO GBE-002-2022 DE FECHA 24-05-2023 CUYO ASUNTO ES " HOJAS DE VIDA - APROBADO GIC-INVIAS-NTS-560-22, RESPUESTA A SU OFICIO GBE-002-2022 DE FECHA 24-05-2023 CUYO ASUNTO ES " PROGRAMA GENERACIÓN DE EMPLEO - APROBADO GIC-INVIAS-NTS-561-22, RESPUESTA A SU OFICIO GBE-002-2022 DE FECHA 24-05-2023 CUYO ASUNTO ES " DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO - OBSERVACIONES GIC-INVIAS-NTS-562-22, RESPUESTA A SU OFICIO GBE-002-2022 DE FECHA 24-05-2023 CUYO ASUNTO ES " PROGRAMACIÓN Y FLUJO DE CAJA - OBSERVACIONES GIC-INVIAS-NTS-563-22, RESPUESTA A SU OFICIO GBE-002-2022 DE FECHA 24-05-2023 CUYO ASUNTO ES " EQUIPO MINIMO - OBSERVACIONES GIC-INVIAS-NTS-564-22, RESPUESTA A SU OFICIO GBE-002-2022 DE FECHA 24-05-2023 CUYO ASUNTO ES " PMT - OBSERVACIONES GIC-INVIAS-NTS-588-22, RESPUESTA A SU OFICIO GBE-007-2022 DE FECHA 18-05-2023 CUYO ASUNTO ES LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO TRAMOS CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA." - OBSERVACIONES</p> <div>ACTIVIDADES TÉCNICAS</div> <p>El Contratista se encuentra realizando actividades de Levantamiento de información en campo para la actualización a Estudios y Diseños del proyecto.</p> <div>ACTIVIDADES AMBIENTALES</div> <p>La interventoría se encuentra a la espera de recibir documentacion pertinente del documento PAGA (Plan Guia a la Adaptación Ambiental) con las observaciones subsanadas por parte del contratista.</p> <div>ACTIVIDADES SOCIALES</div> <p>En la semana se realizaron dos (2) reuniones vía meet con la profesional social del Contratista, en ellas se habló sobre los programas de Gestión Social a ejecutarse durante el desarrollo de la obra, los impactos socioeconómicos a describir y evaluar, así como la descripción del área de influencia y la caracterización del medio socioeconómico; por otra parte, el Contratista envía la socialización realizada con el comité de veeduría ciudadana, donde se aprueban los tramos que serán intervenidos y el acta de conformación y aprobación por parte de la personería del Comité de veeduría ciudadana.</p>																							
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																							
<p>Se procederá con la revisión detallada y si es el caso la aprobación de la documentación entregada por el Contratista, Realizar seguimiento de la documentación aprobada al contratista para inicio a las actividades de construcción en campo. Seguimiento a la alcaldía en cuanto a la devolución de rendimientos financieros.</p>																							
X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS																							
<table><tr><td>PROGRAMADO</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>EJECUTADO</td><td colspan="5"></td></tr></table> <div><div>PROGRAMAD</div><div><div>MANTENIMIENTO</div><div>CONSTRUCCION</div><div>MEJORAMIENTO</div><div>SEÑALIZACIÓN</div><div>TRAMO FUERA DEL</div><div>PUENTE</div></div></div>					PROGRAMADO						EJECUTADO												
PROGRAMADO																							
EJECUTADO																							
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.																							
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO																							
<table><tr><td><div>N/A</div><div>Indicar localización y actividad</div></td><td><div>N/A</div><div>Indicar localización y actividad</div></td><td><div>N/A</div><div>Indicar localización y actividad</div></td></tr></table>					<div>N/A</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>N/A</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>N/A</div> <div>Indicar localización y actividad</div>																
<div>N/A</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>N/A</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>N/A</div> <div>Indicar localización y actividad</div>																					
<div>NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.</div> <table><tr><td><div>XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA</div><div>De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención. Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito. Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.</div></td><td><div>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</div><div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE: DIEGO EFRAIN PEDRAZA CHAVES</div><div>Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND</div></div></td></tr></table>					<div>XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA</div> <div>De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención. Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito. Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.</div>	<div>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</div> <div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE: DIEGO EFRAIN PEDRAZA CHAVES</div><div>Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND</div></div>																	
<div>XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA</div> <div>De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención. Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito. Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.</div>	<div>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</div> <div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE: DIEGO EFRAIN PEDRAZA CHAVES</div><div>Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND</div></div>																						
<div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</div>																							

			V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1	OBSERVACIONES: Una vez sea entregado por parte del Contratista laubicación del punto de atención a la comunidad se actualizará la información aquí solicitada. En espera a que se inicien las obras.	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	15	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	1		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	11	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	10				
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 20						
VI. GESTIÓN PREDIAL						
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A			OBSERVACIONES: N/A			
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A						
AVALÚOS APROBADOS: N/A						
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A						
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD						
N/A						
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS						
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Se llevo a cabo comité de obra No. 4 el 01 de Junio de 2023 Durante la presente semana se han realizado actividades de revisión a documentos como se relaciona a continuación: GIC-INVIAS-NTS-611-22, RESPUESTA A SU OFICIO GBE-006-2022 DE FECHA 16-05-2023 CUYO ASUNTO ES "Solicitud de Prórroga 45 días por cuenta de estudio de diseños."						
ACTIVIDADES TÉCNICAS El Contratista se encuentra realizando actividades de Levantamiento de información en campo para la actualización a Estudios y Diseños del proyecto.						
ACTIVIDADES AMBIENTALES La interventoría se encuentra a la espera de recibir respuesta al oficio N° GIC-INVIAS-NTS-462-22, con observaciones subsanadas en el documento PAGA (Plan de Adaptación a la Guía Ambiental).						
ACTIVIDADES SOCIALES El Contratista envía a esta Interventoría el día 31 de mayo de 2023, la solicitud ante el Ministerio del Interior de Consulta Previa. Igualmente, se realiza una reunión vía meet con la profesional social del Consorcio, con el fin de realizar una revisión a lo desarrollado hasta el momento del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA).						
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA						
Se procederá con la revisión detallada y si es el caso la aprobación de la documentación entregada por el Contratista, Realizar seguimiento de la documentación aprobada al contratista para inicio a las actividades de construcción en campo. Seguimiento a la alcaldía en cuanto a la devolución de rendimientos financieros.						
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS						
<div><div>PROGRAMADO</div><div>EJECUTADO</div></div> <div><div>PROGRAMAD</div><div>MANTENIMIENTO</div><div>CONSTRUCCIÓN</div><div>MEJORAMIENTO</div><div>SENALIZACION</div><div>TRAMO FUERA DEL</div><div>PUENTE</div></div>						
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.						
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
<div>N/A</div> <div>Indicar localización y actividad</div>		<div>N/A</div> <div>Indicar localización y actividad</div>		<div>N/A</div> <div>Indicar localización y actividad</div>		
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.						
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA				DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		
De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención. Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito. Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.				FIRMA NOMBRE: DIEGO EFRAIN PEDRAZA CHAVES Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND		
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.						

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA INFORMES ESPECIALISTAS



**PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MAYO DE 2023**

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

INFORME EJECUTIVO DE LOS PROFESIONALES

ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA

INTERVENTORIA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

CONTRATO: Contrato No. 1053 de 2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Norte de Santander del Programa "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

LOCALIZACION: MUNICIPIO DE OCAÑA-1758, HERRAN Y SANTIAGO,
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

PERIODO: del 01 al 31 de mayo de 2023

ACTIVIDADES POR MUNICIPIO

CACHIRA

El contratista hace entrega del informe, en su primera versión, del componente de hidrología e hidráulica para el proyecto con Contrato de obra pública No 160-2022, MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS Terciarias Priorizadas en el Municipio de CÁCHIRA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

Esta revisión, realizada el 26 de mayo, presenta un avance del 74% tal y como se presenta a continuación:

LISTA DE CHEQUEO PARA LA REVISIÓN DE PROYECTOS VIAS - HIDRÓLOGIA E HIDRÁULICA						
PROYECTO:		MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS Terciarias Priorizadas en el Municipio de CACHIRA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	OBJETO:	ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO VIA CUCUMANA - CACHIRA		FECHA:
DISEÑADOR:			Forma:	TÍTULO DE VÍA:		Revisión:
			Nombre:	MARIO ALBERTO SIERRA LERA		
			Matrícula N°:	N° 54353 264753 575		
				LONG. (M):		N° REVISIÓN:
						1
N°	DESCRIPCIÓN	CUMPLE			OBSERVACIONES	Yo. Ss.
		SI	NO	N/A		
Información recibida: Los anexos enviados fueron:						
 HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA PLAZA NUEVA CACHIRA VIE  CACHA - 019 - 2022  Lista de Chequeo Hidráulica e Hidrología, Cachira						
0. GENERALIDADES						
0.1	Descripción del proyecto, objetivos y alcances 1.1.2. Objetivos <ul style="list-style-type: none"> Obtener las prescripciones técnicas establecidas en el 28 del 4 información existente para la dimensión de la U.S.A. y más cercana al lugar del proyecto. Elaborar el estudio de la zona de estudio. Calcular el hidrograma de diseño para un periodo de retorno de 10 años. 			X	El informe describe brevemente el proyecto, los objetivos y el alcance para el componente de hidrología e hidráulica. Sin embargo, debe retomar el objetivo específico correspondiente al cálculo del hidrograma de diseño para un periodo de retorno de 10 años ya que no corresponde con lo presentado en el informe.	
0.2	Información recopilada			X	Dentro de la información recopilada menciona información sobre climatológica de la estación Estación Agrícola Cachira. También indica que se utilizó información topográfica e imágenes satelitales de Google Earth.	
0.3	Narrativa aplicada y documentos de referencia			X	Indica como referencia principal al Manual de diseño para carreteras ONVIA.	
0.4	Presentación del informe			X	El informe se encuentra estructurado de forma correcta y la información corresponde a un informe de hidrología e hidráulica.	
0.5	Documentos del profesional diseñador			X	Debe adjuntar los documentos del profesional diseñador (cartera profesional, diploma y carta de responsabilidad).	
1. ESTUDIO HIDROLÓGICO						
1	INFORME					
1.1	Ubicación del proyecto			X		Presenta en la Imagen 1, la localización general del proyecto.
1.2	Cartografía consultada y escala manejada			X		Utiliza principalmente imágenes satelitales de Google Earth e información topográfica levantada en campo.



1.3	Información hidrometeorológica	X			Debido de la información recopilada necesita información hidroclimológica de la estación 2543724 AGRIESTIA CACHIMA (23095066). 18000 registros de precipitación máxima en 24 horas y entrega los respectivos anexos.	
1.4	Análisis de la precipitación		X		Con los datos de precipitación, debe presentar el régimen a nivel mensual, con lo cual se observe el comportamiento de la lluvia (temporal, bi modal, etc) para esa región.	
1.5	Influencia de la precipitación sobre el proyecto	X			Presenta imagen con la ubicación de la estación hidroclimológica, con lo cual se establece que es la más próxima a los tramos a intervenir.	
1.6	Cálculo de las curvas IDF	X			Para la estimación de las curvas IDF presenta el método de Vargas & Diaz, con coeficientes para la región Andina.	
1.7	Balaceo Hídrico			X	N/A	
1.8	Caracterización de la cuenca de drenaje	X			Presenta los parámetros de las cuencas (pendientes, tipo de terreno) con lo cual estima gacemientos como coeficientes de recurrencia y tiempos de concentración.	
1.9	Delimitación de la cuenca	X			Presenta imágenes y planos con la delimitación de las cuencas para cada tramo a intervenir.	
Nº	DESCRIPCIÓN	CUMPLE			OBSERVACIONES	No. Ho.
		SI	NO	N/A		
1.10	Cálculo del área afluente - cuencas mayores			X	De acuerdo con el informe, las cuencas no presentan caudal base ni cuentan con un área superior a los 2.5 km ² .	
1.11	Cálculo del área afluente - cuencas menores	X			Presenta la delimitación de cuencas afluente de forma correcta. Toma un ancho de impulsión de 25 metros considerando la construcción del trazo de canalización con lo cual se garantiza que a el canal se ingrese el caudal del total del área afluente a la obra transversal.	
1.12	Cálculo del tiempo de concentración	X			Presenta el cálculo de los tiempos de concentración de forma correcta. Utiliza los métodos de Hershfy, Tinsley y USGS para finalmente promediar y con ello tener una estimación cercana de dicho variable.	
1.13	Cálculo de caudales cuencas mayores			X	N/A	
1.14	Cálculo de caudales cuencas menores	X			Utiliza el método racional para estimar los caudales afluente, método adecuada teniendo en cuenta la magnitud de las áreas comprendidas.	
1	PLANO DE DISEÑO					
1.14	Plano de localización	X			Presenta planos con la localización de los tramos a intervenir.	
1.15	Plano de curvas y/o áreas afluente	X			Presenta planos con las áreas afluente.	
2. ESTUDIO HIDRÁULICO						
2	INFORME					
2.1	Criterios de diseño	X			Presenta criterios de diseño hidráulico para obras de drenaje transversal y longitudinal.	
2.2	<p>Inventario de obras existentes</p> <p>6.5 OBRAS DE DISEÑO EXISTENTES</p> <p>Una vez realizado el recorrido en el lugar de ejecución del proyecto existe en el terreno dos (2) obras de drenaje transversal tipo diques, vale la pena mencionar que estas se encuentran en muy mal estado y deterioro, una evidente a falta de mantenimiento de las mismas.</p> <p>Realizar el inventario para apreciar su estado fue imposible debido a que se encuentran tapadas por los sedimentos presentes, por el mismo motivo no fue posible obtener un registro fotográfico.</p> <p>Por lo tanto todas obras de drenaje no fueron tenidas en cuenta para el análisis hidráulico del proyecto. Por lo que se recomienda que sean demolidas durante la ejecución de la obra.</p> <p>Tampoco se encontró en el lugar del proyecto la presencia de canales o obras de drenaje longitudinal.</p>		X		En el capítulo 4.5 indica que en el proyecto existen dos obras de drenaje, al leer indica que de no se pudieron establecer las características de la obra por que se encontraba colmatada, no implica que el registro fotográfico no se pueda realizar ya que presuntamente debe evidenciarse que la tubería está colmatada y se puede visualizar el trazo de vía donde se encuentra ubicada.	
2.3	Revisión hidráulica de obras existentes			X	Indica que las obras están totalmente colmatadas. ESTE ÍTEM DE REVISARÁ NUNCA MÁS UNA VEZ SE CUENTE CON EL REGISTRO FOTOGRAFICO QUE VALIDE LO INDICADO EN CUANTO AL ESTADO DE LAS TUBERIAS.	



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

2.4	Diseño hidrológico de obras transversales de alcantarilla (Rozamientos y Ase)	X			Presenta modulación hidrológica de la alcantarilla (obra, en desahue, con mayor caudal. La modulación la realiza en el software HEC/HAP/CLIP EXPRESS.
2.5	Diseño hidrológico de obras hidráulicas adicionales (diseños, tramos de grava, desagües, etc.).		X		Indicar, en el informe, si se requieren obras de drenaje adicionales para el proyecto vía, especialmente obras de disposición para la descarga de las alcantarillas (fuentes, canales, etc.).
2.6	Diseño hidrológico de obras longitudinales (cunetas, cunetas, alcantarillas, etc.).	X			Presenta el cálculo hidrológico de los tramos de cuneta a implementar.
2.7	Análisis de excavación			X	N/A

LISTA DE CHEQUEO PARA LA REVISIÓN DE PROYECTOS VÍAS - HIDRÓLOGIA E HIDRÁULICA

PROYECTO:		MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VÍAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CÁCHOA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	OBJETO:	ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO VÍA CUCURUMANA - CÁCHOA		FECHA:	28/05/2023
			DISEÑADOR:	Forma:	TIPO DE VÍA:		
				Nombre:	MARCO ALBERTO SIERRA LEAL	Rural	
				Identificación:	NP 34262-264753 NTS	Nº REVISIÓN:	
						1	

Nº	DESCRIPCIÓN	CUMPLE			OBSERVACIONES	Vb. No.
		SI	NO	N.A.		
2	PLANOS DE DISEÑO					
2.8	Ratio y convenciones	X			Los planos se encuentran en el formato respectivo y debidamente firmados.	
2.9	Diseño en planta		X		Debe presentar la organización de los campos de conexión y proyectarlas hasta los puntos de ensueño (alcantarillas). Presentar la sección recomendada.	
2.10	Diseño en perfil	X			Presenta plano en perfil indicando la ubicación de las obras transversales.	
2.11	Detalles		X		Debe presentar el detalle constructivo de la cuneta y de la zona de conexión.	

CONCLUSIONES: Atender punto a punto las observaciones propuestas.

INTERVENTORIA:	ESPECIALISTA HIDRÁULICO:	Forma:	Vb. No. DIRECTOR DE PROYECTO:
CONTRATO INTERVENTORÍA N°:	Nombre:	JAIRO ALONSO ZORRERO BOA	
	Rel:	25382204707	
PORCENTAJE DE AVANCE:	74%		

LA PLAYA

El contratista hace entrega del INFORME HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO, mediante comunicado OFC-CLP-GIC-023-2023, correspondientes al contrato MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELE (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO NO. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.

En la revisión del 18 de abril se obtuvo un avance del 96% ya que faltó presentar los planos de detalles de las obras de drenaje. A su vez, para las alcantarillas debía presentar la sección transversal donde se evidencien las cotas de implantación del encole y descole, junto con el detalle de la cuneta e implementar.



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

LISTA DE CHEQUEO PARA LA REVISIÓN DE PROYECTOS VÍAS - HIDRÓLOGIA E HIDRÁULICA

PROYECTO:		DEBIDO:		ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO - LA PLAYA - CORREDOR 2		FECHA:	
MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELÉN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO NO. 1883 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		DISEÑADOR		Firma Nombre: CRISTIAN CAMILO GONZALEZ		TIPO DE VÍA: LONG. (m):	
				Matrícula N°: 14260-228926		N° REVISIÓN: 2	
N°	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES		Vto. Se.	
		SI	NO				
Información recibida: Los anexos enviados fueron:							
2. ANEXOS ESTUDIO HIDRÁULICO CORREDOR 2				ANEXO 2 PLANEO DETALLADO TUBOS E HIDRÓLOGICA TRANSVERSAL CORREDOR 2			
3. ESTUDIOS HIDRÁULICOS LA PLAYA - CORREDOR 2				ANEXO 3 ESTUDIO HIDRÁULICO CORREDOR 2			
4. OFC-CIJA-GC-023-2021 ENTREGA DE ESTUDIO HIDRÁULICO CORREDOR 2				ANEXO 4 DETALLE DE APOYACAMIENTOS PLACA HUELLO LA PLAYA CORREDOR 2 DE TALLER ESTRUCTURA PLACA HUELLO 2			
				ANEXO 5 PLANEO DETALLADO CORREDOR 2			
0. GENERALIDADES							
0.1	Descripción del proyecto, objetivos y alcance	X		El informe describe brevemente el proyecto, los objetivos y el alcance para el componente de hidrología e hidráulica.			
0.2	Información recopilada	X		Dentro de la información recopilada menciona imágenes satelitales de Google Earth, planchas IGAC 76394 y información hidroclimatológica de estación La Playa (16055060).			
0.3	Normativa aplicable y documentos de referencia	X		Indica como referencia principal al Manual de diseño para carreteras ONVRS.			
0.4	Presentación del informe	X		El informe se encuentra estructurado de forma sencilla y la información corresponde a un informe de hidrología e hidráulica.			
0.5	Documentos del profesional diseñador	X		Presenta los documentos del profesional diseñador.			
1. ESTUDIO HIDROLÓGICO							
1	INFORME						
1.1	Ubicación del proyecto	X		Presenta imagen de Google Earth con la localización general de los tramos a intervenir.			
1.2	Cartografía consultada y escala manejada	X		La cartografía consultada correspondió a imágenes satelitales de Google Earth, también menciona y anexa la plancha del IGAC 76394.			
1.3	Información hidroclimatológica	X		Utiliza datos hidroclimatológicos de la estación La Playa (16055060), estación, que una vez verificada, se encuentra dentro del área de influencia del proyecto de placa huelle.			
1.4	Análisis de la precipitación	X		Presenta cuadro e imagen con el comportamiento de la precipitación mensual anual.			
1.5	Influencia de la precipitación sobre el proyecto	X		Presenta imagen con la ubicación de la estación La Playa (16055060), figura 5.			
1.6	Cálculo de las curvas IDF	X		Para la estimación de las curvas IDF presenta el método de Vargas & Diaz, con coeficientes para la región Andina lo cual es correcto.			
1.7	Balanza hídrica		X	N/A			
1.8	Caracterización de la cuenca de drenaje	X		Presenta las características de la cuenca, mediante imágenes, en donde se puede establecer el tipo de terreno y cobertura vegetal.			
1.9	Definición de la cuenca	X		Delimita adecuadamente las cuencas afluentes. Presenta imagen con la delimitación.			
1.10	Cálculo del área afluente - cuencas mayores		X	De acuerdo con el informe, las cuencas no presentan caudal base ni cuentan con un área superior a los 2.5 km².			
1.11	Cálculo del área afluente - cuencas menores	X		La magnitud de las cuencas afluentes corresponde con la delimitación establecida y está debidamente justificada.			
1.12	Cálculo del tiempo de concentración	X		Se usó un t_c de 15 minutos el cual es adecuado para drenaje del urbanizado y corresponde con el tiempo de terreno presentado.			



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

Nº	DESCRIPCIÓN	CUMPLE			OBSERVACIONES	Vn. No.
		SI	NO	SLA		
1.13	Cálculo de caudales corrientes mayores			X	N/A	
1.14	Cálculo de caudales corrientes menores	X			Los cuadros se encuentran debidamente calculados mediante el método racional.	
2	PLANOS DE DISEÑO					
1.14	Plano de ubicación	X			Presenta plano con la ubicación del proyecto.	
1.15	Plano de curvas y/o áreas afectadas	X			Las curvas están soportadas con imágenes satelitales del terreno en informe.	
2. ESTUDIO HIDRÁULICO						
3	DATOS					
3.1	Criterios de diseño	X			Presenta criterios de diseño y verificación de obras hidráulicas subterráneas.	
3.2	Inventario de obras existentes			X	Presenta dentro del informe, numeral 13.1, la referencia a obras de drenaje existentes. Informa que en el corredor 2 del proyecto no se encuentran obras de drenaje.	
3.3	Revisión hidráulica de obras existentes			X	De acuerdo con el informe, en el tramo de análisis no existen obras de drenaje.	
3.4	Diseño hidráulico de obras transversales de escorrentía (alcantarillas y box)	X			Presenta Tabla 13 componiendo hidráulica, numeral 4.1, en la cual se observan las capacidades de la tubería de 30" dependiendo de la pendiente. Por la magnitud de las caudales, la obra presentada cumple con la pendiente mínima.	
3.5	Diseño hidráulico de obras hidráulicas adicionales (disipadores, trampas de grasa, desarenadores, etc.)			X	Indica que se requieren obras de disipación de energía para las 5 alcantarillas a implementar. No presenta los planos con el detalle de la estructura de descarga, lo anterior tomado en cuenta que debe considerarse un ancho igual a la descarga de la tubería por la que es independiente que existe el detalle de dicha estructura.	
3.6	Diseño hidráulico de obras longitudinales (zanjas, cunetas, alcantarillados, colectoras, etc.)	X			En la tabla 13 presenta el chequeo hidráulico de las cunetas a implementar.	
3.7	Análisis de erosión			X	N/A	
2	PLANOS DE DISEÑO					
3.8	Plano y conexiones	X			Presenta planos debidamente detallados.	
3.9	Diseño en planta	X			Presenta planos en planta con la ubicación de las obras de drenaje y las características de estas.	
3.10	Diseño en perfil	X			Presenta planos en perfil con la ubicación de las obras de drenaje y las características de estas.	
3.11	Detalles			X	Se implementará el detalle de las obras de descarga de las alcantarillas.	
CONCLUSIONES: Atender las observaciones referentes a las estructuras de descarga de las alcantarillas. Presentar los planos de detalle.						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>INTERVENTORIA:</p> <p>CONTRATO INTERVENTORIA N°:</p> <p>PORCENTAJE DE AVANCE: 92%</p> </div> <div> <p>ESPECIALISTA HIDRÁULICO:</p> <p>Nombre: <u>JAIRO ALEJANDRO ZORRO RDA</u></p> <p>Mat. <u>35283284757</u></p> </div> <div> <p>Fecha: <u>23/05/2023</u></p> <p>Vn. No. DIRECTOR DE PROYECTO:</p> </div> </div>						

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En primera instancia es importante aclarar que las apreciaciones técnicas contenidas en el presente informe fueron revisadas por el profesional encargado y el cual, de manera resumida, para el proyecto de Ocaña, a la fecha se han realizado observaciones a la

documentación presentada, es importante mencionar que para la pronta ejecución de la meta física del proyecto se debe dar aprobación a los estudios y diseños presentados por el contratista.

En el municipio de Cachira deben presentar oficio con respuesta, punto a punto, a cada una de las observaciones propuestas ya que existentes tanto de observaciones de forma como de fondo.

En el municipio de La Playa, corredor 2, que obtuvo un avance del 92%, deberá atender las observaciones referentes a las estructuras de descarga de las alcantarillas.

Cordialmente,



JAIRO ALONSO ZORRO ROA
MP 25202204707 CND
ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA

INTERVENTORIA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO

CONTRATO: Contrato No. 1053 de 2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los municipios del departamento de Norte de Santander del Programa "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

LOCALIZACION: MUNICIPIOS DE SANTIAGO, HERRAN, LA PLAYA DE BELEN, GOBERNACION 1943 y ABREGO

PERIODO: del 01 al 31 de mayo de 2023

SANTIAGO

1. Este municipio se encuentra aprobado en el componente de Diseño Geométrico ya que cumple con los parámetros mínimos de diseño y requerimientos según la cartilla de Colombia Rural.

HERRAN

1. Este municipio se encuentra aprobado con observaciones quedando pendiente subsanar lo siguiente:

INFORME DISEÑO GEOMETRICO

- Anchos de calzada

Se reitera la observación de tener presente que la cuneta no es zona transitable y los anchos descritos en el informe no corresponden a los anchos reales de calzada, estos anchos pertenecen a los anchos totales de la sección, (incluyendo cunetas y bordillos)

TRAMO 1

- Se debe tener presente que la longitud del tramo hasta el empalme con la placa huella existente es de 153m, sin embargo, en planta y perfil se presenta un diseño de 179 m. revisar
- Las secciones transversales en curva vienen en bombeo, estas deben tener el peralte correspondiente a curvas y de máximo el 2%, tal como lo indica la guía de diseño. Lo que genera cambio en los volúmenes presentados.
- En los diseños en perfil se observan 3 perfiles diferentes, por favor presentar el cuadro de convenciones, de igual manera en la guitarra no parece a que perfil hace referencia la cota.

TRAMO 2

- Las secciones transversales en curva vienen en bombeo, estas deben tener el peralte correspondiente a curvas y de máximo el 2%, tal como lo indica la guía de diseño. Lo que genera cambio en los volúmenes presentados.
- En los diseños en perfil se observan 3 perfiles diferentes, por favor presentar el cuadro de convenciones, de igual manera en la guitarra no parece a que perfil hace referencia la cota.

TRAMO 3

- Las secciones transversales en curva vienen en bombeo, estas deben tener el peralte correspondiente a curvas y de máximo el 2%, tal como lo indica la guía de diseño. Lo que genera cambio en los volúmenes presentados.

• En los diseños en perfil se observan 3 perfiles diferentes, por favor presentar el cuadro de convenciones, de igual manera en la guitarra no parece a que perfil hace referencia la cota.

*Por favor anexar en los planos de cada uno de los tramos los cuadros de coordenadas de la línea base o deltas materializados en campo, estos cuadros servirán como base para el replanteo de puntos en el transcurso de la ejecución de la obra.

*Igualmente se recuerda que esta revisión se realizó teniendo en cuenta la topografía suministrada, estando aprobada condicionalmente hasta no presentar las poligonales con sus respectivos cálculos.

De acuerdo a lo anterior, se da aprobación a los diseños geométricos de los 3 tramos (alto del Mejué-sector el ramal), solicitando sean atendidas las observaciones expuestas en el presente documento.

LA PLAYA

1. Se recibe documentación referente al informe de Diseño geométrico mediante comunicado **OFC-CLP-GIC-026-2023 del 8 de mayo - Corredor 1 y 2**, se procede a realizar la revisión generando las observaciones que se relacionan a continuación mediante oficio **GIC-INVIAS-542-21 del 15-May-23**:

Se realiza la entrega del informe de Diseño Geométrico con sus respectivas tablas, parámetros de diseño, tipos de curva e imágenes de cada tramo, sin embargo, el informe es un soporte de los diseños geométricos, por lo tanto, es necesario adjuntar los anexos generales de los archivos del diseño geométrico para su respectiva revisión:

- Informe del diseño Geométrico
- Archivos dwg con el diseño geométrico en planta (con sus respectivos elementos), perfil (con sus respectivos elementos) y secciones transversales; cuadro de elementos con base en los parámetros utilizados para el diseño (radio, deflexiones, sobreanchos, transiciones, zonas de cruce), junto con los requerimientos básicos de un plano (escalas, rótulos con la información necesaria, grilla de coordenadas, norte, cuadro de convenciones, cuadro de coordenadas de la línea base).

Nota: Cabe aclarar que esta revisión se realiza teniendo en cuenta las condiciones topográficas del terreno, anchos de sección(vía), construcciones y puntos obligados que no permitan cumplir con los parámetros antes mencionados.

2. Se recibe documentación en su Versión 1 de Diseño geométrico mediante comunicado **OFC-CLP-GIC-029-2023 del 16 de mayo - Corredor 1 y 2**, se procede

a realizar la revisión generando las observaciones que se relacionan a continuación mediante oficio **GIC-INVIAS-556-21 del 23-May-23**:

Corredor 1

Tramo 1-Llano Grande

- Se deben colocar los nombres de PC-PT y PI de cada curva
- Las deflexiones de cada curva no vienen con el formato correcto (grados, minutos y segundos)
- No colocan la cota rasante en el diseño en perfil
- Los tramos en tangente están diseñados en peralte y las curvas presentan pendientes superiores al 2%.
- Se deben revisar los bloques de las alcantarillas dibujadas en planta, ya que no están coherentes con el diseño.
- Revisar los cortes y rellenos
- Anexar al dibujo el diseño de la losa de transición.
- Hay cortes que pueden generar inestabilidad en los taludes.

Tramo 2-Llano Grande

- Se deben colocar los nombres de PC-PT y PI de cada curva
- Las deflexiones de cada curva no vienen con el formato correcto (grados, minutos y segundos)
- No colocan la cota rasante en el diseño en perfil
- Colocan la cota subrasante en las secciones transversales, se solicita siempre colocar la cota rasante para la revisión.
- Los tramos en tangente están diseñados en peralte y las curvas presentan pendientes superiores al 2%.
- Las transiciones de la curva 3 tienen una longitud mayor (9 metros), a la recomendada por la guía para este tipo de curvas.
- Revisar los cortes y rellenos
- Anexar al dibujo el diseño de la losa de transición.

Tramo 1-San Pedro

- Se deben colocar los nombres de PC-PT y PI de cada curva
- Las deflexiones de cada curva no vienen con el formato correcto (grados, minutos y segundos)
- No colocan la cota rasante en el diseño en perfil

- Colocan la cota subrasante en las secciones transversales, se solicita siempre colocar la cota rasante para la revisión.
- Las secciones en recta están con el bombeo invertido.
- Se debe anotar la pendiente en las secciones en bombeo y peralte.
- Las curvas presentan pendientes superiores al 2%.
- Las curvas 2, 3 y 4 presentan transiciones menores a las recomendadas y empalmes que se deben mejorar por estética y trasitabilidad de los vehículos.
- No diseñan zonas de cruce
- Revisar los cortes y rellenos
- Anexar al dibujo el diseño de la losa de transición.
- Hay cortes que pueden generar inestabilidad en los taludes.

Corredor 2

Tramo 1-Clavellinos

- Se deben colocar los nombres de PC-PT y PI de cada curva
- Las deflexiones de cada curva no vienen con el formato correcto (grados, minutos y segundos)
- No colocan la cota rasante en el diseño en perfil
- Colocan la cota subrasante en las secciones transversales, se solicita siempre colocar la cota rasante para la revisión.
- Las secciones en recta están diseñadas con peralte.
- Se debe anotar la pendiente en las secciones en bombeo y peralte.
- Las curvas presentan pendientes superiores al 2%.
- Las curvas 4, 5 y 6 presentan transiciones menores a las recomendadas y empalmes que se deben mejorar por estética y trasitabilidad de los vehículos.
- Revisar los cortes y rellenos
- Anexar al dibujo el diseño de la losa de transición.
- Hay cortes que pueden generar inestabilidad en los taludes.

Tramo 2-Clavellinos

- Se deben colocar los nombres de PC-PT y PI de cada curva
- Las deflexiones de cada curva no vienen con el formato correcto (grados, minutos y segundos)
- No colocan la cota rasante en el diseño en perfil
- Colocan la cota subrasante en las secciones transversales, se solicita siempre colocar la cota rasante para la revisión.
- Las secciones en recta están diseñadas con peralte.
- Se debe anotar la pendiente en las secciones en bombeo y peralte.
- Las curvas presentan pendientes superiores al 2%.

- Revisar los cortes y rellenos
- Anexar al dibujo el diseño de la losa de transición.
- Hay cortes que pueden generar inestabilidad en los taludes.
- Están diseñando fuera de la topografía de las abscisas 26+430 a 26+470

La Esperanza

- Se deben colocar los nombres de PC-PT y PI de cada curva
- Las deflexiones de cada curva no vienen con el formato correcto (grados, minutos y segundos)
- No colocan la cota rasante en el diseño en perfil
- Colocan la cota subrasante en las secciones transversales, se solicita siempre colocar la cota rasante para la revisión.
- Las secciones en recta están diseñadas con peralte.
- Se debe anotar la pendiente en las secciones en bombeo y peralte.
- Las curvas presentan pendientes superiores al 2%.
- Revisar los cortes y rellenos
- Anexar al dibujo el diseño de la losa de transición.
- Hay cortes que pueden generar inestabilidad en los taludes.

GOBERNACION 1943

1. Se recibe documentación de Diseño geométrico mediante comunicado **UTET-02590-013 del 15 de mayo DE 2023**, vía de la vereda de Santo Domingo municipio de Arboledas, se procede a realizar la revisión generando las observaciones que se relacionan a continuación mediante oficio **GIC-INVIAS-NTS-567-22 del 23-May-23**:

El archivo adjunto DWG "ACAD-DISEÑO GEOMÉTRICO SANTO DOMINGO_" no pudo ser revisado ya que no se cuenta con el componente Topografico con el cual podemos determinar:

- Anchos de calzada existente.
- Detalles característicos del terreno.
- Puntos obligados.
- Obras de drenaje existentes.
- Puntos del levantamiento topografico con su respectiva cota y descripción.

Esto acompañado de los archivos dwg (Planta, perfil y secciones transversales), carteras de campo, equipo Topografico utilizado (Estación total, GPS), documentos del profesional,

certificado de calibración de los equipos, registro fotográfico y demás requerimientos básicos para la presentación de planos topográficos.

Por lo tanto, hasta no tener revisado y aprobado dicho componente no se pudo dar un concepto técnico de los archivos referentes a los diseños geométricos del tramo en mención, solicitando sean entregados de manera oportuna.

De igual manera cabe aclarar que los diseños geométricos deben venir acompañados del informe técnico que contenga Sección típica de la vía, Parámetros de diseño según guía de diseño de pavimentos y cartilla Colombia rural, Las tablas anexas deben ser las utilizadas para el diseño geométrico del tramo, Anexos correspondientes a cálculos y documentos del profesional.

2. Se recibe documentación de Diseño geométrico mediante comunicado **UTET-02590-014 del 23 de mayo DE 2023**, vía de la vereda Helechar municipio de Arboledas, la revisión de este documento no se pudo realizar ya que no se cuenta con los archivos del componente topográfico.

ABREGO

1. El contratista entrega diseños geométricos del corredor 2 mediante oficio OFC-CADV-GIC-065-2023 del 15 de mayo de 2023.

2. El contratista entrega diseños geométricos del corredor 1 con el oficio OFC-CADV-GIC-073-2023 del 18 de mayo de 2023, chorro 1 y 2.

3. Se emiten observaciones de los diseños geométricos del corredor 2 con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-553-22 del 18 mayo de 2023 que son las siguientes:

- Ya diseñaron sobreanchos para algunas curvas que lo requieren, pero aún hay curvas que por tener radios inferiores a 25 metros necesitan el sobreancho. Presentan curvas con radio inferior a 11 metros por las cuales un camión categoría 3 no podría circular. En los numerales 18, 19 y 20 se especifican las curvas que se deben subsanar.
- En el tramo La Vega del Tigre borraron el eje.
- El abscisado de San Vicente no se ve.
- En el tramo San Juan las coordenadas del Delta 3 y la Referencia 3 están invertidas.
- La curva C1 de La Vega del Tigre tiene un radio de 7.48, inferior al radió mínimo para que un camión C3 pueda circular y su sobreancho debe ser de 1.80 m. no de 1.2 m.
- Los tramos rectos aún se ven con peraltes. El tramo Los Milagros si cumple con el bombeo, pero le falta el peralte en la curva.

• Hay curvas con peralte superior al 2%. En La Vega del tigre la curva C5 aparece con peralte invertido. En La Vega del Tigre en la sección K56+340 y en San Juan en las secciones K0+180, K0+210, K0+240, K0+247, K0+320 y K0+327 no se ve peralte, a cambio se ve batea. La transición de bombeo a peralte debe realizarse de 3 a 6 metros antes del PC y después del PT.

• La Vega del Tigre: el radio de la curva C1 está por debajo del mínimo (en mesa de trabajo hablamos que se podía aceptar mínimo 8.20 m); el sobreancho debe ser de 1.80 m.

• La vega del tigre: La transición de sobreancho de la curva C1 debe ser de 9 metros antes del PC y después del PT por recomendación de la guía de diseño, están haciendo una transición de entrada de 2.54m y una transición de salida de 7.88 m.

• En las curvas C1 y C3 de San Luis, las aletas se ven dentro de la calzada en la planta. Por favor revisar las alcantarillas al subsanar las curvas, las cajas y las aletas deben ir afuera de la placa huella. Adicionalmente en los bloques de las alcantarillas usados en las secciones transversales, la longitud de la tubería no es coherente.

• Los tramos San Juan, San Luis y San Vicente tienen más de 200 metros. Recomiendo construir zonas de cruce, por si se encuentran dos vehículos uno de ellos no se vea forzado a reversar más de 100 metros. En el tramo San Vicente sobre la abscisa K0+200, según topografía hay espacio para diseñar una zona de cruce. Ver la Guía de diseño de pavimentos con placa huella INVIAS.

• Las áreas de corte y rellenos de las secciones transversales de los tramos: Los Milagros y San Vicente están mal, les falta o les sobra área. Revisar el cuadro de movimiento de tierras de La Vega del Tigre, en esta oportunidad el abscisado salta de K56+310 a K56+427 y luego de K56+491 pasa a K56+384.

• En el tramo de San Luis en las secciones transversales no se ve el hachurado de la subbase, que si se veía en una versión anterior.

• La planta de La Vega del Tigre no cumple, por el radio y sobreancho de la curva C1. Los diseños en planta de los demás tramos cumplen.

4. Se emiten observaciones del del corredor 1 con el oficio GIC-INVIAS-NTS-568-22 del 23 de mayo de 2023 de los tramos Chorro 1 Chorro 2. Las observaciones son las siguientes:

• En el tramo Chorro 1 borraron el eje y así es complicado revisar radios, longitudes, deflexiones, etc.

• En el tramo El Chorro 1 quitaron los PI.

• La mayoría de las curvas en la columna de clasificación de curvas por tipo están mal.

- El Chorro 1: La franja de piedra pegada que se ve en el eje de la curva C6 no debe ir, va en concreto.
- Al modificar el alineamiento horizontal del tramo El Chorro 1 no tuvieron en cuenta que el perfil de terreno se les modificó y quedó muy cercano al de diseño. El perfil de diseño en este tramo debe subirse cerca a los 45 cm por encima del terreno.
- Las tangentes no tienen bombeo sino peralte.
- Hay curvas con peralte superior al 2% y curvas con bombeo (tramo 1, K9+570) y bateas (tramo 1, K9+660). La transición de bombeo a peralte debe realizarse de 3 a 6 metros antes del PC y después del PT, de tal forma que las curvas tengan peralte del 2% de inicio a fin. Ver Guía de diseño de pavimentos con placa huella del INVIAS.
- Las curvas C4 y C5 del tramo 1 así como la curva C5 del tramo 2 tienen deflexiones superiores a los 150°, deben ser menores de 150°.
- Los radios de las siguientes curvas son inferiores al radio mínimo: en el tramo 1 las curvas C4 y en el tramo 2 la curva C5. En mesa de trabajo se dejó claro que se podía aceptar un radio mínimo de 8.20 m.
- En mesa de trabajo realizada el 19 de abril se expuso que el radio mínimo de giro para un camión categoría 3 es de 11 metros, sin embargo, teniendo en cuenta que las dimensiones de este camión son mucho mayores a una volqueta doble troque, y en la ficha técnica de esta volqueta el radio de giro es de 8.20 m, siendo esta volqueta muy común en las carreteras del país se decide aceptar como mínimo este radio; a pesar de esto, aún presentan radios inferiores a 8.20 m. Además, aún presentan deflexiones superiores a 150°, en esta misma mesa de trabajo se les recomendó que para evitar estas deflexiones la solución era agregar un PI y generar curvas compuestas, de esta forma se evitan las deflexiones superiores a 150° y se pueden ampliar los radios con más facilidad.
- El tramo 2 tiene más de 200 metros. Recomendando construir una zona de cruce, por si se encuentran dos vehículos uno de ellos no se vea forzado a reversar más de 100 metros. Si no se puede construir la zona de cruce, por favor justificar por escrito el por qué no se puede.
- En la abscisa K9+890 de El Chorro 2, la caja de la alcantarilla se ven dentro de la calzada en la planta. Por favor revisar las alcantarillas al subsanar las curvas, las cajas y las aletas deben ir afuera de la placa huella. Adicionalmente en los bloques de las alcantarillas usados en las secciones transversales, la longitud de la tubería no es coherente.
- La escala de la planta del tramo El Chorro 2 (antes estaba en 1:300), no corresponde con la enunciada (1:250). Así como la escala enunciada en el formato del segundo plano de secciones transversales del tramo El Chorro 1 (la escala no es 1:35 sino 1:30).
- La longitud del origen cartográfico está mal, es 73°W, no 74°W.

- Las áreas de corte y rellenos de las secciones transversales en El Chorro 2 están mal, les falta o les sobra área, por lo tanto, las cantidades del cuadro de movimiento de tierras no son verídicas y el cuadro enunciado no corresponden ni el abscisado ni los datos.

5. El contratista hace entrega, con documento OFC-CADV-082-2023 del 30 de mayo de 2023, de diseños geométricos del corredor 2.

CONCLUSIONES

- A la fecha el municipio de Santiago se encuentra aprobado cumpliendo con los requerimientos solicitados
- El municipio de Herran presenta observaciones de forma por lo cual no se ha dado la aprobación final al componente.
- El municipio de la Playa de Belén presenta a la fecha observaciones de fondo pendientes de subsanar, para dar aprobación al componente.
- Los municipios de Gobernación 1943 no han presentado Topografía por lo cual no se han podido generar observaciones a los diseños Geométricos.
- De los diseños geométricos del corredor 1 del municipio de Abrego sólo han sido aprobados 3 de los 5 tramos por parte de los especialistas. Los diseños geométricos del corredor 2 se encuentran en revisión.

Cordialmente,

GICELA CORDOBA LONDOÑO
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO

INFORME EJECUTIVO DE LOS PROFESIONALES

ESPECIALISTA GEOTECNIA

INTERVENTORIA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

CONTRATO: Contrato No. 1053 de 2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

LOCALIZACION: MUNICIPIOS DE CACHIRA, OCAÑA BUENAVISTA, LA PLAYA Y PAMPLONITA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

PERIODO: del 01 al 31 de mayo de 2023

ACTIVIDADES POR MUNICIPIO

1. CACHIRA

La Interventoría una vez revisada la documentación de la versión entregada no incluye el estudio actualizado del Estudio de Suelos. Por lo tanto, todas las observaciones del componente geotécnico persisten.

1. Se hacen observaciones a Caracterización del Material de Subrasante, no presenta ensayos de laboratorio. Se solicita incluir tabla resumen de caracterización Geotécnica, así como los respectivos registros de ensayos de laboratorio.
2. Se hacen observaciones al Perfil Geotécnico se verificará con los registros de ensayos de laboratorio.
3. No presenta Suelos Expansivos.

2. OCAÑA BUENAVISTA

La Interventoría una vez revisada la documentación hace observaciones del corredor 1 con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-551-22 del día 19 de mayo de 2023, las cuales se relacionan a continuación:

1. Se hacen observaciones a Caracterización del Material de Subrasante, No se presentan los registros del ensayo de cono dinámico PDC.
2. Se da viabilidad al Perfil Geotécnico, Concepto de Suelos Expansivos y Caracterización del material de subrasante.

3. LA PLAYA

La Interventoría una vez revisada la documentación hace observaciones del corredor 1 y 2 con el comunicado GIC-INVIAS-478-21 del día 02 de mayo de 2023, las cuales se relacionan a continuación:

1. Se da viabilidad al Perfil Geotécnico, Concepto de Suelos Expansivos y Caracterización Geotécnica del material de subrasante.

4. PAMPLONITA

La Interventoría una vez revisada la documentación hace observaciones con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-552-22 del día 19 de mayo de 2023, las cuales se relacionan a continuación:

1. Se hacen observaciones a Caracterización del Material de Subrasante, Para los tramos 1 al 4, el Contratista presenta un apique por tramo. Por lo tanto, la exploración Geotécnica es insuficiente para generar un modelo Geotécnico con bajo nivel de incertidumbre. El documento menciona el trabajo de reconocimiento en campo realizado corresponde a seis (6) apiques a profundidades 1.50 m - 1.60 m, luego explorando casi 0.7/0.9 m adicional con el cono dinámico "DCP" en el fondo del apique. Se solicita presentar: registros del ensayo de cono dinámico PDC y Diseño Geométrico para validación de los niveles de implantación. De acuerdo a lo mencionado, los valores de CBR corresponden al material más profundo y no sobre el cual se implantará la estructura de Placa Huella.
2. Se hacen observaciones al Perfil Geotécnico se deberá ajustar según observación 3.1.
3. Se da viabilidad al Concepto de Suelos Expansivos.

Luego la Interventoría hace unas observaciones y no se incluye la actualización del Estudio de Suelos. Por lo tanto, persisten las observaciones del modelo Geotécnico presentadas a la versión anterior el día 26 de mayo de 2023, las cuales se relacionan a continuación:

1. Se hacen observaciones a Caracterización del Material de Subrasante, para los tramos 1 al 4, el Contratista presenta un apique por tramo. Por lo tanto, la exploración Geotécnica es insuficiente para generar un modelo Geotécnico con bajo

nivel de incertidumbre. El documento menciona el trabajo de reconocimiento en campo realizado corresponde a seis (6) apiques a profundidades 1.50 m - 1.60 m, luego explorando casi 0.7/0.9 m adicional con el cono dinámico "DCP" en el fondo del apique. Se solicita presentar: registros del ensayo de cono dinámico PDC y Diseño Geométrico para validación de los niveles de implantación. De acuerdo a lo mencionado, los valores de CBR corresponden al material más profundo y no sobre el cual se implantará la estructura de Placa Huella. No se evidencian ensayos de CBR en laboratorio sobre muestras inalteradas falladas en condición sumergida, tal como lo indica la norma INV E 148 13.

2. Se hacen observaciones al Perfil Geotécnico se deberá ajustar según observación 3.1.
3. Se da viabilidad al Concepto de Suelos Expansivos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En primera instancia es importante aclarar que las apreciaciones técnicas contenidas en el presente informe, fueron revisadas por el profesional encargado y el cual, de manera resumida.

El Contratista del municipio de Cachira, a la fecha no cuenta con aprobación de Interventoría, el Contratista no presenta ensayos de laboratorio. Se solicita incluir tabla resumen de caracterización geotécnica, así como los respectivos registros de ensayos de laboratorio y no presenta Suelos Expansivos.

El Contratista del municipio de Ocaña Buenavista, a la fecha no cuenta con aprobación de Interventoría, se encuentra con observaciones el corredor 1.

El Contratista del municipio de La Playa, a la fecha no cuenta con aprobación de Interventoría, se encuentra con observaciones el corredor 1 y 2.

El Contratista del municipio de La Playa, a la fecha no cuenta con aprobación de Interventoría, se encuentra con observaciones de Caracterización del Material de Subrasante, para los tramos 1 al 4, el Contratista presenta un apique por tramo. Por lo tanto, la exploración Geotécnica es insuficiente para generar un modelo Geotécnico con bajo nivel de incertidumbre. El documento menciona el trabajo de reconocimiento en campo realizado corresponde a seis (6) apiques a profundidades 1.50 m - 1.60 m, luego explorando casi 0.7/0.9 m adicional con el cono dinámico "DCP" en el fondo del apique. Se solicita presentar: registros del ensayo de cono dinámico PDC y Diseño Geométrico para validación de los niveles de implantación. De acuerdo a lo mencionado, los valores de CBR corresponden al material más profundo y no sobre el cual se implantará la estructura de Placa Huella. No se evidencian ensayos de CBR en laboratorio sobre muestras inalteradas falladas en condición sumergida, tal como lo indica la norma INV E 148 13.

Cordialmente,



JAVIER ANTONIO MILLÁN LÓPEZ
MP 25202-32873 CND
ESPECIALISTA GEOTECNIA

INFORME EJECUTIVO DE LOS PROFESIONALES

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

INTERVENTORIA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

CONTRATO: Contrato No. 1053 de 2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Norte de Santander del Programa "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

LOCALIZACION: MUNICIPIO DE LA PLATA, PAMPLONITA, ABREGO
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

PERIODO: del 01 al 31 de mayo de 2023

ACTIVIDADES POR MUNICIPIO

MUNICIPIO DE ABREGO

PLACA HUELLA VIAS TERCIARIAS VEREDAS LA VEGA DEL TIGRE – LOS MILAGROS-SANJUAN-SAN LUIS- SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE ABREGO

Con comunicado GIC-INVIAS-NTS-460-22 Se solicitó al Contratista de Obra Consorcio AD VIAS justificar los diseños de los pavimentos calculando momentos y cortantes y sus respectivas comprobaciones con espesores, material y refuerzos, utilizando las siguientes ecuaciones:

$$\phi M_n = \left(\phi \times \rho \times F_{yT} \left(1 - 0.59 \rho \times \left(\frac{F_y}{F_c} \right) \right) \right) \times b \times d^2$$

$$\phi V_c = \phi 0.17 \sqrt{f'_c} b d$$

Solicitando verificar que:

$\phi M_n > M_{\max}$ producido por el camión C3.

$\phi V_c > V_{\max}$ producido por el camión C3.

Adicionalmente se solicitó que se realizaran algunos arreglos en los planos presentados, donde se menciona conveniente Anexar los recubrimientos establecidos en los documentos presentados en el diseño.



El contratista subsana las observaciones realizadas con su comunicado OFC-CADV-GIC-074-2023 del 18-May-2023, dentro de los documentos entregados por el contratista se encuentran los siguientes:



Se recibe 1 Documento: Denominado Anexo 3 Memoria de Calculo Estructural de Pavimentos con Placa Huella en Concreto Reforzado. Con 13 Folios

Memorias de Calculo

No presenta Observaciones.

Se recibe 1 plano estructural

No presenta Observaciones.

Teniendo en cuenta que el contratista subsana todas las observaciones realizadas se da Aprobación al corredor 2 del proyecto.

MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN CORREDOR 1

CORRESPONDIENTE A AL CORREDOR VIAL 1 QUE COMPRENEN LAS VEREDAS SANPEDRO – LLANO GRANDE

Se solicitó al Contratista de Obra Consorcio La Playa 2022 con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-461-22 justificar los diseños de los pavimentos calculando momentos y cortantes y sus respectivas comprobaciones con espesores y refuerzos, utilizando las siguientes ecuaciones:

$$\phi M_n = \left(\phi \times \rho \times F_y \times \left(1 - 0.59 \rho \times \left(\frac{F_y}{F'_c} \right) \right) \right) \times b \times d^2$$

$$\phi V_c = \phi 0.17 \sqrt{f'_c} b d$$

Solicitando verificar que:

$\phi M_n > M_{\max}$ producido por el camión C3.


$\phi V_c > V_{\max}$ producido por el camión C3.

Observación que quedo subsanada con su comunicado OFC-CLP-GIC-026-2023 del 08-May-2023.

Sin embargo, se reitera la observación de que se realizaran algunos arreglos en los planos presentados, donde se menciona conveniente Anexar los recubrimientos establecidos en los documentos presentados en el diseño. Esto Para un mejor desarrollo en el proceso constructivo sería conveniente que en los planos se anexaran los recubrimientos establecidos en los documentos presentados del diseño de pavimento.

El acero de refuerzo se debe colocar en la mitad del espesor de la placa – huella, lo que implica un recubrimiento de 7,5 cm tanto en la cara superior como en la inferior.

El recubrimiento de las varillas longitudinales #4 es de 7,5 cm en la parte inferior de 4,0 cm en la parte superior.

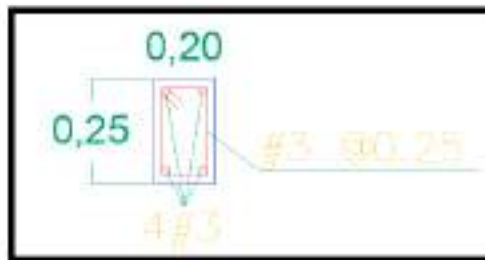

El contratista subsana las observaciones realizadas con su comunicado OFC-CLP-GIC-031-2023 del 24-May-2023, dentro de los documentos entregados por el contratista se encuentran los siguientes:

CORRESPONDIENTE A AL CORREDOR VIAL 1 QUE COMPRENDEN LAS VEREDAS SAN PEDRO – LLANO GRANDE



Se recibe 1 Documento: Denominado Anexo 3 Memoria de Calculo Estructural de Pavimentos con Placa Huella en Concreto Reforzado. Con 13 Folios

Memorias de Calculo

No presenta Observaciones.

Se recibe 1 plano estructural

No presenta Observaciones

Teniendo en cuenta que el contratista subsana todas las observaciones realizadas se da Aprobación al corredor 1 del proyecto.

MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN CORREDOR 2

CORRESPONDIENTE A AL CORREDOR VIAL 2 QUE COMPRENDEN LAS VEREDAS ESPERANZA-ESPERANCITA-CLAVELLINOS

Se solicitó al Contratista de Obra Consorcio La Playa 2022 con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-461-22 justificar los diseños de los pavimentos calculando momentos y cortantes y sus respectivas comprobaciones con espesores y refuerzos, utilizando las siguientes ecuaciones:

$$\phi M_n = \left(\phi \times \rho \times F_y \times \left(1 - 0.59 \rho \times \left(\frac{F_y}{F'_c} \right) \right) \right) \times b \times d^2$$

$$\phi V_c = \phi 0.17 \sqrt{f'_c} b d$$

Solicitando verificar que:

$\phi M_n > M_{\max}$ producido por el camión C3.


$\phi V_c > V_{\max}$ producido por el camión C3.

Observación que quedo subsanada con su comunicado OFC-CLP-GIC-026-2023 del 08-May-2023.

Sin embargo, se reitera la observación de que se realizaran algunos arreglos en los planos presentados, donde se menciona conveniente Anexar los recubrimientos establecidos en los documentos presentados en el diseño. Esto Para un mejor desarrollo en el proceso constructivo sería conveniente que en los planos se anexaran los recubrimientos establecidos en los documentos presentados del diseño de pavimento.

El acero de refuerzo se debe colocar en la mitad del espesor de la placa – huella, lo que implica un recubrimiento de 7,5 cm tanto en la cara superior como en la inferior.

El recubrimiento de las varillas longitudinales #4 es de 7,5 cm en la parte inferior de 4,0 cm en la parte superior.

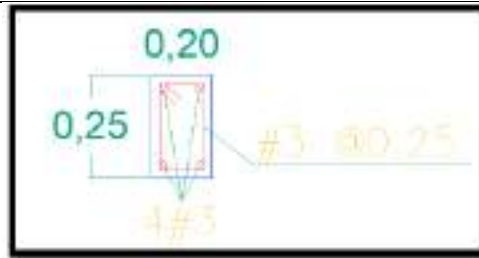

El contratista subsana las observaciones realizadas con su comunicado OFC-CLP-GIC-031-2023 del 24-May-2023, dentro de los documentos entregados por el contratista se encuentran los siguientes:

**CORRESPONDIENTE A AL CORREDOR VIAL 2 QUE COMPRENEN LAS VEREDAS
ESPERANZA-ESPERANCITA-CLAVELLINOS**



Se recibe 1 Documento: Denominado Anexo 3 Memoria de Calculo Estructural de Pavimentos con Placa Huella en Concreto Reforzado. Con 13 Folios

Memorias de Calculo

No presenta Observaciones.

No se reciben Planos Estructurales por lo que una vez se arregle la observación que está a continuación se procederá con la respectiva aprobación

Se recibe 1 plano estructural


No presenta Observaciones

Teniendo en cuenta que el contratista subsana todas las observaciones realizadas se da Aprobación al corredor 2 del proyecto.

MUNICIPIO DE PAMPLONITA

El contratista hace entrega del componente estructural con su comunicado PHP2022 – 003 – 2023 del 18-05-2023, en el cual se recibe la siguiente información:

PLACA HUELLA Y ALCANTARILLA PAMPLONITA

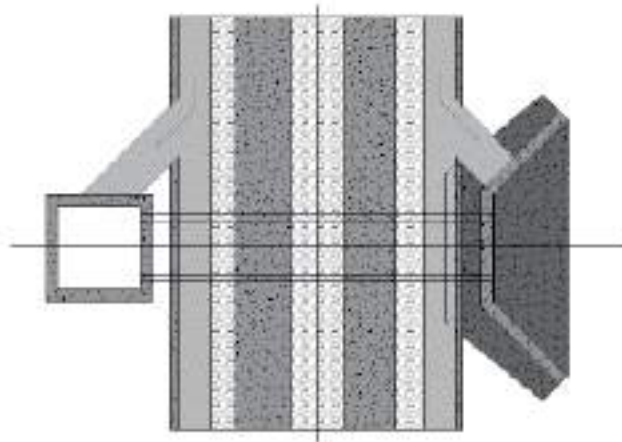

Memorias de Calculo

Se reciben 2 documentos de Memorias de Calculo

1. **Memorias de Calculo Alcantarilla**
2. **Memorias de Calculo Pavimento**

El proyecto no presenta observaciones

Planos Estructurales

Se reciben 4 planos estructurales

El proyecto cumple con los parámetros de revisión.

Teniendo en cuenta que la documentación recibida se encuentra dentro de los lineamientos de la cartilla Colombia rural, se da aprobación a la documentación entregada por el contratista UNION TEMPORAL COLOMBIA.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En primera instancia es importante aclarar que las apreciaciones técnicas contenidas en el presente informe, fueron revisadas por el profesional encargado y el cual, de manera resumida, para los proyectos de ABREGO, LA PLAYA DE BELEN y PAMPLONITA se da aprobación a la documentación recibida.



Cordialmente,

FELIPE STAND

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

INFORME EJECUTIVO DE LOS PROFESIONALES
ESPECIALISTA AMBIENTAL

INTERVENTORIA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

CONTRATO: Contrato No. 1053 de 2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

LOCALIZACION: OCAÑA 1758 y 1814, CACHIRA, ABREGO, Y PAMPLONITA.

PERIODO: 01 al 31 de Mayo de 2023

ACTIVIDADES POR MUNICIPIO

1. MUNICIPIO OCAÑA:

Durante el presente periodo se realiza seguimiento y asesoría a la profesional ambiental de la interventoría en Obra, dentro de las actividades realizadas en el componente ambiental se realizaron las siguientes:

- ✓ Revisión y comentarios al PAGA presentado por el contratista de Obra en su versión 4, dentro de las observaciones realizadas se encuentran las siguiente:
 - No se adjunta la línea base ambiental.
 - No es claro los datos, procedimiento y/o matriz implementada, en el numera 5.5 “Evaluación Ambiental Del Proyecto De Obra”, para la identificación de impactos ambientales que se presenten durante la ejecución del proyecto. Se solicita anexar la Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales, junto con su procedimiento.

Luego se recibida la información por parte del contratista en su versión ajusta, se da aprobación con observaciones al documento PAGA con comunicado GIC-INVIAS-NTS-592-22 del 26 de mayo de 2023.

2. MUNICIPIO OCAÑA - BUENAVISTA:

Durante el presente periodo se realiza seguimiento y asesoría a la profesional ambiental de la interventoría en Obra, dentro de las actividades realizadas en el componente ambiental se reitera al contratista la entrega del PAGA en su versión ajustada de acuerdo a las observaciones realizadas con nuestro comunicado GIC-INVIAS-NTS-462-22:

- ✓ Revisión y comentarios al PAGA presentado por el contratista de Obra en su versión 2, dentro de las observaciones realizadas se encuentran las siguiente:
 - No se adjunta o evidencia la política ambiental, debidamente firmada con la firma del representante legal.
 - Se solicita adjuntar un registro fotográfico del área de influencia directa e indirecta
 - Se solicita en el PMA establecer y anexar, todos los permisos y licencias ambientales requeridas para la ejecución del contrato y/o de

los actores que tendrán intervención; como por ejemplo la escombrera seleccionada para disposición de RCD o del proveedor que suministrara el material para construcción, dentro del documento.

- No se adjunta plan de gestión de residuos peligrosos (RESPEL).
- No se evidencia la matriz de capacitaciones; el cronograma de capacitación debe estar establecido de acuerdo al tiempo contractual y a los programas de manejo ambiental.
- Se solicita anexar procedimiento y formatos de inspecciones a realizar según el PMA.

La interventoría no ha recibido hasta el momento documentación con las observaciones subsanadas en el documento PAGA (Plan Adaptación Guía a la Adaptación Ambiental), desde el mes de abril, por parte del contratista UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022.

3. MUNICIPIO CACHIRA:

Durante el presente periodo se realiza seguimiento y asesoría a la profesional ambiental de la interventoría en Obra, dentro de las actividades realizadas en el componente ambiental se reitera al contratista de obra la subsanación al PAGA observado con comunicado GIC-INVIAS-NST-411-22.

- ✓ Revisión y comentarios al PAGA presentado por el contratista de Obra, dentro de las observaciones realizadas se encuentran las siguiente, el contratista no subsano el documento y entrego la versión inicial sin ninguno de los ajustes solicitados.
 - Se solicita actualizar marco legal correspondiente al componente ambiental.
 - No se presenta la información de línea base, ni la de área de influencia.
 - No se evidencia la información general de la constructora, ni de los responsables de la constructora, a cargo de la ejecución del proyecto (gerente general y/o representante legal, profesionales de área, responsable PMA, etc.).

- Se requiere presentar, de manera más completa la identificación de impacto ambiental. No es claro los datos, procedimiento y/o matriz implementada, para la evaluación del impacto ambiental que genera el proyecto
- No se evidencia la Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales, junto con su procedimiento.
- No se evidencia las fichas y/o programas de manejo ambiental enunciadas en el documento. Las fichas presentadas deben ser acorde a la identificación de los impactos ambientales, hallados en la matriz de impactos.
- No se evidencia la matriz de capacitaciones; el cronograma de capacitación debe estar establecido de acuerdo al tiempo contractual y a los programas de manejo ambiental.
- No se evidencia o presenta, los permisos y licencias ambientales requeridas para la ejecución del contrato y/o de los actores que tendrán intervención; como por ejemplo la escombrera seleccionada para disposición de RCD o del proveedor que suministrara el material para construcción, contratos de concesión para la extracción de material.
- No se evidencia el presupuesto asignado para cada fase del proyecto, ni el valor proyectado para la ejecución el PMA en cada fase
- No se adjunta plan de gestión de residuos peligrosos (RESPEL).
- No se evidencia, los formatos de inspecciones a realizar según el PMA.
- No se evidencia o presenta el plan contingencia.

4. **MUNICIPIO ABREGO:**

Durante el presente periodo se realiza seguimiento y asesoría a la profesional ambiental de la interventoría en Obra, dentro de las actividades realizadas en el componente ambiental se reitera al contratista de obra la subsanación al PAGA observado con comunicado GIC-INVIAS-NTS-447-22.

- ✓ Revisión y comentarios al PAGA presentado por el contratista de Obra en su versión 1, dentro de las observaciones realizadas se encuentran las siguiente:



- Se solicita actualizar marco legal correspondiente al componente ambiental. SIN SUBSANAR, se debe incluir algunas leyes, resoluciones y decretos correspondientes.
- No se adjunta o evidencia la política ambiental, debidamente firmada por el representante legal. SIN SUBSANAR, aunque se incluyó la política ambiental debe ir firmada por el representante legal
- Se solicita adjuntar un registro fotográfico del área de influencia directa e indirecta. SIN SUBSANAR, solo se evidencia las imágenes tomadas de Google Earth, es necesario anexar algunas fotografías del área de la influencia.
- No es claro dentro de los datos generales del proyecto, la fecha de inicio y terminación con el plazo de ejecución del proyecto. SIN SUBSANAR, dentro del documento PAGA en el ítem 6, tabla 2, no se encontró esa información por lo tanto se indicó las fechas de inicio y finalización para que sean anexadas.
- Se solicita que el documento tenga un numeral donde se mencione los responsables del proyecto (gerente general y/o representante legal, profesionales de área, responsable PMA, etc.). SIN SUBSANAR, aunque se incluye los responsables del proyecto debe tener su respectivo ítem e incluir el representante legal.
- De acuerdo a las fichas y/o programas de manejo ambiental presentados, se recomienda verificarlos y ajustarlos, ya que no sea considerado todos los impactos ambientales propios del proyecto y del área de influencia. SIN SUBSANAR
- Se requiere que, las fichas y/o programas de manejo ambiental presentado del plan de manejo, sean acordes al documento, se evidencia temas de gestión social. SIN SUBSANAR
- Se solicita en el PMA establecer y anexar, todos los permisos y licencias ambientales requeridas para la ejecución del contrato y/o de los actores que tendrán intervención; como por ejemplo la escombrera seleccionada para disposición de RCD o del proveedor que suministrara el material para construcción.



- No se adjunta plan de gestión de residuos peligrosos (RESPEL). SIN SUBSANAR
- Se solicita adjuntar programa de almacenamiento de combustible en obra, programa de manejo de derrames de combustible, grasas y aceites. SIN SUBSANAR
- No se evidencia ítem, programa o capítulo del programa de capacitaciones. SIN SUBSANAR, aunque en el ítem 10 del PAGA se evidencia capacitaciones, se requiere realizar un programa.
- No se evidencia la matriz de capacitaciones; el cronograma de capacitación debe estar establecido de acuerdo al tiempo contractual y a los programas de manejo ambiental. SIN SUBSANAR.
- No se evidencia cronograma de ejecución del PMA. SIN SUBSANAR. Aunque se evidencia el cronograma en los diferentes programas, se requiere hacer un cronograma general de ejecución del PMA.
- No. “Plan De Emergencia Y Contingencia”; este debe incluir las medidas de prevención y mitigación de riesgos, los procedimientos para las emergencias y las remediaciones de los daños que se puedan presentar, a su vez incluir el alcance y los planes estratégicos, operativo, informativo. SIN SUBSANAR. Aunque se evidencia el Plan de Emergencia y Contingencia, no se tuvo en cuenta el alcance del mismo, análisis de riesgo y el plan estratégico, plan operativo, plan informativo.
- Se solicita anexar procedimiento y formatos de inspecciones a realizar según el PMA. SIN SUBSANAR. No se evidencia anexos con formatos de inspecciones.
- Se debe verificar, ajustar tablas y justificar el documento, presentan cambios de tamaño, letra y color en las tablas; todas las ilustraciones, tablas y gráficos deben ser enumerados, tener título y fuente de consulta, con su índice correspondiente. SIN SUBSANAR. Se debe tener ajustar el documento.

- Se solicita que el documento se presente con firmas correspondientes. SIN SUBSANAR, Se debe tener en cuenta la firma del representante legal en algunos ítems del PMA.
- Se solicita que el informe de fuente de materiales sea incluido dentro del documento PMA, teniendo en cuenta solo el proveedor del cual se van abastecer para este caso sería, Concreto y Triturados SIN SUBSANAR.

5. MUNICIPIO PAMPLONITA:

Durante el presente periodo se realiza seguimiento y asesoría a la profesional ambiental de la interventoría en Obra, dentro de las actividades realizadas en el componente ambiental se reitera al contratista de obra la subsanación al PAGA observado con comunicado GIC-INVIAS-NTS-598-22.

- ✓ Revisión y comentarios al PAGA presentado por el contratista de Obra en su versión 1, dentro de las observaciones realizadas se encuentran las siguiente:
 - Se requiere ampliar y ajustar los objetivos específicos.
 - Se solicita revisar el marco legal correspondiente al componente ambiental; se sugiere retirar la normativa SST.
 - No se adjunta la línea base ambiental.
 - Se solicita anexar un ítem con la fuente de materiales.
 - Se solicita adjuntar un registro fotográfico del área de influencia directa e indirecta.
 - No se adjunta o evidencia la política ambiental, debidamente firmada con la firma del representante legal.
 - No es claro dentro de los datos generales del proyecto, la fecha de inicio y terminación con el plazo de ejecución del proyecto.
 - Se solicita anexar un ítem donde que incluya la descripción del proyecto.



- Se solicita que el documento tenga un numeral donde se mencione los responsables del proyecto (gerente general y/o representante legal, profesionales de área, responsable PMA, etc.).
- No es claro los datos, procedimiento y/o matriz implementada, en el numera 5.5 “Evaluación Ambiental Del Proyecto De Obra”, para la identificación de impactos ambientales que se presenten durante la ejecución del proyecto. Se solicita anexar el procedimiento que se utilizó para la elaboración de la Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales.
- De acuerdo a las fichas y/o programas de manejo ambiental presentados, se recomienda verificarlos y ajustarlos, ya que no sea considerado todos los impactos ambientales propios del proyecto y del área de influencia.
- Se sugiere que los impactos ambientales a los recursos hídricos y suelo, sus fichas se presenten por aparte.
- Se requiere que, las fichas y/o programas de manejo ambiental presentado del plan de manejo, sean acordes al documento.
- No se evidencia el soporte mencionado en el numeral 7. “Presupuesto”; se sugiere se presente una tabla de resumen, donde se mencione las fases del proyecto y el valor proyectado para la ejecución el PAGA en cada fase.
- Se solicita en el PAGA establecer y anexar, todos los permisos y licencias ambientales requeridas para la ejecución del contrato y/o de los actores que tendrán intervención; como por ejemplo la escombrera seleccionada para disposición de RCD o del proveedor que suministrara el material para construcción.
- No se adjunta plan de gestión de residuos peligrosos (RESPEL).
- Se solicita adjuntar programa de almacenamiento de combustible en obra, programa de manejo de derrames de combustible, grasas y aceites.
- No se evidencia ítem, programa o capítulo del programa de capacitaciones.

- No se evidencia la matriz de capacitaciones; el cronograma de capacitación debe estar establecido de acuerdo al tiempo contractual y a los programas de manejo ambiental.
- Se solicita ajustar el numeral 9. “Plan De Emergencia Y Contingencia”; este debe incluir las medidas de prevención y mitigación de riesgos, los procedimientos para las emergencias y las remediaciones de los daños que se puedan presentar, deben incluir el alcance, análisis de riesgo, complementar el plan estratégico y anexar el plan operativo y plan informativo.
- Se solicita anexar procedimiento y formatos de inspecciones a realizar según el PAGA.
- Se debe verificar, ajustar tablas y justificar el documento, presentan cambios de tamaño, letra y color en las tablas; todas las ilustraciones, tablas y gráficos deben ser enumerados, tener título y fuente de consulta, con su índice correspondiente.
- Se solicita que el documento se presente con firmas correspondientes.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se determinó que la labor del CONSORCIO OK 2022 se está realizando de manera acertada, garantizando el cumplimiento y desarrollo eficaz de las acciones propuestas en cada programa del plan de adaptación de la guía ambiental. La subsanación de las observaciones la están realizando teniendo en cuentas las indicaciones previas de la interventoría.

La interventoría se encuentra a la espera de la respuesta a los oficios enviados al Contratista consorcio MATICCES P&B LTDA, en cuanto a las observaciones realizadas en el PAGA.

La interventoría se encuentra a la espera de la respuesta a los oficios enviados al Contratista CONSORCIO AD VIAS, en cuanto a las observaciones realizadas en el PAGA.

La interventoría se encuentra a la espera de la respuesta a los oficios enviados al Contratista UNION TEMPORAL COLOMBIA, en cuanto a las observaciones realizadas en el PAGA.

Es de aclarar que, para dar aprobación a los documentos correspondientes al PAGA, se deben subsanar todas las observaciones realizadas a los documentos presentados por el contratista y se debe dar estricto cumplimiento a la normatividad vigente.

Cordialmente,



Giancarlo Avena
ESPECIALISTA AMBIENTAL

REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA



PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MAYO DE 2023

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
			VERSIÓN	1	
			PÁGINA		

FECHA

31/05/2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL:

may-23

PROYECTO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

CONTRATO INTERVENTORÍA No.

1053 DE 2021

INTERVENTORÍA:

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

CONTRATOS DE OBRA No.

Contratos derivados de los convenios interadministrativos 1791-2021 (ABREGO), 1863-2021 (LA PLAYA DE BELEN), 1814-2021 y 1758 - 2021 (OCAÑA), 1859-2021 (CACHIRA), 1861-2021 (HERRAN), 1878- 2021 (PAMPLOMITA), 1821-2021 (PAMPLONITA, 1943-2021, 2052- 2021 y 2033-2021 (GOBERNACION DE NTS)

CONTRATISTAS:

N/A

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VEHÍCULO	Renault Duster Dynamique - HWP 247	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A
VEHÍCULO	Renault Duster Dynamique - USK 380	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A
MOTOCICLETA	Hero Thriller - CBP23E	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).

(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

SOAT VEHÍCULO HWP 247 : Desde 23-05-2022 hasta el 23-05-2023.

TECOMECANICA: Desde 10-08-2022 hasta el 10-08-2023

SOAT VEHÍCULO USK 380 : Desde 24-03-2023 hasta el 24-03-2024.

TECOMECANICA: Desde 04-01-2023 hasta el 04-01-2024

SOAT MOTOCOCLETA CBP23E: Desde 21-02-2023 hasta el 20-02-2024

TECNOMECANICA: Desde 24-02-2023 hasta el 24-02-2024

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.

2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.

3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma



Nombre: Diego Efraín Pedraza Chaves

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND

Firma

Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE

Supervisor del Contrato de Interventoría.

Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
											VERSIÓN	1
											PÁGINA	

FECHA

26-jun
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	NORTE DE SANTANDER
-------------------	---------------------------------	------------------------	--------------------

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	1053 DE 2022	INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.
MES INFORME MENSUAL:	MAYO 2023	PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2
CONTRATO DE OBRA No:	Contratos derivados de los convenios interadministrativos 1791-2021 (ABREGO), 1863-2021 (LA PLAYA), 1814-2021 (OCAÑA), 1758-2021 (OCAÑA), 1859-2021 (CACHIRA), 1861-2021 (HERRAN), 1878-2021 (PAMPLONITA), 1821-2021 (SANTIAGO), 1943-2021 (GOBERNACIÓN), 2033-2021 (GOBERNACIÓN) Y 2052-2021 (GOBERNACIÓN)		
	CONTRATISTA:		

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA							
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	931422	13-21 SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GASTO C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	11	Nación	Contrato principal	\$ 40,000,000	\$ -
2023	148423	13-21 SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	11	Nación	Contrato principal	\$ 1,770,000,000	\$ 1,158,580,505
TOTAL						\$ 1,810,000,000	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:		\$ 1,810,000,000					

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA												
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	sep-22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	931422 - 2022/08/22	\$ 40,000,000.00	\$ 4,288,164,910.00		
2	oct-22	\$ 15,314,720.00	\$ 2,909,796.80	\$ 18,224,516.80	\$ -	\$ 18,224,516.80	\$ -	931422 - 2022/08/22	\$ 21,775,483.20	\$ 4,269,940,393.20	135914 de 13/12/2022	
3	nov-22	\$ 18,293,100.00	\$ 3,475,689.00	\$ 21,768,789.00	\$ -	\$ 21,768,789.00	\$ -	931422 - 2022/08/22	\$ 6,694.20	\$ 4,248,171,604.20	138491 de 16/12/2022	
4	dic-22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	931422 - 2022/08/22	\$ 6,694.20	\$ 4,248,171,604.20		
5	ene-23	\$ 5,625.38	\$ 1,068.82	\$ 6,694.20	\$ -	\$ 6,694.20	\$ -	931422 - 2022/08/22	-\$ 0.00	\$ 4,248,164,910.00		
5	ene-23	\$ 113,108,774.62	\$ 21,490,667.18	\$ 134,599,441.80	\$ -	\$ 134,599,441.80	\$ -	148423 - 2023/02/14	\$ 1,635,400,558.20	\$ 4,113,565,468.20		
6	feb-23	\$ 120,947,040.00	\$ 22,979,937.60	\$ 143,926,977.60	\$ -	\$ 143,926,977.60	\$ -	148423 - 2023/02/14	\$ 1,491,473,580.60	\$ 3,969,638,490.60	51262 de 24/05/2023	
7	mar-23	\$ 158,329,920.00	\$ 30,082,684.80	\$ 188,412,604.80	\$ -	\$ 188,412,604.80	\$ -	148423 - 2023/02/14	\$ 1,303,060,975.80	\$ 3,781,225,885.80		
8	abr-23	\$ 121,412,160.00	\$ 23,068,310.40	\$ 144,480,470.40	\$ -	\$ 144,480,470.40	\$ -	148423 - 2023/02/14	\$ 1,158,580,505.40	\$ 3,636,745,415.40		
9	may-23	\$ 106,743,040.00	\$ 20,281,177.60	\$ 127,024,217.60	\$ -	\$ 127,024,217.60	\$ -	148423 - 2023/02/14	\$ 1,031,556,287.80	\$ 3,509,721,197.80		
TOTALES		\$ 654,154,380.00	\$ 124,289,332.20	\$ 778,443,712.20	\$ -	\$ 778,443,712.20	\$ -		\$ 1,031,556,287.80	\$ 3,509,721,197.80		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO			
	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*	\$ 654,154,380.00	\$ 124,289,332	\$ 778,443,712.20
*			
*			
VALOR TOTAL	\$ 654,154,380.00	\$ 124,289,332	\$ 778,443,712.20

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: DIEGO EFRAIN PEDRAZA CHAVES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND

Firma

Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		COODIGO MEP/MND-IN-15-FR-7																																														
			VERSION 1																																														
			PAGINA																																														
			FECHA 31/05/2022 (Día / Mes / Año)																																														
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER																																														
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022			INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.																																														
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2022			PROYECTO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2																																														
CONTRATO DE OBRA No.: Contrato derivado de los convenios interadministrativos 1791-2021 (ABREGO), 1883-2021 (LA PLAYA DE BELÉN), 1814-2021 y 1798-2021 (COCARA), 1869-2021 (CACHIRA), 1861-2021 (HERRAN), 1878-2021 (PAMPLONITA), 1821-2021 (PAMPLONITA, 1943-2021, 2053-2021 y 2033-2021 (GOBERNACION DE NTS)			CONTRATISTA: N/A																																														
NOMBRE ARL: SEGUROS BOLIVAR			NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:																																														
VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL																																																	
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes																												Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Porcentaje		Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	DIEGO EFRAN PEDRAZA CHAVES	80.467.714	DIRECTOR	\$ 2.275.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	35%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	\$ 2.275.000	\$ 158.340	V	SANTITAS	9451934536	\$ 273.000	PORVENIR	9451934536	\$ 364.000	\$ 45.500			
2	ADRIANA GUTIERREZ DE RIVERES ANGARITA	37.335.038	RESIDENTE	\$ 5.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	\$ 5.500.000	\$ 382.800	V	SANTITAS	9451934536	\$ 220.000	COLFONDOS	9451934536	\$ 935.000	\$ 220.000				
3	ROSANA DEL PILAR MATTOS PARRA	37.270.723	RESIDENTE	\$ 5.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	\$ 5.500.000	\$ 382.800	V	SANTITAS	9451934536	\$ 220.000	COLPENSION ES	9451934536	\$ 935.000	\$ 220.000				
4	GERSON JAVIER BUITRAGO PAEZ	1.090.177.481	INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR DE INTERVENTORIA	\$ 3.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	\$ 3.000.000	\$ 208.800	V	COMPENSAR	9451934536	\$ 360.000	COLPENSION ES	9451934536	\$ 480.000	\$ 60.000				
5	KATHERINE NAVARRO CARRASCAL	1.091.666.432	PROFESIONAL AMBIENTAL	\$ 3.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	\$ 3.500.000	\$ 243.600	V	ASMET SALUD EPS SAS	9451934536	\$ 140.000	PORVENIR	9451934536	\$ 560.000	\$ 140.000				
6	ANUAR JESTH CABARCAS CARRASCAL	1.019.076.882	PROFESIONAL SOCIAL	\$ 3.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	\$ 3.500.000	\$ 243.600	V	NUEVA EPS	9451934536	\$ 140.000	COLFONDOS	9451934536	\$ 560.000	\$ 140.000				
7	RUBIELA MOLINA CORTES	60.421.399	INSPECTOR SST	\$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	\$ 2.000.000	\$ 139.200	V	NUEVA EPS	9451934536	\$ 80.000	PORVENIR	9451934536	\$ 320.000	\$ 80.000				
8	FANNY AMAYA GÓMEZ	60.398.879	SECRETARIA	\$ 1.150.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	\$ 1.150.000	\$ 6.100	I	SANTITAS	9451934536	\$ 46.000	PORVENIR	9451934536	\$ 184.000	\$ 46.400				
9	LUIS EDUARDO ESTUPIÑAN GONZALEZ	88.241.378	INSPECTOR	\$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	\$ 2.000.000	\$ 139.200	V	SANTITAS	9451934536	\$ 80.000	PORVENIR	9451934536	\$ 320.000	\$ 80.000				
10	WILMER SALAZAR GARCÍA	88.248.488	CONDUCTOR	\$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	\$ 1.160.000	\$ 80.800	V	SALUD TOTAL	9451934536	\$ 46.400	COLFONDOS	9451934536	\$ 185.800	\$ 46.400				
11	WILLIAM LUNA MELO	1.091.656.642	CONDUCTOR	\$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	\$ 1.160.000	\$ 80.800	V	NUEVA EPS	9451934536	\$ 46.400	COLPENSION ES	9451934536	\$ 185.800	\$ 46.400				
12	DIANA ROCÍO SUAREZ RINCÓN	51.989.792	PROFESIONAL CALIDAD	\$ 3.325.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	95%	DIANA ROCIO SUAREZ RINCÓN	\$ 3.325.000	\$ 231.420	V	SANTITAS	1055371746	\$ 399.000	PORVENIR	1055371746	\$ 532.000					
13	JARO ALONSO ZORRO ROA	1.031.120.730	ESPECIALISTA HIDRAULICO	\$ 900.000	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	\$ 900.000	\$ 62.640	V	SANTITAS	9451934536	\$ 108.000	PORVENIR	9451934536	\$ 144.000	\$ 18.000				
14	GICELA CORDOBA	52.707.067	ESPECIALISTA DISEÑO GEOMETRICO	\$ 2.040.000	X				X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	34%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	\$ 2.040.000	\$ 141.984	V	SANTITAS	9451934536	\$ 244.800	PORVENIR	9451934536	\$ 326.400	\$ 40.800				
15	FELIPE STAND	79.533.915	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	\$ 2.220.000				X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	37%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	\$ 2.220.000	\$ 154.512	I	SANTITAS	9452133254	\$ 266.400	PORVENIR	9452133254	\$ 355.200					
16	JAVIER MILLAN	79.345.746	ESPECIALISTA GECETNA	\$ 780.000	X	X			X			X			X		X		X		X		X		X		X	X	X	X	X	X	13%	JAM INGENIERIA	\$ 780.000	\$ 54.288	V	FAMISANAR	7883590548	\$ 93.600	COLPENSION ES	7883590548	\$ 124.800	\$ 15.600					
17	GIANCARLO AVENA CORRALES	11.036.578	ESPECIALISTA AMBIENTAL	\$ 360.000	X	X			X					X		X		X		X		X		X		X	X	X	X	X	X	X	6%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	\$ 360.000	\$ 25.056	V	SURA	9452298817	\$ 43.200	PORVENIR	9452298817	\$ 57.600						
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				\$ 40.370.000																																													
El Interventor adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 9 del presente formato.																																																	
NOTAS: 1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva. 2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo. 3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades. 4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de Interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual. 5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación. 6. El Interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal. 7. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos. 8. El Supervisor del contrato de Interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría. 9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociadas a la ejecución de la intervención, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio. 10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.																																																	
Firma Nombre: Diego Efran Pedraza Chaves Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND																Firma Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor del Contrato de Interventoría Matrícula profesional No.: 54202-088055 NTS																																	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del RNMS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																																	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13																																																								
		VERSIÓN	1																																																								
		PÁGINA																																																									
		FECHA	31/05/2023 (Día / Mes / Año)																																																								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER																																																									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022		INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.																																																									
OBJETO DEL CONTRATO:																																																											
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.																																																											
FECHA DE INICIO: 26/09/2022																																																											
PLAZO INICIAL: 27 MESES Y 17 DÍAS																																																											
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																											
VALOR INICIAL: \$ 4,288,164,910.00																																																											
VALOR ACUMULADO: \$ 4,288,164,910.00 (Incluye adiciones)																																																											
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE																																																											
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																											
<table><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td></td><td>\$ 428,816,491.00</td><td>24</td><td>6</td><td>2022</td><td>30</td><td>6</td><td>2025</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td>\$ 857,632,982.00</td><td>24</td><td>6</td><td>2022</td><td>30</td><td>6</td><td>2025</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td></td><td>\$ 857,632,982.00</td><td>24</td><td>6</td><td>2022</td><td>31</td><td>12</td><td>2027</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td></td><td>\$ 1,286,449,473.00</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2029</td></tr></table>						Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Cumplimiento		\$ 428,816,491.00	24	6	2022	30	6	2025	Buen manejo y correcta inversión del anticipo		\$ 857,632,982.00	24	6	2022	30	6	2025	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 857,632,982.00	24	6	2022	31	12	2027	Calidad del servicio		\$ 1,286,449,473.00	31	12	2024	31	12	2029
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																								
			Desde			Hasta																																																					
Cumplimiento		\$ 428,816,491.00	24	6	2022	30	6	2025																																																			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		\$ 857,632,982.00	24	6	2022	30	6	2025																																																			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 857,632,982.00	24	6	2022	31	12	2027																																																			
Calidad del servicio		\$ 1,286,449,473.00	31	12	2024	31	12	2029																																																			
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 140991																																																											
Certificado de modificación o anexo No.: 4110039402 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																											
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUREXPO BANCOLDEX-CESCE																																																											
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 26/08/2022																																																											
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																											
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																											
ACTA DE INICIO N.A																																																											
<table><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td></td><td>\$ 428,816,491.00</td><td>24</td><td>6</td><td>2022</td><td>30</td><td>6</td><td>2025</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td>\$ 857,632,982.00</td><td>24</td><td>6</td><td>2022</td><td>30</td><td>6</td><td>2025</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td></td><td>\$ 857,632,982.00</td><td>24</td><td>6</td><td>2022</td><td>31</td><td>12</td><td>2027</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td></td><td>\$ 1,286,449,473.00</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2029</td></tr></table>						Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Cumplimiento		\$ 428,816,491.00	24	6	2022	30	6	2025	Buen manejo y correcta inversión del anticipo		\$ 857,632,982.00	24	6	2022	30	6	2025	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 857,632,982.00	24	6	2022	31	12	2027	Calidad del servicio		\$ 1,286,449,473.00	31	12	2024	31	12	2029
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																								
			Desde			Hasta																																																					
Cumplimiento		\$ 428,816,491.00	24	6	2022	30	6	2025																																																			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		\$ 857,632,982.00	24	6	2022	30	6	2025																																																			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 857,632,982.00	24	6	2022	31	12	2027																																																			
Calidad del servicio		\$ 1,286,449,473.00	31	12	2024	31	12	2029																																																			

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 140991
Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUREXPO BANCOLEX-CESCE
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 20/10/2022
PRORROGA No.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		
Calidad del servicio		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías

Firma
Nombre: Diego Efraín Pedraza Chaves
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND

Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

FECHA

31/05/2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

1053 DE 2022
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los municipios del departamento de Norte de Santander del programa "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

INTERVENTOR:

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

FECHA DE INICIO:

26/09/2022
(Indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL:

27 MESES Y 17 DÍAS

FECHA DE VENCIMIENTO:

31/12/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No:

1859-2021 (CACHIRA), 1861-2021 (HERRAN), 1878-2021 (PÁMPLOMITA), 1821-2021 (PAMPLONITA), 1943-2021, 2052-2021 y 2033-2021
(GOBERNACION DE NTS)
(Indicar número y año)

CONTRATISTA:

N.A

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO:

SI

x

NO

APROBADO:

SI

NO

x

VERSIÓN No.

0

FECHA DE VERSIÓN:

20/02/2023

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO:

SI

NO

x

No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS:

1

FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA:

SI

NO

x

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS:

0

FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES:

Las auditorias aplicaran a partir del sexto mes

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO:

SI

x

NO

APROBADO:

SI

NO

FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES:

No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES:

SI

NO

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra. La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes:

0

No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:

0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:

0

No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:

0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:

0

OBSERVACIONES:

No se han generado no conformidades

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:

0

No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:

0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:

No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:

0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:

0

No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:

0

OBSERVACIONES:

No se han presentado quejas y/o reclamos

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =	100%	Nº de Informes entregados en el período, sin reclamaciones debido a la fecha de entrega / Nº de Informes entregados en el período *100
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	Maquina de los Angeles	Arcinge	1022019	1/08/2022	6/09/2022		
2	Maquina de ensayos a Compresion	No presenta	PSGS-01	1/08/2022	6/08/2022		
3	Manometro Humedometro	Vincicol	No presenta	1/08/2022	6/09/2022		
4	Instrumento de Pesaje no automatico	Mavin	2018010102	1/08/2022	5/08/2022		
5	Instrumento de Pesaje no automatico	Trumax	3202085057	1/08/2022	5/08/2022		
6	Instrumento de Pesaje no automatico	OHAUS	B337764871	1/08/2022	5/08/2022		
7	MÁQUINA SEMIAUTOMÁTICA DIGITAL PARA ENSAYOS MARSHALL Y CBR	VINCICOL INGENIERIA S.A.S.	140219 // J180911306	1/08/2022	6/08/2022		

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma 
Nombre: Diego Efraín Pedraza Chaves
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-109359 CND

Firma 
Nombre: Diana Rocio Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No: 15202 153775

Firma _____
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

REGISTRO FOTOGRAFICO



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MAYO DE 2023

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

MUNICIPIO DE OCAÑA
CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.3879052



PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MAYO DE 2023

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0670

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0665

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0659

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0715

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CUNETAS MARGEN DERECHA

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0620

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: REPLANTEO DE CUNETAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0666

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CONTRA HUELLA CENTRAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0640

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACION E INSTALACION DE VIGA RIOSTRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0650

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0658

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0657

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CONTRAHUELLA LATERAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0620

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACION DE VIGA RIOSTRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0632

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLA Y VIGA RIOSTRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0680

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION ACERO DE CUNETA MARGEN IZQUIERDO

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0590 AL PR 15+0400

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: REPLANTEO Y NIVELACION DE EJE Y ANCHO DE VIA

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0656

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CONTRAHUELLA LATERAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0680

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO DE CUNETA MARGEN IZQUIERDO

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0590

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ADECUACION DE AREA

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0670

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: PERFILADO DE CUNETA MARGEN IZQUIERDO

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0620

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLA Y VIGA RIOSTRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (20)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0611

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO EN VIGA RIOSTRA Y HUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (21)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0655

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO CUNETA MARGEN IZQUIERDA

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (22)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0775

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CUNETA MARGEN IZQUIERDA

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (23)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0580

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE SUB-BASE

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (24)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0590

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: COMPACTACION DE SUB-BASE

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0600

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO EN HUELLA Y VIGA RIOSTRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0600

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLA Y VIGA RIOSTRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0600
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0627

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CONTRA HUELLA CENTRAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0570

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE SUB-BASE

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0610

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CONTRA HUELLA CENTRAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0410
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ADECUACION DE CUNETAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0410

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE SUB BASE

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0590

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0610

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO MARGEN IZQUIERDO

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0570

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO EN HUELLA Y VIGA RIOSTRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (12)




UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0540

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: REPLANTEO DE ALINEAMIENTO DE PLACA HUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (13)

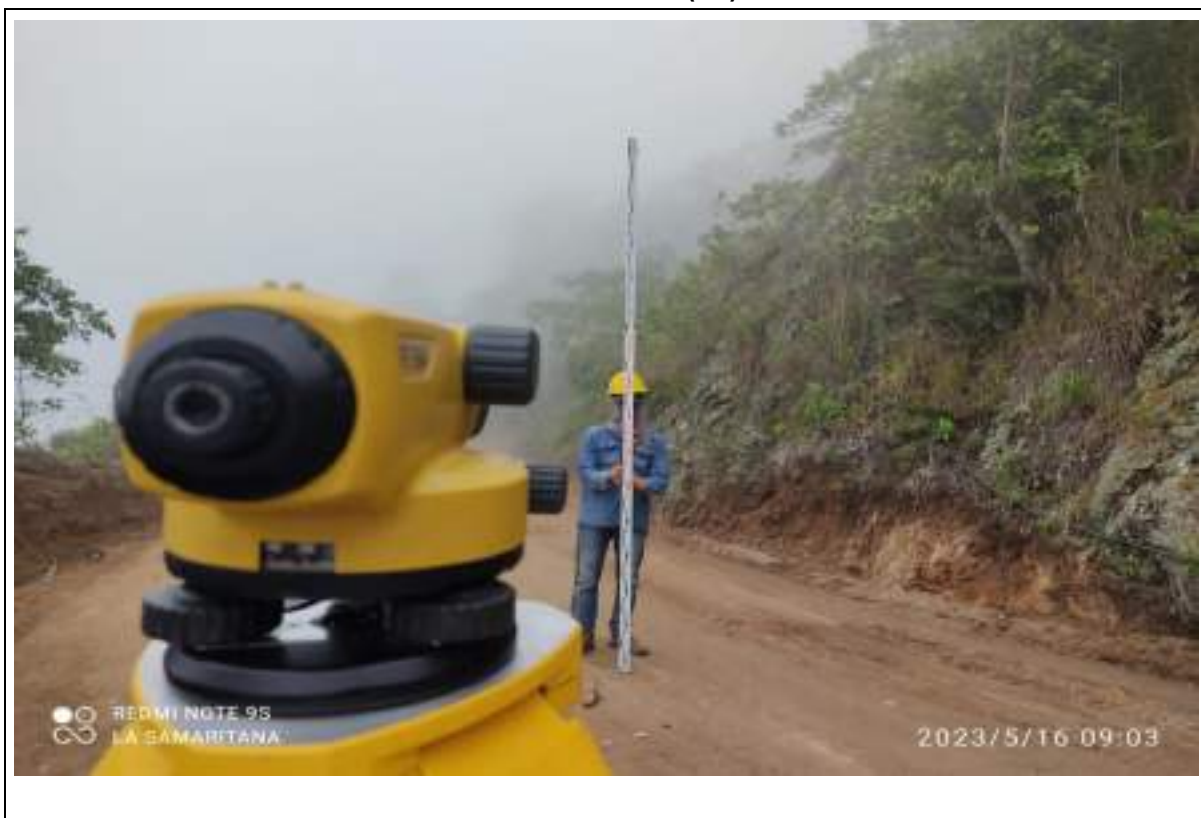

UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0470

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: NIVELACION, CHEQUEO DE COTAS PARA LA BANCA DE LA PLACA HUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0696

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ADECUACION DE VIA

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0546

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO DE VIGA RIOSTRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0560

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO EN HULLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0665

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CUNETA MARGEN DERECHO

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (18)




UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0670

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CUNETA MARGEN DERECHO

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023


FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD:

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (20)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD:

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0660

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLA Y VIGA RIOSTRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0626

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CONTRA HUELLA CENTRAL Y LATERAL DERECHO

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0650

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CUNETA DERECHA

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0810

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CHEQUEO DE NIVELES Y TOMA DE DATOS PARA PLANOS RECORD

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0500

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CHEQUEO DE NIVELES Y TOMA DE DATOS PARA PLANOS RECORD

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0580

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FIGURADO DE ACERO

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0590

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ENCOFRADO CUNETAS MARGEN IZQUIERDO

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0528

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO VIGA RIOSTRA Y HUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0570

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CONTRA HUELLA CENTRAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0568

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CONTRA HUELLA CENTRAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0530

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLA Y VIGA RIOSTRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0620

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ENCOFRADO CUNETA MARGEN DERECHO

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0530

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA CUNETTA MARGEN DERECHO

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0590

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA CONTRA HUELLA LATERAL IZQUIERDA

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0620

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO CUNETAS MARGEN IZQUIERDO

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0620

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ENCOFRADO CUNETA MARGEN DERECHO

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: BARRIO JUAN XXIII

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: RETIRO DE CAPA ASFALTICA EXISTENTE

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: BARRIO JUAN XXIII

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: RETIRO DE CAPA ASFALTICA EXISTENTE

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0548

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CONTRA HUELLA LATERAL IZQUIERDA

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (20)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0620

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA CUNETA MARGEN DERECHO

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: BARRIO JUAN XXIII

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: RETIRO DE CAPA ASFALTICA EXISTENTE

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: BARRIO JUAN XXIII
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD:

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0535

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CUNETAS IZQUIERDA

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0600

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA CONTRA HUELLA LATERAL IZQUIERDA

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0560

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CONTRA HUELLA CENTRAL Y LATERAL DERECHA

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: BARRIO JUAN XXIII

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FINALIZACION DE RETIRO CAPA ASFALTICA EXISTENTE

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: BARRIO JUAN XXIII

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INICIO DE EXCAVACION ESTRUCTURA DE VIA

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0535

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CONTRA HUELLA LATERAL DERECHA

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0632

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO HUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0593

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO CUNETA MARGEN DERECHO

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: BARRIO JUAN XXIII
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACION

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: JUAN XXIII

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDA: EXCAVACION

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: BARRIO JUAN XXIII
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACION

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: BARRIO JUAN XXIII
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACION

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0535

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: AVANCE DE PAÑO COMPLETO

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0574

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ENCOFRADO E INSTALACION DE ACERO CUNETA MARGEN DERECHO

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0504

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO DE HUELLA Y VIGA RIOSTRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0532

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLA Y VIGA RIOSTRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0575

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CUNETA MARGEN DERECHO

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (20)



UBICACIÓN: LA SAMARITANA PR 15+0620

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: PLACA HUELLA

MUNICIPIO DE ABREGO
CONTRATO DE OBRA No. 252 DE 2022



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MAYO DE 2023

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	ABREGO, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS
CONTRATO DE OBRA No.:	252 DE2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 LA YEE DEL CHORRO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: DESCARGUE DE SUB-BASE

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	ABREGO, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS
CONTRATO DE OBRA No.:	252 DE2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 LA YEE DEL CHORRO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE SUB-BASE

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	ABREGO, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS
CONTRATO DE OBRA No.:	252 DE2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 LA YEE DEL CHORRO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: HIDRATACION A SUB-BASE

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	ABREGO, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS
CONTRATO DE OBRA No.:	252 DE2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 PIE DE CRUZ

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: COMPACTACION DE SUB-BASE

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	ABREGO, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS
CONTRATO DE OBRA No.:	252 DE2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 PIE DE CRUZ

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: COMPACTACION DE SUB-BASE

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	ABREGO, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS
CONTRATO DE OBRA No.:	252 DE2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 LA YEE DEL CHORRO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE SUB-BASE

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	ABREGO, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS
CONTRATO DE OBRA No.:	252 DE2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 LA YEE DEL CHORRO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: COMPACTACION DE SUB-BASE

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	ABREGO, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS
CONTRATO DE OBRA No.:	252 DE2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (8)




UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 PIE DE CRUZ

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: COMPACTACION DE SUB-BASE

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	ABREGO, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS
CONTRATO DE OBRA No.:	252 DE2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (9)




UBICACIÓN: ABREGO – LA SABANA

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: SITIO A INTERVENIR CON PLACA HUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	ABREGO, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS
CONTRATO DE OBRA No.:	252 DE2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (10)




UBICACIÓN: ABREGO – LA SABANA

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: SITIO A INTERVENIR CON PLACA HUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	ABREGO, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS
CONTRATO DE OBRA No.:	252 DE2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (11)




UBICACIÓN: ABREGO – LA SABANA

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: SITIO A INTERVENIR CON PLACA HUELLA Y ALCANTARILLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	ABREGO, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS
CONTRATO DE OBRA No.:	252 DE2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (12)




UBICACIÓN: ABREGO – LA SABANA

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: SITIO A INTERVENIR CON PLACA HUELLA Y ALCANTARILLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	ABREGO, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS
CONTRATO DE OBRA No.:	252 DE2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (13)




UBICACIÓN: ABREGO – LA VEGA EL TIGRE

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: SITIO A INTERVENIR CON PLACA HUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	ABREGO, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS
CONTRATO DE OBRA No.:	252 DE2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: ABREGO – LA VEGA EL TIGRE

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: SITIO A INTERVENIR CON PLACA HUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	ABREGO, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS
CONTRATO DE OBRA No.:	252 DE2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: ABREGO – LA VEGA EL TIGRE

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: SITIO A INTERVENIR CON PLACA HUELLA Y ALCANTARILLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	ABREGO, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS
CONTRATO DE OBRA No.:	252 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE SUB-BASE

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	ABREGO, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS
CONTRATO DE OBRA No.:	252 DE2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: SOCIALIZACION

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	ABREGO, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS
CONTRATO DE OBRA No.:	252 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 LA YEE DEL CHORRO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: HIDRATACION A SUB-BASE

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	ABREGO, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS
CONTRATO DE OBRA No.:	252 DE2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 LA YEE DEL CHORRO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: TOMA DE DENSIDADES PRIMERA CAPA

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	ABREGO, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS
CONTRATO DE OBRA No.:	252 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 LA YEE DEL CHORRO

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: TOMA DE DENSIDADES PRIMERA CAPA

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	ABREGO, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS
CONTRATO DE OBRA No.:	252 DE2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 PIE DE CRUZ
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE SUB-BASE

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	ABREGO, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS
CONTRATO DE OBRA No.:	252 DE2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 PIE DE CRUZ

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ACOPIO DE MATERIAL TRITURADO Y ARENA

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	ABREGO, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS
CONTRATO DE OBRA No.:	252 DE2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 PIE DE CRUZ

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION SEGUNDA CAPA DE SUB-BASE

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	ABREGO, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS
CONTRATO DE OBRA No.:	252 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 SANTA LUCIA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: PERFILADO DE LA VIA

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	ABREGO, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS
CONTRATO DE OBRA No.:	252 DE2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 SANBTA LUCIA

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: COMPACTACION DE SUBRASANTE

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	ABREGO, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS
CONTRATO DE OBRA No.:	252 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 SANTA LUCIA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE SUB BASE

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	ABREGO, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS
CONTRATO DE OBRA No.:	252 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 SANTA LUCIA

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: COMPACTACION DE SUB BASE

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	ABREGO, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS
CONTRATO DE OBRA No.:	252 DE2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 SANTA LUCIA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ADECUACION VIA ALTERNA

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	ABREGO, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS
CONTRATO DE OBRA No.:	252 DE2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 SANTA LUCIA 1
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: COMPACTACION VIA ALTERNA

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	ABREGO, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS
CONTRATO DE OBRA No.:	252 DE2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 SANTA LUCIA 1
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE SUB BASE

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	ABREGO, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS
CONTRATO DE OBRA No.:	252 DE2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 SANTA LUCIA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ACOPIO DE SUB-BASE

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	ABREGO, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS
CONTRATO DE OBRA No.:	252 DE2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 PIE DE CRUZ
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: HIDRATACION A SUB BASE

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	ABREGO, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS
CONTRATO DE OBRA No.:	252 DE2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 PIE DE CRUZ

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: COMPACTACION DE SUB BASE

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	ABREGO, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS
CONTRATO DE OBRA No.:	252 DE2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 SANTA LUCIA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ACOPIO DE MATERIAL (TRITURADO)

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	ABREGO, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS
CONTRATO DE OBRA No.:	252 DE2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 SANTA LUCIA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ACOPIO DE MATERIAL (ARENA)

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	ABREGO, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS
CONTRATO DE OBRA No.:	252 DE2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 PIE DE CRUZ
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: IRRIGACION DE SUB BASE

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	ABREGO, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS
CONTRATO DE OBRA No.:	252 DE2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 LA YEE DEL CHORRO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ADECUACION PARA ACOPIO DE MATERIAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	ABREGO, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS
CONTRATO DE OBRA No.:	252 DE2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 PIE DE CRUZ

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: COMPACTACION DE SUB-BASE

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	ABREGO, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS
CONTRATO DE OBRA No.:	252 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 PIE DE CRUZ

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: COMPACTACION DE SUB-BASE

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	ABREGO, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS
CONTRATO DE OBRA No.:	252 DE2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 SANTA LUCIA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE SUB BASE

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	ABREGO, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS
CONTRATO DE OBRA No.:	252 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 PIE DE CRUZ

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CONFORMACION DE CUNETA

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	ABREGO, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS
CONTRATO DE OBRA No.:	252 DE 2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 SANTA LUCIA

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE SUB BASE

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	ABREGO, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS
CONTRATO DE OBRA No.:	252 DE2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 SANTA LUCIA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE SUB BASE

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	ABREGO, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS
CONTRATO DE OBRA No.:	252 DE2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 SANTA LUCIA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE SUB BASE

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	ABREGO, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS
CONTRATO DE OBRA No.:	252 DE2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 SANTA LUCÍA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: COMPACTACION DE SUB BASE

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	ABREGO, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS
CONTRATO DE OBRA No.:	252 DE2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 1 SANTA LUCIA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ACOPIO DE MATERIAL (TRITURADO)

MUNICIPIO DE SANTIAGO
CONTRATO DE OBRA No. LP-OP-01-2022



PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MAYO DE 2023

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	SANTIAGO NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	LP-OP-01-2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	15 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Sector Cuperena- zul alto

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Desplazamiento de maquinaria hacia tramo a intervenir.

NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	SANTIAGO NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	LP-OP-01-2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	15 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: Sector de Cuperena.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Acopio de material.

NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	SANTIAGO NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	LP-OP-01-2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	15 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: MUNICIPIO DE SANTIAGO, ESCUELA ZUL-ALTO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: SOCIALIZACION DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	SANTIAGO NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	LP-OP-01-2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	15 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: ESCUELA ZUL-ALTO

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: SOCIALIZACION DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	SANTIAGO NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	LP-OP-01-2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	15 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: ESCUELA ZUL-ALTO

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: SOCIALIZACION DEL PROYECTO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	SANTIAGO NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	LP-OP-01-2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	15 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: SECTOR DE CUPERENA.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR

NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	SANTIAGO NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	LP-OP-01-2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	15 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: SECTOR DE CUPERENA.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CONFORMACION DE LA RASANTE

NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	SANTIAGO NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	LP-OP-01-2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	15 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: SECTOR DE CUPERENA.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CONFORMACION DE LA RASANTE

NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	SANTIAGO NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	LP-OP-01-2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	15 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: SECTOR DE CUPERENA.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CONFORMACION DE LA RASANTE

NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	SANTIAGO NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	LP-OP-01-2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	15 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: SECTOR DE CUPERENA.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: COMPACTACION DE LA RASANTE.

NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	SANTIAGO NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	LP-OP-01-2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	15 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: SECTOR EL MAMON

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ACOPIO DE MATERIAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	SANTIAGO NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	LP-OP-01-2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	15 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: EL CASINO

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CAMPAMENTO

NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	SANTIAGO NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	LP-OP-01-2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	15 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: K1+000

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ACOPIO DE MATERIAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	SANTIAGO NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	LP-OP-01-2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	15 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: SECTOR DE CUPERENA

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD: EXTENDIDA DE MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR.

NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	SANTIAGO NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	LP-OP-01-2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	15 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: SECTOR DE CUPERENA:

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: RECORRIDO DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	SANTIAGO NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	LP-OP-01-2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	15 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFIA NO. (16)



UBICACIÓN: CAMPAMENTO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: MAQUINARIA DISPONIBLE EN OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	SANTIAGO NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	LP-OP-01-2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	15 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: K1+000 CUPERENA

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: ACOPIO DE MATERIAL.

NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	SANTIAGO NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	LP-OP-01-2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	15 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: CUPERENA HACIA ZUL-ALTO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: RECORRIDO DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	SANTIAGO NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	LP-OP-01-2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	15 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA

**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: RECORRIDO DE OBRA,
EVIDENCIANDO PUNTOS CRITICOS.**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	SANTIAGO NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	LP-OP-01-2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	15 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: SECTOR DE CUPERENA

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: UBICANDO GUARDAGANADO QUE DEBE IR DENTRO DE LA PLACA HUELLA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	SANTIAGO NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	LP-OP-01-2022
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1053 DE 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	15 AL 31 DE MAYO 2023

FOTOGRAFÍA (20)



UBICACIÓN: SECTOR DE CUPERENA

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: RECORRIDO DE OBRA CON SECRETARIO DE PLANEACION DEL MUNICIPIO.

CONTROL CORRESPONDENCIA



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MAYO DE 2023

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

ENVIADA



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

**PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MAYO DE 2023**

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

GIC-INVIAS-NTS-478-22	2-may-23	RESPUESTA A SU OFICIO OFC-CLP-GIC-019-2023 DE FECHA 05-04-2023 CUYO ASUNTO ES "RESPUESTA A OFICIO GIC-INVIAS-NTS-444- 22 OBSERVACIONES ESTUDIO DE SUELOS CORREDOR 1 y 2. " – OBSERVACIONES 3	1	DEYBI JANER MEZA VELASQUEZ Representante Legal CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	DEPC	DEPC	Correo Electronico
GIC-INVIAS-NTS-479-22	3-may-23	RESPUESTA TRÁMITE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL TEMPORAL POSIBLE FUENTE DE MATERIALES - DISTANCIAS MAYORES DE ACARREO	8	JUAN CARLOS JACOME ROPERO Alcalde municipal	ABREGO	DEPC	DEPC	Correo Electronico
GIC-INVIAS-NTS-480-22	3-may-23	RESPUESTA A SU OFICIO UTET-02590-006 DE FECHA 24-04-2023 CUYO ASUNTO ES "ALCANCE ITEM "COMPLEMENTACION Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS"	6 DOCUMENTOS PDF	ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO Representante legal UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590	GOBERNACIÓN 1943	DEPC	DEPC	Correo Electronico
GIC-INVIAS-NTS-481-22	3-may-23	RESPUESTA A SU OFICIO OFC-CADV-GIC-056-2023 FUENTE DE MATERIALES - OBSERVACIONES	1	SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA Representante Legal CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	KNC	DEPC	Correo Electronico
GIC-INVIAS-NTS-482-22	3-may-23	RESPUESTA A SU OFICIO OFC-CLP-GIC-020-2023 FUENTE DE MATERIALES - OBSERVACIONES	1	DEYBI JANER MEZA VELASQUEZ Representante Legal CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	KNC	DEPC	Correo Electronico
GIC-INVIAS-NTS-483-22	3-may-23	INSTRUCTIVO ELABORACION ARTE VALLA IDENTIFICATIVA	2	LUIS JAVIER CARRASCAL CONSORCIO OK 2022	OCAÑA-1758	DEPC	DEPC	Correo Electronico
GIC-INVIAS-NTS-484-22	3-may-23	INSTRUCTIVO ELABORACION ARTE VALLA IDENTIFICATIVA	2	SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA Representante Legal CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	DEPC	DEPC	Correo Electronico
GIC-INVIAS-NTS-485-22	3-may-23	INSTRUCTIVO ELABORACION ARTE VALLA IDENTIFICATIVA	2	JUAN SEBASTIAN BURGOS SANCHEZ Representante Legal UNIÓN TEMPORAL OCAÑA GBE	OCAÑA-1814	DEPC	DEPC	Correo Electronico
GIC-INVIAS-NTS-486-22	3-may-23	INSTRUCTIVO ELABORACION ARTE VALLA IDENTIFICATIVA	2	LUIS EDUARDO BLANCO Director de Obra	SANTIAGO	DEPC	DEPC	Correo Electronico
GIC-INVIAS-NTS-487-22	3-may-23	INSTRUCTIVO ELABORACION ARTE VALLA IDENTIFICATIVA	2	HUGO PERÉZ ÁLVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	CACHIRA	DEPC	DEPC	Correo Electronico
GIC-INVIAS-NTS-488-22	3-may-23	INSTRUCTIVO ELABORACION ARTE VALLA IDENTIFICATIVA	2	LUIS EDUARDO BLANCO Director de Obra	HERRAN	DEPC	DEPC	Correo Electronico
GIC-INVIAS-NTS-489-22	3-may-23	INSTRUCTIVO ELABORACION ARTE VALLA IDENTIFICATIVA	2	DEYBI JANER MEZA VELASQUEZ Representante Legal CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	DEPC	DEPC	Correo Electronico
GIC-INVIAS-NTS-490-22	3-may-23	INSTRUCTIVO ELABORACION ARTE VALLA IDENTIFICATIVA	2	ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO Representante legal UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590	GOBERNACIÓN 1943	DEPC	DEPC	Correo Electronico
GIC-INVIAS-NTS-491-22	3-may-23	INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL COMPONENTE AMBIENTAL	1	LUIS JAVIER CARRASCAL CONSORCIO OK 2022	OCAÑA-1758	DEPC	DEPC	Correo Electronico
GIC-INVIAS-NTS-492-22	4-may-23	SOLICITUD INFORMACIÓN INTERVENCIÓN SEGUNDO TRAMO TUBERIA DE GRESS JUAN XIII	1	SAMIR FERNANDO CASADIEGO SANJUAN Alcalde municipal	OCAÑA-1758	DEPC	DEPC	Correo Electronico
GIC-INVIAS-NTS-493-22	4-may-23	REITERACION SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1758 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE OCAÑA	1	YORBI FRANCO Secretario de Vias – Supervisor de proyecto	OCAÑA-1758	DEPC	DEPC	Correo Electronico
GIC-INVIAS-NTS-494-22	4-may-23	REMISIONI INFORMES SEMANALES LA PLAYA, OCAÑA 1758, ABREGO, SANTIAGO, GOBERNACION SEMANA 21/04/2023 - 27/04/2023	1	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	NORTE DE SANTANDER	VFSO	DEPC	Correo Electronico
GIC-INVIAS-NTS-495-22	5-may-23	RESPUESTA A SU OFICIO UTET-02590-007 DE FECHA ABRIL 24 DE 2023 CUYO ASUNTO ES: "SOLICITUD CAMBIO ACTIVIDAD DE ALCANTARILLAS UTILIZANDO TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC DIAMETRO 36".	1	ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO Representante legal UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590	GOBERNACIÓN 1943	DEPC	DEPC	Correo Electronico
GIC-INVIAS-NTS-496-22	5-may-23	RESPUESTA A SU OFICIO OFC-CADV-GIC-067-2023 DE FECHA 04 DE MAYO DE 2023 CUYO ASUNTO ES: "COMPROMISOS PACTADOS EN COMITES DE OBRA (PRESUPUESTO AJUTADO – VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO)."	10	SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA Representante Legal CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	DEPC	DEPC	Correo Electronico
GIC-INVIAS-NTS-497-22	5-may-23	RESPUESTA A SU OFICIO OK-088-2022 DE FECHA 04-05-2023 CUYO ASUNTO ES "PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS –EQUIPO MÍNIMO – VIBRADOR DE CONCRETO" APROBADO	1	LUIS JAVIER CARRASCAL CONSORCIO OK 2022	OCAÑA-1758	DEPC	DEPC	Correo Electronico
GIC-INVIAS-NTS-498-22	5-may-23	RESPUESTA A SU OFICIO OFC-CLP-GIC-024-2023 DE FECHA 03-05-2023 CUYO ASUNTO ES "ENTREGA DE CARACTERIZACIÓN DE MATERIAL DE SUB-BASE GRANULAR." APROBADO	1	DEYBI JANER MEZA VELASQUEZ Representante Legal CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	DEPC	DEPC	Correo Electronico

GIC-INVIAS-NTS-499-22	5-may-23	RESPUESTA A SU OFICIO OFC-CLP-GIC-022-2023 DE FECHA 28-04-2023 CUYO ASUNTO ES "SOLICITUD DE (ACTAS DE COMITÉ Y GRABACIONES)" - LA PLAYA DE BELEN	1	DEYBI JANER MEZA VELASQUEZ Representante Legal CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	VFSO	DEPC	Correo Electronico
GIC-INVIAS-NTS-500-22	5-may-23	RESPUESTA A SU OFICIO OFC-CADV-GIC-064-2023 DE FECHA 28-04-2023 CUYO ASUNTO ES "SOLICITUD DE ACTAS MESAS DE TRABAJO Y ACTAS DE COMITÉ)	2	Señor SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA Representante Legal CONSORCIO AD VIAS Contratista Abrego – Norte de Santander	ABREGO	VFSO	DEPC	Correo Electronico
GIC-INVIAS-NTS-501-22	5-may-23	RESPUESTA INFORME SST MES DE ABRIL DE 2023 - OCAÑA	2	Señores: CONSORCIO OK 2022 CONTRATAO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.3879052 Ocaña – Norte de Santander	OCAÑA-1758	VFSO	DEPC	Correo Electronico
GIC-INVIAS-NTS-502-22	5-may-23	RECOMENDACIÓN PRORROGA 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1	1	JAVIER ALEXIS PABON ACEVEDO Alcalde municipal	CACHIRA	DEPC	DEPC	Correo Electronico
GIC-INVIAS-NTS-503-22	5-may-23	INFORMACION AL RESPECTO DE LA INFORMACION MINIMA PARA LA ELABORACION DEL DEL PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental)	2 CARPETAS MANUAL DE INTERVENTORIA	ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO Representante legal UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590	GOBERNACIÓN 1943	DEPC	DEPC	Correo Electronico
GIC-INVIAS-NTS-504-22	8-may-23	SOLICITUD DE MEJORA EN PROCEDIMEINTOS Y RENDIMEINTOS EN EJECUCION DE OBRA – INCUMPLIMIENTO PLAN DE CONTINGENCIA	1	CONSORCIO OK 2022	OCAÑA-1758	DEPC	DEPC	Correo Electronico

RECIBIDA



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

**PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MAYO DE 2023**

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

OFC-CLP-GIC-021-2023	4-may-23	RESPUESTA A OFICIO GIC-INVIAS-NTS-421-22 OBSERVACIONES ENTREGA ESTUDIO TOPOGRAFICO CORREDOR 1 Y 2	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO – INGENIEROS CONSULTORES INTERVENTORIA	CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	4/05/2023	20232574	GIC-INVIAS-NTS-515-22	9/05/2023	
OFC-CADV-GIC-066-2023	4-may-23	RESPUESTA A OFICIO GIC-INVIAS-NTS-460-2022 INFORME ESTRUCTURAL CORREDOR 2 OBSERVACIONES - ABREGO	002 FOLIOS	SEÑORES GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES INTERVENTORIA	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	4/05/2023	20232575	GIC-INVIAS-NTS-574-22	25/05/2023	
OK-088-2022	4-may-23	DOCUMENTACION EQUIPO MINIMO - VIBRADOR DE CONCRETO - OCAÑA	001 FOLIOS	SEÑORES GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES INGENIERO DIEGO EFRAIN PEDRAZA DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CONSORCIO OK 2022	OCAÑA 1758	4/05/2023	20232576	GIC-INVIAS-NTS-497-22	5/05/2023	
JUNTA COMUNAL LOS PATIOS	2-may-23	DOCUMENTOS DE LAS JAC COROZAL Y CALIFORNIA A GOBERNACION NORTE DE SANTANDER - LOS PATIOS	001 FOLIOS	GOBERNACION NORTE DE SANTANDER	JUNTA COMUNAL LOS PATIOS	LOS PATIOS	5/05/2023	20232533	No requiere respuesta	N.A	
ALCALDIA MUNICIPAL DE ABREGO	2-may-23	RESPUESTA A OFICIO GIC-INVIAS-NTS-474-22 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2023 - ABREGO	008 FOLIOS	INGENIERO DIEGO EFRAIN PEDRAZA DIRECTOR DE INTERVENTORIA	ALCALDIA MUNICIPAL DE ABREGO	ABREGO	5/05/2023	20232534	GIC-INVIAS-NTS-479-22		
DT-OCA-25109	2-may-23	TRASLADO DERECHO DE PETICION - SR ARMANDO PINEA CASTRO	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO – INGENIEROS CONSULTORES INTERVENTORIA	INVIAS DT NTE SANTANDER	OCAÑA 1758	2/05/2023	20232557	No requiere respuesta	N.A	
OFC-CLP-GIC-024-2023	3-may-23	ENTREGA DE CARACTERIZACION DE MATERIAL DE SUB-BASE GRANULAR	001 FOLIOS	SEÑORES GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES INTERVENTORIA	CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	5/05/2023	20232558	GIC-INVIAS-NTS-498-22	5/05/2023	
OK-087-2022	3-may-23	REPROGRAMACION DE OBRA - OCAÑA 1758	001 FOLIOS	SEÑORES GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS ING DIEGO EFRAIN PEDRAZA	CONSORCIO OK 2022	OCAÑA 1758	5/05/2023	20232585	GIC-INVIAS-NTS-538-22	12/05/2023	

GOBERNACION NORTE DE SANTANDER	2-may-23	RESPUESTA ALCANCE ITEM "COMPLEMENTACION Y AJUSTE ESTUDIOS Y DISEÑOS" -GOBERNACION 1943	004 FOLIOS	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION NORTE DE SANTANDER	GOBERNACIÓN-1943	5/05/2023	20232587	GIC-INVIAS-NTS-480-22	3/05/2023	
OFC-CADV-GIC-067-2023	4-may-23	COMPROMISOS PACTADOS EN COMITES DE OBRA (PRESUPUESTO AJUSTADO-VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO) - ABREGO	2 FOLIOS	SEÑORES GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES INTERVENTORIA	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	9/05/2023	20232604	GIC-INVIAS-NTS-496-22	5/05/2023	
DT-NSA 25755	4-may-23	COMITÉ TECNICO - COLOMBIA RURAL	1 FOLIO	Ingeniero DIEGO EFRAIN PEDRAZA CHAVES Director de Interventoría GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	INVIAS DT NTE SANTANDER	NTE SANTANDER	9/05/2023	20232598	No requiere respuesta	N.A	
OK-090-2022	5-may-23	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO - RESPUESTA A OBSERVACIONES REALIZADAS MEDIANTE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-470-22	1 FOLIO	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S Atn: Ing. DIEGO EFRAIN PEDRAZA Director de Interventoría	CONSORCIO OK 2022	OCAÑA 1758	9/05/2023	20232632	GIC-INVIAS-NTS-536-22	12/05/2023	
OFC-CLP-GIC-026-2023	8-may-23	ENTREGA DE INFORME DISEÑO GEOMETRICO CORREDOR 1-2 - LA PLAYA	1 FOLIO	Señores: GAVINCO - INGENIEROS CONSULTORES INTERVENTORIA Carrera 48 No 101 A -29 Bogotá D.C	CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	9/05/2023	20232639	GIC-INVIAS-NTS-542-22	15/05/2023	
OFC-CLP-GIC-027-2023	8-may-23	RESPUESTA A OFICIO GIC-INVIAS-NTS-461-222 OBSERVACIONES INFORME ESTRUCTURAL CORREDOR 1 Y 2 - LA PLAYA	2 FOLIOS	SEÑORES GAVINCO- INGENIEROS CONSULTORES INTERVENTORIA	CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	9/05/2023	20232640	GIC-INVIAS-NTS-547-22	18/05/2023	
ALCALDIA MUNICIPAL DE ABREGO	8-may-23	INVITACION A LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO	1 FOLIO	SEÑORES GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES INTERVENTORIA	ALCALDIA MUNICIPAL DE ABREGO	ABREGO	9/05/2023	20232652	No requiere respuesta	N.A	
OFC-CADV-GIC-071-2023	9-may-23	ENTREGA PLAN DE MANEJO DE ANTICIPO- SOPORTES	1 FOLIO	SEÑORES GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES INTERVENTORIA	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	10/05/2023	20232694	GIC-INVIAS-NTS-541-22	12/05/2023	
UNION TEMPORAL EDIVIAL- TROJA 2590	9-may-23	RESPUESTA A OFICIO GIC-INVIAS-NTS-503-22 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2023 CUYO ASUNTO ES "INFORMACION AL RESPECTO DE LA INFORMACION MINIMA PARA LA ELABORACION DEL PAGA	1 FOLIO	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S DIEGO E. PEDRAZA CHAVEZ Ingeniero Director	UNION TEMPORAL EDIVIAL TROJA 2590	GOBERNACIÓN-1943	10/05/2023	20232705	GIC-INVIAS-NTS-533-22	12/05/2023	
OK-089-2022	5-may-23	SOBREANCHO DEL PR 15-664 AL PR15-694 PLACA HUELLA LA SAMARIANA- OCAÑA 1758	2 FOLIOS	SEÑORES GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS ING DIEGO EFRAIN PEDRAZA	CONSORCIO OK 2022	OCAÑA 1758	12/05/2023	20232760	GIC-INVIAS-NTS-539-22	12/05/2023	
OFC-CADV-GIC-065-2023	15-may-23	RESPUESTA A OFICIO GIC-INVIAS-NTS-440-22 SUBSANACIÓN DISEÑO GEOMETRICO CORREDOR 2	1 FOLIO	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	15/05/2023	20232798	GIC-INVIAS-NTS-553-22	19/05/2023	
OFC-CADV-GIC-072-2023	15-may-23	RESPUESTA A OFICIO GIC-INVIAS-NTS-541-22. ENTREGA PLAN DE MANEJO DE ANTICIPO - SOPORTES.	1 FOLIO	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	15/05/2023	20232799	RESPUESTA CORREO CERTIFICADO SERVIENTREGA 9160097398 - 24/05/2023	26/05/2023	
OK-086-2022	5-may-23	INFORME SST ABRIL	2 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	CONSORCIO OK 2022	OCAÑA 1758	15/05/2023	20232800	GIC-INVIAS-NTS-501-22	5/05/2023	
DT-NSA 25803	4-may-23	Vallas Informativas - 2023	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	INVIAS-NTS	INVIAS	15/05/2023	20232817	No requiere respuesta	N.A	
UTET-02590-013	13-may-23	ENTREGA DE PROGRAMACIÓN DE OBRA CON FLUJO DE INVERSIÓN Y PRIMERA ENTREGA DISEÑO GEOMÉTRICO DE VÍA.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	UNION TEMPORAL EDIVIAL TROJA 2590	GOBERNACIÓN-1943	15/05/2023	20232818	GIC-INVIAS-NTS-566-22 GIC-INVIAS-NTS-567-22	25-05-2023 25-05-2023	
OFC-CLP-GIC-025-2023	4-may-23	ENTREGA DE DISEÑO GEOMETRICO CORREDOR 1-2 AJUSTADO.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	16/05/2023	20232822	GIC-INVIAS-NTS-556-22	23/05/2023	
OK-095-2022	16-may-23	Documento de subsanación Plan de Gestión Ambiental.	8 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	CONSORCIO OK 2022	OCAÑA 1758	16/05/2023	20232829	GIC-INVIAS-NTS-592-22	26/05/2023	
DT-NSA 27001	10-may-23	Requerimiento – contrato de interventoría 1053 de 2022.	003 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	INVIAS-NTS	INVIAS	16/05/2023	20232828	GIC-INVIAS-NTS-543-22	17/05/2023	
GBE-006-2022	16-may-23	Solicitud de Prórroga 45 días por cuenta de estudio de diseños	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022	OCAÑA 1814	16/05/2023	20232831	GIC-INVIAS-NTS-611-22	1/06/2023	
OK-096-2022	16-may-23	DOCUMENTOS DE SUBSANACION TOPOGRAFIA LA SAMARITANA.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	CONSORCIO OK 2022	OCAÑA 1758	16/05/2023	20232833	GIC-INVIAS-NTS-557-22	23/05/2023	
GBE-004-2022	16-may-23	DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE PLACA HUELLA Y GEOTECNIA (OCAÑA-BUENA VISTA)	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022	OCAÑA 1814	16/05/2023	20232834	GIC-INVIAS-NTS-551-22	19/05/2023	
OFC-CLP-GIC-029-2023	16-may-23	RESPUESTA A OFICIO GIC-INVIAS-NTS-542-22 OBSERVACIONES DISEÑO GEOMETRICO CORREDOR 1 – 2 LA PLAYA.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	16/05/2023	20232838	GIC-INVIAS-NTS-556-22	23/05/2023	
UTET-02590-012	13-may-23	AMPLIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA ETAPA DE REAJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	UNION TEMPORAL EDIVIAL TROJA 2590	GOBERNACIÓN-1943	17/05/2023	20232852			
OFC-CLP-GIC-023-2023	4-may-23	ENTREGA DE ESTUDIO HIDRAULICO CORREDOR 2	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	17/05/2023	20232859	GIC-INVIAS-NTS-600-22	29/05/2023	
DT-NSA 27529	13-may-23	Llamado de atención – contrato de interventoría 1053 de 2022.	003 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	INVIAS-NTS	INVIAS	17/05/2023	20232864	GIC-INVIAS-NTS-603-22	31/05/2023	
OFC-CLP-GIC-030-2023	17-may-23	RESPUESTA A OFICIO GIC-INVIAS-NTS-515-22 OBSERVACIONES ESTUDIO TOPOGRAFICO CORREDOR 1 Y 2 LA PLAYA.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	18/05/2023	20232871	GIC-INVIAS-NTS-597-22	29/05/2023	
OFC-CADV-INVIAS-073-2023	15-may-23	SOLICITUD DE DISEÑO DE VALLA INFORMATIVA.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	18/05/2023	20232872	No requiere respuesta	N.A	
PHP2022 – 003 – 2023	17-may-23	RESPUESTA OFICIO GIC-INVIAS-NTS-506-22, HDV, TOPOGRAFIA, ESTRUCTURAL Y APU	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	UNION TEMPORAL COLOMBIA	PAMPLONITA	18/05/2023	20232873	GIC-INVIAS-NTS-573-22 GIC-INVIAS-NTS-590-22	25/05/2023 26/05/2023	
OFC-CADV-GIC-073-2023	18-may-23	RESPUESTA A OFICIO GIC-INVIAS-NTS-448-22. DISEÑO GEOMETRICO TRAMO CHORRO 1 Y 2. OBSERVACIONES.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	18/05/2023	20232878	GIC-INVIAS-NTS-568-22	23/05/2023	

CORREO DEL 17-05-23	17-may-23	INVITACIÓN SEGUNDA MESA DIALOGO COMUNAL VEREDA COROZAL Y CALIFORNIA	002 FOLIOS	SILVANO SERRANO GUERRERO Gobernador Norte de Santander gobernacion@nortesantander.gov.co	JUNTA DE ACCION COMUNAL	GOBERNACIÓN-1943	18/05/2023	20232880	No requiere respuesta	N.A	
CAC-06-2022	17-may-23	SOCIALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS TRAMOS POR PARTE DE LA VEEDURÍA BUENAVISTA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022	OCAÑA 1814	18/05/2023	20232881	No requiere respuesta	N.A	
PHP2022 – 005 – 2023	18-may-23	ESPUESTA OFICIO GIC-INVIAS-NTS-506-22 ESTUDIO DE SUELOS	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	UNION TEMPORAL COLOMBIA	PAMPLONITA	18/05/2023	20232882	GIC-INVIAS-NTS-552-22	19/05/2023	
Oficio: 180-325	16-may-23	Respuesta solicitud de fecha 30 de abril de 2023, No. DT-NSA 24912 - PROCESO ALCANTARILLADO JUAN XXIII	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	SECRETARIA DE VIAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	OCAÑA 1758	18/05/2023	20232893	No requiere respuesta	N.A	
OK-091-2022	16-may-23	INCUMPLIMIENTO ENTREGA SUBSANACION INFORME MES DE ABRIL	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	CONSORCIO OK 2022	OCAÑA 1758	18/05/2023	20232894	GIC-INVIAS-NTS-548-22	18/05/2023	
OK-093-2022	10-may-23	PLAN DE CONTINGENCIA.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	CONSORCIO OK 2022	OCAÑA 1758	18/05/2023	20232895			
PHP2022 – 006 – 2023	18-may-23	PROGRAMACIÓN OBRA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	UNION TEMPORAL COLOMBIA	PAMPLONITA	18/05/2023	20232896	GIC-INVIAS-NTS-578-22	26/05/2023	
OFC-CADV-GIC-074-2023	18-may-23	RESPUESTA A OFICIO GIC-INVIAS-NTS-460-22 INFORME ESTRUCTURAL CORREDOR 2. OBSERVACIONES.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	19/05/2023	20232907	GIC-INVIAS-NTS-574-22	25/05/2023	
MATICCES - CACHI – 031 -2022	19-may-23	ENTREGA HIDRAULICA E HIDROLOGIA	1 FOLIO	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	CACHIRA	23/05/2023	20232935	GIC-INVIAS-NTS-589-22	26/05/2023	
PHP2022 – 007 – 2023	22-may-23	RESPUESTA OFICIO GIC-INVIAS-NTS-506-22 ENTREGA DOCUMENTOS PRECONSTRUCCIÓN	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	UNION TEMPORAL COLOMBIA	PAMPLONITA	23/05/2023	20232937	GIC-INVIAS-NTS-579-22 GIC-INVIAS-NTS-580-22 GIC-INVIAS-NTS-581-22 GIC-INVIAS-NTS-588-22 GIC-INVIAS-NTS-599-22	26/05/2023 26/05/2023 26/05/2023 29/05/2023 29/05/2023	
GBE-007-2022	18-may-23	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO TRAMOS CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022	OCAÑA 1814	23/05/2023	20232938	GIC-INVIAS-NTS-588-22	26/05/2023	
CORREO DEL 19-05-2023	19-may-23	POLIZAS REINICIO 1	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022	SANTIAGO	23/05/2023	20232941	No requiere respuesta	N.A	
UTET-02590-014	23-may-23	SEGUNDA ENTREGA DISEÑO GEOMÉTRICO DE VÍA.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	UNION TEMPORAL EDIVIAL TROJA 2590	GOBERNACIÓN-1943	23/05/2023	20232943			
correo del 4 mayo de 2023	4-may-23	Instructivo Vallias Informativas	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	INVIAS	N.A	4/05/2023	20232559	No requiere respuesta	N.A	
300-0226	12-may-23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MARZO 2022 A MARZO 2023	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	LA PLAYA	12/05/2023	20232780	GIC-INVIAS-NTS-540-22	12/05/2023	
CORREO DEL 23-05-2023	20-may-23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS HASTA ABRIL 2023	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	CACHIRA	23/05/2023	20232955	GIC-INVIAS-NTS-586-22	26/05/2023	
OFC-CADV-GIC-078-2023	24-may-23	RESPUESTA A OFICIO No GIC-INVIAS-NTS-402-22 ENTREGA ESTUDIO TOPOGRAFICO CORREDOR 2 -APROBADO CON OBSERVACIONES.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	24/05/2023	20232964	GIC-INVIAS-NTS-583-22	26/05/2023	
OFC-CADV-GIC-076-2023	23-may-23	ENTREGA DE ACTAS DE SOCIALIZACIÓN.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	25/05/2023	20232972	No requiere respuesta	N.A	
OFC-CLP-GIC-031-2023	24-may-23	RESPUESTA A OFICIO GIC-INVIAS-NTS-547-22 OBSERVACIONES INFORME ESTRUCTURAL CORREDOR 1 Y 2 LA PLAYA.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	25/05/2023	20232984	GIC-INVIAS-NTS-602-22	30/05/2023	
OFC-CADV-GIC-079-2023	24-may-23	RESPUESTA A OFICIO GIC-INVIAS-NTS-541-22. ANEXOS DEL PLAN DE MANEJO DE ANTICIPO.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	25/05/2023	20232988	CORREO ELECTRONICO DEL 24-05-2023	24/05/2023	
OFC-CADV-GIC-077-2023	24-may-23	RESPUESTA A OFICIO No GIC-INVIAS-NTS-409-22 ENTREGA ESTUDIO TOPOGRAFICO CORREDOR 1 -APROBADO CON OBSERVACIONES.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	25/05/2023	20232983	GIC-INVIAS-NTS-583-22	26/05/2023	
PHS2022 – 053 – 2022	25-may-23	ADICIONAL DE TIEMPO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022	SANTIAGO	25/05/2023	20233019			
OK-100-2022	25-may-23	PMT JUAN XXIII	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	CONSORCIO OK 2022	OCAÑA 1758	25/05/2023	20233022	No requiere respuesta	N.A	
OFC-CLP-GIC-028-2023	25-may-23	RESPUESTA A OFICIO GIC-INVIAS-NTS-498-22 ENSAYOS SUB BASE GRANULAR	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	25/05/2023	20233012	GIC-INVIAS-NTS-593-22	26/05/2023	
CORREO	25-may-23	RESPUESTA AL PAGA DEL CONSORCIO OK 2022.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	CONSORCIO OK 2022	OCAÑA 1758	26/05/2023	20233036	GIC-INVIAS-NTS-592-22	26/05/2023	
CORREO	26-may-23	informe SST mes de ABRIL con observaciones subsanadas	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	CONSORCIO OK 2022	OCAÑA 1758	26/05/2023	20233039	GIC-INVIAS-NTS-608-22	1/06/2023	
UTET-02590-003	26-may-23	SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS PRESUPUESTO DE OBRA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	UNION TEMPORAL EDIVIAL TROJA 2590	GOBERNACIÓN-1943	26/05/2023	20233040	GIC-INVIAS-NTS-577-22	29/05/2023	
PHP2022 – 009 – 2023	28-may-23	PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO, INSTALACIONES PROVISIONALES Y DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	UNION TEMPORAL COLOMBIA	PAMPLONITA	29/05/2023	20233067	621, 620 y 623	05/06/2023 y 06/06/2023	
MATICCES - CACHI – 030 -2022	17-may-23	ENTREGA TOPOGRAFIA, PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAL	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	CACHIRA	29/05/2023	20233068	GIC-INVIAS-NTS-596-22	29/05/2023	
MATICCES - CACHI – 030 -2022	17-may-23	ENTREGA TOPOGRAFIA, PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAL	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	CACHIRA	30/05/2023	20233075	GIC-INVIAS-NTS-596-22	29/05/2023	
CORREO	29-may-23	procesar de manera automatizada la información de las actas que se radican en cuentas por pagar	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	INVIAS	INVIAS	30/05/2023	20233082	No requiere respuesta	N.A	
GBE-008-2022	29-may-23	ESTUDIOS Y DISEÑOS CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022	OCAÑA 1814	30/05/2023	20233085	GIC-INVIAS-NTS-638-22	8/06/2023	
GBE-009-2022	29-may-23	AJUSTES FECHAS PROGRAMACION - OCAÑA BUENAVISTA 1814	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES ING DIEGO EFRAN PEDRAZA	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022	OCAÑA 1814	30/05/2023	20233094	GIC-INVIAS-NTS-685-22	14/06/2023	
PHM2022-003-2022	29-may-23	ENTREGA DOCUMENTACION PARA INICIO DE OBRA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022	GOBERNACION 2052	30/05/2023	20233100	GIC-INVIAS-NTS-612-22	1/06/2023	
CONSORCIO OK - 2022	30-may-23	RESPUESTA AL PAGA DEL CONSORCIO OK 2022 - OCAÑA 1758	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	CONSORCIO OK 2022	OCAÑA 1758	31/05/2023	20233103	GIC-INVIAS-NTS-610-22	1/06/2023	
OFC-CADC-GIC-082-2023	30-may-23	RESPUESTA A OFICIO No. Gic-INVIAS-NTS-553-22 SUBSANACION DISEÑO GEOMETRICO CORREDOR 2 - OBSERVACIONES	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	31/05/2023	20233115	GIC-INVIAS-NTS-626-22	6/06/2023	

DT-NSA-30646	30-may-23	REITERACION OFICIO DT NSA 27529 - INVIAS	002 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	INVIAS NTE SANTANDER	INVIAS	30/05/2023	20233119	GIC-INVIAS-NTS-603-22	31/05/2023	
GBE-010-2022	30-may-23	RESPUESTA A SU OFICIO GIC-INVIAS-NTS-562-22 - CUYO ASUNTO ES EQUIPO MINIMO - OBSERVACIONES	024 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	UNION TEMPORAL GBE	OCAÑA 1814	31/05/2023	20233120	GIC-INVIAS-NTS-674-22	13/06/2023	
DT-NSA-30822	31-may-23	APROBACION HOJA DE VIDA INSPECTORA DE OBRA, CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1053 DE 2022 -INVIAS	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	INVIAS	INVIAS NTE SANTANDER	31/05/2023	20233121	NO SE REQUIERE RESPUESTA		
GBE-011-2022	31-may-23	SUBSANACION DE OBSERVACIONES DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR MEDIO DEL OFICIO GIC-INVIAS-NTS-496-22 - OCAÑA 1814	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	UNION TEMPORAL GBE	OCAÑA 1814	1/06/2023	20233154	GIC-INVIAS-NTS-625-22	6/06/2023	
OFC-CADV-GIC-075-2023	23-may-23	RESPUESTA A OFICIO No GIC-INVIAS-NTS-449 -22 FUENTE DE MATERIALES OBSERVACIONES	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	25/05/2023	20232973	GIC-INVIAS-NTS-635-22	8/06/2023	
SVR 31130	31-may-23	RESPUESTA A OFICIO GIC-INVIAS-NTS-518-22 - INVIAS SANTANDER APROBACIÓN Ing. José Hildebrando Torres Suarez – Residente de Interventoría	1 FOLIO	INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORIA GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	INVIAS SANTANDER	INVIAS	1/06/2023	20233164	No requiere respuesta	N.A	
GBE-008-2022	29-may-23	ESTUDIOS Y DISEÑOS CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA	2 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES At: Ing. DIEGO EFRAIN PEDRAZA Director de Interventoría	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022	OCAÑA 1814	6/06/2023	20233085	GIC-INVIAS-NTS-698-22	20/06/2023	
MATICCES-CACHI-035-2022	13-may-23	SOLICITUD DE PRORROGA A LA SUSPENSION - CACHIRA	1 FOLIO	Señores ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIRA INGENIERO DIEGO PEDRAZA - GAVINCO	CONSTRUCTURA MATICCES P&B LTDA	CACHIRA	8/06/2023	20233207	GIC-INVIAS-NTS-617-22	13/05/2023	
SVR 30355	29-may-23	Alcance al oficio GIC-INVIAS-NTS-587-22 de fecha 26 de mayo de 2023	002 FOLIOS	SAMIR FERNANDO CASADIEGO SANJUANAlcalde MunicipalMUNICIPIO OCAÑA	INVIAS	OCAÑA-1758	5/06/2023	20233215	No requiere respuesta	N.A	
DT-NSA 30796	30-may-23	Respuesta oficio GIC-INVIAS-NTS-543-22 – contrato de interventoria 1053 de 2022 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA	002 FOLIOS	INGENIERO DIEGO PEDRAZA DIRECTOR DE INTERVENTORIA - GAVINCO	INVIAS	INVIAS NTE STD	5/06/2023	20233216			
PHP2022 – 009 – 2023	2-may-23	ENTREGA DOCUMENTOS MAQUINARIA AMARILLA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	UNION TEMPORAL COLOMBIA	PAMPLONITA	6/06/2023	20233226	GIC-INVIAS-NTS-699-22	20/06/2023	
correo electronico	1-may-23	SUBSANACIONES PMT	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES ING DIEGO EFRAIN PEDRAZA	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022	OCAÑA 1814	7/06/2023	20233249	GIC-INVIAS-NTS-686-22	14/06/2023	

BITACORA



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MAYO DE 2023

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

MUNICIPIO DE OCAÑA
CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.3879052



PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MAYO DE 2023

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

Mayo 02

Placa huella

Clima: Día soleado

Hora de inicio: 7 am - 12 pm ; 1 pm - 5 pm.

Personal de Obra: Ing. Residente, SST, profesional social, ambiental, 1 oficial, 1 maestro, 13 ayudantes.

Personal de Interventoria: Ing. Residente, Inspector de Obra, SST, ambiental, profesional social.

Equipos: 2 mezcladoras, 1 vibrador de concreto, canguro, volqueta sencilla, 1 volqueta doble troque.

Actividades de Obra: se realizan actividades de fundida de contra huella laterales y central, instalación de acero en cunetas, viga maestra y huella, fundida de cornisa.

Adriano Gutierrez de P.

Yosib Cervantes P

Mayo 03

Placa huella

Clima: Día soleado

Hora de inicio: 7 am - 12 pm ; 1 pm - 5 pm.

Personal de Obra: Ing. Residente, SST, profesional social, ambiental, 1 oficial, 1 maestro, 13 ayudantes, topografía.

Personal de Interventoria: Ing. Residente, Inspector de Obra, SST, ambiental, profesional social.

Equipos: 2 mezcladoras, 1 vibrador de concreto, 1 canguro,

1 volqueta sencilla, 1 volqueta doble troque.

Actividades de Obra: Se realizan actividades de instalación de acero en huella y cuneta, fundida de cuneta, excavación para instalación de viga Riostra, se evidencia sobre ancho en la curva del PE 15+0694 al PE 15+0664 que no fue optimizada en el diseño al día de hoy, queda en conocimiento del Ing. Residente para una respuesta.

Adriana Gutierrez de P.

Yesid Cervantes P

Mayo 04

Placa huella

Clima: Día soleado

Hora de inicio: 7 am - 12 pm ; 1 pm - 5 pm

Personal de Obra: Ing. Residente, SST, profesional social, ambiental, 1 oficial, 1 maestro, 13 ayudantes.

Personal de interventoria: Ing. Residente, Inspector de Obra, SST, profesional social, ambiental.

Equipos: 2 mezcladoras, 1 vibrador de concreto, conguero, 1 volqueta sencilla, 1 volqueta doble troque.

Actividades de Obra: se realizan actividades de instalación de acero en cuneta, huella y viga riostra, fundida de cuneta y huella.

Adriana Gutierrez de P.

Yesid Cervantes P

Mayo 05

Placa huella

Clima: Día soleado

Hora de inicio: 7 am - 12 pm ; 1 pm - 5 pm

Personal de Obra: Ing. Residente, SST, profesional social, ambiental, 1 oficial, 1 maestro, 13 ayudantes, topografía.

Personal de interventoria: Ing. Residente, Inspector de obra, SST, profesional social, ambiental.

Equipos: 2 mezcladoras, 1 vibrador de concreto, canguro, 1 volqueta sencilla, 1 volqueta doble troque.

Actividades de Obra: se realizan actividades de fundida de huella, cunetas, viga riostra. se realiza trabajo en topografía replantes de cuneta PR 1540620 al PR 1540590.

Adriana Gutierrez de P.

Yesid Cervantes P.

Mayo 06

Placa huella

Clima: Dia soleado

Hora de inicio: 7 am - 12 pm.

Personal de Obra: Ing. Residente, SST, profesional social, ambiental, 1 oficial, 1 maestro, 13 ayudantes.

Personal de Interventoria: Ing. Residente, inspector de Obra, SST, profesional social, ambiental.

Equipos: 2 mezcladoras, canguro, vibrador de concreto, 1 volqueta sencilla, 1 volqueta doble troque.

Actividades de Obra: se realizan actividades de fundida de contra huella central, excavacion e instalacion de viga riostra, instalacion de acero en huella.

Adriana Gutierrez de P.

Yesid Cervantes P.

Mayo 08

Placa huella.

Clima: Dia soleado

Hora de inicio: 7 am - 12 pm ; 1 pm - 5 pm.

Personal de Obra: Ing. Residente, topografía, 1 maestro, 1 oficial, 14 ayudantes, SST, ambiental, profesional social.

Personal de Interventoria: Ing. Residente, inspector de Obra, SST, profesional social, ambiental.

Equipos: 2 mezcladoras, vibrador de concreto, canguro, 1 volqueta sencilla, 1 volqueta doble troque.



Actividades de Obra: se realizan trabajos en topografía en colocación de eje para instalación de parralera, acopio de material, fundida de huella y cuneto.

Adriana Gutierrez de P.

Yesid Cervantes P.

Mayo 09

Placa huella

clima: Día soleado.

Hora de inicio: 7 am - 12 pm, 1 pm - 5 pm.

Personal de Obra: Ing. Residente, SST, ambiental, profesional social, 1 oficial, 14 ayudantes, 1 maestro.

Personal de Interventoría: Ing. Residente, Inspector de Obra, SST, ambiental, profesional social.

Equipos: 2 mezcladoras, 1 conguero, 1 vibrador de concreto, 1 volqueta sencilla, 1 volqueta doble troque.

Actividades de Obra: se realizan actividades de fundida de aclopes PR 15+0657, fundida de huella PR 15+0632, excavación de viga maestra PR 15+620, instalación de acero en cuneta PR 15+0680.

Adriana Gutierrez de P.

Yesid Cervantes P.

Mayo 10

Placa huella

clima: Día soleado.

Hora de inicio: 7 am - 12 pm, 1 pm - 5 pm.

Personal de Obra: Ing. Residente, SST, ambiental, profesional social, 1 oficial, 13 ayudantes, 1 maestro.

Personal de Interventoría: Ing. Residente, Inspector de Obra, SST, profesional social, ambiental.

Equipos: 2 mezcladoras, 1 vibrador de concreto, conguero, 1 volqueta sencilla, 1 volqueta doble troque, 1 pajarita, compactador.

Actividades de Obra: se realizan actividades de fundida de huella y viga nostra PR 1510620, trabaja comision de topografia en replanteo de via y nivelacion de eje, fundida de contra huella lateral derecha PR 1510656, instalacion de acero cuneta margen izquierda PR 1510680.

Adriano Gutierrez de P.

Yosid Cervantes P

Mayo 11.

Placa huella.

Clima: Dia soleado.

Hora de inicio: 7am - 12 pm ; 1 pm - 5pm.

Personal de Obra: Ing. Residente, SST, ambiental, profesional social, 1 oficial, 1 maestro, 13 ayudantes.

Personal de Interventoria: Ing Residente, Inspector de Obra, SST, ambiental, profesional social.

Equipos: 2 mezcladoras, 1 vibrador de concreto, congoro, 1 volqueta sencilla, 1 volqueta doble troque, 1 pajarita, compactador.

Actividades de Obra: se realizan actividades de instalacion de acero en viga nostra y huella PR 1510611, instalacion de acero en cuneta margen izquierdo PR 1510655, fundida de cuneta PR 1510775 margen izquierdo, instalacion y compactacion de sub-base PR 1510580.

Adriano Gutierrez de P.

Yosid Cervantes P

Mayo 12

Placa huella

Clima: Dia soleado (llueve de 2 pm - 4 pm).

Hora de inicio: 7am - 12 pm ; 1 pm - 5pm.

Personal de Obra: Ing Residente, SST, ambiental, profesional social, 1 oficial, 1 maestro, 13 ayudantes, topografia.

Personal de Interventoria: Ing Residente, Inspector de Obra, SST, ambiental, profesional social.



Actividades de Obra: se realizan actividades de instalación de acero de viga Rialtra y huella pp 15+0600, instalación de acero cuneta margen izquierdo PP 15+659, fundida de huella y viga Rialtra PP 15+0600, replanteo de cuneta.

Adriana Gutierrez de P.

Yesid Cervantes P.

Mayo 13

Placa huella.

Clima: Día soleado

Hora de inicio: 7 am - 12 pm.

Personal de Obra: Ing. Residente, SST, social, ambiental, topografía, 1 oficial, 1 maestro, 13 ayudantes.

Personal de Interventoría: Ing. Residente, Inspector de Obra, SST, profesional social, ambiental.

Equipos: 2 mezcladoras, 1 vibrador de concreto, canguro, 1 pajarito, 1 compactador, 1 volqueta sencilla, 1 volqueta doble T.

Actividades de Obra: se realizan actividades de fundida de contra huella central, instalación de acero en huella, cunetas y viga rialtra, trabajos topográfico en conformación de la vía y replanteo de cuneta.

Adriana Gutierrez de P.

Yesid Cervantes P.

Mayo 15.

Placa huella

Clima: Nublado (llueve 3h en la mañana)

Hora de inicio: 7 am - 12 pm; 1 pm - 5 pm.

Personal de Obra: Ing. Residente, SST, ambiental, profesional social, 1 maestro, 1 oficial, 13 ayudantes, topografía.

Personal de Interventoría: Ing. Residente, Inspector de Obra, SST, ambiental, profesional social.

Equipos: 2 mezcladoras, 1 canguro, 1 vibrocompactador, 1 vibrador de concreto, 1 pajarito, 1 volqueta sencilla, 1 volqueta doble.

Actividades de Obra: se realizan actividades de fundido de contra huella central, instalación de acero en cunetas margen izquierda, vigas riestras y huella, conformación de la vía.

Adriana Gutierrez de P.

Yesid Cervantes P.

Mayo 16

Placa huella

Clima: Día Nublado. (llueve 1h en la mañana y 1h en la tarde).

Hora de inicio: 7 am - 12 pm, 5 pm.

Personal de Obra: Ing. Residente, SST, ambiental, topografía, profesional social, 1 oficial, 13 ayudantes, 1 maestro.

Personal de Interventoría: Ing. Residente, Inspector de Obra, SST, ambiental, profesional social.

Equipos: 2 mezcladoras, 1 pajarita, 1 compactador, 1 canguro, 1 vibrador de concreto, 1 volquete sencilla, 1 volquete doble t.

Actividades de Obra: se realizan actividades de instalación de acero cuneta margen izquierdo PR 15+0610, fundido de huella PR 15+0590, topografía en replanteo de cuneta.

Adriana Gutierrez de P.

Yesid Cervantes P.

Mayo 17

Placa huella

Clima: Día soleado - (llovía 1h).

Hora de inicio: 7 am - 12 pm; 1 pm - 5 pm.

Personal de Obra: Ing. Residente, SST, ambiental, profesional social, topografía, 1 oficial, 1 maestro, 13 ayudantes.

Personal de Interventoría: Ing. Residente, Inspector de obra, SST, profesional social, ambiental.

Equipos: 2 mezcladoras, 1 vibrador de concreto, canguro, 1 volquete sencilla, 1 volquete doble t, 1 pajarita, 1 compactador.

Actividades de Obra: se realizan actividades de fundido de cuneta margen derecho PR 15+0670, instalación de



acero en huella PR 15+0560, instalacion de viga Riostra PR 15+0546.

Adriana Gutierrez de P.

Yesid Cervantes P

Mayo 18

Placa huella.

Clima: Dia Nublado (1h de lluvia).

Hora de inicio: 7am - 12pm; 1pm - 5pm.

Personal de Obra: Ing. Residente, SST, ambiental, social,

1 maestro, 1 oficial, 13 ayudantes, topografia.

Personal de interventoria: Ing. Residente, SST, ambiental, social, Inspector de Obra.

Equipos: 2 mezcladoras, 1 vibrador de concreto, 1 canguro,

1 volqueta sencilla, 1 volqueta doble t.

Actividades de Obra: se realizan actividades de instalacion de acero cuneta margen derecho PR 15+0652, fundida de huella PR 15+0560, encofrado para contra huella lateral derecha PR 15+0610. Rendimiento de cunetas bajo.

Adriana Gutierrez de P.

Yesid Cervantes P

Mayo 19.

Placa huella

Clima: Dia Nublado (2h de lluvia en la tarde).

Hora de inicio: 7am - 12pm; 1pm - 5pm.

Personal de Obra: Ing. Residente, SST, ambiental, social,

1 oficial, 1 maestro, 13 ayudantes.

Personal de interventoria: Ing. Residente, Inspector de Obra, SST, social, ambiental.

Equipos: 2 mezcladoras, 1 vibrador de concreto, canguro,

1 volqueta sencilla, 1 volqueta doble t.

Actividades en Obra: se realizan actividades de Obra en fundida de huella y viga riostra PR 15+660, fundida de

cuneta margen derecho PR15+680, fundido de contra huella central y lateral derecha PR15+629, instalación y excavación de viga nostro PR1 +550.

Adriana Gutierrez de P.

Yesid Cervantes P

Mayo 20

Placa huella

Clima: Dia soleado

Hora de inicio: 7am - 12pm.

Personal de Obra: Ing. Residente, SST, social, ambiental, 1 oficial, 1 maestro, 13 ayudantes, topografia

Personal de Interventoria: Ing. Residente, Inspector de Obra, SST, social, ambiental.

Equipos: 2 mezcladoras, 1 vibrador de concreto, canguro, 1 volqueta sencilla, 1 volqueta doble t

Actividades de Obra: se realizan actividades de topografia en levantamiento de placa huella construida y acopio de material (triturado y arena).

Adriana Gutierrez de P.

Yesid Cervantes P

Mayo 22

Placa huella

Clima: Dia Nublado (1h de lluvia en la mañana)

Hora de inicio: 7am - 12pm; 1pm - 5pm.

Personal de Obra: Ing. Residente, SST, ambiental, profesional social, 1 oficial, 1 maestro, 13 ayudantes.

Personal de Interventoria: Ing. Residente, Inspector de Obra, SST, ambiental, profesional social.

Equipos: 2 mezcladoras, 1 vibrador de concreto, canguro, 1 volqueta sencilla, 1 volqueta doble t.

Actividades de Obra: se realizan actividades de figurado de acero para cunetas, instalación de acero en cuneta y

huella, fundida de contra huella central y cuneta margen derecho.

Adriana Gutierrez de P.

Yesid Cervantes P.

Mayo 23

Placa huella.

Clima: Dia Nublado

Hora de inicio: 7 am - 12 pm; 1 pm - 5 pm.

Personal de Obra: Ing. Residente, SST, ambiental, profesional social, 1 oficial, 1 maestro, 13 ayudantes.

Personal de Interventoria: Ing. Residente, Inspector de Obra, SST, ambiental, profesional social.

Equipos: 2 mezcladoras, 1 vibrador de concreto, canguro, 1 volquete sencilla, 1 volquete doble t.

Actividades de Obra: se realizan actividades de fundida de huella central PR 15+568, armado de cuneta margen izquierda PR 15+623, fundida cuneta margen derecho PR 15+626, fundida contra huella lateral derecha PR 15+607.

Visita tecnica por parte de interventoria del area SST, ambiental y profesional social en horas de la tarde.

Adriana Gutierrez de P.

Yesid Cervantes P.

Mayo 24.

Placa huella.

Clima: Dia Nublado (5h de lluvia en la tarde).

Hora de inicio: 7 am - 12 pm; 1 pm - 5 pm.

Personal de Obra: Ing Residente, SST, ambiental, profesional social, 1 oficial, 1 maestro, 13 ayudantes.

Personal de Interventoria: Ing. Residente, Inspector de Obra, SST, profesional social, ambiental.

Equipos: 2 mezcladoras, 1 vibrador de concreto, canguro, 1 volquete sencilla, 1 volquete doble t.

Actividades de Obra: se realizan actividades de fundida de contra huella lateral izquierda, instalación de acero y encofrado de cuneta margen derecho y fundida de la misma. llueve toda la tarde, visita en la mañana por SST, social, ambiental.

Adriana Gutierrez de P.

Yesid Cervantes P.

Mayo 25

Placa huella y Parcheo.

Clima: Día Nublado. (4h de lluvia).

Hora de inicio: 7am - 12pm; 1pm - 5pm.

Personal de Obra: La samaritana: Ing. Residente, 1 oficial, 1 maestro, 13 ayudantes, Juan XXIII: Ing. Residente, 2 ayudantes, 2 auxiliares de trafico, SST, ambiental, topografía, social.

Personal de Interventoria: Ing Residente, Inspector de Obra, SST, profesional social, ambiental.

Equipos: La samaritana: 2 mezcladoras, 1 vibrador de concreto, 1 volqueta sencilla, 1 volqueta doble t, canguro. Juan XXIII: 1 pajarita (las mismas volquetas de la samaritana).

Actividades de Obra: se realizan actividades en el sector de Juan XXIII en retiro de capa existente 60ml, en la samaritana se continua con encofrado de cuneta margen izquierdo, fundida de contra huella lateral izquierdo, encofrado cuneta margen derecho y fundida de la misma. llueve 2h en la mañana y 2h en la tarde.

Adriana Gutierrez de P.

Yesid Cervantes P.

Mayo 26

Placa huella y Parcheo

Clima: Día Nublado

Hora de inicio: 7am - 12pm; 1pm - 5pm.

Personal de Obra: La samaritana: Ing. Residente, 1 oficial, 1 maestro, 13 ayudantes, Juan XXIII: Ing Residente, 2 ayudantes,

2 auxiliares de tráfico, SST, social, ambiental, topógrafo.

Personal de interventoría: Ing. Residente, Inspector de Obra, SST, ambiental profesional social.

Equipos: la samantana: 2 mezcladoras, 1 vibrador de concreto, canguro, Juan XXIII, 1 pajarita, 1 volqueta sencilla, 1 volqueta doble.

Actividades de Obra: la samantana se realizan trabajos de encofrado de cunetas, fundido de contra huella lateral y central.

Juan XXIII se realizan actividades de retiro de asfalto existente 62 ml, instalación de acero en cunetas. (la samantana).

Adriano Gutierrez de P.

Yesid Cervantes P.

Mayo 27.

Placa huella - Parcheo.

clima: Día soleado

Hora de inicio: 7 am - 12 pm.

Personal de Obra: la samantana: Ing. Residente, 1 oficial, 1 maestro, 13 ayudantes. Juan XXIII, Ing. Residente, 2 ayudantes, 2 auxiliares de tráfico, SST, social, ambiental, topógrafo.

Personal de interventoría: Ing. Residente, Inspector de Obra, SST, social, ambiental.

Equipos: la samantana: 2 mezcladoras, 1 vibrador de concreto, canguro, Juan XXIII, 1 pajarita, 1 volqueta sencilla, 1 volqueta doble.

Actividades de Obra: Juan XXIII, se realiza actividad de retiro de capa asfáltica, la samantana, instalación de acero en puneta y fundido de la misma, fundido de contra huella y encofrado.

Adriano Gutierrez de P.

Yesid Cervantes P.

Mayo 29.

Placa huella - Parcheo.

clima: Día Nublado

Hora de inicio: 7 am - 12 pm; 1 pm - 5 pm.

Personal de Obra: Ing. Residente, 1 maestro, 1 Oficial, 1 ayudantes, Juan XXIII, Ing. Residente, 2 ayudantes, 2 auxiliares de trafico, topografia, SST, ambiental, profesional Social.

Personal de interventorio: Ing. Residente, Inspector de obra, SST, ambiental, profesional Social.

Equipos: La samantana: 2 mezcladoras, canguro, 1 vibrador de concreto, 1 volqueta sencilla, 1 volqueta doble T, 1 pajarita.

Actividades de Obra: se realizan actividades en la samantana de instalacion de acero en cuneta margen izquierdo y fundida de la muma; en el banno Juan XXIII se inicia con actividad de excavacion .60 cm.

Adriana Gutierrez de P.

Yesid Cervantes P.

Mayo 30

Placa huella - Parcheo.

Clima: Dia Nublado (llueve 3h en la tarde).

Hora de inicio: 7 am - 12 pm ; 1 pm - 5 pm.

Personal de Obra: Ing Residente, 1 oficial, 1 maestro, 15 ayudantes, SST,

Juan XXIII: Ing. Residente, 2 ayudantes, 2 auxiliares de trafico, topografia.

Personal de interventorio: Ing. Residente, inspector de obra, social, SST, ambiental.

Equipos: 2 mezcladoras, 1 vibrador de concreto, canguro, Juan XXIII:

1 Pajarito, 1 volqueta sencilla, 1 volqueta doble T.

Actividades de Obra: se realizan actividades en la samantana de fundida contra huella lateral derecha, instalacion de acero en huella y viga nastro, fundida de cuneta margen izquierdo. Juan XXIII: se realiza trabajos de excavacion.

Adriana Gutierrez de P.

Yesid Cervantes P.

Mayo 31.

Placa huella - Parcheo

Clima: Día soleado. (llueve 2h en la tarde).

Hora de inicio: 7am - 12pm ; 1pm - 5pm.

Personal de Obra: la samaritana: 1 oficial, 1 maestro, 15 ayudantes,
Juan XXIII: Ing. Residente, 2 ayudantes, 2 auxiliares de tráfico,
SST, ambiental, profesional social, topógrafo.

Personal de Interventoría: Ing Residente, inspector de Obra,
SST, ambiental, profesional social.

Equipos: la samaritana: 2 mezcladoras, 1 carguro, 1 vibrador de
concreto, Juan XXIII: 1 pojarito, 1 volquete senalla, 1 volqueta
doble t.

Actividades de Obra: se realizan actividades en el
barrio Juan XXIII excavacion e instalacion de alcantarillado.
En la samaritana se realiza fundida de huella 6ml e
instalacion de acero hasta las 10 am puesto que se termino
el cemento y acero. se realiza Jornada de aseo en horas
de la tarde.

Adriana Gutierrez de P. Yesid Cervantes P.

MUNICIPIO DE ABREGO
CONTRATO DE OBRA No. 252 DE 2022



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MAYO DE 2023

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

Mayo 08

Placa huella corredor #1.

Clima: Día soleado

Hora de Inicio: 7am - 12pm; 1pm - 5pm.

Personal de Obra: Ing. Residente, Almacénista.

Personal de Interventoría: Ing. Residente, SST, social, ambiental.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 vibrocompactador, 2 volquetas sencillas, 1 pajarita, 1 irrigador de agua.

Actividades de Obra: Se realiza actividad de perfilado, instalación de sub-base y compactación de la misma en el corredor #1 la yee del chorro y, Pie de cruz.

Adriana Gutierrez de P.

Mayo 09

Placa huella corredor #1.

Clima: Día soleado

Hora de Inicio: 7am - 12p; 1pm - 5pm.

Personal de Obra: Ing. Residente, Almacénista

Personal de Interventoría: Ing. Residente, SST, social, ambiental

Equipos: 1 motoniveladora, 1 vibrocompactador, 2 volquetas sencillas, 1 irrigador de agua, 1 pajarita.

Actividades de Obra: Se realizan actividades de perfilado tramo el chorro 1, instalación de sub-base tramo la yee del chorro y Pie de Cruz, compactación de los tramos la yee del chorro y Pie de cruz.

Adriana Gutierrez de P.

Mayo 10

Placa huella corredor #1

Clima: soleado.

Hora de inicio: 7am - 12pm; 1pm - 5pm.

Personal de Obra: Ing. Residente, Almacénista.

personal de Interventoria: Ing. Residente, Ambiental, SST, social.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Vibrocompactador, 1 irrigador de agua, 2 volquetas sencillas, 1 pajarita.

Actividades de Obra: se realizan actividades de instalación y compactación de sub-base tramos La yee del chorro y pie de Cruz, conformación de la vía tramo el chorro 1.

Adriana Gutierrez de P.

Mayo 11

Placa huella corredor #1.

Clima: Día Nublado (2h lluvia).

Hora de inicio: 7am - 12pm; 1pm - 5pm.

Personal de Obra: Ing. Residente, Almacenista.

Personal de Interventoria: Ing. Residente, SST, social, Ambiental.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Vibrocompactador, 2 volquetas sencillas, 1 irrigador de agua, 1 pajarita.

Actividades de Obra: se realizan actividades de perfilado de cuneta tramo el chorro 1, compactación de la subrasante, se suspenden actividades por lluvia a las 3pm.

Adriana Gutierrez de P.

Mayo 12

Placa huella corredor #1.

Clima: Día Nublado (3h lluvia).

Hora de inicio: 7am - 12pm; 1pm - 5pm.

Personal de Obra: Ing. Residente, Almacenista.

Personal de Interventoria: Ing. Residente, SST, Ambiental, social.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Vibrocompactador, 2 volquetas sencillas, 1 irrigador de agua, 1 pajarita.

Actividades de Obra: se realizan actividades de adecuación de subrasante y compactación de la misma.

tramo el chorro 2, compactación de subrasante en el tramo el chorro 1, Realización de la socialización corredor 1 2pm, día de acopio en el corredor Pie de cruz.

Adriana Gutierrez de P.

Mayo 13

Placa huella corredor #1.

Clima: Día soleado.

Hora de inicio: 7am - 12pm.

Personal de Obra: Ing. Residente, Almacenista, profesional social.

Personal de Interventoría: Ing. Residente

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 vibrocompactador, 1 pajarita, 1 irrigador de agua, 4 volquetas senallas.

Actividades de Obra: se realizan actividades de toma de densidades tramo de la Yee del chorro 4 muestras $e = .15cm$, instalación de sub-base y compactación tramo Pie de cruz.

Adriana Gutierrez de P.

Mayo 15

Placa huella corredor #1.

Clima: Día Nublado (5h de lluvia).

Hora de inicio: 7am - 12pm; 1pm - 5pm.

Personal de Obra: Ing. Residente, Almacenista, profesional social

Personal de Interventoría: Ing Residente, ambiental, SST, profesional social.

Equipas: 1 Motoniveladora, 1 compactador, 1 irrigador de agua, 1 pajarita, 4 volquetas Senallas.

Actividades de Obra: se realizan actividades de instalación de segunda capa de sub-base tramo pie de cruz y compactación de la misma, acopio de triturado y arena en el tramo pie de cruz.

Adriana Gutierrez de P.

Mayo 16.

Placa huella corredor #1

Clima: Día Nublado (3h de lluvia)

Hora de inicio: 7am - 12pm; 1pm - 5pm.

Personal de Obra: Ing. Residente, Almacenista, topógrafo, profesional social.

Personal de Interventoría: Ing. Residente, SST, ambiental, profesional social.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Vibracompactor, 1 pajarita (I), 4 volqueta (3.I), 1 Irrigador de agua.

Actividades de Obra: se realizan actividades de perfilado y compactación de subrasante tramo Santa Lucía.

Adriano Gutierrez de P.

Mayo 17

Placa huella corredor #1

Clima: Día Nublado (3h de lluvia).

Hora de inicio: 7am - 12pm; 1pm - 5pm.

Personal de Obra: Ing. Residente, topógrafo, profesional social.

Personal de Interventoría: Ing. Residente, ambiental, SST, social.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 pajarita, 1 vibracompactor, 1 Irrigador de agua, 4 volquetas sencillas.

Actividades de Obra: se realizan actividades de perfilado y compactación tramo Santa Lucía, habilitación de vía alterna tramo Santa Lucía.

Adriano Gutierrez de P.

Mayo 18

Placa huella corredor #1.

Clima: Día soleado.

Hora de inicio: 7am - 12pm; 1pm - 5pm.

Personal de Obra: Ing. Residente, topógrafo, profesional social.

Personal de Interventoría: Ing. Residente, ambiental, SST, profesional social.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 vibrocompactador, 4 volquetes sencillos, 1 irrigador de agua, 1 pajarita.

Actividades de Obra: se realizan actividades de instalación primera capa de sub-base y compactación tramo Santa Lucía, se continúa con la habilitación de vía alterna tramo Santa Lucía y acopio de material (triturado).

Adriana Gutierrez de P.

Mayo 19

Placa huella corredor #1.

Clima: Día soleado.

Hora de inicio: 7 am - 12 pm; 1 pm - 5 pm.

Personal de Obra: Ing. Residente, profesional social, topógrafo.

Personal de Interventoría: Ing. Residente, ambiental, SST, social.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 vibrocompactador, 1 irrigador de agua, 4 volquetes, 1 pajarita.

Actividades de Obra: se realizan actividades de compactación e irrigación de sub-base tramo pie de cruz, Acopio de material (sub-base) tramo Santa Lucía.

Adriana Gutierrez de P.

Mayo 20

Placa huella corredor #1.

Clima: Día soleado.

Hora de inicio: 7 am - 12 pm.

Personal de Obra: Ing. Residente, profesional social, topógrafo.

Personal de Interventoría: Ing. Residente, SST, ambiental, profesional social.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 vibrocompactador, 1 irrigador de agua, 4 volquetes, 1 pajarita.

Actividades de Obra: se realizaron actividades de acopio de material (Canero y triturado) tramo Santa Lucia.

Adriano Gutierrez de P.

Mayo 22

Placa huella corredor #1.

Clima: Dia Soleado

Hora de inicio: 7 am - 12 pm ; 1 pm - 5 pm.

Personal de Obra: Ing. Residente, profesional social, topografo

Personal de Interventoria: Ing. Residente, SST, social, ambiental.

Equipos: 1 motoniveladora, 1 pajarita, 1 irrigador de agua, 4 volquetas sencillas, 1 vibrocompactador.

Actividades de Obra: se realizan actividades de instalacion de sub-base en el tramo de Santa Lucia, adecuacion del sitio de acopio tramo la Yee del chorro.

Adriana Gutierrez de P.

Mayo 23

Placa huella corredor #1.

Clima: Dia Soleado

Hora de inicio: 7 am - 12 pm ; 1 pm - 5 pm.

Personal de Obra: Ing. Residente, profesional social, topografo.

Personal de Interventoria: Ing. Residente, SST, social, ambiental.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 pajarita, 1 irrigador de agua, 1 compactador, 5 volquetas sencillas.

Actividades de Obra: se realizan actividades de instalacion de sub-base tramo Santa Lucia, Acopio de material y compactacion de sub-base.

Adriano Gutierrez de P.

Mayo 24

Placa huella corredor #1.

Clima: Día soleado.

Hora de inicio: 7am - 12pm; 1pm - 5pm

Personal de Obra: Ing. Residente, profesional social, topógrafo.

Personal de Interventoría: Ing. Residente, SST, social, ambiental.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 compactador, 1 pajarito, 1 irrigador, 5 volquetas sencillas, canguro.

Actividades de Obra: se realizan actividades en el tramo santa lucia de instalación y compactación de sub-base, acopio de material. En el tramo de Pie de Cruz compactación con canguro en conformación de caneta, irrigación y compactación de sub-base.

Adriana Gutierrez de P.

Mayo 25

Placa huella corredor #1.

Clima: Día Nublado (llueve 5h).

Hora de inicio: 7am - 12pm; 1pm - 5pm

Personal de Obra: Ing. Residente, profesional social, topógrafo.

Personal de Interventoría: Ing. Residente, SST, social, ambiental.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 pajarito, 1 canguro, 1 irrigador de agua, 1 compactador, 5 volquetas sencillas.

Actividades de Obra: se realizan actividades en el tramo de santa lucia en instalación y compactación de sub-base, acopio de material. En el tramo de Pie de Cruz compactación con canguro en conformación de caneta, irrigación y compactación de sub-base. Almacenamiento en bodega de cemento.

Se presenta lluvia en la tarde por lo cual no permite continuar con las actividades.

Adriana Gutierrez de P.

Mayo 26

Placa huella corredor # 1.

Clima: Dia Nublado (lluvia sh).

Hora de inicio: 7 am - 12 pm ; 1 pm - 5 pm.

Personal de Obra: Ing. Residente, Profesional Social, topografo.


Personal de Interventoria: Ing. Residente, social, ambiental, SST.

Equipos: 1 motoniveladora, 1 pajarita, 1 compactador, 1 canguro, 5 volquetas, 1 irrigador de agua.

Actividades de Obra: se realizan actividades en el tramo de Santa Lucia de instalacion y compactacion de sub-base, acopio de material. En el tramo de Pie de Cruz compactacion con canguro en conformacion de caneta, compactacion e irrigacion de sub-base. y almacenamiento de cemento.

Por lluvia no se realizan actividades en la tarde.

Adriana Gutierrez de P.



Mayo 27

Placa huella corredor # 1.

Clima: Dia Soleado

Hora de inicio: 7 am - 12 pm.


Personal de Obra: Ing. Residente, Profesional Social, topografo.

Personal de Interventoria: Ing. Residente, Social, SST, ambiental.

Equipos: 1 motoniveladora, 1 pajarita, 1 irrigador, 1 compactador, 5 volquetas sencillas.

Actividades en Obra: se realizan actividades en el tramo de Santa Lucia de instalacion, irrigacion, compactacion de la sub-base. En el tramo de Pie de Cruz se almacena en bodega cemento.

Adriana Gutierrez de P.



Mayo 29

Placa huella corredor # 1.

Clima: Día Nublado (lluvia 2h).

Hora de inicio: 7 am - 12 pm ; 1 pm - 5 pm.

Personal de Obra: Ing. Residente, profesional social, topógrafo.

Personal de Interventoría: Ing. Residente, SST, social, ambiental.

Equipos: 1 motoniveladora, 1 irrigador, 1 compactador, 1 pajonta, 5 volquetas sencillas.

Actividades de Obra: se realizan actividades en el tramo de Santa Lucía en instalación, compactación e irrigación de sub-base, almacenamiento de acero. En el tramo de Pie de Cruz almacenamiento de acero.

Adriana Gutierrez de P.

Mayo 30

Placa huella corredor #1.

Clima: Día Nublado (lluvia 8h).

Hora de inicio: 7 am - 12 pm ; 1 pm - 5 pm.

Personal de Obra: Ing. Residente, profesional social, topógrafo.

Personal de Interventoría: Ing. Residente, SST, social, ambiental.

Equipos: 1 motoniveladora, 1 pajonta, 1 compactador, 1 irrigador, 5 volquetas sencillas.

Actividades de Obra: No se realizan actividades debido a las fuertes lluvias en la zona.

Adriana Gutierrez de P.

Mayo 31

Placa huella corredor #1.

Clima: Día Nublado (llueve 8h).

Hora de inicio: 7 am - 12 pm ; 1 pm - 5 pm.

Personal de Obra: Ing. Residente, profesional social, topógrafo.


Personal de Interventoría: Ing. Residente, SST, social, ambiental.

Equipos: 1 motoniveladora, 1 compactador, 1 irrigador, 1 pajonta, 5 volquetas sencillas.

Actividades de Obra: se realizo actividad en el tramo de Santa Lucia de adecuacion punto critico causado por lluvia.

No se realizaron actividades de Obra debido a las fuertes lluvias.

Adriano Gutierrez de P.



MUNICIPIO DE SANTIAGO
CONTRATO DE OBRA No. LP-OP-01-2022



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MAYO DE 2023

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

LUNES, 15 mayo del 2023

HORA INICIO: 7: AM

HORA FIN: 5 PM.

ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: SOLEADO

TARDE: SOLEADO

PERSONAL DE OBRA: OPERADOR DE RETROCARGADOR (1)
OPERADOR DE MOTONIVELADORA (1), AUXILIARES DE CONSTRUCCION (2)
VIGILANTE (1), OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR, Auxiliar de topografía
cadenero (1)

MAQUINARIA EN OBRA: Retrocargador catapillar 416D, motoniv-
eladora catapillar 120 H, vibrocompactador catapillar CO-
433 E, se inicia instalación de cerramiento en el
centro de acopio ubicado en cupura, se encuentra
disponible la comisión topográfica por parte del
contratista pero no realizando ninguna actividad.

se encuentra disponible la maquinaria Retrocargador
catapillar 416D, motoniveladora catapillar 120 H, vibrocompac-
tador catapillar CO-433 E en obra. el personal de
obra se encuentra disponible. por causas de lluvias del día anterior
no se realizan actividades por parte de la maquinaria

~~Rosana Matto~~
Rosana Matto

Residente interventor y
Gavinco

Melisa Cárdenas R.
Melba Cardenas

Auxiliar contratista obra

Celthine Viquez Salazar
Inspector de Interventoría

Martes, 16 Mayo del 2023

HORA INICIO: 7: AM

HORA FIN: 5 PM

ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: SOLEADO

TARDE: SOLEADO

MAQUINARIA EN OBRA: Retrocargador catapillar 416D, moto-
niveladora catapillar 120 H, Vibro compactador catapillar CO-
433 E. se inicia

PERSONAL DE OBRA: OPERADOR DE Retrocargador (1) Operador
DE motoniveladora (1), Auxiliares de construccin (2) vigilante (1) cadenero

se inicia corte y perfilado con maquinaria.
motonuladora en el tramo K0+360 hasta K0+30
se inicia coneteo en el tramo K0+360 hasta K0+30
se inicia compactacion en la rasante en el tramo
K0+360 hasta K0+30, la comision topografica
por parte del contratista se encuentra disponible
en obra pero sin hacer ninguna actividad en
obra.

~~Rosana Matto~~

Rosana Matto

Residente interventora

Gavino

Melisa Cárdenas R.

Melisa Cardenas

Auxiliar contratos obra

catherine viera salazar

Inspector de interentencia.

MIÉRCOLES, 17 MAYO DEL 2023

Hora inicio: 7: AM.

HORA = fin: 5 pm

ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: SOLEADO

TARDE: SOLEADO

PERSONAL DE OBRA: operador de retrocargador (1) operador, cadenero
de motonuladora (1), Auxiliares de construcción (2) vigilante
(1), operador de vibrocompactador, Auxiliar de topografía

MAQUINARIA EN OBRA: Retrocargador catapillar 416 D,
motonuladora catapillar 120 H, vibrocompactador catapillar
CS-433, se encuentra topografía disponible en
obra por parte del contratista pero no realiza ninguna
actividad en obra.

Ingresa herramienta menor al centro de acopio del almacena
miento ubicado en la finca copacema.

maquinaria, retrocargador, motonuladora y vibrocompactador
se encuentran disponibles en obra pero no realizan
ninguna actividad en obra, por causas de lluvias anteriores
no se realizan actividades maquinarias.

Rosana Mattos
 Rosana Mattos
 Residente interentorno
 Gavino

Melisa Cárdenas R.
 Melisa Cárdenas
 Auxiliar contratista obra

Catherine Añez Salazar
 inspectora de interentorno
 Gavino

JUEVES 18 MAYO DEL 2023

HORA INICIO: 9: AM

HORA FIN: 5 PM

ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: SOLEADO TARDE: SOLEADO

PERSONAL DE OBRA: Operador de retrocargador (1) operador,
 de motoniveladora (1), Auxiliares de construcción (2) vigilante
 (1) operador de vibro compactador Auxiliar de topografía, cadenero

MAQUINARIA EN OBRA: Retrocargador caterpillar 416D,
 motoniveladora caterpillar 120 H, vibro compactador caterpillar
 CS-433E Se continúa construcción de campamento
 en la finca Luján. Su topografía por parte del
 contratista se encuentra disponible en obra, se
 realiza instalación de material de sub-base granular
 desde la K+360 hasta K+030.

Se inicia compactación con el vibro compactador y
 se realiza virgo para la sub-base desde el tramo
 K+360 hasta K+030

Rosana Mattos
 Rosana Mattos
 Residente interentorno
 Gavino

Melisa Cárdenas R.
 Melisa Cárdenas
 Auxiliar contratista obra

Catherine Añez Salazar
 inspectora de interentorno
 Gavino

VIERNES 19 MAYO DE 2023

HORA INICIO: 7: AM

HORA FIN: 5 PM.

ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: SECAO TARDE: SOLEADO

PERSONAL DE OBRA: Operador de retrocargador (1) operador de motoniveladora (1), Auxiliares de construcción (2) vigilante (1) operador de vibrocompactador, Auxiliar de topografía, cadenero (1)

MAQUINARIA EN OBRA: Retrocargador Caterpillar 416D motoniveladora Caterpillar 120 H, vibrocompactadora Caterpillar CS-433E. Se realiza compactación con el vibro compactador y riego a la rasante desde el tramo K0+360 y K0+800.

Se realiza perfilado y coneteo con la maquinaria motoniveladora en el tramo K0+360 al K0+800 se continua con la construcción del camamento en la linea cuprena; la topografía por parte del contratista se encuentra disponible.

Rosanna Matta
Rosanna Matta
Residente Interventoría
Bogotá

Melisa Cárdenas R.
Melisa Cárdenas
Auxiliar Contratación
obra.

Catherine Viterbo Salazar
Inspector de Interventoría
Bogotá

SABADO 20 MAYO DE 2023.

HORA INICIO: 7: AM

HORA FIN: 12 PM.

ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: SOLEADO TARDE: LLUVIA

PERSONAL DE OBRA: Operador de Retrocargador (1) Operador de Motoniveladora (1) Auxiliares de construcción (2) vigilante (1) Motoniveladora (1) Vibrocompactador (1) Auxiliar de topografía cadenero (1)

MAQUINARIA EN OBRA: Retrocargador Caterpillar 416D

motoniveladora catapillar 120H, vibro compactador
catapillar CS-433 E, no se realiza ninguna
actividad por causas de lluvias, se encuentra
la topografía disponible en obra, la
maquinaria retrocargador, vibrocompactador y
motoniveladora se encuentra disponible en obra

~~Rosana matt~~
Rosana mattos
Residente interventora
Gauvico

Melisa Cárdenas R.
Melisa cardenas
Auxiliar contactista
de obras

catherine viterro salazar
Inspector de Interventoría
Gauvico

LUNES 22 MAYO DEL 2023

HORA INICIO: 7: am

hora fin: 5pm

ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: LLUVIAS

TARDE: LLUVIAS

PERSONAL DE OBRA: operador de retrocargador (1)
operador de vibrocompactador (1) operador de motoniveladora (1)
auxiliares de construcción (2) auxiliar de
topografía vigilante, cadenero (1)

MAQUINARIA EN OBRA: Retrocargador catapillar 416D
motoniveladora catapillar 120H, vibro compactador
catapillar CS-433 E, la comisión topográfica
se encuentra disponible en obra por parte del contactista
la cual no realizan actividades en obra, la maquinaria
motoniveladora, retrocargador, vibrocompactador se
encuentra disponible en obra pero no realizan
actividades por causa de lluvias en todo el
día.

~~Rosana matt~~
Rosana mattos
Residente interventora

Melisa Cárdenas R.
Melisa cardenas
Auxiliar contactista de obras

Catherine Vivero Salazar
inspector de mantenimiento
Banco

MARTES 23 MAYO DEL 2023

HORA INICIO: 7 am

HORA FIN: 5 pm

ESTADO DEL CIMA: MAÑANA: Lluvias

TARDE: Nublado

PERSONAL DE OBRA: Operador retrocargador (1) operador de vibracompactador (1) operador de motoniveladora (1) cadenero (1) auxiliares de construcción (2) auxiliar de topografía, vigilante
MAQUINARIA EN OBRA: Retrocargador Caterpillar 416 D. motoniveladora Caterpillar 120H, vibracompactador Caterpillar CS-433E. En horas de la mañana se presentaron fuertes lluvias y por saturación del terreno se produjo deslizamiento de la vía, la cual se pudieron realizar actividades en horas de la tarde.

Se continuó en la construcción del almacén para el acopio del material en la finca caparena, la comisión topográfica se encuentra disponible en obra pero no realiza ninguna actividad en obra.

La maquinaria retrocargador, vibracompactador, motoniveladora se encuentran disponible en obra junto con el personal de obra. pero no realizan actividades en la mañana.

Diana Matto

Diana Matto

Residente Intendencia

Catherine Vivero Salazar
inspector de mantenimiento
Banco

Melisa Cárdenas R.

Melisa Cárdenas

Auxiliar contactista de obras

MIÉRCOLES 24 MAYO DEL 2023

HORA INICIO: 7: am

HORA FIN: 5 pm

ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: soleado TARDE: soleado

PERSONAL DE OBRA: operador retrocargador (1)
operador vibrocompactador, operadora de motorizadora (1)
auxiliares de construcción (2) auxiliar de topografía
vigilante cadáver (1)

MAQUINARIA EN OBRA: Retrocargador Caterpillar
416D, motorizadora Caterpillar 120H, vibro compactador
Caterpillar CO-433E, se realiza perfilado
corte y coneteo con la maquina motorizadora
en sentido de cobertura hacia Azul - alto.

- almacenamiento de material granular en el
acopio K1000

se realiza curramiento del acopio ubicado en
el tramo K1000

- la topografía por parte del contratista se
encuentra disponible en obra pero no realiza ninguna
actuación en obra.

Rosana Matto
Rosana Matto
Residente interurbana
Guinea

Melisa Cárdenas R.
Melisa carolinas
Auxiliar contratista
obra

ca. thru nueva salda
Inspector de interurbana y

JUEVES 25 MAYO DEL 2023

HORA INICIO: 7: am

HORA FIN: 5 PM

ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA soleado TARDE lluvioso

PERSONAL DE OBRA: operador de retrocargador (1)
operadora de vibrocompactador, operadora de
motorizadora (1) auxiliares de construcción (2)

auxiliar de topografía, vigilante, cadenero(1)

MAQUINARIA EN OBRA: Retrocargador caterpillar 416D, motoniveladora caterpillar 120H, vibro compactador caterpillar CS-433E.

se realiza labores en horas de la mañana perfilando la vía por presentación de terrumbros ubicados en la abaca kit 125 al kit 300 se realizó compactación y retiro de material sobrante.

en horas de la tarde se presenta fuertes lluvias. la topografía se encuentra disponible pero no se realiza ninguna actividad

Rosana Matto

Rosana Matto

Residente intercomunal

baucos

Melisa Cárdenas R.

Melisa Cárdenas

Auxiliar contratista

obra

carthene urco salas
inspector de intercomunal.

VIERNES 26 MAYO DEL 2023

HORA INICIO: 7 am

HORA FIN: 5 pm

ESTADO DEL DIA: MAÑANA: lluvias TARDE: lluvias

PERSONAL DE OBRA: Operador de retrocargador (1)
operador de vibro compactador (1) Operador de motoniveladora
(1) auxiliar de construcciones (2), auxiliar de topografía,
vigilante, cadenero(1)

MAQUINARIA EN OBRA: Retrocargador caterpillar 416D,
motoniveladora caterpillar 120H, vibro compactador caterpillar
CS-433E.

la topografía se encuentra disponible en obra
pero no realiza ninguna actividad por motivo de
lluvia, la maquinaria retrocargador, vibro compactador

y motoniveladora, y el personal se encuentran disponible pero no realizan ninguna actividad por motivo de lluvia

Rosana Mattos

Rosana mattos

Residente Interventores

Caunco

Melisa Cárdenas R.

Melisa cardenas

Auxiliar contratista

obra

Catherine Vueros Salazar

Inspector de Interventores

SABADO 27 MAYO DEL 2023

HORA INICIO : 7 am

HORA FIN : 12 PM

ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: NUBIOS TARDE: NUBIOS

PERSONAL DE OBRAS operador de retrocargador (1)
operador de vibrocompactador (1) operador de motoniveladora (1) auxiliar de construcción (2) auxiliar de topografía, vigilante, cadenero (1)

MAQUINARIA EN OBRA: Retrocargador Caterpillar 416P,
motoniveladora caterpillar 120h, vibro compactador caterpillar CO-433E.

No se realizan actividades por causa de lluvia pero la topografía se encuentra disponible, el retrocargador, el vibro compactador, y la motoniveladora se encuentran disponibles

Rosana Mattos

Rosana mattos

Residente Interventores

Caunco

Melisa Cárdenas R.

Melisa cardenas

Auxiliar contratista

obra

Catherine Vueros Salazar

Inspector de Interventores

LUNES 29^{mayo} DEL 2023

HORA INICIO: 7 am

HORA FIN: 5 pm

ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: SOLEADO TARDE: SOLEADO

PERSONAL DE OBRA: operador de retrocargador (1) auxiliar SOT (1)
operador de vibrocompactador (1), operador motoniveladora,
auxiliar de construcción (2) auxiliar de topografía, vigilante
MAQUINARIA EN OBRA: Retrocargador caterpillar 416D,
motoniveladora caterpillar 120H, vibrocompactador caterpillar
CS - 433E. Se continúa el perfilado, concreto
del tramo de acceso a la obra en la poza
y se realizó compactación. con el vibro compactador
se continúa la limpieza de alcantarillos existentes
se realiza descarga de cemento en el centro de
acopio de cuparena.

ingreso de material granular al centro de acopio
ubicado en el tramo Kitood, la topografía se
encuentra disponible por parte del contratista.

~~Rosana Matto~~

Rosana matto

Residente Interandina

Quince

Melisa Cárdenas R.

Melisa Cardenas

Auxiliar controlista obra

Catherine Vivero Salazar

Inspector de Interandina

MARTES 30 DE MAYO DEL 2023

HORA INICIO: 7: am.

HORA FIN: 5 pm

ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA:

TARDE:

PERSONAL DE OBRA: Operador de retrocargador (1) operador
de vibrocompactador (1), operador motoniveladora, auxiliar de
construcción (2) auxiliar de topografía, vigilante, cadenero (1)

MAQUINARIA EN OBRA: Retrocargador caterpillar 416D, motoniveladora
caterpillar 120H, vibrocompactador caterpillar CS - 433E
se continúa con limpieza de alcantarillos existentes

Ingresa material de acero en el centro de acopio en cupena, en el día de hoy no se encuentra la auxiliar SOT. Se realiza enterramiento de lote de acopio ubicada en el tramo K1+000, la topografía se encuentra disponible por parte del contratista.

Rosana Matto

Rosana matto

Residente de Intendencia
Cuzco

Melisa Cárdenas R.

Melisa cardenas

Auxiliar contratista obra

catheche vuros salazar
inspector de intendencia

MIERCOLES 31 DE MAYO DEL 2023

HORA INICIO: 7am

HORA FIN: 5pm

ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: DESNUDO

TARDE: SOLEADO

PERSONAL DE OBRA: Operador retrocargador (1) operador de vibracompactador (1), operadora de motoniveladora, auxiliar de construcción (2) auxiliar de topografía, vigilante. Auxiliar SOT, cadenera. MAQUINARIA EN OBRA: Retrocargador caterpillar 416 D, motoniveladora caterpillar 120 H, vibracompactador caterpillar CO-433E.

Se realiza perfilado y compactación en el tramo de la vía K0+50 al K0+800,

se finaliza cerramiento del lote para el almacenamiento de material en el K1+000.

Se realiza retiro de material y nivelación del área para la construcción del campamento en la finca la palma, ingreso de material granular al centro de acopio topografía por parte del contratista está disponible.

Rosana Matto

Rosana matto

Residente de Intendencia
Cuzco

Melisa Cárdenas R.

Melisa cardenas

Auxiliar contratista obra
