



INFORME SEMANAL 02

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
ACUEDUCTO PEÑA NEGRA MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

CONTRATO No: 501 DEL 2024

CONTRATISTA: STATIC INGENIERIA SAS

SUPERVISOR: JORGE EDWIN LOPEZ TORRES – SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA
ALCALDIA DE PAIPA

VALOR DEL CONTRATO: \$ 330,329,355.00

FECHA DE INICIO: 30 DE DICIEMBRE – 2024

FECHA DE TERMINACION: 29 DE MARZO – 2025

DATOS DEL INFORME

OBRA PROGRAMADA: 2.16 %

VALOR PROGRAMADO: \$ 7.143.852.3

OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: 9.18%

VALOR OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 30.331.281,19

OBRA EJECUTADA: 22.26 %

VALOR EJECUTADO: \$ 73.537.608

OBRA EJECUTADA ACUMULADA: 29.66 %

VALOR EJECUTADA ACUMULADO: \$ 97.976.1911

PERIODO: Del 25 de enero al 31 de enero del 2025

TIEMPO TRANSCURRIDO: 32 días

TIEMPO RESTANTE PARA TERMINACION: 58 días

FECHA: 31 DE ENERO 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



Amarre de acero para vigas de cimentación.



Continuación de amarre de aceros



Amarre de acero para placa de contrapiso



Amarre de acero de muros.



Instalación de cinta SIKA PVC $V=0.15$




PERSONAL EN OBRA

PERSONAL ADMINISTRATIVO		
NOMBRE	CEDULA	CARGO
SERGIO LEONARDO GALLEG0 PLAZAS	1.057.586.590	RESIDENTE DE OBRA
DIANA CAROLINA DALLOS MORANTES	1.049.604.684	INSPECTOR SST
MARCO AURELIO CAMARGO HIGUERA	7.229.352	ASESOR ESTRUCTURAL
ANDRES FELIPE BERNAL	1.049.618.165	ASESOR GEOTECNICA
JORGE ALBERTO VILLAMIL MORA	7.173.560	DIRECTOR DE OBRA
PERSONAL OPERATIVO		
NOMBRE	CEDULA	CARGO
JORGE OSPINO	1.052.398.198	OFICIAL
EDUARDO OSPINO	10.883.395	OFICIAL
JUAN DAVID AGUAS	1.100.080.502	OFICIAL
JORGE LUIS OLMOS RAMIREZ	3.836.007	AYUDANTE
GILVERTO VEGA CALDERON	74.320.059	AYUDANTE

CANTIDADES EJECUTADAS EN LA PRESENTE SEMANA.

CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO PEÑA NEGRA MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACA.						
ITEM	COD GOBER	DESCRIPCION	UND	SEMANA 2	VR. UNITARIO	VR.PARCIAL
1	PRELIMINARES					
2.05	1.02.42	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	kg	7625.14	\$ 7,142.00	\$54,458,750.00
2.06	3.13.11	CINTA SIKA PVC. V=0,15	ml	48.00	\$ 43,930.00	\$2,108,640.00
					SUBTOTAL	\$56,567,390.00
					COSTO DIRECTO OBRA	\$ 56,567,390.00
					A.I.U. 22%	\$ 12,444,826.00
					30% 3%	\$ 1,697,022.00
					5%	\$ 2,828,370.00
					VALOR COSTOS INDIRECTOS	\$ 16,970,218.00
					SUB TOTAL COSTO DIRECTO + AIU	\$ 73,537,608.00

Avance ejecutado

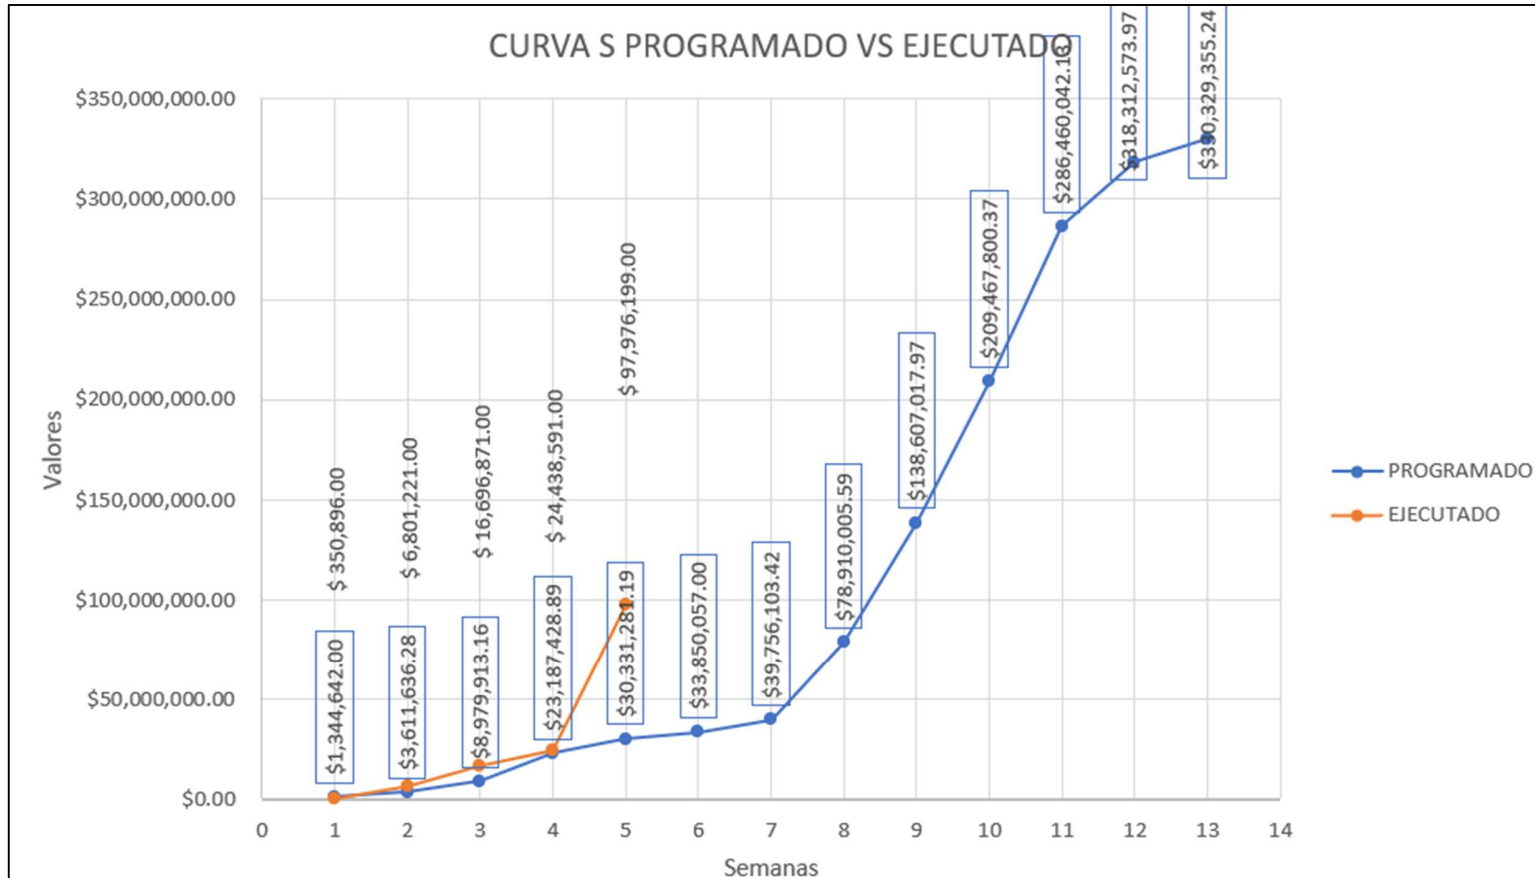



CONCLUSIONES

DURANTE LA SEMANA DEL INFORME 2 SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- Amarre de acero para vigas de cimentación, placa de contrapiso, muros, cajas.
- Instalación de cinta Sika PVC V = 0.15
- ✓ El ingeniero diseñador hidráulico Yeison Torres Suárez, realiza visita a la obra, con el fin de socializar algunos cambios en el diseño inicial y resolver dudas e inquietudes generadas por la residencia de obra.
- ✓ Se observa en la curva S, que lo programado esta por debajo de lo ejecutado, así mismo se contempla que se esta cumpliendo con la programación de obra.
- ✓ En el informe mensual se anexan los certificados de calidad del acero.

SERGIO LEONARDO GALLEGOS PLAZAS
Representante legal – Static Ingeniería S.A.S
