



INFORME SEMANAL 04

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
ACUEDUCTO PEÑA NEGRA MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

CONTRATO No: 501 DEL 2024

CONTRATISTA: STATIC INGENIERIA SAS

SUPERVISOR: JORGE EDWIN LOPEZ TORRES – SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA
ALCALDIA DE PAIPA

VALOR DEL CONTRATO: \$ 330,329,355.00

FECHA DE INICIO: 30 DE DICIEMBRE – 2024

FECHA DE TERMINACION: 29 DE MARZO – 2025

DATOS DEL INFORME

OBRA PROGRAMADA: 1.79 %

VALOR PROGRAMADO: \$ 5.906.046,42

OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: % 12.04

VALOR OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 39.756.103,42

OBRA EJECUTADA: % 4.05

VALOR EJECUTADO: \$ 13.371.680,00

OBRA EJECUTADA ACUMULADA: % 63.54

VALOR EJECUTADA ACUMULADO: \$ 209.886.323,00

PERIODO: Del 8 de febrero al 14 de febrero del 2025

TIEMPO TRANSCURRIDO: 46 días

TIEMPO RESTANTE PARA TERMINACION: 44 días.

FECHA: 14 de febrero 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



Instalación de formaleta tipo camilla para tapa del tanque



Acero de vigas de amarre



Amarre de acero en cajas de entrada y salida



Instalación de malla electrosoldada




PERSONAL EN OBRA

PERSONAL ADMINISTRATIVO		
NOMBRE	CEDULA	CARGO
SERGIO LEONARDO GALLEGU PLAZAS	1.057.586.590	RESIDENTE DE OBRA
DIANA CAROLINA DALLOS MORANTES	1.049.604.684	INSPECTOR SST
MARCO AURELIO CAMARGO HIGUERA	7.229.352	ASESOR ESTRUCTURAL
ANDRES FELIPE BERNAL	1.049.618.165	ASESOR GEOTECNICA
JORGE ALBERTO VILLAMIL MORA	7.173.560	DIRECTOR DE OBRA
PERSONAL OPERATIVO		
NOMBRE	CEDULA	CARGO
JORGE OSPINO	1.052.398.198	OFICIAL
EDUARDO OSPINO	10.883.395	OFICIAL
JUAN DAVID AGUAS	1.100.080.502	OFICIAL
JORGE LUIS OLMOS RAMIREZ	3.836.007	AYUDANTE
GILVERTO VEGA CALDERON	74.320.059	AYUDANTE

CANTIDADES EJECUTADAS EN LA PRESENTE SEMANA.

CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO PEÑA NEGRA MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACA.						
ITEM	COD GOBER	DESCRIPCION	UND	SEMANA 2	VR. UNITARIO	VR.PARCIAL
2	ESTRUCTURAS					
2.05	1.02.42	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	kg	1440.20	\$ 7,142.00	\$10,285,908.00
					SUBTOTAL	\$10,285,908.00
					SUBTOTAL	\$0.00
					COSTO DIRECTO OBRA	\$ 10,285,908.00
			A.I.U.		22%	\$ 2,262,900.00
			30%		3%	\$ 308,577.00
					5%	\$ 514,295.00
					VALOR COSTOS INDIRECTOS	\$ 3,085,772.00
					SUB TOTAL COSTO DIRECTO + AIU	\$ 13,371,680.00

Avance ejecutado

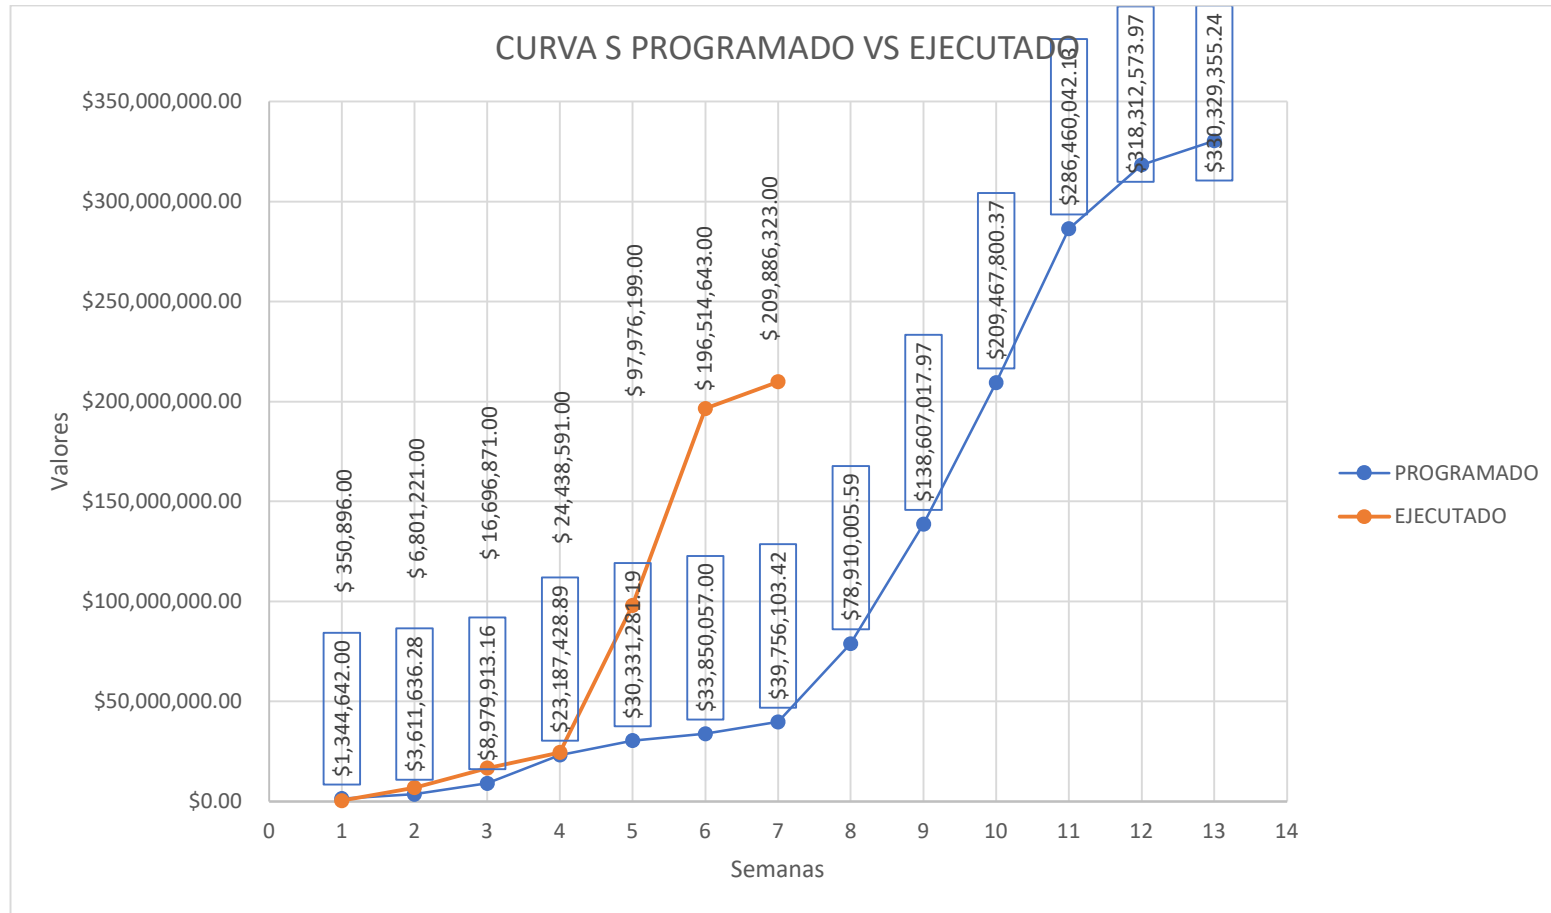



CONCLUSIONES

DURANTE LA SEMANA DEL INFORME 4, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- Instalación de acero de refuerzo para vigas de amarre de tapa del tanque.
- Instalación de refuerzo electrosoldado en placa tapa del tanque.
- ✓ Se deja constancia que todos los concretos usados en el proyecto TANQUE DE PEÑA NEGRA, se realizan con concreto premezclado de la empresa HOLCIM.
- ✓ Se realizan tomas de cilindros de muestras de concreto, los resultados serán entregados en el informe mensual 02.
- ✓ Se observa que la obra programada está por debajo de lo ejecutado, cumpliendo el cronograma de obra.
- ✓ Los certificados de acero, se anexarán en el informe mensual N1

SERGIO LEONARDO GALLEGO PLAZAS
Representante legal – Static Ingeniería S.A.S
