



ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

CONTRATO ESPECÍFICO Nº 086-2210731 DE 2021
INFORME No. 24 PERIODO DE EJECUCIÓN 01 AL 30, JUNIO DE 2024

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO

OBJETO:	CONSTRUCCION DEL NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO PRIMERA ETAPA COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE FUNZA		
PARTICIPANTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales) MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA		
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA		
VALOR APORTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales)	\$ 34.000.000.000	
	MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA	\$ 4.692.432.704	
	ADICIÓN MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA	\$4.558.952.179	
	TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO	\$43.251 384.883	
PLAZO DE EJECUCIÓN	INICIAL: 23 MESES PRORROGA: 3 MESES FINAL: 26 MESES		
FECHA SUSCRIPCIÓN	12/11/2021		
SUPERVISOR DEL CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DEL EJECUTOR	GLADYS GONZALEZ GONZALEZ		
SUPERVISORES ANTERIORES	NOMBRE	DESDE	HASTA
	N/A	N/A	N/A
FECHA INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO	28/06/2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS	MODIFICACIÓN CE 2210731 FECHA 12/08/2022 (MODIFICACIÓN FORMA DE PAGO)		

NOMBRE DEL FUNCIONARIO
Proyectó EDWIN DAZA SANABRIA

CARGO
PROFESIONAL UNIVERSITAR

FIRMA

FECHA
jun 2024



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



	MODIFICACIÓN CE 2210731 FECHA 24/03/23 (PRORROGA Y ADICIÓN PRESUPUESTAL)		
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS	N/A		
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO	28/08/2024		
VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	\$41.070.430.107	VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA INTERVENTORIA	\$2.180 954 776

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
POLIZA 8001004713 AXA COLPATRIA, FECHA APROBACION 28/06/2022	28/06/2022	CUMPLIMIENTO	\$ 3.400.000.000	28/06/2022	28/01/2025
		CUMPLIMIENTO	\$ 3.400.000.000	30/08/2023	28/04/2025

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A ENTerritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO ENTerritorio	17/07/2022	19/08/2022	\$6.800.000.000
SEGUNDO DESEMBOLSO ENTerritorio	31/09/2023	21/11/2023	\$6.800.000.000
TERCER DESEMBOLSO ENTerritorio	17-04-2024	22/04/2024	\$6.800.000.000
"n" DESEMBOLSO ENTerritorio			
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			\$20.400.000.000

Desde el punto de vista presupuestal, el municipio de FUNZA, una vez suscrito el contrato específico, procedió a la incorporación de los recursos al presupuesto de ingresos y gastos mediante al Decreto/Acuerdo No 020 del día 25, del mes enero del año 2022, lo cual permitió generar los certificados de disponibilidad presupuestal No 2022000962 y 2022000964,

NOMBRE DEL FUNCIONARIO
Proyectó EDWIN DAZA SANABRIA

CARGO
PROFESIONAL UNIVERSITAR

FIRMA

FECHA
jun 2024



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



adicionalmente mediante ACUERDO No. 05 DE 2022 (06 DE MAYO DE 2022) permitió generar los certificados de disponibilidad 2023000085 y 2023000086 todos ellos soportaron los procesos de licitación y/o concursos de méritos LP-002-2022 Y CM-005-2022, generándose el siguiente balance presupuestal:

Detalle	Número	Fecha de expedición	Valor CDP	Valor RP	Saldo
Obra					
CDP	2022000964	20/04/2022	\$36.735.638.505		\$0
RP	20220011615	13/09/2022		\$36.735.638.505	
CDP	2023000085	02/01/2023	\$4.334.791.602		\$0
RP	2023000007	02/01/2023		\$4.334.791.602	
Interventoría					
CDP	2022000962	19/04/2022	\$1.956.794.199		\$0
RP	2022001706	04/10/2022		\$1.956.794.199	
CDP	2023000086	02/01/2023	\$224.160.577		\$0
RP	2023000008	02/01/2023		\$224.160.577	
Total			\$43.251.384.883	\$43.251.384.883	\$0

(Anexar el acto administrativo de incorporación, CDP y RPs de los contratos derivados Folios No 01 a 04)

Se detalla el valor de adición presupuestal al contrato específico, cuya motivación nace de la actualización de precios referencia ICCU 2021 con el cual se presupuestó inicialmente el proyecto y la necesidad de actualizarlos a vigencia 2022 dado que es este año cuando se adelantan los contratos derivados se anexan los soportes presupuestales del mismo.

Detalle	Número	Fecha de expedición	Valor CDP	Valor RP	Saldo
Obra					
CDP	2023000085	02/01/2023	\$4.334.791.602		\$0
RP	2023000007	02/01/2023		\$4.334.791.602	
Interventoría					
CDP	2023000086	02/01/2023	\$224.160.577		\$0
RP	2023000008	02/01/2023		\$224.160.577	
Total			4.558.952.179	4.558.952.179	\$0

Información de la Cuenta apertura para el Contrato Específico:

Para el manejo de los recursos, se abrió una cuenta No 462100110420, de Ahorros en el banco DAVIVIENDA denominada: CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO - ENTERRITORIO de fecha 05 del mes enero del año 2022. En dicha cuenta se identificaron los ingresos o

NOMBRE DEL FUNCIONARIO
Proyectó EDWIN DAZA SANABRIA

CARGO
PROFESIONAL UNIVERSITAR

FIRMA

FECHA
jun 2024



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



contrapartidas de los aportantes conforme se pactó la forma de financiación del contrato específico, generándose el siguiente detalle:

Entidad	Detalle	Valor Pactado	Valor Consignado	Fecha de Consignación	Saldo
ENTERRITORIO					
	Transferencia 1	6.800.000.000	6.800.000.000	19/08/2022	0
	Transferencia 2	6.800.000.000	6.800.000.000	21/11/2023	0
	Transferencia 3	6.800.000.000	6.800.000.000	22/04/2024	0
	Transferencia 4	6.800.000.000	0	N/A	6.800.000.000
	Transferencia 5	3.400.000.000	0	N/A	3.400.000.000
	Transferencia 6	3.400.000.000	0	N/A	3.400.000.000
VALOR TOTAL GIRADO POR ENTERRITORIO		34.000.000.000	20.400.000.000		13.600.000.000
ALCALDIA DE FUNZA					
	Transferencia 1	1.956.794.199	0	N/A	1.956.794.199
	Transferencia 2	2.735.638.505	0	N/A	2.735.638.505
	Transferencia 3	4.334.791.602	0	N/A	4.334.791.602
	Transferencia 4	224.160.577	0	N/A	224.160.577
VALOR TOTAL GIRADO POR ALCALDIA DE FUNZA		9.251.384.883	0		9.251.384.883

Se anexan soportes de los extractos financieros de la cuenta de ahorros No 462100110420, del mes de 06 del año 2024 Folios del 05 al 07, donde se resaltan los aportes de las entidades.

Rendimientos Financieros: Dado que una de las obligaciones de la entidad ejecutora es la devolución de los rendimientos financieros generados en la cuenta de manejo exclusivo de los recursos. A continuación, se presenta el balance de los rendimientos financieros generados desde el mes 01 del año 2022 hasta el mes 06 del año 2024 de los recursos aportados por ENTerritorio, balance soportado en las certificaciones bancaria expedidas por el banco DAVIVIENDA, acompañadas del soporte del traslado realizado por el Municipio de FUNZA a la cuenta:

BANCO: BANCO DE LA REPUBLICA

CUENTA No: 6101109-4

NOMBRE DE LA CUENTA: DIRECCION DEL TESORO NACIONAL – RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO

CODIGO: 106

Periodo	Valor Rendimientos	Valores Transferidos
Febrero 2022	0	0
Marzo	0	0
Abril	0	0
Mayo	0	0
Junio	0	0
Julio	0	0

NOMBRE DEL FUNCIONARIO

Proyectó EDWIN DAZA SANABRIA

CARGO

PROFESIONAL UNIVERSITAR

FIRMA

FECHA

jun 2024



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

Agosto	\$ 8.343.819,35	8,343,819.35
Septiembre	\$ 19.263.901,25	19.263.901.25
Octubre	\$ 51.304.346,88	51.304.346.88
Noviembre	\$ 49.663.841,91	49.663.841,91
Diciembre	\$ 68.560.485,26	68.560.485.26
Enero de 2023	\$ 68.411.671,42	68.411.671.42
Febrero de 2023	\$ 61.872.026,08	61.872.026.08
Marzo de 2023	\$ 68.507.665,46	68.507.665.46
Abril de 2023	\$ 24.649.866,12	24.649.866.12
Mayo de 2023	\$ 70.175,04	1.444.645,04
Junio 2023	\$ 4.095,71	1.061.576,71
Julio 2023	\$ 3.487,43	756.392,43
Agosto 2023	\$ 679,87	679.87
Septiembre 2023	\$ 3.991,06	447.835,08
Octubre 2023	\$ 2.332,66	97.457,99
Noviembre 2023	\$ 21.631.079,06	21.631.100,06
Diciembre 2023	\$ 53.929.746,10	53.929.746,10
Enero 2024	\$ 32.250.787,14	32.250.787,14
Febrero 2024	\$ 30.064.191,24	30.064.191,24
Marzo 2024	\$ 31.484.330,69	31.484.330,69
Abril 2024	\$ 46.183.769,43	46.183.769,43
Mayo 2024	\$ 71.448.821,81	71.448.821,81
Junio 2024	\$ 62.032.156,10	
Total	\$ 769.687.267,07	\$ 711.378.957,32

Anexar la certificación bancaria que señala los rendimientos financieros por mes o una general que señale todos los meses, y soporte del Traslado de los mismos a la cuenta del tesoro Folios No 05 a 07

Rendimientos Financieros de Anticipos. En caso de que la entidad hubiera pactado anticipos en los contratos derivados, deberá relacionar un párrafo relacionando el valor total del contrato derivado, su objeto y el valor del anticipo, forma de manejo del mismo (fiducia y demás) y su ejecución financiera.

Número Contrato	CO1.PCCNTR.3952242 DE 2022		
Objeto	CONSTRUCCION DEL NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO PRIMERA ETAPA COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA		
Valor	\$ 41.070.430.107,00	Cuenta o encargo Fiduciario	04000006639 ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS
Valor Anticipo	\$ 8.214.086.021,00	Valor Girado	\$8.214.086.021,00
Porcentaje	20%	Fecha de Giro	13 abril 2023
Detalle Orden	Valor Orden	Fecha	Saldo Anticipo
			\$ 0

NOMBRE DEL FUNCIONARIO
Proyectó EDWIN DAZA SANABRIA

CARGO
PROFESIONAL UNIVERSITAR

FIRMA

FECHA
jun 2024



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



Total			0
Rendimientos Financieros del Anticipo			
Periodo	Valor Rendimientos	Valores Transferidos	
GENERADOS ABRIL-2023 (CUENTA FIDUCIA)	\$ 1,374,470.00	\$ 1,374,470.00 (TRANSFERIDO EN MES DE MAYO CUENTA DEL CONTRATO ESPECIFICO Y POSTERIORMENTE A TESORO NACIONAL)	
GENERADOS MAYO-2023 (CUENTA FIDUCIA)	\$ 1,057,481.00	TRANSFERIDO EN MES DE JUNIO DE FIDUCIA A CUENTA DEL CONTRATO ESPECIFICO Y POSTERIORMENTE A TESORO NACIONAL)	
GENERADOS JUNIO-2023 (CUENTA FIDUCIA)	\$ 752,905.00	TRANSFERIDO EN MES DE JULIO DE FIDUCIA A CUENTA DEL CONTRATO ESPECIFICO Y POSTERIORMENTE A TESORO NACIONAL)	
GENERADOS JULIO-2023 (CUENTA FIDUCIA)	\$ 443,844.02	TRANSFERIDO EN MES DE SEPTIEMBRE DE FIDUCIA A CUENTA DEL CONTRATO ESPECIFICO Y POSTERIORMENTE A TESORO NACIONAL)	
GENERADOS AGOSTO-2023 (CUENTA FIDUCIA)	\$ 95,101.33	TRANSFERIDO EN MES DE OCT DE FIDUCIA A CUENTA DEL CONTRATO ESPECIFICO Y POSTERIORMENTE A TESORO NACIONAL)	
GENERADOS SEPTIEMBRE-2023 (CUENTA FIDUCIA)	\$ 24,00	TRANSFERIDO EN MES DE OCT DE FIDUCIA A CUENTA DEL CONTRATO ESPECIFICO Y POSTERIORMENTE A TESORO NACIONAL)	
GENERADOS OCTUBRE-2023 (CUENTA FIDUCIA)	\$ 21,00	TRANSFERIDO EN MES DE NOV DE FIDUCIA A CUENTA DEL CONTRATO ESPECIFICO Y POSTERIORMENTE A TESORO NACIONAL)	
ENTRA EN LIQUIDACION FIDUCIA NOVIEMBRE (NO GENERA MAS RENDIMIENTOS)			
Total		\$ 3.723.846,35	

Adjuntar el informe final de fiducia, soporte de consignación de los rendimientos de la fiducia a la cuenta de manejo exclusivo y soporte de traslado de estos recursos a la cuenta del Tesoro Nacional.

Saldos en la Cuenta de manejo de Recursos: Se debe relacionar el saldo en la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos del contrato específico, con corte al mes de presentación del informe.

Saldo en la Cuenta		
CONCEPTO	DETALLE	Junio-24
INGRESOS	SALDO INICIAL	\$7,966,397,372,40

NOMBRE DEL FUNCIONARIO
Proyectó EDWIN DAZA SANABRIA

CARGO
PROFESIONAL UNIVERSITAR

FIRMA

FECHA
jun 2024



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



	FRCP	
	SECTOR (TERCER PAGO_22 ABRIL 2024)	
	TERRITORIO	
	OTROS (RENDIMIENTOS FIDUCIA)	\$ 62.032.156,10
	RENDIMIENTOS TOTALES	\$ 62.032.156,10
	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	
	TOTAL INGRESOS	\$ 62.032.156,10
EGRESOS	OBRA	0
	INTERVENTORIA	
	TASAS Y CONTRIBUCIONES	
	TRASLADO RENDIMIENTOS (10 abril)	\$ 71.448.821,81
	TRASLADO RENDIMIENTOS ACUMULADOS	\$ 71.448.821,81
	DESCUENTOS	\$ 0
	RTE FUENTE	
	OTROS	0
	TOTAL, EGRESOS	\$ 71.448.821,81
	SALDO FINAL MES	\$7.956.980.706,69

Adjuntar el extracto correspondiente.

Se debe indicar a que corresponden los ingresos consignados en ella y su manejo, es decir, en caso de haber rendimientos financieros, se debe señalar la fecha de traslado de los mismos a cuenta del Tesoro Nacional. Respecto a los egresos, se debe explicar a qué hacen referencia y finalmente en caso de existir saldos en la cuenta, se debe señalar que valor soporta el mismos o si se trata de valores no ejecutados.

NOTA: La secretaría de hacienda del municipio de Funza determinó que los recursos aportados por el municipio en el marco del presente contrato específico serán desembolsados a los contratos derivados de obra e interventoría directamente de las cuentas propias de la administración, a fin de generar eficiencia en el manejo de los recursos, por lo anterior el cuadro “**Saldos en la Cuenta de manejo de Recursos**” reflejará solo los recursos aportados por ENTerritorio, a continuación se relaciona el manejo de recursos aportados por el municipio.

Manejo recursos aportados por el municipio:

CONCEPTO	DETALLE	junio-24
INGRESOS	RENDIMIENTOS TOTALES	
	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	0
	TOTAL INGRESOS	
EGRESOS	OBRA	
	INTERVENTORIA	

Proyectó **NOMBRE DEL FUNCIONARIO**
EDWIN DAZA SANABRIA

CARGO
PROFESIONAL UNIVERSITAR

FIRMA

FECHA
jun 2024



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



	DESCUENTOS	
	RTE FUENTE	
	OTROS	0
	TOTAL EGRESOS	

Balance General de la Contratación Derivada

Relacionar los contratos derivados que se celebraron por parte de la entidad ejecutora para dar cumplimiento al contrato específico.

Contrato de obra

Objeto del Contrato Derivado:	CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO PRIMERA ETAPA COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA.					
Número Contrato	CO1.PCCNTR.3952 242	Valor:	\$ 41.070.430.10	Plazo:	18 Meses	
Nombre del Contratista	CONSORCIO COLISEO 2022					
Fecha de firma del contrato	9/09/2022	Fecha de acta de inicio	23 DICIEMBRE 2022	Fecha de Terminación del contrato	22 JUNIO 2024	
PAGOS AL CONTRATO DERIVADO						
Concepto	Valor	Descuentos	Valor Neto	Amortización Anticipo	No. Comprobante de egreso	Fecha de pago
Anticipo	\$8.214.086.021,00	0	8.214.086.021,00	0	2023001743	13/05/2023
Acta Parcial No 1	1.493.965.591,00	192.721.612,00	1.002.450.860,80	298.793.118,20	2023002531	14/06/2023
Acta Parcial No 2	2,773,853,706.00	357.827.128,07	1.861.255.836,73	554.770.741,20	2023004506	31/08/2023
Acta Parcial No 3	2.640.716.479,00	340.652.425,79	1.771.920.757,41	528.143.295,80	2023006008	25/10/2023
Acta Parcial No 4	2.430.580.827,00	313.544.926,68	1.630.919.734,92	486.116.165,40	2023007458	12/12/2023
Acta Parcial No 5	2.908.084.466,00	375.142.896,11	1.951.324.676,69	581.616.893,20	2023008182	27/12/2023
Acta Parcial No 6	3.325.540.336,00	428.994.703,34	2.231.437.565,46	665.108.067,20	2024000685	03/05/2024
TOTAL						
Saldo Contrato	\$ 20.398.150.962,00					

Respecto a los ítems descritos en el cuadro se deben allegar los soportes que dicha información requiera, según aplique a cada uno de los pagos (orden de operación, orden de pago, comprobante de egreso y copia de la factura del tercero).

Relación de descuentos aplicados

De manera particular se deben relacionar los descuentos realizados por cada uno de los pagos realizados acuerdo al siguiente cuadro:

Concepto	Valor Bruto	Base	Valor Neto	Valor total de Tasas y/o estampillas (A)	Porcentaje Tasas y/o estampillas	Valor trasladado a cuentas del Muni	Fecha Traslado.	Saldo (A-B)
----------	-------------	------	------------	--	----------------------------------	-------------------------------------	-----------------	-------------

NOMBRE DEL FUNCIONARIO

Proyectó EDWIN DAZA SANABRIA

CARGO

PROFESIONAL UNIVERSITAR

FIRMA

FECHA

jun 2024



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



						pio (B)		
Anticipo								
Acta Parcial No 1	1.493.965.591,00	1.493.965.591,00		192.721.612,0	12.9%			192.721.612,0
Acta Parcial No 2	2,773,853,706.00	2,773,853,706.00		357.827.128,07	12.9%			357.827.128,07
Acta Parcial No 3	2.640.716.479,00	2.640.716.479,00		340.652.425,79	12.9%			340.652.425,79
Acta Parcial No 4	2.430.580.827,00	2.430.580.827,00		313.544.926,68	12.9%			313.544.926,68
Acta Parcial No 5	2.908.084.466,00	2.908.084.466,00		375.142.896,11	12.9%			375.142.896,11
Acta Parcial No 6	3.325.540.336,00	3.325.540.336,00		375.142.896,11	12.9%			428.994.703,34
TOTAL								

Adjuntar certificaciones de los descuentos realizados en la cual se debe señalar la base, el conento de descuento, porcentaje, valor de descuento. Conforme al saldo, se debe relacionar la certificación de las deducciones fueron trasladadas a las correspondientes cuentas del municipio.

Contrato de Interventoría

Objeto del Contrato Derivado:	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO PRIMERA ETAPA COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA					
Número Contrato	CO1.PCCNTR.4047655	Valor:	\$ 2.180.954.776	Plazo:	18 Meses	
Nombre del Contratista	CONSORCIO CONSTRUIR 2022					
Fecha de firma del contrato	3/10/2022	Fecha de acta de inicio	23/12/2022	Fecha de Terminación del contrato	22/06/2024	
PAGOS AL CONTRATO DERIVADO						
Concepto	Valor	Descuentos	Valor Neto	Amortización Anticipo	No. Comprobante de egreso	Fecha de pago
Anticipo						
Acta Parcial No 1						
Acta Parcial No 2						
Acta Parcial No 3						
Acta Parcial No 4						
TOTAL						
Saldo Contrato						

Respecto a los ítems descritos en el cuadro se deben allegar los soportes que dicha información requiera, según aplique a cada uno de los pagos (orden de operación, orden de pago, comprobante de egreso y copia de la factura del tercero).

Relación de descuentos aplicados

NOMBRE DEL FUNCIONARIO
Proyectó EDWIN DAZA SANABRIA

CARGO
PROFESIONAL UNIVERSITAR

FIRMA

FECHA
jun 2024



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



De manera particular se deben relacionar los descuentos realizados por cada uno de los pagos realizados acuerdo al siguiente cuadro:

Concepto	Valor Bruto	Base	Valor Neto	Valor total de Tasas y/o estampillas (A)	Porcentaje Tasas y/o estampillas	Valor trasladado a cuentas del Municipio (B)	Fecha Traslado.	Saldo (A-B)
Anticipo								
Acta Parcial No 1								
Acta Parcial No 2								
Acta Parcial No 3								
Acta Parcial No 4								
TOTAL								

Adjuntar certificaciones de los descuentos realizados en la cual se debe señalar la base, el conento de descuento, porcentaje, valor de descuento. Conforme al saldo, se debe relacionar la certificación de las deducciones fueron trasladadas a las correspondientes cuentas del municipio.

Balance Financiero Contrato Especifico

Conforme a los saldos generados en los capítulos anteriores, se debe realizar el balance general del Contrato específico señalando el valor adeudado por el Fondo Regional de Contratos Plan, el manejo del recursos frente a los valores adeudados a los contratos derivados, señalando el procesos para su pago, deducciones a ser realizadas, traslado de las mismas y liquidación de rendimientos financieros finales

Entidad	Detalle	Valor Pactado	Valor Consignado	Fecha de Consignación	Saldo
ENTERRITORIO					
	Transferencia 1	6.800.000.000	6.800.000.000	19/08/2022	0
	Transferencia 2	6.800.000.000	6.800.000.000	21/11/2023	0
	Transferencia 3	6.800.000.000	6.800.000.000	22/04/2024	0
	Transferencia 4	6.800.000.000	0	N/A	6.800.000.000
	Transferencia 5	3.400.000.000	0	N/A	3.400.000.000
	Transferencia 6	3.400.000.000	0	N/A	3.400.000.000
VALOR TOTAL GIRADO POR ENTERRITORIO		34.000.000.000	20.400.000.000	VALOR ADEUDADO POR ENTERRITORIO	13.600.000.000
ALCALDÍA DE FUNZA					
	Transferencia (Inter)	1.956.794.199			1.956.794.199
	Transferencia (obra)	2.735.638.505			
	Transferencia (obra)	4.334.791.602			0
	Transferencia (inter)	224.160.577			224.160.577

NOMBRE DEL FUNCIONARIO
Proyectó EDWIN DAZA SANABRIA

CARGO
PROFESIONAL UNIVERSITAR

FIRMA

FECHA
jun 2024



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



Entidad	Detalle	Valor Pactado	Valor Consignado	Fecha de Consignación	Saldo
	Transferencia 0 (anticipo obra)		1.414.086.021	13/04/2023	
	Transferencia 1 (corte 1 obra)		1.195.172.472,8	14/06/2023	0
	Transferencia 2 (corte 2 obra)		2.219.082.964,8	31/08/2023	0
	Transferencia 3 (corte 3 obra)		2.112.573.183,2	25/10/2023	0
	Transferencia 4 (corte 4 obra)		129.515.465,20	12/12/2023	0
VALOR TOTAL GIRADO POR ALCALDÍA DE FUNZA		9.251.384.883	\$7.070.430.107	VALOR ADEUDADO POR LA ALCALDÍA DE FUNZA	\$ 2.180.954.776
CONTRATOS DERIVADOS DEL CONTRATO ESPECIFICO					
CONTRATO DE OBRA					
	Anticipo	8.214.086.021	8.214.086.021	13/04/2023	0
	Acta Parcial No 1	1.493.965.591	1.195.172.472,8	14/06/2023	0
	Acta Parcial No 2	2.773.853.706,00	2.219.082.964,8	31/08/2023	0
	Acta Parcial No 3	2.640.716.479,00	2.112.573.183,2	25/10/2023	0
	Acta Parcial No 4	2.430.580.827,00	1.944.464.661,6	12/12/2023	0
	Acta Parcial No 5	2.908.084.466,00	2.326.467.572,8	27/12/2023	0
	Acta Parcial No 6	3.325.540.336,00	2.660.432.268,8	03/05/2024	0
VALOR PAGADO		20.672.279.145,0		VALOR ADEUDADO	20.398.150.962,00
CONTRATO INTERVENTORÍA					
	Anticipo	0	0	N/A	
	Acta Parcial No 1				
	Acta Parcial No 2				
VALOR PAGADO		0	0	VALOR ADEUDADO	2.180.954.776

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

➤ CONTRATO DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO PRIMERA ETAPA COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA	\$ 2.180.954.776
Nombre contratista	CONSORCIO CONSTRUIR 2022	
Fecha Firma del contrato	3/10/2022	
Plazo contrato	18 MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	23/12/2022	

NOMBRE DEL FUNCIONARIO
Proyectó EDWIN DAZA SANABRIA

CARGO
PROFESIONAL UNIVERSITAR

FIRMA

FECHA
jun 2024



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



		Suspensión No1 Un (1) mes desde 17/06/2024 a 17/07/2024				
Fecha Adición, Otrosí, Suspensión, Reinicio No.						
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)		22/07/2024				
	CONCEPTO	% REQ UERIDO	% a pagar	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO
	ANTICIPO			0		
	PRIMER PAGO					
	SEGUNDO PAGO					
	PAGO CONTRA LIQUIDACION					
	VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				0	
	% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				0%	
PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS		
				FECHA INICIO	FECHA FINAL	
	11/10/2022	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	436.190.955,20	23/12/2022	23/12/2024	
		PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	218.095.477,60	23/12/2022	23/06/2027	
		CALIDAD DEL SERVICIO	436.190.955,20	23/12/2022	23/06/2029	
	ESTADO DEL CONTRATO		EJECUCION			

➤ **CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA.**

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
	CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO PRIMERA ETAPA COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA.	\$ 41.070.430.10
Nombre contratista	CONSORCIO COLISEO 2022	
Fecha Firma del contrato	9/09/2022	
Plazo contrato	18 MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	23/12/2022	
Fecha Adición, Otrosí, Suspensión, Reinicio No.	Suspensión No1 Un (1) mes desde 17/06/2024 a 17/07/2024	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	22/07/2024	

NOMBRE DEL FUNCIONARIO
Proyectó EDWIN DAZA SANABRIA

CARGO
PROFESIONAL UNIVERSITAR

FIRMA

FECHA
jun 2024



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

	CONCEPTO	% REQUERIDO	% a pagar	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO
	ANTICIPO	20	20	8.214.086.021,00	2023001743	13/04/2023
	PRIMER PAGO	2.91	2.91	1.195.172.472,8	2023002531	14/06/2023
	SEGUNDO PAGO	5.40	5.40	2.219.082.964,8	2023004506	31/08/2023
	TERCER PAGO	5.14	5.14	2.112.573.183,2	2023006008	25/10/2023
	CUARTO PAGO	4.73	4.73	1.944.464.661,6	2023007458	12/12/2023
	QUINTO PAGO	5.66	5.66	2.326.467.572,8	2023008182	27/12/2023
	SEXTO PAGO	6.48	6.48	2.660.432.268,8	2024000685	03/05/2024
	PAGO CONTRA LIQUIDACION	10	10			
	VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA (LUEGO DE AMORTIZACION)					20.672.279.145,00
	% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS					50,33%
PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS		
				FECHA INICIO	FECHA FINAL	
400043455 400043828	14 / 3 / 2023	PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	2.054.365.242,30	23 / 12 / 2022	23 / 6 / 2024	
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	8.217.460.969.20	23 / 12 / 2022	23/06/2025	
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	4.108.730.484.60	23 / 12 / 2022	23/06/2027	
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	8.217.460.969.20	23 / 12 / 2022	23/12/2024	
		ESTABILIDAD DE LA OBRA	12.326.191.453.80	23 / 12 / 2022	23/06/2029	
		CALIDAD Y CORRECTO	4.108.730.484.60	12/07/2024	12/07/2026	

NOMBRE DEL FUNCIONARIO

Proyectó EDWIN DAZA SANABRIA

CARGO

PROFESIONAL UNIVERSITAR

FIRMA

FECHA

jun 2024



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



		FUNCIONAM IENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRA DOS			
	% AVANCE FISICO EJECUCTADO	62.03%			
	% AVANCE PROGRAMADO	89.43%			
	ESTADO DEL CONTRATO		EJECUCION		

• **INFORME DEL SUPERVISOR:**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFICO:

El informe de supervisión se realiza con fundamento en los informes presentados por parte de los contratistas que ejecutan el proyecto por parte de la entidad y el informe de interventoría que se encuentra debidamente aprobado por parte del supervisor de este contrato y que se relaciona como anexo de este documento.

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Contrato firmado el 03 de octubre 2022.

Pólizas expedidas el 30/09/2022.

Pólizas aprobadas el 14/10/2022.

Firma de acta de inicio 23/12/2022

Suspensión No1 Un (1) mes desde 17/06/2024 a 17/07/2024

El CONSORCIO CONTRUIR 2022 garantiza la participación de las partes interesadas del proyecto mediante la realización de reuniones y comités de obra semanales.

NUMERO DE COMITÉ	FECHA DE REALIZACIÓN
ACTA DE COMITÉ NO. 73	06-06-2024
ACTA DE COMITÉ NO. 74	13-06-2024

La interventoría realiza inventario de proveedores con los que se realizaron las diferentes adquisiciones anteriormente mencionadas:

• **GRUPO ARGOS**

NOMBRE DEL FUNCIONARIO
Proyectó EDWIN DAZA SANABRIA

CARGO
PROFESIONAL UNIVERSITAR

FIRMA

FECHA
jun 2024



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



- TREMIX DE COLOMBIA SA
- GASEOSAS LUX
- AGROCONSTRUCCIONES
- FERREELECTRICOS SA
- MADEMARIN
- AGREGADOS MONTANEL SAS
- RYR INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA
- AGREGADOS Y RELLENOS TERRENA SAS- ESP

La interventoría realiza el control del trabajo y actividades del proyecto, verificando el desempeño y avance del proyecto llevando las siguientes actividades:

- En taller se cuenta con una fabricación del 96,0%
- Montaje de eje 6, incluida lucarna
- Montaje de columnas y cercha eje 5
- Culminación de fundida de graderías 100%
- Excavación y relleno de cimentación cuartos técnicos
- Fundida de escaleras suroccidental
- Fundida de escaleras noroccidental
- Armado de escaleras nororiental
- Mampostería y Red de suministro tribuna Norte

Se evidencia que el CONSORCIO COLISEO 2022 mediante programación de obra inicial, presenta ATRASO con los tiempos estipulados contractualmente presentando un desequilibrio del 27,4% en ejecución y proyección.

Se evidencia que, durante el periodo en mención, se realizaron las actividades de control y aseguramiento de calidad prevista en el plan de inspección y ensayos y se aplicaron los procedimientos del plan de calidad del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el informe de calidad del periodo:

- Avance Financiero
- Seguimiento a la Programación de Obra
- (Avance físico)
- Mejora Continua
- Atención de Quejas y Reclamos
- Inspección en recibo de materiales e insumos
- Inspección en actividades de obra
- Ensayo de materiales

Proyectó **NOMBRE DEL FUNCIONARIO**
EDWIN DAZA SANABRIA

CARGO
PROFESIONAL UNIVERSITAR

FIRMA

FECHA
jun 2024



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



- Procedimiento de acciones correctivas
- Procedimiento para la ejecución de la obra
- Procedimiento gestión de personal
- Procedimiento de compras
- Responsabilidades gerenciales y provisión de recursos
- Indicadores de procesos
- Plan de mejoramiento de procesos

CONTRATO DE OBRA:

Firma de contrato el 09 septiembre 2022.

Pólizas aprobadas el 15 noviembre 2022.

Firma de acta de inicio 23/12/2022.

Suspensión No1 Un (1) mes desde 17/06/2024 a 17/07/2024

Para el presente periodo y durante el desarrollo del proyecto el CONSORCIO COLISEO 2022, se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Fabricación de estructura metálica En taller se cuenta con una fabricación del 96,0%, aproximadamente.
- ✓ Montaje de estructura: Montaje de eje 6, incluida lucarna,
- ✓ Montaje de columnas y cercha eje 5.
- ✓ Culminación de fundida de graderías.
- ✓ Excavación y relleno de cimentación cuartos técnicos
- Fundida de escaleras suroccidental
- ✓ Fundida de escaleras noroccidental
- ✓ Armado de escaleras nororiental
- ✓ Inicio mampostería tribuna Norte.
- ✓ Red de suministro tribuna Norte.



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

NOMBRE DEL FUNCIONARIO

Proyectó EDWIN DAZA SANABRIA

CARGO

PROFESIONAL UNIVERSITAR

FIRMA

FECHA

jun 2024



ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05



Fundida gradería norte



Instalación tubería filtros

NOMBRE DEL FUNCIONARIO
Proyectó EDWIN DAZA SANABRIA

CARGO
PROFESIONAL UNIVERSITAR

FIRMA

FECHA
jun 2024



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05



Fundida escalera suroriental

Proyectó **NOMBRE DEL FUNCIONARIO**
EDWIN DAZA SANABRIA

CARGO
PROFESIONAL UNIVERSITAR

FIRMA

FECHA
jun 2024



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750




ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05



Rellenos cimentación cuartos técnicos

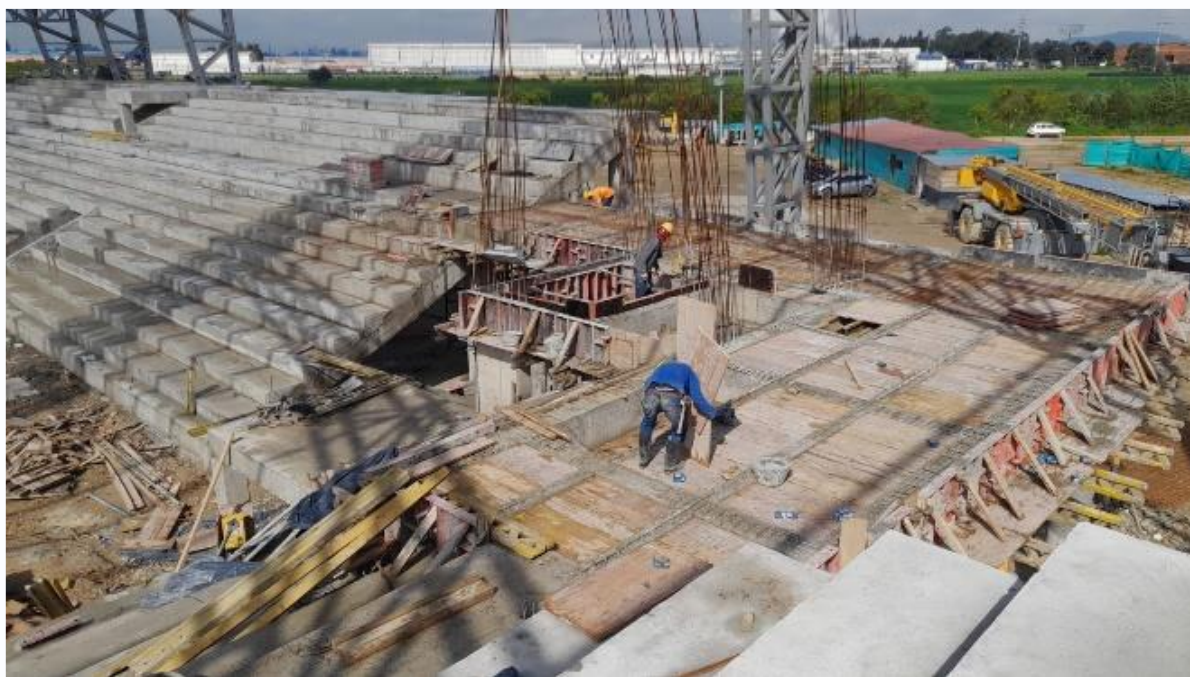

Armado placa escalera Noroccidental

NOMBRE DEL FUNCIONARIO
Proyectó EDWIN DAZA SANABRIA

CARGO
PROFESIONAL UNIVERSITAR

FIRMA

FECHA
jun 2024



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05



Montaje columnas y cercha eje 6



Mampostería gradería Oriental

NOMBRE DEL FUNCIONARIO
Proyectó EDWIN DAZA SANABRIA

CARGO
PROFESIONAL UNIVERSITAR

FIRMA

FECHA
jun 2024



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



CONCLUSIONES DEL PRESENTE INFORME:

14 de junio se radica informe mensual del mes de mayo.

Se evidencia un retraso en la programación cercano al 27,4%.

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 mayo de 2024, se realizaron se llevaron a cabo actividades como: Fabricación de estructura metálica. En taller se cuenta con una fabricación del 96,0%, aproximadamente, montaje de estructura: se realizó el montaje columnas eje, cercha eje 6, se completa la fundición de graderías.

Luego de realizar el balance parte de la interventoría se evidencian los avances por periodo.

AVANCE DE OBRA						
PERIODO	PROGRAMADO EN EL PERÍODO (ACUMULADO)		EJECUTADO EN EL PERÍODO		EJECUTADO ACUMULADO	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
23/12/2023 - 28/02/2023	\$ 20.778.810,55	0,05%	\$ 698.947.203,50	1,70%	\$ 698.947.203,50	1,70%
01/03/2023 - 31/03/2023	\$ 145.999.069,84	0,36%	\$ 710.096.239,06	1,73%	\$ 1.409.043.442,56	3,43%
01/04/2023 - 30/04/2023	\$ 470.294.714,99	1,15%	\$ 84.922.149,63	0,21%	\$ 1.493.965.592,19	3,64%
01/05/2023 - 31/05/2023	\$ 1.511.741.320,40	3,68%	\$ 208.760.341,14	0,51%	\$ 1.702.725.933,33	4,15%
01/06/2023 - 30/06/2023	\$ 3.080.856.252,11	7,50%	\$ 946.238.503,67	2,30%	\$ 2.648.964.437,00	6,45%
30/06/2023 - 31/07/2023	\$ 5.026.901.536,04	12,24%	\$ 2.941.052.677,00	0,51%	\$ 5.590.017.114,00	13,61%
01/08/2023 - 30/08/2023	\$ 6.491.169.806,34	15,80%	\$ 2.767.815.413,00	6,74%	\$ 8.357.832.527,00	20,35%
01/09/2023 - 30/09/2023	\$ 8.073.471.703,54	19,66%	\$ 1.322.536.783,00	3,22%	\$ 9.680.369.310,00	23,57%
01/10/2023 - 31/10/2023	\$ 10.477.594.439,73	25,51%	\$ 1.324.771.316,00	3,23%	\$ 11.005.140.626,00	26,80%
01/11/2023 - 30/11/2023	\$ 15.040.281.332,21	36,62%	\$ 3.531.586.350,00	8,60%	\$ 14.536.726.976,00	35,39%
01/12/2023 - 31/12/2023	\$ 21.299.419.997,04	51,86%	\$ 1.686.666.386,00	4,11%	\$ 16.223.393.362,00	39,50%
REPROGRAMACION						
01/01/2024 - 31/01/2024	\$ 19.865.941.082,24	48,37%	\$ 2.625.096.795,00	6,39%	\$ 18.848.490.157,00	45,89%
01/02/2024 - 29/02/2024	\$ 22.387.199.977,92	54,51%	\$ 1.943.314.785,59	4,73%	\$ 20.791.804.942,59	50,62%
01/03/2024 - 31/03/2024	\$ 25.715.161.719,82	62,61%	\$ 1.527.220.327,55	3,72%	\$ 22.319.025.270,14	54,34%
REPROGRAMACION 2						
01/04/2024 - 30/04/2024	\$ 25.773.228.501,75	62,75%	\$ 1.427.648.323,79	3,48%	\$ 23.746.673.593,93	57,82%
01/05/2024 - 31/05/2024	\$ 34.737.369.784,50	84,58%	\$ 1.343.003.064,50	3,27%	\$ 25.089.925.752,37	61,09%
01/06/2024 - 30/06/2024	\$ 39.012.801.558,64	94,99%	\$ 386.062.043,01	0,94%	\$ 25.475.987.795,37	62,03%

NOMBRE DEL FUNCIONARIO

Proyectó EDWIN DAZA SANABRIA

CARGO

PROFESIONAL UNIVERSITAR

FIRMA

FECHA

jun 2024



SC-CER116470



SA-CER753750




ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



Se evidencia presentación y aprobación de programación V4 como parte de la contingencia de atraso reportado.

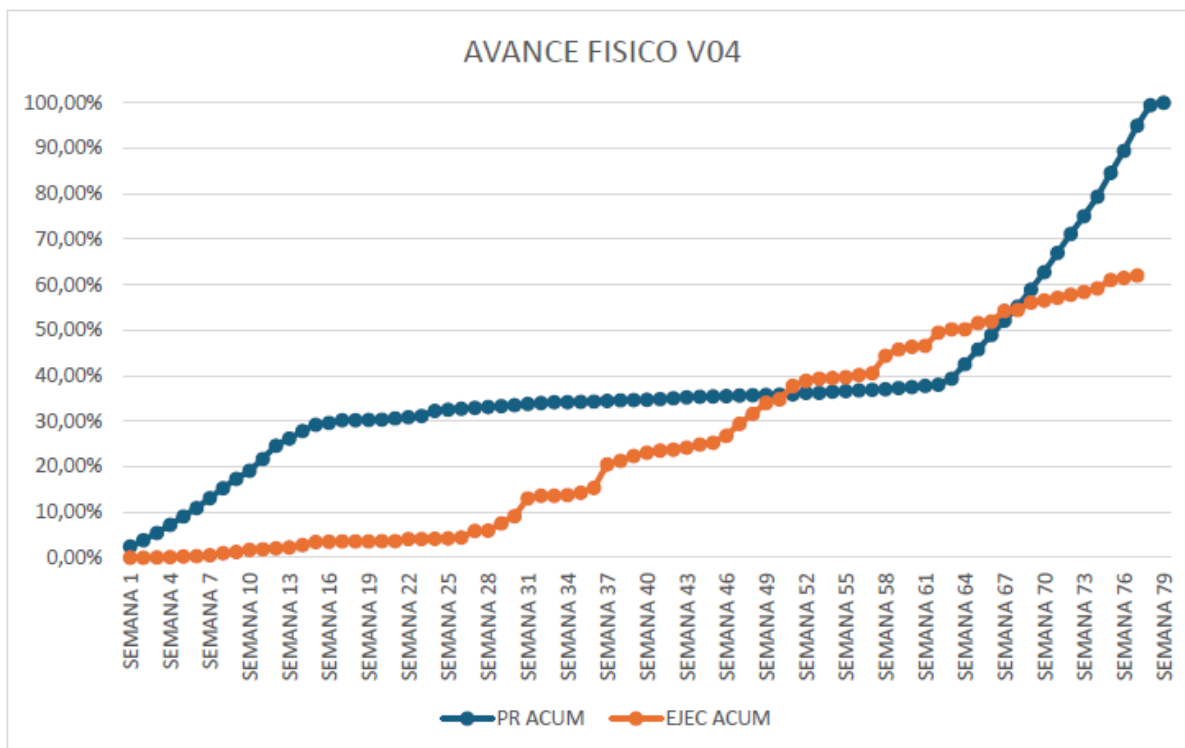

En el período se han realizado las actividades que representan el siguiente avance acumulado en la programación:

PRESUPUESTO CONTRACTUAL					ACUMULADO
ARTÍCULO	DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNITARIO	FASE	% JUNIO
1.1.1	Descapote mecánico e. 20 incluye cargue y retiro	M2	\$ 1.678,00	PROGRAMADO	129,21%
				EJECUTADO	104,33%
1.1.2	Cerca en tela verde h= 2.10 m	ML	\$ 25.028,00	PROGRAMADO	18,84%
				EJECUTADO	18,84%
1.1.3	Campo 18 m2	UN	\$ 2.394.821,00	PROGRAMADO	100,00%
				EJECUTADO	100,00%
1.1.4	Red hidráulica provisional	UN	\$ 3.105.900,00	PROGRAMADO	100,00%
				EJECUTADO	0,00%
1.1.5	Red telefónica provisional	UN	\$ 281.677,00	PROGRAMADO	100,00%
				EJECUTADO	100,00%
1.1.6	Unidades Sanitarias campamento	UN	\$ 1.260.780,00	PROGRAMADO	50,00%
				EJECUTADO	50,00%
1.2.1	Localización y replanteo de cimientos con elementos de precisión	M2	\$ 11.419,00	PROGRAMADO	233,73%
				EJECUTADO	98,81%
2.1.1	Excavación a máquina sin clasificar coliseo (reemplazo por base granular)	m³	\$ 19.375,00	PROGRAMADO	20,69%
				EJECUTADO	76,64%
2.1.2	Excavación a máquina sin clasificar cimentación	m³	\$ 19.375,00	PROGRAMADO	453,77%
				EJECUTADO	584,71%
2.1.3	Excavación manual en material común para zapatas graderías (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor a 5 km)	m³	\$ 54.118,00	PROGRAMADO	116,84%

NOMBRE DEL FUNCIONARIO

Proyectó EDWIN DAZA SANABRIA

CARGO

PROFESIONAL UNIVERSITAR

FIRMA

FECHA

jun 2024



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



ALCALDÍA DE FUNZA

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

				EJECUTADO	0,00%
2.1.4	Excavación manual en material común para vigas de amarre (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor a 5 km)	m³	\$ 54.118,00	PROGRAMADO	51,06%
2.1.5	Prehucos para pilotes H=30 cms	UN	\$ 23.419,00	PROGRAMADO	67,50%
				EJECUTADO	67,50%
2.1.6	Excavación a máquina sin clasificar para tanque	m³	\$ 19.375,00	PROGRAMADO	2129,08%
				EJECUTADO	2064,56%
2.1.10	Relleno en recebo común compactado mecánicamente para tanque	m³	\$ 70.398,00	PROGRAMADO	100,48%
				EJECUTADO	148,99%
2.1.13	Relleno con material del sitio compactado mecánicamente terreno	m³	\$ 23.100,00	PROGRAMADO	100,00%
2.2.1	Concreto de limpieza pobre 1500 psi	m³	\$ 391.822,00	PROGRAMADO	66,28%
				EJECUTADO	62,77%
2.2.2	Pilote preexcavado D=60 CM (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	ML	\$ 399.916,00	PROGRAMADO	100,00%
				EJECUTADO	100,52%
2.2.4	Pedestales en concreto 4000 PSI	m³	\$ 781.186,00	PROGRAMADO	45,46%
				EJECUTADO	43,76%
2.2.7	Columnas en concreto de 4000 psi, graderías	m³	\$ 1.004.327,00	PROGRAMADO	117,49%
				EJECUTADO	81,36%
2.2.8	Placa de contrapiso de 12 cm en concreto de 3000 psi - Incluye corte y dilatación	M2	\$ 93.025,00	PROGRAMADO	85,60%
				EJECUTADO	33,77%
2.2.9	Entrepiso casetón con vigas 3500 PSI, H=0.40 M (sin refuerzo)	M2	\$ 187.472,00	PROGRAMADO	102,80%
				EJECUTADO	28,43%
2.2.10	Viga aérea en concreto de 4000 psi, graderías	m³	\$ 1.363.833,00	PROGRAMADO	262,95%
				EJECUTADO	226,81%
2.2.12	Concreto para gradas coliseo 4000 psi	m³	\$ 1.576.332,00	PROGRAMADO	525,68%
				EJECUTADO	521,16%
2.2.14	Acero figurado de 60000 psi - pilotes	KG	\$ 8.260,00	PROGRAMADO	100,00%
				EJECUTADO	100,00%
2.2.15	Acero figurado de 60000 psi - zapatas	KG	\$ 8.260,00	PROGRAMADO	95,25%
				EJECUTADO	99,87%
2.2.16	Acero figurado de 60000 psi - dados	KG	\$ 8.260,00	PROGRAMADO	87,21%
				EJECUTADO	87,26%
2.2.17	Acero figurado de 60000 psi - pedestales	KG	\$ 8.260,00	PROGRAMADO	75,12%
				EJECUTADO	74,06%
2.2.18	Acero figurado de 60000 psi - vigas de amarre	KG	\$ 8.260,00	PROGRAMADO	81,96%

NOMBRE DEL FUNCIONARIO

Proyectó EDWIN DAZA SANABRIA

CARGO

PROFESIONAL UNIVERSITAR

FIRMA

FECHA

jun 2024



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



				EJECUTADO	84,25%
2.2.19	Acero figurado de 60000 psi - placa de contrapiso malla M-188	KG	\$ 10.412,00	PROGRAMADO	88,64%
				EJECUTADO	85,00%
2.2.21	Acero figurado de 60000 psi - columnas	KG	\$ 8.260,00	PROGRAMADO	185,30%
				EJECUTADO	173,65%
2.2.22	Acero figurado de 60000 psi - vigas aéreas	KG	\$ 8.260,00	PROGRAMADO	534,02%
				EJECUTADO	618,57%
2.2.23	Acero figurado de 60000 psi - escalera	KG	\$ 8.260,00	PROGRAMADO	3632,29%
2.2.25	Estructura en acero estructural, incluye cerchas, correas, contravientos, tensores, anclajes, tornillería, antirrocorsivo, pintura, soldadura y platinas. contemplo fabricación suministro y Montaje	KG	\$ 17.669,00	PROGRAMADO	85,42%
				EJECUTADO	90,93%
2.2.29	Demolición cabeza de pilotes	m³	\$ 361.684,00	PROGRAMADO	39,01%
				EJECUTADO	39,01%
3.1.1	Alfajía en concreto 2500 PSI E=0,25	ML	\$ 65.262,00	PROGRAMADO	24,48%
				EJECUTADO	0,00%
3.1.2	Dinteles en concreto 2.500 PSI .15x.20	ML	\$ 63.024,00	PROGRAMADO	213,82%
				EJECUTADO	0,00%
3.1.3	Muro en bloque No. 5 e=0,12 cms	M2	\$ 48.427,00	PROGRAMADO	8,31%
				EJECUTADO	4,56%
3.1.4	Muro en bloque No. 5 e=0,12 cms	ML	\$ 29.732,00	PROGRAMADO	36,28%
				EJECUTADO	0,00%
3.1.5	Anclaje 3/8" x 8" incluye acero	UN	\$ 18.622,00	PROGRAMADO	70,94%
				EJECUTADO	239,22%
3.1.7	Columnetas de confinamiento 20 x 10 cms concreto 3000 psi	ML	\$ 43.836,00	PROGRAMADO	35,34%
				EJECUTADO	0,00%
4.2.3	Relleno tipo 6 "rajón-piedra"	m³	\$ 82.105,00	PROGRAMADO	101,30%
				EJECUTADO	101,30%
6.2.1	Suministro e instalacion de fachada doble altura entre vanos SISTEMA STICK, con verticales estructurales ocultos de 220 mm x 50 mm (FRX-080), rejilla de ventilacion de 1 mt de altura, perf	M2	\$ 850.194,00	PROGRAMADO	19,17%
				EJECUTADO	0,00%
8.1.7	Pintura para tubería red de incendios con diámetro de hasta 2"	ML	\$ 4.648,00	PROGRAMADO	97,03%
				EJECUTADO	0,00%
8.1.8	Pintura para tubería red de incendios con diámetro mayor a 2"	ML	\$ 7.307,00	PROGRAMADO	73,64%

NOMBRE DEL FUNCIONARIO

Proyectó EDWIN DAZA SANABRIA

CARGO

PROFESIONAL UNIVERSITAR

FIRMA

FECHA

jun 2024



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



				EJECUTADO	0,00%
8.1.19	Reducción 21/2 -1"	UND	\$ 19.395,00	PROGRAMADO	100,00%
				EJECUTADO	0,00%
8.1.20	Derivación strap 2-1/2"	UND	\$ 20.180,00	PROGRAMADO	85,85%
				EJECUTADO	0,00%
8.1.21	Derivación strap 2 1/2-1/2"	UND	\$ 19.616,00	PROGRAMADO	53,06%
				EJECUTADO	0,00%
8.1.22	Desinfección	UND	\$ 517.545,00	PROGRAMADO	100,00%
				EJECUTADO	0,00%
8.1.23	Extintor de polvo químico ABC, capacidad 10 lb	UND	\$ 65.178,00	PROGRAMADO	100,00%
				EJECUTADO	0,00%
8.2.1	Excavación manual en material común h=0.0-2.0 m (incluyendo retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	\$ 54.118,00	PROGRAMADO	104,34%
				EJECUTADO	0,00%
8.2.2	Relleno con material del sitio compactado mecánicamente	M3	\$ 23.100,00	PROGRAMADO	105,13%
				EJECUTADO	0,00%
8.2.3	Relleno en recebo común compactado mecánicamente	M3	\$ 70.398,00	PROGRAMADO	100,95%
				EJECUTADO	0,00%
8.2.4	Red suministro PVC 3/4" RDE 13.5 (Incluye accesorios)	ML	\$ 12.225,00	PROGRAMADO	919,50%
				EJECUTADO	0,00%
8.2.5	Red suministro PVC 1/2" RDE 9 (Incluye accesorios)	ML	\$ 9.870,00	PROGRAMADO	72,91%
				EJECUTADO	0,00%
8.2.6	Red suministro PVC 1" RDE 21 (Incluye accesorios)	ML	\$ 16.201,00	PROGRAMADO	156,55%
				EJECUTADO	0,00%
8.2.7	Red suministro PVC 1 1/4" RDE 21 (Incluye accesorios)	ML	\$ 19.809,00	PROGRAMADO	164,39%
				EJECUTADO	0,00%
8.2.8	Red suministro PVC 1 1/2" RDE 21 (Incluye accesorios)	ML	\$ 25.372,00	PROGRAMADO	98,47%
				EJECUTADO	0,00%
8.2.9	Red suministro PVC 2" RDE 21 (Incluye accesorios)	ML	\$ 36.363,00	PROGRAMADO	217,75%
				EJECUTADO	0,00%
8.2.10	Red suministro PVC 2 1/2" RDE 21 (Incluye accesorios)	ML	\$ 56.254,00	PROGRAMADO	57,61%
				EJECUTADO	0,00%
8.2.11	Red suministro PVC 3" RDE 21 (Incluye accesorios)	ML	\$ 73.275,00	PROGRAMADO	13,19%
				EJECUTADO	0,00%
8.2.12	Red suministro PVC 4" RDE 21 (Incluye accesorios)	ML	\$ 130.851,00	PROGRAMADO	37,08%

NOMBRE DEL FUNCIONARIO

Proyectó EDWIN DAZA SANABRIA

CARGO

PROFESIONAL UNIVERSITAR

FIRMA

FECHA

jun 2024



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

				EJECUTADO	0,00%
8.2.13	Registro 4"	UND	\$ 898.222,00	PROGRAMADO	1846,17%
				EJECUTADO	0,00%
8.2.14	Punto hidráulico pvc- 1/2" paral	UND	\$ 76.046,00	PROGRAMADO	25,97%
				EJECUTADO	0,00%
8.2.15	Punto agua caliente cpvc	UND	\$ 99.992,00	PROGRAMADO	188,62%
				EJECUTADO	0,00%
8.2.16	Spirit electrónica 110v-127v	UND	\$ 188.604,00	PROGRAMADO	68,60%
				EJECUTADO	0,00%
8.2.17	Desinfección	UND	\$ 517.545,00	PROGRAMADO	176,83%
				EJECUTADO	0,00%
8.2.18	Llave de corte especial 4"	UND	\$ 1.372.729,00	PROGRAMADO	122,39%
				EJECUTADO	0,00%
8.2.19	Válvula cheque 4"	UND	\$ 1.680.129,00	PROGRAMADO	14,59%
				EJECUTADO	0,00%
8.2.20	Camiseta 1"	UND	\$ 15.319,00	PROGRAMADO	414,21%
				EJECUTADO	0,00%
8.2.21	T 1 1/4"	Y	\$ 21.151,00	PROGRAMADO	154,13%
				EJECUTADO	0,00%
8.2.22	T 1 1/2"	UND	\$ 25.809,00	PROGRAMADO	1641,24%
				EJECUTADO	0,00%
8.2.23	Camiseta 2"	UND	\$ 35.299,00	PROGRAMADO	367,14%
				EJECUTADO	0,00%
8.2.24	T 2 1/2"	UND	\$ 51.838,00	PROGRAMADO	57,36%
				EJECUTADO	0,00%
8.2.25	Camiseta 3"	UND	\$ 74.341,00	PROGRAMADO	13,79%
				EJECUTADO	0,00%
8.2.26	Camiseta 4"	UND	\$ 143.494,00	PROGRAMADO	0,00%
				EJECUTADO	0,00%
8.2.27	Reducción 4"-1 1/4"	Y	\$ 62.299,00	PROGRAMADO	45,84%
				EJECUTADO	0,00%
8.2.28	Reducción 4"-3"	UND	\$ 57.115,00	PROGRAMADO	71,66%
				EJECUTADO	0,00%
8.2.29	Reducción 3"-1"	UND	\$ 40.927,00	PROGRAMADO	41,53%
				EJECUTADO	0,00%
8.2.30	Reducción 3"-1 1/4"	UND	\$ 42.491,00	PROGRAMADO	50,00%
				EJECUTADO	0,00%
8.2.31	Reducción 3"-1 1/2"	UND	\$ 42.491,00	PROGRAMADO	65,18%

NOMBRE DEL FUNCIONARIO

Proyectó EDWIN DAZA SANABRIA

CARGO

PROFESIONAL UNIVERSITAR

FIRMA

FECHA

jun 2024



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

				EJECUTADO	0,00%
8.2.32	Reducción 11/2"-1/2"	UND	\$ 18.464,00	PROGRAMADO	335,07%
				EJECUTADO	0,00%
8.2.33	Reducción 1"-1/2"	UND	\$ 15.467,00	PROGRAMADO	71,68%
				EJECUTADO	0,00%
8.2.34	Reducción 1 1/4"-3/4"	UND	\$ 16.630,00	PROGRAMADO	51,72%
				EJECUTADO	0,00%
8.2.35	Reducción 2 1/2"- 1 1/4"	UND	\$ 34.404,00	PROGRAMADO	256,59%
				EJECUTADO	0,00%
8.2.36	Reducción 1 1/4"-1/2"	UND	\$ 16.552,00	PROGRAMADO	106,85%
				EJECUTADO	0,00%
8.2.37	Reducción 1 1/4"-1"	UND	\$ 19.159,00	PROGRAMADO	121,46%
				EJECUTADO	0,00%
8.2.38	Reducción 1 1/2"-11/4"	UND	\$ 21.779,00	PROGRAMADO	31,59%
				EJECUTADO	0,00%
8.2.39	Reducción 2 1/2" - 1 1/2"	Y	\$ 34.398,00	PROGRAMADO	69,99%
				EJECUTADO	0,00%
8.2.40	Reducción 21/2" -2"	Y	\$ 36.111,00	PROGRAMADO	306,54%
				EJECUTADO	0,00%
8.2.41	Reducción 2" - 1 1/4"	Y	\$ 22.139,00	PROGRAMADO	70,98%
				EJECUTADO	0,00%
8.2.42	Reducción 2" - 1 1/2"	Y	\$ 23.571,00	PROGRAMADO	146,53%
				EJECUTADO	0,00%
8.2.43	Reducción 2 1/2"-1"	Y	\$ 34.539,00	PROGRAMADO	0,00%
				EJECUTADO	0,00%
8.2.44	Medidor 4"	Y	\$ 972.390,00	PROGRAMADO	0,00%
				EJECUTADO	0,00%
8.2.45	Punto hidráulico pvc- 1" paral	Y	\$ 90.833,00	PROGRAMADO	9,09%
				EJECUTADO	0,00%
8.2.46	Desinfección	Y	\$ 517.545,00	PROGRAMADO	200,00%
				EJECUTADO	0,00%
8.2.47	Registro 1 1/4" red white toyo	UND	\$ 171.986,00	PROGRAMADO	20632,47%
				EJECUTADO	0,00%
8.2.48	Tapa registro 20x20	UND	\$ 22.405,00	PROGRAMADO	10200,00%
				EJECUTADO	0,00%
8.2.49	Suministro equipo de presion de 7,5 hp , incluye tablero electrico de control , tanque hidroacumulador , valvulas y accesorios.	UND	\$ 14.473.947,00	PROGRAMADO	295,03%
				EJECUTADO	0,00%



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

NOMBRE DEL FUNCIONARIO
Proyectó EDWIN DAZA SANABRIA

CARGO
PROFESIONAL UNIVERSITAR

FIRMA

FECHA
jun 2024



8.2.50	Red suministro pvc 6" rde 21 (incluye accesorios)	ML	\$ 207.122,00	PROGRAMADO	98,33%
				EJECUTADO	0,00%
8.2.54	Llave manguera	UND	\$ 41.848,00	PROGRAMADO	700,00%
				EJECUTADO	0,00%
8.2.55	Escotilla en concreto reforzado	UND	\$ 124.043,00	PROGRAMADO	50,00%
8.3.1	Excavación manual en material común h=0.0-2.0 m (incluyendo retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	\$ 54.118,00	PROGRAMADO	107,90%
				EJECUTADO	14,54%
8.3.2	Relleno con material del sitio compactado mecánicamente	M3	\$ 23.100,00	PROGRAMADO	108,77%
				EJECUTADO	0,00%
8.3.3	Relleno en recebo común compactado mecánicamente	M3	\$ 70.398,00	PROGRAMADO	100,00%
				EJECUTADO	43,23%
8.3.4	Red sanitaria PVC-S Ø=2" (Incluye accesorios)	ML	\$ 29.888,00	PROGRAMADO	126,63%
				EJECUTADO	72,23%
8.3.5	Red sanitaria PVC-S Ø=3" (Incluye accesorios)	ML	\$ 41.149,00	PROGRAMADO	85,64%
				EJECUTADO	40,07%
8.3.6	Red sanitaria PVC-S Ø=4" (Incluye accesorios)	ML	\$ 55.781,00	PROGRAMADO	126,35%
				EJECUTADO	30,86%
8.3.7	Red sanitaria PVC-S Ø=6" (Incluye accesorios)	ML	\$ 101.782,00	PROGRAMADO	85,16%
				EJECUTADO	137,34%
8.3.8	Red sanitaria PVC-S Ø=8" (Incluye accesorios)	ML	\$ 133.300,00	PROGRAMADO	279,56%
				EJECUTADO	0,00%
8.3.9	Red ventilación 2"	ML	\$ 21.072,00	PROGRAMADO	150,20%
				EJECUTADO	21,26%
8.3.10	Bajante aguas residuales pvc 4"	ML	\$ 49.848,00	PROGRAMADO	493,04%
				EJECUTADO	0,00%
8.3.11	Salida sanitaria pvc-s/paral 2"	UND	\$ 81.780,00	PROGRAMADO	100,00%
				EJECUTADO	111,39%
8.3.12	Salida sanitaria pvc-s/sifon 2"	UND	\$ 63.860,00	PROGRAMADO	100,00%
				EJECUTADO	66,67%
8.3.13	Salida sanitaria pvc-s/sifon 3"	UND	\$ 86.836,00	PROGRAMADO	100,00%
				EJECUTADO	76,92%
8.3.14	Salida sanitaria pvc-s/sifon 4"	UND	\$ 111.826,00	PROGRAMADO	100,00%
				EJECUTADO	79,45%
8.3.15	Caja de inspección de 60 x 60	UND	\$ 308.264,00	PROGRAMADO	121,43%
				EJECUTADO	0,00%

NOMBRE DEL FUNCIONARIO

Proyectó EDWIN DAZA SANABRIA

CARGO

PROFESIONAL UNIVERSITAR

FIRMA

FECHA

jun 2024



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

8.3.16	Trampa de grasas 60 x 60	UND	\$ 315.716,00	PROGRAMADO	100,00%
				EJECUTADO	0,00%
8.3.17	Tapón de limpieza 2" (Incluye accesorios)	UND	\$ 27.612,00	PROGRAMADO	100,00%
				EJECUTADO	0,00%
8.3.18	Tapón de limpieza 3" (Incluye accesorios)	UND	\$ 41.317,00	PROGRAMADO	100,00%
				EJECUTADO	200,00%
8.3.19	Tapón de limpieza 4" (Incluye accesorios)	UND	\$ 56.565,00	PROGRAMADO	100,00%
				EJECUTADO	71,43%
8.3.20	Sí Ø=2"	UND	\$ 21.465,00	PROGRAMADO	307,50%
				EJECUTADO	165,00%
8.3.21	Sí Ø=3"	UND	\$ 31.480,00	PROGRAMADO	71,67%
				EJECUTADO	140,00%
8.3.22	Sí Ø=4"	UND	\$ 46.267,00	PROGRAMADO	205,26%
				EJECUTADO	135,09%
8.3.23	Rejilla sifón con sosco 4,5cm x3,5 cm	UND	\$ 26.279,00	PROGRAMADO	100,00%
				EJECUTADO	0,00%
8.3.24	Reducción 4"-2"	Y	\$ 46.711,00	PROGRAMADO	100,00%
				EJECUTADO	0,00%
8.3.25	Reducción 4"-3"	Y	\$ 48.150,00	PROGRAMADO	100,00%
				EJECUTADO	22,22%
8.3.26	Reducción 3"-2"	Y	\$ 26.468,00	PROGRAMADO	100,00%
				EJECUTADO	0,00%
8.3.27	Válvula anti roedores 4"	Y	\$ 78.689,00	PROGRAMADO	100,00%
				EJECUTADO	0,00%
8.3.28	Marco tapa caja de inspección	Y	\$ 212.016,00	PROGRAMADO	100,00%
				EJECUTADO	0,00%
8.3.29	Caja de inspección tapón de limpieza	UND	\$ 157.977,00	PROGRAMADO	100,00%
				EJECUTADO	0,00%
8.3.30	Caja de inspección de 70 x 70	UND	\$ 398.563,00	PROGRAMADO	1150,00%
				EJECUTADO	550,00%
8.3.31	Suministro e instalación canaleta sección 0.2x0.2 incluye rejilla	ML	\$ 151.343,00	PROGRAMADO	200,00%
				EJECUTADO	0,00%
8.4.1	Excavación manual en material común h=0.0-2.0 m (incluyendo retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	\$ 54.118,00	PROGRAMADO	417,86%
				EJECUTADO	19,88%
8.4.2	Relleno con material del sitio compactado mecánicamente	M3	\$ 23.100,00	PROGRAMADO	540,09%

NOMBRE DEL FUNCIONARIO

Proyectó EDWIN DAZA SANABRIA

CARGO

PROFESIONAL UNIVERSITAR

FIRMA

FECHA

jun 2024



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



				EJECUTADO	0,00%
8.4.3	Relleno en recebo comun compactado mecánicamente	M3	\$ 70.398,00	PROGRAMADO	476,82%
				EJECUTADO	61,82%
8.4.5	Tubería pvc alcantarillado 6" (incluye uniones)	ML	\$ 145.198,00	PROGRAMADO	109,30%
				EJECUTADO	5,57%
8.4.6	Tubería pvc alcantarillado 8" (incluye uniones)	ML	\$ 147.935,00	PROGRAMADO	126,22%
				EJECUTADO	23,77%
8.4.7	Caja de inspección 70 x 70	Y	\$ 398.563,00	PROGRAMADO	100,00%
8.4.8	Cilindro pozo en ladrillo tolete, di=1.20m, e=0.25m (inc. Pañete interno e =1.5cm y cañuela)	Y	\$ 765.536,00	PROGRAMADO	300,00%
				EJECUTADO	0,00%
8.4.9	Placa de fondo pozo d=1.7m, e=0.25m (concreto 3000 psi con refuerzo).	Y	\$ 1.000.198,00	PROGRAMADO	300,00%
				EJECUTADO	0,00%
8.4.10	Cubierta pozo d=1.7m, e=0.20m concreto 3000psi con refuerzo (incluye aro y tapa hf)	Y	\$ 924.457,00	PROGRAMADO	300,00%
				EJECUTADO	0,00%
8.4.11	Rejilla granada 6"	Y	\$ 32.816,00	PROGRAMADO	120,00%
				EJECUTADO	0,00%
8.4.13	Marco tapa caja de inspección	Y	\$ 212.016,00	PROGRAMADO	106,67%
				EJECUTADO	0,00%
8.4.14	Wash-primer sobre aluminio	M2	\$ 25.723,00	PROGRAMADO	100,00%
				EJECUTADO	0,00%
8.4.17	Caja de inspección 60 x 60	Y	\$ 308.264,00	PROGRAMADO	200,00%
				EJECUTADO	0,00%
9.1.1	Estructura de derivación en poste existente.	un	\$ 1.999.236,00	PROGRAMADO	0,00%
				EJECUTADO	100,00%
9.1.2	Transformador de 112,5 KVA para provisional	un	\$ 9.720.833,00	PROGRAMADO	0,00%
				EJECUTADO	100,00%
9.1.3	Estructura de protecciones para transformador en poste	un	\$ 3.034.677,00	PROGRAMADO	0,00%
				EJECUTADO	100,00%
9.1.4	Puesta a tierra para transformador en poste.	un	\$ 1.007.799,00	PROGRAMADO	0,00%
				EJECUTADO	100,00%
9.1.6	Suministro, plomada e Incada de poste de concreto de 12m, 750 kg.	un	\$ 1.190.743,00	PROGRAMADO	0,00%
				EJECUTADO	50,00%
9.1.7	Armario con grupo de medida para baja tensión	un	\$ 7.843.918,00	PROGRAMADO	0,00%
				EJECUTADO	100,00%

NOMBRE DEL FUNCIONARIO

Proyectó EDWIN DAZA SANABRIA

CARGO

PROFESIONAL UNIVERSITAR

FIRMA

FECHA

jun 2024



SC-CER116470



SA-CER753753



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



9.1.9	Estructura de paso en poste	un	\$ 1.203.275,00	PROGRAMADO	0,00%
				EJECUTADO	100,00%
9.1.10	Tableros móviles certificados, con extensiones.	un	\$ 2.555.687,00	PROGRAMADO	0,00%
				EJECUTADO	55,56%
9.1.11	Tablero general de distribución, para red provisional.	un	\$ 1.606.380,00	PROGRAMADO	0,00%
				EJECUTADO	100,00%
9.1.13	Red Eléctrica provisional L:50m	un	\$ 3.022.642,00	PROGRAMADO	0,00%
				EJECUTADO	50,00%
9.2.44	Canalización en 4ø4" PVC por andén.	Ml	\$ 160.696,00	PROGRAMADO	0,00%
				EJECUTADO	60,41%
9.2.50	Canalización en 2ø1" PVC por zona verde.	Ml	\$ 55.199,00	PROGRAMADO	0,00%
				EJECUTADO	794,92%
9.2.52	Canalización en 2ø2" PVC por andén.	Ml	\$ 88.968,00	PROGRAMADO	0,00%
				EJECUTADO	811,27%
9.2.53	Canalización en 2ø1.1/2" PVC por andén.	Ml	\$ 82.430,00	PROGRAMADO	0,00%
				EJECUTADO	3274,76%
9.7.9	Suministro e instalación de tubería PVC de ø 3/4"	Ml	\$ 5.385,00	PROGRAMADO	0,00%
				EJECUTADO	2995,29%
	Relleno en recebo común compactado mecánicamente para tanque	M2	\$ 71.719,00	PROGRAMADO	3024,68%
				EJECUTADO	1625,01%
2.2NP- 1	Zapatas en concreto 4000 PSI	M3	\$ 813.294,00	PROGRAMADO	108,30%
				EJECUTADO	104,52%
2.2NP- 2	Dados en concreto 4000 psi	M3	\$ 769.570,00	PROGRAMADO	100,00%
				EJECUTADO	101,48%
2.2NP-3	Viga de cimentación en concreto de 4000 psi	M3	\$ 838.270,00	PROGRAMADO	88,34%
				EJECUTADO	79,09%
2.2NP-7.	Proyecto Eléctrico para sub estación tipo serie 3.	UN	\$ 13.096.000,00	PROGRAMADO	100,00%
2.2NP-8.	Proyecto y aprobación para la red provisional serie 5.	UN	\$ 6.548.000,00	PROGRAMADO	100,00%
2.2NP-9.	Plan de Manejo Ambiental		\$ 347.165.860,00	PROGRAMADO	100,00%
				EJECUTADO	100,00%
				%PROGRAMADO	94,99%
				%EJECUTADO	62,03%

La obra se encuentra en un desequilibrio de ejecución, por lo que en solicitud de adición y prórroga presentada por el contratista se contempla la nivelación de programación.

El contratista presento a interventoría solicitud de adición, prórroga y modificatorio al contrato de obra la cual fue remitida por interventoría a la supervisión el 2 de mayo

NOMBRE DEL FUNCIONARIO
Proyectó EDWIN DAZA SANABRIA

CARGO
PROFESIONAL UNIVERSITAR

FIRMA

FECHA
jun 2024



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



de 2024, donde se evidencia que con los recursos actuales no es posible cumplir con el alcance total del proyecto.

A su vez la supervisión ha realizado observaciones a dicha solicitud y remitidas a la interventoría el 30 de mayo de 2024,

Se reciben correcciones de la solicitud de adición por parte de la interventoría el 14 de junio.

El 26 de junio se remiten nuevas observaciones por parte de la supervisión a la interventoría de la solicitud de adición y prórroga.

La entidad realizó la suspensión No.1 de los contratos derivados por periodo de un mes desde el 17/06/2024 a 17/07/2024 para continuar la revisión y viabilización de la adición, prórroga y modificadorio No1. de los contratos de obra e interventoría

- **RELACIÓN DE ÚLTIMA VISITA DE CAMPO DE ENTERRITORIO, REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y/O COMITÉ DEL CONTRATO ESPECÍFICO**


	FECHA REUNIÓN O VISITA	COMPROMISOS

- **ANEXOS**

1. RP contratos derivados.
2. Extractos cuenta exclusiva manejo recursos Enterritorio
3. Comprobante de pago Cuenta No. 6 contrato de obra
4. Programa de obra actualizado.

- **SUPERVISOR**

Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en señal de aprobación del mismo:


GLADYS GONZALEZ GONZALEZ
SUPERVISOR

NOMBRE DEL FUNCIONARIO
Proyectó EDWIN DAZA SANABRIA

CARGO
PROFESIONAL UNIVERSITAR

FIRMA


FECHA
jun 2024



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750
