

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F005	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA	VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☒	INFORME FINAL ☐
Tipo de Contrato:	
OBRA ☐	INTERVENTORÍA ☒
Informe Número: 2	Periodo comprendido entre el 3 al 23 de diciembre del 2024 y del 11 al 28 de febrero del 2025
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato o Aceptación de Oferta No. 4182.010.26.1.563 de 2024	
Nombre Completo del Contratista: CONSORCIO MNTY-INFINITA	
Documento de identificación del contratista: NIT. 901.850.753-2	
Nombre del Supervisor: ARLES OCTAVIO LEMOS CASTRO - TEL: 602 8854666	
Organismo: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	
Obra Física Ejecutada del Periodo: N/A	Obra Física Ejecutada Acumulada: N/A
Objeto del contrato: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO PTARD Y RED DE ALCANTARILLADO VEREDA EL PAJUI FASE III - CORREGIMIENTO LA LEONERA".	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 20/sep/2024	Fecha Terminación 05/abr/2025
Modificación del contrato: Modificación No.1 – Se modifica el plazo de ejecución del contrato de interventoría No. 4182.010.26.1.563-2024 por el término de cuarenta y cinco (45) días, es decir, hasta el 05 de abril de 2025.	
Adición presupuestal: N/A	
Suspensión: 23/dic/2024	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA	MAJA01.04.03.P002.F005	
		VERSIÓN	002

Reanudación: 11/feb/2025

Prorroga: 45 días hasta el 05/abr/2025

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

Acta de recibo final de obra: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del Contrato: SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (\$ 68.572.500)

Adición: N/A

Prórroga: dada mediante Acta de Modificación No.1 – Se modifica el plazo de ejecución del contrato de interventoría No. 4182.010.26.1.563-2024 por el término de cuarenta y cinco (45) días, es decir, hasta el 05 de abril de 2025.

Resumen Contable y Financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
\$68.572.500	\$6.816.107	\$54.892.286	\$ 6.864.107

PERSONA JURÍDICA: N/A

PERSONA NATURAL:

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 28/feb/2024

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo con los requerimientos de Ley.

EVELYN TATIANA DIAZ GONZALEZ

No. Planilla: 9480513432

No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1299563302

Operador: Aportes en Línea

Fecha de Pago: 28/02/2025

Periodo de pago: Feb/2025

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA	MAJA01.04.03.P002.F005	
		VERSIÓN	002

No. Planilla: 9479117535
 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1137838475
 Operador: Aportes en Línea
 Fecha de Pago: 19/12/2024
 Periodo de pago: Dic/2024

FRANK RAMIREZ

No. Planilla: 9482453825
 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1299627787
 Operador: Aportes en Línea
 Fecha de Pago: 02/28/2025
 Periodo de pago: Feb/2025

No. Planilla: 9479377709
 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1148067657
 Operador: Aportes en Línea
 Fecha de Pago: 17/01/2025
 Periodo de pago: Dic/2024

Observaciones al informe contable y financiero: El contratista presenta planillas de seguridad social (EPS y AFP) correspondientes a los meses de diciembre de 2024 y febrero de 2025, que son los que hacen parte del periodo de cobro.

5. INFORME TÉCNICO

- De acuerdo al informe de actividades presentado por la interventoría, se pudo constatar las actividades realizadas durante el periodo relacionado.

Realizó la revisión de las actividades ejecutadas por el contratista de obra que tiene por nombre CONSORCIO PTARD VALLE con el contrato y objeto:

**CONTRATO DE OBRA No. 4182.010.26.1.561-2024 “REALIZAR LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO PTARD Y RED DE ALCANTARILLADO VEREDA EL PAJUI FASE III -
CORREGIMIENTO LA LEONERA.”**

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA	MAJA01.04.03.P002.F005	
		VERSIÓN	002

Administrativas

EN el periodo comprendido entre del 3 al 23 de diciembre del 2024 y del 11 al 28 de febrero del 2025, la interventoría realizó las siguientes actividades de supervisión administrativa:

- Realizó la Supervisión y Control Integral de la ejecución del contrato, lo que incluyó la vigilancia constante y el control de cada uno de los componentes técnicos, ambientales, administrativos, contables, legales y financieros involucrados en el proyecto.
- Realizó informes a la UAESP, mediante la presentación de los informes semanales # 9, 10, 11, 12, 13 y 14, en los que se presentó información sobre el estado actual de los distintos frentes de intervención. Esta actividad fue crucial para mantener a la entidad informada sobre el avance de los trabajos y cualquier situación que pudiera requerir atención o intervención.
- Participó en los Comités Técnicos, donde se discutieron aspectos fundamentales del proyecto. Estos comités sirvieron como plataformas para la toma de decisiones y la resolución de problemas, contribuyendo al alineamiento de esfuerzos entre todas las partes involucradas.
- Elaboró Actas e Informes: La interventoría llevo a cabo la elaboración de Actas de Comité, así como informes para las actas de cobro del contratista. Estos documentos no solo documentaron el progreso del proyecto, sino que también sirvieron como herramientas de análisis y seguimiento para evaluar la efectividad de las acciones implementadas.
- Verificó los Aportes al Sistema de Seguridad Social: Un aspecto importante del seguimiento administrativo fue la verificación del cumplimiento por parte del Contratista en cuanto a los aportes al Sistema de Seguridad Social. Esta actividad fue fundamental para garantizar el bienestar de los trabajadores involucrados en el proyecto y el cumplimiento de las normativas laborales vigentes.
- Realizó el Control de Correspondencia: Se llevó a cabo el control de la correspondencia relacionada con la ejecución del Contrato de Obra.

Aspectos Ambientales

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA	MAJA01.04.03.P002.F005	
		VERSIÓN	002

Llevó a cabo un control ambiental de todas las actividades relacionadas con el proyecto, asegurándose de que cada una de ellas se ejecutara en estricta conformidad con las normativas y regulaciones ambientales vigentes. Este proceso implicó una serie de acciones sistemáticas y metódicas, diseñadas para verificar el cumplimiento de todas las normas y condicionantes establecidos en la legislación ambiental aplicable.

Financiera

Presentó el detalle de los conceptos del Acta Parcial No. 2 de pago del Contrato de Interventoría:

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
INTERVENTORIA CONTRATADA	\$ 68.572.500
ACTA PARCIAL No.1	\$ 54.892.286
ACTA PARCIAL No.2	\$ 6.816.107
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	\$ 61.708.393
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 6.864.107

Técnicas:

Realizó la supervisión de las siguientes actividades durante el periodo comprendido entre el 3 al 23 de diciembre del 2024 y del 11 al 28 de febrero del 2025, al contrato de obra. No. 4182.010.26.1.561-2024 "REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO PTARD Y RED DE ALCANTARILLADO VEREDA EL PAJUI FASE III - CORREGIMIENTO LA LEONERA":

1.1.1.2.1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA TUBERÍAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Identificó y marcó sobre el terreno las posiciones exactas para la instalación de las tuberías y las cámaras de inspección, garantizando la correcta alineación, pendiente y profundidad conforme a los planos y condiciones del sitio. Se realizaron estos trabajos cumpliendo con las especificaciones del proyecto y asegurando el cumplimiento con los estándares de construcción.

1.1.1.2.1.2 CORTE, ROTURA Y DEMOLICIÓN CALZADA EN CONCRETO 0.15M<E<0.20M. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES HASTA 20KM. VÍA
Incluyó la remoción de 0.60m de pavimento existente mediante equipos especializados para corte y demolición, minimizando daños a áreas adyacentes. Estos trabajos se llevaron a cabo cumpliendo con las especificaciones del proyecto y asegurando el cumplimiento con los estándares de construcción y manejo ambiental.

1.1.1.2.2.3 RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO -EN BANCO- DE 0 A 10 KM. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)		MAJA01.04.03.P002.F005
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA		VERSIÓN 002

OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).

Levantó manualmente el material excavado y su cargue en volquetas, sin acarreos internos dentro de la obra. Posteriormente, el material fue transportado hasta un botadero oficial autorizado, cumpliendo con las disposiciones del Decreto 0291 de 2005 y garantizando una disposición final adecuada. Este proceso se llevó a cabo cumpliendo con las especificaciones del proyecto y los estándares ambientales y de manejo responsable de residuos.

1.1.1.2.2.6 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0.30 M. AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO

Consistió en reutilizar el material excavado, que cumpliera con las características adecuadas, para realizar el relleno en las áreas correspondientes. Este material fue compactado con equipo mecánico en capas de 0.30 m de espesor, alcanzando un nivel de compactación del 90% del Proctor Modificado. Este proceso se realizó cumpliendo con las especificaciones del proyecto y los estándares de calidad establecidos, garantizando la estabilidad y resistencia del relleno en las condiciones indicadas.

1.1.1.2.2.7 SUMINISTRO, TRANS. E INSTALACIÓN DE LECHO DE GRAVA ENTRE 1/4" - 1/2" DE ESPESOR, PARA SOPORTE DE LA TUBERÍA PVC.

Consistió en proporcionar y trasladar el material adecuado para formar una capa de soporte sobre la cual se instalaría la tubería de PVC. La grava, de tamaño entre 1/4" y 1/2", fue distribuida uniformemente en el área de trabajo, garantizando un espesor apropiado para proporcionar estabilidad y protección a las tuberías. Este proceso se ejecutó cumpliendo con las especificaciones del proyecto y los estándares de construcción, asegurando que el lecho de grava brindara un soporte adecuado para el sistema de alcantarillado.

1.1.1.2.3.1 PAVIMENTO CONCRETO MR 36 E=0.15 INCL JUNTA BAKE

Se fundió pavimento de concreto en las zonas donde se cortó y demolió el pavimento existente, con el fin de permitir la instalación de la tubería y la fundición de las cajas de inspección. Este proceso involucró la preparación y vertido de concreto de alta resistencia en las áreas afectadas, asegurando una integración adecuada con el resto de la infraestructura. Se realizó cumpliendo con las especificaciones del proyecto, garantizando la calidad del pavimento y su correcta funcionalidad según los estándares de construcción aplicables, proporcionando una superficie duradera y resistente para el tráfico y las operaciones del sistema de alcantarillado.

1.1.1.2.3.4 REFUERZO EN ACERO 60000 PSI

Fue utilizado en las tapas de las cajas de inspección para garantizar la resistencia y durabilidad de las mismas, soportando las cargas del tráfico y otras tensiones externas. Este acero de alta resistencia proporcionó la capacidad estructural necesaria para evitar deformaciones o daños a las tapas, asegurando su funcionamiento óptimo y prolongando la vida útil del sistema. El proceso se realizó cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y los estándares de construcción, garantizando la calidad y seguridad de las obras.

1.1.1.2.4.2 CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO B, SEGÚN NORMAS DE EMCALI, CON

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)		MAJA01.04.03.P002.F005
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA		VERSIÓN 002

ALTURA DE CILINDRO DE 1 A 1.5 (INCLUYE LOSA Y TAPA PREFABRICADA, EXCAVACIÓN RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO, ACARREOS Y RETIROS DE SOBRANTES HASTA 20 KM)
Se realizó conforme a las normas de EMCALI, con una altura de cilindro hasta 1.50 m. Esta actividad incluyó la excavación para ubicar la cámara, la fundición de la misma. Todo el trabajo se ejecutó cumpliendo con las especificaciones del proyecto y los estándares de construcción, asegurando la calidad y durabilidad de la cámara de inspección.

1.1.1.2.6.1 'SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y RETIRO DE CERRAMIENTO EN TELA DE POLIPROPILENO H=1.6M CON POSTES EN GUADUA CADA 3M CON IMAGEN CORPORATIVA DE 1.0X1.5 EN IMPRESIÓN DIGITAL DE 720 DPI CADA 5M (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO EN CONCRETO DE 2500 PSI PARA ANCLAJE DE POSTES)

La actividad de suministro, instalación y retiro de cerramiento en tela de polipropileno con altura de 1.6 m y postes en guadua cada 3 metros. Además, se realizó la excavación necesaria para la instalación de los postes y el relleno con concreto de 2500 PSI para el anclaje de los postes, asegurando la estabilidad y resistencia del cerramiento. Este proceso se ejecutó cumpliendo con las especificaciones del proyecto y los estándares de construcción, garantizando la durabilidad del cerramiento y la visibilidad de la imagen corporativa.

APU-NP 5.3 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO UNION MECANICA DE DOBLE PARED EN PVC (SEGÚN NORMA NTC 3722-1) O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (RIGIDEZ ANULAR MÍNIMA SN8), Ø=6" (200mm) (INCLUYE ACARREO INTERNO). Consistió en el suministro e instalación de la tubería garantizando la estanqueidad y resistencia del sistema de alcantarillado, cumpliendo con las especificaciones del proyecto y los estándares técnicos establecidos.

APU-NP 5.9 CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJES

Consistió en el suministro, mezcla y vertido de concreto con una resistencia de 3000 PSI para la anclajes elaborados con acero, para el soporte de la tubería. Todo el proceso se realizó cumpliendo con las especificaciones del proyecto y los estándares de construcción aplicables.

APU-NP 5.12 CONEXIÓN DE ACOMETIDA SANITARIA A ALCANTARILLADO EN 6"

Se instaló las conexiones de la tubería de 6" La actividad se completó cumpliendo con las especificaciones del proyecto, asegurando la estanqueidad y funcionalidad de la conexión según los estándares de construcción y las normativas de saneamiento.

APU-NP 5.13 SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y RETIRO DE CINTA Y/O PASACALLE DE BARRERA VISUAL CON IMPRESIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA EN BANNER CON IMPRESIÓN DIGITAL DE 720 DPI ANCHO 0.075 METRO Y LONGITUD 300 M/ UNIDAD

Esta actividad se ejecutó cumpliendo con las especificaciones del proyecto, proporcionando una barrera segura y visible para proteger a los trabajadores y transeúntes, y asegurando el cumplimiento con los estándares de seguridad vial y construcción

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)		MAJA01.04.03.P002.F005
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA		VERSIÓN 002

APU-NP 5.14 BARRERA PLASTICA FLEXIBLE (MALETIN) DE 2,0X1,0M EN PLASTICO ANARANJADO CON CINTA REFLECTIVA TIPO III CON LASTRE EN ARENA HASTA MEDIA ALTURA

Esta actividad se ejecutó cumpliendo con las especificaciones del proyecto, proporcionando una barrera segura y visible para proteger a los trabajadores y transeúntes, y asegurando el cumplimiento con los estándares de seguridad vial y construcción

APU-NP 5.15 BARRICADA EN ANGULO 2"X2"X1/4" DE 2,2MX1,2M CON TRES BANDAS HORIZONTALES EN CINTA REFLECTIVA TIPO III

Esta actividad se ejecutó cumpliendo con las especificaciones del proyecto, proporcionando una barrera segura y visible para proteger a los trabajadores y transeúntes, y asegurando el cumplimiento con los estándares de seguridad vial y construcción

APU-NP 5.17 EXCAVACION DE TIERRA A MANO EN TERRENO MUY INCLINADO, DE DIFICIL ACCESO Y ACCESOS ANGOSTOS

Consistió en la remoción manual del material del terreno utilizando herramientas como palas, picas y barras. Este proceso se llevó a cabo en estratos de tierra seca, garantizando la precisión en las dimensiones y niveles requeridos para el proyecto. Se incluyó tanto la mano de obra calificada como las herramientas necesarias para realizar la excavación de manera eficiente y segura. Todo el trabajo se ejecutó cumpliendo con las especificaciones del proyecto y los estándares de construcción aplicables.

Imprevistos

La interventoría reporta los siguientes imprevistos:


El 23 de diciembre se suspende la obra debido a que se están ejecutando los contratos No. 4151.010.26.1.1521-2023, cuyo objeto es " REALIZAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS VEHICULARES Y LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE SANTIAGO DE CALI" y No. 4151.010.26.1.1522-2023, cuyo objeto es " REALIZAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL OCCIDENTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN LOS CORREGIMIENTOS FELIDIA, LOS ANDRES, PICHINDE Y LA LEONERA." Que son obras que hacen parte de proyectos de rehabilitación de infraestructura vial rural liderados por la Secretaría de Infraestructura de Cali, que incluyen la construcción de huellas vehiculares y drenajes en distintos corregimientos. La comunidad del corregimiento El Pajui se encontraba construyendo unas placas huellas en la vía principal, situación que imposibilitaba el transporte de materiales de construcción hacia los tramos 1 y 2 del proyecto.

Adicionalmente, en el frente No 2 al inicio del callejón se presentó el deslizamiento de una roca de aproximadamente 3 metros de diámetro, lo que imposibilitó realizar las excavaciones correspondientes para la instalación de tubería y la construcción de una de las cámaras tipo B. además de impedir el ingreso de material y dificultar el ingreso del personal.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)		MAJA01.04.03.P002.F005
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA		VERSIÓN 002

Una vez superadas las causas de la suspensión anteriormente descritas, se reinicia el contrato el 11 de febrero del 2025 y se aprueba una prórroga por 30 días dejando por nueva fecha de finalización el 21 de marzo del 2025.

REGISTRO FOTOGRAFICO

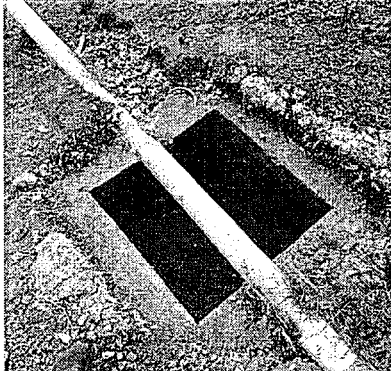	
Foto 1 - Fundición de andenes y pavimentos	Foto 2 – Fundición de cajas domiciliarias
	
Foto 3 – Fundición de tapas de cámaras tipo B	Foto 4 – Excavación cámara de inspección tipo B

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)		MAJA01.04.03.P002.F005
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA		VERSIÓN 002



Foto 5 – Instalación tapas de cajas domiciliarias



Foto 6 – Excavación de zanja para tubería

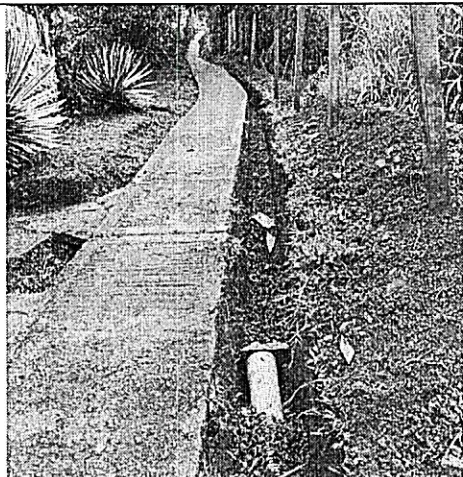


Foto 7 – Instalación de tubería y colchón de grava





Foto 8 – Relleno y compactación

RECIBO A SATISFACCIÓN: N/A

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: N/A

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F005	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA	VERSIÓN	002

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA
No se reportan recomendaciones para este periodo.
7. FIRMAS RESPONSABLES
<div style="text-align: center;">  <hr/> ARLES OCTAVIO LEMOS CASTRO Profesional Universitario Supervisor - UAESP </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <hr/> JULIO CESAR AROCA CALVO Apoyo a la Supervisión </div>
Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 12/Marzo/2025
