

INFORME DE INTERVENTORIA No. 22

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2000.13.12.005-2022

CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA No. 2000.13.05.003-2022

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERGUACARI

CONTRATISTA: CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

FECHA: FEBRERO 28 DE 2025

NOMBRE: EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ

CARGO : REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

FIRMA: 
Representante de la Interventoria

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019
INFORME DE INTERVENTORIA			
INFORME No. 22	PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025		
PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA."			
ESTUDIOS Y DISEÑOS ☐	OBRA ☒	OTRO ☐	ESPECIFIQUE:
1. INFORMACION GENERAL			
1.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA		1.2 CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA	
CONTRATO No. 2000.13.12.005-2022		CONTRATO No. 2000.13.05.003-2022	
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DEL CONTRATO SUSCRITO COMO RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA No. 2000.46.01.005-2022, CUYO OBJETO CONSISTE EN LA "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS CUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA		OBJETO DEL CONTRATO: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA."	
CONTRATISTA: CONSORCIO INTERGUACARI		CONTRATISTA: CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	
REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO CARDENAS R.		REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL	
PLAZO INICIAL: 16 MESES		PLAZO INICIAL: 13 MESES	
ACTA DE INICIO: 01-DICIEMBRE-2022		ACTA DE INICIO: 01 DICIEMBRE 2022	
VALOR INICIAL: \$ 1.502.246.766		VALOR INICIAL: \$ 29.432.080.933	
CDR INICIAL No. 13041		CDR INICIAL No. 13039 - 13040	
FECHA DE TERMINACION: 31-MAR-2024		FECHA DE TERMINACION: 01 ENERO 2024	
FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (1): N/A		FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (1): 21- FEBRERO-2023	
VALOR ADICION (ES): \$ 131,126,000		VALOR ADICION (ES): \$N/A	
CDR OTRO SI (1) No.16431		CDR OTRO SI (1) No.N/A	
VALOR ACTUAL: \$ 1,633,372,766		VALOR ACTUAL: \$29.432.080.933	
PLAZO ADICIONAL: N/A		PLAZO ADICIONAL: N/A	
FECHA DE TERMINACION: N/A		FECHA DE TERMINACION: N/A	
FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (2): N/A		FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (2): N/A	
VALOR ADICION (ES): \$ N/A		VALOR ADICION (ES): \$2,571,146,616	
CDR OTRO SI (2) No.N/A		CDR OTRO SI (2) No.16430	
VALOR ACTUAL: \$N/A		VALOR ACTUAL: \$32,003,227,549	
PLAZO ADICIONAL: N/A		PLAZO ADICIONAL: N/A	
FECHA DE TERMINACION: N/A		FECHA DE TERMINACION:	
FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (3): N/A		FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (3):	
VALOR ADICION (ES): \$ N/A		VALOR ADICION (ES): \$	
CDR OTRO SI (3) No.N/A		CDR OTRO SI (3) No.	
VALOR ACTUAL: \$N/A		VALOR ACTUAL: \$	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-PDA.2.1-4
	INFORME DE INTERVENTORIA		Versión: 4
			Fecha de Vigencia: 01/02/2019
INFORME No. 22	PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025		
PLAZO ADICIONAL: SIETE MESES	PLAZO ADICIONAL: NUEVE MESES		
FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 14-SEPTIEMBRE-2024	FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 14-JUNIO-2024		
FECHA DE SUSPENSION: 27-JULIO-2023	FECHA DE SUSPENSION: 27-JULIO-2023		
FECHA DE REINICIO: 10-ENERO-2024	FECHA DE REINICIO: 10-ENERO-2024		
PLAZO ADICIONAL: 15-ABRIL-2025	PLAZO ADICIONAL: 14-MARZO-2025		
DATOS DE LA SUPERVISIÓN			
Cargo y Nombre del Supervisor designado mediante memorando	MIGUEL EDINSON ZULUAGA MONTERO		
Nombre contratista de apoyo a la Supervisión de VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP que conoció de la ejecución del contrato	HOLMES ZUÑIGA GARCIA		

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019
INFORME No. 22		INFORME DE INTERVENTORÍA		
		PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025		
PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA."				
ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	x	OTRO
ESPECIFIQUE:				
1.1 OBLIGACIONES CONTRACTUALES				
Cumplimiento de Obligaciones del Sistema de seguridad social y salud en el trabajo. (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (iii)	Observaciones (iv)	
Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la Ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido par La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.	SI			
Toda el personal que emplee el Contratista para la ejecución del objeto contractual, incluido el titular del contrato, deberá estar afiliado, desde el mismo día de inicio de las obras, a las Sistemas de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales) sobre el salario real devengado, teniendo en la normatividad que rige la materia.	SI			
Cumplir la normatividad ambiental vigente, relacionada con la ejecución de la obra, así mismo se obliga a cumplir con las normas vigentes en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, lo cual será supervisado y aprobado por la interventoría.	SI			

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-PDA 2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019	
INFORME No. 22		INFORME DE INTERVENTORÍA			
		PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025			
PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA."					
ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X	OTRO	ESPECIFIQUE:
Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i)		Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (iii)		Observaciones (iv)
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior que no supere el treinta por ciento (30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5%, sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y características propias de la región, que no podrá superar el 30% de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.		SI			
2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación		SI			
3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.		SI			
4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.		SI			
5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.		SI			
6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).		SI			
7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.		SI			
8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.		SI			
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.		SI			
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.		SI			
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.		N/A			
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.		SI			
13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).		SI			

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4	
		INFORME DE INTERVENTORÍA		Fecha de Vigencia: 01/02/2019	
INFORME No. 22		PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025			
PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA."					
ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA		X	OTRO
14. Informar periodicamente la composicion del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la informacion relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.		SI			
15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.		SI			
16. Informar a mas tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.		N/A			
17. El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001 :2015 y NTC ISO 10005:2018 en los quince (15) hábiles siguientes a la suscripcion del contrato.		SI			
18. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de obra contratada por la entidad.		SI			
19. El Contratista se compromete a adquirir las bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir las bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.		SI			
20. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisicion de las bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.		SI			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
21. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus anexos.		SI			
22. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato.		SI			
23. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.		SI			
24. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.		SI			
25. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido par el contratante.		SI			
26. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.		SI			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4	
		INFORME DE INTERVENTORÍA		Fecha de Vigencia: 01/02/2019	
INFORME No. 22		PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025			
PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA."					
ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA		X	OTRO
27. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la Ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.		SI			
28. Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.		SI			
29. Reportar la informacion relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida par el contratante.		SI			
30. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando par su culpa se produzca daño o perdida, sin que esto excluya indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar.		SI			
Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato (i)		Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)		Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (iii)	Observaciones (iv)
OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO:					
1. Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al interventor del contrato y recomendar la actuacion que debe proceder, siempre que se afecte o pueda afectar la adecuada ejecución del contrato.		SI			
2. Elaborar y suscribir las actas de inicio de ejecución de los contratos, previo el cumplimiento de los requisitos necesarios para ello.		SI			
3. Elaborar y suscribir las actas de las reuniones que se realicen en ejecución de las obras. Las actas deberán ser entregadas a la Empresa Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P, debidamente suscrita por los asistentes.		SI			
4. Contar con los equipos, materiales, vehículos e insumos requeridos para el desarrollo de las actividades en el Municipio que hacen parte del objeto contractual.		SI			
5. Presentar al Interventor del contrato, con un plazo máximo de cinco (5) días calendario de antelacion al inicio de la obra, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y especifica del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato, con excepción de las personas que hacen parte del equipo de trabajo principal propuesto a la entidad.		SI			
6. Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato.		SI			
7. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les-asignara labores en desarrollo del contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente (cuando aplique, de acuerdo con la normatividad vigente).		SI			

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-PDA 2.1-4 Versión: 4	
		INFORME DE INTERVENTORÍA		Fecha de Vigencia: 01/02/2019	
INFORME No. 22		PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025			
PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA."					
ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X	OTRO	ESPECIFIQUE:
8. Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo, el personal profesional ofrecido, exigido y necesario.		SI			
9. En caso que la obra requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado, este deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado. En todo caso, el interventor deberá aprobar previamente el remplazo.		SI			
10. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial que instaure, impulse o en la que coadyude su personal o sus subcontratistas con la Empresa Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P, por causa o con ocasión del contrato.		N/A			
11. Asumir por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral de tal personal con la Empresa Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P, ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de la contratación. El contratista estará obligado a tramitar los documentos necesarios y requeridos por el consorcio para el pago del RETEICA		SI			
OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO.					
1. Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el cumplimiento del personal mínimo exigido en cada uno de las obras, tal como se presenta en el Anexo técnico. Además, debe garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente.		SI			
2. Tener la disponibilidad de los profesionales presentados en su propuesta, los cuales deben asistir obligatoriamente a las reuniones que VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. considere pertinentes. Los Comités Técnicos de Obra serán convocados por la interventoría y deben contar con la presencia del Director de Obra, el Residente de Obra y de los profesionales que sean necesarios y que hagan parte del personal mínimo presentado en la propuesta por el Contratista.		SI			
3. Convocar para el primer Comité de Obra a todos los profesionales que conforman el personal mínimo requerido aprobado, y garantizara que todos los profesionales de su equipo conozcan al 100% el pliego, el contrato y por ende las obligaciones adquiridas por el Contratista.		SI			
4. Contratar por su cuenta y riesgo, con plena autonomía para ello, el personal necesario, conveniente e idóneo para la ejecución de la obra así mismo el personal administrativo y técnico de acuerdo con el análisis detallado del valor porcentual del AIU, para lo cual antes de iniciar la ejecución de la obra deberá tener todo el personal con las afiliaciones de Ley a la Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales)" y realizar los aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar).		SI			

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4	
		INFORME DE INTERVENTORÍA		Fecha de Vigencia: 01/02/2019	
INFORME No. 22		PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025			
PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA."					
ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA		X	OTRO
					ESPECIFIQUE:
5. Deberá también responder por todos los salarios y prestaciones sociales, indemnizaciones y/o los honorarios de todo el personal vinculado en la ejecución del contrato. Presentar mensualmente a la interventoría un informe en el que se consigne el trabajo ejecutado en el mes, el cual refleje adecuadamente la cantidad ejecutada, índices de gestión mensual y estado de avance con respecto a lo programado. Además, incluirá lo programado para el mes siguiente, con las observaciones necesarias.		SI			
6. También debe adjuntar fotografías (fecha y hora) y las pruebas de calidad hechas a los materiales utilizados.		N/A			
7. De presentarse atraso en la programación inicial, deberá explicar las medidas y acciones a tomar con el fin de ajustar el cronograma, a estos informes se los deberá adjuntar programaciones y anexos aclaratorios. El informe deberá contener los avances acompañados y por novedades gráficos, técnicas, cuadros, fotografías, administrativas, análisis y contables comentarios y financieras.		N/A			
8. Suscribir con la interventor a de obra una bitácora diaria, en la que se llevara una memoria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos. Entre otras circunstancias, se deberá registrar la visita de funcionarios que tengan relación con la ejecución del proyecto. Esta memoria deberá foliarse y firmarse por el director de obra y por el director de interventoría. Al finalizar los trabajos, el contratista deberá entregar este documento, el cual debe permitir la comprensión general y el desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado.		SI			
9. Realizar, a la firma del acta de inicio del contrato, una inspección y evaluación de las áreas por intervenir de acuerdo con la programación presentada por el contratista de obra, para controlar las áreas contiguas y formular recomendaciones de seguridad.		SI			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
10. Revisar, junto con la interventor a, la calidad, cantidad y coherencia de la totalidad de los diseños, planos, estudios técnicos, especificaciones de construcción, en general, toda la información referente al proyecto, con el propósito de evaluar que estén de acuerdo con las normas, especificaciones, permisos, resoluciones, etc., indispensables para el normal desarrollo del proyecto.		SI			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
11. Verificar las áreas y cotas topográficas en terreno, comprobando las cantidades de obra y el presupuesto establecido en el contrato, e informar a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. sobre aspectos que repercutan en el normal desarrollo y comprometan el objeto del contrato, dentro de los quince (15) días siguientes a la suscripción del acta de inicio, si vencido el plazo señalado el contratista no presenta ninguna observación, se entiende que acepta en su integridad tales documentos. De todas maneras, deberán presentar a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. un informe detallado con registro fotográfico de todo el proceso de revisión del proyecto con sus respectivas observaciones.		SI			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4
		INFORME DE INTERVENTORÍA		Fecha de Vigencia: 01/02/2019
INFORME No. 22		PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025		
PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA."				
ESTUDIOS Y DISEÑOS	OBRA	X	OTRO	ESPECIFIQUE:
12. Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o modificación de los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción necesaria para el cumplimiento del objeto contractual, con el fin de obtener el aval del Consultor o en su efecto del interventor, sin perjuicio de las autorizaciones que sean requeridas por parte del consultor que los haya elaborado o de VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. La responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o modificaciones a los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción será asumida por el contratista en el evento que el contrato de consultoría no se encuentre vigente.	SI			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
13. Tomar el registro fotográfico de los sitios o lugares donde se desarrollaran las obras antes, durante y después de ejecutadas.	SI			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
14. Suministrar a la interventoría oportunamente las pruebas de laboratorio que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los diseños y especificaciones técnica acordadas. Los costos de las muestras y ensayos de laboratorio serán por cuenta del contratista de obra, a la cuenta mensual correspondiente se deberá adjuntar copia del informe mensual y los resultados de los ensayos de laboratorio llevados a cabo. Los siguientes ensayos deberán ser hechos a los siguientes materiales: agregados finos y gruesos, concrete (cilindros y núcleos), sub-base o bases compactadas y todos aquellos que la interventoría o la supervisión estime convenientes.	N/A			
15. El contratista deberá entregar el certificado de calidad del laboratorio y calibración de los equipos donde cumple con la normativa vigente.	SI			
16. Pactar con la interventoría de obra y VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., los precios de las actividades o ítems no previstos para la adecuada ejecución de la obra. El interventor, previa consulta con VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., quien deberá autorizarlo, analizarlo y validarlo, los nuevos precios cuando se requieran ítems o actividades no previstas en el contrato y elaborara las especificaciones técnicas respectivas. Justificar la necesidad de su ejecución y analizar, particularmente, su incidencia en el valor del contrato de obra. No obstante, lo anterior, los nuevos precios serán los que VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P apruebe a través del interventor. Los valores unitarios de cada ítem durante la ejecución de la obra, serán calculados de acuerdo al formulario de precios elaborados por el Ministerio en principio, sino existe dicho valor descrito, se verificara conforme a la tabla de la Gobernación de precios oficiales Decreto N°1-17-1276 del 10 de noviembre de 2021. Si existe una actividad no incluida en el listado de la Gobernación, se presentara por parte del contratista un APU y se evaluara en conjunto por la INTERVENTORÍA y VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	N/A			

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4	
INFORME DE INTERVENTORÍA				Fecha de Vigencia: 01/02/2019	
INFORME No.	22			PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	
PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA."					
ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X	OTRO	ESPECIFIQUE:
17. Realizar dichas actividades con el cuidado y diligencia necesarios, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y en el termino previsto; coordinando con el personal que designe VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., la ejecución del contrato en la medida que el cumplimiento de este lo demande.		SI			
18. Cuando por causas imputables al Contratista, fuere necesario prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Obra, por ende, del Contrato del Interventor, el contratista deberá responder por los costos de honorarios adicionales originados por la prorroga. Lo anterior una vez se surta el debido proceso al contratista.		N/A			
19. Permitir y facilitar la supervisión del desarrollo de las actividades del programa, en cualquier momento que lo estime conveniente VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.		SI			
20. No interferir la interventoria pactada en el contrato y prestar la colaboración que la misma requiera. Informar de inmediato cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización de la obra o el cumplimiento del contrato.		SI			
21. Responder por los gastos que demande la reparación de defectos que presente la obra por deficiente ejecución o por no ceñirse a los planos y diseños propuestos y avalados por VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. requeridos para la construcción de la obra. Obrar con honradez y lealtad, no solo en la realización de la obra, sino también frente a la compra de materiales ante la interventoría, el contratante o sus representantes.		N/A			
22. Colocar la valla y todas las seriales preventivas y de seguridad que se requieran en la obra, de conformidad con los diseños entregados por VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.		SI			
23. Realizar por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a las estructuras ya todas las redes de instalaciones, incluida la desinfección de redes, y hacer las correcciones, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la interventoría y VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.		N/A			
24. Entregar al contratante los planos record de la obra.		N/A			
25. Entregar las instalaciones construidas y funcionando.		N/A			
26. Cumplir la normatividad ambiental vigente, relacionada con la ejecución de la obra, así mismo se obliga a cumplir con las normas vigentes en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, lo cual será supervisado y aprobado por la Interventoría.		SI			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
27. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y de Riesgo del sistema, si aplica. Para la contratación el contratista se obliga a contratar mínimo el 10% del personal de la mano de obra no calificada de la región.		SI			
28. Dar cumplimiento a los cronogramas presentados a la empresa.		SI			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4	
		INFORME DE INTERVENTORÍA		Fecha de Vigencia: 01/02/2019	
INFORME No. 22		PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025			
PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA."					
ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X	OTRO	ESPECIFIQUE:
29. Elaborar y ejecutar un Plan de gestión Social que acompañe a la comunidad beneficiada por las obras con un cubrimiento antes, durante y después de la ejecución las obras. Este será orientado, aprobado y supervisado por el Interventor, si aplica. EL CONTRATISTA presentara a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. todos los documentos exigidos en las consideraciones anteriores y los cuales se relacionan en el siguiente cuadro:		SI			
PLAN DE TRABAJO DE OBRA					
VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y PLANOS Y ESTADO DEL ÁREA DE TRABAJO		SI			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
PLAN DE INVERSIÓN - DEL ANTICIPO		SI			
PLAN DE SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		SI			
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL		SI			
INFORME DE LABORES		SI			
BITÁCORA		SI			
ÍTEMS NO PREVISTOS		N/A			
INFORME FINAL		N/A			
Deberá cumplir con las condiciones especiales para la ejecución que a continuacion se transcriben: Cumplir en todo sentido con lo dispuesto en el "Manual de Serializacion Vial del Ministerio de Transporte". Cumplir con buenas practicas ambientales.		SI			
Entregar las obras en perfecta estado de funcionamiento y libre de escombros, dentro de las plazas acordados contractualmente.		N/A			
Toda el personal que emplee el Contratista para la ejecución del objeto contractual, incluido el titular del contrato, deberá estar afiliado, desde el mismo día de inicio de las obras, a las Sistemas de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales) sobre el salario real devengado, teniendo en la normatividad que rige la materia.		SI			
En caso de que el Contratista sea persona natural deberá coma mínimo estar afiliado a salud y pensión en las porcentajes que establece la ley; la afiliación y pago del Contratista deberán ser presentados al Interventor del Contrato..		N/A			
Toda personal que labore en la obra deberá estar identificado y llevara impreso nombre del Contratista o la razón social del contratante		SI			
En el evento de tratarse de un consorcio o unión temporal es decir se trate de personas jurídicas, estas deberán acreditar el pago de los aportes de seguridad social de acuerdo a lo previsto en el inciso 3 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en la Circular N° 060001 del 6 de diciembre de 2004 del Ministerio de Protección Social y las que modifiquen o reglamenten la materia.		SI			
La zona de trabajo deberá permanecer serializada tanto en horas diurnas como en horas nocturnas.		SI			

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4	
		INFORME DE INTERVENTORÍA		Fecha de Vigencia: 01/02/2019	
INFORME No. 22		PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025			
PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA."					
ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X	OTRO	ESPECIFIQUE:
El Contratista deberá disponer todos los escombros producto de las respectivas demoliciones en la escombrera municipal autorizada, adicionalmente, los vehículos utilizados para el transporte de los escombros, deberá estar protegido con una Lona o similar, para evitar la caída de estos escombros en la vía.			SI		
Los vehículos utilizados por el Contratista, deberán cumplir con las normas legales de tránsito, por lo cual deberá anexar en el momento de iniciar los trabajos objeto de este contrato el certificado ambiental, y certificado técnico-mecánico.			SI		
Todas las personas encargadas del manejo de los equipos de construcción así sean de empresas de alquiler, deberá tener la respectiva afiliación a riesgos profesionales, salud y pensión, así como la dotación de seguridad industrial para este tipo de labores; la responsabilidad es directa del Contratista.			SI		
Elaborar e implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con los requerimientos mínimos establecidos por la ley, el interventor hará el seguimiento y control. Implementar el Plan de gestión Social, haciéndole el seguimiento y control que corresponde; así como también el proceso de capacitación que acompañe y fortalezca a la comunidad beneficiada			SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
El Contratista debe tener una oficina fija bien dotada donde se lleva a cabo la obra y que logísticamente sea el lugar mas conveniente, durante todo el tiempo de ejecución del Contrato, en la cual deberán permanecer los profesionales exigidos y demás personal auxiliar que se requiera para la ejecución del proyecto. Dentro de esta oficina se deberá adecuar un espacio para que la interventoría, realice sus labores. De realizarse trabajos nocturnos o aquellos trabajos inconclusos que durante la noche puedan presentar peligro o riesgo de accidente a peatones y/o vehículos deben serializarse, teniendo en cuenta el flujo vehicular, el área ocupada por el trabajo, el impacto a la comunidad, de tal manera que se pueda prevenir el riesgo existente, ofreciendo suficiente visibilidad y oportunidad de prevención. Todas las seriales preventivas utilizadas en la noche deben tener acabados con material reflectivo. No se permitirá utilizar mecheros para las señalizaciones nocturnas, las seriales luminosas deben ser de luz opaca.			SI		
Apoyar en el trámite y mantener vigentes, durante la ejecución del contrato, todas las licencias requeridas para la adecuada ejecución del contrato.			SI		
Garantizar que la ejecución se adelante en forma permanente e ininterrumpida, evitando al máximo las suspensiones y cualquier tipo de dilaciones que afecten la normal ejecución del contrato; para lo cual deberá tomar las medidas necesarias para asegurar el reemplazo inmediato del personal que se ausente en caso de vacaciones, enfermedad, maternidad, accidentes, calamidad doméstica, etc.			N/A		

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4	
		INFORME DE INTERVENTORÍA		Fecha de Vigencia: 01/02/2019	
INFORME No. 22		PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025			
PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA."					
ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA		X	
		OTRO		ESPECIFIQUE:	
El Contratista es responsable de la realización de las pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la obra, incluidas aquellas requeridas para el manejo ambiental del proyecto y entregar a la interventoría los resultados de los mismos.		N/A			
Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato o que correspondan a una orden expresa o verbal de la contratante, en desarrollo de su facultad de dirección del contrato. En caso de que la ejecución del proyecto requiera la suspensión temporal del servicio de acueducto, el Contratista deberá informar con mínimo 2 días antes al operador del servicio y garantizar la gestión de comunicación a la comunidad.		SI			
EL CONTRATISTA será responsable de realizar las pruebas técnicas y ensayos a las tuberías, estructuras construidas, equipos suministrados e instalados, y a los sistemas generales que se construyan, de igual manera deberá realizar la puesta en marcha de las PTAP y/o PTAR que se construyan que se encuentran dentro del alcance del proyecto. El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración Municipal o a terceros		SI			

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la Cláusula correspondiente del contrato. Para aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia el cumplimiento", su concepto sobre el mismo. El supervisor deberá revisar las Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión, relacionar aquellas actividades que se relacionan con el Contrato en los componentes de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y Seguridad de la Información y verificar el cumplimiento de las mismas.

(ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y si sobre dicho incumplimiento se han adelantado las acciones correspondientes. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida.

(iii) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas (de entrega a satisfacción, de reuniones), informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento.

(iv) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

				SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI				Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019			
INFORME DE INTERVENTORIA				PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025							
2. CONTROL DE GARANTIAS											
2.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA						2.2 CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA					
Amparo	Valor Asegurado	No. Poliza	Compañia Aseguradora	Vigencia		Amparo	Valor Asegurado	No. Poliza	Compañia Aseguradora	Vigencia	
				Desde	Hasta					Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 150.224.676,60	C-100050628 ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	24-Sep-24	Cumplimiento	\$ 5.886.416.186,60	C-100050102 ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	31-May-24
SUSPENSION 1	\$ 150.224.676,60	C-100050628 ANEXO 1	SEGUROS MUNDIAL	27-Jul-23	30-Nov-24	SUSPENSION 1	\$ 5.886.416.186,60	C-100050102 ANEXO 2	SEGUROS MUNDIAL	27-Jul-23	1-Sep-24
AMPLIACION 1 SUSPENSION	\$ 150.224.676,60	C-100050628 ANEXO 2	SEGUROS MUNDIAL	27-Sep-23	31-Dec-24	AMPLIACION 1 SUSPENSION	\$ 5.886.416.186,60	C-100050102 ANEXO 3	SEGUROS MUNDIAL	27-Sep-23	1-Oct-24
AMPLIACION 2 SUSPENSION	\$ 150.224.676,60	C-100050628 ANEXO 3	SEGUROS MUNDIAL	27-Oct-23	31-Jan-25	AMPLIACION 2 SUSPENSION	\$ 5.886.416.186,60	C-100050102 ANEXO 4	SEGUROS MUNDIAL	27-Oct-23	1-Feb-24
AMPLIACION 3 SUSPENSION	\$ 150.224.676,60	C-100050628 ANEXO 4	SEGUROS MUNDIAL	27-Nov-23	14-Mar-25	AMPLIACION 3 SUSPENSION	\$ 5.886.416.186,60	C-100050102 ANEXO 5	SEGUROS MUNDIAL	27-Nov-23	14-Dec-24
REINICIO	\$ 150.224.676,60	C-100050628 ANEXO 5	SEGUROS MUNDIAL	10-Jan-24	14-Mar-25	REINICIO	\$ 5.886.416.186,60	C-100050102 ANEXO 6	SEGUROS MUNDIAL	10-Jan-24	14-Dec-24
ADICIONAL EN VALOR	\$ 163.337.276,00	C-100050628 ANEXO 6	SEGUROS MUNDIAL	5-Feb-24	14-Mar-25	ADICIONAL EN VALOR	\$ 6.400.645.515,80	C-100050102 ANEXO 7	SEGUROS MUNDIAL	2-Feb-24	14-Dec-24
PLAZO ADICIONAL	\$ 163.337.276,00	C-100050628 ANEXO 7	SEGUROS MUNDIAL	6-Sep-24	15-Oct-25	PLAZO ADICIONAL	\$ 6.400.645.515,80	C-100050102 ANEXO 8	SEGUROS MUNDIAL	14-Jun-24	14-Sep-25
Buen Manejo del Anticipo	\$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	24-Sep-24	Buen Manejo del Anticipo	\$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	31-May-24
SUSPENSION 1	\$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 1	SEGUROS MUNDIAL	27-Nov-23	30-Nov-24	SUSPENSION 1	\$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 2	SEGUROS MUNDIAL	27-Jul-23	1-Sep-24
AMPLIACION 1 SUSPENSION	\$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 2	SEGUROS MUNDIAL	27-Sep-23	31-Dec-24	AMPLIACION 1 SUSPENSION	\$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 3	SEGUROS MUNDIAL	27-Sep-23	1-Oct-24
AMPLIACION 2 SUSPENSION	\$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 3	SEGUROS MUNDIAL	27-Oct-23	31-Jan-25	AMPLIACION 2 SUSPENSION	\$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 4	SEGUROS MUNDIAL	27-Oct-23	1-Nov-24
AMPLIACION 3 SUSPENSION	\$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 4	SEGUROS MUNDIAL	27-Nov-23	14-Mar-25	AMPLIACION 3 SUSPENSION	\$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 5	SEGUROS MUNDIAL	27-Nov-23	14-Dec-24
REINICIO	\$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 5	SEGUROS MUNDIAL	10-Jan-24	14-Mar-25	REINICIO	\$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 6	SEGUROS MUNDIAL	10-Jan-24	14-Dec-24
ADICIONAL EN VALOR	\$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 6	SEGUROS MUNDIAL	5-Feb-24	14-Mar-25	ADICIONAL EN VALOR	\$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 7	SEGUROS MUNDIAL	2-Feb-24	14-Dec-24
PLAZO ADICIONAL	\$ 450.674.030,80	C-100050628 ANEXO 7	SEGUROS MUNDIAL	6-Sep-24	15-Oct-25	PLAZO ADICIONAL	\$ 8.829.624.297,90	C-100050102 ANEXO 8	SEGUROS MUNDIAL	14-Jun-24	14-Sep-25
Salarios y prestaciones	\$ 75.112.338,30	C-100050628 ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	24-Mar-27	Salarios y prestaciones	\$ 1.471.604.046,65	C-100050102 ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	30-Nov-26
SUSPENSION 1	\$ 75.112.338,30	C-100050628 ANEXO 1	SEGUROS MUNDIAL	27-Jul-23	31-May-27	SUSPENSION 1	\$ 1.471.604.046,65	C-100050102 ANEXO 2	SEGUROS MUNDIAL	27-Jul-23	1-Sep-27
AMPLIACION 1 SUSPENSION	\$ 75.112.338,30	C-100050628 ANEXO 2	SEGUROS MUNDIAL	27-Sep-23	30-Jun-27	AMPLIACION 1 SUSPENSION	\$ 1.471.604.046,65	C-100050102 ANEXO 3	SEGUROS MUNDIAL	27-Sep-23	1-Apr-27
AMPLIACION 2 SUSPENSION	\$ 75.112.338,30	C-100050628 ANEXO 3	SEGUROS MUNDIAL	27-Oct-23	31-Jul-27	AMPLIACION 2 SUSPENSION	\$ 1.471.604.046,65	C-100050102 ANEXO 4	SEGUROS MUNDIAL	27-Oct-23	1-May-27
AMPLIACION 3 SUSPENSION	\$ 75.112.338,30	C-100050628 ANEXO 4	SEGUROS MUNDIAL	27-Nov-23	14-Sep-27	AMPLIACION 3 SUSPENSION	\$ 1.471.604.046,65	C-100050102 ANEXO 5	SEGUROS MUNDIAL	27-Nov-23	14-Jun-27
REINICIO	\$ 75.112.338,30	C-100050628 ANEXO 5	SEGUROS MUNDIAL	10-Jan-24	14-Sep-27	REINICIO	\$ 1.471.604.046,65	C-100050102 ANEXO 6	SEGUROS MUNDIAL	10-Jan-24	14-Jun-27
ADICIONAL EN VALOR	\$ 81.668.638,00	C-100050628 ANEXO 6	SEGUROS MUNDIAL	5-Feb-24	14-Sep-27	ADICIONAL EN VALOR	\$ 1.800.161.378,95	C-100050102 ANEXO 7	SEGUROS MUNDIAL	2-Feb-24	14-Jun-27
PLAZO ADICIONAL	\$ 81.668.639,00	C-100050628 ANEXO 7	SEGUROS MUNDIAL	6-Sep-24	15/04/2028	PLAZO ADICIONAL	\$ 1.800.161.378,95	C-100050102 ANEXO 8	SEGUROS MUNDIAL	14-Jun-24	14-Mar-28
Calidad del Servicio	\$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	24-Mar-24	24-Mar-29	Estabilidad	\$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	30-Nov-23	30-Nov-28
SUSPENSION 1	\$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 1	SEGUROS MUNDIAL	31-May-24	31-May-29	SUSPENSION 1	\$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 2	SEGUROS MUNDIAL	1-Mar-24	1-Mar-29
AMPLIACION 1 SUSPENSION	\$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 2	SEGUROS MUNDIAL	30-Jun-24	30-Jun-29	AMPLIACION 1 SUSPENSION	\$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 3	SEGUROS MUNDIAL	1-Apr-24	1-Apr-29
AMPLIACION 2 SUSPENSION	\$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 3	SEGUROS MUNDIAL	31-Jul-24	31-Jul-29	AMPLIACION 2 SUSPENSION	\$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 4	SEGUROS MUNDIAL	1-May-24	1-May-29

INFORME DE INTERVENTORIA

INFORME No. 22

PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

2. CONTROL DE GARANTÍAS

2.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.2 CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA


AMPLIACION 3 SUSPENSION	\$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 4	SEGUROS MUNDIAL	14-Sep-24	14-Sep-29	AMPLIACION 3 SUSPENSION	\$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 5	SEGUROS MUNDIAL	14-Jun-24	14-Jun-29
REINICIO	\$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 5	SEGUROS MUNDIAL	14-Sep-24	14-Sep-29	REINICIO	\$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 6	SEGUROS MUNDIAL	14-Jun-24	14-Jun-29
ADICIONAL EN VALOR	\$ 490.011.829,00	C-100050628 ANEXO 6	SEGUROS MUNDIAL	14-Sep-24	14-Sep-29	ADICIONAL EN VALOR	\$ 9.600.958.273,70	C-100050102 ANEXO 7	SEGUROS MUNDIAL	14-Jun-24	14-Jun-29
PLAZO ADICIONAL	\$ 490.011.830,00	C-100050628 ANEXO 7	SEGUROS MUNDIAL	15-Apr-24	15-Apr-30	PLAZO ADICIONAL	\$ 9.600.958.273,70	C-100050102 ANEXO 8	SEGUROS MUNDIAL	14-Mar-25	14-Mar-30
Civil extracontractual	\$ 348.000.000,00	C-100012719 ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	24-Mar-24	Civil extracontractual	\$ 1.471.604.046,65	C-100012551 ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	30-Nov-23
SUSPENSION 1	\$ 348.000.000,00	C-100012719 ANEXO 1	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	31-May-24	SUSPENSION 1	\$ 1.471.604.046,65	C-100012551 ANEXO 1	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	1-Mar-24
AMPLIACION 1 SUSPENSION	\$ 348.000.000,00	C-100012719 ANEXO 2	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	30-Jun-24	AMPLIACION 1 SUSPENSION	\$ 1.471.604.046,65	C-100012551 ANEXO 2	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	1-Apr-24
AMPLIACION 2 SUSPENSION	\$ 348.000.000,00	C-100012719 ANEXO 3	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	31-Jul-24	AMPLIACION 2 SUSPENSION	\$ 1.471.604.046,65	C-100012551 ANEXO 3	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	1-May-24
AMPLIACION 3 SUSPENSION	\$ 348.000.000,00	C-100012719 ANEXO 4	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	14-Sep-24	AMPLIACION 3 SUSPENSION	\$ 1.471.604.046,65	C-100012551 ANEXO 4	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	14-Jun-24
REINICIO	\$ 348.000.000,00	C-100012719 ANEXO 5	SEGUROS MUNDIAL	10-Jan-24	14-Sep-24	REINICIO	\$ 1.471.604.046,65	C-100012551 ANEXO 5	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	14-Jun-24
ADICIONAL EN VALOR	\$ 390.000.000,00	C-100012719 ANEXO 6	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	14-Sep-24	ADICIONAL EN VALOR	\$ 1.600.161.377,00	C-100012551 ANEXO 6	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	14-Jun-24
ADICIONAL EN VALOR	\$ 390.000.000,00	C-100012719 ANEXO 7	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	15-Apr-25	ADICIONAL EN VALOR	\$ 1.600.161.377,00	C-100012551 ANEXO 7	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	14-Mar-25

2.1 SANCIONES

Tipo de Sancion (seleccionar con una x)	Fecha del acto administrativo que resolvió el recurso	valor de la sanción impuesta
Multa		
Cláusula Penal		
Caducidad		
Ninguna		

				SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI				Código: FC-PDA.2.1-4 Versión: 4			
		INFORME DE INTERVENTORIA				Fecha de Vigencia: 01/02/2019					
INFORME No. 22		PERIODO:		01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025							
3. CONTROL FINANCIERO											
3.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA						3.2 CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA					
Concepto	Fecha d/cmb ACG	Valor del Acta	% Acumulado ACG	Amortización Anticipo	Valor a Pagar	Concepto	Fecha d/cmb ACG	Valor Acta	% Acumulado Acta	Amortización Anticipo	Valor a Pagar
Anticipo (30%)	20/12/2022		7%		\$ 430.074.030	Anticipo (30.%)	20/12/2022	0000	7%		\$0.029.024.200
Acta No. 1	31-May-20	\$ 427.200.300	20,10%	\$ 120.171.007	\$ 207.029.293	Acta No. 1	31-May-20	\$0.371.000.076	20,10%	\$0.311.020.000	\$0.320.170.130
Acta No. 2	30-Jun-23	\$ 45.217.628	2,77%	\$ 13.565.288	\$ 31.652.340	Acta No. 2	30-Jun-23	\$886.015.856	2,77%	\$265.804.757	\$620.211.099
Acta No. 3	30-Mar-24	\$ 72.195.076	4,42%	\$ 21.658.523	\$ 50.536.553	Acta No. 3	31-Jan-24	\$907.712.127	2,84%	\$272.313.639	\$635.398.488
Acta No. 4	14-Jun-24	\$ 18.783.797	1,15%	\$ 5.635.136	\$ 13.148.661	Acta No. 4	30-Mar-24	\$503.892.952	1,57%	\$151.187.986	\$352.725.066
Acta No. 5	20-Jun-24	\$ 376.165.748	23,03%	\$ 112.849.724	\$ 263.316.024	Acta No. 5	30-Apr-24	\$389.286.058	1,15%	\$110.785.818	\$258.500.240
Acta No. 6	10-Aug-24	\$ 30.070.740	1,89%	\$ 9.201.224	\$ 21.069.516	Acta No. 6	31-May-24	\$1.371.110.304	23,03%	\$2.211.334.010	\$0.109.700.704
Acta No. 7	13-Sep-24	\$ 19.659.237	1,20%	\$ 5.897.471	\$13.760.766	Acta No. 7	31-Jul-24	\$504.131.566	1,89%	\$181.239.470	\$422.892.096
Acta No. 8	30-Sep-24	\$ 35.139.507	2,15%	\$ 10.641.852	\$24.597.655	Acta No. 8	31-Aug-24	\$385.455.620	1,20%	\$115.636.686	\$269.818.934
Acta No. 9	12-Nov-24	\$ 62.044.616	3,80%	\$ 18.613.385	\$43.431.231	Acta No. 9	30-Sep-24	\$689.009.943	2,15%	\$206.702.983	\$482.306.960
Acta No. 10	2-Dec-24	\$ 105.486.042	6,46%	\$ 31.645.813	\$73.840.229	Acta No. 10	8-Nov-24	\$1.216.561.098	3,80%	\$364.968.330	\$851.592.768
Acta No. 11		\$ 35.207.836	2,16%	\$ 10.562.351	\$24.645.485	Acta No. 11	30-Nov-24	\$2.068.353.769	6,46%	\$620.506.131	\$1.447.847.638
						Acta No. 12	28-Feb-25	\$000.000.000	2,16%	\$207.104.977	\$455.244.807
TOTALES		\$ 1.228.008.202	75,19%	\$ 368.402.461	\$1.310.279.771			\$23.372.601.195	75,19%	\$7.218.885.280	\$16.844.065.639

4. CONTROL DE EJECUCION

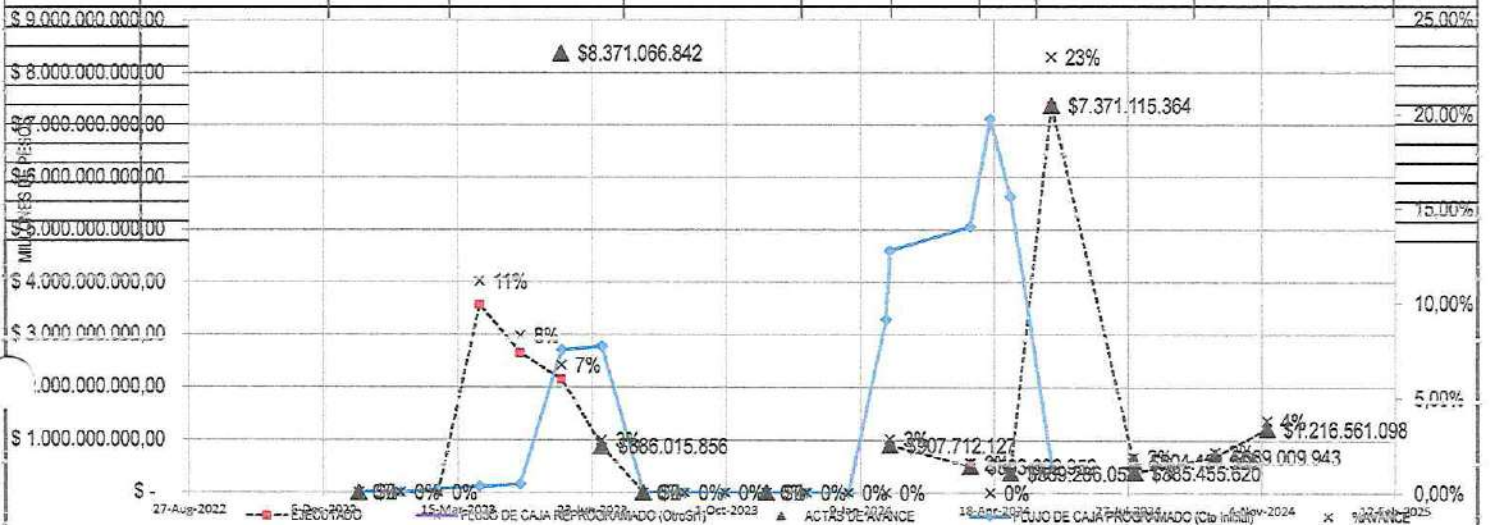

FECHA	FLUJO DE CAJA PROGRAMADO (Cto Inicial)	FLUJO DE CAJA REPROGRAMA D.O. (Cto. S. S.)	EJECUTADO	ACTAS DE AVANCE	%AVANCE
31-Dec-22	\$ -			\$ -	0,00%
31-Jan-23	\$ -		\$ -	\$ -	0,00%
28-Feb-23	\$ 62.322.903,31		\$ -		0,00%
31-Mar-23	\$ 111.845.778,94		\$ 3.588.952.062,00		11,15%
30-Apr-23	\$ 161.373.885,25		\$ 2.651.489.752,00		8,29%
31-May-23	\$ 2.705.571.148,99		\$ 2.150.625.028,00	\$ 8.371.068.842,00	6,72%
30-Jun-23	\$ 2.779.758.170,91		\$ 886.015.856,00	\$ 886.015.856,00	2,77%
31-Jul-23	\$ -		\$ -	\$ -	0,00%
31-Ago-23	\$ -		\$ -	\$ -	0,00%
30-Sep-23	\$ -		\$ -	\$ -	0,00%
31-Oct-23	\$ -		\$ -	\$ -	0,00%
30-Nov-23	\$ -		\$ -	\$ -	0,00%
Dec-23	\$ -		\$ -	\$ -	0,00%
Jan-24	\$ 3.291.610.390,55				0,00%
Jan-24	\$ 4.602.351.753,97		\$ 907.712.127,00	\$ 907.712.127,00	2,84%
31-Mar-24	\$ 5.058.692.137,71		\$ 503.892.952,00	\$ 503.892.952,00	1,67%
15-Apr-24	\$ 7.113.749.748,65				0,00%
30-Apr-24	\$ 5.630.651.827,13		\$ 369.286.058,00	\$ 369.286.058,00	1,15%
31-May-24	\$ 487.299.803,59		\$ 7.371.115.384,00	\$ 7.371.115.384,00	23,03%
31-May-24			\$ 694.451.588,00	\$ 694.451.588,00	1,93%
1-Jun-24			\$ 385.486.620,00	\$ 385.486.620,00	1,20%
30-Sep-24			\$ 689.009.943,00	\$ 689.009.943,00	2,15%
8-Nov-24			\$ 1.216.561.098,00	\$ 1.216.561.098,00	3,80%
30-Nov-24			\$ 2.068.353.769,00	\$ 2.068.353.769,00	6,46%
28-Feb-25			\$ 690.349.724,00	\$ 690.349.724,00	2,16%
	\$ 32.003.227.549,00		\$ 24.062.950.919,00	\$ 24.062.950.919,00	75,19%

ESCALAS TANTO EN VALOR Y TIEMPO

NOTA: EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LA INVERSION ES DEL 75,19 % (ACTIVIDADES INTERVENCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA ALBANIA , INTERVENCIONES FLOCULADORES , SEDIMENTADORES EN LA PTAP GINEBRA Y SEDIMENTADORES EN LA PTAP DE GUACARÍ

  VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PAP-PDA PROGRAMA DE AGUAS POTABLES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA	Código: FO-PDA.2.1-5 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019
INFORME No. 22	PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	
5. SEGURIDAD SOCIAL		
El contratista adjunto en el último pago el certificado del Revisor Fiscal o Contador Diana Sofía Bolaños O., con número de tarjeta profesional 186062-T quien certifica que el contratista CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE pago conforme a la ley lo correspondiente a sus pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales) del personal vinculado al contrato o convenio de quienes figuran en la propuesta (Si aplica). Igualmente, el contratista presentó las planillas de pago de seguridad social del personal que se encuentra registrado en la propuesta y la del representante legal.		
Firma del Interventor Contrato No. 		

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4
		INFORME DE INTERVENTORÍA		Fecha de Vigencia: 01/02/2019
INFORME No 22		PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025		
6. ANEXOS				
6.1 Aspectos Técnicos: Descripción de actividades realizadas acordes con el objeto del contrato de interventoría en el periodo (Actas, Bitácora).				
6.2 Control de Calidad: Según especificaciones técnicas incluir información relacionada con Equipos de Medición, de Inspección y Ensayos.				
6.3 Aspectos Ambientales: Relacionar lo relacionado con Licencias Ambientales, Permisos de Vertimientos, Concesión de Aguas, entre otros.				
6.4 Aspectos Sociales: Relacionar documentos como actas de reuniones, constancias de visitas, correspondencia enviada y recibida.				
6.5 Predios, Servidumbres y Permisos de Intervención: Incluir tramites prediales, servidumbres y permisos requeridos por otras entidades.				
6.6 Recurso Humano (interventoría , contratista) : Relacionar personal utilizado para la ejecución del contrato en el periodo (soportes seg. social), plan integral de salud ocupacional				
6.7 Maquinaria y Equipo (interventoría , contratista) : Relacionar la maquinaria utilizada durante la ejecución de cada actividad (si aplica).				
6.8 Registro Fotográfico: Complementar de manera visual (si aplica) con el seguimiento cronológico con este registro .Anexar CD con fotos en alta resolución				
6.9 Informe del Contratista (si aplica).				
6. ASPECTOS RELEVANTES DEL CONTRATO				
Tramo 3 CADICA en Puente Rojo a PTAP Guacarí: Tubería PEAD diámetro 14" L total =8000ml Estado Actual: El Tramo 3, Instalación tubería PEAD diámetro 14" L: 5.738 ml, la Comunidad suspendió las obras el día 11 de Junio de 2024. La Comunidad representada por Pro-Territorio, firmo el 18 de Diciembre de 2024, un acta de acuerdo pactado entre la Gobernación del Valle y Vallecaucana de Aguas para continuar con las obras. Está en proceso de legalización la servidumbre con el Ingenio Pichichoi – Blum, para la instalación de la tubería PEAD de 14 ". PTAP GINEBRA Sedimentador 1: La obra civil se terminó, ya el Sub contratista Co Ingeniería, va iniciar las labores de verificación de medidas para el barrelodos y canaletas en acero inoxidable . Es. Jo Actual Filtración: Demolición de falso fondos Repello con aditivos para dar acabado a las paredes del filtro Tanque de Almacenamiento Con una capacidad de almacenamiento de 470 m3 en dos compartimientos y caja de válvulas que va abastecer a La Floresta y Villa Vanegas Estado Actual: En ejecución 92 % Actividades por ejecutar: Losa superior de cámaras de entrada y salida Instalación de sistema de válvulas Instalación de tapas en láminas de alfajor para entrada a tanque Rellenos perimetrales: en ejecución – se suspendió por lluvias permanentes Instalación tubería de desagüe				

 	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORÍA	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019
INFORME No 22	PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	
Caseta eléctrica Estado Actual: Ejecución 100 % obra civil Se continúan con las excavaciones para ductos eléctricos del poste de la acometida a la caseta eléctrica Se instala ducto eléctrico que va alimentar el Streaming Current Relleno con material de excavación Se instala el sistema Streaming Current Tanque de almacenamiento La Albania Dimensiones Largo: 25 mts Ancho: 15 mts Profundidad: 5 mts Actividades ejecutadas: Localización y replanteo Chequeo de niveles de la excavación Excavación a máquina y retiro de material sobrante de la excavación Auxiliar vial controlando el tráfico por la salida y entrada de volquetas, en la vía de acceso a el tanque de almacenamiento Fundición solado de limpieza Colocación de refuerzo losa inferior Colocación de refuerzo en muros Espesor de losa y muros: 40 cms - 28 Mpa Instalación de formaleta metálica para muros perimetrales y central Instalación de formaleta metálica para para muros perimetral de caja de salida Instalación de cinta PVC Fundición de losa inferior y 0.5 mtrs de muro el día Viernes 24 de Enero 2025. Toma del Slump y muestras de concreto en la mañana y tarde Colocación de 189 m3 de concreto premezclado Aplicación de antisol		
Retiro de formaleta metálica interior y exterior de parte inicial del muro perimetral Inicio de colocación del acero de refuerzo de los muros perimetrales Inicio de instalación de la formaleta metálica Riego con agua la losa del tanque y parte del muro en la mañana y tarde Se termina de instalar la formaleta metálica Instalación de cinta PVC Fundición de muros en concreto a una altura de 2.4 mtrs Toma de muestras de concreto y slump Retiro total de formaleta metálica Fraguado de muro Instalación de formaleta metálica para terminar el muro en concreto, a una altura de 1.8 mtrs Construcción de formaletas en madera para vigas transversales vigas de 40 por 45 PTAP GUACARI Estado Actual Sedimentador 3: En servicio Estado Actual Sedimentador 2: En servicio Caseta eléctrica		



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI

Código: FO-PDA.2.1-4

Versión: 4

Fecha de Vigencia:
01/02/2019

INFORME DE INTERVENTORÍA

INFORME No 22 PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Actividades ejecutadas

Realizan la excavación de las zapatas adicionales de la caseta

Retoman el armado del acero de los castillos de las columnas

Arman el acero y funden las zapatas y los pedestales de la caseta

Arman el acero de las vigas de cimentación adicionales.

Realizan el relleno con material de sitio en la zona de las zapatas

Fundición de vigas de amarre superior

Fundición de pedestales para cubierta

Colocación de ladrillo estructural

Se llevo a cabo una reunión el día 19 de Febrero de 2025 para tratar temas relacionados con la parte eléctrica de la caseta que se está construyendo, participaron Contratista, Acuavalle e Interventoría (Ing. Eléctrico Luis Mario Davila).

COMPONENTE AMBIENTAL

Con relación al tema ambiental se tiene:

Permiso de aprovechamiento Forestal en la Bocatoma Ginebra, se tiene que, la Alcaldía radicó oficio ante CVC el día 27 de febrero de 2024, No. Radicado 206392024 y se da respuesta : Resolución 740 No. 0741 0678 23-07-2024 - "Por medio de la cual se autoriza un aprovechamiento forestal de árboles aislados predio planta PTAP ubicado en jurisdicción del Municipio de Ginebra, Departamento del Valle del Cauca" - VIGENCIA: 23-07-2025

Permiso para rotura del pavimento del Tramo N° 3, se radica ante la Secretaría de Planeación de Guacarí, pero a la fecha no se tiene respuesta. El contratista radica nuevamente oficio en las Alcaldías de Ginebra y Guacarí el día 22 de octubre de 2024.

Por parte de la Gobernación del Valle, se recibe respuesta del oficio del 5 de agosto, el día 27 de septiembre de 2014, mediante oficio 1.360.129 radicado 2024138147, donde informan que las vías a intervenir son del Municipio de Guacarí.

Permiso de rotura

Se radica solicitud por tercera vez, en el Municipio de Ginebra, para los siguientes tramos:

Tramo 1: Inicia desde la Bocatoma y finaliza en Puente Amarillo.

Tramo 2: Inicia en Puente Rojo y finaliza en el acceso a la PTAP Ginebra

Se radica solicitud por tercera vez, en el Municipio de Guacarí, el tramo que corresponde:

Puente Amarillo a Puente Rojo.

Aprovechamiento Forestal PTAP GINEBRA

7. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

• Las labores en la obra continúan desarrollándose en tres frentes de trabajo:

- PTAP de Guacarí: Sedimentación – Caseta Eléctrica
- PTAP de Ginebra: Sedimentación – Filtración – Tanque de Almacenamiento - Caseta Eléctrica
- Tanque de Almacenamiento La Albania – Ginebra

• El frente del Tramo 3 continua suspendido, se estará coordinando su inicio para Marzo, por la firma de un acta con los compromisos entre la Gobernación del Valle del Cauca, Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P. y la Comunidad encabezada por Pro-territorio.

• Con el Ingenio Pichichi ya se encuentra en la etapa final de la servidumbre, se puede iniciar para Marzo este tramo de tubería PEAD 14" en una L: 500 ml

• Con la Familia Saavedra - Blum ya está en proceso de servidumbre para instalar en su predio la Tubería PEAD 10" en una L: 600 ml

• Los trabajos en las plantas se desarrollan de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato

• Los permisos que se tienen pendientes por la parte ambiental y permisos de demolición de pavimento siguen aún pendientes por parte de las entidades a quien se los ha solicitado.

• Los trabajos de localización y replanteo en la vía del Tramo 1: CADICA a BOCATOMA, continúan sin ningún inconveniente

• Se continúan realizando los trabajos bajo las medidas de seguridad acordados con el contratista.

• Los acercamientos con los líderes del sector de Puente Rojo y Proterritorio han mejorado el dialogo con la comunidad permitiendo que se mejore la aceptación de la obra.

• Todo el personal tiene cobertura de seguridad social y riesgos laborales.

• Se siguen los lineamientos de medicina preventiva, realizando los exámenes de ingreso para el personal nuevo.

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019
ANEXO 1 - ASPECTOS TECNICOS INFORME 22			
I. RELACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO			
ITEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	
	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA - PTAP GINEBRA	Con una capacidad de almacenamiento de 470 m3 en dos compartimientos y caja de válvulas que va abastecer a La Floresta y Villa Vanegas Estado Actual: En ejecución 92 % Actividades por ejecutar: • Losa superior de cámaras de entrada y salida • Instalación de sistema de válvulas • Instalación de tapas en láminas de alijador para entrada a tanque • Rellenos perimetrales: en ejecución – se suspendió por lluvias permanentes • Instalación tubería de desagüe	
	SEDIMENTADOR N° 3 - PTAP GINEBRA	Sistema de barrelados Módulos Tipo Colmena Canaletas en acero inoxidable Tipo dentada , Pasarelas SEDIMENTADOR EN SERVICIO	
	SEDIMENTADOR N° 2 - PTAP GINEBRA	Sistema de barrelados Módulos Tipo Colmena Canaletas en acero inoxidable Tipo dentada , Pasarelas SEDIMENTADOR EN SERVICIO	
	SEDIMENTADOR N° 1 - PTAP GINEBRA	: La obra civil se terminó, ya el Sub contratista Co Ingeniería, va iniciar las labores de verificación de medidas para el barrelados y canaletas en acero inoxidable .	
	CASETA ELÉCTRICA- PTAP GINEBRA:	Durante este periodo, se realizaron las siguientes actividades: • Las actividades en la caseta finalizaron. Esta pendiente el detallado de la caseta, el repello para dar pendiente a la viga canal, la impermeabilización, limpieza de las puertas y las ventanas.	
	CASETA SOPLADORES DE FILTRACIÓN - PTAP GINEBRA:	Durante este periodo no se realizaron actividades en esta caseta, debido a que esta no está incluida en la primera reformulación	
	MURO DE CONTENCIÓN - PTAP GINEBRA:	En comité de obra se decide que este muro no es necesario construirlo. El terreno es estable y no hay ningún tipo de riesgo en esta zona	
	LÍNEA DE CONDUCCIÓN - TRAMO 3	• Las actividades aún se encuentran suspendidas por causa de la comunidad, desde el día 11 de junio del año 2024. El día 18 de diciembre se firma el acuerdo con la Gobernación, Valle caucana de Aguas e representantes de la comunidad. Se espera que con la firma de este documento se pueda retomar en el frente 3 e iniciar los frentes 1 y 2.	
	CASETA ELÉCTRICA - PTAP GUACARÍ:	Estado Actual: Ejecución 100 % obra civil Se continúan con las excavaciones para ductos eléctricos del poste de la acometida a la caseta eléctrica Se instala ducto eléctrico que va alimentar el Streaming Current Relleno con material de excavación Se instala el sistema Streaming Current	
	CASETA SOPLADORES DE FILTRACIÓN - PTAP GUACARÍ:	• En este periodo no se realizaron intervenciones en la caseta de sopladores. Se encuentran en sitio los equipos sopladores	

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-PDA.2.1-4	
		INFORME DE INTERVENTORIA		Versión: 4	
				Fecha de Vigencia: 01/02/2019	
ANEXO 1 - ASPECTOS TECNICOS INFORME 22					
I. RELACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO					
ITEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCION			
	SEDIMENTADOR N° 3 - PTAP GUACARÍ:	• Ajustes de losa de fondo en concreto • Impermeabilización de muros • Instalación de la estructura metálica y los módulos sedimentadores tipo colmena • Instalación de las tres cerchas en acero inoxidable que soportaran las canaletas • Instalación de las canaletas de reparto en acero inoxidable. • Instalación de la estructura metálica de la pasarela y los pasamanos • Instalación válvula mariposa de diámetro 4" para evacuar los lodos • Instalación de las válvulas existentes de diámetro 4" • Ajustes para iniciar las pruebas y puesta en marcha del barrelados con personal de Acuavalle EN SERVICIO			
	SEDIMENTADOR N° 2 - PTAP GUACARÍ:	• Ajustes de losa de fondo en concreto • Impermeabilización de muros • Instalación de la estructura metálica y los módulos sedimentadores tipo colmena • Instalación de las tres cerchas en acero inoxidable que soportaran las canaletas • Instalación de las canaletas de reparto en acero inoxidable. • Instalación de la estructura metálica de la pasarela y los pasamanos • Instalación válvula mariposa de diámetro 4" para evacuar los lodos • Instalación de las válvulas existentes de diámetro 4" • Ajustes para iniciar las pruebas y puesta en marcha del barrelados con personal de Acuavalle EN SERVICIO			
	LÍNEA DE CONDUCCIÓN - TRAMO 1	En este período se realizan las siguientes actividades en este tramo: • La comisión de topografía realiza levantamiento en la zona de la bocatoma • La comisión de topografía en conjunto con la interventoría, realiza batimetría en la zona donde se va construir la bocatoma y el desarenador. • El contratista continúa realizando chequeos, verificaciones, localizaciones donde se debe hacer las intervenciones civiles en este tramo. Tamien se hacer revisió y se busca posibles soluciones a los puntos críticos de la vía donde se va a instalar la tubería.			
	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA - GINEBRA-SECTOR LA ALBANIA:	Dimensiones Largo: 25 mts Ancho: 15 mts Profundidad: 5 mts Actividades ejecutadas: • Localización y replanteo • Chequeo de niveles de la excavación • Excavación a máquina y retiro de material sobrante de la excavación • Auxiliar vial controlando el tráfico por la salida y entrada de volquetas, en la vía de acceso a el tanque de almacenamiento • Fundición solado de limpieza • Colocación de refuerzo losa inferior • Colocación de refuerzo en muros • Espesor de losa y muros: 40 cms - 28 Mpa • Instalación de formaleta metálica para muros perimetrales y central • Instalación de formaleta metálica para para muros perimetral de caja de salida • Instalación de cinta PVC • Fundición de losa inferior y 0.5 mtrs de muro el día Viernes 24 de Enero 2025. • Toma del Slump y muestras de concreto en la mañana y tarde • Colocación de 189 m3 de concreto premezclado • Aplicación de antisol • Retiro de formaleta metálica interior y exterior de parte inicial del muro perimetral • Inicio de colocación del acero de refuerzo de los muros perimetrales • Inicio de instalación de la formaleta metálica • Riego con agua la losa del tanque y parte del muro en la mañana y tarde• Se termina de instalar la formaleta metálica • Instalación de cinta PVC • Fundición de muros en concreto a una altura de 2.4 mtrs • Toma de muestras de concreto y slump • Retiro total de formaleta metálica • Fraguado de muro			
II. RELACION DE SOPORTES DOCUMENTALES (ACTAS, CORRESPONDENCIA,CONTROL BITACORA)					
No	DESCRIPCION	CONTENIDO			
1	INFORME MENSUAL DE CONTRATISTA No. 22	SE ANEXA DOCUMENTO			
2	INFORME No 22 DE INTERVENTORIA CON INFORME DE SST Y COMPONENTE SOCIAL	SE ANEXA DOCUMENTO			

INFORME DE INTERVENTORIA

ANEXO 2 - PRUEBAS/ENSAYOS

FECHA:	FEBRERO 28 DE 2025
MATERIAL:	CONCRETO 3000 PSI
CANTIDAD PARA PRUEBA:	
NOMBRE DE LA PRUEBA/ENSAYO:	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN CILINDROS DE CONCRETO
LOCALIZACION:	PTAP GINEBRA Y GUACARI
LABORATORIO:	GEOZAM
NORMA - ESPECIFICACION:	INV E 410 -13 / NTC 673 / NTC 3546

TEM	ENSAYO REALIZADO	RESULTADO (Mpa)	ANALISIS RESULTADO	CUMPLE S/N	OBSERVACIONES	DECISIONES
1	VIGA DE AMARRE CASETA ELECTRICA GUACARI	25,2	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	SI	28DIAS	
2	REALCE COLUMNAS CASETA ELECTRICA GUACARI	23	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	SI	28DIAS	
3	LOSA NIVELACION SEDIMENTADOR 2 GUACARI	35	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	SI	28 DIAS	
4	LOSA INFERIOR CÁMARA DE INGRESO - PTAP GINEBRA	28,0 Mpa	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	SI	21 Días	
5	LOSA INFERIOR TANQUE ALBANIA	29,8	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	SI	7 DIAS	
6	LOSA INFERIOR TANQUE ALBANIA	31,3	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	SI	14 DIAS	
7	LOSA INFERIOR TANQUE ALBANIA	34	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	SI	28 Días	
8	LOSA INFERIOR TANQUE ALBANIA	35	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	SI	7 Días	
9	LOSA INFERIOR TANQUE ALBANIA	37,3	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	SI	14 Días	
10	LOSA INFERIOR TANQUE ALBANIA	38,6	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	SI	28 días	

INFORME DE INTERVENTORIA

ANEXO 4 - ASPECTOS SOCIALES

INFORME N° 22

I. ASPECTOS SOCIALES

ITEM	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN
1	Diagnóstico de la Zona de Influencia del Proyecto	Continúa pendiente la realización de la cartografía social
2	Censos de Viviendas Afectadas por el Proyecto	En el mes de febrero de 2025 la gestión social del contratista informó que hasta el momento hay un acumulado del 77.14%
3	Programa de Información a la Comunidad	La interventoría evidencia que se ha cumplido con brindar la información a la comunidad por medio de las socializaciones que se han realizado en meses pasados, dando cumplimiento a esta actividad del Plan de Gestión Social, sin embargo, se continuará brindando la información que se requiera para aclarar las inquietudes de la comunidad.
4	Programa de divulgación a la comunidad	En el mes de febrero no se programaron actividades de divulgación a la comunidad.
5	Reuniones con la comunidad	La interventoría evidencia que el contratista ha cumplido con esta actividad de reuniones con la comunidad planteada en el Plan de Gestión Social. Se continúa esperando a que los alcaldes de Ginebra y Guacarí programen la socialización con la comunidad en general la cual fue aplazada.
6	Programa de atención a la comunidad	Se continúa con el espacio dispuesto para el PAC con los formatos de PQRS para que la comunidad acceda a ellos si tienen alguna pregunta, queja o solicitud. En este mes no se recibió PQRS de la comunidad.
7	Programa de atención al ciudadano	El contratista continúa cumpliendo con el programa de atención al ciudadano, en el punto de atención se cumple con los horarios establecidos: Martes de 08:00 am a 12m Viernes 1:00 pm a 4:00 pm, Lugar: oficina ubicada en la calle 11 # 4-37, tercer piso, edificio La Piscina barrio El Centro - corregimiento de Costa Rica, municipio Ginebra, Valle del Cauca. El buzón de sugerencia ubicado en la papelería del señor Jorge Mendoza, carrera 5 #10-46, primer piso, Centro - Costa Rica, funcionó correctamente en el mes de febrero, para el mes de marzo será removido por cierre del establecimiento, se está gestionando una nueva ubicación en la Personería municipal de Guacarí. El segundo buzón de sugerencias esta ubicado en Estanco Top Top, Cra 2 #5-28 en la cabecera municipal de Ginebra, cuando sea su funcionamiento.
8	Recorridos por la Obra	En este mes de febrero no se realizó de recorrido de obra con veedores para mostrar los avances en las plantas de tratamiento de Ginebra y Guacarí, se programará recorrido para el mes de marzo de 2025.
9	Reunión de Avance de Obra	Se evidenció que el componente social del contratista realizó las dos reuniones informativas de
10	Conformación del comité de veeduría ciudadana	Se evidenció que el contratista dio cumplimiento al aspecto N° 10 del Plan de Gestión Social con la
11	Vinculación de mano de obra calificada y no calificada	El contratista informó que en el mes de febrero se contrataron 8 personas de Costa Rica, 3 de Ginebra y Guacarí, para desempeñar labores como ayudantes de obra y oficial. Estas personas fueron seleccionadas del banco de hojas de vida, el contratista manifiesta que la permanencia de algunas personas en la obra es inestable, ocasionando que se deba permanente seleccionar personal para vincular de otros municipios.

II. DOCUMENTOS (Adjuntar soportes)

No.	DESCRIPCION	DETALLE
1	ACTAS	
2	CORRESPONDENCIA	
3	VARIOS	

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI	Código: FO-PDA.2.1-4
			Versión: 4
			Fecha de Vigencia: 01/02/2019
INFORME DE INTERVENTORIA			
ANEXO 5 - PREDIOS, SERVIDUMBRES, PERMISOS INFORME 22			
ITEM	LOCALIZACION	DESCRIPCION	ESTADO DE LA GESTION (AVANCE)
I. PREDIOS			
	N/A		
II. SERVIDUMBRES			
No.	LOCALIZACION	DESCRIPCION	ESTADO DE LA GESTION (AVANCE)
	Vía a el Ingenio Pichichi K6+350 a K6+850 Matricula inmobiliaria N° 373-112779	Dentro de las actividades que se realizaron en la obra fue la localización y replanteo del trazado de la tubería y dentro de este se tiene identificado una parte del trazado de la tubería fue planteado por un carreterable localizado dentro del predio identificado con la matricula inmobiliaria N° 373-112779 de propiedad del Ingenio Pichichi. Después de realizar el levantamiento topográfico se obtuvo que para continuar con el desarrollo del proyecto se requiere intervenir una longitud de 500 mt. para la instalación de tubería PEAD 350 MM PN 10 a una profundidad promedio de 1.45 mt.	EN TRAMITE
	Vía acceso planta de Ginebra	Permiso de intervención instalación tubería diámetro 10": para la instalación de la tubería de llegada a la PTAP de Ginebra en el tramo de servidumbre de la señora Blum, se encuentra pendiente la ejecución de algunos compromisos previamente pactados por Acuavalle, los cuales a la fecha no han sido ejecutados, por lo tanto, la propietaria no autoriza la intervención hasta no sea resuelto este pendiente.	FINALIZADO
III. PERMISOS			
No.	ENTIDAD A EMITIR EL PERMISO	DESCRIPCION	ESTADO DE LA GESTION (AVANCE)
1	CVC	• Permiso de aprovechamiento forestal para la construcción de la bocatoma desarenador, macromedidor y aducción.	Nota 1: La Alcaldía radicó oficio ante CVC el día 27 de febrero de 2024, No. Radicado 206392024 OTORGADO Resolución 740 No. 0741 0678 23-07-2024 "Por medio de la cual se autoriza un aprovechamiento forestal de árboles aislados predio planta PTAP ubicado en jurisdicción del Municipio de Ginebra, Departamento Valle del Cauca" VIGENCIA 23-07-2025
2	CVC	• Estudio de socavación local y general para construcción de la bocatoma, de acuerdo a lo solicitado en las obligaciones de la resolución de ocupación del cauce expedida por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Este estudio es necesario para definir la totalidad de las obras a ejecutar en la bocatoma.	AUN NO SE HA INICIADO LA GESTIÓN
3	CVC	PERMISO OCUPACION DE CAUCES El día 7 de marzo de 2023 se realiza la notificación del acto administrativo por el cual se promulga el permiso de ocupación de cauce otorgado en la Resolución 0740 N° 0741 01430 del 9 de diciembre de 2021. El tiempo del permiso de ocupación de cauce se extendió un (01) año a partir de la fecha de notificación de este acto administrativo. Cabe destacar que durante este periodo no se han adelantado actividades de ocupación del cauce ni desvío del mismo. Respecto a la vigencia del permiso, se continúa enfatizando que la entidad Acuavalle S.A. E.S.P. radicó el oficio AC - 18002024 ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC solicitando la prórroga del permiso de Ocupación de Cauce, con número de radicado 207602024 del 27 de febrero de 2024. Después que Acuavalle recibió el 19 de marzo del 2024 por parte de CVC el cobro por EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO a la solicitud de prórroga, realizaron el pago mediante cheque el día 12 de abril del 2024. Se pudo tener hasta el día 14 de mayo del presente año la visita técnica ambiental por parte de CVC con el fin de evaluar la solicitud de prórroga del Permiso de Ocupación de Cauce. (Documento Adjunto)	AMBIENTAL PARA PRÓRROGA Nota 1: Acuavalle radicó oficio ante CVC el día 27 de Febrero de 2024. Otorgado / 7 marzo de 2024 (1 año) Nota 2: Acuavalle realizó pago el 12 de abril de 2024 por evaluación y seguimiento para prórroga. Prórroga Permiso de Ocupación de Cauce RESOLUCIÓN 0740 No. 0741 0502 del 31 de Mayo de 2024
4	CVC	Permiso de Concesión de aguas superficiales	OTORGADO Resolución 0740 No. 0741 0000576 10-07-2020 "Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales a favor de ACUAVALLE S.A. E.S.P. NIT. 890399032-8 para Los acueductos de los municipios de Ginebra y Guacarí, Departamento del Valle del Cauca" VIGENTE

INFORME DE INTERVENTORIA

ANEXO 5 - PREDIOS, SERVIDUMBRES, PERMISOS INFORME 22

ITEM	LOCALIZACION	DESCRIPCION	ESTADO DE LA GESTION (AVANCE)
5	CVC	Permiso de Aprovechamiento Forestal - PTAP Ginebra	OTORGADO Resolución 740 No. 0741 0381 29-04-2024 Entrega del informe de aprovechamiento forestal a la CVC por parte de ACUAVALLE S.A. Se espera asignación de compensación forestal y aprobación del predio propuesto para la siembra por parte de esta entidad.
6	Planeación Municipal Ginebra	Licencia de Espacio Público	OTORGADO Resolución No. 004-01 2023 26-01-2023 "Por medio de la cual se aprueba una licencia urbanística de intervención y ocupación del espacio público" VIGENCIA 26-01-2025 VIGENTE
7	Planeación Municipal Guacarí	Licencia de Espacio Público	OTORGADO Resolución No. 004-01 2023 26-01-2023 Por la cual se expide una licencia de intervención del espacio público para desarrollar un proyecto" VIGENCIA 03-02-2025 VIGENTE
8	Secretaría de Movilidad de Ginebra	Plan de Manejo de tránsito	OTORGADO Resolución No. 900-50-020 20-03-2023 "Por medio de la cual se aprueba el Plan de Manejo de Tránsito – PMT presentado por el Consorcio Redes y PTAPS Valle" VIGENCIA DURACIÓN DEL PROYECTP VIGENTE
9	Secretaría de Movilidad y transporte de Guacarí	Plan de Manejo de tránsito	OTORGADO "Por medio de la cual se aprueba el Plan de Manejo de Tránsito – PMT presentado por el Consorcio Redes y PTAPS Valle" VIGENCIA DURACIÓN DEL PROYECTP VIGENTE
10	Planeación Municipal Ginebra	Permiso de rotura de pavimento Se radica solicitud por segunda vez, en el Municipio de Ginebra, para los siguientes tramos: Tramo 1: inicia desde la Bocanoma y finaliza en Fuente Amarillo. Tramo 2: Inicia en Puente Rojo y finaliza en el acceso a la PTAP Ginebra Se radica solicitud por segunda vez, en el Municipio de Ginebra, en el tramo: Puente Amarillo a Puente Rojo.	PENDIENTE - El contratista radica nuevamente oficio en la Alcaldía de Ginebra el día 14 de agosto, en la y en la Gobernación del Valle el día 5 de agosto de 2024 - El contratista recibe comunicado por parte de la Gobernación del Valle el día 27 de septiembre 2024, en respuesta a el oficio enviado el día 5 de agosto de 2024. - El contratista radica nuevamente oficio en la Alcaldía de Ginebra el día 22 de octubre de 2024.
11	Planeación Municipal Guacarí	Permiso de rotura de pavimento Se radica solicitud en la Gobernación del Valle, para el tramo: Inicia desde la Abscisa K7+420, (Vía entre los corregimientos de Guabitas y el Placer) hasta la Planta de Guacarí.	PENDIENTE - Se recibe el 22 de mayo 2024 documentación por el Director del Departamento Administrativo de Planeación sobre la solicitud ante la Alcaldía de Guacarí. - "El contratista radica nuevamente oficio en la Alcaldía de Guacarí el día 21 de agosto y en la Gobernación del Valle el día 5 de agosto de 2024" - "El contratista recibe comunicado por parte de la Gobernación del Valle el día 27 de septiembre 2024, en respuesta a el oficio enviado el día 5 de agosto de 2024." - El contratista radica nuevamente oficio en la Alcaldías de Ginebra y Guacarí el día 22 de octubre de 2024.
12	CVC	Aprovechamiento Forestal PTAP GINEBRA En el mes de julio se realizo visita a predio de la Alcaldia de Ginebra para realizar la compensación forestal de las especies arbóreas que fueron aprovechadas en la PTAP Ginebra. Se está a la espera de comunicado de la CVC para aprobación del nuevo predio y su recomendación para poder realizar esta compensación.	EN ESPERA DE RESPUESTA . Es este periodo visitan la obra dos funcionarios de la CVC, la Ingeniera Daniel Castillo y el Técnico Segundo Fiscal para a coordinar la relacionarlo con la siembra por compensación en respuesta al requerimiento realizado por ACUVALLE y en cumplimiento al permiso de aprovechamiento forestal de la planta de Ginebra. Pero no se pudo hacer la visita a el predio debido a que no se dio la autorización para la visita, se debe reprogramar

ANEXO 6 - RECURSO HUMANO INFORME 22

I. RECURSO HUMANO CONTRATISTA

No.	NOMBRE	FORMACION ACADEMICA	CARGO	FUNCIONES
1	CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL	ING. CIVIL	DIR. DE OBRA	- Planificar la organización de la obra. - Proponer los procedimientos y técnicas más idóneas para el desarrollo del proyecto. - Realizar seguimiento a los recursos designados durante la ejecución. - Planificar y fijar los tiempos de gestión y las fases de la construcción, así como hacer un seguimiento de los avances cumpliendo el cronograma establecido. - Controlar la documentación oficial de la obra. - Formar, dirigir y poner en marcha al eficiente equipo de empleados.
2	LINA MARCELA BURITICÁ	ING. CIVIL	COORDINADORA DE PROYECTOS	- Planificar la organización de la obra. - Proponer los procedimientos y técnicas más idóneas para el desarrollo del proyecto. - Realizar seguimiento a los recursos designados durante la ejecución. - Planificar y fijar los tiempos de gestión y las fases de la construcción, así como hacer un seguimiento de los avances cumpliendo el cronograma establecido. - Controlar la documentación oficial de la obra. - Formar, dirigir y poner en marcha al eficiente equipo de empleados.
3	GINA LEIDY LÓPEZ	ING. SANITARIA	RESIDENTE DE OBRA	- Supervisar la ejecución de las obras de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas. - Velar por el cumplimiento del plazo de ejecución de cada obra. - Coordinar las actividades de los diferentes frentes de trabajo, personal directo y/o subcontratistas. - Evaluar la ejecución de los planes y programas de trabajo. - Solicitar los materiales requeridos oportunamente. - Elaborar los reportes y avances de obra. - Calcular las cantidades de obra ejecutada.
4	DIANA MARCELA ECHAVARRIA CASILIMAS,	ING. AMBIENTAL	ING. AMBIENTAL	- Realizar el plan de manejo ambiental del proyecto. - Tramitar los permisos ambientales requeridos ante la entidad competente. - Tramitar los permisos requeridos en las alcaldías municipales de Guacarí y Ginebra. - Implementar el plan de manejo ambiental del proyecto. - Realizar el seguimiento a la implementación del PMA.
5	DARIO ENRIQUE FLOREZ TRUJILLO	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE FUNDACIONES.	RESIDENTE DE OBRA	- Supervisar la ejecución de las obras de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas. - Velar por el cumplimiento del plazo de ejecución de cada obra. - Coordinar las actividades de los diferentes frentes de trabajo, personal directo y/o subcontratistas. - Evaluar la ejecución de los planes y programas de trabajo. - Solicitar los materiales requeridos oportunamente. - Elaborar los reportes y avances de obra. - Calcular las cantidades de obra ejecutada.
6	MARIA FERNANDA MARTINEZ BRICEÑO	TRABAJO SOCIAL, ESPECIALIZACION EN GERENCIA SOCIAL ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD CON ENFASIS EN DESARROLLO EMPRESARIAL	PROFESIONAL EN EL TRABAJO SOCIAL.	- Brindar información clara, concisa y veraz a la población del área de influencia acerca de las actividades técnicas y operativas inherentes al proyecto. - Dar a conocer a la comunidad en general el estado de la infraestructura existente y las obras que se construirán. - Diseñar e implementar campañas informativas de la obra, para los diferentes tipos de población. - Informar oportunamente antes, durante y después de las obras de construcción del proyecto el alcance, actividades, impactos y las correspondientes medidas de manejo o estrategias de intervención para minimizarlos. - Dar respuesta oportuna a las inquietudes de la comunidad.

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-PDA.2.1-4
		INFORME DE INTERVENTORIA		Versión: 4
				Fecha de Vigencia: 01/02/2019
ANEXO 6 - RECURSO HUMANO INFORME 22				
I. RECURSO HUMANO CONTRATISTA				
No.	NOMBRE	FORMACION ACADEMICA	CARGO	FUNCIONES
7	JIMMY JAVIER SINISTERRA ORTIZ	TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA	TOPOGRAFO	- Levantamiento topográfico previo al inicio de las actividades. - Localización y replanteo de estructuras a construir. - Localización y replanteo de tuberías a instalar. - Control y chequeo de excavaciones, verificación de cotas de diseño.
8	DIANA MARCELA MURIEL FLOR	Ingeniera ambiental	INGENIERO AUX. AMBIENTAL	- Realizar el plan de manejo ambiental del proyecto. - Tramitar los permisos ambientales requeridos ante la entidad competente. - Tramitar los permisos requeridos en las alcaldías municipales de Guacarí y Ginebra - Implementar el plan de manejo ambiental del proyecto. - Realizar el seguimiento a la implementación del PMA.
9	FLOR MARÍA MARTÍNEZ	Profesional-SST	PROFESIONAL-SST	Responsable de la ejecución del plan de gestión SST
10	LILIBETH MORA DUARTE	Tecnóloga en obras civiles	INSPECTORA DE OBRA	- Supervisar la ejecución de las obras de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas. - Coordinar las actividades de los diferentes frentes de trabajo, personal directo y/o subcontratistas.
II. RECURSO HUMANO INTERVENTORIA				
No.	NOMBRE	FORMACION ACADEMICA	CARGO	FUNCIONES
1	ALEJANDRO ESTRADA	ING SANITARIO	DIR. DE OBRA	COORDINACION GENERAL DEL PROYECTO
2	JESUS IVAN BASTIDAS	ING SANITARIO	RESIDENTE DE OBRA/ING AMBIENTAL	VERIFICACIÓN REVISION DOCUMENTAL, AJUSTES A DOCUMENTOS, CONTROL DE ACTIVIDADES EN CAMPO. REVISION COMPONENTE AMBIENTAL
4	ANDRES FLECHAS	TOPOGRAFO	TOPOGRAFO	VERIFICACIÓN CONTROL TOPOGRAFIA, MEDICIONES CONJUNTAS, ALTIMETRICAS Y PLANIMETRICAS
5	NEISLER ABADIA	TRAB. SOCIAL	TRAB. SOCIAL	TRABAJO SOCIAL, SOCIALIZACION CON LAS COMUNIDADES, VERIFICACION DE ACTIVIDADES COMPONENTE SOCIAL
6	JULIANA IZQUIERDO M.	PROFESIONAL SST	PROFESIONAL SST	REVISION DOCUMENTAL Y EN CAMPO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD SST, VISITAS EN CAMPO. SEGUIMIENTO EJECUCION PLAN DE SST
7	JULIAN ANDRADE	ING. CIVIL	APOYO A LA DIRECCIÓN	REVISION DOCUMENTAL Y EN CAMPO, VERIFICACIÓN Y CONTROL ACTIVIDADES DE OBRA, REVISIONES CONJUNTAS CON CONTRATISTA PROCEDIMIENTOS DE OBRA

INFORME DE INTERVENTORIA

ANEXO 7 - MAQUINARIA/EQUIPOS 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

7.1 MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIÓN
PLANTA ELECTRICA	SI	SI	SI		PTAP GUACARI	ANCLAJES	
PLANTA ELECTRICA	SI	SI	SI		PTAP GINEBRA	ANCLAJES	
PULIDORA	SI	SI	SI		PTAP GUACARI	MUROS DEL SEDIMENTADOR 2	
TALADRO	SI	SI	SI		PTAP GUACARI	ANCLAJES	
TALADRO	SI	SI	SI		PTAP GINEBRA	ANCLAJES	
VIBRADOR	SI	SI	SI		PTAP GINEBRA	LOSA DE FONDO LOSA SUPERIOR TANQUE	
VIBRADOR	SI	SI	SI		PTAP GUACARI	LOSA DE FONDO	
MEZCLADORA DE CONCRETO	SI	SI	SI		PTAP GUACARI	LOSA DE FONDO REALCES DE MURO	
MEZCLADORA DE CONCRETO	SI	SI	SI		PTAP GINEBRA	REALCES DE MURO	
RETROEXCAVADORA DE ORUGA	SI	SI	NO		PTAP GINEBRA SECTOR ALBANIA	EXCAVACIONES Y LLENOS	
RETROEXCAVADORA DE LLANTA	SI	SI	NO		PTAP GINEBRA SECTOR ALBANIA	EXCAVACIONES Y LLENOS	
VOLQUETAS	SI	SI	NO		PTAP GINEBRA SECTOR ALBANIA	EXCAVACIONES Y LLENOS	

7.2 EQUIPOS DE MEDICION

[illegible]

PTAP GINEBRA



FOTOGRAFÍA No.1: Sedimentador 3 : En servicio



FOTOGRAFÍA No.2: Sedimentador 2 : En servicio



FOTOGRAFÍA No.3: Sedimentador 1: La obra civil se terminó, ya el Sub contratista Co Ingeniería, va iniciar las labores de verificación de medidas para el barrelados y canaletas en acero inoxidable .



FOTOGRAFÍA No.4: Sedimentador 1: La obra civil se terminó, ya el Sub contratista Co Ingeniería, va iniciar las labores de verificación de medidas para el barrelados y canaletas en acero inoxidable .

PTAP GINEBRA - TANQUE DE ALMACENAMIENTO y TANQUE LA ALBANIA



FOTOGRAFÍA No.5: • Rellenos perimetrales: en ejecución



FOTOGRAFÍA No. 6: • Rellenos perimetrales: en ejecución



FOTOGRAFÍA No.7: caseta electrica, obra civil ejecutada,



FOTOGRAFÍA No.8: Tanque de almacenamiento La Albania



FOTOGRAFÍA No.9: Tanque de almacenamiento La Albania



FOTOGRAFÍA No. 10: Tanque de almacenamiento La Albania

PTAP GUACARI



FOTOGRAFÍA No. 11: Sedimentador 3: En servicio



FOTOGRAFÍA No. 12: Sedimentador 2: En servicio

 PAP - PDA REGISTRADO EN EL MINISTERIO DE INTERIORES "SAN DOMINGO" DE BOGOTÁ VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA		Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019
ANEXO 8 - REGISTRO FOTOGRÁFICO	INFORME N° 22	PERIODO:	01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025
			
FOTOGRAFÍA No. 12: Caseta eléctrica Estado Actual: En ejecución 30 %	FOTOGRAFÍA No. 13: Reuniones Técnicas con contratista y subcontratistas de obra.		
			
FOTOGRAFÍA No. 14: TANQUE DE ALMACENAMIENTO - PTAP GINEBRA SECTOR LA ALBANIPLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - PMT	FOTOGRAFÍA No. 15: TANQUE DE ALMACENAMIENTO - PTAP GINEBRA SECTOR LA ALBANIPLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - PMT		

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI				Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019	
INFORME DE INTERVENTORIA							
ANEXO 9 - INFORME INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO					PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025		
CONTRATO No. :		2000.13.05.003-2022					
OBJETO:		EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA."					
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:		\$ 29.432.080.933,00					
CONTRATISTA:		CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE					
INTERVENTOR:		CONSORCIO INTERGUACARI					
PLAZO:		22 MESES					
VALOR ANTICIPO :		30%	\$ 8.829.624.280,00				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO	
1	ADMINISTRATIVOS				-	-	
2	EQUIPOS	\$ 1.744.905.661,00	\$ -	\$ 1.744.905.661,00	\$ 1.744.905.661,00	\$ -	
3	TRANSPORTES				\$ -	\$ -	
4	MATERIALES	\$ 6.125.300.150,00	\$ -	\$ 5.112.500.588,00	\$ 6.125.300.150,00	\$ -	
5	OTROS	\$ 939.416.403,00	\$ -	\$ 946.875.806,00	\$ 946.875.806,00	\$ 10.542.003,00	
TOTALES		\$ 8.829.624.280,00	7.280.569.145,00	7.806.282.055,00	8.819.081.617,00	10.542.663,00	

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019	
INFORME DE INTERVENTORIA					
FICHA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS Y OBRAS INFORME No. 22 FEBRERO DE 2025					
FECHA:	DÍA	MES	AÑO	HORA DE INICIO:	
	28	2	2025	HORA DE FINALIZACIÓN :	
VEREDA/ CORREGIMIENTO:	PUENTE ROJO, LA MAGDALENA, GUABITAS			MUNICIPIO:	GINEBRA/GUACARI
TRAMO/FRENTE DE OBRA:				LONGITUD/ÁREA :	
CONSORCIO : REDES Y PTAPS VALLE				AVANCE DE OBRA (%)	73,03%
DESCRIPCIÓN DE VISITA TÉCNICA					
COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	
AIRE		X			
EMISIONES DE MATERIAL PARTICULADO		X			
EMISIONES DE RUIDO		X			
EMISIÓN DE OLORES OFENSIVOS					
OTROS:					
SUELO	SI	NO	N/A		
AFECTACIÓN DE LA CAPA ORGÁNICA		X			
PROCESOS EROSIVOS		X			
DISPOSICIÓN INADECUADA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		X			
DISPOSICIÓN INADECUADA DE RESIDUOS SOLIDOS (DOMÉSTICOS, ESPECIALES, PELIGROSOS)		X			
DISPOSICIÓN INADECUADA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES - RCD		X			
OTROS:					
AGUA	SI	NO	N/A		
DEFICIENCIAS DE ABASTECIMIENTO EN OBRA		X			
VERTIMIENTOS AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS		X			
VERTIMIENTOS AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES		X			
MALAS INSTALACIONES SANITARIAS		X			
OTROS:					
FLORA Y FAUNA	SI	NO	N/A		
DESCAPOTE DE COBERTURA VEGETAL	X				
INTERVENCIÓN A ESPECIES VEGETALES		X			
EXISTENCIA DE ÁREAS PROTEGIDAS		X			
AFECTACIÓN A ECOSISTEMAS		X			
AFECTACIÓN A HÁBITATS		X			
ALTERACIÓN DE CORREDORES BIOLÓGICOS		X			
OTROS:					
PERMISOS, AUTORIZACIONES, LICENCIAS AMBIENTALES	SI	NO	N/A		
CONCESIÓN DE AGUAS (SUPERFICIALES O SUBTERRÁNEAS)	X				
Ocupación de CAUCE Y APROBACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS	X			EN IMPLEMENTACION	
PERMISO DE VERTIMIENTOS		X			
PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL	X			PENDIENTE DE AUTORIZAR EN LA ZONA BOCATOMA	
PERMISO DE EXPLANACIONES Y/O MOVIMIENTO DE TIERRAS		X			
OTROS:					
SOCIOECONÓMICO	SI	NO	N/A		
PUNTO(S) DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	X				
ACTAS DE VECINDAD	X				
ACTAS DE RECIBO		X			
DIVULGACIÓN DEL PROYECTO CON COMUNIDADES	X				
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS - PQRS		X			
PREDIOS AFECTADOS		X			
AFECTACIÓN A SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		X			
ACTIVIDADES ECONÓMICAS INFORMALES EN LA ZONA		X			
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	X				
MANO DE OBRA LOCAL	X				
PROYECTOS PRODUCTIVOS COMUNITARIOS		X			
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL		X			
GESTIÓN SOCIO-PREDIAL	X				
OTROS:					
OBSERVACIONES:					

INFORME DE INTERVENTORIA

FICHA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS Y OBRAS INFORME No. 22 FEBRERO DE 2025

FECHA:	DÍA 4	MES 3	AÑO 2025	HORA DE INICIO:	10
				HORA DE FINALIZACIÓN:	12
VEREDA/ CORREGIMIENTO:	PUENTE ROJO			MUNICIPIO:	GINEBRA-GUACARI
TRAMO/FRENTE DE OBRA:				LONGITUD/ÁREA:	
CONSORCIO:	CONSRCIO REDES Y PTAPS VALLE			AVANCE DE PLAN DE TRABAJO SST (%):	88%
NOMBRE PROFESIONAL SST:	FLOR MARIA MARTINEZ			NOMBRE PROF. SST INTERVENTORIA:	JULIANA IZQUIERDO M.
DESCRIPCIÓN DE VISITA TÉCNICA					
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	
CERTIFICADO DE AFILIACIÓN Y PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL VIGENTE DE LOS TRABAJADORES, PRINCIPALMENTE DE LOS QUE REALIZAN LABORES PARA LA EVA.	1			Se anexan soportes de pago de seguridad social	
REPORTE DE NOVEDADES DEL MES EN SEGURIDAD SOCIAL, CON RELACIÓN A LOS TRABAJADORES QUE LABORAN PARA LA EVA.	1				
INFORME DE ACCIDENTES DE TRABAJO, INCIDENTES Y/O ENFERMEDADES PROFESIONALES OCURRIDOS DURANTE EL MES CON SU INVESTIGACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS	1			En el mes febrero no se presentaron accidentes o incidentes, no se reporta incapacidades por enfermedad común generando ausentismo de 20 días para	
PLAN DE TRABAJO DE SST, EVIDENCIA DE ACTIVIDADES DEL MES Y % DE AVANCES	1			Se realiza comité del COPASS en el mes de febrero del 2025 en el que se realiza recorrido de obra para verificar señalización de áreas, no hay novedades en equipos, herramientas o EPP, se presenta ausentismo de 20 días por enfermedad de origen común	
POLÍTICA Y OBJETIVOS DIVULGADOS	1			Se adjunta registro fotográfico de las inducciones en las que se tratan los temas de políticas y objetivos SST.	
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DEL RIESGO	1			Se adjuntas formatos AROS para actividades de alto riesgo.	
PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS (PLAN DE EMERGENCIAS Y SU AVANCE EN EL MES DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS)	1			Se diseña plan de emergencia, se designan puntos de encuentro y mantienen en las oficinas los elementos del plan de emergencias	
BRIGADA INTEGRAL DE EMERGENCIA	1				
SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ZONAS	1			Se delimita la zona de excavación	
CAMILLA RÍGIDA CON SU ARNES - INMOVILIZADOR DE CUELLO	1			se realiza inspección	
EXTINTORES	1			se realiza inspección	
BOTIQUÍN	1			se realiza inspección	
KIT DE DERRAMES		1		No hay uso de sustancias tóxicas	
COMPROBANTE DE ENTREGA EPP (CASCO, GAFAS, RESPIRADOR, PROTECCIÓN AUDITIVA, BOTAS DE SEGURIDAD, CAMISA, CHALECO REFLECTIVO, PANTALÓN Y OTROS DE ACUERDO A LA MATRIZ DE EPP).	1			Anexo del informe	
LISTADO DE PUNTOS DE ATENCIÓN (ARL, CLÍNICAS, HOSPITALES, IPS, POLICÍA, BOMBEROS, EJÉRCITO, ETC)	1			Se encuentra instalado en la cartelera SST	
EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONES DEL PERSONAL	1			Se revisan exámenes de los subcontratistas, no se adjuntan anexos al informe	
ACTAS E INFORME DEL COMITÉ, O VIGIA, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	1			Se hace seguimiento a los pendientes	
CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 ESTÁNDARES MÍNIMOS.			1	Aun no adjunta la certificación por parte de la ARL y el ministerio de trabajo del porcentaje de cumplimiento del sistema de gestión.	
INFORME DE ASESORIA DE LA ARL			1		



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - MECI

Código: FO-PDA.2.1-4

Versión: 4

Fecha de Vigencia:
01/02/2019

INFORME DE INTERVENTORIA

FICHA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS Y OBRAS INFORME No. 22 FEBRERO DE 2025

FECHA:	DIA 11	MESES 2	AÑO 2024	HORA DE INICIO:	10
				HORA DE FINALIZACIÓN :	12
VEREDA/ CORREGIMIENTO:	PUENTE ROJO			MUNICIPIO:	GINEBRA-GUACARI
TRAMO/FRENTE DE OBRA:				LONGITUD/ÁREA :	
CONSORCIO :	CONSRCIO REDES Y PTAPS VALLE			AVANCE DE PLAN DE TRABAJO SST (%)	88%
NOMBRE PROFESIONAL SST:	FLOR MARIA MARTINEZ			NOMBRE PROF. SST INTERVENTORIA:	JULIANA IZQUIERDO M.

DESCRIPCIÓN DE VISITA TÉCNICA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
EVIDENCIA REALIZACIÓN PAUSAS ACTIVAS	1			Se adjunta registro fotografico
EVIDENCIA DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES Y/O PLAN DE FORMACIÓN	1			
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS PARA TAREAS RUTINARIAS, NO RUTINARIAS Y DEL ATO RIESGO, ASI COMO LA EVIDENCIA DE SU APLICACIÓN	1			Se presenta ATS para las actividades de alto riesgo
EVIDENCIA CONTROL CONTRATISTAS	1			Se divulga las politicas SST al personal operativo subcontratista y al personal administrativo
PUNTO ECOLOGICO	1			
TOTAL	21	3	0	
CUMPLIMIENTO	88%			

OTROS:

OBSERVACIONES:

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.

INFORME No. 22 DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2000.13.12.005- 2022

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, SOBRE EL OBJETO DEL CONTRATO SUSCRITO COMO RESULTADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 200.46.01.005-2022 CUYO OBJETO CONSISTE EN LA “EJECUTAR EL PLAN DE OBRA PÚBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA”

AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 2000.13.05.003- 2022

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA”

**CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
REPRESENTANTE LEGAL CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL**

**INTERVENTOR
CONSORCIO INTERGUACARI
REPRESENTANTE LEGAL EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ**

**SUPERVISOR
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
MIGUEL EDINSON ZULUAGA MONTERO**

DISTRITO SANTIAGO DE CALI – FEBRERO 2025

INFORMACION GENERAL

1. INFORMACION DEL CONTRATISTA

Contrato No.	2000.13.05.003- 2022
Objeto:	EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA"
Valor del Contrato:	VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$29.432.080.933.00) M/CTE
Valor inicial	\$ 29.432.080.933.00
Valor Adición No.01	\$ 2.571.146.616.00
Valor Total del Contrato	\$ 32.003.227.549.00
Contratista:	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
Interventor:	CONSORCIO INTERGUACARÍ
Fecha de Inicio:	Diciembre 1 de 2022
Plazo de ejecución del proyecto	Trece (13) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio
Fecha de Terminación:	Enero 1 de 2024
Fecha de suspensión No.01:	Dos meses a partir de Julio 27 de 2023
Prorroga No. 01 a la Suspensión No.01	Un mes a partir del 27 de Septiembre del 2023
Prorroga No. 02 a la Suspensión No.01	Un mes a partir del 27 de Octubre del 2023
Prorroga No. 03 a la Suspensión No.01	45 días a partir del 27 de Noviembre del 2023
Fecha de reinicio:	Enero 10 de 2024
Nueva fecha de terminación:	Junio 14 de 2024
Prorroga	Nueve (09) meses
Nueva fecha de terminación prorroga	Marzo 14 de 2025

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

En este informe mensual se resume el seguimiento técnico y financiero de los aspectos más relevantes ocurridos durante la ejecución de la obra en el periodo comprendido entre el 01 al 28 de Febrero de 2025.

2.1 COMITÉS DE OBRA

Durante este mes se realizaron cinco comités de obra, a los cuales asistieron Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P, el contratista Consorcio Redes y PTAPS Valle y la interventoría Consorcio Interguacari y se convocó a una visita y posterior reunión con el Consultor Carlos Valencia para tratar el tema de la instalación de malla COANDA en la bocatoma en reemplazo del desarenador.

2.1.1 – Febrero 04 de 2025

Se realiza la reunión en las instalaciones de la PTAP de Guacari, durante este comité se tratan temas eléctricos de cada una de la Ptaps, tanto en Ginebra como en Guacari.

El comité de obra se transcribe y posteriormente es compartido a los correos electrónicos de los participantes para las observaciones y comentarios.



Comité de obra con Acuavalle, el contratista Consorcio Redes y PTAPS Valle y la interventoría Consorcio Interguacari.

2.1.2 – Febrero 10 de 2025

Se realiza la reunión en las instalaciones de Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P, con asistencia del Ing. Holmes Zúñiga García en representación de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P, Ing. Lina Marcela Buritica, y el Ing. Andrés Cabrales en representación del contratista Consorcio Redes y Ptaps Valle y los Ing. Julián Andrade e Iván Bastidas en representación de la Interventoría Consorcio Interguacari, durante esta reunión se trata temas relacionados a la Reformulación 2.

2.1.3 – Febrero 12 de 2025

Se realiza la visita a las Ptaps de Ginebra y Guacari, recorrido Tramo 3 , Tramo 1(Cadica – Bocatoma) , con asistencia de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P, el contratista Consorcio Redes y Ptaps Valle y la Interventoría Consorcio Interguacari,

Posterior a la visita se lleva a cabo el Comité de obra en la oficina del Contratista Redes y Ptaps del Valle



El comité de obra se transcribe y posteriormente es compartido a los correos electrónicos de los participantes para las observaciones y comentarios.

2.1.4 Febrero 21 de 2025

Se realiza una visita al sitio donde se tiene proyectado la construcción de la Bocatoma y Desarenador con el Consultor Carlos Valencia para tratar el tema de la instalación de malla COANDA en la bocatoma.



2.1.5 Febrero 25 de 2025

Se realiza la reunión en las instalaciones de Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P, con asistencia del Ing. Carlos Valencia – Consultor Externo, Ing. Holmes Zúñiga García en representación de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P, Ing. Lina Marcela Buritica, Ing. Gina Lopez y el Ing. Dario Florez en representación del contratista Consorcio Redes y Ptaps Valle y los Ing. Julián Andrade e Iván Bastidas en representación de la Interventoría Consorcio Interquacari, durante esta reunión se trata temas relacionados a la propuesta de instalar mallas Tipo Coanda en la Bocatoma.



El comité de obra se transcribe y posteriormente es compartido a los correos electrónicos de los participantes para las observaciones y comentarios.

2.2 COMPONENTE FINANCIERO DEL PROYECTO

A la fecha se han tramitado 12 actas parciales al contratista y el respectivo descuento del anticipo:

Descripción	Valor ejecutado	Valor contrato	Porcentaje % ejecución
Valor inicial del contrato:		\$ 29.432.080.933	
Valor adicionado:		\$ 2.571.146.616	
Valor total del contrato:		\$ 32.003.227.549	
Valor Acta Parcial No. 1:	\$ 8.371.066.842		26,16%
Valor Acta Parcial No. 2:	\$ 886.015.856		2,77%
Valor Acta Parcial No. 3:	\$ 907.712.127		2,84%
Valor Acta Parcial No. 4:	\$ 503.892.952		1,57%
Valor Acta Parcial No. 5:	\$ 369.286.058		1,15%
Valor Acta Parcial No. 6:	\$ 7.371.115.364		23,03%
Valor Acta Parcial No. 7:	\$ 604.131.566		1,89%
Valor Acta Parcial No. 8:	\$ 385.455.620		1,20%
Valor Acta Parcial No. 9:	\$ 689.009.943		2,15%
Valor Acta Parcial No. 10:	\$ 1.216.561.098		3,80%
Valor Acta Parcial No. 11:	\$ 2.068.353.769		6,46%
Valor Acta Parcial No.12	\$ 690.349.724		2,16 %
Total, cancelado a la fecha:	\$ 24.062.950.919		75,19%
Saldo por ejecutar:	\$ 7.940.276.630		24,81%
Sumas iguales:	\$ 32.003.227.549	\$ 32.003.227.549	100,00%

Tabla N° 1. Relación pago actas parciales de obra al contratista



Figura N° 1. Gráfico de la relación de pagos de actas parciales contratista

Descripción	Fecha	Valor amortizado	Valor anticipo 30%	% amortización
Valor anticipo del contrato (30 %):			\$ 8.829.624.280	
Amortización acta Parcial N° 1:	31/05/2023	\$ 2.511.320.053		28,44%

Amortización acta Parcial N° 2:	30/06/2023	\$ 265.804.757		3,01%
Amortización acta Parcial N° 3:	31/01/2024	\$ 272.313.639		3,08%
Amortización acta Parcial N° 4:	31/03/2024	\$ 151.167.886		1,71%
Amortización acta Parcial N° 5:	30/04/2024	\$ 110.785.818		1,25%
Amortización acta Parcial N° 6:	31/05/2024	\$ 2.211.334.610		25,04%
Amortización acta Parcial N° 7:	31/07/2024	\$ 181.239.470		2,05%
Amortización acta Parcial N° 8:	31/08/2024	\$ 115.636.686		1,31%
Amortización acta Parcial N° 9:	30/09/2024	\$ 206.702.983		2,34%
Amortización acta Parcial N° 10:	08/11/2024	\$ 364.968.330		4,13%
Amortización acta Parcial N° 11:	30/11/2024	\$ 620.506.131		7,03%
Amortización acta Parcial N° 12:	31/01/2025	\$ 207.104.917		2,35%
Valor amortizado		\$ 7.218.885.280		81,76 %
Saldo por amortizar:		\$ 1.610.739.000		18,24%
Sumas iguales:		\$ 8.829.624.280,00	\$ 8.829.624.280	100,00%

Tabla N° 2. Relación amortización anticipo

Relación de actas parciales de la interventoría:

Descripción	Valor ejecutado	Valor contrato	Porcentaje % ejecución
Valor inicial del contrato:		\$ 1.502.246.766	
Valor adicionado:		\$ 131.126.000	
Valor total del contrato:		\$ 1.633.372.766	
Valor Acta Parcial No. 1:	\$ 427.238.980		26,16%
Valor Acta Parcial No. 2:	\$ 45.217.628		2,77%
Valor Acta Parcial No. 3:	\$ 72.195.076		4,42%
Valor Acta Parcial No. 4:	\$ 18.783.787		1,15%
Valor Acta Parcial No. 5:	\$ 376.165.748		23,03%
Valor Acta Parcial No. 6:	\$ 30.870.745		1,89%
Valor Acta Parcial No. 7:	\$ 19.658.237		1,20%
Valor Acta Parcial No. 8:	\$ 35.139.507		2,16%
Valor Acta Parcial No. 9:	\$ 62.044.616		3,80 %
Valor Acta Parcial No. 10:	\$ 105.486.042		6,46 %
Valor Acta Parcial No. 11:	\$ 35.207.836		2,16 %
Total, cancelado a la fecha:	\$ 1.228.008.202		75,19%
Saldo por ejecutar:	\$ 405.364.564		24,81%
Sumas iguales:	\$ 1.633.372.766	\$ 1.633.372.766	100,00%

Tabla N° 3. Relación de pagos actas parciales interventoría

Relación de la amortización del anticipo realizados a la interventoría:

Descripción	Fecha	Valor amortizado	Valor anticipo 30%	Porcentaje % amortización
Valor anticipo del contrato (30 %):			\$ 450.674.030	
Amortización acta Parcial N° 1:	31/05/2023	\$ 128.171.694		28,44%
Amortización acta Parcial N° 2:	30/06/2023	\$ 13.565.288		3,01%
Amortización acta Parcial N° 3:	31/01/2024	\$ 21.658.523		4,81%
Amortización acta Parcial N° 4:	31/03/2024	\$ 5.635.136		1,25%
Amortización acta Parcial N° 5:	30/04/2024	\$ 112.849.724		25,04%
Amortización acta Parcial N° 6:	31/05/2024	\$ 9.261.224		2,05%
Amortización acta Parcial N° 7:	13/09/2024	\$ 5.897.471		1,31%
Amortización acta Parcial N° 8:	30/09/2024	\$ 10.541.852		2,33%
Amortización acta Parcial N° 9:	12/11/2024	\$ 18.613.385		4,13%
Amortización acta Parcial N° 10:	02/12/2024	\$ 31.645.813		7,02%
Amortización acta Parcial N° 11:	01/31/2025	\$ 10.562.351		2,34%
Valor amortizado		\$ 368.402.461		81,74%
Saldo por amortizar:		\$ 82.271.569		18,25%
Sumas iguales:		\$ 450.674.030	\$ 450.674.030	100,00%

Tabla N° 4. Relación amortización del anticipo realizados a la interventoría

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto tiene como objetivo la optimización del sistema de abastecimiento de los acueductos del casco urbano de los Municipios de Ginebra y Guacarí.

Las obras que se contemplan construir son:

Bocatoma

Línea de Aducción

Desarenador

Cámara de distribución de caudal - CADICA

Viaductos

Líneas de Conducción en tubería PEAD: Tramo 1 en 18" – Tramo 2 en 10 " y Tramo 3 en 14"

Intervenciones en las PTAP de Ginebra y Guacarí


2.3 COMPONENTE TECNICO - ACTIVIDADES DEL CONTRATO

Durante el mes de Febrero de 2025, se desarrollan actividades en:

A. BOCATOMA

1. Tipo de Bocatoma: Lateral sobre el Rio Guabas
2. Caudal de Captación: 233 Lps
3. Caudal de Derivación a Guacari: 164.5 Lps
4. Caudal de Derivación a Ginebra: 68.5 Lps

Estado Actual Bocatoma: **Sin ejecución.** Ya existe acercamiento con la Comunidad, que ha aceptado seguir con la ejecución del proyecto

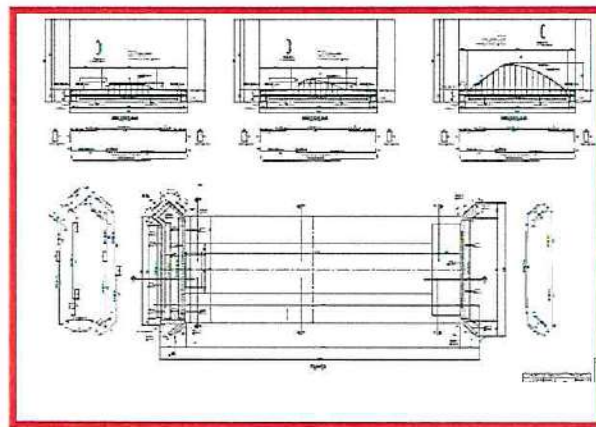

En las oficinas de Vallecaucana de Aguas el día 25 de Febrero de 2025, se reunieron el Consultor - Ing. Carlos Valencia , Contratista Consorcio Redes y Ptaps del Valle, Ing. Holmes Zuñiga Garcia – Apoyo a la Supervisión de Vallecaucana de Aguas e Interventoria para evaluar la posibilidad de implementar una nueva tecnica para reemplazar la funcion del desarenador por malla **Coanda**, la cual va a estar instalada en la bocatoma.



El consultor va a presentar la propuesta económica y técnica el próximo 05 de Marzo de 2025 al contratista Redes y Ptaps del Valle.

B. ADUCCIÓN

1. Línea De Aducción: Tubería PEAD DN 18" L: 6.0 ml
2. Caudal: 233 Lps

Estado Actual Línea de Aducción: Sin ejecución. Ya existe acercamiento con la Comunidad, que ha aceptado seguir con la ejecución del proyecto


C. DESARENADOR

1. Caudal de diseño: 233 Lps

Estado Actual Desarenador: Sin ejecución.

Ya existe acercamiento con la Comunidad, que ha aceptado seguir con la ejecución del proyecto.


Se está evaluando la alternativa de reemplazar esta estructura por la implementación de Mallas COANDA la cual va estar instalada en la bocatoma.

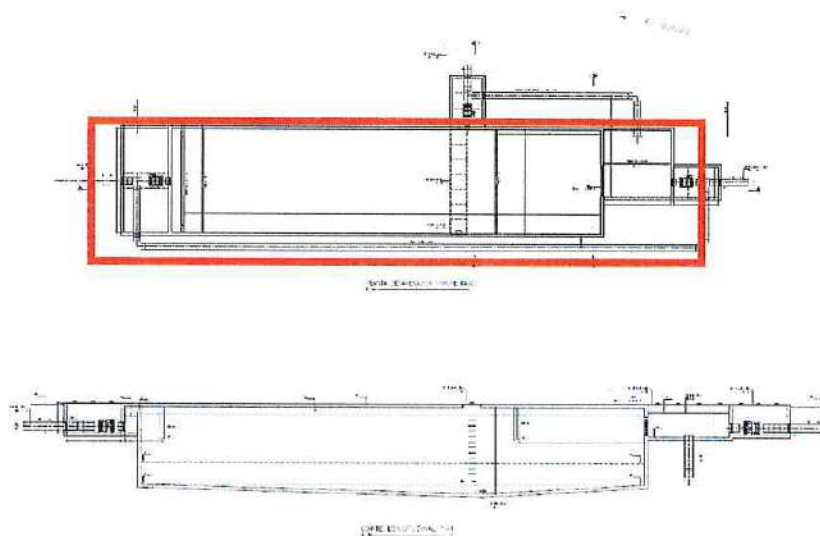

1.1 Dimensiones

Largo: 38 mts
Ancho: 8 mts
Profundidad: 5 mts

D. MACROMEDIDOR

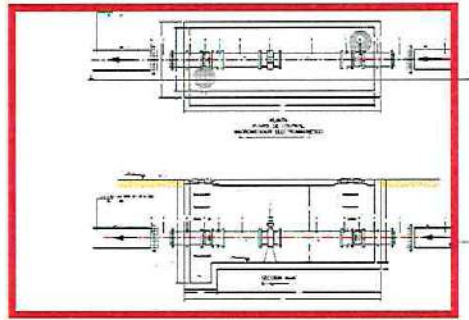


Sin ejecución.


2. CONDUCCIÓN

2.1 Tramo 1 Bocatoma – CADICA en Puente Rojo: Tubería PEAD diámetro 18” – L=3450ml

Estado Actual Tramo 1: Sin ejecución. Ya existe acercamiento con la Comunidad, que ha aceptado seguir con la ejecución del proyecto.

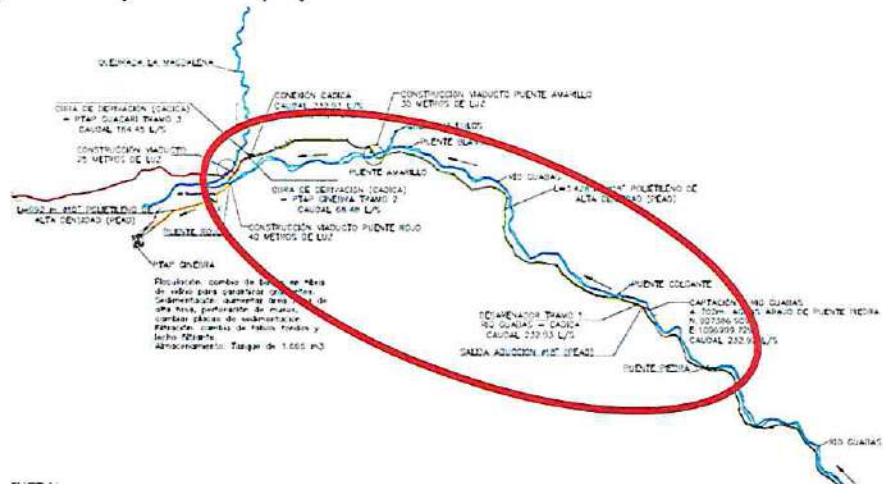

D.2 CADICA: Cámara de Distribución de caudales

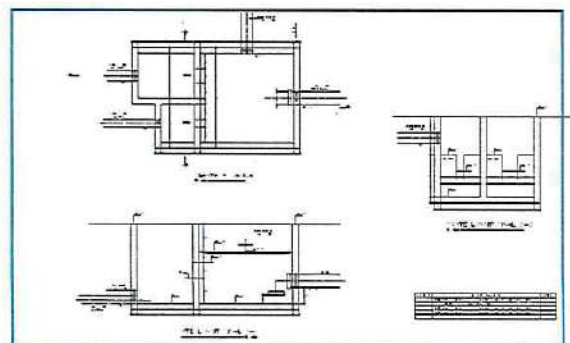

D 2.1 Dimensiones

Largo: 5.4 mts

Ancho: 3.4 mts

Profundidad: 3 mts

Estado Actual CADICA: Sin ejecución. Ya existe acercamiento con la Comunidad, que ha aceptado seguir con la ejecución del proyecto.

Nota:

Se tiene proyectado cambiar de lugar la CADICA, según la Ing. Gina López – encargada de la revisión hidráulica por parte del Contratista, es posible ubicarla aguas arriba donde está proyectada. La revisión hidráulica donde la propone tiene el concepto favorable. Además, hay espacio para su construcción.

Según información suministrada por la Ing. López, el alcantarillado existente está muy superficial al igual que las redes domiciliarias

Se va a evaluar de instalar ese tramo de tuberías PEAD 14" y 10", mediante perforación dirigida.

El contratista va a investigar quien es el dueño de lote donde funciona un parqueadero, sitio donde se tiene proyectado la construcción de la CADICA



Sitio con más probabilidades para su construcción

D.3 Tramo 2 CADICA en Puente Rojo a PTAP Ginebra: Tubería PEAD diámetro 10" – L=1000ml

Estado Actual Tramo 2: Sin ejecución. Ya existe acercamiento con la Comunidad, que ha aceptado seguir con la ejecución del proyecto y la Familia Saavedra

3. PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

PTAP GINEBRA

Floculadores: Cambio de placas de AC a Fibra de Vidrio
Concluido



Sedimentadores 1 – 2 – 3 :

Actividades a ejecutar:

Sistema de barrelados
Módulos Tipo Colmena
Canaletas en acero inoxidable Tipo dentada
Pasarelas





Sedimentador 2 : En servicio





Sedimentador 1: La obra civil se terminó, ya el Sub contratista Co Ingeniería, va iniciar las labores de verificación de medidas para el barrelados y canaletas en acero inoxidable .

Actividades de Filtración: Demolición de canales en concreto
 Retiro de material filtrante
 Demolición de falso fondo
 Ajuste Losa de Fondo
 Sistema de sopladores
 Reemplazo de material filtrante
 Reemplazo de válvulas de lavado
 Cambio de canaletas en acero inoxidable
 Canal Falso Fondo - Leopold

Estado Actual Filtración:

- Demolición de falso fondos



- Repello con aditivos para dar acabado a las paredes del filtro



Tanque de Almacenamiento

Con una capacidad de almacenamiento de 470 m³ en dos compartimientos y caja de válvulas que va abastecer a La Floresta y Villa Vanegas

Estado Actual: En ejecución 92 %


Actividades por ejecutar:

- Losa superior de cámaras de entrada y salida
- Instalación de sistema de válvulas
- Instalación de tapas en láminas de alfajor para entrada a tanque
- Rellenos perimetrales: en ejecución – se suspendió por lluvias permanentes
- Instalación tubería de desagüe

- Conexión al sistema existente



Caseta eléctrica

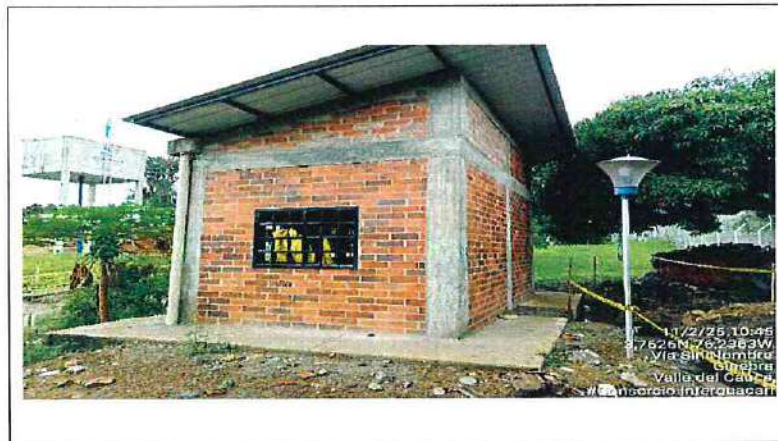

Estado Actual: Ejecución 100 % obra civil

Se continúan con las excavaciones para ductos eléctricos del poste de la acometida a la caseta eléctrica
 Se instala ducto eléctrico que va alimentar el Streaming Current
 Relleno con material de excavación
 Se instala el sistema Streaming Current





Faltan las conexiones eléctricas y de dosificación del coagulante


Suministro de Sopladores



Suministro de Falsos Fondos



Tanque de almacenamiento La Albania

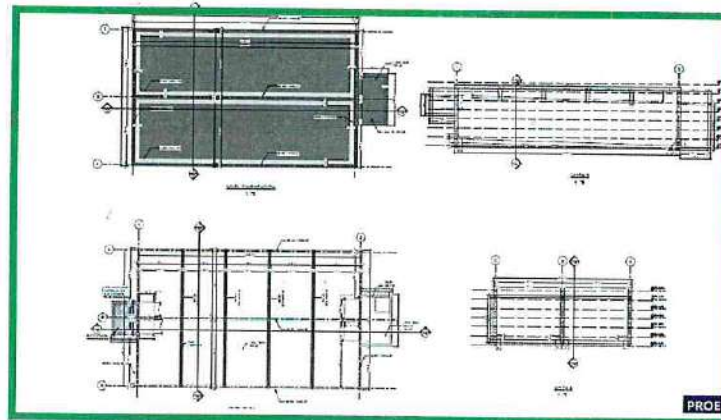

Dimensiones

Largo: 25 mts

Ancho: 15 mts

Profundidad: 5 mts

Actividades ejecutadas:


- Localización y replanteo
- Chequeo de niveles de la excavación
- Excavación a máquina y retiro de material sobrante de la excavación
- Auxiliar vial controlando el tráfico por la salida y entrada de volquetas, en la vía de acceso a el tanque de almacenamiento
- Fundición solado de limpieza
- Colocación de refuerzo losa inferior
- Colocación de refuerzo en muros
- Espesor de losa y muros: 40 cms - 28 Mpa
- Instalación de formaleta metálica para muros perimetrales y central
- Instalación de formaleta metálica para para muros perimetral de caja de salida
- Instalación de cinta PVC
- Fundición de losa inferior y 0.5 mtrs de muro el día Viernes 24 de Enero 2025.
- Toma del Slump y muestras de concreto en la mañana y tarde
- Colocación de 189 m3 de concreto premezclado
- Aplicación de antisol
- Retiro de formaleta metálica interior y exterior de parte inicial del muro perimetral
- Inicio de colocación del acero de refuerzo de los muros perimetrales
- Inicio de instalación de la formaleta metálica
- Riego con agua la losa del tanque y parte del muro en la mañana y tarde

- Se termina de instalar la formaleta metálica
- Instalación de cinta PVC
- Fundición de muros en concreto a una altura de 2.4 mtrs
- Toma de muestras de concreto y slump
- Retiro total de formaleta metálica
- Fraguado de muro
- Instalación de formaleta metálica para terminar el muro en concreto, a una altura de 1.8 mtrs
- Construcción de formaletas en madera para vigas transversales vigas de 40 por 45





Area resaltada en rojo significa fundicion en concreto

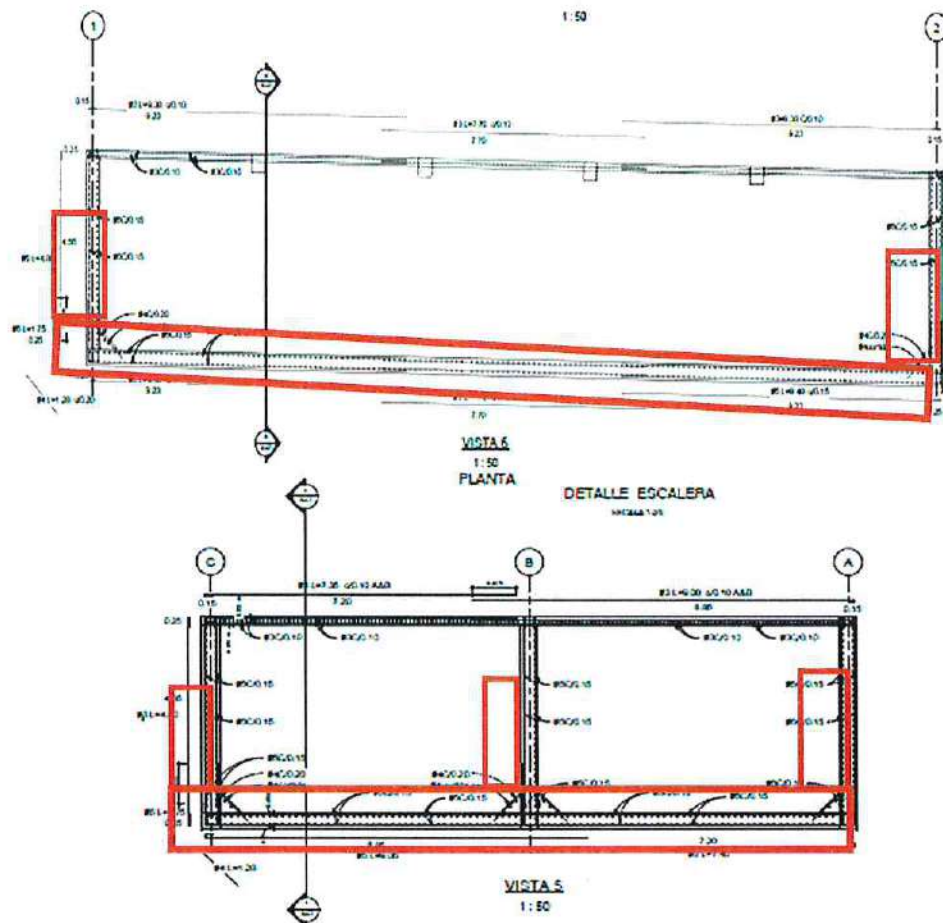

PTAP GUACARI

Floculadores: Sistema nuevo de paletas mecánicas para el primer circuito

Estado Actual Floculadores: Sin ejecución



Sedimentador 1: Sin ejecución






Sedimentadores 1 – 2- 3: Actividades en general:

Sistema de barrelodos
Módulos Tipo Colmena
Canaletas en acero inoxidable Tipo dentada
Pasarelas

Actividades a realizar por Sedimentador:

- Ajustes de losa de fondo en concreto
- Impermeabilización de muros
- Instalación de la estructura metálica y los módulos sedimentadores tipo colmena
- Instalación de las tres cerchas en acero inoxidable que soportaran las canaletas
- Instalación de las canaletas de reparto en acero inoxidable.
- Instalación de la estructura metálica de la pasarela y los pasamanos
- Instalación válvula mariposa de diámetro 4" para evacuar los lodos
- Instalación de las válvulas existentes de diámetro 4"
- Ajustes para iniciar las pruebas y puesta en marcha del barrelodos con personal de Acuavalle

Estado Actual Sedimentador 3: **En servicio**

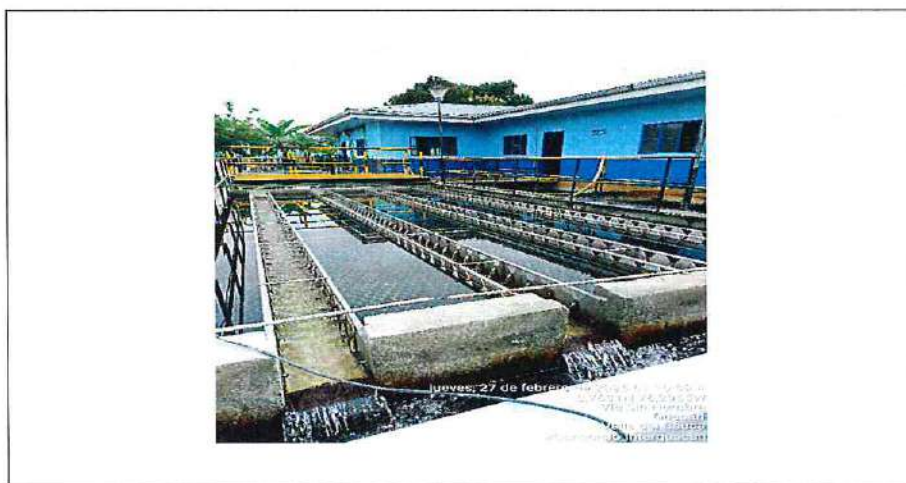

Estado Actual Sedimentador 2: **En servicio**



Filtración: Canal Falso Fondo - Leopold
Ajuste Losa de Fondo
Sistema de sopladores
Reemplazo de material filtrante
Reemplazo de válvulas de lavado
Cambio de canaletas en acero inoxidable

Estado Actual Filtración: **Sin ejecución**

Suministro de falsos fondos – Son seis unidades



Suministro de sopladores -Son dos unidades



Suministro de material filtrante



Caseta eléctrica

Estado Actual: En ejecución 30 %

Actividades ejecutadas

- Realizan la excavación de las zapatas adicionales de la caseta
- Retoman el armado del acero de los castillos de las columnas
- Arman el acero y funden las zapatas y los pedestales de la caseta
- Arman el acero de las vigas de cimentación adicionales.
- Realizan el relleno con material de sitio en la zona de las zapatas

- Fundición de vigas de amarre superior
- Fundición de pedestales para cubierta
- Colocación de ladrillo estructural



Se llevo a cabo una reunión el día 19 de Febrero de 2025 para tratar temas relacionados con la parte eléctrica de la caseta que se está construyendo, participaron Contratista, Acuavalle e Interventoría (Ing. Eléctrico Luis Mario Dávila).



2.3 COMPONENTE AMBIENTAL

Con relación al tema ambiental se tiene:

- Permiso de aprovechamiento Forestal en la Bocatoma Ginebra, se tiene que, la Alcaldía radicó oficio ante CVC el día 27 de febrero de 2024, No. Radicado 206392024 y se da respuesta : Resolución 740 No. 0741 0678 23-07-2024 - "Por medio de la cual se autoriza un aprovechamiento forestal de árboles aislados predio planta PTAP ubicado en jurisdicción del Municipio de Ginebra, Departamento del Valle del Cauca" - VIGENCIA: 23-07-2025
- Permiso para rotura del pavimento del Tramo N° 3, se radico ante la Secretaria de Planeación de Guacarí, pero a la fecha no se tiene respuesta. El contratista radica nuevamente oficio en las Alcaldías de Ginebra y Guacarí el día 22 de octubre de 2024.

- Por parte de la Gobernación del Valle, se recibe respuesta del oficio del 5 de agosto, el día 27 de septiembre de 2014, mediante oficio 1.360.129 radicado 2024138117, donde informan que las vías a intervenir son del Municipio de Guacarí.

- Permiso de rotura

Se radica solicitud por tercera vez, en el Municipio de Ginebra, para los siguientes tramos:

Tramo 1: Inicia desde la Bocatoma y finaliza en Puente Amarillo.

Tramo 2: Inicia en Puente Rojo y finaliza en el acceso a la PTAP Ginebra

- Se radica solicitud por tercera vez, en el Municipio de Guacarí, el tramo que corresponde:

– Puente Amarillo a Puente Rojo.

- Aprovechamiento Forestal PTAP GINEBRA

En el siguiente cuadro se registran los permisos, que se han solicitado, los que se han otorgado y los que están en proceso de ejecución:

ENTIDAD A EMITIR EL PERMISO	DESCRIPCION	ESTADO DE LA GESTION (AVANCE)
CVC	• Permiso de aprovechamiento forestal para la construcción de la bocatoma, desarenador, macromedidor y aducción.	Nota 1: La Alcaldía radicó oficio ante CVC el día 27 de febrero de 2024, No. Radicado 206392024 OTORGADO Resolución 740 No. 0741 0678 23-07-2024 "Por medio de la cual se autoriza un aprovechamiento forestal de árboles aislados predio planta PTAP ubicado en jurisdicción del Municipio de Ginebra, Departamento Valle del Cauca" VIGENCIA 23-07-2025
CVC	• Estudio de socavación local y general para construcción de la bocatoma, de acuerdo a lo solicitado en las obligaciones de la resolución de ocupación del cauce expedida por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Este estudio es necesario para definir la totalidad de las obras a ejecutar en la bocatoma.	AUN NO SE HA INICIADO LA GESTIÓN

CVC	PERMISO OCUPACIÓN DE CAUCES El día 7 de marzo de 2023 se realiza la notificación del acto administrativo por el cual se prorroga el permiso de ocupación de cauce otorgado en la Resolución 0740 N° 0741 01430 del 9 de diciembre de 2021. El tiempo del permiso de ocupación de cauce se extendió un (01) año a partir de la fecha de notificación de este acto administrativo. Cabe destacar que durante este periodo no se han adelantado actividades de ocupación del cauce ni desvío del mismo. Respecto a la vigencia del permiso, se continúa enfatizando que la entidad Acuavalle S.A E.S.P radicó el oficio AC - 19002024 ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC solicitando la prórroga del permiso de Ocupación de Cauce, con número de radicado 207602024 del 27 de febrero de 2024. Después que Acuavalle recibió el 19 de marzo del 2024 por parte de CVC el cobro por EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO a la solicitud de prórroga, realizaron el pago mediante cheque el día 12 de abril del 2024. Se pudo tener hasta el día 14 de mayo del presente año la visita técnica ambiental por parte de CVC con el fin de evaluar la solicitud de prórroga del Permiso de Ocupación de Cauce. (Documento Adjunto)	AMBIENTAL PARA PRÓRROGA Nota 1: Acuavalle radicó oficio ante CVC el día 27 de Febrero de 2024. Otorgado / 7 marzo de 2024 (1 año) Nota 2: Acuavalle realizó pago el 12 de abril de 2024 por evaluación y seguimiento para prórroga. Prórroga Permiso de Ocupación de Cauce RESOLUCIÓN 0740 No. 0741 0502 del 31 de Mayo de 2024
	CVC Permiso de Concesión de aguas superficiales	OTORGADO Resolución 0740 No. 0741 0000576 10-07-2020"Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales a favor de ACUAVALLE S.A. E.S.P. NIT. 890399032-8 para Los acueductos de los municipios de Ginebra y Guacarí, Departamento del Valle del Cauca" VIGENTE
CVC	Permiso de Aprovechamiento Forestal - PTAP Ginebra	OTORGADO Resolución 740 No. 0741 0381 29-04-2024 Entrega del informe de aprovechamiento forestal a la CVC por parte de ACUAVALLE S.A. Se espera asignación de compensación forestal y aprobación del predio propuesto para la siembra por parte de esta entidad.
Planeación Municipal Ginebra	Licencia de Espacio Público	OTORGADO Resolución No. 004-01 2023 26-01-2023 "Por medio de la cual se aprueba una licencia urbanística de intervención y ocupación del espacio público" VIGENCIA 26-01-2025 VIGENTE
ENTIDAD A EMITIR EL PERMISO	DESCRIPCION	ESTADO DE LA GESTION (AVANCE)
Planeación Municipal Guacarí	Licencia de Espacio Público	OTORGADO Resolución No. 004-01 2023 26-01-2023 Por la cual se expide una licencia de intervención del espacio público para desarrollar un proyecto" VIGENCIA 03-02-2025 VIGENTE

Secretaría de Movilidad de Ginebra	Plan de Manejo de tránsito	OTORGADO Resolución No. 900-50-020 20-03-2023 "Por medio de la cual se aprueba el Plan de Manejo de Tránsito – PMT presentado por el Consorcio Redes y PTAPS Valle" VIGENCIA DURACIÓN DEL PROYECTP VIGENTE
Secretaría de Movilidad y transporte de Guacarí	Plan de Manejo de tránsito	OTORGADO "Por medio de la cual se aprueba el Plan de Manejo de Tránsito – PMT presentado por el Consorcio Redes y PTAPS Valle" VIGENCIA DURACIÓN DEL PROYECTP VIGENTE
Planeación Municipal Ginebra	Permiso de rotura pavimento Se radica solicitud por segunda vez, en el Municipio de Ginebra, para los siguientes tramos: Tramo 1: Inicia desde la Bocatoma y finaliza en Puente Amarillo. Tramo 2: Inicia en Puente Rojo y finaliza en el acceso a la PTAP Ginebra Se radica solicitud por segunda vez, en el Municipio de Ginebra, en el tramo: Puente Amarillo a Puente Rojo.	PENDIENTE - El contratista radica nuevamente oficio en la Alcaldía de Ginebra el día 14 de agosto, en la y en la Gobernación del Valle el día 5 de agosto de 2024 - El contratista recibe comunicado por parte de la Gobernación del Valle el día 27 de septiembre 2024, en respuesta a el oficio enviado el día 5 de agosto de 2024. - El contratista radica nuevamente oficio en la Alcaldías de Ginebra el día 22 de octubre de 2024.
Planeación Municipal Guacarí	Se radica solicitud en la Gobernación del Valle, para el tramo: Inicia desde la Abscisa K7+420, (Vía entre los corregimientos de Guabitas y el Placer) hasta la Planta de Guacarí.	PENDIENTE - Se recibe el 22 de mayo 2024 documentación por el Director del Departamento Administrativo de Planeación sobre la solicitud ante la Alcaldía de Guacarí. - "El contratista radica nuevamente oficio en la Alcaldía de Guacarí el día 21 de agosto y en la Gobernación del Valle el día 5 de agosto de 2024" - "El contratista recibe comunicado por parte de la Gobernación del Valle el día 27 de septiembre 2024, en respuesta a el oficio enviado el día 5 de agosto de 2024." - El contratista radica nuevamente oficio en la Alcaldías de Ginebra y Guacarí el día 22 de octubre de 2024.
CVC	Aprovechamiento Forestal PTAP GINEBRAEn el mes de julio se realizó visita a predio de la Alcaldía de Ginebra para realizar la compensación forestal de las especies arbóreas que fueron aprovechadas en la PTAP Ginebra. Se está a la espera de comunicado de la CVC para aprobación del nuevo predio y su recomendación para poder realizar esta compensación.	EN ESPERA DE RESPUESTA . Es este periodo visitan la obra dos funcionarios de la CVC, la Ingeniera Daniel Castillo y el Técnico Segundo Fiscal para a coordinar lo relacionado con la siembra por compensación en respuesta al requerimiento realizado por ACUVALLE y en cumplimiento al permiso de aprovechamiento forestal de la planta de Ginebra. Pero no se pudo hacer la visita a el predio debido a que no se dio la autorización para la visita, se debe reprogramar

2.4.1 Disposición de residuos sobrantes de obra:

El contratista cuenta con dos sitios autorizados para la disposición de estos residuos:

- El relleno sanitario en el corregimiento de Presidente en el Municipio de San Pedro. Este cuenta con Licencia Ambiental otorgada por la CVC
- Servi Transportes López y Recuperación Ambiental S.A.S, en el Municipio de Palmira, el cual cuenta

con una capacidad de recepción de 85.000 m³ para disposición final de RCD avalado por Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC.

- Como el tanque de la PTAP de Ginebra se debe rellenar debido a que el diseño inicial tenía una sección mayor, el material sobrante de las excavaciones del tramo 3 se está llevando a la planta y se está aprovechando este material para hacer el relleno.

2.4 PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - PMT

En este período el contratista inicia la actividad de fundición con concreto premezclado para el tanque de almacenamiento.

- El contratista las señales informativas móviles
- Se cuenta con un auxiliar vial para controlar la salida y el ingreso de las volquetas



2.5 INCONVENIENTES QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Desde que se inició la ejecución del proyecto se ha tenido situaciones que han impedido el correcto desarrollo de los trabajos en la mayoría de los frentes, en este momento solo se está trabajando en las plantas de tratamiento de agua potable de Ginebra y Guacarí, estas plantas se están haciendo adecuaciones en los tanques sedimentadores, en el siguiente cuadro, se resumen las actividades que se encuentran suspendidas:

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN	ESTRUCTURA	ESTADO
Aprovechamiento forestal en la bocatomas	Bocatoma, desarenador, macromedidor	Pendiente visita CVC
Permiso de ocupación de cauce	Bocatoma	Pendiente visita CVC
Servidumbre Ingenio Pichichi K5+350 a K5+850	Tubería de conducción – Tramo 3	Ya el Ingenio Pichichi aprobó.

		Pendiente legalización de la escritura
Permiso por parte de la señora Blum, para la instalación de tubería PEAD 10", llegada a la PTAP de Ginebra	Tubería de conducción tramo 2	Ya se adjudicó el contrato para Realizar la instalación de la tubería en el predio de la señora Blum – Pendiente la servidumbre por parte de la Familia Saavedra-Blum para dar inicio a la instalación de la tubería
Rediseño de las estructuras en la zona de los viaductos	Viaductos	Suspendido – Vallecaucana
Actividades del tramo 3 suspendidas, por comunidad, no están de acuerdo con la ejecución del proyecto	Línea de conducción tramo 3	Ya se firmó el acuerdo entre la Gobernación del Valle del Cauca, Vallecaucana de Aguas y la comunidad- pendiente que el contratista legalice la reformulación
Inicio a trabajar en la bocatoma, desarenador y CADICA	Bocatoma-desarenador-CADICA	Ya se firmó el acuerdo entre la Gobernación del Valle del Cauca, Vallecaucana de Aguas y la comunidad- pendiente que el contratista legalice la reformulación
Por la problemática social que se tiene con los habitantes de la zona rural, no se ha podido dar inicio a las actividades que comprenden el tramo 1. Esto viene desde el año 2023 y hoy no se ha resuelto esta situación	Línea de conducción tramo 1	Ya se firmó el acuerdo entre la Gobernación del Valle del Cauca, Vallecaucana de Aguas y la comunidad- pendiente que el contratista legalice la reformulación

Tabla 7: Inconvenientes presentados que impiden la ejecución de los trabajos

3. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

1. PLAN DE GESTIÓN

El Plan de Gestión Social (PGS), es el instrumento de Gestión Social con el que cuenta para plantear las directrices que le permitirán mitigar, controlar, corregir y/o compensar los impactos generados por la ejecución de la obra desde el componente social, en el área de influencia del Proyecto.

Las estrategias trazadas en el Plan de Gestión Social se ejecutarán mediante el cumplimiento de 11 aspectos sociales:

- Aspecto No. 1: Diagnóstico de la Zona de Influencia del Proyecto
- Aspecto No. 2: Censos de Viviendas Afectadas por el Proyecto
- Aspecto No. 3: Programa de Información a la Comunidad
- Aspecto No. 4: Programa de divulgación a la comunidad
- Aspecto No. 5: Reuniones con la comunidad
- Aspecto No. 6: Programa de atención a la comunidad
- Aspecto No. 7: Programa de atención al ciudadano
- Aspecto No. 8: Recorridos por la Obra

Aspecto No. 9: Reunión de Avance de Obra

Aspecto No. 10: Conformación del comité de veeduría ciudadana

Aspecto No. 11: Vinculación de mano de obra calificada y no calificada

Objetivo: Realizar las actividades pertinentes de acuerdo al Plan de Gestión Social, que contribuyen al fortalecimiento de la participación social y el acompañamiento de la comunidad en el proceso constructivo que viene ejecutando el consorcio Redes y Ptas Valle.

- **Aspecto No. 01: Diagnóstico de la Zona de Influencia del Proyecto.**

Acciones Desarrolladas:

Continúa pendiente la realización de la cartografía social.

- **Aspecto No. 02: Censos de Viviendas Afectadas por el Proyecto**

Objetivo: Garantizar la protección al patrimonio (propiedades inmobiliarias) de las personas que se encuentran en el Área de Influencia Directa e Indirecta del proyecto a ser ejecutado.

Acciones Desarrolladas:

En el mes de febrero de 2025 la gestión social del contratista informó que hasta el momento hay un acumulado del 77.14%

Hasta ahora se han realizado las siguientes actas:

Regaderos - Ginebra :	15 actas de inicio
Sector Puente Amarillo:	6 actas de inicio
Tramo 3 Sector la Esmeralda:	23 actas de inicio
Tramo 2 Planta Ginebra:	7 actas de inicio
Sector Albania:	2 actas de vecindad
	1 acta de entorno

ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	PENDIENTE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Levantamiento de Actas de Vecindad y Fachada de apertura	70	54	16	77.14%

Tabla N° 1 Trazabilidad del programa de conservación del patrimonio inmobiliario público y privado

El componente social del contratista informó que realizó las siguientes actividades:

- Actas de entorno desde el sector donde se construirá la bocatoma hasta el sector de Puente Rojo
- Se evidencia que la vía se encuentra con tramos de placa huella y otros tramos en pavimento asfáltico.
- Identificaron que se requiere mantenimiento en cunetas y alcantarillas pluviales
- También se observaron fisuras y desgaste de la vía.

Realizaron contacto con los Líderes de las Veredas de Juntas, Cocuyos y representante de los transportadores para socializar con la comunidad de la parte alta sobre posible cierre de vía cuando se lleven a cabo las actividades y de esta forma establecer alternativas de movilidad en el sector a intervenir.

En las visitas realizadas al sector donde está proyectada la bocatoma se identificó una invasión irregular construida en plástico y guadua.

Por lo anterior, se visita al Secretario de Planeación del Municipio de Ginebra para informar la situación. El Secretario de Planeación realiza direccionamiento a la Inspección de Policía para que realicen las medidas pertinentes.



Foto N°1. Visita invasión irregular

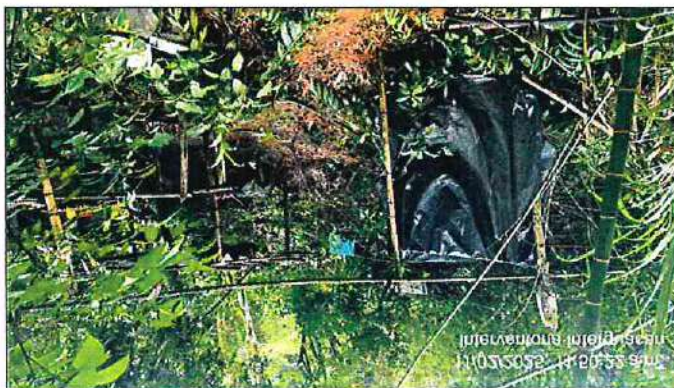


Foto N°2. Invasión irregular sector bocatoma



Ilustración N°1. Volante realización actas de vecindad

- **Aspecto No. 03 : Programa de Información a la Comunidad**

Acciones Desarrolladas:

La interventoría evidencia que se ha cumplido con brindar la información a la comunidad por medio de las socializaciones que se han realizado en meses pasados, dando cumplimiento a esta actividad del Plan de Gestión Social, sin embargo, se continuará brindando la información que se requiera para aclarar las inquietudes de la comunidad.

- **Aspecto No. 04 : Programa de divulgación a la comunidad**

Acciones Desarrolladas:

En el mes de febrero no se programaron actividades de divulgación a la comunidad.

- **Aspecto No. 05: Reuniones con la comunidad**

Acciones Desarrolladas:

La interventoría evidencia que el contratista ha cumplido con esta actividad de reuniones con la comunidad planteada en el Plan de Gestión Social. Se continúa esperando a que los alcaldes de Ginebra y Guacarí programen la socialización con la comunidad en general la cual fue aplazada.

- **Aspecto No.06: PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD**

Objetivo: Informar y divulgar de manera permanente, entre las comunidades del área de influencia directa, contenidos claros y precisos sobre el proyecto, facilitando la generación de un clima de confianza, comprensión y cooperación en la ciudadanía, por las actividades inherentes al mismo.

- **Programa de atención a la comunidad**

Objetivo: Crear y mantener un sistema de atención que permita de manera oportuna y eficaz, recibir, atender y tramitar las quejas, peticiones, reclamos y sugerencias que se presenten, con el fin de contribuir a la satisfacción de los vecinos y usuarios del Proyecto.

Acciones Desarrolladas:

Se continúa con el espacio dispuesto para el PAC con los formatos de PQRS para que la comunidad acceda a ellos si tienen alguna pregunta, queja o solicitud. En este mes no se recibió PQRS de la comunidad.

Se realizó seguimiento a las vallas informativas ubicadas en las vías principales de ingreso de los dos municipios de Ginebra y Guacarí, brindando la información sobre el contrato.



Foto N°3. Punto de Atención a la Comunidad

Foto N°4. Buzón de sugerencias de Ginebra



Foto N°5. Cartelera Informativa



Foto N°6. Valla informativa en Guacarí



Foto N°7. Valla informativa en Ginebra

- **Aspecto No. 07 : Programa de atención al ciudadano**

Objetivo: Crear y mantener un sistema de atención que permita de manera oportuna y eficaz, recibir, atender y tramitar las quejas, peticiones, reclamos y sugerencias que se presenten, con el fin de contribuir a la satisfacción de los vecinos y usuarios del Proyecto.

Acciones Desarrolladas:

El contratista continúa cumpliendo con el programa de atención al ciudadano, en el punto de atención se cumple con los horarios establecidos:

Martes de 08:00 am a 12m

Viernes 1:00 pm a 4:00 pm,

Lugar: oficina ubicada en la calle 11 # 4-37, tercer piso, edificio La Piscina barrio El Centro - corregimiento de Costa Rica, municipio Ginebra, Valle del Cauca.

El buzón de sugerencia ubicado en la papelería del señor Jorge Mendoza, carrera 5 #10-46, primer piso, Centro – Costa Rica, funcionó correctamente en el mes de febrero, para el mes de marzo será removido por cierre del establecimiento.

Se está gestionando una nueva ubicación en la Personería Municipal de Guacarí.

El segundo buzón de sugerencias está ubicado en Estanco Tas- Tas, Cra 2 #5-06 en la cabecera municipal de Ginebra, cumple con su funcionamiento adecuado.

NOMBRE PROFESIONAL	TELÉFONO	CORREO	DIRECCIÓN OFICINA

SOCIAL ENCARGADO			
María Fernanda Martínez	3218673230	redes.pqr@gmail.com	calle 11 # 4-37 tercer piso. edificio La Piscina barrio El Centro corregimiento Costa Rica municipio Ginebra.

Tabla N° 2 Información atención a la comunidad

- **Aspecto No.08: Recorridos por la Obra**

Acciones Desarrolladas:

En este mes de febrero no se realizó de recorrido de obra con veedores para mostrar los avances en las plantas de tratamiento de Ginebra y Guacaré, se programará recorrido para el mes de marzo de 2025.

- **Aspecto No. 09. Reunión de avances de obra**

El contratista debe realizar las reuniones que sean solicitadas de manera (verbal o escrita) por parte de la ciudadanía, las autoridades municipales y organismos de control. Hasta el momento no se han solicitado.

Acciones Desarrolladas:

Se evidenció que el componente social del contratista realizó las dos reuniones informativas de avance de obra con los veedores ciudadanos de los dos municipios: Guacaré y Ginebra.

- **Aspecto No.10: Conformación del comité de veeduría ciudadana.**

Se evidenció que el contratista dio cumplimiento al aspecto N° 10 del Plan de Gestión Social con la conformación de los dos comités de veeduría ciudadana en los dos municipios de Guacaré y Ginebra, en los cuales se realizó la reunión mensual correspondiente al mes de febrero de 2025.

- La interventoría social participó y evidenció la realización del comité de veeduría del municipio de Guacaré, en donde el Ing. Darío Flórez informó sobre las actividades realizadas en enero y febrero hasta el momento, expuso el avance de obra que en el momento se encuentra en 71%.
- Sin embargo, el ingeniero Flórez informa que este porcentaje puede disminuir cuando se realice la reformulación porque aumentarían las actividades debido a que algunas cambiaron por el paso del tiempo, por ejemplo la placa huella que no estaba contemplada inicialmente porque cuando la entidad hizo la formulación las vías estaban sin pavimentar, también pasa lo mismo en el área eléctrica que ampliaron las cantidades.
- En el área social se informó que se han realizado 54 actas de vecindad y 7 de entorno.

- Se informó que los dos buzones de sugerencia están funcionando correctamente, sin embargo, los dos están en Ginebra y Costa Rica, pero el local donde está el de Costa Rica lo cerrarán y ese buzón se tendría que instalar en Guacarí.
- Los veedores sugieren instalarlo en la Personería o la Alcaldía, se realizará la solicitud para su instalación.
- También se informó que para el mes de marzo se programará recorrido de obra para que puedan identificar las actividades que se están desarrollando en terreno, se recomienda que tengan ARL y afiliación a la seguridad social.



Foto N°8. Reunión comité de veeduría Guacarí

- La interventoría social participó y evidenció la realización del comité de veeduría del municipio de Ginebra, esta reunión se realizó en las instalaciones del Consorcio Redes y Ptaps de manera presencial asistieron Yuri Liceth Gallego quienes la nueva integrante del comité de Veeduría y el Ing, Luis Concha – representante de la Secretaría de infraestructura de Guacarí, de manera virtual asistieron el señor Sigifredo Pasos – Presidente de la Veeduría y la señora Lina Santa – Vicepresidenta.
- El Ing. Residente de Obra, Darío Flórez informó sobre las actividades realizadas durante los meses de enero y febrero a la fecha.
- Informó sobre el avance de obra que en el momento se encuentra en 71%. Sin embargo, el Ingeniero Florez informa que este porcentaje puede disminuir cuando se realizó la reformulación porque aumentarían las actividades debido a que algunas cambiaron por el paso del tiempo, por ejemplo, la placa huella que no estaba contemplada inicialmente porque cuando la entidad hizo la formulación las vías estaban sin pavimentar, también pasa lo mismo en el área eléctrica que ampliaron las cantidades.
- En el área social se informó que se han realizado 54 actas de vecindad y 7 de entorno.
- Se informó que los dos buzones de sugerencia están funcionando correctamente, sin embargo, los dos están en Ginebra y Costa Rica, pero el local donde está el de Costa Rica lo cerrarán y ese buzón se tendría que instalar en Guacarí.
- Se realizará la solicitud para su instalación.
- También se informó que para el mes de marzo se programará recorrido de obra para que puedan identificar las actividades que se están desarrollando en terreno, se recomienda que tengan ARL y afiliación a la seguridad social.



Foto N°10. Reunión comité de veeduría Ginebra. Foto N°11. Reunión comité de veeduría Ginebra.

COMITÉS TÉCNICOS

Comité técnico de obra 21 de febrero de 2025

- Se realizó recorrido de obra y en comité de obra en la oficina del contratista en el corregimiento de Costa Rica
- La Dra. María Fernanda Martínez- Residente social del contratista, informó que ya se encuentran conformados los dos comités de Veeduría Ciudadana de los municipios de Ginebra y Guacarí, se ha hecho visitas a las personerías municipales para coordinar y programar las reuniones de los comités de veeduría ciudadana.
- Se coordinó la reunión del comité de Guacarí para el 13 de febrero a las 2:30p.m, y la reunión de Ginebra para el 18 de febrero a las 10:30 a.m
- Indicó que los dos comités cuentan con la Resolución de inscripción y registro emitido por las personerías municipales de Ginebra y Guacarí y el registro ante la Gobernación del Valle.
- El ingeniero Miguel Zuluaga explicó que es importante que los veedores mantengan informados y participen de las reuniones de avances y recorridos de obra con su respectiva ARL para que se enteren de lo que se realiza y evitar malos entendidos y a su vez informen al resto de comunidad.
- La Dra. María Fernanda Martínez- Residente social del contratista manifestó que se ha realizado recorridos con los Veedores y se les mantiene informados de los avances de obra para que se enteren de las actividades que se realizan y a su vez informen a la comunidad.
- Los buzones de sugerencia están funcionando correctamente y en este mes no se ha recibido PQRS.



Foto N°12. Comité técnico de obra



Foto N°13. Comité técnico de obra



Foto N°14. Comité técnico de obra

Foto N°15. Comité técnico de obra

- **Aspecto No.11: Vinculación de mano de obra calificada y no calificada**

Objetivo: Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los dos municipios de Guacaré y Ginebra, especialmente del área de influencia de la obra.

Acciones Desarrolladas:

El contratista informó que en el mes de febrero se contrataron 8 personas de Costa Rica, 3 de Ginebra y Guacaré, para desempeñar labores como ayudantes de obra y oficial. Estas personas fueron seleccionadas del banco de hojas de vida, el contratista manifiesta que la permanencia de algunas personas en la obra es inestable, ocasionando que se deba permanente seleccionar personal para vincular de otros municipios.

4. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. INTRODUCCIÓN

CONSORCIO INTERGUACARI, a través de la gestión de la supervisión en campo, garantizará la seguridad y salud de los trabajadores y contratistas durante la ejecución de sus labores, para lo cual se tendrá en cuenta que:

- Los trabajadores reciban la formación adecuada para el trabajo que se espera de ellos
- Se apliquen las medidas de seguridad en el trabajo.
- Se realicen las afiliaciones al sistema de Riesgos profesionales.

2. OBJETIVO

Presentar el alcance del proyecto y mostrar la gestión de **CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE**, referente a temas de seguridad y salud en el trabajo de la ejecución de la obra en el mes del **1 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025**.

3. ALCANCE

El presente informe verifica las actividades aplicadas por todo el personal que realiza labores en campo, referente a seguridad, salud en el trabajo, considerando las actividades durante el mes, y así y la ejecución en los diferentes puntos de trabajo.

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4.1 DESARROLLO DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DIARIAS	OBSERVACIONES GENERALES
Verificación de condiciones de salud	Antes de iniciar la ejecución del proyecto se realiza verificación de condiciones de salud a los ingenieros y personal de apoyo para identificar y/o controlar cualquier anomalía que pueda afectar o poner en riesgo la salud y las actividades a ejecutar. Mantener las zonas de aguas estancadas, fumigadas y con cloro para evitar la propagación del mosquito Aedes aegypti , responsable del Dengue, Sika y Chicunguña
Verificación de la zona de trabajo y herramientas	Antes de iniciar las actividades, los trabajadores verifican las condiciones del área de trabajo, al igual que el estado de las herramientas a utilizar.
Uso de Elementos de Protección personal	Antes de iniciar las labores, los trabajadores hacen uso de los EPP, haciéndose responsable de su autocuidado y el de sus compañeros, en este periodo se entrega dotación al personal nuevo.
Delimitación del área de trabajo, Orden y aseo	Antes de iniciar cualquier actividad, se delimita el área de trabajo, se solicitó instalar cinta como barrera de protección, para evitar cualquier caída en las excavaciones.
Diligenciamiento de ATS y permisos de trabajo en alturas	Antes de iniciar cualquier actividad, se realiza un análisis del área y los riesgos a los que están expuestos y que se deben intervenir, por esta razón se solicita como adjunto al informe del contratista ATS de las actividades de alto riesgo y permisos en alturas, para las actividades que lo requieran.

	Gestión de actividades de alto riesgo febrero 2025: Traslado e instalación de formaletas Fundición muros con concreto Corte de hierro y traslado de objetos pesados Perforar y satinar formaletas Escarificar y repellar muros Perforación de canaleta Demolición de muros y escarificación de paredes Traslado de formaleta y amarre de hierro
--	---

Exámenes médicos ocupacionales	Durante el mes de Febrero se verifica el cumplimiento del programa de medicina preventiva, con el objetivo de suministrar información clara sobre el estado de salud y procurar el estado integral de todos los colaboradores. En este periodo se verifican exámenes médicos por parte de los contratistas.
--------------------------------	--

Plan de prevención preparación y respuesta ante emergencias	En el periodo de Febrero se mantienen las condiciones óptimas de los elementos de atención a emergencias, y las señalizaciones en oficina y obra, se implementan rutas de evacuación y puntos de encuentro.
---	---

Política y objetivos del SG-SST.	En este periodo de Febrero se realizan inducción y reinducción sobre las políticas SST, medio ambiente, sustancias psicoactivas, reglamento de higiene y seguridad industrial, definición de accidente y enfermedad laboral, clasificación de residuos sólidos, rutas de evacuación y puntos de encuentro.
----------------------------------	--

Actualización curso de trabajo en alturas	En este periodo no se realizaron actualizaciones en cursos de alturas.
---	--

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

VISITAS DEL PROYECTO



Inspeccion de area



Inspeccion locativa



Inspeccion de trabajo en alturas



Inspecciones locativas y de altura



Las charlas realizadas en el mes de febrero se describen a continuación:

5.1 CUADRO ESTADÍSTICO DE CUMPLIMIENTO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES.

DESCRIPCIÓN	Número de asistentes/ Capacitaciones	Dirigido a
Socialización políticas SST y medio ambiente	6	TRABAJADORES
Riesgos asociados a corte y armado de acero	4	TRABAJADORES
Higiene postural levantamiento de cargas, posiciones y movimientos repetitivos	9	TRABAJADORES
Riesgo físico (RUIDO)	10	FORMATOS ATS
Uso adecuado de EPP mantener orden y aseo, clasificación de residuos solidos	8	TRABAJADORES
Uso obligatorio de elementos de protección personal	7	TRABAJADORES
Riesgo locativo, practicas seguras en la marcha en el terreno húmedo y resbaloso	8	TRABAJADORES
Importancia de hacer inspección operativa	7	TRABAJADORES

5.2 INSPECCIÓN

En el presente mes se han realizado las siguientes inspecciones:

ITEM	INSPECCIÓN	HALLAZGOS	No. INSPECCIONES	
			PROGRAMADAS	REALIZADAS
1	Inspección de EPP	Revisión de las condiciones y el estado de los elementos de protección personal	POR ACTIVAD	02-2025
2	Inspecciones locativas (contenedores, excavaciones campamento y oficina)	Sin hallazgos	POR ACTIVAD	02-2025
3	Inspección de herramientas (Pulidora, taladro de mano, mezclador)	Sin hallazgos	POR ACTIVAD	02-2025
4	Inspecciones de extintores, botiquín y camillas	Sin hallazgos	POR ACTIVAD	02-2025

5.3 INDICADORES DE AUSENTISMO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

INDICADOR	
● Número de atenciones médicas comunes reportadas	1

INDICADOR	
● Días perdidos	20
● Número de atenciones médicas ocupacionales reportadas	0
● Días perdidos	0
Incidentes	0
Accidentes	0

5.4 VERIFICACION PERSONAL Y CONTRATISTA EN OBRA.

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE								
No.	NOMBRE	CÉDULA	FECHA		CARGO	SGSS		
			(dd-mm-aa)			EPS	ARL	AFP
			Ingreso	Retiro				
1	Aldo Gutiérrez	79.699.673	N/A		Asesorado	Sura	Sura	Colpensiones
2	Os Andrés Leyva	89.008.184	N/A		Director de la Obra	Sura	Sura	Protección
3	Marcela Cica	42.136.662	01/12/22		Coordinadora de proyectos	S.O.S.	Sura	Colpensiones
4	Gina Leidy Pez	1.144.140.957	17/02/23		Asistente Obra	S.O.S.	Sura	Porvenir
5	Fernanda Pardo Pardo	36.759.739	17/01/24		Supuesto	Sanitas	Sura	Colpensiones
6	Edith Mora Duarte	1.083.008.701	22/01/24		Directora de obra	PS	Sura	Porvenir
7	Flor María Gómez	31.644.927	25/02/23		Asesora SST	S.O.S.	Sura	Colpensiones
8	Dario Enrique Flórez	1.026.277.221	05/02/24		Residente Obra	Sura	Sura	Colfondos
9	Ana Milena Martínez	1.144.081.242	05/02/24		Aux administrativa	Sanitas	Sura	Colpensiones
10	Diana Marcela Echavarría	31.658.574	01/02/23		Ingeniera Ambiental	N EPS	Sura	Colpensiones
11	María Fernanda Martínez	38.856.496	05/01/23		Profesional social	Sura	Sura	Colpensiones
12	Vanessa Estrada Wilson	29.676.981	01/08/24		Ing. Ambiental	Sura		Colpensiones
13	Rodrigo Preciado	16.550.802	05/03/24		Ayudante de obra	N EPS	Sura	Porvenir

14	José Hilder López	7.551.673	11/03/24		Almacenista	Sanidad ponal	Sura	N/A
15	Yelson Castellanos	1083008367	11/06/24		Inspector obra	Coosalud	Sura	Porvenir
16	Jorge Aponte	1.112.098.988	02/09/24		Ayudante de obra	N EPS	Sura	Porvenir
17	Andrés Felipe Cabrales	1045751398	01/10/24	2/25	Ing. Presupuesto	N EPS	Sura	Colfondos
18	Mauricio Fernando Soto	14.652.613	14/11/24		Ayudante obra	SOS	Sura	Porvenir
19	Jorge Hernán Ocampo Cortez	9.858.689	26/11/24		Ayudante obra	Emssanar	Sura	Porvenir
20	Michel David Echeverri	1.112.956.399	15/01/25		Ayudante obra	N EPS	Sura	Colpensiones
21	Johana Martínez	31.655.641	24/02/25		Prof. SST	N EPS	Sura	Protección

PERSONAL OPERATIVO TOPOGRAFÍA								
No.	NOMBRE	CÉDULA	FECHA		RGO	SGSS		
			(dd-mm-aa)			EPS	ARL	AFP
			Ingreso	Retiro				
1	My terra	14.636.383	1/23		ografo	S.	ena	cción
2	Jeiner Andrés os everri	7.401.400	2/24		ografo	d	iva	enir
3	e Ernesto Martínez	2.970.271	1/24		enero	PS	iva	enir

PERSONAL GRUPO 10 LOGISTICA SAS							
	NOMBRE	No. CÉDULA	FECHA		RGO	ISS	
			(dd-mm-aa)				AFP

			Ingreso	ro				
1	la Orlenis Campiño	1.112.966.233	4/24		ante nocturno	PS		Porvenir
2	ar Steven Monsalve	1.112.969.617	8/24		ante fin de ana	sanar		Porvenir
3	an ander arrete	1.010.151.246	8/24		ante nocturno	sanar		Colfondos
4	ni Mabel Bedoya	1.006.248.479	6/24		ante fin de ana	et salud		Porvenir
5	José Ever do	94.452.944	1/25		ante nocturno	d		Porvenir
6	nson piño	1.113.630.799	1/25		ante nocturno	sanar		Porvenir

PERSONAL CONSTRUCTORA CYC PALMIRA ESCOBAR SAS								
	NOMBRE	CÉDULA	FECHA		RGO	SGSS		
			(dd-mm-aa)			EPS	ARL	AFP
			Ingreso	Retiro				
1	ar Ignacio Carabali	16.277.004	4/24		Maestro	Salud Total	Colmena	Colpensiones
2	o Andrés Cruz	90.463.618	1/24		Ing. Aux	N EPS	Colmena	Porvenir
3	an que repo	13.679.286	2/24		Ayudante	N EPS	Colmena	Porvenir
4	ilton illo	13.627.264	2/24	2/25	Oficial	SOS	Colmena	Porvenir
5	inton Galiano	13.652.339	2/24		Oficial	Emssanar	Colmena	Protección
6	ol Stiven Valencia	06.308.185	1/25		Ayudante	Emssanar	Colmena	Porvenir
7	os Mario Henao	06.317.266	2/25		Ayudante	Asmet Salud	Colmena	Colpensiones
8	Luis Ángel a	80.164.498	2/25		Maestro	Salud Total	Colmena	Porvenir
9	Jhon Deyby na	13.665.352	2/25	2/25	Oficial	N EPS	Colmena	Porvenir
10	er Stiven Cortez	14.838.910	2/25		Ayudante	Emssanar	Colmena	Protección

11	s Cortes Domínguez	4.832.209	2/25		Ayudante		Colmena	Porvenir
12	en Alberto Loaiza	93.380.674	2/25		Ayudante	N EPS	Colmena	Porvenir

PERSONAL METALMECANICA CONINGENIERIA SAS								
No.	NOMBRE	CÉDULA	FECHA		CARGO	SGSS		
			(dd-mm-aa)			EPS	ARL	
			Ingreso	Retiro				
1	Jhon Fredy Rincón Marín	3.629.201	09/12/24		Armador	Comfenalc o	Sura	cción
2	Luis Miguel Montaño	4.835.053	30/08/24		Ayudante	SOS	Sura	enir
3	Diego Valor	16.861.728	06/08/24		Soldador	N EPS	Sura	ensione
4	Carlos Andrés Castro	1114.832.403	01/11/24		Ayudante	SOS	Sura	enir
5	Juan Diego Castro	4.813.332	01/11/24		Ayudante	N EPS	Sura	enir
6	Brayan Andrés García	3.641.466	01/11/24		Armador	Comfenalc o	Sura	ensione
7	Jonathan Rivera	3.952.917	17/01/25		Ayudante	SOS	Sura	enir
8	José Elías Murillo	4.814.934	09/12/24		Soldador	N EPS	Sura	enir

PERSONAL INGENIERIA AMSO SAS								
	NOMBRE	CÉDULA	FECHA		CARGO	SGSS		
			(dd-mm-aa)					
			Ingreso	Retiro				
1	erson Sinisterra ameño	94.442.503	1/25		stro	tas		ondos
2	Waldino cios	Rios 3.606.323	1/25		al			enir

3	Rubén Ila	Dario	94.382.330	1/25		ante			ensiones
4	Sinisterra		4.782.622	1/25		al	d Total		enir
5	ar Enrique Canizalez		94.468.200	1/25		al	PS		enir
6	Javier Sinisterra	Angulo	1.773.371	13/01/25		Oficial	SOS	Sura	Colfondos
7	Daniel Arboleda	Adolfo	4.951.197	16/01/25		Ayudante	Emssana r	Sura	Porvenir
8	Nasly Leonor Arango		66.656.370	17/01/25		Inspector SST	N EPS	Sura	Porvenir
9	Edwar Alberto Mina		6.186.943	10/02/25		Ayudante	N EPS	Sura	Protección
	Yimmy Sinisterra Celorio		94.443.411	17/02/25		Ayudante	N EPS	Sura	Porvenir

PERSONAL SAMUEL MARQUEZ								
No.	NOMBRE	CÉDULA	FECHA		GRUPO	SGSS		
			(dd-mm-aa)			EPS	ARL	
			Ingreso	Retiro				
1	Over Pino Vega	15.272.172	2/25		Oficial	Emssanar	Sura	enir
2	Samuel Eliab Pino	3.068.392	2/25		Ayudante	Emssanar	Sura	ensiones
3	Edwin Samir Aragón	3.933.685	2/25		Técnico Electricista	N EPS	Sura	enir
4	Samuel Marquinez	6.184.448	2/25		Ing. electricista		Sura	

PERSONAL WATER APPLICATIONS AND SOLUTIONS WAS SAS								
No.	NOMBRE	CÉDULA	FECHA		RGO	SGSS		
			(dd-mm-aa)			EPS	ARL	
			Ingreso	Retiro				
1	Guillermo León González	14.797.442	1/25		supervisor	SURA	Positiva	enir

2	Fernando Lara	4.166.667	2/25		Analista Ingenieria	SURA	Positiva	ensiones
3	Cristian Quintero	4.179.864	2/25		Analista Ingenieria	SOS	Positiva	acción
4	Carlos Arnulfo García Mejía	70.852.473	1/25		Ayudante	Emssanar	Positiva	ensiones
No.	NOMBRE	CÉDULA	FECHA		RGO	SGSS		
			(dd-mm-aa)			EPS	ARL	
			Ingreso	Retiro				
1	Iván Villanueva	3.719.570	1/25	2/25	ico en montajes	Sura	Sura	ensione
2	Octavio Pérez	112.505.845	1/25	2/25	ico en montajes	N EPS	Sura	ensione

Fuente de elaboración: Informe de contratista, Martínez Flor 02-2025 SST CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

5.5 REALIZACIÓN DE SIMULACROS

Para el mes pasado se realizó 1 simulacro de evacuación acogiéndose a la normativa nacional, el contratista adjunto informe de evacuación.

6. MANEJO AMBIENTAL

6.1 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS RCD

El aprovechamiento de los Residuos De Construcción Y Demolición - RCD se plantea con dos alternativas: reutilizar en obra o transportarlos a centros de acopio temporales o centros de aprovechamiento. Los centros de aprovechamiento planteados como alternativa implican, generalmente, una tercerización de los RCD. Por otro lado, un gran o mediano generador puede pensar en la construcción de centros de acopio temporales, de tal manera que se cuente con una zona de acopio donde se reúnan los RCD aprovechables que no se utilizaron en su totalidad en las obras para ser utilizado.

Las obras civiles, en la mayoría de las etapas constructivas, generan escombros, residuos de materiales de diferentes tamaños (virutas, polvillo de corte, piezas de cerámica, etc.), residuos tóxicos y algunos contaminantes orgánicos que son conocidos como residuos de construcción y demolición (RCD) y han de ser correctamente tratados para minimizar la contaminación y potenciar su aprovechamiento, y así favorecer el entorno social y el posible ecosistema involucrado. Igualmente, la interventoría realiza control a las volquetas y máquinas usadas en obra, verificando los siguientes documentos:

- SOAT.
- Revisión técnico-mecánica
- Póliza daños a terceros

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD	CERTIFICADO
Madera	No reporta	N/A
Chatarra	No reporta	N/A
Material de Excavación RCD		
Residuos Aprovechables y no Aprovechables	No reporta	N/A.
Teja PVC otros	No se genera	N/A

6.2 CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA POR EMISIÓN DE MATERIAL PARTICULADO, GASES Y RUIDO:

La contaminación atmosférica se produce por el uso de equipos, máquinas y/o vehículos y se mitiga mediante los mantenimientos preventivos.

Actividad que se supervisa por medio de las inspecciones que se realizan periódicamente.

- ❖ Señalización, cerramientos provisionales y aislamiento en de los sitios de trabajo.

6.3 INSPECCIÓN ORDEN Y ASEO

TIPO DE MATERIAL	FECHA	CANTIDAD
Inspección de seguridad y ambiente (orden y aseo)	Semanal	

6.4 MAQUINARIA Y EQUIPOS

MAQUINARIA EQUIPO U/O HERRAMIENTA	CANTIDAD	MARCA SERIE - PLACA
Equipos de topografía	Estación – Nivel	NIKON SNDWAY
Retroexcavadora Llantas	1	CAT
Retroexcavadora orugas	1	HYUNDAI R130SNPRO 2024
Volquetas	1	(UFK231)
Taladro demoledor	3	

Pulidora	2	DELWAT
Sierra circular para corte de madera	1	
Planta Generadora 6.5	2	ELITE- NUEVA
Motobomba 2 pulgadas	1	BARNES
Motobomba 3 pulgadas	1	
Mezcladora de concreto	2	TOOLCRAFT
Vibrador eléctrico	3	BOSCH 2.8 HP-NUEVO
Taladros manuales	3	
Martillo demoledor	1	SIEFKEN
Rotomartillo	1	SIEFKEN
Buggy	7	Herragro- Toolcraft
Herramienta menor (palas, picas, martillo, cancel, barra, machete, destornillador, alicate)		

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Las labores en la obra continúan desarrollándose en tres frentes de trabajo:
 - PTAP de Guacari: Sedimentación – Caseta Eléctrica
 - PTAP de Ginebra: Sedimentación – Filtración - Tanque de Almacenamiento - Caseta Eléctrica
 - Tanque de Almacenamiento La Albania – Ginebra
- El frente del Tramo 3 continua suspendido, se estará coordinando su inicio para Marzo, por la firma de un acta con los compromisos entre la Gobernación del Valle del Cauca, Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P y la Comunidad encabezada por Pro-territorio.
- Con el Ingenio Pichichi ya se encuentra en la etapa final de la servidumbre, se puede iniciar para Marzo este tramo de tubería PEAD 14" en una L: 500 ml
- Con la Familia Saavedra - Blum ya está en proceso de servidumbre para instalar en su predio la Tubería PEAD 10" en una L: 600 ml
- Los trabajos en las plantas se desarrollan de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato
- Los permisos que se tienen pendientes por la parte ambiental y permisos de demoliciones de pavimento siguen aún pendientes por parte de las entidades a quien se les ha solicitado.

- Los trabajos de localización y replanteo en la vía del Tramo 1: CADICA a BOCATOMA, continúan sin ningún inconveniente
- Se continúan realizando los trabajos bajo las medidas de seguridad acordados con el contratista.
- Los acercamientos con los líderes del sector de Puente Rojo y Proterritorio han mejorado el dialogo con la comunidad permitiendo que se mejore la aceptación de la obra.
- Todo el personal tiene cobertura de seguridad social y riesgos laborales.
- Se siguen los lineamientos de medicina preventiva, realizando los exámenes de ingreso para el personal nuevo.

Atentamente,



EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
Representante Legal
Consortio Interguacari
Interventoria
