

 POLITÉCNICO COLOMBIANO Jaime Isaza Cadavid	ORDEN DE PAGO	CÓDIGO: FFN44
		VERSIÓN: 05

FECHA: lunes, 23 de diciembre de 2024	C.C. / Nit: 901,443,757-6
Beneficiario: SERVICONSTRUCCIONES R&F S.A.S, Cuenta de Mayor : 72.08.02.07.00	C. de Costos: 10310501
Descripción del pago: Pago Factura FVE No. 40 Avance 2 Final de Contrato No. 54187 de 2024, "Implementar un sistema de riego móvil por goteo y/o aspersión para una Ha en el Centro de Laboratorios de Riegos y Maquinaria Agrícola en Niquía - Bello, que contribuya con la formación académica e investigativa de Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid". CRP 6677	
Valor en letras: SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L	\$ 67.500.000
 Firma y cédula del Responsable VB	TOTAL: \$ 67.500.000

NOMBRE		FIRMA	FECHA
Proyectó	Luis Fernando Agudelo - Técnico Administrativo		23-dic-24
Revisó	Felipe Pineda Betancur - Coordinador Centro de Laboratorios		23-dic-24
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			





SERVICONSTRUCCIONES RYF
S.A.S
NIT 901.443.757-6
CL 24 3 W 10 BRR LA ESMERALDA
Tel: (604) 3016752071
Montería - Colombia
rubendhc28@gmail.com



Factura Electrónica de Venta
No. FVE 40

Señores	POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID		
NIT	890.980.136-6	Teléfono	(57) 3194121997 - Ext. 000
Dirección	CRA 48 No 7 151 El Poblado	Ciudad	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/12/2024, 09:57
Expedición	26/12/2024, 09:57
Vencimiento	26/12/2024

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SISTEMA DE RIEGO POR GOTEY Y ASPERSIÓN MOVIL	SISTEMA DE RIEGO POR GOTEY Y ASPERSIÓN MOVIL	1.00	45,225,000.00	0.00	45,225,000.00
2	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN	1.00	18,900,000.00	0.00	18,900,000.00
3	UTILIDAD	UTILIDAD	1.00	3,375,000.00	0.00	3,375,000.00



Radicado:202402004066
Fecha: 31/12/2024 06:58:43.0
Asunto: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Remitente: SERVICONSTRUCCIONES R&F S.A.S
Destinatario: LUIS FERNANDO AGUDELO ZAPATA

202402004066

Total items: 3

Valor en Letras:

Sesenta y siete millones quinientos mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación \$ 67,500,000.00

Observaciones:

El valor total de la factura corresponde al 50% restante del total del Proceso de Selección Abreviada de Menor cuantía N.º SAMC-1569-2024, celebrado entre SERVICONSTRUCCIONES RYF S.A.S. y el POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID, como avance de las actividades estipuladas contractualmente.

Total Bruto	67,500,000.00
Total a Pagar	67,500,000.00

Luis Fernando Agudelo Zapata
CC.71.761.021
26/dic/2024

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764071300081 aprobado en 20240524 prefijo FVE desde el número 8 al 500 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 8bc928d8879f4896d356336cc49a09b7343c5554ef1120fa61b7e19672a1d183601b1b759106004507925f1d35718b22

 POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME SÁENZ ZAPATA	FORMATO PARA PAGAR PROVEEDORES Y CONVENIOS POR CUOTAS						Código: FFN54
							Versión: 07
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SERVICONSTRUCIONES RYF S.A.S.							
C.C. ó N.I.T.: 901,443,757-6							FECHA: 05/12/2024
NUMERO DE R.P.C 6677 DEL 15 Nov 2024				CONTRATO 54187 DE 2024		VALOR C.R.P:	135.000.000
NÚMERO CUOTA	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	CENTRO DE COSTOS	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR	SALDO	FECHA DE REMISIÓN	FIRMA DEL INTERVENTOR RESPONSABLE
1	FVE 29	10.31.05.01	2301801004202001	\$ 67.500.000,00	67.500.000	06/12/2024	 Luis Fernando Agudelo Zapata CC.71.761.021 26/Dic/2024
2	FVE 40	10.31.05.01	2301801004202001	\$ 67.500.000,00	0	26/12/2024	
NOTA: Los centros de costos y los rubros presupuestales son unicamente los asignados en el Certificado de Registro Presupuestal. Si el saldo final es mayor que 0 (Cero), el interventor debe autorizar liberar dichos recursos mediante razonero o correo electronico, indicando el rubro presupuestal o centro de costos del cual se van a liberar los recursos. (los pagos autorizados no pueden superar el valor del C.R.P.).							
							

 POLITÉCNICO COLOMBIANO Jaime Isaza Cadavid	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA CONTRATOS DE OBRA			Código: FLG65
				Versión: 02
Fecha Diciembre 20 de 2024		Informe No. 02		Periodo de Seguimiento: 22-Noviembre-2024 a 20-Diciembre-2024
1. ASPECTOS GENERALES DEL INTERVENTOR				
Contrato No: 54187 de 2024		Fecha de Inicio: 22 Noviembre 2024	Fecha de Finalización: sin superar el 30 diciembre 2024	Valor del Contrato: \$ 135,000,000
Objeto del Contrato: Adecuar e implementar un sistema de riego por goteo y aspersión – móvil, en el Centro de Laboratorios de Riegos y Maquinaria Agrícola en Niquía - Bello del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.				
Nombre del Supervisor / Interventor: LUIS FERNANDO AGUDELO ZAPATA			Contratista: SERVICONSTRUCCIONES RYF S.AS.	
PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA:				
NOMBRE		PROFESIÓN		CARGO
LUIS FERNANDO AGUDELO ZAPATA		ADMINISTRADOR DE EMPRESAS AGROPECUARIO		TECNICO ADMNISTRATIVO CENTRO DE LABORATORIO DE RIEGO Y MAQUINARIA AGRICOLA NIQUIA - PCJIC
2. ASPECTOS GENERALES DE OBRA				
Contrato No: 54187 DE 2024		Fecha de Inicio: NOVIEMBRE 22 de 2024	Fecha de Finalización: SIN SUPERAR Diciembre 30 de 2024	Valor del Contrato: \$ 135,000,000
Objeto del Contrato: Adecuar e implementar un sistema de riego por goteo y aspersión – móvil, en el Centro de Laboratorios de Riegos y Maquinaria Agrícola en Niquía - Bello del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.				
Localización de la Obra: CENTRO DE LABORATORIOS DE RIEGO Y MAQUINARIA AGRICOLA - NIQUIA - POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID			Contratista: SERVICONSTRUCCIONES RYF S.AS.	
Resumen general de avance de obra: DURANTE ESTE PERIODO SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES CONTRACTUALES COMO: 1- Cubierta de 18x15 para Tanque Australiano, Bomba y Sistema de Filtrado, 2- Excavaciones Tuberías, 3 Tendido de los Laterales de Riego, 4 Tendido de La Tubería Múltiple, 5 Tendido de la Tubería Intrapredial, 6 Sistema de Almacenamiento de Agua, 7 Sistema de Filtrado, 8 Instalación de Válvulas rara Ramales y lavado, 9 Atraque de Tubería, 10 Cajas Módulos De Riegos, 11 Sistema De Bombeo, 12 Tendido de la Tubería Principal de Polietileno 1 1/2", 13 Medidores de Caudal, 14 Acondicionamiento del Reservorio en Tierra, 15 Sistema Eléctrico.				
RELACIÓN DE TIEMPOS				
PERIODO DE ACTIVIDADES	TIEMPO TRANSCURRIDO EN EL PERIODO (DÍAS)	PORCENTAJE RESPECTO AL PLAZO	PLAZO TRANSCURRIDO ACUMULADO (DÍAS)	PORCENTAJE ACUMULADO
1 - CUBIERTA DE 18X15 PARA TANQUE AUSTRALIANO, BOMBA Y SISTEMA DE FILTRADO	8	0,21	8	0,21
2 - EXCAVACIONES TUBERIAS	8	0,21	16	0,42
3 - TENDIDO DE LOS LATERALES DE RIEGO	4	0,11	20	0,53
4 - ENDIDO DE LA TUBERIA MULTIPLE	4	0,11	24	0,63
5 - TENDIDO DE LA TUBERIA INTRAPREDIAL	1	0,03	25	0,66
6 - SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	3	0,08	28	0,74
7 - SISTEMA DE FILTRADO	1	0,03	29	0,76



Código: FLG65

Versión: 02

8 - INSTALACIÓN DE VALVULAS PARA RAMALES Y LAVADO	1	0,03	30	0,79
9 - ATRAQUE DE TUBERIA	1	0,03	31	0,82
10 - CAJAS MODULOS DE RIEGOS	1	0,03	32	0,84
11- SISTEMA DE BOMBEO	1	0,03	33	0,87
12- TENDIDO DE LA TUBERIA PRINCIPAL DE POLIETILENO 1 1/2"	2	0,05	35	0,92
13- MEDIDORES DE CAUDAL	1	0,03	36	0,95
14- ACONDICIONAMIENTO DEL RESERVORIO EN TIERRA	1	0,03	37	0,97
15- SISTEMA ELÉCTRICO	1	0,03	38	1,00

RESUMEN GENERAL DE AVANCE DE OBRA

CAPÍTULO	ÍTEM	NOMBRE					
		UNIDAD		CONTRATADO		ADICIONAL	
DESCRIPCIÓN							
SE ANEXA INFORME DE AVANCE No. 2							
ÍTEMS NO PREVISTOS							
CAPÍTULO DEL PERIODO		ÍTEMS NO PREVISTOS EJECUTADOS DURANTE EL PERIODO	PORCENTAJE DE RENDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			OBSERVACIONES	
14- ACONDICIONAMIENTO DEL RESERVORIO EN TIERRA		ACONDICIONAMIENTO DEL RESERVORIO EN TIERRA	98%				
14- ACONDICIONAMIENTO DEL RESERVORIO EN TIERRA		ACONDICIONAMIENTO DEL RESERVORIO EN TIERRA	98%				
14- ACONDICIONAMIENTO DEL RESERVORIO EN TIERRA		ACONDICIONAMIENTO DEL RESERVORIO EN TIERRA	98%				
REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL (ANEXAR REGISTRO FOTOGRÁFICO DETALLADO)							

SEGUIMIENTO PERSONAL DEL CONTRATISTA

PERIODO

22-11-2024 A 06-12-2024


AÑO

31/12/2024

TOTAL DÍAS CALENDARIO

29

PERSONAL		FECHA																												RESUMEN				
#	CARGO	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	DÍAS POR MES	% DE ASISTENCIA
1	INGO RESIDENTE																															27	93%	
2	INGO AUXILIAR																															27	93%	
3	ENCARGADO																															27	93%	
4	OFICIAL																															27	93%	
5	AYUDANTE																															25	86%	
6	AYUDANTE																															27	93%	
7	AYUDANTE																															23	79%	
TOTAL PERSONAL / DÍA		2	2	2	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	0	7	7	7	7	7	7	0	5	5	6	6	6	0	0		

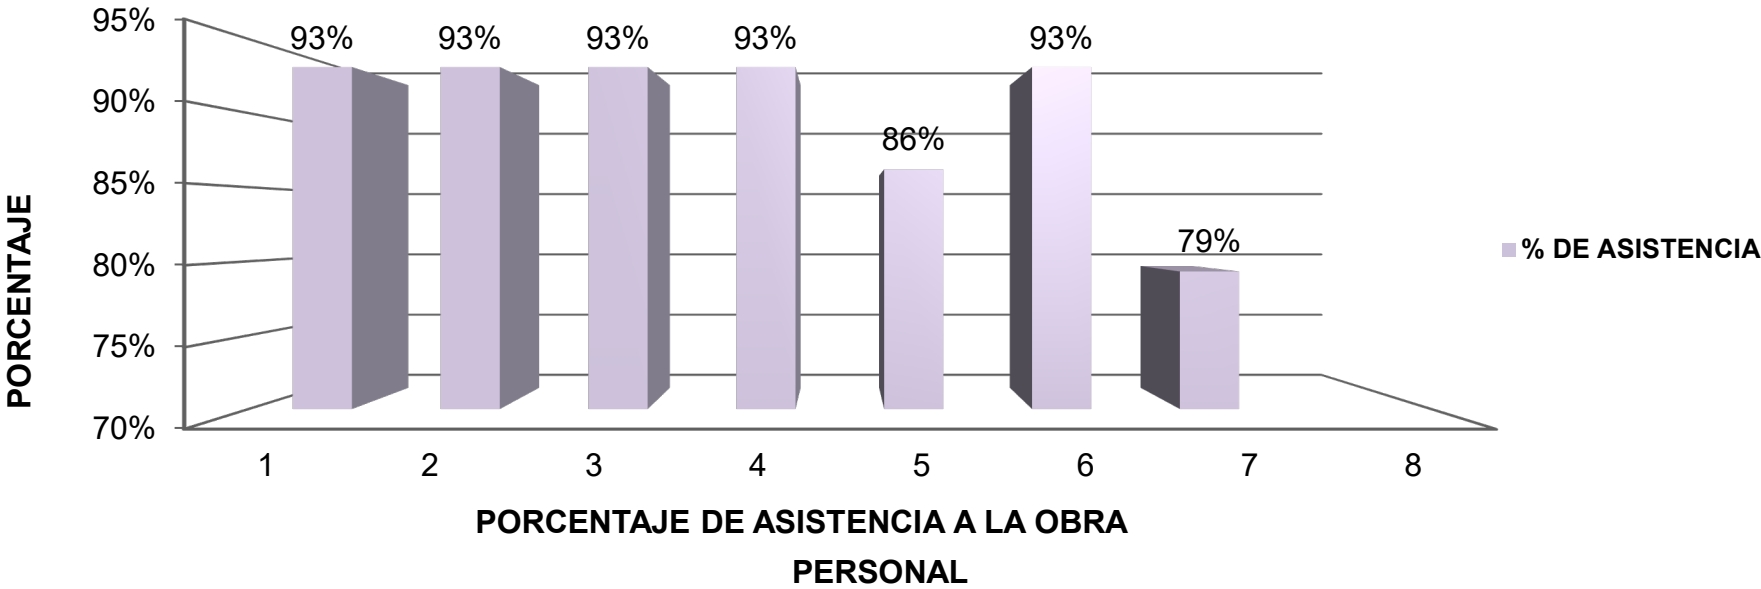

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO

22-11-2024 A 06-12-2024

AÑO

2024

SECO

1

1

LLUVIA MODERADA

2

2

LLUVIA INTENSA

3

3


NUBOSIDAD

4

4


HORAS	FECHA																														
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
6:00 - 7:00																															
7:00 - 8:00																															
8:00 - 9:00																															
9:00 - 10:00																															
10:00 - 11:00																															
11:00 - 12:00																															
12:00 - 13:00																															
13:00 - 14:00																															
14:00 - 15:00																															
15:00 - 16:00																															

RESUMEN MES	
1	61,00%
2	18,00%
3	3,00%
4	18,00%

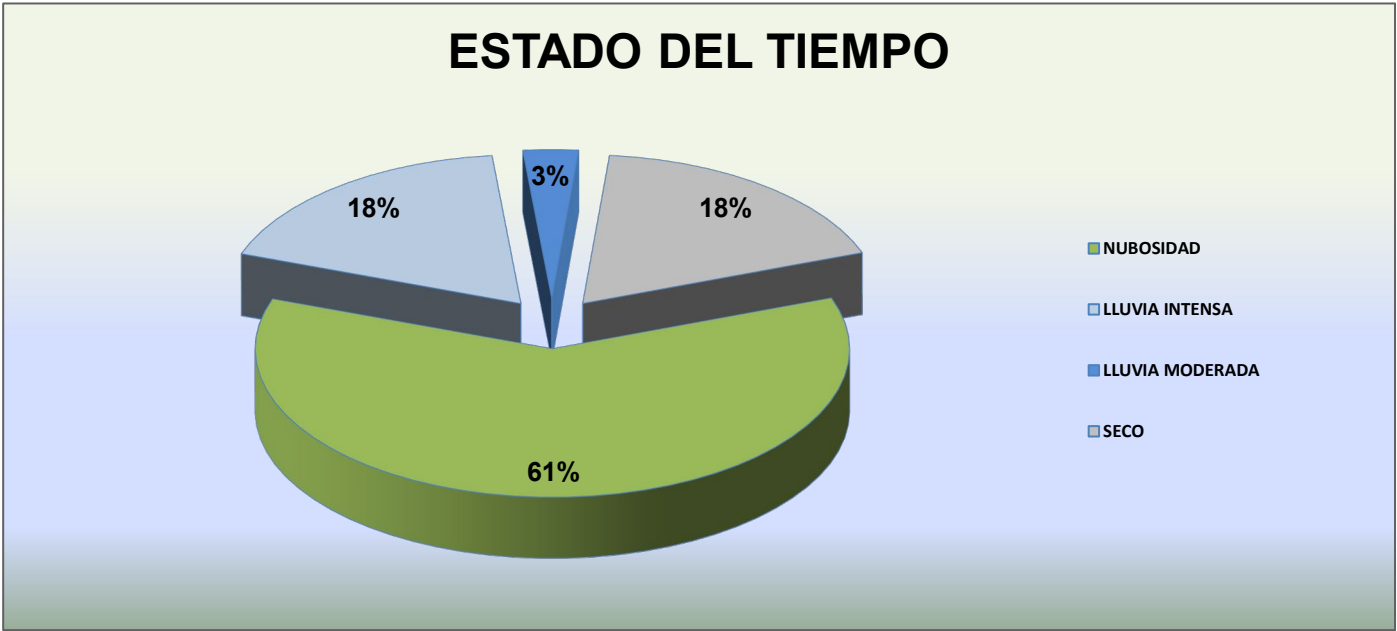

No SEMANA	FECHA	PRESUPUESTO TOTAL PROGRAMADO	% PROGRAMADO	PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO
1	22 Nov al 24 Nov 2024	\$ 20.000.000	14,81%	\$ 3.000.000	2,22%
2	25 Nov al 01 Dic 2024	\$ 15.000.000	11,11%	\$ 25.000.000	18,52%
3	02 Dic al 08 Dic 2024	\$ 18.000.000	13,33%	\$ 22.000.000	16,30%
4	09 Dic al 15 Dic 2024	\$ 10.000.000	7,41%	\$ 10.000.000	7,41%
5	16 Dic al 22 Dic 2024	\$ 29.000.000	21,48%	\$ 22.000.000	16,30%
6	23 Dic al 29 Dic 2024	\$ 25.000.000	18,52%	\$ 28.000.000	20,74%
7	30 Dic al 31 Dic 2024	\$ 18.000.000	13,33%	\$ 25.000.000	18,52%

RELACIÓN PRESUPUESTO PROGRAMADO VS EJECUTADO

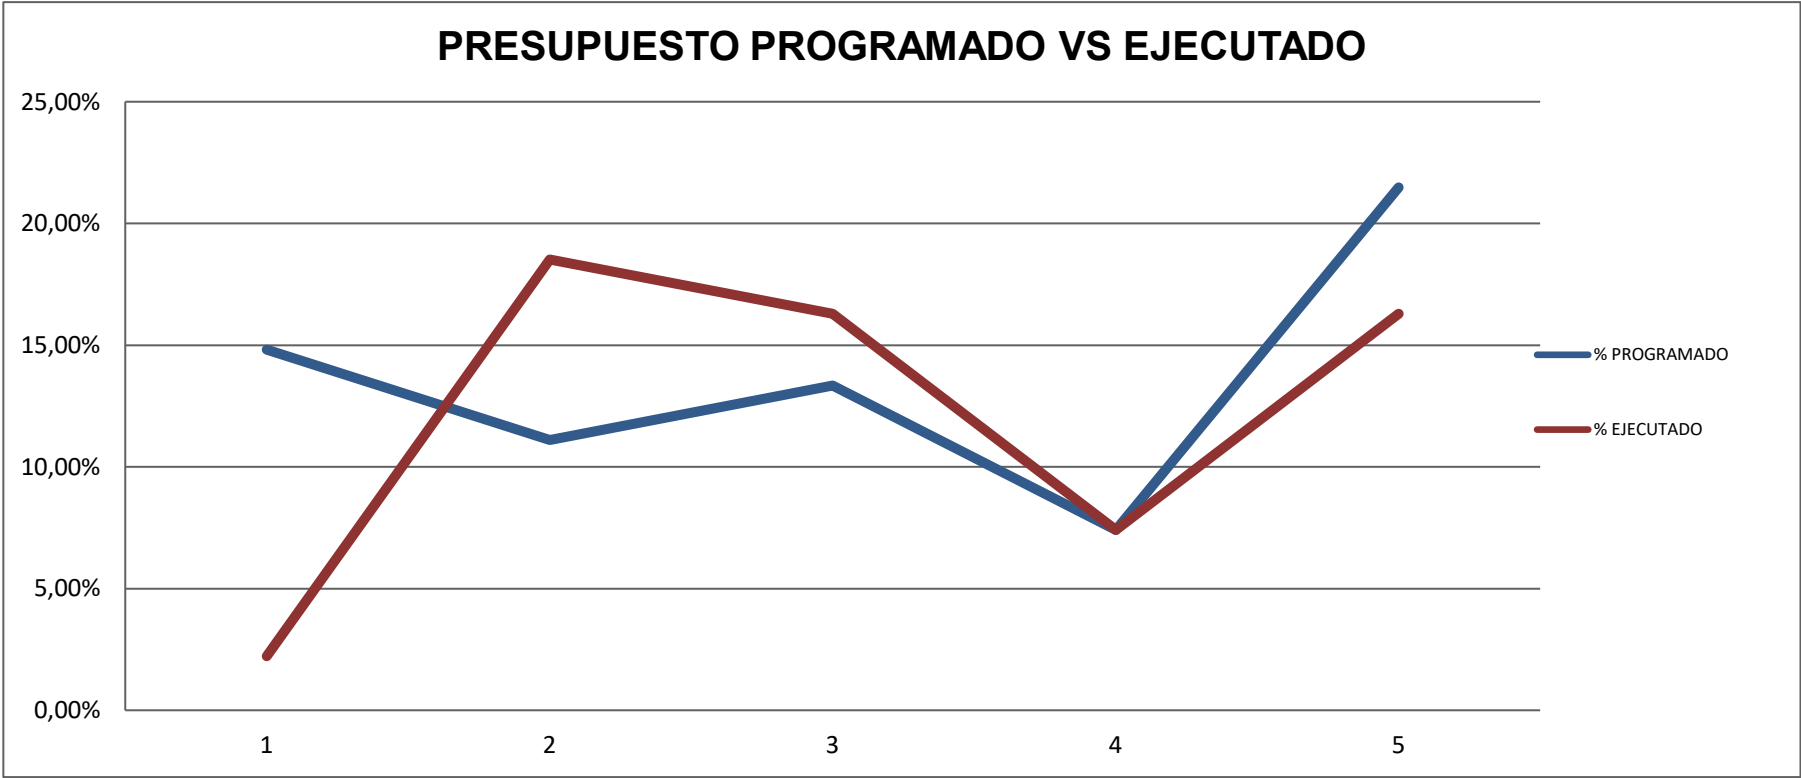



Código: FLG65

Versión: 02

PAGOS REALIZADOS

No DE ACTA	FECHA	VALOR ACTA	VALOR AMORTIZADO CON ANTICIPO	VALOR TOTAL DESEMBOLSADO	% VR EJECUTADO / AL VALOR INICIAL	% VALOR ACUMULADO EJECUTADO / VALOR INICIAL	% TIEMPO TRANSCURRIDO	% TIEMPO TRANSCURRIDO ACUMULADO
1	6/12/2024	\$ 67.500.000	67500000	0	50%	50%	50%	50%

CONTROL DEL ANTICIPO

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	CONCEPTO
N,A			
TOTAL AUTORIZADO A LA FECHA			

RELACIÓN DE COMUNICACIONES


[illegible]

 POLITÉCNICO COLOMBIANO Jaime Isaza Cadavid	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA CONTRATOS DE OBRA				Código: FLG65
					Versión: 02
4. ASPECTOS TÉCNICOS					
ANÁLISIS ENSAYOS DE LABORATORIO					
RECOMENDACIONES					
5. SEGUIMIENTO AL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA					
DESCRIPCIÓN					
RECOMENDACIONES					
EVALUACIÓN ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD					
UNIDAD EJECUTORA:		NOMBRE DEL ESPECIALISTA:			
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES					
ECONÓMICO - ADMINISTRATIVAS					
TÉCNICAS					

7. ANEXOS

☐	Copia de la bitácora de obra	☐	Balance de mayores y menores cantidades de obra contratadas.
☒	Copia de las afiliaciones del personal	☐	Requerimiento de obra adicional para aprobación por la Institución. (Ordenador del Gasto, Planeación y Consejo Superior).
☐	Ensayos de Laboratorio	☒	Registro fotográfico detallado
☒	Actas suscritas durante el periodo	☐	Evaluación de Proveedores Cuantía Mayor o Igual a 50 SMLMV
☐	Correspondencia entre el contratista y el interventor	☐	Lista de Chequeo Informe de Supervisión y/o Interventoría
☐	Control de Equipos	☐	Otro:
☐	Control de Seguridad Industrial		
☐	Acta Ítems no previstos.		

Firma:



SUPERVISOR (A) / INTERVENTOR (A)

Nombre: LUIS FERNANDO AGUDELO ZAPATA

Correo electrónico: lfagudelo@elpoli.edu.co

Teléfono: 3235821788



RAZONERO

Medellín, 20 de Diciembre 2024

PARA: FREDY OSVALDO RODRÍGUEZ HENAO
Profesional Especializado - Coordinación de Tesorería

DE: LUIS FERNANDO AGUDELO ZAPATA
Técnico Administrativo – Centro de Laboratorio de Riego y Maquinaria Agrícola

ASUNTO: No Desembolso pago Factura No. FVE 40 Serviconstrucciones R&F S.A.S.

El Pago Factura **FVE No. 40 Avance 2 Final de Contrato No. 54187 de 2024**, "Implementar un sistema de riego móvil por goteo y/o aspersión para una Ha en el Centro de Laboratorios de Riegos y Maquinaria Agrícola en Niquía - Bello, que contribuya con la formación académica e investigativa de Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid", **favor no desembolsar hasta no tener autorización del supervisor.**

Cordialmente,

LUIS FERNANDO AGUDELO Z
Técnico Administrativo
Centro de Laboratorio de Riego y Maquinaria Agrícola

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó	LUIS FERNANDO AGUDELO Z- Técnico Administrativo – Centro de Laboratorio de Riego y Maquinaria Agrícola		20/12/2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			

RAZONERO

Medellín, 20 de Diciembre 2024

PARA: FREDY OSVALDO RODRÍGUEZ HENAO
Profesional Especializado - Coordinación de Tesorería

DE: LUIS FERNANDO AGUDELO ZAPATA
Técnico Administrativo – Centro de Laboratorio de Riego y Maquinaria Agrícola

ASUNTO: No Desembolso pago Factura No. FVE 40 Serviconstrucciones R&F S.A.S.

El Pago Factura **FVE No. 40 Avance 2 Final de Contrato No. 54187 de 2024**, "Implementar un sistema de riego móvil por goteo y/o aspersión para una Ha en el Centro de Laboratorios de Riegos y Maquinaria Agrícola en Niquía - Bello, que contribuya con la formación académica e investigativa de Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid", **favor no desembolsar hasta no tener autorización del supervisor.**

Cordialmente,

LUIS FERNANDO AGUDELO Z
Técnico Administrativo
Centro de Laboratorio de Riego y Maquinaria Agrícola

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó	LUIS FERNANDO AGUDELO Z- Técnico Administrativo – Centro de Laboratorio de Riego y Maquinaria Agrícola		20/12/2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901443757	6	SERVICONSTRUCCIONES R & F S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLEGIO	cl 33 No 301	MONTERIA-CORDOBA	7819496	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1100408616	9478498983	E	2024/12/13	2024/12/04	NEQUI	0	\$818,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 1143367717	HERNANDEZ RUBEN	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF16	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0
2	CC 10766013	LLORENTE FERNANDO	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF16	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0
3	CC 1020102949	MORALES JHON	230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS040	1	\$43,334	\$1,800	CCF16	1	\$43,334	\$1,800	14-23	1	\$43,334	\$3,100	1	\$0	\$0
Total Afiliados(3)					\$2,643,334	\$423,000			\$2,643,334	\$105,800			\$2,643,334	\$105,800			\$2,643,334	\$184,100		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$423,000	\$0	\$0	\$423,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$423,000	\$0	\$0	\$423,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$184,100	\$0	\$0	\$184,100	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	\$184,100	\$0	\$0	\$184,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$105,800	\$0	\$0	\$105,800	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	3	\$105,800	\$0	\$0	\$105,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$105,800	\$0	\$0	\$105,800	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$1,800	\$0	\$0	\$1,800	
TOTAL				3	\$818,700	\$0	\$0	\$818,700	



DAF INTERNATIONAL CORPORATION S.A.S.

Contadores Públicos, Abogados, Administradores,
Consultoría Profesional, Auditoría y Revisoría Fiscal Externas.

Medellín, 07 de noviembre de 2024

CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El suscrito revisor fiscal de la **CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS - CIS**, con NIT **811.003.209-8**, certifico que a la fecha de expedición de este documento se encuentra a paz y salvo, al periodo correspondiente del mes de octubre de 2024, por todo concepto de pago de aportes de los empleados al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y servicios complementarios (cajas de compensación familiar), aportes parafiscales SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF. Señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas reglamentarias.

Cordialmente,

JUAN GUILLERMO SOTO OCHOA

T.P. 34620-T

Revisor Fiscal

En representación de DAF SAS

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1185026302081940

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LISBETH DIAZ HERRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1041263399 de SAN PEDRO DE URABA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 212426-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO DE LA EMPRESA SERVICONSTRUCCIONES R&F S.A.S

CERTIFICA QUE:

Yo **LISBETH DÍAZ HERRERA** identificada con C.C. No **1.041.263.399** de San Pedro de Urabá – Antioquia, con tarjeta profesional de contador numero **T.P. 212426 - T** en mi calidad de Contador Público de la empresa **SERVICONSTRUCCIONES R&F S.A.S**, declaro que se encuentra al día con los aportes patronales a los subsistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cesantías no cubiertos con los recursos del Sistema General de Participaciones, así como los aportes a cargo de los trabajadores para los subsistemas de salud y pensiones, Y se han reportaron a las diferentes administradoras de estos subsistemas los listados detallados de los afiliados a través del formulario de autoliquidación.

Igualmente, se certifica que se encontraban al día con los aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) al 30 de noviembre de 2024, y que dichos pagos se hacen a través Sistema para la Declaración y Pago Electrónico Integrado de Seguridad Social y Parafiscales, PILA con el operador Aportes de Línea.

Para mayor constancia se firma en Montería - Córdoba, a los (05) días del mes de Diciembre del año 2024.



LISBETH DÍAZ HERRERA
Contador Público
CC. No 1.041.263.399
T.P No 212426 -T

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

212426-T

LISBETH
DIAZ HERRERA
C.C. 1041263399

RESOLUCION INSCRIPCION 12 **FECHA 29/01/2016**
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA **223625**



215226

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



www.idecs.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.041.263.399**

DIAZ HERRERA
APELLIDOS
LISBETH
NOMBRES

LISBETH DIAZ H
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-OCT-1991**
SAN PEDRO DE URABA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

27-OCT-2009 SAN PEDRO DE URABA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-0123700-00210382-F-1041263399-20100125 0020253328A 1 33085685

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

 POLITÉCNICO COLOMBIANO Jaime Isaza Cadavid UNIDAD EJECUTORA:		ACTA EJECUCIÓN DE OBRA												
		POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID		PLAZO INICIAL: 60 DIAS CALENDARIO FECHA INICIO DEL CONTRATO: 22/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: VALOR DEL CONTRATO: \$ 135,000,000 VALOR ACUMULADO: VALOR ADICIÓN: \$ 0 \$135.000.010										
CONTRATO N° :		54187 de 2024												
OBJETO:		"Adecuar e implementar un sistema de riego por goteo y aspersión – móvil, en el Centro de Laboratorios de Riegos y Maquinaria Agrícola en Niquía - Bello del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid."												
CONTRATISTA:		SERVICONSTRUCCIONES R&F S.A.S												
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACUMULADO ACTA No. 1 - ACTA No. 2		MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDADES CONTRACTUALES		MAYORES Y MENORES		CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1 - CUBIERTA DE 18X15 PARA TANQUE AUSTRALIANO, BOMBA Y SISTEMA DE FILTRADO			\$21.699.944				\$21.699.944							\$21.699.944
1.0	CUBIERTA DE 18X15 PARA TANQUE AUSTRALIANO, BOMBA Y SISTEMA DE FILTRADO			\$21.699.944				\$21.699.944						\$21.699.944
1.1	Cubierta de 18x15 para tanque australiano, bomba y sistema de filtrado, Suministro e instalación de perfilería estructural cuadrada de 100x100 en hierro calibre 3 milímetros. Incluye suministro, transporte, instalación, hoyado para fijar los perfiles al suelo y refuerzo en concreto para cada perfil	m	42,00	\$ 90.476	\$3.799.992	42,00	\$3.799.992	42,00	\$ 90.476	0,00	\$0	42,00	\$ 90.476	\$3.799.992
1.2	Suministro e instalación de perfilería estructural cuadrada de 40x80 en hierro calibre 2,5 milímetros. Incluye suministro, transporte, instalación, hoyado para fijar los perfiles al suelo y refuerzo en concreto para cada perfil.	m	132,00	\$ 63.636	\$8.399.952	132,00	\$8.399.952	132,00	\$ 63.636	0,00	\$0	132,00	\$ 63.636	\$8.399.952
1.3	Suministro e instalación de teja termoacustica a una altura de 2 metros. Incluye suministro, transporte, instalación y recolección.	m	160,00	\$ 59.375	\$9.500.000	160,00	\$9.500.000	160,00	\$ 59.375	0,00	\$0	160,00	\$ 59.375	\$9.500.000
2 - EXCAVACIONES TUBERIAS			\$8.373.100				\$5.705.932							\$5.705.932
2.0	EXCAVACIONES TUBERIAS.			\$8.373.100				\$5.705.932						\$5.705.932
2.1	Excavación de Zanjas de 70 cm de profundidad y 40cm de ancho para tubería de PE 1 1/2". Disponer el material de excavación en un sitio de acopio y proteger del exceso de humedad.	m	1000,00	\$ 2.400	\$2.400.000	630,00	\$1.512.000	1000,00	\$ 2.400	-370,00	-\$888.000	630,00	\$ 2.400	\$1.512.000
2.2	Zanjas de 50 cm de profundidad y 40 cm de ancho para tubería intrapredial de PVC 1 1/2". Disponer el material de excavación en un sitio de acopio y proteger del exceso de humedad	m	300,00	\$ 1.576	\$472.800	263,20	\$414.803	300,00	\$ 1.576	-36,80	-\$57.997	263,20	\$ 1.576	\$414.803
2.3	Llenado de brecha con material de la excavación y chipiado de madera presente en la zona. Incluye transporte del material desde el sitio de acopio hasta el sitio de la obra.	m	1300,00	\$ 4.231	\$5.500.300	893,20	\$3.779.129	1300,00	\$ 4.231	-406,80	-\$1.721.171	893,20	\$ 4.231	\$3.779.129
3 - TENDIDO DE LOS LATERALES DE RIEGO			\$2.601.341				\$1.533.505							\$1.533.505
3.0	TENDIDO DE LOS LATERALES DE RIEGO			\$2.601.341				\$1.533.505						\$1.533.505
3.1	Suministro, transporte e instalación de silleta en caucho de 16 mm	und	150,00	\$ 611	\$91.650	87,70	\$53.585	150,00	\$ 611	-62,30	-\$38.065	87,70	\$ 611	\$53.585
3.2	Suministro, transporte e instalación de Conector inicial 16 mm	und	150,00	\$ 572	\$85.800	146,37	\$83.724	150,00	\$ 572	-3,63	-\$2.076	146,37	\$ 572	\$83.724
3.3	Suministro, transporte e instalación de Fin de Línea doble "O" de 16mm	und	150,00	\$ 532	\$79.800	100,00	\$53.200	150,00	\$ 532	-50,00	-\$26.600	100,00	\$ 532	\$53.200
3.4	Transporte interno y tendido de la línea de goteo de 16 mm	m	1809,00	\$ 76	\$137.484	1809,00	\$137.484	1809,00	\$ 76	0,00	\$0	1809,00	\$ 76	\$137.484
3.5	Suministro, transporte y tendido de manguera PE 1" para laterales de riego por aspersión	m	416,00	\$ 3.075	\$1.279.200	200,00	\$615.000	416,00	\$ 3.075	-216,00	-\$664.200	200,00	\$ 3.075	\$615.000

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACUMULADO ACTA No. 1 - ACTA No. 2		MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDADES CONTRACTUALES		MAYORES Y MENORES		CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
										CANTIDAD	VALOR			
3.6	Suministro, transporte e instalación de válvulas para manguera de 16mm	und	67,00	\$ 36	\$2.412	67,00	\$2.412	67,00	\$ 36	0,00	\$0	67,00	\$ 36	\$2.412
3.7	Instalación de Aspersor Serie 4012-1 #13 boquilla blanca	und	10,00	\$ 4.730	\$47.300	10,00	\$47.300	10,00	\$ 4.730	0,00	\$0	10,00	\$ 4.730	\$47.300
3.8	Suministro, transporte e instalación de elevador de aspersor en tubo de PVC de 1" de 45cm de longitud	m	10,00	\$ 2.250	\$22.500	10,00	\$22.500	10,00	\$ 2.250	0,00	\$0	10,00	\$ 2.250	\$22.500
3.9	Suministro, transporte e instalación de collarín de derivación 1 1/2" X 1" PVC presión	und	33,00	\$ 25.915	\$855.195	20,00	\$518.300	33,00	\$ 25.915	-13,00	-\$336.895	20,00	\$ 25.915	\$518.300
4 - TENDIDO DE LA TUBERÌA MULTIPLE					\$3.426.399		\$2.561.012							\$2.561.004
4.0	TENDIDO DE LA TUBERÌA MULTIPLE				\$3.426.399		\$2.561.012							\$2.561.004
4.1	Suministro, transporte y tendido de la Tubería PVC 1½ pulga RDE 26	m	174,00	\$ 8.046	\$1.400.004	174,00	\$1.400.012	174,00	\$ 8.046	0,00	\$0	174,00	\$ 8.046	\$1.400.004
4.2	Suministro, transporte e instalación de Accesorios PVC 1 1/2", codos, tapones roscados, adaptadores, uniones, tee	glb	1,00	\$ 861.000	\$861.000	1,00	\$861.000	1,00	\$ 861.000	0,00	\$0	1,00	\$ 861.000	\$861.000
4.3	Suministro, transporte e instalación de Válvulas de PVC de 1 1/2" PVC	und	11,00	\$ 30.000	\$330.000	10,00	\$300.000	11,00	\$ 30.000	-1,00	-\$30.000	10,00	\$ 30.000	\$300.000
4.4	Suministro, transporte e instalación de Válvula de aire doble acción de 3/4"	und	11,00	\$ 75.945	\$835.395	0,00	\$0	11,00	\$ 75.945	-11,00	-\$835.395	0,00	\$ 75.945	\$0
5 - TENDIDO DE LA TUBERÌA INTRA PREDIAL					\$5.257.398		\$1.464.206							\$1.464.206
5.0	TENDIDO DE LA TUBERÌA INTRA PREDIAL				\$5.257.398		\$1.464.206							\$1.464.206
5.1	Suministro, transporte y tendido de la Tubería PVC 1½ pulga RDE 26	m	310,00	\$ 7.419	\$2.299.890	89,20	\$661.767	310,00	\$ 7.419	-220,80	-\$1.638.115	89,20	\$ 7.419	\$661.767
5.2	Suministro, transporte e instalación de Accesorios PVC, codos, tapones, adaptadores, uniones, tee	glb	1,00	\$ 600.500	\$600.500	1,00	\$600.500	1,00	\$ 600.500	0,00	\$0	1,00	\$ 600.500	\$600.500
5.3	Suministro, transporte e instalación de Hidrantes de 1" con Bayoneta y accesorios requeridos	und	16,00	\$ 67.313	\$1.077.008	3,00	\$201.939	16,00	\$ 67.313	-13,00	-\$875.069	3,00	\$ 67.313	\$201.939
5.4	Suministro, transporte e instalación de caja porta hidrantes	und	4,00	\$ 320.000	\$1.280.000	0,00	\$0	4,00	\$ 320.000	-4,00	-\$1.280.000	0,00	\$ 320.000	\$0
6 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEL AGUA					\$18.172.824		\$25.100.001							\$17.909.324
6.0	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEL AGUA				\$18.172.824		\$25.100.001							\$17.909.324
6.1	Suministro, transporte e instalación de tanque australiano de 100.000 litros construido en lámina galvanizada calibre 18 y geomembrana calibre 30 mils (0,75mm) en polietileno de alta densidad (HDPE). Las medidas del tanque serán de 10,86 metros de diámetro y 1,10 metros de altura. Se debe instalar una salida inferior del tanque de 2" de diámetro nominal para mantenimientos. Todas las pegas (termofusión) de la geomembrana se deben hacer en campo mediante termosellado para garantizar la total impermeabilización del tanque.	Und	1,00	\$ 15.000.000	\$15.000.000	1,00	\$15.000.000	1,00	\$ 15.000.000	0,00	\$0	1,00	\$ 15.000.000	\$15.000.000
6.2	Nivelación del terreno-adeacuación: limpieza y nivelación del terreno para la instalación del tanque australiano	m²	92,00	\$ 8.797	\$809.324	909,40	\$8.000.001	92,00	\$ 8.797	0,00	\$0	92,00	\$ 8.797	\$809.324
6.3	Suministro, transporte e Instalación de tanques plásticos de 2.000 litros	Und	2,00	\$ 1.050.000	\$2.100.000	2,00	\$2.100.000	2,00	\$ 1.050.000	0,00	\$0	2,00	\$ 1.050.000	\$2.100.000
6.4	Suministro, transporte e instalación de Hidrante con bayoneta de 1" PVC y accesorios	und	2,00	\$ 74.100	\$148.200	0,00	\$0	2,00	\$ 74.100	-2,00	-\$148.200	0,00	\$ 74.100	\$0
6.5	Suministro, transporte e instalación de Caja porta hidrantes	und	2,00	\$ 57.650	\$115.300	0,00	\$0	2,00	\$ 25.850	-2,00	-\$51.700	0,00	\$ 25.850	\$0
7 SISTEMA DE FILTRADO					\$7.254.598		\$3.888.348							\$3.888.348

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACUMULADO ACTA No. 1 - ACTA No. 2		MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDADES CONTRACTUALES		MAYORES Y MENORES		CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
										CANTIDAD	VALOR			
7.0	SISITEMA DE FILTADO					\$7.254.598		\$3.888.348						\$3.888.348
7.1	Suministro, transporte e instalación de válvula de paso PVC presión lisa de 3/4"	und	2,00	\$ 17.050	\$34.100	1,00	\$17.050	2,00	\$ 17.050	-1,00	-\$17.050	1,00	\$ 17.050	\$17.050
7.2	accesorios PVC de 3/4"	glb	1,00	\$ 42.900	\$42.900	1,00	\$42.900	1,00	\$ 42.900	0,00	\$0	1,00	\$ 42.900	\$42.900
7.3	suministro, transporte e instalación de válvulas de retrolavado de 2"	und	2,00	\$ 1.400.000	\$2.800.000	0,00	\$0	2,00	\$ 1.400.000	-2,00	-\$2.800.000	0,00	\$ 1.400.000	\$0
7.4	suministro, transporte e instalación de válvula lisa doble universal PVC presión de 1 1/2"	und	2,00	\$ 58.000	\$116.000	2,00	\$116.000	2,00	\$ 58.000	0,00	\$0	2,00	\$ 58.000	\$116.000
7.5	suministro, transporte e instalación de filtro de discos de 2" 120 mesh, de gran caudal autolimpiantes	und	2,00	\$ 1.350.000	\$2.700.000	2,00	\$2.700.000	2,00	\$ 1.350.000	0,00	\$0	2,00	\$ 1.350.000	\$2.700.000
7.6	suministro, transporte e instalación de adaptador hembra PVC presión de 2"	und	4,00	\$ 14.500	\$58.000	4,00	\$58.000	4,00	\$ 14.500	0,00	\$0	4,00	\$ 14.500	\$58.000
7.7	suministro, transporte e instalación de manómetro de glicerina + accesorios	und	2,00	\$ 60.000	\$120.000	2,00	\$120.000	2,00	\$ 60.000	0,00	\$0	2,00	\$ 60.000	\$120.000
7.8	suministro, transporte e instalación de unión universal PVC presión de 2"	und	2,00	\$ 25.500	\$51.000	2,00	\$51.000	2,00	\$ 25.500	0,00	\$0	2,00	\$ 25.500	\$51.000
7.9	suministro, transporte e instalación de codo PVC presión de 1	und	5,00	\$ 11.100	\$55.500	5,00	\$55.500	5,00	\$ 11.100	0,00	\$0	5,00	\$ 11.100	\$55.500
7.10	suministro, transporte e instalación de tee PVC presión de 1 1/2"	und	4,00	\$ 11.775	\$47.100	4,00	\$47.100	4,00	\$ 11.775	0,00	\$0	4,00	\$ 11.775	\$47.100
7.11	suministro, transporte e instalación de codo PVC presión de 2"	und	6,00	\$ 17.383	\$104.298	6,00	\$104.298	6,00	\$ 17.383	0,00	\$0	6,00	\$ 17.383	\$104.298
7.12	suministro, transporte e instalación de tee PVC presión de 2"	und	6,00	\$ 13.650	\$81.900	4,00	\$54.600	6,00	\$ 13.650	-2,00	-\$27.300	4,00	\$ 13.650	\$54.600
7.13	suministro, transporte e instalación de colectores PVC de 2"	und	2,00	\$ 171.150	\$342.300	1,00	\$171.150	2,00	\$ 171.150	-1,00	-\$171.150	1,00	\$ 171.150	\$171.150
7.14	suministro, transporte e instalación de soporte metálico para estación de filtrado	und	2,00	\$ 350.750	\$701.500	1,00	\$350.750	2,00	\$ 350.750	-1,00	-\$350.750	1,00	\$ 350.750	\$350.750
8 - INSTALACIÓN DE VALVULAS PARA RAMALES Y LAVADO					\$129.256		\$129.256							\$129.256
8.0	INSTALACIÓN DE VALVULAS PARA RAMALES Y LAVADO				\$129.256		\$129.256							\$129.256
8.1	Instalación de válvulas de ramales para lavado suministro, transporte e instalación de válvula PVC de 1 1/2"	und	4,00	\$ 32.314	\$129.256	4,00	\$129.256	4,00	\$ 32.314	0,00	\$0	4,00	\$ 32.314	\$129.256
9 - ATRAQUE DE TUBERIA					\$449.800		\$449.800							\$449.800
9.0	ATRAQUE DE TUBERIA				\$449.800		\$449.800							\$449.800
9.1	Atraque de tubería suministro, transporte y aplicación de concreto ciclópeo	m3	1,00	\$ 449.800	\$449.800	1,00	\$449.800	1,00	\$ 449.800	0,00	\$0	1,00	\$ 449.800	\$449.800
10- CAJAS MODULOS DE RIEGOS					\$1.770.000		\$0							\$0
10.0	CAJAS MODULOS DE RIEGOS				\$1.770.000		\$0							\$0
10.1	suministro, transporte e instalación de válvula reguladora de presión en línea pr-30 hf	und	15,00	\$ 80.000	\$1.200.000	0,00	\$0	15,00	\$ 80.000	-15,00	-\$1.200.000	0,00	\$ 80.000	\$0
10.2	Suministro, transporte e instalación de válvula de compuerta 1 1/2" PVC	und	15,00	\$ 30.000	\$450.000	0,00	\$0	15,00	\$ 30.000	-15,00	-\$450.000	0,00	\$ 30.000	\$0
10.3	Suministro, transporte e instalación de accesorios PVC, codos, tapones, adaptadores, uniones, tee	glb	1,00	\$ 120.000	\$120.000	0,00	\$0	1,00	\$ 120.000	-1,00	-\$120.000	0,00	\$ 120.000	\$0
11 - SISTEMAA DE BOMBEO					\$20.278.500		\$5.452.914							\$5.452.914
11.0	SISTEMAA DE BOMBEO				\$20.278.500		\$5.452.914							\$5.452.914

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACUMULADO ACTA No. 1 - ACTA No. 2		MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDADES CONTRACTUALES		MAYORES Y MENORES		CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
11.1	Sistema de bombeo suministro, transporte e instalación de bomba centrífuga trifásica	glb	1,00	\$ 4.700.000	\$4.700.000	0,00	\$0	1,00	\$ 4.700.000	-1,00	-\$4.700.000	0,00	\$ 4.700.000	\$0
11.2	suministro, transporte e instalación de soporte metálico para la bomba centrífuga	und	1,00	\$ 219.700	\$219.700	1,00	\$219.700	1,00	\$ 219.700	0,00	\$0	1,00	\$ 219.700	\$219.700
11.3	suministro, transporte e instalación de eléctricos (arrancador, breakers, cable encauchetado, tubería emt)	glb	1,00	\$ 410.800	\$410.800	2,00	\$821.189	1,00	\$ 410.800	1,00	\$410.800	2,00	\$ 410.800	\$821.189
11.4	suministro, transporte e instalación de variador de velocidad de 10 hp	und	1,00	\$ 3.500.000	\$3.500.000	0,27	\$928.025	1,00	\$ 3.500.000	-0,73	-\$2.555.000	0,27	\$ 3.500.000	\$928.025
11.5	suministro, transporte e instalación de caja ip	und	1,00	\$ 264.000	\$264.000	0,00	\$0	1,00	\$ 264.000	-1,00	-\$264.000	0,00	\$ 264.000	\$0
11.6	suministro, transporte e instalación de sensor de nivel	und	1,00	\$ 375.000	\$375.000	1,00	\$375.000	1,00	\$ 375.000	0,00	\$0	1,00	\$ 375.000	\$375.000
11.7	suministro, transporte e instalación de presóstato diferencial completo	und	1,00	\$ 7.700.000	\$7.700.000	0,00	\$0	1,00	\$ 7.700.000	-1,00	-\$7.700.000	0,00	\$ 7.700.000	\$0
11.8	suministro, transporte e instalación de succión de 2" completa	und	1,00	\$ 856.000	\$856.000	1,00	\$856.000	1,00	\$ 856.000	0,00	\$0	1,00	\$ 856.000	\$856.000
11.9	suministro, transporte e instalación de descarga de 2" completa	und	1,00	\$ 1.018.000	\$1.018.000	1,00	\$1.018.000	1,00	\$ 1.018.000	0,00	\$0	1,00	\$ 1.018.000	\$1.018.000
11.10	suministro, transporte e instalación de accesorios PVC de 1 1/2"	glb	1,00	\$ 102.000	\$102.000	1,00	\$102.000	1,00	\$ 102.000	0,00	\$0	1,00	\$ 102.000	\$102.000
11.11	suministro, transporte e instalación de válvula doble universal de 1 1/2"	und	2,00	\$ 56.500	\$113.000	2,00	\$113.000	2,00	\$ 56.500	0,00	\$0	2,00	\$ 56.500	\$113.000
11.12	suministro, transporte e instalación de válvula hidráulica sostenedora de presión de 2"	und	1,00	\$ 1.020.000	\$1.020.000	1,00	\$1.020.000	1,00	\$ 1.020.000	0,00	\$0	1,00	\$ 1.020.000	\$1.020.000
12 - TENDIDO DE LA TUBERIA PRINCIPAL 1 1/2"					\$8.837.600		\$5.570.996							\$5.570.996
12.0	TENDIDO DE LA TUBERIA PRINCIPAL 1 1/2"				\$8.837.600		\$5.570.996							\$5.570.996
12.1	Tendido de la tubería principal de polietileno 1 ½ " suministro, transporte y tendido de manguera polietileno doble capa de 1 1/2" externa x 100 metros para 200 psi	m	1000,00	\$ 6.300	\$6.300.000	700,00	\$4.410.000	1000,00	\$ 6.300	-300,00	-\$1.890.000	700,00	\$ 6.300	\$4.410.000
12.2	Suministro, transporte e instalación de unión acople rápido de 1 1/2" PVC presión	und	10,00	\$ 23.500	\$235.000	10,00	\$235.000	10,00	\$ 23.500	0,00	\$0	10,00	\$ 23.500	\$235.000
12.3	suministro, transporte e instalación de tee acople rápido de 1 1/2" PVC presión	und	1,00	\$ 36.000	\$36.000	1,00	\$36.000	1,00	\$ 36.000	0,00	\$0	1,00	\$ 36.000	\$36.000
12.4	suministro, transporte e instalación deadaptador macho acople rápido PVC presión	und	12,00	\$ 14.583	\$174.996	12,00	\$174.996	12,00	\$ 14.583	0,00	\$0	12,00	\$ 14.583	\$174.996
12.5	suministro, transporte e instalación de collarín de 1 1/2" x 1" PVC presión	und	5,00	\$ 25.200	\$126.000	5,00	\$126.000	5,00	\$ 25.200	0,00	\$0	5,00	\$ 25.200	\$126.000
12.6	suministro, transporte e instalación de collarín de 1 1/2" x 1 1/2" PVC presión	und	3,00	\$ 25.333	\$75.999	3,00	\$75.999	3,00	\$ 25.333	0,00	\$0	3,00	\$ 25.333	\$75.999
12.7	suministro, transporte e instalación de hidrante con bayoneta de 1" y accesorios	und	1,00	\$ 70.000	\$70.000	1,00	\$70.000	1,00	\$ 70.000	0,00	\$0	1,00	\$ 70.000	\$70.000
12.8	suministro, transporte e instalación de ventosa doble efecto de 1 1/2" PVC	und	3,00	\$ 41.667	\$125.001	3,00	\$125.001	3,00	\$ 41.667	0,00	\$0	3,00	\$ 41.667	\$125.001
12.9	suministro, transporte e instalación de válvula PVC presión roscada de 1 1/2"	und	4,00	\$ 49.250	\$197.000	4,00	\$197.000	4,00	\$ 49.250	0,00	\$0	4,00	\$ 49.250	\$197.000
12.10	suministro, transporte e instalación de accesorios PVC de 1 1/2"	glb	1,00	\$ 121.000	\$121.000	1,00	\$121.000	1,00	\$ 121.000	0,00	\$0	1,00	\$ 121.000	\$121.000
12.11	suministro, transporte e instalación de caja portahidrantes	und	1,00	\$ 54.000	\$54.000	0,00	\$0	1,00	\$ 54.000	-1,00	-\$54.000	0,00	\$ 54.000	\$0
12.12	12 medidores de caudal suministro, transporte e instalación de macromedidor para aguas residuales o riego de 2" b x b	und	1,00	\$ 1.000.000	\$1.000.000	0,00	\$0	1,00	\$ 1.000.000	-1,00	-\$1.000.000	0,00	\$ 1.000.000	\$0

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACUMULADO ACTA No. 1 - ACTA No. 2		MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDADES CONTRACTUALES		MAYORES Y MENORES		CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
										CANTIDAD	VALOR			
12.13	suministro, transporte e instalación de bridas van stone PVC, de 2"	und	2,00	\$ 67.500	\$135.000	0,00	\$0	2,00	\$ 67.500	-2,00	-\$135.000	0,00	\$ 67.500	\$0
12.14	empaques para brida de 2"	und	2,00	\$ 18.802	\$37.604	0,00	\$0	2,00	\$ 18.802	-2,00	-\$37.604	0,00	\$ 18.802	\$0
12.15	suministro, transporte e instalación de tornillos, tuercas y arandelas en acero inoxidable para el macromedidor	glb	1,00	\$ 150.000	\$150.000	0,00	\$0	1,00	\$ 150.000	-1,00	-\$150.000	0,00	\$ 150.000	\$0
13 - ACONDICIONAMIENTO DEL RESERVOSIO EN TIERRA					\$253.007		\$25.000.000							\$253.007
13.0	ACONDICIONAMIENTO DEL RESERVOSIO EN TIERRA				\$253.007		\$25.000.000							\$253.007
13.1	acondicionamiento del reservorio de tierra, limpieza del reservorio lodos y arvenses	M2	22,60	\$ 11.195	\$253.007	2233,14	\$25.000.000	22,60	\$ 11.195	0,00	\$0	22,60	\$ 11.195	\$253.007
14 - SISTEMA ELÉCTRICO					\$3.000.000		\$3.000.000							\$3.000.000
14.0	SISTEMA ELÉCTRICO				\$3.000.000		\$3.000.000							\$3.000.000
14.1	Sistema Eléctrico	glb	1,00	\$ 3.000.000	\$3.000.000	1,00	\$3.000.000	1,00	\$ 3.000.000	0,00	\$0	1,00	\$ 3.000.000	\$3.000.000
NP	VALORES CANTIDADES NO PREVISTAS				\$0		\$0							\$31.937.669
N.P.1	6.2 Nivelación del terreno-adequación: limpieza y nivelación del terreno para la instalación del tanque australiano, se realizan vaciado en concreto y malla elctrosoldada para dar mayor estabilidad al terreno para un area de 121m2	m²	0,00	\$ 0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 0	121,00	\$0	121,00	\$ 59.427	\$7.190.676
N.P.2	13.1 Acondicionamiento del reservorio de tierra, limpieza del reservorio lodos y arvenses, ncluye caja de registro, sedimentador y laguna de oxidación, Suministro e instalación de tubería de 8", incluye cama de arena. ML12, Suministro e instalación de caja de registro 0,6x0,8, Construcción de sedimentador en concreto de 1,5x2,5x0,9 e=20 cm UND1, Construcción de laguna de oxidación en concreto 4X2,50X1,80 e=20 cm UND1	m²	0,00	\$ 0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 0	22,60	\$0	22,60	\$ 1.095.000	\$24.746.993
		TOTAL COSTO DIRECTO			\$101.503.767	\$101.555.914								\$101.555.905
		ADMINISTRACION			28,0%	\$28.421.055	\$28.435.656	28,00%						28,00% \$28.435.653
		UTILIDAD			5,0%	\$5.075.188	\$5.077.796	5,00%						5,00% \$5.077.795
		VALOR TOTAL DE LA OBRA			\$135.000.010	\$135.069.366								\$135.069.353

100,05%

Firma: 
Nombre: RUBEN DARIO HERNANDEZ COGOLLO
Representante Legal
Contratista de obra SERVICONSTRUCCIONES R&F S.A.S,
Cedula de Ciudadania No. 1,143,367,717

Firma: 
Nombre: LUIS FERNANDO AGUDELO ZAPATA
Supervisor del Contrato
Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
Cedula de Cuidadania No. 71,761,021

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO EN EJECUCIÓN N°2		
Título del Proyecto	Adecuar e implementar un sistema de riego por goteo y aspersión – móvil, en el Centro de Laboratorios de Riegos y Maquinaria Agrícola en Niquía - Bello del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.	
Código de Proyecto	54187	
Investigador Principal	Gustavo Rodríguez Barrios – ingeniero residente	
Institución Beneficiaria	Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid	
Fecha de inicio del proyecto	Fecha de finalización del proyecto 31/12/2024	Fecha de elaboración del Informe de Avance Final 31/12/2024
Fecha de elaboración de Informes anteriores	Informe 1: 6/12/2024 cumplido avance 50 % Informe 2: 26/12/2024 Descripción de actividades, según el cronograma cumplido avance 100 %	

2. Actividades

2.1 Cronograma de Actividades

-CUBIERTA Y PERFILERIA METALICA

-CUBIERTA DE 18X15 PARA TANQUE AUSTRALIANO, BOMBA Y SISTEMA DE FILTRADO:

Los perfiles fueron fijados en la tierra aproximadamente una profundidad de 40 CM., y vaciados en concreto estructural. Actividad cumplida al 100%

-EXCAVACIONES TUBERIA: Excavación de zanja de 70Cm de profundidad X50 Cm de ancho para meter la tubería de PE-HR- de 1' ½ esta actividad se cumplió al 100% quedando instalados 700 m de tubería. Excavación de zanja de 50 Cm de profundidad X 40Cm de ancho y llenado de brecha con material de excavación, actividades se cumplieron al 100%



-TENDIDO DE LOS LATERALES DE RIEGO: La instalación de silletas de caucho de 16 mm, instalación de conectores de 16 mm, fin de línea doble, y línea de goteo de 16 mm, se cumplieron al 100%. Igual con el tendido de manguera de PE.1" para los laterales de riego por aspersión, collarín de derivación de 1 ½" X 1" y la instalación de elevadores en tubo de PVC de 1" de 45 Cm de longitud. Actividad cumplida al 100%



-TENDIDO DE TUBERIA MULTIPLE: Tendido de tubería PVC 1 ½" RD 26, codos, tapones roscados, adaptadores, uniones, tees, válvula de PVC 1 ½" y válvula de aire doble acción instaladas. Actividad cumplida al 100%

-TENDIDO DE LA TUBERIA INTRAPREDIAL: Tendido de tubería PVC 1 ½" RD 26, accesorios codos, tapones, adaptadores, uniones, tees en PVC 1 ½" e hidrantes y cajas porta hidrantes. Actividad cumplida al 100%

-SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA: La instalación del TK., australiano de 100.000 litros construido en lamina galvanizado calibre 18 y geomembrana calibre 30mils (0.75) mm en PEHD, cumpliendo las medidas del proyecto al igual que la adecuación, limpieza y nivelación del terreno donde se ubicó dicho tanque se ejecutó en un 100%.




-INSTALACION DE TANQUES PLASTICOS DE 2000 LITROS: La ubicación de estos tanques quedo en los extremos de la línea principal, conectados a esta con uniones universales de 1 1/2", actividad finalizada en el 100%

-SISTEMA DE FILTRADO: Esta actividad se realizó de manera parcial, las actividades de instalación de válvulas de retro lavado de 2" así como la instalación de filtro de disco de 2" 120 mesh de gran caudal auto limpiantes con soportes metálicos para estación de filtrado. Se adicionarán a la actividad de adecuación y construcción del reservorio desde la parte externa (inicio del flujo de agua) hasta el reservorio primario. Para buscar el balance ideal entre las actividades programadas en el proyecto y la actividad imprevista de adecuación y construcción del reservorio, de modo tal que no se modifique o se aumente el costo inicial del proyecto.

-INSTALACION VALVULAS DE RAMALES PARA LAVADO: actividad cumplida en un 100% quedaron instaladas válvulas de 1" 1/2 en los ramales de la línea principal de PVC. 1" 1/2 para lavado o riego en el momento que se amerite.

-ATRAQUE DE TUBERIA: Se utilizo concreto estructural para el soporte de la tubería, actividad que se cumplió en un 100%

-CAJA MODULO DE RIEGO: Se instalo válvula reguladora de presión en línea principal y válvula de compuerta de 1" 1/2 en PVC en la línea principal de riego con sus respectivos accesorios, tales como codos, tapones adaptadores, uniones y tee. Actividad cumplida al 100%



-SISTEMA DE BOMBEO: En esta actividad se hicieron varios cambios. Uno de ellos es no instalar la bomba de 7.5 hp trifásica de 220 v; Porque en el área donde se instalará no hay corriente trifásica, en su lugar se instaló una bomba centrífuga monofásica de 3 hp con soporte metálico, arrancador(breaker), sensor de nivel y caja o cubículo para operación. Actividad que se cumplió al 100%.

-INSTALACION DE INTERRUPTOR DE PRESION (presostato): Esta actividad está incluida en la modificación realizada por la adecuación y construcción en concreto del reservorio, estamos en conversación de

ejecutarla o no, pero estamos en capacidad de cumplir con esta actividad satisfactoriamente en un porcentaje del 100%

-INSTALACION DE SUCCION COMPLETA 2": Instalación en el tanque australiano, succión del reservorio principal y la instalación de las uniones universales de 2" en PVC y reducción de 2" a 1" ½ de PVC A PE 1" ½ Actividades que se cumplieron al 100%, así como la instalación de la válvula hidráulica sostenedora de presión, finalizada al 100%

-TENDIDO DE TUBERIA DE POLIETILENO HR DOBLE CAPA DE 1 1/2": Esta actividad se ejecutó al 100% al igual que la instalación de codos, tee, adaptadores y uniones de acople rápido, quedando instalada 700 m de los 1000 m establecidos en el proyecto. Los 300 m restantes, se incluirán y Se adicionarán a la actividad imprevista de adecuación y construcción del reservorio en concreto. Todas estas actividades, tales como instalación de válvula de PVC de presión roscada, collarines, ventosa doble efecto de 1 1/2" y demás accesorios quedaron finalizadas al 100%

-MEDIDOR DE CAUDAL: Se instalo un macromedidor para aguas residuales o riego tipo bXb de 2" y la instalación de bridas Stone PVC, de 2" con sus respectivos accesorios de instalación tuercas tornillos arandelas entre otros. Actividad cumplida al 100%

-ACONDICIONAMIENTO DEL RESERVORIO DE TIERRA: Actividad que fue modificada por **ADECUACION Y CONSTRUCCION EN CONCRETO DEL RESERVORIO:** Actividad Imprevista que no está contemplada en el proyecto original, pero hubo acuerdos en realizar esta actividad nueva prioridad, la cual consistió en traslapar o anular ciertas actividades que sumadas den con el valor o costo(25.000.000) millones estimado del reservorio y así no modificar el costo del proyecto que esta en 135.000.000 millones, lógicamente esto altero el cronograma en la finalización del proyecto, pero se logro culminar esta actividad en porcentaje del 100%.

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO EN EJECUCIÓN N°2



INFORME DE AVANCE DE PROYECTO EN EJECUCIÓN N°2

2.3 Actividades no previstas inicialmente que han sido realizadas o a incorporar durante la ejecución del proyecto

Producto del proyecto al que pertenecen	Actividad realizada	Observaciones
Adecuación y limpieza del reservorio	Construcción del reservorio en concreto, unido desde la parte externa con tubo PVC., corrugada para aguas residuales de 10"	Esta actividad genero alteración en el cronograma de entrega de actividades

3. Obstáculos que se han presentado para la ejecución del proyecto

Limitaciones	Actividades correctivas desarrolladas	Acciones correctivas por desarrollar
Modificación de la actividad adecuación del reservorio	Construcción del reservorio desde la parte externa hasta el reservorio final	Ninguna
Entrevista y elección de trabajadores	Cambio de trabajadores por otros con una actitud positiva hacia el trabajo	Ser más selectivo en la elección de trabajadores

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO EN EJECUCIÓN N°2		

GUSTAVO RODRIGUEZ BARRIOS

Firma Investigador/a Principal

	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	Código: FLG51
		Versión: 06

CONTRATO No: 54187- 2024

CONTRATANTE: EL POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

NIT: 890980136-6

ORDENADOR DEL GASTO: OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIO

CONTRATISTA: SERVICONSTRUCCIONES R&F S.A.S

NIT O CÉDULA: 901443757-6

REPRESENTANTE LEGAL: RUBEN DARIO HERNANDEZ COGOLLO

NIT O CÉDULA: 1143367717

SUPERVISOR: LUIS FERNANDO AGUDELO ZAPATA

APOYO A LA SUPERVISIÓN: N/A

INTERVENTOR: N/A

OBJETO: Adecuar e implementar un sistema de riego por goteo y aspersión – móvil, en el Centro de Laboratorios de Riegos y Maquinaria Agrícola en Niquía - Bello del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.

VALOR: CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M.CTE **(\$135.000.000)**

ANTICIPO: N/A

FORMA DE PAGO: El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, pagará al contratista el valor total del contrato, en moneda legal colombiana, por el sistema de PRECIOS UNITARIOS NO REAJUSTABLES de la siguiente manera:

Pago mensual acorde a los elementos e insumos entregados durante este periodo. Previa entrega de factura, documentación e informe de avance y entrega, con recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. En todo caso, la última acta de pago no será inferior al diez (10%) del valor total del contrato y se cancelará una vez el Contratista entregue al Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid lo siguiente desde el componente técnico:

- Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados.
- Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él.



- c. El recibo a satisfacción, por parte del supervisor de todos los trabajos realizados.
- d. El recibo a satisfacción de los siguientes requisitos: i) Acta cantidades de obra con sus respectivas memorias de cálculo finales. ii) Pólizas actualizadas.

CDP: 3816 del 27/06/2024

CRP: 6677 del 15/11/2024

PLAZO: 60 días calendario, desde la suscripción del acta de inicio sin superar la vigencia el 31 de diciembre de 2024.

GARANTÍAS:

AMPARO	VIGENCIA	MONTO ASEGURADO
Cumplimiento del Contrato y Cláusula Penal	Por el plazo del contrato y 4 meses más	15% del valor del contrato
Garantía de estabilidad la obra	Por el término de cinco (5) años	20% del valor del contrato
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	Por un término igual al plazo de ejecución del contrato y por 12 meses más.	20% del valor del contrato
Póliza de Salarios, prestaciones sociales	Por el término de vigencia del mismo y tres (3) años más.	10% del valor del contrato
Responsabilidad civil extracontractual	Por el plazo del contrato y 4 meses más	200 SMLMV

Las pólizas fueron aprobadas el día Veintidós (22) del mes de Noviembre del año dos mil veinticuatro (2024).


A los Veintidós (22) del mes de Noviembre del año dos mil veinticuatro (2024). Se reunieron en las instalaciones del Politécnico, el supervisor **Luis Fernando Agudelo Zapata** y el contratista **Rubén Darío Hernández Cogollo**, con el fin de dar inicio al objeto del contrato en mención.

Que de común acuerdo se establece como fecha de iniciación del Contrato No. 54187 de 2024 el día **Veintidós (22) del mes de Noviembre del año dos mil veinticuatro (2024)**.

El supervisor y/o intervisor del contrato, previo al inicio del mismo, certifica que realizó frente al contratista la verificación de:

- Afiliación al Sistema de Seguridad Social (salud y pensiones).
- Afiliación al Sistema de Riesgos Laborales.
- Paz y salvo de aportes patronales y parafiscales (sólo para personas jurídicas).

Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron.


 Luis Fernando Agudelo Zapata
 CC.71.761.021
 22/Nov/2024

Supervisor y/o Interventor



Contratista



POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
DIRECCION FINANCIERA - PRESUPUESTO

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 6677

NUMERO DE CDP: 3816 **FECHA DE EXPEDICION:** 2024.11.15 VIGENCIA: 2024

RAZON SOCIAL: SERVICONSTRUCCIONES R&F S.A.S

NIT : 901443757-6

RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA: OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIO NIT: 98530179

DEPENDENCIA: LABORATORIO DE RIEGOS Y MAQUINARIA

OBJETO: IMPLEMENTAR SISTEMA DE RIESGO MOVIL POR GOTEO CENTRO LABORAT

UNIDAD EJEC.	CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	VALOR
10310501	2301801004202001	Mejoramiento de la infrae	135,000,000.00

VALOR TOTAL : 135,000,000.00



Responsable Presupuesto

Certificación Bancaria

Miércoles, 13 de noviembre de 2024

Señores:

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **SERVICONSTRUCCIONES R&F SAS** identificado(a) con NIT. **901443757** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorro	166-000016-07	2021/09/30	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Santiago Valencia Calderón
Lider Área de Conocimiento Autoservicios

 **Bancolombia**
