

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE
VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA**

**INFORME MENSUAL 7
JULIO 01 A 31 DE JULIO DE 2022**

CERETE, CÓRDOBA

JULIO 2022

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 2276-2021

**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE
VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA**

**INFORME MENSUAL 7
JULIO 01 A 31 DE JULIO DE 2022**

CERETE, CÓRDOBA

JULIO 2022

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

Contrato de Obra No. 172 DE 2021 Contratista: DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA

Contrato de Interventoría No. 2276 del 2021 Interventoría: CONSORCIO ACI-3B

Objeto Contrato de Obra:
 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEDRO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

INFORME MENSUAL No. 7 MES O PERIODO: julio

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	3
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	4
1	INTRODUCCIÓN		6
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		7
2.1	Localización		7
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		9
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		9
2.4	Características técnicas del proyecto		10
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		17
3.1	Información general del contrato		17
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		17
3.3	Seguimiento ítems no previstos		19
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría		19
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		20
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	20
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	21
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	21
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	21
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	21
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	22
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	22
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	22
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		22
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	22
	• Seguimiento Programa de Obra	MEPI-MN-IN-2-FR-2	22
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	23
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-6-FR-2	23
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-1	23
		MEPI-MN-IN-14-FR-2	23
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		36
5.1	Información general del contrato		36
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		36
5.3	Informes especialistas y profesionales		37
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		37
5.5	Informe matriz de riesgos.		37
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		37
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		37
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		37
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	37
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	38
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	38
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	38
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	38
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		38
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	38
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-3-FR-2	38
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-2	38
		MEPI-MN-IN-9-FR-3	38
7	Conclusiones y recomendaciones		45
8	Anexos		46
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		46
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		46
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		51
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		52

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: NESTOR LEMÚS VILLADIEGO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
 Resolución de designación No.558 de fecha 17 de febrero de 2022

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA.
 Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
				VERSION	1
				PÁGINA	1 DE 2

				FECHA	4/08/2022 <small>(Día / Mes / Año)</small>
--	--	--	--	-------	---

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CÓRDOBA	PERIODO MES:	JULIO
-------------------	------------------------------	------------------------	---------	--------------	-------

CONTRATO DE OBRA No.: 172 DE 2021	PLAZO INICIAL:	6 MESES	
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEDRO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA	FECHA DE INICIO:	31/01/2022	VALOR INICIAL (incluido IVA) :
	FECHA DE SUSPENSIÓN:		VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
	FECHA DE REANUDACIÓN:		VALOR ACUMULADO (incluido IVA):
	FECHA DE VENCIMIENTO:	31/07/2022	ANTICIPO CONCEDIDO:
CONTRATISTA: DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA	PLAZO ACUMULADO:		ANTICIPO AMORTIZADO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	2276 DE 2021	INTERVENTOR:	CONSORCIO ACI-3B	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
----------------------------	--------------	--------------	------------------	---	--

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO
----------------------------------	---

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">ACTIVIDAD</th> <th style="width: 10%;">UNIDAD</th> <th style="width: 10%;">CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Pavimentación</td> <td>Construcción</td> <td>ml</td> </tr> <tr> <td>Mejoramiento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rehabilitación</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Estructuras</td> <td>Túneles</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Puentes</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pontones</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros (Especificar cuales)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción	ml	Mejoramiento		Rehabilitación		Estructuras	Túneles		Puentes		Pontones		Mantenimiento			Otros (Especificar cuales)			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">ACTIVIDAD</th> <th style="width: 10%;">UNIDAD</th> <th style="width: 10%;">CANTIDAD MES</th> <th style="width: 10%;">CANTIDAD ACUMULADA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Pavimentación</td> <td>Construcción</td> <td>ml</td> <td>348</td> </tr> <tr> <td>Mejoramiento</td> <td></td> <td>858</td> </tr> <tr> <td>Rehabilitación</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Estructuras</td> <td>Túneles</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Puentes</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pontones</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros (Especificar cuales)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción	ml	348	Mejoramiento		858	Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)			
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																						
Pavimentación	Construcción	ml																																																						
	Mejoramiento																																																							
	Rehabilitación																																																							
Estructuras	Túneles																																																							
	Puentes																																																							
	Pontones																																																							
Mantenimiento																																																								
Otros (Especificar cuales)																																																								
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																					
Pavimentación	Construcción	ml	348																																																					
	Mejoramiento		858																																																					
	Rehabilitación																																																							
Estructuras	Túneles																																																							
	Puentes																																																							
	Pontones																																																							
Mantenimiento																																																								
Otros (Especificar cuales)																																																								

AVANCE FINANCIERO				
--------------------------	--	--	--	--

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES	VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES
---	--

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	5.636.522.432,00		5.636.522.432,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	15.928.400,00	3.026.396,00	18.954.796,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	29.633.731,90		29.633.731,90
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			5.685.110.960,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	\$ 413.744.219,60		413.744.219,60	2.152.921.235,00
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS	15.928.400,00	\$ 3.026.396,00	18.954.796,00	
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				2.152.921.235,00

INVERSIÓN EN OBRA INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 5.685.110.960 INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 2.152.921.235,00 AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 37,87%	EMPLEOS GENERADOS EN EL MES MANO DE OBRA CALIFICADA: 9 MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 12 EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 3 TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 24
---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Vía San Antonio - Cedro, El contratista realiza cero en afirmado del (K2+580 al K2+090)



Vía San Antonio - Los cedros, El contratista instala pavimento del (K2+885 al K2+825)

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma 
Nombre Miguel Armando Diaz
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-12786 CND
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCIÓN.

Con el objeto de mejorar la calidad de la infraestructura vial de nuestro país, el Gobierno Nacional viene implementado diferentes estrategias encaminadas al logro de ese objetivo, es así como en el sector de la red terciaria, dentro el programa “Colombia rural” por medio de INVIAS, se suscribieron convenios con los municipios del país con el objeto de ejecutar actividades de mejoramiento, conservación y mantenimiento a sus diferentes vías, donde la entidad aporta los recursos que se requieren para su ejecución que atienda los documentos técnicos, normas y especificaciones requeridas.

Para esto Los municipios tenían la responsabilidad de contratar las empresas encargadas de ejecutar estas actividades, mediante licitación pública o selección abreviada según sea el caso para cada municipio, proceso constructivo que atenderá los diseños, alcances especificaciones y normas que defina INVIAS

La necesidad que se pretende satisfacer con la celebración del presente Convenio se encuentra en los Estudios Previos suscritos por el Subdirector de la Red Terciaria y Férrea, los cuales forman parte del presente documento.

INVIAS adjudicó el contrato No. 2276 de 2021 al CONSORCIO ACI-3B, cuyo objeto es **“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA”**.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado en el municipio de Cereté, en el departamento de Córdoba, Colombia. El municipio de Cereté limita por el norte con los municipios de San Pelayo y Chima, por el este con el municipio de Ciénaga de Oro, por el oeste con el municipio de Montería y por el sur con los municipios de San Carlos y Montería.

El proyecto en estudio se localiza en zona rural del municipio de Cereté en el corregimiento de Rabolargo en el sector San Antonio – El Cedro, en la siguiente tabla se muestran las características de las vías. Nomenclatura Catastral Ancho de calzada (m) Bordillo (m) Longitud del tramo (m) Funcionalidad Tipo de terreno.

Nomenclatura Catastral	Ancho de calzada (m)	Bordillo (m)	Longitud del tramo (m)	Funcionalidad	Tipo de Terreno
San Antonio -El Cedro	5.50	0.2	3488.76	Terciaria	Plano

El material que se va a utilizar en este proyecto, será suministrado por la cantera VILLA CARMEN la cual cuenta con Licencia Ambiental otorgada por la CAR del departamento. Es preciso aclarar que no será necesario montaje de Plantas de asfalto y/o concreto, dicho material será suministrado por Plantas ya establecidas que cuenten con los permisos requeridos por la Corporación Autónoma Regional de los valles del Sinú y del San Jorge – CVS. Asimismo, para el caso de material de arrastre, la explotación de dicho material no se hará en la zona, sino que será suministrado por canteras legalizadas.

A continuación, se muestra una imagen general y específica de la ubicación de la vía en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba.

Figura 1 Localización General del Proyecto.

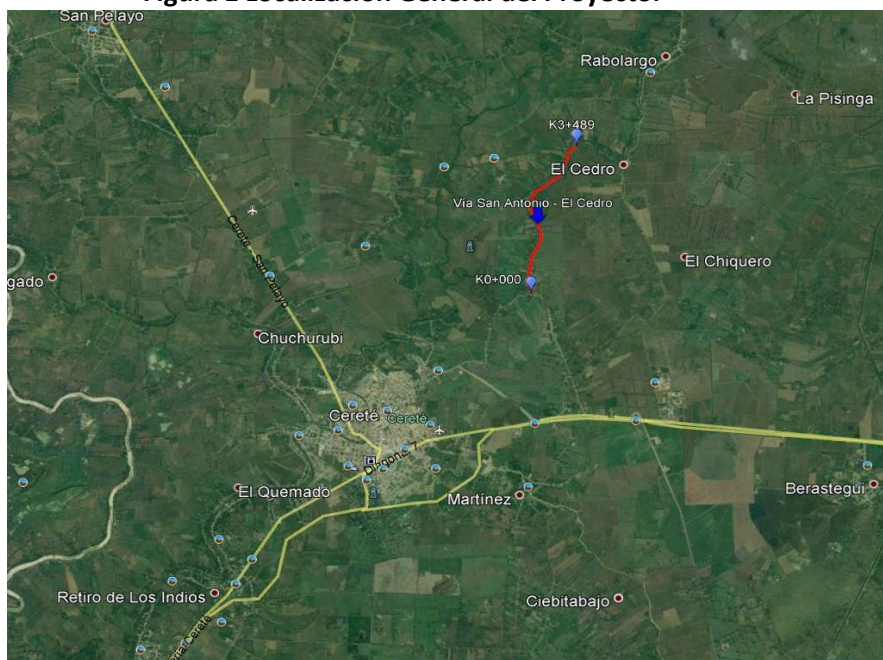
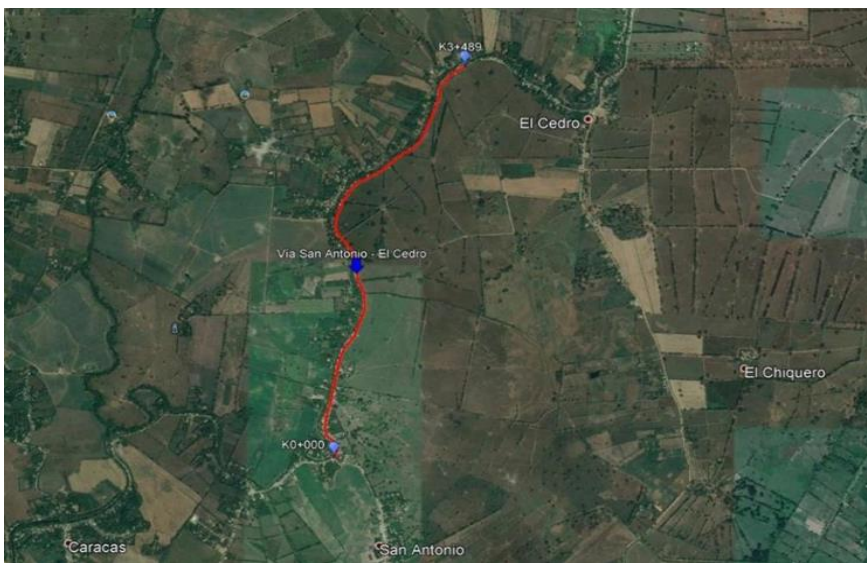


Figura 2 Localización específica de la vía a diseño

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

Este proyecto cuenta con varios municipios que hacen parte de la zona de influencia, limitando al norte con el municipio de San Pelayo, por el este con el municipio de Ciénaga de oro, por el oeste con el municipio de Montería y por el sur con el municipio de San Carlos,

Los cuales se ven beneficiados con la realización de este proyecto, ya que estos permiten la unión entre las cabeceras municipales, de esta manera se potencia el intercambio comercial y se fortalece la economía nacional, reduciendo también los costos operativos, proporcionando una mayor movilidad de personas, bienes y servicios; mejorando en tiempo y contaminación del ambiente y en consecuencia brindando más impulso económico de la zona por donde atraviesa dicho proyecto.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA

DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR:

Actualmente esta vía se encuentra en afirmado en regulares condiciones, ya que su capa de rodadura se ha desgastado por la falta de mantenimiento periódico y rutinario, no se han atendido los puntos críticos aunado al tránsito de vehículos pesados, lo que conlleva a daño en vehículos particulares, baja transitabilidad y largos periodos de desplazamiento; notándose deterioros generalizados como ondulaciones, ahuellamiento, pérdida de grava, baches.




Antonio – Cedro , vía con sub base K2+770



San Antonio – Cedro Instalación de rieles para fundida de concreto K2+770.



San Antonio – Cedro , vía con sub base, K2+680

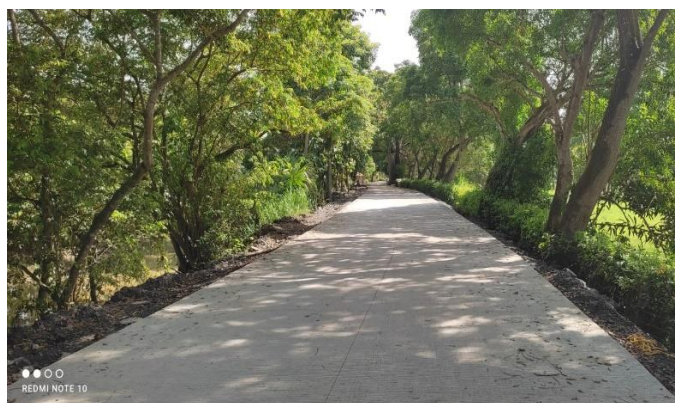

San Antonio – Cedro , Pavimento instalado K2+680

2.4 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO


DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto en general consiste en la construcción de 3.488,76 metros lineales pavimento, ubicados en la zona rural del Municipio de Cereté, como seguidamente se anota:



Alineamiento/Nomenclatura Catastral	PR Inicial	PR Final	Coordenadas PR Inicial		Coordenadas PR Final	
			Este	Norte	Este	Norte
Vía San Antonio - El Cedro	K0+000.00	K3+488.76	1144304.298	1477322.493	1145169.775	1480292.632

Características propuestas de diseño geométrico de la vía


Longitud:	K3+488.76
Tipo de terreno:	Plano
Velocidad de diseño:	40 Km/h
Ancho de Calzada:	5.50 m
Ancho de Carril:	2.75 m
Bombeo Normal:	2.00%
E_{max}	4%

SECCIÓN TRANSVERSAL TÍPICA

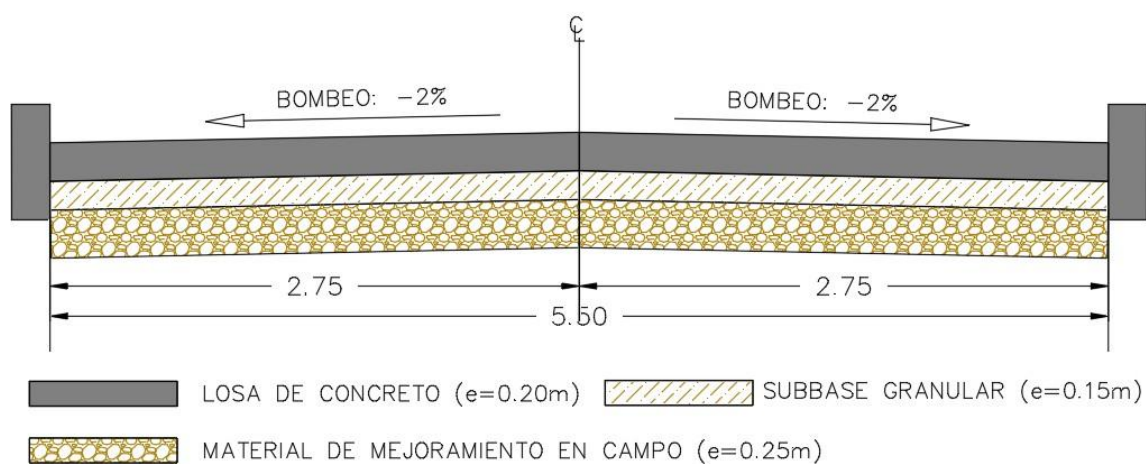


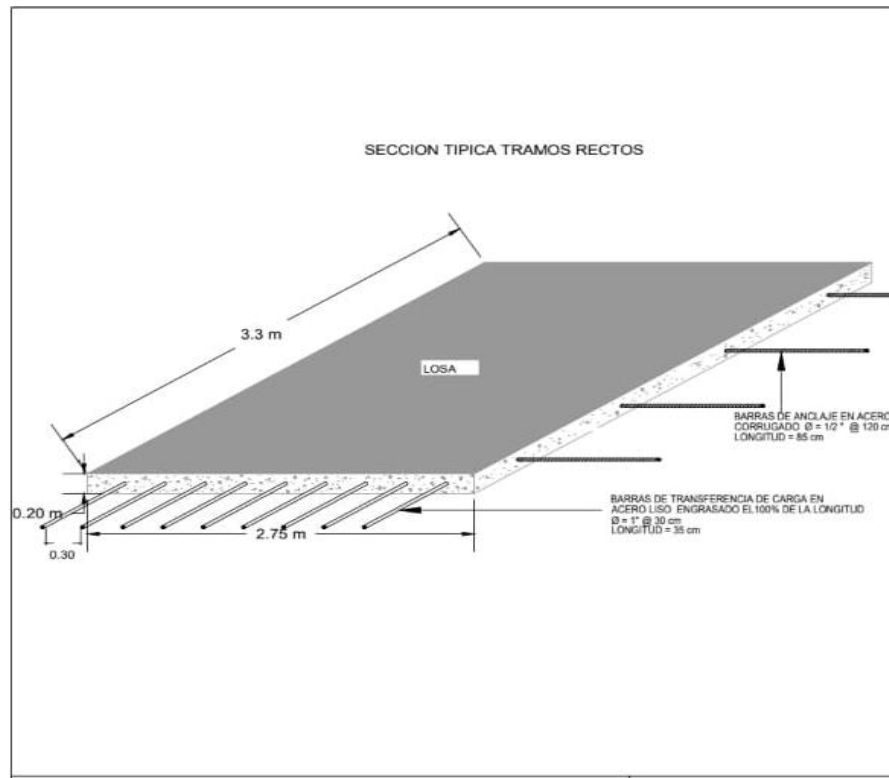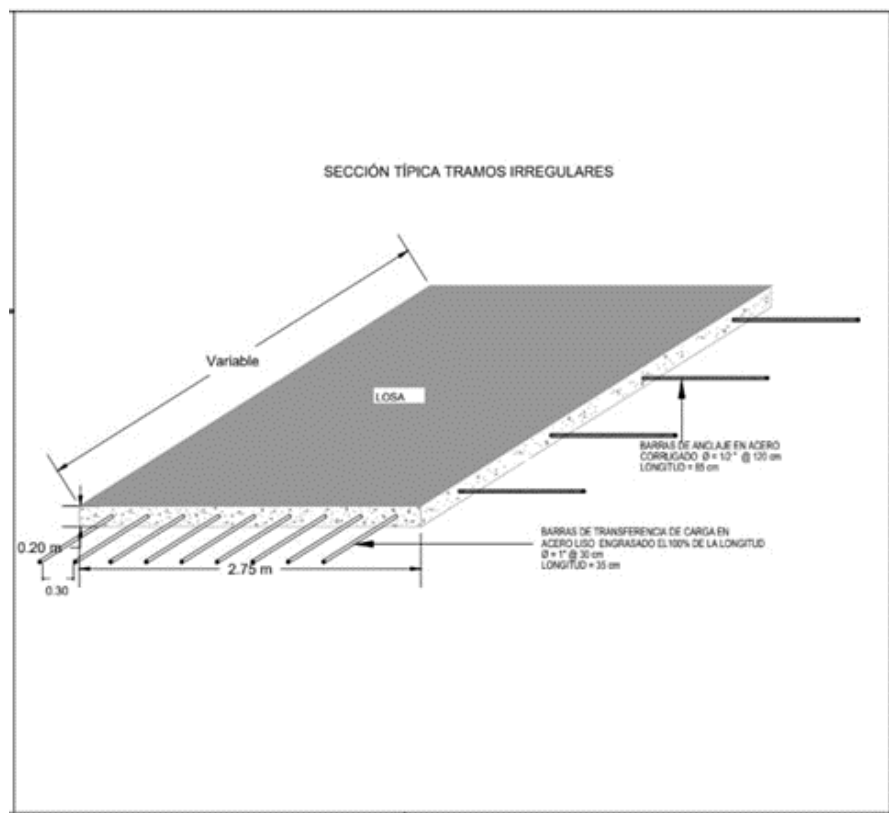


ISOMETRICO INSTALACIÓN BARRAS DE TRANSFERENCIA

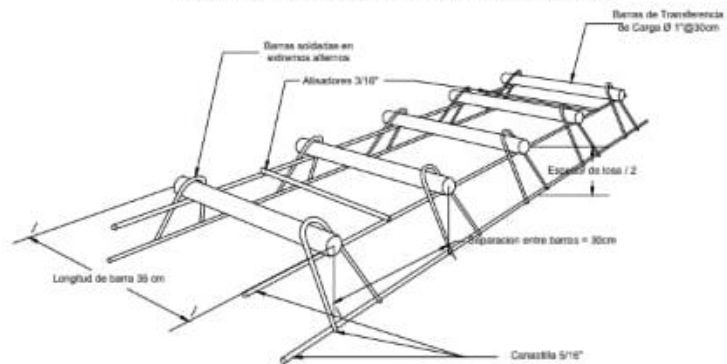


PLANTA INSTALACIÓN BARRAS DE TRANSFERENCIA

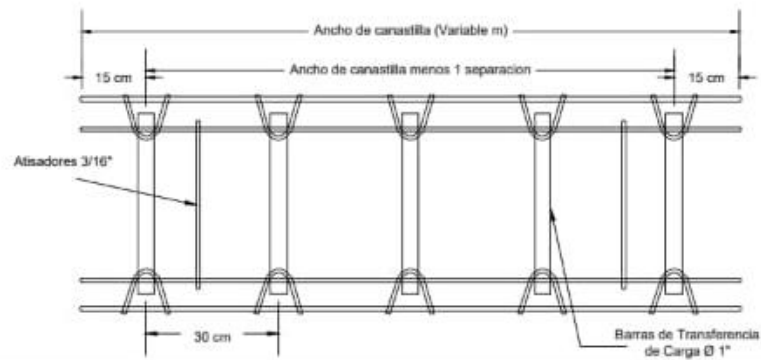


CORTE INSTALACIÓN BARRAS DE TRANSFERENCIA

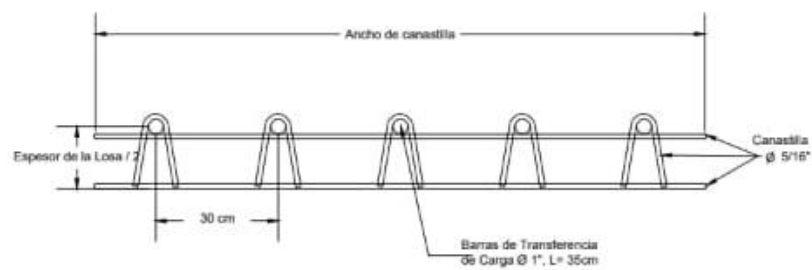


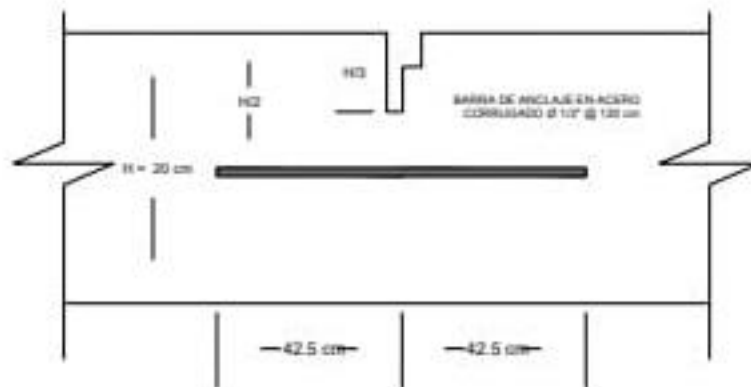


DETALLE CONSTRUCTIVO JUNTA LONGITUDINAL

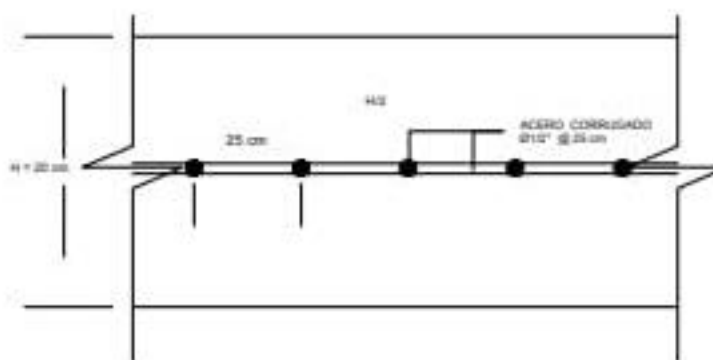


DETALLE CONSTRUCTIVO LOSA REFORZADA

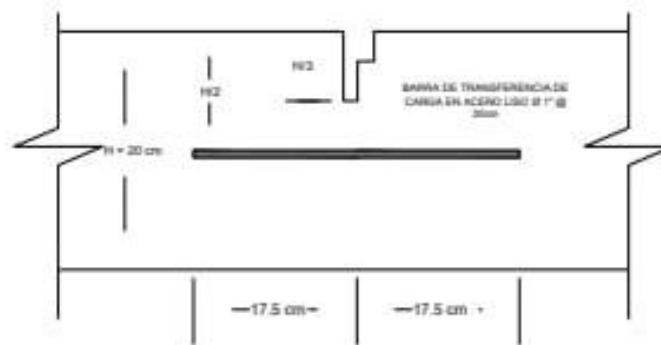

DETALLE CONSTRUCTIVO JUNTA TRANSVERSAL

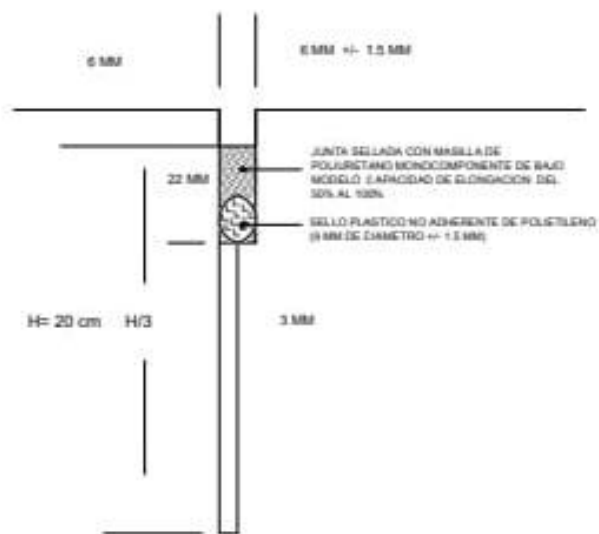

DETALLE CONSTRUCCION JUNTA TRANSVERSAL

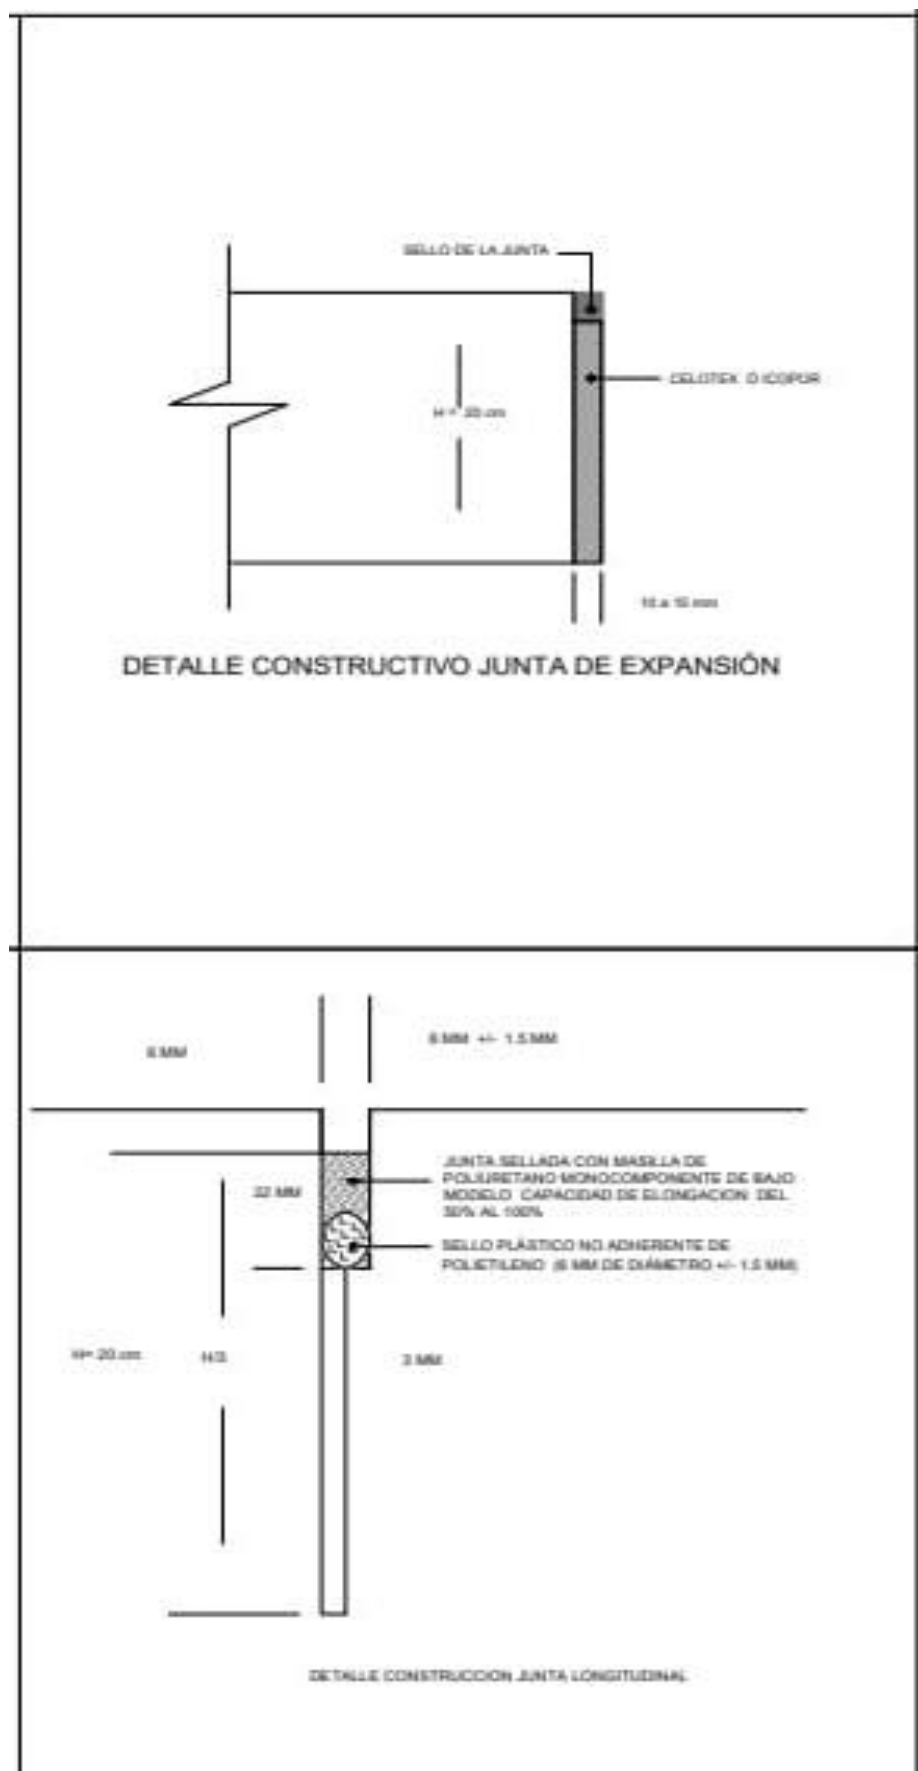

Igualmente de conformidad con el convenio suscrito por el Municipio de Cereté e INVIAS del cual se deriva la presente contratación se adelantará una etapa de revisión, ajustes y/o actualización de los estudios y diseños de las obras a ejecutadas.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

A continuación, se presenta la información general del contrato de obra No 172 de 2021

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEDRO CORREGIMIENTO DE RABOLARGO MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
CONTRATO DE OBRA	N0. 172 DE 2021
CONTRATISTA	DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA 100% DE PARTICIPACIÓN
NIT CONTRATISTA	10784359
DIRECCIÓN	CRA 6 N0. 65-24 PLACES MALL RECRO OFICINA 319.
TELEFONO	3103585668
PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA:	6 MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA:	31 DE ENERO DE 2022
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA	31 DE JULIO DE 2022 3103585668
VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA (IVA INCLUIDO):	\$ 5.685.110.960.00

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.

- Excavación Mecánica: Consiste en remoción extracción de material natural, además del cargue, retiro y disposición de los materiales provenientes de dicha actividad, con el fin de

alcanzar las cotas requeridas.

El contratista realizo la excavación total desde el K0+000 al K3+488

- Instalación de Afirmado: consiste en instalar una capa compactada de material granular natural o procesada, con gradación específica que soporta directamente las cargas y esfuerzos del tránsito. Debe poseer la cantidad apropiada de material fino cohesivo que permita mantener aglutinadas las partículas.

El contratista termino la actividad de instalación de afirmado del K0+000 al K3+488.

- Transporte de material: consiste en el transporte de los materiales provenientes de la excavación, el cual debe ir a un sitio de disposición de materiales autorizado.

El contratista retiro todo el material proveniente de las excavaciones del K0+000 al K3+488.

- Instalación de sub base: consiste en instalar un material granular grueso compuesto por triturados, arena y material grueso, es altamente resistente a la erosión y permite el libre drenaje con el fin de prevenir el bombeo. Se somete a menores presiones que la Base Granular, se emplea como capa en la instalación de pavimentos asfálticos y de concreto.

En este periodo el contratista instalo sub base del K2+880 hasta el K2+430.

- Instalación de concreto: Es aquel que fundamentalmente está constituido por una losa de concreto hidráulico, apoyada sobre la sub rasante o sobre una capa de material seleccionado, la cual se denomina sub base del pavimento rígido.

El contratista en este periodo instalo pavimento del K2+978 al K2+630

- Se realizan liberaciones de sub rasante, sub base e instalación de rieles por parte de la interventoría.
- Se toman densidades en afirmado del K2+880 al K2+090

- El contratista toma densidades a la sub base del K2+880 al K2+630
- Se instalan rieles para fundida de pavimento del K2+978 al K2+978
- Se toman muestras de vigueta al concreto para efectos de calidad del material.
- Se toma muestra de slump para verificar el asentamiento del concreto.
- El día 29 de julio se realiza comité de obra donde estuvieron presentes contratista, funcionarios de la secretaria de planeación e infraestructura e interventoría, donde se trataron los siguientes temas.
 - Revisión de compromisos
 - Avance de obra

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR ACTUALIZADO(según ultima acta de modificación	VALOR EJECUTADO DEL MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
Subtotal básico de obras	\$ 5.636.522.432,00		\$ 413.744.220,00	\$ 2.152.921.235,00	\$ 3.483.601.197,00
Provisión	0				
IVA	0				
Estudios y diseños	\$ 15.928.400,00			\$ 15.928.400	0
IVA estudios y diseños	\$ 3.026.396,00			\$ 3.026.396,00	0
Gestión social, Gestión predial, Gestión ambiental	\$ 29.633.731,90				\$ 29.633.731,90
Gestión de sostenibilidad					
otros	\$ 0,00				
VALOR TOTAL	\$ 5.685.110.959,90		\$ 413.744.220,00	\$ 2.171.876.031,00	\$ 3.513.234.928,90

3.3 SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS.

En este periodo no se realizaron Ítems no previstos en este contrato.

3.4 ESTADO DE AVANCES Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

A la fecha el contratista según el programa de obra el debería llevar una inversión de obra acumulada de\$ 5.685.110.959,09 equivalente a 100 % y ejecutado acumulado lleva \$2.152.921.234,60 equivalente al 37,87%, lo cual indica que el contratista presenta una atraso de

62,1% lo anterior correspondiente a la ejecución de las siguientes actividades Excavación en material común de la explanación y canales, instalación de afirmado (Material para Mejoramiento), transporte de materiales provenientes de la excavación, instalación de sub base, instalación de acero y fundida de concreto.

Esta interventoría tomo las siguientes acciones al ver el atraso presentado por el contratista se le ha insistido al contratista por medio de oficios con el tema del atraso que ha presentado ya que es de gran preocupación lo que quedo consignado en el siguiente radicado.

SAL-22-010684 del 05 de julio de 2022,

Donde se le solicito presentara plan de contingencia el cual presento y no cumplió con la programación de obra presentada en el plan de contingencia la que iniciaba el 10 de mayo y finalizaba el 31 de mayo de 2021, por tal motivo se le requirió al contratista una reprogramación del plan de contingencia con el fin que súper el atraso presentado.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA.

Se presenta el estado de avance, durante la etapa de construcción del proyecto mediante los formatos e información por el Instituto Nacional de Vías, como se indica a continuación.

4.1. INFORME SEMANAL.

El Consorcio ACI-3B en el mes de julio de 2022, en desarrollo del proyecto hace entrega de los informes semanales de interventoría donde se informa sobre el avance de las actividades programadas. Utilizando el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3.

Informe Semanal No.	Periodo	
1	01 al 07 de julio de 2022	Ver Pág. 67
2	08 al 14 de julio de 2022	Ver pág. 69
3	15 al 21 de julio de 2022	Ver pág. 71
4	22 al 28 de julio de 2022	Ver pág. 73

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATADO DE OBRA.

Se efectúa el control diario de equipo del Contratista durante el mes de mayo de 2022 y se realiza con base en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. (Ver pág. 24)

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA.

Se relaciona el personal contratado directamente con el contratista David Fernando Castro Gaviria: personal mano de obra (Constructora Terluz S.A.S), (Constructora Carranza S.A.S), operarios de maquinaria y conductores de volquetas (Soluciones de Ingeniería Nómadas S.A.S), comisión de topografía (Topolico S.A.S), en el formato mepi-mn1-in-15-fr-6, se relaciona el personal que laboró para el contratista en la obra durante el mes de junio de 2022 (ver pág. 25)

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATADO DE OBRA.

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 se relaciona el Estado Financiero y Presupuestal del Contrato de Obra. (Ver pág. 26)

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10, se muestra el estado general del tiempo

acontecido en el presente periodo, para lo cual se llevó el aproximado de las horas de sol y lluvia que se presentaron durante cada día. (Ver pág. 28)

4.6 RESUMEN DE ENSAYO DE LABORATORIO.

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11, se registran los resultados de los ensayos de laboratorio realizados en el mes de junio de 2022 necesarios para verificar que las obras ejecutadas cumplan con las especificaciones de construcción y las normas de ensayo correspondientes.

En el formato se describe los resultados obtenidos de los laboratorios realizados por parte del contratista e interventoría. (Ver pág. 29)

4.7 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Se relacionan las Garantía y Seguros del contrato de Obra, (Ver pág. 31).

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA.

El Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14. Referente al seguimiento del plan de calidad se encuentra en ejecución.

4.9 OTROS DOCUMENTOS.

- **SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DE ANTICIPO.**

Este proyecto no contempla anticipo.

- **SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA.**

Se anexa seguimiento al programa de obra del contratista (ver pag.33)

SEGUIMIENTO PROPGRAMA DE INVERSIÓN.

Se anexa cuadro programa de inversión (ver pág.35)

- **ACTAS DE COMITÉ DE OBRA.**

Se relaciona Formato MEPI-MN1-IN-14-FR-1.ver pág. 75

- **ACTAS DE REUNION.**

Se relaciona Formato MEPI-MN1-IN-14-FR-2. Ver pag.78

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	1 DE 1

	FECHA
	4/08/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA
--	--------------------------------

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA																															
PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JULIO DE 2022				PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias del Programa "COLOMBIA RURAL" en los Municipios del Departamento del Córdoba - GRUPO 4																											
CONTRATO No. 172 DE 2021				CONTRATISTA: DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA																											
CONTRATO INTERVENTORIA No. 2276 DE 2021				INTERVENTORIA: CONSORCIO ACI-3B																											

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTONIVELADORA	CAT120K 2012	12 TON	SAN ANTONIO CEDRO	A	A		A	I	A	A	A	A		I	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	I		A	A	A	A	A	A	A
MINICARGADOR	CAT 236B	8,84 TON	SAN ANTONIO CEDRO	A	A		A	I	A	A	A	A		I	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	I		A	A	A	A	A	A	A
VIBROCOMPACTADOR	CAT CP03	12 TON	SAN ANTONIO CEDRO	A	A		A	I	A	A	A	A		I	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	I		A	A	A	A	A	A	A
NIVEL AUTOMÁTICO	RUIDE RL-C32		SAN ANTONIO CEDRO	A	A		A	I	A	A	A	A		I	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	I		A	A	A	A	A	A	A
ESTACION			SAN ANTONIO CEDRO	A	A		A	I	A	A	A	A		I	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	I		A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA	INTERNATIONAL	14 M3	BOTADERONSAN VILLA CELINA	A												A				A									A					
VOLQUETA	INTERNATIONAL	14 M3	SAN ANTONIO CEDRO- BOTADERONSAN VILLA CELINA	A												A				A									A					
			SAN ANTONIO CEDRO-																															
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				7	5		5	5	5	5	5	5		5	5	7	5	5	7		7	5		5	5	5		5	7	5	5	5	5	5
TOTAL ACTIVO				7	5		5	0	5	5	5	5		0	5	7	0	5	7		7	5		5	5	0		5	7	5	5	5	5	5
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				0	0		0	5	0	0	0	0		5	0	0	5	0	0		0	0		0	0	5		0	0	0	0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%	CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	140	100%	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	120	86%	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	20	14%	


REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA: Los días 05,11 y 23 de julio de 2022 los equipos figuran inactivos debido a las fuertes lluvias presentadas las cuales no permitieron realizar las actividades programadas para esos días.

LA INTERVENTORIA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

- El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
- Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
- Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
- En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
- Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma:  Nombre: Jesús Alberto Zapa Pérez Residente de Obra Matrícula Profesional No.: 22202286336COR	Firma:  Nombre: Carmelita Oviedo Ramos Residente de Interventoría Matrícula Profesional No.: 22202193598 Cór
--	--

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

FECHA	4/08/2022 (Día / Mes / Año)
-------	--------------------------------

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFACOR

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JESUS ZAPA PEREZ	1064997706	RESIDENTE DE OBRA	\$ 2.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCTOR A TERLUZ S.A.S.	6,96%	5	SALUD TOTAL	9433620744	\$ 112.000	PORVENIR	9433620744	\$ 458.700	\$ 116.700						
2	JESUS NARVEZ	1064977134	TOPOGRAFO	\$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCTOR A TERLUZ S.A.S.	6,96%	5	CAJA COPATLANTICO	9433620744	\$ 2.700	PORVENIR	9433620744	\$ 458.700	\$ 116.700							
3	DIEGO ERNESTO DAGUIR DIAZ	1064993404	ALUMINAR HSE	\$ 966.667	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCTOR A TERLUZ S.A.S.	6,96%	5	CAJA COPATLANTICO	9433620744	\$ 36.400	PORVENIR	9433620744	\$ 145.600	\$ 36.400								
4	JAVIER ERNESTO PACHECO ARTEAGA	1073815678	TRABAJADOR SOCIAL	\$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCTOR A TERLUZ S.A.S.	6,96%	5	SALUD TOTAL	9433620744	\$ 60.000	COLPENSIONES	9433620744	\$ 240.000	\$ 60.000							
5	RAFAEL ANTONIO MARTINEZ PADILLA	1047365217	OPERADOR MINICARGADOR	\$ 1.100.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS S.A.S.	6,96%	5	MUTUAL SER	23109132	\$ 44.000	PORVENIR	23109132	\$ 176.000	\$ 44.000							
6	KEVIN ANDRES MAYTUE JARAMA	1047509839	OPERADOR MINICARGADOR	\$ 1.100.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS S.A.S.	6,96%	5	CAJA COPATLANTICO	9433620744	\$ 36.400	PROTECCION	23109132	\$ 145.000	\$ 36.000							
7	JAVIER ENRIQUE ORTEGA GONZALES	1064997508	OPERADOR MINICARGADOR	\$ 1.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS S.A.S.	6,96%	5	SALUD TOTAL	23109132	\$ 48.000	PROTECCION	23109132	\$ 192.000	\$ 48.000							
8	LUIS MANUEL PAEZ BARRA	1062674605	OPERADOR PAJARITA	\$ 1.050.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS S.A.S.	6,96%	5	CAJA COPATLANTICO	9433620744	\$ 36.400	PORVENIR	23109132	\$ 176.000	\$ 44.000							
9	ALEXANDER MANUEL HERNANDEZ LAGARES	1003193352	AYUDANTE	\$ 900.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCTOR A TERLUZ S.A.S.	6,96%	5	SALUD TOTAL	9433620744	\$ 36.000	PORVENIR	9433620744	\$ 144.000	\$ 36.000							
10	CARLOS ANDRES DIAZ MARTINEZ	1003718322	AYUDANTE	\$ 966.667	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCTOR A TERLUZ S.A.S.	6,96%	5	CAJA COPATLANTICO	9433620744	\$ 38.700	PORVENIR	9433620744	\$ 154.700	\$ 38.700							
11	LIJANA DEL CARMEN HERNANDEZ PERERA	35117527	PALETERA	\$ 966.667	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCTOR A TERLUZ S.A.S.	6,96%	5	MUTUAL SER	9433620744	\$ 38.700	PORVENIR	9433620744	\$ 154.700	\$ 38.700							

8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Nombre: Miguel Armando Díaz
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-12786 CND

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.


RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTA DE OBRA NÚ. 1			\$ 1.710.382.032
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma 
 Nombre: Orlando Isaac Castellón Marrugo
 Director de Obra
 Matricula Profesional No.: 13202120629BLV

Firma 
 Nombre: Miguel Armando Díaz
 Director de Interventoría
 Matricula Profesional No.: 25202-12786 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	1 DE 1

	FECHA	4/08/2022 (Día / Mes / Año)
--	-------	---------------------------------------

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 172 DE 2021
CONTRATISTA: DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2022
PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias del Programa "COLOMBIA RURAL" en los Municipios del Departamento del Córdoba - Grupo 4

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2276 DE 2021
INTERVENTOR: CONSORCIO ACI-3B


ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																	
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															Total	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Seco	X	X	X	X		X		X		X				X	X	X	X	X	X					X			X		X	X	X	X	18
Lluvias moderadas							X				X		X								X		X		X	X		X				8	
Lluvias intensas					X				X			X								X		X										5	
Total horas	24	24	24	24	2	24	1	24	2	24	3	3	1	24	24	24	24	24	24	2	2	1	2	24	3	2	24	2	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
 Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:


 Firma
 Nombre: Jesus Alberto Zapa Perez
 Residente de Obra
 Matrícula Profesional No.: 22202286336COR


 Firma
 Nombre: Carmelina Oviedo Ramos
 Residente de Interventoría
 Matrícula Profesional No.: 22202193598 Cór

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS							CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE							VERSIÓN	1	
	MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA							PAGINA	1 DE 1	
	RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO									
							FECHA		4/08/2022 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CÓRDOBA			
CONTRATO DE OBRA No.:		172 DE 2021			CONTRATISTA:		DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA			
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:		JUNIO DE 2022			PROYECTO:		MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - GRUPO 4"			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:		2276 DE 2021			INTERVENTOR:		CONSORCIO ACI-3B			
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES										
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones	
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA										
1	4-jul-22	ANALISIS GRANULOMETRICO AFIRMADO	E-213	JOMEVE	1	TABLA 320-3 CAPITULO 3 INVIAS	EL MATERIAL CUMPLE CON EL LIMITE LIQUIDO MAXIMO ESTABLECIDO POR EL ART 311-13 DE LA NORMA INVIAS	SI		
2	4-jul-22	DESGASTE DE LA MAQUINA DE LOS ANGELES AFIRMADO	E-218	JOMEVE	1	MENRO A 50%	40%	SI		
3	5-jul-22	ENSAYO DE COMPACTACIÓN AFIRMADO	E142	JOMEVE	1	N/A	N/A		LA DENSIDAD EN LABORATORIA ES DE 130, 8 LB/PIE Y SU HUMEDAD OPTIMA ES DEL 6,8%	
4	7-jul-22	CBR AFIRMADO	E-148	JOMEVE	1	MAYOR 15 %	21%			
5	4-jul-22	ANALISIS GRANULOMETRICO SUB-BASE	E-213	JOMEVE	1	TABLA 320-3 CAPITULO 3 INVIAS	EL MATERIAL SE AJUSTA EN SU TOTALIDAD A LOS LIMITES DE GRANULOMETRIA ESTABLECIDOS	SI		
6	4-jul-22	DESGASTE DE LA MAQUINA DE LOS ANGELES SUB-BASE	E-218	JOMEVE	1	MENOR A 50%	36%	SI		
7	5-jul-22	EQUIVALENTE DE ARENA SUB-BASE	E133	JOMEVE	1	MAYOR 25%	36%			
8	5-jul-22	ENSAYO DE COMPACTACIÓN SUB-BASE	E142	JOMEVE	1	N/A	N/A		LA DENSIDAD EN LABORATORIA ES DE 135, 8 LB/PIE Y SU HUMEDAD OPTIMA ES DEL 6,6%	
9	9-jul-22	CBR AFIRMADO	E-148	JOMEVE	1	MAYOR 30 %	30%			

B. ENSAYO CONTRATO DE INTERVENTORIA									
F-ED-DNS-005	2/07/2022	DENSIDAD EN SUB ASE GRANULAR	INV E 161-13	DENSIDAD M-008-1 K2+970 C DERECHO	1	MAYOR DE 95%	100%	SI	EL PROMEDIO DE ESTE LOTE ES DE 100% LO CUAL QUIERE DECIR QUE CUMPLE
F-ED-DNS-005	2/07/2022	DENSIDAD EN SUB ASE GRANULAR	INV E 161-13	DENSIDAD M-008-2 K2+970 C IZQUIERDO	1	MAYOR DE 95%	100%	SI	

OBSERVACIONES:

NOTAS:

0


2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de ensayo.

3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.

4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.

6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma 

Nombre: Orlando Isaac Castellón Marrugo

Director de Obra

Matrícula Profesional No.: 13202120629BLV

Firma 

Nombre: Miguel Armando Díaz Rivera

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 25202-12786 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1 DE 2		

FECHA		4/08/2022		
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 172 DE 2021 CONTRATISTA: DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA

OBJETO DEL CONTRATO:
 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEDRO CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

FECHA DE INICIO: 31 DE ENERO DE 2022
 PLAZO INICIAL: 6 MESES
 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE JULIO DE 2022
 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 5.685.110.960,00
 VALOR ACUMULADO: \$ -
 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ -
 VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2276 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ACI-3B

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 568.511.096,00	3	11	2021	3/12/2022		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$ 1.705.533.288,00	3	11	2021	3/12/2022		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 1.137.022.192,00	3	11	2021	3	6	2025
Calidad de Estudios y Diseños	30%	\$ 4.778.520,00	3	6	2022	3	6	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 1.705.533.288,00	3	6	2022	3	6	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101366414

Certificado de modificación o anexo No.:
 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: CASTRO GAVIRIA DAVIR FERNANDO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	\$ 454.263.000,00	11	2	2022	31	7	2022
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-101175283 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.:
 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: CASTRO GAVIRIA DAVID FERNANDO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES											
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.											
ADICIONAL No.:			PRÓRROGA No.:			MODIFICACIÓN No.:			SUSPENSIÓN No.:		
Amparo			% Amparo		Valor Asegurado (\$)						
Cumplimiento											
Buen manejo y correcta inversión del anticipo											
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones											
Calidad de Estudios y Diseños											
Estabilidad y/o Calidad de Obra											

VIGENCIA								
Desde			Hasta					
Día	Mes	Año						
Día	Mes	Año						
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año			
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año			
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año			

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.											
ADICIONAL No.:			PRÓRROGA No.:			MODIFICACIÓN No.:			SUSPENSIÓN No.:		
Seguro			% Asegurado		Valor Asegurado (\$)						
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)											
Otros											

VIGENCIA								
Desde			Hasta					
Día	Mes	Año						
Día	Mes	Año						
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año			
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año			

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Miguel Armando Diaz
 Director de Interventoría
 Matrícula Profesional No.: 25202-12786 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	febrero 2022							marzo 2022							abril 2022							mayo 2022							junio 2022							julio 2022							agosto 2022																
							23	26	29	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9
1		"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEDRO, CORREGIMIENTO DE TABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CORDOBA"	175 días	jun 31/01/22	sáb 30/07/22	\$5.685.116.960,00																																																											
2		ACTA DE INICIO	0 días	jun 31/01/22	jun 31/01/22	\$0,00																																																											
3		EXPLANACIONES	15 días	jun 31/01/22	mar 8/03/22	\$68.797.338,00																																																											
4		Excavaciones varias en material común en seco.	5 días	mié 2/03/22	mar 8/03/22	\$7.471.801,00																																																											
5		Excavación en material común de la explanación y canales	30 días	jun 31/01/22	mié 2/03/22	\$61.325.537,00																																																											
6		PAVIMENTOS AFIRMADO, SUBBASES Y BASES	125 días	mar 8/03/22	vie 15/07/22	\$5.434.537.836,00																																																											
7		Subbase Granular Clase C.	30 días	sáb 2/04/22	mar 3/05/22	\$747.677.952,00																																																											
8		Afirmado (Material para Mejoramiento)	25 días	mar 8/03/22	sáb 2/04/22	\$727.481.194,00																																																											
9		Pavimento de concreto hidráulico módulo de rotura 38 MPa	40 días	mié 4/05/22	mar 14/06/22	\$2.945.108.556,00																																																											
10		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm ² (60.000 PSI).	20 días	sáb 2/04/22	sáb 23/04/22	\$461.814.896,00																																																											
11		Bordillo de Piezas Prefabricadas de Concreto; incluye la preparación de la superficie de apoyo	30 días	mar 14/06/22	vie 15/07/22	\$552.455.238,00																																																											
12		TRANSPORTE	15 días	mié 2/03/22	jue 17/03/22	\$91.734.490,00																																																											
13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	15 días	mié 2/03/22	jue 17/03/22	\$91.734.490,00																																																											
14		SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	45 días	mar 14/06/22	sáb 30/07/22	\$39.089.860,00																																																											
15		Señal Vertical de Tránsito tipo 1 con lámina retrorreflectiva tipo II (75 x 75) cm	15 días	vie 15/07/22	sáb 30/07/22	\$17.938.074,00																																																											
16		Línea de Demarcación con Pintura en Frío.	10 días	mar 14/06/22	vie 24/06/22	\$21.151.786,00																																																											
17		CARACTERIZACIÓN VIAL	15 días	mar 14/06/22	mié 29/06/22	\$2.362.918,00																																																											
18		Caracterización del corredor	15 días	mar 14/06/22	mié 29/06/22	\$2.362.918,00																																																											
19		OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	15 días	jun 31/01/22	mar 15/02/22	\$29.633.732,00																																																											
20		REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	20 días	jun 31/01/22	sáb 19/02/22	\$15.928.400,00																																																											
21		IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	20 días	jun 31/01/22	sáb 19/02/22	\$3.026.396,00																																																											
22		ACTA FINAL	0 días	sáb 30/07/22	sáb 30/07/22	\$0,00																																																											

Elaboró:

Activar Windows Defender
Ve a Configuración de Windows Defender

		ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA PROGRAMA DE INVERSIONES										PAGINA: 1 DE 1 FECHA: 31/01/2022									
ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE		SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL										PROGRAMA DE INVERSIONES ☒ REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____ <small>(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)</small>									
CONTRATO No.: 172-2021 OBJETO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA VEDA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEDRO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA CONTRATISTA: DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VEREDA EL CERD CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 2276 del 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ACI 38														PLAZO INICIAL: hasta 31 de julio de 2022 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 31/01/2022 FECHA DE SUSPENSIÓN: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 5.685.110.959.90 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C)=(A)+(B): \$ 5.685.110.959.90				PLAZO ACUMULADO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2020 FECHA DE REANUDACIÓN: VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -			
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)		VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
		VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Ejecutado	Enero de 2022	Febrero de 2022	Marzo de 2022	Abril de 2022	Mayo de 2022	Junio de 2022	Julio de 2022	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...						
I. EXPLANACIONES		\$68.797.328	1,22%	0,00%	% P \$ P \$ E % E			0,50% \$32.706.948	0,54% \$38.090.380							100%					
II. PAVIMENTOS, AFIRMADO, SBG Y BASES		\$5.434.537.836	96,42%	0,00%	% P \$ P \$ E % E			5,90% \$332.562.832	10,73% \$604.928.595	17,73% \$995.482.615	50,51% \$2.846.938.271	11,54% \$650.625.523									
III. TRANSPORTE		\$91.734.490	1,63%	0,00%	% P \$ P \$ E % E			1,51% \$91.734.490													
IV. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL		\$39.089.860	0,69%	0,00%	% P \$ P \$ E % E							0,59% \$39.089.860									
VI. CARACTERIZACIÓN VIAL		\$2.362.918	0,04%	0,00%	% P \$ P \$ E % E							0,04% \$2.362.918				50%					
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)		\$ 5.636.522.432.00	100%	0,00%	% E											2%					
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')					% E																
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES		%			0,00%	0,00%	6,48%	13,80%	17,73%	50,51%	12,28%										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		VALOR (Miles de Pesos)		\$0	\$0	\$365.269.779	\$732.753.466	\$995.482.615	\$2.846.938.271	\$650.625.523											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES		%		0,00%	0,00%	6,48%	13,80%	17,73%	50,51%	12,28%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		VALOR (Miles de Pesos)		\$0	\$0	\$365.269.779	\$732.753.466	\$995.482.615	\$2.846.938.271	\$650.625.523											
		%																			
		VALOR (Miles de Pesos)																			
		%																			
		VALOR (Miles de Pesos)																			
		%																			
		VALOR (Miles de Pesos)																			
		%																			
		VALOR (Miles de Pesos)																			
		%																			
		VALOR (Miles de Pesos)																			
		%																			
		VALOR (Miles de Pesos)																			
		%																			
		VALOR (Miles de Pesos)																			
		%																			
		VALOR (Miles de Pesos)																			
		%																			
		VALOR (Miles de Pesos)																			
		%																			
		VALOR (Miles de Pesos)																			
		%																			
		VALOR (Miles de Pesos)																			
		%																			
		VALOR (Miles de Pesos)																			
		%																			
		VALOR (Miles de Pesos)																			
		%																			
		VALOR (Miles de Pesos)																			
		%																			
		VALOR (Miles de Pesos)																			
		%																			
		VALOR (Miles de Pesos)																			
		%																			
		VALOR (Miles de Pesos)																			
		%																			
		VALOR (Miles de Pesos)																			
		%																			
		VALOR (Miles de Pesos)																			
		%																			
		VALOR (Miles de Pesos)																			
		%																			
		VALOR (Miles de Pesos)																			
		%																			
		VALOR (Miles de Pesos)																			
		%																			
		VALOR (Miles de Pesos)																			
		%																			
		VALOR (Miles de Pesos)																			
		%																			
		VALOR (Miles de Pesos)																			
		%																			
		VALOR (Miles de Pesos)																			
		%																			
		VALOR (Miles de Pesos)																			
		%																			
		VALOR (Miles de Pesos)																			
		%																			
		VALOR (Miles de Pesos)																			
		%																			
		VALOR (Miles de Pesos)																			
		%																			
		VALOR (Miles de Pesos)																			
		%																			
		VALOR (Miles de Pesos)																			
		%																			
		VALOR (Miles de Pesos)																			
		%																			
		VALOR (Miles de Pesos)																			
		%																			
		VALOR (Miles de Pesos)																			
		%																			
		VALOR (Miles de Pesos)																			
		%																			
		VALOR (Miles de Pesos)																			
		%																			
		VALOR (Miles de Pesos)																			
		%																			
		VALOR (Miles de Pesos)																			
		%																			
		VALOR (Miles de Pesos)																			
		%																			
		VALOR (Miles de Pesos)																			
		%																			
		VALOR (Miles de Pesos)																			
		%																			
		VALOR (Miles de Pesos)																			
		%																			
		VALOR (Miles de Pesos)																			
		%																			
		VALOR (Miles de Pesos)																			
		%																			
		VALOR (Miles de Pesos)																			
		%																			
		VALOR (Miles de Pesos)																			
		%																			
		VALOR (Miles de Pesos)																			
		%																			
		VALOR (Miles de Pesos)																			
		%																			
		VALOR (Miles de Pesos)																			
		%																			
		VALOR (Miles de Pesos)																			
		%																			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MEP-MNI-N-6-FR-2 1
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1 DE JUNIO DE 2022 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)		VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 1.710.382.032	
CONTRATO No. 172-2021 OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VIDA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEDRO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE		PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE JULIO DE 2022 PLAZO ACUMULADO: 11 MESES FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 31/01/2022 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2022 FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 5.685.110.959,90 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 5.685.110.959,90	
CONTRATISTA: DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 2276 del 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ACI 3B			

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado \$ Valor Programado	% Ejecutado \$ Valor Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Ejecutado		ENERO DE 2022	FEBRERO DE 2022	MARZO DE 2022	ABRIL DE 2022	MAYO DE 2022	JUNIO DE 2022	JULIO DE 2022	AGOSTO DE 2022	SEPTIEMBRE DE 2022	OCTUBRE DE 2022	
I. EXPLANACIONES	\$88.797.328	1,22%	0,00%	% P \$ P \$ E	0,58% 0,64%			\$32.706.948	\$36.096.380		\$119.877.635,46					
II. PAVIMENTOS, AFIRMADO, SBG Y BASES	\$5.434.537.836	96,42%	0,00%	% P \$ P \$ E	5,90% 10,72% 11,54%			\$339.562.833	\$804.928.595	\$999.482.615	\$2.846.938.271	\$650.625.923				
III. TRANSPORTE	\$91.734.490	1,63%	0,00%	% P \$ P \$ E	1,63%			\$91.734.490			\$29.739.715					
IV. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	\$39.089.860	0,69%	0,00%	% P \$ P \$ E	0,00%							\$39.089.860				
VI. CARACTERIZACIÓN VIAL	\$2.382.918	0,04%	0,00%	% P \$ P \$ E	0,04%							\$2.382.918				
TOTAL OTROS ÍTEM				% P \$ P \$ E	0,33%						\$18.864.796					
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$ 5.636.522.432,00	100%	0,00%													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

- Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
- El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
- El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
- El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
- Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DEBILLO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	\$ Valor	\$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	VALOR (Miles de Pesos)	0,00%	0,00%	6,48%	13,00%	17,73%	50,51%	12,28%				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	0,00%	0,00%	6,48%	19,48%	37,21%	87,72%	100,00%				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	VALOR (Miles de Pesos)	0,00%	0,00%	6,48%	13,00%	17,73%	50,51%	12,28%				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	0,00%	0,00%	6,48%	13,00%	17,73%	50,51%	12,28%				

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
 Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ -	\$ -	%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	\$ -	\$ -	%
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS	\$ -	\$ -	%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 15.928.400,00	\$ -	%
IVA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 3.026.396,00	\$ -	%
GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	\$ -	\$ -	%
GESTIÓN AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	\$ 29.633.731,90	\$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	\$ 48.588.527,90	\$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	\$ -	\$ -	%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 5.685.110.959,90	\$ -	%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A+B')	\$ -	\$ -	%

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprobada Firma: DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
 Nombre: David Fernando Castro Gaviria
 Representante legal o apoderado del Contratista
 Matrícula Profesional No.: 2220215274ACOR

Aprobada Firma: MIGUEL ARMANDO DIAZ RIVERA
 Nombre: Miguel Armando Diaz Rivera
 Director de Interventoría
 Matrícula Profesional No.: 25202-12786 CND

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO.

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	“INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA- GRUPO 4”.
CONTRATO DE INTERVENTORIA	N0. 2276 DE 2021
INTERVENTORIA	CONSORCIO ACI-3B
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	ACI PROYECTOS S.A.S 50% 3B PROYECTOS S.A.S 50%
NIT DE INTERVENTORIA	90155192-6
TELEFONO	3134024184
DIRECCION	-CARRERA 7 156-10 PISO 31 TORRE KRYSTAL-NORTH POINT -CARRERA 18 13°04 AP 301 ED COLOSINA BARRIO VENUS II, CERETE, CORDOBA
PLAZO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA :	6 MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	31 DE ENERO DE 2022
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	31 DE JULIO DE 2022
VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA (IVA INCLUIDO):	\$1.930.530.773

5.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

- Hacer seguimiento al programa de obra del contratista.
- Revisión de la documentación entregada por el contratista.
- Realizar control de calidad del material utilizado e instalado en obra
- Realizar pruebas de densidad y toma de vigas al concreto para efecto de calidad
- Verificación de afiliaciones del personal.
- Realizar comités de obra.
- Realizar los informes semanales.
- Realizar Informes mensuales.

- Llevar un control en la bitácora de las actividades diarias que el contratista ejecuta.
- Requerimientos escritos al contratista para el cumplimiento de obligaciones Contractuales.
- Verificar la calidad de los materiales que el contratista está instalando en obra.
- Inspección de las condiciones de seguridad y verificación de señalizaciones.
- Llevar un Control diario de los equipos que el contratista tiene en obra.
- Control diario del personal del contratista en obra.
- Llevar un control diario del estado del tiempo

5.3. INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES.

Informe de especialista se encuentra en ejecución

5.4. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC.

El informe de programa anual de caja –PAC Se encuentra en ejecución

5.5 . INFORME MATRIZ DE RIESGOS.

El informe de matriz de riesgo se encuentra en ejecución en este mes.

5.6 .INFORMACION DE OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA.

Toda la información correspondiente al proyecto se viene guardando y actualizando con frecuencia en Drive.

6 REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

6.1. EQUIPO Y VEHICULOS CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Se anexa formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5. Correspondiente equipo y vehículos contrato de interventoría (ver pág. 39)

6.2. PERSONAL CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Esta información se encuentra relacionada en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7. (Ver pág. 40)

6.3. INFORMACIÓN FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Esta información se encuentra relacionada en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 S. (Ver pág. 41)

6.4. SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Esta información se encuentra relacionada en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13. (Ver pág. 42)

6.5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA.

No se anexa formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15. Debido a que el plan de calidad se encuentra en elaboración.

6.6. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL.

- **SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO:** El Contrato de Interventoría no contempla anticipo.
- **PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO:**
Esta información se encuentra relacionada en el formato MEPI-MN-IN-9-FR-2. (Ver pág. 44)
- **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGA:** Esta información se encuentra relacionada en el formato MEPI-MN-IN-9-FR-3.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-5

VERSIÓN

1

PÁGINA

1 DE 1

FECHA

31-jul-22

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL:

JULIO

PROYECTO:

P65- INTERVENTORÍA VÍAS CÓRDOBA - GRUPO 4

CONTRATO INTERVENTORÍA No.

2276 DE 2021

INTERVENTORÍA:

CONSORCIO ACI-3B

CONTRATO DE OBRA No.

172-180-181 DE 2021, 001 DE 2022

CONTRATISTA:

ING.DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA, CONSORCIOEYR019, CONSORCIO CRT PROGRESA, CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
CAMIONETA	CAMIONETA DOBLE CABINA, PLACA UGU681, MARCA TOYOTA, CILINDRAJE 2494, MODELO 2015	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	
ESTACIÓN PARA TOPOGRAFÍA	MARCA SOKKIA SET 6 SERIE D22852	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	
NIVEL	MARCA TOPCOM, MODELO AT-B4, SERIE MZ 9945	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	
MOTOCICLETA	MARCA AKT ENDURO, PLACA ASX-48G, CILINDRAJE 200, MODELO 2022	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	
MOTOCICLETA	MARCA HONDA, CILINDRAJE 162 CC MODELO 2022	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	
MAQUINA ENSAYOS A LA COMPRESIÓN	MARCA RYR, MODELO SG-BM, SERIE 162070	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	
DIAL ANALOGO BAKER	MARCA BAKER, MODELO ANALOGO, SERIE UDD996, UTK308	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	
HUMEDOMETRO TIPO SPEEDY PINZUAR	MARCA PINZUAR, MODELO TYPE D1	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	
BALANZA DIGITAL TRUMAX	MARCA TRUMAX, MODELO MIX-A, YS 202725	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	

CONVENCIONES:

ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).

(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

Mantenimiento vehículo: 163.195 km

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.

2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.

3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma

Nombre: MIGUEL ARMANDO DIAZ RIVERA

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 25202-12786 CND

Firma

Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO

Supervisor del Contrato de Interventoría.

Matrícula No. :22202097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		CÓDIGO	MEPH-MNL-N-15-FR-7
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	1 DE 1

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES	FECHA: 4-ago-22 (Día / Mes / Año)
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2276 DE 2021	INTERVENTOR: CONSORCIO ACI-38
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2022	PROYECTO: PES-INTERVENTORIA VÍAS CORDOBA- GRUPO 4
CONTRATO DE OBRA No: 172-180-181 DE 2021, 001 DE 2022	CONTRATISTA: ING.DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA- CONSORCIOEYR019, CONSORCIO CRT PROGRESA, CONSORCIO VAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021
NOMBRE ARL: SURA	NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFACOR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL																																																	
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (EC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			% Dedicación en el mes	Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	
1	Miguel Armando Díaz Rivera	79.153.481	Director de Interventoría	\$ 6.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	ACI	\$ 6.500.000	\$ 452.400	V	NUEVA EPS	9433392973	\$ 260.000	PORVENIR	9433392973	\$ 1.040.000	\$ 260.000	\$ -	\$ -			
2	Carmelina Rosa Oviedo Ramos	30.581.482	Ingeniero Residente de Interventoría - El Cedro	\$ 4.600.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	ACI	\$ 4.600.000	\$ 320.200	V	NUEVA EPS	9433392973	\$ 184.000	PORVENIR	9433392973	\$ 736.000	\$ 184.000	\$ -	\$ -			
3	Sergio Javier Solano Almanza	78.760.291	Ingeniero Residente de Interventoría - El Cepillo	\$ 4.600.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	ACI	\$ 4.600.000	\$ 256.200	V	NUEVA EPS	9433392973	\$ 184.000	PORVENIR	9433392973	\$ 736.000	\$ 184.000	\$ -	\$ -			
4	Carlos Mian Carvajal Pinto	1.047.387.270	Ingeniero Residente de Interventoría - Martínez	\$ 4.600.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	ACI	\$ 4.600.000	\$ 320.160	V	SANITAS	9433417680	\$ 184.000	COLPENSIONES	9433417680	\$ 736.000	\$ 184.000	\$ -	\$ -			
5	Libardo Arteaga	78.077.318	Ingeniero Residente de Interventoría	\$ 4.600.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	ACI	\$ 4.600.000	\$ 320.200	V	NUEVA EPS	9435891693	\$ 184.000	PROTECCION	9435891693	\$ 736.000	\$ 184.000	\$ -	\$ -			
6	Said Mauricio Soto Martinez	1.071.357.798	Ingeniero Auxiliar	\$ 3.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	ACI	\$ 3.200.000	\$ 334.000	V	SALUD TOTAL	9435891693	\$ 128.000	PROTECCION	9435891693	\$ 512.000	\$ 128.000					
7	Lina Ramos	1.071.355.092	Ingeniero Auxiliar	\$ 3.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	ACI	\$ 3.200.000	\$ 222.720	V	MUTUAL SER	9435891693	\$ 25.600	PORVENIR	9435891693	\$ 512.000	\$ 128.000					
8	Franciso Jose Cervantes Velez*	79.123.298	Especialista Especialista en Geotecnia y/o																																							\$ -	\$ -	\$ -					
9	Andres Felipe Gomez Sanchez*	79.956.763	Especialista en Hidráulica e Hidrología																																							\$ -	\$ -	\$ -					
10	Víctor Antonio Hernández Gordillo*	73.109.426	Especialista en Estructuras	\$ 4.000.000																																							\$ -	\$ -	\$ -				
11	Néstor Escorcia*	72.179.441	Especialista Ambiental	\$ 2.100.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	ACI	\$ 2.100.000	\$ 146.160	V			\$ 84.000			\$ 336.000	\$ 84.000	\$ -	\$ -			
12	Maria José Teherán Guerra	1.101.819.235	Inspector	\$ 2.100.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	ACI	\$ 2.100.000	\$ 117.000	V	NUEVA EPS	9433417680	\$ 84.000	PORVENIR	9433417680	\$ 336.000	\$ 84.000					
13	Naima Rocío Charrasquel Rivero	1.065.007.803	Secretaria	\$ 1.015.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	ACI	\$ 1.015.000	\$ 70.644	V	NUEVA EPS	9433417680	\$ 40.600	PORVENIR	9433417680	\$ 162.400	\$ 40.600					
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				\$ 40.515.000																																													

El Interventor adjunta la certificación de fecha JULIO a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

- El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
- El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
- Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
- Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
- En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelante o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
- El Interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
- En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
- El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
- El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
- El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma: 

Nombre: MIGUEL ARMANDO DIAZ RIVERA
 Director de Interventoría
 Matrícula Profesional No.: 25202-12786 CND

Firma: 

Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
 Supervisor del Contrato de Interventoría
 Matrícula Profesional No.: 22202097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA.
 Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA								CÓDIGO	EP-MN1-IN-15-FR
									VERSIÓN	1
									PÁGINA	
									FECHA	3/08/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2276 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ACI - 3B
 MES INFORME MENSUAL: jul-22 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS
 PROYECTO: TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA – GRUPO 4
 CONTRATO DE OBRA No: 172 DE 2021, 181 DE 2021, 180 DE 2021 Y 001 DE 2022 DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA - CONSORCIO EYR 019 - CONSORCIO CRT PROGRESA - CONSORCIO VIAL CORREDORES
 CONTRATISTA: RURALES COTORRA 2021

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2021	1084921	C-2402-0600-12-0-2402041-02	54	Nación	Principal	\$ 242.430.000,00
2022	280222	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	Nación	Principal	\$ 1.588.100.773,00
2022	280222	C-2402-0600-12-0-2402112-02	11	Nación	Principal	\$ 100.000.000,00
TOTAL						1.930.530.773,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 1.930.530.773,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
C-2402-0600-12-0-2402041-02								\$ 242.430.000,00			
1	ene-22	\$ 456.300,00	\$ 86.697,00	\$ 542.997,00	\$ 542.997,00	\$ 542.997,00	1084921 - 30/12/2021	\$ 241.887.003,00	\$ 1.929.987.776,00		
2	feb-22	\$ 39.956.820,00	\$ 7.591.796,00	\$ 47.548.616,00	\$ 47.548.616,00	\$ 47.548.616,00	1084921 - 30/12/2021	\$ 194.338.387,00	\$ 1.882.439.160,00		
3	mar-22	\$ 61.066.163,00	\$ 11.602.571,00	\$ 72.668.734,00	\$ 72.668.734,00	\$ 72.668.734,00	1084921 - 30/12/2021	\$ 121.669.653,00	\$ 1.809.770.426,00		
4	abr-22	\$ 88.928.160,00	\$ 16.896.350,00	\$ 105.824.510,00	\$ 105.824.510,00	\$ 105.824.510,00	1084921 - 30/12/2021	\$ 15.845.143,00	\$ 1.703.945.916,00		
5	may-22	\$ 13.315.246,00	\$ 2.529.897,00	\$ 15.845.143,00	\$ 15.845.143,00	\$ 15.845.143,00	1084921 - 30/12/2021	\$ -	\$ 1.688.100.773,00		
C-2402-0600-12-0-2402112-02								\$ 100.000.000,00			
5	may-22	\$ 78.131.354,00	\$ 14.844.957,00	\$ 92.976.311,00	\$ 92.976.311,00	\$ 92.976.311,00	280222 - 23/02/2022	\$ 7.023.689,00	\$ 1.595.124.462,00		
6	jun-22	\$ 5.902.260,00	\$ 1.121.429,00	\$ 7.023.689,00	\$ 7.023.689,00	\$ 7.023.689,00	280222 - 23/02/2022	\$ -	\$ 1.588.100.773,00		
C-2402-0600-12-0-2402041-02								\$ 1.588.100.773,00			
6	jun-22	\$ 94.536.797,00	\$ 17.961.992,00	\$ 112.498.789,00	\$ 112.498.789,00	\$ 112.498.789,00	280222 - 23/02/2022	\$ 1.475.601.984,00	\$ 1.475.601.984,00		
7	jul-22	\$ 101.134.200,00	\$ 19.215.498,00	\$ 120.349.698,00	\$ 120.349.698,00	\$ 120.349.698,00	280222 - 23/02/2022	\$ 1.355.252.286,00	\$ 1.355.252.286,00		
TOTALES		\$ 483.427.300,00	\$ 91.851.187,00	\$ 575.278.487,00	\$ 575.278.487,00	\$ 120.349.698,00		\$ 1.355.252.286,00	\$ 1.355.252.286,00		


Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS PERSONAL	\$ 404.141.400	\$ 76.786.866	\$ 480.928.266
OTROS COSTOS DIRECTOS	\$ 79.285.900	\$ 15.064.321	\$ 94.350.221
+			
VALOR TOTAL	\$ 483.427.300	\$ 91.851.187	\$ 575.278.487

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
 1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
 2. Este formato se diligencia por año.


 Firma
 Nombre: MIGUEL ARMANDO DIAZ RIVERA
 Director de Interventoría
 Matricula No.: 25202-12786 CND


 Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
 Supervisor de Contrato de Interventoría
 Matrícula Profesional No. 22202097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
			VERSIÓN	1	
			PÁGINA	1 DE 2	

FECHA		4-ago-22 (Día / Mes / Año)
-------	--	-------------------------------

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA
-------------------	------------------------------	--------------------------------

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2276 DE 2021	INTERVENTOR: CONSORCIO ACI-3B
---	-------------------------------

OBJETO DEL CONTRATO:
 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA- GRUPO 4

FECHA DE INICIO:	31 DE ENERO DE 2022
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31 DE JULIO DE 2022 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL:	\$ 1.930.530.773,00
VALOR ACUMULADO:	\$ - (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
---	-------------------------------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL		
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		\$ 811.147.384,00
Calidad del servicio		\$ 579.159.232,00
Cumplimiento de Servicio		\$ 193.053.077,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 386.106.155,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
27	ENE	2022	1	MAR	2023
29	AGOS	2022	29	AGOS	2027
27	ENE	2022	1	MAR	2023
27	ENE	2022	29	AGOS	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3237551-6	
Certificado de modificación o anexo No.:	
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)	
Razón Social Compañía Aseguradora:	SURAMERICANA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		
Calidad del servicio		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año			
Día	Mes	Año			
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:
NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma 
Nombre: MIGUEL ARMANDO DIAZ RIVERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-12786 CND

Firma 
Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORA OBRA PÚBLICA PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS	CÓDIGO MEPM-M1-N-9-FR-2
		VERSIÓN 1
		PÁGINA 1

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA	PLAN DE CARGAS INICIAL ☒ REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☐ No. _____ (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)
		PLAN DE CARGAS FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORA No.: 2278 INTERVENOR: CONSORCIO ACI 38 SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORIA: ING. NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO RESOLUCIÓN No.: _____ DE _____ CONTRATO DE OBRAS: RETE 172.180.181 COTORRA 001 DE 2022 CONTRATISTA: DAVID CASTRO CRT PROGRESO, EYR19 DE CERETE Y JESUS ALBERTO MARTINEZ DE COTORRA	PLAZO INICIAL: PLAZO FINAL: 31 DE JULIO DE 2022 FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/01/2022 FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ VALOR INICIAL (incluido VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ _____ VALOR ACUMULADO VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ _____ PLAZO ACUMULADO: _____ FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: _____ FECHA DE REANUDACIÓN: _____ VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ _____
--	---

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. de fecha		2022												TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total (\$)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total (\$)	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		MES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	1	Director de Interventoría	\$ 4.500.000,00		9	\$ 18.000.000,00					500	\$ 195.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,00		\$ 4.500.000,0

7 CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES.

El contratista a la fecha según el programa de obra el debería llevar una inversión de obra acumulada de \$ 5.685.110.959,09 equivalente a 100 % y ejecutado acumulado lleva \$ 2.152.921.234,60 equivalente al 37,87%, lo cual indica que el contratista presenta una atraso de 62,1% lo anterior correspondiente a la ejecución de las siguientes actividades excavación, en material común de la explanación y canales, instalación de afirmado (Material para Mejoramiento), transporte de materiales provenientes de la excavación, instalación de sub base, instalación de acero y fundida de concreto.

Esta interventoría tomo las siguientes acciones al ver el atraso presentado por el contratista se le ha insistido al contratista por medio de oficios con el tema del atraso que ha presentado ya que es de gran preocupación lo que quedo consignado en el siguiente radicado.

SAL-22-010684 del 05 de julio de 2022,

Donde se le solicito presentara plan de contingencia el cual presento y no cumplió con la programación de obra presentada en el plan de contingencia la que iniciaba el 10 de mayo y finalizaba el 31 de mayo de 2021, por tal motivo se le requirió al contratista una reprogramación del plan de contingencia con el fin que súper el atraso presentado.

Se le solicito al contratista hacer entrega de reprogramación y flujo de caja para poder llevar el respectivo control de las actividades a ejecutar a partir del 01 de agosto de 2022.

En nuestro afán de proteger el pavimento de la socavación por las lluvias presentadas se le solicito al contratista iniciar con la instalación de los bordillos, también continuar con el sello de juntas en el pavimento.

Se le solicito al contratista adecuar la vía de acceso que comunica al corregimiento de san Antonio con el corregimiento del Cedro ya que se están formando huecos debido a las lluvias

Presentadas, además de esto mmejorar el acabado del pavimento cuando este lloviendo, se puede notar un rayado del pavimento no tan óptimo.

Al momento de realizar el corte de las juntas, realizar limpieza y sello de estas, debido a que se están presentando que los cortes se están saturando de lodos o suciedad.

Evitar hormiguelo que se encuentra en los laterales para esto se debe vibrar más el concreto, el que ya se encuentra debe ser corregido ya que se evidencia puntos no homogéneos al momento de quitar la formaleta.

Se le recomienda al contratista que al momento de instalar el material en obra (afirmado o sub base) verifique que no se encuentre con grado alto de humedad ya que el material que se instale húmedo será mandado a retirar.

8 ANEXOS.

8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR.

Se anexa cuadro relación de correspondencia Contratista e interventoría (Ver pág. 81)

8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS DE MÁXIMO 15 MINUTOS.

REGISTRO FOTOGRAFICO.

Céreo de Sub base



Compactación de sub Base



Instalación de rieles



Toma de densidades en Sub base



Instalación de concreto



Instalación de concreto



Toma de viguetas para efecto de calidad del concreto



Toma de Slump para verificar el asentamiento del concreto



Comité de obra

8.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS DE MÁXIMO 15 MINUTOS (CUANDO EL CONTRATO TENGA QUE ADELANTAR ESTAS GESTIONES).

Se presenta registro fotográfico.



Charla social con la comunidad

8.4. BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE.

Se anexa evidencia de bitácora correspondiente al mes de Junio. (Ver pág. 53)


01 de Julio de 2022 (viernes)


Estado del tiempo: Seco

equipos y maquinaria: Minicargador - Motoni-
veladora - Vibro Compactador

Personal en obra: Residente de obra Topografía (2)
Ayudantes (2) Paletero (2) Social (1) Hse (1) Operador (3)

Actividad en obra: Se ~~certifica~~ sub base del
K2+880 al K2+980.

x 




02 de Julio de 2022 (sábado)

Estado del tiempo: Seco

equipos y maquinaria: Minicargador - Motoni-
veladora - Vibrador de concreto - Vibro compactador

Personal en obra: Residente de obra - Topografía (2)
Ayudantes (2) Operadores (3) Paletero (2) Hse (1) Social (1)

Actividad en obra: Se recibe liberación por top-
ografía sub base y nivelación de rieles K2+978 al K2+918
- se instalan rieles para fundición de concreto
- Se instala pavimento del K2+978 al K2+918
- Se toman viguetas - se toman dos rieles en sub base
se hace muestra de slump.

x 



03 de Julio de 2022 (Domingo)

NO se realizan actividades en obra

x S-A

Cornejo

04 de Julio de 2022 (Lunes)

No se realizan actividades en obra por ser festivo

x S-A

Cornejo

05 de Julio de 2022 (Martes)

Tiempo: Se presentan lluvias en horas de la mañana de 07:00 am a 09:00 am.

Equipo y maquinaria: minicargador - Motoniveladora - Vibro compactador

Personal en obra: Pendiente de obra Topografía (2)
Ayudantes (1) operador (2) paletero (2) HSEC (1)
Socool (1)

Actividad en obra: Se realiza cerco en afirmado

Observación: Debido a las lluvias presentadas en la mañana el contratista no pudo cumplir con todas las actividades programadas el día de hoy.

S-A

Cornejo

06 de Julio de 2022 (Miércoles)


Tiempo: Seco


Equipo y Maquinaria: Vibrador de concreto - mini Cargador - Vibro compactador - Moto niveladora

Personal en obra: Residente de obra Topografía
Ayudantes (10) Pilatera (2) HSE (1) Social (1)
operador (3)

Actividad en obra: Se recibe por parte de la Comisión de topografía de interventoría liberación de Sobobos y nivel de Riebo. K2+918 al K2+885.

- se fonde concreto del K2+918 al K2+885
- se toma muestra de slump para verificar asentamiento del concreto.

x 



07 de Julio de 2022 (Jueves)

Estado del tiempo: Se presentan lluvias en horas de la tarde de: 04:00 pm a 05:00 pm


Equipo y maquinaria: Minicargador - Vibro compactador moto niveladora

Personal en obra: Residente de obra Topografía (2)
Ayudantes (2) Pilatera (2) operador (3) HSE (1) Social (1)

Actividad en obra: Se realiza Cero de afirmado. Se coloca alineamiento y anchos por parte de Topografía del K2+780 al K2+880.

- Se inicia con el Seto de juntas de K3+488 al K3+368.

x 



08 de Julio de 2022 (Viernes)

Tiempo: Seco.

Equipo y maquinaria: Minicargador - Motoniveladora Vibro compactador

Personal en obra: Residente de obra Topografía (2)
Ayudantes (2) operador (3) HSE (1) Social (1)
Piloto (2)

Actividad en obra: Se continua con el
cereo en afirmado del K2+880 al K2+780

- Se recibe por topografía liberación en afirmado
del K2+880 al K2+780
- Se toman densidades en afirmado por
parte de la intervención en la Abs K2+825 izquierdo
y en la K2+860 derecho

x *[Signature]*

09 de Julio de 2022 (Sabado).

[Signature]

Tiempo: Seco.

Equipos y Maquinaria: Motorizadora - Mini-
cargador - Vibro compactador.

Personal en obra: Residente de obra
Topografía (1) Piloto (2) Ayudantes (2)
operador (3) Social (1) HSE (1)

Actividad en obra: Se realiza cereo en
afirmado del K2+780 al K2+680.
Se continua con el sello de juntas
del K3+368 al K3+300.

x *[Signature]*

10 de Julio de 2022 (Domingo)

[Signature]

No se realizan actividades en obra

x *[Signature]*

[Signature]

11 de julio de 2022 (Lunes)

Tiempo: Se presentan lluvias en horas de la mañana de 07:00 am a 10:00 am

✓ Equipos y Maquinaria: Motoniveladora - Vibro compactador - minicargador (Equipos Inactivos)

Personal en obra: Residente de obra Topografía (2) Ayudantes (2) Operador (3) Palotera (2) HSE (1) Social (1)

Actividad en obra: Por motivo de las fuertes lluvias presentadas en horas de la mañana se vio afectada la programación del día solo se evacuó agua estancada.

[Signature]

[Signature]

12 de Julio de 2022 (Martes)

Tiempo: Se presentan fuertes lluvias de 12:30 pm - 3:30 pm.

Equipos y maquinaria: Motoniveladora - Vibro compactador - Minicargador

Personal en obra: Residente de obra Topografía (2) Ayudantes (2) Paloteras (2) HSE (1) Social (1) Operador (3)

Actividad en obra: se continúa con el cerco en afirmado del K2+780 al K2+680 por motivo de las lluvias presentadas en horas de la tarde el contratista tuvo que parar las actividades que estaba realizando.

[Signature]

[Signature]

13 de julio de 2022 (Miércoles)

Estado del tiempo: Se presentaron lluvias de 06:00 a 07:00

Equipo y maquinaria: Minicargador - Motoniveladora - Vibro Compactador - Estación - Nivel.

Personal en obra: Residente de obra operarios (3) topografía (2) Ayudantes (2) paletero (2) social Hse.

Actividad en obra: en horas de la mañana se vaciaron aguas estancadas, por las lluvias presentadas

- En horas de la tarde se extiende y compacta sub base.

[Signature]

14 de julio de 2022 (Jueves)

[Signature]

- Tiempo: seco

Equipo y maquinaria: Minicargador - Moto niveladora - Vibro compactador - Vibrador de concretos - Nivel - Estación - Herramientas menores - Nivel - C

Personal en obra: Residente de obra Topografía (2) Paletero (2) - Hse (1) Social (1) - Operador (3) Ayudantes (10)

Actividad en obra: Se recibe por topografía sub base y nivelación de rieles del K + al K2+830.

- Se toman coteos en sub base. K2+885 Izquierdo y K2+830 derecho.

- Se correa afirmado del K2+770 al K2+570.

- Se instala concreto del K2+885 al K2+830

Se toman viguetas y muestra de Slump para efecto de calidad del concreto.

[Signature] 15 de Julio de 2022 (viernes) *[Signature]*

Tiempo: Seco

Equipo y maquinaria: Minicargador - Motoniveladora - Vibrocompactador

Personal en obra: Residente de obra topografía (2) operador (3) Ayudantes (2) Paleta (2) HSE Cu Social (1)

Actividad en obra: Se continua con el Cerezo de afirmado del K2+780 al K2+580.

- Se libera por parte de la topografía de interventoría afirmado del K2+780 al K2+580.

[Signature] *[Signature]*

16 de Julio de 2022 (Sábado).

Tiempo: Seco.

Equipo y maquinaria: Minicargador motoniveladora Vibro Compactador - Vibrador de concreto

Personal en obra: Residente de obra topografía (2) Ayudantes (10) Paleta (2) operador (3) HSE Cu Social (1)

Actividad en obra: Se instala sub base del K2+780 al K2+820.

- Se recibe sub base y nivelación de rieles (K2+830-K2+795) por parte de la topografía. El contratista e interventoría toman consideraciones.
- Se instala concreto del K2+830 al K2+795.
- Se toma slump para verificar asentamiento de concreto.

J-A

Barufent

17 de Julio (Domingo)

No se realizan actividades en obra.

J-A

Barufent

18 de Julio de 2022 (Lunes)

Tiempo: Seco

Equipo y Maquinaria: Minicargador - Motoniveladora
vibrocompactador - Nivel - estación

Personal en obra: Residente de obra topografía (2)
Ayudantes (2) operarios (3)

Actividad en obra: Se instala y compacta
sub base del K2+790 al K2+710.
Se correa sub base del K2+790 al K2+710.

J-A

Barufent

19 de Julio de 2022 (Martes)

Tiempo: Seco

Equipo y Maquinaria: Minicargador - Motoniveladora
vibrocompactador - Vibrador de concreto nivel estación

Personal en obra: Residente de obra - Topografía(2) Hse social operador(3) Ayudantes(10) paletera(2)

Actividad en obra: Se instalan rieles.

- Se recibe por topografía del K2+795 al K2+712 (Sob base)
- Se toman densidades en sob base K2+740 Izq.
- Se instala Concreto del K2+795 al K2+712.
- Se toma slump para verificar asentamiento del Concreto.

[Signature]

[Signature]

20 de Julio de 2022 (Miércoles)

Tiempo: Se presentan lluvias en horas de la tarde de 03:00 pm a 05:00 pm

- Equipo y maquinaria: Motoniveladora - Vibro - Compactador - Minicargador

- Personal en obra: Residente de obra - Topografía(2) Hse(1) Social(1) - operador(3) Ayudantes(2) paletera(2)

Actividad en obra: Se realiza cerco de Sob base del K2+712 al.

- Se instala Sob base del K2+712 al K2+630.

[Signature]

[Signature]

21 de Julio de 2022 (Jueves)

Tiempo: Se presentan lluvias en horas de la mañana de 07:00 am a 09:00 am.

Equipo y maquinaria: Motoniveladora - Minicargador

Vibro Compactador Nivel - estación

Personal en obra: Residente de obra operador(3)
Ayudantes(2) Topografía(2) Hse Social Palotera(2)

Actividad en obra: en horas de la mañana
se evacua agua y se retira material húmedo
de la vía

- En horas de la tarde se cerea afirmado
del K2+600 al K2+500.

J-D

22 de julio de 2022 (viernes).

Barufecuf

Tiempo: Lluvias en horas de la mañana de 6:00 am a
07:00 am.

Equipo y maquinaria: Vibro Compactador - Mini-
cargador - Motoniveladora - Vibrador de
concreto Herramientas menores - Nivel

Personal en obra: Residente de obra Topografía(2)
Auxiliar Social Auxiliares Hse Palotera(2) Ayudantes(4)
operadores(3)

Actividad en obra: Se libera sub base y nivel de
rieles del K2+712 al K2+630
se instala concreto del K2+712 al K2+630.

J-D

23 de julio de 2022 (Sábado).

Barufecuf

Tiempo: Se presentan lluvias en horas de la
mañana de 07:00 am a 09:00 am.

equipo y maquinaria: minicargador - motoniveladora
Vibro Compactador Nivel

Personal en obra: Residente de obra Topografía (2)
Auxiliar Social Auxiliar Hse operadores (3)
Ayudantes (2) Paletera (2)

Actividad en obra: Por motivo a los lloviznos presentados el contratista no pudo realizar las actividades programadas. Solo se evacua agua estancada.

[Signature]

[Signature]

24 de Julio de 2022 (Domingo)

No se realizan actividades en obra

[Signature]

[Signature]

25 de Julio de 2022 (Lunes)

Tiempo: Lloviznos en horas de la tarde de 01:30 a 04:30pm

Equipo y maquinaria: Minicargador - Motoniveladora
Vibro Compactador

Personal en obra: Residente de obra; Topografía (2)
Operador (3) Ayudantes (2) Hse (1) Social (1) Paletera (2)

Actividad en obra: Se realiza ceros en afirmado
K2+500 al K2+150.

- Se evacua agua estancada debido a los fuertes lloviznos presentados en horas de la tarde

[Signature]

26 de Julio de 2022 (Martes)

Tiempo: Se presentan lluvias en horas de la mañana de 07:00 a 09:00 am

Equipo y maquinaria: minicargador
motoniveladora - VibroCompactador

Personal en obra: Residente de obra
topografía (2) Ayudantes (2) Operador (3)
palatera (2) HSE (1) Social (1)

Actividad en obra: Se extiende y
compacta sub base del K2+630 al K2+430
- se funden losas laterales en carcamo para
proteger tubería de agua potable (8 folg)
del K2+470 hasta K2+485 ml.

27 de Julio de 2022 (Miércoles)

Tiempo: Seco.

Equipo y maquinaria: Minicargador - Motoniveladora
Vibro Compactador - Vibrador de concreto Herramientas
menores

Personal en obra: Residente de obra Topografía (2)
operadores (3) Ayudantes (10) HSE (1) Social (1)
palatera (2)

Actividad en obra: Se continúa con el Cero a
Sub base del K2+630 al K2+760.
- Se recibe Nivelación de Rieles y Sub base por
topografía del K2+630 al K2+760.

Se toman densidades en Sub base K2+590 (1-Orchis)
 Se funde del K2+485 al K2+470 Caricoma
 Se toman muestra de Slump para verificar asentamiento
 Se toman Viguetas para efecto de calidad del concreto.

[Signature]

[Signature]

28 de Julio de 2022 (Jueves).

Tiempo: Se presentan llovios en horas de la mañana de 07:00 am a 09:00 am.

Equipo y maquinaria: Minicargador - motoniveladora
 Vibro Compactador; Volquetes (2)

Personal en obra: Residente de obra topografía (2)
 Ayudantes (2) Operador (3) HSE (1) Social (1) Conductores (2)

Actividad en obra: En horas de la mañana no se pueden ejecutar actividades debido a que el suelo se encuentra saturado
 - En horas de la tarde se extiende Sub base al K2+430 al K2+300

[Signature]

[Signature]

29 de Julio de 2022 (Viernes)

Tiempo: Seco.

Equipo y Maquinaria: Minicargador Motoniveladora
 Vibro Compactador

Personal en obra: Residente de obra topografía (2)
 Ayudantes (10) Operador (3) HSE (1) Social (1)

Actividades en obra: Se instalan rieles del K2+630 al K2+560

- Se toman muestras de slump para verificar asentamiento

- Se toman viguetas para efecto de calidad del Concreto

S-A

Barryfend

30 de Julio de 2022 (Sabado)

Tiempo: Seis

Equipos en obra: Minicargador motor nivelador Vibro Compactador

Personal en obra: Peón de obra Topografía (2) Ayudante (1) Paletero (2) HSE Social

Actividades en obra: Se realiza cerco de Subbas del K2+560 al K2+300.

Se realiza corte de Junta

S-A

Barryfend

31 de Julio de 2022

- Tiempo: ocho

- Equipos en obra: Minicargador - Motor nivelador - Nivel Vibro Compactador

- Personal en obra: Peón de obra - Topografía (2) HSE Social

Actividades en obra: Se instalan rieles del K2+560 al K2+440

S-A

Barryfend

IV. GESTIÓN AMBIENTAL									
FUENTES DE MATERIALES					PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL				
UBICACIÓN:	PLANTA VIACÓN	PERMISO MINERO:	SI	DISPONIBLE	NO	ZONAS DE DEPÓSITO:	SI	NO	NA
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI			LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	NA
						APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	NA
UBICACIÓN:	TRENICAL 2, VÍA CERETE-SAN CARLOS, KILÓM.	PERMISO MINERO:	SI			CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	NA
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI			OCCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	NA
						VERTIENTES:	SI	NO	NA
						EMISIONES:	SI	NO	NA
						OTROS (Especificar cual):	SI	NO	NA
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)									
ESTADO: APROBADO									
V. GESTIÓN SOCIAL									
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		OBRA	INTER	Nº DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:		Nº DE CAPACITACIONES REALIZADAS:			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		4	0	Nº DE CAPACITACIONES REALIZADAS:		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		30		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO		VIA SAN ANTONIO, SAN ANTONIO			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		3							
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 37									
VI. GESTIÓN PRECISA									
TOTAL ESTIMADO PRECIOS A ADQUIRIR: 0									
FICHAS PRECISALES APROBADAS: 0									
ANÁLISIS APROBADOS: 0									
PRECIOS ADQUIRIDOS: 0									
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD									
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y AGENDA DIAS									
El Contratista revisa y revisa caso en afirmado del K2+780 al K2+850. Se toman densidades en afirmado. Se instala y revisa talas del K2+850 al K2+825. Se instala y revisa talas del K2+850 al K2+825 para instalar concreto. Se instala concreto del K2+850 al K2+825. Se toman muestras de aguas para efectos de calidad del concreto. Se realiza Stump para verificar el asentamiento del concreto. Se realiza sello de juntas del pavimento del K3+358 al K3+350.									
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA									
La próxima semana el contratista debe continuar con la instalación de sub base, toma de densidad, liberación de tramos de afirmado y sub base por parte de la topografía de inventaria y construcción de pavimento.									
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS									
PROGRAMADO									
EJECUTADO									
<p>CONVENCIÓNES</p> <p>ESTUDIOS Y DISEÑOS EXPLANACIÓN TRANSPORTE AFIRMADO SUB BASE PAVIMENTO EN CONCRETO SEÑALIZACION</p>									
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEP/INT-035 del Manual de Interventoría.									
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO									
<p>Vía San Antonio - Los cafetos, Se instalan y revisan rieles para colocar concreto del (K2+850 al K2+825).</p> <p>Vía San Antonio - Los cafetos, El contratista instala pavimento del (K2+850 al K2+825).</p> <p>Vía San Antonio - Los cafetos, Se toman densidades en afirmado del (K2+870 al K2+825).</p>									
<p>NOTA A LOS CONTRATISTAS Y A LOS MONITOREOS EN EL MONITORING: VERIFICAR LA CALIDAD DEL MATERIAL.</p> <p>VERIFICAR LAS ACCIONES A REALIZAR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA.</p> <p>VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE ESTEN CUMPLIENDO DE ACUERDO AL PROGRAMA DE OBRA, VERIFICAR QUE EL CONTRATISTA REALICE CONTROL DE CALIDAD DEL MATERIAL UTILIZADO.</p> <p>SE REALIZAN VERIFICACIONES POR PARTE DE LA TOPOGRAFIA DE AFIRMADO, SUB BASE Y VIBRACION DE RIELES.</p> <p>SE TOMAN DENSIDADES Y MUESTRAS DE VIGUETAS DEL CONCRETO PARA EFECTO DE CALIDAD.</p> <p>VERIFICAR QUE EL PERSONAL QUE ESTE EN OBRA CUENTA CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.</p> <p>VERIFICAR QUE EL CONTRATISTA CUENTE CON LA MAQUINARIA Y EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS.</p> <p>SE LE REQUERIRÁ AL CONTRATISTA ABRICAR LA VÍA SAN ANTONIO ZAPAL, CERRAR DERECHO YA QUE ESTA SE ENCUENTRA INTRANSITABLE POR LAS FUERTES LLUVIAS Y EL PAGO DE LAS VOLQUETES CARGADAS DE MATERIAL, PARA EL PROYECTO.</p> <p>SE OBSERVA QUE EL CONTRATISTA CUMPLE CON LA PROGRAMACION PRESENTADA CON EL PLAN DE CONTINGENCIA DEBIDO AL ATRASO SIGNIFICATIVO PRESENTEADO EN LA EVALUACION DEL SEPI.</p> <p>SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA ABRICAR LOS TRAMOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS EN LA VÍA SAN ANTONIO ZAPAL CERRAR.</p> <p>Señalar informe mensual de intervención. Archivo de Control del Obra.</p> <p>Señalar informe mensual de intervención. Archivo de Control del Obra.</p>									
<p>DIRECCIÓN DE INTERVENTORIA</p> <p>FIRMA: _____</p> <p>Nombre: MIGUEL ARMANDO VILLALBA</p> <p>Matrícula Profesional: 142502-14786 CND</p>									

[illegible]

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

	FECHA	1/07/2022 <small>(Día / Mes / Año)</small>
--	-------	---

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 9
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 172 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEDRO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2276 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI - 3B

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS		
ENTREGAR ENSAYO DE SUBBASE	viernes, 17 de junio de 2022	CUMPLIÓ
COMPLEMENTAR PROPUESTA PARA EL TUBO DE ACUEDUCTO	lunes, 13 de junio de 2022	NO CUMPLIÓ
OFICIO DE INCUMPLIMIENTO	lunes, 13 de junio de 2022	CUMPLIÓ
PLAN DE CONTINGENCIA	martes, 14 de junio de 2022	NO CUMPLIÓ
FALLOS	martes, 14 de junio de 2022	NO CUMPLIÓ
NUEVA PRUEBA DEL AFIRMADO	martes, 14 de junio de 2022	NO CUMPLIÓ
ACTAS DE VECINDAD	sábado, 11 de junio de 2022	CUMPLIÓ PARCIALMENTE
CARCAMO	martes, 14 de junio de 2022	NO CUMPLIÓ
ASEO DE OBRA	lunes, 13 de junio de 2022	CUMPLIÓ
ARREGLO DE LA VÍA	martes, 14 de junio de 2022	CUMPLIÓ PARCIALMENTE
INSTALACIÓN DE BORDILLOS	martes, 21 de junio de 2022	NO CUMPLIÓ

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
Revisión de compromisos
Avance de obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 3
		FECHA	1/07/2022 (Día / Mes / Año)
DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA <p>El comité de obra inicia con el director de la Interventoría verificando los compromisos del acta anterior y el cumplimiento de los mismos.</p> <p>El proyecto presenta un atraso del 57.2%, lo cuál es significativo y preocupante para esta Interventoría.</p> <p>La ingeniera residente de interventoría manifiesta que la vía de acceso al proyecto se encuentra en muy mal estado, que se han estado intervinieron los puntos críticos, pero que se debe continuar con el arreglo, porque la comunidad se ha estado viendo afectada por esta problemática.</p> <p>La ingeniera residente de la interventoría indica que para el vaciado del concreto es importante que se siga utilizando planta y mixers con el fin de agilizar esta actividad, que en reiteradas ocasiones presenta demoras en su ejecución.</p> <p>La interventoría fue informada hace varias semanas atrás que se había presentado un daño en una de las viviendas de la zona aledaña al proyecto por parte de un operario del contratista, se le solicita al contratista dar pronta solución a este asunto.</p> <p>La inspectora SST de la interventoría indica que la sede del Servicio de Atención al Usuario (SAU) se encuentra en muy malas condiciones y solicita el arreglo de éste, el ingeniero residente del contratista indica que lo van a reparar y que será reubicado en la vereda El Zapal.</p>			

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	3 de 3
			FECHA	1/07/2022 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día / Mes / Año)	RESPONSABLES
Construcción del cárcamo	martes, 5 de julio de 2022	CONTRATISTA
Plan de contingencia	miércoles, 6 de julio de 2022	CONTRATISTA
Procedimiento de fallos	jueves, 7 de julio de 2022	CONTRATISTA
Prueba del afirmado	miércoles, 6 de julio de 2022	CONTRATISTA
Entrega de seguimientos de actas de vecindad	miércoles, 6 de julio de 2022	CONTRATISTA
Instalación de bordillos	miércoles, 6 de julio de 2022	CONTRATISTA
Juntas del pavimento	martes, 5 de julio de 2022	CONTRATISTA
Arreglo del SAU	viernes, 8 de julio de 2022	CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

- Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
- Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
- Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MIGUEL DÍAZ	DIRECTOR INTERVENTORÍA	CONSORCIO ACI - 3B	
CARMELINA OVIEDO	RESIDENTE INTERVENTORIA	CONSORCIO ACI - 3B	
CAMILO VIVAS	TOPOGRAFO INTERVENTORIA	CONSORCIO ACI - 3B	
MARIA JOSE TEHERAN	INSPECTORA SST	CONSORCIO ACI - 3B	MARIA TEHERAN
ORLANDO CASTELLON	DIRECTOR DE OBRA	DAVID CASTRO	
JESUS ZAPA	INGENIERO RESIDENTE	DAVID CASTRO	
PILAR PUCHE	SUPERVISORA PLANEACIÓN	ALCALDÍA DE CERETÉ	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

	FECHA
	29/07/2022 <small>(Día / Mes / Año)</small>

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 10
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 172 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEDRO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2276 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI - 3B

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS		
Construcción del cárcamo	martes, 5 de julio de 2022	CUMPLIÓ
Plan de contingencia	miércoles, 6 de julio de 2022	NO CUMPLIÓ
Procedimiento de fallos	jueves, 7 de julio de 2022	NO CUMPLIÓ
Prueba del afirmado	miércoles, 6 de julio de 2022	NO CUMPLIÓ
Entrega de seguimientos de actas de vecindad	miércoles, 6 de julio de 2022	NO CUMPLIÓ
Instalación de bordillos	miércoles, 6 de julio de 2022	NO CUMPLIÓ
Juntas del pavimento	martes, 5 de julio de 2022	CUMPLIÓ PARCIALMENTE
Arreglo del SAU	viernes, 8 de julio de 2022	NO CUMPLIÓ

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
Revisión de compromisos Avance de obra

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</p> <p style="text-align: center;">PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</p> <p style="text-align: center;">MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA</p> <p style="text-align: center;">ACTA DE COMITÉ DE OBRA</p>	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 3
		FECHA	29/07/2022 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

El comité de obra inicia con el director de la Interventoría verificando los compromisos del acta anterior y el cumplimiento de los mismos.

El director de la interventoría indica que el contratista debe enviar la reprogramación y el flujo de caja, la reprogramación va a arrancar con atraso, por lo cual también se necesita que envíen un plan de contingencia. El contratista indica que ya ha estado trabajando en esto y se fijan los compromisos de entrega.

El director de interventoría indica que el contratista debe presentar el procedimiento de fallos explicando el proceso constructivo y acompañado del análisis unitario.

La interventoría solicita entrega de seguimiento de actas de vecindad en físico, el contratista hizo entrega por medio digital, pero se deben radicar en físico.

El director de interventoría solicita el arreglo del SAU, el contratista indica que la carpa es la que debe ser reparada, pero que la atención al ciudadano ha permanecido en el punto con el acompañamiento del profesional social que siempre está presto a atender las solicitudes de la comunidad.

Hasta la fecha se presenta un atraso del proyecto del 62.1%.

La ingeniera residente de interventoría hace las siguientes observaciones:

El desvío se encuentra en malas condiciones, la comunidad está presentando quejas y se le solicita al contratista la adecuación del desvío lo más pronto posible.

Al momento de realizar las liberaciones se ha observado que no se está cumpliendo con los anchos de la vía estipulados. En los laterales de la vía se está observando que el material está contaminado, debido a que las aguas se están estancando y se mezclan los dos afirmados.

Los rieles que se están utilizando están doblados.

El contratista indica que ha tenido inconvenientes con el suministro de material para arreglar el desvío ya que su proveedor no cuenta con volquetas sencillas que son las que pueden ingresar hasta la zona que se va a adecuar, estuvo buscando otras personas con volquetas que cumplan con este requerimiento, fueron a inspeccionar la zona pero estos no accedieron ya que el estado de la vía de acceso (Chimborazo) no está en buenas condiciones, siguen buscando con la ayuda de la junta de acción comunal del Zapal el contacto de alguien que es de la zona y se va a seguir estudiando las posibilidades. En cuanto al material contaminado, el material anterior va a ser retirado antes de instalar el material nuevo para poder cumplir con los lineamientos. Y en cuanto a los rieles doblados ya están siendo retirados del frente de trabajo.

La inspectora SST de interventoría indica que se necesita entregar el segundo informe socioambiental, solicita entrega por parte del contratista de los formatos diligenciados que van anexos al informe trimestral, también solicita entrega del informe No. 5 del PAGA que es necesario para la elaboración de dicho informe. El contratista indica que la profesional social solicita retroalimentación de la primera entrega del informe trimestral socioambiental, pero Invias no ha emitido concepto sobre si se aprueban o no los informes.

En cuanto a la parte de seguridad, se ha evidenciado que el personal ocasionalmente no utiliza elementos de protección personal. Solicita también que los profesionales del área de seguridad sean más estrictos en los frentes de trabajo. También hace un llamado de atención por el arreglo del desvío porque se presentó una situación con un habitante de la comunidad que necesitaba salir por un tratamiento médico y fue muy difícil sacarlo por el mal estado de esta vía.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	3 de 3

FECHA		29/07/2022 (Día / Mes / Año)
-------	--	---------------------------------

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día / Mes / Año)	RESPONSABLES
Entrega de reprogramación y flujo de caja	sábado, 30 de julio de 2022	Contratista
Entrega de plan de contingencia de la semana del 1 al 6	lunes, 1 de agosto de 2022	Contratista
Entrega de plan de contingencia del mes de agosto	viernes, 5 de agosto de 2022	Contratista
Instalación de bordillos	lunes, 8 de agosto de 2022	Contratista
Juntas de pavimento	miércoles, 3 de agosto de 2022	Contratista
Arreglo de carpa del SAU	viernes, 5 de agosto de 2022	Contratista
Reunión sobre actas de vecindad interventoría, contratista	viernes, 29 de julio de 2022	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

- Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
- Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtir de manera previa el trámite interno correspondiente.
- Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MIGUEL DÍAZ	DIRECTOR INTERVENTORÍA	CONSORCIO ACI - 3B	
CARMELINA OVIEDO	RESIDENTE INTERVENTORIA	CONSORCIO ACI - 3B	
MARIA JOSE TEHERAN	INSPECTORA SST	CONSORCIO ACI - 3B	MARIA JOSE TEHERAN
CESAR HERNANDEZ	REPRESENTANTE CONTRATISTA	DAVID CASTRO	
JUAN CARLOS MARTINEZ	SUPERVISOR PLANEACIÓN	ALCALDÍA DE CERETÉ	
PILAR PUCHE	SUPERVISORA PLANEACIÓN	ALCALDÍA DE CERETÉ	
SUGHEIDY MONTIEL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	ALCALDÍA DE CERETÉ	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENTRE INTERVENTOR Y CONTRATISTA

FECHA DE RECIBO	ASUNTO	RADICADO
2022-07-02	Mejorar las condiciones del SAU.	SAL-22-010616
2022-07-05	Requerimiento N0. 2 al nuevo plan de contingencia.	SAL-22-010684
2022-07-05	Observaciones en cuanto a segregación en sub base, horarios de liberación de afirmado, sub base y nivelación de rieles y doblez en rieles.	SAL-22-010685
2022-07-08	Requerimiento por Incumplimiento a compromisos pactados en acta de comité de obra N0.9.	SAL-22-010970
2022-07-14	Respuesta al oficio SAL-22-010335 con asunto "Requerimiento nuevo plan de contingencia".	SAL-22-011400
2022-07-14	Respuesta al oficio SAL-22-008534 con asunto "Tramo en observación por material con exceso de humedad".	SAL-22-011402
2022-07-14	Respuesta al oficio SAL-22-010335 con asunto "Requerimiento nuevo plan de contingencia".	SAL-22-011408
2022-07-14	Respuesta al oficio SAL-22-009237 con asunto "Solicitud programación de horarios de inicio y finalización de fundida de concreto".	SAL-22-011416
2022-07-16	Solicitud cambio de rieles que se encuentran doblados.	SAL-22-011565
2022-07-18	Respuesta al oficio SAL-22-009933 con asunto "Incumplimiento compromiso entrega diseño de subbase".	SAL-22-011585
2022-07-21	Consulta estado actas de vecindad	SAL-22-011902
2022-07-22	Entrega de Diseños de Material de Afirmado y Subbase del nuevo proveedor JOMEVE.	SAL-22-011917
2022-07-28	Solicitud reprogramación de obra y programa de inversiones.	SAL-22-012377

Bogotá D.C., 2 de julio de 2022

Ingeniero
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
REPRESENTANTE LEGAL
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
davidfcastrog01@gmail.com, diroperativo2021@gmail.com

Asunto: : Mejorar las condiciones del SAU.

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

En nuestro seguimiento y Control que realiza esta Interventoría a su Contrato de Obra No 172 de 2021, nos permitimos realizar el siguiente requerimiento:

1. Teniendo en cuenta que la obra debe tener un punto de atención a la comunidad para atender las necesidades o inconformidad que en esta se presente, es necesario tener en excelentes condiciones y señalizado para así poder brindar una buena atención.
2. Por otro lado se solicita la presencia en el punto del trabajador social del proyecto.

Se anexa evidencias de lo anterior mencionado.



CONSORCIO ACI-3B

Por lo anterior esta Interventoría solicita atender dicha solicitud en un plazo no mayor a un (01) día de recibido dicho comunicado.

Cordialmente,



Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 2

Anexo:

Nombre anexos:

CONSORCIO ACI-3B

Bogotá D.C., 5 de julio de 2022

Ingeniero
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
REPRESENTANTE LEGAL
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
davidfcastrog@gmail.com, dirooperativo2021@gmail.com

Asunto: Requerimiento N0. 2 al nuevo plan de contingencia.

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

Conforme al seguimiento y control que esta interventoría realiza a su Contrato de Obra No. 172 de 2021, nos permitimos realizar la siguiente observación:

Esta interventoría ha venido insistiendo en reiteradas ocasiones al contratista DAVID FERNANDO CASTRO GAVIERIA en hacer entrega de un nuevo plan de contingencia, vemos con preocupación que a la fecha usted no ha entregado el nuevo plan de contingencia el cual se le requirió el día 21 de junio por medio de radicado **SAL-22- 009802** al que se le dio un plazo de entrega no mayor a un (1) día del recibido del comunicado en mención, se ha venido insistiendo en reiteradas ocasiones con el tema del atraso que se vienen presentando en obra por medio de oficios los cuales se citan a continuación:

SAL-22-004413 del 29 de marzo de 2022

SAL-22-005313 del 11 de abril de 2022

SAL-22-005659 del 18 de abril de 2022

SAL-22-006013 del 24 de abril de 2022

SAL-22-006728 del 06 de mayo de 2022

SAL-22-006729 del 06 de mayo de 2022

SAL-22-007269 del 16 de mayo de 2022

SAL-22-007829 del 21 de mayo de 2022

SAL-22-009235 del 12 de junio de 2022

SAL-22- 009802 del 21 de junio de 2022

SAL-22-010335 del 28 de junio de 2022

Valga aclarar que el contratista presento a esta interventoría un plan de contingencia con una programación que inicio el día 10 de mayo y finalizo el 31 de mayo de 2022 a la que esta interventoría le hizo el respectivo seguimiento y se evidencio que el contratista no cumplió con lo programado en el plan de contingencia.

CONSORCIO ACI-3B

Se le informa al contratista DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA que de acuerdo con el último informe semanal presentado a INVIAS usted lleva un porcentaje de atraso del 57,2%.

Por lo anterior insistimos y solicitamos nuevamente al contratista presentar a esta interventoría un nuevo plan de choque que garantice la ejecución del proyecto dentro del plazo contractual, el cual debe ser entregado en un plazo no mayor a un (1) día del recibo del presente comunicado.

Cordialmente,



Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 2

Anexo:

Nombre anexos:



Bogotá D.C., 5 de julio de 2022

Ingeniero
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
REPRESENTANTE LEGAL
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
davidfcastrog@gmail.com, dirooperativo2021@gmail.com

Asunto: : Observaciones en cuanto a segregación en sub base, horarios de liberación de afirmado, sub base y nivelación de rieles y doblez en rieles.

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

Conforme al seguimiento y control que esta interventoría realiza a su Contrato de Obra No. 172 de 2021, nos permitimos realizar la siguiente observación:

Se le informa al contratista DAVID FERNANDO CASTRO que con el fin de evitar segregaciones en la sub-base granular esta debe satisfacer los requisitos de calidad indicados en la Tabla 320 - 2. Además, se deberán ajustar a alguna de las franjas granulométricas que se muestran en la Tabla 320 - 3 del manual de especificaciones de INVIAS esto con el fin prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y resistencia exigidos por la presente especificación, el material que produzca el Constructor deberá dar lugar a una curva granulométrica

Lo anterior es debido a que al momento de realizar las liberaciones de sub base por parte de la interventoría se han venido observando segregaciones en varios de los proyectos donde hacemos interventoría, motivo por el cual la interventoría no ha hecho las liberaciones programadas por los contratistas.

Por tal motivo se informa que si al momento de realizar las liberaciones programadas por el contratista se evidencia segregaciones en la sub base o falta de compactación en los laterales en esta, la comisión topografica de esta interventoría se verá en la penosa situación de retirarse sin realizar liberaciones hasta tanto el tramo a entregar no se encuentre en las condiciones óptimas.

Por otro lado se le recomienda al contratista cumplir con los horarios de liberación ya que se ha observado que solicitan liberación de afirmado, sub base niveles de rieles para una hora específica y al momento de la interventoría llegar no se encuentra el terreno listo.

CONSORCIO ACI-3B

También se le solicita al contratista instalar rieles rectos sin signos de doblez ya que al momento de chequear niveles de rieles se han observado rieles doblados y en mal estado..

Por tal motivo se le solicita al contratista tener en cuenta las observaciones anteriores y hacer cambio de los rieles que presenten doblez.

Lo anterior es con el fin de garantizar la calidad de las actividades a ejecutar en el proyecto del cual usted es contratista.

Cordialmente,



Miguel Armando Díaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 2

Anexo:

Nombre anexos:

CONSORCIO ACI-3B

Bogotá D.C., 8 de julio de 2022

Ingeniero
 DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
 REPRESENTANTE LEGAL
 DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
 davidfcastrog@gmail.com, dioperativo2021@gmail.com

Asunto: Requerimiento por Incumplimiento a compromisos pactados en acta de comité de obra N0.9.

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

Conforme al seguimiento y control que esta interventoría realiza a su Contrato de Obra No. 172 de 2021, nos permitimos realizar la siguiente observación:

El día 10 de junio de 2022 se realizó el comité de obra N0. 9 en las oficinas de la interventoría en el que estuvieron presentes funcionarios de la alcaldía e interventoría y contratista.

En este se tocaron varios temas entre ellos los compromisos que habían quedado pactados en el comité de obra N0. 8 los cuales se detallan en la siguiente tabla.

COMPROMISOS	FECHA	CUMPLIO/NO CUMPLIO
Entregar ensayo de sub base	viernes, 17 de junio de 2022	CUMPLIÓ
Complementar propuesta para el tubo de acueducto	lunes, 13 de junio de 2022	NO CUMPLIÓ
Oficio de incumplimiento	lunes, 13 de junio de 2022	CUMPLIÓ
Plan de contingencia	martes, 14 de junio de 2022	NO CUMPLIÓ
Fallos	martes, 14 de junio de 2022	NO CUMPLIÓ
Nueva prueba del afirmado	martes, 14 de junio de 2022	NO CUMPLIÓ

CONSORCIO ACI-3B

Actas de vecindad	sábado, 11 de junio de 2022	CUMPLIÓ PARCIALMENTE
Cárcamo	martes, 14 de junio de 2022	NO CUMPLIÓ
Aseo de obra	lunes, 13 de junio de 2022	CUMPLIÓ
Arreglo de la vía	martes, 14 de junio de 2022	CUMPLIÓ PARCIALMENTE
Instalación de bordillos	martes, 21 de junio de 2022	NO CUMPLIÓ

Como se puede observar algunos de estos compromisos no se cumplieron por tal motivo se volvieron a tocar en comité de obra No. 9 y se pactaron nuevos compromisos los cuales están detallados de la siguiente tabla.

COMPROMISOS	FECHA	RESPONSABLE
Construcción del cárcamo	martes, 5 de julio de 2022	CONTRATISTA
Plan de contingencia	miércoles, 6 de julio de 2022	CONTRATISTA
Procedimiento de fallos	jueves, 7 de julio de 2022	CONTRATISTA
Prueba del afirmado	miércoles, 6 de julio de 2022	CONTRATISTA
Instalación de bordillos	miércoles, 6 de julio de 2022	CONTRATISTA

De lo anterior se observa que ninguno de los compromisos pactados por el contratista en el acta de comité N0. 9 se cumplieron.

Se le ha insistido al contratista en reiteradas ocasiones que cumpla a cabalidad con los compromisos que ha venido adquiriendo.

Por tal motivo, solicitamos al contratista DAVID FERANDO CASTRO GAVIRIA cumplir los compromisos que no se han cumplido a la fecha, en un plazo no mayor a 1 (un) día del recibo del presente comunicado.

Cordialmente,

CONSORCIO ACI-3B

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA

G4

Radicado No. SAL-22-010970

2022-07-08 07:28:33 a. m.



Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 3

Anexo:

Nombre anexos:

Radicación relacionada: ENT-22-013060

Bogotá D.C., 14 de julio de 2022

Señor(a)
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
CL 58 11 92 ED FLORENCIA AP 604
davidfcastro01@gmail.com
CORDOBA - MONTERIA

Asunto: Respuesta al oficio SAL-22-010335 con asunto Requerimiento nuevo plan de contingencia".

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.
Cordial saludo:

Una vez revisada la información relacionada en el asunto esta Interventoría manifiesta lo siguiente:

Los materiales instalados en obra deben cumplir con las especificaciones técnicas según INVIAS, además de esto deben estar en las condiciones óptimas al momento de ser instalados. No deben presentar altos grados de humedad como se presentó tramo correspondiente del K3+390 al K3+340 en el cual se observaba exceso de humedad, motivo por el cual se ofició al contratista según radicado SAL-22-008534,

Por tal motivo esta interventoría le informa al contratista David Fernando Castro Gaviria que de aquí en adelante el material que llegue a obra con exceso de humedad y sea extendido por usted esta interventoría no procederá a realizar las densidades correspondientes y se verán atrasadas las liberaciones por parte de la topografía.

Cordialmente,



Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 2

The logo for Consorcio ACI-3B features the text "CONSORCIO ACI-3B" in a bold, blue, sans-serif font. The letters are slightly shadowed, giving it a three-dimensional appearance. The logo is positioned on the left side of the page, above the "Anexo:" label.

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA

G4

Radicado No. SAL-22-011400

2022-07-14 08:57:10 a. m.

Anexo:

Nombre anexos:

SEDE COLOMBIA – BOGOTÁ D.C., Carrera 7 No. 156-10 piso 31 Torre Krystal PBX. (571) 7460460 APARTADO AÉREO 250229
E-Mail: info@aciproyectos.com – Web: www.aciproyectos.com

SEDE PERÚ – LIMA, Avenida Benavides No. 1555 Oficina 703, TEL. (511) 2434567 – (511) 6361566 E-Mail: peru@aciproyectos.com –
Web: www.aciproyectos.pe

Radicación relacionada: ENT-22-013072

Bogotá D.C., 14 de julio de 2022

Señor(a)
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
CL 58 11 92 ED FLORENCIA AP 604
davidfcastrog01@gmail.com
CORDOBA - MONTERIA

Asunto: Respuesta al oficio SAL-22-008534 con asunto Tramo en observación por material con exceso de humedad".

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.
Cordial saludo:

Una vez revisada la información relacionada en el asunto esta Interventoría manifiesta lo siguiente:

Los materiales instalados en obra deben cumplir con las especificaciones técnicas según INVIAS, además de esto deben estar en las condiciones óptimas al momento de ser instalados. No deben presentar altos grados de humedad como se presentó tramo correspondiente del K3+390 al K3+340 en el cual se observaba exceso de humedad, motivo por el cual se ofició al contratista según radicado SAL-22-008534,

Por tal motivo esta interventoría le informa al contratista David Fernando Castro Gaviria que de aquí en adelante el material que llegue a obra con exceso de humedad y sea extendido por usted esta interventoría no procederá a realizar las densidades correspondientes y se verán atrasadas las liberaciones por parte de la topografía.

Cordialmente,



Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

The logo for Consorcio ACI-3B features the company name in a bold, blue, sans-serif font. The letters are slightly shadowed, giving it a three-dimensional appearance. The logo is positioned on the left side of the page, above the document details.

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA

G4

Radicado No. SAL-22-011402

2022-07-14 09:05:16 a. m.

Folios: 2
Anexo:
Nombre anexos:

SEDE COLOMBIA – BOGOTÁ D.C., Carrera 7 No. 156-10 piso 31 Torre Krystal PBX. (571) 7460460 APARTADO AÉREO 250229
E-Mail: info@aciproyectos.com – Web: www.aciproyectos.com

SEDE PERÚ – LIMA, Avenida Benavides No. 1555 Oficina 703, TEL. (511) 2434567 – (511) 6361566 E-Mail: peru@aciproyectos.com –
Web: www.aciproyectos.pe

Radicación relacionada: ENT-22-013060

Bogotá D.C., 14 de julio de 2022

Señor(a)
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
CL 58 11 92 ED FLORENCIA AP 604
davidfcastrog01@gmail.com
CORDOBA - MONTERIA

Asunto: Respuesta al oficio SAL-22-010335 con asunto Requerimiento nuevo plan de contingencia".

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.
Cordial saludo:

Una vez revisada la información relacionada en el asunto está Interventoría manifiesta lo siguiente:

De acuerdo a la respuesta que usted da al oficio enviado por esta interventoría con radicado SAL-22-010335 usted manifiesta que debido a la solicitud de prórroga que usted presento, se plantea una reprogramación de las actividades de obra, con el fin de completar el objeto contractual en el tiempo prorrogado, por lo cual, esta firma contratista no presentará un nuevo plan de contingencia para las actividades hasta el 31 de julio 2022. Es importante tener en cuenta que en estos términos damos alcance al comunicado del asunto y a los comunicados futuros relacionados al tema de solicitud del plan de contingencia.

De acuerdo a los siguiente esta interventoría le informa al contratista David Fernando castro que el plan de contingencia solicitado en reiteradas ocasiones por esta interventoría debe ser presentado, ya que prorroga y plan de contingencia son dos cosas distintas y teniendo en cuenta el atraso que usted presenta el cual es de en un 58,7 % es necesario presentar el nuevo plan de contingencia.

Cordialmente,



Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 2

The logo for Consorcio ACI-3B features the text "CONSORCIO ACI-3B" in a bold, blue, sans-serif font. The letters are slightly shadowed, giving it a three-dimensional appearance. The logo is positioned on the left side of the page, below a thin horizontal line.

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA

G4

Radicado No. SAL-22-011408

2022-07-14 09:46:24 a. m.

Anexo:

Nombre anexos:

SEDE COLOMBIA – BOGOTÁ D.C., Carrera 7 No. 156-10 piso 31 Torre Krystal PBX. (571) 7460460 APARTADO AÉREO 250229
E-Mail: info@aciproyectos.com – Web: www.aciproyectos.com

SEDE PERÚ – LIMA, Avenida Benavides No. 1555 Oficina 703, TEL. (511) 2434567 – (511) 6361566 E-Mail: peru@aciproyectos.com –
Web: www.aciproyectos.pe

CONSORCIO ACI-3B

Radicación relacionada: ENT-22-013099

Bogotá D.C., 14 de julio de 2022

Señor(a)
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
CL 58 11 92 ED FLORENCIA AP 604
davidfcastro01@gmail.com
CORDOBA - MONTERIA

Asunto: Respuesta al oficio SAL-22-009237 con asunto Solicitud programación de horarios de inicio y finalización de fundida de concreto".

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.
Cordial saludo:

Una vez revisada la información relacionada en el asunto está Interventoría manifiesta lo siguiente:

De acuerdo a la respuesta que usted da al oficio enviado por esta interventoría con radicado SAL-22-009237 usted le informa a esta interventoría que la programación se tiene y se hace anticipada con el proveedor, la cual, se encuentra sujeta a la disponibilidad que les especifique y les garantice dicho proveedor, por lo tanto, es importante enmarcar que dentro del periodo de 2 horas no contractuales de liberación de pista, estipulado por la interventoría, su consorcio tiene toda la disponibilidad en hacer en el menor tiempo posible la fundición del concreto bajo las especificaciones establecidas por la interventoría, con la finalidad de evitar que los cambios de climas que actualmente afectan al país generen un atraso en el proyecto, a lo que cabe resaltar, que se ha implementado el trabajo en horario nocturno por lo anteriormente expresado.

A lo anterior esta interventoría le solicito una programación para llevar un control y organización de las fundidas que se realicen en el proyecto San Antonio – Cedro por lo tanto esta interventoría requiere una programación por parte del contratista o la que les suministra el proveedor del concreto.

Cordialmente,



Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

The logo for Consorcio ACI-3B features the company name in a bold, blue, sans-serif font. The letters are slightly shadowed, giving it a three-dimensional appearance. The logo is positioned on the left side of the page, below a thin horizontal line.

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA

G4

Radicado No. SAL-22-011416

2022-07-14 10:23:29 a. m.

Folios: 2
Anexo:
Nombre anexos:

SEDE COLOMBIA – BOGOTÁ D.C., Carrera 7 No. 156-10 piso 31 Torre Krystal PBX. (571) 7460460 APARTADO AÉREO 250229
E-Mail: info@aciproyectos.com – Web: www.aciproyectos.com

SEDE PERÚ – LIMA, Avenida Benavides No. 1555 Oficina 703, TEL. (511) 2434567 – (511) 6361566 E-Mail: peru@aciproyectos.com –
Web: www.aciproyectos.pe

CONSORCIO ACI-3B

Bogotá D.C., 16 de julio de 2022

Ingeniero
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
REPRESENTANTE LEGAL
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
davidfcastrog@gmail.com, dirooperativo2021@gmail.com

Asunto: Solicitud cambio de rieles que se encuentran doblados.

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

Conforme al seguimiento y control que esta interventoría realiza a su Contrato de Obra No. 172 de 2021, nos permitimos realizar la siguiente observación:

Al momento de realizar las liberaciones de nivel de rieles se ha observado que los rieles que el contratista está utilizando para realizar las fundidas se encuentran doblados en varias ocasiones se le han hecho recomendaciones al contratista para que los cambie y a la fecha se continua presentando el mismo inconveniente.

Por tal motivo se le informa nuevamente al contratista David Fernando Castro Gaviria cambiar dichos rieles, de no ser así la comisión de topografía de esta interventoría se verá en la obligación de retirarse sin realizar las liberaciones solicitadas por el contratista.

Lo anterior es con el fin de hacer un trabajo óptimo y de buena calidad

Cordialmente,



Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

The logo for Consorcio ACI-3B features the company name in a bold, blue, sans-serif font. The letters are slightly shadowed, giving the logo a three-dimensional appearance.

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA

G4

Radicado No. SAL-22-011565

2022-07-16 08:03:42 a. m.

Folios: 2

Anexo:

Nombre anexos:

SEDE COLOMBIA – BOGOTÁ D.C., Carrera 7 No. 156-10 piso 31 Torre Krystal PBX. (571) 7460460 APARTADO AÉREO 250229
E-Mail: info@aciproyectos.com – Web: www.aciproyectos.com

SEDE PERÚ – LIMA, Avenida Benavides No. 1555 Oficina 703, TEL. (511) 2434567 – (511) 6361566 E-Mail: peru@aciproyectos.com –
Web: www.aciproyectos.pe

Radicación relacionada: ENT-22-013225

Bogotá D.C., 18 de julio de 2022

Señor(a)
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
CL 58 11 92 ED FLORENCIA AP 604
davidfcastro01@gmail.com
CORDOBA - MONTERIA

Asunto: Respuesta al oficio SAL-22-009933 con asunto Incumplimiento compromiso entrega diseño de subbase".

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.
Cordial saludo:

Una vez revisada la información relacionada en el asunto está Interventoría manifiesta lo siguiente:

De acuerdo a la respuesta que usted da al oficio enviado por esta interventoría con radicado SAL-22-009933 donde usted manifiesta que en cuanto a la presentación del diseño de mezcla para sub base cumpliendo con la especificación del manual de INVIAS, nos permitimos por consiguiente aclarar y dar por finalizado dicho requerimiento, ya que se envió el documento solicitado bajo el comunicado OFIC-DFCG-055 el 22 de junio de 2022.

Teniendo en cuenta su respuesta esta interventoría le solicita ensayos permanentes de los materiales a utilizar como lo es afirmado y sub base, en el caso del afirmado se evidencio que uno de los viajes que llego a obra venia contaminado, bastante húmedo y con presencia de arcilla.

Lo anterior es con el fin de verificar que el material a utilizar cumple con las especificaciones técnicas del INVIAS y así garantizar la calidad del mismo.

Cordialmente,



Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 2
Anexo:



Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA

G4

Radicado No. SAL-22-011585
2022-07-18 07:28:41 a. m.

Nombre anexos:

SEDE COLOMBIA – BOGOTÁ D.C., Carrera 7 No. 156-10 piso 31 Torre Krystal PBX. (571) 7460460 APARTADO AÉREO 250229
E-Mail: info@aciproyectos.com – Web: www.aciproyectos.com

SEDE PERÚ – LIMA, Avenida Benavides No. 1555 Oficina 703, TEL. (511) 2434567 – (511) 6361566 E-Mail: peru@aciproyectos.com –
Web: www.aciproyectos.pe

Radicación relacionada: ENT-22-013709

Bogotá D.C., 21 de julio de 2022

Señor(a)
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
CL 58 11 92 ED FLORENCIA AP 604
davidfcastro01@gmail.com
CORDOBA - MONTERIA

Asunto: Consulta estado actas de vecindad

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.
Cordial saludo.

Una vez revisada la información relacionada en el OFIC-DFCG-070 esta Interventoría manifiesta lo siguiente:

El día 16 de mayo de 2022 se recibieron las actas de vecindad iniciales de este proyecto, luego de esto se requirió por parte de esta interventoría realizar actas de seguimiento a las actas de vecindad, dichas actas fueron radicadas de manera digital el día 07 de julio de 2022. Por lo tanto, se solicita la entrega de las actas de seguimiento en forma física para poder darle trámite a su solicitud, ya que las actas originales deben reposar en los archivos de la interventoría.

Cordialmente,



Miguel Armando Díaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 2
Anexo:
Nombre anexos:

The logo for Consorcio ACI-3B features the company name in a bold, blue, sans-serif font. The letters are slightly shadowed, giving it a three-dimensional appearance. The logo is positioned on the left side of the page, above a horizontal line.

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA

G4

Radicado No. SAL-22-011902

2022-07-21 06:57:36 p. m.

SEDE COLOMBIA – BOGOTÁ D.C., Carrera 7 No. 156-10 piso 31 Torre Krystal PBX. (571) 7460460 APARTADO AÉREO 250229
E-Mail: info@aciproyectos.com – Web: www.aciproyectos.com

SEDE PERÚ – LIMA, Avenida Benavides No. 1555 Oficina 703, TEL. (511) 2434567 – (511) 6361566 E-Mail: peru@aciproyectos.com –
Web: www.aciproyectos.pe

Radicación relacionada: ENT-22-013278

Bogotá D.C., 22 de julio de 2022

Señor(a)
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
CL 58 11 92 ED FLORENCIA AP 604
davidfcastro01@gmail.com
CORDOBA - MONTERIA

Asunto: Entrega de Diseños de Material de Afirmado y Subbase del nuevo proveedor JOMEVE.

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.
Cordial saludo:

Una vez revisada la información relacionada en el asunto está Interventoría manifiesta lo siguiente:

De acuerdo a la respuesta que usted da al oficio enviado por esta interventoría con radicado SAL-22-010970 del 8 de julio de 2022. En la que usted hace entrega de los nuevos diseños de materiales de Afirmado y Sub base donde informa que teniendo como premisa el cambio de proveedor de dichos materiales, el cual será entregado por la empresa JOMEVE, que en competencia a mejorar el rendimiento y la producción del material para evitar atrasos, el cual usted utilizara estratégicamente para abastecimiento en la construcción del proyecto en referencia, con el compromiso de cumplir en los tiempos establecidos. Anexando los siguientes archivos de diseños de materiales:

- DISEÑO COMPLETO AFIRMADO JOMEVE
- DISEÑO COMPLETO SUBBASE JOMEVE

De acuerdo a su respuesta esta interventoría le informa al contratista David Fernando Castro Gaviria que el material en mención no puede ser utilizado hasta no tener la comprobación de esta interventoría.

Lo anterior es con el fin de verificar que dicho material cumpla con los respectivos estándares de calidad y con las especificaciones técnicas del INVIAS.

Cordialmente,

CONSORCIO ACI-3B

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA

G4

Radicado No. SAL-22-011917

2022-07-22 07:57:43 a. m.



Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 2

Anexo:

Nombre anexos:



Bogotá D.C., 28 de julio de 2022

Ingeniero
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
REPRESENTANTE LEGAL
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
davidfcastro@gmail.com, dirooperativo2021@gmail.com

Asunto: Solicitud reprogramación de obra y programa de inversiones.

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

Conforme al seguimiento y control que esta interventoría realiza a su Contrato de Obra No. 172 de 2021, nos permitimos realizar la siguiente observación:

De acuerdo a la solicitud de prórroga hecha por el señor DAVID FERNANDO CASTRO en tiempo de cinco (5) meses más del estipulado, a partir del 01 de agosto de 2022, con fecha de terminación el 31 de diciembre de 2022, esta interventoría le solicita al contratista hacer entrega de la reprogramación de obra y del programa de inversión, de acuerdo a la fecha de terminación del contrato de obra 172 de 2021.

Lo anterior es con el fin de llevar un control de las actividades y tiempo de ejecución de las mismas, y de esta manera continuar con el seguimiento al contrato de obra.

Por tal motivo se le solicita al contratista DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA hacer entrega de dicha documentación en un tiempo no mayor a un (1) día del recibo del presente comunicado.

Cordialmente,

CONSORCIO ACI-3B

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA

G4

Radicado No. SAL-22-012377

2022-07-28 11:35:30 a. m.



Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 2

Anexo:

Nombre anexos:

	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO A	Código:	FLB-012
	AFIRMADO	Versión:	2
		Fecha:	10 ene 22

EMPRESA: DAVID CASTRO

OBRA: CONTRATO No 172 DE 2021 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIAS QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO EL CERDRO ,CORREGIMIENTO DE RABO LARGO , MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA."

INFORME No 1

DESCRIPCIÓN: _____ **MUESTRA No** 1


FUENTE: JOMEVE **SOLICITUD No** 1

FECHA DE TOMA: lunes, 4 de julio de 2022 **FECHA DE ENSAYO:** 4/07/2022

LOCALIZACIÓN: STOCK PATIO

NORMA DE ENSAYO E-213							
TAMIZ		PESO RETENIDO	% RETENIDO		% PASA	FRANJA GRANULOMÉTRICA ESPECIFICADA	
mm.	No.		TOTAL	ACUMULADO		ART 311 Afirmado A-38	
PORCENTAJE QUE PASA							
50	2"	0	0,0	0,00	100,0	100	100
37,5	1 1/2"	0,00	0,0	0,00	100,0	100	100
25,0	1"	0,00	0,0	0,00	100,0	100	100
19,1	3/4"	232,93	3,6	3,56	96,4	80	100
9,5	3/8"	1.101,20	16,8	20,40	79,6	60	85
4,8	No.4	1.521,60	23,3	43,66	56,3	40	65
2,00	No.10	698,82	10,7	54,35	45,7	30	50
0,425	No.40	1.359,80	20,8	75,14	24,9	13	30
0,075	No.200	887,80	13,6	88,72	11,3	9	18
FONDO		738,01	11,3	100,00			

6.540

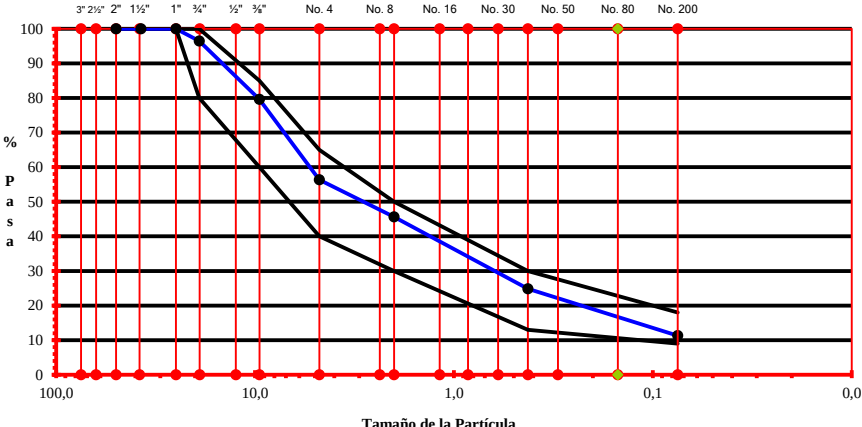

LÍMITE LÍQUIDO	25,48%	Cu =	D60 / D10	ÍNDICE DE GRUPO	_____
LÍMITE PLÁSTICO	19,90%	Cg =	(D30)^2 * D10	CLASIFICACIÓN AASHTO	_____
ÍNDICE PLÁSTICO	5,58%	Cg =	(D30) ^2 * D10	CLASIFICACIÓN USC	_____

CUMPLE ESPECIFICACIÓN (S/N) **N**

OBSERVACIONES:

EL MATERIAL CUMPLE CON EL LIMITE LIQUIDO MAXIMO ESTABLECIDO POR EL ART 311-13 DE LA NORMA INVIAS PARA MATERIAL DE AFIRMADO

EL MATERIAL CUMPLE CON EL INDICE DE PLASTICIDAD ESTABLECIDO POR EL ART 311-13 DE LA NORMA INVIAS PARA MATERIAL DE AFIRMADO

EL MATERIAL SE AJUSTA EN SU TOTALIDAD A LOS LIMITES DE GRANULOMETRIA ESTABLECIDOS PARA MATERIAL DE AFIRMADO A 38 DEL ART. 311-13 DE LA NORMA DE INVIAS.

ESPECIFICACIONES

ENSAYOS ASOCIADOS: INV E - 125 Y 126

RESPONSABLE DE ENSAYOS: _____

JULIO GIL
ELABORÓ: JULIO GIL
LABORATORISTA


APROBO: ING. DAYANE OBAÑAL BERNAL
INGENIERO

	VIAS EN ASFALTO Y CONCRETO						Código: FLB-011	
	ENSAYO DE LIMITES DE CONSISTENCIA Y HUMEDAD NATURAL						Versión: 2	
							Fecha: 10-ene-22	

EMPRESA:	DAVID CASTRO		
OBRA:	CONTRATO No 172 DE 2021 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIAS" QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO EL CERDRO ,CORREGIMIENTO DE RABO LARGO , MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA."		
DESCRIPCIÓN:	0		
FUENTE:	JOMEVE		
FECHA DE TOMA:	lunes, 04 de julio de 2022		
LOCALIZACIÓN:	STOCK PATIO		
MÉTODO DE SECADO:	HORNO		
EQUIPO UTILIZADO:	EN CODIGOS		
INFORME No	1		
MUESTRA No	1		
SOLICITUD No	1		
FECHA DE ENSAYO:	lunes, 04 de julio de 2022		

NORMA DE ENSAYO	E - 125	HUMEDAD NATURAL	LÍMITE LÍQUIDO				LÍMITE PLÁSTICO		
	E - 126		1	2	3	4	5		
MUESTRA No.									
PESO RECIPIENTE, grs. (Wc)		350	15,44	15,74	15,66		8,47	8,79	
PESO RECIPIENTE + MUESTRA HÚMEDA, grs (W1)		4642	30,42	32,7	34,58		18,8	18,9	
PESO RECIPIENTE + MUESTRA SECA AL HORNO, grs. (W2)		4410	27,55	29,3	30,48		17,15	17,16	
PESO DEL AGUA, grs. (Ww) = W1 - W2		232	0	2,87	3,4	4,1	0	1,65	1,74
PESO DE LA MUESTRA SECA, grs (Ws) = W2 - Wc		4060	0	12,11	13,56	14,82	0	8,68	8,37
NÚMERO DE GOLPES, Und			35	25	15				
HUMEDAD NATURAL, % (W) = (Ww / Ws)*100		5,7%	0	23,7	25,1	27,7	0	19,0	20,8
									0,0

VALORES SEGÚN ESPECIFICACION DEL MATERIAL		
HUMEDAD NATURAL PROMEDIO %	5,71%	
LÍMITE LÍQUIDO, % (L.L.)	25,48%	
LÍMITE PLÁSTICO, % (L.P.)	19,90%	
ÍNDICE DE PLASTICIDAD % , I.P. = L.L. - L.P.	5,58%	
% PASA TAMIZ No 200:	11,28%	
CLASIFICACION U.S.C		
CUMPLE ESPECIFICACIÓN(S/N):		NA

NOTAS ADICIONALES

OBSERVACIONES: _____


ESPECIFICACIONES _____

ENSAYOS ASOCIADOS: GRADACION

RESPONSABLE DE ENSAYOS: _____

JULIO GIL
ELABORÓ: JULIO GIL
LABORATORISTA

APROBÓ: ING. DAYANE OBAJI BERNAL
INGENIERO

	DESGASTE EN LA MAQUINA DE LOS ANGELES	Código: FLB-019 Versión: 2 Fecha: 10 ene 22						
EMPRESA: DAVID CASTRO								
OBRA: CONTRATO No 172 DE 2021 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIAS QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO EL CERDRO ,CORREGIMIENTO DE RABO LARGO , MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA." INFORME No 1								
DESCRIPCIÓN: 0 MUESTRA No 1								
FUENTE: JOMEVE SOLICITUD No 1								
FECHA DE TOMA: 4/07/2022 FECHA DE ENSAYO: 4/07/2022								
LOCALIZACIÓN: STOCK PATIO								
ESPECIFICACIÓN DEL MATERIAL INVIAS 311								
MUESTRA	1	2	3	4	5	6	7	
Gradación usada	A							
No. de esferas	12							
No. de revoluciones	500							
Pa= masa muestra seca antes del	5000							
Pb= masa muestra seca después	2988							
Pa - Pb = pérdida	2012							
% Desgaste= (Pa-Pb)/Pa	40,2%							
Valor según especificación	< 50							
Cumple especificación (s/n)	S							
DATOS SOBRE GRADACION, CARGA ABRASIVA Y REVOLUCIONES								
NORMA DE ENSAYO: E - 218 E - 219								
TAMAÑOS		PESO Y GRADACION DE LA MUESTRA (g)						
PASA	RETIENE	A	B	C	D	E	F	G
63 mm (2 ½")	63,5 mm (2 ½")					2500		
63,5m (2 ½")	50.8 mm (2")					2500		
50.8 mm (2")	38.1 mm (1 ½")					5000	5000	
38.1 mm (1 ½")	25,4 mm (1")	1250					5000	5000
25,4 mm (1")	19 mm (¾")	1250						5000
19 mm (¾")	12.7 mm (½")	1250	2500					
12.7 mm (½")	9.5 mm (3/8")	1250	2500					
9.5 mm (3/8")	6.4 mm (No. 3)			2500				
6.4 mm (No. 3)	4.75 mm (No. 4)			2500				
4.75 mm (No. 4)	2.4 mm (No. 8)				5000			
No. DE ESFERAS		12	11	8	6	12	12	12
No. DE REVOLUCIONES		500	500	500	500	1000	1000	1000
OBSERVACIONES: EL MATERIAL CUMPLE CON EL DESGASTE MAXIMO EN LA MAQUINA DE LOS ANGELES ESTABLECIDOS POR EL ART. 311-13 DE LA NORMA INVIAS, PARA MATERIAL DE AFIRMADO.								
ESPECIFICACIONES								
ENSAYOS ASOCIADOS:								
RESPONSABLE DE ENSAYOS:								
JULIO GIL				 APROBO: ING. DAYANE OBAÑAL BERNAL INGENIERO				
ELABORÓ: JULIO GIL LABORATORISTA								



VIAS EN ASFALTO Y CONCRETO

ENSAYO DE COMPACTACION

Código:FLB-007

Versión:2

Fecha:10-ene-22

EMPRESA:DAVID CASTRO

OBRA:CONTRATO No 172 DE 2021 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIAS QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO EL CERDRO CORREGIMIENTO DE RABO LARGO, MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA."

DESCRIPCIÓN:0

FUENTE:JOMEVE

FECHA DE TOMA:5/07/2022

LOCALIZACIÓN:STOCK PATIO

INFORME No:1

MUESTRA No:1

FECHA DE ENSAYO:5/07/2022

PESO MARTILLO No. 110 LbsALTURA DE CAÍDA18 PlgDIÁMETRO:6 Plg


EQUIPO UTILIZADO:Equipos en Codigos

NORMA DE ENSAYO I.N.V.E-142									
ENSAYO	UND	1	2	3	4	5	6	7	8
DENSIDAD							C.-B.-R.		
No. de Capas:		5	5	5		5	5	5	
Golpes por Capa:		56	56	56		56	25	10	
Molde No.		1	2	3		4	5	6	
Peso molde + suelo compactado	Grs.	7308	7603	7471		8559	8503	8307	
Peso del molde	Grs.	2938	2938	2938		3870	3870	3870	
Peso del suelo compactado	Grs.	4370	4665	4533		4689	4633	4437	
Volumen suelo compactado	Cm3	2085	2085	2085		2105	2105	2105	
Densidad suelo húmedo	Grs./cm3	2,096	2,237	2,174		2,228	2,201	2,108	
Contenido de humedad	%	3,65	6,78	10,71		6,9	6,7	6,5	
Densidad suelo seco	Grs./cm3	2,022	2,095	1,964		2,083	2,063	1,979	
Densidad suelo seco	Lbs./pie3	126,2	130,7	122,5		130,01	128,72	123,46	
CONTENIDO DE HUMEDAD									
Peso recipiente + suelo húmedo	Grs.	431,00	395,00	312,00		338,3	348,3	334,2	
Peso recipiente + suelo seco	Grs.	417,00	372,00	285,00		318,8	328,8	316,0	
Peso del recipiente	Grs.	33,60	32,90	32,90		37,44	37,44	37,44	
Peso del suelo seco	Grs.	383,40	339,1	252,1		281,4	291,4	278,6	
Peso del agua evaporada	Grs.	14,00	23,00	27,00		19,46	19,50	18,20	
Contenido de humedad	%	3,7	6,8	10,7		6,9	6,7	6,5	

RESULTADOS OBTENIDOS

HUMEDAD ÓPTIMA	6,8
DENSIDAD MÁXIMA (Lb/pie3)	130,8

COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO

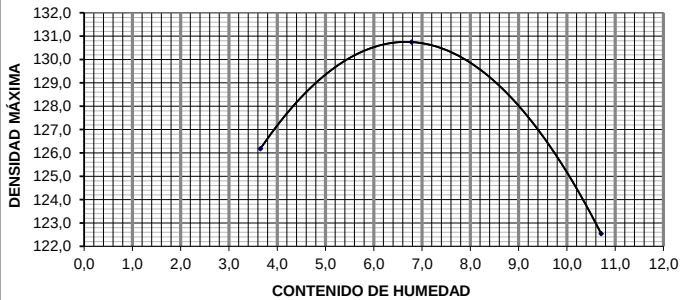

OBSERVACIONES:

ESPECIFICACIONES

ENSAYOS ASOCIADOS:

RESPONSABLE DE ENSAYOS:

JULIO GIL

ELABORÓ: JULIO GIL

LABORATORISTA



APROBÓ: ING. DAYANE OBAJI BERNAL

INGENIERO

	VIAS EN CONCRETO Y ASFALTO				Código:	FLB-020
	ENSAYO " CBR " PENETRACION				Versión:	1
					Fecha:	6-feb-06

EMPRESA:	DAVID CASTRO				
OBRA:	CONTRATO No 172 DE 2021 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIAS QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO EL CERDRO ,CORREGIMIENTO DE RABO LARGO , MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA"				
DESCRIPCIÓN:	0	MUESTRA No	1		
FUENTE:	JOMEVE	SOLICITUD No	1		
FECHA DE TOMA:	4/07/2022	FECHA DE ENSAYO:	8/07/2022		
LOCALIZACIÓN:	STOCK PATIO				

NORMA DE ENSAYO : E - 148											
EQUIPO UTILIZADO: Balanza digital No. 01 trípode con DIAL 01											
EXPANSIÓN											
Fecha:	8/07/2022	Molde No. 1	Molde No. 2		Molde No. 3		% EXPANSIÓN				
Hora:	10:00 a. m.	Lec. inicial	0	%expan.	Lec. inicial	0	%expan.	Lec. inicial	0	%expan.	PROMEDIO
Días transcurridos:	1	Lec. final.	10	0,20	Lec. final.	10	0,20	Lec. final.	8	0,16	0,19

NOTA = altura de la muestra = 5 pulgadas = 12.70 cm

PENETRACIONES - CARGAS - C.B.R.													
EQUIPO UTILIZADO: Balanza digital No. 01, prensa marshall No.01													
Tiempo	Penet. en Pulg.	Molde No. 1 (55)				Molde No. 2 (26)				Molde No. 3 (10)			
		Lect. DIAL	L. Corr	Carga lb/pul2	C.B.R.	Lect. DIAL	L. Corr	Carga lb/pul2	C.B.R.	Lect. DIAL	L. Corr	Carga lb/pul2	C.B.R.
30"	0,025	855	855	284,9		627	627	209		196	196	65	
60"	0,050	1093	1093	364,3		885	885	295		261	261	87	
1' 30"	0,075	1251	1251	416,9		1098	1098	366		339	339	113	
2'	0,100	1461	1461	487,1	49	1221	1221	407	41	434	434	145	14
4'	0,200	1894	1894	631,4	42	1687	1687	562	37	931	931	310	21
6'	0,300	2214	2214	738,0		1871	1871	624		1215	1215	405	
8'	0,400	2403	2403	801,0		2070	2070	690		1491	1491	497	
10'	0,500	2579	2579	859,6		2226	2226	742		1674	1674	558	
PESO FINAL CILINDRO + MUESTRA HUMEDA													
HUMEDAD FINAL		6,92				6,69				6,53			

CURVAS DE PENETRACIÓN CBR

VALORES DE C.B.R. CORREGIDO			
	CANT GOLPES	0.1"	0.2"
○	55 Golpes/Capa	49	42
□	26 Golpes/Capa	41	37
△	10 Golpes/Capa	14	21

OBSERVACIONES:	
ESPECIFICACIONES	
ENSAYOS ASOCIADOS:	
RESPONSABLE DE ENSAYOS:	


JULIO GIL

ELABORÓ: JULIO GIL

LABORATORISTA

APROBÓ: ING. DAYANE OBAÑI BERNAL

INGENIERO

	SANIDAD DEL AGREGADO GRUESO: ANÁLISIS CUANTITATIVO						Código:		
							Versión:		
							Fecha:		
<p>OBRA: CONTRATO No 172 DE 2021 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIAS QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO EL CERDRO ,CORREGIMIENTO DE RABO LARGO , MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA."</p> <p>EJECUTADO POR: <u>Julio gill</u></p> <p>REVISADO POR: _____ FECHA: <u>4 de julio de 2022</u></p> <p>DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA: <u>STOCK PATIO</u> PROCEDENCIA: <u>JOMEVE</u></p> <p>ESPECIFICACIÓN: _____ ABSCISA: _____ Sulf. Sodio _____</p> <p>EQUIPO UTILIZADO: <u>Balanza No. 02, serie de tamices No.01</u> Sulf. Magnesio <u>X</u></p>									
NORMA DEL ENSAYO: E - 220									
FRACCIÓN		GRADACIÓN ORIGINAL %	PESO DE LA FRACCIÓN ENSAYADA (GRS)		No. DE PARTICULAS	PESO RETENIDO DESPUÉS DEL ENSAYO (GRS)	PÉRDIDA TOTAL %	PÉRDIDA CORREGIDA %	No. DE PARTÍCULAS
PASA	RETIENE	A	B	C	D	E	F	G	H
19 mm (1")	12.5 mm (3/4")	3,56	1500	1500		1304,6	13,03	1,1	
12.5 mm (3/4")	9.5 mm (3/8")	16,84	1000	1000		939,6	6,04	2,3	
9.5 mm (3/8")	4.75 mm (No. 4)	23,27	300	300		279,5	6,83	3,6	
TOTALES		43,66452808	2800					7,0	
<p>C: Contadas antes del ensayo. RANGO ESPECIFICADO PARA EL MATERIAL: < 18%</p> <p>E: Fracciones pesadas después del ensayo.</p> <p>H: Se cuentan todas aquellas no desintegradas después del CUMPLE EL MATERIAL LA ESPECIFICACIÓN (S/N): SI</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div> $F = \frac{C - E}{C} * 100$ </div> <div> $G = \frac{A * F}{41,3} = 7,0$ </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <u>JULIO GIL</u> Nombre y Firma LABORATORISTA </div> <div style="text-align: center;">  Nombre y Firma INGENIERO </div> </div>									

**Informe de Resultados****F-ED-DNS-005**

Fecha: 2/07/2022

Pag. 1 de 2

Geotecnologia Ingenieria y Control S.A.S
NIT: 900.950.052-3

Calle. 2B 12-18 B. Los Garzones, Montería - Córdoba
Tel. (604)7973746 Cel. 3184316345 – 3162324365

CONSORCIO ACI-3B

Carrera 7 N° 156-10 Piso 31 Edf. Torre Krystal North Point
Tel: - 7460460

Obra:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO D VÍAS
TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS
DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - GRUPO 4 DERIVADO DEL

Muestra ID.

Tipo de Estructura:
Localización de la Obra:
Fuente de materiales:

DENSIDAD-M-008-1 - Km 2+970 Derecha

Material Subbase Granular
Proyecto Vereda El Cedro-Municipio de Cereté, Córdoba
Cantera Villa Carmen, Montería

Muestra ID.

Tipo de Estructura:
Localización de la Obra:
Fuente de materiales:

DENSIDAD-M-008-2 - Km 2+940 Izquierda

Material Subbase Granular
Proyecto Vereda El Cedro-Municipio de Cereté, Córdoba
Cantera Villa Carmen, Montería

Fecha de Elaboración
Fecha de Análisis
Resultados de los Ensayos

2-jul.-22
2-jul.-22
Consulte la(s) Página(s) Siguiente(s)


M.S. N° 19316-00111 CPSL

Fredy Rodriguez Rubio
Jefe de Laboratorio

ADVERTENCIA: Las conclusiones registradas en este documento, Resultados de ensayos, corresponden estrictamente a las muestras proporcionadas por el cliente y no constituyen garantía de la representatividad del material. Cualquier alteración, del mismo, lo invalida completamente.

GEOTECNOLOGIA INGENIERIA Y CONTROL S.A.S

Tel. (604)7976746 Cel. 3135563977 – 3162324365 Calle. 2B 12-18 B. Los Garzones-Montería Córdoba



Informe de Resultados

F-ED-DNS-005

Fecha: 2/07/2022

Pag. 2 de 2

Resultados de los Ensayos

Densidad o Masa Unitaria del Suelo en el Terreno Método del Cono y Arena

Norma de Ensayo: INV E-161-13

Especificación: INV Art. 320.5.2.2.3

Muestra ID.

DENSIDADES SUBBASE GRANULAR

Item(s) de Ensayo	Unid	Resultado							Especificación
Nº de Prueba	#	1	2	-	-	-	-	-	
Profundidad de la Prueba	cm	15	15	-	-	-	-	-	
Peso Frasco y Arena Inicial	cm	5378	5355	-	-	-	-	-	SI : GCm - (K(p)*S) ≥ 0,90
Peso Frasco y Arena Restante	cm	1242	1230	-	-	-	-	-	
Peso Arena Total Usada (A-B)	M1 g	4136	4125	-	-	-	-	-	
Constante del Cono	M2 cm	1734		-	-	-	-	-	
Densidad de la Arena	ρ1 g/cm³	1,413		-	-	-	-	-	
Volumen del Hueco (M1-M2/ρ1)	V cm³	1700	1692	-	-	-	-	-	
Peso Material Grueso Ret. 3/4"	MDC g	263	270	-	-	-	-	-	-
Peso Material Fino	MDF g	3764	3767	-	-	-	-	-	
Gravedad Especifica Bulk (g/cm³)	GM g/cm³	2,600	2,600	-	-	-	-	-	
Humedad de la Fracción Gruesa	WG %	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-
Peso Material Extraído Humedo	M3 g	4027	4037	-	-	-	-	-	GCm= 99,9
Peso Material Extraído Seco	M4 g	3729	3738	-	-	-	-	-	
Porcentaje Retenido Grueso (Ret. 3/4")	PFG %	7,0	7,2	-	-	-	-	-	
Porcentaje Partículas Finas	PFE %	93,0	92,8	-	-	-	-	-	
Humedad Total (Finos y Gruesos)	w %	8,0	8,0	-	-	-	-	-	S= 0,01
Contenido de Humedad de la Fracción Fina	WF %	8,5	8,5	-	-	-	-	-	n= 2
Densidad Humeda In situ del Mat. Ensayado	ρm g/cm³	2,369	2,386	-	-	-	-	-	k= 1,229
Densidad Seca In situ del Mat. Ensayado	ρd g/cm³	2,1934	2,209	-	-	-	-	-	
Peso Unitario Seco en el Sitio	γd lbf/pie³	136,9	137,9	-	-	-	-	-	GCI(90),% 99,89
Peso Unitario Seco de la Fracción Fina de la Muestra de Campo	γF g/cm³	2,168	2,184	-	-	-	-	-	
Peso Unitario Seco de la Fracción Fina de la Muestra de Campo	γF lbf/pie³	135,3	136,3	-	-	-	-	-	-
DENSIDAD MAXIMA DE LABORATORIO	γd,m g/cm³	2,178		-	-	-	-	-	-
CONTENIDO OPTIMO DE AGUA (Humedad)	wopt %	6,70		-	-	-	-	-	
COMPACTACION DEL TERRENO (GCI)	%	100	100	-	-	-	-	-	SE ACEPTA LOTE

Equipo Cono y Arena Utilizado:

5

Densidad de la Arena:

g/cm³ 1,413

Constante del Cono:

g 1734,0

Fecha Verificación del Cono:

22-jun.-22

ADVERTENCIA: Las conclusiones registradas en este documento, Resultados de ensayos, corresponden estrictamente a las muestras proporcionadas por el cliente y no constituyen garantía de la representatividad del material. Cualquier alteración, del mismo, lo invalida completamente.

GEOTECNOLOGÍA INGENIERÍA Y CONTROL S.A.S

Tel. (604)7973746 Cel. 3135563977 - 3162324365 Calle. 2B 12-18 B. Los Garzones-Montería Córdoba

**Informe de Resultados****F-ED-DNS-005**

Fecha: 8/07/2022

Pag. 1 de 2

Geotecnologia Ingenieria y Control S.A.S
NIT: 900.950.052-3

Calle. 2B 12-18 B. Los Garzones, Montería - Córdoba
Tel. (604)7973746 Cel. 3184316345 – 3162324365

CONSORCIO ACI-3B

Carrera 7 N° 156-10 Piso 31 Edf. Torre Krystal North Point
Tel: - 7460460

Obra:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO D VÍAS
TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS
DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - GRUPO 4 DERIVADO DEL

Muestra ID.

Tipo de Estructura:
Localización de la Obra:
Fuente de materiales:

DENSIDAD-M-006-1 - Km 2+825 Izquierda

Material Tipo Afirmado
Proyecto Vereda El Cedro-Municipio de Cereté, Córdoba
Cantera Villa Carmen, Montería

Muestra ID.

Tipo de Estructura:
Localización de la Obra:
Fuente de materiales:

DENSIDAD-M-006-2 - Km 2+860 Derecha

Material Tipo Afirmado
Proyecto Vereda El Cedro-Municipio de Cereté, Córdoba
Cantera Villa Carmen, Montería

Fecha de Elaboración
Fecha de Análisis
Resultados de los Ensayos

8-jul.-22
8-jul.-22
Consulte la(s) Página(s) Siguiente(s)


M.S.L. N° 19316-00111 CPSL

Fredy Rodriguez Rubio
Jefe de Laboratorio

ADVERTENCIA: Las conclusiones registradas en este documento, Resultados de ensayos, corresponden estrictamente a las muestras proporcionadas por el cliente y no constituyen garantía de la representatividad del material. Cualquier alteración, del mismo, lo invalida completamente.

GEOTECNOLOGIA INGENIERIA Y CONTROL S.A.S

Tel. (604)7976746 Cel. 3135563977 – 3162324365 Calle. 2B 12-18 B. Los Garzones-Montería Córdoba



Informe de Resultados

F-ED-DNS-005

Fecha: 8/07/2022

Pag. 2 de 2

Resultados de los Ensayos

Densidad o Masa Unitaria del Suelo en el Terreno Método del Cono y Arena

Norma de Ensayo: INV E-161-13

Especificación: INV Art. 311.5.2.2.3

Muestra ID.

DENSIDADES AFIRMADO

Item(s) de Ensayo	Unid	Resultado								Especificación
Nº de Prueba	#	1	2	-	-	-	-	-	-	
Profundidad de la Prueba	cm	15	15	-	-	-	-	-	-	
Peso Frasco y Arena Inicial	cm	6163	6155	-	-	-	-	-	-	SI : GCm - (K(p)*S) ≥ 0,90
Peso Frasco y Arena Restante	cm	2113	2049	-	-	-	-	-	-	
Peso Arena Total Usada (A-B)	M1 g	4050	4106	-	-	-	-	-	-	
Constante del Cono	M2 cm	1605		-	-	-	-	-	-	
Densidad de la Arena	ρ1 g/cm³	1,377		-	-	-	-	-	-	
Volumen del Hueco (M1-M2/ρ1)	V cm³	1776	1816	-	-	-	-	-	-	
Peso Material Grueso Ret. 3/4"	MDC g	211	479	-	-	-	-	-	-	-
Peso Material Fino	MDF g	3858	3767	-	-	-	-	-	-	
Gravedad Especifica Bulk (g/cm³)	GM g/cm³	2,600	2,600	-	-	-	-	-	-	
Humedad de la Fracción Gruesa	WG %	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-
Peso Material Extraído Humedo	M3 g	4069	4246	-	-	-	-	-	-	GCm= 97,3
Peso Material Extraído Seco	M4 g	3768	3913	-	-	-	-	-	-	
Porcentaje Retenido Grueso (Ret. 3/4")	PFG %	5,5	12,1	-	-	-	-	-	-	
Porcentaje Partículas Finas	PFE %	94,5	87,9	-	-	-	-	-	-	
Humedad Total (Finos y Gruesos)	w %	8,0	8,5	-	-	-	-	-	-	S= 0,00
Contenido de Humedad de la Fracción Fina	WF %	8,4	9,4	-	-	-	-	-	-	n= 2
Densidad Humeda In situ del Mat. Ensayado	ρm g/cm³	2,292	2,338	-	-	-	-	-	-	k= 1,229
Densidad Seca In situ del Mat. Ensayado	ρd g/cm³	2,1219	2,1546	-	-	-	-	-	-	
Peso Unitario Seco en el Sitio	γd lbf/pie³	132,5	134,5	-	-	-	-	-	-	GCI(90),% 97,31
Peso Unitario Seco de la Fracción Fina de la Muestra de Campo	γF g/cm³	2,099	2,105	-	-	-	-	-	-	
Peso Unitario Seco de la Fracción Fina de la Muestra de Campo	γF lbf/pie³	131,1	131,4	-	-	-	-	-	-	-
DENSIDAD MAXIMA DE LABORATORIO	γd,m g/cm³	2,160		-	-	-	-	-	-	-
CONTENIDO OPTIMO DE AGUA (Humedad)	wopt %	5,60		-	-	-	-	-	-	
COMPACTACION DEL TERRENO (GCI)	%	97	97	-	-	-	-	-	-	SE ACEPTA LOTE

Equipo Cono y Arena Utilizado:

6

Densidad de la Arena:

g/cm³ 1,377

Constante del Cono:

g 1605,0

Fecha Verificación del Cono:

11-mar.-22

ADVERTENCIA: Las conclusiones registradas en este documento, Resultados de ensayos, corresponden estrictamente a las muestras proporcionadas por el cliente y no constituyen garantía de la representatividad del material. Cualquier alteración, del mismo, lo invalida completamente.

GEOTECNOLOGÍA INGENIERÍA Y CONTROL S.A.S

Tel. (604)7973746 Cel. 3135563977 - 3162324365 Calle. 2B 12-18 B. Los Garzones-Montería Córdoba

**Informe de Resultados****F-ED-DNS-005**

Fecha: 14/07/2022

Pag. 1 de 2

Geotecnología Ingeniería y Control S.A.S
NIT: 900.950.052-3

Calle. 2B 12-18 B. Los Garzones, Montería - Córdoba
Tel. (604)7973746 Cel. 3184316345 – 3162324365

CONSORCIO ACI-3B

Carrera 7 N° 156-10 Piso 31 Edf. Torre Krystal North Point
Tel: - 7460460

Obra:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO D VÍAS
TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS
DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - GRUPO 4 DERIVADO DEL

Muestra ID.

Tipo de Estructura:
Localización de la Obra:
Fuente de materiales:

DENSIDAD-M-007-1 - Km 2+660 Derecha

Material Tipo Afirmado
Proyecto Vereda El Cedro-Municipio de Cereté, Córdoba
Cantera Villa Carmen, Montería

Fecha de Elaboración
Fecha de Análisis
Resultados de los Ensayos

14-jul.-22
14-jul.-22
Consulte la(s) Página(s) Siguiente(s)

M.S.L. N° 19316-00111 CPSL

Fredy Rodriguez Rubio
Jefe de Laboratorio

ADVERTENCIA: Las conclusiones registradas en este documento, Resultados de ensayos, corresponden estrictamente a las muestras proporcionadas por el cliente y no constituyen garantía de la representatividad del material. Cualquier alteración, del mismo, lo invalida completamente.

GEOTECNOLOGIA INGENIERIA Y CONTROL S.A.S

Tel. (604)7976746 Cel. 3135563977 – 3162324365 Calle. 2B 12-18 B. Los Garzones-Montería Córdoba

Informe de Resultados**F-ED-DNS-005**

Fecha: 14/07/2022

Pag. 2 de 2

Resultados de los Ensayos

Densidad o Masa Unitaria del Suelo en el Terreno Método del Cono y Arena

Norma de Ensayo: INV E-161-13

Especificación: INV Art. 311.5.2.2.3

Muestra ID.**DENSIDADES AFIRMADO**

Item(s) de Ensayo	Unid	Resultado							Especificación
N° de Prueba	#	1	-	-	-	-	-	-	
Profundidad de la Prueba	cm	15	-	-	-	-	-	-	
Peso Frasco y Arena Inicial	cm	6015	-	-	-	-	-	-	SI : GCm - (K(p)*S) ≥ 0,90
Peso Frasco y Arena Restante	cm	2118	-	-	-	-	-	-	
Peso Arena Total Usada (A-B)	M1 g	3897	-	-	-	-	-	-	
Constante del Cono	M2 cm	1605							
Densidad de la Arena	ρ1 g/cm³	1,377							
Volumen del Hueco (M1-M2/ρ1)	V cm³	1664	-	-	-	-	-	-	
Peso Material Grueso Ret. 3/4"	MDC g	716	-	-	-	-	-	-	-
Peso Material Fino	MDF g	3238	-	-	-	-	-	-	
Gravedad Especifica Bulk (g/cm³)	GM g/cm³	2,600	-	-	-	-	-	-	
Humedad de la Fracción Gruesa	WG %	2,00	-	-	-	-	-	-	-
Peso Material Extraído Humedo	M3 g	3954	-	-	-	-	-	-	GCm= 98,2
Peso Material Extraído Seco	M4 g	3661	-	-	-	-	-	-	
Porcentaje Retenido Grueso (Ret. 3/4")	PFG %	19,4	-	-	-	-	-	-	
Porcentaje Partículas Finas	PFE %	80,6	-	-	-	-	-	-	
Humedad Total (Finos y Gruesos)	w %	8,0	-	-	-	-	-	-	S= 0,00
Contenido de Humedad de la Fracción Fina	WF %	9,4	-	-	-	-	-	-	n= 1
Densidad Humeda In situ del Mat. Ensayado	ρm g/cm³	2,376	-	-	-	-	-	-	k= 1,271
Densidad Seca In situ del Mat. Ensayado	ρd g/cm³	2,1995	-	-	-	-	-	-	
Peso Unitario Seco en el Sitio	γd lbf/pie³	137,3	-	-	-	-	-	-	GCI(90),% 98,20
Peso Unitario Seco de la Fracción Fina de la Muestra de Campo	γF g/cm³	2,121	-	-	-	-	-	-	
Peso Unitario Seco de la Fracción Fina de la Muestra de Campo	γF lbf/pie³	132,4	-	-	-	-	-	-	-
DENSIDAD MAXIMA DE LABORATORIO	γd,m g/cm³	2,160							-
CONTENIDO OPTIMO DE AGUA (Humedad)	wopt %	5,60							
COMPACTACION DEL TERRENO (GCI)	%	98	-	-	-	-	-	-	SE ACEPTA LOTE

Equipo Cono y Arena Utilizado:

6

Densidad de la Arena:

g/cm³ 1,377

Constante del Cono:

g 1605,0

Fecha Verificación del Cono:

11-mar.-22

ADVERTENCIA: Las conclusiones registradas en este documento, Resultados de ensayos, corresponden estrictamente a las muestras proporcionadas por el cliente y no constituyen garantía de la representatividad del material. Cualquier alteración, del mismo, lo invalida completamente.

**Informe de Resultados****F-ED-DNS-005**

Fecha: 14/07/2022

Pag. 1 de 2

Geotecnologia Ingenieria y Control S.A.S
NIT: 900.950.052-3

Calle. 2B 12-18 B. Los Garzones, Montería - Córdoba
Tel. (604)7973746 Cel. 3184316345 – 3162324365

CONSORCIO ACI-3B

Carrera 7 N° 156-10 Piso 31 Edf. Torre Krystal North Point
Tel: - 7460460

Obra:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO D VÍAS
TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS
DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - GRUPO 4 DERIVADO DEL

Muestra ID.

Tipo de Estructura:
Localización de la Obra:
Fuente de materiales:

DENSIDAD-M-009-1 - Km 2+885 Izquierda

Material Subbase Granular
Proyecto Vereda El Cedro-Municipio de Cereté, Córdoba
Cantera Villa Carmen, Montería

Muestra ID.

Tipo de Estructura:
Localización de la Obra:
Fuente de materiales:

DENSIDAD-M-009-2 - Km 2+820 Derecha

Material Subbase Granular
Proyecto Vereda El Cedro-Municipio de Cereté, Córdoba
Cantera Villa Carmen, Montería

Fecha de Elaboración
Fecha de Análisis
Resultados de los Ensayos

14-jul.-22
14-jul.-22
Consulte la(s) Página(s) Siguiente(s)


M.S. N° 19316-00111 CPSL

Fredy Rodriguez Rubio
Jefe de Laboratorio

ADVERTENCIA: Las conclusiones registradas en este documento, Resultados de ensayos, corresponden estrictamente a las muestras proporcionadas por el cliente y no constituyen garantía de la representatividad del material. Cualquier alteración, del mismo, lo invalida completamente.

GEOTECNOLOGIA INGENIERIA Y CONTROL S.A.S

Tel. (604)7976746 Cel. 3135563977 – 3162324365 Calle. 2B 12-18 B. Los Garzones-Montería Córdoba



Informe de Resultados

F-ED-DNS-005

Fecha: 14/07/2022

Pag. 2 de 2

Resultados de los Ensayos

Densidad o Masa Unitaria del Suelo en el Terreno Método del Cono y Arena

Norma de Ensayo: INV E-161-13

Especificación: INV Art. 320.5.2.2.3

Muestra ID.

DENSIDADES SUBBASE GRANULAR

Item(s) de Ensayo	Unid	Resultado							Especificación
N° de Prueba	#	1	2	-	-	-	-	-	
Profundidad de la Prueba	cm	15	15	-	-	-	-	-	
Peso Frasco y Arena Inicial	cm	6083	6076	-	-	-	-	-	SI : GCm - (K(p)*S) ≥ 0,90
Peso Frasco y Arena Restante	cm	1932	1889	-	-	-	-	-	
Peso Arena Total Usada (A-B)	M1 g	4151	4187	-	-	-	-	-	
Constante del Cono	M2 cm	1605		-	-	-	-	-	
Densidad de la Arena	ρ1 g/cm³	1,377		-	-	-	-	-	
Volumen del Hueco (M1-M2/ρ1)	V cm³	1849	1875	-	-	-	-	-	
Peso Material Grueso Ret. 3/4"	MDC g	550	373	-	-	-	-	-	-
Peso Material Fino	MDF g	3835	3999	-	-	-	-	-	
Gravedad Especifica Bulk (g/cm³)	GM g/cm³	2,600	2,600	-	-	-	-	-	
Humedad de la Fracción Gruesa	WG %	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-
Peso Material Extraído Humedo	M3 g	4385	4372	-	-	-	-	-	GCm= 97,7
Peso Material Extraído Seco	M4 g	4041	4048	-	-	-	-	-	
Porcentaje Retenido Grueso (Ret. 3/4")	PFG %	13,5	9,1	-	-	-	-	-	
Porcentaje Partículas Finas	PFE %	86,5	90,9	-	-	-	-	-	
Humedad Total (Finos y Gruesos)	w %	8,5	8,0	-	-	-	-	-	S= 0,01
Contenido de Humedad de la Fracción Fina	WF %	9,5	8,6	-	-	-	-	-	n= 2
Densidad Humeda In situ del Mat. Ensayado	ρm g/cm³	2,372	2,332	-	-	-	-	-	k= 1,229
Densidad Seca In situ del Mat. Ensayado	ρd g/cm³	2,1858	2,1589	-	-	-	-	-	
Peso Unitario Seco en el Sitio	γd lbf/pie³	136,5	134,8	-	-	-	-	-	GCI(90),% 97,69
Peso Unitario Seco de la Fracción Fina de la Muestra de Campo	γF g/cm³	2,133	2,123	-	-	-	-	-	
Peso Unitario Seco de la Fracción Fina de la Muestra de Campo	γF lbf/pie³	133,2	132,5	-	-	-	-	-	-
DENSIDAD MAXIMA DE LABORATORIO	γd,m g/cm³	2,178		-	-	-	-	-	-
CONTENIDO OPTIMO DE AGUA (Humedad)	wopt %	6,70		-	-	-	-	-	
COMPACTACION DEL TERRENO (GCI)	%	98	97	-	-	-	-	-	SE ACEPTA LOTE

Equipo Cono y Arena Utilizado:

6

Densidad de la Arena:

g/cm³ 1,377

Constante del Cono:

g 1605,0

Fecha Verificación del Cono:

11-mar.-22

ADVERTENCIA: Las conclusiones registradas en este documento, Resultados de ensayos, corresponden estrictamente a las muestras proporcionadas por el cliente y no constituyen garantía de la representatividad del material. Cualquier alteración, del mismo, lo invalida completamente.

GEOTECNOLOGIA INGENIERIA Y CONTROL S.A.S

Tel. (604)7973746 Cel. 3135563977 - 3162324365 Calle. 2B 12-18 B. Los Garzones-Montería Córdoba



Geotecnología Ingeniería y Control S.A.S
Nit: 900.950.052-3

Calle. 2B 12-18 B. Los Garzones-Montería, Córdoba
Tel. (604)7973746 Cel. 3135563977 - 3162324365

F-ED-RF-002

CONSORCIO ACI-3B

Carrera 7 N° 156-10 Piso 31 Edf. Torre Krystal North Point
Tel: - 7460460

Fecha : 14/07/2022

Pag. 1 de 1

Obra:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO D VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - GRUPO 4 DERIVADO DEL CONCURSO DE MÉRITOS No. CNA-DOSRT-167-2021.

Ubicación de la Obra:

Vereda El Cedro, Municipio de Cereté, Dpto. de Córdoba

Resultados de los Ensayos

Resistencia a la Flexión del Concreto Usando una Viga Simplemente Apoyada y Cargada en los Tercios de la Luz Libre

Norma de Ensayo: INV E-414-13

Especificación: INV Art. 500-13

Muestra N°	Descripción	Fecha de Elaboración	Fecha de Ensayo	Edad (Días)	Altura (cm) d	Distancia entre Apoyos (cm) L	Ancho (cm) b	Carga (KN)	Modulo de Rotura (Kg/cm ²)		
									Edad (Días)		
									7		28
ED-RF-RM-M-001-1	CONCRETO PARA PAVIMENTO HIDRAULICO MR:38 Kg/cm ²	28/05/2022	04/06/2022	7	15,3	45,0	15,3	29,2	37,4		
ED-RF-RM-M-001-2	Concreto Premezclado Planta Viascon	28/05/2022	25/06/2022	28	15,5	45,0	15,5	32,2			39,7
ED-RF-RM-M-001-3	Km 3+473 - Km 3+488	28/05/2022	25/06/2022	28	15,5	45,0	15,3	32,9			41,1
ED-RF-RM-M-002-1	CONCRETO PARA PAVIMENTO HIDRAULICO MR:38 Kg/cm ²	31/05/2022	07/06/2022	7	15,8	45,0	15,7	29,3	34,3		
ED-RF-RM-M-002-2	Concreto Premezclado Planta Viascon	31/05/2022	28/06/2022	28	15,3	45,0	15,5	30,9			39,1
ED-RF-RM-M-002-3	0	31/05/2022	28/06/2022	28	15,3	45,0	15,3	31,6			40,5
ED-RF-RM-M-003-1	CONCRETO PARA PAVIMENTO HIDRAULICO MR:38 Kg/cm ²	02/06/2022	09/06/2022	7	15,5	45,0	15,8	27,2	32,8		
ED-RF-RM-M-003-2	Concreto Premezclado Planta Viascon	02/06/2022	30/06/2022	28	15,2	45,0	15,3	30,4			39,5
ED-RF-RM-M-003-3	0	02/06/2022	30/06/2022	28	15,2	45,0	15,2	30,5			39,9
ED-RF-RM-M-004-1	CONCRETO PARA PAVIMENTO HIDRAULICO MR:38 Kg/cm ²	03/06/2022	10/06/2022	7	15,5	45,0	16,0	27,5	32,8		
ED-RF-RM-M-004-2	Concreto Premezclado Planta Viascon	03/06/2022	17/06/2022	14	15,3	45,0	15,2	27,9		36,0	
ED-RF-RM-M-004-3	0	03/06/2022	01/07/2022	28	15,5	45,0	15,5	31,2			38,4
ED-RF-RM-M-005-1	CONCRETO PARA PAVIMENTO HIDRAULICO MR:38 Kg/cm ²	11/06/2022	18/06/2022	7	15,2	45,0	15,5	26,1	33,4		
ED-RF-RM-M-005-2	Concreto Premezclado Planta Viascon	11/06/2022	09/07/2022	28	15,4	45,0	15,4	31,1			39,1
ED-RF-RM-M-006-1	CONCRETO PARA PAVIMENTO HIDRAULICO MR:38 Kg/cm ²	16/06/2022	23/06/2022	7	15,5	45,0	15,3	26,5	33,1		
ED-RF-RM-M-006-2	Concreto Premezclado Planta Viascon	16/06/2022	14/07/2022	28	15,5	45,0	15,3	30,9			38,6
RESISTENCIA PROMEDIO (Kg/cm ²)									34,0	36,0	40,0
RESISTENCIA NOMINAL (Kg/cm ²)									38		
PORCENTAJE DE RESISTENCIA									89,4	94,7	105,2

OBSERVACIONES :

Mat. N° 19516-00111 CPSL

Fredy Rodriguez Rubio
Jefe de Laboratorio

ADVERTENCIA: Las conclusiones registradas en este documento, Resultados de ensayos, corresponden estrictamente a las muestras proporcionadas por el cliente y no constituyen garantía de la representatividad del material. Cualquier alteración, del mismo, lo invalida completamente.



Geotecnología Ingeniería y Control S.A.S
Nit: 900.950.052-3

Calle. 2B 12-18 B. Los Garzones-Montería, Córdoba
Tel. (604)7973746 Cel. 3135563977 - 3162324365

F-ED-RF-002

CONSORCIO ACI-3B

Carrera 7 N° 156-10 Piso 31 Edf. Torre Krystal North Point
Tel: - 7460460

Fecha : 29/07/2022

Pag. 1 de 1

Obra:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO D VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - GRUPO 4 DERIVADO DEL CONCURSO DE MÉRITOS No. CNA-DOSRT-167-2021.

Ubicación de la Obra:

Vereda El Cedro, Municipio de Cereté, Dpto. de Córdoba

Resultados de los Ensayos

Resistencia a la Flexión del Concreto Usando una Viga Simplemente Apoyada y Cargada en los Tercios de la Luz Libre

Norma de Ensayo: INV E-414-13

Especificación: INV Art. 500-13

Muestra N°	Descripción	Fecha de Elaboración	Fecha de Ensayo	Edad (Días)	Altura (cm) d	Distancia entre Apoyos (cm) L	Ancho (cm) b	Carga (KN)	Modulo de Rotura (Kg/cm ²)		
									Edad (Días)		
									7		28
ED-RF-RM-M-007-1	CONCRETO PARA PAVIMENTO HIDRAULICO MR:38 Kg/cm ²	23/06/2022	30/06/2022	7	15,3	45,0	15,5	27,3	34,5		
ED-RF-RM-M-007-2	Concreto Premezclado Planta Viascon	23/06/2022	21/07/2022	28	15,4	45,0	15,2	32,7			41,6
ED-RF-RM-M-008-1	CONCRETO PARA PAVIMENTO HIDRAULICO MR:38 Kg/cm ²	14/07/2022	21/07/2022	7	15,2	45,0	15,4	26,1	33,7		
ED-RF-RM-M-008-1	Km 2+885 - Km 2+830										-
ED-RF-RM-M-009-1	CONCRETO PARA PAVIMENTO HIDRAULICO MR:38 Kg/cm ²	19/07/2022	26/07/2022	7	15,4	45,0	15,4	27,5	34,6		
ED-RF-RM-M-009-1	Km 2+795 - Km 2+712										-
ED-RF-RM-M-010-1	CONCRETO PARA PAVIMENTO HIDRAULICO MR:38 Kg/cm ²	22/07/2022	29/07/2022	7	15,5	45,0	15,3	26,9	33,6		
ED-RF-RM-M-010-1	Km 2+712 - Km 2+630										-
RESISTENCIA PROMEDIO (Kg/cm ²)									34,1	-	41,6
RESISTENCIA NOMINAL (Kg/cm ²)									38		
PORCENTAJE DE RESISTENCIA									89,7	-	109,5

OBSERVACIONES :


Mat. N° 19516-00111 CPSA

Fredy Rodriguez Rubio
Jefe de Laboratorio

ADVERTENCIA: Las conclusiones registradas en este documento, Resultados de ensayos, corresponden estrictamente a las muestras proporcionadas por el cliente y no constituyen garantía de la representatividad del material. Cualquier alteración, del mismo, lo invalida completamente.
