

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, DE VÍAS Terciarias DEL
PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**

INFORME MENSUAL IM-02

PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CERETÉ, CÓRDOBA

AGOSTO DE 2022

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

CONTRATO 2276 de 2021

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, DE VÍAS Terciarias del
PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**

INFORME MENSUAL IM-02

PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ACI-3B

CONTRATISTA: CONSORCIO CÓRDOBA 2022

CERETÉ, CÓRDOBA

AGOSTO DE 2022

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No.	104-2022	Contratista:	CONSORCIO CORDOBA 2022
Contrato de Interventoría No.	2276 de 2021	Interventoría:	CONSORCIO ACI-3B

Objeto Contrato de Obra:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA COLOMBIA RURAL

INFORME MENSUAL No.	2	MES O PERIODO:	AGOSTO
----------------------------	---	-----------------------	--------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	3
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	5
1	INTRODUCCIÓN		7
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		8
2.1	Localización		8
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		10
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		11
2.4	Características técnicas del proyecto		11
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		14
3.1	Información general del contrato		14
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		14
3.3	Seguimiento ítems no previstos		15
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		15
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		16
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	16
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	16
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	17
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	17
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	17
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	17
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	17
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	18
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		18
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	18
	• Seguimiento Programa de Obra	MEPI-MN-IN-2-FR-2	18
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	18
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-6-FR-2	18
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-1	18
		MEPI-MN-IN-14-FR-2	18
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		19
5.1	Información general del contrato		19
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		20
5.3	Informes especialistas y profesionales		20
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		20
5.5	Informe matriz de riesgos.		20
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		21
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		21
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	21
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	21
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	22
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	22
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	22
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		22
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	22
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-3-FR-2	22
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-2	22
		MEPI-MN-IN-9-FR-3	22

7	Conclusiones y recomendaciones		23
8	Anexos		24
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		24
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		24
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		24
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		24

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: 
Nombre: NESTOR ELEAN LÉMUS VILLADIEGO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 558 de fecha 17 de febrero de 2022

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
				VERSION	1
				PÁGINA	

				FECHA	31/08/2022 <small>(Día / Mes / Año)</small>
--	--	--	--	-------	--

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA	PERIODO MES: AGOSTO
-------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------

CONTRATO DE OBRA No.: 104-2022 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL CONTRATISTA: CONSORCIO CORDOBA 2022	PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE JULIO DE 2022 FECHA DE INICIO: 25 DE JULIO DE 2022 FECHA DE SUSPENSIÓN: NA FECHA DE REANUDACIÓN: NA FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DE 2022 PLAZO ACUMULADO:	VALOR INICIAL (incluido IVA) : \$ 16.321.717.210,00 VALOR ADICIONALES (incluido IVA): VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 16.321.717.210,00 ANTICIPO CONCEDIDO: \$ - ANTICIPO AMORTIZADO:
---	--	---

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	2276 de 2021	INTERVENTOR:	CONSORCIO ACI-3B	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	CONSORCIO CORDOBA 2022
----------------------------	--------------	--------------	------------------	---	------------------------

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO
----------------------------------	---

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDAD</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Pavimentación</td> <td>Construcción</td> <td>ML 7700</td> </tr> <tr> <td>Mejoramiento</td> <td>ML 7700</td> </tr> <tr> <td>Rehabilitación</td> <td>ML 7700</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Estructuras</td> <td>Túneles</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Puentes</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pontones</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros (Especificar cuales)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción	ML 7700	Mejoramiento	ML 7700	Rehabilitación	ML 7700	Estructuras	Túneles		Puentes		Pontones		Mantenimiento			Otros (Especificar cuales)			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDAD</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD MES</th> <th>CANTIDAD ACUMULADA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Pavimentación</td> <td>Construcción</td> <td>ML 0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Mejoramiento</td> <td>ML 0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rehabilitación</td> <td>ML 0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Estructuras</td> <td>Túneles</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Puentes</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pontones</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros (Especificar cuales)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción	ML 0	0	Mejoramiento	ML 0	0	Rehabilitación	ML 0	0	Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)			
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																						
Pavimentación	Construcción	ML 7700																																																						
	Mejoramiento	ML 7700																																																						
	Rehabilitación	ML 7700																																																						
Estructuras	Túneles																																																							
	Puentes																																																							
	Pontones																																																							
Mantenimiento																																																								
Otros (Especificar cuales)																																																								
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																					
Pavimentación	Construcción	ML 0	0																																																					
	Mejoramiento	ML 0	0																																																					
	Rehabilitación	ML 0	0																																																					
Estructuras	Túneles																																																							
	Puentes																																																							
	Pontones																																																							
Mantenimiento																																																								
Otros (Especificar cuales)																																																								

AVANCE FINANCIERO				
--------------------------	--	--	--	--

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES	VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES
---	--

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>BÁSICO</th> <th>IVA</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBRAS</td> <td>16.225.955.882,00</td> <td></td> <td>16.225.955.882,00</td> </tr> <tr> <td>AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td> <td>31.856.800,00</td> <td>6.052.792,00</td> <td>37.909.592,00</td> </tr> <tr> <td>GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD</td> <td>57.851.736,00</td> <td></td> <td>57.851.736,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td> <td>16.315.664.418,00</td> <td>6.052.792,00</td> <td>16.321.717.210,00</td> </tr> </tbody> </table>		BÁSICO	IVA	TOTAL	OBRAS	16.225.955.882,00		16.225.955.882,00	AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				ESTUDIOS Y DISEÑOS	31.856.800,00	6.052.792,00	37.909.592,00	GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	57.851.736,00		57.851.736,00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	16.315.664.418,00	6.052.792,00	16.321.717.210,00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>BÁSICO</th> <th>IVA</th> <th>TOTAL</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBRAS</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>AJUSTES</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR EJECUTADO</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	OBRAS	0,00		0,00	0,00	AJUSTES	0,00		0,00	0,00	OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	0,00		0,00	0,00	JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	0,00		0,00	0,00	ESTUDIOS Y DISEÑOS	0,00		0,00	0,00	GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	0,00		0,00	0,00	GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	0,00		0,00	0,00	GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	0,00		0,00	0,00	GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	0,00		0,00	0,00	VALOR EJECUTADO	0,00		0,00	0,00
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																																																	
OBRAS	16.225.955.882,00		16.225.955.882,00																																																																																	
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES																																																																																				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN																																																																																				
ESTUDIOS Y DISEÑOS	31.856.800,00	6.052.792,00	37.909.592,00																																																																																	
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	57.851.736,00		57.851.736,00																																																																																	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	16.315.664.418,00	6.052.792,00	16.321.717.210,00																																																																																	
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																																																
OBRAS	0,00		0,00	0,00																																																																																
AJUSTES	0,00		0,00	0,00																																																																																
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	0,00		0,00	0,00																																																																																
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	0,00		0,00	0,00																																																																																
ESTUDIOS Y DISEÑOS	0,00		0,00	0,00																																																																																
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	0,00		0,00	0,00																																																																																
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	0,00		0,00	0,00																																																																																
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	0,00		0,00	0,00																																																																																
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	0,00		0,00	0,00																																																																																
VALOR EJECUTADO	0,00		0,00	0,00																																																																																

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 50.149.159,14
 INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -
 AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 4
 MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 1
 EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
 TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 5

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1. Inicio de actas de vecindad En chuchurubi



Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma 
 Nombre: Miguel Armando Díaz
 Director de Interventoría
 Matricula Profesional No. 25202-12786 CND
 Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCIÓN

Con el objeto de mejorar la calidad de la infraestructura vial de nuestro país, el Gobierno Nacional viene implementado diferentes estrategias encaminadas al logro de ese objetivo, es así como en el sector de la red terciaria, dentro el programa “Colombia Rural” por medio de INVIAS, se suscribieron convenios con los municipios del país con el objeto de ejecutar actividades de mejoramiento, conservación y mantenimiento a sus diferentes vías, donde la entidad aporta los recursos que se requieren para su ejecución que atienda los documentos técnicos, normas y especificaciones requeridas.

La necesidad que se pretende satisfacer con la celebración del presente Convenio se encuentra en los Estudios Previos suscritos por el Subdirector de la Red Terciaria y Férrea, los cuales forman parte del presente documento.

El Instituto Nacional de vías INVIAS mediante Resolución Número 4218 del 21 de diciembre de 2021, realizó la apertura del Concurso de Méritos No. CMA-DO-SRT-167-2021 para contratar la Interventoría cuyo objeto es **“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.**

El presente documento contiene el informe Mensual de interventoría No. 02, el cual tiene por objeto describir en forma detallada cada una de las actividades realizadas tanto por el Contratista de obra como por la Interventoría, durante el período comprendido entre el 01 al 31 de Agosto de 2022.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto se encuentra localizado en el municipio de Cereté, en el departamento de Córdoba, Colombia. El municipio de Cereté limita por el norte con los municipios de San Pelayo y Chima, por el este con el municipio de Ciénaga de Oro, por el oeste con el municipio de Montería y por el sur con los municipios de San Carlos y Montería.

El proyecto en estudio se localiza en zona rural del municipio de Cereté en el corregimiento de Martínez (barrio Alberto Saibis, 20 de julio, la lucha y Chuchurubí).

El material que se va a utilizar en este proyecto, será suministrado por la cantera Villa Carmen la cual cuenta con licencia ambiental otorgada por la CAR del departamento y se encuentra ubicada en la vía hacia Planeta Rica.

Es preciso aclarar que no será necesario montaje de plantas de asfalto y/o concreto, dicho material será suministrado por plantas ya establecidas que cuenten con los permisos requeridos por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS. Así mismo, para el caso de material de arrastre, la explotación de dicho material no se hará en la zona, sino que será suministrado por canteras legalizadas

A continuación, se muestra una imagen general y específica de la ubicación de la vía en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Figura 1 Localización General del Proyecto.

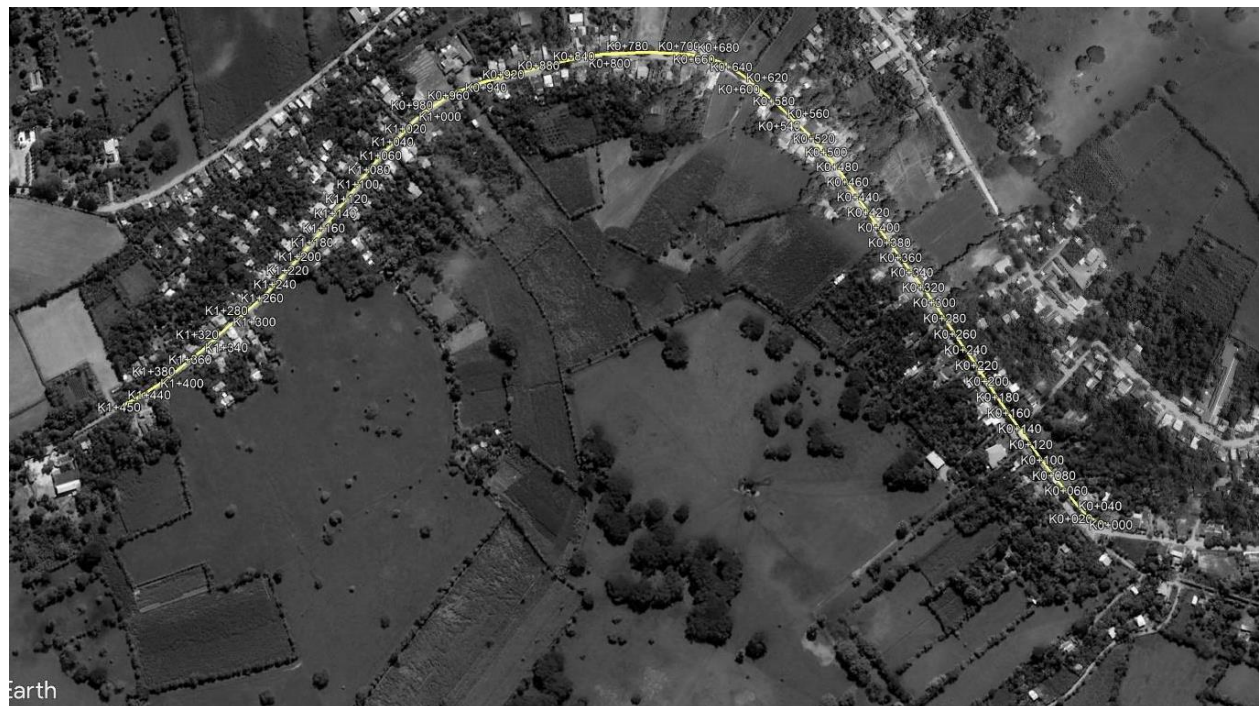


Figura 2 Localización específica de la vía a diseñar sector Chichurubí.

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

De esta manera se potencia el intercambio comercial y se fortalece la economía nacional, reduciendo también los costos operativos, proporcionando una mayor movilidad de personas, bienes y servicios; mejorando en tiempo y contaminación del ambiente y en consecuencia brindando más impulso económico de la zona por donde atraviesa dicho proyecto.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO ACTUAL DE LA VÍA

Actualmente esta vía se encuentra en afirmado en regulares condiciones, ya que su capa de rodadura se ha desgastado por la falta de mantenimiento periódico y rutinario, no se han atendido los puntos críticos aunado al tránsito de vehículos pesados, lo que conlleva a daño en vehículos particulares, baja transitabilidad y largos periodos de desplazamiento; notándose deterioros generalizados como ondulaciones, ahuellamiento, pérdida de grava, baches.

	
PR K0+818 al K0+830 Sector Chuchurubí	PR K0+092 Sector Martínez. Calle 8 vía media tapa.

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto en general consiste en la construcción de 7.700 metros lineales de pavimento de 20 cm de espesor y 38Mpa, la estructura con anchos de diseño de 5.50 m, 5.00 m, 4.50 m, y 4.00 m con bombeos normales del 2% y bombeos transicionales ajustados a las condiciones actuales de drenaje y empalmes viales, con bordillo prefabricados en ambos lados, una capa en afirmado con un espesor de 0.25 metros para el tramo 1 y 3 y 0.45 metros para el tramo 2; y subbase granular con un espesor de 0.15 metros para los 3 tramos.

Adicionalmente se construirán 3 box coulvert de sección transversal de 1mx1m y longitud de 7 metros ubicados según diseño hidráulico e hidrológico en el corregimiento de Martínez en los PR

K0+310 (Cra 7 Ac Entre Diagonal 3 Y Carrera 2), en el PR K0+922 (calle 8 vía media tapa) y en el pr k1+467 (calle 8 vía media tapa).

Parámetros de Diseño

Tipo de terreno	Plano
Bombeo	2%
Ancho de Calzada	5.50, 5.00, 4.50, y 4.00m
Longitud	7700 Metros

CORTE SECCIÓN TRANSVERSAL DE LA VÍA

DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO

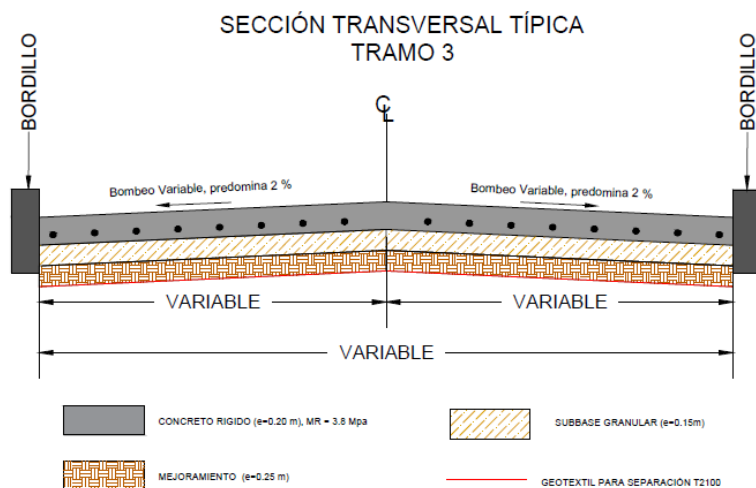


Figura 4. Tramo 1 y Tramo 3

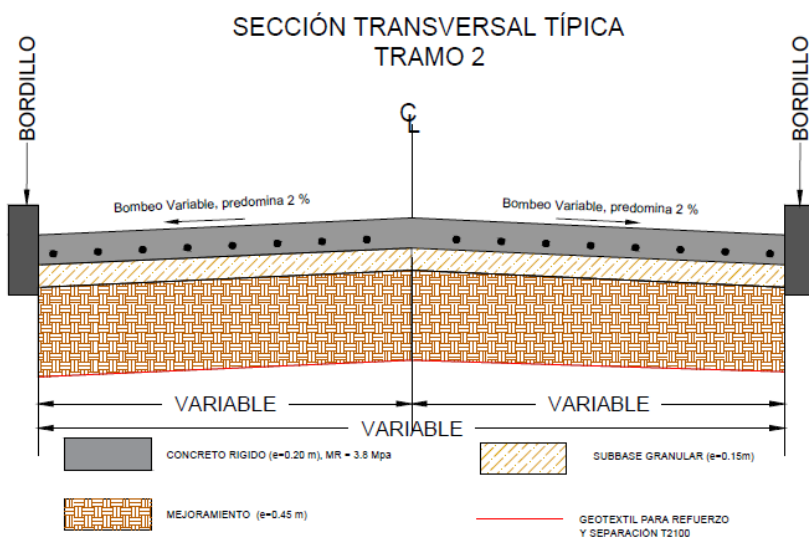


Figura 5. Tramo 2

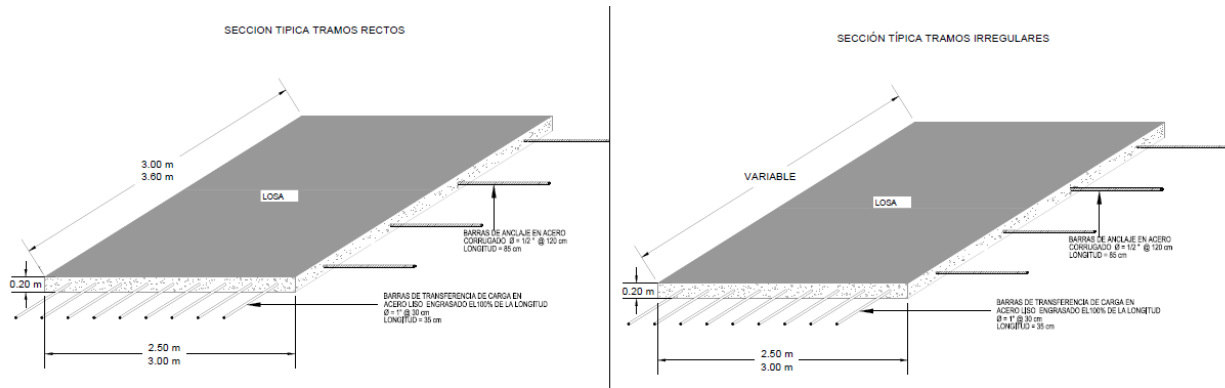


Figura 6. Sección típica

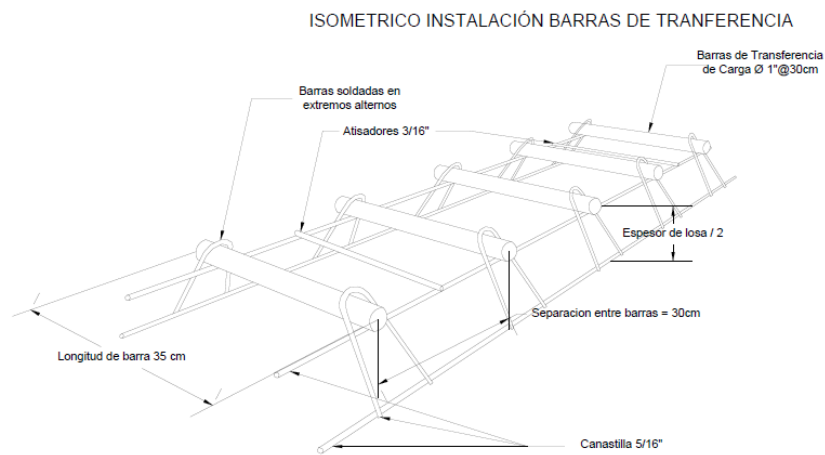


Figura 7. Canastillas de Instalación de barras de transferencia.

3 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CERETE – CÓRDOBA
OBJETO DEL CONTRATO	“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL RURAL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL”
CONTRATO DE OBRA No	No. 104-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO CÓRDOBA 2022 INTEGRANTES: ANDRÉS ALBERTO PICO GUERRERO 100%
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRÉS ALBERTO PICO GUERRERO
NIT	901598916-6
DIRECCIÓN	Carrera 6#65-24 OFIC 317 Montería
TELÉFONO	3185162227
PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA	25 DE JULIO DE 2022
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA	31 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	31 DE DICIEMBRE DE 2022
VALOR DEL CONTRATO	\$ 16.321.717.210,00

3.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

En este período se iniciaron las actividades de levantamiento topográfico inicial el día 09/08/2022 en Chuchurubí, se instaló la valla informativa el día 12/08/2022, se radicó por parte del contratista de obra los estudios y diseños previos ante interventoría el día 13/08/2022 y se iniciaron las actas de vecindad en Chuchurubí el día 22/08/2022.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES AGOSTO				
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	0,00		0,00	0,00
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO	0,00			0,00

3.3 ÍTEMS NO PREVISTOS

Actualmente el contrato no requiere de actividades no previstas.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

- * Una vez recibidos los estudios y diseños previos por parte del contratista, la Interventoría procede a la revisión de los mismos por parte de sus especialistas.
- * La Interventoría inició acompañamiento al contratista de obra en el levantamiento topográfico y de actas de vecindad.

4. REPORTE DE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 INFORME SEMANAL

Se realizaron cinco (05) informes semanales correspondientes al periodo en mención, los cuales se encuentra relacionados en el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3. (Ver página 24)

INFORMES SEMANALES	FECHA
02	29 JULIO AL 4 AGOSTO
03	5 AL 11 AGOSTO
04	12 AL 18 AGOSTO
05	19 AL 25 AGOSTO
06	26 AGOSTO AL 1 SEP.

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Se relacionan la maquinaria y los equipos en el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. (ver página 34)

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

CONTRATO DE OBRA

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 se relaciona el personal de este período. (ver página 36)

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

En este período no se realizaron actividades de obra, por ende, en el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 se relaciona el Estado Financiero y Presupuestal del Contrato de Obra con un valor ejecutado del 0%. (ver página 37)

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 se relacionan el estado general del tiempo del presente mes. (Ver página 39)

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

En este período no se realizaron actividades de obra, por ende, no se relaciona ensayos de laboratorio realizados en obra en el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se relacionan el Seguimientos Garantías y Seguros Contrato de Obra se adjuntan en el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 (Ver página 40)

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	10%	\$ 1.632.171.721,00	31/05/2022	31/05/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$ 4.896.515.163,00	31/05/2022	31/01/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 3.264.343.442,00	31/05/2022	31/07/2025
Estabilidad y Calidad de la Obra	30%	\$ 4.896.515.163,00	5 años a partir del Recibo y Aprobación del Acta Final y Recibo a Satisfacción de la Entidad Contratante	
Calidad de la revisión de estudios y diseños.	30%	\$ 9.557.040,00	31/05/2022	31/05/2027
Predios, labores y operaciones		\$ 816.085.860,00	31/05/2022	31/07/2022
Contratistas y subcontratistas		\$ 816.085.860,00	31/05/2022	31/07/2022
Vehículos propios y no propios		\$ 326.434.344,00	31/05/2022	31/07/2022

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA

A la fecha el contratista hizo entrega del Plan de calidad correspondiente, el cual se encuentra en revisión por parte de interventoría, por ende, no ha sido aprobado y no se puede dar Seguimiento en el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14.

4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

Seguimiento a la inversión del Anticipo: a este contrato no le ha sido desembolsado al contratista el anticipo asignado según contrato del 30%.

Seguimiento Programa de Obra: Se entregaron los estudios y diseños previos por parte del contratista el día 13/08/2022, se encuentran en revisión por parte de Interventoría.

Seguimiento Programa de Inversiones: A la fecha el contratista no ha entregado el Programa de inversiones, razón por la cual no se relaciona el mismo y su seguimiento en los formatos MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

Actas de Comité de Obra: no se realizó Comité de Obra en este período, por lo cual no se relacionan en el Formato MEPI-MN1-IN-14-FR-1

Actas de Reunión: Se realizó una (01) reunión el día 08/08/2022, por lo cual se relaciona en el Formato MEPI-MN1-IN-14-FR-2. (Ver página 42)

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS)
INTERVENTORÍA:	<p>CONSORCIO ACI-3B INTEGRADO POR:</p> <p>ACI PROYECTOS SAS CON NIT. 860.059.851-6 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50 %</p> <p>Y 3B PROYECTOS SAS CON NIT. 900.504.398-4 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50%</p>
NIT	901.551.292-6
TELÉFONO	601-74060460
DIRECCIÓN	Oficina. Carrera 7 156 -10 Piso 31 Torre Krystal – North Point
CONTRATO No	2276 DE 2021
OBJETO:	“INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias del Programa Colombia Rural en los Municipios del Departamento de Córdoba- Grupo 4”
LOCALIZACIÓN:	“CORREGIMIENTO DE MARTÍNEZ (BARRIO ALBERTO SAIBIS, 20 DE JULIO, LA LUCHA Y CHUCHURUBÍ) CERETÉ CÓRDOBA”
VALOR DEL CONTRATO:	\$1.930.530.773

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	28 DE ENERO DE 2022
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	31 DE JULIO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	31 DE DICIEMBRE DE 2022

5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

La Interventoría realizó las siguientes actividades:

Inicio de revisión de los estudios y diseños previos entregados por el contratista.

Acompañamiento al contratista en la realización de las actas de vecindad sector Chuchurubí.

Realización de acta de reunión #1 como seguimiento a los avances programados.

Realización de informes semanales y mensual.

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

No se presentaron Informe de los Especialistas.

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

El Informe de matriz de riesgo se encuentra en ejecución por parte de esta Interventoría

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS

El Informe de matriz de riesgo se encuentra en ejecución por parte de esta Interventoría

5.6 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA.

La interventoría se encuentra recopilando y actualizando los documentos electrónicos en la plataforma CIFRA de acuerdo al sistema de gestión documental implementado por INVIAS.

6. REPORTE DE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 se encuentran relacionados los equipos y vehículos para este período. (Ver página 45)

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se encuentra relacionada en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 (Ver página 46)

PERSONAL DE INTERVENTORÍA	
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
Miguel Armando Díaz Rivera	Director
María José Teherán Guerra	Inspector SST
Ivanna Rocío Charrasquiél Rivero	Secretaria

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta
TOTALES		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Se relacionada en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 (Ver página 47)

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se encuentra relacionada en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13. (Ver página 49)

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Buen Manejo del Anticipo	27/01/2022	01/03/2023	\$ 811.147.384
Calidad de Servicio	29/08/2022	29/08/2027	\$ 579.159.232
Cumplimiento	27/01/2022	01/03/2023	\$193.053.077
Salarios y prestaciones Sociales	27/01/2022	29/08/2025	\$ 386.106.155

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La Interventoría, se encuentra en elaboración del plan de calidad. En el presente informe no se presenta el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15.

6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

Seguimiento a la inversión del Anticipo: el Contrato de Interventoría no contempla anticipo.

Plan De Cargas se encuentra relacionado en el formato. MEPI-MN-IN-9-FR-2 (Ver Página 51)

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En agosto de 2022, se tenía previsto una Inversión Programada Acumulada de \$50.149.159,14 la cual representa un porcentaje del 0,31% versus una Inversión Ejecutada Acumulada de \$ 0,00 la cual representa un porcentaje del 0,00 %, teniendo en cuenta que el plazo del contratista para entregar estudios y diseños era hasta el 24/08/2022, los cuales fueron entregado dentro del plazo, pero se encuentran en revisión por parte de la interventoría.
- En este período se iniciaron las actividades de levantamiento topográfico inicial el día 09/08/2022 en Chuchurubí, se instaló la valla informativa el día 12/08/2022, se radicó por parte del Contratista de obra los estudios y diseños previos ante Interventoría el día 13/08/2022 y se iniciaron las actas de vecindad en Chuchurubí el día 22/08/2022.
- Se realizó el día 08 de agosto de 2022 el acta de reunión #1 en las instalaciones de la Interventoría Consorcio ACI-3B en Cereté, en conjunto con el representante del Contratista de obra, Director de Interventoría, Supervisor designado de la Territorial Córdoba por parte de INVIAS y personal designado por parte de Planeación Municipal con el objetivo de dar seguimiento a las actividades de obra.

8 ANEXOS

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

Se adjunta correspondencia recibida por parte del Contratista de obra y enviada por parte de interventoría. (VER PAGINA 52)

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

Se adjunta registro fotográfico de las actividades ejecutadas en obra. (Ver página 55)

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PEDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS

Se adjunta registro fotográfico de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad, dada que estas actividades no se han realizado. (Ver página 57)

8.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

Se adjunta la Bitácora de Obra, libro donde se realizan todas las actividades que se realizaron durante el periodo. (Ver página 59)

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
 DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

<p>OBSERVACIONES:</p>

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	1
-----------------------------	---

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PEDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No se realizó ninguna actividad. Se está a la espera de la entrega de los estudios previos por parte del contratista de obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

No se tiene previsto ninguna actividad, toda vez que el contratista tiene estipulado en su programación culminar la etapa de estudios y diseños el día 24/08/2022.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

[illegible]

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada y la meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENIDORA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se está a la espera de entrega de diseños la cual tiene como fecha limite el día 24/08/2022

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: Miquel Armando Díaz
Matrícula Profesional No.: 25202-12786 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
 DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	9
-----------------------------	---

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PEDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se iniciaron las actividades de topografía inicial en el sector chuchurubí. Se está a la espera de la entrega de los estudios previos por parte del contratista de obra

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se tiene previsto continuar con la topografía inicial. Se está a la espera de culminar la etapa de estudios y diseños el día 24/08/2022

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

[illegible]

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENITORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se está a la espera de entrega de diseños la cual tiene como fecha límite el día 24/08/2022. • Se realizó el día 08 de agosto de 2022 el acta de reunión #1 en las instalaciones de la Interventoría Consorcio ACI-3B en Cereté, en conjunto con el representante del Contratista de obra, Director de Interventoría, Supervisor designado de la Territorial Córdoba por parte de INVIAS y personal designado por parte de Planeación Municipal con el objetivo de dar seguimiento a las actividades de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: Miguel Armando Díaz

Matrícula Profesional No.: 25202-12786 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

FECHA	19/08/2022 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:		P65- INTERVENTORÍA VÍAS CÓRDOBA - GRUPO 4	
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CÓRDOBA
		SEMANA No.:	4 del 12-ago al 18-ago Último Informe Semanal SI ☐
		(Numeración consecutiva)	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.		
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):			
EL ALCANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO + BORDILLOS PREFABRICADOS DE 7.700 ML EN EL CORREGIMIENTO DE MARTÍNEZ (B/ 20 DE JULIO, 8/CHUCHURUBÍ, B/ALBERTO SÁIBIS Y B/LA LUCHA) EN EL MUNICIPIO DE CERÉTÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, TRES (03) BOX CULVERT DE SECCIÓN 1MX1M Y L=7M UBICADOS EN LOS PR K0+310 (Cra 7 Ac Entre Diagonal 3 Y Carrera 2), en el PR K0+922 (CALLE 8 VIA MEDIA TAPA) y en el PR K1+467 (CALLE 8 VIA MEDIA TAPA) Y OBRAS DE ARTE COMO DESCOLES, CUNETAS Y/O DISIPADORES PARA EVACUACIÓN EN LAS AGUAS LLUVIAS.			

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE 38Mpa Y 20CM DE ESPESOR + BORDILLOS PREFABRICADOS, CON ANCHOS DIFERENTES POR TRAMOS DE 5.50m, 5.00m, 4.50m, y 4.00m, CON UNA ESTRUCTURA DE AFIRMAO DE 25CM PARA TRAMO Y TRAMO 3 Y 45CM PARA TRAMO 2, MÁS 15 CM DE SUBBASE PARA LOS TRES TRAMOS; ADemás DE LA CONSTRUCCION DE TRES (03) BOX CULVERT DE SECCIÓN 1MX1M Y L=7M UBICADOS EN LOS PR K0+310 (Cra 7 Ac Entre Diagonal 3 Y Carrera 2), en el PR K0+922 (CALLE 8 VIA MEDIA TAPA) y en el PR K1+467 (CALLE 8 VIA MEDIA TAPA) Y OBRAS DE ARTE COMO DESCOLES, CUNETAS Y/O DISIPADORES PARA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS LLUVIAS.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO CÓRDOBA 2022			INTERVENTOR:	CONSORCIO ACI-3B		
INTEGRANTES:	ANDRÉS ALBERTO PICO GUERRERO 100%			INTEGRANTES:	ACI PROYECTOS S.A.S CON 50% - 3B PROYECTOS S.A.S CON 50%		
CONTRATO No.	104 DE 2022	VALOR INICIAL:	\$ 16.321.717.210,00	CONTRATO No.	2276 DE 2021	VALOR INICIAL:	\$ 1.930.530.773,00
FECHA DE INICIO:	25/07/2022	VALOR ADICIONES:	\$ -	FECHA DE INICIO:	28/01/2022	VALOR ADICIONES:	\$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2022	VALOR ACUMULADO:	\$ 16.321.717.210,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2022	VALOR ACUMULADO:	\$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2022		\$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2022	VALOR ANTICIPO:	\$ -
			\$ -			VALOR AMORTIZADOR:	\$ -
			\$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$	16.321.717.210,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$	-	
	SALDO DE VIGENCIA		\$	16.321.717.210,00	
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$	1.930.530.773	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$	-	
	SALDO DE VIGENCIA		\$	1.930.530.773	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA			
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$	16.321.717.210,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	33.501.358,76	0,21%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	-	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	(33.501.358,76)	-0,21%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	-	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	33.501.358,76	0,21%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	-	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	(33.501.358,76)	-0,21%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	33.501.358,76	0,21%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	-	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____

PERIODO FACTURADO: _____

VALOR FACTURA: \$ _____

SI NO

☐ ☒

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORIA	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ - %
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ - %

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____

PERIODO FACTURADO: _____

VALOR FACTURA: \$ _____

SI NO

☐ ☐

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado \$	
Amortizado \$	
Saldo \$	

INDICADOR IIC
En el mes:
Acumulado:

ANTICIPOS	
Otorgado \$	
Amortizado \$	
Saldo \$	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %	 0,05%	Avanço o Atraso Físico %	 -0,05%
Meta Física Ejecutada %			

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	
Estudios y diseños					Prog						
* []					Ejec						
[]					Prog						
* []					Ejec						
[]					Prog						
[]					Ejec						
[]					Prog						
[]					Ejec						

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
 TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: _____ _____ UBICACIÓN: _____ _____		DISPONIBLE PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____			
OBSERVACIONES: El contratista no ha hecho entrega del PAGA 				OBSERVACIONES: 			
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: NO HA SIDO ENTREGADO POR PARTE DEL CONTRATISTA				OBSERVACIONES: 			

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
 DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	8
-----------------------------	---

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	
AVALÚOS APROBADOS:	
PREDIOS ADQUIRIDOS:	

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

En esta semana se hizo entrega de la carpeta de los ajustes de estudios y a la interventoria para su respectiva revision y aprobacion el día 13/08/2022, por otro lado se realizo instalacion de la valla publicitaria en la absc K0+000 el día 12/08/2022

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

No se tiene previsto ninguna actividad, toda vez que el contratista tiene estipulado en su programación culminar la etapa de estudios y diseños el día 24/08/2022

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

[illegible]

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENITORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoria se encuentra revisando los ajustes de estudios y diseños entregados por el contratista el día 13/08/2022 para su respectiva aprobación.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: Miguel Armando Díaz
Matrícula Profesional No.: 25202-12786 CND



P65- INTERVENTORÍA VÍAS CÓRDOBA - GRUPO 4

INTERVENTORÍA: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE 38MPa Y 20CM DE ESPESOR + BORDILLOS PREFABRICADOS, CON ANCHOS DIFERENTES POR TRAMOS DE 5.50m, 5.00m, 4.50m, y 4.00m PARA TRAMO 1 Y 2, 4.50m PARA TRAMO 3 Y 4.00m PARA TRAMO 4, 3.50m PARA TRAMO 5, 3.00m PARA TRAMO 6, 2.50m PARA TRAMO 7, 2.00m PARA TRAMO 8, 1.50m PARA TRAMO 9, 1.00m PARA TRAMO 10, 0.50m PARA TRAMO 11, 0.25m PARA TRAMO 12, 0.125m PARA TRAMO 13, 0.0625m PARA TRAMO 14, 0.03125m PARA TRAMO 15, 0.015625m PARA TRAMO 16, 0.0078125m PARA TRAMO 17, 0.00390625m PARA TRAMO 18, 0.001953125m PARA TRAMO 19, 0.0009765625m PARA TRAMO 20, 0.00048828125m PARA TRAMO 21, 0.000244140625m PARA TRAMO 22, 0.0001220703125m PARA TRAMO 23, 0.00006103515625m PARA TRAMO 24, 0.000030517578125m PARA TRAMO 25, 0.0000152587890625m PARA TRAMO 26, 0.00000762939453125m PARA TRAMO 27, 0.000003814697265625m PARA TRAMO 28, 0.0000019073486328125m PARA TRAMO 29, 0.00000095367431640625m PARA TRAMO 30, 0.000000476837158203125m PARA TRAMO 31, 0.0000002384185791015625m PARA TRAMO 32, 0.00000011920928955078125m PARA TRAMO 33, 0.000000059604644775390625m PARA TRAMO 34, 0.0000000298023223876953125m PARA TRAMO 35, 0.00000001490116119384765625m PARA TRAMO 36, 0.000000007450580596923828125m PARA TRAMO 37, 0.0000000037252902984619140625m PARA TRAMO 38, 0.00000000186264514923095703125m PARA TRAMO 39, 0.000000000931322574615478515625m PARA TRAMO 40, 0.0000000004656612873077392578125m PARA TRAMO 41, 0.00000000023283064365386962890625m PARA TRAMO 42, 0.000000000116415321826934814453125m PARA TRAMO 43, 0.0000000000582076609134674072265625m PARA TRAMO 44, 0.00000000002910383045673370361328125m PARA TRAMO 45, 0.000000000014551915228366851806640625m PARA TRAMO 46, 0.0000000000072759576141834259033203125m PARA TRAMO 47, 0.00000000000363797880709171295166015625m PARA TRAMO 48, 0.000000000001818989403545856475830078125m PARA TRAMO 49, 0.0000000000009094947017729282379150390625m PARA TRAMO 50, 0.00000000000045474735088646411895751953125m PARA TRAMO 51, 0.000000000000227373675443232059478759765625m PARA TRAMO 52, 0.0000000000001136868377216160297393798828125m PARA TRAMO 53, 0.00000000000005684341886080801486968994140625m PARA TRAMO 54, 0.000000000000028421709430404007434844970703125m PARA TRAMO 55, 0.0000000000000142108547152020037174224853515625m PARA TRAMO 56, 0.00000000000000710542735760100185871124267578125m PARA TRAMO 57, 0.0000000000000035527136788005009293556213384375m PARA TRAMO 58, 0.00000000000000177635683940025004647781066921875m PARA TRAMO 59, 0.000000000000000888178419700125023238905334609375m PARA TRAMO 60, 0.0000000000000004440892098500625116194526673046875m PARA TRAMO 61, 0.00000000000000022204460492503125578972633365234375m PARA TRAMO 62, 0.000000000000000111022302462515627894863166826171875m PARA TRAMO 63, 0.0000000000000000555111512312578139474315834130859375m PARA TRAMO 64, 0.00000000000000002775557561562890697371579170654296875m PARA TRAMO 65, 0.000000000000000013877787807814453486857895853271484375m PARA TRAMO 66, 0.0000000000000000069388939039072267434289479266357421875m PARA TRAMO 67, 0.00000000000000000346944695195361337171447396331787109375m PARA TRAMO 68, 0.000000000000000001734723475976806685857236981658935546875m PARA TRAMO 69, 0.0000000000000000008673617379884033429286184908294677734375m PARA TRAMO 70, 0.00000000000000000043368086899420167146430924541473388671875m PARA TRAMO 71, 0.000000000000000000216840434497100835732154622707366943359375m PARA TRAMO 72, 0.0000000000000000001084202172485504178660773113536834716796875m PARA TRAMO 73, 0.00000000000000000005421010862427520893303865567684173583984375m PARA TRAMO 74, 0.000000000000000000027105054312137604466519327838420867919921875m PARA TRAMO 75, 0.0000000000000000000135525271560688022332596639192104339599609375m PARA TRAMO 76, 0.00000000000000000000677626357803440111662983195960521697998046875m PARA TRAMO 77, 0.000000000000000000003388131789017200558314915979802608489990234375m PARA TRAMO 78, 0.0000000000000000000016940658945086002791574579899013042449951171875m PARA TRAMO 79, 0.00000000000000000000084703294725430013957872899495065212249755859375m PARA TRAMO 80, 0.000000000000000000000423516473627150069789364497475326061248779296875m PARA TRAMO 81, 0.0000000000000000000002117582368135750348946822487376630306243896484375m PARA TRAMO 82, 0.00000000000000000000010587911840678751744724112436883151531219482421875m PARA TRAMO 83, 0.000000000000000000000052939559203393758723620562184415757656074412109375m PARA TRAMO 84, 0.000000000000000000000026469779601696879361810281092207878828037206046875m PARA TRAMO 85, 0.0000000000000000000000132348898008484396809051405461039394140186030234375m PARA TRAMO 86, 0.00000000000000000000000661744490042421984045257027305196970700930151171875m PARA TRAMO 87, 0.000000000000000000000003308722450212109920226285136525984853504650755859375m PARA TRAMO 88, 0.000000000000000000000001

CONSORCIO CORDOBA 2022				CONSORCIO ACI-3B			
ANDRES ALBERTO PICO GUERRERO 100%				ACI PROYECTOS S.A.S CON 50% - 3B PROYECTOS S.A.S CON 50%			
104 DE 2022	VALOR INICIAL:	\$	16.321.717.210,00	CONTRATO No.	2276 DE 2021	VALOR INICIAL:	\$ 1.930.530.773,00
25/07/2022	VALOR ADICIONES:	\$	-	FECHA DE INICIO:	28/01/2022	VALOR ADICIONES:	\$ -
FECHAL: 31/07/2022	VALOR ACUMULADO:	\$	16.321.717.210,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2022	VALOR ACUMULADO:	\$ -
ENTE: 31/12/2022		\$	-	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2022	VALOR ANTICIPO:	\$ -
		\$	-			VALOR AMORTIZADO:	\$ -
		\$	-			SALDO POR PAGAR:	\$ -

S PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
en pesos)

INTERVENTORIA		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	- %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	- %
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	- %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	- %
<div style="display: flex; justify-content: flex-end; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</div> <div style="display: flex; border: 1px solid black; padding: 2px;"> <div style="width: 40px; text-align: center;">SI</div> <div style="width: 40px; text-align: center;">NO</div> </div> </div>		
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		
PERIODO FACTURADO:		
VALOR FACTURA:	\$ -	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite) </div>		
Observaciones:		

ANTICIPOS	
Otorgado \$	
Amortizado \$	
Saldo \$	

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES:
---	--	----------------

ESTADO:	NO HA SIDO ENTREGADO POR PARTE DEL CONTRATISTA
---------	--

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
 DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

<p>OBSERVACIONES:</p>

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	8
-----------------------------	---

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PEDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

En esta semana se continúa en avance de revisión de los ajustes de los estudios y diseños entregados por el contratista a esta interventoría para su respectiva aprobación. Se iniciaron las actas de vecindad en el sector chuchurubí el día 22/08/2022.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se tiene previsto culminar la etapa de estudios y diseños el día 24/08/2022 e iniciar el día 25/08/2022 con las actividades de excavación una vez aprobados los diseños. Así mismo continuar con las actas de vecindad faltantes en el sector chuchurubi

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PROGRAMADO																													PROGRAMADO
	KM1+000		KM2+000		KM3+000		KM4+000		KM5+000		KM6+000		KM7+000		KM7+700														
EJECUTADO																													EJECUTADO
	KM1+000		KM2+000		KM3+000		KM4+000		KM5+000		KM6+000		KM7+000		KM7+700														
CONVENCIONES	 ESTUDIOS Y DISEÑOS		 BOX-COULVERT		 PAVIMENTO EN CONCRETO		 SEÑALIZACION		 EXCAVACIÓN		 AFIRMADO		SUBBASE		BORDILLO														

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENITORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se esta continua realizando acompañamiento a toma de actas de vecindad y la revision de los estudios y diseños

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: 
NOMBRE: Miquel Armando Díaz
Matrícula Profesional No.: 25202-12786 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
 DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:	
----------------	--

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	6
-----------------------------	---

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PEDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

En esta semana se continuo con la realizacion de actas de vecindad, y se avanza en la revisioon de los estudios y diseños entregados por el contratsita para su respectiva revision y/o aprobacion

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se tiene previsto continuar con las actas de vecindad mientras interventoría continua revisando los estudios y diseños entregados por el contratista

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PROGRAMADO																					PROGRAMADO
	KM1+000		KM2+000		KM3+000		KM4+000		KM5+000		KM6+000		KM7+000		KM7+700						
EJECUTADO																					EJECUTADO
CONVENCIONES	KM1+000		KM2+000		KM3+000		KM4+000		KM5+000		KM6+000		KM7+000		KM7+700						
	ESTUDIOS Y DISEÑOS		BOX-COULVERT		PAVIMENTO EN CONCRETO		SEÑALIZACION		EXCAVACIÓN		AFIRMADO		SUBBASE		BORDILLO						

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENITORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se esta continua realizando acompañamiento a toma de actas de vecindad y la revision de los estudios y diseños

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: 
NOMBRE: Miguel Armando Díaz
Matrícula Profesional No.: 25202-12786 CND

	<p>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA</p>	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1
<p>Residente de Obra Matrícula Profesional No.: 22202-404918</p> <p>Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 25202-12786 CND</p>		FECHA	31-ago-22 (Día / Mes / Año)
		<p>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.</p>	

[illegible]

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO
MEPI-MN1-IN-15-FR-8

VERSIÓN
1

PÁGINA

FECHA
31/08/2022
(Día / Mes / Año)

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	\$ -	\$ -	\$ -
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ -	\$ -	\$ -
*			
*			
VALOR TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: FERNANDO ISAAC CASTELLÓN MARRUGO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 13202-120629 BLV

Firma

Nombre: Miguel Armando Díaz
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-12786 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
			VERSIÓN	1	
			PÁGINA		

FECHA			31/08/2022 (Día / Mes / Año)	
-------	--	--	---------------------------------	--

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CÓRDOBA	
-------------------	------------------------------	--	------------------------	---------	--

CONTRATO DE OBRA No:	104-2022		CONTRATISTA:	CONSORCIO CORDOBA 2022	
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:	AGOSTO DE 2022		PROYECTO:	P65- INTERVENTORÍA VÍAS CÓRDOBA - GRUPO 4	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	2276 de 2021		INTERVENTOR:	CONSORCIO ACI-3B	

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																															
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	19	19	19	24	19	19	24	24	24	24	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23	24	24	24	24	22	165
Lluvias moderadas											2															1					2	
Lluvias intensas	5	5	5		5	5																										
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

<div>Firma </div> <div>Nombre: Marcela Quiroz Chaverri</div> <div>Residente de Obra</div> <div>Matrícula Profesional No.: 22202-404918</div>	<div>Firma </div> <div>Nombre: Miguel Armando Díaz</div> <div>Director de Interventoría</div> <div>Matrícula Profesional No. 25202-12786 CND</div>
--	--

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA			

FECHA						31	8	2022
						(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 104-2022 CONTRATISTA: CONSORCIO CORDOBA 2022

OBJETO DEL CONTRATO:
 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO: 25 DE JULIO DE 2022
 PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE JULIO DE 2022
 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 16.321.717.210,00
 VALOR ACUMULADO: \$ 16.321.717.210,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 37.909.592,00
 VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 37.909.592,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2276 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ACI-3B

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 1.632.171.721,00	31	5	2022	31	5	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$ 4.896.515.163,00	31	5	2022	31	1	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 3.264.343.442,00	31	5	2022	31	7	2025
Calidad de Estudios y Diseños	30%	\$ 9.557.040,00	31	5	2022	31	5	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 4.896.515.163,00	5 años a partir de acta recibo satisfacción			5 años a partir de acta recibo satisfacción		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101172752

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SAS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	\$ 816.085.860,50	31	5	2022	31	7	2022
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 96-40-101061054 OTRAS PÓLIZAS No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SAS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA	31	8	2022
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
			Día	Mes	Año			
Cumplimiento								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones						Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños						Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra						Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:


Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma 

Nombre: Miguel Armando Díaz

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No. 25202-12786 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	8/08/2022 (Día / Mes / Año)
-------	--------------------------------

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 104 DE 2022, CONVENIO 924-2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CÓRDOBA 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE
 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2276 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI - 3B

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN Comité de seguimiento contractual Convenio 924 - 2021

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN Documentación inicial Estudios y diseños
--

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	8/08/2022 (Día / Mes / Año)
-------	--------------------------------

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 1. DOCUMENTACIÓN INICIAL El director de Interventoría indica que el contratista no ha hecho entrega de la documentación inicial para la respectiva revisión de la interventoría, que sólo le han enviado los APU. Se fija fecha de entrega el viernes de esta semana. 2. REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS El contratista no ha hecho entrega de los estudios y diseños del proyecto para revisión y aprobación de la Interventoría. También se fija la fecha de entrega para el viernes 12 de agosto. El director de Interventoría propone realizar visita conjunta con los especialistas hidráulicos del contratista e interventoría para evaluar los tramos a intervenir.
--

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	1 DE 1

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2022

PROYECTO: P65- INTERVENTORÍA VÍAS CORDOBA - GRUPO 4

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2276 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ACI-3B

CONTRATO DE OBRA No. 104-2022

CONTRATISTA: CONSORCIO CORDOBA 2022

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
CAMIONETA	CAMIONETA DOBLE CABINA, PLACA UGU681, MARCA TOYOTA, CILINDRAJE 2494, MODELO 2015	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma

Nombre: MIGUEL ARMANDO DIAZ RIVERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-12786 CND

Firma

Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matricula No. :22202097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA							CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9			
								VERSIÓN	1			
								PÁGINA	1 DE 1			
								FECHA	31-ago-22 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES								DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2276 DE 2021								INTERVENTOR: CONSORCIO ACI-3B				
MES INFORME MENSUAL: AGOSTO								PROYECTO: P65- INTERVENTORÍA VÍAS CÓRDOBA - GRUPO 4				
CONTRATO DE OBRA No: 104 DE 2022								CONTRATISTA: CONSORCIO CORDOBA 2022				
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA												
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior					
2021	1084921	C-2402-0600-12-0-2402041-02	54	NACION	PRINCIPAL	\$ 242.430.000						
2022	280222	C-2402-0600-12-0-2402112-02	11			\$ 1.588.100.773						
2022	280222	C-2402-0600-12-0-2402112-02	11			\$ 100.000.000						
TOTAL						\$ 1.930.530.773						
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 1.930.530.773												
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA												
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar	Observaciones
Anticipo												
TOTALES		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS PERSONAL			
OTROS COSTOS DIRECTOS			
*			
VALOR TOTAL			

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma 
Nombre: MIGUEL ARMANDO DIAZ RIVERA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-12786 CND

Firma _____
Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No. : 22202097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13																																														
			VERSIÓN	1																																														
			PÁGINA	1 DE 2																																														
			FECHA	31-ago-22 (Día / Mes / Año)																																														
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA																																															
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2276 DE 2021			INTERVENTOR: CONSORCIO ACI-3B																																															
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA- GRUPO 4																																																		
FECHA DE INICIO: 31 DE ENERO DE 2022																																																		
PLAZO INICIAL: 6 MESES																																																		
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																		
VALOR INICIAL: \$ 1.930.530.773,00																																																		
VALOR ACUMULADO: \$ - (Incluye adiciones)																																																		
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO																																																		
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																		
<table><tr><th colspan="3">Amparo</th><th colspan="3">% Amparo</th><th colspan="3">Valor Asegurado (\$)</th></tr><tr><td colspan="3">Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="3">\$ 811.147.384,00</td></tr><tr><td colspan="3">Calidad del servicio</td><td colspan="3">30%</td><td colspan="3">\$ 579.159.232,00</td></tr><tr><td colspan="3">Cumplimiento de Servicio</td><td colspan="3">10%</td><td colspan="3">\$ 193.053.077,00</td></tr><tr><td colspan="3">Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td colspan="3">20%</td><td colspan="3">\$ 386.106.155,00</td></tr></table>						Amparo			% Amparo			Valor Asegurado (\$)			Buen manejo y correcta inversión del anticipo			100%			\$ 811.147.384,00			Calidad del servicio			30%			\$ 579.159.232,00			Cumplimiento de Servicio			10%			\$ 193.053.077,00			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			20%			\$ 386.106.155,00		
Amparo			% Amparo			Valor Asegurado (\$)																																												
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			100%			\$ 811.147.384,00																																												
Calidad del servicio			30%			\$ 579.159.232,00																																												
Cumplimiento de Servicio			10%			\$ 193.053.077,00																																												
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			20%			\$ 386.106.155,00																																												
<table><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>27</td><td>ENE</td><td>2022</td><td>1</td><td>MAR</td><td>2023</td></tr><tr><td>29</td><td>AGOS</td><td>2022</td><td>29</td><td>AGOS</td><td>2027</td></tr><tr><td>27</td><td>ENE</td><td>2022</td><td>1</td><td>MAR</td><td>2023</td></tr><tr><td>27</td><td>ENE</td><td>2022</td><td>29</td><td>AGOS</td><td>2025</td></tr></table>						VIGENCIA						Desde			Hasta			27	ENE	2022	1	MAR	2023	29	AGOS	2022	29	AGOS	2027	27	ENE	2022	1	MAR	2023	27	ENE	2022	29	AGOS	2025									
VIGENCIA																																																		
Desde			Hasta																																															
27	ENE	2022	1	MAR	2023																																													
29	AGOS	2022	29	AGOS	2027																																													
27	ENE	2022	1	MAR	2023																																													
27	ENE	2022	29	AGOS	2025																																													
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3237551-6																																																		
Certificado de modificación o anexo No.: (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																		
Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA																																																		
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:																																																		

	<p>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</p> <p>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</p> <p>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</p> <p>SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA</p>	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA	31-ago-22
(Día / Mes / Año)	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)

VIGENCIA					
Desde			Hasta		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

<p>Firma </p> <p>Nombre: MIGUEL ARMANDO DIAZ RIVERA</p> <p>Director de Interventoría</p> <p>Matrícula Profesional No.: 25202-12786 CND</p>	<p>Firma </p> <p>Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO</p> <p>Supervisor Contrato de Interventoría</p> <p>Matrícula Profesional No.: 22202097095 COR</p>
--	--

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.



Montería, 11 de agosto de 2022

OFIC-CC2022-006

Señores:

JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA

R/L CONSORCIO ACI-3B

ING. MIGUEL DIAZ

Director de Interventoría

L. C.

Ref: Contrato No. 104-2022 **Cuyo Objeto es:** “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA – COLOMBIA RURAL”.

Asunto: remisión de estudios y diseños revisados y avalados por parte del contratista para construcción del proyecto

Cordial saludo,

De manera formal me permito hacer entrega de los Estudios y Diseños correspondientes al proyecto de la referencia. No obstante, se adjunta la revisión realizada por parte de los consultores de acuerdo a cada volumen en su especialidad y además por medio de su revisión dan constancia de la calidad del trabajo, sustentando la veracidad de la información realizada y validando por medio de oficio la justificación y el cumplimiento de los estudios y diseños entregados bajo este comunicado formal, que comprende la declaración pactada bajo el contrato de la referencia, y en cumplimiento a la revisión y entrega de los Estudios y Diseños para dar inicio a la construcción del objeto contractual del contrato No. 104-2022.

Anexo los siguientes documentos revisados y avalados por medio de comunicado emitido por cada uno de los especialistas :

- VOL I - ESTUDIO DE TRANSITO y carta de validación emitida por parte del especialista consultor
- VOL II - GEOMETRICO Y SEÑALIZACIÓN y carta de validación emitida por parte del especialista consultor
- VOL VI - ESTUDIO GEOTECNICO PARA PAVIMENTO y carta de validación emitida por parte del especialista consultor
- VOL VII - HIDRAULICO E HIDROLOGICO y carta de validación emitida por parte del especialista consultor

CONSORCIO CORDOBA 2022
Carrera 6 # 65-24 OFIC 317 – Cel. – 3185162227
Cordobaconsorcio2022@gmail.com
Montería – Córdoba



- VOL VIII - ESTUDIO Y DISEÑO DE PAVIMENTO y carta de validación emitida por parte del especialista consultor
- VOL X - COMPONENTE AMBIENTAL y carta de validación emitida por parte del especialista consultor

Agradezco su atención;

ANDRES ALBERTO PICO GUERRERO
CC: 1.067.869.298 de Montería.
RL CONSORCIO CORDOBA 2022



Montería, 17 de agosto de 2022

OFIC-CC2022-008

Señores:

JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA

R/L CONSORCIO ACI-3B

ING. MIGUEL DIAZ

Director de Interventoría

L. C.

Ref: Contrato No. 104-2022 **Cuyo Objeto es:** “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA – COLOMBIA RURAL”.

Asunto: Fecha inicio Actas de Vecindad.

De manera atenta me dirijo a esta interventoría para notificar que el día 22 de agosto del año en curso, a partir de las 8:00 a.m. se estará dando inicio al levantamiento de actas de vecindad del contrato en mención, en el sector denominado “chuchurubí”, del municipio de cerete, la actividad estará a cargo del equipo social del contratista, y solicitamos a esta interventoría su acompañamiento en el proceso.

Agradezco su atención;

ANDRES ALBERTO PICO GUERRERO

CC: 1.067.869.298 de Montería.

RL CONSORCIO CORDOBA 2022

CONSORCIO CORDOBA 2022
Carrera 6 # 65-24 OFIC 317 – Cel. – 3185162227
Cordobaconsorcio2022@gmail.com
Montería – Córdoba

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS



Foto 1. Valla informativa instalada



Foto 2. Valla informativa instalada



Foto 3. Levantamiento topográfico Inicial Chuchurubí.



Foto 4. Levantamiento topográfico Inicial Chuchurubí.

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS.



Foto 5. Actas de vecindad Chuchurubí



Foto 6. Actas de vecindad Chuchurubí



Foto 7. Actas de vecindad Chuchurubí




Foto 8. Actas de vecindad Chuchurubí

Domingo 31 de Julio de 2022.

No se realizan actividades en este día por ser día de descanso.

Mauleán



Jueves 1 de agosto de 2022.

Estado del tiempo: nublado

Equipos: No

Personal en obra: No

En este día se realiza actividad administrativa de revisión y ajustes de documentación.

Mauleán



Martes 2 de agosto de 2022.


Estado del tiempo: Nublado

Equipos: No

Personal en obra: No.

Se continúa en este día con actividad de revisión de documentación referente a estudios y diseños.

Mauleán



Miércoles 3 de agosto de 2022.

Estado del tiempo: Nublado

Equipos: No.

Personal en obra: No.

En este día se continúa con actividades del día anterior.

Mauleán



6

Jueves 4 de agosto de 2022.

Estado del tiempo: Soleado.

Equipos: no

Personal en obra: no.

En este día se realiza actividad de ajustes y revisión de documentación por parte del contratista para posterior revisión por parte de la interventoría.

Paula Luz



Viernes 5 de agosto de 2022.


Estado del tiempo: Nublado

Equipos: no

Personal en obra: no.

En este día el contratista continúa con labores administrativas y de documentación respectiva a los estudios y diseños del proyecto. La interventoría se encuentra a la espera de esta entrega para su revisión y posterior aprobación.

Paula Luz



Sábado 6 de agosto de 2022.


Estado del tiempo: Nublado

Equipos: no

Personal en obra: no.

En este día se realiza actividad de revisión y ajustes de documentación por parte del contratista.


Paula Luz



Domingo 7 de agosto de 2022.

No se realiza actividad en este día por ser día de descanso.

Marcela Cruz



Lunes 8 de agosto de 2022.

En este día se realiza actividad de revisión y ajustes de documentación respectiva a estudios y diseños por parte del contratista. La interventoría se encuentra a la espera de estos para su revisión y posterior aprobación si es el caso.


Estado del tiempo: Soleado.

Equipos: no.

Personal en obra: no.

Nota aclaratoria: En este día se realiza reunión técnica N°1 y recorrido.

Marcela Cruz



Martes 9 de agosto de 2022.

Estado del tiempo: Soleado.

Equipos: ltrás menores, equipo topográfico.


Personal en obra: 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 residente de obra.

En este día se inician actividades correspondientes a localización y replanteo del terreno. Se realiza levantamiento topográfico desde el 10 en adelante. (Frente de Chuchumbi).

Por otro lado se continúa con actividad administrativa y de documentación por parte del contratista para entrega y revisión por parte de la interventoría.

No hubo novedad alguna en este día.

Marcela Cruz



8

Miércoles 10 de agosto de 2022.

Estado del tiempo: Soleado.

Equipos: hts menores, equipo topográfico.

Personal en obra: 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 residente de obra.

En este día se realiza actividad de localización y replanteo del terreno sobre el tramo a intervenir. Se continúa el levantamiento con base en el trabajo realizado el día anterior. (Frente Chuchurubi).

En labores administrativas, el contratista continúa con los ajustes de la documentación referente a los estudios y diseños. La interventoría por su parte está a la espera de la entrega de estos para su revisión y posterior aprobación y/o observaciones.

No hubo novedad en este día.

Paula Cruz



Jueves 11 de agosto de 2022.

Estado del tiempo: Nublado


Equipos: hts menores, equipo topográfico.

Personal en obra: 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 residente de obra.

Se continúan este día las labores de localización y replanteo del terreno o tramo a intervenir, en el frente de obra de Chuchurubi. Este levantamiento topográfico se continúa con base en lo realizado anteriormente y se da por terminado en este día haciendo un tramo total de 1.450 ml desde ABS K0+000 hasta K1+450.

Por otro lado se continúa con los ajustes de documentación referente a la ejecución de este proyecto para ser revisada y aprobada por la interventoría.

Paula Cruz



Viernes 12 de agosto de 2022.

Estado del tiempo: nublado.

Equipos: hts menores.


Personal en obra: 2 ayudantes.

En este día se realiza actividad de revisión y ajustes de documentación referente a estudios y diseños para entrega a interventoría.

Por otro lado, se realiza en este día instalación de valla informativa en la ABS Kotoño.

No hubo novedad alguna en este día.

Paula Qui



Sábado 13 de agosto de 2022.

Estado del tiempo: lluvioso.

Equipos: no

Personal en obra: no.

En este día es entregada por parte del contratista la carpeta documental de los estudios y diseños del proyecto, los cuales estarán en revisión por parte de la interventoría para posterior observaciones y/o aprobación.


Paula Qui



Domingo 14 de agosto de 2022.

No se realiza actividad en este día por ser día de descanso.

Paula Qui



Lunes 15 de agosto de 2022.

Estado del tiempo:

Equipos: no

10


Personal en obra: no.

En este día la Interventoría inicia revisión de estudios y diseños entregados por el contratista para realizar observaciones o proceder a aprobación.

No hubo novedad en este día.

*Nota aclaratoria: en este día no se realiza actividad por ser día festivo. Lo anteriormente descrito es actividad realizada el día martes 16 de agosto.

Paula Ay



Martes 16 de agosto de 2022.

Estado del tiempo: Soleado


equipos: no

Personal en obra: no

En este día la Interventoría inicia revisión de estudios y diseños entregados por el contratista para realizar observaciones o proceder a aprobación.

No hubo novedad en este día.

Paula Ay



Miércoles 17 de agosto.

Estado del tiempo: Soleado.

equipos: no.

Personal en obra: no.

La Interventoría se encuentra en revisión de estudios y diseños entregados por el contratista para hacer las respectivas observaciones y posterior aprobación.

Paula Ay



Jueves 18 de agosto de 2022.

Estado del tiempo: Soleado.

Equipos: no

Personal en obra: no

En este día la interventoría hace revisión de estudios y diseños entregados por el contratista para realizar observaciones o aprobación.

Maula Ley



Viernes 19 de agosto de 2022.

Estado del tiempo: Soleado.

Equipos: no

Personal en obra: no

En este día, los estudios y diseños entregados por el contratista son revisados por el profesional de interventoría encargado del área para realizar las respectivas observaciones y posteriormente su aprobación.

Maula Ley



Sábado 20 de agosto de 2022.

Estado del tiempo: Soleado.

Equipos: no

Personal en obra: no

Durante la mañana de este día se continúa con las actividades del día anterior.

Se termina la jornada sin novedad alguna.

Maula Ley



12

Domingo 21 de agosto de 2022.

No se realiza actividad en este día por ser día de descanso.

Paula Ar

Lunes 22 de agosto de 2022.

Estado del tiempo: Soleado.

Equipos: no

Personal en obra: 1 profesional Social.

En este día la interventoría continúa con labores de revisión de estudios y diseños entregados por el contratista para realizar las respectivas observaciones. Por otro lado, se inicia levantamiento de actas de vecindad en tramo chuchumbi.

Paula Ar

Martes 23 de agosto de 2022.

Estado del tiempo: Soleado.

Equipos: no

Personal en obra: 1 profesional Social.

En este día se realiza revisión a los estudios y diseños entregados por el contratista para realizar las respectivas observaciones por el profesional de la interventoría encargado del área. Además, se continúa con actas de vecindad.

Paula Ar

Miércoles 24 de agosto de 2022.

Estado del tiempo: Soleado.

Equipos: no

Personal en obra: 1 profesional social.

Durante este día la interventoria realiza revisión de estudios y diseños entregados por el contratista.

No hubo novedad en este día. Además, se realiza levantamiento de actas de vecindad en frente de Chuchumbi.

Paula Ay



Jueves 25 de agosto de 2022.

Estado del tiempo: Soleado.

Equipos: No

Personal en obra: 1 profesional social.

En este día se continúan labores de revisión documental de estudios y diseños por parte del profesional de interventoria encargado del área con el fin de dar observaciones y posterior aprobación. Se continúa con actas de vecindad.

Paula Ay



Viernes 06 de agosto de 2022.

Estado del tiempo: Soleado.

Equipos: No

Personal en obra: 1 profesional social.

Durante este día el profesional por parte de la interventoria realiza revisión de estudios y diseños entregados por el contratista para realizar las respectivas observaciones a corregir o en su defecto realizar la aprobación de estos en caso de cumplir con las condiciones requeridas.

No hay novedad alguna en este día.

Por otro lado, se continúa con levantamiento de actas de vecindad en frente de Chuchumbi.

Paula Ay



14

Sábado 27 de agosto 2022.

Estado del tiempo: Soleado.

Equipos: No

Personal en obra: No

Durante esta jornada se continúa con la revisión de los estudios y diseños entregados por el contratista.

No hay quedada en este día.


Paula Ay



Domingo 28 de agosto de 2022.

No se realiza actividad en este día por ser día de descanso.

Paula Ay



Lunes 29 de agosto de 2022.

Estado del tiempo: Soleado.

Equipos: No

Personal en obra: 1 profesional social.

En este día se realiza actividad de revisión de estudios y diseños por parte de la Intendencia a los documentos entregados por el contratista. Se continúa con actas de veracidad.

Paula Ay



Martes 30 de agosto de 2022.

Estado del tiempo: Soleado

Equipos: No

Personal en obra: 1 profesional social.

La interventoría se encuentra en revisión de estudios y diseños entregados por el contratista para observaciones y/o aprobación. Se continúa con actos de vecindad.

Paula Arz

[Firma]

Miércoles 31 de agosto de 2022.

Estado del tiempo: Soleado.

Equipos: No

Personal en obra: No.

La interventoría se encuentra en revisión de estudios y diseños por parte del personal en el área para realizar observaciones.

No hay novedad alguna en este día.

Paula Arz

[Firma]

Jueves 1 de septiembre de 2022.

Estado del tiempo: Soleado.

Equipos: No

Personal en obra: 1 profesional social.

La interventoría se encuentra en revisión de estudios y diseños entregados por el contratista para realizar observaciones y/o proceder a la aprobación según sea el caso.

Por otro lado, en este día, la interventoría se permite recibir por parte del contratista una carpeta A4 contenida de documentación contractual requerida y concerniente al contrato en mención, la cual será revisada por la interventoría para corroborar tal información.

También, se continúan los trabajos de levantamiento de actos de vecindad en frente de Chuchurubi.

Paula Arz

[Firma]
