

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, DE VIAS TERCIARIAS DEL
PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE CORDOBA**

INFORME MENSUAL IM-08

PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CERETE, CORDOBA

AGOSTO DE 2022

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

CONTRATO 2276 de 2021

**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, DE VIAS TERCIARIAS DEL
PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE CORDOBA**

INFORME MENSUAL IM-08

PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ACI-3B

CONTRATISTA: CONSORCIO EYR 019

CERETE, CORDOBA

AGOSTO DE 2022

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

Contrato de Obra No. <u>181 DE 2021</u>	Contratista: <u>CONSORCIO EYR 019</u>
Contrato de Interventoría No. <u>2276 DE 2021</u>	Interventoría: <u>CONSORCIO ACI-3B</u>

Objeto Contrato de Obra:
 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEPILLO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

INFORME MENSUAL No. <u>8</u>	MES O PERIODO: <u>AGOSTO</u>
-------------------------------------	-------------------------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	2
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	4
1	INTRODUCCIÓN		6
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		7
2.1	Localización		7
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		8
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		9
2.4	Características técnicas del proyecto		10
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		15
3.1	Información general del contrato		15
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		15
3.3	Seguimiento ítems no previstos		18
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		18
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		18
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	18
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	19
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	19
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	20
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	20
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	20
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	20
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	21
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		21
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
	• Seguimiento Programa de Obra	MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-6-FR-2	22
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-1	22
		MEPI-MN-IN-14-FR-2	22
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		22
5.1	Información general del contrato		22
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		23
5.3	Informes especialistas y profesionales		24
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		24
5.5	Informe matriz de riesgos.		24
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		24
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		24
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	24
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	25
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	25
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	26
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	26
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		26

	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	26
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	Conclusiones y recomendaciones		27
8	Anexos		29
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		29
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		29
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		29
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		29

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.



Firma: _____

Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. 558 de fecha 17 de febrero de 2022

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
			VERSION	1
			PÁGINA	1 DE 2

			FECHA	31-ago-22 (Día / Mes / Año)
--	--	--	-------	--------------------------------

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CÓRDOBA	PERIODO MES:	AGOSTO
-------------------	------------------------------	------------------------	---------	--------------	--------

CONTRATO DE OBRA No.: 181 DE 2021	PLAZO INICIAL:	6 MESES	VALOR INICIAL (incluido IVA):	\$ 4.431.421.060,00
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEPILLO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	FECHA DE INICIO:	31/01/2022	VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	\$ -
	FECHA DE SUSPENSIÓN:		VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	\$ -
	FECHA DE REANUDACIÓN:	31/12/2022	ANTICIPO CONCEDIDO:	\$ -
CONTRATISTA: CONSORCIO EYR 019	PLAZO ACUMULADO:		ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	2276 DE 2021	INTERVENTOR:	CONSORCIO ACI-3B	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	ING. NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
----------------------------	--------------	--------------	------------------	---	------------------------------------

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:20%;">ACTIVIDAD</th> <th style="width:10%;">UNIDAD</th> <th style="width:10%;">CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Pavimentación</td> <td>Construcción</td> <td>ml</td> </tr> <tr> <td>Mejoramiento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rehabilitación</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Estructuras</td> <td>Túneles</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Puentes</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pontones</td> <td>unidad</td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros (Especificar cuales)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción	ml	Mejoramiento		Rehabilitación		Estructuras	Túneles		Puentes		Pontones	unidad	Mantenimiento			Otros (Especificar cuales)			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:20%;">ACTIVIDAD</th> <th style="width:10%;">UNIDAD</th> <th style="width:10%;">CANTIDAD MES</th> <th style="width:10%;">CANTIDAD ACUMULADA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Pavimentación</td> <td>Construcción</td> <td>ml</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mejoramiento</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rehabilitación</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Estructuras</td> <td>Túneles</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Puentes</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pontones</td> <td>unidad</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros (Especificar cuales)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción	ml		Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones	unidad		Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)			
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																						
Pavimentación	Construcción	ml																																																						
	Mejoramiento																																																							
	Rehabilitación																																																							
Estructuras	Túneles																																																							
	Puentes																																																							
	Pontones	unidad																																																						
Mantenimiento																																																								
Otros (Especificar cuales)																																																								
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																					
Pavimentación	Construcción	ml																																																						
	Mejoramiento																																																							
	Rehabilitación																																																							
Estructuras	Túneles																																																							
	Puentes																																																							
	Pontones	unidad																																																						
Mantenimiento																																																								
Otros (Especificar cuales)																																																								

AVANCE FINANCIERO


VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES	VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES
--	---------------------------------

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	4.363.516.035,00		4.363.516.035,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	48.950.049,10		48.950.049,10
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	15.928.551,00	3.026.425,00	18.954.976,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	4.412.466.084,00	0,00	4.431.421.060,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	507.619.129,50		507.619.129,50	2.656.673.543,32
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS	15.928.551,00	3.026.425,00	18.954.976,00	18.954.976,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO	523.547.680,50			2.675.628.519,32

INVERSIÓN EN OBRA INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 2.800.070.038,00 INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 2.656.673.543,32 AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 94,88%	EMPLEOS GENERADOS EN EL MES MANO DE OBRA CALIFICADA: 15 MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 9 EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2 TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 26
--	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO PARA PAVIMENTO ENTRE LAS ABCISAS K1+450 A K1+020	ALETAS DE BOXCULVERT DE 3X3 K1+480
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)	
<div><div><div>Firma</div><div></div></div><div>Nombre Miguel Armando Diaz Director de Interventoría Matrícula Profesional No.25202-12786 CND</div><div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial</div></div>	

1. INTRODUCCIÓN

Con el objeto de mejorar la calidad de la infraestructura vial de nuestro país, el Gobierno Nacional viene implementado diferentes estrategias encaminadas al logro de ese objetivo, es así como en el sector de la red terciaria, dentro el programa “Colombia Rural” por medio de INVÍAS, se suscribieron convenios con los municipios del país con el objeto de ejecutar actividades de mejoramiento, conservación y mantenimiento a sus diferentes vías, donde la entidad aporta los recursos que se requieren para su ejecución que atienda los documentos técnicos, normas y especificaciones requeridas.

La necesidad que se pretende satisfacer con la celebración del presente Convenio se encuentra en los Estudios Previos suscritos por el Subdirector de la Red Terciaria y Férrea, los cuales forman parte del presente documento.

El Instituto Nacional de vías INVÍAS mediante Resolución Número 4218 del 21 de diciembre de 2021, realizó la apertura del Concurso de Méritos No. CMA-DO-SRT-167-2021 para contratar la Interventoría cuyo objeto es **“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.**

El presente documento contiene el informe Mensual de interventoría No.08, el cual tiene por objeto describir en forma detallada cada una de las actividades realizadas tanto por el Contratista de obra como por la Interventoría, durante el período comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2022.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto se encuentra localizado en el municipio de Cereté, en el departamento de Córdoba, Colombia. El municipio de Cereté limita por el norte con los municipios de San Pelayo y Chimá, por el este con el municipio de Ciénaga de Oro, por el oeste con el municipio de Montería y por el sur con los municipios de San Carlos y Montería.

El proyecto en estudio se localiza en zona rural del municipio de Cereté en el corregimiento de Rabolargo en el sector San Antonio – El Cepillo,

El material que se va a utilizar en este proyecto, será suministrado por la cantera Villa Carmen la cual cuenta con Licencia Ambiental otorgada por la CAR del departamento y se encuentra ubicada en la vía hacia Planeta Rica.

Es preciso aclarar que no será necesario montaje de Plantas de asfalto y/o concreto, dicho material será suministrado por plantas ya establecidas que cuenten con los permisos requeridos por la Corporación Autónoma Regional de los valles del Sinú y del San Jorge – CVS. Así mismo, para el caso de material de arrastre, la explotación de dicho material no se hará en la zona, sino que será suministrado por canteras legalizadas

A continuación, se muestra una imagen general y específica de la ubicación de la vía en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

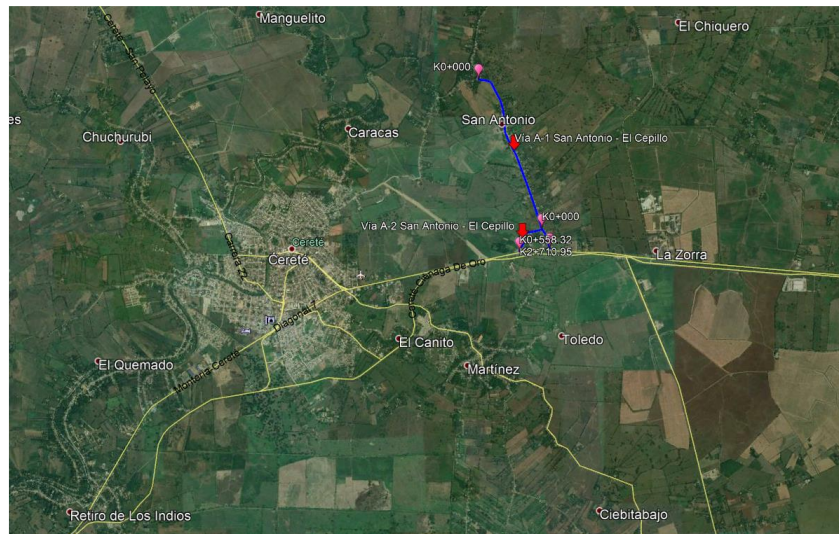


Figura 1 Localización General del Proyecto.

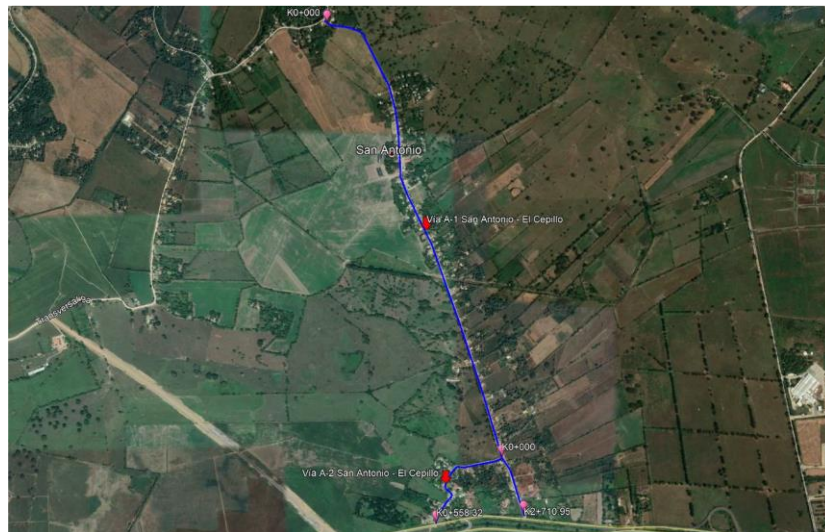


Figura 2 Localización específica de la vía a diseñar.

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto cuenta con varios municipios que hacen parte de la zona de influencia, limitando al norte con el municipio de San Pelayo, por el este con el municipio de Ciénaga de oro, por el oeste con el municipio de Montería y por el sur con el municipio de San Carlos,

Los cuales se ven beneficiados con la realización de este proyecto, ya que estos permiten la unión entre las cabeceras municipales, de esta manera se potencia el intercambio comercial y se fortalece la economía nacional, reduciendo también los costos operativos, proporcionando una mayor movilidad de personas, bienes y servicios; mejorando en tiempo y contaminación del ambiente y en consecuencia brindando más impulso económico de la zona por donde atraviesa dicho proyecto.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO ACTUAL DE LA VÍA

Actualmente esta vía se encuentra en afirmado en regulares condiciones, ya que su capa de rodadura se ha desgastado por la falta de mantenimiento periódico y rutinario, no se han atendido los puntos críticos aunado al tránsito de vehículos pesados, lo que conlleva a daño en vehículos particulares, baja transitabilidad y largos periodos de desplazamiento; notándose deterioros generalizados como ondulaciones, ahuellamiento, pérdida de grava, baches.

	
PR K1+850 Estado Inicial de la Obra	PR k1+850 Pavimento Terminado
	
PR 2+450 Estado Inicial de la Obra	PR 2+450 Pavimento Terminado

	
PR 1+600 Estado Inicial de la Obra	PR 1+600 Pavimento Terminado
	
PR 1+000 Estado Inicial de la Obra	PR 1+000 Seguimiento Con Afirmado
	
PR 2+600 Estado Inicial de la Obra	PR 2+600 Pavimento Terminado

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto en general consiste en la construcción de 2.710 metros lineales de pavimento, la estructura costa con un ancho de 5 metros, con bordillo prefabricados en ambos lados, una capa en afirmado con un espesor de 0,3 metros y de subbase con un espesor de 0,15 metros, de igual manera se construirán 2 box culvert, uno de 1x1 (L =8,1m) y un segundo: DOBLE 3X3 (L =8,1m), los cuales se ubicarán en la zona rural vía san Antonio cepillo, como seguidamente se anota

La vía se localiza en terreno plano con un ancho de calzada de 5.00 m. Los vehículos circulan a velocidades de operación de 40 km/h para el alineamiento 1 y 30 km/h para el

alineamiento 2, en casos en donde por condiciones geométricas no se puede circular a esa velocidad se avisará al conductor que disminuya la velocidad por medio de señales de tránsito.

Parámetros de Diseño

Velocidad de Diseño	30 a 40 Kh/h
Tipo de terreno	Plano
Bombeo	2%
Ancho de Calzada	5 metros
Ancho de Carril	2,5 metros
Pendiente Máxima	4%
Longitud	2,710 Metros

CORTE SECCIÓN TRANSVERSAL DE LA VÍA

DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO






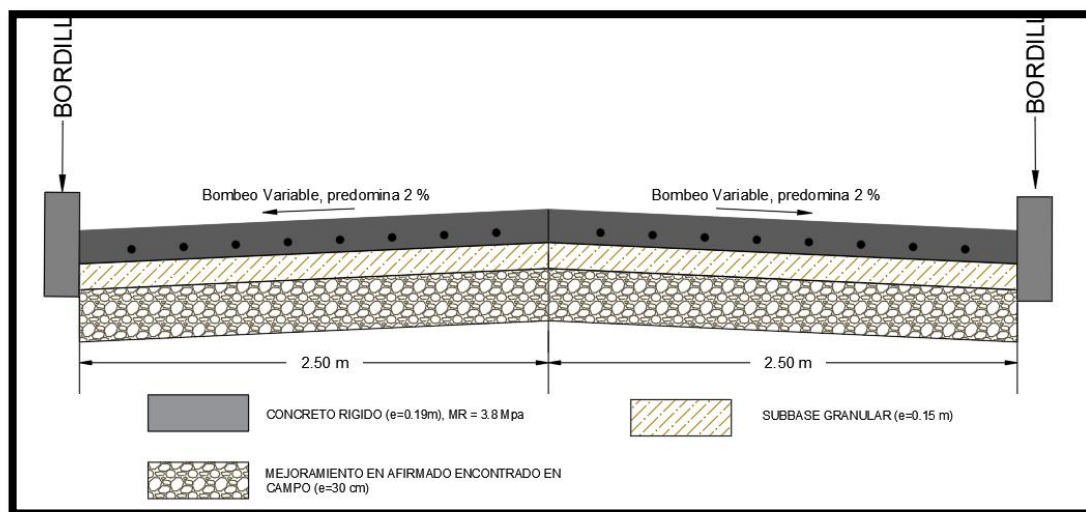


Figura 1

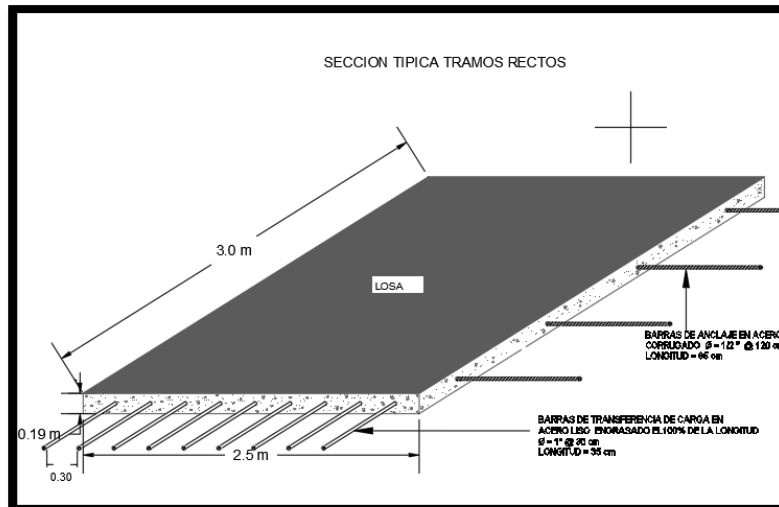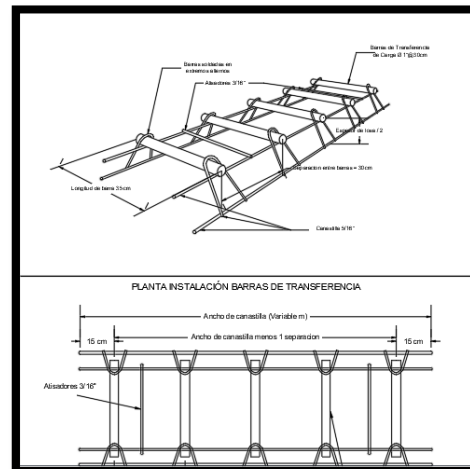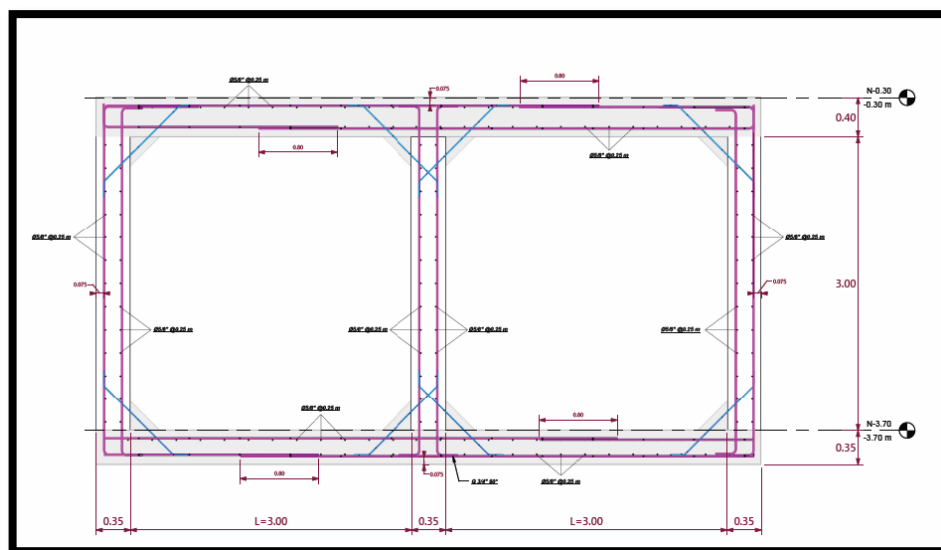

DISEÑO DEL BOXCULVERT K1+480

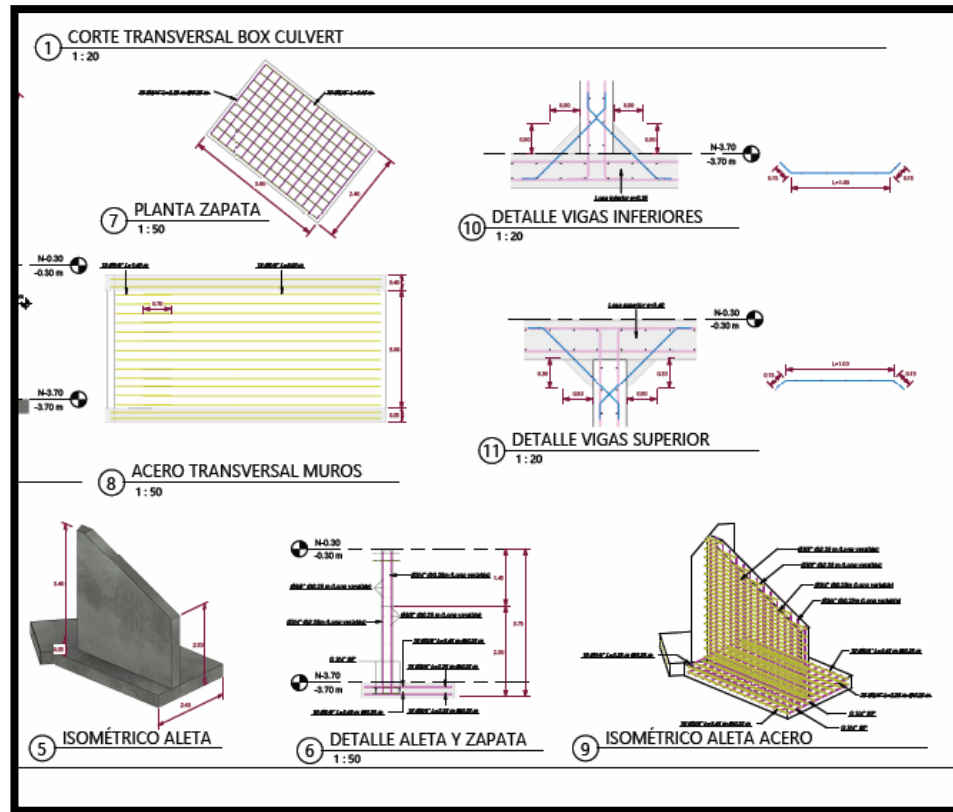

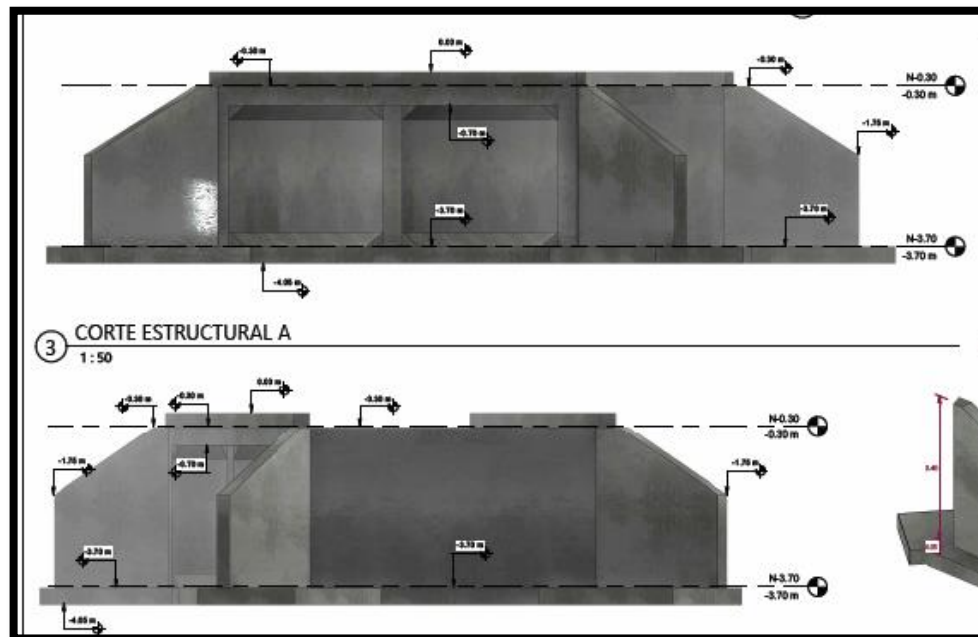

3 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRANTE	MUNICIPIO DE CERETE – CORDOBA
OBJETO DEL CONTRATO	“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEPILLO CORREGIMIENTO DE RABOLARGO MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”.
CONTRATO DE OBRA No	No. 181 DE 2021
CONTRATISTA	CONSORCIO EYR 019 INTEGRANTES: ELESCO S.A.S 90% RAFAEL NAVAS MONTES 10%
REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL MONTES NAVAS
NIT	901543340-8
DIRECCIÓN	Carrera 11 # 59-49 Oficina 201 Montería
TELÉFONO	604-7860389
PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA	6 MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA	31 DE ENERO DE 2022
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA	31 DE JULIO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA No. 1	31 DE DICIEMBRE DE 2022
VALOR DEL CONTRATO	\$ 4.431.421.060.00

3.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

- **Excavación Mecánica:** es el conjunto de actividades de excavar, remover, cargar transportar hasta el límite de acarreo libre y colocar en los sitios de disposición, los materiales provenientes de los cortes requeridos para la explanación, canales.

La actividad de excavación mecánica se realizó para la estructural del Boxculvert de 1x1 en el k2+700 y para la excavación de las aletas del Bxoculvert de 3x3 del k1+480

- **Afirmado:** es el suministro, transporte, colocación y compactación de los materiales de afirmado sobre la subrasante terminada o sobre un afirmado existente. En el presente

mes se instaló material de afirmado entre las abscisas entre las k0+000 a k1+200 y se compacto, se resalta que este material tuvo que ser cambiado porque se encontraba en mal estado por el paso continuo de las volquetas y los fuertes aguacero material que es colocado a costo del contratista.

- Subbase: es el suministro, transporte, colocación, humedecimiento, extensión y conformación, compactación y terminado del material de sub-base granular aprobada sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos y demás documentos del proyecto o establecidos por el Interventor. Este material en el presente mes se ha instalado entre las abscisas entre k1+380 a k1+000
- Concreto Pavimento Hidráulico: se refiere a la construcción de un pavimento de concreto hidráulico con juntas; y consiste en la elaboración, el transporte y el vibrado de una mezcla de concreto hidráulico en forma de losas, con o sin refuerzo; la ejecución y el sellado de juntas; el acabado, el curado y las demás actividades necesarias para la correcta construcción del pavimento de concreto hidráulico de acuerdo con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos y demás documentos del proyecto o establecidos por el Interventor.

En el presente mes el Contratista instaló Concreto para Pavimento entre las abscisas k2+680 y K2+708 y entre k1+020 a k1+450 obteniendo una longitud acumulada de 1.600 ml.

- En los boxculvert del k1+480 y k2+700 se figuró e instalo acero de refuerzo, también se colocó concreto con resistencia de 4.000 PSI para muros, y losas inferiores.
- Se realizan liberaciones de sub base e instalación de rieles por parte de la Interventoría.

Se toman densidades en Subbase entre las abscisas del k1+020 a k1+450 por parte del laboratorio de Interventoría

- Se toman muestras de vigueta al concreto para efectos de calidad del material.
- Se toma muestra de slump para verificar el asentamiento del concreto.
- El 19 de agosto se realiza comité de obra donde estuvieron presentes contratista, funcionarios de la Secretaria de Planeación, Infraestructura e Interventoría, donde se trataron los siguientes temas: revisión de compromisos, avance de obra

A continuación, se presentan las cantidades de obra ejecutadas al corte de este informe

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES AGOSTO

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	507.619.129,50		507.619.129,50	2.656.673.543,32
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS	15.928.551,00	3.026.425,00	18.954.976,00	18.954.976,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				

GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO	523.547.680,50			2.675.628.519,32

3.3 ÍTEMS NO PREVISTOS

Actualmente el contrato no requiere de actividades no previstas.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

- Se le solicito al Contratista arreglar la vía entre las abscisas del k0+800 a k1+000 debido al gran deterioro que esta presenta, por el constante paso de volquetas y las fuertes lluvias caídas en el sector. Del mismo modo se recomendó que en los tramos donde se están afectando la tubería de 8 pulgadas se instalara cárcamos
- Se solicitó al Consorcio EYR tomar los correctivos necesarios para no volver a presentar lo sucedido el pasado 5 de julio del presente año, donde se fundió con planta móvil en la abscisa del k2+320 y se le informo al Residente de obra que la planta había colocado ese concreto sin cemento debido a un inconveniente que presento en ese momento, pero la cuadrilla no saco ese material que cayó si no que lo revolvió con el resto de la mezcla, por lo cual la placa se está segregando el material por lo que se requiere que el Contratista presente una propuesta para arreglar la placa en mención lo más pronto posible, esto en aras de preservar la calidad de la obra terminada.

4 REPORTE DE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 INFORME SEMANAL

Se realizaron cinco (5) informes semanales correspondientes al periodo en mención, los cuales se encuentra relacionados en el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3. (Ver página 30)

INFORMES SEMANALES	FECHA
27	DEL 29 JULIO AL 4 AGOSTO
28	DEL 5 AL 11 AGOSTO

INFORMES SEMANALES	FECHA
29	DEL 12 AL 18 AGOSTO
30	DEL 19 AL 25 AGOSTO
31	DEL 26 AGOSTO AL 1 SEPTIEMBRE

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 se relacionan la maquinaria y equipos relacionados en el presente mes. (ver 40 página)

MAQUINARIA Y EQUIPO			
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN
MOTONIVELADORA	CATERPILAR	12 TONELADA	EL CEPILLO
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILAR	12 TONELADA	EL CEPILLO
RETRO-CARGADOR	CATERPILAR	1,0 M3	EL CEPILLO
VOLQUETAS	INTERNACIONAL	14 M3	EL CEPILLO
VOLQUETAS	KIA	14 M3	EL CEPILLO
MIXER	KENWORTH	8M3	EL CEPILLO

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 se relaciona el Personal del contrato de obra que laboró en el mes de junio (Ver Página 42)

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO		
No.	DESCRIPCIÓN	NOMBRE
1	Director de Obra	CESAR HERNANDEZ
2	Profesional Social	YULLIA PADILLA MONTES
3	Topografía	EMERSON AVILA MULASCO
4	Cadenero 1	JOSE DANIEL FERNANDEZ BARRERA

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO		
No.	DESCRIPCIÓN	NOMBRE
5	Cadenero 1	EMERSON DAVID AVILA MULAZCO
6	Oficios Varios	JOSE MIGUEL BERROCAL LÓPEZ
7	Ingeniero Residente	KAREN JOSEFA GUTIERREZ ARRIETA
8	Auxiliar Hseq En Obra	LEISY SOFÍA GONZÁLEZ COGOLLO
9	Paletero	ANA PATRICIA DIAZ PEREZ
10	Paletero	LUISA FERNANDA ARDILA ALVAREZ
11	Oficios Varios	JAIRO ARMANDO POMARES HERRERA
12	Operador	LUIS PAEZ IBARRA
13	Operador	OSCAR MORA MORA
14	Operador	CRISTIAN LOPEZ HERAZO

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 se relaciona el Estado Financiero y Presupuestal del Contrato de Obra, el contratista ya presento el acta de obra número dos (2) el cual corresponde al 16% del valor ejecutado del mes de julio y fue revisada y aprobada por esta Interventoría. En este mes el Contratista no se presentó acta de obra (Ver página 44)

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 se relacionan el estado general del tiempo del presente mes. (Ver página 46)

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

El Contratista presento ensayos de laboratorio, los cuales están en el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 (Ver página 47)

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se relacionan el Seguimientos Garantías y Seguros Contrato de Obra se adjuntan en el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 (Ver página 60)

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	100%	\$ 443.142.106,00	31/01/2022	3/12/2022
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$ 1.329.426.318,00	31/01/2022	3/12/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	100%	\$ 886.284.212,00	31/01/2022	3/06/2025
Estabilidad y Calidad de la Obra	100%	\$ 1.329.426.318,00	5 años a partir del Recibo y Aprobación del Acta Final y Recibo a Satisfacción de la Entidad Contratante	
Calidad del Servicio	100%	\$ 4.778.556,00	3/06/2022	3/06/2027

Pólizas adición en tiempo

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	100%	\$ 443.142.106,00	31/01/2022	1/07/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$ 1.329.426.318,00	31/01/2022	1/07/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	100%	\$ 886.284.212,00	31/01/2023	1/01/2027
Estabilidad y Calidad de la Obra	100%	\$ 1.329.426.318,00	5 años a partir del Recibo y Aprobación del Acta Final y Recibo a Satisfacción de la Entidad Contratante	
Calidad del Servicio	100%	\$ 4.778.556,00	31/12/2022	31/12/2027

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA

Se relacionan el Seguimiento al Plan de Calidad del Contrato de Obra, pero se adjuntan el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14. (Ver página 66)

4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

- Seguimiento a la inversión del Anticipo: este Contrato no contempla anticipo

- Seguimiento Programa de Obra: Para este mes se tenía programado instalación de concreto para pavimento de bordillo, los cuales fueron incumplidos por el Contratista, por tal razón fue necesario aprobar una prórroga en tiempo por 5 meses más.
- Seguimiento Programa de Inversiones: Para este mes se tenía previsto una Inversión Programada Acumulada de \$ 2.800.070.038 la cual representa un porcentaje del 63,19% versus una Inversión Ejecutada Acumulada de \$ 2.656.673.543 la cual representa un porcentaje del 59,95 % siendo el atraso de 3,24%. (Ver Página 71)
- Actas de Comité de Obra: se realizó un (1) Comité de Obra esta información se presenta en el Formato MEPI-MN1-IN-14-FR-1(Ver página 72)
- Actas de Reunión: no se realizó Acta de reunión por lo cual no se relaciona en el Formato MEPI-MN1-IN-14-FR-2

5 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)
OBJETO:	“INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA- GRUPO 4”
CONTRATO No	2276 DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO ACI-3B INTEGRADO POR: ACI PROYECTOS SAS CON NIT. 860.059.851-6 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50 %

	Y 3B PROYECTOS SAS CON NIT. 900.504.398-4 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50%
NIT	901.551.292-6
TELEFONO	601-74060460
DIRECCIÓN	Oficina. Carrera 7 156 -10 Piso 31 Torre Krystal – North Point
LOCALIZACIÓN:	“SAN ANTONIO EL CEPILLO CORREGIMIENTO DE RABOLARGO CERETÉ CORDOBA”
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	28 DE ENERO DE 2022
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	31 DE JULIO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA No. 1	31 DE DICIEMBRE DE 2022
VALOR DEL CONTRATO:	\$1.930.530.773

5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

La Interventoría realizó las siguientes actividades:

- Revisión de la documentación entregada por el contratista.
- Seguimiento de las actividades de excavación, retiro y colocación de material de afirmado.
- Verificación de afiliaciones del personal.
- Realización de Comités de obra.
- Realización de informes semanales y mensual.

- Requerimientos escritos al contratista para el cumplimiento de obligaciones contractuales conforme a lo establecido en el pliego de condiciones.
- Seguimiento al avance de obra registrado en el período
- Registro fotográfico de los avances de obra registrados en el periodo.
- Seguimiento al cumplimiento de normas de seguridad industrial, control de señalización y demarcación de frentes de trabajo, control de suministro y uso de dotación de obra y elementos de seguridad.

5.3. INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

No se presentaron Informe de los Especialistas.

5.4. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

El Informe de matriz de riesgo se encuentra en ejecución por parte de esta Interventoría

5.5. INFORME MATRIZ DE RIESGOS

El Informe de matriz de riesgo se encuentra en ejecución por parte de esta Interventoría

5.6. INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA.

De acuerdo al sistema de gestión documental implementado por INVIAS a través de las fuentes de información que maneja los documentos electrónicos, a la fecha se encuentra actualizada la plataforma CIFRA.

6 REPORTE DE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Esta información se encuentra relacionada en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5. (Ver página 75)

EQUIPOS Y VEHICULOS	
DESCRIPCIÓN	MARCA O MODELO
CAMIONETA	Doble Cabina, Placa Ugu681, Marca Toyota, Cilindraje 2494, Modelo 2015
MOTOCICLETAS	Marca: Akt, Cilindraje: 200, Placa: Asx-48g
NIVEL	Marca Topcom, Modelo At-B4, Serie Mz 9945
ESTACIÓN PARA TOPOGRAFÍA	Marca Sokkia Set 6 Serie D22852

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se encuentra relacionada en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 (Ver página 77)

PERSONAL DE INTERVENTORIA	
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
Miguel Armando Díaz Rivera	Director
Sergio Solano Almanza	Residente
María José Teherán Guerra	Inspector Siso
Camilo Vivas Ospina	Topógrafo
Luis Miguel Oviedo Ramos	Cadenero
Jesús Alfonso Carrascal Soto	Conductor

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta
1	ENERO - 2022	\$ 456.300,00	\$ 86.697,00	\$ 542.997,00
2	FEBRERO - 2022	\$ 39.956.820,00	\$ 7.591.796,00	\$ 47.548.616,00
3	MARZO - 2022	\$ 61.066.163,00	\$ 11.602.571,00	\$ 72.668.734,00

4	ABRIL - 2022	\$ 88.928.160,00	\$ 16.896.350,00	\$ 105.824.510,00
5	MAYO - 2022	\$ 13.315.246,05	\$ 2.529.897,00	\$ 15.845.143,00
		\$ 78.131.354,00	\$ 14.844.957,00	\$ 92.976.311,00
6	JUNIO - 2022	\$ 5.902.260,00	\$ 1.121.429,00	\$ 7.023.689,00
		\$ 94.536.797,00	\$ 17.961.992,00	\$ 112.498.789,00
7	JULIO - 2022	\$ 101.134.200,00	\$ 19.215.498,00	\$ 120.349.698,00
8	AGOSTO - 2022	\$ 111.185.700,00	\$ 21.125.283,00	\$ 132.310.983,00
TOTALES		\$ 594.613.000,05	\$ 112.976.470	\$ 707.589.470

Se relacionada en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 (Ver página 79)

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se encuentra relacionada en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13. (Ver página 81)

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Buen Manejo del Anticipo	27/01/2022	01/03/2023	\$ 811.147.384
Calidad de Servicio	29/08/2022	29/08/2027	\$ 579.159.232
Cumplimiento	27/01/2022	01/03/2023	\$193.053.077
Salarios y prestaciones Sociales	27/01/2022	29/08/2025	\$ 386.106.155

Pólizas Adición de Tiempo

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Buen Manejo del Anticipo	27/01/2022	03/07/2023	\$ 811.147.384
Calidad de Servicio	31/12/2022	21/12/2027	\$ 579.159.232
Cumplimiento	27/01/2022	03/07/2023	\$193.053.077
Salarios y prestaciones Sociales	27/01/2022	31/12/2025	\$ 386.106.155

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La Interventoría, se encuentra en elaboración del plan de calidad. En el presente informe no se presenta el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15.

6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

- Seguimiento a la inversión del Anticipo: el Contrato de Interventoría no contempla anticipo.
- Plan De Cargas o Reprogramación al Plan de Cargas Aprobado: Esta información es la misma dada que a la fecha no se han registrado reprogramación. (Ver Página 83)
- Seguimiento al Plan de Cargas: Esta información se encuentra en ejecución por parte de esta Interventoría por lo que no se relacionada en el formato MEPI-MN-IN-9-FR-3.

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En agosto de 2022, se tenía previsto una Inversión Programada Acumulada de \$ 2.800.070.038 la cual representa un porcentaje del 63,19% versus una Inversión Ejecutada Acumulada de \$ 2.656.673.543, la cual representa un porcentaje del 59,95 % siendo el atraso de 3,24%, este avance es teniendo en cuenta que el contrato se prorrogó hasta diciembre y se aprobó una nueva reprogramación.
- Al corte de este informe el Contratista lleva 1.6070 metros lineales de pavimento instalado divididos así: k1+530 a k2+7070 y entre k1+020 a k1+450, el boxculvert de 3x3 del 1+480 se encuentra en un porcentaje de ejecución del 90 % faltando por fundir dos aletas y el relleno estructura, el box de 1x1 del k2+700 ya se encuentra ejecutado en un 100%.
- Se recomendó al Consorcio EYR 019 tomar los correctivos necesarios para que el Concreto instalado para los Boxculvert no sigue presentando segregación debido a que se están evidenciando segregaciones en la estructura específicamente, esto se presenta ya sea por la mala dosificación del material en planta o por la falta de vibración al concreto.
- El día 08 de agosto de 2022, el Contratista ejecutó la instalación de concreto para pavimento entre las abscisas k1+320 a 1+380 sin la presencia de la Interventoría, situación que es preocupante debido que no es la primera vez que sucede, a pesar de que esta fundida había sido cancelada como a las 5:00 pm de ese día por el mal estado de la vía entre k0+980 a k0+900, dicho tramo empezó la fundida como a las 11.00 pm de la noche terminando como a las 4:00 am del día siguientes. La interventoría requirió al Contratista programar las fundidas de concreto con tiempo para que el personal de la Interventoría pueda ejercer el control de la actividad.

- El pasado 5 de julio del presente año se fundió con planta móvil en la abscisa del k2+320 en donde se le informo al residente de obra que la planta había colocado ese concreto sin cemento debido a un inconveniente que presento en ese momento, pero la cuadrilla no saco ese material que cayó si no que lo revolvió con el resto de la mezcla. La Interventoría solicitó al Consorcio EYR tomar los correctivos necesarios para no volver a presentar dicha situación y presentar una propuesta para arreglar la placa en mención lo más pronto posible, el Contratista ya realizó visita en conjunto con la Interventoría y se tomó la decisión de demoler una placa completa y un tercio de la otra para realizar el respectivo arreglo.
- Se le reiteró al Contratista la necesidad de contar en obra con el personal mínimo requerido tal como es el caso del Director y Residente de Obra el cual debe tener la disponibilidad de estar en la obra tal como aparecen en los Pliegos de Condiciones y Anexo Técnico.

8 ANEXOS

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

Se relaciona correspondencia enviada al Contratista (Ver página 85)

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

Se adjunta registro fotográfico del avance de las actividades ejecutadas en obra (Ver página 110)

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS

Se adjunta registro fotográfico de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad, dada que estas actividades no se han realizado. (Ver página 112)

8.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

Se adjunta la Bitácora de Obra, libro donde se realizan todas las actividades que se realizaron durante el periodo. (Ver página 113)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MIMP-ING-015-FR-3 1 1						
		FECHA	5-ago-22 <small>(Día / Mes / Año)</small>						
I. INFORMACIÓN GENERAL									
PROYECTO MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA - GRUPO 4... UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA SEMANA No.: 27 del 29-Jul-22 al 4-ago-22 SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ING NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO GESTOR TECNICO DE PROYECTO: (Numeración consecutiva) OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO DEL CÉPELO CORREGIMIENTO DE RAOLARGO MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: LA META FISICA A EJECUTAR ES LA PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LOS K2+710 DE LA VIA SAN ANTONIO-EL CEPILLO									
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE 38 MR, CON UNA SECCIÓN TÍPICA DE 5.5 DE ANCHO POR 30CM DE ESPESOR, CON UNA ESTRUCTURA DE AFIRMADO Y 15 CM DE SUBBASE. EL ESPESOR DEL CONCRETO PARA EL PAVIMENTO ES DE 19 CM, ADEMÁS DE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS BOX COULVERT EN LA VIA AL CEPILLO, BORDILLOS EN CONCRETO PREFABRICADO Y LA SEÑALIZACIÓN VIAL CORRESPONDIENTE									
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:							
CONTRATISTA: CONSORCIO EVO 019 INTEGRANTES: ELASCO S.A.S CON 80% - PASEAL NUVAS MONTES CON 20% CONTRATO No.: 161 VALOR INICIAL: \$ 4.431.421.090,00 FECHA DE INICIO: 31-08-21 VALOR ADICIONES: \$ VALOR ACUMULADO: \$ FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31-08-22 PRORROGA EN TIEMPO ADICIONAL: \$ 5.163,65 FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: 31-08-22 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: \$		INTERVENTOR: CONSORCIO ALC 38 INTEGRANTES: ALC INTERVENTORES S.A.S CON 50% - 18 PROYECTOS S.A.S CON 50% CONTRATO No.: 2275-061-2021 VALOR INICIAL: \$ 1.930.530.773,00 FECHA DE INICIO: 28-08-21 VALOR ADICIONES: \$ VALOR ACUMULADO: \$ FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31-08-22 PRORROGA EN TIEMPO ADICIONAL: \$ 5.163,65 FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: 31-08-22 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: \$ VALOR ANTICIPO: \$ VALOR AMORTIZADO: \$ SALDO POR AMORTIZAR: \$							
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO									
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:									
CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024				
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 4.431.421.090							
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA								
	SALDO DE VIGENCIA								
	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1.930.530.773							
INTERVENCIÓN A	RECURSOS POR VIGENCIA								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA								
	SALDO DE VIGENCIA								
OBRA									
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 4.431.421.090,00								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 4.431.421.090,00	100,00%							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 2.241.147.603,65	50,58%							
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ 2.241.147.603,65	50,58%							
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 15.508.551,00	0,35%							
<small>(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)</small>									
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 4.431.421.090,00	100,00%							
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 2.241.147.603,65	50,58%							
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ 2.241.147.603,65	50,58%							
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	\$ 317.107.969,70	7,27%							
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	\$ 99.798.510,85	2,18%							
INTERVENTORIA									
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 779.817.634,59	29,32 %							
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 550.183.787,47	26,50 %							
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	\$ 8.750.707,44	0,45% %							
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	\$ 7.135.051,15	0,97% %							
ANTICIPOS									
Obligado \$	0								
Amortizado \$	0								
Saldo \$	0								
INDICADOR IC									
En el mes:	0								
Acumulado:	0								
ANTICIPOS									
Obligado \$	0								
Amortizado \$	0								
Saldo \$	0								
III. AVANCE FÍSICO									
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base									
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia en	Avance Físico	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
						Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total
Estudios y diseños	g	2	2021	2021	100%	1	1	2	100,00%
Box-culvert	mt	2	2021	2021	100%	1	1	2	100,00%
Pavimento concreto	mt	2710	2021	2021	100%	2710	0	2710	100,00%
Señalización	mt	2710	2021	2021	100%	2710	0	2710	100,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO									
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible							
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	1							
MOTONIVELADORA	1	1							
VIBROCOMPACTADOR	1	1							
VOLQUETAS	2	2							
Total	5	5							
IV. GESTIÓN AMBIENTAL									
FUENTES DE MATERIALES									
UBICACIÓN: PLANTA VASCON TRONCAL 2 VIA CERETE SAN CARLOS	PERMISO MINERO: SI	X	NO						
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO						
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI		NO						
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO						
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL									
ZONAS DE DEPÓSITO	SI		NO						
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO						
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO						
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO						
OCCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO						
VERTIMIENTOS:	SI		NO						
EMISORES:	SI		NO						
OTROS (Especificar cual):	SI		NO						
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)									
V. GESTIÓN SOCIAL									
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	19	2							
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9								
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2								
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4								
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	17								
VI. GESTIÓN PREDIAL									
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	0								
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	0								
AVANOS APROBADOS:	0								
PREDIOS ADQUIRIDOS:	0								
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD									
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS									
El Contratista lleva acumulada las siguientes actividades:	ABS INI	ABS FIN	LONG (m)	TOTAL (m)					
Excavación Mecánica	K0+000	K2+680	2.680,0	2.680,0					
Instalación de Afirmado	K0+000	K1+420	1.420,0	2.600,0					
	K1+500	K2+680	1.180,0						
Instalación de Sub-base	K1+530	K2+680	1.150,0	1.280,0					
	K1+320	K1+450	130,0						
Instalación de Concreto Pavimento	K1+530	K2+680	1.150,0	1.220,0					
	K1+380	K1+450	70,0						
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA									

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS									
PROGRAMADO									PROGRAMADO
EJECUTADO									EJECUTADO
CONVENIONES									
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI/MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.									
XII. REGISTRO FOTOGRÁFICO									
Via San Antonio- El capillo Instalación de Concreto para Pavimento K1+380 A K1+450			Via San Antonio- El capillo Instalación de Concreto para los inferior y acero de muros del Box de 131 K2+700			Via San Antonio- El capillo Conformación e Instalación de Material de Sub-base K1+350 a K1+450			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.									
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA									
Se le reitera al Consorcio EYR la entrega de la Re programación y Programa de Inversiones de acuerdo a la nueva fecha de terminación y de esta manera continuar con el respectivo seguimiento al Contrato de Obra.									
FIRMA									
NOMBRE: <u>MEDEL ANTONIO DIAZ RIVERA</u>									
Matrícula Profesional No.: <u>2502-12786 CND</u>									
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Control del Proyecto.									
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Operatividad, Contratación, Interventoría y Dirección Técnica.									

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO REGIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MEP-INV-015-FR-3						
				VERSIÓN	1						
				Página							
				FECHA	12-ago-22 (Día / Mes / Año)						
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA - GRUPO 4.											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA		SEMANA No.: 28 del 5-ago-22 al 11-ago-22 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ING NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. ALVARO GALVE									
OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO DELA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO EL CEPILLO CORREGIMIENTO DE RAOLARGO MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: LA META FÍSICA A EJECUTAR ES LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LOS K2+710 DE LA VIA SAN ANTONIO-EL CEPILLO											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE 38 MR, CON UNA SECCIÓN TÍPICA DE 5.5 DE ANCHO POR 30CM DE ESPESOR, CON UNA ESTRUCTURA DE AFIRMADO Y 15 CM DE SUBBASE. EL ESPESOR DEL CONCRETO PARA EL PAVIMENTO ES DE 19 CM, ADEMÁS DE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS BOX CULVERT EN LA VIA AL CEPILLO, BORDILLOS EN CONCRETO PREFABRICADO Y LA SEÑALIZACIÓN VIAL CORRESPONDIENTE											
CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:								
CONTRATISTA: CONSORCIO EVO 019 INTEGRANTES: ELASCO S.A.S CON 80% - PASEAL NUVOS MONTES CON 20% CONTRATO No.: 181 VALOR INICIAL: \$ 4.431.421.050,00 FECHA DE INICIO: 21-ago-22 VALOR ADICIONES: \$ FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31-ago-22 VALOR ACUMULADO: \$ PRORROGA EN TIEMPO ADICIONAL: \$ 3.963,65 FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: 31-ago-22 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: \$			INTERVENITOR: CONSORCIO JAL 38 INTEGRANTES: ASU PROYECTOS S.A.S CON 50% - 18 PROYECTOS S.A.S CON 50% CONTRATO No.: 2275-061-2021 VALOR INICIAL: \$ 1.930.530.773,00 FECHA DE INICIO: 28-ago-22 VALOR ADICIONES: \$ FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31-ago-22 VALOR ACUMULADO: \$ PRORROGA EN TIEMPO ADICIONAL: \$ 3.963,65 FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: 31-ago-22 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: \$ VALOR ANTICIPO: \$ VALOR AMORTIZADO: \$ SALDO POR AMORTIZAR: \$								
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024						
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 4.431.421.050									
	SALDO DE VIGENCIA										
INTERVENCIÓN A	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1.930.530.773									
	SALDO DE VIGENCIA										
OBRA		INTERVENTORIA									
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 4.431.421.050,00	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 7.985.878,422,03								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 2.449.521.584,53										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 2.312.004.463,89	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 582.413.838,19								
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ 287.417.586,11										
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 15.508.551,00										
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 2.449.521.584,53	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	\$ 7.135.051,15								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 2.312.004.463,89										
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ 137.517.120,64										
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	\$ 74.588.723,52										
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	\$ 95.766.510,85										
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI NO	RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI NO								
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:									
PERIODO FACTURADO:	AL	PERIODO FACTURADO:									
VALOR FACTURA:		VALOR FACTURA:									
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar al estado del trámite)		(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar al estado del trámite)									
Observaciones:		Observaciones:									
ANTICIPOS		INDICADOR IC		ANTICIPOS							
Obligado \$	0	En el mes:	\$	Obligado \$	0						
Amortizado \$	0	Acumulado:	0	Amortizado \$	0						
Saldo \$	0			Saldo \$	0						
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%		
Estudios y diseños					Prog			2	100,0%		
Box-culvert	mt	2	2021		Ejec			1,54	77,0%		
Pavimento concreto	mt	2710	2021		Prog			1487,99	55,28%		
Señalización	mt	2710	2021		Ejec			1368,37	50,49%		
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES		DISPONIBLE		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL							
UBICACIÓN: PLANTA VASCON TRONCAL 2 VIA CERETE SAN CARLOS	PERMISO MINERO: SI	X	NO	ZONAS DE DEPOSITO: SI	NO						
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO						
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI		NO	APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI	NO						
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	CONCESIÓN DE AGUAS: SI	NO						
				OCCUPACIÓN DE CAUCES: SI	NO						
				VERTIMIENTOS: SI	NO						
				EMISORES: SI	NO						
				OTROS (Especificar cual): SI	NO						
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)											
V. GESTIÓN SOCIAL											
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		Nº DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:									
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	19 2	Nº DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0								
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	9	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	Calle 34-38 Vereda el Cepillo Papetería Cambá								
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4										
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	17										
VI. GESTIÓN PREDIAL											
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:											
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	0										
AVANOS APROBADOS:	0										
PREDIOS ADQUIRIDOS:	0										
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD											
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS											
El Contratista lleva acumulada las siguientes actividades:	ABS INI	ABS FIN	LONG (m)	TOTAL (m)							
Excavación Mecánica	K0+000	K2+680	2.680,0	2.680,0							
Instalación de Afirmado	K0+000	K1+420	1.420,0	2.600,0							
	K1+500	K2+680	1.180,0								
Instalación de Sub-base	K1+530	K2+680	1.150,0	1.300,0							
	K1+300	K1+450	150,0								
Instalación de Concreto Pavimento	K1+530	K2+680	1.150,0	1.300,0							
	K1+300	K1+450	150,0								
Construcción de Boxculvert k1+480 3X3	Se a realizado excavación, instalación de acero de refuerzo, instalación de Concreto de losa inferior y de los tres muros, tambien se instalo el acero de refuerzo de la losa superior y se colocaron las formaletas de esta estructura, se excavaron las alas y se le colocó su piedra rajon y el solado de limpieza, se fundo losa superior										
Construcción de Boxculvert k2+700 1X1	Se a realizado excavación, instalación de acero de refuerzo, instalación de Concreto de limpieza, se fundo la losa inferior, también se instaló el acero de refuerzo de los muros y de la losa superior. Se fundo muros y la losa superior										
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA											
Continuar con las Actividades de instalación de material de afirmado y subbase, toma de densidades y liberación por parte de topografía de interventoria. También se continuará con la construcción del Box-culvert del k1+480 de 3X3 y el Box del k2+700 de 1X1, y la Instalación de Concreto para Pavimento											

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS									
PROGRAMADO									PROGRAMADO
									PR2+710
EJECUTADO									EJECUTADO
									PR 2+710
CONVENCIONES									
El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEP/IMN-15 del Manual de Interventoría.									
XII. REGISTRO FOTOGRÁFICO									
<div><div><p>Via San Antonio- El capillo Instalación de Concreto para Losa Superior de Bocculvert 3X3 k1+480</p></div><div><p>Via San Antonio- El capillo Instalación de Concreto para pavimento entre ka 1+300 a k1+080</p></div><div><p>Via San Antonio- El capillo Instalación de Concreto para Losa Superior Bocculvert 3X3 k2+700</p></div></div>									
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.									
XIII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA									
Se le solicita al Contratista arreglar la vía entre las abscisas del k0+800 a k1+000 debido al gran deterioro que esta presenta por el constante paso de volquetas y las fuertes lluvias caídas en el sector. Del mismo modo se recomendó que en los tramos donde se están afectando la tubería de 8 pulgadas se instalara cárcamos									
FIRMA:  NOMBRE: MIGUEL ARMANDO DIAZ RIVERA Matrícula Profesional No.: 2502-12786 CND									
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Control de Interventoría. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Operatividad, Contratación, Interventoría y Dirección Técnica									

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS									
PROGRAMADO									PROGRAMADO
									PR2+710
EJECUTADO									EJECUTADO
									PR 2+710
CONVENCIÓNES									
El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI/MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.									
XII. REGISTRO FOTOGRÁFICO									
<div><div><p>Via San Antonio- El cepillo Instalación de Sub-base entre k1+200 a k1+300</p></div><div><p>Via San Antonio- El cepillo Instalación de Concreto para pavimento entre k1+250 a k1+300</p></div><div><p>Via San Antonio- El cepillo Instalación de Concreto para Aléas de Bocuvert 1X1 k2+700</p></div></div>									
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.									
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA									
Se le solicita al Contratista arreglar la vía entre las abscisas del k0+000 a k1+000 debido al gran deterioro que esta presenta por el constante paso de volquetas y las fuertes lluvias caídas en el sector.									
FIRMA:  NOMBRE: MIGUEL ARMANDO DIAZ RIVERA Matrícula Profesional No.: 2502-12786 CND									
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Control del CND/INRAIG. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Supervisión, Contratación, Interventoría y Dirección Técnica									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO REGIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MIMP-ING-015-FR-3 1 1																																																																																										
FECHA		26-ago-22 (Día / Mes / Año)																																																																																											
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																													
PROYECTO MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA - GRUPO 4... UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA SEMANA No.: 30 del 18-ago-22 al 25-ago-22 SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ING NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING ALVARO GALVE OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO DEL CÉPILLO CORREGIMIENTO DE RABOLARGO MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: LA META FÍSICA A EJECUTAR ES LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LOS K2+710 DE LA VIA SAN ANTONIO-EL CEPILLO																																																																																													
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE 38 MR, CON UNA SECCIÓN TÍPICA DE 5.5 DE ANCHO POR 30CM DE ESPESOR, CON UNA ESTRUCTURA DE AFIRMADO Y 15 CM DE SUBBASE. EL ESPESOR DEL CONCRETO PARA EL PAVIMENTO ES DE 19 CM, ADemás DE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS BOX COULVERT EN LA VIA AL CEPILLO, BORDILLOS EN CONCRETO PREFABRICADO Y LA SEÑALIZACIÓN VIAL CORRESPONDIENTE																																																																																													
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																																											
CONTRATISTA: CONSORCIO EYR 019 INTEGRANTES: ELASCO S.A.S CON 80% - JAZEL NÚÑEZ MONTES CON 20% CONTRATO No.: 161 VALOR INICIAL: \$ 4.431.421.060,00 FECHA DE INICIO: 31-08-22 VALOR ADICIONES: \$ VALOR ACUMULADO: \$ FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31-08-22 PRORROGA EN TIEMPO ADICIONAL: \$ 3.163,65 FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: 31-08-22 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: \$		INTERVENTOR: CONSORCIO JAL 38 INTEGRANTES: ASU PROYECTOS S.A.S CON 50% - 18 PROYECTOS S.A.S CON 50% CONTRATO No.: 2275-091-2021 VALOR INICIAL: \$ 1.930.530.773,00 FECHA DE INICIO: 26-ago-22 VALOR ADICIONES: \$ VALOR ACUMULADO: \$ FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31-08-22 PRORROGA EN TIEMPO ADICIONAL: \$ 3.163,65 FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: 31-08-22 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: \$ VALOR ANTICIPO: \$ VALOR AMORTIZADO: \$ SALDO POR AMORTIZAR: \$																																																																																											
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																													
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																													
CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024																																																																																								
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 4.431.421.060,00																																																																																											
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA																																																																																												
	SALDO DE VIGENCIA																																																																																												
	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1.930.530.773,00																																																																																											
INTERVENCIÓN A	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1.930.530.773,00																																																																																											
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA																																																																																												
	SALDO DE VIGENCIA																																																																																												
	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1.930.530.773,00																																																																																											
(Especificidad de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																																													
OBRA VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 4.431.421.060,00 INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 2.699.353.181,08 60,91% INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 2.699.353.181,08 60,92% AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ 189.869.886,52 4,28% OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ 15.928.551,00 0,36% (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 2.699.353.181,08 60,92% TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 2.699.353.181,08 60,92% AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ 189.869.886,52 4,28% INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: \$ 115.993.671,19 2,62% INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ 135.994.014,30 3,02% RADICADO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____ PERÍODO FACTURADO: _____ VALOR FACTURA: _____ (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior, informar al estado del trámite) Observaciones: _____			INTERVENTORIA TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 899.903.934,11 45,56% TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 632.358.886,52 30,76% INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: \$ 8.750.707,44 0,45% \$ 7.135.051,15 0,37% RADICADO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____ PERÍODO FACTURADO: _____ VALOR FACTURA: _____ (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior, informar al estado del trámite) Observaciones: _____																																																																																										
ANTECIPOS Otorgado \$ 0 Amortizado \$ 0 Saldo \$ 0			INDICADOR IC En el mes: \$ Acumulado: 0																																																																																										
ANTECIPOS Otorgado \$ 0 Amortizado \$ 0 Saldo \$ 0			ANTECIPOS Otorgado \$ 0 Amortizado \$ 0 Saldo \$ 0																																																																																										
III. AVANCE FÍSICO Meta Física Programada % 60,91% Meta Física Ejecutada % 60,92% Avance o Atraso Físico % -3,97%																																																																																													
MAQUINARIA Y EQUIPO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Equipo Mínimo</th> <th>Total Disponible</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RETROEXCAVADORA DE LLANTAS</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>MOTONIVELADORA</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>VIBROCOMPACTADOR</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>VOLQUETAS</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> Equipo mínimo correspondiente al exigido en el pliego de condiciones.						Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	1	MOTONIVELADORA	1	1	VIBROCOMPACTADOR	1	1	VOLQUETAS	2	2				Total	5	5																																																																			
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																																											
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	1																																																																																											
MOTONIVELADORA	1	1																																																																																											
VIBROCOMPACTADOR	1	1																																																																																											
VOLQUETAS	2	2																																																																																											
Total	5	5																																																																																											
IV. GESTIÓN AMBIENTAL <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>UBICACIÓN</th> <th>PERMISO MINERO</th> <th>SI</th> <th>X</th> <th>NO</th> <th>DISPONIBLE</th> <th>PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</th> <th>SI</th> <th>X</th> <th>NO</th> <th>N/A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PLANTA VASCON TRONCAL 2 VIA CERETE SAN CARLOS</td> <td>LICENCIA AMBIENTAL</td> <td>SI</td> <td>X</td> <td>NO</td> <td></td> <td>LICENCIA AMBIENTAL</td> <td>SI</td> <td>X</td> <td>NO</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LICENCIA AMBIENTAL</td> <td>SI</td> <td>X</td> <td>NO</td> <td></td> <td>APROVECHAMIENTO FORESTAL</td> <td>SI</td> <td></td> <td>NO</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LICENCIA AMBIENTAL</td> <td>SI</td> <td></td> <td>NO</td> <td></td> <td>CONCESIÓN DE AGUAS</td> <td>SI</td> <td></td> <td>NO</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LICENCIA AMBIENTAL</td> <td>SI</td> <td></td> <td>NO</td> <td></td> <td>OCCUPACIÓN DE CAUCES</td> <td>SI</td> <td></td> <td>NO</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LICENCIA AMBIENTAL</td> <td>SI</td> <td></td> <td>NO</td> <td></td> <td>VERTIMIENTOS</td> <td>SI</td> <td></td> <td>NO</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LICENCIA AMBIENTAL</td> <td>SI</td> <td></td> <td>NO</td> <td></td> <td>EMISORES</td> <td>SI</td> <td></td> <td>NO</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LICENCIA AMBIENTAL</td> <td>SI</td> <td></td> <td>NO</td> <td></td> <td>OTROS (Especificar cual)</td> <td>SI</td> <td></td> <td>NO</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>						UBICACIÓN	PERMISO MINERO	SI	X	NO	DISPONIBLE	PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	SI	X	NO	N/A	PLANTA VASCON TRONCAL 2 VIA CERETE SAN CARLOS	LICENCIA AMBIENTAL	SI	X	NO		LICENCIA AMBIENTAL	SI	X	NO	N/A		LICENCIA AMBIENTAL	SI	X	NO		APROVECHAMIENTO FORESTAL	SI		NO	N/A		LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO		CONCESIÓN DE AGUAS	SI		NO	N/A		LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO		OCCUPACIÓN DE CAUCES	SI		NO	N/A		LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO		VERTIMIENTOS	SI		NO	N/A		LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO		EMISORES	SI		NO	N/A		LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO		OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A
UBICACIÓN	PERMISO MINERO	SI	X	NO	DISPONIBLE	PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	SI	X	NO	N/A																																																																																			
PLANTA VASCON TRONCAL 2 VIA CERETE SAN CARLOS	LICENCIA AMBIENTAL	SI	X	NO		LICENCIA AMBIENTAL	SI	X	NO	N/A																																																																																			
	LICENCIA AMBIENTAL	SI	X	NO		APROVECHAMIENTO FORESTAL	SI		NO	N/A																																																																																			
	LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO		CONCESIÓN DE AGUAS	SI		NO	N/A																																																																																			
	LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO		OCCUPACIÓN DE CAUCES	SI		NO	N/A																																																																																			
	LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO		VERTIMIENTOS	SI		NO	N/A																																																																																			
	LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO		EMISORES	SI		NO	N/A																																																																																			
	LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO		OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A																																																																																			
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: APROBADO																																																																																													
V. GESTIÓN SOCIAL <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</th> <th>OBRA</th> <th>INTER</th> <th>Nº DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:</th> <th>0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td> <td>19</td> <td>2</td> <td>Nº DE CAPACITACIONES REALIZADAS:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td> <td>9</td> <td></td> <td>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:</td> <td>Calle 34-38 Vereda el Cepillo Papetería Cambá</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:</td> <td colspan="4">17</td> </tr> </tbody> </table>						TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	Nº DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	0	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	19	2	Nº DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	9		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	Calle 34-38 Vereda el Cepillo Papetería Cambá	EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4				TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	17																																																																		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	Nº DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	0																																																																																									
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	19	2	Nº DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0																																																																																									
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	9		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	Calle 34-38 Vereda el Cepillo Papetería Cambá																																																																																									
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4																																																																																												
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	17																																																																																												
VI. GESTIÓN PREDIAL TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 0 FICHAS PREDIALES APROBADAS: 0 AVANOS APROBADOS: 0 PREDIOS ADQUIRIDOS: 0																																																																																													
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD																																																																																													
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS Se instaló sub-base entre las abscisas K1+000 a K1+250, y concreto para pavimento entre K1+130 a K1+250 en el box del K2+700 se colocó material de relleno. El contratista viene arreglando la vía en donde se encuentra bastante deteriorada por los fuertes aguaceros y por el paso constante de la maquinaria. Se solicitó al Consorcio EYR tomar los correctivos necesarios para no volver a presentar lo sucedido el pasado 5 de julio del presente año donde se fundió con planta móvil en la abscisa del K2+320 y se le informó al residente de obra que la planta había colocado ese concreto sin cemento debido a un inconveniente que presentó en ese momento, pero la cuadrilla no sacó ese material que cayó si no que lo revolvió con el resto de la mezcla, dicha situación está presentando que en dicha placa se esté segregando el material por lo que se requiere que el Contratista presente una propuesta para arreglar la placa en mención lo más pronto posible, esto en aras de preservar la calidad de la obra terminada.																																																																																													
El Contratista lleva acumulada las siguientes actividades:																																																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>ABS INI</th> <th>ABS FIN</th> <th>LONG (m)</th> <th>TOTAL (m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Excavación Mecánica</td> <td>K0+000</td> <td>K2+680</td> <td>2.680,0</td> <td>2.680,0</td> </tr> <tr> <td>Instalación de Afirmado</td> <td>K0+000</td> <td>K1+430</td> <td>1.430,0</td> <td>2.680,0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>K1+500</td> <td>K2+680</td> <td>1.180,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Instalación de Sub-base</td> <td>K1+530</td> <td>K2+680</td> <td>1.150,0</td> <td>1.600,0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>K1+000</td> <td>K1+450</td> <td>450,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Instalación de Concreto Pavimento</td> <td>K1+530</td> <td>K2+680</td> <td>1.150,0</td> <td>1.470,0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>K1+130</td> <td>K1+450</td> <td>320,0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							ABS INI	ABS FIN	LONG (m)	TOTAL (m)	Excavación Mecánica	K0+000	K2+680	2.680,0	2.680,0	Instalación de Afirmado	K0+000	K1+430	1.430,0	2.680,0		K1+500	K2+680	1.180,0		Instalación de Sub-base	K1+530	K2+680	1.150,0	1.600,0		K1+000	K1+450	450,0		Instalación de Concreto Pavimento	K1+530	K2+680	1.150,0	1.470,0		K1+130	K1+450	320,0																																																	
	ABS INI	ABS FIN	LONG (m)	TOTAL (m)																																																																																									
Excavación Mecánica	K0+000	K2+680	2.680,0	2.680,0																																																																																									
Instalación de Afirmado	K0+000	K1+430	1.430,0	2.680,0																																																																																									
	K1+500	K2+680	1.180,0																																																																																										
Instalación de Sub-base	K1+530	K2+680	1.150,0	1.600,0																																																																																									
	K1+000	K1+450	450,0																																																																																										
Instalación de Concreto Pavimento	K1+530	K2+680	1.150,0	1.470,0																																																																																									
	K1+130	K1+450	320,0																																																																																										
Se a realizado excavación, instalación de acero de refuerzo, instalación de Concreto de losa inferior y de los tres muros, también se instaló el acero de refuerzo de la losa superior y se colocaron las formaleitas de esta estructura, se excavaron las aletas y se les colocó su piedra rajón y el solado de limpieza, se fundió losa superior, también se han fundido las zapatas de dos aletas Se a realizado excavación, instalación de acero de refuerzo, instalación de Concreto de limpieza, se fundió la losa inferior, también se instaló el acero de refuerzo de los muros y de la losa superior. Se fundió muros, la losa superior y aletas, se realizó relleno																																																																																													
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																																																													
Continuar con las Actividades de instalación de material de afirmado y subbase, toma de densidades y liberación por parte de topografía de Interventoría. También se continuará con la construcción del Box-culvert del K1+480 de 3X3 y el Box del K2+700 de 1X1, y la Instalación de Concreto para Pavimento																																																																																													

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS									
PROGRAMADO									PROGRAMADO
									PR2+710
EJECUTADO									EJECUTADO
									PR 2+710
CONVENCIÓNES									
El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEP/IN-15 del Manual de Interventoría.									
XII. REGISTRO FOTOGRÁFICO									
<div><div></div><div></div><div></div></div>									
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.									
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA									
Se solicitó nuevamente al Consorcio EYR tomar los correctivos necesarios y hacer la entrega de un plan de Contingencia teniendo en cuenta el atraso que ya presenta nuevamente el Contrato de Obra.									
FIRMA:									
NOMBRE: MIGUEL ARMANDO DIAZ RIVERA									
Matrícula Profesional No.: 2502-12786 CND									
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del Proyecto.									
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Supervisión, Contratación, Interventoría y Dirección Técnica.									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO VERSION REGIÓN	MEMORIO 40-15-PR-3 1 																																																																								
	FECHA 2-sep-22 (Día / Mes / Año)																																																																											
	I. INFORMACIÓN GENERAL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE OBRAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA - GRUPO 1. UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA SEMANA N.º: 31 del 26-sep-22 al 1-sep-22 SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ING. NESTOR ELIEN LEMUS VILLANEGRO GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. ALVARO CALVO OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO EL CEPILLO CORREGIMIENTO DE BABALARGO MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: LA META FÍSICA A EJECUTAR ES LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LOS K2+730 DE LA VÍA SAN ANTONIO - EL CEPILLO																																																																											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE 38 MR. CON UNA SECCIÓN TÍPICA DE 5.5 DE ANCHO POR 30CM DE ESPESOR, CON UNA ESTRUCTURA DE AFIRMADO Y 15 CM DE SUBBASE. EL ESPESOR DEL CONCRETO PARA EL PAVIMENTO ES DE 19 CM, ADEMAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS BOX CULVERT EN LA VÍA AL CEPILLO. BORDILLOS EN CONCRETO PREFABRICADO Y LA SEÑALIZACIÓN VIAL CORRESPONDIENTE																																																																												
CONTRATO DE OBRA: CONTRATISTA: CONSORCIO EYR S.A.S. INTEGRANTES: ELIASO S.A.S. CON SOH. RAFAEL NIVAS MINIENTES CON 100% CONTRATO N.º: 383 VALOR INICIAL: \$ 4.431.421.000,00 FECHA DE INICIO: 31-ago-22 VALOR ADICIONES: \$ FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31-sep-22 VALOR ACUMULADO: \$ PRORROGA EN TIEMPO ADICIONAL: 5.16.56.55 FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: 31-sep-22 \$ FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-sep-22 \$		CONTRATO DE INTERVENTORIA: INTERVENTOR: CONSORCIO AID 38 INTEGRANTES: AID PROYECTOS S.A.S. CON SOH. 38 PROYECTOS S.A.S. CON SOH. CONTRATO N.º: 2276 del 2021 VALOR INICIAL: \$ 1.930.530.773,00 FECHA DE INICIO: 26-sep-22 VALOR ADICIONES: \$ FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31-sep-22 VALOR ACUMULADO: \$ PRORROGA EN TIEMPO ADICIONAL: 5.16.56.55 FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: 31-sep-22 VALOR ANTERIOR: \$ FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-sep-22 VALOR AUTORIZADO: \$ SALDO POR AMORTIZAR: \$																																																																										
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONTRATO</th> <th>VIGENCIA</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBRA</td> <td>RECURSOS POR VIGENCIA</td> <td>\$ 4.431.421.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>SALDO DE VIGENCIA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INTERVENTORIA</td> <td>RECURSOS POR VIGENCIA</td> <td>\$ 1.930.530.773</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>SALDO DE VIGENCIA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024	OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 4.431.421.000					EJECUTADO DE LA VIGENCIA						SALDO DE VIGENCIA					INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1.930.530.773					EJECUTADO DE LA VIGENCIA						SALDO DE VIGENCIA																																		
CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024																																																																							
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 4.431.421.000																																																																										
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA																																																																											
	SALDO DE VIGENCIA																																																																											
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1.930.530.773																																																																										
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA																																																																											
	SALDO DE VIGENCIA																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">OBRA</th> <th colspan="2">INTERVENTORIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A)</td> <td>\$ 4.431.421.000,00</td> <td>TOTAL INVERSIÓN</td> <td>\$ 792.382.399,27</td> </tr> <tr> <td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td> <td>\$ 2.800.070.038,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B)</td> <td>\$ 2.800.070.038,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AVANCE O ATRASO DE OBRA</td> <td>\$ 143.326.624,08</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td> <td>\$ 15.928.553,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td> <td>\$ 2.800.070.038,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td> <td>\$ 2.800.070.038,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN</td> <td>\$ 143.326.624,08</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td> <td>\$ 99.473.146,74</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td> <td>\$ 135.994.014,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</td> <td>SI NO</td> <td>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</td> <td>SI NO</td> </tr> <tr> <td>Nº. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:</td> <td></td> <td>Nº. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PERIODO FACTURADO:</td> <td></td> <td>PERIODO FACTURADO:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR FACTURA:</td> <td></td> <td>VALOR FACTURA:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td> <td></td> <td>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Observaciones:</td> <td></td> <td>Observaciones:</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					OBRA		INTERVENTORIA		VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A)	\$ 4.431.421.000,00	TOTAL INVERSIÓN	\$ 792.382.399,27	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 2.800.070.038,00			INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B)	\$ 2.800.070.038,00			AVANCE O ATRASO DE OBRA	\$ 143.326.624,08			OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 15.928.553,00			(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)				TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 2.800.070.038,00			TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 2.800.070.038,00			AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN	\$ 143.326.624,08			INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 99.473.146,74			INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 135.994.014,30			RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI NO	RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI NO	Nº. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		Nº. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		PERIODO FACTURADO:		PERIODO FACTURADO:		VALOR FACTURA:		VALOR FACTURA:		(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)		(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)		Observaciones:		Observaciones:	
OBRA		INTERVENTORIA																																																																										
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A)	\$ 4.431.421.000,00	TOTAL INVERSIÓN	\$ 792.382.399,27																																																																									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 2.800.070.038,00																																																																											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B)	\$ 2.800.070.038,00																																																																											
AVANCE O ATRASO DE OBRA	\$ 143.326.624,08																																																																											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 15.928.553,00																																																																											
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)																																																																												
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 2.800.070.038,00																																																																											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 2.800.070.038,00																																																																											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN	\$ 143.326.624,08																																																																											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 99.473.146,74																																																																											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 135.994.014,30																																																																											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI NO	RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI NO																																																																									
Nº. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		Nº. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:																																																																										
PERIODO FACTURADO:		PERIODO FACTURADO:																																																																										
VALOR FACTURA:		VALOR FACTURA:																																																																										
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)		(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																										
Observaciones:		Observaciones:																																																																										
III. AVANCE FÍSICO Meta Física Programada % 63.19% Avance o Atraso Físico 1 -2.53% Meta Física Ejecutada % 63.66%																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Meta Física (Programa de Obra) Línea Base</th> <th colspan="2">Meta Física Programada Ejecutada Acumulada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>Descripción de la Meta Física Contractual</th> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>%</th> </tr> <tr> <td>Estudios y diseños</td> <td>Unidad</td> <td>2</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>Box-culvert</td> <td>mt</td> <td>2</td> <td>66.6%</td> </tr> <tr> <td>Pavimento concreto</td> <td>mt</td> <td>2710</td> <td>63.19%</td> </tr> <tr> <td>Señalización</td> <td>mt</td> <td>2710</td> <td>63.19%</td> </tr> </tbody> </table>					Meta Física (Programa de Obra) Línea Base		Meta Física Programada Ejecutada Acumulada		Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	%	Estudios y diseños	Unidad	2	100.0%	Box-culvert	mt	2	66.6%	Pavimento concreto	mt	2710	63.19%	Señalización	mt	2710	63.19%																																																
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base		Meta Física Programada Ejecutada Acumulada																																																																										
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	%																																																																									
Estudios y diseños	Unidad	2	100.0%																																																																									
Box-culvert	mt	2	66.6%																																																																									
Pavimento concreto	mt	2710	63.19%																																																																									
Señalización	mt	2710	63.19%																																																																									
IV. GESTIÓN AMBIENTAL UBICACIÓN: PLANTA VASCON TRONCAL 2 VÍA CERETE SAN CARLOS PERMISO MINERO: SI X NO LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO																																																																												
V. GESTIÓN SOCIAL TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 15 2 EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 9 0 EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2 0 EMPLEOS EN LA ZONA DE REFERENCIA: 4 0 TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17																																																																												
VI. GESTIÓN PRELIAL TOTAL ESTIMADO PRELIAL A ADQUIRIR: 0 FICHAS PRELIALES APROBADAS: 0 AVALUOS APROBADOS: 0 PRELIALES ADQUIRIDOS: 0																																																																												
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD																																																																												
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS Se instaló sub-base entre las abscisas k0+900 a k1+000, y concreto para pavimento entre k1+020 a k1+130 y entre k2+680 a k2+707 en este tramo se reforzaron las placas que están en el box de 1X1 y las de llegada al pavimento asfáltico, en el box del k1+480 se fundieron dos de las aletas. Llegaron a obra bordillos. El contratista hizo entrega de un plan de contingencia el cual fue devuelto porque no contempla ni fechas, cantidades diarias para poder realizar su respectivo seguimiento, como lo entregaron se encuentra muy general no están definidas fechas de cumplimiento. El pasado 30 agosto del presente año se fundió con concreto para pavimento el tramo comprendido entre k2+680 a k2+710 y se terminó como a las 11:00 de la noche, al siguiente día se evidenció que las dos últimas placas fueron dañadas por la subida de una motocicleta por lo que se solicitó al Consorcio EYR tomar los correctivos necesarios para no volver a presentar dicha situación y presentar una propuesta para arreglar la placa en mención lo más pronto posible, esto en aras de preservar la calidad de la obra terminada.																																																																												
El Contratista lleva acumulada las siguientes actividades:																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ABS IN</th> <th>ABS FIN</th> <th>LONG (M)</th> <th>TOTAL (M)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Excavación Mecánica</td> <td>K0+900</td> <td>K1+080</td> <td>2.680,0</td> <td>2.680,0</td> </tr> <tr> <td>Instalación de Afirmado</td> <td>K0+900</td> <td>K1+420</td> <td>1.420,0</td> <td>2.600,0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>K1+500</td> <td>K2+680</td> <td>1.180,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Instalación de Sub-base</td> <td>K1+530</td> <td>K2+680</td> <td>1.150,0</td> <td>1.700,0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>K0+900</td> <td>K1+450</td> <td>550,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Instalación de Concreto Pavimento</td> <td>K1+530</td> <td>K2+707</td> <td>1.177,0</td> <td>1.607,0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>K1+020</td> <td>K1+050</td> <td>430,0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						ABS IN	ABS FIN	LONG (M)	TOTAL (M)	Excavación Mecánica	K0+900	K1+080	2.680,0	2.680,0	Instalación de Afirmado	K0+900	K1+420	1.420,0	2.600,0		K1+500	K2+680	1.180,0		Instalación de Sub-base	K1+530	K2+680	1.150,0	1.700,0		K0+900	K1+450	550,0		Instalación de Concreto Pavimento	K1+530	K2+707	1.177,0	1.607,0		K1+020	K1+050	430,0																																	
	ABS IN	ABS FIN	LONG (M)	TOTAL (M)																																																																								
Excavación Mecánica	K0+900	K1+080	2.680,0	2.680,0																																																																								
Instalación de Afirmado	K0+900	K1+420	1.420,0	2.600,0																																																																								
	K1+500	K2+680	1.180,0																																																																									
Instalación de Sub-base	K1+530	K2+680	1.150,0	1.700,0																																																																								
	K0+900	K1+450	550,0																																																																									
Instalación de Concreto Pavimento	K1+530	K2+707	1.177,0	1.607,0																																																																								
	K1+020	K1+050	430,0																																																																									
Construcción de Boxculvert k1+480 3X3 Se realizó excavación, instalación de acero de refuerzo, instalación de Concreto de los aletas y de los tres muros, también se instaló el acero de refuerzo de la losa superior y se colocaron las formaletas de esta estructura, se excavaron las aletas y se les colocó su piedra rajón y el solado de limpieza, se fundió losa superior, también se han fundido las zapatas de dos aletas																																																																												
Construcción de Boxculvert k2+700 1X1 Esta Estructura se encuentra lista																																																																												
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA Continuar con las Actividades de instalación de material de afirmado y subbase, toma de densidades y liberación por parte de topografía de interventoría. También se continuará con la construcción del Box-culvert del k1+480 de 3X3 y el Box del k2+700 de 1X1, y la Instalación de Concreto para Pavimento																																																																												

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS									
PROGRAMADO									PROGRAMADO
									PR2+710
EJECUTADO									EJECUTADO
									PR 2+710
<div>CONVENIONES</div> <div>ESTRUCOS Y DISEÑOS</div> <div>BOX/COLA/VERT</div> <div>PAVIMENTO EN CONCRETO</div> <div>SEÑALIZACION</div> <div>EXCAVACIÓN</div> <div>AFIRMADO</div> <div>SUBBASE</div> <div>109.16667</div>									
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO									
<div><p>Via San Antonio- El cepillo Instalación de Concreto para pavimento entre k1+020 a k 1+130</p></div> <div><p>Via San Antonio- El cepillo Instalación de Concreto para pavimento entre k2+680 a k 2+707</p></div> <div><p>Via San Antonio- El cepilloBox de 3X3 Fundido Aletas k1+480</p></div>									
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.									
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA.									
El contratista hizo entrega de un plan de contingencia el cual fue devuelto porque no contempla ni fechas, cantidades diarias para poder realizar su respectivo seguimiento, como lo entregaron se encuentra muy general no están definidas fechas de cumplimiento									
<div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: MIGUEL ARMANDO DIAZ RIVERA</div> <div>Matrícula Profesional No.: 33200-13786 CUBA</div> <div>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</div>									
<div>Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del R00045.</div> <div>Copias: Unidad Ejecutora, Subordinados de Supervisión, Comité de Interventoría y Dirección Técnica.</div>									



	<p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</p> <p style="text-align: center;">PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</p> <p style="text-align: center;">MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</p> <p style="text-align: center;">MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA</p>	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA	31-ago-22 (Día / Mes / Año)
-------	--------------------------------

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

<p>Firma </p> <p>Nombre: César Eduardo Hernández López</p> <p>Residente de Obra</p> <p>Matrícula Profesional No.: 22202-313316 COR</p>	<p>Firma </p> <p>Nombre: Sergio Javier Solano Almanza</p> <p>Residente de Interventoría</p> <p>Matrícula Profesional No.: 22202178687 COR</p>
--	--

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-15-FR-6
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	1 DE 1

FECHA		31-08-22 (Día / Mes / Año)
-------	--	-------------------------------

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.

6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Gusto Galván H

Firma

Nombre: Gusto José Galván Hernández

Director de Obra

Matrícula Profesional No.: 13202-307977 BLV

Miguel Amado Díaz

Firma

Nombre: Miguel Amado Díaz

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 25202-12786 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA.
Copias: Interventor, Dirección Técnica.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA

31-ago-22
(Día / Mes / Año)

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.


RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTA DE OBRA 1			\$ 1.383.489.869
ACTA DE OBRA 2			\$ 698.996.504
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			\$ 2.082.486.373

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.


Firma
 Nombre: Guido José Galván Hernández
 Director de Obra
 Matricula Profesional No.: 13202-307977 BLV


Firma
 Nombre: Miguel Armando Díaz
 Director de Interventoría
 Matricula Profesional No.: 25202-12786 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	1 DE 1

	FECHA	31-ago-22 <small>(Día / Mes / Año)</small>
--	-------	--

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA
--	--------------------------------

CONTRATO DE OBRA No: 181 DE 2021	CONTRATISTA: CONSORCIO EYR 019
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias del Programa "COLOMBIA RURAL" en los Municipios del Departamento del Córdoba - Grupo 4,
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2276 DE 2021	INTERVENTOR: CONSORCIO ACI-3B



ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																	
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total	
Seco	21	20	21	22	18	18	24	24	24	24	24	20	19	20	21	24	24	24	24	23	19	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	675
Lluvias moderadas		2	1	1	4	3						2	1	2	3						2											21	
Lluvias intensas	3	2	2	1	2	3						2	4	2						1	5										5	32	
Total horas	3	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	29		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.


NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.


OBSERVACIONES:

En el presente mes se han presentado fuertes aguaceros que han

 Firma Nombre: César Eduardo Hernández López Residente de Obra Matrícula Profesional No.: 22202-313316 COR	 Firma Nombre: ✓ Sergio Javier Solano Almanza Residente de Interventoría Matrícula Profesional No.: 22202178687 COR
---	--

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CODIGO: EL-F-C001		FORMATOS										 INGELABCON S.A.S. Confiable en nuestros resultados					
FECHA: 13/07/2021		RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673															
VERSION: 02																	
PAGINA 1 DE 1																	
CLIENTE:	CONSORCIO ACI-3B					NIT:	901551292-6					ORDEN DE SERVICIO N°	498-22				
PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - GRUPO 4					UBICACIÓN:	CORREGIMIENTO EL CEPILLO, CERETÉ - CORDOBA										
CONTÁCTO:	ING. MIGUEL DÍAZ					EMAIL:	migueldiaz@aciproyectos.com				CEL:	310 2320202					
FECHA DE INFORME:	miércoles, 24 de agosto de 2022					CONSECUTIVO:	002										
ITEM	COD. CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	CILINDRO			CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (PSI)	% EVOLUCIÓN	PROM. % EVOL	TIPO FALLA	OBSERVACIÓN
							DIAS	D. (cm)	A. (cm2)								
1	C1	MUROS BOX 1X1 K2+700	4000	NORMAL	10/08/2022	24/08/2022	14	15,1	179,1	458,32	255,9	25,1	3656	91	91	E	
TIPOS DE FALLA:										OBSERVACIONES:							
																	
 JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ LABORATORISTA JEFE										 ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO							
Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio -INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.																	
INGELABCON S.A.S NIT. 901.124.673-8 Oficina: Calle 44 # 1º-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba Cel: 3146317410 – Email: ingelabcon@gmail.com																	

CODIGO: EL-F-C001		FORMATOS										 INGELABCON S.A.S. Confiable en nuestros resultados					
FECHA: 13/07/2021		RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673															
VERSION: 02																	
PAGINA 1 DE 1																	
CLIENTE:	CONSORCIO ACI-3B					NIT:	901551292-6					ORDEN DE SERVICIO N°	498-22				
PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - GRUPO 4					UBICACIÓN:	CORREGIMIENTO EL CEPILLO, CERETÉ - CORDOBA										
CONTÁCTO:	ING. MIGUEL DÍAZ					EMAIL:	migueldiaz@aciproyectos.com					CEL:	310 2320202				
FECHA DE INFORME:	jueves, 25 de agosto de 2022					CONSECUTIVO:	003										
ITEM	COD. CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	CILINDRO			CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (PSI)	% EVOLUCIÓN	PROM. % EVOL	TIPO FALLA	OBSERVACIÓN
							DIAS	D. (cm)	A. (cm2)								
1	C1	LOSA SUPERIOR BOX 1X1 K2+700	4000	NORMAL	11/08/2022	25/08/2022	14	15,1	179,1	463,28	258,7	25,4	3696	92	92	E	
TIPOS DE FALLA:										OBSERVACIONES:							
																	
 JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ LABORATORISTA JEFE										 ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO							
Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio -INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.																	
INGELABCON S.A.S NIT. 901.124.673-8 Oficina: Calle 44 # 1º-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba Cel: 3146317410 – Email: ingelabcon@gmail.com																	

CODIGO: EL-F-C002		FORMATOS										 INGELABCON S.A.S. Confiable en nuestros resultados					
FECHA: 13/07/2021		RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE VIGUETAS DE CONCRETO NTC-2871															
VERSION: 01																	
PAGINA 1 DE 1																	
CLIENTE:		CONSORCIO ACI-3B						NIT:		901551292-6				ORDEN DE SERVICIO N°		498-22	
PROYECTO:		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - GRUPO 4						UBICACIÓN:		CORREGIMIENTO EL CEPILLO, CERETÉ - CORDOBA							
CONTÁCTO:		ING. MIGUEL DÍAZ						E-MAIL:		migueldiaz@aciproyectos.com				CEL:		310 2320202	
FECHA DE INFORME:		jueves, 1 de septiembre de 2022						CONSECUTIVO:		001							
ITEM	COD. VIGUETA	N° MUESTRA	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (kg/cm2) ESPECIFICADA	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	VIGUETA				CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	% EVOLUCIÓN	% EVOLUCIÓN PROMEDIO	OBSERVACIÓN
								DÍAS	B. (cm)	d. (cm)	LUZ. (cm)						
1	V1	1	K1+380 - K1+300	38	NORMAL	4/08/2022	1/09/2022	28	15,10	15,10	45,00	31,22	40,8	4,0	107	107	TERCIO MEDIO
TIPOS DE FALLA:					OBSERVACIONES:												
TERCIO MEDIO																	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  INGELABCON S.A.S. NIT: 901124673-8 JEYSON JAVIER ATENCIA AGÁMEZ LABORATORISTA JEFE </div> <div style="text-align: center;">  ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO </div> </div>																	
Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio -INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.																	
INGELABCON S.A.S NIT. 901.124.673-8 Oficina: Calle 44 # 1º-60 Barrio Sucre - Montería - Córdoba Cel: 3146317410 - Email: ingelabcon@gmail.com																	

CODIGO: EL-F-C002		FORMATOS										 INGELABCON S.A.S. Confiable en nuestros resultados																							
FECHA: 13/07/2021																																			
VERSION: 01		RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE VIGUETAS DE CONCRETO																																	
PAGINA 1 DE 1		NTC-2871																																	
CLIENTE:		CONSORCIO ACI-3B						NIT:		901551292-6				ORDEN DE SERVICIO N°		498-22																			
PROYECTO:		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - GRUPO 4						UBICACIÓN:		CORREGIMIENTO EL CEPILLO, CERETÉ - CORDOBA																									
CONTÁCTO:		ING. MIGUEL DÍAZ						E-MAIL:		migueldiaz@aciproyectos.com				CEL:		310 2320202																			
FECHA DE INFORME:		viernes, 26 de agosto de 2022						CONSECUTIVO:		001																									
ITEM	COD. VIGUETA	N° MUESTRA	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (kg/cm2) ESPECIFICADA	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	VIGUETA				CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	% EVOLUCIÓN	% EVOLUCIÓN PROMEDIO	OBSERVACIÓN																		
								DIAS	B. (cm)	d. (cm)	LUZ. (cm)																								
1	V1	1	K1+300 - K1+240	38	NORMAL	12/08/2022	26/08/2022	14	15,10	15,10	45,00	27,74	36,3	3,6	95	95	TERCIO MEDIO																		
2	V2	2	K1+300 - K1+240	38	NORMAL	12/08/2022	9/09/2022	28	15,10	15,10	45,00		0,0	0,0	0	0																			
TIPOS DE FALLA:					OBSERVACIONES:																														
TERCIO MEDIO																																			
 INGELABCON S.A.S. NIT: 901124473-8 JEYSON JAVIER ATENCIA AGÁMEZ LABORATORISTA JEFE																		 ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO																	
Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio –INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.																																			
INGELABCON S.A.S. NIT. 901.124.673-8 Oficina: Calle 44 # 1º-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba Cel: 3146317410 – Email: ingelabcon@gmail.com																																			

CODIGO: EL-F-C002			FORMATOS										 INGELABCON S.A.S. Confiable en nuestros resultados																						
FECHA: 13/07/2021																																			
VERSION: 01			RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE VIGUETAS DE CONCRETO																																
PAGINA 1 DE 1			NTC-2871																																
CLIENTE:			CONSORCIO ACI-3B					NIT:		901551292-6				ORDEN DE SERVICIO N°		498-22																			
PROYECTO:			INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - GRUPO 4					UBICACIÓN:		CORREGIMIENTO EL CEPILLO, CERETÉ - CORDOBA																									
CONTÁCTO:			ING. MIGUEL DÍAZ					E-MAIL:		migueldiaz@aciproyectos.com				CEL:		310 2320202																			
FECHA DE INFORME:			viernes, 26 de agosto de 2022					CONSECUTIVO:		001																									
ITEM	COD. VIGUETA	N° MUESTRA	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (kg/cm2) ESPECIFICADA	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	VIGUETA				CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	% EVOLUCIÓN	% EVOLUCIÓN PROMEDIO	OBSERVACIÓN																		
								DÍAS	B. (cm)	d. (cm)	LUZ. (cm)																								
1	V1	1	K1+248 - K1+180	38	NORMAL	19/08/2022	26/08/2022	7	15,10	15,10	45,00	27,71	36,2	3,5	95	95	TERCIO MEDIO																		
2	V2	2	K1+248 - K1+180	38	NORMAL	19/08/2022	16/09/2022	28	15,10	15,10	45,00		0,0	0,0	0	0																			
TIPOS DE FALLA:					OBSERVACIONES:																														
TERCIO MEDIO																																			
 INGELABCON S.A.S. NIT: 901124473-8 JEYSON JAVIER ATENCIA AGÁMEZ LABORATORISTA JEFE																		 ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO																	
Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio –INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.																																			
INGELABCON S.A.S. NIT. 901.124.673-8 Oficina: Calle 44 # 1º-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba Cel: 3146317410 – Email: ingelabcon@gmail.com																																			

CODIGO: EL-F-C002		FORMATOS										 INGELABCON S.A.S. Confiable en nuestros resultados																							
FECHA: 13/07/2021		RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE VIGUETAS DE CONCRETO NTC-2871																																	
VERSION: 01																																			
PAGINA 1 DE 1																																			
CLIENTE:		CONSORCIO ACI-3B						NIT:		901551292-6				ORDEN DE SERVICIO N°		498-22																			
PROYECTO:		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - GRUPO 4						UBICACIÓN:		CORREGIMIENTO MARTÍNEZ, CERETÉ - CORDOBA																									
CONTÁCTO:		ING. MIGUEL DÍAZ						E-MAIL:		migueldiaz@aciproyectos.com				CEL:		310 2320202																			
FECHA DE INFORME:		jueves, 18 de agosto de 2022						CONSECUTIVO:		004																									
ITEM	COD. VIGUETA	N° MUESTRA	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (kg/cm2) ESPECIFICADA	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	VIGUETA				CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	% EVOLUCIÓN	% EVOLUCIÓN PROMEDIO	OBSERVACIÓN																		
								DÍAS	B. (cm)	d. (cm)	LUZ. (cm)																								
1	V1	1	K1+280 - K1+330	38	NORMAL	11/08/2022	18/08/2022	7	15,10	15,10	45,00	24,35	31,8	3,1	84	84	TERCIO MEDIO																		
2	V2	2	K1+280 - K1+330	38	NORMAL	11/08/2022	8/09/2022	28	15,10	15,10	45,00		0,0	0,0	0	0																			
TIPOS DE FALLA:					OBSERVACIONES:																														
TERCIO MEDIO																																			
 INGELABCON S.A.S. NIT: 901124473-8 JEYSON JAVIER ATENCIA AGÁMEZ LABORATORISTA JEFE																		 ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO																	
Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio –INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.																																			
INGELABCON S.A.S. NIT. 901.124.673-8 Oficina: Calle 44 # 1º-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba Cel: 3146317410 – Email: ingelabcon@gmail.com																																			

CODIGO: EL-F-C002		FORMATOS										 INGELABCON S.A.S. Confiable en nuestros resultados					
FECHA: 13/07/2021																	
VERSION: 01		RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE VIGUETAS DE CONCRETO															
PAGINA 1 DE 1		NTC-2871															
CLIENTE:		CONSORCIO ACI-3B						NIT:		901551292-6				ORDEN DE SERVICIO N°		498-22	
PROYECTO:		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - GRUPO 4						UBICACIÓN:		CORREGIMIENTO MARTÍNEZ, CERETÉ - CORDOBA							
CONTÁCTO:		ING. MIGUEL DÍAZ						E-MAIL:		migueldiaz@aciproyectos.com				CEL:		310 2320202	
FECHA DE INFORME:		sábado, 27 de agosto de 2022						CONSECUTIVO:		005							
ITEM	COD. VIGUETA	N° MUESTRA	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (kg/cm2) ESPECIFICADA	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	VIGUETA				CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	% EVOLUCIÓN	% EVOLUCIÓN PROMEDIO	OBSERVACIÓN
								DÍAS	B. (cm)	d. (cm)	LUZ. (cm)						
1	V1	1	K1+330 - K1+360	38	NORMAL	13/08/2022	27/08/2022	14	15,10	15,10	45,00	25,41	33,2	3,3	87	87	TERCIO MEDIO
2	V2	2	K1+330 - K1+360	38	NORMAL	13/08/2022	10/09/2022	28	15,10	15,10	45,00		0,0	0,0	0	0	
TIPOS DE FALLA:					OBSERVACIONES:												
TERCIO MEDIO																	
 INGELABCON S.A.S. NIT: 901124473-8 JEYSON JAVIER ATENCIA AGÁMEZ LABORATORISTA JEFE																	
 ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO																	
Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio –INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.																	
INGELABCON S.A.S. NIT. 901.124.673-8 Oficina: Calle 44 # 1º-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba Cel: 3146317410 – Email: ingelabcon@gmail.com																	

CODIGO: EL-F-C002		FORMATOS										 INGELABCON S.A.S. Confiable en nuestros resultados																							
FECHA: 13/07/2021																																			
VERSION: 01		RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE VIGUETAS DE CONCRETO																																	
PAGINA 1 DE 1		NTC-2871																																	
CLIENTE:		CONSORCIO ACI-3B						NIT:		901551292-6				ORDEN DE SERVICIO N°		498-22																			
PROYECTO:		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - GRUPO 4						UBICACIÓN:		CORREGIMIENTO MARTÍNEZ, CERETÉ - CORDOBA																									
CONTÁCTO:		ING. MIGUEL DÍAZ						E-MAIL:		migueldiaz@aciproyectos.com				CEL:		310 2320202																			
FECHA DE INFORME:		viernes, 26 de agosto de 2022						CONSECUTIVO:		006																									
ITEM	COD. VIGUETA	N° MUESTRA	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (kg/cm2) ESPECIFICADA	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	VIGUETA				CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	% EVOLUCIÓN	% EVOLUCIÓN PROMEDIO	OBSERVACIÓN																		
								DÍAS	B. (cm)	d. (cm)	LUZ. (cm)																								
1	V1	1	K1+360 - K1+410	38	NORMAL	19/08/2022	26/08/2022	7	15,10	15,10	45,00	31,65	41,4	4,1	109	109	TERCIO MEDIO																		
2	V2	2	K1+360 - K1+410	38	NORMAL	19/08/2022	16/09/2022	28	15,10	15,10	45,00		0,0	0,0	0	0																			
TIPOS DE FALLA:					OBSERVACIONES:																														
TERCIO MEDIO																																			
 INGELABCON S.A.S. NIT: 901124473-8 JEYSON JAVIER ATENCIA AGÁMEZ LABORATORISTA JEFE																		 ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO																	
Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio –INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.																																			
INGELABCON S.A.S. NIT. 901.124.673-8 Oficina: Calle 44 # 1º-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba Cel: 3146317410 – Email: ingelabcon@gmail.com																																			

CODIGO: EL-F-C002		FORMATOS										 INGELABCON S.A.S. Confiable en nuestros resultados																							
FECHA: 13/07/2021		RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE VIGUETAS DE CONCRETO NTC-2871																																	
VERSION: 01																																			
PAGINA 1 DE 1																																			
CLIENTE:		CONSORCIO ACI-3B						NIT:		901551292-6				ORDEN DE SERVICIO N°		498-22																			
PROYECTO:		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - GRUPO 4						UBICACIÓN:		CORREGIMIENTO MARTÍNEZ, CERETÉ - CORDOBA																									
CONTÁCTO:		ING. MIGUEL DÍAZ						E-MAIL:		migueldiaz@aciproyectos.com				CEL:		310 2320202																			
FECHA DE INFORME:		lunes, 29 de agosto de 2022						CONSECUTIVO:		007																									
ITEM	COD. VIGUETA	N° MUESTRA	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (kg/cm2) ESPECIFICADA	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	VIGUETA				CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	% EVOLUCIÓN	% EVOLUCIÓN PROMEDIO	OBSERVACIÓN																		
								DÍAS	B. (cm)	d. (cm)	LUZ. (cm)																								
1	V1	1	K1+410 - K1+500	38	NORMAL	22/08/2022	29/08/2022	7	15,10	15,10	45,00	28,15	36,8	3,6	97	97	TERCIO MEDIO																		
2	V2	2	K1+410 - K1+500	38	NORMAL	22/08/2022	19/09/2022	28	15,10	15,10	45,00		0,0	0,0	0	0																			
TIPOS DE FALLA:					OBSERVACIONES:																														
TERCIO MEDIO																																			
 INGELABCON S.A.S. NIT: 901124473-8 JEYSON JAVIER ATENCIA AGÁMEZ LABORATORISTA JEFE																		 ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO																	
Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio –INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.																																			
INGELABCON S.A.S. NIT. 901.124.673-8 Oficina: Calle 44 # 1º-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba Cel: 3146317410 – Email: ingelabcon@gmail.com																																			

CODIGO: EL-F-S009	FORMATOS									
FECHA :13/07/2021										
VERSION : 02	DENSIDAD EN CAMPO CON CONO Y ARENA									
PAGINA 1 DE 1	INV-161-13									
CLIENTE:	CONSORCIO ACI-3B									
PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - GRUPO 4									
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	CORREGIMIENTO EL CEPILLO, CERETÉ - CORDOBA		ORDEN DE SERVICIO N°:	517-22						
FECHA DE ENSAYO:	martes, 30 de agosto de 2022	HORA INC:	3:00:00 p. m.	HORA FIN: 3:20:00 p. m.						
ZONA DE ESTUDIO:	SUBBASE GRANULAR.									
ALCANCE DE LA SOLICITUD										
Se realizará una (1) densidad en el proyecto ya mencionado.										
DESCRIPCIÓN BÁSICA MATERIAL										
CANTERA:	JOMEVE									
DENSIDAD MAX. PROCTOR:	2,170 (gr/cm3)		HUMEDAD ÓPTIMA:	5,60%						
PUNTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ABSCISA, COTA Y/O ESPESOR DE LA CAPA	K2+695									
W.frasco+arena inicial (gr)	5543,0									
W.frasco+arena final (gr)	2442,0									
W. arena total usada (gr)	3101									
Constante del Cono (gr)	1568									
W. arena en el hueco (gr)	1533									
Densidad de la arena (gr/cm³)	1,344									
Volumen del Hueco (cm³)	1141									
W. material extraído humedo(gr)	2545									
Humedad (%)	7,8									
W. material extraído seco(gr)	2361									
Densidad seca (gr/cm³)	2,070									
Densidad seca (lb/ft³)	129,2									
Densidad max. Proctor(gr/cm³)	2,170									
%Compactación (%)	95,4									
OBSERVACIONES:										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  <p>JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ LABORATORISTA JEFE</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO</p> </div> </div>										
<p>Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio -INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.</p>										
<p style="text-align: center;">INGELABCON S.A.S. NIT. 901.124.673-8 Oficina: Calle 44 # 1°-60 Barrio Sucre - Montería - Córdoba Cel: 3146317410 - Email: ingelabcon@gmail.com</p>										

CODIGO: EL-F-S009	FORMATOS									
FECHA :13/07/2021										
VERSION : 02	DENSIDAD EN CAMPO CON CONO Y ARENA									
PAGINA 1 DE 1	INV-161-13									
CLIENTE:	CONSORCIO ACI-3B									
PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - GRUPO 4									
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	CORREGIMIENTO MARTÍNEZ, CERETÉ - CORDOBA		ORDEN DE SERVICIO N°:	517-22						
FECHA DE ENSAYO:	martes, 30 de agosto de 2022	HORA INC:	3:40:00 p. m.	HORA FIN:	4:20:00 p. m.					
ZONA DE ESTUDIO:	SUBBASE GRANULAR.									
ALCANCE DE LA SOLICITUD										
Se realizaron dos (2) densidades en el proyecto ya mencionado.										
DESCRIPCIÓN BÁSICA MATERIAL										
CANTERA:	JOMEVE									
DENSIDAD MAX. PROCTOR:	2,170 (gr/cm ³)		HUMEDAD ÓPTIMA:	5,60%						
PUNTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ABSCISA, COTA Y/O ESPESOR DE LA CAPA	K1+960	K1+860								
W.frasco+arena inicial (gr)	5532,0	5504,0								
W.frasco+arena final (gr)	2245,0	2155,0								
W. arena total usada (gr)	3287	3349								
Constante del Cono (gr)	1568	1568								
W. arena en el hueco (gr)	1719	1781								
Densidad de la arena (gr/cm ³)	1,344	1,344								
Volumen del Hueco (cm ³)	1279	1325								
W. material extraído humedo(gr)	2897	2976								
Humedad (%)	8,8	8,4								
W. material extraído seco(gr)	2663	2745								
Densidad seca (gr/cm ³)	2,082	2,072								
Densidad seca (lb/ft ³)	129,9	129,3								
Densidad max. Proctor(gr/cm ³)	2,170	2,170								
%Compactación (%)	95,9	95,5								
OBSERVACIONES:										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ LABORATORISTA JEFE</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>CAMILLO HERNESTO HOYOS ALVAREZ COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO</p> </div> </div>										
Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio -INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.										
INGELABCON S.A.S. NIT. 901.124.673-8 Oficina: Calle 44 # 1°-60 Barrio Sucre - Montería - Córdoba Cel: 3146317410 - Email: ingelabcon@gmail.com										

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1 DE 2		

	FECHA	31-ago-22 (Día) (Mes) (Año)
--	-------	--------------------------------

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA
--	--------------------------------

CONTRATO DE OBRA No. 181 DE 2021	CONTRATISTA: CONSORCIO EYR 019
----------------------------------	--------------------------------

OBJETO DEL CONTRATO:
 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEPILLO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

FECHA DE INICIO: 31 DE ENERO DE 2022	
PLAZO INICIAL: 6 MESES	
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (Incluye prórrogas y suspensiones)	
VALOR INICIAL: \$ 4.431.421.060,00	
VALOR ACUMULADO: \$ - (Incluye adiciones)	
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ -	
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ -	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2276 del 2021	INTERVENTOR: CONSORCIO ACI-3B
---	-------------------------------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																										
<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 30%;">Amparo</th> <th style="width: 10%;">% Amparo</th> <th style="width: 60%;">Valor Asegurado (\$)</th> </tr> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td style="text-align: center;">10%</td> <td>\$ 443.142.106,00</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td>\$ 1.329.426.318,00</td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td style="text-align: center;">20%</td> <td>\$ 886.284.212,00</td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y Calidad de la Obra</td> <td style="text-align: center;">30%</td> <td>\$ 1.329.426.318,00</td> </tr> <tr> <td>Calidad del Servicio</td> <td style="text-align: center;">30%</td> <td>\$ 4.778.556,00</td> </tr> </table>	Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 443.142.106,00	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$ 1.329.426.318,00	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 886.284.212,00	Estabilidad y Calidad de la Obra	30%	\$ 1.329.426.318,00	Calidad del Servicio	30%	\$ 4.778.556,00																								
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																								
Cumplimiento	10%	\$ 443.142.106,00																																								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$ 1.329.426.318,00																																								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 886.284.212,00																																								
Estabilidad y Calidad de la Obra	30%	\$ 1.329.426.318,00																																								
Calidad del Servicio	30%	\$ 4.778.556,00																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Desde</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">Hasta</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">31</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2022</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">2022</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">31</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2022</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">2022</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">31</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2022</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">2025</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">5 años apartir del Recibo y Aprobación del Acta Final y Recibo a Satisfacción de la Entidad Contratante</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">2022</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">2027</td> </tr> </table>	VIGENCIA						Desde			Hasta			31	1	2022	3	12	2022	31	1	2022	3	12	2022	31	1	2022	3	6	2025	5 años apartir del Recibo y Aprobación del Acta Final y Recibo a Satisfacción de la Entidad Contratante						3	6	2022	3	6	2027
VIGENCIA																																										
Desde			Hasta																																							
31	1	2022	3	12	2022																																					
31	1	2022	3	12	2022																																					
31	1	2022	3	6	2025																																					
5 años apartir del Recibo y Aprobación del Acta Final y Recibo a Satisfacción de la Entidad Contratante																																										
3	6	2022	3	6	2027																																					

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 540-47-994000018583	
--	--

Certificado de modificación o anexo No.:
 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: CONSORCIO EYR 019

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																								
<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 30%;">Seguro</th> <th style="width: 10%;">% Asegurado</th> <th style="width: 60%;">Valor Asegurado (\$)</th> </tr> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td>\$ 400.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	\$ 400.000.000,00	Otros																	
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																						
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	\$ 400.000.000,00																						
Otros																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Desde</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">Hasta</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2022</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">2022</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Día</td> <td style="text-align: center;">Mes</td> <td style="text-align: center;">Año</td> <td style="text-align: center;">Día</td> <td style="text-align: center;">Mes</td> <td style="text-align: center;">Año</td> </tr> </table>	VIGENCIA						Desde			Hasta			3	1	2022	3	6	2022	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
VIGENCIA																								
Desde			Hasta																					
3	1	2022	3	6	2022																			
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																			

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 540-74-994000004004	OTRAS PÓLIZAS No.
--	------------------------

Certificado de modificación o anexo No.:
 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1 DE 2		

FECHA	31-ago-22		
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: 1 SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 443.142.106,00	3	1	2022	31	1	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$ 1.329.426.318,00	3	1	2022	31	1	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 886.284.212,00	3	1	2022	31	7	2025
Calidad de Estudios y Diseños	30%	\$ 1.329.426.318,00	5 años apartir del Recibo y Aprobación del Acta Final y Recibo a Satisfacción de la Entidad Contratante					
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 4.778.556,00	31	7	2022	31	7	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 540-47-994000018583

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: 1 SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
Cumplimiento	10%	\$ 443.142.106,00	31	1	2022	1	7	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$ 1.329.426.318,00	31	1	2022	1	7	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 886.284.212,00	31	1	2022	1	1	2027
Calidad de Estudios y Diseños	30%	\$ 1.329.426.318,00	5 años apartir del Recibo y Aprobación del Acta Final y Recibo a Satisfacción de la Entidad Contratante					
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 4.778.556,00	31	12	2022	31	12	2027

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma: 
Nombre: Miguel Armando Díaz Rivera
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-12786 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
MUNICIPIO DE CERETÉ
NIT: 800.096.744-5



OFICINA ASESORA JURÍDICA

CONSTANCIA DE ESTUDIO Y APROBACIÓN DE PÓLIZA
DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

COMPañÍA ASEGURADORA:

POLIZA No. 540-47-994000018583

INICIAL:

X

CONTRATISTA:

NIT/CÉDULA:

OBJETO DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO INICIAL:

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

FECHA DE EXPEDICIÓN: 04/01/2022


MODIFICACION:

CONSORCIO EYR 019.

No. 901543340-8.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEPILLO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SESENTA PESOS M/CTE (\$4.431.421.060,00).



MUNICIPIO DE CERETE
NIT: 800.172.918-6

Página 1 de 2

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE VIGENCIAS FUTURAS
No. VF-0001

EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE PRESUPUESTO

HACE CONSTAR:

Que El Municipio comprometi6 vigencias futuras conforme a aprobaci6n del Concejo Municipal, segun Acuerdo No. 004 del 20/07/2021, como se Detalla:

Vigencia: 2022
Fecha de Expedici6n: 22 de julio de 2021
Tipo de Compromiso: CONTRATO

Objeto: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA - COLOMBIA RURAL

C6digo	Descripci6n c6digo	Recurso	Descripci6n recurso
A 94.2	Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitaci6n de Corredores Rurales Productivos en el Municipio de Ceret6 Departamento de C6rdoba.	507	COFINANCIACION NACIONAL - CONVENIO 929/21 INVIAS

Valor: \$ 9,870,400.000.00

TOTAL CERTIFICADO: \$ 9,870,400.000.00

Telefonos: 7641560 Fax 7746180 Direcci6n: Calle. 12 Nro. 12 - 37

MUNICIPIO DE CERETÉ

Hoja 2 de 2

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE VIGENCIAS FUTURAS
No. VF-0001

EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE PRESUPUESTO

HACE CONSTAR:

Que El Municipio contempló vigencias futuras conforme a aprobación del Concejo Municipal, según Acuerdo No. 004 del 20/07/2021, como se Detalla.



ROGER JAVIER PADILLA NOVOA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE PRESUPUESTO

AMPAROS PACTADOS

RIESGO	(%)	CONDICIONES	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10% del valor total del contrato	Hasta la liquidación del contrato	\$443.142.106,00	03/01/2022	03/12/2022
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	100% del monto que el contratista reciba para la ejecución del contrato, a título de anticipo.	Hasta la liquidación del contrato	\$1.329.426.318,00	03/01/2022	03/12/2022
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20% del valor total del contrato	Por el término del contrato y 3 años más	\$886.284.212,00	03/01/2022	03/06/2025
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30% del valor final de las obras	Por el término de cinco (05) años contados a partir de la fecha del acta de entrega y recibo definitivo de obra	\$1.329.426.318,00	Tiene vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la entidad contratante,	
CALIDAD DEL SERVICIO	30% del valor de éste ítem	Por el término Cinco (05) años contados a partir de la fecha del acta de aprobación definitiva de la revisión, actualización y/o modificación y/o ajuste de los estudios y diseños.	\$4.778.566,00	03/01/2022	03/06/2027

Revisada los amparos y hecha la verificación y análisis correspondientes de la póliza de Seguro de Cumplimiento No. 540-47-994000018583, se aprueba la garantía por reunir los requisitos exigidos por el MUNICIPIO DE CERETÉ, para el Contrato de Obra No. 181 de fecha 29 de Noviembre de 2021.

Se aprueba en el Municipio de Cereté, el día cuatro (04) de Enero de 2022.



EVER ENRIQUE DÍAZ BEDOYA
Jefe Oficina Jurídica



NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS 5401353767

PÓLIZA No: 540 - 47 - 994000018583 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: MONTERÍA

COD. AGENCIA: 540 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION

TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

DIA MES AÑO 04 01 2022 DIA MES AÑO 04 01 2022 FECHA DE EXPEDICIÓN FECHA DE IMPRESIÓN

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: CONSORCIO EYR 019

IDENTIFICACIÓN: HIT 901.543.340-8

DIRECCIÓN: CR 11 A 59 49 OF 201

CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA

TELÉFONO: 6047860389

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE CERETE

IDENTIFICACIÓN: NIT 800.096.744-5

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CERETE

IDENTIFICACIÓN: NIT 800.096.744-5

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO			
CUMPLIMIENTO	03/01/2022	03/12/2022	443,142,106.00
ANTICIPO	03/01/2022	03/12/2022	1,329,426,318.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	03/01/2022	03/06/2025	886,284,212.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VER NOTA	ACLARATORIA	1,329,426,318.00
CALIDAD DEL SERVICIO	03/06/2022	03/06/2027	4,778,566.00

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

CC 78038056 - MONTES NAVAS, RAFAEL EDUARDO - PART: 10.00%
NIT 900104178 - ELESKO S.A.S - PART: 90.00%

BENEFICIARIOS
NIT 800096744 - MUNICIPIO DE CERETE

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:
I

OBJETO DE LA GARANTIA
EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 181, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEPILLO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ *3,993,057,520.00	VALOR PRIMA: \$ *****23,102,259	GASTOS EXPEDICION: \$ *****15,000.00	IVA: \$ *****4,392,279	TOTAL A PAGAR: \$ *****27,509,538
NOMBRE INTERMEDIARIO ROSALINA ISABEL PEREZ ZAPATA	CLAVE 9949	%PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART VALOR ASEGURADO

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS - FIANZAS - SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS - CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000540135376

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

CBDC20790C0AFF7959

GRAN CONTRIBUYENTE RES-2508 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601 - ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: MONTERÍA COD. AGENCIA: 540 RAMO: 47 No PÓLIZA: 994000018583 ANEXO: 0

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:	CONSORCIO EYR 019	IDENTIFICACIÓN:	NIT	901.543.340-8
ASEGURADO:	MUNICIPIO DE CERETE	IDENTIFICACIÓN:	NIT	800.096.744-5
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE CERETE	IDENTIFICACIÓN:	NIT	800.096.744-5

TEXTO ITEM 1

*** NOTA ACLARATORIA ***
EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

*** NOTA ACLARATORIA ***
EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIOS CORRESPONDE AL AMPARO DE CALIDAD DE LA REVISION, ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

CLIENTE



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
MUNICIPIO DE CERETÉ
NIT: 800.096.744-5



OFICINA ASESORA JURÍDICA

CONSTANCIA DE ESTUDIO Y APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE PÓLIZA
DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

COMPañÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

POLIZA No. 540-74-994000004004 FECHA DE EXPEDICIÓN: 04/01/2022

INICIAL: MODIFICACION: ☒

CONTRATISTA: CONSORCIO EYR 019.

NIT/CÉDULA: No. 901543340-8.

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEPILLO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

VALOR DEL CONTRATO INICIAL: CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SESENTA PESOS M/CTE (\$4.431.421.060,00).

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:



MUNICIPIO DE CERETE
NIT. 800.177.918-6

Hoja 1 de 2

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE VIGENCIAS FUTURAS
No. VF-0001

EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE PRESUPUESTO

HACE CONSTAR:

Que El Municipio comprometió vigencias futuras conforme a aprobación del Concejo Municipal, según Acuerdo No. 004 del 20/07/2021, como se Detalla:

Vigencia: 2022

Fecha de Expedición: 22 de julio de 2021

Tipo de Compromiso: CONTRATO

Objeto: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA - COLOMBIA RURAL

Código	Descripción código	Recurso	Descripción recurso
A 9.4.2	Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Corredores Rurales Productivos en el Municipio de Cereté Departamento de Córdoba.	507	COFINANCIACION NACIONAL - CONVENIO 929/21 INVIAS

Valor: \$ 9,870,400.000.00

TOTAL CERTIFICADO: \$ 9,870,400.000.00

Telefonos: 7641560 Fax 7746180 Dirección: Calle. 12 Nro. 12 - 37

MUNICIPIO DE CERETÉ
TEL: 900 172.918-6


Elega 2 de 2

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE VIGENCIAS FUTURAS
No. VF-0001

EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE PRESUPUESTO

HACE CONSTAR:

Que El Municipio contempló vigencias futuras conforme a aprobación del Concejo Municipal, según Acuerdo No. 004 del 20/07/2021, como se Detalla.



ROGER JAVIER PADILLA NOVOA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE PRESUPUESTO

AMPAROS PACTADOS

RIESGO		VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
PREDIOS, LABORES OPERACIONES	Y	\$400.000.000,00	03/06/2022	31/07/2022

Revisada los amparos y hecha la verificación y análisis correspondientes de la modificación de la póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 540-74-994000004004, se aprueba la garantía por reunir los requisitos exigidos por el MUNICIPIO DE CERETÉ, para el Contrato de Obra No. 181 de fecha 29 de Noviembre de 2021, de conformidad con el Modificadorio No. 01 de fecha diecisiete (17) de Diciembre de 2021, ASEGURADO/BENEFICIARIOS: MUNICIPIO DE CERETÉ NIT: 800096744-5 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS NIT: 800215807-2

Se aprueba en el Municipio de Cereté, el día veintiuno (21) de Enero de 2022.



EVER ENRIQUE DÍAZ BEDOYA
Jefe Oficina Jurídica



POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS 5401353833

PÓLIZA No: 540 -74 - 994000004004 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: MONTERÍA				COD AGE: 540				RAMO: 74				PAP:			
DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	
04	01	2022		03	01	2022	23:59	03	06	2022	23:59	151	04	01	2022
FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA DE LA PÓLIZA				VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA			
				A LAS				A LAS				DÍAS			
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL												TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION			

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION				DIA				MES				AÑO				HORAS				DIA				MES				AÑO				HORAS				DÍAS			
				03				01				2022				23:59				03				06				2022				23:59				151			
				VIGENCIA DEL ANEXO				VIGENCIA DESDE				A LAS				VIGENCIA HASTA				A LAS																			

DATOS DEL TOMADOR				NOMBRE: CONSORCIO EYR 019				IDENTIFICACIÓN: NIT 901.543.340-8			
DIRECCIÓN: CR 11 A 59 49 OF 201				CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA				TELÉFONO: 6047860389			

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO				ASEGURADO: MUNICIPIO DE CERETE				IDENTIFICACIÓN: NIT 800.096.744-5			
DIRECCIÓN: CARRERA 14 12 41				CIUDAD: CERETE, CORDOBA				TELÉFONO: 7746180			
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS								IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8			

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS				ASEGURADO: MUNICIPIO DE CERETE				NIT : 800096744			
ITEM: 1				DEPARTAMENTO: CORDOBA				CIUDAD: CERETE			

DIRECCIÓN: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 181				ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA							
TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO				TIPO DE RIESGO: ESTATAL				MANZANA:			

DESCRIPCION				AMPAROS				SUMA ASEGURADA				% INVAR				SUBLIMITE			
CONTRATO				PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES				\$ 400,000,000.00				400,000,000.00							

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES			
BENEFICIARIOS			
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS			
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y MUNICIPIO DE CERETE NIT. 800.096.744			

Mediante la presente póliza se amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley colombiana en virtud de la ejecución del CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 181, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEPILLO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
\$ ****400,000,000.00	\$ *****655,315	\$ ****15,001.00	\$ *****127,360	\$ *****797,676

INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO	
NOMBRE	CLAVE	%PART	VALOR ASEGURADO
ROSALINA ISABEL PEREZ ZAPATA	9949	100.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000003000007000540135383

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CBDC20790C0AFF765C

CLIENTE:

ESALGADO 0

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES-2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VEGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
MUNICIPIO DE CERETÉ
NIT: 800.096.744-5



OFICINA ASESORA JURÍDICA

CONSTANCIA DE ESTUDIO Y APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE PÓLIZA
DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

POLIZA No. 540-47-994000018583 FECHA DE EXPEDICIÓN: 21/01/2022

INICIAL: ☐ MODIFICACION: ☒

CONTRATISTA: CONSORCIO EYR 019.

NIT/CÉDULA: No. 901543340-8.

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEPILLO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

VALOR DEL CONTRATO INICIAL: CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SESENTA PESOS M/CTE (\$4.431.421.060,00).

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:



MUNICIPIO DE CERETE
NIT. 900.377.918-6

Página 1 de 2

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE VIGENCIAS FUTURAS
No. VP-0001

EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE PRESUPUESTO

HACE CONSTAR:

Que El Municipio comprometió vigencias futuras conforme a aprobación del Concejo Municipal, según Acuerdo No. 004 del 20/07/2021, como se Detalla:

Vigencia: 2022

Fecha de Expedición: 22 de julio de 2021

Tipo de Compromiso: CONTRATO

Objeto: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL.

Código	Descripción código	Recurso	Descripción recurso
A 9.4.2	Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Corredores Rurales Productivos en el Municipio de Cereté Departamento de Córdoba.	507	COOFINANCIACIÓN NACIONAL - CONVENIO 929/21 INVIAS

Valor: \$ 9,870,400,000.00

TOTAL CERTIFICADO: \$ 9,870,400,000.00

Telefonos: 7641560 Fax 7746180 Dirección: Calle. 12 Nro. 12 - 37



AlcaldiaCereTE



alcaldia_cerete



@alcaldia_cerete



www.cerete-cordoba.gov.co



alcaldia@cerete-cordoba.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
MUNICIPIO DE CERETÉ
NIT: 800.096.744-5



MUNICIPIO DE CERETE
BOL. 900.772.918-6

Hoja 2 de 2

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE VIGENCIAS FUTURAS
No. VF-0001

EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE PRESUPUESTO

HACE CONSTAR:

Que El Municipio comprometi6 vigencias futuras conforme a aprobaci6n del Concejo Municipal, seg6n Acuerdo No. 004 del 20/07/2021, como se Detalla:

ROGER JAVIER PADILLA NOVOA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE PRESUPUESTO

AMPAROS PACTADOS

RIESGO		(<div>%)</div>	CONDICIONES	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
					DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		10% del valor total del contrato	Hasta la liquidaci6n del contrato	\$443.142.106,00	03/01/2022	31/01/2023
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSI6N DEL ANTICIPO		100% del monto que el contratista reciba para la ejecuci6n del contrato, a t6tulo de anticipo.	Hasta la liquidaci6n del contrato	\$1.329.426.318,00	03/01/2022	31/01/2023
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES		20% del valor total del contrato	Por el t6rmino del contrato y 3 a6os m6s	\$886.284.212,00	03/01/2022	31/07/2025
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		30% del valor final de las obras	Por el t6rmino de cinco (05) a6os contados a partir de la fecha del acta de entrega y recibo definitivo de obra	\$1.329.426.318,00	Tiene vigencia de cinco (5) a6os, contados a partir de la fecha de suscripci6n del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacci6n por parte de la entidad contratante,	
CALIDAD DEL SERVICIO		30% del valor de 6ste 6tem	Por el t6rmino Cinco (05) a6os contados a partir de la fecha del acta de aprobaci6n definitiva de la revisi6n, actualizaci6n y/o modificaci6n y/o ajuste de los estudios y dise6os.	\$4.778.566,00	31/07/2022	31/07/2027

Telefonos: 7641560 Fax 7746180 Direcci6n: Calle. 12 Nro. 12 - 37



AlcaldiaCeret6



alcaldia_cerete



@alcaldia_cerete



www.cerete-cordoba.gov.co



alcaldia@cerete-cordoba.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
MUNICIPIO DE CERETÉ
NIT: 800.096.744-5



Revisada los amparos y hecha la verificación y análisis correspondientes de la modificación de la póliza de Seguro de Cumplimiento No. 540-47-994000018583, se aprueba la garantía por reunir los requisitos exigidos por el MUNICIPIO DE CERETÉ, para el Contrato de Obra No. 181 de fecha 29 de Noviembre de 2021, de conformidad con el Modificadorio No. 01 de fecha diecisiete (17) de Diciembre de 2021, ASEGURADO/BENEFICIARIOS: MUNICIPIO DE CERETÉ NIT: 800096744-5 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS NIT: 800215807-2.

Se aprueba en el Municipio de Cereté, el día veintiuno (21) de Enero de 2022.

EVER ENRIQUE DÍAZ BEDOYA
Jefe Oficina Jurídica

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS 5401353767

PÓLIZA No: 540 - 47 - 994000018583 ANEXO: 1

AGENCIA EXPEDIDORA: MONTERÍA

COD AGENCIA: 549 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

21 01 2022 21 01 2022

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: CONSORCIO EYR 019

IDENTIFICACIÓN: NIT 901.543.340-8

DIRECCIÓN: CR 11 A 59 49 OF 201

CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA

TELEFONO: 6047860389

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE CERETE

IDENTIFICACIÓN: NIT 800.096.744-5

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CERETE

IDENTIFICACIÓN: NIT 800.096.744-5

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO ANTICIPO	03/01/2022	31/01/2023	443,142,106.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	03/01/2022	31/01/2023	1,329,426,318.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	03/01/2022	31/07/2025	886,284,212.00
CALIDAD DEL SERVICIO	31/07/2022	31/07/2027	1,329,426,318.00
			4,778,566.00

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

CC 78038056 - MONTES NAVAS, RAFAEL EDUARDO - PART: 10.00%
NIT 900104178 - ELESKO S.A.S - PART: 90.00%

BENEFICIARIOS
NIT 800096744 - MUNICIPIO DE CERETE

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

ASEGURADO/BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CERETE - CORDOBA NIT. 800.096.744-5 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT. 800.215.807-2

OBJETO DE LA GARANTIA

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ *3,993,057,520.00	VALOR PRIMA: \$ *****861,905	GASTOS EXPEDICION: \$ *****5,000.00	IVA: \$ *****164,712	TOTAL A PAGAR: \$ *****1,031,617
NOMBRE INTERMEDIARIO ROSALINA ISABEL PEREZ ZAPATA	CLAVE 9949	%PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART VALOR ASEGURADO

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS - TU RESPALDO. SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS - CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)00000000007000540135376

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

CBDC20790C09FC7959

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/83 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6801. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: MONTERÍA COD. AGENCIA: 540 RAMO: 47 No PÓLIZA: 994000018583 ANEXO: 1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSORCIO EYR 019 IDENTIFICACIÓN: NIT 901.543.340-8
ASEGURADO: MUNICIPIO DE CERETE IDENTIFICACIÓN: NIT 800.096.744-5
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CERETE IDENTIFICACIÓN: NIT 800.096.744-5

TEXTO ITEM 1

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 181, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEPILLO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIOS CORRESPONDE AL AMPARO DE CALIDAD DE LA REVISION, ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

TEXTO MODIFICATORIO

SE REALIZA AJUSTE A LAS VIGENCIAS ARIPIA CITADAS SEGUN MODIFICACION N° 01 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 181. PLAZO DEL CONTRATO HASTA 31/07/2022.

LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES.

CLIENTE





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
MUNICIPIO DE CERETÉ
NIT: 800.096.744-5



OFICINA ASESORA JURÍDICA

CONSTANCIA DE ESTUDIO Y APROBACIÓN DE PÓLIZA
DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

COMPañÍA ASEGURADORA:

POLIZA No. 540-74-994000004004

INICIAL:

X

CONTRATISTA:

NIT/CÉDULA:

OBJETO DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO INICIAL:

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

FECHA DE EXPEDICIÓN: 04/01/2022

MODIFICACION:

CONSORCIO EYR 019.

No. 901543340-8.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEPILLO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SESENTA PESOS M/CTE (\$4.431.421.060,00).



MUNICIPIO DE CERETE
NIT. 900.372.918 6

Hoja 1 de 2

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE VIGENCIAS FUTURAS
No. VF-0001

EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE PRESUPUESTO

HACE CONSTAR:

Que El Municipio comprometió vigencias futuras conforme a aprobación del Concejo Municipal, según Acuerdo No. 004 del 20/07/2021, como se Detalla:

Vigencia:

Fecha de Expedición:

Tipo de Compromiso:

Objeto:

2022

22 de julio de 2021

CONTRATO

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA - COLOMBIA RURAL.

Código	Descripción código	Recurso	Descripción recurso
A 9 4.2	Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Corredores Rurales Productivos en el Municipio de Cereté Departamento de Córdoba.	507	COFINANCIACION NACIONAL - CONVENIO 929/21 INVIAS

Valor: \$ 9,870,400,000.00

TOTAL CERTIFICADO: \$ 9,870,400,000.00

Telefonos: 7641560 Fax 7746180 Dirección: Calle. 12 Nro. 12 - 37

MUNICIPIO DE CERETÉ
Tel: 900 377 018-6


Foja 2 de 2

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE VIGENCIAS FUTURAS
No. VF-0001

EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE PRESUPUESTO

HACE CONSTAR:

Que El Municipio compromete vigencias futuras conforme a aprobación del Concejo Municipal, según Acuerdo No. 004 del 20/07/2021, como se Detalla.


ROGER JAVIER PADILLA NOVOA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE PRESUPUESTO

AMPAROS PACTADOS
AMPAROS PACTADOS

RIESGO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	\$400.000.000,00	03/01/2022	03/06/2022

Revisada los amparos y hecha la verificación y análisis correspondientes de la póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 540-74-994000004004, se aprueba la garantía por reunir los requisitos exigidos por el MUNICIPIO DE CERETÉ, para el Contrato de Obra No. 181 de fecha 29 de Noviembre de 2021.

Se aprueba en el Municipio de Cereté, el día cuatro (04) de Enero de 2022.



EVER ENRIQUE DÍAZ BEDOYA
Jefe Oficina Jurídica



POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS
5401353833

PÓLIZA No: 540 -74 - 994000004004 ANEXO:1

AGENCIA EXPEDIDORA: MONTERIA	COD AGE: 540	RAMO: 74	PAP:
DIA MES AÑO 20 01 2022	DIA MES AÑO HORAS 03 06 2022 23:59	DIA MES AÑO HORAS 31 07 2022 23:59	DIA MES AÑO HORAS 21 01 2022
FECHA DE EXPEDICION	VIGENCIA DESDE A LAS	VIGENCIA HASTA A LAS	FECHA DE IMPRESION
MODALIDAD FACTURACION: ANUAL	TIPO DE IMPRESION: IMPRESION		

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA	DIA MES AÑO HORAS 03 06 2022 23:59	DIA MES AÑO HORAS 31 07 2022 23:59	DIA MES AÑO HORAS 21 01 2022
	VIGENCIA DEL ANEXO: VIGENCIA DESDE A LAS	VIGENCIA HASTA A LAS	

DATOS DEL TOMADOR	
NOMBRE: CONSORCIO EYR 019	IDENTIFICACION: NIT 901.543.340-8
DIRECCION: CR 11 A 59 49 OF 201	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA
	TELEFONO: 6047860289

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO	
ASEGURADO: MUNICIPIO DE CERETE	IDENTIFICACION: NIT 800.096.744-5
DIRECCION: CARRERA 14 12 41	CIUDAD: CERETE, CORDOBA
	TELEFONO: 7746180
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS	IDENTIFICACION: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS	
ASEGURADO: MUNICIPIO DE CERETE	NIT : 800096744

ITEM: 1	DEPARTAMENTO: CORDOBA	CIUDAD: CERETE
DIRECCION: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 181		
ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA		
TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO		TIPO DE RIESGO: ESTATAL
MANZANA:		

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	\$ 400,000,000.00		
		400,000,000.00		

DEDUCTIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

ASEGURADO/BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CERETE - CORDOBA NIT. 800.096.744-5 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT. 800.215.807-2

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y MUNICIPIO DE CERETE NIT. 800.096.744-5

Mediante la presente póliza se amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley colombiana en virtud de la ejecución del CONTRATO DE OBPA PUBLICA N° 181, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEPILLO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

TEXTO MODIFICATORIO
SE REALIZA AJUSTE A LAS VIGENCIAS ARRIBA CITADAS SEGUN MODIFICACION N° 01 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 181.
PLAZO DEL CONTRATO HASTA 31/07/2022.
VIGENCIA DESDE 03/01/2022 HASTA 31/07/2022

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ****400,000,000.00	VALOR PRIMA: \$ *****251,710	GASTOS EXPEDICION: \$ *****5,000.00	IVA: \$ *****48,775	TOTAL A PAGAR: \$ *****305,485
---	---------------------------------	--	------------------------	-----------------------------------

INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO	
NOMBRE ROSALINA ISABEL PEREZ ZAPATA	CLAVE 9949	%PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA %
		VALOR ASEGURADO	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR	(415)7701861000019(8020)000000000007000540135383	FIRMA TOMADOR
------------------	--	---------------

DIRECCION NOTIFICACION ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá	CLIENTE	ESALGADO 0
--	---------	------------

CBDC20790C05FC/958

CLIENTE



ESALGADO 0

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: MONTERIA COD. AGENCIA: 540 RAMO: 74 No POLIZA: 994000004004 ANEXO: 1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSORCIO EYR 019 IDENTIFICACIÓN: NIT 901.543.340-8
ASEGURADO: MUNICIPIO DE CERETE IDENTIFICACIÓN: NIT 800.096.744-5
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

TEXTO ITEM 1

LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES.

CLIENTE



NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS 5401353833

PÓLIZA No: 540 -74 - 994000004004 ANEXO:1

AGENCIA EXPEDIDORA: MONTERÍA

COD. AGE: 540

RAMO: 74

PAP:

DIA MES AÑO 20 01 2022

VIGENCIA DE LA PÓLIZA

DIA MES AÑO HORAS 03 06 2022 23:59

VIGENCIA DESDE

A LAS

DIA MES AÑO HORAS 31 07 2022 23:59

VIGENCIA HASTA

A LAS

DIA MES AÑO 21 01 2022

FECHA DE IMPRESIÓN

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL

TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO PRORROGA

VIGENCIA DEL ANEXO

DIA MES AÑO HORAS 03 06 2022 23:59

VIGENCIA DESDE

A LAS

DIA MES AÑO HORAS 31 07 2022 23:59

VIGENCIA HASTA

A LAS

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSORCIO EYR 019

IDENTIFICACIÓN: NIT 901.543.340-8

DIRECCIÓN: CR 11 A 59 49 OF 201

CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA

TELÉFONO: 6047860389

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE CERETE

IDENTIFICACIÓN: NIT 800.096.744-5

DIRECCIÓN: CARRERA 14 12 41

CIUDAD: CERETE, CORDOBA

TELÉFONO: 7746180

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: MUNICIPIO DE CERETE

NIT : 800096744

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: CORDOBA

CIUDAD: CERETE

DIRECCION: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 181

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL

MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		\$ 400,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	400,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS

NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

ASEGURADO/BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CERETE - CORDOBA NIT. 800.096.744-5 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT. 800.215.807-2

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y MUNICIPIO DE CERETE NIT. 800.096.744-5

Mediante la presente póliza se amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley colombiana en virtud de la ejecución del CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 181, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEPILLO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

TEXTO MODIFICATORIO

SE REALIZA AJUSTE A LAS VIGENCIAS ARRIBA CITADAS SEGUN MODIFICACION N° 01 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 181.

PLAZO DEL CONTRATO HASTA 31/07/2022.

VIGENCIA DESDE 03/01/2022 HASTA 31/07/2022

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
\$ ****400,000,000.00	\$ *****251,710	\$ *****5,000.00	\$ *****48,775	\$ *****305,485

INTERMEDIARIO

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE	CLAVE	%PART
ROSALINA ISABEL PEREZ ZAPATA	9949	100.00

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)00000000007000540135383

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

ESALGADO 0

CBDC20790C09FC7958

CLIENTE



Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2508 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUARIA RETENCION EN LA FUENTE

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: MONTERÍA

COD. AGENCIA: 540 RAMO: 74 No PÓLIZA: 994000004004 ANEXO: 1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSORCIO EYR 019**

IDENTIFICACIÓN: NIT **901.543.340-8**

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE CERETE**

IDENTIFICACIÓN: NIT **800.096.744-5**

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS**

IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

TEXTO ITEM 1

LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES.

CLIENTE

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS 5401353767

PÓLIZA No: 540-47-994000018583 ANEXO: 1

AGENCIA EXPIDIDORA: MONTERÍA

COD. AGENCIA: 540 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

DIA MES AÑO 21 01 2022 FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO 21 01 2022 FECHA DE IMPRESIÓN

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: CONSORCIO EYR 019

IDENTIFICACIÓN: NIT 901.543.340-8

DIRECCIÓN: CR 11 A 59 49 OF 201

CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA

TELÉFONO: 6047860389

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE CERETE

IDENTIFICACIÓN: NIT 800.096.744-5

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CERETE

IDENTIFICACIÓN: NIT 800.096.744-5

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEGURADA 03/01/2022 31/01/2023 443,142,106.00 03/01/2022 31/01/2023 1,329,426,318.00 03/01/2022 31/07/2025 886,284,212.00 31/07/2022 31/07/2027 4,778,566.00

CUMPLIMIENTO ANTICIPO PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA CALIDAD DEL SERVICIO

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

CC 78038056 - MONTES NAVAS, RAFAEL EDUARDO - PART: 10.00% NIT 900104178 - ELESKO S.A.S - PART: 90.00%

BENEFICIARIOS NIT 800096744 - MUNICIPIO DE CERETE

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

ASEGURADO/BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CERETE - CORDOBA NIT. 800.096.744-5 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT. 800.215.807-2

OBJETO DE LA GARANTIA

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ *3,993,057,520.00	VALOR PRIMA: \$ *****861,905	GASTOS EXPEDICION: \$ *****5,000.00	IVA: \$ *****164,712	TOTAL A PAGAR: \$ *****1,031,617
NOMBRE INTERMEDIARIO ROSALINA ISABEL PEREZ ZAPATA	CLAVE 9949	%PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART VALOR ASEGURADO

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS - TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS - CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR



(415)7701861000019(8020)00000000007000540135376

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá CLIENTE

CBDC20790C09FC7959



Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2508 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: MONTERÍA COD. AGENCIA: 540 RAMO: 47 No PÓLIZA: 994000018583 ANEXO: 1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:	CONSORCIO EYR 019	IDENTIFICACIÓN:	NIT	901.543.340-8
ASEGURADO:	MUNICIPIO DE CERETE	IDENTIFICACIÓN:	NIT	800.096.744-5
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE CERETE	IDENTIFICACIÓN:	NIT	800.096.744-5

TEXTO ITEM 1

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 181, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEPILLO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

*** NOTA ACLARATORIA ***
EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

*** NOTA ACLARATORIA ***
EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIOS CORRESPONDE AL AMPARO DE CALIDAD DE LA REVISION, ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

TEXTO MODIFICATORIO
SE REALIZA AJUSTE A LAS VIGENCIAS ARRIBA CITADAS SEGUN MODIFICACION N° 01 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 181. PLAZO DEL CONTRATO HASTA 31/07/2022.
LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES.

CLIENTE

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	1 DE 2

			FECHA	31-ago-22
			(Día)	(Mes)
			(Año)	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 181 DE 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEPILLO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

CONTRATISTA: CONSORCIO EYR 019

FECHA DE INICIO: 31 DE ENERO DE 2022 (Indicar día, mes y año) PLAZO INICIAL: 6 MESES FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (Indicar día, mes y año)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 2276 del 2021 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI-3B

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI NO APROBADO: SI NO VERSIÓN No. FECHA DE VERSIÓN:

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI NO No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:
 PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI NO No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI NO APROBADO: SI NO FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI NO

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	
					VERSIÓN	1	
					PÁGINA	1 DE 2	

		FECHA	31-ago-22
			(Día) (Mes) (Año)

La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
 La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes:	No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:	No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:	

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:	No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:	No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:	No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	NIVEL AUTOMATICO	ruide	X205307	10/02/2022	NA5782053	9/08/2022	

OBSERVACIONES:

NOTA:
 Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma _____

Nombre: Guido José Galván Hernández
 Director de Obra
 Matrícula Profesional No.: 13202-307977 BLV

Firma  _____

Nombre: _____
 Profesional en Calidad Contrato de Obra
 Matrícula Profesional No.: _____


Firma  _____

Nombre: Miguel Armando Díaz Rivera
 Director de la Interventoría
 Matrícula Profesional No.: 25202-12786 CND

Firma _____

Nombre: _____
 Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
 Matrícula Profesional No.: _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.





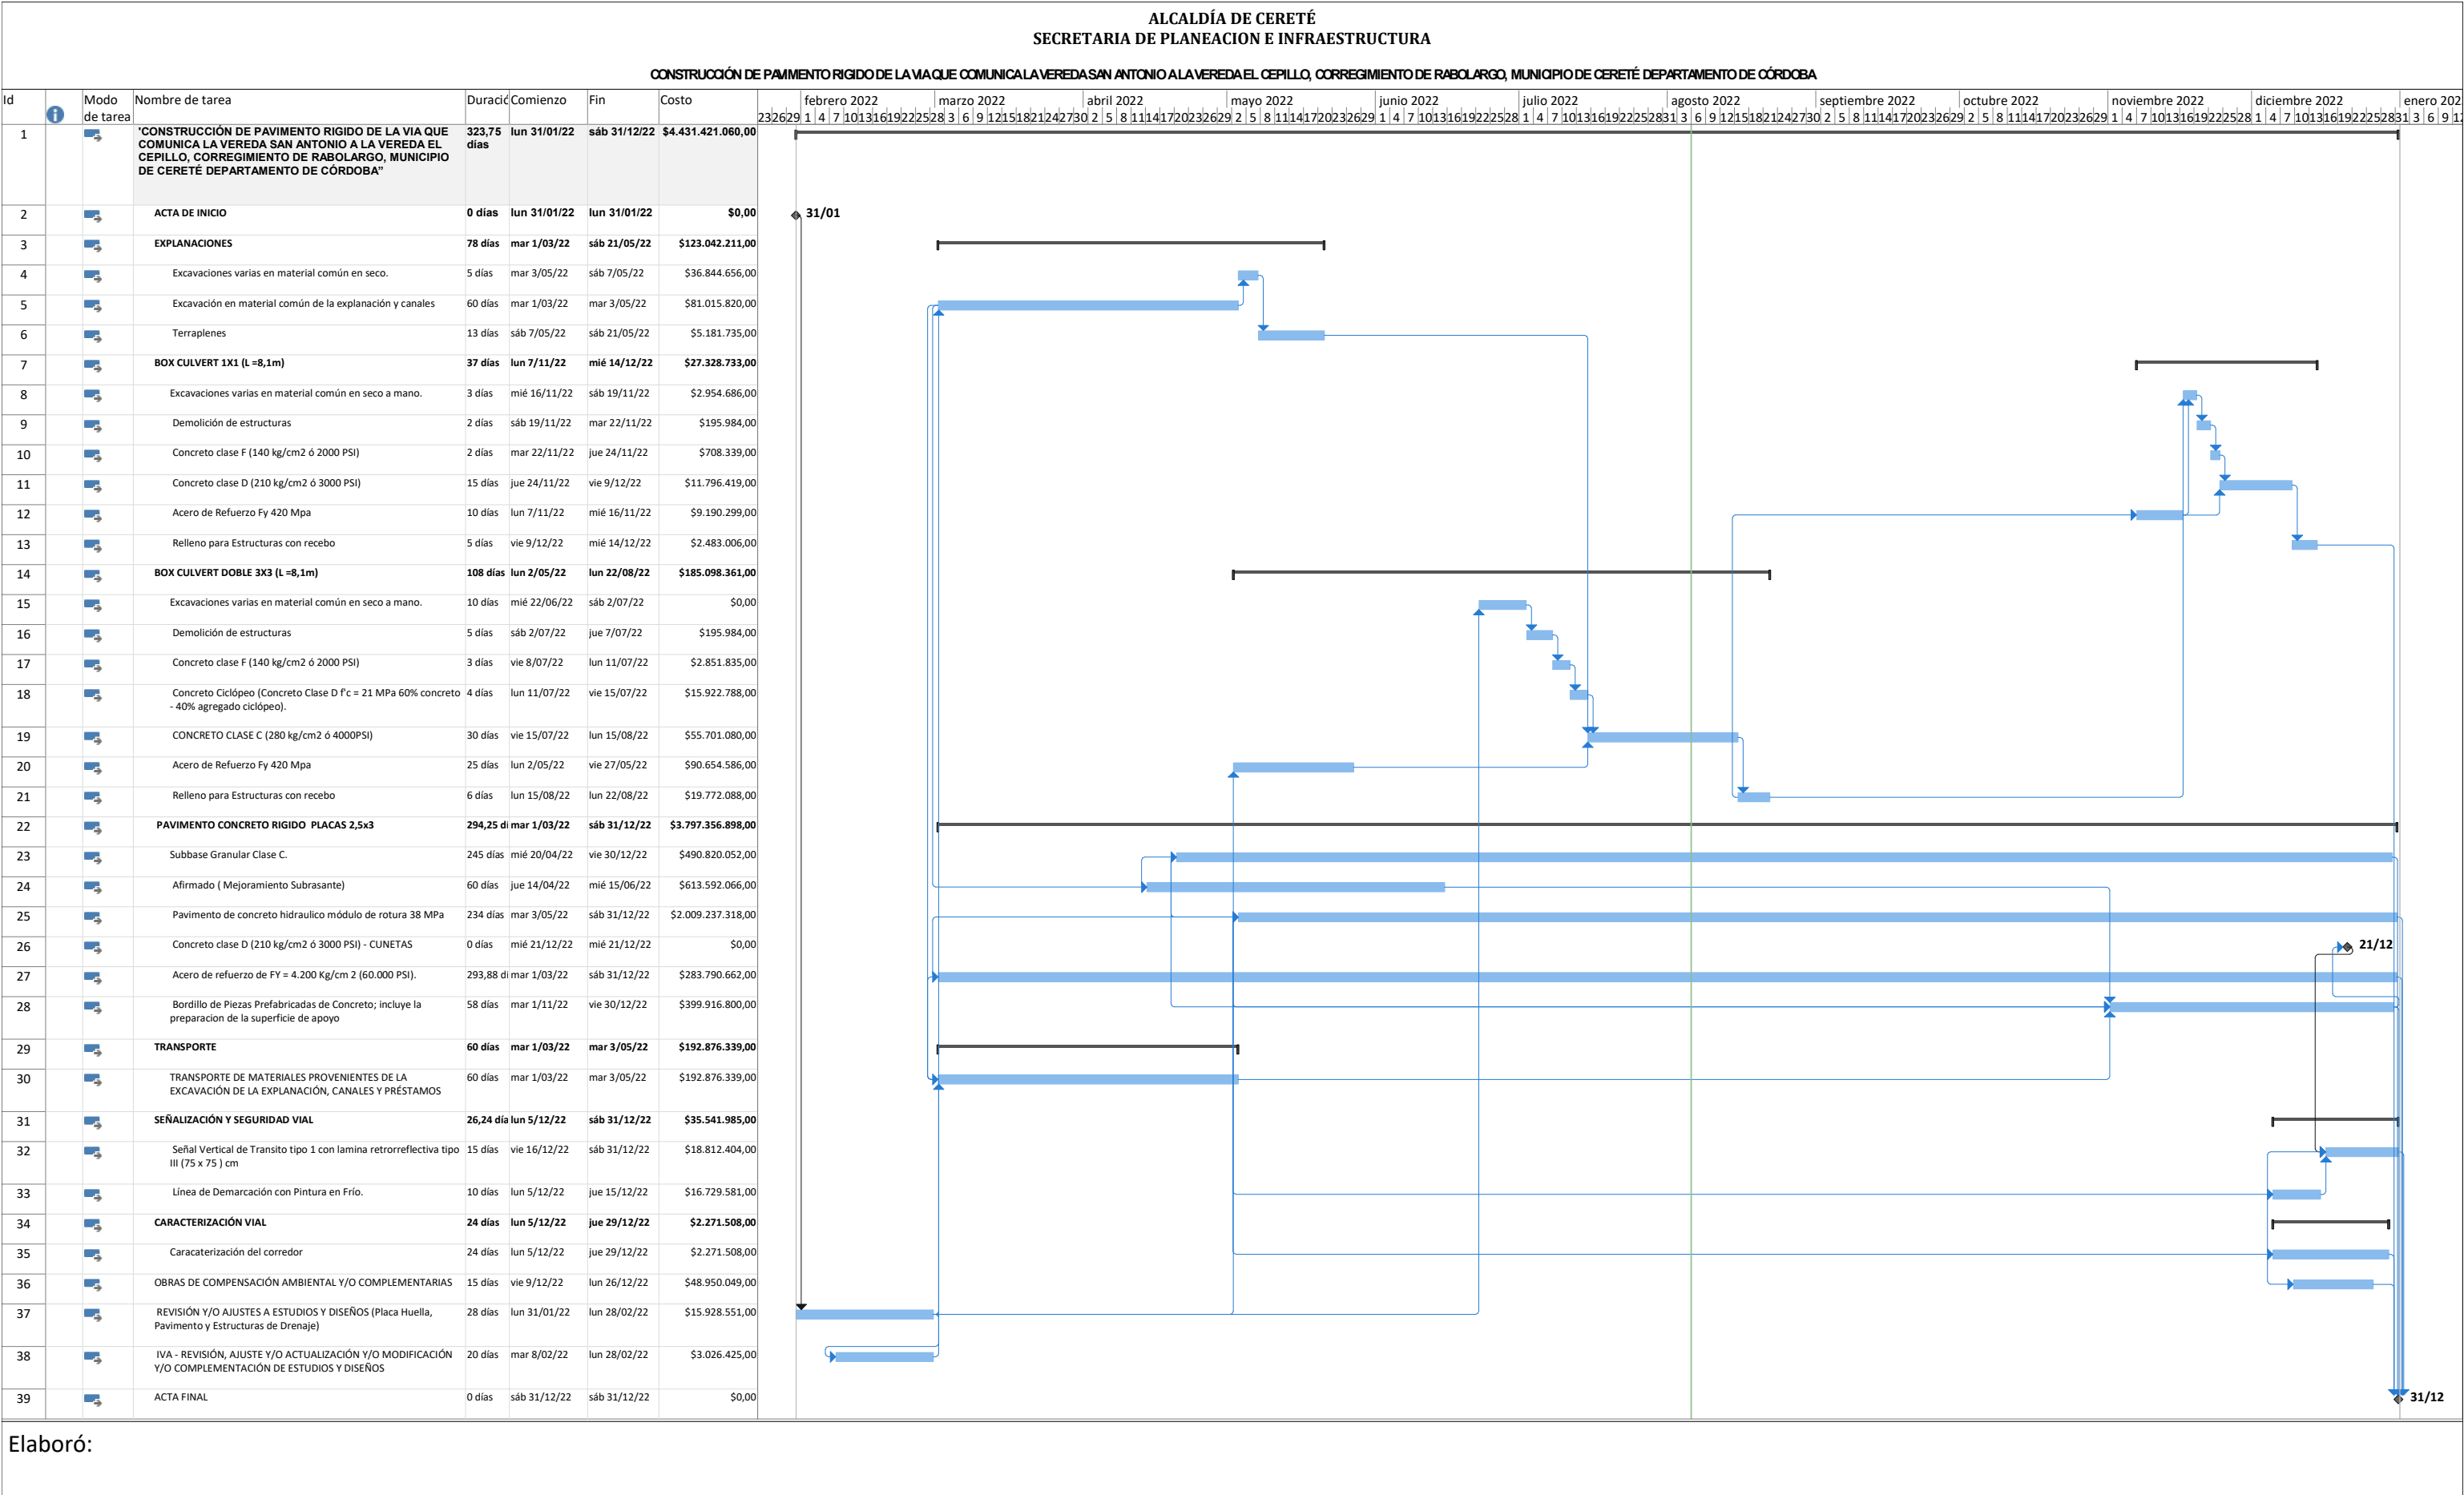


Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1															
		VERSIÓN	1															
		PÁGINA	1 de 3															
		FECHA	19/08/2022 <small>(Día / Mes / Año)</small>															
(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)																		
ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. <u>11</u> <small>(La numeración será consecutiva)</small>																		
UNIDAD EJECUTORA: <u>SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES</u>		DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>CÓRDOBA</u>																
CONTRATO DE OBRA No. <u>181 DE 2021</u> <small>(Indicar número de contrato y año)</small>																		
CONTRATISTA: <u>CONSORCIO EYR 019</u>																		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEPILLO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.																		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. <u>2276 DE 2021</u> <small>(Indicar número de contrato y año)</small>																		
INTERVENTOR: <u>CONSORCIO ACI - 3B</u>																		
LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Entrega de reprogramación y flujo de caja</td> <td style="width: 30%;">sábado, 30 de julio de 2022</td> <td style="width: 20%;">CUMPLIÓ</td> </tr> <tr> <td>Entrega de plan de contingencia de la semana del 1 al 6</td> <td>lunes, 1 de agosto de 2022</td> <td>NO CUMPLIÓ</td> </tr> <tr> <td>Entrega de plan de contingencia del mes de agosto</td> <td>viernes, 5 de agosto de 2022</td> <td>NO CUMPLIÓ</td> </tr> <tr> <td>Reunión sobre actas de vecindad interventoría, contratista</td> <td>viernes, 29 de julio de 2022</td> <td>CUMPLIÓ</td> </tr> <tr> <td>Juntas de pavimento</td> <td>miércoles, 3 de agosto de 2022</td> <td>CUMPLIÓ</td> </tr> </table>				Entrega de reprogramación y flujo de caja	sábado, 30 de julio de 2022	CUMPLIÓ	Entrega de plan de contingencia de la semana del 1 al 6	lunes, 1 de agosto de 2022	NO CUMPLIÓ	Entrega de plan de contingencia del mes de agosto	viernes, 5 de agosto de 2022	NO CUMPLIÓ	Reunión sobre actas de vecindad interventoría, contratista	viernes, 29 de julio de 2022	CUMPLIÓ	Juntas de pavimento	miércoles, 3 de agosto de 2022	CUMPLIÓ
Entrega de reprogramación y flujo de caja	sábado, 30 de julio de 2022	CUMPLIÓ																
Entrega de plan de contingencia de la semana del 1 al 6	lunes, 1 de agosto de 2022	NO CUMPLIÓ																
Entrega de plan de contingencia del mes de agosto	viernes, 5 de agosto de 2022	NO CUMPLIÓ																
Reunión sobre actas de vecindad interventoría, contratista	viernes, 29 de julio de 2022	CUMPLIÓ																
Juntas de pavimento	miércoles, 3 de agosto de 2022	CUMPLIÓ																
TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Revisión de compromisos</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Avance de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Horario de vaciado del concreto</td> <td></td> </tr> </table>				Revisión de compromisos		Avance de obra		Horario de vaciado del concreto										
Revisión de compromisos																		
Avance de obra																		
Horario de vaciado del concreto																		

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA</p>	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 3
		FECHA	19/08/2022 (Día / Mes / Año)

<p>DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA</p> <p>El comité de obra inicia con el director de Interventoría verificando los compromisos del acta anterior y el cumplimiento de los mismos.</p> <p>El director de la interventoría indica que se presentan demoras en las vaciadas del concreto, la interventoría libera la pista en las mañanas y el concreto llega a la obra en las horas de la tarde, se van a tomar medidas en este tema porque no se justifica esperar tanto tiempo por el concreto.</p> <p>El contratista indica que el problema se presenta por retrasos con el proveedor, se comunicaron con el proveedor para mejorar la programación del suministro del concreto.</p> <p>Nuevamente se hace la observación que cuando la interventoría llega a las liberaciones los tramos no están listos, los rieles están torcidos y la mixer ya está en el sitio aunque el terreno finalmente no está en óptimas condiciones para la fundida.</p> <p>Se resuelve impedir el paso de carros por la vía hasta que se terminen de sellar las juntas y se solicita arreglar la vía de la cancha porque está afectando mucho a la comunidad.</p> <p>El ingeniero residente de interventoría hace las siguientes observaciones:</p> <p>El atraso de este proyecto es de 4.6%. Se tienen 1350 metros lineales, el Box de 1x1 está al 90 % y el Box de 3x3 falta fundir las aletas. Se solicita presentar una propuesta para las barandas. Se encuentran dos placas con segregación. Se les solicitó la instalación de unos cárcamos para proteger la tubería que se está viendo afectada por el paso de la maquinaria. Para cuando se cobre el acta de obra se necesita que el contratista actualice el plan de inversión.</p> <p>El contratista indica que se ha estado trabajando en el box de 3x3. Las placas con segregación están en observación y se está evaluando una solución</p>

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	3 de 3
			FECHA	19/08/2022 (Día / Mes / Año)
COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día / Mes / Año)	RESPONSABLES		
Reprogramación de los bordillos	martes, 23 de agosto de 2022	Contratista		
Entrega de plan de inversión	martes, 23 de agosto de 2022	Contratista		
Entrega de plan de contingencia	lunes, 22 de agosto de 2022	Contratista		
FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)				
NOTAS: 1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra. 2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtir de manera previa el trámite interno correspondiente. 3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.				
LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:				
NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA	
MIGUEL DÍAZ	DIRECTOR INTERVENTORÍA	CONSORCIO ACI - 3B		
ALEXANDER GARCÍA	GERENTE DE PROYECTOS	ACI PROYECTOS		
SERGIO SOLANO	RESIDENTE INTERVENTORÍA	CONSORCIO ACI - 3B		
LINA RAMOS	INGENIERA AUXILIAR	CONSORCIO ACI-3B		
MARIA JOSE TEHERAN	INSPECTORA SST	CONSORCIO ACI - 3B		
CESAR HERNANDEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO EYR 019		
PILAR PUCHE	SUPERVISORA PLANEACIÓN	ALCALDÍA DE CERETÉ		
JUAN CARLOS MARTINEZ	SUPERVISOR PLANEACIÓN	ALCALDÍA DE CERETÉ		

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
			VERSIÓN	1	
			PÁGINA	1 DE 1	

			FECHA	31-ago-22 <small>(Día / Mes / Año)</small>	
--	--	--	-------	---	--

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA
--	--------------------------------

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA																															
PERIODO / MES INFORME MENSUAL:	AGOSTO										PROYECTO:	P65- INTERVENTORÍA VÍAS CÓRDOBA - GRUPO 4																			
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	2276 DE 2021										INTERVENTORÍA:	CONSORCIO ACI-3B																			
CONTRATO DE OBRA No.	172-180-181 DE 2021, 001 DE 2022										CONTRATISTA:	ING.DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA, CONSORCIOEYR019, CONSORCIO CRT PROGRESA, CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021																			

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CAMIONETA	CAMIONETA DOBLE CABINA, PLACA UGU681, MARCA TOYOTA, CILINDRAJE 2494, MODELO 2015	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
ESTACIÓN PARA TOPOGRAFÍA	MARCA SOKKIA SET 6 SERIE D22852	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
NIVEL	MARCA TOPCOM, MODELO AT-B4, SERIE MZ 9945	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
MOTOCICLETA	MARCA AKT ENDURO, PLACA ASX-48G, CILINDRAJE 200, MODELO 2022	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
MOTOCICLETA	MARCA HONDA, CILINDRAJE 162 CC MODELO 2022	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
MAQUINA ENSAYOS A LA COMPRESIÓN	MARCA RYR, MODELO SG-BM, SERIE 162070	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
DIAL ANALOGO BAKER	MARCA BAKER, MODELO ANALOGO, SERIE UDD996, UTK308	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
HUMEDOMETRO TIPO SPEEDY PINZUAR	MARCA PINZUAR, MODELO TYPE D1	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
BALANZA DIGITAL TRUMAX	MARCA TRUMAX, MODELO MIX-A, YS 202725	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

	FECHA
	31-ago-22 <small>(Día / Mes / Año)</small>

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS: Mantenimiento vehículo: 163.195 km


EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma 

Nombre: MIGUEL ARMANDO DIAZ RIVERA
 Director de Interventoría
 Matrícula Profesional No.: 25202-12786 CND

Firma 

Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
 Supervisor del Contrato de Interventoría.
 Matrícula No. :22202097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA						CÓDIGO	MEP-MN1-IN-15-FR-8	
							VERSIÓN	1	
							PÁGINA	1 DE 1	

							FECHA	31-ago-22 (Día / Mes / Año)	
--	--	--	--	--	--	--	-------	--------------------------------	--

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA
--	--------------------------------

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 2276 DE 2021	INTERVENTOR: CONSORCIO ACI-3B
MES INFORME MENSUAL: JULIO	PROYECTO: P65- INTERVENTORIA VÍAS CORDOBA - GRUPO 4
CONTRATO DE OBRA No: 172-180-181 DE 2021-001 DE 2022	CONTRATISTA: ING.DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA, CONSORCIO EYR019, CONSORCIO CRT PROGRESA, CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación o Propios)	(Nación	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	1084921	C-2402-0600-12-0-2402041-02	54	NACION	PRINCIPAL		\$ 242.430.000	
2022	280222	C-2402-0600-12-0-2402112-02	11				\$ 1.588.100.773	
2022	280222	C-2402-0600-12-0-2402112-02	11				\$ 100.000.000	
TOTAL							\$ 1.930.530.773	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:	\$ 1.930.530.773
-------------------------------	------------------

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
Anticipo									\$ 242.430.000,00			
1	ENERO - 2022	\$ 456.300,00	\$ 86.697,00	\$ 542.997,00	\$ -	\$ 542.997,00	\$ -	1084921 - 30/12/2021	\$ 241.887.003,00	\$ 1.929.987.776		
2	FEBRERO - 2022	\$ 39.956.820,00	\$ 7.591.796,00	\$ 47.548.616,00	\$ -	\$ 47.548.616,00	\$ -	1084921 - 30/12/2021	\$ 194.338.387	\$ 1.882.439.160		
3	MARZO - 2022	\$ 61.066.163,00	\$ 11.602.571,00	\$ 72.668.734,00	\$ -	\$ 72.668.734,00	\$ -	1084921 - 30/12/2021	\$ 121.669.653	\$ 1.809.770.426		
4	ABRIL - 2022	\$ 88.928.160,00	\$ 16.896.350,00	\$ 105.824.510,00	\$ -	\$ 105.824.510,00	\$ -	1084921 - 30/12/2021	\$ 15.845.143	\$ 1.703.945.916		
5	MAYO - 2022	\$ 13.315.246,05	\$ 2.529.897,00	\$ 15.845.143,00		\$ 15.845.143,00			\$ -	\$ 1.688.100.773		
		\$ 78.131.354,00	\$ 14.844.957,00	\$ 92.976.311,00		\$ 92.976.311,00			\$ 7.023.689	\$ 1.595.124.462		
6	JUNIO - 2022	\$ 5.902.260,00	\$ 1.121.429,00	\$ 7.023.689,00		\$ 7.023.689,00				\$ 1.588.100.773		
		\$ 94.536.797,00	\$ 17.961.992,00	\$ 112.498.789,00		\$ 112.498.789,00			\$ 1.475.601.984	\$ 1.475.601.984		
7	JULIO - 2022	\$ 101.134.200,00	\$ 19.215.498,00	\$ 120.349.698,00		\$ 120.349.698,00			\$ 1.355.252.286	\$ 1.355.252.286		
8	AGOSTO - 2022	\$ 111.185.700,00	\$ 21.125.283,00	\$ 132.310.983,00		\$ 132.310.983,00			\$ 1.222.941.303	\$ 1.222.941.303		
TOTALES		\$ 594.613.000,05	\$ 112.976.470	\$ 707.589.470	\$ -	\$ 707.589.470,00	\$ -		\$ 1.222.941.303	\$ 1.222.941.303		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS PERSONAL	\$ 499.414.500	\$ 94.888.755	\$ 594.303.255
OTROS COSTOS DIRECTOS	\$ 95.198.500	\$ 18.067.715	\$ 113.266.215
*			
VALOR TOTAL	\$ 594.613.000	\$ 112.976.470	\$ 707.589.470

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma 
Nombre: MIGUEL ARMANDO DIAZ RIVERA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-12786 CND

Firma 
Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No. : 22202097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13																																															
		VERSIÓN	1																																															
		PÁGINA	1 DE 2																																															
		FECHA	31-ago-22 (Día / Mes / Año)																																															
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA																																															
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:		2276 DE 2021		INTERVENTOR: CONSORCIO ACI-3B																																														
OBJETO DEL CONTRATO:																																																		
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA- GRUPO 4																																																		
FECHA DE INICIO: 31 DE ENERO DE 2022																																																		
PLAZO INICIAL: 6 MESES																																																		
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE JULIO DE 2022 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																		
VALOR INICIAL: \$ 1.930.530.773,00																																																		
VALOR ACUMULADO: \$ - (Incluye adiciones)																																																		
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO																																																
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																		
<table><tr><th colspan="3">Amparo</th><th colspan="3">% Amparo</th><th colspan="3">Valor Asegurado (\$)</th></tr><tr><td colspan="3">Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">\$ 811.147.384,00</td></tr><tr><td colspan="3">Calidad del servicio</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">\$ 579.159.232,00</td></tr><tr><td colspan="3">Cumplimiento de Servicio</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">\$ 193.053.077,00</td></tr><tr><td colspan="3">Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">\$ 386.106.155,00</td></tr></table>						Amparo			% Amparo			Valor Asegurado (\$)			Buen manejo y correcta inversión del anticipo						\$ 811.147.384,00			Calidad del servicio						\$ 579.159.232,00			Cumplimiento de Servicio						\$ 193.053.077,00			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones						\$ 386.106.155,00		
Amparo			% Amparo			Valor Asegurado (\$)																																												
Buen manejo y correcta inversión del anticipo						\$ 811.147.384,00																																												
Calidad del servicio						\$ 579.159.232,00																																												
Cumplimiento de Servicio						\$ 193.053.077,00																																												
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones						\$ 386.106.155,00																																												
<table><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>27</td><td>ENE</td><td>2022</td><td>1</td><td>MAR</td><td>2023</td></tr><tr><td>29</td><td>AGOS</td><td>2022</td><td>29</td><td>AGOS</td><td>2027</td></tr><tr><td>27</td><td>ENE</td><td>2022</td><td>1</td><td>MAR</td><td>2023</td></tr><tr><td>27</td><td>ENE</td><td>2022</td><td>29</td><td>AGOS</td><td>2025</td></tr></table>						VIGENCIA						Desde			Hasta			27	ENE	2022	1	MAR	2023	29	AGOS	2022	29	AGOS	2027	27	ENE	2022	1	MAR	2023	27	ENE	2022	29	AGOS	2025									
VIGENCIA																																																		
Desde			Hasta																																															
27	ENE	2022	1	MAR	2023																																													
29	AGOS	2022	29	AGOS	2027																																													
27	ENE	2022	1	MAR	2023																																													
27	ENE	2022	29	AGOS	2025																																													
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3237551-6																																																		
Certificado de modificación o anexo No.: (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																		
Razón Social Compañía Aseguradora:		SURAMERICANA																																																
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:																																																		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 2	

	FECHA	31-ago-22 <small>(Día / Mes / Año)</small>
--	-------	---

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		\$ 811.147.384,00
Calidad del servicio		\$ 579.159.232,00
Cumplimiento de Servicio		\$ 193.053.077,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 386.106.155,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
27	ENE	2022	3	JUL	2023
31	DIC	2022	31	DIC	2027
27	ENE	2022	3	JUL	2023
27	ENE	2022	31	DIC	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

- El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
- El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma 

Nombre: MIGUEL ARMANDO DIAZ RIVERA
 Director de Interventoría
 Matrícula Profesional No.: 25202-12786 CND

Firma 

Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
 Supervisor Contrato de Interventoría
 Matrícula Profesional No.: 22202097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
No. Salida	Fecha Radicado	Asunto / Tema Asociado	Destinatario
SAL-22-012725	2022-08-03	Segregación del Concreto Boxculvert 3X3	Consortio EYR 019
SAL-22-012879	2022-08-05	Reiteración de Reprogramación y Programa de Inversiones	Consortio EYR 019
SAL-22-013013	2022-08-08	Adecuación del desvío del box culvert	Consortio EYR 019
SAL-22-013116	2022-08-09	Instalación de Concreto para Pavimento k1 320 a k1 380	Consortio EYR 019
SAL-22-013118	2022-08-09	Seguimiento a Comité de Obra 29-julio-2022	Consortio EYR 019
SAL-22-013586	2022-08-17	Reiteración de Seguimiento a Comité de Obra 29-julio-2022	Consortio EYR 019
SAL-22-013587	2022-08-17	Arreglo de Vía k0 000 a k1 000	Consortio EYR 019
SAL-22-013848	2022-08-21	Arreglo de Placas en la abscisa k2 320	Consortio EYR 019
SAL-22-013988	2022-08-23	Cierre de vía en el K2 400	Consortio EYR 019
SAL-22-014473	2022-08-29	DETALLE DE EMPALME TRAMO CEPILLO-SAN ANTONIO	Consortio EYR 019
SAL-22-014474	2022-08-29	Respuesta a oficio SAL-22-008876 asunto correspondiente a Disponibilidad de Residente y Director de Obra"	Consortio EYR 019
SAL-22-014600	2022-08-31	Arreglo de Placas en la abscisa k2+705	Consortio EYR 019



Bogotá D.C., 3 de agosto de 2022

Ingeniero
CESAR HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EYR 019
consorcioeyr019@gmail.com, dioperativo2021@gmail.com

Asunto: Segregación del Concreto Boxculvert 3X3

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo:

Teniendo en cuenta el seguimiento que se realiza a su contrato de obra, queremos manifestar lo siguiente:

Se viene presentando que la instalación del Concreto para el Boxculvert de 3X3 se están evidenciando segregaciones en la estructura específicamente en los Muros, esto se presenta ya sea por la mala dosificación del Material en planta o por la falta de vibración al Concreto.

Se cita el siguiente artículo de las Especificaciones del Invias del Capítulo 5 en donde hacen referencia al tema de la segregación 505.3.3 Equipos para la colocación del concreto La mezcla de concreto se debe extender y consolidar por los medios apropiados para garantizar la homogeneidad de la mezcla colocada, y se debe evitar la segregación y la aparición de vacíos, con el fin de alcanzar el espesor y la densidad adecuados, así como el contenido de aire especificado.

Por lo anterior esta Interventoría solicita al Consorcio EYR 019 tomar los correctivos necesarios para que el Concreto instalado para los Boxculvert no sigue presentando segregación, de no ver mejoras en la siguiente solicitud se cancelara y no se dejara continuar con la siguiente actividad hasta que se vea su mejora.

Cordialmente,

CONSORCIO ACI-3B

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA

G4

Radicado No. SAL-22-012725

2022-08-03 11:35:05 a. m.



Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 2

Anexo:

Nombre anexos:

CONSORCIO ACI-3B

Bogotá D.C., 5 de agosto de 2022

Ingeniero
CESAR HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EYR 019
consorcioeyr019@gmail.com, dioperativo2021@gmail.com

Asunto: Reiteración de Reprogramación y Programa de Inversiones

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo:

Teniendo en cuenta que el pasado 27 de julio del presente año se solicitó al Contratista la entrega de la reprogramación y programa de inversiones mediante comunicado SAL-22-012332, de acuerdo a la aprobación de la prórroga en tiempo por cinco (5) meses con una nueva fecha de terminación la cual es el 31 de diciembre de 2022, esta Interventoría reitera la entrega de la Reprogramación y Programa de Inversiones de acuerdo a la nueva fecha de terminación del Contrato de obra 181 de 2021.

Por lo anterior se les reitera al Consorcio EYR 019 haga la entrega de la documentación requerida en un tiempo no menor de un (1) día del recibo del presente comunicado y de esta manera continuar con el respectivo seguimiento al Contrato de Obra.

Cordialmente,



Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 2
Anexo:

The logo for Consorcio ACI-3B features the text "CONSORCIO ACI-3B" in a bold, blue, sans-serif font. The letters are slightly shadowed, giving it a three-dimensional appearance. The logo is positioned on the left side of the page, above the "Nombre anexos:" label.

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA

G4

Radicado No. SAL-22-012879

2022-08-05 10:01:29 a. m.

Nombre anexos:

Bogotá D.C., 8 de agosto de 2022

Ingeniero
CESAR HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EYR 019
consorcioeyr019@gmail.com, dioperativo2021@gmail.com

Asunto: Adecuación del desvío del box culvert

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

En nuestro Seguimiento y Control que realiza esta Interventoría a su Contrato de Obra No 181 de 2021, nos permitimos realizar el siguiente requerimiento:

De acuerdo a la intervención que se realiza en el Kilómetro 1+480 (BOX CULVERT), es necesario habilitar nuevamente el desvío implementado con el fin de garantizar la seguridad y circulación de los peatones y del mismo personal en obra, evitando que se generen accidentes por el estado en que actualmente se encuentra.

Por lo tanto esta interventoría solicita subsanar esta solicitud en un plazo no mayor a un (01) día a partir de recibido dicho comunicado.

Anexo registro fotográfico.



Cordialmente,

CONSORCIO ACI-3B

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA

G4

Radicado No. SAL-22-013013

2022-08-08 04:25:20 p. m.



Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 2

Anexo:

Nombre anexos:

Bogotá D.C., 9 de agosto de 2022

Ingeniero
CESAR HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EYR 019
consorcioeyr019@gmail.com, dioperativo2021@gmail.com

Asunto: : Instalación de Concreto para Pavimento k1 320 a k1 380

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo:

Con base en nuestros compromisos de supervisión y control al Contrato de la referencia, nos permitimos comentar lo siguiente.

En el día de ayer 8 de agosto de 2022, el Contratista ejecutó la instalación de Concreto para pavimento entre las abscisas k1+320 a 1+380 sin la presencia de la Interventoría situación que es preocupante para esta Interventoría debido que no es la primera vez que sucede, a pesar de que esta fundida había sido cancelada como a las 5:00 pm de ese día por el mal estado de la vía entre k0+980 a k0+900 dicho tramo empezó la fundida como a las 11.00 pm de la noche terminando como a las 4:00 am del día siguientes.

Esta interventoría solicita programar las fundidas de concreto avisar con tiempo para que el personal de la Interventoría pueda ejercer el Control de la actividad.

Cordialmente,



Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 2
Anexo:
Nombre anexos:

The logo for Consorcio ACI-3B features the company name in a bold, blue, sans-serif font. The text is slightly shadowed, giving it a three-dimensional appearance. The logo is positioned in the top left corner of the page.

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA

G4

Radicado No. SAL-22-013116

2022-08-09 05:38:28 p. m.

SEDE COLOMBIA – BOGOTÁ D.C., Carrera 7 No. 156-10 piso 31 Torre Krystal PBX. (571) 7460460 APARTADO AÉREO 250229
E-Mail: info@aciproyectos.com – Web: www.aciproyectos.com

SEDE PERÚ – LIMA, Avenida Benavides No. 1555 Oficina 703, TEL. (511) 2434567 – (511) 6361566 E-Mail: peru@aciproyectos.com –
Web: www.aciproyectos.pe



Bogotá D.C., 9 de agosto de 2022

Ingeniero
CESAR HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EYR 019
consorcioeyr019@gmail.com, dirooperativo2021@gmail.com

Asunto: Seguimiento a Comité de Obra 29-julio-2022

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo:

El pasado 29 de julio del año en curso se realizó Comité de Seguimiento al Contrato de Obra No 181, en compañía de Interventoría, Alcaldía y el Contratista, en donde se acordaron los siguientes compromisos para que el Consorcio EYR 019 los cumplieran de la siguiente manera:

Entrega de Reprogramación y Flujo de caja con fecha de cumplimiento el 30 de julio de 2022

Entrega de plan de Contingencia del mes de agosto con fecha de cumplimiento el 5 de agosto de 2022

Juntas de pavimento con fecha de cumplimiento del 3 de agosto de 2022

Como se pueden observar todos los compromisos que adquirió el Contratista los incumplió nuevamente excepto la reprogramación.

Por lo anterior, solicitamos al Consorcio EYR cumplir con los compromisos adquiridos en el comité del 29 de julio en un término de 2 días del recibo del presente comunicado, de no tener respuesta se procederá a iniciar proceso sancionatorio por no cumplir con sus obligaciones contractuales.

Cordialmente,

CONSORCIO ACI-3B

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA

G4

Radicado No. SAL-22-013118

2022-08-09 05:43:11 p. m.



Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 2

Anexo:

Nombre anexos:

CONSORCIO ACI-3B

Bogotá D.C., 17 de agosto de 2022

Ingeniero
CESAR HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EYR 019
consorcioeyr019@gmail.com, dioperativo2021@gmail.com

Asunto: Reiteración de Seguimiento a Comité de Obra 29-julio-2022

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

El pasado 9 de agosto del año en curso mediante comunicado No. SAL-22-013118 se le solicitó al Contratista cumplir con los compromisos adquiridos en el comité de obra del pasado 29 de julio de 2022 sin que hasta la fecha haya dado cumplimiento.

Por lo anterior, solicitamos al Consorcio EYR cumplir con los compromisos adquiridos en el comité del 29 de julio en un término de 2 días del recibo del presente comunicado, de no tener respuesta se procederá a iniciar proceso sancionatorio por no cumplir con sus obligaciones contractuales.

Cordialmente,



Miguel Armando Díaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 1

Anexo:

Nombre anexos:

The logo for Consorcio ACI-3B features the company name in a bold, blue, sans-serif font. The text is slightly shadowed, giving it a three-dimensional appearance. The logo is positioned in the top left corner of the page.

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA

G4

Radicado No. SAL-22-013586

2022-08-17 02:29:13 p. m.

SEDE COLOMBIA – BOGOTÁ D.C., Carrera 7 No. 156-10 piso 31 Torre Krystal PBX. (571) 7460460 APARTADO AÉREO 250229
E-Mail: info@aciproyectos.com – Web: www.aciproyectos.com

SEDE PERÚ – LIMA, Avenida Benavides No. 1555 Oficina 703, TEL. (511) 2434567 – (511) 6361566 E-Mail: peru@aciproyectos.com –
Web: www.aciproyectos.pe

CONSORCIO ACI-3B

Bogotá D.C., 17 de agosto de 2022


Ingeniero
CESAR HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EYR 019
consorcioeyr019@gmail.com, dioperativo2021@gmail.com

Asunto: Arreglo de Vía k0 000 a k1 000

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo:

Teniendo en cuenta que el Consorcio EYR 019 se encuentra ejecutando actividades en el tramo comprendido entre las abscisas k0+000 a k1+000, el cual actualmente se encuentra en muy mal estado, debido al paso constante de las volquetas llenas de material y los mixer llenos de concreto, además de las fuertes lluvias que han caído en la zona, esta situación tiene a la comunidad muy preocupada por el deterioro que presenta la vía en este tramo cada vez que llueve y el paso constante de los vehículos que utiliza el Contratista, a continuación se muestra el estado actual de la vía:



Por lo anterior, solicitamos nuevamente al Consorcio EYR tomar los correctivos necesarios y empezar a arreglar la vía en el sector mencionada en un plazo máximo de dos (2) días del recibo del presente comunicado, de no ver un avance en las k0+000 a k1+000 se procederá a recomendar a la entidad contratante para que inicie proceso sancionatorio por incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Cordialmente,

CONSORCIO ACI-3B

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA

G4

Radicado No. SAL-22-013587

2022-08-17 02:40:50 p. m.



Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 2

Anexo:

Nombre anexos:

CONSORCIO ACI-3B

Bogotá D.C., 21 de agosto de 2022

Ingeniero
CESAR HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EYR 019
consorcioeyr019@gmail.com, dioperativo2021@gmail.com

Asunto: Arreglo de Placas en la abscisa k2 320

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo:

Teniendo en cuenta el Control que realiza esta Interventoría a su contrato de obra nos permitimos realizar la siguiente observación:

El pasado 5 de julio del presente años se fundió con planta móvil en la abscisa del k2+320 en donde se le informo al residente de obra que la planta había colocado ese concreto sin cemento debido a un inconveniente que presento en ese momento, pero la cuadrilla no saco ese material que cayó si no que lo revolvió con el resto de la mezcla.

Dicha abscisa ya presenta segregación de material como se muestra a continuación:



Por lo anterior, solicitamos al Consorcio EYR tomar los correctivos necesarios para no volver a presentar dicha situación y presentar una propuesta para arreglar la placa en mención lo más pronto posible, esto en aras de preservar la calidad de la obra terminada.

Cordialmente,

CONSORCIO ACI-3B

Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 2

Anexo:

Nombre anexos:

Bogotá D.C., 23 de agosto de 2022

Ingeniero
CESAR HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EYR 019
consorcioeyr019@gmail.com, dioperativo2021@gmail.com

Asunto: Cierre de vía en el K2 400

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

En nuestro Seguimiento y Control que realiza esta Interventoría a su Contrato de Obra No 181 de 2021, nos permitimos realizar el siguiente requerimiento:

Es necesario realizar el cierre de la vía en el K2+400, debido a que no se ha terminado el sello de las juntas del pavimento entre el K1+0530 hasta K2+680, lo que puede ocasionar daños irreparables en la estructura, razón por la cual no se puede seguir permitiendo el paso de vehículos.

Por lo tanto esta interventoría solicita subsanar este requerimiento en un plazo no mayor a un (01) día a partir de recibido dicho comunicado.

Anexo registro fotográfico.



Cordialmente,

CONSORCIO ACI-3B

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA

G4

Radicado No. SAL-22-013988

2022-08-23 12:05:49 p. m.



Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 2

Anexo:

Nombre anexos:

Radicación relacionada: ENT-22-017280

Bogotá D.C., 29 de agosto de 2022

Señor(a)
CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ
Director operativo
CONSORCIO EYR 019
CR 11 A 59 49 OF 201
consorcioeyr019@gmail.com
CORDOBA - MONTERIA

Asunto: DETALLE DE EMPALME TRAMO CEPILLO-SAN ANTONIO

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.
Cordial saludo:

Una vez revisado el comunicado relacionado en el asunto, en donde el Consorcio EYR 019 hacen la entrega del detalle del empalme para la estructura de pavimento rígido con el tramo de pavimento asfáltico de la vía Abcisa K2+711, en donde se evidencia que hace falta el acero de refuerzo del dentellón el cual es vital para su perfecto funcionamiento, además el esquema presentarlo en formato Autocad.

Por lo anterior, solicitamos al Consorcio EYR subsanar las anotaciones mencionada anteriormente lo más pronto posible esto en aras de poder liberar el tramo en cuestión.

Cordialmente,



Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 2
Anexo:
Nombre anexos:

Radicación relacionada: ENT-22-017242

Bogotá D.C., 29 de agosto de 2022

Señor(a)
CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ
Director operativo
CONSORCIO EYR 019
CR 11 A 59 49 OF 201
consorcioeyr019@gmail.com
CORDOBA - MONTERIA

Asunto: Respuesta a oficio SAL-22-008876 asunto correspondiente a Disponibilidad de Residente y Director de Obra"

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.
Cordial saludo:

Una vez revisado el comunicado relacionado en el asunto, en donde el Consorcio EYR 019 en donde manifiestan que "el director y residente del proyecto siempre han estado disponibles y así mismo dispuestos a recibir las recomendaciones dadas por la interventoría lo que se ha visto reflejado en el avance del mismo, por lo que no se nos hace pertinente su observación", al respecto esta Interventoría sigue manifestando que la presencia en Obra tanto del Director como el Residente es de vital importancia para el proyecto y no solo que hagan presencia cuando se informe de visitas del Invias si no en toda la ejecución de las actividades, además el Contratista está incumpliendo con los Pliegos de Condiciones referente al Personal Mínimo Requerido en Obra.

Por lo anterior, esta Interventoría reitera lo solicitado en el comunicado SAL-22-008876 y el de contar en obra con el personal mínimo requerido Principalmente el Director de Obra y que tenga **la disponibilidad de estar en la obra** tal como aparecen en los Pliegos de Condiciones y Anexo Técnico.

Cordialmente,



Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

The logo for Consorcio ACI-3B features the company name in a bold, blue, sans-serif font. The letters are slightly shadowed, giving it a three-dimensional appearance. The logo is positioned on the left side of the page, above the main body of text.

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA

G4

Radicado No. SAL-22-014474

2022-08-29 04:27:55 p. m.

Folios: 2
Anexo:
Nombre anexos:

CONSORCIO ACI-3B

Bogotá D.C., 31 de agosto de 2022

Ingeniero
CESAR HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EYR 019
consorcioeyr019@gmail.com, diroperativo2021@gmail.com

Asunto: Arreglo de Placas en la abscisa k2 705

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo:

Teniendo en cuenta el Control que realiza esta Interventoría a su contrato de obra nos permitimos realizar la siguiente observación:

El pasado 30 agosto del presente años se fundió con concreto para pavimento el tramo comprendido entre k2+680 a k2+710 y se terminó como a las 11:00 de la noche, al siguiente día se evidencio que las dos últimas placas fueron dañadas por la subida de una motocicleta como se muestra a continuación:



Como se puede evidenciar no hay señalización que indicara que ese concreto estaba fresco ni celador.

CONSORCIO ACI-3B

Por lo anterior, solicitamos al Consorcio EYR tomar los correctivos necesarios para no volver a presentar dicha situación y presentar una propuesta para arreglar la placa en mención lo más pronto posible, esto en aras de preservar la calidad de la obra terminada.

Cordialmente,



Miguel Armando Díaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 2

Anexo:

Nombre anexos:

REGISTRO FOTOGRÁFICO AGOSTO 2022



Vía San Antonio- El cepillo Instalación de Concreto para Pavimento K1+380 A K1+450



Vía San Antonio- El cepillo Instalación de Concreto para losa Inferior y acero de muros del Box de 1X1 k2+700



Vía San Antonio- El cepillo Conformación e Instalación de Material de Sub-base k1+350 a k1+450



Vía San Antonio- El cepillo Instalación de Concreto para Pavimento k2+360 a k2+460



Vía San Antonio- El cepillo Instalación de Concreto para pavimento entre ka 1+300 a k1+380



Vía San Antonio- El cepillo instalación de Concreto para Losa Superior Bocuvert 1X1 k2+700



Vía San Antonio- El cepillo Instalación de Sub-base entre k1+200 a k1+300



Vía San Antonio- El cepillo Instalación de Concreto para pavimento entre ka 1+250 a k1+300



Vía San Antonio- El cepillo instalación de Concreto para Aletas de Bocuvert 1X1 k2+700



Vía San Antonio- El cepillo Instalación de Concreto para pavimento entre ka 1+130 a k1+250



Vía San Antonio- El cepillo Instalación de Concreto para pavimento entre ka 1+130 a k1+250



Vía San Antonio- El cepillo Toma de Densidades Laboratorio de Inventoria


REGISTRO FOTOGRÁFICO AGOSTO 2022		
		
Acero de Refuerzo Losa Superior Box 3X3 k1+480	Instalación de Concreto Aletas Box 1X1 k2+700	Instalación de Concreto para Pavimento k1+120 a k1+190
		
Placas Reforzadas K2+706	Placas Reforzadas K2+706	Instalación de Concreto Aletas Box 1X1 k2+700
		
Aletas de Boxculvert de 2X2 1+480	Instalación de Concreto k1+080 a k1+020	Instalación de Concreto k1+080 a k1+020

REGISTRO FOTOGRÁFICO SOCIAL, AMBIENTAL, SISO AGOSTO		
		
Charlas Antes de Iniciar Actividades	Charlas Antes de Iniciar Actividades	Charlas Antes de Iniciar Actividades
		
Recolección de Residuos	Instalación de Señalización	Charlas Antes de Iniciar Actividades
		
Reunión de veduria	Comité de Obra	Relleno de Box 1X1 2+700


31 de Julio de 2022 Domingo.

Se presentaron fuertes lluvias en la madrugada de
 1:00 a 6:00 am





01 de Agosto de 2022 Lunes.

Personal Contratista: 1 residente auxiliar, 1 siso auxiliar, 1 social, 3 operadores, 1 topógrafo auxiliar, 1 cadenero y 7 obreros


Equipos: 1 motoniveladora, 1 minicargador, 1 minicompactor, 1 nivel, 1 estación

Personal Interventoría: 1 Director, 1 residente, 1 siso, 1 topógrafo

Actividades: Se continúa con la instalación de las formaletas para la losa superior del box de 3x3 m K1+480. Se fija el acero de refuerzo para los muros del box de 1x1 K2+700. Se saca agua de las excavaciones con motobomba sobre K1+200 a K1+000. Se instala material de sub-base

Estado Tiempo: Lluvias fuerte desde 1:00 pm a 3:00 pm.





02 Agosto de 2022 Martes

Personal Contratista: 1 residente auxiliar, 1 siso, 1 social, 3 operadores, 1 topógrafo auxiliar, 1 cadenero, 7 obreros

Equipos: 1 motoniveladora, 1 minicargador, 1 minicompactor, 1 nivel.

Personal Interventoría: 1 Director, 1 residente, 1 siso, 1 topógrafo

Actividades: Se continúa con la instalación de las formaletas para la losa superior del box de 3x3 m K1+480. Se amarra el acero de refuerzo para

los muros. En el box de 1x1 se figura y amarra el acero de refuerzo. Se instala material de sub-base.
Estado Tiempo: Se presentan lluvias toda la madrugada 2:00 a 6:00 am.

~~SSA~~

~~SSA~~

03 Agosto 2022 Miércoles

Personal Contratista: 1 residente auxiliar, 1 siso auxiliar, 1 social, 3 operadores, 1 topógrafo auxiliar, 1 cadenero, 7 obreros.

Equipos: 1 motoniveladora, 1 minicargador, 1 minicompactor, 1 nivel, 2 motobombas.

Personal Interventoría: 1 Director, 1 residente, 1 siso, 1 topógrafo.

Actividades: Se termina de colocar las formalitas del box de 3x3 y 1x3 para fundir lasas superiores. se saca agua de las excavación en la vta. Se coloca material de sub-base.

Estado del Tiempo: Se presentan lluvias en la madrugada 4:00 a 7:00 am.

~~SSA~~

~~SSA~~

04 Agosto 2022 Jueves


Personal Contratista: 1 residente auxiliar, 1 siso auxiliar, 1 social, 3 operadores, 1 topógrafo auxiliar, 1 cadenero, 7 obreros.

Equipos: 1 motoniveladora, 1 minicargador, 1 minicompactor, 1 nivel, 2 motobombas.

Personal Interventoría: 1 Director, 1 residente, 1 siso, 1 topógrafo.

Actividades: Se recibe trámite por topografía de Interventoría entre K+380 a K+360. se inicia instalación del conoreto como a las 9:00 pm y después de descargar el primer mixer se suspende por lluvias que se presentaron en

al sector. Estado tiempo: Lluvias 9:00 pm a 11:00 pm



05 de Agosto de 2022 Viernes

Personal de Contratistas: 1 residente auxiliar, 1 siso auxiliar, 1 social, 3 operadores, 1 topógrafo auxiliar, 1 cadenero, 7 obreros.

Equipos: 1 motoniveladora, 1 minicargador, 1 minicompactor, 1 nivel, 2 motobombas.

Personal Interventor: 1 director, 1 residente, 1 siso, 1 topógrafo.

Actividades: En el box de 3x3 R1+480 se había programado fundido pero por condiciones del terreno no se pudo fundir como también porque el proveedor también presentó problemas en la producción de concreto. La pista preparada para la fundición se encuentra saturada por las lluvias presentadas durante la noche y la madrugada. Se está evacuando el agua. Se realizó corte de juntas. Se funden 2 losas con planta móvil que había quedado del día anterior.

Estado Tiempo: Lluvias 12:00 a 9:00 am.



06 de Agosto de 2022 Sábado

Personal Contratistas: 1 residente auxiliar, 1 siso auxiliar, 1 social, 3 operadores, 1 topógrafo auxiliar, 1 cadenero, 7 obreros.

Equipos: 1 motoniveladora, 1 minicargador, 1 minicompactor, 1 nivel, 2 motobombas.

Personal Interventor: 1 director, 1 residente, 1 siso, 1 topógrafo.

Actividades: Debido al fuerte aguacero que cayó la noche anterior y parte de la madrugada no se terminó la fundida del concreto de pavimento. Se saca agua de las excavaciones. Se funde losa superior.

boxculvert del K1+480.

Estado tiempo: lluvias madrugada 2:00 am a 9:00 am.

~~\$\$\$~~

~~\$\$\$~~

07 de Agosto de 2022 Domingo

Personal Contratista: 1 residente auxiliar, 3 operadores, 4 obreros.

Equipos: 1 motobomba, 1 minicargador.

Actividades: Se retira agua de las excavaciones también se retira material de aflojado que se encuentra en mal estado.

Estado tiempo: Seco

~~\$\$\$~~

~~\$\$\$~~

08 de Agosto de 2022 Lunes

Personal Contratista: 1 residente auxiliar, 1 siso auxiliar, 3 operadores, 10 obreros, 1 social, 1 topógrafo, 1 code nero.

Equipos: 2 motobomba, 1 minicargador, 1 motor niveladora, 1 minicompactor, 1 estacaón, 1 nivel.

Personal Interventoria: 1 Director, 1 residente, 1 siso, 1 topógrafo.

Actividades: Se inician actividades con la desalojo del agua, se conforma vía entre K1+100 a K1+240. Se recibe visita del Invia. Se saca agua en el boxculvert K2+700. Se fonde tramo entre K1+320 a K1+380. esta actividad fue ejecutada sin la supervisión de la interventoria debido a que esta fundición habria sido cancelada desde las 5:00 pm. Se conforma la vía entre K0+80 a K1+100.

Estado tiempo: Seco.

~~\$\$\$~~

09 de Agosto de 2022 Martes

Personal Contratista: 1 residente auxiliar, 1 siso auxiliar, 3 operadores, 10 obreros, 1 social, 1 topógrafo,

1 cadenero.

Equipos: 2 motobomba, 1 minicargador, 1 motoniveladora, 1 minicompactor, 1 estación, 1 nivel.

Personal Interventoria: 1 Director, 1 residente, 1 siso, 1 topógrafo.

Actividades: Se instala material de alfilerado entre K1+290 a K1+770. Se arregla tubería de 8" pulgadas que está averiada. Se colocan formaletas para concreto de box K2+700. Se saca agua de las excavaciones de las alcantarillas. Se le solicitó al contratista que coloque nuevamente el desvío del K1+480 debido a que el dueño de la finca lo rompió el pasado 07 de agosto porque se estaba inundando el cultivo de maíz. Se libera trabajo por la topografía de la intervención en afirmado K1+770 a K1+290.

Estado Tiempo: Lluvias en la madrugada. 3:00-6:00

10 de Agosto de 2022 Miércoles

Personal Contratista: 1 residente auxiliar, 1 siso auxiliar, 3 operadores, 10 obreros, 1 social, 1 topógrafo, 1 cadenero.

Equipos: 1 motoniveladora, 1 minicargador, 1 minicompactor, 1 estación, 1 nivel.

Personal Interventoria: 1 Director, 1 residente, 1 siso, 1 topógrafo.

Actividades: Se inician actividades de arreglo de la vía entre K0+980 a K0+800. Se saca agua de la excavación de las alcantarillas box 1+480. Se termina de instalar acero de refuerzo y formaletas en el box de 1x1 K2+700. Se puden los muros del box 2+700.

Estado Tiempo SEW

11 de Agosto 2022 Jueves

Personal Contratista: 1 residente auxiliar, 1 si so auxiliar, 1 social, 3 operadores, 10 obreros, 1 topografo auxiliar,

Equipos: 1 motoniveladora, 1 minicargador, 1 payarita, 1 vibrocompactador, 1 nivel.

Personal Interventoria: 1 Director, 1 residente, 1 si so, 1 topografo.

Actividades: Debido al puente aguacero caido la madrugada, solo se saca agua de las excavaciones, tambien se saca todo el material de afirmado dañado entre K0+980 a 0+960. En el box de 1x1 se coloca el concreto de la losa superior.

Estado tiempo: Seco.

12 de Agosto 2022 Viernes

Personal Contratista: 1 residente, 1 si so auxiliar, 1 social, 4 operadores, 10 obreros, 1 topografo

Equipos: 1 motoniveladora, 1 minicargador, 1 payarita, 1 vibrocompactador, 1 nivel.

Personal Interventoria: 1 Director, 1 residente, 1 si so, 1 topografo.

Actividades: Se continúa con el arreglo de la vía sacando el material en mal estado por material de afirmado nuevo, tambien se corrige fuga de agua en tuberías de 8 pulgadas. Se recomienda al contratista colocar calcetín en los drenajes donde se está afectando la tubería de 8 pulgadas por estar superficialmente. Se desmolda el box de 3x3 en K7+480.

Estado tiempo: Lluvia 2:00 a 6:00 am

13 de Agosto 2022 Sábado.

Personal Contratista: 1 residente auxiliar, 1 siso auxiliar, 1 social, 4 operadores, 10 obreros, 1 topógrafo auxiliar.


Equipos: 1 motoniveladora, 1 minicargador, 1 payamón, 1 vibrocompactador, 1 nivel.

Personal Interventoría: 1 Director, 1 residente, 1 siso, 1 topógrafo.

Actividades: Se saca agua de las excavaciones, se perfila traquea en sub-base. Se fija acero de refuerzo para el box de 1x1 K21700. Debido al fuerte aguacero que cayó la madrugada se cancela fundido para pavimento.

Estado Tiempo: Lluvias 1:00 a 6:00 am.






14 de Agosto de 2022 Domingo.

Se saca agua de las excavaciones.

Lluvias: 10:00 am a 13:00 pm.



15 de Agosto de 2022 Lunes Festivo.

Se continúa con el arreglo de la vía sacando material en anal estuido y reemplazándolo por nuevo. También se saca agua de las excavaciones.

Estado tiempo: 4:00 a 7:00 am.





16 de Agosto de 2022 Martes.


Personal Contratista: 1 residente auxiliar, 1 siso auxiliar, 1 social, 4 operadores, 10 obreros, 1 topógrafo.

Equipos: 1 motoniveladora, 1 minicargador, 1 payamón, 1 vibrocompactador, 1 nivel.

Personal Interventoría: 1 Director, 1 topógrafo, 1 siso, 1 residente.

Actividades: se inician las actividades sacando agua de las excavaciones. Se rellenan excavaciones de aletas de box de 3x3 K1+480, se instala material de sub-base entre K1+290 a K1+220. Se quitan las formalebas de los box de 1x1.

Estado Tiempo: Seco





17 de Agosto de 2022 Miércoles

Personal Contratista: 1 residente auxiliar, 1 siso auxiliar, 1 social, 10 obreros, 4 operadores, 1 topógrafo, 1 cadenero.

Equipos: 1 motoniveladora, 1 vibrocompactor, 1 minicargador, 1 pajarita, 1 motobomba, 1 nivel, 1 estación.

Personal Interventoría: 1 Director, 1 siso, 1 Residente, 1 topógrafo.

Actividades: se pinta aletas del box de 1x1 en K2+700, se colocan concretos para pavimento entre K1+290 a K1+220. Se continúa arreglando la vía entre K1+000 a K0+700.

Estado Tiempo: Seco.





18 de Agosto de 2022 Jueves

Personal Contratista: 1 residente auxiliar, 1 siso auxiliar, 1 social, 10 obreros, 4 operadores, 1 topógrafo.

Equipos: 1 motoniveladora, 1 vibrocompactor, 1 minicargador, 1 pajarita, 1 motobomba.

Actividades: se coloca material de sub-base y se extiende. Se continúa arreglando la vía entre K1+000 a K0+700. Los maquinarios en horas de la mañana estuvieron en

manteniéndolo por fallas mecánicas. Solo se trabajó en horas de la tarde.

Estado tiempo: Seco.





19 de Agosto de 2022 Viernes.


Personal Contratista: 1 residente auxiliar, 1 siso, 1 social, 10 obreros, 4 operadores, 1 topógrafo.

Equipos: 1 motoniveladora, 1 vibrocompactador, 1 minicargador,

Actividades: Se instaló concreto para pavimento entre K7+230 a K7+180 después de haber sido liberado el dramo por topografía de interventoría. También se arregla tubería de 2" pulgadas que estaba en mal estado. También se continúa arreglando la vía.

Estado tiempo: seco.





20 de Agosto de 2022 Sábado.

Personal Contratista: 1 residente auxiliar, 1 siso, 1 social, 10 obreros, 4 operadores, 1 topógrafo,

Equipos: 1 motoniveladora, 1 vibrocompactador, 1 minicargador, 1 estación, 1 nivel,

Actividades: Se continúa arreglar la vía, también se continúa arreglando la tubería de 2 pulgadas que se encuentra cristalizando la cual se está reemplazando por otra. Se libera dramo afirmado en K7+160 a K7+060 por la topografía de Interventoría.

Estado tiempo: Lluvias leves 10:00 a 10:30 am.





21 de Agosto de 2022 Domingo

Se presenta fuerte aguacero

3:00 a 7:00 am.


22 de Agosto 2022 LunesPersonal Contratista: 1 Residente auxiliar, 1 siso auxiliar, 1 social, 10 ayudantes, 4 operadores.Equipos: 1 motoniveladora, 1 vibrocompactador, 1 minicargador, 2 motobombas.Actividades: Se saca agua de las excavaciones, se retira material en mal estado en los tramos más dañados en K0+000 a K0+800. Se colocan wellies al box de K+1 2000. Se funda zapata en box de 3x3. Se perfilan la vía en los sectores más dañados.Estado tiempo: Lluvias 2:00 a 4:00 pm.23 de Agosto 2022 MartesPersonal Contratista: 1 residente auxiliar, 1 siso auxiliar, 1 social, 10 ayudantes, 4 operadores.Equipos: 1 motoniveladora, 1 pagarruta, 1 vibrocompactador, 1 minicargador, 1 estacion.Actividades: Se coloca material de sub-base entre K2+050 a K2+711. Se compacta material de sub-base en K1+170 a K2+110 este tramo no se libera porque no se encuentran los alfileres al tiempo que pidieron liberación. Se continúa arreglando la obra entre K0+000 + 0+800. Se corrigen fugas en tubería de agua potable.Estado tiempo: seco24 de Agosto 2022 Miércoles

Personal Contratista: 1 residente auxiliar, 1 siso auxiliar, 1 social, 10 ayudantes, 4 operadores,

Equipos: 1 motoniveladora, 1 vibrocompactador, 1 mini cargador, 1 estacaón, 1 payarita.

Actividades: se libera dramo de subirse por la topografía de Interventoría entre K+1700 a K+1720 lo mismo con los rieles. se tuvo que cancelar la fundida debido a la demora de la llegada del concreto dado que se libero desde las 10:00 am y todavía eran las 6:00 pm y no se había fundido por lo que fue necesario cancelar la fundida. Se continúa con el arreglo de las pugas y cambio de tubería de agua potable. También se continúa arreglando la vía en los sectores donde está dando el mantenimiento. En el box de 3x3 se continúa avanzando el acero de las aletas.

Estado Tiempo: Seco.

25 de Agosto de 2022 Jueves

Personal Contratista: 1 residente auxiliar, 1 siso auxiliar, 1 social, 10 ayudantes, 4 operadores.

Equipos: 1 motoniveladora, 1 vibrocompactador, 1 mini cargador, 1 payarita, 1 nivel.

Actividades: Debido al fuerte aguacero caído en la madrugada en la mañana se saca agua de la vía. Se funde concreto para pavimento entre K+1720 a K+1740. Se le recomienda al contratista que para cuando se este fundiendo tener disponibles las maquinarias como payaritas, mini cargador más cuando se haya presurizado llevar el día anterior, esto para garantizar que las mixer cuando se arrancan enterradas pueden ser sacadas y

no esperar más de dos horas mientras los operadores de las máquinas.

Estado tiempo: Seco

~~SSA~~

~~SSA~~

26 de Agosto de 2022 Viernes

Personal Obra: 1 residente auxiliar, 1 socio auxiliar, 1 social, 10 ayudantes, 4 operadores, 1 topógrafo

Equipos: 1 motoniveladora, 1 minicargador, 1 excavadora tipo payarita, 1 nivel.

Actividades: Se termina de colocar concreto para pavimento entre K1+150 a K1+080. También se colocaron las pormaletas para las aletas del box de 3x3 K1+480. Se continúa arreglando la vía en los sectores donde están deteriorada.

Estado del tiempo: Seco

~~SSA~~

~~SSA~~

27 de Agosto de 2022 Sábado

Personal Obra: 1 residente auxiliar, 1 socio auxiliar, 1 social, 10 ayudantes, 4 operadores, 1 topógrafo.

Equipos: 1 motoniveladora, 2 minicargador, 1 payarita, 1 nivel, 1 estación.

Actividades: se corrige fuga en tubería de 8". Se coloca material de subbase entre K1+500 a K2+711. Se termina de colocar las pormaletas a dos aletas en el box 3x3 K1+480. se funden estas aletas. Entre las abscisas K2+680 a K2+711 se coloca material de subbase y se perfilan se colocan rieles.

Estado tiempo: Seco.

~~SSA~~

~~SSA~~

28 de Agosto de 2022 Domingo

No se realizan actividades.

SSAA

SSAA

29 de Agosto de 2022 Lunes

Personal Obra: 1 residente auxiliar, 1 siso auxiliar, 1 social, 10 ayudantes, 4 operadores, 1 topógrafo.

Equipos: 1 motoniveladora, 1 minicargador, 1 vib. compactador, 1 nivel.

Actividades: en el tramo entre K2+680 a K2+710 la interventoría solicita ajustar diseño en este tramo para poder liberar. En el tramo entre K1+070 a K1+080 se está conformando. También le falta por entregar el diseño completo del drenaje que va a empalmar con el asfalto.

Estado tiempo: Seco

SSAA

SSAA

30 de Agosto de 2022 Martes

Personal Obra: 1 residente auxiliar, 1 siso auxiliar, 1 social, 10 ayudantes, 4 operadores, 1 topógrafo.

Equipos: 1 motoniveladora, 1 minicargador, 1 vib. compactador, 1 nivel, 1 estación.

Actividades: Se alista tramo en K2+650 a K2+711 teniendo en cuenta el nuevo alineamiento entregado por el contratista. El tramo entre K1+070 a K1+080 se cancela su liberación debido a que no se encontraba listo y el material de sub-base llegó tarde. Se funde tramo en K2+680 a K2+707.

Estado tiempo: Seco.

SSAA

SSAA

31 de Agosto de 2022 Miércoles

Personal obra: 1 residente auxiliar, 1 sigo auxiliar, 1 señal, 4 operadores, 10 ayudantes, 1 topógrafo auxiliar.

Equipos: 1 moto niveladora, 1 vibrocompactador, 1 mini cargador, 1 estación, 1 nivel.

Actividades: Se evidenció que en el tramo que se colocó concreto para pavimento entre K2+600 y K2+707 que una motocicleta dañó varias placas por lo que se le solicitó al Contratista presentar propuesta para dicho arreglo. Se libera tramo entre K1+070 a K1+070, pero no se pudo por inconvenientes logísticos en la planta de producción del concreto. Se empieza el corte de pavimento en la abscisa 2+707 donde una moto pasa estropeando el concreto fresco. Lo que propuso el contratista es cortar 5m de pavimento de la placa completa y en turno de la siguiente. Después de realizar el corte se va colocar aditivo especial en el concreto.

Estado Tiempo: Seco
