

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, DE VÍAS Terciarias DEL
PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE CORDOBA**

INFORME MENSUAL IM- 10

PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CERETE, CÓRDOBA

OCTUBRE DE 2022

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

CONTRATO 001 DE 2022

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, DE VÍAS Terciarias del
PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**

INFORME MENSUAL IM- 10

PERIODO: 01-31 DE OCTUBRE DE 2022

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ACI-3B

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES

COTORRA 2021

CERETE, CÓRDOBA

OCTUBRE DE 2022

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

Contrato de Obra No.	001 de 2022	Contratista:	CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021
Contrato de Interventoría No.	2276 DE 2021	Interventoría:	CONSORCIO ACI-3B

Objeto Contrato de Obra:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE COTORRA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

INFORME MENSUAL No.	10	MES O PERIODO:	OCTUBRE
----------------------------	----	-----------------------	---------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Portada Informe		1
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	3
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	4
1	INTRODUCCIÓN		6
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		7
2.1	Localización		7
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		9
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		9
2.4	Características técnicas del proyecto		11
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		18
3.1	Información general del contrato		18
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		18
3.3	Seguimiento Items no previstos		20
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		20
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		21
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	21
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	21
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	22
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	23
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	23
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	23
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	23
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	23
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		24
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	24
	• Seguimiento Programa de Obra	MEPI-MN-IN-2-FR-2	24
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	24
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-6-FR-2	24
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-1	24
		MEPI-MN-IN-14-FR-2	24
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		25
5.1	Información general del contrato		25
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		25
5.3	Informes especialistas y profesionales		26
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		26
5.5	Informe matriz de riesgos.		26
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		27
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		27
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		27
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	27
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	27
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	28
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	28
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	28
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		28
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	28
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-3-FR-2	28
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-2	28
		MEPI-MN-IN-9-FR-3	28
7	Conclusiones y recomendaciones		29
8	Anexos		31
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		31
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		31
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		31
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		31

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 558 de fecha 17 de Febrero del 2022

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
				VERSION	1
				PÁGINA	1 DE 2

				FECHA	31/10/2022 (Día / Mes / Año)
--	--	--	--	-------	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CÓRDOBA	PERIODO MES:	OCTUBRE
-------------------	------------------------------	------------------------	---------	--------------	---------

CONTRATO DE OBRA No.: 001 de 2022 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE COTORRA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021	PLAZO INICIAL: 6 MESES FECHA DE INICIO: 17/02/2022 FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2022 PLAZO ACUMULADO:	VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 2.847.000.210 VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ - VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ - ANTICIPO CONCEDIDO: \$ - ANTICIPO AMORTIZADO: \$ -
--	--	--

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	2276 DE 2021	INTERVENTOR:	CONSORCIO ACI-3B	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
----------------------------	--------------	--------------	------------------	---	--

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDAD</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Pavimentación</td> <td>Construcción</td> <td>ml</td> </tr> <tr> <td>Mejoramiento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rehabilitación</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Estructuras</td> <td>Túneles</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Puentes</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pontones</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros (Especificar cuales)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción	ml	Mejoramiento		Rehabilitación		Estructuras	Túneles		Puentes		Pontones		Mantenimiento			Otros (Especificar cuales)			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDAD</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD MES</th> <th>CANTIDAD ACUMULADA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Pavimentación</td> <td>Construcción</td> <td>ML</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>Mejoramiento</td> <td></td> <td>460</td> </tr> <tr> <td>Rehabilitación</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Estructuras</td> <td>Túneles</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Puentes</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pontones</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros (Especificar cuales)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción	ML	70	Mejoramiento		460	Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)			
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																						
Pavimentación	Construcción	ml																																																						
	Mejoramiento																																																							
	Rehabilitación																																																							
Estructuras	Túneles																																																							
	Puentes																																																							
	Pontones																																																							
Mantenimiento																																																								
Otros (Especificar cuales)																																																								
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																					
Pavimentación	Construcción	ML	70																																																					
	Mejoramiento		460																																																					
	Rehabilitación																																																							
Estructuras	Túneles																																																							
	Puentes																																																							
	Pontones																																																							
Mantenimiento																																																								
Otros (Especificar cuales)																																																								

AVANCE FINANCIERO	VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES
-------------------	---------------------------------

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES	VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES
--	---------------------------------

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	\$ 2.797.388.525		\$ 2.797.388.525
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 15.928.400	\$ 3.026.396,00	18.954.796,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	\$ 30.656.889		\$ 30.656.889
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 2.843.973.814	\$ 3.026.396	2.847.000.210,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	\$ 77.859.163,00		77.859.163,00	797.717.641,97
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 18.954.796,00		\$ 18.954.796,00	
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO	\$ 96.813.959,00		\$ 96.813.959,00	\$ 797.717.641,97

INVERSIÓN EN OBRA INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 2.847.000.210 INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	EMPLEOS GENERADOS EN EL MES MANO DE OBRA CALIFICADA: MANO DE OBRA NO CALIFICADA: EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
---	--

1. INTRODUCCIÓN

Con el objeto de mejorar la calidad de la infraestructura vial de nuestro país, el Gobierno Nacional viene implementado diferentes estrategias encaminadas al logro de ese objetivo, es así como en el sector de la red terciaria, dentro del programa “Colombia Rural” por medio de INVIAS, se suscribieron convenios con los municipios del país con el objeto de ejecutar actividades de mejoramiento, conservación y mantenimiento a sus diferentes vías, donde la entidad aporta los recursos que se requieren para su ejecución que atienda los documentos técnicos, normas y especificaciones requeridas.

La necesidad que se pretende satisfacer con la celebración del presente Convenio se encuentra en los Estudios Previos suscritos por el subdirector de la Red Terciaria y Férrea, los cuales forman parte del presente documento.

El instituto Nacional de Vías INVIAS mediante Resolución Número 4218 del 21 de diciembre de 2021, realizó la apertura del Concurso de Méritos No. CMA-DO-SRT-167-2021 para contratar la interventoría cuyo objeto es “Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para el mejoramiento, de vías terciarias del Programa Colombia Rural en los municipios del departamento de Córdoba”.

El presente documento contiene el informe Mensual de Interventoría No. 10, el cual tiene por objeto describir en forma detallada cada una de las actividades realizadas tanto por el contratista de obra como por la Interventoría, durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2022.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El municipio de Cotorra está localizado en el norte del departamento de Córdoba, en un relieve constituido por suelo de formación fluvio-lacustre correspondiente al complejo lagunal de la zona baja de la cuenca hidrográfica del río Sinú.

Su superficie abarca una extensión de territorial de 8778.55 hectáreas, con coordenadas 9° 2' 21.35'' latitud norte y 75° 47' 25.84'' longitud oeste, respecto al Meridiano de Greenwich. Aproximadamente, solo 665 Ha del territorio pertenece al área urbana, el resto (8113 Ha) pertenece a suelo rural distribuidos en 8 corregimientos: Abrojal, El paso de las Flores, La Culebra, Las Arepas, Los Cedros, Los Gómez, Moralito y Trementino.

El municipio de Cotorra limita al norte y al occidente con el municipio Santa Cruz de Lorica; al sur con San Pelayo y al oriente con San Pelayo y Chima. Cotorra está situado a 45 km de Montería, la capital departamental.

Se localiza en zona rural del municipio de Cotorra en el corregimiento paso de las Flores en el sector Guayabal como se muestra en la siguiente imagen. El material que se va a utilizar en este proyecto será suministrado por la cantera las Balsas de Ciénaga de Oro. a continuación, se muestra una imagen general y específica de la ubicación de la vía en el municipio de Cotorra, departamento de Córdoba

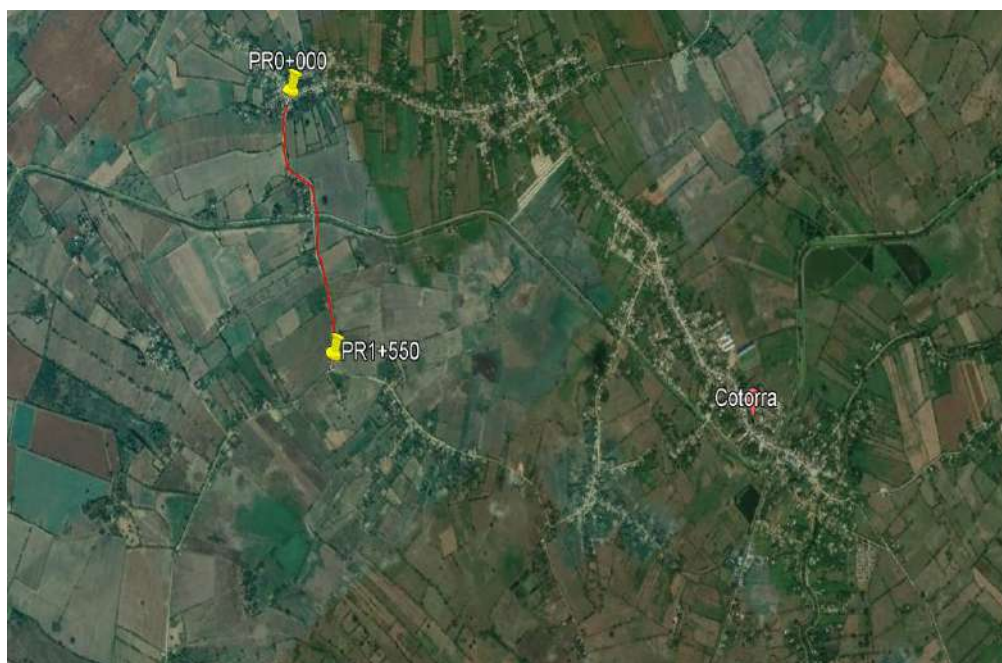


Figura 1 Localización General del Proyecto.
Fuente: Elaboración propia



Figura 2 Localización específica de la vía a diseñar.
Fuente: Elaboración propia

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

Este proyecto cuenta con varios municipios que hacen parte de la zona de influencia, limitando al norte y noroeste con Lorica, al sur y el oeste con San Pelayo y por el noroeste con Chima, Los cuales se ven beneficiados con la realización de este proyecto, ya que estos permiten la unión entre las cabeceras municipales.

De esta manera se potencia el intercambio comercial y se fortalece la economía nacional, reduciendo también los costos operativos, proporcionando una mayor movilidad de personas, bienes y servicios; mejorando en tiempo y contaminación del ambiente y en consecuencia brindando más impulso económico de la zona por donde atraviesa dicho proyecto.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

La vía se encuentra en afirmado en regulares condiciones, debido a que su capa de rodadura se ha desgastado por la falta de mantenimiento periódico y rutinario, no se han atendido los puntos críticos aunado al tránsito de vehículos pesados, lo que conlleva a daño en vehículos particulares, baja transpirabilidad y largos periodos de desplazamiento; notándose deterioros generalizados como ondulaciones, ahuellamiento, pérdida de grava y baches.

Tabla 1.

	
<p>El paso de las flores y villa nueva, Estado inicial sub base K1+400</p>	<p>El paso de las flores y villa nueva, Seguimiento con Pavimento Hidráulico K1+400</p>
	
<p>El paso de las flores y villa nueva, Estado inicial en excavación K1+000</p>	<p>El paso de las flores y villa nueva, Seguimiento con afirmado K1+000</p>

Fuente: Elaboración propia

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto en general consiste en la construcción de dos tramos en pavimento rígido de 1080 ml con ancho de estructura de 6m, con bordillos prefabricados en ambos lados, una capa de afirmado con un espesor de 0.3 m y sub base con un espesor de 0.20 m como se muestra en la siguiente imagen.

Tabla 2.

Localización de los tramos de pavimento.

LOCALIZACIÓN DEL TRAMO DE PAVIMENTO			
TRAMO	LONGITUD DE VIA (m)	INICIO DE TRAMO (ABSCISA)	FIN DEL TRAMO (ABSCISA)
1	440	K0+000	K0+440
2	640	K0+800	K1+460

A continuación, se visualizan el espesor de cada capa.

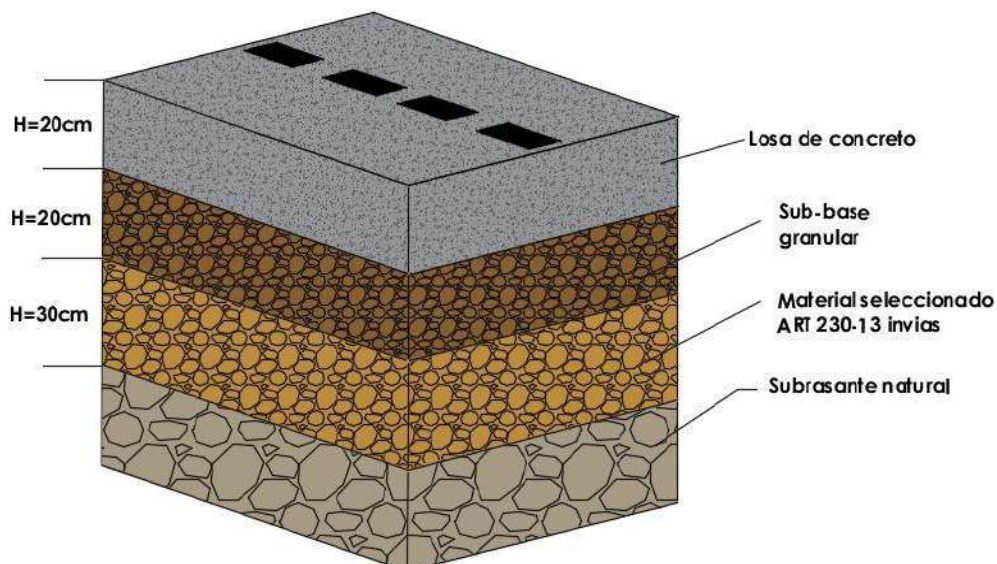


Figura 3. Espesores de capas
Fuente: Diseños

Tabla 3.*Especificaciones de proyecto*

Nomenclatura Catastral	Ancho de calzada (m)	Bordillo (m)	Longitud del tramo (m)	Funcionalidad	Tipo de terreno
Paso de las Flores - Villa nueva	6	0.2	1550	Terciaria	Plano

Fuente:

En este proyecto se presentó un $CBR < 3\%$, lo cual indica que necesita material seleccionado para mejorar su capacidad portante, para ello se recomiendan capas de mejoramiento en los dos tramos de 30 cm, sobre toda el área del tramo correspondiente del proyecto cumpliendo la condición establecida por la cartilla de Obras menores de drenaje y estructuras viales Programa Colombia Rural.

Además, contrarrestaría la posible expansión de los suelos encontrados en condiciones de saturación.

Tabla 4.*Análisis de mejoramiento para cada tramo.*

TRAMO	LONGITUD DE VIA (m)	MATERIAL DE MEJORAMIENTO
1	440	30 cm
2	640	30 cm

Fuente:

La valoración de los esfuerzos internos y de bordes, así como el control de esfuerzos por cambio uniforme de temperatura, se consideran adecuados y que cumplen con un proceso de diseño. Se considera losas de concreto de 3.0 metros de ancho por 3.00 metros de largo.

REVISIÓN DE CARACTERÍSTICAS Y PARÁMETROS GEOMÉTRICOS DEFINIDOS PARA EL DISEÑO GEOMÉTRICO.

Tabla 5.

Características Geométricas

CARACTERÍSTICA	DEFINIDO	OBSERVACIÓN
Tipo de vía	Terciaria	¡Cumple!
Tipo de Terreno	Plano	¡Cumple!
Velocidad de diseño	40 km/h	¡Cumple! Considerando la categoría de la carretera, el tipo de terreno y aplicando la tabla 2.1 del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras de INVIAS.
Peralte Máximo	6%	¡Cumple!

Fuente:

Tabla 6.

Parámetros de diseño en planta

PARÁMETRO	DEFINIDO	REVISIÓN
Radio Mínimo ($V_d = 40$ K/h)	43 m.	¡Cumple!
Entretangencia mínima curvas de distinto sentido	Cinco (5) segundos a la velocidad específica.	¡Cumple!
Entretangencia Mínima Curvas del mismo sentido	Quince (15) segundos a la velocidad específica.	¡Cumple!

Fuente:

Tabla 7.

Parámetros de Diseño en Perfil

PARÁMETRO	DEFINIDO	REVISIÓN
Pendiente longitudinal mínima	0.50%	¡Cumple!
Pendiente media máxima	7%	¡Cumple!
K mínimo curvas cóncavas	4	¡Cumple!
K mínimo curvas cóncavas	9	¡Cumple!

Fuente:

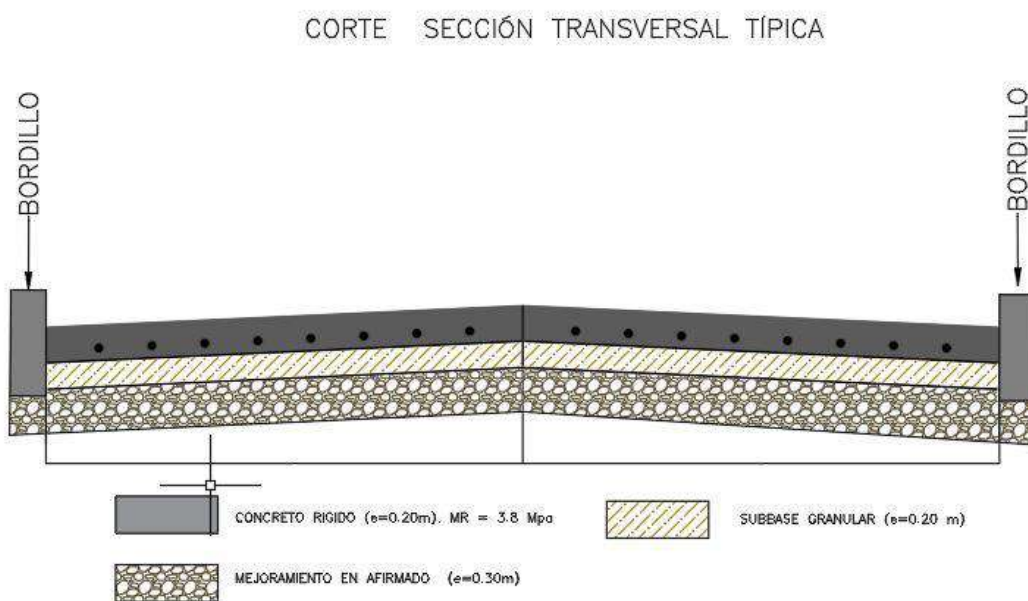


Figura 4. Sección Trasversal de la Vía
Fuente:

SECCION TIPICA TRAMOS RECTOS

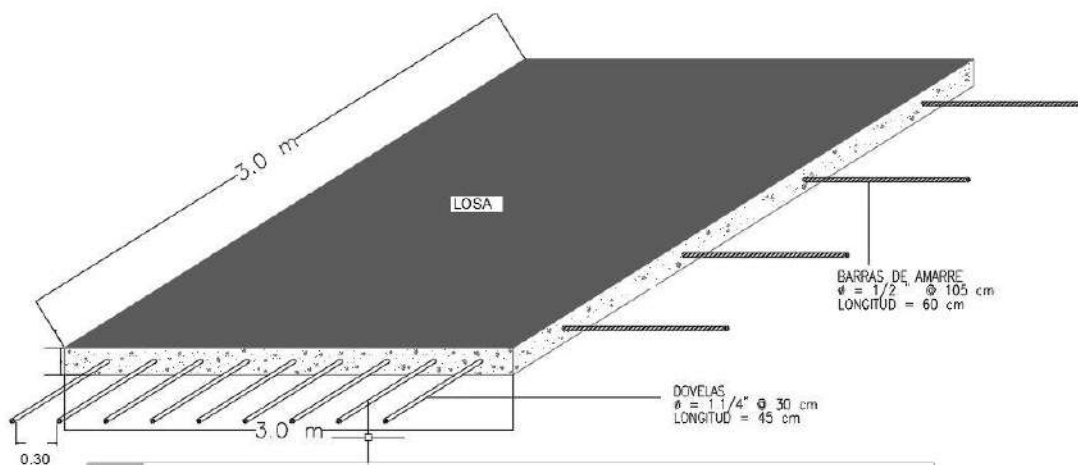


Figura 5. Sección Típica de Tramos Rectos
Fuente:

SECCIÓN TÍPICA TRAMOS IRREGULARES


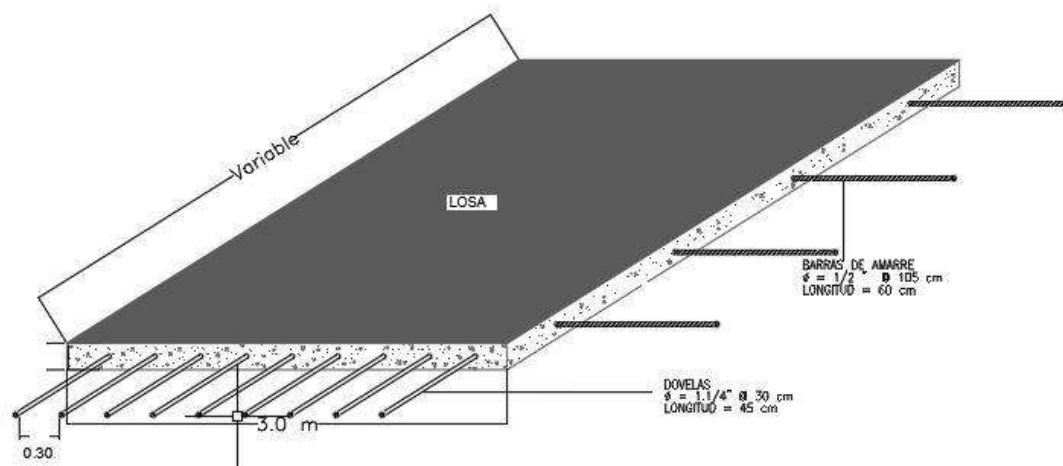


Figura 6. Sección Típica de Tramos Irregulares

Fuente:

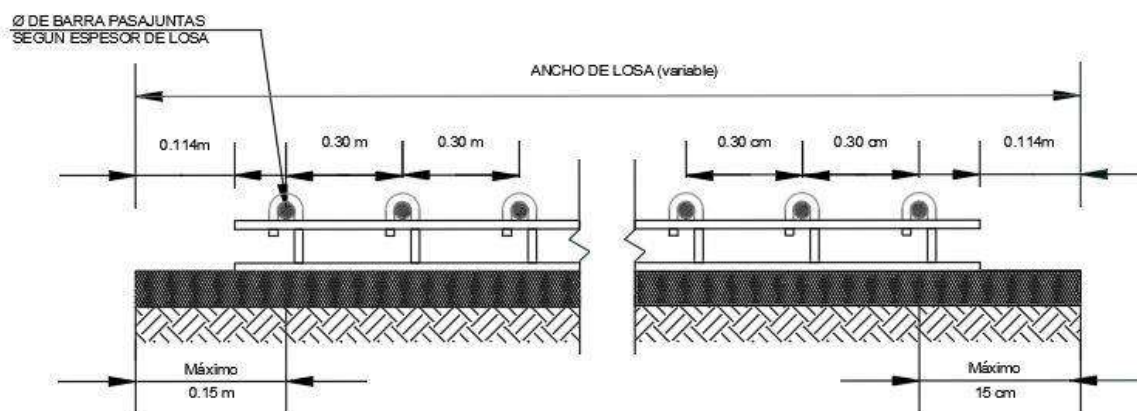

NOTA: LOS ATIESADORES SE DEBERÁN CORTAR ANTES DEL PROCESO DE
 VIBRADO MANUAL

CORTE B-B DETALLE 7

Figura 7. Detalles de Canastillas

Fuente:


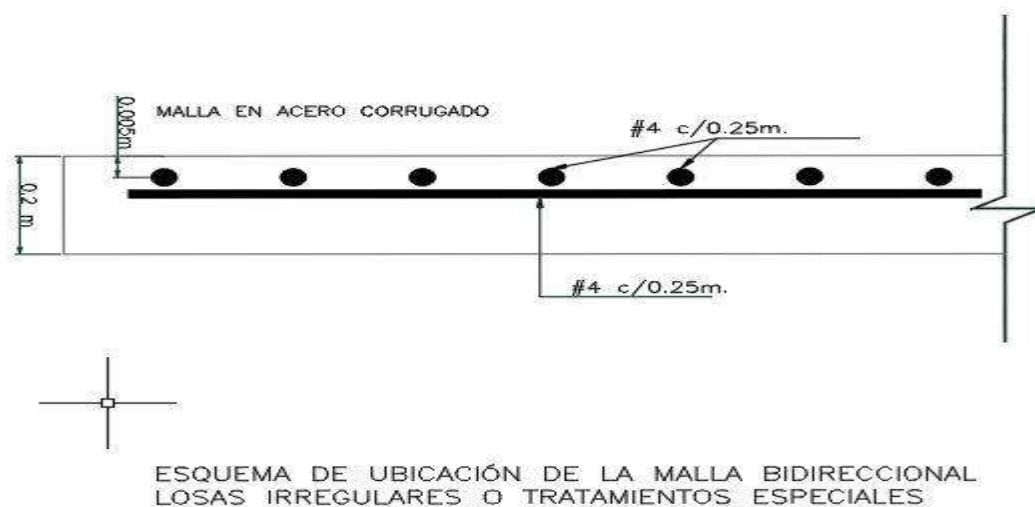


Figura 8. Detalle de Malla en Losas Irregulares

Fuente:

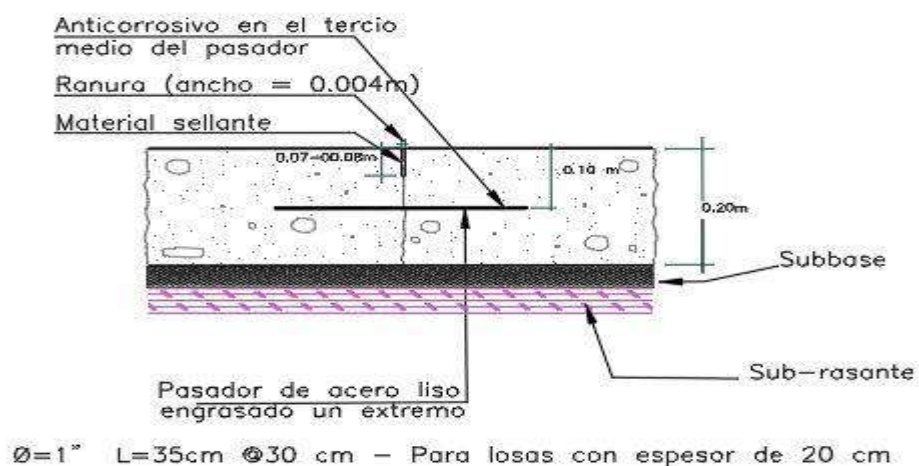

DETALLE DE JUNTA TRANSVERSAL CON PASADORES SEGÚN
MODELACIÓN

Figura 9. Detalle de juntas transversal con pasadores

Fuente:

Tabla 8.

Parámetros de transición de peralte

PARÁMETRO	DEFINIDO	REVISIÓN
Sección transversal típica	2 carriles de 3.00 m de ancho con bordillos en todo el recorrido.	¡Cumple! Considerando la categoría de la carretera, el tipo de terreno y aplicando la tabla 5.2 del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras de INVIAS.
Berma		No se considera debido a las limitaciones topográficas.
Peralte máximo	6%	¡Cumple!
Pendiente máxima de la rampa de peralte	0.96	¡Cumple!
Pendiente mínima de la rampa de peralte	0.1xa	¡Cumple!

Fuente:

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tabla 9.

Localización del proyecto:	Corregimiento de el paso de las flores y villa nueva
Plazo del contrato de obra:	6 meses
Fecha de inicio del contrato de obra:	17de enero de 2022
Fecha de vencimiento del contrato de obra	31 de julio de 2022
Prorroga No. 1	5 meses
Fecha de vencimiento actualizada del contrato de obra	31 de diciembre de 2022
Valor total contrato de obra (IVA incluido):	\$ 2.847.000.210
Número del proceso de selección	LP - 03- 2021
Integrantes, NIT y porcentajes de participación	4l Ingeniería S.A.S: con el 40% de participación y NIT: 901144628-1 AZ Civil S.A.S: con el 60% de participación y NIT: 900.849.836-1
Fecha de suscripción	
Campamento	Finca la lucha
Dirección contratista	35 # 8ª-04 municipio de montería córdoba
Número de teléfono del contratista	3232862727
Número de contrato	001 de 2022
NIT	901.558.600-3
Contratista de obra:	consorcio vial corredores rurales cotorra 2021
Objeto del contrato de obra	Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de corredores rurales productivos en el municipio de cotorra departamento de córdoba.

Fuente:

3.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

- **Excavación Mecánica:** Es el conjunto de actividades de excavar, remover, cargar transportar hasta el límite de acarreo libre y colocar en los sitios de disposición, los materiales provenientes de los cortes requeridos para la explanación, canales. En el presente mes se realizó excavación de cortes a la explanación entre absc K0+380 a la K0+480 y entre la absc K0+560 a la K0+640 se realizaron actividades de cortes a la explanación.

- Afirmado: es el suministro, transporte, colocación y compactación de los materiales de afirmado sobre la subrasante terminada o sobre un afirmado existente. En el presente mes no se realizó esta actividad.
- Transporte: consiste, única y exclusivamente, en el transporte de los materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales. Este material ha sido en su mayoría regalado a la comunidad aferente al proyecto, son muy pocos los viajes llevados al botadero autorizado por la Alcaldía.
- Subbase: Es el suministro, transporte, colocación, humedecimiento, extensión y conformación, compactación y terminado del material de subbase granular aprobada sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de conformidad con los alineamientos pendientes y dimensiones indicados en los planos y demás documentos del proyecto o establecidos por el interventor. En el presente mes no se realizó esta actividad.
- Concreto Pavimento Hidráulico: Se refiere a la construcción de pavimento de concreto hidráulico con juntas; y consiste en la elaboración, el transporte y el vibrado de una mezcla de concreto hidráulico en forma de losas, con o sin refuerzo; la ejecución y el sellado de juntas; el acabado, el curado y las demás actividades necesarias para la correcta construcción del pavimento de concreto hidráulico de acuerdo con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos y demás documentos del proyecto o establecido por el interventor.

En el presente mes no se realizó esta actividad, la longitud acumulada hasta la fecha es de 460 ml.

A continuación, se presentan las cantidades de obra ejecutadas al corte de este informe.

Tabla 10.

OCTUBRE					
DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR ACTUALIZADO(según última acta de modificación)	VALOR EJECUTADO DEL MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
Subtotal básico de obras	\$ 2.797.388.525,00		\$ 3.178.898,69	\$ 797.717.642,24	\$ 1.999.670.882,76
Provisión	0				
IVA	0				
Estudios y diseños	\$ 15.928.400,00			\$ 15.928.400	\$ 15.928.400
IVA estudios y diseños	\$ 3.026.396,00			\$ 3.026.396,00	\$ 3.026.396,00
Gestión social, Gestión predial, Gestión ambiental	\$ 30.656.889,00				\$ 30.656.889,00
Gestión de sostenibilidad					
Otros	\$ 0,00				
VALOR TOTAL	\$ 2.847.000.210,00				\$ 2.049.282.567,76

Fuente:

3.3 SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS

Actualmente el contrato no requiere de actividades no previstas.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

Se ha solicitado al Contratista:

- Mediante oficios, bitácora y comités de obra presente el balance incluido box coulvert para así seguir el buen funcionamiento y ejecución del proyecto.
- Celeridad en las actividades esto debido a que ellos vienen trabajando a un ritmo muy lento días si y días no, es preocupante esta situación para el avance y terminación del proyecto.
- Iniciar con las actividades de instalación de bordillos prefabricados ya que ellos debían iniciar el día 17 de octubre del presente año según plan técnico de instalación de bordillos que ellos entregaron a la Interventoría.

- Acelerar y ejecutar las actividades de excavación e instalación tanto de sub base como afirmado, al igual que las fundidas de concreto.

- Responder los oficios y asistir a los comités de obras citados por la Interventoría ya que en este mes no asistió a ninguno.

La acción de la Interventoría es seguir el control y supervisión para que las actividades ejecutadas se hagan bajo las especificaciones técnicas requeridas y así darle buena ejecución a la obra.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 INFORME SEMANAL

Se realizaron 5 informes semanales como se indica en el siguiente cuadro (Ver página 32-41).

Tabla 11.

INFORME SEMANAL	FECHA	PAGINA
1. Inf. semanal	Del 30 de septiembre al 06 de octubre de 2022	
2. Inf. semanal	Del 07 al 13 de octubre de 2022	
3. Inf. semanal	Del 14 al 20 de octubre de 2022	
4. Inf. semanal	Del 21 al 27 de octubre de 2022	
5. Inf. semanal	Del 28 de octubre al 03 de noviembre de 2022	

Fuente: Elaboración propia

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Tabla 12.

DESCRIPCION	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACION
MOTONIVELADORA	CHAMPIOM 710A	12 TONELADAS	EL PASO DE LAS FLORES VILLA NUEVA
RETROEXCAVADORA	HITACHI 200 EX	22 TONELADAS	EL PASO DE LAS FLORES VILLA NUEVA
VIBROCOMPACTADOR	XXXXXXXXX	8 TONELADAS	EL PASO DE LAS FLORES VILLA NUEVA

MINI CARGADOR	CAT 246B	1 TONELADA	EL PASO DE LAS FLORES VILLA NUEVA
VOLQUETAS	INTERNATIONAL	18 M3	EL PASO DE LAS FLORES VILLA NUEVA
VOLQUETAS	INTERNATIONAL	7 M3	EL PASO DE LAS FLORES VILLA NUEVA

Fuente: Elaboración propia

La información correspondiente al MEPI-MN1-IN-15-FR-4 se encuentra relacionada (Ver página 42-43).

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Tabla 13.

No.	DESCRIPCION	NOMBRES
1	DIRECTOR DE OBRA	
2	ING RESIDENTE DE OBRA	RODRIGO ANTONIO MORENO PAEZ
3	ING AUXILIAR	RAFAEL YESID PETRO ESPITIA
4	SISO	YASBLEIDI ESTER ESPITIA CANTERO
5	CADENERO	HERNANDO MIGUEL JUL+IO ESPITIA
6	TOPOGRAFO	MARLA VEGA DÍAZ
7	OPERADOR MOTONIVELADORA	GERMAN GABRIEL GALEANO JULIO
8	OPERADOR RETROEXCAVADORA	LEONARDO LUIS LOPEZ ARTEAGA
9	OPERADOR MINI CARGADOR	ELAN ELIAS PETRO GALVIZ
10	OPERADOR VOLQUETA	DANIEL RIVERA LOPEZ
11	OPERADOR VOLQUETA	JHON JADER BERROCAL GARCES
12	OPERADOR VOLQUETA	JORGE LEONARDO MADERA LLORENTE
13	OPERADOR VOLQUETA	NICOLAS DE JESUS GIRALDO TORRES
14	OPERADOR VOLQUETA	OSCAR ANTONIO BERROCAL GARCES
15	OPERADOR	ADALBERTO GUZMAN CAUSIL

La información correspondiente al MEPI-MN1-IN-15-FR-6 se encuentra relacionada (Ver página 44-46).

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 se relaciona el Estado Financiero y Presupuestal del contrato de obra de las actividades que se programó y se ejecutaron en el mes de octubre, donde el Contratista a la fecha presenta atraso, esto debido a que ellos en la reprogramación tienen actividades de excavaciones, instalación de sub base y afirmado y fundida de pavimento y a la fecha solo están ejecutando actividades de excavación mecánica.

El Contratista ya ha presentado tres Actas de Obra No.1, No. 2 y No. 3, lleva el 28.47% en ejecución de la obra. (Ver página 47).

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

La información correspondiente al MEPI-MN1-IN-15-FR-10, se encuentra relacionada (Ver página 48).

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

El Contratista e Interventoría no presentaron ensayos de laboratorio. La información correspondiente al MEPI-MN1-IN-15-FR-11, se encuentra relacionada (Ver página 49-50).

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

La información correspondiente al MEPI-MN1-IN-15-FR-12 se encuentra relacionada (Ver página 51-57).

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Se relacionan el Seguimiento al Plan de Calidad del Contrato de Obra, pero se adjuntan el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14, se encuentra relacionado (Ver página 58-63).

4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

- **SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO:** este contrato si contempla anticipo, pero hasta fecha no se ha pagado.
- **FLUJO DE INVERSION:** la inversión se puede ver página (64).
- **SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA:** se tenía programado el inicio del ítem de explanaciones, transporte y pavimento, según la reprogramación entregada por el Contratista (Ver página 65-72)
- **SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES:** en octubre de 2022, se tenía previsto una inversión programada de \$ 967.118.635.79 la cual representa un porcentaje del 34.57% versus una Inversión Ejecutada de \$ 797.717.641.97 la cual representa un porcentaje del 28.52%, representa un atraso del 6.06%, El Contratista presenta atrasos en obra debido a su reprogramación de obras que ellos incluyeron hacer excavaciones e instalación de afirmado y sub base y fundiendo concreto por lo cual presentan atraso porque solo están realizando excavaciones mecánicas y muy mínimas. se presenta en el formato MEPI-MN-IN6-FR-2 (Ver página 73).
- **ACTAS DE COMITÉ DE OBRA:** el Contratista no asistió al Comité de Obra realizado este mes, esta información se presenta en el Formato MEPI-MN1-IN-14-FR-1(Ver página).
- **ACTAS DE REUNIÓN:** No asistió a Acta de reunión, se relaciona en el Formato MEPI-MN1-IN-14-FR-2. (Ver página).

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tabla 14.

ENTIDAD CONTRATANTE	INVIAS
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO ACI-3B
CONTRATO No.:	2276 DE 2021
OBJETO:	“INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA- GRUPO 4”
LOCALIZACIÓN:	“SAN ANTONIO EL CEDRO CORREGIMIENTO DE RABOLARGO MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA”
CONTRATISTA	INTERVENTOR CONSORCIO ACI – 3B CON NIT. 901.551.292-6 (INTEGRADO POR ACI PROYECTOS SAS CON NIT. 860.059.851-6 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50 % Y 3B PROYECTOS SAS CON NIT. 900.504.398-4 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50%).
DIRECCIÓN Y NUMERO DE TELÉFONO	CR 18 13A 04 APT 301 COLOSINA, BARRIO VENUS II, CERETÉ, CÓRDOBA / MÓVIL: 3134024184
VALOR DEL CONTRATO:	\$1.930.530.773
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	28 DE ENERO DE 2022
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	31 DE JULIO DE 2022
PRORROGA No. 1	5 MESES
FECHA ACTUALIZADA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DE 2022

Fuente:

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

La Interventoría realizó las siguientes actividades

- Revisión de la documentación entregada por el Contratista.

- Seguimiento a la instalación de material sub base granular, afirmado, excavación y fundida de pavimento hidráulico.
- Seguimiento al avance de obras registrado en el periodo.
- Seguimiento al cumplimiento de normas de seguridad industrial como el uso de la dotación del personal y control de la señalización en obra.
- Verificación de afiliaciones de personal.
- Realizar informes semanales.
- Llevar control en la bitácora de las actividades diarias.
- Control de equipos del Contratista en obra.
- Control diario del personal en obra.
- Llevar control del estado del tiempo diario.

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

Debido a las actividades realizadas este mes no se encuentra informe ejecutivo de los profesionales y especialistas.

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

El informe de programa anual de CAJA- PAC se encuentra en ejecución.

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGO

El Informe de matriz de riesgo se encuentra en ejecución por parte de la Interventoría.

5.6 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORA.

De acuerdo con el Sistema de Gestión Documental implementado por INVIAS a través de las fuentes de información que maneja los documentos electrónicos, a la fecha no se encuentra actualizada la plataforma CIFRA dado a que se solicitó a INVIAS mediante comunicado la entrega de usuario y contraseña y hasta la fecha no se ha recibido dicha información.

6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla 15.

DESCRIPCION	MARCA/MODELO
CAMIONETA	DOBLE CABINA, PLACA UGU681, MARCA TOYOTA, CILINDRAJE 2494, MODELO 2015
NIVEL TOPOGRAFICO	MARCA TOPCOM, MODELO AT-B4, SERIE MZ 9945
ESTACION TOPOGRAFICA	MARCA SOKKIA SET 6 SERIE D22852

Fuente:

La información correspondiente al MEPI-MN1-IN-15-FR-5 se encuentra relacionada (Ver página 74-75).

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla 16.

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MIGUEL ARMANDO DÍAZ RIVERA	DIRECTOR
LIBARDO ANTONIO ARTEAGA HERNANDEZ	RESIDENTE
MARÍA JOSÉ TEHERÁN GUERRA	INSPECTOR SISO
CAMILO VIVAS OSPINA	TOPOGRAFO
LUIS MIGUEL OVIEDO RAMOS	CADENERO
DARIO ENRRIQUE CANTERO MENDOZA	CONDUCTOR

Fuente:

La información correspondiente al MEPI-MN1-IN-15-FR-7 se encuentra relacionada (Ver página 76-77).

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La información correspondiente al MEPI-MN1-IN-15-FR-9 se encuentra relacionada (Ver página 78- 79).

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La información correspondiente MEPI-MN1-IN-15-FR-13 se encuentra relacionada (Ver página 80- 81).

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No se realizó ninguna actividad respecto al MEPI-MN1-IN-15-FR-15.

6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

- Seguimiento a la inversión del anticipo: el contrato de Interventoría no contempla anticipo.
- Plan de cargas o reprogramación al Plan de Cargas Aprobado: Esta información se encuentra relacionada en el formato MEPI-MN-IN-9-FR-2, la información correspondiente se encuentra anexada. (Ver página 82 -83)
- Seguimiento al Plan de Cargas: Esta información se encuentra relacionada en el formato MEPI-MN-IN-9-FR-3, sin embargo, no se encuentra anexada.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En octubre de 2022, se tenía previsto una Inversión Programada de \$ 967.118.635.79 la cual representa un porcentaje del 34.57% versus una Inversión Ejecutada de \$ 797.717.641.97 la cual representa un porcentaje del 28.52% teniendo un atraso del 6.06%.
- Se solicitó al Consorcio Vial Corredores Rurales 2021 que realice entrega del balance incluido box coulvert.
- Se solicitó al Contratista iniciar con las actividades de instalación de bordillo prefabricado ya que debía iniciar el día 17 de octubre del año en curso esto según plan técnico de instalación entregado por ellos.
- Se le solicito al Contratista asistir a los comités de obra citados por esta Interventoría ya que en este mes no asistió a ninguno.
- Se le solicito al Contratista mediante oficios, bitácora y comités responder los oficios enviados para así tener una mejor transparencia en la comunicación, ellos no han respondido oficios en este último mes.
- Se solicito al Contratista agilizar con la Alcaldía la construcción de la alcantarilla encontrada en la absc K0+924.40, de la cual ya tienen la tubería en campo.
- Se le solicito mejorar la señalización en obra ya que ellos no tienen muy buena señalización
- También se les solicito entregar las observaciones realizadas al PAGA es de carácter urgente.
- Se le recomienda al Contratista agilizar las actividades como excavaciones, instalación de afirmado y sub base, al igual que las fundidas de concreto ya que estas actividades han venido paradas hace un mes, solo han reactivado las excavaciones mecánicas y están las reactivaron desde el 19 de octubre del presente año.

- La Interventoría viene con gran preocupación por el avance que en este mes ha presentado el Contratista, ya que ha sido un avance muy insignificativo, se le pide celeridad en las actividades para mejorar el avance y así no seguir en atrasos. El contratista tiene un atraso hasta el corte de este informe del 6.06% este ha venido aumentando semana tras semana respecto al mes de septiembre ellos venían con un adelanto del 0.31%.

8. ANEXOS

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO.

Los documentos anexos de la correspondencia se encuentran relacionada (Ver página 84-114).

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS.

Se adjunta registro fotográfico del avance de las actividades ejecutadas en obra (Ver página 115-120)

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PEDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS.

No se adjunta registro fotográfico de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad.

8.4 BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

Se encuentra anexada desde la (página 121-141)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEP/INT-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	7-oct-22 (05/106/1706)

I. INFORMACIÓN GENERAL			
PROYECTO MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - GRUPO 4:			
UNIDAD EJECUTORA: <u>SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES</u>	DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>CORDOBA</u>	SEMANA No. <u>33</u> del <u>30-sep-22</u> al <u>6-oct-22</u> (Numeración consecutiva)	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: <u>ING NESTOR ELIAN LEWIS VILLADIEGO</u> GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: <u>ING. ALVARO GALVIS</u>			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: <u>MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE COTORRA DEPARTAMENTO DE CORDOBA</u>			
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: <u>LA META FÍSICA A EJECUTAR ES LA PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LOS K21+120 DE LA VIA EL PASO DE LAS FLORES Y VILLANUEVA</u>			
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: <u>PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO, CON UNA SECCION TIPICA DE 6.0 DE ANCHO POR 20CM DE ESPESOR, CON UNA ESTRUCTURA DE AFIRMADO Y 20 CM DE SUBBASE, CON LA CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN CONCRETO DOS BOX COULVERT EN LA VIA AL CEPILLO, BORDILLOS EN CONCRETO PREFABRICADO Y LA SEÑALIZACION VAL CORRESPONDIENTE</u>			

CONTRATO DE OBRA: CONTRATISTA: <u>CONSORCIO VAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021</u> INTEGRANTES: <u>SI INGENIERIA S.A.S CON EL 40% DE PARTICIPACION Y MT-901446680-3- AZCUAL S.A.S CON EL 60% DE PARTICIPACION Y MT-900848806-1</u> CONTRATO No. <u>001 DE 2022</u> VALOR INICIAL: <u>\$ 2.847.000.000,00</u> FECHA DE INICIO: <u>17/05/2022</u> VALOR ADICIONES: <u>\$</u> FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: <u>31/07/2022</u> VALOR ACUMULADO: <u>\$</u> FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: <u></u> VALOR ACUMULADO: <u>\$</u> <u>\$</u>	CONTRATO DE INTERVENTORIA: INTERVENIENTES: <u>CONSORCIO AC 3B</u> INTEGRANTES: <u>ACI PROYECTOS S.A.S CON 90% - 3B PROYECTOS S.A.S CON 10%</u> CONTRATO No. <u>2276-09-2021</u> VALOR INICIAL: <u>\$ 1.930.530.773,00</u> FECHA DE INICIO: <u>28/01/2022</u> VALOR ADICIONES: <u>\$</u> FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: <u></u> VALOR ACUMULADO: <u>\$</u> FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: <u></u> VALOR ANTICIPO: <u>\$</u> <u>\$</u> VALOR AMORTIZADO: <u>\$</u> <u>\$</u> SALDO POR AMORTIZAR: <u>\$</u>
---	--

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
	RECURSOS POR VIGENCIA				
INTERVENIENTES A	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 1.930.530.773			
	SALDO DE VIGENCIA				
	(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)				
	(Indicar valores en pesos)				
OBRA					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 2.787.388.525,00				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 785.964.446,91		28,19%		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 784.538.743,28		28,15%		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ (8.574.286,38)		-0,31%		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 15.928.551,09		0,57%		
(Estudios y Diseños, gestión prestat, social, ambiental y otras)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 785.964.446,91		28,19%		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 784.538.743,28		28,15%		
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ (8.574.286,38)		-0,31%		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	\$ 154.018.259,50		5,51%		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	\$		0,00%		
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 911.521.177,00		47,22 %		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 843.637.967,00		43,70 %		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	\$ 9.700.478,00		0,50% %		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	\$ 7.821.230,00		0,41% %		
Anticipos					
Amortizado \$					
Saldo \$					
Anticipos					
Amortizado \$					
Saldo \$					

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia an.	Avance Físico	%
Estudios y diseños	g	0	2021			
Box coulvert	mt	0	2021			
Pavimento concreto	mt	1550	2021			
Señalización	mt	0	2021			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia an.	Avance Físico	%
Estudios y diseños	g	0	2021			
Box coulvert	mt	0	2021			
Pavimento concreto	mt	1550	2021			
Señalización	mt	0	2021			

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS									
PROGRAMADO									
PR0+000									
PR1+550									
EJECUTADO									
PR0+000									
PR0+800									
PR0+820									
PR0+840									
PR0+940									
PR0+980									
PR0+800									
PR0+940									
PR1+000									
PR1+010									
PR1+200									
PR1+220									
PR1+140									
PR1+303									
PR1+1400									
PR1+500									
PR1+550									
CONVENIONES									
ESTUDIOS Y DISEÑOS									
BOX-CULVERT									
PAVIMENTO EN CONCRETO									
SEÑALIZACIÓN									
EXCAVACIÓN									
AFRIMADO									
SUBBASE									
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEP/INT-18-15 del Manual de Interventoría.									
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO									
									
Via paso de las flores - villa nueva Profundización de tubería de alcantarillado entre contratista y empresa triple AAA									
Via paso de las flores - Villanueva Profundización de tubería de alcantarillado entre contratista y empresa triple AAA									
Via Paso de las flores - Villa nueva Profundización de tubería de alcantarillado entre contratista y empresa triple AAA									
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.									
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL									
DIRECTOR DE INTERVENTORIA									
El contratista en esta semana continua con la disminución en el avance en esta semana no realizaron ninguna actividad, pero aun así continua superado el atraso, el atraso a este corte fue superado -0,31%. Se ha notado que el avance esta bajando esto debido a que el contratista no esta realizando ninguna actividad.									
Firma: 									
Nombre: MIGUEL ARMANDO DIAZ RIVERA									
Matrícula Profesional No.: 45263-12786 (CNC)									
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del BVAAS.									
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial.									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEP/INT-16-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA		14-oct-22 (09/186/1746)
-------	--	----------------------------

I. INFORMACIÓN GENERAL			
PROYECTO MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA - GRUPO 4:			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA	SEMANA No: 34 del 7-oct-22 al 13-oct-22	(Numeración consecutiva)
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ING NESTOR LEAN LEWIS VILLALBA			
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. ALVARO GALVIS			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE COTORRA DEPARTAMENTO DE CORDOBA			
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: LA META FÍSICA A EJECUTAR ES LA PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LOS K21+120 DE LA VIA EL PASO DE LAS FLORES Y VILLANUEVA			
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO, CON UNA SECCION TIPICA DE 6.0 DE ANCHO POR 20CM DE ESPESOR, CON UNA ESTRUCTURA DE AFIRMADO Y 20 CM DE SUBBASE, CON LA CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN CONCRETO DOS BOX COULVERT EN LA VIA AL CEPILLO, BORDILLOS EN CONCRETO PREFABRICADO Y LA SEÑALIZACION VAL CORRESPONDIENTE			

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONTRATISTA: CONSORCIO VAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021	INTERVENIOR: CONSORCIO AC 3B		
INTEGRANTES: SI INGENIERIA S.A.S CON EL 40% DE PARTICIPACION Y MT-90144660-3- ALZCIVIL S.A.S CON EL 60% DE PARTICIPACION Y MT-90084800-1	INTEGRANTES: AC1 PROYECTOS S.A.S CON 90% - 3B PROYECTOS S.A.S CON 10%		
CONTRATO No: 001 DE 2022	CONTRATO No: 2276-09-2021	VALOR INICIAL: \$ 2.847.000.000,00	VALOR INICIAL: \$ 1.930.530.773,00
FECHA DE INICIO: 01/05/2022	FECHA DE INICIO: 28/01/2022	VALOR ADICIONES: \$	VALOR ADICIONES: \$
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2022	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2022	VALOR ACUMULADO: \$	VALOR ACUMULADO: \$
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2022	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2022	VALOR ANTICIPO: \$	VALOR ANTICIPO: \$
		VALOR AMORTIZADO: \$	VALOR AMORTIZADO: \$
		SALDO POR AMORTIZAR: \$	SALDO POR AMORTIZAR: \$

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 2.847.000.000,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
	RECURSOS POR VIGENCIA				
INTERVENIOR A	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1.930.530.773			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
	RECURSOS POR VIGENCIA				
OBRA					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 2.787.388.525,00				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 631.252.984,13	22,72%			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 754.538.743,28	26,97%			
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ 36.714.259,85	1,31%			
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión preal, social, ambiental y otras)	\$ 15.928.551,09	0,57%			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 631.252.984,13	22,72%			
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 754.538.743,28	26,97%			
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ 36.714.259,85	1,31%			
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	\$ 154.018.259,50	5,51%			
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	\$	0,00%			
SI	NO				
☐	☒				
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 921.221.555,00	47,72 %			
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 651.458.787,00	44,10 %			
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	\$ 9.700.478,00	0,50% %			
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	\$ 7.821.230,00	0,41% %			
SI	NO				
☐	☒				
Amortizado \$					
Saldo \$					
En el mes					
Acumulado:					

III. AVANCE FÍSICO	
Meta Física Programada %: 100,00%	Avance o Atraso Físico: -70,32%
Meta Física Ejecutada %: 26,68%	

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia an	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	g	0	2021			1,00			1,00	
						Prog				
Box coulvert	mt	0	2021			0			0	
						Prog				
Pavimento concreto	mt	1550	2021			1550			1550,00	100,00%
						Prog			460,00	29,69%
Señalización	mt	0	2021			0			0	
						Prog				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal

TRAMO Y/O SECTOR 1: _____

TRAMO Y/O SECTOR (n): _____

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETROEXCAVADORA	1	1
MOTONIVELADORA	1	1
VEREDOCOMPACTADOR	1	1
VOLICUETAS	5	5
MINICARROZADOR BOMBA	1	1
CORTADORA DE PAVIMENTO	1	1
Total	10	10

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL									
FUENTES DE MATERIALES					PERMISOS AMBIENTALES Y LICENCIAMIENTO AMBIENTAL				
UBICACIÓN: PLANTA CANTERA JOMEVE	PERMISO MINERO: SI	DISPONIBLE	NO		ZONAS DE DEPÓSITO: SI	NO		NA	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO		LECIENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO	NA	X
UBICACIÓN: TRONCAL 2 VIA CERETE - DENASA DE ORO	PERMISO MINERO: SI	X	NO		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI	NO		NA	X
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO		CONCESION DE AGUAS: SI	NO		NA	X
					OCCUPACION DE CALCES: SI	NO		NA	X
					VESTIMENTOS: SI	NO		NA	X
					EMISIONES: SI	NO		NA	X
					OTROS (Especificar cual): SI	NO		NA	X

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)	
ESTADO: CON OBSERVACIONES	

V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 14	INTER: 2	NO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 10		NO DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 3		DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: 0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: 1			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16			


VI. GESTIÓN PREDIAL			
TOTAL ESTADO PREDIOS A ADQUIRIR: 0			
FECHAS PREDALES APROBADAS: 0			
AVALES APROBADOS: 0			
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0			

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD			
---------------------------------------	--	--	--

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
En la presente semana el Contratista no realizó ninguna actividad, se continuo y finalizó con la profundización de la tubería de alcantarillado entre absc K0+660 -K0+000 esta actividad en conjunto con la empresa prestadora de servicios de acueducto y alcantarillado de cotorra triple AAA, se realizaron ciertas observaciones al contratista como son: 1. Se le pide celeridad al contratista en las actividades de instalación de afirmado y sub absc granular, también que continúe con la fundida de pavimento, 2. también se le pide iniciar con la instalación de bordillos prefabricados.			
El Contratista lleva acumulada las siguientes actividades: Excavación desde el K1+400 hasta el K1+150; y K1+150 hasta K0+980; y K0+980 hasta K0+840; y K0+840 hasta K0+800; Relleno con Material de Afirmado K1+400 a K1+240; y K1+240 a la K1+100; y K1+100 a K1+000; y K1+000 a la K0+820; Instalación de Material Sub Base Granular entre absc K1+400 a la K1+360; y K1+360 hasta K1+140; y K1+140 a la K1+000; y K1+000 a la K0+940; Fundida de pavimento hidráulico módulo de rotura de 38 mpa con mixer entre absc K1+400 a la K1+305; y K1+305 a la K1+220; y K1+220 a la K1+085; y K1+085 a la K1+010; y K1+010 a la K0+940;			

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
Continuar con las Actividades de instalación de material de afirmado subbase para toma de densidades y liberación por parte de Interventoría, seguir con la construcción de pavimento hidráulico.			

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS															
PROGRAMADO															
PR0+000															
PR1+550															
EJECUTADO															
PR0+000															
PR0+800															
PR0+820															
PR0+840															
PR0+940															
PR0+980															
PR0+800															
PR0+940															
PR1+000															
PR1+010															
PR1+200															
PR1+220															
PR1+140															
PR1+303															
PR1+1400															
PR1+500															
PR 1+550															
CONVENCIONES															
ESTUDIOS Y DISEÑOS															
BOX-CULVERT															
PAVIMENTO EN CONCRETO															
SEÑALIZACION															
EXCAVACION															
AFRIMADO															
SUBBASE															
El esquema grafico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEP/INT-18-15 del Manual de Interventoría.															
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO															
															
Via paso de las flores - villa nueva Profundización de tubería de alcantarillado entre contratista y empresa triple AAA															
															
Via paso de las flores - Villanueva Arreglo de fuga en tubería de alcantarillado entre contratista y empresa triple AAA															
															
Via Paso de las flores - Villa nueva Profundización de tubería de alcantarillado entre contratista y empresa triple AAA															
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.															
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL															
DIRECTOR DE INTERVENTORIA															
El contratista en esta semana ya tiene un atraso de obra del 1,31% esto debido a que el contratista en esta semana no realizaron ninguna actividad, el contratista viene desde el 5 de septiembre sin realizar ninguna actividad que genere avance en el proyecto.															
Firma															
Nombre: MIGUEL ARMANDO DIAZ RIVERA															
Matrícula Profesional No.: 65263-12786 (CNC)															
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del BVAAS.															
Copias: Unidad Ejecutora, Subsecretaría de Planeación, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial.															

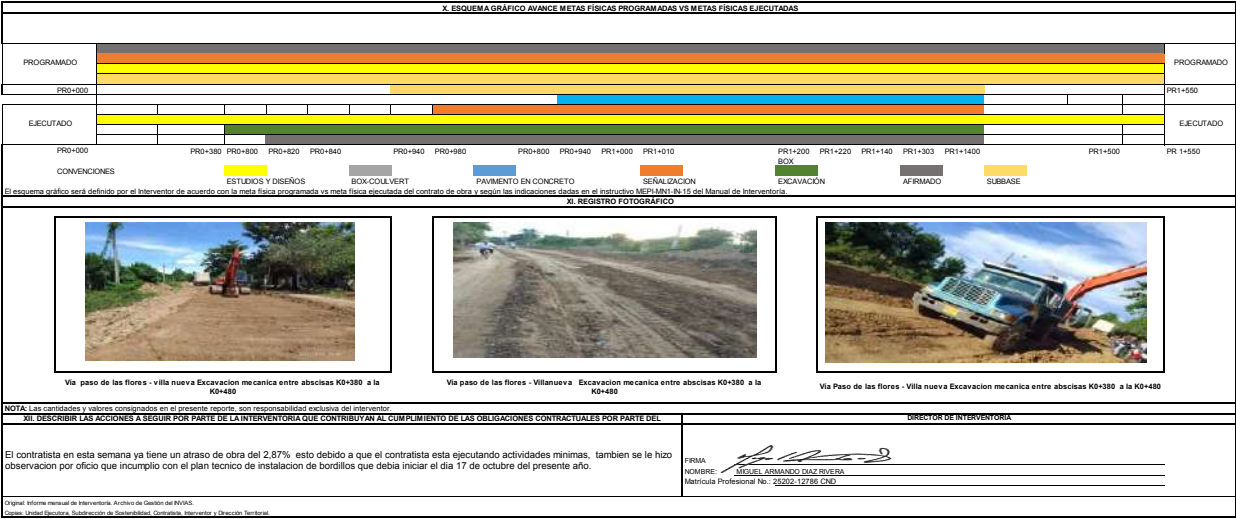

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEP/INT-16-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	28-oct-22 (09/186/1746)

I. INFORMACIÓN GENERAL			
PROYECTO MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - GRUPO 4:			
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CORDOBA
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:	ING. NESTOR ELIAN LEWIS VILLADIEGO		SEMANA No. 36 del 21-oct-22 al 27-oct-22 (Numeración consecutiva)
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE COTORRA DEPARTAMENTO DE CORDOBA		
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:	LA META FÍSICA A EJECUTAR ES LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LOS K21+120 DE LA VIA EL PASO DE LAS FLORES Y VILLANUEVA		
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO, CON UNA SECCIÓN TÍPICA DE 6.0 DE ANCHO POR 20CM DE ESPESOR, CON UNA ESTRUCTURA DE AFIRMADO Y 20 CM DE SUBBASE, CON LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS EN CONCRETO DOS BOX COULVERT EN LA VIA AL CEPILLO, BORDILLOS EN CONCRETO PREFABRICADO Y LA SEÑALIZACIÓN VAL CORRESPONDIENTE			

CONTRATO DE OBRA: CONTRATISTA: CONSORCIO VAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021 INTEGRANTES: SI INGENIERIA S.A.S CON EL 40% DE PARTICIPACIÓN Y MT-901446680-3- ALZCIVIL S.A.S CON EL 60% DE PARTICIPACIÓN Y MT-900848806-1 CONTRATO No.: 001 DE 2022 FECHA DE INICIO: 17/05/2022 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2022 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2022 VALOR INICIAL: \$ 2.847.000.000,00 VALOR ADICIONES: \$ VALOR ACUMULADO: \$ \$	CONTRATO DE INTERVENTORIA: INTERVENTOR: CONSORCIO AC 3B INTEGRANTES: AC1 PROYECTOS S.A.S CON 90% - 3B PROYECTOS S.A.S CON 10% CONTRATO No.: 2276-09-2021 FECHA DE INICIO: 28/01/2022 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2022 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2022 VALOR INICIAL: \$ 1.930.530.773,00 VALOR ADICIONES: \$ VALOR ACUMULADO: \$ VALOR ANTICIPO: \$ VALOR AMORTIZADO: \$ SALDO POR AMORTIZAR: \$
--	--

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 2.847.000.000,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
	RECURSOS POR VIGENCIA				
INTERVENTOR A	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$	1.930.530.773		
	SALDO DE VIGENCIA				
OBRA					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$	2.787.388.525,00			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	921.830.988,57	32,95%		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	757.717.651,97	28,52%		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	124.112.446,60	4,44%		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	15.928.551,09	0,57%		
<small>(Estudios y Diseños, gestión prestat, social, ambiental y otras)</small>					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	921.830.988,57	32,95%		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	757.717.651,97	28,52%		
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	124.112.446,60	4,44%		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	\$	154.018.259,50	5,51%		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	\$		0,00%		
SI	NO				
	X				
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	940.622.611,00	48,72 %		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	867.101.287,00	44,62 %		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	\$	9.700.478,00	0,50% %		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	\$	7.821.230,00	0,41% %		
SI	NO				
	X				
Anticipos					
Amortizado \$					
Saldo \$					
Indicador					
En el mes					
Acumulado					
Anticipos					
Amortizado \$					
Saldo \$					

III. AVANCE FÍSICO	
Meta Física Programada %: 100,00%	Avance o Atraso Físico: -70,32%
Meta Física Ejecutada %: 28,68%	

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia an.	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	
Estudios y diseños	g	0	2021			Prog. 1,00			1,00		
						Ejec. 0			0		
Box coulvert	mt	0	2021			Prog. 0			0		
						Ejec. 0			0		
Pavimento concreto	mt	1550	2021			Prog. 1550			1550,00	100,00%	
						Ejec. 460			460,00	29,69%	
Señalización	mt	0	2021			Prog. 0			0		
						Ejec. 0			0		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal

TRAMO Y/O SECTOR 1: _____

TRAMO Y/O SECTOR (n): _____

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETROEXCAVADORA	1	1
MOTOPULVERIZADORA	1	1
VEREDOCOMPACTADOR	1	1
VOLICUETAS	5	5
MINI CARPOTERRO BUCICAT	1	1
CORTADORA DE PAVIMENTO	1	1
Total	10	10

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL									
FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: PLANTA CANTERA JOMEVE PERMISO MINERO: SI X NO LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO UBICACIÓN: TRONCAL 2 VIA CERETE - DENASA DE ORO PERMISO MINERO: SI X NO LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO					PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE DEPÓSITO: SI X NO NA LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO NA APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO NA X CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO NA X OCUPACIÓN DE CALCES: SI NO NA X VESTIMENTOS: SI NO NA X EMISIONES: SI NO NA X OTROS (Especificar cual): SI NO NA X				

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)	
ESTADO: CON OBSERVACIONES	


V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 14 EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 10 EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 3 EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: 1 TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0 DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 0		

VI. GESTIÓN PREDIAL			
TOTAL ESTADO PREDIOS A ADQUIRIR: 0 FICHAS PREDIALES APROBADAS: 0 AVALUOS APROBADOS: 0 PREDIOS ADQUIRIDOS: 0			

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD			

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
En la presente semana el Contratista continuó con las actividades de excavación mecánica entre las absc K0+560 a la K0+638, se realizaron ciertas observaciones al contratista como son: 1. Se le pide celeridad al contratista en las actividades de instalación de afirmado y sub abase granular, también que continúe con la fundida de pavimento, 2. también se le pide iniciar con la instalación de bordillos prefabricados, 3. reforzar la señalización en obra El Contratista lleva acumulada las siguientes actividades: Excavación desde el K1+400 hasta el K1+150; y K1+150 hasta K0+980; y K0+980 hasta K0+940; y K0+940 hasta K0+800; K0+380 hasta el K0+480; K0+560 hasta el K0+638; Relleno con Material de Afirmado K1+400 a K1+240; y K1+240 a la K1+100; y K1+100 a K1+000; y K1+000 a la K0+820; Instalación de Material Sub Base Granular entre absc K1+400 a la K1+360; y K1+360 hasta K1+140; y K1+140 a la K1+000; y K1+000 a la K0+940; Fundida de pavimento hidráulico modulo de rotura de 38 mpa con mixer entre absc K1+400 a la K1+303; y K1+303 a la K1+220; y K1+220 a la K1+085; y K1+085 a la K1+010; y K1+010 a la K0+940;			

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
Continuar con las Actividades de instalación de material de afirmado subbase para toma de densidades y liberación por parte de Interventoría, seguir con la construcción de pavimento hidráulico e instalación de bordillos prefabricados			

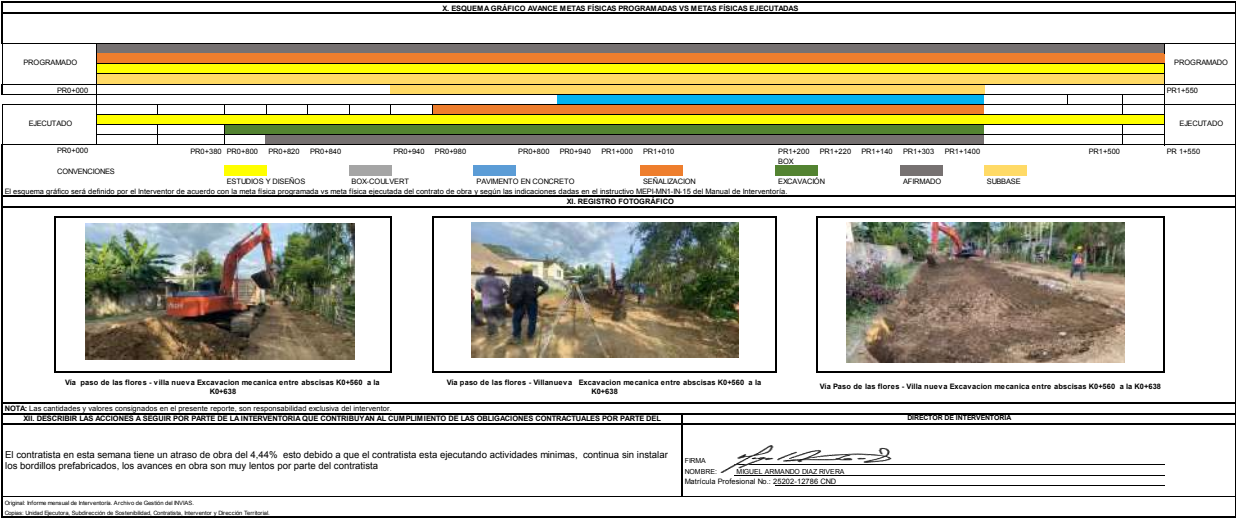

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MEP/INT-06-15-FR-3
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

FECHA		4-nov-22 (05/186 / 786)
-------	--	----------------------------

I. INFORMACIÓN GENERAL		
PROYECTO MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA - GRUPO 4:		
UNIDAD EJECUTORA: <u>SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES</u>	DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>CORDOBA</u>	SEMANA No.: <u>37</u> del <u>28-oct-22</u> al <u>3-nov-22</u> (Numeración consecutiva)
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: <u>ING NESTOR ELIAN LEWIS VILLADIEGO</u>		
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: <u>ING. ALVARO GALVIS</u>		
OBJETO CONTRATO DE OBRA: <u>MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE COTORRA DEPARTAMENTO DE CORDOBA</u>		
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: <u>LA META FÍSICA A EJECUTAR ES LA PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LOS K21+120 DE LA VIA EL PASO DE LAS FLORES Y VILLANUEVA</u>		
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: <u>PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO, CON UNA SECCION TIPICA DE 6.0 DE ANCHO POR 20CM DE ESPESOR, CON UNA ESTRUCTURA DE AFIRMADO Y 20 CM DE SUBBASE, CON LA CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN CONCRETO DOS BOX COULVERT EN LA VIA AL CEPILLO, BORDILLOS EN CONCRETO PREFABRICADO Y LA SEÑALIZACION VAL CORRESPONDIENTE</u>		

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONTRATISTA: <u>CONSORCIO VAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021</u>		INTERVENTOR: <u>CONSORCIO AC 38</u>	
INTEGRANTES: <u>SI INGENIERIA S.A.S CON EL 40% DE PARTICIPACION Y MT-001446680-3- AC 38 S.A.S CON EL 60% DE PARTICIPACION Y MT-000848806-1</u>		INTEGRANTES: <u>AC 38 PROYECTOS S.A.S CON 90% - 38 PROYECTOS S.A.S CON 10%</u>	
CONTRATO No.: <u>001 DE 2022</u>	VALOR INICIAL: <u>\$ 2.847.000.000,00</u>	CONTRATO No.: <u>2276-08-2021</u>	VALOR INICIAL: <u>\$ 1.930.530.773,00</u>
FECHA DE INICIO: <u>17/05/2022</u>	VALOR ADICIONES: <u>\$</u>	FECHA DE INICIO: <u>28/01/2022</u>	VALOR ADICIONES: <u>\$</u>
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: <u>31/07/2022</u>	VALOR ACUMULADO: <u>\$</u>	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: <u></u>	VALOR ACUMULADO: <u>\$</u>
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: <u></u>	VALOR ANTICIPO: <u>\$</u>	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: <u></u>	VALOR ANTICIPO: <u>\$</u>
			VALOR AMORTIZADO: <u>\$</u>
			SALDO POR AMORTIZAR: <u>\$</u>

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 2.847.000.000,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
	RECURSOS POR VIGENCIA	\$	1.930.530.773		
INTERVENTOR A	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
OBRA					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$	2.787.388.525,00			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	967.118.535,79	34,57%		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	787.717.641,97	28,25%		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	169.400.993,82	6,09%		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	15.928.551,09	0,57%		
<i>(Estudios y Diseños, gestión prest. social, ambiental y otras)</i>					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	967.118.535,79	34,57%		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	787.717.641,97	28,25%		
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	169.400.993,82	6,09%		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	\$	154.018.259,50	5,51%		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	\$		0,00%		
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	960.323.089,00	49,23 %		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	674.922.487,00	45,32 %		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	\$	9.700.478,00	0,50% %		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	\$	7.821.230,00	0,41% %		
Anticipos					
Amortizado \$					
Saldo \$					
INDICADOR					
En el mes					
Acumulado					
Anticipos					
Amortizado \$					
Saldo \$					

III. AVANCE FÍSICO	
Meta Física Programada %: <u>100,00%</u>	Avance o Atraso Físico: <u>-70,32%</u>
Meta Física Ejecutada %: <u>28,68%</u>	

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia an.	Avance Físico
Estudios y diseños	g	0	2021		
Box couvert	mt	0	2021		
Pavimento concreto	mt	1550	2021		
Señalización	mt	0	2021		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia an.	Avance Físico
Estudios y diseños	g	0	2021		
Box couvert	mt	0	2021		
Pavimento concreto	mt	1550	2021		
Señalización	mt	0	2021		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal

TRAMO Y/O SECTOR 1: _____

TRAMO Y/O SECTOR (n): _____

TRAMO Y/O SECTOR 2: _____

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	1 DE 1

FECHA			31/10/2022 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA		

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA																															
PERIODO / MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE CONTRATO No. 001 de 2022 CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2276 DE 2021				PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias del Programa "COLOMBIA RURAL" en los Municipios del Departamento del Córdoba - Grupo 4. CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021 INTERVENTORÍA: CONSORCIO ACI-3B																											

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ESTACION	SOUTH/NTS-362R	30X, 45mm y 1° 30'	EL PASO DE LAS FLORES Y VILLA NUEVA -COTORRA	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	A	A	A	A		I	A	I	A	A	I		A
NIVEL	TOPCON/ATB4	24X, 3mm y 1° 30'	EL PASO DE LAS FLORES Y VILLA NUEVA -COTORRA	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	A	A	A	A		I	A	I	A	A	I		A
MOTONIVELADORA	CHAMPIONS 710A		EL PASO DE LAS FLORES Y VILLA NUEVA -COTORRA	R		R	R	R	R	R	R		R	R	R	R	R	R		R	R	R	R	R	R		R	R	R	R	R	R		R
RETROEXCAVADORA	HITACHI 200 EX		EL PASO DE LAS FLORES Y VILLA NUEVA -COTORRA	A		A	A	A	A	A	A		I	I	I	I	A	A		I	I	A	A	A	A		A	I	I	I	A	I		A
BOBCAT	CAT 246B		EL PASO DE LAS FLORES Y VILLA NUEVA -COTORRA	A		A	A	A	A	A	A		I	I	I	I	I	I		I	I	I	A	A	A		I	A	I	I	A	I		A
VOLQUETA TLA -345	INTERNATIONAL	18 M3	EL PASO DE LAS FLORES Y VILLA NUEVA -COTORRA	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I
VOLQUETA TLA -346	INTERNATIONAL	18M3	EL PASO DE LAS FLORES Y VILLA NUEVA -COTORRA	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	A	A	A	A		I	I	I	I	I	I		I
VOLQUETA TLA -232	INTERNATIONAL	18M3	EL PASO DE LAS FLORES Y VILLA NUEVA -COTORRA	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I
VOLQUETA TLA -318	INTERNATIONAL	18M3	EL PASO DE LAS FLORES Y VILLA NUEVA -COTORRA	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I
VOLQUETA QED -072	DODGE	7M3	EL PASO DE LAS FLORES Y VILLA NUEVA -COTORRA	I		A	A	A	A	A	A		I	I	I	I	A	A		I	I	A	A	A	A		A	A	I	I	A	I		A
VIBRO COMPACTADOR	VIBRO COMPACTADOR	8 TONELADAS	EL PASO DE LAS FLORES Y VILLA NUEVA -COTORRA	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				11		11	11	11	11	11	11		11	11	11	11	11	11		11	11	11	11	11	11		11	11	11	11	11	11		11
TOTAL ACTIVO				2		3	3	3	3	3	3		0	0	0	0	2	2		0	0	5	5	5	5		2	4	0	2	5	0		5
TOTAL EN REPARACIÓN				1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1
TOTAL INACTIVO				8		7	7	7	7	7	7		10	10	10	10	8	8		10	10	5	5	5	5		8	6	10	8	5	10		5

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	286	100%	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	42	15%	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	26	9%	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	198	69%	

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</p> <p style="text-align: center;">PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</p> <p style="text-align: center;">MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</p> <p style="text-align: center;">MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA</p>	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA	31/10/2022 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: En este periodo el contratista inicio labores de obras con la maquinaria de los cuales ha presentado un vibro compactador de 8 toneladas y no adecuado para las labores ya q es un vibro arrastrado por un tractor, esta observacion se le hizo al contratista por medio de oficios solicitando el cambio de este. en cuanto a las reparaciones q se presentan son reparaciones leves como cambio de mangueras y cambios de aceites hidraulicos

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
 Nombre: Roberto Antonio Moreno Paez
 Residente de Obra
 Matrícula Profesional No.: 2520250945CND

Firma
 Nombre: Libardo Antonio Arteaga Hernández
 Residente de Interventoría
 Matrícula Profesional No.: 22202-273816COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901558600	3	CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO VIAL	CL 35 8 04	MONTERIA-CORDOBA	3232882727	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2022-08	2022-09	1000000989	9441120694	E	2022/09/02	2022/10/06	BANCO BOGOTA	\$3,014,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 3839091	ALDANA ALDANA ARMANDO DAVID	231001	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS002	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF16	30	\$1,200,000	\$48,000	14-4	30	\$1,200,000	\$83,600	30	\$0	\$0
2	CC 1062676214	ARTEAGA GONZALEZ OSCAR LUIS	231001	6	\$200,000	\$32,000	EPS040	6	\$200,000	\$8,000	CCF16	6	\$200,000	\$8,000	14-4	6	\$200,000	\$14,000	6	\$0	\$0
3	CC 1065006669	BAUTISTA FIGUEROA CARLOS ANDRES	230301	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS002	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF16	30	\$1,200,000	\$48,000	14-4	30	\$1,200,000	\$83,600	30	\$0	\$0
4	CC 78748312	BERROCAL GARCES JHON JADER	231001	3	\$100,000	\$16,000	ESSC07	3	\$100,000	\$4,000	CCF16	3	\$100,000	\$4,000	14-4	3	\$100,000	\$7,000	3	\$0	\$0
5	CC 78754997	BERROCAL GARCES OSCAR ANTONIO	25-14	3	\$100,000	\$16,000	ESSC07	3	\$100,000	\$4,000	CCF16	3	\$100,000	\$4,000	14-4	3	\$100,000	\$7,000	3	\$0	\$0
6	CC 11035460	BORJA PEÑATA EDER	230201	5	\$166,667	\$26,700	EPS037	5	\$166,667	\$6,700	CCF16	5	\$166,667	\$6,700	14-4	5	\$166,667	\$11,700	5	\$0	\$0
7	CC 10981359	CONDE HOYOS LUIS GABRIEL	230301	5	\$166,667	\$26,700	ESSC07	5	\$166,667	\$6,700	CCF16	5	\$166,667	\$6,700	14-4	5	\$166,667	\$11,700	5	\$0	\$0
8	CC 78756095	DORIA JULIO FRANCISCO MIGUEL	231001	5	\$166,667	\$26,700	ESSC07	5	\$166,667	\$6,700	CCF16	5	\$166,667	\$6,700	14-4	5	\$166,667	\$11,700	5	\$0	\$0
9	CC 1062675166	ESPITIA CANTERO YASBLEIDI ESTER	230301	30	\$1,200,000	\$192,000	ESSC07	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF16	30	\$1,200,000	\$48,000	14-4	30	\$1,200,000	\$83,600	30	\$0	\$0
10	CC 15028290	GALEANO JULIO GERMAN GABRIEL	230301	3	\$100,000	\$16,000	ESSC07	3	\$100,000	\$4,000	CCF16	3	\$100,000	\$4,000	14-4	3	\$100,000	\$7,000	3	\$0	\$0
11	CC 1062676661	GALEANO HERNANDEZ JORGE DAVID	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	ESSC07	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF16	30	\$1,000,000	\$40,000	14-4	30	\$1,000,000	\$69,600	30	\$0	\$0
12	CC 6891224	GIRALDO TORRES NICOLAS DE JESUS	230301	3	\$100,000	\$16,000	EPS002	3	\$100,000	\$4,000	CCF16	3	\$100,000	\$4,000	14-4	3	\$100,000	\$7,000	3	\$0	\$0
13	CC 1062675842	GUEVARA CONDE KEIVER	230201	6	\$200,000	\$32,000	ESSC07	6	\$200,000	\$8,000	CCF16	6	\$200,000	\$8,000	14-4	6	\$200,000	\$14,000	6	\$0	\$0
14	CC 10981464	GUZMAN GALVIS CRISTIAN CAMILO	231001	3	\$100,000	\$16,000	ESSC07	3	\$100,000	\$4,000	CCF16	3	\$100,000	\$4,000	14-4	3	\$100,000	\$7,000	3	\$0	\$0
15	CC 7376639	JULIO ESPITIA HERNANDO MIGUEL	231001	3	\$100,000	\$16,000	ESSC07	3	\$100,000	\$4,000	CCF16	3	\$100,000	\$4,000	14-4	3	\$100,000	\$7,000	3	\$0	\$0
16	CC 10981273	LLORENTE MADERA ADRIAN MAURICIO	230301	5	\$166,667	\$26,700	ESSC07	5	\$166,667	\$6,700	CCF16	5	\$166,667	\$6,700	14-4	5	\$166,667	\$11,700	5	\$0	\$0
17	CC 1062679161	LOPEZ ARTEAGA LEONARDO LUIS	230301	3	\$100,000	\$16,000	EPS041	3	\$100,000	\$4,000	CCF16	3	\$100,000	\$4,000	14-4	3	\$100,000	\$7,000	3	\$0	\$0
18	CC 78079730	MADERA LLORENTE JORGE LEONARDO	230301	3	\$100,000	\$16,000	ESSC07	3	\$100,000	\$4,000	CCF16	3	\$100,000	\$4,000	14-4	3	\$100,000	\$7,000	3	\$0	\$0
19	CC 79506681	MORENO PAEZ RODRIGO ANTONIO	230301	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS005	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF16	30	\$1,200,000	\$48,000	14-4	30	\$1,200,000	\$83,600	30	\$0	\$0
20	CC 1062679942	PETRO GALVIS ELAN ELIAS	230301	3	\$100,000	\$16,000	ESSC07	3	\$100,000	\$4,000	CCF16	3	\$100,000	\$4,000	14-4	3	\$100,000	\$7,000	3	\$0	\$0
21	CC 1062677522	PETRO RUBIO LUIS FERNANDO	230301	6	\$200,000	\$32,000	ESSC07	6	\$200,000	\$8,000	CCF16	6	\$200,000	\$8,000	14-4	6	\$200,000	\$14,000	6	\$0	\$0
22	CC 1062682520	PETRO ESPITIA YESID RAFAEL	230301	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS002	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF16	30	\$1,200,000	\$48,000	14-4	30	\$1,200,000	\$83,600	30	\$0	\$0
23	CC 10903030	POSSO VILLALBA LUIS ALBERTO	230301	5	\$166,667	\$26,700	ESSC07	5	\$166,667	\$6,700	CCF16	5	\$166,667	\$6,700	14-4	5	\$166,667	\$11,700	5	\$0	\$0
24	CC 1073813104	RIVERA LOPEZ DANIEL	230201	3	\$100,000	\$16,000	EPS037	3	\$100,000	\$4,000	CCF16	3	\$100,000	\$4,000	14-4	3	\$100,000	\$7,000	3	\$0	\$0
Total Afiliados(24)					\$9,433,335	\$1,509,500			\$9,433,335	\$377,500			\$9,433,335	\$377,500			\$9,433,335	\$658,100		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				24	\$1,509,500	\$47,300	\$0	\$1,556,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	\$298,700	\$9,400	\$0	\$308,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$16,000	\$500	\$0	\$16,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	\$960,100	\$30,000	\$0	\$990,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$234,700	\$7,400	\$0	\$242,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	\$658,100	\$20,600	\$0	\$678,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	24	\$658,100	\$20,600	\$0	\$678,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				24	\$377,500	\$11,800	\$0	\$389,300
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	24	\$377,500	\$11,800	\$0	\$389,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				24	\$377,500	\$12,100	\$0	\$389,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	15	\$158,800	\$5,000	\$0	\$163,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$10,700	\$400	\$0	\$11,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$4,000	\$200	\$0	\$4,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$148,000	\$4,700	\$0	\$152,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$48,000	\$1,500	\$0	\$49,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$8,000	\$300	\$0	\$8,300
TOTAL				24	\$2,922,600	\$91,800	\$0	\$3,014,400

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MNT-IN-15-FR-8	
											VERSIÓN	1	
											PÁGINA	1 DE 2	

										FECHA	31/10/2022 (Día / Mes / Año)	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	---------------------------------	--

UNIDAD EJECUTORA: <u>SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES</u>	DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>CÓRDOBA</u>
---	---------------------------------------

CONTRATO DE OBRA No.: <u>001 de 2022</u>	CONTRATISTA: <u>CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021</u>
MES INFORME MENSUAL: <u>OCTUBRE</u>	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA -
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: <u>2276 DE 2021</u>	PROYECTO: <u>GRUPO 4</u>
	INTERVENTOR: <u>CONSORCIO AGI-3B</u>

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	20220027	CPC 53211	1.3.3	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 2.847.000.210	
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 2.847.000.210

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación	Indicar pago según		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRAS	jun-22	\$ 18.954.796		\$ 18.954.796	-					\$ 2.778.433.729				
2	OBRAS	jul-22	\$ 195.890.321		\$ 195.890.321	-					\$ 2.601.498.204				
3	OBRAS	ago-22	\$ 554.065.978		\$ 554.065.978	-					\$ 2.243.322.547				
TOTALES			\$ 768.911.095		\$ 768.911.095						\$ 2.028.477.430				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTA 1	\$ 18.954.796		\$ 18.954.796
ACTA 2	\$ 195.890.321		\$ 195.890.321
ACTA 3	\$ 554.065.978		\$ 554.065.978
*			
VALOR TOTAL	\$ 768.911.095		\$ 768.911.095

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma: <u>Jesús Martínez</u> Nombre: Jesús Martínez - Rep Legal Director de Obra Matrícula Profesional No.: 22202 - 181579COR	Firma: <u>[Firma]</u> Nombre: Miguel Armando Díaz Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202-12786 CND
--	---

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	1 DE 1

	FECHA	31/10/2022 <small>(Día / Mes / Año)</small>
--	-------	--

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES
 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 001 de 2022
 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2022
 PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4",

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2276 DE 2021
 INTERVENTOR: CONSORCIO ACI-3B

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Seco	X		X	X	X	X	X	X			X		X	X	X			X	X	X	X	X		X	X			X	X		X	21
Lluvias moderadas										X		X														X	X					4
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	1	24	2	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	1	2	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:


 Firma
 Nombre: Roberto Antonio Moreno Paez
 Residente de Obra
 Matrícula Profesional No.: 2520250945CND


 Firma
 Nombre: Libardo Antonio Arteaga Hernandez
 Residente de Interventoría
 Matrícula Profesional No.: 22202-273816COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
VERSIÓN	1
PAGINA	1 DE 1

FECHA	31/10/2022 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------



UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No.: 001 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:	OCTUBRE DE 2022	PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - GRUPO 4"
---------------------------------------	-----------------	------------------	---

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2276 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ACI-3B

[illegible]

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</p> <p style="text-align: center;">PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</p> <p style="text-align: center;">MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA</p> <p style="text-align: center;">RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO</p>							CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
								VERSIÓN	1
								PAGINA	1 DE 1
								FECHA	31/10/2022 (Día / Mes / Año)
OBSERVACIONES: EN ESTE MES EL CONTRATISTA E INTERVENTORIA NO REALIZARON ENSAYOS DE LABAROTARIO									
NOTAS: 1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo. 2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo. 3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad. 4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras. 5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual. 6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.									
Firma  Nombre: Jesus Martinez - Rep Legal Director de Obra Matrícula Profesional No.: 22202 - 181579COR					Firma  Nombre: Miguel Armando Diaz Rivera Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202-12786 CND				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1 DE 2		

	FECHA	31/10/2022	(Día)	(Mes)	(Año)
--	-------	------------	-------	-------	-------

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA
--	--------------------------------

CONTRATO DE OBRA No. 001 de 2022	CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021
----------------------------------	---

OBJETO DEL CONTRATO:
 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE COTORRA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

FECHA DE INICIO: 17 DE FEBRERO DE 2022	
PLAZO INICIAL: 6 MESES	
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE JULIO DE 2022 (Incluye prórrogas y suspensiones)	
VALOR INICIAL: \$ 2.847.000.210	
VALOR ACUMULADO: \$ - (Incluye adiciones)	
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ -	
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ -	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2276 del 2021	INTERVENTOR: CONSORCIO ACI-3B
---	-------------------------------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																											
Cumplimiento	10%	\$ 284.700.021,00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>2022</td> <td colspan="3">30/11/2022</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>2022</td> <td colspan="3">30/11/2022</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>2022</td> <td>31</td> <td>7</td> <td>2025</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>7</td> <td>2022</td> <td>31</td> <td>7</td> <td>2027</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>2022</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2027</td> </tr> </table>	VIGENCIA						Desde			Hasta			1	2	2022	30/11/2022			1	2	2022	30/11/2022			1	2	2022	31	7	2025	31	7	2022	31	7	2027	1	2	2022	1	2	2027
VIGENCIA																																													
Desde				Hasta																																									
1	2	2022		30/11/2022																																									
1	2	2022		30/11/2022																																									
1	2	2022	31	7	2025																																								
31	7	2022	31	7	2027																																								
1	2	2022	1	2	2027																																								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$ 199.290.014,70																																											
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 569.400.042,00																																											
Calidad de Estudios y Diseños	30%	\$ 5.686.439,00																																											
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 854.100.063,00																																											

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 53-44-101019943

Certificado de modificación o anexo No.: _____
 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																									
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	\$ 300.000.000,00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>2022</td> <td>31</td> <td>7</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> </table>	VIGENCIA						Desde			Hasta			1	2	2022	31	7	2022	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
VIGENCIA																											
Desde			Hasta																								
1	2	2022	31	7	2022																						
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																						
Otros																											

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 53-40-101006855 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No.: _____
 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1 DE 2		

	FECHA	31/10/2022		
	(Día)	(Mes)	(Año)	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 284.700.021.00	11	2	2022	30/04/2023		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$ 199.290.014.70	11	2	2022	30/04/2023		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 569.400.042.00	11	2	2022	21	12	2025
Calidad de Estudios y Diseños	30%	\$ 854.100.063.00	21	12	2022	21	12	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 5.686.439.00	10	8	2022	10	8	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 53-44-101019943

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	300,000,000,00	11	2	2022	31	12	2022
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 53-40-101006855

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

- El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
- El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma 

Nombre: Miguel Armando Díaz
 Director de Interventoría
 Matrícula Profesional No.: 25202-12786 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor y Dirección Territorial.


**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MONTERIA			SUCURSAL AGENCIA MONTERIA			COD.SUC 53	NO.PÓLIZA 53-44-101019943	ANEXO 3
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
05 08 2022	11 02 2022		00:00	10 08 2027		23:59	ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.558.600-3
DIRECCIÓN: CL 35 8 A 04	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA TELÉFONO: 3232862727

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE COTORRA	IDENTIFICACIÓN NIT: 812.001.675-1
DIRECCIÓN: CALLE 15 NRO 6-165 BARRIO DEL CARMEN	CIUDAD: COTORRA, CORDOBA TELÉFONO: 7748055

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO, REFERENTE A MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE COTORRA DEPARTAMENTO DE CORDOBA. CONTRATO No 001-2022

ASEGURADO/BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE COTORRA E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/02/2022	30/04/2023	\$284,700,021.00	\$284,700,021.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	11/02/2022	30/04/2023	\$199,290,014.70	\$199,290,014.70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11/02/2022	21/12/2025	\$569,400,042.00	\$569,400,042.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$854,100,063.00	\$854,100,063.00
CALIDAD DEL SERVICIO	10/08/2022	10/08/2027	\$5,686,439.00	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA ADICIÓN EN TIEMPO DE ACUERDO A PRORROGA No 1

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****591,669.00	\$ *****8,000.00	\$ *****113,937.00	\$ *****713,606.00	\$ *****1,913,176,579.70	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SOC CONSULTORES LTDA	194675	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELÉFONO: 7813230 - MONTERIA

53-44-101019943

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 96-26 BOGOTÁ D.C. TELÉFONO: 2186077

ANDREAPAVARES

1



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MONTERIA			SUCURSAL AGENCIA MONTERIA			COD.SUC 53		NO.PÓLIZA 53-44-101019943		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 05 08 2022			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 11 02 2022			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 10 08 2027		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.558.600-3					
DIRECCIÓN: CL 35 8 A 04								CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA				TELÉFONO: 3232862727	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE COTORRA								IDENTIFICACIÓN NIT: 812.001.675-1					
DIRECCIÓN: CALLE 15 NRO 6-185 BARRIO DEL CARMEN								CIUDAD: COTORRA, CORDOBA				TELÉFONO: 7748055	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :
NOMBRE
AZ CIVIL S.A.S
4L INGENIERIA S.A.S

IDENTIFICACION	PARTICIPACION
900849836-1	60.00
901144628-1	40.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELÉFONO: 7813230 - MONTERIA

53-44-101019943

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

ANDREAPAYARES

2



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MONTERIA			SUCURSAL AGENCIA MONTERIA			COD.SUC 53	NO.POLIZA 53-40-101006855	ANEXO 3
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 05 08 2022			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 11 02 2022			A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 31 12 2022	
						A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.558.600-3
DIRECCIÓN: CL 35 8 A 04	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA
TELÉFONO: 3232862727	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE COTORRA	IDENTIFICACIÓN NIT: 812.001.675-1
DIRECCIÓN: CALLE 15 NRO 6-165 BARRIO DEL CARMEN	CIUDAD: COTORRA, CORDOBA
TELÉFONO: 7748055	
BENEFICIARIO: 812001675 - MUNICIPIO DE COTORRA	

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :
NOMBRE
AZ CIVIL S.A.S
4L INGENIERIA S.A.S

IDENTIFICACION	PARTICIPACION
900849836-1	60.00
901144628-1	40.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-40-101006855

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zaramb B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

ANDREAPAYARES



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO**

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MONTERIA				SUCURSAL AGENCIA MONTERIA				COD.SUC 53		NO.PÓLIZA 53-40-101006855		ANEXO 3		
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS	VIGENCIA HASTA			A LAS	TIPO MOVIMIENTO			
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO			HORAS	DÍA MES AÑO			HORAS				
05 08 2022			11 02 2022			00:00	31 12 2022			23:59	ANEXO DE PRORROGA			

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021							IDENTIFICACIÓN NIT: 901.558.600-3		
DIRECCIÓN: CL 35 8 A 04	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA							TELÉFONO: 3232862727		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		MUNICIPIO DE COTORRA			IDENTIFICACIÓN NIT: 812.001.675-1		
DIRECCIÓN: CALLE 15 NRO 6-165 BARRIO DEL CARMEN				CIUDAD: COTORRA, CORDOBA		TELÉFONO 7748055	
BENEFICIARIO: 812001675 - MUNICIPIO DE COTORRA				ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL ASEGURADO POR DAÑOS MATERIALES Y LESIONES PERSONALES CAUSADOS A TERCEROS DURANTE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA Y QUE SUCEDAN DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL AFIANZADO, EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2341 DE NUESTRO CÓDIGO CIVIL, REFERENTE A MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE COTORRA DEPARTAMENTO DE CORDOBA. CONTRATO No 001-2022

ASEGURADO: MUNICIPIO DE COTORRA E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

BENEFICIARIOS: MUNICIPIO DE COTORRA E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/02/2022	31/12/2022	\$300,000,000.00	\$300,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/02/2022	31/12/2022	\$30,000,000.00	\$30,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/02/2022	31/12/2022	\$30,000,000.00	\$30,000,000.00

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA ADICION EN TIEMPO DE ACUERDO A PRORROGA No 1

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****260.068.00	\$ *****3.000.00	\$ *****49.983.00	\$ *****313.051.00	\$ *****300.000.000.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SOC CONSULTORES LTDA	194675	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-40-101006855

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2156977

ANDREAPAYARES



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**
NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MONTERIA			SUCURSAL AGENCIA MONTERIA			COD.SUC 53	Nº.PÓLIZA 53-40-101006855	ANEXO 3
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 05 08 2022			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 11 02 2022			A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 31 12 2022	
						A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.558.600-3
DIRECCIÓN: CL 35 8 A 04	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA
	TELÉFONO: 3232862727

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE COTORRA	IDENTIFICACIÓN NIT: 812.001.675-1
DIRECCIÓN: CALLE 15 NRO 6-165 BARRIO DEL CARMEN	CIUDAD: COTORRA, CORDOBA
	TELÉFONO: 7748055
BENEFICIARIO: 812001675 - MUNICIPIO DE COTORRA	

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/02/2022	31/12/2022	\$30,000,000.00	\$30,000,000.00
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/02/2022	31/12/2022	\$30,000,000.00	\$30,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/02/2022	31/12/2022	\$30,000,000.00	\$30,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELÉFONO: 7813230 - MONTERIA

53-40-101006855

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

ANOREAPAYARES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	1 DE 2

FECHA		31/10/2022
		(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 001 de 2022
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE COTORRA DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021

FECHA DE INICIO: 17 DE FEBRERO DE 2022 PLAZO INICIAL: 6 MESES FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE JULIO DE 2022
(Indicar día, mes y año) (Indicando prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2276 del 2021
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI-3B

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI NO APROBADO: SI NO VERSIÓN No. FECHA DE VERSIÓN:

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI NO No. DE AUDITORIAS PROGRAMADAS: FECHA ÚLTIMA AUDITORIA:
 PRESENTO INFORME DE AUDITORIA: SI NO No. DE AUDITORIAS REALIZADAS: FECHA PRÓXIMA AUDITORIA:

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI NO APROBADO: SI NO FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES:

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI NO

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
 La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
 La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:
 No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:
 No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:
 No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:
 No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	
					VERSIÓN	1	
					PÁGINA	1 DE 2	

FECHA		31/10/2022
		(Día) (Mes) (Año)

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título Indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	ESTACION TOPOGRAFICA	SOUTH	NTS-362R	3/09/2022	3/09/2022	3/03/2023	
1	NIVEL TOPOGRAFICO	SOKKIA	B4D	3/09/2022	3/09/2022	3/09/2022	

OBSERVACIONES:

LOS EQUIPOS DE TOPOGRAFIA PRESENTAN SUS CERTIFICACIONES DE CALIBRACION Y PRESENTAN BUEN ESTADO

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Jesús Martínez

Firma

Nombre: Jesús Martínez - Rep Legal
 Director de la Obra
 Matrícula Profesional No.: 22202 - 181579COR

Miguel Armando Díaz Rivera

Firma

Nombre: Miguel Armando Díaz Rivera
 Director de la Interventoría
 Matrícula Profesional No.: 25202-12786 CND

[Firma]

Firma

Nombre: [Nombre]
 Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
 Matrícula Profesional No.: [Matrícula]

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.



CERTIFICACION DE CALIBRACION

FECHA DE ENTRADA DEL EQUIPO: 3 de septiembre del 2022

CLIENTE: NILTON OVIEDO

CEDULA: 1069480644

DATOS DEL EQUIPO	
MARCA: SOUTH	MODELO : NTS-362R
TIPO: ESTACION	SERIAL: 558040

CUMPLE CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES DEL TELESCOPIO	
Aumento	30X
Apertura	45mm
Campo de visión	1°30'

ESPECIFICACIONES DE LA ESTACION	
Mínima lectura angular	1.0Seg.
Precisión angular	5.0Seg.
Distancia mínima focal	0.5m
Rango de alcance con un prisma	3000m
Rango de alcance sin prisma	350m
Rango compensador	+ 3Seg

AJUSTES REALIZADOS

- La estación se chequeo ejes del nivel del plato encontrándose la perpendicularidad
- Se chequeo el nivel ojo de pollo del plato. Coincidiendo con el nivel tubular del mismo y el nivel digital incorporado en el menú de la pantalla
- El hilo horizontal con la horizontal perpendicular al hilo vertical, se transitó el Angulo 0 se encontró el 180 en su respectivo a lineamiento angularmente esta en optima condición de uso
- El nivel del equipo en sus giros de 0°90°180°270°360° grados se encontró en su centro la línea del nivel en sus giros 0°90°180°270°360° grados coincidió al milímetro
- Los tornillos para nivelar el equipo se encuentran en óptimas condiciones de uso
- El tornillo tangencial del equipo se encuentra en óptimas condiciones de uso
- Se chequeo la plomada laser giros 0°90°180°270°360° grados coincidió con el punto

FECHA DE VENCIMIENTO: 3 DE MARZO DEL 2023

X

Aprobado

rechazado

Los equipos por fuera del laboratorio después de los ajustes no se responden por el uso indebido o transporte del mismo.



Marca: SOUTH		Modelo: NTS-362R	
TIPO: ESTACION		SERIAL: 558040	
N° Placa de calibración: 0064			
DATOS DEL COLIMADOR			
Colimador: Hillger and watts	Modelo: TA50	Serial :151160	
Preclalón:0.5Seg	Rango: 10min	Alcance ocular :1.140seg	
Lectura retículo: micrómetro		Distancia máxima 30M a 90 Ft	
TIPO DE MANTENIMIENTO			
Mantenimiento Exterior		Condiciones	
Batería		Aplica	
Chequeo del displaye y del teclado		Aplica	
Cobertura externa		Aplica	
Lente de la plomada óptica		Aplica	
Lentes (ocular - objetivo)		Aplica	
Tornillos tangenciales horizontal y vertical		Aplica	
Mantenimiento Interno		Condiciones	
Ajuste de compensador automático		No Aplica	
Ajuste de plomada óptica o laser		Aplica	
Ajuste del nivel ojo de pollo		Aplica	
Ajuste del nivel tubular		Aplica	
Ajuste del retículo		Aplica	
Ajuste del sistema de enfoque		Aplica	
Colimación del instrumento		No Aplica	
Comprobación /ajuste del hilo vertical y horizontal del retículo		Aplica	
Miras de puntería		Aplica	
Resolución		Aplica	
Tornillos base Nivelante		Aplica	
Condiciones de funcionamiento <u>Excelente</u>			
Novedades presentadas: <u>Ninguna</u>			
Observaciones: _____			

Edgar Augusto Pinto Moreno.
TECNICO DE CALIBRACIÓN

CONTACTO: 3153022628-3157243479



REGIMEN SIMPLIFICADO
NIT: 13743006-1

CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN

FECHA DE ENTRADA DEL EQUIPO: 3 de septiembre del 2022

CLIENTE: NILTON OVIEDO

CEDULA: 1069480644

DATOS DEL EQUIPO	
MARCA: SOKKIA	MODELO: B4D
TIPO: NIVEL	SERIAL: 251959

CUMPLE CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES DEL TELESCOPIO	
Aumento	24X
Apertura	30mm
Campo de visión	1°30

ESPECIFICACIONES DEL NIVEL	
Precisión en mm de nivelación por km. doble	+ 2.0mm
Distancia mínima focal	0.5m
Factor multiplicador de la estadía	100
Rango compensador	+ 15

AJUSTES REALIZADOS

- El eje vertical perpendicular al plato del aparato (nivel) en buenas condiciones
- El nivel del equipo en sus giros de 0 90 180 270 360 grados sé encontró en su centro
- La línea de nivel en sus giros 0 90 180 270 360 grados coincidió al milímetro
- Los tornillos para nivelar el equipo se encuentran óptimas condiciones de uso
- Los tornillos tangenciales del equipo se encuentran en optima condición de uso
- El eje del automático no presenta bloque y está en condiciones óptima.

FECHA DE VENCIMIENTO

03 DE MARZO DE 2023

X

Aprobado

rechazado

Los equipos por fuera del laboratorio después de los ajustes no se responden por el uso indebido o transporte del mismo.



REGIMEN SIMPLIFICADO
NIT: 13743006-1

Marca: SOKKIA		Modelo: B4D
Tipo: NIVEL		Serial: 251929
N° Placa de calibración: EP 0074		
DATOS DEL COLIMADOR		
Collimator: Hillier and watts Precision: 0.00	Modelo: TA50	Serial :151170
Preclalón:0.5seg	Rango: 10min	Alcance ocular :1.140seg
Lectura retículo: micrómetro		Distancia máxima 30M a 90 Ft
TIPO DE MANTENIMIENTO		
Mantenimiento Exterior		Condiciones
Batería		No aplica
Chequeo del displaye y del teclado		No aplica
Cobertura externa		Aplica
Lente de la plomada óptica		No aplica
Lentes (ocular - objetivo)		Aplica
Tornillos tangenciales horizontal y vertical		Aplica
Mantenimiento <i>Interno</i>		Condiciones
Ajuste de compensador automático		Aplica
Ajuste de plomada óptica o laser		No aplica
Ajuste del nivel ojo de pollo		Aplica
Ajuste del nivel tubular		Aplica
Ajuste del retículo		Aplica
Ajuste del sistema de enfoque		Aplica
Colimación del instrumento		Aplica
Comprobación /ajuste del hilo vertical y horizontal del retículo		Aplica
Miras de puntería		Aplica
Resolución		Aplica
Tornillos base nivelante		Aplica
Condiciones de funcionamiento Excelente		
Novedades presentadas: Ninguna		
Observaciones: _____		

Técnico en calibración Tel: 3153022628-3157243479
Edgar Augusto Pinto Moreno



		ALCALDIA MUNICIPAL DE COTORRA SECRETARIA DE PLANEACION PROGRAMA DE INVERSIONES												<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>PÁGINA</div> <div>1</div> <div>DE</div> <div>1</div> </div>							
ALCALDIA MUNICIPAL DE COTORRA		SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL				PROGRAMA DE INVERSIONES REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____												<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>FECHA</div> <div>1</div> <div>8</div> <div>2022</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 0.8em;"> <div>(Día)</div> <div>(Mes)</div> <div>(Año)</div> </div>			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> CONTRATO No.: _____ OBJETO: _____ CONTRATISTA: _____ CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: _____ </div> <div> PLAZO INICIAL: _____ FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: _____ FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): \$ _____ VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (A+B): \$ _____ </div> <div> PLAZO ACUMULADO: _____ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: _____ FECHA DE REANUDACIÓN: _____ VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): \$ _____ </div> </div>																					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> INTERVENIENTE: CONSORCIO ACI 3B </div> <div> LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): _____ </div> </div>																					

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Miles de pesos		Miles de pesos	\$ Valor programado	Enero de 2022	Febrero de 2022	Marzo de 2022	Abril de 2022	Mayo de 2023	Junio de 2022	Julio de 2022	Agosto de 2022	Septiembre de 2023	Octubre de 2023	Noviembre de 2022	Diciembre de 2022	
I. EXPLANACIONES	\$44.751.210	1,00%	\$30.140.733	0,41%													
II. PAVIMENTOS, AFIRMADO, SBO Y BASES	\$2.633.055.071	94,13%	\$288.036.181	0,99%													
III. TRANSPORTE	\$100.814.244	3,60%	\$31.247.034	0,55%													
IV. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	\$16.978.000	0,61%	\$0	0,00%													
VI. CARACTERIZACIÓN VIAL	\$1.750.000	0,06%	\$0	0,00%													
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$ 2.797.388.525,00	100%	\$49.421.948,00														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																	

	%	0,00%	0,00%	0,41%	0,99%	1,00%	2,22%	13,18%	4,00%	4,00%	0,00%	20,24%	45,19%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$0	\$11.448.101	\$27.691.106,60	\$44.751.210	\$52.439.538	\$368.827.719	\$113.221.368	\$168.108.840	\$24.469.738	\$1.264.161.648	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$0	\$11.448.101	\$39.139.208	\$83.885.319	\$146.095.454	\$514.233.164	\$627.454.532	\$740.675.900	\$967.118.638	\$1.633.225.476	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL	VALOR ACTUALIZADO
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$0	\$0
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$0	\$0
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$0	\$0
REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$15.928.400	\$15.928.400
IVA - REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$3.028.396	\$3.028.396
GESTIÓN SOCIAL Y FISCAL (Incluye IVA)	\$0	\$0
GESTIÓN AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	\$30.696.688	\$30.696.688
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	\$49.611.885	\$49.611.885
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$2.847.000.210	\$2.847.000.210
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')		

NOTAS:

- Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
- El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
- El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
- El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
- El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
- El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
- Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

Firma: _____

Nombre: JESUS ALBERTO MARTINEZ PAOLLA

Representante legal o apoderado del Contratista

Firma: _____

Nombre: CONSORCIO ACI 3B

Interventoría

Firma: _____



Nombre: LUIS CARLOS GALEANO GUZMAN (e)


Secretaría de planeación e infraestructura - Cotorra

Id		Modo de tarea	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	1 ago '22														8 ago '22							15 ago '22			
							D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J						
1			EXPLANACIONES	115,5 días	lun 1/08/22	lun 19/12/22																									
2			Excavaciones varias en material común en seco.	45 días	jue 20/10/22	mié 14/12/22																									
3			Excavación en material común de la explanación y canales	90 días	lun 1/08/22	jue 17/11/22																									
4			Terraplenes	45 días	mar 25/10/22	lun 19/12/22																									
5			PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO PLACAS 3x3	112,5 días	sáb 6/08/22	mié 21/12/22																									
6			Subbase Granular Clase C.	90 días	jue 11/08/22	mar 29/11/22																									
7			Afirmado (Material para Mejoramiento)	90 días	sáb 6/08/22	mié 23/11/22																									
8			Pavimento de concreto hidraulico modulo de rotura 38 MPa	100 días	mar 16/08/22	jue 15/12/22																									
9			Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm ² (60.000 PSI).	100 días	mar 16/08/22	jue 15/12/22																									
10			Bordillo de Piezas Prefabricadas de Concreto; incluye la preparacion de la superficie de apoyo	45 días	jue 27/10/22	mié 21/12/22																									
11			TRANSPORTE	24 días	jue 17/11/22	vie 16/12/22																									
12			Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m).	24 días	jue 17/11/22	vie 16/12/22																									


Tareas críticas		Resumen del proyecto		Informe de resumen manual	
División crítica		Tarea crítica resumida		Resumen manual	
Tarea		División crítica resumida		solo el comienzo	
División		Tarea inactiva		solo fin	
Hito		Hito inactivo		Tareas externas	
Margen de demora		Resumen inactivo		Hito externo	
Atraso		Tarea manual		Fecha límite	
Resumen		solo duración		Progreso	

Id		Modo de tarea	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	D	1 ago '22							D	8 ago '22							D	15 ago '22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								L	M	X	J	V	S	L		M	X	J	V	S	L	M		X	J																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
13			SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	8 días	jue 22/12/22	sáb 31/12/22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				


Tareas críticas		Resumen del proyecto		Informe de resumen manual	
División crítica		Tarea crítica resumida		Resumen manual	
Tarea		División crítica resumida		solo el comienzo	
División		Tarea inactiva		solo fin	
Hito		Hito inactivo		Tareas externas	
Margen de demora		Resumen inactivo		Hito externo	
Atraso		Tarea manual		Fecha límite	
Resumen		solo duración		Progreso	

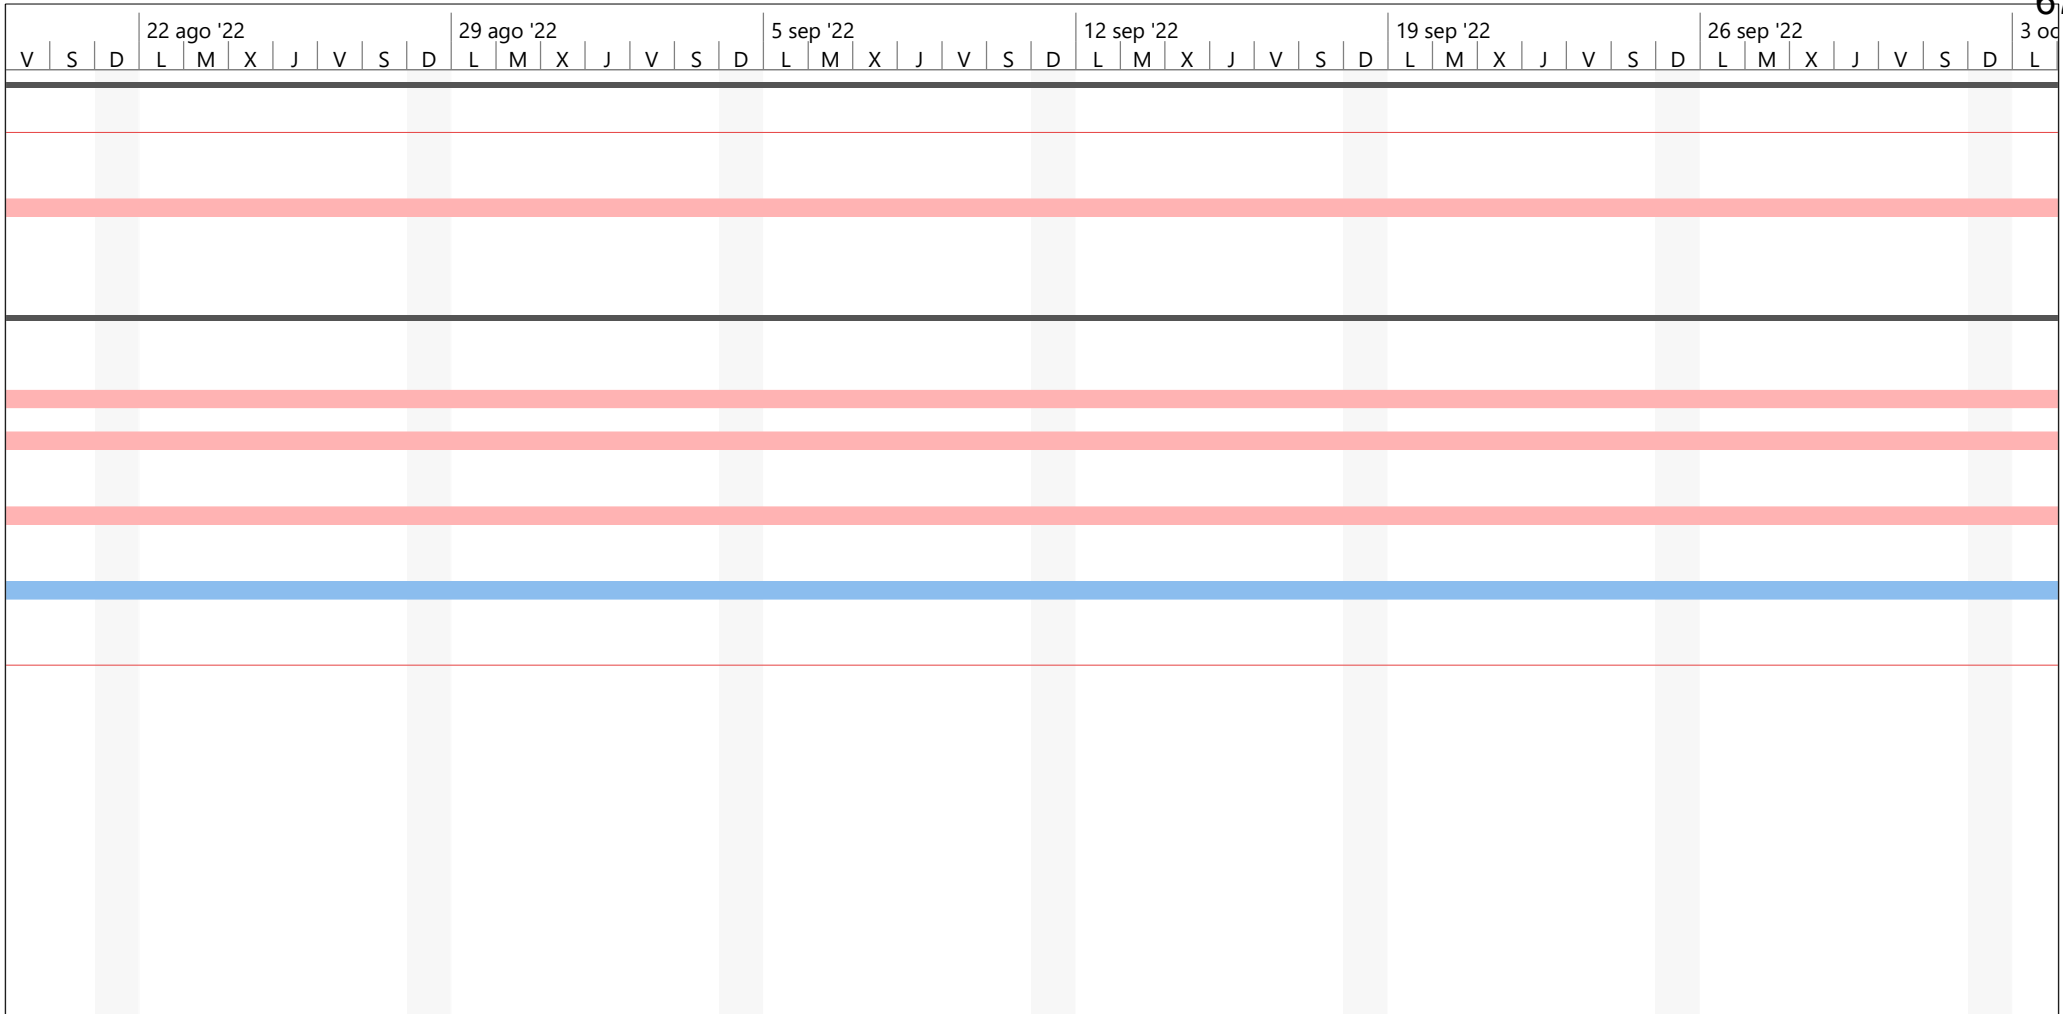


Tareas críticas		Resumen del proyecto		Informe de resumen manual	
División crítica		Tarea crítica resumida		Resumen manual	
Tarea		División crítica resumida		solo el comienzo	
División		Tarea inactiva		solo fin	
Hito		Hito inactivo		Tareas externas	
Margen de demora		Resumen inactivo		Hito externo	
Atraso		Tarea manual		Fecha límite	
Resumen		solo duración		Progreso	



Tareas críticas		Resumen del proyecto		Informe de resumen manual	
División crítica		Tarea crítica resumida		Resumen manual	
Tarea		División crítica resumida		solo el comienzo	
División		Tarea inactiva		solo fin	
Hito		Hito inactivo		Tareas externas	
Margen de demora		Resumen inactivo		Hito externo	
Atraso		Tarea manual		Fecha límite	
Resumen		solo duración		Progreso	

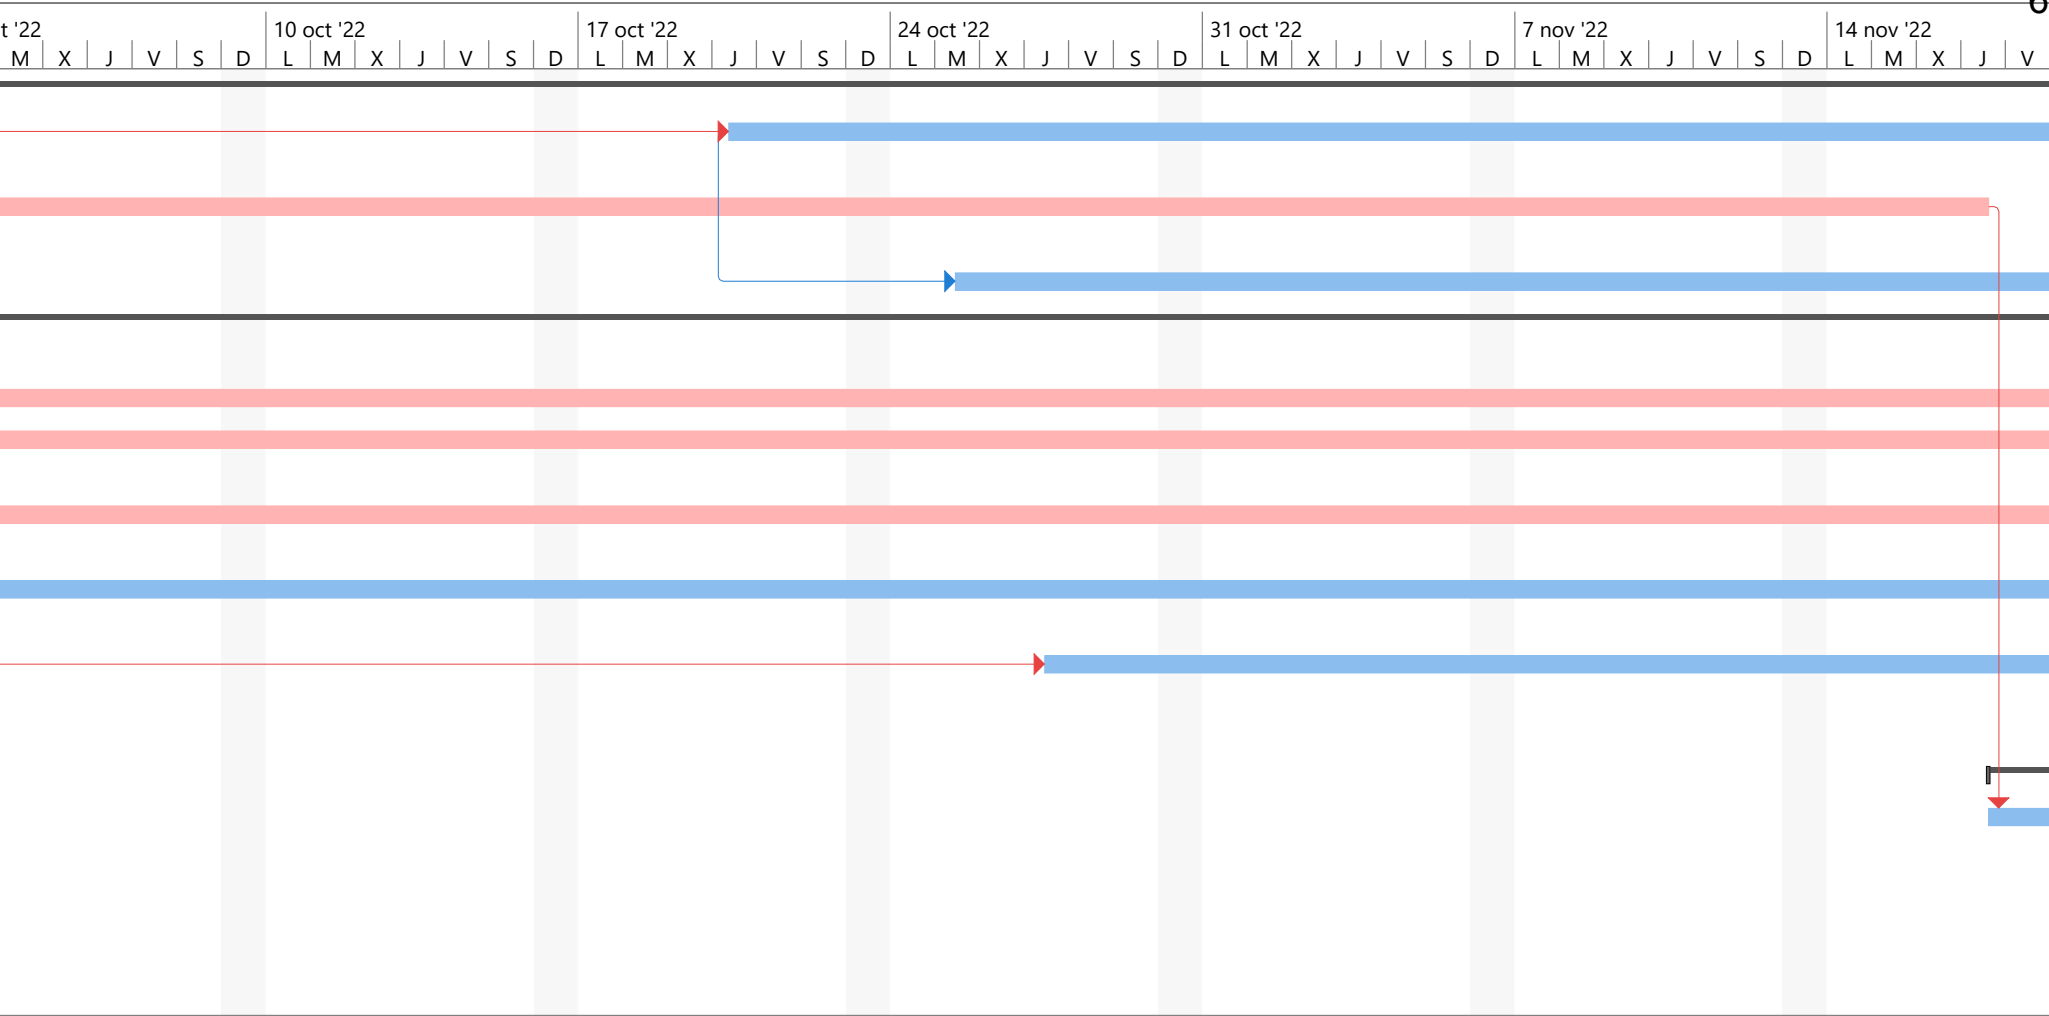

Tareas críticas		Resumen del proyecto		Informe de resumen manual	
División crítica		Tarea crítica resumida		Resumen manual	
Tarea		División crítica resumida		solo el comienzo	
División		Tarea inactiva		solo fin	
Hito		Hito inactivo		Tareas externas	
Margen de demora		Resumen inactivo		Hito externo	
Atraso		Tarea manual		Fecha límite	
Resumen		solo duración		Progreso	

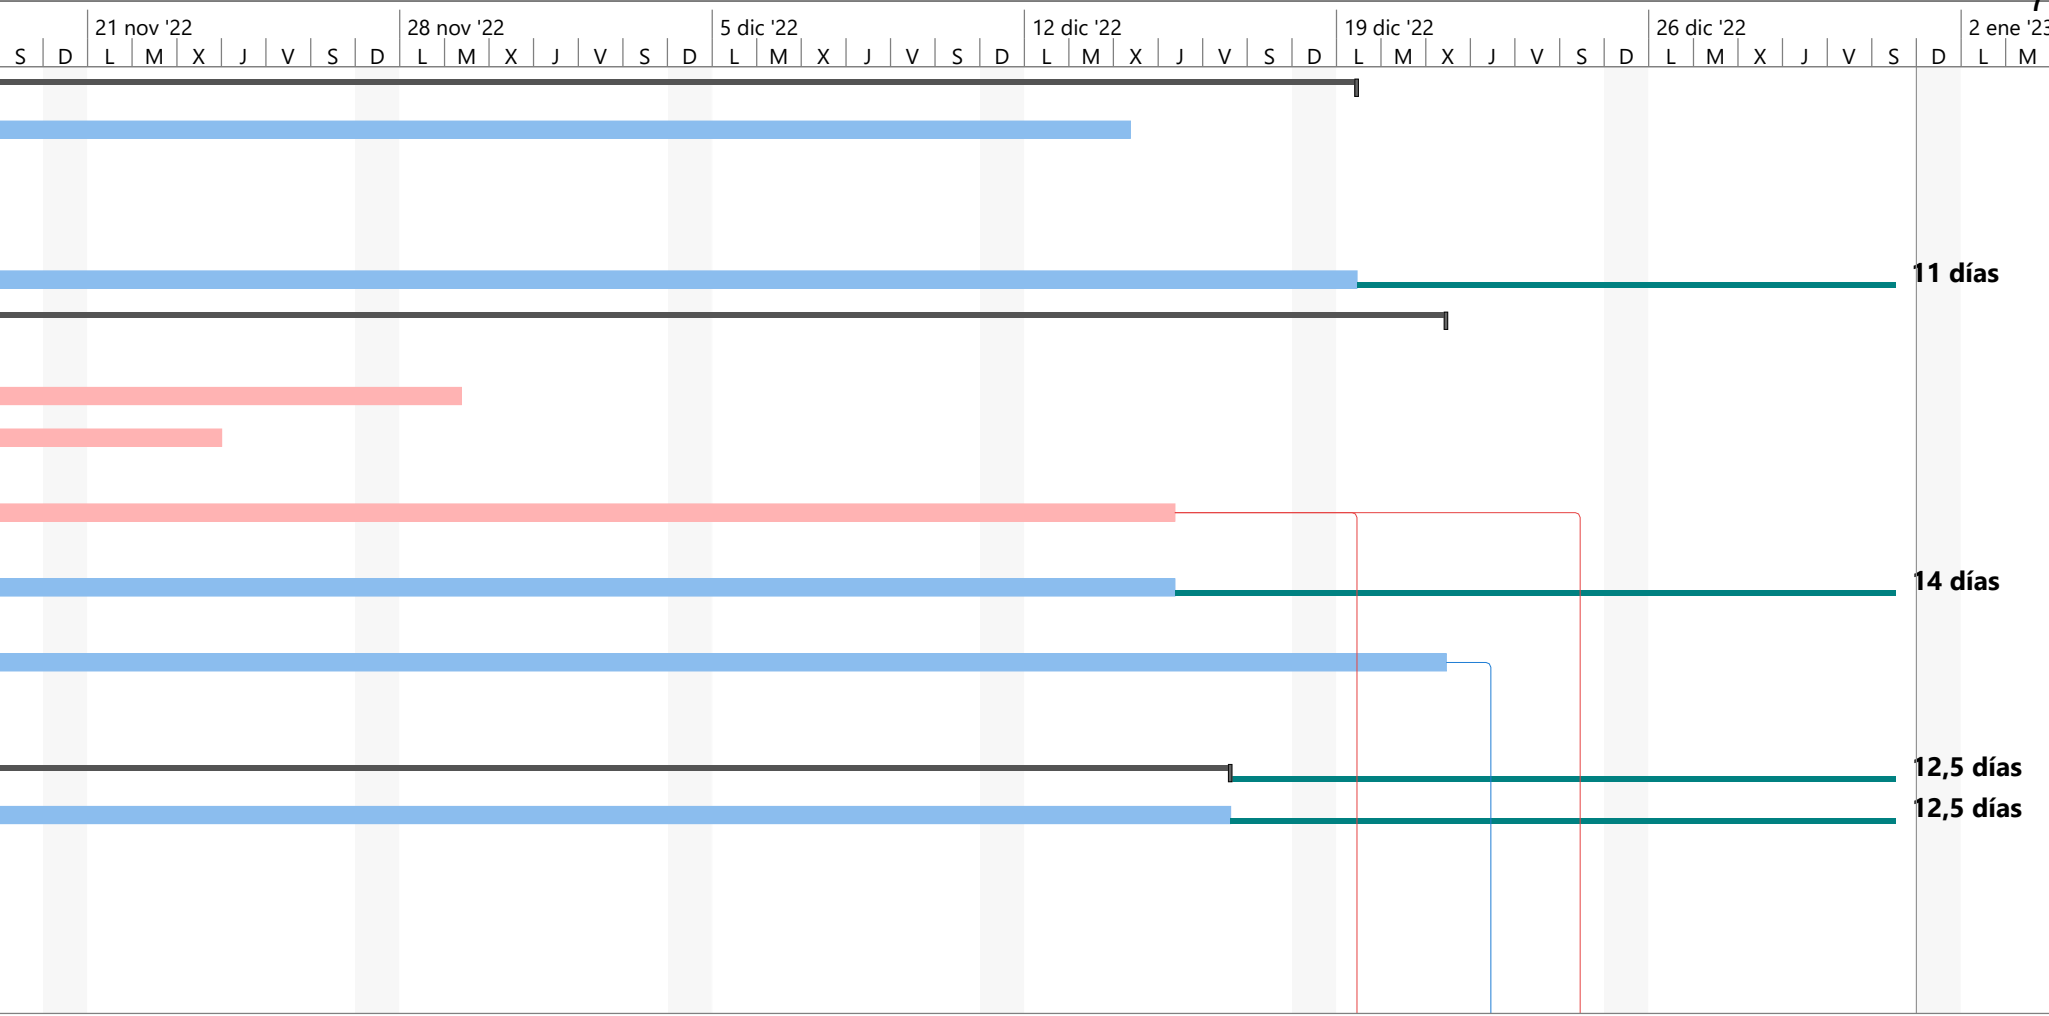

Tareas críticas		Resumen del proyecto		Informe de resumen manual	
División crítica		Tarea crítica resumida		Resumen manual	
Tarea		División crítica resumida		solo el comienzo	
División		Tarea inactiva		solo fin	
Hito		Hito inactivo		Tareas externas	
Margen de demora		Resumen inactivo		Hito externo	
Atraso		Tarea manual		Fecha límite	
Resumen		solo duración		Progreso	

Tareas críticas		Resumen del proyecto		Informe de resumen manual	
División crítica		Tarea crítica resumida		Resumen manual	
Tarea		División crítica resumida		solo el comienzo	
División		Tarea inactiva		solo fin	
Hito		Hito inactivo		Tareas externas	
Margen de demora		Resumen inactivo		Hito externo	
Atraso		Tarea manual		Fecha límite	
Resumen		solo duración		Progreso	

Aprobada Firma: Jesus Al
Nombre: JESUS ALBERTO MARTINEZ PADILLA
Representante legal del Contratista

Aprobada Firma: Miguel Armando Diaz
Nombre: Miguel Armando Diaz
Director de Interventoria

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

	FECHA	31-oct-22 <small>(Día / Mes / Año)</small>
--	-------	---

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA																															
PERIODO / MES INFORME MENSUAL: oct-22	PROYECTO: P65- INTERVENTORÍA VÍAS CÓRDOBA - GRUPO 4																														
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2276 DE 2021	INTERVENTORÍA: CONSORCIO ACI-3B																														
CONTRATO DE OBRA No. 172-180-181 DE 2021, 001 DE 2022	CONTRATISTA: ING.DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA, CONSORCIOEYR019, CONSORCIO CRT PROGRESA, CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021																														

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES OCTUBRE																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CAMIONETA	CAMIONETA DOBLE CABINA, PLACA UGU681, MARCA TOYOTA, CILINDRAJE 2494, MODELO 2015	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A
ESTACIÓN PARA TOPOGRAFIA	MARCA SOKKIA SET 6 SERIE D22852	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A
NIVEL	MARCA TOPCOM, MODELO AT-B4, SERIE MZ 9945	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A
MOTOCICLETA	MARCA AKT ENDURO, PLACA ASX-48G, CILINDRAJE 200, MODELO 2022	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A
MOTOCICLETA	MARCA HONDA, CILINDRAJE 162 CC MODELO 2022	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A
MAQUINA ENSAYOS A LA COMPRESIÓN	MARCA RYR, MODELO SG-BM, SERIE 162070	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A
DIAL ANALOGO BAKER	MARCA BAKER, MODELO ANALOGO, SERIE UDD996, UTK308	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A
HUMEDOMETRO TIPO SPEEDY PINZUAR	MARCA PINZUAR, MODELO TYPE D1	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A
BALANZA DIGITAL TRUMAX	MARCA TRUMAX, MODELO MIX-A, YS 202725	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA	31-oct-22 <small>(Día / Mes / Año)</small>
-------	---

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma 

Nombre: MIGUEL ARMANDO DIAZ RIVERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-12786 CND

Firma 

Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. :22202097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA														CÓDIGO	MEPH-MN1-IN-15-FR-7	
															VERSIÓN	1	
															PÁGINA		

FECHA																31/10/2022 (Día / Mes / Año)	
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--

UNIDAD EJECUTORA <u>SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES</u>	<u>CORDOBA</u>		
---	----------------	--	--

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: <u>2276 DE 2021</u>	INTERVENOR: <u>CONSORCIO ACI-3B</u>		
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: <u>oct-22</u>	PROYECTO: <u>P65- INTERVENTORIA VIAS CORDOBA - GRUPO 4</u>		
CONTRATO DE OBRA No.: <u>172 DE 2021, 181 DE 2021, 180 DE 2021 Y 001 DE 2022</u>	CONTRATISTA: <u>ING.DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA, CONSORCIO EYR019, CONSORCIO CRT PROGRESA, CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021</u>		
NOMBRE ARL: <u>ARL SURA</u>	NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: <u>COMFACOR</u>		

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL																	
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
						Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	Miguel Armando Díaz Rivera	79.153.481	Director de Interventoría	\$ 6.500.000,00	\$ 6.500.000,00	\$ 452.400	V	NUEVA EPS	9442335840	\$ 260.000,00	PORVENIR	1736939109	\$ 1.040.000	\$ 260.000			
2	Carmelina Rosa Oviedo Ramos	30.581.482	Ingeniero Residente de Interventoría - El Cedro	\$ 4.600.000,00	\$ 4.600.000,00	\$ 288.200	V	NUEVA EPS	9442335840	\$ 182.000,00	PORVENIR	1736939109	\$ 727.900	\$ 177.900			
3	Sergio Javier Solano Almanza	78.760.291	Ingeniero Residente de Interventoría - El Cepillo	\$ 4.600.000,00	\$ 4.600.000,00	\$ 320.200	V	NUEVA EPS	9442335840	\$ 184.000,00	PORVENIR	1736939109	\$ 736.000	\$ 184.000			
4	Carlos Milan Carvajal Pinto	1.047.387.270	Ingeniero Residente de Interventoría - Martínez	\$ 4.600.000,00	\$ 4.600.000,00	\$ 320.200	V	SANITAS	9442335840	\$ 184.000,00	COLPENSIONES	1736939109	\$ 736.000	\$ 184.000			
5	Libardo Antonio Arteaga Hernandez	78.077.318	Ingeniero Residente de Interventoría	\$ 4.600.000,00	\$ 4.600.000,00	\$ 320.200	V	NUEVA EPS	9442335840	\$ 184.000,00	PROTECCION	1736939109	\$ 736.000	\$ 184.000			
6	Nohemi Sofia Padron Torres	1.065.004.889	Ingeniero Residente de Interventoría	\$ 2.898.000,00	\$ 2.898.000,00	\$ 202.800	V	NUEVA EPS	9442335840	\$ 116.600,00	PORVENIR	1736939109	\$ 466.200	\$ 116.600			
7	Said Mauricio Soto Martinez	1.071.357.798	Ingeniero Auxiliar	\$ 3.200.000,00	\$ 3.200.000,00	\$ 222.800	V	SALUD TOTAL	9442335840	\$ 128.000,00	PROTECCION	1736939109	\$ 512.000	\$ 128.000			
8	Lina Maria Ramos Benavides	1.071.355.692	Ingeniero Auxiliar	\$ 3.200.000,00	\$ 3.200.000,00	\$ 222.800	V	MUTUAL SER	9442335840	\$ 128.000,00	PORVENIR	1736939109	\$ 512.000	\$ 128.000			
N1	Katherine Paola Lopesierra Arteaga	1.073.815.505	Profesional Social	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,00	\$ 40.600	V	NUEVA EPS	9442335840	\$ 23.400,00	PORVENIR	1736939109	\$ 93.400	\$ 23.400			
N2	Claudia Marcela Benitez Camacho	1.067.937.483	Profesional Ambiental	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 92.800	V	EPS SURA	9442335840	\$ 53.400,00	COLFONDOS	1736939109	\$ 213.400	\$ 53.400			
8	Franciso Jose Cervantes Velez*	79.123.298	Especialista Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos	\$ 1.575.000,00		\$ -	V	SANITAS	7843512498	\$ 0,00	COLPENSIONES	7843512498	\$ -	\$ -			
9	Andres Felipe Gomez Sanchez*	79.956.763	Especialista en Hidráulica e Hidrología	\$ 1.575.000,00		\$ -	V	SANITAS	1651535821	\$ 0,00	PORVENIR	1651535821	\$ -	\$ -			
10	Victor Antonio Hernandez Gordillo*	73.109.426	Especialista en Estructuras	\$ 1.575.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 41.800,00	V	COMPENSAR EPS	59795902	\$ 500.000,00	COLPENSIONES	59795902	\$ 640.000	\$ -			
11	Néstor Escorcía*	72.179.441	Especialista Ambiental	\$ -		\$ -	V	EPS SURA	9439625452	\$ 0,00	PORVENIR	1637649282	\$ -	\$ -			
						\$ -	V			\$ 0,00			\$ -	\$ -			
12	María José Teheraán Guerra	1.101.819.235	Inspector SST	\$ 2.100.000,00	\$ 2.100.000,00	\$ 146.200	V	NUEVA EPS	9442335840	\$ 84.000,00	PORVENIR	1736939109	\$ 336.000	\$ 84.000			
13	Ivanna Rocio Charrasqui Rivero	1.065.007.803	Secretaria	\$ 1.015.000,00	\$ 1.015.000,00	\$ 3.600	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9442335840	\$ 40.500,00	PORVENIR	1736939109	\$ 161.800	\$ 40.600			

TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES	\$ 49.538.000,00	\$ 48.813.000,00	\$ 2.674.600,00				\$ 2.067.900,00			\$ 6.910.700,00	\$ 1.563.900,00	\$ -	\$ -	
---------------------------------------	------------------	------------------	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	-----------------	------	------	--

El Interventor adjunta la certificación de fecha octubre ^{ok} a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.

2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.

3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes

4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos


7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.

8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.

9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los

10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma



Nombre: MIGUEL ARMANDO DIAZ RIVERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-12786 CND

Firma



Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VIJA DIEGO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA								CÓDIGO	EPI-MN1-IN-15-FR	
									VERSIÓN	1	
									PÁGINA		
									FECHA	31/10/2022 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES										CORDOBA	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 2276 de 2021										INTERVENTOR: CONSORCIO ACI - 3B	
MES INFORME MENSUAL: oct-22										PROYECTO: TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – GRUPO 4	
CONTRATO DE OBRA No: 172 DE 2021, 181 DE 2021, 180 DE 2021 Y 001 DE 2022										CONTRATISTA: DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA - CONSORCIO EYR 019 - CONSORCIO CRT PROGRESA - CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021	
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA											
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor					
2021	1084921	C-2402-0600-12-0-2402041-02	54	Nación	Principal	\$ 242.430.000,00					
2022	280222	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	Nación	Principal	\$ 1.588.100.773,00					
2022	280222	C-2402-0600-12-0-2402112-02	11	Nación	Principal	\$ 100.000.000,00					
TOTAL						1.930.530.773,00					
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 1.930.530.773,00											
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA											
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
C-2402-0600-12-0-2402041-02								\$ 242.430.000,00			
1	ene-22	\$ 456.300,00	\$ 86.697,00	\$ 542.997,00	\$ 542.997,00	\$ 542.997,00	1084921 - 30/12/2021	\$ 241.887.003,00	\$ 1.929.987.776,00		
2	feb-22	\$ 39.956.820,00	\$ 7.591.796,00	\$ 47.548.616,00	\$ 47.548.616,00	\$ 47.548.616,00	1084921 - 30/12/2021	\$ 194.338.387,00	\$ 1.882.439.160,00		
3	mar-22	\$ 61.066.163,00	\$ 11.602.571,00	\$ 72.668.734,00	\$ 72.668.734,00	\$ 72.668.734,00	1084921 - 30/12/2021	\$ 121.669.653,00	\$ 1.809.770.426,00		
4	abr-22	\$ 88.928.160,00	\$ 16.896.350,00	\$ 105.824.510,00	\$ 105.824.510,00	\$ 105.824.510,00	1084921 - 30/12/2021	\$ 15.845.143,00	\$ 1.703.945.916,00		
5	may-22	\$ 13.315.246,00	\$ 2.529.897,00	\$ 15.845.143,00	\$ 15.845.143,00	\$ 15.845.143,00	1084921 - 30/12/2021	\$ -	\$ 1.688.100.773,00		
C-2402-0600-12-0-2402112-02								\$ 100.000.000,00			
5	may-22	\$ 78.131.354,00	\$ 14.844.957,00	\$ 92.976.311,00	\$ 92.976.311,00	\$ 92.976.311,00	280222 - 23/02/2022	\$ 7.023.689,00	\$ 1.595.124.462,00		
6	jun-22	\$ 5.902.260,00	\$ 1.121.429,00	\$ 7.023.689,00	\$ 7.023.689,00	\$ 7.023.689,00	280222 - 23/02/2022	\$ -	\$ 1.588.100.773,00		
C-2402-0600-12-0-2402041-02								\$ 1.588.100.773,00			
6	jun-22	\$ 94.536.797,00	\$ 17.961.992,00	\$ 112.498.789,00	\$ 112.498.789,00	\$ 112.498.789,00	280222 - 23/02/2022	\$ 1.475.601.984,00	\$ 1.475.601.984,00		
7	jul-22	\$ 101.134.200,00	\$ 19.215.498,00	\$ 120.349.698,00	\$ 120.349.698,00	\$ 120.349.698,00	280222 - 23/02/2022	\$ 1.355.252.286,00	\$ 1.355.252.286,00		
8	ago-22	\$ 113.107.700,00	\$ 21.490.463,00	\$ 134.598.163,00	\$ 134.598.163,00	\$ 134.598.163,00	280222 - 23/02/2022	\$ 1.220.654.123,00	\$ 1.220.654.123,00		
9	sep-22	\$ 105.579.070,00	\$ 20.060.023,00	\$ 125.639.093,00	\$ 125.639.093,00	\$ 125.639.093,00	280222 - 23/02/2022	\$ 1.095.015.030,00	\$ 1.095.015.030,00		
10	oct-22	\$ 132.502.830,00	\$ 25.175.538,00	\$ 157.678.368,00	\$ 157.678.368,00	\$ 157.678.368,00	280222 - 23/02/2023	\$ 937.336.662,00	\$ 937.336.662,00		
TOTALES		\$ 834.616.900,00	\$ 158.577.211,00	\$ 993.194.111,00	\$ 993.194.111,00	\$ 157.678.368,00		\$ 937.336.662,00	\$ 937.336.662,00		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS PERSONAL	\$ 704.932.020	\$ 133.937.084	\$ 838.869.104
OTROS COSTOS DIRECTOS	\$ 129.684.880	\$ 24.640.127	\$ 154.325.007
*			
VALOR TOTAL	\$ 834.616.900	\$ 158.577.211	\$ 993.194.111

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

- NOTAS:
- 1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
 - 2. Este formato se diligencia por año.

Firma 
Nombre: MIGUEL ARMANDO DIAZ RIVERA
Director de Interventoría
Matricula No. : 25202-12786 CND


Nombre: NÉSTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matricula Profesional No. 22202097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13																																														
			VERSIÓN	1																																														
			PÁGINA	1 DE 2																																														
			FECHA	31-oct-22 (Día / Mes / Año)																																														
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA																																															
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2276 DE 2021			INTERVENTOR: CONSORCIO ACI-3B																																															
OBJETO DEL CONTRATO:																																																		
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA- GRUPO 4																																																		
FECHA DE INICIO: 31 DE ENERO DE 2022																																																		
PLAZO INICIAL: 6 MESES																																																		
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																		
VALOR INICIAL: \$ 1.930.530.773,00																																																		
VALOR ACUMULADO: \$ - (Incluye adiciones)																																																		
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO																																																		
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																		
<table><tr><th colspan="3">Amparo</th><th colspan="3">% Amparo</th><th colspan="3">Valor Asegurado (\$)</th></tr><tr><td colspan="3">Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">\$ 811.147.384,00</td></tr><tr><td colspan="3">Calidad del servicio</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">\$ 579.159.232,00</td></tr><tr><td colspan="3">Cumplimiento de Servicio</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">\$ 193.053.077,00</td></tr><tr><td colspan="3">Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">\$ 386.106.155,00</td></tr></table>						Amparo			% Amparo			Valor Asegurado (\$)			Buen manejo y correcta inversión del anticipo						\$ 811.147.384,00			Calidad del servicio						\$ 579.159.232,00			Cumplimiento de Servicio						\$ 193.053.077,00			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones						\$ 386.106.155,00		
Amparo			% Amparo			Valor Asegurado (\$)																																												
Buen manejo y correcta inversión del anticipo						\$ 811.147.384,00																																												
Calidad del servicio						\$ 579.159.232,00																																												
Cumplimiento de Servicio						\$ 193.053.077,00																																												
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones						\$ 386.106.155,00																																												
<table><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>27</td><td>ENE</td><td>2022</td><td>1</td><td>MAR</td><td>2023</td></tr><tr><td>29</td><td>AGOS</td><td>2022</td><td>29</td><td>AGOS</td><td>2027</td></tr><tr><td>27</td><td>ENE</td><td>2022</td><td>1</td><td>MAR</td><td>2023</td></tr><tr><td>27</td><td>ENE</td><td>2022</td><td>29</td><td>AGOS</td><td>2025</td></tr></table>						VIGENCIA						Desde			Hasta			27	ENE	2022	1	MAR	2023	29	AGOS	2022	29	AGOS	2027	27	ENE	2022	1	MAR	2023	27	ENE	2022	29	AGOS	2025									
VIGENCIA																																																		
Desde			Hasta																																															
27	ENE	2022	1	MAR	2023																																													
29	AGOS	2022	29	AGOS	2027																																													
27	ENE	2022	1	MAR	2023																																													
27	ENE	2022	29	AGOS	2025																																													
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3237551-6																																																		
Certificado de modificación o anexo No.: (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																		
Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA																																																		
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:																																																		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 2	

	FECHA	31-oct-22
		(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		\$ 811.147.384,00
Calidad del servicio		\$ 579.159.232,00
Cumplimiento de Servicio		\$ 193.053.077,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 386.106.155,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
27	ENE	2022	3	JUL	2023
31	DIC	2022	31	DIC	2027
27	ENE	2022	3	JUL	2023
27	ENE	2022	31	DIC	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma 

Nombre: MIGUEL ARMANDO DIAZ RIVERA
 Director de Interventoría
 Matrícula Profesional No.: 25202-12786 CND

Firma 

Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
 Supervisor Contrato de Interventoría
 Matrícula Profesional No.: 22202097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor y Dirección Territorial.

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR

<i>FECHA DE RECIBO</i>	<i>ASUNTO</i>	<i>RADICADO</i>
2022-10-03	Solicitud entrega de planilla de seguridad social vigente.	SAL-22-016960
2022-10-04	Seguimiento a Acta de Reunión #5 de 27 de septiembre de 2022	SAL-22-017123
2022-10-08	Requerimiento a acta de comité de seguimiento del 27 de septiembre del año en curso	SAL-22-017426
2022-10-11	Atrasos en Ejecución de Actividades	SAL-22-017620
2022-10-13	Requerimiento a Hoja de Vida de Director de Obra	SAL-22-017772
2022-10-18	Requerimiento de Atrasos en Ejecución de Actividades	SAL-22-018086
2022-10-18	Requerimiento #2 a Hoja de Vida de Director de Obra	SAL-22-018087
2022-10-18	Incumplimiento a Compromiso Plan Técnico de Instalación de Bordillos	SAL-22-018089
2022-10-24	Requerimiento ambiental N°2 sobre comité de seguimiento del 27 de septiembre de 2022.	SAL-22-018492
2022-10-25	Solicitud de Diseño Vía Villa Nueva – El Paso de las Flores Cotorra	SAL-22-018532

2022-10-25	Solicitud de Arreglo de Valla Publicitaria del Contrato	SAL-22-018533
2022-10-25	Señalización adecuada en el frente de obra.	SAL-22-018581
2022-10-26	Apremio No. 2	SAL-22-018675
2022-10-28	Solicitud de Plan de Contingencia Atraso de obra	SAL-22-018854



Bogotá D.C., 3 de octubre de 2022

Ingeniero

JESUS ALBERTO MARTINEZ PADILLA

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021

consorciovialcotorra2021@gmail.com

Asunto: Solicitud entrega de planilla de seguridad social vigente.

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

En nuestro seguimiento y Control que realiza esta Interventoría a su Contrato de Obra No 001 de 2022, nos permitimos realizar las siguientes solicitudes.

1. Se solicita realizar la entrega de la planilla de pago de la seguridad social del siguiente personal de la empresa Triple AAA que llevara a cabo las actividades de excavación para la tubería de alcantarillado en este proyecto.

Luis Manuel Mesquida Hoyos, Cedula de Ciudadanía: 1.003.715.874

Julián Güillín Morales, Cedula de Ciudadanía: 78.030.631

Héctor Alfonso Ramírez Issa, Cedula de Ciudadanía: 1.064.997.819

Alberto Jose Peñafiel Hernández, Cedula de Ciudadanía: 1.062.677.178

Royer Felipe Arteaga Mira, Cedula de Ciudadanía: 1.062.678.330

Jacinto Padilla Blanco Fontanero, Cedula de Ciudadanía: 78.035.262

Miber Lugo Jiménez, Cedula de Ciudadanía: 73.800.963

Kevin Andrés Guzmán Espitia, Cedula de Ciudadanía: 1.003.033.963

Fernando Salgado González, Cedula de Ciudadanía: 1.007.298.713

Keider Alberto Hernández Bustamante, Cedula de Ciudadanía: 1.007.588.614

CONSORCIO ACI-3B

2. El personal debe contar en campo con la dotación necesaria como lo es Casco, Gafas, Guantes, Botas de Seguridad, Camisa Manga Larga y Jean sin rotos para llevar acabo la actividad en mención.

Por lo anterior esta Interventoría solicita subsanar esta solicitud una vez recibido este comunicado.

Cordialmente,



Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 2

Anexo:

Nombre anexos:



Bogotá D.C., 4 de octubre de 2022

Ingeniero

JESUS ALBERTO MARTINEZ PADILLA

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021

consorciovialcotorra2021@gmail.com

Asunto: Seguimiento a Acta de Reunión #5 de 27 de septiembre de 2022

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo:

El pasado 27 de septiembre de 2022 se realizó Acta de Reunión #5 al Convenio 929 de 2021 por parte del INVIAS, con asistencia del Contratista e Interventoría, en donde el Consorcio Vial corredores Rurales 2021, se hizo los siguientes compromisos:

Profundización de tubería de alcantarillado para iniciar el día 28 de septiembre de 2022.

1. Reactivación de obra para el día 28 de septiembre de 2022.
2. Entrega de observaciones del PAGA para el día 3 de octubre de 2022.
3. Arreglo de fisuras para el día 3 de octubre de 2022.

Como se pueden observar los compromisos que adquirió el contratista incumpliendo en los siguientes: entrega de observaciones del PAGA y Arreglo de fisuras.

Por lo anterior, solicitamos al Consorcio Vial Corredores Rurales 2021 cumplir con los compromisos adquiridos en el acta de reunión #5, dado que este incumplimiento proporciona iniciar proceso sancionatorio y a la vez liquidación del contrato con sus respectivas multas al contratista, solicitados dentro de los plazos pactados.

Cordialmente,

CONSORCIO ACI-3B

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA

G4

Radicado No. SAL-22-017123

2022-10-04 03:23:33 p. m.



Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 2

Anexo:

Nombre anexos:



Bogotá D.C., 8 de octubre de 2022

Ingeniero

JESUS ALBERTO MARTINEZ PADILLA

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021

consorciovialcotorra2021@gmail.com

Asunto: : Requerimiento a acta de comité de seguimiento del 27 de septiembre del año en curso.

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo.

En cumplimiento a las labores de seguimiento y control ejercidas por esta interventoría al contrato de obra No. 001 de 2022; basados en el comité de seguimiento realizado el 27 de septiembre del año en curso, donde se solicitó de forma reiterativa al contratista Consorcio Vial corredores Rurales 2021 subsanar las observaciones realizadas al PAGA inicial, el día 18 de julio del presente año a través de un oficio con radicado SAL-22011591, en la solicitud de realizar la entrega de los informes de cumplimiento socioambiental a la fecha, y teniendo en cuenta el compromiso adquirido por parte del contratista y consignado en el acta de comité en referencia, relacionado a la entrega del PAGA con las observaciones subsanadas al día lunes 03 de octubre de 2022, compromiso que evidentemente no fue cumplido; esta interventoría se permite realizar el siguiente requerimiento:

El contratista de obra Consorcio Vial corredores Rurales 2021 debe suministrar el PAGA con las observaciones realizadas el 18 de julio del año en curso debidamente subsanadas y los informes de cumplimiento socioambiental que a la fecha no han sido entregados, en un plazo no mayor a (5) días a partir del recibido de este comunicado. En caso de no tener respuesta en el tiempo solicitado se procederá a iniciar proceso sancionatorio con sus respectivas multas.

Cordialmente,

CONSORCIO ACI-3B

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA

G4

Radicado No. SAL-22-017426

2022-10-08 12:08:51 p. m.



Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 2

Anexo:

Nombre anexos:



Bogotá D.C., 11 de octubre de 2022

Ingeniero

JESUS ALBERTO MARTINEZ PADILLA

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021

consorciovialcotorra2021@gmail.com

Asunto: Atrasos en Ejecucion de Actividades

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

Con gran preocupación vemos que las metas y avances propuestas al mes de septiembre no se han cumplido, el día de hoy 11 de octubre apenas se han ejecutado 460 ml de pavimento, cabe recordar que tenían una meta la cual eran hacer 200 ml mas a corte del mes de septiembre para así llegar a 660 ml la cual quedo en compromiso en el acta de comité #7 de fecha 2 de septiembre de 2022 y no se ha cumplido, al igual que la construcción de la alcantarilla que quedo de hacer la alcaldía municipal con apoyo del contratista y la entrega de documentación del PAGA.

Aún más preocupante es que en el mes de septiembre y lo que va del mes de octubre el contratista ha venido sin realizar actividades como lo son: excavaciones, instalación de afirmado y sub base granular, fundidas de concreto e instalación de bordillo prefabricados, le agradecemos de antemano nos informen los motivos y el por que no han reiniciado estas actividades.

Los invitamos a reactivar las actividades para que no se vaya ver afectado el tiempo de ejecución de la obra.

Por lo anterior esta interventoria solicita al Consorcio Vial Corredores Rurales Cotorra 2021 su pronta respuesta y toma de medidas sobre el asunto en 2 días de haber recibido este comunicado.

Cordialmente,

CONSORCIO ACI-3B

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA

G4

Radicado No. SAL-22-017620

2022-10-11 05:33:13 p. m.



Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 2

Anexo:

Nombre anexos:



Bogotá D.C., 13 de octubre de 2022

Ingeniero

JESUS ALBERTO MARTINEZ PADILLA

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021

consorciovialcotorra2021@gmail.com

Asunto: Requerimiento a Hoja de Vida de Director de Obra

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo:

En nuestro seguimiento y control que realiza esta interventoría a su contrato de Obra No. 001 de 2021, nos permitimos realizar el siguiente requerimiento.

El pasado 14 de septiembre de 2022 mediante oficio SAL-22-015610 y 21 de septiembre mediante oficio SAL-22-016120 se realizaron requerimientos de la Hoja de Vida del Cambio de director de obra al Consorcio Vial Corredores Rurales Cotorra 2021.

Como se puede observar el contratista hasta la fecha no se ha pronunciado ni ha enviado la hoja de vida para su respectiva revisión por esta interventoría, incumplió con la entrega de esta, esto debido a que el pasado 5 de septiembre renunció el que estaba y se solicitó presentar la nueva hoja de vida del remplazo ya que la obra no puede estar sin este profesional.

Por lo anterior esta interventoría solicita remitir la información requerida en un plazo no mayor a (2) días del recibido de este comunicado, de no tener respuesta en el tiempo solicitado se procederá a iniciar proceso sancionatorio con sus respectivas multas al contratista.

Cordialmente,

CONSORCIO ACI-3B

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA

G4

Radicado No. SAL-22-017772

2022-10-13 10:20:50 a. m.



Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 2

Anexo:

Nombre anexos:

The logo for Consorcio ACI-3B features the text "CONSORCIO ACI-3B" in a bold, blue, sans-serif font. The letters are slightly shadowed, giving it a three-dimensional appearance. The logo is set against a white background with a thin blue horizontal line above it.

Bogotá D.C., 18 de octubre de 2022

Ingeniero
JESUS ALBERTO MARTINEZ PADILLA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021
consorciovialcotorra2021@gmail.com

Asunto: Requerimiento de Atrasos en Ejecucion de Actividades

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

En pasado 11 de octubre se envió un oficio con referencia SAL-22-017620, del cual a la fecha no se ha pronunciado el contratista, esta interventoria ve con gran preocupación que las metas y avances propuestas al mes de septiembre y lo que va del mes de octubre no se han cumplido, el día de hoy 18 de octubre apenas se han ejecutado 460 ml de pavimento, cabe recordar que tenían una meta la cual era hacer 200 ml mas a corte del mes de septiembre para así llegar a 660 ml la cual quedó en compromiso en el acta de comité #7 de fecha 2 de septiembre de 2022 y no se ha cumplido, al igual que la construcción de la alcantarilla que quedó de hacer la alcaldía municipal con apoyo del contratista y la entrega de documentación del PAGA.

Aún más preocupante es que en el mes de septiembre y lo que va del mes de octubre el contratista ha venido sin realizar actividades como lo son: excavaciones, instalación de afirmado y sub base granular, fundidas de concreto e instalación de bordillo prefabricados, le agradecemos de antemano nos informen los motivos y el por que no han reiniciado estas actividades.

Los invitamos a reactivar las actividades para que no se vaya ver afectado el tiempo de ejecución de la obra.

Cordialmente,

CONSORCIO ACI-3B

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA

G4

Radicado No. SAL-22-018086

2022-10-18 06:34:45 p. m.



Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 2

Anexo:

Nombre anexos:

The logo for Consorcio ACI-3B features the text "CONSORCIO ACI-3B" in a bold, blue, sans-serif font. The letters are slightly shadowed, giving it a three-dimensional appearance. The background is white.

Bogotá D.C., 18 de octubre de 2022

Ingeniero
JESUS ALBERTO MARTINEZ PADILLA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021
consorciovialcotorra2021@gmail.com

Asunto: Requerimiento #2 a Hoja de Vida de Director de Obra

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo:

En nuestro seguimiento y control que realiza esta interventoría a su contrato de Obra No. 001 de 2021, nos permitimos realizar el siguiente requerimiento.

Esta interventoría ha venido manifestando requerimientos de la hoja de vida del director de obra al Consorcio Vial Corredores Rurales Cotorra 2021 mediante los siguientes oficios: oficio de referencia SAL-22-015610 de fecha 14 de septiembre de 2022, oficio de referencia SAL-22-016120 de fecha 21 de septiembre de 2022 y oficio de referencia SAL-22-017772.

Como se puede observar el contratista hasta la fecha no se ha pronunciado ni ha enviado la hoja de vida para su respectiva revisión por esta interventoría, incumplió con la entrega de esta, esto debido a que el pasado 5 de septiembre renunció el que estaba y se solicitó presentar la nueva hoja de vida del remplazo ya que la obra no puede estar sin este profesional.

Por lo anterior esta interventoría solicita remitir la información requerida en un plazo no mayor a (1) días del recibido de este comunicado, de no tener respuesta en el tiempo solicitado se procederá a iniciar proceso sancionatorio con sus respectivas multas al contratista.

Cordialmente,

CONSORCIO ACI-3B

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA

G4

Radicado No. SAL-22-018087

2022-10-18 06:40:20 p. m.



Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 2

Anexo:

Nombre anexos:

CONSORCIO ACI-3B

Bogotá D.C., 18 de octubre de 2022

Ingeniero

JESUS ALBERTO MARTINEZ PADILLA

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021

consorciovialcotorra2021@gmail.com

Asunto: Incumplimiento a Compromiso Plan Técnico de Instalación de Bordillos

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

El pasado 22 de septiembre de 2022 el Consorcio Vial Corredores Rurales Cotorra 2021 hizo entrega del Plan Técnico de Instalación de Bordillos Prefabricados corregidos mediante oficio OFI-113 de fecha 22 de septiembre de 2022, esta interventoría avalo y dio visto bueno mediante oficio de referencia SAL-22-016260 de fecha 22 de septiembre de 2022.

El contratista en su Plan Técnico de Instalación de Bordillos Prefabricado debió iniciar a instalar el día 17 de octubre de 2022 y hasta el día de hoy incumplió debido a que no ha iniciado con esta actividad la cual es de carácter urgente ya que se convirtió en un ítem de ruta crítica para el proyecto.

Por lo anterior esta interventoria solicita al Consorcio Vial Corredores Rurales Cotorra 2021 su pronta respuesta y toma de medidas sobre el asunto en 2 dias de haber recibido este comunicado.

Cordialmente,



Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

The logo for Consorcio ACI-3B features the text "CONSORCIO ACI-3B" in a bold, blue, sans-serif font. The letters are slightly shadowed, giving it a three-dimensional appearance. The logo is set against a light blue background with a subtle gradient.

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA

G4

Radicado No. SAL-22-018089

2022-10-18 06:45:57 p. m.

Folios: 2

Anexo:

Nombre anexos:

CONSORCIO ACI-3B

Bogotá D.C., 24 de octubre de 2022

Ingeniero

JESUS ALBERTO MARTINEZ PADILLA

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021

consorciovialcotorra2021@gmail.com

Asunto: Requerimiento ambiental N°2 sobre comité de seguimiento del 27 de septiembre de 2022.

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo.

Por medio del presente, el consorcio ACI-3B ejerciendo sus funciones de interventoría al contrato de obra No. 001 de 2022; y teniendo en cuenta que a la fecha no se tiene respuesta por parte del contratista CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021, sobre el requerimiento ambiental N°1 con radicado N° SAL-22-017426 del 08 de octubre del año en curso; esta interventoría se permite emitir un segundo requerimiento a fin de que el contratista subsane la información relacionada con las correcciones de la versión N°1 del PAGA para el proyecto, a fin de ser evaluadas y poder viabilizar la aprobación del mismo.

De acuerdo a lo anterior, se requiere que la información relacionada en el presente oficio sea allegada por el contratista de obra en un plazo no mayor a tres (03) días hábiles contados partir del recibido del presente comunicado. En caso de no tener respuesta en el tiempo solicitado se procederá a iniciar proceso sancionatorio con sus respectivas multas.

Cordialmente,

Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 1
Anexo:
Nombre anexos:

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este
documento escanee el código QR
24/10/2022 4:07:21 p. m.

The logo for Consorcio ACI-3B features the company name in a bold, blue, sans-serif font. The text is slightly shadowed, giving it a three-dimensional appearance. The logo is positioned in the top left corner of the page.

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA

G4

Radicado No. SAL-22-018492

2022-10-24 04:07:20 p. m.

SEDE COLOMBIA – BOGOTÁ D.C., Carrera 7 No. 156-10 piso 31 Torre Krystal PBX. (571) 7460460 APARTADO AÉREO 250229
E-Mail: info@aciproyectos.com – Web: www.aciproyectos.com

SEDE PERÚ – LIMA, Avenida Benavides No. 1555 Oficina 703, TEL. (511) 2434567 – (511) 6361566 E-Mail: peru@aciproyectos.com –
Web: www.aciproyectos.pe



Bogotá D.C., 25 de octubre de 2022

Ingeniero

JESUS ALBERTO MARTINEZ PADILLA

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021

consorciovialcotorra2021@gmail.com

Asunto: Solicitud de Diseño Vía Villa Nueva – El Paso de las Flores Cotorra

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo;

Por medio de la presente solicito a ustedes nos sean entregados los nuevos diseños de la vía entre absc K0+660 a la K0+000, y el levantamiento del canal existente que se encuentra al lado de esta para revisar y tomar decisiones sobre las cotas y niveles.

Por lo anterior esta interventoría solicita remitir la información requerida en un plazo no mayor a (2) días del recibido de este comunicado, para evitar inconvenientes con el transcurrir del contrato.

Cordialmente,

Miguel Armando Díaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 1

Anexo:

Nombre anexos:

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este
documento escanee el código QR
25/10/2022 8:10:49 a. m.

CONSORCIO ACI-3B

Bogotá D.C., 25 de octubre de 2022

Ingeniero

JESUS ALBERTO MARTINEZ PADILLA

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021

consorciovialcotorra2021@gmail.com

Asunto: Solicitud de Arreglo de Valla Publicitaria del Contrato

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo;

Por medio de la presente solicito a ustedes arreglo de la valla publicitaria del contrato ya que esta se encuentra en el suelo hacen ya varios días, adjunto anexo fotografía del estado actual de la valla.



Por lo anterior solicito a ustedes un plazo no mayor a (2) días del recibido de este comunicado, para evitar inconvenientes con el transcurrir del contrato.

Cordialmente,

Miguel Armando Díaz Rivera
Director De Interventoría

The logo for Consorcio ACI-3B features the text "CONSORCIO ACI-3B" in a bold, blue, sans-serif font. The letters are slightly shadowed, giving it a three-dimensional appearance. The logo is positioned on the left side of the page, above the main content area.

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA

G4

Radicado No. SAL-22-018533

2022-10-25 08:13:49 a. m.

Folios: 2
Anexo:
Nombre anexos:

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este
documento escanee el código QR
25/10/2022 8:13:50 a. m.

Bogotá D.C., 25 de octubre de 2022

Ingeniero

JESUS ALBERTO MARTINEZ PADILLA

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021

consorciovialcotorra2021@gmail.com



Asunto: Señalización adecuada en el frente de obra.

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

En nuestro seguimiento y Control que realiza esta Interventoría a su Contrato de Obra No 001 de 2022, nos permitimos realizar la siguiente solicitud.

Se solicita implementar delineadores tubulares y cinta de peligro en el Absc K0+000 a la k0+660, debido a la excavación que se lleva acabo es necesario canalizar el flujo de peatones que circula por la zona donde se está interviniendo con el fin de evitar que se generen accidentes por las actividades que se están realizando o se lleve a cabo el cierre total de la vía y adecuar una vía alterna para el tránsito de la comunidad.

Como es establecido en el PMT entregado por ustedes:

5.2. MANEJO DE PEATONES Sin duda los peatones son los más vulnerables en la vía para brindar el mayor grado de seguridad y accesibilidad a estos se emplearán los dispositivos que sean necesarios para este fin. En caso de que se requiera canalizar el flujo de peatones que circulara por la zona de donde se esté realizando la obra se debe tener en cuenta:

- La señalización vertical y horizontal de los senderos peatonales los cuales deben estar claramente establecido
- Implementación de senderos peatonales temporales los cuales deben estar debidamente señalizados mediante el uso de delineadores tubulares y cintas plásticas los cuales ayudaran a canalizar los flujos peatonales que transiten por la zona de influencia del proyecto.

Anexo registro fotográfico.



Por lo anterior esta Interventoría solicita subsanar esta solicitud una vez recibido este comunicado.

Cordialmente,



Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 2
Anexo:
Nombre anexos:

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este
documento escanee el código QR
25/10/2022 12:06:56 p. m.




Bogotá D.C., 26 de octubre de 2022

Ingeniero
GUILLERMO LLORENTE PETRO
ALCALDE MUNICIPAL COTORRA
ALCALDIA MUNICIPAL COTORRA
alcalde@cotorra-cordoba.gov.co, contactenos@cotorra-
cordoba.gov.co, consorcioalcotorra2021@gmail.com

Asunto: Apremio No. 2

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo:

En nuestra calidad de Interventores del Contrato de la Referencia, y responsables que se ejecute de acuerdo a lo establecido en los Pliegos de Condiciones, y conforme a sus términos, en cumplimiento de lo establecido en la cláusula de asunto, ponemos en su conocimiento los hechos que a continuación relacionamos que pueden considerarse incumplimientos por parte del Contratista, en lo que se refiere a las obligaciones contractuales previstas en la Cláusula nueve del Contrato en los incisos tres 3 y cuatro 4 : 3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, 4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Fundamentamos esta posición en los siguientes hechos y consideraciones jurídicas:

HECHOS

1. La Alcaldía de Cotorra, mediante Resolución No 308 del 12 de noviembre de 2021 la entidad abrió el Proceso de Contratación número LP-03_2021, y Mediante Resolución No. 377 de 22 diciembre de 2021 la Entidad adjudico el Contrato de Obra N0 001 de 2022 al CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE COTORRA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."
2. Que el valor del Contrato No. 001 de 2022 corresponde a la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ PESOS (\$2.847.000.210, 00) M/TE, incluido IVA
3. El plazo máximo previsto para la ejecución del contrato es de seis (6) meses, se hizo una prórroga de cinco (5) meses.
4. La Orden de inicio del Contrato de Obra fue suscrita el 17 de febrero de 2022, pero con la nueva prórroga el contrato finaliza el 31 de diciembre de 2022.



5. El día 02 de septiembre de 2022 se realizó un comité de obras en el cual quedaron unos compromisos pactados, al igual que los otros compromisos que ellos se hicieron de los cuales hasta la fecha el contratista no ha cumplido en algunos y no ha dado respuesta alguna, a continuación, se describirán los incumplimientos:

- Balance incluido box coulvert
- Pavimentar 200m de pavimento
- Observaciones del PAGA
- Requerimiento de Hoja de Vida director de Obra
- Incumplimiento al Plan Técnico de Bordillos Instalación
- Requerimiento de Atrasos en Ejecución de Actividades
- El Contratista no esta asistiendo a los comités de obras ni reuniones citadas por esta interventoría.

6. La Interventoría en repetidas oportunidades ha venido manifestando por medio de oficios en reiteradas ocasiones su preocupación por el buen avance de la obra a continuación de los siguientes oficios y comité de obra:

- SAL-22-015049 del 7 de septiembre de 2022
- SAL-22-015393 del 12 de septiembre de 2022
- SAL-22-015395 del 12 de septiembre de 2022
- SAL-22-012401 del 12 de septiembre de 2022
- Comité de Obra #6 del 2 de septiembre de 2022
- SAL-22-015615 del 14 de septiembre de 2022
- SAL-22-017620 del 11 de octubre de 2022
- SAL-22-017772 del 13 de octubre de 2022
- SAL-22-018086 del 18 de octubre de 2022
- SAL-22-018087 del 18 de octubre de 2022
- SAL-22-018089 del 18 de octubre de 2022

7. Como se puede ver, la Interventoría en lo que va transcurrido de la ejecución del Contrato de la Referencia, ha comunicado al CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021 en repetidas ocasiones, mediante oficios relacionados, para que se tomen las acciones y tener una buena comunicación y ejecución del proyecto y que de no hacerlo esta Interventoría procedería a dar inicio al proceso sancionatorio previsto en el Contrato de la Referencia por incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales.

En resumen, esta Interventoría considera que la falta de respuesta y ejecución por parte del CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021 de las actividades correspondientes, ha incurrido en omisión y sumado al hecho que no se observa un verdadero compromiso por parte del Contratista en tomar acciones, esto a criterio de esta Interventoría genera un total incumplimiento del Contratista respecto a sus obligaciones contractuales.

CONSIDERACIONES JURÍDICASCONTRATO DE OBRA No 001 DE 2022 CLAUSAULA 15 MULTAS

1. *“...En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo de EL CONTRATISTA, éste autoriza expresamente al MUNICIPIO, mediante el presente documento para efectuar la tasación y cobro, previo procedimiento contemplado para el efecto, de multas diarias sucesivas del 1% del valor total del contrato por cada día de retraso, sin exceder el 10% del valor del mismo.*
2. *“...Multas equivalentes a 2 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al Cinco por ciento 5% del valor del contrato.*

CONTRATO DE OBRA No 001 DE 2022 CLAUSAULA 16 PENAL

1. *“...En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente diez por ciento 10% del valor del contrato*

Con fundamento en lo anteriormente expuesto,

SOLICITAMOS:

Que se dé inicio al procedimiento establecido en la Cláusula Quince Para la Aplicación de la Cláusula Penal Contrato de la Referencia, para la imposición al CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021 de las sanciones pactadas en el Contrato No. 001 DE 2022, por el incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales.

Cordialmente,



Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

The logo for Consorcio ACI-3B features the text "CONSORCIO ACI-3B" in a bold, blue, sans-serif font. The letters are slightly shadowed, giving it a three-dimensional appearance. The logo is positioned on the left side of the page, below a thin horizontal line.

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA

G4

Radicado No. SAL-22-018675
2022-10-26 11:49:12 a. m.

Folios: 4
Anexo:
Nombre anexos:

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este
documento escanee el código QR
26/10/2022 11:49:13 a. m.



Bogotá D.C., 28 de octubre de 2022

Ingeniero

JESUS ALBERTO MARTINEZ PADILLA

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021

consorciovialcotorra2021@gmail.com

Asunto: Solicitud de Plan de Contingencia Atraso de obra

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo;

Con base en nuestros compromisos de supervisión y control al Contrato de la referencia, nos permitimos comentar lo siguiente:

El Consorcio Vial Corredores Rurales Cotorra 2021 tenían prevista una Inversión Programada Acumulada hasta la semana 36 del presente año según reprogramación de \$921.830.088.57 que equivale el 32,95 % Vs una Inversión Ejecutada Acumulada de \$797.717.641.97 que equivale el 28.52 % lo que representa un atraso de 4,44% teniendo en cuenta la programación aprobada por esta Interventoría.

Por lo anterior, solicitamos al Consorcio Vial Corredores Rurales Cotorra 2021 tomar los correctivos necesarios y hacer la entrega de un plan de Contingencia teniendo en cuenta el atraso que ya presenta el Contrato de Obra, este documento debe ser entregado en un tiempo no mayor a tres (3) días del recibo del presente comunicado.

Cordialmente,

CONSORCIO ACI-3B

Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 2
Anexo:
Nombre anexos:

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este
documento escanee el código QR
28/10/2022 9:05:24 a. m.

REGISTRO FOTOGRAFICO OCTUBRE 2022

ÍTEMS EJECUTADOS EXCAVACION MECANICA



FOTO No. 1 Excavación mecánica entre absc K0+380 a la K0+480



FOTO No. 2 Excavación mecánica entre absc K0+380 a la K0+480



FOTO No. 3 Excavación mecánica entre absc K0+380 a la K0+480



FOTO No. 4 Excavación mecánica entre absc K0+380 a la K0+480

ÍTEMS EJECUTADOS COMPACTACION A EXCAVACION MECANICA



FOTO No. 5 Compactación entre absc K0+380 – K0+640



FOTO No. 6 Compactación entre absc K0+380 – K0+640



FOTO No. 7 Compactación entre absc K0+380 – K0+640



FOTO No. 8 Compactación entre absc K0+380 – K0+640

ÍTEMS EJECUTADOS EXCAVACION MECANICA



FOTO No. 9 Excavación mecánica entre absc K0+380 a la K0+480



FOTO No. 10 Excavación mecánica entre absc K0+380 a la K0+480



FOTO No. 11 Excavación mecánica entre absc K0+380 a la K0+480



FOTO No. 12 Excavación mecánica entre absc K0+380 a la K0+480

ÍTEMS EJECUTADOS EXCAVACION MECANICA



FOTO No. 13 Excavación mecánica entre absc K0+560 a la K0+640



FOTO No. 14 Excavación mecánica entre absc K0+560 a la K0+640



FOTO No. 15 Excavación mecánica entre absc K0+560 a la K0+640



FOTO No. 16 Excavación mecánica entre absc K0+560 a la K0+640

ÍTEMS EJECUTADOS EXCAVACION MECANICA



FOTO No. 17 Excavación mecánica entre absc K0+560 a la K0+640



FOTO No. 18 Excavación mecánica entre absc K0+560 a la K0+640



FOTO No. 19 Excavación mecánica entre absc K0+560 a la K0+640



FOTO No. 20 Excavación mecánica entre absc K0+560 a la K0+640

**ÍTEMS EJECUTADOS DE ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACION DE TUBERIA DE
ALCANTARILLADO REALIZADO POR LA EMPRESA TRIPLE AAA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE COTORRA PARA EL FUNCIONAMINETO Y AVANCE DE OBRA**



FOTO No. 21 Profundización de tubería de alcantarillado entre absc K0+640 a la K0+000



FOTO No. 22 Profundización de tubería de alcantarillado entre absc K0+640 a la K0+000



FOTO No. 23 Profundización de tubería de alcantarillado entre absc K0+640 a la K0+000



FOTO No. 24 Profundización de tubería de alcantarillado entre absc K0+640 a la K0+000

01 de Octubre de 2022 (Sábado).



Estado del tiempo: Día Soleado.

Personal en obras: 1 Ing Residente, 1 Ing Auxiliar, 13 ayudantes
1 Oper retroexcavadora, 1 Oper Bobcat.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Minidumper,
1 Bobcat, 1 Vibro Compactador, 1 Volqueta simple,
4 Volquetas dobles, 1 Vibro de Concreto, 1 Cortadora de
Pavimento, Arramientes menores.



Actividades: El día de hoy se continuo con la profundización
de tubería de alcantarillado.

- La finalización en obra aun continua incompleta. Se le solicito al Contratista mediante oficio y se le dijo por este medio y hasta la fecha no la han mejorado.
- Se le pide celeridad al Contratista en las actividades de suministro e instalacion de firmeado y sub base, al igual que la fundido de pavimento.
- Tambien se le manifestó la instalacion de bordillos Prefabricados.
- La Motoniveladora aun continua baruda.
- El personal continua sin cascos, Se les pide al Contratista que les entregue cascos de seguridad tambien se le solicito por oficio al Contratista y por este medio, si el día lunes no tienen toda la dotacion se suspenderon las actividades por esta intervención.

02 de Octubre de 2022 (Domingo).

No se laburo.

03 de Octubre de 2022 (Jueves).

Estado del tiempo: Día Soleado.

Personal en obras: 1 Jefe Auxiliar, 13 ayudantes, 1 Oper Retroexcavadora, 1 Oper Bobcat, 1 Oper Volquete.



Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Bobcat, 1 Tractor, 1 Vibro Compactador, 1 Volquete Simple, 4 Volquetes dobles, 1 Vibro de Concreto, 1 Cortadora de Pavimento, Herramientas Manuales.

Actividades: El día de hoy se Continúa con la profundización de la tubería de alcantarillado.

- La finalización continúa deficiente e incompleta se le volvió a solicitar al Contratista.

- La Motoniveladora aún continúa barriendo.

- Se le pide Celeridad al Contratista en las demás actividades como son: Instalación de alambrado y Sub base granular, Excavaciones, fundida de Concreto y instalación de bordillos prefabricados.

04 de Octubre de 2022 (Viernes).

Estado del tiempo: Día Soleado.

Personal en obras: 1 Jefe Residente, 1 Jefe Auxiliar, 1 Jefe, 1 Oper Retroexcavadora, 1 Oper Bobcat, 1 Oper Volquete.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Bobcat, 1 Tractor, 1 Vibro Compactador, 1 Volquete Simple, 4 Volquetes dobles, 1 Vibro de Concreto, 1 Cortadora de Pavimento, Herramientas Manuales.

Actividades: El día de hoy se Continúa con la profundización de la tubería de alcantarillado.

- La instalación continúa deficiente e incompleta se le volvió a requerir al Contratista.

- El Contratista Continúa sin realizar las actividades de excavación, instalación de Afirmado y Sub base, al igual que los fundidos de Pavimento e instalación de bordillos Prefabricados.

Se le pide celeridad al Contratista en estas actividades ya que esto está reflejado atraso en el Proyecto.

- La Motoniveladora aún Continúa parada.

05 de Octubre de 2022 (Martes)

Estado del tiempo: Día Soleado.

Personal en obras: 1 Ing Auxiliar, 1 Ing Residente, 1 Siso,
1 Oper Retroexcavadora, 1 Oper Bobcat, 1 Oper
Volquete, 13 ayudantes.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retro excavadora, 1 Bobcat,
1 Tractor, 1 Vibro Compactador, 1 Volquete Simple,
4 Volquetes dobles, 1 Vibro de Concreto, 1 Cortadora de Pavimento,
Herramientas Manuales.

Actividades: El día de hoy se Continúa con la profundización de la tubería de alcantarillado trabajos realizados por Personal de la empresa triple AAA en conjunto con el Contratista.

- Se Continúa sin iniciar las actividades de excavación, instalación de Afirmado y Sub base, al igual que los fundidos de concreto e instalación de bordillos Prefabricados esto genera atrasos en el avance del Proyecto.

- Se le pide celeridad al Contratista con el inicio de estas actividades.

- La Motoniveladora aún Continúa parada.

06 de Octubre de 2022 (Jueves).

Estado del tiempo: Día Soleado.

Personal en obras: 1 Ing Residente, 1 Ing Auxiliar, 1 Srto,
13 ayudantes, 1 opo Retroexcavadora,
1 opo Bobcat, 1 opo Volqueta.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Bobcat,
1 Vibro Compactador, 1 Huidumper, 1 Volqueta
Súccula, 4 Volquetas dobles, 1 vibro de Concreto,
1 Cortadora de Pavimento, herramientas comunes.
1 Raso compactador.

Actividades: El día de hoy se Continúa Con la Profundización de la tubería de alcantarillado trabajos realizados por Personal de la empresa Prestadora de Servicios de alcantarillado y acuerdo de Orden Triple AAA. Con apoyo del Contratista. Se Continúa Sin iniciar las actividades de excavación, instalación de afirmado y Sub base, al igual que la fundición de Concreto e instalación de bordillos prefabricados.

Se le Solicita al Contratista Claridad en estas actividades debido a quel avance que llevarán la bajada el día de hoy es de -0,31% y la línea pisada está en -1,93, esto debido al no realizar ningún rem de la obra.

Se le Solicita al Contratista Claridad en estas actividades debido a quel avance que llevarán la bajada el día de hoy es de -0,31% y la línea pisada está en -1,93, esto debido al no realizar ningún rem de la obra.

07 de Octubre de 2022 (Viernes).

Estado del tiempo: Soleado

Personal en obras: 1 Ing Auxiliar, 13 ayudantes, 1 opo Retroexcavadora, 1 opo Bobcat, 1 opo Volqueta.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora

1 Bobcat, 1 Luidomper, 1 Volquete sencilla, 4 Volquetes dobles,
1 Vibro Compactador, 1 Puma Compactadora, 1 Vibro de Concreto,
1 Cortadora de Pavimento, Herramientas diversas.

Actividades: El día de hoy se Continúa con la Profundización de la tubería de alcantarillado trabajos realizados por personal de la Empresa Prestadora de Servicios de alcantarillado y acueducto de Cofre triple AAA, con apoyo del Contratista. Se Continúa sin mayor las actividades de excavación, instalación de afirmado y sub base granular al agua que las fundidas de Concreto e instalación de bordillos prefabricados. Se Solicita al Contratista dar inicio lo mas pronto posible a estas actividades debido a que el tiempo de ejecución del Contratos corto.

08 de Octubre de 2022 (Sábado).

Estado del tiempo: Día Soleado.

Personal en obras: 1 Ing Auxiliar, 13 ayudantes,
1 Oper Bobcat, 1 Oper Retroexcavadora,
1 Oper Volquete.


Equipos: 1 Retroexcavadora, 1 Retroexcavadora, 1 Bobcat,
1 Luidomper, 1 Vibro Compactador, 1 Volquete sencilla,
4 Volquetes dobles, 1 Puma Compactadora, 1 Vibro de
Concreto, 1 Cortadora de Pavimento, Herramientas diversas.


Actividades: El día de hoy se finaliza con la actividad profundización de la tubería de alcantarillado que inició en la obra K0460 - K04010. actividades realizadas por la empresa Prestadora del Servicio de acueducto y alcantarillado de Cofre triple AAA con apoyo del Contratista lo cual quedó al 100%.

- El Contratista Continúa Sin realizar ninguna actividad como son excavaciones, instalación de Afirmado y Sub base granular, al igual que la fundación de Concreto e instalación de bordillos Perforados.

- Se le solicita al Contratista iniciar con urgencia estas actividades debido que el avance ha estado disminuyendo el cual ya está en $-0,31\%$.


- Se le pide celeridad al Contratista en estas actividades.






09 de Octubre de 2022 (Domingo).

No se labora.





10 de Octubre de 2022 (Lunes).

Estado del tiempo: Lluvias en la madrugada - Niebla.

Personal en obras: Ninguno.


Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Bobcat, 1 Camión, 1 Vibro de Concreto, 1 Vibro Compactador, 1 Volquete Simple, 4 Volquetes dobles, 1 Remolcadora, 1 Cortadora de pavimento, Herramientas.

Actividades: El día de hoy el Contratista no realizó ningún tipo de actividad.

Esta intervención va con gran preocupación la ejecución del proyecto debido a que el Contratista ha venido con poco avance en las actividades.

- Se le pide celeridad y reactivación inmediata en estos.

- La Hotonivelada aun sigue parada.





11 de Octubre de 2022 (Portes).

Estado del tiempo: Día Soleado


Personal en obras: 1 Ing. Auxiliar, 1 Siso, 5 ayudantes

Equipos: 1 Hotoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Bobcat,
1 Hidropompa, 1 Vibro Compactador, 1 Volquete Suella,
4 Volquetes dobles, 1 Rova Compactadora, 1 tubo de Concreto,
1 Cortadora de Pavimento, Herramientas Plumas.

Actividades: El día de hoy el Contratista Continúa
sin realizar las actividades de excavación, instalación de
aprimado y subbase al igual que los frentes de Concreto.
es preocupante esta situación debido a que los tiempos de
ejecución van avanzando y no se vaya a terminar el
Contrato en el tiempo estimado

- Se le pide al Contratista reactivar y celeridad en las
actividades.

- El día de hoy se encuentran un equipo de la empresa
triple AAA en compañía del Contratista. arreglando una
fuga que se presentó en la tubería de alcantarillado la
cual estaban profundizando, esto se vio debido a que la
empresa realizó sondeos y se pudo dar tiempo de esta.





12 de Octubre de 2022 (Miércoles).

Estado del tiempo: Nubos de 6:30 - 8:30. - tarde
Soleada.

Personas en obras: Ninguna

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Bobcat,
1 Minidumper, 1 Vibro Compactador, 1 Roca Compactador,
1 Vibro de Concreto, 1 Cortador de Pavimento, Volquete,
Siclla, 4 volquetes dobles, Herramientas menores.



Actividades: El día de hoy el Contratista Continúa Sin
realizar ningún tipo de actividad.

Esta interventoría se encuentra muy preocupada debido a
que el Contratista viene sin presentar avances en la obra,
y ellos no dan motivo alguno el porque la suspensión
de sus actividades, al ing residente no da ninguna
respuesta sobre esta situación.

Por otro lado ellos están sin director de obras desde el
5 de septiembre, esta interventoría ha variado mucho debido
por medio de oficios la nueva hora de vida para su
respectiva revisión, ya que la obra no puede estar sin
este profesional.

La Motoniveladora aún continúa parada.

Se le pide celeridad al Contratista en retomar las actividades
debido a que el apoyo en este mes puede disminuir.

13 de Octubre de 2022 (jueves).

Estado del tiempo: Día Soleado.

Personal en obras: Ninguno.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Bobcat, 1 Mini dumper, 1 Vibro Compactador, 1 Paño Compactador, 1 Vibro de Concreto, 1 Costadora de pavimento, 1 Volquete Sucella, 4 Volquetes dobles, Herramientas Manuales.

Actividades: El día de hoy el Contratista Continúa sin realizar ninguna tipo de actividad.


Esta intervención a venido muy preocupada debido a que el Contratista no responde por ningún medio llamase oficios. Los cuales se les han enviado, al igual que el personal como un residente e un Auxiliar, no dan ninguna explicación del por que no están ejecutando ninguna actividad.


Es preocupante hasta el corte de hoy presentan un atraso del 1,31% esto debido a que desde el 5 de Septiembre ellos no han ejecutado ninguna actividad que genere avance en el Proyecto.

Se le pide calendario e inicio urgente al contratista esto debido a que si continúan así no van a cumplir con el tiempo de ejecución total del contrato.

La Motoniveladora aun Continúa parada.

La Comunidad ha venido manifestando quejas al mal estado de la vía esto debido a que la empresa triple AAA al profundizar la tubería dejó la faja abierta y esto ocasiona que la vía esté en mal estado.





14 de Octubre de 2022 (Viernes).

Estado del tiempo: Día Soleado.


Personal en obra: 1 Oper Retro excavadora, 1 Oper Volqueta,
1 Ing Auxiliar, 1 Biso.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retro excavadora, 1 Bobcat,
1 Luidumper, 1 Vibro Compactador, 1 Volqueta
Sencilla, 4 Volquetas dobles, 1 Puma Compactadora,
1 Vibro de Concreto, 1 Cortadora de Pavimento,
Herramientas Manuales.

Actividades: El día de hoy el Contratista Continúa
Sin realizar ningún tipo de actividad.
Se le pide al Contratista Calentador a iniciar con
estas actividades debido a que ya tienen un atraso
del 1,31%.

La Motoniveladora aún Continúa Barriendo.

El Contratista Retiro el material que quedó en la vía
producto de la Excavación de la profundización de la
tubanía de el antillado.



15 de Octubre de 2022 (Sabado).

Estado del tiempo: Día Soleado.

Personal en obra: 1 Ing Auxiliar, 1 Oper Retro excavadora,
1 Biso, 1 Oper Volqueta.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retro excavadora,
1 Luidumper, 1 Bobcat, 1 Vibro Compactador
1 Puma Compactadora, 1 Volqueta Sencilla,
4 volquetas dobles, 1 Cortadora de Pavimento,
1 Vibro de Concreto, Herramientas Manuales.

Actividades: El Contratista Continúa sin realizar ninguna de las actividades como son: excavación, instalación de afirmado y sub base granular, al igual que las fundidas de concreto.

Es preocupante esta situación debido a que ya llevan un atraso de obra del 1.31%.

Esta intervención ha venido manifestando por medio de oficios y por llamados el por que están parados, pero ellos no dan respuesta alguna.

La flotabilidad aún sigue burlada.

Se le pide calidad e interés de estas actividades urgente.

Realizaron retiro de material proveniente de la excavación de la profundización de la tubería ya que esta estaba afectando el paso de autos y transeúntes.

16 de Octubre de 2022 (Domingo).

No se labora.

17 de Octubre de 2022 (Lunes) F.

No se labora.

18 de Octubre de 2022 (Hartes).

Estado del tiempo: Día Soleado.

Personal en obra: Ninguno.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Bobcat,
1 Minidumper, 1 Vibro Compactador, 1 Volqueta sencilla,
4 Volquetas dobles, 1 Vibro de Concreto, 1 Rova Compactadora,
1 Cortadora de Pavimento, Herramientas Menores.



Actividades: El día de hoy el Contratista Continúa Sin realizar ningún tipo de actividad como lo son: Excavaciones, Instalación de afirmado y Sub base granular, al igual que los fundidos de Concreto.

- Por otro lado el día 17 de Octubre de 2022 el Contratista en su Plan técnico de instalación de bordillos el cual puso a esta interventoría y fue aprobado mediante oficio SAL-22-016260 de fecha 22 de Septiembre de 2022 por este interventoría iniciaron instalación de bordillos la cual no lo hicieron se esta a la espera el por que y cuando lo iniciaron, Por lo tanto sigue incumpliendo quedando aquí como evidencia.

- La Motoniveladora aún continúa parada.

- El Contratista hasta la fecha lleva un atraso del 1.31%. Es preocupante esta situación ya que esto afecta el avance y tiempo de terminación del mismo.

- Se le solicita celeridad al Contratista en las actividades y reactivación urgente del proyecto.

19 de Octubre de 2022 (Viernes).

Estado del tiempo: Día Soleado.


Personal en obra: 1 Ing Auxiliar, 2 oper. Volquetas,
1 Comision Topografica, 1 oper Retroexcav.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Bobcat,
1 Minidumper, 1 Vibro Compactador, 1 Volqueta sencilla,
4 Volquetas dobles, 1 Vibro de Concreto, 1 Rana compact,
1 Cortadora de Pavimento, Herramientas Manuales.

Actividades: El día de hoy el Contratista retoma actividades las cuales fue Excavación mecánica entre obsc. K+380 a la K+420. también se realizó retiro de material de excavación.

La Señalización en obra esta deficiente se le dijo al Contratista hacer cumplir con el PNT.

La Motoniveladora aun continua parada.




20 de Octubre de 2022 (Sábado).

Estado del tiempo: Día Soleado

Personal en obra: 1 Ing Auxiliar, 2 oper Volquetas,
1 oper Retro excavadora, 1 oper Bobcat.
1 ayudante, 1 Comision Topografica.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retro excavadora, 1 Bobcat,
1 Minidumper, 1 Vibro Compactador, 1 Volqueta sencilla,
4 Volquetas dobles, 1 Vibro de Concreto, 1 Rana compactadora,
1 Cortadora de Pavimento, Herramientas Manuales.

Actividades: El día de hoy se continuo

Con la excavación mecánica entre absc. K+420 a la K+480. y Retiro del material producido de la excavación.

- El contratista no ha mejorado la finalización
Se le recomienda seguir PRT para así evitar
Cualquier accidente del peso de los transeúntes y
Autos.

- Se le pide Celeridad al Contratista en las actividades.
Hasta la fecha el Contratista aun no inicia con la
instalación de los Bordillos prefabricados de los
Axles quedaron iniciar el día 17 de octubre de 2022
Segun plan tecnico de instalación de Bordillos.

- La Motoniveladora aun sigue parada.

21 de Octubre de 2022 (Viernes).

Estado del tiempo: Día Soleado.

Personal en obra: 1 Comisión topografica,
1 Ing Auxiliar, 1 Oper Retroexcavadora
1 Oper Bobcat, 1 Ayudante,
2 Oper Volquetas.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora,
1 Bobcat, 1 Minidumper, 1 Vibro Compactador,
1 Volqueta Simple, 4 Volquetas dobles,
1 Vibro de Concreto, 1 Rana Compactadora,
1 Cortadora de Pavimento, Herramientas Diversas.

Actividades: El día de hoy se Continuo con
la excavación mecánica entre absc K+560 a la
K+640. con ancho de 6,4 mts. y se respectivo
retiro del material producido de la excavación.

22 de Octubre de 2022 (Sábado).

Estado del tiempo: Día Soleado



Personal en obra: 1 Ing Auxiliar, 1 Comisión Topográfica,
1 Oper Retroexcavadora, 1 Oper Bobcat,
2 Oper Volquetas.

Equipos: 1 Motor niveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Bobcat,
1 Anidumper, 1 Vibro Compactador, 1 Volqueta
Sencilla, 4 Volquetas dobles, 1 Vibro de Concreto,
1 Rova Compactadora, 1 Cortadora de Pavimento,
Herramientas Menores.

Actividades: El día de hoy se Continúa con la
excavación mecánica entre absc K+560 a la K+640
con ancho de 6,4mts. y su respectivo retiro de Material.



- Se le pide Calendón al Contratista en las actividades.
- la Motor niveladora aun Continúa Marcada.

El Contratista Continúa sin iniciar la instalación
de los bordillos prefabricados. Segun Plan
técnico de Bordinhos.

23 de Octubre de 2022 (Domingo).

NO Se labora.

24 de Octubre de 2022 (Jueves).

Estado del tiempo: Día Soleado

Personal en obra: 1 oper Retroexcavadora, 1 Ing Auxiliar,
3 ayudantes, 1 oper Volqueta.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Bobcat,
1 Minidumper, 1 Vibro Compactador, 1 Volqueta
Suealla, 4 volquetas dobles, 1 vibro de Concreto,
1 Rano Compactadora, 1 Cortadora de Pavimento,
Herramientas Menores.



Actividades: El día de hoy el Contratista realizó
actividades de instalación de cambio de tubería x
tunelera de Acometidos que Cruzan la vía,
La Motoniveladora con Continúa Burada

se realizó Arreglo de tubería del agua Principal de
4 pulgadas.

Las actividades de excavación el día de hoy no se
realizaron.

Se le pide Celeridad al Contratista en estas actividades.

También se le solicita arreglo de la valla publicitaria
de Acl se encuentra en el Suelo y sin información del
letrero.

25 de Octubre de 2022 (Viernes).

Estado del tiempo: Día Soleado.

Personal en obra: 1 Ing Auxiliar, 1 oper Bobcat,
1 Comisión topográfica

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora,
1 Minidumper, 1 Bobcat, 1 Vibro Compactador


1 Volqueta Sucella, 4 Volquetas dobles, 1 Vibro de Concreto, 1 Rano Compactadora, 1 Cortadora de pavimento, Herramientas nuevas.

Actividades: El día de hoy el Contratista realiza levantamiento topográfico del canal de aguas lluvias y Senderos que se encuentra al lado de la vía, este con el fin de determinar niveles y cotas con el pavimento.

- Las actividades de excavación no se realiza Se le pide celeridad al Contratista para así avanzar y no dejar aumentar el abuso de obra que duran.

- La Motoniveladora continúa barriendo.

- La vía le falta Señalización se le hizo observación al Contratista tanto por oficio como verbalmente. y se dijo constancia por si llega a pasar algún accidente.





26 de Octubre de 2022 (Viernes).

Estado del tiempo: fuertes lluvias en la madrugada día cubierto.

Personal en obra: 1 Muej Auxiliar, 2 ayudantes.



Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Bobcat, 1 Liniolumper, 1 Vibro Compactador, 1 Volqueta Sucella, 4 Volquetas dobles, 1 Rano Compactadora, 1 Cortadora de pavimento, 1 Vibro de Concreto, Herramientas nuevas.

Actividades: El día de hoy el Contratista no realizó ningún tipo de actividad, ya que se presentaron lluvias por la noche y el frío.

Se encontraba muy Saturado de agua
- Realizo saque de agua de la Caja Producto de la excavación con dos ayudantes.

la Motoniveladora aun sigue parada
- Se le pide celeridad al Contratista en las actividades ya que el ha venido trabajando muy lento y además trabaja unos días si y otros no en las semanas.

- Es preocupante esta intervención ha venido manifestando por medio de oficios y de manera verbal, la obra a la fecha ya tiene un Atraso del 4.44%.

27 de Octubre de 2022 (jueves).

Estado del tiempo: Lluvias en la mañana de 6:30 - 8:30
tarde soleada



Personal en obras: 1 Ing Auxiliar, 1 Siso, 1 Comisión
Topográfica, 1 Ayudante, 2 Ing Residentes

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Bobcat,
1 Minidumper, 1 Vibro Compactador, 1 Volqueta
Sencilla, 4 Volquetas dobles, 1 Puma Compactadora,
1 Costador de Pavimento, 1 Vibro de Concreto,
Herramientas Menores.

Actividades: El día del Ing el Contratista no
realizo ningún tipo de actividad.

- Se realizó Visita a obra por Parte del Ing Nestor
Jennys Supervisor del Contrato INVIAS, Ing Miguel Díaz
Director de Interventoría y Contratista.

- Se le pide celeridad al Contratista en las actividades
- la Motoniveladora Continúa parada.

28 de Octubre de 2022 (Viernes).

Estado del tiempo: Día Soleado.

Personal en obra: 1 Ing Auxiliar, 1 Comisión tipográfica,
1 opy Retroexcavadora, 1 oper Bobcat,
1 oper Volquete.

Equipos: 1 Fotoniiveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Bobcat,
1 Minidumper, 1 Vibro Compactador, 1 Volquete
Sencilla, 4 Volquetes dobles, 1 Rana Compactadora,
1 Cortadora de pavimento, 1 Vibro de Concreto,
Herramientas menores.

Actividades: El día de hoy se continuo con la
excavación mecánica entre absc K0+500 a la K0+540.
con ancho de 6,4 mts.

- Se puso un tubo de 4 pulg de agua potable con la
flaguera el cual fue intervenido en el acto por el
Contratista el cual quedo reparado.

- Se le pide celeridad al Contratista en las actividades

29 de Octubre de 2022 (Sábado).

Estado del tiempo: Día Soleado.


Personal en obra: Ninguno

Equipos: 1 Fotoniiveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Bobcat,
1 Minidumper, 1 Vibro Compactador, 1 Volquete
Pequeña, 4 Volquetes sencillos, 1 Rana
Compactadora, 1 Cortadora de pavimento,
1 Vibro de Concreto, Herramientas Menores.

Actividades: El día de hoy el Contratista



No realizo ninguna actividad, esta intervención viene muy preocupada ya que el Contratista viene trabajando un día si otro no, el avance que ellos llevan es del 4.44% y ellos no aceleran el ritmo de trabajo.

- se le pide celeridad en las actividades y mas seriedad en la ejecución del Proyecto y actividades.
- la Motoniveladora aun continua buscando.
- la finalización continua deficiente.




30 de Octubre de 2022 (Domingo).

No se laboro.

31 de Octubre de 2022 (Jueves).

Estado del tiempo: Día Soleado.

Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Ing Auxiliares, 1 So, 1 Comisión Topografica, 1 Oper Bobcat, 1 Oper Volqueta, 1 Oper Retroexcavadora.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Bobcat, 1 Finidumper, 1 Vibro Compactador, 1 Volqueta sencilla, 4 Volquetes dobles, 1 Pava Compactadora, 1 Cortadora de Pavimento, 1 Vibro de Concreto, Herramientas menores.

Actividades: El día de hoy se continuo con la excavación mecánica entre los K0+640 a la K0+540. con ancho de

6.4 mts

- Se le pide celeridad al Contratista en las actividades.
- la Motonivela aun Continúa baranda.





01 de Noviembre de 2022 (Martes)

Estado del tiempo: Día Soleado.

Personal en obra: 1 Ing Auxiliar, 1 Comisión topográfica,
1 Siso, 1 Oper Retroexcavadora, 1 Oper
Bobcat, 2 Oper Volquetes.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora,
1 Tricamper, 1 Bobcat, 1 Vibro Compactador,
1 Volqueta Simple, 4 Volquetes dobles, 1 Rana
Compactadora, 1 Cortadora de Pavimento, 1 Vibro
de Concreto, Herramientas Hueros.

Actividades: El día de hoy se Continúa con la
excavación mecánica entre cota +540 a la
+540 con ancho de 6.4 mts.

- Se le pide celeridad al Contratista ya que las
actividades reprogramadas van a un ritmo muy lento.
- tambien se le requiere que se labore todos los
días ya que hay días que no lo hacen, y se
debe aprovechar el buen tiempo que se está presentando
en obra.

- la Motoniveladora aun Continúa baranda.

- Se reprograma la finalización en poco.

- hasta la fecha se le venido enviando y solicitando
al Contratista mediante oficios el inicio de la inst.
de bordillos.

