



ACTA DE COMITÉ

Consecutivo Acta	FECHA:	HORA INICIO:	HORA FINAL	LUGAR:
002	05/02/2025	08:00 AM	11:00 PM	PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO – TOTTE GENTIUM
OBJETIVO DE LA REUNIÓN				
Seguimiento de cronograma de actividades de acuerdo a modificación 2 realizada en el contrato de obra MC 22 DE 2024 2024				
RESPONSABLES DE LA REUNIÓN				
NOMBRE			ROL	
FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA			SUPERVISORA DEL CONTRATO	

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ASISTIÓ		DELEGÓ	
		SI	NO	SI	NO
Francy Lorena Hernandez Arrieta	Supervisora	x			
Jeily Jailyn Martínez Atencia	Rep. Legal contrato de obra	x			
Oscar Luis Herazo Seba	Rep. legal contrato de interventoría	x			

AGENDA

1. Recorrido de obra para verificación y validación de actividades ejecutadas de acuerdo a la reprogramación de obra aportada en modificación No. 2 del contrato de obra MC 22 DE 2024.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN


A las 08:00 horas del 05 de febrero de 2025, se da inicio al comité de obra No. 2, junto con la presencia de los contratistas involucrados en el proceso: el contratista de obra, el contratista de interventoría y el supervisor del contrato. En el transcurso de los días de prórroga establecidos en la Modificación No. 2 del Contrato de Obra MC 22 de 2024, se ha llevado a cabo un seguimiento detallado de las actividades ejecutadas en el campo. Tras la observación y verificación de las labores realizadas en campo, se concluye que las actividades contratadas están siendo ejecutadas dentro de los tiempos establecidos en la reprogramación del cronograma, el cual hace parte del presente documento. cumpliendo a cabalidad con la reprogramación establecido.

Este cronograma ha sido motivo de seguimiento y vigilado de manera constante mediante la interventoría, bajo el marco del contrato MC 24 de 2024, lo que garantiza que el avance de la obra se



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial
Sincelejo – Sucre

ha desarrollado de acuerdo con lo pactado. A continuación, se presenta una gráfica detallada que ilustra el seguimiento al proceso de ejecución en este periodo:

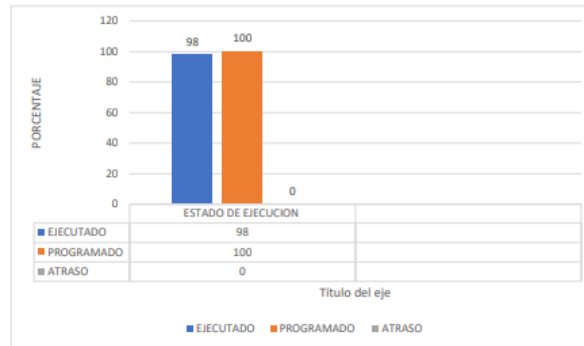

Se presenta una ejecución del 98% faltando un 2% por ejecutar, que no es necesario para alcanzar la meta física del proyecto.

TAREAS Y COMPROMISOS

No.	TAREA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTREGA
1	Entrega de documentación final del contrato MC 22 DE 2024	Rep. Legal contrato de obra	25/02/2025

SEGUIMIENTO TAREAS PENDIENTES

No.	TAREA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	Revisión y aprobación de información del contrato MC 22 DE 2024	Rep. Legal contrato de interventoría

En constancia firman,

Francy Lorena Hernandez Arrieta Profesional Universitario – Ing. Civil	Jeily Jelynn Martinez Atencia Rep. Legal JEMAD INGENIERIA S.A.S
Oscar Luis Herazo Seba Rep. legal INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S	
