

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 29

CONTRATO NÚMERO 973 DE 2022

**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS
TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - LOTE 4**



**PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2025**

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</p> <p style="text-align: center;">PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</p> <p style="text-align: center;">MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</p> <p style="text-align: center;">LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA</p>		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	1

Contrato de Obra No.	L.P.006 DE 2022 557 DE 2022 558 DE 2022	Contratista:	CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK CONSORCIO SAN RAFAEL CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUÉ
Contrato de Interventoría No.	973 DE 2022	Interventoría:	CAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

Objeto Contrato de Obra:
 CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CORREGIMIENTO DE LOS NÍSPEROS HASTA EL CORREGIMIENTO DE SINCERIN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACHÍ – DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
 MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE CASCAJAL HASTA EL CORREGIMIENTO DE LA PASCUALA DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
 MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO HASTA EL CORREGIMIENTO DE LA SAN RAFAEL DE CORTINAS DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

INFORME MENSUAL No.	29	MES O PERIODO:	ENERO DE 2025
----------------------------	----	-----------------------	---------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	2
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	3
1	INTRODUCCIÓN		12
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		13
2.1	Localización		14
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		23
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		23
2.4	Características técnicas del proyecto		28
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		32
3.1	Información general del contrato		33
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		36
3.3	Seguimiento Items no previstos		38
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		39
4	REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA		41
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	47
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	68
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	70
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	72
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	75
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	77
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	78
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	116
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		121
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	121
	• Seguimiento Programa de Obra	MEPI-MN-IN-2-FR-2	122
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	122
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-6-FR-2	123
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-1	124
		MEPI-MN-IN-14-FR-2	126
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		133
5.1	Información general del contrato		133
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		133
5.3	Informes especialistas y profesionales		134
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		135
5.5	Informe matriz de riesgos.		135
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		135
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		135
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	136
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	138
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	140
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	155
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	158
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		162
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	162
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-3-FR-2	164
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-2	165
		MEPI-MN-IN-9-FR-3	165
7	Conclusiones y recomendaciones		166
8	Anexos		167
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		168
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		168
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		170
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		171

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____
 Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
 Resolución de designación No. 2856 de fecha 22 de agosto de 2023

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor, Dirección Territorial

Tabla de contenido

Tabla de contenido.....	1
1. INTRODUCCIÓN.....	10
2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS.....	11
2.1. LOCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS	12
2.1.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO L.P.006 DE 2022.....	12
2.1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 557 DE 2022.	14
2.1.3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 558 DE 2022.	18
2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	20
2.2.1. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto N°L.P.006 de 2022.	20
2.2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto N°557 de 2022.....	21
2.2.3. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto N°558 de 2022.....	21
2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA.....	21
2.3.1. Inventario y estado inicial de la Vía proyecto N°L.P.006 de 2022.....	21
2.3.2. Inventario y estado inicial de la vía proyecto N°557 de 2022.	23
2.3.3. Inventario y estado inicial de la vía proyecto N°558 de 2022.	26
2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO.....	26
2.4.1. Características Técnicas del proyecto N°L.P.006 de 2022.....	26
2.4.2. Características técnicas del proyecto N°557 de 2022.	27
2.4.3. Características técnicas del proyecto N°558 de 2022.	28
3. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA	30
3.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS	31

3.1.1.	Información general del contrato de obra L.P 006 de 2022 – municipio de Achí.	31
3.1.2.	Información general del contrato de obra 557 de 2022 – municipio de Magangué.....	32
3.1.3.	Información general del contrato de obra 558 de 2022 – municipio de Magangué.....	33
3.2.	Descripción de las Actividades Ejecutadas en el mes.....	34
3.2.1.	Descripción de las Actividades Ejecutadas en el mes contrato L.P.006 de 2022	34
3.2.2.	Descripción de las Actividades Ejecutadas en el mes Contrato 557 de 2022.	35
3.2.3.	Descripción de las Actividades Ejecutadas en el mes Contrato 558 de 2022.	36
3.3.	Seguimiento Ítems No Previstos	36
3.3.1.	Seguimiento Ítems No previstos contrato L.P.006 de 2022.	36
3.3.2.	Seguimiento Ítems No Previstos contrato 557 de 2022.	36
3.3.3.	Seguimiento Ítems No Previstos contrato 558 de 2022.	37
3.4.	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría	37
3.4.1.	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría contrato L.P.006 de 2022.....	37
3.4.2.	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría contrato 557 de 2022.	38
3.4.3.	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría contrato 558 de 2022.	39
4.	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA.....	39
4.1.	INFORME SEMANAL	46
4.1.1.	MUNICIPIO DE ACHÍ – BOLÍVAR CONTRATO N° L.P.006 DE 2022.	46
4.1.2.	MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N° 557 DE 2022.	56

4.1.3.	MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N° 558 DE 2022.	66
4.2.	MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	66
4.2.1.	MUNICIPIO DE ACHÍ – BOLÍVAR CONTRATO N° L.P.006 DE 2022.	66
4.2.2.	MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N° 557 DE 2022.	67
4.2.3.	MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N° 558 DE 2022.	68
4.3.	PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	68
4.3.1.	MUNICIPIO DE ACHÍ – BOLÍVAR CONTRATO N° L.P.006 DE 2022.	68
4.3.2.	MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N°557 DE 2022 ..	69
4.3.3.	MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N°558 DE 2022 ..	69
4.4.	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	70
4.4.1.	MUNICIPIO DE ACHÍ – BOLÍVAR CONTRATO N°L.P.006 DE 2022.	70
4.4.2.	MUNICIPIO DE MAGANGUÉ - BOLÍVAR CONTRATO N° 557 DE 2022 ..	71
4.4.3.	MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N° 558 DE 2022 .	72
4.5.	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	73
4.5.1.	MUNICIPIO DE ACHÍ – BOLÍVAR CONTRATO N° L.P.006 DE 2022	73
4.5.2.	MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N°557 DE 2022 ..	73
4.5.3.	MUNICPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N°558 de 2022	74
4.6.	RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	75
4.6.1.	MUNICIPIO DE ACHÍ – BOLÍVAR CONTRATO N°L.P.006 DE 2022	75
4.6.2.	MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N°558 DE 2022 ..	75
4.6.3.	MUNICPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N°557 de 2022	75
4.7.	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.....	76
4.7.1.	MUNICIPIO DE ACHÍ – BOLÍVAR CONTRATO N° L.P.006 DE 2022	76

4.7.2.	MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N°557 DE 2022 ..	92
4.7.3.	MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N°558 de 2022 ..	103
4.8.	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	114
4.8.1.	MUNICIPIO DE ACHÍ – BOLÍVAR CONTRATO N° L.P.006 DE 2022	114
4.8.2.	MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N°557 DE 2022	116
4.8.3.	MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N°558 de 2022 ..	118
4.9.	OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL	119
5.	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	131
5.1.	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.....	131
5.2.	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor	131
5.2.1	Municipio De Achí - Contrato No. L.P.006 de 2022.	131
5.2.2.	Municipio De Magangué – Contrato No. 557 de 2022.	131
5.2.3.	Municipio de Magangué – Contrato No. 558 de 2022.	132
5.3.	Informes especialistas y profesionales.....	132
5.4.	Informe del programa Anual de Caja -PAC (No aplica)	133
5.5.	Informe matriz de riesgos	133
5.6.	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de obra e Interventoría (No aplica)	133
6.	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.	133
6.1.	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	134
6.2.	Personal control aportes legales y seguridad social contrato de Interventoría. (Anexo formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7)	136
6.3.	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	138
6.4.	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría.....	153
6.5.	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría.....	156

6.6.	Otros documentos seguimiento mensual	160
6.6.1.	Seguimiento a la inversión del Anticipo	160
6.6.2.	Plan de carga o reprogramación al Plan de Cargas.....	162
7.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.	164
8.	ANEXOS.....	165
8.2.	Registro fotográfico del avance de las obras	166
8.3.	Registro fotográfico de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas.	168
8.4.	Copia de la Bitacora del mes correspondiente	169

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Información del estado de los Contratos de Obra	30
Tabla 2 Información Contrato de Obra L.P.006 DE 2022 Municipio de Achí.	31
Tabla 3 Información Contrato de Obra 557 de 2022 Municipio de Magangué vía que conduce desde Cascajal hasta La Pascuala.	32
Tabla 4. Información contrato de obra 558 de 2022 vía que conduce desde el municipio de Magangué hasta el corregimiento de San Rafael de Cortinas.	33
Tabla 5. Saldos de cada una de las actividades para el control de la inversión L.P.006 de 2022.	34
Tabla 6. Saldos de cada una de las actividades para el control de la inversión 557 de 2022.	35
Tabla 7. Saldos de cada una de las actividades para el control de la inversión 558 de 2022.	36
Tabla 8. Estado de avance ejecutado CTO L.P.006 de 2022.	38
Tabla 9. Estado de avance ejecutado CTO 557 de 2022.	38
Tabla 10. Estado de avance ejecutado CTO 558 de 2022.	39
Tabla 11. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA L.P 006 DE 2022 – MUNICIPIO DE ACHÍ.	41
Tabla 12. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA No. 557 DE 2022 – MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – LOTE 1.	43
Tabla 13. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA No. 558 DE 2022 – MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – LOTE 2.	45
Tabla 14. Personal del Consorcio VIA LOS NISPEROS JK.	68
Tabla 15. Personal del Consorcio SAN RAFAEL.	69
Tabla 16. Personal del Consorcio MEGAVIAS MAGANGUÉ.	69
Tabla 17 Información Contrato de Interventoría 973 de 2022.	131
Tabla 18 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	133

Tabla 19. Personal contrato de interventoría.	136
Tabla 20. Correspondencia generada entre contratista e interventor contrato L.P.006 de 2022.	165
Tabla 21. Correspondencia generada entre contratista e interventor contrato 557 de 2022.	165
Tabla 22. Correspondencia generada entre contratista e interventor contrato 558 de 2022.	166

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Ubicación Geográfica del Proyecto.	11
Ilustración 2 Ubicación general del municipio de Achí, Departamento de Bolívar.	13
Ilustración 3 Ubicación Geográfica del sitio Corregimiento de Los Nísperos y Sincerin. ..	14
Ilustración 4 Ubicación general de los corregimientos Cascajal, Ceibal y La Pascuala del municipio de Magangué, Departamento de Bolívar.	15
Ilustración 5 Ubicación Geográfica del sitio Corregimientos de Cascajal, Ceibal y La Pascuala.	16
Ilustración 6. Fuente de base, subbase y triturado.	16
Ilustración 7. Ubicación de la concretera.	17
Ilustración 8. Ubicación de la planta de asfalto CMV.	17
Ilustración 9 Ubicación general del corregimiento de San Rafael de Cortinas en el municipio de Magangué, Departamento de La Guajira.	18
Ilustración 10 Ubicación Geográfica del sitio San Rafael de Cortinas.	19
Ilustración 11. Fuente de base, subbase, triturado y mezcla asfáltica.	19
Ilustración 12. Fuente de material terraplén y material seleccionado.	20
Ilustración 13. Sección típica de la vía.	29

LISTA DE DISTRIBUCIÓN


Copias de este documento serán entregadas a las dependencias indicadas en el cuadro siguiente. Todas aquellas observaciones que resulten de su revisión y aplicaciones deben ser informadas al director del Proyecto para proceder a ejecutar sus modificaciones.

ÁREAS O DEPENDENCIA		No. DE COPIAS
Copia No. 1	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	1 (Original)
Copia No. 2	BIBLIOTECA DEL PROYECTO	1 (Copia)

INDICE DE MODIFICACIONES

INDICE VERSIÓN	CAPITULO MODIFICADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	-	-	-

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

TITULO DOCUMENTO:	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.29	
PERIODO:	1 al 31 de enero de 2025	
RESPONSABLE ELABORACIÓN	Nombre:	Leonardo Javier Arbeláez Buelvas Edgar Fabián Penagos Padilla
	Fecha:	05/02/2025
RESPONSABLE REVISIÓN	Nombre:	Illuminada Castellar Arrieta
	Firma:	
	Fecha:	10/02/2025
Vo. Bo. Representante Legal	Nombre:	Luz Andrea Fajardo Corredor
	Firma:	
	Fecha:	10/02/2025
APROBÓ	Nombre:	Fabian Ernesto Arango Pineda
	Supervisor	Instituto Nacional de Vías - INVIAS
	Firma:	

1. INTRODUCCIÓN

Con el presente informe, GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES, en su calidad de Interventor, del contrato No. 973 DE 2022, cuyo objeto es *“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – LOTE 4”*, adjudicado previo Concurso de Méritos No. CMA-DTE-SEP-196-2021, reporta a la Entidad el cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por Los Contratistas a cargo de los contratos de obra que se desarrollan dentro del marco del programa *“COLOMBIA RURAL”* Mantenimiento y Mejoramiento De la Red Terciaria 2019 – 2022, cuyas obras tienen como objetivos: Garantizar la movilidad y accesibilidad de la Red Rural del país, Priorizar corredores productivos, Incrementar la productividad del campo, Conectar los territorios y Mejorar la calidad de vida de las comunidades directamente beneficiadas.

A través de este informe se presenta a la entidad contratante, INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, el seguimiento a los tres contratos de obra que se relacionan a continuación: **Municipio de Achí: Contrato de obra No. L.P.006 -2022** por Licitación Pública LP-006 DEL 2022 convocada por plataforma SECOP I, adjudicada a **CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK** por un valor de \$ 8.085.806.846; **Municipio de Magangué: Contrato de obra No. 557 del 2022** por Licitación Pública No. LP-005 de 2022 convocado por plataforma SECOP I, adjudicada a **CONSORCIO SAN RAFAEL** por un valor de \$ 22.888.390.685; **Municipio de Magangué: Contrato de obra pública No. 558 de 2022** por Licitación Pública No. LP-005 DE 2022 por plataforma SECOP I, adjudicada a **CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUÉ** por un valor de \$ 12.301.199.730.

Se presenta el seguimiento en aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales y Bioseguridad (Covid-19) de las obras y se establece el cumplimiento de las actividades contratadas, las eventualidades que se han presentado durante el desarrollo del contrato, así como las observaciones y recomendaciones que ayuden a la correcta ejecución de los proyectos, de acuerdo al programa de trabajo.

El presente documento, detalla en forma resumida las actividades adelantadas por Los Contratistas y la Interventoría en el período comprendido entre **el 01 y el 31 de enero de 2025** que constituye el **Informe Mensual de Interventoría No. 29**. Se anexan al presente informe los registros que evidencian el seguimiento efectuado por esta Interventoría a los Contratos de Obra en ejecución.

Para el control y vigilancia el INVIAS designó a la Ingeniera **FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA** como Supervisor del Contrato de Interventoría. Así mismo, al Ingeniero **EDY ALEXANDER CAMARGO JIMÉNEZ**, como Gestor Técnico del Proyecto.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS

El contrato de Interventoría denominado *“INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias del Programa Colombia Rural en los Municipios del Departamento de Bolívar – LOTE 4”* está constituido por dos (2) Municipios ubicados en el departamento de Bolívar (Achí y Magangué), como se observa en la Ilustración 1.

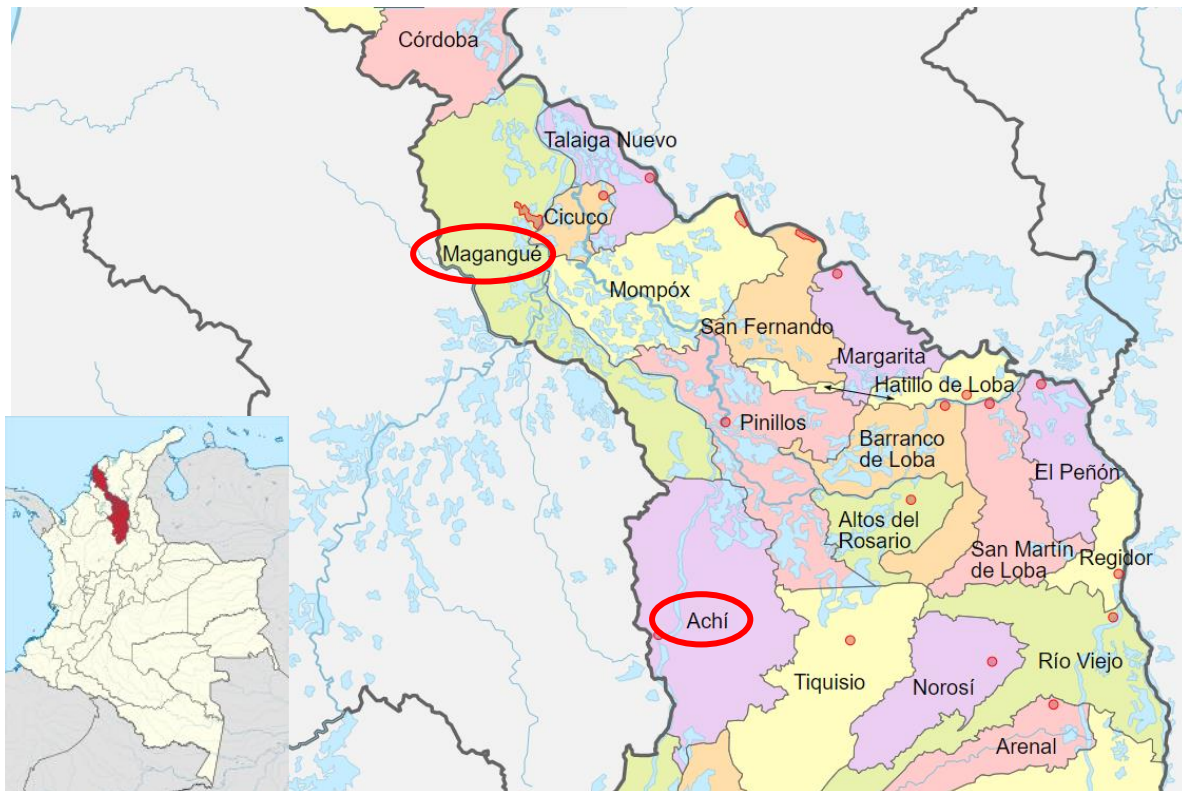


Ilustración 1 Ubicación Geográfica del Proyecto.

CONTRATO DE OBRA L.P.006 DE 2022 – MUNICIPIO DE ACHÍ

El proyecto denominado: *“CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CORREGIMIENTO DE LOS NÍSPEROS HASTA EL CORREGIMIENTO DE SINCERIN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACHÍ - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”*, tiene como finalidad la construcción de placa huella en la vía que conduce de la vereda de los Nísperos hasta el corregimiento de Sincerin, Departamento De Bolívar, donde actualmente existen senderos con calzadas en terreno natural y secciones transversales mal definidas, los cuales requieren de una recuperación oportuna, identificando un eje de vía, teniendo en cuenta que la movilidad en estos tramos genera a su vez dificultad para los vehículos al tener que recorrer una vía afectada por huecos y socavaciones que cada época de lluvias causa afectaciones en el terreno natural.

CONTRATO DE OBRA 557 DE 2022 – MUNICIPIO DE MAGANGUÉ

El proyecto denominado: “MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE CASCAJAL HASTA EL CORREGIMIENTO DE LA PASCUALA DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.”, tiene como finalidad el mejoramiento de 13 km en pavimento asfáltico de la vía que conduce a los corregimientos de Cascajal, La Pascuala y Ceibal en el municipio de Magangué, donde actualmente existe una vía en estado deficiente, con una rasante de bajo espesor con bajo contenido de finos, peligrosa de transitar y exigente de la conducción, caracterizada por tener zonas inestables y superficies deslizantes. En la vía hay presencia de 4 estructuras que permiten el paso sobre quebradas:

- Puente 1 ubicado en las coordenadas 9°19'9.12"N - 74°48'51.42"O
- Puente 2 ubicado en las coordenadas 9°21'13.66"N - 74°49'11.40"O
- Puente 3 ubicado en las coordenadas 9°22'2.94"N - 74°49'43.38"O
- Puente 4 ubicado en las coordenadas 9°23'31.38"N - 74°49'30.90"O

Estos se encuentran en avanzado estado de desgaste, exposición de acero de refuerzo en algunos casos y en la mayoría de los casos del agregado grueso; ninguna de estas posee señalización horizontal ni vertical.

CONTRATO DE OBRA 558 DE 2022 – MUNICIPIO DE MAGANGUÉ

El proyecto denominado: “MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO HASTA EL CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL DE CORTINAS DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.” Tiene como finalidad el mejoramiento de 5.5 km en pavimento asfáltico de la vía que conduce al municipio de Magangué con el corregimiento de San Rafael de Cortinas, en donde actualmente se encuentra en terreno natural destapado, el cual evidencia un gran porcentaje de áreas en mal estado, debido al deterioro provocado por las fuertes lluvias presentadas en la zona, donde no se dispone de obras de drenaje que mitiguen los efectos de las escorrentías sobre el terreno, y a la falta de mantenimiento o mejoramiento de la misma.

2.1. LOCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS

2.1.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO L.P.006 DE 2022.

El municipio de Achí está ubicado en la margen izquierda del Río Cauca, cerca de los límites con el departamento de Sucre en la llamada depresión Momposina, a los 8°34'09" de latitud norte y 74°33'22" de longitud oeste del meridiano de Greenwich, limitando con el municipio de Magangué al norte; los municipios de Pinillos y Tiquisio al este; Montecristo y San Jacinto del Cauca al sur; y el departamento de Sucre al oeste, con los municipios de Majagual y Guaranda, a una distancia de 229 km de Cartagena, la capital de Bolívar. Su extensión territorial es de 1471 km² y su altitud es media de 20 metros sobre el nivel del mar.



Ilustración 2 Ubicación general del municipio de Achí, Departamento de Bolívar.

El proyecto se encuentra ubicado en el Municipio de Achí, en los límites con el departamento de Sucre.

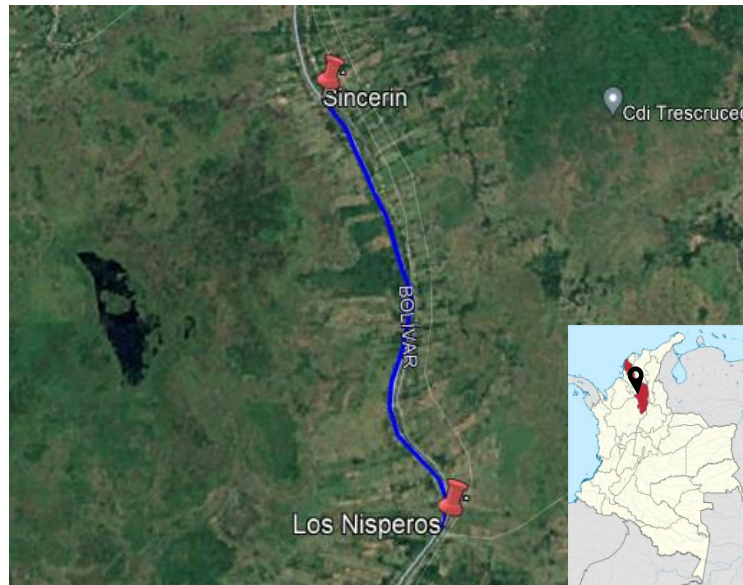


Ilustración 3 Ubicación Geográfica del sitio Corregimiento de Los Nisperos y Sincerin.

2.1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 557 DE 2022.

Los corregimientos de Cascajal, Ceibal y La Pascuala pertenecientes al municipio de Magangué que está ubicado al centro del departamento de Bolívar, situado en el extremo noroccidental de Colombia, a una distancia de 216.8 km de Cartagena, la capital de Bolívar, a los 9°14'48" de latitud norte y 74°45'34" de longitud oeste del meridiano de Greenwich. Localizado a orillas del río Magdalena y en la zona con más ciénagas del país.

Su extensión territorial es de 1568 km², su altitud media es de 49 metros sobre el nivel del mar; limita al norte con los departamentos de Córdoba y Magdalena; al sur con Achí; al oriente con Talaigua y Pinillos y al Occidente con el departamento de Sucre.

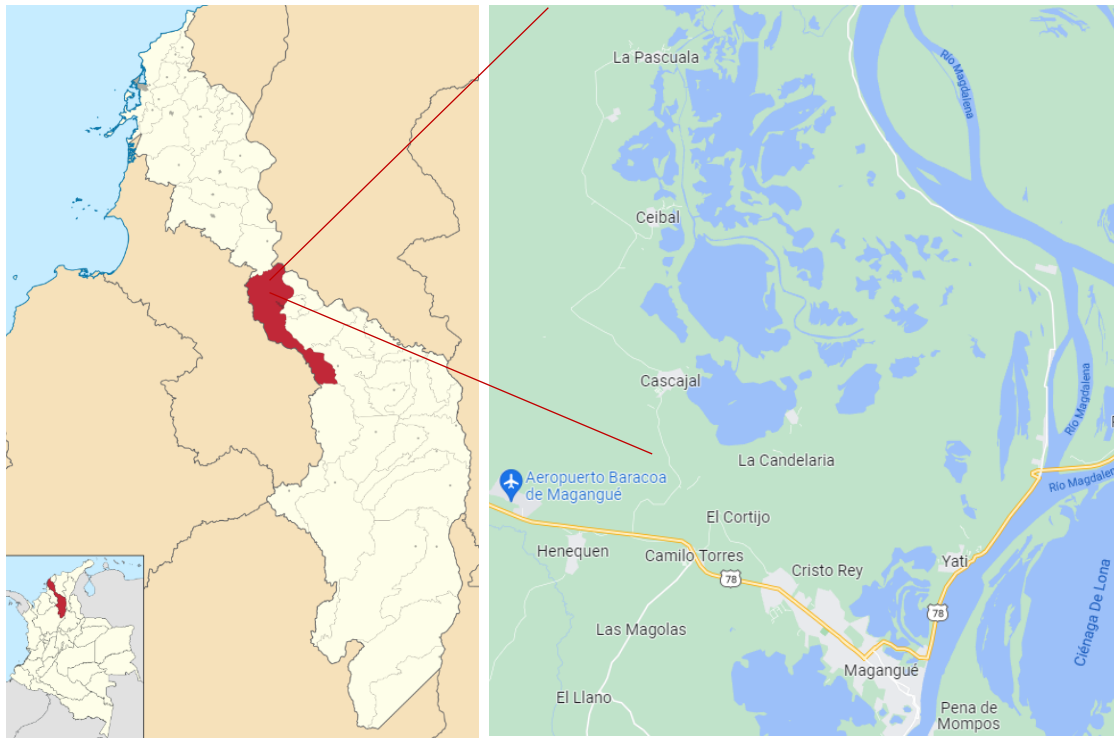


Ilustración 4 Ubicación general de los corregimientos Cascajal, Ceibal y La Pascuala del municipio de Magangué, Departamento de Bolívar.

El proyecto se encuentra ubicado en la vía que conduce a los corregimientos de Cascajal, La Pascuala y Ceibal, al centro del departamento de Bolívar, (abscisas de referencia inicio: K0+000 con coordenadas 9°18'56.56"N 74°48'29.02"O y fin K13+000 con coordenadas 9°23'44.18"N 74°49'07.57"O.)

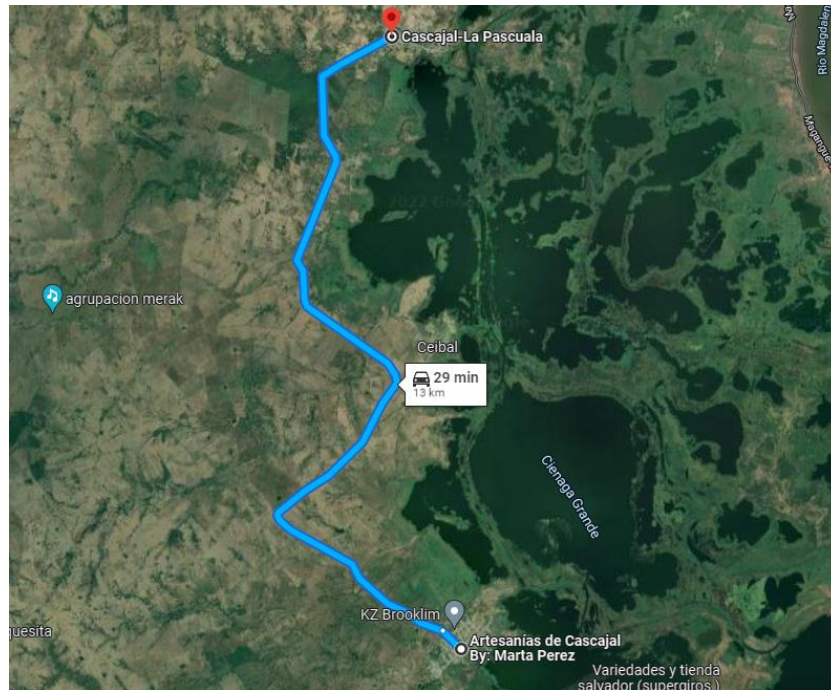


Ilustración 5 Ubicación Geográfica del sitio Corregimientos de Cascajal, Ceibal y La Pascuala.

Las fuentes de donde se tomarán los materiales son las siguientes:

- Base, subbase y triturado serán tomados de Tolú Viejo, a una distancia de 113 km del corregimiento de Ceibal como lo muestra la Ilustración 6.

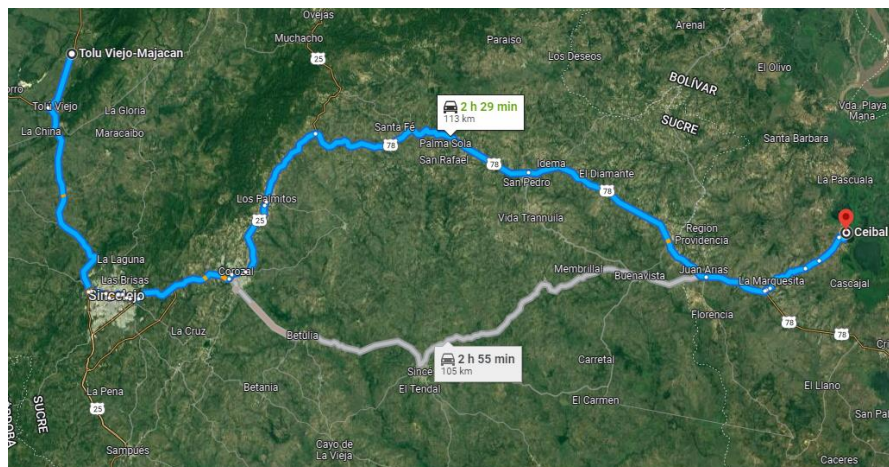


Ilustración 6. Fuente de base, subbase y triturado.

La concretera CONCRENORTE S.A.S. está ubicada a 87.6 km del corregimiento de Ceibal como lo muestra la Ilustración 7.

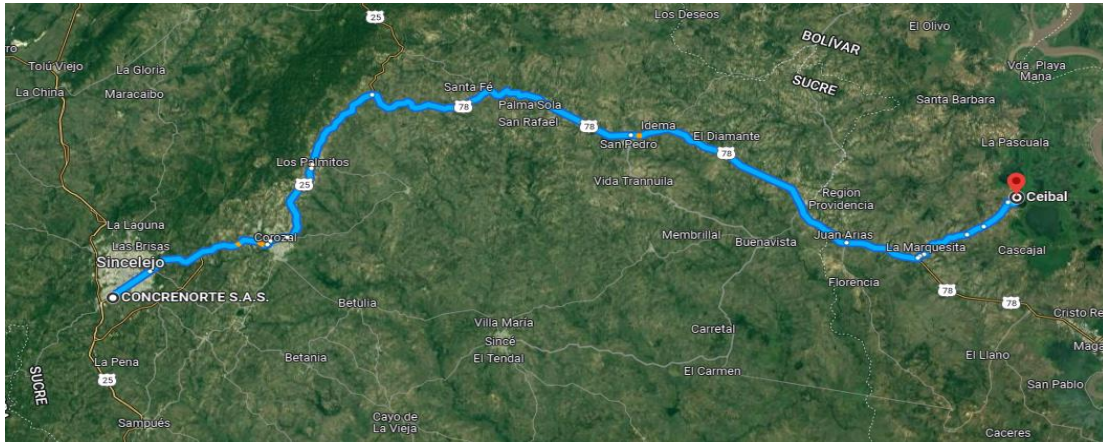


Ilustración 7. Ubicación de la concretera.

La planta de asfalto CMV se encuentra en Tolú Viejo Sucre a 111km del corregimiento de Ceibal como lo indica la Ilustración 8.

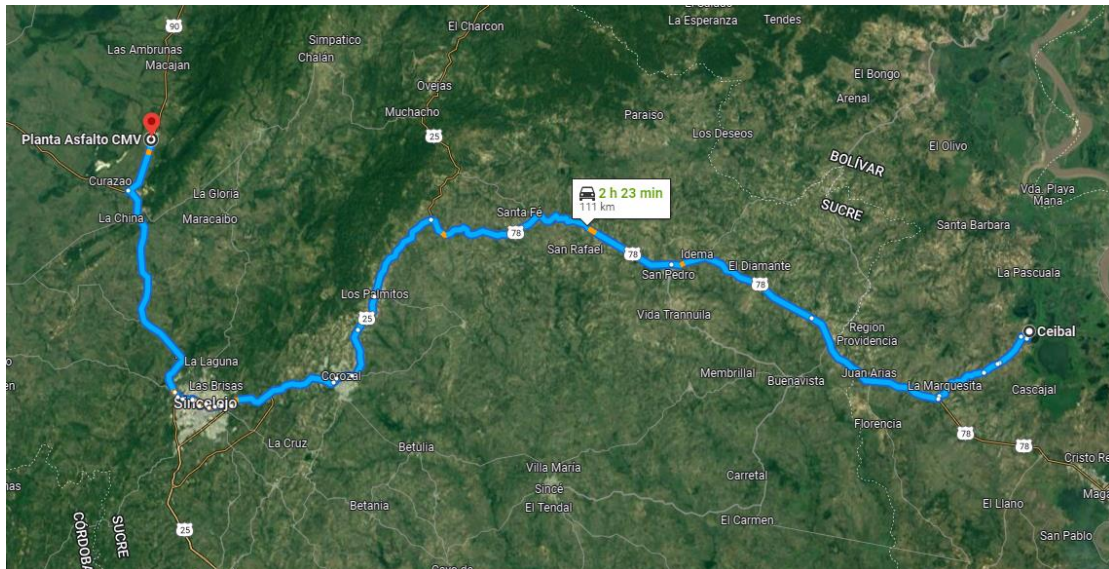


Ilustración 8. Ubicación de la planta de asfalto CMV.

2.1.3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 558 DE 2022.

El corregimiento de San Rafael De Cortinas perteneciente al municipio de Magangué está ubicado al centro del departamento de Bolívar, situado en el extremo noroccidental de Colombia, a una distancia de 216.8 km de Cartagena, la capital de Bolívar, a los 9°14'48" de latitud norte y 74°45'34" de longitud oeste del meridiano de Greenwich. Localizado a orillas del río Magdalena y en la zona con más ciénagas del país.

Su extensión territorial es de 1568 km², su altitud media es de 49 metros sobre el nivel del mar; limita al norte con los departamentos de Córdoba y Magdalena; al sur con Achí; al oriente con Talaigua y Pinillos y al Occidente con el departamento de Sucre.



Ilustración 9 Ubicación general del corregimiento de San Rafael de Cortinas en el municipio de Magangué, Departamento de La Guajira.



El proyecto de obra objeto de vigilancia contempla la realización del trazado, diseño geométrico y señalización para el mejoramiento de la vía que conduce del municipio de Magangué al corregimiento de San Rafael de Cortinas en el departamento de Bolívar. Esta vía presenta una longitud total de 5.5 km.

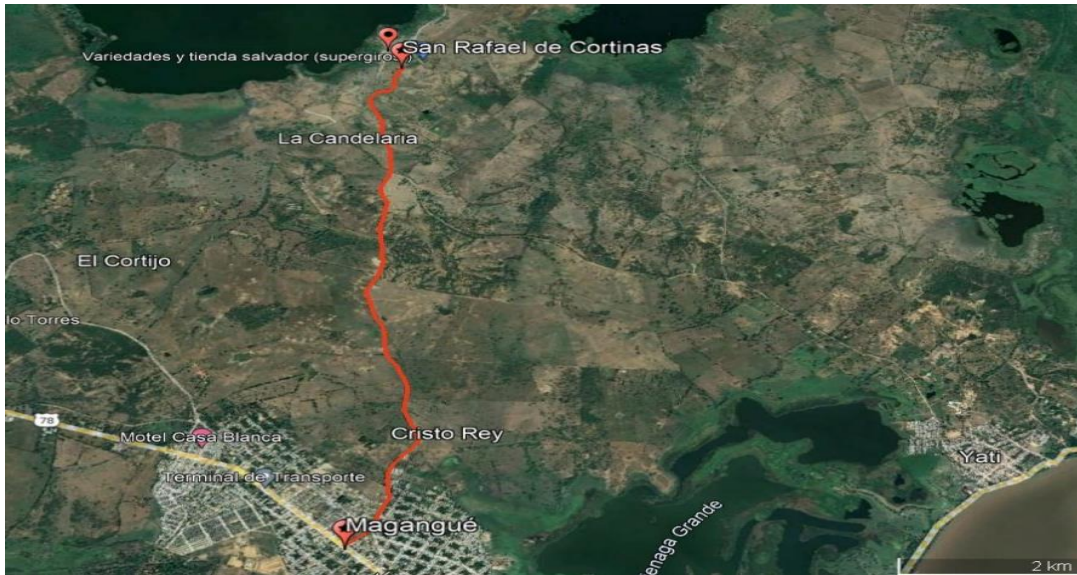


Ilustración 10 Ubicación Geográfica del sitio San Rafael de Cortinas.

Las fuentes de donde se tomarán los materiales son las siguientes:

- Base, subbase, triturado y mezcla asfáltica serán tomados de Tolú Viejo, a una distancia de 120 km del corregimiento de San Rafael de Cortina como lo muestra la Ilustración 11.

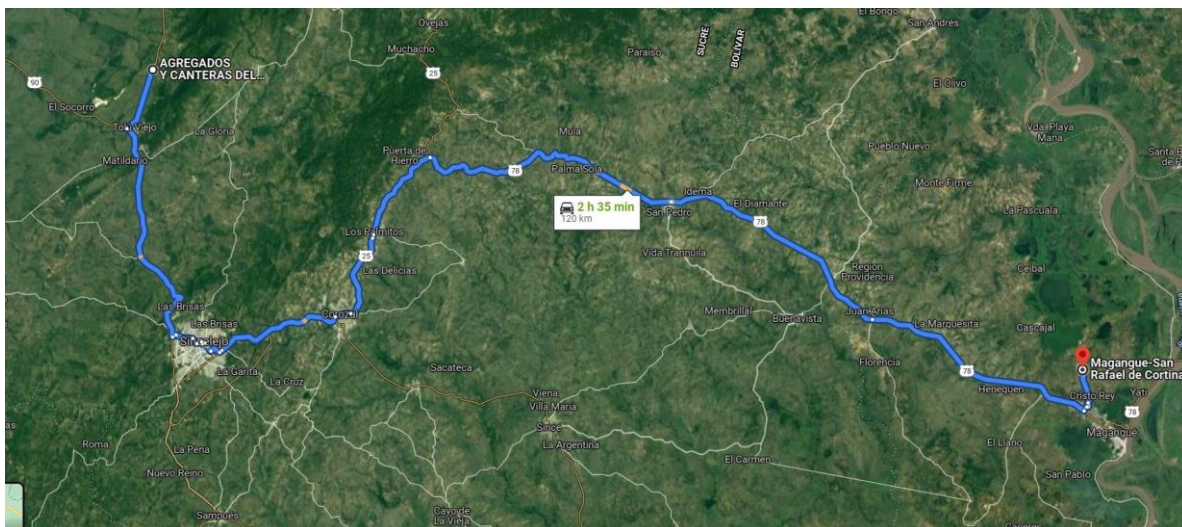


Ilustración 11. Fuente de base, subbase, triturado y mezcla asfáltica.



- El material terraplén y material seleccionado será tomado a una distancia de 17km del corregimiento de San Rafael de Cortina como lo muestra la Ilustración 12.

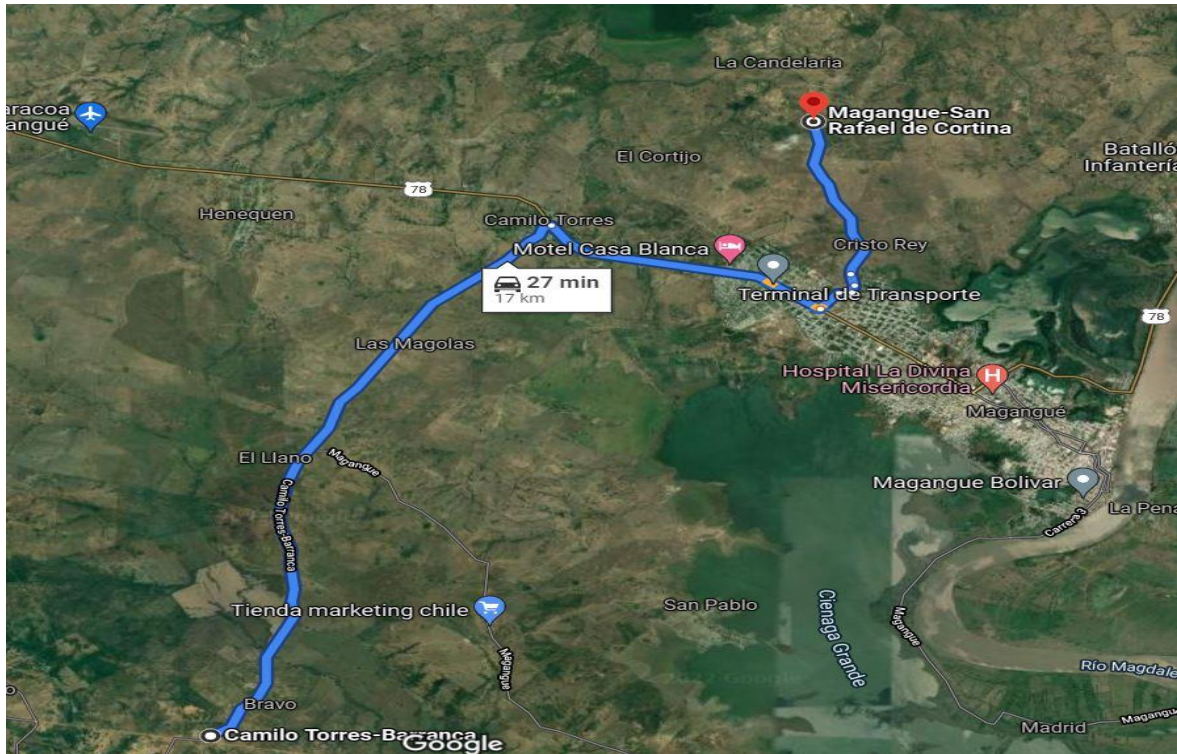


Ilustración 12. Fuente de material terraplén y material seleccionado.

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

2.2.1. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto N°L.P.006 de 2022.

La intervención por realizar comprende el mejoramiento de la infraestructura de la vía rural, para normalizar el tránsito de la población de la zona, debido a que en época de invierno se hace casi imposible transitar por dicha vía, y a su vez se garantiza un acceso idóneo a usuarios de la vía, principalmente a estudiantes pertenecientes a los corregimientos aledaños como, Concepción, Arboleda, La travesía, Paso Mantequera y demás población. Asimismo, proporciona un mejor acceso a puntos de atención médica del municipio de Achí, el puesto de salud de Arboleda y otros puntos de gran confluencia.



2.2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto N°557 de 2022.

La construcción de este proyecto permitirá la comercialización de los productos entre los centros urbanos y los de producción de la zona, el control de aguas de drenaje para evitar inundaciones en temporadas de lluvia y de esa forma facilitar el acceso de las comunidades a los diferentes centros urbanos de los municipios y una reducción significativa de costos de actividad productiva en la zona, puesto que en es un tramo en el que se cultivan y comercializan muchos productos agrícolas, posibilitando así su mercado en la capital del departamento de Sucre y otras ciudades cercanas.

2.2.3. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto N°558 de 2022.

La construcción de este proyecto permitirá la comercialización de los productos entre los centros urbanos y los de producción de la zona, el control de aguas de drenaje para evitar inundaciones en temporadas de lluvia y de esa forma facilitar el acceso de las comunidades a los diferentes centros urbanos de los municipios y una reducción significativa de costos de actividad productiva, puesto que es un tramo en el que se cultivan y comercializan muchos productos agrícolas, posibilitando así su mercado en la capital del departamento de Sucre y otras ciudades cercanas.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA.

2.3.1. Inventario y estado inicial de la Vía proyecto N°L.P.006 de 2022.

Para el reconocimiento de la vía se realizó una visita técnica el día 16 de noviembre de 2022, donde estuvieron presentes funcionarios de la Administración Municipal de Achí – Bolívar, ingenieros representantes del Contratista de la obra y la ingeniera directora de la Interventoría. Siendo las 2:30 p.m., se reunieron los invitados en el punto de encuentro, la vivienda del alcalde en el municipio de Achí, desde este punto se partió al tramo en donde se desarrollarán las obras en el marco del contrato de obra L.P.006 de 2022. El recorrido de aproximadamente 10 km se realizó en motos en la siguiente ruta Los Nísperos - Sincerin.

Se hizo reconocimiento del estado actual de la vía, evidenciándose lo imprescindible que es la realización de la obra; se encontró una vía con presencia de obras de arte, en muy mal estado producto de las lluvias provocando una difícil situación de movilidad para estas poblaciones y otros corregimientos aledaños puesto que esta es la única vía de acceso de los habitantes a sus instituciones educativas, centros de salud y el único modo para movilizarse es en moto o caminando. Se tomó registro fotográfico del tramo.



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES



Fotografía 1. Tramo de la vía en terreno entre las abscisas K4+100 Y K4+200



Fotografía 2. Tramo de la vía en terreno entre las abscisas K5+300 Y K5+400



Fotografía 3. Tramo de la vía en terreno entre las abscisas K5+300 Y K5+400

2.3.2. Inventario y estado inicial de la vía proyecto N°557 de 2022.

Para el reconocimiento de la vía se realizó una visita técnica el día 6 de septiembre del 2022, donde estuvieron presentes funcionarios de Invias, de la Administración Municipal de Magangué – Bolívar, ingenieros representantes del Contratista de la obra y la ingeniera Directora de la Interventoría.

El recorrido fue de aproximadamente 13 kilómetros, conformada por una superficie del terreno o rasante tipo afirmado, con evidentes tramos en deterioro K6+500 – K6+700. Por otra parte, la comunidad expresa que han pasado por temporadas en las que en nivel de los cuerpos de agua sube hasta llegar a cubrir la vía, situación que no se evidenció para la temporada en la que fue realizada la visita. Además, se realizará la intervención de 4 puentes vehiculares que evidencian la carencia de barandas, exposición del acero expuesto y desportillamiento.



Fotografía 4. Tramo de la vía en terreno entre las abscisas K0+100 Y K1+000



Fotografía 5. Tramo de la vía en terreno entre las abscisas k6+500 y k6+700



*Fotografía 7. Puente 1, ubicación 9°19'9.12" N
- 74°48'51.42" O.*



*Fotografía 6. Puente 1 evidencia de carencia de
barandas y exposición de acero de refuerzo.*



Fotografía 8. Puente 2 barandas con presencia de desportillamiento y acero expuesto.



Fotografía 9. Puente 3 Corrosión en acero expuesto.



Fotografía 10. Puente 4, barandas con desportillamiento.

2.3.3. Inventario y estado inicial de la vía proyecto N°558 de 2022.

En la visita de obra realizada el día 7 de septiembre de 2022, se hizo reconocimiento total del tramo materia del contrato en donde estuvieron presentes ingenieros Contratistas, directora de interventoría, Alcaldía de Magangué e Instituto Nacional de Vías – INVIAS. Se evidencio una vía difícil de transitar, dificultando la comunicación de la cabecera municipal hasta el municipio de San Rafael de Cortinas. Los tramos K2+100 – K2+230 y K4+300 – K4+550 evidencian ser críticos, por lo que se hace necesario la pavimentación de la vía.

	
<p><i>Fotografía 11. K2+100.</i></p>	<p><i>Fotografía 12. K4+300.</i></p>

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

2.4.1. Características Técnicas del proyecto N°L.P.006 de 2022.

Si bien es cierto que, existen unos diseños iniciales que comprenden un estudio de suelos, un estudio hidráulico, un diseño de pavimentos y un diseño geométrico para la placa huella, dentro de la etapa inicial del contrato, se incluyó una actividad denominada “*Revisión y/o ajuste a estudios y diseños (Placa huella, Pavimento y estructuras de drenaje)*”, de cuyo resultado, surgirá la versión final de los estudios y diseños.

2.4.1.1. Parámetros de diseño

La velocidad de diseño esta entre 40 y 50 (Km/h), velocidad específica de la curva horizontal no menor a 50 Km/h, radio de curvatura mínimo de 78.7m y un radio mínimo redondeado de 79m. El transito promedio diario (TPD) es de 30 vehículos diarios y el número de ejes acumulados de 8.2 Ton es <1'000.000 ejes. Al presentar un volumen de tránsito bajo, en cuanto al coeficiente de drenaje y de transmisión de cargas los valores son de 1.0 y 2.7 respectivamente. Un pavimento con espesor de losa de 3.4" cuyo soporte tiene un CBR igual a 2.30% y un módulo de reacción de la subrasante de 20Mpa. 3000 PSI o 32 Kg/cm².

2.4.1.2. Parámetros geométricos

La vía, al encontrarse dentro de zona rural, es tomada como vía terciaria, consiste en la construcción de placas huellas en concreto que constan de dos (2) huellas de 0.90 m de ancho, (8.6) centímetros de espesor y una longitud de tres (3.0) metros cada huella, separadas entre sí por tres secciones de piedra pegada, dos secciones ubicadas en los lados externos y una central de 0.90 m, construidas en concreto de 3.000 psi. Las placas están arriostradas por unas viguetas de 20 cm de ancho por 25 cm de alto, localizadas cada tres (3) metros. El desarrollo longitudinal de la vía tiene pendientes de (0.30% - 12%) de tal manera que se conserve el perfil longitudinal que actualmente tiene la vía. En tangentes se efectúa el drenaje a dos direcciones con bombeos laterales de 2%, para las secciones en curva la pendiente transversal obedece al mismo valor del bombeo ya que las velocidades son bajas.

2.4.2. Características técnicas del proyecto N°557 de 2022.

Si bien es cierto que, existen unos diseños iniciales, dentro del proyecto se incluyó una actividad denominada "*Revisión y/o ajuste a estudios y diseños (Placa huella, Pavimento y estructuras de drenaje)*", de cuyo resultado, surgirá la versión final de los estudios y diseños.

2.4.2.1. Parámetros de diseño

La velocidad de diseño será entre 50 y 60 (Km/ h), radio de curvatura mínimo de 73 m para una velocidad de 50 km/h y de 113 m para una velocidad de 60 km/h. La distancia de visibilidad de parada mínima adoptada para el proyecto es de 65 m en los tramos de terreno ondulado y 85 m en los tramos sobre terreno plano, distancia de visibilidad de adelantamiento mínima adoptada es de 345 m y 410 en tramos sobre terreno plano. El diseño en planta de la vía consta de elementos geométricos que permiten la operación segura, entre ellos se encuentra el radio de curvatura mínimo que para este caso teniendo una velocidad de 50 km/h es de 73 m y para una velocidad de 60 km/h es de 113 m. La pendiente longitudinal mínima es de 0.3% teniendo en cuenta que la vía se ubica en un terreno plano y la pendiente longitudinal máxima es de 6%.

El transito promedio diario (TPD) es de 213 vehículos diarios y el número de ejes equivalentes de 8.2 ton para un periodo de diseño de 10 años es de 172309.

Se diseñarán 20 estructuras de drenaje box culverts con un periodo de retorno de 20 años.

2.4.2.2. Parámetros geométricos

La vía es considerada vía terciaria, con carriles en dos direcciones cuyo ancho de calzada es de 7 m, compuesta por bermas de 0.5 m y carriles de 3.0 m. El sistema cuenta con cunetas de sección triangular de 1.0 m, distribuido 0.96 m al lado de la calzada y 0.04 m del lado del talud y 0.20 m de profundidad, obteniendo así una pendiente lateral de 20.8%

2.4.3. Características técnicas del proyecto N°558 de 2022.

Si bien es cierto que, existen unos diseños iniciales, dentro del proyecto se incluyó una actividad denominada “*Revisión y/o ajuste a estudios y diseños (Placa huella, Pavimento y estructuras de drenaje)*”, de cuyo resultado, surgirá la versión final de los estudios y diseños.

2.4.3.1. Parámetros de diseño

La velocidad de diseño será de 60 km/h para los tramos en terreno plano y de 50 km/h para los tramos en terreno ondulado, el radio de curvatura mínimo de 73 m para una velocidad de 50 km/h y de 113 m para una velocidad de 60 km/h. La distancia de visibilidad de parada mínima adoptada para el proyecto es de 65 m en los tramos de terreno ondulado y 85 m en los tramos sobre terreno plano, distancia de visibilidad de adelantamiento mínima adoptada es de 345 m y 410 m en tramos sobre terreno plano. El diseño en planta de la vía consta de elementos geométricos que permiten la operación segura, entre ellos se encuentra el radio de curvatura mínimo que para este caso teniendo una velocidad de 50 km/h es de 73 m y para una velocidad de 60 km/h es de 113 m. La pendiente longitudinal mínima es de 0.3% teniendo en cuenta que la vía se ubica en un terreno plano y la pendiente longitudinal máxima es de 6%.

El tránsito promedio diario (TPD) es de 706 vehículos diarios y el número de ejes equivalentes de 8.2 ton para un periodo de diseño de 10 años es de 6153044 ejes.

Se diseñaron 10 estructuras de drenaje box culverts con un periodo de retorno de 20 años cuyas dimensiones son de 1.0 m x 1.0m.

SECCIÓN TÍPICA

Sin escala

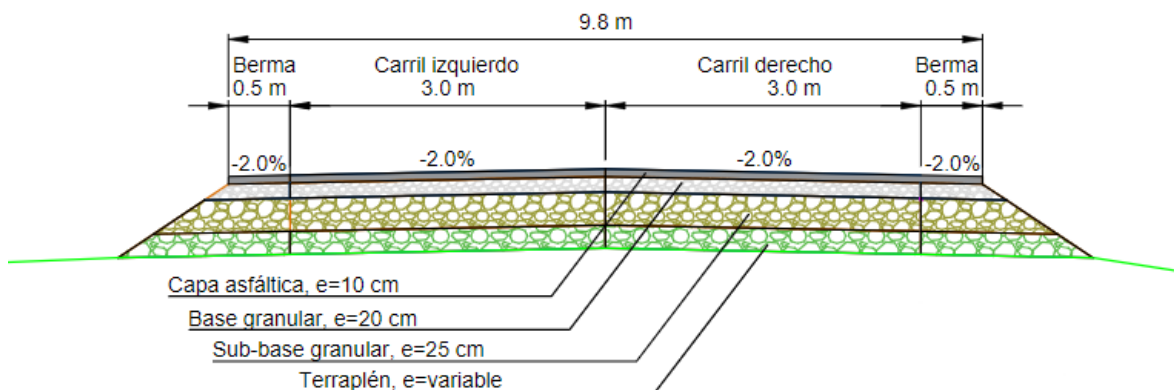


Ilustración 13. Sección típica de la vía.

2.4.3.2. Parámetros geométricos

La vía es considerada vía terciaria, con carriles en dos direcciones cuyo ancho de calzada es de 7 m, compuesta por bermas de 0.5 m y carriles de 3.0 m. El sistema cuenta con cunetas de sección triangular de 1.0 m, distribuido 0.96 m al lado de la calzada y 0.04 m del lado del talud y 0.20 m de profundidad, obteniendo así una pendiente lateral de 20.8%.

3. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA

El contrato de interventoría está elaborado para dar seguimiento y control a tres contratos de obra a ejecutar en dos Municipios, Magangué (dos contratos) y Achí (Un contrato). Los cuales se encuentran en el siguiente estado a la fecha, tal como se evidencia en la siguiente tabla.

Municipio	Estado	No. Contrato	Contratista
Achí	En ejecución	L.P.006 de 2022	CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK
Magangué (Cascajal, Ceibal, La Pascuala)	En ejecución	557 de 2022	CONSORCIO SAN RAFAEL
Magangué (San Rafael de Cortina)	Finalizado	558 de 2022	CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUÉ

Tabla 1 Información del estado de los Contratos de Obra

A continuación, se hace un recuento detallado de cada uno de los contratos y su estado de ejecución contractual:

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

3.1.1. Información general del contrato de obra L.P 006 de 2022 – municipio de Achí.

CONDICIONES – CONTRATO DE OBRA L.P.006 DE 2022	
Número de contrato:	L.P.006 DE 2022
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CORREGIMIENTO DE LOS NÍSPEROS HASTA EL CORREGIMIENTO DE SINCERIN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACHÍ – DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
Contratista:	CONSORCIO VÍA LOS NÍSPEROS JK JAVIER JOSE DOMINGUEZ 40% - KABOB EXECUTIVE GROUP S.A.S 60%
NIT	901.627.819-5
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	10 de agosto de 2022
Valor Inicial:	\$8.085.806.846.00
Fecha de inicio:	29 de noviembre de 2022
Fecha de terminación contractual:	29 de mayo de 2023
Fecha de terminación actual:	27 de mayo de 2025
Prorroga 1:	Un (1) mes a partir del 29 de mayo de 2023
Prorroga 2:	Cuatro (4) meses a partir del 29 de junio de 2023
Suspensión 1:	Un (1) mes a partir del 29 de octubre de 2023
Acta de reinicio 1:	25 de noviembre de 2023
Prorroga 3:	Un (1) mes a partir del 29 de noviembre de 2023
Prorroga 4:	Tres (3) meses a partir del 29 de diciembre de 2023
Prorroga 5:	Cuatro (4) meses a partir del 29 de marzo de 2024
Prorroga 6:	Dos (2) meses a partir del 29 de julio de 2024
Suspensión 2:	Un (1) mes a partir de 30 de agosto de 2024
Acta de reinicio 2:	1 de octubre de 2024
Suspensión 3:	Un (1) mes y veintiséis (26) a partir del 8 de octubre de 2024
Acta de reinicio 3:	5 de diciembre de 2024
Prorroga 7:	Cinco (5) meses
Plazo inicial:	Seis (6) meses
Plazo total:	Veintinueve (29) meses y veintiocho (28) días

Tabla 2 Información Contrato de Obra L.P.006 DE 2022 Municipio de Achí.

3.1.2. Información general del contrato de obra 557 de 2022 – municipio de Magangué

CONDICIONES – CONTRATO DE OBRA 557 DE 2022	
Número de contrato:	557 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE CASCAJAL HASTA EL CORREGIMIENTO DE LA PASCUALA DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
Contratista:	CONSORCIO SAN RAFAEL, conformado por, PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S 90% - A.S.S. CONSTRUCTORA S.A.S. 10%.
NIT:	901.613.519-1
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	15 de julio de 2022
Valor Inicial:	\$22.888.390.685.00
Fecha de inicio:	24 de octubre de 2022
Fecha de terminación inicial:	24 de abril de 2024
Fecha de terminación actual:	24 de febrero de 2025
Prorroga 1:	Tres (3) meses a partir del 24 de abril de 2024
Prorroga 2:	Cinco (5) meses a partir del 24 de julio de 2024
Prorroga 3:	Dos (2) meses a partir del 24 de diciembre de 2024
Plazo inicial:	Dieciocho (18) meses
Plazo final	Veintiocho (28) meses
Fecha adición:	29 de noviembre de 2023
Adición:	\$10.180.710.000.00
Dirección:	Marbella, Cra 3# 46-57, Edificio Laguna 46, Oficina 1401
No. De teléfono:	(5) 643 6418

Tabla 3 Información Contrato de Obra 557 de 2022 Municipio de Magangué vía que conduce desde Cascajal hasta La Pascuala.

3.1.3. Información general del contrato de obra 558 de 2022 – municipio de Magangué

CONDICIONES INICIALES - CONTRATO DE OBRA 558 DE 2022	
Número de contrato:	558 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO HASTA EL CORREGIMIENTO DE LA SAN RAFAEL DE CORTINAS DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
Contratista:	CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUÉ, conformado por: CONSTRUCCION S.A.S. 90% - SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIANOS S.A.S. 10%
NIT:	901.613.672-9
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	15 de julio de 2022
Valor Inicial:	\$12.301.199.730.00
Fecha de inicio:	19 de octubre de 2022
Fecha de terminación contractual:	18 de enero de 2024
Fecha de terminación actual:	30 de julio de 2024
Fecha adición:	14 de diciembre de 2023
Adición:	\$5.470.830.000.00
Prorroga 1:	Tres (3) meses a partir del 18 de enero de 2023
Prorroga 2:	Dos (2) meses a partir del 18 de abril de 2024
Prorroga 3:	Cuarenta y tres (43) días a partir del 17 de junio de 2024
Plazo inicial:	Quince (15) meses
Plazo total:	Veinte (20) meses y cuarenta y tres (43) días
Fecha de Finalización de obra:	30 de julio de 2024
Dirección:	Av Pedro de Heredia Calle 31 No.50–122 Edificio Torre Sion Of. 301
No. De teléfono:	(205)5091845

Tabla 4. Información contrato de obra 558 de 2022 vía que conduce desde el municipio de Magangué hasta el corregimiento de San Rafael de Cortinas.

3.2. Descripción de las Actividades Ejecutadas en el mes.

3.2.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas en el mes contrato L.P.006 de 2022

Semana del 27 de diciembre de 2024 al 2 de enero de 2025: Se realiza mejoramiento de acceso a la vía en puntos críticos. se presentan fuertes lluvias en la semana.

Semana del 3 al 9 de enero de 2025: Se realiza mejoramiento de acceso a la vía en puntos críticos. se presentan fuertes lluvias durante la semana.

Semana del 10 al 16 de enero de 2025: Se realiza mejoramiento de acceso a la vía en puntos críticos, acopio de madera para instalación de formaletas, instalación de formaletas y armado de acero de refuerzo. lluvias en la semana.

Semana del 17 al 23 de enero de 2025: El contratista durante la semana no realiza actividades sin justificación alguna.

Semana del 24 al 30 de enero de 2025: Se realiza mejoramiento de acceso a la vía en puntos críticos, acopio de material pétreo, instalación de formaletas y armado de acero de refuerzo.

La Tabla 5 muestra el control de la inversión y de los saldos de cada una de las actividades, provisiones y gestiones.

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR ACTUALIZADO (Según última acta de modificación)	VALOR EJECUTADO MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
Sub-total básico de obra	\$ 8.038.849.320	N/A	\$ 960.105.258,70	\$ 1.560.076.972,61	\$ 6.478.772.347
Obras de compensación ambiental y/o complementarias (PAGA)	\$ 16.372.622	N/A	\$ 0	\$ 0	\$ 16.372.622
Revisión y/o ajustes a estudios y diseños (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	\$ 25.701.600	N/A	\$ 0	\$ 20.561.280	\$ 5.140.320
IVA - Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños.	\$ 4.883.304	N/A	\$ 0	\$ 3.906.643	\$ 976.661
Total estudios y diseños, revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños	\$ 30.584.904	N/A	\$ 0	\$ 24.467.923	\$ 6.116.981
VALOR TOTAL	\$ 8.085.806.846		\$ 960.105.258,70	\$ 1.584.544.895,81	\$ 6.501.261.950

Tabla 5. Saldos de cada una de las actividades para el control de la inversión L.P.006 de 2022.

Etapas de estudios y diseños.

La interventoría está en revisión del PAGA remitido por el contratista, la cual la interventoría, mediante el comunicado GIC-INVIAS-BOL-547-22, realiza solicitud de la cartografía del área de influencia directa, planos de localización del proyecto, formatos requeridos en el manual de interventoría y anexos cartográficos.



3.2.2. Descripción de las Actividades Ejecutadas en el mes Contrato 557 de 2022.

Semana del 27 de diciembre de 2024 al 2 de enero de 2025: construcción de piedra pegada en ambos márgenes de la vía, céreo de base granular clase c y acopio de base granular clase c en el campamento de k4+320.

Semana del 3 al 9 de enero de 2025: Construcción de cunetas, construcción de piedra pegada en ambos márgenes de la vía, instalación y compactación de mezcla densa en caliente mdc-19, acopio de base granular clase c en el campamento de k4+320.

Semana del 10 al 16 de enero de 2025: Construcción y limpieza de cunetas en el margen izquierdo de la vía, obra para protección de taludes en terraplén de la vía mediante excavación para desvío de cauce (se estaba a la espera de que cesara el invierno para la realización de la actividad), céreo y compactación de base granular clase c, acopio de material de base en campamento del k4+320, levantamiento con rtk para el plano récord del proyecto.

Semana del 17 al 23 de enero de 2025: Instalación de la mezcla densa en caliente mdc-19 en margen izquierdo de la vía, construcción de las cunetas del lado derecho de la vía, instalación de la base granular clase c, perfilado y conformación del talud del terraplén en la vía, obras de protección e instalación de dique para protección de taludes.

Semana del 24 al 30 de enero de 2025: Instalación de la mezcla densa en caliente mdc-19 en margen izquierdo de la vía, construcción de las cunetas del lado derecho de la vía, perfilado y conformación del talud del terraplén en la vía para obras de protección de taludes (piedra pegada), obras de protección e instalación de muro de protección en los accesos de los puentes.

La siguiente Tabla. muestra el control de la inversión y de los saldos de cada una de las actividades, provisiones y gestiones

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR ACTUALIZADO (Según última acta de modificación)	VALOR EJECUTADO MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
Sub-total básico de obra	\$ 22.790.815.161	\$ 32.971.525.180	\$ 5.116.665.949,00	\$ 31.509.278.078	\$ 1.462.247.102
Obras de compensación ambiental y/o complementarias (PAGA)	\$ 21.995.505	\$ 21.995.505	\$ 0	\$ 0	\$ 21.995.505
Revisión y/o ajustes a estudios y diseños (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	\$ 50.580.000	\$ 50.580.000	\$ 0	\$ 13.595.904	\$ 36.984.096
IVA - Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños.	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	\$ 0	\$ 2.583.221,76	\$ 22.416.778
Total estudios y diseños, revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños	\$ 75.580.000	\$ 75.580.000	\$ 0	\$ 16.179.126	\$ 59.400.874
VALOR TOTAL	\$ 22.888.390.666	\$ 33.069.100.685	\$ 5.116.665.949,00	\$ 31.525.457.203,29	\$ 1.543.643.482

Tabla 6. Saldos de cada una de las actividades para el control de la inversión 557 de 2022.



3.2.3. Descripción de las Actividades Ejecutadas en el mes Contrato 558 de 2022.

Actividades de obra finalizadas el 30 de julio de 2024.

La siguiente Tabla. muestra el control de la inversión y de los saldos de cada una de las actividades, provisiones y gestiones.

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR ACTUALIZADO (Según última acta de modificación)	VALOR EJECUTADO MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
Sub-total básico de obra	\$ 12.222.705.570	\$ 17.693.535.570	\$ 5.427.856.130	\$ 16.875.132.706	\$ 818.402.865
Obras de compensación ambiental y/o complementarias (PAGA)	\$ 37.016.472	\$ 37.016.472	\$ 0	\$ 0	\$ 37.016.472
Revisión y/o ajustes a estudios y diseños (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	\$ 34.855.200	\$ 34.855.200	\$ 0	\$ 6.971.040	\$ 27.884.160
IVA - Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños.	\$ 6.622.488	\$ 6.622.488	\$ 0	\$ 1.324.498	\$ 5.297.990
Total estudios y diseños, revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños	\$ 41.477.688	\$ 41.477.688	\$ 0	\$ 8.295.538	\$ 33.182.150
VALOR TOTAL	\$ 12.301.199.730	\$ 17.772.029.730	\$ 5.427.856.130,33	\$ 16.883.428.244	\$ 888.601.487

Tabla 7. Saldos de cada una de las actividades para el control de la inversión 558 de 2022.

3.3. Seguimiento Ítems No Previstos

3.3.1. Seguimiento Ítems No previstos contrato L.P.006 de 2022.

Los ítems existentes en las condiciones contractuales de los contratos de obra objetos del presente informe, fueron incluidos por parte de la Entidad Estatal en la etapa de planeación y contemplados en el valor total presupuestado para el Proceso de Contratación. A la fecha del presente informe no se han contemplado ítems no previstos.

3.3.2. Seguimiento Ítems No Previstos contrato 557 de 2022.

Durante la ejecución del contrato de obra, se identificaron diversos elementos no contemplados en el presupuesto inicial, lo que ha generado la necesidad de realizar ajustes y revisiones en la gestión financiera del proyecto. A continuación, se muestran los Ítems no previstos presentados durante la ejecución del proyecto.

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				Acta No 3		OBRA EJECUTADA	
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ÍTEM NO PREVISTOS						\$ 572.401.465,14		\$ 572.401.465,00
OBRAS DE PROTECCIÓN								
NP56	Empradizado de taludes	m2		\$ 9.953,76	3390,00	\$ 33.743.229,69	3390,00	\$ 33.743.230
NP57	RECUBRIMIENTO CON PIEDRA PEGADA Y MORTERO 1:4 de e= 10 cm	m2		\$ 85.558,81	5564,30	\$ 476.074.870,41	5564,30	\$ 476.074.870
NP58	REMOCIÓN DE CERCAS DE ALAMBRE	ml		\$ 2.386,81	2783,06	\$ 6.642.622,56	2783,06	\$ 6.642.623
NP59	CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE MADERA	ml		\$ 20.028,91	2793,00	\$ 55.940.742,48	2793,00	\$ 55.940.742
PUENTES								
NP 60	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1,0 M (incluye acero de refuerzo según	ml		\$ 3.980.718,00				
NP 61	Baranda metálica para tráfico vehicular	ml		\$ 1.905.492,00				
NP 62	IZAJE DE VIGAS	Und		\$ 79.963.421,00				

NOV	%	12.86%	48.56%	0.21%	35.91%
	VALOR	\$1.039.834.760,4	\$3.926.467.804,42	\$16.980.194,38	\$2.903.613.238,39

Tabla 8. Estado de avance ejecutado CTO L.P.006 de 2022.

3.4.2. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría contrato 557 de 2022.

A la fecha de elaboración del presente informe mensual de Interventoría No. 29 (del 1 de enero de 2025 al 31 de enero de 2025), **GAVINCO INGENIEROS CONSUSTORES S.A.S.** realizó lo siguiente:

- ✓ Se han adelantado actividades de elaboración de informes semanales, 122, 123, 124, 125 y 126; vigilancia y control ante el cumplimiento de los términos y condiciones del contrato y seguimiento a las obligaciones del municipio de acuerdo con el convenio administrativo no. 1897 de 2021.
- ✓ Vigilancia y control ante el cumplimiento de los términos y condiciones del contrato.
- ✓ Inspecciones de las actividades realizadas en obra.
- ✓ Presencia en el corredor vial para supervisión.
- ✓ Se realiza vigilancia y control ante el cumplimiento de los términos y condiciones del contrato y seguimiento a las obligaciones del municipio de acuerdo al convenio interadministrativo no. 1897 de 2021.
- ✓ Se aprueba prorroga N°3 mediante oficio respuesta a comunicado CSR-557-070.
- ✓ Respuesta a comunicación CSR-557-060- entrega de ajustes del PAGA, se remite paga CTO 557 de 2022 a la subdirección de sostenibilidad.

El estado de avance ejecutado acumulado hasta el día 31 de enero de 2025, es del 96.27%

1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025					
	VALOR DEL PROYECTO			\$ 33.069.100.685	
MES		OBRA PROGRAMADA		OBRA EJECUTADA	
		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
NOV	%	2,47%	97,70%	1,04%	96,27%
	VALOR	816.806.786,92	\$32.308.511.369,25	\$343.918.647,12	\$31.834.738.994,47

Tabla 9. Estado de avance ejecutado CTO 557 de 2022.

3.4.3. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría contrato 558 de 2022.

A la fecha de elaboración del presente informe mensual de Interventoría No. 29 (del 1 de enero de 2025 al 31 de enero de 2025), **GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.** realizó lo siguiente:

- ✓ Vigilancia y control ante el cumplimiento de los términos y condiciones del contrato y seguimiento a las obligaciones del municipio de acuerdo con el convenio administrativo no. 1898 de 2021.
- ✓ Vigilancia y control ante el cumplimiento de los términos y condiciones del contrato.
- ✓ Seguimiento a las obligaciones del municipio de acuerdo al convenio interadministrativo No. 1897 de 2021

El estado de avance ejecutado acumulado hasta el día 31 de enero de 2025, es del 100%.

1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025					
VALOR DEL PROYECTO				\$ 17.772.029.730	
MES		OBRA PROGRAMADA		OBRA EJECUTADA	
		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
NOV	%	0 %	100%	0 %	100%
	VALOR	\$0	\$17.772.029.730	\$0	\$17.772.029.730

Tabla 10. Estado de avance ejecutado CTO 558 de 2022.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

Reportes ejecución mensual contrato de obra L.P 006 de 2022 – municipio de Achí

No.	Contenido	Formato	Observación
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	Aplica
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	Aplica
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	Aplica



4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	Aplica
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	Aplica
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	Aplica
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	Aplica
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	Aplica
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	No aplica – El Contrato de Obra Pública L.P. 006 de 2022, no presenta anticipo ni pago por anticipado
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		Aplica
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	Aplica
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	Aplica
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	Aplica
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	Aplica
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		Aplica
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		Aplica
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades		Aplica



	ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas.		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		Aplica

Tabla 11. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA L.P 006 DE 2022 – MUNICIPIO DE ACHÍ.

Reportes ejecución mensual contrato de obra No. 557 de 2022 – municipio de Magangué – Lote 1.

No.	Contenido	Formato	Observación
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	Aplica
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	Aplica
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	Aplica
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	Aplica
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	Aplica
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	Aplica
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	Aplica



4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	Aplica
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	No aplica – El Contrato de Obra Pública 557 de 2022, no presenta anticipo ni pago por anticipado
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		Aplica
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	Aplica
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	Aplica
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	Aplica
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	Aplica
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		Aplica
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		Aplica, se anexa el registro fotográfico correspondiente a las actividades en obra.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales,		Aplica, se anexa el registro fotográfico correspondiente a las actividades en obra.



	prediales y de sostenibilidad adelantadas.		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		Aplica, se anexa copia de bitácora correspondiente a las actividades en obra.

Tabla 12. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA No. 557 DE 2022 – MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – LOTE 1.

Reportes ejecución mensual contrato de obra no. 558 de 2022 – Municipio de Magangué – Lote2.

No.	Contenido	Formato	Observación
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	Aplica
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	Aplica
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	Aplica
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	Aplica
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	Aplica
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	Aplica



4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	Aplica
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	Aplica
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	No aplica – El Contrato de Obra Pública 557 de 2022, no presenta anticipo ni pago por anticipado
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		Aplica
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	Aplica
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	Aplica
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	Aplica
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	Aplica
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		Aplica
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		Aplica, se anexa el registro fotográfico correspondiente a las actividades en obra.



8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas.		Aplica, se anexa el registro fotográfico correspondiente a las actividades en obra.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		Aplica, se anexa copia de bitácora correspondiente a las actividades en obra.

Tabla 13. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA No. 558 DE 2022 – MUNICIPIO DE MAGANGÜÉ – LOTE 2.

4.1. INFORME SEMANAL

4.1.1. MUNICIPIO DE ACHÍ – BOLÍVAR CONTRATO N° L.P.006 DE 2022.

[illegible]



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

P.A.G. A (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)				
ESTADO: LAS OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA FUERON REMITIDAS AL CONTRATISTA, SE ESTA EN ESPERA DE SU RESPUESTA				
		V. GESTIÓN SOCIAL		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	29	5		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	20			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:				
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	29			
VI. GESTIÓN PREDIAL				
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A		Observaciones: No se tienen observaciones.	
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A			
AVILLOS APROBADOS:	N/A			
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A			
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD				
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
EL CONTRATISTA DURANTE LA SEMANA REALIZÓ LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: SE REALIZA MEJORAMIENTO DE ACCESO A LA VÍA EN PUNTOS CRÍTICOS, SE PRESENTAN FUERTES LLUVIAS EN LA SEMANA. LA INTERVENTORIA DURANTE LA PRESENTE SEMANA HA REALIZADO LA ELABORACIÓN DE INFORME SEMANAL No. 109. SE REALIZA ADÉMÁS CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO Y SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1895 DE 2021. MUNICIPIO APRUEBA PRORROGARLO POR UN PLAZO DE 5 MESES, CON FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL EL 27 DE MAYO DE 2025.				
ASÍ MISMO, SE TIENE EL SIGUIENTE CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVÍADA:				
GC-IVIAS-BOL-632-22	8 ene-25	REMISIÓN INFORME SEMANAL No. 121 DE INTERVENTORIA – MUNICIPIO DE MINGANQUE, BOLIVAR – LOTE 1		
GC-IVIAS-BOL-633-22	8 ene-25	REMISIÓN INFORME SEMANAL No. 105 DE INTERVENTORIA – MUNICIPIO DE ACHÉ, BOLIVAR		
GC-IVIAS-BOL-634-22	8 ene-25	REMISIÓN INFORME SEMANAL No. 105 DE INTERVENTORIA – MUNICIPIO DE ACHÉ, BOLIVAR		
GC-IVIAS-BOL-635-22	8 ene-25	REMISIÓN INFORME SEMANAL No. 107 DE INTERVENTORIA – MUNICIPIO DE ACHÉ, BOLIVAR		
GC-IVIAS-BOL-636-22	8 ene-25	SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN DE OBRA CTO LP-006-2022		
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
ELABORACIÓN DEL INFORME SEMANAL No. 109 PRESENCIA EN OBRA PARA SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORIA SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1895 DE 2021. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE OBRA				
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS				
PROGRAMADO				
EJECUTADO				
CONVENIO PROGRAMADO				
El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MG-IN-15 del Manual de Interventoría.				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
Mejoramiento de la vía de acceso		Mejoramiento de la vía de acceso		
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		
LA INTERVENTORIA ENTREGA A TIEMPO OFICIAL AL CONTRATISTA CON LA INFORMACIÓN ESPECÍFICA REQUERIDA, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS E INVERSIÓN DEL PROYECTO.		FIRMA: NOMBRE: MARIANA CASTELLÓN ARREOLA Matrícula Profesional No.: 3320213007461V		
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del RMVS. Copias: Unidad Operativa, Subdirección de Supervisión, Contratos, Interventoría y Dirección Técnica				



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 29
Del 01 de enero de 2025 al 31 de enero de 2025
Versión 1



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PAG 6 (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)																											
ESTADO: LAS OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA FUERON REMITIDAS AL CONTRATISTA, SE ESTA EN ESPERA DE SU RESPUESTA																											
		V. GESTIÓN SOCIAL																									
<table border="1"><thead><tr><th></th><th>OBRA</th><th>INTER</th></tr></thead><tbody><tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS</td><td>29</td><td>8</td></tr><tr><td>EMPLEOS OBJETIVO GENERADOS</td><td>29</td><td></td></tr><tr><td>EMPLEOS REPERTEO GENERADOS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			OBRA	INTER	TOTAL EMPLEOS GENERADOS	29	8	EMPLEOS OBJETIVO GENERADOS	29		EMPLEOS REPERTEO GENERADOS			EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA			No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____										
	OBRA	INTER																									
TOTAL EMPLEOS GENERADOS	29	8																									
EMPLEOS OBJETIVO GENERADOS	29																										
EMPLEOS REPERTEO GENERADOS																											
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA																											
Observaciones: No se tienen observaciones.																											
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 37																											
VI. GESTIÓN PREDIAL																											
TOTAL ESTIMADO PRECIOS A ADQUIRIR: N/A FICHAS PRECIALES APROBADAS: N/A AVALES APROBADOS: N/A PRECIOS ADQUIRIDOS: N/A																											
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD																											
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																											
EL CONTRATISTA DURANTE LA SEMANA REALIZÓ LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: SE REALIZA MEJORAMIENTO DE ACCESO A LA VÍA EN PUNTOS CRÍTICOS. SE PRESENTAN FUERTES LLUVIAS DURANTE LA SEMANA. LA INTERVENTORIA DURANTE LA PRESENTE SEMANA HA REALIZADO LA ELABORACIÓN DE INFORME SEMANAL No. 109. SE REALIZA ADÉMÁS CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO Y SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1895 DE 2021. ASÍ MISMO, SE TIENE EL SIGUIENTE CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENADA:																											
<table border="1"><thead><tr><th>GE- INVAS- BOL- 433- 22</th><th>8 ene- 25</th><th>REMIÓN INFORME SEMANAL No. 105 DE INTERVENTORIA – MUNICIPIO DE ACHÉ- BOLIVAR</th></tr></thead><tbody><tr><td>GE- INVAS- BOL- 434- 22</td><td>8 ene- 25</td><td>REMIÓN INFORME SEMANAL No. 106 DE INTERVENTORIA – MUNICIPIO DE ACHÉ- BOLIVAR</td></tr><tr><td>GE- INVAS- BOL- 435- 22</td><td>8 ene- 25</td><td>REMIÓN INFORME SEMANAL No. 107 DE INTERVENTORIA – MUNICIPIO DE ACHÉ- BOLIVAR</td></tr><tr><td>GE- INVAS- BOL- 436- 22</td><td>8 ene- 25</td><td>SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN DE OBRA CTO LP 095-2022</td></tr><tr><td>GE- INVAS- BOL- 437- 22</td><td>8 ene- 25</td><td>REMIÓN INFORME SEMANAL No. 109 DE INTERVENTORIA – MUNICIPIO DE MAGANGÜE- BOLIVAR – LOTE1</td></tr></tbody></table>				GE- INVAS- BOL- 433- 22	8 ene- 25	REMIÓN INFORME SEMANAL No. 105 DE INTERVENTORIA – MUNICIPIO DE ACHÉ- BOLIVAR	GE- INVAS- BOL- 434- 22	8 ene- 25	REMIÓN INFORME SEMANAL No. 106 DE INTERVENTORIA – MUNICIPIO DE ACHÉ- BOLIVAR	GE- INVAS- BOL- 435- 22	8 ene- 25	REMIÓN INFORME SEMANAL No. 107 DE INTERVENTORIA – MUNICIPIO DE ACHÉ- BOLIVAR	GE- INVAS- BOL- 436- 22	8 ene- 25	SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN DE OBRA CTO LP 095-2022	GE- INVAS- BOL- 437- 22	8 ene- 25	REMIÓN INFORME SEMANAL No. 109 DE INTERVENTORIA – MUNICIPIO DE MAGANGÜE- BOLIVAR – LOTE1									
GE- INVAS- BOL- 433- 22	8 ene- 25	REMIÓN INFORME SEMANAL No. 105 DE INTERVENTORIA – MUNICIPIO DE ACHÉ- BOLIVAR																									
GE- INVAS- BOL- 434- 22	8 ene- 25	REMIÓN INFORME SEMANAL No. 106 DE INTERVENTORIA – MUNICIPIO DE ACHÉ- BOLIVAR																									
GE- INVAS- BOL- 435- 22	8 ene- 25	REMIÓN INFORME SEMANAL No. 107 DE INTERVENTORIA – MUNICIPIO DE ACHÉ- BOLIVAR																									
GE- INVAS- BOL- 436- 22	8 ene- 25	SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN DE OBRA CTO LP 095-2022																									
GE- INVAS- BOL- 437- 22	8 ene- 25	REMIÓN INFORME SEMANAL No. 109 DE INTERVENTORIA – MUNICIPIO DE MAGANGÜE- BOLIVAR – LOTE1																									
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																											
ELABORACIÓN DEL INFORME SEMANAL No. 110 PRESENCIA EN OBRA PARA SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORIA SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1895 DE 2021. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE OBRA																											
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																											
<table border="1"><thead><tr><th></th><th>K2+000</th><th>K3+000</th><th>K7+000</th><th>K8+000</th><th>K9+000</th></tr></thead><tbody><tr><td>PROGRAMADO</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>EJECUTADO</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>CONVENIO PROGRAMADO</td><td colspan="5"></td></tr></tbody></table>					K2+000	K3+000	K7+000	K8+000	K9+000	PROGRAMADO						EJECUTADO						CONVENIO PROGRAMADO					
	K2+000	K3+000	K7+000	K8+000	K9+000																						
PROGRAMADO																											
EJECUTADO																											
CONVENIO PROGRAMADO																											
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MI-15 del Manual de Interventoría.																											
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO																											
<table border="1"><tbody><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejramiento de la vía de acceso</td><td>Mejramiento de la vía de acceso</td></tr></tbody></table>						Mejramiento de la vía de acceso	Mejramiento de la vía de acceso																				
Mejramiento de la vía de acceso	Mejramiento de la vía de acceso																										
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																											
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA																									
LA INTERVENTORIA ENTREGA A TIEMPO OFICIAL AL CONTRATISTA CON LA INFORMACIÓN ESPECÍFICA REQUERIDA. VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS E REVERSIÓN DEL PROYECTO.		Firma:																									
		Nombre: RODRIGO CASTELLAR ANDRÉS																									
		Número Profesional No.: 230023003861																									

Original: Informe Mensual de Interventoría, Archivo de Control del P.A.C.
Copias: Archivo de Seguimiento, Subproyecto de Supervisión, Copia para el Interventor y Dirección Terrestre



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 29
Del 01 de enero de 2025 al 31 de enero de 2025
Versión 1



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)																											
ESTADO: LAS OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORA FUERON REMITIDAS AL CONTRATISTA, SE ESTA EN ESPERA DE SU RESPUESTA																											
		V. GESTIÓN SOCIAL																									
TOTAL EMPLEOS GENERADOS	OBRA	INTER	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:																								
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	20	0																									
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	0	0																									
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA																											
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	20	0																									
VI. GESTIÓN PRECUAL																											
TOTAL ESTIMADO PRECIOS A ADQUIRIR:	N/A																										
FICHAS PRECUALS APROBADAS:	N/A																										
AVANZOS APROBADOS:	N/A																										
PRECIOS ADQUIRIDOS:	N/A																										
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD																											
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																											
EL CONTRATISTA DURANTE LA SEMANA REALIZÓ LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: SE REALIZA MEJORAMIENTO DE ACCESO A LA VÍA EN PUNTOS CRÍTICOS, ACOPIO DE MADERA PARA INSTALACIÓN DE FORMALETAS, INSTALACIÓN DE FORMALETAS Y ARMADO DE ACERO DE REPLAZO, LLUVIAS EN LA SEMANA. LA INTERVENTORA DURANTE LA PRESENTE SEMANA HA REALIZADO LA ELABORACIÓN DE INFORME SEMANAL No. 110. SE REALIZA ADÉMÁS CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO Y SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1895 DE 2021. ASÍ MISMO, SE TIENE EL SIGUIENTE CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVADA:																											
<table border="1"><thead><tr><th>GC</th><th>INFORME</th><th>SEM</th><th>FECHA</th></tr></thead><tbody><tr><td>GC-IVIAS-BOL-633-22</td><td>Informe-25</td><td>REMIÓN INFORME SEMANAL No. 105 DE INTERVENTORA - MUNICIPIO DE ACHÍ BOLIVAR</td><td></td></tr><tr><td>GC-IVIAS-BOL-634-22</td><td>Informe-25</td><td>REMIÓN INFORME SEMANAL No. 106 DE INTERVENTORA - MUNICIPIO DE ACHÍ BOLIVAR</td><td></td></tr><tr><td>GC-IVIAS-BOL-635-22</td><td>Informe-25</td><td>REMIÓN INFORME SEMANAL No. 107 DE INTERVENTORA - MUNICIPIO DE ACHÍ BOLIVAR</td><td></td></tr><tr><td>GC-IVIAS-BOL-636-22</td><td>Informe-25</td><td>REMIÓN INFORME SEMANAL No. 108 DE INTERVENTORA - MUNICIPIO DE ACHÍ BOLIVAR</td><td></td></tr><tr><td>GC-IVIAS-BOL-637-22</td><td>Informe-25</td><td>REMIÓN INFORME SEMANAL No. 109 DE INTERVENTORA - MUNICIPIO DE ACHÍ BOLIVAR</td><td></td></tr></tbody></table>				GC	INFORME	SEM	FECHA	GC-IVIAS-BOL-633-22	Informe-25	REMIÓN INFORME SEMANAL No. 105 DE INTERVENTORA - MUNICIPIO DE ACHÍ BOLIVAR		GC-IVIAS-BOL-634-22	Informe-25	REMIÓN INFORME SEMANAL No. 106 DE INTERVENTORA - MUNICIPIO DE ACHÍ BOLIVAR		GC-IVIAS-BOL-635-22	Informe-25	REMIÓN INFORME SEMANAL No. 107 DE INTERVENTORA - MUNICIPIO DE ACHÍ BOLIVAR		GC-IVIAS-BOL-636-22	Informe-25	REMIÓN INFORME SEMANAL No. 108 DE INTERVENTORA - MUNICIPIO DE ACHÍ BOLIVAR		GC-IVIAS-BOL-637-22	Informe-25	REMIÓN INFORME SEMANAL No. 109 DE INTERVENTORA - MUNICIPIO DE ACHÍ BOLIVAR	
GC	INFORME	SEM	FECHA																								
GC-IVIAS-BOL-633-22	Informe-25	REMIÓN INFORME SEMANAL No. 105 DE INTERVENTORA - MUNICIPIO DE ACHÍ BOLIVAR																									
GC-IVIAS-BOL-634-22	Informe-25	REMIÓN INFORME SEMANAL No. 106 DE INTERVENTORA - MUNICIPIO DE ACHÍ BOLIVAR																									
GC-IVIAS-BOL-635-22	Informe-25	REMIÓN INFORME SEMANAL No. 107 DE INTERVENTORA - MUNICIPIO DE ACHÍ BOLIVAR																									
GC-IVIAS-BOL-636-22	Informe-25	REMIÓN INFORME SEMANAL No. 108 DE INTERVENTORA - MUNICIPIO DE ACHÍ BOLIVAR																									
GC-IVIAS-BOL-637-22	Informe-25	REMIÓN INFORME SEMANAL No. 109 DE INTERVENTORA - MUNICIPIO DE ACHÍ BOLIVAR																									
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																											
ELABORACIÓN DEL INFORME SEMANAL No. 111 PRESENCIA EN OBRA PARA SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORA SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1895 DE 2021. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE OBRA																											
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																											
PROGRAMADO																											
EJECUTADO																											
CONVENIO PROGRAMADO																											
El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPLAM No.15 del Manual de Interventoría.																											
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO																											
<div> Instalación de acero de refuerzo</div> <div> Acopio de madera para instalación de formaletas</div> <div> Instalación de formaletas</div>																											
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																											
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA																									
LA INTERVENTORA ENTREGA A TIEMPO DEDICADO AL CONTRATISTA CON LA INFORMACIÓN ESPECÍFICA REQUERIDA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS E INVERSIÓN DEL PROYECTO.		<div>FORMA: </div> <div>COSEBRE: JOHANNA CASTELLANOS ARMENTA</div> <div>Matrícula Profesional No.: 1320218070481 V</div>																									
Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del P.A.G.A. Copias: Unidad Operativa, Subdirección de Sostenibilidad, Gerencia, Interventoría y Dirección Terrestre																											



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 29
Del 01 de enero de 2025 al 31 de enero de 2025
Versión 1



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



P.A.S.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA DINÁMICA AMBIENTAL)			
ESTADO: LAS OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA FUERON REMITIDAS AL CONTRATISTA SE ESTÁ EN ESPERA DE SU RESPUESTA			
		V. GESTIÓN SOCIAL	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	20	Nº DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
EMPLIDOS DIRECTOS GENERADOS:	20	Nº DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLIDOS INDIRECTOS GENERADOS:		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	
EMPLIDOS DEL PUESTO DE REFERENCIA:			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 20		Observaciones: No se tienen observaciones.	
VI. GESTIÓN PRESIDIAL			
TOTAL ESTIMADO PRESIDIOS A ADQUIRIR:	N/A		
FICHAS PRESIDIALES APROBADAS:	N/A		
AVALUOS APROBADOS:	N/A		
PRESIDIOS ADQUIRIDOS:	N/A		
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD			
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
EL CONTRATISTA DURANTE LA SEMANA REALIZA ACTIVIDADES SIN JUSTIFICACIÓN ALGUNA.			
LA INTERVENTORIA DURANTE LA PRESENTE SEMANA HA REALIZADO LA ELABORACIÓN DE INFORME SEMANAL No. 111. SE REALIZA ADÉMÁS CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO Y SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1895 DE 2021.			
ASÍ MISMO, SE TIENE EL SIGUIENTE CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVÍADA:			
GC-INVAS-BOL-634-22	8 ene-25	REVISIÓN INFORME SEMANAL No. 108 DE INTERVENTORIA - MUNICIPIO DE ACHÉ BOLIVAR.	
GC-INVAS-BOL-635-22	8 ene-25	REVISIÓN INFORME SEMANAL No. 107 DE INTERVENTORIA - MUNICIPIO DE ACHÉ BOLIVAR.	
GC-INVAS-BOL-636-22	8 ene-25	REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE OBRA C.T.O LP 005-2022	
GC-INVAS-BOL-637-22	8 ene-25	REVISIÓN INFORME SEMANAL No. 102 DE INTERVENTORIA - MUNICIPIO DE MAGANGUE BOLIVAR - LOTE 1.	
GC-INVAS-BOL-638-22	14 ene-25	REVISIÓN INFORME SEMANAL No. 103 DE INTERVENTORIA - MUNICIPIO DE MAGANGUE BOLIVAR - LOTE 1.	
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
ELABORACIÓN DEL INFORME SEMANAL No. 112			
PRESENCIA EN OBRA PARA SEGUIMIENTO			
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORIA			
SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1895 DE 2021.			
SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE OBRA			
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS			
PROGRAMADO			
EJECUTADO			
COMIENZO PROGRAMADO			
El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs. meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPA-MNL-RV-15 del Manual de Interventoría.			
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
<div>Contratista no ejecuta actividades</div> <div>Contratista no ejecuta actividades</div> <div>Contratista no ejecuta actividades</div>			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA.		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
LA INTERVENTORIA ENTREGA A TIEMPO OFICIALES AL CONTRATISTA CON LA INFORMACIÓN ESPECÍFICA REQUERIDA. VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS E INVERSIÓN DEL PROYECTO.		Firma:	
		Nombre: <u>ANDRÉS CASTELLANOS GONZÁLEZ</u>	
		Matrícula Profesional No.: <u>33503338748LV</u>	
<small>Según Informe Mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del MIVIS. Código: Unidad Operativa, Subdivisión de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Gestión Técnica</small>			



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORES OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL		CODIGO VERSION PAGINA		MERN-MU-BL-10-25-3 1 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
FECHA: 20/11/2025 (20/11/2025)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
I. INFORMACION GENERAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PROYECTO: No. LP 006 DE 2022				SEMANA No. 112 de 2451/2024 # 30/01/2025 Último Informe Semanal 58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: BOLIVAR				SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA GESTOR TECNICO DE PROYECTO: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCION DE PLACA HUELTA EN LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL CORREIMIENTO DE LOS NIÑEROS HASTA EL CORREIMIENTO DE SINCIERN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACHI- DEPARTAMENTO DE BOLIVAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta fisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
I. EXPLANACIONES. II. RESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CULVERT L=6m CONSTRUCCION DE 2 BOX CULVERT L=1x(4+6) III. PLACA HUELTA, CONSTRUCCION DE 7300 METROS DE PLACA HUELTA EN CONCRETO; ANCHO 5M IV. TRANSPORTE V. CARACTERIZACION VAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
LAS CARACTERISTICAS TECNICAS QUE CONTEMPLA EL PROYECTO SON: EXPLANACIONES, ESTRUCTURA DE DRENAJE BOX CULVERT L=6m, PLACA HUELTA ANCHO 5m, TRANSPORTE Y CARACTERIZACION VAL.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CONTRATISTA: CONSORCIO VALLOS NIÑEROS S.A. INTEGRANTES: JAVIER JOSE DOMINGUEZ ARIAS- KAREB EXECUTIVE GROUP S.A.S 80% CONTRATO No. LP 006 DE 2022 VALOR INICIAL \$ 8.086.925.573,30 FECHA DE INICIO: 20 DE NOVIEMBRE DE 2022 VALOR ADICIONES \$ FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 VALOR ACUMULADO \$ 8.086.925.573,30 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 \$				INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S INTEGRANTES: N/A CONTRATO No. 973 DE 2022 VALOR INICIAL: \$ 3.895.780.731,00 FECHA DE INICIO: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 VALOR ADICIONES: \$ N/A FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE AGOSTO DE 2024 VALOR ACUMULADO: \$ 3.895.780.731,00 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28 DE JUNIO DE 2025 VALOR ANTICIPO: \$ 654.753.084,00 VALOR AMORTIZADO: \$ 654.753.084,00 SALDO POR AMORTIZAR: \$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table><tr><th>CONTRATO</th><th>VIGENCIA</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr><tr><td rowspan="5">OBRA</td><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td>\$ 8.000.000.000</td><td>\$ 4.599.100.000</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td><td>\$ 1.800.000.000</td><td>\$ 624.439.637,11</td><td>\$ 960.335.758,70</td><td></td></tr><tr><td>RECURSOS POR RESERVA</td><td>\$ 1.800.000.000</td><td>\$ 5.574.600.363</td><td>\$ 5.544.555.345</td><td></td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA RESERVA</td><td></td><td></td><td></td><td>\$ 6.544.555.345</td></tr><tr><td>SALDO DE RESERVA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">INTERVENTORIA</td><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td>\$ 299.053.333</td><td>\$ 1.500.000.000</td><td>\$ 2.738.487.058</td><td></td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td><td>\$ 295.969.275</td><td>\$ 1.538.459.536,80</td><td>\$ 1.543.367.697</td><td></td></tr><tr><td>SALDO DE VIGENCIA</td><td>\$ 133.077,02</td><td>\$ 107.433,20</td><td>\$ 537.033,705</td><td></td></tr><tr><td>RECURSOS POR RESERVA</td><td></td><td></td><td></td><td>\$ 537.315.700,00</td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA RESERVA</td><td></td><td></td><td></td><td>\$ 537.315.700,00</td></tr></table>								CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025	OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 8.000.000.000	\$ 4.599.100.000			EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 1.800.000.000	\$ 624.439.637,11	\$ 960.335.758,70		RECURSOS POR RESERVA	\$ 1.800.000.000	\$ 5.574.600.363	\$ 5.544.555.345		EJECUTADO DE LA RESERVA				\$ 6.544.555.345	SALDO DE RESERVA					INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 299.053.333	\$ 1.500.000.000	\$ 2.738.487.058		EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 295.969.275	\$ 1.538.459.536,80	\$ 1.543.367.697		SALDO DE VIGENCIA	\$ 133.077,02	\$ 107.433,20	\$ 537.033,705		RECURSOS POR RESERVA				\$ 537.315.700,00	EJECUTADO DE LA RESERVA				\$ 537.315.700,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 8.000.000.000	\$ 4.599.100.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 1.800.000.000	\$ 624.439.637,11	\$ 960.335.758,70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	RECURSOS POR RESERVA	\$ 1.800.000.000	\$ 5.574.600.363	\$ 5.544.555.345																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	EJECUTADO DE LA RESERVA				\$ 6.544.555.345																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	SALDO DE RESERVA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 299.053.333	\$ 1.500.000.000	\$ 2.738.487.058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 295.969.275	\$ 1.538.459.536,80	\$ 1.543.367.697																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 133.077,02	\$ 107.433,20	\$ 537.033,705																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	RECURSOS POR RESERVA				\$ 537.315.700,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	EJECUTADO DE LA RESERVA				\$ 537.315.700,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table><tr><th colspan="4">OBRA</th><th colspan="4">INTERVENTORIA</th></tr><tr><td>VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A)</td><td>\$</td><td>8.086.925.573,30</td><td>99,39%</td><td>TOTAL INVERSION PROGRAMADA</td><td>\$</td><td>3.895.780.731,00</td><td>100%</td></tr><tr><td>INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA</td><td>\$</td><td>2.872.991.046,04</td><td>35,53%</td><td>TOTAL INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>13.059.548,08</td><td>0,34%</td></tr><tr><td>INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B)</td><td>\$</td><td>2.872.991.046,04</td><td>35,53%</td><td>INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>13.059.548,08</td><td>0,34%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA</td><td>\$</td><td>0,00</td><td>0,00%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: Estructuras y Drenajes, gestión ambiental, social, ambiental y otros</td><td>\$</td><td>1.538.460.074,42</td><td>48,59%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSION PROGRAMADA</td><td>\$</td><td>2.872.991.046,04</td><td>35,53%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSION EJECUTADA</td><td>\$</td><td>2.872.991.046,04</td><td>35,53%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION</td><td>\$</td><td>1.022.777.629,38</td><td>12,80%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>207.969.823,08</td><td>2,572%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>13.059.548,08</td><td>0,340%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								OBRA				INTERVENTORIA				VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A)	\$	8.086.925.573,30	99,39%	TOTAL INVERSION PROGRAMADA	\$	3.895.780.731,00	100%	INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$	2.872.991.046,04	35,53%	TOTAL INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	13.059.548,08	0,34%	INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B)	\$	2.872.991.046,04	35,53%	INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	13.059.548,08	0,34%	AVANCE O ATRASO DE OBRA	\$	0,00	0,00%					OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: Estructuras y Drenajes, gestión ambiental, social, ambiental y otros	\$	1.538.460.074,42	48,59%					TOTAL INVERSION PROGRAMADA	\$	2.872.991.046,04	35,53%					TOTAL INVERSION EJECUTADA	\$	2.872.991.046,04	35,53%					AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION	\$	1.022.777.629,38	12,80%					INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	207.969.823,08	2,572%					INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	13.059.548,08	0,340%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
OBRA				INTERVENTORIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A)	\$	8.086.925.573,30	99,39%	TOTAL INVERSION PROGRAMADA	\$	3.895.780.731,00	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$	2.872.991.046,04	35,53%	TOTAL INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	13.059.548,08	0,34%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B)	\$	2.872.991.046,04	35,53%	INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	13.059.548,08	0,34%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
AVANCE O ATRASO DE OBRA	\$	0,00	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: Estructuras y Drenajes, gestión ambiental, social, ambiental y otros	\$	1.538.460.074,42	48,59%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL INVERSION PROGRAMADA	\$	2.872.991.046,04	35,53%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL INVERSION EJECUTADA	\$	2.872.991.046,04	35,53%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION	\$	1.022.777.629,38	12,80%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	207.969.823,08	2,572%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	13.059.548,08	0,340%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
RADIO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 362 - 12/09/2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PERIODO FACTURADO: MARZO DE 2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
VALOR FACTURA: \$ 250.335.258,70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
El presente documento se encuentra suscrito en el momento de imprimir el estado del trabajo.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Observaciones:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table><tr><th colspan="4">ANTICIPOS</th><th colspan="4">INDICADOR IIC</th><th colspan="4">ANTICIPOS</th></tr><tr><td>Obligado \$</td><td>\$</td><td>N/A</td><td></td><td>En el mes</td><td>L379</td><td></td><td></td><td>Obligado \$</td><td>\$</td><td>654.753.084,00</td><td></td></tr><tr><td>Amortizado \$</td><td>\$</td><td>N/A</td><td></td><td>Acumulado</td><td>7.079</td><td></td><td></td><td>Amortizado \$</td><td>\$</td><td>654.753.084,00</td><td></td></tr><tr><td>Saldo \$</td><td>\$</td><td>N/A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Saldo \$</td><td>\$</td><td></td><td></td></tr></table>								ANTICIPOS				INDICADOR IIC				ANTICIPOS				Obligado \$	\$	N/A		En el mes	L379			Obligado \$	\$	654.753.084,00		Amortizado \$	\$	N/A		Acumulado	7.079			Amortizado \$	\$	654.753.084,00		Saldo \$	\$	N/A						Saldo \$	\$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ANTICIPOS				INDICADOR IIC				ANTICIPOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Obligado \$	\$	N/A		En el mes	L379			Obligado \$	\$	654.753.084,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Amortizado \$	\$	N/A		Acumulado	7.079			Amortizado \$	\$	654.753.084,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Saldo \$	\$	N/A						Saldo \$	\$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
III. AVANCE FISICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Meta Fisica Programada % 48,59% Avance o Atraso Fisico % 12,80%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Meta Fisica Ejecutada % 35,53%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table><tr><th colspan="4">Meta Fisica (Programa de Obra) Línea Base</th><th colspan="4">Meta Fisica Programada / Ejecutada Acumulado</th></tr><tr><th>Descripción de la Meta Fisica Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th><th>Vigencia 2022</th><th>Avance</th><th>Meta</th><th>Total</th><th>%</th></tr><tr><td>REVISION VIO AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huelta, Pavimento y Estructuras de Drenaje)</td><td>Unid</td><td></td><td></td><td>Prog</td><td>1</td><td>1</td><td>100%</td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>550</td><td></td><td>Ejec</td><td>0,85</td><td>0,85</td><td>0,15%</td></tr><tr><td>Excavación en material común de la explanación y canales</td><td>m3</td><td>4725</td><td></td><td>Prog</td><td>550</td><td>550</td><td>100,00%</td></tr><tr><td>Tanque de agua</td><td>m3</td><td>6825</td><td></td><td>Ejec</td><td>550</td><td>550</td><td>100,00%</td></tr><tr><td>Excavación en material común de la explanación y canales</td><td>m3</td><td>4725</td><td></td><td>Prog</td><td>4725</td><td>4725</td><td>100,00%</td></tr><tr><td>Tanque de agua</td><td>m3</td><td>4725</td><td></td><td>Ejec</td><td>4725</td><td>4725</td><td>100,00%</td></tr><tr><td>Demolicion de estructuras</td><td>m3</td><td>5</td><td></td><td>Prog</td><td>6423,30</td><td>6423,30</td><td>94,34%</td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td>4438,25</td><td>4438,25</td><td>85,09%</td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Excavaciones varias en material común en seco</td><td>m3</td><td>150</td><td></td></tr></table>								Meta Fisica (Programa de Obra) Línea Base				Meta Fisica Programada / Ejecutada Acumulado				Descripción de la Meta Fisica Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Avance	Meta	Total	%	REVISION VIO AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huelta, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	Unid			Prog	1	1	100%	Excavaciones varias en material común en seco	m3	550		Ejec	0,85	0,85	0,15%	Excavación en material común de la explanación y canales	m3	4725		Prog	550	550	100,00%	Tanque de agua	m3	6825		Ejec	550	550	100,00%	Excavación en material común de la explanación y canales	m3	4725		Prog	4725	4725	100,00%	Tanque de agua	m3	4725		Ejec	4725	4725	100,00%	Demolicion de estructuras	m3	5		Prog	6423,30	6423,30	94,34%	Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec	4438,25	4438,25	85,09%	Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec				Excavaciones varias en material común en seco	m3	150	
Meta Fisica (Programa de Obra) Línea Base				Meta Fisica Programada / Ejecutada Acumulado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Descripción de la Meta Fisica Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Avance	Meta	Total	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
REVISION VIO AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huelta, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	Unid			Prog	1	1	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Excavaciones varias en material común en seco	m3	550		Ejec	0,85	0,85	0,15%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Excavación en material común de la explanación y canales	m3	4725		Prog	550	550	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Tanque de agua	m3	6825		Ejec	550	550	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Excavación en material común de la explanación y canales	m3	4725		Prog	4725	4725	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Tanque de agua	m3	4725		Ejec	4725	4725	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Demolicion de estructuras	m3	5		Prog	6423,30	6423,30	94,34%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec	4438,25	4438,25	85,09%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150		Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)																											
ESTADO: LAS OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA FUERON REMITIDAS AL CONTRATISTA, SE ESTÁ EN ESPERA DE SU RESPUESTA.																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>OBRA</th> <th>INTER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS</td> <td>29</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS</td> <td>29</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			OBRA	INTER	TOTAL EMPLEOS GENERADOS	29	0	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	29	0	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS			EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA			V. GESTIÓN SOCIAL No. de SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1 No. de CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____										
	OBRA	INTER																									
TOTAL EMPLEOS GENERADOS	29	0																									
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	29	0																									
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS																											
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA																											
Observaciones: No se tienen observaciones.																											
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 29																											
VI. GESTIÓN PRELAL																											
TOTAL ESTADO PRELAL A ADQUIRIR: N/A FICHAS PRELAL APROBADAS: N/A AVALES APROBADOS: N/A PRELAL APROBADOS: N/A																											
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD																											
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																											
EL CONTRATISTA DURANTE LA SEMANA REALIZÓ LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:																											
SE REALIZA MEJORAMIENTO DE ACCESO A LA VÍA EN PUNTOS CRÍTICOS, ACOPIO DE MATERIAL PÉTREO, INSTALACIÓN DE FORMALETAS Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO.																											
LA INTERVENTORIA DURANTE LA PRESENTE SEMANA HA REALIZADO LA ELABORACIÓN DE INFORME SEMANAL No. 112. SE REALIZA ADÉMÁS CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO Y SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1895 DE 2021. ADÉMÁS SE PRESENTA LLAMADO DE ATENCIÓN POR SUSPENSIÓN INJUSTIFICADA DE ACTIVIDADES DE OBRA Y LLAMADO DE ATENCIÓN POR AUSENCIA INJUSTIFICADA EN REUNIONES DE COMITÉ.																											
ASÍ MISMO, SE TIENE EL SIGUIENTE CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA:																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>CONTENIDO</th> <th>REMITENTE</th> <th>RECEPTOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24-ene-25</td> <td>REVISIÓN INFORME SEMANAL No. 124 DE INTERVENTORIA - MUNICIPIO DE MAGANGUE, BOLIMAR - LOTE 1</td> <td>INVIAS</td> <td>CONTRATISTA</td> </tr> <tr> <td>24-ene-25</td> <td>ALCANCE A COMPARAR: GC - INVIAS BOL 436-22 CON COTIZADO DE DOCUMENTACIÓN CTO DE OBRA L.P. 806</td> <td>INVIAS</td> <td>CONTRATISTA</td> </tr> <tr> <td>24-ene-25</td> <td>REVISIÓN INFORME SEMANAL No. 125 DE INTERVENTORIA - MUNICIPIO DE MAGANGUE, BOLIMAR - LOTE 1</td> <td>INVIAS</td> <td>CONTRATISTA</td> </tr> <tr> <td>24-ene-25</td> <td>LLAMADO DE ATENCIÓN SUSPENSIÓN INJUSTIFICADA DE ACTIVIDADES DE OBRA</td> <td>INVIAS</td> <td>CONTRATISTA</td> </tr> <tr> <td>24-ene-25</td> <td>LLAMADO DE ATENCIÓN POR AUSENCIA INJUSTIFICADA EN REUNIONES DE COMITÉ</td> <td>INVIAS</td> <td>CONTRATISTA</td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	CONTENIDO	REMITENTE	RECEPTOR	24-ene-25	REVISIÓN INFORME SEMANAL No. 124 DE INTERVENTORIA - MUNICIPIO DE MAGANGUE, BOLIMAR - LOTE 1	INVIAS	CONTRATISTA	24-ene-25	ALCANCE A COMPARAR: GC - INVIAS BOL 436-22 CON COTIZADO DE DOCUMENTACIÓN CTO DE OBRA L.P. 806	INVIAS	CONTRATISTA	24-ene-25	REVISIÓN INFORME SEMANAL No. 125 DE INTERVENTORIA - MUNICIPIO DE MAGANGUE, BOLIMAR - LOTE 1	INVIAS	CONTRATISTA	24-ene-25	LLAMADO DE ATENCIÓN SUSPENSIÓN INJUSTIFICADA DE ACTIVIDADES DE OBRA	INVIAS	CONTRATISTA	24-ene-25	LLAMADO DE ATENCIÓN POR AUSENCIA INJUSTIFICADA EN REUNIONES DE COMITÉ	INVIAS	CONTRATISTA
FECHA	CONTENIDO	REMITENTE	RECEPTOR																								
24-ene-25	REVISIÓN INFORME SEMANAL No. 124 DE INTERVENTORIA - MUNICIPIO DE MAGANGUE, BOLIMAR - LOTE 1	INVIAS	CONTRATISTA																								
24-ene-25	ALCANCE A COMPARAR: GC - INVIAS BOL 436-22 CON COTIZADO DE DOCUMENTACIÓN CTO DE OBRA L.P. 806	INVIAS	CONTRATISTA																								
24-ene-25	REVISIÓN INFORME SEMANAL No. 125 DE INTERVENTORIA - MUNICIPIO DE MAGANGUE, BOLIMAR - LOTE 1	INVIAS	CONTRATISTA																								
24-ene-25	LLAMADO DE ATENCIÓN SUSPENSIÓN INJUSTIFICADA DE ACTIVIDADES DE OBRA	INVIAS	CONTRATISTA																								
24-ene-25	LLAMADO DE ATENCIÓN POR AUSENCIA INJUSTIFICADA EN REUNIONES DE COMITÉ	INVIAS	CONTRATISTA																								
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																											
ELABORACIÓN DEL INFORME SEMANAL No. 113																											
PRESENCIA EN OBRA PARA SEGUIMIENTO																											
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORIA																											
SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1895 DE 2021.																											
SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE OBRA																											
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGRAMADO</th> <th>EJECUTADO</th> <th>COMENCIÓN PROGRAMADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>TERRAPLEN</td> </tr> <tr> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>CUNETAS</td> </tr> <tr> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>PLACA HUELTA</td> </tr> <tr> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>SURBASE</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>4.00</td> <td>ESTRUCTURA DE DRENAJE BOX CULVERT</td> </tr> </tbody> </table>				PROGRAMADO	EJECUTADO	COMENCIÓN PROGRAMADO	0.00	0.00	TERRAPLEN	1.00	1.00	CUNETAS	2.00	2.00	PLACA HUELTA	3.00	3.00	SURBASE	4.00	4.00	ESTRUCTURA DE DRENAJE BOX CULVERT						
PROGRAMADO	EJECUTADO	COMENCIÓN PROGRAMADO																									
0.00	0.00	TERRAPLEN																									
1.00	1.00	CUNETAS																									
2.00	2.00	PLACA HUELTA																									
3.00	3.00	SURBASE																									
4.00	4.00	ESTRUCTURA DE DRENAJE BOX CULVERT																									
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MNL-15 del Manual de Interventoría.																											
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO																											
<div>  <p>Instalación de acero de refuerzo</p> </div> <div>  <p>Instalación de rieles y acero de refuerzo</p> </div> <div>  <p>Armado de acero de refuerzo</p> </div>																											
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																											
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA																											
LA INTERVENTORIA ENTREGA A TIEMPO CÍVICOS AL CONTRATISTA CON LA INFORMACIÓN ESPECÍFICA REQUERIDA, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS E INVERSIÓN DEL PROYECTO.																											
Firma: <u>Guillermo Castellanos Arrieta</u> Nombre: <u>GUILLERMO CASTELLANOS ARRIETA</u> Matrícula Profesional No.: <u>4050180141-V</u>		DIRECTOR DE INTERVENTORIA																									

Original: Manual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Operativa, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Técnica.

4.1.2. MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N° 557 DE 2022.

[illegible]



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PUENTES			
Piso de concreto vacado en situ de espesor 1.00 (incluye acero de refuerzo)	m ²	240	
Gravilla gruesa para tráfico vehicular	m ³	92	
RELLENO PARA TERRAPLENES REFORZADOS CON GEOTEXTILES	m ³	1440	
Geotextil para reforzo de terraplenes reforzados con geotextiles (Análisis para un Geotextil tipo 1500)	m ²	1260	
IMPULSION Puentes Vehiculares			
Localización replanteo	GI	1	
Demolición de Estructuras	m ³	28.35	
Tarrajeado	m ³	350	
Obras en tubería PVC 4"	Und	18	
Pavimento de concreto de FY=4.200 kg/cm ² (2.65.000 PSI)	m ²	13823.9	
Concreto Resistente 28 Mpa o 4000 PSI	m ³	92.1	
ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLAS			
Excavaciones varias en material común en seco a mano	m ³	455	
Concreto clase F (140 kg/cm ² ó 2000 PSI)	m ³	26.67	
Concreto clase D (210 kg/cm ² ó 3000 PSI)	m ³	181.76	
Pavimento de concreto FY=4200 Mpa	m ²	6723.13	
Replanteo para estructuras con material común	m ³	350	
Replanteo para estructuras con concreto	m ³	125	
TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO CLASE D DE 600 MM	Und	0.19	
MANEJO, MONITOREO Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	Und	0.19	

IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN	Tali wapo Mbagani	PERMISO MINERO	SI ☒ NO ☐
		LICENCIA AMBIENTAL	SI ☒ NO ☐
UBICACIÓN	Grandeño, Bolívar	PERMISO MINERO	SI ☒ NO ☐
	Concesionario S.A.S.	LICENCIA AMBIENTAL	SI ☒ NO ☐
UBICACIÓN	Mbagani, Bolívar	PERMISO MINERO	SI ☒ NO ☐
	Promotor de negocios, Barrio S.A.S.	LICENCIA AMBIENTAL	SI ☒ NO ☐
OBSERVACIONES: No se tienen observaciones en cuanto a los fuentes de materiales.			
OBSERVACIONES: El contratista ha hecho entrega de permisos de la planta, de emisiones y sitios de disposición final de sobrantes de obra.			

V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS	45	ENTERO	21
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	43		9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	2		12
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA	47		21
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	47		21
OBSERVACIONES: Durante el periodo se ha realizado socialización con vecindades para informar sobre los avances de obra.			

VI. GESTIÓN PRECISAL			
TOTAL ESTIMADO PRECIOS A ADQUIRIR:	NA		
FICHAS PRECIALES APROBADAS:	NA		
ANILLOS APROBADOS:	NA		
PRECIOS ADQUIRIDOS:	NA		
OBSERVACIONES: Para este proyecto no se requiere la adaptación de precios.			

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD										
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS										
EL CONTRATISTA DURANTE LA SEMANA REALIZÓ LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:										
CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA PEGADA EN AMBOS MARGENES DE LA VÍA, CERO DE BASE GRANULAR CLASE C Y ACOPIO DE BASE GRANULAR CLASE C EN EL CAMPAMENTO DE K4+320										
POR PARTE DE LA INTERVENTORA, SE HA REALIZADO ELABORACIÓN DE INFORME SEMANAL No. 122, INSPECCIONES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA, SE REALIZA VIGILANCIA Y CONTROL ANTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO Y SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1897 DE 2021.										
ASIMISMO, SE TIENE EL SIGUIENTE CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA:										
DE: RVAS-BOL-035-22	Remo-25	REMISIÓN INFORME SEMANAL No. 122 RT-ACH								
DE: RVAS-BOL-035-22	Remo-25	REMISIÓN INFORME SEMANAL No. 122 RT-ACH								
DE: RVAS-BOL-035-22	Remo-25	REMISIÓN INFORME SEMANAL No. 122 RT-ACH								
DE: RVAS-BOL-035-22	Remo-25	REMISIÓN INFORME SEMANAL No. 122 DE INTERVENTORA-MUNICIPIO DE MAGANGUE-BOLIVAR-LOTE1								
DE: RVAS-BOL-035-22	Remo-25	REMISIÓN INFORME SEMANAL No. 122 DE INTERVENTORA-MUNICIPIO DE MAGANGUE-BOLIVAR-LOTE1								
DE: RVAS-BOL-035-22	Remo-25	REMISIÓN INFORME SEMANAL No. 122 DE INTERVENTORA-MUNICIPIO DE MAGANGUE-BOLIVAR-LOTE1								
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA										
ELABORACIÓN DEL INFORME SEMANAL No. 123.										
PRESENCIA EN OBRA PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE AVANCES										
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORA										
SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1897 DE 2021.										
SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE OBRA										
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS										
PROGRAMADO										
EJECUTADO										
CONVENCIÓN PROGRAMADO										
El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo METABOL-15-02 Manual de Interventoría.										
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO										
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA OBRA										
LA INTERVENTORA DESEMPEÑARÁ LA ACCIÓN DE SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Y ENTRARÁ A TIEMPO EFICAZ CON LA INFORMACIÓN REQUERIDA. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1897 DE 2021. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE OBRA.										
Firma:										
Módulo Profesional No. 330013001081-V										
Firma:										
Módulo Profesional No. 330013001081-V										

Elaborado: Ingeniero de Interventoría, Asesoría de Gestión de Obras
Código: Interventoría, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Técnica



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 29
Del 01 de enero de 2025 al 31 de enero de 2025
Versión 1

[illegible]



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 29
Del 01 de enero de 2025 al 31 de enero de 2025
Versión 1



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



Puentes									
Plata de concreto vacado in situ de 1.50m ancho sobre de enlase	m	240				Prog	240		240 100.00%
						Epcc	240		240 100.00%
Sección metálica para tráfico vehicular	m	90				Prog	90		90 100.00%
						Epcc	90		90 100.00%
RETELLO PARA TERRAPLENES REFORZADOS CON GEOTEXTILES									
Usado para la construcción de terraplenes reforzados con geotextiles	m	1440				Prog			
						Epcc			
Geotextil de refuerzo para terraplenes reforzados con geotextiles	m	7360				Prog	1440		1440 19.83%
						Epcc	1440		1440 19.83%
AMPLIACIÓN PUENTES VEHICULARES									
Localización repetido	Gl	1				Prog	0.00	0.00	1.00 100.00%
						Epcc	0.00	0.00	1.00 100.00%
Demarcación de Estructuras	m	28.35				Prog	12.35	18.00	28.35 100.00%
						Epcc	12.35	18.00	28.35 100.00%
Tarugados	m	350				Prog	70.00	10.00	140.00 40.00%
						Epcc	70.00	10.00	140.00 40.00%
Cercos en tubería PVC 4"	Und	32				Prog	3.00	9.00	12.00 37.50%
						Epcc	3.00	9.00	12.00 37.50%
Acero de refuerzo de FY=4,200 kg/cm ² (265,000 PSI)	kg	13623.6				Prog	8811.80	8811.80	17623.60 100.00%
						Epcc	8811.80	8811.80	17623.60 100.00%
Cercos horizontales 28 Mpa 0-4000 PVC (CL-180) y anillos	m	30.1				Prog	15.05	15.05	30.10 100.00%
						Epcc	15.05	15.05	30.10 100.00%
ESTRUCTURA DE DRENAJE ALCANTARILLAS									
Excavaciones varias en material común en seco a mano	m	465				Prog		465	465.00000 100.00%
						Epcc		465	465.00000 100.00%
Concreto clase F (140 kg/cm ² o 1000 PSI)	m	26.67				Prog	26.67	26.67	53.34000 100.00%
						Epcc	26.67	26.67	53.34000 100.00%
Concreto clase D (210 kg/cm ² o 1500 PSI)	m	181.78				Prog	181.78	181.78	363.56000 100.00%
						Epcc	181.78	181.78	363.56000 100.00%
Acero de Refuerzo FY=420 Mpa	kg	6723.13				Prog	6723.13	6723.13	13446.26000 100.00%
						Epcc	6723.13	6723.13	13446.26000 100.00%
Rebudo para estructuras con material común	m	350				Prog	350	350	700.00000 100.00%
						Epcc	350	350	700.00000 100.00%
Rebudo para estructuras con rebudo	m	325				Prog	125	125	250.00000 100.00%
						Epcc	125	125	250.00000 100.00%
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE D DE 600 MM	m	326				Prog	126	126	252.00000 100.00%
						Epcc	126	126	252.00000 100.00%
VAL, REBUDO, ANILLO Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	Und	0.19				Prog	0.16	0.1635	0.3235 6.86%
						Epcc	0.16	0.1635	0.3235 6.86%
						Prog	0.16	0.1635	0.3235 6.86%
						Epcc	0.16	0.1635	0.3235 6.86%

El Interventor garantiza la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás productos contemplados contractualmente y el avance físico mensual acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: K0+000 AL K4+000

TRAMO Y/O SECTOR 2: K4+000 AL K7+320

TRAMO Y/O SECTOR 3: K7+320 AL K10+000

IV. GESTIÓN AMBIENTAL									
Fuentes de Materiales					Permisos Ambientales y/o Licenciamiento Ambiental				
Ubicación	Tali wajo-Magacjan	Permiso Minero	SI	X	NO	Permisos Ambientales y/o Licenciamiento Ambiental	ZONAS DE DEPÓSITO		
		Licencia Ambiental	SI	X	NO		LICENCIA AMBIENTAL		
Ubicación	Sinobito, Santa	Permiso Minero	SI	X	NO		APLICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL		
	Concepción S.A.S	Licencia Ambiental	SI	X	NO		CONCESIÓN DE AGUAS		
Ubicación	Magangué, Bolívar	Permiso Minero	SI	X	NO		OCCUPACIÓN DE CAUCES		
	Promotora de negocios Bantus S.A.S	Licencia Ambiental	SI	X	NO		VERTIENTES		
							EMISIONES		
							OTROS (Especificar cual)		
OBSERVACIONES: No se tienen observaciones en cuanto a las entregas de materiales.					OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA HA HECHO ENTREGA DE PERMISOS DE LA PLANTA, DE EMISIONES Y SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRESANTES DE OBRA.				

P.A.D.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: LA INTERVENTORA APROBÓ Y ENTREGÓ LA GUÍA AMBIENTAL AL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ.

V. GESTIÓN SOCIAL									
TOTAL EMPLEOS GENERADOS	43	INTER	22						
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	43		22						
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	2		9						
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA	2		9						
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	53		31						
OBSERVACIONES: Durante el periodo se han realizado socializaciones con vecindarios para informar sobre los avances de obra.									

VI. GESTIÓN PRECISAL									
TOTAL ESTIMADO PRECIOS A ADQUIRIR	NA								
FICHAS PRELIMINARES APROBADAS:	NA								
ANILLOS APROBADOS:	NA								
PRECIOS APROBADOS:	NA								
OBSERVACIONES: Para este proyecto no se requiere la adquisición de predios.									

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD									
VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS									
EL CONTRATISTA DURANTE LA SEMANA REALIZÓ LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:									
CONSTRUCCIÓN Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL MARGEN DERECHO DE LA VÍA, OBRA PARA PROTECCIÓN DE TALUDES EN TERRAPLENES DE LA VÍA MEDIANTE EXCAVACIÓN PARA DESMOLDO DE CAUCE (SE ESTABA A LA ESPERA DE QUE CESARA EL RIVIERO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD), CEREO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR CLASE C, ACOPO DE MATERIAL DE BASE EN CAMPAMENTO DEL K4+320, LEVANTAMIENTO CON RTK PARA EL PLANO RECORD DEL PROYECTO.									
POR PARTE DE LA INTERVENTORA, SE HA REALIZADO ELABORACIÓN DE INFORME SEMANAL No. 124, INSPECCIONES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA, SE REALIZA VOLUNTARIA Y CONTROL ANTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO Y SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO AL COMENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1897 DE 2021.									
ASIMISMO, SE TIENE EL SIGUIENTE CONTROL DE CORRESPONDENCIA EMANADA:									
GC-RVMS-BOL-438-22	24 ene-25	REMISIÓN INFORME SEMANAL No. 123 DE INTERVENTORA - MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, BOLÍVAR - LOTET							
GC-RVMS-BOL-437-22	24 ene-25	REMISIÓN INFORME SEMANAL No. 122 DE INTERVENTORA - MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, BOLÍVAR - LOTET							
GC-RVMS-BOL-436-22	14 ene-25	SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN CTD DE OBRA P. 009							
GC-RVMS-BOL-435-22	8 ene-25	REMISIÓN INFORME SEMANAL No. 107 INT - ACHI							
GC-RVMS-BOL-434-22	8 ene-25	REMISIÓN INFORME SEMANAL No. 106 INT - ACHI							
GC-RVMS-BOL-433-22	8 ene-25	REMISIÓN INFORME SEMANAL No. 105 INT - ACHI							

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA									
ELABORACIÓN DEL INFORME SEMANAL No. 125.									
PRESENCIA EN OBRA PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE AVANCES									
SUPERVISIÓN DEL COMPONENTE AMBIENTAL EN EL DESMOLDO DEL CAUCE									
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORA									
SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO AL COMENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1897 DE 2021.									
SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE OBRA									

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PROGRAMADO: K0+000, K0+200, K0+400, K1+000, K1+200, K1+400, K1+600, K1+800, K2+000, K2+200, K2+400, K2+600, K2+800, K3+000, K3+200, K3+400, K3+600, K3+800, K4+000, K4+200, K4+400, K4+600, K4+800, K5+000, K5+200, K5+400, K5+600, K5+800, K6+000, K6+200, K6+400, K6+600, K6+800, K7+000, K7+200, K7+400, K7+600, K7+800, K8+000, K8+200, K8+400, K8+600, K8+800, K9+000, K9+200, K9+400, K9+600, K9+800, K10+000

EJECUTADO: [Diagrama de barras de progreso mostrando el avance de las obras]

CONVENCIÓN PROGRAMADO: BASE GRANULAR, TERRAPLEN, CUNETAS, CARACTERIZACIÓN VIAL, SUBBASE, ESTRUCTURA DE DRENAJE BOH CUA VERT, PUENTE VEHICULAR, ALCANTARILLAS, MDC

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del control de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPLAN-1.15 del Manual de Interventoría.

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO									

X. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA									
LA INTERVENTORA GESTIONARÁ UNA ACCIÓN DE MEDIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Y ENTRARÁ A TIEMPO OÍFICOS CON LA INFORMACIÓN REQUERIDA.									
REVISAR PROYECTO, SOLUCIÓN EN CASO DE PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.									
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS Y INVERSIÓN DEL PROYECTO.									

Original: Archivo mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del Proyecto.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contraloría, Interventoría y Dirección Técnica.

Director de Interventoría:

Firma:

Nombre: LUIS MARÍA CÁRDENAS

Modo de Firma: 20250101010101



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 29
Del 01 de enero de 2025 al 31 de enero de 2025
Versión 1














INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 29
Del 01 de enero de 2025 al 31 de enero de 2025
Versión 1



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 29
Del 01 de enero de 2025 al 31 de enero de 2025
Versión 1

PUENTES							
Pista de concreto vacado in situ, de 3.30m (incluye acero de refuerzo)	m ²	240		Prog	240		240 100.00%
				Ejec	240		240 100.00%
Revoque metálico para taludes vehicular	m ²	52		Prog	52		52 100.00%
				Ejec	52		52 100.00%
REFRIGIO PARA TERRAPLENES REFORZADOS CON GEOTEXTILES	m ³	1440		Prog			
				Ejec			
RECTORIL DE REFLEJO PARA TERRAPLENES REFORZADOS CON GEOTEXTILES	m ²	7260		Prog	1840		1840 25.34%
				Ejec	1840		1840 25.34%
INSTALACIÓN PUENTES VEHICULARES							
Localización replanteo	GI	1		Prog	0.50	0.50	1.00 100.00%
				Ejec	0.50	0.50	1.00 100.00%
Demolición de Estructuras	m ³	28.35		Prog	17.35	18.00	28.35 100.00%
				Ejec	17.35	18.00	28.35 100.00%
Trazamiento	m ²	350		Prog	70.00	70.00	140.00 40.00%
				Ejec	70.00	70.00	140.00 40.00%
Revoque en taludes PVC 4"	Und	38		Prog	3.80	3.80	12.00 31.58%
				Ejec	3.80	3.80	12.00 31.58%
Acero de refuerzo de PY=4.200 kg/cm ² (180.000 PSI)	kg	13623.6		Prog	6811.80	6811.80	13623.60 100.00%
				Ejec	6811.80	6811.80	13623.60 100.00%
Concreto mediano 30 Mpa o 4000 Psi (C1 y 1800 y 1800)	m ³	50.1		Prog	15.93	15.93	50.10 100.00%
				Ejec	15.93	15.93	50.10 100.00%
ESTRUCTURA DE ORILLAS ALCANTARILLAS							
Preparaciones varias en material granular en obra a mano	m ³	455		Prog		455	455 0.00%
				Ejec		455	455 0.00%
Formas para F 1000 kg/cm ² o 3000 PSI	m ²	26.67		Prog	26.67	26.67	53.34 100.00%
				Ejec	26.67	26.67	53.34 100.00%
Formas para F 1210 kg/cm ² o 3000 PSI	m ²	191.76		Prog	191.76	191.76	383.52 100.00%
				Ejec	191.76	191.76	383.52 100.00%
Acero de Refuerzo PY=420 Mpa	kg	6723.13		Prog	6723.13	6723.13	13446.26 100.00%
				Ejec	6723.13	6723.13	13446.26 100.00%
Revoque para estructuras con material granular	m ³	360		Prog	360	360	720 0.00%
				Ejec	360	360	720 0.00%
Revoque para estructuras con revoque	m ³	125		Prog	125	125	250 0.00%
				Ejec	125	125	250 0.00%
TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE C O DE 80 MM	m	126		Prog	126	126	252 0.00%
				Ejec	126	126	252 0.00%
NA- REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	Und	0.19		Prog	0.16	0.1615	0.323 0.8%
				Ejec	0.16	0.1615	0.323 0.8%
* El inventario identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por semana y/o sector).							
TRAMO Y/O SECTOR 1: K+000 AL K+400							
TRAMO Y/O SECTOR 2: K+400 AL K+7330							
TRAMO Y/O SECTOR 3: K+7330 AL K+10+650							

Fuentes de Materiales				N. GESTIÓN AMBIENTAL																		
UBICACIÓN:	Todo tipo de Material	PERMISO MINERO:	SI ☒ NO ☐	PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																		
UBICACIÓN:	Sincedes, Sucre	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ☒ NO ☐	ZONAS DE DEPOSITO	SI ☐ NO ☐	N/A																
UBICACIÓN:	Magangué, Bolívar	PERMISO MINERO:	SI ☒ NO ☐	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ☐ NO ☐	N/A																
	Proveedores de Logística Barrio S.A.S	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ☒ NO ☐	APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ☒ NO ☐	N/A																
OBSERVACIONES: No se tienen observaciones en cuanto a las fuentes de materiales.				OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA HA HECHO ENTREGA DE PERMISOS DE LA PLANTA, DE EMISIONES Y SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES DE OBRA.																		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)				OBSERVACIONES:																		
ESTADO: LA INTERVENTORA APROBADA Y PERMITE PAGAR A LA SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD																						
V. GESTIÓN SOCIAL				OBSERVACIONES: Durante el periodo se ha realizado socializaciones con vecindarios para informar sobre los avances de obra.																		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 48				Nº DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 22																		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 48				Nº DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 9																		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: 48				DIRECCIÓN DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Magangué - Bolívar																		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 53				CALLE 17 A Carrera 35-118, Apartamento 1, planta, Barrio San Mateo, Ct.																		
VI. GESTIÓN PRELIMINAR				OBSERVACIONES: Para este proyecto no se requiere la adaptación de predios.																		
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A																						
FICHAS PRELIMINARES APROBADAS: N/A																						
AJUSTES APROBADOS: N/A																						
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A																						
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD																						
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																						
EL CONTRATISTA DURANTE LA SEMANA REALIZÓ LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:																						
INSTALACIÓN DE LA MEZCLA DENSA EN CALIENTE (MDC) EN MARGEN IZQUIERDO DE LA VÍA, CONSTRUCCIÓN DE LAS CUNETAS DEL LADO DERECHO DE LA VÍA, PERIFILADO Y CONFORMACIÓN DEL TALUD DEL TERRAPLEN EN LA VÍA PARA OBRAS DE PROTECCIÓN DE TALUDES (PIEDRA PEGADA), OBRAS DE PROTECCIÓN E INSTALACIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN EN LOS ACCESOS DE LOS PUNTES.																						
POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, SE HA REALIZADO ELABORACIÓN DE INFORME SEMANAL No. 126, INSPECCIONES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA, SE REALIZA VIGILANCIA Y CONTROL ANTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO Y SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE ALCERDIO AL CONVENIO INTERCOMUNITARIO No. 1897 DE 2021.																						
ASIMISMO, SE TIENE EL SIGUIENTE CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENMADA:																						
<table border="1"> <tr> <td>GE-INVAS-BOL-684-22</td> <td>24-ene-25</td> <td>REVISIÓN INFORME SEMANAL No. 126 DE INTERVENTORÍA - MUNICIPIO DE MAGANGUE, BOLIVAR - LOTET</td> </tr> <tr> <td>GE-INVAS-BOL-684-22</td> <td>24-ene-25</td> <td>REVISIÓN INFORME SEMANAL No. 126 DE INTERVENTORÍA - MUNICIPIO DE MAGANGUE, BOLIVAR - LOTET</td> </tr> <tr> <td>GE-INVAS-BOL-684-22</td> <td>24-ene-25</td> <td>REVISIÓN INFORME SEMANAL No. 126 DE INTERVENTORÍA - MUNICIPIO DE MAGANGUE, BOLIVAR - LOTET</td> </tr> <tr> <td>GE-INVAS-BOL-684-22</td> <td>24-ene-25</td> <td>REVISIÓN INFORME SEMANAL No. 126 DE INTERVENTORÍA - MUNICIPIO DE MAGANGUE, BOLIVAR - LOTET</td> </tr> <tr> <td>GE-INVAS-BOL-684-22</td> <td>24-ene-25</td> <td>REVISIÓN INFORME SEMANAL No. 126 DE INTERVENTORÍA - MUNICIPIO DE MAGANGUE, BOLIVAR - LOTET</td> </tr> </table>								GE-INVAS-BOL-684-22	24-ene-25	REVISIÓN INFORME SEMANAL No. 126 DE INTERVENTORÍA - MUNICIPIO DE MAGANGUE, BOLIVAR - LOTET	GE-INVAS-BOL-684-22	24-ene-25	REVISIÓN INFORME SEMANAL No. 126 DE INTERVENTORÍA - MUNICIPIO DE MAGANGUE, BOLIVAR - LOTET	GE-INVAS-BOL-684-22	24-ene-25	REVISIÓN INFORME SEMANAL No. 126 DE INTERVENTORÍA - MUNICIPIO DE MAGANGUE, BOLIVAR - LOTET	GE-INVAS-BOL-684-22	24-ene-25	REVISIÓN INFORME SEMANAL No. 126 DE INTERVENTORÍA - MUNICIPIO DE MAGANGUE, BOLIVAR - LOTET	GE-INVAS-BOL-684-22	24-ene-25	REVISIÓN INFORME SEMANAL No. 126 DE INTERVENTORÍA - MUNICIPIO DE MAGANGUE, BOLIVAR - LOTET
GE-INVAS-BOL-684-22	24-ene-25	REVISIÓN INFORME SEMANAL No. 126 DE INTERVENTORÍA - MUNICIPIO DE MAGANGUE, BOLIVAR - LOTET																				
GE-INVAS-BOL-684-22	24-ene-25	REVISIÓN INFORME SEMANAL No. 126 DE INTERVENTORÍA - MUNICIPIO DE MAGANGUE, BOLIVAR - LOTET																				
GE-INVAS-BOL-684-22	24-ene-25	REVISIÓN INFORME SEMANAL No. 126 DE INTERVENTORÍA - MUNICIPIO DE MAGANGUE, BOLIVAR - LOTET																				
GE-INVAS-BOL-684-22	24-ene-25	REVISIÓN INFORME SEMANAL No. 126 DE INTERVENTORÍA - MUNICIPIO DE MAGANGUE, BOLIVAR - LOTET																				
GE-INVAS-BOL-684-22	24-ene-25	REVISIÓN INFORME SEMANAL No. 126 DE INTERVENTORÍA - MUNICIPIO DE MAGANGUE, BOLIVAR - LOTET																				
IX. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SIGUIENTE SEMANA																						
ELABORACIÓN DEL INFORME SEMANAL No. 127.																						
PRESENCIA EN OBRA PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE AVANCES																						
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA																						
SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE ALCERDIO AL CONVENIO INTERCOMUNITARIO No. 1897 DE 2021.																						
SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE OBRA																						
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																						
																						
El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo METAFI-01-15 del Manual de Interventoría.																						
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO																						
  																						
<table border="1"> <tr> <td>Instalación de sacos con suelo-cemento, para protección de taludes.</td> <td>Construcción de cunetas</td> <td>Reparaciones de talud afectados por las escorrentías para colocación de protección con piedra pegada</td> </tr> </table>								Instalación de sacos con suelo-cemento, para protección de taludes.	Construcción de cunetas	Reparaciones de talud afectados por las escorrentías para colocación de protección con piedra pegada												
Instalación de sacos con suelo-cemento, para protección de taludes.	Construcción de cunetas	Reparaciones de talud afectados por las escorrentías para colocación de protección con piedra pegada																				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA.																						
<table border="1"> <tr> <td>LA INTERVENTORÍA GESTIONARÁ UN ACCIÓN DE MEDIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Y EMITIRÁ A TIEMPO OPORTUNOS CON LA INFORMACIÓN REQUERIDA.</td> <td> <div>  </div> </td> </tr> <tr> <td>SEGUIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS E INVERSIÓN DEL PROYECTO.</td> <td> <div>  </div> </td> </tr> <tr> <td>SEGUIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS E INVERSIÓN DEL PROYECTO.</td> <td> <div>  </div> </td> </tr> </table>								LA INTERVENTORÍA GESTIONARÁ UN ACCIÓN DE MEDIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Y EMITIRÁ A TIEMPO OPORTUNOS CON LA INFORMACIÓN REQUERIDA.	<div>  </div>	SEGUIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS E INVERSIÓN DEL PROYECTO.	<div>  </div>	SEGUIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS E INVERSIÓN DEL PROYECTO.	<div>  </div>									
LA INTERVENTORÍA GESTIONARÁ UN ACCIÓN DE MEDIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Y EMITIRÁ A TIEMPO OPORTUNOS CON LA INFORMACIÓN REQUERIDA.	<div>  </div>																					
SEGUIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS E INVERSIÓN DEL PROYECTO.	<div>  </div>																					
SEGUIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS E INVERSIÓN DEL PROYECTO.	<div>  </div>																					
<div>  </div>																						



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

4.1.3. MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N° 558 DE 2022.

No se reportan informes semanales debido que obra finalizo el 30 de Julio de 2024.

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

4.2.1. MUNICIPIO DE ACHÍ – BOLÍVAR CONTRATO N° L.P.006 DE 2022.

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-RN-15-FR-4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				VERSION	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				PÁGINA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				FECHA	31/01/2025 (del Mes / Año)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
PERIODO / MES INFORME MENSUAL:		PROYECTO:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CONTRATO No.		CONTRATISTA:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CONTRATO INTERVENTORÍA No.		INTERVENTORÍA:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">MAQUINARIA Y EQUIPO</th><th colspan="32">DÍAS DEL MES</th></tr><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>MARCA / MODELO</th><th>CAPACIDAD</th><th>LOCALIZACIÓN</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th><th>21</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th><th>25</th><th>26</th><th>27</th><th>28</th><th>29</th><th>30</th><th>31</th></tr></thead><tbody><tr><td>Herramienta menor</td><td></td><td></td><td>Nisperos - Sincern</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td></tr><tr><td>Herramienta menor</td><td></td><td></td><td>Nisperos - Sincern</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td></tr><tr><td>Herramienta menor</td><td></td><td></td><td>Nisperos - Sincern</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td></tr><tr><td>Vibro compactador (Tipo rana)</td><td></td><td></td><td>Nisperos - Sincern</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td></tr><tr><td>Vibro compactador (Tipo rana)</td><td></td><td></td><td>Nisperos - Sincern</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td></tr><tr><td>Motonevuladora</td><td></td><td></td><td>Nisperos - Sincern</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td></tr><tr><td>Motonevuladora</td><td></td><td></td><td>Nisperos - Sincern</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td></tr><tr><td>Volquetas sencillas</td><td></td><td></td><td>Nisperos - Sincern</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td></tr><tr><td>Volquetas sencillas</td><td></td><td></td><td>Nisperos - Sincern</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td></tr><tr><td>Volquetas sencillas</td><td></td><td></td><td>Nisperos - Sincern</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td></tr><tr><td>Volquetas sencillas</td><td></td><td></td><td>Nisperos - Sincern</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td></tr><tr><td>Volquetas sencillas</td><td></td><td></td><td>Nisperos - Sincern</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td></tr><tr><td>Volquetas sencillas</td><td></td><td></td><td>Nisperos - Sincern</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td></tr><tr><td>Volquetas sencillas</td><td></td><td></td><td>Nisperos - Sincern</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td></tr><tr><td>Volquetas doble troque</td><td></td><td></td><td>Nisperos - Sincern</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td></tr><tr><td>Volquetas doble troque</td><td></td><td></td><td>Nisperos - Sincern</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td></tr><tr><td>Volquetas doble troque</td><td></td><td></td><td>Nisperos - Sincern</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td></tr><tr><td>Volquetas doble troque</td><td></td><td></td><td>Nisperos - Sincern</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td></tr><tr><td>Volquetas doble troque</td><td></td><td></td><td>Nisperos - Sincern</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td></tr><tr><td>Mezcladora de concreto (Tipo trompo)</td><td></td><td></td><td>Nisperos - Sincern</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td></tr><tr><td>Mezcladora de concreto (Tipo trompo)</td><td></td><td></td><td>Nisperos - Sincern</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td></tr><tr><td>Mezcladora de concreto (Tipo trompo)</td><td></td><td></td><td>Nisperos - Sincern</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td></tr><tr><td>Mezcladora de concreto (Tipo trompo)</td><td></td><td></td><td>Nisperos - Sincern</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td></tr><tr><td>Compactor</td><td></td><td></td><td>Nisperos - Sincern</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td></tr><tr><td>Retroelevadora</td><td>Hitachi 60</td><td></td><td>Nisperos - Sincern</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td></tr><tr><td colspan="4">TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</td><td>26</td><td>26</td><td>26</td><td>26</td><td>26</td><td>26</td><td>26</td><td>26</td><td>26</td><td>26</td><td>26</td><td>26</td><td>26</td><td>26</td><td>26</td><td>26</td><td>26</td><td>26</td><td>26</td><td>26</td><td>26</td><td>26</td><td>26</td><td>26</td><td>26</td><td>26</td><td>26</td><td>26</td><td>26</td><td>26</td><td>26</td></tr><tr><td colspan="4">TOTAL ACTIVO</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td></tr><tr><td colspan="4">TOTAL EN REPARACIÓN</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="4">TOTAL INACTIVO</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td></tr></tbody></table>						MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																																DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Herramienta menor			Nisperos - Sincern	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Herramienta menor			Nisperos - Sincern	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	Herramienta menor			Nisperos - Sincern	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	Vibro compactador (Tipo rana)			Nisperos - Sincern	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Vibro compactador (Tipo rana)			Nisperos - Sincern	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	Motonevuladora			Nisperos - Sincern	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Motonevuladora			Nisperos - Sincern	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	Volquetas sencillas			Nisperos - Sincern	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Volquetas sencillas			Nisperos - Sincern	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Volquetas sencillas			Nisperos - Sincern	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Volquetas sencillas			Nisperos - Sincern	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	Volquetas sencillas			Nisperos - Sincern	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	Volquetas sencillas			Nisperos - Sincern	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	Volquetas sencillas			Nisperos - Sincern	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	Volquetas doble troque			Nisperos - Sincern	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	Volquetas doble troque			Nisperos - Sincern	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	Volquetas doble troque			Nisperos - Sincern	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	Volquetas doble troque			Nisperos - Sincern	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	Volquetas doble troque			Nisperos - Sincern	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	Mezcladora de concreto (Tipo trompo)			Nisperos - Sincern	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Mezcladora de concreto (Tipo trompo)			Nisperos - Sincern	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Mezcladora de concreto (Tipo trompo)			Nisperos - Sincern	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	Mezcladora de concreto (Tipo trompo)			Nisperos - Sincern	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	Compactor			Nisperos - Sincern	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Retroelevadora	Hitachi 60		Nisperos - Sincern	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	TOTAL ACTIVO				9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TOTAL INACTIVO				17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17		
MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Herramienta menor			Nisperos - Sincern	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Herramienta menor			Nisperos - Sincern	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Herramienta menor			Nisperos - Sincern	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Vibro compactador (Tipo rana)			Nisperos - Sincern	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Vibro compactador (Tipo rana)			Nisperos - Sincern	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Motonevuladora			Nisperos - Sincern	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Motonevuladora			Nisperos - Sincern	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Volquetas sencillas			Nisperos - Sincern	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Volquetas sencillas			Nisperos - Sincern	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Volquetas sencillas			Nisperos - Sincern	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Volquetas sencillas			Nisperos - Sincern	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Volquetas sencillas			Nisperos - Sincern	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Volquetas sencillas			Nisperos - Sincern	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Volquetas sencillas			Nisperos - Sincern	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Volquetas doble troque			Nisperos - Sincern	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Volquetas doble troque			Nisperos - Sincern	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Volquetas doble troque			Nisperos - Sincern	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Volquetas doble troque			Nisperos - Sincern	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Volquetas doble troque			Nisperos - Sincern	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Mezcladora de concreto (Tipo trompo)			Nisperos - Sincern	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Mezcladora de concreto (Tipo trompo)			Nisperos - Sincern	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Mezcladora de concreto (Tipo trompo)			Nisperos - Sincern	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Mezcladora de concreto (Tipo trompo)			Nisperos - Sincern	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Compactor			Nisperos - Sincern	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Retroelevadora	Hitachi 60		Nisperos - Sincern	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL ACTIVO				9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL INACTIVO				17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RESUMEN PERIODO / MES		No.	%	CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		26	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		9	34.62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		0	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		17	65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: La interventoría no ha recibido información por parte del contratista acerca de la maquinaria y equipo del proyecto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
NOTAS:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Firma				Firma																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Nombre: Jose Manuel Cardenas Bolivar				Nombre: Jose Manuel Cardenas Bolivar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Residente de Obra				Residente de Interventoría																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Matrícula Profesional No. 13202-360133BLV				Matrícula Profesional No. 0820297701ATL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

4.2.2. MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N° 557 DE 2022.

[illegible]

4.2.3. MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N° 558 DE 2022.

Actividades de obra finalizadas el 30 de Julio de 2024.

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

4.3.1. MUNICIPIO DE ACHÍ – BOLÍVAR CONTRATO N° L.P.006 DE 2022.

Conforme al Anexo No. 1 – Anexo Técnico de los Pliegos de Condiciones, el personal mínimo requerido conforme a lo establecido en el numeral 6. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL – a. Requisitos del personal de dicho documento, quedo establecido y aprobado de la siguiente manera en el comunicado No. GIC-INVIAS-BOL-225-22 de la Interventoría del 19 de abril de 2023.

CARGO	PROFESIONAL
DIRECTOR DE OBRA	JAVIER JOSÉ DOMÍNGUEZ VERGARA
RESIDENTE DE OBRA	ASAEL CERPA MONTES
SUPERVISOR SST	ELIZABETH PÉREZ MELÉNDEZ

Tabla 14. Personal del Consorcio VIA LOS NISPEROS JK.

Durante el mes, el contratista CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK no ha hecho la entrega de los soportes de pago de seguridad social del personal en obra.

4.3.2. MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N°557 DE 2022

Conforme al Anexo No. 1 – Anexo Técnico de los Pliegos de Condiciones, el personal mínimo requerido conforme a lo establecido en el numeral 6. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL – a. Requisitos del personal de dicho documento, quedo establecido y aprobado de la siguiente manera en el comunicado No. GIC-INVIAS-BOL-057-22 de la Interventoría del 24 de octubre de 2022. A continuación, en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 se relaciona el personal, aportes legales y seguridad social del contrato de obra.

CARGO	PROFESIONAL
DIRECTOR DE OBRA	GONZALO DE JESUS ARBELAEZ AGUIRRE
RESIDENTE DE OBRA	GLORIA ESTHER COELLO TORRES
INGENIERO ESPECIALISTA EN VÍAS	ERNESTO RAFAEL MERLANO MORALES
RESIDENTE AMBIENTAL	ETTY YULIET CALVO RAMIREZ

Tabla 15. Personal del Consorcio SAN RAFAEL.

4.3.3. MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N°558 DE 2022

Conforme al Anexo No. 1 – Anexo Técnico de los Pliegos de Condiciones, el personal mínimo requerido conforme a lo establecido en el numeral 6. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL – a. Requisitos del personal de dicho documento, quedo establecido y aprobado de la siguiente manera en el comunicado No. GIC-INVIAS-BOL-056-22 de la Interventoría del 19 de octubre de 2022.

CARGO	PROFESIONAL
DIRECTOR DE OBRA	DIEGO ARMANDO ALVAREZ HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA	KEVIN JAVIER ESPELETA BRITTO
INGENIERO ESPECIALISTA EN VÍAS	JAIRO ALBERTO QUINTERO DÁBILA

Tabla 16. Personal del Consorcio MEGAVIAS MAGANGUÉ.

No se reporta aportes a seguridad social durante el periodo puesto que actividades de obra finalizaron el 30 de Julio de 2024.



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTO DE OBRA

4.4.1. MUNICIPIO DE ACHÍ – BOLÍVAR CONTRATO N°L.P.006 DE 2022.

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN-I-15-FR-8		
												VERSIÓN	1		
												PÁGINA			
												FECHA	31/01/2025 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES												DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR			
CONTRATO DE OBRA No.: L.P.006 DE 2022												CONTRATISTA: CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK			
MES INFORME MENSUAL: ENERO DE 2025												PROYECTO: VÍA LOS NISPEROS - SINCERIN			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 973 DE 2022												INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS			
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propio)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior								
2022	22-00393	2402-0600-0012	-	NACIÓN	L.P.006 DE 2022	\$ 1.800.000.000	N/A								
2023	22-00393	2402-0600-0012	-	NACIÓN	L.P.006 DE 2022	\$ 6.299.100.000	N/A								
TOTAL						\$ 8.099.100.000									
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 8.085.906.946,00															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descartando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF		Observaciones
													SI	NO	
1	RECIBO PARCIAL DE OBRA	dic-23	\$ 505.796.106,06	\$ 118.643.531,05	\$ 624.439.637,11	N/A	N/A	N/A	22-00393 DE 2022	\$ 7.474.660.363	\$ 7.461.367.208,89	N/A	X		
2	RECIBO PARCIAL DE OBRA	mar-24	\$ 777.685.259,55	\$ 182.419.999,15	\$ 960.105.258,70	N/A	N/A	N/A	22-00393 DE 2022	\$ 6.514.555.104	\$ 6.501.261.950	N/A	X		
TOTALES			\$ 1.283.481.366	\$ 301.063.530	\$ 1.584.544.896						\$ 7.461.367.209				
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.															
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO															
	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL												
SUB TOTAL BASICO OBRAS	\$ 1.283.662.348	\$ 296.414.625	\$ 1.580.076.973												
OBRA DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)	\$ -	\$ -	\$ -												
REVISIÓN Y/O AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	\$ 19.819.018	\$ 4.648.905	\$ 24.467.923												
VALOR TOTAL	\$ 1.283.481.365	\$ 301.063.530	\$ 1.584.544.896												
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.															
NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.															
<div><div> Nombre: JAVIER JOSE DOMINGUEZ VERGARA Director de Obra Matrícula Profesional No. 08202-095351</div><div> Nombre: LUMNADA CASTELLAR ARRIETA Directora de Interventoría Matrícula Profesional No. 132021300748LV</div></div>															

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

4.4.2. MUNICIPIO DE MAGANGUÉ - BOLÍVAR CONTRATO N° 557 DE 2022

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORA OBRA PUBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO: MEP-INV-RV-15-FR-8 VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1 FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)													
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR															
CONTRATO DE OBRA No: 557 DE 2022		CONTRATISTA: CONSORCIO SAN RAFAEL															
MES INFORME MENSUAL: ENERO DE 2025		MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE CASCAJAL HASTA EL CORREGIMIENTO DE LA PASCUALA DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.															
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 973 DE 2022		INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.															
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA																	
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propio)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior										
2022	2915	2402-0000-0012		PROPIOS	557 DE 2022	\$ 456.300.000	N/A										
2023	2915	2402-0000-0012		PROPIOS	557 DE 2022	\$ 4.500.000.000	N/A										
2024	2915	2402-0000-0012		PROPIOS	557 DE 2022	\$ 17.937.000.000	N/A										
2024	5055	2402-0000-0012		PROPIOS	Adicional N°1	\$ 10.180.720.000	N/A										
TOTAL						\$ 33.074.020.000											
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y CUATRO MILLONES DIEZ MIL PESOS																	
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA																	
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS		Indicar pago según reporte SIF		Observaciones	
												SI	NO	SI	NO		
1	RECIBO PARCIAL DE OBRA	dic-22	\$ 415.330.623,97	\$ 4.165.994,03	\$ 419.496.618,00	\$ -	N/A	N/A	2915 DE 2022	\$ 32.654.513.382,00	\$ 32.649.604.067,00	N/A			X		
2	RECIBO PARCIAL DE OBRA	may-23	\$ 4.535.464.462,18	\$ 1.153.224	\$ 4.536.617.686,18	\$ -	N/A	N/A	2915 DE 2022	\$ 28.117.895.695,82	\$ 28.112.986.380,82	N/A			X		
3	RECIBO PARCIAL DE OBRA	nov-23	\$ 7.864.871.427,70	\$ 138.387	\$ 7.865.009.814,58	\$ -	N/A	N/A	2915 DE 2022	\$ 20.252.885.881,24	\$ 20.247.976.566,24	N/A			X		
4	RECIBO PARCIAL DE OBRA	dic-23	\$ 2.373.241.133,65	\$ 138.387	\$ 2.373.379.520,53	\$ -	N/A	N/A	2915 DE 2022	\$ 17.879.506.360,71	\$ 17.874.597.045,71	N/A			X		
5	RECIBO PARCIAL DE OBRA	abr-24	\$ 5.051.337.113,59	\$ -	\$ 5.051.337.113,59	\$ -	N/A	N/A	2915 DE 2022	\$ 12.828.169.247,12	\$ 12.823.259.932,12	N/A			X		
6	RECIBO PARCIAL DE OBRA	jun-24	\$ 2.582.516.279,00	\$ -	\$ 2.582.516.279,00	\$ -	N/A	N/A	2915 DE 2022	\$ 10.245.652.968,12	\$ 10.240.743.653,12	N/A			X		
7	RECIBO PARCIAL DE OBRA	sep-24	\$ 3.468.357.200,00	\$ -	\$ 3.468.357.200,00	\$ -	N/A	N/A	2915 DE 2022	\$ 6.777.295.768,12	\$ 6.772.386.453,12	N/A			X		
8	RECIBO PARCIAL DE OBRA	nov-24	\$ 5.116.665.949,00	\$ -	\$ 5.116.665.949,00	\$ -	N/A	N/A	2915 DE 2022	\$ 1.660.629.819,12	\$ 1.655.720.504,12	N/A			X		
TOTALES			\$ 31.407.784.189,1	\$ 5.595.992	\$ 31.413.380.180,9	\$ -	\$ -	\$ -									
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.																	
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO																	
		VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL											
SUB TOTAL BASICO OBRAS		\$ 31.397.201.054,42		\$ -		\$ 31.397.201.054,42											
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)		\$ -		\$ -		\$ -											
REVISIÓN Y/O AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa huella, pavimento y estructura de drenaje)		\$ 13.595.904,00		\$ 2.583.221,76		\$ 16.179.125,76											
*																	
*																	
*																	
*																	
*																	
VALOR TOTAL		\$ 31.410.796.958,42		\$ 2.583.221,76		\$ 31.413.380.180,18											
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																	
NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.																	
<div><div> Firma Nombre: GONZALO DE JESUS ARBELAEZ AGUIRRE Director de Obra Matrícula Profesional No.: 13202125619BLV</div><div> Firma Nombre: EDMUNDO CASTELLARI ARRIETA Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 13202130074BLV</div></div>																	
Original Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial																	



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

4.4.3. MUNICIPIO DE MAGANGÜÉ – BOLÍVAR CONTRATO N° 558 DE 2022

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA						CÓDIGO: MEP/MIU-IN-15-FR-8 VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1 DE 1						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES								FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)						
CONTRATO DE OBRA No.: 558 DE 2022								DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR						
CONTRATISTA: CONSORCIO MEGAVÍAS MAGANGÜÉ														
MES INFORME MENSUAL: ENERO DE 2025														
PROYECTO: MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFÁLTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO HASTA EL CORREGIMIENTO DE LA SAN RAFAEL DE CORTINAS DEL MUNICIPIO DE MAGANGÜÉ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.														
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 973 DE 2022								INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS						
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA														
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Puente de Financiación (Nación o Propio)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior							
2022	2916	2402-0600-0012		NACIÓN	558 de 2022	\$ 1.632.900.000	N/A							
2023	2916	2402-0600-0012		NACIÓN	558 de 2022	\$ 4.500.000.000	N/A							
2024	2916	2402-0600-0012		NACIÓN	558 de 2022	\$ 6.171.000.000	N/A							
2024	5056	2402-0600-0012		NACIÓN	Adicional N°1	\$ 5.470.830.000	N/A							
TOTAL						\$ 17.774.730.000,00								
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 17.772.829.730,00														
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA														
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF	Observaciones
1	RECIBO PARCIAL DE OBRA	dic-22	\$ 1.426.022.447,77	\$ 11.134.237,23	\$ 1.437.156.685,00	\$ -	N/A	N/A	2916 DE 2022	\$ 16.337.573.315	\$ 16.334.873.045	N/A	X	
2	RECIBO PARCIAL DE OBRA	may-23	\$ 4.670.546.215	\$ 11.134.237	\$ 4.681.680.451,92	\$ -	N/A	N/A	2916 DE 2022	\$ 11.655.892.863	\$ 11.653.192.593	N/A	X	
3	RECIBO PARCIAL DE OBRA	dic-23	\$ 5.326.262.988,02	\$ 10.471.988,23	\$ 5.336.734.976,25	\$ -	N/A	N/A	2916 DE 2022	\$ 6.319.157.887	\$ 6.316.457.617	N/A	X	
4	RECIBO PARCIAL DE OBRA	abr-24	\$ 5.427.856.130,33	\$ -	\$ 5.427.856.130,33	\$ -	N/A	N/A	2916 DE 2022	\$ 891.301.757	\$ 888.601.487	N/A	X	
TOTALES			\$ 16.850.687.781	\$ 32.740.463	\$ 16.883.428.244	\$ -	\$ -	\$ -						
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.														
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO														
			VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL							
SUB TOTAL BÁSICO OBRAS			\$ 16.843.716.740,48		\$ 31.415.964,69		\$ 16.875.132.705							
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)														
REVISIÓN Y/O AJUSTES ESTUDIOS Y DISEÑOS (placa huella, pavimento y estructuras de drenaje)			\$ 6.971.040,00		\$ 1.324.498,00		\$ 8.295.538,00							
VALOR TOTAL			\$ 16.850.687.780,48		\$ 32.740.462,69		\$ 16.883.428.243,17							
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.														
NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación de formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.														
Firma: Nombre: DIEGO ARMANDO ALVAREZ HERNANDEZ Director de Obra Matrícula Profesional No.: 13202130071BLV										Firma: Nombre: Luminada Castellanos Arrieta Directora de Interventoría Matrícula Profesional No.: 13202130074BLV				
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventoría y Dirección Territorial.														



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

4.5.1. MUNICIPIO DE ACHÍ – BOLÍVAR CONTRATO N° L.P.006 DE 2022

En Achí, los veranos son cortos y tórridos, los inviernos son calurosos y mojados y está opresivo y nublado todo el año. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 24 °C a 37 °C y rara vez baja a menos de 22 °C o sube a más de 40 °C.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO	I																												
			VERSIÓN	1																												
			PÁGINA																													
			FECHA	31/01/2025 (Día / Mes / Año)																												
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR																													
CONTRATO DE OBRA No: L.P.006 DE 2022			CONTRATISTA: CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK																													
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2025			PROYECTO: VÍA LOS NISPEROS - SINCERIN																													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 973 DE 2022			INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.																													
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	21	24	24	24	24	22	23	24	24	24	24	24	24	24	21	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23	24	24	734
Lluvias moderadas	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Lluvias intensas	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																
OBSERVACIONES: Estación IDEAM mas cercana al proyecto :BUENAVISTA [25027260].																																
<div><div> Firma: Nombre: Residente de Obra: Asael Cerpa Matrícula Profesional No.:13202-360133BLV</div><div> Firma: Nombre: Jose Manuel Cardenas Bolivar Residente de Interventoría Matrícula Profesional No.: 08202097701 ATL</div></div>																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																

4.5.2. MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N°557 DE 2022

En Magangué, los veranos son cortos, tórridos y secos; los inviernos son cortos, calurosos y mojados y está opresivo y nublado durante todo el año. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 23 °C a 37 °C y rara vez baja a menos de 22 °C o sube a más de 39 °C.

La temporada calurosa dura 2,5 meses, del 31 de enero al 13 de abril, y la temperatura máxima promedio diaria es más de 36 °C. El mes más cálido del año en Magangué es marzo, con una temperatura máxima promedio de 37 °C y mínima de 25 °C.



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

La temporada fresca dura 2,7 meses, del 13 de septiembre al 2 de diciembre, y la temperatura máxima promedio diaria es menos de 33 °C. El mes más frío del año en Magangué es octubre, con una temperatura mínima promedio de 23 °C y máxima de 32 °C.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10																												
			VERSIÓN	1																												
			PÁGINA	1																												
			FECHA	31/01/2025 (Día / Mes / Año)																												
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR																													
CONTRATO DE OBRA No: 557 DE 2022			CONTRATISTA: CONSORCIO SAN RAFAEL MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE CASCAJAL HASTA EL CORREGIMIENTO DE LA PASCUALA DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ EN EL																													
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2025			PROYECTO: DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR																													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 973 DE 2022			INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S																													
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	743
Lluvias moderadas	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																
OBSERVACIONES: La estación más cercana al Proyecto es MAGANGUE [25025110]																																
<div><div> Firma Nombre: Gloria Coello Torres Residente de Obra Matrícula Profesional No.: 25202-192140 CND</div><div> Firma Nombre: Edgar Alfonso Argon Otero Residente de Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202226695CND</div></div>																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																

4.5.3. MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N°558 de 2022

No se reporta estado general del tiempo puesto que actividades de obra finalizaron el 30 de Julio de 2024

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

4.6.1. MUNICIPIO DE ACHÍ – BOLÍVAR CONTRATO N°L.P.006 DE 2022

4.6.2. MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N°558 DE 2022

Actividades de obra finalizaron el 30 de Julio de 2024

4.6.3. MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N°557 de 2022



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

4.7.1. MUNICIPIO DE ACHÍ – BOLÍVAR CONTRATO N° L.P.006 DE 2022

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12																																																														
		VERSIÓN	1																																																														
		PÁGINA	1																																																														
		FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	2025 (Año)																																																												
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR																																																															
CONTRATO DE OBRA No. L.P.006 DE 2022		CONTRATISTA: CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK																																																															
OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CORREGIMIENTO DE LOS NISPEROS HASTA EL CORREGIMIENTO DE SINCERIN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACHÍ - DAPARTAMENTO DE BOLÍVAR.																																																																	
FECHA DE INICIO: 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 PLAZO INICIAL: 6 meses FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27 DE MAYO DE 2025 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 8.085.806.846,00 VALOR ACUMULADO: \$ 8.085.806.846,00 (Incluye adiciones) VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 30.692.004,00 VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 30.692.004,00 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 973 DE 2022 INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.																																																																	
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																																	
<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 808.580.684,60</td><td>29</td><td>11</td><td>2022</td><td>29</td><td>6</td><td>2023</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td colspan="3">N/A</td><td colspan="3">N/A</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>20%</td><td>\$ 1.617.161.369,20</td><td>29</td><td>11</td><td>2022</td><td>29</td><td>6</td><td>2026</td></tr><tr><td>Calidad de Estudios y Diseños</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td colspan="3">N/A</td><td colspan="3">N/A</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>30%</td><td>\$ 2.425.742.053,80</td><td colspan="3">Inicio del contrato</td><td colspan="3">5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de recibo Definitivo a satisfacción de las obras por parte de la Entidad</td></tr></tbody></table>						Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 808.580.684,60	29	11	2022	29	6	2023	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 1.617.161.369,20	29	11	2022	29	6	2026	Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A	N/A			N/A			Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 2.425.742.053,80	Inicio del contrato			5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de recibo Definitivo a satisfacción de las obras por parte de la Entidad		
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																														
			Desde			Hasta																																																											
Cumplimiento	10%	\$ 808.580.684,60	29	11	2022	29	6	2023																																																									
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A																																																											
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 1.617.161.369,20	29	11	2022	29	6	2026																																																									
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A	N/A			N/A																																																											
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 2.425.742.053,80	Inicio del contrato			5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de recibo Definitivo a satisfacción de las obras por parte de la Entidad																																																											
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101395581																																																																	
Certificado de modificación o anexo No.: 3 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																																	
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.																																																																	
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																																	



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 1 PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: 1 SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	N/A	\$ 808.580.684,60
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	N/A	\$ 1.617.161.369,20
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N/A	\$ 2.425.742.053,80

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
29	11	2022	29	6	2023
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
29	11	2022	29	6	2026
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días					

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101395581

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 500.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
29	11	2022	29	6	2023
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-101197791 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

- El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
- El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma Iluminada Castellar A.

Nombre:
Director de Interventoría Iluminada Castellar Arrieta
Matrícula Profesional No.: 13202130074BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 2 PRÓRROGA No.: 2 MODIFICACIÓN No.: 2 SUSPENSIÓN No.: 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	N/A	\$ 808.580.684,60
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	N/A	\$ 1.617.161.369,20
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N/A	\$ 2.425.742.053,80

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
29	11	2022	29	11	2023
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
29	11	2022	29	11	2026
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
29	5	2023	29	5	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101395581

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ PRÓRROGA No.: _____ MODIFICACIÓN No.: _____ SUSPENSIÓN No.: _____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	\$ 500.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
29	11	2022	29	11	2023
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-101197791 OTRAS PÓLIZAS No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

OBSERVACIONES:

NOTAS:

- El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
- El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma Iluminada Castellar A.

Nombre:
Director de Interventoría Iluminada Castellar Arrieta
Matrícula Profesional No.: 13202130074BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 3 PRÓRROGA No.: 3 MODIFICACIÓN No.: 3 SUSPENSIÓN No.: 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	N/A	\$ 808.580.684,60
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	N/A	\$ 1.617.161.369,20
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N/A	\$ 2.425.742.053,80

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
29	11	2022	29	2	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
29	11	2022	28	2	2027
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
29	5	2023	29	5	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101395581

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ PRÓRROGA No.: _____ MODIFICACIÓN No.: _____ SUSPENSIÓN No.: _____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	\$ 500.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
29	11	2022	29	2	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-101197791 OTRAS PÓLIZAS No. _____

Certificado de modificación o anexo No. 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

OBSERVACIONES:

NOTAS:

- El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
- El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma Iluminada Castellar A.

Nombre:
Director de Interventoría Iluminada Castellar Arrieta
Matrícula Profesional No.: 13202130074BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 4 PRÓRROGA No.: 4 MODIFICACIÓN No.: 4 SUSPENSIÓN No.: 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	N/A	\$ 808.580.684,60
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	N/A	\$ 1.617.161.369,20
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N/A	\$ 2.425.742.053,80

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
29	11	2022	29	6	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
29	11	2022	28	6	2027
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
29	5	2023	29	5	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101395581

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ PRÓRROGA No.: _____ MODIFICACIÓN No.: _____ SUSPENSIÓN No.: _____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	\$ 500.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
29	11	2022	29	6	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-101197791 OTRAS PÓLIZAS No. _____

Certificado de modificación o anexo No. 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

OBSERVACIONES:

NOTAS:

- El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
- El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma Iluminada Castellar A.

Nombre:
Director de Interventoría Iluminada Castellar Arrieta
Matrícula Profesional No.: 13202130074BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ PRÓRROGA No.: 5 MODIFICACIÓN No.: 5 SUSPENSIÓN No.: _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	N/A	\$ 808.580.684,60
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	N/A	\$ 1.617.161.369,20
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N/A	\$ 2.425.742.053,80

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
29	11	2022	29	10	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
29	11	2022	29	10	2027
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
29	5	2023	29	5	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101395581

Certificado de modificación o anexo No. 8
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ PRÓRROGA No.: 5 MODIFICACIÓN No.: 5 SUSPENSIÓN No.: _____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	\$ 500.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
29	11	2022	29	6	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-101197791 OTRAS PÓLIZAS No. _____

Certificado de modificación o anexo No. 8
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

OBSERVACIONES:

NOTAS:

- El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
- El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma Iluminada Castellar A.

Nombre:
Director de Interventoría Iluminada Castellar Arrieta
Matrícula Profesional No.: 13202130074BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 6 MODIFICACIÓN No.: 6 SUSPENSIÓN No.:

<i>Garmincón Consultores A</i> Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	N/A	\$ 808.580.684,60
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	N/A	\$ 1.617.161.369,20
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N/A	\$ 2.425.742.053,80

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
29	11	2022	29	12	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
29	11	2022	29	12	2027
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
29	5	2023	29	5	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101395581

Certificado de modificación o anexo No.: 9
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 6 MODIFICACIÓN No.: 6 SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	\$ 500.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
29	11	2022	29	12	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-101197791 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 9
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 7 MODIFICACIÓN No.: 7 SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	N/A	\$ 808.580.684,60
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	N/A	\$ 1.617.161.369,20
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N/A	\$ 2.425.742.053,80

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
29	11	2022	5	3	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
29	11	2022	5	3	2028
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
29	5	2023	29	5	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101395581

Certificado de modificación o anexo No. 11
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 7 MODIFICACIÓN No.: 7 SUSPENSIÓN No.: 3

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	\$ 500.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
29	11	2022	5	3	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-101197791 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 11
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma
Nombre:

Director de Interventoría Iluminada Castellar Arrieta
Matrícula Profesional No.: 13202130074BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

 SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-5												POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL DECRETO 1082 DE 2015																									
CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY						COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-44-10139581		ANEXO 11																					
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 19 12 2024			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 29 11 2022			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 29 05 2028			A LAS HORAS 23:59		TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA																								
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO																																					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK										IDENTIFICACIÓN NIT: 901.627.819-5																											
DIRECCIÓN: CR 24 C NRO. 6 D - 30										CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE				TELÉFONO: 3006030506																							
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO																																					
ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ACHI DEPARTAMENTO DE BOLIVAR										IDENTIFICACIÓN NIT: 800.037.371-1																											
DIRECCIÓN: ALCALDIA MUNICIPAL DE ACHI BOLIVAR										CIUDAD: ACHI, BOLIVAR				TELÉFONO: 6820302																							
ADICIONAL:																																					
OBJETO DEL SEGURO																																					
CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN EC0015B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA: EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDENIZACIONES LABORALES, LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.L.P.066 DE 2022, REFERENTE A CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL CORREGIMIENTO DE LOS NISPEROS HASTA EL CORREGIMIENTO DE SINCELEJO ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACHI - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. NOTA: LA VIGENCIA PARA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS SE AJUSTARA A CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCION DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA ENTIDAD. ASEGURADOS: MUNICIPIO DE ACHI - BOLIVAR NIT. 800.037.371-1 E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT. 860.215.807-2																																					
AMFAROS																																					
RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS																																					
<table><thead><tr><th>AMFAROS</th><th>VIGENCIA DESDE</th><th>VIGENCIA HASTA</th><th>SUMA ASEO/ACTUAL</th><th>SUMA ASEO/ANTERIOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</td><td>29/11/2022</td><td>05/03/2025</td><td>\$808,580,684.60</td><td>\$808,580,684.60</td></tr><tr><td>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES</td><td>29/11/2022</td><td>05/03/2028</td><td>\$1,617,161,369.20</td><td>\$1,617,161,369.20</td></tr><tr><td>ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA</td><td>29/05/2023</td><td>29/05/2028</td><td>\$2,425,742,053.80</td><td></td></tr></tbody></table>														AMFAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEO/ACTUAL	SUMA ASEO/ANTERIOR	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/11/2022	05/03/2025	\$808,580,684.60	\$808,580,684.60	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/11/2022	05/03/2028	\$1,617,161,369.20	\$1,617,161,369.20	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	29/05/2023	29/05/2028	\$2,425,742,053.80					
AMFAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEO/ACTUAL	SUMA ASEO/ANTERIOR																																	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/11/2022	05/03/2025	\$808,580,684.60	\$808,580,684.60																																	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/11/2022	05/03/2028	\$1,617,161,369.20	\$1,617,161,369.20																																	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	29/05/2023	29/05/2028	\$2,425,742,053.80																																		
ACLARACIONES POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN VIGENCIAS SEGUN ACTA DE SUSPENSION NO. 3 Y ACTA DE REINICIO NO. 3 - AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. L.P.066 DE 2022, DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES																																					
<table><thead><tr><th>VALOR PRIMA NETA</th><th>GASTOS EXPEDICIÓN</th><th>IVA</th><th>TOTAL A PAGAR</th><th>VALOR ASEGURADO TOTAL</th><th>PLAN DE PAGO</th></tr></thead><tbody><tr><td>\$ ****864,586.00</td><td>\$ ****8,000.00</td><td>\$ ****127,791.00</td><td>\$ *****800,378.00</td><td>\$ ****4,851,484,107.80</td><td>CONTADO</td></tr></tbody></table>														VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO	\$ ****864,586.00	\$ ****8,000.00	\$ ****127,791.00	\$ *****800,378.00	\$ ****4,851,484,107.80	CONTADO												
VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO																																
\$ ****864,586.00	\$ ****8,000.00	\$ ****127,791.00	\$ *****800,378.00	\$ ****4,851,484,107.80	CONTADO																																
<table><thead><tr><th colspan="3">INTERMEDIARIO</th><th colspan="3">DISTRIBUCION COASEGURO</th></tr><tr><th>NOMBRE</th><th>CLAVE</th><th>% DE PART.</th><th>NOMBRE COMPAÑIA</th><th>% PART.</th><th>VALOR ASEGURADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>GR BARRETO Y CIA LTDA</td><td>ASESORES DE</td><td>978034</td><td>100.00</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>														INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO			NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO	GR BARRETO Y CIA LTDA	ASESORES DE	978034	100.00								
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO																																		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO																																
GR BARRETO Y CIA LTDA	ASESORES DE	978034	100.00																																		
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.																																					
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.																																					
 21-44-10139581 FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ochoa - Vicepresidente de Finanzas																																					
FIRMA TOMADOR																																					
LISTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 80, PISO 5 TELEFONO: 601-2106977, 601-6019330 XIMENA HORTUASUS 1																																					



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

SEGUROS DEL ESTADO S.A.									
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL									
DECRETO 1082 DE 2015									
CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			CODSUC 21		NO PÓLIZA 21-44-101395581	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	
19 12 2024		29 11 2022		00:00		29 05 2028		23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA									
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO									
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.627.819-5	
DIRECCIÓN: CR 24 C NRO. 6 D - 30						CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE		TELÉFONO: 3006030606	
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO									
ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ACHI DEPARTAMENTO DE BOLIVAR								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.037.371-1	
DIRECCIÓN: ALCALDIA MUNICIPAL DE ACHI BOLIVAR						CIUDAD: ACHI, BOLIVAR		TELÉFONO: 6820302	
ADICIONAL:									
<div><div></div><div></div><div><p>Pagos con convenio *No aplica para transferencias</p><div> Bancode Bogotá Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445</div><div> Grupo Bancolombia Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189</div></div></div>									
VALOR PRIMA NETA \$ ****664,586.00		GASTOS EXPEDICIÓN \$ ****8,000.00		IVA \$ ****127,791.00		TOTAL A PAGAR \$ ****800,378.00		VALOR ASEGURADO TOTAL \$ ****4,851,484,107.60	
PLAN DE PAGO CONTADO									
INTERMEDIARIO					DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
NOMBRE		CLAVE		% DE PART.		NOMBRE COMPAÑÍA		% PART. VALOR ASEGURADO	
GB BARRETO Y CIA LTDA		ASESORES DE		97#034		100.00			
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.									
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA. POR LO TANTO EL ASEGURADO COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-19 - TELÉFONO: 6-917983 - BOGOTÁ, D.C.									
FORMA DE PAGO									
BANCO		CHEQUE No.		VALOR					
EFECTIVO									
CHEQUE									
TOTAL \$									
REFERENCIA PAGO: 1100513718383-8									
COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE									



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 850.009.578-6										POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL DECRETO 1082 DE 2015									
CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY				COD.SUC 21		NO.POLIZA 21-44-101395581		ANEXO 11					
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO						
19 12 2024			29 11 2022			00:00		29 05 2026			23:59		ANEXO DE PRORROGA						
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO																			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK										IDENTIFICACIÓN NIT: 901.627.819-5									
DIRECCIÓN: CR 24 C NRO. 6 D - 30										CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE		TELÉFONO: 3006030606							
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO																			
ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ACHI DEPARTAMENTO DE BOLIVAR										IDENTIFICACIÓN NIT: 800.037.371-1									
DIRECCIÓN: ALCALDIA MUNICIPAL DE ACHI BOLIVAR										CIUDAD: ACHI, BOLIVAR		TELÉFONO: 6820302							
ADICIONAL:																			
TEXTO ACLARATORIO																			
PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :																			
NOMBRE IDENTIFICACION PARTICIPACION																			
DOMINGUEZ VERGARA JAVIER JOSE 92153531 40.00																			
KABOD EXECUTIVE GROUP S.A.S. 901396685-1 60.00																			
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.																			
NOTA: SEGUROS DE ESTADOS A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN.																			
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELÉFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.																			
																			
21-44-101395581																			
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas																			
FIRMA TOMADOR																			
JOSE ANTONIO TULIUS																			



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-5

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101395581, anexo 11, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTÁ, D.C. a los 19 días del mes de DICIEMBRE de 2024

21-44-101395581

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

 SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.678-6		POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RCE CONTRATOS															
CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY						COD. SUC 21		NO PÓLIZA 21-40-101197791		ANEXO 11	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO				
18 12 2024			29 11 2022			00:00		05 03 2025			23:59		ANEXO DE PRORROGA				
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO																	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK												IDENTIFICACIÓN NIT: 901.627.819-5					
DIRECCIÓN: CR 24 C NRO. 6 D - 30										CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE				TELÉFONO: 3006030506			
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO																	
ASEGURADO: MUNICIPIO DE ACHI DEPARTAMENTO DE BOLIVAR												IDENTIFICACIÓN NIT: 800.037.371-1					
DIRECCIÓN: ALCALDIA MUNICIPAL DE ACHI BOLIVAR										CIUDAD: ACHI, BOLIVAR				TELÉFONO: 6820302			
BENEFICIARIO: 800037371 - MUNICIPIO DE ACHI DEPARTAMENTO DE BOLIVAR																	
OBJETO DEL SEGURO																	
CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1123-P-06-00000-K-RCE-002A-0001 / 31-03-22 - 1123-P-06-00000-K-RCE-001P-0001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA: LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL ASEGURADO POR DAÑOS MATERIALES Y LESIONES PERSONALES CAUSADOS A TERCEROS DURANTE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA Y QUE SUCEDAN DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL AFIANZADO SEGUN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. L.P. 006 DE 2022, REFERENTE A CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELA EN LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CORRESMIENTO DE LOS NISPEROS HASTA EL CORRESMIENTO DE SINCELEJO ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACHI - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. ASEGURADOS : MUNICIPIO DE ACHI - BOLIVAR NIT. 800.037.371-1 E INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS NIT. 860.215.607-2 BENEFICIARIO : TERCEROS AFECTADOS																	
AMFAROS																	
RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS																	
AMFAROS		DEDUCIBLE		VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		SUMA ASEG. ACTUAL		SUMA ASEG. ANTERIOR							
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV		29/11/2022		05/03/2025		\$500.000.000.00		\$500.000.000.00							
ACLARACIONES																	
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN VIGENCIAS SEGUN ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 3 Y ACTA DE REINICIO NO. 3 - AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. L.P. 006 DE 2022, DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES																	
VALOR PRIMA NETA		GASTOS EXPEDICIÓN		IVA		TOTAL A PAGAR		VALOR ASEGURADO TOTAL		PLAN DE PAGO							
\$ ****226.027.00		\$ *****3.000.00		\$ *****43.515.00		\$ *****272.542.00		\$ *****500.000.000.00		CONTADO							
INTERMEDIARIO						DISTRIBUCIÓN COASEGURO											
NOMBRE		CLAVE		% DE PART.		NOMBRE COMPAÑÍA		% PART.		VALOR ASEGURADO							
OB BARRETO Y CIA LTDA		ASESORES DE		578034		100.00											
LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO. NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELÉFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.																	
 21-40-101197791 FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oueda - Vicepresidente de Finanzas																	
																	
FIRMA TOMADOR																	
Usted puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELÉFONO: 601-2386977, 601-6019336 01F97803MD 1																	



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RCE CONTRATOS													
SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 890.009.578-6			CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY		COD.SUC 21		NO PÓLIZA 21-40-101197791		ANEXO 11	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 18 12 2024			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 29 11 2022			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 05 03 2025		A LAS HORAS 23:59		TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA	
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO													
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK										IDENTIFICACIÓN NIT: 901.627.819-9			
DIRECCIÓN: CR 24 C NRO. 6 D - 30								CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE			TELÉFONO: 3006030606		
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO													
ASEGURADO: MUNICIPIO DE ACHI DEPARTAMENTO DE BOLIVAR										IDENTIFICACIÓN NIT: 800.037.371-1			
DIRECCIÓN: ALCALDIA MUNICIPAL DE ACHI BOLIVAR								CIUDAD: ACHI, BOLIVAR			TELÉFONO: 6820302		
BENEFICIARIO:													
<div><div></div><div><div>PAGINA WEB</div><div></div></div><div><div>CORRESPONSALES BANCARIOS</div><div></div></div><div><div>Pagos con convenio *No aplica para transferencias</div><div></div></div></div>													
VALOR PRIMA NETA \$ ****226.027.00		GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****3.000.00		IVA \$ ****43.515.00		TOTAL A PAGAR \$ *****272.542.00		VALOR ASEGURADO TOTAL \$ ****500.000.000.00		PLAN DE PAGO CONTADO			
INTERMEDIARIO						DISTRIBUCION COASEGURO							
NOMBRE GB BARRETO Y CIA LTDA		CLAVE ASESORES DE		% DE PART. 978036 100.00		NOMBRE COMPAÑIA		% PART.		VALOR ASEGURADO			
LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y PARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.													
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-19 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.													
FORMA DE PAGO													
BANCO		CHEQUE No.		VALOR									
EFFECTIVO													
CHEQUE													
TOTAL \$													
COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE													



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CIUDAD DE EXPEDICIÓN		SUCURSAL		COD.SUC		Nº.POLIZA		ANEXO	
BOGOTÁ, D.C.		ANTIGUO COUNTRY		21		21-40-101197791		11	
FECHA EXPEDICIÓN		VIGENCIA DESDE		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	HORAS
18	12	2024	29	11	2022	00:00	05	03	2025
								23:59	
TIPO MOVIMIENTO									
ANEXO DE PRORROGA									
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO									
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.627.819-5	
DIRECCIÓN: CR 24 C NRO. 6 D - 30						CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE		TELÉFONO: 3006030506	
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO									
A SEGURO: MUNICIPIO DE ACHI DEPARTAMENTO DE BOLIVAR								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.037.371-1	
DIRECCIÓN: ALCALDIA MUNICIPAL DE ACHI BOLIVAR						CIUDAD: ACHI, BOLIVAR		TELÉFONO: 6620302	
BENEFICIARIO: 800037371 - MUNICIPIO DE ACHI DEPARTAMENTO DE BOLIVAR									
TEXTO ACLARATORIO									
PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL : NOMBRE DOMÍNGUEZ VERGARA JAVIER JOSE KASOD EXECUTIVE GROUP S.A.S.									
				IDENTIFICACION		PARTICIPACION			
				921579311		40.00			
				901396689-1		60.00			
LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.									
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION									
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELÉFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.									
									
21-40-101197791									
FIRMA AUTORIZADA: José Luis Oyeda - Vicepresidente de Finanzas									
FIRMA TOMADOR									
DL F9780340									



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

4.7.2. MUNICIPIO DE MAGANGÜÉ – BOLÍVAR CONTRATO N°557 DE 2022

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12																																																														
		VERSIÓN	1																																																														
		PÁGINA	1																																																														
		FECHA	31	1	2025																																																												
			(Día)	(Mes)	(Año)																																																												
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR																																																															
CONTRATO DE OBRA No. 557 DE 2022		CONTRATISTA: CONSORCIO SAN RAFAEL																																																															
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE CASCAJAL HASTA EL CORREGIMIENTO DE LA PASCUALA DEL MUNICIPIO DE MAGANGÜÉ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.																																																																	
FECHA DE INICIO: 24 de octubre de 2022 PLAZO INICIAL: 18 meses FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 24 de febrero de 2025 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 22.888.390.685,00 VALOR ACUMULADO: \$ 33.069.100.685,00 (Incluye adiciones) VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 75.580.000,00 VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 75.580.000,00 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 973 de 2022 INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S																																																																	
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																																	
<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento del contrato</td><td>10</td><td>\$ 2.288.839.068,50</td><td>15</td><td>7</td><td>2022</td><td>15</td><td>7</td><td>2024</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td colspan="3">N/A</td><td colspan="3">N/A</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5</td><td>\$ 1.144.419.534,25</td><td>15</td><td>7</td><td>2022</td><td>15</td><td>1</td><td>2027</td></tr><tr><td>Calidad de Estudios y Diseños</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td colspan="3">N/A</td><td colspan="3">N/A</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>5</td><td>\$ 1.144.419.534,25</td><td>15</td><td>1</td><td>2024</td><td>15</td><td>1</td><td>2029</td></tr></tbody></table>						Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento del contrato	10	\$ 2.288.839.068,50	15	7	2022	15	7	2024	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	\$ 1.144.419.534,25	15	7	2022	15	1	2027	Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A	N/A			N/A			Estabilidad y/o Calidad de Obra	5	\$ 1.144.419.534,25	15	1	2024	15	1	2029
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																														
			Desde			Hasta																																																											
Cumplimiento del contrato	10	\$ 2.288.839.068,50	15	7	2022	15	7	2024																																																									
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A																																																											
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	\$ 1.144.419.534,25	15	7	2022	15	1	2027																																																									
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A	N/A			N/A																																																											
Estabilidad y/o Calidad de Obra	5	\$ 1.144.419.534,25	15	1	2024	15	1	2029																																																									
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100174571 Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 04 de agosto de 2022																																																																	
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																																	
<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Seguro</th><th rowspan="2">% Asegurado</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>5</td><td>\$ 1.144.419.534,00</td><td>15</td><td>7</td><td>2022</td><td>15</td><td>1</td><td>2024</td></tr><tr><td>Responsabilidad civil patronal</td><td>1,5</td><td>\$ 343.325.860,00</td><td>15</td><td>7</td><td>2022</td><td>15</td><td>1</td><td>2024</td></tr><tr><td>Contratistas y subcontratistas</td><td>1,5</td><td>\$ 343.325.860,00</td><td>15</td><td>7</td><td>2022</td><td>15</td><td>1</td><td>2024</td></tr><tr><td>Vehiculos propios y no propios</td><td>1,5</td><td>\$ 343.325.860,00</td><td>15</td><td>7</td><td>2022</td><td>15</td><td>1</td><td>2024</td></tr></tbody></table>						Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5	\$ 1.144.419.534,00	15	7	2022	15	1	2024	Responsabilidad civil patronal	1,5	\$ 343.325.860,00	15	7	2022	15	1	2024	Contratistas y subcontratistas	1,5	\$ 343.325.860,00	15	7	2022	15	1	2024	Vehiculos propios y no propios	1,5	\$ 343.325.860,00	15	7	2022	15	1	2024									
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																														
			Desde			Hasta																																																											
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5	\$ 1.144.419.534,00	15	7	2022	15	1	2024																																																									
Responsabilidad civil patronal	1,5	\$ 343.325.860,00	15	7	2022	15	1	2024																																																									
Contratistas y subcontratistas	1,5	\$ 343.325.860,00	15	7	2022	15	1	2024																																																									
Vehiculos propios y no propios	1,5	\$ 343.325.860,00	15	7	2022	15	1	2024																																																									
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. M-100035544 OTRAS PÓLIZAS No. Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 4 de agosto de 2022																																																																	



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: 2 SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Amparo basico - predios, labores y operaciones		\$ 1.653.455.034,25
Patronal		\$ 1.653.455.034,25
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 1.653.455.034,25
Calidad de Estudios y Diseños		\$ 1.653.455.034,25

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
24	10	2022	25	7	2024
24	10	2022	25	7	2024
24	10	2022	25	7	2024
24	10	2022	25	7	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:



GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:1..... PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento		\$ 3.306.910.068,50
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 1.653.455.034,25
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A
Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ 1.653.455.034,25

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
29	11	2023	24	10	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
29	11	2023	24	4	2027
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
24	4	2024	24	4	2029
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:6.....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:



GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: 2 SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento		\$ 3.306.910.068,50
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 1.653.455.034,25
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A
Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ 1.653.455.034,25

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
2	4	2024	24	1	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
2	4	2024	24	7	2027
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
24	7	2024	24	7	2029
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:



GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: 2 SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento		\$ 3.306.910.068,50
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 6.613.820.137,00
Calidad del servicio		\$ 22.674.000,00
Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ 9.920.730.205,50

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
2	4	2024	24	1	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
2	4	2024	24	7	2027
24	7	2024	24	7	2029
24	7	2024	24	7	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100174571

Certificado de modificación o anexo No.: 8
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:



GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: 2 SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento		\$ 3.306.910.068,50
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 6.613.820.137,00
Calidad del servicio		\$ 22.674.000,00
Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ 9.920.730.205,50

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
2	4	2024	24	1	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
2	4	2024	24	7	2027
24	7	2024	24	7	2029
24	7	2024	24	7	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100174571

Certificado de modificación o anexo No.: 9
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: 2 SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento		\$ 3.306.910.068,50
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 6.613.820.137,00
Calidad del servicio		\$ 22.674.000,00
Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ 9.920.730.205,50

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
2	4	2024	24	1	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
2	4	2024	24	7	2027
24	7	2024	24	7	2029
24	7	2024	24	7	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100174571

Certificado de modificación o anexo No.: 10
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 2 MODIFICACIÓN No.: 3 SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento		\$ 3.306.910.068,50
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 6.613.820.137,00
Calidad del servicio		\$ 22.674.000,00
Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ 9.920.730.205,50

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
2	4	2024	24	1	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
2	4	2024	24	7	2027
24	7	2024	24	7	2029
24	7	2024	24	7	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100174571

Certificado de modificación o anexo No.: 11
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

- El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
- El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma Iluminada Castellar A.
Nombre:
Director de Interventoría Iluminada Castellar Arrieta
Matrícula Profesional No.: 13202130074BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES



NIT 860 037 013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPAÑIA
MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.08.12 14:03:02 -05:00

Código de Seguridad: 0wJhQFcFGOK3g/bN+3Tw5w==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 66 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLASIFICADA V0-04-2024-1221-P-02-PP20240800000000-00001

No. PÓLIZA	M-100174571	No. ANEXO	11	No. CERTIFICADO	14905577	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	12/08/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN
VIGENCIA DESDE	24/10/2022	VIGENCIA HASTA	24/12/2029	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	
00:00 Horas Del		24:00 Horas Del				VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
					N/A		N/A

TOMADOR	CONSORCIO SAN RAFAEL	No. DOC. IDENTIDAD	901.613.519-1
DIRECCIÓN	BRR MARBELLA CRA 3 46 57 ED EDIFICIO LAGUNA 46 OF 1401	TELÉFONO	6466418
ASEGURADO	MUNICIPIO DE MAGANGUE - BOLIVAR	No. DOC. IDENTIDAD	800.028.432-2
DIRECCIÓN	CALLE 16 NO.16A - 208	TELÉFONO	3116196772
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE MAGANGUE - BOLIVAR	No. DOC. IDENTIDAD	800.028.432-2
DIRECCIÓN	CALLE 16 NO.16A - 208	TELÉFONO	3116196772

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS CONFIRMA Y ACEPTA QUE SEGUN OTROSÍ MODIFICATORIO NO. 003, FECHADO EL 22/07/2024 AL CONTRATO NO. 557 DE 2022, PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO POR CINCO (5) MESES MAS QUEDANDO EN UN PLAZO CONTRACTUAL FINAL HASTA EL 24/12/2024.

* SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE PÓLIZA CUENTA CON SU COBERTURA DESDE 24/10/2022.

- ASEGURADO/BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE MAGANGUE NIT 800.028.432-4 , INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800.215.807-2

* LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 22/07/2024	24:00 Horas Del 24/06/2025	3.306.910.068,50	3.830.579,66
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 22/07/2024	24:00 Horas Del 24/12/2027	6.613.820.137,00	7.762.631,63
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 24/12/2024	24:00 Horas Del 24/12/2029	9.920.730.205,50	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 24/12/2024	24:00 Horas Del 24/12/2029	22.674.000,00	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 19.864.134.411,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN	PRIMA BRUTA	\$
RAVE AGENCIA DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00		11.593.211,29
DESCUENTOS			\$	
EXTRA PRIMA				
PRIMA NETA			\$	11.593.211,29
GASTOS EXP.			\$	0,00
IVA			\$	2.202.710,15
TOTAL A PAGAR			\$	13.795.921,44

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDIAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADÉMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR



Lineas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PSA - AIF



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES



seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	M-198174571	No. ANEXO	11	No. CERTIFICADO	14985577	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	12/08/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 24/10/2022	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 24/12/2029	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

OBJETO:
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.557 DE 2022 , CUYO OBJETO ES

MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFÁLTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE CASCAJAL HASTA EL CORREGIMIENTO DE LA PASCUALA DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

NOTA: SE ACLARA QUE LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S. NIT: 900508212 (PART. 90 %)
INTEGRANTE 2 - A.S.S CONSTRUCTORA S.A.S. NIT: 890210939 (PART. 10 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO SAN RAFAEL)

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno de estos canales por medio de:
Página web: www.seguros-mundial.com.co
Correo electrónico: mundial@seguros-mundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+501) 3274712 - (+501) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO
Administración Nacional de Aseguración de Colombia



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

APLICAR A LA CLASIFICACIÓN DE LA INFLUENCIA Y PAGO. APP



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES



NIT 960.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.



LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **M-100174571** y endoso, 11 cuyo afianzado es:
CONSORCIO SAN RAFAEL Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE MAGANGUE - BOLIVAR / MUNICIPIO DE MAGANGUE - BOLIVAR**, expedida por la Compañía en **12/08/2024**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

MEDELLIN a los 12 días del mes **AGOSTO** del año **2024**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO
REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS
DE COLOMBIA



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA&APF



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

4.7.3. MUNICIPIO DE MAGANGÜÉ – BOLÍVAR CONTRATO N°558 de 2022

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12																																																														
		VERSIÓN	1																																																														
		PÁGINA	1																																																														
		FECHA	31	1	2025																																																												
			(Día)	(Mes)	(Año)																																																												
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR																																																															
CONTRATO DE OBRA No. 558 DE 2022		CONTRATISTA: CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGÜÉ																																																															
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFÁLTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO HASTA EL CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL DE CORTINAS DEL MUNICIPIO DE MAGANGÜÉ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.																																																																	
FECHA DE INICIO: 19 de octubre de 2022 PLAZO INICIAL: 15 meses FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 de julio de 2024 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: 12.301.199.730,00 VALOR ACUMULADO: \$ 17.772.029.730,00 (Incluye adiciones) VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 41.477.688,00 VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 41.477.688,00 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 973 de 2022 INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS																																																																	
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																																	
<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento general del contrato</td><td>10</td><td>\$ 1.230.119.973,00</td><td>15</td><td>7</td><td>2022</td><td>15</td><td>4</td><td>2024</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>-</td><td>-</td><td colspan="3">N.A.</td><td colspan="3">N.A.</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5</td><td>\$ 615.059.986,50</td><td>15</td><td>7</td><td>2022</td><td>15</td><td>10</td><td>2026</td></tr><tr><td>Calidad de Estudios y Diseños</td><td>-</td><td>-</td><td colspan="3">N.A.</td><td colspan="3">N.A.</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>5</td><td>\$ 615.059.986,50</td><td>15</td><td>10</td><td>2023</td><td>15</td><td>10</td><td>2028</td></tr></tbody></table>						Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento general del contrato	10	\$ 1.230.119.973,00	15	7	2022	15	4	2024	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	-	-	N.A.			N.A.			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	\$ 615.059.986,50	15	7	2022	15	10	2026	Calidad de Estudios y Diseños	-	-	N.A.			N.A.			Estabilidad y/o Calidad de Obra	5	\$ 615.059.986,50	15	10	2023	15	10	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																														
			Desde			Hasta																																																											
Cumplimiento general del contrato	10	\$ 1.230.119.973,00	15	7	2022	15	4	2024																																																									
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	-	-	N.A.			N.A.																																																											
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	\$ 615.059.986,50	15	7	2022	15	10	2026																																																									
Calidad de Estudios y Diseños	-	-	N.A.			N.A.																																																											
Estabilidad y/o Calidad de Obra	5	\$ 615.059.986,50	15	10	2023	15	10	2028																																																									
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 59779 Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 8 de agosto de 2022																																																																	



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5	\$ 615.059.986,50	15	7	2022	15	10	2023
Contratistas y subcontratistas	1	\$ 123.011.997,00	15	7	2022	15	10	2023
Vehiculos propios y no propios	1	\$ 123.011.997,00	15	7	2022	15	10	2023
Responsabilidad civil patronal	1	\$ 123.011.997,00	15	7	2022	15	10	2023
Gastos medicos	1	\$ 123.011.997,00	15	7	2022	15	10	2023
Daño emergente y lucro cesante	1	\$ 123.011.997,00	15	7	2022	15	10	2023
Perjuicios patrimoniales	1	\$ 123.011.997,30	15	7	2022	15	10	2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 17756 OTRAS PÓLIZAS No. _____
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 8 de agosto de 2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: _____ SUSPENSIÓN No.: _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento		\$ 1.777.202.973,00	19	10	2022	18	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 888.601.486,50	19	10	2022	18	4	2027
Calidad de Estudios y Diseños		N/A	N/A			N/A		
Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ 888.601.486,50	18	4	2024	18	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 59779
Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: _____ SUSPENSIÓN No.: _____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ OTRAS PÓLIZAS No. _____

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ PRÓRROGA No.: _____ MODIFICACIÓN No.: 1 SUSPENSIÓN No.: _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento		\$ 1.777.202.973,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 3.554.405.946,00
Calidad de Estudios y Diseños		N/A
Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ 5.331.608.919,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
19	10	2022	18	10	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
19	10	2022	18	4	2027
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
18	4	2024	18	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 59779

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: 1 SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: 3 SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento		\$ 1.777.202.973,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		\$ 3.554.405.946,00
Calidad de Estudios y Diseños		N/A
Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ 5.331.608.919,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
19	10	2022	18	12	2024
N/A			N/A		
19	10	2022	18	6	2027
N/A			N/A		
18	6	2024	18	6	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 59779

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: 3 SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 9/7/2024



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: 4 SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento		\$ 1.777.202.973,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		\$ 3.554.405.946,00
Calidad de Estudios y Diseños		N/A
Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ 5.331.608.919,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
19	10	2022	31	1	2025
N/A			N/A		
19	10	2022	31	7	2027
N/A			N/A		
18	6	2024	31	7	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 59779

Certificado de modificación o anexo No. 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: 4 SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma Illuminada Castellón A
Nombre: Illuminada Castellón Arrieta
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202130074BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE		POLIZA / ENDOSO	
CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUE		CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES		59779 / 6	
AV PEDRO DE HEREDIA CL 31 50 122 ED TO SION OF 301 CARTAGENA DE INDIAS BOLIVAR NIT: 9016136729 Teléf. 6438428		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 30/09/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/09/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 31/07/2029.			
ASEGURADO		NUMERO DE FACTURA		05 - 0059779 / 000	
MUNICIPIO DE MAGANGUÉ - BOLÍVAR		BENEFICIARIO		MUNICIPIO DE MAGANGUÉ - BOLÍVAR	
CL. 11 CRA 2 Y 3 MAGANGUÉ BOLIVAR NIT: 8000284322 Teléf. 6877720		CL. 11 CRA 2 Y 3 MAGANGUÉ BOLIVAR NIT: 8000284322 Teléf. 6877720			
MODIFICACION CON VALOR		CODIGO DE VERIFICACION : 050005977900068BOG202409301650484 Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.			
PRIMA		GASTOS DE EXPEDICION		IVA	
COP 0,00		COP 0,00		COP 0,00	
PRIMA TOTAL		VENCIMIENTO PAGO			
COP 0,00		/ /			
INTERMEDIARIOS : STRATEGY SEGUROS LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 115040					
CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio. La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CUES07-0001 para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula. Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente. Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos. No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511. No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85					
<div> MARIA YOLANDA ARDILA GUARINI PRESIDENTE Firma Autorizada</div> <div> EL TOMADOR</div>					

CODIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
03052022-1347-P-05-CUES07-0001 y 03052022-1347-NTP-05-CUES06-0001

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá Calle 75 No. 5 - 88 Edificio Difransa, Piso 3 PBX 601 3572727	Medellín Calle 7 Sur No. 42 - 70 Edificio Fórum, oficina 2501 PBX 604 3222707	Barranquilla Carrera 51 B No. 80 - 58 Smart Office Center, oficina 410 PBX 605 3187620	Bucaramanga Carrera 29 No. 45 - 45 Edificio Metropolitan, oficina 1314 PBX 607 6898099	Cali Calle 36 Norte No. 6A - 65 Ed. World Trade Center Pacific Mall, oficina 1813 PBX 601 3572727 Ext 4477/78
---	--	---	---	--

VIGILADO servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUE	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	59779 / 6
AV PEDRO DE HEREDIA CL 31 50 122 ED TO SION OF 301 CARTAGENA DE INDIAS BOLIVAR	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 30/09/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/09/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 31/07/2029.	
NIT: 9016136729	Telef. 6438428	NUMERO DE FACTURA 05 - 0059779 / 000
CARATULA		
<p>POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACION DE CONTRATO DE FECHA 30/07/2024, SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES. ☐</p> <p>POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN OTROSI No. 004 DE FECHA 17/06/2024, SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES. ☐</p> <p>POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN OTROSI No. 003 DE FECHA 17/04/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES. ☐</p> <p>POR MEDIO DEL ENDOSO 0003 EMITIDO EN FECHA 16/04/2024 Y SEGUN MODIFICATORIO SE INCLUYE COBERTURA/S Y SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA. ☐</p> <p>POR MEDIO DEL ENDOSO 0002 EMITIDO EN FECHA 11/04/2024 Y SEGUN OTROSI No. 001 DE FECHA 14/12/2023 Y OTROSI No. 002 DE FECHA 28/12/2023 SE PRORROGA LA VIGENCIA Y SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA. ☐</p> <p>POR MEDIO DEL ENDOSO 0001 EMITIDO EN FECHA 27/10/2022 Y SEGUN ORDEN DE INICIO DEL 19/10/2022 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA. ☐</p> <p>AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN VIRTUD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.558-2022, CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE AL CASCO URBANO HASTA EL CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL DE CORTINAS DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. ☐</p> <p>TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUE NIT 901.613.672-9 CONFORMADO POR: ☐</p> <p>CONSTRUCCION S.A.S. NIT 900.888.903-1 PARTICIPACION 90% ☐ SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIANOS S.A.S. NIT 800.038.866-8 PARTICIPACION 10% ☐</p> <p>ASEGURADOS/BENEFICIARIOS: MUNICIPIO DE MAGANGUÉ - BOLÍVAR NIT 800.028.432-2 Y INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS NIT 800.215.807-2 ☐</p> <p>LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD SERÁ DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS. ☐</p> <p>LA GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO HACE REFERENCIA A LA CALIDAD DE LA REVISIÓN, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAS OBRAS TENDRA UNA</p>		

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
03052022-1347-P-05-CUES07-000I y 03052022-1347-NTP-05-CUES06-000I

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitano,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUE	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	59779 / 6
AV PEDRO DE HEREDIA CL 31 50 122 ED TO SION OF 301 CARTAGENA DE INDIAS BOLIVAR NIT: 9016136729 Teléf. 6438428	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 30/09/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/09/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 31/07/2029.	
NUMERO DE FACTURA		05 - 0059779 / 000
CARATULA		
VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CALIDAD DE LA REVISIÓN, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAS OBRAS. CONTINUA/N LA/S COBERTURA/S : CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ----- COP 1.777.202.973,00 Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 19/10/2022, hasta las 0 hs del 31/01/2025 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 3.554.405.946,00 Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 19/10/2022, hasta las 0 hs del 31/07/2027 ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ----- COP 5.331.608.919,00 Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 30/07/2024, hasta las 0 hs del 31/07/2029 CALIDAD DEL SERVICIO ----- COP 12.443.306,40 Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 30/07/2024, hasta las 0 hs del 31/07/2029		

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
03052022-1347-P-05-CUES07-000I y 03052022-1347-NTP-05-CUES06-000I

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá

Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín

Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla

Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga

Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitano,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali

Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE		POLIZA / ENDOSO	
CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUE		CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES		59779 / 6	
AV PEDRO DE HEREDIA CL 31 50 122 ED TO SION OF 301 CARTAGENA DE INDIAS BOLIVAR NIT: 9016136729 Teléf. 6438428		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 30/09/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/09/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 31/07/2029.			
ASEGURADO		NUMERO DE FACTURA		05 - 0059779 / 000	
MUNICIPIO DE MAGANGUÉ - BOLÍVAR		BENEFICIARIO			
CL. 11 CRA 2 Y 3 MAGANGUÉ BOLIVAR NIT: 8000284322 Teléf. 6877720		MUNICIPIO DE MAGANGUÉ - BOLÍVAR			
MODIFICACION CON VALOR		CODIGO DE VERIFICACION : 050005977900068BOG202409301650484 Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.			
PRIMA		GASTOS DE EXPEDICION		IVA	
COP 0,00		COP 0,00		COP 0,00	
INTERMEDIARIOS : STRATEGY SEGUROS LTDA		CLASE: AGENCIAS		CLAVE: 115040	
CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio. La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CUES07-0001 para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula. Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente. Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos. No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511. No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85					
 MARIA YOLANDA ARDILA GUARINI PRESIDENTE Firma Autorizada		 EL TOMADOR			

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitan,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUE	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	59779 / 6
AV PEDRO DE HEREDIA CL 31 50 122 ED TO SION OF 301 CARTAGENA DE INDIAS BOLIVAR NIT: 9016136729 Teléf. 6438428	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 30/09/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/09/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 31/07/2029.	
	NUMERO DE FACTURA	05 - 0059779 / 000
CARATULA		
<p>POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACION DE CONTRATO DE FECHA 30/07/2024, SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.□□</p> <p>□□</p> <p>POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN OTROSI No. 004 DE FECHA 17/06/2024, SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.□□</p> <p>□□</p> <p>POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN OTROSI No. 003 DE FECHA 17/04/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.□□</p> <p>□□</p> <p>POR MEDIO DEL ENDOSO 0003 EMITIDO EN FECHA 16/04/2024 Y SEGUN MODIFICATORIO SE INCLUYE COBERTURA/S Y SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA.□□</p> <p>□□</p> <p>POR MEDIO DEL ENDOSO 0002 EMITIDO EN FECHA 11/04/2024 Y SEGUN OTROSI No. 001 DE FECHA 14/12/2023 Y OTROSI No. 002 DE FECHA 28/12/2023 SE PRORROGA LA VIGENCIA Y SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA.□□</p> <p>□□</p> <p>POR MEDIO DEL ENDOSO 0001 EMITIDO EN FECHA 27/10/2022 Y SEGUN ORDEN DE INICIO DEL 19/10/2022 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.□□</p> <p>□□</p> <p>AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN VIRTUD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.558-2022, CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE AL CASCO URBANO HASTA EL CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL DE CORTINAS DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.□□</p> <p>□□</p> <p>TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUE NIT 901.613.672-9 CONFORMADO POR: □□</p> <p>□□</p> <p>CONSTRUCCION S.A.S. NIT 900.888.903-1 PARTICIPACION 90% □□</p> <p>SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIANOS S.A.S. NIT 800.038.866-8 PARTICIPACION 10%□□</p> <p>□□</p> <p>ASEGURADOS/BENEFICIARIOS: MUNICIPIO DE MAGANGUÉ - BOLÍVAR NIT 800.028.432-2 Y INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS NIT 800.215.807-2□□</p> <p>□□</p> <p>LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD SERÁ DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.□□</p> <p>□□</p> <p>LA GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO HACE REFERENCIA A LA CALIDAD DE LA REVISIÓN, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAS OBRAS TENDRA UNA</p> <p style="text-align: right;">CONTINUA</p>		

RESPONSABILIDAD FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá

Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín

Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla

Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga

Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitano,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali

Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO MEGAVÍAS MAGANGUE	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	59779 / 6
AV PEDRO DE HEREDIA CL 31 50 122 ED TO SION OF 301 CARTAGENA DE INDIAS BOLIVAR	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 30/09/2024.	
NIT: 9016136729	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/09/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 31/07/2029.	
Teléf. 6438428	NUMERO DE FACTURA	05 - 0059779 / 000
CARATULA		
VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CALIDAD DE LA REVISIÓN, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAS OBRAS. ☐		
☐ CONTINUA/N LA/S COBERTURA/S : ☐		
☐		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ----- COP 1.777.202.973,00 ☐		
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 19/10/2022, hasta las 0 hs del 31/01/2025 ☐		
☐		
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 3.554.405.946,00 ☐		
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 19/10/2022, hasta las 0 hs del 31/07/2027 ☐		
☐		
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ----- COP 5.331.608.919,00 ☐		
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 30/07/2024, hasta las 0 hs del 31/07/2029 ☐		
☐		
CALIDAD DEL SERVICIO ----- COP 12.443.306,40 ☐		
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 30/07/2024, hasta las 0 hs del 31/07/2029 ☐		
☐		

REFERENCIA: FINANCIERA
DE LOS SEGUROS
VIGILADO

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitano,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

4.8.1. MUNICIPIO DE ACHÍ – BOLÍVAR CONTRATO N° L.P.006 DE 2022

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	1
			FECHA	31/01/2025 (Día) (Mes) (Año)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR				
CONTRATO DE OBRA No. L.P.006 DE 2022 (Indicar número y año)				
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CORREGIMIENTO DE LOS NISPEROS HASTA EL CORREGIMIENTO DE SINCERIN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACHÍ – DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR				
CONTRATISTA: CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK				
FECHA DE INICIO: 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 PLAZO INICIAL: 6 MESES FECHA DE VENCIMIENTO: 27 DE MAYO DE 2025 (Indicar día, mes y año) (Incluye prórrogas y suspensiones)				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 973 DE 2022 (Indicar número y año)				
INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.				
1. PLAN DE CALIDAD				
PRESENTADO: SI ☒ NO ☐ APROBADO: SI ☒ NO ☐ VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: 2/09/2022				
OBSERVACIONES:				
2. AUDITORIAS DE CALIDAD				
PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ☐ NO ☒ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ☐ NO ☒ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:				
OBSERVACIONES:				
3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)				
PRESENTADO: SI ☐ NO ☒ APROBADO: SI ☐ NO ☐ FECHA DE APROBACIÓN:				
No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: - No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES: -				
CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ☐ NO ☐				
OBSERVACIONES:				
El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías. La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute. La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.				
4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES				
No. de No Conformidades reportadas en el mes: No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:				
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:				
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:				
OBSERVACIONES:				
5. QUEJAS Y RECLAMOS				
No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:				
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:				
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:				
OBSERVACIONES:				
Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.				



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título Indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGN: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).


No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

No se han iniciado actividades de obra


NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma: 
Nombre: Jayer Jairo Domínguez Vergara
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.: 08202-095351ATL

Firma: _____
Nombre: N/A
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.: _____

Firma: 
Nombre: Ruminada Castellar Arieta
Directora de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202130074BLV

Firma: 
Nombre: Alfonso Luis Añez May
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. 13202-090186

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

4.8.2. MUNICIPIO DE MAGANGÜÉ – BOLÍVAR CONTRATO N°557 DE 2022

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEP-MN1-IN-15-FR-14
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	1
			FECHA	31/01/2025 (Día) (Mes) (Año)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR		
CONTRATO DE OBRA No. 557 DE 2022 (Indicar número y año)				
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE CASCAJAL HASTA EL CORREGIMIENTO DE LA PASCUALA DEL MUNICIPIO DE MAGANGÜÉ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.				
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN RAFAEL				
FECHA DE INICIO: 24 de octubre de 2022 (Indicar día, mes y año) PLAZO INICIAL: 18 meses FECHA DE VENCIMIENTO: 24 de febrero de 2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 973 DE 2022 (Indicar número y año)				
INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS				
1. PLAN DE CALIDAD				
PRESENTADO: SI ☒ NO ☐ APROBADO: SI ☒ NO ☐ VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: 12/10/2022				
OBSERVACIONES: Plan de calidad acorde para el desarrollo del objeto contractual.				
2. AUDITORIAS DE CALIDAD				
PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ☒ NO ☐ No. de AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 1 FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: 12/10/2022				
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ☐ NO ☒ No. de AUDITORÍAS REALIZADAS: 1 FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: 12/10/2022				
OBSERVACIONES: No aplica				
3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)				
PRESENTADO: SI ☒ NO ☐ APROBADO: SI ☒ NO ☐ FECHA DE APROBACIÓN: 12/10/2022				
No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: 1 No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 1				
CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ☐ NO ☒				
OBSERVACIONES: El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías. La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute. La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.				
4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES				
No. de No Conformidades reportadas en el mes: 1 No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 1				
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 1 No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 1				
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 1				
OBSERVACIONES: No aplica				



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



5. QUEJAS Y RECLAMOS							
No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:		4		No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:		3	
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:		1		No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:		5	
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:		1		No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:		4	
OBSERVACIONES:							
Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.							
6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)							
Título indicador de Gestión:		Valor del IG mes		Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)			
IG1: Índice de cumplimiento de cronograma		0,286		Se calcula dividiendo el número de actividades completadas a tiempo entre el número total de actividades planificadas.			
IG2: Control de calidad		0,272727273		Se calcula dividiendo el número de defectos o no conformidades identificados durante las inspecciones entre el número total de elementos inspeccionados.			
IG3: Cumplimiento de especificaciones		1		Se calcula dividiendo el número de elementos construidos correctamente entre el número total de elementos inspeccionados.			
Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.							
OBSERVACIONES:							
7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).							
No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
OBSERVACIONES:							
NOTA: Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.							
Firma:		Firma: _____		Firma:		Firma:	
Nombre: GONZALO DE JESÚS ARBELÁEZ AGUIRRE		Nombre: N/A		Nombre: Ileana Castellar Arrieta		Nombre: Alfonso Luis Alvar May	
Director de la Obra		Profesional en Calidad Contrato de Obra		Director de la Interventoría		Profesional en Calidad Contrato de Interventoría	
Matrícula Profesional No.: 13202125619BLV		Matrícula Profesional No.:		Matrícula Profesional No.: 13202130074BLV		Matrícula Profesional No. 13202-090186	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.							

4.8.3. MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N°558 de 2022

No se reporta modificaciones con respecto a seguimiento de plan de calidad del contrato puesto que actividades de obra finalizaron el 30 de Julio de 2024

4.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

PROGRAMA DE INVERSIONES MUNICIPIO DE ACHÍ – BOLÍVAR CONTRATO N°L.P.006 DE 2022

[illegible]

PROGRAMA DE INVERSIONES MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N°557 DE 2022

[illegible]

PROGRAMA DE INVERSIONES MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N°558 de 2022

[illegible]



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

ACTAS DE REUNIÓN Y COMITÉ DE OBRA MUNICIPIO DE ACHÍ – BOLÍVAR CONTRATO N°L.P.006 DE 2022.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA		25/10/2024 (Día / Mes / Año)
-------	--	---------------------------------

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. EXTRAORDINARIO
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No. L.P.006 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CORREGIMIENTO DE LOS NISPEROS HASTA EL CORREGIMIENTO DE SINCERIN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACHÍ - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 973 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS NO APLICA. COMITÉ DE OBRE EXTRAORDINARIO.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA 1. INTRODUCCIÓN 2. SITUACION Y PROBLEMÁTICA ACTUAL EN OBRA 3. ACCIONES EN EJECUCIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
--

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA 1. PRESENTACIÓN 2. INTERVENCIÓN DEL CONTRATISTA SOBRE EL ESTADO DE LA OBRA, MANIFIESTAN QUE REPORTAN ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO POR COMUNIDAD Y GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY. INTERVIENE LA ALCALDÍA, COMENTA QUE NO PUEDEN GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE PERSONAL EN OBRA, SE HA REALIZA COMITE DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE ACHÍ EN LA CUAL SE REALIZARAN DIALOGOS Y CONCILIACIÓN PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS CON LOS ACTORES, RAZONES POR LA CUAL EL CONTRATISTA SOLICITA LA SUSPENSIÓN EL PASADO 8 DE OCTUBRE DE 2024 Y SE COMPROMETEN A REINICIAR UNA VEZ SE SOLVENTE EL CONFLICTO. 3. SE PROGRAMA COMITE EN 1 SEMANA, PARA SEGUIMIENTO Y DAR PRONTO REINICIO.
--

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día / Mes / Año)	RESPONSABLES
ENVÍO DE ACTA DE SUSPENSIÓN	8/10/2024	CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK
REUNION DE SEGUIMIENTO	25/10/2024	CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS ALCALDIA DE ACHÍ
FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA	POR DEFINIR (Día / Mes / Año)	

NOTAS:


- Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
- Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtir de manera previa el trámite interno correspondiente.
- Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
ASAEL CERPA	RESIDENTE OBRA	CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK	
EDY ALEXANDER CAMARGO	GESTOR NACIONAL	INVIAS	
ANA ACUÑA	GESTORA NACIONAL	INVIAS	
ILUMINADA CASTELLAR	DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	
ELKIN ROYERO	SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA DE ACHÍ	
JOSE CARDENAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	
LEONARDO ARBELAEZ	INGENIERO INTERVENTOR	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	
JAVIER DOMINGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

REGISTRO FOTOGRÁFICO

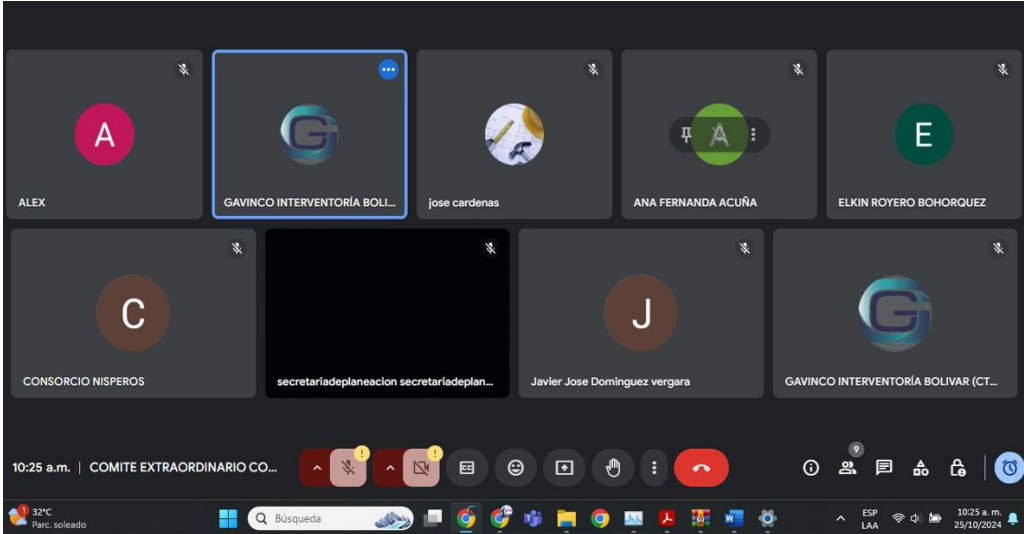



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEP48V14-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	08/10/2024 (Día / Mes / Año)
(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)			
ACTA DE REUNIÓN No. _____ (La numeración será consecutiva)			
UNIDAD EJECUTORA: <u>Subdirección Vías Regionales</u>		DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>BASVAR</u>	
CONTRATO DE OBRA No. <u>LP-006 de 2022</u> (Indicar número de contrato y año)			
CONTRATISTA: <u>CONSORCIO VÍA LOS NIÑEROS JS</u>			
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: <u>CONSTRUCCIÓN DE PASEO HUERTO EN LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CORRENTAMENTO DE LOS NIÑEROS HASTA EL CORRENTAMENTO DE SINCERU CON RUTA DEL MUNICIPIO DE ACHI.</u>			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. <u>973 de 2022</u> (Indicar número de contrato y año)			
INTERVENTOR: <u>GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS</u>			
OBJETIVOS DE LA REUNIÓN			
<u>+ REA LÍZAR SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE 10 PASEO HUERTOS - SINCERU.</u>			
TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN			
<u>+ ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO</u> <u>+ ASPECTOS ADMINISTRATIVOS / LEGALES</u> <u>+ ASPECTOS SST.</u> <u>+ SITUACIÓN ORDEN PÚBLICO EN LA ZONA</u>			



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPMI-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	(Día / Mes / Año)
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
<p>* EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE LAS OBRAS SE PARALIZARON POR ORDEN PÚBLICO, RAZÓN POR LA CUAL DE ESTÁN REALIZANDO ACTIVIDADES Y ACUSACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE INVIAS Y DIRECTORA DE INTERVENTORÍA NO INGRESAR A LA OBRA.</p> <p>* EL CONTRATISTA SOLICITA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO POR ORDEN PÚBLICO</p> <p>* LA INTERVENTORÍA REITERA SU PREOCUPACIÓN POR EL POLO AVANCE DEL PROYECTO, LOS POCOS DATOS QUE LE CUENTA Y RECUERDO EL VENCIMIENTO DEL CONVENIO INVIAS - MUNICIPIO DE ACHI EL 31/MAR/2024; TIEMPO NO SUFICIENTE PARA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA</p> <p>* EL CONTRATISTA DUECE NO HABER PODIDO AVANZAR OBRAS POR LAS CONSTANTES LLUVIAS Y EL DIFICIL ACCESO A LA OBRA</p> <p>* LA INTERVENTORÍA REITERA QUE EL CONTRATISTA DEBE REALIZAR LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL PAGO, PUES A LO FECHAS AUN NO SE CUENTA CON PAGOS APROBADOS.</p> <p>* SE LE RECUERDA A LA ENTIDAD CONTRATANTE QUE DEBE REALIZAR LA DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.</p> <p>* INTERVENTORÍA RECUERDA A LA ENTIDAD CONTINUAR CON EL PROCESO SANCIONATORIO AL CONTRATISTA QUE A LA FECHA NO SE HA REALIZADO</p> <p>* LA INTERVENTORÍA REITERA AL CONTRATISTA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS ACABADOS DE LA PLACA HUELLA, CAMBIANDO LA FORMACIÓN DE LOS BORADOS, REALIZAR LIMPIEZA DEL PROYECTO, SEPARAR Y ACOPIAR LOS MATERIALES GRANULARES DEBIDAMENTE, TAMBIÉN REITERA REALIZAR LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EVITAR LA FISURACIÓN DE LAS PLACAS HUELLAS</p> <p>* SE LE RECOMIENDA A LA ENTIDAD LOCAL Y ACORDAR CON LA COMUNIDAD PARA QUE PERMITAN EL ACCESO DE VOLICUETOS A LA OBRA YA QUE ARGUMENTAN RASOS EN LA VÍA DE ACCESO</p>			



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO MEP-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN 1
		PÁGINA
FECHA (Día / Mes / Año)		
COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día / Mes / Año)	RESPONSABLES
* PRESENTAR OBSERVACIONES POR PAGOS.	11/10/2024	CONTRATISTA
* COMPLETAR LA PLACA HUELLA CON CONCRETOS Y BORDILLOS	UNA VEZ SE BAYO INGRESAR A OBRA	CONTRATISTA
* REALIZAR LA DEVOLUCIÓN DE LOS RESIDUOS FINANCIEROS	15/10/2024	ALCALDIA DE ACHÍ
* CONTINUAR CON EL PROCESO SANCIONATORIO DEL CONTRATISTA	16/10/2024	ALCALDIA DE ACHÍ
* DEFENDER SITUACIÓN DEL CONTRATO DE OBRERA A CONSEJO DE SEGURIDAD DE REALIZACIÓN EN UNOS DE LO TRABAJA	9/10/2024	ALCALDIA DE ACHÍ
FECHA PRÓXIMA REUNIÓN (Día / Mes / Año)		
NOTAS: 1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modificar por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente. 2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervinieron, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA		CÓDIGO MEP-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN 1
		PÁGINA DE
FECHA (Día / Mes / Año)		
LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:		
NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD
ILUMINADA CASTELLAR	DIRECTOR DE OBRAS	INTERVENTORIA GAVINCO
ING. JOSE MANUEL CARDENAS	ING. RESIDENTE	INTERVENTORIA GAVINCO
DAINER GUZAMAN	ALCALDE	ACHI BOLIVAR
ASAE CERPA	ING. RESIDENTE	CONSORCIO JK
GEOVANY GUTIERREZ	SEC. DE PLANEACION	ACHI BOLIVAR
ELKIN ROYERO	SEC. OBRAS URBICAS	ACHI BOLIVAR
LUIS RETAMOZA	TOPOGRAFO	GAVINCO
ANA FERNANDA ACUÑA	SUPERVISOR (Apro.)	INVIAS
LILA HERRERA	SUPERVISOR (Copro.)	INVIAS
Miguel Acosta Topografo Consorcio JK.		
Original: Informe mensual de Interventoría.		
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial		
Jose Boloños Aresol Junduo Alcaldia.		
Aldemiro Alfaro Aresol Junduo Alcaldia.		
Samir Sayas Diaz Tesorero Alcaldia.		



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	30/08/2024 (Día / Mes / Año)
(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)			
ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 12 (La numeración será consecutiva)			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR	
CONTRATO DE OBRA No. L.P.006 DE 2022 (Indicar número de contrato y año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK			
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CORREGIMIENTO DE LOS NISPEROS HASTA EL CORREGIMIENTO DE SINCERIN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACHÍ - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 973 DE 2022 (Indicar número de contrato y año)			
INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S			
LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS 1.INICIAR SEGUNDO PROCESO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA 2.PROGRAMACIÓN DE COMITÉ EN 15 DÍAS PARA TOMAR DECISIÓN DEFINITIVA RESPECTO AL PROYECTO 3.ACCESO A LA OBRA COMPLETAMENTE HABILITADO. 4.PLAN DE CONTINGENCIA PARA EJECUCIÓN DE OBRA. 5.COMITÉ PRESENCIAL. 6.ENTREGA DE EXTRACTOS Y SALDOS BANCARIOS			
TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA 1. INTRODUCCIÓN 2. LECTURA DE COMPROMISOS DE COMITÉ ANTERIOR 3. ACTIVIDADES EN OBRA 4.CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES			



DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. PRESENTACIÓN
2. INTERVENCIÓN DEL CONTRATISTA SOBRE EL ESTADO DE LA OBRA, MANIFIESTAN QUE REPORTAN A LA INTERVENTORIA DIARIAMENTE EL TEMA CLIMÁTICO EN EL QUE ESTÁ ATRAVESANDO LA OBRA Y SUGIERE QUE SE SUSPENDA PARCIALMENTE EL CONTRATO HACIÉNDOLE SEGUIMIENTO A LAS LLUVIAS Y COMPROMISO DE ACOPIO DE MATERIAL EN LA ZONA DURANTE LA SUSPENSIÓN.
INTERVIENE LA ALCALDÍA, COMENTA QUE NO PUEDEN GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO MIENTRAS LA COMUNIDAD CONTINUE CON EL PASO DE TRACTORES, TRAILERS Y VOLQUETAS SACANDO COSECHAS, ESTÁN REALIZANDO TRABAJO CON LA COMUNIDAD DE PODADO DE ARBOLES QUE DAN SOMBRA A LA VÍA Y NO PUEDEN IMPEDIR QUE LA COMUNIDAD PIERDA SU COSECHA.
3. EL CONTRATISTA SOLICITA SUSPENSIÓN Y SE COMPROMETE A ENVIARLA

COMPROMISOS PACTADOS

FECHA DE CUMPLIMIENTO
(Día / Mes / Año)

RESPONSABLES

INFORME DE INCONVENIENTES EN OBRA	16/08/2024	CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK
ENVÍO DEL PAGA	20/08/2024	CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK
REUNIÓN DE SEGUIMIENTO	29/07/2024	CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS ALCALDIA DE ACHÍ

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA **POR DEFINIR**
(Día / Mes / Año)

NOTAS:


- Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
- Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modificar por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
- Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
ASAE CERPA	RESIDENTE OBRA	CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK	
EDY ALEXANDER CAMARGO	GESTOR NACIONAL	INVIAS	
ILUMINADA CASTELLAR	DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	
ELKIN ROYERO	SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS	ALCALDIA DE ACHÍ	
LAURA ALVAREZ	INGENIERA INTERVENTORA	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	
JAVIER DOMINGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

REGISTRO FOTOGRÁFICO

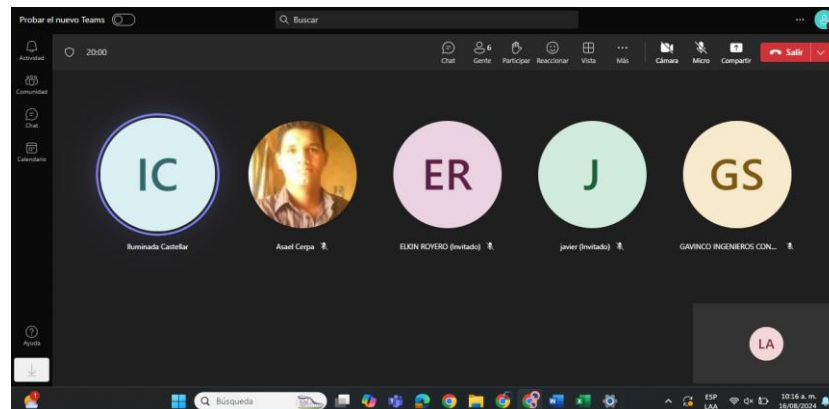



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

ACTAS DE REUNIÓN Y COMITÉ DE OBRA MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N°557 DE 2022

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	7/09/2023
(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)			
ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. <u>18</u> (La numeración será consecutiva)			
UNIDAD EJECUTORA: <u>SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES</u> DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>BOLÍVAR</u>			
CONTRATO DE OBRA No. <u>557 DE 2022</u> (Indicar número de contrato y año)			
CONTRATISTA: <u>CONSORCIO SAN RAFAEL</u>			
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFÁLTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE CASCAJAL HASTA EL CORREGIMIENTO DE LA PASCUALA DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. <u>973 DE 2022</u> (Indicar número de contrato y año)			
INTERVENTOR: <u>GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S</u>			
LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS 1. REVISIÓN PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL: LA INTERVENTORÍA EMITE SUS OBSERVACIONES 2. PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUSES SE ENCUENTRA EN TRAMITE 3. ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			
TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA 1. PRESENTACIÓN. 2. LECTURA DE COMPROMISOS DEL COMITÉ DE OBRA ANTERIOR 3. CONCLUSIONES Y ASIGNACIÓN DE COMPROMISOS.			
DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA 1. PRESENTES EN EL COMITÉ DE OBRA, LA DIRECCIÓN DE INTERVENTORÍA ILLUMINADA CASTELLAR ARRIETA, EDGAR ARAGÓN RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, GLORIA COELLO RESIDENTE DE OBRA, SUPERVISOR DEL CONTRATO FABIAN CABRERA DIAZ, DIRECTOR DE OBRA GONZALO ARBELAEZ, INGENIERA RESIDENTE GLORIA COELLO E INGENIERAS INTERVENTORAS LAURA ALVAREZ Y SOFIA CASTELLAR. 2. LA INTERVENTORÍA HACE LLAMO DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA POR EL ATRASO PRESENTADO Y SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN, SE RECUERDA EL COMPROMISO DEL PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCES AL CUAL SE ENCUENTRA EN TRAMITE EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA, EL CONTRATISTA HA HECHO LEVANTAMIENTO DE LAS CANTIDADES EJECUTADAS, CUANTIFICADO ACTIVIDADES CRÍTICAS ETC. MANIFIESTAN QUE SE HAN QUEDADO SIN RECURSOS Y QUE SOLO ESTARÍAN REALIZANDO OBRAS DE PROTECCIÓN, HAN REALIZADO COMITÉS CON VEEDURIAS NOTÁNDOSE MENOS ASISTENCIA PERO EN GENERAL LA COMUNIDAD ESTÁ SATISFECHA CON LA VÍA, EL CONTRATISTA EXPLICÓ EL MANEJO DE LOS RECURSOS POR VIGENCIAS DÁNDOSE A ENTENDER EL POR QUÉ DE LA DISMINUCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS EN OBRA. 3. LA INTERVENTORÍA SUGIERE LA ELABORACIÓN DE UNA REPROGRAMACIÓN CON LA RESPECTIVA JUSTIFICACIÓN, TENIENDO EN CUENTA LOS ATRASOS PRESENTADOS.			



COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día / Mes / Año)	RESPONSABLES	
PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCES	28/09/2023	CONSORCIO SAN RAFAEL	
FORMATO MENSUAL DEL ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	28/09/2023	CONSORCIO SAN RAFAEL	
JUSTIFICACIÓN DE LA DISMINUCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS	28/09/2023	CONSORCIO SAN RAFAEL	
FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBI ..	28/09/2023 (Día / Mes / Año)		
NOTAS:			
1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.			
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.			
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.			
LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:			
NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
FABIAN CABRERA DIAZ	SUPERVISOR DEL CONTRATO	MUNICIPIO DE MAGANGUÉ	
GLORIA COELLO T	RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO SAN RAFAEL	
ILUMINADA CASTELLAR	DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	
EDGAR ARAGÓN	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	
GONZALO ARBELAEZ A	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO SAN RAFAEL	
LAURA ALVAREZ BENEDETTI	INGENIERA INTERVENTORA	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	
DANIELA SOFIA CASTELLAR	INGENIERA INTERVENTORA	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial			

ACTAS DE REUNIÓN Y COMITÉ DE OBRA MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N°558 DE 2022

No se reporta actas de reunión o comités, puesto que actividades de obra finalizaron el 30 de Julio de 2024

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	973 de 2022
Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - LOTE 4.
Contratista:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
NIT:	900.916.608
Representante legal	LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
Fecha de Inicio:	1 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024
Prorroga 1:	SEIS (6) MESES
Prorroga 2:	SEIS (6) MESES
Plazo acumulado:	HASTA EL 28 DE JUNIO DE 2025
Valor Inicial:	\$3.895.780.731

Tabla 17 Información Contrato de Interventoría 973 de 2022.

5.2. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

A continuación, se muestra un resumen detallado de las actividades realizadas por el interventor por cada municipio, correspondiente a este periodo:

5.2.1 Municipio De Achí - Contrato No. L.P.006 de 2022.

A la fecha de elaboración del presente informe mensual de Interventoría No. 29 (del 1 de enero de 2025 al 31 de enero de 2025), **GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.** realizó lo siguiente:

- ✓ Elaboración de informes semanales 108, 109, 110, 111 y 112 seguimiento a las obligaciones del municipio de acuerdo con el convenio administrativo No. 1895 de 2021.
- ✓ Vigilancia y control ante el cumplimiento de los términos y condiciones del contrato.

- ✓ Control de cumplimiento de los términos y condiciones del contrato, se realiza además seguimiento a las obligaciones del municipio de acuerdo al convenio interadministrativo no. 1895 de 2021.
- ✓ Solicitud de prórroga al contrato de interventoría 973 de 2022.
- ✓ Se solicita al contratista acelerar las actividades de mejoramiento de acceso para continuar con la normalidad de actividades en obra.
- ✓ Presencia en el corredor vial para supervisión.
- ✓ Replanteo topográfico de ejes y niveles.
- ✓ Contratista presenta solicitud de prórroga N°7 el día 27 de diciembre soportado por los retrasos causados por las fuertes lluvias y alteración del orden público de la zona, se aprueba prórroga por cinco (5) meses, con fecha de finalización actual del 27 de mayo de 2025.

El estado de avance ejecutado acumulado hasta el día 31 de enero de 2025, es del 35.91%

5.2.2. Municipio De Magangué – Contrato No. 557 de 2022.

A la fecha de elaboración del presente informe mensual de Interventoría No. 29 (del 1 de enero de 2025 al 31 de enero de 2025), **GAVINCO INGENIEROS CONSUSTORES S.A.S.** realizó lo siguiente:

- ✓ Se han adelantado actividades de elaboración de informes semanales, 122, 123, 124, 125 y 126; vigilancia y control ante el cumplimiento de los términos y condiciones del contrato y seguimiento a las obligaciones del municipio de acuerdo con el convenio administrativo no. 1897 de 2021.
- ✓ Vigilancia y control ante el cumplimiento de los términos y condiciones del contrato.
- ✓ Inspecciones de las actividades realizadas en obra.
- ✓ Presencia en el corredor vial para supervisión.
- ✓ Se realiza vigilancia y control ante el cumplimiento de los términos y condiciones del contrato y seguimiento a las obligaciones del municipio de acuerdo al convenio interadministrativo no. 1897 de 2021.
- ✓ Se aprueba prorroga N°3 mediante oficio respuesta a comunicado CSR-557-070.
- ✓ Respuesta a comunicación CSR-557-060- entrega de ajustes del PAGA, se remite pagaduría 557 de 2022 a la subdirección de sostenibilidad.

El estado de avance ejecutado acumulado hasta el día 31 de enero de 2025, es del 96.27%

5.2.3. Municipio de Magangué – Contrato No. 558 de 2022.

A la fecha de elaboración del presente informe mensual de Interventoría No. 29 (del 1 de diciembre al 31 de enero de 2025), **GAVINCO INGENIEROS CONSUSTORES S.A.S.** realizó lo siguiente:

- ✓ Vigilancia y control ante el cumplimiento de los términos y condiciones del contrato y seguimiento a las obligaciones del municipio de acuerdo con el convenio administrativo no. 1898 de 2021.



- ✓ Vigilancia y control ante el cumplimiento de los términos y condiciones del contrato.
- ✓ Seguimiento a las obligaciones del municipio de acuerdo al convenio interadministrativo No. 1897 de 2021

El estado de avance ejecutado acumulado hasta el día 31 de enero de 2025, es del 100%.

5.3. Informes especialistas y profesionales

5.4. Informe del programa Anual de Caja -PAC (No aplica)

5.5. Informe matriz de riesgos

Se envía como anexo

5.6. Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de obra e Interventoría (No aplica)

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

No.	Contenido	Formato	Anexo
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	Aplica
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	Aplica
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	Aplica
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	Aplica
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	Aplica
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	Aplica
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	No aplica
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	Aplica
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	No aplica

Tabla 18 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MEPH-MN1-IN-15-FR-5																												
			VERSIÓN	1																												
			PÁGINA	1																												
			FECHA	31/01/2025 (Día / Mes / Año)																												
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR																														
CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA																																
PERIODO / MES INFORME MENSUAL: <u>ENERO DE 2025</u>		PROYECTO: MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFÁLTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE CASCAJAL HASTA EL CORREGIMIENTO DE LA PASCUALA DEL MUNICIPIO DE MAGANGÜE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR																														
CONTRATO INTERVENTORÍA No. <u>973 DE 2022</u>		INTERVENTORÍA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S																														
CONTRATO DE OBRA No. <u>557 DE 2022</u>		CONTRATISTA: CONSORCIO SAN RAFAEL																														
EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Camioneta o Camper de más de 2000 c.c. (1): 4x4	Placa EGQ668, Nissan, 2488c.c., 2019 (incluye conductor peajes y Combustible)	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
Motocicleta	(Placa GUN16G, Suzuki, 155 c.c., 2023, incluye combustible y SOAT)	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
Trabajo de topografía	(incluye personal, equipo y transporte)	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
Ensayos de Laboratorio	Ensayos de resistencia a la compresión de cilindros de concreto	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
Oficina/Campamento	(incluye dotación y servicios públicos)	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.																																
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:																																
(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva). (Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindrada y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).																																
RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:																																
EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.																																
NOTAS: 1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación. 2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto. 3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación. 4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.																																
<div><div> Firma Nombre: Iuminada Castellar Arrieta Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 13202130074BLV</div><div> Firma Nombre: Fabián Ernesto Arango Pineda Supervisor del Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: 1320209-7750BLV</div></div>																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEP-MN1-IN-15-FR-5																														
		VERSIÓN	1																														
		PÁGINA	1																														
		FECHA	31/01/2025 (Día / Mes / Año)																														
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR																															
CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA																																	
PERIODO / MES INFORME MENSUAL: <u>ENERO DE 2025</u>		PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CORREGIMIENTO DE LOS NISPEROS HASTA EL CORREGIMIENTO DE SINCERIN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACHÍ - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.																															
CONTRATO INTERVENTORÍA No. <u>973 DE 2022</u>		INTERVENTORÍA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S																															
CONTRATO DE OBRA No. <u>L.P. 006 DE 2022</u>		CONTRATISTA: CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK																															
EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Motocicleta	(Placa GUN16G, Suzuki, 155 c.c., 2023, incluye combustible y SOAT)	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
Trabajo de topografía	(incluye personal, equipo y transporte)	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
Ensayos de Laboratorio	Ensayos de CBR de laboratorio, con expansión (E-148) y granulometría (E-123)	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
Oficina/Campamento	(incluye dotación y servicios públicos)	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.																																	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:																																	
(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva). (Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).																																	
RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:																																	
EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.																																	
NOTAS: 1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación. 2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto. 3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación. 4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.																																	
<div><div> Firma Nombre: Iuminada Castellar Arrieta Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 13202130074BLV</div><div> Firma Nombre: Fabian Ernesto Arango Pineda Supervisor del Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No. 1320209-7750BLV</div></div>																																	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																	

En cuanto a los vehiculos de la interventoria del contrato 558 de 2022 de Magangue, no se reportan debido a que se finalizaron actividades de obra el 30 de Julio de 2024..

6.2. Personal control aportes legales y seguridad social contrato de Interventoría. (Anexo formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7)

Conforme al Anexo No. 1 – Anexo Técnico de los Pliegos de Condiciones, el personal mínimo requerido conforme a lo establecido en el numeral 4.2. EQUIPO DE TRABAJO. Requisitos del personal de dicho documento, quedo establecido y aprobado de la siguiente manera en los comunicados.

CARGO	PROFESIONAL	APROBACIÓN INVIAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	ILUMINADA CASTELLAR ARRIETA	SVR 51450 30 DE AGOSTO DE 2022
INGENIERO AUXILIAR INTERVENTORÍA	EDGAR FABIAN PENAGOS PADILLA	SVR 55677 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	ENRIQUE ALFONSO SÁNCHEZ TRONCOSO	SVR 5042 02 DE FEBRERO DE 2023
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	EDGAR ALFONSO ARAGÓN OTERO	SVR 12871 08 DE MARZO DE 2023
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO	ADOLFO ENRIQUE ARROYO ORTIZ	SVR 51450 30 DE AGOSTO DE 2022
ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA	JAIRO ALONSO ZORRO ROA	SVR 51450 30 DE AGOSTO DE 2022
PROFESIONAL DE ASEGURAMIENTO O GESTIÓN DE LA CALIDAD	ALFONSO LUIS ALVEAR MAY	SVR 51450 30 DE AGOSTO DE 2022
ESPECIALISTA AMBIENTAL Y/O SOSTENIBILIDAD	JORGE ARMANDO ORTEGÓN GARCÍA	SVR 54730 2 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ALEJANDRO ELJAIK SALOME	SVR 54730 2 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS Y/O VÍAS	ORLANDO ISAAC CASTELLÓN MARRUGO	SVR 52743 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y/O GEOTECNIA	EMIRO FÉLIX VANEGAS GÓMEZ	SVR 52743 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022
INSPECTOR SST	MARIO JOSÉ PRASCA DUARTE	2024S-VBOL-031605 21 DE MAYO DE 2024
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	JOSE MANUEL CARDENAS BOLIVAR	04 DE JULIO DE 2023
SECRETARIA	DEISY VICTORIA MONTAÑEZ	N/A

Tabla 19. Personal contrato de interventoría.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 29
Del 01 de enero de 2025 al 31 de enero de 2025
Versión 1



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MEP-MN1-RV-15-FR-9							
				VERSIÓN	1							
				PÁGINA								
				FECHA	5/12/2022 (Día / Mes / Año)							
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:		973 DE 2022		INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS								
MES INFORME MENSUAL:		1		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCERIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - LOTE 4.								
CONTRATO DE OBRA No:		557 de 2022, 558 de 2022 y LP.006 2022		CONTRATISTA: CONSORCIO SAN RAFAEL, CONSORCIO MEGAVÍAS MAGANGÜE Y CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK.								
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA												
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propio)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior					
2022	94622	2402-0600-0012	11	Nación	contrato principal	\$ 296.093.333	\$ 296.093.333					
2023		2402-0600-0012	11	Nación	contrato principal	\$ 1.520.000.000						
2024		2402-0600-0012	11	Nación	contrato principal	\$ 2.079.687.998						
			TOTAL			\$ 3.895.780.731						
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:						\$ 3.895.780.731						
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA												
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							\$ 250.443.046,00		\$ 296.093.333	\$ 3.895.780.731		
1	SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 7.102.000	\$ 1.349.380	\$ 8.451.380	\$ 1.420.400,00	\$ 7.030.980,00	\$ 249.022.646,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 38.619.307	\$ 3.887.329.351		EN REVISIÓN.
TOTALES		\$ 7.102.000	\$ 1.349.380	\$ 8.451.380	\$ 1.420.400	\$ 7.030.980	\$ 249.022.646		\$ 38.619.307	\$ 3.887.329.351		
Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse: estén o no facturadas.												
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO												
		VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL								
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (A) + (B) = ©		\$ 7.102.000,00		\$ 7.102.000,00								
PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRETE ADICIONAL = D)		\$ -		\$ -								
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (C) + (D) = E		\$ 7.102.000,00		\$ 7.102.000,00								
IVA = 19% * (E) = (F)			\$ 1.349.380,00	\$ 1.349.380,00								
VALOR TOTAL		\$ 7.102.000,00	\$ 1.349.380,00	\$ 8.451.380,00								
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.												
NOTAS:												
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.												
2. Este formato se diligencia por año.												
Firma		Firma										
Nombre: Luminada Castellar Arieta		Nombre: Carmen Cecilia Pérez López										
Director de Interventoría		Supervisor del Contrato de Interventoría										
Matrícula Profesional No.: 13202130074BLV		Matrícula Profesional No.: 13202188727 BLV										
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.												
Copias: Interventor y Dirección Territorial												



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA						CÓDIGO	MEP-MN1-RV-15-FR-9				
							VERSIÓN	1				
							PÁGINA					
FECHA: 5/12/2022 (Día / Mes / Año)												
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES				DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 973 DE 2022 INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS												
MES INFORME MENSUAL: 2 PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - LOTE 4.												
CONTRATO DE OBRA No.: 557 de 2022, 558 de 2022 y LP 006 2022 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN RAFAEL, CONSORCIO MEGAVÍAS MAGANGÜE, Y CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK.												
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA												
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior					
2022	887122	2402-0600-0012	11	Nación	contrato principal	\$ 296.093.333	\$ 38.639.307					
2023		2402-0600-0012	11	Nación	contrato principal	\$ 1.520.000.000						
2024		2402-0600-0012	11	Nación	contrato principal	\$ 2.079.687.398						
TOTAL						\$ 3.895.780.731						
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 3.895.780.731												
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA												
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							\$ 250.443.046,00		\$ 296.093.333	\$ 3.895.780.731		
1	SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 7.102.000	\$ 1.349.380	\$ 8.451.380	\$ 1.420.400,00	\$ 7.030.980,00	\$ 249.022.646,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 38.619.307	\$ 3.887.329.351		EN REVISIÓN.
2	OCTUBRE DE 2022	\$ 4.802.000	\$ 874.380	\$ 5.476.380	\$ 920.400	\$ 4.555.980	\$ 248.102.246,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 34.063.327	\$ 3.881.852.971		EN REVISIÓN.
TOTALES		\$ 11.704.000	\$ 2.223.760	\$ 13.927.760	\$ 2.340.800	\$ 11.586.960	\$ 248.102.246		\$ 34.063.327	\$ 3.881.852.971		
Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse: estén o no facturadas.												
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO												
		VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL						
*SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (A) + (B) = C		\$ 11.704.000,00				\$ 11.704.000,00						
*PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRETE ADICIONAL = D		\$				\$						
*SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS + (C) + (D) = E		\$ 11.704.000,00				\$ 11.704.000,00						
IVA = 19% * (E) = (F)				\$ 2.223.760,00		\$ 2.223.760,00						
VALOR TOTAL		\$ 11.704.000,00		2.223.760,00		\$ 13.927.760,00						
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.												
NOTAS: 1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes. 2. Este formato se diligencia por año.												
Firma: Nombre: Flaminia Castellani Arieta Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 13202130074BLV												
Firma: Nombre: Carmen Cecilia Pérez López Supervisor del Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: 13202188727 BLV												
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial												



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA						CÓDIGO	MEPMW1-IV-15-FR-9				
							VERSIÓN	1				
							PÁGINA					
FECHA								5/12/2022 (Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES						DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 973 DE 2022						INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS						
MES INFORME MENSUAL: 3						INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROYECTO: PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - LOTE 4						
CONTRATO DE OBRA No: 557 de 2022, 558 de 2022 y LP.006 2022						CONTRATISTA: CONSORCIO SAN RAFAEL, CONSORCIO MEGAVÍAS MAGANGÜE Y CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK						
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA												
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior					
2022	887122	2402-0900-0012	11	Nación	contrato principal	\$ 296.093.333	\$ 38.639.307					
2023			11	Nación	contrato principal	\$ 1.520.000.000						
2024			11	Nación	contrato principal	\$ 2.079.687.398						
TOTAL						\$ 3.895.780.731						
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 3.895.780.731												
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA												
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							\$ 250.443.046,00		\$ 296.093.333	\$ 3.895.780.731		
1	SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 7.102.000	\$ 1.349.380	\$ 8.451.380	\$ 1.420.400,00	\$ 7.030.980,00	\$ 249.022.646,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 38.619.307	\$ 3.887.329.351		EN REVISIÓN.
2	OCTUBRE DE 2022	\$ 4.602.000	\$ 874.380	\$ 5.476.380	\$ 920.400	\$ 4.555.980	\$ 248.102.246,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 34.063.327	\$ 3.881.852.971		EN REVISIÓN.
3	NOVIEMBRE DE 2022	\$ 16.102.000	\$ 3.059.380	\$ 19.161.380	\$ 3.220.400	\$ 15.940.980	\$ 244.881.846,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 18.122.347	\$ 3.862.691.591		
4												
TOTALES		\$ 27.806.000	\$ 5.283.140	\$ 33.089.140	\$ 5.561.200	\$ 27.527.940	\$ 248.102.246		\$ 18.122.347	\$ 3.862.691.591		
Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.												
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO												
		VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL						
*SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (A) + (B) = C		\$ 27.806.000,00				\$ 27.806.000,00						
*PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D		\$ -				\$ -						
*SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (C) + (D) = E		\$ 27.806.000,00				\$ 27.806.000,00						
*IVA = 19% * (E) = (F)				\$ 5.283.140,00		\$ 5.283.140,00						
VALOR TOTAL		\$ 27.806.000,00		\$ 5.283.140,00		\$ 33.089.140,00						
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.												
NOTAS:												
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.												
2. Este formato se diligencia por año.												
Firma:												
Nombre: luminada castellar Arrieta												
Director de Interventoría												
Matrícula Profesional No.: 13202130074BLV												
Firma:												
Nombre: Carmen Cecilia Pérez López												
Supervisor del Contrato de Interventoría												
Matrícula Profesional No.: 13202188727 BLV												
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVAS.												
Copias: Interventor y Dirección Territorial.												



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA						CÓDIGO	MEP/M12-04-15-FR-9				
							VERSIÓN	1				
							PÁGINA					
FECHA: 13/12/2022 (Día / Mes / Año)												
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES				DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR								
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 973 DE 2022				INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS								
MES INFORME MENSUAL: 4				PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR- LOTE 4.								
CONTRATO DE OBRA No: 557 de 2022, 558 de 2022 y LP.006 2022				CONTRATISTA: CONSORCIO SAN RAFAEL, CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUE, Y CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK								
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA												
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior					
2022	887122	2402-0600-0012	11	Nación	contrato principal	\$ 296.093.333	\$ 36.639.307					
2023			11	Nación	contrato principal	\$ 1.520.000.000						
2024			11	Nación	contrato principal	\$ 2.079.687.398						
TOTAL						\$ 3.895.780.731						
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:				\$ 3.895.780.731								
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA												
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							\$ 250.443.046,00		\$ 296.093.333	\$ 3.895.780.731		
1	SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 7.102.000	\$ 1.349.380	\$ 8.451.380	\$ 1.420.400,00	\$ 7.030.980,00	\$ 249.022.646,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 38.619.307	\$ 3.887.329.351		EN REVISIÓN.
2	OCTUBRE DE 2022	\$ 4.602.000	\$ 874.380	\$ 5.476.380	\$ 920.400	\$ 4.555.980	\$ 248.102.246,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 34.063.327	\$ 3.881.852.971		EN REVISIÓN.
3	NOVIEMBRE DE 2022	\$ 13.923.000	\$ 2.531.370	\$ 15.854.370	\$ 2.664.600	\$ 13.189.770	\$ 245.437.646,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 20.873.557	\$ 3.865.998.601		
4	DICIEMBRE DE 2022	\$ 20.599.000	\$ 3.913.810	\$ 24.512.810	\$ 4.119.800	\$ 20.393.010	\$ 241.317.846,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 480.547,00			
TOTALES		\$ 45.626.000	\$ 8.668.940	\$ 54.294.940	\$ 9.125.200	\$ 45.169.740	\$ 248.102.246		\$ 480.547	\$ 3.865.998.601		
Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.												
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO												
		VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL						
*SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = C		\$ 45.626.000,00				\$ 45.626.000,00						
*PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D		\$ -				\$ -						
*SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = E		\$ 45.626.000,00				\$ 45.626.000,00						
*IVA = 19% * (E) = (F)				\$ 8.668.940,00		\$ 8.668.940,00						
VALOR TOTAL		\$ 45.626.000,00		\$ 8.668.940,00		\$ 54.294.940,00						
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.												
NOTAS: 1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes. 2. Este formato se diligencia por año.												
Firma: Nombre: Rómulo Castellar Arreola Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 132021300748LV												
Firma: Nombre: Carmen Cecilia Pérez López Supervisor del Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: 13202188727 BLV												
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial												



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



COLOMBIA RURAL		PROCESO REGIONAL: RECTORADO NACIONAL DE VÍAS EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA PARA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL, CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CÓDIGO: MEPM-NC-10-25-PR-9						
						VERSIÓN: 1						
						PÁGINA: 1						
						FECHA: 2025/01/29						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR										
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 973 DE 2022		INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS										
MES INFORME MENSUAL: 1		PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCERAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - LOTE 4										
CONTRATO DE OBRA No: 557 de 2022, 558 de 2022 y L.P. 008 2022		CONTRATISTA: CONSORCIO SAN RAFAEL, CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUE Y CONSORCIO VIA LOS INSPIEROS S.A.										
RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA												
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación	Nación o Progenio	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior				
2022	887122	2402-0800-0012	11		Nación	contrato principal	\$ 296.093.333	\$ 36.639.907				
2023	144623	2402-0800-0012	11		Nación	contrato principal	\$ 1.503.036.000					
2024			11		Nación	contrato principal	\$ 2.079.687.368					
TOTAL							\$ 3.895.780.731					
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:		\$ 3.895.780.731										
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA												
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
						\$ 241.247.646,00	\$ 296.093.333		\$ 3.895.780.731			
1	SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 7.102.000,00	\$ 1.349.380,00	\$ 8.451.380,00	\$ 1.420.400,00	\$ 7.030.980,00	\$ 249.027.646,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 38.619.307,00	\$ 3.887.325.561,00		
2	OCTUBRE DE 2022	\$ 4.602.000,00	\$ 874.280,00	\$ 5.476.280,00	\$ 920.400,00	\$ 4.555.880,00	\$ 248.102.240,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 34.563.307,00	\$ 3.981.862.971,00		
3	NOVIEMBRE DE 2022	\$ 13.298.000,00	\$ 2.526.620,00	\$ 15.824.620,00	\$ 2.659.600,00	\$ 13.165.020,00	\$ 245.442.646,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 20.898.307,00	\$ 3.968.028.363,00		
4	DICIEMBRE DE 2022	\$ 20.976.000,00	\$ 3.995.750,00	\$ 24.960.250,00	\$ 4.195.000,00	\$ 20.765.250,00	\$ 241.247.646,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 133.057,00	\$ 3.841.066.101,00		
TOTALES		\$ 45.977.000,00	\$ 8.735.630,00	\$ 54.712.630,00	\$ 9.195.400,00	\$ 45.517.230,00	\$ 241.247.646,00		\$ 133.057,00	\$ 3.841.066.101,00		
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
						\$ 241.247.646,00	\$ 1.520.000.000		\$ 3.841.068.101			
5	ENERO DE 2023	\$ 81.028.100,00	\$ 15.395.338,00	\$ 96.423.438,00	\$ 16.205.620,00	\$ 80.217.818,00	\$ 225.042.026,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 1.439.762.181,00	\$ 3.744.644.662,00		
6	FEBRERO DE 2023	\$ 71.043.030,00	\$ 13.498.175,70	\$ 84.541.205,70	\$ 14.208.606,00	\$ 70.332.599,70	\$ 210.833.429,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 1.369.449.581,30	\$ 3.660.103.456,30		
7	MARZO DE 2023	\$ 101.250.300,00	\$ 19.227.557,00	\$ 120.477.857,00	\$ 20.250.060,00	\$ 100.227.797,00	\$ 190.583.360,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 1.269.211.784,30	\$ 3.539.615.599,30		
8	ABRIL DE 2023	\$ 99.118.545,00	\$ 18.832.523,00	\$ 117.951.068,00	\$ 19.823.738,00	\$ 98.127.329,00	\$ 179.798.652,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 1.171.084.429,70	\$ 3.421.664.536,70		
TOTALES		\$ 362.439.970,00	\$ 66.963.594,30	\$ 419.403.564,30	\$ 70.487.994,00	\$ 348.915.570,30	\$ 179.798.652,00		\$ 1.171.084.429,70	\$ 3.421.664.536,70		
Todos las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría, deben relacionarse entre sí o no factuadas.												
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO VIGENCIA 2023												
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (A) + (B) + (C)		VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL						
\$ 362.439.970,00		\$ 362.439.970,00		\$ 362.439.970,00		\$ 362.439.970,00						
PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRETE ADICIONAL + (D)		\$ -		\$ 1.593.031.991,68		\$ 1.593.031.991,68						
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS + (C) + (D) + (E)		\$ 362.439.970,00		\$ 362.439.970,00		\$ 362.439.970,00						
IVA = 15% * (B) + (F)		\$ 66.963.594,30		\$ 66.963.594,30		\$ 66.963.594,30						
VALOR TOTAL		\$ 362.439.970,00		\$ 66.963.594,30		\$ 429.403.564,30						
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.												
NOTAS: 1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes. 2. Este formato se diligencia por el:												
Firma: <i>Guillermo Cordero</i> Nombre: Guillermo Cordero Arreola Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 130213007-RLV						Firma: _____ Nombre: Corneio Cecilia Pérez López Supervisor del Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: 1302188727-BLV						
Digital: Informe Mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventoría y Dirección Territorial.												



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



		RECTORADO NACIONAL DE VÍAS PROCESO REGIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRAS PÚBLICAS INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL, CONTRATO DE INTERVENTORÍA						CÓDIGO	MEP/INF-40-15-PR-9			
								VERSION	1			
								PÁGINA				
								FECHA	2025/01/01			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOGOTÁ										
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 973 DE 2022		INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS										
MES INFORME MENSUAL: 1		PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCERAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ - LOTE 4										
CONTRATO DE OBRA No: 557 de 2022, 558 de 2022 y L.P. 008 2022		CONTRATISTA: CONSORCIO SAN RAFAEL, CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUE Y CONSORCIO VIA LOS INSPIEROS S.A.										
RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA												
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación	Nación o Prodigio	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior				
2022	887122	2402-0600-0012	11		Nación	contrato principal	\$ 296.093.333	\$ 36.639.907				
2023		2402-0600-0012	11		Nación	contrato principal	\$ 1.503.006.000					
2024			11		Nación	contrato principal	\$ 2.079.687.368					
TOTAL							\$ 3.895.786.731					
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 3.895.786.731												
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA												
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							\$ 250.443.046,00		\$ 296.093.333	\$ 3.895.786.731		
1	SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 7.102.000,00	\$ 1.349.380,00	\$ 8.451.380,00	\$ 1.420.400,00	\$ 7.030.980,00	\$ 249.022.646,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 38.619.307,00	\$ 3.887.325.581,00		
2	OCTUBRE DE 2022	\$ 4.602.000,00	\$ 874.280,00	\$ 5.476.280,00	\$ 920.400,00	\$ 4.555.880,00	\$ 248.102.246,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 34.063.307,00	\$ 3.881.862.971,00		
3	NOVIEMBRE DE 2022	\$ 13.298.000,00	\$ 2.526.620,00	\$ 15.824.620,00	\$ 2.659.600,00	\$ 13.165.020,00	\$ 246.442.646,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 20.898.307,00	\$ 3.868.028.363,00		
4	DICIEMBRE DE 2022	\$ 20.976.000,00	\$ 3.985.290,00	\$ 24.960.290,00	\$ 4.195.000,00	\$ 20.765.290,00	\$ 243.247.646,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 133.057,00	\$ 3.841.066.103,00		
TOTALES		\$ 45.977.000,00	\$ 8.735.630,00	\$ 54.712.630,00	\$ 9.195.400,00	\$ 45.517.230,00	\$ 243.247.646,00		\$ 133.057,00	\$ 3.841.066.103,00		
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							\$ 241.247.646,00		\$ 1.520.000.000	\$ 3.841.068.103		
5	ENERO DE 2023	\$ 81.028.100,00	\$ 15.395.338,00	\$ 96.423.438,00	\$ 16.205.620,00	\$ 80.217.818,00	\$ 225.042.026,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 1.439.762.181,00	\$ 3.744.644.662,00		
6	FEBRERO DE 2023	\$ 71.043.030,00	\$ 13.498.175,70	\$ 84.541.205,70	\$ 14.208.606,00	\$ 70.332.599,70	\$ 210.833.420,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 1.369.449.581,30	\$ 3.660.103.456,30		
7	MARZO DE 2023	\$ 101.290.300,00	\$ 19.227.567,00	\$ 120.487.867,00	\$ 20.790.060,00	\$ 100.237.797,00	\$ 190.583.360,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 1.269.211.784,30	\$ 3.539.615.599,30		
8	ABRIL DE 2023	\$ 107.164.000,00	\$ 20.359.260,00	\$ 127.523.260,00	\$ 21.439.800,00	\$ 106.083.460,00	\$ 189.152.560,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 1.163.179.324,30	\$ 3.413.102.399,30		
9	MAYO DE 2023	\$ 110.121.540,00	\$ 20.933.092,00	\$ 131.044.632,00	\$ 22.024.306,00	\$ 109.020.326,00	\$ 147.139.250,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 1.054.108.999,30	\$ 3.293.697.706,30		
TOTALES		\$ 470.596.970,00	\$ 89.413.424,30	\$ 560.010.394,30	\$ 94.119.394,00	\$ 465.891.000,30	\$ 147.128.252,00		\$ 1.054.108.999,30	\$ 3.293.697.706,30		
Todos las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse entre sí o no factuadas.												
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO VIGENCIA 2023												
		VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL								
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (A) + (B) + (C)		\$ 470.596.970,00		\$ 470.596.970,00								
PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRETE ADICIONAL + (D)		\$ -		\$ -								
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (C) + (D) + (E)		\$ 470.596.970,00		\$ 470.596.970,00								
IVA = 19% * (E) + (F)		\$ 89.413.424,30		\$ 89.413.424,30								
VALOR TOTAL		\$ 470.596.970,00	\$ 89.413.424,30	\$ 560.010.394,30								
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.												
NOTAS: 1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes. 2. Este formato se diligencia por año.												
Firma:						Firma:						
Código de Interventoría: 1202189721-BLV						Código de Interventoría: 1202189721-BLV						
Digital Informe Mensual de Interventoría: Archivo de Gestión del BVCIS Código Interventoría y Dirección Territorial												



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



		PROCESO REGIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA (INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL, CONTRATO DE INTERVENTORÍA)				CÓDIGO	MEP/MS-40-15-FR-9					
						VERSION	1					
						PÁGINA						
						FECHA	29/06/2025 (del 01/01/2025 al 31/01/2025)					
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES				DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:		973 DE 2022				INTERVENIENTE: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS						
MES INFORME MENSUAL:		9				INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCERAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR- LOTE 4						
CONTRATO DE OBRA No:		557 de 2022, 558 de 2022 y L.P. 008 2022				CONTRATISTA: CONSORCIO SAN RAFAEL, CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUE Y CONSORCIO VIA LOS INSPIEROS, S.A.						
RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA												
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación	Nación o Progenio	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior				
2022	887122	2402-0600-0012	11		Nación	contrato principal	\$ 295.099.333	\$ 36.639.907				
2023	144623	2402-0600-0012	11		Nación	contrato principal	\$ 1.520.000.000					
2024			11		Nación	contrato principal	\$ 2.079.687.358					
TOTAL							\$ 3.895.786.731					
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 3.895.786.731												
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA												
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
						\$ 250.443.046,00			\$ 296.093.333	\$ 3.895.786.731		
1	SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 7.102.000,00	\$ 1.349.380,00	\$ 8.451.380,00	\$ 1.420.400,00	\$ 7.030.980,00	\$ 249.022.646,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 38.619.307,00	\$ 3.887.325.581,00		
2	OCTUBRE DE 2022	\$ 4.602.000,00	\$ 874.280,00	\$ 5.476.280,00	\$ 920.400,00	\$ 4.555.880,00	\$ 248.102.246,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 34.063.307,00	\$ 3.881.862.971,00		
3	NOVIEMBRE DE 2022	\$ 13.298.000,00	\$ 2.526.620,00	\$ 15.824.620,00	\$ 2.659.600,00	\$ 13.165.020,00	\$ 245.442.646,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 20.898.307,00	\$ 3.868.028.363,00		
4	DICIEMBRE DE 2022	\$ 20.976.000,00	\$ 3.985.250,00	\$ 24.960.250,00	\$ 4.195.000,00	\$ 20.765.250,00	\$ 243.247.646,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 174.147,00	\$ 3.841.066.101,00		
TOTALES		\$ 45.977.000,00	\$ 8.735.630,00	\$ 54.712.630,00	\$ 9.195.400,00	\$ 45.517.230,00	\$ 243.247.646,00		\$ 133.857,00	\$ 3.841.066.101,00		
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
						\$ 241.247.646,00			\$ 1.520.000.000	\$ 3.841.068.101		
5	ENERO DE 2023	\$ 81.028.100,00	\$ 15.395.338,00	\$ 96.423.438,00	\$ 16.205.620,00	\$ 80.217.818,00	\$ 225.042.026,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 1.439.762.181,00	\$ 3.744.644.662,00		
6	FEBRERO DE 2023	\$ 71.043.030,00	\$ 13.498.175,70	\$ 84.541.205,70	\$ 14.208.606,00	\$ 70.332.599,70	\$ 210.833.420,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 1.369.449.581,30	\$ 3.660.103.456,30		
7	MARZO DE 2023	\$ 101.250.300,00	\$ 19.237.657,00	\$ 120.487.957,00	\$ 20.750.060,00	\$ 100.237.797,00	\$ 190.583.360,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 1.269.211.784,30	\$ 3.539.615.599,30		
8	ABRIL DE 2023	\$ 95.118.240,00	\$ 18.612.522,60	\$ 113.730.762,60	\$ 17.623.708,00	\$ 96.107.054,60	\$ 170.788.652,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 1.171.084.429,10	\$ 3.421.604.536,70		
9	MAYO DE 2023	\$ 120.629.340,00	\$ 23.628.928,00	\$ 144.258.268,00	\$ 21.325.188,00	\$ 122.933.080,00	\$ 148.834.464,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 1.062.954.749,10	\$ 3.291.209.668,10		
TOTALES		\$ 462.065.910,00	\$ 87.792.522,90	\$ 549.858.432,90	\$ 92.413.182,00	\$ 457.445.250,90	\$ 148.834.464,00		\$ 1.062.954.749,10	\$ 3.291.209.668,10		
Todos las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse entre sí o no factuadas.												
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO VIGENCIA 2023												
		VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL						
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (A) + (B) + (C)		\$ 462.065.910,00		\$ 462.065.910,00		\$ 462.065.910,00						
PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTES ADICIONAL = (D)		\$ -		\$ -		\$ -						
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (C) + (D) + (E)		\$ 462.065.910,00		\$ 462.065.910,00		\$ 462.065.910,00						
IVA = 15% * (E) + (F)		\$ 87.792.522,90		\$ 87.792.522,90		\$ 87.792.522,90						
VALOR TOTAL		\$ 462.065.910,00		\$ 549.858.432,90		\$ 549.858.432,90						
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.												
NOTAS:												
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.												
2. Este formato se diligencia por año.												
Firma:						Firma:						
Nombre: Juan Carlos Esteban Arango Prieto						Nombre: Pablo Ernesto Arango Prieto						
Director de Interventoría						Supervisor del Contrato de Interventoría						
Matrícula Profesional No. 1320219007-RLV						Matrícula Profesional No. 13202097750						
Digital Informe Mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.												
Código: Interventoría y Dirección Territorial.												



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



COLOMBIA RURAL		PROCESO REGIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRAS PÚBLICAS INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL, CONTRATO DE INTERVENTORIA				CÓDIGO		MEP/MS-40-15-PR-9				
						VERSION		1				
						PÁGINA		1				
						FECHA		24/01/2025				
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR												
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 973 DE 2022 INTERVENIENTE: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS												
MES INFORME MENSUAL: 10 PROYECTO: INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - LOTE 4												
CONTRATO DE OBRA No: 557 de 2022, 558 de 2022 y L.P. 008 2022 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN RAFAEL, CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUE Y CONSORCIO VIA LOS INSPIEROS S.A.												
RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA												
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación	Nación o Progenio	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior				
2022	887122	2402-0600-0012	11	Nación	contrato principal		\$ 296.093.333	\$ 36.639.907				
2023		2402-0600-0012	11	Nación	contrato principal		\$ 1.520.000.000					
2024			11	Nación	contrato principal		\$ 2.079.687.368					
TOTAL							\$ 3.895.780.731					
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 3.895.780.731												
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA												
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
						\$ 250.443.046,00			\$ 296.093.333	\$ 3.895.780.731		
1	SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 7.102.000,00	\$ 1.349.380,00	\$ 8.451.380,00	\$ 1.420.400,00	\$ 7.030.980,00	\$ 249.022.646,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 38.619.307,00	\$ 3.887.325.561,00		
2	OCTUBRE DE 2022	\$ 4.603.000,00	\$ 874.280,00	\$ 5.476.280,00	\$ 920.400,00	\$ 4.555.880,00	\$ 248.102.246,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 34.063.307,00	\$ 3.861.862.971,00		
3	NOVIEMBRE DE 2022	\$ 13.298.000,00	\$ 2.526.620,00	\$ 15.824.620,00	\$ 2.659.600,00	\$ 13.165.020,00	\$ 245.442.646,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 20.898.307,00	\$ 3.868.028.363,00		
4	DICIEMBRE DE 2022	\$ 20.976.000,00	\$ 3.985.750,00	\$ 24.960.750,00	\$ 4.195.000,00	\$ 20.765.750,00	\$ 243.247.646,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 174.174,00	\$ 3.841.066.103,00		
TOTALES		\$ 45.977.000,00	\$ 8.735.630,00	\$ 54.712.630,00	\$ 9.195.400,00	\$ 45.517.230,00	\$ 243.247.646,00		\$ 133.857,00	\$ 3.841.066.103,00		
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
						\$ 241.247.646,00			\$ 1.520.000.000	\$ 3.841.068.103		
5	ENERO DE 2023	\$ 81.028.100,00	\$ 15.395.338,00	\$ 96.423.438,00	\$ 16.205.620,00	\$ 80.217.818,00	\$ 225.042.026,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 1.439.762.181,00	\$ 3.744.644.662,00		
6	FEBRERO DE 2023	\$ 71.043.030,00	\$ 13.498.175,70	\$ 84.541.205,70	\$ 14.208.606,00	\$ 70.332.599,70	\$ 210.833.429,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 1.369.449.583,30	\$ 3.660.103.456,30		
7	MARZO DE 2023	\$ 101.250.300,00	\$ 19.227.567,00	\$ 120.477.867,00	\$ 20.750.060,00	\$ 99.727.797,00	\$ 190.563.360,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 1.269.211.784,30	\$ 3.539.615.599,30		
8	ABRIL DE 2023	\$ 99.118.540,00	\$ 18.832.520,00	\$ 117.951.060,00	\$ 19.623.708,00	\$ 98.327.352,00	\$ 170.789.602,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 1.171.084.429,30	\$ 3.421.046.536,30		
9	MAYO DE 2023	\$ 120.629.340,00	\$ 23.029.928,00	\$ 143.659.268,00	\$ 21.525.188,00	\$ 122.134.080,00	\$ 148.634.464,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 1.050.554.149,30	\$ 3.293.209.668,30		
10	JUNIO DE 2023	\$ 105.312.840,00	\$ 20.011.148,00	\$ 125.323.988,00	\$ 21.064.368,00	\$ 104.259.620,00	\$ 127.770.096,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 958.266.127,00	\$ 3.165.876.676,30		Aprobada
TOTALES		\$ 567.387.750,00	\$ 107.893.672,50	\$ 675.281.422,50	\$ 113.477.596,00	\$ 561.713.826,50	\$ 148.834.464,00		\$ 1.062.554.749,30	\$ 3.291.209.668,30		
Todos las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse entre sí o no factuadas.												
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO VIGENCIA 2023												
		VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL						
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (A) + (B) + (C)		\$	567.387.750,00			\$	567.387.750,00					
PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTES ADICIONAL = (D)		\$	-			\$	-					
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (C) + (D) = E		\$	567.387.750,00			\$	567.387.750,00					
IVA = 15% * (E) = (F)		\$		\$	107.893.672,50	\$	107.893.672,50					
VALOR TOTAL		\$	567.387.750,00		107.893.672,50	\$	675.281.422,50					
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.												
NOTAS: 1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes. 2. Este formato se diligencia por año												
Firma: <u>Juliana Cárdenas A.</u> Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 132021007-RLV						Firma: _____ Supervisor del Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: 13202097750						
Digital Informe Mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS Código: Interventoría y Dirección Territorial												



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRAS PUBLICAS INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		CODIGO MEP-MN1-R-15-FR-9 VERSION 1 PAGINA								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES				FECHA: 14/08/2023 (Día / Mes / Año)								
DIRECCION TERRITORIAL: BOLIVAR												
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 973 DE 2022				INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS								
MES INFORME MENSUAL: 11				PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCERIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - LOTE 4.								
CONTRATO DE OBRA No.: 557 de 2022, 558 de 2022 y LP 006 2022				CONTRATISTA: CONSORCIO SAN RAFAEL, CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUE, Y CONSORCIO VIA LOS NESPEROS JK								
RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA												
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Proyecto) Nación o	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo de Acta Anterior					
2022	887122	2402-0600-2012	11	Nación	contrato principal	\$ 296.093.333	\$ 36.638.307					
2023	144623	2402-0600-2012	11	Nación	contrato principal	\$ 1.520.000.000						
2024			11	Nación	contrato principal	\$ 2.078.687.265						
TOTAL						\$ 3.895.780.731						
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:						\$ 3.895.780.731						
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA												
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descartando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 7.102.000,00	\$ 1.349.380,00	\$ 8.451.380,00	\$ 1.420.400,00	\$ 7.030.980,00	\$ 250.443.046,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 296.093.333	\$ 3.895.780.731		
2	OCTUBRE DE 2022	\$ 4.602.000,00	\$ 874.380,00	\$ 5.476.380,00	\$ 920.400,00	\$ 4.555.980,00	\$ 248.102.246,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 38.619.307,00	\$ 3.887.329.351,00		
3	NOVIEMBRE DE 2022	\$ 13.298.000,00	\$ 2.526.620,00	\$ 15.824.620,00	\$ 2.659.600,00	\$ 13.165.020,00	\$ 245.442.646,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 34.063.327,00	\$ 3.881.852.871,00		
4	DICIEMBRE DE 2022	\$ 20.975.000,00	\$ 3.985.250,00	\$ 24.960.250,00	\$ 4.195.000,00	\$ 20.765.250,00	\$ 241.247.646,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 20.896.307,00	\$ 3.866.028.351,00		
TOTALES		\$ 45.977.000,00	\$ 8.735.630,00	\$ 54.712.630,00	\$ 9.195.400,00	\$ 45.517.230,00	\$ 241.247.646,00		\$ 133.057,00	\$ 3.841.068.101,00		
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descartando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
5	ENERO DE 2023	\$ 81.028.100,00	\$ 15.395.339,00	\$ 96.423.439,00	\$ 16.205.620,00	\$ 80.217.819,00	\$ 225.042.026,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 1.439.782.181,00	\$ 3.744.644.662,00		
6	FEBRERO DE 2023	\$ 71.041.000,00	\$ 13.498.175,70	\$ 84.541.205,70	\$ 14.208.606,00	\$ 70.332.599,70	\$ 210.833.420,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 1.369.449.581,30	\$ 3.660.103.456,30		
7	MARZO DE 2023	\$ 101.250.300,00	\$ 19.277.557,00	\$ 120.527.857,00	\$ 20.250.080,00	\$ 100.277.777,00	\$ 190.563.380,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 1.289.211.784,30	\$ 3.539.815.599,30		
8	ABRIL DE 2023	\$ 99.118.540,00	\$ 18.832.522,60	\$ 117.951.062,60	\$ 19.823.708,00	\$ 98.127.354,60	\$ 170.759.652,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 1.171.084.429,70	\$ 3.421.664.536,70		
9	MAYO DE 2023	\$ 109.625.940,00	\$ 20.828.928,60	\$ 130.454.868,60	\$ 21.925.188,00	\$ 108.529.680,60	\$ 148.834.464,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 1.062.554.749,10	\$ 3.291.209.668,10		Aprobada
10	JUNIO DE 2023	\$ 105.321.840,00	\$ 20.011.149,60	\$ 125.332.989,60	\$ 21.064.368,00	\$ 104.268.621,60	\$ 127.770.096,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 1.066.815.808,10	\$ 3.296.331.547,30		En revisión
11	JULIO DE 2023	\$ 106.990.040,00	\$ 20.328.107,60	\$ 127.318.147,60	\$ 21.398.008,00	\$ 105.920.139,60	\$ 106.372.088,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 956.634.609,50	\$ 3.163.891.520,50		En revisión
TOTALES		\$ 674.377.790,00	\$ 128.131.780,10	\$ 802.509.570,10	\$ 134.875.558,00	\$ 667.634.012,10	\$ 106.372.088,00		\$ 956.634.609,50	\$ 3.163.891.520,50		
Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse entre sí o no facturadas.												
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO VIGENCIA 2023												
VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL								
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) + (C)		\$ 674.377.790,00		\$ 674.377.790,00								
PROVISION PARA AJUSTES Y/O FRENTES ADICIONAL = (D)		\$ 674.377.790,00		\$ 674.377.790,00								
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) + (E)		\$ 674.377.790,00		\$ 674.377.790,00								
IVA = 10% * (E) = (F)		\$ 128.131.780,10		\$ 128.131.780,10								
VALOR TOTAL		\$ 674.377.790,00		\$ 802.509.570,10								
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.												
NOTAS: 1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes. 2. Este formato se diligencia por año.												
Firma: Nombre: Fabián Ernesto Arango Pineda Supervisor del Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: 1320287750												
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.												



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



		RECTORADO NACIONAL DE VÍAS PROCESO REGIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRAS PÚBLICAS INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CÓDIGO MEP/INF-10-15-PR-9						
						VERSIÓN 1						
						PÁGINA						
						FECHA (DD/MM/AAAA)						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR										
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 973 DE 2022		INTERVENIENTE: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS										
MES INFORME MENSUAL: 12		PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - LOTE 4										
CONTRATO DE OBRA No: 557 de 2022, 558 de 2022 y LP 008 2022		CONTRATISTA: CONSORCIO SAN RAFAEL, CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUE Y CONSORCIO VIA LOS INSPIEROS S.A.										
RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA												
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación	Nación o Prodigio	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior				
2022	887122	2402-0800-0012	11	Nación	Contrato principal		\$ 296.093.333	\$ 36.939.907				
2023	144623	2402-0800-0012	11	Nación	Contrato principal		\$ 1.520.000.000					
2024			11	Nación	Contrato principal		\$ 2.937.831.949,60					
TOTAL							\$ 3.895.780.731					
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 3.895.780.731												
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA												
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
						\$ 250.443.046,00			\$ 296.093.333	\$ 3.895.780.731		
1	SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 7.102.000,00	\$ 1.349.380,00	\$ 8.451.380,00	\$ 1.420.400,00	\$ 7.030.980,00	\$ 249.022.646,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 38.619.307,00	\$ 3.887.325.561,00		
2	OCTUBRE DE 2022	\$ 4.602.000,00	\$ 874.280,00	\$ 5.476.280,00	\$ 920.400,00	\$ 4.555.880,00	\$ 248.102.246,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 34.563.307,00	\$ 3.861.862.974,00		
3	NOVIEMBRE DE 2022	\$ 13.298.000,00	\$ 2.526.620,00	\$ 15.824.620,00	\$ 2.659.600,00	\$ 13.165.020,00	\$ 245.442.646,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 20.898.307,00	\$ 3.866.026.363,00		
4	DICIEMBRE DE 2022	\$ 20.978.000,00	\$ 3.985.290,00	\$ 24.963.290,00	\$ 4.195.000,00	\$ 20.768.290,00	\$ 243.247.646,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 174.147,00	\$ 3.841.066.101,00		
TOTALES		\$ 45.977.000,00	\$ 8.735.630,00	\$ 54.712.630,00	\$ 9.195.400,00	\$ 45.517.230,00	\$ 243.247.646,00		\$ 133.857,00	\$ 3.841.066.101,00		
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
						\$ 241.247.646,00			\$ 1.520.000.000	\$ 3.841.068.101		
5	ENERO DE 2023	\$ 81.028.100,00	\$ 15.395.338,00	\$ 96.423.438,00	\$ 16.205.620,00	\$ 80.217.818,00	\$ 225.042.026,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 1.439.762.181,00	\$ 3.744.644.662,00		
6	FEBRERO DE 2023	\$ 71.043.030,00	\$ 13.498.175,70	\$ 84.541.205,70	\$ 14.258.606,00	\$ 70.332.599,70	\$ 210.833.420,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 1.369.449.581,30	\$ 3.660.103.456,30		
7	MARZO DE 2023	\$ 101.290.300,00	\$ 19.227.607,00	\$ 120.487.887,00	\$ 20.290.060,00	\$ 100.237.797,00	\$ 190.583.360,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 1.269.211.784,30	\$ 3.539.615.599,30		
8	ABRIL DE 2023	\$ 89.118.540,00	\$ 16.823.520,00	\$ 105.942.060,00	\$ 17.673.080,00	\$ 88.272.354,00	\$ 170.788.660,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 1.171.284.429,30	\$ 3.421.064.536,30		
9	MAYO DE 2023	\$ 120.629.340,00	\$ 23.029.180,00	\$ 139.454.860,00	\$ 21.525.188,00	\$ 108.529.680,00	\$ 148.834.464,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 1.050.554.149,30	\$ 3.293.209.668,30		Aprobado
10	JUNIO DE 2023	\$ 105.312.840,00	\$ 20.011.149,00	\$ 125.323.989,00	\$ 21.064.368,00	\$ 104.268.621,00	\$ 127.770.096,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 958.268.127,60	\$ 3.165.876.676,50		En revisión
11	JULIO DE 2023	\$ 106.990.040,00	\$ 20.328.107,60	\$ 127.318.147,60	\$ 21.388.008,00	\$ 105.920.139,60	\$ 106.372.088,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 852.365.987,60	\$ 3.038.558.930,00		En revisión
12	AGOSTO DE 2023	\$ 109.854.270,00	\$ 20.872.311,30	\$ 130.726.581,30	\$ 21.870.854,00	\$ 108.795.727,30	\$ 84.401.234,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 743.610.260,60	\$ 2.907.831.949,60		Pendiente por enviar
TOTALES		\$ 784.232.060,00	\$ 149.004.091,40	\$ 933.236.151,40	\$ 156.846.412,00	\$ 776.389.739,40	\$ 84.401.234,00		\$ 743.610.260,60	\$ 2.907.831.949,60		
Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse entre sí o no facturadas.												
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO VIGENCIA 2023												
VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL								
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (A) + (B) + (C)		\$ 784.232.060,00		\$ 784.232.060,00								
PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FOMENTO ADICIONAL = (D)		\$ -		\$ -								
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (A) + (B) + (C) + (D)		\$ 784.232.060,00		\$ 784.232.060,00								
IVA = 10% * (E) = (F)		\$ 149.004.091,40		\$ 149.004.091,40								
VALOR TOTAL		\$ 784.232.060,00		\$ 933.236.151,40								
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.												
NOTAS:												
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.												
2. Este formato se diligenciará por año.												
<div><div></div><div><p>Firma: Diana Cecilia Ariza Nombre: Diana Cecilia Ariza Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 132021900748LV</p></div></div> <div><div></div><div><p>Firma: Fabián Ernesto Arango Prieto Nombre: Fabián Ernesto Arango Prieto Supervisor del Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: 1320097750</p></div></div>												
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor a Dirección Territorial												

	PROCESO NACIONAL EXISTENTE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRAS PÚBLICAS INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENCIÓN		FORMA 1
			FECHA 13/09/2023 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR	
CONTRATO DE INTERVENCIÓN N°: 973 DE 2022		INTERVENIOR: GAVINO INGENIEROS CONSULTORES SAS	
MES INFORME MENSUAL: 11		PROYECTO: INTERVENCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCAERAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - LOTJE 4	
CONTRATO DE OBRA N°: 557 de 2022, 558 de 2022 y LP 004 2022		CONTRATISTA: CONSORCIO SAN RAFAEL, CONSORCIO MEGAVIS MAGANGUI E CONSORCIO LOS NIÑEROS JK	

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación	Nación o Nación	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	887132	2600-0000-0022	11		Nación	contrato principal	\$ 296.089.333	\$ 85.639.307
2023	144623	2600-0000-0023			Nación	contrato principal	\$ 1.520.000.000	
2024			11		Nación	contrato principal	\$ 2.978.687.398	
TOTAL							\$ 1.895.786.731	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 1.895.786.731

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
						\$ 256.443.046,00	\$ 256.069.333		\$ 1.895.786.731			
1	SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 7.102.000,00	\$ 1.349.380,00	\$ 8.451.380,00	\$ 1.420.400,00	\$ 7.030.980,00	\$ 249.022.644,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 38.613.307,00	\$ 3.887.329.353,00		
2	OCTUBRE DE 2022	\$ 4.602.000,00	\$ 874.380,00	\$ 5.476.380,00	\$ 920.400,00	\$ 4.555.980,00	\$ 246.102.246,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 34.861.327,00	\$ 3.881.852.971,00		
3	NOVIEMBRE DE 2022	\$ 13.288.000,00	\$ 2.526.620,00	\$ 15.814.620,00	\$ 2.659.600,00	\$ 13.155.020,00	\$ 245.442.646,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 20.898.307,00	\$ 3.866.028.393,00		
4	DICIEMBRE DE 2022	\$ 20.975.000,00	\$ 3.885.250,00	\$ 24.860.250,00	\$ 4.195.000,00	\$ 20.665.250,00	\$ 241.247.646,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 19.147,00	\$ 3.841.068.103,00		
TOTALES		\$ 45.977.000,00	\$ 8.735.630,00	\$ 54.712.630,00	\$ 9.195.400,00	\$ 45.517.230,00	\$ 241.247.646,00		\$ 133.057,00	\$ 3.841.068.103,00		

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
						\$ 645.957.664,00	\$ 1.520.000,00		\$ 3.841.068.103			
5	ENERO DE 2023	\$ 81.028.100,00	\$ 15.395.339,00	\$ 96.423.439,00	\$ 16.205.620,00	\$ 80.217.819,00	\$ 629.352.044,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 1.439.782.181,00	\$ 3.744.644.662,00		
6	FEBRERO DE 2023	\$ 71.043.020,00	\$ 13.498.375,70	\$ 84.541.395,70	\$ 14.238.026,00	\$ 70.303.369,70	\$ 615.143.488,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 1.369.449.581,00	\$ 3.680.123.456,30		
7	MARZO DE 2023	\$ 101.250.840,00	\$ 19.237.561,00	\$ 120.488.401,00	\$ 20.256.000,00	\$ 100.232.401,00	\$ 564.889.278,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 1.269.241.274,30	\$ 3.538.814.596,30		
8	ABRIL DE 2023	\$ 99.118.540,00	\$ 18.832.522,60	\$ 117.951.062,60	\$ 19.623.708,00	\$ 98.327.354,60	\$ 575.989.670,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 1.171.084.420,70	\$ 3.421.654.536,70		
9	MAYO DE 2023	\$ 109.628.940,00	\$ 20.828.926,00	\$ 130.457.866,00	\$ 21.525.188,00	\$ 108.932.678,00	\$ 503.144.400,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 1.062.054.749,10	\$ 3.291.209.666,10		
10	JUNIO DE 2023	\$ 105.321.840,00	\$ 20.011.149,00	\$ 125.332.98								



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MESIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CÓDIGO	MEP/INF-40-15-FR-9					
						VERSION	1					
						PÁGINA						
						FECHA	29/11/2025 (2025-11-29)					
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES				DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:		973 DE 2022				INTERVENIENTE: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS						
MES INFORME MENSUAL:		14				INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCERAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR- LOTE 4						
CONTRATO DE OBRA No:		557 de 2022, 558 de 2022 y L.P. 008 2022				CONTRATISTA: CONSORCIO SAN RAFAEL, CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUE Y CONSORCIO VIA LOS INSPIEROS S.A.						
RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA												
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación	Proyecto	Nación o	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo de Acta Anterior			
2022	887122	2402-0800-0012	11	Nación	contrato principal			\$ 266.099.307	\$ 36.639.907			
2023	144623	2402-0800-0012	11	Nación	contrato principal			\$ 1.520.000.000				
2024			11	Nación	contrato principal			\$ 2.079.687.398				
TOTAL								\$ 3.865.786.731				
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:		\$ 3.865.786.731										
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA												
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							\$ 250.443.046,00		\$ 250.093.333	\$ 3.895.780.731		
1	SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 7.102.000,00	\$ 1.349.380,00	\$ 8.451.380,00	\$ 1.420.400,00	\$ 7.030.980,00	\$ 249.022.646,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 38.619.307,00	\$ 3.887.325.951,00		
2	OCTUBRE DE 2022	\$ 4.602.000,00	\$ 874.280,00	\$ 5.476.280,00	\$ 920.400,00	\$ 4.555.880,00	\$ 248.102.240,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 34.062.307,00	\$ 3.861.862.971,00		
3	NOVIEMBRE DE 2022	\$ 13.298.000,00	\$ 2.526.620,00	\$ 15.824.620,00	\$ 2.659.600,00	\$ 13.165.020,00	\$ 245.442.646,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 20.898.307,00	\$ 3.866.026.363,00		
4	DICIEMBRE DE 2022	\$ 20.976.000,00	\$ 3.985.290,00	\$ 24.960.290,00	\$ 4.195.000,00	\$ 20.765.290,00	\$ 243.247.646,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 174.174,00	\$ 3.841.066.101,00		
TOTALES		\$ 45.977.000,00	\$ 8.735.630,00	\$ 54.712.630,00	\$ 9.195.400,00	\$ 45.517.230,00	\$ 243.247.646,00		\$ 133.857,00	\$ 3.841.066.101,00		
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							\$ 645.557.664,00		\$ 1.520.000.000	\$ 3.841.068.101		
							\$ 1.115.698.962,00					
5	ENERO DE 2023	\$ 81.028.100,00	\$ 15.395.338,00	\$ 96.423.438,00	\$ 16.205.620,00	\$ 80.217.818,00	\$ 629.352.044,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 1.035.472.163,00	\$ 3.744.644.662,00		
6	FEBRERO DE 2023	\$ 71.043.030,00	\$ 13.498.175,70	\$ 84.541.205,70	\$ 14.208.606,00	\$ 70.332.599,70	\$ 615.143.438,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 965.139.563,30	\$ 3.660.103.456,30		
7	MARZO DE 2023	\$ 101.292.300,00	\$ 19.227.657,00	\$ 120.519.957,00	\$ 20.290.060,00	\$ 100.227.797,00	\$ 594.893.378,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 864.901.796,30	\$ 3.539.615.599,30		
8	ABRIL DE 2023	\$ 99.118.540,00	\$ 18.832.522,60	\$ 117.951.062,60	\$ 19.623.708,00	\$ 98.327.354,60	\$ 575.068.070,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 766.714.411,30	\$ 3.421.064.536,70		
9	MAYO DE 2023	\$ 109.629.940,00	\$ 20.829.928,60	\$ 130.459.868,60	\$ 21.525.188,00	\$ 108.934.680,60	\$ 553.144.462,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 658.244.731,30	\$ 3.293.209.668,00		
10	JUNIO DE 2023	\$ 105.321.840,00	\$ 20.011.149,60	\$ 125.332.989,60	\$ 21.064.368,00	\$ 104.268.621,60	\$ 532.080.114,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 553.876.109,50	\$ 3.165.876.676,50		
11	JULIO DE 2023	\$ 106.990.040,00	\$ 20.328.107,60	\$ 127.318.147,60	\$ 21.388.008,00	\$ 105.930.139,60	\$ 510.692.106,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 448.065.969,30	\$ 3.038.556.530,90		
12	AGOSTO DE 2023	\$ 109.854.270,00	\$ 20.872.311,30	\$ 130.726.581,30	\$ 21.870.854,00	\$ 108.755.727,30	\$ 488.711.252,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 299.300.242,60	\$ 2.807.831.649,60		
13	SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 96.822.330,00	\$ 18.724.242,70	\$ 115.546.572,70	\$ 19.764.466,00	\$ 95.782.106,70	\$ 468.946.196,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 241.466.136,90	\$ 2.790.233.376,90		
14	OCTUBRE DE 2023	\$ 96.545.930,00	\$ 18.343.726,70	\$ 114.889.656,70	\$ 19.309.186,00	\$ 95.580.470,70	\$ 449.637.600,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 145.885.665,20	\$ 2.675.343.720,00		
TOTALES		\$ 979.600.320,00	\$ 186.124.060,80	\$ 1.165.724.380,80	\$ 195.920.064,00	\$ 969.804.316,80	\$ 449.637.600,00		\$ 145.885.665,20	\$ 2.790.233.376,90		
Todos las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estas o no facturadas.												
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO VIGENCIA 2023												
		VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL						
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (A) + (B) + (C)		\$ 979.600.320,00				\$ 979.600.320,00						
PROVISIÓN PARA AJUSTES VIO FRENTE ADICIONAL = (D)		\$ -				\$ -						
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (C) + (D) + (E)		\$ 979.600.320,00				\$ 979.600.320,00						
IVA = 19% * (E) + (F)		\$ 186.124.060,80				\$ 186.124.060,80						
VALOR TOTAL		\$ 979.600.320,00		\$ 186.124.060,80		\$ 1.165.724.380,80						
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.												
NOTAS:												
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.												
2. Este formato se diligencia por año.												
<div><div></div><div><p>Firma Nombre: Fabian Ernesto Arango Prieto Superior del Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No. 1302097750</p></div></div>												



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO REGIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRAS PÚBLICAS INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA						CÓDIGO MEP/INF-01-25-PR-9				
								VERSIÓN 1				
								PÁGINA				
								FECHA 4/12/2025 (2025-12-04)				
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR												
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 973 DE 2022 INTERVENIENTE: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS												
MES INFORME MENSUAL: 15 PROYECTO: INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - LOTE 4												
CONTRATO DE OBRA No.: 557 de 2022, 558 de 2022 y L.P. 008 2022 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN RAFAEL, CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUE Y CONSORCIO VIA LOS INSERIDOS S.A.												
RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA												
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación	Proyecto	Nación o	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo de Acta Anterior			
2022	887122	2402-0600-0012	11	Nación	Contrato principal			\$ 266.099.307	\$ 36.639.907			
2023		2402-0600-0012	11	Nación	Contrato principal			\$ 1.503.006.000				
2024			11	Nación	Contrato principal			\$ 2.079.687.308				
TOTAL								\$ 3.895.793.215				
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 3.895.793.215												
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA												
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
						\$ 250.443.046,00			\$ 250.093.333	\$ 3.895.793.215		
1	SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 7.102.000,00	\$ 1.349.380,00	\$ 8.451.380,00	\$ 1.420.400,00	\$ 7.030.980,00	\$ 249.022.646,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 38.019.307,00	\$ 3.887.235.951,00		
2	OCTUBRE DE 2022	\$ 4.602.000,00	\$ 874.280,00	\$ 5.476.280,00	\$ 920.000,00	\$ 4.556.280,00	\$ 248.102.246,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 34.363.307,00	\$ 3.863.862.971,00		
3	NOVIEMBRE DE 2022	\$ 13.298.000,00	\$ 2.526.620,00	\$ 15.824.620,00	\$ 2.659.000,00	\$ 13.165.620,00	\$ 245.442.646,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 20.898.307,00	\$ 3.868.028.363,00		
4	DICIEMBRE DE 2022	\$ 20.976.000,00	\$ 3.995.790,00	\$ 24.960.250,00	\$ 4.195.000,00	\$ 20.765.250,00	\$ 243.247.646,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 17.174.770,00	\$ 3.841.066.103,00		
TOTALES		\$ 45.977.000,00	\$ 8.735.630,00	\$ 54.712.630,00	\$ 9.195.400,00	\$ 45.517.230,00	\$ 243.247.646,00		\$ 133.857,00	\$ 3.841.066.103,00		
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
						\$ 645.557.664,00			\$ 1.520.000.000	\$ 3.841.068.103		
						\$ 1.175.699.962,00			\$ 1.175.699.962,00	\$ 3.744.644.662,00		
5	ENERO DE 2023	\$ 81.028.100,00	\$ 15.395.338,00	\$ 96.423.438,00	\$ 16.205.620,00	\$ 80.217.818,00	\$ 629.352.044,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 1.035.472.163,00	\$ 3.660.103.456,30		
6	FEBRERO DE 2023	\$ 71.043.030,00	\$ 13.498.175,70	\$ 84.541.205,70	\$ 14.258.606,00	\$ 70.282.599,70	\$ 615.143.438,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 965.139.563,30	\$ 3.539.615.599,30		
7	MARZO DE 2023	\$ 101.250.300,00	\$ 19.227.657,00	\$ 120.477.957,00	\$ 20.250.060,00	\$ 100.227.797,00	\$ 584.893.378,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 884.901.796,30	\$ 3.421.064.536,70		
8	ABRIL DE 2023	\$ 99.118.540,00	\$ 18.830.522,60	\$ 117.949.062,60	\$ 17.663.020,00	\$ 99.127.254,60	\$ 575.088.670,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 795.774.411,30	\$ 3.293.209.668,30		
9	MAYO DE 2023	\$ 109.628.040,00	\$ 20.828.928,00	\$ 130.456.968,00	\$ 21.525.188,00	\$ 108.929.680,00	\$ 563.144.462,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 698.244.173,30	\$ 3.165.876.676,50		
10	JUNIO DE 2023	\$ 105.321.840,00	\$ 20.011.149,60	\$ 125.332.989,60	\$ 21.064.368,00	\$ 104.268.621,60	\$ 552.080.114,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 610.692.108,00	\$ 3.038.558.530,30		
11	JULIO DE 2023	\$ 106.990.040,00	\$ 20.328.107,60	\$ 127.318.147,60	\$ 21.388.008,00	\$ 105.929.139,60	\$ 540.682.108,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 548.065.969,30	\$ 2.907.831.649,60		
12	AGOSTO DE 2023	\$ 109.854.270,00	\$ 20.872.311,30	\$ 130.726.581,30	\$ 21.870.854,00	\$ 108.755.727,30	\$ 489.711.262,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 239.300.242,80	\$ 2.792.232.376,30		
13	SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 98.622.230,00	\$ 18.754.242,70	\$ 117.376.472,70	\$ 19.764.466,00	\$ 97.612.006,70	\$ 468.946.798,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 241.466.136,30	\$ 2.550.766.239,60		
14	OCTUBRE DE 2023	\$ 96.545.930,00	\$ 18.343.736,70	\$ 114.889.666,70	\$ 19.309.188,00	\$ 95.580.478,70	\$ 449.637.800,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 145.885.665,20	\$ 2.399.880.574,40		
15	NOVIEMBRE DE 2023	\$ 88.939.800,00	\$ 16.897.802,00	\$ 105.837.602,00	\$ 17.787.160,00	\$ 88.050.442,00	\$ 431.890.440,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 57.839.223,20	\$ 2.341.941.351,20		
TOTALES		\$ 1.068.536.120,00	\$ 203.021.862,80	\$ 1.271.557.982,80	\$ 215.767.224,00	\$ 1.055.790.758,80	\$ 431.890.440,00		\$ 57.839.223,20	\$ 2.341.941.351,20		
Todos los Actos aprobados por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse sobre o no facturado.												
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO VIGENCIA 2023												
		VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL						
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (A) + (B) = C		\$ 1.068.536.120,00				\$ 1.068.536.120,00						
PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRETE ADICIONAL = D		\$ -				\$ -						
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (C) + (D) = E		\$ 1.068.536.120,00				\$ 1.068.536.120,00						
IVA = 18% * (E) = F				\$ 203.021.862,80		\$ 203.021.862,80						
VALOR TOTAL		\$ 1.068.536.120,00		\$ 203.021.862,80		\$ 1.271.557.982,80						
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.												
NOTAS:												
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.												
2. Este formato se diligenció por año.												
<div><div></div><div><p>Firma: Nombre: Juan Carlos Estrella A. Cargo: Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 1320113007-881V</p></div><div><p>Firma: Nombre: Edoardo Arango Prieto Cargo: Supervisor del Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: 1320097790</p></div></div>												
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del BVS-LS Copias: Interventoría y Dirección Técnica												



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO NACIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA							CÓDIGO MEF/MN/IN-15-FR-9			
									VERSIÓN 1			
									PÁGINA			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR							FECHA 4/12/2024 (Día / Mes / Año)			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 973 DE 2022		INTERVENIENTE: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS										
MES INFORME MENSUAL: 28		INTERVENIENTE TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - LOTE 4										
CONTRATO DE OBRA No: 557 de 2022, 558 de 2022 y LP 006 2022		CONTRATISTA: CONSORCIO SAN RAFAEL, CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUE Y CONSORCIO VIA LOS INSERPOS_K										
RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA												
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación	Propios	(Nación o	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior			
2022	887122	2402-0000-0012	11	Nación			contrato principal	\$ 296.093.333	\$ 133.067			
2023	144623	2402-0000-0012	11	Nación			contrato principal	\$ 1.520.000.000	\$ 697.423			
2024	183024	2402-0000-0012	11	Nación			contrato principal	\$ 2.079.687.398				
TOTAL								\$ 3.895.780.731				
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:		\$ 3.895.780.731		\$ 3.895.780.731								
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA												
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							\$ 250.443.046,00		\$ 296.093.333	\$ 3.895.780.731		
1	SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 7.102.000,00	\$ 1.349.380,00	\$ 8.451.380,00	\$ 1.420.400,00	\$ 7.030.980,00	\$ 249.022.646,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 38.619.307,00	\$ 3.638.306.705,00		
2	OCTUBRE DE 2022	\$ 4.602.000,00	\$ 874.380,00	\$ 5.476.380,00	\$ 920.400,00	\$ 4.556.000,00	\$ 248.102.246,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 34.063.327,00	\$ 3.633.750.725,00		
3	NOVIEMBRE DE 2022	\$ 13.298.000,00	\$ 2.526.620,00	\$ 15.824.620,00	\$ 2.659.600,00	\$ 13.165.020,00	\$ 245.442.646,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 20.898.307,00	\$ 3.620.585.705,00		
4	DICIEMBRE DE 2022	\$ 20.975.000,00	\$ 3.985.250,00	\$ 24.960.250,00	\$ 4.195.000,00	\$ 20.765.250,00	\$ 241.247.646,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 133.057,00	\$ 3.599.820.455,00		
TOTALES		\$ 45.977.000,00	\$ 8.735.630,00	\$ 54.712.630,00	\$ 9.195.400,00	\$ 45.517.230,00	\$ 241.247.646,00		\$ 133.057,00	\$ 3.599.820.455,00		
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							\$ 404.310.018,00		\$ 1.520.000.000,00	\$ 3.599.820.455		
							\$ 645.957.664,00		\$ 1.115.689.982,00	\$ 654.763.064,00		
5	ENERO DE 2023	\$ 81.028.100,00	\$ 15.395.339,00	\$ 96.423.439,00	\$ 16.205.620,00	\$ 80.217.819,00	\$ 629.352.044,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 1.035.472.163,00	\$ 3.115.292.618,00		
6	FEBRERO DE 2023	\$ 71.043.030,00	\$ 13.498.175,70	\$ 84.541.205,70	\$ 14.208.606,00	\$ 70.332.599,70	\$ 615.143.438,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 965.139.563,30	\$ 3.044.960.018,30		
7	MARZO DE 2023	\$ 101.250.300,00	\$ 19.237.557,00	\$ 120.487.857,00	\$ 20.250.060,00	\$ 100.237.797,00	\$ 594.893.378,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 864.901.766,30	\$ 2.944.722.221,30		
8	ABRIL DE 2023	\$ 99.118.540,00	\$ 18.832.522,60	\$ 117.951.062,60	\$ 19.823.708,00	\$ 98.127.354,60	\$ 575.069.670,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 766.774.411,70	\$ 2.846.584.866,70		
9	MAYO DE 2023	\$ 109.625.940,00	\$ 20.828.928,60	\$ 130.454.868,60	\$ 21.925.188,00	\$ 108.529.680,60	\$ 553.144.482,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 658.244.731,10	\$ 2.738.065.186,10		
10	JUNIO DE 2023	\$ 105.321.840,00	\$ 20.011.149,60	\$ 125.332.989,60	\$ 21.064.368,00	\$ 104.268.621,60	\$ 532.080.114,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 553.976.109,50	\$ 2.633.796.564,50		
11	JULIO DE 2023	\$ 106.990.040,00	\$ 20.328.107,60	\$ 127.318.147,60	\$ 21.399.039,00	\$ 105.920.139,60	\$ 510.682.106,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 448.055.969,90	\$ 2.527.876.424,90		
12	AGOSTO DE 2023	\$ 109.854.270,00	\$ 20.872.311,30	\$ 130.726.581,30	\$ 21.970.854,00	\$ 108.755.727,30	\$ 488.711.252,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 339.302.242,60	\$ 2.419.120.687,60		
13	SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 98.822.330,00	\$ 18.776.242,70	\$ 117.598.572,70	\$ 19.764.495,00	\$ 97.834.108,70	\$ 469.946.786,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 241.466.125,90	\$ 2.321.286.590,90		
14	OCTUBRE DE 2023	\$ 95.545.930,00	\$ 18.343.726,70	\$ 114.889.656,70	\$ 19.309.186,00	\$ 95.580.470,70	\$ 449.637.600,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 145.885.665,20	\$ 2.225.706.120,20		
15	NOVIEMBRE DE 2023	\$ 88.935.800,00	\$ 16.897.802,00	\$ 105.833.602,00	\$ 17.787.160,00	\$ 88.046.442,00	\$ 431.850.440,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 57.839.223,20	\$ 2.137.659.678,20		
16	DICIEMBRE DE 2023	\$ 57.820.000,00	\$ 10.985.800,00	\$ 68.805.800,00	\$ 11.564.000,00	\$ 57.241.800,00	\$ 420.286.440,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 597.423,20	\$ 2.080.417.878,20		
TOTALES		\$ 1.126.356.120,00	\$ 214.007.662,80	\$ 1.340.363.782,80	\$ 225.271.224,00	\$ 1.115.092.558,80	\$ 420.286.440,00		\$ 597.423,20	\$ 2.080.417.878,20		
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
									\$ 2.079.687.398,00			
17	ENERO DE 2024	\$ 127.592.040,00	\$ 24.242.487,60	\$ 151.834.527,60	\$ 25.518.408,00	\$ 126.316.119,60	\$ 394.768.032,00	183824 DE 12/03/2024	\$ 1.953.968.701,60	\$ 1.954.101.758,60		
18	FEBRERO DE 2024	\$ 132.981.000,00	\$ 25.266.390,00	\$ 158.247.390,00	\$ 26.596.200,00	\$ 131.651.190,00	\$ 368.171.832,00	183824 DE 12/03/2024	\$ 1.822.317.512	\$ 1.822.450.568,60		
19	MARZO DE 2024	\$ 136.273.200,00	\$ 25.891.908,00	\$ 162.165.108,00	\$ 26.596.200,00	\$ 135.568.908,00	\$ 341.575.632,00	183824 DE 12/03/2024	\$ 1.686.748.604	\$ 1.686.881.660,60		
20	ABRIL DE 2024	\$ 131.719.200,00	\$ 25.026.648,00	\$ 156.745.848,00	\$ 26.343.840,00	\$ 130.402.008,00	\$ 315.231.792,00	183824 DE 12/03/2024	\$ 1.556.346.596	\$ 1.556.479.652,60		
21	MAYO DE 2024	\$ 132.852.000,00	\$ 25.241.880,00	\$ 158.093.880,00	\$ 26.570.400,00	\$ 131.523.480,00	\$ 288.661.392,00	183824 DE 12/03/2024	\$ 1.424.823.116	\$ 1.424.956.172,60		
22	JUNIO DE 2024	\$ 138.516.000,00	\$ 26.318.040,00	\$ 164.834.040,00	\$ 27.703.200,00	\$ 137.130.840,00	\$ 260.958.192,00	183824 DE 12/03/2024	\$ 1.287.692.276	\$ 1.287.825.332,60		
23	JULIO DE 2024	\$ 138.515.000,00	\$ 26.318.040,00	\$ 164.834.040,00	\$ 52.191.638,40	\$ 112.642.401,60	\$ 208.756.593,60	183824 DE 12/03/2024	\$ 1.175.048.874	\$ 1.175.182.931,00		
24	AGOSTO DE 2024	\$ 146.809.200,00	\$ 27.746.696,00	\$ 174.555.896,00	\$ 42.498.696,00	\$ 132.057.200,00	\$ 192.297.897,56	183824 DE 12/03/2024	\$ 1.043.786.672	\$ 1.043.899.729,04		
25	SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 139.987.200,00	\$ 26.597.568,00	\$ 166.584.768,00	\$ 45.493.584,44	\$ 119.091.173,56	\$ 117.774.273,12	183824 DE 12/03/2024	\$ 925.675.496	\$ 925.808.555,48		
26	OCTUBRE DE 2024	\$ 143.810.400,00	\$ 27.323.976,00	\$ 171.134.376,00	\$ 51.050.853,53	\$ 120.083.522,47	\$ 66.723.421,59	183824 DE 12/03/2024	\$ 805.591.974	\$ 805.725.031,01		
27	NOVIEMBRE DE 2024	\$ 139.987.200,00	\$ 26.597.568,00	\$ 166.584.768,00	\$ 66.723.421,59	\$ 99.861.346,41	\$ -	183824 DE 12/03/2024	\$ 705.730.628	\$ 705.863.684,60		
28	DICIEMBRE DE 2024	\$ 141.633.600,00	\$ 26.910.384,00	\$ 168.543.984,00	\$ -	\$ 168.543.984,00	\$ -	183824 DE 12/03/2024	\$ 537.186.644	\$ 537.319.701		
TOTALES		\$ 1.649.903.040,00	\$ 313.481.577,60	\$ 1.963.384.617,60	\$ 420.286.440,00	\$ 1.543.098.177,60	\$ -		\$ 537.319.701			
Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.												
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO VIGENCIA 2024												
		VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL						
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (A) + (B) + (C)		\$ 1.649.903.040,00		\$ 313.481.577,60		\$ 1.963.384.617,60						
PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D)		\$ -		\$ -		\$ -						
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (C) + (D) + E		\$ 1.649.903.040,00		\$ 313.481.577,60		\$ 1.963.384.617,60						
IVA = 19% * (B) = (F)				\$ 313.481.577,60		\$ 313.481.577,60						
VALOR TOTAL		\$ 1.649.903.040,00		\$ 313.481.577,60		\$ 1.963.384.617,60						
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.												
NOTAS:												
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.												
2. Este formato se diligencia por año.												
Firma:												
Nombre: Fabian Ernesto Arango Pineda Supervisor del Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: 132002097750												
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Código: Interventoría y Dirección Territorial.												



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA										CÓDIGO	MEP-MIN-15-FR-9
											VERSIÓN	1
											PÁGINA	
											FECHA	4/01/2025 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES											DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 973 DE 2022											INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	
MES INFORME MENSUAL: 29											PROYECTO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - LOTE 4.	
CONTRATO DE OBRA No: 687 de 2022, 558 de 2023 y LP 006 2022											CONTRATISTA: CONSORCIO SAN RAFAEL, CONSORCIO MESAVALDES MAGANGUE Y CONSORCIO VAL LOS NEPEROS S.A.	
RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA												
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación	Proyecto	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior				
2022	887122	2402-0800-0012	11	Nación	contrato principal		\$ 296.093.333	\$ 133.057				
2023	144623	2402-0800-0012	11	Nación	contrato principal		\$ 1.520.000.000	\$ 597.423				
2024	183824	2402-0800-0012	11	Nación	contrato principal		\$ 2.079.687.398					
TOTAL							\$ 3.895.780.731	\$ 3.895.780.731				
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 3.895.780.731												
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA												
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							\$ 250.443.046,00		\$ 296.093.333	\$ 3.895.780.731		
1	SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 7.102.000,00	\$ 1.349.380,00	\$ 8.451.380,00	\$ 1.420.400,00	\$ 7.030.980,00	\$ 249.022.646,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 38.619.307,00	\$ 3.638.306.705,00		
2	OCTUBRE DE 2022	\$ 4.602.000,00	\$ 874.380,00	\$ 5.476.380,00	\$ 920.400,00	\$ 4.555.980,00	\$ 248.102.246,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 34.063.327,00	\$ 3.633.750.725,00		
3	NOVIEMBRE DE 2022	\$ 13.298.000,00	\$ 2.526.620,00	\$ 15.824.620,00	\$ 2.659.600,00	\$ 13.165.020,00	\$ 245.442.646,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 20.898.307,00	\$ 3.620.585.705,00		
4	DICIEMBRE DE 2022	\$ 20.975.000,00	\$ 3.985.250,00	\$ 24.960.250,00	\$ 4.195.000,00	\$ 20.765.250,00	\$ 241.247.646,00	887122 DE 06/08/2022	\$ 133.057,00	\$ 3.599.820.455,00		
TOTALES \$ 45.977.000,00 \$ 8.735.630,00 \$ 54.712.630,00 \$ 9.195.400,00 \$ 45.517.230,00 \$ 241.247.646,00 \$ 133.057,00 \$ 3.599.820.455,00												
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							\$ 404.310.018,00		\$ 1.520.000.000,00	\$ 3.599.820.455		
							\$ 645.557.664,00		\$ 1.115.689.982,00			\$ 654.753.064,00
5	ENERO DE 2023	\$ 81.028.100,00	\$ 15.395.339,00	\$ 96.423.439,00	\$ 16.205.620,00	\$ 80.217.819,00	\$ 629.352.044,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 1.035.472.163,00	\$ 3.115.292.618,00		
6	FEBRERO DE 2023	\$ 71.043.030,00	\$ 13.498.175,70	\$ 84.541.205,70	\$ 14.208.605,00	\$ 70.332.599,70	\$ 615.143.438,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 965.139.563,30	\$ 3.044.950.015,30		
7	MARZO DE 2023	\$ 101.250.300,00	\$ 19.237.557,00	\$ 120.487.857,00	\$ 20.250.060,00	\$ 100.237.797,00	\$ 594.893.378,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 854.901.766,30	\$ 2.944.722.221,30		
8	ABRIL DE 2023	\$ 99.118.540,00	\$ 18.832.522,60	\$ 117.951.062,60	\$ 19.823.708,00	\$ 98.127.354,60	\$ 575.069.670,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 766.774.411,70	\$ 2.845.594.866,70		
9	MAYO DE 2023	\$ 109.625.940,00	\$ 20.828.928,60	\$ 130.454.868,60	\$ 21.925.188,00	\$ 108.529.680,60	\$ 553.144.482,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 658.244.731,10	\$ 2.738.055.186,10		
10	JUNIO DE 2023	\$ 105.321.840,00	\$ 20.111.149,60	\$ 125.332.989,60	\$ 21.064.368,00	\$ 104.268.621,60	\$ 532.080.114,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 553.796.109,50	\$ 2.633.796.564,50		
11	JULIO DE 2023	\$ 106.990.040,00	\$ 20.328.107,60	\$ 127.318.147,60	\$ 21.398.008,00	\$ 105.920.139,60	\$ 510.682.105,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 448.055.959,90	\$ 2.527.876.424,90		
12	AGOSTO DE 2023	\$ 109.854.270,00	\$ 20.872.311,30	\$ 130.726.581,30	\$ 21.670.854,00	\$ 109.055.727,30	\$ 488.711.252,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 339.893.242,80	\$ 2.410.120.697,80		
13	SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 98.822.330,00	\$ 18.778.242,70	\$ 117.598.572,70	\$ 19.754.458,00	\$ 97.834.109,70	\$ 469.948.786,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 241.466.135,80	\$ 2.371.298.590,80		
14	OCTUBRE DE 2023	\$ 96.545.920,00	\$ 18.343.726,70	\$ 114.889.646,70	\$ 19.309.198,00	\$ 95.580.470,70	\$ 449.637.600,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 145.885.665,20	\$ 2.225.706.120,20		
15	NOVIEMBRE DE 2023	\$ 88.935.800,00	\$ 16.887.802,00	\$ 105.823.602,00	\$ 17.787.160,00	\$ 88.046.442,00	\$ 431.850.440,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 57.839.223,20	\$ 2.137.659.678,20		
16	DICIEMBRE DE 2023	\$ 57.820.000,00	\$ 10.985.800,00	\$ 68.805.800,00	\$ 11.564.000,00	\$ 57.241.800,00	\$ 420.286.440,00	144623 DE 14/02/2023	\$ 597.423,20	\$ 2.080.417.878,20		
TOTALES \$ 1.126.356.120,00 \$ 214.007.662,80 \$ 1.340.363.782,80 \$ 225.271.224,00 \$ 1.115.092.558,80 \$ 420.286.440,00 \$ 597.423,20 \$ 2.080.417.878,20												
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
									\$ 2.079.687.398,00			
17	ENERO DE 2024	\$ 127.592.040,00	\$ 24.242.487,60	\$ 151.834.527,60	\$ 25.518.408,00	\$ 126.316.119,60	\$ 394.768.032,00	183824 DE 12/03/2024	\$ 1.953.968.701,60	\$ 1.954.101.758,60		
18	FEBRERO DE 2024	\$ 132.981.000,00	\$ 25.268.390,00	\$ 158.247.390,00	\$ 26.596.200,00	\$ 131.651.190,00	\$ 368.171.832,00	183824 DE 12/03/2024	\$ 1.822.317.512	\$ 1.822.450.568,60		
19	MARZO DE 2024	\$ 136.273.200,00	\$ 25.891.908,00	\$ 162.165.108,00	\$ 26.596.200,00	\$ 135.568.908,00	\$ 341.575.632,00	183824 DE 12/03/2024	\$ 1.686.748.604	\$ 1.686.881.660,60		
20	ABRIL DE 2024	\$ 131.719.200,00	\$ 25.026.648,00	\$ 156.745.848,00	\$ 26.343.840,00	\$ 130.402.008,00	\$ 315.231.792,00	183824 DE 12/03/2024	\$ 1.556.346.596	\$ 1.556.479.652,60		
21	MAYO DE 2024	\$ 132.852.000,00	\$ 25.241.880,00	\$ 158.093.880,00	\$ 26.570.400,00	\$ 131.523.480,00	\$ 288.661.392,00	183824 DE 12/03/2024	\$ 1.424.823.116	\$ 1.424.956.172,60		
22	JUNIO DE 2024	\$ 138.516.000,00	\$ 26.318.040,00	\$ 164.834.040,00	\$ 27.703.200,00	\$ 137.130.840,00	\$ 260.958.192,00	183824 DE 12/03/2024	\$ 1.287.692.276	\$ 1.287.825.332,60		
23	JULIO DE 2024	\$ 138.516.000,00	\$ 26.318.040,00	\$ 164.834.040,00	\$ 52.191.638,40	\$ 112.642.401,60	\$ 208.766.553,60	183824 DE 12/03/2024	\$ 1.175.049.874	\$ 1.175.182.931,00		
24	AGOSTO DE 2024	\$ 146.035.200,00	\$ 27.746.688,00	\$ 173.781.888,00	\$ 42.498.686,04	\$ 131.283.201,96	\$ 166.267.867,56	183824 DE 12/03/2024	\$ 1.043.766.672	\$ 1.043.899.729,04		
25	SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 139.987.200,00	\$ 26.597.568,00	\$ 166.584.768,00	\$ 48.493.584,44	\$ 118.091.173,56	\$ 117.774.273,12	183824 DE 12/03/2024	\$ 925.675.498	\$ 925.808.555,48		
26	OCTUBRE DE 2024	\$ 143.810.400,00	\$ 27.323.976,00	\$ 171.134.376,00	\$ 51.050.851,53	\$ 120.083.524,47	\$ 66.723.421,59	183824 DE 12/03/2024	\$ 805.591.974	\$ 805.725.031,01		
27	NOVIEMBRE DE 2024	\$ 139.987.200,00	\$ 26.597.568,00	\$ 166.584.768,00	\$ 66.723.421,59	\$ 99.861.346,41		183824 DE 12/03/2024	\$ 705.780.628	\$ 705.863.684,60		
28	DICIEMBRE DE 2024	\$ 141.633.600,00	\$ 26.910.384,00	\$ 168.543.984,00		\$ 168.543.984,00		183824 DE 12/03/2024	\$ 537.186.644	\$ 537.319.701		
TOTALES \$ 1.649.903.040,00 \$ 313.481.577,60 \$ 1.963.384.617,60 \$ 420.286.440,00 \$ 1.543.098.177,60 \$ - \$ 537.319.701												
Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estas o no facturadas.												
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO VIGENCIA 2024												
VALOR BÁSICO IVA TOTAL												
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (A) + (B) + (C)												
PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRETE ADICIONAL = (D)												
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (C) + (D) = E												
IVA = 19% * (E) = (F)												
VALOR TOTAL												
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.												
NOTAS:												
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.												
2. Este formato se diligencia por año.												
Firma: [Firma]												
Nombre: [Nombre]												
Cargo: [Cargo]												
Firma: [Firma]												
Nombre: [Nombre]												
Cargo: [Cargo]												
Matrícula Profesional No.: 132021300748LV												
Matrícula Profesional No.: 13202097750												
Original informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.												
Código: Interventoría y Dirección Territorial.												



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

6.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13																																																				
		VERSIÓN	1																																																				
		PÁGINA																																																					
		FECHA	31/01/2025 (Día / Mes / Año)																																																				
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR																																																							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 973-2022 INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S																																																							
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - LOTE 4.																																																							
FECHA DE INICIO: 1/09/2022 PLAZO INICIAL: 31 DE JULIO 2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28 DE JUNIO DE 2025 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 3.895.780.731 VALOR ACUMULADO: \$ 3.895.780.731 (Incluye adiciones)																																																							
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING FABIAN ARANGO PINEDA																																																							
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																							
<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>389,578,074.00</td><td>11</td><td>5</td><td>2022</td><td>31</td><td>1</td><td>2025</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>20%</td><td>779,156,147.00</td><td>11</td><td>5</td><td>2022</td><td>31</td><td>1</td><td>2025</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>20%</td><td>779,156,147.00</td><td>11</td><td>5</td><td>2022</td><td>31</td><td>7</td><td>2027</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td>30%</td><td>1,168,734,220.00</td><td>11</td><td>5</td><td>2022</td><td>11</td><td>5</td><td>2027</td></tr></tbody></table>					Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	389,578,074.00	11	5	2022	31	1	2025	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	779,156,147.00	11	5	2022	31	1	2025	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	779,156,147.00	11	5	2022	31	7	2027	Calidad del servicio	30%	1,168,734,220.00	11	5	2022	11	5	2027
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																				
			Desde			Hasta																																																	
Cumplimiento	10%	389,578,074.00	11	5	2022	31	1	2025																																															
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	779,156,147.00	11	5	2022	31	1	2025																																															
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	779,156,147.00	11	5	2022	31	7	2027																																															
Calidad del servicio	30%	1,168,734,220.00	11	5	2022	11	5	2027																																															
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 15-44-101262225 Certificado de modificación o anexo No.: 0 Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 25/05/2022																																																							



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	389,578,074.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	779,156,147.00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	779,156,147.00
Calidad del servicio	30%	1,168,734,220.00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
11	5	2022	1	7	2025
11	5	2022	1	7	2025
11	5	2022	31	12	2027
11	5	2022	11	5	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 15-44-101262225

Certificado de modificación o anexo No.: 8
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma 
Nombre: LUMINADA CASTELAR ARRIETA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202130074BLV

Firma 
Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202097750

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	389,578,074.00
Buen manejo y correcta inversión del	20%	779,156,147.00
Pago de Salarios, prestaciones sociales	20%	779,156,147.00
Calidad del servicio	30%	1,168,734,220.00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
11	5	2022	28	12	2025
11	5	2022	27	12	2025
11	5	2022	28	6	2028
11	5	2022	11	5	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 15-44-101262225

Certificado de modificación o anexo No.: 9
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: _____

OBSERVACIONES:

NOTAS:

- El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
- El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: LUMINADA CASTELLAR ARRIETA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202130074BLV

Firma
Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202097750

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
				VERSIÓN	1
				PÁGINA	1
				FECHA	31/01/2025 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA:		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 973 DE 2022 (Indicar número y año)					
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS CUMINCIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - LOTE 4.					
INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S					
FECHA DE INICIO:		29 DE NOVIEMBRE DE 2022 (Indicar día, mes y año)		PLAZO INICIAL:	6 MESES
				FECHA DE VENCIMIENTO:	27 DE MAYO DE 2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)
CONTRATO DE OBRA No.: L.P. 006 DE 2022 (Indicar número y año)					
CONTRATISTA: CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK					
1. PLAN DE CALIDAD					
PRESENTADO:		SI ☒ NO ☐		APROBADO:	SI ☒ NO ☐
				VERSIÓN No.	0
				FECHA DE VERSIÓN:	1/06/2022
OBSERVACIONES:					
2. AUDITORIAS DE CALIDAD					
PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO:		SI ☐ NO ☒		No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS:	
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA:		SI ☐ NO ☒		No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS:	
				FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:	
				FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:	
OBSERVACIONES:					
3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)					
PRESENTADO:		SI ☐ NO ☒		APROBADO:	SI ☐ NO ☒
				FECHA DE APROBACIÓN:	
No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES:				No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES:	
CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES:		SI ☐ NO ☐			
OBSERVACIONES:					
El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra. La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.					
4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES					
No. de No Conformidades reportadas en el mes:				No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:	
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:				No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:	
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:					
OBSERVACIONES:					
5. QUEJAS Y RECLAMOS					
No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:		0		No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:	0
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:		0		No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:	0
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:				No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:	
OBSERVACIONES:					
Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.					



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma: 
Nombre: Illuminada Castellar Arieta
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202130074BLV

Firma: 
Nombre: Alfonso Luis Alvear May
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.13202-090186

Firma: 
Nombre: Fabian Ernesto Arango Pinilla
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:13202097750

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA		CÓDIGO	MINFRA-MINL-PN-15-FR-15
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	1
			FECHA	31/01/2025 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 973 DE 2022 (Indicar número y año)				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - LOTE 4.				
INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS				
FECHA DE INICIO: 24 DE OCTUBRE DE 2022 (Indicar día, mes y año)		PLAZO INICIAL: 18 MESES		FECHA DE VENCIMIENTO: 24 DE FEBRERO DE 2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)
CONTRATO DE OBRA No: 557 DE 2022 (Indicar número y año)				
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN RAFAEL				
1. PLAN DE CALIDAD				
PRESENTADO: SI ☒ NO ☐ APROBADO: SI ☒ NO ☐ VERSIÓN No. 0 FECHA DE VERSIÓN: 1/06/2022				
OBSERVACIONES:				
2. AUDITORIAS DE CALIDAD				
PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ☐ NO ☒ No. DE AUDITORIAS PROGRAMADAS: FECHA ÚLTIMA AUDITORIA:				
PRESENTO INFORME DE AUDITORIA: SI ☐ NO ☒ No. DE AUDITORIAS REALIZADAS: FECHA PRÓXIMA AUDITORIA:				
OBSERVACIONES:				
3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)				
PRESENTADO: SI ☐ NO ☒ APROBADO: SI ☐ NO ☒ FECHA DE APROBACIÓN:				
No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES:				
CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ☐ NO ☒				
OBSERVACIONES:				
El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra. La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.				
4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES				
No. de No Conformidades reportadas en el mes: 1		No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 1		
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 1		No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:		
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:				
OBSERVACIONES:				
La comunidad de la Pascuala manifiesta inconformidades, puesto que la cobertura del proyecto no contempla la llegada hasta el corregimiento				
5. QUEJAS Y RECLAMOS				
No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:		No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:		
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:		No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:		
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:		No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:		



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



OBSERVACIONES:							
Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.							
6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)							
Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)					
IG1: Índice de gestión 1 =							
IG2: Índice de gestión 2 =							
IG3: Índice de gestión 3 =							
IG4: Índice de gestión 4 =							
IG5: Índice de gestión 5 =							
IGn: Índice de gestión n =							
Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.							
OBSERVACIONES:							
7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).							
No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
OBSERVACIONES:							
NOTA: Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.							
Firma		Firma			Firma		
Nombre: Illuminada Castellar Arrieta Director de la Interventoría Matrícula Profesional No. 13202130074BLV		Nombre: Alfonso Luis Alvear May Profesional en Calidad Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No. 13202-090186			Nombre: Fabian Ernesto Arango Pineda Supervisor del Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No. 13202097750		
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.							



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

6.6. Otros documentos seguimiento mensual

6.6.1. Seguimiento a la inversión del Anticipo

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MEPI-MNT-IN-3-FR-1			
		VERSIÓN	1 DE 1			
		PÁGINA	1			
FECHA		16/11/2022 (Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES					
DIRECCIÓN TERRITORIAL:		BOLÍVAR				
DATOS GENERALES						
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. <u>1</u> (Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan inicial el número 1)						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. <u>973 DE 2022</u> (Indicar número y año)		INTERVENTOR: <u>GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S</u>				
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - LOTE 4.						
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: <u>CARMEN CECILIA PÉREZ LÓPEZ</u>						
JUSTIFICACIÓN: (Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)						
DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO						
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	PERSONAL PROFESIONAL	\$ 10.000.000,00	\$ 27.140.000,00	\$ 33.223.046,00	\$ 70.363.046,00	28%
2	MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS	\$ 31.580.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ 141.580.000,00	57%
3	VIATICOS	\$ 1.500.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 7.500.000,00	3%
3	COSTOS DE ALQUILER Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 5.500.000,00	\$ 7.000.000,00	\$ 10.500.000,00	\$ 23.000.000,00	9%
4	OTROS COSTOS	\$ 2.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 8.000.000,00	3%
TOTAL		\$ 50.580.000,00	\$ 90.140.000,00	\$ 109.723.046,00	\$ 250.443.046,00	100%
NOTAS: 1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Interventor. 2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio honorarios y nómina. No aplica para compra ni alquiler de vehículos. 3. Solo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría específico. 4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.						
Firma:		Firma:				
Nombre: LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR Representante Legal o su Apoderado Interventor Matrícula Profesional No.: N.A.		Nombre: CARMEN CECILIA PÉREZ LÓPEZ Supervisor del contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: 13202188727 BLV				
Original: Archivo de Gestión del INVIAS Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial						



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO REGIONAL DE ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ELABORACION DE LA PROYECTO DE INTERVENTORIAS PLAN DE VERIFICACION DEL ANTIPOCORTADO DE INTERVENTORIA		000000	INTERVENIENTE			
		VERSION	1			
		PAGINA	1			
FECHA		24/04/2023 (Día/Mes/Año)				
UNIDAD EJECUTORA: <u>SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES</u>		DIRECCION TERRITORIAL: <u>BOLMAR</u>				
DATOS GENERALES						
PLAN DE INVERSION DEL ANTIPOCORTADO No. <u>2</u> (Indicar en forma consecutiva el número de la subdirección y el plan inicial el número 1)						
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. <u>973 DE 2022</u> (Indicar número y año)		INTERVENTOR: <u>GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S</u>				
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENIENTE TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLMAR - LOTE 4.						
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: <u>CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ</u>						
JUSTIFICACION: Salvo de anticipo, de acuerdo a la cláusula décima primera ("...EL INSTITUTO podrá otorgar el anticipo de hasta el veinte por ciento (20%) del costo de la intervención 973 de 2022. Inicialmente se habilita el veinte (20%) de la suma acordada a la ejecución del contrato de 2022. (Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)						
DETALLE DEL PLAN DE INVERSION DEL ANTIPOCORTADO						
ITEM No.	DESCRIPCION DEL ITEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VALOR PROGRAMADO (A)	%
1	PERSONAL PROFESIONAL	\$ 85.000.000,00	\$ 90.000.000,00	\$ 103.310.018,00	\$ 278.310.018,00	69%
2	MONTOS AGOTABLES ESPECIALISTAS	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 28.000.000,00	\$ 34.000.000,00	8%
3	VIATOS	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 9.000.000,00	2%
3	COSTOS DE ALUGILERO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 25.000.000,00	\$ 25.000.000,00	\$ 25.000.000,00	\$ 75.000.000,00	19%
4	OTROS COSTOS	\$ 2.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 8.000.000,00	2%
TOTAL		\$ 118.000.000,00	\$ 124.000.000,00	\$ 162.310.018,00	\$ 404.310.018,00	100%
NOTAS: 1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora a la vez que se elabora el presupuesto por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% de la suma otorgada como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el presupuesto al Intermediario. 2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, asistencia para el estudio, dotación de oficina, alimentación, libros y suministros, en el caso de laboratorio, honorarios y viáticos. No se permite la compra de materiales. 3. Solo se permite hasta el quince por ciento (15%) de la suma del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el Intermediario solicite y justifique la mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de la intervención debe analizar la solicitud y pasarla al concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, según lo establece el artículo 10 del contrato de la intervención específica. 4. El Intermediario debe programar a más tardar la inversión del anticipo otorgado en el plazo acordado con el Supervisor de la Intervención para su inversión.						
Firma:		Firma:				
Nombre: <u>LUZ ARRIBA FAJARDO CORREDO</u>		Nombre: <u>CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ</u>				
Representante Legal o su Apoderado		Supervisor del contrato de Interventoría				
Matrícula Profesional No.: <u>N/A</u>		Matrícula Profesional No.: <u>133321557-27 BLV</u>				
Original/Recibo de Cesión del INVIAS: Código/Unidad Ejecutora, No. documento de cesión/Entidad						

6.6.2. Plan de carga o reprogramación al Plan de Cargas.

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIÓN EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS																		MEF/MINI-IN-9-FR-2	
																				1	
																				09/12/2024	
																				(Ene / May / Nov)	
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES									DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR										
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:		973 de 2022																			
OBJETO:		INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR- LOTE 4																			
INTERVENIOR:		GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS																			
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORIA:		FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA																			
RESOLUCIÓN No.:		2856 DE 2022/2023																			
CONTRATO DE OBRA No.:		157 de 2022, 558 de 2022 y LP 006 de 2022									CONTRATISTA: CONSORCIO SAN RAFAEL, CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUE Y CONSORCIO VALLOS NEPEROS JK										



* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal correspondiera a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción.

Se realiza modificación por la necesidad de un acta modificatoria para balancear recursos y actualización de precios

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Ocas o Programa de Inversión con base en estos documentos presentados en su esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, fuentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permita identificar la proyección de la distribución del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación del Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, fuentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las deducciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las acciones de mantenimiento para cada período, e identifica y distribuye el personal y otros costos para los siguientes períodos; optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La actualización del personal y otros costos requeridos se encuentra a cargo del personal que presta aprobación del Superior del contrato.
4. En los eventos de suspensión de plazo contractual, el período más de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada período del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Cuentas rendida.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas


Firma

Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: N/A.

Firma: _____
Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202-097750 BLV
(Suscribe según su competencia)

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.
Contrato de Interventoría No. 973 de 2022

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 29
Del 01 de enero de 2025 al 31 de enero de 2025
Versión 1

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Para el presente periodo, comprendido **del 01 al 31 de enero de 2025**, la Interventoría, Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S a cargo de los contratos de obra No, L.P.006 de 2022, No.557 de 2022 y No. 558 de 2022, ha realizado actividades para dar cumplimiento de objetivos y la correcta ejecución de cada contrato.

En concordancia con lo anterior, para el contrato 557, se ha hecho adiciones y modificaciones a los contratos debido a la aparición de ítems no previstos durante la ejecución de las actividades. Este ajuste presupuestario se realizó con el fin de darle continuidad a los proyectos sin comprometer su calidad ni su cronograma. Estas adiciones se gestionarán de manera eficiente y transparente, con una comunicación clara entre las partes interesadas y una supervisión rigurosa por parte de la interventoría. En cuanto al contrato 558, se dio la terminación de labores de obra el 30 de julio de 2024, contrato se encuentra pendiente de liquidación.

En lo que refiere al contrato de obra No.L.P.006 de 2022, luego de la **suspensión N°3** del contrato con fecha del 8 de octubre de 2024, se dio fecha de reinicio el 05 de diciembre de 2024 y se ha solicitado por parte del contratista 7^{ma} prórroga con ampliación de cinco (5) meses, para una fecha de terminación del contrato de 27 de mayo de 2025.

Durante el periodo, la interventoría ha realizado inspección periódica de la calidad de las actividades ejecutadas por el contratista, inspecciones SST, control topográfico, implementado medidas de control, emitido recomendaciones y observaciones mediante la realización periódica de comité de obra, en los cuales se han discutido temas de avances e inconvenientes presentados en obra; es decir la comunicación entre contratista e interventoría ha sido efectiva, lo que ha contribuido al logro de los resultados esperados.

Finalmente, tras la realización del presente Informe se manifiesta que, se ha dado cumplimiento oportuno a las obligaciones adquiridas en el Contrato de Interventoría No. 973 de 2022, se ha observado un aumento en los rendimientos de obra durante el período evaluado y se recomienda a los Contratistas asistir a los comités convocados semanalmente y atender oportunamente los comunicados enviados y dar respuesta a cada uno de ellos, para dar cumplimiento a las fechas establecidas en la programación y por consiguiente la fecha de finalización estipulada en los contratos de obra.

8. ANEXOS

8.1. Relación de correspondencia generada entre el contratista e interventor

CONTRATO L.P.006 DE 2022

CORRESPONDENCIA GENERADA CONTATISTA E INTERVENTOR - CONTRATO DE OBRA L.P.006 DE 2022				
No.	CONSECUTIVO	FECHA DE REMISIÓN	ASUNTO	ESTADO
1	GIC-INVIAS-BOL-636-22	14-ene-25	SOLICITUD DE DOCUMENTACION DE OBRA CTO LP.006-2022	ENVIADO
2	GIC-INVIAS-BOL-643-22	24-ene-25	ALCANCE A COMUNICADO GIC-INVIAS-BOL-636-22, SOLICITUD DE DOCUMENTACION CTO DE OBRA L.P.006	ENVIADO
3	GIC-INVIAS-BOL-645-22	24-ene-25	LLAMADO DE ATENCIÓN-SUSPENSIÓN INJUSTIFICADA DE ACTIVIDADES DE OBRA	ENVIADO
4	GIC-INVIAS-BOL-646-22	24-ene-25	RESPUESTA A SOLICITUD DE SUSPENSIÓN TEMPORAL N°2 AL CONTRATO DE OBRA L.P.006 DE 2022.	ENVIADO

Tabla 20. Correspondencia generada entre contratista e interventor contrato L.P.006 de 2022.

CONTRATO 557 DE 2022

CORRESPONDENCIA GENERADA CONTATISTA E INTERVENTOR - CONTRATO DE OBRA 557 DE 2022				
No.	CONSECUTIVO	FECHA DE REMISIÓN	ASUNTO	ESTADO
1	GIC-INVIAS-BOL-625-22	5-dic-24	RESPUESTA A COMUNICADO CSR-557-070 - SOLICITUD DE PRÓRROGA	ENVIADO

Tabla 21. Correspondencia generada entre contratista e interventor contrato 557 de 2022

CONTRATO 558 DE 2022

CORRESPONDENCIA GENERADA CONTRATISTA E INTERVENTOR - CONTRATO DE OBRA 558 DE 2022				
No.	CONSECUTIVO	FECHA DE REMISIÓN	ASUNTO	ESTADO
Contrato finalizado el 30 de Julio de 2024				

Tabla 22. Correspondencia generada entre contratista e interventor contrato 558 de 2022.

8.2. Registro fotográfico del avance de las obras

Contrato No. L.P.006 de 2022




Contrato No. 557 de 2022



Contrato No. 558 de 2022

Contrato de obra se reporta finalizado el 30 de Julio de 2024

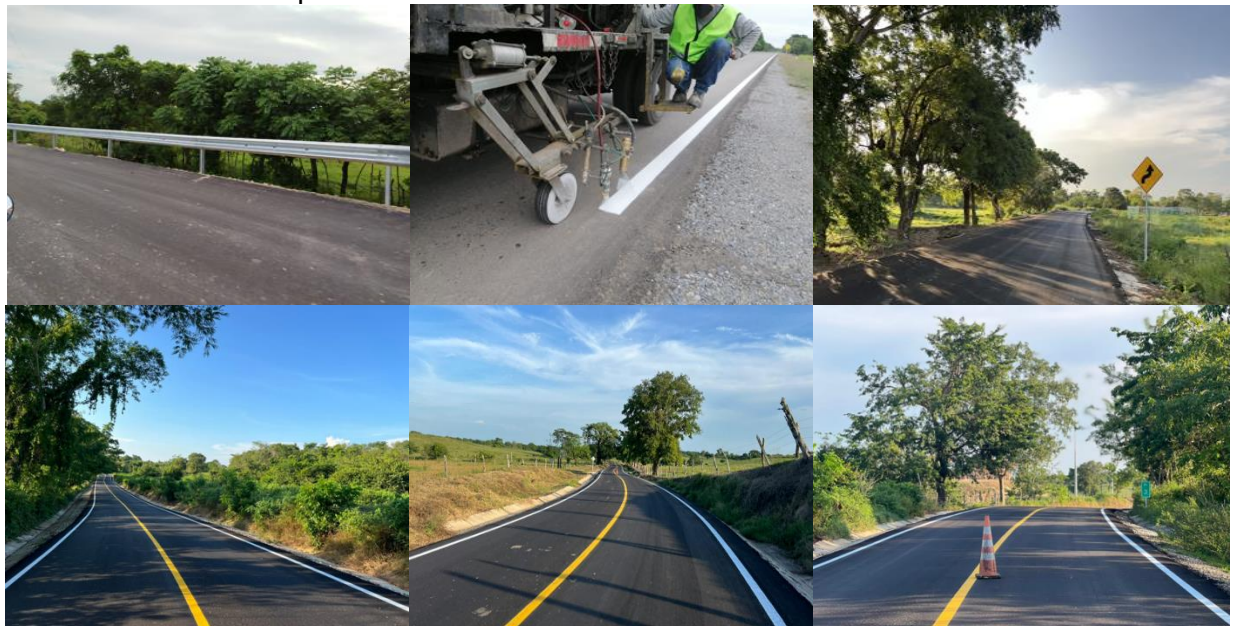

8.3. Registro fotográfico de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas.





8.4. Copia de la Bitacora del mes correspondiente

Continuación lunes 30 de diciembre de 2024 123

En ambos sentidos de la vía, Acopio de material de base granular clase "C" en el Campamento de la K 4+320

[Firma] Edgar Aragón
Residente de obra Residente de interventoría

Martes 31 de diciembre de 2024

Estado del tiempo: Seco y Soleado.

Personal de obra:

Director de obra, residente de obra, Director de interventoría, residente de interventoría, SISO de interventoría, auxiliar de ingeniería, dos topógrafos, dos cadeneros, 6 operadores de maquinaria pesada, dos conductores de camiones 4 conductores de Volquetes dobles traques, 5 conductores de Volquetes sencillos, 6 Ayudantes de oficios varios, Un laboratorista, Un ingeniero y Un operador de planta de asfalto.

Actividades realizadas:

Careo de base, Construcción de piedra pegada en ambos sentidos de la vía, Acopio de material de base granular clase "C" en el Campamento de la K 4+320

[Firma] Edgar Aragón
Residente de obra Residente de interventoría

Miércoles 01 de enero de 2025

Estado del tiempo: Seco y Soleado

No se realizan actividades por ser día festivo

Jueves 02 de enero de 2025

Estado del tiempo: Seco y Soleado

Personal de obra:

Director de obra, residente de obra, Director de interventoría, residente de interventoría, dos topógrafos, dos cadeneros, 6 operadores de maquinaria pesada, dos conductores de camiones 4 conductores de Volquetes sencillos



124 Continuation 02 de Enero de 2025

5 Conductores de Volquetes dobletraques, 6 oficios ayudantes de oficios varios, 11n, laboratorista, 11n operador y un ingeniero de planta de asfalto.

Actividades realizadas:

Corte de base, construcción de piedra pegada en ambos sentidos de la vía, Acopio de material de base granular clase "C" en el campamento de la K41320

Edgar Aragon

Residente de obra

Residente de interventoría

Vieles 03 de enero de 2025

Estado del tiempo: Se presenta lluvias fuertes durante la mañana.

Personal de obra:

Director de obra, residente de obra, Director de interventoría, residente de interventoría, Siso de interventoría, auxiliar de ingeniería, dos topogras, dos cadeneros, 6 operadores de maquinaria pesada, dos conductores de camiones, 7 conductores de volquetes dobletraques, 5 conductores de volquetes sencillos, 6 ayudantes de oficios varios, 11n laboratorista, 11n ingeniero y un operador de planta de asfalto.

Actividades realizadas:

No se realizan actividades por causa de los fuertes lluvias.

Edgar Aragon

Residente de obra

Residente de interventoría

Sabado 04 de enero de 2025

Estado del tiempo: Lluvias moderadas en la mañana.

Personal de obra:

Director de obra, residente de obra, Director de interventoría, auxiliar de ingeniería, residente de interventoría, Siso de interventoría,



Continuación Sábado 04 de enero de 2025¹²⁵

auxiliar de ingeniería, dos topógrafos, dos cadeneros, 6 operadores de maquinaria pesada, dos conductores de Camiones, 8 Conductores de Volquetes dobletrque, 7 Conductores de Volquetes sencillos, 6 Ayudantes de oficios varios, Un laboratorista, Un ingeniero y Un operador de planta de asfalto

Actividades realizadas:

Instalación y Compactación de mezcla densa en Caliente MDC-19 entre K10+500 a la K7+800, Acopio de Base granular Clase "C" en el Campamento de la K4+320

Edgar Aragón
Residente de obra. Residente de interventoría.

Domingo 05 de enero de 2025

Estado del tiempo: Seco y Soleado

Personal de obra:

Director de obra, residente de obra, Director de interventoría, residente de interventoría, Siso de interventoría, auxiliar de ingeniería, dos topógrafos, dos cadeneros, 6 operadores de maquinaria pesada, dos conductores de Camiones 7 Conductores de Volquetes dobletrque, 12 Conductores de Volquetes sencillos, 7 Ayudantes de oficios varios, Un laboratorista, Un ingeniero y Un operador de planta de asfalto.

Actividades realizadas:

Instalación y Compactación de mezcla densa en Caliente MDC-19 entre K10+500 a la K7+800 Acopio de Base granular Clase "C" en el Campamento de la K4+320

Edgar Aragón
Residente de obra. Residente de interventoría

Jueves 06 de enero de 2025

No se realizan actividades por ser día festivo.



126 Martes 07 de Enero de 2025

Estado del tiempo: Seco y Soleado

Personal de obra:

Director de obra, residente de obra, Director de interventoría, residente de interventoría, Siso de interventoría, auxiliar de ingeniería, dos topógrafos, dos cadeneros, 6 operadores de maquinaria pesada, dos conductores de camiones, 8 Conductores de Volquetes dobles traxes, 9 Conductores de Volquetes sencillos, 4 ayudantes de oficios varios, 11n laboratorista, 11n ingeniero y 11n operador de planta de asfalto

Actividades realizadas:

Instalación y Compactación de la mezcla densa en Caliente entre la K 10+500 a la K 7+600, Acopio de Base granular clase "C" en el Campamento de la K 4+320

Edgar Aragón

Residente de obra

Residente de interventoría

Miércoles 08 de Enero de 2025

Estado del tiempo: Seco y Soleado

Personal de obra:

Director de obra, residente de obra, Director de interventoría, residente de interventoría, Siso de interventoría, auxiliar de ingeniería, dos topógrafos, dos cadeneros, 6 operadores de maquinaria pesada, dos conductores de camiones, 8 conductores de Volquetes dobles traxes, 9 Conductores de Volquetes sencillos, 4 Ayudantes de oficios varios, 11n laboratorista, 11n ingeniero y 11n operador de planta de asfalto.

Actividades realizadas:

Instalación y Compactación de mezcla densa en Caliente MCD-19 entre la K 10+500 a la K 7+500, Acopio de Base granular clase "C" en el Campamento

Edgar Aragón

Residente de obra

Residente de interventoría



Sueves 09 de Enero de 2025

127

Estado del tiempo: Seco y Soleado.

Personal de obra:

Director de obra, residente de obra, Director de interventoría, residente de interventoría, Siso de interventoría, Auxiliar de ingeniería, dos topógrafos, dos albaneros, 6 operadores de maquinaria pesada, dos conductores de Camiones, 6 operadores de Volquetes dobletrque, 7 Conductores de Volquetes sencillos, 4 Ayudantes de oficios Varios, Un laboratorista, Un Ingeniero y Un operador de planta de asfalto.

Actividades realizadas:

Instalación y Compactación de la mezcla densa en Caliente MDC-19 entre de K10+500 a la K7+500, Se Continúa con el acopio de Base granular clase "C" en el Campamento

Residente de Obra.

Edgar Aragón
Residente de interventoría

Viernes 10 de Enero de 2025

Estado del tiempo: Seco y Soleado.

Personal de obra:

Director de obra, residente de obra, Director de interventoría, residente de interventoría, Siso de interventoría, Auxiliar de ingeniería, dos topógrafos, dos albaneros, 5 operadores de maquinaria pesada, dos conductores de Camiones, 7 operadores de Volquetes dobletrque, 7 Conductores de Volquetes sencillos, 4 ayudantes de oficios Varios, Un laboratorista, Un ingeniero y Un operador de planta de asfalto.

Actividades realizadas:

Construcción y limpieza de cunetas en el margen izquierdo de la vía, obra para protección de taludes en terraplén de la vía mediante excavación para desvío de cauce (Se estaba a la espera que cesara el invierno para la realización de la actividad).



128 Continuación Vías 10 de Enero de (2024) 2025

Cero y compactación de Base granular clase C, Acopio de material de base en el campamento del K4+320, levantamiento con RTK para el plano Record del Proyecto.

Residente de Obra
Edgar Aragón
Residente de interventoría

Sábado 11 de Enero de (2024) 2025

Estado del tiempo: Seco y Soleado

Personal de obra:

Director de obra, residente de obra, Director de interventoría, auxiliar de ingeniería, residente de interventoría, Siso de interventoría, dos topógrafos, dos cadeneros, 6 operadores de maquinaria pesada, dos conductores de Camiones, 7 conductores de Volquetes dobles troques, 5 conductores de Volquetes sencillos, 4 Ayudantes de oficios Varios, Un laboratorista, Un Ingeniero y un operador de planta de asfalto.

Actividades realizadas:

Construcción y limpieza de cunetas en el margen izquierdo de la vía, obra para protección de taludes en terraplen de la vía mediante excavación para desvío de cauce (Se estaba a la espera que cerra el invierno para la realización de la actividad), Cero y compactación de Base granular clase C, Acopio de material de Base en el Campamento del K4+320, levantamiento con RTK para el plano Record del Proyecto.

Residente de Obra
Edgar Aragón
Residente de interventoría

Domingo 12 de Enero de 2025

Estado del tiempo: Seco y Soleado

No se realizan actividades por ser día festivo.

Jueves 13 de Enero de 2025

Estado del tiempo: Seco y Soleado



Continuación Lunes 13 de Enero de 2025 129

Personal de obra:

Director de obra, residente de obra, Director de interventoría, residente de interventoría, Siso de interventoría, dos topógrafos, dos cadeneros, 6 Ayudantes de oficios Varios, 6 Operadores de maquinaria pesada, dos conductores de Camiones, 7 conductores de Volquetes dobleroques, 5 conductores de Volquetes sencillos, Un laboratorista, Un ingeniero y Un operador de planta de Asfalto.

Actividades realizadas:

Construcción y limpieza de Cunetas en el margen izquierdo de la vía, obra para protección de Taludes en el margen Terropón de la vía mediante arriación para desvío del cauce (Se estaba a la espera que cesara el invierno para la realización de la actividad), Cero y Compactación de Base granular clase "C", Acopio de material de Base en el Campamento del K4+320, levantamiento con RTK por el plano Record del proyecto

Edgar Aragón

Residente de obra.

Residente de interventoría

Martes 14 de Enero de 2025

Estado del tiempo: Seco y Soleado

Director de obra, residente de obra, Director de interventoría, Residente de interventoría, Siso de interventoría, dos topógrafos, dos cadeneros, 6 Ayudantes de oficios Varios, 6 Operadores de maquinaria pesada, dos conductores de Camiones, 7 conductores de Volquetes dobleroques, 5 conductores de Volquetes sencillos, Un laboratorista, Un ingeniero y Un operador de planta de Asfalto.

Actividades realizadas:

Construcción y limpieza de Cunetas en el margen izquierdo de la vía, obra para la protección de Taludes en el Terropón de la vía mediante arriación para el desvío del cauce (Se estaba



130 Continuación Martes 14 de Enero de 2025

a la espera que cesara el invierno para la realización de la actividad), Cero y compactación de la base granular clase "C", Acopio de Base en el campamento de la K4+320, levantamiento con RTK para el plano Record del proyecto.

Edgar Aragón

Residente de obra

Residente de interventoría

Miércoles 15 de Enero de 2025

Estado del tiempo: Seco y soleado

Personal de obra:

Director de obra, Residente de obra, Director de interventoría, Residente de interventoría, Siso de interventoría, dos topógrafos, dos cadeneros, 6 Acopiadores de oficio Varios, 6 operadores de maquinaria pesada, dos conductores de Camiones, 7 Conductores de Volquetas dobles traseros, 5 Conductores de Volquetas Simples, Un laboratorista, Un ingeniero y un operador de planta de asfalto.

Actividades realizadas:

Construcción y limpieza de cunetas en el margen izquierdo de la vía, obra para la protección de taludes en el terraplén de la vía mediante excavación para el desate del cruce (Se estaba a la espera que cesara el invierno para la realización de la actividad), Cero y compactación de la Base granular clase "C", Acopio de material de Base en el campamento de la K4+320, levantamiento con RTK para el plano Record del proyecto.

Edgar Aragón

Residente de obra

Residente de interventoría

Jueves 16 de Enero de 2025

Estado del tiempo: Seco y soleado

Personal de obra:

Director de obra, Residente de obra, Director



Continuación Jueves 16 de Enero de 2025 131

de interventoría, Residente de interventoría, Siso de interventoría, dos topógrafos, dos cadeneros, 6 Ayudantes de maquinaria pesada, 6 operadores de maquinaria pesada, 6 Ayudantes de oficios varios, dos conductores de Camiones, 7 conductores de Volquetas dobles, 5 conductores de Volquetas sencillas, un laboratorista, un ingeniero y un operador de planta de asfalto.

Actividades realizadas:

Construcción y limpieza de Cunetas en el margen izquierdo de la vía, obra para la protección de Taludes en el Terraplén de la vía mediante excavación para el desvío del Cauca (Se estaba a la espera que cesara el invierno para la realización de la actividad), Cero y compactación de la Base granular clase "C", Acopio de material de Base en el Campamento del K4+320, levantamiento con RTK para el plano Record del proyecto.

Residente de obra

Edgar Aragón
Residente de interventoría

Viernes 17 de Enero de 2025

Estado del tiempo: Seco y soleado.

Personal de obra:

Director de obra, Residente de obra, Director de interventoría, Residente de interventoría, Siso de interventoría, dos topógrafos, dos cadeneros, 6 Ayudantes de oficios varios, 6 operadores de maquinaria pesada, dos conductores de Camiones, 7 conductores de Volquetas dobles, 7 conductores de Volquetas sencillas, un laboratorista, un ingeniero y un operador de planta de asfalto.

Actividades Realizadas:

Instalación de Malla de acero en Caliente MCD-19 en el margen izquierdo de la vía,



132 Continuation Viernes 17 de Enero de 2025

Construcción de los cunetas del lado derecho de la vía, Instalación de la Base granular de clase "C", perfilado y conformación del talud del terraplén en la vía, obras de protección e instalación de Dique para la protección de Taludes.

Edgar Aragón
Residente de obra Residente de interventoría

Sábado 18 de Enero de 2025

Estado del tiempo: Seco y soleado.

Personal de obra:

Director de obra, Residente de obra, Director de interventoría, Residente de interventoría, Siso de interventoría, 6 operadores de maquinaria pesada, dos topógrafos, dos cadeneros, 6 Ayudantes de oficios varios, dos conductores de Camiones, 7 conductores de Volquetes dobletroques, 5 conductores de Volquetes sencillos, Un laboratorista, Un laboratorista, Un ingeniero y un operador de la planta de Asfalto.

Actividades Realizadas:

Instalación de Mezcla densa en Cabente MDC-19, en el margen izquierdo de la vía, Construcción de cunetas del lado derecho de la vía, Instalación de la Base granular clase "C", perfilado y conformación del Talud del Terraplén en la vía, obras de protección e instalación de Dique para la protección de Taludes.

Edgar Aragón
Residente de obra Residente de interventoría

Domingo 19 de Enero de 2025

Estado del tiempo: Seco y soleado

No se realizan actividades por ser día festivo.



Jueves 20 de Enero de 2025

133

Estado del tiempo: Seco y Soleado

Personal de obra:

Director de obra, Residente de obra, Director de interventoría, Residente de interventoría, Siso de interventoría, 6 operadores de maquinaria pesada, dos topógrafos, dos cadeneros, 6 Ayudantes de oficios Varios, dos Conductores de Camiones, 7 Conductores de Volquetes doblétricos, 5 Conductores de Volquetes Sencillos, un laboratorista, un ingeniero y un operador de planta de asfalto.

Actividades realizadas:

Instalación de Mezcla densa en Caliente MDC-19, en el margen izquierdo de la vía, Construcción de Cunetas del lado derecho de la vía, Instalación de la Base granular clase "C" perfilado y Conformación del talud del terraplen en la vía, obras de protección e instalación de Dique para la protección de Taludes.

Edgar Aragón

Residente de obra.

Residente de interventoría

Martes 21 de Enero de 2025

Estado del tiempo: Seco y Soleado

Personal de obra:

Director de obra, Residente de obra, Director de interventoría, Residente de interventoría, Siso de interventoría, 6 operadores de maquinaria pesada, dos topógrafos, dos cadeneros, 6 Ayudantes de oficios Varios, dos Conductores de Camiones, 7 Conductores de Volquetes doblétricos, 5 Conductores de Volquetes Sencillos, un laboratorista, un ingeniero un operador de planta de asfalto.

Actividades realizadas:

Instalación de mezcla densa en Caliente MDC-19, en el margen izquierdo de la vía, Construcción de cunetas del lado derecho de la



134 Continúa martes 21 de enero de 2025

vía, instalación de la base granular clase "C",
perfilado y conformación del talud del terraplen
en la vía, obras de protección e instalación
de Dique para la protección de Toludos.

Residente de obra Edgón Aragón
Residente de interventoría

Miércoles 22 de Enero de 2025

Estado del tiempo: Seco y Soleado

Personal de obra:

Director de obra, residente de obra, Director
de obra, residente de obra, Director de interventoría
residente de interventoría, Siso de interventoría,
6 operadores de maquinaria pesada, dos topógrafos,
dos cadeneros, 6 Ayudantes de oficios varios,
dos Conductores de Camiones, 7 Conductores de
Volquetes dobles troques, 5 Conductores de Volquetes
Sencillos, Un laboratorista, Un ingeniero y Un
operador de plantas de asfalto.

Actividades realizadas:

Instalación de mezcla densa en caliente
MDC-19, en el margen izquierdo de la vía,
Construcción de cunetas del lado derecho de la
vía, Instalación de la Base granular clase "C"
perfilado y conformación del talud del terraplen
en la vía, obras de protección e instalación de
Dique para la protección de Toludos

Residente de obra Edgón Aragón
Residente de interventoría

Jueves 23 de Enero de 2025

Estado del tiempo: Seco y Soleado

Personal de obra:

Director de obra, residente de obra, Director de
interventoría, residente de interventoría, Siso de
interventoría, 6 operadores de maquinaria pesada,
dos topógrafos, dos cadeneros, 6 Ayudantes de
oficios varios, dos conductores de camiones,



Continuación Jueves 23 de Enero de 2025 135

7 Conductores de Volquetas dobles troques, 5 Conductores de Volquetas sencillas, Un laboratorista, Un ingeniero y Un operador de planta de asfalto.
Actividades realizadas:

Instalación de mezcla densa en Caliente MDC-19, en el margen izquierdo de la vía, Instalación de la Base granular clase "C", perfilado y conformación del talud del terraplén en la vía, obras de protección e instalación de Dique para la protección de Taludes

Residente de obra.

Edgar Aragón
Residente de interventoría

Viernes 24 de Enero de 2025

Estado del tiempo: Seco y soleado

Personal de obra:

Director de obra, residente de obra, Director de interventoría, residente de interventoría, Siso de interventoría, 6 operadores de maquinaria pesada, dos topógrafos, dos cabeneros, 6 Ayudantes de oficios varios, dos conductores de Camiones, 7 Conductores de Volquetas dobles troques, 5 Conductores de Volquetas sencillas, Un laboratorista, Un ingeniero y Un operador de planta de asfalto.

Actividades realizadas:

Instalación de la mezcla densa en Caliente MDC-19 en el margen izquierdo de la vía, construcción de las cunetas del lado derecho de la vía, perfilado del talud del terraplén en la vía para obras de protección de taludes (Piedra pegada), obras de protección e instalación de muro de protección en los accesos a los puentes

Residente de obra

Residente de interventoría

Sábado 25 de Enero de 2025

Estado del tiempo: Seco y Soleado



Continuación Subado 25 de Enero de 2024

Personal de obra:

Director de obra, Residente de obra, Director de interventoría, Residente de interventoría, Siso de interventoría, 6 operadoras de maquinaria pesada, dos topógrafos, dos cadeneros, 6 Ayudantes de oficios varios, dos conductores de camiones, 7 conductores de Volquetes doblétricos, 5 conductores de Volquetes sencillos, Un laboratorista, Un ingeniero y un operador de planta de asfalto.

Actividades realizadas:

Instalación de la mezcla densa en Caliente MDC-14 en el margen izquierdo de la vía, Construcción de Cunetas del lado derecho de la vía, Perfilado y Conformación del Talud del terraplen en la vía para los obras de protección de taludes (Piedra pegada) obras de protección e instalación de muros de protección en los accesos de los puentes.

Edgar Aragón

Residente de obra

Residente de interventoría

Domingo 26 de Enero de 2025

No se realizan actividades por ser día festivo.

Jueves 27 de Enero de 2025

Estado del clima: Seco y Soleado.

Personal de obra:

Director de obra, Residente de obra, Director de interventoría, Residente de interventoría, Siso de interventoría, 6 operadoras de maquinaria pesada, dos topógrafos, dos cadeneros, 6 Ayudantes de oficios varios, dos conductores de camiones, 7 conductores de Volquetes doblétricos, 5 conductores de Volquetes sencillos, Un laboratorista, Un Ingeniero y un operador de planta de asfalto.

Actividades Realizadas:

Instalación de la mezcla densa en Caliente

MDC-14 en el margen izquierdo de la vía,



Continuación Lunes 27 de Enero de 2025¹³⁷

Construcción de Cunetas del lado derecho de la vía, perfilado y conformación del talud del terraplen en la vía para obras de protección de taludes (Piedra Pegada), obras de protección e instalación de muro de protección en los accesos de los puentes.

Residente de obra

Edgar Aragón
Residente de interventoría

Martes 28 de Enero de 2025

Estado del tiempo: Seco y Soleado

Personal de obra:

Director de obra, Residente de obra, Director de Interventoría, Residente de interventoría, Siso de interventoría, 6 operadores de maquinaria pesada, dos topógrafos, dos cadeneros, 6 Ayudantes de oficios varios, dos conductores de Camiones, 7 Conductores de Volquetes de 3 ejes, 5 Conductores de Volquetes sencillos, Un laboratorista, Un ingeniero y Un operador de planta de Asfalto.

Actividades Realizadas:

Instalación de la mezcla densa en Caliente MDG 14 en el margen izquierdo de la vía, Construcción de Cunetas del lado derecho de la vía, perfilado y conformación del talud del terraplen en la vía para obras de protección de taludes (Piedra Pegada), obras de protección e instalación de muro de protección en los accesos de los puentes.

Residente de obra.

Edgar Aragón
Residente de interventoría

Miércoles 29 de Enero de 2025

Estado del tiempo: Seco y Soleado.

Personal de obra:

Director de obra, Residente de obra, Director de interventoría, Residente de interventoría,



138 Miércoles 29 de Enero de 2025

Personal de obra:

Siso de inventaría, 6 operadores de maquinaria pesada, dos topógrafos, dos cadeneros, 6 Ayudantes de oficios Varios, dos Conductores de Camiones, 7 Conductores de Volquetes dobles, 5 conductores de Volquetes sencillos, un laboratorista, un ingeniero y un operador de la planta de asfalto.

Actividades Realizadas:

Instalación de la mezcla densa en Caliente MDC-19, en el margen izquierdo de la vía, Construcción de Cunetas del lado derecho de la vía, Perfilado y conformación del talud del terraplén en la vía para obras de protección de Taludes, (Piedra pegada), obras de protección e instalación de muro de protección en los accesos de las puentes.

Edgar Aragón

Residente de obra

Residente de interventoría

Jueves 30 de Enero de 2025

Estado del tiempo: Seco y Soleado

Personal de obra:

Director de obra, residente de obra, Director de inventaría, Residente de inventaría, Siso de inventaría, 6 operadores de maquinaria pesada, dos topógrafos, dos cadeneros, 6 Ayudantes de oficios Varios, dos Conductores de Camiones 7 Conductores de Volquetes dobles, 5 Conductores de Volquetes sencillos, un laboratorista un ingeniero y un operador de planta de asfalto.

Actividades Realizadas:

Instalación de la mezcla densa en Caliente MDC-19, en el margen izquierdo de la vía, Construcción de Cunetas del lado derecho de la vía, Perfilado y conformación del talud del



Continuación Juvenes 30 de enero de 2025 ¹³⁹

Terraplen en la vía para obras de protección de taludes (Piedra Pegada) obras de protección e instalación de muro de protección en los accesos de puentes

Residente de obra Edgón Aragón
Residente de interventoría

Juvenes 31 de Enero de 2025

Estado del tiempo: Soleado y Soleado

Personal de obra:

Director de obra, residente de obra, Director de interventoría, Residente de interventoría, Siso de interventoría, 6 operadores de maquinaria pesada, dos topógrafos, dos cadeneros, 6 Ayudantes de oficina Varrios, dos Conductores de Camiones, 7 Conductores de Volquetes dobles-troques, 5 Conductores de Volquetes sencillos, Un laboratorista, Un ingeniero y Un operador de planta de asfalto.

Actividades Realizadas:

Instalación de la mezcla densa en Caliente

MDC-19 en el margen izquierdo de la vía,

Construcción de Cunetas del lado derecho de

la vía, Perfilado y Conformación del talud

del terraplen en la vía para obras de

protección de taludes (Piedra Pegada)

Obras de protección e instalación de muro

de protección e instalación de muro de

protección en los accesos de los puentes

Residente de obra Edgón Aragón
Residente de interventoría



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



En cuanto a la bitacora del contrato 558 de 2022 de Maguangué, no se reportan debido a que se finalizaron actividades de obra el 30 de Julio de 2024.
