

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°8
	JAC: LAS PAVAS, SABANA EN MEDIO, LOS ESTADOS Y HATONUEVO	G&G INGENIEROS S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No. 3191-2023, 4536-2023, 3078-2023, 3732-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5034 de 2023	
OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONUEVO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.			

REGISTRO FOTOGRAFICO LAS PAVAS



	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°8
	JAC: LAS PAVAS, SABANA EN MEDIO, LOS ESTADOS Y HATONUEVO	G&G INGENIEROS S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No. 3191-2023, 4536-2023, 3078-2023, 3732-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5034 de 2023	
OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONUEVO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.			

REGISTRO FOTOGRAFICO LOS ESTADOS



	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°8
	JAC: LAS PAVAS, SABANA EN MEDIO, LOS ESTADOS Y HATONUEVO	G&G INGENIEROS S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No. 3191-2023, 4536-2023, 3078-2023, 3732-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5034 de 2023	
OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONUEVO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.			

REGISTRO FOTOGRAFICO SABANA EN MEDIO



	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°8
	JAC: LAS PAVAS, SABANA EN MEDIO, LOS ESTADOS Y HATONUEVO	G&G INGENIEROS S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No. 3191-2023, 4536-2023, 3078-2023, 3732-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5034 de 2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONUEVO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.			

REGISTRO FOTOGRAFICO BAÑADEROS



ANEXOS CONVENIO LAS PAVAS 3191- 2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO	MEP-MN-AL-15-FR-2																																												
			VERSIÓN	1																																												
			PÁGINA																																													
			FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)																																												
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL:	GUAJIRA																																												
			PERÍODO MES:	JULIO 1-31																																												
CONTRATO DE OBRA No.: 3191-2023																																																
OBJETO: ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA LAS PAVAS MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		PLAZO INICIAL: 3 MESES FECHA DE INICIO: 27/12/2023 FECHA DE SUSPENSIÓN: 18/02/2024 FECHA DE REANUDACIÓN: 18/02/2024 FECHA DE VENCIMIENTO: 30/02/2024		VALOR INICIAL (Incluido IVA): \$ 200.168.754,00 VALOR ADICIONALES (Incluido IVA): \$ 0,00 VALOR ACUMULADO (Incluido IVA): \$ 200.168.754,00 ANTICIPO CONCEDIDO: \$ 0,00 ANTICIPO AMORTIZADO: \$ 0,00																																												
CONTRATISTA: JAC VEREDA LAS PAVAS		CONTRATO DE INTERVENORIA: 5024-2023																																														
INTERVENTOR: G&G INGENIEROS S.A.S																																																
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO																																																
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pavimentación</td><td></td><td></td></tr><tr><td> Construcción</td><td>ML</td><td>120</td></tr><tr><td> Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td> Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Estructuras</td><td></td><td></td></tr><tr><td> Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td> Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td> Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuáles)</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación			Construcción	ML	120	Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras			Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento			Otros (Especificar cuáles)													
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																														
Pavimentación																																																
Construcción	ML	120																																														
Mejoramiento																																																
Rehabilitación																																																
Estructuras																																																
Túneles																																																
Puentes																																																
Pontones																																																
Mantenimiento																																																
Otros (Especificar cuáles)																																																
AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pavimentación</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> Construcción</td><td>ML</td><td>108</td><td>8</td></tr><tr><td> Mejoramiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> Rehabilitación</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Estructuras</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> Túneles</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> Puentes</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> Pontones</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuáles)</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación				Construcción	ML	108	8	Mejoramiento				Rehabilitación				Estructuras				Túneles				Puentes				Pontones				Mantenimiento				Otros (Especificar cuáles)			
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																													
Pavimentación																																																
Construcción	ML	108	8																																													
Mejoramiento																																																
Rehabilitación																																																
Estructuras																																																
Túneles																																																
Puentes																																																
Pontones																																																
Mantenimiento																																																
Otros (Especificar cuáles)																																																
AVANCE FINANCIERO																																																
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES																																																
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																													
OBRAS	145.578.911,00	0,19	145.578.911,00																																													
APORTE AOC	1.000.000,00																																															
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN																																																
GASTOS ADMINISTRATIVOS	49.222.476,00	0,19	49.222.476,00																																													
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	4.367.367,00	0,19	4.367.367,00																																													
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	200.168.754,00	0,19	200.168.754,00																																													
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																
VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																												
OBRAS	135.335.572,00		135.335.572,00	135.335.572,00																																												
AJUSTES GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL				0,00																																												
GASTOS ADMINISTRATIVOS	6.736.000,00	1.279.840,00	8.015.840,00	8.015.840,00																																												
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN																																																
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES																																																
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)																																																
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)																																																
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)																																																
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)																																																
VALOR EJECUTADO	142.071.572,00	1.279.840,00	143.351.412,00	143.351.412,00																																												
INVERSIÓN EN OBRA																																																
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 200.168.753,00																																																
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 128.497.056,00																																																
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 64,19%																																																
EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																
MANO DE OBRA CALIFICADA: 7																																																
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0																																																
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0																																																
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 7																																																
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																
<div> CONCRETO- VEREDA LAS PAVAS</div> <div> CONCRETO- VEREDA LAS PAVAS</div>																																																
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																
NA																																																
<div> Firma: LUIS GALARRAGA HERRERA Nombre: LUIS GALARRAGA HERRERA Director de Interventoría Matrícula Profesional No.0820239162ATL</div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del PROYECTO. Código: Interventoría, Dirección: Técnico</div>																																																

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CODIGO	
			VERSION	
			PAGINA	
			FECHA	4/07/2024 (Dia / Mes / Año)
I. INFORMACION GENERAL				
PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONUEVO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL				
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		SEMANA No.: 14 del 1 al 4 Último Informe Semanal SI ☐		
		(Numeración consecutiva)		
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MILAGRO CAMARGO AREVALO		
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, VEREDA LAS PAVAS MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL				
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):				
con la aprobación de estudios y diseños correspondiente a la Junta de acción Comunal de la vereda las pavas, La Guajira se tiene contemplado 120 metros lineales de placa huella, teniendo en cuenta La Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.				
DESCRIPCION BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO				
construcción de obras de drenaje y/o placa huella en la zona rural del Municipio de barrancas vereda las pavas de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.				
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:				
CONTRATISTA: JAC VEREDA LAS PAVAS		INTERVENTOR: G&G INGENIEROS S.A.S		
CONVENIO No. 3191-2023		INTEGRANTES: MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES		
FECHA DE INICIO: 14/12/2023		CONTRATO No. 5034-2023		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE INICIO: 27/12/2023		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2023		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024		
VALOR INICIAL: \$ 200.168.754,00		VALOR INICIAL: \$ 77.675.231,00		
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -		
VALOR ACUMULADO: \$ -		VALOR ACUMULADO: \$ -		
		VALOR ANTICIPO: \$ -		
		VALOR AMORTIZADO: \$ -		
		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -		
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO				
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:				
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.168.754	\$ 200.168.754	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.168.754		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 77.675.231	\$ 77.675.231	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 77.675.231		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)				
CONVENIOINTERVENTORIA				
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 145.578.911,00				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 85.000.000,00 58,39%				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 90.505.302,00 62,17%				
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ 5.505.302,00 3,78%				
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -				
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)				
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 85.000.000,00 42,46%				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 90.505.302,00 45,21%				
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ 5.505.302,00 2,75%				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 27.365.796,00 13,67%				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 8.750.000,00 4,37%				
Observaciones:				
INTERVENTORIA				
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 76.675.231,00 98,71%				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 68.169.153,93 87,76%				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 15.335.046,20 20,00%				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 13.633.830,79 17,78%				
RADIO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO				
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:				
PERIODO FACTURADO:				
VALOR FACTURA: \$ -				
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				
Observaciones:				
III. AVANCE FÍSICO				
Meta Física Programada % 58% Avance o Atraso Físico % 3,78%				
Meta Física Ejecutada % 62%				
MAQUINARIA Y EQUIPO				
Meta Física (Programa de Obra)				
Descripción de la Meta Física Contractual				
Unidad				
Cantidad				
MEJORAMIENTO				
Concreto reforzado				
resistencia 21 MPA (D) -				
mezcla in situ				
M3				
14,96				
Concreto Ciclópeo				
Resistencia 14MPa (G)				
M3				
6,59				
Acero de refuerzo de FY =				
4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)				
Kl				
603,47				
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Avance Físico				
Tramo y/o sector 1				
Tramo y/o sector 2				
Tramo y/o sector (n)				
Total				
%				
Prog				
35,01				
49,1%				
Ejec				
13,18				
41,96%				
Prog				
14,58				
46,4%				
Ejec				
12,40				
0,21%				
Prog				
1810,42				
55,08%				
Ejec				
2220,35				
67,55%				
Descripción				
Equipo				
Mínimo				
Total				
Disponible				
MEZCLADORA				
1				
2				
Total				
2				
Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico				
TRAMO Y/O SECTOR 1:				
TRAMO Y/O SECTOR 2:				
TRAMO Y/O SECTOR (n):				

IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: COMERCIALIZADORES DE MATERIALES	DISPONIBLE	ZONAS DE DEPOSITO	SI NO X N/A
	PERMISO MINERO: SI NO X	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO X N/A
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO X	APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI NO X N/A
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO X	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI NO X N/A
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO X	OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI NO X N/A
		VERTIMIENTOS:	SI NO X N/A
		EMISIONES:	SI NO X N/A
		OTROS (Especificar cual)	SI NO X N/A
OBSERVACIONES:		OBSERVACIONES: Para este convenio solidario no se requiere licenciamiento y permisos ambientales, considerando que la vía a intervenir es existente, adicionalmente no realizarán intervenciones sobre ningún cauce de agua, así mismo, se anota que considerando la cuantía de estos	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: La junta presentó mediante comunicado el programa de adaptación a la guía ambiental (PAGA) y una vez revisado por el profesional ambiental de la interventoría se realizó la aprobación	
ESTADO: NA			
V. GESTIÓN SOCIAL			
	OBRA	INTER	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	2	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	2	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	10		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14			
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1			
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:			
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:			
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:			
OBSERVACIONES: Se realizó una socialización inicial a los convenios del programa Caminos Comunitarios para a Paz total el día 27 de febrero de 2024 en el municipio de barrancas- La Guajira, vereda las pavas una vez finalice la etapa de revision de Estudios y Diseños y se establezca la meta física del proyecto, se realizará una segunda socialización previo al inicio de las obras.			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
ACTIVIDAD TÉCNICA: Se continúa la fundida de concreto en placas restantes y cunetas.			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
fundir concreto ciclopeo , reforzado			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
Programado	Pr+000 Pr+120m		
Ejecutado	65%		Acero concreto Subbase
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
*Evidenciar y documentar las actividades realizadas por el contratista en la ejecución del contrato. * Evaluar y verificar las intervenciones y el desempeño del contratista en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras. * Verificar el cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los convenios solidarios, a fin de garantizar la legalidad y transparencia del proceso.		FIRMA NOMBRE: JORGE GAMARRA Matricula Profesional No.: 0820239162ATL	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO																																																					
			VERSIÓN																																																					
			PÁGINA																																																					
			FECHA	11/07/2024 (Día / Mes / Año)																																																				
I. INFORMACION GENERAL																																																								
PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONUEVO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																								
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		SEMANA No.:	15 del 5 al 11 Último Informe Semanal ☐																																																				
			(Numeración consecutiva)																																																					
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:	DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	MILAGRO CAMARGO AREVALO																																																				
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, VEREDA LAS PAVAS MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):																																																								
con la aprobación de estudios y diseños correspondiente a la Junta de acción Comunal de la vereda las pavas, La Guajira se tiene contemplado 120 metros lineales de placa huella, teniendo en cuenta La Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.																																																								
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																								
construcción de obras de drenaje y/o placa huella en la zona rural del Municipio de barrancas vereda las pavas de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales																																																								
CONVENIO SOLIDARIO:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																					
CONTRATISTA:	JAC VEREDA LAS PAVAS		INTERVENTOR:	G&G INGENIEROS S.A.S																																																				
CONVENIO No.	3191-2023	VALOR INICIAL: \$ 200.168.754,00	INTEGRANTES:	MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES																																																				
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES: \$ -	CONTRATO No.	5034-2023																																																				
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: \$ -	FECHA DE INICIO:	27/12/2023																																																				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2023		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023																																																				
			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024																																																				
				VALOR INICIAL: \$ 77.675.231,00																																																				
				VALOR ADICIONES: \$ -																																																				
				VALOR ACUMULADO: \$ -																																																				
				VALOR ANTICIPO: \$ -																																																				
				VALOR AMORTIZADO: \$ -																																																				
				SALDO POR AMORTIZAR: \$ -																																																				
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																								
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX																																																			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.168.754	\$ 200.168.754																																																					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.168.754																																																						
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 77.675.231	\$ 77.675.231																																																					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA																																																							
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 77.675.231	\$ 77.675.231																																																					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																								
<table><thead><tr><th colspan="4">CONVENIO</th></tr></thead><tbody><tr><td>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</td><td>\$</td><td>145.578.911,00</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$</td><td>95.500.000,00</td><td>65,80%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$</td><td>98.600.000,00</td><td>67,73%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$</td><td>3.100.000,00</td><td>2,13%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$</td><td>95.500.000,00</td><td>47,71%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$</td><td>98.600.000,00</td><td>49,26%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$</td><td>3.100.000,00</td><td>1,55%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>27.365.796,00</td><td>13,67%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>13.313.000,00</td><td>6,65%</td></tr><tr><td>Observaciones:</td><td colspan="3"></td></tr></tbody></table>					CONVENIO				VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$	145.578.911,00		INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	95.500.000,00	65,80%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	98.600.000,00	67,73%	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	3.100.000,00	2,13%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:				(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)				TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	95.500.000,00	47,71%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	98.600.000,00	49,26%	AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	3.100.000,00	1,55%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	27.365.796,00	13,67%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	13.313.000,00	6,65%	Observaciones:			
CONVENIO																																																								
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$	145.578.911,00																																																						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	95.500.000,00	65,80%																																																					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	98.600.000,00	67,73%																																																					
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	3.100.000,00	2,13%																																																					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:																																																								
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)																																																								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	95.500.000,00	47,71%																																																					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	98.600.000,00	49,26%																																																					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	3.100.000,00	1,55%																																																					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	27.365.796,00	13,67%																																																					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	13.313.000,00	6,65%																																																					
Observaciones:																																																								
<table><thead><tr><th colspan="4">INTERVENTORIA</th></tr></thead><tbody><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$</td><td>76.675.231,00</td><td>98,71%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$</td><td>68.169.153,93</td><td>87,76%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>15.335.046,20</td><td>20,00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>13.633.830,79</td><td>17,78%</td></tr><tr><td>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</td><td></td><td></td><td>SI NO</td></tr><tr><td>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>PERIODO FACTURADO:</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>VALOR FACTURA:</td><td>\$</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr><tr><td>Observaciones:</td><td colspan="3"></td></tr></tbody></table>					INTERVENTORIA				TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	76.675.231,00	98,71%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	68.169.153,93	87,76%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	15.335.046,20	20,00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	13.633.830,79	17,78%	RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			SI NO	No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:				PERIODO FACTURADO:				VALOR FACTURA:	\$	-		(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				Observaciones:											
INTERVENTORIA																																																								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	76.675.231,00	98,71%																																																					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	68.169.153,93	87,76%																																																					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	15.335.046,20	20,00%																																																					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	13.633.830,79	17,78%																																																					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			SI NO																																																					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:																																																								
PERIODO FACTURADO:																																																								
VALOR FACTURA:	\$	-																																																						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																								
Observaciones:																																																								
III. AVANCE FÍSICO																																																								
Meta Física Programada % 65% Avance o Atraso Físico % 2%																																																								
Meta Física Ejecutada % 67%																																																								
MAQUINARIA Y EQUIPO																																																								
<table><thead><tr><th colspan="4">Meta Física (Programa de Obra)</th></tr><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ</td><td>M3</td><td>14,96</td><td></td></tr><tr><td>Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)</td><td>M3</td><td>6,59</td><td></td></tr><tr><td>Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)</td><td>KI</td><td>603,47</td><td></td></tr></tbody></table>					Meta Física (Programa de Obra)				Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	14,96		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	6,59		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KI	603,47																																	
Meta Física (Programa de Obra)																																																								
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad																																																						
Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	14,96																																																						
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	6,59																																																						
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KI	603,47																																																						
<table><thead><tr><th colspan="6">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</th></tr><tr><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td>14,96</td><td>20,98%</td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td>36,00</td><td>50,49%</td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td>6,59</td><td>21,0%</td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td>17,83</td><td>56,77%</td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td>603,47</td><td>18,36%</td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td>2259,70</td><td>68,75%</td></tr></tbody></table>					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Prog				14,96	20,98%	Ejec				36,00	50,49%	Prog				6,59	21,0%	Ejec				17,83	56,77%	Prog				603,47	18,36%	Ejec				2259,70	68,75%				
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada																																																								
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																			
Prog				14,96	20,98%																																																			
Ejec				36,00	50,49%																																																			
Prog				6,59	21,0%																																																			
Ejec				17,83	56,77%																																																			
Prog				603,47	18,36%																																																			
Ejec				2259,70	68,75%																																																			
<table><thead><tr><th>Descripción</th><th>Equipo Mínimo</th><th>Total Disponible</th></tr></thead><tbody><tr><td>MEZCLADORA</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	MEZCLADORA	1	1										Total																																				
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																						
MEZCLADORA	1	1																																																						
Total																																																								
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).																																																								
TRAMO Y/O SECTOR 1: _____ TRAMO Y/O SECTOR 2: _____																																																								
TRAMO Y/O SECTOR (n): _____																																																								

IV. GESTION AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	COMERCIALIZADORES DE MATERIALES I	PERMISO MINERO:	SI X NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI NO X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO X
OBSERVACIONES:		OBSERVACIONES: Para este convenio solidario no se requiere licenciamiento y permisos ambientales, considerando que la vía a intervenir es existente, adicionalmente no realizarán intervenciones sobre ningún cauce de agua, así mismo, se anota que considerando la cuantía de estos	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES:	
ESTADO: EN ESTADO DE APROBACION			
V. GESTION SOCIAL			
	OBRA	INTER	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	2	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	10		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14			
OBSERVACIONES: Se realizó una socialización inicial a los convenios del programa Caminos Comunitarios para a Paz total el día 27 de febrero de 2024 en el municipio de barrancas- La Gualjira, vereda las pavas una vez finalice la etapa de revision de Estudios y Diseños y se establezca la meta física del proyecto, se realizará una segunada socializacion previo al inicio de las obras.			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
ACTIVIDADES TECNICAS: Se preparan cunetas para fundida de estas			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
Formaleteo y acondicionamiento de terreno para continuación de fundida			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
<div>ProgramadoPr+000Pr+120m</div> <div>Ejecutado</div> <div>66%</div> <div>Acero concreto Subbase</div>			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
FIRMA	
NOMBRE: JORGE GAMARRA	
Matricula Profesional No.: 0820239162ATL	
*Evidenciar y documentar las actividades realizadas por el contratista en la ejecución del contrato. * Evaluar y verificar las intervenciones y el desempeño del contratista en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras. * Verificar el cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los convenios solidarios, a fin de garantizar la legalidad y transparencia del proceso.	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO																																																																																																																	
			VERSIÓN																																																																																																																	
			PÁGINA																																																																																																																	
			FECHA	19/07/2024 (Día / Mes / Año)																																																																																																																
I. INFORMACION GENERAL																																																																																																																				
PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONUEVO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																																																																				
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		SEMANA No.:	16 del 12 al 18 Último Informe Semanal SI ☐																																																																																																																
			(Numeración consecutiva)																																																																																																																	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:	DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	MILAGRO CAMARGO AREVALO																																																																																																																
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS PAVAS MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																																																																				
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):																																																																																																																				
con la aprobación de estudios y diseños correspondiente a la Junta de acción Comunal de la vereda las pavas, La Guajira se tiene contemplado 120 metros lineales de placa huella, teniendo en cuenta La Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.																																																																																																																				
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																																																																																				
construcción de obras de drenaje y/o placa huella en la zona rural del Municipio de barrancas vereda las pavas de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales																																																																																																																				
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																																																																		
CONTRATISTA: JAC VEREDA LAS PAVAS		INTERVENTOR: G&G INGENIEROS S.A.S																																																																																																																		
CONVENIO No. 3191-2023 VALOR INICIAL: \$ 200.168.754,00		INTEGRANTES: MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES																																																																																																																		
FECHA DE INICIO: 14/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -		CONTRATO No. 5034-2023 VALOR INICIAL: \$ 77.675.231,00																																																																																																																		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ -		FECHA DE INICIO: 27/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -																																																																																																																		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2023		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ -																																																																																																																		
		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024 VALOR ANTICIPO: \$ -																																																																																																																		
		VALOR AMORTIZADO: \$ -																																																																																																																		
		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -																																																																																																																		
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																																																				
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																																																				
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX																																																																																																																
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.168.754																																																																																																																		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																																																		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.168.754																																																																																																																		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 77.675.231																																																																																																																		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA																																																																																																																			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 77.675.231																																																																																																																		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																																																																				
<div><div><div>CONVENIO</div><table><tr><td>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</td><td>\$</td><td>145.578.911,00</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$</td><td>110.000.000,00</td><td>75,56%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$</td><td>120.000.000,00</td><td>82,43%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$</td><td>(63.411.030,55)</td><td>-43,56%</td></tr><tr><td colspan="4">OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td></tr><tr><td colspan="4">(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</td></tr><tr><td colspan="4">TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td></tr><tr><td></td><td>\$</td><td>110.000.000,00</td><td>54,95%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$</td><td>120.000.000,00</td><td>59,86%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$</td><td>10.000.000,00</td><td>5,00%</td></tr><tr><td colspan="4">INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td></tr><tr><td></td><td>\$</td><td>27.365.796,00</td><td>13,67%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>5.650.000,00</td><td>2,82%</td></tr><tr><td colspan="4">Observaciones:</td></tr></table></div><div><div>INTERVENTORIA</div><table><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$</td><td>76.675.231,00</td><td>98,71%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$</td><td>68.169.153,93</td><td>87,76%</td></tr><tr><td colspan="4">INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td></tr><tr><td></td><td>\$</td><td>15.335.046,20</td><td>20,00%</td></tr><tr><td colspan="4">INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td></tr><tr><td></td><td>\$</td><td>13.633.830,79</td><td>17,78%</td></tr><tr><td colspan="4">RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td colspan="4">No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:</td></tr><tr><td colspan="4">PERIODO FACTURADO:</td></tr><tr><td colspan="4">VALOR FACTURA:</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="4">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr><tr><td colspan="4">Observaciones:</td></tr></table></div></div>					VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$	145.578.911,00		INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	110.000.000,00	75,56%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	120.000.000,00	82,43%	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	(63.411.030,55)	-43,56%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:				(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)				TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:					\$	110.000.000,00	54,95%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	120.000.000,00	59,86%	AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	10.000.000,00	5,00%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA					\$	27.365.796,00	13,67%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	5.650.000,00	2,82%	Observaciones:				TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	76.675.231,00	98,71%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	68.169.153,93	87,76%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA					\$	15.335.046,20	20,00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA					\$	13.633.830,79	17,78%	RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:						SI	NO	No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:				PERIODO FACTURADO:				VALOR FACTURA:						\$	-	(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				Observaciones:			
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$	145.578.911,00																																																																																																																		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	110.000.000,00	75,56%																																																																																																																	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	120.000.000,00	82,43%																																																																																																																	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	(63.411.030,55)	-43,56%																																																																																																																	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:																																																																																																																				
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)																																																																																																																				
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:																																																																																																																				
	\$	110.000.000,00	54,95%																																																																																																																	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	120.000.000,00	59,86%																																																																																																																	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	10.000.000,00	5,00%																																																																																																																	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA																																																																																																																				
	\$	27.365.796,00	13,67%																																																																																																																	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	5.650.000,00	2,82%																																																																																																																	
Observaciones:																																																																																																																				
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	76.675.231,00	98,71%																																																																																																																	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	68.169.153,93	87,76%																																																																																																																	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA																																																																																																																				
	\$	15.335.046,20	20,00%																																																																																																																	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA																																																																																																																				
	\$	13.633.830,79	17,78%																																																																																																																	
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:																																																																																																																				
		SI	NO																																																																																																																	
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:																																																																																																																				
PERIODO FACTURADO:																																																																																																																				
VALOR FACTURA:																																																																																																																				
		\$	-																																																																																																																	
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																																																																				
Observaciones:																																																																																																																				
III. AVANCE FÍSICO																																																																																																																				
Meta Física Programada % 75% Avance o Atraso Físico % 7%																																																																																																																				
Meta Física Ejecutada % 82,00%																																																																																																																				
MAQUINARIA Y EQUIPO																																																																																																																				
<table><tr><td colspan="4">Meta Física (Programa de Obra)</td><td colspan="4">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</td><td colspan="3">MAQUINARIA Y EQUIPO</td></tr><tr><td>Descripción de la Meta Física Contractual</td><td>Unidad</td><td>Cantidad</td><td></td><td>Avance Físico</td><td>Tramo y/o sector 1</td><td>Tramo y/o sector 2</td><td>Tramo y/o sector (n)</td><td>Total</td><td>%</td><td>Descripción</td><td>Equipo Mínimo</td><td>Total Disponible</td></tr><tr><td rowspan="2">MEJORAMIENTO de resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ</td><td rowspan="2">M3</td><td rowspan="2">14,96</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td>64,93</td><td>91,07%</td><td rowspan="2">MEZCLADORA</td><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">2</td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td>40,46</td><td>56,74%</td></tr><tr><td rowspan="2">Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)</td><td rowspan="2">M3</td><td rowspan="2">6,59</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td>26,35</td><td>83,9%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td>19,70</td><td>62,73%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)</td><td rowspan="2">KI</td><td rowspan="2">603,47</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td>3017,36</td><td>91,80%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td>2287,80</td><td>69,60%</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Meta Física (Programa de Obra)				Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				MAQUINARIA Y EQUIPO			Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad		Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	MEJORAMIENTO de resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	14,96		Prog				64,93	91,07%	MEZCLADORA	1	2	Ejec				40,46	56,74%	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	6,59		Prog				26,35	83,9%				Ejec				19,70	62,73%				Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KI	603,47		Prog				3017,36	91,80%				Ejec				2287,80	69,60%																												
Meta Física (Programa de Obra)				Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				MAQUINARIA Y EQUIPO																																																																																																												
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad		Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																																																								
MEJORAMIENTO de resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	14,96		Prog				64,93	91,07%	MEZCLADORA	1	2																																																																																																								
			Ejec				40,46	56,74%																																																																																																												
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	6,59		Prog				26,35	83,9%																																																																																																											
			Ejec				19,70	62,73%																																																																																																												
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KI	603,47		Prog				3017,36	91,80%																																																																																																											
			Ejec				2287,80	69,60%																																																																																																												
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).																																																																																																																				
TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:																																																																																																																				
TRAMO Y/O SECTOR (n):																																																																																																																				

IV. GESTION AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: COMERCIALIZADORES DE MATERIALES	DISPONIBLE	ZONAS DE DEPOSITO	SI NO X N/A
PERMISO MINERO: X NO	LICENCIA AMBIENTAL: X NO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO X N/A
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO X	APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI NO X N/A
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO X		CONCESIÓN DE AGUAS:	SI NO X N/A
OBSERVACIONES:		OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI NO X N/A
		VERTIMENTOS:	SI NO X N/A
		EMISIONES:	SI NO X N/A
		OTROS (Especificar cual)	SI NO X N/A
		OBSERVACIONES::Para este convenio solidario no se requiere licenciamiento y permisos ambientales, considerando que la vía a intervenir es existente, adicionalmente no realizaran intervenciones sobre ningun cauce de agua, asi mismo, se anota que considerando la cuantía de	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES:	
ESTADO: EN APROBACIÓN			
V. GESTIÓN SOCIAL			
	OBRA	INTER	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	2	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	2	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	10		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	12		ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	
OBSERVACIONES: Se realizó una socialización inicial a los convenios del programa Caminos Comunitarios para a Paz total el día 27 de febrero de 2024 en el municipio de barrancas- La Guajira, vereda las pavas una vez finalice la etapa de revision de Estudios y Diseños y se establezca la meta fisica del proyecto, se realizará una segunda socializacion previo al inicio de las obras.			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
ACTIVIDADES TECNICAS: Se inicia fundida de cunetas restantes			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
Terminación de obras			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
Programado	Pr+000	Pr+120m	
Ejecutado	69%		Acero concreto Subbase
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Evidenciar y documentar las actividades realizadas por el contratista en la ejecución del contrato. • Evaluar y verificar las intervenciones y el desempeño del contratista en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras. • Verificar el cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los convenios solidarios, a fin de garantizar la legalidad y transparencia del proceso.	FIRMA NOMBRE: JORGE GAMARRA Matricula Profesional No.: 0820239162ATL
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.	

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO VERSION PÁGINA</div>																																																																																	
		FECHA	25/07/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																																																																
I INFORMACION GENERAL																																																																																			
PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONUEVO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"																																																																																			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		SEMANA No.: 17 del 19 al 25 Último Informe Semanal SI ☐ <small>(Numeración consecutiva)</small>																																																																																	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MILAGRO CAMARGO AREVALO																																																																																	
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, VEREDA LAS PAVAS MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																																			
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): con la aprobación de estudios y diseños correspondiente a la Junta de acción Comunal de la vereda las pavas, La Guajira se tiene contemplado 120 metros lineales de placa huella, teniendo en cuenta La Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.																																																																																			
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO construcción de obras de drenaje y/o placa huella en la zona rural del Municipio de barrancas vereda las pavas de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales																																																																																			
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																																	
CONTRATISTA: JAC VEREDA LAS PAVAS		INTERVENTOR: G&G INGENIEROS S.A.S																																																																																	
CONVENIO No. 3191-2023 VALOR INICIAL: \$ 200.168.754,00		INTEGRANTES: MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES																																																																																	
FECHA DE INICIO: 14/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -		CONTRATO No. 9034-2023 VALOR INICIAL: \$ 77.675.231,00																																																																																	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ -		FECHA DE INICIO: 27/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -																																																																																	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2023		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ -																																																																																	
		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024 VALOR ANTICIPO: \$ -																																																																																	
		VALOR AMORTIZADO: \$ -																																																																																	
		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -																																																																																	
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																			
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																			
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX																																																																														
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.168.754																																																																																	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																	
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.168.754	\$ 200.168.754																																																																																
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 77.675.231																																																																																	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA																																																																																		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 77.675.231	\$ 77.675.231																																																																																
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																																			
<table><thead><tr><th colspan="3">CONVENIO</th><th colspan="3">INTERVENTORIA</th></tr></thead><tbody><tr><td>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</td><td>\$</td><td>145.578.911,00</td><td></td><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ 76.675.231,00 98,71%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$</td><td>145.578.911,00 100,00%</td><td></td><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ 68.169.153,93 87,76%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$</td><td>122.000.000,00 83,80%</td><td></td><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 15.335.046,20 20,00%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$</td><td>(23.578.911,00) -16,20%</td><td></td><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 13.633.830,79 17,78%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$</td><td>145.578.911,00 72,73%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$</td><td>122.000.000,00 60,95%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$</td><td>(23.578.911,00) -11,78%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>14.700.667,08 7,34%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>6.350.000,00 3,17%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Observaciones:</td><td colspan="5"></td></tr></tbody></table>						CONVENIO			INTERVENTORIA			VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$	145.578.911,00		TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 76.675.231,00 98,71%	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	145.578.911,00 100,00%		TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 68.169.153,93 87,76%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	122.000.000,00 83,80%		INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 15.335.046,20 20,00%	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	(23.578.911,00) -16,20%		INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 13.633.830,79 17,78%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:						(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)						TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	145.578.911,00 72,73%				TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	122.000.000,00 60,95%				AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	(23.578.911,00) -11,78%				INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	14.700.667,08 7,34%				INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	6.350.000,00 3,17%				Observaciones:					
CONVENIO			INTERVENTORIA																																																																																
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$	145.578.911,00		TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 76.675.231,00 98,71%																																																																														
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	145.578.911,00 100,00%		TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 68.169.153,93 87,76%																																																																														
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	122.000.000,00 83,80%		INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 15.335.046,20 20,00%																																																																														
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	(23.578.911,00) -16,20%		INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 13.633.830,79 17,78%																																																																														
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:																																																																																			
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)																																																																																			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	145.578.911,00 72,73%																																																																																	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	122.000.000,00 60,95%																																																																																	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	(23.578.911,00) -11,78%																																																																																	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	14.700.667,08 7,34%																																																																																	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	6.350.000,00 3,17%																																																																																	
Observaciones:																																																																																			
III. AVANCE FÍSICO																																																																																			
Meta Física Programada % 100% Avance o Atraso Físico % -16,20% Meta Física Ejecutada % 83,80%																																																																																			
MAQUINARIA Y EQUIPO																																																																																			
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			Maquinaria y Equipo																																																																													
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																											
* Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - (mezcla in situ)	M3	6,37	Prog				14,96	20,98%																																																																											
			Ejec				36,00	50,49%																																																																											
* Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	5,05	Prog				6,59	21,0%																																																																											
			Ejec				17,83	56,77%																																																																											
* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KI	269,64	Prog				603,47	18,36%																																																																											
			Ejec				2259,70	68,75%																																																																											
Observaciones: * El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico																																																																													
TRAMO Y/O SECTOR 1:			TRAMO Y/O SECTOR 2:																																																																																
TRAMO Y/O SECTOR (n):																																																																																			

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: COMERCIALIZADORES DE MATERIALES F

UBICACIÓN:

OBSERVACIONES:

DISPONIBLE

PERMISO MINERO: SI X NO X

LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO X

PERMISO MINERO: SI NO X

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO X

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO

LICENCIA AMBIENTAL:

APROVECHAMIENTO FORESTAL:

CONCESIÓN DE AGUAS:

OCUPACIÓN DE CAUCES:

VERTIENTES:

EMISIONES:

OTROS (Especificar cual)

SI

NO

X

N/A

SI

NO

X

N/A

SI

NO

X

N/A

SI

NO

X

N/A

SI

NO

X

N/A

SI

NO

X

N/A

SI

NO

X

N/A

OBSERVACIONES: Para este convenio solidario no se requiere licenciamiento y permisos ambientales, considerando que la vía a intervenir es existente, adicionalmente no realizarán intervenciones sobre ningún cauce de agua, así mismo, se anota que considerando la cuantía de estos

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN APROBACIÓN

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

12

2

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

2

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

10

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizó una socialización inicial a los convenios del programa Caminos Comunitarios para a Paz total el día 27 de febrero de 2024 en el municipio de barrancas- La Gualjira, vereda las pavas una vez finalice la etapa de revision de Estudios y Diseños y se establezca la meta física del proyecto, se realizará una segunda socialización previo al inicio de las obras.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

14

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS :Figuración de acero, fundida de concreto ciclopeo y reforzado

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

FIN DE OBRAS

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

Programado

Ejecutado

Pr+000

Pr+120m

90%

Acero

concreto

Subbase

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO





CONCRETO PLACA HUELLA RESTANTE

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Evidenciar y documentar las actividades realizadas por el contratista en la ejecución del contrato.

Evaluar y verificar las intervenciones y el desempeño del contratista en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras.

Verificar el cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los convenios solidarios, a fin de garantizar la legalidad y transparencia del proceso.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: JORGE GAMARRA

Matricula Profesional No.: 0820239162ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVAIS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
			VERSION	
			PÁGINA	
			FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)
I. INFORMACION GENERAL				
PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONUEVO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL				
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		SEMANA No.:	17 del 26 al 31 Último Informe Semanal SI ☐
			(Numeración consecutiva)	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:	DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	MILAGRO CAMARGO AREVALO
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, VEREDA LAS PAVAS MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL				
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):				
con la aprobación de estudios y diseños correspondiente a la Junta de acción Comunal de la vereda las pavas, La Guajira se tiene contemplado 120 metros lineales de placa huella, teniendo en cuenta La Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.				
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO				
construcción de obras de drenaje y/o placa huella en la zona rural del Municipio de barrancas vereda las pavas de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales				
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA: JAC, VEREDA LAS PAVAS		INTERVENTOR: G&G INGENIEROS S.A.S		
		INTEGRANTES: MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES		
CONVENIO No.	3191-2023	VALOR INICIAL:	\$	200.168.754,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	\$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	\$	-
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2023			
		CONTRATO No.	5034-2023	VALOR INICIAL:
				\$ 77.675.231,00
		FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:
				\$ -
		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:
				\$ -
		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:
				\$ -
				VALOR AMORTIZADO:
				\$ -
				SALDO POR AMORTIZAR:
				\$ -
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO				
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:				
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.168.754		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.168.754	\$ 200.168.754	
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 77.675.231		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 77.675.231	\$ 77.675.231	
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)				
CONVENIO				
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 145.578.911,00				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 145.578.911,00 100,00%				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 122.000.000,00 83,80%				
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ (23.578.911,00) -16,20%				
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:				
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)				
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 145.578.911,00 72,73%				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 122.000.000,00 60,95%				
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ (23.578.911,00) -11,78%				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 14.700.667,08 7,34%				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 6.350.000,00 3,17%				
Observaciones:				
INTERVENTORIA				
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 76.675.231,00 98,71%				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 68.169.153,93 87,76%				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 15.335.046,20 20,00%				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 13.633.830,79 17,78%				
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO				
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:				
PERIODO FACTURADO:				
VALOR FACTURA: \$ -				
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				
Observaciones:				
III. AVANCE FÍSICO				
Meta Física Programada % 100%				
Meta Física Ejecutada % 83,80%				
Avance o Atraso Físico % -16,20%				
MAQUINARIA Y EQUIPO				
Meta Física (Programa de Obra)				
Descripción de la Meta Física Contractual				
Unidad				
Cantidad				
* Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ				
M3				
6,37				
* Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)				
M3				
5,05				
* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)				
KI				
269,64				
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).				
TRAMO Y/O SECTOR 1:				
TRAMO Y/O SECTOR (n):				
TRAMO Y/O SECTOR 2:				

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: COMERCIALIZADORES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

OBSERVACIONES:

DISPONIBLE

PERMISO MINERO: SI X NO X

LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO X

PERMISO MINERO: SI NO X

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO X

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO X N/A

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO X N/A

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO X N/A

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO X N/A

OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO X N/A

VERTIMIENTOS: SI NO X N/A

EMISIONES: SI NO X N/A

OTROS (Especificar cual) SI NO X N/A

OBSERVACIONES:Para este convenio solidario no se requiere licenciamiento y permisos ambientales, considerando que la vía a intervenir es existente, adicionalmente no realizaran intervenciones sobre ningún cauce de agua, así mismo, se anota que considerando la cuantía de estos

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN APROBACION

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	10	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:Se realizó una socialización inicial a los convenios del programa Caminos Comunitarios para a Paz total el día 27 de febrero de 2024 en el municipio de barrancas- La Gualjira, vereda las pavas una vez finalice la etapa de revision de Estudios y Diseños y se establezca la meta fisica del proyecto, se realizará una segunada socializacion previo al inicio de las obras.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS :Figuración de acero, fundida de concreto ciclopeo y reforzado

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Figuración de acero , fundida de concreto ciclopeo y reforzado

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

Programado Pr+000 Pr+120m

Ejecutado

90%

Acero
concreto
Subbase

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Evidenciar y documentar las actividades realizadas por el contratista en la ejecución del contrato.
* Evaluar y verificar las intervenciones y el desempeño del contratista en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras.
* Verificar el cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los convenios solidarios, a fin de garantizar la legalidad y transparencia del proceso.


DIRECTOR DE INTERVENTORIA


FIRMA

NOMBRE: JORGE GAMARRA

Matricula Profesional No.: 0820239182ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

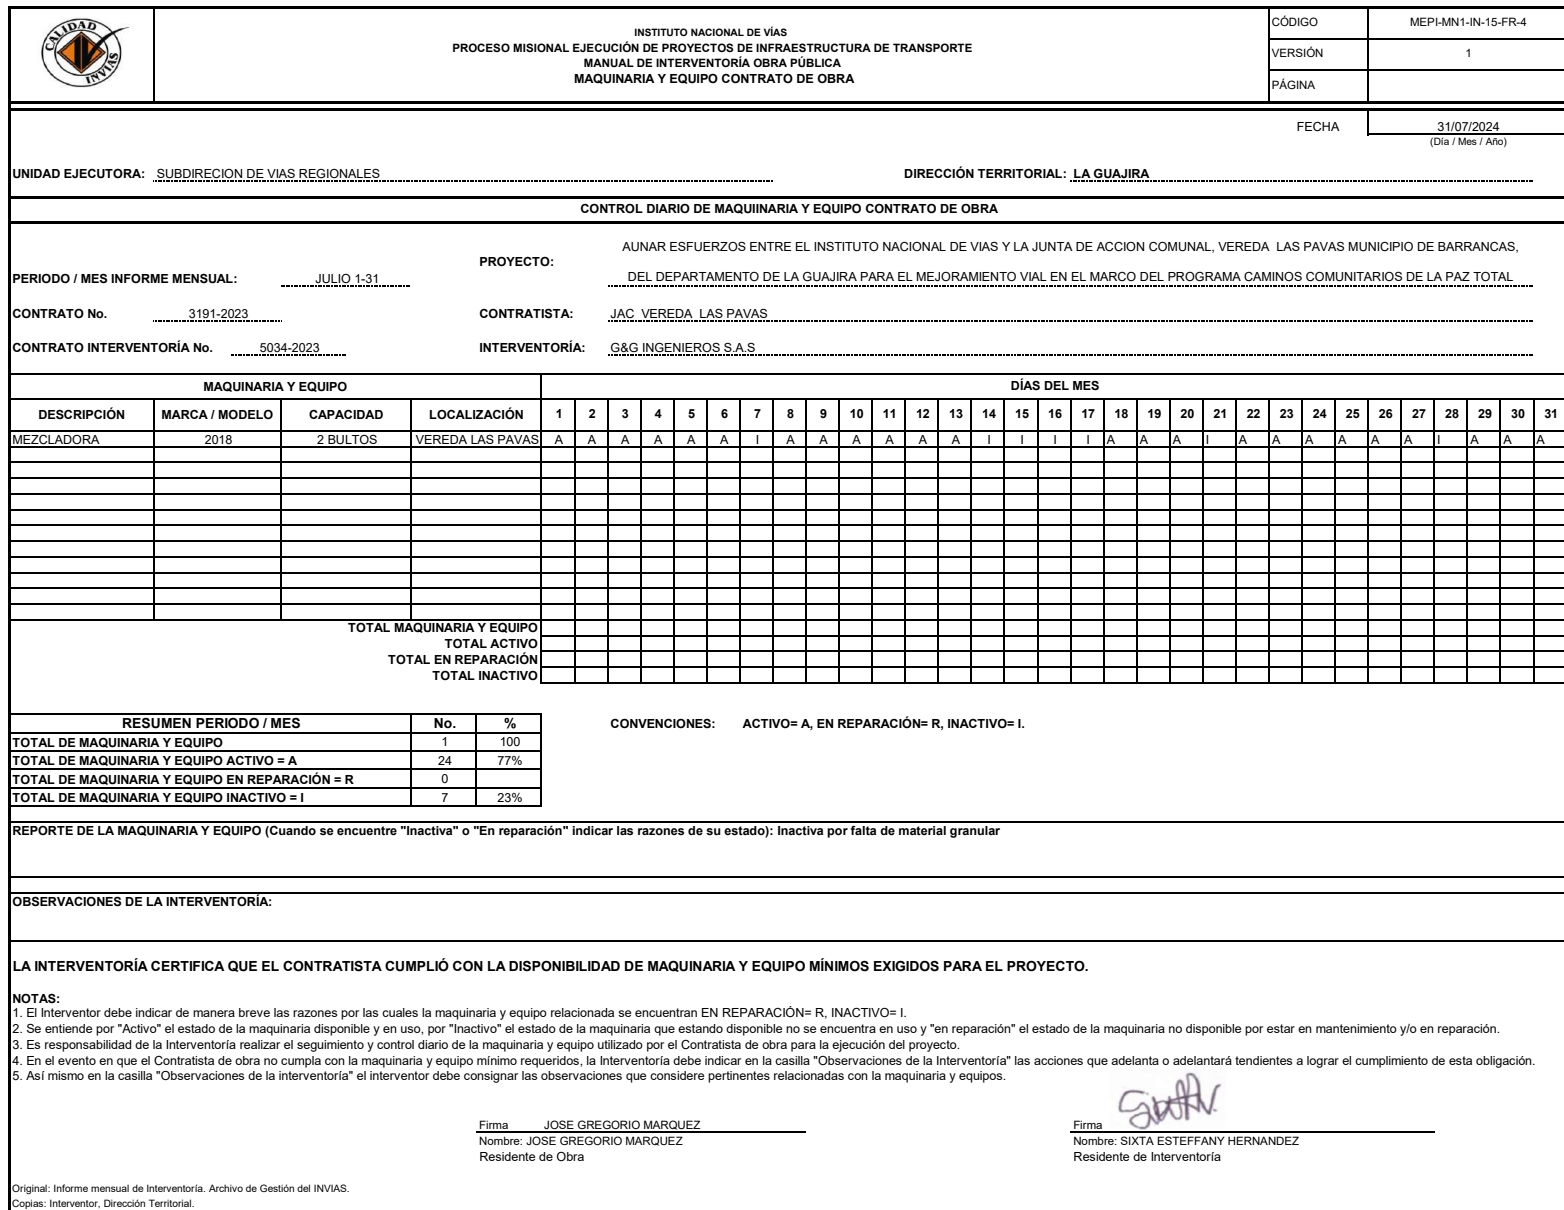

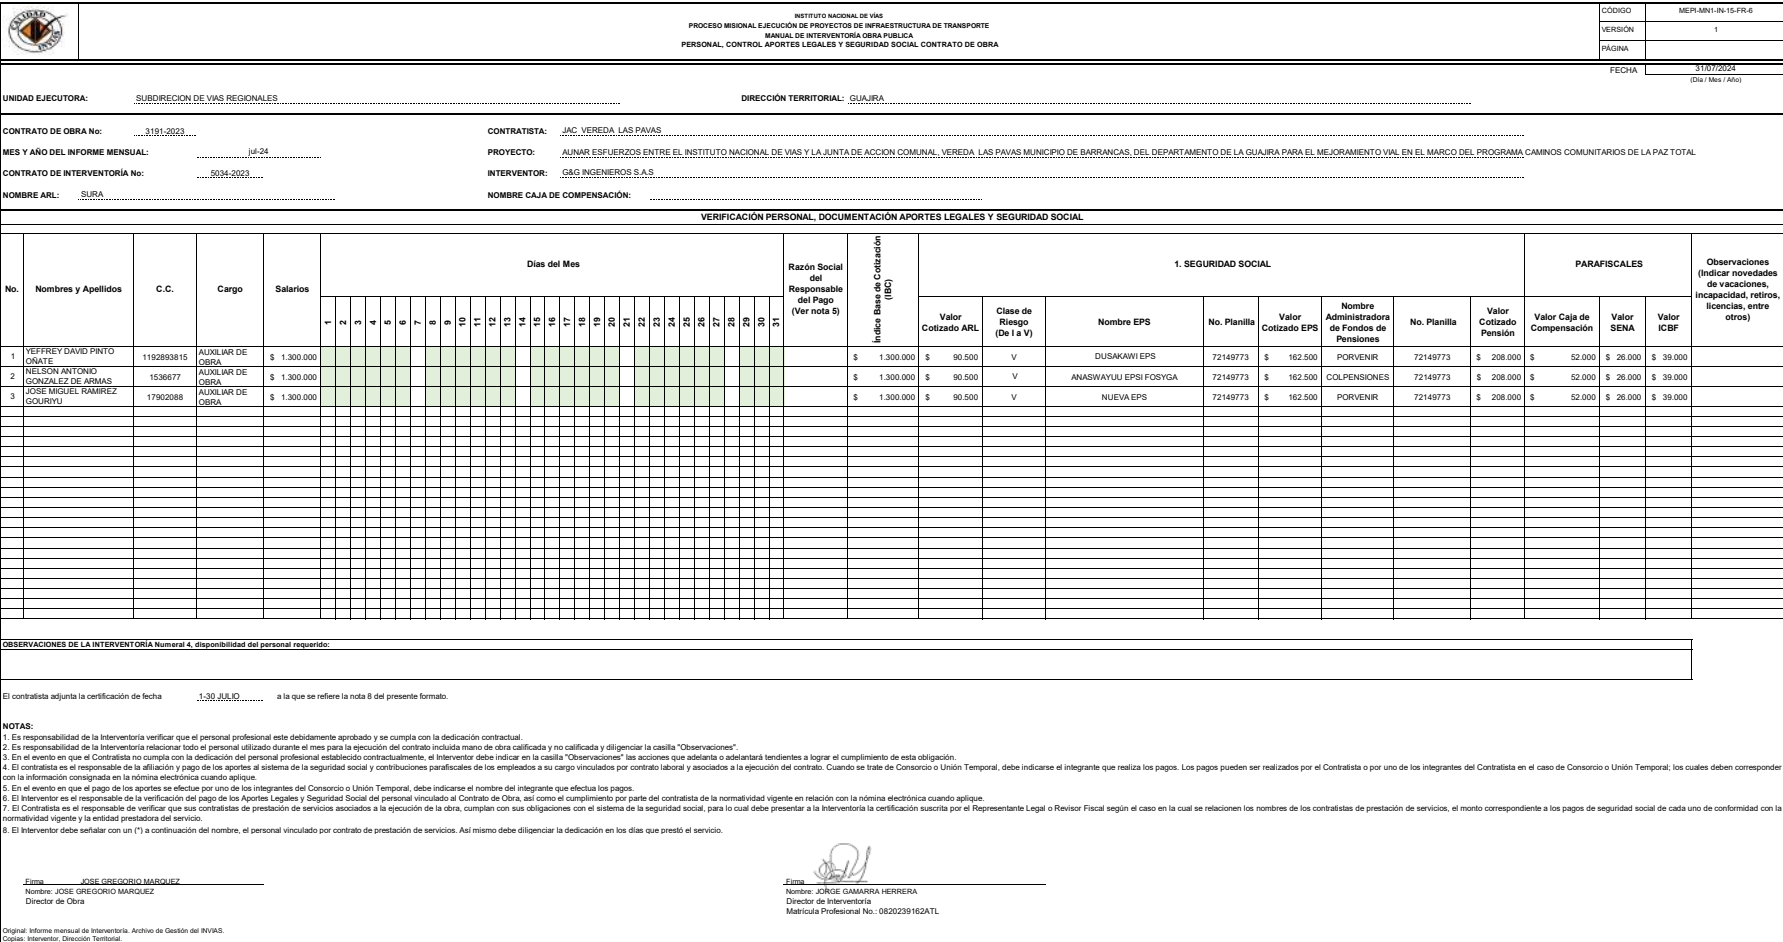



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 31/07/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: 3191-2023 CONTRATISTA: JAC VEREDA LAS PAVAS
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL,
VEREDA LAS PAVAS MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL
MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24 PROYECTO:
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5034-2023 INTERVENTOR: G&G INGENIEROS S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total	
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23	22	22	23	23	22	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
Lluvias moderadas													1	2				2	1														
Lluvias intensas															2	1	1																
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DIA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma JOSE GREGORIO MARQUEZ
Nombre: JOSE GREGORIO MARQUEZ
Residente de Obra

Firma SIXTA ESTEFFANY HERNANDEZ
Nombre: SIXTA ESTEFFANY HERNANDEZ
Residente de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA		
							FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES				DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA			
CONTRATO DE OBRA No.:		3191-2023				CONTRATISTA: JAC VEREDA LAS PAVAS			
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:		jul-24				PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LA VEREDA LAS PAVAS , MUNICIPIO DE BARRANCAS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:		5034-2023				INTERVENTOR: G&G INGENIEROS S.A.S			
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	Rotura 15/05/2024	7 Días rotura	ICONTEC 673	vereda las pavas	3	40%	82%	SI	TIPO FRACTURA 5
2	Rotura 23/05/2024	14 Dias rotura	ICONTEC 673	vereda las pavas	3	65%	90%	SI	TIPO FRACTURA 5
3	Rotura 07/06/2024	28 Días rotura	ICONTEC 673	vereda las pavas	3	90%	105%	SI	TIPO FRACTURA 5
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	Rotura 15/05/2024	7 Días rotura	ICONTEC 673	vereda las pavas	3	40%	82%	SI	TIPO FRACTURA 5
2	Rotura 23/05/2024	14 Dias rotura	ICONTEC 673	vereda las pavas	3	65%	90%	SI	TIPO FRACTURA 5
3	Rotura 07/06/2024	28 Días rotura	ICONTEC 673	vereda las pavas	3	90%	105%	SI	TIPO FRACTURA 5
OBSERVACIONES:									
NOTAS: 1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo. 2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo. 3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad. 4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras. 5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual. 6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.									
Firma _____ Nombre: JOSE GREGORIO MARQUEZ Director de Obra					 Firma _____ Nombre: JORGE LUIS GAMARRA Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 0820239162ATL				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.									

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA		30/09/2024		
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	LA GUAJIRA	
-------------------	---------------------------------	------------------------	------------	--

CONTRATO DE OBRA No.	3191-2023	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA - LAS PAVAS	
----------------------	-----------	--------------	--	--

OBJETO DEL CONTRATO:				
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, VEREDA LAS PAVAS MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL				

FECHA DE INICIO:	27/12/2023
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	30/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL:	\$ 200.168.754,00
VALOR ACUMULADO:	\$ 200.168.754,00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ 6.500.000,00
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ 6.500.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	5034-2023	INTERVENTOR:	G&G INGENIEROS S.A.S	
-------------------------------	-----------	--------------	----------------------	--

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL											
Amparo			% Amparo	Valor Asegurado (\$)		VIGENCIA					
						Desde			Hasta		
Cumplimiento			20%	\$ 40.033.750,0		7	9	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo											
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			5%	\$ 10.008.437,7		7	9	2023	31	12	2026
Calidad de Estudios y Diseños											
Estabilidad y/o Calidad de Obra			30%	\$ 60.050.626,2		31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	100289115
Certificado de modificación o anexo No.:	0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)	
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	26/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL											
Seguro			% Asegurado	Valor Asegurado (\$)		VIGENCIA					
						Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			171,79SLMN	\$ 232.000.000		7	9	2023	31	12	2023
Otros						Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	100070792	OTRAS PÓLIZAS No.	NO
Certificado de modificación o anexo No.:	0		
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)			
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS		
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:	26/12/2023		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			
		FECHA	30/09/2024		
			(Día)	(Mes)	(Año)
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES					
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.					
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA		
Cumplimiento	10	\$ 40.033.750,0			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo					
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20	\$ 10.008.437,7			
Calidad del servicio	30	\$ 60.050.626,2			
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100289115					
Certificado de modificación o anexo No.: 4 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)					
Razón Social Compañía Aseguradora:		COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A			
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:		PENDIENTE			
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL					
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	171,79SLM	\$ 260.000.000			
Otros					
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100070792		OTRAS PÓLIZAS No.	NO		
Certificado de modificación o anexo No.: 4 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)					
Razón Social Compañía Aseguradora:		SEGUROS MUNDIAL			
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:		PENDIENTE			
 Nombre: JORGE GAMARRA Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 0820239162ATL					
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.					

**ANEXOS CONVENIO LOS ESTADOS
4536-2023**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			CÓDIGO	MEP-MIN-15-FR-2																																																																														
				VERSION	1																																																																														
				PÁGINA																																																																															
FECHA: 31/07/2024 (Día/Mes/Año)																																																																																			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAYMA		PERIODO MES: JULIO, 2024																																																																															
CONTRATO DE OBRA No.: 4536-2023		PLAZO INICIAL: 1 MES FECHA DE INICIO: 27/12/2023 FECHA DE SUSPENSIÓN: 31/12/2023 FECHA DE REANUDACIÓN: 30/01/2024 FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2024		VALOR INICIAL (Incluido IVA): \$ 200.257.364,00 VALOR ADICIONALES (Incluido IVA): \$ 0,00 VALOR ACUMULADO (Incluido IVA): \$ 200.257.364,00 ANTICIPO CONCEDIDO: \$ 0,00 ANTICIPO AMORTIZADO: \$ 0,00																																																																															
OBJETO: ACORDA EMPUJOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMunal DE VEREDA LOS ESTADOS MUNICIPIO DE BARRANCAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAYMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		CONTRATISTA: JAC LOS ESTADOS																																																																																	
CONTRATO DE INTERVENTORIA: 5034-2023		INTERVENTOR: G&G INGENIEROS S.A.S																																																																																	
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO			AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																																
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Mezclamiento</td><td>ML</td></tr><tr><td></td><td>Rehabilitación</td><td></td></tr><tr><td>Estructuras</td><td>Tanques</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Puentes</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Parabrisas</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción			Mezclamiento	ML		Rehabilitación		Estructuras	Tanques			Puentes			Parabrisas		Mantenimiento			Otros (Especificar cuales)			<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Mezclamiento</td><td>ML</td><td>112</td></tr><tr><td></td><td>Rehabilitación</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>Estructuras</td><td>Tanques</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Parabrisas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción				Mezclamiento	ML	112		Rehabilitación		0	Estructuras	Tanques				Puentes				Parabrisas			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)																		
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																																																	
Pavimentación	Construcción																																																																																		
	Mezclamiento	ML																																																																																	
	Rehabilitación																																																																																		
Estructuras	Tanques																																																																																		
	Puentes																																																																																		
	Parabrisas																																																																																		
Mantenimiento																																																																																			
Otros (Especificar cuales)																																																																																			
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																																																
Pavimentación	Construcción																																																																																		
	Mezclamiento	ML	112																																																																																
	Rehabilitación		0																																																																																
Estructuras	Tanques																																																																																		
	Puentes																																																																																		
	Parabrisas																																																																																		
Mantenimiento																																																																																			
Otros (Especificar cuales)																																																																																			
AVANCE FINANCIERO																																																																																			
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES			VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																																																
<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>145.664.608,00</td><td></td><td>145.664.608,00</td></tr><tr><td>APORTE OAC</td><td>1.000.000,00</td><td></td><td>1.000.000,00</td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 34 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>49.222.818,00</td><td></td><td>49.222.818,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD</td><td>4.369.938,00</td><td></td><td>4.369.938,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>200.257.364,00</td><td></td><td>200.257.364,00</td></tr></tbody></table>				BÁSICO	IVA	TOTAL	OBRAS	145.664.608,00		145.664.608,00	APORTE OAC	1.000.000,00		1.000.000,00	JORNADAS DE TRABAJO 34 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				ESTUDIOS Y DISEÑOS	49.222.818,00		49.222.818,00	GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	4.369.938,00		4.369.938,00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	200.257.364,00		200.257.364,00	<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>25.881.000,00</td><td>4.917.390,00</td><td>30.798.390,00</td><td>30.798.390,00</td></tr><tr><td>AJUSTES GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>5.160.000,00</td><td>980.400,00</td><td>6.140.400,00</td><td>6.140.400,00</td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 34 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR TOTAL EJECUTADO</td><td>31.041.000,00</td><td>5.897.790,00</td><td>36.938.790,00</td><td>36.938.790,00</td></tr></tbody></table>				BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	OBRAS	25.881.000,00	4.917.390,00	30.798.390,00	30.798.390,00	AJUSTES GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL					GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.160.000,00	980.400,00	6.140.400,00	6.140.400,00	JORNADAS DE TRABAJO 34 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN					GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)					GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)					GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)					GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)					VALOR TOTAL EJECUTADO	31.041.000,00	5.897.790,00	36.938.790,00	36.938.790,00
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																																																
OBRAS	145.664.608,00		145.664.608,00																																																																																
APORTE OAC	1.000.000,00		1.000.000,00																																																																																
JORNADAS DE TRABAJO 34 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN																																																																																			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	49.222.818,00		49.222.818,00																																																																																
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	4.369.938,00		4.369.938,00																																																																																
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	200.257.364,00		200.257.364,00																																																																																
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																																															
OBRAS	25.881.000,00	4.917.390,00	30.798.390,00	30.798.390,00																																																																															
AJUSTES GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL																																																																																			
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.160.000,00	980.400,00	6.140.400,00	6.140.400,00																																																																															
JORNADAS DE TRABAJO 34 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN																																																																																			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)																																																																																			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)																																																																																			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)																																																																																			
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)																																																																																			
VALOR TOTAL EJECUTADO	31.041.000,00	5.897.790,00	36.938.790,00	36.938.790,00																																																																															
INVERSIÓN EN OBRA			EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																																																
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 145.664.608,00			MANO DE OBRA CALIFICADA: 7																																																																																
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 59.226.349,12			MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0																																																																																
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 80%			EMPLEOS INCORRECTOS GENERADOS: 0																																																																																
			TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 7																																																																																
REGISTRO FOTOGRAFICO																																																																																			
																																																																																			
CONCRETO VEREDA LOS ESTADOS			CONCRETO REFORZADO- VEREDA LOS ESTADOS																																																																																
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																																																			
<div> Firma Nombre: JORGE LUIS GAMARRA HERRERA Director del Interventoría Matrícula Profesional No. 0820230162ATL <small>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial</small></div>																																																																																			

<div></div>		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MEP-MN1-IN-15-FR-3																																																																																																												
				VERSIÓN	1																																																																																																												
				PÁGINA																																																																																																													
				FECHA	4/07/2024 (Día / Mes / Año)																																																																																																												
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																																																	
PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONU																																																																																																																	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA SEMANA No.: 14 del 1 al 4 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)																																																																																																																	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MILAGRO CAMARGO AREVALO																																																																																																																	
OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, DE VEREDA LOS ESTADOS MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL																																																																																																																	
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): teniendo en cuenta que para el alcance del convenio se preve el mejoramiento de 160 ml de placa huella.																																																																																																																	
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO Para el convenio suscrito se van a realizar el mejoramiento y construcción de 160 ml de obras de placa huella en la vereda los estados perteneciente al municipio de barrancas la guajira, de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la cartilla de obras menores y estructuras viales.																																																																																																																	
CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																																																														
CONTRATISTA: JAC LOS ESTADOS			INTERVENIOR: G&G INGENIEROS S.A.S																																																																																																														
INTEGRANTES:			INTEGRANTES: MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES																																																																																																														
CONTRATO No. 4536-2023 VALOR INICIAL: \$ 200.257.364,00			CONTRATO No. 5034-2023 VALOR INICIAL: \$ 77.675.231,00																																																																																																														
FECHA DE INICIO: 28/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -			FECHA DE INICIO: 27/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -																																																																																																														
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ -			FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ -																																																																																																														
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024 VALOR AMORTIZADO: \$ -			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024 VALOR AMORTIZADO: \$ -																																																																																																														
\$ -			\$ -																																																																																																														
II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																																																	
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																																																	
<table><tr><th>CONTRATO</th><th>VIGENCIA</th><th>2023</th><th>2024</th><th>20XX</th><th>20XX</th></tr><tr><td rowspan="3">OBRA</td><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td>\$ 200.257.364</td><td>\$ 200.257.364</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SALDO DE VIGENCIA</td><td>\$ 200.257.364</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">INTERVENTORIA</td><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td>\$ 77.675.231</td><td>\$ 77.675.231</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SALDO DE VIGENCIA</td><td>\$ 77.675.231</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <small>(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)</small>						CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX	OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.257.364	\$ 200.257.364			EJECUTADO DE LA VIGENCIA					SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.257.364				INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 77.675.231	\$ 77.675.231			EJECUTADO DE LA VIGENCIA					SALDO DE VIGENCIA	\$ 77.675.231																																																																									
CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX																																																																																																												
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.257.364	\$ 200.257.364																																																																																																														
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA																																																																																																																
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.257.364																																																																																																															
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 77.675.231	\$ 77.675.231																																																																																																														
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA																																																																																																																
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 77.675.231																																																																																																															
<table><tr><th colspan="4">OBRA</th></tr><tr><td>VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):</td><td>\$</td><td>145.664.608,00</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$</td><td>94.681.995,20</td><td>65%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$</td><td>74.288.950,08</td><td>51%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$</td><td>(20.393.045,12)</td><td>-14%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)</td><td>\$</td><td>1.500.000,00</td><td>0,75%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$</td><td>94.681.995,20</td><td>65,0%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$</td><td>74.288.950,08</td><td>51,0%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$</td><td>(20.393.045,12)</td><td>-10%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>18.936.399,04</td><td>13,0%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>11.653.168,64</td><td>8,0%</td></tr><tr><td colspan="4"><table><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</td></tr><tr><td colspan="4">No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____</td></tr><tr><td colspan="4">PERIODO FACTURADO: _____</td></tr><tr><td colspan="4">VALOR FACTURA: \$ _____</td></tr><tr><td colspan="4">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr><tr><td colspan="4">Observaciones:</td></tr></table>						OBRA				VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$	145.664.608,00		INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	94.681.995,20	65%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	74.288.950,08	51%	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	(20.393.045,12)	-14%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	\$	1.500.000,00	0,75%	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	94.681.995,20	65,0%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	74.288.950,08	51,0%	AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	(20.393.045,12)	-10%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	18.936.399,04	13,0%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	11.653.168,64	8,0%	<table><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table> RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:				SI	NO		X	No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____				PERIODO FACTURADO: _____				VALOR FACTURA: \$ _____				(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				Observaciones:																																							
OBRA																																																																																																																	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$	145.664.608,00																																																																																																															
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	94.681.995,20	65%																																																																																																														
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	74.288.950,08	51%																																																																																																														
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	(20.393.045,12)	-14%																																																																																																														
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	\$	1.500.000,00	0,75%																																																																																																														
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	94.681.995,20	65,0%																																																																																																														
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	74.288.950,08	51,0%																																																																																																														
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	(20.393.045,12)	-10%																																																																																																														
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	18.936.399,04	13,0%																																																																																																														
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	11.653.168,64	8,0%																																																																																																														
<table><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table> RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:				SI	NO		X																																																																																																										
SI	NO																																																																																																																
	X																																																																																																																
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____																																																																																																																	
PERIODO FACTURADO: _____																																																																																																																	
VALOR FACTURA: \$ _____																																																																																																																	
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																																																																	
Observaciones:																																																																																																																	
<table><tr><th colspan="2">ANTICIPOS</th><th>INDICADOR IC</th><th colspan="2">ANTICIPOS</th></tr><tr><td>Otorgado \$</td><td>NA</td><td>En el mes:</td><td>Otorgado \$</td><td></td></tr><tr><td>Amortizado \$</td><td>NA</td><td>Acumulado:</td><td>Amortizado \$</td><td></td></tr><tr><td>Saldo \$</td><td></td><td></td><td>Saldo \$</td><td></td></tr></table>						ANTICIPOS		INDICADOR IC	ANTICIPOS		Otorgado \$	NA	En el mes:	Otorgado \$		Amortizado \$	NA	Acumulado:	Amortizado \$		Saldo \$			Saldo \$																																																																																									
ANTICIPOS		INDICADOR IC	ANTICIPOS																																																																																																														
Otorgado \$	NA	En el mes:	Otorgado \$																																																																																																														
Amortizado \$	NA	Acumulado:	Amortizado \$																																																																																																														
Saldo \$			Saldo \$																																																																																																														
III. AVANCE FÍSICO																																																																																																																	
Meta Física Programada % 65% Avance o Atraso Físico % -14% Meta Física Ejecutada % 51%																																																																																																																	
<table><tr><th colspan="5">Meta Física (Programa de Obra) Línea Base</th><th colspan="4">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</th></tr><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th><th>Vigencia</th><th>Vigencia (n)</th><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr><tr><td>* Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) -</td><td>M3</td><td>14,96</td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td>35,01</td><td>49,1%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td>13,18</td><td>41,96%</td></tr><tr><td>* Concreto Ciclopeo Resistencia 14MPa (G)</td><td>M3</td><td>6,59</td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td>14,58</td><td>46,4%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td>12,40</td><td>0,21%</td></tr><tr><td>* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)</td><td>Kl</td><td>603,47</td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td>1810,42</td><td>55,08%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td>2220,35</td><td>67,55%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <small>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</small> TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0 + 000 PR 0 + 160 TRAMO Y/O SECTOR 2: _____ TRAMO Y/O SECTOR (n): _____						Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	* Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) -	M3	14,96			Prog				35,01	49,1%						Ejec				13,18	41,96%	* Concreto Ciclopeo Resistencia 14MPa (G)	M3	6,59			Prog				14,58	46,4%						Ejec				12,40	0,21%	* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kl	603,47			Prog				1810,42	55,08%						Ejec				2220,35	67,55%						Prog											Ejec					
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada																																																																																																												
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																																																							
* Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) -	M3	14,96			Prog				35,01	49,1%																																																																																																							
					Ejec				13,18	41,96%																																																																																																							
* Concreto Ciclopeo Resistencia 14MPa (G)	M3	6,59			Prog				14,58	46,4%																																																																																																							
					Ejec				12,40	0,21%																																																																																																							
* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kl	603,47			Prog				1810,42	55,08%																																																																																																							
					Ejec				2220,35	67,55%																																																																																																							
					Prog																																																																																																												
					Ejec																																																																																																												
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																																																																	
FUENTES DE MATERIALES			PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																																																																														
UBICACIÓN: SAN JUAN -LA GUAJIRA			ZONAS DE DEPÓSITO SI NO N/A X																																																																																																														
			LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X																																																																																																														
			APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A X																																																																																																														
			CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A X																																																																																																														
			OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A X																																																																																																														
			VERTIENTOS: SI NO N/A X																																																																																																														
			EMISIONES: SI NO N/A X																																																																																																														
			OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X																																																																																																														
OBSERVACIONES:			OBSERVACIONES: Para este convenio solidario no se requiere licenciamientos y permisos ambientales ,adicionalmente no se se realizaron intervenciones sobre ningún cauce de agua																																																																																																														
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)																																																																																																																	
ESTADO: Etapa de desarrollo																																																																																																																	
OBSERVACIONES: la guía ambiental (paga) se encuentra en etapa inicial de desarrollo																																																																																																																	

V. GESTIÓN SOCIAL				
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ 1	OBSERVACIONES: Se realizó una socialización inicial a los convenios de los programas caminos comunitarios para la paz total el día 26 de febrero de 2024 en la vereda los estados perteneciente al municipio de barrancas la guajira una vez finalice la etapa de estudios y diseños y se establezca la meta física del proyecto se realizará una segunda socialización previo al inicio de obra
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	2	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	14		_____	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____				
VI. GESTIÓN PREDIAL				
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____ FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ AVALÚOS APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____			OBSERVACIONES: <div style="border: 1px solid black; height: 80px; margin-top: 5px;"></div>	
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD				
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
AREA TECNICA: Se lleva a cabo fundida de placas restantes ciclopeo y reforzado.				
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
continuar con fundida de concreto reforzado y ciclopeo				
X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS				
PR+000 PROG. EJEC.	<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> PR+000 PR+160 </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">86%</div>			
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px); border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> BORDILLO <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: black; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> ACERO <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: grey; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> CONCRETO <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: yellow; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> SUBBASE </div>			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				



<p>NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.</p>	
<p>XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA</p> <p>• Evidenciar y documentar las actividades realizadas por el contratista en la ejecución del contrato.</p> <p>• Evaluar y verificar las intervenciones y el desempeño del contratista en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras.</p> <p>• Verificar el cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los convenios solidarios, a fin de garantizar la legalidad y transparencia del proceso.</p>	<p>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</p> <p></p> <p>FIRMA _____</p> <p>NOMBRE: <u>JORGE GAMARRA</u></p> <p>Matrícula Profesional No.: <u>0820239162ATL</u></p>
<p>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</p> <p>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</p>	

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONUE'

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA SEMANA No.: 16 del 12 al 18, Último Informe Semanal SI ☐

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, DE VEREDA LOS ESTADOS MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
teniendo en cuenta que para el alcance del convenio se preve el mejoramiento de 160 ml de placa huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Para el convenio suscrito se van a realizar el mejoramiento y construcción de 160 ml de obras de placa huella en la vereda los estados perteneciente al municipio de barrancas la guajira, de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la cartilla de obras menores y estructuras viales.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA: JAC LOS ESTADOS				INTERVENTOR: G&G INGENIEROS S.A.S			
INTEGRANTES:				INTEGRANTES: MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES			
CONTRATO No. 4536-2023		VALOR INICIAL: \$ 200.257.364,00		CONTRATO No. 5034-2023		VALOR INICIAL: \$ 77.675.231,00	
FECHA DE INICIO: 28/12/2023		VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 27/12/2023		VALOR ADICIONES: \$ -	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		VALOR ACUMULADO: \$ -		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		VALOR ACUMULADO: \$ -	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024		\$ -		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024		VALOR ANTICIPO: \$ -	
		\$ -				VALOR AMORTIZADO: \$ -	
		\$ -				SALDO POR AMORTIZAR: \$ -	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.257.364	\$ 200.257.364		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.257.364			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 77.675.231	\$ 77.675.231		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 77.675.231			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 145.664.608,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 131.098.147,20 90%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 87.398.764,80 60%

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ 43.699.382,40 30%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ 2.166.666,67 1,1%

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 131.098.147,20 90,0%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 87.398.764,80 60,0%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ (43.699.382,40) 30%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 18.936.399,04 13,0%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 10.487.851,78 8,0%

SI NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____

PERIODO FACTURADO: _____

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: el convenio se encuentra en proceso de validación de firma con la entidad bancaria

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 76.675.231,00 98,71%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 68.169.153,93 87,76%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA \$ 15.335.046,20 20,00%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA \$ 13.633.830,79 17,78%

SI NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____

PERIODO FACTURADO: _____

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		INDICADOR IIC	
Otorgado \$	NA	En el mes:	
Amortizado \$	NA	Acumulado:	
Saldo \$			

ANTICIPOS	
Otorgado \$	
Amortizado \$	
Saldo \$	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 90% Avance o Atraso Físico % 30

Meta Física Ejecutada % 60%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) -	M3	14,96			Prog				64,93	91,07%
					Ejec				40,46	56,74%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	6,59			Prog				26,35	83,9%
					Ejec				19,70	62,73%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kl	603,47			Prog				3017,36	91,80%
					Ejec				2287,80	69,60%
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0 + 000 PR 0 + 160

TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
1 MEZCLADORA	1	1
Total		1

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: SAN JUAN - LA GUAJIRA

PERMISO MINERO: SI X NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A X

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A

OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A X

VERTIENTOS: SI NO N/A X

EMISIONES: SI NO N/A X

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X


OBSERVACIONES: Para este convenio solidario no se requiere licenciamientos y permisos ambientales ,adicionalmente no se se realizaron intervenciones sobre ningún cauce de agua

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: NA

OBSERVACIONES: la guia ambiental (paga) se encuentra en etapa inicial de desarrollo

[illegible]

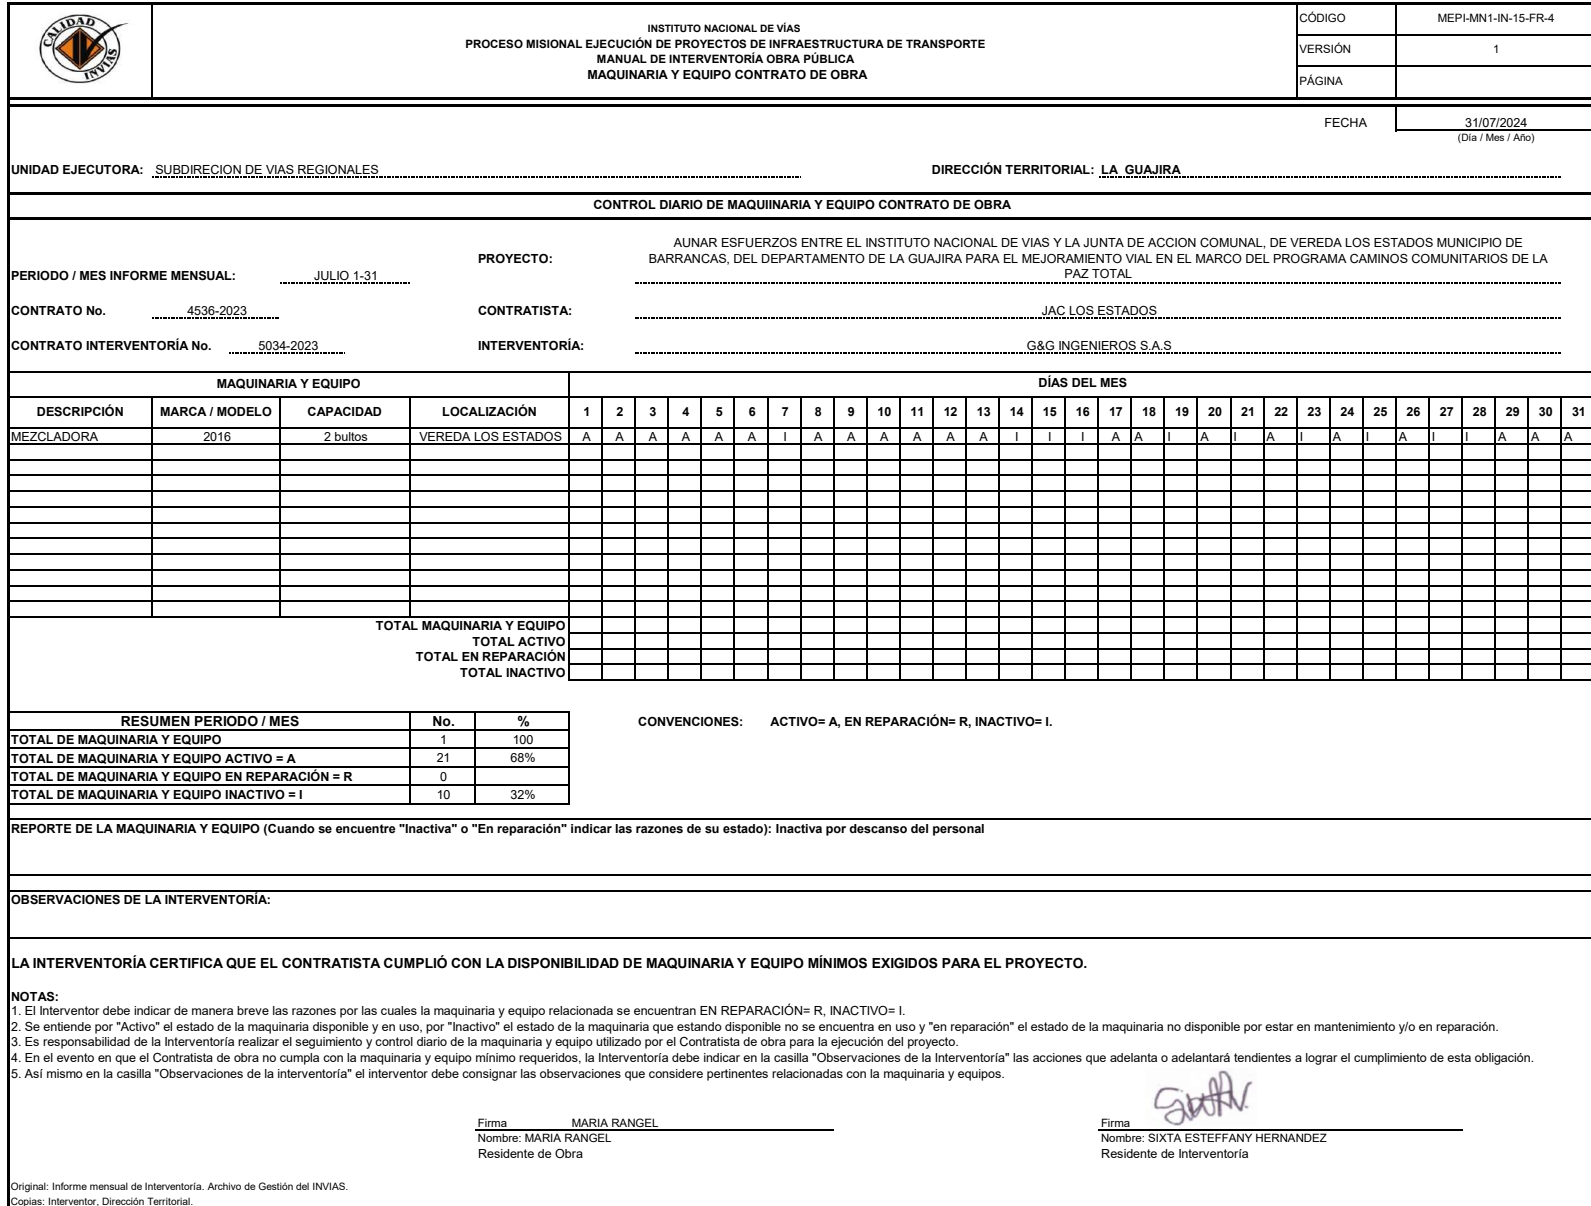



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 31/07/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: 4536-2023

CONTRATISTA: JAC LOS ESTADOS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, DE VEREDA LOS ESTADOS MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5034-2023

INTERVENTOR: G&G INGENIEROS S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																																Total		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	22	21	23	23	22	24	24	24	24	22	24	22	24	24	24	24	24	24		
Lluvias moderadas																2	3			2					2		2								
Lluvias intensas																		1	1																
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:

Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma MARIA RANGEL
Nombre: MARIA RANGEL
Residente de Obra

Firma
Nombre: SIXTA ESTEFFANY HERNANDEZ
Residente de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA		
							FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES				DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA			
CONTRATO DE OBRA No.:		4536-2023				CONTRATISTA: JAC VEREDA LOS ESTADOS			
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:		jul-24				PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LA VEREDA LOS ESTADOS, MUNICIPIO DE BARRANCAS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:		5034-2023				INTERVENTOR: G&G INGENIEROS S.A.S			
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	Rotura 15/05/2024	7 Días rotura	ICONTEC 673	vereda los estados	3	40%	82%	SI	TIPO FRACTURA 5
2	Rotura 29/05/2024	14 Días rotura	ICONTEC 673	vereda los estados	3	65%	90%	SI	TIPO FRACTURA 5
3	Rotura 12/06/2024	28 Días rotura	ICONTEC 673	vereda los estados	3	90%	105%	SI	TIPO FRACTURA 5
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	Rotura 15/05/2024	7 Días rotura	ICONTEC 673	vereda los estados	3	40%	82%	SI	TIPO FRACTURA 5
2	Rotura 29/05/2024	14 Días rotura	ICONTEC 673	vereda los estados	3	65%	90%	SI	TIPO FRACTURA 5
3	Rotura 12/06/2024	28 Días rotura	ICONTEC 673	vereda los estados	3	90%	105%	SI	TIPO FRACTURA 5
OBSERVACIONES:									
NOTAS:									
<p>1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.</p> <p>2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.</p> <p>3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.</p> <p>4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.</p> <p>5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.</p> <p>6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.</p>									
Firma MARIA RANGEL					Firma				
Nombre: MARIA RANGEL					Nombre: JORGE LUIS GAMARRA				
Director de Obra					Director de Interventoría				
					Matrícula Profesional No.: 0820239162ATL				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.									
Copias: Interventor, Dirección Territorial.									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA			
			FECHA	30	9	2024
				(Día)	(Mes)	(Año)
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA		
CONTRATO DE OBRA No.		4536-2023		CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA - LOS ESTADOS		
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, DE VEREDA LOS ESTADOS MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL						
FECHA DE INICIO: 27/12/2023						
PLAZO INICIAL: 3 meses						
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)						
VALOR INICIAL: \$ 200.257.364,00						
VALOR ACUMULADO: \$ 200.257.364,00 (Incluye adiciones)						
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 6.500.000,00						
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 6.500.000,00						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.		5034-2023		INTERVENTOR: G&G INGENIEROS S.A		
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL						
Amparo			% Amparo	Valor Asegurado (\$)		
Cumplimiento			1000%	\$ 40.051.473,0		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			5%	\$ 10.012.869,0		
Calidad de Estudios y Diseños						
Estabilidad y/o Calidad de Obra			30%	\$ 60.077.210,0		
VIGENCIA						
Desde			Hasta			
21	11	2023	31	10	2024	
21	11	2023	31	12	2026	
31	12	2023	31	12	2028	
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100295192						
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)						
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A						
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 26/12/2023						
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL						
Seguro		% Asegurado	Valor Asegurado (\$)		VIGENCIA	
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		171.79SLMN	\$ 232.000.000		Desde Hasta	
Otros					Día Mes Año	
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100072885		OTRAS PÓLIZAS No.		Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)		
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A		Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 26/12/2023				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			
		FECHA	30	9	2024
			(Día)	(Mes)	(Año)
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES					
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.					
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA		
Cumplimiento	10	\$ 40.051.473,0			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo					
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	\$ 10.012.869,0			
Calidad del servicio	30	\$ 60.077.210,0			
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100295192					
Certificado de modificación o anexo No.: 4					
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)					
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A					
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: PENDIENTE					
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL					
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	171,79SLM	\$ 260.000.000			
Otros					
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100072885		OTRAS PÓLIZAS No. NO			
Certificado de modificación o anexo No.: 4					
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)					
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL					
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: PENDIENTE					
					
Nombre: JORGE GAMARRA					
Director de Interventoría					
Matrícula Profesional No.: 0820239162ATL					
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.					
Copias: Interventor y Dirección Territorial.					

**ANEXOS CONVENIO SABANA EN
MEDIO 3078-2023**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRAS PÚBLICAS RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO MEP-IMP-04-15-FR-2																																																																															
			VERSIÓN 1																																																																															
			PÁGINA																																																																															
			FECHA 31/07/2023 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																																																															
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	GUAJARA																																																																															
		PERÍODO MES:	06.01.23																																																																															
CONTRATO DE OBRA N.º: 3078-2023																																																																																		
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SABANA EN MEDIO MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL		PLAZO INICIAL: 01/07/2023 FECHA DE INICIO: 07/07/2023	VALOR INICIAL (Incluido IVA): \$ 106.813.797,00																																																																															
		FECHA DE SUSPENSIÓN: 31/07/2023 FECHA DE REANUDACIÓN: 01/08/2023	VALOR ADICIONALES (Incluido IVA): N/A																																																																															
CONTRATISTA: JAC SABANA EN MEDIO		FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2024	VALOR ACUMULADO (Incluido IVA): \$ 106.813.797,00																																																																															
		ANTICIPO CONCEDIDO: N/A	ANTICIPO AMORTIZADO: N/A																																																																															
CONTRATO DE INTERVENCIÓN: 0034-2023		INTERVENIOR: G&G INGENIEROS S.A.S	I																																																																															
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO		AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																																
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td>140</td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Rehabilitación</td><td></td></tr><tr><td>Turales</td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Mantenimiento</td><td>Piedras</td><td></td></tr><tr><td>Piedras</td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuáles)</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción		Mejoramiento	140	Estructuras	Rehabilitación		Turales		Puentes		Mantenimiento	Piedras		Piedras		Otros (Especificar cuáles)			<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td>105</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Rehabilitación</td><td>150</td><td></td></tr><tr><td>Turales</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Mantenimiento</td><td>Piedras</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Piedras</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuáles)</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción			Mejoramiento	105		Estructuras	Rehabilitación	150		Turales			Puentes			Mantenimiento	Piedras			Piedras			Otros (Especificar cuáles)																											
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																																																
Pavimentación	Construcción																																																																																	
	Mejoramiento	140																																																																																
Estructuras	Rehabilitación																																																																																	
	Turales																																																																																	
	Puentes																																																																																	
Mantenimiento	Piedras																																																																																	
	Piedras																																																																																	
Otros (Especificar cuáles)																																																																																		
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																																															
Pavimentación	Construcción																																																																																	
	Mejoramiento	105																																																																																
Estructuras	Rehabilitación	150																																																																																
	Turales																																																																																	
	Puentes																																																																																	
Mantenimiento	Piedras																																																																																	
	Piedras																																																																																	
Otros (Especificar cuáles)																																																																																		
AVANCE FINANCIERO																																																																																		
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES		VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																																																
<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 142.369.259,00</td><td>19%</td><td>142.369.259,00</td></tr><tr><td>AFORTE DAC</td><td>1.000.000,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDAVAL Y DE SOSTENIBILIDAD</td><td>\$ 4.271.078,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 49.209.637,00</td><td>19%</td><td>49.209.637,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>\$ 196.849.974,00</td><td>19%</td><td>196.849.974,00</td></tr></tbody></table>		BÁSICO	IVA	TOTAL	OBRAS	\$ 142.369.259,00	19%	142.369.259,00	AFORTE DAC	1.000.000,00			GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDAVAL Y DE SOSTENIBILIDAD	\$ 4.271.078,00			GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 49.209.637,00	19%	49.209.637,00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 196.849.974,00	19%	196.849.974,00	<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>95.087.000,00</td><td></td><td>95.087.000,00</td><td>95.087.000,00</td></tr><tr><td>AJUSTES</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>21.549.305,00</td><td></td><td>21.549.305,00</td><td>21.549.305,00</td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDAVAL (PREACTA)</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>116.636.305,00</td><td>0,00</td><td>116.636.305,00</td><td>116.636.305,00</td></tr></tbody></table>				BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	OBRAS	95.087.000,00		95.087.000,00	95.087.000,00	AJUSTES					GASTOS ADMINISTRATIVOS	21.549.305,00		21.549.305,00	21.549.305,00	JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	0,00				ESTUDIOS Y DISEÑOS					GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)					GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)					GESTIÓN PREDAVAL (PREACTA)	0,00				GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	0,00				VALOR EJECUTADO	116.636.305,00	0,00	116.636.305,00	116.636.305,00
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																																															
OBRAS	\$ 142.369.259,00	19%	142.369.259,00																																																																															
AFORTE DAC	1.000.000,00																																																																																	
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDAVAL Y DE SOSTENIBILIDAD	\$ 4.271.078,00																																																																																	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 49.209.637,00	19%	49.209.637,00																																																																															
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 196.849.974,00	19%	196.849.974,00																																																																															
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																																														
OBRAS	95.087.000,00		95.087.000,00	95.087.000,00																																																																														
AJUSTES																																																																																		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	21.549.305,00		21.549.305,00	21.549.305,00																																																																														
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	0,00																																																																																	
ESTUDIOS Y DISEÑOS																																																																																		
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)																																																																																		
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)																																																																																		
GESTIÓN PREDAVAL (PREACTA)	0,00																																																																																	
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	0,00																																																																																	
VALOR EJECUTADO	116.636.305,00	0,00	116.636.305,00	116.636.305,00																																																																														
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																																																		
INVERSIÓN EN OBRA		EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																																																
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 65.604.265,00		MANO DE OBRA CALIFICADA: 7																																																																																
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 65.604.265,00		MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0																																																																																
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 76,00%		EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0																																																																																
		TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 7																																																																																
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																																																		
																																																																																		
CONCRETO SABANA EN MEDIO		CONCRETO SABANA EN MEDIO																																																																																
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																																																		
NA																																																																																		
Firma:  Nombre: JORGE LUIS CAMARERO HERRERA Director de Interventoría Matrícula Profesional No.082023162ATL <small>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Lugar: Barrancas, Guajira, Colombia</small>																																																																																		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MEP/MN1-IN-15-FR-3
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	
FECHA				4/07/2024 (Día / Mes / Año)
I. INFORMACIÓN GENERAL				
PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONU				
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA SEMANA No.: 14 del 1 al 4 Último Informe Semanal SI ☐				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MILAGRO CAMARGO AREVALO				
OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, DE VEREDA SABANA EN MEDIO MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL				
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): teniendo en cuenta que para el alcance del convenio se preve el mejoramiento de 140 ml de placa huella .				
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO				
Para el convenio suscrito se van a realizar el mejoramiento y construcción de 140 ml de obras de placa huella en la vereda sabana en medio perteneciente al municipio de barrancas la guajira , de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la cartilla de obras menores y estructuras viales.				
CONTRATO DE OBRA: CONTRATISTA: JAC SANANA EN MEDIO				
CONTRATO DE INTERVENTORIA: INTEGRANTES: G&G INGENIEROS S.A.S				
INTEGRANTES: INTEGRANTES: MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES				
CONTRATO No. 3078-2023 VALOR INICIAL: \$ 196.812.797,00				
FECHA DE INICIO: 20/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -				
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ -				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024 VALOR ACUMULADO: \$ -				
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO				
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:				
CONTRATO VIGENCIA 2023 2024 20XX 20XX				
OBRA RECURSOS POR VIGENCIA \$ 196.812.797 \$ 196.812.797				
EJECUTADO DE LA VIGENCIA \$ 196.812.797				
SALDO DE VIGENCIA \$ 77.675.231 \$ 77.675.231				
INTERVENTORIA RECURSOS POR VIGENCIA \$ 77.675.231				
EJECUTADO DE LA VIGENCIA \$ 77.675.231				
SALDO DE VIGENCIA \$ 77.675.231				
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)				
OBRA VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 142.369.259,00				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -				
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -				
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ 1.500.000,00 0,8%				
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)				
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -				
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 18.508.003,67 13,0%				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 11.389.540,72 8,0%				
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO				
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: \$ -				
PERIODO FACTURADO: \$ -				
VALOR FACTURA: \$ -				
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				
Observaciones:				
ANTICIPOS				
Otorgado \$ NA				
Amortizado \$ NA				
Saldo \$				
INDICADOR I/C				
En el mes: \$				
Acumulado: \$				
III. AVANCE FÍSICO				
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %				
Meta Física Ejecutada %				
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base				
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual Unidad Cantidad Vigencia Vigencia (n) Avance Físico Tramo y/o sector 1 Tramo y/o sector 2 Tramo y/o sector (n) Total %				
Prog				
Ejec				
Prog				
Ejec				
Prog				
Ejec				
Prog				
Ejec				
Prog				
Ejec				
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).				
TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0 + 000 PR 0 + 140				
TRAMO Y/O SECTOR (n):				
TRAMO Y/O SECTOR 2:				
IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
FUENTES DE MATERIALES				
UBICACIÓN: SAN JUAN LA GUAJIRA				
PERMISO MINERO: SI DISPONIBLE				
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO				
UBICACIÓN:				
PERMISO MINERO: SI NO				
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO				
OBSERVACIONES:				
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL				
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A				
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A				
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A				
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A				
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A				
VERTIMENTOS: SI NO N/A				
EMISIONES: SI NO N/A				
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A				
OBSERVACIONES: Para este convenio solidario no se requiere licenciamientos y permisos ambientales ,adicionalmente no se se realizaron intervenciones sobre ningun cauce de agua				
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)				
ESTADO: Etapa de desarrollo				
OBSERVACIONES: la guía ambiental (paga) se encuentra en etapa inicial de desarrollo				

V. GESTIÓN SOCIAL		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ 1		
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____		
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		

OBSERVACIONES: Se realizo una socializacion inicial a los convenios de los programas caminos comunitarios para la paz total el dia 26 de febrero de 2024 en la vereda los estados perteneciente al municipio de barrancas la guajira,una vez finalice la etapa de estudios y diseños y se establezca la meta fisica del proyecto se realizara una segunda socializacion previo al inicio de obra		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____		
VI. GESTIÓN PREDIAL		
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	_____	OBSERVACIONES:
FICHAS PEDIALES APROBADAS:	_____	
AVALÚOS APROBADOS:	_____	
PREDIOS ADQUIRIDOS:	_____	
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD		
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
AREA TECNICA: Se llevo acabo la figuracion de acero, fundida de concreto reforzado y ciclopeo cumpliendo con las especificaciones pactadas en los estudios y diseños aprobados		
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
figuracion de acero , fundida de concreto reforzado y ciclopeo		
X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
PROG.	K+000	K+140
EJEC.		
40%		
ACERO BORDILLO CONCRETO SUBBASE		
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO		



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
*Evidenciar y documentar las actividades realizadas por el contratista en la ejecución del contrato. • Evaluar y verificar las intervenciones y el desempeño del contratista en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras. • Verificar el cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los convenios solidarios, a fin de garantizar la legalidad y transparencia del proceso.	FIRMA 
	NOMBRE: JORGE GAMARRA
	Matrícula Profesional No.: 0820239162ATL

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONUE'

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA SEMANA No.: 16 del 12 al 18, Último Informe Semanal SI ☐

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, DE VEREDA SABANA EN MEDIO MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
teniendo en cuenta que para el alcance del convenio se prevé el mejoramiento de 140 ml de placa huella .

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Para el convenio suscrito se van a realizar el mejoramiento y construcción de 140 ml de obras de placa huella en la vereda sabana en medio perteneciente al municipio de barrancas la guajira , de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la cartilla de obras menores y estructuras viales.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	JAC SANANA EN MEDIO			INTERVENTOR:	G&G INGENIEROS S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES		
CONTRATO No.	3078-2023	VALOR INICIAL:	\$ 196.812.797,00	CONTRATO No.	5034-2023	VALOR INICIAL:	\$ 77.675.231,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	\$ -	FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	\$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	\$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	\$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024		\$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	\$ -
			\$ -			VALOR AMORTIZADO:	\$ -
			\$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 196.812.797	\$ 196.812.797		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 196.812.797			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 77.675.231	\$ 77.675.231		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 77.675.231			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 142.369.259,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ 1.500.000,00 0,8%

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 18.508.003,67 13,0%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 11.389.540,72 8,0%

SI NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El convenio se encuentra en proceso de validación de firma con la entidad bancaria

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 76.675.231,00 98,71%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 68.169.153,93 87,76%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA \$ 15.335.046,20 20,00%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA \$ 13.633.830,79 17,78%

SI NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS

Otorgado \$ NA

Amortizado \$ NA

Saldo \$

INDICADOR IIC

En el mes:

Acumulado:

ANTICIPOS

Otorgado \$

Amortizado \$

Saldo \$

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0 + 000 PR 0 + 140

TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: SAN JUAN - LA GUAJIRA

PERMISO MINERO: SI X NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A X

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A

OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A X

VERTIMIENTOS: SI NO N/A X

EMISIONES: SI NO N/A X

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X

OBSERVACIONES:Para este convenio solidario no se requiere licenciamientos y permisos ambientales ,adicionalmente no se se realizaran intervenciones sobre ningun cauce de agua

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: NA

OBSERVACIONES: la guia ambiental (paga) se encuentra en etapa inicial de desarrollo

INVS

CALIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO

MEP-MN1-IN-15-FR-3

VERSIÓN

1

PÁGINA

FECHA

25/07/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONU

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

LA GUAJIRA

SEMANA No.:

17

 del

19

 al

25

 Último Informe Semanal SI☐

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, DE VEREDA SABANA EN MEDIO MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

teniendo en cuenta que para el alcance del convenio se preve el mejoramiento de 140 ml de placa huella .

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Para el convenio suscrito se van a realizar el mejoramiento y construcción de 140 ml de obras de placa huella en la vereda sabana en medio perteneciente al municipio de barrancas la guajira , de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la cartilla de obras menores y estructuras viales.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JAC SANANA EN MEDIO

INTERVENIOR:

G&G INGENIEROS S.A.S

INTEGRANTES:

MICHAEL ANDRÉS GAMARRA TORRES

CONTRATO No.

3078-2023

 VALOR INICIAL:

\$ 196.812.797,00

CONTRATO No.

5034-2023

 VALOR INICIAL:

\$ 77.675.231,00

FECHA DE INICIO:

20/12/2023

 VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

27/12/2023

 VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

 VALOR ACUMULADO:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

 VALOR ACUMULADO:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

30/09/2024

 VALOR AMORTIZADO:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

30/09/2024

 SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 196.812.797	\$ 196.812.797		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 196.812.797			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 77.675.231	\$ 77.675.231		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 77.675.231			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 142.369.259,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 142.369.259,00 100,0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 95.087.000,00 67%
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ (47.282.259,00) -33%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ 1.500.000,00 0,8%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 142.369.259,00 100,0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 95.087.000,00 66,8%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ (47.282.259,00) -24%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 18.508.003,67 13,0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 11.389.540,72 8,0%

SI NO

X

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El convenio se encuentra en proceso de validacion de firma con la entidad bancaria

ANTICIPOS

INDICADOR I/C

Anticipo Obra

Anticipo Interventoria

III. AVANCE FISICO

Meta Fisica Programada % 100% Avance o Atraso Fisico % -33%
Meta Fisica Ejecutada % 67%

Meta Fisica (Programa de Obra) Linea Base

Meta Fisica Programada / Ejecutada Acumulada

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance fisico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0 + 000 PR 0 + 140 TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACION: SAN JUAN - LA GUAJIRA PERMISO MINERO: SI X NO DISPONIBLE LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

UBICACION: PERMISO MINERO: SI NO VERTIENTES: SI NO EMISIONES: SI OTROS (Especificar cual) SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A X
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A X
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A X
VERTIENTES: SI NO N/A X
EMISIONES: SI NO N/A X
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X

OBSERVACIONES: Para este convenio solidario no se requiere licenciamientos y permisos ambientales ,adicionalmente no se realizaran intervenciones sobre ningun cauce de agua

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Etapa de desarrollo

OBSERVACIONES: la guia ambiental (paga) se encuentra en etapa inicial de desarrollo

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizo una socializacion inicial a los convenios de los programas caminos comunitarios para la paz total el día 26 de febrero de 2024 en la vereda los estados perteneciente al municipio de barrancas la guajira,una vez finalice la etapa de estudios y diseños y se establezca la meta fisica del proyecto se realizara una segunda socialización previo al inicio de obra

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

AREA TECNICA:Figuracion de acero, fundida de concreto reforzado y ciclopeo según las especificaciones dadas

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Figuracion de acero,fundir placas en concreto ciclopeo y reforzado según las especificaciones pactadas.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PROG.

EJEC.

K+000

K+140

67%

ACERO

BORDILLO

CONCRETO

SUBBASE

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*Evidenciar y documentar las actividades realizadas por el contratista en la ejecución del contrato.

• Evaluar y verificar las intervenciones y el desempeño del contratista en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras.

• Verificar el cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los convenios solidarios, a fin de garantizar la legalidad y transparencia del proceso.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JORGE GAMARRA

Matrícula Profesional No.: 0820239162ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.


<div></div>	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL						CÓDIGO	MEP-MNI-IN-15-FR-3	
							VERSIÓN	1	
							PÁGINA		
							FECHA	31/07/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>	
I. INFORMACIÓN GENERAL									
PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONU									
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA SEMANA No.: 18 del 26 al 31 Último Informe Semanal SI ☐ <small>(Numeración consecutiva)</small>									
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MILAGRO CAMARGO AREVALO									
OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, DE VEREDA SABANA EN MEDIO MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA									
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): teniendo en cuenta que para el alcance del convenio se preve el mejoramiento de 140 ml de placa huella .									
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO Para el convenio suscrito se van a realizar el mejoramiento y construcción de 140 ml de obras de placa huella en la vereda sabana en medio perteneciente al municipio de barrancas la guajira , de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la cartilla de obras menores y estructuras viales.									
CONTRATO DE OBRA:					CONTRATO DE INTERVENTORIA:				
CONTRATISTA: JAC SANANA EN MEDIO					INTERVENIOR: G&G INGENIEROS S.A.S				
INTEGRANTES:					INTEGRANTES: MICHAEL ANDRÉS GAMARRA TORRES				
CONTRATO No. 3078-2023 VALOR INICIAL: \$ 196.812.797,00					CONTRATO No. 5034-2023 VALOR INICIAL: \$ 77.675.231,00				
FECHA DE INICIO: 20/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -					FECHA DE INICIO: 27/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -				
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ -					FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ -				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024 VALOR AMORTIZADO: \$ -					FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024 SALDO POR AMORTIZAR: \$ -				
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO									
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:									
CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX				
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 196.812.797	\$ 196.812.797						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA								
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 196.812.797							
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 77.675.231	\$ 77.675.231						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA								
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 77.675.231							
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)									
<div><div><div>OBRA</div><div><div>VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 142.369.259,00</div><div>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 142.369.259,00 100%</div><div>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 106.776.944,25 75%</div><div>AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ (35.592.314,75) -25%</div><div>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ 1.500.000,00 0,8% <small>(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)</small></div><div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 142.369.259,00 100,0%</div><div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 106.776.944,25 75,0%</div><div>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ (35.592.314,75) -18%</div><div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 18.508.003,67 13,0%</div><div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 11.389.540,72 8,0%</div></div><div><div>SI NO</div><div>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:<div>X</div></div><div>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: </div><div>PERIODO FACTURADO: </div><div>VALOR FACTURA: \$ -</div></div><div>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</div><div>Observaciones: El convenio se encuentra en proceso de validacion de firma con la entidad bancaria</div></div><div><div>INTERVENTORIA</div><div><div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 76.675.231,00 98,71%</div><div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 68.169.153,93 87,76%</div><div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA \$ 15.335.046,20 20,00%</div><div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA \$ 13.633.830,79 17,78%</div></div><div><div>SI NO</div><div>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:<div></div></div><div>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: </div><div>PERIODO FACTURADO: </div><div>VALOR FACTURA: \$ -</div></div><div>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</div><div>Observaciones:</div></div></div>									


III. AVANCE FÍSICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Meta Física Programada % 100% Avance o Atraso Físico % -25% Meta Física Ejecutada % 75%																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%		---	--------	----------	----------	--------------	---------------	--------------------	--------------------	----------------------	-------	---							Prog												Ejec												Prog												Ejec												Prog												Ejec												Prog												Ejec						* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector). TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0 + 000 PR 0 + 140 TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO Y/O SECTOR (n): MAQUINARIA Y EQUIPO	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible		-------------	---------------	------------------																						Total			Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.	IV. GESTIÓN AMBIENTAL										FUENTES DE MATERIALES					PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					UBICACIÓN: SAN JUAN - LA GUAJIRA					ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X										LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X										APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A X										CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A X										OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A X										VERTIENTOS: SI NO N/A X										EMISIONES: SI NO N/A X										OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X					OBSERVACIONES:					OBSERVACIONES: Para este convenio solidario no se requiere licenciamientos y permisos ambientales ,adicionalmente no se realizaran intervenciones sobre ningun cauce de agua					P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)					OBSERVACIONES: la guía ambiental (paga) se encuentra en etapa inicial de desarrollo					ESTADO: Etapa de desarrollo																	

V. GESTIÓN SOCIAL		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA 3	INTER 2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5		
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1		
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:		
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:		
OBSERVACIONES: Se realizó una socialización inicial a los convenios de los programas caminos comunitarios para la paz total el día 26 de febrero de 2024 en la vereda los estados perteneciente al municipio de barrancas la guajira, una vez finalice la etapa de estudios y diseños y se establezca la meta física del proyecto se realizará una segunda socialización previo al inicio de obra		
VI. GESTIÓN PREDIAL		
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:		OBSERVACIONES:
FICHAS PEDIALES APROBADAS:		
AVALÚOS APROBADOS:		
PREDIOS ADQUIRIDOS:		
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD		
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
AREA TECNICA:Figuracion de acero, fundida de concreto reforzado y ciclopeo según las especificaciones dadas		
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
Figuracion de acero,fundir placas en concreto ciclopeo y reforzado según las especificaciones pactadas.		
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS		
PROG.	K+000	K+140
EJEC.		
75%		
ACERO BORDILLO CONCRETO SUBBASE		
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO		



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
<ul style="list-style-type: none">Evidenciar y documentar las actividades realizadas por el contratista en la ejecución del contrato.Evaluar y verificar las intervenciones y el desempeño del contratista en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras.Verificar el cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los convenios solidarios, a fin de garantizar la legalidad y transparencia del proceso.	FIRMA NOMBRE: JORGE GAMARRA Matrícula Profesional No.: 0820239162ATL
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.	

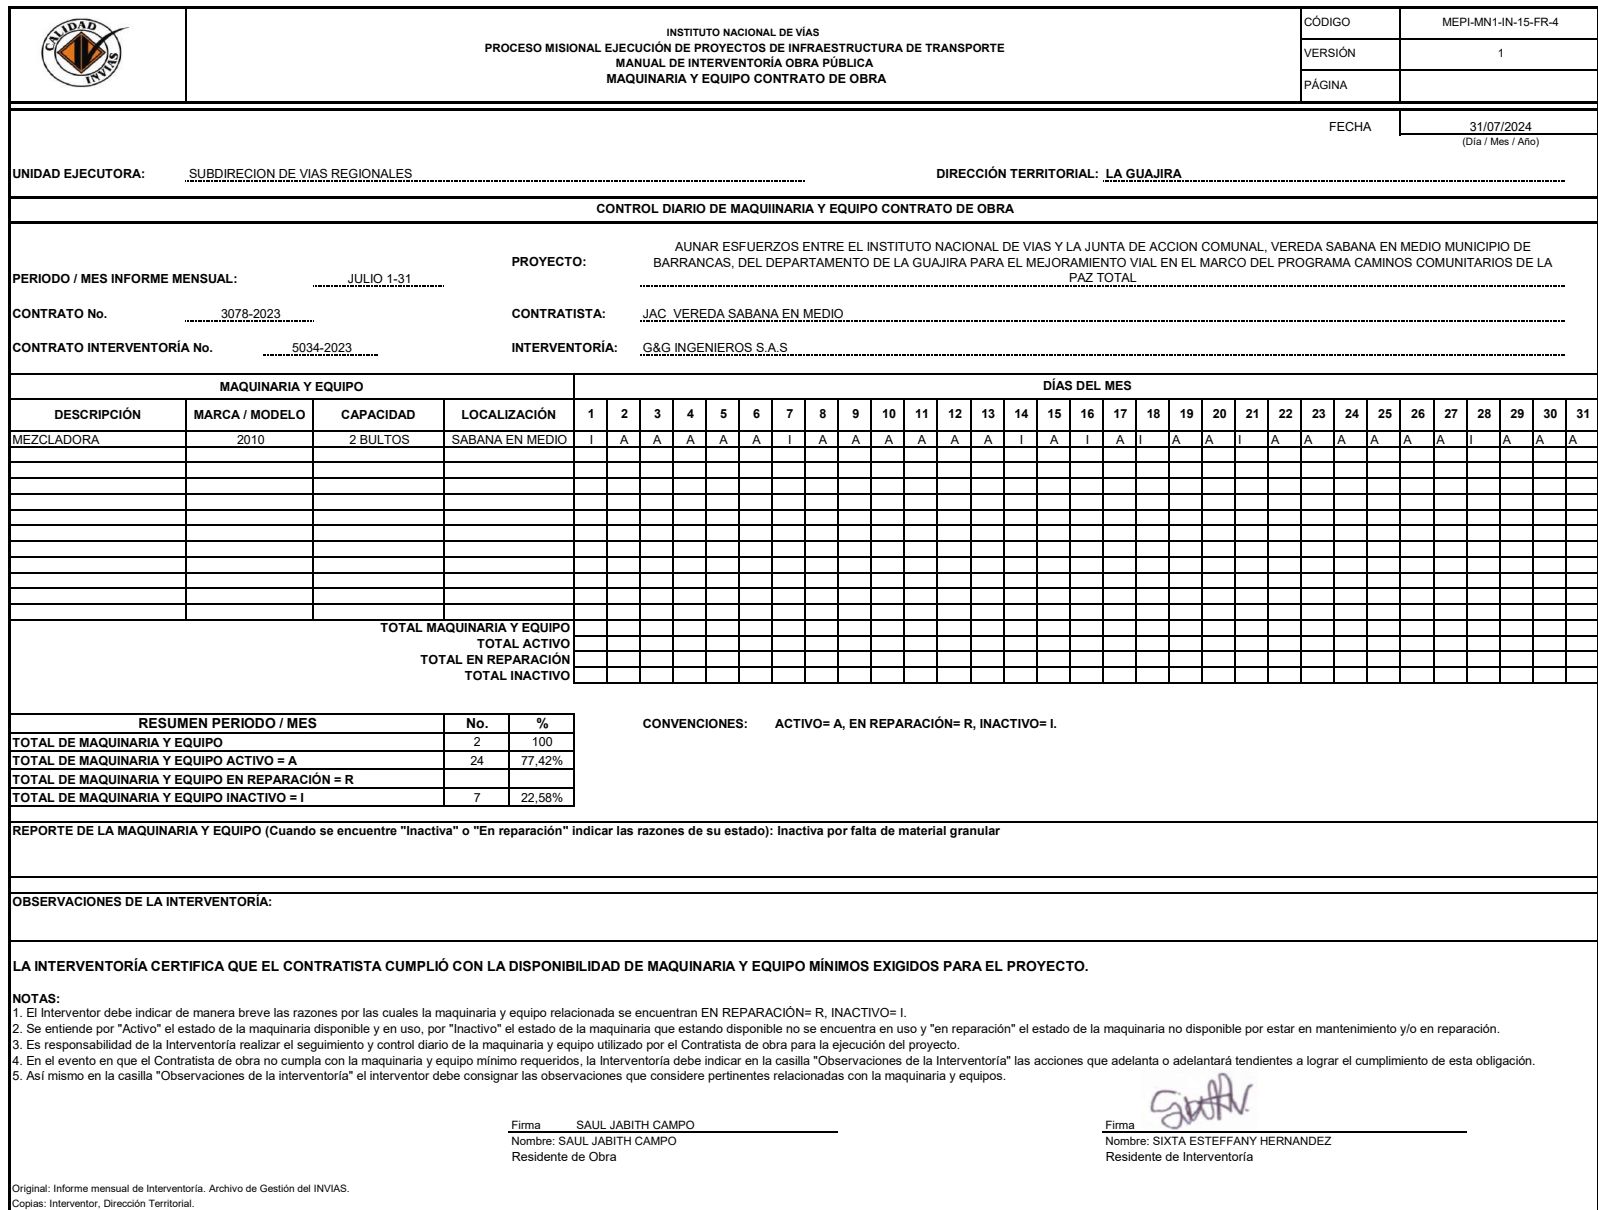

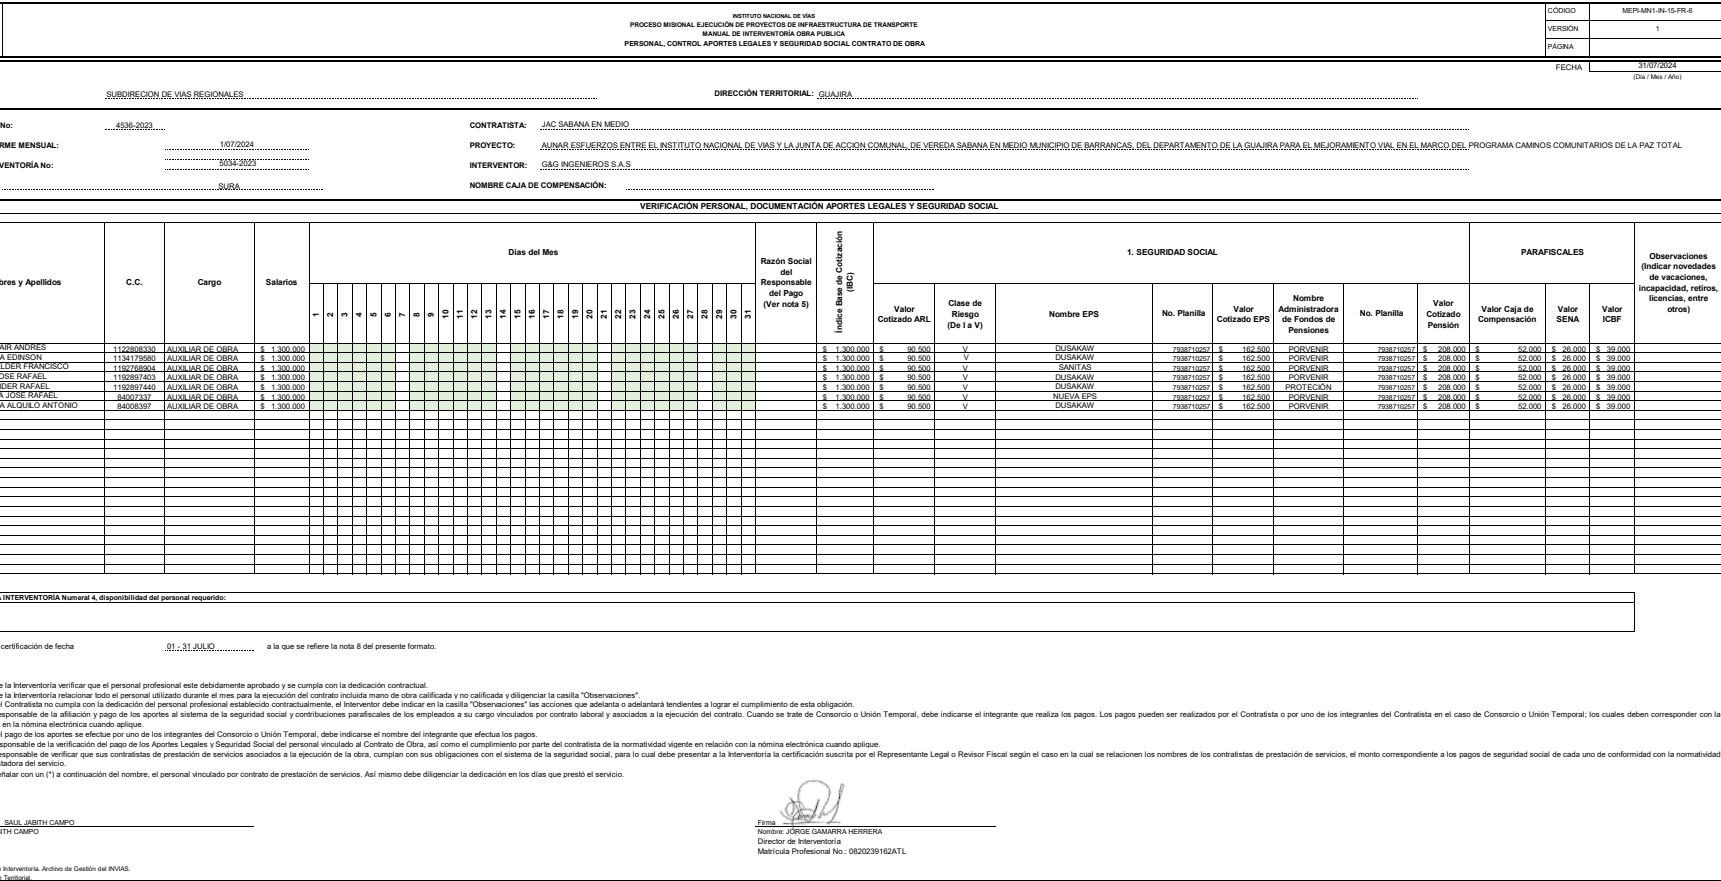

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA		
							FECHA	4-jul-24 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES							DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA		
CONTRATO DE OBRA No.: 3078-2023							CONTRATISTA: VEREDA SABANA EN MEDIO		
							AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL, DE VEREDA SABANA EN MEDIO MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24							PROYECTO:		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5034-2023							INTERVENTOR: G&G INGENIEROS S.A.S		
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	22/05/2024	SUBBASE GRANULAR CLASE C	INV E - 161 -13	(K0+010, K0+060, K0+140)	3	95	98,6%	SI	
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	22/05/2024	SUBBASE GRANULAR CLASE C	INV E - 161 -13	(K0+010, K0+060, K0+140)	3	95	98,6%	SI	
OBSERVACIONES:									
NOTAS:									
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.									
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.									
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.									
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.									
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.									
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.									
Firma SAUL JABITH CAMPO					Firma				
Nombre: SAUL JABITH CAMPO					Nombre: JORGE LUIS GAMARRA				
Director de Obra					Director de Interventoría				
					Matrícula Profesional No.: 0820239162ATL				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.									
Copias: Interventor, Dirección Territorial.									

**ANEXOS CONVENIO BAÑADEROS
3732-2023**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			CÓDIGO MEP-MN-IN-15-FR-2																																																							
				VERSION 1																																																							
				PÁGINA																																																							
				FECHA 31/07/2024 (Día / Mes / Año)																																																							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA		PERIODO MES: JULIO 1-31																																																							
CONTRATO DE OBRA No.: 3732-2023																																																											
OBJETO: ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA BANADEROS MUNICIPIO DE HATONUEVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		PLAZO INICIAL: 3 MESES FECHA DE INICIO: 20/12/2023 FECHA DE SUSPENSIÓN: 31/12/2023 FECHA DE REANUDACIÓN: 18/01/2024 FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2024		VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 185.608.093,00 VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ ANTICIPO CONCEDIDO: NA ANTICIPO AMORTIZADO: NA																																																							
CONTRATISTA: JAC MUNICIPIO DE HATONUEVO		CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5034-2023 INTERVENTOR: G&G INGENIEROS S.A.S																																																									
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO																																																											
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td>ML</td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuáles)</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción		Mejoramiento	ML	Rehabilitación		Estructuras	Túneles		Puentes		Pontones		Mantenimiento			Otros (Especificar cuáles)			<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td>ML</td><td>117</td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuáles)</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción			Mejoramiento	ML	117	Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento				Otros (Especificar cuáles)			
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																									
Pavimentación	Construcción																																																										
	Mejoramiento	ML																																																									
	Rehabilitación																																																										
Estructuras	Túneles																																																										
	Puentes																																																										
	Pontones																																																										
Mantenimiento																																																											
Otros (Especificar cuáles)																																																											
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																								
Pavimentación	Construcción																																																										
	Mejoramiento	ML	117																																																								
	Rehabilitación																																																										
Estructuras	Túneles																																																										
	Puentes																																																										
	Pontones																																																										
Mantenimiento																																																											
Otros (Especificar cuáles)																																																											
AVANCE FINANCIERO																																																											
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES		VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																									
<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>APORTE OAC</td><td>1.000.000,00</td><td></td><td>1.000.000,00</td></tr><tr><td>OBRAS</td><td>143.481.280,00</td><td></td><td>143.481.280,00</td></tr><tr><td>GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>4.304.438,00</td><td></td><td>4.304.438,00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>46.822.375,00</td><td></td><td>46.822.375,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>195.608.093,00</td><td></td><td>195.608.093,00</td></tr></tbody></table>		BÁSICO	IVA	TOTAL	APORTE OAC	1.000.000,00		1.000.000,00	OBRAS	143.481.280,00		143.481.280,00	GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL	4.304.438,00		4.304.438,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	46.822.375,00		46.822.375,00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	195.608.093,00		195.608.093,00	<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>24.424.995,00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AJUSTES GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>5.647.000,00</td><td>1.072.930,00</td><td>6.719.930,00</td><td>6.719.930,00</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>30.071.995,00</td><td>5.713.679,05</td><td>35.785.674,05</td><td>35.785.674,05</td></tr></tbody></table>					BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	OBRAS	24.424.995,00				AJUSTES GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.647.000,00	1.072.930,00	6.719.930,00	6.719.930,00	VALOR EJECUTADO	30.071.995,00	5.713.679,05	35.785.674,05	35.785.674,05						
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																								
APORTE OAC	1.000.000,00		1.000.000,00																																																								
OBRAS	143.481.280,00		143.481.280,00																																																								
GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL	4.304.438,00		4.304.438,00																																																								
GASTOS ADMINISTRATIVOS	46.822.375,00		46.822.375,00																																																								
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	195.608.093,00		195.608.093,00																																																								
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																							
OBRAS	24.424.995,00																																																										
AJUSTES GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00																																																							
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.647.000,00	1.072.930,00	6.719.930,00	6.719.930,00																																																							
VALOR EJECUTADO	30.071.995,00	5.713.679,05	35.785.674,05	35.785.674,05																																																							
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta economica aprobada																																																											
INVERSIÓN EN OBRA		EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):100%.....		MANO DE OBRA CALIFICADA:7.....																																																									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):90%.....		MANO DE OBRA NO CALIFICADA:0.....																																																									
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:0.....																																																									
		TOTAL EMPLEOS GENERADOS:7.....																																																									
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																											
VEREDA LOS BANADEROS- CONCRETO		VEREDA LOS BANADEROS -CONCRETO																																																									
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																											
<div></div> <div>Firma</div> <div>Nombre- JORGE LUIS GAMARRA HERRERA</div> <div>Director de Interventoría</div> <div>Matrícula Profesional No.0820239162ATL</div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.</div> <div>Copias: Interventor, Dirección Territorial</div>																																																											

<div></div>		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MEP-MN1-IN-15-FR-3																																																																																																																																								
				VERSIÓN	1																																																																																																																																								
				PÁGINA																																																																																																																																									
FECHA					4/07/2024 (Día / Mes / Año)																																																																																																																																								
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																																																																													
PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONU																																																																																																																																													
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA SEMANA No.: 14 del 1 al 4 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)																																																																																																																																													
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MILAGRO CAMARGO AREVALO																																																																																																																																													
OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, DE VEREDA LOS ESTADOS MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL																																																																																																																																													
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): teniendo en cuenta que para el alcance del convenio se preve el mejoramiento de 160 ml de placa huella.																																																																																																																																													
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO Para el convenio suscrito se van a realizar el mejoramiento y construcción de 160 ml de obras de placa huella en la vereda los estados perteneciente al municipio de barrancas la guajira, de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la cartilla de obras menores y estructuras viales.																																																																																																																																													
CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																																																																																										
CONTRATISTA: JAC LOS ESTADOS			INTERVENIOR: G&G INGENIEROS S.A.S																																																																																																																																										
INTEGRANTES:			INTEGRANTES: MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES																																																																																																																																										
CONTRATO No. 4536-2023 VALOR INICIAL: \$ 200.257.364,00			CONTRATO No. 5034-2023 VALOR INICIAL: \$ 77.675.231,00																																																																																																																																										
FECHA DE INICIO: 28/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -			FECHA DE INICIO: 27/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -																																																																																																																																										
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ -			FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ -																																																																																																																																										
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024 VALOR AMORTIZADO: \$ -			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024 VALOR AMORTIZADO: \$ -																																																																																																																																										
\$ -			\$ -																																																																																																																																										
II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																																																																													
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																																																																													
<table><tr><th>CONTRATO</th><th>VIGENCIA</th><th>2023</th><th>2024</th><th>20XX</th><th>20XX</th></tr><tr><td rowspan="3">OBRA</td><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td>\$ 200.257.364</td><td>\$ 200.257.364</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SALDO DE VIGENCIA</td><td>\$ 200.257.364</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">INTERVENTORIA</td><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td>\$ 77.675.231</td><td>\$ 77.675.231</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SALDO DE VIGENCIA</td><td>\$ 77.675.231</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <small>(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)</small>						CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX	OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.257.364	\$ 200.257.364			EJECUTADO DE LA VIGENCIA					SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.257.364				INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 77.675.231	\$ 77.675.231			EJECUTADO DE LA VIGENCIA					SALDO DE VIGENCIA	\$ 77.675.231																																																																																																					
CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX																																																																																																																																								
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.257.364	\$ 200.257.364																																																																																																																																										
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA																																																																																																																																												
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.257.364																																																																																																																																											
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 77.675.231	\$ 77.675.231																																																																																																																																										
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA																																																																																																																																												
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 77.675.231																																																																																																																																											
<table><tr><th colspan="4">OBRA</th><th colspan="4">INTERVENTORIA</th></tr><tr><td>VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):</td><td>\$</td><td>145.664.608,00</td><td></td><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$</td><td>76.675.231,00</td><td>98,71%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$</td><td>94.681.995,20</td><td>65%</td><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$</td><td>68.169.153,93</td><td>87,76%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$</td><td>74.288.950,08</td><td>51%</td><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA</td><td>\$</td><td>15.335.046,20</td><td>20,00%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$</td><td>(20.393.045,12)</td><td>-14%</td><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA</td><td>\$</td><td>13.633.830,79</td><td>17,78%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)</td><td>\$</td><td>1.500.000,00</td><td>0,75%</td><td>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</td><td>SI NO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$</td><td>94.681.995,20</td><td>65,0%</td><td>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$</td><td>74.288.950,08</td><td>51,0%</td><td>PERIODO FACTURADO:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$</td><td>(20.393.045,12)</td><td>-10%</td><td>VALOR FACTURA:</td><td>\$</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>18.936.399,04</td><td>13,0%</td><td>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>11.653.168,64</td><td>8,0%</td><td>Observaciones:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</td><td>SI NO</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PERIODO FACTURADO:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR FACTURA:</td><td>\$</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Observaciones: El convenio se encuentra en proceso de validacion de firma con la entidad bancaria</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						OBRA				INTERVENTORIA				VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$	145.664.608,00		TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	76.675.231,00	98,71%	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	94.681.995,20	65%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	68.169.153,93	87,76%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	74.288.950,08	51%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	\$	15.335.046,20	20,00%	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	(20.393.045,12)	-14%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	\$	13.633.830,79	17,78%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	\$	1.500.000,00	0,75%	RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI NO			TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	94.681.995,20	65,0%	No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:				TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	74.288.950,08	51,0%	PERIODO FACTURADO:				AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	(20.393.045,12)	-10%	VALOR FACTURA:	\$	-		INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	18.936.399,04	13,0%	(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	11.653.168,64	8,0%	Observaciones:				RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI NO	X						No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:								PERIODO FACTURADO:								VALOR FACTURA:	\$	-						(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)								Observaciones: El convenio se encuentra en proceso de validacion de firma con la entidad bancaria							
OBRA				INTERVENTORIA																																																																																																																																									
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$	145.664.608,00		TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	76.675.231,00	98,71%																																																																																																																																						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	94.681.995,20	65%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	68.169.153,93	87,76%																																																																																																																																						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	74.288.950,08	51%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	\$	15.335.046,20	20,00%																																																																																																																																						
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	(20.393.045,12)	-14%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	\$	13.633.830,79	17,78%																																																																																																																																						
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	\$	1.500.000,00	0,75%	RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI NO																																																																																																																																								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	94.681.995,20	65,0%	No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:																																																																																																																																									
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	74.288.950,08	51,0%	PERIODO FACTURADO:																																																																																																																																									
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	(20.393.045,12)	-10%	VALOR FACTURA:	\$	-																																																																																																																																							
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	18.936.399,04	13,0%	(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																																																																																									
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	11.653.168,64	8,0%	Observaciones:																																																																																																																																									
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI NO	X																																																																																																																																											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:																																																																																																																																													
PERIODO FACTURADO:																																																																																																																																													
VALOR FACTURA:	\$	-																																																																																																																																											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																																																																																													
Observaciones: El convenio se encuentra en proceso de validacion de firma con la entidad bancaria																																																																																																																																													
<table><tr><th colspan="4">ANTICIPOS</th><th colspan="2">INDICADOR IC</th><th colspan="4">ANTICIPOS</th></tr><tr><td>Otorgado \$</td><td></td><td>NA</td><td></td><td>En el mes:</td><td></td><td>Otorgado \$</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Amortizado \$</td><td></td><td>NA</td><td></td><td>Acumulado:</td><td></td><td>Amortizado \$</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Saldo \$</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Saldo \$</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						ANTICIPOS				INDICADOR IC		ANTICIPOS				Otorgado \$		NA		En el mes:		Otorgado \$				Amortizado \$		NA		Acumulado:		Amortizado \$				Saldo \$						Saldo \$																																																																																																			
ANTICIPOS				INDICADOR IC		ANTICIPOS																																																																																																																																							
Otorgado \$		NA		En el mes:		Otorgado \$																																																																																																																																							
Amortizado \$		NA		Acumulado:		Amortizado \$																																																																																																																																							
Saldo \$						Saldo \$																																																																																																																																							
III. AVANCE FÍSICO																																																																																																																																													
Meta Física Programada % 65% Avance o Atraso Físico % -14% Meta Física Ejecutada % 51%																																																																																																																																													
<table><tr><th colspan="5">Meta Física (Programa de Obra) Línea Base</th><th colspan="5">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</th></tr><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th><th>Vigencia</th><th>Vigencia (n)</th><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr><tr><td>* Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) -</td><td>M3</td><td>14,96</td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td>35,01</td><td>49,1%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td>13,18</td><td>41,96%</td></tr><tr><td>* Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)</td><td>M3</td><td>6,59</td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td>14,58</td><td>46,4%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td>12,40</td><td>0,21%</td></tr><tr><td>* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)</td><td>Kl</td><td>603,47</td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td>1810,42</td><td>55,08%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td>2220,35</td><td>67,55%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <small>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</small> TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0 + 000 PR 0 + 160 TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO Y/O SECTOR (n): 						Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	* Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) -	M3	14,96			Prog				35,01	49,1%						Ejec				13,18	41,96%	* Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	6,59			Prog				14,58	46,4%						Ejec				12,40	0,21%	* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kl	603,47			Prog				1810,42	55,08%						Ejec				2220,35	67,55%						Prog											Ejec																																
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada																																																																																																																																								
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																																																																																			
* Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) -	M3	14,96			Prog				35,01	49,1%																																																																																																																																			
					Ejec				13,18	41,96%																																																																																																																																			
* Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	6,59			Prog				14,58	46,4%																																																																																																																																			
					Ejec				12,40	0,21%																																																																																																																																			
* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kl	603,47			Prog				1810,42	55,08%																																																																																																																																			
					Ejec				2220,35	67,55%																																																																																																																																			
					Prog																																																																																																																																								
					Ejec																																																																																																																																								
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																																																																																													
<table><tr><th>FUENTES DE MATERIALES</th><th>PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</th></tr><tr><td>UBICACIÓN: SAN JUAN -LA GUAJIRA</td><td>ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X</td></tr><tr><td></td><td>LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X</td></tr><tr><td></td><td>Aprovechamiento Forestal: SI NO N/A X</td></tr><tr><td></td><td>Concesión de Aguas: SI NO N/A X</td></tr><tr><td></td><td>Ocupación de Cau</td></tr></table>						FUENTES DE MATERIALES	PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	UBICACIÓN: SAN JUAN -LA GUAJIRA	ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X		Aprovechamiento Forestal: SI NO N/A X		Concesión de Aguas: SI NO N/A X		Ocupación de Cau																																																																																																																												
FUENTES DE MATERIALES	PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																																																																																																												
UBICACIÓN: SAN JUAN -LA GUAJIRA	ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X																																																																																																																																												
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X																																																																																																																																												
	Aprovechamiento Forestal: SI NO N/A X																																																																																																																																												
	Concesión de Aguas: SI NO N/A X																																																																																																																																												
	Ocupación de Cau																																																																																																																																												

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

OBRA

INTER

12

2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

1

OBSERVACIONES:

Se realizo una socializacion inicial a los convenios de los programas caminos comunitarios para la paz total el día 26 de febrero de 2024 en la vereda los estados perteneciente al municipio de barrancas la guajira,una vez finalice la etapa de estudios y diseños y se establezca la meta fisica del proyecto se realizara una segunda socialización previo al inicio de obra

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

14

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PEDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

AREA TECNICA: Se figura y arma el acero de refuerzo , seguidamente se prepara el terreno con formaletas y se inicia fundida de concreto ciclopeo y reforzado

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

armar el acero de refuerzo , seguidamente preparar el terreno con formaletas y se inicia fundida de concreto ciclopeo y reforzado

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

PR+000

PROG.

EJEC.

85%

PR+160

BORDILLO

ACERO

CONCRETO

SUBBASE

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*Evidenciar y documentar las actividades realizadas por el contratista en la ejecución del contrato.

• Evaluar y verificar las intervenciones y el desempeño del contratista en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras.

• Verificar el cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los convenios solidarios, a fin de garantizar la legalidad y transparencia del proceso.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: JORGE GAMARRA

Matrícula Profesional No.: 0820239162ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONUE'

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA SEMANA No.: 16 del 12 al 18, Último Informe Semanal SI ☐

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, DE VEREDA LOS ESTADOS MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
teniendo en cuenta que para el alcance del convenio se preve el mejoramiento de 160 ml de placa huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Para el convenio suscrito se van a realizar el mejoramiento y construccion de 160 ml de obras de placa huella en la vereda los estados perteneciente al municipio de barrancas la guajira, de conformidad con las especificaciones y características tecnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la cartilla de obras menores y estructuras viales.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA: JAC LOS ESTADOS				INTERVENTOR: G&G INGENIEROS S.A.S			
INTEGRANTES:				INTEGRANTES: MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES			
CONTRATO No. 4536-2023		VALOR INICIAL: \$ 200.257.364,00		CONTRATO No. 5034-2023		VALOR INICIAL: \$ 77.675.231,00	
FECHA DE INICIO: 28/12/2023		VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 27/12/2023		VALOR ADICIONES: \$ -	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		VALOR ACUMULADO: \$ -		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		VALOR ACUMULADO: \$ -	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024		\$ -		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024		VALOR ANTICIPO: \$ -	
		\$ -				VALOR AMORTIZADO: \$ -	
		\$ -				SALDO POR AMORTIZAR: \$ -	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.257.364	\$ 200.257.364		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.257.364			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 77.675.231	\$ 77.675.231		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 77.675.231			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)			
(Indicar valores en pesos)			
OBRA			
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$	145.664.608,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	131.098.147,20	90%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	87.398.764,80	60%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	43.699.382,40	30%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	2.166.666,67	1,1%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	131.098.147,20	90,0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	87.398.764,80	60,0%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	(43.699.382,40)	30%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	18.936.399,04	13,0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	10.487.851,78	8,0%
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			
		SI	NO
			X
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____			
PERIODO FACTURADO: _____			
VALOR FACTURA: \$ _____ -			
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			
Observaciones: _____			

INTERVENTORIA			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	76.675.231,00	98,71%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	68.169.153,93	87,76%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	\$	15.335.046,20	20,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	\$	13.633.830,79	17,78%
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			
		SI	NO
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____			
PERIODO FACTURADO: _____			
VALOR FACTURA: \$ _____ -			
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			
Observaciones: _____			

ANTICIPOS		INDICADOR IIC	
Otorgado \$	NA	En el mes:	
Amortizado \$	NA	Acumulado:	
Saldo \$			

ANTICIPOS	
Otorgado \$	
Amortizado \$	
Saldo \$	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 90% Avance o Atraso Físico % 30

Meta Física Ejecutada % 60%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) -	M3	14,96			Prog				64,93	91,07%
					Ejec				40,46	56,74%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	6,59			Prog				26,35	83,9%
					Ejec				19,70	62,73%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kl	603,47			Prog				3017,36	91,80%
					Ejec				2287,80	69,60%
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0 + 000 PR 0 + 160 TRAMO Y/O SECTOR 2: _____

TRAMO Y/O SECTOR (n): _____

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
1 MEZCLADORA	1	1
Total		1

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: SAN JUAN - LA GUAJIRA PERMISO MINERO: SI X NO LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A X

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A X

OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A X

VERTIENTOS: SI NO N/A X

EMISIONES: SI NO N/A X

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X

OBSERVACIONES:Para este convenio solidario no se requiere licenciamientos y permisos ambientales ,adicionalmente no se se realizaron intervenciones sobre ningun cauce de agua


P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)


ESTADO: NA

OBSERVACIONES: la guia ambiental (paga) se encuentra en etapa inicial de desarrollo

[illegible]

[illegible]

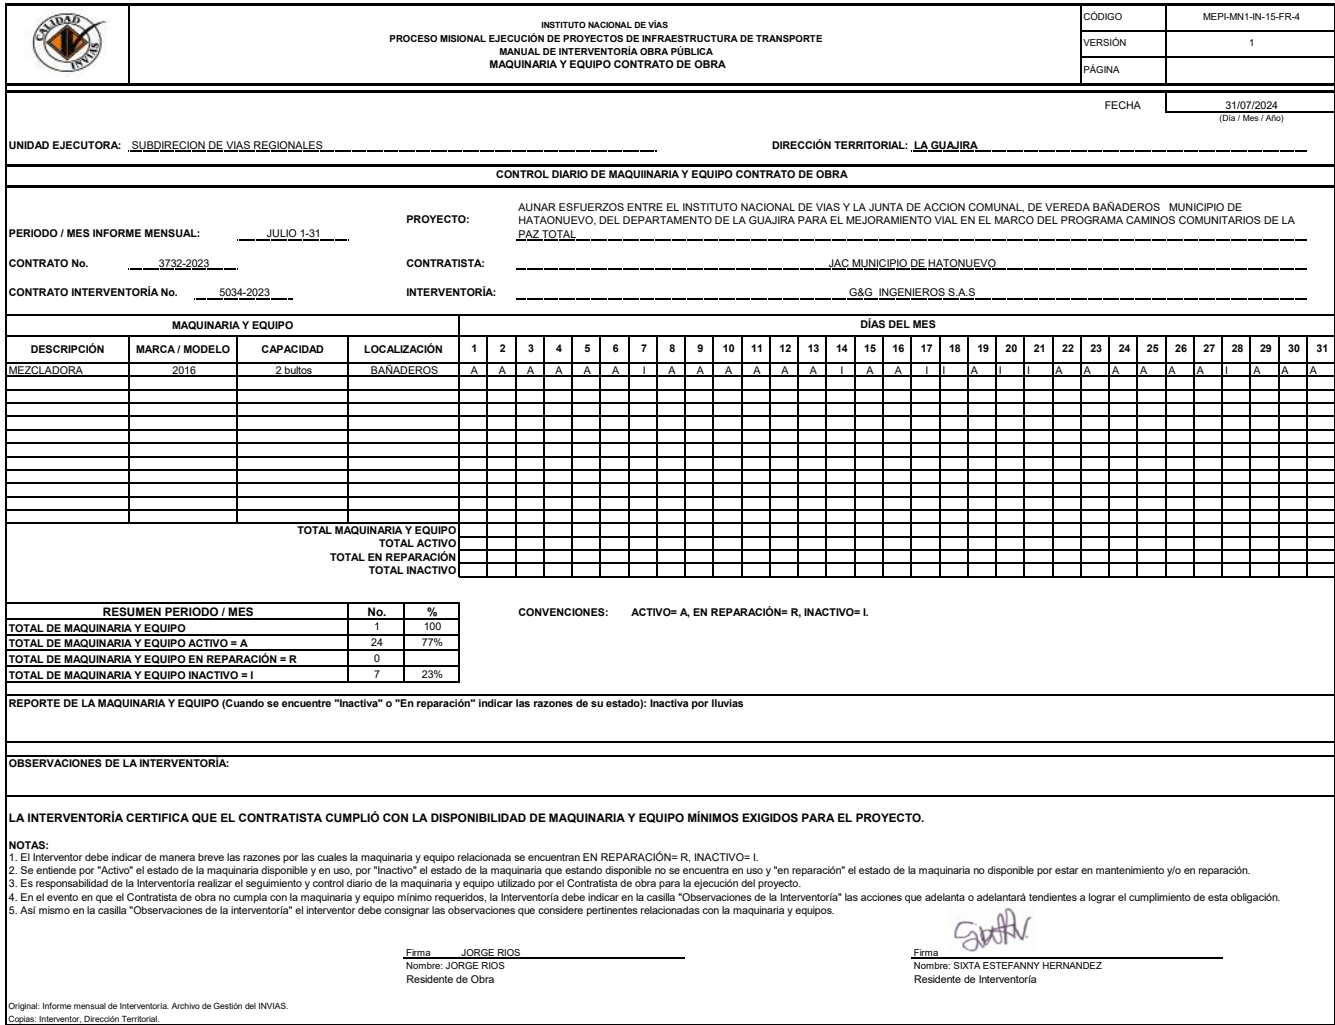

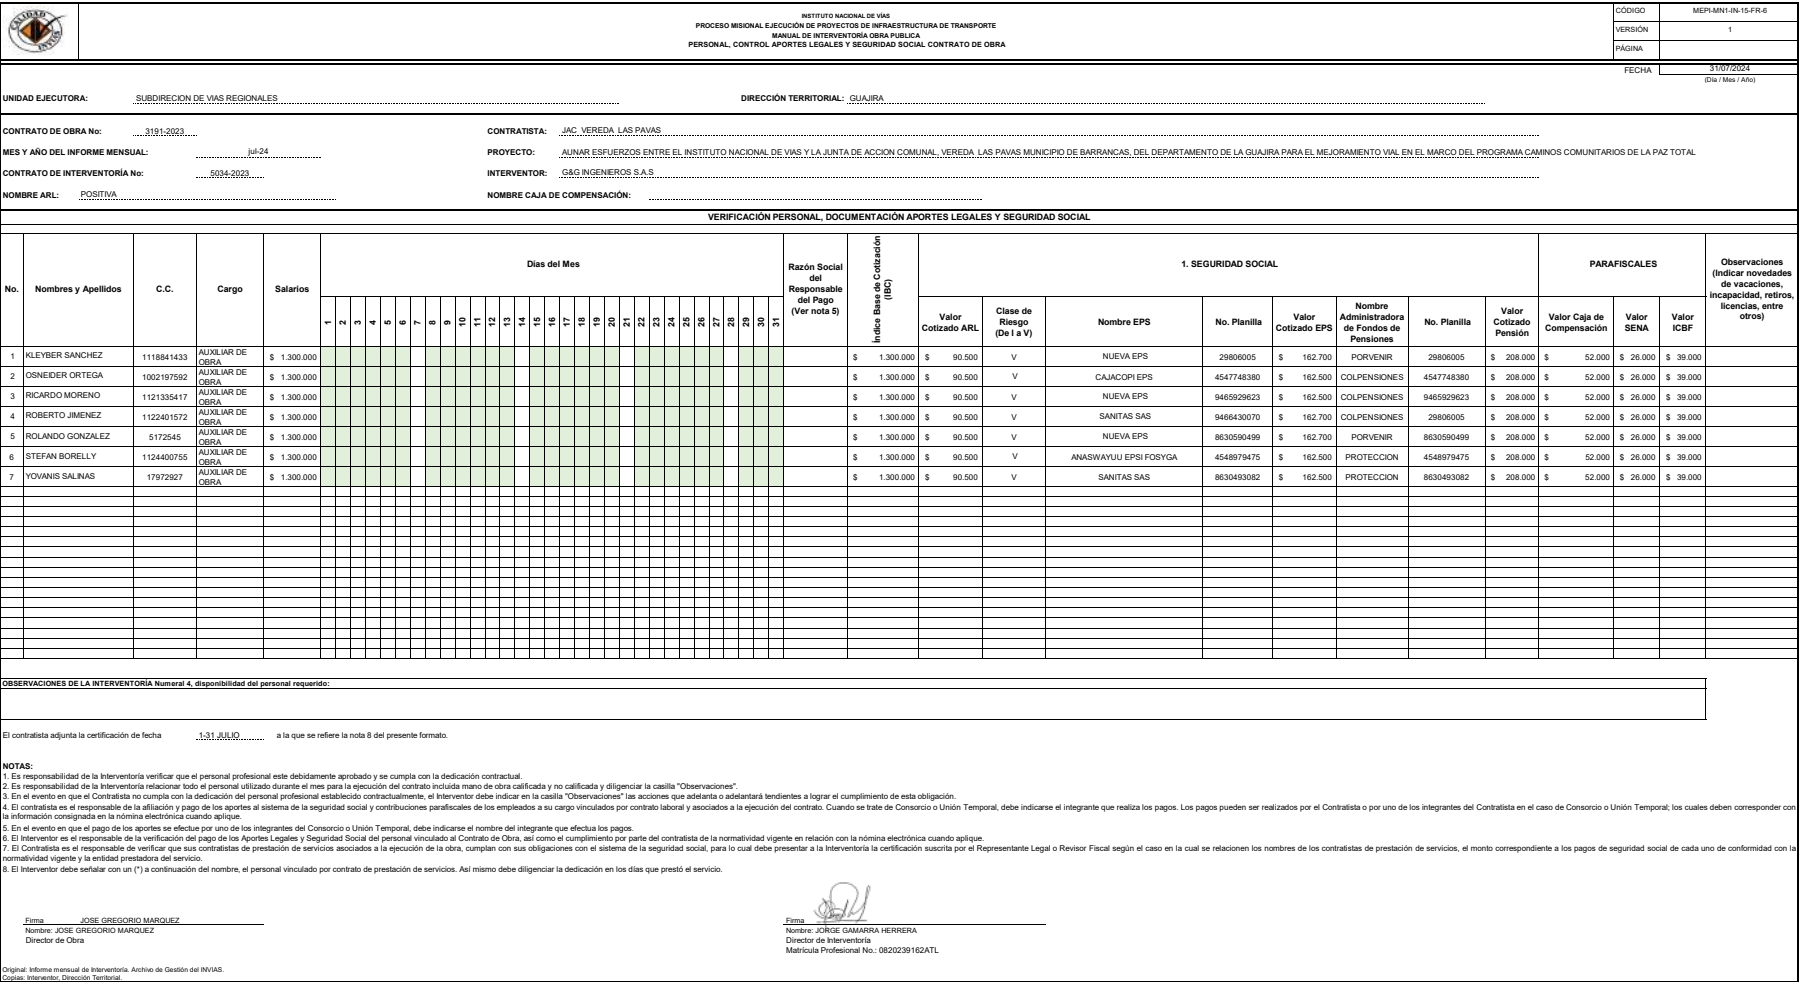



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 31/07/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: 3732-2023 CONTRATISTA: JAC MUNICIPIO DE HATONUEVO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, DE VEREDA BAÑADEROS MUNICIPIO DE HATAONUEVO, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5034-2023 INTERVENTOR: G&G INGENIEROS S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total	
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23	23	22	22	22	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
Lluvias moderadas															1	1			2	1													
Lluvias intensas																	2	2															
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma JORGE RIOS
Nombre: JORGE RIOS
Residente de Obra

Firma
Nombre: SIXTA ESTEFFANY HERNANDEZ
Residente de Interventoría


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA		
							FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES				DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA			
CONTRATO DE OBRA No.:		3732-2023				CONTRATISTA: JAC VEREDA BAÑADEROS			
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:		jul-24				PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL RURALES EN LA VEREDA BAÑADEROS, MUNICIPIO DE HATONUEVO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:		5034-2023				INTERVENTOR: G&G INGENIEROS S.A.S			
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	Rotura 15/05/2024	7 Días rotura	ICONTEC 673	vereda bañaderos	3	40%	82%	SI	TIPO FRACTURA 5
2	Rotura 23/05/2024	14 Días rotura	ICONTEC 673	vereda bañaderos	3	65%	90%	SI	TIPO FRACTURA 5
3	Rotura 07/06/2024	28 Días rotura	ICONTEC 673	vereda bañaderos	3	90%	105%	SI	TIPO FRACTURA 5
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	Rotura 15/05/2024	7 Días rotura	ICONTEC 673	vereda bañaderos	3	40%	82%	SI	TIPO FRACTURA 5
2	Rotura 23/05/2024	14 Días rotura	ICONTEC 673	vereda bañaderos	3	65%	90%	SI	TIPO FRACTURA 5
3	Rotura 07/06/2024	28 Días rotura	ICONTEC 673	vereda bañaderos	3	90%	105%	SI	TIPO FRACTURA 5
OBSERVACIONES:									
NOTAS:									
<p>1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.</p> <p>2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.</p> <p>3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.</p> <p>4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.</p> <p>5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.</p> <p>6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.</p>									
Firma _____ Nombre: JORGE RIOS Director de Obra					Firma Nombre: JORGE LUIS GAMARRA Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 0820239162ATL				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA			
			FECHA	30	9	2024
				(Día)	(Mes)	(Año)
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA		
CONTRATO DE OBRA No.		3732-2023		CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL HATONUEVO- LOS BAÑADEROS		
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL MUNICIPIO DE HATONUEVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL						
FECHA DE INICIO: 27/12/2023 PLAZO INICIAL: 3 meses FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 195.608.093,00 VALOR ACUMULADO: \$ 195.608.093,00 (Incluye adiciones) VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 6.500.000,00 VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 6.500.000,00						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.		5034-2023		INTERVENTOR: G&G INGENIEROS S.A.S		
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL						
Amparo		% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA		
Cumplimiento		20%	\$ 39.121.618,6	Desde: 24 10 2023 Hasta: 31 10 2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		5%	\$ 9.780.404,7	Desde: 24 10 2023 Hasta: 3112 1 2026		
Calidad de Estudios y Diseños						
Estabilidad y/o Calidad de Obra		30%	\$ 59.043.839,0	Desde: 31 12 2024 Hasta: 31 12 2028		
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100291421 Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 26/12/2023						
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL						
Seguro		% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		171,79SLM	\$ 232.000.000	Desde: 24 10 2023 Hasta: 31 12 2023		
Otros				Desde: Día Mes Año Hasta: Día Mes Año		
PÓLIZA DE SEGURO RCE No.		100071588		OTRAS PÓLIZAS No. NO		
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 26/12/2023						

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12																																																				
		VERSIÓN	1																																																				
		PÁGINA																																																					
		FECHA	30	9	2024																																																		
			(Día)	(Mes)	(Año)																																																		
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																							
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																							
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>10</td><td>\$ 39.121.618,6</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e</td><td>20</td><td>\$ 9.780.404,7</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td>30</td><td>\$ 59.043.839,0</td></tr></tbody></table>	Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10	\$ 39.121.618,6	Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20	\$ 9.780.404,7	Calidad del servicio	30	\$ 59.043.839,0		<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>12</td><td>6</td><td>2024</td><td>1</td><td>7</td><td>2025</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>6</td><td>2024</td><td>31</td><td>8</td><td>2027</td></tr><tr><td>31</td><td>8</td><td>2024</td><td>31</td><td>8</td><td>2029</td></tr></tbody></table>	VIGENCIA						Desde			Hasta			12	6	2024	1	7	2025							12	6	2024	31	8	2027	31	8	2024	31	8	2029		
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																					
Cumplimiento	10	\$ 39.121.618,6																																																					
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																																							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20	\$ 9.780.404,7																																																					
Calidad del servicio	30	\$ 59.043.839,0																																																					
VIGENCIA																																																							
Desde			Hasta																																																				
12	6	2024	1	7	2025																																																		
12	6	2024	31	8	2027																																																		
31	8	2024	31	8	2029																																																		
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100291421																																																							
Certificado de modificación o anexo No.: 4 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																							
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																							
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: PENDIENTE																																																							
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																							
<table><thead><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>171,79SLM</td><td>\$ 260.000.000</td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	171,79SLM	\$ 260.000.000	Otros				<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>24</td><td>10</td><td>2023</td><td>31</td><td>8</td><td>2024</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></tbody></table>	VIGENCIA						Desde			Hasta			24	10	2023	31	8	2024	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																				
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																																					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	171,79SLM	\$ 260.000.000																																																					
Otros																																																							
VIGENCIA																																																							
Desde			Hasta																																																				
24	10	2023	31	8	2024																																																		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																		
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100071588 OTRAS PÓLIZAS No. NO																																																							
Certificado de modificación o anexo No.: 4 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																							
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL																																																							
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: PENDIENTE																																																							
 Nombre: JORGE GAMARRA Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 0820239162ATL																																																							
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.																																																							

ANEXOS INTERVENTORÍA 5034-2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
											VERSIÓN	1	
											PÁGINA		
FECHA												26/09/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES												DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 5034-2023												INTERVENTOR: G&G INGENIEROS SAS	
MES INFORME MENSUAL: Jul-24												PROYECTO: HATONUEVO Y BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	
CONTRATO DE OBRA No: 3191.4536.3078Y.3732 DE 2023												CONTRATISTA: JAC LAS PAVAS, JAC LOS ESTADOS, JAC SABANA EN MEDIO, JAC HATONUEVO	
RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA													
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional		Valor	Saldo del Acta Anterior			
2023	138123	C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO		10	NACION		PRINCIPAL		\$ 77.675.231	\$ 27.841.359			
TOTAL													
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 77.675.231													
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA													
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones	
1	Del 23 al 29 de Dic-2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	138123 de 19/07/2023	\$ 77.675.231	\$ 77.675.231	N/A		
2	Del 18 al 31 de Ene-2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	138123 de 19/07/2023	\$ 77.675.231	\$ 77.675.231	N/A		
3	feb-24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	138123 de 19/07/2023	\$ 77.675.231	\$ 77.675.231	N/A		
4	mar-24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	138123 de 19/07/2023	\$ 77.675.231	\$ 77.675.231	N/A		
5	abr-24	\$ 8.837.800	\$ 1.679.182,00	\$ 10.516.982,00	\$ -	\$ -	\$ -	138123 de 19/07/2023	\$ 67.158.249	\$ 67.158.249	N/A		
6	may-24	\$ 17.631.603,30	\$ 3.350.004,63	\$ 20.981.607,93	\$ -	\$ -	\$ -	138123 de 19/07/2023	\$ 46.176.641	\$ 46.176.641	N/A		
7	jun-24	\$ 15.407.800,00	\$ 2.927.482,00	\$ 18.335.282,00	\$ -	\$ -	\$ -	138123 de 19/07/2023	\$ 27.841.359	\$ 27.841.359	N/A		
8	jul-24	\$ 15.407.800	\$ 2.927.482,00	\$ 18.335.282,00	\$ -	\$ -	\$ -	138123 de 19/07/2023	\$ 9.506.077	\$ 9.506.077	N/A		
TOTALES		\$ 57.285.003,30	\$ 10.884.150,63	\$ 68.169.153,93					\$ 9.506.077	\$ 9.506.077			
Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.													
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO													
		VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL							
TOTAL COSTOS DE PERSONAL		\$ 52.233.603,30		\$ 9.924.384,63		\$ 62.157.987,93							
TOTAL OTROS COSTOS		\$ -		\$ -		\$ -							
-													
VALOR TOTAL		\$ 52.233.603,30		\$ 9.924.384,63		\$ 62.157.987,93							
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.													
NOTAS:													
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.													
2. Este formato se diligencia por año.													
<div><div>Firma</div><div></div><div>Nombre: JORGE GAMARRA HERRERA Director de Interventoria Matricula Profesional No.: 082202-39162-ATL</div></div> <div><div>Firma</div><div></div><div>Firmado digitalmente por DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ</div></div>													
<div>Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.</div> <div>Copias: Interventor y Dirección Territorial.</div>													

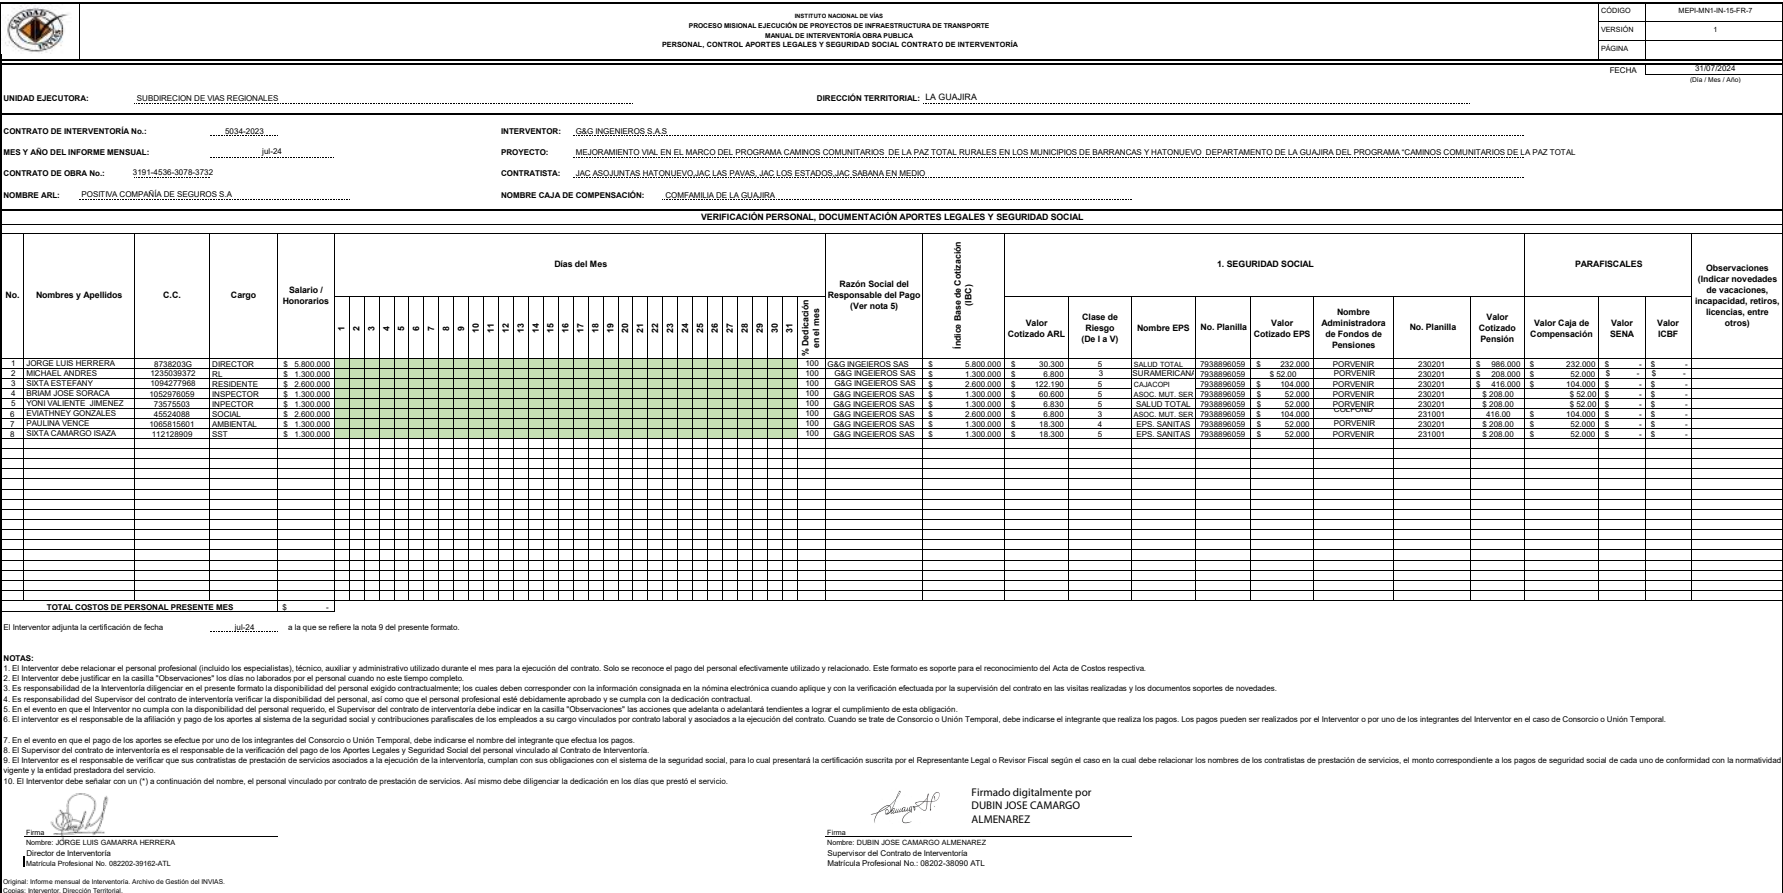

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA

30/09/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:	IRECCION DE VIAS REGION	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	LA GUAJIRA
-------------------	-------------------------	------------------------	------------

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	5034-2023	INTERVENTOR:	G&G INGENIEROS S.A.S
--------------------------------	-----------	--------------	----------------------

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONUEVO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

FECHA DE INICIO:

27/12/2023

PLAZO INICIAL:

31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

15/10/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL:

\$ 77.675.231,00

VALOR ACUMULADO:

\$ 77.675.231,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10	7.767.523,10	21	12	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		N/A	21	12	2023	31	12	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales	20	7.767.523,10	21	12	2023	31	12	2024
Calidad del servicio	30	23.302.569,30						

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

1050937

Certificado de modificación o anexo No.:

0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

26/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10	7.767.523,10	12	06	2024	15	4	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		N/A	12	06	2024	15	10	2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales	20	7.767.523,10	12	06	2024	15	10	2025
Calidad del servicio	30	23.302.569,30						

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

1050937

Certificado de modificación o anexo No.:

8

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

PENDIENTE

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma



Nombre: MICHAEL GAMARRA TORRES
Representante Legal
C.C. 1.235.039.372

Firma



Firmado digitalmente
por DUBIN JOSE
CAMARGO ALMENAREZ
Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-38090 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA

PLAN DE CARGAS INICIAL
REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS
PLAN DE CARGAS FINAL

FECHA: 23/06/2024
(Día / Mes / Año)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 5034-2023

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES, EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

INTERVENTOR: G&G INGENIEROS

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORIA: DUBIN JOSÉ CAMARGO ALMENAÑEZ

RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)

PLAZO INICIAL: 0,16 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 77.675.231,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 77.675.231,00

PLAZO ACUMULADO: 7,5 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 17/01/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -

CONTRATO DE OBRA No.: 3191, 4536, 3078 y 3732 DE 2023

CONTRATISTA: JAC LAS PAVAS, LOS ESTADOS, SABANA EN MEDIO Y ASOJUNTAS HATONUEVO

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ____ de fecha _____		2023		2024		2024		2024		2024		2024		2024		TOTAL			
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total (\$)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total (\$)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																										
	1	Director de Interventoria	\$ 5.800.000		1,00	\$ 5.800.000												0,33	\$ 1.914.000	0,33	\$ 1.914.000	0,2	\$ 1.160.000	0,14	\$ 812.000		1,00	\$ 5.800.000
	1	Ingeniero Residente de Interventoria	\$ 2.600.000		3,00	\$ 7.800.000												1,00	\$ 2.600.000	1,00	\$ 2.600.000	1,00	\$ 2.600.000		\$ -	3,00	\$ 7.800.000	
	1	Profesional Ambiental	\$ 2.800.000		0,45	\$ 1.260.000												0,00	\$ -	0,20	\$ 560.000	0,10	\$ 280.000	0,15	\$ 420.000	0,45	\$ 1.260.000	
	1	Profesional Social	\$ 2.800.000		0,45	\$ 1.260.000												0,15	\$ 420.000	0,00	\$ -	0,10	\$ 280.000	0,20	\$ 560.000	0,45	\$ 1.260.000	
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)	\$ 3.731.649																							0,00	\$ -	
		Especialista en Pavimentos y/o vías	\$ 5.000.000		0,1493	\$ 746.330															0,10	\$ 500.000,00	0,05	\$ 246.329,80		0,15	\$ 746.329,80	
		Especialista en Geología y/o Geotecnia	\$ 5.000.000		0,1493	\$ 746.330																	0,1493	\$ 746.330		0,15	\$ 746.329,80	
		Especialista en Estructuras	\$ 5.000.000		0,1493	\$ 746.330															0,10	\$ 500.000,00	0,05	\$ 246.329,80		0,15	\$ 746.329,80	
		Especialista en Hidráulica e Hidrología	\$ 5.000.000		0,1493	\$ 746.330																	0,1493	\$ 746.330		0,15	\$ 746.329,80	
		Especialista en Diseño Geométrico	\$ 5.000.000		0,1493	\$ 746.330															0,10	\$ 500.000,00	0,05	\$ 246.329,80		0,15	\$ 746.329,80	
	1	Inspector	\$ 1.200.000		6,00	\$ 7.200.000												0,00	\$ -	1,00	\$ 1.200.000	2,00	\$ 2.400.000	3,00	\$ 3.600.000	6,00	\$ 7.200.000	
	1	Inspector SST	\$ 1.200.000		3,00	\$ 3.600.000												0,00	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.200.000	2,00	\$ 2.400.000	3,00	\$ 3.600.000	
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				\$ 30.651.649												\$ 4.934.000	\$ 7.774.000	\$ 8.666.989	\$ 9.284.660	\$ 1.70	\$ 1.70	\$ 1.70	\$ 1.70	\$ -	\$ 30.651.649	
		FACTOR MULTIPLICADOR				1,70													1,70		1,70		1,70		1,70			52.107.803
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				\$ 52.107.803												\$ 8.387.800,0	\$ 13.215.800,0	\$ 14.720.282,0	\$ 15.783.921,3	\$ 1,70	\$ 1,70	\$ 1,70	\$ 1,70	\$ -	\$ 52.107.803	

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total (\$)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total (\$)	2023				2024												TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
											NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO				JULIO		AGOSTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		OTROS COSTOS DIRECTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
con el fin de dar cumplimiento a nuestras funciones, se considerará necesario prorrogar el contrato de interventoría No. 5055 de 2023 hasta el 30 de marzo de 2024 para Continuar seguimiento a los convenios que le corresponden. A la fecha se están realizando las actividades preliminares para la ejecución de las obras; sin embargo, para continuar la ejecución de las actividades para la construcción de obras sin afectar el rendimiento y su programación, incrementando el tiempo de ejecución de las mismas, surge la necesidad de prorrogar el contrato de interventoría. Como consecuencia de lo anterior, esta interventoría solicita realizar prórroga al contrato 4562 de 2023, toda vez que se requiere realizar apoyo en campo con las comunidades como desarrollo de la etapa preliminar y de ejecución de las obras lo que implica el tiempo necesario y de esa manera garantizar el seguimiento y control a los correspondientes convenios.

NOTAS:

- 1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
- 2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
- 3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
- 4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
- 5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma 
Nombre: MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES
Representante Legal o su Apoderado Interventor
C.C. 1.235.039.372

 Firmado digitalmente
por DUBIN JOSE
CAMARGO ALMENAREZ
Firma:
Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-38090 ATL
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.
