

**“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL
MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL
MUNICIPIO DE EL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA
GUAJIRA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS
DE LA PAZ TOTAL” CONTRATO 4821 DE 2023.**

REPUBLICA DE COLOMBIA



MINISTERIO DE TRANSPORTES



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

**INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORIA N°8**

Período de 1 al 31 de julio de 2024

CONSORCIO NRT&IG 2023

Calle 14 No. 17-46 Int. 15
nicolasredondom@live.com

Valledupar

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 3767-2023 Y 3925-2023	Contratista: JAC PAPELES Y JAC BARRIALES
Contrato de Interventoría No. 4821-2023	Interventoría: CONSORCIO NRT&IG 2023

Objeto Contrato de Obra:

INFORME MENSUAL No. 8	MES O PERIODO: 1 AL 30 DE JUNIO 2023
------------------------------	---

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	2
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	3
1	INTRODUCCION		
2	DESCRIPCION DEL PROYECTO		
2.1	Localización		8 Y 15
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		9 Y 16
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		9 Y 16
2.4	Características técnicas del proyecto		9 Y 16
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		
3.1	Información general del contrato		10 Y 17
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		11 Y 18
3.3	Seguimiento Items no previstos		11 Y 18
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		11 Y 18
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	29 Y 49
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	37 Y 58
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	39 Y 60
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	43 Y
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	40 Y 61
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N/A
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	41 Y 61
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	N/A
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N/A
	• Seguimiento Programa de Obra	MEPI-MN-IN-2-FR-2	N/A
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N/A
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-6-FR-2	N/A
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-14-FR-2	N/A
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
5.1	Información general del contrato		22
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		22
5.3	Informes especialistas y profesionales		23
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N/A
5.5	Informe matriz de riesgos.		N/A
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N/A
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	N/A
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N/A
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N/A
		MEPI-MN-IN-9-FR-3	N/A
7	Conclusiones y recomendaciones		25
8	Anexos		25
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		25
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		26
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N/A
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N/A

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.


Firma: _____
Nombre: **DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ**
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Firmado digitalmente
por **DUBIN JOSE**
CAMARGO ALMENAREZ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 8
	JAC: VEREDA LOS PAPELES Y VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO-GAJIRA	CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No.3767-2023 Y 3925-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2	
				VERSION	1	
				PÁGINA		

FECHA

23/08/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	GUAJIRA	PERIODO MES:	JULIO
-------------------	---------------------------------	------------------------	---------	--------------	-------

CONTRATO DE OBRA No.:	3925-2023	PLAZO INICIAL:	0,17 MESE	VALOR INICIAL (incluido IVA) :	\$ 189.389.426,00
		FECHA DE INICIO:	28/12/2023	VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	
		FECHA DE SUSPENSIÓN:		VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	\$ 189.389.426,00
		FECHA DE REANUDACIÓN:		ANTICIPO CONCEDIDO:	
		FECHA DE VENCIMIENTO:	30/07/2024	ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ -
		PLAZO ACUMULADO:	6,35		

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JAC LOS BARRIALES NUEVAS ID EAS-EL MOLINO-GUAJIRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	4821-2023	INTERVENTOR:	CONSORCIO NRT&IG 2023	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
----------------------------	-----------	--------------	-----------------------	---	------------------------------

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO				
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML	112	Pavimentación	Construcción	ML	31	31
	Mejoramiento				Mejoramiento			
	Rehabilitación				Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			Estructuras	Túneles			
	Puentes				Puentes			
	Pontones				Pontones			
Mantenimiento				Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO					
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES	
	BÁSICO	IVA	TOTAL		ACUMULADO
APORTE OAC	1.000.000,00		1.000.000,00	OBRAS	59.443.500,00
OBRAS	135.154.029,00		135.154.029,00	GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL	
GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL	4.054.621,00		4.054.621,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11.130.545,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	49.180.776,00		49.180.776,00		
VALOR TOTAL DEL CONVENIO			189.389.426,00	VALOR EJECUTADO	70.574.045,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	\$ 128.563.978,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 107.713.286,23
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	83,78%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES	
MANO DE OBRA CALIFICADA:	1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	
		FECHA	23/08/2024 (Día / Mes / Año)
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA 31 ML		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA 31 ML	
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)			
<div><div></div><div>Firma Nombre NICOLAS REDONDO MOLINA Director de Interventoría Matrícula Profesional No.08202-09853ATL Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA. Copias: Interventor, Dirección Territorial</div></div>			



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA 23/08/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA PERIODO MES: JULIO

CONTRATO DE OBRA No.: 3767-2023 PLAZO INICIAL: 0,17 MESES
FECHA DE INICIO: 15/12/2023 VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 189.671.431,00
FECHA DE SUSPENSIÓN: VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
FECHA DE REANUDACIÓN: VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 189.671.431,00
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/07/2024 ANTICIPO CONCEDIDO:
PLAZO ACUMULADO: 6,35 ANTICIPO AMORTIZADO: \$

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PAPELES,
MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO
DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA: JAC LOS PAPELES -EL MOLINO-GUAJIRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4821-2023 INTERVENTOR: CONSORCIO NRT&IG 2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO				
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML	116	Pavimentación	Construcción	ML	61	61
	Mejoramiento				Mejoramiento			
	Rehabilitación				Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			Estructuras	Túneles			
	Puentes				Puentes			
	Pontones				Pontones			
Mantenimiento				Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO				
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES
	BÁSICO	IVA	TOTAL	
APORTE OAC	1.000.000,00		1.000.000,00	OBRAS
OBRAS	135.426.761,00		135.426.761,00	GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL
GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL	4.062.803,00		4.062.803,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS	49.181.867,00		49.181.867,00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			189.671.431,00	VALOR EJECUTADO

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 118.217.546,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 115.579.339,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 97,77%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 3
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 11

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
			VERSION	1
			PÁGINA	
			FECHA	23/08/2024 (Día / Mes / Año)
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA 60ML		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA 60ML		
COLOACION DE SUBBASE				
<div><div></div><div>Firma Nombre NICOLAS REDONDO MOLINA Director de Interventoría Matrícula Profesional No.08202-09853ATL Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial</div></div>				

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 8
	JAC: VEREDA LOS PAPELES Y VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO-GAJIRA	CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No.3767-2023 Y 3925-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			

1. INTRODUCCIÓN

Mediante convenio No. 3767 de 2023, INTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS TERRITORIAL GUAJIRA y La JUNTA DE ACCION COMUNAL PAPELES DEL MUNCIPIO DEL MOLINO-GUAJIRA, cuyo Objeto es : AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PAPELES, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, Valor \$189.671.431 y un plazo de 3 meses.

Mediante convenio No. 3925 de 2023, INTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS TERRITORIAL GUAJIRA y La JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIALES NUEVAS IDEAS DEL MUNCIPIO DEL MOLINO-GUAJIRA, cuyo Objeto es : AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS BARRIALES NUEVAS IDEAS, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, Valor \$189.389.420 y un plazo de 3 meses.

Y que Mediante el Concurso de Menor Cuantía No. IP-DT-GUA-009-2023 cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.” fue adjudicado al CONSORCIO NRT&IG 2023 Representado legalmente por el Ing. ROBERTO CARLOS LOPEZ JULIO , y perfeccionado mediante Contrato 4821-2023, con el fin de ejercer Para el control técnico, administrativo y socio ambiental y financiero del contrato de obra.

El Gestor Técnico del Proyecto del Contrato de Interventoría es la Ing. MILAGRO CAMARGO AREVALO y el supervisor de interventoría es el ing. DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ.

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 8
	JAC: VEREDA LOS PAPELES Y VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO-GAJIRA	CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No.3767-2023 Y 3925-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			

2. CONVENIO SOLIDARIO No. 3767-2023 VEREDA LOS PAPELES

2.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1.1 Localización del Proyecto

El municipio del Molino se encuentra ubicado en el departamento de la Guajira. Tiene superficie total de 242 kilómetros cuadrados.

Latitud: 10.65

Longitud: -72.917

Latitud: 10° 39' 0" Norte

Longitud: 72° 55' 1" Oeste

MUNICIPIO DEL MOLINO



El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio del Molino, en la vereda los Papeles

VIA EL MOLINO-VEREDA LOS PAPELES



 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 8
	JAC: VEREDA LOS PAPELES Y VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO-GAJIRA	CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No.3767-2023 Y 3925-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			

2.1.2 Municipios en la zona de Influencia y Beneficios

Con la ejecución del proyecto, la población de la vereda Los Papeles ubicada en el municipio del Molino son productoras de pan coger como plátanos, yuca y arracacha lo cual permite mejorar las condiciones de conectividad en materia de transporte con el municipio del Molino.

2.1.3. Inventario y estado Inicial de la vía

La vía El Molino- Los papeles se encuentra en estado transitable, como vía terciaria presenta tramos que necesitan intervención, pero se escogió una cuesta que en tiempo de invierno hace imposible el transito allí.

2.1.4. Características Técnicas del Convenio

Relación de las obras existentes y a Intervenir:
Aproximadamente 113 metros lineales de placa huella.

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 8
	JAC: VEREDA LOS PAPELES Y VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO-GAJIRA	CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No.3767-2023 Y 3925-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			

2.2.1 INFORMACION CONVENIO 3767-2023

Convenio solidario No.	3767-2023
Suscripción de convenio	5 OCTUBRE DE 2024
Objeto	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PAPELES, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Contratista	JAC LOS PAPELES EL MOLINO
Nit	901.726.638-3
Valor Inicial	189.671.431,00
Valor Total	189.671.431,00
Orden de Inicio	15 DE DICIEMBRE DE 2023
Plazo Inicial	31 DE DICIEMBRE DE 2023
Prorroga No.1	30 DE ABRIL DE 2024
Prorroga No.2	30 DE JUNIO DE 2024
Prorroga No. 3	30 DE JULIO DE 2024
Fecha de Terminación	30 DE AGOSTO DE 2024

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 8
	JAC: VEREDA LOS PAPELES Y VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO-GAJIRA	CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No.3767-2023 Y 3925-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			

2.2.2 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

- Se nivela el terreno a ejecutar del PR 3+835 al PR 3+968
- Se transporta, extiende y compacta base en el PR 3+835 al PR 3+968
- Se inicia construccion de placa huella desde el PR 3+908 al PR 3+968, completa con piedra pegada, cuneta y bordillos.
- Por otra parte se presenta la relacion del presupuesto y valores ejecutados a corte 30 de julio de 2024:

DESCRIPCION	VALOR	VALOR ACTAL.	VALOR EJECUTADO	VALOR ACUMULADO
BASICO OBRA	\$ 138.515.557,00	N/A	\$ 66.294.620,00	\$ 93.962.355,00
APORTE OAC	\$ 1.000.000,00	N/A	0.00	0.00
GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	\$ 4.155.467,00	N/A	0.00	0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 46.000.000,00	N/A	\$ 17.579.881,00	\$ 52.314.442,00
TOTAL	\$ 189.671.024,00		\$ 83.874.501,00	\$ 146.276.797,00

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado del proyecto en el periodo reportado corresponde a 49,80%.

2.2.3 Seguimiento Items No Previstos

A la fecha no se ha requerido la creacion de items no previstos al presupuesto.

2.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interentoria.

Se efectuaran los comites operativos dirigidos por la interventoria, con la participacion de la junta de Accion Comunal, presidente y tesorero, asi como de los profesionales de contaduria e ingenieria civil contratados, alli se presentaran comparativos acompañados de cotizaciones y se realiaran la

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 8
	JAC: VEREDA LOS PAPELES Y VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO-GAJIRA	CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No.3767-2023 Y 3925-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			

evaluacion correspondiente costo/beneficio para la aprobacion y tramite de transferencia de recursos que permitan la compra y adquisicion de los bienes y servicios requeridos para el proyecto.

2.3 REPORTES DE EJECUCION MENSUAL DEL CONVENIO

2.3.1 Informe Semanal.

Con el fin de realizar un seguimmiento a las activivades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectua el diligenciamiento del informe semanal:

- Semana 14: Desde 28 de junio al 4 de julio de 2024
- Semana 15: Desde 5 de julio al 11 de julio de 2024
- Semana 16: Desde 12 de julio al 18 de julio de 2024
- Semana 17: Desde 19 de julio al 25 de julio de 2024
- Semana 18: Desde 26 de julio al 1 de agosto de 2024

Se anexan los formatos: INFORMES SEMANALES

2.3.2 Maquinaria y Equipo

En el mes de julio de 2024 se utilizaron los siguientes equipos:

CANT.	EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD
2	MEZCLADORA	VARIAS	1 BULTO
1	VOLTEOS	VARIAS	8 M3
1	VIBRADOR DE CONCRETO	HONDA	9HP

2.3.3 Personal, control legales y segridad social contrato de obra

No.	NOMBRE	CARGO	INICIO	VINCULACION
1	FIDEL BELEÑO HERNANDEZ	ING. RESIDENTE OBRA	1/04/2023	PRESTACION DE SERVICIO
2	LUZ ELENA CARRILLO	CONTADORA	1/04/2023	PRESTACION DE SERVICIO
3	YESIDE BALCAZAR BULA	MAESTRO DE OBRA	1/04/2023	PRESTACION DE SERVICIO

Se anexa Formato CONTROL DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL.

2.3.4 Informe Financiero y Presupuestal del Contrato de Obra.

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 8
	JAC: VEREDA LOS PAPELES Y VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO-GAJIRA	CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No.3767-2023 Y 3925-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			

De acuerdo con el convenio 3767-2023, Clausula septima: CLAUSULA SÉPTIMA: GIROS DE LOS RECURSOS: EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023, cuando el OAC cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del presente convenio. Dicho giro estará sujetos a la disponibilidad del PAC.

Con base en el CDP No. 115424 de fecha 7 de junio de 2024, se hizo registro presupuestal por valor \$188.671.431 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-12-0-2402041-02.

Como se realizaron desembolsos para proveedores en los primeros comites operativos se anexa formatos PLAN DE INVERSION DESEMBOLSO CONVENIOS, INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO ESEMBOLSO DE CONVENIO Y ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIO.

2.3.5 Estado General del tiempo

Durante el mes de julio de 2024, se realizaron actividades en obra, por lo que el registro de bitacora por parte del residente de obra no contiene el reporte de Estado General Del Tiempo. Es de precisar que este mes fue lluvioso.

anexa formato de Estado General del tiempo.

2.3.6 Resumen Ensayos de Laboratorios

Durante el mes de julio de 2024, se realizaron toma de densidades a subbase.

No se anexa formato Resumen Ensayo de Laboratorio

2.3.7 Seguimiento garantias y seguros contrato obra

A continuacion se presenta una relacion de las polizas y amparos correspondientes;

AMPARO	% AMPARO	VR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	37.877.885,20	30/07/24	01/082025
PRESTACIONES SOCIALES	5%	9.469.471,30	30/07/24	30/09/2027
ESTABILIDAD	30%	56.816.827,80	30/06/24	30/06/2029

 	CONTRATISTA DE OBRA		CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 8
	JAC: VEREDA LOS PAPELES Y VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO-GAJIRA		CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No.3767-2023 Y 3925-2023		CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL				
TOTAL				
REPOSABILIDAD CIVIL	200 SLMMV	260.000.000,00		

En relacion a las polizas correspondientes a la prorroga No. 3.

Se anexa el formato SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS

2.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de construccion para Carreteras del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- Version 2022 ola normatividad que se encuentre vigente.

2.3.9 Otros documentos seguimiento mensual:

- Seguimiento al programa de ejecucion e inversiones de la obra, a corte de 30 de julio de 2023.
- Las Actas de comité de obra y actas de reunion se llevaran de acuerdo a los formatos asignados.
- Los comité operativos tambien seran presentados en sus formatos.

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 8
	JAC: VEREDA LOS PAPELES Y VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO-GAJIRA	CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No.3767-2023 Y 3925-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			

3. CONVENIO SOLIDARIO No. 3925-2023 VEREDA BARRIELES NUEVAS IDEAS

3.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO

3.1.1 Localización del Proyecto

El municipio del Molino se encuentra ubicado en el departamento de la Guajira. Tiene superficie total de 242 kilómetros cuadrados.

Latitud: 10.65

Longitud: -72.917

Latitud: 10° 39' 0" Norte

Longitud: 72° 55' 1" Oeste

MUNICIPIO DEL MOLINO



El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio del Molino, en la vereda Barriales Nuevas Ideas.

VIA EL MOLINO-VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS



3.1.2 Municipios en la zona de Influencia y Beneficios

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 8
	JAC: VEREDA LOS PAPELES Y VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO-GAJIRA	CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No.3767-2023 Y 3925-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			

Con la ejecución del proyecto, la población de la vereda barriales nuevas ideas ubicada en el municipio del Molino son productoras de pan coger como plátanos, yuca y arracacha lo cual permite mejorar las condiciones de conectividad en materia de transporte con el municipio del Molino.

3.1.3. Inventario y estado Inicial de la vía

La vía El Molino- Barriales nuevas ideas se encuentra en estado transitable, como vía terciaria presenta tramos que necesitan intervención, pero se escogió dos Tramos que en tiempo de invierno hace imposible el transito allí.

3.1.4 Características Técnicas del Convenio

Relación de las obras existentes y a Intervenir:
Aproximadamente 112 metros lineales de placa huella.

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 8
	JAC: VEREDA LOS PAPELES Y VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO-GAJIRA	CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No.3767-2023 Y 3925-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			

3.2.1 INFORMACION CONVENIO 3925-2023

Convenio solidario No.	3925-2023
Suscripción de convenio	13 OCTUBRE DE 2024
Objeto	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS BARRIALES NUEVAS IDEAS, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Contratista	JAC LOS BARRIALES- EL MOLINO
Nit	901.674.548-4
Valor Inicial	189.389.426,00
Valor Total	189.389.426,00
Orden de Inicio	28 DE DICIEMBRE DE 2023
Plazo Inicial	31 DE DICIEMBRE DE 2023
Prorroga No.1	30 DE ABRIL DE 2024
Prorroga No.2	30 DE JUNIO DE 2024
Prorroga No.3	30 DE JULIO DE 2024
Fecha de Terminación	30 DE AGOSTO DE 2024

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 8
	JAC: VEREDA LOS PAPELES Y VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO-GAJIRA	CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No.3767-2023 Y 3925-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			

3.2.2 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

- Se nivela y excava el terreno a ejecutar del PR 3+835 al PR 3+968
 - Se transporta, extiende y compacta base en el PR 7+744 al PR 7+825 y PR 8+149 al PR 8+180
 - Se inicia construccion placa huella del PR 8+149 al PR 8+180 (31ml), completa con piedra pegada, cuneta y bordillo.
- ∞ Por otra parte se presenta la relacion del presupuesto y valores ejecutados a corte 30 de julio de 2024:

DESCRIPCION	VALOR	VALOR ACTAL.	VALOR EJECUTADO	VALOR ACUMULADO
BASICO OBRA	\$ 142.790.382,00	N/A	\$ 26.365.738,00	\$ 39.548.607,00
APORTE OAC	\$ 1.000.000,00	N/A	0.00	0.00
GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	\$ 4.283.711,00	N/A	0.00	0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 41.315.302,00	N/A	\$ 11.130.545,00	\$ 35.089.917,23
TOTAL	\$ 189.389.395,00		\$ 37.496.283,00	\$ 74.638.524,23

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado del proyecto en el periodo reportado corresponde a 39,41%.

3.2.3 Seguimiento Items No Previstos

A la fecha se ha requerido la creacion de items no previstos al presupuesto, RELLENO PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.

3.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interentoria.

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 8
	JAC: VEREDA LOS PAPELES Y VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO-GAJIRA	CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No.3767-2023 Y 3925-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			

Se efectuaran los comites operativos dirigidos por la interventoria, con la participacion de la junta de Accion Comunal, presidente y tesorero, asi como de los profesionales de contaduria e ingenieria civil contratados, alli se presentaran comparativos acompañados de cotizaciones y se realiarn la evaluacion correspondiente costo/beneficio para la aprobacion y tramite de transferencia de recursos que permitan la compra y adquisicion de los bienes y servicios requeridos para el proyecto.

En la etapa actual se esta en la adquisicion de material de subbase y etros al igual que la maquinaria para ejecutar la obra.

3.3 REPORTES DE EJECUCION MENSUAL DEL CONVENIO

3.3.1 Informe Semanal.

Con el fin de realizar un seguimmiento a las activivades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectua el deligenciamiento del informe semanal:

- Semana 14: Desde 28 de junio al 4 de julio de 2024
- Semana 15: Desde 5 de julio al 11 de julio de 2024
- Semana 16: Desde 12 de julio al 18 de julio de 2024
- Semana 17: Desde 19 de julio al 25 de julio de 2024
- Semana 18: Desde 26 de julio al 1 de agosto de 2024

Se anexan los formatos: INFORMES SEMANALES

3.3.2 Maquinaria y Equipo

En el mes de julio de 2024 se utilizaron los siguientes equipos:

CANT.	EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD
1	MEZCLADORA		1 BULTO
1	VOLTEOS		8 M3
1	VIBRADOR DE CONCRETO	GEMPAR	

3.3.3 Personal, control legales y segridad social contrato de obra

No.	NOMBRE	CARGO	INICIO	VINCULACION
1	ROBERTO CLADERON	ING. RESIDENTE	15/06/2023	PRESTACION DE SERVICIO

 	CONTRATISTA DE OBRA		CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 8	
	JAC: VEREDA LOS PAPELES Y VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO-GAJIRA		CONSORCIO NRT&IG 2023		
	CONVENIOS SOLIDARIOS No.3767-2023 Y 3925-2023		CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023		
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
			OBRA		
2	EDGAR A. OLIVELLA ARIAS	CONTADORA	1/04/2023	PRESTACION DE SERVICIO	
3	LUIS A. VEGA MARTINEZ	MAESTRO DE OBRA	1/04/2023	PRESTACION DE SERVICIO	

Se anexa Formato CONTROL DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL.

3.3.4 Informe Financiero y Presupuestal del Contrato de Obra.

De acuerdo con el convenio 3767-2023, Clausula septima: CLAUSULA SÉPTIMA: GIROS DE LOS RECURSOS: EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023, cuando el OAC cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del presente convenio. Dicho giro estará sujetos a la disponibilidad del PAC.

Con base en el CDP No. 115424 de fecha 7 de junio de 2024, se hizo registro presupuestal por valor \$188.389.426 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-12-0-2402041-02.

Como se realizaron desembolsos para proveedores en los primeros comites operativos se anexa formatos PLAN DE INVERSION DESEMBOLSO CONVENIOS, INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO ESEMBOLSO DE CONVENIO.

3.3.5 Estado General del tiempo

Durante el mes de julio de 2024, nose realizaron actividades en obra, por lo que el registro de bitacra por parte del residente de obra no contiene el reporte de Estado General Del Tiempo. Es de precisar que este mes fue lluvioso.

Se anexa formato de Estado General del tiempo.

3.3.6 Resumen Ensayos de Laboratorios

Durante el mes de julio de 2024, se realizaron las densidades a subbase.

se anexa formato Resumen Ensayo de Laboratorio

3.3.7 Seguimiento garantias y seguros contrato obra

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 8
	JAC: VEREDA LOS PAPELES Y VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO-GAJIRA	CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No.3767-2023 Y 3925-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			

A continuacion se presenta una relacion de las polizas y amparos correspondientes;

AMPARO	% AMPARO	VR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	37.877.885,20	30/07/24	01/08/2025
PRESTACIONES SOCIALES	5%	9.469.471,30	30/06/24	30/08/2027
ESTABILIDAD	30%	56.816.827,80	30/09/24	30/09/2029
TOTAL				
REPOSABILIDAD CIVIL	200 SLMMV	260.000.000,00		

En relacion a las polizas correspondientes a la prorroga No.3.

Se anexa el formato SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS

3.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de construccion para Carreteras del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- Version 2022 ola normatividad que se encuentre vigente.

3.3.9 Otros documentos seguimiento mensual:

- Seguimiento al programa de ejecucion e inversiones de la obra, a corte de 30 de julio de 2023, el contratista no ha presentado el Programa de inversion y ejecucion de obras.
- Las Actas de comité de obra y actas de reunion se llevaran de acuerdo a los formatos asignados.
- Los comité operativos tambien seran presentados en sus formatos.

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 8
	JAC: VEREDA LOS PAPELES Y VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO-GAJIRA	CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No.3767-2023 Y 3925-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			

4.0 INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

PROCESO DE SELECCION	IP-DT-GUA-009-2023.
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4821 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCION	11 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATISTA	CONSORCIO NRT&IG 2023
NIT	901781662-4
VALOR INICIAL	\$60.632.761
VALOR ADICIONAL	\$0.00
VALOR TOTAL	\$60.632.761
ORDEN DE INICIO	27 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023
PRORROGA No. 1	30 DE ABRIL DEL 2024
PRORROGA No. 2	30 DE JUNIO DE 2024
PRORROGA No. 3	30 DE JULIO DE 2024
FECHA DE TERMINACION	30 DE AGOSTO DE 2024
DIRECCION	CALLE 14 No. 17-46 Interior 15
NUMERO DE CELULAR	315 5751982
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ING. DUBIN CAMARGO ALMENAREZ

4.1 Descripción de las actividades realizadas por el interventor

Las actividades realizadas durante este periodo fue realizar comités operativos para el desembolso de recursos para los procesos de compra y contrataciones necesarias para la marcha normal de ambos convenios.

- Controlar, supervisar y medir la construcción de placa huella instalada en los dos proyectos en Barriales Nuevas Ideas y en Papeles.

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 8
	JAC: VEREDA LOS PAPELES Y VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO-GAJIRA	CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No.3767-2023 Y 3925-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			

4.2 Informe de especialistas y profesionales

- Los especialistas evaluaron los estudios y Diseños (diseño geométrico y diseño de pavimento) JAC BARRIALES.
- El director y residente de la interventoria acudieron a las diferentes socializaciones de los proyectos, asistieron a diversas reuniones con el Invias, presencial y virtual.
- Se coordinó la evaluación de los propuestos presentados y el cronograma de obra e inversión.

4.3 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de obra e Interventoría.

En el presente periodo se realizó seguimiento a la aprobación de Estudios y Diseños JAC barriales requeridos para la ejecución de los proyectos, se verificó el uso de la Cartilla de obras menores de drenaje y estructuras Viales de Invias, las especificaciones generales de construcción de carreteras

4.4 REPORTE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

4.4.1 Equipo y vehículo contrato de Interventoría

Durante este periodo se tiene dos motocicletas para los dos frentes de obra, también equipos de cómputos y dotación de oficina necesarias para la puesta en marcha de la oficina.

Se anexa el formato Equipo y Vehículo

4.4.2 Informe de especialistas y profesionales

 	CONTRATISTA DE OBRA		CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 8
	JAC: VEREDA LOS PAPELES Y VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO-GAJIRA		CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No.3767-2023 Y 3925-2023		CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL				

- Durante este periodo no hubo informe de los especialistas.

4.4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social

Durante el mes de abril se relaciona el personal de interventoría

No.	NOMBRE	CARGO	INICIO	TIPO DE CONTRATO
1	NICOLAS REDONDO MOLINA	Director Interventoria	1/04/2024	Prestación de servicio
2	JANIO TAPIAS HERRERA	Residente de Interventoria	1/04/2024	Prestación de servicio
3	LUZ ELENA FRAGOZO	Social de Interventoria	9/05/2024	Personal de planta
4	ANGELICA VANEGAS PADILLA	Ambiental de Interventor	1/07/2024	Personal de planta
5	JHON VEGA CASTANEDA	INSPECTOR-SISO	15/06/2024	Personal de planta
6	JOSE LUIS	INSPECTOR	15/06/2024	Personal de planta

Se anexa formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7

4.4.4 Seguimiento a garantías y seguros contrato de interventoría

A continuación, se presenta una relación de póliza y amparos correspondiente al periodo actual:

AMPARO	% AMPARO	VR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO	10%	6.063.276,10	29/01/2024	30/10/2024
PRESTACIONES	20%	12.126.552,20	29/01/2024	30/04/2027
CALIDAD	30%	18.189.828,30	29/01/2024	30/04/2025
TOTAL		36.379.656,60		

Se anexa formato MEPI-MN1-IN15-FR-13

4.4.5 Otros documentos seguimiento mensual

- **Seguimiento al Plan de Cargas o Reprogramación al Plan de Cargas después de prorroga 1**

Se anexa MEPI-MN1-IN-9-FR-2

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 8
	JAC: VEREDA LOS PAPELES Y VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO-GAJIRA	CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No.3767-2023 Y 3925-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			

• Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría

Con base en el CDP 138123 del 19 de julio del 2023 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera de INVIA.

CATALOGO DE GASTOS	FUENTE	RECURSO	VALOR AFECTADO
C-2402-0600-14-0-2402041-02.	Nacion	10	\$60.632.761

5.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Una vez colocada la subbase, se debe iniciar la excavación de viga riostras, armada de hierro de palca huella, vigas, cunetas y bordillo.
- Fundida de tramos de placa huella completos.
- Realizar comité operativo para maquinaria, materiales pétreos y subbase y demás componentes para inicio de obras.

6.0 ANEXOS

6.0.1 Relación Correspondencia:

Durante este periodo del mes de julio se llevó la siguiente:

RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA DEL CONTRATO 4821-2023

CONSORCIO NRT&IG 2023 ENVIADAS

REFERENCIA	FECHA	ASUNTO	OBSERVACION
INTER-INV-MOL-031	12/07/2024	ACTA DE COSTOS No. 6 CONTRATO No. 4821-2023	
INTER-INV-MOL-032	22/07/2024	PLAN DE CARGA PRORROGA 3 CONTRATO No. 4821-2023	
INTER-INV-MOL-033	23/07/2024	ACTA DE COSTOS No. 7 CONTRATO No. 4821-2023	
INTER-INV-MOL-034	25/07/2024	ACTA MODIF. No. 1 Y PLAN DE CARGAS CONTRATO No. 4821-2023	
INTER-INV-MOL-035	31/07/2024	SOLICITUD DE PRORROGA CONVENIOS 3925-2023 Y 3767-2023	

CORRESPONDENCIA ENVIADA AL CONSORCIO NRT&IG 2023

REFERENCIA	FECHA	ASUNTO	OBSERVACION
20245-VGUA-043565	4/07/2024	reiteracion e incumplimiento	

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 8
	JAC: VEREDA LOS PAPELES Y VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO-GAJIRA	CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No.3767-2023 Y 3925-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			

6.0.2 Registro fotográfico

1. DATOS GENERALES											
CONTRATISTA	JAC BARRIALES NUEVAS IDEAS	CONTRATO N°	3925-2024	INFORME MENSUAL	8						
INTERVENTORIA	CONSORCIO NRT&IG 2023	CONTRATO N°	4821-2023								
NOMBRE DEL PROYECTO	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO EL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"										
											
TOMA DE DESGASTES A SUBBASE						TOMA DE DESGASTES A SUBBASE					
											
ARMADO DE HIERRO Y FORMATEADA DE PLACA HUELLA						ARMADO DE HIERRO Y FORMATEADA DE PLACA HUELLA					

Página 1 de 1

1. DATOS GENERALES					
CONTRATISTA	JAC BARRIALES NUEVAS IDEAS	CONTRATO N°	3925-2024	INFORME MENSUAL	8
INTERVENTORIA	CONSORCIO NRT&IG 2023	CONTRATO N°	4821-2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO EL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"				
<div><div></div><div></div></div>					
FUNDIDA DE PLACA HUELLA LOS PRIMEROS 30 ML			FUNDIDA DE PLACA HUELLA LOS PRIMEROS 30 ML		
<div><div></div><div></div></div>					
FUNDIDA DE PLACA HUELLA LOS PRIMEROS 30 ML			FUNDIDA DE PLACA HUELLA LOS PRIMEROS 30 ML		

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 8
	JAC: VEREDA LOS PAPELES Y VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO-GAJIRA	CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No.3767-2023 Y 3925-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			

1. DATOS GENERALES					
CONTRATISTA	JAC BARRIALES NUEVAS IDEAS	CONTRATO N°	3925-2024	INFORME MENSUAL	8
INTERVENTORIA	CONSORCIO NRT&IG 2023	CONTRATO N°	4821-2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO EL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"				
					
FUNDIDA DE PLACA HUELLA LOS PRIMEROS 60 ML					
					
FUNDIDA DE PLACA HUELLA LOS PRIMEROS 60 ML					
					
FUNDIDA DE PLACA HUELLA LOS PRIMEROS 60 ML					

1. DATOS GENERALES					
CONTRATISTA	JAC BARRIALES NUEVAS IDEAS	CONTRATO N°	3925-2024	INFORME MENSUAL	8
INTERVENTORIA	CONSORCIO NRT&IG 2023	CONTRATO N°	4821-2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO EL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."				
					
					
VISITA DEL PERSONAL DE INVÍAS					
					
ELEMENTOS DE ASEO E HIGIENE Y PRIMEROS AUXILIO					
					
BUZÓN DE SUGERENCIA					

 INVIAT INSTITUTO NACIONAL	CONTRATISTA DE OBRA		CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 8
	JAC: VEREDA LOS PAPELES Y VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO-GAJIRA		CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No.3767-2023 Y 3925-2023		CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL				

1. DATOS GENERALES					
CONTRATISTA	JAC PAPELES	CONTRATO N°	3767-2024	INFORME MENSUAL	8
INTERVENTORÍA	CONSORCIO NRT&IG 2023	CONTRATO N°	4821-2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO EL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"				
					
TOMA DE DENSIDADES DE SUBBASE		TOMA DE DENSIDADES DE SUBBASE			
					
FORMALETEADA Y ARMADO DE HIERRO		FORMALETEADA Y ARMADO DE HIERRO			

1. DATOS GENERALES					
CONTRATISTA	JAC PAPELES	CONTRATO N°	3767-2024	INFORME MENSUAL	8
INTERVENTORÍA	CONSORCIO NRT&IG 2023	CONTRATO N°	4821-2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO EL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"				
					
FUNDIDA DE PLACA HUELLA		FUNDIDA DE PLACA HUELLA			
					
FUNDIDA DE PLACA HUELLA		FUNDIDA DE PLACA HUELLA			

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 8
	JAC: VEREDA LOS PAPELES Y VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO-GAJIRA	CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No.3767-2023 Y 3925-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			

1. DATOS GENERALES					
CONTRATISTA	JAC PAPELES	CONTRATO N°	3767-2024	INFORME MENSUAL	8
INTERVENTORIA	CONSORCIO NRT&IG 2023	CONTRATO N°	4821-2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO EL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"				





VISITA DE INVIAS

VISITA DE INVIAS






BUZON DE SUGERENCIA

TOMA DE MUESTRA DE CONCRETO


 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 8
	JAC: VEREDA LOS PAPELES Y VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO-GAJIRA	CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No.3767-2023 Y 3925-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			

CONVENIO 3767-2023 **JAC VEREDA LOS PAPELES**

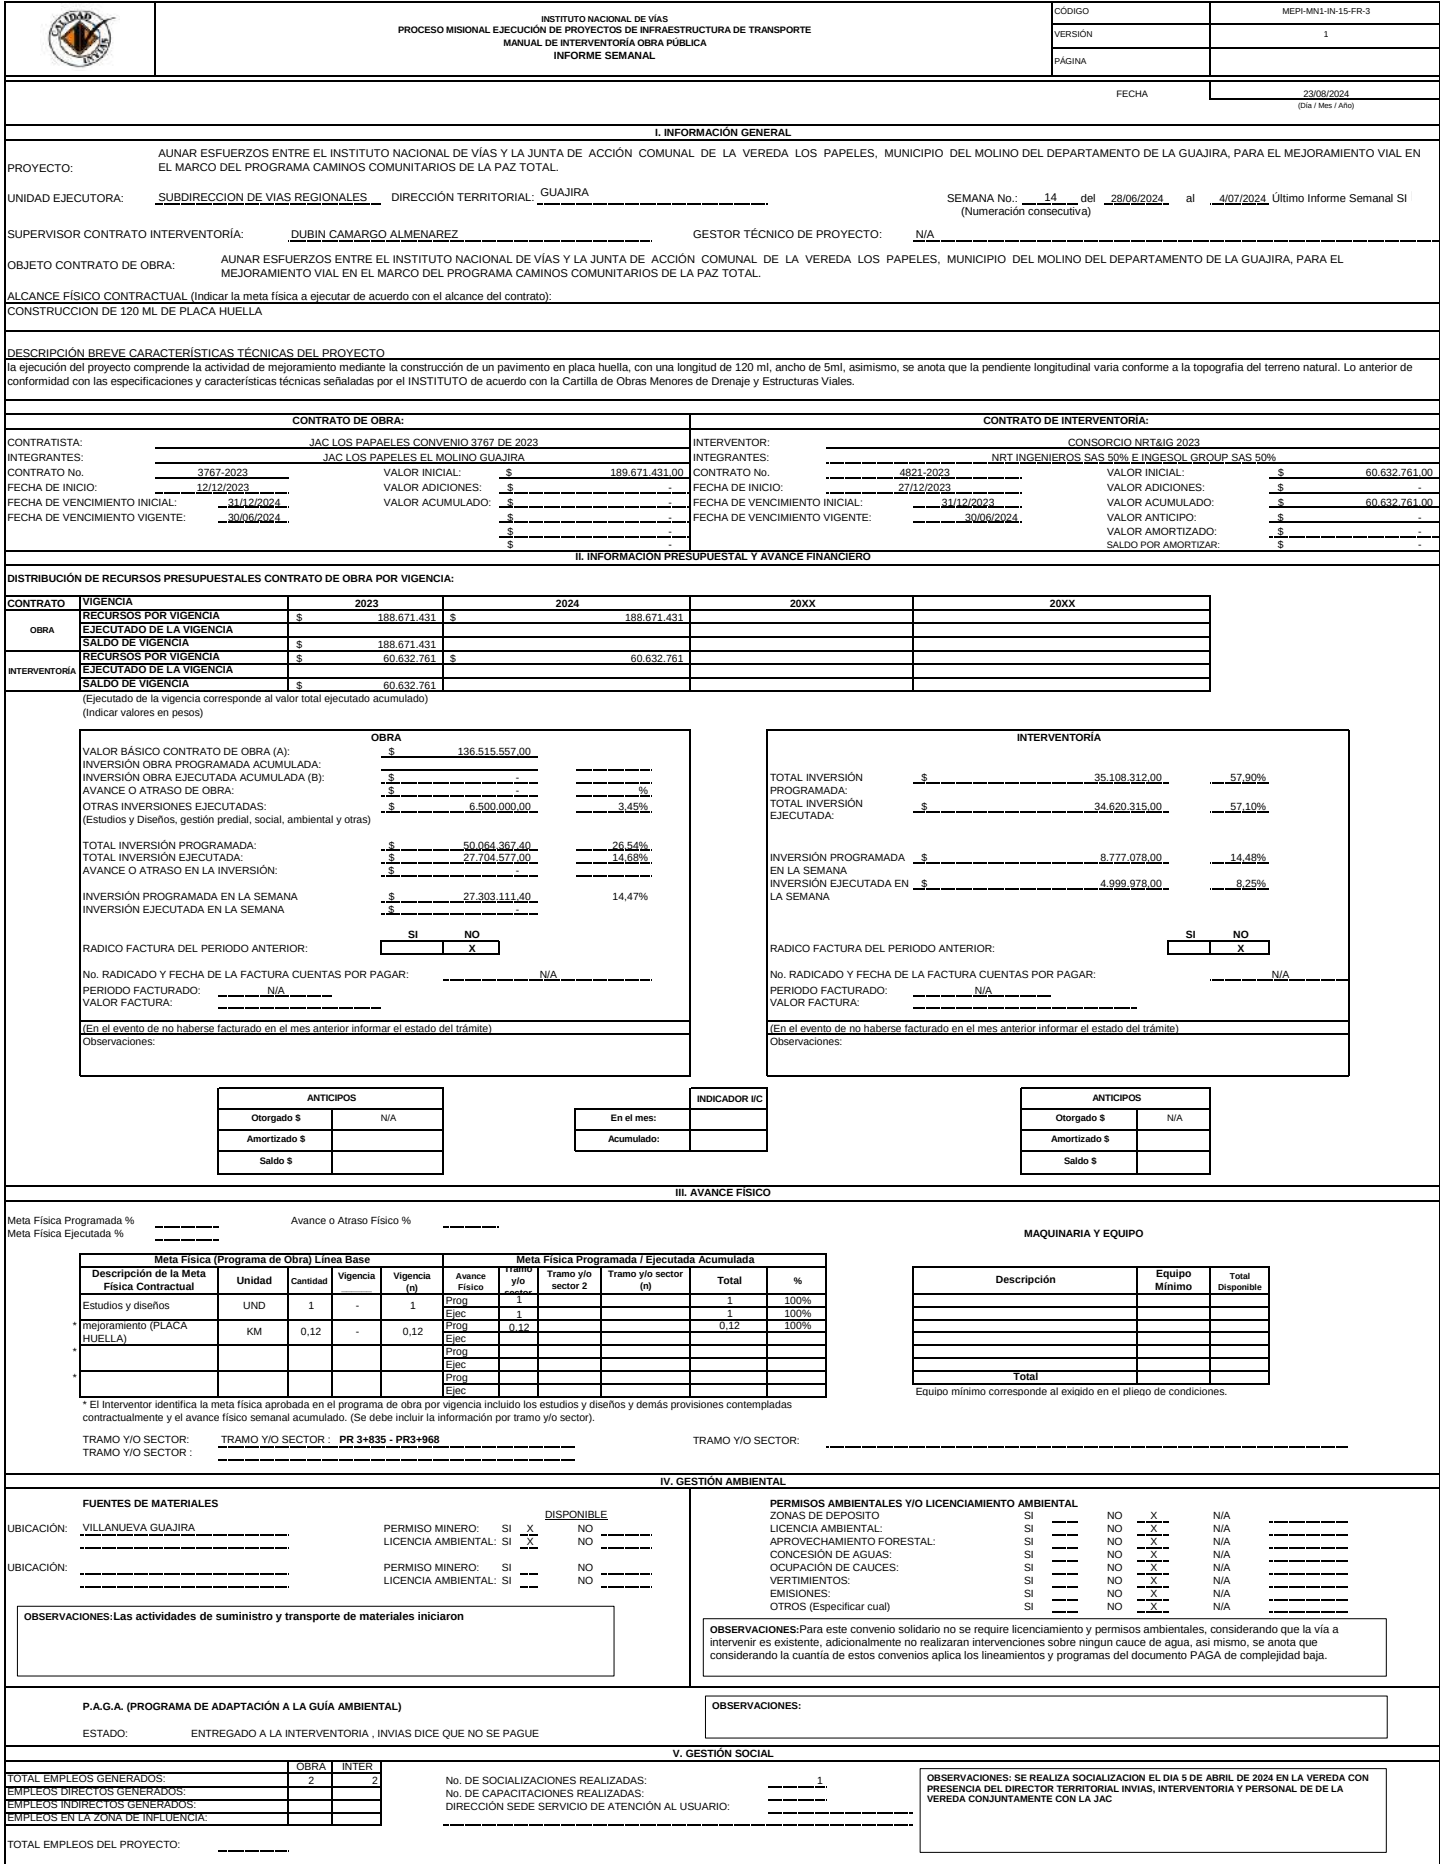


VI. GESTIÓN PREDIAL	
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____ FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ AVALÚOS APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____	OBSERVACIONES: <div></div>
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS	
ÁREA TÉCNICA RAIZ DE LA FUERTE OLA INVERNAL QUE AZOTA LA ZONA DE LOS TRABAJOS NO SE PUEDE ALLEGAR MATERIALES, EQUIPOS NI OBREROS.	
ÁREA SOCIAL	

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
---	--

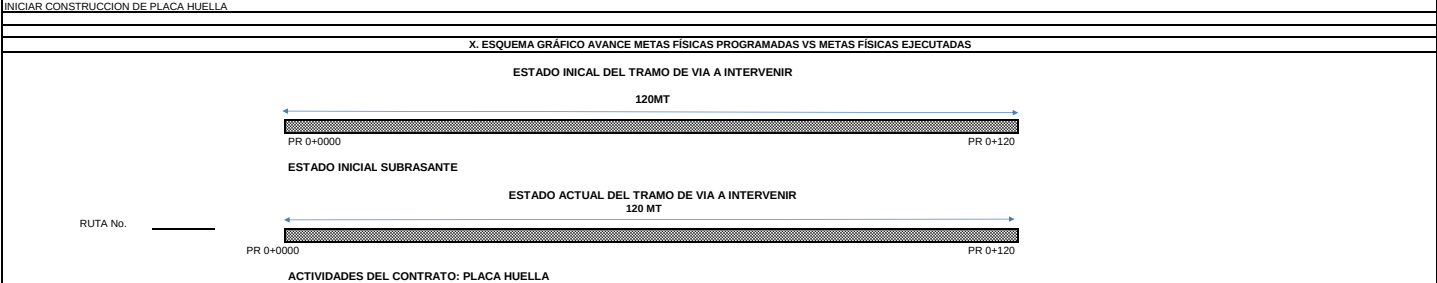


El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO




NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Revisar, Controlar y Aprobar los procesos técnicos, administrativos, financieros y legales, respetando los estándares de calidad, tiempos y costos	FIRMA 
	NOMBRE: NICOLAS REDONDO MOLINA
	Matrícula Profesional No.: 08202-09853ATL
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial	

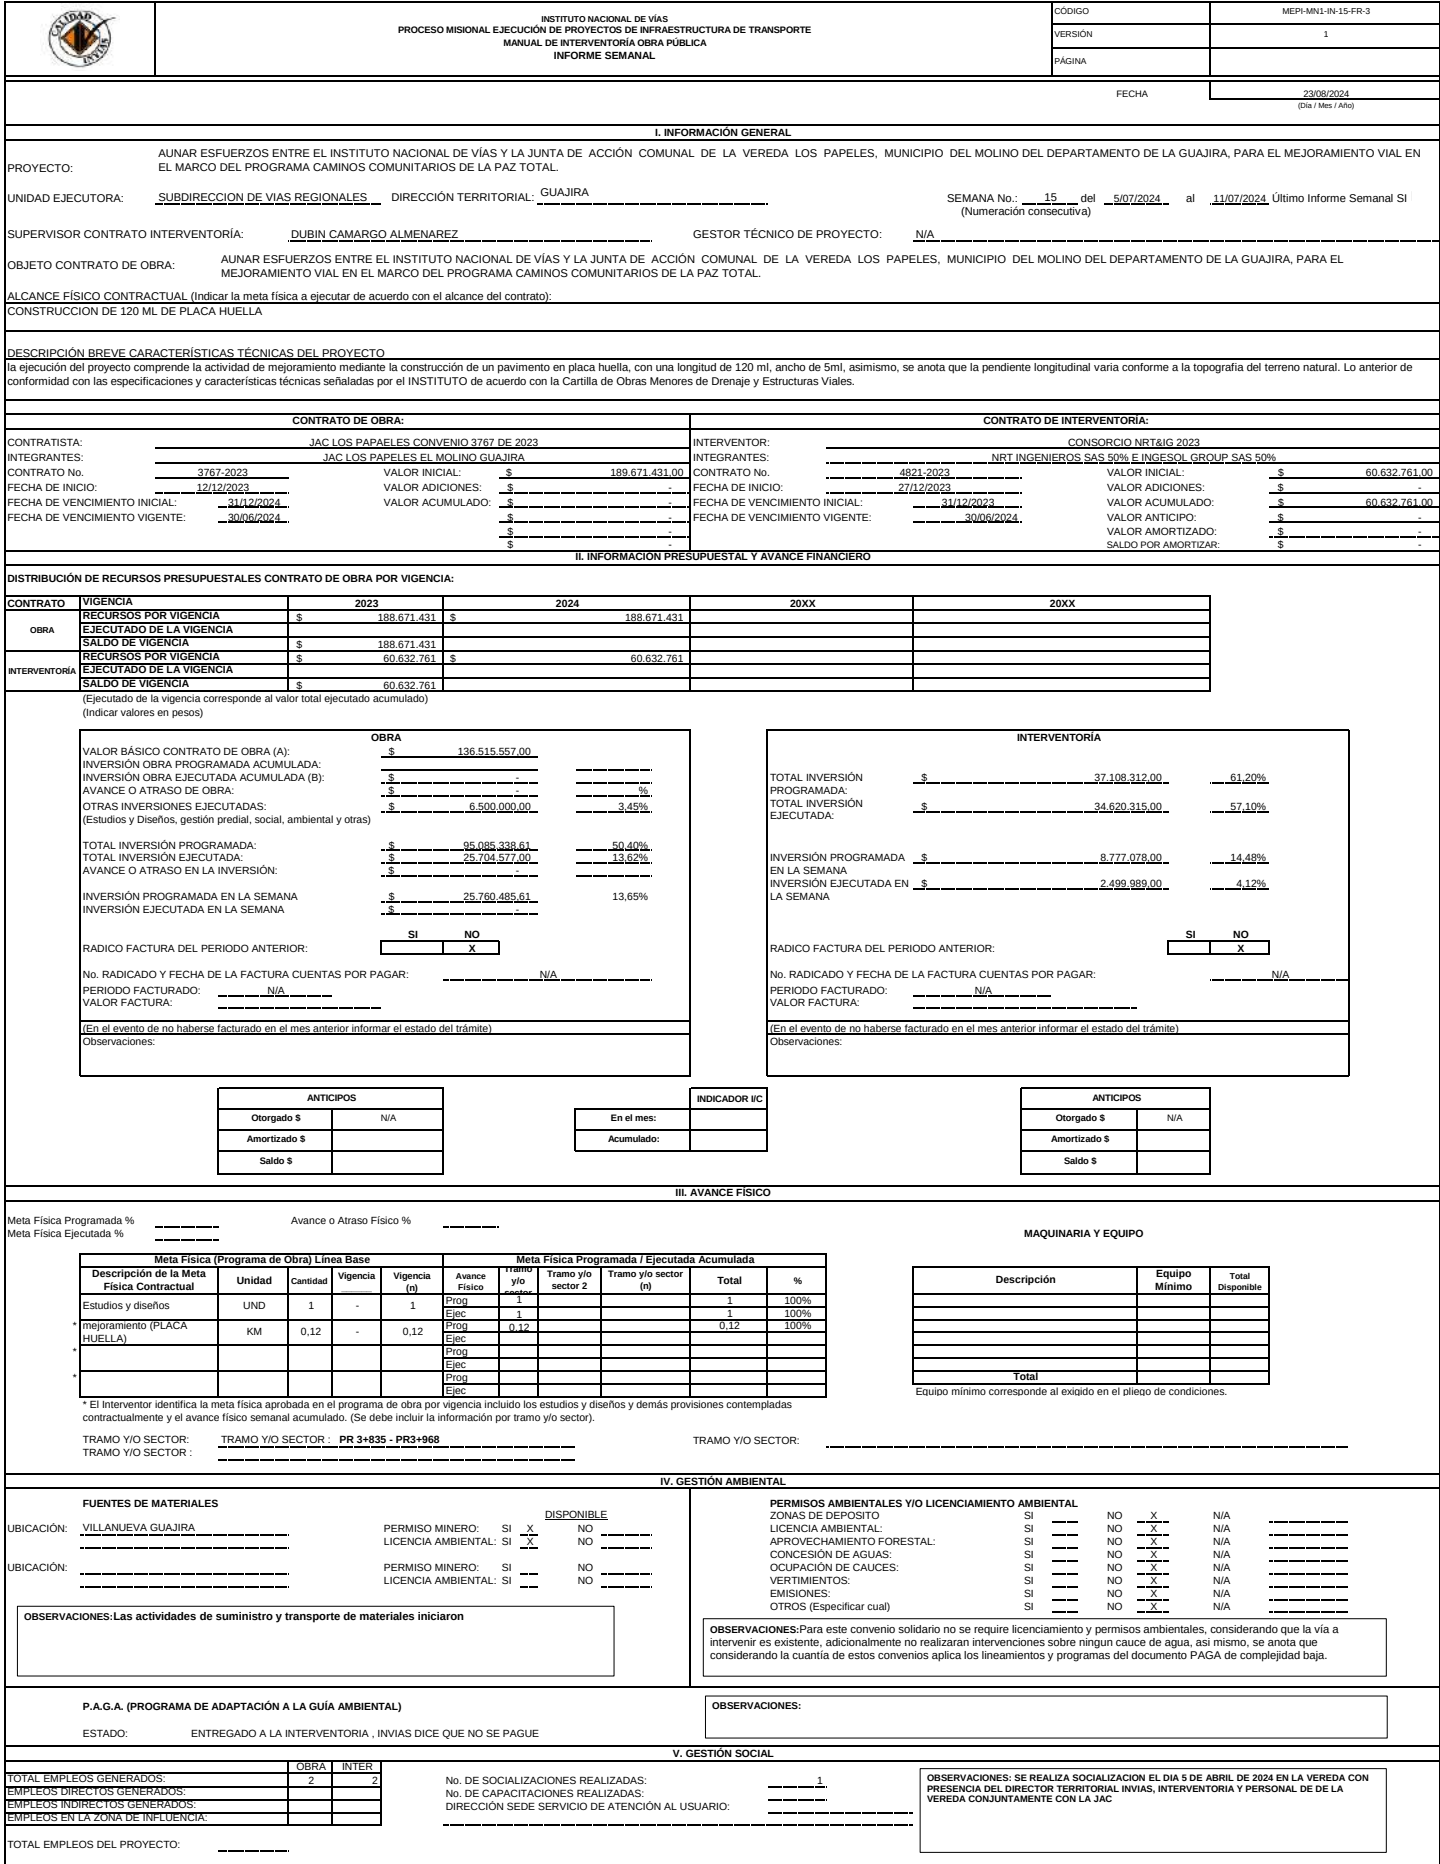


VI. GESTIÓN PREDIAL	
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____ FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ AVALÚOS APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____	OBSERVACIONES: <div></div>
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS	
ÁREA TÉCNICA RAIZ DE LA FUERTE OLA INVERNAL QUE AZOTA LA ZONA DE LOS TRABAJOS NO SE PUEDE ALLEGAR MATERIALES, EQUIPOS NI OBREROS.	
ÁREA SOCIAL	

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
---	--

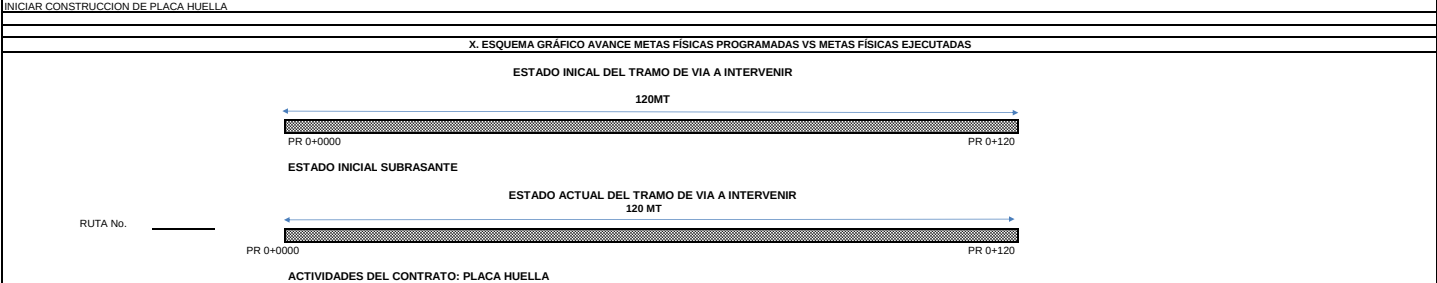

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Revisar, Controlar y Aprobar los procesos técnicos, administrativos, financieros y legales, respetando los estándares de calidad, tiempos y costos	FIRMA 
	NOMBRE: NICOLAS REDONDO MOLINA
	Matrícula Profesional No.: 08202-09853ATL
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL

CODIGO

VERSION

PÁGINA

MEPI-MNI-IN-15-FR-3

1

FECHA

23/08/2024

(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PAPELES, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

GUAJIRA

SEMANA No.:

16

del

12/07/2024

al

18/07/2024

Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

DUBIN CAMARGO ALMENAREZ

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

N/A

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PAPELES, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCION DE 120 ML DE PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

la ejecución del proyecto comprende la actividad de mejoramiento mediante la construcción de un pavimento en placa huella, con una longitud de 120 ml, ancho de 5ml, asimismo, se anota que la pendiente longitudinal varia conforme a la topografía del terreno natural. Lo anterior de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JAC LOS PAPELES CONVENIO 3767 DE 2023

INTEGRANTES: JAC LOS PAPELES EL MOLINO GUAJIRA

CONTRATO No. 3767-2023

FECHA DE INICIO: 12/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024

VALOR INICIAL: \$ 189.671.431,00

VALOR ADICIONES: \$ -

VALOR ACUMULADO: \$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTEGRANTES: CONSORCIO NRT&IG 2023

CONTRATO No. 4821-2023

FECHA DE INICIO: 27/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024

VALOR INICIAL: \$ 60.632.761,00

VALOR ADICIONES: \$ -

VALOR ACUMULADO: \$ 60.632.761,00

VALOR ANTICIPO: \$ -

VALOR AMORTIZADO: \$ -

SALDO POR AMORTIZAR: \$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 188.671.431	\$ 188.671.431		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 60.632.761	\$ 60.632.761		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 60.632.761			

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 136.515.557,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ 6.500.000,00

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 130.845.824,22

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 25.704.577,00

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 25.760.485,61

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: N/A

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 42.108.312,00

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 39.620.303,00

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 8.777.079,00

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 2.499.989,00

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: N/A

Observaciones:

ANTICIPOS

Otorgado \$	N/A
Amortizado \$	
Saldo \$	

En el mes: Acumulado:

INDICADOR IIC

ANTICIPOS

Otorgado \$	N/A
Amortizado \$	
Saldo \$	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1	-	1	Prog	1			1	100%
Mejoramiento (PLACA HUELLA)	KM	0,12	-	0,12	Ejec	1	0,12		1	100%
					Prog				0,12	100%
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR: PR 3+835 - PR3+968

TRAMO Y/O SECTOR:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: VILLANUEVA GUAJIRA

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:Las actividades de suministro y transporte de materiales iniciaran

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO

Ocupación DE CAUCES: SI NO

VERTIENTES: SI NO

EMISIONES: SI NO

OTROS (Especificar cual) SI NO

OBSERVACIONES:Para este convenio solidario no se requiere licenciamiento y permisos ambientales, considerando que la vía a intervenir es existente, adicionalmente no realizaran intervenciones sobre ningún cauce de agua, así mismo, se anota que considerando la cuantía de estos convenios aplica los lineamientos y programas del documento PAGA de complejidad baja.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: ENTREGADO A LA INTERVENTORIA , INVIAS DICE QUE NO SE PAGUE

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: SE REALIZA SOCIALIZACION EL DIA 5 DE ABRIL DE 2024 EN LA VEREDA CON PRESENCIA DEL DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS, INTERVENTORIA Y PERSONAL DE DE LA VEREDA CONJUNTAMENTE CON LA JAC

VI. GESTIÓN PREDIAL	
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____ FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ AVALÚOS APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____	OBSERVACIONES: <div></div>
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS	
ÁREA TÉCNICA RAIZ DE LA FUERTE OLA INVERNAL QUE AZOTA LA ZONA DE LOS TRABAJOS NO SE PUEDE ALLEGAR MATERIALES, EQUIPOS NI OBREROS. SE REALIZ AVISITA TECNICA EL 17 DE JULIO DE 2024 DE INVIAS EL SUPERVISOR DEL PROYECTOY SE NALIZA VANCES DEL MISMO Y POSIBLE PRORROGA AGOSTO	
ÁREA SOCIAL SE REALIZA REUNION CON LA SOCIAL DE INVIAS Y LA INTERVENTORIA PARA ANALIZAR Y ESTUDIAR ESTRATEGIAS PARA FINALIZAR EL CONVENIO.	

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	

INICIAR CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS	
ESTADO INICAL DEL TRAMO DE VIA A INTERVENIR	
<div><div>120MT</div><div><div>PR 0+0000</div><div>PR 0+120</div></div></div>	
ESTADO INICIAL SUBRASANTE	
ESTADO ACTUAL DEL TRAMO DE VIA A INTERVENIR	
RUTA No. _____	<div><div>120 MT</div><div><div>PR 0+0000</div><div>PR 0+120</div></div></div>
ACTIVIDADES DEL CONTRATO: PLACA HUELLA	
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.	
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO	

<div></div>	<div></div>	<div></div>
-------------	-------------	-------------

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	
Revisar, Controlar y Aprobar los procesos técnicos, administrativos, financieros y legales, respetando los estandares de calidad, tiempos y costos	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
	FIRMA <div></div>
	NOMBRE: NICOLAS REDONDO MOLINA
	Matrícula Profesional No.: 08202-09853ATL
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial	



ANUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PAPELES, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

prende la actividad de mejoramiento mediante la construcción de un pavimento en placa huella, con una longitud de 120 ml, ancho de 5ml, asimismo, se anota que la pendiente longitudinal varía conforme a la topografía del terreno natural. Lo anterior de acciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

	0000	0004	0010	0014
--	------	------	------	------

la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
en pesos)

ANTICIPOS		INDICADOR I/C	ANTICIPOS	
Otorgado \$	N/A	En el mes:	Otorgado \$	N/A
Amortizado \$		Acumulado:	Amortizado \$	
Saldo \$			Saldo \$	

[illegible]

-----	Avance o Atraso Físico %	-----	
-----			MAQUINARIA Y EQUIPO

Identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas en el presupuesto y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

SECTOR: TRAMO Y/O SECTOR: PR 3+835 - PR3+968 TRAMO Y/O SECTOR: _____

SECTOR : _____


MATERIALES	PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
------------	---

GRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)	OBSERVACIONES:
ENTREGADO A LA INTERVENTORIA , INVIAS DICE QUE NO SE PAGUE	

	OBRA	INTER	
--	------	-------	--

VI. GESTIÓN PREDIAL	
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____	OBSERVACIONES:
FICHAS PEDIALES APROBADAS: _____	
AVALUOS APROBADOS: _____	
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____	
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS	
ÁREA TÉCNICA	
SE TOMAN DENSIDADES Y SE INICIAN CONTRUCCION DE PLACA HUELLA APROXIMADAMENTE 30ML COMPLETO CON CUNETAS Y BORDILLOS. EL CONTRATISTA PRESENTA UNA NUEVA PROGRAMACION AJUSTADA A FINALIZAR 15 DE AGOSTO.	
ÁREA SOCIAL	

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	

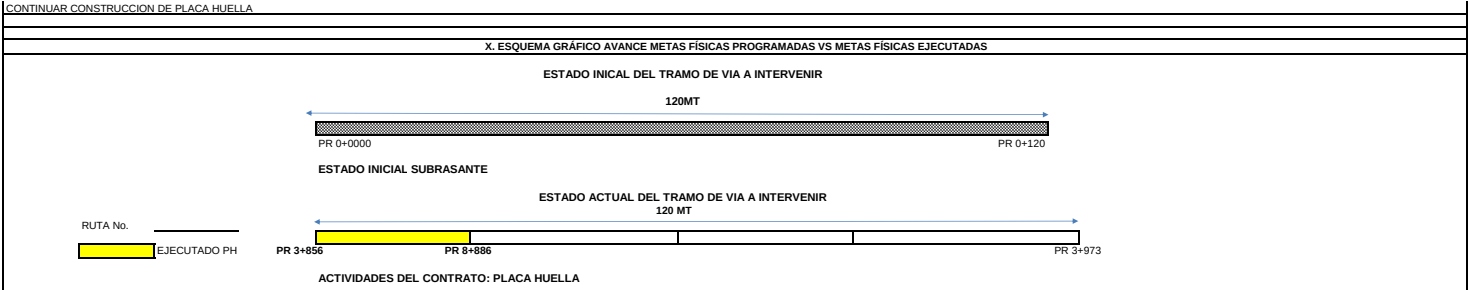

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TOMA DE DENSIDADES




ARMADO DE PLACA HUELLA



FUNDIDA DE PLACA HUELLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	
Revisar, Controlar y Aprobar los procesos técnicos, administrativos, financieros y legales, respetando los estándares de calidad, tiempos y costos	
FIRMA _____	
NOMBRE: NICOLAS REDONDO MOLINA	
Matrícula Profesional No.: 08202-09853ATL	

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.



ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PAPELES, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

RA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PAPELES, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DE PLACA HUELLA

pendiente de la actividad de mejoramiento mediante la construcción de un pavimento en placa huella, con una longitud de 120 ml, ancho de 5ml, asimismo, se anota que la pendiente longitudinal varía conforme a la topografía del terreno natural. Lo anterior de acuerdo a las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO	
--	--

	2023	2024	20XX	20XX
OR VIGENCIA	\$ 188.671.431	\$ 188.671.431		
E LA VIGENCIA				
ENCIA	\$ 188.671.431			
OR VIGENCIA	\$ 60.632.761	\$ 60.632.761		
E LA VIGENCIA				
ENCIA	\$ 60.632.761			

en pesos)

ANTICIPOS	
Otorgado \$	N/A
Amortizado \$	
Saldo \$	

En el mes:
Acumulado:

ANTICIPOS	
Otorgado \$	N/A
Amortizado \$	
Saldo \$	

Otorgado \$	N/A	En el mes:	
Amortizado \$		Acumulado:	

Meta Fisica (Programa de Obra) Línea Base				Meta Fisica Programada / Ejecutada Acumulada					
Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Fisico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
UND	1	-	1	Prog	1			1	100%
				Ejec	1			1	100%
PLACA HUELLA)	KM	0.12		0.12	Prog	0.12		0.12	100%
				Prog					
				Ejec					
				Prog					
				Ejec					

Identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas e el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

CTOR: TRAMO Y/O SECTOR : PR 3+835 - PR3+968
CTOR: _____

Actividades de suministro y transporte de materiales iniciaron

IONES: Para este convenio solidario no se requiere licenciamiento y permisos ambientales, considerando que la vía a
es existente, adicionalmente no realizarán intervenciones sobre ningún cauce de agua, así mismo, se anota que
do la cuantía de estos convenios aplica los lineamientos y programas del documento PAGA de complejidad baja.

V. GE

[illegible][illegible]

CTO: _____

CTO: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ 1
 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
 DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES: SE REALIZA SOCIALIZACION EL DIA 5 DE ABRIL DE 2024 EN LA VEREDA CON PRESENCIA DEL DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS, INTERVENTORIA Y PERSONAL DE DE LA VEREDA CONJUNTAMENTE CON LA JAC

CTO: _____

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Revisar, Controlar y Aprobar los procesos técnicos, administrativos, financieros y legales, respetando los estándares de calidad, tiempos y costos	
	FIRMA: _____
	NOMBRE: <u>NICOLAS REDONDO MOLINA</u>
	Matrícula Profesional No.: <u>08202-09853ATL</u>
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del RWAAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA

23/08/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JULIO

PROYECTO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO EL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATO No. 3767-2023

CONTRATISTA: JAC PAPELES EL MOLINO LA GUAJIRA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023

INTERVENTORÍA: CONSORCIO NRT&IG 2023

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Mezcladora				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
htas menores				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.


REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.


NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma



Nombre: JANIO TAPIAS HERRERA
Residente de interventoria
Matrícula Profesional No.: 0820251738ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

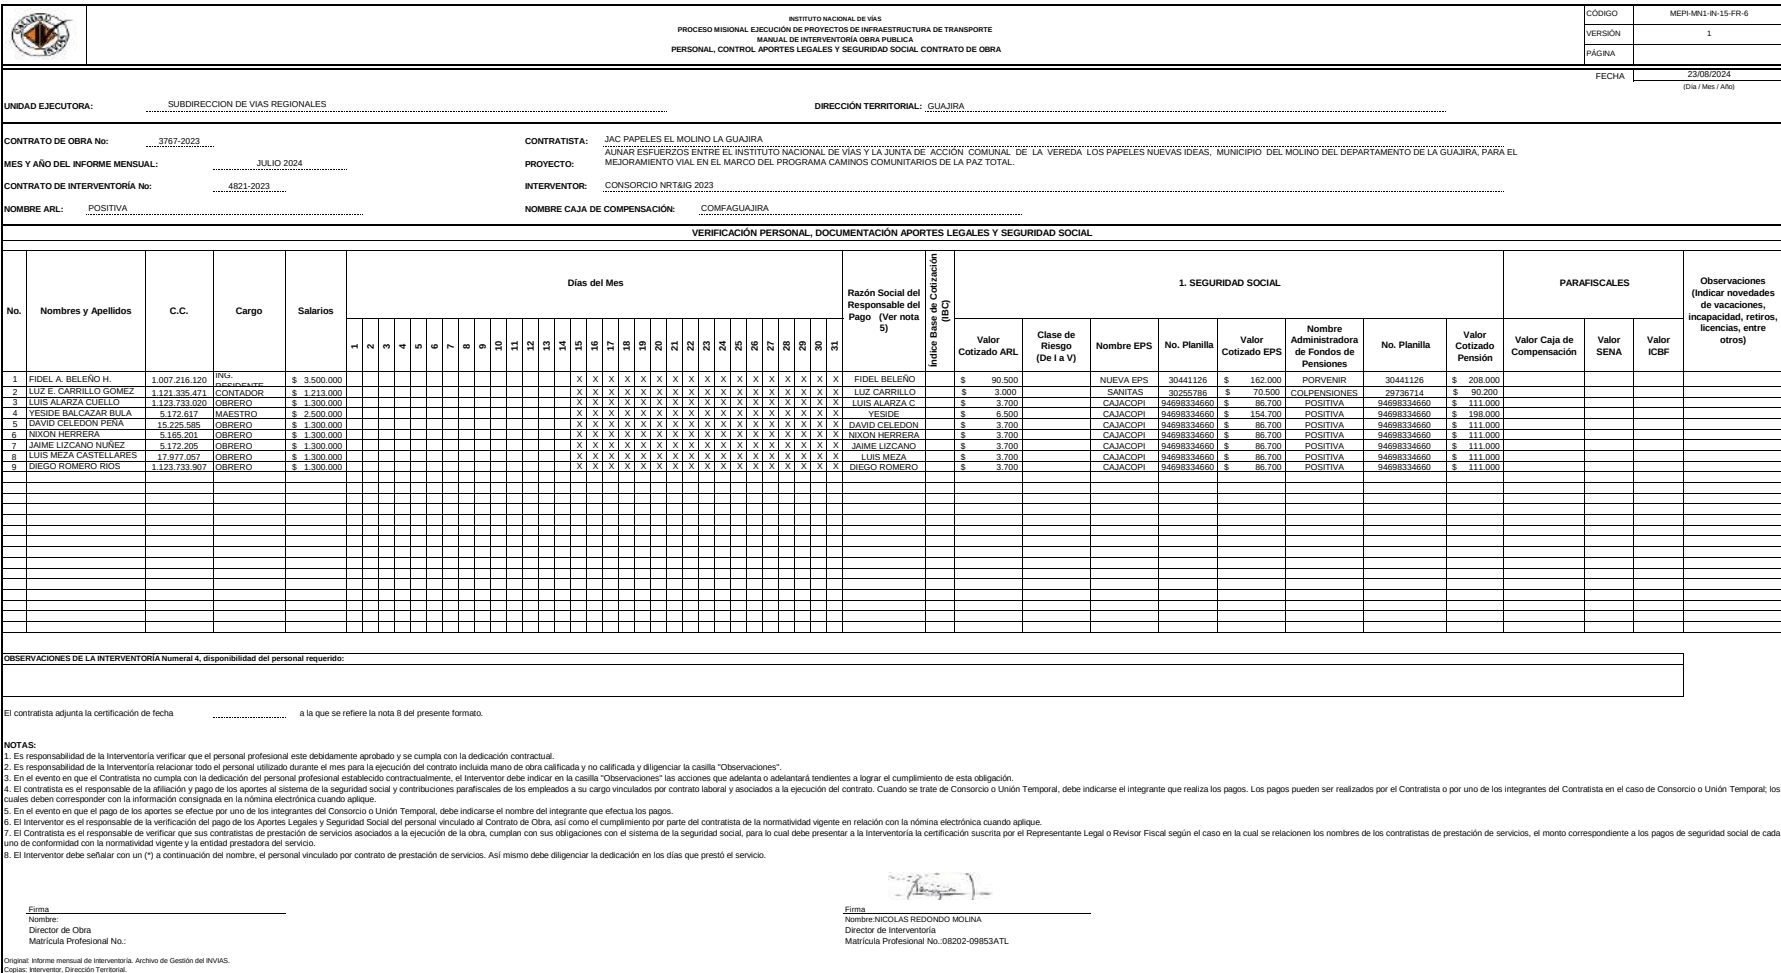

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
			VERSIÓN	1	
			PÁGINA		

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA	
---	--	--------------------------------	--

CONTRATO DE OBRA No:	3767-2023	CONTRATISTA:	JAC PAPELES EL MOLINO-LA GUAJIRA
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:	JULIO	PROYECTO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO EL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	4821-2023	INTERVENTOR:	CONSORCIO NRT&IG 2023

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco		24	20	24	19	21	22	24	18	21	19	24	20	21	24	24	24	22	24	22	19	24	24	20	24	21	24	24	21	22	24	363
Lluvias moderadas			4		5	3	2		6	3	5		4	3				2		2	5			4		4			3	2		22
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre: JANIO TAPIAS HERRERA

Residente de Interventoría

Matrícula Profesional No.:08202-51738ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA		
							FECHA	28/08/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES TERRITORIAL: GUAJIRA									
CONTRATO DE OBRA No.: 3767-2023 CONTRATISTA: JAC VEREDA LOS PAPELES EL MOLINO LA GUAJIRA MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4821-2023 PROYECTO: PAPELES, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL INTERVENTOR: CONSORCIO NRT6IG 2023									
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	18/07/2024	Densidad y PESO Unitario de Suelo en el terreno, metodo cono arena-Subbase	INV E161-13	PR 3+920	1		97,4	SI	
2	18/07/2024	Densidad y PESO Unitario de Suelo en el terreno, metodo cono arena-Subbase	INV E161-13	PR 3+890	1		95,3	SI	
3	18/07/2024	Densidad y PESO Unitario de Suelo en el terreno, metodo cono arena-Subbase	INV E161-13	PR 3+850	1		96,9	SI	
OBSERVACIONES:									
NOTAS: 1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo. 2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo. 3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad. 4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras. 5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual. 6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.									
Firma Nombre NICOLAS REDONDO MOLINA Director de Interventoría Matrícula Profesional No.08202-09853ATL					Firma Nombre: DUBIN CAMARGO ALMENAREZ Supervisor del contrato de interventoria Matrícula Profesional No.:08202-38090ATL				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

		FECHA	23	8	2024
			(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA
--	--------------------------------

CONTRATO DE OBRA No. 3767-2023	CONTRATISTA: JAC PAPELES EL MOLINO-GUAJIRA
--------------------------------	--

OBJETO DEL CONTRATO:
 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PAPELES, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 15/12/2023	
PLAZO INICIAL: 0.17MESES	
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/07/2024	(Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: \$ 189.671.431,00	
VALOR ACUMULADO: \$ 189.671.431,00	(Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 6.500.000,00	
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 6.500.000,00	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4821	INTERVENTOR: CONSORCIO NRT&IG 2023
------------------------------------	------------------------------------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL					
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA		
Cumplimiento	20%	\$ 37.934.286,20	Desde	Hasta	
			5	10	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo					
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 9.483.571,55	5	10	2023
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 56.901.429,30	5	10	2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB 100288457	
---	--

Certificado de modificación o anexo No.: 0	(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
--	--

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL	
--	--

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	
--	--

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL					
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200SMMMLV%	\$ 322.000.000,00	Desde	Hasta	
			5	10	2023
Otros			Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB 10070598	OTRAS PÓLIZAS No.
--------------------------------------	-------------------

Certificado de modificación o anexo No.: 0	(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
--	--

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL	
--	--

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:	
--	--

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

	FECHA	23	8	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 2 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	\$ 37.934.286,20	31	12	23	1	3	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 9.483.571,55	31	12	23	30	4	2027
Calidad de Estudios y Diseños		\$ -						
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 56.901.429,30	30	4	24	30	4	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB 100288457
Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200SMMLV%	\$ 322.000.000,00	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB 10070598 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).


 Firma
 Nombre: NICOLAS REDONDO MOLINA
 Director de Obra
 Matrícula Profesional No.: 08202-09853ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor y Dirección Territorial.

COMITES OPERATIVOS VEREDA LOS PAPELES

VALOR CONVENIO \$ 189.671.431,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS \$ 46.000.000,00
GASTO OBRA \$ 138.515.557,00


COMITÉ No.	FECHA COMITÉ	FECHA DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR		ACUMULADO		SALDO		MES
				ADMON	OBRA	ADMON	OBRA	ADMON	OBRA	
1	1/04/2024	8/04/2024	ENSAYOS Y LABORATORIOS DE SUELOS	\$ 500.000,00						ABRIL
		8/04/2024	ESTUDIO GEOTECNICO	\$ 1.235.000,00						
		8/04/2024	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	\$ 1.500.000,00						
		8/04/2024	POLIZAS INICIALES	\$ 1.418.821,19						
		8/04/2024	CAJA MENOR	\$ 300.000,00						
			TOTALES ABRIL	\$ 4.953.821,19	\$ -	\$ 4.953.821,19	\$ -	\$ 41.046.178,81	\$ 138.515.557,00	
2	6/04/2024	SE PAGO EN MAYO	PAGO ING. RESIDENTE MES ABRIL							
			PAGO CONTADOR MES ABRIL							
			PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS							
			SALDO DE IVA ESTUDIO GEOTECNICO							
			PAGO POLIZA PRORROGA 1							
			DISEÑO DE MEZCLA							
			VALLA PUBLICITARIA							
3	8/05/2024	28/05/2024	ARRIENDO RETROEXCAVADORA		\$ 3.040.000,00					MAYO
			SUMINISTRO DE DOTACION	\$ 1.772.505,66						
			CAJA MENOR	\$ 300.000,00						
			EXAMENES DE INGRESO SALUD OCUPAS.	\$ 420.000,00						
			SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$ 400.000,00						
			PAGO POLIZA PRORROGA 2	\$ 139.138,63						
4	10/05/2024	10/05/2024	PAGO ING. RESIDENTE MES ABRIL	\$ 3.500.000,00						
			PAGO CONTADOR MES ABRIL	\$ 1.213.000,00						
			PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1.500.000,00						
			SALDO DE IVA ESTUDIO GEOTECNICO	\$ 329.650,00						
			PAGO POLIZA PRORROGA 1	\$ 277.045,81						
			DISEÑO DE MEZCLA	\$ 309.400,00						
			VALLA PUBLICITARIA	\$ 350.000,00						
5	23/05/2024	24/05/2023	SUBBASE Y TRANSPORTE DE SUBBASE		\$ 8.730.000,00					
			TOTALES MAYO	\$ 10.510.740,10	\$ 11.770.000,00	\$ 15.464.561,29	\$ 11.770.000,00	\$ 30.535.438,71	\$ 126.745.557,00	
6	6/06/2024	18/06/2024	PAGO ING. RESIDENTE MES MAYO	\$ 3.500.000,00						JUNIO
			PAGO CONTADOR MES MAYO	\$ 1.213.000,00						
			RETEFUENTE MES DE MAYO	\$ 212.000,00						
			DEVOLUCION DE RENDIENTOS FINANCIEROS	\$ 9.323,89						
7	24/06/2024	25/06/2024	TRANSPORTE DE SUBBASE		\$ 12.348.000,00					
			CEMENTO 200BULTOS		\$ 5.395.935,00					
			VARILLA 3/8" 150 UND Y 25 KG ALAMBRE		\$ 3.174.850,00					
			TOTALES JUNIO	\$ 4.934.323,89	\$ 20.918.785,00	\$ 20.398.885,18	\$ 32.688.785,00	\$ 25.601.114,82	\$ 105.826.772,00	
8	29/06/2024	5/07/2024	TRANSPORTE DE CEMENTO Y VARILLA		\$ 2.469.600,00					JULIO
			PAGO SEG. SOCIAL TRABAJADORES	\$ 1.985.000,00						
			PAGO DE TRANSP. 40M3 ARENA Y 40M3 TTDO		\$ 12.720.400,00					
			PAGO ARRIENDO DE RANA , TROMPOY RIELES		\$ 7.427.100,00					
9	12/07/2024	15/07/2024	PAGO ARRIENDO DE RANA		\$ 1.795.500,00					
			VARILLA 3/8" 150 UND		\$ 7.141.000,00					
			CEMENTO 200BULTOS		\$ 5.620.250,00					
			PAGO RETEFUENTE JUNIO 2024	\$ 644.515,00						
			PAGO POLIZA PRORROGA 2	\$ 103.416,00						
			PAGO ENSAYO DENSIDADES DE SUBBASE	\$ 532.000,00						
			CAJA MENOR-PAPELERIA	\$ 300.000,00						
			SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$ 400.000,00						
			PAGO ING. RESIDENTE MES JUNIO	\$ 3.500.000,00						
			PAGO CONTADOR MES JUNIO	\$ 1.214.000,00						
			PAGO SEG. SOCIAL ARL INDEPENDIENTES	\$ 94.000,00						
			PAGO DE LA CONFORMACION DE SUBBASE		\$ 505.000,00					
10	27/07/2024	29/07/2024	PAGO 300 VARILLAS 3/8,CINTA, CLAVOS Y ALAMB		\$ 5.759.120,00					
			PAGO SEGURIDAD SOCIAL JUNIO	\$ 2.071.100,00						
			PAGO 200 BULTOS DE CEMENTO		\$ 5.620.250,00					
			PAGO TRANSP. ARENA, GRAVA Y PIEDRA		\$ 12.720.400,00					
			PAGO TRANSP. CEMENTO Y VARILLA		\$ 4.116.000,00					
			PAGO BODEGA DE ALMACEN MATERIALES		\$ 400.000,00					
			PAGO SUELDO M.O DE OBREROS Y MAESTRO	\$ 3.945.850,00						
			40M3 DE ARENA,40M3 DE GRAV. Y 8 M3 PIEDRA	\$ 2.790.000,00						
			TOTALES JULIO	\$ 17.579.881,00	\$ 66.294.620,00	\$ 37.978.766,18	\$ 98.983.405,00	\$ 8.021.233,82	\$ 39.532.152,00	

FORMATO ACTA DE REUNION - COMITÉ OPERATIVO No.8		FORMATO	
			VERSION: 01
			FECHA: 29-06-2024
			Página 1 de 2
FECHA:	29/06/2024	LUGAR:	VIRTUAL
INTERVENTORIA:	CONSORCIO NTR & IC 2023	HORA:	10:00 a. m.
CONTRATISTA:	JAC VEREDA LOS PAPELES	CONVENIO No.	3767 de 2023
OBRA:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PAPELES, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
ORDEN DEL DIA			
<p>1. Aprobación de pagos de los siguientes materiales y equipos. Arena (40 m3), triturado 3/4" (40 m3), piedra rajon o canto rodado para concreto ciclopeo (8 m3), alquiler de rana vibro-compactadora (6 días) y transporte de la misma, alquiler de mezcladora tipo trompo (1 mes) y transporte del mismo, alquiler de rieles para formaleta (1 mes) servicio de transporte para llevar cemento, varillas y rieles al sitio a intervenir y compra de tablas para formaletas (10 tablas).</p>			
<p>2. Avance de obra hasta la fecha.</p>			
<p>3. Aprobación de pagos de la seguridad social de los trabajadores dependientes (Nómina) e independientes (Por contrato de prestación de servicios).</p>			
<p>La presidenta y representante de la vereda Los Papeles Maria Soledad Castañeda da la bienvenida y lectura a todos los presentes al comité operativo No.8 para dar inicio a la reunion, representado por el Ingeniero residente, Representante de la veeduría, Contador, La Presidenta de JAC Los Papeles y la Interventoría, a continuacion desarrollaremos los puntos antes mencionados : Luego de exponer las cotizaciones presentadas, se eligio en comun acuerdo como proveedor de los materiales petreos al señor Jose Mendoza por ser el unico que cuenta con la documentacion legal al día; para el transporte de los materiales al señor Javier Daza por ser la propuesta mas economica para transportar los materiales petreos; para transportar los materiales anteriormente mencionados se van a utilizar los servicios del carro a la señora Yadira Perez Acosta, por ser la propuesta mas economica para transportar los materiales; el alquiler de rana vibro-compactadora por (6 días) y transporte de la misma, alquiler de mezcladora tipo trompo (1 mes) y transporte de la misma, Rieles y tablas, se elige a la señora Bibiana Montero, ya que cuenta con los equipos a disposicion que necesita la obra en estos momentos.</p>			
<p>Se aprobó el pago de los materiales y equipos mencionados anteriormente y que este giro llegue a la JAC, debido a inconvenientes presentados con los anticipos girados anteriormente a algunos de los proveedores y que la JAC haga los respectivos pagos a los proveedores a medida que va recibiendo el material.</p>			
<p>El ingeniero residente da una breve informacion del estado actual del proyecto, anunciando que hasta el momento se encuentra esparcida y compactada en el area a intervenir un 70% del total de la subbase.</p>			
<p>El ingeniero residente socializa con todos los miembros del comité que debido a los altos costo del transporte de materiales petreos, el tramo de placa huella que estaba establecido a entregar era de (130m lineales), y debido a que se incrementaron los costos hay que hacer un reajuste para modificar esta longitud. Dicho esto interventoria pidio que se le realizaran los ajuste s necesarios y enviar el nuevo presupuesto.</p>			

Se aprobó el pago de la seguridad social (ARL) de trabajadores independientes por contrato de prestación de servicios (Ingeniero residente y Contador) correspondiente a los meses de abril y mayo de 2024, de igual forma se aprobó el pago de la seguridad social (SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES) de trabajadores dependientes (Nómina) correspondiente al mes de junio de 2024. Ya que hay fecha limite de pago hasta el día 10 de julio de 2024.

Por último, el ingeniero Nicolas Redondo recomienda que sigamos con los lineamientos del convenio para darle continuidad a la obra. Damos por terminado el comité operativo las partes que lo integran, estuvieron de acuerdo con lo dicho anteriormente.

No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA
1	Reunion programada para el dia 03 de julio con el representante de la JAC e interventor para las firmas y autorizaciones de desembolso	JAC - LOS PAPELES	3/07/2024
2	enviar el nuevo presupuesto con un aproximado de placa huella a entregar	JAC - LOS PAPELES	2/07/2024

ASISTENCIA				
No.	PARTICIPANTE	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	FIDEL ALFONSO BELEÑO HERNANDEZ	JAC- VEREDA LOS PAPELES	RESIDENTE DE OBRA	
2	LUZ ELENA CARRILLO GOMEZ	JAC- VEREDA LOS PAPELES	CONTADOR	LUZ Elena C.
3	DAMERIS DIAZ MENDOZA	JAC- VEREDA LOS PAPELES	REPRESENTANTE VEEDURIA	
4	MARIA SOLEDAD CASTAÑEDA HENAO	JAC- VEREDA LOS PAPELES	PRESIDENTA JAC LOS PAPELES	
5	NICOLAS REDONDO MOLINA	CONSORCIO NTR & IC 2023	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE DE FACILITADOR:				
OBSERVACIONES:				

FORMATO ACTA DE REUNION - COMITÉ OPERATIVO No.9		FORMATO	
			VERSION: 01
			FECHA: 12-07-2024
		Página 1 de 2	
FECHA:	12/07/2024	LUGAR:	VIRTUAL
INTERVENTORIA:	CONSORCIO NTR & IC 2023	HORA:	10:00 a. m.
CONTRATISTA:	JAC VEREDA LOS PAPELES	CONVENIO No.	3767 de 2023
OBRA:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PAPELES, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
ORDEN DEL DIA			
1. Aprobación del pago de 400 varillas 3/8" y transporte de las mismas al sitio de la obra.			
2. Aprobación del pago de 200 bultos de cemento y transporte de los mismos al sitio de la obra.			
3. Aprobación de 10 días de rana vibro compactadora y dos operadores de la misma.			
4. Aprobación del pago de la conformación de la subbase.			
5. Renovación de los contratos de los profesionales (ingeniero residente y contadora)			
6. Aprobación del pago del mes de junio de los profesinales (ingeniero residente y contadora)			
7. El PAGA			
8. Aprobación del pago la reterfente del mes de junio.			
9. Aprobación del pago de la Póliza de seguro			
10. Aprobación del pago de la seguridad social (ARL) del mes de junio 2024 (ingeniero residente y contadora)			
11. Aprobacion del pago de caja menor- papeleria y subsidio al dignatario para transporte			
<p>La presidenta y representante de la vereda Los Papeles Maria Soledad Castañeda da la bienvenida y lectura a todos los presentes al comité operativo No.9 para dar inicio a la reunion, representado por el Ingeniero residente, Representante de la veeduría, Contador, La Presidenta de JAC Los Papeles y la Interventoría, el orden de el día que tiene que ver con el siguiente punto: con base al orden del dia, se debate cada uno de los puntos a tratar y se llega en comun acuerdo como se especifica a contituación.</p>			
1. Aprobado el pago de 400 varillas 3/8" y transporte de las mismas al sitio de la obra.			
2. Aprobado el pago de 200 bultos de cemento y transporte de los mismos al sitio de la obra.			
3. Aprobado el pago para 10 días de rana vibró compactadora y dos operadores de la misma.			
4. Aprobado el pago de la conformación de la subbase.			
5. La renovación de los contratos de los profesionales (ingeniero residente y contadora) queda pendiente por gestionarse ante el INVIAS, debido a que dichos profesionales solo estaban contratado hasta el 30 de junio del presente año.			
6. Aprobado el pago del mes de junio de los profesinales (ingeniero residente y contadora)			
7. Queda pendiente por definir el PAGA			

8. Aprobado el pago la retefuente del mes de junio.



9. Aprobado el pago de la poliza de seguro

10. Aprobado el pago de la seguridad social (ARL) mes de junio 2024 de los profesionales (ingeniero residente y contador)

11. Aprobado el pago del tercer y ultimo desembolso de la caja menor y papeleria de igual manera se aprobó el pago del subsidio al dignatario para transporte.

Por último, el ingeniero Nicolas Redondo recomienda que sigamos con los lineamientos del convenio para darle continuidad a la obra. Damos por terminado el comité operativo las partes que lo integran, estuvieron de acuerdo con lo dicho anteriormente.



No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA
1	Reunion programada para el dia 15 de julio con el representante de la JAC e interventor para las firmas y autorizaciones de desembolso.	JAC - LOS PAPELES	15/07/2024
2	Gestionar ante INVIAS el pago del informe de PAGA	JAC - LOS PAPELES	
3	Gestión ante el INVIAS la renovación de los contratos de los profesionales.	JAC - LOS PAPELES	13/07/2024

ASISTENCIA				
No.	PARTICIPANTE	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	FIDEL ALFONSO BELEÑO HERNANDEZ	JAC- VEREDA LOS PAPELES	RESIDENTE DE OBRA	
2	LUZ ELENA CARRILLO GOMEZ	JAC- VEREDA LOS PAPELES	CONTADOR	
3	DAMERIS DIAZ MENDOZA	JAC- VEREDA LOS PAPELES	REPRESENTANTE VEEDURIA	
4	MARIA SOLEDAD CASTAÑEDA HENAO	JAC- VEREDA LOS PAPELES	PRESIDENTA JAC LOS PAPELES	
5	NICOLAS REDONDO MOLINA	CONSORCIO NTR & IC 2023	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	

NOMBRE DE FACILITADOR:	
------------------------	--

OBSERVACIONES:

FORMATO ACTA DE REUNION - COMITÉ OPERATIVO No.10		FORMATO	
			VERSION: 01
			FECHA: 27-07-2024
			Página 1 de 2
FECHA:	27/07/2024	LUGAR:	VIRTUAL
INTERVENTORIA:	CONSORCIO NTR & IC 2023	HORA:	10:00 a. m.
CONTRATISTA:	JAC VEREDA LOS PAPELES	CONVENIO No.	3767 de 2023
OBRA:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PAPELES, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".		
ORDEN DEL DIA			
1. Renovación de los contratos de los profesionales (ingeniero residente y contadora) para el mes de julio 2024.			
2. Aprobación del pago de la ARL del personal de la mano de obra, ingeniero residente y contadora del mes de julio.			
3.EI PAGA			
4. Aprobación del pago de materiales y transporte de los mismos.			
5. Aprobación del pago del personal de la mano de obra.			
6. Aprobación del pago de bodega			
La presidenta y representante de la vereda Los Papeles María Soledad Castañeda da la bienvenida y lectura a todos los presentes al comité operativo No.10 para dar inicio a la reunion, representado por el Ingeniero residente, Representante de la veeduría, Contador, La Presidenta de JAC Los Papeles y la Interventoría, el orden de el día que tiene que ver con los siguientes puntos: renovacion de los contratos de los profesionales para el mes de julio, pago de ARL del personal del mes de julio, el PAGA, compra de materiales y transporte de los mismos, pago de la mano de obra mes de julio y pago de la bodega de almacenamiento de materiales. Se debate cada uno y se llega en comun acuerdo como se especifica a continuación.			
1. Se aprueba los contratos de los profesionales (ingeniero residente y contadora) para el mes de julio, quedando el compromiso por parte del ingeniero residente de continuar en obra hasta el 15 de agosto siempre y cuando falten actividades por ejecutar.			
2. Se aprueba el pago de la ARL del personal de la mano de obra, ingeniero residente y contadora del mes de julio.			
3. Con respecto a EI PAGA se realizará una actividad que contemple lo social y lo ambiental.			
4. Se aprueba la compra de materiales petreos y de ferreteria para continuar las actividades en obra (200 bultos de cemento, 40 m3 de triturado, 40 m3 de arena, 300 varillas 3/8", 1 rollo de cinta peligro de 500 metros, 3 cajas de clavos de 2", 50 KG de alambre de amarre, 2 discos para pulidora de 1/16" y 8 m3 de piedra para concreto ciclopeo)			
5. Se aprueba el pago del personal de la mano de obra.			
6. Se aprueba el pago de la bodega de almacenamiento de materiales.			
Por último, el ingeniero Nicolas Redondo recomienda que sigamos con los lineamientos del convenio para darle continuidad a la obra. Damos por terminado el comité operativo las partes que lo integran, estuvieron de acuerdo con lo dicho anteriormente.			

No.	COMPROMISOS		RESPONSABLE	FECHA
1	Reunion programada para el día 29 de julio con el representante de la JAC e interventor para las firmas y autorizaciones de desembolso.		JAC - LOS PAPELES	29/07/2024
ASISTENCIA				
No.	PARTICIPANTE	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	FIDEL ALFONSO BELEÑO HERNANDEZ	JAC- VEREDA LOS PAPELES	RESIDENTE DE OBRA	
2	LUZ ELENA CARRILLO GOMEZ	JAC- VEREDA LOS PAPELES	CONTADOR	LUZ Elena C
3	DAMERIS DIAZ MENDOZA	JAC- VEREDA LOS PAPELES	REPRESENTANTE VEEDURIA	
4	MARIA SOLEDAD CASTAÑEDA HENAO	JAC- VEREDA LOS PAPELES	PRESIDENTA JAC LOS PAPELES	
5	NICOLAS REDONDO MOLINA	CONSORCIO NTR & IC 2023	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE DE FACILITADOR:				
OBSERVACIONES:				

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 8
	JAC: VEREDA LOS PAPELES Y VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO-GAJIRA	CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No.3767-2023 Y 3925-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			

CONVENIO No. 3925-2023
JAC VEREDA BARRIALES

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	UBERRA	INTER	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	2	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____4_____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____1_____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES: SE REALIZA SOCIALIZACION EL DIA 5 DE ABRIL DE 2024 EN LA VEREDA CON PRESENCIA DEL DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS, INTERVENTORIA Y PERSONAL DE LA VEREDA CONJUNTAMENTE CON LA JAC

VI. GESTIÓN PREDIAL	
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____ FICHAS PEDIALES APROBADAS: _____ AVALUOS APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____	OBSERVACIONES: <div></div>
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS	
ÁREA TÉCNICA	
A RAIZ DE LA FUERTE OLA INVERNAL DE LA ZONA MONTAÑOZA DE LOS TRABAJOS Y PARA LLEGAR AL SITIO DE LOS TRABAJOS HAY QUE CRUZAR EL RIO 6 VECES IMPIDIENDO LA ENTRADA DE EQUIPOS, MATERIALES Y PERSONAL AL PROYECTO.	
ÁREA SOCIAL	

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS	
ESTADO INICIAL DE TRAMO DE VIA A INTERVENIR 436 MTS (112MTS A INTERVENIR)	
<div><div>PR 7+744</div><div>PR 8+180</div></div>	
ESTADO INICIAL: SUBRASANTE	
ESTADO ACTUAL DE VIA AINTERVENIR	
<div><div>81MT</div><div>31MT</div></div> <div><div>PR 7+744</div><div>PR 7+825</div><div>PR 8+149</div><div>PR 8+180</div></div>	
ACTIVIDADES DEL CONTRATO: PLACA HUELLA	
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.	
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO	
<div><div></div><div></div><div></div></div>	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
Revisar, Controlar y Aprobar los procesos técnicos, administrativos, financieros y legales, respetando los estándares de calidad, tiempos y costos establecidos de manera contractual.	
FIRMA 	
NOMBRE: NICOLAS REDONDO MOLINA	
Matrícula Profesional No.: 08202-09853ATL	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del RVIAS.	
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial	

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	VERBA	INTER	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	_____ 1	OBSERVACIONES: SE REALIZA SOCIALIZACION EL DIA 5 DE ABRIL DE 2024 EN LA VEREDA CON PRESENCIA DEL DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS, INTERVENTORIA Y PERSONAL DE LA VEREDA CONJUNTAMENTE CON LA JAC
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	2	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	_____	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:	_____	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:				_____	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	_____ 4				

VI. GESTIÓN PREDIAL	
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____ FICHAS PEDIALES APROBADAS: _____ AVALUOS APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____	OBSERVACIONES: <div></div>
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS	
ÁREA TÉCNICA	
A RAIZ DE LA FUERTE OLA INVERNAL DE LA ZONA MONTAÑOZA DE LOS TRABAJOS Y PARA LLEGAR AL SITIO DE LOS TRABAJOS HAY QUE CRUZAR EL RIO 6 VECES IMPIDIENDO LA ENTRADA DE EQUIPOS, MATERIALES Y PERSONAL AL PROYECTO.	
ÁREA SOCIAL	

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS	
ESTADO INICIAL DE TRAMO DE VIA A INTERVENIR 436 MTS (112MTS A INTERVENIR)	
<div><div>PR 7+744</div><div>PR 8+180</div></div>	
ESTADO INICIAL: SUBRASANTE	
ESTADO ACTUAL DE VIA AINTERVENIR	
<div><div>81MT</div><div>31MT</div></div> <div><div>PR 7+744</div><div>PR 7+825</div><div>PR 8+149</div><div>PR 8+180</div></div>	
ACTIVIDADES DEL CONTRATO: PLACA HUELLA	
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.	
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO	
<div><div></div><div></div><div></div></div>	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
Revisar, Controlar y Aprobar los procesos técnicos, administrativos, financieros y legales, respetando los estándares de calidad, tiempos y costos establecidos de manera contractual.	
FIRMA 	
NOMBRE: NICOLAS REDONDO MOLINA	
Matrícula Profesional No.: 08202-09853ATL	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del RVIAS.	
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial	

VI. GESTIÓN PREDIAL	
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____ FICHAS PEDIALES APROBADAS: _____ AVALUOS APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____	OBSERVACIONES: <div></div>
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS	
ÁREA TÉCNICA	
A RAIZ DE LA FUERTE OLA INVERNAL DE LA ZONA MONTAÑOZA DE LOS TRABAJOS Y PARA LLEGAR AL SITIO DE LOS TRABAJOS HAY QUE CRUZAR EL RIO 6 VECES IMPIDIENDO LA ENTRADA DE EQUIPOS, MATERIALES Y PERSONAL AL PROYECTO.	
ÁREA SOCIAL	

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS	
ESTADO INICIAL DE TRAMO DE VIA A INTERVENIR 436 MTS (112MTS A INTERVENIR)	
<div><div>PR 7+744</div><div>PR 8+180</div></div>	
ESTADO INICIAL: SUBRASANTE	
ESTADO ACTUAL DE VIA AINTERVENIR	
RUTA No. _____	<div><div>81MT</div><div>31MT</div></div> <div><div>PR 7+744</div><div>PR 7+825</div><div>PR 8+149</div><div>PR 8+180</div></div>
ACTIVIDADES DEL CONTRATO: PLACA HUELLA	
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.	
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO	
<div><div></div><div></div><div></div></div>	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
Revisar, Controlar y Aprobar los procesos técnicos, administrativos, financieros y legales, respetando los estándares de calidad, tiempos y costos establecidos de manera contractual.	
FIRMA 	
NOMBRE: NICOLAS REDONDO MOLINA	
Matrícula Profesional No.: 08202-09853ATL	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del RIVIAS.	
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial	


VI. GESTIÓN PREDIAL	
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____ FICHAS PEDIALES APROBADAS: _____ AVALUOS APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____	OBSERVACIONES: <div></div>
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS	
ÁREA TÉCNICA SE HACE LAS DENSIDADES DE CAMPO. SE REALIZA VISITA DE INVIAS AL SITIO DE LAS OBRAS. SE INICIA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA 31 ML COMPLETOS	
ÁREA SOCIAL	

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS	
ESTADO INICIAL DE TRAMO DE VIA A INTERVENIR 436 MTS (112MTS A INTERVENIR)	
<div><div>PR 7+744</div><div>PR 8+180</div></div>	
ESTADO INICIAL: SUBRASANTE	
ESTADO ACTUAL DE VIA AINTERVENIR	
RUTA No. _____	<div><div>81MT</div><div>31MT</div></div>
<div><div>EJECUTADO</div><div>PR 7+744</div><div>PR 7+825</div><div>PR 8+149</div><div>PR 8+180</div></div>	
ACTIVIDADES DEL CONTRATO: PLACA HUELLA	
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.	
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO	
<div></div> <div>TOMA DE DENSIDADES</div>	<div></div> <div>ARMADO DE HIERRA Y FORMALETERIA</div>
<div></div> <div>FUNDIDAS DE HUELLA Y PIEDRA PEGADA</div>	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
Revisar, Controlar y Aprobar los procesos técnicos, administrativos, financieros y legales, respetando los estándares de calidad, tiempos y costos establecidos de manera contractual.	<div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE: NICOLAS REDONDO MOLINA</div><div>Matrícula Profesional No.: 08202-09853ATL</div></div>
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial	

VI. GESTIÓN PREDIAL	
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	OBSERVACIONES:
FICHAS PEDIALES APROBADAS:	
AVALUOS APROBADOS:	
PREDIOS ADQUIRIDOS:	
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS	
ÁREA TÉCNICA	
NO SE PUSO LABORAR ESTA SEMANA DEBIDO A QUE SE INCREMENTARON LAS LLUVIAS Y CRECIO EL RIO IMPIDIENDO LA LLEGADA DE LOS OBREROS	
ÁREA SOCIAL	

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS	
ESTADO INICIAL DE TRAMO DE VIA A INTERVENIR 436 MTS (112MTS A INTERVENIR)	
	
ESTADO INICIAL: SUBRASANTE	
ESTADO ACTUAL DE VIA AINTERVENIR	
	
ACTIVIDADES DEL CONTRATO: PLACA HUELLA	
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.	
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO	

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	
Revisar, Controlar y Aprobar los procesos técnicos, administrativos, financieros y legales, respetando los estándares de calidad, tiempos y costos establecidos de manera contractual.	
FIRMA	
NOMBRE: NICOLAS REDONDO MOLINA	
Matricula Profesional No.: 08202-09853ATL	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.	
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial	

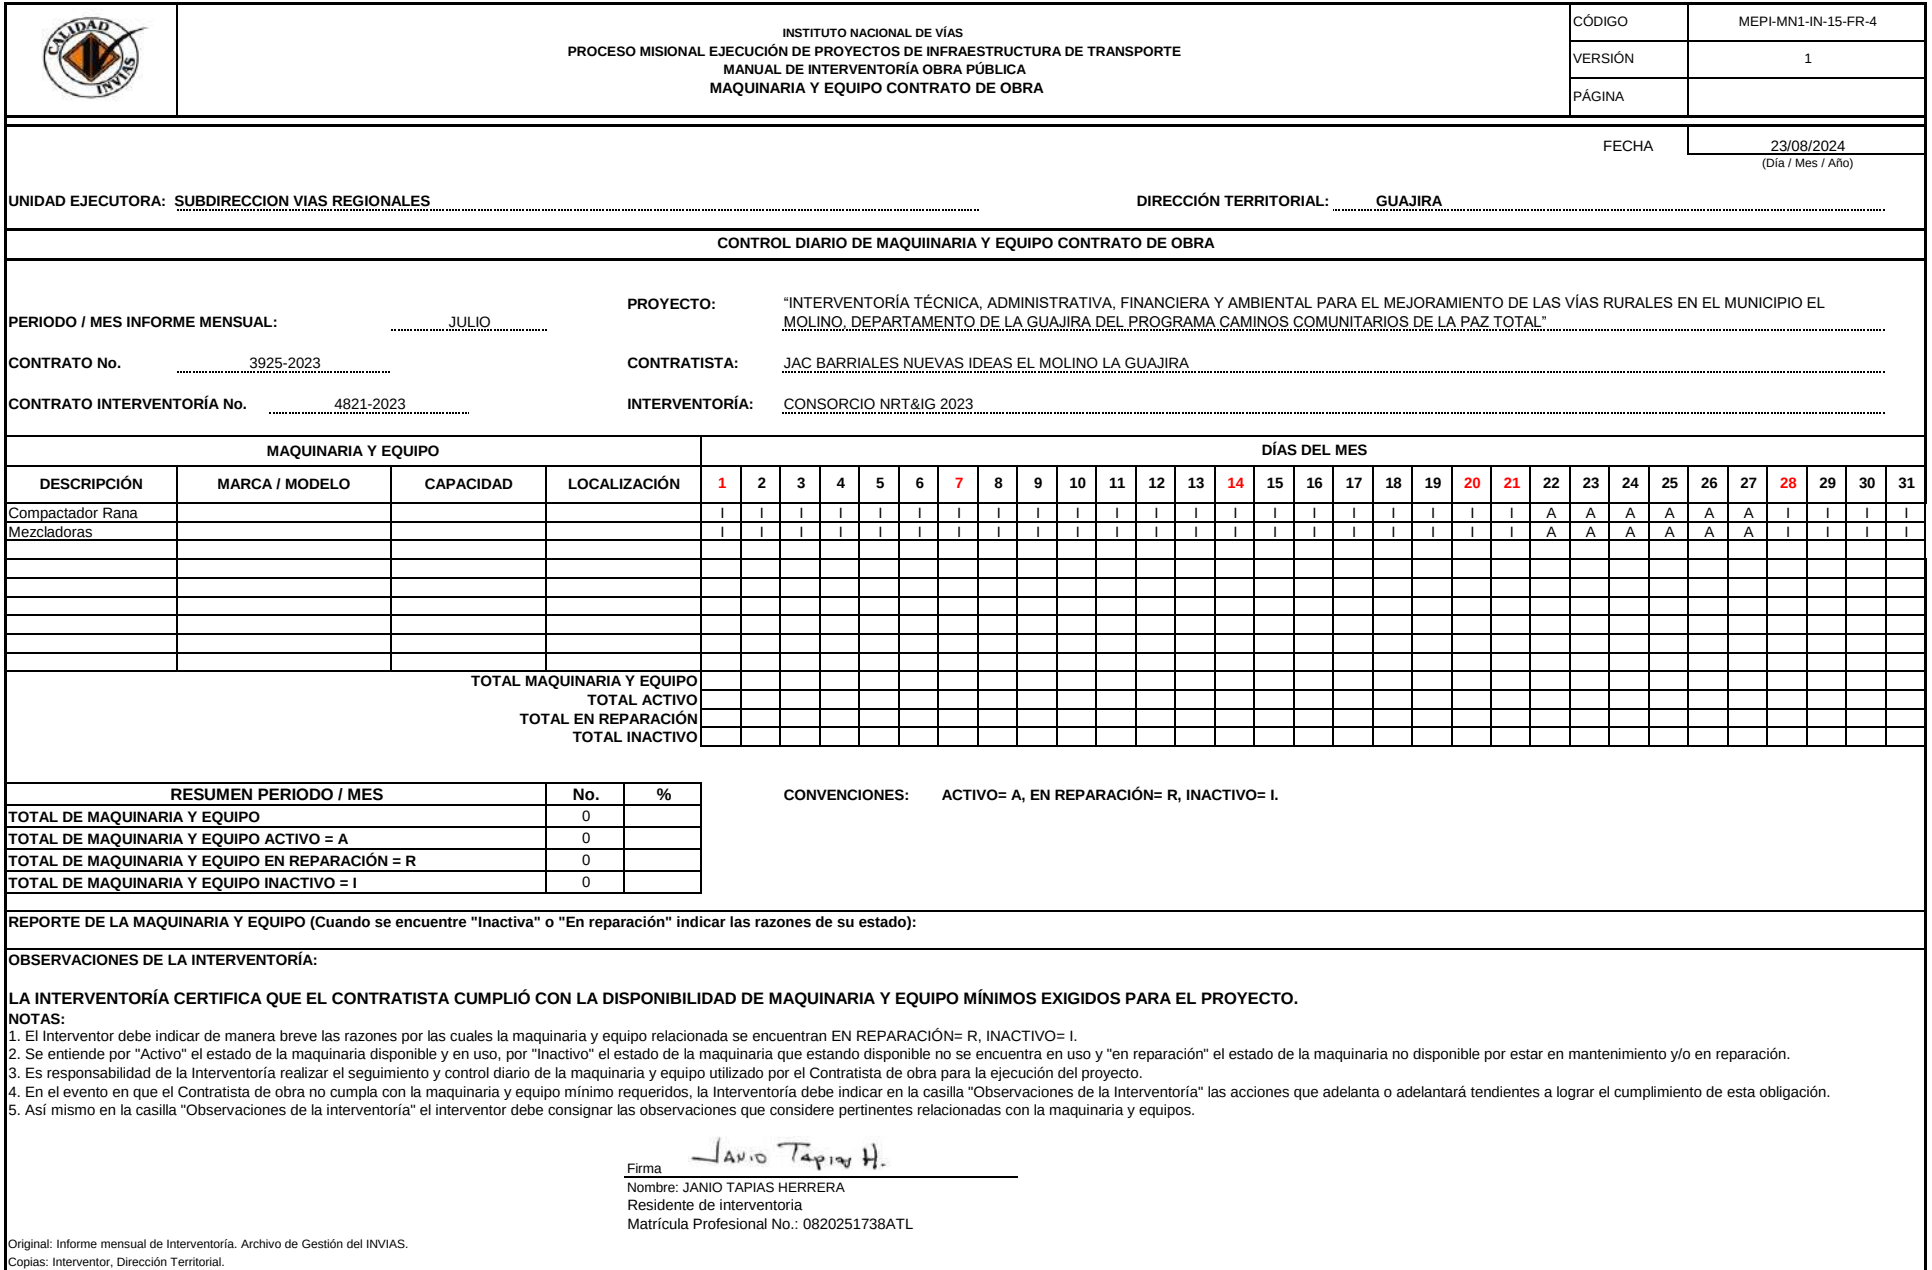

[illegible]

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																				CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-15-FR-10					
																					VERSIÓN		1					
																					PÁGINA							

FECHA																												23/08/2024 (Día / Mes / Año)			
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES														DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONTRATO DE OBRA No: 3925-2023														CONTRATISTA: JAC BARRIALES NUEVAS IDEAS EL MOLINO-LA GUAJIRA													
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO														PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO EL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4821-2023														INTERVENTOR: CONSORCIO NRT&IG 2023													

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																															
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco		24	20	24	19	21	22	24	18	21	19	24	20	21	24	24	24	22	24	22	19	21	20	20	24	21	24	20	21	22	24	352
Lluvias moderadas			4		5	3	2		6	3	5		4	3				2		2	5	3	4	4		4		4	3	2		33
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:																															
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Firma

Nombre: JANIO TAPIAS HERRERA

Residente de Interventoría

Matrícula Profesional No.:08202-51738ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA		
							FECHA	28/08/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES TERRITORIAL: GUAJIRA									
CONTRATO DE OBRA No.: 3925-2023 CONTRATISTA: JAC VEREDA BARRIALES EL MOLINO LA GUAJIRA MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4821-2023 INTERVENTOR: CONSORCIO NRT6IG 2023 PROYECTO: BARRIALES NUEVAS IDEAS, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL									
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	26/07/2024	Densidad y PESO Unitario de Suelo en el terreno, metodo cono arena-Subbase	INV E161-13	PR 8+160	1		96,6	SI	
2	26/07/2024	Densidad y PESO Unitario de Suelo en el terreno, metodo cono arena-Subbase	INV E161-13	PR 7+465	1		96	SI	
3	26/07/2024	Densidad y PESO Unitario de Suelo en el terreno, metodo cono arena-Subbase	INV E161-13	PR 7+780	1		97,5	SI	
4	26/07/2024	Densidad y PESO Unitario de Suelo en el terreno, metodo cono arena-Subbase	INV E161-13	PR 7+820	1		98,6	SI	
OBSERVACIONES:									
NOTAS: 1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo. 2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo. 3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad. 4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras. 5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual. 6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.									
Firma Nombre NICOLAS REDONDO MOLINA Director de Interventoría Matrícula Profesional No.08202-09853ATL					Firma Nombre: N/A Director de Obra				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

	FECHA	23 (Día)	8 (Mes)	2024 (Año)
--	-------	-------------	------------	---------------

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 3925-2023 **CONTRATISTA:** JAC BARRIALES NUEVAS IDEAS EL MOLINO-GUAJIRA

OBJETO DEL CONTRATO:
 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 27/12/2023
PLAZO INICIAL: 0,17 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 189.389.426,00
VALOR ACUMULADO: \$ 189.389.426,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 6.500.000,00
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 6.500.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4821 **INTERVENTOR:** CONSORCIO NRT&IG 2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	\$ 37.877.885,20	31	10	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 9.469.471,30	31	10	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 56.816.827,80	31	10	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB 100290106

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200SMMMLV%	\$ 322.000.000,00	31	10	2023			
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB 10071127 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

	FECHA	23	8	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	\$ 37.877.885,20	31	12	2023	1	3	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 9.469.471,30	31	12	2023	30	4	2027
Calidad de Estudios y Diseños		\$ -						
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 56.816.827,80	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB 100290106

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200SMMLV%	\$ 322.000.000,00						
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB 1007127 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: NICOLAS REDONDO MOLINA

Director de Obra

Matrícula Profesional No.: 08202-09853ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

COMITES OPERATIVOS VEREDA BARRIALES-NUEVAS IDEAS

VALOR CONVENIO \$ 189.389.426,00
VALOR OBRA \$ 142.790.382,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS \$ 41.315.302,00

COMITÉ No.	FECHA COMITÉ	FECHA DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR		ACUMULADO		SALDO		MES
				ADMON	OBRA	ADMON	OBRA	ADMON	OBRA	
1	19/03/2024	2/04/2024	ENSAYOS Y LABORATORIOS DE SUELOS	\$ 234.650,00						ABRIL
			POLIZAS INICIALES	\$ 1.397.791,61						
			ESTUDIO TOPOGRAFICO	\$ 880.000,00						
			ESTUDIOS DE SUELOS	\$ 1.235.000,00						
2	4/04/2024	N/A	PRESENTAN HV DE ESPECIALISTAS							
4	21/04/2024	SE PAGA MAYO	POLIZAS PRORROGA 1							
5	30/04/2024	30/04/2024	AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 4.000.000,00						
			SALARIO MES DE ABRIL RESIDENTE	\$ 3.500.000,00						
			SALARIO MES DE ABRIL CONTADOR	\$ 2.800.000,00						
			TOTALES ABRIL	\$ 14.047.441,61	\$ -	\$ 14.047.441,61	\$ -	\$ 27.267.860,39	\$ 142.790.382,00	
3	6/05/2024	6/05/2024	VALLA INFORMATIVA	\$ 160.000,00						MAYO
4	21/04/2024	21/05/2024	POLIZAS PRORROGA 1	\$ 261.078,45						
			TOTALES MAYO	\$ 421.078,45	\$ -	\$ 14.468.520,06	\$ -	\$ 26.846.781,94	\$ 142.790.382,00	
6	6/06/2024		TRANSPORTE SUBBASE		\$ 3.255.339,50					JUNIO
			SALARIO MES DE MAYO RESIDENTE	\$ 3.500.000,00						
			SUMINISTRO DE SUBBASE		\$ 4.360.000,00					
	27/06/2024		SALARIO MES DE MAYO RESIDENTE	\$ 1.750.000,00						
	14/06/2024		POLIZA PRORROGA 2	\$ 140.294,98						
			SUBSIDIO DE TRANSPORTE DIGNATARIO	\$ 400.000,00						
			CAJA MENOR MES ABRIL	\$ 300.000,00						
	21/06/2024		PAGO RETENCION MAYO	\$ 142.217,75						
			TOTALES JUNIO	\$ 6.232.512,73	\$ 7.615.339,50	\$ 20.701.032,79	\$ 7.615.339,50	\$ 20.614.269,21	\$ 135.175.042,50	
7	2/07/2024	3/07/2024	SUBSIDIO DE TRANSPORTE DIGNATARIO	\$ 400.000,00						JULIO
	2/07/2024	3/07/2024	PAGO SERVICIO DE TOPOGRAFIA	\$ 500.000,00						
	2/07/2024	3/07/2024	PAGO 15 DIAS JULIO MAESTRO DE OBRA	\$ 1.160.000,00						
	2/07/2024	3/07/2024	TRANSPORTE SUBBASE		\$ 4.874.755,00					
7(1)	18/07/2024	24/07/2024	COMPRA DE ACERO 1328 BARR 3/8"		\$ 18.857.600,00					
	18/07/2024	24/07/2024	COMPRA DE CEMENTO 635BULTOS		\$ 10.153.650,00					
	18/07/2024	24/07/2024	ARRIENDO RANA Y TRANSPORTE		\$ 938.700,00					
	18/07/2024	24/07/2024	TRANSPORTE TRITURADO 80M3		\$ 2.970.000,00					
	18/07/2024	24/07/2024	EXAMENES MEDICOS	\$ 420.000,00						
	18/07/2024	24/07/2024	DOTACION UNIFORME 7UND	\$ 1.843.725,00						
	18/07/2024	24/07/2024	COMPRA DE GRAVA 80 M3		\$ 3.120.000,00					
	18/07/2024	24/07/2024	ARRIENDO MEZCLADORA		\$ 1.062.000,00					
	18/07/2024	25/07/2024	COMPRA Y TRANS. DE ARENA 50M3		\$ 3.073.125,00					
	18/07/2024	25/07/2024	DISEÑO DE MEZCLA Y DENSIDADES	\$ 740.700,00						
	18/07/2024	26/07/2024	COMPRA DE 50M3 DE PIEDRA		\$ 1.180.500,00					

	18/07/2024	26/07/2024	PAGO DE CONTADOR JUNIO	\$ 1.400.000,00					
8	30/07/2024	31/07/2024	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANC.	\$ 6.120,00					
	30/07/2024	31/07/2024	5 DIAS DE CARRO TANQUE		\$ 2.250.000,00				
	30/07/2024	31/07/2024	PAGO RETROEXCAVADORA PEQUEÑA		\$ 2.545.920,00				
	30/07/2024	31/07/2024	LUIS VEGA MARTINEZ 15 DIAS MAESTRO	\$ 1.160.000,00					
	30/07/2024	31/07/2024	PAGO JULIO RESIDENTE	\$ 3.500.000,00					
	30/07/2024	31/07/2024	ARRIENDO PULIDORA Y PLANTA ELECT		\$ 450.000,00				
	30/07/2024	31/07/2024	COMPRAS VARIAS FERRETERIA		\$ 350.000,00				
	30/07/2024	31/07/2024	ARRIENDO RIELES		\$ 600.000,00				
	30/07/2024	31/07/2024	13 TABLAS DE MADERA		\$ 403.000,00				
	30/07/2024	31/07/2024	TRANSPORTE DE MAT. CEMENTO ACERO		\$ 6.014.250,00				
	30/07/2024	31/07/2024	ARRIENDO VIBRODE CONCRETO		\$ 600.000,00				
TOTALES				\$ 11.130.545,00	\$ 59.443.500,00	\$ 31.831.577,79	\$ 67.058.839,50	\$ 9.483.724,21	\$ 75.731.542,50

FORMATO ACTA DE REUNION - COMITÉ OPERATIVO No.7		FORMATO	
		 	VERSION: 01
			FECHA: 19-03-2024
			Página 1 de 1
FECHA:	18/07/2024	LUGAR:	virtual
INTERVENTORIA:	CONSORCIO NTR & IC 2023	HORA:	10:30 a.m
CONTRATISTA:	JAC VEREDA LOS BARRIALES . NUEVAS IDEAS	CONVENIO No.	3925 de 2023
OBRA:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS BARRIALES NUEVAS IDEAS, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".		
ORDEN DEL DIA			
1. PRESENTACION DEL COMITÉ OPERATIVO			
2. LECTURA DEL COMITÉ ANTERIOR			
3. COMPRA Y TRANSPORTE DE GRAVA			
4. COMPRA Y TRANSPORTE DE ARENA			
5. COMPRA Y TRANSPORTE DE CEMENTO			
6. COMPRA Y TRANSPORTE DE ACERO			
7. COMPRA Y TRANSPORTE DE PIEDRA			
8. COMPRA DE MEDIDAS AMBIENTALES			
9. ALQUILER DE CARRO TANQUE			
10. PAGO DEL CONTADOR			
11. MAQUINARIA			
12. ALQUILER DE RANA			
13. ALQUILER DE TROMPO MEZCLADOR			
14. EXAMENES DE INGRESO A OBREROS			
15. SUBSIDIO DE TRANSPORTE			
16. ENSAYOS DE LABORATORIO			
17. COMPRA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACION			
TEMAS TRATADOS			

-COMPRA Y TRANSPORTE DE GRAVA: Se analizan las cotizaciones presentadas por el señor, JOSE ANTONIO MENDOZA RODRIGUEZ. Se toman en cuenta factores como el precio, la calidad del producto, el plazo de entrega y las condiciones de pago. Los miembros del Comité discuten las cotizaciones y toman la decisión de comprar los 80m3 de grava al señor JOSE ANTONIO MENDOZA RODRIGUEZ. Y al señor, RODRIGO GUTIERREZ QUINTERO el transporte del material desde la cantera cooper, vía al tablazo al área de influencia a intervenir con un valor unitario de \$80.000 m3, más el transporte \$75.000 por metro cubico cada viaje, sería \$155.000 por viaje, por un valor total de \$12.400.000.

-COMPRA Y TRANSPORTE DE ARENA: Se analizan las cotizaciones presentadas por el señor, RODRIGO GUTIERREZ QUINTERO. Se toman en cuenta factores como el precio, la calidad del producto, el plazo de entrega y las condiciones de pago. Los miembros del Comité discuten las cotizaciones y toman la decisión de comprar los 50m3 de arena con un valor unitario de \$55.000m3 al señor, RODRIGO GUTIERREZ QUINTERO. Y al señor, RODRIGO GUTIERREZ QUINTERO el transporte del material desde el rio cesar (VILLANUEVA) hasta el área a intervenir, con un valor unitario de \$70.000m3, con un valor total de 6.250.000.

-COMPRA Y TRANSPORTE DE CEMENTO: Se analiza la cotización para la compra de 635 bultos de cemento Cemex estructural de 42.5kg, se toman en cuenta factores como el precio, la calidad del producto, el plazo de entrega, las condiciones de pago y el transporte, por un valor unitario de \$32.800 representa un valor total de \$20.828.000 sin incluir transporte.

-COMPRA Y TRANSPORTE DE ACERO: Se analiza la cotización para la compra de 1.328 varillas g- w 3/8", se toman en cuenta factores como el precio, la calidad del producto, el plazo de entrega, las condiciones de pago, por un valor total de \$19.256.000 sin incluir transporte. Más 50kg de alambre negro, valor unitario \$7.000, suma un valor de \$350.000, más el alquiler de 30 rieles con un valor unitario de \$2.000 sumando \$60.000, con un global de \$19.666.000.

-COMPRA Y TRANSPORTE DE PIEDRA: Se analizan las cotizaciones presentadas por el señor, RODRIGO GUTIERREZ QUINTERO. Se toman en cuenta factores como el precio, la calidad del producto, el plazo de entrega y las condiciones de pago. Los miembros del Comité discuten las cotizaciones y toman la decisión de compra y transporte de 15m3 de arena con un valor unitario de \$50.000 m3, este mismo se encarga del transporte del material desde el rio cesar (VILLANUEVA) hasta el área a intervenir, con un valor unitario de \$70.000 m3, con un valor total de \$1.800.000.

-COMPRA DE MEDIDAS AMBIENTALES: Se analizan las cotizaciones presentadas por Suministros y Materiales en General S.A. NIT. 900892259. Se toman en cuenta factores como el precio, la calidad de los productos, el plazo de entrega, las condiciones de pago y los servicios postventa. Los miembros del Comité discuten las cotizaciones y toman la decisión para la compra de las medidas ambientales a Suministros y Materiales en General S.A. por un valor de \$161.000, el comité aprueba esta decisión.

-ALQUILER DE CARRO TANQUE: El comité discute y evalúa la posibilidad de alquilar un carro tanque de agua para el riego del material instalado al señor, LUIS EMILIO MONTERO RODRIGUEZ C.C. 17973251, por valor de \$450.000 por día con un valor total de \$900.000 por los dos días, el comité aprueba esta decisión.

-PAGO AL CONTADOR: Al contador EDGAR ALFREDO OLIVELLA ARIAS C.C. 5172384, se le autoriza el pago restante por el contrato por prestación de servicio por valor de \$1.400.000.

-ALQUILER DE MAQUINARIA: El comité discute y evalúa la posibilidad de alquilar maquinaria (pajarita) para el desarrollo de las actividades de excavación y riego de subbase al señor, LUIS EMILIO MONTERO RODRIGUEZ C.C. 17973251, por valor de \$170.000 por hora con un valor total de \$2.550.000 por 15h requeridas para el uso de esta, el comité aprueba esta decisión.

-ALQUILER DE RANA: El comité discute y evalúa la posibilidad de alquilar una Rana para el desarrollo de las actividades de compactación del material de subbase al señor, JAIME DIAZ QUINTERO C.C. 17971005, por valor de \$80.000 por día con un valor total de \$720.000 por 9 días requeridos para el uso de esta, más el transporte de esta por \$250.000, con global de \$970.000, el comité aprueba esta decisión.

-ALQUILER DE TROMPO MEZCLADOR: El comité discute y evalúa la posibilidad de alquilar un trompo para el desarrollo de las actividades de mezcla del concreto al señor, RICARDO ANDRES CALDERON MONTERO C.C. 1121335633, por valor de \$90.000 por día con un valor total de \$1.800.000 por 20 días requeridos para el uso de este, más el valor agregado del transporte \$400.000 y el consumo de combustible \$280.000, con un global de \$2.480.000, el comité aprueba esta decisión.

-EXAMENES DE INGRESO A OBREROS: El Comité discute el plan de exámenes médicos. Se aprueba el plan sin modificaciones, se programa la fecha y hora para la realización de los exámenes médicos de los 7 obreros. Se asegura que los obreros tengan el tiempo suficiente para realizar los exámenes sin afectar su jornada laboral. Valor unitario por obrero \$60.000 con un valor total de \$420.000.




-SUBSIDIO DE TRANSPORTE: El presidente de la junta de acción comunal vereda los barriales – nuevas ideas MARCOS SERGIO DIAZ DUARTE solicita el pago del subsidio de transporte por valor de \$400.000.

-ENSAYOS DE LABORATORIO: Se analizan las cotizaciones presentadas por JP INGENIERIA CIVIL S.A.S. para realizar los ensayos de diseño de mezcla de concreto por valor de \$290.000 y densidad de campo por valor de \$240.000, más el transporte del técnico por valor de \$110.000, con un global total de \$740.000 IVA incluido. Los miembros del Comité aprueban esta cotización.

-COMPRA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACION: Se analizan las cotizaciones presentadas por Suministros y Materiales en General S.A. NIT. 900892259. Se toman en cuenta factores como el precio, la calidad de los productos, el plazo de entrega, las condiciones de pago y los servicios postventa. Los miembros del Comité discuten las cotizaciones y toman la decisión de comprar la dotación a Suministros y Materiales en General S.A. Se consideran los siguientes aspectos:

- Suministros y Materiales en General S.A. ofrece un precio competitivo que cumple con el presupuesto de la obra.
- La calidad de los productos es la requerida para el proyecto.
- El plazo de entrega se ajusta al cronograma de la obra.
- Las condiciones de pago son favorables.

Por un valor total de \$ 2.013.473.

No.	COMPROMISOS		RESPONSABLE	FECHA
ASISTENCIA				
No.	PARTICIPANTE	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	ROBERTO CALDERON GRANADILLO	JAC- VEREDA LOS BARRIALES - NUEVAS IDEAS	RESIDENTE DE OBRA	
2	MARCOS DIAZ DUARTE	JAC- VEREDA LOS BARRIALES - NUEVAS IDEAS	PRESIDENTE JAC LOS BARRIALES	
3	RODRIGO GUTIERREZ	JAC- VEREDA LOS BARRIALES - NUEVAS IDEAS	SUPLENTE TESORERA	
4	EDGAR OLIVELLA ARIAS	JAC- VEREDA LOS BARRIALES - NUEVAS IDEAS	CONTADOR	
5	ROSA OLIVELLA DURAN	JAC- VEREDA LOS BARRIALES - NUEVAS IDEAS	SUPLENTE REPRESENTANTE VEEDURIA	
6	NICOLAS REDONDO MOLINO	CONSORCIO NTR & IC 2023	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE DE FACILITADOR:				
OBSERVACIONES:				

FORMATO ACTA DE REUNION - COMITÉ OPERATIVO No.8		FORMATO	
		 	VERSION: 01
			FECHA: 19-03-2024
			Página 1 de 1
FECHA:	30/07/2024	LUGAR:	virtual
INTERVENTORIA:	CONSORCIO NTR & IC 2023	HORA:	10:30 a.m
CONTRATISTA:	JAC VEREDA LOS BARRIALES, NUEVAS IDEAS	CONVENIO No.	3925 de 2023
OBRA:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS BARRIALES NUEVAS IDEAS, MUNICIPIO DEL MOLINO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
ORDEN DEL DIA			
1. PRESENTACION DEL COMITÉ OPERATIVO			
2. LECTURA DEL COMITÉ ANTERIOR			
3. PAGO DE NOMINA MAESTRO DE OBRA			
4. PAGO DE NOMINA RESIDENTE DE OBRA			
5. ALQUILER DE CARRO TANQUE			
6. ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA			
7. ALQUILER DE PULIDORA			
8. COMPRA DE MEDIDAS AMBIENTALES			
9. ALQUILER DE RIELES			
10. COMPRA DE TABLAS			
11. TRANSPORTE DE ACERO Y CEMENTO HACIA LA OBRA			
12. ALQUILER DE VIBRADOR DE CONCRETO			
TEMAS TRATADOS			

-PAGO DE NOMINA MAESTRO DE OBRA: Al señor, LUIS ALFONSO VEGA MARTINEZ, se le solicita el pago de su nómina por valor de \$1.160.000 que corresponde al restante del mes laborado por su servicio como maestro de obra.

-PAGO DE NOMINA RESIDENTE DE OBRA: Al ingeniero, ROBERTO CARLOS CALDERON GRANADILLO, se le solicita el pago de nómina por valor de \$3.500.000 que corresponde al mes laborado.

-ALQUILER DE CARRO TANQUE: El comité discute y evalúa la posibilidad de alquilar un carro tanque de agua para el uso de los materiales a instalar en obra al señor, LUIS EMILIO MONTERO RODRIGUEZ C.C. 17973251, por valor de \$450.000 por día con un valor total de \$2.250.000 por los 5 días de alquiler, el comité aprueba esta decisión.

-ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA: Se toman en cuenta las cotizaciones para las actividades de acabados del concreto y se decide alquilar esta herramienta para el uso de actividades varias, por valor de \$50.000 día, se calcula utilizar esta misma por 6 días sumando así un valor total de \$300.000, el comité aprueba esta decisión.

-ALQUILER DE PULIDORA: Se toman en cuenta las cotizaciones para las actividades de figurado de acero y se decide alquilar esta herramienta para este fin, por valor de \$25.000 día, se calcula utilizar esta misma por 6 días sumando así un valor total de \$150.000, más 4 discos de corte.

-COMPRA DE MEDIDAS AMBIENTALES: Se analizan las cotizaciones, se toman en cuenta factores como el precio, la calidad de los productos, el plazo de entrega, las condiciones de pago. Los miembros del Comité discuten las cotizaciones y toman la decisión para la compra de plástico negro para cubrimiento de agregados, por valor de \$350.000 el comité aprueba esta decisión.




-ALQUILER DE RIELES: Se toman en cuenta las cotizaciones para las actividades de acabados del concreto y se decide alquilar 30 rieles a \$2.000 pesos por día, esto por los 20 días solicitados suma un valor de \$1.200.000.

-COMPRA DE TABLAS Y PUNTILLAS: Se toman en cuenta las cotizaciones para la actividad de encofrado y se decide comprar 13 tablas a \$31.000 sumando un valor total de \$403.000.

-TRANSPORTE DE MATERIALES (ACERO Y CEMENTO): Se analizan las cotizaciones presentadas por el señor, RODRIGO GUTIERREZ QUINTERO. Se toman en cuenta factores como el precio, el plazo de entrega y las condiciones de pago. Los miembros del Comité discuten las cotizaciones y toman la decisión de 9 viajes a \$75.000 por cada viaje suma el valor de \$675.000, para el transporte de los materiales desde la bodega (molino) hacia la obra.

-ALQUILER DE VIBRADOR DE CONCRETO: Se toman en cuenta las cotizaciones para las actividades de acabados del concreto y se decide alquilar este equipo por valor de \$62.400 día, por los 20 días solicitados, suma un valor total de \$1.248.000.

COMENTARIOS: La interventoría aprueba el avance del 50% para el pago de los alquileres de herramientas a utilizar en obra.

No.	COMPROMISOS		RESPONSABLE	FECHA
ASISTENCIA				
No.	PARTICIPANTE	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	ROBERTO CALDERON GRANADILLO	JAC- VEREDA LOS BARRIALES - NUEVAS IDEAS	RESIDENTE DEOBRA	
2	MARCOS DIAZ DUARTE	JAC- VEREDA LOS BARRIALES - NUEVAS IDEAS	PRESIDENTE JAC LOS BARRIALES	
3	RODRIGO GUTIERREZ	JAC- VEREDA LOS BARRIALES - NUEVAS IDEAS	SUPLENTE TESORERA	
4	EDGAR OLIVELLA ARIAS	JAC- VEREDA LOS BARRIALES - NUEVAS IDEAS	CONTADOR	
5	ROSA OLIVELLA DURAN	JAC- VEREDA LOS BARRIALES - NUEVAS IDEAS	SUPLENTE REPRESENTANTE VEEDURIA	
6	NICOLAS REDONDO MOLINO	CONSORCIO NTR & IC 2023	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE DE FACILITADOR:				
OBSERVACIONES:				

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 8
	JAC: VEREDA LOS PAPELES Y VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS MUNICIPIO DEL MOLINO-GAJIRA	CONSORCIO NRT&IG 2023	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No.3767-2023 Y 3925-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4821-2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			

FORMATOS INTERVENTORIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
											VERSIÓN	1
											PÁGINA	

FECHA

9/09/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES										DIRECCIÓN TERRITORIAL:		GUAJIRA	
-------------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	---------	--

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:		4821-2023										INTERVENTOR:		CONSORCIO NRT&IC 2023	
MES INFORME MENSUAL:		JULIO										PROYECTO:		"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO EL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"	
CONTRATO DE OBRA No:		3767-2023 Y 3925-2023										CONTRATISTA:		JAC LOS PAPELES Y JAC BARRIALES NUEVAS IDEAS EL MOLINO-GUAJIRA	

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA													
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto			Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional		Valor	Saldo del Acta Anterior		
2023	1399623	C-2402-0600-14-0-240241-02			10	NACION		CONTRATO PRINCIPAL		\$ 60.632.761	\$ 26.898.641		
TOTAL													

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:	\$	60.632.761
-------------------------------	----	------------

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA													
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones	
1	Del 27 al 31 de Dic-23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1399623 DE 19/12/23	\$ 60.632.761,00	\$ 60.632.761,00			
2	Del 17 al 31 de Ene-24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1399623 DE 19/12/23	\$ 60.632.761,00	\$ 60.632.761,00			
3	FEBRERO 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1399623 DE 19/12/23	\$ 60.632.761,00	\$ 60.632.761,00			
4	MARZO 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1399623 DE 19/12/23	\$ 60.632.761,00	\$ 60.632.761,00			
5	ABRIL 2024	\$ 7.587.820,00	\$ 1.441.685,80	\$ 9.029.505,80	\$ -	\$ -	\$ -	1399623 DE 19/12/23	\$ 51.603.255,20	\$ 51.603.255,20			
6	MAYO 2024	\$ 8.957.020,00	\$ 1.701.833,80	\$ 10.658.853,80	\$ -	\$ -	\$ -	1399623 DE 19/12/23	\$ 40.944.401,40	\$ 40.944.401,40			
7	JUNIO 2024	\$ 11.803.160,00	\$ 2.242.600,40	\$ 14.045.760,40	\$ -	\$ -	\$ -	1399623 DE 19/12/23	\$ 26.898.641,00	\$ 26.898.641,00			
8	JULIO 2024	\$ 8.323.500,00	\$ 1.581.465,00	\$ 9.904.965,00	\$ -	\$ -	\$ -	1399623 DE 19/12/23	\$ 16.993.676,00	\$ 16.993.676,00			
TOTALES		\$ 36.671.500,00	\$ 6.967.585,00	\$ 43.639.085,00					\$ 16.993.676,00	\$ 16.993.676,00			

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO			
	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTA 8			
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	7.416.500,00	1.409.135,00	8.825.635,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	907.000,00	172.330,00	1.079.330,00
VALOR TOTAL	8.323.500,00	1.581.465,00	9.904.965,00

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

2. Este formato se diligencia por año.

Firma



Nombre: NICOLAS REDONDO MOLINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 08202-09853ATL

Firma



Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. 08202-38090ATL

Firmado digitalmente por DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		

FECHA		23/08/2024 (Día / Mes / Año)	
-------	--	---------------------------------	--

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	GUAJIRA
-------------------	------------------------------	------------------------	---------

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	4821-2023	INTERVENTOR:	CONSORCIO NRT&IC 2023
--------------------------------	-----------	--------------	-----------------------

OBJETO DEL CONTRATO:			
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO EL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"			

FECHA DE INICIO:	27/12/2023		
PLAZO INICIAL:	0.17 MESES		
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)		
VALOR INICIAL:	\$	60.632.761,00	
VALOR ACUMULADO:	\$	60.632.761,00 (Incluye adiciones)	

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
---	------------------------------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL			
---	--	--	--

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	6.063.276,10	27	12	23	28	1	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0,0%	0,00						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	12.126.552,20	27	12	23	27	3	2026
Calidad del servicio	30%	18.189.828,30	27	12	23	27	12	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	B-100078794
Certificado de modificación o anexo No.:	0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)	
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	23/08/2024
	(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	6.063.276,10
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		0,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	12.126.552,20
Calidad del servicio	30%	18.189.828,30

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
29	1	2024	30	10	2024
29	1	2024	30	4	2027
29	1	2024	30	4	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100078794

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:
POR PRORROGA No. 1

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	6.063.276,10
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		0,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales	20%	12.126.552,20
Calidad del servicio	30%	18.189.828,30

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
15	5	2024	30	12	2024
15	5	2024	30	6	2027
15	5	2024	30	6	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100078794

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:
POR PRORROGA No. 2

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías


Firma
Nombre: NICOLAS REDONDO MOLINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-09853ATL


Firma
Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-38090ATL

Firmado digitalmente
por DUBIN JOSE
CAMARGO ALMENAREZ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA PARA PÚBLICA PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS																		MEP-MN1-IV-9-FR-2 1																		
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA										PLAN DE CARGAS INICIAL REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No. 1 (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)										2307/2023 (Día / Mes / Año)																
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4821/2023		OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCERA LA SANCHEZ, GUADUAS CON CÓDIGO RNAS 4448 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN										PLAZO INICIAL: 1 MES (En meses según contrato principal) FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/02/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 60.636.733,00 (Según contrato principal) VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C)=(A+B)										PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):																
INTERVENTOR: CONSORCIO NTI 165 2023		SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORIA: RUBIN CAMARGO ALMENAREZ		DE		CONVENIOS No.:		CONTRATISTA:																														
No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. de fecha		2023																2024		TOTAL									
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total (\$)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (n-mes)	Valor Total (\$)	H-M	VALOR	DICIEMBRE	H-M	VALOR	ENERO	H-M	VALOR	FEBRERO	H-M	VALOR	MARZO	H-M	VALOR	ABRIL	H-M	VALOR	MAYO	H-M	VALOR	JUNIO	H-M	VALOR	JULIO	H-M	VALOR	AGOSTO	H-M
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																																						
PERSONAL PROFESIONAL																																						
1	1	Director de Interventoría	\$ 5.800.000,00		1,00	\$ 5.800.000,00																			0,33	\$ 1.933.333,33	0,33	\$ 1.933.333,33	0,33	\$ 1.933.333,33	0,33	\$ 1.933.333,33	0,33	\$ 1.933.333,33	1,67	\$ 9.666.666,67		
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría	\$ 2.600.000,00		3,00	\$ 7.800.000,00																			1,00	\$ 2.600.000,00	1,00	\$ 2.600.000,00	1,00	\$ 2.600.000,00	1,00	\$ 2.600.000,00	1,00	\$ 2.600.000,00	5,00	\$ 13.000.000,00		
3	1	Profesional Ambiental	\$ 2.800.000,00		0,30	\$ 840.000,00																																
4	1	Profesional Social	\$ 2.800.000,00		0,30	\$ 840.000,00																																
5	1	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS				3.200.000,00																																
6	1	Especialista en Pavimentos y/o vías	\$ 5.000.000,00		0,32	\$ 1.600.000,00																																
7	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	\$ 5.000.000,00			\$																																
8	1	Especialista en Estructuras	\$ 5.000.000,00			\$																																
9	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	\$ 5.000.000,00			\$																																
10	1	Especialista en Diseño Geométrico	\$ 5.000.000,00		0,32	\$ 1.600.000,00																																
PERSONAL TECNICO																																						
1	1	Inspector SST	\$ 1.200.000,00		2,00	\$ 2.400.000,00																																
2	1	Inspector	\$ 1.200.000,00		2,00	\$ 2.400.000,00																																
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						\$ 26.480.000,00								\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.533.333,33	\$ 5.373.333,33	\$ 5.373.333,33	\$ 6.673.333,33	\$ 11.813.333,33	\$ 8.613.333,33	\$	\$ 36.906.666,67					
FACTOR MULTIPLICADOR						1,63																				1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						\$ 43.362.400,00								\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.389.333,33	\$ 8.798.533,33	\$ 10.714.533,33	\$ 12.256.733,33	\$ 14.039.733,33	\$ 14.039.733,33	\$	\$ 60.157.866,67					
No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total (\$)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total (\$)	2023																2024		TOTAL									
											H-M	VALOR	DICIEMBRE	H-M	VALOR	ENERO	H-M	VALOR	FEBRERO	H-M	VALOR	MARZO	H-M	VALOR	ABRIL	H-M	VALOR	MAYO	H-M	VALOR	JUNIO	H-M	VALOR	JULIO	H-M	VALOR	AGOSTO	H-M
OTROS COSTOS DIRECTOS																																						
VIATICOS																																						
1	1	Viáticos Director y/o Especialistas	\$ 140.000,00	Día	5,00	\$ 700.000,00																																
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																																						
2	1	Misceláneas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y ISCAT)	\$ 600.000,00	Mes	7,00	\$ 4.200.000,00																																
3	1	Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y transporte)	\$ 2.800.000,00	Según Comprobante	1,50	\$ 4.200.000,00																																
4	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos	\$ 900.000,00	Según Comprobante	3,00	\$ 900.000,00																																
5	1	Oficina/Campamento (Incluye: dotación y servicios públicos)	\$ 600.000,00	Según Comprobante	3,00	\$ 1.800.000,00																																
OTROS COSTOS																																						
7	1	Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	\$ 200.000,00	Según Comprobante	2,00	\$ 400.000,00																																
8	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, mapas, fotografías, videos, etc.	\$ 90.000,00	Según Comprobante	3,00	\$ 270.000,00																																
9	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc)	\$ 140.000,00	Según Comprobante	3,00	\$ 420.000,00																																
10	1	Veeduría Técnica Comunitaria	\$ 38.500,00	Según Comprobante	3,00	\$ 115.500,00																																
Ajuste al peso																																						
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)						\$ 13.005.500,00								\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 230.000,00	\$ 230.000,00	\$ 4.230.000,00	\$ 4.830.000,00	\$ 3.045.500,00	\$	\$ 12.565.500,00						
SUBTOTAL COSTOS BASICOS (A)+(B) = (C)						\$ 56.167.900,00								\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.619.333,33	\$ 8.988.533,33	\$ 14.944.533,33	\$ 24.085.733,33	\$ 17.085.233,33	\$	\$ 72.723.366,67						
IVA= 19% * (C) = (D)						\$ 10.671.901,00								\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.447.673,33	\$ 1.707.821,33	\$ 2.839.461,33	\$ 4.576.289,33	\$ 3.246.184,33	\$	\$ 13.817.439,67							
COSTO TOTAL = (C) + (D)						\$ 66.839.801,00								\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.067.006,67	\$ 10.696.354,67	\$ 17.783.994,67	\$ 28.662.022,67	\$ 20.331.427,67	\$	\$ 86.540.806,33							
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																						
CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS																																						
ADICION \$ 19.701.005																																						
CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (Causas delegadas). Se debe reducir la justificación de la modificación. Cuando la causal correspondiente a una adición, se trate a modificación del contrato debe indicarse así: Por exceso de la adición, se trató a modificación y la fecha de suspensión.																																						
NOTAS:																																						
1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.																																						
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.																																						
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de intervención.																																						
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.																																						
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.																																						
Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas																																						
Firma: Nombre: ROBERTO CARLOS LOPEZ JULIO Representante Legal CONSORCIO NTI 165 2023 Matrícula Profesional No 22202-333867 COR																																						
Firma: Firmado digitalmente por DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ Nombre: DUBIN CAMARGO ALMENAREZ Supervisor de Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: 38020-38090ATL (Suscribe según su competencia)																																						
Original: Archivo de Gestión del RNVAI. Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.																																						
