

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	16

SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FÉRREA
CAMILO ANDRÉS ROA ROJAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO No. 2068-2021 VIVE COLOMBIA VÍAS VERDES
Periodo:	Del 01 al 31 de enero de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	NE

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: SALENTO, ARMENIA MONTENEGRO, QUIMBAYA Y RISARALDA.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 47 Km

1. CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2068-2021		
EJECUTOR	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA	NIT:	801004883-0.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS TENDIENTES AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED FÉRREA NACIONAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA “VIVE COLOMBIA – VÍAS VERDES” EN EL CORREDOR FÉRREO, SALENTO, ARMENIA MONTENEGRO, QUIMBAYA Y RISARALDA”.		
FECHA DE INICIO:	29 de diciembre de 2021	No. de Oficio:	SMFF 73938
VALOR INICIAL:	\$ 41.402.347.740		
VALOR ADICIONES:	N.A.		
ADICIÓN 1:	\$ 0		
ADICIÓN NN:	\$ 0		
VALOR ACTUAL:	\$ 41.402.347.740		
ANTICIPO	N.A.		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	16

ANTICIPO OTORGADO:	N.A.
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2030
TOTAL PRÓRROGAS:	N.A.
PRÓRROGA 1:	N.A.
PRÓRROGA N:	N.A.
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2030

LOCALIZACION

El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Quindío y Risaralda. El corredor por intervenir hace parte del programa “VIVE COLOMBIA – VIAS VERDES” Tendientes al mantenimiento y conservación de la red férrea nacional.

Los tramos objeto a intervenir son los siguientes:

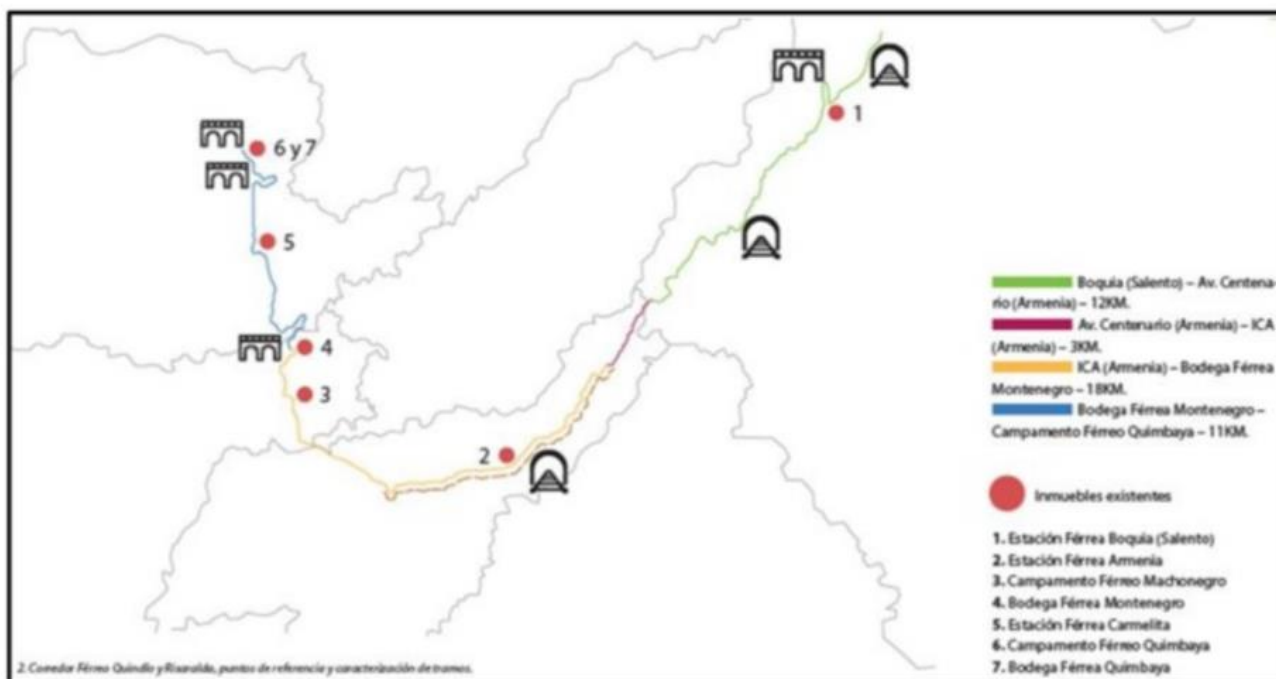


Figura 1.1. Localización de la vía, zonas del Quindío y Risaralda.

Fuente: Banco de imágenes de INVIAS

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	16

Tramo	KM
T1 (Boquia -Av- Centenario)	11,7
T2 (Av- Centenario - ICA)	3
T3 (ICA - Est. Armenia)	5,87
T4 (Est. Armenia - Montenegro)	13,5
T5 (Montenegro - Quimbaya)	11
T6 (Morelia - Puente Sucre)	10
TOTAL	55,07

Actualmente, el convenio se encuentra en la fase de preconstrucción, que abarca estudios y diseños. Las actividades se están llevando a cabo en los tramos 5 y 6 de los cuales se conoce pertenecen al Instituto Nacional de Vías, ya que aún no se ha autorizado la intervención en los demás tramos. La Dirección Territorial Quindío, encargada de supervisar el convenio, está a la espera de directrices relacionadas con la titularidad, viabilidad y entrega de los otros tramos por parte de la Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea. Es importante destacar que estas acciones deben realizarse de manera conjunta, dado que la Territorial Quindío no posee las competencias necesarias para proporcionar dichos insumos.

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

VIGENCIA	RUBRO	FUENTE	RECURSO	VALOR
2022	240204	Nación	54	\$ 11.400.000.000,00
2023	240204	Nación	54	\$.194.338.521,30
2024	240204	Nación	54	\$ 6.615.009.159,30
2025	240204	Nación	54	\$ 7.064.999.958,60
2026	240204	Nación	54	\$ 16.128.000.100,80
TOTAL				\$ 41.402.347.740,00

A la fecha se han girado los siguientes recursos del convenio a PROYECTA:

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
67122	11	C-2404-0600-2-0-2404031-02	\$2.380.000.000,00	\$2.380.000.000,00	\$ 0

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 16

67122	11	C-2404-0600-2-0-2404019-02	\$3.020.000.000,00	\$3.020.000.000,00	\$ 0
1361922	11	C-2404-0600-2-0-2404019-02	\$6.000.000.000,00	\$6.000.000.000,00	\$0

CONTRATO DE OBRA	001 – A DE 2023		
CONTRATISTA	CONSORCIO CORREDOR FERREO	NIT:	901.666.206-7
INTEGRANTES	RL. EDUARDO SANTOS MARTINES - 100%		
OBJETO:	“CONSTRUIR, CONSERVAR Y SOSTENER EL CORREDOR FERREO Y SUS ANEXIDADES, POR MEDIO DE LA INICIATIVA VIVE COLOMBIA – VIAS VERDES, EN EL MUNICIPIO DE SALENTO, ARMENIA, MONTENEGRO, QUIMBAYA ABARCANDO EL TRAMO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, INCLUYE LOS DISEÑOS PARA SU EJECUCION”		
FECHA DE INICIO:	29 de julio de 2024		
VALOR INICIAL:	\$ 39.282.922.823		
VALOR ADICIONES:	N.A.		
ADICIÓN 1:	\$ 0		
ADICIÓN NN:	\$ 0		
VALOR ACTUAL:	\$ 39.282.922.823		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	Cuatro (4) Años		
TOTAL PRÓRROGAS:	N.A.		
PRÓRROGA 1:	N.A.		
PRÓRROGA N:	N.A.		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	28/Julio/2028		

Las actividades desarrolladas por el contratista de obra durante el periodo de enero:

- ✓ Remisión de documentos iniciales.
- ✓ Propuesta económica estudio de gestión ambiental y social en etapa avanzada.
- ✓ Respuesta a comunicado CCF-CO0110-1617-2024 observaciones metodología elaboración de planos.
- ✓ Respuesta a comunicado CCF-CO0110-1676-2024 metodología estudio de gestión ambiental predial y social. – componente predial.
- ✓ Remisión de estudio de tránsito de los tramos 5 Montenegro – Quimbaya y tramos 6 Morelia – Puente Sucre.
- ✓ Diseño de chaleco y carnet de identificación del personal del consorcio corredor férreo.
- ✓ Respuesta a comunicado CCF-CO0110-1676-2024 metodología estudio de gestión ambiental predial y social. – componente predial.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	16

- ✓ Respuesta a comunicado CCF-CO0110-2064-2024 Sobre puntos de interés para urbanismos tramos 5 y 6.
- ✓ Metodología evaluación socioeconómica del proyecto.
- ✓ Envío informe de informe geotécnico para el diseño de obras de estabilización – corredores verdes sector quimbaya – Montenegro.
- ✓ Envío de informe del estudio del componente hidrológico.
- ✓ Solicitud de información catastral.
- ✓ Reporte de instalación de redes de gas domiciliario en el tramo No 6 Morelia Puente Sucre, vereda la Selva, sector Pedregales.
- ✓ Solicitud cambio de Hoja de Vida Profesional Social
- ✓ Respuesta oficio CCF-CO0110-2188-2025 del 17 de enero de 2025 – informe componente forestal tramo 5
- ✓ Solicitud de viabilidad para ejecutar las obras del programa Vive Colombia Vías Verdes en el corredor férreo de propiedad del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS).
- ✓ Informe de geología de los tramos No 5 Morelia – Puente Sucre y No 6 Montenegro Quimbaya.
- ✓ Desistimiento de cambio de profesional social del proyecto.
- ✓ Informe de estudios de geotecnia y propuesta de obras de estabilización de taludes del tramo No 6 Morelia Puente Sucre.

AVANCE DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, CALIDAD Y AMBIENTAL.

SOCIAL:

El contratista radico mediante oficio CCF-5-222-2025 el 2 de enero de 2025 informe del área social No 5 correspondiente al mes de diciembre del 2024.

El contratista radico mediante oficio CCF-5-224-2025 el 3 de enero de 2025 Informe Ambiental y SST # 5 – Diciembre de 2024.

El contratista radico mediante oficio CCF-5-237-2025 el 20 de enero de 2025 respuesta comunicado No CCF-CO0110-2176-2025 - informe técnico, social, ambiental correspondiente al mes de diciembre de 2024.

PREDIAL:

A la fecha de este informe no se ha ejecutado ninguna actividad correspondiente a la gestión predial. Solo se ha generado solicitud de fichas catastrales del corredor férreo, mediante oficio CCF-05-63-2024; adicional a este comunicado se sostuvo reunión con el IGAC Armenia y la subdirección de catastro Pereira, para solicitar las fichas catastrales, polígonos y coordenadas del corredor férreo de Quindío y Risaralda.

El contratista radico mediante oficio CCF-5-234-2025 el 14 de enero de 2025 con consecutivo CCF-CE0110-1723-2025 Solicitud de información catastral.

Durante el periodo actual no se presentó reporte por parte del contratista de Obra sobre la necesidad de adquisición predial a lo largo del proyecto.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 16

AMBIENTAL:

El contratista remite mediante comunicado CCF-5-224-2025 el 3 de enero de 2025 informe Ambiental y SST # 5 – diciembre 2024.

CALIDAD:

El contratista dio respuesta mediante comunicado CCF-5-232-2024 con consecutivo CCF-CE0110-1717-2024 el 13 de enero respuesta comunicado No CCF-CO0110-2127-2024 Observaciones al plan de inspección y ensayo.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 16

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1102 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GINPRO INV 199/22	NIT:	901.581.618-1
CONFORMACIÓN:	GINPROCOL S.A.S identificado con NIT 901.162.700-0 con un porcentaje de participación del 95% y GINPROSA COLOMBIA S.A.S identificada con NIT 900.761.711-8 con un porcentaje de participación del 5%		
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIVE COLOMBIA VÍAS VERDES, CORREDORES FÉRREOS INACTIVOS, ANTIOQUIA, QUINDÍO, RISARALDA, CALDAS, HUILA Y CUNDINAMARCA		
Fecha de Inicio:	9 de diciembre de 2022	No. de Oficio:	
Valor Inicial:	\$ 17.137.863.539,00		
Valor Adiciones:	\$ 0		
Adición 1:	\$ 0		
Adición 1:	\$ 0		
Valor Actual:	\$ 17.137.863.539,00		
Anticipo Entregado:	\$ 0		
Anticipo Amortizado:	\$ 0		
Saldo por Amortizar:	\$ 0		
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2028		
Total Prórrogas:	N.A.		
Prórroga 1:	N.A.		
Prórroga 2:	N.A.		
Fecha de Fin:	31 de diciembre de 2028		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	16

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

De acuerdo con los recorridos realizados se ha podido evidenciar que el corredor férreo contempla más de los 47 km tal y como se evidencia en la localización del proyecto, el cual ya se expuso la situación a Proyecta para que adelante las actuaciones pertinentes de aclaración.

Se ha insistido al contratista que avance con la entrega de los ajustes a los estudios y diseños, tendientes a garantizar la entrega de estos a más tardar el 29 de enero de 2025.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Demoras en la firma del acta de inicio del contrato de obra, debido a temas administrativos y legales los cuales se debieron resolver previo al inicio de la obra, razón por la cual se suscribieron modificatorios Nos. 1 y 2.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Demoras en la entrega de propuestas metodológicas y económicas de los ajustes a los estudios y diseños por parte del contratista.

La interventoría ha realizado solicitudes y reiteraciones al contratista para la entrega oportuna de los documentos iniciales e informe mensual correspondiente al componente técnico, social y ambiental.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD.

Durante los recorridos realizados se evidencia ocupación de predios que podrá dificultar la ejecución de algunas actividades.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

En el periodo de ENERO/2025 no se realizaron salidas a campo.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		1	DE

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

7/01/2025	2106	SOLICITUD DE INFORME MENSUAL TÉCNICO, GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y SST DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 Y EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS MEPI.	solicita se remita el informe mensual técnico, de gestión social y ambiental correspondiente al mes de DICIEMBRE del año 2024, con el fin de evidenciar el avance de la gestión técnica, social y ambiental adelantada por el Contratista	Interventoría	Contratista
9/01/2025	2112	RESPUESTA OFICIO NO. CCF-5-224-2025DEL3DE ENERO DE 2025– INFORME COMPONENTE AMBIENTAL DICIEMBRE 2024	APROBADO el INFORME MENSUAL DEL COMPONENTE AMBIENTAL del periodo comprendido entre el 1 de diciembre y 31 de diciembre de 2024	Interventoría	Contratista
9/01/2025	2114	RESPUESTA COMUNICADO CCF-5-218-2024DE FECHA 30/12/2018. ASUNTO: REMISIÓN RESOLUCIÓN NO. SST- 1838DE 27/12/2024EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA MINISTERIO DEL INTERIOR	se RESUELVE: 1. Que no procede la Consulta Previa con Comunidades Indígenas. 2. Que no procede la consulta previa con Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 3. Que no procede la consulta previa con Comunidades Rom.	Interventoría	Contratista
9/01/2025	2117	RESPUESTA COMUNICADO CCF-5-222-2025DEL2/01/2025. ASUNTO: REMISIÓN INFORME SOCIAL NO. 5- MES DICIEMBRE 2024	APROBACIÓN, del informe social No. 5 del periodo DICIEMBRE 2024	Interventoría	Contratista

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 16

9/01/2025	2127	OBSERVACIONES A LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA BAJO EL OFICIO CCF-05-216-2024, AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO, VERSIÓN 10,02 DE DICIEMBRE DE 2024	observaciones a la información entregada por el contratista	Interventoría	Contratista
10/01/2025	2133	RESPUESTA COMUNICADO CCF-5-225-2025 RESPUESTA A COMUNICADO CCF-CO0110-1617-2024 OBSERVACIONES METODOLOGÍA ELABORACIÓN DE PLANOS - CONCEPTO TÉCNICO REVISIÓN METODOLOGÍA PARA ELABORACIÓN DE PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CORREDOR VERDE SALENTO-ARMENIA-MONTENEGRO-QUIMBAYA REV1	se insta al Contratista a garantizar una coherencia en la entrega de planos entre especialidades	Interventoría	Contratista
10/01/2025	2134	RESPUESTA COMUNICADO CCF-5-219-2025– SOLICITUD PRÓRROGA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN	Se informa que no ve procedente dar trámite a la solicitud, hasta tanto no se atiendan las observaciones mencionadas en el presente oficio y allegue los soportes correspondientes	Interventoría	Contratista
10/01/2025	2135	SOLICITUD DEL PRESUPUESTO GENERAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS.	Se solicita al contratista se remita el presupuesto general de los DISEÑOS contemplados en la etapa de pre-construcción	Interventoría	Contratista
13/01/2025	2142	RESPUESTA CCF-5-221-2024– INFORME TÉCNICO #4– NOVIEMBRE 2024	no se evidencia el registro de entrega de insumos de protección personal o de dotación al personal activo	Interventoría	Contratista

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		3	DE 16

13/01/2025	2143	RESPUESTA AL COMUNICADO CCF-5-228-2025- DISEÑO DE CHALECO Y CARNET DE IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL DEL CONSORCIO CORREDOR FÉRREO	se espera que la entidad (PROYECTA) defina el chaleco y carnet de identificación a emplear	Interventoría	Contratista
13/01/2025	2147	REITERACIÓN No.01 ALOFICIO CCF-CO0110-1997-2024RESPUESTA A COMUNICADO CCF-5-202- 2024- CONCEPTO REVISIÓN METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE TRÁNSITO EN LOS T5 (MONTENEGRO – QUIMBAYA) Y T6(MORELIA – PUENTE SUCRE).	solicita que en un plazo no mayor a un (1) día contado a partir de la recepción del presente comunicado, proceda con la respuesta dando cumplimiento a las prerrogativas contractuales pactadas	Interventoría	Contratista
13/01/2025	2149	SOLICITUD RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS TRAMO 6 (MORELIA – PUENTE SUCRE)	Se solicita al CONSORCIO CORREDOR FERREO iniciar con el retiro de material sobrante, el cual se ha generado por la limpieza de las obras hidráulicas transversales en el tramo 6 Morelia - Puente Sucre	Interventoría	Contratista
13/01/2025	2154	RESPUESTA A OFICIO CCF-5-221-2024SOBRE PROPUESTA ECONÓMICA PARA ESTUDIO PREDIAL - CONTRATO DE OBRA NO. 001– A DE 2023	Se realizan observaciones técnicas y jurídicas a la propuesta económica presentada para la realización del estudio predial	Interventoría	Contratista
13/01/2025	2155	RESPUESTA A RESPUESTA AL COMUNICADO CCF-5-226-2025 METODOLOGÍA ESTUDIO DE GESTIÓN AMBIENTAL PREDIAL Y SOCIAL. – COMPONENTE PREDIAL	Se requiere reformular el alcance contractual limitándolo estrictamente a las actividades necesarias para un diagnóstico predial, excluyendo aquellas propias de procesos de gestión y adquisición predial	Interventoría	Contratista

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 16

13/01/2025	2156	SOLICITUD DE VOLÚMENES COMPLETOS POR ESPECIALIDAD.	Se requiere al Contratista la entrega de todos los estudios y diseños en fase de construcción de los dos tramos entregados por la entidad	Interventoría	Contratista
14/01/2025	2157	INFORME SST#5– DICIEMBRE DE 2024	No se evidencia el registro de entrega de insumos de protección personal o de dotación al personal activo	Interventoría	Contratista
14/01/2025	2158	RESPUESTA A OFICIO CCF-5-229-2025PROPUESTA DE PUNTOS DE INTERÉS PARA URBANISMO TRAMO 5“MONTENEGRO QUIMBAYA” Y TRAMO 6“MORELIA PUENTE SUCRE”	se viabilizan los puntos de interés expuestos por el contratista para el “tramo 5” y el “tramo 6”	Interventoría	Contratista
14/01/2025	2159	RESPUESTA A OFICIO CCF-5-217-2024RESPUESTA A OFICIO CCF CO0110-2059-2024 OBSERVACIONES INFORME GEOTÉCNICO SITIO PUENTE A CONSTRUIR - CONCEPTO TÉCNICO REVISIÓN ESTUDIO GEOLÓGICO PUENTE QUEBRADA INNOMINADA SECTOR BUENA VISTA (QUIMBAYA) REV1	Una vez revisada la información del componente geológico del puente sobre la quebrada Innominada entregado por la firma Contratista, se tiene como conclusión que el estudio NO CUMPLE	Interventoría	Contratista
14/01/2025	2160	APROBACIÓN CONDICIONADA PLAN DE CALIDAD Y PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS VERSIÓN 11 ATENCIÓN OBSERVACIONES CON EL OFICIO CCF-05-232-2025, AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO, VERSIÓN 10,13DE ENERO DE 2025	Plan de calidad y Plan de inspección y ensayo versión 11 de 13 de enero de 2025 CUMPLEN	Interventoría	Contratista

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		5	DE

15/01/2025	2168	RESPUESTA CORREO ELECTRÓNICO 10 DE ENERO DE 2025(5:30P.M.) - ORDEN DE OPERACIÓN NO. 1- ANTICIPO	Se adjunta los modelos de cómo deben venir los paquetes de pagos de seguridad social y nomina respectivamente	Interventoría	Contratista
17/01/2025	2176	REITERACIÓN NO. 1 SOLICITUD DE INFORME MENSUAL TÉCNICO, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 Y EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS MEPI	Se solicita remitir informe mensual técnico, correspondiente al mes de DICIEMBRE del presente año, con el fin de evidenciar el avance de la gestión técnica y el diligenciamiento de los formatos MEPI	Interventoría	Contratista
17/01/2025	2179	RESPUESTA COMUNICADO CCF-5-236-2025- SOLICITUD PRÓRROGA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN	se informa que no ve procedente dar trámite a la solicitud del CONSORCIO CORREDOR FERREO, hasta tanto no se atiendan las observaciones	Interventoría	Contratista
17/01/2025	2185	SOLICITUD INFORMES DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO	Se solicita se remita recopilado el informe de inversión de Anticipo del mes de noviembre y diciembre de 2024	Interventoría	Contratista
17/01/2025	2188	RESPUESTA OFICIO NO. CCF-5-215-2024 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2024 – INFORME COMPONENTE FORESTAL TRAMO 5	se solicita al contratista dar claridad al presente comunicado para proceder con lo respectivo	Interventoría	Contratista
17/01/2025	2190	RESPUESTA COMUNICADO CCF-5-223-2025 DEL 3/01/2025. ASUNTO PROPUESTA ECONÓMICA ESTUDIO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL EN ETAPA AVANZADA	el COMPONENTE SOCIAL NO SE APRUEBA	Interventoría	Contratista

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		6	DE

20/01/2025	2191	RESPUESTA COMUNICADO CCF-5-233-2025ENVIÓ INFORME COMPONENTE HIDROLÓGICO - CONCEPTO TÉCNICO REVISIÓN METODOLOGÍA PARA ESTUDIO Y DISEÑOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS DEL PROYECTO CORREDOR VERDE SALENTO-ARMENIA-MONTENEGRO-QUIMBAYA REVO	Se solicita al contratista verificar que la información entregada cumpla con los estándares técnicos y normativos aplicables, a fin de evitar observaciones adicionales que impacten la ejecución del proyecto	Interventoría	Contratista
20/01/2025	2192	RESPUESTA COMUNICADO CCF-5-230-2025-INFORME DE REVISIÓN DE INTERVENTORÍA - METODOLOGÍA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO.	Se requiere la subsanación, complemento y envío nuevamente del componente: METODOLOGÍA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA	Interventoría	Contratista
21/01/2025	2205	RESPUESTA COMUNICADO CCF-5-231-2025ENVIÓ INFORME DE INFORME GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN – CORREDORES VERDES SECTOR QUIMBAYA – MONTENEGRO - CONCEPTO TÉCNICO REVISIÓN ESTUDIO GEOTÉCNICO OBRAS DE ESTABILIZACIÓN QUIMBAYA-MONTENEGRO SECTORES MACHO NEGRO Y CARMELITA 1REV1	La información del componente geotécnico y geológico de las obras de estabilización Quimbaya-Montenegro Sectores Macho negro y Carmelita 1 - NO CUMPLE	Interventoría	Contratista
22/01/2025	2208	RESPUESTA COMPONENTE SOCIAL INTERVENTORÍA AL COMUNICADO CCF-5-237-2025DEL 20/01/2025. ASUNTO: COMPILADO DEL INFORME TÉCNICO CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE DE 2024.	El informe social mensual de diciembre 2024 y sus correspondientes anexos fueron aprobados a través del comunicado CCF-CO0110-2117-2025 de fecha 9/01/2025	Interventoría	Contratista

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 16


23/01/2025	2215	RESPUESTA OFICIO CCF-5-240-2025– CAMBIO PROFESIONAL SOCIAL	NO CUMPLE	Interventoría	Contratista
23/01/2025	2220	RESPUESTA COMUNICADO CCF-5-237-2025– INFORME MENSUAL NO. 5DICIEMBRE COMPONENTE TÉCNICO	APROBACION sin OBSERVACIONES AL COMPONENTE TECNICO	Interventoría	Contratista
24/01/2023	2221	REITERACIÓN NO.1 COMUNICADO CCF-CO0110-2005-2024RESPUESTA COMUNICADO CCF-5-201-2024– INFORME MENSUALES NO. 4 NOVIEMBRE. COMPONENTE TÉCNICO	se solicita remitir la subsanación de las observaciones del informe mensual técnico, correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2024	Interventoría	Contratista
23/01/2025	2223	RESPUESTA COMUNICADO NO. CCF-5-243-2025DEL23DE ENERO DE 2024– CONSTANTES CAMBIOS EN EL PROCEDIMIENTO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS CON LOS RECURSOS DEL ANTICIPO.	Se cita a una mesa de trabajo para el 24 de enero de 2025 a las 10:00a.m. de manea virtual	Interventoría	Contratista
27/01/2025	2229	RESPUESTA COMUNICADO CCF-5-238-2025DEL22/01/2025. ASUNTO RESPUESTA OFICIO CCF-CO0110-2188-2025DEL17DE ENERO DE 2025– INFORME COMPONENTE FORESTAL TRAMO 5.	Se solicita propuesta formal la cual deberá incluir lo respectivo desde el componente ambiental, frente al corredor a intervenir	Interventoría	Contratista
27/01/2025	2232	RESPUESTA COMUNICADO CCF-5-244-2025– DESISTIMIENTO CAMBIO PROFESIONAL SOCIAL.	Se acusa recibo de la información de desistimiento del profesional social	Interventoría	Contratista

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 16

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

- ✓ Aclarar alcance de la metafísica en relación con la longitud del proyecto por parte de Proyecta.
- ✓ Realizar la entrega del corredor faltante por parte de PROYECTA, toda vez que la no entrega completa podrá generar tiempos adicionales a la etapa de Preconstrucción.
- ✓ Se recomienda al contratista avanzar en la entrega de documentos iniciales.
- ✓ Se recomienda al contratista informar los sitios en los cuales se evidencian posibles ocupaciones del corredor.

Cordial saludo,



ING LENIN TITO MENDOZA PEÑA
DIRECTOR TERRITORIAL QUINDIO (E)
