

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
			1		
		PÁGINA	1	DE	20

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES-SVR

OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO

TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)

NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

INFORME 01

Ingeniera

MARIA CELENY OCAMPO ARIAS

Directora Territorial Risaralda

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL CONTRATO No 2932 DEL 2024 Interventoría.
Periodo:	Del 01 al 31 de octubre de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	No 132 del 12 de septiembre de 2024, Ing. ELKIN MEJIA CARCAMO

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VIAS TERCARIAS A CARGO DE LA TERRITORIAL RISARALDA. OBJETO ES: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA


LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR 6 VIAS: 15 Km

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		2	DE 20

CODIGO	CAMINO	MUNICIPIO	LONGITUD EN KM
45220	EL GARAJE- LA SONADORA	SANTA ROSA DE CABAL	2,00
45225	RIO OTUN-PUENTE ALBAN-LA MARIA	SANTA ROSA DE CABAL	4,00
45230	RIO OTUN-VEREDA SAN MARCOS	SANTA ROSA DE CABAL	2,00
45800	NAPOLES- LA SIRENA	SANTUARIO	4,00
46000	COLUMBIA-CAUCAYA	BELEN DE UMBRIA	1,50
46350	SANTA TERESITA- EL MUÑECO	BELEN DE UMBRIA	1,50
		TOTAL, RED TERCIARIA	15 KM

La vía específica del contrato es:

CODIGO	CAMINO	MUNICIPIO	LONGITUD EN KM
45800	NAPOLES- LA SIRENA	SANTUARIO	4,00

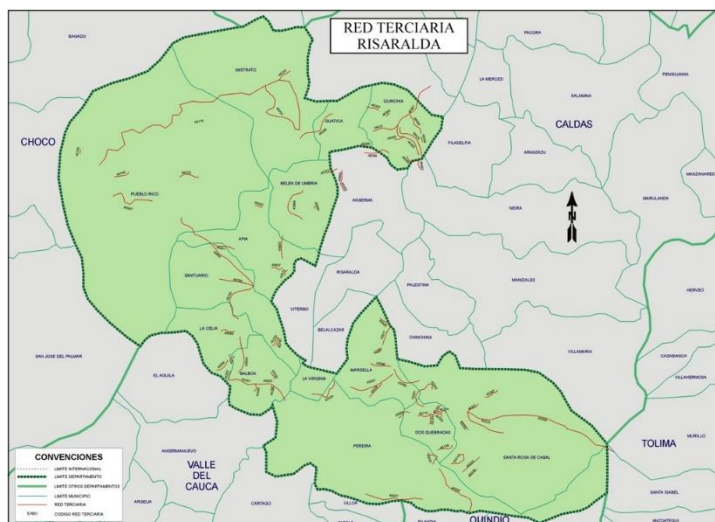




MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR

CÓDIGO	MEPI-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	20

MUNICIPIO DE SANTUARIO RISARALDA.

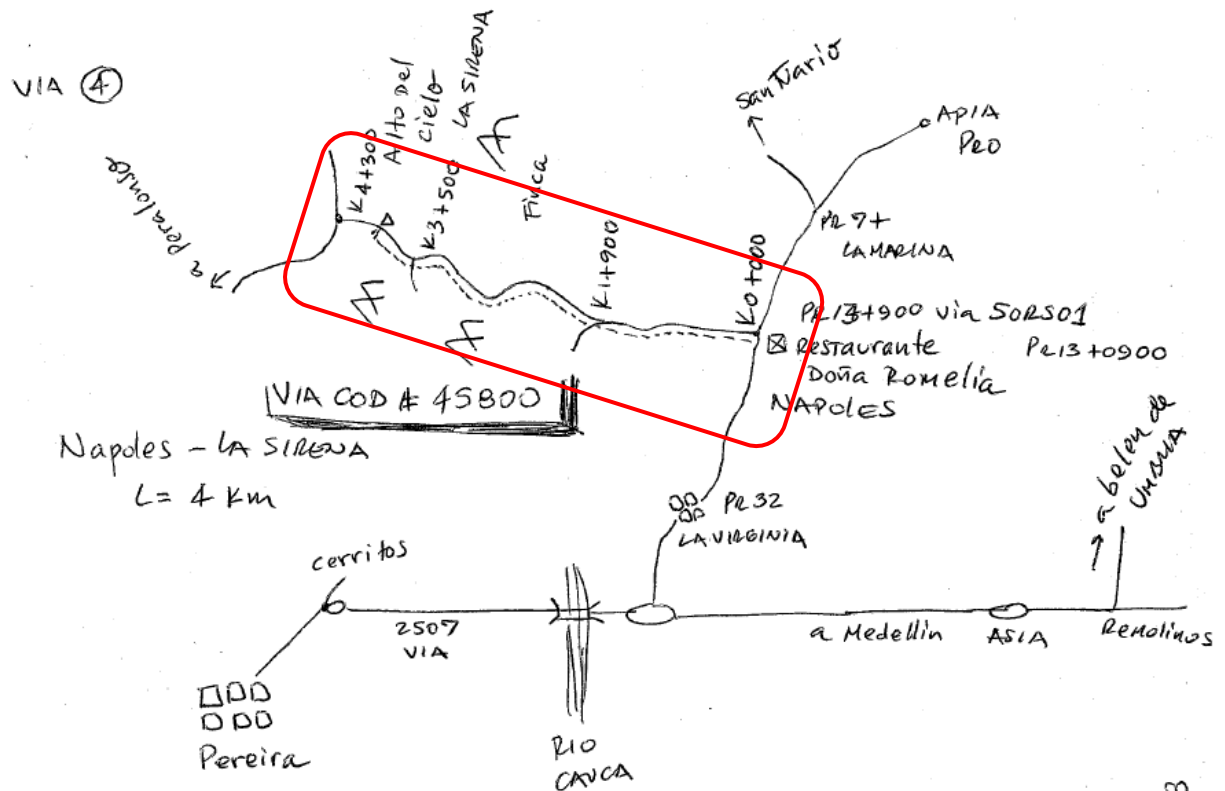

10/05/2018

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 20

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	No 3325 de 2024		
CONTRATISTA:	CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA	NIT:	cédula de ciudadanía Nro. 75.106.064 de Manizales.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	“ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED Terciaria a cargo de INVIAS, a través del sistema de monto agotable, en vías a cargo de la Dirección Territorial Risaralda”		
FECHA DE INICIO:	01/10/2024	OFICIO 2024S-VRIS-070298, DE 30/09/2024	DT-RIS
VALOR INICIAL:	\$ 284.455.278,50		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN 2:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 284.455.278,50		
ANTICIPO	Si, se solicitara el 30% del total, eso es \$ 84.717.494,25 anticipo, del 30% del costo básico del contrato \$ 282.391.647,50		
ANTICIPO OTORGADO:	Aun no se desembolsa en este mes de octubre 2024		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	90 días o Hasta el 31/12/2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA 3:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR				CÓDIGO		MEPI-FR-1	
					VERSIÓN		1	
					PÁGINA		5	DE 20

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
Compromiso Presupuestal No.802124	2024	Nación 11	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02 ADQUIS. DE BYS - SITIO CRÍTICO DE LA RED TERCARIA ESTABILIZADO - MEJORAMIENTO ,MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED TERCARIA. NACIONAL	\$284.455.278,50	\$ 0	\$284.455.278,50
			ACTA de obra No 01 (del 01 al 31 de octubre de 2024)		\$ 0,00	\$284.455.278,50
				Desembolso de anticipo xx/xx/2024	\$ 84.717.494,25	Aun no desembolsado
TOTAL				\$284.455.278,50	0.00	\$284.455.278,50

Este valor del anticipo solicitado es \$ es \$ 84.717.494,25 corresponde a un 30% del valor basico del contrato de obra.

A momento de este informe el contratista no ha facturado el acta 1.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 20

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01 (del 01 al 31 de octubre de 2024)	\$0		\$0	\$0

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría **No. 01 de fecha 05/11/2024**, para el periodo del 01 al 31 de octubre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 284.455.278,50	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA, según programa 1 inicial	\$ 18.476.523	6,80%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 0	0%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		7	DE 20

En el informe 01, se indica folio 18/48:

El contratista presenta un avance del 0%, esto no es crítico, debido a que como son obras de monto agotable y emergencias, se elabora un cronograma inicial tentativo inicial, el cual indico que se avanzaba en el mes 1 un 6.8%.

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$ 84.717.494,25 (30%)
Amortizado	0
Saldo	\$ 84.717.494,25 (30%)

El contratista de obra ha manifestado que requiere el anticipo.

Aun no se gira el anticipo

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 6,80%: según el programa 1.

Meta física ejecutada 0 %:

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 20

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A para este periodo	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: con la firma del contrato
 FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 24 septiembre de 2024
 MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
 FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
 POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		9	DE 20

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza Única de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 55-44-101082042 Anexo No. 1 26/08/2024	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 28.445.527,90		26/08/2024	20/06/2025
Buen Manejo Anticipo	\$85.336.583,70		26/08/2024	20/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$56 891.055,80	Póliza No. 55-44-101082042 Anexo No. 1 26/08/2024	26/08/2024	31/12/2027
Estabilidad y Calidad de la obra	\$85.336.583,70		31/12/2024	31/12/2029
Calidad del servicio (estudios)				

AMPAROS			
RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/08/2024	30/06/2025	\$28,445,527.90
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	26/08/2024	30/06/2025	\$85,336,583.70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	26/08/2024	31/12/2027	\$56,891,055.80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$85,336,583.70
ACLARACIONES			
* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		10	DE 20

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 55-44-101082042, Anexo No. 1 13/09/2024	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$ 260.000.000,00		26/08/2024	31/12/2024
Contratista y subcontratistas	\$ 260.000.000,00	Póliza No. 55-44-101082042, Anexo No. 1 13/09/2024	26/08/2024	31/12/2024
Vehículos propios y no propios	\$ 260.000.000,00		26/08/2024	31/12/2024
Responsabilidad Civil Patronal	\$ 260.000.000,00		26/08/2024	31/12/2024

AMPAROS					
RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES					
AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 15.00 SMMLV	26/08/2024	31/12/2024	\$260,000,000.00	
ACLARACIONES POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE INCLUYEN LSO SIGUIENTES AMPAROS ADICIONALES EN LA POLIZA ARRIBA CITADA: R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS, R.C. PATRONAL, R.C. CRUZADA, PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES, BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL. TODAS LAS DEMAS CONDICIONES NO MODIFICADAS CON EL PRESENTE CERTIFICADO CONTINUAN EN VIGOR.					

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		11	DE 20

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
1.1					

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CO_002-CCA-RISARDA--2932-2024	06/09/2024	INVIAS DT-RIS	Hojas de vida personal de interventoría
2024S-VRIS-066582	18/09/2024	INTERVENTOR	Aprobación Anexo 0 Póliza Cumplimiento Contrato Nro. 2932 de 2024
2024S-VRIS-070130	27/09/2024	INTERVENTOR	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-086988. Aprobación personal interventoría
2024S-VRIS-070296	30/09/2024	INTERVENTOR	Asignación de Interventorías al contrato de Obra No: 3325 de 2024
2024-10-23-CEHV-01	23/10/2024	INTERVENTOR	Equipo Mínimo.
2024-10-23-CEHV-02	23/10/2024	INTERVENTOR	Instalaciones provisionales
2024-10-23-CEHV-03	23/10/2024	INTERVENTOR	Ensayos de laboratorio
2024-10-23-CEHV-04	23/10/2024	INTERVENTOR	Programa Reincorporación Integral (PRI).
2024-10-23-CEHV-05	23/10/2024	INTERVENTOR	Entrega documentación.
2024-12-26-CEHV-01	26/12/2024	INTERVENTOR	Tránsito de vehículos, en obra recién fundada.

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		12	DE 20

INFORME 01

2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2932-2024		
CONTRATISTA:	CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS	NIT:	900.132.794-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VIAS A CARGO TERRITORIAL RISARALDA		
FECHA DE INICIO:	01/10/2024	Oficio No 2024S-VRIS-070297, DE FECHA 30/09/2024	Oficio No 2024S-VRIS-070297, DE FECHA 30/09/2024
VALOR INICIAL:	\$ 29.999.999,96		
VALOR ADICIONES:	\$ 0,00		
ADICIÓN 1:	\$ 0,00		
ADICIÓN 2:	\$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	\$ 29.999.999,96		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 0.00		
PLAZO INICIAL:	3 meses 11 DIAS, o hasta 31 /12/2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:	N/A		
SUSPENSIONES:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		13	DE 20

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
709724	2024	Nación-11	C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	29.999.999,96	\$ 0	29.999.999,96
			ACTA de costos No 01 (del 01 al 31 de octubre de 2024)		6.647.959,99	\$ 23.352.039,97
TOTAL				29.999.999,96	6.647.959,99	\$ 23.352.039,97

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		14	DE 20

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
ACTA de costos No 1 (del 01 al 31 de octubre de 2024)	5.586.521	\$ 1.061.438,99	\$ 6 .647.959,99
ACTA de costos No 02 (del 01 al 30 de noviembre de 2024)			
ACTA de costos No 03 (del 01 al 31 de diciembre de 2024)			

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor **No. 01 De fecha 05/11/2024** para el período 01 al 31 de octubre de 2024 el contrato reporta un avance de 22.15%

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada:	\$ 6 .647.959,99	22.15 %
Total, inversión ejecutada:	\$ 6 .647.959,99	22.15 %

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	15	DE	20

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		17	DE 20

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A para este periodo				

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CO_002-CCA-RISARDA--2932-2024	06/09/2024	INVIAS DT-RIS	Hojas de vida personal de interventoría
2024S-VRIS-066582	18/09/2024	INTERVENTOR	Aprobación Anexo 0 Póliza Cumplimiento Contrato Nro. 2932 de 2024
2024S-VRIS-070130	27/09/2024	INTERVENTOR	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-086988. Aprobación personal interventoría
2024S-VRIS-070296	30/09/2024	INTERVENTOR	Asignación de Interventorías al contrato de Obra No: 3325 de 2024
2024-10-23-CEHV-01	23/10/2024	INTERVENTOR	Equipo Mínimo.
2024-10-23-CEHV-02	23/10/2024	INTERVENTOR	Instalaciones provisionales
2024-10-23-CEHV-03	23/10/2024	INTERVENTOR	Ensayos de laboratorio
2024-10-23-CEHV-04	23/10/2024	INTERVENTOR	Programa Reincorporación Integral (PRI).
2024-10-23-CEHV-05	23/10/2024	INTERVENTOR	Entrega documentación.
2024-12-26-CEHV-01	26/12/2024	INTERVENTOR	Tránsito de vehículos, en obra recién fundada.

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		18	DE 20

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Informe 01 mes octubre de 2024, folio 45/48

- *En mes de octubre de 2024, se realizaron visitas para establecer el balance del contrato y evaluar los recursos y las metas físicas, en la vía terciaria: NAPOLES-LA SIRENA, también conocido como alto del cielo, en el Municipio de Santuario-Risaralda.*
- *El clima ha impedido la normal labor de los trabajos.*
- *Se coordina la socialización del proyecto, para noviembre de 2024.*
- *El PMT es fundamental, socializarlo con la comunidad, ya que debe hacerse cierre total de la vía.*

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Sin comentarios

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

El anticipo del contrato de obra, aun no se desembolsa

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	19	DE	20

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

El contrato de obra inicia con elaborar el PAGA, y ajustes a los estudios y diseños de acuerdo a la cartilla Colombia rural guía placa huella y obras menores.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Resolución/Solicitud de comisión	Fecha de Visita
Res 146 de 27 /09/2024	El 04/10/2024, se realiza visita al proyecto, Orden de inicio y reunión técnica inicial

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Sin comentarios


	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		20	DE 20

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

En los meses de enero, febrero y marzo de cada año, es difícil ir a visitar el proyecto, ya que no se tiene recursos de viáticos. Por otra parte, es difícil, la situación por combustible en los vehículos del INVIAS, y el tema de SOAT, TECNICO-MECANICA, algunos vehículos no se cuentan en estos meses.

Mediante resolución No 1366 de 25/04/2024, el INVIAS expide directriz de reducción de viáticos, esto es nefasto para el funcionario, quitando herramientas y desmotivando la supervisión a los proyectos.

Cordialmente,



ELKIN MEJIA CARCAMO

CC 72.198.373 DE BARRANQUILLA

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 GRADO 17

FECHA ELABORACION INFORME 11/11/2024
