



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - MECI

**INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE
CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA Y/O CONVENIOS**

Código: FO-PDA.2.1-5

Versión: 1

Fecha de Vigencia:
04/06/2015

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 23.

CONTRATO / CONVENIO No. 2000.13.12.005-2022

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DEL CONTRATO SUSCRITO COMO RESULTADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 2000.46.01.005-2022 CUYO OBJETO CONSISTE EN "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI, EN EL VALLE DEL CAUCA".

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 01 AL 31 DE MARZO DE 2025

Nombre del Supervisor: DIEGO JOSE CALDERON VILLANUEVA

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERGUACARI

MARZO 2025

FIRMA :


SUPERVISOR



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - MECI

**INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE
CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA Y/O CONVENIOS**

Código: FO-PDA.2.1-5

Versión: 1

Fecha de Vigencia:
04/06/2015

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 01 AL 31 DE MARZO DE 2025

INFORME No. 23.

CONTRATO / CONVENIO : 2000.13.12.005-2022

CONTENIDO

ÍTEM	DESCRIPCION	OBSERVACIONES	ACCIONES A SEGUIR
1	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
2	EJECUCION FINANCIERA		
3	CONTROL DE GARANTÍAS		
4	ASPECTOS TÉCNICOS		
5	SEGURIDAD SOCIAL		
6	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES		
7	REGISTRO FOTOGRAFICO		



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - MECI

Código: FO-PDA.2.1-5

Versión: 1

**INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE
CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA Y/O CONVENIOS**

Fecha de Vigencia:
04/06/2015

INFORME No. 23.	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 01 AL 31 DE MARZO DE 2025
PROYECTOS INCLUIDOS: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI.	
ESTUDIOS Y DISEÑOS	OBRA OTRO ☒ ESPECIFIQUE: INTERVENTORIA
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO / CONVENIO	
1.1 Identificación del Contrato / Convenio	
CONTRATO No.	2000.13.12.005-2022
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DEL CONTRATO SUSCRITO COMO RESULTADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 2000.46.01.005-2022 CUYO OBJETO CONSISTE EN "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI, EN EL VALLE DEL CAUCA".
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERGUACARI
REPRESENTANTE LEGAL:	EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
NIT	901.652.925-3
1.2. Plazos del Contrato / Convenio	
FECHA DEL CONTRATO/CONVENIO:	24 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTA DE INICIO	01 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	16 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE MARZO DE 2024
FECHA DEL ACTA DE SUSPENSIÓN:	27 DE JULIO DE 2023
FECHA DEL ACTA DE REINICIO:	10 DE ENERO DE 2024
PLAZO ADICIONAL ,OTRO SI NO, _:	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	22 DE FEBRERO DE 2026
1.3 Valor del Contrato / Convenio	
VALOR INICIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA/CONVENIO:	\$ 1.502.246.766,00
OTRO SÍ EN VALOR :	\$ 131.126.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO	\$ 1.633.372.766,00
ACTA DE COMITÉ DIRECTIVO Y FECHA	
No. de CDR	13041 del 10/08/2022
CARTA DE VIABILIZACION DEL MVCT Y FECHA (si aplica)	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - MECI

Código: FO-PDA.2.1-5

Versión: 1

Fecha de Vigencia:
04/06/2015

**INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE
CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA Y/O CONVENIOS**

INFORME No. 23.

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 01 AL 31 DE MARZO
DE 2025

2. EJECUCION FINANCIERA

Concepto	Fecha Acta (dd/mm/aa)	Valor del Acta	% Ejecución	Amortización Anticipo	Valor Total Pagado	Estado
Anticipo (30%)	5-dic.-2022		0%	\$ -	\$ 450.674.029,80	Pagado
Acta No. 1	23-jun.-2023	\$ 427.238.980,00	28,44%	\$ 128.171.694,00	\$ 299.067.286,00	Pagado
Acta No. 2	14-jul.-2023	\$ 45.217.628,00	3,01%	\$ 13.565.288,00	\$ 31.652.340,00	Pagado
Acta No. 3	30-mar.-2024	\$ 72.195.076,00	4,42%	\$ 21.658.523,00	\$ 50.536.553,00	Pagado
Acta No. 4	14-jun.-2024	\$ 18.783.787,00	1.15%	\$ 5.635.136,00	\$ 13.148.651,00	Pagado
Acta No. 5	20-jun.-2024	\$ 376.165.748,00	23.03%	\$ 112.849.724,00	\$ 263.316.024,00	Pagado
Acta No. 6	16-ago.-2024	\$ 30.870.745,00	1.89%	\$ 9.261.224,00	\$ 21.609.521,00	Pagado
Acta No. 7	13-sep.-2024	\$ 19.658.237,00	1.2%	\$ 5.897.471,00	\$ 13.760.766,00	Pagado
Acta No. 8	30-sep.-2024	\$ 35.139.507,00	2.16%	\$ 10.541.852,00	\$ 24.597.655,00	Pagado
Acta No. 9	12-nov.-2024	\$ 62.044.616,00	3,8%	\$ 18.613.385,00	\$ 43.431.231,00	Pagado
Acta No. 10	2-dic.-2024	\$ 105.486.042,00	6,46%	\$ 31.645.813,00	\$ 73.840.229,00	Pagado
Acta No. 11	1-feb.-2025	\$ 35.207.836,00	2.16%	\$ 10.562.351,00	\$ 24.645.485,00	Pagado
Acta No. 12	13-mar.-2025	\$ 117.987.100,00	7,22%	\$ 35.396.130,00	\$ 82.590.970,00	Pagado
TOTALES		\$1.025.269.708	82.41%	\$ 403.798.591,00	\$1.392.870.741	Pagado

De acuerdo a lo anterior, el presente informe describe las actividades de supervisión efectuadas desde el 01/03/2024 hasta el 31/03/2024, de acuerdo al Manual del Interventoría de Vallecaucana de Aguas SA ESP



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - MECI

**INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE
CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA Y/O CONVENIOS**

Código: FO-PDA.2.1-5

Versión: 1

Fecha de Vigencia:
04/06/2015

INFORME No. 23.

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 01 AL 31
DE MARZO DE 2025

3. CONTROL DE GARANTIAS

Amparo	Valor Asegurado	No. Poliza	Compañía Aseguradora	Vigencia		Observaciones
				Desde	Hasta	
Cumplimiento	\$ 150.224.676,60	C-100050628	SEGUROS MUNDIAL	24-nov.-2022	24-sep.-2024	Resolución de Aprobación No. 2000.37.223-2022 del 30/11/2022
Cumplimiento (Suspensión)	\$ 150.224.676,60	C-100050628 (Anexo No. 1)	SEGUROS MUNDIAL	27-jul.-2023	30-nov.-2024	Resolución de Aprobación No. 2000.45.03.201-2023 del 10/08/2023
Cumplimiento (Ampliación No. 1 Suspensión)	\$ 150.224.676,60	C-100050628 (Anexo No. 2)	SEGUROS MUNDIAL	27-sep.-2023	31-dic.-2024	Resolución de Aprobación No. 2000.45.03.266-2023 del 05/10/2023
Cumplimiento (Ampliación No. 2 Suspensión)	\$ 150.224.677,60	C-100050628 (Anexo No. 3)	SEGUROS MUNDIAL	27-oct.-2023	31-ene.-2025	Resolución de Aprobación No. 2000.45.03.302-2023 del 10/11/2023
Cumplimiento (Ampliación No. 3 Suspensión)	\$ 150.224.677,60	C-100050628 (Anexo No. 4)	SEGUROS MUNDIAL	27-nov.-2023	14-mar.-2025	Resolución de Aprobación No. 2000.45.03.332-2023 del 12/12/2023
Cumplimiento (Reinicio)	\$ 150.224.677,60	C-100050628 (Anexo No. 5)	SEGUROS MUNDIAL	10-ene.-2024	14-mar.-2025	Resolución de Aprobación No. 2000.45.03.037-2024 del 07/02/2024
Adicional en valor	\$ 163.337.276,00	C-100050628 (Anexo No. 6)	SEGUROS MUNDIAL	5-feb.-2024	14-mar.-2025	
Plazo Adicional	\$ 163.337.276,00	C-100050628 (Anexo No. 7)	SEGUROS MUNDIAL	6-sep.-2024	15-oct.-2025	
Plazo Adicional	\$ 163.337.276,00	C-100050628 (Anexo No. 8)	SEGUROS MUNDIAL	25-abr.-2025	22-ago.-2026	
Otro Si 3						
Buen Manejo del Anticipo	\$ 450.674.029,80	C-100050628	SEGUROS MUNDIAL	24-nov.-2022	24-sep.-2024	Resolución de Aprobación No. 2000.37.223-2022 del 30/11/2022
Buen Manejo del Anticipo (Suspensión)	\$ 450.674.029,80	C-100050628 (Anexo No. 1)	SEGUROS MUNDIAL	27-jul.-2023	30-nov.-2024	Resolución de Aprobación No. 2000.45.03.201-2023 del 10/08/2023
Buen Manejo del Anticipo (Ampliación No. 1 Suspensión)	\$ 450.674.029,80	C-100050628 (Anexo No. 2)	SEGUROS MUNDIAL	27-sep.-2023	31-dic.-2024	Resolución de Aprobación No. 2000.45.03.266-2023 del 05/10/2023
Buen Manejo del Anticipo (Ampliación No. 2 Suspensión)	\$ 450.674.029,80	C-100050628 (Anexo No. 3)	SEGUROS MUNDIAL	27-oct.-2023	31-ene.-2025	Resolución de Aprobación No. 2000.45.03.302-2023 del 10/11/2023
Buen Manejo del Anticipo (Ampliación No. 3 Suspensión)	\$ 450.674.029,80	C-100050628 (Anexo No. 4)	SEGUROS MUNDIAL	27-nov.-2023	14-mar.-2025	Resolución de Aprobación No. 2000.45.03.332-2023 del 12/12/2023
Buen Manejo del Anticipo (Reinicio)	\$ 450.674.029,80	C-100050628 (Anexo No. 5)	SEGUROS MUNDIAL	10-ene.-2024	14-mar.-2025	Resolución de Aprobación No. 2000.45.03.037-2024 del 07/02/2024
Adicional en valor	\$ 450.674.029,80	C-100050628 (Anexo No. 6)	SEGUROS MUNDIAL	5-feb.-2024	15-mar.-2025	
Plazo Adicional	\$ 450.674.029,80	C-100050628 (Anexo No. 7)	SEGUROS MUNDIAL	6-sep.-2024	15-oct.-2025	
Plazo Adicional	\$ 450.674.029,80	C-100050628 (Anexo No. 8)	SEGUROS MUNDIAL	25-mar.-2025	22-ago.-2026	
Salarios y Prestaciones Sociales	\$ 75.112.338,30	C-100050628	SEGUROS MUNDIAL	24-nov.-2022	24-mar.-2027	Resolución de Aprobación No. 2000.37.223-2022 del 30/11/2022
Salarios y Prestaciones Sociales (Suspensión)	\$ 75.112.338,30	C-100050628 (Anexo No. 1)	SEGUROS MUNDIAL	27-jul.-2023	31-may.-2027	Resolución de Aprobación No. 2000.45.03.201-2023 del 10/08/2023

INFORME No. 23.

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 01 AL 31
DE MARZO DE 2025

Salarios y Prestaciones Sociales (Ampliación No. 1 Suspensión)	\$ 75.112.338,30	C-100050628 (Anexo No. 2)	SEGUROS MUNDIAL	27-sep.-2023	30-jun.-2027	Resolución de Aprobación No. 2000.45.03.266-2023 del 05/10/2023
Salarios y Prestaciones Sociales (Ampliación No. 2 Suspensión)	\$ 75.112.338,30	C-100050628 (Anexo No. 3)	SEGUROS MUNDIAL	27-oct.-2023	31-jul.-2027	Resolución de Aprobación No. 2000.45.03.302-2023 del 10/11/2023
Salarios y Prestaciones Sociales (Ampliación No. 3 Suspensión)	\$ 75.112.338,30	C-100050628 (Anexo No. 4)	SEGUROS MUNDIAL	27-nov.-2023	14-sep.-2027	Resolución de Aprobación No. 2000.45.03.332-2023 del 12/12/2023
Salarios y Prestaciones Sociales (Reinicio)	\$ 75.112.338,30	C-100050628 (Anexo No. 5)	SEGUROS MUNDIAL	10-ene.-2024	14-sep.-2027	Resolución de Aprobación No. 2000.45.03.037-2024 del 07/02/2024
Adicional en valor	\$ 81.668.638,00	C-100050628 (Anexo No. 6)	SEGUROS MUNDIAL	5-feb.-2024	15-sep.-2027	
Plazo Adicional	\$ 81.668.638,00	C-100050628 (Anexo No. 7)	SEGUROS MUNDIAL	6-sep.-2024	15-sep.-2028	
Plazo Adicional	\$ 81.668.638,00	C-100050628 (Anexo No. 8)	SEGUROS MUNDIAL	25-mar.-2025	22-feb.-2029	
Otro Si 3						
Calidad del Servicio	\$ 450.674.029,80	C-100050628	SEGUROS MUNDIAL	24-nov.-2022	24-mar.-2029	Resolución de Aprobación No. 2000.37.223-2022 del 30/11/2022
Calidad del Servicio (Suspensión)	\$ 450.674.029,80	C-100050628 (Anexo No. 1)	SEGUROS MUNDIAL	31-may.-2024	31-may.-2029	Resolución de Aprobación No. 2000.45.03.201-2023 del 10/08/2023
Calidad del Servicio (Ampliación No. 1 Suspensión)	\$ 450.674.029,80	C-100050628 (Anexo No. 2)	SEGUROS MUNDIAL	30-jun.-2024	30-jun.-2029	Resolución de Aprobación No. 2000.45.03.266-2023 del 05/10/2023
Calidad del Servicio (Ampliación No. 2 Suspensión)	\$ 450.674.029,80	C-100050628 (Anexo No. 3)	SEGUROS MUNDIAL	31-jul.-2024	31-jul.-2029	Resolución de Aprobación No. 2000.45.03.302-2023 del 10/11/2023
Calidad del Servicio (Ampliación No. 3 Suspensión)	\$ 450.674.029,80	C-100050628 (Anexo No. 4)	SEGUROS MUNDIAL	14-sep.-2024	14-sep.-2029	Resolución de Aprobación No. 2000.45.03.332-2023 del 12/12/2023
Calidad del Servicio (Reinicio)	\$ 450.674.029,80	C-100050628 (Anexo No. 5)	SEGUROS MUNDIAL	14-sep.-2024	14-sep.-2029	Resolución de Aprobación No. 2000.45.03.037-2024 del 07/02/2024
Adicional en valor	\$ 490.011.829,00	C-100050628 (Anexo No. 6)	SEGUROS MUNDIAL	15-sep.-2024	15-sep.-2029	
Plazo Adicional	\$ 490.011.829,00	C-100050628 (Anexo No. 7)	SEGUROS MUNDIAL	15-abr.-2024	15-abr.-2030	
Plazo Adicional	\$ 490.011.829,00	C-100050628 (Anexo No. 8)	SEGUROS MUNDIAL	22-feb.-2026	22-feb.-2031	
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 348.000.000,00	C-100012719	SEGUROS MUNDIAL	24-nov.-2022	24-mar.-2024	Resolución de Aprobación No. 2000.37.223-2022 del 30/11/2022
Responsabilidad Civil Extracontractual (Suspensión)	\$ 348.000.000,00	C-100012719 (Anexo No. 1)	SEGUROS MUNDIAL	24-nov.-2022	31-may.-2024	Resolución de Aprobación No. 2000.45.03.201-2023 del 10/08/2023
Responsabilidad Civil Extracontractual (Ampliación No. 1 Suspensión)	\$ 348.000.000,00	C-100012719 (Anexo No. 2)	SEGUROS MUNDIAL	24-nov.-2022	30-jun.-2024	Resolución de Aprobación No. 2000.45.03.266-2023 del 05/10/2023
Responsabilidad Civil Extracontractual (Ampliación No. 2 Suspensión)	\$ 348.000.000,00	C-100012719 (Anexo No. 3)	SEGUROS MUNDIAL	24-nov.-2022	31-jul.-2024	Resolución de Aprobación No. 2000.45.03.302-2023 del 10/11/2023



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - MECI

**INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE
CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA Y/O CONVENIOS**

Código: FO-PDA.2.1-5

Versión: 1

Fecha de Vigencia:
04/06/2015

INFORME No. 23.					PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 01 AL 31 DE MARZO DE 2025	
Responsabilidad Civil Extracontractual (Ampliación No. 3 Suspensión)	\$ 348.000.000,00	C-100012719 (Anexo No. 4)	SEGUROS MUNDIAL	24-nov.-2022	14-sep.-2024	Resolución de Aprobación No. 2000.45.03.332-2023 del 12/12/2023
Responsabilidad Civil Extracontractual (Reinicio)	\$ 390.000.000,00	C-100012719 (Anexo No. 5)	SEGUROS MUNDIAL	24-nov.-2022	14-sep.-2024	Resolución de Aprobación No. 2000.45.03.037-2024 del 07/02/2024
Adicional en valor	\$ 390.000.000,00	C-100012719 (Anexo No. 6)	SEGUROS MUNDIAL	25-nov.-2022	14-sep.-2024	
Plazo Adicional	\$ 390.000.000,00	C-100012719 (Anexo No. 7)	SEGUROS MUNDIAL	24-nov.-2022	15-abr.-2025	
Plazo Adicional	\$ 390.000.000,00	C-100012719 (Anexo No. 8)	SEGUROS MUNDIAL	24-nov.-2022	22-feb.-2026	
Otro Si 2						
Otro Si 3						

INFORME No.: 23.

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 01 AL 31 DE MARZO DE 2025

4. ASPECTOS TÉCNICOS

4.1 Reporte de informes

Informe

TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA ALBANIA.

Durante el presente periodo, se desencofra por parte del constructor los muros fundidos en sus 2/3 partes y se procede a encofrar el último tercio de estos muros perimetrales y el muro central, igualmente se encofra para la fundición de los muros perimetrales de la caja de salida, también se realiza la instalación de la cinta PVC. También se procede a construir la formaleta en madera para la construcción de las vigas superiores y proceder a instalación de los aceros de refuerzo de la losa de cubierta.

Se trabaja en la adecuación del FILTRO N°. 1, componente eléctrico y la caseta de sopladores.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE GUACARÍ.

En este sistema de tratamiento de agua potable se encuentran optimizados las estructuras de los sedimentadores 2 y 3, los cuales se encuentran en servicio.

La Caseta Eléctrica se encuentra en proceso de construcción, el constructor se encuentra en proceso de armado de hierros y las excavaciones pendientes para la construcción de las vigas de cimentación, se procede a rellenar las áreas perimetrales de las zapatas, igualmente se instala la mampostería estructural. Se le solicitó a la interventoría coordinar una reunión entre el constructor y los técnicos de la empresa Acuavalle con el propósito de coordinar las actividades a realizar en la caseta eléctrica y evitar se presenten inconvenientes en el proceso de tratamiento y distribución de agua durante el proceso de construcción.

SEDIMENTADOR N°. 3 y FLOCULADOR N°. 3, se intervienen en el presente periodo.

SOPLADORES: se trabaja en la construcción de la caseta de sopladores

ACTIVIDADES EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

Consecución de los permisos (servidumbres, con el ingenio Pichichí y la familia Blum), para la instalación de la tubería de conducción que va hacia Guacarí y Ginebra, respectivamente.

Localización y replanteo de las redes de conducción desde Puente Rojo hacia la estructura de captación.

El constructor de la obra Redes y Ptaps del Valle, nuevamente ha radicado la solicitud ante las secretarías de obras de los municipios de Guacarí y Ginebra, las solicitudes de rotura de pavimento en los sitios que se han identificado que se deben intervenir para la instalación de la tubería.

La Línea de Aducción, Desarenador y la Línea de Conducción desde la Bocatoma hasta la CADICA, son actividades que se han tenido que aplazar debido a las dificultades que se presentó inicialmente con las comunidades ubicadas en la parte alta de Puente Rojo asentadas sobre el río Guabas y los representantes de Pro-territorio, situación que solo se superó a finales del año 2024.

sopladores

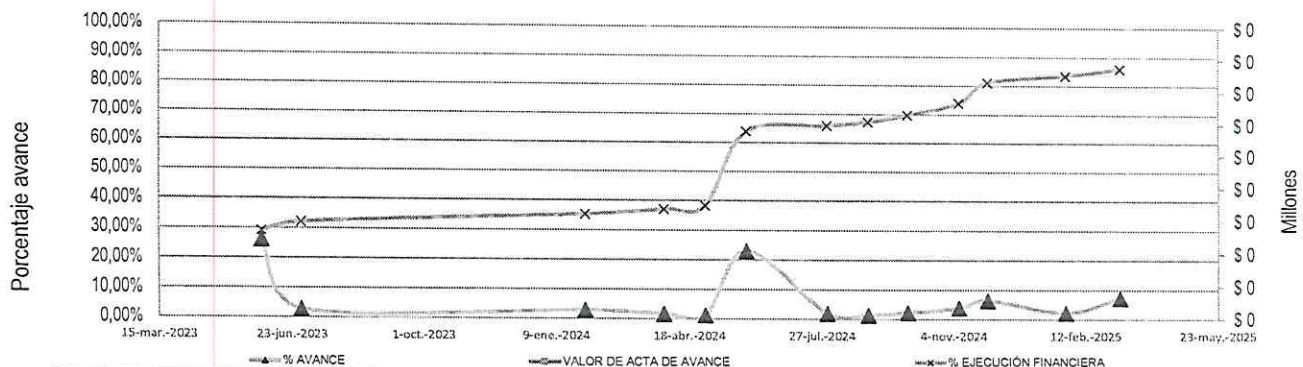
Ficha de Seguimiento
N.A.

Fecha de Corte

4.3 Avance de ejecución

4.4 Cronograma

ACTA	FECHA (dd/mm/aa)	% AVANCE	VALOR DE ACTA DE AVANCE	% EJECUCIÓN FINANCIERA
1	31-may.-2023	26,16%	\$ 8.371.066.482,00	26,16%
2	30-jun.-2023	2,77%	\$ 886.015.856,00	28,93%
3	31-ene.-2024	2,84%	\$ 907.712.127,00	31,77%
4	30-mar.-2024	1,57%	\$ 503.892.952,00	33,34%
5	30-abr.-2024	1,15%	\$ 369.286.058,00	34,49%
6	31-may.-2024	23,03%	\$ 7.371.115.364,00	57,52%
7	31-jul.-2024	1,89%	\$ 604.131.566,00	59,41%
8	31-ago.-2024	1,20%	\$ 385.455.620,00	60,61%
9	30-sep.-2024	2,15%	\$ 689.009.943,00	62,77%
10	8-nov.-2024	3,80%	\$ 1.216.561.088,00	66,57%
11	30-nov.-2024	6,40%	\$ 2.068.353.769,00	73,03%
12	28-ene.-2025	2,16%	\$ 690.349.724,00	75,19%
13	10-mar.-2025	7,23%	\$ 2.313.472.543,00	77,35%
				82,42%





SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - MECI

Código: FO-PDA.2.1-5

Versión: 1

**INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE
CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA Y/O CONVENIOS**

Fecha de Vigencia:
04/06/2015

INFORME No. 23.

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 01 AL 31 DE MARZO DE 2025

5. SEGURIDAD SOCIAL

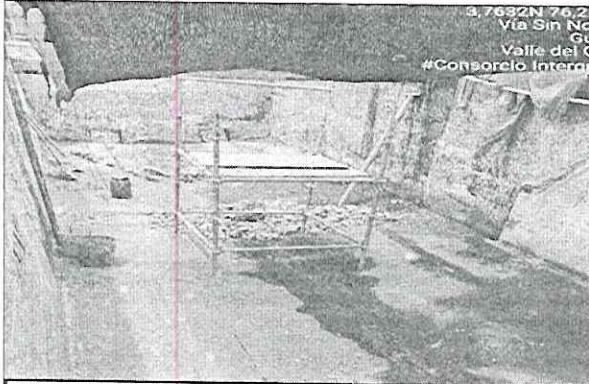
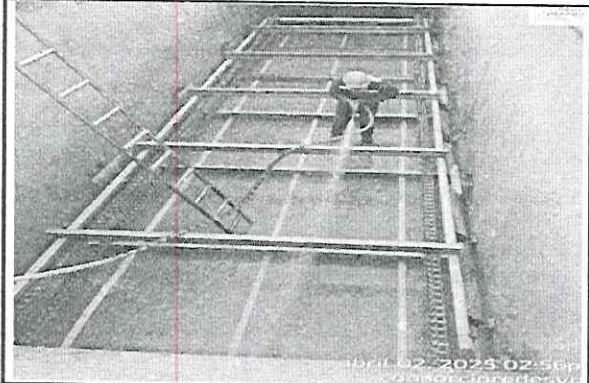
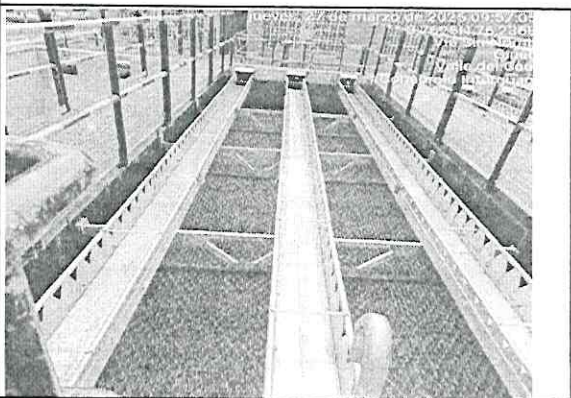
La interventoría avala el certificado del revisor fiscal, contadora Diana Sofía Bolaños O, acreditada con su tarjeta profesional 186062-T, con relación al pago de los aportes al sistema de seguridad social por parte del CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE. Correspondiente al periodo del presente informe, soportado con las respectivas planillas de seguridad social.

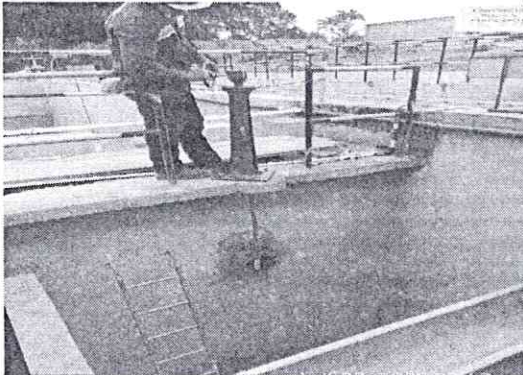
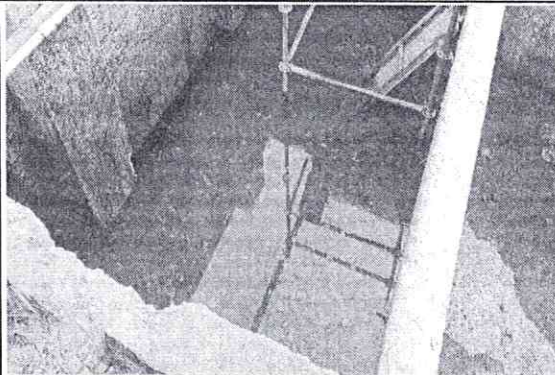
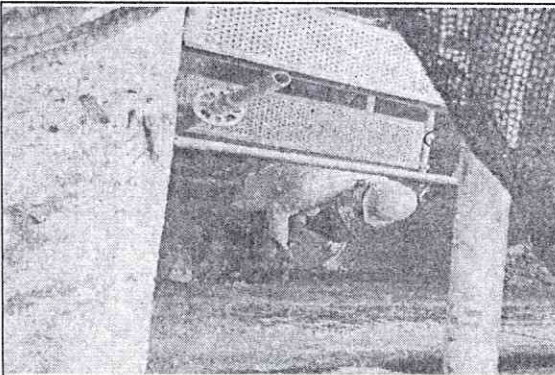
6. CONCLUSIONES

La interventoría CONSORCIO INTERGUACARÍ presenta en su informe mensual de Abril del 2025, acompanyado por la certificación expedida el 07 de Abril del año en curso, por el contador público Eduardo Ali Alban Vargas, con Tarjeta Profesional T.P.5063T.


Firma del Supervisor Contrato / Convenio No. 2000.13.12.005-2022
Área Técnica - Vallecaucana de Aguas S.A. ESP.

Revisado por: Diego Jose Calderon Villanueva - Director Técnico

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI	Código: FO-PDA.2.1-5
		INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA Y/O CONVENIOS	Versión: 1
			Fecha de Vigencia: 04/06/2015
INFORME No. 23.	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 01 AL 31 DE MARZO DE 2025		
7. REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
ESCARIFICACIÓN MUROS SEDIMENTADOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE GINEBRA		ALISTAMIENTO PARA FUNDICION LOSA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA ALBANIA	
			
INSTALACION HERRAJE PARA COLOCACION DEL EQUIPO BARRE LOD		INSTALACION CANALETA DE ACERO PARA RECOLECCION AGUA SEDIMENTADA	
			
NIVELACION DE L MONTAJE A INSTALAR EN SEDIMENTADORES		SEDIMENTADOR OPTIMIZADO PLANTA DE TRATAMIENTO DE GUACARÍ	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA Y/O CONVENIOS	Código: FO-PDA.2.1-5 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/06/2015
INFORME No. 23.	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 01 AL 31 DE MARZO DE 2025	
7. REGISTRO FOTOGRAFICO		
		
COLOCACION VALVULAS EN LOS SEDIMENTADORES	CAJA VALVULAS DE DESAGUES QUE SE DEBE OPTIMIZAR	
		
CONSTRUCCIÓN CASETA ELÉCTRICA PLANTA DE TRATAMIENTO GUACARÍ	ADECUACION DRENAJE SEDIMENTADORES	
