

**INFORME DE
SUPERVISIÓN
DE OBRA
N°2**



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2



CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
PERIODO DE INFORME: DEL 04/01/2025 AL 04/04/2025

PROYECTO CÓDIGO BPIN No. 2023006860290

**"MEJORAMIENTO D AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL
BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL INSTITUCION DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO"**

**DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
ABRIL 2025**



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2



CONTENIDO

1. INTRODUCCION.
2. LOCALIZACION DEL PROYECTO.
3. INFORMACION ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA.
4. REGISTRÓ FOTOGRÁFICO.
5. CONCLUSIONES.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2



1. INTRODUCCIÓN

El CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL adelanta el proyecto identificado con código BPIN No. 2023006860290, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DAMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL INSTITUCION DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" por un valor inicial de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 368.748.657,53) MDA/CTE, con el fin de llevar a cabo el mejoramiento de la infraestructura educativa del CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL.

El mejoramiento de la infraestructura del CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL surge a raíz de la necesidad de brindar espacios dignos donde se puedan realizar diferentes actividades académicas y lúdicas de la institución, ampliando de esta manera las oportunidades educativas para comunidades desfavorecidas.

En cumplimiento a mis obligaciones como supervisor me permito exponer el estado administrativo, técnico y financiero en el que se encuentra actualmente el proyecto.

En la actualidad el contrato de obra se encuentra terminado, tal como consta en el Acta de Recibo Final de fecha 20/03/2025, de igual manera se hizo terminación del contrato de interventoría con fecha 04/04/2025.

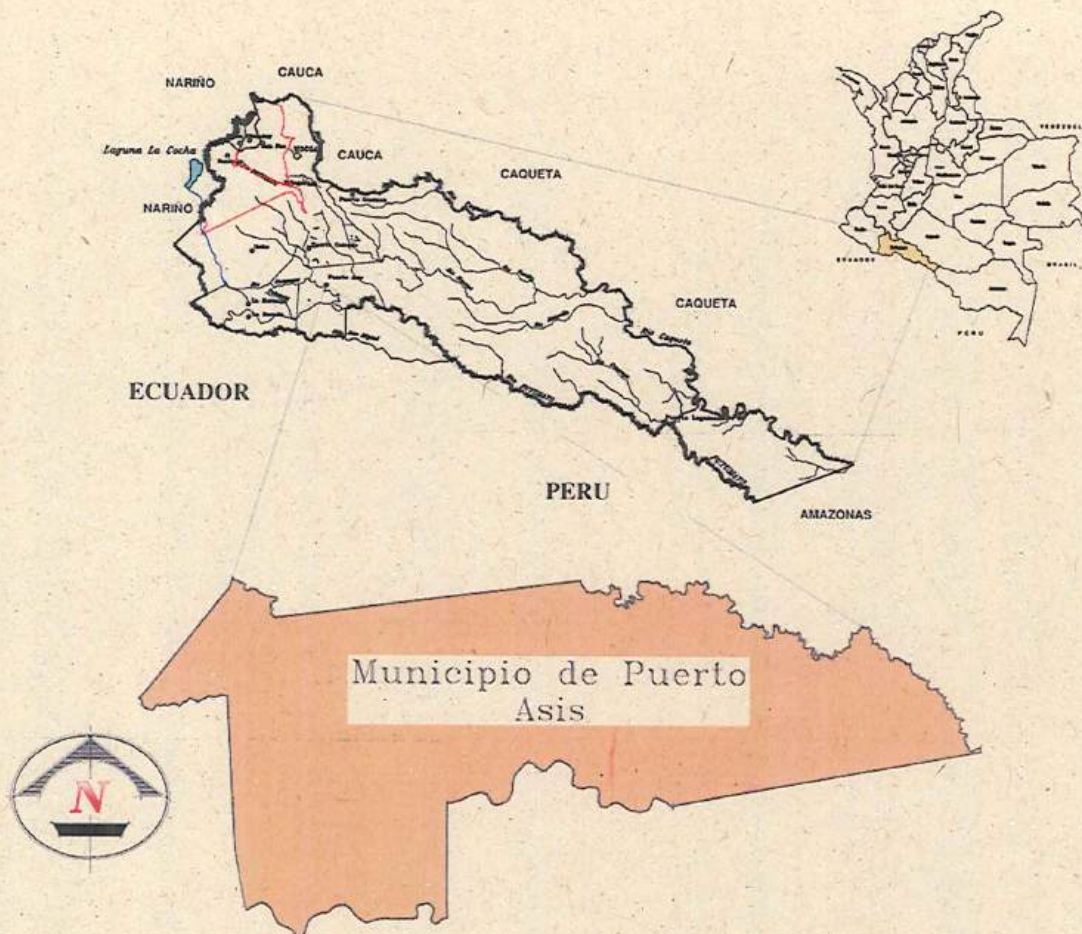


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2



2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto identificado con código BPIN No. 2023006860290 se localiza en la Vereda Buenavista en del Municipio de Puerto Asís – Putumayo. En las siguientes imágenes se aprecia su ubicación exacta:





REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2



3. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA TÉCNICA Y FINANCIERA

3.1. ASPECTO ADMINISTRATIVO, GENERALIDADES DEL PROYECTO.

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO			
CÓDIGO BPIN:	2023006860290		
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO D AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL INSTITUCION DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
EJECUTOR:	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA	NIT	846003704-1
	R.L. HUMBERTO ERNEY PIAGUAJE	C.C.	18.124.339
VALOR INICIAL DEL PROYECTO:	TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 368.748.657,53) MDA/CTE		
PLAZO INICIAL DEL PROYECTO:	DOS (02) MESES		



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2

PRÓRROGA No. 1:	UN (01) MES
PLAZO TOTAL ACUMULADO:	TRES (03) MESES

Para dar cumplimiento al proyecto identificado con código BPIN No. 2023006860290, el CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL se encuentra ejecutando el Contrato de Obra Pública No 004-2024 que se suscribió con la empresa SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S. Nit. 900912227-3, representada legalmente por LEYDY YULIETH TEJADA, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.123.207.998 de Puerto Asís (Putumayo) por un valor de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS (\$ 341.433.942,16) MDA/CTE y un plazo inicial de DOS (02) meses, bajo las siguientes condiciones:

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR
1.0	PRELIMINARES				
1.1	Localización y Replanteo	M2	347,58	\$ 2.303	\$ 800.320,14
1.2	Cerramiento en Polisombra	M2	253,60	\$ 17.100	\$ 4.336.560,94
1.3	Desmante de Cubierta y Estructura Portante	M2	516,13	\$ 20.277	\$ 10.465.779,50
				Sub-total	\$ 15.602.660,57
2.0	ESTRUCTURAS METÁLICAS				
2.1	Estructura metálica en Acero ASTM - A572 (incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje)	KG	1373,36	\$ 29.784	\$ 40.903.909,15
2.2	Estructura metálica en Acero ASTM - A36 (Incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje)	KG	2772,78	\$ 28.944	\$ 80.255.003,14
2.3	Templetes, Barra Lisa de 1/2", Incluye Pintura Anticorrosiva y Esmalte	M	65,82	\$ 47.896	\$ 3.152.503,71
2.4	Contravientos, Barra Lisa de 1/2", Incluye Pintura Anticorrosiva y Esmalte	M	137,93	\$ 49.759	\$ 6.863.295,99
				Sub-total	\$ 131.174.711,99
3.0	CUBIERTA				
3.1	Suministro e Instalación de Teja en Zinc Arquitectónico Cal 30	M2	516,13	\$ 84.015	\$ 43.362.779,52
3.2	Suministro e Instalación de Canal en lamina galvanizada cal. 20 (incluye: accesorios de instalación y bajante)	M	98,29	\$ 174.316	\$ 17.132.608,11
3.3	Suministro e instalación caballete en Zinc Cal.30	M	48,50	\$ 81.431	\$ 3.949.404,28
				Sub-total	\$ 64.444.791,91
4.0	REPELLO, ESTUCO Y PINTURA				
4.1	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	55,16	\$ 47.518	\$ 2.621.248,49
4.2	Estuco Plastico para muros interiores y exteriores	M2	55,16	\$ 27.347	\$ 1.508.538,54
4.3	Aplicación de Pintura TIPO I para interiores	M2	532,58	\$ 26.464	\$ 14.094.069,80
4.4	Aplicación de Pintura TIPO I para exteriores	M2	168,62	\$ 28.606	\$ 4.823.422,08
4.5	Aplicación de Pintura 3 en 1 para carpintería metálica	M2	95,45	\$ 37.199	\$ 3.550.757,98
				Sub-total	\$ 26.598.036,89
5.0	CONCRETOS				
5.1	Vigas Cintas (0,15Mx20M) en concreto 21MPa (incluye acero de refuerzo según diseños)	M3	1,96	\$ 2.836.742	\$ 5.560.013,46
				Sub-total	\$ 5.560.013,46
6.0	ASEO				
6.1	ASEO GENERAL	M2	698,41	\$ 1.422	\$ 993.075,67
				Sub-total	\$ 993.075,67



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2

TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 244.373.290,49
ADMINISTRACION	29,00%	\$ 70.868.254,24
UTILIDAD	5,00%	\$ 12.218.664,52
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 2.443.732,90
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 85.530.651,67
PMA		\$ 11.530.000,00
COSTO TOTAL DE LA OBRA		\$ 341.433.942,16

El día 04 de MARZO de 2025, se aprueba Acta de Mayores y Menores Cantidades de Obra, mediante la cual se actualiza las condiciones iniciales del contrato, quedando de la siguiente manera:

PRESUPUESTO OFICIAL CANTIDADES CONTRATADAS						CANTIDADES MODIFICADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1.0	PRELIMINARES								
1.1	Localización y Replanteo	M2	347,58	\$ 2.303	\$ 800.320,14	0,00	\$ 0,00	347,58	\$ 800.320,14
1.2	Cerramiento en Polisombra	M2	253,60	\$ 17.100	\$ 4.336.560,94	0,00	\$ 0,00	253,60	\$ 4.336.560,94
1.3	Desmante de Cubierta y Estructura Portante	M2	516,13	\$ 20.277	\$ 10.465.779,50	0,00	\$ 0,00	516,13	\$ 10.465.779,50
				Sub-total	\$ 15.602.660,57		\$ 0,00		\$ 15.602.660,57
2.0	ESTRUCTURAS METÁLICAS								
2.1	Estructura metalica en Acero ASTM - A572 (Incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	KG	1373,36	\$ 29.784	\$ 40.903.909,15	74,95	\$ 2.232.177,42	1448,30	\$ 43.136.086,57
2.2	Estructura metalica en Acero ASTM - A36 (Incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	KG	2772,78	\$ 28.944	\$ 80.255.003,14	91,78	\$ 2.656.350,95	2864,56	\$ 82.911.354,09
2.3	Templetes, Barra Lisa de 1/2", Incluye Pintura Anticorrosiva y Esmalte	M	65,82	\$ 47.896	\$ 3.152.503,71	-65,82	-\$ 3.152.503,71	0,00	\$ 0,00
2.4	Contravientos, Barra Lisa de 1/2", Incluye Pintura Anticorrosiva y Esmalte	M	137,93	\$ 49.759	\$ 6.863.295,99	-137,93	-\$ 6.863.295,99	0,00	\$ 0,00
				Sub-total	\$ 131.174.711,99		-\$ 5.127.271,33		\$ 126.047.440,66
3.0	CUBIERTA								
3.1	Suministro e Instalación de Teja en Zinc Arquitectónico Cal 30	M2	516,13	\$ 84.015	\$ 43.362.779,52	17,03	\$ 1.430.524,69	533,16	\$ 44.793.304,21
3.2	Suministro e Instalación de Canal en lamina galvanizada cal. 20 (Incluye: accesorios de instalación y bajante)	M	98,29	\$ 174.316	\$ 17.132.608,11	4,20	\$ 732.125,49	102,49	\$ 17.864.733,61
3.3	Suministro e instalación caballete en Zinc Cal.30	M	48,50	\$ 81.431	\$ 3.949.404,28	1,60	\$ 130.289,63	50,10	\$ 4.079.693,90
				Sub-total	\$ 64.444.791,91		\$ 2.292.939,80		\$ 66.737.731,72
4.0	REPELLO, ESTUCO Y PINTURA								
4.1	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	55,16	\$ 47.518	\$ 2.621.248,49	0,00	\$ 0,00	55,16	\$ 2.621.248,49
4.2	Estuco Plastico para muros interiores y exteriores	M2	55,16	\$ 27.347	\$ 1.508.538,54	0,00	\$ 0,00	55,16	\$ 1.508.538,54
4.3	Aplicación de Pintura TIPO I para interiores	M2	532,58	\$ 26.464	\$ 14.094.069,80	0,00	\$ 0,00	532,58	\$ 14.094.069,80
4.4	Aplicación de Pintura TIPO I para exteriores	M2	168,62	\$ 28.606	\$ 4.823.422,08	0,00	\$ 0,00	168,62	\$ 4.823.422,08
4.5	Aplicación de Pintura 3 en 1 para carpintería metálica	M2	95,45	\$ 37.199	\$ 3.550.757,98	0,00	\$ 0,00	95,45	\$ 3.550.757,98
				Sub-total	\$ 26.598.036,89		\$ 0,00		\$ 26.598.036,89
5.0	CONCRETOS								
5.1	Vigas Cintas (0,15Mx20M) en concreto 21MPa (Incluye acero de refuerzo según diseños)	M3	1,96	\$ 2.836.742	\$ 5.560.013,46	1,18	\$ 3.333.171,33	3,14	\$ 8.893.184,79
				Sub-total	\$ 5.560.013,46		\$ 3.333.171,33		\$ 8.893.184,79



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2

6.0	ASEO								
6.1	ASEO GENERAL	M2	698,41	\$ 1.422	\$ 993.075,67	-350,82	-\$ 498.839,80	347,58	\$ 494.235,87
Sub-total					\$ 993.075,67		-\$ 498.839,80		\$ 494.235,87

TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 244.373.290,48	\$ 244.373.290,49
ADMINISTRACION	29,00%	\$ 70.868.254,24	\$ 70.868.254,24
UTILIDAD	5,00%	\$ 12.218.664,52	\$ 12.218.664,52
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 2.443.732,90	\$ 2.443.732,90
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 85.530.651,67	\$ 85.530.651,67
PMA		\$ 11.530.000,00	\$ 11.530.000,00
COSTO TOTAL DE LA OBRA		\$ 341.433.942,16	\$ 341.433.942,16

Como se puede evidenciar, la modificación planteada no afecta ni el objeto ni el valor del contrato.

De igual manera, el CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL se encuentra ejecutando el Contrato de Interventoría No 003-2024 que se suscribió con la empresa INCAM S.A.S ZOMAC NIT. 901.310.022-0, representada legalmente por KARINA LILIBETH PÉREZ PASCUAZA, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.006.962.043 de Puerto Caicedo (Putumayo), por un valor inicial de VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 24.457.143,58) MDA/CTE.E y un plazo inicial de DOS (02) meses.

Al día del presente informe tenemos las siguientes condiciones en el Contra de Obra Pública No. 004-2024:

CONTRATO DE OBRA No. 004-2024			
Objeto del Contrato	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
Contratista:	SOLUCIONES CIVILES J.M S.A.S. R.L. LEYDY YULIETH TEJADA	NIT. C.C.	900912227-3 1.123.207.998 de Puerto Asís (Putumayo)
Interventor:	INCAM S.A.S ZOMAC R.L. KARINA LILIBETH PÉREZ PASCUAZA	NIT. C.C.	901310022-0 1.006.962.043 de Puerto Caicedo (Putumayo)
Supervisor del Contrato:	HUMBERTO ERNEY PIAGUAJE	C.C.	18.124.339
Valor total del contrato:	TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS (\$ 341.433.942,16) MDA/CTE		
Plazo Inicial del Contrato:	DOS (02) MESES		
Fecha Inicio del Contrato:	04	DICIEMBRE	2024
Fecha de Terminación No. 1:	04	FEBRERO	2025
Fecha de Suspensión No. 1:	27	ENERO	2025
Fecha de Reinicio No. 1:	27	FEBRERO	2025
Fecha de Terminación No. 2:	04	MARZO	2025



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2



Fecha de Prórroga No. 1 (1 Mes):	27	FEBRERO	2025
Fecha de Terminación 3:	04	ABRIL	2025
Fecha de Recibo Final:	20	MARZO	2025

Y del Contrato de Interventoría No 003-2024:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 003-2024			
Objeto del Contrato	INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL INSTITUCION DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
Interventor:	INCAM S.A.S ZOMAC R.L. KARINA LILIBETH PÉREZ PASCUAZA	NIT. C.C.	901310022-0 1.006.962.043 de Puerto Caicedo (Putumayo)
Supervisor del Contrato:	HUMBERTO ERNEY PIAGUAJE	C.C.	18.124.339
Valor total del contrato:	VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 24.457.143,58) MDA/CTE.		
Plazo Inicial del Contrato:	DOS (02) MESES		
Fecha Inicio del Contrato:	04	DICIEMBRE	2024
Fecha de Terminación No. 1:	04	FEBRERO	2025
Fecha de Suspensión No. 1:	27	ENERO	2025
Fecha de Reinicio No. 1:	27	FEBRERO	2025
Fecha de Terminación No. 2:	04	MARZO	2025
Fecha de Prórroga No. 1 (1 Mes):	27	FEBRERO	2025
Fecha de Terminación 3:	04	ABRIL	2025
Fecha de Recibo Final:	04	ABRIL	2025

A la fecha del presente informe los contratos se encuentran ejecutados en su totalidad.

Es así como podemos determinar que el Proyecto se encuentra en las siguientes condiciones:

3.2.AVANCE FISICO DEL PROYECTO

El avance físico reportado en el siguiente cuadro corresponde a la obra ejecutada.

AVANCE FÍSICO ACUMULADO

100%



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2

PRESUPUESTO OFICIAL CANTIDADES CONTRATADAS										CANTIDADES Y VALOR EJECUTADO MES 1				CANTIDADES Y VALOR EJECUTADO MES 2				CANTIDADES Y VALOR ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNID	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1.0	PRELIMINARES																				
1.1	Localización y Replanteo	M2	347,58	\$ 2.303	\$ 800.320,14	347,58	\$ 800.320,14		\$ 800.320,14	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	347,58	\$ 800.320,14		\$ 800.320,14		\$ 800.320,14		\$ 800.320,14
1.2	Cerramiento en Polisombra	M2	253,60	\$ 17.100	\$ 4.336.560,94	253,60	\$ 4.336.560,94		\$ 4.336.560,94	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	253,60	\$ 4.336.560,94		\$ 4.336.560,94		\$ 4.336.560,94		\$ 4.336.560,94
1.3	Desmonte de Cubierta y Estructura Portante	M2	516,13	\$ 20.277	\$ 10.465.779,50	516,13	\$ 10.465.779,50		\$ 10.465.779,50	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	516,13	\$ 10.465.779,50		\$ 10.465.779,50		\$ 10.465.779,50		\$ 10.465.779,50
	Sub-total				\$ 15.602.660,57		\$ 15.602.660,57		\$ 15.602.660,57		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 15.602.660,57		\$ 15.602.660,57
2.0	ESTRUCTURAS METÁLICAS																				
2.1	Estructura metálica en Acero ASTM - A572 (Incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje)	KG	1373,36	\$ 29.784	\$ 40.903.909,15	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	1448,30	\$ 43.136.086,57		\$ 0,00	1448,30	\$ 43.136.086,57		\$ 43.136.086,57		\$ 43.136.086,57		\$ 43.136.086,57
2.2	Estructura metálica en Acero ASTM - A36 (Incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje)	KG	2772,78	\$ 28.944	\$ 80.255.003,14	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	2864,56	\$ 82.911.354,09		\$ 0,00	2864,56	\$ 82.911.354,09		\$ 82.911.354,09		\$ 82.911.354,09		\$ 82.911.354,09
2.3	Templates, Barra Lisa de 1/2", incluye Pintura Anticorrosiva y Esmalte	M	65,82	\$ 47.896	\$ 3.152.503,71	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00
2.4	Contraventos, Barra Lisa de 1/2", incluye Pintura Anticorrosiva y Esmalte	M	137,93	\$ 49.759	\$ 6.863.295,99	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00
	Sub-total				\$ 131.174.711,99		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 131.174.711,99		\$ 131.174.711,99
3.0	CUBIERTA																				
3.1	Suministro e Instalación de Teja en Zinc Arquitectónico Cal 30	M2	516,13	\$ 84.015	\$ 43.362.779,52	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	533,16	\$ 44.793.304,21		\$ 0,00	533,16	\$ 44.793.304,21		\$ 44.793.304,21		\$ 44.793.304,21		\$ 44.793.304,21
3.2	Suministro e Instalación de Canal en lamina galvanizada cal. 20 (Incluye: accesorios de instalación y bajante)	M	98,29	\$ 174.316	\$ 17.132.608,11	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	102,49	\$ 17.864.733,61		\$ 0,00	102,49	\$ 17.864.733,61		\$ 17.864.733,61		\$ 17.864.733,61		\$ 17.864.733,61
3.3	Suministro e Instalación caballete en Zinc Cal 30	M	48,50	\$ 81.431	\$ 3.949.404,28	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	50,10	\$ 4.079.693,90		\$ 0,00	50,10	\$ 4.079.693,90		\$ 4.079.693,90		\$ 4.079.693,90		\$ 4.079.693,90
	Sub-total				\$ 64.444.791,91		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 64.444.791,91		\$ 64.444.791,91
4.0	REPELLO, ESTUCCO Y PINTURA																				
4.1	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	55,16	\$ 47.518	\$ 2.621.248,49	55,16	\$ 2.621.248,49		\$ 2.621.248,49	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	55,16	\$ 2.621.248,49		\$ 2.621.248,49		\$ 2.621.248,49		\$ 2.621.248,49
4.2	Estuco Plástico para muros interiores y exteriores	M2	55,16	\$ 27.347	\$ 1.508.538,54	55,16	\$ 1.508.538,54		\$ 1.508.538,54	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	55,16	\$ 1.508.538,54		\$ 1.508.538,54		\$ 1.508.538,54		\$ 1.508.538,54
4.3	Aplicación de Pintura TIPO I para interiores	M2	532,58	\$ 26.464	\$ 14.094.069,80	532,58	\$ 14.094.069,80		\$ 14.094.069,80	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	532,58	\$ 14.094.069,80		\$ 14.094.069,80		\$ 14.094.069,80		\$ 14.094.069,80
4.4	Aplicación de Pintura TIPO I para exteriores	M2	168,62	\$ 28.606	\$ 4.823.422,08	168,62	\$ 4.823.422,08		\$ 4.823.422,08	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	168,62	\$ 4.823.422,08		\$ 4.823.422,08		\$ 4.823.422,08		\$ 4.823.422,08
4.5	Aplicación de Pintura 3 en 1 para carpintería metálica	M2	95,45	\$ 37.199	\$ 3.550.757,98	95,45	\$ 3.550.757,98		\$ 3.550.757,98	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	95,45	\$ 3.550.757,98		\$ 3.550.757,98		\$ 3.550.757,98		\$ 3.550.757,98
	Sub-total				\$ 26.598.036,89		\$ 26.598.036,89		\$ 26.598.036,89		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 26.598.036,89		\$ 26.598.036,89
5.0	CONCRETOS																				
5.1	Vigas Cintas (0,15Mx20M) en concreto 21MPa (Incluye acero de refuerzo según diseños)	M3	1,96	\$ 2.835.742	\$ 5.560.013,46	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	3,14	\$ 8.893.184,79		\$ 0,00	3,14	\$ 8.893.184,79		\$ 8.893.184,79		\$ 8.893.184,79		\$ 8.893.184,79
	Sub-total				\$ 5.560.013,46		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 5.560.013,46		\$ 5.560.013,46
6.0	ASEO																				
6.1	ASEO GENERAL	M2	698,41	\$ 1.422	\$ 993.075,67	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	347,58	\$ 494.235,87		\$ 0,00	347,58	\$ 494.235,87		\$ 494.235,87		\$ 494.235,87		\$ 494.235,87
	Sub-total				\$ 993.075,67		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 993.075,67		\$ 993.075,67
TOTAL COSTO DIRECTO										\$ 244.373.290,48				\$ 202.172.593,03				\$ 244.373.290,48			
ADMINISTRACION										29,00%				\$ 58.630.051,98				\$ 58.630.051,98			
UTILIDAD										5,00%				\$ 10.108.629,65				\$ 10.108.629,65			
IMPREVISTOS										1,00%				\$ 2.021.725,93				\$ 2.021.725,93			
TOTAL COSTOS INDIRECTOS										\$ 70.760.407,56				\$ 70.760.407,56				\$ 70.760.407,56			
PMA										\$ 5.765.000,00				\$ 5.765.000,00				\$ 5.765.000,00			
COSTO TOTAL DE LA OBRA										\$ 341.433.942,16				\$ 278.698.000,60				\$ 341.433.942,16			



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1

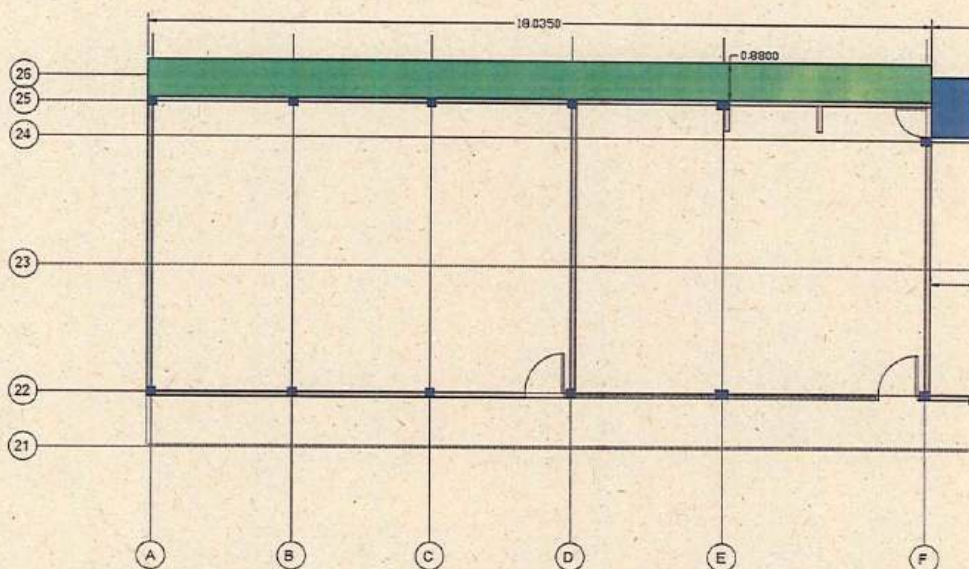


INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2

Durante la ejecución del proyecto fue necesario llevar a cabo actividades que no se encontraban incluidas en el mismo, pero que eran de vital importancia su ejecución, las actividades se relacionan a continuación:

- **CONSTRUCCIÓN DE ANDEN EN CONCRETO DE 3000PSI ($e=0,1m$):** con el fin de garantizar espacios idóneos para los estudiantes, se solicita realizar dos tramos de andén perimetral, estos cuenta con las siguientes dimensiones:

1. Tramo No. 1: Ancho de 0.88 metros y longitud de 18 metros, quedando de esta manera un total de 15,84 metros cuadrados (m^2)



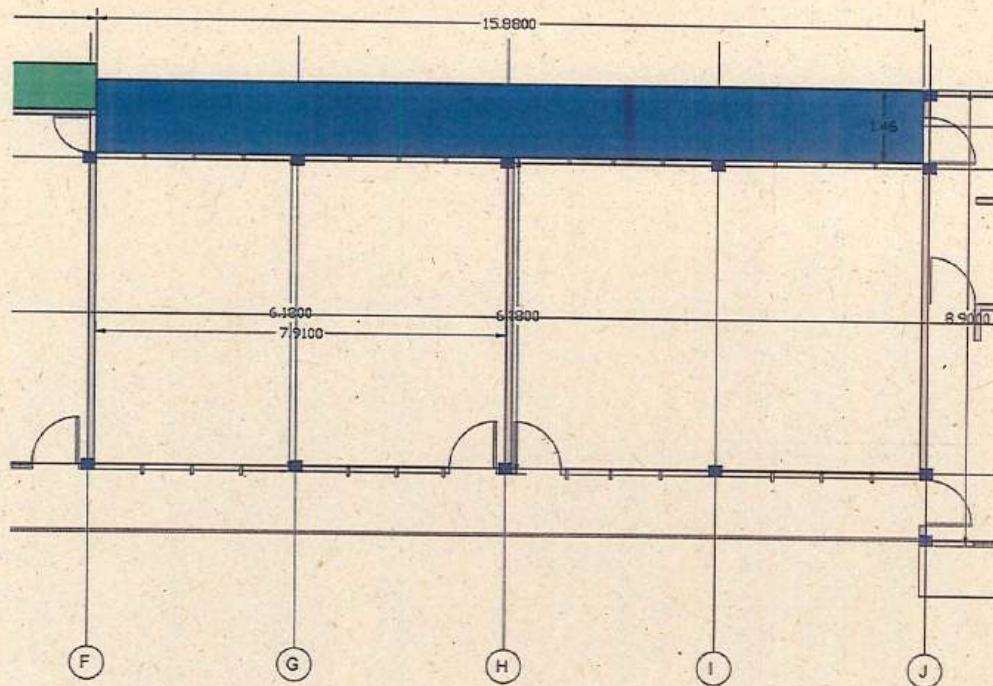
2. Tramo No. 2: Ancho de 1.46 metros y longitud de 15,88 metros, quedando de esta manera un total de 23,18 metros cuadrados (m^2)



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2



- **PROYECCIÓN DE TUBERÍA PARA REDES Y PUNTOS ELÉCTRICOS:** durante la ejecución se evidencio que la infraestructura no contaba con la proyección de las redes de energía que a futuro se podrían conectar al suministro de la misma, teniendo en cuenta lo antes mencionado, la supervisión e interventoría sugirieron que para evitar a futuro un detrimento de la intervención realizada con la ejecución del presente contrato, era necesario llevar a cabo la proyección de las redes eléctricas y de igual manera los puntos eléctricos, que permita futuro hacer las respectivas conexiones sin ir a intervenir la infraestructura mejorada.

Es así como en el periodo del presente informe, se llevó a cabo la instalación de 198 metros de tubería Conduit (incluye regate y resane de muros) y de igual manera la proyección de 60 puntos eléctricos (Tomacorrientes e Interruptores).



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2



3.3. ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO

El valor total del proyecto asciende a la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 368.748.657,53) MDA/CTE, Correspondientes a TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS (\$ 341.433.942,16) MDA/CTE para OBRA, y VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 24.457.143,58) MDA/CTE para INTERVENTORÍA. En concordancia con el presupuesto establecido en el proyecto Registrado BPIN No. 2023006860290. El valor total del convenio será financiado con recursos del Departamento del Putumayo.

Para la ejecución del contrato de obra el CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL expide el CDP No. 13 de 2024 de fecha 29/10/2024 en el cual se comprometen TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS (\$ 341.433.942,16) MDA/CTE.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
CERADA MEDIANTE DECRETO NOVO DE FEBRERO 24 DE 2003
CURSO DARE No. 200300000000
NIT 846003704-1



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Nº 13 2024

EL SUSCRITO DIRECTOR DEL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA HACE CONSTAR:

Que en el presupuesto de la vigencia 2024, existe disponibilidad presupuestal así:

CÓDIGO PRESUPUESTAL	032107
RUBRO PRESUPUESTAL	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
OBJETO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	RECURSOS GOBIERNACIONALES SEGUN RESOLUCION 4470 DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$ 341.433.942,16
VALOR EN LETRAS	TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS
FECHA DE CDP	29 DE OCTUBRE 2024

H. HERNANDEZ
HUMBERTO HERNANDEZ PIQUAJE
C.C. N° 18124339
DIRECTOR



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2

De igual manera para la ejecución del contrato de interventoría el CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL expide el CDP No. 14 de 2024 de fecha 29/10/2024 en el cual se comprometen VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 27.314.715,37) MDA/CTE.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
CREADA MEDIANTE DECRETO 0045 DE FEBRERO 24 DE 2000
CODIGO DANE 84 2854004339
NIT 846003704-1



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Nº 14 2024

EL SUSCRITO DIRECTOR DEL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA HACE
CONSTAR:

Que en el presupuesto de la vigencia 2024, existe disponibilidad presupuestal así:

CÓDIGO PRESUPUESTAL	632107
RUBRO PRESUPUESTAL	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	RECURSOS CORRIENTES SEGÚN RESOLUCIÓN 4470 DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$ 27.314.715,37
VALOR EN LETRAS	VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS
FECHA DE CDP	29 DE OCTUBRE 2024

HUMBERTO HERNEY PIAGUAJE
C.C. N° 18124339
DIRECTOR

Una vez contratados los procesos de obra e interventoría se emiten los siguientes Registros Presupuestales:



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2



Contrato de Obra.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
Creada mediante Decreto 0049 de 7 febrero 24 de 2004
Código N° 846003704-1



REGISTRO PRESUPUESTAL

N° 13 2024

EL SUSCRITO DIRECTOR DEL CER BUENAVISTA HACE CONSTAR:

Que en el Presupuesto del Fondo de Servicios Educativos, para la vigencia del Primer (1°) de Enero al Treinta y uno (31) de Diciembre del año 2024 existe Disponibilidad para Contratar y Reserva Presupuestal denominada así:

FECHA DE RP	04 DE DICIEMBRE DEL 2024
RUBRO PRESUPUESTAL	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DETALLE DEL GASTO	CONTRATO DE OBRA
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	RECURSOS PROPIOS SEGUN DONACION 01 DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2024
OBJETO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
NOMBRE DEL PROVEEDOR	DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS PUTUMAYO S.A.S
NIT DEL PROVEEDOR	900 912 227-3
VALOR A PAGAR EN PESOS	\$ 341.433.942,16
VALOR EN LETRAS	TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS
FECHA DE CDP	24 DE OCTUBRE 2024

HUMBERTO HERNEY PAGUAJE
C.C. N° 18124339
DIRECTOR

Contrato de Interventoría.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
CERRADA MEDIANTE DECRETO 0294 DE FEBRERO 21 DE 2005
EDUARDO SUAREZ S. 00846003704-1
NIT 846003704-1



REGISTRO PRESUPUESTAL

Nº 14 2024

EL SUSCRITO DIRECTOR DEL CER BUENAVISTA HACE CONSTAR:

Que en el Presupuesto del Fondo de Servicios Educativos, para la vigencia del Primer (1°) de Enero al Trimestre y una (31) de Diciembre del año 2024 existo disponibilidad para Contratar y Reserva Presupuestal denominada así:

FECHA DE RP	04 DE DICIEMBRE 2024
RUBRO PRESUPUESTAL	INTERVENTORIA CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DETALLE DEL GASTO	HONORARIOS
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	RECURSOS GOBERNACION SEGUN RESOLUCION 4426 DEL 16 DE OCTUBRE DEL
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL PROYECTO REFORMA DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA 5801 PRINCIPAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
NOMBRE DEL PROVEEDOR	WECAM S.A.S. ZONAC
NIT DEL PROVEEDOR	901 310 022 6
VALOR A PAGAR EN PESOS	1.24.457.147.58
VALOR EN LETRAS	VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS
FECHA DE CDP	29 DE OCTUBRE 2024

HUMBERTO HERNEY PRAGUAJE
C.C. N° 18124339
DIRECTOR

El día 27 de febrero de 2025 mediante comité técnico, se aprueba la adición en tiempo por un periodo de UN (01) mes para los contratos de obra e interventoría, de igual manera se aprueba la adición de recursos para garantizar la continuidad del contrato de Interventoría, recurso que se respalda mediante el CDP No. 01 de 2025 con fecha 04 de marzo de 2025, tal como se muestra a continuación:



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
CERADA MEDIANTE DECRETO 0343 DE FEBRERO 24 DE 2003
CODIGO PAISE 84-346003704-1
NIT 846003704-1



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Nº 01 2025

EL SUSCRITO DIRECTOR DEL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA HACE
CONSTAR:

Que en el presupuesto de la vigencia 2025, existe disponibilidad presupuestal así:

CÓDIGO PRESUPUESTAL	032102
RUBRO PRESUPUESTAL	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
PROCEDECIA DE LOS RECURSOS	RECURSOS GOBERNACION SEGUN RESOLUCION 4470 DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2024
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$ 2.057.571.75
VALOR EN LETRAS	DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS
FECHA DE CDP	04 DE MARZO 2025

HUMBERTO HERNEY PIAGUAJE
C.C. N° 18124339
DIRECTOR

Una vez realizado el modificatorio No. 1 al contrato de interventoría, se expide el RP No. 1 de 2025 con fecha 2 de Abril de 2025, tal como se indica a continuación:



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
CREADO MEDIANTE DECRETO 0014 DEL FEBRERO 24 DE 2004
CORREO ELECTRÓNICO: 200400000000
NIT 846003704-1



REGISTRO PRESUPUESTAL

Nº 01 2025

EL SUSCRITO DIRECTOR DEL CER BUENAVISTA HACE CONSTAR:

Que en el Presupuesto del Fondo de Servicios Educativos, para la vigencia del Primer (1º) de Enero al Treinta (30) de Diciembre del año 2024 existe Disponibilidad para Contratar y Reservar Presupuestal denominada así:

FECHA DE OP.	2 de abril de 2025
INDICADOR PRESUPUESTAL	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DETALLE DEL GASTO	HONORARIOS
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	RECURSOS GOBERNACION SEGUN RESOLUCIÓN 4470 DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024
OBJETO	INTERVENCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
NOMBRE DEL PROVEEDOR	ENAM S.A.S. ZOMAC
NIT DEL PROVEEDOR	901.310.622-0
VALOR PAGADO EN PESOS	\$ 2.400.000,00
VALOR EN LETRAS	DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS
FECHA DE COP	02/04/2025

HUMBERTO HERNÁNDEZ PRAGA
C.C. N° 18124239
DIRECTOR

En el periodo del presente de informe tenemos una relación de avance como se relaciona a continuación:

El avance de Obra a la fecha se relaciona así:

DESCRIPCIÓN	VALORES CONTRATO DE OBRA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 341.433.942,16
VALOR PAGO ANTICIPO	\$ 182.945.542,87
VALOR EJECUTADO INFORME No. 1	\$ 62.735.941,56
VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE INFORME	\$ 278.698.000,60
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	\$ 341.433.942,16
VALOR SALDO POR EJECUTAR	\$ 0,00
% DE RECURSO EJECUTADO INFORME No. 1	18,37%
% DE RECURSO EJECUTADO EN EL PRESENTE INFORME	81,63%
% DE RECURSO TOTAL EJECUTADO	100%
% DE RECURSO POR EJECUTAR	0 %

De igual manera el avance de interventoría a la fecha se relaciona así:

DESCRIPCIÓN	VALORES CONTRATO DE INTERVENTORÍA
-------------	-----------------------------------



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 24.457.143,58
VALOR ADICIONAL No. 1	\$ 2.800.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 27.257.143,58
VALOR PAGO ANTICIPO	\$ 12.228.571,79
VALOR EJECUTADO INFORME No. 1	\$ 5.018.875,33
VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE INFORME	\$ 22.238.268,25
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	\$ 27.257.143,58
VALOR SALDO POR EJECUTAR	\$ 0,00
% DE RECURSO EJECUTADO INFORME No. 1	20,52%
% DE RECURSO EJECUTADO EN EL PRESENTE INFORME	79,48%
% DE RECURSO EJECUTADO	100%
% DE RECURSO POR EJECUTAR	0%

En resumen, tenemos el siguiente estado financiero del proyecto hasta la fecha:

Valor inicial del Proyecto:	\$ 368.748.657,53
Valor del contrato de Obra:	\$ 341.433.942,16
Valor del contrato de Interventoría:	\$ 27.257.143,58
Valor Final (Obra + Interventoría):	\$ 368.691.085,74
Diferencia valor Inicial y Valor Final (Saldo a favor del Departamento):	\$ 57.571,79
Valor Ejecutado Informe No. 1:	\$ 67.754.816,89
Valor Ejecutado en el presente Informe:	\$ 300.936.268,85
Valor Total Ejecutado:	\$ 368.691.085,74
Pagos Realizados al Contrato de Obra:	\$ 182.945.542,87
Pagos realizados al Contrato de Interventoría:	\$ 12.228.571,79
Total Pagos Realizados:	\$ 195.174.114,66
Pago Pendiente por pagar Obra:	\$ 182.945.542,87
Pago Pendiente por pagar Interventoría:	\$ 12.228.571,79
Valor Total pendiente por pagar:	\$ 195.174.114,66

A la fecha del presente informe se tiene que los contratos de obra e interventoría derivados del proyecto, se encuentran terminados.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2

4. REGISTRO FOTOGRAFICO, ESTADO ACTUAL DE LA OBRA.

REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ASTM - A572 (INCLUYE: SUMINISTRO - FABRICACION - PINTURA - MONTAJE)	ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ASTM - A36 (INCLUYE: SUMINISTRO - FABRICACION - PINTURA - MONTAJE)
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA EN ZINC ARQUITECTÓNICO CAL 30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 (INCLUYE: ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y BAJANTE)
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE EN ZINC CAL.30	VIGAS CINTAS (0,15MX20M) EN CONCRETO 21MPA (INCLUYE ACERO DE REFUERZO SEGÚN DISEÑOS)



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2




ASEO GENERAL

5. CONCLUSIONES

- Que el porcentaje de avance físico de las obras a la fecha del presente convenio es de 100%.
- Que, de acuerdo al resumen financiero del proyecto, se tiene que el porcentaje pagado a la fecha del presente informe es del 50%.
- Que, de acuerdo al resumen financiero del proyecto, se tiene que el porcentaje pagado a la fecha del presente informe al contrato de obra es del 50%.
- Que, de acuerdo al resumen financiero del proyecto, se tiene que el porcentaje pagado a la fecha del presente informe al contrato de interventoría es del 50%.
- Que, los contratos de Obra e Interventoría que se derivan del proyecto se encuentran ejecutados en un 100%.

Agradeciendo la atención prestada

Atentamente,


HUMBERTO ERNEY PIAGUAJE
Rector CER Buenavista



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2



Anexos:


- Informe No. 2 Contrato de Obra
- Informe No. 2 Contrato de Interventoría

**INFORME DE
OBRA N° 2**

INFORME No. 2
CONTRATO DE OBRA No. 004-2024.
PERIODO: 04 DE ENERO AL 04 DE ABRIL DE 2025

OBJETO:

**“MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO
ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE
PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”.**



LEYDY YULIETH TEJADA
REPRESENTANTE LEGAL
SOLUCIONES CIVILES JM SAS

MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
04 de Abril de 2025

TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	3
2	DESCRIPCIÓN PROYECTO	4
2.1	LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	4
3	INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	7
3.1	INFORMACIÓN GENERAL	7
3.1.1	Contrato de Obra	7
3.2	PÓLIZAS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA	8
3.3	PRESUPUESTO INICIAL A EJECUTAR	8
3.4	PERSONAL A CARGO DEL CONTRATISTA	10
3.4.1	Mano de obra calificada	10
3.4.2	Mano de obra no calificada	10
3.5	ACTIVIDADES EJECUTADAS ESTE PERIODO	11
3.5.1	Actividades y cantidades ejecutadas	11
3.5.1.1	Programación de obra inicial	13
3.5.1.2	Memorias de cantidades de actividades ejecutadas	14
3.6	CUANTIFICACIÓN NUMÉRICA DE AVANCE DE OBRA	18
3.6.1	Avance físico:	18
3.6.2	Avance físico acumulado:	18
3.6.3	Avance financiero:	18
3.6.4	Avance financiero acumulado:	18
4	REGISTRO FOTOGRÁFICO	19
5	INCONVENIENTES PRESENTADOS EN EL DESARROLLO DE LA OBRA	20
6	CONCLUSIONES	20

1 INTRODUCCIÓN

A partir de la ejecución del Contrato de Obra N° 004-2024 que tiene por objeto: "MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", con la ejecución de este proyecto se justifica con base en todos los beneficios que se genera para la población estudiantil y docente del CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL del Municipio de Puerto Asís, los cuales podrán contar con un mejor espacio de aprendizaje y de tal forma tener mejoras en la calidad académica.

2 DESCRIPCIÓN PROYECTO

El municipio de Puerto Asís se encuentra ubicado al sur de Colombia en el departamento del Putumayo, limita con el municipio de Puerto Caicedo y Puerto Guzmán al norte, con los municipios de Orito, Valle del Guamuez y San Miguel al occidente, con el municipio de Puerto Leguizamo al oriente y con la Republica del Ecuador al sur; tiene una altura media de 250 m.s.n.m. El clima es tropical, con precipitaciones significativas. Incluso en el mes más seco hay mucha lluvia. Esta ubicación está clasificada como Af por Köppen y Geiger. La temperatura aquí es en promedio 24.9 °C. En un año, la precipitación media es 3850 mm.

El CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL, requiere una intervención a su infraestructura educativa específicamente en el área de la cubierta de las aulas, con lo cual se logre solucionar problemas de filtración, humedad y seguridad y de esta manera lograr un mejor espacio académico y así se evitar la deserción estudiantil. Para brindar espacios adecuados para el aprendizaje se proyecta el cambio de cubierta de los salones existentes y mantenimiento mediante aplicación de pintura sobre muros y carpintería metálica, lo cual puede desencadenar en un aumento representativo en estudiantes y así mismo en todo el sector productivo que involucre a dicha institución.

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El Contrato de Obra N° 004-2024 que tiene por objeto: "MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", se localiza en la Vereda Buenavista del Municipio de Puerto Asís, departamento del Putumayo, como se puede apreciar en las imágenes.

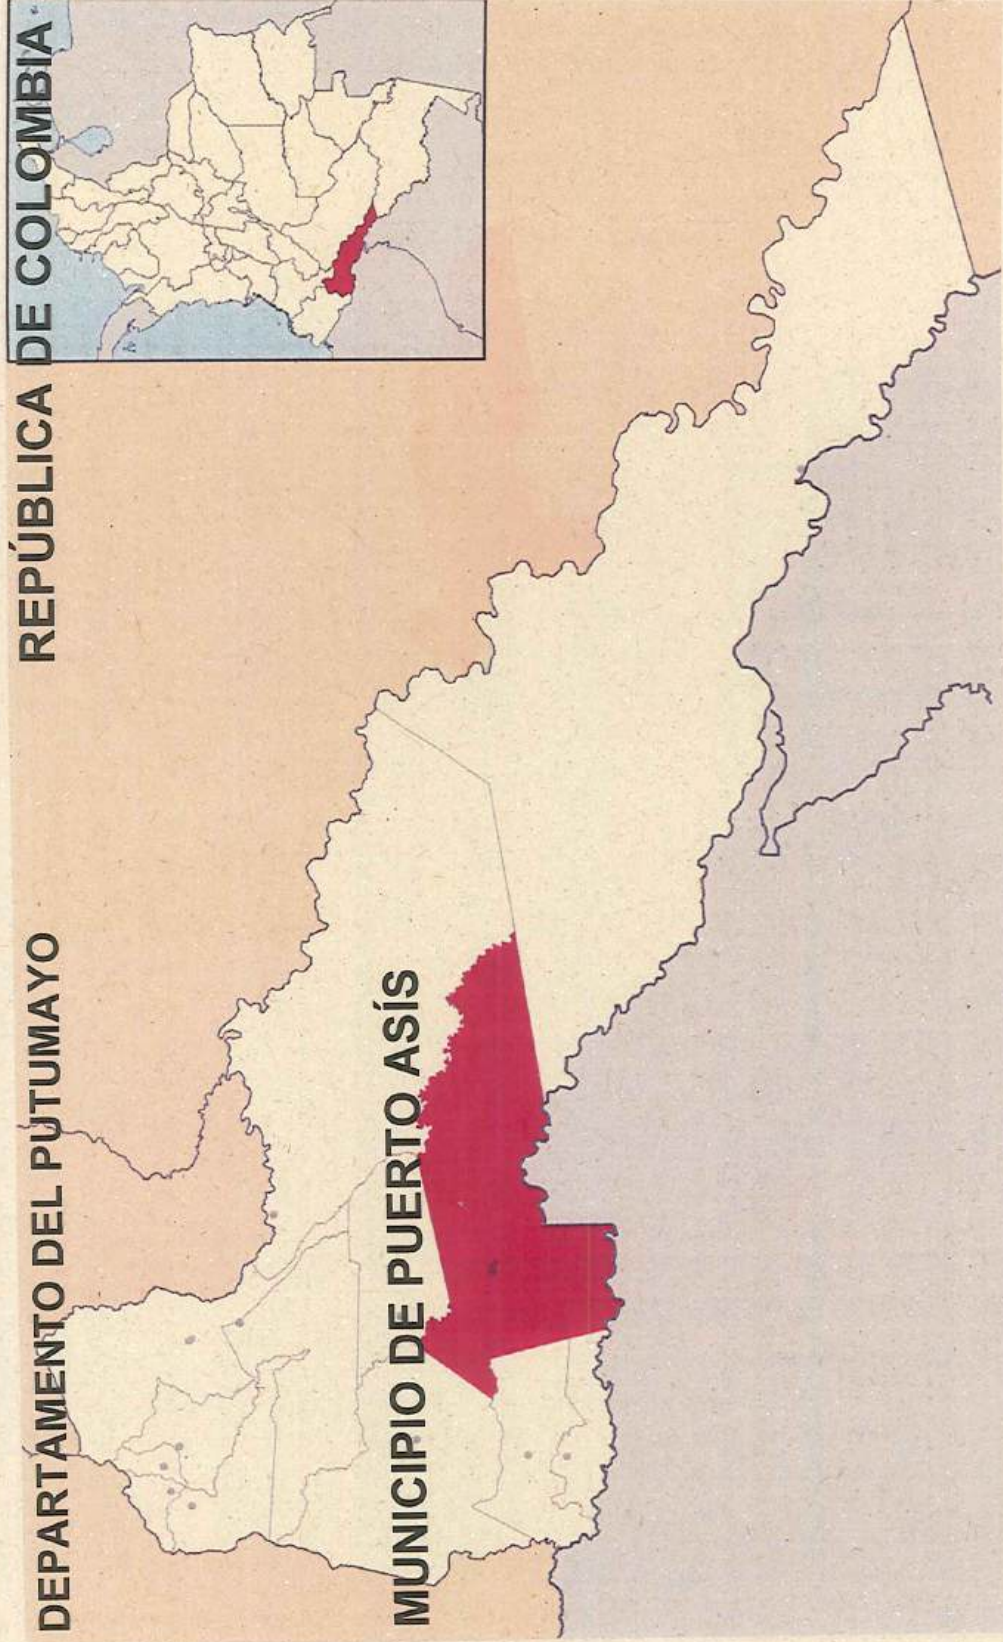


Imagen 1: Municipio de Puerto Asís. Fuente: Google Maps.



Imagen 2: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL. Fuente: Google Earth.

Calle 10 No. 36-42 Barrio El Carmen – celular 313-3198734
Puerto Asís Putumayo – Colombia E-mail: solucionescivilesjm@gmail.com

3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

3.1.1 Contrato de Obra

El Contrato de Obra N° 004-2024 que tiene por objeto: “MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”, se localiza en el la parte rural del Municipio de Puerto Asís, del Departamento del Putumayo.

A continuación, se indica la información general del Contrato de obra:

Tabla 1: datos contractuales del contrato de obra.

CONTRATANTE:	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL
CLASE DE CONTRATO:	OBRA PÚBLICA
CONTRATISTA:	SOLUCIONES CIVILES JM SAS
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO	\$341.433.942,16 (Trescientos cuarenta y un millones cuatrocientos treinta y tres mil novecientos cuarenta y dos pesos con dieciséis centavos)
PLAZO DEL CONTRATO	DOS (2) MESES A PARTIR DE SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO	04 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN No. 1	04 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	27 DE ENERO DE 2025
FECHA DE REINICIO No. 1	27 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN No. 2	04 DE MARZO DE 2025
FECHA PRÓRROGA No. 1 (1 MES)	27 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN No. 3	04/04/2025
FECHA DE RECIBO FINAL	20 DE MARZO DE 2025

Fuente: Propia.

3.2 PÓLIZAS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A., Póliza de responsabilidad civil No. 41-40-101054371 ANEXO 4 y póliza de cumplimiento No. 41-44-101288873 ANEXO 5, con fecha de expedición 06 de marzo de 2025

ANEXO	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA
5	06/03/2025	Cumplimiento del Contrato	04/12/2024	04/08/2025	\$34.143.394,22
		Buen manejo y correcta inversión del anticipo	04/12/2024	04/08/2025	\$170.716.971,08
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	04/12/2024	04/04/2028	\$17.071.697,11
		Estabilidad y calidad de la obra	5 años, 0 meses y 0 días		\$34.143.394,22
4	06/03/2025	Predios labores y operaciones	04/12/2024	04/04/2025	\$34.143.394,22
		Contratistas y subcontratistas	04/12/2024	04/04/2025	\$34.143.394,22
		Vehículos propios y no propios	04/12/2024	04/04/2025	\$34.143.394,22

3.3 PRESUPUESTO A EJECUTAR.

De acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas, de los estudios previos y el contrato de obra, en la tabla 2 se describe el presupuesto inicial a ejecutar.

Tabla 2: Presupuesto del contrato de obra inicial.

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR
1.0	PRELIMINARES				
1.1	Localización y Replanteo	M2	347,58	\$ 2.303	\$ 800.320,14
1.2	Cerramiento en Polisombra	M2	253,60	\$ 17.100	\$ 4.336.560,94
1.3	Desmonte de Cubierta y Estructura Portante	M2	516,13	\$ 20.277	\$ 10.465.779,50
				Sub-total	\$ 15.602.660,57
2.0	ESTRUCTURAS METÁLICAS				
2.1	Estructura metalica en Acero ASTM - A572 (incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	KG	1373,36	\$ 29.784	\$ 40.903.909,15
2.2	Estructura metalica en Acero ASTM - A36 (Incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	KG	2772,78	\$ 28.944	\$ 80.255.003,14
2.3	Templetes, Barra Lisa de 1/2", Incluye Pintura Anticorrosiva y Esmalte	M	65,82	\$ 47.896	\$ 3.152.503,71
2.4	Contravientos, Barra Lisa de 1/2", Incluye Pintura Anticorrosiva y Esmalte	M	137,93	\$ 49.759	\$ 6.863.295,99
				Sub-total	\$ 131.174.711,99
3.0	CUBIERTA				

3.1	Suministro e Instalación de Teja en Zinc Arquitectónico Cal 30	M2	516,13	\$ 84.015	\$ 43.362.779,52
3.2	Suministro e Instalación de Canal en lamina galvanizada cal. 20 (incluye: accesorios de instalación y bajante)	M	98,29	\$ 174.316	\$ 17.132.608,11
3.3	Suministro e instalación caballete en Zinc Cal.30	M	48,50	\$ 81.431	\$ 3.949.404,28
				Sub-total	\$ 64.444.791,91
4.0	REPELLO, ESTUCO Y PINTURA				
4.1	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	55,16	\$ 47.518	\$ 2.621.248,49
4.2	Estuco Plastico para muros interiores y exteriores	M2	55,16	\$ 27.347	\$ 1.508.538,54
4.3	Aplicación de Pintura TIPO I para interiores	M2	532,58	\$ 26.464	\$ 14.094.069,80
4.4	Aplicación de Pintura TIPO I para exteriores	M2	168,62	\$ 28.606	\$ 4.823.422,08
4.5	Aplicación de Pintura 3 en 1 para carpintería metálica	M2	95,45	\$ 37.199	\$ 3.550.757,98
				Sub-total	\$ 26.598.036,89
5.0	CONCRETOS				
5.1	Vigas Cintas (0,15Mx20M) en concreto 21MPa (incluye acero de refuerzo según diseños)	M3	1,96	\$ 2.836.742	\$ 5.560.013,46
				Sub-total	\$ 5.560.013,46
6.0	ASEO				
6.1	ASEO GENERAL	M2	698,41	\$ 1.422	\$ 993.075,67
				Sub-total	\$ 993.075,67

TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 244.373.290,49
ADMINISTRACION	29,00%	\$ 70.868.254,24
UTILIDAD	5,00%	\$ 12.218.664,52
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 2.443.732,90
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 85.530.651,67
PMA		\$ 11.530.000,00
COSTO TOTAL DE LA OBRA		\$ 341.433.942,16

Fuente: Contrato de obra.

El valor del presupuesto inicial del contrato de obra pública es por la suma de: \$341.433.942,16 (Trescientos cuarenta y un millones cuatrocientos treinta y tres mil novecientos cuarenta y dos pesos con dieciséis centavos).

El día 04 de MARZO de 2025, se aprueba Acta de Mayores y Menores Cantidades de Obra, mediante la cual se actualiza las condiciones iniciales del contrato, quedando de la siguiente manera:

PRESUPUESTO OFICIAL CANTIDADES CONTRATADAS						CANTIDADES MODIFICADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1.0	PRELIMINARES								
1.1	Localización y Replanteo	M2	347,58	\$ 2.303	\$ 800.320,14	0,00	\$ 0,00	347,58	\$ 800.320,14
1.2	Cerramiento en Polisombra	M2	253,60	\$ 17.100	\$ 4.336.560,94	0,00	\$ 0,00	253,60	\$ 4.336.560,94
1.3	Desmonte de Cubierta y Estructura Portante	M2	516,13	\$ 20.277	\$ 10.465.779,50	0,00	\$ 0,00	516,13	\$ 10.465.779,50
					Sub-total		\$ 0,00		\$ 15.602.660,57
2.0	ESTRUCTURAS METÁLICAS								
2.1	Estructura metálica en Acero ASTM - A572 (incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje)	KG	1373,36	\$ 29.784	\$ 40.903.909,15	74,95	\$ 2.232.177,42	1448,30	\$ 43.136.086,57
2.2	Estructura metálica en Acero ASTM - A36 (incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje)	KG	2772,78	\$ 28.944	\$ 80.255.003,14	91,78	\$ 2.656.350,95	2864,56	\$ 82.911.354,09
2.3	Templetes, Barra Lisa de 1/2", Incluye Pintura Anticorrosiva y Esmalte	M	65,82	\$ 47.896	\$ 3.152.503,71	-65,82	-\$ 3.152.503,71	0,00	\$ 0,00
2.4	Contravientos, Barra Lisa de 1/2", Incluye Pintura Anticorrosiva y Esmalte	M	137,93	\$ 49.759	\$ 6.863.295,99	-137,93	-\$ 6.863.295,99	0,00	\$ 0,00
					Sub-total		-\$ 5.127.271,33		\$ 126.047.440,66
3.0	CUBIERTA								
3.1	Suministro e Instalación de Teja en Zinc Arquitectónico Cal 30	M2	516,13	\$ 84.015	\$ 43.362.779,52	17,03	\$ 1.430.524,69	533,16	\$ 44.793.304,21

3.2	Suministro e Instalación de Canal en lamina galvanizada cal. 20 (incluye: accesorios de instalación y bajante)	M	98,29	\$ 174.316	\$ 17.132.608,11	4,20	\$ 732.125,49	102,49	\$ 17.864.733,61
3.3	Suministro e instalación caballete en Zinc Cal.30	M	48,50	\$ 81.431	\$ 3.949.404,28	1,60	\$ 130.289,63	50,10	\$ 4.079.693,90
Sub-total					\$ 64.444.791,91		\$ 2.292.939,80		\$ 66.737.731,72
4.0	REPELLO, ESTUCO Y PINTURA								
4.1	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	55,16	\$ 47.518	\$ 2.621.248,49	0,00	\$ 0,00	55,16	\$ 2.621.248,49
4.2	Estuco Plastico para muros interiores y exteriores	M2	55,16	\$ 27.347	\$ 1.508.538,54	0,00	\$ 0,00	55,16	\$ 1.508.538,54
4.3	Aplicación de Pintura TIPO I para interiores	M2	532,58	\$ 26.464	\$ 14.094.069,80	0,00	\$ 0,00	532,58	\$ 14.094.069,80
4.4	Aplicación de Pintura TIPO I para exteriores	M2	168,62	\$ 28.606	\$ 4.823.422,08	0,00	\$ 0,00	168,62	\$ 4.823.422,08
4.5	Aplicación de Pintura 3 en 1 para carpintería metálica	M2	95,45	\$ 37.199	\$ 3.550.757,98	0,00	\$ 0,00	95,45	\$ 3.550.757,98
Sub-total					\$ 26.598.036,89		\$ 0,00		\$ 26.598.036,89
5.0	CONCRETOS								
5.1	Vigas Cintas (0,15Mx20M) en concreto 21MPa (incluye acero de refuerzo según diseños)	M3	1,96	\$ 2.836.742	\$ 5.560.013,46	1,18	\$ 3.333.171,33	3,14	\$ 8.893.184,79
Sub-total					\$ 5.560.013,46		\$ 3.333.171,33		\$ 8.893.184,79
6.0	ASEO								
6.1	ASEO GENERAL	M2	698,41	\$ 1.422	\$ 993.075,67	-350,82	-\$ 498.839,80	347,58	\$ 494.235,87
Sub-total					\$ 993.075,67		-\$ 498.839,80		\$ 494.235,87

TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 244.373.290,48
ADMINISTRACION	29,00%	\$ 70.868.254,24
UTILIDAD	5,00%	\$ 12.218.664,52
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 2.443.732,90
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 85.530.651,67
PMA		\$ 11.530.000,00
COSTO TOTAL DE LA OBRA		\$ 341.433.942,16

\$ 244.373.290,48
\$ 70.868.254,24
\$ 12.218.664,52
\$ 2.443.732,90
\$ 85.530.651,67
\$ 11.530.000,00
\$ 341.433.942,16

Como se puede evidenciar, la modificación planteada no afecta ni el objeto ni el valor del contrato.

3.4 PERSONAL A CARGO DEL CONTRATISTA.

3.4.1 Mano de obra calificada

El personal administrativo y de obra que apoyó las actividades desarrolladas durante el presente periodo, se describe en la siguiente tabla:

Tabla 3: Descripción de la mano de obra calificada empleada por el contratista en la obra.

NOMBRE	CARGO	CEDULA
Leydy Yulieth Tejada Saldarriaga	Representante legal	1.123.207.998
Daniela Portilla Burbano	Residente de obra	1.124.859.667

Fuente: Propia.

3.4.2 Mano de obra no calificada

La mano de obra no calificada para la ejecución de los trabajos y actividades realizadas por el contratista durante el periodo corresponde a: maestro y ayudantes. En la siguiente tabla se presenta los nombres y cargo del personal que conforma la mano de obra no calificada.

Tabla 4: Descripción de la mano de obra no calificada empleada por el contratista en la obra.

NOMBRE	CARGO	CEDULA
José Orlando Bravo Cubillos	Maestro	80.381.853
Wilmer Naty Tombe	Ayudante	17.688.257
Mario Fernando Cuadros	Ayudante	1.115.074.053
Juan Libardo Pai Taicuz	Ayudante	1.123.304.807
Juan Libardo Pai Taicuz	Ayudante	1.123.304.807

Fuente: Propia.

3.5 ACTIVIDADES EJECUTADAS ESTE PERIODO.

3.5.1 Actividades y cantidades ejecutadas.

Como se manifestó en el informe No. 1, el día 21 de diciembre por festividades de fin de año y carnavales de inicio de nuevo año, se suspendieron las actividades del contrato, reiniciando de esta manera el día 8 de enero del año 2025, una vez superada la situación antes mencionada.

Durante este periodo se continua con las actividades de aplicación de pintura Tipo I en interiores, exteriores y aplicación de pintura tipo 3 en 1 para carpintería metálica.

El día 24 de Enero de 2025 se solicita a interventoría realizar suspensión de las actividades de obra en base a que los proveedores de la estructura para cubierta mediante certificación mencionan que hasta esa fecha no había sido posible el suministro del material que se utilizará para la fabricación de cerchas y correas de la cubierta, solicitud que fue aceptada por la interventoría y la supervisión donde se procedió a suspender las actividades del contrato por el término de un mes calendario contados a partir del día 27 de enero de 2025.

Una vez superada la situación que conlleva a la suspensión No. 1 del contrato, se reinician actividades el día 27 de febrero de 2025, iniciando con el ingreso de material necesario para la estructura de cubierta, lo cual corresponde a Teja en Zinc Arquitectónico 1,01X6m Cal 30, Estructura metálica en Acero ASTM - A572 y Estructura metálica en Acero ASTM - A536.

Se llevó a cabo el desmonte de la cubierta y estructura existente, para de esta manera llevar a cabo la instalación de la nueva estructura y cubierta en las áreas definidas por el proyecto.

Se culmina con la instalación de la Teja en Zinc Arquitectónico 1,01X6m Cal 30, caballetes y Canal en lámina galvanizada cal. 20 en las áreas definidas de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

De esta manera una vez completadas las actividades del proyecto, se lleva a cabo el aseo general y se hace la respectiva entrega.

A continuación se puede evidenciar las actividades ejecutadas en el periodo del presente informe junto a sus respectivas cantidades y valores.

3.5.1.1 Programación de obra inicial.

PRESUPUESTO OFICIAL CANTIDADES CONTRATADAS							CANTIDADES Y VALOR EJECUTADO MES 2	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	
1.0	PRELIMINARES							
1.1	Localización y Replanteo	M2	347,58	\$ 2.303	\$ 800.320,14	0,00	\$ 0,00	
1.2	Cerramiento en Polissombra	M2	253,60	\$ 17.100	\$ 4.336.560,94	0,00	\$ 0,00	
1.3	Desmonte de Cubierta y Estructura Portante	M2	516,13	\$ 20.277	\$ 10.465.779,50	0,00	\$ 0,00	
				Sub-total	\$ 15.602.660,57		\$ 0,00	
2.0	ESTRUCTURAS METÁLICAS							
2.1	Estructura metálica en Acero ASTM - A572 (Incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje)	KG	1373,36	\$ 29.784	\$ 40.903.909,15	1448,30	\$ 43.136.086,57	
2.2	Estructura metálica en Acero ASTM - A36 (Incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje)	KG	2772,78	\$ 28.944	\$ 80.255.003,14	2864,56	\$ 82.911.354,09	
2.3	Templetes, Barra Lisa de 1/2", Incluye Pintura Anticorrosiva y Esmalte	M	65,82	\$ 47.896	\$ 3.152.503,71	0,00	\$ 0,00	
2.4	Contravientos, Barra Lisa de 1/2", Incluye Pintura Anticorrosiva y Esmalte	M	137,93	\$ 49.759	\$ 6.863.295,99	0,00	\$ 0,00	
				Sub-total	\$ 131.174.711,99		\$ 126.047.440,66	
3.0	CUBIERTA							
3.1	Suministro e Instalación de Teja en Zinc Arquitectónico Cal 30	M2	516,13	\$ 84.015	\$ 43.362.779,52	533,16	\$ 44.793.304,21	
3.2	Suministro e Instalación de Canal en lamina galvanizada cal. 20 (Incluye: accesorios de Instalación y balante)	M	98,29	\$ 174.316	\$ 17.132.608,11	102,49	\$ 17.864.733,61	
3.3	Suministro e Instalación caballete en Zinc Cal.30	M	48,50	\$ 81.431	\$ 3.949.404,28	50,10	\$ 4.079.693,90	
				Sub-total	\$ 64.444.791,91		\$ 66.737.731,72	
4.0	REPELLO, ESTUCCO Y PINTURA							
4.1	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	55,16	\$ 47.518	\$ 2.621.248,49	0,00	\$ 0,00	
4.2	Estuco Plastico para muros interiores y exteriores	M2	55,16	\$ 27.347	\$ 1.508.538,54	0,00	\$ 0,00	
4.3	Aplicación de Pintura TIPO I para interiores	M2	532,58	\$ 26.464	\$ 14.094.069,80	0,00	\$ 0,00	
4.4	Aplicación de Pintura TIPO I para exteriores	M2	168,62	\$ 28.606	\$ 4.823.422,08	0,00	\$ 0,00	
4.5	Aplicación de Pintura 3 en 1 para carpintería metálica	M2	95,45	\$ 37.199	\$ 3.550.757,98	0,00	\$ 0,00	
				Sub-total	\$ 26.598.036,89		\$ 0,00	
5.0	CONCRETOS							
5.1	Vigas Cintas (0,15Mx20M) en concreto 21MPa (Incluye acero de refuerzo según diseños)	M3	1,96	\$ 2.836.742	\$ 5.560.013,46	3,14	\$ 8.893.184,79	
				Sub-total	\$ 5.560.013,46		\$ 8.893.184,79	
6.0	ASEO							
6.1	ASEO GENERAL	M2	698,41	\$ 1.422	\$ 993.075,67	347,58	\$ 494.235,87	
				Sub-total	\$ 993.075,67		\$ 494.235,87	

TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 244.373.290,48
ADMINISTRACION	\$ 70.868.254,24
UTILIDAD	\$ 12.218.664,52
IMPREVISTOS	\$ 2.443.732,90
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	\$ 85.530.651,67
PMA	\$ 11.530.000,00
COSTO TOTAL DE LA OBRA	\$ 341.433.942,16

3.5.1.2 Memorias de cantidades de actividades ejecutadas.

Se anexa memoria de cantidades

Tabla 5: Avance físico de obra.

PRESUPUESTO OFICIAL CANTIDADES CONTRATADAS										CANTIDADES Y VALOR EJECUTADO MES 1				CANTIDADES Y VALOR EJECUTADO MES 2				CANTIDADES Y VALOR ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNID	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1.0	PRELIMINARES																				
1.1	Localización y Replanteo	M2	347,58	\$ 2.303	\$ 800.320,14	347,58	\$ 800.320,14	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 800.320,14	0,00	\$ 0,00
1.2	Cerramiento en Polissombra	M2	253,60	\$ 17.100	\$ 4.336.560,94	253,60	\$ 4.336.560,94	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 4.336.560,94	0,00	\$ 0,00
1.3	Desmonte de Cubierta y Estructura Portante	M2	516,13	\$ 20.277	\$ 10.465.779,50	516,13	\$ 10.465.779,50	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 10.465.779,50	0,00	\$ 0,00
	Sub-total				\$ 15.602.660,57		\$ 15.602.660,57		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 15.602.660,57		\$ 0,00
2.0	ESTRUCTURAS METÁLICAS																				
2.1	Estructura metálica en Acero ASTM - A572 (Incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje)	KG	1373,36	\$ 29.784	\$ 40.503.909,15	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 40.503.909,15	0,00	\$ 0,00
2.2	Estructura metálica en Acero ASTM - A36 (Incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje)	KG	2772,78	\$ 28.944	\$ 80.255.003,14	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 80.255.003,14	0,00	\$ 0,00
2.3	Templetes, Barra Lisa de 1/2", Incluye Pintura Anticorrosiva y Esmalte	M	65,82	\$ 47.896	\$ 3.152.503,71	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 3.152.503,71	0,00	\$ 0,00
2.4	Contraventos, Barra Lisa de 1/2", Incluye Pintura Anticorrosiva y Esmalte	M	137,93	\$ 49.759	\$ 6.863.295,99	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 6.863.295,99	0,00	\$ 0,00
	Sub-total				\$ 131.174.711,93		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 131.174.711,93		\$ 0,00
3.0	CUBIERTA																				
3.1	Suministro e Instalación de Teja en Zinc Arquitectónico Cal 30	M2	516,13	\$ 84.015	\$ 43.362.779,52	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 43.362.779,52	0,00	\$ 0,00
3.2	(Incluye: accesorios de instalación y bajante)	M	98,29	\$ 174.316	\$ 17.132.608,11	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 17.132.608,11	0,00	\$ 0,00
3.3	Suministro e Instalación caballete en Zinc Cal 30	M	48,50	\$ 81.431	\$ 3.949.404,28	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 3.949.404,28	0,00	\$ 0,00
	Sub-total				\$ 64.444.791,91		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 64.444.791,91		\$ 0,00
4.0	REPIELLO, ESTUCCO Y PINTURA																				
4.1	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	55,16	\$ 47.518	\$ 2.621.248,49	55,16	\$ 2.621.248,49	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 2.621.248,49	0,00	\$ 0,00
4.2	Estuco Plástico para muros interiores y exteriores	M2	55,16	\$ 27.347	\$ 1.508.538,54	55,16	\$ 1.508.538,54	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 1.508.538,54	0,00	\$ 0,00
4.3	Aplicación de Pintura TIPO I para interiores	M2	532,58	\$ 26.464	\$ 14.094.069,80	532,58	\$ 14.094.069,80	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 14.094.069,80	0,00	\$ 0,00
4.4	Aplicación de Pintura TIPO I para exteriores	M2	168,62	\$ 28.606	\$ 4.823.422,08	168,62	\$ 4.823.422,08	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 4.823.422,08	0,00	\$ 0,00
4.5	Aplicación de Pintura 3 en 1 para carpintería metálica	M2	95,45	\$ 37.199	\$ 3.550.757,98	95,45	\$ 3.550.757,98	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 3.550.757,98	0,00	\$ 0,00
	Sub-total				\$ 26.598.036,89		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 26.598.036,89		\$ 0,00
5.0	CONCRETOS																				
5.1	Vigas Cintas (0.15Mx20M) en concreto 21MPa (Incluye acero de refuerzo según diseños)	M3	1,96	\$ 2.836.742	\$ 5.560.013,46	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 5.560.013,46	0,00	\$ 0,00
	Sub-total				\$ 5.560.013,46		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 5.560.013,46		\$ 0,00
6.0	ASEO																				
6.1	ASEO GENERAL	M2	698,41	\$ 1.422	\$ 993.075,67	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 993.075,67	0,00	\$ 0,00
	Sub-total				\$ 993.075,67		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 993.075,67		\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO										\$ 244.373.250,48				\$ 202.172.593,03				\$ 244.373.250,48			
ADMINISTRACION										\$ 70.868.254,24				\$ 58.630.051,98				\$ 70.868.254,24			
UTILIDAD										\$ 12.218.664,52				\$ 10.108.629,65				\$ 12.218.664,52			
IMPREVISTOS										\$ 2.443.732,90				\$ 2.021.725,93				\$ 2.443.732,90			
TOTAL COSTOS INDIRECTOS										\$ 85.530.651,67				\$ 70.760.407,56				\$ 85.530.651,67			
PMA										\$ 11.530.000,00				\$ 5.765.000,00				\$ 11.530.000,00			
COSTO TOTAL DE LA OBRA										\$ 341.433.942,16				\$ 278.698.000,60				\$ 341.433.942,16			

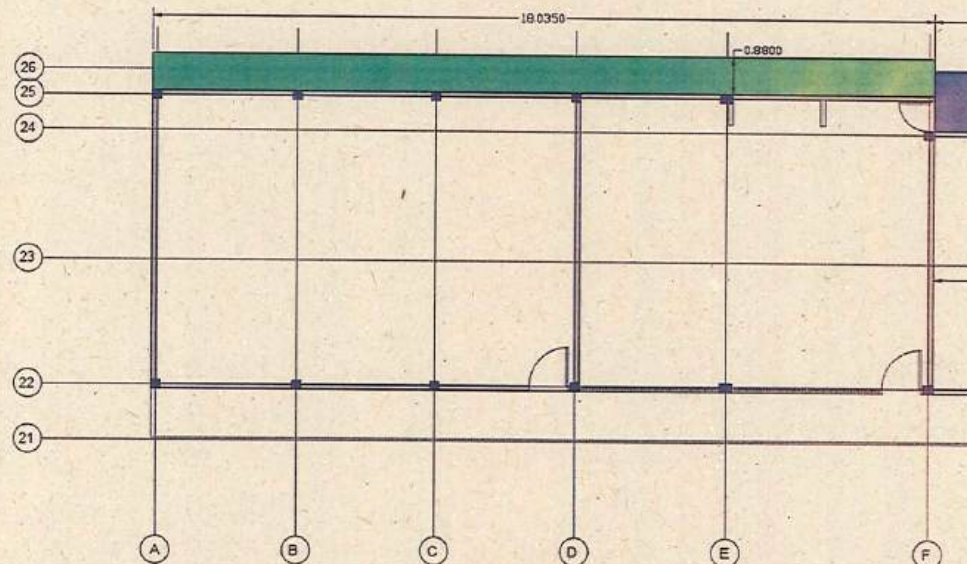
Fuente: Propia.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 341.433.942,16
VALOR EJECUTADO MES 1	\$ 62.735.941,56
VALOR EJECUTADO MES 2	\$ 278.698.000,60
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	\$ 341.433.942,16
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 0,00
% DE AVANCE MES 1	18,37%
% DE AVANCE MES 2	81,63%
% DE AVANCE ACUMULADO	100,00%
% DE AVANCE PENDIENTE POR EJECUTAR	0,00%

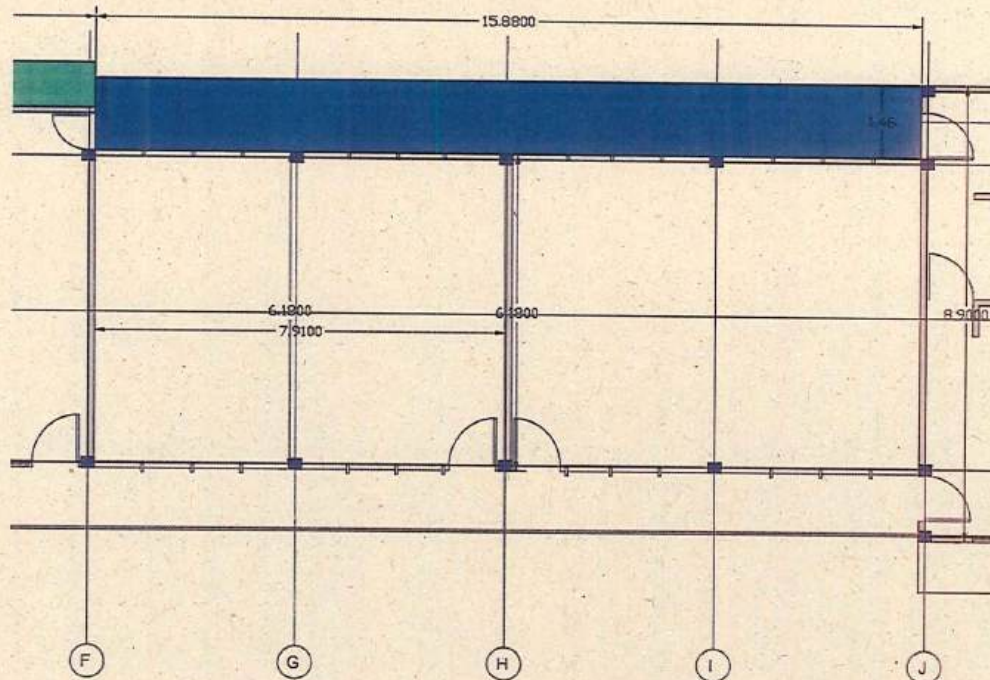
De igual manera, atendiendo la solicitud del supervisor, se llevaron a cabo actividades que no estaban contempladas dentro del contrato, estas se relacionan a continuación:

- **CONSTRUCCIÓN DE ANDEN EN CONCRETO DE 3000PSI (e=0,1m):** con el fin de garantizar espacios idóneos para los estudiantes, se solicita realizar dos tramos de anden perimetral, estos cuenta con las siguientes dimensiones:

1. Tramo No. 1: Ancho de 0.88 metros y longitud de 18 metros, quedando de esta manera un total de 15,84 metros cuadrados (m2)



2. Tramo No. 2: Ancho de 1.46 metros y longitud de 15,88 metros, quedando de esta manera un total de 23,18 metros cuadrados (m²)



- **PROYECCIÓN DE TUBERÍA PARA REDES Y PUNTOS ELÉCTRICOS:** durante la ejecución se evidencio que la infraestructura no contaba con la proyección de las redes de energía que a futuro se podrían conectar al suministro de la misma, teniendo en cuenta lo antes mencionado, la supervisión e interventoría sugirieron que para evitar a futuro un detrimento de la intervención realizada con la ejecución del presente contrato, era necesario llevar a cabo la proyección de las redes eléctricas y de igual manera los puntos eléctricos, que permita futuro hacer las respectivas conexiones sin ir a intervenir la infraestructura mejorada.

Es así como en el periodo del presente informe, se llevó a cabo la instalación de 198 metros de tubería Conduit (incluye regate y resane de muros) y de igual manera la proyección de 60 puntos eléctricos (Tomacorrientes e Interruptores).

Para evidencia de las actividades antes mencionadas, se anexa registro fotográfico de las mismas.

3.6 CUANTIFICACIÓN NUMÉRICA DE AVANCE DE OBRA.

3.6.1 Avance físico:

Se tiene que el avance físico de obra durante el presente periodo corresponde al 81,63% con relación al 100% del contrato de obra, lo que representa un valor de: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$ 278.698.000,60) MDA/CTE. (Se anexa acta parcial de obra No. 2 y memoria de cantidades de obra ejecutadas).

3.6.2 Avance físico acumulado:

El avance físico acumulado de obra es por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS (\$ 341.433.942,16) MDA/CTE. lo que corresponde a un porcentaje acumulado de obra del 100,00% del total del contrato de obra.

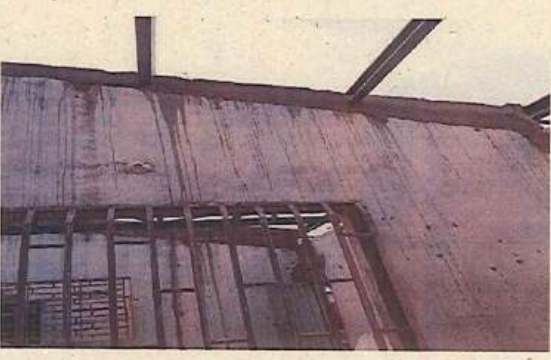
3.6.3 Avance financiero:

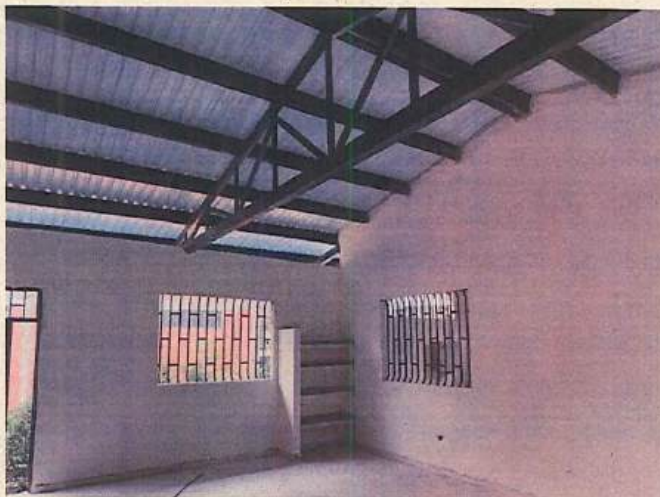
Considerando que la firma contratista SOLUCIONES CIVILES JM SAS, ha realizado la ejecución total de los ítems del contrato de obra en el periodo del presente informe, los cuales fueron descritos anteriormente, se tiene que el avance financiero de obra ejecutado es por valor de: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$ 278.698.000,60) MDA/CTE, siendo el 81,63% del valor total del contrato de obra.

3.6.4 Avance financiero acumulado:

El avance financiero acumulado de obra equivale a TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS (\$ 341.433.942,16) MDA/CTE lo que corresponde a un porcentaje acumulado de obra del 100,00% del total del contrato de obra.

4 REGISTRO FOTOGRÁFICO.

	
ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ASTM - A572 (INCLUYE: SUMINISTRO - FABRICACION - PINTURA - MONTAJE)	ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ASTM - A36 (INCLUYE: SUMINISTRO - FABRICACION - PINTURA - MONTAJE)
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA EN ZINC ARQUITECTÓNICO CAL 30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 (INCLUYE: ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y BAJANTE)
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE EN ZINC CAL.30	VIGAS CINTAS (0,15MX20M) EN CONCRETO 21MPA (INCLUYE ACERO DE REFUERZO SEGÚN DISEÑOS)



ASEO GENERAL

5 INCONVENIENTES PRESENTADOS EN EL DESARROLLO DE LA OBRA.

- Al no contar con el insumo necesario para la fabricación de la estructura de la cubierta, fue necesario llevar a cabo la suspensión del contrato por un periodo de 1 mes calendario. (Se anexa copia de Acta de Suspensión No. 1).
- Teniendo en cuenta el inconveniente antes mencionado, fue necesario llevar a cabo una adición en tiempo al contrato, lo cual garantice la ejecución de las actividades pendientes y de esta manera culminar las actividades y cantidades contratadas inicialmente. (Se anexa copia de Acta de Prorroga No. 1).

6 CONCLUSIONES

El avance físico de obra durante el presente periodo corresponde al 81,63% con relación al 100% del contrato de obra, lo que representa un valor de: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$ 278.698.000,60) MDA/CTE.


El avance físico acumulado de obra es por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS (\$ 341.433.942,16)

MDA/CTE, lo que corresponde a un porcentaje acumulado de obra del 100,00% del total del contrato de obra.

El avance financiero se debe a que la firma contratista SOLUCIONES CIVILES JM SAS ha realizado la ejecución parcial y/o total de algunos ítems del contrato de obra, los cuales fueron descritos anteriormente, se tiene que el avance financiero de obra ejecutado en el presente periodo es por valor de: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$ 278.698.000,60) MDA/CTE, siendo el 81,63% del valor total del contrato de obra.

El avance financiero acumulado de obra equivale a TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS (\$ 341.433.942,16) MDA/CTE, lo que corresponde a un porcentaje acumulado de obra del 100,00% del total del contrato de obra.

Presentó;



SOLUCIONES CIVILES JM SAS

R/L LEYDY YULIETH TEJADA

Contratista de Obra

POLIZAS



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-44-101288873		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 04 12 2024			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 02 12 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 02 02 2030		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL SOLUCIONES CIVILES J.M.S.A.S								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.912.227-3			
DIRECCIÓN: CALLE 10 NO 26-42 BARRIO EL CARMEN								CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO		TELÉFONO: 3133198734	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA								IDENTIFICACIÓN NIT: 846.003.704-1			
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA								CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO		TELÉFONO 3123370616	
ADICIONAL:											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTENIDAS DEL CONTRATO No 004-2024 DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/12/2024	02/06/2025	\$34,143,394.22
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	02/12/2024	02/06/2025	\$170,716,971.08
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	02/12/2024	02/02/2028	\$17,071,697.11
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$34,143,394.22

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****981,225.00	\$ *****20,000.00	\$ *****190,232.00	\$ *****1,191,457.00	\$ *****256,075,456.63	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CRG AGENCIA DE SEGUROS LTDA	143664	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

41-44-101288873

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF143664A

1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-40-101054371		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 04 12 2024			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 02 12 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 02 02 2025		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL SOLUCIONES CIVILES J.M.S.A.S		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.912.227-3	
DIRECCIÓN: CALLE 10 NO 26-42 BARRIO EL CARMEN		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3133198734	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		IDENTIFICACIÓN NIT: 846.003.704-1	
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO 3123370616	
BENEFICIARIO: 846003704 - CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATO No 004-2024 DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

ASEGURADOS: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA IDENTIFICADA CON NIT 846003704-1 Y EL CONTRATISTA
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y CENTRO ETNOEDUCATIVO IDENTIFICADA CON NIT 846003704-1

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG. ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/12/2024	02/02/2025	\$34,143,394.22
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/12/2024	02/02/2025	\$34,143,394.22
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/12/2024	02/02/2025	\$34,143,394.22

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****128,753.00	\$ *****3,000.00	\$ *****25,033.00	\$ *****156,786.00	\$ *****34,143,394.22	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CRG AGENCIA DE SEGUROS LTDA	143664	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101054371

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF143664A

1



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.POLIZA 41-40-101054371		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 04 12 2024			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 02 12 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 02 02 2025		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL SOLUCIONES CIVILES J.M.S.A.S		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.912.227-3	
DIRECCIÓN: CALLE 10 NO 26-42 BARRIO EL CARMEN		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3133198734	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		IDENTIFICACIÓN NIT: 846.003.704-1	
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3123370616	
BENEFICIARIO: 846003704 - CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA			

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/12/2024	02/02/2025	\$34,143,394.22
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/12/2024	02/02/2025	\$34,143,394.22
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/12/2024	02/02/2025	\$34,143,394.22

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101054371

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF143664A

2



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-40-101054371		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 04 03 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 02 12 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 02 02 2025		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE MODIFICACION											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL SOLUCIONES CIVILES J.M.S.A.S		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.912.227-3	
DIRECCIÓN: CALLE 10 NO 26-42 BARRIO EL CARMEN		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3133198734	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		IDENTIFICACIÓN NIT: 846.003.704-1	
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO 3123370616	
BENEFICIARIO: 846003704 - CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D001 / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:
GARANTIZA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATO No 004-2024 DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

ASEGURADOS: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA IDENTIFICADA CON NIT 8460003704-1 Y EL CONTRATISTA
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y CENTRO ETNOEDUCATIVO IDENTIFICADA CON NIT 846003704-1

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES					
AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE APLICA EL ACTA DE INICIO A PARTIR DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2024, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****(128,753.00)	\$ ***** (3,000.00)	\$ ****(25,033.00)	\$ ***** (156,786.00)	\$ ***** (34,143,394.22)	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION OCASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CRG AGENCIA DE SEGUROS LTDA	143664	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101054371

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas



FIRMA TOMADOR

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-44-101288873		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 04 03 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 02 12 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 02 02 2030		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE MODIFICACION											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL SOLUCIONES CIVILES J.M.S.A.S		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.912.227-3	
DIRECCIÓN: CALLE 10 NO 26-42 BARRIO EL CARMEN		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3133198734	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		IDENTIFICACIÓN NIT: 846.003.704-1	
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
ADICIONAL:		TELÉFONO 3123370616	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTENIDAS DEL CONTRATO No 004-2024 DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE APLICA EL ACTA DE INICIO A PARTIR DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2024, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *** (981.225.00)	\$ **** (20.000.00)	\$ *** (190.232.00)	\$ ***** (1.191.457.00)	\$ **** (256.075.456.63)	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CRG AGENCIA DE SEGUROS LTDA	143664	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101288873

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas




FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF143664A

1

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

DLF143664A



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-40-101054371		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 04 03 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 04 12 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 04 02 2025		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL SOLUCIONES CIVILES J.M.S.A.S		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.912.227-3	
DIRECCIÓN: CALLE 10 NO 26-42 BARRIO EL CARMEN		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3133198734	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		IDENTIFICACIÓN NIT: 846.003.704-1	
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO 3123370616	
BENEFICIARIO: 846003704 - CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D001 / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATO No 004-2024 DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

ASEGURADOS: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA IDENTIFICADA CON NIT 8460003704-1 Y EL CONTRATISTA
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y CENTRO ETNOEDUCATIVO IDENTIFICADA CON NIT 8460003704-1

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	04/12/2024	04/02/2025	\$34,143,394.22	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	04/12/2024	04/02/2025	\$34,143,394.22	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	04/12/2024	04/02/2025	\$34,143,394.22	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE APLICA EL ACTA DE INICIO A PARTIR DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2024, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****128,753.00	\$ *****3,000.00	\$ *****25,033.00	\$ *****156,786.00	\$ *****34,143,394.22	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CRG AGENCIA DE SEGUROS LTDA	143664	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101054371

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF143664A

1



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-40-101054371		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 04 03 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 04 12 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 04 02 2025		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SOLUCIONES CIVILES J.M.S.A.S					
DIRECCIÓN: CALLE 10 NO 26-42 BARRIO EL CARMEN					
CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO					
IDENTIFICACIÓN NIT: 900.912.227-3					
TELÉFONO: 3133198734					

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO					
ASEGURADO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA					
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA					
CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO					
IDENTIFICACIÓN NIT: 846.003.704-1					
TELÉFONO: 3123370616					
BENEFICIARIO: 846003704 - CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA					

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	04/12/2024	04/02/2025	\$34,143,394.22	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	04/12/2024	04/02/2025	\$34,143,394.22	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	04/12/2024	04/02/2025	\$34,143,394.22	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101054371

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF143664A

2

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-5

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-44-101288873		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 04 03 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 04 12 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 04 02 2030		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL SOLUCIONES CIVILES J.M.S.A.S		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.912.227-3	
DIRECCIÓN: CALLE 10 NO 26-42 BARRIO EL CARMEN		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3133198734	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		IDENTIFICACIÓN NIT: 846.003.704-1	
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO 3123370616	
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTENIDAS DEL CONTRATO No 004-2024 DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/12/2024	04/06/2025	\$34,143,394.22	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	04/12/2024	04/06/2025	\$170,716,971.08	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	04/12/2024	04/02/2028	\$17,071,697.11	
LABORALES				
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$34,143,394.22	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE APLICA EL ACTA DE INICIO A PARTIR DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2024, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****981,225.00	\$ *****20,000.00	\$ *****190,232.00	\$ *****1,191,457.00	\$ *****256,075,456.63	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CRG AGENCIA DE SEGUROS LTDA	143664	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101288873

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF143664A

1

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-44-101288873		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 04 03 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 04 12 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 04 02 2030		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SOLUCIONES CIVILES J.M.S.A.S		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.912.227-3	
DIRECCIÓN: CALLE 10 NO 26-42 BARRIO EL CARMEN		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3133198734	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		IDENTIFICACIÓN NIT: 846.003.704-1	
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3123370616	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101288873

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF143664A

2

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-40-101054371		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 06 03 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 04 12 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 04 03 2025		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL SOLUCIONES CIVILES J.M.S.A.S		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.912.227-3	
DIRECCIÓN: CALLE 10 NO 26-42 BARRIO EL CARMEN		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3133198734	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		IDENTIFICACIÓN NIT: 846.003.704-1	
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO 3123370616	
BENEFICIARIO: 846003704 - CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D001 / 31-03-22-1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATO No 004-2024 DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

ASEGURADOS: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA IDENTIFICADA CON NIT 8460003704-1 Y EL CONTRATISTA
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y CENTRO ETNOEDUCATIVO IDENTIFICADA CON NIT 846003704-1

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	04/12/2024	04/03/2025	\$34,143,394.22	\$34,143,394.22
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	04/12/2024	04/03/2025	\$34,143,394.22	\$34,143,394.22
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	04/12/2024	04/03/2025	\$34,143,394.22	\$34,143,394.22

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIA DEL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, CONFORME ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 DEL 27 DE ENERO DEL 2025, ACTA DE REINICIO No. 1 DEL 27 DE FEBRERO DEL 2025 DEL CONTRATO No. 004-2024, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****58,146.00	\$ *****3,000.00	\$ *****11,617.00	\$ *****72,764.00	\$ *****34,143,394.22	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CRG AGENCIA DE SEGUROS LTDA	143664	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101054371

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF143664A

1

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.POLIZA 41-40-101054371		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 06 03 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 04 12 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 04 03 2025		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SOLUCIONES CIVILES J.M.S.A.S	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.912.227-3
DIRECCIÓN: CALLE 10 NO 26-42 BARRIO EL CARMEN	CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO
TELÉFONO: 3133198734	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO	
ASEGURADO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA	IDENTIFICACIÓN NIT: 846.003.704-1
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA	CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO
TELÉFONO: 3123370616	
BENEFICIARIO: 846003704 - CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA	

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	04/12/2024	04/03/2025	\$34,143,394.22	\$34,143,394.22
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	04/12/2024	04/03/2025	\$34,143,394.22	\$34,143,394.22
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	04/12/2024	04/03/2025	\$34,143,394.22	\$34,143,394.22

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101054371

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF143664A

2



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-44-101288873		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 06 03 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 04 12 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 04 02 2030		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL SOLUCIONES CIVILES J.M.S.A.S		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.912.227-3	
DIRECCIÓN: CALLE 10 NO 26-42 BARRIO EL CARMEN		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3133198734	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		IDENTIFICACIÓN NIT: 846.003.704-1	
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
ADICIONAL:		TELÉFONO 3123370616	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:
EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTENIDAS DEL CONTRATO No 004-2024 DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/12/2024	04/07/2025	\$34,143,394.22	\$34,143,394.22
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	04/12/2024	04/06/2025	\$170,716,971.08	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	04/12/2024	04/02/2028	\$17,071,697.11	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$34,143,394.22	\$34,143,394.22

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO, CONFORME ACTA DE SUSPENSION No. 1 DEL 27 DE ENERO DEL 2025, ACTA DE REINICIO No. 1 DEL 27 DE FEBRERO DEL 2025 DEL CONTRATO No. 004-2024, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****256,075,456.63	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CRG AGENCIA DE SEGUROS LTDA	143664	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101288873

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF143664A

1



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.POLIZA 41-44-101288873		ANEXO 3		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 06 03 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 04 12 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 04 02 2030			A LAS HORAS 23:59	
										TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA		

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SOLUCIONES CIVILES J.M.S.A.S		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.912.227-3	
DIRECCIÓN: CALLE 10 NO 26-42 BARRIO EL CARMEN		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3133198734	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		IDENTIFICACIÓN NIT: 846.003.704-1	
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3123370616	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101288873

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF143664A

2

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-40-101054371		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 06 03 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 04 12 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 04 04 2025		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL SOLUCIONES CIVILES J.M.S.A.S		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.912.227-3	
DIRECCIÓN: CALLE 10 NO 26-42 BARRIO EL CARMEN		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3133198734	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		IDENTIFICACIÓN NIT: 846.003.704-1	
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
BENEFICIARIO: 846003704 - CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		TELÉFONO 3123370616	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D001 / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATO No 004-2024 DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

ASEGURADOS: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA IDENTIFICADA CON NIT 8460003704-1 Y EL CONTRATISTA

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y CENTRO ETNOEDUCATIVO IDENTIFICADA CON NIT 8460003704-1

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	04/12/2024	04/04/2025	\$34,143,394.22	\$34,143,394.22
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	04/12/2024	04/04/2025	\$34,143,394.22	\$34,143,394.22
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	04/12/2024	04/04/2025	\$34,143,394.22	\$34,143,394.22

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA ARriba CITADA POR EL TERMINO DE 1 MESES, CONFORME ACTA DE PRORROGA No. 1 DEL 27 DE FEBRERO DEL 2025 DEL CONTRATO No.004-2024, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****64,376.00	\$ *****3.000.00	\$ *****12,801.00	\$ *****80,178.00	\$ *****34,143,394.22	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CRG AGENCIA DE SEGUROS LTDA	143664	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101054371

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oieda - Vicepresidente de Finanzas



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF143664A

1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-40-101054371		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 06 03 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 04 12 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 04 04 2025		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SOLUCIONES CIVILES J.M.S.A.S		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.912.227-3	
DIRECCIÓN: CALLE 10 NO 26-42 BARRIO EL CARMEN		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3133198734	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		IDENTIFICACIÓN NIT: 846.003.704-1	
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3123370616	
BENEFICIARIO: 846003704 - CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA			

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	04/12/2024	04/04/2025	\$34,143,394.22	\$34,143,394.22
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	04/12/2024	04/04/2025	\$34,143,394.22	\$34,143,394.22
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	04/12/2024	04/04/2025	\$34,143,394.22	\$34,143,394.22

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101054371

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLE143664A

2

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-5

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-44-101288873		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 06 03 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 04 12 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 04 02 2030		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL SOLUCIONES CIVILES J.M.S.A.S		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.912.227-3	
DIRECCIÓN: CALLE 10 NO 26-42 BARRIO EL CARMEN		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3133198734	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		IDENTIFICACIÓN NIT: 846.003.704-1	
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
ADICIONAL:		TELÉFONO 3123370616	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTENIDAS DEL CONTRATO No 004-2024 DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/12/2024	04/07/2025	\$34,143,394.22	\$34,143,394.22
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	04/12/2024	04/07/2025	\$170,716,971.08	\$170,716,971.08
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	04/12/2024	04/03/2028	\$17,071,697.11	\$17,071,697.11
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$34,143,394.22	\$34,143,394.22

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO Y PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, CONFORME ACTA DE SUSPENSION No. 1 DEL 27 DE ENERO DEL 2025, ACTA DE REINICIO No. 1 DEL 27 DE FEBRERO DEL 2025 DEL CONTRATO No. 004-2024 LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****46,163.00	\$ *****8,000.00	\$ *****10,291.00	\$ *****64,454.00	\$ *****256,075,456.63	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CRG AGENCIA DE SEGUROS LTDA	143664	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101288873

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Queda - Vicepresidente de Finanzas



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF143664A

1

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-44-101288873		ANEXO 4		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 06 03 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 04 12 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 04 02 2030			A LAS HORAS 23:59	
										TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA		

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SOLUCIONES CIVILES J.M.S.A.S		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.912.227-3	
DIRECCIÓN: CALLE 10 NO 26-42 BARRIO EL CARMEN		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3133198734	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		IDENTIFICACIÓN NIT: 846.003.704-1	
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3123370616	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101288873

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF143664A

2



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-44-101288873		ANEXO 5	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 06 03 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 04 12 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 04 02 2030		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL SOLUCIONES CIVILES J.M.S.A.S		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.912.227-3	
DIRECCIÓN: CALLE 10 NO 26-42 BARRIO EL CARMEN		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3133198734	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		IDENTIFICACIÓN NIT: 846.003.704-1	
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO 3123370616	
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTENIDAS DEL CONTRATO No 004-2024 DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/12/2024	04/08/2025	\$34,143,394.22	\$34,143,394.22
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	04/12/2024	04/08/2025	\$170,716,971.08	\$170,716,971.08
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	04/12/2024	04/04/2028	\$17,071,697.11	\$17,071,697.11
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$34,143,394.22	\$34,143,394.22

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA ARRIBA CITADA POR EL TERMINO DE 1 MESES, CONFORME ACTA DE PRORROGA No. 1 DEL 27 DE FEBRERO DEL 2025 DEL CONTRATO No.004-2024, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****56,547.00	\$ *****8,000.00	\$ *****12,263.00	\$ *****76,811.00	\$ *****256,075,456.63	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CRG AGENCIA DE SEGUROS LTDA	143664	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101288873

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-44-101288873		ANEXO 5	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 06 03 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 04 12 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 04 02 2030		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SOLUCIONES CIVILES J.M.S.A.S		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.912.227-3	
DIRECCIÓN: CALLE 10 NO 26-42 BARRIO EL CARMEN		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3133198734	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		IDENTIFICACIÓN NIT: 846.003.704-1	
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3123370616	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101288873

FIRMA AUTORIZADA: José Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF143664A

2



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-44-101288873		ANEXO 6	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 21 04 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 04 12 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 04 02 2030		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO											
NOMBRE O RAZON SOCIAL SOLUCIONES CIVILES J.M.S.A.S										IDENTIFICACIÓN NIT: 900.912.227-3	
DIRECCIÓN: CALLE 10 NO 26-42 BARRIO EL CARMEN						CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO		TELÉFONO: 3133198734			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO											
ASEGURADO / BENEFICIARIO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA										IDENTIFICACIÓN NIT: 846.003.704-1	
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA						CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO		TELÉFONO 3123370616			
ADICIONAL:											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTENIDAS DEL CONTRATO No 004-2024 DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/12/2024	04/08/2025	\$34,143,394.22	\$34,143,394.22
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	04/12/2024	04/08/2025	\$170,716,971.08	\$170,716,971.08
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	04/12/2024	04/04/2028	\$17,071,697.11	\$17,071,697.11
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	20/03/2025	04/02/2030	\$34,143,394.22	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE APLICA EL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO No 004-2024 A PARTIR DEL 20 DE MARZO DEL 2025, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****256,075,456.63	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CRG AGENCIA DE SEGUROS LTDA	143664	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101288873

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF143664A

1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.POLIZA 41-44-101288873		ANEXO 6	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 21 04 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 04 12 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 04 02 2030		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL SOLUCIONES CIVILES J.M.S.A.S		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.912.227-3	
DIRECCIÓN: CALLE 10 NO 26-42 BARRIO EL CARMEN		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3133198734	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		IDENTIFICACIÓN NIT: 846.003.704-1	
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3123370616	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101288873

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF143664A

2

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-44-101288873		ANEXO 7	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 21 04 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 04 12 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 20 03 2030		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL SOLUCIONES CIVILES J.M.S.A.S		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.912.227-3	
DIRECCIÓN: CALLE 10 NO 26-42 BARRIO EL CARMEN		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3133198734	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		IDENTIFICACIÓN NIT: 846.003.704-1	
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
ADICIONAL:		TELÉFONO 3123370616	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTENIDAS DEL CONTRATO No 004-2024 DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/12/2024	04/08/2025	\$34,143,394.22	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	04/12/2024	04/08/2025	\$170,716,971.08	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	04/12/2024	04/04/2028	\$17,071,697.11	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	20/03/2025	20/03/2030	\$34,143,394.22	\$34,143,394.22

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA A PARTIR DEL 20 DE MARZO DEL 2025 HASTA EL 20 DE MARZO DEL 2030, CONFORME ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO No 004-2024, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****256,075,456.63	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CRG AGENCIA DE SEGUROS LTDA	143664	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101288873

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Queda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF143664A

1



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-44-101288873		ANEXO 7	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 21 04 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 04 12 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 20 03 2030		A LAS HORAS 23:59	
										TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SOLUCIONES CIVILES J.M.S.A.S		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.912.227-3	
DIRECCIÓN: CALLE 10 NO 26-42 BARRIO EL CARMEN		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3133198734	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		IDENTIFICACIÓN NIT: 846.003.704-1	
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3123370616	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101288873

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF143664A

2

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

BITACORAS


	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		ANEXO			H O J A
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES		1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024		MES SEMANA	DICIEMBRE 1		

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	miércoles, 4 de diciembre de 2024	TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS	1

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se inicia con el ingreso de personal, equipos y herramienta menor desde el casco urbano del municipio de Puerto Asis, para proceder a la instalación del personal externo de la zona y de esta manera dar inicio a las actividades de obra contempladas en el contrato.

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	8	Residente de Obra	1		
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANNENYS PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoria
SOLUCIONES CIVILES JM S.A.S.	INCAM S.A.S. ZOMAC



	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		ANEXO			H O J A
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES		3			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024		MES DICIEMBRE	SEMANA 1		
						2

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	jueves, 5 de diciembre de 2024	TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS	2

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se continua con el ingreso de personal, equipos y herramienta menor desde el casco urbano del municipio de Puerto Asis, para proceder a la instalaci3n del personal externo de la zona y de esta manera dar inicio a las actividades de obra contempladas en el contrato.

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	8	Residente de Obra	1		
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES
No se realizaron labores por bajos niveles del r3o por ausencia de lluvia, lo cual no permitio el ingreso de motor fuera de borda.

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNYS PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoria
SOLUCIONES CIVILES JM S.A.S.	INCAM S.A.S. ZOMAC



	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		ANEXO			H O J A
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES		1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024		MES SEMANA	DICIEMBRE 2		
						3

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	viernes, 6 de diciembre de 2024	TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS	3

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se realiza el cerramiento del área de trabajo con lona verde de 2 metros de altura en una longitud total de 127 metros

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	8	Residente de Obra	1	Pulidora	8
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNY'S PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoria
SOLUCIONES CIVILES JM S.A.S.	INCAM S.A.S. ZOMAC



	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		ANEXO			H O J A
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES		1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024		MES SEMANA	ENERO 2		

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S. ZOMAC		
FECHA REPORTE	sábado, 7 de diciembre de 2024	TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS	4

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se realiza la localización y replanteo del área de trabajo: 347,58 metros cuadrados
Se determina que se iniciará con las actividades contempladas dentro del capítulo de REPELO, ESTUCO Y PINTURA
El capítulo de ESTRUCTURAS METÁLICAS y CUBIERTA se iniciará una vez se cuente con el acero de la estructura de cubierta

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	5	Residente de Obra	1		
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	5				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNYS PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoría
SOLUCIONES CIVILES JM S.A.S.	INCAM S.A.S. ZOMAC



	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA	ANEXO			H O J A 5
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES	1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024	MES SEMANA	ENERO 2		

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	lunes, 9 de diciembre de 2024	TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS	5

ACTIVIDADES REALIZADAS
Retiro de repello deteriorado, para proceder a actividades de resane con mortero impermeabilizado: 30 metros cuadrados

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	8	Residente de Obra	1		
Nublado		Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNY PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoria
SOLUCIONES CIVILES JM S.A.S.	INCAM S.A.S. ZOMAC



	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA	ANEXO			H O J A 6
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES	1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024	MES SEMANA	ENERO 2		

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	martes, 10 de diciembre de 2024		TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS 6

ACTIVIDADES REALIZADAS
Resane con MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 en áreas deterioradas: 12 metros cuadrados
Se continua con retiro de repello deteriorado, para proceder a actividades de resane con mortero impermeabilizado: 25,16 metros cuadrados

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	8	Residente de Obra	1		
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNYS PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoria
SOLUCIONES CIVILES JM S.A.S.	INCAM S.A.S. ZOMAC



	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		ANEXO			H O J A
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES		1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024		MES SEMANA	ENERO 2		

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	miércoles, 11 de diciembre de 2024	TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS	7

ACTIVIDADES REALIZADAS
Resane con MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 en áreas deterioradas:13 metros cuadrados

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	8	Residente de Obra	1		
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNY PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoria
SOLUCIONES CIVILES JM S.A.S.	INCAM S.A.S. ZOMAC


	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		ANEXO			H O J A
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES		1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024		MES SEMANA	ENERO 2		

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	jueves, 12 de diciembre de 2024	TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS	8

ACTIVIDADES REALIZADAS
Resane con MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 en áreas deterioradas: 12 metros cuadrados
Filos y Dilataciones

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	8	Residente de Obra	1		
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANNENYS PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoría
SOLUCIONES CIVILES JM S.A.S.	INCAM S.A.S. ZOMAC



	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		ANEXO			H O J A 9
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES		1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024		MES SEMANA	ENERO 3		

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	viernes, 13 de diciembre de 2024	TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS	9

ACTIVIDADES REALIZADAS	
Resane con MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 en áreas deterioradas: 15 metros cuadrados	
Filos y Dilataciones	

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	8	Residente de Obra	1		
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNY S. PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoria
SOLUCIONES CIVILES JM S.A.S.	INCAM S.A.S. ZOMAC



	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		ANEXO			H O J A
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES		1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024		MES SEMANA	ENERO 3		

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	sábado, 14 de diciembre de 2024	TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS	10

ACTIVIDADES REALIZADAS
Resane con MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 en áreas deterioradas: 3,16 metros cuadrados
Filos y Dilataciones

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	5	Residente de Obra	1		
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	5				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNYS PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoria


	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA	ANEXO			H O J A
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES	1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024	MES SEMANA	ENERO 3		

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	lunes, 16 de diciembre de 2024	TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS	11

ACTIVIDADES REALIZADAS
Aplicación de Estuco Plastico para muros interiores y exteriores: 14 metros cuadrados

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	8	Residente de Obra	1		
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNYS PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoría



	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		ANEXO		H O J A
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES				
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024		MES SEMANA		

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	martes, 17 de diciembre de 2024		TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS 12

ACTIVIDADES REALIZADAS
Aplicación de Estuco Plastico para muros interiores y exteriores: 16 metros cuadrados

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	8	Residente de Obra	1		
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovisna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNYS PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoría
