

**INFORME DE
SUPERVISIÓN
DE
INTERVENTORIA
Nº1**



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1



CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
PERIODO DE INFORME: DEL 04/12/2024 AL 04/01/2025

PROYECTO CÓDIGO BPIN No. 2023006860290

**"MEJORAMIENTO D AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL
BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL INSTITUCION DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO"**

**DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
ENERO 2025**



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1



CONTENIDO

1. INTRODUCCION.
2. LOCALIZACION DEL PROYECTO.
3. INFORMACION ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA.
4. REGISTRÓ FOTOGRÁFICO.
5. CONCLUSIONES.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1



1. INTRODUCCIÓN

El CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL adelanta el proyecto identificado con código BPIN No. 2023006860290, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO D AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL INSTITUCION DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" por un valor inicial de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 368.748.657,53) MDA/CTE, con el fin de llevar a cabo el mejoramiento de la infraestructura educativa del CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL.

El mejoramiento de la infraestructura del CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL surge a raíz de la necesidad de brindar espacios dignos donde se puedan realizar diferentes actividades académicas y lúdicas de la institución, ampliando de esta manera las oportunidades educativas para comunidades desfavorecidas.

En cumplimiento a mis obligaciones como supervisor me permito exponer el estado administrativo, técnico y financiero en el que se encuentra actualmente el proyecto.

En la actualidad el proyecto se encuentra en ejecución desde el día 04/12/2024 y con fecha de finalización el día 04/02/2025 de acuerdo Acta de Inicio de fecha 04/12/2024.




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto identificado con código BPIN No. 2023006860290 se localiza en la Vereda Buenavista en del Municipio de Puerto Asís – Putumayo. En las siguientes imágenes se aprecia su ubicación exacta:

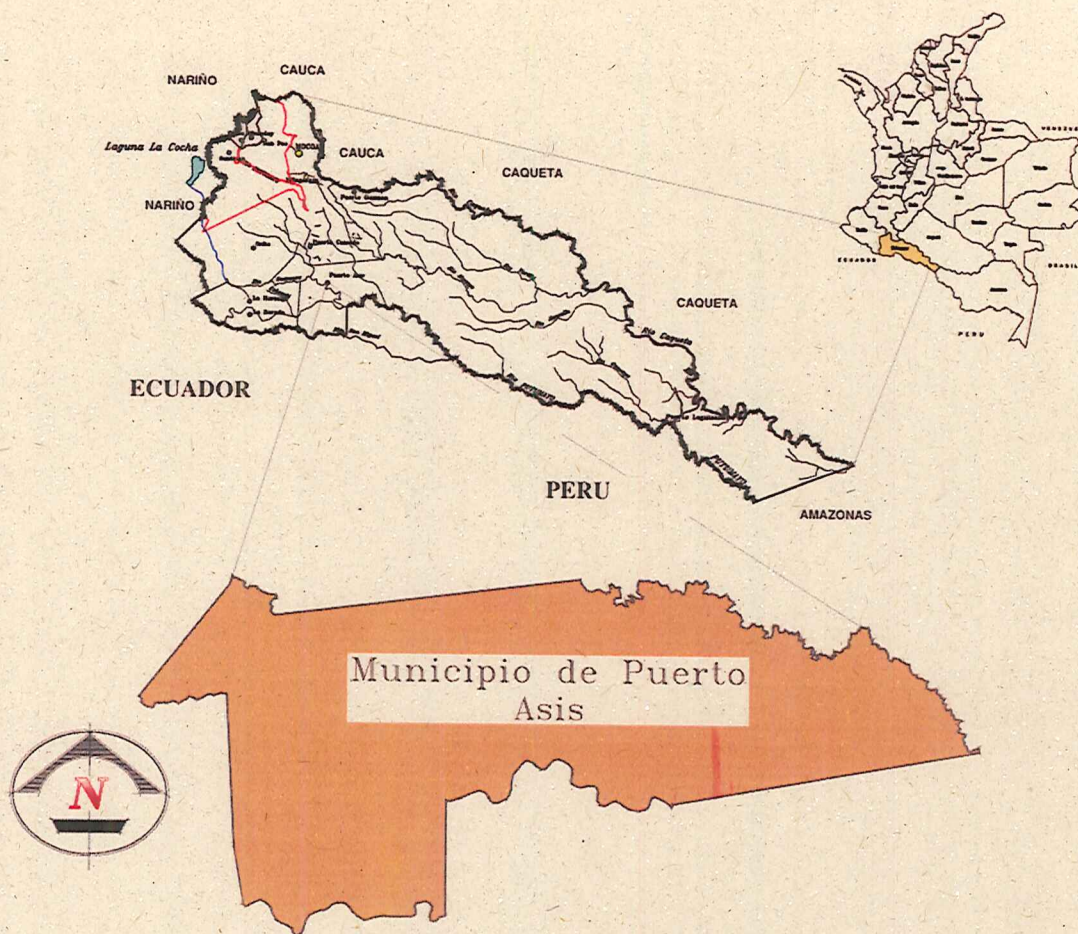



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1



3. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA TÉCNICA Y FINANCIERA

3.1. ASPECTO ADMINISTRATIVO, GENERALIDADES DEL PROYECTO.

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO			
CÓDIGO BPIN:	2023006860290		
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DAMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL INSTITUCION DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
EJECUTOR:	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA	NIT	846003704-1
	R.L. HUMBERTO ERNEY PIAGUAJE	C.C.	18.124.339



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

VALOR INICIAL DEL PROYECTO:	TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 368.748.657,53) MDA/CTE
PLAZO INICIAL DEL PROYECTO:	DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL ACUMULADO:	DOS (02) MESES

Para dar cumplimiento al proyecto identificado con código BPIN No. 2023006860290, el CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL se encuentra ejecutando el Contrato de Obra Pública No 004-2024 que se suscribió con la empresa SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S. Nit. 900912227-3, representada legalmente por LEYDY YULIETH TEJADA, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.123.207.998 de Puerto Asís (Putumayo) por un valor de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS (\$ 341.433.942,16) MDA/CTE y un plazo inicial de DOS (02) meses, bajo las siguientes condiciones:

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR
1.0	PRELIMINARES				
1.1	Localización y Replanteo	M2	347,58	\$ 2.303	\$ 800.320,14
1.2	Cerramiento en Polisombra	M2	253,60	\$ 17.100	\$ 4.336.560,94
1.3	Desmonte de Cubierta y Estructura Portante	M2	516,13	\$ 20.277	\$ 10.465.779,50
				Sub-total	\$ 15.602.660,57
2.0	ESTRUCTURAS METÁLICAS				
2.1	Estructura metalica en Acero ASTM - A572 (incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	KG	1373,36	\$ 29.784	\$ 40.903.909,15
2.2	Estructura metalica en Acero ASTM - A36 (Incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	KG	2772,78	\$ 28.944	\$ 80.255.003,14
2.3	Templetes, Barra Lisa de 1/2", Incluye Pintura Anticorrosiva y Esmalte	M	65,82	\$ 47.896	\$ 3.152.503,71
2.4	Contravientos, Barra Lisa de 1/2", Incluye Pintura Anticorrosiva y Esmalte	M	137,93	\$ 49.759	\$ 6.863.295,99
				Sub-total	\$ 131.174.711,99
3.0	CUBIERTA				
3.1	Suministro e Instalación de Teja en Zinc Arquitectónico Cal 30	M2	516,13	\$ 84.015	\$ 43.362.779,52
3.2	Suministro e Instalación de Canal en lamina galvanizada cal. 20 (incluye: accesorios de instalación y bajante)	M	98,29	\$ 174.316	\$ 17.132.608,11
3.3	Suministro e instalación caballete en Zinc Cal.30	M	48,50	\$ 81.431	\$ 3.949.404,28
				Sub-total	\$ 64.444.791,91
4.0	REPELLO, ESTUCO Y PINTURA				
4.1	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	55,16	\$ 47.518	\$ 2.621.248,49
4.2	Estuco Plastico para muros interiores y exteriores	M2	55,16	\$ 27.347	\$ 1.508.538,54
4.3	Aplicación de Pintura TIPO I para interiores	M2	532,58	\$ 26.464	\$ 14.094.069,80
4.4	Aplicación de Pintura TIPO I para exteriores	M2	168,62	\$ 28.606	\$ 4.823.422,08
4.5	Aplicación de Pintura 3 en 1 para carpinteria metálica	M2	95,45	\$ 37.199	\$ 3.550.757,98
				Sub-total	\$ 26.598.036,89
5.0	CONCRETOS				
5.1	Vigas Cintas (0,15Mx20M) en concreto 21MPa (incluye acero de refuerzo según diseños)	M3	1,96	\$ 2.836.742	\$ 5.560.013,46
				Sub-total	\$ 5.560.013,46
6.0	ASEO				
6.1	ASEO GENERAL	M2	698,41	\$ 1.422	\$ 993.075,67
				Sub-total	\$ 993.075,67



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 244.373.290,49
ADMINISTRACION	29,00%	\$ 70.868.254,24
UTILIDAD	5,00%	\$ 12.218.664,52
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 2.443.732,90
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 85.530.651,67
PMA		\$ 11.530.000,00
COSTO TOTAL DE LA OBRA		\$ 341.433.942,16

De igual manera, el CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL se encuentra ejecutando el Contrato de Interventoría No 003-2024 que se suscribió con la empresa INCAM S.A.S ZOMAC NIT. 901.310.022-0, representada legalmente por KARINA LILIBETH PÉREZ PASCUAZA, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.006.962.043 de Puerto Caicedo (Putumayo), por un valor inicial de VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 24.457.143,58) MDA/CTE.E y un plazo inicial de DOS (02) meses.

Al día del presente informe tenemos las siguientes condiciones en el Contra de Obra Pública No. 004-2024:

CONTRATO DE OBRA No. 004-2024			
Objeto del Contrato	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
Contratista:	SOLUCIONES CIVILES J.M S.A.S. R.L. LEYDY YULIETH TEJADA	NIT. C.C.	900912227-3 1.123.207.998 de Puerto Asís (Putumayo)
Interventor:	INCAM S.A.S ZOMAC R.L. KARINA LILIBETH PÉREZ PASCUAZA	NIT. C.C.	901310022-0 1.006.962.043 de Puerto Caicedo (Putumayo)
Supervisor del Contrato:	HUMBERTO ERNEY PIAGUAJE	C.C.	18.124.339
Valor total del contrato:	TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS (\$ 341.433.942,16) MDA/CTE		
Plazo Inicial del Contrato:	DOS (02) MESES		
Fecha Inicio del Contrato:	04	DICIEMBRE	2024
Fecha de Terminación No. 1:	04	FEBRERO	2025

Y del Contrato de Interventoría No 003-2024:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 003-2024



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

Objeto del Contrato	INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL INSTITUCION DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
Interventor:	INCAM S.A.S ZOMAC R.L. KARINA LILIBETH PÉREZ PASCUAZA	NIT. C.C.	901310022-0 1.006.962.043 de Puerto Caicedo (Putumayo)
Supervisor del Contrato:	HUMBERTO ERNEY PIAGUAJE	C.C.	18.124.339
Valor total del contrato:	VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 24.457.143,58) MDA/CTE.		
Plazo Inicial del Contrato:	DOS (02) MESES		
Fecha Inicio del Contrato:	04	DICIEMBRE	2024
Fecha de Terminación No. 1:	04	FEBRERO	2025

A la fecha del presente informe los contratos se encuentran vigentes y en ejecución.

Es así como podemos determinar que el Proyecto se encuentra en las siguientes condiciones:

3.2.AVANCE FISICO DEL CONVENIO

El avance físico reportado en el siguiente cuadro corresponde a la obra ejecutada.

AVANCE FÍSICO ACUMULADO

18,37%



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1



PRESUPUESTO OFICIAL CANTIDADES CONTRATADAS						CANTIDADES Y VALOR EJECUTADO MES 1			CANTIDADES Y VALOR ACUMULADO		
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.0	PRELIMINARES										
1.1	Localización y Replanteo	M2	347,58	\$ 2.303	\$ 800.320,14	347,58	\$ 800.320,14	347,58	\$ 800.320,14		\$ 800.320,14
1.2	Cerramiento en Polislombra	M2	253,60	\$ 17.100	\$ 4.336.560,94	253,60	\$ 4.336.560,94	253,60	\$ 4.336.560,94		\$ 4.336.560,94
1.3	Desmonte de Cubierta y Estructura Portante	M2	516,13	\$ 20.277	\$ 10.465.779,50	516,13	\$ 10.465.779,50	516,13	\$ 10.465.779,50		\$ 10.465.779,50
				Sub-total	\$ 15.602.660,57		\$ 15.602.660,57		\$ 15.602.660,57		\$ 15.602.660,57
2.0	ESTRUCTURAS METÁLICAS										
2.1	Estructura metálica en Acero ASTM - A572 (incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje)	KG	1373,36	\$ 29.784	\$ 40.903.909,15	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00
2.2	Estructura metálica en Acero ASTM - A36 (incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje)	KG	2772,78	\$ 28.944	\$ 80.255.003,14	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00
2.3	Templateles, Barra Lisa de 1/2", Incluye Pintura Anticorrosiva y Esmalte	M	65,82	\$ 47.896	\$ 3.152.503,71	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00
2.4	Contravientos, Barra Lisa de 1/2", Incluye Pintura Anticorrosiva y Esmalte	M	137,93	\$ 49.759	\$ 6.863.295,99	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00
				Sub-total	\$ 131.174.711,99		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00
3.0	CUBIERTA										
3.1	Suministro e Instalación de Teja en Zinc Arquitectónico Cal 30	M2	516,13	\$ 84.015	\$ 43.362.779,52	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00
3.2	Suministro e Instalación de Canal en lamina galvanizada cal. 20 (incluye: accesorios de instalación y bajante)	M	98,29	\$ 174.316	\$ 17.132.608,11	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00
3.3	Suministro e instalación caballete en Zinc Cal. 30	M	48,50	\$ 81.431	\$ 3.949.404,28	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00
				Sub-total	\$ 64.444.791,91		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00
4.0	REPELLO, ESTUCO Y PINTURA										
4.1	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	55,16	\$ 47.518	\$ 2.621.248,49	55,16	\$ 2.621.248,49	55,16	\$ 2.621.248,49		\$ 2.621.248,49
4.2	Estuco Plástico para muros interiores y exteriores	M2	55,16	\$ 27.347	\$ 1.508.538,54	55,16	\$ 1.508.538,54	55,16	\$ 1.508.538,54		\$ 1.508.538,54
4.3	Aplicación de Pintura TIPO I para interiores	M2	532,58	\$ 26.464	\$ 14.094.069,80	532,58	\$ 14.094.069,80	532,58	\$ 14.094.069,80		\$ 14.094.069,80
4.4	Aplicación de Pintura TIPO I para exteriores	M2	168,62	\$ 28.606	\$ 4.823.422,08	168,62	\$ 4.823.422,08	168,62	\$ 4.823.422,08		\$ 4.823.422,08
4.5	Aplicación de Pintura 3 en 1 para carpintería metálica	M2	95,45	\$ 37.199	\$ 3.550.757,98	95,45	\$ 3.550.757,98	95,45	\$ 3.550.757,98		\$ 3.550.757,98
				Sub-total	\$ 26.598.036,89		\$ 26.598.036,89		\$ 26.598.036,89		\$ 26.598.036,89
5.0	CONCRETOS										
5.1	Vigas Cintas (0,15Mx20M) en concreto 21MPa (incluye acero de refuerzo según diseños)	M3	1,96	\$ 2.836.742	\$ 5.560.013,46	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00
				Sub-total	\$ 5.560.013,46		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00
6.0	ASEO										
6.1	ASEO GENERAL	M2	698,41	\$ 1.422	\$ 993.075,67	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00
				Sub-total	\$ 993.075,67		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 244.373.280,49		\$ 42.200.697,45		\$ 42.200.697,45		\$ 42.200.697,45



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

ADMINISTRACION	29,00%	\$ 70.868.254,24
UTILIDAD	5,00%	\$ 12.218.664,52
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 2.443.732,90
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 85.530.651,67
PMA		\$ 11.530.000,00
COSTO TOTAL DE LA OBRA		\$ 341.433.942,16

VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 341.433.942,16
VALOR EJECUTADO MES 1	\$ 62.735.941,56
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	\$ 62.735.941,56
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 278.698.000,60
% DE AVANCE MES 1	18,37%
% DE AVANCE ACUMULADO	18,37%
% DE AVANCE PENDIENTE POR EJECUTAR	81,63%

\$ 12.238.202,26
\$ 2.110.034,87
\$ 422.006,97
\$ 14.770.244,11
\$ 5.765.000,00
\$ 62.735.941,56

\$ 12.238.202,26
\$ 2.110.034,87
\$ 422.006,97
\$ 14.770.244,11
\$ 5.765.000,00
\$ 62.735.941,56



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1



3.3. ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO

El valor total del proyecto asciende a la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 368.748.657,53) MDA/CTE, Correspondientes a TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS (\$ 341.433.942,16) MDA/CTE para OBRA, y VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 24.457.143,58) MDA/CTE para INTERVENTORÍA. En concordancia con el presupuesto establecido en el proyecto Registrado BPIN No. 2023006860290. El valor total del convenio será financiado con recursos del Departamento del Putumayo.

Para la ejecución del contrato de obra el CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL expide el CDP No. 13 de 2024 de fecha 29/10/2024 en el cual se comprometen TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS (\$ 341.433.942,16) MDA/CTE.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
CREADA MEDIANTE DECRETO 0293 DE FEBRERO 24 DE 2003
CODIGO DANE No 28066000309
NIT 846003704-1



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

N° 13 2024

EL SUSCRITO DIRECTOR DEL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA HACE CONSTAR:

Que en el presupuesto de la vigencia 2024, existe disponibilidad presupuestal así:

CODIGO PRESUPUESTAL	032107
RUBRO PRESUPUESTAL	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
OBJETO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	RECURSOS GOBERNACION SEGUN RESOLUCION 4470 DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$ 341.433.942,16
VALOR EN LETRAS	TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS
FECHA DE CDP	29 DE OCTUBRE 2024

HUMBERTO HERNEY PIAGUAJE
C.C. N° 18124339
DIRECTOR



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1



De igual manera para la ejecución del contrato de interventoría el CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL expide el CDP No. 14 de 2024 de fecha 29/10/2024 en el cual se comprometen VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 27.314.715,37) MDA/CTE.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
CREADA MEDIANTE DECRETO 0293 DE FEBRERO 24 DE 2003
CODIGO DANE No 28464000339
NIT 846003704-1



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

N° 14 2024

EL SUSCRITO DIRECTOR DEL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA HACE
CONSTAR:

Que en el presupuesto de la vigencia 2024, existe disponibilidad presupuestal así:

CÓDIGO PRESUPUESTAL	032107
RUBRO PRESUPUESTAL	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	RECURSOS GOBIERNACIÓN SEGUN RESOLUCION 4470 DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$ 27.314.715,37
VALOR EN LETRAS	VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS
FECHA DE CDP	29 DE OCTUBRE 2024

HUMBERTO HERNEY PIAGUAJE
C.C. N° 18124339
DIRECTOR

Una vez contratados los procesos de obra e interventoría se emiten los siguientes Registros Presupuestales:



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
CREADA MEDIANTE DECRETO 0073 DE FEBRERO 24 DE 2003
CÓDIGO DANE RA 38656600359
NIT 846003704-1



REGISTRO PRESUPUESTAL

Nº 14 2024

EL SUSCRITO DIRECTOR DEL CER BUENAVISTA HACE CONSTAR:

Que en el Presupuesto del Fondo de Servicios Educativos, para la vigencia del Primero (1º) de Enero al Treinta y uno (31) de Diciembre del año 2024 existe Disponibilidad para Contratar y Reserva Presupuestal denominada así:

FECHA DE RP	04 DE DICIEMBRE 2024
RUBRO PRESUPUESTAL	INTERVENTORIA CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DETALLE DEL GASTO	HONORARIOS
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	RECURSOS GOBERNACION SEGUN RESOLUCION 4470 DEL 10 DE OCTUBRE DEL
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
NOMBRE DEL PROVEEDOR	INCAM S.A.S. ZOMAC
NIT DEL PROVEEDOR	901.310.022-0
VALOR A PAGAR EN PESOS	\$ 24.457.143,58
VALOR EN LETRAS	VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS
FECHA DE CDP	29 DE OCTUBRE 2024

HUMBERTO HERNEY PIAGUAJE
C.C. N° 18124339
DIRECTOR

En el periodo del presente de informe tenemos una relación de avance como se relaciona a continuación:

El avance de Obra a la fecha se relaciona así:

DESCRIPCIÓN	VALORES CONTRATO DE OBRA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 341.433.942,16
VALOR PAGO ANTICIPO	\$ 182.945.542,87
VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE INFORME	\$ 62.735.941,56
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	\$ 62.735.941,56
VALOR SALDO POR EJECUTAR	\$ 278.698.000,60
% DE RECURSO EJECUTADO EN EL PRESENTE INFORME	18,37%
% DE RECURSO TOTAL EJECUTADO	18,37%
% DE RECURSO POR EJECUTAR	81,63%

De igual manera el avance de interventoría a la fecha se relaciona así:

DESCRIPCIÓN	VALORES CONTRATO DE INTERVENTORÍA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 24.457.143,58
VALOR PAGO ANTICIPO	\$ 12.228.571,79



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE INFORME	\$ 5.018.875,33
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	\$ 5.018.875,33
VALOR SALDO POR EJECUTAR	\$ 19.438.268,25
% DE RECURSO EJECUTADO EN EL PRESENTE INFORME	20,52%
% DE RECURSO EJECUTADO	20,52%
% DE RECURSO POR EJECUTAR	79,48%

En resumen, tenemos el siguiente estado financiero del proyecto hasta la fecha:

Valor inicial del Proyecto:	\$ 368.748.657,53
Valor del contrato de Obra:	\$ 341.433.942,16
Valor del contrato de Interventoría:	\$ 24.457.143,58
Valor Final (Obra + Interventoría):	\$ 365.891.085,74
Diferencia valor Inicial y Valor Final (Saldo a favor del Departamento):	\$ 2.857.571,79
Valor Ejecutado en el presente Informe:	\$ 67.754.816,89
Valor Total Ejecutado:	\$ 67.754.816,89
Pagos Realizados al Contrato de Obra:	\$ 182.945.542,87
Pagos realizados al Contrato de Interventoría:	\$ 12.228.571,79
Total Pagos Realizados:	\$ 195.174.114,66
Pago Pendiente por pagar Obra:	\$ 182.945.542,87
Pago Pendiente por pagar Interventoría:	\$ 12.228.571,79
Valor Total pendiente por pagar:	\$ 195.174.114,66

A la fecha del presente informe se tiene que los contratos de obra e interventoría derivados del proyecto, se encuentran en ejecución.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1



4. REGISTRO FOTOGRAFICO, ESTADO ACTUAL DE LA OBRA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
LOCALIZACION Y REPLANTEO	CERRAMIENTO
DESMONTE DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA PORTANTE	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1



ESTUCO PLASTICO PARA MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



APLICACIÓN DE PINTURA TIPO I PARA INTERIORES

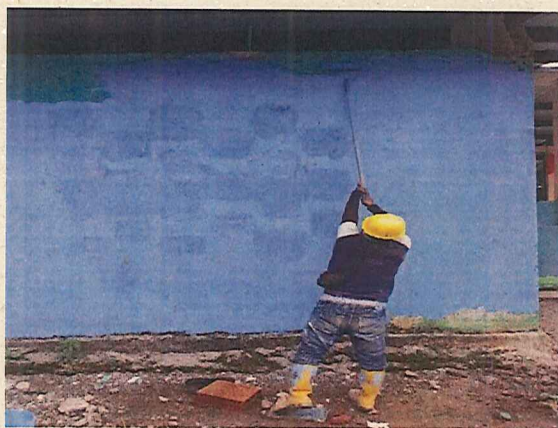

APLICACIÓN DE PINTURA TIPO I PARA EXTERIORES



APLICACIÓN DE PINTURA 3 EN 1 PARA CARPINTERIA METÁLICA

5. CONCLUSIONES



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1



- Que el porcentaje de avance físico de las obras a la fecha del presente convenio es de 18,37%.
- Que, de acuerdo al resumen financiero del proyecto, se tiene que el porcentaje pagado a la fecha del presente informe es del 50%.
- Que, de acuerdo al resumen financiero del proyecto, se tiene que el porcentaje pagado a la fecha del presente informe al contrato de obra es del 50%.
- Que, de acuerdo al resumen financiero del proyecto, se tiene que el porcentaje pagado a la fecha del presente informe al contrato de interventoría es del 50%.
- Que, los contratos de Obra e Interventoría que se derivan del proyecto se encuentran en ejecución.

Agradeciendo la atención prestada

Atentamente,


HUMBERTO ERNEY PIAGUAJE
Rector CER Buenavista

- Anexos:
- Informe No. 1 Contrato de Obra
 - Informe No. 1 Contrato de Interventoría

**INFORME DE
INTERVENTORIA
N°1**

INFORME No. 1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 003-2024.
PERIODO: 04 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 04 DE ENERO DE 2025

OBJETO:

**“INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO “MEJORAMIENTO DAMBIENTES ESCOLARES EN
EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL INSTITUCION DE
PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”**

KARINA LILIBETH PÉREZ PASCUAZA
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. INCAM S.A.S ZOMAC
NIT 901.310.022-0

MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
04 de Enero de 2025



Barrio Palermo-Puerto Caicedo-Putumayo



314-476-4642



+57 314 476 4642



incamsas@gmail.com

1. INTRODUCCIÓN

El CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL adelanta el proyecto identificado con código BPIN No. 2023006860290, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO D AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL INSTITUCION DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" por un valor inicial de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 368.748.657,53) MDA/CTE, con el fin de llevar a cabo el mejoramiento de la infraestructura educativa del CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL.

El mejoramiento de la infraestructura del CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL surge a raíz de la necesidad de brindar espacios dignos donde se puedan realizar diferentes actividades académicas y lúdicas de la institución, ampliando de esta manera las oportunidades educativas para comunidades desfavorecidas.

En cumplimiento a mis obligaciones como Interventor me permito exponer el estado administrativo, técnico y financiero en el que se encuentra actualmente el proyecto.

En la actualidad el proyecto se encuentra en ejecución desde el día 04/12/2024 y con fecha de finalización el día 04/02/2025 de acuerdo a Acta de Inicio de fecha 04/12/2024.



2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El municipio de Puerto Asís se encuentra ubicado al sur de Colombia en el departamento del Putumayo, limita con el municipio de Puerto Caicedo y Puerto Guzmán al norte, con los municipios de Orito, Valle del Guamuez y San Miguel al occidente, con el municipio de Puerto Lèguizamo al oriente y con la Republica del Ecuador al sur; tiene una altura media de 250 m.s.n.m. El clima es tropical, con precipitaciones significativas. Incluso en el mes más seco hay mucha lluvia. Esta ubicación está clasificada como Af por Köppen y Geiger. La temperatura aquí es en promedio 24.9 °C. En un año, la precipitación media es 3850 mm.

El CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL, requiere una intervención a su infraestructura educativa específicamente en el área de la cubierta de las aulas, con lo cual se logre solucionar problemas de filtración, humedad y seguridad y de esta manera lograr un mejor espacio académico y así se evitar la deserción estudiantil. Para brindar espacios adecuados para el aprendizaje se proyecta el cambio de cubierta de los salones existentes y mantenimiento mediante aplicación de pintura sobre muros y carpintería metálica, lo cual puede desencadenar en un aumento representativo en estudiantes y así mismo en todo el sector productivo que involucre a dicha institución.



3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto que tiene por objeto: “MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”, se localiza en la Vereda Buenavista del Municipio de Puerto Asís, departamento del Putumayo, como se puede apreciar en las imágenes

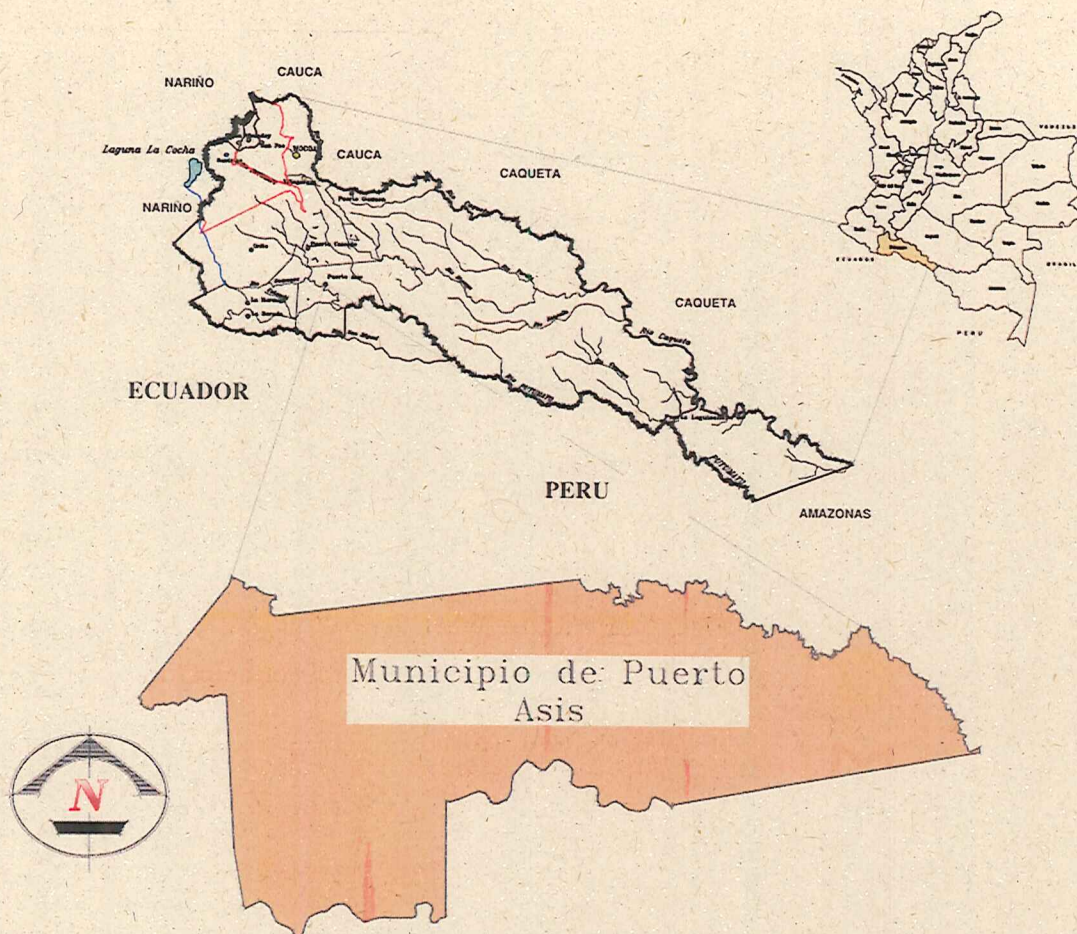


Imagen 1: Municipio de Puerto Asís. Fuente: Propia.



Barrio Palermo-Puerto Caicedo-Putumayo



314-476-4642



+57 314 476 4642



incamsas@gmail.com



Imagen 2: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL. Fuente: Google Earth.

4. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA TÉCNICA Y FINANCIERA

4.1. INFORMACIÓN GENERAL

4.1.1. CONTRATO DE OBRA

El Contrato de Obra No. 004-2024 que tiene por objeto: “MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”, se localiza en el la parte rural del Municipio de Puerto Asís, del Departamento del Putumayo.

A continuación, se indica la información general del Contrato de obra:



Barrio Palermo-Puerto Caicedo-Putumayo



314-476-4642



+57 314 476 4642



incamsas@gmail.com

Tabla 1: Datos contractuales del contrato de obra.

CONTRATANTE:	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL
CLASE DE CONTRATO:	OBRA PÚBLICA
CONTRATISTA:	SOLUCIONES CIVILES JM SAS
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO	\$341.433.942,16 (Trescientos cuarenta y un millones cuatrocientos treinta y tres mil novecientos cuarenta y dos pesos con dieciséis centavos)
PLAZO DEL CONTRATO	DOS (2) MESES A PARTIR DE SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO	04 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	04 DE FEBRERO DE 2025

4.1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El Contrato de Interventoría No. 003-2024 que tiene por objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO “MEJORAMIENTO D AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL INSTITUCION DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”, se localiza en el la parte rural del Municipio de Puerto Asís, del Departamento del Putumayo.

A continuación, se indica la información general del Contrato de interventoría:

Tabla 2: Datos contractuales del contrato de Interventoría.

CONTRATANTE:	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL
CLASE DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
CONTRATISTA:	INCAM S.A.S ZOMAC
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO “MEJORAMIENTO D AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL INSTITUCION DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”
VALOR DEL CONTRATO	\$24.457.143,58 (VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS)



PLAZO DEL CONTRATO	DOS (2) MESES A PARTIR DE SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO	04 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	04 DE FEBRERO DE 2025

4.2. PÓLIZAS Y GARANTÍAS DE LOS CONTRATOS

4.2.1. PÓLIZAS Y GARANTÍAS CONTRATO DE OBRA

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A., Póliza de responsabilidad civil No. 41-40-101054371 Y póliza de cumplimiento No. 41-44-101288873, con fecha de expedición 04 de diciembre de 2024.

Tabla 3: Datos pólizas y garantías del contrato de Obra.

ANEXO	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA
0	04/12/2024	Cumplimiento del Contrato	02/12/2024	02/06/2025	\$34.143.394,22
		Buen manejo y correcta inversión del anticipo	02/12/2024	02/06/2025	\$170.716.971,08
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	02/12/2024	02/02/2028	\$17.071.697,11
		Estabilidad y calidad de la obra	5 años, 0 meses y 0 días		\$34.143.394,22
0	04/12/2024	Predios labores y operaciones	02/12/2024	02/02/2025	\$34.143.394,22
		Contratistas y subcontratistas	02/12/2024	02/02/2025	\$34.143.394,22
		Vehículos propios y no propios	02/12/2024	02/02/2025	\$34.143.394,22

4.2.2. PÓLIZAS Y GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A., POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 41-44-101288822, con fecha de expedición 03 de diciembre de 2024.

Tabla 4: Datos pólizas y garantías del contrato de Interventoría.



Barrio Palermo-Puerto Caicedo-Putumayo



314-476-4642



+57 314 476 4642



incamsas@gmail.com

ANEXO	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA
0	03/12/2024	Cumplimiento del Contrato	02/12/2024	02/06/2025	\$ 2.445.714,36
		Buen manejo y correcta inversión del anticipo	02/12/2024	02/06/2025	\$ 12.228.571,79
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	02/12/2024	02/02/2028	\$ 1.222.857,18
		Calidad del servicio	02/02/2025	02/02/2030	\$ 2.445.714,36

4.3. PRESUPUESTO INICIAL DEL PROYECTO

4.3.1. PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONTRATO DE OBRA

De acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas, de los estudios previos y el contrato de obra, en la tabla 5 se describe el presupuesto inicial a ejecutar.

Tabla 5::Presupuesto del contrato de obra inicial.

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR
1.0	PRELIMINARES				
1.1	Localización y Replanteo	M2	347,58	\$ 2.303	\$ 800.320,14
1.2	Cerramiento en Polisombra	M2	253,60	\$ 17.100	\$ 4.336.560,94
1.3	Desmante de Cubierta y Estructura Portante	M2	516,13	\$ 20.277	\$ 10.465.779,50
				Sub-total	\$ 15.602.660,57
2.0	ESTRUCTURAS METÁLICAS				
2.1	Estructura metalica en Acero ASTM - A572 (incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	KG	1373,36	\$ 29.784	\$ 40.903.909,15
2.2	Estructura metalica en Acero ASTM - A36 (Incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	KG	2772,78	\$ 28.944	\$ 80.255.003,14
2.3	Templetes, Barra Lisa de 1/2", Incluye Pintura Anticorrosiva y Esmalte	M	65,82	\$ 47.896	\$ 3.152.503,71
2.4	Contravientos, Barra Lisa de 1/2", Incluye Pintura Anticorrosiva y Esmalte	M	137,93	\$ 49.759	\$ 6.863.295,99
				Sub-total	\$ 131.174.711,99
3.0	CUBIERTA				
3.1	Suministro e Instalación de Teja en Zinc Arquitectónico Cal 30	M2	516,13	\$ 84.015	\$ 43.362.779,52
3.2	Suministro e Instalación de Canal en lamina galvanizada cal. 20 (incluye: accesorios de instalación y bajante)	M	98,29	\$ 174.316	\$ 17.132.608,11
3.3	Suministro e instalación caballete en Zinc Cal.30	M	48,50	\$ 81.431	\$ 3.949.404,28
				Sub-total	\$ 64.444.791,91
4.0	REPELLO, ESTUCO Y PINTURA				
4.1	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	55,16	\$ 47.518	\$ 2.621.248,49
4.2	Estuco Plastico para muros interiores y exteriores	M2	55,16	\$ 27.347	\$ 1.508.538,54
4.3	Aplicación de Pintura TIPO I para interiores	M2	532,58	\$ 26.464	\$ 14.094.069,80
4.4	Aplicación de Pintura TIPO I para exteriores	M2	168,62	\$ 28.606	\$ 4.823.422,08
4.5	Aplicación de Pintura 3 en 1 para carpintería metálica	M2	95,45	\$ 37.199	\$ 3.550.757,98
				Sub-total	\$ 26.598.036,89
5.0	CONCRETOS				
5.1	Vigas Cintas (0,15Mx20M) en concreto 21MPa (incluye acero de refuerzo según diseños)	M3	1,96	\$ 2.836.742	\$ 5.560.013,46



Barrio Palermo-Puerto Caicedo-Putumayo



314-476-4642



+57 314 476 4642



incamsas@gmail.com

6.0	ASEO			Sub-total	\$ 5.560.013,46
6.1	ASEO GENERAL	M2	698,41	\$ 1.422	\$ 993.075,67
				Sub-total	\$ 993.075,67

TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 244.373.290,49
ADMINISTRACION	29,00%	\$ 70.868.254,24
UTILIDAD	5,00%	\$ 12.218.664,52
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 2.443.732,90
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 85.530.651,67
PMA		\$ 11.530.000,00
COSTO TOTAL DE LA OBRA		\$ 341.433.942,16

El valor del presupuesto inicial del contrato de obra pública es por la suma de: \$341.433.942,16 (Trescientos cuarenta y un millones cuatrocientos treinta y tres mil novecientos cuarenta y dos pesos con dieciséis centavos).

4.3.2. PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas, de los estudios previos y el contrato de interventoría se estableció que el presupuesto inicial para este equivale a un total de \$24.457.143,58 (VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS).

4.4. PLAZO PARA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Para la ejecución de las actividades tanto del contrato de obra como del contrato de interventoría equivale a DOS (02) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio de los contratos.

4.5. PERSONAL EN OBRA

4.5.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

El personal administrativo y de obra que apoyó las actividades desarrolladas durante el presente periodo, se describe en la siguiente tabla:

Tabla 6: Descripción de la mano de obra calificada empleada por el contratista en la obra.

NOMBRE	CARGO	CEDULA
Leydy Yulieth Tejada Saldarriaga	Representante legal	1.123.207.998
Daniela Portilla Burbano	Residente de obra	1.124.859.667



4.5.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

La mano de obra no calificada para la ejecución de los trabajos y actividades realizadas por el contratista durante el periodo corresponde a: maestro y ayudantes. En la siguiente tabla se presenta los nombres y cargo del personal que conforma la mano de obra no calificada.

Tabla 7: Descripción de la mano de obra calificada empleada por el contratista en la obra.

NOMBRE	CARGO	CEDULA
José Orlando Bravo Cubillos	Maestro	80.381.853
Wilmer Naty Tombe	Ayudante	17.688.257
Mario Fernando Cuadros	Ayudante	1.115.074.053
Juan Libardo Pai Taicuz	Ayudante	1.123.304.807
Juan Libardo Pai Taicuz	Ayudante	1.123.304.807

4.6. MODIFICACIONES

4.6.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRA

Durante la ejecución del periodo del presente informe no se han presentado modificaciones al contrato de obra.

4.6.2. MODIFICACIONES AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Durante la ejecución del periodo del presente informe no se han presentado modificaciones al contrato de interventoría.

4.7. AVANCE FÍSICO

El avance físico reportado en el siguiente cuadro corresponde a la obra ejecutada.



PRESUPUESTO OFICIAL CANTIDADES CONTRATADAS						CANTIDADES Y VALOR EJECUTADO MES 1		CANTIDADES Y VALOR ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1.0	PRELIMINARES								
1.1	Localización y Replanteo	M2	347,58	\$ 2.303	\$ 800.320,14	347,58	\$ 800.320,14	347,58	\$ 800.320,14
1.2	Cerramiento en Polisombra	M2	253,60	\$ 17.100	\$ 4.336.560,94	253,60	\$ 4.336.560,94	253,60	\$ 4.336.560,94
1.3	Desmonte de Cubierta y Estructura Portante	M2	516,13	\$ 20.277	\$ 10.465.779,50	516,13	\$ 10.465.779,50	516,13	\$ 10.465.779,50
	Sub-total				\$ 15.602.660,57		\$ 15.602.660,57		\$ 15.602.660,57
2.0	ESTRUCTURAS METÁLICAS								
2.1	Estructura metalica en Acero ASTM - A572 (incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	KG	1373,36	\$ 29.784	\$ 40.903.909,15	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.2	Estructura metalica en Acero ASTM - A36 (Incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	KG	2772,78	\$ 28.944	\$ 80.255.003,14	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.3	Templetes, Barra Lisa de 1/2", Incluye Pintura Anticorrosiva y Esmalte	M	65,82	\$ 47.896	\$ 3.152.503,71	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.4	Contravientos, Barra Lisa de 1/2", Incluye Pintura Anticorrosiva y Esmalte	M	137,93	\$ 49.759	\$ 6.863.295,99	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
	Sub-total				\$ 131.174.711,99		\$ 0,00		\$ 0,00
3.0	CUBIERTA								
3.1	Suministro e Instalación de Teja en Zinc Arquitectónico Cal 30	M2	516,13	\$ 84.015	\$ 43.362.779,52	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.2	Suministro e Instalación de Canal en lamina galvanizada cal. 20 (incluye: accesorios de instalación y bajante)	M	98,29	\$ 174.316	\$ 17.132.608,11	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.3	Suministro e instalación caballete en Zinc Cal.30	M	48,50	\$ 81.431	\$ 3.949.404,28	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
	Sub-total				\$ 64.444.791,91		\$ 0,00		\$ 0,00
4.0	REPELO, ESTUCO Y PINTURA								
4.1	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	55,16	\$ 47.518	\$ 2.621.248,49	55,16	\$ 2.621.248,49	55,16	\$ 2.621.248,49
4.2	Estuco Plastico para muros interiores y exteriores	M2	55,16	\$ 27.347	\$ 1.508.538,54	55,16	\$ 1.508.538,54	55,16	\$ 1.508.538,54
4.3	Aplicación de Pintura TIPO I para interiores	M2	532,58	\$ 26.464	\$ 14.094.069,80	532,58	\$ 14.094.069,80	532,58	\$ 14.094.069,80
4.4	Aplicación de Pintura TIPO I para exteriores	M2	168,62	\$ 28.606	\$ 4.823.422,08	168,62	\$ 4.823.422,08	168,62	\$ 4.823.422,08
4.5	Aplicación de Pintura 3 en 1 para carpintería metálica	M2	95,45	\$ 37.199	\$ 3.550.757,98	95,45	\$ 3.550.757,98	95,45	\$ 3.550.757,98
	Sub-total				\$ 26.598.036,89		\$ 26.598.036,89		\$ 26.598.036,89
5.0	CONCRETOS								
5.1	Vigas Cintas (0,15Mx20M) en concreto 21MPa (incluye acero de refuerzo según diseños)	M3	1,96	\$ 2.836.742	\$ 5.560.013,46	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
	Sub-total				\$ 5.560.013,46		\$ 0,00		\$ 0,00
6.0	ASEO								
6.1	ASEO GENERAL	M2	698,41	\$ 1.422	\$ 993.075,67	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
	Sub-total				\$ 993.075,67		\$ 0,00		\$ 0,00

TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 244.373.290,49
ADMINISTRACION	29,00%	\$ 70.868.254,24
UTILIDAD	5,00%	\$ 12.218.664,52
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 2.443.732,90
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 85.530.651,67
PMA		\$ 11.530.000,00
COSTO TOTAL DE LA OBRA		\$ 341.433.942,16

\$ 42.200.697,45
\$ 12.238.202,26
\$ 2.110.034,87
\$ 422.006,97
\$ 14.770.244,11
\$ 5.765.000,00
\$ 62.735.941,56

\$ 42.200.697,45
\$ 12.238.202,26
\$ 2.110.034,87
\$ 422.006,97
\$ 14.770.244,11
\$ 5.765.000,00
\$ 62.735.941,56

VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 341.433.942,16
VALOR EJECUTADO MES 1	\$ 62.735.941,56
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	\$ 62.735.941,56
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 278.698.000,60
% DE AVANCE MES 1	18,37%
% DE AVANCE ACUMULADO	18,37%
% DE AVANCE PENDIENTE POR EJECUTAR	81,63%



Barrio Palermo-Puerto Caicedo-Putumayo



314-476-4642



+57 314 476 4642



incamsas@gmail.com

4.8. AVANCE FINANCIERO

Valor inicial del Proyecto:	\$ 368.748.657,53
Valor del contrato de Obra:	\$ 341.433.942,16
Valor del contrato de Interventoría:	\$ 24.457.143,58
Valor Total (Obra + Interventoría):	\$ 365.891.085,74
Valor Ejecutado en el presente Informe:	\$ 62.735.941,56
Valor Total Ejecutado:	\$ 62.735.941,56
Pagos Realizados al Contrato de Obra (Anticipo 50%):	\$ 182.945.542,87
Pagos realizados al Contrato de Interventoría (Anticipo 50%):	\$ 12.228.571,79
Total Pagos Realizados:	\$ 195.174.114,66

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO




LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO



CERRAMIENTO EN POLISOMBRA



DESMONTE DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA PORTANTE

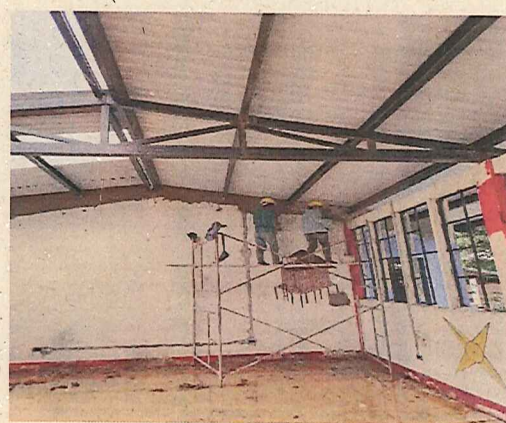

MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3





**ESTUCO PLASTICO PARA MUROS
INTERIORES Y EXTERIORES**



**APLICACIÓN DE PINTURA TIPO I PARA
INTERIORES**



**APLICACIÓN DE PINTURA TIPO I PARA
EXTERIORES**



**APLICACIÓN DE PINTURA 3 EN 1 PARA
CARPINTERIA METÁLICA**

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS EN EL DESARROLLO DE LA OBRA


- Teniendo en cuenta que el proyecto inicia su ejecución en el mes de Diciembre, se presenta el inconveniente de suspender actividades por motivos de cierre y fin de año, tanto de proveedores como de la misma comunidad, al igual que las festividades de carnales en inicio de año, por lo cual se da un receso de labores a partir del día 22 de diciembre del año 2024, hasta el día 08 de enero de 2025.
- A la fecha del presente informe no se cuenta con el insumo necesario para la construcción de la estructura de cubierta, esto debido al motivo antes expuesto



7. CONCLUSIONES

- El proyecto se encuentra en ejecución.
- El avance físico de obra durante el presente periodo corresponde al 18,37% con relación al 100% del contrato de obra, lo que representa un valor de: SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 62.735.941,56) MDA/CTE.
- El avance físico acumulado de obra es por la suma de SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 62.735.941,56) MDA/CTE, lo que corresponde a un porcentaje acumulado de obra del 18,37% del total del contrato de obra.
- El avance financiero se debe a que la firma contratista SOLUCIONES CIVILES JM SAS ha realizado la ejecución parcial y/o total de algunos ítems del contrato de obra, los cuales fueron descritos anteriormente, se tiene que el avance financiero de obra ejecutado es por valor de: SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 62.735.941,56) MDA/CTE, siendo el 18,37% del valor total del contrato de obra.
- El avance financiero acumulado de obra equivale a SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 62.735.941,56) MDA/CTE, lo que corresponde a un porcentaje acumulado de obra del 18,37% del total del contrato de obra.

Presentado por:

	
KARINA LILIBETH PÉREZ PASCUAZA R.L. INCAM S.A.S ZOMAC NIT 901.310.022-0	DANDENNYS PAZ PORTILLA Residente de Interventoría M.P. 19202-274596 CAU



Barrio Palermo-Puerto Caicedo-Putumayo



314-476-4642



+57 314 476 4642



incamsas@gmail.com

SEGURIDAD SOCIAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901310022	0	INCCAN SAS ZOMAC	A - 200 O MAS COTIZANTES	KARINA JULIBETH PEREZ PASCUALA	cra 26 con calle 10 N° 25-23	PUERTO CAICEDO-PUTUMAYO	3144764642	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1162153657	9479260842	E	2025/01/09	2024/12/30	0	\$578,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
1	CC 1125110072	PAZ DANIELINIS	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP0307	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF63	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$1,300,000	\$65,000	
Total		Afiliados(1)			\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$90,500		\$1,300,000	\$65,000	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$90,500	\$0	\$0	\$90,500
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$90,500	\$0	\$0	\$90,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
NUEVA E.P.S.	EP0307	900,156,264	2	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$39,000	\$0	\$0	\$39,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$39,000	\$0	\$0	\$39,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000
TOTAL				1	\$578,000	\$0	\$0	\$578,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901310022	0	INCAM SAS ZOMAC	A - 200 O MAS COTIZANTES	KARINA LILIBETH PEREZ PASCUALA	cra 26 con calle 10 N° 25-23	PUERTO CAICEDO-PUTUMAYO	3144764642	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2025-01	1259661701	9480689613	E	2025/02/07	2025/02/11 BANCOLOMBIA	\$633,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vet	sin	lge	una	vac	avp	vct	lrit	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF						
1	CC	1125410072	PAZ DAIDENNY																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5037	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF63	30	\$1,423,500	\$57,000	1423	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$1,423,500	\$71,300	No	\$633,200	
Total		Afiliados(1)						X															\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$99,100			\$71,300	No	\$633,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901310022	0	INCAAM SAS ZONAC	A - 200 O MAS COTIZANTES	KARINA ILLIBETH PEREZ PASCUAZA	Cra 26 con calle 10 N°25-23	PUERTO CAICEDO-PUTUMAYO	314764642	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	111284941	9477647245	E		2024/12/06	BANCOLOMBIA	3	\$579,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES											
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tae	tdp	lap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes				
1	CC	1125410072																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EF9037	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF63	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$50,500	30	\$1,300,000	\$65,000	Nº	\$578,000
Total		Afiliados(1)																																	\$578,000				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901310022	0	INICAM SAS ZOMAC	A - 200 O MAS COTIZANTES	KARINA LILIBETH PEREZ PASCUAZA	cra 26 con calle 10 N° 25-23	PUERTO CAICEDO-PUTUMAYO	3144764642	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1112984941	9477647245	E	2024/12/06	2024/12/09	BANCOLOMBIA	3	\$579,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$208,000	\$500	\$0	\$208,500
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$208,000	\$500	\$0	\$208,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$90,500	\$200	\$0	\$90,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$90,500	\$200	\$0	\$90,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$52,000	\$200	\$0	\$52,200
CONFAMILIAR PUTUMAYO		CCF63	891,200,337	8	1	\$52,000	\$200	\$0	\$52,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$162,500	\$400	\$0	\$162,900
NUEVA E.P. S.		EPS037	900,156,264	2	1	\$162,500	\$400	\$0	\$162,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$39,000	\$100	\$0	\$39,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	1	\$39,000	\$100	\$0	\$39,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$26,000	\$100	\$0	\$26,100
SENA		PASENA	899,999,034	1	1	\$26,000	\$100	\$0	\$26,100
TOTAL					1	\$578,000	\$1,500	\$0	\$579,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEVA e ICBF
NIT 901310022	0	INCAW SAS ZOMAC	A - 200 O MAS COTIZANTES	KARINA LILIBETH PEREZ PASCUANZA	cra 26 con calle 10 N° 25-23	PUERTO CAICEDO-PUTUMAYO	3144764642	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Pensión	Salud	Planilla	Limite	Pago	Valor
2024-10	2024-11	E	2024/11/08	2024/11/20	\$583,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	cup	tap	usp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct	int	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SEVA e ICBF	Total Aportes				
1	CC	1125410072	PAZ DANIBENIYS	X																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP0307	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF63	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$1,300,000	\$65,000	No	\$578,000
Total		Afiliados(1)																																			\$578,000			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901310022	0	INCAAM SAS ZOMAC	A - 200 O MAS COTIZANTES		KARINA LILIBETH PEREZ PASCUAZA	cra 26 con calle 10 N°25-23	PUERTO CAICEDO-PUTUMAYO	3144764642	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1064761164	9477590559		E	2024/11/08	2024/11/20	BANCOLOMBIA	12
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$208,000	\$1,800	\$0	\$209,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$90,500	\$800	\$0	\$91,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
CONFAMILIAR PUTUMAYO		CCF63	891,200,337	8	1	\$52,000	\$500	\$0	\$52,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	1	\$162,500	\$1,400	\$0	\$163,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)									
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	1	\$39,000	\$400	\$0	\$39,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)									
SENA		PASENA	899,999,034	1	1	\$26,000	\$300	\$0	\$26,300
TOTAL					1	\$578,000	\$5,200	\$0	\$583,200
