

**INFORME DE
SUPERVISIÓN
DE
INTERVENTORIA
N°2**



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2



CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
PERIODO DE INFORME: DEL 04/01/2025 AL 04/04/2025

PROYECTO CÓDIGO BPIN No. 2023006860290

**“MEJORAMIENTO D AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL
BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL INSTITUCION DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO”**

**DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
ABRIL 2025**



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2



CONTENIDO

1. INTRODUCCION.
2. LOCALIZACION DEL PROYECTO.
3. INFORMACION ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA.
4. REGISTRÓ FOTOGRÁFICO.
5. CONCLUSIONES.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2



1. INTRODUCCIÓN

El CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL adelanta el proyecto identificado con código BPIN No. 2023006860290, cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO D AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL INSTITUCION DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” por un valor inicial de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 368.748.657,53) MDA/CTE, con el fin de llevar a cabo el mejoramiento de la infraestructura educativa del CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL.

El mejoramiento de la infraestructura del CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL surge a raíz de la necesidad de brindar espacios dignos donde se puedan realizar diferentes actividades académicas y lúdicas de la institución, ampliando de esta manera las oportunidades educativas para comunidades desfavorecidas.

En cumplimiento a mis obligaciones como supervisor me permito exponer el estado administrativo, técnico y financiero en el que se encuentra actualmente el proyecto.

En la actualidad el contrato de obra se encuentra terminado, tal como consta en el Acta de Recibo Final de fecha 20/03/2025, de igual manera se hizo terminación del contrato de interventoría con fecha 04/04/2025.




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2



2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto identificado con código BPIN No. 2023006860290 se localiza en la Vereda Buenavista en del Municipio de Puerto Asís – Putumayo. En las siguientes imágenes se aprecia su ubicación exacta:

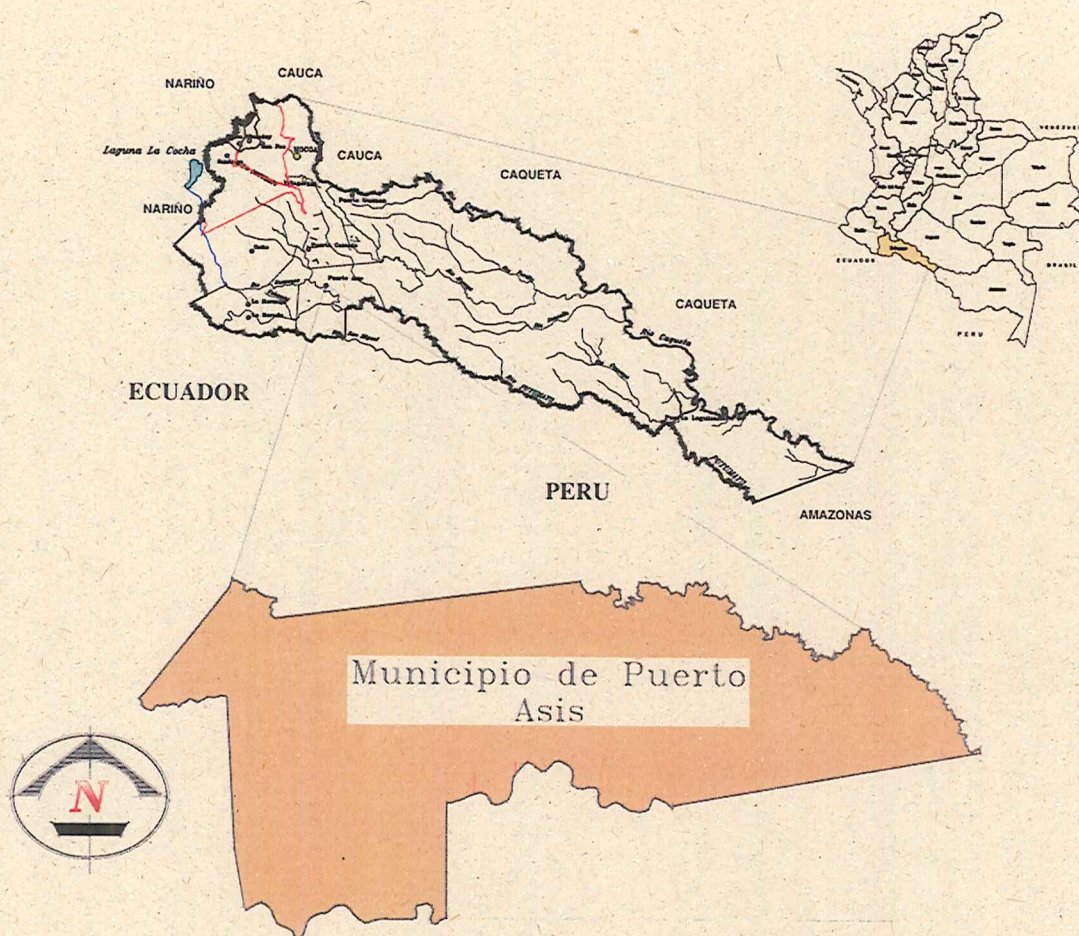



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2



3. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA TÉCNICA Y FINANCIERA

3.1. ASPECTO ADMINISTRATIVO, GENERALIDADES DEL PROYECTO.

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO			
CÓDIGO BPIN:	2023006860290		
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DAMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL INSTITUCION DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
EJECUTOR:	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA	NIT	846003704-1
	R.L. HUMBERTO ERNEY PIAGUAJE	C.C.	18.124.339
VALOR INICIAL DEL PROYECTO:	TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 368.748.657,53) MDA/CTE		
PLAZO INICIAL DEL PROYECTO:	DOS (02) MESES		



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2

PRÓRROGA No. 1:	UN (01) MES
PLAZO TOTAL ACUMULADO:	TRES (03) MESES

Para dar cumplimiento al proyecto identificado con código BPIN No. 2023006860290, el CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL se encuentra ejecutando el Contrato de Obra Pública No 004-2024 que se suscribió con la empresa SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S. Nit. 900912227-3, representada legalmente por LEYDY YULIETH TEJADA, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.123.207.998 de Puerto Asís (Putumayo) por un valor de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS (\$ 341.433.942,16) MDA/CTE y un plazo inicial de DOS (02) meses, bajo las siguientes condiciones:

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR
1.0	PRELIMINARES				
1.1	Localización y Replanteo	M2	347,58	\$ 2.303	\$ 800.320,14
1.2	Cerramiento en Polisombra	M2	253,60	\$ 17.100	\$ 4.336.560,94
1.3	Desmante de Cubierta y Estructura Portante	M2	516,13	\$ 20.277	\$ 10.465.779,50
				Sub-total	\$ 15.602.660,57
2.0	ESTRUCTURAS METÁLICAS				
2.1	Estructura metalica en Acero ASTM - A572 (incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	KG	1373,36	\$ 29.784	\$ 40.903.909,15
2.2	Estructura metalica en Acero ASTM - A36 (Incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	KG	2772,78	\$ 28.944	\$ 80.255.003,14
2.3	Templetes, Barra Lisa de 1/2", Incluye Pintura Anticorrosiva y Esmalte	M	65,82	\$ 47.896	\$ 3.152.503,71
2.4	Contravientos, Barra Lisa de 1/2", Incluye Pintura Anticorrosiva y Esmalte	M	137,93	\$ 49.759	\$ 6.863.295,99
				Sub-total	\$ 131.174.711,99
3.0	CUBIERTA				
3.1	Suministro e Instalación de Teja en Zinc Arquitectónico Cal 30	M2	516,13	\$ 84.015	\$ 43.362.779,52
3.2	Suministro e Instalación de Canal en lamina galvanizada cal. 20 (incluye: accesorios de instalación y bajante)	M	98,29	\$ 174.316	\$ 17.132.608,11
3.3	Suministro e instalación caballete en Zinc Cal.30	M	48,50	\$ 81.431	\$ 3.949.404,28
				Sub-total	\$ 64.444.791,91
4.0	REPELLO, ESTUCO Y PINTURA				
4.1	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	55,16	\$ 47.518	\$ 2.621.248,49
4.2	Estuco Plastico para muros interiores y exteriores	M2	55,16	\$ 27.347	\$ 1.508.538,54
4.3	Aplicación de Pintura TIPO I para interiores	M2	532,58	\$ 26.464	\$ 14.094.069,80
4.4	Aplicación de Pintura TIPO I para exteriores	M2	168,62	\$ 28.606	\$ 4.823.422,08
4.5	Aplicación de Pintura 3 en 1 para carpintería metálica	M2	95,45	\$ 37.199	\$ 3.550.757,98
				Sub-total	\$ 26.598.036,89
5.0	CONCRETOS				
5.1	Vigas Cintas (0,15Mx20M) en concreto 21MPa (incluye acero de refuerzo según diseños)	M3	1,96	\$ 2.836.742	\$ 5.560.013,46
				Sub-total	\$ 5.560.013,46
6.0	ASEO				
6.1	ASEO GENERAL	M2	698,41	\$ 1.422	\$ 993.075,67
				Sub-total	\$ 993.075,67



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2

TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 244.373.290,49
ADMINISTRACION	29,00%	\$ 70.868.254,24
UTILIDAD	5,00%	\$ 12.218.664,52
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 2.443.732,90
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 85.530.651,67
PMA		\$ 11.530.000,00
COSTO TOTAL DE LA OBRA		\$ 341.433.942,16

El día 04 de MARZO de 2025, se aprueba Acta de Mayores y Menores Cantidades de Obra, mediante la cual se actualiza las condiciones iniciales del contrato, quedando de la siguiente manera:

PRESUPUESTO OFICIAL CANTIDADES CONTRATADAS						CANTIDADES MODIFICADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1.0	PRELIMINARES								
1.1	Localización y Replanteo	M2	347,58	\$ 2.303	\$ 800.320,14	0,00	\$ 0,00	347,58	\$ 800.320,14
1.2	Cerramiento en Polisombra	M2	253,60	\$ 17.100	\$ 4.336.560,94	0,00	\$ 0,00	253,60	\$ 4.336.560,94
1.3	Desmante de Cubierta y Estructura Portante	M2	516,13	\$ 20.277	\$ 10.465.779,50	0,00	\$ 0,00	516,13	\$ 10.465.779,50
	Sub-total				\$ 15.602.660,57		\$ 0,00		\$ 15.602.660,57
2.0	ESTRUCTURAS METÁLICAS								
2.1	Estructura metalica en Acero ASTM - A572 (incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	KG	1373,36	\$ 29.784	\$ 40.903.909,15	74,95	\$ 2.232.177,42	1448,30	\$ 43.136.086,57
2.2	Estructura metalica en Acero ASTM - A36 (Incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	KG	2772,78	\$ 28.944	\$ 80.255.003,14	91,78	\$ 2.656.350,95	2864,56	\$ 82.911.354,09
2.3	Templetes, Barra Lisa de 1/2", Incluye Pintura Anticorrosiva y Esmalte	M	65,82	\$ 47.896	\$ 3.152.503,71	-65,82	-\$ 3.152.503,71	0,00	\$ 0,00
2.4	Contravientos, Barra Lisa de 1/2", Incluye Pintura Anticorrosiva y Esmalte	M	137,93	\$ 49.759	\$ 6.863.295,99	-137,93	-\$ 6.863.295,99	0,00	\$ 0,00
	Sub-total				\$ 131.174.711,99		-\$ 5.127.271,33		\$ 126.047.440,66
3.0	CUBIERTA								
3.1	Suministro e Instalación de Teja en Zinc Arquitectónico Cal 30	M2	516,13	\$ 84.015	\$ 43.362.779,52	17,03	\$ 1.430.524,69	533,16	\$ 44.793.304,21
3.2	Suministro e Instalación de Canal en lamina galvanizada cal. 20 (incluye: accesorios de instalación y bajante)	M	98,29	\$ 174.316	\$ 17.132.608,11	4,20	\$ 732.125,49	102,49	\$ 17.864.733,61
3.3	Suministro e instalación caballete en Zinc Cal.30	M	48,50	\$ 81.431	\$ 3.949.404,28	1,60	\$ 130.289,63	50,10	\$ 4.079.693,90
	Sub-total				\$ 64.444.791,91		\$ 2.292.939,80		\$ 66.737.731,72
4.0	REPELLO, ESTUCO Y PINTURA								
4.1	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	55,16	\$ 47.518	\$ 2.621.248,49	0,00	\$ 0,00	55,16	\$ 2.621.248,49
4.2	Estuco Plastico para muros interiores y exteriores	M2	55,16	\$ 27.347	\$ 1.508.538,54	0,00	\$ 0,00	55,16	\$ 1.508.538,54
4.3	Aplicación de Pintura TIPO I para interiores	M2	532,58	\$ 26.464	\$ 14.094.069,80	0,00	\$ 0,00	532,58	\$ 14.094.069,80
4.4	Aplicación de Pintura TIPO I para exteriores	M2	168,62	\$ 28.606	\$ 4.823.422,08	0,00	\$ 0,00	168,62	\$ 4.823.422,08
4.5	Aplicación de Pintura 3 en 1 para carpintería metálica	M2	95,45	\$ 37.199	\$ 3.550.757,98	0,00	\$ 0,00	95,45	\$ 3.550.757,98
	Sub-total				\$ 26.598.036,89		\$ 0,00		\$ 26.598.036,89
5.0	CONCRETOS								
5.1	Vigas Cintas (0,15Mx20M) en concreto 21MPa (incluye acero de refuerzo según diseños)	M3	1,96	\$ 2.836.742	\$ 5.560.013,46	1,18	\$ 3.333.171,33	3,14	\$ 8.893.184,79
	Sub-total				\$ 5.560.013,46		\$ 3.333.171,33		\$ 8.893.184,79



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2

6.0	ASEO								
6.1	ASEO GENERAL	M2	698,41	\$ 1.422	\$ 993.075,67	-350,82	-\$ 498.839,80	347,58	\$ 494.235,87
Sub-total					\$ 993.075,67		-\$ 498.839,80		\$ 494.235,87

TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 244.373.290,48	\$ 244.373.290,49
ADMINISTRACION	29,00%	\$ 70.868.254,24	\$ 70.868.254,24
UTILIDAD	5,00%	\$ 12.218.664,52	\$ 12.218.664,52
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 2.443.732,90	\$ 2.443.732,90
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 85.530.651,67	\$ 85.530.651,67
PMA		\$ 11.530.000,00	\$ 11.530.000,00
COSTO TOTAL DE LA OBRA		\$ 341.433.942,16	\$ 341.433.942,16

Como se puede evidenciar, la modificación planteada no afecta ni el objeto ni el valor del contrato.

De igual manera, el CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL se encuentra ejecutando el Contrato de Interventoría No 003-2024 que se suscribió con la empresa INCAM S.A.S ZOMAC NIT. 901.310.022-0, representada legalmente por KARINA LILIBETH PÉREZ PASCUAZA, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.006.962.043 de Puerto Caicedo (Putumayo), por un valor inicial de VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 24.457.143,58) MDA/CTE.E y un plazo inicial de DOS (02) meses.

Al día del presente informe tenemos las siguientes condiciones en el Contra de Obra Pública No. 004-2024:

CONTRATO DE OBRA No. 004-2024			
Objeto del Contrato	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
Contratista:	SOLUCIONES CIVILES J.M S.A.S. R.L. LEYDY YULIETH TEJADA	NIT. C.C.	900912227-3 1.123.207.998 de Puerto Asís (Putumayo)
Interventor:	INCAM S.A.S ZOMAC R.L. KARINA LILIBETH PÉREZ PASCUAZA	NIT. C.C.	901310022-0 1.006.962.043 de Puerto Caicedo (Putumayo)
Supervisor del Contrato:	HUMBERTO ERNEY PIAGUAJE	C.C.	18.124.339
Valor total del contrato:	TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS (\$ 341.433.942,16) MDA/CTE		
Plazo Inicial del Contrato:	DOS (02) MESES		
Fecha Inicio del Contrato:	04	DICIEMBRE	2024
Fecha de Terminación No. 1:	04	FEBRERO	2025
Fecha de Suspensión No. 1:	27	ENERO	2025
Fecha de Reinicio No. 1:	27	FEBRERO	2025
Fecha de Terminación No. 2:	04	MARZO	2025



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2



Fecha de Prórroga No. 1 (1 Mes):	27	FEBRERO	2025
Fecha de Terminación 3:	04	ABRIL	2025
Fecha de Recibo Final:	20	MARZO	2025

Y del Contrato de Interventoría No 003-2024:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 003-2024			
Objeto del Contrato	INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL INSTITUCION DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
Interventor:	INCAM S.A.S ZOMAC R.L. KARINA LILIBETH PÉREZ PASCUAZA	NIT. C.C.	901310022-0 1.006.962.043 de Puerto Caicedo (Putumayo)
Supervisor del Contrato:	HUMBERTO ERNEY PIAGUAJE	C.C.	18.124.339
Valor total del contrato:	VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 24.457.143,58) MDA/CTE.		
Plazo Inicial del Contrato:	DOS (02) MESES		
Fecha Inicio del Contrato:	04	DICIEMBRE	2024
Fecha de Terminación No. 1:	04	FEBRERO	2025
Fecha de Suspensión No. 1:	27	ENERO	2025
Fecha de Reinicio No. 1:	27	FEBRERO	2025
Fecha de Terminación No. 2:	04	MARZO	2025
Fecha de Prórroga No. 1 (1 Mes):	27	FEBRERO	2025
Fecha de Terminación 3:	04	ABRIL	2025
Fecha de Recibo Final:	04	ABRIL	2025

A la fecha del presente informe los contratos se encuentran ejecutados en su totalidad.

Es así como podemos determinar que el Proyecto se encuentra en las siguientes condiciones:

3.2.AVANCE FISICO DEL PROYECTO

El avance físico reportado en el siguiente cuadro corresponde a la obra ejecutada.

AVANCE FÍSICO ACUMULADO

100%



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT: 846003704-1



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2

PRESUPUESTO OFICIAL CANTIDADES CONTRATADAS										CANTIDADES Y VALOR EJECUTADO MES 1				CANTIDADES Y VALOR EJECUTADO MES 2				CANTIDADES Y VALOR ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR				
1.0	PRELIMINARES																				
1.1	Localización y Replanteo	M2	347,58	\$ 2.303	\$ 800.320,14	347,58	\$ 800.320,14	0,00	\$ 0,00	347,58	\$ 800.320,14	0,00	\$ 0,00	347,58	\$ 800.320,14						
1.2	Cerramiento en Polilombra	M2	253,60	\$ 17.100	\$ 4.336.560,94	253,60	\$ 4.336.560,94	0,00	\$ 0,00	253,60	\$ 4.336.560,94	0,00	\$ 0,00	253,60	\$ 4.336.560,94						
1.3	Desmonte de Cubierta y Estructura Portante	M2	516,13	\$ 20.277	\$ 10.465.779,50	516,13	\$ 10.465.779,50	0,00	\$ 0,00	516,13	\$ 10.465.779,50	0,00	\$ 0,00	516,13	\$ 10.465.779,50						
	Sub-total				\$ 15.602.660,57		\$ 15.602.660,57		\$ 0,00		\$ 15.602.660,57		\$ 0,00		\$ 15.602.660,57						
2.0	ESTRUCTURAS METÁLICAS																				
2.1	Estructura metálica en Acero ASTM - A572 (Incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje)	KG	1373,36	\$ 29.784	\$ 40.903.909,15	0,00	\$ 0,00	1448,30	\$ 43.136.086,57	1448,30	\$ 43.136.086,57			1448,30	\$ 43.136.086,57						
2.2	Estructura metálica en Acero ASTM - A36 (Incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje)	KG	2772,78	\$ 28.944	\$ 80.255.003,14	0,00	\$ 0,00	2864,56	\$ 82.911.354,09	2864,56	\$ 82.911.354,09			2864,56	\$ 82.911.354,09						
2.3	Templetes, Barra Lisa de 1/2", Incluye Pintura Anticorrosiva y Esmalte	M	65,82	\$ 47.896	\$ 3.152.503,71	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			0,00	\$ 0,00						
2.4	Contravientos, Barra Lisa de 1/2", Incluye Pintura Anticorrosiva y Esmalte	M	137,93	\$ 49.759	\$ 6.863.295,99	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			0,00	\$ 0,00						
	Sub-total				\$ 131.174.711,99		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 126.047.440,66		\$ 0,00		\$ 126.047.440,66						
3.0	CUBIERTA																				
3.1	Suministro e Instalación de Teja en Zinc Arquitectónico Cal 30	M2	516,13	\$ 84.015	\$ 43.362.779,52	0,00	\$ 0,00	533,16	\$ 44.793.304,21	533,16	\$ 44.793.304,21			533,16	\$ 44.793.304,21						
3.2	Suministro e Instalación de Canal en lamina galvanizada cal. 20 (Incluye: accesorios de instalación y bajante)	M	98,29	\$ 174.316	\$ 17.132.608,11	0,00	\$ 0,00	102,49	\$ 17.864.733,61	102,49	\$ 17.864.733,61			102,49	\$ 17.864.733,61						
3.3	Suministro e Instalación caballete en Zinc Cal.30	M	48,50	\$ 81.431	\$ 3.949.404,28	0,00	\$ 0,00	50,10	\$ 4.079.693,90	50,10	\$ 4.079.693,90			50,10	\$ 4.079.693,90						
	Sub-total				\$ 64.444.791,91		\$ 0,00		\$ 66.737.731,72		\$ 66.737.731,72				\$ 66.737.731,72						
4.0	REPELLO, ESTUCCO Y PINTURA																				
4.1	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	55,16	\$ 47.518	\$ 2.621.248,49	55,16	\$ 2.621.248,49	0,00	\$ 0,00	55,16	\$ 2.621.248,49			55,16	\$ 2.621.248,49						
4.2	Estuco Plástico para muros interiores y exteriores	M2	55,16	\$ 27.347	\$ 1.508.538,54	55,16	\$ 1.508.538,54	0,00	\$ 0,00	55,16	\$ 1.508.538,54			55,16	\$ 1.508.538,54						
4.3	Aplicación de Pintura TIPO I para interiores	M2	532,58	\$ 26.464	\$ 14.094.069,80	532,58	\$ 14.094.069,80	0,00	\$ 0,00	532,58	\$ 14.094.069,80			532,58	\$ 14.094.069,80						
4.4	Aplicación de Pintura TIPO I para exteriores	M2	168,62	\$ 28.606	\$ 4.823.422,08	168,62	\$ 4.823.422,08	0,00	\$ 0,00	168,62	\$ 4.823.422,08			168,62	\$ 4.823.422,08						
4.5	Aplicación de Pintura 3 en 1 para carpintería metálica	M2	95,45	\$ 37.199	\$ 3.550.757,98	95,45	\$ 3.550.757,98	0,00	\$ 0,00	95,45	\$ 3.550.757,98			95,45	\$ 3.550.757,98						
	Sub-total				\$ 26.598.036,89		\$ 26.598.036,89		\$ 0,00		\$ 26.598.036,89		\$ 0,00		\$ 26.598.036,89						
5.0	CONCRETOS																				
5.1	Vigas Cintas (0,15Mx20M) en concreto 21MPa (Incluye acero de refuerzo según diseños)	M3	1,96	\$ 2.836.742	\$ 5.560.013,46	0,00	\$ 0,00	3,14	\$ 8.893.184,79	3,14	\$ 8.893.184,79			3,14	\$ 8.893.184,79						
	Sub-total				\$ 5.560.013,46		\$ 0,00		\$ 8.893.184,79		\$ 8.893.184,79				\$ 8.893.184,79						
6.0	ASEO																				
6.1	ASEO GENERAL	M2	698,41	\$ 1.422	\$ 993.075,67	0,00	\$ 0,00	347,58	\$ 494.235,87	347,58	\$ 494.235,87			347,58	\$ 494.235,87						
	Sub-total				\$ 993.075,67		\$ 0,00		\$ 494.235,87		\$ 494.235,87				\$ 494.235,87						
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 244.373.290,48																
ADMINISTRACION					29,00%										\$ 202.172.593,03						
UTILIDAD					5,00%										\$ 58.630.051,98						
IMPREVISTOS					1,00%										\$ 10.108.629,65						
TOTAL COSTOS INDIRECTOS															\$ 2.021.725,93						
PMA															\$ 70.760.407,56						
COSTO TOTAL DE LA OBRA															\$ 5.765.000,00						
															\$ 278.698.000,60						
															\$ 244.373.290,49						
															\$ 70.868.254,24						
															\$ 12.218.664,52						
															\$ 2.443.732,90						
															\$ 85.530.651,67						
															\$ 11.530.000,00						
															\$ 341.433.942,16						



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1




INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2

Durante la ejecución del proyecto fue necesario llevar a cabo actividades que no se encontraban incluidas en el mismo, pero que eran de vital importancia su ejecución, las actividades se relacionan a continuación:

- **CONSTRUCCIÓN DE ANDEN EN CONCRETO DE 3000PSI ($e=0,1m$):** con el fin de garantizar espacios idóneos para los estudiantes, se solicita realizar dos tramos de andén perimetral, estos cuenta con las siguientes dimensiones:


1. Tramo No. 1: Ancho de 0.88 metros y longitud de 18 metros, quedando de esta manera un total de 15,84 metros cuadrados (m^2)

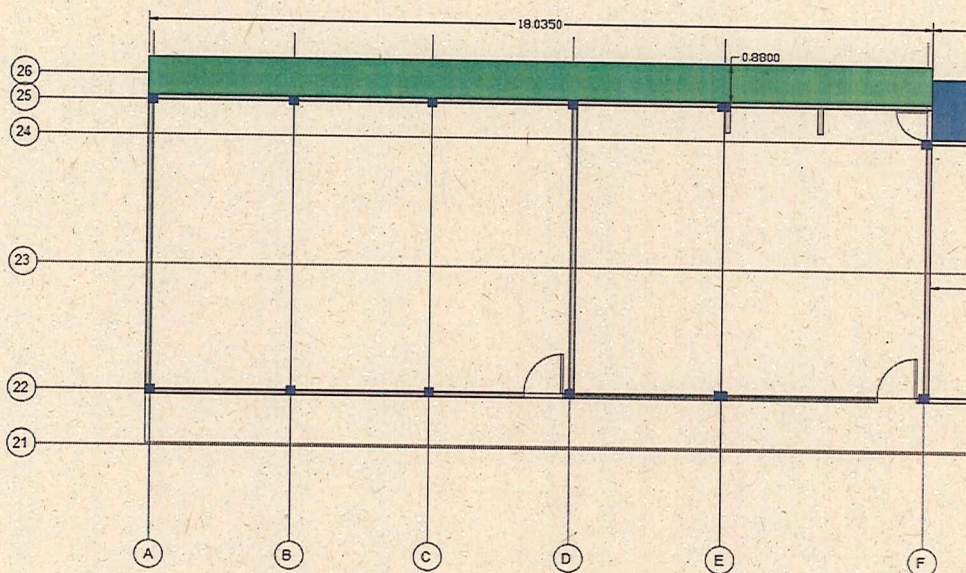

2. Tramo No. 2: Ancho de 1.46 metros y longitud de 15,88 metros, quedando de esta manera un total de 23,18 metros cuadrados (m^2)



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2

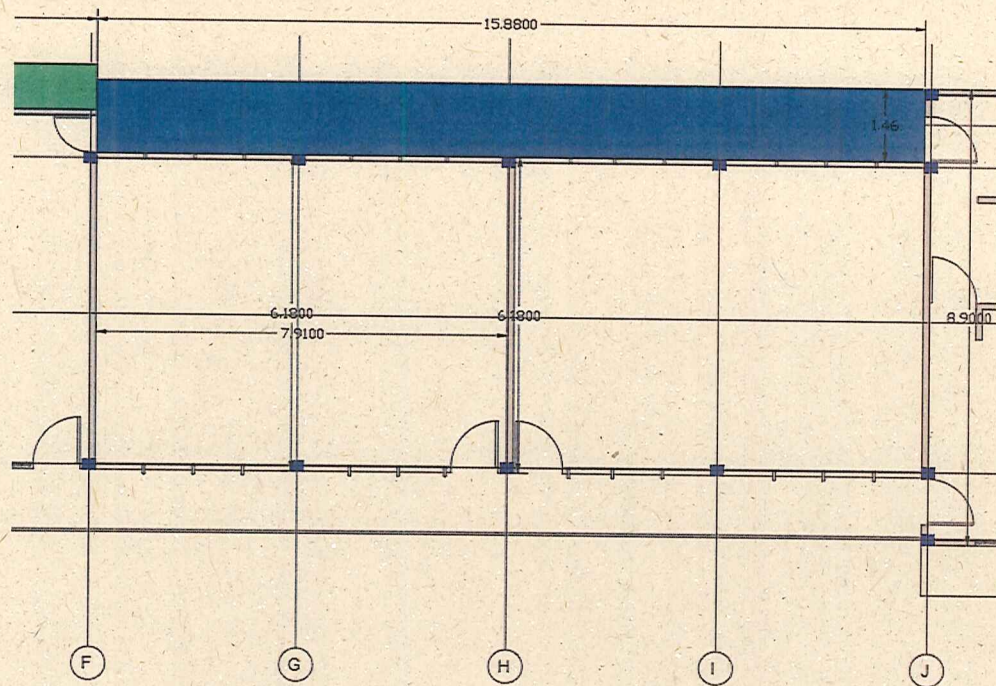

- **PROYECCIÓN DE TUBERÍA PARA REDES Y PUNTOS ELÉCTRICOS:** durante la ejecución se evidenció que la infraestructura no contaba con la proyección de las redes de energía que a futuro se podrían conectar al suministro de la misma, teniendo en cuenta lo antes mencionado, la supervisión e interventoría sugirieron que para evitar a futuro un detrimento de la intervención realizada con la ejecución del presente contrato, era necesario llevar a cabo la proyección de las redes eléctricas y de igual manera los puntos eléctricos, que permita futuro hacer las respectivas conexiones sin ir a intervenir la infraestructura mejorada.

Es así como en el periodo del presente informe, se llevó a cabo la instalación de 198 metros de tubería Conduit (incluye regate y resane de muros) y de igual manera la proyección de 60 puntos eléctricos (Tomacorrientes e Interruptores).



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2



3.3. ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO

El valor total del proyecto asciende a la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 368.748.657,53) MDA/CTE, Correspondientes a TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS (\$ 341.433.942,16) MDA/CTE para OBRA, y VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 24.457.143,58) MDA/CTE para INTERVENTORÍA. En concordancia con el presupuesto establecido en el proyecto Registrado BPIN No. 2023006860290. El valor total del convenio será financiado con recursos del Departamento del Putumayo.

Para la ejecución del contrato de obra el CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL expide el CDP No. 13 de 2024 de fecha 29/10/2024 en el cual se comprometen TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS (\$ 341.433.942,16) MDA/CTE.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
CREADA MEDIANTE DECRETO 0293 DE FEBRERO 24 DE 2003
CODIGO DANE 35-38656000395
NIT 846003704-1



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

N° 13 2024

EL SUSCRITO DIRECTOR DEL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA HACE CONSTAR:

Que en el presupuesto de la vigencia 2024, existe disponibilidad presupuestal así:

CÓDIGO PRESUPUESTAL	032107
RUBRO PRESUPUESTAL	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
OBJETO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	RECURSOS GOBERNACION SEGUN RESOLUCION 4470 DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$ 341.433.942,16
VALOR EN LETRAS	TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS
FECHA DE CDP	29 DE OCTUBRE 2024

HUMBERTO HERNY PIAGUAJE
C.C. N° 18124339
DIRECTOR



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2



De igual manera para la ejecución del contrato de interventoría el CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL expide el CDP No. 14 de 2024 de fecha 29/10/2024 en el cual se comprometen VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 27.314.715,37) MDA/CTE.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
CREADA MEDIANTE DECRETO 0293 DE FEBRERO 24 DE 2003
CODIGO DANE 84 24600003399
NIT 846003704-1



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

N° 14 2024

EL SUSCRITO DIRECTOR DEL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA HACE
CONSTAR:

Que en el presupuesto de la vigencia 2024, existe disponibilidad presupuestal así:

CODIGO PRESUPUESTAL	032107
RUBRO PRESUPUESTAL	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	RECURSOS GOBERNACION SEGUN RESOLUCION 4470 DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$ 27.314.715,37
VALOR EN LETRAS	VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS
FECHA DE CDP	29 DE OCTUBRE 2024

HUMBERTO HERNEY PIAGUAJE
C.C. N° 18124339
DIRECTOR

Una vez contratados los procesos de obra e interventoría se emiten los siguientes Registros Presupuestales:



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2



Contrato de Obra.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
CREADA MEDIANTE DECRETO 0293 DE FEBRERO 24 DE 2003
CÓDIGO DANE 84-384600003704
NIT 846003704-1




REGISTRO PRESUPUESTAL

N° 13 2024

EL SUSCRITO DIRECTOR DEL CER BUENAVISTA HACE CONSTAR:

Que en el Presupuesto del Fondo de Servicios Educativos, para la vigencia del Primero (1°) de Enero al Treinta y uno (31) de Diciembre del año 2024 existe Disponibilidad para Contratar y Reserva Presupuestal denominada así:

FECHA DE RP	04 DE DICIEMBRE DEL 2024
RUBRO PRESUPUESTAL	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DETALLE DEL GASTO	CONTRATO DE OBRA
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	RECURSOS PROPIOS SEGUN DONACION 01 DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2024
OBJETO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
NOMBRE DEL PROVEEDOR	DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS PUTUMAYO S.A.S
NIT DEL PROVEEDOR	900 912 227-3
VALOR A PAGAR EN PESOS	\$ 341.433 942 16
VALOR EN LETRAS	TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS
FECHA DE CDP	29 DE OCTUBRE 2024


HUMBERTO HERNEY PIAGUAJE
C.C. N° 18124339
DIRECTOR

Contrato de Interventoría.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
CREADA MEDIANTE DECRETO 0293 DE FEBRERO 24 DE 2003
CÓDIGO BANE No. 380566000370
NIT 846003704-1



REGISTRO PRESUPUESTAL

Nº 14 2024

EL SUSCRITO DIRECTOR DEL CER BUENAVISTA HACE CONSTAR:

Que en el Presupuesto del Fondo de Servicios Educativos, para la vigencia del Primero (1º) de Enero al Treinta y uno (31) de Diciembre del año 2024 existe Disponibilidad para Contratar y Reserva Presupuestal denominada así:

FECHA DE RP	04 DE DICIEMBRE 2024
RUBRO PRESUPUESTAL	INTERVENTORIA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DETALLE DEL GASTO	HONORARIOS
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	RECURSOS GOBERNACION SEGUN RESOLUCION 4470 DEL 10 DE OCTUBRE DEL
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO, MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
NOMBRE DEL PROVEEDOR	INICAM S.A.S. ZOMAC
NIT DEL PROVEEDOR	901.310.022-6
VALOR A PAGAR EN PESOS	\$ 24.457.143,58
VALOR EN LETRAS	VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS
FECHA DE CDP	29 DE OCTUBRE 2024

HUMBERTO HERNEY PIACUAJE
C.C. N° 18124339
DIRECTOR

El día 27 de febrero de 2025 mediante comité técnico, se aprueba la adición en tiempo por un periodo de UN (01) mes para los contratos de obra e interventoría, de igual manera se aprueba la adición de recursos para garantizar la continuidad del contrato de Interventoría, recurso que se respalda mediante el CDP No. 01 de 2025 con fecha 04 de marzo de 2025, tal como se muestra a continuación:



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
CERADA MEDIANTE DECRETO 0043 DEL FEBRERO 24 DE 2003
CÓDIGO DANE No. 28054000339
NIT 846003704 - 1



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

N° 01 2025

EL SUSCRITO DIRECTOR DEL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA HACE
CONSTAR:

Que en el presupuesto de la vigencia 2025, existe disponibilidad presupuestal así:

CÓDIGO PRESUPUESTAL	032107
RUBRO PRESUPUESTAL	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	RECURSOS GOBERNACION SEGUN RESOLUCION 4470 DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$ 2.857.571,79
VALOR EN LETRAS	DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS
FECHA DE CDP	04 DE MARZO 2025

HUMBERTO HERNEY PIAGUAJE
C.C. N° 18124339
DIRECTOR

Una vez realizado el modificadorio No. 1 al contrato de interventoría, se expide el RP No. 1 de 2025 con fecha 2 de Abril de 2025, tal como se indica a continuación:



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
CREADA MEDIANTE DECRETO 0791 DE FEBRERO 24 DE 2003
CORRESPONDENCIA PRESUPUESTAL
NIT 846003704-1

REGISTRO PRESUPUESTAL

Nº 01 2025

EL SUSCRITO DIRECTOR DEL CER BUENAVISTA HACE CONSTAR:

Que en el Presupuesto del Fondo de Servicios Educativos, para la vigencia del Primer (1º) de Enero al Treinta y uno (31) de Diciembre del año 2024 existe Disponibilidad para Contratar y Reserva Presupuestal denominada así:

FECHA DE RP	2 de abril de 2025
GRUPO PRESUPUESTAL	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DETALLE DEL GASTO	HONORARIOS
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	RECURSOS GOBERNACIÓN SECUR. RESOLUCIÓN 4470 DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024
OBJETO	INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
NOMBRE DEL PROVEEDOR	INCAM S.A.S. ZOMAC
NIT DEL PROVEEDOR	901.310.022-8
VALOR PAGADO EN PESOS	\$ 2.800.000,00
VALOR EN LETRAS	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS
FECHA DE CDP	04 DE ABRIL DE 2025

HUMBERTO HERNY PIAGUAJE
C.C. Nº 18124339
DIRECTOR

En el periodo del presente de informe tenemos una relación de avance como se relaciona a continuación:

El avance de Obra a la fecha se relaciona así:

DESCRIPCIÓN	VALORES CONTRATO DE OBRA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 341.433.942,16
VALOR PAGO ANTICIPO	\$ 182.945.542,87
VALOR EJECUTADO INFORME No. 1	\$ 62.735.941,56
VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE INFORME	\$ 278.698.000,60
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	\$ 341.433.942,16
VALOR SALDO POR EJECUTAR	\$ 0,00
% DE RECURSO EJECUTADO INFORME No. 1	18,37%
% DE RECURSO EJECUTADO EN EL PRESENTE INFORME	81,63%
% DE RECURSO TOTAL EJECUTADO	100%
% DE RECURSO POR EJECUTAR	0 %

De igual manera el avance de interventoría a la fecha se relaciona así:

DESCRIPCIÓN	VALORES CONTRATO DE INTERVENTORÍA
-------------	-----------------------------------



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 24.457.143,58
VALOR ADICIONAL No. 1	\$ 2.800.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 27.257.143,58
VALOR PAGO ANTICIPO	\$ 12.228.571,79
VALOR EJECUTADO INFORME No. 1	\$ 5.018.875,33
VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE INFORME	\$ 22.238.268,25
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	\$ 27.257.143,58
VALOR SALDO POR EJECUTAR	\$ 0,00
% DE RECURSO EJECUTADO INFORME No. 1	20,52%
% DE RECURSO EJECUTADO EN EL PRESENTE INFORME	79,48%
% DE RECURSO EJECUTADO	100%
% DE RECURSO POR EJECUTAR	0%

En resumen, tenemos el siguiente estado financiero del proyecto hasta la fecha:

Valor inicial del Proyecto:	\$ 368.748.657,53
Valor del contrato de Obra:	\$ 341.433.942,16
Valor del contrato de Interventoría:	\$ 27.257.143,58
Valor Final (Obra + Interventoría):	\$ 368.691.085,74
Diferencia valor Inicial y Valor Final (Saldo a favor del Departamento):	\$ 57.571,79
Valor Ejecutado Informe No. 1:	\$ 67.754.816,89
Valor Ejecutado en el presente Informe:	\$ 300.936.268,85
Valor Total Ejecutado:	\$ 368.691.085,74
Pagos Realizados al Contrato de Obra:	\$ 182.945.542,87
Pagos realizados al Contrato de Interventoría:	\$ 12.228.571,79
Total Pagos Realizados:	\$ 195.174.114,66
Pago Pendiente por pagar Obra:	\$ 182.945.542,87
Pago Pendiente por pagar Interventoría:	\$ 12.228.571,79
Valor Total pendiente por pagar:	\$ 195.174.114,66

A la fecha del presente informe se tiene que los contratos de obra e interventoría derivados del proyecto, se encuentran terminados.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
NIT. 846003704-1
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2



Anexos:

- Informe No. 2 Contrato de Obra
- Informe No. 2 Contrato de Interventoría

**INFORME DE
INTERVENTORIA
N°2**

INFORME No. 2
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 003-2024.
PERIODO: 04 DE ENERO AL 04 DE ABRIL DE 2025

OBJETO:

**“INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO “MEJORAMIENTO DAMBIENTES ESCOLARES EN
EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL INSTITUCION DE
PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”**

KARINA LILIBETH PÉREZ PASCUAZA
REPRESENTANTE LEGAL
R.L. INCAM S.A.S ZOMAC
NIT 901.310.022-0

MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
04 de Abril de 2025



Barrio Palermo-Puerto Caicedo-Putumayo



314-476-4642



+57 314 476 4642



incamsas@gmail.com

1. INTRODUCCIÓN

El CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL adelanta el proyecto identificado con código BPIN No. 2023006860290, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DAMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL INSTITUCION DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" por un valor inicial de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 368.748.657,53) MDA/CTE, con el fin de llevar a cabo el mejoramiento de la infraestructura educativa del CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL.

El mejoramiento de la infraestructura del CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL surge a raíz de la necesidad de brindar espacios dignos donde se puedan realizar diferentes actividades académicas y lúdicas de la institución, ampliando de esta manera las oportunidades educativas para comunidades desfavorecidas.

En cumplimiento a mis obligaciones como Interventor me permito exponer el estado administrativo, técnico y financiero en el que se encuentra actualmente el proyecto.

En la actualidad el contrato de obra se encuentra terminado como consta en el Acta de Recibo Final de fecha 20/03/2025, pendiente de la firma del Acta de Liquidación.



2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El municipio de Puerto Asís se encuentra ubicado al sur de Colombia en el departamento del Putumayo, limita con el municipio de Puerto Caicedo y Puerto Guzmán al norte, con los municipios de Orito, Valle del Guamuez y San Miguel al occidente, con el municipio de Puerto Leguizamo al oriente y con la Republica del Ecuador al sur; tiene una altura media de 250 m.s.n.m. El clima es tropical, con precipitaciones significativas. Incluso en el mes más seco hay mucha lluvia. Esta ubicación está clasificada como Af por Köppen y Geiger. La temperatura aquí es en promedio 24.9 °C. En un año, la precipitación media es 3850 mm.

El CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL, requiere una intervención a su infraestructura educativa específicamente en el área de la cubierta de las aulas, con lo cual se logre solucionar problemas de filtración, humedad y seguridad y de esta manera lograr un mejor espacio académico y así se evitar la deserción estudiantil. Para brindar espacios adecuados para el aprendizaje se proyecta el cambio de cubierta de los salones existentes y mantenimiento mediante aplicación de pintura sobre muros y carpintería metálica, lo cual puede desencadenar en un aumento representativo en estudiantes y así mismo en todo el sector productivo que involucre a dicha institución.



3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto que tiene por objeto: “MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”, se localiza en la Vereda Buenavista del Municipio de Puerto Asís, departamento del Putumayo, como se puede apreciar en las imágenes

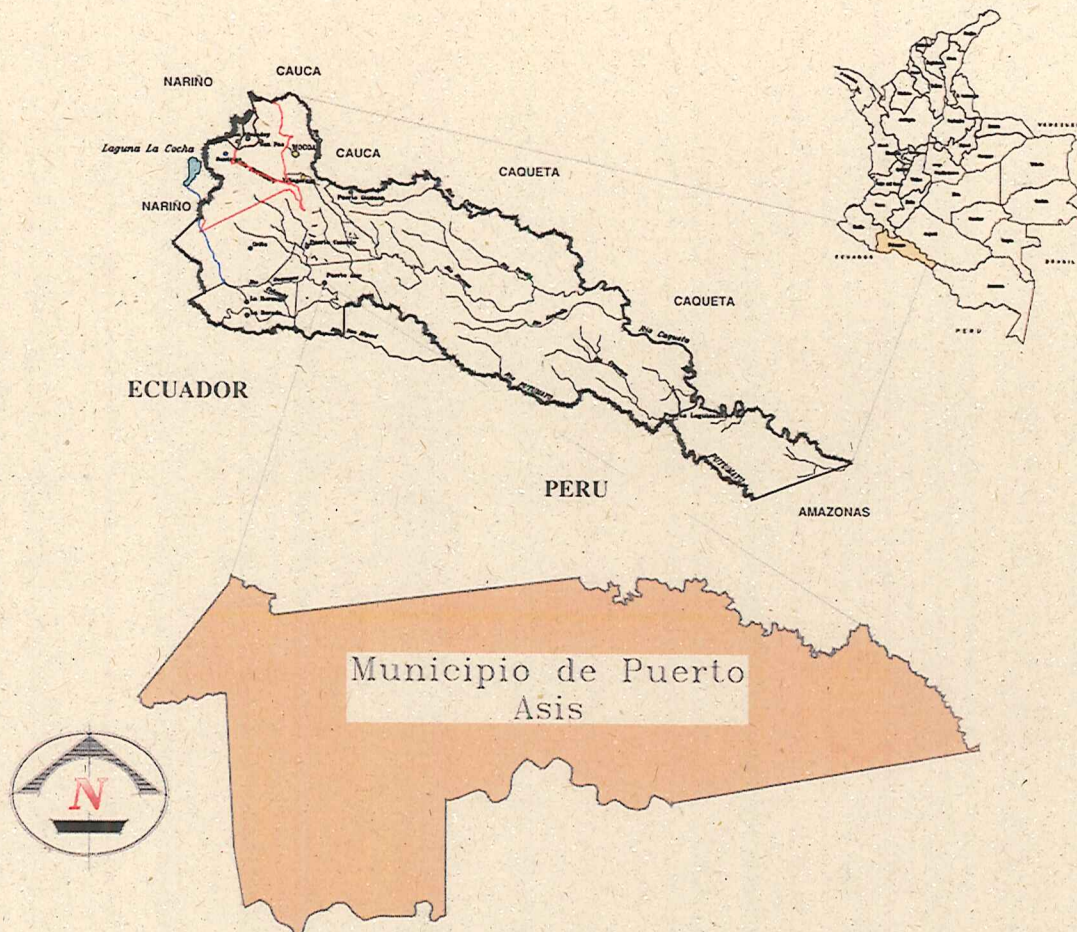


Imagen 1: Municipio de Puerto Asís. Fuente: Propia.





Imagen 2: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL. Fuente: Google Earth.

4. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA TÉCNICA Y FINANCIERA

4.1. INFORMACIÓN GENERAL

4.1.1. CONTRATO DE OBRA

El Contrato de Obra No. 004-2024 que tiene por objeto: “MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”, se localiza en el la parte rural del Municipio de Puerto Asís, del Departamento del Putumayo.

A continuación, se indica la información general del Contrato de obra:



Barrio Palermo-Puerto Caicedo-Putumayo



314-476-4642



+57 314 476 4642



incamsas@gmail.com

Tabla 1: Datos contractuales del contrato de obra.

CONTRATANTE:	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL
CLASE DE CONTRATO:	OBRA PÚBLICA
CONTRATISTA:	SOLUCIONES CIVILES JM SAS
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO	\$341.433.942,16 (Trescientos cuarenta y un millones cuatrocientos treinta y tres mil novecientos cuarenta y dos pesos con dieciséis centavos)
PLAZO DEL CONTRATO	DOS (2) MESES A PARTIR DE SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO	04 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN No. 1	04 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	27 DE ENERO DE 2025
FECHA DE REINICIO No. 1	27 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN No. 2	04 DE MARZO DE 2025
FECHA PRÓRROGA No. 1 (1 MES)	27 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN No. 3	04 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE RECIBO FINAL	20 DE MARZO DE 2025

4.1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El Contrato de Interventoría No. 003-2024 que tiene por objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO “MEJORAMIENTO D AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL INSTITUCION DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”, se localiza en el la parte rural del Municipio de Puerto Asís, del Departamento del Putumayo.

A continuación, se indica la información general del Contrato de interventoría:

Tabla 2: Datos contractuales del contrato de Interventoría.

CONTRATANTE:	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL
CLASE DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
CONTRATISTA:	INCAM S.A.S ZOMAC
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO “MEJORAMIENTO D AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL INSTITUCION DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”
VALOR DEL CONTRATO	\$24.457.143,58 (VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS)



PLAZO DEL CONTRATO	DOS (2) MESES A PARTIR DE SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO	04 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN No. 1	04 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	27 DE ENERO DE 2025
FECHA DE REINICIO No. 1	27 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN No. 2	04 DE MARZO DE 2025
FECHA PRÓRROGA No. 1 (1 MES)	27 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN No. 3	04 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE RECIBO FINAL	04 DE ABRIL DE 2025

4.2. PÓLIZAS Y GARANTÍAS DE LOS CONTRATOS

4.2.1. PÓLIZAS Y GARANTÍAS CONTRATO DE OBRA

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A., Póliza de responsabilidad civil No. 41-40-101054371 ANEXO 4 y póliza de cumplimiento No. 41-44-101288873 ANEXO 5, con fecha de expedición 06 de marzo de 2025.

Tabla 3: Datos pólizas y garantías del contrato de Obra.

ANEXO	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA
5	06/03/2025	Cumplimiento del Contrato	04/12/2024	04/08/2025	\$34.143.394,22
		Buen manejo y correcta inversión del anticipo	04/12/2024	04/08/2025	\$170.716.971,08
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	04/12/2024	04/04/2028	\$17.071.697,11
		Estabilidad y calidad de la obra	5 años, 0 meses y 0 días		\$34.143.394,22
4	06/03/2025	Predios labores y operaciones	04/12/2024	04/04/2025	\$34.143.394,22
		Contratistas y subcontratistas	04/12/2024	04/04/2025	\$34.143.394,22
		Vehículos propios y no propios	04/12/2024	04/04/2025	\$34.143.394,22



4.2.2. PÓLIZAS Y GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A., POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 41-44-101288822, con fecha de expedición 03 de abril de 2025.

Tabla 4: Datos pólizas y garantías del contrato de Interventoría.

ANEXO	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA
6	03/04/2025	Cumplimiento del Contrato	04/12/2024	04/08/2025	\$ 2.725.714,36
		Buen manejo y correcta inversión del anticipo	04/12/2024	04/08/2025	\$ 13.628.571,79
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	04/12/2024	04/04/2028	\$ 1.362.857,18
		Calidad del servicio	04/12/2024	04/02/2030	\$ 2.725.714,36

4.3. PRESUPUESTO INICIAL DEL PROYECTO

4.3.1. PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONTRATO DE OBRA

De acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas, de los estudios previos y el contrato de obra, en la tabla 5 se describe el presupuesto inicial a ejecutar.

Tabla 5: Presupuesto del contrato de obra inicial.

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR
1.0	PRELIMINARES				
1.1	Localización y Replanteo	M2	347,58	\$ 2.303	\$ 800.320,14
1.2	Cerramiento en Polisombra	M2	253,60	\$ 17.100	\$ 4.336.560,94
1.3	Desmonte de Cubierta y Estructura Portante	M2	516,13	\$ 20.277	\$ 10.465.779,50
				Sub-total	\$ 15.602.660,57
2.0	ESTRUCTURAS METÁLICAS				
2.1	Estructura metalica en Acero ASTM - A572 (incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	KG	1373,36	\$ 29.784	\$ 40.903.909,15
2.2	Estructura metalica en Acero ASTM - A36 (Incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	KG	2772,78	\$ 28.944	\$ 80.255.003,14
2.3	Templetes, Barra Lisa de 1/2", Incluye Pintura Anticorrosiva y Esmalte	M	65,82	\$ 47.896	\$ 3.152.503,71
2.4	Contravientos, Barra Lisa de 1/2", Incluye Pintura Anticorrosiva y Esmalte	M	137,93	\$ 49.759	\$ 6.863.295,99
				Sub-total	\$ 131.174.711,99
3.0	CUBIERTA				
3.1	Suministro e Instalación de Teja en Zinc Arquitectónico Cal 30	M2	516,13	\$ 84.015	\$ 43.362.779,52
3.2	Suministro e Instalación de Canal en lamina galvanizada cal. 20 (incluye: accesorios de instalación y bajante)	M	98,29	\$ 174.316	\$ 17.132.608,11
3.3	Suministro e instalación caballete en Zinc Cal.30	M	48,50	\$ 81.431	\$ 3.949.404,28
				Sub-total	\$ 64.444.791,91
4.0	REPELLO, ESTUCO Y PINTURA				
4.1	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	55,16	\$ 47.518	\$ 2.621.248,49



4.2	Estuco Plástico para muros interiores y exteriores	M2	55,16	\$ 27.347	\$ 1.508.538,54
4.3	Aplicación de Pintura TIPO I para interiores	M2	532,58	\$ 26.464	\$ 14.094.069,80
4.4	Aplicación de Pintura TIPO I para exteriores	M2	168,62	\$ 28.606	\$ 4.823.422,08
4.5	Aplicación de Pintura 3 en 1 para carpintería metálica	M2	95,45	\$ 37.199	\$ 3.550.757,98
Sub-total					\$ 26.598.036,89
5.0	CONCRETOS				
5.1	Vigas Cintas (0,15Mx20M) en concreto 21MPa (incluye acero de refuerzo según diseños)	M3	1,96	\$ 2.836.742	\$ 5.560.013,46
Sub-total					\$ 5.560.013,46
6.0	ASEO				
6.1	ASEO GENERAL	M2	698,41	\$ 1.422	\$ 993.075,67
Sub-total					\$ 993.075,67

TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 244.373.290,49
ADMINISTRACION	29,00%	\$ 70.868.254,24
UTILIDAD	5,00%	\$ 12.218.664,52
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 2.443.732,90
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 85.530.651,67
PMA		\$ 11.530.000,00
COSTO TOTAL DE LA OBRA		\$ 341.433.942,16

El valor del presupuesto inicial del contrato de obra pública es por la suma de: \$341.433.942,16 (Trescientos cuarenta y un millones cuatrocientos treinta y tres mil novecientos cuarenta y dos pesos con dieciséis centavos).

El día 04 de MARZO de 2025, se aprueba Acta de Mayores y Menores Cantidades de Obra, mediante la cual se actualiza las condiciones iniciales del contrato, quedando de la siguiente manera:

PRESUPUESTO OFICIAL CANTIDADES CONTRATADAS						CANTIDADES MODIFICADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1.0	PRELIMINARES								
1.1	Localización y Replanteo	M2	347,58	\$ 2.303	\$ 800.320,14	0,00	\$ 0,00	347,58	\$ 800.320,14
1.2	Cerramiento en Polisombra	M2	253,60	\$ 17.100	\$ 4.336.560,94	0,00	\$ 0,00	253,60	\$ 4.336.560,94
1.3	Desmante de Cubierta y Estructura Portante	M2	516,13	\$ 20.277	\$ 10.465.779,50	0,00	\$ 0,00	516,13	\$ 10.465.779,50
Sub-total					\$ 15.602.660,57		\$ 0,00		\$ 15.602.660,57
2.0	ESTRUCTURAS METÁLICAS								
2.1	Estructura metálica en Acero ASTM - A572 (incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje)	KG	1373,36	\$ 29.784	\$ 40.903.909,15	74,95	\$ 2.232.177,42	1448,30	\$ 43.136.086,57
2.2	Estructura metálica en Acero ASTM - A36 (incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje)	KG	2772,78	\$ 28.944	\$ 80.255.003,14	91,78	\$ 2.656.350,95	2864,56	\$ 82.911.354,09
2.3	Templetes, Barra Lisa de 1/2", Incluye Pintura Anticorrosiva y Esmalte	M	65,82	\$ 47.896	\$ 3.152.503,71	-65,82	-\$ 3.152.503,71	0,00	\$ 0,00
2.4	Contravientos, Barra Lisa de 1/2", Incluye Pintura Anticorrosiva y Esmalte	M	137,93	\$ 49.759	\$ 6.863.295,99	-137,93	-\$ 6.863.295,99	0,00	\$ 0,00
Sub-total					\$ 131.174.711,99		-\$ 5.127.271,33		\$ 126.047.440,66
3.0	CUBIERTA								
3.1	Suministro e Instalación de Teja en Zinc Arquitectónico Cal 30	M2	516,13	\$ 84.015	\$ 43.362.779,52	17,03	\$ 1.430.524,69	533,16	\$ 44.793.304,21
3.2	Suministro e Instalación de Canal en lamina galvanizada cal. 20 (incluye: accesorios de instalación y bajante)	M	98,29	\$ 174.316	\$ 17.132.608,11	4,20	\$ 732.125,49	102,49	\$ 17.864.733,61
3.3	Suministro e instalación caballete en Zinc Cal.30	M	48,50	\$ 81.431	\$ 3.949.404,28	1,60	\$ 130.289,63	50,10	\$ 4.079.693,90



Barrio Palermo-Puerto Caicedo-Putumayo



314-476-4642



+57 314 476 4642



incamsas@gmail.com

				Sub-total	\$ 64.444.791,91		\$ 2.292.939,80		\$ 66.737.731,72
4.0	REPELLO, ESTUCO Y PINTURA								
4.1	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	55,16	\$ 47.518	\$ 2.621.248,49	0,00	\$ 0,00	55,16	\$ 2.621.248,49
4.2	Estuco Plastico para muros interiores y exteriores	M2	55,16	\$ 27.347	\$ 1.508.538,54	0,00	\$ 0,00	55,16	\$ 1.508.538,54
4.3	Aplicación de Pintura TIPO I para interiores	M2	532,58	\$ 26.464	\$ 14.094.069,80	0,00	\$ 0,00	532,58	\$ 14.094.069,80
4.4	Aplicación de Pintura TIPO I para exteriores	M2	168,62	\$ 28.606	\$ 4.823.422,08	0,00	\$ 0,00	168,62	\$ 4.823.422,08
4.5	Aplicación de Pintura 3 en 1 para carpintería metálica	M2	95,45	\$ 37.199	\$ 3.550.757,98	0,00	\$ 0,00	95,45	\$ 3.550.757,98
				Sub-total	\$ 26.598.036,89		\$ 0,00		\$ 26.598.036,89
5.0	CONCRETOS								
5.1	Vigas Cintas (0,15Mx20M) en concreto 21MPa (incluye acero de refuerzo según diseños)	M3	1,96	\$ 2.836.742	\$ 5.560.013,46	1,18	\$ 3.333.171,33	3,14	\$ 8.893.184,79
				Sub-total	\$ 5.560.013,46		\$ 3.333.171,33		\$ 8.893.184,79
6.0	ASEO								
6.1	ASEO GENERAL	M2	698,41	\$ 1.422	\$ 993.075,67	-350,82	-\$ 498.839,80	347,58	\$ 494.235,87
				Sub-total	\$ 993.075,67		-\$ 498.839,80		\$ 494.235,87

TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 244.373.290,48
ADMINISTRACION	29,00%	\$ 70.868.254,24
UTILIDAD	5,00%	\$ 12.218.664,52
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 2.443.732,90
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 85.530.651,67
PMA		\$ 11.530.000,00
COSTO TOTAL DE LA OBRA		\$ 341.433.942,16

\$ 244.373.290,49
\$ 70.868.254,24
\$ 12.218.664,52
\$ 2.443.732,90
\$ 85.530.651,67
\$ 11.530.000,00
\$ 341.433.942,16

Como se puede evidenciar, la modificación planteada no afecta ni el objeto ni el valor del contrato.

4.3.2. PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas, de los estudios previos y el contrato de interventoría se estableció que el presupuesto inicial para este equivale a un total de \$24.457.143,58 (VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS).

Teniendo en cuenta el modificadorio No. 1 que se le realizó al contrato de interventoría, el cual se firma con fecha del 31 de Marzo de 2025, se le adicionó un total de DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$ 2.800.000,00) MDA/CTE, quedando de esta manera como valor total de contrato de interventoría, la suma de VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 27.257.143,58) MDA/CTE.

4.4. PLAZO PARA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Para la ejecución de las actividades tanto del contrato de obra como del contrato de interventoría equivale inicialmente a DOS (02) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio de los contratos.



Teniendo en cuenta la solicitud realizada por el contratista de obra en cuanto a la Suspensión No. 1 del contrato y adicionalmente la Prorroga no. 1 al mismo, el tiempo total de ejecución ascendió a un total de TRES (03) MESES.

4.5. PERSONAL EN OBRA

4.5.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

El personal administrativo y de obra que apoyó las actividades desarrolladas durante el presente periodo, se describe en la siguiente tabla:

Tabla 6: Descripción de la mano de obra calificada empleada por el contratista en la obra.

NOMBRE	CARGO	CEDULA
Leydy Yulieth Tejada Saldarriaga	Representante legal	1.123.207.998
Daniela Portilla Burbano	Residente de obra	1.124.859.667

4.5.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

La mano de obra no calificada para la ejecución de los trabajos y actividades realizadas por el contratista durante el periodo corresponde a: maestro y ayudantes. En la siguiente tabla se presenta los nombres y cargo del personal que conforma la mano de obra no calificada.

Tabla 7: Descripción de la mano de obra calificada empleada por el contratista en la obra.

NOMBRE	CARGO	CEDULA
José Orlando Bravo Cubillos	Maestro	80.381.853
Wilmer Naty Tombe	Ayudante	17.688.257
Mario Fernando Cuadros	Ayudante	1.115.074.053
Juan Libardo Pai Taicuz	Ayudante	1.123.304.807
Juan Libardo Pai Taicuz	Ayudante	1.123.304.807

4.6. MODIFICACIONES

4.6.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRA

Durante la ejecución del periodo del presente informe se llevó a cabo las siguientes modificaciones al contrato de obra:

- Suspensión No. 1 de fecha 27 de Enero de 2025, esta se realizó por un periodo equivalente a UN (01) mes.



- Adición en Tiempo (Prorroga No. 1), se llevó a cabo el día 27 de Febrero de 2025, mediante la cual se le adiciona UN (01) mes de ejecución al plazo del contrato.

4.6.2. MODIFICACIONES AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Durante la ejecución del periodo del presente informe se llevó a cabo las siguientes modificaciones al contrato de Interventoría:

- Suspensión No. 1 de fecha 27 de Enero de 2025, esta se realizó por un periodo equivalente a UN (01) mes.
- Adición en Tiempo (Prorroga No. 1), se llevó a cabo el día 27 de Febrero de 2025, mediante la cual se le adiciona UN (01) mes de ejecución al plazo del contrato.
- Modificadorio No. 1, mediante el cual se adicionaron recursos que garanticen la presencia de la Interventoría en el plazo adicionado mediante la prorroga No. 1.

4.7. AVANCE FÍSICO

El avance físico reportado en el siguiente cuadro corresponde a la obra ejecutada.

PRESUPUESTO OFICIAL CANTIDADES CONTRATADAS						CANTIDADES Y VALOR EJECUTADO MES 1		CANTIDADES Y VALOR EJECUTADO MES 2		CANTIDADES Y VALOR ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1.0	PRELIMINARES										
1.1	Localización y Replanteo	M2	347,58	\$ 2.303	\$ 800.320,14	347,58	\$ 800.320,14	0,00	\$ 0,00	347,58	\$ 800.320,14
1.2	Cerramiento en Polisombra	M2	253,60	\$ 17.100	\$ 4.336.560,94	253,60	\$ 4.336.560,94	0,00	\$ 0,00	253,60	\$ 4.336.560,94
1.3	Desmonte de Cubierta y Estructura Portante	M2	516,13	\$ 20.277	\$ 10.465.779,50	516,13	\$ 10.465.779,50	0,00	\$ 0,00	516,13	\$ 10.465.779,50
	Sub-total				\$ 15.602.660,57		\$ 15.602.660,57		\$ 0,00		\$ 15.602.660,57
2.0	ESTRUCTURAS METÁLICAS										
2.1	Estructura metálica en Acero ASTM - A572 (incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	KG	1373,36	\$ 29.784	\$ 40.903.909,15	0,00	\$ 0,00	1448,30	\$ 43.136.086,57	1448,30	\$ 43.136.086,57
2.2	Estructura metálica en Acero ASTM - A36 (Incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	KG	2772,78	\$ 28.944	\$ 80.255.003,14	0,00	\$ 0,00	2864,56	\$ 82.911.354,09	2864,56	\$ 82.911.354,09
2.3	Templateles, Barra Lisa de 1/2", Incluye Pintura Anticorrosiva y Esmalte	M	65,82	\$ 47.896	\$ 3.152.503,71	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.4	Contravientos, Barra Lisa de 1/2", Incluye Pintura Anticorrosiva y Esmalte	M	137,93	\$ 49.759	\$ 6.863.295,99	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
	Sub-total				\$ 131.174.711,99		\$ 0,00		\$ 126.047.440,66		\$ 126.047.440,66
3.0	CUBIERTA										
3.1	Suministro e Instalación de Teja en Zinc Arquitectónico Cal 30	M2	516,13	\$ 84.015	\$ 43.362.779,52	0,00	\$ 0,00	533,16	\$ 44.793.304,21	533,16	\$ 44.793.304,21
3.2	Suministro e Instalación de Canal en lamina galvanizada cal. 20 (incluye: accesorios de instalación y bajante)	M	98,29	\$ 174.316	\$ 17.132.608,11	0,00	\$ 0,00	102,49	\$ 17.864.733,61	102,49	\$ 17.864.733,61
3.3	Suministro e instalación caballete en Zinc Cal.30	M	48,50	\$ 81.431	\$ 3.949.404,28	0,00	\$ 0,00	50,10	\$ 4.079.693,90	50,10	\$ 4.079.693,90
	Sub-total				\$ 64.444.791,91		\$ 0,00		\$ 66.737.731,72		\$ 66.737.731,72
4.0	REPELLO, ESTUCO Y PINTURA										
4.1	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	55,16	\$ 47.518	\$ 2.621.248,49	55,16	\$ 2.621.248,49	0,00	\$ 0,00	55,16	\$ 2.621.248,49



Barrio Palermo-Puerto Caicedo-Putumayo



314-476-4642



+57 314 476 4642



incamsas@gmail.com

4.2	Estuco Plastico para muros interiores y exteriores	M2	55,16	\$ 27.347	\$ 1.508.538,54	55,16	\$ 1.508.538,54	0,00	\$ 0,00	55,16	\$ 1.508.538,54
4.3	Aplicación de Pintura TIPO I para interiores	M2	532,58	\$ 26.464	\$ 14.094.069,80	532,58	\$ 14.094.069,80	0,00	\$ 0,00	532,58	\$ 14.094.069,80
4.4	Aplicación de Pintura TIPO I para exteriores	M2	168,62	\$ 28.606	\$ 4.823.422,08	168,62	\$ 4.823.422,08	0,00	\$ 0,00	168,62	\$ 4.823.422,08
4.5	Aplicación de Pintura 3 en 1 para carpintería metálica	M2	95,45	\$ 37.199	\$ 3.550.757,98	95,45	\$ 3.550.757,98	0,00	\$ 0,00	95,45	\$ 3.550.757,98
Sub-total					\$ 26.598.036,89		\$ 26.598.036,89		\$ 0,00		\$ 26.598.036,89
5.0	CONCRETOS										
5.1	Vigas Cintas (0,15Mx20M) en concreto 21MPa (incluye acero de refuerzo según diseños)	M3	1,96	\$ 2.836.742	\$ 5.560.013,46	0,00	\$ 0,00	3,14	\$ 8.893.184,79	3,14	\$ 8.893.184,79
Sub-total					\$ 5.560.013,46		\$ 0,00		\$ 8.893.184,79		\$ 8.893.184,79
6.0	ASEO										
6.1	ASEO GENERAL	M2	698,41	\$ 1.422	\$ 993.075,67	0,00	\$ 0,00	347,58	\$ 494.235,87	347,58	\$ 494.235,87
Sub-total					\$ 993.075,67		\$ 0,00		\$ 494.235,87		\$ 494.235,87

TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 244.373.290,48
ADMINISTRACION	29,00%	\$ 70.868.254,24
UTILIDAD	5,00%	\$ 12.218.664,52
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 2.443.732,90
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 85.530.651,67
PMA		\$ 11.530.000,00
COSTO TOTAL DE LA OBRA		\$ 341.433.942,16

\$ 42.200.697,45
\$ 12.238.202,26
\$ 2.110.034,87
\$ 422.006,97
\$ 14.770.244,11
\$ 5.765.000,00
\$ 62.735.941,56

\$ 202.172.593,03
\$ 58.630.051,98
\$ 10.108.629,65
\$ 2.021.725,93
\$ 70.760.407,56
\$ 5.765.000,00
\$ 278.698.000,60

\$ 244.373.290,49
\$ 70.868.254,24
\$ 12.218.664,52
\$ 2.443.732,90
\$ 85.530.651,67
\$ 11.530.000,00
\$ 341.433.942,16


VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 341.433.942,16
VALOR EJECUTADO MES 1	\$ 62.735.941,56
VALOR EJECUTADO MES 2	\$ 278.698.000,60
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	\$ 341.433.942,16
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 0,00
% DE AVANCE MES 1	18,37%
% DE AVANCE MES 2	81,63%
% DE AVANCE ACUMULADO	100,00%
% DE AVANCE PENDIENTE POR EJECUTAR	0,00%

De igual manera, atendiendo la solicitud del supervisor, se llevaron a cabo actividades que no estaban contempladas dentro del contrato, estas se relacionan a continuación:


- **CONSTRUCCIÓN DE ANDEN EN CONCRETO DE 3000PSI (e=0,1m):** con el fin de garantizar espacios idóneos para los estudiantes, se solicita realizar dos tramos de andén perimetral, estos cuenta con las siguientes dimensiones:

1. Tramo No. 1: Ancho de 0.88 metros y longitud de 18 metros, quedando de esta manera un total de 15,84 metros cuadrados (m2)



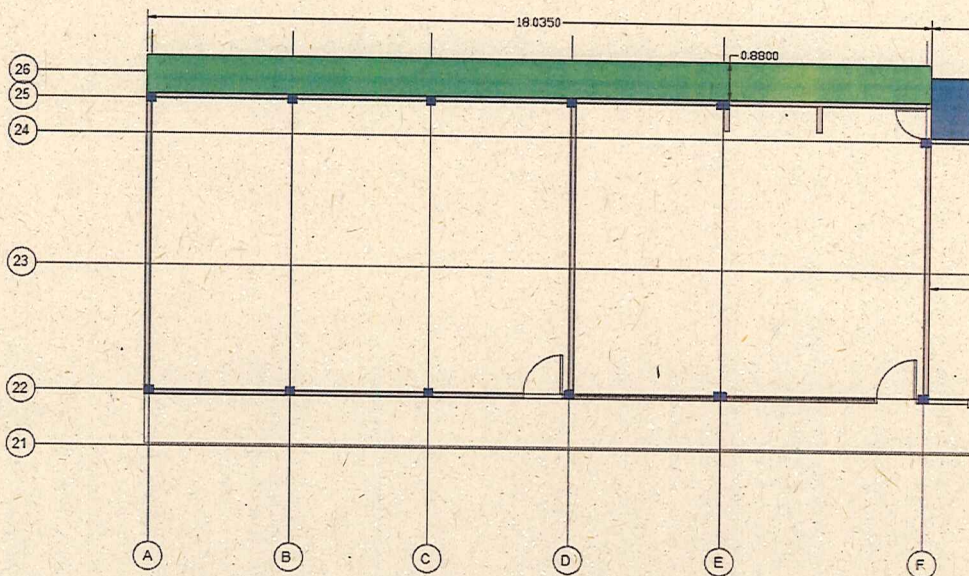

2. Tramo No. 2: Ancho de 1.46 metros y longitud de 15,88 metros, quedando de esta manera un total de 23,18 metros cuadrados (m²)

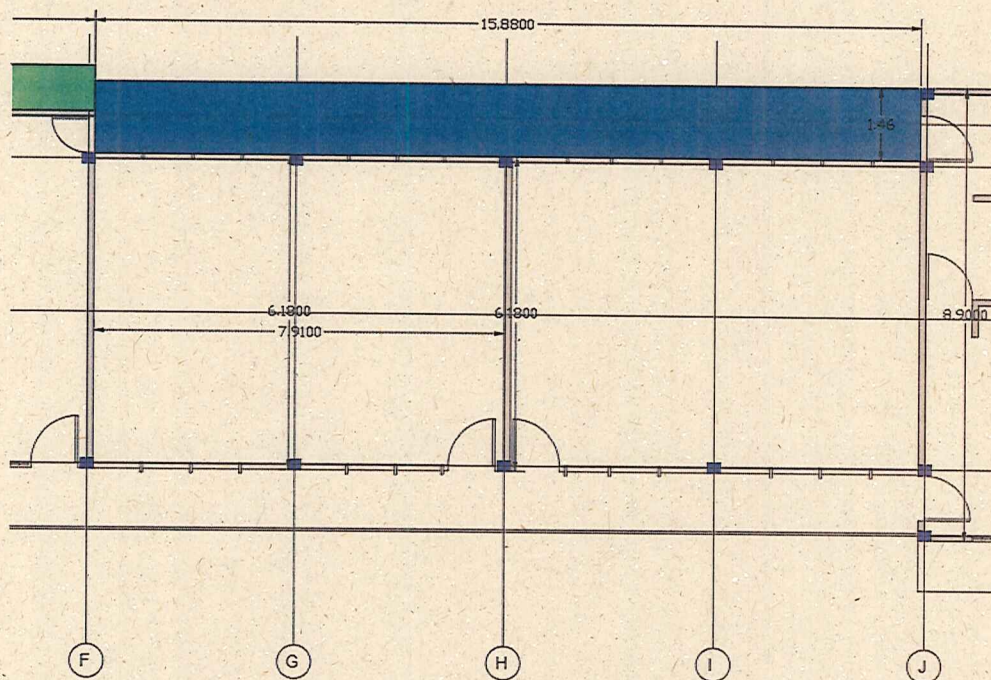

Barrio Palermo-Puerto Caicedo-Putumayo



314-476-4642



+57 314 476 4642



incamsas@gmail.com

- **PROYECCIÓN DE TUBERÍA PARA REDES Y PUNTOS ELÉCTRICOS:** durante la ejecución se evidencio que la infraestructura no contaba con la proyección de las redes de energía que a futuro se podrían conectar al suministro de la misma, teniendo en cuenta lo antes mencionado, la supervisión e interventoría sugirieron que para evitar a futuro un detrimento de la intervención realizada con la ejecución del presente contrato, era necesario llevar a cabo la proyección de las redes eléctricas y de igual manera los puntos eléctricos, que permita futuro hacer las respectivas conexiones sin ir a intervenir la infraestructura mejorada.

Es así como en el periodo del presente informe, se llevó a cabo la instalación de 198 metros de tubería Conduit (incluye regate y resane de muros) y de igual manera la proyección de 60 puntos eléctricos (Tomacorrientes e Interruptores).




Para evidencia de las actividades antes mencionadas, se anexa registro fotográfico de las mismas.

4.8. AVANCE FINANCIERO

Valor inicial del Proyecto:	\$ 368.748.657,53
Valor del contrato de Obra:	\$ 341.433.942,16
Valor del contrato de Interventoría:	\$ 24.457.143,58
Valor Total (Obra + Interventoría):	\$ 365.891.085,74
Valor Ejecutado en el presente Informe:	\$ 62.735.941,56
Valor Total Ejecutado:	\$ 62.735.941,56
Pagos Realizados al Contrato de Obra (Anticipo 50%):	\$ 182.945.542,87
Pagos realizados al Contrato de Interventoría (Anticipo 50%):	\$ 12.228.571,79
Total Pagos Realizados:	\$ 195.174.114,66



5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

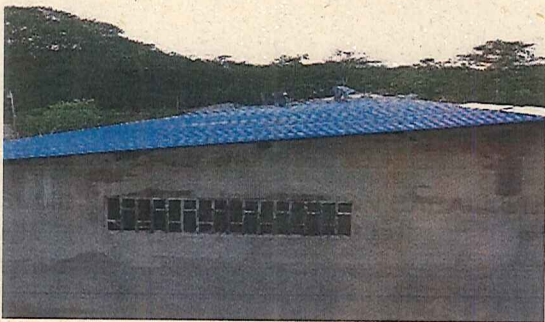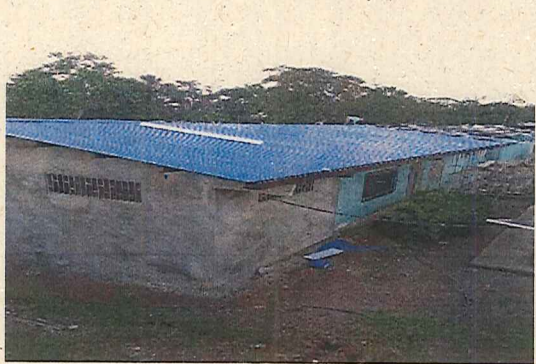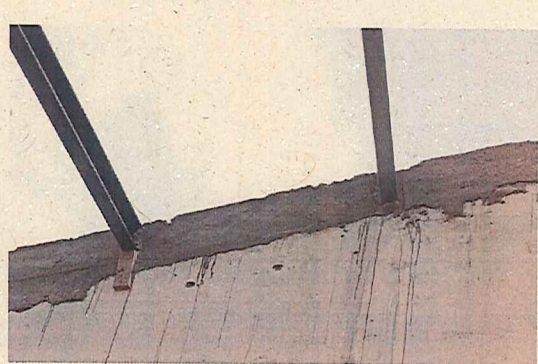	
ESTRUCTURA METALICA EN ACERO. ASTM - A572 (INCLUYE: SUMINISTRO - FABRICACION - PINTURA - MONTAJE)	ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ASTM - A36 (INCLUYE: SUMINISTRO - FABRICACION - PINTURA - MONTAJE)
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA EN ZINC ARQUITECTÓNICO CAL 30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 (INCLUYE: ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y BAJANTE)
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE EN ZINC CAL.30	VIGAS CINTAS (0,15MX20M) EN CONCRETO 21MPA (INCLUYE ACERO DE REFUERZO SEGÚN DISEÑOS)



Barrio Palermo-Puerto Caicedo-Putumayo



314-476-4642



+57 314 476 4642



incamsas@gmail.com



ASEO GENERAL

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS EN EL DESARROLLO DE LA OBRA

- Al no contar con el insumo necesario para la fabricación de la estructura de la cubierta, fue necesario llevar a cabo la suspensión del contrato por un periodo de 1 mes calendario. (Se anexa copia de Acta de Suspensión No. 1).
- Teniendo en cuenta el inconveniente antes mencionado, fue necesario llevar a cabo una adición en tiempo al contrato, lo cual garantice la ejecución de las actividades pendientes y de esta manera culminar las actividades y cantidades contratadas inicialmente. (Se anexa copia de Acta de Prorroga No. 1).



7. CONCLUSIONES

- El proyecto se encuentra terminado con ejecución del 100% de las actividades contratadas.
- El avance físico de obra durante el presente periodo corresponde al 81,63% con relación al 100% del contrato de obra, lo que representa un valor de: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$ 278.698.000,60) MDA/CTE.
- El avance físico acumulado de obra es por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS (\$ 341.433.942,16) MDA/CTE, lo que corresponde a un porcentaje acumulado de obra del 100,00% del total del contrato de obra.



- El avance financiero se debe a que la firma contratista SOLUCIONES CIVILES JM SAS ha realizado la ejecución parcial y/o total de algunos ítems del contrato de obra, los cuales fueron descritos anteriormente, se tiene que el avance financiero de obra ejecutado en el presente periodo es por valor de: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$ 278.698.000,60) MDA/CTE, siendo el 81,63% del valor total del contrato de obra.
- El avance financiero acumulado de obra equivale a TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS (\$ 341.433.942,16) MDA/CTE, lo que corresponde a un porcentaje acumulado de obra del 100,00% del total del contrato de obra.

Presentado por:

	
KARINA LILIBETH PÉREZ PASCUAZA R.L. INCAM S.A.S ZOMAC NIT 901.310.022-0	DANDENNYS PAZ PORTILLA Residente de Interventoría M.P. 19202-274596 CAU



MEMORIAN DE CANTIDADES



MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA									
ITEM	DESCRIPCION	LOCALIZACION EJES/ESPACIO	CANTIDADES					TOTAL CANTIDAD	UND.
			LONG. (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	+/-	CALCULOS PARCIAL		
2	ESTRUCTURAS METÁLICAS								
2.1	Estructura metálica en Acero ASTM - A572 (Incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje)							1,448.30	KG
		Perfiles Metálicos para Cerchas TIPO 1	Longitud (m)	Peso (kg/m)	Cantidad de Cerchas				
		Cordon Superior	11.28	5.59	1.00		63.06	4	KG
		Cordon Inferior	11.00	11.69	1.00		128.59	4	KG
		Paraleles	6.25	2.34	1.00		14.63	4	KG
		Diagonales	10.78	2.34	1.00		25.22	4	KG
		Portacorreas	0.25	0.80	12.00		2.40	4	KG
		Perfiles Metálicos para Cerchas TIPO 2	Longitud (m)	Peso (kg/m)	Cantidad de Cerchas				
		Cordon Superior	11.35	5.59	1.00		63.44	2	KG
		Cordon Inferior	6.70	11.69	1.00		78.32	2	KG
		Paraleles	4.25	2.34	1.00		9.95	2	KG
		Diagonales	6.82	2.34	1.00		15.97	2	KG
		Portacorreas	0.25	0.80	12.00		2.40	2	KG
		DIAGONALES	Longitud (m)	Peso (kg/m)	Cantidad				
		Diagonal Tipo 1	2.17	12.62	1.00		27.34	5	KG
		Diagonal Tipo 2	0.52	12.62	1.00		6.51	2	KG
		Diagonal Tipo 3	1.81	12.62	1.00		22.84	1	KG
2.2	Estructura metálica en Acero ASTM - A36 (Incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje)							2,864.56	KG
		Correas Metálicas	Longitud (m)	Peso (kg/m)			238.71	12	KG
			49.94	4.78					
2.3	Templetes, Barra Lisa de 1/2", Incluye Pintura Anticorrosiva y Esmalte							0.00	M
		Templetes 1/2"	10.97				10.97	0	M



MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	LOCALIZACION EJES/ESPACIO	CANTIDADES				CALCULOS PARCIAL	No. VECES	TOTAL CANTIDAD	UND.
			LONG. (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	+/-				
2.4	Contravientos, Barra Lisa de 1/2". Incluye Pintura Anticorrosiva y Esmalte	Contravientos 1/2"	137,93				137,93	0	0,00	M
3.0	CUBIERTA									
3.1	Suministro e Instalación de Teja en Zinc Arquitectónico Cal 30	Cubierta	50,10	10,64			533,16	1	533,16	M2
3.2	Suministro e Instalación de Canal en lámina galvanizada cal 20 (incluye: accesorios de instalación y bajante)	Eje 25 A-F Eje 24 F-J Eje 26 J-M Eje 22 A-J Eje 21 J-M	19,05 15,87 15,19 35,92 16,47				19,05 15,87 15,19 35,92 16,47	1 1 1 1 1	102,49	M
3.3	Suministro e Instalación caballote en Zinc Cal 30	Eje 23 A-M	50,10				50,10	1	50,10	M



MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA												
ITEM	DESCRIPCION	LOCALIZACION EJES/ESPACIO	CANTIDADES					CALCULOS		TOTAL CANTIDAD	UND.	
			LONG. (m)	MEDIDAS ANCHO (m)	ALTURA (m)	+/-	PARCIAL	No. VECES				
4.3	Aplicación de Pintura TIPO I para interiores									532,58	M2	
		MURO RESPALDO FACHADA PRINCIPAL										
		A-D	9,80		3,15			30,85	1	30,85	M2	
		Ventana A-B	2,80		0,70	-1,00		-1,96	1	-1,96	M2	
		Ventana B-C	2,75		0,70	-1,00		-1,93	1	-1,93	M2	
		Ventana C-D	3,05		0,70	-1,00		-2,14	1	-2,14	M2	
		Puerta C-D	1,00		2,00	-1,00		-2,00	1	-2,00	M2	
		D-F	8,13		3,15			25,61	1	25,61	M2	
		Ventana D-E	3,24		1,10	-1,00		-3,56	1	-3,56	M2	
		Ventana E-F	4,40		1,10	-1,00		-4,83	1	-4,83	M2	
		Puerta E-F	1,00		2,00	-1,00		-2,00	1	-2,00	M2	
		F-J	16,11		3,15			50,75	1	50,75	M2	
		Ventanas F-J	0,90		1,71	-1,00		-1,54	16	-24,62	M2	
		Puertas F-J	1,00		2,00	-1,00		-2,00	2	-4,00	M2	
		J-M	14,47		3,15			45,56	1	45,56	M2	
		Ventana J-K	2,00		1,25	-1,00		-2,50	1	-2,50	M2	
		Ventana K-L	2,00		1,25	-1,00		-2,50	1	-2,50	M2	
		Ventana L-M	2,00		1,25	-1,00		-2,50	1	-2,50	M2	
		Puerta K-L	1,00		2,45	-1,00		-2,45	1	-2,45	M2	
		Puerta L-M	1,00		2,00	-1,00		-2,00	1	-2,00	M2	
		MURO RESPALDO FACHADA POSTERIOR										
		M-J	14,47		3,15			45,56	1	45,56	M2	
		Ventana M-L	2,00		0,50	-1,00		-1,00	1	-1,00	M2	
		Ventana L-K	2,00		1,25	-1,00		-2,50	1	-2,50	M2	
		Puerta L-K	1,00		2,45	-1,00		-2,45	1	-2,45	M2	
		Ventanas J-F	0,90		1,71	-1,00		-1,54	16	-24,62	M2	
		Ventana D-C	2,75		0,71	-1,00		-1,95	1	-1,95	M2	
		Ventana C-B	2,75		0,71	-1,00		-1,95	1	-1,95	M2	
		Ventana B-A	2,80		0,71	-1,00		-1,99	1	-1,99	M2	
		MURO RESPALDO FACHADA LATERAL DERECHA						35,06	1	35,06	M2	
		MURO RESPALDO FACHADA LATERAL IZQUIERDA						30,67	1	30,67	M2	
		MUROS INTERNOS										
		EJE D						28,06	2	56,11	M2	
		EJE F						26,66	2	53,31	M2	
		EJE H						25,64	2	51,27	M2	
		EJE J						31,50	2	63,01	M2	
		EJE K						35,06	2	70,13	M2	
		EJE L						35,06	2	70,13	M2	



MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA												
ITEM	DESCRIPCION	LOCALIZACION EJES/ESPACIO	CANTIDADES					CALCULOS		TOTAL CANTIDAD	UND.	
			LONG. (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	+/-	PARCIAL	No. VECES				
4.4	Aplicación de Pintura TIPO I para exteriores									168,62	M2	
		FACHADA PRINCIPAL										
		A-D	9,80		3,15			30,85	1	30,85	M2	
		Ventana A-B	2,80		0,70	-1,00		-1,96	1	-1,96	M2	
		Ventana B-C	2,75		0,70	-1,00		-1,93	1	-1,93	M2	
		Ventana C-D	3,05		0,70	-1,00		-2,14	1	-2,14	M2	
		Puerta C-D	1,00		2,00	-1,00		-2,00	1	-2,00	M2	
		D-F	8,13		3,15			25,61	1	25,61	M2	
		Ventana D-E	3,24		1,10	-1,00		-3,56	1	-3,56	M2	
		Ventana E-F	4,40		1,10	-1,00		-4,83	1	-4,83	M2	
		Puerta E-F	1,00		2,00	-1,00		-2,00	1	-2,00	M2	
		F-J	16,11		3,15			50,75	1	50,75	M2	
		Ventanas F-J	0,90		1,71	-1,00		-1,54	16	-24,62	M2	
		Puertas F-J	1,00		2,00	-1,00		-2,00	2	-4,00	M2	
		J-M	14,47		3,15			45,56	1	45,56	M2	
		Ventana J-K	2,00		1,25	-1,00		-2,50	1	-2,50	M2	
		Ventana K-L	2,00		1,25	-1,00		-2,50	1	-2,50	M2	
		Ventana L-M	2,00		1,25	-1,00		-2,50	1	-2,50	M2	
		Puerta K-L	1,00		2,45	-1,00		-2,45	1	-2,45	M2	
		Puerta L-M	1,00		2,00	-1,00		-2,00	1	-2,00	M2	
		FACHADA POSTERIOR										
		M-J	14,47		3,15			45,56	1	45,56	M2	
		Ventana M-L	2,00		0,50	-1,00		-1,00	1	-1,00	M2	
		Ventana L-K	2,00		1,25	-1,00		-2,50	1	-2,50	M2	
		Puerta L-K	1,00		2,45	-1,00		-2,45	1	-2,45	M2	
		Ventanas J-F	0,90		1,71	-1,00		-1,54	16	-24,62	M2	
		Ventana D-C	2,75		0,71	-1,00		-1,95	1	-1,95	M2	
		Ventana C-B	2,75		0,71	-1,00		-1,95	1	-1,95	M2	
		Ventana B-A	2,80		0,71	-1,00		-1,99	1	-1,99	M2	
		FACHADA LATERAL DERECHA						35,06	1	35,06	M2	
		FACHADA LATERAL IZQUIERDA						30,67	1	30,67	M2	


[illegible]



MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	LOCALIZACION EJES/ESPACIO	CANTIDADES					TOTAL CANTIDAD	UND.
			LONG. (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	+/-	CALCULOS PARCIAL		
6.0	ASEO							347,58	M2
6.1	ASEO GENERAL								
		Salon 1	9,78	7,00			68,46	68,46	M2
		Sala de Informatica	8,03	7,00			56,21	56,21	M2
		Salon 2	7,91	6,18			48,88	48,88	M2
		Salon 3	7,84	6,18			48,45	48,45	M2
		Dirección	3,85	8,90			34,27	34,27	M2
		Salon 4	6,00	8,90			53,40	53,40	M2
		Biblioteca	4,26	8,90			37,91	37,91	M2



DANIELA PORTILLA
DANIELA PORTILLA BURBANO
Ingeniera Civil
M.P. 63202-434833 QND

POLIZAS



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO						SUCURSAL PASTO						COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-44-101288822		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	HORAS	DÍA	MES	AÑO	HORAS							
03	12	2024	02	12	2024	00:00	02	02	2030	23:59	EMISION ORIGINAL						



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-44-10128822		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 05 03 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 02 12 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 02 02 2030		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE MODIFICACION											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL INCAM S.A.S ZOMAC		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.310.022-0	
DIRECCIÓN: CL 13 NRO. 18 - 17 BRR LAS AMERICAS		CIUDAD: PUERTO CAICEDO, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3144764642	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		IDENTIFICACIÓN NIT: 846.003.704-1	
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO 3123370616	
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTENIDAS DE LA COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA No 003-2024 DEL 2 DE DICIEMBRE DEL 2024, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO D AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL INSTITUCION DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
---------	----------------	----------------	------------------	--------------------

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE APLICA EL ACTA DE INICIO A PARTIR DEL 4 DE DICIEMBRE DEL 2024, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *** (103,331.00)	\$ **** (8,000.00)	\$ **** (21,152.00)	\$ ***** (132,484.00)	\$ **** (18,342,857.69)	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CRG AGENCIA DE SEGUROS LTDA	143664	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

41-44-10128822

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Queda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF143664A

1

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-44-101288822		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 05 03 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 02 12 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 02 02 2030		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE MODIFICACION											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL INCAM S.A.S ZOMAC		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.310.022-0	
DIRECCIÓN: CL 13 NRO. 18 - 17 BRR LAS AMERICAS		CIUDAD: PUERTO CAICEDO, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3144764642	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		IDENTIFICACIÓN NIT: 846.003.704-1	
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3123370616	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101288822

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF143664A

2



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-44-101288822		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 05 03 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 04 12 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 04 02 2030		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL INCAM S.A.S ZOMAC								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.310.022-0			
DIRECCIÓN: CL 13 NRO. 18 - 17 BRR LAS AMERICAS								CIUDAD: PUERTO CAICEDO, PUTUMAYO		TELÉFONO: 3144764642	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA								IDENTIFICACIÓN NIT: 846.003.704-1			
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA								CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO		TELÉFONO 3123370616	
ADICIONAL:											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTENIDAS DE LA COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA No 003-2024 DEL 2 DE DICIEMBRE DEL 2024, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DAMEIENES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL INSTITUCION DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/12/2024	04/06/2025	\$2,445,714.36	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	04/12/2024	04/06/2025	\$12,228,571.79	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	04/12/2024	04/02/2028	\$1,222,857.18	
CALIDAD DEL SERVICIO	04/02/2025	04/02/2030	\$2,445,714.36	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE APLICA EL ACTA DE INICIO A PARTIR DEL 4 DE DICIEMBRE DEL 2024, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****103,331.00	\$ *****8,000.00	\$ *****21,152.00	\$ *****132,484.00	\$ *****18,342,857.69	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CRG AGENCIA DE SEGUROS LTDA	143664	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101288822

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF143664A

1



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-44-101288822		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 05 03 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 04 12 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 04 02 2030		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO											
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL INCAM S.A.S ZOMAC								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.310.022-0			
DIRECCIÓN: CL 13 NRO. 18 - 17 BRR LAS AMERICAS						CIUDAD: PUERTO CAICEDO, PUTUMAYO		TELÉFONO: 3144764642			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO											
ASEGURADO / BENEFICIARIO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA								IDENTIFICACIÓN NIT: 846.003.704-1			
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA						CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO		TELÉFONO: 3123370616			

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101288822

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF143664A

2

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-44-101288822		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 07 03 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 04 12 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 04 02 2030		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL INCAM S.A.S ZOMAC		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.310.022-0	
DIRECCIÓN: CL 13 NRO. 18 - 17 BRR LAS AMERICAS		CIUDAD: PUERTO CAICEDO, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3144764642	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		IDENTIFICACIÓN NIT: 846.003.704-1	
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO 3123370616	
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTENIDAS DE LA COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA No 003-2024 DEL 2 DE DICIEMBRE DEL 2024, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DAMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL INSTITUCION DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/12/2024	04/07/2025	\$2,445,714.36	\$2,445,714.36
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	04/12/2024	04/06/2025	\$12,228,571.79	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	04/12/2024	04/02/2028	\$1,222,857.18	
LABORALES				
CALIDAD DEL SERVICIO	04/02/2025	04/02/2030	\$2,445,714.36	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO, CONFORME ACTA DE SUSPENSION No.1 DEL 27 DE ENERO DEL 2025, ACTA DE REINICIO No.1 DEL 27 DE FEBRERO DEL 2025 DEL CONTRATO No.003-2024, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****18,342,857.69	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CRG AGENCIA DE SEGUROS LTDA	143664	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101288822

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF143664A

1



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-44-101288822		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 07 03 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 04 12 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 04 02 2030		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL INCAM S.A.S ZOMAC		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.310.022-0	
DIRECCIÓN: CL 13 NRO. 18 - 17 BRR LAS AMERICAS		CIUDAD: PUERTO CAICEDO, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3144764642	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		IDENTIFICACIÓN NIT: 846.003.704-1	
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3123370616	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101288822

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF143664A

2



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO						SUCURSAL PASTO						COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-44-101288822		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
07 03 2025			04 12 2024			00:00	04 02 2030			23:59	ANEXO DE PRORROGA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL INCAM S.A.S ZOMAC								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.310.022-0			
DIRECCIÓN: CL 13 NRO. 18 - 17 BRR LAS AMERICAS						CIUDAD: PUERTO CAICEDO, PUTUMAYO			TELÉFONO: 3144764642		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA			IDENTIFICACIÓN NIT: 846.003.704-1	
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO		TELÉFONO 3123370616
ADICIONAL:				

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTENIDAS DE LA COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA No 003-2024 DEL 2 DE DICIEMBRE DEL 2024, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL INSTITUCION DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/12/2024	04/07/2025	\$2,445,714.36	\$2,445,714.36
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	04/12/2024	04/07/2025	\$12,228,571.79	\$12,228,571.79
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	04/12/2024	04/03/2028	\$1,222,857.18	\$1,222,857.18
CALIDAD DEL SERVICIO	04/02/2025	04/02/2030	\$2,445,714.36	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO Y PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, CONFORME ACTA DE SUSPENSION No.1 DEL 27 DE ENERO DEL 2025, ACTA DE REINICIO No.1 DEL 27 DE FEBRERO DEL 2025 DEL CONTRATO No.003-2024, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****8,020.00	\$ *****4,000.00	\$ *****2,283.00	\$ *****14,304.00	\$ *****18,342,857.69	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CRG AGENCIA DE SEGUROS LTDA	143664	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101288822

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Queda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF143664A

1

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NÓ.PÓLIZA 41-44-101288822		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 07 03 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 04 12 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 04 02 2030		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL INCAM S.A.S ZOMAC		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.310.022-0	
DIRECCIÓN: CL 13 NRO. 18 - 17 BRR LAS AMERICAS		CIUDAD: PUERTO CAICEDO, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3144764642	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		IDENTIFICACIÓN NIT: 846.003.704-1	
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3123370616	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101288822

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF143664A

2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO						SUCURSAL PASTO						COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-44-101288822		ANEXO 5	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
07 03 2025			04 12 2024			00:00	04 02 2030			23:59	ANEXO DE PRORROGA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL INCAM S.A.S ZOMAC								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.310.022-0			
DIRECCIÓN: CL 13 NRO. 18 - 17 BRR LAS AMERICAS						CIUDAD: PUERTO CAICEDO, PUTUMAYO			TELÉFONO: 3144764642		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA										IDENTIFICACIÓN NIT: 846.003.704-1	
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA					CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO				TELÉFONO 3123370616		
ADICIONAL:											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTENIDAS DE LA COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA No 003-2024 DEL 2 DE DICIEMBRE DEL 2024, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL INSTITUCION DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/12/2024	04/08/2025	\$2,445,714.36	\$2,445,714.36
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	04/12/2024	04/08/2025	\$12,228,571.79	\$12,228,571.79
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	04/12/2024	04/04/2028	\$1,222,857.18	\$1,222,857.18
CALIDAD DEL SERVICIO	04/02/2025	04/02/2030	\$2,445,714.36	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA ARRIBA CITADA POR EL TERMINO DE 1 MESES, CONFORME ACTA DE PRORROGA No.1 DEL 27 DE FEBRERO DEL 2025 DEL CONTRATO No. 003-2024, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****12,154.00	\$ *****4,000.00	\$ *****3,069.00	\$ *****19,223.00	\$ *****18,342,857.69	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CRG AGENCIA DE SEGUROS LTDA	143664	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101288822

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF143664A

1

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-44-101288822		ANEXO 5	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 07 03 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 04 12 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 04 02 2030		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL INCA S.A.S ZOMAC		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.310.022-0	
DIRECCIÓN: CL 13 NRO. 18 - 17 BRR LAS AMERICAS		CIUDAD: PUERTO CAICEDO, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3144764642	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		IDENTIFICACIÓN NIT: 846.003.704-1	
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3123370616	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101288822

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF143664A

2

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

SEGURIDAD SOCIAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901310022	0	INICAM SAS ZOMAC	A - 200 O MAS COTIZANTES	KARINA LILIBETH PEREZ PASCUAZA	cra 26 con calle 10 N° 25-23	PUERTO CAICEDO-PUTUMAYO	3144764642	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1259461701		9480689613	E		2025/02/07	2025/02/11	2025/02/07	BANCOLOMBIA	4	\$635,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$700	\$0	\$228,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$700	\$0	\$228,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$99,100	\$300	\$0	\$99,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$99,100	\$300	\$0	\$99,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$57,000	\$200	\$0	\$57,200
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	\$57,000	\$200	\$0	\$57,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$500	\$0	\$178,500
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$178,000	\$500	\$0	\$178,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$42,800	\$200	\$0	\$43,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$42,800	\$200	\$0	\$43,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$28,500	\$100	\$0	\$28,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$28,500	\$100	\$0	\$28,600
TOTAL				1	\$633,200	\$2,000	\$0	\$635,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901310022	0	INICAM SAS ZONAC	A - 200 O MAS COTIZANTES	KARINA LILIBETH PEREZ PASCUA	cra 26 con calle 10 N°25-23	PUERTO CAICEDO-PUTUMAYO	3144764642	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2025-02	2025-03	1388074966	9482075796	E	2025/03/07	2025/04/04	\$644,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
1	CC	1125410072	PAZ DAVIDENNY	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP037	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF63	30	\$1,423,500	\$57,000	1423	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$1,423,500	\$71,300	
Total				Afiliados(1)																			

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$4,100	\$0	\$231,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$4,100	\$0	\$231,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$99,100	\$1,800	\$0	\$100,900
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$99,100	\$1,800	\$0	\$100,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$57,000	\$1,100	\$0	\$58,100
CONFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	\$57,000	\$1,100	\$0	\$58,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$3,200	\$0	\$181,200
NUEVA E.P.S.	EP037	900,156,264	2	1	\$178,000	\$3,200	\$0	\$181,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$42,800	\$800	\$0	\$43,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$42,800	\$800	\$0	\$43,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$28,500	\$600	\$0	\$29,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$28,500	\$600	\$0	\$29,100
TOTAL				1	\$633,200	\$11,600	\$0	\$644,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901310022	0	INICAM SAS ZOMAC	A - 200 O MAS COTIZANTES	KARINA LILIBETH PEREZ PASCUAZA	cra 26 con calle 10 N° 25-23	PUERTO CAICEDO-PUTUMAYO	3144764642	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2025-03	1386081196	9483495349	E		2025/04/07	2025/04/04	\$433,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	Aporte
1	CC 1125410072	PAZ DANDENNY S	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP0307	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF63	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$71,300
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$99,100		\$1,423,500	\$99,100		\$71,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$99,100	\$0	\$0	\$99,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$99,100	\$0	\$0	\$99,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
NUEVA E.P.S.	EP0307	900,156,264	2	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$42,800	\$0	\$0	\$42,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$42,800	\$0	\$0	\$42,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500
TOTAL				1	\$633,200	\$0	\$0	\$633,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NT 901310022	0	INICAM SAS ZOMAC	A - 200 O MAS COTIZANTES	KARINA LILIBETH PEREZ PASCUAZA	cra 26 con calle 10 N°25-23	PUERTO CAICEDO-PUTUMAYO	3144764642	No

						DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite		Banco	Valor
2025-04	2025-05	1388085966		9484170659	E	2025/05/08		2025/04/04	BANCOLOMBIA
									\$84.600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	hombre	ing	ret	tde	tde	tap	vip	cor	vot	sin	ige	lma	vac	ayp	vct	uti	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	IBC	Dias	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	Aporte	Exonerado Salud e ICBF	Total Aportes				
1	CC	PAZ DANDENIS	X														Z30301	4	\$189,800	\$30,400	EFP037	4	\$189,800	\$23,800	CCF43	4	\$189,800	\$7,600	14-23	4	\$189,800	\$13,300	4	\$189,800	\$9,500	No	\$84,600
Total		Afiliados(1)																				\$189,800	\$23,800		\$189,800	\$7,600		\$189,800	\$13,300		\$189,800	\$9,500		\$84,600			



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901310022	0	INCCAM SAS ZOMAC	A - 200 O MAS COTIZANTES	KARINA LILIBETH PEREZ PASCUAIZA	cra 26 con calle 10 N° 25-23	PUERTO CAICEDO-PUTUMAYO	3144764642	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2025-04	2025-05	1380085966	9484170659	E		2025/05/08	2025/04/04	BANCOLOMBIA	\$84,600
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$30,400	\$0	\$0	\$0	\$30,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$30,400	\$0	\$0	\$0	\$30,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$13,300	\$0	\$0	\$0	\$13,300
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$13,300	\$0	\$0	\$0	\$13,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,600	\$0	\$0	\$0	\$7,600
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	\$7,600	\$0	\$0	\$0	\$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$23,800	\$0	\$0	\$0	\$23,800
NUOVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$23,800	\$0	\$0	\$0	\$23,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$5,700	\$0	\$0	\$0	\$5,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$5,700	\$0	\$0	\$0	\$5,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$3,800	\$0	\$0	\$0	\$3,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$3,800	\$0	\$0	\$0	\$3,800
TOTAL			1	1	\$84,600	\$0	\$0	\$0	\$84,600
