


**INFORME DE
OBRA N° 2**

INFORME No. 2
CONTRATO DE OBRA No. 004-2024.
PERIODO: 04 DE ENERO AL 04 DE ABRIL DE 2025

OBJETO:
"MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO
ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE
PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".


LEYDY YULIETH TEJADA
REPRESENTANTE LEGAL
SOLUCIONES CIVILES JM SAS

MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
04 de Abril de 2025

TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	3
2	DESCRIPCIÓN PROYECTO	4
2.1	LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	4
3	INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	7
3.1	INFORMACIÓN GENERAL	7
3.1.1	Contrato de Obra	7
3.2	PÓLIZAS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA	8
3.3	PRESUPUESTO INICIAL A EJECUTAR.	8
3.4	PERSONAL A CARGO DEL CONTRATISTA.	10
3.4.1	Mano de obra calificada	10
3.4.2	Mano de obra no calificada	10
3.5	ACTIVIDADES EJECUTADAS ESTE PERIODO.	11
3.5.1	Actividades y cantidades ejecutadas.	11
3.5.1.1	Programación de obra inicial	13
3.5.1.2	Memorias de cantidades de actividades ejecutadas.	14
3.6	CUANTIFICACIÓN NUMÉRICA DE AVANCE DE OBRA.	18
3.6.1	Avance físico:	18
3.6.2	Avance físico acumulado:	18
3.6.3	Avance financiero:	18
3.6.4	Avance financiero acumulado:	18
4	REGISTRO FOTOGRÁFICO	19
5	INCONVENIENTES PRESENTADOS EN EL DESARROLLO DE LA OBRA.	20
6	CONCLUSIONES	20

1 INTRODUCCIÓN

A partir de la ejecución del Contrato de Obra N° 004-2024 que tiene por objeto: "MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", con la ejecución de este proyecto se justifica con base en todos los beneficios que se genera para la población estudiantil y docente del CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL del Municipio de Puerto Asís, los cuales podrán contar con un mejor espacio de aprendizaje y de tal forma tener mejoras en la calidad académica.

2 DESCRIPCIÓN PROYECTO

El municipio de Puerto Asís se encuentra ubicado al sur de Colombia en el departamento del Putumayo, limita con el municipio de Puerto Caicedo y Puerto Guzmán al norte, con los municipios de Orito, Valle del Guamuez y San Miguel al occidente, con el municipio de Puerto Leguizamo al oriente y con la Republica del Ecuador al sur; tiene una altura media de 250 m.s.n.m. El clima es tropical, con precipitaciones significativas. Incluso en el mes más seco hay mucha lluvia. Esta ubicación está clasificada como Af por Köppen y Geiger. La temperatura aquí es en promedio 24.9 °C. En un año, la precipitación media es 3850 mm.

El CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL, requiere una intervención a su infraestructura educativa específicamente en el área de la cubierta de las aulas, con lo cual se logre solucionar problemas de filtración, humedad y seguridad y de esta manera lograr un mejor espacio académico y así se evitar la deserción estudiantil. Para brindar espacios adecuados para el aprendizaje se proyecta el cambio de cubierta de los salones existentes y mantenimiento mediante aplicación de pintura sobre muros y carpintería metálica, lo cual puede desencadenar en un aumento representativo en estudiantes y así mismo en todo el sector productivo que involucre a dicha institución.

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El Contrato de Obra N° 004-2024 que tiene por objeto: "MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", se localiza en la Vereda Buenavista del Municipio de Puerto Asís, departamento del Putumayo, como se puede apreciar en las imágenes.

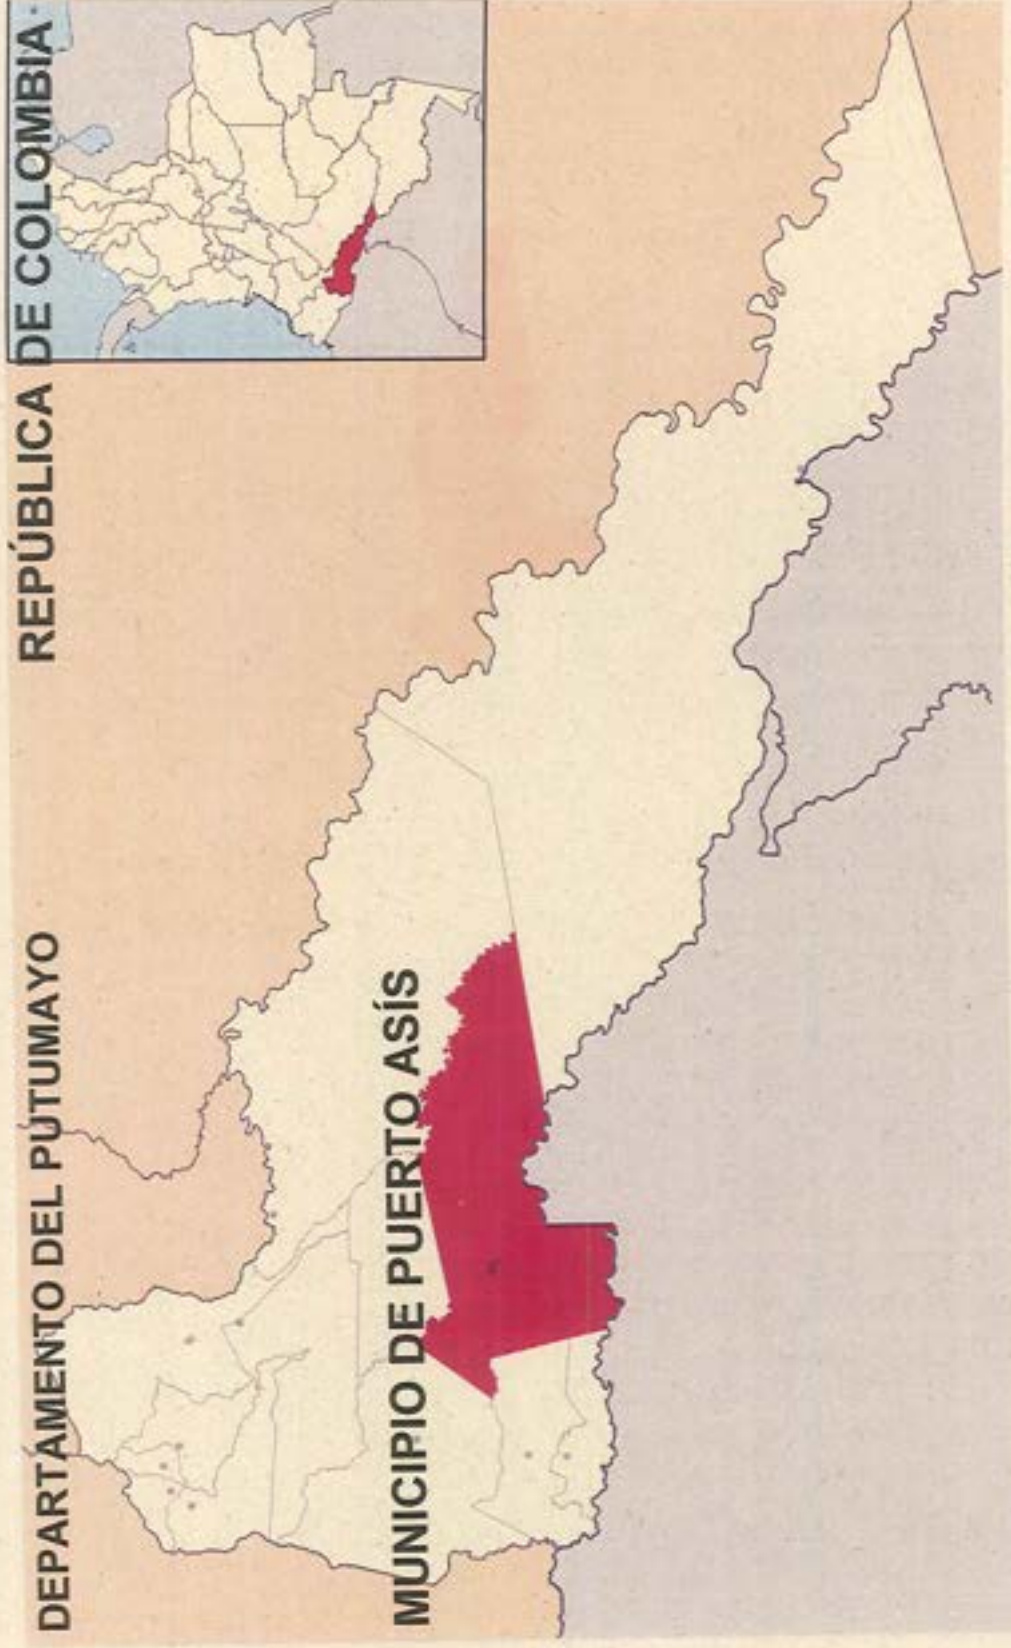


Imagen 1: Municipio de Puerto Asís. Fuente: Google Maps.

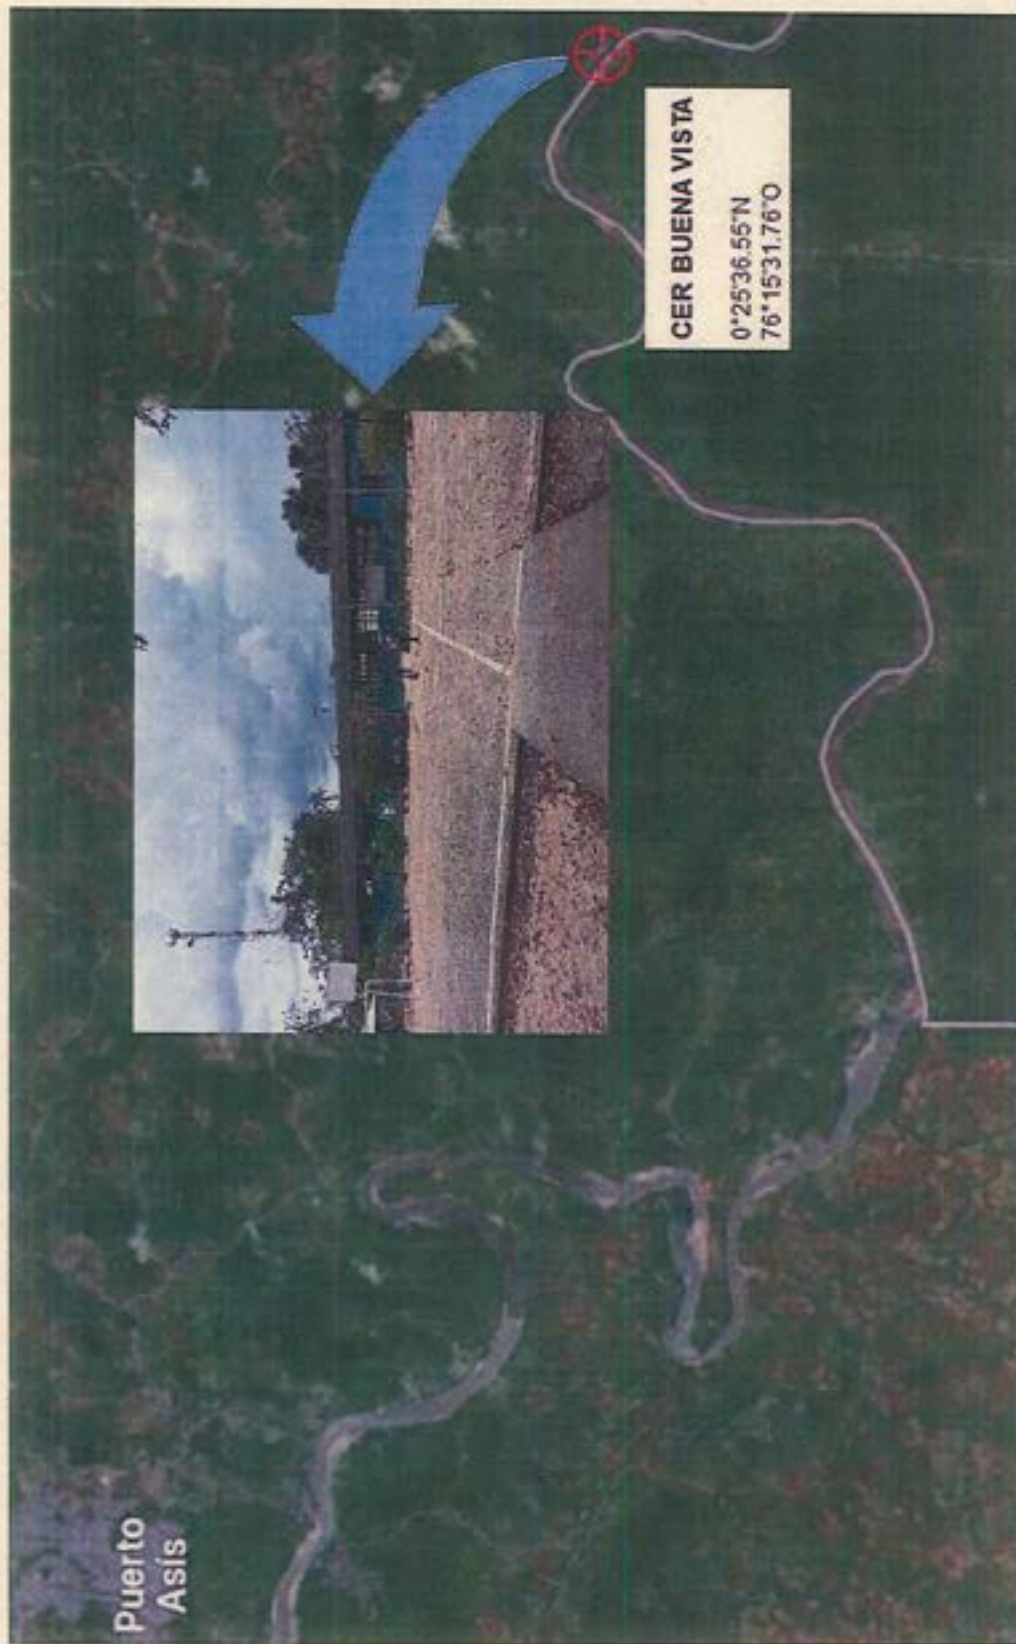


Imagen 2: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL. Fuente: Google Earth.

Calle 10 No. 36-42 Barrio El Carmen – celular 313-3198734
Puerto Asís Putumayo – Colombia E-mail: solucionescivilesjm@gmail.com

3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

3.1.1 Contrato de Obra

El Contrato de Obra N° 004-2024 que tiene por objeto: "MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", se localiza en el la parte rural del Municipio de Puerto Asís, del Departamento del Putumayo.

A continuación, se indica la información general del Contrato de obra:

Tabla 1: datos contractuales del contrato de obra.

CONTRATANTE:	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL
CLASE DE CONTRATO:	OBRA PÚBLICA
CONTRATISTA:	SOLUCIONES CIVILES JM SAS
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO	\$341.433.942,16 (Trescientos cuarenta y un millones cuatrocientos treinta y tres mil novecientos cuarenta y dos pesos con dieciséis centavos)
PLAZO DEL CONTRATO	DOS (2) MESES A PARTIR DE SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO	04 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN No. 1	04 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	27 DE ENERO DE 2025
FECHA DE REINICIO No. 1	27 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN No. 2	04 DE MARZO DE 2025
FECHA PRÓRROGA No. 1 (1 MES)	27 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN No. 3	04/04/2025
FECHA DE RECIBO FINAL	20 DE MARZO DE 2025

Fuente: Propia.

3.2 PÓLIZAS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A., Póliza de responsabilidad civil No. 41-40-101054371 ANEXO 4 y póliza de cumplimiento No. 41-44-101288873 ANEXO 5, con fecha de expedición 06 de marzo de 2025

ANEXO	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA
5	06/03/2025	Cumplimiento del Contrato	04/12/2024	04/08/2025	\$34.143.394,22
		Buen manejo y correcta inversión del anticipo	04/12/2024	04/08/2025	\$170.716.971,08
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	04/12/2024	04/04/2028	\$17.071.697,11
		Estabilidad y calidad de la obra	5 años, 0 meses y 0 días		\$34.143.394,22
4	06/03/2025	Predios labores y operaciones	04/12/2024	04/04/2025	\$34.143.394,22
		Contratistas y subcontratistas	04/12/2024	04/04/2025	\$34.143.394,22
		Vehículos propios y no propios	04/12/2024	04/04/2025	\$34.143.394,22

3.3 PRESUPUESTO A EJECUTAR.

De acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas, de los estudios previos y el contrato de obra, en la tabla 2 se describe el presupuesto inicial a ejecutar.

Tabla 2: Presupuesto del contrato de obra inicial.

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNID	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR
1.0	PRELIMINARES				
1.1	Localización y Replanteo	M2	347,58	\$ 2.303	\$ 800.320,14
1.2	Cerramiento en Polisombra	M2	253,60	\$ 17.100	\$ 4.336.560,94
1.3	Desmonte de Cubierta y Estructura Portante	M2	516,13	\$ 20.277	\$ 10.465.779,50
				Sub-total	\$ 15.602.660,57
2.0	ESTRUCTURAS METÁLICAS				
2.1	Estructura metálica en Acero ASTM - A572 (Incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje)	KG	1373,36	\$ 29.784	\$ 40.903.909,15
2.2	Estructura metálica en Acero ASTM - A36 (Incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje)	KG	2772,78	\$ 28.944	\$ 80.255.003,14
2.3	Templetes, Barra Lisa de 1/2", Incluye Pintura Anticorrosiva y Esmalte	M	65,82	\$ 47.896	\$ 3.152.503,71
2.4	Contravientos, Barra Lisa de 1/2", Incluye Pintura Anticorrosiva y Esmalte	M	137,93	\$ 49.759	\$ 6.863.295,99
				Sub-total	\$ 131.174.711,99
3.0	CUBIERTA				

3.1	Suministro e Instalación de Teja en Zinc Arquitectónico Cal 30	M2	516,13	\$ 84.015	\$ 43.362.779,52
3.2	Suministro e Instalación de Canal en lamina galvanizada cal. 20 (incluye: accesorios de instalación y bajante)	M	98,29	\$ 174.316	\$ 17.132.608,11
3.3	Suministro e Instalación caballete en Zinc Cal.30	M	48,50	\$ 81.431	\$ 3.949.404,28
				Sub-total	\$ 64.444.791,91
4.0	REPELLO, ESTUCO Y PINTURA				
4.1	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	55,16	\$ 47.518	\$ 2.621.248,49
4.2	Estuco Plastico para muros interiores y exteriores	M2	55,16	\$ 27.347	\$ 1.508.538,54
4.3	Aplicación de Pintura TIPO I para interiores	M2	532,58	\$ 26.464	\$ 14.094.069,80
4.4	Aplicación de Pintura TIPO I para exteriores	M2	168,62	\$ 28.606	\$ 4.823.422,08
4.5	Aplicación de Pintura 3 en 1 para carpintería metálica	M2	95,45	\$ 37.199	\$ 3.550.757,98
				Sub-total	\$ 26.598.036,89
5.0	CONCRETOS				
5.1	Vigas Cintas (0,15Mx20M) en concreto 21MPa (incluye acero de refuerzo según diseños)	M3	1,96	\$ 2.836.742	\$ 5.560.013,46
				Sub-total	\$ 5.560.013,46
6.0	ASEO				
6.1	ASEO GENERAL	M2	698,41	\$ 1.422	\$ 993.075,67
				Sub-total	\$ 993.075,67

TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 244.373.290,49
ADMINISTRACION	29,00%	\$ 70.868.254,24
UTILIDAD	5,00%	\$ 12.218.664,52
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 2.443.732,90
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 85.530.651,67
PMA		\$ 11.530.000,00
COSTO TOTAL DE LA OBRA		\$ 341.433.942,16

Fuente: Contrato de obra.

El valor del presupuesto inicial del contrato de obra pública es por la suma de: \$341.433.942,16 (Trescientos cuarenta y un millones cuatrocientos treinta y tres mil novecientos cuarenta y dos pesos con dieciséis centavos).

El día 04 de MARZO de 2025, se aprueba Acta de Mayores y Menores Cantidades de Obra, mediante la cual se actualiza las condiciones iniciales del contrato, quedando de la siguiente manera:

PRESUPUESTO OFICIAL CANTIDADES CONTRATADAS						CANTIDADES MODIFICADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1.0	PRELIMINARES								
1.1	Localización y Replanteo	M2	347,58	\$ 2.303	\$ 800.320,14	0,00	\$ 0,00	347,58	\$ 800.320,14
1.2	Cerramiento en Polisombra	M2	253,60	\$ 17.100	\$ 4.336.560,94	0,00	\$ 0,00	253,60	\$ 4.336.560,94
1.3	Desmonte de Cubierta y Estructura Portante	M2	516,13	\$ 20.277	\$ 10.465.779,50	0,00	\$ 0,00	516,13	\$ 10.465.779,50
					Sub-total		\$ 0,00		\$ 15.602.660,57
2.0	ESTRUCTURAS METÁLICAS								
2.1	Estructura metálica en Acero ASTM - A572 (incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje)	KG	1373,36	\$ 29.784	\$ 40.903.909,15	74,95	\$ 2.232.177,42	1448,30	\$ 43.136.086,57
2.2	Estructura metálica en Acero ASTM - A36 (incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje)	KG	2772,78	\$ 28.944	\$ 80.255.003,14	91,78	\$ 2.656.350,95	2864,56	\$ 82.911.354,09
2.3	Templetes, Barra Lisa de 1/2", Incluye Pintura Anticorrosiva y Esmalte	M	65,82	\$ 47.896	\$ 3.152.503,71	-65,82	-\$ 3.152.503,71	0,00	\$ 0,00
2.4	Contravientos, Barra Lisa de 1/2", Incluye Pintura Anticorrosiva y Esmalte	M	137,93	\$ 49.759	\$ 6.863.295,99	-137,93	-\$ 6.863.295,99	0,00	\$ 0,00
					Sub-total		-\$ 5.127.271,33		\$ 126.047.440,66
3.0	CUBIERTA								
3.1	Suministro e Instalación de Teja en Zinc Arquitectónico Cal 30	M2	516,13	\$ 84.015	\$ 43.362.779,52	17,03	\$ 1.430.524,69	533,16	\$ 44.793.304,21

3.2	Suministro e instalación de Canal en lamina galvanizada cal. 20 (incluye: accesorios de instalación y bajante)	M	98,29	\$ 174.316	\$ 17.132.608,11	4,20	\$ 732.125,49	102,49	\$ 17.864.733,61
3.3	Suministro e instalación caballete en Zinc Cal 30	M	48,50	\$ 81.431	\$ 3.949.404,28	1,60	\$ 130.289,63	50,10	\$ 4.079.693,90
				Sub-total	\$ 64.444.791,91		\$ 2.292.939,80		\$ 66.737.731,72
4.0	REPELLO, ESTUCO Y PINTURA								
4.1	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	55,16	\$ 47.518	\$ 2.621.248,49	0,00	\$ 0,00	55,16	\$ 2.621.248,49
4.2	Estuco Plastico para muros interiores y exteriores	M2	55,16	\$ 27.347	\$ 1.508.538,54	0,00	\$ 0,00	55,16	\$ 1.508.538,54
4.3	Aplicación de Pintura TIPO I para interiores	M2	532,58	\$ 26.464	\$ 14.094.069,80	0,00	\$ 0,00	532,58	\$ 14.094.069,80
4.4	Aplicación de Pintura TIPO I para exteriores	M2	168,62	\$ 28.606	\$ 4.823.422,08	0,00	\$ 0,00	168,62	\$ 4.823.422,08
4.5	Aplicación de Pintura 3 en 1 para carpintería metálica	M2	95,45	\$ 37.199	\$ 3.550.757,98	0,00	\$ 0,00	95,45	\$ 3.550.757,98
				Sub-total	\$ 26.598.036,89		\$ 0,00		\$ 26.598.036,89
5.0	CONCRETOS								
5.1	Vigas Cintas (0,15Mx20M) en concreto 21MPa (incluye acero de refuerzo según diseños)	M3	1,96	\$ 2.836.742	\$ 5.560.013,46	1,18	\$ 3.333.171,33	3,14	\$ 8.893.184,79
				Sub-total	\$ 5.560.013,46		\$ 3.333.171,33		\$ 8.893.184,79
6.0	ASEO								
6.1	ASEO GENERAL	M2	698,41	\$ 1.422	\$ 993.075,67	-350,82	\$ -498.839,80	347,58	\$ 494.235,87
				Sub-total	\$ 993.075,67		\$ -498.839,80		\$ 494.235,87

TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 244.373.290,48
ADMINISTRACION	29,00%	\$ 70.868.254,24
UTILIDAD	5,00%	\$ 12.218.664,52
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 2.443.732,90
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 85.530.651,67
PMA		\$ 11.530.000,00
COSTO TOTAL DE LA OBRA		\$ 341.433.942,16

\$ 244.373.290,48
\$ 70.868.254,24
\$ 12.218.664,52
\$ 2.443.732,90
\$ 85.530.651,67
\$ 11.530.000,00
\$ 341.433.942,16

Como se puede evidenciar, la modificación planteada no afecta ni el objeto ni el valor del contrato.

3.4 PERSONAL A CARGO DEL CONTRATISTA.

3.4.1 Mano de obra calificada

El personal administrativo y de obra que apoyó las actividades desarrolladas durante el presente periodo, se describe en la siguiente tabla:

Tabla 3: Descripción de la mano de obra calificada empleada por el contratista en la obra.

NOMBRE	CARGO	CEDULA
Leydy Yulieth Tejada Saldarriaga	Representante legal	1.123.207.998
Daniela Portilla Burbano	Residente de obra	1.124.859.667

Fuente: Propia.

3.4.2 Mano de obra no calificada

La mano de obra no calificada para la ejecución de los trabajos y actividades realizadas por el contratista durante el periodo corresponde a: maestro y ayudantes. En la siguiente tabla se presenta los nombres y cargo del personal que conforma la mano de obra no calificada.

Tabla 4: Descripción de la mano de obra no calificada empleada por el contratista en la obra.

NOMBRE	CARGO	CEDULA
José Orlando Bravo Cubillos	Maestro	80.381.853
Wilmer Naty Tombe	Ayudante	17.688.257
Mario Fernando Cuadros	Ayudante	1.115.074.053
Juan Libardo Pai Taicuz	Ayudante	1.123.304.807
Juan Libardo Pai Taicuz	Ayudante	1.123.304.807

Fuente: Propia.

3.5 ACTIVIDADES EJECUTADAS ESTE PERIODO.

3.5.1 Actividades y cantidades ejecutadas.

Como se manifestó en el informe No. 1, el día 21 de diciembre por festividades de fin de año y carnavales de inicio de nuevo año, se suspendieron las actividades del contrato, reiniciando de esta manera el día 8 de enero del año 2025, una vez superada la situación antes mencionada.

Durante este periodo se continua con las actividades de aplicación de pintura Tipo I en interiores, exteriores y aplicación de pintura tipo 3 en 1 para carpintería metálica.

El día 24 de Enero de 2025 se solicita a interventoría realizar suspensión de las actividades de obra en base a que los proveedores de la estructura para cubierta mediante certificación mencionan que hasta esa fecha no había sido posible el suministro del material que se utilizará para la fabricación de cerchas y correas de la cubierta, solicitud que fue aceptada por la interventoría y la supervisión donde se procedió a suspender las actividades del contrato por el término de un mes calendario contados a partir del día 27 de enero de 2025.

Una vez superada la situación que conlleva a la suspensión No. 1 del contrato, se reinician actividades el día 27 de febrero de 2025, iniciando con el ingreso de material necesario para la estructura de cubierta, lo cual corresponde a Teja en Zinc Arquitectónico 1,01X6m Cal 30, Estructura metálica en Acero ASTM - A572 y Estructura metálica en Acero ASTM - A536.

Se llevó a cabo el desmonte de la cubierta y estructura existente, para de esta manera llevar a cabo la instalación de la nueva estructura y cubierta en las áreas definidas por el proyecto.

Se culmina con la instalación de la Teja en Zinc Arquitectónico 1,01X6m Cal 30, caballetes y Canal en lámina galvanizada cal. 20 en las áreas definidas de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

De esta manera una vez completadas las actividades del proyecto, se lleva a cabo el aseo general y se hace la respectiva entrega.

A continuación se puede evidenciar las actividades ejecutadas en el periodo del presente informe junto a sus respectivas cantidades y valores.

3.5.1.1 Programación de obra inicial.

PRESUPUESTO OFICIAL CANTIDADES CONTRATADAS							CANTIDADES Y VALOR EJECUTADO MES 2	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNID	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	
1.0 PRELIMINARES								
1.1	Localización y Replanteo	M2	347,58	\$ 2.303	\$ 800.320,14	0,00	\$ 0,00	
1.2	Cerramiento en Poltsombra	M2	253,60	\$ 17.100	\$ 4.336.560,94	0,00	\$ 0,00	
1.3	Desmonte de Cubierta y Estructura Portante	M2	516,13	\$ 20.277	\$ 10.465.779,50	0,00	\$ 0,00	
				Sub-total	\$ 15.602.659,57		\$ 0,00	
2.0 ESTRUCTURAS METÁLICAS								
2.1	Estructura metálica en Acero ASTM - A572 (incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje)	KG	1373,36	\$ 29.784	\$ 40.903.909,15	1448,30	\$ 43.136.086,57	
2.2	Estructura metálica en Acero ASTM - A36 (incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje)	KG	2772,78	\$ 28.944	\$ 80.255.003,14	2864,56	\$ 82.911.354,09	
2.3	Templeros, Barra Uss de 1/2", incluye Pintura Anticorrosiva y Esmalte	M	65,82	\$ 47.896	\$ 3.152.503,71	0,00	\$ 0,00	
2.4	Contravientos, Barra Uss de 1/2", incluye Pintura Anticorrosiva y Esmalte	M	137,93	\$ 49.759	\$ 6.863.295,99	0,00	\$ 0,00	
				Sub-total	\$ 131.174.711,99		\$ 126.047.440,66	
3.0 CUBIERTA								
3.1	Suministro e instalación de Teja en Zinc Arquitectónico Cal 30	M2	516,13	\$ 84.015	\$ 43.362.779,52	533,16	\$ 44.793.304,21	
3.2	Suministro e instalación de Canal en lamina galvanizada cal. 20 (incluye: accesorios de instalación y bajante)	M	98,29	\$ 174.316	\$ 17.132.608,11	102,49	\$ 17.864.733,61	
3.3	Suministro e instalación caballete en Zinc Cal. 30	M	48,50	\$ 81.431	\$ 3.949.404,28	50,10	\$ 4.079.693,90	
				Sub-total	\$ 64.444.791,91		\$ 66.737.731,72	
4.0 REPELLO, ESTUCCO Y PINTURA								
4.1	MORTERO IMPERMEABILIZADO 3:3	M2	55,16	\$ 47.518	\$ 2.621.248,49	0,00	\$ 0,00	
4.2	Estuco Plástico para muros interiores y exteriores	M2	55,16	\$ 27.947	\$ 1.508.538,54	0,00	\$ 0,00	
4.3	Aplicación de Pintura TIPO I para interiores	M2	532,58	\$ 26.464	\$ 14.094.069,80	0,00	\$ 0,00	
4.4	Aplicación de Pintura TIPO I para exteriores	M2	168,62	\$ 28.606	\$ 4.823.472,08	0,00	\$ 0,00	
4.5	Aplicación de Pintura 3 en 1 para carpintería metálica	M2	95,45	\$ 37.109	\$ 3.550.757,98	0,00	\$ 0,00	
				Sub-total	\$ 26.598.036,89		\$ 0,00	
5.0 CONCRETOS								
5.1	Vigas Cintás (0,15Mx20M) en concreto 21MPa (incluye acero de refuerzo según diseños)	M3	1,96	\$ 2.836.742	\$ 5.560.013,46	3,14	\$ 8.893.184,79	
				Sub-total	\$ 5.560.013,46		\$ 8.893.184,79	
6.0 ASFO								
6.1	ASEO GENERAL	M2	698,41	\$ 1.422	\$ 993.075,67	347,58	\$ 494.235,87	
				Sub-total	\$ 993.075,67		\$ 494.235,87	

TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 264.378.250,48
ADMINISTRACION	\$ 70.858.254,24
UTILIDAD	\$ 12.218.654,52
IMPREVISTOS	\$ 2.443.732,90
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	\$ 85.530.631,67
PMA	\$ 11.530.000,00
COSTO TOTAL DE LA OBRA	\$ 341.433.942,16

Calle 10 No. 36-42 Barrio El Carmen – celular 313-3198734
Puerto Asís Putumayo – Colombia E-mail: solucionescivilesjm@gmail.com

3.5.1.2 Memorias de cantidades de actividades ejecutadas.

Se anexa memoria de cantidades

Tabla 5: Avance físico de obra.

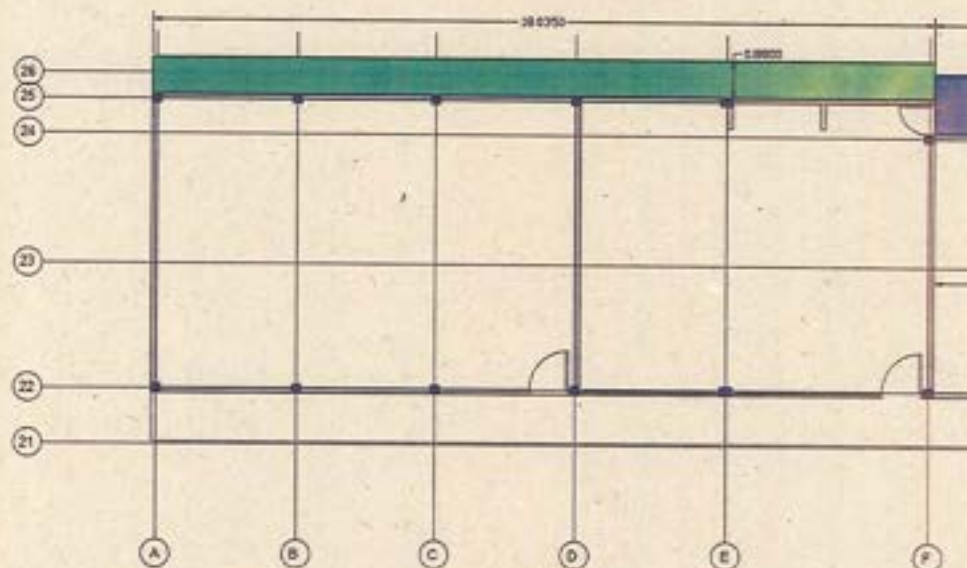
PRESUPUESTO OFICIAL CANTIDADES CONTRATADAS										CANTIDADES Y VALOR EJECUTADO MES 1				CANTIDADES Y VALOR EJECUTADO MES 2				CANTIDADES Y VALOR ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	U.D.	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	MES 1		MES 2		MES 1		MES 2		MES 1		MES 2		MES 1	
1.0	PRELIMINARES																		
1.1	Locustación y Replanteo	M2	347,58	\$ 2.803,320,14	\$ 974,336,560,94	0,00	\$ 800,320,14	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 800,320,14	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 800,320,14	0,00	\$ 0,00	\$ 800,320,14	\$ 800,320,14
1.2	Cercamiento en Policondura	M2	253,60	\$ 17.100	\$ 4.336.560,94	0,00	\$ 4.336.560,94	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 4.336.560,94	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 4.336.560,94	0,00	\$ 0,00	\$ 4.336.560,94	\$ 4.336.560,94
1.3	Desmonte de Cubierta y Estructura Portante	M2	516,13	\$ 20.277	\$ 10.465.779,50	0,00	\$ 10.465.779,50	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 10.465.779,50	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 10.465.779,50	0,00	\$ 0,00	\$ 10.465.779,50	\$ 10.465.779,50
	Sub-total				\$ 15.602.660,57		\$ 15.602.660,57		\$ 0,00		\$ 15.602.660,57		\$ 0,00		\$ 15.602.660,57		\$ 0,00	\$ 15.602.660,57	\$ 15.602.660,57
2.0	ESTRUCTURAS METÁLICAS																		
2.1	Estructura metálica en Acero ASTM - A572 (incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje)	KG	1373,36	\$ 29.784	\$ 40.903.903,15	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 43.136.086,57	\$ 43.136.086,57
2.2	Estructura metálica en Acero ASTM - A36 (incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje)	KG	2772,78	\$ 28.944	\$ 80.255.003,14	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 82.911.354,09	\$ 82.911.354,09
2.3	Terminales, Barras Lias de 1/2", Incluye Pintura Anticorrosiva y Ensamble	M	65,82	\$ 47.896	\$ 3.152.503,71	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4	Contravientos, Barras Lias de 1/2", Incluye Pintura Anticorrosiva y Ensamble	M	137,93	\$ 49.759	\$ 6.803.205,99	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	Sub-total				\$ 131.128.711,29		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 126.947.440,66	\$ 126.947.440,66
3.0	CUBIERTA																		
3.1	Suministro e Instalación de Teja en Zinc Argenteo/Color Cal 30	M2	516,13	\$ 84.015	\$ 43.362.779,52	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 44.793.304,21	\$ 44.793.304,21
3.2	Incluye: accesorios de instalación y bajante	M	96,29	\$ 174.356	\$ 17.172.608,11	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 17.864.733,61	\$ 17.864.733,61
3.3	Suministro e Instalación de cubiertas en Zinc Cal 30	M	48,50	\$ 81.431	\$ 3.969.404,38	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 4.079.693,90	\$ 4.079.693,90
	Sub-total				\$ 64.444.792,01		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 66.737.731,72	\$ 66.737.731,72
4.0	REPIELLO, ESTUQUE Y PINTURA																		
4.1	MONTERO IMPERMEABILIZADO L-3	M2	55,16	\$ 2.621.248,49	\$ 145.616,49	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 145.616,49	\$ 145.616,49
4.2	Estuco Plástico para muros interiores y exteriores	M2	55,16	\$ 1.508.538,54	\$ 83.166,54	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 83.166,54	\$ 83.166,54
4.3	Aplicación de Pintura TIPO I para interiores	M2	532,58	\$ 14.094.069,80	\$ 7.500,80	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 14.094.069,80	\$ 14.094.069,80
4.4	Aplicación de Pintura TIPO I para exteriores	M2	168,62	\$ 4.823.422,08	\$ 808,62	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 4.823.422,08	\$ 4.823.422,08
4.5	Aplicación de Pintura 3 en 1 para carpintería metálica	M2	95,45	\$ 3.550.757,88	\$ 338,45	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 3.550.757,88	\$ 3.550.757,88
	Sub-total				\$ 26.598.036,89		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 26.598.036,89	\$ 26.598.036,89
5.0	CONCRETOS																		
5.1	Vigas Chetas (R.150x250) en concreto 21MPa (incluye acero de refuerzo según diseño)	M3	3,14	\$ 5.500.013,66	\$ 17.270,46	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 17.270,46	\$ 17.270,46
	Sub-total				\$ 17.270,46		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 17.270,46	\$ 17.270,46
6.0	ASFO																		
6.1	ASFO GENERAL	M2	698,41	\$ 993.075,67	\$ 693.075,67	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 693.075,67	\$ 693.075,67
	Sub-total				\$ 693.075,67		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 693.075,67	\$ 693.075,67
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 244.373.200,48													\$ 244.373.200,48	\$ 244.373.200,48
ADMINISTRACION					\$ 70.868.254,24													\$ 70.868.254,24	\$ 70.868.254,24
UTILIDAD					\$ 12.218.664,52													\$ 12.218.664,52	\$ 12.218.664,52
IMPREVISTOS					\$ 2.443.732,90													\$ 2.443.732,90	\$ 2.443.732,90
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 85.530.651,67													\$ 85.530.651,67	\$ 85.530.651,67
PNIA					\$ 11.530.000,00													\$ 11.530.000,00	\$ 11.530.000,00
COSTO TOTAL DE LA OBRA					\$ 341.433.942,36													\$ 341.433.942,36	\$ 341.433.942,36

Fuente: Propia.

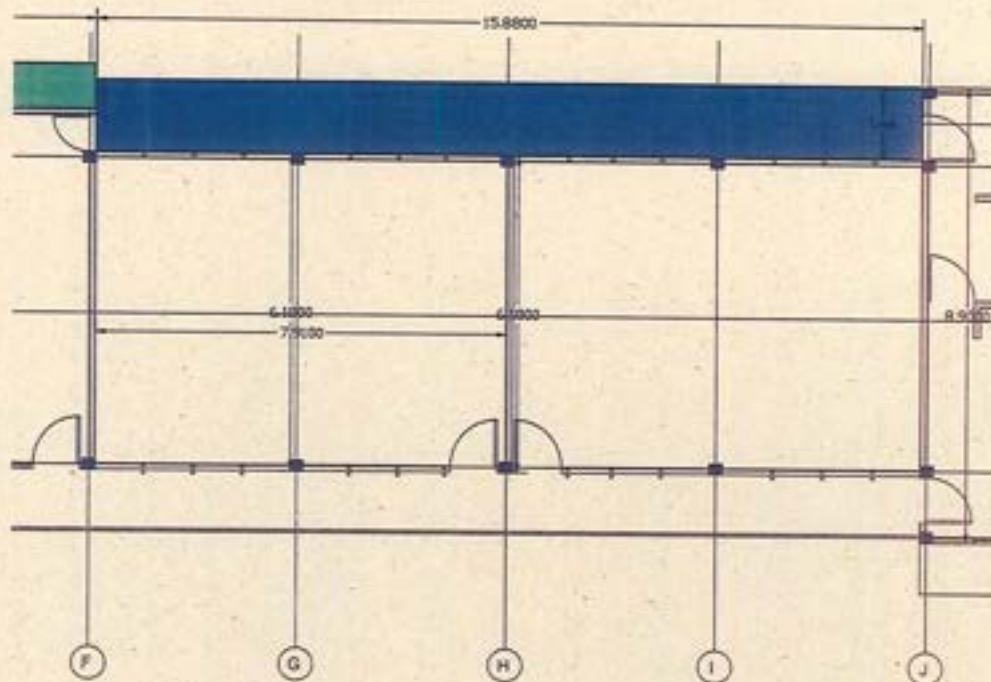
VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 341.433.942,16
VALOR EJECUTADO MES 1	\$ 62.735.941,56
VALOR EJECUTADO MES 2	\$ 278.698.000,60
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	\$ 341.433.942,16
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 0,00
% DE AVANCE MES 1	18,37%
% DE AVANCE MES 2	81,63%
% DE AVANCE ACUMULADO	100,00%
% DE AVANCE PENDIENTE POR EJECUTAR	0,00%

De igual manera, atendiendo la solicitud del supervisor, se llevaron a cabo actividades que no estaban contempladas dentro del contrato, estas se relacionan a continuación:

- **CONSTRUCCIÓN DE ANDEN EN CONCRETO DE 3000PSI (e=0,1m):** con el fin de garantizar espacios idóneos para los estudiantes, se solicita realizar dos tramos de andén perimetral, estos cuenta con las siguientes dimensiones:
1. Tramo No. 1: Ancho de 0.88 metros y longitud de 18 metros, quedando de esta manera un total de 15,84 metros cuadrados (m²)



2. Tramo No. 2: Ancho de 1.46 metros y longitud de 15,88 metros, quedando de esta manera un total de 23,18 metros cuadrados (m²)



- **PROYECCIÓN DE TUBERÍA PARA REDES Y PUNTOS ELÉCTRICOS:** durante la ejecución se evidencio que la infraestructura no contaba con la proyección de las redes de energía que a futuro se podrían conectar al suministro de la misma, teniendo en cuenta lo antes mencionado, la supervisión e interventoría sugirieron que para evitar a futuro un detrimento de la intervención realizada con la ejecución del presente contrato, era necesario llevar a cabo la proyección de las redes eléctricas y de igual manera los puntos eléctricos, que permita futuro hacer las respectivas conexiones sin ir a intervenir la infraestructura mejorada.

Es así como en el periodo del presente informe, se llevó a cabo la instalación de 198 metros de tubería Conduit (incluye regate y resane de muros) y de igual manera la proyección de 60 puntos eléctricos (Tomacorrientes e Interruptores).

Para evidencia de las actividades antes mencionadas, se anexa registro fotográfico de las mismas.

3.6 CUANTIFICACIÓN NUMÉRICA DE AVANCE DE OBRA.

3.6.1 Avance físico:

Se tiene que el avance físico de obra durante el presente periodo corresponde al 81,63% con relación al 100% del contrato de obra, lo que representa un valor de: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$ 278.698.000,60) MDA/CTE. (Se anexa acta parcial de obra No. 2 y memoria de cantidades de obra ejecutadas).

3.6.2 Avance físico acumulado:

El avance físico acumulado de obra es por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS (\$ 341.433.942,16) MDA/CTE. lo que corresponde a un porcentaje acumulado de obra del 100,00% del total del contrato de obra.

3.6.3 Avance financiero:

Considerando que la firma contratista SOLUCIONES CIVILES JM SAS, ha realizado la ejecución total de los ítems del contrato de obra en el periodo del presente informe, los cuales fueron descritos anteriormente, se tiene que el avance financiero de obra ejecutado es por valor de: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$ 278.698.000,60) MDA/CTE, siendo el 81,63% del valor total del contrato de obra.

3.6.4 Avance financiero acumulado:

El avance financiero acumulado de obra equivale a TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS (\$ 341.433.942,16) MDA/CTE lo que corresponde a un porcentaje acumulado de obra del 100,00% del total del contrato de obra.

4 REGISTRO FOTOGRÁFICO.

	
ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ASTM - A572 (INCLUYE: SUMINISTRO - FABRICACION - PINTURA - MONTAJE)	ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ASTM - A36 (INCLUYE: SUMINISTRO - FABRICACION - PINTURA - MONTAJE)
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA EN ZINC ARQUITECTÓNICO CAL 30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 (INCLUYE: ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y BAJANTE)
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE EN ZINC CAL.30	VIGAS CINTAS (0,15MX20M) EN CONCRETO 21MPA (INCLUYE ACERO DE REFUERZO SEGÚN DISEÑOS)



ASEO GENERAL

5 INCONVENIENTES PRESENTADOS EN EL DESARROLLO DE LA OBRA.

- Al no contar con el insumo necesario para la fabricación de la estructura de la cubierta, fue necesario llevar a cabo la suspensión del contrato por un periodo de 1 mes calendario. (Se anexa copia de Acta de Suspensión No. 1).
- Teniendo en cuenta el inconveniente antes mencionado, fue necesario llevar a cabo una adición en tiempo al contrato, lo cual garantice la ejecución de las actividades pendientes y de esta manera culminar las actividades y cantidades contratadas inicialmente. (Se anexa copia de Acta de Prorroga No. 1).

6 CONCLUSIONES

El avance físico de obra durante el presente periodo corresponde al 81,63% con relación al 100% del contrato de obra, lo que representa un valor de: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$ 278.698.000,60) MDA/CTE.


El avance físico acumulado de obra es por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS (\$ 341.433.942,16)

MDA/CTE, lo que corresponde a un porcentaje acumulado de obra del 100,00% del total del contrato de obra.

El avance financiero se debe a que la firma contratista SOLUCIONES CIVILES JM SAS ha realizado la ejecución parcial y/o total de algunos ítems del contrato de obra, los cuales fueron descritos anteriormente, se tiene que el avance financiero de obra ejecutado en el presente periodo es por valor de: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$ 278.698.000,60) MDA/CTE, siendo el 81,63% del valor total del contrato de obra.

El avance financiero acumulado de obra equivale a TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS (\$ 341.433.942,16) MDA/CTE, lo que corresponde a un porcentaje acumulado de obra del 100,00% del total del contrato de obra.

Presentó;



SOLUCIONES CIVILES JM SAS
R/L LEYDY YULIETH TEJADA
Contratista de Obra

POLIZAS



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41	NO.PÓLIZA 41-44-101288873	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
04 12 2024	02 12 2024		00:00	02 02 2030		23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	SOLUCIONES CIVILES J.M.S.A.S	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.912.227-3
DIRECCIÓN: CALLE 10 NO 26-42 BARRIO EL CARMEN	CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	TÉLEFONO: 3133198734

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA	IDENTIFICACIÓN NIT: 846.863.704-1
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA	CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	TÉLEFONO 3123370616
ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUDIGES, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTENIDAS DEL CONTRATO No 004-2024 DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/12/2024	02/06/2025	\$34,143,394.22
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	02/12/2024	02/06/2025	\$170,716,971.08
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	02/12/2024	02/02/2028	\$17,071,697.11
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$34,143,394.22

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL MISMO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****981.225.00	\$ *****20.000.00	\$ *****190.232.00	\$ *****1.191.457.00	\$ *****256.075.456.63	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CRO AGENCIA DE SEGUROS LTDA	143664	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

41-44-101288873

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Planes

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE 6-103 -66, PISO 5 TELEFONO: 601-218677, 601-6018330

DLF143664A

1



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COO.SUC 41	Nº.PÓLIZA 41-40-101054371	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
04 12 2024	02 12 2024		00:00	02 02 2025		23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL SOLUCIONES CIVILES J.M.S.A.S	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.912.227-3
DIRECCIÓN: CALLE 10 NO 26-42 BARRIO EL CARMEN	Ciudad: PUERTO ASIS, PUTUMAYO
	TELÉFONO: 3133198734

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA	IDENTIFICACIÓN NIT: 846.003.704-1
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA	Ciudad: PUERTO ASIS, PUTUMAYO
BENEFICIARIO: 846003704 - CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA	TELÉFONO 3123370616

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-0001 / 31-03-22 - 1329-P-06-00000-E-RCE-001P-0001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATO No 004-2024 DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

ASEGURADOS: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA IDENTIFICADA CON NIT 846003704-1 Y EL CONTRATISTA BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y CENTRO ETNOEDUCATIVO IDENTIFICADA CON NIT 846003704-1

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG. ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/12/2024	02/02/2025	\$34,143,394.22
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/12/2024	02/02/2025	\$34,143,394.22
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/12/2024	02/02/2025	\$34,143,394.22

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****128.753.00	\$ *****3.000.00	\$ *****25.033.00	\$ *****156.786.00	\$ *****34,143,394.22	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CRS AGENCIA DE SEGUROS LTDA	143664	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101054371

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Flotras



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELÉFONO: 601-2158977, 601-6015330

DLF143664A

1



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			CDD.SUC 41		NO.POLIZA 41-40-101054371		ANEXO 0		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 04 12 2024			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 02 12 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 02 02 2025			A LAS HORAS 23:59	
										TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL		

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SOLUCIONES CIVILES J.M.S.A.S		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.912.227-3	
DIRECCIÓN: CALLE 10 NO 26-42 BARRIO EL CARMEN		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3133198734	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		IDENTIFICACIÓN NIT: 846.003.704-1	
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3123370610	
BENEFICIARIO: 846003704 - CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA			

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG. ACTUAL
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 \$MILV	02/12/2024	02/02/2025	\$34,143,394.22
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 \$MILV	02/12/2024	02/02/2025	\$34,143,394.22
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 \$MILV	02/12/2024	02/02/2025	\$34,143,394.22

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN:

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226822 - PASTO

41-40-101054371

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

DLF14066A

2



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41	NO.PÓLIZA 41-40-101054371	ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
04 03 2025	02 12 2024		00:00	02 02 2025		23:59	ANEXO DE MODIFICACION	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SOLUCIONES CIVILES J.M.S.A.S	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.912.227-3
DIRECCIÓN: CALLE 10 NO 26-42 BARRIO EL CARMEN	Ciudad: PUERTO ASIS, PUTUMAYO
	TELÉFONO: 3133198734

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA	IDENTIFICACIÓN NIT: 846.003.704-1
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA	Ciudad: PUERTO ASIS, PUTUMAYO
	TELÉFONO 3123370616
BENEFICIARIO: 846003704 - CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00600-E-RCE-002A-D001 / 31-03-22 -1329-P-06-00600-E-RCE-001P-D001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:
GARANTIZA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATO No 004-2024 DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

ASEGURADOS: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA IDENTIFICADA CON NIT 846003704-1 Y EL CONTRATISTA
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y CENTRO ETNOEDUCATIVO IDENTIFICADA CON NIT 846003704-1

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES					
AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASES ACTUAL	SUMA ASES ANTERIOR

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE APLICA EL ACTA DE INICIO A PARTIR DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2024, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****(128,753.00)	\$ ****(3,000.00)	\$ ****(25,033.00)	\$ ***** (156,786.00)	\$ ****(34,143,394.22)	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASSEGURADO
CBS AGENCIA DE SEGUROS LTDA	143664	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101054371

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Planes



FIRMA TOMADOR



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-44-101288873		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 04 03 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 02 12 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 02 02 2030		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE MODIFICACION											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SOLUCIONES CIVILES J.M.S.A.S		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.912.227-3	
DIRECCIÓN: CALLE 10 NO 26-42 BARRIO EL CARMEN		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3133198734	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		IDENTIFICACIÓN NIT: 846.003.704-1	
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO 3123370616	
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECOSILOS, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTENIDAS DEL CONTRATO No 034-2024 DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
---------	----------------	----------------	------------------	--------------------

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE AMPARO SE APLICA EL ACTA DE INICIO A PARTIR DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2024, LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *** (981.225.00)	\$ **** (20.000.00)	\$ *** (190.232.00)	\$ ***** (1.191.457.00)	\$ **** (256.075.456.63)	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CRS AGENCIA DE SEGUROS LTDA	143464	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA. POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101288873

FIRMA AUTORIZADA: José Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas



FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 80, PISO 5 TELÉFONO: 601-218877, 601-6819330

DLF143664A

1



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.POLIZA 41-44-101288873		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 04 03 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 02 12 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 02 02 2030		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE MODIFICACION											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO									
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SOLUCIONES CIVILES J.M.S.A.S									
IDENTIFICACIÓN NIT: 900.912.227-3									
DIRECCIÓN: CALLE 10 NO 26-42 BARRIO EL CARMEN									
CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO									
TELÉFONO: 3133198734									

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO									
ASEGURADO / BENEFICIARIO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA									
IDENTIFICACIÓN NIT: 846.003.704-1									
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA									
CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO									
TELÉFONO: 3123370618									

ADICIONAL:									
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TEXTO ACLARATORIO									
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101288873

FIRMA AUTORIZADA: Jesse Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DL143644

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-8

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN						SUCURSAL						COD.SUC		NO.PÓLIZA		ANEXO	
PASTO						PASTO						41		41-40-101054371		2	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO								
04	03	2025	04	12	2024	00:00	04	02	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SOLUCIONES CIVILES J.M.S.A.S	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.912.227-3
DIRECCIÓN: CALLE 10 NO 26-42 BARRIO EL CARMEN	CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	TELÉFONO: 3133198734

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA	IDENTIFICACIÓN NIT: 846.003.704-1
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA	CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	TELÉFONO 3123370518
BENEFICIARIO: 846003704 - CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00500-E-RCE-002A-0001 / 31-03-22-1329-P-06-00500-E-RCE-001E-0001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATO No 004-2024 DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

ASEGURADOS: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA IDENTIFICADA CON NIT 846003704-1 Y EL CONTRATISTA.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y CENTRO ETNOEDUCATIVO IDENTIFICADA CON NIT 846003704-1

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG. ACTUAL	SUMA ASEG. ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	04/12/2024	04/02/2025	\$34,143,394.22	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	04/12/2024	04/02/2025	\$34,143,394.22	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	04/12/2024	04/02/2025	\$34,143,394.22	

ACLARACIONES

Mediante el presente anexo se aplica el Acta de Inicio a partir del 04 de diciembre del 2024, los demás términos y condiciones no se modifican.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****128,753.00	\$ *****3,000.00	\$ *****25,033.00	\$ *****156,786.00	\$ *****34,143,394.22	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CRG AGENCIA DE SEGUROS LTDA	143464	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101054371

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Cárdenas, Vicepresidente de Finanzas



FIRMA TOMADOR

SE PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELÉFONO: 601-2188977, 601-2193330

CLP14384A

1

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			CÓD. SUC 41		Nº. POLIZA 41-40-101054371		ANEXO 2		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 04 03 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 04 12 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 04 02 2025			A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA												

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO											
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SOLUCIONES CIVILES J.M.S.A.S										IDENTIFICACIÓN NIT: 900.912.227-3	
DIRECCIÓN: CALLE 10 NO 28-42 BARRIO EL CARMEN						CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO			TELÉFONO: 3135198734		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO											
ASEGURADO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA										IDENTIFICACIÓN NIT: 846.003.704-1	
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA						CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO			TELÉFONO: 3123370616		
BENEFICIARIO: 846003704 - CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA											

AMFAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLGV	04/12/2024	04/02/2025	\$34,143,394.22	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLGV	04/12/2024	04/02/2025	\$34,143,394.22	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLGV	04/12/2024	04/02/2025	\$34,143,394.22	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226522 - PASTO

41-40-101054371

FIRMA AUTORIZADA: Jesse Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

DLP14384A

2

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 900.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-44-10128873		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 04 03 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 04 12 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 04 02 2030		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO									
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SOLUCIONES CIVILES J.M.S.A.S									
IDENTIFICACIÓN NIT: 900.912.227-3									
DIRECCIÓN: CALLE 10 NO 26-42 BARRIO EL CARMEN					CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO			TELÉFONO: 3133198734	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO									
ASEGURADO / BENEFICIARIO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA									
IDENTIFICACIÓN NIT: 846.003.704-1									
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA					CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO			TELÉFONO 3123370616	
ADICIONAL:									

OBJETO DEL SEGURO									
CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUTIOL, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTÍA:									
EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTENIDAS DEL CONTRATO No 004-2024 DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.									

AMPAROS									
RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES									
AMPAROS									
		VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		SUMA ASEG/ACTUAL		SUMA ASEG/ANTERIOR	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		04/12/2024		04/06/2025		\$34,143,394.22			
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO		04/12/2024		04/06/2025		\$170,716,971.08			
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		04/12/2024		04/02/2028		\$17,071,697.11			
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *				\$34,143,394.22			

ACLARACIONES									
* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE APLICA EL ACTA DE INICIO A PARTIR DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2024, LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN									

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****981.225.00	\$ *****20.000.00	\$ *****190.232.00	\$ *****1.191.457.00	\$ *****256.075.456.63	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CRS AGENCIA DE SEGUROS LTDA	143664	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. 65 CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

41-44-10128873

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Cordero - Vicepresidente de Finanzas



FIRMA TOMADOR



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.POLIZA 41-44-101288873		ANEXO 2		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 04 03 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 04 12 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 04 02 2030			A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA												

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SOLUCIONES CIVILES J.M.S.A.S		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.912.227-3	
DIRECCIÓN: CALLE 10 NO 26-42 BARRIO EL CARMEN		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3133198734	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		IDENTIFICACIÓN NIT: 846.003.704-1	
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3123370618	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101288873

FIRMA AUTORIZADA: José Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF10864

2



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN						SUCURSAL						COD.SUC		NO.PÓLIZA		ANEXO	
PASTO						PASTO						41		41-40-101054371		3	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO				
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO			DÍA	MES	AÑO							
06	03	2025	04	12	2024	00:00		04	03	2025	23:59		ANEXO DE PRORROGA				



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO**

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.POLIZA 41-40-101054371		ANEXO 3		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 06 03 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 04 12 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 04 03 2025			A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA												

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SOLUCIONES CIVILES J.M.S.A.S		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.912.227-3	
DIRECCIÓN: CALLE 10 NO 26-42 BARRIO EL CARMEN		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3133186734	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		IDENTIFICACIÓN NIT: 846.003.704-1	
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3123370616	
BENEFICIARIO: 846003704 - CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA			

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 Dólv	04/12/2024	04/03/2025	\$34,143,394.22	\$34,143,394.22
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 Dólv	04/12/2024	04/03/2025	\$34,143,394.22	\$34,143,394.22
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 Dólv	04/12/2024	04/03/2025	\$34,143,394.22	\$34,143,394.22

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101054371

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF143664A

2



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-44-101288873		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 06 03 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 04 12 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 04 02 2026		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SOLUCIONES CIVILES J.M.S.A.S		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.912.227-3	
DIRECCIÓN: CALLE 10 NO 26-42 BARRIO EL CARMEN		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3133198734	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		IDENTIFICACIÓN NIT: 846.983.704-1	
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO 3123370616	
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE AMECAN ECUADOR, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTENIDAS DEL CONTRATO No 004-2024 DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/12/2024	04/07/2025	\$34,143,394.22	\$34,143,394.22
BON MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	04/12/2024	04/06/2025	\$170,716,971.08	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	04/12/2024	04/02/2026	\$17,071,697.11	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$34,143,394.22	\$34,143,394.22

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO, CONFORME ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 DEL 27 DE ENERO DEL 2025, ACTA DE REINICIO No. 1 DEL 27 DE FEBRERO DEL 2025 DEL CONTRATO No. 004-2024, LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****256,075,456.63	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CIG AGENCIA DE SEGUROS LTDA	143664	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101288873

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Cordero - Vicepresidente de Finanzas



FIRMA TOMADOR



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.POLIZA 41-44-101288873		ANEXO 3		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 06 03 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 04 12 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 04 02 2030			A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA												

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SOLUCIONES CIVILES J.M.S.A.S		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.912.227-3	
DIRECCIÓN: CALLE 10 NO 26-42 BARRIO EL CARMEN		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3133198734	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		IDENTIFICACIÓN NIT: 846.003.704-1	
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3123370616	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101288873

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF10304A

2



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-40-101054371		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 06 03 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 04 12 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 04 04 2025		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SOLUCIONES CIVILES J.M.S.A.S		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.912.227-3	
DIRECCIÓN: CALLE 10 NO 26-42 BARRIO EL CARMEN		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3133198734	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		IDENTIFICACIÓN NIT: 846.003.704-1	
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
BENEFICIARIO: 846003704 - CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		TELÉFONO 3123370616	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-03-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-0001 / 31-03-22-1329-P-06-00000-E-RCE-001P-0001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATO No 004-2024 DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

ASEGURADOS: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA IDENTIFICADA CON NIT 846003704-1 Y EL CONTRATISTA

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y CENTRO ETNOEDUCATIVO IDENTIFICADA CON NIT 846003704-1

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG. ACTUAL	SUMA ASEG. ANTERIOR
FREDDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	04/12/2024	04/04/2025	\$34,143,394.22	\$34,143,394.22
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	04/12/2024	04/04/2025	\$34,143,394.22	\$34,143,394.22
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	04/12/2024	04/04/2025	\$34,143,394.22	\$34,143,394.22

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA ASPIRA CITADA POR EL TERMINO DE 1 MES, CONFORME ACTA DE PRORROGA No. 1 DEL 27 DE FEBRERO DEL 2025 DEL CONTRATO No.004-2024, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****64,376.00	\$ *****3,000.00	\$ *****12,801.00	\$ *****80,178.00	\$ *****34,143,394.22	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CRO AGENCIA DE SEGUROS LTDA	143664	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101054371

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Cieda - Vicepresidente de Finanzas



FIRMA TOMADOR

Usted puede consultar esta póliza en WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

Oficina Principal: AutoPista Norte # 103 - 60, Piso 3 Teléfono: 601-2186977, 601-4219330

DLF143664A

1



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.POLIZA 41-40-101054371		ANEXO 4		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 06 03 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 04 12 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 04 04 2025			A LAS HORAS 23:59	
										TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA		

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SOLUCIONES CIVILES J.M.S.A.S		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.912.227-3	
DIRECCIÓN: CALLE 10 NO 26-42 BARRIO EL CARMEN		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3133198734	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		IDENTIFICACIÓN NIT: 846.003.704-1	
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3123370616	
BENEFICIARIO: 846003704 - CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA			

AMPAIOS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 \$MOLV	04/12/2024	04/04/2025	\$34,143,394.22	\$34,143,394.22
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 \$MOLV	04/12/2024	04/04/2025	\$34,143,394.22	\$34,143,394.22
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 \$MOLV	04/12/2024	04/04/2025	\$34,143,394.22	\$34,143,394.22

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101054371

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF143864A

2



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-44-101288873		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 06 03 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 04 12 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 04 02 2030		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SOLUCIONES CIVILES J.M.S.A.S		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.912.227-3	
DIRECCIÓN: CALLE 10 NO 26-42 BARRIO EL CARMEN		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3133198734	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		IDENTIFICACIÓN NIT: 846.863.764-1	
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO 3123370516	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE AMEDAN EDCUION, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTÍA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTENIDAS DEL CONTRATO No 004-2024 DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/12/2024	04/07/2025	\$34,143,394.22	\$34,143,394.22
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	04/12/2024	04/07/2025	\$170,716,971.08	\$170,716,971.08
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDENIZACIONES LABORALES	04/12/2024	04/03/2028	\$17,071,697.11	\$17,071,697.11
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$34,143,394.22	\$34,143,394.22

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO Y PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDENIZACIONES LABORALES, CONFORME ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 DEL 27 DE ENERO DEL 2025, ACTA DE REINICIO No. 1 DEL 27 DE FEBRERO DEL 2025 DEL CONTRATO No. 004-2024 LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****46,163.00	\$ *****8,000.00	\$ *****10,291.00	\$ *****64,454.00	\$ *****256,075,456.63	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CAG AGENCIA DE SEGUROS LTDA	143664	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101288873

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda, Vicepresidente de Finanzas



FIRMA TOMADOR

Usted puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com

Oficina Principal: Autopista Norte # 193 - 68, Piso 5 Teléfono: 801-2186977, 801-6019330

DLF142664A



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.POLIZA 41-44-101266873		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 06 03 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 04 12 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 04 02 2030		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO												
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SOLUCIONES CIVILES J.M.S.A.S										IDENTIFICACIÓN NIT: 900.912.227-3		
DIRECCIÓN: CALLE 10 NO 26-42 BARRIO EL CARMEN										CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO		TELÉFONO: 3133198734

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO												
ASEGURADO / BENEFICIARIO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA										IDENTIFICACIÓN NIT: 846.003.704-1		
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA										CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO		TELÉFONO: 3123370616
ADICIONAL:												

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101266873

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

DLP1426644

2



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-44-101288873		ANEXO 5	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 06 03 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 04 12 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 04 02 2026		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SOLUCIONES CIVILES J.M.S.A.S		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.912.227-3	
DIRECCIÓN: CALLE 10 NO 26-42 BARRIO EL CARMEN		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3133198734	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		IDENTIFICACIÓN NIT: 846.003.704-1	
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO 3123370616	
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUSION, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTENIDAS DEL CONTRATO No 004-2024 DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/12/2024	04/08/2025	\$34,143,394.22	\$34,143,394.22
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	04/12/2024	04/08/2025	\$170,716,971.08	\$170,716,971.08
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	04/12/2024	04/04/2026	\$17,071,697.11	\$17,071,697.11
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SE AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$34,143,394.22	\$34,143,394.22

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO ENICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LAS VIGENCIAS DE LA PÓLIZA ANTERIOR CITADA POR EL TÉRMINO DE 1 MESES, CONFORME ACTA DE PRORROGA No. 1 DEL 27 DE FEBRERO DEL 2025 DEL CONTRATO No.004-2024, LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****56.547.00	\$ *****8.000.00	\$ *****12.263.00	\$ *****76.811.00	\$ *****256.075.456.63	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CRO AGENCIA DE SEGUROS LTDA	143664	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101288873

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fievoras



FIRMA TOMADOR

Usted puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 183 - 60, PISO 5 TELÉFONO: 601-2186977, 601-4819330

DLF143664A

1



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.POLIZA 41-44-101288873		ANEXO 5	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 06 03 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 04 12 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 04 02 2030		A LAS HORAS 23:59	
										TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO											
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SOLUCIONES CIVILES J.M.S.A.S								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.912.227-3			
DIRECCIÓN: CALLE 10 NO 26-42 BARRIO EL CARMEN						CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO				TELÉFONO: 3133198734	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO											
ASEGURADO / BENEFICIARIO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA								IDENTIFICACIÓN NIT: 846.003.704-1			
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA						CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO				TELÉFONO: 3123370618	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101288873

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

DLP1426644

2



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-5

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-44-101288873		ANEXO 6	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 21 04 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 04 12 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 04 02 2030		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO									
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SOLUCIONES CIVILES J.M.S.A.S									
IDENTIFICACIÓN NIT: 900.912.227-3									
DIRECCIÓN: CALLE 10 NO 26-42 BARRIO EL CARMEN					CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO				
TELÉFONO: 3133198734									

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO									
ASEGURADO / BENEFICIARIO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA									
IDENTIFICACIÓN NIT: 846.993.704-1									
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA					CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO				
TELÉFONO 3123370616									
ADICIONAL:									

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE AMEXAN ECUADOR, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTENIDAS DEL CONTRATO No 004-2024 DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

AMPAROS				
RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES				
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/12/2024	04/08/2025	\$34,143,394.22	\$34,143,394.22
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	04/12/2024	04/08/2025	\$170,716,971.08	\$170,716,971.08
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	04/12/2024	04/04/2028	\$17,071,697.11	\$17,071,697.11
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	20/03/2025	04/02/2030	\$34,143,394.22	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE APLICA EL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO No 004-2024 A PARTIR DEL 20 DE MARZO DEL 2025, LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****256,075,456.63	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CPS AGENCIA DE SEGUROS LTDA	143664	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101288873

FIRMA AUTORIZADA: José Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas



FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 193 - 68. PISO 5 TELÉFONO: 601-2106977, 601-6018330

DLP143066A



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		Nº.PÓLIZA 41-44-101288873		ANEXO 6	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 21 04 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 04 12 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 04 02 2030		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA											

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SOLUCIONES CIVILES J.M.S.A.S		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.912.227-3	
DIRECCIÓN: CALLE 10 NO 26-42 BARRIO EL CARMEN		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3133198754	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO			
ASEGURADO / BENEFICIARIO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		IDENTIFICACIÓN NIT: 846.003.704-1	
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3123370516	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101288873

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

DLP140644

2



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-44-101288873		ANEXO 7	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 21 04 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 04 12 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 20 03 2030		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SOLUCIONES CIVILES J.M.S.A.S		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.912.227-3	
DIRECCIÓN: CALLE 10 NO 26-42 BARRIO EL CARMEN		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3133198734	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		IDENTIFICACIÓN NIT: 846.803.704-1	
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
ADICIONAL:		TELÉFONO 3123370616	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN EC00108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTENIDAS DEL CONTRATO NO 004-2024 DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASGO/ACTUAL	SUMA ASGO/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/12/2024	04/08/2025	\$34,143,394.22	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	04/12/2024	04/08/2025	\$170,716,971.08	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	04/12/2024	04/04/2028	\$17,071,697.11	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	20/03/2025	20/03/2030	\$34,143,394.22	\$34,143,394.22

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA A PARTIR DEL 20 DE MARZO DEL 2025 HASTA EL 20 DE MARZO DEL 2030, CONFORME ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO NO 004-2024, LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****256,075,456.63	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CRG AGENCIA DE SEGUROS LTDA	143664	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101288873

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Cieda - Vicepresidente de Finanzas



FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 50, PISO 5 TELÉFONO: 601-2188577, 601-4819330

DLF143664A

1



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.POLIZA 41-44-10128873		ANEXO 7		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 21 04 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 04 12 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 20 03 2030			A LAS HORAS 23:59	
										TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA		

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SOLUCIONES CIVILES J.M.S.A.S		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.912.227-3	
DIRECCIÓN: CALLE 10 NO 26-42 BARRIO EL CARMEN		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3133198734	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		IDENTIFICACIÓN NIT: 846.003.704-1	
DIRECCIÓN: VEREDA BUENAVISTA		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3123370616	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

41-44-10128873

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLP14366A

2

BITACORAS


	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA	ANEXO			H O J A
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES	1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024	MES DICIEMBRE	SEMANA 1		

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	miércoles, 4 de diciembre de 2024	TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS	1

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se inicia con el ingreso de personal, equipos y herramienta menor desde el casco urbano del municipio de Puerto Asis, para proceder a la instalación del personal externo de la zona y de esta manera dar inicio a las actividades de obra contempladas en el contrato.

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	8	Residente de Obra	1		
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNYS PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoria
SOLUCIONES CIVILES JM S.A.S.	INCAM S.A.S. ZOMAC


	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		ANEXO			H O J A
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES		3			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024		MES DICIEMBRE	SEMANA 1		
						2

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S. ZOMAC		
FECHA REPORTE	Jueves, 5 de diciembre de 2024		TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS
			2

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se continua con el ingreso de personal, equipos y herramienta menor desde el casco urbano del municipio de Puerto Asis, para proceder a la instalaci3n del personal externo de la zona y de esta manera dar inicio a las actividades de obra contempladas en el contrato.

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	8	Residente de Obra	1		
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES
No se realizaron labores por bajos niveles del rio por ausencia de lluvia, lo cual no permitio el ingreso de motor fuera de borda.

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNYS PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoria
SOLUCIONES CIVILES JM S.A.S.	INCAM S.A.S. ZOMAC



	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		ANEXO			H O J A
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES		1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024		MES SEMANA	DICIEMBRE 2		
						3

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	viernes, 6 de diciembre de 2024	TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS	3

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se realiza el cerramiento del área de trabajo con lona verde de 2 metros de altura en una longitud total de 127 metros.

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	8	Residente de Obra	1	Pulidora	8
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNY PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoria
SOLUCIONES CIVILES JM S.A.S.	INCAM S.A.S. ZOMAC



	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		ANEXO			H O J A
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES		1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024		MES SEMANA	ENERO 2		

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S. ZOMAC		
FECHA REPORTE	sábado, 7 de diciembre de 2024	TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS	4

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se realiza la localización y replanteo del área de trabajo: 347,58 metros cuadrados
Se determina que se iniciará con las actividades contempladas dentro del capítulo de REPELLO, ESTUCCO Y PINTURA
El capítulo de ESTRUCTURAS METÁLICAS y CUBIERTA se iniciará una vez se cuente con el acero de la estructura de cubierta

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	5	Residente de Obra	1		
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	5				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNYS PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoría
SOLUCIONES CIVILES JM S.A.S.	INCAM S.A.S. ZOMAC



	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA	ANEXO			H O J A
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES	1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024	MES SEMANA	ENERO 2		

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S. ZOMAC		
FECHA REPORTE	Junes. 9 de diciembre de 2024	TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS	5

ACTIVIDADES REALIZADAS
Retiro de repello deteriorado, para proceder a actividades de resane con mortero impermeabilizado: 30 metros cuadrados

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	8	Residente de Obra	1		
Nublado		Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNY PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoria
SOLUCIONES CIVILES JM S.A.S.	INCAM S.A.S. ZOMAC


	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA	ANEXO			H O J A
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES	1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024	MES SEMANA	ENERO 2		

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	martes, 10 de diciembre de 2024		TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS 6

ACTIVIDADES REALIZADAS
Resane con MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 en áreas deterioradas: 12 metros cuadrados
Se continua con retiro de repello deteriorado, para proceder a actividades de resane con mortero impermeabilizado: 25,16 metros cuadrados

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	8	Residente de Obra	1		
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNYS PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoria
SOLUCIONES CIVILES JM S.A.S.	INCAM S.A.S. ZOMAC


	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		ANEXO			H O J A
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES		1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024		MES SEMANA	ENERO 2		
						7

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	miércoles, 11 de diciembre de 2024		TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS 7

ACTIVIDADES REALIZADAS
Resane con MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 en áreas deterioradas:13 metros cuadrados

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	8	Residente de Obra	1		
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNYS PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoria
SOLUCIONES CIVILES JM S.A.S.	INCAM S.A.S. ZOMAC


	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA	ANEXO			H O J A
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES	1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024	MES SEMANA	ENERO 2		

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S. ZOMAC		
FECHA REPORTE	jueves, 12 de diciembre de 2024	TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS	8

ACTIVIDADES REALIZADAS
Resane con MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 en áreas deterioradas: 12 metros cuadrados
Filos y Dilataciones

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	8	Residente de Obra	1		
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNYS PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoría
SOLUCIONES CIVILES JM S.A.S.	INCAM S.A.S. ZOMAC



	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		ANEXO			H O J A
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES		1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024		MES SEMANA	ENERO 3		

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S. ZOMAC		
FECHA REPORTE	viernes, 13 de diciembre de 2024	TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS	9

ACTIVIDADES REALIZADAS
Resane con MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 en áreas deterioradas: 15 metros cuadrados Fios y Dilataciones

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	8	Residente de Obra	1		
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNYS PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoría
SOLUCIONES CIVILES JM S.A.S.	INCAM S.A.S. ZOMAC



	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		ANEXO			H O J A
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES		1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024		MES SEMANA	ENERO 3		
						1
						0

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	sábado, 14 de diciembre de 2024	TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS	10

ACTIVIDADES REALIZADAS
Resane con MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 en áreas deterioradas: 3,16 metros cuadrados Filos y Dilataciones

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	5	Residente de Obra	1		
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	5				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNY PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoría



	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA	ANEXO			H O J A
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES	1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024	MES SEMANA	ENERO 3		

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	lunes, 16 de diciembre de 2024	TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS	11

ACTIVIDADES REALIZADAS
Aplicación de Estuco Plastico para muros interiores y exteriores: 14 metros cuadrados

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	8	Residente de Obra	1		
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNYS PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoria



	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA	ANEXO			H O J A
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES	1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024	MES SEMANA	ENERO 3		

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	martes, 17 de diciembre de 2024		TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS 12

ACTIVIDADES REALIZADAS
Aplicación de Estuco Plastico para muros interiores y exteriores: 16 metros cuadrados

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	8	Residente de Obra	1		
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNYS PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoría



	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		ANEXO			H O J A
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES		1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024		MES SEMANA	ENERO 3		

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	miércoles, 18 de diciembre de 2024	TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS	13

ACTIVIDADES REALIZADAS
Aplicación de Estuco Plastico para muros interiores y exteriores: 20 metros cuadrados

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	8	Residente de Obra	1		
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNYS PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoría
SOLUCIONES CIVILES JM S.A.S.	INCAM S.A.S. ZOMAC



	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA	ANEXO			H O J A
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES	1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024	MES SEMANA	ENERO 3		

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	jueves, 19 de diciembre de 2024	TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS	14

ACTIVIDADES REALIZADAS
Aplicación de Estuco Plastico para muros interiores y exteriores: 15,16 metros cuadrados

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	8	Residente de Obra	1		
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNYS PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoría



	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA	ANEXO			H O J A
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES	1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024	MES SEMANA	ENERO 4		
					1
					5

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	viernes, 20 de diciembre de 2024	TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS	15

ACTIVIDADES REALIZADAS
Aplicación de Pintura TIPO I para interiores: 25 metros cuadrados

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	8	Residente de Obra	1		
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNYS PAZ PORTILLA



	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		ANEXO			H O J A
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES		1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024		MES SEMANA	ENERO 4		
						1
						6

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	sábado, 21 de diciembre de 2024	TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS	16

ACTIVIDADES REALIZADAS
Aplicación de Pintura TIPO I para interiores: 29 metros cuadrados

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	8	Residente de Obra	1		
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES
Se deja constancia que a la fecha no ha sido posible adquirir los materiales necesarios para la elaboración de la estructura metálica de la cubierta, esto debido a que los proveedores se encuentran en cierre de año, por lo que se espera que en el transcurso del mes de Enero se pueda contar con estos materiales en obra.

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNYS PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoría



	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA	ANEXO			H O J A 1 7
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES	1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024	MES SEMANA	ENERO 4		

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCA S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	sábado, 21 de diciembre de 2024	TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS	17

ACTIVIDADES REALIZADAS
Aplicación de Pintura TIPO I para interiores: 27 metros cuadrados

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	5	Residente de Obra	1		
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	5				

OBSERVACIONES
Por temas de festividades de fin de año y carnavales de inicio de año, el personal se retira a partir de la fecha hasta el día 08/01/2025, una vez culminen las festividades se retoman las actividades de obra pendientes

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANNENYS PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoría


	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		ANEXO			H O J A
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES		1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024		MES SEMANA	ENERO 4		

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	miércoles, 8 de enero de 2025		TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS 18

ACTIVIDADES REALIZADAS
Aplicación de Pintura TIPO I para interiores: 30 metros cuadrados

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	8	Residente de Obra	1		
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNYS PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoria


	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA	ANEXO			H O J A
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES	1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024	MES SEMANA	ENERO 4		

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	jueves, 9 de enero de 2025	TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS	19

ACTIVIDADES REALIZADAS
Aplicación de Pintura TIPO I para interiores: 30 metros cuadrados

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	8	Residente de Obra	1		
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNYS PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoria


	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		ANEXO			H O J A
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES		1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024		MES SEMANA	ENERO 4		

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCA S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	viernes, 10 de enero de 2025	TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS	20

ACTIVIDADES REALIZADAS
Aplicación de Pintura TIPO I para interiores: 31 metros cuadrados

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	8	Residente de Obra	1		
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNYS PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoría



	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA	ANEXO			H O J A
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES	1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024	MES SEMANA	ENERO 5		
					2
					1

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	sábado, 11 de enero de 2025	TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS	21

ACTIVIDADES REALIZADAS
Aplicación de Pintura TIPO I para interiores: 13 metros cuadrados

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	5	Residente de Obra	1		
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-LD	5				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANNENYS PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoría


	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA	ANEXO			H O J A
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES	1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024	MES SEMANA	ENERO 5		

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	lunes, 13 de enero de 2025		TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS 22

ACTIVIDADES REALIZADAS
Aplicación de Pintura TIPO I para interiores: 28 metros cuadrados

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	8	Residente de Obra	1		
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNYS PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoria
