



	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		ANEXO			H O J A
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES		1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024		MES SEMANA	ENERO 5		

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	martes, 14 de enero de 2025		TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS 23

ACTIVIDADES REALIZADAS
Aplicación de Pintura TIPO I para interiores: 29 metros cuadrados
Se alista las áreas a intervenir con Aplicación de Pintura 3 en 1 para carpintería metálica

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	8	Residente de Obra	1		
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNY S PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoria
SOLUCIONES CIVILES JM S.A.S.	INCAM S.A.S. ZOMAC



	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		ANEXO			H O J A 2 4
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES		1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024		MES SEMANA	ENERO 5		

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	miércoles, 15 de enero de 2025	TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS	24

ACTIVIDADES REALIZADAS
Aplicación de Pintura TIPO I para interiores: 29 metros cuadrados Aplicación de Pintura TIPO I para exteriores: 18 metros cuadrados Se alista las áreas a intervenir con Aplicación de Pintura 3 en 1 para carpintería metálica

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	8	Residente de Obra	1		
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNYS PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoria



	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		ANEXO			H O J A
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES		1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024		MES SEMANA	ENERO 5		

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	jueves, 16 de enero de 2025	TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS	25

ACTIVIDADES REALIZADAS
Aplicación de Pintura TIPO I para interiores: 30 metros cuadrados
Aplicación de Pintura TIPO I para exteriores: 16 metros cuadrados
Se alista las áreas a intervenir con Aplicación de Pintura 3 en 1 para carpintería metálica

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	8	Residente de Obra	1		
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNYS PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoria



	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA	ANEXO			H O J A 2 6
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES	1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024	MES SEMANA	ENERO 5		

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	viernes, 17 de enero de 2025	TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS	26

ACTIVIDADES REALIZADAS
Aplicación de Pintura TIPO I para interiores: 28 metros cuadrados Aplicación de Pintura TIPO I para exteriores: 17 metros cuadrados Se alista las áreas a intervenir con Aplicación de Pintura 3 en 1 para carpintería metálica

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	8	Residente de Obra	1		
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANNENYS PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoría


	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		ANEXO			H O J A 2 7
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES		1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024		MES SEMANA	ENERO 5		

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	sábado, 18 de enero de 2025	TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS	27

ACTIVIDADES REALIZADAS
Aplicación de Pintura TIPO I para interiores: 29 metros cuadrados
Aplicación de Pintura TIPO I para exteriores: 18 metros cuadrados
Aplicación de Pintura 3 en 1 para carpintería metálica: 16 metros cuadrados

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	5	Residente de Obra	1		
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	5				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNYS PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoría



	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		ANEXO			H O J A 2 8
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES		1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024		MES ENERO	SEMANA 5		

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	lunes, 20 de enero de 2025	TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS	28

ACTIVIDADES REALIZADAS
Aplicación de Pintura TIPO I para interiores: 30 metros cuadrados
Aplicación de Pintura TIPO I para exteriores: 16 metros cuadrados
Aplicación de Pintura 3 en 1 para carpintería metálica: 14 metros cuadrados

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	8	Residente de Obra	1		
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNYS PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoría



	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		ANEXO			H O J A
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES		1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024		MES SEMANA	ENERO 5		

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	martes, 21 de enero de 2025		TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS 29

ACTIVIDADES REALIZADAS
Aplicación de Pintura TIPO I para interiores: 28 metros cuadrados
Aplicación de Pintura TIPO I para exteriores: 18 metros cuadrados
Aplicación de Pintura 3 en 1 para carpintería metálica: 15 metros cuadrados

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	8	Residente de Obra	1		
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNYS PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoría



	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		ANEXO			H O J A
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES		1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024		MES SEMANA	ENERO 5		

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S.ZOMAC		
FECHA REPORTE	miércoles, 22 de enero de 2025	TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS	30

ACTIVIDADES REALIZADAS
Aplicación de Pintura TIPO I para interiores: 29 metros cuadrados
Aplicación de Pintura TIPO I para exteriores: 16 metros cuadrados
Aplicación de Pintura 3 en 1 para carpintería metálica: 14 metros cuadrados

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	8	Residente de Obra	1		
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNYS PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoría



	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA	ANEXO			H O J A 3 1
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES	1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024	MES SEMANA	ENERO 5		

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	jueves, 23 de enero de 2025	TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS	31

ACTIVIDADES REALIZADAS
Aplicación de Pintura TIPO I para interiores: 28 metros cuadrados
Aplicación de Pintura TIPO I para exteriores: 15 metros cuadrados
Aplicación de Pintura 3 en 1 para carpintería metálica: 14 metros cuadrados

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	8	Residente de Obra	1		
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovisna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNYS PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoría



	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA	ANEXO			H O J A
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES	1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024	MES SEMANA	ENERO 5		

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	viernes, 24 de enero de 2025	TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS	32

ACTIVIDADES REALIZADAS
Aplicación de Pintura TIPO I para interiores: 29 metros cuadrados
Aplicación de Pintura TIPO I para exteriores: 14 metros cuadrados
Aplicación de Pintura 3 en 1 para carpintería metálica: 14 metros cuadrados

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	8	Residente de Obra	1		
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNYS PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoría



	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		ANEXO			H O J A
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES		1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024		MES SEMANA	ENERO 5		

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	sábado, 25 de enero de 2025	TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS	33

ACTIVIDADES REALIZADAS
Aplicación de Pintura TIPO I para interiores: 28,58 metros cuadrados
Aplicación de Pintura TIPO I para exteriores: 20,62 metros cuadrados
Aplicación de Pintura 3 en 1 para carpintería metálica: 8,45 metros cuadrados

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	5	Residente de Obra	1		
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	5				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNY PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoría



	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		ANEXO			H O J A
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES		1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024		MES SEMANA	ENERO 5		

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	lunes, 27 de enero de 2025		TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS 34

ACTIVIDADES REALIZADAS
Transporte de material para cubierta: Teja en Zinc Arquitectónico 1,01X6m Cal 30, se lleva hasta el sitio de la obra un total de 112 tejas de Zinc arquitectonico x 6 metros calibre 30

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	7	Residente de Obra	1		
Nublado	2	Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	9				

OBSERVACIONES
De acuerdo al Acta de Suspensión No. 1 a partir de hoy se suspenden las actividades por un termino de UN (01) mes, lo cual indica que se deben reiniciar actividades de obra el día 27 de febrero de 2025

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNYS PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoria



	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		ANEXO			H O J A
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES		1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024		MES SEMANA	ENERO 5		
						3
						5

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	jueves, 27 de febrero de 2025	TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS	35

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se ingresa Estructura metalica en Acero ASTM - A572: 1374 kilgramos

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	8	Residente de Obra	1		
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNYS PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoria



	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		ANEXO			H O J A
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES		1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024		MES SEMANA	ENERO 5		
						3
						6

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	viernes, 28 de febrero de 2025	TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS	36

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se ingresa Estructura metalica en Acero ASTM - A536: 2773 kilogramos

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	8	Residente de Obra	1		
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNYS PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoria



	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		ANEXO			H O J A 3 7
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES		1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024		MES SEMANA	ENERO 5		

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	sábado, 1 de marzo de 2025	TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS	37

ACTIVIDADES REALIZADAS	
Se ingresa Templatetes, Barra Lisa de 1/2"	
Se ingresa Contravientos, Barra Lisa de 1/2"	

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	8	Residente de Obra	1		
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES	

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNYS PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoria



	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		ANEXO			H O J A
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES		1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024		MES SEMANA	ENERO 5		

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	lunes, 3 de marzo de 2025		TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS 38

ACTIVIDADES REALIZADAS
Desmonte de Cubierta y Estructura Portante: 260 metros cuadrados

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	8	Residente de Obra	1	Andamios	8
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNYS PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoría



	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		ANEXO			H O J A
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES		1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024		MES SEMANA	ENERO 5		

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	martes, 4 de marzo de 2025		TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS 39

ACTIVIDADES REALIZADAS
Desmante de Cubierta y Estructura Portante: 256,13 metros cuadrados

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	8	Residente de Obra	1	Andamios	8
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES
Teniendo en cuenta el Acta de Mayores y Menores cantidades aprobada, se procederá con la fabricacion de las estructuras de cubierta

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNYS PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoria



	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		ANEXO			H O J A
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES		1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024		MES SEMANA	ENERO 5		

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	miércoles, 5 de marzo de 2025	TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS	40

ACTIVIDADES REALIZADAS
Instalación de Estructura metalica en Acero ASTM - A572:500 kilogramos Instalación de Estructura metalica en Acero ASTM - A36: 1000 kilogramos Se inicia encofrado para fundir Vigas Cintas (0,15Mx20M) en concreto 21MPa

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	8	Residente de Obra	1	Andamios	8
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNYS PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoria



	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		ANEXO			H O J A
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES		1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024		MES SEMANA	ENERO 5		

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	jueves, 6 de marzo de 2025	TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS	41

ACTIVIDADES REALIZADAS
Instalación de Estructura metalica en Acero ASTM - A572: 480 kilogramos Instalación de Estructura metalica en Acero ASTM - A36: 950 kilogramos Vigas Cintas (0,15Mx20M) en concreto 21MPa: 1,57 metro cubico

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	8	Residente de Obra	1	Andamios	8
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNYS PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoria



	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA	ANEXO			H O J A
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES	1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024	MES SEMANA	ENERO 5		
					4
					2

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	viernes, 7 de marzo de 2025	TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS	42

ACTIVIDADES REALIZADAS
Instalación de Estructura metalica en Acero ASTM - A572: 468,31 kilogramos
Instalación de Estructura metalica en Acero ASTM - A36: 914,56 kilogramos
Vigas Cintas (0,15Mx20M) en concreto 21MPa: 1,57 metros cubicos

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	8	Residente de Obra	1	Andamios	8
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANNENYS PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoria



	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		ANEXO			H O J A
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES		1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024		MES SEMANA	ENERO 5		

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	lunes, 10 de marzo de 2025		TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS 43

ACTIVIDADES REALIZADAS
Suministro e Instalación de Teja en Zinc Arquitectónico Cal 30: 180 metros cuadrados

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	8	Residente de Obra	1	Andamios	8
Nublado	0	Ambiental	0	Taladro	8
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNYS PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoría



	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		ANEXO			H O J A
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES		1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024		MES SEMANA	ENERO 5		
						4
						4

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No.	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	martes, 11 de marzo de 2025		TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS 44

ACTIVIDADES REALIZADAS	
Suministro e Instalación de Teja en Zinc Arquitectónico Cal 30: 180 metros cuadrados	

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	8	Residente de Obra	1	Andamios	8
Nublado	0	Ambiental	0	Taladro	8
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES	

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNY PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoría



	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		ANEXO			H O J A
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES		1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024		MES SEMANA	ENERO 5		

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	miércoles, 12 de marzo de 2025	TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS	45

ACTIVIDADES REALIZADAS
Suministro e Instalación de Teja en Zinc Arquitectónico Cal 30: 173,16 metros cuadrados

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	8	Residente de Obra	1	Andamios	8
Nublado	0	Ambiental	0	Taladro	8
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNY PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoria



	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA	ANEXO			H O J A 4 6
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES	1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024	MES SEMANA	ENERO 5		

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	jueves, 13 de marzo de 2025	TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS	46

ACTIVIDADES REALIZADAS
Suministro e instalación caballete en Zinc Cal.30: 25,05 metros

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	8	Residente de Obra	1	Andamios	8
Nublado	0	Ambiental	0	Taladro	8
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNY PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoria



	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA	ANEXO			H O J A
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES	1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024	MES SEMANA	ENERO 5		

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	viernes, 14 de marzo de 2025	TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS	47

ACTIVIDADES REALIZADAS
Suministro e instalación caballete en Zinc Cal.30: 25,05 metros

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	8	Residente de Obra	1	Andamios	8
Nublado	0	Ambiental	0	Taladro	8
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANNENYS PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoria



	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		ANEXO			H O J A
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES		1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024		MES SEMANA	ENERO 5		

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	viernes, 14 de marzo de 2025	TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS	47

ACTIVIDADES REALIZADAS
Suministro e instalación caballete en Zinc Cal.30: 25,05 metros

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	8	Residente de Obra	1	Andamios	8
Nublado	0	Ambiental	0	Taladro	8
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNYS PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoria
SOLUCIONES CIVILES JM S.A.S.	INCAM S.A.S. ZOMAC



	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA	ANEXO			H O J A
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES	1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024	MES SEMANA	ENERO 5		

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S. ZOMAC		
FECHA REPORTE	sábado, 15 de marzo de 2025	TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS	48

ACTIVIDADES REALIZADAS
Suministro e Instalación de Canal en lamina galvanizada cal. 20: 25,63 metros

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	8	Residente de Obra	1		
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNYS PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoria
SOLUCIONES CIVILES JM S.A.S.	INCAM S.A.S. ZOMAC



	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA	ANEXO			H O J A 4 9
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES	1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024	MES SEMANA	ENERO 5		

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	lunes, 17 de marzo de 2025	TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS	49

ACTIVIDADES REALIZADAS
Suministro e Instalación de Canal en lamina galvanizada cal. 20: 25,63 metros

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	8	Residente de Obra	1		
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANNENYS PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoria
SOLUCIONES CIVILES JM S.A.S.	INCAM S.A.S/ ZOMAC



	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA	ANEXO			H O J A
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES	1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024	MES SEMANA	ENERO 5		

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	martes, 18 de marzo de 2025		TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS 50

ACTIVIDADES REALIZADAS
Suministro e Instalación de Canal en lamina galvanizada cal. 20: 25,63 metros

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	6	Residente de Obra	1		
Nublado	1	Ambiental	0		
Llovisna	1	Almacenista	0		
Lluvia	0	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANNENYS PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoría
SOLUCIONES CIVILES JM S.A.S.	INCAM S.A.S. ZOMAC



	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA		ANEXO			H O J A
	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES		1			
	VIGENCIA DESDE EL 4/12/2024		MES SEMANA	ENERO 5		

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No	004-2024	DEL	2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES J.M. S.A.S.		
INTERVENTOR	INCAM S.A.S ZOMAC		
FECHA REPORTE	miércoles, 19 de marzo de 2025	TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS	51

ACTIVIDADES REALIZADAS
Suministro e Instalación de Canal en lamina galvanizada cal. 20: 25.63 metros

ESTADO DEL TIEMPO		PERSONAL EN OBRA		EQUIPO	
DESCRIPCION	HORA		CANTIDAD	DESCRIPCION	HORAS
Soleado	5	Residente de Obra	1		
Nublado	0	Ambiental	0		
Llovizna	0	Almacenista	0		
Lluvia	3	Maestro de obra	1		
Tormenta	0	Oficiales	0		
		Obreros	4		
TOTAL HR-L/D	8				

OBSERVACIONES

Vo. Bo. Contratista	Vo. Bo. Interventor
	
DANIELA PORTILLA BURBANO	DANDENNYS PAZ PORTILLA
Residente de Obra	Residente de Interventoria
SOLUCIONES CIVILES JM S.A.S.	INCAM S.A.S. ZOMAC

MEMORIA DE CANTIDADES

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO



MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	LOCALIZACION EJES/ESPACIO	CANTIDADES				TOTAL CANTIDAD	UND.
			LONG. (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	PARCIAL No. VECES		
1	PRELIMINARES							
1.1	Localización y Replanteo						347,69	M2
		Salon 1	9,78	7,00		68,46		M2
		Sala de Informatica	8,03	7,00		56,21		M2
		Salon 2	7,91	6,18		48,88		M2
		Salon 3	7,84	6,18		48,45		M2
		Dirección	3,85	8,90		34,27		M2
		Salon 4	6,00	8,90		53,40		M2
		Biblioteca	4,26	8,90		37,91		M2
1.2	Cerramiento en Polisombra						253,60	M2
		Fachada Principal	51,50		2,00	103,00		M2
		Fachada Posterior	51,50		2,00	103,00		M2
		Fachada Lateral Derecha	11,90		2,00	23,80		M2
		Fachada Lateral Izquierda	11,90		2,00	23,80		M2
1.3	Desmonte de Cubierta y Estructura Portante							
		Cubierta	48,50	10,64		516,13		M2
							516,13	M2



MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	LOCALIZACION EJE/ESPACIO	CANTIDADES					TOTAL CANTIDAD	UND.	
			MEDIDAS		ALTURA (m)	+/-	CALCULOS			
			LONG. (m)	ANCHO (m)					PARCIAL	No. VECES
2.4	Contravientos, Barra Lisa de 1/2", Incluye Pintura Anticorrosiva y Esmalte	Contravientos 1/2"	137,93				137,93	0	0,00	M
										
3.0	CUBIERTA									
3.1	Suministro e instalación de Teja en Zinc Arquitectónico Gal 30	Cubierta	50,10	10,64			533,16	1	533,16	M2
										
3.2	Suministro e instalación de Canal en lamina galvanizada cal. 20 (incluye: accesorios de instalación y bajante)								102,49	M
		Eje 25 A-F Eje 24 F-J Eje 20 J-M Eje 22 A-J Eje 21 J-M	19,05 15,87 15,19 35,92 16,47				19,05 15,87 15,19 35,92 16,47	1 1 1 1 1	19,05 15,87 15,19 35,92 16,47	M M M M M
3.3	Suministro e instalación caballero en Zinc Gal30	Eje 23 A-M	50,10				50,10	1	50,10	M
										

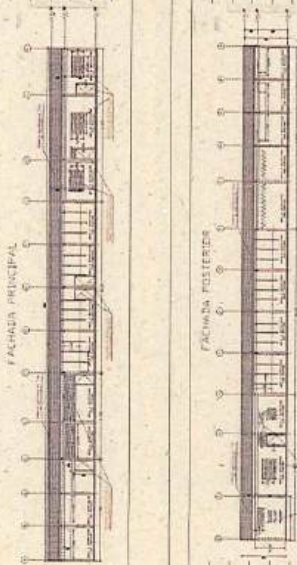




MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ITEM	DESCRIPCION	LOCALIZACION EJES/ESPACIO	CANTIDADES					TOTAL CANTIDAD	UND.
			LONG. (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	+/-	PARCIAL	No. VECES	
4.0	REBELLO, ESTUCCO Y PINTURA								
4.1	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3								
		FACHADA LATERAL DERECHA							
		FACHADA POSTERIOR							
		RESANES							
			4.58		3.15		14.43	1	M2
			2.00		0.50	-1.00	-1.00	1	M2
			1.00		1.00		1.00	5	M2
			5.00	0.15			0.75	1	M2
			1.00		0.45		0.45	1	M2
			0.15		0.15		0.02	21	M2
4.2	Estuco Plastico para muros interiores y exteriores								
		FACHADA LATERAL DERECHA							
		FACHADA POSTERIOR							
		RESANES							
			4.58		3.15		14.43	1	M2
			2.00		0.50	-1.00	-1.00	1	M2
			1.00		1.00		1.00	5	M2
			5.00	0.15			0.75	1	M2
			1.00		0.45		0.45	1	M2
			0.15		0.15		0.02	21	M2



MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA													
ITEM	DESCRIPCION	LOCALIZACION	EJES/ESPACIO	MEDIDAS			CANTIDADES		CALCULOS		TOTAL CANTIDAD	UND.	
				LONG. (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	+/-	PARCIAL	No. VECES				
4.3	Aplicación de Pintura TIPO I para Interiores		MURO RESPALDO FACHADA PRINCIPAL	A-D	9.80		3.15		30.85	1	30.85	M2	
				Ventilana A-B	2.80		0.70	-1.00	-1.96	1	-1.96	M2	
				Ventilana B-C	2.75		0.70	-1.00	-1.93	1	-1.93	M2	
				Ventilana C-D	3.05		0.70	-1.00	-2.14	1	-2.14	M2	
				Puerta C-D	1.00		2.00	-1.00	-2.00	1	-2.00	M2	
				D-F	8.13		3.15		25.61	1	25.61	M2	
				Ventilana D-E	3.24		1.10	-1.00	-3.56	1	-3.56	M2	
				Ventilana E-F	4.40		1.10	-1.00	-4.83	1	-4.83	M2	
				Puerta E-F	1.00		2.00	-1.00	-2.00	1	-2.00	M2	
				F-J	16.11		3.15		50.75	1	50.75	M2	
				Ventilanas F-J	0.90		1.71	-1.00	-1.54	16	-24.62	M2	
				Puertas F-J	1.00		2.00	-1.00	-2.00	2	-4.00	M2	
				J-M	14.47		3.15		45.56	1	45.56	M2	
				Ventilana J-K	2.00		1.25	-1.00	-2.50	1	-2.50	M2	
				Ventilana K-L	2.00		1.25	-1.00	-2.50	1	-2.50	M2	
				Ventilana L-M	2.00		1.25	-1.00	-2.50	1	-2.50	M2	
				Puerta K-L	1.00		2.45	-1.00	-2.45	1	-2.45	M2	
				Puerta L-M	1.00		2.00	-1.00	-2.00	1	-2.00	M2	
				MURO RESPALDO FACHADA POSTERIOR	M-J	14.47		3.15		45.56	1	45.56	M2
					Ventilana M-L	2.00		0.50	-1.00	-1.00	1	-1.00	M2
Ventilana L-K	2.00		1.25		-1.00	-2.50	1	-2.50	M2				
Puerta L-K	1.00		2.45		-1.00	-2.45	1	-2.45	M2				
Ventilanas J-F	0.90		1.71		-1.00	-1.54	16	-24.62	M2				
Ventilana D-C	2.75		0.71		-1.00	-1.95	1	-1.95	M2				
Ventilana C-B	2.75		0.71		-1.00	-1.95	1	-1.95	M2				
Ventilana B-A	2.80		0.71		-1.00	-1.99	1	-1.99	M2				
MURO RESPALDO FACHADA LATERAL DERECHA						35.06	1	35.06	M2				
MURO RESPALDO FACHADA LATERAL IZQUIERDA						30.67	1	30.67	M2				
MUROS INTERNOS	EJE D					28.06	2	56.11	M2				
	EJE F					26.66	2	53.31	M2				
	EJE H					25.64	2	51.27	M2				
	EJE J					31.50	2	63.01	M2				
	EJE K					35.06	2	70.13	M2				
	EJE L					35.06	2	70.13	M2				








MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	LOCALIZACION EJES/ESPACIO	CANTIDADES				TOTAL CANTIDAD	UND.	
			MEDIDAS		CALCULOS				
			LONG. (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	+/-	PARCIAL	No. VEGES	
4.4	Aplicación de Pintura TIPO I para exteriores								168.62
		FACHADA PRINCIPAL							
		A-D	9.80		3.15		30.85	1	30.85
		Ventana A-B	2.80		0.70	-1.00	-1.96	1	-1.96
		Ventana B-C	2.75		0.70	-1.00	-1.93	1	-1.93
		Ventana C-D	3.05		0.70	-1.00	-2.14	1	-2.14
		Puerta C-D	1.00		2.00	-1.00	-2.00	1	-2.00
		D-F	8.13		3.15		25.61	1	25.61
		Ventana D-E	3.24		1.10	-1.00	-3.56	1	-3.56
		Ventana E-F	4.40		1.10	-1.00	-4.83	1	-4.83
		Puerta E-F	1.00		2.00	-1.00	-2.00	1	-2.00
		F-J	16.11		3.15		50.75	1	50.75
		Ventanas F-J	0.90		1.71	-1.00	-1.54	16	-24.62
		Puertas F-J	1.00		2.00	-1.00	-2.00	2	-4.00
		J-M	14.47		3.15		45.56	1	45.56
		Ventana J-K	2.00		1.25	-1.00	-2.50	1	-2.50
		Ventana K-L	2.00		1.25	-1.00	-2.50	1	-2.50
		Ventana L-M	2.00		1.25	-1.00	-2.50	1	-2.50
		Puerta K-L	1.00		2.45	-1.00	-2.45	1	-2.45
		Puerta L-M	1.00		2.00	-1.00	-2.00	1	-2.00
		FACHADA POSTERIOR							
		M-J	14.47		3.15		45.56	1	45.56
		Ventana M-L	2.00		0.50	-1.00	-1.00	1	-1.00
		Ventana L-K	2.00		1.25	-1.00	-2.50	1	-2.50
		Puerta L-K	1.00		2.45	-1.00	-2.45	1	-2.45
		Ventanas J-F	0.90		1.71	-1.00	-1.54	16	-24.62
		Ventana D-C	2.75		0.71	-1.00	-1.95	1	-1.95
		Ventana C-B	2.75		0.71	-1.00	-1.95	1	-1.95
		Ventana B-A	2.00		0.71	-1.00	-1.99	1	-1.99
		FACHADA LATERAL DERECHA					35.06	1	35.06
		FACHADA LATERAL IZQUIERDA					30.67	1	30.67






INFORME FINAL
P.M.A

INFORME FINAL
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

COMPRENDE DESDE EL 4 DE DICIEMBRE HASTA EL 4 DE ABRIL

CONTRATO DE OBRA N° 004-2024

**OBJETO: MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO
ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE
PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**

		
Elaboro: EDUARDO BLADIMIR GUAPUCAL	Revisó: DANIELA PORTILLA	Aprobó: LEYDY YULIETH TEJADA SALDARRAGIA
Profesional Ambiental	Residente de Obra	Representante Legal



Generalidades del proyecto

Objeto: MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Contratistas:

- **Obra:** SOLUCIONES CIVILES JM SAS
- **Interventoría:** INCAM S.A.S. ZOMAC

Generalidades del proyecto



Localización del proyecto: El proyecto de obra correspondiente al contrato de obra civil No 004 2024., se encuentra ubicado de la ciudad de Puerto Asís, departamento del putumayo. En la (vereda Buenavista)

Extensión área urbana: La cabecera municipal está localizada aproximadamente a los 00°29'36" de latitud norte y 76°30'15" de longitud oeste, a una altura sobre el nivel del mar de 253 m. Dista de Mocoa la capital departamental 94 km por vía terrestre.

Puerto Asís el área municipal es de 2.610 km² y limita al Norte con Puerto Caicedo y Puerto Guzmán (Putumayo), al Este con Puerto Leguizamo (Putumayo), al Sur con la República del Ecuador y al Oeste con San Miguel (La Dorada), Valle del Guamuez (La Hormiga) y Orito (Putumayo). Cuenta con los corregimientos de La Carmelita, Piñuña Blanco, Santana, Teteye y Villa Victoria, las inspecciones de policía de Alto Danubio, Caña Brava, Comandante y Puerto Vega, además de 3 caseríos y 3 centros poblados.

Límites del municipio

- ✚ Al sur, limita con la República del Ecuador
- ✚ Al norte, limita con Puerto Caicedo y Puerto Guzmán
- ✚ Al occidente, limita con Orito, Valle de Guamuez y San Miguel
- ✚ Al oriente, limita con Puerto Leguizamo





Ejecución

Se implementa actividades de capacitación



Ejecución

Se implementan actividades de capacitación:

- Socialización
- Taller de educación ambiental
- Uso adecuado de EPP
- Vector de control de plagas
- Reciclaje
- Manejo de desechos
- Señalización visible acopios RCD
- Código de colores clasificación RCD
- Ahorro de agua y energía
- Cumplimiento legal en materia de prevención y control de emisiones de contaminantes
- Cambio climático
- Orden y aseo

INFORME FINAL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

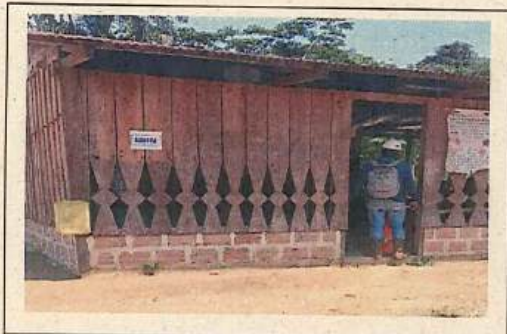
Nº	ACTIVIDADES	PERIODO DE EJECUCION DEL PROYECTO	
		Mes 1	Mes 2
1	Socialización		
2	Taller de educación ambiental		
3	Uso adecuado de EPP		
4	Vectores de control de plagas		
5	Reciclaje		
6	Manejo de desechos		
7	Señalización visibles acopios RCD		
8	Código de colores clasificación RCD		
9	Ahorro de agua y energía		
10	Cumplimiento legal en materia de prevención y control de emisiones de contaminantes		
11	Cambio climático		
12	Orden y aseo		

Indicador	Descripción del indicador	Tipo de indicador	periodicidad de la evaluación	Registro de cumplimiento
No. Capacitaciones ejecutadas / No. Capacitaciones programadas * 100	Realizar el 100% de las capacitaciones propuestas para el periodo programado	Porcentaje	Mensual	Registro de asistencia y registro fotográfico

Indicador	Descripción del indicador	Tipo de indicador	periodicidad de la evaluación	Registro de cumplimiento
$12 / 12 * 100 = 100\%$	100%	%	Mensual	Registro de asistencia y registro fotográfico

Ejecución

Manejo integral de materiales de construcción



Ejecución

Señalización en frentes de obra y sitios temporales

- Se delimitó la zona de trabajo con lona verde estabilizada y cinta, se instaló la valla informativa y demás señalización necesaria.
- Todo el personal vinculado a la obra estuvo distinguido con uniformes e implementos de protección personal (EPP).
- Los sitios de almacenamiento temporal de material reutilizable se adecuaron, delimitaron, y se protegieron contra la acción erosiva del agua y aire para prevenir su contaminación.

A continuación, registro fotográfico:

Ejecución

Señalización en frentes de obra y sitios temporales



Ejecución

Manejo y disposición final de escombros y materiales de excavación

- Con el material de excavación se utilizó para acondicionar el terreno.
- Parte de ello se donó a predio autorizado por el propietario





INFORME FINAL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Ejecución

Manejo de residuos

- Se realizó un inventario de sumideros o sistemas de desagües dentro del área de influencia directa de la obra.
- Se efectuó la limpieza de sumideros localizados en el frente de obra, como mínimo una vez por semana.
- No se realizó ningún tipo de vertimiento de residuo líquido a las calles, canales y cuerpos de agua.
- Sensibilización ambiental enfocada en el ahorro y uso eficiente de agua, centrándose en el compromiso por la conservación de los recursos naturales.
- Es importante resaltar que en la mayoría de los casos se aplicó el principio de aprovechamiento de aguas lluvias y reutilización del recurso hídrico.

Ejecución

Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales, punto ecológico:



FIRMA

EDUARDO BLADIMIR GUAPUCAL
ING. AMBIENTAL Y SANITARIO
TP.19260-393608 CAU

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.123.333.225
GUAPUCAL ESCOBAR

APELLIDOS
EDUARDO BLADIMIR

NOMBRES


FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-MAY-1997

ORITO
(PUTUMAYO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72


ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

16-JUL-2015 ORITO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-6402300-00735917-N-1123333225-20150818

0045926300A 1

37115866



Metrcula Profesional No.
19260-393608 CAU
Fecha de Expedición: **13/07/2018**

Nombre:
**EDUARDO GLADIMIR
GUAPICAL ESCOBAR**
Identificación:
C.C. 1123333225
Profesión:
**INGENIERO AMBIENTAL Y
SANITARIO**
Institución:
**CORPORACION UNIVERSITARIA
AUTONOMA DEL CAUCA**



Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003,
que autoriza al titular a ejercer como Ingeniero en el Territorio Nacional.

DIRECTOR GENERAL

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA, Calle 78 No. 9-57 primer piso
Línea Nacional: 01 8000 116590



SOLUCIONES CIVILES JM SAS



CONTROL SEGUIMIENTO AMBIENTAL SG-SSS

ANEXO

FECHA ULTIMA
ACT

2

FEBRERO -
ABRIL

CONTRATO N°

004-2024

TIPO DE CONTRATO:

OBRA:

OBJETIVO:

MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO
RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CONTRATISTA:

SOLUCIONES CIVILES J.M.S.A.S

VALOR ACTUALIZADO:

\$ 341.433.942,16

MANEJO DE MATERIAL DE ESCOMBROS

COMPONENTES	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CLASIFICACION			VALOR
		SI	NO	NO APLICA	BUENA	ACEPTABLE	DEFICIENTE	
MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS	Capacitación de Personal	X			5			5
	Mantenimiento Preventivo	X			5			5
	Definición de Horarios de trabajo	X			5			5
	Ficha de control de actividades	X			5			5
	Uso de equipos en buen estado , certificado	X			6			6
	Elementos de protección Personal	X			6			6
	Extintores	X			6			6
	Medidas de contingencia	X			5			5
	Volumen del material (m3)							
	Volumen de excavación (m3)							
	Volumen de demolición(m3)							
	Volumen de tierra (m3)							
CALIFICACIÓN		Buena :5-6	Aceptable :4-5	Deficiente:0-3	PROMEDIO			43
					VALOR FINAL			5,38

MANEJO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES

COMPONENTES	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CLASIFICACION			VALOR
		SI	NO	NO APLICA	BUENA	ACEPTABLE	DEFICIENTE	
MANEJO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES	Capacitación Personal	X			6			6
	Dotación de elementos de protección personal	X			6			6
	Adopción de Medidas de seguridad Industrial y salud ocupacional	X			6			6
	Espacio para peticiones ,quejas y reclamos	X			5,5			5,5
	Programas de información a la comunidad	X			5,5			5,5
	Socializaciones	X			5			5
	Arboles talados			X	6			6
	Arboles podados			X	6			6
	Arboles bloqueados			X	6			6
	Arboles sembrados			X	6			6
CALIFICACIÓN		Buena :5-6	Aceptable :4-5	Deficiente:0-3	PROMEDIO			58
					VALOR FINAL			5,8

OBSERVACIONES

SE REALIZO LIMPIEZA DEL LUGAR EL CUAL SALIO 3 M3 DE VOLUMEN

para constancia de lo anterior , se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella ,el día 25 DE ENERO DE 2025

Firma

EDUARDO BLADIMIR GUAPUCAL
ING. AMBIENTAL Y SANITARIO
TP. 19260-393608 CAU

**SOLUCIONES CIVILES JM SAS****CONTROL SEGUIMIENTO AMBIENTAL
SG-SSS**

ANEXO

FECHA ULTIMA
ACT

2

FEBRERO -
ABRIL

CONTRATO N°

004-2024

TIPO DE CONTRATO:

OBRA:

OBJETIVO:

MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO
RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CONTRATISTA:

SOLUCIONES CIVILES J.M.S.A.S

VALOR ACTUALIZADO:

\$ 341.433.942,16

COMPONENTES	MEDIDAS DE MITIGACION	SUELO			CLASIFICACION			
		SI	NO	NO APLICA	BUENA	ACEPTABLE	DEFICIENTE	VALOR
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	Capacitación personal	X			5			5
	Separación y Clasificación	X			5			5
	Disposición final	X			5			5
	Programación de retiro	X			5,5			5,5
	Protección del suelo en manejo de sustancias peligrosas	X			5			5
	Limpieza interna y externa de la obra	X				4,5		4,5
	Almacenamiento de materiales y combustible	X			5			5
	Campamento	X			6			6
	Manejo de Vegetación	X			4,5			4,5
	Estabilidad de Taludes			X		4		4
CALIFICACIÓN		Buena :5-6 Aceptable :4-5 Deficiente:0-3			PROMEDIO			
					VALOR FINAL			

COMPONENTES	MEDIDAS DE MITIGACION	AGUA			CLASIFICACION			
		SI	NO	NO APLICA	BUENA	ACEPTABLE	DEFICIENTE	VALOR
MANEJO DE VERTIMIENTOS	Capacitación Personal	X				4,5		4,5
	Manejo Escorrentia	X			5			5
	Protección del suelo y el agua en la manipulación de sustancias peligrosas	X				4,5		4,5
	Medidas de contingencia		X		5			5
	Zona de trabajo secas	X			5			5
	Manejo de nivel freático	X				4,5		4,5
	Separación y clasificación de vertimientos	X			5			5
	Conexión a sistemas de tratamiento (manejo de aguas residuales domesticas)	X				4,5		4,5
CALIFICACIÓN		Buena :5-6 Aceptable :4-5 Deficiente:0-3			PROMEDIO			
					VALOR FINAL			

COMPONENTES	MEDIDAS DE MITIGACION	AIRE			CLASIFICACION			
		SI	NO	NO APLICA	BUENA	ACEPTABLE	DEFICIENTE	VALOR
ATMOSFERICO Y CONTROL DE RUIDO	Capacitación personal	X			5			5
	Humedecimiento de áreas de trabajo		X		5			5
	Cubrimiento de acopios de materiales	X				4,5		4,5
	Uso de mallas protectoras		X		6			6
	No exceder volúmenes del volco de los camiones			X	6			6
	Olores desagradables		X		6			6
	Aseo interno y externo de la obra	X				4,5		4,5
	Uso de equipos en buen estado	X			5			5
	Apantallamiento sonoro del área	X			5			5
	Planificación de horarios de trabajo	X			5			5
	Medidas de contingencia	X			5			5
CALIFICACIÓN		Buena :5-6 Aceptable :4-5 Deficiente:0-3			PROMEDIO			
					VALOR FINAL			



SOLUCIONES CIVILES JM SAS



CONTROL SEGUIMIENTO AMBIENTAL SG-SSS

ANEXO

FECHA ULTIMA
ACT

2

FEBRERO -
ABRIL

CONTRATO N°

004-2024

TIPO DE CONTRATO:

OBRA:

OBJETIVO:

MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO
RURAL BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CONTRATISTA:

VALOR ACTUALIZADO:

SOLUCIONES CIVILES J.M S.A.S

\$ 341.433.942,16

CAMPAMENTO, ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y COMBUSTIBLE


COMPONENTES	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CLASIFICACION			
		SI	NO	NO APLICA	BUENA	ACEPTABLE	DEFICIENTE	VALOR
CUIDADOS AMBIENTALES	Programa de manejo y almacenamiento de materiales	X			5,5			5,5
	Almacenamiento adecuado de combustible	X			5			5
	Localización y señalización en el campamento	X			5,5			5,5
	Elementos de seguridad, botiquín, camilla, extintor entre otros	X			6			6
	Obras de contención			X	6			6
	Capacitación personal	X			6			6
CALIFICACIÓN		Buena :5-6 Aceptable :4-5 Deficiente:0-3			PROMEDIO			
					VALOR FINAL			
					34			
					5,67			

COMPONENTES	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CLASIFICACION			
		SI	NO	NO APLICA	BUENA	ACEPTABLE	DEFICIENTE	VALOR
AISLAMIENTO DEL FRENTE DE TRABAJO Y SEÑALIZACION	Capacitación personal	X			5,5			5,5
	Demarcación del perímetro	X			5			5
	Zonificación de la obra	X			5,5			5,5
	Lona de cerramiento	X			6			6
	Cinta reflectiva	X			5,5			5,5
	Señales informativas y preventivas	X			5,5			5,5
	Uso de paletas			X	6			6
	Iluminación nocturna	X			5	4,5		9,5
CALIFICACIÓN		Buena :5-6 Aceptable :4-5 Deficiente:0-3			PROMEDIO			
					VALOR FINAL			
					49			
					6,13			

COMPONENTES	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CLASIFICACION			
		SI	NO	NO APLICA	BUENA	ACEPTABLE	DEFICIENTE	VALOR
AMBIENTAL LABORAL, CONVIVENCIA Y COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD	Capacitación personal	X			6			6
	Dotación de elementos de protección personal	X			6			6
	Adopción de medidas de seguridad industrial y salud ocupacional	X			6			6
	Espacio para peticiones, quejas y reclamos	X			6			6
	Programa de información a la comunidad	X			6			6
	Socializaciones	X			6			6
CALIFICACIÓN		Buena :5-6 Aceptable :4-5 Deficiente:0-3			PROMEDIO			
					VALOR FINAL			
					36			
					6			

COMPONENTES	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CLASIFICACION			
		SI	NO	NO APLICA	BUENA	ACEPTABLE	DEFICIENTE	VALOR
MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	Capacitación personal	X			6			6
	Mantenimiento Preventivo	X			6			6
	Definición de Horarios de trabajo	X			6			6
	Ficha de control de actividades	X			6			6
	Uso de equipos en buen estado, Certificados	X			6			6
	Elementos de Protección personal	X			6			6
	Extintores	X			6			6
	Medidas de contingencia	X			5,5			5,5
CALIFICACIÓN		Buena :5-6 Aceptable :4-5 Deficiente:0-3			PROMEDIO			
					VALOR FINAL			
					47,5			
					5,94			

SEGURIDAD SOCIAL



"Las mejores obras donde más se necesitan"

CERTIFICACION PAZ Y SALVO Y APORTES PARAFISCALES

La Contadora Pública **YESMITH CAROLINA ANAYA CHAPAL**, Identificada
Con Tarjeta Profesional No 271112-T, debidamente Inscrita ante la Junta
Central De Contadores.

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la
Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y Ley 828 de 2005 Artículo 1.


CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

La empresa **SOLUCIONES CIVILES JM S.A.S** identificada con NIT
900.912.227-3 con representante legal la señora **LEIDY YULIETH TEJADA**
SALDARRIAAG, identificada con cédula de ciudadanía No 1.123.207.998
expedida en Puerto Asís (Ptyo).

Ha dado cumplimiento oportuno y completo durante los últimos seis (6) meses,
con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto
del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a
Salud, Pensión y Riesgos Profesionales, y cuando ha sido del caso con los
aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA) y Caja de Compensación Familiar.

Se expide a solicitud del interesado en Puerto Asís a los veinticuatro (24) días
del mes de abril del año Dos mil Veinticinco (2025)

YESMITH CAROLINA ANAYA CHAPAL
Tarjeta Profesional No 271112-T
Contadora



"Las mejores obras donde más se necesitan"



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No: **82925220250924FC**

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **YESMITH CAROLINA ANAYA CHAPAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1061778041 de POPAYAN (CAUCA) y Tarjeta Profesional No 271112-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTÁ a los 14 días del mes de Marzo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Milena Barrios Pulido
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Yesmith Carolina Anaya Chapal
YESMITH CAROLINA ANAYA CHAPAL
T.P 271112-T
CC. 1061778041

Barrio. Las Colinas
celular 3133198734 - 3222900330
Puerto Asís Putumayo – Colombia E-mail:
solucionescivilesjm@gmail.com

2025/02/07 04:22 PM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900912227	3	SOLUCIONES CIVILES JH S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PUERTO ASIS	BARRIO EL CARMEN	PUERTO ASIS-PUTUMAYO	4227026	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-02	2025-03		E	2025/03/07			0		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO									
No.	Identificación	Nombre	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Valor
1	CC 00381853	BRANO JOSE	X						
2	CC 1115074053	CUADROS MARIO	X						
3	CC 17688257	NATI WILLMER	X						
4	CC 1123304307	PAI JUAN	X						
5	CC 1124896647	PORTILLA DANIELA	X						
6	CC 1085981125	PULSTAR YERSON	X						
Total Afiliados (6)									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900912227	3	SOLUCIONES CIVILES JH S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PUERTO ASIS	BARRIO EL CARMEN	PUERTO ASIS-PUTUMAYO	4227026	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-02	2025-03		E	2025/03/07			0		

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	\$1,070,600	\$0	\$0	\$1,070,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$425,200	\$0	\$0	\$425,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$432,800	\$0	\$0	\$432,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$212,600	\$0	\$0	\$212,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$465,900	\$0	\$0	\$465,900	
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	\$465,900	\$0	\$0	\$465,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$267,900	\$0	\$0	\$267,900	
CONFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	6	\$267,900	\$0	\$0	\$267,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	\$267,900	\$0	\$0	\$267,900	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$53,200	\$0	\$0	\$53,200	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	\$159,600	\$0	\$0	\$159,600	
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$55,100	\$0	\$0	\$55,100	
TOTAL				6	\$2,072,300	\$0	\$0	\$2,072,300	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 900912227	3	SOLUCIONES CIVILES IM S.A.S	B - MENOS DE 200 CONTRATANTES	PUERTO ASIS	BARRIO EL CARMEN	PUERTO ASIS-PUTUMAYO	4227026
							Exonerado SENAE e ICBF
							SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla		Limite	Pago	Banco	Valor
2025-03	2025-04				E				
						2025/04/07			0

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Inscripción	Declaración	Actuación	Actuación	Código	Días	IBIC	Aporte	Código	Días	IBIC	Aporte	Código	Días	IBIC	Tarifa	Aporte	Días	IBIC	Aporte	Exonerado SINIA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PUERTO ASIS (6 Afiliados)																								
Centro de Trabajo: RIESGO V (6 Afiliados)																								
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (6 Afiliados)																								
1	CC 80381853	BAÑO JOSE					21020	21	\$996,450	\$159,500	ES5C18	21	\$996,450	\$39,900	CC763	21	\$996,450	6.600%	\$69,400	21	\$996,450	\$69,400	\$0	\$1,852,200
2	CC 1115074653	GUINDOS MARIO					25-14	21	\$996,450	\$159,500	ES5C18	21	\$996,450	\$39,900	CC763	21	\$996,450	6.600%	\$69,400	21	\$996,450	\$69,400	\$0	\$1,852,200
3	CC 17688257	WATI WILVER					21030	21	\$996,450	\$159,500	ES5D11	21	\$996,450	\$39,900	CC763	21	\$996,450	6.600%	\$69,400	21	\$996,450	\$69,400	\$0	\$308,700
4	CC 1123304607	PAL JUAN					21030	21	\$996,450	\$159,500	ES5C18	21	\$996,450	\$39,900	CC763	21	\$996,450	6.600%	\$69,400	21	\$996,450	\$69,400	\$0	\$308,700
5	CC 1124859465	PORTILLA DAIRELA	X	X			21030	21	\$996,450	\$159,500	ES5D31	21	\$996,450	\$39,900	CC763	21	\$996,450	6.600%	\$69,400	21	\$996,450	\$69,400	\$0	\$308,700
6	CC 1080981125	PULISTAR YEDSON					25-14	21	\$996,450	\$159,500	ES5C18	21	\$996,450	\$39,900	CC763	21	\$996,450	6.600%	\$69,400	21	\$996,450	\$69,400	\$0	\$308,700
Total Afiliados (6)									\$997,000	\$239,400			\$5,978,700	\$239,400			\$5,978,700		\$416,400		\$0	\$0	\$1,852,200	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900912227	3	SOLUCIONES CIVILES JIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PUERTO ASIS	BARRIO EL CARMEN	PUERTO ASIS-PUTUMAYO	4227026	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla		Limite		Banco	Valor
2025-03	2025-04					E			
							2025/04/07		0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	\$957,000	\$0	\$0	\$957,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$319,000	\$0	\$0	\$319,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$478,500	\$0	\$0	\$478,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$159,500	\$0	\$0	\$159,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$416,400	\$0	\$0	\$416,400
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	\$416,400	\$0	\$0	\$416,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$239,400	\$0	\$0	\$239,400
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	6	\$239,400	\$0	\$0	\$239,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	\$239,400	\$0	\$0	\$239,400
CAPITAL SALUD	EPS34	900,298,372	9	1	\$39,900	\$0	\$0	\$39,900
ENESSAMAR	ESSC18	901,021,585	8	3	\$119,700	\$0	\$0	\$119,700
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$39,900	\$0	\$0	\$39,900
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$39,900	\$0	\$0	\$39,900
TOTAL				6	\$1,852,200	\$0	\$0	\$1,852,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEHA e ICBF	
NIT 900912227	3	SOLUCIONES CIVILES JM S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PUERTO ASIS	BARRIO EL CARMEN	PUERTO ASIS-PUTUMAYO	4227026	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	9481490818	E		2025/02/07			0	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR		230301	800,224,808	8	2	\$455,600	\$0	\$0	\$455,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	2	\$106,600	\$0	\$0	\$106,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COMFAMILIAR PUTUMAYO		CCF63	891,200,337	8	2	\$109,000	\$0	\$0	\$109,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
NUEVA E.P.S.		EP5037	900,156,264	2	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
TOTAL					2	\$785,200	\$0	\$0	\$785,200

FIC



Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social SOLUCIONES CIVILES JM S.A.S identificado con el NIT 900912227, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

Nº Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
CTO N.004-2024	MJNTO DE A,E CER BNVISTA PTO A	PUERTO ASIS	853,600	2025-03	23-ABR-2025	129929468
		Total	853,600			

Expedido por el SENA, a los veinticinco (25) días del mes de Abril de 2025

"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2025-04-25

Generado por : NEIRA MAYELI BURBANO INSUASTY

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor ingrese a la página web <https://certificadoempresarios.sena.edu.co/> enlace CONSULTAR CODIGO CERTIFICADO y digite:

el código de verificación: 322827959 y el Número de Certificado: 382438

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE DE GERENCIA**

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido
máximo hasta el quinto día de haberse generado, en
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y
generar un nuevo cupón

REFERENCIA		
No. 129929468		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
22	04	2025
FECHA VENCIMIENTO		
27	04	2025

Nombre Pagador SOLUCIONES CIVILES JM SAS

NIT o C.C. 900912227

Dirección CL 10 26 42

Teléfono +57,313

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-2-07-1-02-1-04-43 Putumayo		
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS COLOMBIANOS PESOS.	SUBTOTAL	\$ 853,600.00
	IVA	
	TOTAL FACTURA ➡	\$ 853,600.00

Observaciones

Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:

La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.

Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.

Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).

Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.

Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co

Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co



(415)7707012100010(8020)7702936(3900)000000853600(96)20250427

Bancolombia

CONVENIO No. 29232

REFERENCIA No. 129929468

Ciudad	D	M	A	NIT	900912227	Telefono
Nombre del Pagador / Cliente: SOLUCIONES CIVILES JM						
Bco	CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR		
Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes.				CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO	
					CHEQUE	
					TOTAL	

AREA PARA SELLO



9 90 230801 EMYCO

ABR 23 2025 11:30:03 REMDES 9,90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

CENTRO PUERTO ASIS I P
CLL 11 19 01 CENTRO PUE

C. UNICO: 3007025647 TER: A0062680

RECIBO: 274516

RRN: 433447

APRO: 324625

RECAUDO

CONVENIO: 29232

SERVICIO NACIONAL DE

REF: 7702936

VALOR

\$ 853.600

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** COMERCIO ***

FACTURA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

6a8abb6cd0689e182f8361f18420d4e7ddcaba9a1bd7351d8c092e2a4b669a4ebbcea16ec58be56a420f2af14d23da7f

Número de Factura: FEG-82

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 24/04/2025

Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Fecha de Vencimiento: 02/05/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SOLUCIONES CIVILES J.M.S.A.S

Nombre Comercial: SOLUCIONES CIVILES J.M.S.A.S

Nit del Emisor: 900912227

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Putumayo

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Puerto Asís

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CR 34 10 98 BRR COLINAS FRENTE ACCION
CONTRA EL HAMBRE

Actividad Económica: 4290

Teléfono / Móvil: 3133198734

Correo: solucionescivilesjm@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 846003704

Departamento: Putumayo

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Puerto Asís

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: Calle 000

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 0000000

Correo: solucionescivilesjm@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001	COSTO DIRECTO	ZZ	1,00	\$ 244.373.290,49	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 244.373.290,49
2	002	ADMINISTRACION	ZZ	1,00	\$ 70.868.254,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 70.868.254,24
3	003	IMPREVISTOS	ZZ	1,00	\$ 2.443.732,91	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 2.443.732,91
4	004	UTILIDADES	ZZ	1,00	\$ 12.218.664,52	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 12.218.664,52
5	005	PMA	ZZ	1,00	\$ 11.530.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 11.530.000,00

Datos Totales



Documento generado el:
24/04/2025 20:06:00
Documento validado por la
DIAN:
24/04/2025 20:06:02
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	341433942.16
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	341433942.16
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	341433942.16
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 341433942.16

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	341.433.942,16
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	341.433.942,16
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	341.433.942,16
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 341.433.942,16

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764088186023 Rango desde: 79 Rango hasta: 150 Vigencia: 2026-02-02

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764088186023



(415)7707212489984(8020) 0018764088186023

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

9 0 0 9 1 2 2 2 7 | 3

11. Razón social

SOLUCIONES CIVILES J.M S.A.S

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Puerto Asís

Cód.

4 6

24. Dirección

CR 34 10 98 BRR COLINAS FRENTE ACCION CONTRA EL HAMBRE

25. País

Colombia

26. Departamento

Putumayo

27. Municipio

Puerto Asís

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres TEJADA SALDARRIAGA LEYDY YULIETH

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 1123207998 1004. DV 2

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización SOLUCIONES CIVILES J.M S.A.S

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

2 0 2 5-0 2-0 2/1 0:0 5:4 4

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764088186023



(415)7707212489984(8020) 001876408818602 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV
9 0 0 9 1 2 2 2 7 3

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

SOLUCIONES CIVILES J.M S.A.S

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento	SOLUCIONES CIVILES J.M S.A.S CR 34 10 98 BRR COLINAS FRENTE ACCION CONTRA EL HAMBRE							
30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEG	79	150	12	HABILITACIÓN	2	
29. Establecimiento								
30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
29. Establecimiento								
30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
29. Establecimiento								
30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
29. Establecimiento								
30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
29. Establecimiento								
30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
29. Establecimiento								
30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
29. Establecimiento								
30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
29. Establecimiento								
30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
29. Establecimiento								
30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
29. Establecimiento								
30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
29. Establecimiento								
30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 1.123.207.998

TEJADA Saldarriaga

APELLIDOS

LEYDY YULIETH

NOMBRES

Leydy Tejada



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 09-FEB-1989

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58

ESTATURA

O+

G. B. RH

F

SEXO

25-MAY-2007 PUERTO ASIS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS SALDARRIAGA



A-6400200-00864511-F 1123207998 20170216

0053791895A.1

H184296633

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141157360355



(415)7707212489984(8020) 000014115736035 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 9 1 2 2 2 7 3

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Puerto Asís

14. Buzón electrónico

4 6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

SOLUCIONES CIVILES J.M S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

1 6 9

Putumayo

8 6

40. Ciudad/Municipio

Puerto Asís

5 6 8

41. Dirección principal

CR 34 10 98 BRR COLINAS FRENTE ACCION CONTRA EL HAMBRE

42. Correo electrónico

solucionescivilesjm@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 3 3 1 9 8 7 3 4

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

4 2 9 0

2 0 1 5 0 6 1 9

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

4 6 6 3

2 0 1 5 0 6 1 9

Otras actividades

50. Código

1 2

4 7 1 1 4 7 6 1

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de rent

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

52- Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

2

1

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre TEJADA SILDARRIAGA LEYDY YULIETH

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141157360355



(415)7707212489984(8020) 000014115736035 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 9 1 2 2 2 7 3

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Puerto Asís

14. Buzón electrónico

4 6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 4	0 1	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	1	0 0 2	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	2 0 1 5 0 6 1 9	2 0 1 9 1 0 0 5	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 5 1 1 2 3	2 0 1 9 1 0 1 0	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	5 6 8 7 6	5 6 8 7 6	
78. Departamento	8 6	8 6	
79. Ciudad/Municipio	4 6	4 6	
Vigencia			
80. Desde	2 0 1 5 0 6 1 9		
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 0 1 0 1		
2	4 9	2 0 2 4 0 7 0 2		
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

Página 3 de 3 Hoja 3

4. Número de formulario

141157360355



(415)7707212489984(8020) 000014115736035 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 9 1 2 2 2 7 3

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Puerto Asís

14. Buzón electrónico

Representación

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN	1 8		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 2 3 2 0 7 9 9 8		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
TEJADA	SALDARRIAGA	LEYDY	YULIETH
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	



Net Cash

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **SOLUCIONES CIVILES J M S.A.S**, identificado(a) con NIT número **900.912.227-3** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA **CUENTA CORRIENTE** No. **0726019698** abierta el **24 de junio del 2020**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **10 de noviembre del 2024**.

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos: **0726019698**

Cuenta de 16 dígitos: **0726000100019698**

Cuenta de 20 dígitos: **00130726000100019698**

Firma autorizada
BBVA Colombia
