



ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO

- Programación: se presenta cuadro de actividades para la continuación de ejecuciones y corresponde a avances del segundo corte.

"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISEÑO E INSTALACIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LA CASA DE LA PAR"																																							
Task Mode	Nombre de tarea	Start	Finish	10 Dec '23							17 Dec '23							24 Dec '23							31 Dec '23							7 Jan '24							
				S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	
1	 PROYECTO TUNUELITO	lun. 11/12/23 8:00 a. m.	sáb. 20/04/24 7:00 p. m.																																				
2	 CASA DE LA CULTURA	lun. 11/12/23 8:00 a. m.	jue. 18/04/24 7:00 p. m.																																				
3	 Revisión y diagnóstico de todo el componente eléctrico de la casa de la cultura de Tunjuelito	lun. 11/12/23 8:00 a. m.	mié. 13/03/24 8:00 a. m.																																				
4	 Reconexión o instalación de circuitos inhabilitados	jue. 21/03/24 8:00 a. m.	dom. 14/04/24 8:00 a. m.																																				
5	 Suministro e instalación de luces tipo ufo 100W	vie. 23/02/24 8:00 a. m.	jue. 11/04/24 8:00 a. m.																																				
6	 Suministro e instalación de luces tipo ufo 50W	jue. 29/02/24 3:00 p. m.	mié. 17/04/24 3:00 p. m.																																				
7	 Suministro e instalación de panel led redondo	dom. 24/03/24 3:00 p. m.	sáb. 13/04/24 3:00 p. m.																																				
8	 Suministro e instalación de toma eléctrica con polo a tierra	sáb. 30/03/24 3:00 p. m.	vie. 19/04/24 3:00 p. m.																																				
9	 Suministro e instalación de interruptor de pared para luminaria	sáb. 30/03/24 3:00 p. m.	vie. 19/04/24 3:00 p. m.																																				
10	 Suministro e instalación sensor de movimiento infrarrojo ajustable	dom. 14/04/24 8:00 a. m.	dom. 14/04/24 5:00 p. m.																																				
11	 Suministro e instalación de cable awg calibre 12 color blanco	dom. 31/03/24 10:00 a. m.	vie. 12/04/24 10:00 a. m.																																				
12	 Suministro e instalación de cable awg calibre 12 color negro	dom. 31/03/24 10:00 a. m.	vie. 12/04/24 10:00 a. m.																																				
13	 Suministro e instalación de cable awg calibre 12 color verde	dom. 31/03/24 10:00 a. m.	vie. 12/04/24 10:00 a. m.																																				
14	 Tubo led 120 cm 18W	vie. 12/04/24 12:00 p. m.	mié. 24/04/24 12:00 p. m.																																				
15	 Suministro e instalación lampara led de sobreponer tamaño 60 cm 24W	sáb. 6/04/24 5:00 p. m.	vie. 12/04/24 12:00 p. m.																																				
16	 Suministro e instalación de luminaria led 36W	sáb. 6/04/24 5:00 p. m.	vie. 12/04/24 12:00 p. m.																																				

Página 1

ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO

- Se presenta cuadro de actividades para la continuación de ejecuciones y corresponde a avances del segundo corte.

"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISEÑO E INSTALACIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LA CASA DE LA PAR												
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Predecesoras	10 dic '23						
						S	D	L	M	X	J	V
14		Tubo led 120 cm 18W	vie 8/03/24	mié 20/03/24	8FC-35%							
15		Suministro e instalación lampara led de sobreponer tamaño 60 cm 24W	vie 8/03/24	jue 14/03/24	12FC-45%							
16		Suministro e instalación de luminaria led 36W	vie 8/03/24	jue 14/03/24	12FC-45%							
17		Suministro e instalación de reflectores 100W para exteriores luz blanca	jue 14/03/24	dom 17/03/24	12							
18		Suministro e instalación reflectores led 50W luz blanca	lun 11/12/23	lun 11/12/23								
19		Abrazadera para tubería	mar 5/03/24	dom 17/03/24	12CC-3 días							
20		Tubería eléctrica EMT	mar 5/03/24	dom 17/03/24	19CC							
21		Caja inspección eléctrica galvanizada	mar 5/03/24	dom 17/03/24	20CC							
22		Suministro e instalación de reflector RGB 100W para exteriores	jue 14/03/24	dom 17/03/24	12							
23		Suministro e instalación de reflector RGB 50W	dom 17/03/24	mié 20/03/24	22							
24		Sensor de humo	dom 17/03/24	mié 20/03/24								
25		Sirena con luz estroboscópica	mié 20/03/24	vie 22/03/24	24							
26		Panel Alarma 16 zonas	mié 20/03/24	sáb 23/03/24	24							
27		Fuente de voltaje centralizada	sáb 23/03/24	dom 24/03/24	26							
28		Estación manual	sáb 23/03/24	mar 26/03/24	26							



- Se presenta cuadro de actividades para la continuación de ejecuciones y corresponde a avances del segundo corte.





ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO

- Se presenta cuadro de actividades para la continuación de ejecuciones y corresponde a avances del segundo corte.

*CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISEÑO E INSTALACIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LA CASA DE LA PAR																																								
Task Mode	Nombre de tarea	Start	Finish	10 Dec '23							17 Dec '23							24 Dec '23							31 Dec '23							7 Jan '24							1	
				S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S		
17	➡	Suministro e instalación de reflectores 100W para exteriores luz blanca	jue. 4/04/24 10:00 a. m.	dom. 7/04/24 12:00 p. m.																																				
18	➡	Suministro e instalación reflectores led 50W luz blanca	jue. 4/04/24 10:00 a. m.	dom. 7/04/24 12:00 p. m.																																				
19	➡	Abrazadera para tubería	sáb. 6/04/24 5:00 p. m.	jue. 18/04/24 4:50 p. m.																																				
20	➡	Tubería eléctrica EMT	sáb. 6/04/24 5:00 p. m.	jue. 18/04/24 4:50 p. m.																																				
21	➡	Caja inspección eléctrica galvanizada	sáb. 6/04/24 5:00 p. m.	jue. 18/04/24 5:00 p. m.																																				
22	➡	Suministro e instalación de reflector RGB 100W para exteriores	vie. 12/04/24 10:00 a. m.	lun. 15/04/24 12:00 p. m.																																				
23	➡	Suministro e instalación de reflector RGB 50W	jue. 4/04/24 1:00 p. m.	dom. 7/04/24 3:00 p. m.																																				
24	➡	Sensor de humo	lun. 15/04/24 4:00 p. m.	jue. 18/04/24 4:10 p. m.																																				
25	➡	Sirena con luz estroboscópica	jue. 18/04/24 4:00 p. m.	sáb. 20/04/24 4:00 p. m.																																				
26	➡	Panel Alarma 16 zonas	jue. 18/04/24 4:00 p. m.	dom. 21/04/24 4:10 p. m.																																				
27	➡	Fuente de voltaje centralizada	dom. 21/04/24 4:00 p. m.	lun. 22/04/24 4:10 p. m.																																				
28	➡	Estación manual	dom. 21/04/24 4:00 p. m.	mié. 24/04/24 4:00 p. m.																																				
29	➡	instalación y puesta en marcha del sistema para detección de incendios - Alarmas de emergencia	dom. 21/04/24 1:00 p. m.	mié. 24/04/24 3:00 p. m.																																				
30	➡	Generación de planos récord de acuerdo a las modificaciones y trabajos a realizados.	mié. 24/04/24 3:00 p. m.	vie. 26/04/24 10:00 a. m.																																				
31	➡	CASA DE LA PARTICIPACION VILLA XIMENA	jue. 21/12/23 8:00 a. m.	mié. 24/04/24 8:00 a. m.																																				
32	➡	Diseño y proyección de rutas para cableado UTP y puesta de toma eléctricas adicionales para la casa de la participación de Tunjuelito	jue. 21/12/23 8:00 a. m.	mié. 10/04/24 8:00 a. m.																																				
33	➡	Adecuacion general de espacio para rack de 18 RU e instalacion de equipos de red para el rack	mar. 2/04/24 8:00 a. m.	mié. 17/04/24 10:00 a. m.																																				
34	➡	Switch Administrable 36 puertos	mié. 3/04/24 1:00 p. m.	mar. 23/04/24 12:00 p. m.																																				

Página 4




- Se presenta cuadro de actividades para la continuación de ejecuciones y corresponde a avances del segundo corte.

Página 5



ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO

- Se presenta cuadro de actividades para la continuación de ejecuciones y corresponde a avances del segundo corte.

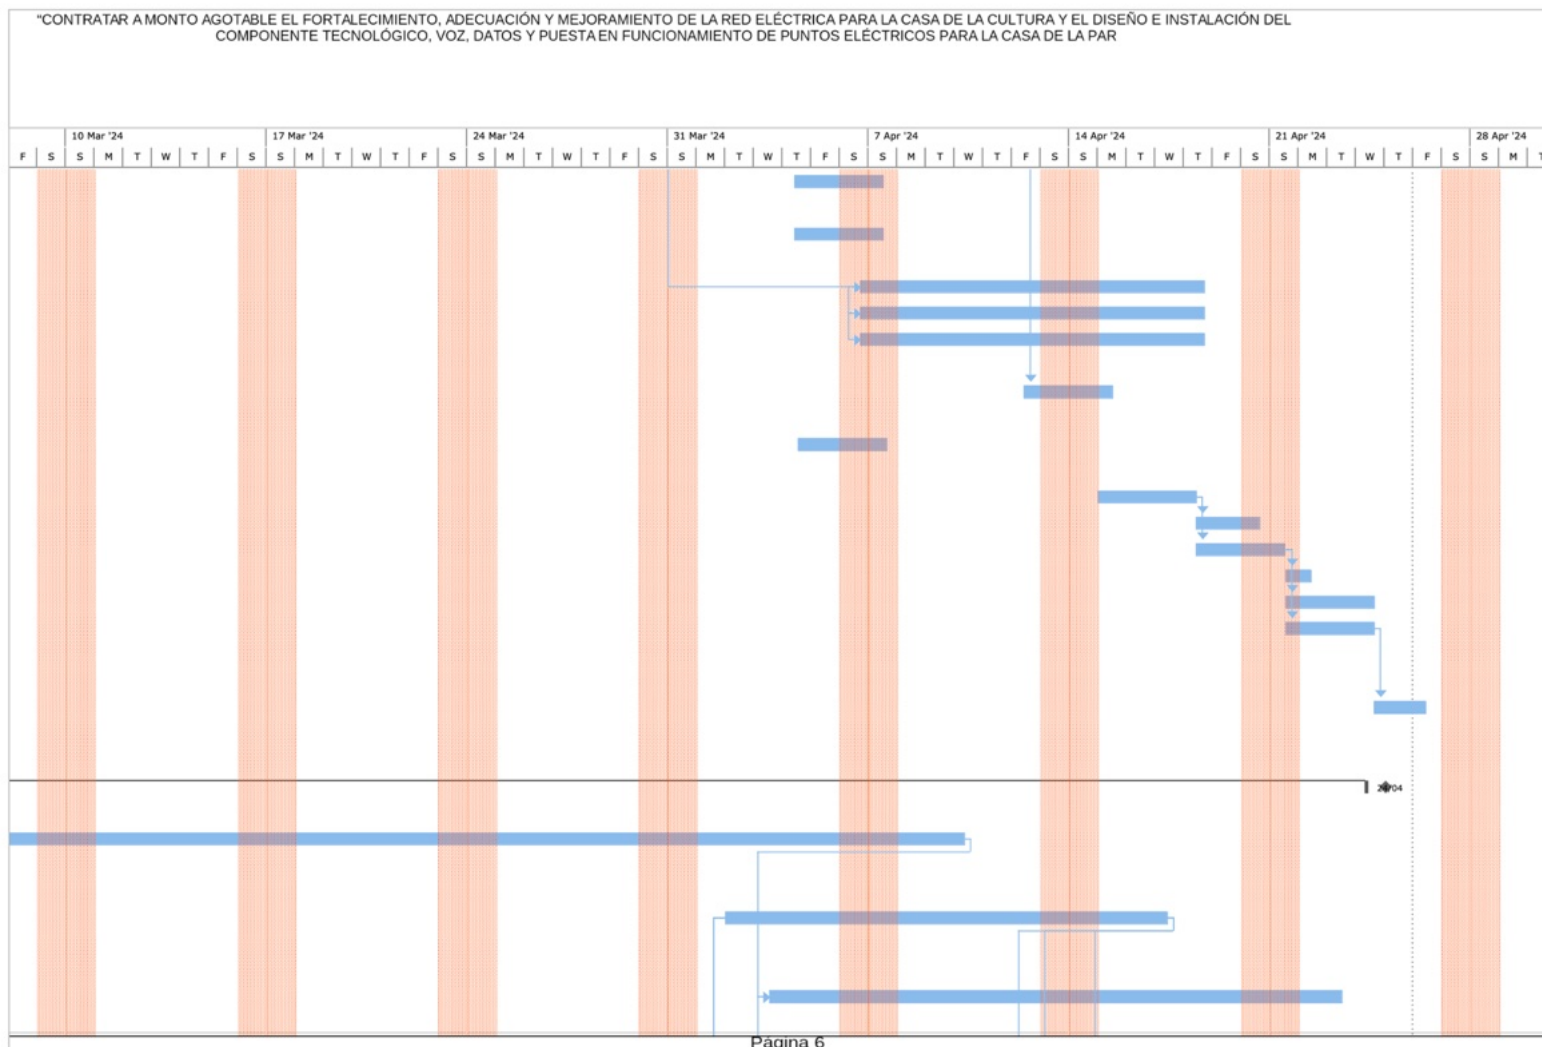



ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO

Se presenta cuadro de actividades para la continuación de ejecuciones y corresponde a avances del segundo corte.

"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISEÑO E INSTALACIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LA CASA DE LA PAR																																							
Task Mode	Nombre de tarea	Start	Finish	10 Dec '23							17 Dec '23							24 Dec '23							31 Dec '23							7 Jan '24							
				S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	
35	 Panel de conexión 36 puertos	mié. 3/04/24 1:00 a. m.	mar. 23/04/24 1:00 a. m.																																				
36	 Suministros e instalacion Canaleta metálica con división	mar. 2/04/24 8:00 a. m.	dom. 14/04/24 8:00 a. m.																																				
37	 Cable flutp cat 6a	sáb. 6/04/24 8:00 a. m.	lun. 15/04/24 8:00 a. m.																																				
38	 Jack rj45 cat 6a	mar. 9/04/24 10:00 a. m.	mié. 17/04/24 10:00 a. m.																																				
39	 Patch cord cat 6a de red flutp certificado de 1.5m	vie. 12/04/24 4:12 p. m.	mar. 16/04/24 7:12 a. m.																																				
40	 Faceplate modular doble	jue. 11/04/24 12:00 a. m.	mié. 17/04/24 12:00 a. m.																																				
41	 Certificación de puntos de red	lun. 15/04/24 12:00 a. m.	mar. 16/04/24 12:00 a. m.																																				
42	 Access Point	vie. 12/04/24 12:34 a. m.	mar. 16/04/24 12:34 a. m.																																				
43	 Bandeja para Rack	vie. 5/04/24 10:00 a. m.	mié. 17/04/24 12:00 a. m.																																				
44	 Suministro e instalacion de Tablero eléctrico	lun. 15/04/24 7:12 a. m.	mar. 16/04/24 2:12 p. m.																																				
45	 Suministro e instalacion de Tablero eléctrico para circuito regulado	sáb. 13/04/24 1:00 p. m.	lun. 15/04/24 8:00 a. m.																																				
46	 Suministro e instalacion Breaker para circuito	lun. 15/04/24 8:00 a. m.	lun. 15/04/24 5:00 p. m.																																				
47	 Suministro e instalacion UPS	sáb. 13/04/24 10:00 a. m.	mar. 16/04/24 12:00 a. m.																																				
48	 Puesta en funcionamiento del sistema de video vigilancia	sáb. 13/04/24 2:36 p. m.	mar. 16/04/24 7:36 a. m.																																				
49	 Suministro e instalacion PDU para rack	jue. 11/04/24 3:00 p. m.	mié. 17/04/24 10:00 a. m.																																				
50	 Suministro e instalación de cable awg calibre 12 color rojo	lun. 8/04/24 8:00 a. m.	mié. 24/04/24 8:00 a. m.																																				

Página 7



Se presenta cuadro de actividades para la continuación de ejecuciones y corresponde a avances del segundo corte.

GCO-GCI-F110
Versión: 06
Vigencia: 17 de julio de 2019
Página 12 de 63



ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO

Se presenta cuadro de actividades para la continuación de ejecuciones y corresponde a avances del segundo corte.

