



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CORTE DE OBRA Nº 2

CONTRATISTA

INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S
ADECUACIONES CUARTO DE RESIDUOS EDIFICIO CALLE 72

CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA Nº 173 DE 2019



CUMPLIDO CONTRATO CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 173 DE 2019
CONTRATO DE OBRA

CORTE DE OBRA N° 02
Corte Final

El suscrito Arquitecto Juan Carlos Alvarez Orjuela, Técnico de la División de Estudios y Diseños de la Unidad de Infraestructura Física en apoyo a la Unidad Administrativa, como supervisor del contrato N°173 de 2019

Hace constar que la firma INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S, identificado con Nit. N° 900.960.149-1, ha cumplido con los compromisos y responsabilidades contemplados en el contrato Carta de Aceptación de la oferta No. 173 del 2019 suscrito con La Nación Consejo Superior de la Judicatura, cuyo objeto es *“Realizar las obras civiles para la construcción del cuarto de residuos y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.”*, teniendo como base las actividades plasmadas según Acta Mensual de corte de obra N° 2, el cual se anexa a la presente. Este Corte de obra corresponde al periodo entre el 18 de diciembre y el 31 de diciembre de 2019.

El presente cumplido se expide a los 31 de julio de 2020, como soporte de la segunda (2) acta parcial del contrato anteriormente mencionado. Teniendo en cuenta que este corte incluye el pago tanto en el componente de OBRA CIVIL como MOBILIARIO se anexan dos facturas. La primera por el componente de OBRA con número 126 del 03 de julio de 2020 por valor de \$29'446.874,08 y una segunda factura por el componente MOBILIARIO con número 127 del 03 de julio de 2020 por valor de \$5'398.518,30.

Este corte se realiza por el componente de OBRA CIVIL y MOBILIARIO. Las actas de entrada al almacén del mobiliario suministrado e instalado se anexan en el presente corte de obra.

El suscrito mediante este cumplido certifica que se cumplieron con todas las actividades descritas dentro del contrato Carta de aceptación de la oferta N° 173 de 2019 por lo que se autoriza a cancelar el saldo final del contrato de obra con un saldo final de \$ 34'845.392,38.

Cabe resaltar que la fecha de presentación de este corte se extendió por más de 6 meses debido a mal diligenciamiento y falta de documentación por parte del contratista de obra, periodo en el cual se corrigieron diferentes formatos y documentación en aproximadamente 7 oportunidades, por parte del supervisor.

JUAN CARLOS ALVAREZ O.

Técnico - División de Diseño

Unidad de Infraestructura Física en apoyo a la Unidad Administrativa
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Supervisor del Contrato 173 de 2019

NIVEL CENTRAL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
NIT: 800.093.816,3



ENTRADA DE PRODUCTOS -DETALLADO-
De AGOSTO a AGOSTO de 2020

DOCUMENTO	CONT 173	FECHA DOC.	18/08/2020	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA
NIT/ NOMBRE	900960149,1 - INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S.			18/08/2020	0	ENTRADAS (RECEPCION DE COMPRAS)	745
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	BODEGA	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL		
218019105	LOCKER METALICO DE 2 MTS. 16 PUESTOS	UND B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	1,00	963.945,22	963.945,22		
191001028	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPAÑOS	UND B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	2,00	380.800,00	761.600,00		
218015130	ESCRITORIO RECTO DE 1,50 X 0,80	UND B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	1,00	531.373,08	531.373,08		
191001027	ESTANTE METALICO DE 6 ENTREPAÑOS	UND B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	3,00	380.800,00	1.142.400,00		
218019004	LOCKER METALICO CON COMPARTIMENTOS	UND B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	1,00	785.400,00	785.400,00		
218015047	PUESTO DE TRABAJO RECTO DE 1,20 X 0,60 CON	UND B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	2,00	606.900,00	1.213.800,00		

OBSERVACIONES:

CONTRATO 173 DE 2019 INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S. "REALIZAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DEL CUARTO DE RESIDUOS Y ADECUACIONES EN EL SOTANO 2 EN EL EDIFICIO DE LA CALLE 72" SEGÚN OFICIO DEAJADM20-844 AVG

TOTALES:

5.398.518,30

Bienes y suministro

Apróbo



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física



CONTRATO N°	173 DE 2019
CONTRATISTA DE OBRA	INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S
NIT	900.960.149-1
VALOR CONTRATO INICIAL	\$59.909.624
VALOR ADICIÓN N° 1	\$15.940.950
VALOR TOTAL FINAL	\$75.850.574
LUGAR DE EJECUCIÓN	Edificio calle 72 N° 7-96

ACTA DE ENTREGA MOBILIARIO DE CONTRATISTA A LA ENTIDAD

Objeto: Realizar las obras civiles para la construcción del cuarto de residuos y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96												
ITEM	DESCRIPCION	UNIDA D	SÓTANO N° 2		SÓTANO N° 1		CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO• antes de IVA	Valor IVA	VALOR TOTAL con IVA	NOMBRE SERVIDOR JUDICIAL PARA CARGAR EL ELEMENTO EN INVENTARIO	
			ÁREA MANTENIMIENTO	ÁREA CONTRATISTA ASEO	ÁREA SERVICIO	CANTIDAD DE ELEMENTOS					NOMBRE	NÚMERO DE CÉDULA
2.1	Suministro e instalación de puesto de trabajo RECTO de 1.20 m x 0,60m x 0,75m de altura, la única superficie será de 1,20m de largo x 0,60m de ancho. La superficie será en madera tipo táblex de 30 mm (norma ANSINEMA LD3-2005), enchapado por la parte superior en laminado de alta presión Fórmica (F8), en la parte inferior llevará Balance-Backer (F8). Perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor. Color similar a la superficie de trabajo. Tendrá 2 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies según diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 5 rodachinas (antivuelco) con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un oficio en la superficie de 8 cm. de diámetro.	UN	1	1		2,00	\$ 510.000	\$ 96.900,00	\$ 606.900,00	1,00	José Guillermo Herrera Aldana	80.262.662
2.2	ESTANTE FIJO: Suministro e instalacion de estanteria fija fabricada en lamina Cold Rolled compuesta por 6 entrepaños con refuerzos inferiores en altura mas piso y techo de calibre 20 reforzados, estructura mediante 4 paralelos calibre 14 con sistema uña. Dimensiones 0,90m frente x 0,40m fondo. H=2,10m Terminado en pintura electrostática tono a elegir.	UN		3		3,00	\$ 320.000	\$ 60.800,00	\$ 380.800,00	3,00	Fidel Antonio Gutiérrez Gutiérrez	11.428.440
2.3	ESCRITORIO RECTO DE 1.50 X 0.80 SIN CAJONERA: La superficie serán en madera tipo táblex de 30 mm (norma ANSINEMA LD3-2005), enchapado por la parte superior en laminado de alta presión Fórmica (F8), en la parte inferior llevará Balance-Backer (F8). Perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor. color similar a la superficie de trabajo. Tendrá 2 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies según diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. Los costados se conectarán por medio de vigas metálicas en todo el perímetro de la superficie reforzado por una viga en la mitad, para su estabilidad. Adicionalmente se requiere 1 pasa cables de 8 cm. de diámetro.	UN	1			1,00	\$ 446.532	\$ 84.841,08	\$ 531.373,08	1,00	José Guillermo Herrera Aldana	80.262.662
2.4	Suministro y puesta en sitio de LOCKER METÁLICO de 200cm de altura x 120cm de largo x 0,30cm de fondo, Terminación en pintura electrostática con 16 puestos, cada uno llevará manija plástica, portacandado, celosía de ventilación.	UN		1		1,00	\$ 810.038	\$ 153.907,22	\$ 963.945,22	1,00	Fidel Antonio Gutiérrez Gutiérrez	11.428.440
N.P - 3.1	Suministro e instalacion de locker metálico de 4 puestos Terminación en pintura electrostática medida aproximada de 1,80m x 0,8m x 0,30m	UN			1	1,00	\$ 660.000	\$ 125.400,00	\$ 785.400,00	1,00	Diana Jahel Buitrago Garavito	52.910.035
N.P - 3.5	ESTANTE FIJO: Suministro e instalación de estanteria fija fabricada en lamina Cold Rolled compuesta por 5 entrepaños con refuerzos inferiores en altura más piso y techo de calibre 20 reforzados, estructura mediante 4 paralelos calibre 14 con sistema uña. Dimensiones 0,90m frente x 0,40m fondo. H=2,10m Terminado en pintura electrostática tono a elegir.	UN	2			2,00	\$ 320.000	\$ 60.800,00	\$ 380.800,00	2,00	José Guillermo Herrera Aldana	80.262.662

JUAN MANUEL NOVOA TOBÓN
Representante Legal
INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S
Contratista de obra contrato 173 de 2019

Arq. JUAN CARLOS ALVAREZ ORJUELA
Unidad de Infraestructura Física en apoyo a la Unidad Administrativa
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Supervisor contrato 173 de 2019

NOTA El mobiliario adquirido no tendrá un aumento adicional, teniendo en cuenta que este contrato no conto con interventoria.



INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S

NIT: 900.960.149-1 Régimen Común
No somos grandes contribuyentes

Abstenerse de aplicar retención en la fuente
nos acogemos a los beneficios
Numeral 1 Art. 7 ley de la ley 1429/2010

Cra. 32#8-76 Sur Bogotá Colombia
Tels: 3583967 - 3183696612
www.intecpys.com - intecpys@gmail.com

FACTURA DE VENTA

No. 126

Resolución Dian No. 18762009133489
Fecha: 2018/07/11
Actividad Económica No. 3314/4321/4330
Numeración Autorizada
del 89 al 2000

CLIENTE : NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

NIT / C.C. : 800.093.816-3

DIRECCIÓN Calle 72 No. 7-96

FECHA FACTURA: 03 de Julio de 2020

CIUDAD : Bogota D.C

FORMA DE PAGO: Pagos parciales

CONCEPTO: Aceptacion de la oferta No. 173 de 2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	De acuerdo a cantidades ejecutadas, revisadas y aprobadas en el Acta Corte mensual No.2 (Final) Adjunto a la presente Factura (RUBRO OBRA)	UND	1	23.379.812,69	23.379.812,69
				Administracion 17%	3.974.568,16
				Imprevistos 3%	701.394,38
				Utilidad 5%	1.168.990,63
				Iva 19%	222.108,22
				VALOR TOTAL	29.446.874,08
Son: Veintinueve millones cuatrocientos cuarenta y seis mil ochocientos setenta y cuatro mil pesos ocho centavos m/cte				SUBTOTAL	
Observaciones: Hacer caso omiso a los beneficios del Numeral 1 Art. 7 de la ley 1429/201				RTE. FUENTE	
 INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S Nit. 900.960.149-1				I.V.A	
				RTE. ICA	
				TOTAL	
RECIBÍ DE CONFORMIDAD Nombre y Cédula					



INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S

NIT: 900.960.149-1 Régimen Común

No somos grandes contribuyentes

Abstenerse de aplicar retención en la fuente
nos acogemos a los beneficios
Numeral 1 Art. 7 ley de la ley 1429/2010

Cra. 32#8-76 Sur Bogotá Colombia
Tels: 3583967 - 3183696612
www.intecpys.com - intecpys@gmail.com

FACTURA DE VENTA

No. 127

Resolución Dian No. 18762009133489
Fecha: 2018/07/11
Actividad Económica No. 3314/4321/4330
Numeración Autorizada
del 89 al 2000

CLIENTE : NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

NIT / C.C. : 800.093.816-3

DIRECCIÓN Calle 72 No. 7-96

FECHA FACTURA: 03 de Julio de 2020

CIUDAD : Bogota D.C

FORMA DE PAGO: Pagos parciales

CONCEPTO: Aceptacion de la oferta No. 173 de 2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	De acuerdo a cantidades ejecutadas, revisadas y aprobadas en el Acta Corte mensual No.2 (Final) Adjunto a la presente Factura (RUBRO MOBILIARIO)	UND	1	4.536.570,00	4.536.570,00
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.1	puesto de trabajo RECTO de 1.20 m x 0,60m x 0,75m de altura	UN	2,00	\$ 510.000	\$ 1.020.000,00
2.2	ESTANTE FIJO: compuesta por 6 entrepaños	UN	3,00	\$ 320.000	\$ 960.000,00
2.3	ESCRITORIO RECTO DE 1,50 X 0,80 SIN CAJONERA	UN	1,00	\$ 446.532	\$ 446.532,00
2.4	Suministro y puesta en sitio de LOCKER METÁLICO de 200cm de altura x 120cm de largo x 0,30cm de fondo, Terminación en pintura electroestática con 16 puestos	UN	1,00	\$ 810.038	\$ 810.038,00
N.P - 3.1	Suministro e instalacion de locker metalico de 4 puestos Terminación en pintura electroestática medida aproximada de 1.80m x 0.8m x 0.30m	UN	1,00	\$ 660.000	\$ 660.000,00
N.P - 3.5	ESTANTE FIJO: compuesta por 5 entrepaños	UN	2,00	\$ 320.000	\$ 640.000,00
SUBTOTAL ANTES DE IVA					4.536.570,00
Son: Cinco millones trecientos noventa y ocho mil quinientos dieciocho pesos treinta centavos m/cte				SUBTOTAL	4.536.570,00
Observaciones: Hacer caso omiso a los beneficios del Numeral 1 Art. 7 de la ley 1429/201				RTE. FUENTE	
 INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S Nit. 900.960.149-1				I.V.A	861.948,30
				RTE. ICA	
				TOTAL	5.398.518,30
RECIBÍ DE CONFORMIDAD Nombre y Cédula					



CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

03 de Agosto de 2020

Señores
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

REFERENCIA: Contrato No. 173 de 2019 para Realizar las obras civiles para la construcción del cuarto de residuos y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96

Por medio del presente documento me permito certificar que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha definitiva de presentación de este comunicado, con el pago de los aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen.

Atentamente,

Juan Manuel Novoa Tobón
C.C. N° 1.032.493.382 de Bogotá D.C
Carrera cra 25 # 37-33.
Bogotá D.C.
PBX: 3583967
Intecpys@gmail.com
Intec Proyectos y Servicios S.A.S
NIT:900.960.149-1



BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. Aceptación de la oferta No. 173 de 2019

OBJETO Realizar las obras civiles para la construcción del cuarto de residuos y adecuaciones en el sotano 2 del edificio de la calle 72 No. 7-96

CONTRATISTA INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S

CONSULTOR INTERVENTORIA

VALOR INICIAL \$ 59.909.624
ADICIONAL EN VALOR No. 1 \$ 15.940.950
VALOR TOTAL \$ 75.850.574,00
FECHA DE INICIACIÓN 06/12/2019
ADICIÓN EN PLAZO No. 1 16 días
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 31/12/2019
PERIODO DEL CORTE 13 de diciembre a 31 de diciembre de 2019

A- RELACIÓN DE ACTAS PRESENTADAS

CONCEPTO	MES/AÑO	TIPO	VALOR EJECUTADO	DESCUENTO (PAGO ANTICIPADO 30%)	VALOR DEL ACTA Y/O FACTURAS	SALDO POR PAGAR
Acta No.1	dic-19		\$41.005.181,62		\$41.005.182	
Acta No.2	dic-19		\$34.845.392,38		\$34.845.392,38	
TOTALES			\$75.850.574,00	\$0	\$75.850.574,00	\$0


SALDO POR EJECUTAR	\$0
--------------------	-----


B- RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO	TIPO	FECHA	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	SALDO POR PAGAR
Acta No.1		13-dic-19	\$41.005.181,62		
TOTALES			\$41.005.181,62	\$0	\$34.845.392,38

SALDO POR PAGAR	\$34.845.392,38
-----------------	-----------------

VALOR A LIBERAR	\$0
-----------------	-----


Juan Manuel Novoa Tobon
Representante Legal
Intec Proyectos y Servicios S.A.S
CONTRATISTA


Arq Juan Carlos Alvarez Orjuela
Unidad de Infraestructura Física
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Supervisor del Contrato

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div><div>Rama Judicial</div><div>Consejo Superior de la Judicatura</div><div>República de Colombia</div></div></div></div><div><div><div>Consejo Superior de la Judicatura</div><div>Dirección Ejecutiva de Administración Judicial</div><div>Unidad de Infraestructura Física</div></div></div></div></div></div>					
CONTRATISTA		:	INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S		
NIT		:	: 900.960.149-1		
DIRECCIÓN		:	: Cra 32 No. 8-76 Sur		
TÉLEFONO		:	: 5713015899		
INTERVENTOR		:	: N/A		
NIT		:			
DIRECCIÓN		:			
TÉLEFONO		:			

CONTRATO DE OBRA No. Carta de aceptación N° 173 del 07 de noviembre de 2019					
OBJETO: Realizar las obras civiles para la construcción del cuarto de residuos y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96					
ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 02		PERIODO MES DE: Diciembre de 2019		FECHA: 24/06/2020	
VR.INICIAL OBRA	:	\$ 59.909.624,00	LOCALIZACIÓN	:	BOGOTÁ D.C.
VR. ADICIONAL No.	:	\$ 15.940.950	FECHA INICIACIÓN	:	06/12/2019
VR. ADICIONAL No.	:	\$ 0,00	PLAZO INICIAL	:	9 días
VR. TOTAL	:	\$ 75.850.574,00	ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	16 días
PAGO ANTICIPADO 30%	:	\$ 0,00	ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	25 días
LEGALIZADO ACTA No.1	:	\$ 0,00	PLAZO TOTAL	:	
LEGALIZADO ACTA No.2	:	\$ 0,00	FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
SALDO POR LEGALIZAR	:	\$ 0,00	FECHA REINICIACIÓN No.	:	
			FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	31/12/2019

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA					OBRA EJECUTADA				

ÍTEM	UN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)
1.1 OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES					
1.1.1	ML	Cerramiento en lona verde (polisombra) incluye parales en madera y altura de 3.5m incluye trasiego y disposición provisional en sitio designado dentro del edificio.	20	\$ 7.469	\$ 149.380
1.1.2	UN	Desmonte de lámparas de sobreponer.	12	\$ 4.200	\$ 50.400
1.1.3	UN	Desmonte de ventanería metálica.	5	\$ 5.419	\$ 27.095
1.1.4	ML	Desmonte y retiro de tub. y canaleta PVC y met. (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición en botadero oficial).	50	\$ 1.599	\$ 79.950
1.1.5	M2	Desmonte de panel en fibrocemento de 0.06mts de espesor. Con sus respectiva estructura en ángulo metálico. Incluye acarreo horizontal en lonas, y retiro de escombros fuera del inmueble.	31	\$ 14.200	\$ 441.109
1.1.6	M2	Demolición muros en mampostería e=0.15 (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición en botadero oficial).	11	\$ 9.391	\$ 103.301
1.1.7	ML	Regata con pulidora en piso (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición en botadero oficial).	25	\$ 6.821	\$ 170.525
1.2 MAMPOSTERIA E INSTALACIÓN EN SECO					
1.2.1	M2	Suministro e instalación de mampostería en bloque No 5 o similar (e=0.12 a 0.15 m), incluye mortero de pega.	77	\$ 22.500	\$ 1.728.360
1.2.2	ML	Suministro e instalación de mampostería en bloque No 5 o similar (e=0.12 a 0.15 m), incluye mortero de pega.	15	\$ 24.839	\$ 372.585
1.2.3	M2	Suministro e instalación de muro en Drywall e= 0.12 mt, Doble cara, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza), perflería galvanizada. Pintura 3 manos tipo 1.	5	\$ 49.373	\$ 246.865
1.2.4	ML	Suministro e instalación de muro y dintel en Drywall Una Cara, incluye Pintura 2 manos, tipo 1.	5	\$ 38.000	\$ 190.000
1.3 PAÑETE					
1.3.3	M2	Suministro y aplicación de pañete 1:4 sobre Muros.	154	\$ 8.256	\$ 1.268.386
1.3.4	ML	Suministro y aplicación de pañete 1:4 en Muros franjas menores de 50 cm.	15	\$ 6.206	\$ 93.090
1.3.5	ML	Filos y dilataciones en pañetes.	25	\$ 1.901	\$ 47.525
1.4 ESTUCCO Y PINTURA					
1.4.1	M2	Suministro y aplicación de estuco en muros/cielo rasos.	371	\$ 4.232	\$ 1.568.515
1.4.5	ML	Filos y dilataciones en estuco.	195	\$ 2.041	\$ 397.995
1.4.2	M2	Suministro y aplicación de pintura Vinilo para muros y techos T1, tres manos, incluye resanes.	523	\$ 7.800	\$ 4.079.291
1.4.3	ML	Suministro y aplicación de pintura Vinilo tipo 1, muros franjas menores de 50 cm, tres manos.	55	\$ 2.924	\$ 160.820
1.4.8	ML	Suministro y aplicación de pintura demarcación muros de parqueaderos color amarillo y negro.	45	\$ 12.263	\$ 551.835
1.4.4	M2	Resane de Placa, Techo y Muros.	155	\$ 9.838	\$ 1.524.890
1.4.9	M2	Suministro y aplicación de PINTURA ACRILICA BASE AGUA, impermeable, elástica de alta resistencia a la carbonatación, lavable (e=15mils. Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Micro esteras).	186	\$ 28.476	\$ 5.295.853

PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)
0,00	0,00	6,73	\$ 50.266,37	6,73	\$ 50.266,37
8,00	33.800,00	4,00	\$ 16.800,00	12,00	\$ 50.400,00
0,00	0,00	5,00	\$ 27.095,00	5,00	\$ 27.095,00
0,00	0,00	10,00	\$ 15.990,00	10,00	\$ 15.990,00
48,00	681.600,00	0,00	\$ 0,00	48,00	\$ 681.600,00
0,00	0,00	16,96	\$ 159.271,36	16,96	\$ 159.271,36
0,00	0,00	16,10	\$ 109.818,10	16,10	\$ 109.818,10
0,00	0,00	65,15	\$ 1.465.904,25	65,15	\$ 1.465.904,25
0,00	0,00	3,87	\$ 96.126,93	3,87	\$ 96.126,93
0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
29,00	239.405,84	138,37	\$ 1.142.400,88	167,37	\$ 1.381.806,72
7,42	46.048,52	23,95	\$ 148.633,70	31,37	\$ 194.682,22
0,00	0,00	65,34	\$ 124.211,34	65,34	\$ 124.211,34
199,30	843.454,53	168,70	\$ 713.921,47	368,00	\$ 1.557.376,00
0,00	0,00	65,34	\$ 133.358,94	65,34	\$ 133.358,94
222,90	1.738.620,00	300,00	\$ 2.340.000,00	522,90	\$ 4.078.620,00
55,00	160.820,00	0,00	\$ 0,00	55,00	\$ 160.820,00
45,00	551.835,00	0,00	\$ 0,00	45,00	\$ 551.835,00
55,00	541.090,00	110,00	\$ 1.082.180,00	165,00	\$ 1.623.270,00
72,12	2.053.689,12	170,00	\$ 4.840.920,00	242,12	\$ 6.894.609,12

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad de Infraestructura Física		
Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia			
CONTRATISTA		:	INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S
NIT		:	900.960.149-1
DIRECCIÓN		:	Cra 32 No. 8-76 Sur
TELÉFONO		:	5713015899
INTERVENTOR		:	N/A
NIT		:	
DIRECCIÓN		:	
TELÉFONO		:	

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO									
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					OBRA EJECUTADA				
OBRA CIVIL									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)				
1.4.10	Demarcación metros lineales en pintura tipo trafico base solvente color blanco y/o amarilla. línea 0.12m y 16 mils (incluye suministro y aplicación con equipo. incluye micro esferas tipo drop on para líneas de borde y de carril).	ML	178	\$ 2.445	\$ 436.188				
1.4.11	Demarcación metros cuadrado en pintura tipo trafico base solvente color naranja 16 mils para primera capa. (incluye suministro y aplicación con equipo. incluye micro esferas).	M2	39	\$ 26.230	\$ 1.022.970				
1.5	PISOS								
1.5.1	Suministro e instalación de placa de contrapiso E=0.125m.	M2	2	\$ 52.092	\$ 104.184				
1.5.2	Suministro y aplicación de alístateo de piso con mortero impermeabilizado. Espesor entre 2 y 4cm en zonas húmedas.	M2	166	\$ 16.531	\$ 2.744.146				
1.5.3	Suministro e instalación de Poceta de aseo en mampostería, enchapada en cerámica.	UN	1	\$ 210.617	\$ 210.617				
1.5.4	Pulida, destroncada y brillada de pisos en granito.	M2	206	\$ 13.318	\$ 2.743.508				
1.5.5	Suministro e instalación de media caña en mortero 1:3.	ML	48	\$ 14.172	\$ 680.256				
1.6	CARPINTERIA METÁLICA								
1.6.3	Suministro e instalación de puerta metálica cal.18 incluye marco de 1.00 x 2.10 mts. incluye anticorrosivo, pintura electrostática y cerradura de seguridad.	UN	2	\$ 510.000	\$ 1.020.000				
1.6.1	Suministro e instalación de Malla eslabonada plastificada calibre 10.5 2" altura mayor a 2.20m incluye postes, marco metálico y todo lo necesario para su correcta instalación. (Incluye puerta con pasador y manija).	M2	26	\$ 202.145	\$ 5.204.021				
1.6.4	Suministro e instalación de marco y tapa para tanque 0.52m x 0.90m.	UN	2	\$ 226.283	\$ 452.566				
1.6.2	Suministro e instalación de Ventana corrediza en aluminio, con vidrio 6mm templado (incluye todos los elementos de fijación).	M2	1	\$ 326.084	\$ 326.084				
1.7	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS								
1.7.1	Suministro e instalación de red general A.F. Tubería PVC-P RDE 21 Ø=2".	ML	35	\$ 14.393	\$ 503.755				
1.7.2	Suministro e instalación de red general A.F. Accesorio PVC-P Ø=2".	UN	35	\$ 9.025	\$ 315.875				
1.7.3	Suministro e instalación de Puntos hidráulicos poceta aseo.	UN	2	\$ 26.087	\$ 52.174				
1.7.4	Suministro e instalación de tapa registro de 20*20 cms ubicadas en válvulas de registro tipo cortina.	UN	2	\$ 25.186	\$ 50.372				
1.7.5	Suministro e instalación de llaves de control de 1/2", suministro e instalación.	UN	2	\$ 29.423	\$ 58.846				
1.7.6	Suministro e instalación de Tubería PVC Sanitaria de 2".	ML	36	\$ 14.716	\$ 529.776				
1.7.7	Suministro e instalación de Salida sanitaria para poceta de aseo.	UN	2	\$ 33.366	\$ 66.732				
1.7.8	Suministro e instalación de salida sifón, suministro e instalación.	UN	2	\$ 34.241	\$ 68.482				
1.7.9	Suministro e instalación de rejilla 5" x 3" con sosco.	UN	2	\$ 20.516	\$ 41.032				
1.8	INSTALACIONES ELECTRICAS								
1.8.1	Suministro e instalación de acometida en 3X8 F + 1x8 N + 1x10T desde tablero eléctrico de distribución de piso a tableros control NORMAL, REGULADO E ILUMINACIÓN en piso. Incluye bornas.	ML	19	\$ 24.247	\$ 460.693				
1.8.3	Suministro e instalación de punto eléctrico. Incluye Caja de Paso 30x30 cable y tubería EMT 1/2".	UN	6	\$ 51.882	\$ 311.292				

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA				OBRA EJECUTADA			
PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)		
178,40	436.188,00	0,00	\$	0,00	\$	178,40	\$ 436.188,00
39,00	1.022.970,00	0,00	\$	0,00	\$	39,00	\$ 1.022.970,00
0,00	0,00	0,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00
62,14	1.027.236,34	0,00	\$	0,00	\$	62,14	\$ 1.027.236,34
1,00	210.617,00	0,00	\$	0,00	\$	1,00	\$ 210.617,00
19,73	262.764,14	0,00	\$	0,00	\$	19,73	\$ 262.764,14
0,00	0,00	0,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00
0,00	0,00	2,00	\$	2,00	\$	2,00	\$ 1.020.000,00
0,00	0,00	18,17	\$	18,17	\$	18,17	\$ 3.672.974,65
0,00	0,00	4,00	\$	4,00	\$	4,00	\$ 905.132,00
		0,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00
1,00	26.087,00	0,00	\$	0,00	\$	1,00	\$ 26.087,00
1,00	25.186,00	0,00	\$	0,00	\$	1,00	\$ 25.186,00
1,00	29.423,00	0,00	\$	0,00	\$	1,00	\$ 29.423,00
0,00	0,00	0,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00
1,00	33.366,00	0,00	\$	0,00	\$	1,00	\$ 33.366,00
2,00	68.482,00	0,00	\$	0,00	\$	2,00	\$ 68.482,00
2,00	41.032,00	0,00	\$	0,00	\$	2,00	\$ 41.032,00
19,00	460.693,00	0,00	\$	0,00	\$	19,00	\$ 460.693,00
6,00	311.292,00	0,00	\$	0,00	\$	6,00	\$ 311.292,00

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div></div></div><div><div>Rama Judicial</div><div>Consejo Superior de la Judicatura</div><div>República de Colombia</div></div></div></div><div><div>Consejo Superior de la Judicatura</div><div>Dirección Ejecutiva de Administración Judicial</div><div>Unidad de Infraestructura Física</div></div></div>					
CONTRATISTA	:	INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S			
NIT	:	900.960.149-1			
DIRECCIÓN	:	Cra 32 No. 8-76 Sur			
TELÉFONO	:	5713015899			
INTERVENTOR	:	N/A			
NIT	:				
DIRECCIÓN	:				
TELÉFONO	:				

CONTRATO DE OBRA No. Carta de aceptación N° 173 del 07 de noviembre de 2019		
OBJETO: Realizar las obras civiles para la construcción del cuarto de residuos y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96		
ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 02	PERIODO MES DE: Diciembre de 2019	FECHA: 24/06/2020
VR.INICIAL OBRA	:	\$ 59.909.624,00
VR. ADICIONAL No.	:	\$ 15.940.950
VR. ADICIONAL No.	:	\$ 0,00
VR. TOTAL	:	\$ 75.850.574,00
PAGO ANTICIPADO 30%	:	\$ 0,00
LEGALIZADO ACTA No.1	:	\$ 0,00
LEGALIZADO ACTA No.2	:	\$ 0,00
SALDO POR LEGALIZAR	:	\$ 0,00
LOCALIZACIÓN	:	BOGOTÁ D.C.
FECHA INICIACIÓN	:	06/12/2019
PLAZO INICIAL	:	9 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	16 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	
PLAZO TOTAL	:	25 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	31/12/2019

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO		
MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA		
OBRA EJECUTADA		

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					
OBRA CIVIL					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)
1.8.2	Suministro e instalación de salida interruptor conmutable doble.	UN	8	\$ 34.004	\$ 272.032
1.8.4	Suministro e instalación de salida eléctrica con cable homologado calibre 12 trenzado libre de halógeno, toma tipo hospitalaria con polo aislado certificada, identificación y conectores (una y auto desforre).	UN	1	\$ 63.176	\$ 63.176
1.8.5	Suministro e instalación de salida eléctrica con cable homologado calibre 12 trenzado libre de Halógeno, toma tipo normal con polo a tierra certificada, identificación y conectores (una y auto desforre) entre 3 y 5 metros.	UN	6	\$ 60.619	\$ 363.714
1.8.6	Suministro e instalación de salida para luminaria de techo alambre homologado libre de halógeno calibre 12 (panel led 60x60 o similar). Incluye toma corriente. No incluye tubería en EMT.	UN	15	\$ 63.176	\$ 947.640
1.8.7	Suministro e instalación panel LED 60 x 60 CM, de 50 W.	UN	15	\$ 87.000	\$ 1.305.000
1.8.8	Suministro e instalación de interruptor doble tipo Luminex, certificado, incluye caja, cable y accesorios.	UN	8	\$ 33.050	\$ 264.400
1.8.9	Suministro e instalación de tubería de 1/2", conduit de PVC.	ML	130	\$ 2.066	\$ 268.580
1.8.10	Suministro e instalación de tubería EMT 3/4", incluye accesorios de conexión, soporte y anclaje.	ML	45	\$ 12.610	\$ 567.450
1.8.11	Suministro e instalación de Breaker enchufable de 2x30 Amp.	UN	8	\$ 37.476	\$ 299.808
1.8.12	Suministro e instalación de Tablero circuitos Normales y alumbrado 3F - 5H - 208/120V - 12 circuitos.	UN	2	\$ 263.951	\$ 527.902
1.8.13	Reinstalación lámparas.	UN	8	\$ 30.098	\$ 240.784
1.9 ASEO Y VARIOS					
1.9.1	Aseo y limpieza general (incluye protección de áreas de circulación pasillos y hall de ascensor.	M2	235	\$ 900	\$ 211.500
1.9.4	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	28	\$ 18.373	\$ 513.823
N.P-1 ITEMS NO PREVISTOS					
N.P-1.1	Suministro e instalación de placa de contrapiso esmaltada con mineral, sikafloor o similar, espesor de 0,10m	M2	0	\$ 58.820	\$ -
N.P-1.2	Desmonte, adecuacion e instalacion de rejas en tubería metálica, incluye masillada pintura, riel para puerta y cambio de tubería	M2	0	\$ 73.510	\$ -
N.P-1.3	Suministro e instalación de red general A.F. Tubería PVC-P RDE Ø=1/2".	ML	0	\$ 8.560	\$ -
N.P-1.4	Suministro e instalación de red general A.F. Accesorio PVC-P Ø=1/2".	UN	0	\$ 7.200	\$ -
N.P-1.5	Suministro e instalación de Tubería PVC Sanitaria de 3".	ML	0	\$ 17.800	\$ -
N.P-1.6	Suministro e instalación de Tubería PVC Sanitaria de 4".	ML	0	\$ 19.600	\$ -
N.P-1.7	Fabricación e instalación de bicicetero anclado en placa en dos puntos, en tubo estructural de 2,5" con una longitud de 2,52 cm, para 5 servicios de bicluario	UN	0	\$ 297.618	\$ -
N.P-2 ADECUACION DE BAÑO					
N.P-2.1	Desmonte de enchape (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición en botadero oficial).	M2	0	\$ 9.391	\$ -
N.P-2.2	Suministro y instalación de cielo raso en pvc (incluye la iluminacion necesaria) incluye corniza perimetral y toda su perfleria	M2	0	\$ 47.530	\$ -
N.P-2.3	Suministro y aplicación de enchape sobre muros incluye enboquillada	M2	0	\$ 49.765	\$ -
N.P-2.4	Suministro y aplicación de enchape de piso incluye enboquillada formato de 40x40cm o similar	M2	0	\$ 52.002,7	

PRESENTE ACTA			ACUMULADO ANTERIOR			ACUMULADO ACTUAL		
(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR (\$)		CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)	
	10,00	340.040,00	0,00	\$		10,00	\$	340.040,00
	1,00	63.176,00	0,00	\$		1,00	\$	63.176,00
	6,00	363.714,00	0,00	\$		6,00	\$	363.714,00
	9,00	568.584,00	0,00	\$		9,00	\$	568.584,00
	9,00	783.000,00	0,00	\$		9,00	\$	783.000,00
	10,00	330.500,00	0,00	\$		10,00	\$	330.500,00
	32,74	67.640,84	0,00	\$		32,74	\$	67.640,84
	107,75	1.358.727,50	0,00	\$		107,75	\$	1.358.727,50
	8,00	299.808,00	0,00	\$		8,00	\$	299.808,00
	1,00	263.951,00	0,00	\$		1,00	\$	263.951,00
	8,00	240.784,00	0,00	\$		8,00	\$	240.784,00
	235,00	211.499,88	0,00	\$		235,00	\$	211.499,88
	21,00	385.833,00	14,00	\$	257.222,00	35,00	\$	643.055,00
	0,00							
	242,00	14.234.487,27	242,00	\$	14.234.487,27	242,00	\$	14.234.487,27
	10,89	800.523,90	0,00	\$		10,89	\$	800.523,90
	25,00	214.000,00	0,00	\$		25,00	\$	214.000,00
	2,00	14.400,00	0,00	\$		2,00	\$	14.400,00
	16,72	297.662,62	0,00	\$		16,72	\$	297.662,62
	26,00	509.600,00	0,00	\$		26,00	\$	509.600,00
	1,00	297.618,10	0,00	\$		1,00	\$	297.618,10
	28,72	269.709,52	0,00	\$		28,72	\$	269.709,52
	4,10	194.873,00	0,00	\$		4,10	\$	194.873,00
	13,49	671.329,85	0,00	\$		13,49	\$	671.329,85
	4,10	213.210,99	0,00	\$		4,10	\$	213.210,99

<div><div><div><div><div><div></div><div>Rama Judicial</div></div></div><div><div>Consejo Superior de la Judicatura</div><div>Consejo Superior de la Judicatura</div><div>República de Colombia</div></div></div></div><div><div>Consejo Superior de la Judicatura</div><div>Dirección Ejecutiva de Administración Judicial</div><div>Unidad de Infraestructura Física</div></div></div>		<div>CONTRATO DE OBRA No. Carta de aceptación N° 173 del 07 de noviembre de 2019</div> <div>OBJETO: Realizar las obras civiles para la construcción del cuarto de residuos y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96</div>					
		ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 02		PERIODO MES DE: Diciembre de 2019		FECHA: 24/06/2020	
CONTRATISTA	:	INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S		VR.INICIAL OBRA	:	\$ 59.909.624,00	
				VR. ADICIONAL No.	:	\$ 15.940.950	
NIT	:	900.960.149-1		VR. ADICIONAL No.	:	\$ 0,00	
DIRECCIÓN	:	Cra 32 No. 8-76 Sur		VR. TOTAL	:	\$ 75.850.574,00	
TELÉFONO	:	5713015899					
INTERVENTOR	:	N/A		PAGO ANTICIPADO 30%	:	\$ 0,00	
				LEGALIZADO ACTA No.1	:	\$ 0,00	
NIT	:			LEGALIZADO ACTA No.2	:	\$ 0,00	
DIRECCIÓN	:			SALDO POR LEGALIZAR	:	\$ 0,00	
TELÉFONO	:						
BALANCE GENERAL ACTUALIZADO							
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							
OBRA CIVIL							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)		
						CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)
N.P-2.5	Suministro e instalaciones hidrosanitarias, incluye regatas con pulidora, demolición de placa, cargue y retiro de escombros	GLO	0	\$ 762.600	\$ -	1,00	762.600,00
N.P-2.6	Suministro e instalación de sanitario corona de capacidad del tanque: 12. litros o similar con bajo consumo de agua	UN	0	\$ 350.000	\$ -	1,00	350.000,00
N.P-2.7	Suministro e instalación de lavamanos corona de pedestal	UN	0	\$ 250.000	\$ -	1,00	250.000,00
N.P-2.8	Suministro e instalación de orinal color blanco con su fluxometro o grifería de push	UN	0	\$ 455.000	\$ -	1,00	455.000,00
N.P-2.9	Suministro e instalación de placa en concreto, forrado en triplex de 6.5mm pintado e inmunizado	UN	0	\$ 420.000	\$ -	1,00	420.000,00
N.P-2.10	Suministro e instalación de espejo biselado de 0.9mx0.9m aproximadamente	UN	0	\$ 281.000	\$ -	1,00	281.000,00
N.P-2.11	Suministro e instalación de puerta metálica cal.18 incluye marco de 0.75 x 2.10 mts. Aproximadamente incluye anticorrosivo, pintura y cerradura.	UN	0	\$ 420.000	\$ -	2,00	840.000,00
N.P-3	LETREROS EN PINTURA						
NP-3.2	Suministro y aplicación de pintura de tráfico en señalización de piso tipo letra tamaño 18 color blanco, según diseño.	UN	0	\$ 38.117	\$ -	3,00	114.351,00
NP-3.3	Suministro y aplicación de pintura ignífuga en señalización de pared y puertas tipo letra tamaño 12 color negro, según diseño.	UN	0	\$ 42.182	\$ -	3,00	126.546,00
NP-3.4	Suministro y aplicación de pintura ignífuga en señalización de pared tipo diagrama color blanco, tamaño de acuerdo a diseño	UN	0	\$ 58.210	\$ -	3,00	174.630,00
					\$		
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					\$	23.379.812,69	
A. I. U.							
(25%)							
ADMINISTRACIÓN					\$	3.974.568,16	
(17%)							
IMPREVISTOS					\$	701.394,38	
(3%)							
UTILIDAD					\$	1.168.990,63	
(5%)							
IVA					\$	222.108,22	
(19%)							
A. TOTAL OBRA CIVIL					\$	29.446.874,08	

<div><div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div></div> <div>Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad de Infraestructura Física</div>			CONTRATO DE OBRA No. Carta de aceptación N° 173 del 07 de noviembre de 2019 OBJETO: Realizar las obras civiles para la construcción del cuarto de residuos y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96					
ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 02		PERIODO MES DE: Diciembre de 2019		FECHA: 24/06/2020				
CONTRATISTA	:	INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S	VR.INICIAL OBRA	:	\$ 59.909.624,00	LOCALIZACIÓN	:	BOGOTÁ D.C.
			VR. ADICIONAL No.	:	\$ 15.940.950			
			VR. ADICIONAL No.	:	\$ 0,00	FECHA INICIACIÓN	:	06/12/2019
NIT	:	900.960.149-1	VR. TOTAL	:	\$ 75.850.574,00	PLAZO INICIAL	:	9 días
DIRECCIÓN	:	Cra 32 No. 8-76 Sur				ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	16 días
TELÉFONO	:	5713015899	PAGO ANTICIPADO 30%	:	\$ 0,00	ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	
INTERVENTOR	:	N/A	LEGALIZADO ACTA No.1	:	\$ 0,00	PLAZO TOTAL	:	25 días
			LEGALIZADO ACTA No.2	:	\$ 0,00	FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
NIT	:		SALDO POR LEGALIZAR	:	\$ 0,00	FECHA REINICIACIÓN No.	:	
DIRECCIÓN	:						:	
TELÉFONO	:					FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	31/12/2019

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO									
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA				
OBRA CIVIL					OBRA EJECUTADA				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
MOBILIARIO									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
2.1	Suministro e instalación de puesto de trabajo RECTO de 1.20 m x 0.60m x 0.75m de altura. la única superficie será de 1.20m de largo x 0.60m de ancho. La superficie será en madera tipo táblex de 30 mm (norma ANSI/NEMA LD3-2005), enchapado por la parte superior en laminado de alta presión Fórmica (F8), en la parte inferior llevará Balance-Backer (F8). Perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor. Color similar a la superficie de trabajo. Tendrá 2 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies según diseños a definir en sitio. en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epoxico. Incluye archivador independiente con 5 rodachinas (antivuelco) con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.	UN	1	\$ 510.000,00	\$ 510.000,00		2,00	\$ 1.020.000,00	0,00
2.2	ESTANTE FIJO: Suministro e instalación de estantería fija fabricada en lamina Cold Rolled compuesta por 6 entrepaños con refuerzos inferiores en altura mas piso y techo. de calibre 20 reforzados, estructura mediante 4 paralelas calibre 14 con sistema uña. Dimensiones 0,90m frente x 0,40m fondo. H=2,10m Terminado en pintura electrostática tono a elegir.	UN	5	\$ 320.000	\$ 1.600.000,00		3,00	\$ 960.000,00	0,00
2.3	ESCRITORIO RECTO DE 1.50 X 0.80 SIN CAJONERA: La superficie serán en madera tipo táblex de 30 mm (norma ANSI/NEMA LD3-2005), enchapado por la parte superior en laminado de alta presión Fórmica (F8), en la parte inferior llevará Balance-Backer (F8). Perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor. color similar a la superficie de trabajo. Tendrá 2 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies según diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. Los costados se conectarán por medio de vigas metálicas en todo el perímetro de la superficie reforzado por una viga en la mitad, para su estabilidad. Adicionalmente se requiere 1 pasa cables de 8 cm. de diámetro.	UN	2	\$ 446.532	\$ 893.064,00		1,00	\$ 446.532,00	0,00
2.4	Suministro y puesta en sitio de LOCKER METÁLICO de 200cm de altura x 120cm de largo x 0.30cm de fondo. Terminación en pintura electrostática con 16 puestos, cada uno llevará manija plástica, portacandado, celosía de ventilación.	UN	1	\$ 810.038	\$ 810.038,00		1,00	\$ 810.038,00	0,00
2.5	Biciclero. Soporte metálico para fijar en pared de 25cm x 15cm con numeración en vinilo adhesivo acabado en Pintura electrostática.	UN	6	\$ 52.500	\$ 315.000,00		0,00	\$ 0,00	0,00
2.6	Suministro e instalación de señal informativa en polietileno y en cinta o vinilo reflectivo foto luminiscente de 12 horas. Tamaño 50cm de altura. Incluye limpieza de área a intervenir. El tiempo de letra se definirá después de adjudicado el contrato.	UN	5	\$ 90.640	\$ 453.200,00		0,0000	\$ 0,00	0,00
2.7	Suministro e instalación de señal informativa fondo en polietileno azul y letras blancas, frente en reflectivo y textos impresión digital tamaño 35cm de ancho x 25cm de alto con logotipo del Consejo Superior de la Judicatura y según diseño suministrado por esta entidad.	UN	40	\$ 38.117	\$ 1.524.680,00		0,0000	\$ 0,00	0,00
N.P - 3.1	Suministro e instalación de locker metálico de 4 puestos Terminación en pintura electrostática medida aproximada de 1.80m x 0.8m x 0.30m	UN	0	\$ 660.000,00	\$ 0,00		1,00	\$ 660.000,00	0,00

<div><div><div></div><div><div>Rama Judicial</div><div>Consejo Superior de la Judicatura</div><div>Republica de Colombia</div></div></div><div><div>Consejo Superior de la Judicatura</div><div>Dirección Ejecutiva de Administración Judicial</div><div>Unidad de Infraestructura Física</div></div></div> <div><div>CONTRATO DE OBRA No. Carta de aceptación N° 173 del 07 de noviembre de 2019</div><div>OBJETO: Realizar las obras civiles para la construcción del cuarto de residuos y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96</div></div>										<div>ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 02</div> <div>PERIODO MES DE: Diciembre de 2019</div> <div>FECHA: 24/06/2020</div>									
<div>CONTRATISTA : INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S</div> <div>NIT : 900.960.149-1</div> <div>DIRECCIÓN : Cra 32 No. 8-76 Sur</div> <div>TELÉFONO : 5713015899</div> <div>INTERVENTOR : N/A</div> <div>NIT :</div> <div>DIRECCIÓN :</div> <div>TELÉFONO :</div>										<div>VR.INICIAL OBRA : \$ 59.909.624,00</div> <div>VR. ADICIONAL No. : \$ 15.940.950</div> <div>VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00</div> <div>VR. TOTAL : \$ 75.850.574,00</div> <div>PAGO ANTICIPADO 30% : \$ 0,00</div> <div>LEGALIZADO ACTA No.1 : \$ 0,00</div> <div>LEGALIZADO ACTA No.2 : \$ 0,00</div> <div>SALDO POR LEGALIZAR : \$ 0,00</div> <div>LOCALIZACIÓN : BOGOTÁ D.C.</div> <div>FECHA INICIACIÓN : 06/12/2019</div> <div>PLAZO INICIAL : 9 días</div> <div>ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 16 días</div> <div>ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : 25 días</div> <div>PLAZO TOTAL : 25 días</div> <div>FECHA SUSPENSIÓN No. : 31/12/2019</div> <div>FECHA REINICIACIÓN No. :</div> <div>FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 31/12/2019</div>									
BALANCE GENERAL ACTUALIZADO																			
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO										OBRA EJECUTADA									
MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA																			
OBRA CIVIL																			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)	ACUMULADO ACTUAL				
N.P - 3.5	ESTANTE FIJO: Suministro e instalación de estantería fija fabricada en lamina Cold Rolled compuesta por 5 entrepatios con refuerzos inferiores en altura más piso y techo, de calibre 20 reforzados, estructura mediante 4 pares de calibre 14 con sistema uña. Dimensiones 0,90m frente x 0,40m fondo. H=2,00m Terminado en pintura electrostática tono a elegir.	UN	0	\$ 320.000,00	\$ 0,00		2,00	\$ 640.000,00		\$ 640.000,00	2,00	\$ 640.000,00		\$ 640.000,00					
SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO					\$ 6.105.982,00			\$ 4.536.570,00		\$ 4.536.570,00		\$ 4.536.570,00		\$ 4.536.570,00					
IVA					\$ 1.160.136,58			\$ 861.948,30		\$ 861.948,30		\$ 861.948,30		\$ 861.948,30					
B. TOTAL MOBILIARIO					\$ 7.266.118,58			\$ 5.398.518,30		\$ 5.398.518,30		\$ 5.398.518,30		\$ 5.398.518,30					
VALOR TOTAL (A + B)					\$ 59.909.624			\$ 75.850.574,00		\$ 34.845.392,38		\$ 41.005.181,62		\$ 75.850.574,00					
DESCUENTO PAGO ANTICIPADO (0%)										\$ 0,00									
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA										\$ 34.845.392,38									
Balance del contrato																			
VR. Contratado					\$ 59.909.624														
VR. Adicional					\$ 15.940.950														
VR. Final del contrato					\$ 75.850.574,00														
<div></div> <div>Juan Manuel Novoa Tobón</div> <div>Representante Legal</div> <div>INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S</div> <div>CONTRATISTA</div>										<div></div> <div>Arq. Juan Carlos Alvarez Orjuela</div> <div>Unidad de Infraestructura Física en apoyo a la Unidad Administrativa</div> <div>Dirección Ejecutiva de administración Judicial</div> <div>Supervisor</div>									



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:	INTEC		CORTE No. 2	ACTA DE RECIBO PARCIAL 02
OBRA	Calle 72 N° 7 - 96.		FECHA:	17 de febrero de 2020
CAPITULO	1	PRELIMINARES		
ITEM N°:	1.1.2	DESCRIPCION ITEM	Desmonte de lámparas de sobreponer.	UND

[illegible]

OBSERVACIONES:	REVISOR		Vo. Bº. INTEC
	Firma: ARQ. JUANCARLOS SUPERVISOR		
	Firma:		
			Firma: Residente de obra



MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:		INTEC		CORTE No. 2		ACTA DE RECIBO PARCIAL 01	
OBRA		Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.		FECHA:		17 de febrero de 2020	
CAPITULO		1		PRELIMINARES			
ITEM N°:		1.3.3		DESCRIPCION ITEM		Suministro y aplicación de pañete 1:4 sobre Muros.	
				UND:		M2	

[illegible]

OBSERVACIONES:	REVISOR		Vn. Bn. INTEC	Firma: Residente de obra
	Firma: ARQ. JUANCARLOS			
	SUPERVISOR			
	Firma:			



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:		INTEC		CORTE No. 2		ACTA DE RECIBO PARCIAL 01	
OBRA		Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.		FECHA:		13 de diciembre de 2019	
CAPITULO		1		PRELIMINARES			
ITEM N°:	1.3.4	DESCRIPCION ITEM		Suministro y aplicación de pañete 1:4 en Muros franjas menores de 50 cm.			
				UND:		ml	

[illegible]

OBSERVACIONES:	REVISOR	Vc. Bc. INTEC
	Firma: ARQ. JUANCARLOS SUPERVISOR	
	Firma:	



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:		INTEC		CORTE No. 2		ACTA DE RECIBO PARCIAL 01	
OBRA		Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.		FECHA:		17 de febrero de 2020	
CAPITULO		1		PRELIMINARES			
ITEM N°:	1.4.1	DESCRIPCION ITEM		Suministro y aplicación de estuco en muros/cielo rasos.			
				UND:		M2	

[illegible]

OBSERVACIONES:	REVISOR		Vº. Bº. INTEC
	Firma: ARQ. JUANCARLOS		
	SUPERVISOR		
	Firma:		
			Firma: Residente de obra



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:		INTEC		CORTE No. 2		ACTA DE RECIBO PARCIAL 01	
OBRA		Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.		FECHA:		17 de febrero de 2020	
CAPITULO		1		PRELIMINARES			
ITEM N°:		1.4.2		DESCRIPCION ITEM		Suministro y aplicación de pintura Vinilo para muros y techos T1 tres manos, incluye resanes.	
				UND:		M2	

[illegible]**OBSERVACIONES:**

REVISOR

Firma: ARQ. JUANCARLOS
SUPERVISOR

Firma:

Vo. Bo. INTEC

Firma: Residente de obra

SUBTOTAL	222,90
VIENEN	-
TOTAL	222,90

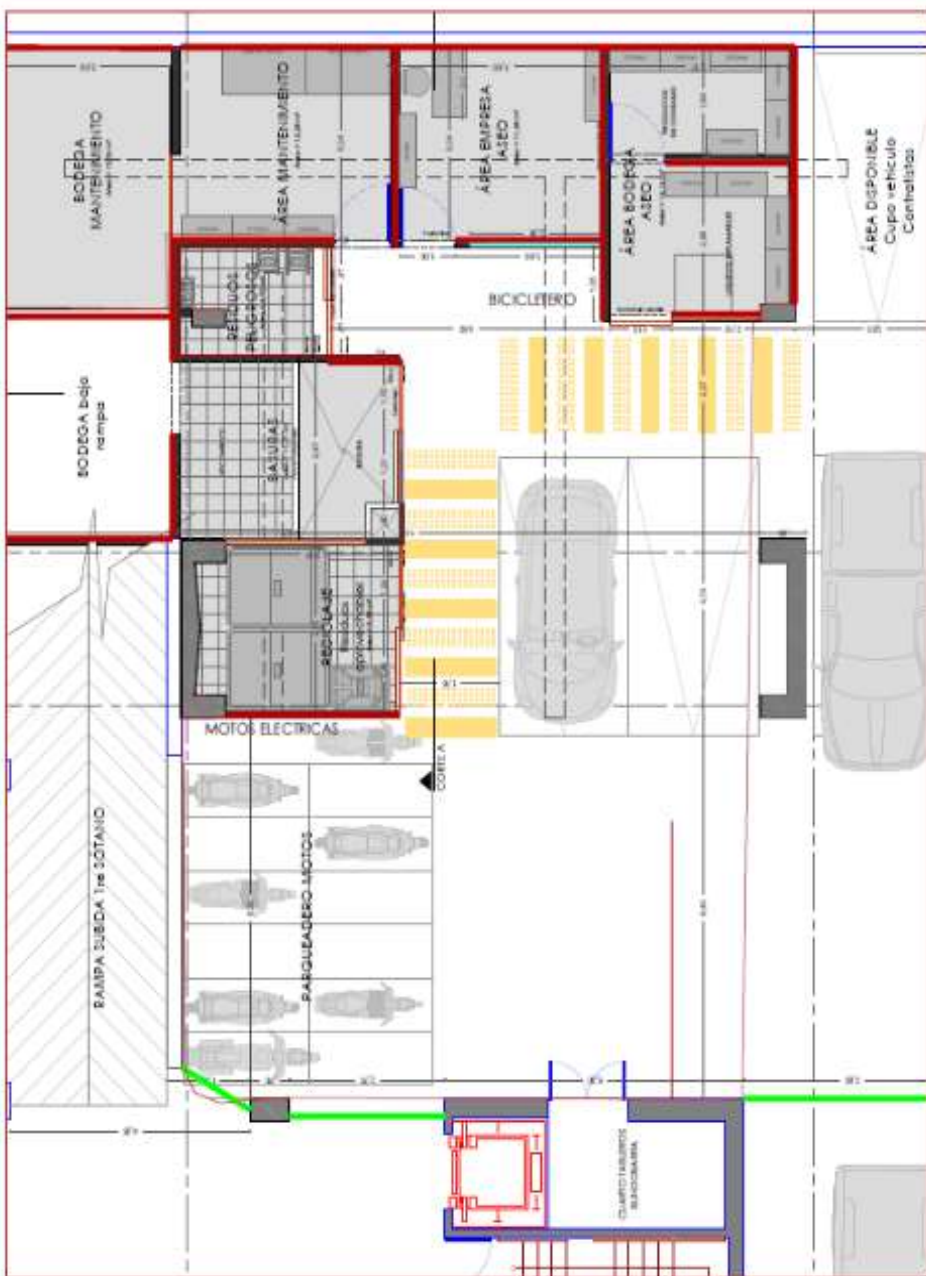


Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:		INTEC		CORTE No. 2		ACTA DE RECIBO PARCIAL 01	
OBRA		Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.		FECHA:		17 de febrero de 2020	
CAPITULO		1		PRELIMINARES			
ITEM N°:		1.4.3		DESCRIPCION ITEM		Suministro y aplicación de pintura Vinilo tipo 1 muros franjas menores de 50 cm, tres manos.	
				UND:		MI	

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA						
DESCRIPCION		DIMENSIONES			PROF.	TOTAL
SEGUN PLANO ADJUNTO	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO			
<div><div>PINTURA</div><div></div></div>						
		2.00	1.40	0.50		2.80
		2.00	3.60	0.40		7.20
		1.00	3.50	0.45		3.50
		2.00	1.80	0.50		3.60
		2.00	3.10	0.40		6.20
		2.00	2.40	0.40		4.80
		1.00	2.40	0.60		2.40
		2.00	2.75	0.50		5.50
		2.00	3.50	0.40		7.00
		1.00	2.70	0.30		2.70
		1.00	2.50	0.30		2.50
		2.00	2.10	0.45		4.20
		1.00	2.60	0.50		2.60

OBSERVACIONES:	REVISOR	Vo. Bo. INTEC	
	Firma: ARQ. JUANCARLOS SUPERVISOR		
	Firma:	Firma: Residente de obra	



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:		INTEC		CORTE No. 2		ACTA DE RECIBO PARCIAL 01	
OBRA		Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.		FECHA:		17 de febrero de 2020	
CAPITULO		1		PRELIMINARES			
ITEM N°:		1.4.4		DESCRIPCION ITEM		Resane de Placa, Techo y Muros.	
				UND:		M2	

[illegible]

OBSERVACIONES:	REVISOR	Vc. Bc. INTEC
	Firma: ARQ. JUANCARLOS SUPERVISOR	
	Firma:	
		Firma: Residente de obra

Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:

OBRA

RAMA JUDICIAL
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.

INTEC

CORTE No. 2

ACTA DE RECIBO PARCIAL 01

17 de febrero de 2020

CAPITULO

1

PRELIMINARES

ITEM N°:

1.4.8

DESCRIPCION ITEM

Suministro y aplicación de pintura demarcación muros de parqueaderos color amarillo y negro.

UND:

ML

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA							
	DESCRIPCION	DIMENSIONES			PROF.	TOTAL	
		CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO			
<div><div>PINTURA</div><div></div></div>	SEGUN PLANO ADJUNTO						
		1.00	2.50	0.20		2.50	
		1.00	2.40	0.20		2.40	
		1.00	2.40	0.20		2.40	
		1.00	2.30	0.20		2.30	
		1.00	3.40	0.20		3.40	
		1.00	2.40	0.20		2.40	
		1.00	2.42	0.20		2.42	
		2.00	2.75	0.20		5.50	
		2.00	3.50	0.20		7.00	
		2.00	2.70	0.20		5.40	
		1.00	2.50	0.20		2.50	
		2.00	2.09	0.20		4.18	
		1.00	2.60	0.20		2.60	

OBSERVACIONES:

REVISOR

Firma: ARQ. JUANCARLOS SUPERVISOR

Vo. Bo. INTEC

Firma: Residente de obra

Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:

OBRA

Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.

INTEC

1

1.4.9

ACTA DE RECIBO PARCIAL 01

17 de febrero de 2020

CAPITULO

ITEM N°:

PRELIMINARES

Suministro y aplicación de PINTURA ACRILICA BASE AGUA, impermeable, elástica de alta resistencia a la carbonatación, lavable

UND:

M2

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA					DIMENSIONES				PROF.	TOTAL
					DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO		
<div><div><div>PINTURA ACRILICA</div><div></div></div></div>	SEGUN PLANO ADJUNTO									
						1.00	3.4	2.10		7.14
						1.00	2.3	3.00		6.90
						1.00	3.1	2.50		7.75
						1.00	3.1	3.64		11.28
						1.00	3.2	1.81		5.79
						1.00	2.1	2.40		5.04
						1.00	1.8	2.70		4.86
						1.00	2.6	3.60		9.36
						1.00	2.90	1.50		4.35
						1.00	2.45	2.10		5.15
						1.00	3.00	1.50		4.50
					SUBTOTAL					72.12
					VIENEN					-
					TOTAL					72.12

OBSERVACIONES:

REVISOR

Firma: ARQ. JUANCARLOS SUPERVISOR

Vo. Bo. INTEC

Firma: Residente de obra



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:	INTEC		CORTE No. 2	ACTA DE RECIBO PARCIAL 01
OBRA	Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.		FECHA:	17 de febrero de 2020
CAPITULO	PRELIMINARES			
ITEM N°:	1	1.4.10	Demarcación metros lineales en pintura tipo trafico base solvente color blanco y/o amarilla. 16 mils (incluye suministro y aplicación con equipo. incluye micro esferas tipo drop on para líneas de borde y de carril).	UND:
				ML

[illegible]

OBSERVACIONES:	REVISOR	Vº. Bº. INTERVENTORIA CONSORCIO INTER DEPORTIVOS	Firma: Residente de obra
	Firma: ARQ. JUANCARLOS		
	SUPERVISOR		
	Firma:		



MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

OBSERVACIONES:	REVISOR		Va. Bto. INTEC
	Firma: ARQ. JUANCARLOS		
	SUPERVISOR		
	Firma:		
			Firma: Residente de obra



MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

OBSERVACIONES:	REVISOR		V.O. Bo. INTEC
	Firma: ARQ. JUANCARLOS		
	SUPERVISOR		
	Firma:		
			Firma: Residente de obra

Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:

OBRA

CAPITULO

ITEM N°:

INTEC

Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.

1

1.5.4

CORTE No. 2

ACTA DE RECIBO PARCIAL 01

FECHA:

17 de febrero de 2020

PRELIMINARES

Pulida, destroncada y brillada de pisos en granito.

M2

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		DIMENSIONES				PROF.	TOTAL
		DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO		
<div><div>PULIDA DE PISO</div><div></div><div></div></div>		SEGUN PLANO ADJUNTO					
			1.00	2,97	3,77		11,20
			1.00	3,07	2,78		8,53
						SUBTOTAL	19,73
						VIENEN	-
						TOTAL	19,73

OBSERVACIONES:

REVISOR

Firma: ARQ. JUANCARLOS SUPERVISOR

Firma:

Vo. Bo. INTEC

Firma: Residente de obra



MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

OBSERVACIONES:	REVISOR		V.O. Bo. INTEC
	Firma: ARQ. JUANCARLOS		
	SUPERVISOR		
	Firma:		
			Firma: Residente de obra



MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	DIMENSIONES			PROF.	TOTAL	
	DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD			ANCHO
SEGÚN PLANO ADJUNTO						



OBSERVACIONES:	REVISOR		V.O. Bo. INTEC
	Firma: ARQ. JUANCARLOS		
	SUPERVISOR		
	Firma:		
			Firma: Residente de obra



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:

OBRA

CAPITULO

ITEM N°:

1

1.7.7

DESCRIPCION ITEM

Suministro e instalación de Salida sanitaria para poceta de aseo.

UND:

UND

INTEC

Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.

CORTE No. 2

ACTA DE RECIBO PARCIAL 01

FECHA:

17 de febrero de 2020

PRELIMINARES

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO		DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA				DIMENSIONES			PROF.	TOTAL
		DESCRIPCION		CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO				
		SEGUN PLANO ADJUNTO								
				1,00	1,0	1,0				1,00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-



MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

[illegible]



MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

[illegible]

OBSERVACIONES:	REVISOR		V.O. Bo. INTEC
	Firma: ARQ. JUANCARLOS		
	SUPERVISOR		
	Firma:		
			Firma: Residente de obra



MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

Suministro e instalación de saída eléctrica con cable homologado calibre12 trenzado libre de halógeno, toma tipo hospitalaria con polo aislado certificada, identificación y conectores (uña y auto destorpe).

1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

Vo. Bo. INTEC

Firma: Residente de obra



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:		INTEC		CORTE No. 2		ACTA DE RECIBO PARCIAL 01	
OBRA		Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.		FECHA:		17 de febrero de 2020	
CAPITULO		1		PRELIMINARES			
ITEM N°:	1.8.7	DESCRIPCION ITEM		Suministro e instalación panel LED 60 x 60 CM, de 50 W.		UND	

[illegible]

SUBTOTAL	9,00
VIENEN	-
TOTAL	9,00

OBSERVACIONES:	REVISOR		Vo. Bo. INTEC
	Firma: ARQ. JUANCARLOS		
	SUPERVISOR		
	Firma:		
			Firma: Residente de obra



MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

[illegible]



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:		INTEC		CORTE No. 2		ACTA DE RECIBO PARCIAL 01	
OBRA		Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.		FECHA:		17 de febrero de 2020	
CAPITULO		1		PRELIMINARES			
ITEM N°:	1.8.11	DESCRIPCION ITEM		Suministro e instalación de Breaker enchufable de 2x30 Amp.			
				UND:		UND	

[illegible]

SUBTOTAL	8,00
VIENEN	-
TOTAL	8,00

OBSERVACIONES:	REVISOR	Vc. Bo. INTEC
	Firma: ARQ. JUANCARLOS	
	SUPERVISOR	
	Firma:	
		Firma: Residente de obra



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

[illegible]



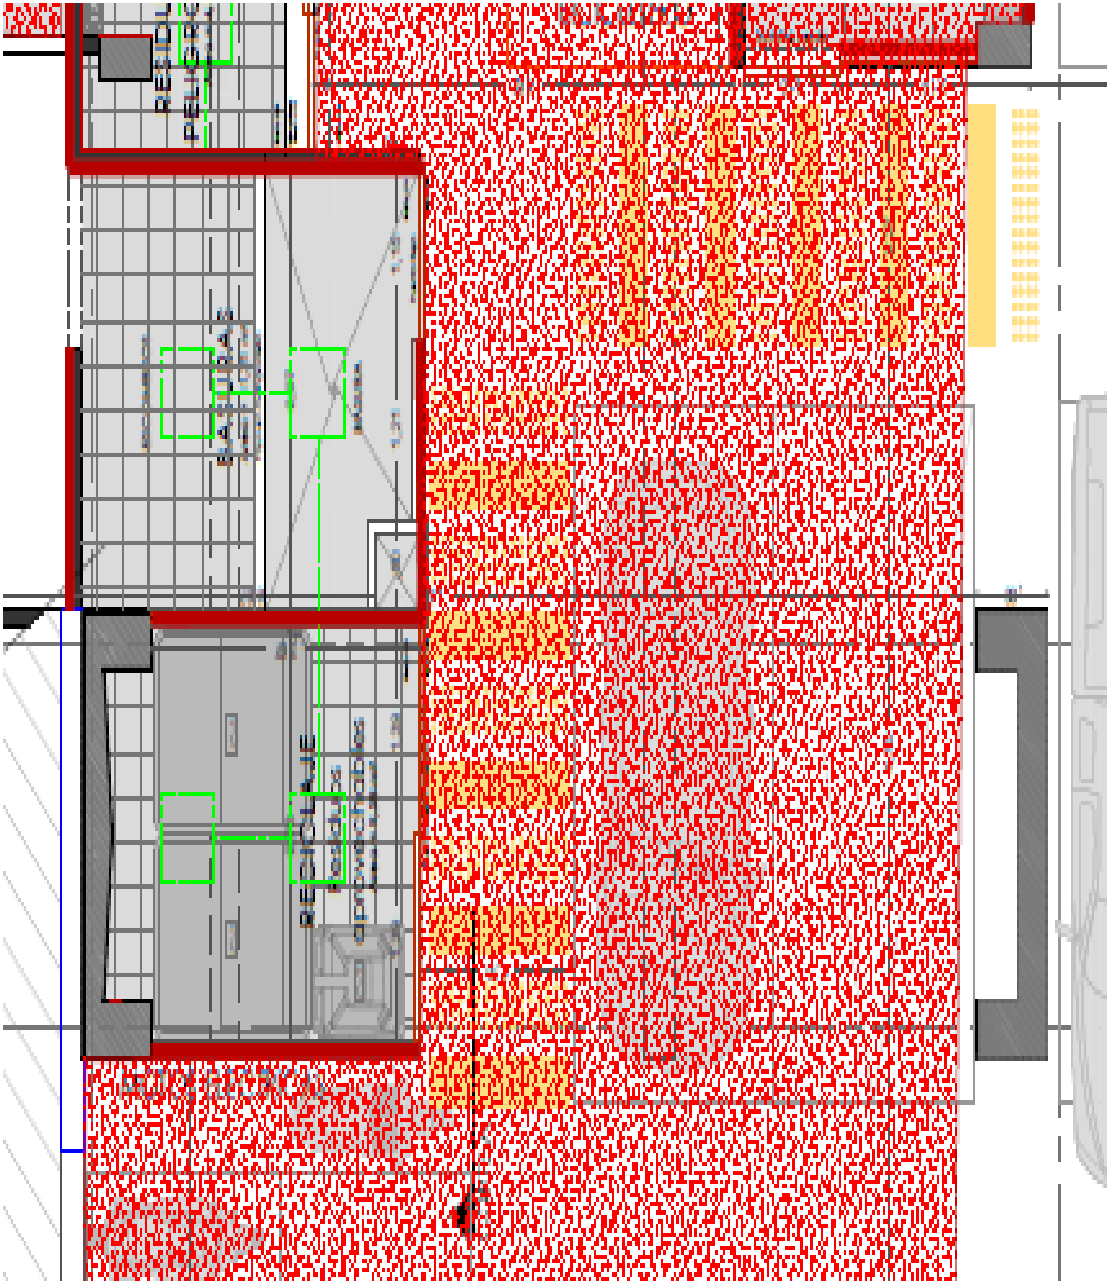
MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

[illegible]

Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:	INTEC		CORTE No. 1	ACTA DE RECIBO PARCIAL 01
OBRA	Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.		FECHA:	17 de febrero de 2020
CAPITULO	1	PRELIMINARES		
ITEM N°:	1.9.1	DESCRIPCION ITEM	Aseo y limpieza general (incluye protección de áreas de circulación pasillos y hall de ascensor.	UND: M2

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		DIMENSIONES				PROF.	TOTAL
		DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO		
<div>ASEO</div> <div></div>	SEGUN PLANO ADJUNTO						
							235,00
						SUBTOTAL	235,00
						VIENEN	-
						TOTAL	235,00

OBSERVACIONES:		REVISOR	Vo. Bo. INTEC	
		Firma: ARQ. JUANCARLOS SUPERVISOR		
		Firma:	Firma: Residente de obra	



Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:		INTEC		CORTE No. 1		ACTA DE RECIBO PARCIAL 01	
OBRA		Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.		FECHA:		13 de diciembre de 2019	
CAPITULO		1		PRELIMINARES			
ITEM N°:	1.9.4	DESCRIPCION ITEM		TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO			
				UND:		m3	

[illegible]

	SUBTOTAL	21,00
	VIENEN	-
	TOTAL	21,00

OBSERVACIONES:	REVISOR		Va. Bto. INTEC
	Firma: ARQ. JUANCARLOS		
	SUPERVISOR		
	Firma:		
			Firma: Residente de obra



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:		INTEC		CORTE No. 1		ACTA DE RECIBO PARCIAL 01	
OBRA		Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.		FECHA:		13 de diciembre de 2019	
CAPITULO		1		PRELIMINARES			
ITEM N°:	N.P 1.2	DESCRIPCION ITEM		Desmante, adecuacion e instalacion de rejias en tuberia metalica, incluye masillada pintura, riel para puerta y cambio de tuberia		UND:	M2

[illegible]

OBSERVACIONES:	REVISOR		Vo. Bo. INTEC
	Firma: ARQ. JUANCARLOS		
	SUPERVISOR		
	Firma:		
			Firma: Residente de obra



MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:	INTEC	CORTE No. 1	ACTA DE RECIBO PARCIAL 01
OBRA	Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.	FECHA:	13 de diciembre de 2019
CAPITULO	PRELIMINARES		
ITEM N°:	1		
	N.P 1.3	DESCRIPCION ITEM	UND: ML
		Suministro e instalación de red general A.F. Tubería PVC-P RDE Ø=1/2".	

[illegible]

OBSERVACIONES:	REVISOR		Vo. Bo. INTEC
	Firma: ARQ. JUANCARLOS		
	SUPERVISOR		
	Firma:		
			Firma: Residente de obra



MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:	INTEC		CORTE No. 1	ACTA DE RECIBO PARCIAL 01
OBRA	Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.		FECHA:	13 de diciembre de 2019
CAPITULO	PRELIMINARES			
ITEM N°:	1			
	N.P 1.4			
	DESCRIPCION ITEM		UND: UND	
			Suministro e instalación de red general A.F. Accesorio PVC-P Ø=1/2".	

[illegible]

OBSERVACIONES:	REVISOR	Vo. Bo. INTERVENTORIA CONSORCIO INTER DEPORTIVOS	Vo. Bo. INTEC
	Firma: ARQ. JUANCARLOS		
	SUPERVISOR		
	Firma:		Firma: Residente de obra



MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

OBSERVACIONES:	REVISOR		Vo. Bo. INTEC
	Firma: ARQ. JUANCARLOS		
	SUPERVISOR		
	Firma:		
			Firma: Residente de obra



MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:	INTEC		CORTE No. 1	ACTA DE RECIBO PARCIAL 01
OBRA	Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.		FECHA:	13 de diciembre de 2019
CAPITULO	1		PRELIMINARES	
ITEM N°:	N.P 1.6	DESCRIPCION ITEM	Suministro e instalación de Tubería PVC Sanitaria de 4".	
			UND:	ML

[illegible]

OBSERVACIONES:	REVISOR	Vo. Bo.	Vo. Bo. INTEC
	Firma: ARQ. JUANCARLOS SUPERVISOR		
	Firma:		
			Firma: Residente de obra



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:	INTEC		CORTE No. 1	ACTA DE RECIBO PARCIAL 01
OBRA	Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.		FECHA:	13 de diciembre de 2019
CAPITULO		1	PRELIMINARES	
ITEM N°:	N.P 1.7	DESCRIPCION ITEM	Fabricación e instalación de biciclotero anclado en placa en dos puntos, en tubo estructural de 2.5" con una longitud de 2.52 cm, para 5 servicios de bicisuario	
			UND:	UN

Bicicletero



PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA							PROF.	TOTAL	
DESCRIPCION		DIMENSIONES			LONGITUD	ANCHO			
SEGÚN PLANO ADJUNTO		CANTIDAD							
<div><div>Bicicletero</div><div></div></div>		1.00		1.0			1.00		

OBSERVACIONES:	REVISOR	Vo. Bo.	Vo. Bo. INTEC
	Firma: ARQ. JUANCARLOS		
	SUPERVISOR	Vo. Bo.	
	Firma:		
			Firma: Residente de obra



MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

[illegible]



MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

OBSERVACIONES:	REVISOR		V.O. Bo. INTEC
	Firma: ARQ. JUANCARLOS		
	SUPERVISOR		
	Firma:		
			Firma: Residente de obra



MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

[illegible]



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:	INTEC		CORTE No. 2	ACTA DE RECIBO PARCIAL 01
OBRA	Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.		FECHA:	13 de diciembre de 2019
PRELIMINARES				
CAPITULO	1			
ITEM N°:	N.P 2.6	DESCRIPCION ITEM	Suministro einstalacion de sanitario corona de capacidad del tanque: 12. litros o similar con bajo consumo de agua	
			UND:	UND

[illegible]

SUBTOTAL	1,00
VIENEN	-
TOTAL	1,00

OBSERVACIONES:	REVISOR		Vº. Bº. INTEC
	Firma: ARQ. JUANCARLOS SUPERVISOR		
	Firma:		
			Firma: Residente de obra



MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

[illegible]



MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ORINAL



MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

PLACA PARA SILLA



MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	DIMENSIONES			PROF.	TOTAL	
	DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD			ANCHO
	SEGÚN PLANO ADJUNTO					



OBSERVACIONES:	REVISOR		V.O. Bo. INTEC
	Firma: ARQ. JUANCARLOS		
	SUPERVISOR		
	Firma:		
			Firma: Residente de obra



MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	DIMENSIONES			PROF.	TOTAL	
	DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD			ANCHO
	SEGÚN PLANO ADJUNTO					



OBSERVACIONES:	REVISOR		V.O. Bo. INTEC
	Firma: ARQ. JUANCARLOS		
	SUPERVISOR		
	Firma:		
			Firma: Residente de obra



MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	DIMENSIONES			PROF.	TOTAL	
	DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD			ANCHO
	SEGÚN PLANO ADJUNTO					



OBSERVACIONES:	REVISOR		V.O. Bo. INTEC
	Firma: ARQ. JUANCARLOS		
	SUPERVISOR		
	Firma:		
			Firma: Residente de obra



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:	INTEC		CORTE No. 2	ACTA DE RECIBO PARCIAL 01
OBRA	Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.		FECHA:	13 de diciembre de 2019
CAPITULO	1	PRELIMINARES		
ITEM N°:	2.3	DESCRIPCION ITEM	<p>ESCRITORIO RECTO DE 1.50 X 0.80 SIN CAJONERA: La superficie serán en madera tipo táblex de 30 mm (norma ANSI/NEMA LD3-2005), enchapado por la parte superior en laminado de alta presión Fórmica (F8), en la parte inferior llevará Balance-Backer (F8). Perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor. color similar a la superficie de trabajo. Tendrá 2 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies según diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. Los costados se conectarán por medio de vigas metálicas en todo el perímetro de la superficie reforzado por una viga en la mitad, para su estabilidad. Adicionalmente se requiere 1 pasa cables de 8 cm. de diámetro.</p>	
			UND:	UND

[illegible]**OBSERVACIONES:**

REVISOR

Vo. Bo. INTEC

Firma: ARQ. JUANCARLOS SUPERVISOR		Firma: Residente de obra

<div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>						Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.							MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA												
CONTRATISTA:		INTEC						CORTE No. 2		ACTA DE RECIBO PARCIAL 01															
OBRA		Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.						FECHA:		13 de diciembre de 2019															
CAPITULO	1					PRELIMINARES																			
ITEM N°:	2.4	DESCRIPCION ITEM				Suministro y puesta en sitio de LOCKER METÁLICO de 200cm de altura x 120cm de largo x 0.30cm de fondo, Terminación en pintura electrostática con 16 puestos, cada uno llevará manija plástica, portacandado, celosía de ventilación.		UND:		UND															
PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA												DIMENSIONES	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	PROF.	TOTAL								
<div>Locker</div> 												SEGÚN PLANO ADJUNTO													
																	1.00	1.0	1.0	-	1.00				
																								SUBTOTAL	1.00
																								VIENEN	-
												TOTAL	1.00												
OBSERVACIONES:					REVISOR		Vó. Bó. INTEC																		
				Firma: ARQ. JUANCARLOS SUPERVISOR																					
				Firma:				Firma: Residente de obra																	



Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:		INTEC		CORTE No. 2		ACTA DE RECIBO PARCIAL 01	
OBRA		Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.		FECHA:		13 de diciembre de 2019	
CAPITULO		1		PRELIMINARES			
ITEM N°:	N.P 3.1	DESCRIPCION ITEM		Suministro e instalacion de locker metalico de 4 puestos Terminación en pintura electrostática medida aproximada de 1.80m x 0.8m x 0.30m		UND:	UND

[illegible]

	SUBTOTAL	1,00
	VIENEN	-
	TOTAL	1,00

OBSERVACIONES:	REVISOR		Va. Bto. INTEC
	Firma: ARQ. JUANCARLOS		
	SUPERVISOR		
	Firma:		Firma: Residente de obra

