



HILDA NORA ECHAVARRIA ECHAVARRIA

Yo,

en mi calidad de COORDINADORA del grupo administrativo de la Regional Antioquia y de acuerdo con el certificado adjunto, recibido por parte de la SUPERVISORA del contrato relacionado en el presente documento en el que indica que: para efectos del presente pago, el proveedor o contratista ha cumplido con las obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ó ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016. En tal virtud, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S		
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	900.297.404-1
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	05015942024
		FECHA SUSCRIPCIÓN	5 septiembre 2024 día mes año
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 10 septiembre 2024 día mes año	HASTA 30 diciembre 2024 día mes año	RÉGIMEN TRIBUTARIO RESPONSABLE DEL IMPUESTO
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	8 mayo 2025 día mes año		

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Reserva presupuestal	PAGO No:	3	DE	3
VALOR A PAGAR	\$ 106.131.219,00	EN LETRAS	CIENTO SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/L		
PERÍODO DE PAGO	DESDE 1 diciembre 2024 día mes año	HASTA 30 diciembre 2024 día mes año			

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECUR	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
ADQUIS. DE BYS - ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, FAMILIAS Y COMUNIDADES A NIVEL NACIONAL	529924	10	C-4602-1500-9-704020-4602008-02	997	A-02-02-02-008-007-02-9	\$ 106.131.219,00

NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

2.2 INFORMACION BANCARIA

CONSIGNAR EN EL BANCO:	BANCOLOMBIA S.A.	NÚMERO DE CUENTA	15426457725	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE
------------------------	------------------	------------------	-------------	----------------	-----------

3. OBSERVACIONES

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como LUP-PA-NU-CLUNTHULALUA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1591 DE 2012.

4. ANTICIPOS

VALOR A PAGAR	\$ -	A	EN LETRAS	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	\$ -		CUOTA NÚMERO	DE

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR \$ 106.131.219,00
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR \$ 106.131.219,00 B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR: \$ 106.131.219,00

SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO				
NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
HILDA NORA ECHEVERRI ECHEVERRI	COORDINADORA	REGIONAL ANTIOQUIA	GRUPO ADMINISTRATIVO	Hilda Nora Echeverri
NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA
FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL				
NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA
ERIKA ALEXANDRA LONDOÑO SOTO	FINANCIERA	REGIONAL ANTIOQUIA	GRUPO ADMINISTRATIVO	Erika Alexandra Londoño Soto

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC			
NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURÍAS			
RECEPCIÓN DOCUMENTOS			
NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA
DEVOLUCIONES			
NOMBRE QUIÉN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN			
NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
bfdd98137a5c59a8a31cfa9bac6b2b41e9a2f779f66d7213bd0d5ae0b209f49b2c0451c33654341b0b9c2f5cada9b27a

Número de Factura: 1554

Fecha de Emisión: 24/04/2025

Fecha de Vencimiento: 23/06/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES SAS

Nombre Comercial: QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES SAS

Nit del Emisor: 900297404

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 0

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.

Dirección: CALLE 99 No. 49 - 38 OFICINA 1010

Teléfono / Móvil: 6017028880

Correo: comercial@quattroproyectos.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 899999239

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-13;O-15;O-23

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Antioquia

Municipio / Ciudad: Medellín

Dirección: CALLE 45 79 141

Teléfono / Móvil: 4093440

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	41309501	Servicio de obra	94	1,00	\$ 84.974.315,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 84.974.315,00
2	41309502	Administración	94	1,00	\$ 13.595.890,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 13.595.890,00
3	41309504	Utilidad	94	1,00	\$ 3.568.921,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 678.094,99	19.00			\$ 3.568.921,00
4	41309503	Imprevistos	94	1,00	\$ 3.313.998,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 3.313.998,00

Notas Finales

CORTE DE OBRA 03 FINAL DEL CONTRATO DE OBRA ICBF MEDALLIN 05015942024 Cuyo objeto es PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 65 No. 25-73 DEL MUNICIPIO DE MEDALLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA

Datos Totales



Documento generado el:
24/04/2025 16:01:05
Documento validado por la
DIAN:
24/04/2025 16:11:06
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
900534356
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	
\$ \$	

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	
Rete IVA	
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		105.453.124,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		105.453.124,00
IVA		678.095,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		678.095,00
Total neto factura (=)		106.131.219,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)		COP \$106.131.219,00
\$		

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	
Rete IVA	2.109.062,48
Rete ICA	101.714,25
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764069069787 Rango desde: 1302 Rango hasta: 3000 Vigencia: 2026-04-16

Reasignar facturas electrónicas de venta a unidades y subunidades ejecutoras

Fecha de Registro:

NIT Unidad/Sub Unidad:

Unidad/Sub Unidad:

Año Fiscal:

Consulta de facturas									
☐	Tipo Documento	Numero de factura	Fecha de factura	Fecha de radicación	Documento Tercero	Nombre o razón social	Valor Despues IVA	Valor a Obligar	Poi
☐		1554							
☐	FE	FV51554	2025-02-06 00:00:00	2025-02-06 00:00:00	830015970	CAMPO ALTO ACESALUD S.A.S.	\$2.105.000,00	\$2.105.000,00	41-06-00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
☒	FE	1554	2025-04-24 00:00:00	2025-04-24 00:00:00	900297404	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S	\$106.131.219,00	\$106.131.219,00	46-02-00-005 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA

« « | Página 1 de 1 | » » 10

Mostrando 1 - 2 de 2



Bogotá, D.C., Mayo 8 de 2025

Señores

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR "ICBF"

Regional Antioquia

Ate.: **Ing. Janeth Victoria Nivia Castillo**

Coordinadora grupo administrativo

Supervisor Contrato

Medellín

CLARA PATRICIA TIBASOZA CORREDOR identificada con la cedula de ciudadanía No. **51.953.958** de Bogotá, obrando como contador de **QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.**, identificada con el **NIT.: 900.297.404-1**, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y lo establecido en la Ley 828 de 2003, me permito:

CERTIFICA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Que a la fecha y referente al **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA NUMERO 05015942024 CUYO OBJETO ES: "ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA"**, se ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA cuando a ello ha habido lugar desde la fecha de constitución hasta la fecha.

Cordialmente,

CLARA PATRICIA
TIBASOZA
CORREDOR

Firmado digitalmente por
CLARA PATRICIA TIBASOZA
CORREDOR
Fecha: 2025.05.08 14:48:27
-04'00'

CLARA PATRICIA TIBASOZA CORREDOR

C.C.: 51.953.958 de Bogotá

Matricula Profesional 62447-T

QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

N.I.T. 900.297.404-1

PAGADO 04/01/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES SAS		
Documento	NI900297404	Dirección	CL 99 NORTE #49 - 38 OFICINA 1010
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	7028880
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal	GAITAN MAURICIO VARGAS	Identificación	CC 79527629
Total Afiliados	4	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total											
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TDP	TAP	USP	COR	USI	SEN	IGE	UMA	VAC	VAP	VCT	IND	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1011320412	DAYAN KATHERIN RAMIREZ MARIN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.500.000	\$ 240.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.500.000	\$ 60.000	0,522	\$ 1.500.000	\$ 7.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.500.000	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 367.900
CC 1019106770	JUAN CARLOS SUAREZ GIL	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.500.000	\$ 400.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 2.500.000	\$ 100.000	6,960	\$ 2.500.000	\$ 174.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 2.500.000	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 774.000
CC 37335335	ELIANA MARIA RUEDAS ARENAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.000.000	\$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.000.000	\$ 80.000	6,960	\$ 2.000.000	\$ 139.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 2.000.000	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 619.200
CC 79527629	MAURICIO VARGAS GAITAN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 9.500.000	\$ 1.615.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 9.500.000	\$ 380.000	6,960	\$ 9.500.000	\$ 661.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 9.500.000	\$ 380.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.036.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 15.500.000	\$ 15.500.000	\$ 15.500.000	\$ 15.500.000	\$ 2.575.000	\$ 620.000	\$ 982.300	\$ 620.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.797.300	\$ 12.800	\$ 4.810.100

PAGADO 02/05/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES SAS		
Documento	NI900297404	Dirección	CL 99 NORTE #49 - 38 OFICINA 1010
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	7028880
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal	GAITAN MAURICIO VARGAS	Identificación	CC 79527629
Total Afiliados	3	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total					
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TDP	TAP	USP	COR	SVT	SGR	IME	UMA	VAC	VAP	VCT	IND	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 52972899	JENNY ALEXANDRA VARON MACIAS	01	01	X																0	0	14	14	14	(NIN-AF) NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 664.300	\$ 26.600	0,522	\$ 664.300	\$ 3.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 664.300	\$ 26.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.700
CC 79527629	MAURICIO VARGAS GAITAN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 9.500.000	\$ 1.615.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 9.500.000	\$ 380.000	0,522	\$ 9.500.000	\$ 49.600	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 9.500.000	\$ 380.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.424.600
CC 80189319	MAXIMILIANO FLOREZ GARZON	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 2.500.000	\$ 400.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 2.500.000	\$ 100.000	6,960	\$ 2.500.000	\$ 174.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 2.500.000	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 774.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 12.000.000	\$ 12.664.300	\$ 12.664.300	\$ 12.664.300	\$ 2.015.000	\$ 506.600	\$ 227.100	\$ 506.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.255.300	\$ 0	\$ 3.255.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

- 1 Información general
- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Proveedor
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del contrato
- 8 Modificaciones del Contrato
- 9 Incumplimientos

Documento del contrato cargado

Volver

Imprimir

Modificar

<

>

Ejecución del contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Identificación de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor t
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					
<div></div>					

Saldo de pagos y Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	438.182.102,00 pesos	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	438.182.102,00 pesos	100%	-
Valor pendiente de entrega:	438.182.102,00 pesos	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	01. CERTIFICADO DE PAGO 1 CTO 05015942024 -QUATTRO.pdf	01. CERTIFICADO DE PAGO 1 CTO 05015942024 -QUATTRO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	02. INFORME DE SUPERVISIÓN PAGO 1 05015942024 -QUATTRO.pdf	02. INFORME DE SUPERVISIÓN PAGO 1 05015942024 -QUATTRO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle


Editar contrato

☐	03. CONSOLIDADO PAGO 1 QUATTRO.pdf	03. CONSOLIDADO PAGO 1 QUATTRO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	08. CORTE DE OBRA No 01 Y MEMORIAS ADECUACION HI EL REBANO.pdf	08. CORTE DE OBRA No 01 Y MEMORIAS ADECUACION HI EL REBANO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	4. CONSOLIDADO CUATRO PAGO 2.pdf	4. CONSOLIDADO CUATRO PAGO 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE INICIO ORDEN DE SERVICIO 05015942024.pdf	ACTA DE INICIO ORDEN DE SERVICIO 05015942024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUMPLIMIENTO EJE AMBIENTAL.rar	CUMPLIMIENTO EJE AMBIENTAL.rar	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUMPLIMIENTO EJE CALIDAD.rar	CUMPLIMIENTO EJE CALIDAD.rar	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUMPLIMIENTO EJE SST.rar	CUMPLIMIENTO EJE SST.rar	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISION PAGO 2 05015942024 -QUATTRO.pdf	INFORME DE SUPERVISION PAGO 2 05015942024 -QUATTRO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL DE OBRA No 2 ADECUACIONES HI EL REBAÑO.pdf	INFORME MENSUAL DE OBRA No 2 ADECUACIONES HI EL REBAÑO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Oficio de Notificación ADICION Y PRORROGA MENOR CUANTÍA No. 05015942024.pdf	Oficio de Notificación ADICION Y PRORROGA MENOR CUANTÍA No. 05015942024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Oficio de Notificación MENOR CUANTÍA No. 05015942024.pdf	Oficio de Notificación MENOR CUANTÍA No. 05015942024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RPC 529924 CTO MC 05015942024 QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES SApdf	RPC 529924 CTO MC 05015942024 QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES SApdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RPC 529924 MOD 1 ADICION.pdf	RPC 529924 MOD 1 ADICION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RV DEVOLUCION Registro modificación_05015942024_QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES SAS.msg	RV DEVOLUCION Registro modificación_05015942024_QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES SAS.msg	Comprador	Descargar	Detalle
☐	05. Consolidado de pago #3 QUATTRO.pdf	05. Consolidado de pago #3 QUATTRO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Eliminar seleccionado

Subir nuevo


		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141040001141			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9002974041				6. DV 1		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
				14. Buzón electrónico 32			
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		001	
41. Dirección principal CL 99 49 38 O F 1010 ED CENTUM							
42. Correo electrónico gerencia@quattroproyectos.com							
43. Código postal		44. Teléfono 1 2159400		45. Teléfono 2 3103215648			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 7020	47. Fecha inicio actividad 20210101	48. Código 4112	49. Fecha inicio actividad 20090702	50. Código 1 7111 2 7120	51. Código		
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 579101442485255							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico							
07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales							
09- Retención en la fuente en el impuesto							
10- Obligado aduanero							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 23				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 05 - 14 / 10 : 00: 14			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre VARGAS GAITAN MAURICIO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 5 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141040001141			
				 (415)7707212489984(8020) 000014104000114 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 2 9 7 4 0 4		1		Impuestos de Bogotá		3 2	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		1 2	
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				70. Beneficio		1	
64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados							
67. Sociedades y organismos extranjeros							
71. Clase							
0 4				0 1			
72. Número		1 3 0 9 4 0 7		1 1			
73. Fecha		2 0 0 9 0 7 0 2		2 0 1 3 0 4 1 1			
74. Número de notaría							
75. Entidad de registro		0 3		0 3			
76. Fecha de registro		2 0 0 9 0 7 0 2		2 0 1 3 0 4 1 8			
77. No. Matrícula mercantil		0 1 9 0 9 7 1 3		0 1 7 2 3 4 3 8			
78. Departamento		1 1		1 1			
79. Ciudad/Municipio		4		4			
82. Nacional 1 0 0 %							
83. Nacional público 0 . 0 %							
84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %							
85. Extranjero 0 %							
86. Extranjero público 0 . 0 %							
87. Extranjero privado 0 . 0 %							
80. Desde 2 0 0 9 0 7 0 2							
81. Hasta 2 0 1 9 0 7 0 2							
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades 5							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	8 0	2 0 1 7 0 1 0 1		-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.		
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141040001141



(415)7707212489984(8020) 000014104000114 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico


9 0 0 2 9 7 4 0 4 1


Impuestos de Bogotá

3 2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9 0 7 0 2
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 9 5 2 7 6 2 9	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido VARGAS	105. Segundo apellido GAITAN	106. Primer nombre MAURICIO
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9 0 7 0 2
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 5 2 0 2 7 1 5 7	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido BERNAL	105. Segundo apellido SANCHEZ	106. Primer nombre ROCIO
107. Otros nombres DEL PILAR	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

		Formulario del Registro Único Tributario Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 5 Hoja 4			
				4. Número de formulario 141040001141			
				 (415)7707212489984(8020) 000014104000114 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 2 9 7 4 0 4 1		1		Impuestos de Bogotá		3 2	
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales							
1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	1 3		5 2 0 2 7 1 5 7		COLOMBIA 1 6 9		
	115. Primer apellido BERNAL		116. Segundo apellido SANCHEZ		117. Primer nombre ROCIO		118. Otros nombres DEL PILAR
	119. Razón social						
	120. Valor capital del socio 5,000,000		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 5 0 2 0 0 9 0 7 0 2		123. Fecha de retiro
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	1 3		7 9 5 2 7 6 2 9		COLOMBIA 1 6 9		
	115. Primer apellido VARGAS		116. Segundo apellido GAITAN		117. Primer nombre MAURICIO		118. Otros nombres
	119. Razón social						
	120. Valor capital del socio 5,000,000		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 5 0 2 0 0 9 0 7 0 2		123. Fecha de retiro
3	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro
4	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro
5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro

		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001			
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 5 Hoja 5					
				4. Número de formulario 141040001141					
 (415)7707212489984(8020) 000014104000114 1									
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico			
9 0 0 2 9 7 4 0 4		1		Impuestos de Bogotá		3 2			
Revisor Fiscal y Contador									
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV			127. Número de tarjeta profesional	
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre			131. Otros nombres	
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada				
	135. Fecha de nombramiento								
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV			139. Número de tarjeta profesional	
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre			143. Otros nombres	
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada				
	147. Fecha de nombramiento								
Contador	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV			151. Número de tarjeta profesional	
	Cédula de Ciudadanía 1 3		5 1 9 5 3 9 5 8					6 2 4 4 7 T	
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre			155. Otros nombres	
	TIBASOZA		CORREDOR		CLARA			PATRICIA	
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada					
159. Fecha de nombramiento		2 0 2 4 0 5 0 1							

MEMORANDO



Radicado No: 202531500000048213

Para: ANA MILENA CUARTAS TOBÓN
Coordinadora Grupo Financiero

Asunto: PAGO # 3 DEL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 65 C No. 25-73 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO, CTO 05015942024, QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S

Fecha: 2025-05-08

En mi calidad de coordinadora del grupo administrativo, y teniendo en cuenta documento recibido por parte de la supervisora del contrato No. 05015942024, en el que certifica que: para efectos del presente pago, QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S, cumplió con las obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016, además cumple a cabalidad con los requisitos de desembolso exigidos en la resolución 05360 de 2023, por tal motivo autorizo la constitución de la cuenta por pagar correspondiente a los servicios prestados.

“...Los documentos remitidos a través de mensaje de datos son válidos y los mismos pueden obrar como prueba para el trámite de pago, siempre que cumplan con las condiciones establecidas en la Ley 527 de 1999”; y estos documentos del contrato convenio No. 05015942024, han sido radicados mediante ORFEO.

Cordialmente,

Hilda Nora Echeverri

HILDA NORA ECHEVERRI ECHEVERRI

Coordinadora Grupo Administrativo

Proyectó: Erika Alexandra Londoño Soto – Financiera del Grupo Administrativo

www.icbf.gov.co

 @icbfcolombiaoficial

 @ICBFColombia

 @icbfcolombiaoficial

 ICBFColombia

Erika Alexandra Londono Soto

De: Hilda Nora Echeverri Echeverri
Enviado el: jueves, 8 de mayo de 2025 3:37 p. m.
Para: Ana Milena Cuartas Tobon
CC: Angela Bibiana Osorio Patiño; Nelly Patino Arboleda; Erika Alexandra Londono Soto
Asunto: RV: Autorización del pago # 3 contrato 05015942024 QUATTRO PROYECTOS E

Doctora
ANA MILENA CUARTAS TOBON
Coordinadora Financiera
Regional Antioquia, ICBF
E.S.D

Cordial saludo doctora Ana Milena,

En mi calidad de Coordinadora del grupo administrativo y de acuerdo con documento recibido por parte de la SUPERVISORA JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO, del contrato No. 05015942024, certificando que: para efectos del presente pago, QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S, cumplió con las obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016, además cumple a cabalidad con los requisitos de desembolso exigidos en la resolución 05360 de 2023, por tal motivo autorizo la constitución de la cuenta por pagar correspondiente a los servicios prestados.

"...Los documentos remitidos a través de mensaje de datos son válidos y los mismos pueden obrar como prueba para el trámite de pago, siempre que cumplan con las condiciones establecidas en la Ley 527 de 1999"; y estos documentos del contrato convenio No. 05015942024, han sido radicados mediante ORFEO.

Cordialmente,



Hilda Nora Echeverri Echeverri
Profesional Especializado
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Regional Antioquia
Calle 45, 79 -141, América
Teléfono: (604) 4093440 Ext. 400017
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener información reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co


LA COORDINADORA DEL GRUPO ADMINISTRATIVO
DEL ICBF REGIONAL ANTIOQUIA
CERTIFICA QUE:

Ha recibido a satisfacción el acta del corte de obra y memorias No. 3 del contrato # 05015942024 el cual cuenta con el siguiente objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA, está acta es recibida a corte 30 de diciembre del 2024 ejecutada por la empresa QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S con NIT 900.297.404-1, en cumplimiento con el contrato # 05015942024 y acorde con el **acta del corte de obra y memorias No. 3**, adecuaciones finalizadas el 30 de diciembre del 2024 en el Hogar Infantil El Rebaño, los cuales se adjunta en el presente certificado, así las cosas, se autoriza el pago pendiente # 3 por valor de: \$ 106.131.219.

Para constancia se firma a los 30 días del mes de diciembre de 2024.



JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
Coordinadora Grupo Administrativo



CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
Apoyo supervisión - Grupo Administrativo

<div>QUATTRO</div> <div>PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.</div>		REPUBLICA DE COLOMBIA INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF REGIONAL ANTIOQUIA ACTA 3					<div></div> <div>BIENESTAR FAMILIAR</div>																																																																																																																																																																																																								
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.						1. Contratista de Obra: QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.																																																																																																																																																																																																									
						2. Supervisión Grupo Administrativo - Regional Antioquia																																																																																																																																																																																																									
						CORTE DE OBRA 03 FINAL																																																																																																																																																																																																									
<table><tr><td colspan="6">FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</td><td colspan="4">05 SEPTIEMBRE DE 2024</td></tr><tr><td colspan="6">FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO</td><td colspan="4">30 DICIEMBRE DE 2024</td></tr><tr><td colspan="6">VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td colspan="4">\$ 292.418.561</td></tr><tr><td colspan="6">ADICION No. 1</td><td colspan="4">\$ 145.763.541</td></tr><tr><td colspan="6">FECHA ADICIÓN No. 1</td><td colspan="4">06 DICIEMBRE DE 2024</td></tr><tr><td colspan="6">VALOR ACTUAL DEL CONTRATO</td><td colspan="4">\$ 438.182.102</td></tr></table>										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO						05 SEPTIEMBRE DE 2024				FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO						30 DICIEMBRE DE 2024				VALOR INICIAL DEL CONTRATO						\$ 292.418.561				ADICION No. 1						\$ 145.763.541				FECHA ADICIÓN No. 1						06 DICIEMBRE DE 2024				VALOR ACTUAL DEL CONTRATO						\$ 438.182.102																																																																																																																																													
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO						05 SEPTIEMBRE DE 2024																																																																																																																																																																																																									
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO						30 DICIEMBRE DE 2024																																																																																																																																																																																																									
VALOR INICIAL DEL CONTRATO						\$ 292.418.561																																																																																																																																																																																																									
ADICION No. 1						\$ 145.763.541																																																																																																																																																																																																									
FECHA ADICIÓN No. 1						06 DICIEMBRE DE 2024																																																																																																																																																																																																									
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO						\$ 438.182.102																																																																																																																																																																																																									
<table><tr><th colspan="2" rowspan="2">DESCRIPCION</th><th colspan="4">CANTIDADES CONTRACTUALES</th><th colspan="2">BALANCE DE OBRA No 1</th><th colspan="2">ACTA 03</th></tr><tr><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th><th>VR. UNITARIO</th><th>VR. TOTAL</th><th>CANTIDAD MAYOR O MENOR</th><th>VR. TOTAL</th><th>CANTIDAD</th><th>VR. TOTAL</th></tr><tr><td>1</td><td>RETIROS</td><td></td><td></td><td></td><td>\$ 10.370.502</td><td></td><td>\$ 12.569.770</td><td></td><td>\$ -</td></tr><tr><td>1.1</td><td>Retiro de pisos tipo gres y/o material similar para cambio de pisos. Incluye botada de escombros.</td><td>M2</td><td>200,00</td><td>\$ 17.100</td><td>\$ 3.420.000</td><td>185,00</td><td>\$ 3.163.500</td><td>0,00</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>1.2</td><td>Retiro de lavamanos, puertas, lava traperos, enchape de cerámica y zócalos; incluye disposición final .</td><td>GL</td><td>1,00</td><td>\$ 1.284.659</td><td>\$ 1.284.659</td><td>1,00</td><td>\$ 1.284.659</td><td>0,00</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>1.3</td><td>Retiro de cubierta: incluye: retiro de estructura, tablilla, manto asfáltico, alfardas y materiales en mal estado, cargue y botada de escombros y/o el retiro de material recuperable. Medido en proyección horizontal. Teja de barro y tablilla.</td><td>M2</td><td>220,00</td><td>\$ 19.555</td><td>\$ 4.302.100</td><td>210,00</td><td>\$ 4.106.550</td><td>0,00</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>1.4</td><td>Excavación manual de material heterogéneo De 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la Interventoría y/o la Supervisión Técnica y su medida será en el sitio, incluye entibado. (excavación cimientos).</td><td>M3</td><td>27,00</td><td>\$ 50.509</td><td>\$ 1.363.743</td><td>79,49</td><td>\$ 4.015.061</td><td>0,00</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>2</td><td>CONCRETOS Y PISOS</td><td></td><td></td><td></td><td>\$ 45.430.029</td><td></td><td>\$ 32.956.430</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.1</td><td>Mortero de nivelación para cambio de piso en concreto f'c= 14MPa (140kg/cm2). espesor 0,05 m.</td><td>M2</td><td>200,00</td><td>\$ 30.341</td><td>\$ 6.068.200</td><td>185,00</td><td>\$ 5.613.085</td><td>0,00</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>2.2</td><td>Suministro e instalación de porcelanato 60x60 institucional, antideslizante, color por definir, incluye pegacor</td><td>M2</td><td>200,00</td><td>\$ 88.128</td><td>\$ 17.625.600</td><td>160,00</td><td>\$ 14.100.480</td><td>0,00</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>2.3</td><td>Suministro e instalación de piso en baños en material resistente antideslizante, incluye zócalo</td><td>M2</td><td>24,00</td><td>\$ 110.139</td><td>\$ 2.643.336</td><td>25,00</td><td>\$ 2.753.475</td><td>0,00</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>2.4</td><td>Suministro e instalación de guarda escobas en porcelanato con una altura de 0,07 m. Incluye suministro y transporte de los materiales, pegante para porcelanato tipo Pegacor o equivalente, juntas cada 1.8 m. con varilla de dilatación PVC de 4 mm, lechada con Boquilla tipo Concolor 5-15mm o equivalente, remates, cortes con máquina y todo lo necesario para su correcta instalación.</td><td>ML</td><td>410,00</td><td>\$ 28.587</td><td>\$ 11.720.670</td><td>160,00</td><td>\$ 4.573.920</td><td>0,00</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>2.5</td><td>Suministro y aplicado de impermeabilizante tipo brea asfáltica para muros bajos y cimientos, incluye: dos manos.</td><td>M2</td><td>156,00</td><td>\$ 37.268</td><td>\$ 5.813.808</td><td>119,00</td><td>\$ 4.434.892</td><td>0,00</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>2.6</td><td>Relleno con material del sitio compactado mecánicamente. (zanja de impermeabilización cimientos)</td><td>M3</td><td>27,00</td><td>\$ 20.695</td><td>\$ 558.765</td><td>71,54</td><td>\$ 1.480.578</td><td>0,00</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>2.7</td><td>Limpieza, lavado superficial con ácido muriático para pisos y baldosín existentes del patio, incluye; emboquillado.</td><td>M2</td><td>50,00</td><td>\$ 19.993</td><td>\$ 999.650</td><td>0,00</td><td>\$ -</td><td>0,00</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>3</td><td>INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS</td><td></td><td></td><td></td><td>\$ 6.704.090</td><td></td><td>\$ 11.726.058</td><td></td><td>\$ -</td></tr><tr><td>3.1</td><td>Diagnóstico red hidráulica y sanitaria</td><td>GL</td><td>1,00</td><td>\$ 63.663</td><td>\$ 63.663</td><td>1,00</td><td>\$ 63.663</td><td>0,00</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>3.2</td><td>Suministro, transporte e instalación de medidor y contador en 1/2" con acometida de 1/2" , calibrado, incluye la instalación de la tapa metálica, según norma</td><td>GL</td><td>1,00</td><td>\$ 548.063</td><td>\$ 548.063</td><td>0,00</td><td>\$ -</td><td>0,00</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>3.3</td><td>Suministro, transporte e instalación válvula compuerta 1/2" o equivalente. Se entregará debidamente instalada sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado.</td><td>UND</td><td>3,00</td><td>\$ 264.385</td><td>\$ 793.155</td><td>3,00</td><td>\$ 793.155</td><td>0,00</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>3.4</td><td>Suministro e instalación de nueva red hidráulica en tubería de PVC de 1/2", la cual debe estar embebida en la edificación, incluye: tubería de 1/2", accesorio, demolición, revoque, pintura, obra civil, porcelanato y terminación final y demás elementos para su correcto funcionamiento para el cumplimiento de la norma de salud.</td><td>ML</td><td>110,00</td><td>\$ 19.862</td><td>\$ 2.184.820</td><td>50,00</td><td>\$ 993.100</td><td>0,00</td><td>\$ -</td></tr></table>										DESCRIPCION		CANTIDADES CONTRACTUALES				BALANCE DE OBRA No 1		ACTA 03		UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD MAYOR O MENOR	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	1	RETIROS				\$ 10.370.502		\$ 12.569.770		\$ -	1.1	Retiro de pisos tipo gres y/o material similar para cambio de pisos. Incluye botada de escombros.	M2	200,00	\$ 17.100	\$ 3.420.000	185,00	\$ 3.163.500	0,00	\$ -	1.2	Retiro de lavamanos, puertas, lava traperos, enchape de cerámica y zócalos; incluye disposición final .	GL	1,00	\$ 1.284.659	\$ 1.284.659	1,00	\$ 1.284.659	0,00	\$ -	1.3	Retiro de cubierta: incluye: retiro de estructura, tablilla, manto asfáltico, alfardas y materiales en mal estado, cargue y botada de escombros y/o el retiro de material recuperable. Medido en proyección horizontal. Teja de barro y tablilla.	M2	220,00	\$ 19.555	\$ 4.302.100	210,00	\$ 4.106.550	0,00	\$ -	1.4	Excavación manual de material heterogéneo De 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la Interventoría y/o la Supervisión Técnica y su medida será en el sitio, incluye entibado. (excavación cimientos).	M3	27,00	\$ 50.509	\$ 1.363.743	79,49	\$ 4.015.061	0,00	\$ -	2	CONCRETOS Y PISOS				\$ 45.430.029		\$ 32.956.430			2.1	Mortero de nivelación para cambio de piso en concreto f'c= 14MPa (140kg/cm2). espesor 0,05 m.	M2	200,00	\$ 30.341	\$ 6.068.200	185,00	\$ 5.613.085	0,00	\$ -	2.2	Suministro e instalación de porcelanato 60x60 institucional, antideslizante, color por definir, incluye pegacor	M2	200,00	\$ 88.128	\$ 17.625.600	160,00	\$ 14.100.480	0,00	\$ -	2.3	Suministro e instalación de piso en baños en material resistente antideslizante, incluye zócalo	M2	24,00	\$ 110.139	\$ 2.643.336	25,00	\$ 2.753.475	0,00	\$ -	2.4	Suministro e instalación de guarda escobas en porcelanato con una altura de 0,07 m. Incluye suministro y transporte de los materiales, pegante para porcelanato tipo Pegacor o equivalente, juntas cada 1.8 m. con varilla de dilatación PVC de 4 mm, lechada con Boquilla tipo Concolor 5-15mm o equivalente, remates, cortes con máquina y todo lo necesario para su correcta instalación.	ML	410,00	\$ 28.587	\$ 11.720.670	160,00	\$ 4.573.920	0,00	\$ -	2.5	Suministro y aplicado de impermeabilizante tipo brea asfáltica para muros bajos y cimientos, incluye: dos manos.	M2	156,00	\$ 37.268	\$ 5.813.808	119,00	\$ 4.434.892	0,00	\$ -	2.6	Relleno con material del sitio compactado mecánicamente. (zanja de impermeabilización cimientos)	M3	27,00	\$ 20.695	\$ 558.765	71,54	\$ 1.480.578	0,00	\$ -	2.7	Limpieza, lavado superficial con ácido muriático para pisos y baldosín existentes del patio, incluye; emboquillado.	M2	50,00	\$ 19.993	\$ 999.650	0,00	\$ -	0,00	\$ -	3	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS				\$ 6.704.090		\$ 11.726.058		\$ -	3.1	Diagnóstico red hidráulica y sanitaria	GL	1,00	\$ 63.663	\$ 63.663	1,00	\$ 63.663	0,00	\$ -	3.2	Suministro, transporte e instalación de medidor y contador en 1/2" con acometida de 1/2" , calibrado, incluye la instalación de la tapa metálica, según norma	GL	1,00	\$ 548.063	\$ 548.063	0,00	\$ -	0,00	\$ -	3.3	Suministro, transporte e instalación válvula compuerta 1/2" o equivalente. Se entregará debidamente instalada sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado.	UND	3,00	\$ 264.385	\$ 793.155	3,00	\$ 793.155	0,00	\$ -	3.4	Suministro e instalación de nueva red hidráulica en tubería de PVC de 1/2", la cual debe estar embebida en la edificación, incluye: tubería de 1/2", accesorio, demolición, revoque, pintura, obra civil, porcelanato y terminación final y demás elementos para su correcto funcionamiento para el cumplimiento de la norma de salud.	ML	110,00	\$ 19.862	\$ 2.184.820	50,00	\$ 993.100	0,00	\$ -
DESCRIPCION		CANTIDADES CONTRACTUALES				BALANCE DE OBRA No 1		ACTA 03																																																																																																																																																																																																							
		UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD MAYOR O MENOR	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL																																																																																																																																																																																																						
1	RETIROS				\$ 10.370.502		\$ 12.569.770		\$ -																																																																																																																																																																																																						
1.1	Retiro de pisos tipo gres y/o material similar para cambio de pisos. Incluye botada de escombros.	M2	200,00	\$ 17.100	\$ 3.420.000	185,00	\$ 3.163.500	0,00	\$ -																																																																																																																																																																																																						
1.2	Retiro de lavamanos, puertas, lava traperos, enchape de cerámica y zócalos; incluye disposición final .	GL	1,00	\$ 1.284.659	\$ 1.284.659	1,00	\$ 1.284.659	0,00	\$ -																																																																																																																																																																																																						
1.3	Retiro de cubierta: incluye: retiro de estructura, tablilla, manto asfáltico, alfardas y materiales en mal estado, cargue y botada de escombros y/o el retiro de material recuperable. Medido en proyección horizontal. Teja de barro y tablilla.	M2	220,00	\$ 19.555	\$ 4.302.100	210,00	\$ 4.106.550	0,00	\$ -																																																																																																																																																																																																						
1.4	Excavación manual de material heterogéneo De 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la Interventoría y/o la Supervisión Técnica y su medida será en el sitio, incluye entibado. (excavación cimientos).	M3	27,00	\$ 50.509	\$ 1.363.743	79,49	\$ 4.015.061	0,00	\$ -																																																																																																																																																																																																						
2	CONCRETOS Y PISOS				\$ 45.430.029		\$ 32.956.430																																																																																																																																																																																																								
2.1	Mortero de nivelación para cambio de piso en concreto f'c= 14MPa (140kg/cm2). espesor 0,05 m.	M2	200,00	\$ 30.341	\$ 6.068.200	185,00	\$ 5.613.085	0,00	\$ -																																																																																																																																																																																																						
2.2	Suministro e instalación de porcelanato 60x60 institucional, antideslizante, color por definir, incluye pegacor	M2	200,00	\$ 88.128	\$ 17.625.600	160,00	\$ 14.100.480	0,00	\$ -																																																																																																																																																																																																						
2.3	Suministro e instalación de piso en baños en material resistente antideslizante, incluye zócalo	M2	24,00	\$ 110.139	\$ 2.643.336	25,00	\$ 2.753.475	0,00	\$ -																																																																																																																																																																																																						
2.4	Suministro e instalación de guarda escobas en porcelanato con una altura de 0,07 m. Incluye suministro y transporte de los materiales, pegante para porcelanato tipo Pegacor o equivalente, juntas cada 1.8 m. con varilla de dilatación PVC de 4 mm, lechada con Boquilla tipo Concolor 5-15mm o equivalente, remates, cortes con máquina y todo lo necesario para su correcta instalación.	ML	410,00	\$ 28.587	\$ 11.720.670	160,00	\$ 4.573.920	0,00	\$ -																																																																																																																																																																																																						
2.5	Suministro y aplicado de impermeabilizante tipo brea asfáltica para muros bajos y cimientos, incluye: dos manos.	M2	156,00	\$ 37.268	\$ 5.813.808	119,00	\$ 4.434.892	0,00	\$ -																																																																																																																																																																																																						
2.6	Relleno con material del sitio compactado mecánicamente. (zanja de impermeabilización cimientos)	M3	27,00	\$ 20.695	\$ 558.765	71,54	\$ 1.480.578	0,00	\$ -																																																																																																																																																																																																						
2.7	Limpieza, lavado superficial con ácido muriático para pisos y baldosín existentes del patio, incluye; emboquillado.	M2	50,00	\$ 19.993	\$ 999.650	0,00	\$ -	0,00	\$ -																																																																																																																																																																																																						
3	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS				\$ 6.704.090		\$ 11.726.058		\$ -																																																																																																																																																																																																						
3.1	Diagnóstico red hidráulica y sanitaria	GL	1,00	\$ 63.663	\$ 63.663	1,00	\$ 63.663	0,00	\$ -																																																																																																																																																																																																						
3.2	Suministro, transporte e instalación de medidor y contador en 1/2" con acometida de 1/2" , calibrado, incluye la instalación de la tapa metálica, según norma	GL	1,00	\$ 548.063	\$ 548.063	0,00	\$ -	0,00	\$ -																																																																																																																																																																																																						
3.3	Suministro, transporte e instalación válvula compuerta 1/2" o equivalente. Se entregará debidamente instalada sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado.	UND	3,00	\$ 264.385	\$ 793.155	3,00	\$ 793.155	0,00	\$ -																																																																																																																																																																																																						
3.4	Suministro e instalación de nueva red hidráulica en tubería de PVC de 1/2", la cual debe estar embebida en la edificación, incluye: tubería de 1/2", accesorio, demolición, revoque, pintura, obra civil, porcelanato y terminación final y demás elementos para su correcto funcionamiento para el cumplimiento de la norma de salud.	ML	110,00	\$ 19.862	\$ 2.184.820	50,00	\$ 993.100	0,00	\$ -																																																																																																																																																																																																						



REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF
REGIONAL ANTIOQUIA



ACTA 3

3.5	Suministro, transporte e instalación de SALIDA PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2". Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	UND	5,00	\$	60.418	\$	302.090	15,00	\$	906.270	0,00	\$	-
3.6	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 2", para aguas residuales ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagarán en su ítem respectivo.	ML	31,00	\$	27.622	\$	856.282	5,47	\$	151.092	0,00	\$	-
3.7	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 3", para aguas residuales o lluvia ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagarán en su ítem respectivo.	ML	17,00	\$	30.341	\$	515.797	75,50	\$	2.290.746	0,00	\$	-
3.8	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 4", para aguas residuales o lluvia ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagarán en su ítem respectivo.	ML	8,00	\$	40.083	\$	320.664	126,36	\$	5.064.888	0,00	\$	-
3.9	Suministro, transporte e instalación de SALIDA SANITARIA DE 2". Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	UND	5,00	\$	57.283	\$	286.415	10,00	\$	572.830	0,00	\$	-
3.10	Suministro, transporte e instalación de SALIDA SANITARIA DE 3". Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	UND	5,00	\$	69.187	\$	345.935	7,00	\$	484.309	0,00	\$	-
3.11	Suministro, transporte e instalación de SALIDA SANITARIA DE 4". Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	UND	6,00	\$	81.201	\$	487.206	5,00	\$	406.005	0,00	\$	-
4	APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES					\$	7.815.197		\$	3.528.882		\$	-
4.1	Suministro y colocación de Sanitario bajo consumo para niños, color blanco. Incluye: brida de fijación, tapón con rosca para brida del color del sanitario, grifería, abasto metálico, (con manguera flexible), emboquillado con silicona antihongos y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	UND	5,00	\$	750.802	\$	3.754.010	0,00	\$	-	0,00	\$	-
4.2	Suministro y colocación de Sanitario bajo consumo para adultos, color blanco. Incluye: brida de fijación, tapón con rosca para brida del color del sanitario, grifería, abasto metálico, (con manguera flexible), emboquillado con silicona antihongos y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	UND	1,00	\$	657.850	\$	657.850	1,00	\$	657.850	0,00	\$	-
4.3	Suministro, transporte y colocación de lavamanos de sobreponer (tipo Marcella o equivalente), color blanco. Incluye sifón botella, emboquillado con silicona antihongos y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	5,00	\$	285.519	\$	1.427.595	5,00	\$	1.427.595	0,00	\$	-
4.4	Suministro, transporte y colocación de orinal pequeño o mediano, línea institucional de corona o equivalente, color blanco. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	2,00	\$	359.810	\$	719.620	1,00	\$	359.810	0,00	\$	-
4.5	Suministro, transporte y colocación de grifería para lavamanos tipo push Grival o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, conexiones a la red de abastos, accesorios, válvula economizadora y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	6,00	\$	81.245	\$	487.470	5,00	\$	406.225	0,00	\$	-
4.6	Suministro, transporte y colocación de grifería para orinal tipo push Grival o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, conexiones a la red de abastos, accesorios y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	2,00	\$	193.784	\$	387.568	2,00	\$	387.568	0,00	\$	-
4.7	Suministro, transporte y colocación de lava escobas prefabricado en concreto forrado en granito de 47x47x30 cm. fondo gris. Incluye mortero 1:4, conexiones a la red hidrosanitaria, sifón y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	1,00	\$	250.443	\$	250.443	0,00	\$	-	0,00	\$	-



REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF
REGIONAL ANTIOQUIA



ACTA 3

4.8	Suministro, transporte y colocación de canilla boca manguera tipo llave de jardín liviana satinada Grival o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, conexiones a la red de abastos, accesorios y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	1,00	\$ 44.985	\$ 44.985	2,00	\$ 89.970	0,00	\$ -
4.9	Suministro, transporte y colocación de rejilla de piso de perforación cuadriculada con dimensiones de 10x10mm o equivalente. Incluye suministro e instalación.	UND	3,00	\$ 28.552	\$ 85.656	7,00	\$ 199.864	0,00	\$ -
5	CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA				\$ 14.027.691		\$ 11.565.356		\$ -
5.1	Suministro y colocación de puerta (marco y ala) en lamina calibre 20 troquelada, para WC, incluye pasadores metálicos, pintura anticorrosiva y a base de aceite., según diseño. (de 0,60/075) x 1,60 m.	UND	1,00	\$ 710.289	\$ 710.289	0,00	\$ -	0,00	\$ -
5.2	Suministro e Instalación de puerta en madera entamborada (0.80 x 2.20 mts) Incluye: marco, cerradura y ventana de inspección. (puerta salones).	UND	13,00	\$ 747.382	\$ 9.715.966	13,00	\$ 9.715.966	0,00	\$ -
5.3	Suministro e instalación de puerta en lamina c.r. calibre 12 con cerradura de seguridad, manija en acero inoxidable, con estructura interna en perfil tubular cuadrado, instalado con accesorios y bisagra de alta resistencia. (incluye marco, pintura, herrajes y cerraduras). (puerta acceso principal)	UND	1,00	\$ 1.276.766	\$ 1.276.766	1,00	\$ 1.276.766	0,00	\$ -
5.4	Suministro e instalación de puerta reja de ingreso de seguridad en hierro tubo cuadrado (incluye herrajes, anticorrosivo, esmalte y cerraduras)	ML	2,00	\$ 264.824	\$ 529.648	1,00	\$ 264.824	0,00	\$ -
5.5	Suministro y aplicado de esmalte para rejas de ventanas y puerta de acceso, incluye; raspada y anticorrosivo, color a definir	M2	18,00	\$ 17.100	\$ 307.800	18,00	\$ 307.800	0,00	\$ -
5.6	Mantenimiento de closet. Incluye ajustes necesarios, pintura general, bisagras, tornillos y todo lo requerido para su buen funcionamiento	GL	1,00	\$ 838.316	\$ 838.316	0,00	\$ -	0,00	\$ -
5.7	Suministro y aplicado de esmalte para soportes (tubos) metálicos patio central y reja metálica, incluye; raspada y anticorrosivo, color a definir	GL	1,00	\$ 648.906	\$ 648.906	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6	TRATAMIENTO DE MUROS				\$ 20.229.709		\$ 21.631.302		\$ 14.154.234
6.1	Enchape en baldosín blanco tipo egeo: Incluye pegacor, remate en varilla de PVC intermatex acolillado para los baños.	M2	59,00	\$ 89.137	\$ 5.259.083	70,00	\$ 6.239.590	0,00	\$ -
6.2	Suministro y aplicado de pintura a base de agua , vinilo de primera calidad sobre pintura existente, tres manos , incluye resanes , con estuco plástico tipo plastestuco o similar diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir, (rasquetiada o rutiada), hasta obtener una superficie pareja y homogénea Color a definir, según aprobación de la interventoría en muro.	M2	719,00	\$ 19.686	\$ 14.154.234	719,00	\$ 14.154.234	719,00	\$ 14.154.234,00
6.3	Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior en muro y patios. (hidro repelente) tipo coraza, para exteriores, diluido en agua, color a definir, aprobado por la interventoría	M2	38,00	\$ 21.484	\$ 816.392	57,60	\$ 1.237.478	0,00	\$ -
7	APARATOS SANITARIOS				\$ 13.055.932		\$ 5.262.841		\$ 5.262.841
7.1	Suministro e instalación de mesón en acero inoxidable AISI 430 calibre 22 (0.7 mm) de 320 cm x 60 cm, con estufa de 4 fogones y con lavaplatos (incluye grifería y accesorios de desagüe).	UND	1,00	\$ 2.911.308	\$ 2.911.308	0,00	\$ -	0,00	\$ -
7.2	Suministro e instalación de mueble alto y bajo en acero inoxidable de 3.5 mt x 0.6 mt, incluye: gabinetes, puertas, cerraduras y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1,00	\$ 3.418.156	\$ 3.418.156	0,00	\$ -	0,00	\$ -
7.3	Suministro e instalación de cielo falso en PVC color blanco para la cocina, incluye remates, estructura y acabado final.	M2	13,00	\$ 109.613	\$ 1.424.969	22,00	\$ 2.411.486	22,00	\$ 2.411.486,00
7.4	Suministro y aplicado de pintura epóxica color blanca, incluye: resanes y lijado.	M2	55,00	\$ 16.223	\$ 892.265	78,00	\$ 1.265.394	78,00	\$ 1.265.394,00
7.5	Suministro e instalación de muro super board doble cara 0.12 m (incluye estructura, accesorios, anclaje, cinta y pintura).	M2	16,00	\$ 92.601	\$ 1.481.616	0,00	\$ -	0,00	\$ -
7.6	Suministro e instalación de campana extractora de acero inoxidable, incluye: conexión eléctrica	UND	1,00	\$ 539.294	\$ 539.294	0,00	\$ -	0,00	\$ -
7.7	Puerta en aluminio color champaña, con perfilera en aluminio tipo alm-serie 4525-3 para puertas batientes, sistema 500-3 biselado para cuerpos fijos y cristal incoloro templado de seguridad de 5mm, incluye manijas.	UND	2,00	\$ 747.645	\$ 1.495.290	1,00	\$ 747.645	1,00	\$ 747.645,00
7.8	Suministro e instalación de ventana en aluminio anodizado corrediza - color mate natural (incluye vidrio cristal templado incoloro e = 6 mm, película de seguridad, accesorios, angeo anti-insectos y anclajes en acero inoxidable)	M2	2,00	\$ 419.158	\$ 838.316	2,00	\$ 838.316	2,00	\$ 838.316,00
7.9	Suministro, transporte y colocación de rejilla de piso de perforación cuadriculada con dimensiones de 10x10mm o equivalente. Incluye suministro e instalación.	UND	2,00	\$ 27.359	\$ 54.718	0,00	\$ -	0,00	\$ -
8	CUBIERTA				\$ 69.891.897		\$ 78.826.422		\$ -



REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF
REGIONAL ANTIOQUIA



ACTA 3

8.1	Suministro y colocación de cinta asfáltica (ruana), de 30cm de desarrollo, espesor 1,5 mm. Incluye todos los elementos para su correcta fijación.	ML	55,00	\$	25.079	\$	1.379.345	72,00	\$	1.805.688	0,00	\$	-
8.2	Suministro y colocación de canoa en U en lámina galvanizada calibre 24 moldurada, grafada y soldada en las uniones, desarrollo 0.70 m., incluye: embudos, boquillas, tapas, ganchos de fijación, pintura anticorrosiva verde y de acabado color a definir por la supervisión, y todos los elementos para su correcta fijación.	ML	55,00	\$	54.631	\$	3.004.705	9,05	\$	494.411	0,00	\$	-
8.3	Suministro e instalación de teja UPVC de 2.5 mm, color naranja, incluye estructura metálica, pintura, obra civil y lo de más requerido para su buen funcionamiento.	M2	220,00	\$	92.513	\$	20.352.860	200,00	\$	18.502.600	0,00	\$	-
8.4	Suministro e instalación caballete en teja UPVC de 2.5 mm color naranja.	ML	30,00	\$	77.080	\$	2.312.400	45,00	\$	3.468.600	0,00	\$	-
8.5	Suministro e instalación claraboya en teja UPVC de 2.5 mm color naranja, incluye reja metálica, pintura, obra civil y lo de más requerido para su buen funcionamiento.	M2	20,00	\$	87.971	\$	1.759.420	0,00	\$	-	0,00	\$	-
8.6	Suministro e instalación de tabilla pino inmunizado (machimbre) incluye: barnizada y pintura (color por definir), retiro de la tabilla existente, cargue y botada de escombros, medido en proyección horizontal para su pago.	M2	220,00	\$	60.418	\$	13.291.960	200,00	\$	12.083.600	0,00	\$	-
8.7	Suministro e instalación de impermeabilización con manto asfáltico, incluye: retiro del manto asfáltico existente, cargue y botada de escombros, medido en proyección horizontal para su pago.	M2	220,00	\$	49.089	\$	10.799.580	200,00	\$	9.817.800	0,00	\$	-
8.8	Suministro e instalación de viga en madera de abarco inmunizada de 15 cm x 15 cm, incluye, retiro de la existente, barnizada y pintura (color por definir). (vigas patio)	ML	10,00	\$	71.204	\$	712.040	0,00	\$	-	0,00	\$	-
8.9	Suministro e instalación de viga en madera de abarco inmunizada de 20 cm x 20 cm, incluye, retiro de la existente, barnizada y pintura (color por definir). (viga principal cubierta)	ML	5,00	\$	87.076	\$	435.380	0,00	\$	-	0,00	\$	-
8.10	Suministro e instalación de viga en madera de abarco inmunizada de 10 cm x 15 cm, incluye, retiro de la existente, barnizada y pintura (color por definir). (correas apoyo viga principal cubierta)	ML	20,00	\$	63.575	\$	1.271.500	70,00	\$	4.450.250	0,00	\$	-
8.11	Suministro e instalación de alfaras y viguetas de 5 cm x 10 cm en madera de pino inmunizada, incluye retiro de las existentes. (cambio de las que presenten deterioro).	ML	150,00	\$	53.473	\$	8.020.950	430,50	\$	23.020.127	0,00	\$	-
8.12	Suministro e instalación de cercha formada por piezas de 3x6 pulgadas en madera de pino inmunizado, para una luz de 4,20 m y pendiente 25 %, incluye: retiro de la existente, barnizada y pintura (color por definir).	UND	3,00	\$	846.209	\$	2.538.627	3,00	\$	2.538.627	0,00	\$	-
8.13	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta de teja traslucida (patios)	M2	25,00	\$	77.430	\$	1.935.750	20,00	\$	1.548.600	0,00	\$	-
8.14	Suministro e instalación de teja traslucida en policarbonato de 0.7 mm, incluye: amarres (patio)	M2	10,00	\$	54.806	\$	548.060	20,00	\$	1.096.120	0,00	\$	-
8.15	Suministro e instalación de bajante aguas lluvias PVC 4"	ML	40,00	\$	38.233	\$	1.529.320	0,00	\$	-	0,00	\$	-
9	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y RED					\$	44.164.830		\$	52.601.080		\$	52.159.824,00
9.1	Diagnóstico eléctrico	GL	1,00	\$	441.256	\$	441.256	1,00	\$	441.256	0,00	\$	-
9.2	Suministro, transporte e instalación de contador electrónico multifuncional 3 fases- 3H calibrado y aprobado ante EPM. Incluye 2 transformadores de corriente 300/5A clase 0.5 calibrados y aprobados por EPM, incluye caja para contador de energía, con espacio para protección y accesorios para su correcta instalación.	UND	1,00	\$	710.289	\$	710.289	1,00	\$	710.289	1,00	\$	710.289,00
9.3	Suministro, transporte e instalación de acometida en cables 3No8(F) +1No8(N)+1No8(T) cobreTHWN-90°C . Incluye conectores, encintada y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.	ML	17,00	\$	99.090	\$	1.684.530	17,00	\$	1.684.530	17,00	\$	1.684.530,00
9.4	Suministro e instalación de caja certificada de sobreponer de 18 circuitos , incluye; totalizados de 60 amperios y 18 breakers de 20 amp	UND	1,00	\$	740.981	\$	740.981	1,00	\$	740.981	1,00	\$	740.981,00
9.5	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de toma doble con polo a tierra GFCI-15 A - 125 V , norma NEMA 5 - 15R, con Led indicador de estado, que no dispare en falso en caso de ser expuesto a condiciones de radiofrecuencia, REF LEV 7599-W, con certificado de conformidad RETIE, reconocido por la S.I.C y certificación de Underwriters Laboratories Inc UL 1493, por ducto PVC empotrado. Incluye: el tomacorriente GFCI con tapa, ducto PVC, cajas 4"x4" con tapa suplemento, conectores de empalme y conexión, curvas, adaptadores terminales, pega PVC, conductores de cobre 1No 10+ 2No12 AWG-CU-THHN/THWN-90°C, tornillos, obra civil y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. (salida promedio de 5 mts).	UND	5,00	\$	116.277	\$	581.385	5,00	\$	581.385	5,00	\$	581.385,00



REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF
REGIONAL ANTIOQUIA



ACTA 3

9.6	Suministro, transporte, instalación de tubería Ø1/2" EMT . Incluye: Uniones, entradas a caja, conduletas, elementos de fijación grapa doble ala más chazo, marcación franja naranja de 10 cm y demás accesorios necesarios para su correcta instalación, que permitan el adecuado desarrollo de los tramos de cableado, cumpliendo con las especificaciones y el RETIE. Este precio deberá incluir todos los costos de mano de obra, accesorios, materiales, transporte y demás costos directos e indirectos para la entrega a satisfacción.	ML	190,00	\$ 36.830	\$ 6.997.700	190,00	\$ 6.997.700	190,00	\$ 6.997.700,00
9.7	Suministro e instalación a todo costo de bandeja cablofil 200mm x 54mm x 2000mm galvanizada y certificada , incluye materiales de instalación y accesorios.	ML	25,00	\$ 114.172	\$ 2.854.300	25,00	\$ 2.854.300	25,00	\$ 2.854.300,00
9.8	Suministro transporte e instalación de Cableado 3N*12 THHN AWG, Libre de Halógenos LS HF FR , (negro/amarillo/azul-blanco-verde) para tomacorriente normal en general por tubería empotrada PVC ó EMT Ø1/2" Incluye accesorio de fijación, y conectores certificados por la RETIE, marcación del cable con el número del circuito y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	395,00	\$ 44.897	\$ 17.734.315	595,00	\$ 26.713.715	595,00	\$ 26.713.715,00
9.9	Suministro e instalación de canaleta metálica 10 cm x 4 cm x 240 cm , blanca, calibre 26 con división interna, incluye tapa y materiales necesarios para su instalación.	ML	4,00	\$ 53.052	\$ 212.208	0,00	\$ -	0,00	\$ -
9.10	Suministro e instalación de lámpara panel led de sobreponer 60x60 con marco 40w luz blanca 6500k 120/277v IP20 (garantía mínima 1 año) certificación RETILAP), incluye: cable encauchetado 3x12 y clavija trifásica.	UND	35,00	\$ 158.368	\$ 5.542.880	35,00	\$ 5.542.880	35,00	\$ 5.542.880,00
9.11	Suministro e instalación de salida de punto energía para las luminarias y tomacorrientes , incluye: toma corriente doble con polo a tierra, tubería Ø1/2" EMT, uniones, caja metálica 2x4, entradas a caja, conduletas, guayas, elementos de fijación grapa doble ala más chazo, marcación franja naranja de 10 cm y demás accesorios necesarios para su correcta instalación, que permitan el adecuado desarrollo de los tramos de cableado, cumpliendo con las especificaciones y el RETIE	UND	48,00	\$ 72.870	\$ 3.497.760	48,00	\$ 3.497.760	48,00	\$ 3.497.760,00
9.12	Suministro e instalación de cable en cu desnudo #8awg certificado, para aterrizar bandeja cablofil y tableros de distribución. Incluye conectores y amarres.	ML	28,00	\$ 38.671	\$ 1.082.788	28,00	\$ 1.082.788	28,00	\$ 1.082.788,00
9.13	Suministro e instalación de interruptor sencillo con tapa resistente a la corrosión certificado (garantía mínima de 1 año) color blanco. Incluye; conectores de resorte, caja metálica 4x4 o 2x4, cinta aislante y demás accesorios para la instalación.	UND	13,00	\$ 39.724	\$ 516.412	13,00	\$ 516.412	13,00	\$ 516.412,00
9.14	Suministrar e instalar cable UTP CAT 6A GRIS LSZH COMMScope (AMP) por tubería Ø1/2" EMT, incluye; uniones, caja metálica 4x4 o 2x4, entradas a caja, conduletas, guayas, elementos de fijación grapa doble ala más chazo, marcación franja azul de 10 cm y demás accesorios necesarios para su correcta instalación, que permitan el adecuado desarrollo de los tramos de cable y cumpliendo con las especificaciones.	ML	160,00	\$ 3.595	\$ 575.200	160,00	\$ 575.200	160,00	\$ 575.200,00
9.15	Suministro e instalación de punto de red con Jack RJ 45, RJ 45 y face plate, incluye: caja metálica 2x4 e instalación y ponchado de los elementos.	UND	9,00	\$ 110.314	\$ 992.826	6,00	\$ 661.884	6,00	\$ 661.884,00
10	OBRAS VARIAS				\$ 2.436.018		\$ 2.638.013		\$ 1.469.677,19
10.1	Aseo general y limpieza. (Incluye lavado especializado de pisos)	M2	197,00	\$ 7.191	\$ 1.416.627	225,09	\$ 1.618.622	125,09	\$ 899.522,19
10.2	Trámite ante la curaduría; solicitud de concepto de reparaciones locativas	GL	1,00	\$ 449.236	\$ 449.236	1,00	\$ 449.236	0,00	\$ -
10.3	Suministro e instalación de aviso institucional en madera (cumplir norma patrimonial) de 1mt x 2mt	UND	1,00	\$ 570.155	\$ 570.155	1,00	\$ 570.155	1,00	\$ 570.155,00
	COSTO DIRECTO				\$ 234.125.895		\$ 233.306.155		\$ 73.046.576,19
	ADMINISTRACIÓN			16,00%	\$ 37.460.143		\$ 37.328.985		\$ 11.687.452
	IMPREVISTOS			3,90%	\$ 9.130.910		\$ 9.098.940		\$ 2.848.816
	UTILIDAD			4,20%	\$ 9.833.288		\$ 9.798.859		\$ 3.067.956
	IVA SOBRE UTILIDAD			19,00%	\$ 1.868.325		\$ 1.861.783		\$ 582.912
	COSTO TOTAL				\$ 292.418.560		\$ 291.394.722		\$ 91.233.713



REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF
REGIONAL ANTIOQUIA



ACTA 3

NO PREVISTAS	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDADES			BALANCE DE OBRA 1		ACTA 03	
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD MAYOR O MENOR	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES				\$ -		\$ 15.132.852,36		\$ -
NP 001	Desmante de cielo raso existente en madera (estructura en repisa y lamina en triplex), incluye el retiro y disposicion final	M2	0,00	\$ 20.900,00	\$ -	22,00	\$ 459.800	0,00	\$ -
NP 002	Demolicion de muros divisorios y cuchillas en mamposteria , incluye el retiro y disposicion final.	M2	0,00	\$ 36.596,00	\$ -	28,60	\$ 1.046.646	0,00	\$ -
NP 003	Demolicion de revoques en mal estado , en muros de cimentacion y muros divisorios, incluye el retiro y disposicion final.	M2	0,00	\$ 26.730,00	\$ -	80,00	\$ 2.138.400	0,00	\$ -
NP 004	Demolicion mesónes en concreto reforzado en cocina y baños , ancho 0,60 metros, incluye retiro y disposicion final.	ML	0,00	\$ 26.013,00	\$ -	6,48	\$ 168.564	0,00	\$ -
NP 005	Desmante de entrepiso existente en tabilla sobre la despensa, incluye el retiro y disposicion final.	M2	0,00	\$ 36.297,00	\$ -	6,80	\$ 246.820	0,00	\$ -
NP 006	Demolicion buitrones o ductos para bajantes de aguas lluvias , altura 3,70 metros, en ladrillo y mortero, incluye el retiro y disposicion final.	ML	0,00	\$ 36.297,00	\$ -	31,50	\$ 1.143.356	0,00	\$ -
NP 007	Demolicion de placa de contrapiso existente , en mortero espesor 6 cms, incluye el retiro y disposicion final.	M2	0,00	\$ 26.506,00	\$ -	182,50	\$ 4.837.345	0,00	\$ -
NP 008	Escarificacion mecanica de muros laterales cimentacion para panete, altura 1 metro, espesor 2 centimetros	ML	0,00	\$ 25.114,00	\$ -	147,78	\$ 3.711.347	0,00	\$ -
NP 009	Desmante de Bordillo en perfil de acero tipo riel , sobre anden de acceso existente, incluye retiro y disposicion final	UN	0,00	\$ 240.253,00	\$ -	1,00	\$ 240.253	0,00	\$ -
NP 010	Desmante de vigas de maderas existentes , seccion 200x200 y 150 x 150, incluye retiro y disposicion final.	ML	0,00	\$ 50.681,00	\$ -	22,50	\$ 1.140.323	0,00	\$ -
2	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS				\$ -		\$ 5.976.946,80		\$ -
NP 011	Caja de inspeccion de 80 x 80 en ladrillo comun, panetada con mortero impermeabilizado, cañuelas y tapa en concreto	UN	0,00	\$ 750.000,00	\$ -	2,00	\$ 1.500.000	0,00	\$ -
NP 012	Cama con arenilla fina y compactada manual para tubería hidrosanitaria y aguas lluvias.	ML	0,00	\$ 33.960,00	\$ -	131,83	\$ 4.476.947	0,00	\$ -
3	PISOS BASES				\$ -		\$ 34.096.871,50		\$ -
NP 014	Relleno de nivelacion suelo portante en material de subase compactado mecanicamente, espesor 10 centimetros promedio.	M2	0,00	\$ 28.215,00	\$ -	182,50	\$ 5.149.238	0,00	\$ -
NP 015	Placa de contrapiso en concreto de 3,000 PSI , espesor 10 centimetros, incluye trasporte traciego horizontal.	M2	0,00	\$ 135.000,00	\$ -	182,50	\$ 24.637.500	0,00	\$ -




REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF
REGIONAL ANTIOQUIA



ACTA 3

NP 016	Refuerzo placa de contrapiso en malla electrosoldada 0,15 x 0,15 x 0,06 en ambos sentidos.	M2	0,00	\$ 19.084,00	\$ -	182,50	\$ 3.482.830	0,00	\$ -
NP 017	Base pedestal 60x60x100 en concreto armado 3,000 PSI, incluye excavacion, amarre acero y fundida.	UN	0,00	\$ 413.652,00	\$ -	2,00	\$ 827.304	0,00	\$ -
4	MAMPOSTERIA, PANETES Y PINTURAS			\$ -			\$ 32.128.776,36		\$ 1.952.821,11
NP 018	Construccion de muros en soga con ladrillo recocido para buitrones Altura= 4,50 metros	ML	0,00	\$ 71.938,00	\$ -	55,50	\$ 3.992.559	0,00	\$ -
NP 019	Construccion de muros en soga con ladrillo recocido para cuchillas Altura= 1,50 metros	ML	0,00	\$ 51.786,00	\$ -	6,00	\$ 310.716	0,00	\$ -
NP 020	Construccion de muros en tizon con ladrillo de perforacion horizontal rayado medidas 10cm x 20cm x 40 cm	M2	0,00	\$ 115.050,00	\$ -	70,00	\$ 8.053.500	0,00	\$ -
NP 021	Pañete impermeabilizado integralmente 1:4 para fundaciones, altura 60 centimetros y espesor 3 centimetros.	ML	0,00	\$ 28.461,00	\$ -	147,78	\$ 4.205.967	0,00	\$ -
NP 022	Pañete impermeabilizado integralmente 1:4 para culatas, espesor 2 centimetros.	M2	0,00	\$ 35.129,00	\$ -	72,00	\$ 2.529.288	0,00	\$ -
NP 023	Pañete impermeabilizado integralmente 1:4 para muros existentes, espesor 2 centimetros	M2	0,00	\$ 35.129,00	\$ -	155,59	\$ 5.465.721	55,59	\$ 1.952.821,11
NP 024	Pañete impermeabilizado integralmente 1:4 para muros existentes, espesor 2 centimetros hasta 60 centimetros de ancho	ML	0,00	\$ 28.339,00	\$ -	50,00	\$ 1.416.950	0,00	\$ -
NP 025	Carteras en panete 1:4 para muros existentes, espesor 2 centimetros hasta 60 centimetros de ancho, para boca puertas Inc. Madera para chazos de fijacion marco en madera.	ML	0,00	\$ 28.339,00	\$ -	50,00	\$ 1.416.950	0,00	\$ -
NP 026	Encorazada o confinamiento de muros doble en bloque No 4 estriado (incluye cortes diagonales)	ML	0,00	\$ 49.141,00	\$ -	80,73	\$ 3.967.126	0,00	\$ -
NP 013	Empastada de muros nuevos en estuco plastico o similar.	M2	0,00	\$ 11.000,00	\$ -	70,00	\$ 770.000	0,00	\$ -
5	CUBIERTA			\$ -			\$ 20.215.500,00		\$ -
NP 027	Construccion e instalacion canoas con figura V y L, en lamina galvanizada calibre 24 ancho 1.00 metro, soldadas en estaño, con tapas, soscros, esquinas y dobleces (incluye anticorrosivo)	ML	0,00	\$ 150.000,00	\$ -	65,05	\$ 9.757.500	0,00	\$ -
NP 028	Suministro e instalacion de carpinteria metalica de soporte en Perfil Estructural Tubular para soporte de cubierta existente, incluye cortes, soldaduras, anticorrosivo y pintura en esmalte.	KG	0,00	\$ 25.000,00	\$ -	418,32	\$ 10.458.000	0,00	\$ -
6	ACERO INOXIDABLE			\$ -			\$ 9.974.917,05		\$ 9.974.917,05
NP 029	Puertas y divisiones en acero inoxidable A304 para banos infantiles (incluye fijacion, herrajes, bisagras, pasador).	M2	0,00	\$ 949.992,10	\$ -	10,50	\$ 9.974.917	10,50	\$ 9.974.917,05

	COSTO DIRECTO		\$ -		\$ 350.832.019	\$ 84.974.314,35
	ADMINISTRACIÓN	16,00%	\$ -		\$ 56.133.123	\$ 13.595.890
	IMPREVISTOS	3,90%	\$ -		\$ 13.682.449	\$ 3.313.998
	UTILIDAD	4,20%	\$ -		\$ 14.734.945	\$ 3.568.921
	IVA SOBRE UTILIDAD	19,00%	\$ -		\$ 2.799.640	\$ 678.095
	COSTO TOTAL		\$ -		\$ 438.182.176	\$ 106.131.219


ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.


JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA


ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.


ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

TOTAL FACTURA,
CORTE 3: \$ 106.131.219



REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF
REGIONAL ANTIOQUIA

QUATTRO
PROYECTOS E
INVERSIONES S.A.S.

MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 3 FINAL

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	SUPERVISOR:	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	PERIODO:	11 DICIEMBRE A 30 DICIEMBRE 2024

ITEM:	6.2	Suministro y aplicado de pintura a base de agua, vinilo de primera calidad sobre pintura existente, tres manos, incluye resanes, con estuco plástico tipo plastestuco o similar diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir, (rasquetiada o rutiada), hasta obtener una superficie pareja y homogénea Color a definir, según aprobación de la interventoría en muro.
-------	-----	---

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
M2	719,00	0,00	719,00	719,00



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Acceso salon 1	1	8,30		3,42	28,39			28,39
Salon 1	1	11,70		3,62	42,35			42,35
Salon 2	1	19,44		3,62	70,30			70,30
Salon 3	1	19,52		3,38	65,92			65,92
Salon 4	1	18,38		3,45	63,45			63,45
Dispensa	1	17,14		2,50	42,85			42,85
Espacio pedagógico+wc+rack	1	24,59		3,48	85,58			85,58
Hall cocina	1	10,54		3,34	35,20			35,20
Comedor y patio central	1	23,92		3,98	95,23			95,23
Baños	1	19,49		4,91	95,70			95,70
Cocina	1	14,4		0,70	10,08			10,08
Taco escalas	1	6,95		2,50	17,38			17,38
Segundo piso	1	26,63		2,50	66,58			66,58
TOTAL								719,00

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

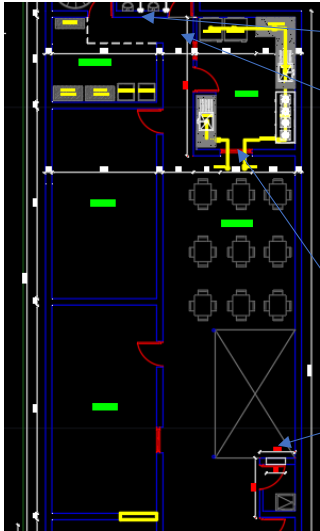
ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSÉ CRUZ GARCÍA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO





ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 3 FINAL				
OBJETO DEL CONTRATO:		CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL		
CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1		SUPERVISOR:	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024			
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN		PERIODO:	11 DICIEMBRE A 30 DICIEMBRE 2024
ITEM:	7.8	Suministro e instalación de ventana en aluminio anodizado corrediza - color mate natural (incluye vidrio cristal templado incoloro e = 6 mm, película de seguridad, accesorios, angeo anti-insectos y anclajes en acero inoxidable)		
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA
UND	2,00		0,00	2,00
				CANTIDAD ACUMULADA
				2,00




LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Bano Auxiliar	1,00	0,60		0,50	0,30			0,30
Cocina	1,00	0,80		0,60	0,48			0,48
Comedor	1,00	1,00		0,60	0,60			0,60
Reparacion Bateria	1,00	1,00		0,65	0,65			0,65
TOTAL								2,00


ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.


JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA


ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

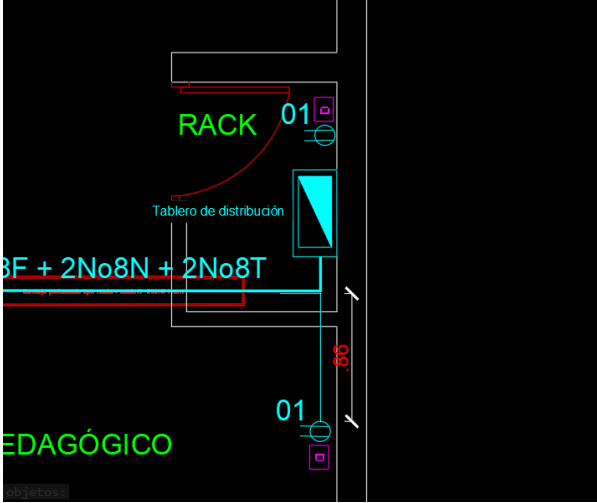
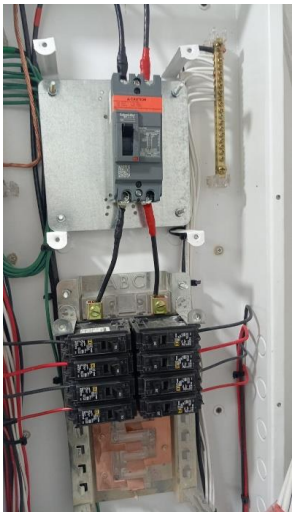

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 3 FINAL

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1			SUPERVISOR:	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024				
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN			PERIODO:	11 DICIEMBRE A 30 DICIEMBRE 2024
ITEM:	9.4	Suministro e instalación de caja certificada de sobreponer de 18 circuitos, incluye; totalizados de 60 amperios y 18 breakers de 20 amp			
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL		CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
UND	1,00	0,00		1,00	1,00



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Rack	1							1,00
TOTAL								1,00

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO



REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF
REGIONAL ANTIOQUIA

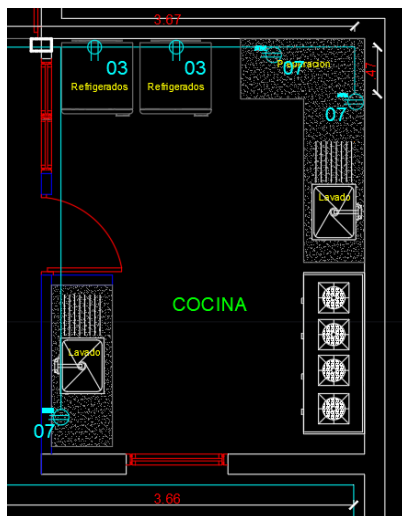


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 3 FINAL


OBJETO DEL CONTRATO:


CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:		QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1		SUPERVISOR:		JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO			
CONTRATO:		No. 05015942024							
LOCALIZACION:		CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN		PERIODO:		11 DICIEMBRE A 30 DICIEMBRE 2024			
ITEM:		9.5 Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de toma doble con polo a tierra GFCI-15 A - 125 V, norma NEMA 5 - 15R, con Led indicador de estado, que no dispare en falso en caso de ser expuesto a condiciones de radiofrecuencia, REF LEV 7599-W, con certificado de conformidad RETIE, reconocido por la S.I.C y certificación de Underwriters Laboratories Inc UL 1493, por ducto PVC empotrado. Incluye: el tomacorriente GFCI con tapa, ducto PVC, cajas 4"x4" con tapa suplemento, conectores de empalme y conexión, curvas, adaptadores terminales, pega PVC, conductores de cobre 1No 10+ 2No12 AWG-CU-THHN/THWN-90°C, tornillos, obra civil y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. (salida promedio de 5 mts).							
UNIDAD		CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD ADICIONAL		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
UND		5,00		0,00		5,00		5,00	



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Cocina	5							5,00
TOTAL								5,00


ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.


JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA


ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.


ARQ. CARLOS JOSÉ CRUZ GARCÍA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO



REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF
REGIONAL ANTIOQUIA



MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 3 FINAL


OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1		SUPERVISOR:	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO	
CONTRATO:	No. 05015942024				
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN		PERIODO:	11 DICIEMBRE A 30 DICIEMBRE 2024	
ITEM:	9.6	Suministro, transporte, instalación de tubería Ø1/2" EMT. Incluye: Uniones, entradas a caja, conduletas, elementos de fijación grapa doble ala más chazo, marcación franja naranja de 10 cm y demás accesorios necesarios para su correcta instalación, que permitan el adecuado desarrollo de los tramos de cableado, cumpliendo con las especificaciones y el RETIE. Este precio deberá incluir todos los costos de mano de obra, accesorios, materiales, transporte y demás costos directos e indirectos para la entrega a satisfacción.			
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	
ML	190,00	0,00	190,00	190,00	




LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Acometida pal.		17,00						17,00
Salon 1		20,00						20,00
Salon 2		20,00						20,00
Salon 3		25,00						25,00
Salon 4		25,00						25,00
Despensa		10,00						10,00
Cocina		20,00						20,00
Bateria sanitaria		20,00						20,00
Extension P2		33,00						33,00
TOTAL								190,00




ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.



JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA



ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.



ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO



REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF
REGIONAL ANTIOQUIA


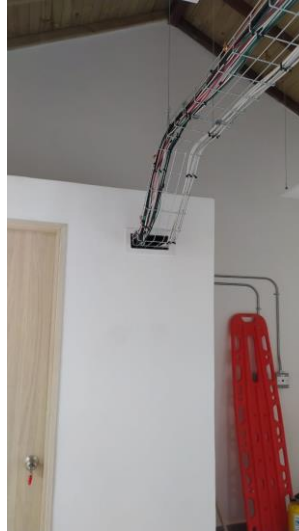
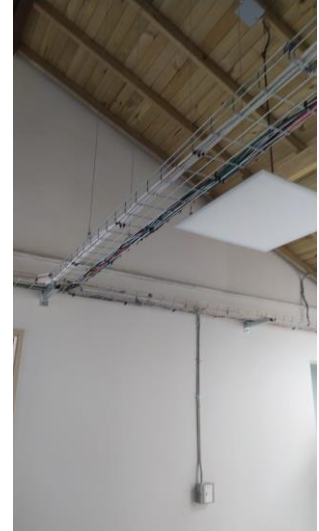


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 3 FINAL


OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.


CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1		SUPERVISOR:	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO	
CONTRATO:	No. 05015942024				
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN		PERIODO:	11 DICIEMBRE A 30 DICIEMBRE 2024	
ITEM:	9.7	Suministro e instalación a todo costo de bandeja cablofil 200mm x 54mm x 2000mm galvanizada y certificada, incluye materiales de instalación y accesorios.			
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	
ML	25,00	0,00	25,00	25,00	



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Hall Pal.		20,34						20,34
Espacio pedag.		3,76						3,76
Rack		0,90						0,90
TOTAL								25,00


ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.


JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA


ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.


ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO



REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF
REGIONAL ANTIOQUIA



MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 3 FINAL


OBJETO DEL CONTRATO:


CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.


CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1		SUPERVISOR:	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO		
CONTRATO:	No. 05015942024					
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN		PERIODO:	11 DICIEMBRE A 30 DICIEMBRE 2024		
ITEM:	9.8	Suministro transporte e instalación de Cableado 3N°12 THHN AWG, Libre de Halógenos LS HF FR, (negro/amarillo/azul-blanco-verde) para tomacorriente normal en general por tubería empotrada PVC ó EMT Ø1/2" Incluye accesorio de fijación, y conectores certificados por la RETIE, marcación del cable con el número del circuito y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.				
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD ADICIONAL		CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
ML	595,00		0,00		595,00	595,00



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Salon 1		40,00						40,00
Salon 2		40,00						40,00
Salon 3		45,00						45,00
Salon 4		45,00						45,00
Despensa		25,00						25,00
Cocina		35,00						35,00
Bateria sanitaria		35,00						35,00
Extension P2		52,00						52,00
Interruptores	10	3,00						30,00
Bandeja cabofil	8	28,00						224,00
Tablero	8	3,00						24,00
TOTAL								595,00


ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.


JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA


ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.


ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO



REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF
REGIONAL ANTIOQUIA

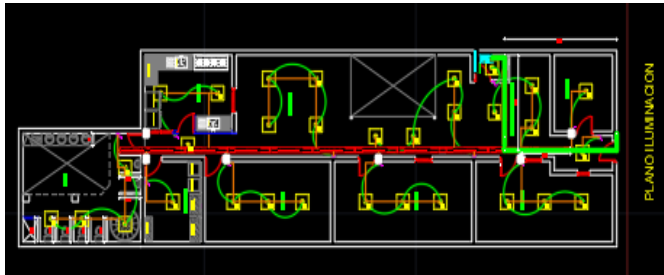


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 3 FINAL

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1		SUPERVISOR:	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024			
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN		PERIODO:	11 DICIEMBRE A 30 DICIEMBRE 2024
ITEM:	9.10	Suministro e instalación de lámpara panel led de sobreponer 60x60 con marco 40w luz blanca 6500k 120/277v IP20 (garantía mínima 1 año) certificación RETILAP), incluye: cable encauchetado 3x12 y clavija trifásica.		
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
UND	35,00	0,00	35,00	35,00



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Hall acceso	1							1,00
Hall Pal.	4							4,00
Salon 1	1							1,00
Salon 2	3							3,00
Salon 3	3							3,00
Salon 4	3							3,00
Espacio Pedagog.	3							3,00
Rack y baño aux	2							2,00
Comedor	4							4,00
Cocina	2							2,00
Despensa	2							2,00
Bateria sanitaria	3							3,00
Piso 2	4							4,00
TOTAL								35,00

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO



REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF
REGIONAL ANTIOQUIA

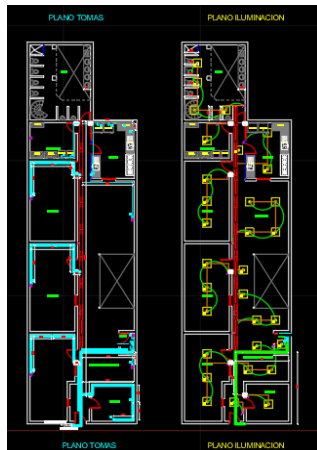
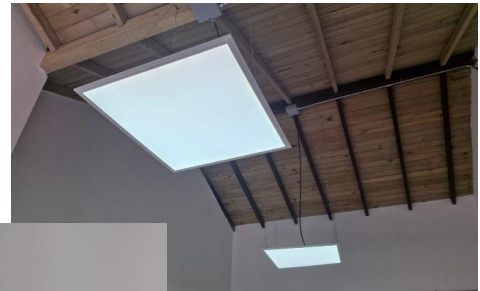


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 3 FINAL


OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.


CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1		SUPERVISOR:	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024			
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN		PERIODO:	11 DICIEMBRE A 30 DICIEMBRE 2024
ITEM:	9.11	Suministro e instalación de salida de punto energía para las luminarias y tomacorrientes, incluye; toma corriente doble con polo a tierra, tubería Ø1/2" EMT, uniones, caja metálica 2x4, entradas a caja, conduletas, guayas, elementos de fijación grapa doble ala más chazo, marcación franja naranja de 10 cm y demás accesorios necesarios para su correcta instalación, que permitan el adecuado desarrollo de los tramos de cableado, cumpliendo con las especificaciones y el RETIE		
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
UND	48,00	0,00	48,00	48,00



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL		TOTAL
		TOMA	LAMPARA		LONGITUD	VOLUMEN	
Hall acceso		0,00	1,00				1,00
Hall Pal.		0,00	4,00				4,00
Salon 1		2,00	1,00				3,00
Salon 2		2,00	3,00				5,00
Salon 3		2,00	3,00				5,00
Salon 4		2,00	3,00				5,00
Esp. Pedag.		1,00	3,00				4,00
Rack y baño aux		1,00	2,00				3,00
Comedor		1,00	4,00				5,00
Cocina		3,00	2,00				5,00
Despensa		2,00	2,00				4,00
Bateria sanitaria		0,00	3,00				3,00
Piso 2		0,00	1,00				1,00
TOTAL							48,00


ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.


JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA


ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.


ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO



REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF
REGIONAL ANTIOQUIA



MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 3 FINAL


OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1		SUPERVISOR:	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO		
CONTRATO:	No. 05015942024					
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN		PERIODO:	11 DICIEMBRE A 30 DICIEMBRE 2024		
ITEM:	9.12	Suministro e instalación de cable en cu desnudo #8awg certificado, para aterrizar bandeja cablofil y tableros de distribución. Incluye conectores y amarres.				
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD ADICIONAL		CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
ML	28,00		0,00		28,00	28,00



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Hall Pal.		20,34						20,34
Espacio pedag.		3,76						3,76
Barraje y medidor		3,90						3,90
TOTAL								28,00


ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.


JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA


ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.


ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO



REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF
REGIONAL ANTIOQUIA

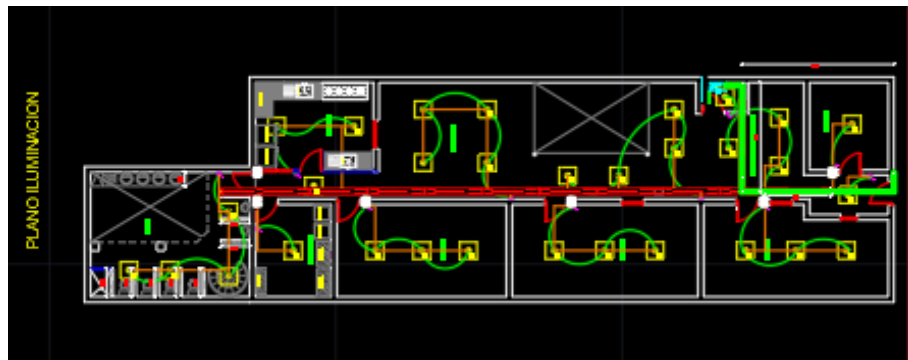


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 3 FINAL


OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.


CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1		SUPERVISOR:	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO	
CONTRATO:	No. 05015942024				
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN		PERIODO:	11 DICIEMBRE A 30 DICIEMBRE 2024	
ITEM:	9.13	Suministro e instalación de interruptor sencillo con tapa resistente a la corrosión certificado (garantía mínima de 1 año) color blanco. Incluye; conectores de resorte, caja metálica 4x4 o 2x4, cinta aislante y demás accesorios para la instalación.			
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD ADICIONAL		CANTIDAD EJECUTADA
UND	13,00		0,00		13,00
					CANTIDAD ACUMULADA
					13,00




LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Hall acceso	1							1,00
Hall Pal.	1							1,00
Salon 1	1							1,00
Salon 2	1							1,00
Salon 3	1							1,00
Salon 4	1							1,00
Esp. Pedag.	1							1,00
Rack y baño aux	2							2,00
Comedor	1							1,00
Cocina	1							1,00
Despensa	1							1,00
Bateria sanitaria	1							1,00
TOTAL								13,00


ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.


JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA


ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.


ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO



REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF
REGIONAL ANTIOQUIA



MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 3 FINAL


OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1		SUPERVISOR:	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO	
CONTRATO:	No. 05015942024				
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN		PERIODO:	11 DICIEMBRE A 30 DICIEMBRE 2024	
ITEM:	9.14	Suministrar e instalar cable UTP CAT 6A GRIS LSZH COMMSCOPE (AMP) por tubería Ø1/2" EMT, incluye; uniones, caja metálica 4x4 o 2x4, entradas a caja, conduletas, guayas, elementos de fijación grapa doble ala más chazo, marcación franja azul de 10 cm y demás accesorios necesarios para su correcta instalación, que permitan el adecuado desarrollo de los tramos de cable y cumpliendo con las especificaciones.			
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD ADICIONAL		CANTIDAD EJECUTADA
ML	160,00		0,00		160,00
					160,00



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Rack	1	2,00						2,00
Salon 1	1	15,00						15,00
Salon 2	1	25,00						25,00
Salon 3	1	35,00						35,00
Salon 4	1	40,00						40,00
Salon pedag	1	13,00						13,00
Comedor	1	30,00						30,00
TOTAL								160,00


ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.


JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA


ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.


ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO



REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF
REGIONAL ANTIOQUIA

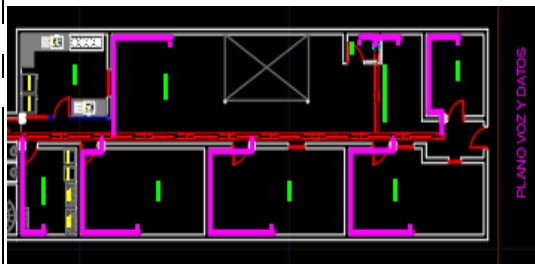
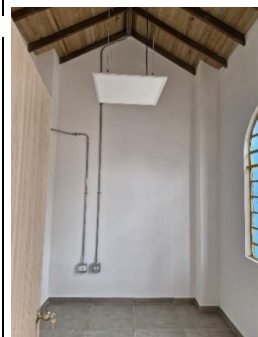
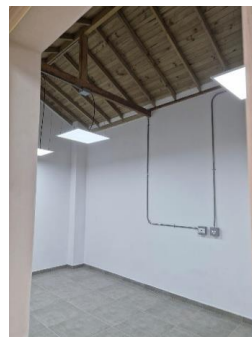


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 3 FINAL


OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1		SUPERVISOR:	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO		
CONTRATO:	No. 05015942024					
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN		PERIODO:	11 DICIEMBRE A 30 DICIEMBRE 2024		
ITEM:	9.15	Suministro e instalación de punto de red con Jack RJ 45, RJ 45 y face plate, incluye: caja metálica 2x4 e instalación y ponchado de los elementos.				
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD ADICIONAL		CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
UND	15,00		0,00		6,00	6,00



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Rack	1							1,00
Salon 1	1							1,00
Salon 2	1							1,00
Salon 3	1							1,00
Salon 4	1							1,00
Salon pedag	1							1,00
TOTAL								6,00


ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.


JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA


ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.


ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO



REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF
REGIONAL ANTIOQUIA



MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 3 FINAL


OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.


CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1		SUPERVISOR:	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO		
CONTRATO:	No. 05015942024					
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN		PERIODO:	11 DICIEMBRE A 30 DICIEMBRE 2024		
ITEM:	10.3	Suministro e instalación de aviso institucional en madera (cumplir norma patrimonial) de 1mt x 2mt				
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD ADICIONAL		CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
UND	1,00		0,00		1,00	1,00



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Fachada Pal	1							1,00
TOTAL								1,00


ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.


JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA



ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.


ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 3 FINAL				
OBJETO DEL CONTRATO:		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.		
CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1		SUPERVISOR:	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024			
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN		PERIODO:	11 DICIEMBRE A 30 DICIEMBRE 2024
ITEM:	NP. 023	Pañete impermeabilizado integralmente 1:4 para muros existentes, espesor 2 centímetros		
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
UND	155,59	0,00	55,59	155,59



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
SALON 1	1	2,75		3,62	9,96			9,96
SALON 2	1	6,65		3,62	24,07			24,07
ESPACIO PEDAGOGICO	1	5,42		1,74	9,43			9,43
SALON 3	1	6,97		1,74	12,13			12,13
TOTAL								55,59


ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.


JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA


ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.


ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

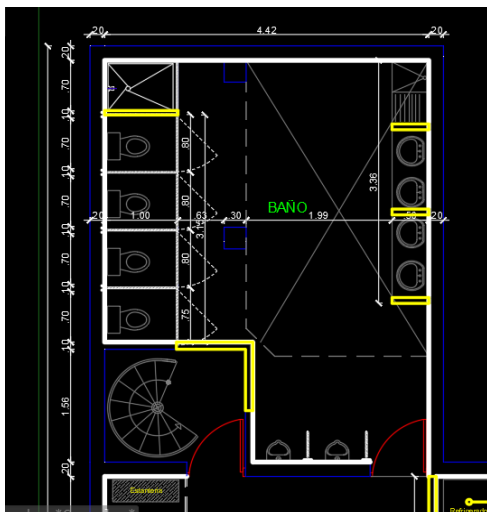


REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF
REGIONAL ANTIOQUIA




MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 3 FINAL

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL				
CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1		SUPERVISOR:	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024			
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN		PERIODO:	11 DICIEMBRE A 30 DICIEMBRE 2024
ITEM:	NP 029 Puertas y divisiones en acero inoxidable A304 para banos infantiles (incluye fijacion, herrajes, bisagras, pasador).			
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
M2	10,50	0,00	10,50	10,50



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Divisiones orinal	2	1,00		1,00				2,00
Divisiones sanit 1	1	1,00		1,20				1,20
Divisiones sanit 2	1	1,00		1,20				1,20
Divisiones sanit 3	1	1,00		1,20				1,20
Divisiones sanit 4	1	1,00		1,20				1,20
Fachada	1	3,10		1,20				3,70
TOTAL								10,50


ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.


JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA


ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.


ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO



QUATTRO PROYECTOS E
INVERSIONES SAS

NIT: 900297404 - 1

Factura Electrónica de Venta

1554

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764069069787 que habilita desde 1302
hasta 3000. Vence 16/04/2026.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención
de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad
Económica ICA

Bogotá, D.C. CALLE 99 No. 49 - 38 OFICINA 1010
Teléfono 6017028880
Correo Electrónico contabilidad@quattroproyectos.com

Cliente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF			NIT: 899999239 - 2		
Dirección: CALLE 45 79 141		Ciudad: Medellín		Teléfono: 4093440	
Fecha: 24/04/2025		Vencimiento: 23/06/2025		Forma de Pago: Crédito	
		\$46-02-00005;05015942			
		Concepto: 024;robinson.castaneda			
		@icbf.gov.co#\$			

Vendedor: QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES SAS

Por Concepto de:

CORTE DE OBRA 03 FINAL DEL CONTRATO DE OBRA ICBF MEDELLIN 05015942024 Cuyo objeto es "PRESTAR EL SERVICIO DE
ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 65C No. 25-73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL
ANTIOQUIA

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	IVA		Total
							%	Valor	
1	41309501	Servicio de obra	und	1	84.974.315	0	0	0	84.974.315
2	41309502	Administración	und	1	13.595.890	0	0	0	13.595.890
3	41309504	Utilidad	und	1	3.568.921	0	19	678.095	3.568.921
4	41309503	Imprevistos	und	1	3.313.998	0	0	0	3.313.998

Valor en Letras CIENTO TRÉS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS BBVA COLOMBIA Cuenta Corriente No. 00130180000100033193 CODIGO SWIFT: GEROCBB	TOTAL LINEAS O ITEMS	4
	SUBTOTAL	\$ 105.453.124
	DESCUENTO	\$ 0
	IVA	\$ 678.095
Recibido Por _____ Firma Responsable _____	TOTAL OPERACION	\$ 106.131.219
	RETEFUENTE	\$ 2.109.062
	RETEIVA	\$ 101.714
	RETEICA	\$ 0
TOTAL DOCUMENTO		\$ 103.920.442



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-04-24 14:38:36

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)


cufe: bfdd98137a5c59a8a31cfa9bac6b2b41e9a2f779f66d7213bd0d5ae0b209f49b2c0451c33654341b0b9c2f5cada9b27a

Fecha de Impresión: 24/04/2025 16:11:36

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14894994967



(415)7707212489984(8020) 000001489499496 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 2 9 7 4 0 4

1

Impuestos de Bogotá

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 99 49 38 O F 1010 ED CENTUM

42. Correo electrónico

gerencia@quattroproyectos.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

2 1 5 9 4 0 0

45. Teléfono 2

3 1 0 3 2 1 5 6 4 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

7 0 2 0

2 0 2 1 0 1 0 1

4 1 1 2

2 0 0 9 0 7 0 2

7 1 1 1

7

1

2

0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5										

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2	3							
	11	12	13	14	15	16	17	18	19

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 02 - 09 / 11 : 44: 39

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre VARGAS GAITAN MAURICIO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14894994967



(415)7707212489984(8020) 000001489499496 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 2 9 7 4 0 4 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 4	0 1	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	1 3 0 9 4 0 7	1 1	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	2 0 0 9 0 7 0 2	2 0 1 3 0 4 1 1	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 0 9 0 7 0 2	2 0 1 3 0 4 1 8	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 1 9 0 9 7 1 3	0 1 7 2 3 4 3 8	
78. Departamento	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	4	
Vigencia			
80. Desde	2 0 0 9 0 7 0 2		
81. Hasta	2 0 1 9 0 7 0 2		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 7 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14894994967



(415)7707212489984(8020) 000001489499496 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 2 9 7 4 0 4

1

Impuestos de Bogotá

3 2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9 0 7 0 2
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 9 5 2 7 6 2 9	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido VARGAS	105. Segundo apellido GAITAN	106. Primer nombre MAURICIO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9 0 7 0 2
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 5 2 0 2 7 1 5 7	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido BERNAL	105. Segundo apellido SANCHEZ	106. Primer nombre ROCIO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	


98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14894994967



(415)7707212489984(8020) 000001489499496 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 2 9 7 4 0 4 1

Impuestos de Bogotá

3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 5 2 0 2 7 1 5 7	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
115. Primer apellido BERNAL	116. Segundo apellido SANCHEZ	117. Primer nombre ROCIO	118. Otros nombres DEL PILAR	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 5,000,000	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 2 0 0 9 0 7 0 2	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 7 9 5 2 7 6 2 9	113. DV 2	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
115. Primer apellido VARGAS	116. Segundo apellido GAITAN	117. Primer nombre MAURICIO	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 5,000,000	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 2 0 0 9 0 7 0 2	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	


111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14894994967



(415)7707212489984(8020) 000001489499496 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 2 9 7 4 0 4 1

Impuestos de Bogotá

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 0 2 1 0 1 8 8		2 4 9 4 2 4 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	CAMARGO	GONZÁLEZ	CAROLINE	SLEIN
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento				
2 0 1 9 1 2 0 3				

QUATTRO

PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.



Bogotá, D.C., abril 08 de 2025

Señores

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR "ICBF"

Regional Antioquia

Ate.: **Sr. Robinson Castañeda Giraldo**

Coordinador grupo administrativo

Medellín

CLARA PATRICIA TIBASOZA CORREDOR identificada con la cedula de ciudadanía No. **51.953.958** de Bogotá, obrando como contador de **QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.**, identificada con el **NIT.: 900.297.404-1**, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y lo establecido en la Ley 828 de 2003, me permito:

CERTIFICA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Que a la fecha y referente al **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA NUMERO 05015942024 CUYO OBJETO ES: "ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA"**, se ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA cuando a ello ha habido lugar desde la fecha de constitución hasta la fecha.

Cordialmente,

CLARA PATRICIA TIBASOZA CORREDOR

C.C.: 51.953.958 de Bogotá

Matricula Profesional 62447-T

QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

N.I.T. 900.297.404-1

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A B 0 8 1 0 5 2 E E 6 3 6 9 A B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **CLARA PATRICIA TIBASOZA CORREDOR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51953958 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 62447-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 11 días del mes de Marzo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.953.958**

TIBASOZA CORREDOR
APELLIDOS

CLARA PATRICIA
NOMBRES

[Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-JUL-1969**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 **A+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

17-NOV-1987 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1500102-47139864-F-0051953958-20051108 0454505312A 02 203883702

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

62447-T

**CLARA PATRICIA
TIBASOZA CORREDOR
C.C. 51953958
RES. INSCRIPCION 146
UNIVERSIDAD CENTRAL**

DEL 17/12/1998



264827

**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL**

70621

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Certificado Bancario

Martes, 29 de octubre de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES SAS identificado(a) con NIT 900297404, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	15458767739	2010/05/06	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.527.629**

VARGAS GAITAN

APELLIDOS

MAURICIO

NOMBRES

Mauricio Vargas Gaitan
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-MAR-1970**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.85

A+

M

ESTATURA


G.S. RH

SEXO

30-JUN-1988 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00164499-M-0079527629-20090727

0013977691A 1

1140102779

PAGADO 04/01/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES SAS		
Documento	NI900297404	Dirección	CL 99 NORTE #49 - 38 OFICINA 1010
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	7028880
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal	GAITAN MAURICIO VARGAS	Identificación	CC 79527629
Total Afiliados	4	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total							
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TDP	TAP	USP	COR	USI	SEN	IGE	UMA	UMA	UMA	UMA	UMA	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total						
CC 1011320412	DAYAN KATHERIN RAMIREZ MARIN	01	00																	0 30 30 30 30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.500.000	\$ 240.000	(EPS07) FAMISANAR EPS	\$ 1.500.000	\$ 60.000	0,522	\$ 1.500.000	\$ 7.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.500.000	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 367.900
CC 1019106770	JUAN CARLOS SUAREZ GIL	01	00																	0 30 30 30 30	(230301) PORVENIR	\$ 2.500.000	\$ 400.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 2.500.000	\$ 100.000	6,960	\$ 2.500.000	\$ 174.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 2.500.000	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 774.000
CC 37335335	ELIANA MARIA RUEDAS ARENAS	01	00																	0 30 30 30 30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.000.000	\$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.000.000	\$ 80.000	6,960	\$ 2.000.000	\$ 139.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 2.000.000	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 619.200
CC 79527629	MAURICIO VARGAS GAITAN	01	00																	0 30 30 30 30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 9.500.000	\$ 1.615.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 9.500.000	\$ 380.000	6,960	\$ 9.500.000	\$ 661.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 9.500.000	\$ 380.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.036.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 15.500.000	\$ 15.500.000	\$ 15.500.000	\$ 15.500.000	\$ 2.575.000	\$ 620.000	\$ 982.300	\$ 620.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.797.300	\$ 12.800	\$ 4.810.100



FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO No. 05015942024			
INFORME PERIODICO N° 3			
1. Datos generales			
Período del informe	DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE	Número de contrato/convenio:	05015942024
Tipo de contrato/convenio	MENOR CUANTIA(RESOLUCION DE ADJUDICACION)	Fecha suscripción contrato/convenio:	5/09/2024
Valor Inicial del contrato/convenio	\$ 292.418.561,00	Plazo de Ejecución Inicial (hasta cuándo):	del 10 de septiembre al 15 de diciembre de 2024
Objeto	PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA		
Alcance del objeto (si aplica)			
2. Datos supervisor			
Nombre y cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO	Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato/convenio)	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO - COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
Nombre y cargo Supervisor ICBF (según memorando de designación, si aplica)		Fecha memorando de designación de supervisión (si aplica)	
Nombre Supervisor ICBF (para efectos de liquidación)		Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)	
Otros supervisores (*)		Cargos de otros supervisores	
(*) Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.			
3. Datos contratista			
Nombre Contratista:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S	Cédula o NIT:	900.297.404-1
Dirección:	CL 99 49 38 O F 1010 ED CENTUM	Correo electrónico:	gerencia@quattroproyectos.com
Representante Legal que suscribió el contrato/convenio:	MAURICIO VARGAS GAITAN	Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación (i):	
Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal (i):	12/08/2024		
(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación.			
4. Plazo de duración del contrato/convenio			
Desde cuándo:	10/09/2024	Hasta cuándo:	15/12/2024
Fecha aprobación pólizas:	10/09/2024	Fecha expedición R.P.:	6/09/2024
Fecha acta de inicio:	10/09/2024	Fecha inicio del contrato/convenio:	10/09/2024
Fecha documento de Prórroga (si aplica):		Prorrogado hasta cuándo (si aplica):	
Fecha aprobación póliza de la prórroga:		Fecha de terminación:	15/12/2024
Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.			
5. Información presupuestal			
Valor Inicial del contrato/convenio	\$ 292.418.561,00		
Aporte ICBF	\$ 292.418.561,00		
Aporte Contratista (si aplica)			
No. de CDP:	108124	Fecha CDP:	2/05/2024
No. de RP:	529924	Fecha RP:	6/09/2024
Valor de CDP:	\$ 303.000.000,00		
Valor de RP:	\$ 292.418.561,00		



(+) ADICIONES

Fecha Documento Adición: _____ Valor Adición: _____
Descripción del concepto de adición realizada en el periodo: _____

No.CDP Adición:	108124	Fecha CDP Adición:	29/11/2024	Valor CDP Adición:	\$ 135.182.102,00
No. de RP Adición:	529924	Fecha RP Adición:	10/12/2024	Valor RP Adición:	\$ 145.763.541,00

Valor adición aporte contratista: _____
Fecha aprobación póliza de la adición _____

Si se presentan más adiciones, incluir filas para éstas.

(-) DISMINUCIONES

Fecha Documento Disminución: _____ Valor disminución : _____
Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo: _____

No.CDP disminución :	_____	Fecha CDP	_____	Valor CDP disminución :	_____
No. de RP disminución :	_____	Fecha RP disminución	_____	Valor RP disminución :	_____

Si se presentan más disminuciones, incluir filas para éstas.

(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones) \$ 438.182.102,00

Valor anticipo (si aplica):	_____	Fecha pago anticipo (si aplica):	_____
Porcentaje amortización (si aplica):	_____	Período facturado:	_____

Forma de Pago:

El valor del contrato a suscribir será hasta por el valor del presupuesto oficial incluidos todos los costos directos e indirectos asociados al suministro de los bienes y/o prestación del servicio, el IVA, demás impuestos de ley, teniendo en cuenta el valor unitario ofertado por el proponente adjudicatario dentro de la oferta económica, según las necesidades que presente la entidad. Se pagará al contratista así:
El valor del presente contrato se pagará mediante pagos mensuales contra cortes quincenales de obra, los cuales deben ser aprobados por la Supervisión del contrato, previa presentación de las actas parciales de obra.
El pago se realizará dentro de los 30 días hábiles siguientes a la radicación de la factura y la certificación de cumplimiento, previa aprobación del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) del ICBF.
Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.
Todos los pagos se realizarán conforme al PAC del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

6. Información relacionada con la contratación derivada (si aplica)

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. N/A de N/A, consistente en N/A(cantidad) contratos, suscritos por N/A (contratante), con el fin de N/A(objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en N/A folios, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales y la certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente.

7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	12/11/2024	\$ 82.135.525,00	
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	17/12/2024	\$ 249.915.358,00	

8. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Financiera

Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago	Valor de desembolsos según minuta contractual (A)	Valor pagado o desembolsado (B)	Diferencia (A-B)	Fecha y número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)
1	\$ 82.135.525,00	\$ 82.135.525,00	\$ 0,00	20/11/2024- OP 441022024	
2	\$ 249.915.358,00	\$ 249.915.358,00	\$ 0,00	23/12/2024 - OP 520523424 - 520534824	
3	\$ 106.131.219,00	0	\$ 106.131.219,00		
TOTALES	\$ 438.182.102,00	\$ 332.050.883,00	\$ 0,00		

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.



9. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
TOTAL		

10. Reintegros efectuados (si aplica)

Fecha reintegro	Valor reintegro	Comprobante reintegro	Concepto reintegro

11. Resumen ejecución presupuestal acumulado (aplica también para informe final)

Concepto		Valor
Valor Inicial del convenio o contrato	Aporte inicial en dinero por EL ICBF	\$ 292.418.561
	Aporte inicial en especie por EL ICBF	\$ 0
	Aporte inicial en dinero por CONTRATISTA	\$ 0
	Aporte inicial en especie por CONTRATISTA	\$ 0
	Total	\$ 292.418.561
Valor adiciones	Adición aporte ICBF	\$ 145.763.541
	Adición aporte CONTRATISTA	\$ 0
	Total	\$ 145.763.541
Valor disminuciones	Disminuciones aporte ICBF	\$ 0
	Disminuciones aporte CONTRATISTA	\$ 0
	Total	\$ 0
Valor total del convenio o contrato	Aporte dinero por EL ICBF	\$ 438.182.102
	Aporte en especie por EL ICBF	\$ 0
	Aporte en dinero por CONTRATISTA	\$ 0
	Aporte en especie por CONTRATISTA	\$ 0
	Total	\$ 438.182.102
Valor total pagado por el ICBF		\$ 332.050.883
Valor total ejecutado recursos del ICBF		\$ 438.182.102
Recursos reintegrados al ICBF		\$ 0
Valor consignaciones - rendimientos financieros (si aplica)*		\$ 0
Valor total ejecutado recursos del CONTRATISTA		\$ 0
Saldo pendiente por reintegrar al ICBF		\$ 0
Saldo Pendiente por Pagar		\$ 106.131.219
Saldo pendiente por liberar **		\$ 0

* Para el informe final, debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado de rendimientos financieros, copias de consignaciones de rendimientos y certificación de la Dirección Financiera que avale dichas consignaciones.

** El saldo pendiente por liberar corresponde a (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las razones por las cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista).....

Fecha estado de cuenta 17/12/2024

12. Garantías

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CSC-100047609	3/09/2024	30/06/2025
Prestaciones sociales			3/09/2024	30/12/2027
Calidad del Servicio			3/09/2024	30/12/2025
calidad y correcto funcionamiento			3/09/2024	30/12/2025
Predios laborales y operaciones	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CSC-100012296	3/09/2024	30/12/2025
Contratistas y subcontratistas			3/09/2024	30/12/2025
vehículos propios y no propios			3/09/2024	30/12/2025

Nota: Es necesario ingresar las garantías de las modificaciones realizadas al contrato. Así mismo, la garantía de estabilidad de obra, debe estar previamente aprobada por la Dirección de Contratación o las Coordinaciones Jurídicas en las Regionales del ICBF, según sea el caso.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

13. Sanciones

Marque con una "X" el tipo de sanción impuesta al contratista.

Tipo de Sanción (seleccionar con una x)	Número y fecha del acto administrativo que resuelve el proceso administrativo sancionatorio contractual.	Número y fecha del acto administrativo que resolvió el recurso (si aplica)	Fecha de ejecutoria del proceso administrativo sancionatorio contractual.	Valor de la sanción impuesta
Multa. (art. 17 Ley 1150 de 2007)				
Declaratoria de incumplimiento con cobro de perjuicios. (art. 17 Ley 1150 de 2007)	Total			
	Parcial			
Caducidad (art. 14, 18, Ley 1150 de 2007)				

14. Cumplimiento de Obligaciones

Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)	Observaciones (iv)
1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y el ICBF.	SI	Certificado de cumplimiento.pdf , este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	
2. Constituir y allegar a EL ICBF las garantías requeridas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.	SI	Las garantías requeridas, estos documentos, reposan en la carpeta condiciones y reposan en el SECOP II,	
3. Participar y apoyar a EL ICBF en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato.	SI	Certificado de cumplimiento.pdf, este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	
4. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del presente contrato.	SI	Certificado de cumplimiento.pdf, este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	
5. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta EL ICBF a través del Supervisor del contrato, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.	SI	08. CORTE DE OBRA No 03 Y MEMORIAS ADECUACION HI EL REBANO, este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	
6. Entregar al Supervisor del contrato, los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera.	SI	08. CORTE DE OBRA No 03 Y MEMORIAS ADECUACION HI EL REBANO, este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	
7. Presentar la factura de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago.	SI	Certificado de cumplimiento.pdf, este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	
8. Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga carácter de pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita del ICBF.	SI	Certificado de cumplimiento.pdf, este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	
9. Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de información que maneje en desarrollo de su actividad.	SI	Certificado de cumplimiento.pdf, este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	
10. Asumir un buen trato para con los demás colaboradores internos y externos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia.	SI	Certificado de cumplimiento.pdf, este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	
11. Devolver al ICBF, una vez finalizado la ejecución del contrato los documentos que en desarrollo del contrato se hayan producido, e igualmente todos los archivos que se hayan generado en cumplimiento de sus obligaciones.	SI	08. CORTE DE OBRA No 03 Y MEMORIAS ADECUACION HI EL REBANO, este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	
12. Colaborar con el ICBF en el suministro y respuesta de la información correspondiente, a los requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del presente documento.	SI	Certificado de cumplimiento.pdf, este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	
13. Utilizar la imagen del ICBF de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste, salvo autorización expresa y escrita de las partes, no se podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole.	SI	Certificado de cumplimiento.pdf, este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	
14. Realizar los pagos al SSS (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales, de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes.	SI	Certificado de cumplimiento.pdf, este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	
15. Respetar la política medioambiental del ICBF, política que incluye todas las normas internas sobre el uso de los recursos ambientales, como el agua y la energía, racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos residuales.	SI	Certificado de cumplimiento.pdf, este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	
16. Cumplir con las disposiciones establecidas en el Capítulo "Buenas Prácticas en la Gestión Contractual" del Manual de Contratación vigente.	SI	Certificado de cumplimiento.pdf, este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

17. Remitir al Supervisor del contrato, dentro de los tres (3) días siguientes a la consignación, copia del documento donde conste la operación que, por concepto de reintegros, rendimientos financieros, multas o cualquier otro, se causen a favor de la Entidad en razón a la ejecución del contrato. PARÁGRAFO: Las consignaciones a que hace referencia esta obligación deben realizarse únicamente en la cuenta informada por escrito por el Supervisor del contrato.	N/A		
Cumplimiento de Obligaciones Específicas del Contrato/ convenio (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste. (iii)	Observaciones (iv)
1. Cumplir con plena autonomía técnica y administrativa, con las actividades, lineamientos técnicos y estándares definidos en el numeral 6 "Especificaciones Técnicas de los insumos, bienes, productos, o servicios a entregar" de la Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien (FCT).	SI	Certificado de cumplimiento.pdf, este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	
2. Cumplir con el objeto del contrato y todas las obligaciones pactadas en el mismo, en la invitación a ofertar, estudios previos y demás documentos anexos.	SI	08. CORTE DE OBRA No 03 Y MEMORIAS ADECUACION HI EL REBANO, este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	
3. Disponer de la capacidad operativa, técnica y logística y de los recursos propios necesarios que permitan el desarrollo eficiente para la ejecución del objeto del contrato	SI	Certificado de cumplimiento.pdf, este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	
4. Suscribir Acta de Inicio con la supervisión, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y los requisitos de ejecución del contrato.	SI	08. CORTE DE OBRA No 03 Y MEMORIAS ADECUACION HI EL REBANO, este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	
5. Presentar a la supervisión del contrato, dentro de los cinco 5 días calendario siguientes a la suscripción y legalización del contrato los Análisis de Precios Unitarios que soportan la propuesta técnica y económica del inmueble a intervenir.	SI	08. CORTE DE OBRA No 03 Y MEMORIAS ADECUACION HI EL REBANO, este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	
6. Realizar las obras de acuerdo con lo exigido por la normatividad vigente, así como lo contemplado en los anexos técnicos.	SI	08. CORTE DE OBRA No 03 Y MEMORIAS ADECUACION HI EL REBANO, este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	
7. Presentar en la oferta, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica del personal que desarrollará las etapas del proyecto.	SI	08. CORTE DE OBRA No 03 Y MEMORIAS ADECUACION HI EL REBANO, este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	
8. Presentar en la oferta la programación del proyecto indicando la ruta crítica.	SI	08. CORTE DE OBRA No 03 Y MEMORIAS ADECUACION HI EL REBANO, este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	
9. Tener la disponibilidad de los profesionales, en sitio, presentados en la propuesta técnica, de acuerdo con el cronograma que hace parte de la misma.	SI	08. CORTE DE OBRA No 03 Y MEMORIAS ADECUACION HI EL REBANO, este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	
10. Presentar los informes parciales y final establecidos en el presente documento.	SI	Certificado de cumplimiento.pdf, este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	
11. Asistir a los comités o reuniones técnicas citadas por parte del ICBF o concertadas con el Supervisor del contrato.	SI	Certificado de cumplimiento.pdf, este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	
12. Mantener informado al Supervisor del contrato, del avance de las actividades en el desarrollo de las obras, así como cualquier novedad que llegara a ocurrir durante la ejecución del contrato.	SI	08. CORTE DE OBRA No 03 Y MEMORIAS ADECUACION HI EL REBANO, este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	
13. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instauran, impulsen o coadyuven el personal o los subcontratistas contra el ICBF, por causa o con ocasión de la ejecución del contrato.	N/A		
14. Designar por escrito un representante de Gestión Ambiental responsable del tema durante toda la vigencia del contrato, para que coordine, apoye y garantice el cumplimiento de la normativa ambiental y el control de los impactos ambientales asociados a la ejecución del contrato.	SI	08. CORTE DE OBRA No 03 Y MEMORIAS ADECUACION HI EL REBANO, este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	
15. Tramitar y obtener los permisos y licencias que se requieran para la ejecución de cada una de las actividades de adecuación y mantenimiento que se indican en el "FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA" de la invitación a ofertar en caso de ser necesario.	N/A		

16. Establecer junto con la supervisión los precios de las actividades o ítems no previstos para la adecuada ejecución de la obra. El contratista efectuará el análisis de rendimientos correspondiente y deberá contar con el aval de la supervisión. La definición de los precios de las actividades o ítems no previstos se realizará acorde al procedimiento establecido en el numeral 10.	SI	08. CORTE DE OBRA No 03 Y MEMORIAS ADECUACION HI EL REBANO, este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	
17. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos y los demás elementos necesarios. Los materiales e insumos deberán ser nuevos y de primera calidad.	SI	08. CORTE DE OBRA No 03 Y MEMORIAS ADECUACION HI EL REBANO, este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	
18. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra.	SI	08. CORTE DE OBRA No 03 Y MEMORIAS ADECUACION HI EL REBANO, este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	
19. Efectuar las reparaciones necesarias en las áreas intervenidas y contiguas que hayan sufrido daño por ocasión de la obra, previa autorización del supervisor.	SI	08. CORTE DE OBRA No 03 Y MEMORIAS ADECUACION HI EL REBANO, este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	
20. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el supervisor, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad realizado por la supervisión y que no cumpla con las normas de calidad requeridas para la misma, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.	SI	08. CORTE DE OBRA No 03 Y MEMORIAS ADECUACION HI EL REBANO, este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	
21. Realizar los ensayos y/o laboratorios requeridos para el control de calidad de los materiales en un laboratorio que cuente con certificados de calibración de los diferentes equipos utilizados	SI	08. CORTE DE OBRA No 03 Y MEMORIAS ADECUACION HI EL REBANO, este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	
22. Presentar a la supervisión los esquemas, diseños y demás elementos necesarios para cumplir con las condiciones técnicas y la normatividad vigente, según la intervención a adelantar.	SI	08. CORTE DE OBRA No 03 Y MEMORIAS ADECUACION HI EL REBANO, este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	
23. Presentar los informes de avance establecidos en el anexo técnico de acuerdo a lo establecido con el numeral 6.8.1. Informes parciales.	SI	08. CORTE DE OBRA No 03 Y MEMORIAS ADECUACION HI EL REBANO, este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	
24. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instauren, impulsen o coadyuven el personal o los subcontratistas contra el ICBF, por causa o con ocasión de la ejecución del contrato.	N/A		
25. Entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza.	SI	08. CORTE DE OBRA No 03 Y MEMORIAS ADECUACION HI EL REBANO, este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	
26. Retirar los materiales sobrantes de cada sitio intervenido y depositarlos en los lugares debidamente autorizados por la Autoridad Ambiental local, para lo cual se deberá hacer entrega de los recibos y demás documentos en original, que demuestren que se ha dado un buen manejo y disposición final de residuos y demás materiales sobrantes. Estos recibos y demás documentos deben contener	SI	08. CORTE DE OBRA No 03 Y MEMORIAS ADECUACION HI EL REBANO, este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	
27. Responder por la entrega de la obra funcionando en las condiciones contratadas.	SI	08. CORTE DE OBRA No 03 Y MEMORIAS ADECUACION HI EL REBANO, este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	
28. Presentar informes quincenales en los periodos definidos previamente, sobre el estado de ejecución y avance de los contratos conforme lo estipulado por el supervisor por cada uno de los componentes objeto de la supervisión, los cuales deben ceñirse a los parámetros técnicos de presentación de informes, planos, dibujos y demás contenidos en la Norma Técnica Colombiana NTC. A continuación, se listan los elementos mínimos básicos que debe contener cada uno de los informes: a) Portada que indique el contenido, al inicio del mismo. b) Introducción donde se establezca el alcance de la obra, sus objetivos básicos y los trabajos desarrollados. c) Tabla detallada de contenido o índice. d) Descripción del trabajo de campo u oficina realizado. e) Descripción de las obras realizadas durante el periodo. f) Normas y códigos a los cuales se ciñen los diseños cuando aplique. g) Descripción de la metodología de obra empleada. h) Descripción y análisis de las condiciones existentes. i) Para el presupuesto de obra, incluir el documento, el cual debe estar de acuerdo con lo dispuesto en este numeral. j) Protocolos de Procedimientos. k) Memoria de cantidades de obra, las cuales deben coincidir con las indicadas en el presupuesto. l) Conclusiones y recomendaciones. m) Anexos. n) Esquemas. o) Bibliografía.	SI	08. CORTE DE OBRA No 03 Y MEMORIAS ADECUACION HI EL REBANO, este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	

29. Entregar un informe final del resumen de la ejecución de todas las obras, conforme lo estipulado por el supervisor, de igual forma debe contener todos los soportes de la ejecución de cada una de las obligaciones del contrato, registro fotográfico, los componentes de los informes parciales y toda la información que se considere pertinente para la liquidación del contrato conforme a los estipulado por la supervisión y el cual deberá ceñirse a los parámetros técnicos de presentación de informes, planos, dibujos y demás contenidos en la Norma Técnica Colombiana NTC.	SI	08. CORTE DE OBRA No 03 Y MEMORIAS ADECUACION HI EL REBANO , este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	
OBLIGACIONES CONTRACTUALES ASOCIADAS A LOS EJES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)	Observaciones (iv)
Obligaciones del Eje de Gestión de Calidad			
1. Asegurar que el personal requerido para la ejecución del contrato cuente con el perfil de; Educación (formal: primaria, secundaria, pregrado, posgrado), formación (cursos específicos de la actividad a desarrollar como diplomados, seminarios, talleres entre otros) o experiencia para garantizar la óptima prestación del servicio.	SI	CUMPLIMIENTO EJE CALIDAD.rar , este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	
2. Demostrar que selecciona y evalúa sus proveedores de bienes y servicios relacionados directamente con la prestación del servicio contratado, haciendo cumplir las normas legales vigentes, así como las normas y especificaciones técnicas según corresponda.	SI	CUMPLIMIENTO EJE CALIDAD.rar , este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	
3. Determinar un mecanismo para conocer la percepción del beneficiario frente a la prestación del servicio, a través de un instrumento establecido por el mismo operador para tal fin.	SI	CUMPLIMIENTO EJE CALIDAD.rar , este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	
4. Demostrar mediante evidencias la implementación de acciones de mejora (correctivas o preventivas frente a cualquier situación que afecte la prestación del servicio) que permita tomar las decisiones a que haya lugar o experiencia exitosas que de muestren la mejora en la prestación de servicio.	SI	CUMPLIMIENTO EJE CALIDAD.rar , este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	
Obligaciones Para el eje de Seguridad de la Información:	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)	Observaciones (iv)
1. Informar al supervisor, en el momento que ocurran incidentes de seguridad que afecten la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la información del ICBF, en el marco de la ejecución del contrato.	SI	Certificado de cumplimiento.pdf , este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	
2. Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato una vez se firme el contrato.	SI	Certificado de cumplimiento.pdf , este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	
Obligaciones del Eje de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)	Observaciones (iv)
1. Socializar la Política de Salud y Seguridad en el Trabajo del ICBF, en virtud de la ejecución del objeto del contrato o convenio.	SI	CUMPLIMIENTO EJE SST.rar , este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	
2. Designar por escrito un representante de seguridad y salud en el trabajo, que cumpla con el perfil establecido en la Resolución 1111 de 2017 del Ministerio de Trabajo y garantice el cumplimiento de obligaciones contractuales establecidas en el marco de la ejecución del contrato o convenio y la normatividad vigente.	SI	CUMPLIMIENTO EJE SST.rar , este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	
3. Garantizar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el trabajo durante la ejecución del contrato o convenio.	SI	CUMPLIMIENTO EJE SST.rar , este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	
4. Garantizar que todos los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social, incluido los riesgos laborales.	SI	CUMPLIMIENTO EJE SST.rar , este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	
5. Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato o convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.	SI	CUMPLIMIENTO EJE SST.rar , este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	
6. Garantizar que los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio cuentan con los Elementos de Protección Personal requerido para la realización de sus actividades. En caso de deterioro, daño o pérdida deberá contemplarse los protocolos correspondientes para la reposición, sin afectar la ejecución del contrato o convenio.	SI	CUMPLIMIENTO EJE SST.rar , este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	
7. Realizar los exámenes médicos ocupacionales requeridos de acuerdo con las actividades propias del objeto contratado y la normatividad vigente.	SI	CUMPLIMIENTO EJE SST.rar , este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	
8. Informar al ICBF los Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral – ATEL del personal a cargo del operador/contratista, reportados a la ARL y EPS, durante el plazo de ejecución del contrato o convenio.	SI	CUMPLIMIENTO EJE SST.rar , este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	



9. Realizar trabajos en alturas en cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente.	SI	CUMPLIMIENTO EJE SST.rar, este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	
Obligaciones Para el eje de Gestión Ambiental:	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste. (iii)	Observaciones (iv)
1. Cumplir con la política ambiental del ICBF, implementando buenas prácticas ambientales relacionadas con el ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel, y manejo de residuos.	SI	CUMPLIMIENTO EJE AMBIENTAL.rar, este documento reposa en el secop II (carpeta ejecución del contrato)	

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la cláusula correspondiente del contrato/convenio. Para aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.

(ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y qué acciones se han tomado sobre dicho incumplimiento. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida.

(iii) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas de entrega a satisfacción o de reuniones, informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento y su ubicación.

(iv) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

15. Seguimiento a matriz de riesgos


Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio?	SI	X	NO	
Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	SI		NO	X
Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:				
Observaciones adicionales:				

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la [Dirección de Contratación de la Sede de la Dirección General](#).


16. Certificación

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Fecha emisión de Informe 30/12/2024


JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO


CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
CONTRATISTA - GRUPO ADMINISTRATIVO


LICETH ALEJANDRA DURANGO BETANCUR
CONTRATISTA - GRUPO ADMINISTRATIVO

Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.
