

INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO 1620-24

(Del 02 de enero del 2025 al 01 de marzo del 2025)



TRANSMILENIO S.A
DIRECCION TECNICA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No. CTO 1620-24

“Contratar el suministro e instalación de elementos para el mejoramiento de los paraderos del sistema integrado de transporte público – SITP de Bogotá, a cargo de Transmilenio S.A.”

CONTRATISTA:
GRUPO FAO S.A.S

MARZO 2025

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

| | |
|-------------------------------------|---|
| CONTRATO | 1620-24 |
| CONTRATANTE | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A. |
| NIT | 830.063.506-6 |
| CONTRATISTA | GRUPO FAO SAS R.L. ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA |
| NIT/CC | NIT. 901484861 |
| SUPERVISIÓN | Manuel Ignacio Vanegas Bernal TRANSMILENIO S.A. |
| INTERVENTORIA | N/A |
| OBJETO | Contratar el suministro e instalación de elementos para el mejoramiento de los paraderos del sistema integrado de transporte público – SITP de Bogotá, a cargo de Transmilenio S.A. |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | \$ 49.952.678 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 20/DICIEMBRE/2024 |
| FECHA DE INICIO | 02 / ENERO/ 2025 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL | DOS (2) MESES |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | 01/MARZO/2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN FINAL | 01/MARZO/2025 |

2. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

2.1 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION

- Se realizó el acompañamiento bajo el rol de supervisión a diferentes paraderos para identificar las actividades a realizar en cada punto los días 07 de enero y 14 de enero de 2025.
- Se realizaron comités de seguimiento al desarrollo del contrato, el 10 de enero y 26 de febrero, en las cuales se realiza la supervisión y vigilancia permanente del cumplimiento de las obligaciones técnicas suscritas por el contratista.
- Mediante visitas de campo se realizaron inspecciones de las actividades conforme a la solicitud de las actividades realizadas por la entidad.

2.2 EJECUCION FISICA

Se realiza el seguimiento y verificación en campo de las obligaciones contractuales técnicas suscritas por el contratista FAO S.A.S. para las obras que se ejecutan en los paraderos del SITP en el marco del contrato 1620 de 2024, en relación con las actividades ejecutadas durante el periodo, las cuales se mencionan a continuación:

Instalación loseta piso táctil

Se realizó la instalación de 184 metros de loseta piso táctil, en los paraderos que se muestran a continuación:

Paradero
223A01

Ilustración



026A01



224A01



319A01



226A01



318A01



120A06



035A06



140A06



139A06



417A06



042A06



391A05



Demarcación logo símbolo de accesibilidad

Se realizó la demarcación de 15 logo símbolos de accesibilidad en los siguientes paraderos

| Paradero | Ilustración |
|----------|-------------|
| 223A01 | |
| 026A01 | |

224A01



319A01



226A01




318A01



120A06



035A06




140A06



139A06




417A06

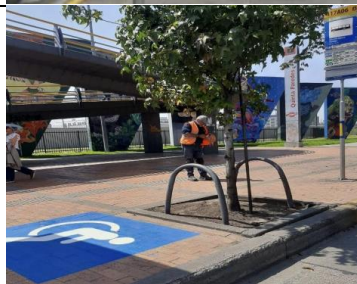

042A06



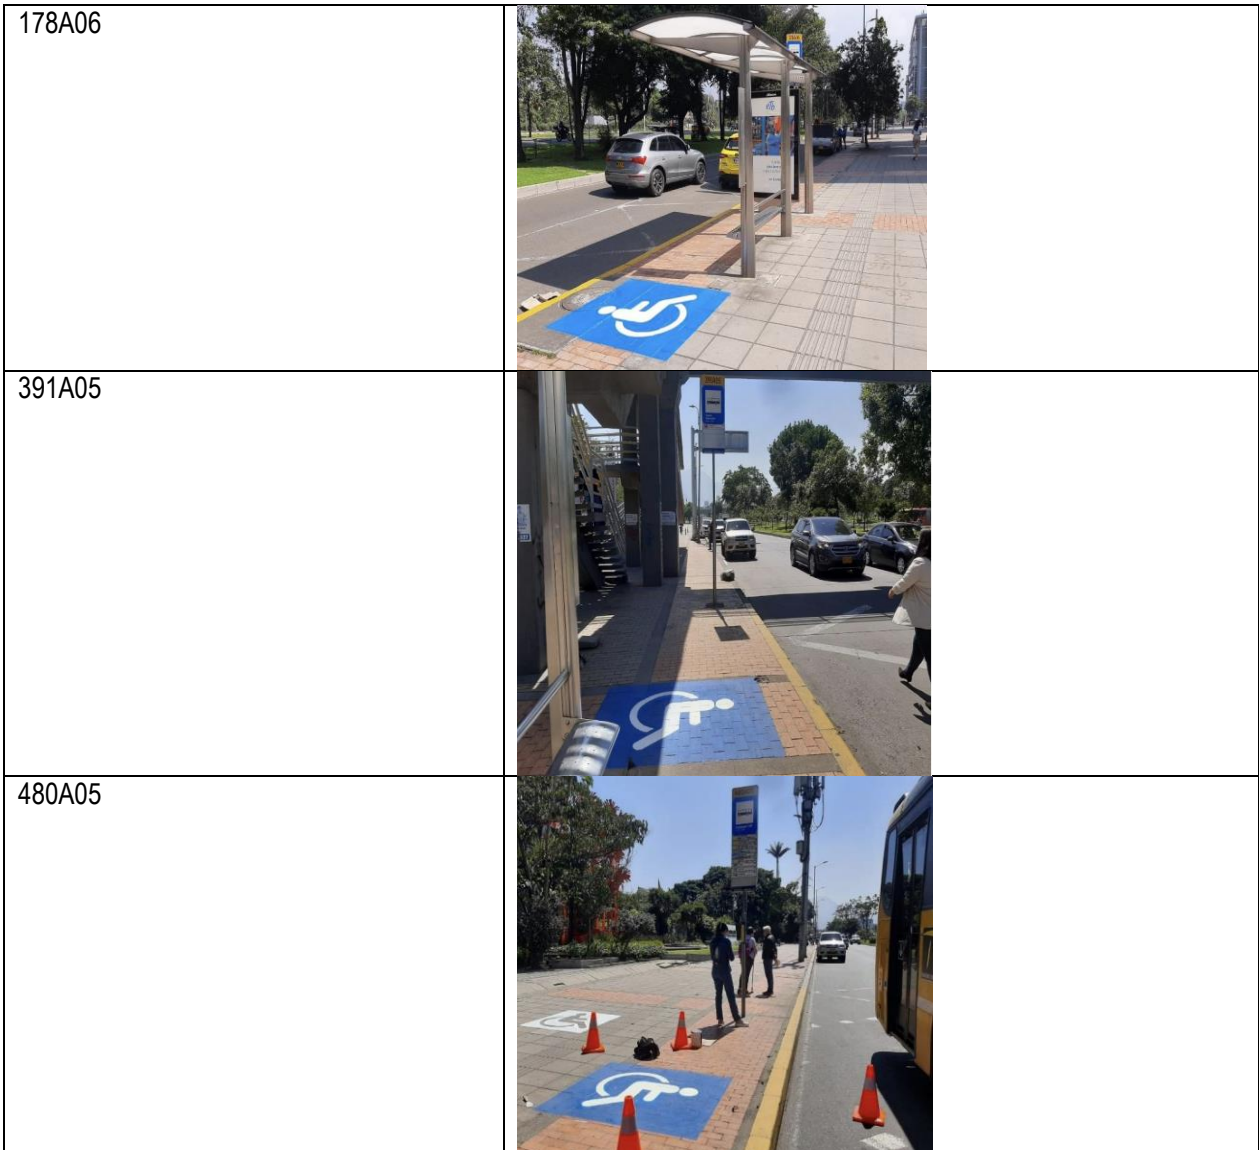

2.3 CRONOGRAMA

Se vigila el cumplimiento del cronograma de trabajo, indicando el avance y/o retraso en las actividades planteadas para el presente periodo.

| ACTIVIDAD | PLANEADO | COMPLETADO | ATRASO |
|---|----------|------------|--------|
| Instalación loseta piso táctil | 100% | 100% | 0% |
| Demarcación logo símbolo de accesibilidad | 100% | 100% | 0% |

2.4 COMITES DE SEGUIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Se realizan comités de seguimiento semanales, en los cuales se realiza la supervisión y vigilancia permanente del cumplimiento de las obligaciones técnicas suscritas por el contratista EME INGENIERIA

COMITÉ No 1

Llevado a cabo el 10 de enero de 2025, se habló sobre el estado actual de los paraderos visitados, se aclaró que actividades son las que se pueden ejecutar. Y se solicita celeridad en las mismas.

COMITÉ No 2

Llevado a cabo el 26 de febrero de 2025, el contratista manifiesta algunos inconvenientes con el suministro de material, sin embargo, a la fecha se cuenta con un 75% programado de ejecución acorde al cronograma de trabajo.

2.5 EJECUCION PRESUPUESTAL

El valor ejecutado durante el periodo objeto del presente informe es de \$ 44.907.489 lo cual corresponde a un 89.90% del valor del contrato.

3. EQUIPO DE TRABAJO

Al ser un contrato de suministro y de mínima cuantía, no se exige un personal mínimo necesario.

4. PENDIENTES PARA LIQUIDACION

Las actividades del contrato fueron ejecutadas, una vez realizado el cobro se puede proceder a liquidar

El presente documento es elaborado y firmado por la Supervisión Técnica de la Dirección Técnica de Infraestructura de TRANSMILENIO S.A.

ING. MARIA ANTONIA SALMANCA SOLANO
SUPERVISION TECNICA
TRANSMILENIO S.A.

ING. MANUEL IGNACIO VANEGAS BERNAL
SUPERVISOR
TRANSMILENIO S.A.
