

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 46 INVIAS-IM – 0971-2021 MARZO DE 2025	

Anexo No 1.

Informes semanales



INVIAS



Remite: CONSORCIO ICEACSA - TPF <consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com>

Fecha: 2025-03-07 07:53:25

Para: atencionciudadano@invias.gov.co


Asunto: C971 4091 2025 Informe semanal de Interventoria No 194

Adjuntos: 02

Radicado: 2025E-VUVRAZ-024559

Fecha Radicación: 2025-03-07 09:15:13

Cc:



Zipaquirá (Cundinamarca), 03 de marzo de 2025

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Atn.: Ing. Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo

Supervisor del Contrato de Interventoría

Dirección Territorial Cundinamarca

Fontibón

R e f . : Contrato No 971 de 2021 "Interventoría para las obras de mejoramiento mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la ruta de los comuneros (Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga; Girón - Piedecuesta) en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030" módulo 1."

Asunto: Informe semanal de Interventoría No 194

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft para el INVÍAS

Zipaquirá (Cundinamarca), 03 de marzo de 2025

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Atn.: Ing. Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo

Supervisor del Contrato de Interventoría

Dirección Territorial Cundinamarca

Fontibón

Ref.: Contrato No 971 de 2021 “Interventoría para las obras de mejoramiento mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la ruta de los comuneros (Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga; Girón - Piedecuesta) en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública “vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” módulo 1.”.

Asunto: Informe semanal de Interventoría No 194

Respetado Señor,

El Consorcio ICEACSA - TPF en cumplimiento de sus obligaciones contractuales del contrato citado en la referencia, se permite remitir el Informe Semanal No 194 del periodo comprendido entre el 28 de febrero a 06 de marzo de 2025 de acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoría en su instructivo MINFRA-MN-IN-15.

Cordialmente,



LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

Director de interventoría

Elaboro: Área Técnica

Aprobó: Luis Antonio Rueda Rueda

Copia: Ing. Javier Augusto Cañon Bonilla – Gerente SMDC Grupo Oriente - INVIAS
Archivo.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIÓN AL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSION

PAGINA

MPI-MNI-IN-15-FR-3

1

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

Cantera la Suiza, Km 29 costado sur vía El Viro - La Vega, Vereda Suberosa, San Francisco, Cundinamarca

UBICACIÓN:

Cantera Los Pinos, KM 55 VIA, Zipaquira-Ubaté, Sutatausa, Cundinamarca

UBICACIÓN:

Cantera Ingeogravias, Vereda Neusa, Zipaquira-Ubaté, Sutatausa, Cundinamarca

UBICACION:

Cantera La Resaca, vereda Yerbaibaina, Chia, Cundinamarca

PERMISO MINERO:

LICENCIA AMBIENTAL:

PERMISO MINERO:

LICENCIA AMBIENTAL:

PERMISO MINERO:

LICENCIA AMBIENTAL:

PERMISO MINERO:

LICENCIA AMBIENTAL:

SIDISPONIBLE

SIXNO

SIXNO

SIXNO

SIXNO

SIXNO

SIXNO

SIXNO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO

LICENCIA AMBIENTAL:

APROVECHAMIENTO FORESTAL:

CONCESIÓN DE AGUAS:

OCCUPACIÓN DE CAUCES:

VERTIMENTOS:

EMISIONES:

OTROS (Especificar cual)

SINO

SINO

SINO

SIXNO

SINO

SIXNO

SINO

N/A

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

OBSERVACIONES:

A continuación se relaciona las licencias ambientales de las fuentes de materiales anteriormente mencionadas. Resolución 1711 de 1999 La suiza, Resolución 2576 de 1996 El Triangulo, Resolución 0487 de 2014 Los Pinos y Resolución 0059 de 2015 La Resaca. El contratista ha implementado actividades de extracción en la Cantera Los Pinos cuando se requiere grandes cantidades de material.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

Se aprueba el PAGA en su versión 9 en el comunicado C971-3754-2024 de la interventoría y con concepto favorable del INVIAS mediante comunicado 2024SVBOG-900179.

OBSERVACIONES:

Se realiza el trámite de un PAGA para la ejecución de obras de mantenimiento (parqueo de pavimentos). Se continua con el desarrollo constructivo final del tramo 1. El contratista presenta el impacto ambiental para la modificación de la licencia ambiental y la interventoría inicia con la revisión del documento.

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

OBRA

INTER

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

SAU EN SUTATAUSA UBICADO EN LA CARRERA 3 No. 4-33 / CENTRO. CONTACTO 323 2457512

SAU BARANDILLAS EN ZIPAQUIRA UBICADO CALLE 3 No. 6-196 BARRIO BARANDILLAS. CONTACTO: 310 7540078

HORARIO DE ATENCIÓN SAU LUNES A VIERNES: 7:00 AM A 12:00 PM - 1:00 PM A 5:00 PM; SÁBADOS: 7:00 AM A 10:00 AM

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

.....191.

REPORTE DE PQRS CONTRATO 989 DEL 2021 A FEBRERO DEL 2025:

No. de Quejas y Reclamos recibidos en el mes: 8

No. de quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 3

No. Acumulado de quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 7

No. de Quejas y Reclamos atendidos en el mes: 7

No. Acumulado de Quejas y Reclamos recibidas en el contrato: 224

No. Acumulado de Quejas y Reclamos atendidos en el contrato: 217

REPORTE DE ACTAS DE VICINIDAD:

Actas de inicio Variante Zipaquira: 137

Actas de vecindad de inicio bandas alertadoras: 163

Actas de inicio picache 1 y 2: 21

Actas de inicio tramo 2: 2

Actas de seguimiento Variante de Zipaquira: 5

Actas de cierre Picache 1 y 2: 21

Actas de cierre tramo 1: 109

El 28 de febrero de 2025, se hace revisión del informe mensual social No. 43, encontrando observaciones que se deben ajustar, por lo cual se remite el comunicado C971-4075-2025. Por otro lado, a través del comunicado C971-4073-2025 se remite al INVIAS el informe ICA No. 7 correspondiente al 01 de julio al 30 de diciembre de 2024. El 03 de marzo de 2025, se atiende a través del oficio C971-4076-2025, el comunicado del contratista con el que notifican el traslado de la oficina SAU de Barandillas, para la entrada del campamento ubicado en el sector de Ave Colombiana vereda Susagá, informando la aprobación e importancia de continuar garantizando el horario establecido y el equipamiento requerido desde el PAGA. Se remite por medio de correo electrónico observaciones al volante No. 103 el cual contiene información sobre el traslado de esta oficina. De igual forma, este mismo día, se lleva a cabo mesa de trabajo virtual con los asistentes SAU del contratista para hacer seguimiento a las PQRS recibidas y cerradas en el mes de febrero del año en curso, reporte que se relaciona en este informe. 04 de febrero, se realiza acompañamiento a asesoría social dirigida al vendedor informal ubicado en el costado nororiental de la glorieta Ave Colombiana contiguo a zona de obra, con el fin de brindarle recomendaciones sobre el adecuado uso del espacio de derecho de vía y las medidas de seguridad que debe tener por su cercanía con la obra, asimismo, se verifica que el equipamiento que utiliza para su actividad económica se encuentre dentro de un predio privado a nombre del señor Juan Manuel Arango, quien en llamada telefónica confirmo que dio autorización. Este mismo día, por parte de interventoría se realiza visita de verificación a la oficina SAU del municipio de Sutatausa, confirmado la atención presencial por parte del asistente social Kevin Benítez. En la visita se hacen recomendaciones para mejorar la ubicación y actualización de la cartelería informativa y avisos con los datos de emergencia que deben estar disponibles y visibles a la comunidad, asimismo, contar con todo el equipamiento mínimo requerido en el PAGA. Los comunicados enviados en el periodo son relacionados con: aprobación informe mensual social No. 42 versión 2, solicitud de cumplimiento compromisos acordados componente arqueología, aprobación preacta de arqueología enero 2025, envío al INVIAS del plan de trabajo social año 2025 y aprobación del informe mensual social No. 43 versión 2. Se encuentra pendiente el envío de la preacta No. 43 firmada por parte del contratista para proceder a enviar para visto bueno de INVIAS.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PEDIALES APROBADAS:

AVAULOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

173

18

18

18

OBSERVACIONES:

Los estudios y diseños completos de fase III, del tramo 2, están en ejecución por lo que se priorizo el primer sector de 7 kilómetros con 88 predios y mejoras, para adelantar la gestión predial 1° PR 40 al 47, 2° En los 5 kilómetros PR47 al PR 52, se tendrán que iniciar los Diseños y se tendrán 63 predios mas. Para avanzar en estas etapas, se está realizando las siguientes actividades:

1- Se llevó a cabo la revisión y verificación de la ficha predial correspondiente al predio 009-D-T2-MCRC, donde se identificaron y documentaron observaciones pertinentes al contratista para ajustes. Asimismo, se remitieron las fichas prediales 001-D-T2-MCRC y 039-I-T2-MCRC al SS INVIAS para su revisión y obtención del Visto de No Objeción, mediante los oficios C971-4081-2025 y C971-4078-2025, respectivamente.

2- El 28 de febrero de 2025, se llevó a cabo una reunión virtual, registrada en el acta No. 139, entre el contratista y la interventoría, allí se discutieron temas relevantes como los formatos de avalúo, el estado actual de los predios del tramo 2, las expropiaciones realizadas y la gestión de los expedientes relacionados con el cierre predial.

3- A través del oficio C971-4080-2025, se realizó la revisión y verificación de los Estudios de Títulos de los predios 032-D-T2-MCRC y 035-I-T2-MCRC, con el objetivo de enviarlos a la SS INVIAS para su revisión y obtención del Visto de No Objeción. Además, se envió el oficio C971-4079-2025, que incluía la Oferta e Inscripción de Oferta del predio 031-D-T2-MCRC para su revisión y obtención del Visto de No Objeción. También se llevaron a cabo revisiones de las escrituras públicas de los predios 011-D-T2-MCRC y 012-D-T2-MCRC, así como de la minuta de la escritura pública del predio 029-D-T2-MCRC.

4- Se proporcionó una respuesta a los funcionarios de la SS INVIAS a través de correo electrónico, en la que se informaron sobre los predios que habían recibido pagos totales y parciales correspondientes a los meses de enero y febrero de 2025, conforme a la solicitud realizada.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Dentro de los de 3 componentes estratégicos del programa de sostenibilidad siendo 1) Gestión hacia operaciones sostenibles, 2) Gestión del cambio climático, 3) Gestión integral de sostenibilidades. Se tienen los siguientes reportes:

1) Se presenta una reducción en el consumo de combustible dada por la reducción de las actividades en la construcción de la Segunda Calzada de la Variante de Zipaquira, y las actividades predominantes de mantenimientos y Rehabilitaciones.

2) Se identificaron las emisiones evitadas por la implementación de la tecnología de iluminación LED de bajo consumo en centro administrativo, oficinas y demás espacios de obra durante el mes de junio de 2024, para un ahorro de energía de 18 kWh/mes, ahorro determinado por el periodo facturado para el mes y con la implementación de estrategias a través de focos led.

3) Se tiene un acumulado generado de 9490.54 toneladas de CO₂, valor que corresponde a la suma de las emisiones mensuales calculadas. Este acumulado representa el 79.08%. Total establecido contractualmente. Se presenta un aumento en el consumo de combustible dada por el incremento de las actividades de rehabilitación y mantenimiento en el tramo Ubaté- Puente Nacional, conformación Glorieta de Ave Colombiana, y mantenimientos / Rehabilitación en la variante Zipaquira.

4) Se reporta la entrega de residuos sólidos ordinarios específicamente de 0.69 Toneladas

5) Uso eficiente del papel: a la fecha a partir de la implementación de las estrategias para disminuir el consumo de papel, siendo las principales la utilización de medios digitales, uso de papel ecológico, reutilización de papel e impresión en ambas caras, se reporta un consumo promedio en oficina central del 15,8 %, SAU barandillas de 28,7% y campamento del 36,4% tomando como referente el presupuesto mensual que se tiene.

7) Teniendo en cuenta que el contrato en sus apéndices establece que la captura de CO₂ equivalente se limitó a 12.000 toneladas durante toda la ejecución del proyecto, se presenta el acumulado de CO₂ equivalente de 9490.54 toneladas de CO₂, valor que corresponde a la suma de las emisiones mensuales calculadas. Este acumulado representa el 79.09 % del total establecido contractualmente

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

TRAMO 1 Continúa la construcción de la segunda calzada de la Variante de Zipaquira realizando las siguientes actividades:

Espacio Público:

-Instalación de bordillo en zona de rampa 1 de puente peatonal.

-Instalación de rajo, sello, geotextil y subbase granular costado oriental de rampa 1 de puente peatonal.

Puente peatonal:

- Instalación de placas alveolares en rampa 2.

- Continúa instalación de placas alveolares en pasarela de pías 2 y 3.

- Continúan trabajos de soldadura en rampa 2

K 2+820 - Obra No 19 (Arco metálico - Ave Colombiana) se realiza:

-Fundida de última sección de columna oriental de pórtico de salida de arco metálico.

-Fundida de placa interior, dintelón y muro norte de box de transición.

-Fundida de 2da, 3er y 4ta sección de muros módulo 2 de canal de acceso.

-Fundida de zarpa de muro de cierre pórtico de salida de arco metálico.

-Fundida de solado y armado de acero de placa inferior de módulos 3 y 4 de canal de acceso.

TRAMO 2

K44+180, Obra 31, enrocado y fundida de 2da sección de muros de caja de inspección


K44+170 - K44+190: instalación de 5ta capa de terraplén.

K44+210 - K44+242: instalación de BTA.

K44+242 - K44+300: instalación de BTA y MSC-25.

K44+330: demolición de la vivienda.

K44+340 - K44+400: excavación para tramo de vía.

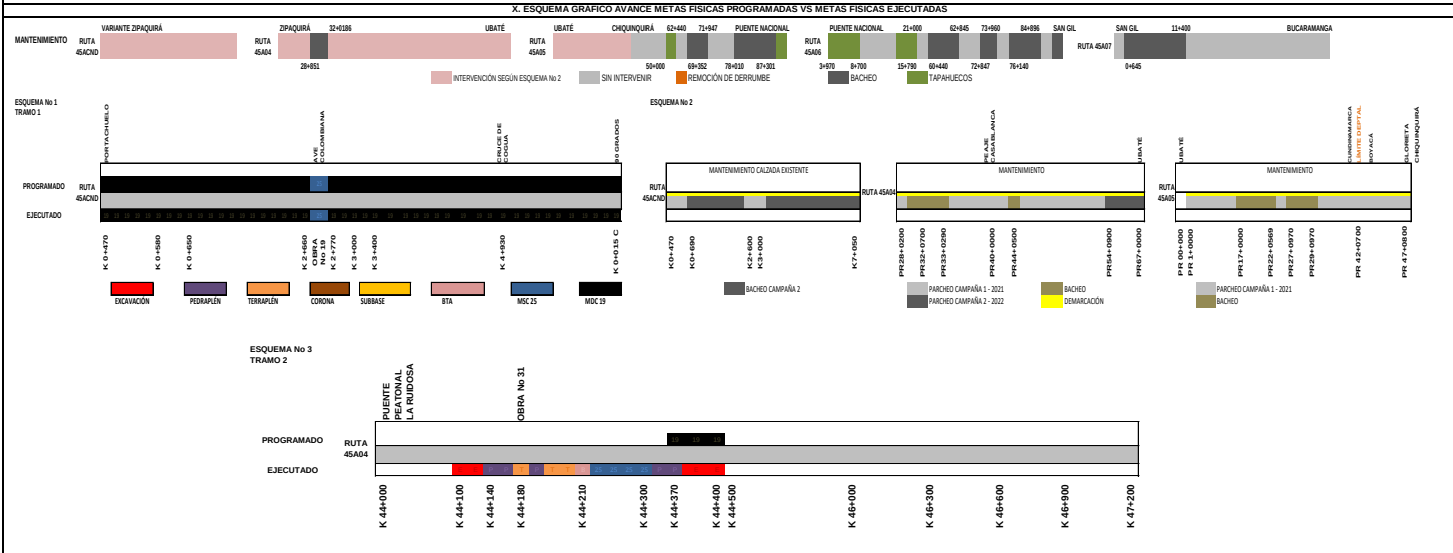	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIÓN AL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA			
Demarcación Ruta 45 A 06 -Suaita: PR56 a PR60 demarcación de doble línea amarilla de eje. -Suaita: PR60+0858 - PR61+0440 demarcación de líneas blancas de borde ambos costados.						
Bacheo Ruta 45 A 05 -Puente Nacional: abarcando entre PR75+0456 y PR76+0276, fresado e instalación de BTA y MDC-19						
En la semana se ejecutaron las siguientes cantidades aproximadamente: MDC-19: 438m3; Fresado: 438m3.						
Se encuentra ejecutado las siguientes longitudes acumuladas por actividades en la construcción de la segunda calzada de la Variante de Zipaquirá : Descapote: km, Excavación de explanación km, pedreglón km, Terraplén km, Subbase SGB-38 km, BTA Km, MSC-25 Km y MDC-19 Km. De la longitud ejecutada de terraplén se encuentra en corona 6.57Km						
Se encuentra ejecutado las siguientes longitudes acumuladas por actividades en la construcción de la segunda calzada de Tramo 2, Peaje Casablanca hacia Ubaté : Descapote: 0.17km, Excavación de explanación 0.17km, Terraplén 0.15km, Subbase SGB-380.09km, Subbase SGB-38 0.09km, BTA 0.054Km, MSC-25 0Km y MDC-19 0.35Km. De la longitud ejecutada de terraplén se encuentra en corona 0.09Km.						
Durante la semana aumentan las precipitaciones de alta intensidad en el área de los trabajos, por lo cual, no es posible un desarrollo normal en las actividades de obra en la variante de Zipaquirá sector Ave Colombiana para el arco metálico como armado de acero y fundida de concreto, así como la instalación de placas alveolares en el puente peatonal. Así mismo, en el Tramo 2, en la excavación e instalación material de pedreglón y terraplén, subbase granular, BTA y MSC-25.						
La Interventoría registra el siguiente equipo en campo, incluyendo el mínimo requerido y el adicional para el cumplimiento de las metas físicas: (2) Retrocargador, (1) Bulldozer, (1) Cargador, (1) Motorveladora, (1) Minicargador, (4) Vibrocompactador, (1) Compactador llanta, (4) Benlín, (2) Dumper, (14) Volquetas, (1) Bomba de concreto, (1) Autohormigonera, (1) Camabaja, (2) Torre de iluminación, (1) Finisher, (2) Camión irigador, (1) Compresor, (2) Carro tanque de agua, (1) Grúa telescópica, (1) Barredora, (2) Fresadora, (1) Camión, (4) Camionetas, (3) Microbus, (1) Direct Feed, (1) Equipo de demarcación, (1) Grúa en los frentes de obra del proyecto						
Dentro del control de calidad: La Interventoría ha realizado la toma de muestra de los diferentes materiales para realizar el control de los ensayos a través de un laboratorio externo. Durante el proceso de instalación de las mezclas asfálticas se lleva acabo los controles de temperatura de BTA, MDC 25, MDC -19. En el caso de concretos se realiza la toma de asentamiento con el cono slump, toma de muestras en cilindros de concreto para posterior evaluación de resistencia a la compresión y en el caso de los pilotes se lleva a cabo pruebas de integridad. Se verifican para las actividades de demarcación de borde y eje los espesores secos y la reflectividad. Adicionalmente se realizan ensayos de control de calidad a los materiales en conjunto Interventoría y contratista en el laboratorio implementando por el contratista en el campamento ubicado en la intersección de Ave Colombiana, así como el acompañamiento semanal en la ejecución de ensayos de control de mezclas y materiales el laboratorio de la planta de producción de asfaltos CMOP.						
En cuanto a las actividades de Estudios y Diseños Según informe semanal No. 191 de estudios y diseños radicado el 4 de marzo de 2025 se establece:						
-El Contratista radica el oficio D-000005351, dando respuesta al oficio C971-3501-2024, por el cual se da respuesta a cada observación remitida por interventoría de la entrega de los Zodime 1 y 2 del tramo Peaje Casablanca-Ubaté. -El Contratista radica el oficio D-000005368, dando respuesta al oficio C971-4036-2025, por el cualse da respuesta a cada observación remitida por interventoría de los estudios geotécnicos (Versión C) de la estructura de contención proyectada entre el K41+773 y el K41+785. -El Contratista radica el oficio D-000005371, dando respuesta al oficio C971-4850-2025, por el cual se da respuesta a cada observación remitida por interventoría de los estudios geotécnicos (Versión C) de la estructura de contención proyectada entre el K41+830 y el K41+848. -El Contratista radica el oficio D-000005354, dando respuesta al oficio C971-4067-2025, por el cual se remite los planos en Autocad y los diseños fotométricos en dialux evo del diseño de iluminación en versión E del Sector Ave Colombiana. -El Contratista radica el oficio D-000005355, dando respuesta al oficio C971-4052-2025, por el cual se da respuesta a cada observación remitida por interventoría del diseño estructural de la placa del paso peatonal y bici usuarios de Ave Colombiana VA. -El Contratista radica el oficio D-000005358, dando respuesta al oficio C971-4034-2025, por el cual se da respuesta a cada observación de tipo estructural remitida por interventoría del memorando geotécnico del muro de contención del descole del Arco metálico en el sector de Ave Colombiana. -El Contratista radica el oficio D-000005359, dando respuesta al oficio C971-4055-2025, por el cual se da respuesta a cada observación de tipo geotécnico remitida por interventoría del memorando geotécnico del muro de contención del descole del Arco metálico en el sector de Ave Colombiana. -El Contratista da alcance al oficio D-000005210, mediante oficio D-000005364, por el cual se informa que debido a las condiciones actuales de la calzada existente en la variante de Zipaquirá - separador (botos 1, 2 y 3), se ha proyectado la implementación de una cuneta con base de 30 cm, un espaldar de 50 cm de altura y un espesor de 20 cm (figuras 1 y 2) en el sector comprendido entre el K6+610 y el K7+000 en la vía existente.						
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA						
Continuar con el reforzamiento de señalización en sitios críticos de accidentalidad, mediante la instalación de señales verticales y/o demarcación, de acuerdo con los inventarios y esquemas realizados por parte de los especialistas de tránsito.						
Continuar la construcción del canal de acceso a la obra del arco metálico y la obra de transición entre los dos tramos de arco metálico ya construidos. Terminar el montaje de la rampa oriental del puente peatonal y el armado de la estructura metálica. Continuar la construcción del piso en el puente vehicular con las placas alveolares y losas fundidas in sitio.						
Continuar la construcción de cunetas revestidas en concreto y la construcción de las obras para la recolección de aguas lluvias en el sector de la Glorieta de Ave Colombiana y en la calzada existente. Iniciar los trabajos de urbanismo en la glorieta de Ave Colombiana.						
Continuar las actividades de descapote, excavación y construcción de capas de mejoramiento con material de terraplén y construcción de capa de subbase en el Tramo 2. Igualmente terminar la construcción de la obra hidráulica No. 31 en tubería de concreto reforzado diámetro 0.90 m.						
Continuar con la actividad de pintura de líneas de demarcación y marcas viales en los sectores ya establecidos en las rutas 45A04, 45A05, y 45A06 así como el sello de fisuras como medida provisional, evitando que el agua penetre a la carpeta asfáltica, y se produzcan daños aún mayores a la superficie.						
Continuar las actividades de mantenimiento de la carpeta asfáltica mediante Tapa huecos, parcheos técnico y Bacheos en los sectores de Zipaquirá - Ubaté, Ubaté - Chiquinquirá, Saboya - Puente Nacional - Oiba - Socorro - San Gil Peaje Cutú, para atender compromisos adquiridos con la comunidad en las reuniones de Socorro, Saboyá, Cutú						
Continuar con los trabajos de adecuación de campamento en el K44+200 para las actividades constructivas del tramo 2.						
Intensificar actividades de gestión predial en los primeros 7 km, del tramo Peaje de Casablanca - Ubaté para lograr permisos de intervención y así dar inicio en los próximos meses, la construcción de la segunda calzada en este tramo.						
X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS						
						
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.						
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
 PARCHEO RUTA 45 A 05, PUNTE NACIONAL, PR75+0775 - PR76+0054, FRESADO E INSTALACIÓN DE MDC-19  DEMARCACIÓN RUTA 45 A 06, SUAITA, PR56 A PR60, DOBLE LÍNEA AMARILLA DE EJE  TRAMO 2, K44+242 - K44+300, INSTALACIÓN DE MSC-25						

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIÓN AL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-3 VERSIÓN 1 PÁGINA														
	TRAMO 2, K44+180, OBRA No 31, FUNDIDA DE 2da SECCIÓN DE MUROS DE CAJA DE INSPECCIÓN		VARIANTE ZIQAQUIRÁ, OBRA No 19, FUNDIDA DE ZARPA DE MURO DE CIERRE PÓRTICO DE SALIDA DE ARCO METÁLICO		VARIANTE ZIQAQUIRÁ, OBRA No 19, FUNDIDA DE MURO NORTE DE BOX EXISTENTE											
	VARIANTE ZIQAQUIRÁ, PUENTE PEATONAL, CONTINUAN TRABAJOS DE SOLDADURAS EN RAMPA 2		VARIANTE ZIQAQUIRÁ, OBRA No 19, FUNDIDA DE 4ta SECCIÓN DE MUROS MÓDULO 2 DE CANAL DE ACCESO		VARIANTE ZIQAQUIRÁ, ESPACIO PÚBLICO, INSTALACIÓN DE RAJÓN, SELLO Y GEOTEXTIL COSTADO ORIENTAL DE RAMPA 1											
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor. <table><tr><td>XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA</td><td>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</td></tr><tr><td>SE REALIZÓ CONTROL, SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA QUE SE VIENE EJECUTANDO EN LOS CORREDORES OBJETO DEL CONTRATO CON EL FIN DE MITIGAR LA SINIESTRALIDAD VIAL. ASÍ MISMO SE REALIZÓ RECORRIDO EN LOS SECTORES ENTREOIBA - OLIVAL PARA DEFINIR LOS SECTORES Y TRAMOS A INTERVENIR.</td><td rowspan="6"> FIRMA: _____ NOMBRE: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STD </td></tr><tr><td>SE REALIZÓ CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFÁLTICA QUE SE VIENE EJECUTANDO EN EN EL SECTOR DE LA RUTA RUTA 45 A 06 OIBA , RUTA 45 A 07 SAN GIL PEAJE CURITI.</td></tr><tr><td>CON OFICIO C971-3729-2024 SE REITERA AL CONTRATISTA LA DEMARCACIÓN VIAL Y SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LOS SECTORES DEL CORREDOR QUE ASÍ LO REQUIEREN</td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td colspan="2"> Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del 2024S. Código: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratos, Interventoría y Dirección Territorial </td></tr></table>						XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	SE REALIZÓ CONTROL, SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA QUE SE VIENE EJECUTANDO EN LOS CORREDORES OBJETO DEL CONTRATO CON EL FIN DE MITIGAR LA SINIESTRALIDAD VIAL. ASÍ MISMO SE REALIZÓ RECORRIDO EN LOS SECTORES ENTREOIBA - OLIVAL PARA DEFINIR LOS SECTORES Y TRAMOS A INTERVENIR.	FIRMA: _____ NOMBRE: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STD	SE REALIZÓ CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFÁLTICA QUE SE VIENE EJECUTANDO EN EN EL SECTOR DE LA RUTA RUTA 45 A 06 OIBA , RUTA 45 A 07 SAN GIL PEAJE CURITI.	CON OFICIO C971-3729-2024 SE REITERA AL CONTRATISTA LA DEMARCACIÓN VIAL Y SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LOS SECTORES DEL CORREDOR QUE ASÍ LO REQUIEREN				Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del 2024S. Código: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratos, Interventoría y Dirección Territorial	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA															
SE REALIZÓ CONTROL, SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA QUE SE VIENE EJECUTANDO EN LOS CORREDORES OBJETO DEL CONTRATO CON EL FIN DE MITIGAR LA SINIESTRALIDAD VIAL. ASÍ MISMO SE REALIZÓ RECORRIDO EN LOS SECTORES ENTREOIBA - OLIVAL PARA DEFINIR LOS SECTORES Y TRAMOS A INTERVENIR.	FIRMA: _____ NOMBRE: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STD															
SE REALIZÓ CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFÁLTICA QUE SE VIENE EJECUTANDO EN EN EL SECTOR DE LA RUTA RUTA 45 A 06 OIBA , RUTA 45 A 07 SAN GIL PEAJE CURITI.																
CON OFICIO C971-3729-2024 SE REITERA AL CONTRATISTA LA DEMARCACIÓN VIAL Y SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LOS SECTORES DEL CORREDOR QUE ASÍ LO REQUIEREN																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del 2024S. Código: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratos, Interventoría y Dirección Territorial																



INVIAS



Remite: CONSORCIO ICEACSA - TPF <consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com>

Fecha: 2025-03-13 20:06:44

Para: atencionciudadano@invias.gov.co


Asunto: C971 4124 2025 Informe semanal de Interventoria No 195

Adjuntos: 02

Radicado: 2025E-VUVRAZ-027443

Fecha Radicación: 2025-03-14 08:32:55

Cc:



Zipaquirá (Cundinamarca), 13 de marzo de 2025

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Atn.: Ing. Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo

Supervisor del Contrato de Interventoría

Dirección Territorial Cundinamarca

Fontibón

R e f . : Contrato No 971 de 2021 "Interventoría para las obras de mejoramiento mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la ruta de los comuneros (Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga; Girón - Piedecuesta) en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030" módulo 1."

Asunto: Informe semanal de Interventoría No 195

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft para el INVÍAS

Zipaquirá (Cundinamarca), 13 de marzo de 2025

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Atn.: Ing. Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo

Supervisor del Contrato de Interventoría

Dirección Territorial Cundinamarca

Fontibón

Ref.: Contrato No 971 de 2021 “Interventoría para las obras de mejoramiento mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la ruta de los comuneros (Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga; Girón - Piedecuesta) en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública “vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” módulo 1.”.

Asunto: Informe semanal de Interventoría No 195

Respetado Señor,

El Consorcio ICEACSA - TPF en cumplimiento de sus obligaciones contractuales del contrato citado en la referencia, se permite remitir el Informe Semanal No 195 del periodo comprendido entre el 07 a 13 de marzo de 2025 de acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoría en su instructivo MINFRA-MN-IN-15.

Cordialmente,



LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

Director de interventoría

Elaboro: Área Técnica

Aprobó: Luis Antonio Rueda Rueda

Copia: Ing. Javier Augusto Cañon Bonilla – Gerente SMDC Grupo Oriente - INVIAS
Archivo.

						MEMPLAN-M-15-FR-3	
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIÓN AL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL						CÓDIGO	1
						VERSIÓN	
						PÁGINA	
IV. GESTIÓN AMBIENTAL							
FUENTES DE MATERIALES				PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL			
UBICACIÓN:		Cartera la Suiza, Km 29 costado sur vía El Vño - La Vega, Vereda Sabana, San Francisco, Cundinamarca		DISPONIBLE		ZONAS DE DEPÓSITO	
		PERMISO MINERO:		SI X NO -----		SI ----- NO ----- N/A ----- X -----	
		LICENCIA AMBIENTAL:		SI X NO -----		LICENCIA AMBIENTAL: SI ----- NO ----- N/A -----	
UBICACIÓN:		Cartera Los Pinos, KM 55 VIA, Zipaquira, Ubaté, Subatausa, Cundinamarca		PERMISO MINERO:		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI ----- NO ----- N/A -----	
		PERMISO MINERO:		SI X NO -----		CONCESIÓN DE AGUAS: SI ----- NO ----- N/A -----	
		LICENCIA AMBIENTAL:		SI X NO -----		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI ----- NO ----- N/A -----	
UBICACIÓN:		Cartera Inogregraves, Vereda Neusa, Zipaquira, Ubaté, Subatausa, Cundinamarca		PERMISO MINERO:		VERTIMENTOS: SI ----- NO ----- N/A -----	
		PERMISO MINERO:		SI X NO -----		EMISIONES: SI ----- NO ----- N/A -----	
		LICENCIA AMBIENTAL:		SI X NO -----		OTROS (Especificar cual)	
UBICACIÓN:		Cartera La Resaca, vereda Yerobueno, Obá, Cundinamarca		PERMISO MINERO:		SI ----- NO ----- N/A -----	
		PERMISO MINERO:		SI X NO -----			
		LICENCIA AMBIENTAL:		SI X NO -----			
OBSERVACIONES: A continuación se relaciona las licencias ambientales de las fuentes de materiales anteriormente mencionadas. Resolución 1711 de 1999 La Suiza, Resolución 2576 de 1996 El Triángulo, Resolución 0467 de 2014 Los Pinos y Resolución 0059 de 2015 La Resaca. El contratista ha implementado actividades de extracción en la Cartera Los Pinos cuando se requiere grandes cantidades de material.							
OBSERVACIONES: El contrato se encuentra en la etapa de construcción y revisión de estudios y diseños. La licencia ambiental otorgada a la concesión comunes es cedida en su totalidad al INVIAS y se inicia actividades de cesión parcial para el proyecto al contratista. A la fecha nos encontramos realizando ajustes al documento de acuerdo al pronunciamiento de la ANLA en cuanto al alcance de la licencia ambiental. Actualmente se encuentra el proyecto en estudio para la modificación de la licencia ambiental mediante el desarrollo de un Estudio de Impacto Ambiental.							
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)							
ESTADO: Se aprueba el PAGA en su versión 9 en el comunicado C971-3754-2024 de la interventoría y con concepto favorable del INVIAS mediante comunicado 2024SVBOG-900179.							
V. GESTIÓN SOCIAL							
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		OBRA 176 INTER 17		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:		----- 138 -----	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		66 8		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:		----- 956 -----	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		110 9		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:		-----	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		66 8		SAU EN SUTATAUSA UBICADO EN LA CARRERA 3 No. 4-33 / CENTRO. CONTACTO 323 2457512		REPORTE DE PQRS CONTRATO 989 DEL 2023 A MARZO DEL 2025: No. de Quejas y Reclamos recibidos en el mes 5: No. de quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 5 No. Acumulado de quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 9 No. de Quejas y Reclamos atendidos en el mes 0: No. Acumulado de Quejas y Reclamos recibidas en el contrato: 228 No. Acumulado de Quejas y Reclamos atendidos en el contrato: 219	
				SAU BARANDILLAS EN ZIPAQUIRA UBICADO CALLE 3 No. 6-196 BARRIO BARANDILLAS. CONTACTO: 310 7540078		REPORTE DE ACTAS DE VICINIDAD: Actas de inicio Variante Zipaquirá: 137 Actas de vecindad de inicio bandes alertadoras: 163 Actas de inicio picacho 1 y 2: 21 Actas de inicio tramo 2: 2 Actas de seguimiento Variante de Zipaquirá: 5 Actas de cierre Picacho 1 y 2: 21 Actas de cierre tramo 1: 109 El 06 de marzo de 2025, se llevó a cabo el comité social No. 43, en donde se hizo seguimiento a las actividades realizadas desde las áreas social, arqueología y sociopedagogía, y se generaron compromisos. El 07 de marzo de 2025, se hizo acompañamiento a la queja No. 186 a nombre del señor Carlos Capador, por posible tapotamiento en una caja de inspección y tubería en el acceso a la Vereda la Granja de Zipaquirá, se deja compromiso de respuesta para el 13 de marzo de 2025. Por otro lado, ese mismo día se lleva a cabo reunión con los asistentes sociales del contratista para revisar el cierre de actas de compromiso y asesorías sociales. El 10 de marzo de 2025, se da aprobación al volante No. 103 con el que el contratista notifica el traslado de la oficina SAU de Zipaquirá para la entrada del campamento ubicado en el sector de la glorieta de Ave Colombiana. El día 11 de marzo el contratista hace la entrega de 108 volantes a la comunidad. El 12 de marzo de 2025, se hizo acompañamiento a las reuniones realizadas en los municipios de Subatausa y Tausa, en atención a las PQRS 5-38 y 5-26. Los temas tratados de manera general fueron: solicitud de ambulancia, carro taller y grúa, solicitud de construcción de puentes peatonales en la construcción de la segunda calzada, demarcación en los sectores de Tierra Negra y Boquerón, cambio en el diseño de los accesos al municipio de Tausa, envío de información de convocatorias laborales y mantenimiento rutinario. Por otro lado, ese mismo día se hizo acompañamiento a la verificación de la PQRS 190 a nombre del señor Rubén Trujillo, quien solicita se nivele el acceso frente a su predio ya que fue tapado por el material que dejó la obra. Se genera compromiso de nivelación del terreno a más tardar el 17 de marzo de 2025. Con relación a los oficios remitidos por interventoría, se envió aprobación a los informes sociales No. 43 versión 2 e informe No. 42 versión 2. De igual forma, se envió al INVIAS el Plan de Trabajo Social del año 2025, la preacta social No. 45, y se dio respuesta al comunicado D-00005376, con el visto bueno del plan de inversión social del componente arqueológico.	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: ----- 193 -----							
VI. GESTIÓN PREDIAL							
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:		----- 173 -----		FICHAS PREDIALES APROBADAS:		----- 54 -----	
FICHAS PREDIALES APROBADAS:		----- 54 -----		AVALUOS APROBADOS:		----- 37 -----	
AVALUOS APROBADOS:		----- 37 -----		PREDIOS ADQUIRIDOS:		----- 18 -----	
Nota: Son 56 Franjas prediales adquiridos por la ANI, y 13 por INVIAS del Tramo1. 15 fichas aprobadas y 15 avalúos, y 2 procesos de expropiación con demanda adminda. En 195 predios del tramo 2 Primer sector 7 Km, con 39 Fichas aprobadas y 22 avalúos y 3 con resoluciones de expropiación en notificación.							
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD							
Dentro de los 3 componentes estratégicos del programa de sostenibilidad siendo 1) Gestión hacia operaciones sostenibles, 2) Gestión del cambio climático, 3) Gestión integral de sostenibilidad. Se tienen los siguientes reportes:							
1) Se presenta una reducción en el consumo de combustible dada por la reducción de las actividades en la construcción de la Segunda Calzada de la Variante de Zipaquira, y las actividades predominantes de mantenimientos y Rehabilitaciones.							
2) Se identificaron las emisiones evitadas por la implementación de la tecnología de iluminación LED de bajo consumo en centro administrativo, oficinas y demás espacios de obra durante el mes de junio de 2024, para un ahorro de energía de 18 kWh/mes, ahorro determinado por el periodo facturado para el mes y con la implementación de estrategias a través de focus led.							
3) Se tiene un acumulado generado de 9490.54 toneladas de CO2, valor que corresponde a la suma de las emisiones mensuales calculadas. Este acumulado representa el 79.08%. Total establecido contractualmente. Se presenta un aumento en el consumo de combustible dada por el incremento de las actividades de rehabilitación y mantenimiento en el tramo Ubate- Puente Nacional, conformación Glorieta de Ave Colombiana, y mantenimientos / Rehabilitación en la variante Zipaquira.							
4) Se reporta la entrega de residuos sólidos ordinarios específicamente de 0.69 Toneladas							
5) Uso eficiente del papel: a la fecha a partir de la implementación de las estrategias para disminuir el consumo de papel, siendo las principales la utilización de medios digitales, uso de papel ecológico, reutilización de papel e impresión en ambas caras, se reporta un consumo promedio en oficina central del 15,8 %, SAU barandillas de 28,7% y campamento del 36,4% tomando como referencia la disponibilidad mensual que se tiene.							
7) Teniendo en cuenta que el contrato en sus apéndices establece que la captura de CO2 equivalente se limitó a 12.000 toneladas durante toda la ejecución del proyecto, se presenta el acumulado de CO2 equivalente de 9490.54 toneladas de CO2, valor que corresponde a la suma de las emisiones mensuales calculadas. Este acumulado representa el 79.09 % del total establecido contractualmente							
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS							
TÉCNICA							
TRAMO 1 Continúa la construcción de la segunda calzada de la Variante de Zipaquira realizando las siguientes actividades: K4+750, Cruce de Cogua, conformación de material de excavación por margen derecha de calzada existente Espacio Público: -Retiro de ceramiento y construcción de filtro perimetral costado occidental de rampa 1 -Perforación de caja para desagüe de filtro perimetral -Demolicion de cajas de inspección para nivelación -Excavación e instalación de bordillos costado oriental de rampa 1 -Fundición tramo de prueba de concreto estampado costado occidental de rampa 1 Glorieta Ave Colombiana corte y excavación para isla occidental conexión con calle 8. Puente peatonal: -Instalación de luminarias en pasarela -Armado de acero y fundida de curva 1 de rampa 2 K 2+820 - Obra No 19 (Arco metálico - Ave Colombiana) se realiza: -Armado de acero y fundida placa de módulo dealetas de cierre pórtico norte -Encofrado y fundida 1er sección de aleta oriental pórtico de salida -Instalación de tubería 900mm en vástago de muro de salida de arco metálico -Encofrado y fundida de vástago de muro de salida de arco metálico -Encofrado y fundida de placa inferior de módulos 3 y 4 de canal de acceso							
TRAMO 2 K44+200: conformación de terreno de depósito de material de descapote K44+180, Obra 31, retiro del sistema de contención provisional y conformación de relleno por costados de caja de inspección K44+310 - K44+350: excavación y compactación de subsanste K4							

Durante la semana aumentan las precipitaciones de alta intensidad en el área de los trabajos, por lo cual, no es posible un desarrollo normal en las actividades de obra en la variante de Zipaquirá sector Ave Colombiana para el arco metálico como armado de acero y fundida de concreto, así como la instalación de placas alveolares en el puente peatonal. Así mismo, en el Tramo 2, en la excavación e instalación material de pedraplén y terraplén, subbase granular, BTA y MSC-25.

La Interventoría registra el siguiente equipo en campo, incluyendo el mínimo requerido y el adicional para el cumplimiento de las metas físicas: (2) Retrocargador, (1) Bulldozer, (1) Cargador, (1) Motorveladora, (2) Minicargador, (4) Vibrocompactador, (1) Compactador llianta, (3) Benitín, (2) Dumper, (12) Volquetas, (1) Bomba de concreto, (1) Autohormigonera, (1) Camabaja, (2) Torre de iluminación, (1) Finisher, (1) Camión irigador, (1) Compresor, (2) Carro tanque de agua, (1) Grúa telescópica, (1) Barredora, (3) Fresadora, (1) Camión, (4) Camionetas, (3) Microbus, (1) Planta de asfalto, (1) Grúa en los frentes de obra del proyecto

Dentro del control de calidad: La interventoría ha realizado la toma de muestra de los diferentes materiales para realizar el control de los ensayos a través de un laboratorio externo. Durante el proceso de instalación de las mezclas asfálticas se lleva a cabo los controles de temperatura de BTA, MDC 25, MDC-19. En el caso de concretos se realiza la toma de asentamiento con el cono slump, toma de muestras en cilindros de concreto para posterior evaluación de resistencia a la compresión y en el caso de los pilotes se llevó a cabo pruebas de integridad. Se verifican para las actividades de demarcación de borde y eje los espesores secos y la reflectividad. Adicionalmente se realizan ensayos de control de calidad a los materiales en conjunto Interventoría y contratista en el laboratorio implementando por el contratista en el campamento ubicado en la intersección de Ave Colombiana, así como el acompañamiento semanal en la ejecución de ensayos de control de mezclas y materiales el laboratorio de la planta de producción de asfaltos CMQP.

En cuanto a las actividades de Estudios y Diseños Según informe semanal No. 192 de estudios y diseños radicado el 11 de marzo de 2025 se establece:

- El Contratista radica el oficio D-000005382, dando respuesta al oficio C971-3817-2024, por el cual se da respuesta a cada observación remitida por interventoría del informe final Volumen III. Geología para la ingeniería en versión D del Tramo Casablanca - Ubaté.
- El Contratista radica el oficio D-000005390, dando respuesta al oficio C971-4005-2025, por el cual se da respuesta a cada observación remitida por interventoría de la prueba de carga del puente del K44+500 del tramo Casablanca - Ubaté.
- El Contratista radica el oficio D-000005395, dando respuesta al oficio C971-3681-2024, por el cual se remite las memorias de Diseño y adicionalmente las carteras de alineamiento horizontal, vertical y de replanteo, con el cálculo de coordenadas y cotas de eje y bordes correspondientes a los accesos: K42+300, K42+900, K43+600, K43+850 y K44+350 de los primeros 7 kms del tramo Peaje Casablanca - Ubaté en versión C.
- El Contratista radica el oficio D-000005354, dando respuesta al oficio C971-4067-2025, por el cual se remite los planos en Autocad y los diseños fotométricos en dialux evo del diseño de iluminación en versión E del Sector Ave Colombiana.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con el reforzamiento de señalización en sitios críticos de accidentalidad, mediante la instalación de señales verticales y/o demarcación, de acuerdo con los inventarios y esquemas realizados por parte de los especialistas de tránsito.

Continuar la construcción del canal de acceso a la obra del arco metálico y la obra de transición entre los dos tramos de arco metálico ya construidos. Terminar el montaje de la rampa oriental del puente peatonal y el armado de la estructura metálica. Continuar la construcción del piso en el puente peatonal con las placas alveolares y losas fundidas in situ.

Continuar la construcción de cunetas revestidas en concreto y la construcción de las obras para la recolección de aguas lluvias en el sector de la Glorieta de Ave Colombiana y en la calzada existente. Continuar los trabajos de urbanismo en la glorieta de Ave Colombiana.

Continuar las actividades de descapote, excavación y construcción de capas de mejoramiento con material de terraplén y construcción de capa de subbase en el Tramo 2. Igualmente terminar la construcción de la obra hidráulica No. 31 en tubería de concreto reforzado diámetro 0.90 m.


Continuar con la actividad de pintura de líneas de demarcación y marcas viales en los sectores ya establecidos en las rutas 45A04, 45A05, y 45A06 así como el sello de fisuras como medida provisional, evitando que el agua penetre a la carpeta asfáltica, y se produzcan daños aún mayores a la superficie.

Continuar las actividades de mantenimiento de la carpeta asfáltica mediante Tapa huecos, parches técnico y Baches en los sectores de Zipaquirá - Ubaté, Ubaté - Chiquinquirá, Saboya - Puente Nacional - Obia - Socorro - San Gil Peaje Curtil, para atender compromisos adquiridos con la comunidad en las reuniones de Socorro, Saboyá, Curtil

Continuar con los trabajos de adecuación de campamento en el K44+200 para las actividades constructivas del tramo 2.

Intensificar actividades de gestión predial en los primeros 7 km, del tramo Peaje de Casablanca - Ubaté para lograr permisos de intervención y así dar inicio en los próximos meses, la construcción de la segunda calzada en este tramo.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

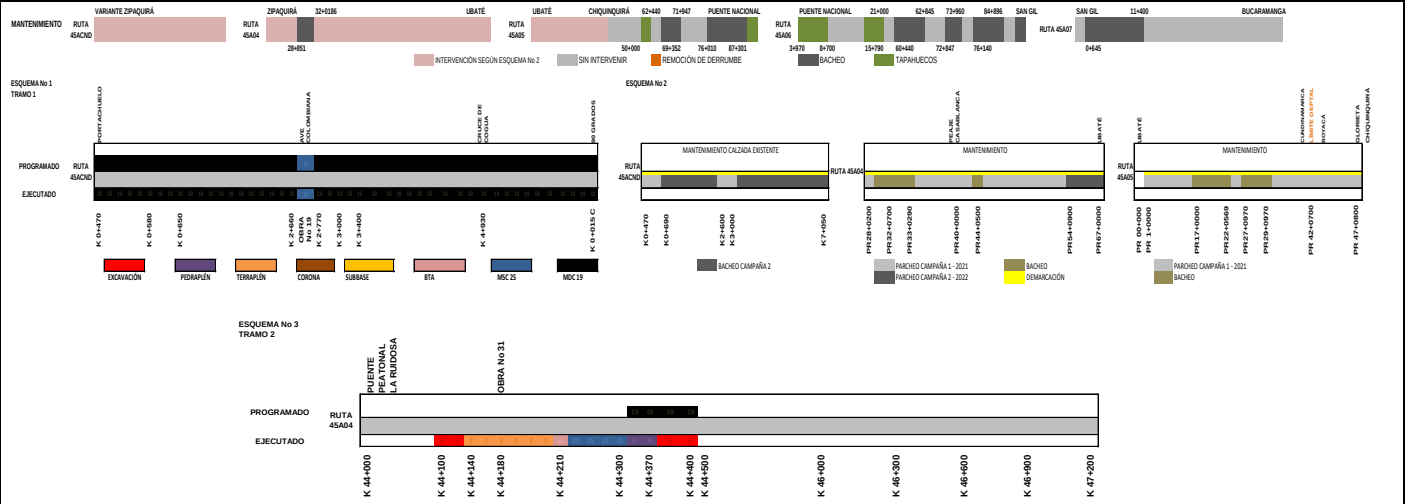

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-INV-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



PARCHEO RUTA 45 A 05, PUENTE NACIONAL, PR77+0350 - PR77+0456, FRESADO E INSTALACIÓN DE MDC-19



VARIANTE ZIPIQUIRÁ, ESPACIO PÚBLICO AVE COLOMBIANA, FUNDIDA DE CONCRETO ESTAMPADO EN RAMPA 1



VARIANTE ZIPIQUIRÁ, OBRA No 19, FUNDIDA DE PLACA DE MÓDULO DE ALETAS DE CIERRE PÓRTICO NORTE



VARIANTE ZIPIQUIRÁ, PUENTE PEATONAL, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN PASARELA



VARIANTE ZIPIQUIRÁ, ESPACIO PÚBLICO, INSTALACIÓN DE BORDILLOS COSTADO ORIENTAL DE RAMPA 1



DEMARCACIÓN RUTA 45 A05, SUSÁ, PR29+0000 - PR30+0000, LÍNEA BLANCA DE BORDE



VARIANTE ZIPIQUIRÁ, PUENTE PEATONAL, FUNDIDA DE PLACA DE CURVA 1 DE RAMPA 2



TRAMO 2, K44+130 - K44+190 LIBERACIÓN POR DENSIDADES DE CAPA DE TERRAPLEN



VARIANTE ZIPIQUIRÁ, OBRA No 19, FUNDIDA DE PLACA INFERIOR DE MÓDULOS 3 Y 4 DE CANAL DE ACCESO



INVIAS



Remite: CONSORCIO ICEACSA - TPF <consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com>

Fecha: 2025-03-21 08:33:12

Para: atencionciudadano@invias.gov.co


Asunto: C971 4145 2025 Informe semanal de Interventoria No 196

Adjuntos: 02

Radicado: 2025E-VUVRAZ-030252

Fecha Radicación: 2025-03-21 09:20:18

Cc:



Zipaquirá (Cundinamarca), 20 de marzo de 2025

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Atn.: Ing. Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo

Supervisor del Contrato de Interventoría

Dirección Territorial Cundinamarca

Fontibón

R e f . : Contrato No 971 de 2021 "Interventoría para las obras de mejoramiento mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la ruta de los comuneros (Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga; Girón - Piedecuesta) en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030" módulo 1."

Asunto: Informe semanal de Interventoría No 196

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft para el INVÍAS

Zipaquirá (Cundinamarca), 20 de marzo de 2025

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Atn.: Ing. Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo

Supervisor del Contrato de Interventoría

Dirección Territorial Cundinamarca

Fontibón

Ref.: Contrato No 971 de 2021 “Interventoría para las obras de mejoramiento mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la ruta de los comuneros (Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga; Girón - Piedecuesta) en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública “vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” módulo 1.”.

Asunto: Informe semanal de Interventoría No 196

Respetado Señor,

El Consorcio ICEACSA - TPF en cumplimiento de sus obligaciones contractuales del contrato citado en la referencia, se permite remitir el Informe Semanal No 196 del periodo comprendido entre el 14 a 20 de marzo de 2025 de acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoría en su instructivo MINFRA-MN-IN-15.

Cordialmente,



LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

Director de interventoría

Elaboro: Área Técnica

Aprobó: Luis Antonio Rueda Rueda

Copia: Ing. Javier Augusto Cañón Bonilla – Gerente SMDC Grupo Oriente - INVIAS
Archivo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIÓN AL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	
TRAMO 2				
K44+330 - K44+380: chequeo de niveles de subrasante.				
K44+400 - K44+450: levantamiento topográfico de descapote.				
Demarcación Ruta 45 A 05 -Susú: PR27+0711 - PR29+0000 demarcación de línea blanca de borde.				
Tapahueros con MDC-19 Ruta 45A04 -Ubaté: PR65+0000 - PR66+0580				
Parcheo Ruta 45 A 05 -Puente Nacional: abarcando entre PR77+0300 y PR79+0180, fresado e instalación de MDC-19				
En la semana se ejecutaron las siguientes cantidades aproximadamente: Pedraplén: 26m3; Terraplén: 3m3; BTA: 34; MDC-19: 455m3; Fresado: 481m3.				
En la semana se ejecutaron cantidades de Concreto hidráulico: Concreto 21MPa: 8.32m3; Concreto 28MPa: 8.34m3; Concreto 28MPa zapatas: 74.71m3; Cuneta: 8.15m3; Bordillos: 4.90m3.				
En la semana se ejecutaron cantidades de pintura: tramo lineal: 9.522m.				
Se encuentra ejecutado las siguientes longitudes acumuladas por actividades en la construcción de la segunda calzada de la Variante de Zipaquirá : Descapote: km, Excavación de explanación km, pedraplén km, Terraplén km, Subbase SGB-38 km, BTA Km, MSC-25 Km y MDC-19 Km. De la longitud ejecutada de terraplén se encuentra en corona 6.57Km				
Se encuentra ejecutado las siguientes longitudes acumuladas por actividades en la construcción de la segunda calzada de Tramo 2, Peaje Casablanca hacia Ubaté : Descapote: 0,27km, Excavación de explanación 0,27km, Terraplén 0,18km, Subbase SGB-38 0,09km, BTA 0,09Km, MSC-25 0,054Km y MDC-19 0Km. De la longitud ejecutada de terraplén se encuentra en corona 0,09Km.				
Durante la semana aumentan las precipitaciones de alta intensidad en el área de los trabajos, por lo cual, no es posible un desarrollo normal en las actividades de obra en la variante de Zipaquirá sector Ave Colombiana para el arco metálico como armado de acero y fundida de concreto, así como la instalación de placas alveolares en el puente peatonal. Así mismo, en el Tramo 2, en la excavación e instalación material de pedraplén y terraplén, subbase granular, BTA y MSC-25.				
La Interventoría registra el siguiente equipo en campo, incluyendo el mínimo requerido y el adicional para el cumplimiento de las metas físicas : (2) Retrocargador, (1) Buldozer, (1) Cargador, (1) Motorveladora, (3) Minicargador, (4) Vibrocompactador, (1) Compactador llanta, (1) Benlín, (2) Dumper, (12) Volquetas, (2) Bomba de concreto, (1) Autohormigonera, (1) Camabaja, (2) Torre de iluminación, (1) Finisher, (2) Camión irrigador, (1) Compresor, (1) Grúa telescópica, (1) Baredora, (2) Fresadora, (1) Camión, (4) Camionetas, (3) Microbus, (1) Clasificadora de granulares, (1) Planta de asfalto, (1) Encofradora de concreto, (1) Tractor, (1) Grúa en los frentes de obra del proyecto				
Dentro del control de calidad: La interventoría ha realizado la toma de muestra de los diferentes materiales para realizar el control de los ensayos a través de un laboratorio externo.Durante el proceso de instalación de las mezclas asfálticas se lleva a cabo los controles de temperatura de BTA, MDC 25, MDC-19. En el caso de concretos se realiza la toma de asentamiento con el cono slump, toma de muestras en cilindros de concreto para posterior evaluación de resistencia a la compresión y en el caso de los pilotes se llevo a cabo pruebas de integridad. Se verifican para las actividades de demarcación de borde y eje los espesores secos y la reflectividad. Adicionalmente se realizan ensayos de control de calidad a los materiales en conjunto interventoría y contratista en el laboratorio implementando por el contratista en el campamento ubicado en la intersección de Ave Colombiana, así como el acompañamiento semanal en la ejecución de ensayos de control de mezclas y materiales el laboratorio de la planta de producción de asfaltos CMOP.				
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
Continuar con el reforzamiento de señalización en sitios críticos de accidentalidad, mediante la instalación de señales verticales y/o demarcación, de acuerdo con los inventarios y esquemas realizados por parte de los especialistas de tránsito.				
Continuar la construcción del canal de acceso a la obra del arco metálico y la obra de transición entre los dos tramos de arco metálico ya construidos. Terminar el montaje de la rampa oriental del puente peatonal y el armado de la estructura metálica. Continuar la construcción del piso en el puente peatonal con las placas alveolares y losas fundidas en sitio.				
Continuar la construcción de cunetas revestidas en concreto y la construcción de las obras para la recolección de aguas lluvias en el sector de la Gorieta de Ave Colombiana y en la calzada existente. Continuar los trabajos de urbanismo en la gorieta de Ave Colombiana.				
Continuar las actividades de descapote, excavación y construcción de capas de mejoramiento con material de terraplén y construcción de capa de subbase en el Tramo 2. Igualmente terminar la construcción de la obra hidráulica No. 31. en tubería de concreto reforzado diámetro 0.90 m.				
Continuar con la actividad de pintura de líneas de demarcación y marcas viales en los sectores ya establecidos en las rutas 45A04, 45A05, y 45A06 así como el sello de fisuras como medida provisional, evitando que el agua penetre a la carpeta asfáltica, y se produzcan daños aún mayores a la superficie.				
Continuar las actividades de mantenimiento de la carpeta asfáltica mediante Tapa huecos, parcheos técnico y Bacheos en los sectores de Zipaquirá - Ubaté, Ubaté -Chiquinquirá, Saboya - Puente Nacional - Olita - Socorro - San Gil Peaje Curti, para atender compromisos adquiridos con la comunidad en las reuniones de Socorro, Saboyá, Curti				
Continuar con los trabajos de adecuación de campamento en el K44+200 para las actividades constructivas del tramo 2.				
Intensificar actividades de gestión predial en los primeros 7 km. del tramo Peaje de Casablanca - Ubaté para lograr permisos de intervención y así dar inicio en los próximos meses, la construcción de la segunda calzada en este tramo.				
X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS				
El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIÓN AL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-3 VERSION 1 PÁGINA
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
 PARCHEO RUTA 45 A 05, PUENTE NACIONAL, PR77+0922 - PR78+0033, FRESADO E INSTALACIÓN DE MDC-19	 TAPAHUECOS RUTA 45 A 05, UBATÉ, PR66+0020 - PR66+0300, TAPAHUECOS CON MDC-19	 VARIANTE ZIQAQUIRÁ, ESPACIO PÚBLICO, FUNDIDA DE BORDILLO COSTADO OCCIDENTAL
 VARIANTE ZIQAQUIRÁ, ESPACIO PÚBLICO, COMPACTACIÓN DE MATERIAL ADECUADO EN CONECTANTE OCCIDENTAL	 VARIANTE ZIQAQUIRÁ, PUENTE PEATONAL, NIVELACIÓN CON FRESADO DE CURVA 3 DE RAMPA 2	 VARIANTE ZIQAQUIRÁ, OBRA No 19, FUNDIDA DE 4ta SECCIÓN DE MUROS MÓDULO 3 DE CANAL DE ACCESO
 VARIANTE ZIQAQUIRÁ, ESPACIO PÚBLICO, INSTALACIÓN DE CONCRETO Y PIEDRA BAJO RAMPA 1	 VARIANTE ZIQAQUIRÁ, PUENTE PEATONAL, TRABAJOS DE LUJADO Y PINTURA EN PASARELA Y PILA 4	 VARIANTE ZIQAQUIRÁ, GLORIETA, CONFORMACIÓN DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN EN CÍRCULO CENTRAL
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
SE REALIZÓ CONTROL, SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAPETA ASFÁLTICA QUE SE VIENE EJECUTANDO EN LOS CORREDORES OBJETO DEL CONTRATO CON EL FIN DE MITIGAR LA SINIESTRALIDAD VIAL. ASÍ MISMO SE REALIZÓ RECORRIDO EN LOS SECTORES ENTREOIBA - OLIVAL PARA DEFINIR LOS SECTORES Y TRAMOS A INTERVENIR.		
SE REALIZÓ CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA CAPETA ASFÁLTICA QUE SE VIENE EJECUTANDO EN EL SECTOR DE LA RUTA RUTA 45 A 06 OIBA - RUTA 45 A 07 SAN GIL REAJE CURITL.		
CON OFICIO C971-3729-2024 SE REITERA AL CONTRATISTA LA DEMARCACIÓN VIAL Y SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LOS SECTORES DEL CORREDOR QUE ASÍ LO REQUIEREN		
FIRMA:		
NOMBRE:		LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Matrícula Profesional No.:		66202-16905 STD
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.		
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contraloría, Interventoría y Dirección Territorial.		



INVIAS



Remite: CONSORCIO ICEACSA - TPF <consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com>

Fecha: 2025-03-27 19:11:33

Para: atencionciudadano@invias.gov.co


Asunto: C971 4157 2025 Informe semanal de Interventoria No 197

Adjuntos: 03

Radicado: 2025E-VUVRAZ-032542

Fecha Radicación: 2025-03-28 08:52:23

Cc:



Zipaquirá (Cundinamarca), 27 de marzo de 2025

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Atn.: Ing. Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo

Supervisor del Contrato de Interventoría

Dirección Territorial Cundinamarca

Fontibón

Ref.: Contrato No 971 de 2021 “Interventoría para las obras de mejoramiento mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la ruta de los comuneros (Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga; Girón - Piedecuesta) en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública “vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” módulo 1.”.

Asunto: Informe semanal de Interventoría No 197

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft para el INVÍAS

Zipaquirá (Cundinamarca), 27 de marzo de 2025

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Atn.: Ing. Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo

Supervisor del Contrato de Interventoría

Dirección Territorial Cundinamarca

Fontibón

Ref.: Contrato No 971 de 2021 “Interventoría para las obras de mejoramiento mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la ruta de los comuneros (Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga; Girón - Piedecuesta) en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública “vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” módulo 1.”.

Asunto: Informe semanal de Interventoría No 197

Respetado Señor,

El Consorcio ICEACSA - TPF en cumplimiento de sus obligaciones contractuales del contrato citado en la referencia, se permite remitir el Informe Semanal No 197 del periodo comprendido entre el 21 a 27 de marzo de 2025 de acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoría en su instructivo MINFRA-MN-IN-15.

Cordialmente,



LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA


Director de interventoría

Elaboro: Área Técnica

Aprobó: Luis Antonio Rueda Rueda

Copia: Ing. Javier Augusto Cañón Bonilla – Gerente SMDC Grupo Oriente - INVIAS
Archivo.


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIÓN AL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-RN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
SE REALIZÓ CONTROL, SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAPETA ASFÁLTICA QUE SE VIENE EJECUTANDO EN LOS CORREDORES OBJETO DEL CONTRATO CON EL FIN DE MITIGAR LA SINIESTRALIDAD VIA. ASÍ MISMO SE REALIZÓ RECORRIDO EN LOS SECTORES ENTREOIBA - OLIVAL PARA DEFINIR LOS SECTORE Y TRAMOS A INTERVENIR.	
SE REALIZÓ CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA CAPETA ASFÁLTICA QUE SE VIENE EJECUTANDO EN EN EL SECTOR DE LA RUTA RUTA 45 A 06 OIBA , RUTA 45 A 07 SAN GIL PEAJE CURITI.	
CON OFICIO C971-3729-2024 SE REITERA AL CONTRATISTA LA DEMARCACIÓN VAL Y SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LOS SECTORES DEL CORREDOR QUE ASÍ LO REQUIEREN	
CON OFICIO C971-4156-2025 SE RADICÓ AL INVIAS EL ACTA DE MODIFICACIÓN No 19. REPROGRAMACIÓN DE INVERSIONES No 21. DEBIDO A LA INCLUSIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS NECESARIOS PARA LA TERMINACIÓN DE LA GLORETA AVE COLOMBIANA Y PERMITIR LA INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES EN LA CARRERA 36 PARA SU FUNCIONAMIENTO EN DOBLE SENTIDO.	
	FIRMA: _____
	NOMBRE: _____ LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
	Matricula Profesional No. _____ 88202-16905 STD
Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.	
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Comités, Interventor y Dirección Territorial	

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 46 INVIAS-IM – 0971-2021 MARZO DE 2025	

Anexo No 2.

MEPI-MN1-IN-15-FR-4 Maquinaria y equipo contrato de obra

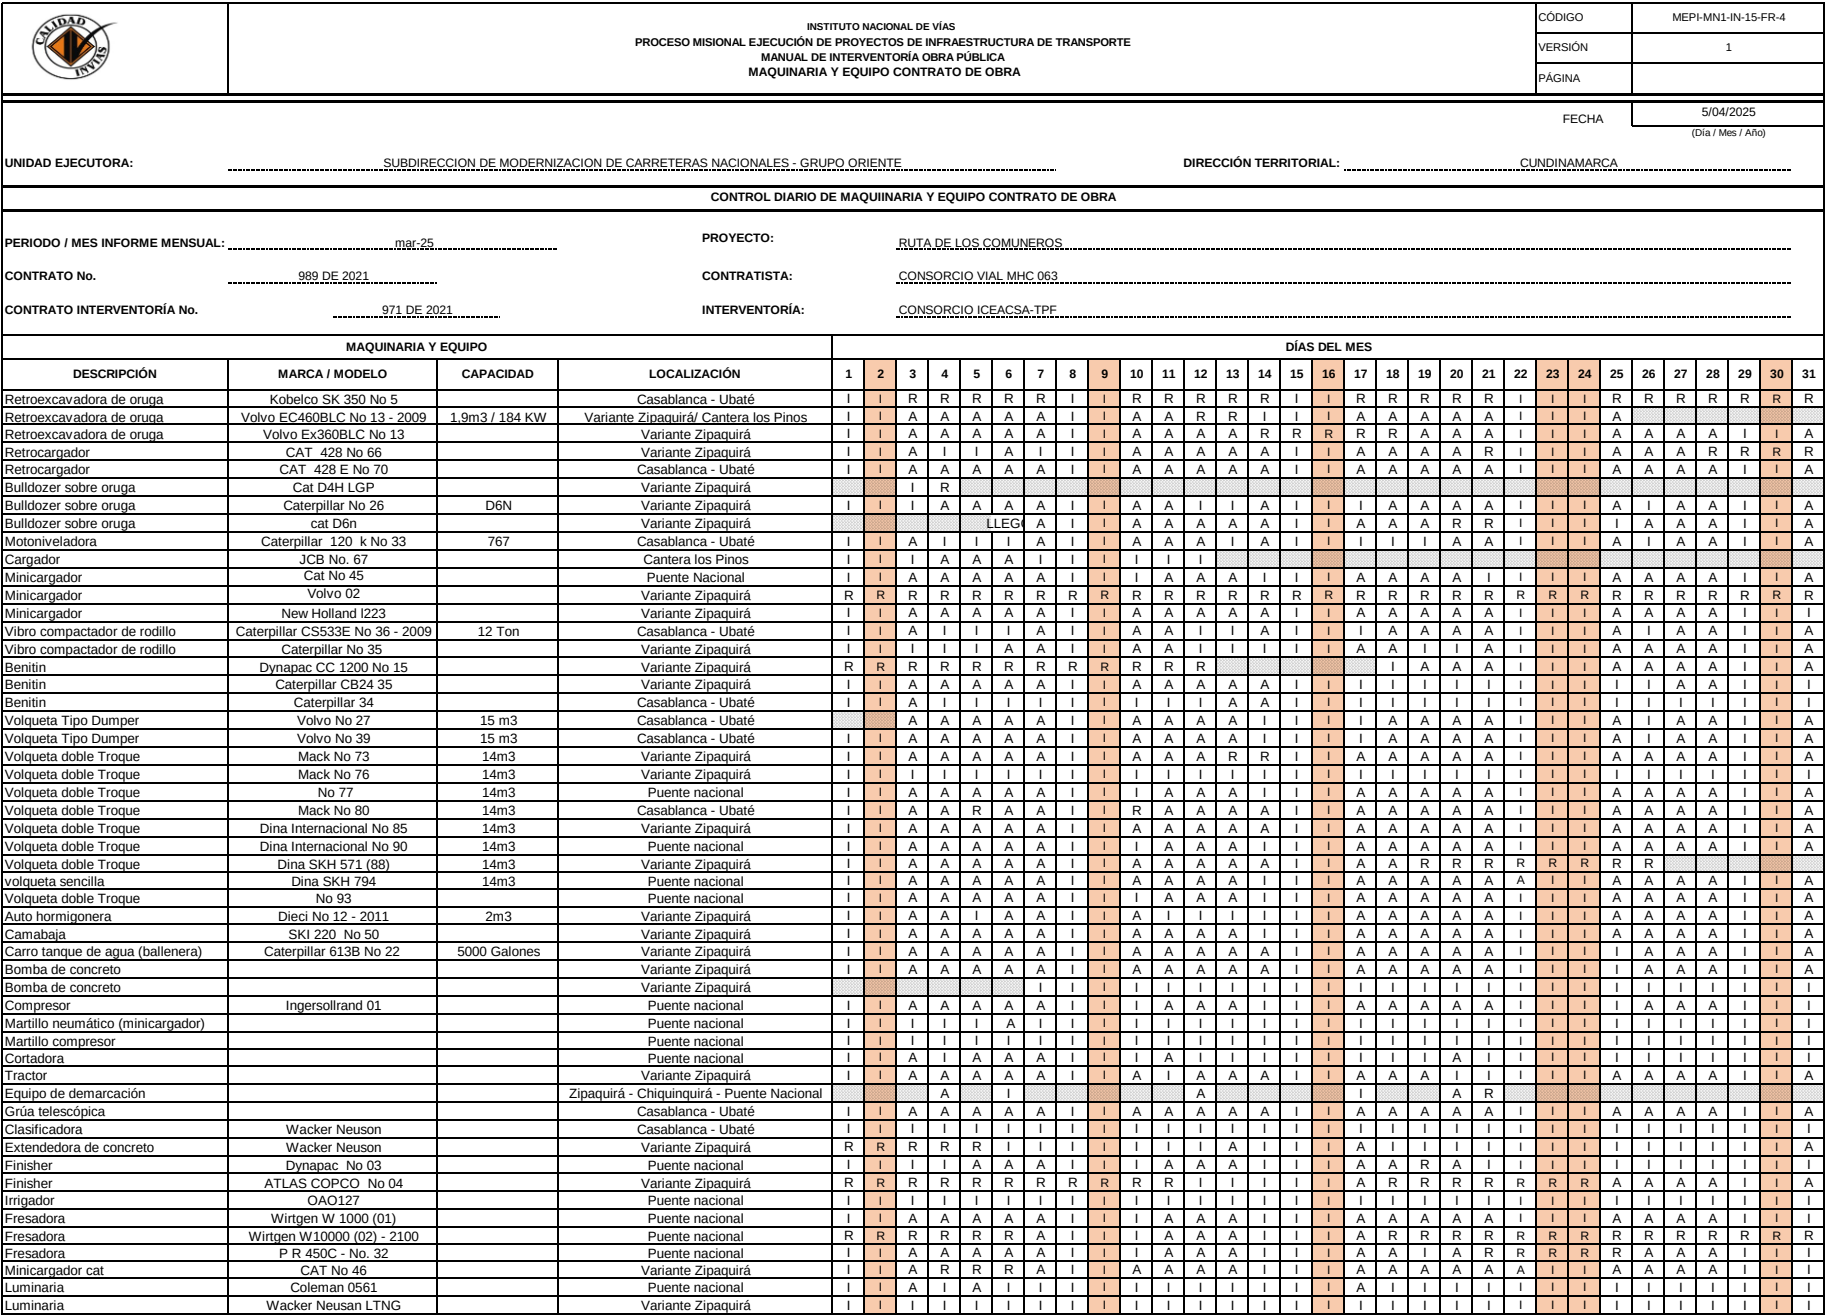

Barredora	85		Puente nacional	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	I	I	I	A	R	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	I	I	
Vibro compactador mixto	Ham 25		Puente nacional	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	I	I	I	A	A	I	A	A	I	I	I	I	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	I	I
Vibro compactador mixto	Ham H075 (23)		Variante Zipaquirá	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
Vibro compactador de llanta	CAT PS 180 No. 21		Puente nacional	I	I	A	R	R	R	A	I	I	I	A	A	A	I	I	I	A	A	I	A	I	I	I	I	I	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	I	I
Irrigador	Ford Rie 036		Puente nacional	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	I	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	I	A
Camión Turbo	NKR		Puente nacional	I	I	A	I	A	A	A	I	I	I	A	I	I	I	I	I	A	A	A	A	I	I	I	I	I	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	I	A
Carrotanque de Agua	INTERNACIONAL 02		Puente nacional	I	I	A	A	A	A	I	I	I	I	A	A	A																											
Grúa linbelt			Variante Zipaquirá	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A			
Carro elevador			Variante Zipaquirá	I	I									A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	I	I	I	I	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				55	55	57	58	56	58	58	58	58	59	60	57	56	56	56	57	57	57	58	58	57	57	57	57	56	55	54	54	54	54										
TOTAL ACTIVO				0	0	39	33	34	37	40	0	0	27	41	37	35	16	0	0	34	33	31	36	30	2	0	0	32	33	39	37	0	0	28									
TOTAL EN REPARACIÓN				5	5	6	9	9	7	4	3	3	5	4	4	4	4	2	2	3	6	6	6	9	5	5	5	5	4	3	4	4	4	4									
TOTAL INACTIVO				50	50	12	16	13	12	14	55	55	26	14	19	18	36	54	54	20	18	20	16	19	50	52	52	20	19	13	13	50	50	22									

RESUMEN PERIODO / MES

No.

%

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO

1757

100%

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A

674

38.36%

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R

149

8.48%

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I

932

53.04%

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

-Los días 2, 9, 16, 23, 24 y 30 de marzo del 2025 corresponden a domingos y/o festivos en los cuales aplica restricción vehicular de acuerdo a la resolución de INVIAS y por ende los sábados no se ejecutan actividades que afecten la circulación vial.

El siguiente equipo se encuentre en reparación por las siguientes razones:

1) Retroexcavadora de oruga Kobelco SK 350 No 5 : Daño en la culata

2) Retroexcavadora de oruga Volvo EC460BLC No 13: Mantenimiento

3) Retroexcavadora de oruga Volvo Ex360BLC No 13: Daños en el radiador

4) Retrocargador CAT 428 No 66: Daño de manguera y botella

5) Bulldozer sobre oruga Cat D4H LGP: Recalentamiento

6) Minicargador Volvo 02: Daños en la bomba

7) Benitin Dynapac CC 1200 No 15: Daño en el ventilador

8) Volqueta doble Troque Mack No 73: Cambio de espárragos

9) Volqueta doble Troque Mack No 76: Sin conductor

10) Volqueta doble Troque Mack No 80: Cambio de espárragos

9) Equipo de demarcación: Daño en el sistema de aplicación de las pistolas

10) Extendedora de concreto Wacker Neuson: Daños en las bombas

11) Finisher ATLAS COPCO No 04: Daño en la tarjeta y sensores

12) Volqueta doble troque Dina SKH 571 (88) : Daño en el arranque

13) Vibro compactador mixto Ham 25 H075: Sin operador

14) Bulldozer sobre oruga CAT D6N: Daño en la Oruga

15) Vibro compactador de llanta CAT PS 180 No. 21: Fallos en el sistema de frenado

16) Minicargador CAT No 46: Fallo en bomba de combustible

17) Finisher Dynapac No 03: Daño en la plancha

19) Fresadora Wirtgen W10000 (02) - 2100: Daño en el turbo

20) Barredora 85: Desgaste cepillo

21) Fresadora P R 450C - No. 32: Daño en rotor de puntas solenoide

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

1) El anexo técnico del contrato establece dentro del equipo mínimo una perforadora Jumbo (3 Brazos), perforadora Jumbo (2 Brazos) y Bomba de Inyección Lechada (2m3/h), sin embargo acorde al alcance y necesidades del contrato, la anterior maquinaria no se requiere por el momento.

2) Se registra el retiro de la siguiente maquinaria: Bulldozer sobre oruga Cat D4H LGP, Benitin Dynapac CC 1200 No 15, Grúa linbelt, Fresadora Wirtgen W10000 (02) - 2100

3) Se registra el Ingreso de la siguiente maquinaria: Benitin Dynapac CC 1200 No 15, Volqueta Tipo Dumper No. 27, Bomba de concreto, Carro elevador, Bulldozer sobre oruga CAT D6N

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.

3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.

4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

LUIS FELIPE MORENO BRAVO

Residente de Obra

Matrícula No. : 25202-05870 CND

Firma

JORGE ENRIQUE SÁNCHEZ PRADA

Residente de Interventoría

Matrícula No. : 6820201827 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 46 INVIAS-IM – 0971-2021 MARZO DE 2025	

Anexo No 3.

MEPI-MN1-IN-15-FR-6 Personal de obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS																				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6																											
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE																				VERSIÓN	1																											
	MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA																				PÁGINA																												
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA																																																	
FECHA4/04/2025 (Día / Mes / Año)																																																	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE																				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA																													
CONTRATO DE OBRA No: 989-2021																				CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063																													
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1																																																	
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: mar-25																				PROYECTO:																													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2021																				INTERVENTOR:																													
NOMBRE ARL: SURA																				NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COLSUBSIDIO																													
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones de (indicar novedad de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administrador a de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	PENAGOS CASTILLO FREDY JAVIER	2948251	CONDUCTOR 2.TROQ. DINA 87 SKH-570	2500000	S	D		ING	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	3317934	144400	IV	SALUD TOTAL EPS	1071608220	132800	PORVENIR	1071608220	132800	530900	0	0	INGRESO POR TRASLADO DESDE 04-03-2025 DE 2025			
2	DIAZ JULIO ALEJANDRO	3028799	AYUDANTE GENERAL OBRA	1423500	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	1469918	102400	V	FAMISANAR EPS	1071608220	58800	PORVENIR	1071608220	58800	235200	0	0					
3	MEDINA RODRIGUEZ ISRAEL	3057201	OPERADOR CILINDRO DYNAPACK 1200.14	1900000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	1900000	132300	V	SALUD TOTAL EPS	1071608220	76000	COLFONDOS	1071608220	76000	304000	0	0					
4	ROCHA DELGADILLO LUIS ALBERTO	3146633	AYUDANTE GENERAL OBRA	1423500	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	1438972	100200	V	FAMISANAR EPS	1071608220	57600	PORVENIR	1071608220	57600	230300	0	0					
5	BLANCO RUIZ ARIEL	4107095	AYUDANTE FINISHER	1423500	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	2042414	142200	V	SALUD TOTAL EPS	1071608220	81700	PORVENIR	1071608220	81700	326800	0	0					
6	MELO MORALES PEDRO MIGUEL	4188849	OPERADOR FINISHER VOGELE 1803 1	2800000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	3192608	222300	V	FAMISANAR EPS	1071608220	127800	PORVENIR	1071608220	127800	510900	0	0					
7	ECHEVERRI GIRALDO ALBEIRO	9845440	AYUDANTE EXTENDEDOR A CONCRETO	1500000	S	D			INC	X	X	S	D				S	D	LR	LR	LR	LR	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	1494900	80100	V	SALUD TOTAL EPS	1071608220	59800	PORVENIR	1071608220	56000	239200	0	0	DESCANSO POR TRASLADO DEL 17 AL 21 DE MARZO DE 2025 INCAPACIDAD 06 DE			
8	AREVALO CASTILLO ISMAEL	11345802	AYUDANTE GENERAL OBRA	1423500	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	1446709	100700	V	FAMISANAR EPS	1071608220	57900	COLPENSIONES	1071608220	57900	231500	0	0					
9	RIOS EDGAR JOAQUIN	11346058	RESIDENTE ADMINISTRATIVO OBRA	4700000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	4700000	327200	V	EPS SANITAS	1071608220	188000	COLPENSIONES	1071608220	188000	752000	0	0			
10	HIDALGO BALLESTEROS EDUARDO	11346492	OPERADOR MINICARGADOR CAT. 45	2100000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	2282608	158900	V	COMPENSAR EPS	1071608220	91400	COLPENSIONES	1071608220	91400	365300	0	0		
11	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE ARTURO	11347058	CONDUCTOR 2.TROQ. DINA 88 SHK-571	2300000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	2460000	171300	V	COMPENSAR EPS	1071608220	98400	PORVENIR	1071608220	98400	393600	0	0		
12	GONZALEZ RUBIANO VICTOR JULIO	11349838	AYUDANTE GENERAL OBRA	1423500	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	1423500	99100	V	NUEVA EPS S.A.	1071608220	57000	COLPENSIONES	1071608220	57000	227800	0	0		
13	CASTRO ANGEL CARLOS ALBERTO	11439559	CONDUCTOR MULA DINA 47 SKH-023	3700000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	4580761	318900	V	FAMISANAR EPS	1071608220	183300	COLPENSIONES	1071608220	183300	733000	0	0		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA																							CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6																													
																								VERSIÓN	1																													
																								PÁGINA																														
FECHA																									4/04/2025 (Día / Mes / Año)																													
UNIDAD EJECUTORA:																									SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE										DIRECCIÓN TERRITORIAL:										CUNDINAMARCA									
CONTRATO DE OBRA No:																									989-2021										CONTRATISTA:										CONSORCIO VIAL MHC 063									
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:																									mar-25										PROYECTO:										MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDRECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:																									971 de 2021										INTERVENTOR:										CONSORCIO ICEACSA TPF									
NOMBRE ARL:																									SURA										NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:										COLSUBSIDIO									
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (indicar novedad de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administrador a de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA		Valor ICBF					
14	GARCIA MARTINEZ ARMANDO	11520902	AYUDANTE ORDEN ASEO Y LIMPIEZA	1423500	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	1423500	99100	V	COMPENSAR EPS	1071608220	57000	COLPENSIONES	1071608220	57000	227800	0	0									
15	LANDAZURI GUTIERREZ WILSON LORENZO	13054388	AYUDANTE FINISHER	1500000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	2181521	151900	V	COMPENSAR EPS	1071608220	87300	PORVENIR	1071608220	87300	349100	0	0									
16	GUTIERREZ VALBUENA HEYNE FERNEL	13513502	OPERADOR MIXER KENWORTH TSM.444.74	3300000	S	D	PM	X	X	X	X	S	D	LR	LR	LR	LR	S	D	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	4250862	111200	IV	SALUD TOTAL EPS	1071608220	170300	PROTECCION	1071608220	128700	680300	0	0	PERMISO POR CITA MEDICA DEL 03 DE MARZO DE 2025 DESCANSO POR							
17	DEL RIO CAÑON JULIAN ANDRES	13993947	COORDINADOR TOPOGRAFIA	4000000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	4000000	278400	V	EPS SANITAS	1071608220	160000	PORVENIR	1071608220	160000	640000	0	0							
18	RAVAGLI SUAREZ NELSON HERNAN	14327150	RESIDENTE SOCIAL PREDIAL	5000000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	5000000	348000	V	EPS SANITAS	1071608220	200000	PORVENIR	1071608220	200000	800000	0	0							
19	REYES CASTELLON ISAIAS GUILLERMO	15048605	LABORATORISTA MHC	2900000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	LR	LR	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	2900001	188400	V	EPS SANITAS	1071608220	116100	COLFONDOS	1071608220	116100	464100	0	0	DESCANSO POR TRASLADO DEL 10 AL 11 DE MARZO DE 2025						
20	BARRETO ANTONIO MANUEL	15049840	MAESTRO EXTENDEADOR A CONCRETO	2300000	S	D	LR	LR	LR	LR	LR	S	D	X	X	X	X	X	S	D	LL	LL	LL	LL	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	2300002	106800	V	NUEVA EPS S.A.	1071608220	92200	COLPENSIONES	1071608220	92200	368200	0	0	DESCANSO POR TRASLADO DEL 3 AL 7 DE MARZO LICENCIA POR LUTO						
21	PAEZ LLORENTE RICHARD RAFAEL	15647219	AUXILIAR LABORATORIO	1900000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	2674458	186200	V	COMPENSAR EPS	1071608220	107000	PORVENIR	1071608220	107000	428000	0	0							
22	POTOSI CHUÑA WILLIAN ELIAS	15877102	OPERADOR MINICARGADOR NWH L223 63	2000000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	LL	LL	LL	LL	LL	S	D	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	2258697	134100	V	SALUD TOTAL EPS	1071608220	90500	PORVENIR	1071608220	90500	361500	0	0	LICENCIA POR LUTO DEL 10 AL 14 DE MARZO DE 2025						
23	ARIAS GARCIA JOSE FERNANDO	15906260	OPERADOR BULLDOZER CAT D5H 21	3400000	S	D	LR	LR	LR	LR	LR	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	3400001	197300	V	NUEVA EPS S.A.	1071608220	136100	COLPENSIONES	1071608220	136100	544100	0	0	DESCANSO POR TRASLADO DEL 3 AL 7 DE MARZO DE 2025						
24	ROJAS HINCAPIE JOHNNY ALEXANDER	16161903	CADENERO PRIMERO INSPECTOR	2600000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	LR	LR	LR	LR	S	INC	INC	INC	INC	INC	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	2491796	120700	V	NUEVA EPS S.A.	1071608220	99800	COLPENSIONES	1071608220	86800	398800	0	0	DESCANSO POR TRASLADO DEL 17 AL 21 DE MARZO INCAPACIDAD DEL 23 AL						
25	MARTINEZ ARMANDO JOSE	18762276	TORNILLERO EXTENDEADOR A CONCRETO	2200000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	2211957	154000	V	FAMISANAR EPS	1071608220	88500	COLPENSIONES	1071608220	88500	354000	0	0							
26	MORENO BRAVO LUIS FELIPE	19256252	DIRECTOR INVESTIGACION Y DESARROLLO	15000000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	15000000	1044000	V	ALIANSALUD	1071608220	1875000	NINGUNA AFP	1071608220	600000	0	300000	450000							
27	SIERRA GALEANO BLANCA INES	23500541	AYUDANTE CONTROLADOR TRANSITO	1423500	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	1801037	125400	V	NUEVA EPS S.A.	1071608220	72100	COLPENSIONES	1071608220	72100	288200	0	0							

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS																				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6																											
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE																				VERSIÓN	1																											
	MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA																				PÁGINA																												
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA																																																	
FECHA4/04/2025 (Día / Mes / Año)																																																	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE																				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA																													
CONTRATO DE OBRA No: 989-2021																				CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063																													
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1																																																	
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: mar-25																				PROYECTO:																													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2021																				INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA TPF																													
NOMBRE ARL: SURA																				NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COLSUBSIDIO																													
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones de (indicar novedad de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administrador a de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
28	RINCON RODRIGUEZ EDILMA	35417966	AYUDANTE SERVICIOS GENERALES OBRA	1423500	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	1423500	99100	V	EPS SURA	1071608220	57000	COLFONDOS	1071608220	57000	227800	0	0				
29	SANCHEZ PORRAS LUZ AMPARO	37754784	PROFESIONAL SOCIAL	5700000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	5700000	396800	V	NUEVA EPS S.A.	1071608220	228000	PORVENIR	1071608220	288800	912000	0	0					
30	GONZALEZ SOLORIZANO YERLY XIOMARA	53075000	GERENTE CONSTRUCCION	15000000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	15000000	1044000	V	ADRES MIN002 antes	1071608220	1875000	COLPENSIONES	1071608220	600000	2400000	300000	450000					
31	GUTIERREZ RODRIGUEZ JULIED ANDREA	53103582	RESIDENTE AMBIENTAL	6000000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	6000000	417600	V	EPS SURA	1071608220	240000	COLPENSIONES	1071608220	240000	960000	0	0					
32	RAMIREZ LOPERA ANA CATALINA	53906302	RESIDENTE JURIDICO PREDIAL	6000000	S	D	X	X	X	X	X	S	D		X	X	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	6000000	417600	V	COMPENSAR EPS	1071608220	240000	COLPENSIONES	1071608220	240000	960000	0	0					
33	PARRA PEÑA DISNEYDA	66680055	AYUDANTE CONTROLADOR TRANSITO	1423500	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	1997543	139100	V	FAMISANAR EPS	1071608220	80000	PORVENIR	1071608220	80000	319700	0	0					
34	TORRES ALEXANDER	71949982	AYUDANTE CONTROLADOR TRANSITO	1423500	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	1677254	116800	V	SALUD TOTAL EPS	1071608220	67100	PROTECCION	1071608220	67100	268400	0	0					
35	CRIADO TORRES SANDRO MANUEL	72311406	AYUDANTE EXTENDEDOR A CONCRETO	1500000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	1508152	105000	V	NUEVA EPS S.A.	1071608220	60400	COLFONDOS	1071608220	60400	241400	0	0					
36	VASQUEZ VERGARA NILSON RAFAEL	73433515	OPERADOR EQUIPO MENOR	1900000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	1982609	138000	V	SALUD TOTAL EPS	1071608220	79400	COLFONDOS	1071608220	79400	317300	0	0					
37	LOPEZ AVELLA CESAR LEONARDO	74084323	ANALISTA TECNICO TOPOGRAFIA	3800000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	3800000	264500	V	FAMISANAR EPS	1071608220	152000	PROTECCION	1071608220	152000	608000	0	0					
38	BOHORQUEZ ROJAS NELSON DARIO	74281791	RESIDENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	5500000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	5500000	382800	V	COMPENSAR EPS	1071608220	220000	COLFONDOS	1071608220	220000	880000	0	0					
39	GIRALDO OROZCO DIEGO FERNANDO	75103003	TORNILLERO EXTENDEDOR A ASFALTO	1800000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	2396741	166900	V	SALUD TOTAL EPS	1071608220	95900	COLPENSIONES	1071608220	131900	383500	0	0					
40	PEÑA SIERRA JOSELIN	79058664	CONDUCTOR 2.TROO. INTER.108 SLI-790	2300000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	3267500	227500	V	EPS SANITAS	1071608220	130700	PROTECCION	1071608220	130700	522800	0	0					
41	CONEJO MARIN MELQUECIDE	79167728	OPERADOR DUMPER VOLVO 30 A25F	3300000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	3300000	229700	V	FAMISANAR EPS	1071608220	132000	COLPENSIONES	1071608220	132000	528000	0	0					

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

VERSIÓN

1

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

FECHA

4/04/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECTORA:

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No:

989-2021

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAL MHC 063

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:

mar-25

PROYECTO:

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDRECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

971 de 2021

INTERVENOTOR:

CONSORCIO ICEACSA TPF

NOMBRE ARL:

SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

COLSUBSIDIO

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (indicar novedad de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administrador a de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
56	BERMUEZ ALAPE JOHAN CAMILO	80658165	OPERADOR DUMPER VOLVO 36 A25F	3000000	S	D		ING	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	3000000	208800	V	FAMISANAR EPS	1071608220	120000	PORVENIR	1071608220	120000	480000	0	0	INGRESO POR TRASLADO 04-03-2025
57	RIAÑOS GUZMAN FREDY GIOVANI	80758274	AYUDANTE TOPOGRAFIA	1423500	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	1431236	99700	V	SALUD TOTAL EPS	1071608220	57300	PORVENIR	1071608220	57300	229000	0	0	
58	PINZON MIRANDA LUIS EZEQUIEL	81720239	OPERADOR AUTOHORMIGONERO DIECI 12	2400000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	2491304	173400	V	COMPENSAR EPS	1071608220	99700	PORVENIR	1071608220	99700	398700	0	0	
59	SUAZA CASTRO JULIO ESNEYDER	83090711	MECANICO	2700000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	3078587	214300	V	EPS SANITAS	1071608220	123200	PROTECCION	1071608220	123200	492600	0	0	
60	CUADROS ALMEIDA JHON JAIRO	91510564	OPERADOR CARGADOR HYUNDAI HI 740.60	3200000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	3200000	222800	V	FAMISANAR EPS	1071608220	128000	PORVENIR	1071608220	128000	512000	0	0	
61	TINOCO ANGEL CARLOS AUGUSTO	93340776	CONDUCTOR 2.TROQ. MACK 80 FSC-S57	2300000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	2300000	160100	V	NUEVA EPS S.A.	1071608220	92000	COLPENSIONES	1071608220	92000	368000	0	0	
62	ZAMORA MORA WILSON	93363609	DIRECTOR DE TOPOGRAFIA DE CAMPO	8800000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	8800000	612500	V	NUEVA EPS S.A.	1071608220	352000	COLPENSIONES	1071608220	352000	1408000	0	0	
63	ALVAREZ VIVAS DIEGO MAURICIO	94482582	OPERADOR MOTO CAT 14G 33	3600000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	3600000	250600	V	NUEVA EPS S.A.	1071608220	144000	COLPENSIONES	1071608220	144000	576000	0	0	
64	PARRA ORTIZ MARCOS FREDDY	98466368	GUIARRERO	2100000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	2830436	197000	V	NUEVA EPS S.A.	1071608220	113300	COLPENSIONES	1071608220	113300	452900	0	0	
66	PARRA GONZALEZ JOAN ESTEAVEN	1001546083	AYUDANTE EXTENDEDOR A CONCRETO	1500000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	1601087	111500	V	ALIANZA MEDELLIN	1071608220	64100	PORVENIR	1071608220	64100	256200	0	0	
67	PEREZ LABIOSA ANDRES FERNANDO	1002093749	OPERADOR TRACTOR FORD 5000	1900000	S	D	LR	LR	LR	LR	LR	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	1900001	110300	V	NUEVA EPS S.A.	1071608220	76100	PORVENIR	1071608220	76100	304100	0	0	DESCANSO POR TRASLADO DEL 03 AL 07 DE MARZO DE 2025
68	ROJAS ANGARITA GUSTAVO ALFONSO	1002304116	AYUDANTE EXTENDEDOR A CONCRETO	1423500	S	D						S	D				ING	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	1281150	89200	V	ASOCIACION MUTUAL SER	1071608220	51300	COLPENSIONES	1071608220	51300	205000	0	0	INGRESO POR TRASLADO DESDE EL 13-03-2025
69	VIANA LARA DEIBIS JOSE	1002326435	AYUDANTE FINISHER	1423500	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	2062528	143600	V	EPS SURA	1071608220	82600	COLFONDOS	1071608220	82600	330100	0	0	
70	GOMEZ PELAYO JUAN DANIEL	1002548316	AYUDANTE GENERAL OBRA	1423500	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	1423500	99100	V	NUEVA EPS S.A. CM	1071608220	57000	PORVENIR	1071608220	57000	227800	0	0	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

VERSIÓN

1

PÁGINA

FECHA

4/04/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No:

989-2021

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAL MHC 063

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:

mar-25

PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

971 de 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO ICEACSA TPF

NOMBRE ARL:

SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

COLSUBSIDIO

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones de (indicar novedad de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administrador a de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF			
71	CALDERON MONTES SANTIAGO	1003882515	CADENERO SEGUNDO	1900000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	1910326	133000	V	EPS SURA	1071608220	76500	COLPENSIONES	1071608220	76500	305700	0	0		
72	TORRES GALVAN CHRISTYAN DAVID	1005387314	AYUDANTE EXTENDEDOR A CONCRETO	1500000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	1532609	106700	V	NUEVA EPS S.A.	1071608220	61400	PROTECCION	1071608220	61400	245300	0	0		
73	RAMIREZ ORDOÑEZ ANDRES JULIAN	1005848655	AYUDANTE EXTENDEDOR A CONCRETO	1423500	S	D						S	D				ING	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	1281150	89200	V	FAMISANAR EPS	1071608220	51300	PORVENIR	1071608220	51300	205000	0	0	INGRESO POR TRASLADO DESDE EL 13-03-2025
74	CHAVES ANGARITA DIEGO ALEXANDER	1007341923	AYUDANTE CONTROLADOR TRANSITO	1423500	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	1638572	114100	V	FAMISANAR EPS	1071608220	65600	PORVENIR	1071608220	65600	262200	0	0		
75	MANJARREZ TRIANA DIEGO ALEJANDRO	1007534795	TORNILLERO EXTENDEDOR A ASFALTO	2100000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	2727718	189900	V	EPS SANITAS	1071608220	109200	PORVENIR	1071608220	109200	436500	0	0		
76	BOLAÑO CARRANZA DANIEL DAVID	1007833311	AYUDANTE EXTENDEDOR A CONCRETO	1500000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	1557066	108400	V	NUEVA EPS S.A.	1071608220	62300	PORVENIR	1071608220	62300	249200	0	0		
77	RIOS ALFONSO JOHAN NICOLAS	1007861118	GESTOR ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS	2000000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	2000000	139200	V	EPS SANITAS	1071608220	80000	COLPENSIONES	1071608220	80000	320000	0	0		
78	VALLEJO TICORA GERMAN ANDRES	1010242603	ARQUEOLOGO	3500000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	3500000	243600	V	EPS SANITAS	1071608220	140000	COLFONDOS	1071608220	140000	560000	0	0		
79	HUERTAS SANCHEZ JUAN GABRIEL	1012351697	OFICIAL EXTENDEDOR A CONCRETO	2300000	S	D	ING	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	2312500	161000	V	COMPENSAR EPS	1071608220	92500	PORVENIR	1071608220	92500	370000	0	0	INGRESO 03 DE MARZO DE 2025	
81	VELASQUEZ GARZON HECTOR YESID	1020810038	TOPOGRAFO INSPECTOR	3200000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	3200000	222800	V	SALUD TOTAL EPS	1071608220	128000	PROTECCION	1071608220	128000	512000	0	0		
82	HERNANDEZ ARGOTE MONICA TATIANA	1022404846	ARQUEOLOGO	4000000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	4000000	278400	V	COMPENSAR EPS	1071608220	160000	COLFONDOS	1071608220	160000	640000	0	0		
83	CONTRERAS ALFONSO WILMER JAVIER	1024463954	OPERADOR FRESADORA WIRTGEN W1000 EX	3000000	S	D	ING	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	3831521	266700	V	SALUD TOTAL EPS	1071608220	153300	PORVENIR	1071608220	153300	613100	0	0	INGRESO 03 DE MARZO DE 2025	
84	HERRERA TOVAR JEFFERSON ALEJANDRO	1030536614	COORDINADOR TECNICO PREDIAL	6300000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	6300000	438500	V	EPS SURA	1071608220	252000	PROTECCION	1071608220	252000	1008000	0	0		
85	CIRO RUIZ YEISON IVAN	1038384131	TORNILLERO EXTENDEDOR A ASFALTO	1700000	S	D	RET					S	D						S	D					S	D	F					S	D		MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	1736424	75700	V	ALIANZA MEDELLIN	1070905715	56500	PORVENIR	1070905715	264900	96700	0	0	RETIRO 03/03/2025	



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

VERSIÓN

1

PÁGINA

FECHA

4/04/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No:

989-2021

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAL MHC 063

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:

mar-25

PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

971 de 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO ICEACSA TPF

NOMBRE ARL:

SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

COLSUBSIDIO

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones de (indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administrador a de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF			
86	CASTAÑEDA NAYIBE ANDREA	1038386075	ASISTENTE TALENTO HUMANO OBRA	2400000	S	D	RE T					S	D						S	D						S	D	F					S	D		MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	2400000	9700	IV	NUEVA EPS S.A.	1070905715	96000	COLPENSIONES	1070905715	384000	162400	0	0	RETIRO 03/03/2025
87	SANDOVAL HERNANDEZ MARCOS ISAI	1032389610	OPERADOR RETRO CARG. 428 E 68	2800000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	2830435	197000	V	ADRES MIN001 antes	1071608220	113300	PROTECCION	1071608220	113300	452900	0	0	
88	VALENCIA LOTERO CARLOS ENRIQUE	1038387232	OFICIAL EXTENDEDOR A CONCRETO	2300000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	2325000	161900	V	NUEVA EPS S.A.	1071608220	93000	PORVENIR	1071608220	93000	372000	0	0	
89	VARGAS CANO JOSE JAVIER	1042060825	OPERADOR RETRO CARG. 428 E 68	2800000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	2800000	194900	V	NUEVA EPS S.A.	1071608220	112000	COLFONDOS	1071608220	112000	448000	0	0	
90	ROJAS GARZON YOVANNY DE JESUS	1042062574	AYUDANTE FINISHER	1800000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	2445654	170300	V	NUEVA EPS S.A.	1071608220	97900	PROTECCION	1071608220	97900	391400	0	0	
91	DAZA BELTRAN HAIDER MATIAS	1054682707	CONDUCTOR MICROBUS N.5 HSS-449	1600000	S	D	ING	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	2043478	142300	V	FAMISANAR EPS	1071608220	81800	PORVENIR	1071608220	81800	327000	0	0	INGRESO 03 DE MARZO DE 2025
92	GALVEZ VERGARA YOMARA	1054988888	RESIDENTE TECNICO PREDIAL	5500000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	5500000	382800	V	EPS SURA	1071608220	220000	PORVENIR	1071608220	220000	880000	0	0	
93	LARGO HERNEY	1054994349	AYUDANTE EXTENDEDOR A CONCRETO	1500000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	LR	LR	LR	LR	LR	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	1500000	87000	V	SALUD TOTAL EPS	1071608220	60000	PORVENIR	1071608220	60000	240000	0	0	DESCANSO POR TRASLADO DEL 10 AL 14 DE MARZO DE 2025
94	MANRIQUE CUEVAS BRAYAN RICARDO	1057545375	AYUDANTE CONTROLADOR TRANSITO	1423500	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	1423500	99100	V	NUEVA EPS S.A. CM	1071608220	57000	PORVENIR	1071608220	57000	227800	0	0	
95	VEGA SUAREZ EDWIN JAVIER	1057581418	INSPECTOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3300000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	3927717	273400	V	EPS SANITAS	1071608220	157200	COLPENSIONES	1071608220	157200	628500	0	0	
96	MORA CEPEDA PAULA DANIELA	1057607448	ASISTENTE TALENTO HUMANO OBRA	2500000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	2500000	174000	V	NUEVA EPS S.A. CM	1071608220	100000	PORVENIR	1071608220	100000	400000	0	0	
97	ZABALA BERROCAL OSCAR DARIO	1067859959	OFICIAL EXTENDEDOR A CONCRETO	2000000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	2021739	140800	V	NUEVA EPS S.A.	1071608220	80900	PROTECCION	1071608220	80900	323500	0	0	
98	NEGRETE PACHECO CARLOS ANDRES	1067893519	OPERADOR CAMION GRUA CHEVROLET SPM 968	4100000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	4434240	163200	IV	EPS SURA	1071608220	177500	PORVENIR	1071608220	177500	709600	0	0	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA																							CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6																													
																								VERSIÓN	1																													
																								PÁGINA																														
FECHA																									4/04/2025 (Día / Mes / Año)																													
UNIDAD EJECUTORA:																									SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE										DIRECCIÓN TERRITORIAL:										CUNDINAMARCA									
CONTRATO DE OBRA No:																									989-2021										CONTRATISTA:										CONSORCIO VIAL MHC 063									
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:																									mar-25										PROYECTO:										MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDRECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:																									971 de 2021										INTERVENTOR:										CONSORCIO ICEACSA TPF									
NOMBRE ARL:																									SURA										NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:										COLSUBSIDIO									
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (indicar novedad de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administrador a de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA		Valor ICBF					
99	JIMENEZ MONTERO EDWIN DAVID	1069100434	ASISTENTE MAQUINARIA Y EQUIPO	1800000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	1800000	125300	V	EPS SURA	1071608220	72000	PORVENIR	1071608220	72000	288000	0	0									
100	MOLINA NIÑO NESTOR JULIAN	1069100660	CADENERO SEGUNDO	1900000	INC	INC	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	1868234	123500	V	COMPENSAR EPS	1071608220	74800	PORVENIR	1071608220	71000	299000	0	0	INCAPACIDAD DEL 01 AL 02 DE MARZO DE 2025								
101	GIL AREVALO MAURICIO	1069265330	CONDUCTOR 2.TROQ. MACK 72 GLB-277	2300000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	23000000	160100	V	FAMISANAR EPS	1071608220	92000	PROTECCION	1071608220	92000	368000	0	0									
102	RAMOS ARRIETA YISETH PAOLA	1069497814	INGENIERO AUXILIAR DIRECCION	3000000	S	D	ING	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	3081522	214500	V	NUEVA EPS S.A. CM	1071608220	123300	PORVENIR	1071608220	123300	493100	0	0	INGRESO 03 DE MARZO DE 2025								
103	CAMARGO RODRIGUEZ LORENZO	1070607202	CONDUCTOR SENCILLA DINA 08 SKH-803	2000000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	2734784	190400	V	FAMISANAR EPS	1071608220	109400	PORVENIR	1071608220	109400	437600	0	0									
104	VILLAMIZAR VILLAMIZAR JOSE EVANGELISTA	1070943492	OPERADOR GRUA TELESCOPICA	3000000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	3032609	211100	V	FAMISANAR EPS	1071608220	121400	COLPENSIONES	1071608220	121400	485300	0	0						
105	RINCON BACHILLER JUAN CARLOS	1070951879	OPERADOR RETRO EXC. KOBELCO SK 360.5	4100000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	4100000	285400	V	FAMISANAR EPS	1071608220	164000	COLPENSIONES	1071608220	164000	656000	0	0							
106	BARBOSA CANACUE WEHIMAR	1070959621	OPERADOR FRESADORA WIRTGEN 2100 DC 3	3400000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	4349783	302800	V	FAMISANAR EPS	1071608220	174000	PROTECCION	1071608220	174000	696000	0	0							
107	SALCEDO JORGE LUIS	1072446599	AYUDANTE GENERAL OBRA	1423500	S	D	ING	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	1423500	99100	V	SALUD TOTAL EPS	1071608220	57000	COLPENSIONES	1071608220	57000	227800	0	0	INGRESO 03 DE MARZO DE 2025					
108	CAMELO SEGURA YOHAN ALDEMAR	1072447725	OPERADOR CILINDRO HAMM HD 75K 23	2500000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	3721196	259000	V	NUEVA EPS S.A.	1071608220	148900	PORVENIR	1071608220	148900	595400	0	0							
109	BENITEZ OTALORA KEVIN SEBASTIAN	1072673962	ASISTENTE SOCIAL	1800000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	1800000	125300	V	NUEVA EPS S.A.	1071608220	72000	PORVENIR	1071608220	72000	288000	0	0							
110	RAMIREZ JOHN FREDY	1072744032	CONDUCTOR 2.TROQ. DINA 84 SOA-804	2300000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	INC	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	3279945	217500	V	FAMISANAR EPS	1071608220	131200	PORVENIR	1071608220	125000	524800	0	0	INCAPACIDAD DEL 24 AL 24 DE MARZO DE 2025						
111	RODRIGUEZ GOMEZ ROBERTO	1075656178	CONDUCTOR 2.TROQ. DINA 90 SKH-632	2500000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	3524457	245400	V	SALUD TOTAL EPS	1071608220	141000	COLPENSIONES	1071608220	141000	564000	0	0							
112	GARCIA BOLIVAR LILIA JOHANA	1075658523	ASISTENTE GESTION DOCUMENTAL OBRA	1800000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	F	X	INC	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	1787450	121200	V	EPS SURA	1071608220	71500	PROTECCION	1071608220	69600	286000	0	0	INCAPACIDAD DEL 26 AL 26 DE MARZO DE 2025						

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA																							CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6																								
																								VERSIÓN	1																								
																								PÁGINA																									
FECHA																									4/04/2025 (Día / Mes / Año)																								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE																									DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA																								
CONTRATO DE OBRA No: 989-2021																									CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063																								
																									MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDRECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1																								
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: mar-25																									PROYECTO:																								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2021																									INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA TPF																								
NOMBRE ARL: SURA																									NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COLSUBSIDIO																								
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (indicar novedad de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administrador a de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA		Valor ICBF
113	RAMIREZ OCHOA CARLOS FERNANDO	1075664068	CADENERO PRIMERO INSPECTOR	2600000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	2600000	181000	V	EPS SURA	1071608220	104000	PORVENIR	1071608220	104000	416000	0	0	
114	GARCIA PINILLA PITER CAMILO	1075664381	RESIDENTE CONTROL OBRA	6000000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	6000000	417600	V	EPS SANITAS	1071608220	240000	PORVENIR	1071608220	240000	960000	0	0	
115	NOVA HERNANDEZ NORVI STEFANY	1075670213	ASISTENTE SOCIAL	1800000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	V	V	V	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	1800000	112800	V	EPS SANITAS	1071608220	72000	PORVENIR	1071608220	72000	288000	0	0	VACACIONES DEL 25 AL 27 DE MARZO
116	JULIO RAMOS JEISON ENRIQUE	1075670406	AYUDANTE CONTROLADO R TRANSITO	1423500	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	1853645	129100	V	NUEVA EPS S.A. CM	1071608220	74200	PORVENIR	1071608220	74200	296600	0	0	
117	PEÑA VILLAMIL MARIA DEL PILAR	1075670604	INSPECTOR AMBIENTAL	3000000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	3000000	208800	V	COMPENSAR EPS	1071608220	120000	COLPENSIONES	1071608220	120000	480000	0	0	
118	MATEUS SANTOS JEISON FREIDAN	1075682749	AYUDANTE GENERAL OBRA	1423500	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	1650951	115000	V	NUEVA EPS S.A.	1071608220	66100	PORVENIR	1071608220	66100	264200	0	0	
119	RAMIREZ RINCON DANIEL SANTIAGO	1075685563	AYUDANTE TOPOGRAFIA	1423500	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	1423500	99100	V	FAMISANAR EPS	1071608220	57000	PORVENIR	1071608220	57000	227800	0	0	
120	GOMEZ PELAYO SEBASTIAN ORLANDO	1075687690	AUXILIAR DIGITACION	1423500	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	1423500	99100	V	SALUD TOTAL EPS	1071608220	57000	PORVENIR	1071608220	57000	227800	0	0	
121	ROMERO GONZALEZ ANDREA YINETH	1075688014	RESIDENTE OBRA	2300000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	2600000	181000	V	COMPENSAR EPS	1071608220	104000	PORVENIR	1071608220	104000	416000	0	0	
122	FAJARDO CASTELLANOS CRISTIAN DAVID	1077085173	CONDUCTOR MICROBUS 5 TSM -434	2000000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	2373913	103300	IV	FAMISANAR EPS	1071608220	95000	PORVENIR	1071608220	95000	379900	0	0	
123	MEDINA SALAZAR JOSE MIGUEL	1077862999	AUXILIAR LABORATORIO	1600000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	1686956	117500	V	NUEVA EPS S.A.	1071608220	67500	PROTECCION	1071608220	67500	270000	0	0	
124	GUTIERREZ MAHECHA DAVINSON	1077972031	OPERADOR LANZADORA DE CONCRETO	2300000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	2540000	176800	V	EPS SANITAS	1071608220	101600	PORVENIR	1071608220	101600	406400	0	0	
125	PRADA VELASQUEZ HERNAN DARIO	1078369090	AYUDANTE GENERAL OBRA	1423500	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	1446709	100700	V	NUEVA EPS S.A.	1071608220	57900	COLPENSIONES	1071608220	57900	231500	0	0	
126	NARVAEZ GARCIA ANA CASIMIRA	1085225826	RESIDENTE JURIDICO PREDIAL	6000000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	6000000	417600	V	SALUD TOTAL EPS	1071608220	240000	PORVENIR	1071608220	240000	960000	0	0	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA																			CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
																				VERSIÓN	1	
																				PÁGINA		

FECHA

4/04/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No:

989-2021

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAL MHC 063

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:

mar-25

PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

971 de 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO ICEACSA TPF

NOMBRE ARL:

SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

COLSUBSIDIO

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones de (indicar noveda de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administrador a de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
127	BELTRAN DUARTE OSCAR IVAN	1090368350	AYUDANTE CONTROLADOR TRANSITO	1423500	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	1726768	120200	V	EPS SURA	1071608220	69100	PORVENIR	1071608220	69100	276300	0	0		
128	LAMUS GOMEZ LUIS LEONARDO	1095934443	MAESTRO OBRA	2800000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	2823435	189500	V	NUEVA EPS S.A.	1071608220	108900	PORVENIR	1071608220	108900	447800	0	0		
129	CASTILLO GOMEZ SERGIO ALEXANDER	1098610928	COORDINADOR DISEÑOS	8000000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	8000000	556800	V	EPS SURA	1071608220	320000	PORVENIR	1071608220	320000	1280000	0	0		
130	VARGAS CARREÑO MARIA LORENA	1098797292	RESIDENTE CALIDAD MATERIALES	4000000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	4000000	278400	V	EPS SANITAS	1071608220	160000	COLPENSIONES	1071608220	160000	640000	0	0		
131	ECHEVERRI HOYOS CESAR AUGUSTO	1099552669	AYUDANTE TOPOGRAFIA	1423500	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	2112042	147000	V	NUEVA EPS S.A.	1071608220	84500	COLPENSIONES	1071608220	84500	338000	0	0		
132	TORRES GALVAN TOMAS VIDAL	1099960224	OPERADOR EXTENDEDOR A CONCRETO SP 15	2600000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	2648044	184400	V	SALUD TOTAL EPS	1071608220	106000	PORVENIR	1071608220	106000	423700	0	0		
133	ALCAZAR DIAZ MAURIS	1101453229	AYUDANTE FINISHER	1500000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	1940217	135100	V	NUEVA EPS S.A.	1071608220	77700	PORVENIR	1071608220	77700	310500	0	0		
134	PARRA JAIMES BYRON ALFONSO	1102382293	INGENIERO AUXILIAR ESTUDIOS Y DISEÑOS	2200000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	2200000	153200	V	SALUD TOTAL EPS	1071608220	88000	PORVENIR	1071608220	88000	352000	0	0		
135	MARTINEZ PINTO DAVID ANDRES	1104070710	RESIDENTE TECNICO PREDIAL	5500000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	5500000	382800	V	NUEVA EPS S.A.	1071608220	220000	COLPENSIONES	1071608220	220000	880000	0	0		
136	ORJUELA ESPEJO FRANCO DAVID	1105672175	AYUDANTE FINISHER	1500000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	2100000	146200	V	EPS SANITAS	1071608220	84000	PROTECCION	1071608220	84000	336000	0	0		
137	MAHECHA GIRALDO JEFFRY	1105785152	CONDUCTOR 2.TROQ. DINA 81 SOA-800	2300000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	2582500	179800	V	FAMISANAR EPS	1071608220	103300	PORVENIR	1071608220	103300	413200	0	0		
138	VASQUEZ RODRIGUEZ NEYLA YISSETH	1105786307	ASISTENTE PREDIAL	2800000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	2800000	194900	V	EPS SANITAS	1071608220	112000	COLPENSIONES	1071608220	112000	448000	0	0		
139	PINZON CAICEDO LUIS EDUARDO	1109386847	OPERADOR FINISHER DYNAPAC SD2500C-4	2800000	S	D	LR	LR	LR	LR	LR	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	3828698	231100	V	SALUD TOTAL EPS	1071608220	153200	PORVENIR	1071608220	151500	612700	0	0	DESCANSO POR TRASLADO DEL 03 AL 07 DE MARZO	
140	SIERRA ORDUZ MIGUEL ANGEL	1116871736	OPERADOR FRESADORA WIRTGEN 2100 DCN 2	3000000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	4160869	289600	V	COMPENSAR EPS	1071608220	166500	PORVENIR	1071608220	166500	665800	0	0		



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

VERSIÓN

1

PÁGINA

FECHA

4/04/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No:

989-2021

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAL MHC 063

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:

mar-25

PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

971 de 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO ICEACSA TPF

NOMBRE ARL:

SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

COLSUBSIDIO

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (indicar novedad de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administrador a de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF			
141	COTRINA CRISTIAN FABIAN	1121868169	INSPECTOR PAVIMENTOS	3800000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	5319999	370300	V	FAMISANAR EPS	1071608220	212800	COLFONDOS	1071608220	212800	851200	0	0	
142	ZAMORA SUAREZ ANGIE CAROLINA	1233899380	AUXILIAR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	2100000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	2134239	148600	V	NUEVA EPS S.A.	1071608220	85400	PORVENIR	1071608220	85400	341500	0	0	
143	ORTIZ CERVANTES ADRIAN ESTEBAN	1007422869	OFICIAL	1423500	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	S	D	X	YRM INGENIEROS S.A.S	1423500	99075,6	V	NUEVA EPS	9483292830	56940	PORVENIR	9483292830	227760	65144	0	0	PAGO 21/04/2025
144	CERVANTES VARGAS JESUS ALBERTO	1042351213	MAESTRO	1423500	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	S	D	X	YRM INGENIEROS S.A.S	1423500	99075,6	V	NUEVA EPS	9483292830	56940	PORVENIR	9483292830	227760	65144	0	0	PAGO 21/04/2025
145	GUTIERREZ MARTINEZ JESUS MIGUEL	1010146394	AYUDANTE	1423500	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	S	D	X	YRM INGENIEROS S.A.S	1423500	99075,6	V	NUEVA EPS	9483292830	56940	PORVENIR	9483292830	227760	65144	0	0	PAGO 21/04/2025
146	CORTEZ ARANGO MARCEL FERNANDO	1055479622	INSPECTOR SST	2000000	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	RET	S	D	X	YRM INGENIEROS S.A.S	2000000	139200	V	NUEVA EPS	9483292830	80000	PROTECCION	9483292830	320000	80000	0	0	RETIRO EL 28/03/2025 PAGO 21-04-2025
147	HERNANDEZ SOLIPA JOSE FRANCISCO	1133869649	AYUDANTE	1423500	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	RET	S	D						S	D	F					S	D	X	YRM INGENIEROS S.A.S	1423500	99075,6	V	NUEVA EPS	9483292830	56940	PORVENIR	9483292830	227760	65144	0	0	RETIRO EL 14/03/2025 PAGO 21/04/2025
148	OSORIO CERVANTES SANTIAGO RAFAEL	1007563918	AYUDANTE	1423500	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	S	D	X	YRM INGENIEROS S.A.S	1423500	99075,6	V	NUEVA EPS	9483292830	56940	PORVENIR	9483292830	227760	65144	0	0	PAGO 21/04/2025
149	SILVA RODRIGUEZ YOLEINER DE JESUS	1004212747	AYUDANTE	1423500	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	S	D	X	YRM INGENIEROS S.A.S	1423500	99075,6	V	NUEVA EPS	9483292830	56940	PORVENIR	9483292830	227760	65144	0	0	PAGO 21/04/2025
150	MONSALVO GUTIERREZ FREIDER ANTONIO	1007564108	AYUDANTE	1423500	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	S	D	X	YRM INGENIEROS S.A.S	1423500	99075,6	V	NUEVA EPS	9483292830	56940	PROTECCION	9483292830	227760	80000	0	0	PAGO 21/04/2025
151	CESAR JULIO GUTIERREZ RODRIGUEZ	85083863	AYUDANTE	1423500	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	S	D	X	YRM INGENIEROS S.A.S	1423500	99075,6	V	NUEVA EPS	9483292830	56940	PROTECCION	9483292830	227760	80000	0	0	PAGO 21/04/2025
152	DEIVIS RAFAEL HERNÁNDEZ MARTINEZ	1080013959	AYUDANTE	1423500	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	S	D	X	YRM INGENIEROS S.A.S	1423500	99075,6	V	NUEVA EPS	9483292830	56940	PROTECCION	9483292830	227760	80000	0	0	PAGO 21/04/2025
153	EDILSON JAVIER HUESO	1121833035	MAESTRO	1423500	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	S	D	X	YRM INGENIEROS S.A.S	1423500	99075,6	V	NUEVA EPS	9483292830	56940	PROTECCION	9483292830	227760	80000	0	0	PAGO 21/04/2025
154	FERNANDEZ DIAZ ALFONSO RAFAEL	1042352076	AYUDANTE	1423500	S	D							D						S	D	ING	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	S	D	X	YRM INGENIEROS S.A.S	1423500	99075,6	V	NUEVA EPS	9483292830	56940	PROTECCION	9483292830	227760	80000	0	0	INGRESO EL 17/03/2025 PAGO 21/04/2025



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

VERSIÓN

1

PÁGINA

FECHA

4/04/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No:

989-2021

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAL MHC 063

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:

mar-25

PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

971 de 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO ICEACSA TPF

NOMBRE ARL:

SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

COLSUBSIDIO

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones de (indicar noveda de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administrador a de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF			
155	QUIÑONES JULIO PEDRO JOSE	1101460854	AYUDANTE	1423500	S	D							D						S	D	ING	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	S	D	X	YRM INGENIEROS S.A.S	1423500	99075,6	V	NUEVA EPS	9483292830	56940	PROTECCION	9483292830	227760	80000	0	0	INGRESO EL 17/03/2025 PAGO 21/04/2025
156	LOPEZ GRANADOS EDILSON JAVIER	1098690935	MAESTRO	1423500	S	D							D						S	D	ING	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	S	D	X	YRM INGENIEROS S.A.S	1423500	99075,6	V	NUEVA EPS	9483292830	56940	PROTECCION	9483292830	227760	80000	0	0	INGRESO EL 17/03/2025 PAGO 21/04/2025
157	ALVEAR CALDERON JESUS ANDRES	1005776321	VIGILANTE	1423500	X	X	X		X		X	X	X		X		X		X	X	X		X		X	X	X	F	X		X		X	X	X	SEGUIRIDAD ARMY VIG LTDA	1823500	126915,6	V	NUEVA EPS S.A.	1070693504	73000	PORVENIR	1070693504	291800	73000	0	0	PAGO 25/04/2025
158	DIAZ ROMERO REINALDO	72176528	VIGILANTE	1423500	X	X	X		X		X	X	X		X		X		X	X	X		X		X	X	INA	F	X		X		X	X	X	SEGUIRIDAD ARMY VIG LTDA	1823500	126915,6	V	COMPENSAR EPS	1070693504	73000	COLPENSIONES	1070693504	291800	73000	0	0	INASISTENCIA 23/03/2025 PAGO 25-04-2025
159	RANGEL MEDERO MIGUEL ANGEL	1050461776	VIGILANTE	1423500	X	X		X		X		X	X	X		X		X	X	X	X	X		X		X	X	X		X		X	X	X	SEGUIRIDAD ARMY VIG LTDA	1423500	99075,6	V	NUEVA EPS	1070693504	73000	PROTECCION	1070693504	291800	73000	0	0	PAGO 25/04/2025	
160	SIEMPIRA AMADO HECTOR WILMAN	80854212	VIGILANTE	1423500	X	X	X		X		X	X	X		X		X		X	X	X		X		X	X	X		X		X	X	X	X	SEGUIRIDAD ARMY VIG LTDA	1823500	126915,6	V	FAMISANAR EPS	1070693504	73000	PROTECCION	1070693504	291800	73000	0	0	PAGO 25/04/2025	
161	TOVAR ROBAYO JOSE GREGORIO	1073598391	VIGILANTE	1423500	X	X		X		X		X	X	X		X		X	X	X	X	X		X		X	X	X		X		X	X	X	SEGUIRIDAD ARMY VIG LTDA	1823500	126915,6	V	NUEVA EPS	1070693504	73000	PORVENIR	1070693504	291800	73000	0	0	PAGO 25/04/2025	
162	RIASCOS SINISTERRA JHON EDINSON	1007795935	VIGILANTE	1423500	X	X		X		X		X	X	X		X		X	X	X	X	X		X		X	X	X		X		X	X	X	SEGUIRIDAD ARMY VIG LTDA	1823500	126915,6	V	NUEVA EPS	1070693504	73000	PORVENIR	1070693504	291800	73000	0	0	PAGO 25/04/2025	
163	MONTAÑO CORTES JOSE CRISTOBAL	79166821	VIGILANTE	1423500	X	X		X		X		X	X	X		X		X	X	X	X	X		X		X	X	X		X		X	X	X	SEGUIRIDAD ARMY VIG LTDA	1823500	126915,6	V	NUEVA EPS	1070693504	73000	COLPENSIONES	1070693504	291800	73000	0	0	PAGO 25/04/2025	
164	RODRIGUEZ CUSBA MIGUEL ANGEL	1070963839	VIGILANTE	1423500	X	X	X		X		X	X	X		X		X		X	X	X		X		X	X	X		X		X		X	X	X	SEGUIRIDAD ARMY VIG LTDA	1856500	129212,4	V	FAMISANAR EPS	1070693504	129300	PORVENIR	1070693504	297100	129300	0	0	PAGO 25/04/2025
165	RUBEN DARIO RODRIGUEZ CASTILLO	1075681994	VIGILANTE	1423500	X	X		X		X		X	X	X		X		X	X	X	X	X		X		X	X	X		X		X	X	X	SEGUIRIDAD ARMY VIG LTDA	1856500	129212,4	V	SURA EPS	1070693504	129300	PORVENIR	1070693504	297100	129300	0	0	PAGO 25/04/2025	
166	JOJOA MAYA EMIR ANDRES	1069099603	SUPERVISOR	1423500	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	SEGUIRIDAD ARMY VIG LTDA	1856500	129212,4	V	FAMISANAR EPS	1070693504	129300	PROTECCION	1070693504	297100	129300	0	0	PAGO 25/04/2025
167	GUZMAN FLORIAN HUBERT YESID	1050457497	SUPERVISOR	1423500	S	D				X	X	S	D				X	X	S	D				X	X	S	D	F			X	X				SEGUIRIDAD ARMY VIG LTDA	1856500	129212,4	V	FAMISANAR EPS	1070693155	129300	COLPENSIONES	1070693155	297100	129300	0	0	PAGO 25/04/2025
168	LOZANO BETANCOURT ELIBERTO	93451084	SUPERVISOR	1423500	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X		X	SEGUIRIDAD ARMY VIG LTDA	1856500	129212,4	V	NUEVA EPS	1070693155	129300	COLFONDOS	1070693155	297100	129300	0	0	PAGO 25/04/2025	



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

VERSIÓN

1

PÁGINA

FECHA

4/04/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No:

989-2021

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAL MHC 063

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:

mar-25

PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

971 de 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO ICEACSA TPF

NOMBRE ARL:

SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

COLSUBSIDIO

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones de (indicar novedad de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administrador a de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF			
169	HERNANDEZ MOVILLA HERNAN ENRIQUE	91493096	DIRECTOR DE OBRA	4000000	S	D			X		S	D						S	D	RE T						S	D	F					S	D		TECMO SA	5960000	414816	V	SALUD TOTAL EPS	9483162925	238400	PORVENIR	9483162925	953600	238400	0	0	RETIRO POR TRASLADO 17/03/2025 PAGO 14/03/2025
170	RAMIREZ CASTRO JOHAN ALEXANDER	1073176571	RESIDENTE DE OBRA	2800000	S	D					S	D						S	D	RE T						S	D	F					S	D		TECMO SA	3448000	239980,8	V	FAMISANAR	9483162925	138000	COLPENSIONES	9483162925	551700	138000	0	0	RETIRO POR TRASLADO 17/03/2025 PAGO 14/03/2025
171	VERA TORRES LAURA JURIETH	1110596380	RESIDENTE SST OBRA	2100000	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	RE T						S	D	F					S	D		TECMO SA	2800000	194880	V	SANITAS	9483162925	112000	PROTECCION	9483162925	448000	112000	0	0	RETIRO POR TRASLADO 17/03/2025 PAGO 14/03/2025
172	ALFONSO CALDERON JOSE HENRY	79130583	OFICIAL DE MONTAJE	1962000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	RE T					S	D	F					S	D		TECMO SA/METALICAS HYM	1423500	99075,6	V	SANITAS	9483317977	57000	COLPENSIONES	9483317977	227800	57000	0	0	RETIRO POR TRASLADO 17/03/2025 PAGO 20/04/2025
173	FANDIÑO ABELLA ISRAEL	79381641	OFICIAL DE MONTAJE	1623000	S	D		X		X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	RE T					S	D	F					S	D		TECMO SA/METALICAS HYM	1423500	99075,6	V	SALUD TOTAL EPS	9483317977	57000	COLPENSIONES	9483317977	227800	57000	0	0	RETIRO POR TRASLADO 17/03/2025 PAGO 20/04/2025
174	HUERTAS ABELLA OMAR	19476504	SUPERVISOR DE MONTAJE	1500000	S	D		X				S	D		X		X		S	D	RE T					S	D	F					S	D		TECMO SA/METALICAS HYM	1500000	104400	V	SANITAS	9483317977	60000	COLPENSIONES	9483317977	240000	60000	0	0	RETIRO POR TRASLADO 17/03/2025 PAGO 20/04/2025
175	LUNA CARVAJAL ALBEIRO	1063723386	OFICIAL DE MONTAJE	1962000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	RE T					S	D	F					S	D		TECMO SA/METALICAS HYM	1423500	99075,6	V	NUEVA EPS	9483317977	57000	PORVENIR	9483317977	227800	57000	0	0	RETIRO POR TRASLADO 17/03/2025 PAGO 20/04/2025
176	LUNA CARVAJAL BEIMAR	1063717083	OFICIAL DE MONTAJE	1962000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	RE T					S	D	F					S	D		TECMO SA/METALICAS HYM	1423500	99075,6	V	SALUD TOTAL EPS	9483317977	57000	PORVENIR	9483317977	227800	57000	0	0	RETIRO POR TRASLADO 17/03/2025 PAGO 20/03/2025
177	SALGADO ALFONSO ROBINSON ARIEL	1048849157	SOLDADOR	2142000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	RE T					S	D	F					S	D		TECMO SA/METALICAS HYM	1500000	104400	V	SALUD TOTAL EPS	9483317977	60000	COLFONOS	9483317977	240000	60000	0	0	RETIRO POR TRASLADO 17/03/2025 PAGO 20/04/2025
178	SOCADAGUI GALLO CARLOS ARTURO	79123484	SUPERVISOR	1962000	S	D	X	X	X	X		S	D	X	X	X	X	X	S	D	RE T					S	D	F					S	D		TECMO SA/METALICAS HYM	1423500	99075,6	V	FAMISANAR	9483317977	57000	COLPENSIONES	9483317977	227800	57000	0	0	RETIRO POR TRASLADO 17/03/2025 PAGO 20/04/2025
179	TORRES HERNANDEZ PEDRO VICENTE	80380687	OFICIAL DE MONTAJE	1962000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	RE T					S	D	F					S	D		TECMO SA/METALICAS HYM	1423500	99075,6	V	NUEVA EPS	9483317977	57000	COLPENSIONES	9483317977	227800	57000	0	0	RETIRO POR TRASLADO 17/03/2025 PAGO 20/04/2025
180	LUNA CARVAJAL GRIMALDO	11173138	OFIAL DE MONTAJE	2123500	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	RE T					S	D	F					S	D		TECMO SA/METALICAS HYM	1423500	99075,6	V	SALUD TOTAL EPS	9483317977	57000	PORVENIR	9483317977	227800	57000	0	0	RETIRO POR TRASLADO 17/03/2025 PAGO 20/04/2025
181	TAO ATENCIA CLAUDIO	6892259	AYUDANTE DE MONTAJE	1823500	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	RE T					S	D	F					S	D		TECMO SA/METALICAS HYM	1423500	99075,6	V	NUEVA EPS	9483317977	57000	COLPENSIONES	9483317977	227800	57000	0	0	RETIRO POR TRASLADO 17/03/2025 PAGO 20/04/2025
182	SANCHEZ VALERO YEISON EDUARDO	1077085653	INSPECTOR SST	2200000	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	RE T					S	D	F					S	D		TECMO SA/METALICAS HYM	840000	58464	V	NUEVA EPS	9483317977	33600	PROTECCION	9483317977	134400	33600	0	0	RETIRO POR TRASLADO 17/03/2025 PAGO 20/04/2025



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

VERSIÓN

1

PÁGINA

FECHA

4/04/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No:

989-2021

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAL MHC 063

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:

mar-25

PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

971 de 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO ICEACSA TPF

NOMBRE ARL:

SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

COLSUBSIDIO

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL									PARAFISCALES			Observaciones (indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administrador a de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF			
183	QUINAYAS GUIRALES BELQUIN JAMES	1002920098	OFICIAL DE PINTURA	1500000	S	D					S	D	ING	X	X	X	X	X	S	D	RE T					S	D	F					S	D		TECMO/ PINTUMONTAJES	1423500	99075,6	V	SANITAS	9483068705	57000	PORVENIR	9483068705	227800	57000	0	0	Y RETIRO POR TRASLADO 17/03/2025 PAGO 11/04/2025
184	CHAVES QUINAYAS WILLIAM ALDINEVER	1031805785	PINTOR	1500000	S	D					S	D	ING	X	X	X	X	X	S	D	RE T					S	D	F					S	D		TECMO/ PINTUMONTAJES	1423500	99075,6	V	SANITAS	9483068705	57000	COLPENSIONES	9483068705	227800	57000	0	0	INGRESO 10 DE MARZO Y RETIRO POR TRASLADO 17/03/2025 PAGO 11/03/2025
185	RAMIREZ GALINDO JOSE FERNEY	1055247079	OPERARIO	1423500	S	D					S	D						S	D						S	D	F					S	D		JO SEÑALIZAR	1423500	99075,6	V	SALUD TOTAL	1070546806	57000	PROTECCIÓN	1070546806	227800	57000	0	0	FECHA DE PAGO 21/04/2025	
186	SALDAÑA GALINDO JOSE HENRY	80745594	OPERARIO	1423500	S	D					S	D						S	D						S	D	F					S	D		JO SEÑALIZAR	1423500	99075,6	V	SALUD TOTAL	1070546806	57000	COLFONDOS	1070546806	227800	57000	0	0	FECHA DE PAGO 21/04/2025	
187	ORTEGÓN FERRO JULIO MOISES	7307743	SUPERVISOR	5000000	S	D					S	D						S	D						S	D	F					S	D		JO SEÑALIZAR	5000000	348000	V	FAMISANAR	1070546806	200000	COLPENSIONES	1070546806	800000	200000	0	0	FECHA DE PAGO 21/03/2025	
188	PEÑA VARGAS CARLOS ALBERTO	1033684346	OPERARIO	1918100	S	D		X		X	S	D				X		S	D			X	X	X	S	D	F					S	D		VYS COMERCIAL SAS	1918100	133499,76	V	COMPENSAR	1071638727	76800	PORVENIR	1071638727	306900	76800	0	0	FECHA DE PAGO 06/04/2025	
189	CAICEDO RIAÑO PABLO ANTONIO	79566921	OPERARIO	1584600	S	D					S	D						S	D						S	D	F					S	D		VYS COMERCIAL SAS	1584600	110288,16	V	FAMISANAR	1071638727	63400	COLFONDOS	1071638727	253600	63400	0	0	FECHA DE PAGO 06/03/2025	
190	SALAS SÁNCHEZ JUAN SEBASTIÁN	1014303283	OPERARIO	1423500	S	D					S	D						S	D						S	D	F					S	D		VYS COMERCIAL SAS	1423500	99075,6	V	FAMISANAR	1071638727	57000	PORVENIR	1071638727	227800	52000	0	0	FECHA DE PAGO 06/04/2025	
191	ROSARIO VARGAS JHON HECTOR	1003359685	AYUDANTE	1423500	S	D					S	D						S	D						S	D	F					S	D		VYS COMERCIAL SAS	1423500	99075,6	V	NUEVA EPS	1071638727	57000	COLPENSIONES	1071638727	227800	57000	0	0	FECHA DE PAGO 06/04/2025	
192	VARGAS BELTRAN WILMER JOHAN	1076516639	OPERARIO	1423500	S	D		X		X	S	D				X		S	D				X	X	S	D	F					S	D		VYS COMERCIAL SAS	1423500	99075,6	V	FAMISANAR	1071638727	57000	PORVENIR	1071638727	227800	57000	0	0	FECHA DE PAGO 06/04/2025	
193	TELLEZ CHAPARRO TANIA YULIETH	1000253811	AYUDANTE	1423500	S	D		X		X	S	D				X		S	D			X	X	X	S	D	F					S	D		VYS COMERCIAL SAS	1423500	99075,6	V	COMPENSAR	1071638727	57000	PORVENIR	1071638727	227800	57000	0	0	FECHA DE PAGO 06/04/2025	
194	MALAYER CHAVEZ HAROLD GIOVANY	1003823946	AYUDANTE	1423500	S	D		X		X	S	D						S	D			X		X	S	D	F					S	D	RE T	VYS COMERCIAL SAS	1423500	99075,6	V	SURA	1071638727	57000	PROTECCIÓN	1071638727	227800	57000	0	0	RETIRO 31/03/2025 FECHA DE PAGO 06/04/2025	
195	BUSTOS CLAUDIA MILENA	107565890	AUXILIAR SST	1700000	S	D		X		X	S	D				X		S	D			X	X	X	S	D	F					S	D		VYS COMERCIAL SAS	1700000	118320	V	COMPENSAR	1071638727	68000	COLPENSIONES	1071638727	272000	68000	0	0	FECHA DE PAGO 06/04/2025	



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA	4/04/2025 (Día / Mes / Año)
-------	--------------------------------

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CUNDINAMARCA
--------------------------	--	-------------------------------	--------------

CONTRATO DE OBRA No:	989-2021	CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL MHC 063
----------------------	----------	--------------	------------------------

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:	mar-25	PROYECTO:	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	971 de 2021	INTERVENTOR:	CONSORCIO ICEACSA TPF
NOMBRE ARL:	SURA	NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:	COLSUBSIDIO


No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL									PARAFISCALES			Observaciones (indicar novedad de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administrador a de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF		
196	TAYO JHON ALEXANDER	80795127	OPERARIO	711750	S	D						S	D				RE T	D					S	D	F					S	D		VYS COMERCIAL SAS	711750	49537,8	V	NUEVA EPS	1071638727	28500	PROTECCIÓN	1071638727	113900	28500	0	0	RETIRO 15/03/2025 FECHA DE PAGO 06/04/2025				
197	TAYO JUAN CARLOS	80263350	OPERARIO	711750	S	D					S	D					RE T	D					S	D	F					S	D		VYS COMERCIAL SAS	711750	49537,8	V	NUEVA EPS	1071638727	28500	PORVENIR	1071638727	113900	28500	0	0	RETIRO 15/03/2025 FECHA DE PAGO 06/04/2025				
198	MORA ANDRES	79837150	OPERARIO	711750	S	D					S	D					RE T	D					S	D	F					S	D		VYS COMERCIAL SAS	711750	49537,8	V	COMPENSAR	1071638727	28500	PORVENIR	1071638727	113900	28500	0	0	RETIRO 15/03/2025 FECHA DE PAGO 06/04/2025				
199	SUAREZ JUAN MANUEL	1075679961	OPERARIO	1423500	S	D					S	D					S	D			X	X	X	S	D	F				S	D		VYS COMERCIAL SAS	1423500	99075,6	V	NUEVA EPS	1071638727	57000	PORVENIR	1071638727	227800	57000	0	0	FECHA DE PAGO 06/04/2025				
200	GONZALEZ CARRILLO DUMAR ALBERTO	1002604623	OPERARIO	1423500	RE T	D					S	D					S	D					S	D	F				S	D		VYS COMERCIAL SAS /JO SEÑALIZAR	1423500	99100	V	SALUD TOTAL EPS	1071638727	57000	PORVENIR	1071638727	227800	57000	0	0	RETIRO 01/04/2025 FECHA DE PAGO 21/04/2025					
201	NEME HECTOR LAUREANO	3119010	CONDUCTOR	1423500	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	D	X	AMERICAN TOUR S.A.S	1423500	99075,6	IV	COMPENSAR	9481401694	56940	PROTECCION	9481401694	227760	56940	0	0	INGRESO 01/03/2025 PAGO 03/04/2025				
202	JOYA BARRERO WILSON ESTIVEN	1023962411	INSPECTOR SGI	2500000	S	D					S	D		X	X		S	D					S	D	F		X	X		S	D		EHU INGENIERIA S.A.S	2333334	162400,0464	V	SURA EPS	1071142587	93333	PORVENIR	1071142587	373333	93333	0	0	INGRESO 11/03/2025 PAGO 13/04/2025				
203	CABEZAS GUTIÉRREZ ANDERSSON	1033735991	TÉCNICO ELECTRICISTA	2000000	S	D					S	D		X	X		S	D					S	D	F		X	X		S	D		EHU INGENIERIA S.A.S	2000000	139200	V	COMPENSAR EPS	1071142587	80000	PROTECCIÓN	1071142587	320000	80000	0	0	PAGO 13/04/2025				
204	AHUMADA MARTÍNEZ CESAR AUGUSTO	72343903	AUXILIAR TÉCNICO	2000000	S	D					S	D		ING	X		S	D					S	D	F		X	X		S	D		EHU INGENIERIA S.A.S	2000000	139200	V	SURA EPS	1071142587	74667	PORVENIR	1071142587	298667	74667	0	0	INGRESO 11/03/2025 PAGO 13/04/2025				
205	ORTIZ MAURICIO ANDRES	80544027	CONDUCTOR	1423500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MAVITOURS	1423500	99075,6	4,35	SALUD TOTAL	25375549	57012	PORVENIR	25375549	208000	57012	0	0	FECHA DE PAGO 18/04/2025				
206	GUTIERREZ CAMELO ERIKA LUCÍA*	20362761	ARQUEÓLOGA LÍDER	6475000		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X									ERIKA LUCIA GUTIERREZ CAMELO	5000000	348000	V	ALIANSALUD	1071497597	875000	COLPENSIONES	1071497597	1190000	140000	0	0	FECHA DE PAGO 14/04/2025				
207	CARRILLO JOSE GONZALO*	2989413	CONDUCTOR	\$ 1.423.500	S	D					S	D					S	D		ING	X	X	X	S	D	X	X	X		S	D		CONSTRUCCIONES/JO SE GONZALO CARRILLO	1423500	62000	V	NUEVA EPS	9481959643	178000	COLPENSIONES	9481959643	227800	0	0	0	INGRESO 18/04/2025				
208	USCATEGUI GERMAN	1020738002	CONDUCTOR	\$ 1.423.500	S	D					S	D			ING	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X		S	D		CONSTRUCCIONES DYG SAS	1423500	99100	IV	FAMISANAR	9483335964	57000	PORVENIR	9483335964	227800	57000	0	0	INGRESO 12/03/2025 FECHA DE PAGO 25/04/2025				

	CALIDAD INVIAS	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-6																																														
			VERSIÓN 1																																														
			PÁGINA																																														
FECHA 4/04/2025 (Día / Mes / Año)																																																	
UNIDAD EJECTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL:CUNDINAMARCA																																																	
CONTRATO DE OBRA No:989-2021CONTRATISTA:CONSorcio VIAL MHC 063 MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPQUIRÁ -BARBOSA -BUARAMANGA; GIRÓN -PIEDRECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1 MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:mar-25PROYECTO: CONTRATO DE INTERVENORIA No:971 de 2021INTERVENIOR:CONSorcio ICEACSA TPF NOMBRE ARL:SURANOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:COLSUBSIDIO																																																	
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (indicar novedad de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administrador a de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
209	SANCHEZ VILLAMIL USMAN FIOBAN*	1075672239	CONDUCTOR	\$ 1.423.500	S	D						S	D						S	D	ING	X	X	X	S	D	X	X	X			S	D			CONSTRUCCIONES/US MAN FIOBAN SANCHEZ VILLAMIL	1423500	62000	IV	SURA	84951020	178000	PROTECCIÓN	84951020	227800	0	0	0	INGRESO 18/03/2025 FECHA DE PAGO 11/04(2025)
210	LOPEZ ESPINEL JULIAN YESID	1020747692	CONDUCTOR	\$ 1.423.500	S	D						S	D						S	D					S	D	ING	X			S	D			CONSTRUCCIONES DYG SAS	1423500	99100	V	SALUD TOTAL	9483335964	57000	PORVENIR	9483335964	227800	57000	0	0	INGRESO 25/03/2025 FECHA DE PAGO 25/04(2025)	
El contratista adjunta la certificación de fecha 4/04/2025 que se refiere la nota 8 del presente formato. NOTAS: 1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual. 2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones". 3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Intervenor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación. 4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique. 5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos. 6. El Intervenor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique. 7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio. 8. El Intervenor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.																																																	
Firma																Firma																																	
Nombre:	Pablo Cesar Molina Salinas															Nombre:	Luis Antonio Rueda Rueda																																
Director de Obra																Director de Interventoría																																	
Matrícula Profesional No.:	25202105926 CND															Matrícula Profesional No.:	68202-16905 STD																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.																																																	


 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 46 INVIAS-IM – 0971-2021 MARZO DE 2025	

Anexo No 4.

MEPI-MN1-IN-15-FR-8 Informe financiero

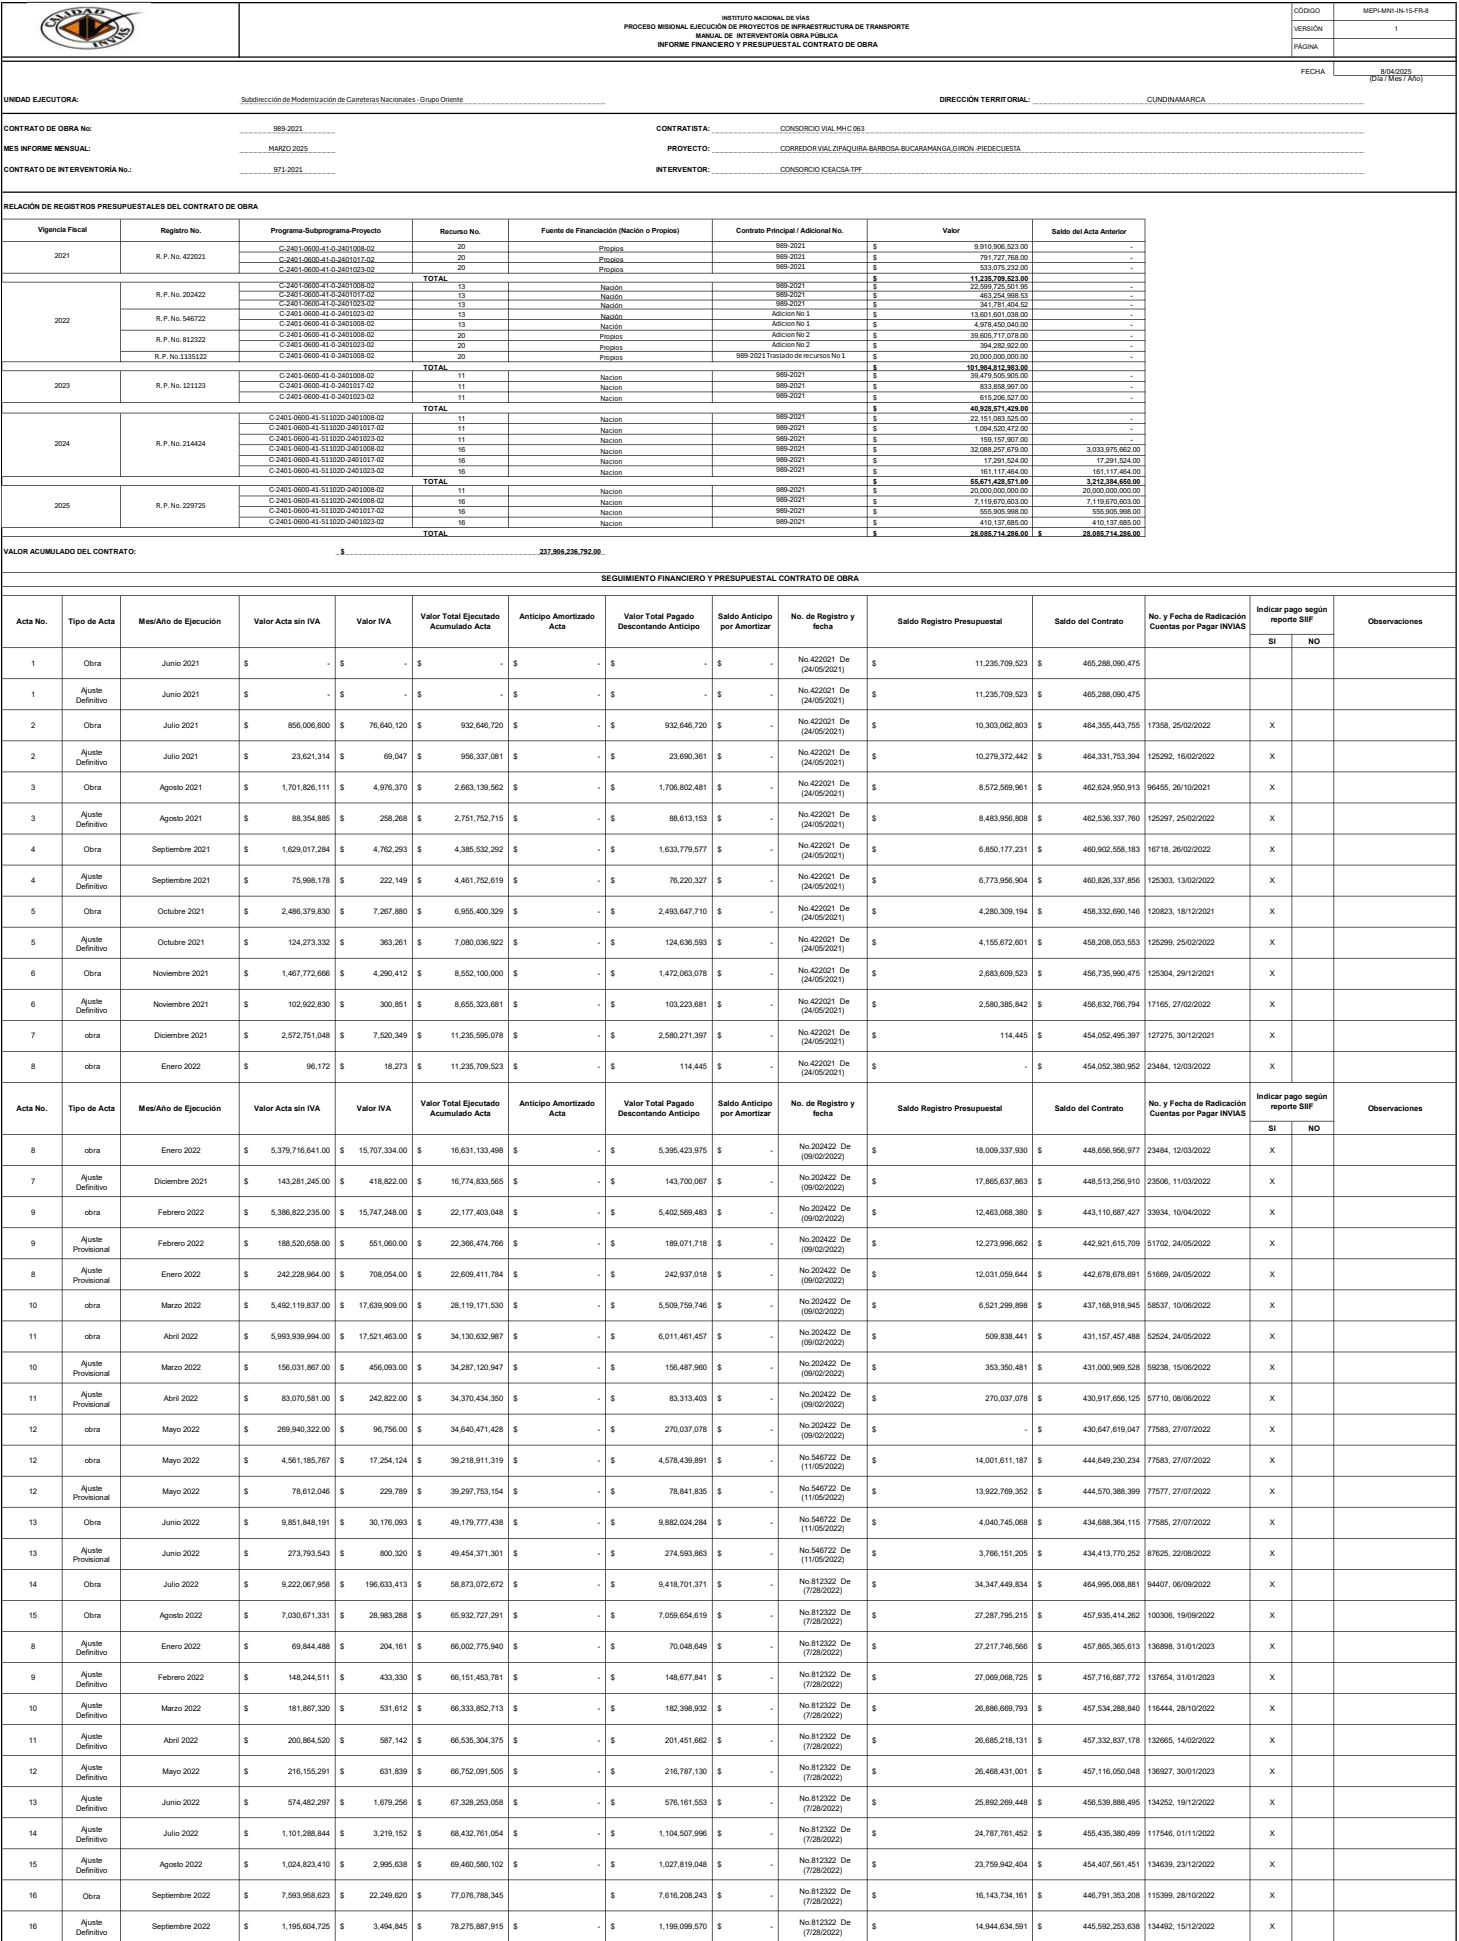

			INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INVENTORIO OBRAS PÚBLICAS INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO MEP-MINI-IN-15-FR-8			
													VERSION 1			
													PÁGINA			
													FECHA 05/09/2025 (DÍA MES AÑO)			
UNIDAD EJECUTORA:			Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente										DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CUNDINAMARCA	
CONTRATO DE OBRA No:			989-2023										CONTRATISTA:		CONSORCIO VIAL-MHC-063	
MES INFORME MENSUAL:			MARZO 2025										PROYECTO:		CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARCOSA-BUCARAMANGA-GIRON-PIEDECUESTA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:			973-2023										INTERVENTOR:		CONSORCIO KECASIA-TFF	
17	Obra	Octubre 2022	\$ 5,314,743,936	\$ 74,446,733	\$ 83,665,078,584	\$ -	\$ 5,389,190,669	\$ -	No 812322 De (7/28/2022)	\$ 9,555,443,922	\$ 440,203,062,969	129490, 30/11/2022	X			
17	Ajuste Provisional	Octubre 2022	\$ 837,572,751	\$ 2,448,290	\$ 84,505,099,825	\$ -	\$ 840,021,041	\$ -	No 812322 De (7/28/2022)	\$ 8,715,422,881	\$ 439,363,041,928	141930, 01/02/2023	X			
17	Ajuste Definitivo	Octubre 2022	\$ 44,575,007	\$ 130,296	\$ 84,549,804,928	\$ -	\$ 44,705,303	\$ -	No 812322 De (7/28/2022)	\$ 8,670,717,578	\$ 439,318,336,625	12390, 22/02/2023	X			
18	Obra	Noviembre 2022	\$ 6,708,720,272	\$ 20,152,067	\$ 91,278,677,267	\$ -	\$ 6,728,672,339	\$ -	No 812322 De (7/28/2022)	\$ 1,941,845,239	\$ 432,589,464,286	137963, 27/01/2023	X			
18	Ajuste Provisional	Noviembre 2022	\$ 1,228,609,873	\$ 3,591,321	\$ 92,510,878,461	\$ -	\$ 1,232,201,194	\$ -	No 812322 De (7/28/2022)	\$ 709,644,045	\$ 431,357,263,092	141953, 01/02/2023	X			
19	Obra	Diciembre 2022	\$ 704,587,605	\$ 5,096,440	\$ 93,220,522,506	\$ -	\$ 709,644,045	\$ -	No 812322 De (7/28/2022)	\$ -	\$ 430,647,619,047	141922, 01/02/2023	X			
19	Obra	Diciembre 2022	\$ 9,622,972,689	\$ 59,411,536	\$ 102,902,906,731	\$ -	\$ 9,682,384,225	\$ -	No 1135122 De (19/24/2022)	\$ 10,317,615,775	\$ 420,965,234,822	141922, 01/02/2023	X			
19	Ajuste Provisional	Diciembre 2022	\$ 2,091,059,845	\$ 6,112,328	\$ 105,000,078,904	\$ -	\$ 2,097,172,173	\$ -	No 1135122 De (19/24/2022)	\$ 8,220,443,602	\$ 418,868,062,649	141955, 11/02/2023	X			
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF		Observaciones	
													SI	NO		
20	Obra	Enero 2023	\$ 1,831,866,913	\$ 7,607,705	\$ 106,839,553,582	\$ -	\$ 1,839,474,678	\$ -	No 1135122 De (19/24/2022)	\$ 6,380,968,924	\$ 417,028,587,971	20483, 08/03/2023	X			
20	Ajuste Provisional	Enero 2023	\$ 166,728,843	\$ 487,362	\$ 107,006,769,787	\$ -	\$ 167,216,205	\$ -	No 1135122 De (19/24/2022)	\$ 6,213,752,719	\$ 416,861,371,766	34658, 17/04/2023	X			
21	Obra	Febrero 2023	\$ 6,015,093,638	\$ 18,687,555	\$ 113,040,550,980	\$ -	\$ 6,033,781,193	\$ -	No 121123 De (02/07/2023)	\$ 36,094,790,236	\$ 410,827,590,573	29130, 28/03/2023	X			
21	Ajuste Provisional	Febrero 2023	\$ 1,128,432,175	\$ 3,298,494	\$ 114,172,281,649	\$ -	\$ 1,131,730,669	\$ -	No 121123 De (02/07/2023)	\$ 34,963,059,567	\$ 409,695,859,904	37966, 20/04/2023	X			
22	Obra	Marzo 2023	\$ 3,199,999,721	\$ 46,914,926	\$ 117,419,196,296	\$ -	\$ 3,246,914,647	\$ -	No 121123 De (02/07/2023)	\$ 31,716,144,920	\$ 406,448,945,257	36558, 18/04/2023	X			
22	Ajuste Provisional	Marzo 2023	\$ 767,465,921	\$ 2,243,362	\$ 118,188,955,579	\$ -	\$ 769,709,283	\$ -	No 121123 De (02/07/2023)	\$ 30,946,435,637	\$ 405,679,235,974	38082, 20/04/2023	X			
23	Obra	Abril 2023	\$ 3,269,573,881	\$ 10,697,920	\$ 121,469,177,380	\$ -	\$ 3,280,271,801	\$ -	No 1135122 De (19/24/2022)	\$ 2,833,480,918	\$ 402,398,964,173	53601, 14/06/2023	X			
23	Ajuste Provisional	Abril 2023	\$ 956,134,353	\$ 2,794,854	\$ 122,428,106,567	\$ -	\$ 958,929,207	\$ -	No 1135122 De (19/24/2022)	\$ 1,974,551,711	\$ 401,440,034,866	53900, 15/06/2023	X			
24	Obra	Mayo 2023	\$ 1,966,773,725	\$ 7,777,986	\$ 124,402,658,268	\$ -	\$ 1,974,551,711	\$ -	No 1135122 De (19/24/2022)	\$ -	\$ 399,465,483,265	61617, 17/07/2023	X			
24	Obra	Mayo 2023	\$ 2,320,110,095	\$ 9,175,323	\$ 126,731,943,716	\$ -	\$ 2,329,285,418	\$ -	No 121123 De (02/07/2023)	\$ 28,617,150,219	\$ 397,136,197,837	61617, 17/07/2023	X			
24	Ajuste Provisional	Mayo 2023	\$ 945,017,297	\$ 2,762,358	\$ 127,679,723,371	\$ -	\$ 947,779,655	\$ -	No 121123 De (02/07/2023)	\$ 27,669,370,564	\$ 396,188,418,182	64804, 06/07/2023	X			
25	Obra	Junio 2023	\$ 3,217,905,526	\$ 10,673,901	\$ 130,908,302,798	\$ -	\$ 3,228,579,427	\$ -	No 121123 De (02/07/2023)	\$ 24,440,791,137	\$ 392,959,638,755	70343, 20/07/2023	X			
25	Ajuste Provisional	Junio 2023	\$ 601,075,149	\$ 1,756,989	\$ 131,511,134,306	\$ -	\$ 602,832,138	\$ -	No 121123 De (02/07/2023)	\$ 23,837,958,999	\$ 392,357,006,617	76637, 09/08/2023	X			
26	Obra	Julio 2023	\$ 1,084,001,313	\$ 3,281,516	\$ 132,598,417,765	\$ -	\$ 1,087,282,829	\$ -	No 121123 De (02/07/2023)	\$ 22,750,676,170	\$ 391,269,723,788	80363, 22/08/2023	X			
26	Ajuste Provisional	Julio 2023	\$ 195,373,240	\$ 571,091	\$ 132,794,362,096	\$ -	\$ 195,944,331	\$ -	No 121123 De (02/07/2023)	\$ 22,554,731,839	\$ 391,073,779,457	80534, 24/08/2023	X			
18	Ajuste Definitivo	Noviembre 2022	\$ 87,120,068	\$ 254,659	\$ 132,881,736,823	\$ -	\$ 87,374,727	\$ -	No 121123 De (02/07/2023)	\$ 22,467,357,112	\$ 390,986,404,730	81981, 25/09/2023	X			
19	Ajuste Definitivo	Diciembre 2022	\$ 129,838,042	\$ 379,527	\$ 133,011,954,392	\$ -	\$ 130,217,569	\$ -	No 121123 De (02/07/2023)	\$ 22,337,139,543	\$ 390,856,187,161	81720, 19/09/2023	X			
20	Ajuste Definitivo	Enero 2023	\$ 71,015,812	\$ 207,583	\$ 133,083,177,787	\$ -	\$ 71,223,395	\$ -	No 121123 De (02/07/2023)	\$ 22,265,916,148	\$ 390,784,963,766	81722, 20/09/2023	X			
21	Ajuste Definitivo	Febrero 2023	\$ 149,043,160	\$ 435,664	\$ 133,232,656,611	\$ -	\$ 149,478,824	\$ -	No 121123 De (02/07/2023)	\$ 22,116,437,324	\$ 390,635,484,942	82174, 26/09/2023	X			
22	Ajuste Definitivo	Marzo 2023	\$ 44,496,958	\$ 130,068	\$ 133,277,283,637	\$ -	\$ 44,627,026	\$ -	No 121123 De (02/07/2023)	\$ 22,071,810,298	\$ 390,550,857,916	81724, 21/09/2023	X			
27	Obra	Agosto 2023	\$ 1,655,891,362	\$ 7,359,034	\$ 134,940,534,033	\$ -	\$ 1,663,250,396	\$ -	No 121123 De (02/07/2023)	\$ 20,408,559,902	\$ 388,927,607,520	81982, 22/09/2023	X			
28	Obra	Septiembre 2023	\$ 2,081,745,441	\$ 6,541,847	\$ 137,028,821,321	\$ -	\$ 2,088,287,288	\$ -	No 121123 De (02/07/2023)	\$ 18,320,272,614	\$ 386,839,320,232	83218, 20/10/2023	X			
29	Obra	Octubre 2023	\$ 2,388,482,822	\$ 8,763,623	\$ 139,426,067,766	\$ -	\$ 2,397,246,445	\$ -	No 121123 De (02/07/2023)	\$ 15,923,026,169	\$ 384,442,073,787	85220, 22/11/2023	X			
27	Ajuste Provisional	Agosto 2023	\$ 502,880,067	\$ 1,469,957	\$ 139,930,417,790	\$ -	\$ 504,350,024	\$ -	No 121123 De (02/07/2023)	\$ 15,418,676,145	\$ 383,937,723,763	86223, 04/12/2024	X			
28	Ajuste Provisional	Septiembre 2023	\$ 659,637,980	\$ 1,928,173	\$ 140,591,963,943	\$ -	\$ 661,566,153	\$ -	No 121123 De (02/07/2023)	\$ 14,757,109,992	\$ 383,276,157,610	86224, 04/12/2023	X			
29	Ajuste Provisional	Octubre 2023	\$ 791,962,086	\$ 2,314,937	\$ 141,386,250,966	\$ -	\$ 794,267,023	\$ -	No 121123 De (02/07/2023)	\$ 13,962,842,969	\$ 382,481,890,587	89010, 05/03/2024	X			
30	Obra	Noviembre 2023	\$ 4,708,466,466	\$ 14,130,560	\$ 146,108,947,992	\$ -	\$ 4,722,597,026	\$ -	No 121123 De (02/07/2023)	\$ 8,040,245,943	\$ 377,759,293,561	87790, 01/02/2024	X			
30	Ajuste Provisional	Noviembre 2023	\$ 2,179,390,225	\$ 6,370,526	\$ 148,294,608,743	\$ -	\$ 2,185,760,751	\$ -	No 121123 De (02/07/2023)	\$ 5,854,485,192	\$ 375,573,532,810	87792, 16/12/2023	X			
31	Obra	Diciembre 2023	\$ 4,222,178,084	\$ 12,341,751	\$ 152,529,128,578	\$ -	\$ 4,234,519,835	\$ -	No 121123 De (02/07/2023)	\$ 1,619,965,367	\$ 371,339,012,975	87793, 17/12/2023	X			
31	Ajuste Provisional	Diciembre 2023	\$ 1,615,243,875	\$ 4,721,482	\$ 154,149,093,935	\$ -	\$ 1,619,965,367	\$ -	No 121123 De (02/07/2023)	\$ -	\$ 369,719,047,618	87800, 17/12/2023	X			
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF		Observaciones	
													SI	NO		
32	Obra	Enero 2024	\$ 1,110,474,272	\$ 4,242,781	\$ 155,263,810,988	\$ -	\$ 1,114,717,053	\$ -	No 214424 De (15/03/2024)	\$ 55,056,711,518	\$ 368,604,330,565	1798, 03/04/2024	X			
32	Ajuste Provisional	Enero 2024	\$ 352,671,948	\$ 1,030,887	\$ 155,617,513,823	\$ -	\$ 353,702,835	\$ -	No 214424 De (15/03/2024)	\$ 54,703,008,683	\$ 368,250,627,730	2049, 04/04/2024	X			
33	Obra	Febrero 2024	\$ 3,432,134,271	\$ 10,756,403	\$ 159,060,404,497	\$ -	\$ 3,442,890,674	\$ -	No 214424 De (15/03/2024)	\$ 51,260,118,009	\$ 364,807,737,056	2050, 04/04/2024	X			
33	Ajuste Provisional	Febrero 2024	\$ 1,265,984,654	\$ 3,700,570	\$ 160,330,089,721	\$ -	\$ 1,269,685,224	\$ -	No 214424 De (15/03/2024)	\$ 49,990,432,785	\$ 363,538,051,832	2451, 22/04/2024	X			
34	Obra	Marzo 2024	\$ 2,805,319,125	\$ 9,462,375	\$ 163,144,871,221	\$ -	\$ 2,814,781,500	\$ -	No 214424 De (15/03/2024)	\$ 47,175,651,285	\$ 360,723,270,332	3109, 25/04/2024	X			
34	Ajuste Provisional	Marzo 2024	\$ 1,062,552,647	\$ 3,105,923	\$ 164,210,529,791	\$ -	\$ 1,065,658,570	\$ -	No 214424 De (15/03/2024)	\$ 46,109,992,715	\$ 359,657,611,762	4153, 17/05/2024	X			
35	Obra	Abril 2024	\$ 2,537,880,112	\$ 10,527,278	\$ 166,758,937,181	\$ -	\$ 2,548,407,390	\$ -	No 214424 De (15/03/2024)	\$ 43,561,585,325	\$ 357,109,204,372	4200, 20/05/2024	X			
35	Ajuste Provisional	Abril 2024	\$ 1,014,861,267	\$ 2,966,517	\$ 167,776,764,965	\$ -	\$ 1,017,827,784	\$ -	No 214424 De (15/03/2024)							



FECHA	8/04/2025 (Día/Mes/Año)
-------	----------------------------

CONTRATO DE OBRA No.:	989-2021	CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL MHC-063
MES INFORME MENSUAL:	MARZO 2025	PROYECTO:	CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA GIRON-PEDEQUESTA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	971-2021	INTERVENTOR:	CONSORCIO ICECSA-TFF

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma: 
Nombre: PABLO CESAR MOLINA SALINAS
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202105926CNE

Firma _____
Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 46 INVIAS-IM – 0971-2021 MARZO DE 2025	

Anexo No 5.

MEPI-MN1-IN-15-FR-10 Estado general del tiempo

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																								CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10						
																									VERSIÓN	1						
																									PÁGINA							
																								FECHA	5/04/2025 (Día / Mes / Año)							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MORDERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES																								DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA								
CONTRATO DE OBRA No: 989 DE 2021																								CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063								
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: mar-25																								PROYECTO: RUTA DE LOS COMUNEROS								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 DE 2021																								INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA TPF								
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	21	23	23	21	23	20	24	24	17	22	24	23	23	24	20	21	24	23	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	711
Lluvias moderadas	0	0	3	1	1	3	1	3	0	0	2	2	0	1	1	0	2	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																
OBSERVACIONES: Durante el mes predomina el tiempo seco, presentando 95.56% tiempo seco, 3.36% lluvias moderadas y 1.08% lluvias intensas																																
Firma LUIS FELIPE MORENO BRAVO Ing. Residente de Obra Matrícula No. : 25202-05870 CND Firma JORGE ENRIQUE SÁNCHEZ PRADA Ing. Residente de Interventoría Matrícula No.: 68202-01827 STD																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																
