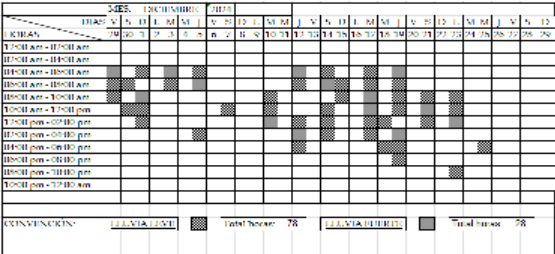



	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		VERSIÓN: 01
			F.A.: 25/03/2021
CONTRATISTA DE OBRA: EESALAMANCA SAS		CONTRATO No: No. 933 de 2024	
INTERVENTORIA: JOAN ANDRES LENIS		CONTRATO No: No. 910 de 2024	
Semana Número: 3 Del: domingo, 15 de diciembre de 2024 Al: sábado, 21 de diciembre de 2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 22,00 Días Supervisor Contrato de Interventoria: Aries Octavio Lemos castro			
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.			
REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO PTAP VILLA DEL ROSARIO FASE II, CORREGIMIENTO LA PAZ			
Obra programada (%) SEMANAL 23,70% ACUMULADO 95,16% Valor básico de la Obra programada: \$ 0 \$ 0		Obra Física Ejecutada (%) SEMANAL 2,14% ACUMULADO 67,00% Valor básico de la Obra \$ 0 \$ 0	
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista: EESALAMANCA SAS Contrato No. No. 933 de 2024 Valor Inicial: \$ 174.295.850 Valor Actualizado: \$ N.A. Plazo Inicial: 30 días Plazo Actualizado: 30 días Fecha de Iniciación: 29/11/2024 Fecha de Vencimiento: 31/12/2024 Fecha de Finalización: 31/12/2024		Interventor: JOAN ANDRES LENIS Contrato No. No. 910 de 2022 Valor Inicial: \$ 27.102.250 Valor Actualizado: \$ N.A. Plazo Inicial: 30 días Plazo Actualizado: 30 días Fecha de Iniciación: 29/11/2024 Fecha de Vencimiento: 31/12/2024 Fecha de Finalización: 31/12/2024	
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA			
El contrato N° 880 DE 2022 es de Interventoría de obra, y se encuentra ligado directamente al contrato de Obra N° 851 DE 2022. Durante este periodo se han realizado actividades de acuerdo a los requerimientos de los contratos, la ejecución durante el periodo es la siguiente: IMPERMEABILIZACIÓN INTERNA TANQUES RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION Y/O ESCOMBROS EN VOLQUETA CON CARGUE MANUAL PARA DISTANCIAS HASTA 10 KM RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE SEMIFLEXIBLE REHABILITACIÓN GRIETAS EN MUROS RECUBRIMIENTO PROTECTOR EPOXICO EN ELEMENTOS DE CONCRETO BAJO AGUA CERRAMIENTO TAPON GALV MACHO 1,1/2" DIAGONALES EN TUBERIA GALVA 1,1/2" MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 2" COMPLEMENTARIOS ENERGIA PROVISIONAL SARDINEL EN CONCRETO 3100 PSI PROTECTOR CAMARA SALIDA FGDÍ			
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
De acuerdo al cronograma de obra, se tiene proyectado realizar las siguientes actividades: IMPERMEABILIZACIÓN INTERNA TANQUES RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION Y/O ESCOMBROS EN VOLQUETA CON CARGUE MANUAL PARA DISTANCIAS HASTA 10 KM RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE SEMIFLEXIBLE REHABILITACIÓN GRIETAS EN MUROS RECUBRIMIENTO PROTECTOR EPOXICO EN ELEMENTOS DE CONCRETO BAJO AGUA CERRAMIENTO TAPON GALV MACHO 1,1/2" DIAGONALES EN TUBERIA GALVA 1,1/2" MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 2" COMPLEMENTARIOS ENERGIA PROVISIONAL SARDINEL EN CONCRETO 3100 PSI PROTECTOR CAMARA SALIDA FGDÍ			
REPORTE DE LLUVIAS EN OBRA			
			
ACTIVIDADES SISO, AMBIENTALES Y SOCIALES			
Se realizaron las siguientes actividades referentes a la actividad: * Verificación del uso de equipos y pausas activas * Implementación del plan de manejo ambiental			
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO			
1. Acta de inicio del Contrato de obra e interventoria: 29 de NOVIEMBRE de 20224 2. Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2024.			

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		VERSIÓN: 01
			F.A.: 25/03/2021
CONTRATISTA DE OBRA: EESALAMANCA SAS		CONTRATO No: No. 933 de 2024	
INTERVENTORIA: JOAN ANDRES LENIS		CONTRATO No: No. 910 de 2024	
Semana Número: 3 Del: domingo, 15 de diciembre de 2024 Al: sábado, 21 de diciembre de 2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 22,00 Días Supervisor Contrato de Interventoría: Aries Octavio Lemos castro			
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.			
REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO PTAP VILLA DEL ROSARIO FASE II, CORREGIMIENTO LA PAZ			
OBSERVACIONES			DIRECTOR DE INTERVENTORIA
	%PROGRAMADO	% EJECTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	71,46%	64,86%	-28%
Durante el periodo	23,70%	2,14%	
Acumulado actual	95,16%	67,00%	
			
De acuerdo a la ejecución de la obra, El porcentaje semanal equivale al 2,17% del costo de obra y de la ejecución, y del total del contrato equivale al 67 % ver gráficos de avance:			
CURVA "S"			


Firma

Nombre:

JOAN ANDRES LENIS

Matrícula No. : 76202215396VLL

Grafica de Curva "S"

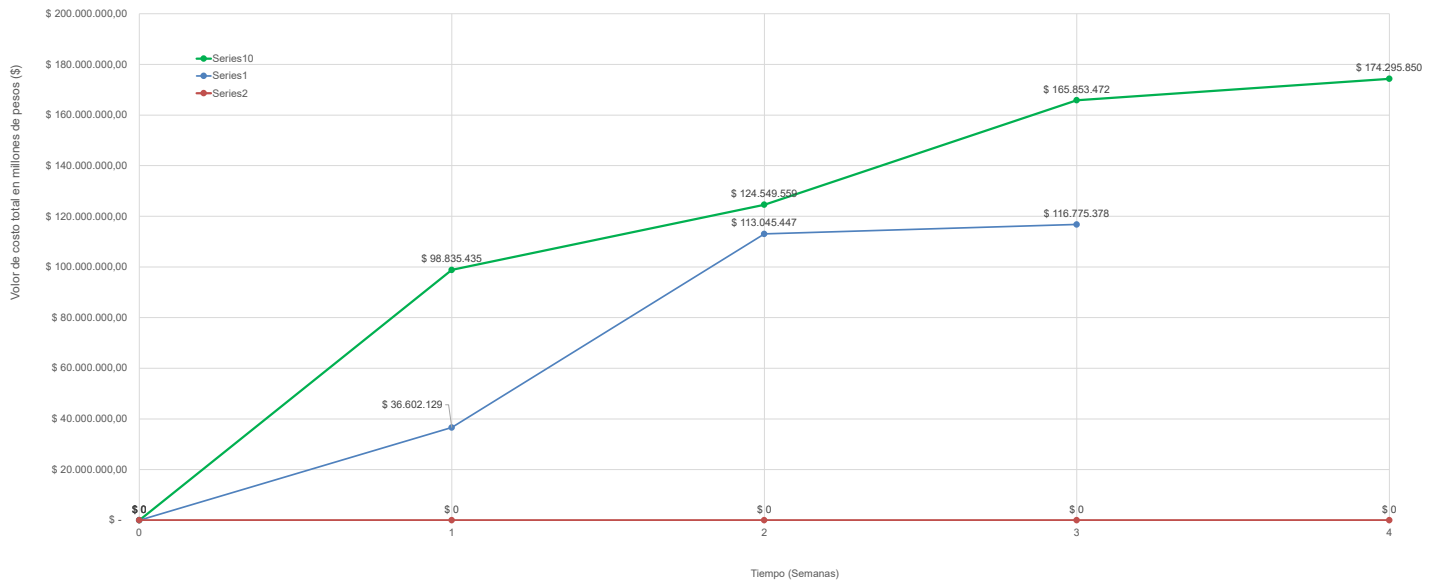

FECHA		No. SEMANAS	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			GESTIÓN		
INICIO	FIN		AVANCE PROGRAMADO PERIODO	ACUMULADO	VALOR PROGRAMADO	AVANCE EJECTADO PERIODO	ACUMULADO	VALOR EJECTADO	VALOR PAGADO	RETRASO	AVANCE EN TIEMPO
25/11/2024	1/12/2024	0	0.00%		\$ -	0.00%		\$ -	\$ -	0.00%	23.33%
2/12/2024	7/12/2024	1	56.71%	\$ 98.835.435.40	\$ 98.835.435.40	21.00%	\$ 36.602.128.50	\$ 36.602.128.50	\$ -	35.71%	23.33%
8/12/2024	14/12/2024	2	14.75%	\$ 25.714.123.20	\$ 124.549.558.60	43.86%	\$ 76.443.318.05	\$ 113.045.446.55	\$ -	6.60%	46.67%
15/12/2024	21/12/2024	3	23.70%	\$ 41.303.913.40	\$ 165.853.472.00	2.14%	\$ 3.729.931.19	\$ 116.775.377.74	\$ -	28.16%	70.00%
22/12/2024	28/12/2024	4	4.84%	100.00%	\$ 8.442.378.00			\$ -	\$ -		

REGISTRO FOTOGRÁFICO


 Descripción:
CIMENTACION PARA CERRAMIENTO

 Descripción:
RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE

 Descripción:
CONSTRUCCION DE 6RADAS
