




	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	VERSIÓN: 01 F.A.: 28/03/2021																	
CONTRATISTA DE OBRA: EESALAMANCA SAS CONTRATO No.: No. 933 de 2024																			
INTERVENTORIA: JOAN ANDRES LENIS CONTRATO No.: No. 910 de 2024																			
Semana Número: 5 Del: lunes, 17 de febrero de 2025 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 66,00 Días: domingo, 23 de febrero de 2025 Supervisor Contrato de Interventoría: Arles Octavio Lemos castro																			
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.																			
REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO PTAP VILLA DEL ROSARIO FASE II, CORREGIMIENTO LA PAZ																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="background-color: #d9ead3;">OBSERVACIONES</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="background-color: #d9ead3;">%PROGRAMADO</th> <th style="background-color: #d9ead3;">% EJECUTADO</th> <th style="background-color: #d9ead3;">DIFERENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acumulado anterior</td> <td>85,70%</td> <td>68,50%</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">-20%</td> </tr> <tr> <td>Durante el periodo</td> <td>5,00%</td> <td>2,30%</td> </tr> <tr> <td>Acumulado actual</td> <td>90,70%</td> <td>70,80%</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div> <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">De acuerdo a la ejecución de la obra, El porcentaje semanal equivale al 2,30% del costo de obra y de la ejecución, y del total del contrato equivale al 70,80% ver gráficos de avance:</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: small;">CURVA "S"</p>	OBSERVACIONES					%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	Acumulado anterior	85,70%	68,50%	-20%	Durante el periodo	5,00%	2,30%	Acumulado actual	90,70%	70,80%	<p style="text-align: center; background-color: #cccccc; font-weight: bold; font-size: small;">DIRECTOR DE INTERVENTORIA</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  Firma </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">Nombre: JOAN ANDRES LENIS</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Matrícula No. : 76202215396VLL</p>
OBSERVACIONES																			
	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA																
Acumulado anterior	85,70%	68,50%	-20%																
Durante el periodo	5,00%	2,30%																	
Acumulado actual	90,70%	70,80%																	

Grafica de Curva "S"

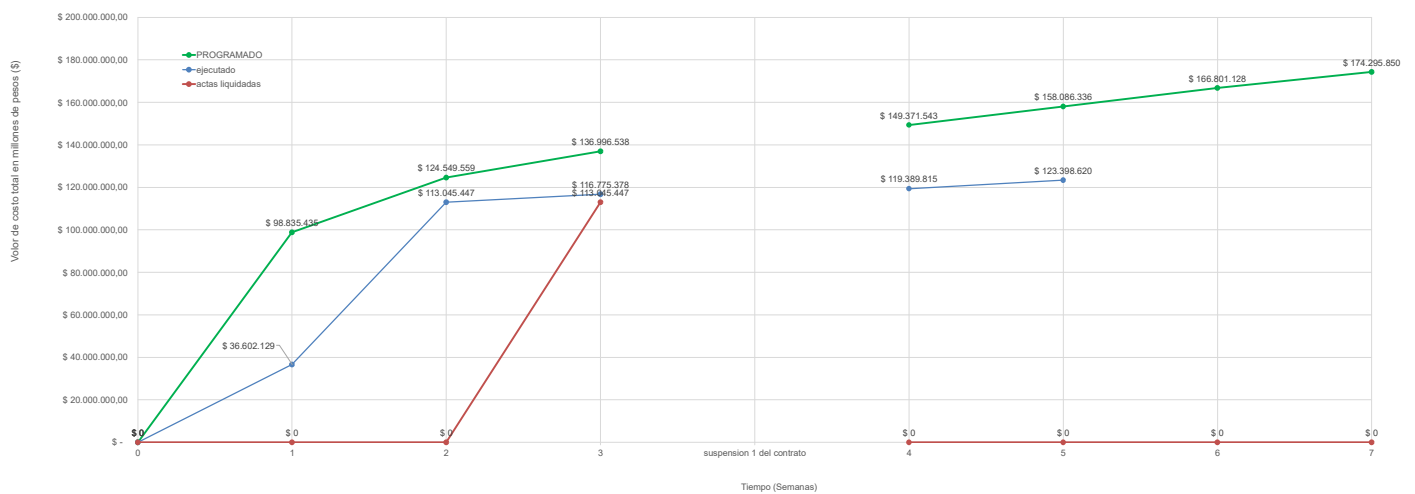

FECHA		No. SEMANAS	PROGRAMACION			EJECUCION			GESTION	
INICIO	FIN		AVANCE PROGRAMADO PERIODO	ACUMULADO	PROGRAMADO	AVANCE EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO	VALOR PAGADO	RETRASO	AVANCE EN TIEMPO
25/11/2024	1/12/2024	0	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	23,33%
2/12/2024	7/12/2024	1	56,71%	\$ 98.835.435,40	\$ 98.835.435,40	21,00%	\$ 36.602.128,50	\$ -	35,71%	23,33%
8/12/2024	14/12/2024	2	14,75%	\$ 25.714.123,20	\$ 124.549.558,60	43,86%	\$ 76.443.318,00	\$ 113.045.446,55	6,60%	46,67%
8/12/2024	14/12/2024	3	7,14%	-	\$ 136.996.538,10	2,14%	\$ 3.729.931,19	\$ 116.775.377,74	11,60%	46,67%
24/12/2024	11/02/2025	suspension 1 del contrato								
11/02/2025	17/02/2025	4	7,10%	\$ 85,70%	\$ 12.375.005,35	1,50%	\$ 2.614.437,75	\$ 119.389.815,49	17,20%	56,00%
17/02/2025	23/02/2025	5	5,00%	\$ 90,70%	\$ 8.714.792,50	2,30%	\$ 4.008.804,55	\$ 123.398.620,04	19,90%	70,00%
23/02/2025	1/03/2025	6	5,00%	\$ 95,70%	\$ 8.714.792,50		\$ -	\$ -		
1/03/2025	11/03/2025	7	4,30%	100,00%	\$ 7.494.721,55		\$ -	\$ -		

REGISTRO FOTOGRAFICO

