



<div>Joan Lenis</div>		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		VERSIÓN: 01	
				F.A.: 25/03/2021	
CONTRATISTA DE OBRA:		EESALAMANCA SAS		CONTRATO No: No. 933 de 2024	
INTERVENTORIA:		JOAN ANDRES LENIS		CONTRATO No: No. 910 de 2024	
Semana: Número: 7		Del: lunes, 3 de marzo de 2025		Al: lunes, 10 de marzo de 2025	
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		101,00		Días	
Supervisor Contrato de Interventoria:		Arles Octavio Lemos castro			
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.					
REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO PTAP VILLA DEL ROSARIO FASE II, CORREGIMIENTO LA PAZ					
OBSERVACIONES				DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
	%PROGRAMADO	% EJECTUTADO	DIFERENCIA		
Acumulado anterior	95,70%	75,00%			
Durante el periodo	4,30%	15,00%			
Acumulado actual	100,00%	90,00%			
<div><div><div>95,70%</div><div>75,00%</div></div><div><div>4,30%</div><div>15%</div></div><div><div>100,00%</div><div>90,00%</div></div></div> <div><div>Acumulado anterior</div><div>Durante el periodo</div><div>Acumulado actual</div></div>				<div>Firma</div> <div></div> <div>Nombre: JOAN ANDRES LENIS</div> <div>Matricula No. : 76202215396VLL</div>	
De acuerdo a la ejecución de la obra, El porcentaje semanal equivale al 15% del costo de obra y de la ejecución, y del total del contrato equivale al 90% ver gráficos de avance:					

Grafica de Curva "S"

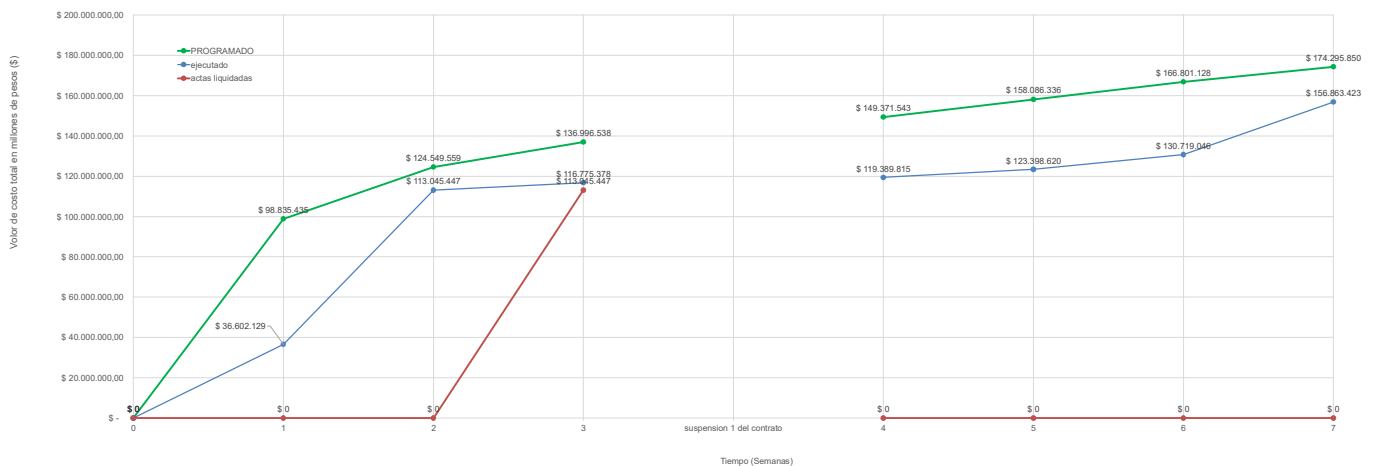

FECHA		No. SEMANAS	AVANCE PROGRAMADO PERIODO	PROGRAMACION		VALOR		EJECUCION		VALOR		VALOR PAGADO		GESTION		
INICIO	FIN			ACUMULADO	PROGRAMADO	ACUMULADO	PROGRAMADO	ACUMULADO	EJECUTADO	ACUMULADO	EJECUTADO		RETRASO	AVANCE EN TIEMPO		
25/11/2024	11/12/2024	0	0.00%	0.00%	\$	0.00%	\$	0.00%	0.00%	\$	0.00%	\$	0	0.00%	23.33%	
21/12/2024	12/12/2024	1	58.71%	96.71%	\$	98,638,435.40	\$	98,638,435.40	21.00%	21.00%	\$	36,602,128.50	\$	36,602,128.50	35.71%	73.33%
18/12/2024	14/12/2024	2	14.72%	14.72%	\$	123,549,558.82	\$	113,940,878.10	43.80%	43.80%	\$	6,607,680.72	\$	6,607,680.72	46.67%	66.67%
9/12/2024	14/12/2024	3	7.14%	76.60%	\$	138,996,538.10	\$	138,996,538.10	23.40%	23.40%	\$	3,729,931.91	\$	116,375,817.19	113.04%	46.67%
24/12/2025	11/02/2025		suspension del contrato	71.00%	\$	12,375,005.35	\$	149,371,543.45	1.50%	68.00%	\$	2,614,437.75	\$	110,789,835.44	17.20%	56.00%
17/02/2025	23/02/2025	5	5.00%	90.70%	\$	8,714,792.50	\$	158,086,335.95	2.30%	70.80%	\$	4,009,804.55	\$	123,398,620.24	19.90%	70.00%
6/03/2025	13/03/2025	6	5.00%	95.70%	\$	8,714,792.50	\$	166,801,128.45	4.00%	76.80%	\$	8,470,609.74	\$	131,869,230.00	20.70%	70.00%
10/03/2025	11/03/2025	7	4.30%	90.00%	\$	174,295,850.00	\$	158,086,335.95	15.80%	80.00%	\$	26,144,377.90	\$	148,004,852.14	20.00%	98.00%

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción:
CERRAMIENTO



Descripción:
IMPERMEABILIZACIÓN TANQUES



Descripción:
RECUBRIMIENTO PROTECTOR
