

 Fecha Aprobación: 13/02/2023	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CGID-F23
	INFORME DE OBRA	Versión: 2 Página 1 de 18

CONTRATO DE OBRA No. CLPIH383 DE 2023

INFORME DE OBRA No. 1

MENSUAL

☒

FINAL

☐

Objeto Contrato:

“CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA”



MUNICIPIO: SAN AGUSTÍN


DEPARTAMENTO: HUILA

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderrhuila.gov.co - atencionusuario@inderrhuila.gov.co
Neiva-Huila

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Código: DIH-CGID-F23
	INFORME DE OBRA		Versión: 2 Página 2 de 18
Fecha Aprobación: 13/02/2023			

CONTRATO DE OBRA No. CLPIH383 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y DANES INGENIEROS S.A.S

APOYO A LA SUPERVISIÓN	CESAR JOAQUÍN VELÁSQUEZ	ENTIDAD	INDERHUILA
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	CLPIH383 DE 2023		
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA"	PERIODO DEL INFORME	Del 16 de noviembre al 21 de diciembre de 2023
CONTRATISTA	DANES INGENIEROS S.A.S	NIT:	900.219.918-2
REPRESENTANTE LEGAL:	NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA	C.C:	7.719.364 de Neiva (H)
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	01/11/2023		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	16/11/2023		
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES		
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):	N.A.		
PLAZO TOTAL:	TRES (03) MESES		
VALOR INICIAL:	\$ 506.549.699		
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	N.A.		
VALOR TOTAL:	\$ 506.549.699		
INTERVENTOR:	CONSOCIO WF	NIT:	901.769.619-8
REPRESENTANTE LEGAL:	FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANÍA	C.C:	7.711.430 de Neiva (H)
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO			
El proyecto se desarrolla en la vereda Los Andes zona rural del municipio de San Agustín – Departamento del Huila.			

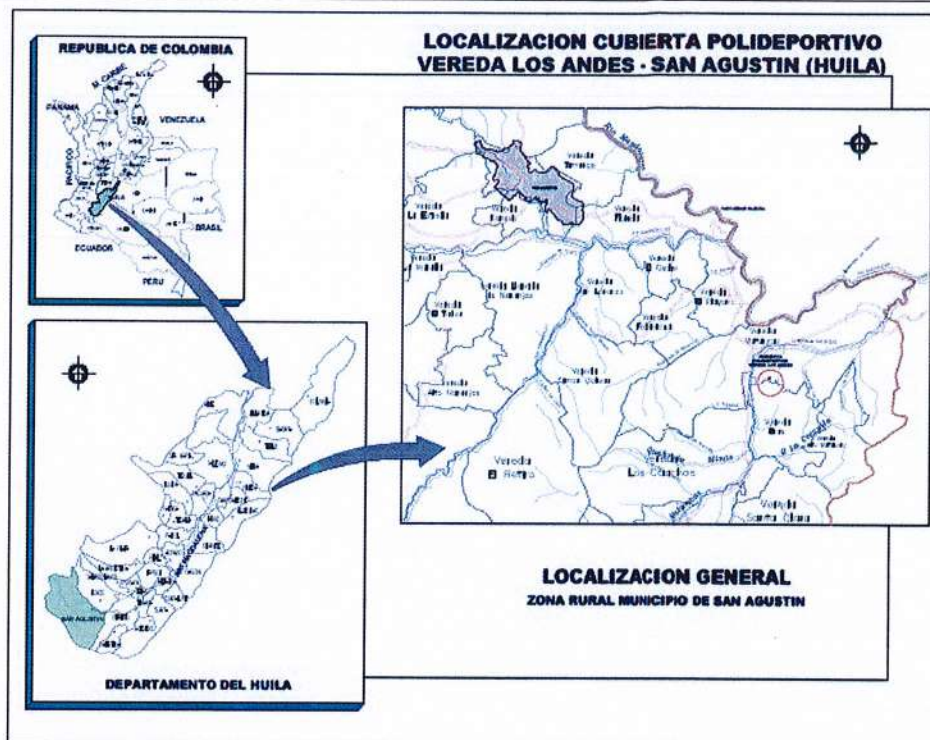

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto arquitectónico contempla un área a intervenir de 632,32 m², en la que se encuentra contemplada la construcción de la cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 20 en paneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pinto poliéster estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz, para el polideportivo ubicado en la vereda Los Andes del Municipio de San Agustín – Huila, la cual tiene una destinación de uso recreativo, deportivo y cultural; el polideportivo corresponde a estructura de cubierta, iluminación y sistema hidráulico para el manejo de aguas lluvias.

La cubierta será con sistema autoportante, sostenida con columnas en concreto de 3.00 PSI. El sistema estructural propuesto consiste en columnas y vigas aéreas en concreto reforzado en 3.000 PSI y una cimentación tipo zapatas, vigas de cimentación y viga canal. Todas las obras atienden lo establecido en la NORMA SISMORRESISTENTE de 2010 – NSR-10.

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

- ACTIVIDADES PRELIMINARES
- CIMENTACIÓN
- ESTRUCTURA EN CONCRETO

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
		Código: DIH-CGID-F23
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE OBRA	Versión: 2 Página 4 de 18

- CUBIERTA
- ACABADOS – PLACA DE CONCRETO
- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
- INSTALACIONES ELÉCTRICAS
- TRANSPORTE

4. INFORME CONCRETO SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL DURANTE EL PERIODO

Se realizó reunión de socialización del proyecto con la comunidad donde participó la interventoría y el contratista, en la cual, entre otras cosas, se dieron a conocer las dificultades para dar inicio a la construcción por las afectaciones que se puede presentar en la vía de acceso y en la vivienda que se ubica en el costado occidental del polideportivo, al momento de realizar las excavaciones para la cimentación. La comunidad quedó comprometida con dar solución para que esos permisos y afectaciones no interfirieran en la obra y se pueda dar inicio a la construcción del proyecto. Este aspecto fue uno de los cuales motivaron la suspensión del contrato.


5. HISTORIA CRONOLÓGICA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCIÓN TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSIÓN TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/aaaa)
Iniciación	16/11/2023			
Suspensión No. 1	21/12/2023	36		
Reiniciación No. 1				
Terminación	29/12/2023			
TOTAL DÍAS		36		

6. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de Inicio, acta de Suspensión, acta de Reinicio, actas de Modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)



Tipo de Acta	No.	Fecha
INICIO		16/11/2023
ACTA DE COMITÉ DE OBRA	1	30/11/2023
ACTA DE VEEDURIA	1	07/12/2023
ACTA DE CONCETRACION Y SOCIALIZACIÓN INICIO DE OBRA	1	07/12/2023
ACTA DE SUSPENSION	1	21/12/2023
ACTA DE JUSTIFICACIÓN	1	21/12/2023


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
		Código: DIH-CGID-F23
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE OBRA	Versión: 2 Página 5 de 18

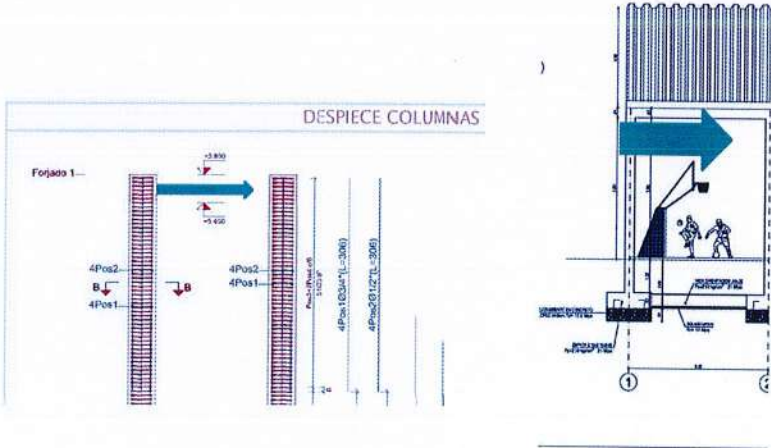7. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	
a). Actividades administrativas	<ul style="list-style-type: none"> - Publicación de pólizas para legalización del contrato, conforme a lo establecido en la CLÁUSULA 18 – GARANTÍAS, del contrato de obra en el secop II. - Suscripción del acta de inicio - Entrega de pólizas actualizadas por el acta de inicio del contrato - entrega de documentos para tramite de anticipo - Suscripción de acta de justificación para la suspensión No.1 - Suscripción acta de suspensión No. 01.
b). Actividades operativas	<p>Las actividades llevadas a cabo en el presente periodo fueron:</p> <p>Se recibe de parte de la entidad contratante la siguiente documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plano A-01-Implantación San Agustín-Vereda Los Andes • Plano Elec San Agustín-Vereda Los Andes • Plano Estru San Agustín-Vereda Los Andes • Plano HS-01-Aguas lluvias San Agustín-Vereda Los Andes • Plano L-01-Localización San Agustín-Vereda Los Andes <p>Una vez revisados los documentos, se encuentran las siguientes observaciones estructurales:</p> <p>En el plano "<u>Estru San Agustín-Vereda Los Andes E2</u>" encontramos que la cota y despieces de las columnas no coincide con la mostrada en el plano "<u>Estru San Agustín-Vereda Los Andes E3</u>" como corte de la estructura, lo que conllevaría a que el despiece del hierro establecido para una altura de columna no sea la que realmente se vaya a construir. Por lo tanto, se requiere una aclaración por parte del diseñador estructural en este caso.</p> <div style="text-align: center;">  </div>





También se evidencio mediante una visita realizada el día 22 de noviembre del presente año, que la implantación del proyecto generará una afectación en la vía principal del casco urbano de la vereda, ya que dicha se encuentra ubicada en un costado colindante con el polideportivo, donde en el momento de realizar la excavación de la cimentación de la estructura, dicha vía se perdería ya que se requeriría hacer un corte al talud afectado la huella de la ruta.

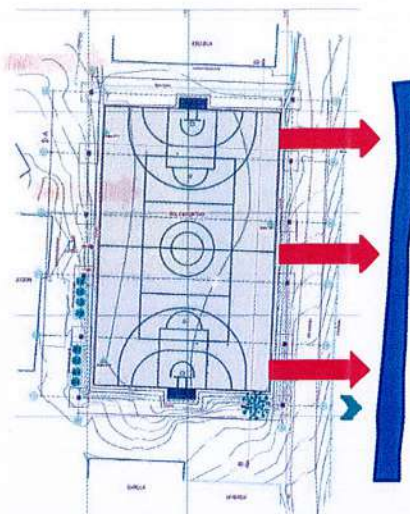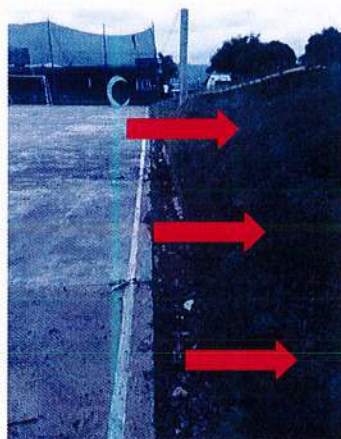

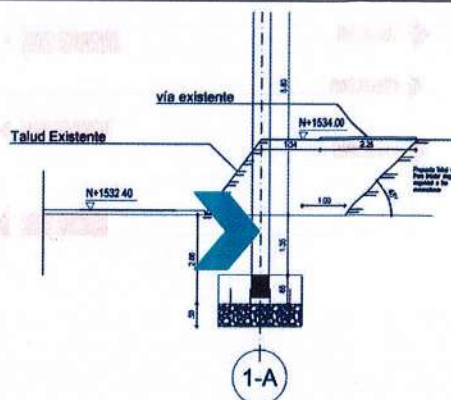


Igualmente se pudo evidenciar en la visita que se debe considerar la adecuación de una vía de acceso al costado occidental del proyecto para poder acceder con una retroexcavadora sobre llantas y por esa misma vía retirar el material de excavación proveniente del talud de ese costado ya que el sitio de la obra se encuentra rodeado por viviendas y una escuela y por el polideportivo no pueden transitar estos equipos ya que afectarían la placa existente.

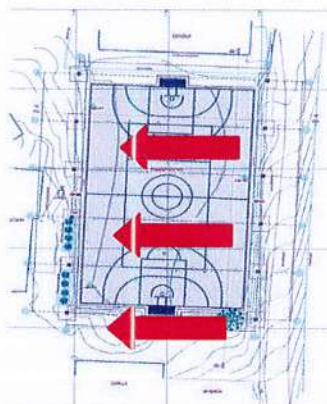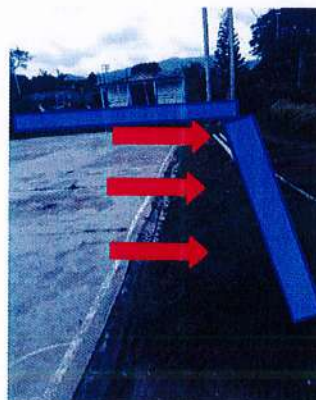

Así también, en el mismo costado occidental se encuentra una vivienda que cuya construcción se verá afectada en el momento de la realización de las actividades de excavación para las zapatas de la estructura, situación que quedó plasmada en la socialización del proyecto ante la comunidad que debe ser solucionada para poder darle arranque al proyecto.

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	Informe de Obra	Código: DIH-CGID-F23 Versión: 2 Página 8 de 18
Fecha Aprobación: 13/02/2023		

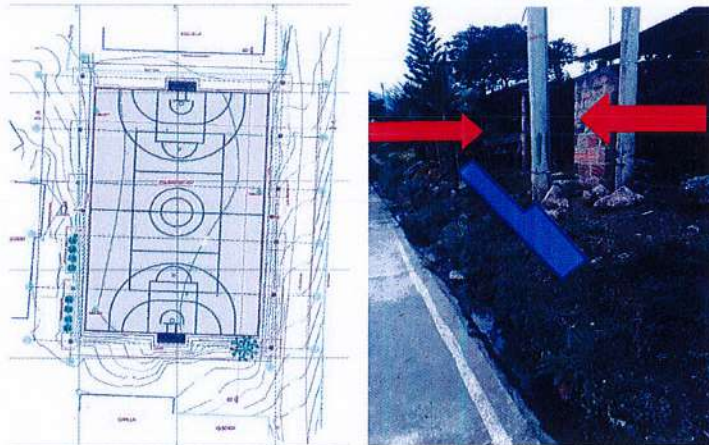	
	<p>Se envió el respectivo informe a la interventoría y a la entidad contratante de las observaciones encontradas, dichos análisis fueron revisadas por parte del ente interventor solicitando a su vez un comité técnico con el apoyo a la supervisión por parte del INDERHUILA, en donde fueran expuestas las observaciones encontradas en los planos juntos con otras observaciones encontradas en el sitio de la obra, el INDERHUILA.</p> <p>La Entidad contratante una vez revisó la información presentada por el contratista y avalado por al interventoría, procedió a autorizar la suspensión del contrato de obra por un lapso de 45 días calendarios y/o hasta que se superen las situaciones que dieron lugar a la suspensión, teniendo en cuenta que para cumplir con el objeto del contrato se deben tener aprobados los ajustes a los diseños estructurales y la comunidad cuente con los permisos necesarios para llevar a cabo todas las actividades de la obra.</p> <p>También se realiza la instalación de la valla respectiva del contrato en el sitio de la obra.</p>
c). Actividades Operativas	<ul style="list-style-type: none"> - Visita de localización de obra - Se realizo socialización del proyecto con la comunidad
8. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO	
<p>DURANTE EL PERIODO SE HAN PRESENTADO PERMANENTES PRESIPITACIONES EN LA ZONA, LA PRESENCIA DE LLUVIAS ES CONSTANTE EN LA VEREDA LOS ANDES.</p> <p>No se adelantaron actividades ni se contó con personal en el sitio de obra.</p>	

	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	Código: DIH-CGID-F23	
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE OBRA	Versión: 2
		Página 9 de 18

9. CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO							
Tipo Prueba de Laboratorio		Resistencia concreto			Relación volumétrica concreto		
N/A							
10. COMITÉS DE OBRA							
Fecha de Realización (dd/mm/aaaa)		Lugar		Resultado del Comité (Describir)			
30/11/2023		INDERHUILA		Acta de comité, se debate la justificación de la solicitud de la suspensión de la obra, dado los hallazgos encontrados por parte del contratista en campo y en los documentos técnicos del proyecto (presupuestos y memorias de cantidades), los cuales fueron avalados por la interventoría, y que requieren ajustes o modificaciones estructurales por parte del diseñador.			
11. CONTROL DEL ANTICIPO							
No ha sido girado por parte de la entidad contratante							
12. RELACIÓN DE PERSONAL (Profesional y Mano de obra)							
NOMBRE Y APELLIDOS		No. IDENTIFICACIÓN		CARGO		MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	
NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA.		C.C. 7.719.364		DIRECTOR DE OBRA		INDEFINIDO	
WILMAR ARMANDO JIMÉNEZ MARULANDA		C.C. 80.926.744		COORDINADOR		PRESTACION DE SERVICIOS	
JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO		C.C. 1.075.304.693		RESIDENTE DE OBRA		PRESTACION DE SERVICIOS	
13. RELACIÓN DE PAGOS							
TIPO DE PAGO (Anticipo / Acta No.)		No. COMPROBANTE		FECHA			
Anticipo				NO SE HA REALIZADO EL PAGO			
14. RELACIÓN DE PAGOS DURANTE EL PERIODO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL							
PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	N° PLANILLA	FECHA DE PAGO
NOVIEMBRE DE 2023							
NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA.	\$185.600	\$46.400	\$6,100	\$46.400	EXONERADO	9460090325	06/12/2023

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Código: DiH-CGID-F23
	INFORME DE OBRA		Versión: 2 Página 19 de 18
Fecha Aprobación: 13/02/2023			

JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO	\$5.220.00 0	\$3.625.00 0	\$2.018. 400	\$0	EXONERADO	9460310327	13/12/2023
DICIEMBRE DE 2023							
NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA.	\$185.600	\$46.400	\$6,100	\$46.400	EXONERADO	9461784678	19/01/2024
JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO	\$5.220.00 0	\$3.625.00 0	\$2.018. 400	\$0	EXONERADO	9460830053	28/12/2023

15. RELACIÓN DE PÓLIZAS DE GARANTÍA

Póliza legalización del CONTRATO:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051691	0	02/11/2023	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	20/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	20/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	20/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Acta de recibo final	5 años desde acta de recibo final

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
				DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101018815	0	02/11/2023	01/11/2023	20/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE INICIO:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051691	1	22/11/2023	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	20/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	20/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	20/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Acta de recibo final	5 años desde acta de recibo final

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
				DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101018815	1	22/11/2023	01/11/2023	20/02/2024

	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
		Código: DIH-CGID-F23
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE OBRA	Versión: 2 Página 11 de 13

16. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	17. REGISTRO FOTOGRÁFICO
Instalación de valla en sitio de obra	
Reunión de socialización	

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
		Código: DIH-CGID-F23
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE OBRA	Versión: 2 Página 12 de 18

Taludes en ambos costados de la obra, que obstaculizan las excavaciones de cimentación, y que pueden afectar la vía y la vivienda en el lado occidental del proyecto.



	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Código: DIH-CGID-F23
			Versión: 2
			Página 13 de 18
Fecha Aprobación: 13/02/2023		INFORME DE OBRA	

18. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS

CONDICIONES CONTRACTUALES										EJECUCIÓN OBRA PRESENTE INFORME				EJECUCIÓN DE OBRA ACUMULADA			
ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	% EJECUCIÓN	CANT.	VR/TOTAL	% EJECUCIÓN	CANT.	VR/TOTAL	% EJECUCIÓN			
1																	
1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES																
1.01	Localización y replanteo.	M2	632,32	\$ 3.549,00	\$ 2.244.104,00												
1.02	Demolición de cuneta existente.	ML	62,80	\$ 7.544,00	\$ 473.763,00												
1.03	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	M2	2,40	\$ 26.210,00	\$ 62.904,00												
1.04	Demolición de cerramiento perimetral existente (muro, malla, cimentación) hasta, H= 3 mt. Incluye retiro de material sobrante.	ML	2,10	\$ 20.804,00	\$ 43.688,00												
1.05	Desmonte marcos canchas existentes.	UND	2,00	\$ 116.413,00	\$ 232.826,00												
1.06	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	204,04	\$ 45.880,00	\$ 9.361.355,00												
1.1.7	Relleno en rebase seleccionado y compactado mecánicamente.	M3	92,29	\$ 83.375,00	\$ 12.712.825,00												
Sub-total					\$ 25.131.465,00												
2																	
2.1	CIMENTACIÓN																
2.01	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0,05 mts	M2	63,82	\$ 33.922,00	\$ 2.164.902,00												
2.02	Concreto ciclópeo - 2500 PSI (140 KG/CM2) 60% Concreto 2.000 PSI + 40% Piedra media zonga	M3	21,66	\$ 359.045,00	\$ 7.776.915,00												
2.03	Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.	M3	26,71	\$ 617.415,00	\$ 16.491.155,00												
2.04	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas	KG	1.698,00	\$ 7.097,00	\$ 12.050.706,00												

2.05	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	M3	8,20	\$ 740.066,00	\$ 6.068.541,00				
2.06	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación	KG	612,00	\$ 7.097,00	\$ 4.343.364,00				
Sub-total					\$ 48.895.583,00				
3									
3.1	ESTRUCTURA EN CONCRETO								
3.01	Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.	M3	14,00	\$ 918.378,00	\$ 12.857.292,00				
3.02	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas	KG	3.491,00	\$ 7.097,00	\$ 24.775.627,00				
3.03	Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Incluye Impermeabilización.	M3	17,00	\$ 1.002.201,00	\$ 17.037.417,00				
3.04	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal	KG	1.756,00	\$ 7.097,00	\$ 12.462.332,00				
3.05	Suministro e instalación de manto zetal viga canal.	M2	57,76	\$ 40.240,00	\$ 2.324.262,00				
Sub-total					\$ 69.456.930,00				
4									
4.1	CUBIERTA								
4.01	Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto soportante a base de lámina de acero cal. 20, en paneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintura políester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.	M2	670,93	\$ 285.939,00	\$ 191.845.053,00				
Sub-total					\$ 191.845.053,00				
5									
5.1	ACABADOS - PLACA EN CONCRETO								
5.01	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.	ML	317,78	\$ 14.758,00	\$ 4.689.797,00				

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		
	INFORME DE OBRA		
	Fecha Aprobación: 13/02/2023	Código: DIH-CGID-F23	
		Versión: 2	
		Página 15 de 18	

5.02	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Fútbol de Salón, Baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,05 M , Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura	UND	2,00	\$ 3.700.895,00	\$ 7.401.790,00				
5.03	Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm.	M2	2,40	\$ 84.509,00	\$ 202.822,00				
5.04	Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño.	ML	62,80	\$ 83.629,00	\$ 5.251.901,00				
Sub-total					\$ 17.546.310,00				
6									
6.1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS								
6.01	Bajantes en tubería PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagües y bajantes de aguas lluvias.	ML	63,20	\$ 79.932,00	\$ 5.051.702,00				
6.02	Suministro e instalación de tubería PVC-S de 6" , con accesorios de conexión; para desagües.	ML	20,60	\$ 106.806,00	\$ 2.200.204,00				
6.03	Suministro e instalación de tubería PVC-S de 8" , con accesorios de conexión; para salida.	ML	30,00	\$ 218.470,00	\$ 6.554.100,00				
6.04	Caja de inspección en concreto de F'c=2500 PSI, de sección 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts. según diseño	UND	2,00	\$ 349.057,00	\$ 698.114,00				
Sub-total					\$ 14.504.120,00				
7									
7.1	INSTALACIONES ELÉCTRICAS								
7.01	Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, cableado y demolición de machón en concreto.	UND	2,00	\$ 292.572,00	\$ 585.144,00				
7.02	Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alforaj.	UND	3,00	\$ 637.202,00	\$ 1.911.606,00				

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Código: DIH-CGID-F23	
	INFORME DE OBRA		Versión: 2	
			Página 16 de 18	
Fecha Aprobación: 13/02/2023				

7.03	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	5,12	\$ 45.880,00	\$ 234.906,00				
7.04	Canalización en ductos Conduit PVC tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mls.	ML	32,00	\$ 49.210,00	\$ 1.574.720,00				
7.05	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"	UND	2,00	\$ 303.693,00	\$ 607.386,00				
7.06	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1"	UND	2,00	\$ 281.525,00	\$ 563.050,00				
7.07	Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.	UND	1,00	\$ 1.014.120,00	\$ 1.014.120,00				
7.08	Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.	UND	1,00	\$ 4.688.701,00	\$ 4.688.701,00				
7.09	Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu.	ML	16,00	\$ 88.300,00	\$ 1.412.800,00				
7.10	Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.	UND	12,00	\$ 367.987,00	\$ 4.415.844,00				
7.11	Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.	ML	60,00	\$ 57.998,00	\$ 3.479.880,00				
7.12	Suministro e instalación de reflector led de 150 w	UND	12,00	\$ 1.016.078,00	\$ 12.192.936,00				
7.13	Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.	UND	1,00	\$ 972.420,00	\$ 972.420,00				
7.14	Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.	UND	1,00	\$ 1.032.612,00	\$ 1.032.612,00				
Sub-total					\$ 34.686.125,00				
8									
8.1	TRANSPORTE								
8.01	Transporte de materiales pétreos	M3-Km	2.760,15	\$ 1.150,00	\$ 3.174.173,00				
Sub-total					\$ 3.174.173,00				



NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en el presente informe, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.


ING. NESTOR RODRIGO FIERRO LOSADA
DANES INGENIEROS S.A.S.
CONTRATISTA OBRA



ING. FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANÍA
R.L. CONSORCIO WF
CONTRATISTA INTERVENTORIA

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderhuila.gov.co - atencionusuuario@inderhuila.gov.co
Neiva-Huila

 Fecha Aprobación: 13/02/2023	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CGID-F23
	INFORME DE OBRA	Versión: 2 Página 18 de 18

1. ANEXOS

- BITÁCORA DE OBRA.
- SOPORTES DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS-ARP-AFP).
- CERTIFICADO VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA REALIZADO POR EL INTERVENTOR (Vo.Bo. Interventor).

 ING. NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA	09/02/2024	 ING. FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANÍA
FIRMA ORIGINAL CONTRATISTA DE OBRA	FECHA DE ENTREGA	FIRMA ORIGINAL Vo.Bo CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CGID-F23
		Versión: 2
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE OBRA	Página 18 de 18

ANEXOS

Informe 1

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	INFORME DE OBRA	Código: DIH-CGID-F23
Fecha Aprobación: 13/02/2023		Versión: 2 Página 18 de 18

ANEXO 2. SOPORTES DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS-ARP-AFP)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900219918	2	DANES INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA	CALLE 4 # 7-78 APTO 301	NEIVA-HUILA	8641151	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2023-11	Salud	41212054	946090325	E	2023/12/06	2023/12/06	0	\$1,658,700	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO									
No.	Identificación	Nombre	Ingeniería	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago
NOVEDADES									
PENSION									
SALUD									
CCF									
RIESGOS									
PARAFISCALES									
Total Aportes									
No.	Identificación	Nombre	Ingeniería	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago
NOVEDADES									
PENSION									
SALUD									
CCF									
RIESGOS									
PARAFISCALES									
Total Aportes									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900219918	2	DANES INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA	CALLE 4 # 7-78 APTO 301	NEIVA-HUILA	8641151	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2023-11	Salud	41212054	946090325	E	2023/12/06	2023/12/06	0	\$1,658,700	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	\$934,200	\$0	\$0	\$934,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$748,600	\$0	\$0	\$748,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$257,300	\$0	\$0	\$257,300	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	\$257,300	\$0	\$0	\$257,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$233,600	\$0	\$0	\$233,600	
CONFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	6	\$233,600	\$0	\$0	\$233,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	\$233,600	\$0	\$0	\$233,600	
NEUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$187,200	\$0	\$0	\$187,200	
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
TOTAL				6	\$1,658,700	\$0	\$0	\$1,658,700	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900219918	2	DANES INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA	CALLE 4 # 7-78 APTO 301	NEIVA-HUILA	8641151	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	94107710	9461784678	E		2024/01/05	2024/01/19	BANCO DE OCCIDENTE		14	\$1,667,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO										RIESGOS									
No.	Identificación	Nombre	Ing	Ret	Sal	Dep	Cap	Dep	Cap	Dep	Cap	Dep	Cap	Dep	Cap	Dep	Cap	Dep	Cap
NOVEDADES										PENSION									
SUCURSAL: NEIVA (5 Afiliados)										SALUD									
Centro de Trabajo: PERSONAL ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)										CCF									
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)										TARIFAS									
1 CC 7719364 PIERRE HESTOR										Aporte									
2 CC 36067241 MERINA SANDRA										Exonerado SENA e ICBF									
Centro de Trabajo: PERSONAL DE OBRA (3 Afiliados)										Aporte									
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (3 Afiliados)										Exonerado SENA e ICBF									
3 CC 1080187924 AVILA NICOLAS										Aporte									
4 CC 1075380329 OSADA DIVA										Exonerado SENA e ICBF									
5 CC 1075306422 TRUJILLO NICOLAS										Aporte									
Total Afiliados(5)										Total Aportes									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900219918	2	DANES INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA	CALLE 4 # 7-78 APTO 301	NEIVA-HUILA	8641151	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	94107710	9461784678	E		2024/01/05	2024/01/19	BANCO DE OCCIDENTE		14	\$1,667,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	\$928,000	\$11,800	\$0	\$939,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$742,400	\$9,400	\$0	\$751,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$185,600	\$2,400	\$0	\$188,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$254,600	\$3,300	\$0	\$257,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	\$254,600	\$3,300	\$0	\$257,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$232,000	\$3,000	\$0	\$235,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	5	\$232,000	\$3,000	\$0	\$235,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	\$232,000	\$3,000	\$0	\$235,000
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	4	\$185,600	\$2,400	\$0	\$188,000
SANTAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$46,400	\$600	\$0	\$47,000
TOTAL				5	\$1,646,600	\$21,100	\$0	\$1,667,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1057304693		RIOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	mirador de las lomas manzana 28 casa 4	MANIZALES-CALDAS	8728181	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla		Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-11	2023-11	33395526		9460310327	I	2023/12/22	2023/12/13	BANCO DAVIVIENDA	0	\$10,863,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1037304693		RIO3 PALACIO JOHAN SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	mirador de las lomas manizana 28 casa 4	MANIZALES-CALDAS	8728181	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

	Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
	Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2023-11	2023-11		333955326		I	2023/12/22	2023/12/13	DIA MORA	\$10,863,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$5,220,000	\$0	\$0	\$5,220,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$5,220,000	\$0	\$0	\$5,220,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$2,018,400	\$0	\$0	\$2,018,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$2,018,400	\$0	\$0	\$2,018,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$3,625,000	\$0	\$0	\$3,625,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$3,625,000	\$0	\$0	\$3,625,000
TOTAL				1	\$10,863,400	\$0	\$0	\$10,863,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1057304693		RIDOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	mirador de las lomas manzana 28 casa 4	MANIZALES-CALDAS	8728181	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	366287828	9460830053	1	2024/01/23	2023/12/28	BANCO DAVIVIENDA	0	\$10,863,400
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO									
No.	Identificación	Nombre	Ingresos base de liquidación	Impuesto	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla
NOVEDADES									
PENSION									
SALUD									
CCF									
RIESGOS									
PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombre	Ingresos base de liquidación	Impuesto	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)									
1	1057304693	RIDOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN	\$29,000,000	\$5,220,000	\$5,220,000	\$5,220,000	\$5,220,000	\$5,220,000	\$5,220,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)									
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)									
1	1057304693	RIDOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN	\$29,000,000	\$5,220,000	\$5,220,000	\$5,220,000	\$5,220,000	\$5,220,000	\$5,220,000
Total Afiliados (1)									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1057304693		RIDOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	mirador de las lomas manzana 28 casa 4	MANIZALES-CALDAS	8728181	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	366287828	9460830053	1	2024/01/23	2023/12/28	BANCO DAVIVIENDA	0	\$10,863,400
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)			1	\$5,220,000	\$0	\$5,220,000	\$0	\$0	\$5,220,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	\$5,220,000	\$0	\$5,220,000	\$0	\$0	\$5,220,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)			1	\$2,018,400	\$0	\$2,018,400	\$0	\$0	\$2,018,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	\$2,018,400	\$0	\$2,018,400	\$0	\$0	\$2,018,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)			1	\$3,625,000	\$0	\$3,625,000	\$0	\$0	\$3,625,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	\$3,625,000	\$0	\$3,625,000	\$0	\$0	\$3,625,000
TOTAL			1	\$10,863,400	\$0	\$10,863,400	\$0	\$0	\$10,863,400

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 2 Página 1 de 17

Fecha Aprobación:
13/02/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIHCM420 DE de 2023

INFORME DE INTERVENTORIA No. 1

MENSUAL


☒

FINAL

☐

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Objeto Contrato: _____

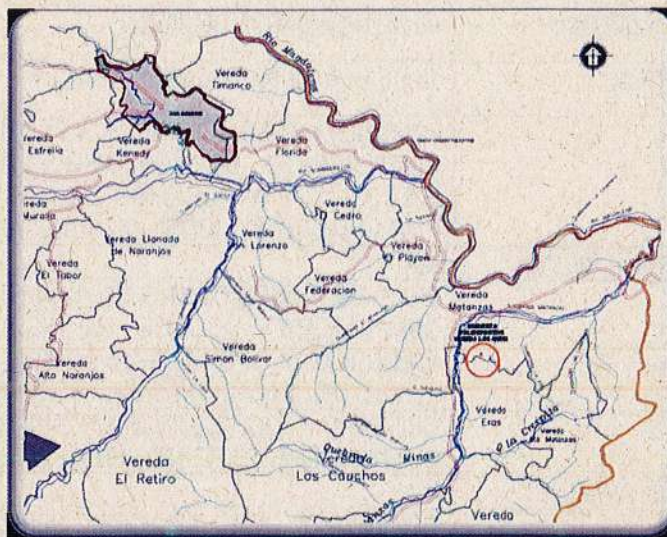

MUNICIPIO: SAN AGUSTIN – VEREDA LOS ANDES

DEPARTAMENTO: HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIHCM420 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y CONSORCIO WF.

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
 Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderhuila.gov.co - atencionusuario@inderhuila.gov.co
 Neiva-Huila

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: IDH-CGID-F06
		Versión: 2
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE INTERVENTORIA	Página 2 de 17


APOYO A LA SUPERVISIÓN	1. CESAR JOAQUIN VELASQUEZ	ENTIDAD	INDERHUILA
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO INTERVENTORIA			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	___ CIHCM420 ___ DE 2023 ___		
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO DEL INFORME	16 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
CONTRATISTA	CONSORCIO WF	NIT:	901.769.619 - 8.
REPRESENTANTE LEGAL:	FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	C.C:	7.711.430 DE NEIVA
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	09 DE NOVIEMBRE DE 2023		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	16 DE NOVIEMBRE DE 2023		
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.		
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):	N.A		
PLAZO TOTAL:	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.		
VALOR INICIAL:	OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS (\$ 88.657.430,00) M/CTE.		
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	N.A		
VALOR TOTAL:	OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS (\$ 88.657.430,00) M/CTE.		
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA No.	CLPIH383 DE 2023		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
CONTRATISTA	DANES INGENIEROS S.A.S	NIT:	900.219.918-2

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
		Código: IDH-CGID-F06
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 2 Página 3 de 17

REPRESENTANTE LEGAL:	NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA	C.C:	7.719.364
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	01 DE NOVIEMBRE DE 2023		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	16 DE NOVIEMBRE DE 2023		
PLAZO INICIAL	3 MESES		
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):	N/A		
PLAZO TOTAL:	3 MESES		
VALOR INICIAL:	\$ 506.549.699		
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	N/A		

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto Cubierta Autoportante con Iluminación para la Vereda Los Andes de la Zona Rural del Municipio San Agustín - Departamento Del Huila

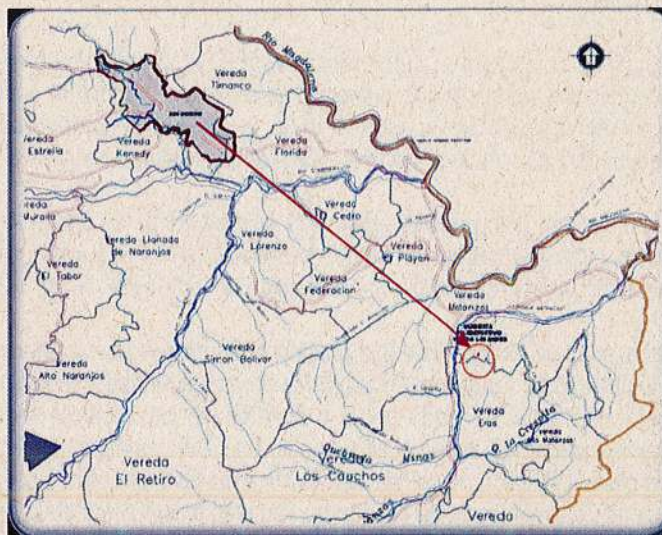

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La misión del INDERHUILA es generar y brindar a la comunidad oportunidades de participación en los procesos de iniciación, formación, fomento y práctica del deporte, la educación física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, como contribución al desarrollo integral del individuo, para el mejoramiento de la calidad de vida de la población del Departamento del Huila, por medio de la masificación, la promoción y el apoyo a la práctica deportiva.

En consecuencia, de lo anterior se requiere la adecuación locativa de los terrenos existentes para llevar a cabo la **CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA**; lo permitirán a la población realizar las prácticas deportivas, que van a contribuir con la mejora de la calidad de vida de las personas que acuden a estos escenarios recreo

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
		Código: IDH-CGID-F06 Versión: 2 Página 4 de 17
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE INTERVENTORIA	

deportivos. Se resalta que este tipo de obras contribuyen a minimizar el déficit de espacios deportivos que existe en el Departamento del Huila.

El objetivo principal es promover la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre hacia el desarrollo humano integral; donde se promuevan y estimulen los valores para la convivencia, participación, disminución de la violencia, y construcción del tejido social: apoyado en estrategias que beneficien los habitantes de la ciudad para fortalecer el desarrollo del deporte la recreación y la educación física, con la implementación de programas orientados a la construcción de tejido social y convivencia ciudadana en la totalidad de la población Huilense con una infraestructura deportiva técnicamente adecuada, desarrollando acciones articuladas entre sí, que mejoren la calidad de vida de todas y todos los habitantes del Departamento del Huila, bajo los principios de sostenibilidad ambiental, participación ciudadana, democracia, equidad e inclusión de personas con movilidad reducida y respeto por las libertades individuales y que permitan posicionar al Departamento en el contexto regional, nacional y mundial, en concordancia con las Políticas Departamentales y Nacionales.

Las presentes especificaciones contienen el alcance para la ejecución de las obras de construcción de las cubiertas en el Departamento del Huila.

El proyecto arquitectónico contempla un área construida de 632,32 m² por cubierta aproximadamente, en la que se encuentra contemplada la construcción de la cubierta autoportante a base de lámina de acero cal: 20 para el polideportivo ubicado en la vereda los Andes del municipio de San Agustín — Huila, la cual tiene una destinación de uso recreativo, deportivo y cultural; el polideportivo corresponderá a estructura, cubierta, iluminación y sistema hidráulico para el manejo de aguas lluvias.

La cubierta será con sistema auto portante, sostenida con columnas en concreto de 3000 PSI. sistema estructural propuesto consiste en columnas y vigas aéreas en concreto reforzado en 3000 PSI y una cimentación tipo zapatas, vigas de cimentación y viga canal. Todas las obras deberán atender lo establecido en la NORMA SISMORESISTENTE de 2010 - NSR-10.

Actualmente en la vereda Los Andes existe una placa polideportiva en buen estado, la cual se encuentra sin cubierta y con una mala iluminación, lo que impide que la comunidad de la vereda Los Andes, especialmente de la población juvenil e infantil quienes usan continuamente este espacio, pueda gozar y disfrutar de los espacios recreo deportivos, generando también que los programas no lleguen a la comunidad; en el sitio existen dos (02) postes de iluminación y una línea de energía que pasa por la zona verde entre la placa y vía del costado oriental. Existe espacio entre los dos costados longitudinales oriente y occidente) para la localización de la futura cimentación de columnas. También existe cerca de la esquina de la escuela una cuneta en concreto de evacuación aguas lluvias.

5. DESCRIPCION DEL AVANCE MENSUAL DE OBRA

Las actividades de avance de obra se han centrado en la formalización y ordenamiento contractual, adecuación del terreno y las actividades preliminares. Tal como se describen en este informe.

SEMANA (16-18 NOVIEMBRE)

Se revisan los diseños en compañía del contratista de obra.

El contratista adelanta trabajos de consecución y organización de documentación del proyecto, análisis de especificaciones técnicas, y revisión de planos.

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: IDH-CGID-F06
		Versión: 2 Página 5 de 17
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE INTERVENTORIA	

Una vez revisados los planos estructurales de la obra "Estru San Agustín-Vereda Los Andes_E2" el contratista encontró que la cota y despieces de las columnas no coincide con la mostrada en el plano "Estru San Agustín-Vereda Los Andes_E3" como corte de la estructura, lo que conllevaría a que el despiece del hierro establecido para una altura de columna no sea la que realmente se vaya a construir. Por lo tanto, se requiere una aclaración por parte del diseñador estructural en este caso.

SEMANA (20-25 NOVIEMBRE)

Se realiza visita de inspección al sitio de ejecución del proyecto. Se cuenta con acompañamiento de la comunidad y se realiza la instalación de la Valla Informativa en la vereda los andes con la información correspondiente.

El contratista de acuerdo a la visita de obra realizada el 22 de Noviembre de 2023, se evidencia que la implantación del proyecto generará una afectación en la vía principal del casco urbano de la vereda, ya que dicha se encuentra ubicada en un costado colindante con el polideportivo, donde en el momento de realizar la excavación de la cimentación de la estructura, dicha vía se perdería ya que se requeriría hacer un corte al talud afectado la huella de la ruta.

Igualmente se pudo evidenciar en la visita que se debe considerar la adecuación de una vía de acceso al costado occidental del proyecto para poder acceder con una retroexcavadora sobre llantas y por esa misma vía retirar el material de excavación proveniente del talud de ese costado ya que el sitio de la obra se encuentra rodeado por viviendas y una escuela y por el polideportivo no pueden transitar estos equipos ya que afectarían la placa existente.

Así también, en el mismo costado occidental se encuentra una vivienda que cuya construcción se verá afectada en el momento de la realización de las actividades de excavación para las zapatas de la estructura, situación que quedó plasmada en la socialización del proyecto ante la comunidad que debe ser solucionada para poder darle arranque al proyecto.

SEMANA (27-30 NOVIEMBRE)

Se realiza comité de obra el 30 de Noviembre de 2023 en las instalaciones del INDERHUILA, donde se hicieron presentes el contratista, la interventoría, el ingeniero apoyo a la supervisión por parte del INDERHUILA y analizadas las circunstancias expuestas en el oficio de observaciones se decide invitar a dicha reunión al Ing. Calculista del proyecto, quien concluye que se debe modificar el diseño estructural de la cubierta cambiando de zapatas concéntricas a zapatas excéntricas para tratar de minimizar las actividades adicionales en obra que esto requeriría estando de acuerdo el contratista y la interventoría.

El contratista inicia la consecución y organización de documentos para solicitar el desembolso del anticipo del contrato, teniendo en cuenta que plazo para presentación de documentos es hasta el 05 de Diciembre de 2023.

6. HISTORIA CRONOLOGICA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION (dd/mm/aaaa)
Iniciación	16/11/2023	15		
Suspensión No. 1				

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	Informe de Interventoría	
Fecha Aprobación: 13/02/2023		Código: IDH-CGID-F06 Versión: 2 Página 6 de 17

Reiniciación No. 1				
TERMINACIÓN Cto.	29/12/2023			
TOTAL DIAS		15	0	

7. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de Inicio, acta de Suspensión, acta de Reinicio, actas de Modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
ACTA DE INICIO 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	1	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
ACTA DE COMITÉ DE OBRA	1	30 DE DICIEMBRE 2023

8. ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PARA EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA DURANTE EL PERIODO
(Cumplimiento Obligaciones del contrato).

a). Obligaciones de Carácter General.	<ol style="list-style-type: none"> Se presentó al InderHuila el personal técnico de interventoría Director y Residente. Se he realizado la entrega de documentación en papel reciclado. Se realizó afiliación y pago de seguridad social (Salud, Pensión y riesgos). Se verifico la localización de los trabajos y condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el contrato. Se realiza revisión conjunta de los planos y especificaciones técnicas del contrato de obra. Durante el periodo de inicio se realizó el cambio de equipo de trabajo propuesto en la interventoría. El cual fue entregado a la entidad con sus respectivos anexos. Se suscribió con el contratista de obra el acta de inicio, el cual fue tramitada ante el Inderhuila. Se realizó revisión de pólizas de acuerdo al acta de inicio del contratista de obra, el cual se tramitó a la entidad para su aprobación. La interventoría cuenta con oficina en la carrera 4# 9-25 oficina 507. Una vez suscrito el contrato de interventoría se realizaron los pagos correspondientes a la legalización del contrato y estampillas correspondientes a la Gobernación del Huila el día 9 de noviembre de 2023. 						
b). Actividades Administrativas.	<ol style="list-style-type: none"> se realiza control y seguimiento del personal que ejecuta la obra <table border="1" data-bbox="451 1499 1357 1675"> <thead> <tr> <th>CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PERSONAL</th><th>CARGO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NESTOR RODRIGO LOSADA</td><td>Director de Obra</td></tr> <tr> <td>WILMAR ARMANDO JIMENEZ MARULANDA</td><td>Residente de Obra</td></tr> </tbody> </table>	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PERSONAL	CARGO	NESTOR RODRIGO LOSADA	Director de Obra	WILMAR ARMANDO JIMENEZ MARULANDA	Residente de Obra
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PERSONAL	CARGO						
NESTOR RODRIGO LOSADA	Director de Obra						
WILMAR ARMANDO JIMENEZ MARULANDA	Residente de Obra						

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
		Código: IDH-CGID-F06
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 2 Página 7 de 17

	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EQUIPOS	Sin equipos que requieran seguimiento y control a la fecha.
	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES	Solo se han realizado actividades administrativas.
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	Planilla relacionada NRO. DE PLANILLA 9460090325 PENSION: \$934.200 SALUD: \$233.600 ARL: \$257.300 CCF: \$233.600
		DICIEMBRE 6 DE 2023
	<ol style="list-style-type: none"> La interventoría reviso y suscribió el acta de inicio celebrados entre el contratista de obra, interventoría y entidad el día 16 de noviembre de 2023, Se hace visita de obra inicial el 22 de Noviembre de 2023 y se realiza la instalación de la Valla Informativa en la vereda los andes con la información correspondiente, así mismo se realiza acta de comité de obra el día 30 de Noviembre de 2023; durante el mes ejecutado no se suscribieron demás actas y/o documentos. Durante el mes se presentaron observaciones a los diseños de los planos estructurales y se solicita primera solicitud de suspensión por parte del contratista. Se realizó la revisión de las vigencias de las pólizas del contrato de obra las cuales fueron remitidas a la entidad. la interventoría deja constancia que el contratista de obra no entrega soportes de afiliación del personal en obra y el cumplimiento legal de seguridad industrial y salud ocupacional de Entrega de dotación, alegando que no ha podido iniciar las actividades y, por lo tanto, no ha realizado ninguna actividad contractual. 	
c). Actividades Operativas.	<ol style="list-style-type: none"> No se llevaron a cabo debido a las inconsistencias encontradas en los diseños de los planos estructurales y en la implantación del proyecto. 	
d). Actividades Logísticos.	<ol style="list-style-type: none"> Se hace seguimiento a las observaciones presentadas en los planos "Estru San Agustín-Vereda Los Andes_E2" el contratista encontró que la cota y despieces de las columnas no coincide con la mostrada en el plano "Estru San Agustín-Vereda Los Andes_E3". 	
e). Obligaciones de Carácter Ambiental.	<ol style="list-style-type: none"> Se solicita el plan de Manejo ambiental al contratista para verificar su cumplimiento en obra, el contratista no hizo entrega del plan de manejo ambiental, debido a que no ha podido iniciar actividades. 	

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	Código: IDH-CGID-F06	
	Versión: 2	
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE INTERVENTORIA	
	Página 8 de 17	

f). Actividades Financieras.	1. Se realiza la solicitud del plan de anticipo y la documentación requerida para la gestión del anticipo al contratista de obra para el inicio del proceso de aprobación y gestión por parte de la interventoría.
g). Actividades Jurídicos.	1. Se realiza seguimiento a pólizas y garantías


POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (D/M/A):	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (D/M/A):	HASTA (D/M/A):
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051691		22/11/2023	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	20/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	20/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	20/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Acta de recibo final	5 AÑOS
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (D/M/A):		VIGENCIA	
					DESDE (D/M/A):	HASTA (D/M/A):
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101018815		22/11/2023		01/11/2023	20/02/2024

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (D/M/A):	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (D/M/A):	HASTA (D/M/A):
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051691		22/11/2023	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	20/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	20/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	20/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Acta de recibo final	5 AÑOS
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (D/M/A):		VIGENCIA	
					DESDE (D/M/A):	HASTA (D/M/A):
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101018815		22/11/2023		01/11/2023	20/02/2024

9. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO

	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	Informe de Interventoría	
	Fecha Aprobación: 13/02/2023	
		Código: IDH-CGID-F06 Versión: 2 Página 9 de 17

Las temperaturas máximas diarias son alrededor de 22 °C, rara vez bajan a menos de 20 °C o exceden 24 °C. La temperatura máxima promedio diaria más baja es 22 °C el 20 de noviembre. Las temperaturas mínimas diarias son alrededor de 15 °C, rara vez bajan a menos de 14 °C o exceden 16 °C. La temperatura mínima promedio diaria más baja es 15 °C el 8 de noviembre. Como referencia, el 20 de septiembre, el día más caluroso del año, las temperaturas en San Agustín generalmente varían de 15 °C a 23 °C, mientras que el 5 de julio, el día más frío del año, varían de 15 °C a 22 °C.

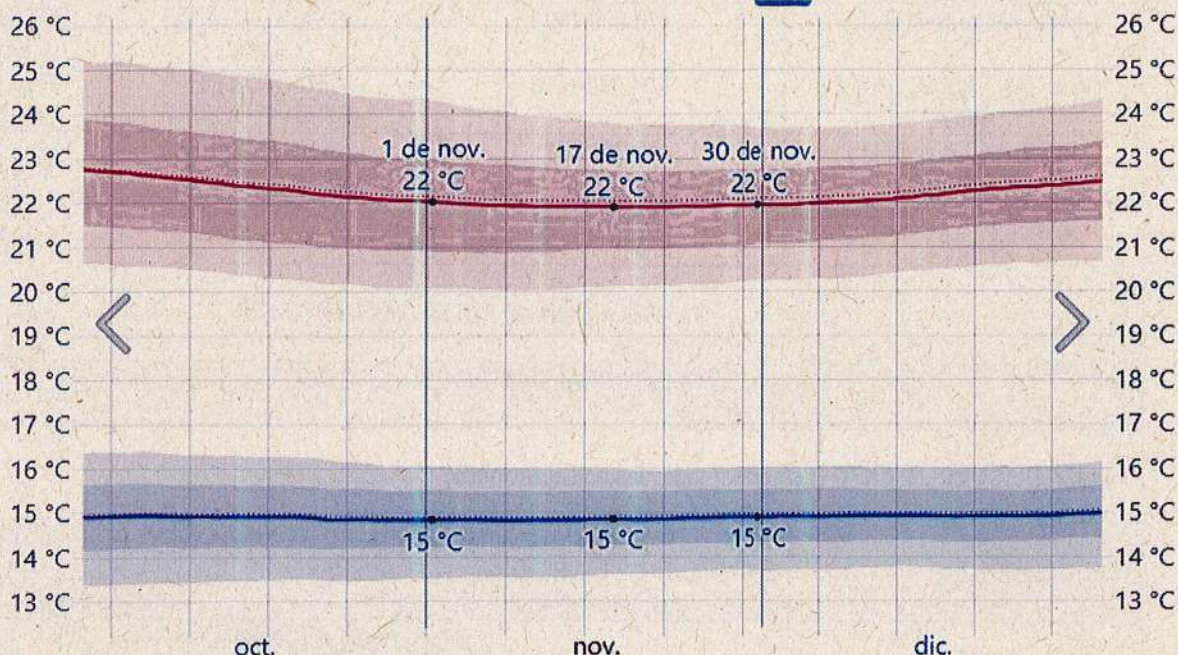

Temperatura máxima y mínima promedio en San Agustín. Tomado de *Weather Spark*
<https://es.weatherspark.com/s/21464/3/Tiempo-promedio-en-el-invierno-en-San-Agust%C3%ADn-Colombia#Figures-Temperature>

10. ENSAYOS DE LABORATORIO		
N/A		
11. COMITES DE OBRA		
Fecha de Realización (dd/mm/aaaa)	Lugar	Resultado del Comité (Describir)
30-11-2023	INDERHUILA	ACTA DE COMITÉ DE OBRA N 01 (SE ADJUNTA)

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: IDH-CGID-F06
		Versión: 2
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE INTERVENTORIA	Página 10 de 17

12. RELACION DE PERSONAL (Profesional Interventoria)						
NOMBRE YAPELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATACION			
FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	7.711.430	REPRESENTANTE LEGAL	PRESTACIÓN DE SERVICIO			
JOSE WILMER CHILITO	76.320.749	REPRESENTANTE LEGAL	PRESTACIÓN DE SERVICIO			
CRISTIAN FABIAN JUNCO AVILA	1.012.354.706	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	PRESTACIÓN DE SERVICIO			
JAIME ANDRES CELIS FLORIANO	12.241.491	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	PRESTACIÓN DE SERVICIO			
INGRID YOMARA DELGADO RAMOS	1.075.277.887	SECRETARIA	PRESTACIÓN DE SERVICIO			
13. RELACIÓN DE POLIZAS DE GARANTIA						
PÓLIZA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO:						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010098	0	09/11/2023	Cumplimiento del contrato	09/11/2023	09/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09/11/2023	09/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	09/02/2024	09/02/2029
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	AMPARO	VIGENCIA		
				DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)	
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001951	0	Amparo Básico, Predios, Labores y Operaciones	09/11/2023	09/02/2024	

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	Código: IDH-CGID-F06	
	Versión: 2	
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE INTERVENTORIA	
	Página 11 de 17	

PÓLIZA ACTUALIZADA (ANULADA)

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010098	1	21/11/2023	Cumplimiento del contrato	09/11/2023	09/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09/11/2023	09/02/2027
				Calidad del Servicio	09/02/2024	09/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	AMPARO	VIGENCIA	
				DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002028	1	Amparo Básico, Predios, Labores y Operaciones	09/11/2023	09/02/2024

PÓLIZA ACTUALIZADA – INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010098	2	21/11/2023	Cumplimiento del contrato	16/11/2023	16/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	16/11/2023	16/02/2027
				Calidad del Servicio	16/02/2024	16/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	AMPARO	VIGENCIA	
				DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA		Versión: 2 Página 12 de 17
Fecha Aprobación: 13/02/2023			

SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002028	2	Amparo Básico, Predios, Labores y Operaciones	16/11/2023	16/02/2024
14. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO (Describir el contenido del plano)					
N/A					



Fecha Aprobación:
13/02/2023

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

Código: IDH-CGID-F06

Versión: 2

Página 13 de 17

INFORME DE INTERVENTORIA

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TRABAJO DE OBRA											
DIAGRAMA DE AVANCE											
CONDICIONES CONTRACTUALES											
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANT.	VR/UNIT	% DE AVANCE	CANT.	VR/TOTAL	% DE AVANCE
1											
1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES										
1.01	Localización y replanteo.	M2	632,32	\$ 3.549,00	\$ 2.244.104,00	0,00	\$ -	0%	0,00	\$ -	0%
1.02	Corte de placa de concreto e=0.10 mts.	ML	62,80	\$ 7.544,00	\$ 473.763,00	0,00	\$ -	0%	0,00	\$ -	0%
1.03	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	M2	2,40	\$ 26.210,00	\$ 62.904,00	0,00	\$ -	0%	0,00	\$ -	0%
1.04	Demolición de cerramiento perimetral existente (muro, malla, cimentación) hasta, H= 3 mt. Incluye retiro de material sobrante.	ML	2,10	\$ 20.804,00	\$ 43.688,00	0,00	\$ -	0%	0,00	\$ -	0%
1.05	Desmonte marcos canchales existentes.	UND	2,00	\$ 116.413,00	\$ 232.826,00	0,00	\$ -	0%	0,00	\$ -	0%
1.06	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	204,04	\$ 45.880,00	\$ 9.361.355,00	0,00	\$ -	0%	0,00	\$ -	0%
1.07	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.	M3	152,02	\$ 83.626,00	\$ 12.712.825,00	0,00	\$ -	0%	0,00	\$ -	0%
Subtotal				\$ -	\$ 25.131.465,00		\$ -			\$ -	
2											
2.1	CIMENTACIÓN										
2.01	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	M2	63,82	\$ 33.927,00	\$ 2.164.902,00	0,00	\$ -	0%	0,00	\$ -	0%
2.02	Concreto ciclópeo - 2500 PSI (140 KG/CM2) 60% Concreto 2.000 PSI +40% Piedra media zoga	M3	21,66	\$ 359.045,00	\$ 7.776.915,00	0,00	\$ -	0%	0,00	\$ -	0%
2.03	Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.	M3	26,71	\$ 617.415,00	\$ 16.491.155,00	0,00	\$ -	0%	0,00	\$ -	0%
2.04	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas	KG	1698,00	\$ 7.097,00	\$ 12.050.706,00	0,00	\$ -	0%	0,00	\$ -	0%
2.05	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	M3	8,20	\$ 740.065,00	\$ 6.068.541,00	0,00	\$ -	0%	0,00	\$ -	0%
2.06	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación	KG	612,00	\$ 7.097,00	\$ 4.343.364,00	0,00	\$ -	0%	0,00	\$ -	0%
Subtotal				\$ -	\$ 48.895.583,00		\$ -			\$ -	
3											
3.1	ESTRUCTURA EN CONCRETO										
3.01	Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.	M3	14,00	\$ 918.378,00	\$ 12.857.292,00	0,00	\$ -	0%	0,00	\$ -	0%
3.02	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas	KG	3491,00	\$ 7.097,00	\$ 24.775.627,00	0,00	\$ -	0%	0,00	\$ -	0%
3.03	Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Incluye impermeabilización.	M3	17,00	\$ 1.002.201,00	\$ 17.037.417,00	0,00	\$ -	0%	0,00	\$ -	0%
3.04	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal	KG	1756,00	\$ 7.097,00	\$ 12.462.332,00	0,00	\$ -	0%	0,00	\$ -	0%
3.05	Suministro e instalación de manto zetal viga canal.	M2	57,76	\$ 40.240,00	\$ 2.324.262,00	0,00	\$ -	0%	0,00	\$ -	0%
Subtotal				\$ -	\$ 69.456.930,00		\$ -			\$ -	



INFORME DE INTERVENTORIA


Código: IDH-CGID-F06

Página 14 de 17

 $a = 0.40 \text{ mts.}$

Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderhuila.gov.co - atencionusuario@inderhuila.gov.co

Página 14 de 17



NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en el presente informe, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.


DANES INGENIEROS SAS
ING. NÉSTOR RODRÍGUEZ FIERRO LOSADA
CONTRATISTA

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA		Versión: 2 Página 16 de 17

15. REGISTRO FOTOGRAFICO




VISITA DE OBRA E INSTALACIÓN DE VALLA

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
 Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderhuila.gov.co - atencionusuario@inderhuila.gov.co
 Neiva-Huila

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 2 Página 17 de 17
Fecha Aprobación: 13/02/2023		

16. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

1. Se realiza revisión de planos e implantación del proyecto.
2. Se realizan observaciones a los diseños de los planos estructurales y se solicita suspensión.
3. Se continúan con la consecución y entrega de documentos requeridos para el pago de anticipo.
4. El contratista anexo un solo informe correspondiente al periodo 16 de Noviembre al 16 de Diciembre de 2023. No incluye soportes, ya que no ha podido iniciar las actividades y, por lo tanto, no ha realizado ninguna actividad contractual.

		
R.L. FAVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	(20/02/2024)	ING. CESAR JOAQUIN VELASQUEZ
FIRMA ORIGINAL INTERVENTOR	FECHA DE ENTREGA	FIRMA ORIGINAL Vo.Bo APOYO SUPERVISION

[illegible]

PÁGINA 1 DE 1

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL


DATOS GENERALES DEL APORTANTE CÉDULA DE CIUDADANÍA: 711430 DEPARTAMENTO: NEIVA CIUDAD/ALDEA/INICIO: CR 49 25 OF 87 TIPO APORTANTE: 02 INDEPENDIENTE TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E CUIF (REFORMA TRIBUTARIA) APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E CUIF (REFORMA TRIBUTARIA): NO		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 7908240442 TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2023 DÍAS DE MORA: 3 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2023/12/14 FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA: 790712523	
--	--	--	--

TOTAL APORTES A PENSION									
ADMINISTRADORA		APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES	
CODIGO	NOMBRE	NO. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLACADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP
202021	PROTECCION	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:									

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación		dv	Razon Social		Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE e ICBP
CC 76320749			JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA		INDEPENDIENTE	JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA	CRA 8 CL25N BL G AP 305	POPAYAN-CAUCA	3122879619	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2023-11	2023-11	424567176	9459437094		2023/12/11	2024/01/30	NEQUI	50	\$428,900	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$185,600	\$8,500	\$0	\$193,500	
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$185,600	\$8,500	\$0	\$193,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$ 80,800	\$4,800	\$0	\$84,300	
COLPATRIA ARP		14-4	860,002,183	9	1	\$ 80,800	\$4,800	\$0	\$84,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$145,000	\$4,200	\$0	\$149,500	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD		EPS018	805,001,157	2	1	\$145,000	\$4,200	\$0	\$149,500	
TOTAL					1	\$411,400	\$17,500	\$0	\$428,900	

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE CÉDULA DE CIUDADANÍA: 771430 PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY DÍA DE NACIMIENTO: 860920 DEPARTAMENTO: BOGOTÁ CIUDAD: BOGOTÁ CR 43 25 OF 807 TELÉFONO: 860920 CLASE APORTANTE: INDEPENDIENTE FORMA DE PRESENTACIÓN: PLANILLA ÚNICA ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y DISEÑO		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 4528232357 TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: DÍAS DE MORA: 2023 MES: noviembre AÑO: 2023 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 20231124		EEMPLACOS: 2023 MES: diciembre AÑO: 2023 867419	
--	--	--	--	---	--

TOTAL APORTES A PENSION									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	MORA
20381	20381-PORVENIR		3	\$ 396.000			\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL:				\$ 396.000			\$ 0	\$ 0	\$ 396.000

TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA WATERBURY	VALOR	PLANILLA	VALOR	VALOR A FAVOR
EP5005	EP5005-SANTITAS S.A.		2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EP5007	EP5007-NUOVA EPS		1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EP5007	EP5007-NUOVA EPS		1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL:				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL APORTES A RESERVA PROFESIONALES									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	INCAPACIDAD RFP	VALOR	PLANILLA	VALOR	VALOR A FAVOR	VALOR A FAVOR
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI S.A.		4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL:				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	INCAPACIDAD RFP	VALOR	PLANILLA	VALOR	VALOR A FAVOR	VALOR A FAVOR
CF13	CF13-COMFAC		2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CF13	CF13-COMFAC		2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL:				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

DETALLE DE APORTES									
Nº. IDENTIFICACIÓN	TIPO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	VALOR	PLANILLA	VALOR	VALOR A FAVOR	VALOR A FAVOR	VALOR A FAVOR
1	CC	EP5005	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 396.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
4	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
5	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
6	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
7	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
8	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
9	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
10	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
11	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
12	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
13	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
14	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
15	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
16	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
17	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
18	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
19	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
20	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
21	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
22	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
23	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
24	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
25	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
26	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
27	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
28	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
29	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
30	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
31	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
32	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
33	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
34	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
35	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
36	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
37	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
38	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
39	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
40	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
41	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
42	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
43	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
44	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
45	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
46	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
47	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
48	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
49	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
50	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
51	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
52	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
53	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
54	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
55	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
56	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
57	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
58	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
59	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
60	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
61	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
62	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
63	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
64	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
65	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
66	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
67	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
68	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
69	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
70	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
71	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
72	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
73	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
74	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
75	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
76	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
77	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
78	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
79	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
80	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
81	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
82	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
83	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
84	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
85	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
86	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
87	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
88	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
89	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
90	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
91	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
92	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
93	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
94	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
95	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
96	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
97	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
98	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
99	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
100	CC	EP5007	PAISER EDUARDO PERDOMO PULMAY	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL \$ 778.500

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-02-20, 09:14:22 AM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Número Planilla: 1086183901
Periodo Cotización: noviembre de 2023 Período Servicio: diciembre de 2023 Fecha límite de pago: 2023-12-06

PAGADA 20/02/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO WF
Documento	NI901769619
Tipo de Empresa	EMPLEADOR
Tipo Persona	JURÍDICA
Ciudad	NEIVA
Representante Legal	PERDOMO POLANIA FAIVER EDUARDO
Dirección	CR 4 #9 - 25 OFICINA 507
Teléfono	8668020
Forma Presentación	ÚNICO
Departamento	HUILA
Identificación	CC7711430
Total Afiliados	3

II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación	Datos del Afiliado		Novedades										Pensiones		Salud		Riesgos		Cajas				Parafiscales				Total
			Grupo	Tip	Co	Co	Co	Co	Co	Co	Co	Co	Co	Co	Co	Co	Co	Co	Co	Co	Co	Co	Co	Co	Co	Co	
CC 108386204	GUINALDO JIMENEZ JAVIER	01	00	X																							\$ 348.200
CC 1018364708	JUNCO AYALA CRISTIAN FABIAN	01	00	X																							\$ 425.700
CC 1078174095	POLANIA LEIVA YINA CHARME	01	00	X																							\$ 222.200

III. TOTALES

IBC Pensión	\$ 3.250.000	IBC Salud	\$ 3.250.000	IBC Riesgos	\$ 3.250.000	IBC Cajas	\$ 3.250.000	Aportes Pensión	\$ 520.000	Aportes FSP	\$ 0	Aportes FPPS	\$ 0	Aportes Salud	\$ 130.000	Aportes Riesgos	\$ 222.200	Aportes Cajas	\$ 130.000	Aportes Sana	\$ 0	Aportes ICBF	\$ 0	Aportes ESAP	\$ 0	Aportes Min Educación	\$ 0	Aportes Incapacidades Licencias Saldo	\$ 0	Subtotal SIN INTERESES DE	\$ 1.000.200	TOTAL FINAL	\$ 1.048.600
-------------	--------------	-----------	--------------	-------------	--------------	-----------	--------------	-----------------	------------	-------------	------	--------------	------	---------------	------------	-----------------	------------	---------------	------------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	-----------------------	------	---------------------------------------	------	---------------------------	--------------	-------------	--------------

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 2 Página 1 de 18

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIHCM420 DE de 2023

INFORME DE INTERVENTORIA No. 2

MENSUAL


☒

FINAL

☐

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Objeto Contrato:

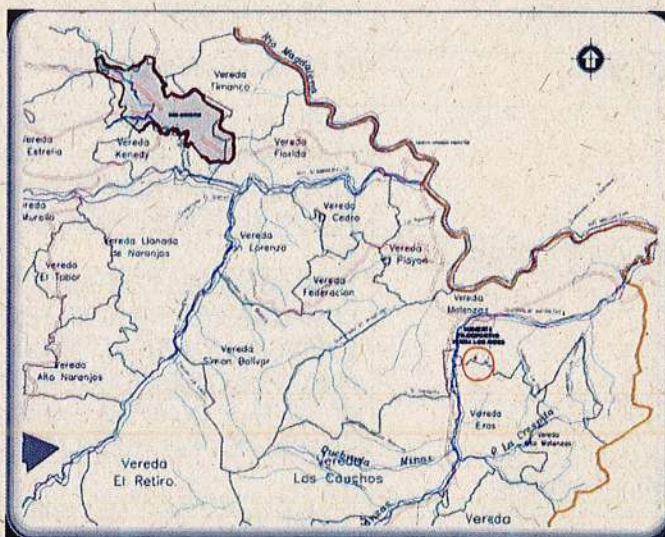

MUNICIPIO:

SAN AGUSTIN – VEREDA LOS ANDES

DEPARTAMENTO: HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIHCM420 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y CONSORCIO WF.

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
 Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderhuila.gov.co - atencionusuario@inderhuila.gov.co
 Neiva-Huila

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	Informe de Interventoría	
Fecha Aprobación: 13/02/2023		Código: IDH-CGID-F06 Versión: 2 Página 2 de 18


APOYO A LA SUPERVISIÓN		1. CESAR JOAQUIN VELASQUEZ	ENTIDAD	INDERHUILA
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO INTERVENTORIA				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.		___ CIHCM420 ___ DE 2023 ___		
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA .		PERIODO DEL INFORME	1 DE DICIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DEL 2023.
CONTRATISTA	CONSORCIO WF		NIT:	901.769.619 - 8.
REPRESENTANTE LEGAL:	FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA		C.C:	7.711.430 DE NEIVA
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):		09 DE NOVIEMBRE DE 2023		
FECHA DE INICIO (D/M/A):		16 DE NOVIEMBRE DE 2023		
PLAZO INICIAL		TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.		
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):		N.A		
PLAZO TOTAL:		TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.		
VALOR INICIAL:		OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS (\$ 88.657.430,00) M/CTE.		
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):		N.A		
VALOR TOTAL:		OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS (\$ 88.657.430,00) M/CTE.		
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA				
CONTRATO DE OBRA No.		CLPIH383 DE 2023		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA.			
CONTRATISTA	DANES INGENIEROS S.A.S		NIT:	900.219.918-2
REPRESENTANTE LEGAL:	NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA		C.C:	7.719.364
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):		01 DE NOVIEMBRE DE 2023		
FECHA DE INICIO (D/M/A):		16 DE NOVIEMBRE DE 2023		

	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
		Código: IDH-CGID-F06
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 2 Página 3 de 18

PLAZO INICIAL	3 MESES
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):	N/A
PLAZO TOTAL:	3 MESES
VALOR INICIAL:	\$ 506.549.699
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	N/A

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto Cubierta Autoportante con Iluminación para la Vereda Los Andes de la Zona Rural del Municipio San Agustín - Departamento Del Huila

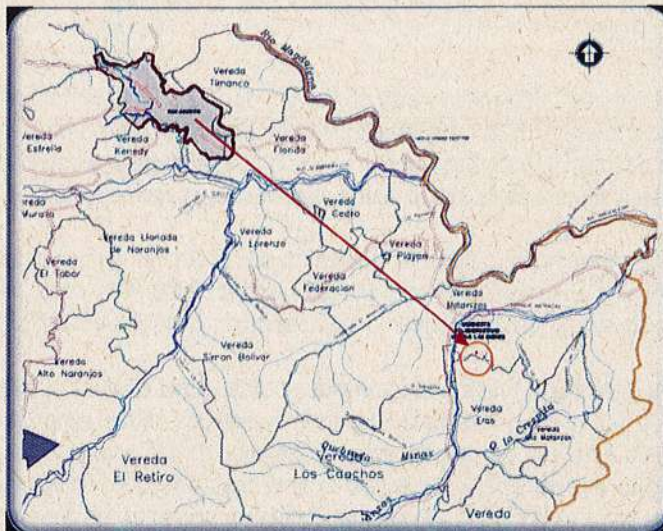

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La misión del INDERHUILA es generar y brindar a la comunidad oportunidades de participación en los procesos de iniciación, formación, fomento y práctica del deporte, la educación física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, como contribución al desarrollo integral del individuo, para el mejoramiento de la calidad de vida de la población del Departamento del Huila, por medio de la masificación, la promoción y el apoyo a la práctica deportiva.

En consecuencia, de lo anterior se requiere la adecuación locativa de los terrenos existentes para llevar a cabo la **CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA**; lo permitirán a la población realizar las prácticas deportivas, que van a contribuir con la mejora de la calidad de vida de las personas que acuden a estos escenarios recreo deportivos. Se resalta que este tipo de obras contribuyen a minimizar el déficit de espacios deportivos que existe en el Departamento del Huila.

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
		Código: IDH-CGID-F06
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 2 Página 4 de 18

El objetivo principal es promover la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre hacia el desarrollo humano integral; donde se promuevan y estimulen los valores para la convivencia, participación, disminución de la violencia, y construcción del tejido social: apoyado en estrategias que beneficien los habitantes de la ciudad para fortalecer el desarrollo del deporte la recreación y la educación física, con la implementación de programas orientados a la construcción de tejido social y convivencia ciudadana en la totalidad de la población Huilense con una infraestructura deportiva técnicamente adecuada, desarrollando acciones articuladas entre sí, que mejoren la calidad de vida de todas y todos los habitantes del Departamento del Huila, bajo los principios de sostenibilidad ambiental, participación ciudadana, democracia, equidad e inclusión de personas con movilidad reducida y respeto por las libertades individuales y que permitan posicionar al Departamento en el contexto regional, nacional y mundial, en concordancia con las Políticas Departamentales y Nacionales.

Las presentes especificaciones contienen el alcance para la ejecución de las obras de construcción de las cubiertas en el Departamento del Huila.

El proyecto arquitectónico contempla un área construida de 632,32 m² por cubierta aproximadamente, en la que se encuentra contemplada la construcción de la cubierta autoportante a base de lámina de acero cal: 20 para el polideportivo ubicado en la vereda los Andes del municipio de San Agustín — Huila, la cual tiene una destinación de uso recreativo, deportivo y cultural; el polideportivo corresponderá a estructura, cubierta, iluminación y sistema hidráulico para el manejo de aguas lluvias.

La cubierta será con sistema auto portante, sostenida con columnas en concreto de 3000 PSI. sistema estructural propuesto consiste en columnas y vigas aéreas en concreto reforzado en 3000 PSI y una cimentación tipo zapatas, vigas de cimentación y viga canal. Todas las obras deberán atender lo establecido en la NORMA SISMORESISTENTE de 2010 - NSR-10.

Actualmente en la vereda Los Andes existe una placa polideportiva en buen estado, la cual se encuentra sin cubierta y con una mala iluminación, lo que impide que la comunidad de la vereda Los Andes, especialmente de la población juvenil e infantil quienes usan continuamente este espacio, pueda gozar y disfrutar de los espacios recreo deportivos, generando también que los programas no lleguen a la comunidad; en el sitio existen dos (02) postes de iluminación y una línea de energía que pasa por la zona verde entre la placa y vía del costado oriental. Existe espacio entre los dos costados longitudinales oriente y occidente) para la localización de la futura cimentación de columnas. También existe cerca de la esquina de la escuela una cuneta en concreto de evacuación aguas lluvias.

5. DESCRIPCION DEL AVANCE MENSUAL DE OBRA

Las actividades de avance de obra se han centrado en la formalización y ordenamiento contractual, adecuación del terreno y las actividades preliminares. Tal como se describen en este informe.

SEMANA (1-2 DICIEMBRE)

El 1 de Diciembre el contratista solicita suspensión del contrato de obra, debido a que es necesario realizar unas modificaciones al diseño estructural establecido inicialmente, lo que conlleva a más tiempo sin poder arrancar las actividades de obra, ya que a la fecha llevamos transcurridos 16 días sin ejecutar actividades de obra.

SEMANA (04-09 DICIEMBRE)

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA		Versión: 2 Página 5 de 18
Fecha Aprobación: 13/02/2023			

El 4 de Diciembre de 2023, la interventoría a cargo del presente proyecto remite a la ENTIDAD INDERHUILA, oficio radicado por el CONTRATISTA DANES INGENIERIA SAS, REITERANDO LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. CLPIH383 de 2023.

Se continua con la consecución de documentos requeridos para la radicación del anticipo de obra.

El 7 de Diciembre de 2023, bajo radicado IH 2-2023-1581 la entidad INDERHUILA da traslado al oficio IH1-2023-4225, para dar solución a la petición presentada por el contratista de obra y la interventoría.

Esta interventoría el 9 de diciembre de 2023, solicita nuevamente la revisión de los diseños estructurales de la cimentación de la estructura de cubierta autoportante, para la Vereda Los Andes zona rural del municipio de San Agustín – departamento del Huila, debido a que se han realizado reuniones con el contratista y la supervisión, en las cuales por parte de esta interventoría considera necesario la revisión y ajuste de esta cimentación, debido a que al realizar la implantación afecta una vía paralela al sitio donde se va a construir las zapatas, además al efectuar la revisión de los aceros, se encontró diferencias en los despieces de los planos E2 y E3 (Estru San Agustín-Vereda Los Andes).

SEMANA (11- 16 DICIEMBRE)

EL 15 de diciembre de 2023, bajo el radicado SANAND. WF42023-006, y recibido por la entidad con No. IH1-2023-4445 la Interventoría aprueba la solicitud de suspensión del contrato de obra No. CLPIH383-2023 por los motivos expuestos con anterioridad por parte del CONTRATISTA, debido a que a la fecha la entidad no ha dado respuesta, a los oficios anteriores.

Adicional a eso y en revisión conjunta de la implantación del proyecto en el área se evidencia la necesidad de realizar mayores cantidades de localización y replanteo por lo cual se suspende la ejecución de dicha actividad hasta tanto se realice la aprobación de mayores y menores cantidades de obra.

SEMANA (18- 21 DICIEMBRE)

En espera por parte de la entidad INDERHUILA que dé respuesta a las observaciones presentadas o suspenda el contrato de obra.

El 21 de Diciembre se efectúa acta de justificación y suspensión del contrato de obra No. CLPIH383-2023.

6. HISTORIA CRONOLOGICA DEL PROYECTO				
ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION (dd/mm/aaaa)
Iniciación	16/11/2023	36		
Suspensión No. 1	21/12/2023			
Reiniciación No. 1				
TERMINACIÓN Cto.	29/12/2023			
TOTAL DIAS		36	0	

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	Informe de Interventoría	
Fecha Aprobación: 13/02/2023		Código: IDH-CGID-F06 Versión: 2 Página 6 de 18

7. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de Inicio, acta de Suspensión, acta de Reinicio, actas de Modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
ACTA DE INICIO 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	1	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
ACTA DE COMITÉ DE OBRA	1	30 DE DICIEMBRE 2023
ACTA DE CONCERTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE INICIO DE OBRA	1	07 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE CONFORMACIÓN DE VEEDURÍA CIUDADANA	1	07 DE DICIEMBRE DE 2023

8. ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PARA EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA DURANTE EL PERIODO
(Cumplimiento Obligaciones del contrato).

a). Obligaciones de Carácter General.	<ol style="list-style-type: none">1. Se he realizado la entrega de documentación en papel reciclado.2. Se continua con la revisión conjunta de los planos y especificaciones técnicas del contrato de obra.3. Por medio de Oficio SANAND. WF42023-003, se solicita al contratista los documentos del proyecto, según obligaciones del contratista.4. Se solicita al contratista hacer entrega de la documentación requerida para el desembolso del anticipo de obra, antes del 5 de Diciembre de 2023.5. Se realiza acta de socialización del proyecto el día 7 de Diciembre de 20236. El día 21 de Diciembre de 2023 se suscribe acta e Justificación y Suspensión 1 al contrato de obra pública No. CLPIH383 DE 2023.										
b). Actividades Administrativas.	<div>1. se realiza control y seguimiento del personal que ejecuta la obra</div> <table><tr><th>CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PERSONAL</th><th>CARGO</th></tr><tr><td>NESTOR RODRIGO LOSADA</td><td>Director de Obra</td></tr><tr><td>WILMAR ARMANDO JIMENEZ MARULANDA</td><td>Residente de Obra</td></tr><tr><td>CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EQUIPOS</td><td>Sin equipos que requieran seguimiento y control a la fecha.</td></tr><tr><td>CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES</td><td>Solo se han realizado actividades admirativas.</td></tr></table>	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PERSONAL	CARGO	NESTOR RODRIGO LOSADA	Director de Obra	WILMAR ARMANDO JIMENEZ MARULANDA	Residente de Obra	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EQUIPOS	Sin equipos que requieran seguimiento y control a la fecha.	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES	Solo se han realizado actividades admirativas.
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PERSONAL	CARGO										
NESTOR RODRIGO LOSADA	Director de Obra										
WILMAR ARMANDO JIMENEZ MARULANDA	Residente de Obra										
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EQUIPOS	Sin equipos que requieran seguimiento y control a la fecha.										
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES	Solo se han realizado actividades admirativas.										

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	Código: IDH-CGID-F06	
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE INTERVENTORIA	
		Versión: 2 Página 7 de 18


	CONTROL Y SEGUIMIENTO A APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	Planilla relacionada NRO. DE PLANILLA 9462994590 PENSION: \$ 198.000 SALUD: \$ 49.600 ARL: \$86.200 CCF: \$49.600	
		FEBRERO 15 DE 2024	
	<div>1. El 7 de diciembre de 2023, La Interventoría, junto con el contratista de obra y el apoyo a la supervisión, suscriben acta de concertación y socialización de inicio de obra y acta de conformación de veeduría ciudadana.</div> <div>2. Durante el mes se siguen presentando las observaciones a los diseños de los planos estructurales y se solicita nuevamente solicitud de suspensión debido a que a la fecha la entidad no ha dado respuesta.</div> <div>3. La interventoría deja constancia que el contratista de obra no entrega soportes de afiliación del personal en obra y el cumplimiento legal de seguridad industrial y salud ocupacional de Entrega de dotación, alegando que no ha podido iniciar las actividades y, por lo tanto, no ha realizado ninguna actividad contractual.</div>		
c). Actividades Operativas.	<div>1. No se llevaron a cabo debido a las inconsistencias encontradas en los diseños de los planos estructurales y en la implantación del proyecto.</div>		
d). Actividades Logísticos.	<div>1. Se continúa haciendo seguimiento a las observaciones presentadas en los planos "Estru San Agustín-Vereda Los Andes_E2" el contratista encontró que la cota y despieces de las columnas no coincide con la mostrada en el plano "Estru San Agustín-Vereda Los Andes_E3".</div>		
e). Obligaciones de Carácter Ambiental.	<div>1. Se solicita el plan de Manejo ambiental al contratista para verificar su cumplimiento en obra, el contratista no hace entrega del plan de manejo ambiental, debido a que no ha podido iniciar actividades.</div>		
f). Actividades Financieras.	<div>1. Se realiza la solicitud del plan de anticipo y la documentación requerida para la gestión del anticipo al contratista de obra para el inicio del proceso de aprobación y gestión por parte de la interventoría.</div>		
g). Actividades Jurídicos.	<div>1. Se realiza seguimiento a pólizas y garantías</div>		

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 2 Página 8 de 18
Fecha Aprobación: 13/02/2023		

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (D/M/A)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (D/M/A)	HASTA (D/M/A)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051691		22/11/2023	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	20/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	20/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	20/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Acta de recibo final	5 AÑOS
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (D/M/A)	VIGENCIA		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101018815		22/11/2023	DESDE (D/M/A)	HASTA (D/M/A)	
				01/11/2023	20/02/2024	
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (D/M/A)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (D/M/A)	HASTA (D/M/A)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051691		22/11/2023	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	20/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	20/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	20/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Acta de recibo final	5 AÑOS
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (D/M/A)	VIGENCIA		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101018815		22/11/2023	DESDE (D/M/A)	HASTA (D/M/A)	
				01/11/2023	20/02/2024	
9. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO						

	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	Código: IDH-CGID-F06	
	Versión: 2	
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE INTERVENTORIA	
	Página 9 de 18	

Las temperaturas máximas diarias son alrededor de 22 °C, rara vez bajan a menos de 20 °C o exceden 24 °C. La temperatura máxima promedio diaria más baja es 22 °C el 20 de noviembre. Las temperaturas mínimas diarias son alrededor de 15 °C, rara vez bajan a menos de 14 °C o exceden 16 °C. La temperatura mínima promedio diaria más baja es 15 °C el 8 de noviembre. Como referencia, el 20 de septiembre, el día más caluroso del año, las temperaturas en San Agustín generalmente varían de 15 °C a 23 °C, mientras que el 5 de julio, el día más frío del año, varían de 15 °C a 22 °C.

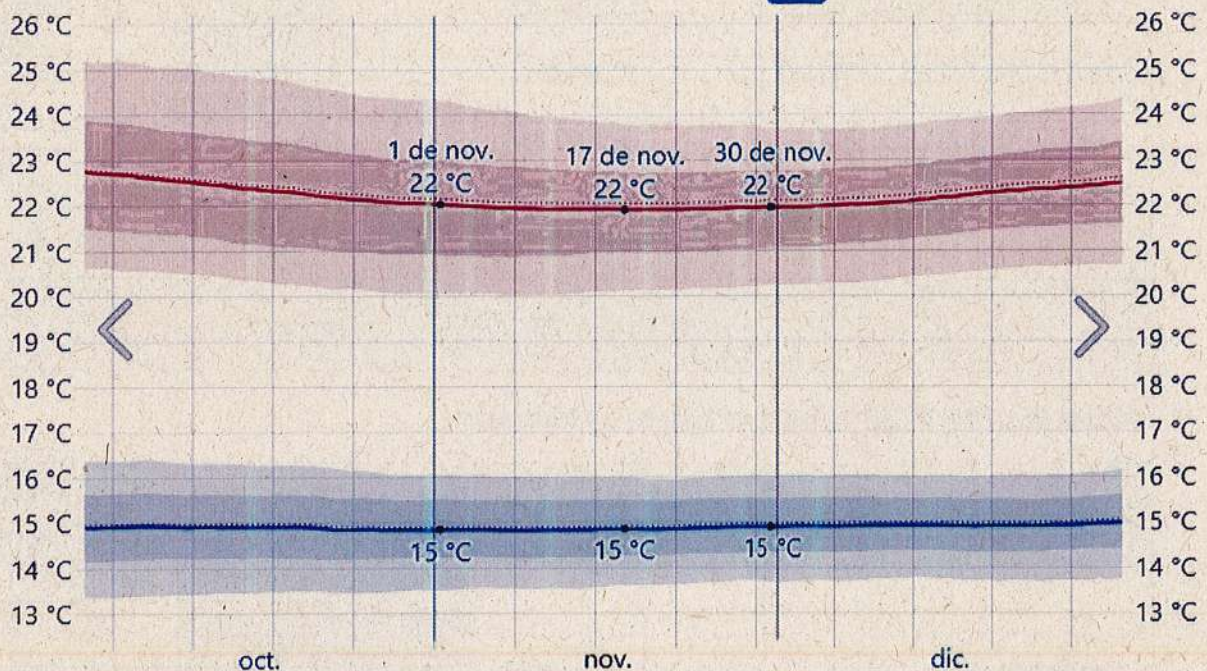

Temperatura máxima y mínima promedio en San Agustín. Tomado de *Weather Spark*
<https://es.weatherspark.com/s/21464/3/Tiempo-promedio-en-el-invierno-en-San-Agust%C3%ADn-Colombia#Figures-Temperature>

10. COMITES DE OBRA

Fecha de Realización (dd/mm/aaaa)	Lugar	Resultado del Comité (Describir)
30-11-2023	INDERHUILA	ACTA DE COMITÉ DE OBRA N 01 (SE ADJUNTA)

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
 Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderhuila.gov.co - atencionusuario@inderhuila.gov.co
 Neiva-Huila

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	Código: IDH-CGID-F06	
	Versión: 2	
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE INTERVENTORIA	
	Página 10 de 18	

11. RELACION DE PERSONAL (Profesional Interventoría)			
NOMBRE Y APELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATACION
FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	7.711.430	REPRESENTANTE LEGAL	PRESTACIÓN DE SERVICIO
JOSE WILMER CHILITO	76.320.749	REPRESENTANTE LEGAL	PRESTACIÓN DE SERVICIO
CRISTIAN FABIAN JUNCO AVILA	1.012.354.706	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	PRESTACIÓN DE SERVICIO
JAIME ANDRES CELIS FLORIANO	12.241.491	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	PRESTACIÓN DE SERVICIO
INGRID YOMARA DELGADO RAMOS	1.075.277.887	SECRETARIA	PRESTACIÓN DE SERVICIO

12. RELACIÓN DE POLIZAS DE GARANTIA						
PÓLIZA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO:						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010098	0	09/11/2023	Cumplimiento del contrato	09/11/2023	09/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09/11/2023	09/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	09/02/2024	09/02/2029
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	AMPARO		VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001951	0	Amparo Básico, Predios, Labores y Operaciones		09/11/2023	09/02/2024

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA		Versión: 2 Página 11 de 18
Fecha Aprobación: 13/02/2023			

PÓLIZA ACTUALIZADA (ANULADA)						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010098	1	21/11/2023	Cumplimiento del contrato	09/11/2023	09/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09/11/2023	09/02/2027
				Calidad del Servicio	09/02/2024	09/02/2029
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	AMPARO	VIGENCIA		
				DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)	
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002028	1	Amparo Básico, Predios, Labores y Operaciones	09/11/2023	09/02/2024	
PÓLIZA ACTUALIZADA – INICIO						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010098	2	21/11/2023	Cumplimiento del contrato	16/11/2023	16/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	16/11/2023	16/02/2027
				Calidad del Servicio	16/02/2024	16/02/2029

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	Código: IDH-CGID-F06	
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE INTERVENTORIA	
	Versión: 2 Página 12 de 18	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	AMPARO	VIGENCIA	
				DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002028	2	Amparo Básico, Predios, Labores y Operaciones	16/11/2023	16/02/2024
13. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO (Describir el contenido del plano)					
N/A					




SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - MIPG

Código: IDH-CGID-F06
Versión: 2
Página 13 de 18

Fecha Aprobación: 13/02/2023

INFORME DE INTERVENTORIA

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TRABAJO DE OBRA												
DIAGRAMA DE AVANCE												
CONDICIONES CONTRACTUALES				EJECUCION DE OBRA MENSUAL				ACUMULADA				
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANT.	VR/UNIT	% DE AVANCE	CANT.	VR/TOTAL	% DE AVANCE	
1												
1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES											
1.01	Localización y replanteo.	M2	632,32	\$ 3.549,00	\$ 2.244.104,00	0,00	\$	0%	0,00	\$	0%	
1.02	Corte de placa de concreto e=0.10 mts.	ML	62,80	\$ 7.544,00	\$ 473.763,00	0,00	\$	0%	0,00	\$	0%	
1.03	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	M2	2,40	\$ 26.210,00	\$ 62.904,00	0,00	\$	0%	0,00	\$	0%	
1.04	Demolición de cerramiento perimetral existente (muro, malla, cimentación) hasta, H= 3 mt. Incluye retiro de material sobrante.	ML	2,10	\$ 20.804,00	\$ 43.688,00	0,00	\$	0%	0,00	\$	0%	
1.05	Desmonte marcos canchales existentes.	UND	2,00	\$ 116.413,00	\$ 232.826,00	0,00	\$	0%	0,00	\$	0%	
1.06	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	204,04	\$ 45.880,00	\$ 9.361.355,00	0,00	\$	0%	0,00	\$	0%	
1.07	Relleno en rebase seleccionado y compactado mecánicamente.	M3	152,02	\$ 83.626,00	\$ 12.712.825,00	0,00	\$	0%	0,00	\$	0%	
Subtotal					\$ 25.131.465,00		\$			\$		
2												
2.1	CIMENTACIÓN											
2.01	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e=0.05 mts	M2	63,82	\$ 33.922,00	\$ 2.164.902,00	0,00	\$	0%	0,00	\$	0%	
2.02	Concreto ciclópeo - 2500 PSI (140 KG/CM2) 60% Concreto 2.000 PSI + 40% Piedra media zoga	M3	21,66	\$ 359.045,00	\$ 7.776.915,00	0,00	\$	0%	0,00	\$	0%	
2.03	Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.	M3	26,71	\$ 617.415,00	\$ 16.491.155,00	0,00	\$	0%	0,00	\$	0%	
2.04	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas	KG	1698,00	\$ 7.097,00	\$ 12.050.706,00	0,00	\$	0%	0,00	\$	0%	
2.05	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	M3	8,20	\$ 740.066,00	\$ 6.068.541,00	0,00	\$	0%	0,00	\$	0%	
2.06	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación	KG	612,00	\$ 7.097,00	\$ 4.343.364,00	0,00	\$	0%	0,00	\$	0%	
Subtotal					\$ 48.895.583,00		\$			\$		
3												
3.1	ESTRUCTURA EN CONCRETO											
3.01	Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.	M3	14,00	\$ 918.378,00	\$ 12.857.292,00	0,00	\$	0%	0,00	\$	0%	
3.02	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas	KG	3491,00	\$ 7.097,00	\$ 24.775.627,00	0,00	\$	0%	0,00	\$	0%	
3.03	Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Incluye impermeabilización.	M3	17,00	\$ 1.002.201,00	\$ 17.037.417,00	0,00	\$	0%	0,00	\$	0%	
3.04	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal	KG	1756,00	\$ 7.097,00	\$ 12.462.332,00	0,00	\$	0%	0,00	\$	0%	
3.05	Suministro e instalación de manto zetal viga canal.	M2	57,76	\$ 40.240,00	\$ 2.324.262,00	0,00	\$	0%	0,00	\$	0%	
Subtotal					\$ 69.456.930,00		\$			\$		



Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderhuila.gov.co - atencionsuuario@inderhuila.gov.co
Neiva-Huila



SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG


Código: IDH-CGID-F06
Versión: 2
Página 15 de 18

Informe de Interventoría

Fecha Aprobación: 13/02/2023

7.05	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"	UND	2,00	\$	303.693,00	\$	607.386,00	0,00	\$	0,00	0%	\$	-	\$0
7.06	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1"	UND	2,00	\$	281.525,00	\$	563.050,00	0,00	\$	0,00	0%	\$	-	\$0
7.07	Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.	UND	1,00	\$	1.014.120,00	\$	1.014.120,00	0,00	\$	0,00	0%	\$	-	\$0
7.08	Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.	UND	1,00	\$	4.688.701,00	\$	4.688.701,00	0,00	\$	0,00	0%	\$	-	\$0
7.09	Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu.	ML	16,00	\$	88.300,00	\$	1.412.800,00	0,00	\$	0,00	0%	\$	-	\$0
7.10	Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para andar el reflector.	UND	12,00	\$	367.987,00	\$	4.415.844,00	0,00	\$	0,00	0%	\$	-	\$0
7.11	Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.	ML	60,00	\$	57.998,00	\$	3.479.880,00	0,00	\$	0,00	0%	\$	-	\$0
7.12	Suministro e instalación de reflector led de 150 w	UND	12,00	\$	1.016.078,00	\$	12.192.936,00	0,00	\$	0,00	0%	\$	-	\$0
7.13	Suministro e instalación de tomacorriente a 220v.	UND	1,00	\$	972.420,00	\$	972.420,00	0,00	\$	0,00	0%	\$	-	\$0
7.14	Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120v.	UND	1,00	\$	1.032.612,00	\$	1.032.612,00	0,00	\$	0,00	0%	\$	-	\$0
Subtotal					\$		34.686.125,00		\$					\$0
8	TRANSPORTE													
8.01	Transporte de materiales petreos	M3-Km	2760,15	\$	1.150,00	\$	3.174.173,00	0,00	\$	0,00	0%	\$	-	\$0
Subtotal					\$		3.174.173,00		\$		0%	\$	-	\$0
	TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 405.239.759						\$0	\$0
	AVANCE DE OBRA											\$0		

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en el presente informe, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.



CONSORCIO WF
R.L. ING. FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
 INTERVENTORIA



DANES INGENIEROS SAS
ING. NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA
 CONTRATISTA

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	INFORME DE INTERVENTORIA	Código: IDH-CGID-F06 Versión: 2 Página 16 de 18
Fecha Aprobación: 13/02/2023		

14. REGISTRO FOTOGRAFICO




Fecha: 7 de diciembre de 2023 – Concertación y socialización de obra, Elección de Veeduría Ciudadana



Fecha: 7 de diciembre de 2023 – Concertación y socialización de obra, Elección de Veeduría Ciudadana

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 2 Página 17 de 18

Fecha Aprobación:
13/02/2023

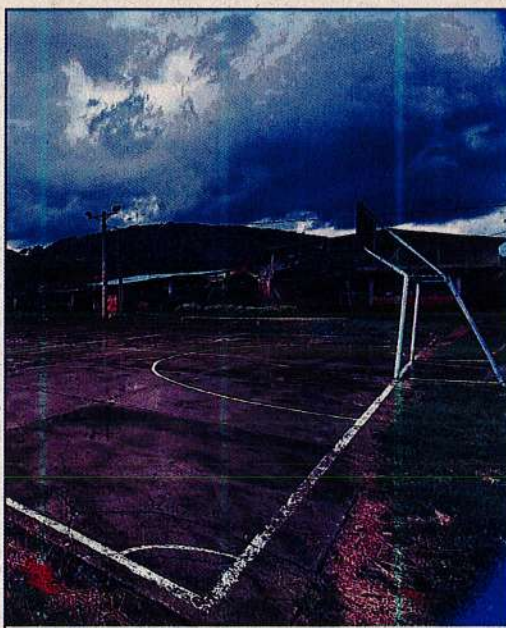


VISITA DE OBRA

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderhuila.gov.co - atencionusuario@inderhuila.gov.co
Neiva-Huila



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 230201		NÚMERO PLANILLA: 7907245981	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: FAVER EDUARDO PERDOMO PULAINA		TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	
CÉDULA/MUNICIPIO: NEIVA DEPARTAMENTO: CR 49 25 OF 507		diciembre AÑO: 2023	
DIRECCIÓN: 02 INDEPENDIENTE		diciembre AÑO: 2023	
TIPO EMPLEADOR: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO		NÚMERO AUTORIZACIÓN: 20240206	
FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		FECHA PAGO (aaaa/mm/aa):	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NÚMERO AUTORIZACIÓN: 20240206	

TOTAL APORTES A PENSIÓN									
CÓDIGO	230201	PROTECCIÓN	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD
SUB-TOTALES:					1	\$ 185.000		\$ 0	\$ 0

TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO	EP5037	NEUEVA EPS	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	INDETERMINADO POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERIDAD	VALOR	PLANILLA
SUB-TOTALES:					1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES									
SEGURIDAD SOCIAL									
PENSIÓN									
SALUD									
PARAFISCALES									
TOTAL									

TOTAL \$ 338.800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			N-CORRECCIONES
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDELA DE CIUDADANA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	NÚMERO PLANILLA:	TIPO DE PLANILLA:	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:	2883
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	FAVER EDUARDO PERDOMO POLIANA		HULLA	DIAS DE MORA:		527574577
CIUDADANÍA/CIUDAD:	NEIVA	DEPARTAMENTO:				20240236
DIRECCIÓN:	CR 4 25 OF 507	TELÉFONO:	8690320	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	23/03/21	
ESTADO CIVIL:	SOLTERO	ESTADO CIVIL:	UNIVERSITARIO	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	7597245981	
TIPO EMPLEADOR:	EMPRESA PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería / 2224	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:		
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO					
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E CBF (REFORMA TRIBUTARIA):						
						NO

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A PENSION							TOTALS			
CODIGO	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	FSP	MORA	APORTES	MORA	
250001 - PROTECCION		1		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
SUBTOTALS:											\$ 0	\$ 0
GRAND TOTALS:											\$ 0	\$ 0
VALOR PAGADO											\$ 0	\$ 0

[illegible]

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A RESERVOROS PROFESIONALES				SALDO A FAVOR		TOTAL	
CÓDIGO	NOMBRE	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANIILLA	VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-2	14-2-SEGUROS DE VIDA COUPATHIA S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 28.336	\$ 28.336	\$ 0	\$ 28.336
							\$ 33.500	\$ 0	\$ 33.500
							\$ 33.500	\$ 0	\$ 33.500
SUBTOTAL:							\$ 61.836	\$ 0	\$ 61.836

[illegible]

TOTAL	\$ 30,100
--------------	------------------

Planilla Resumen

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																												
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre												Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SEMA e ICB	Total Aportes
SUCURSAL: JOSE WILMER CHILTO RIVADENERIA (1 Afiliados)																												
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																												
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																												
1	CC	76320749	CHILTO JOSE											\$185,600	EPS018	30		\$1,160,000							\$0		\$0	\$411,400
				203001	30	\$1,160,000		\$185,600						\$145,000		0	\$0		\$0	14-4	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	0	\$0	No	\$411,400
Total Afiliados: 1														\$185,600			\$0		\$1,160,000						\$0	\$0	\$0	\$411,400

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$185,600	\$3,000	\$0	\$188,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$185,600	\$3,000	\$0	\$188,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$ 80,800	\$1,800	\$0	\$82,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$ 80,800	\$1,800	\$0	\$82,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$145,000	\$1,600	\$0	\$146,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	EPS018	805,001,157	2	1	\$145,000	\$1,600	\$0	\$146,600
TOTAL				1	\$411,400	\$6,400	\$0	\$417,800



**AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA**

Fecha creación reporte: 2024-02-20, 09:41:50 AM

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla: 1066184523

Período Cotización: diciembre de 2023

Periodo Servicio: enero de 2024

Fecha limite de pago: 2024-01-05

PAGADA 20/02/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

III. DETALLE DEL APORTANTE

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Rilegas	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Rilegas	Aportes Caja	Aportes Sesa	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos)	Incapacidades AIP	SUBTOTAL SIN INTERESES	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
\$ 5.908.334	\$ 5.908.334	\$ 5.908.334	\$ 5.908.334	\$ 945.400	\$ 0	\$ 0	\$ 236.400	\$ 411.400	\$ 236.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.829.600	\$ 33.000	\$ 1.862.600

Página 1 de 1

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil. SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

**¡El poder
de lo simple!**
